

271

6.8 Construcción de cajas de inspección tipo alumbrado en concreto de 30x30.

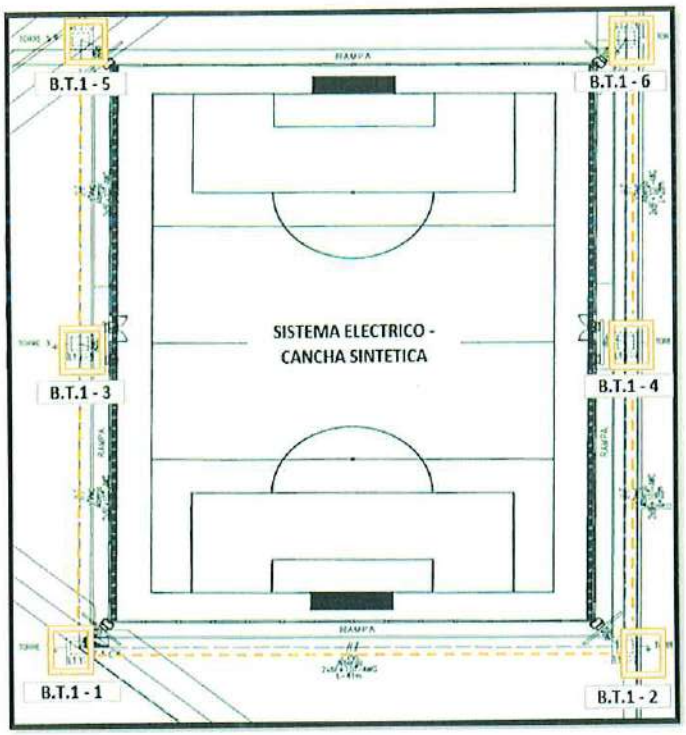


6.9 Cajas de inspección de 60X60 CM (medida interior).

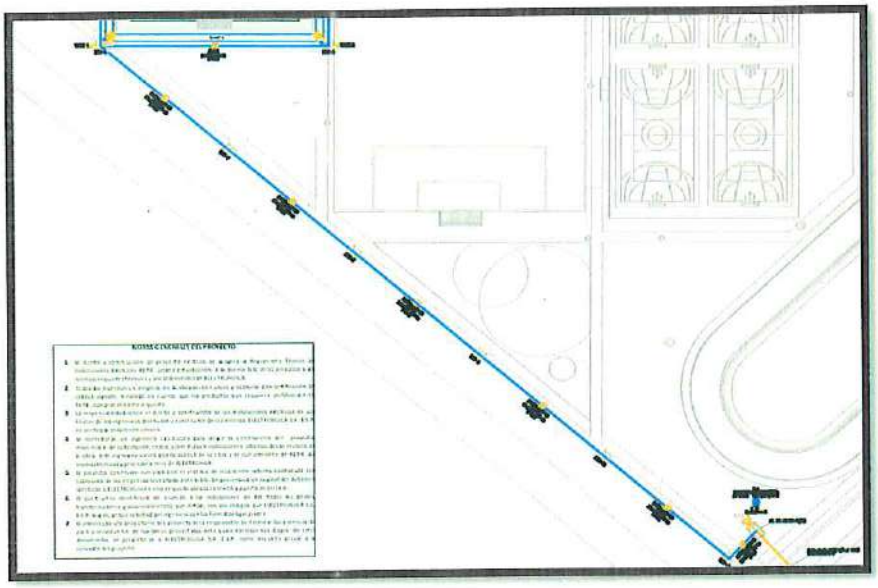


272

6.10 Suministro e Instalación de sistema de apantallamiento.

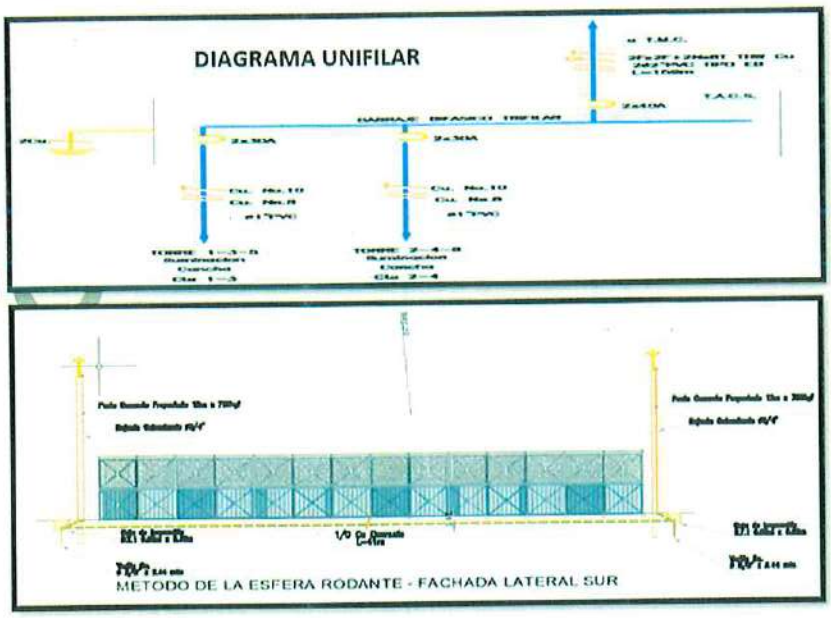


Actividades de Ítems No Previstos

NP 01 Suministro, montaje y conexión de Proyector led 300 W, flujo luminoso 50100 lm incluye soporte.

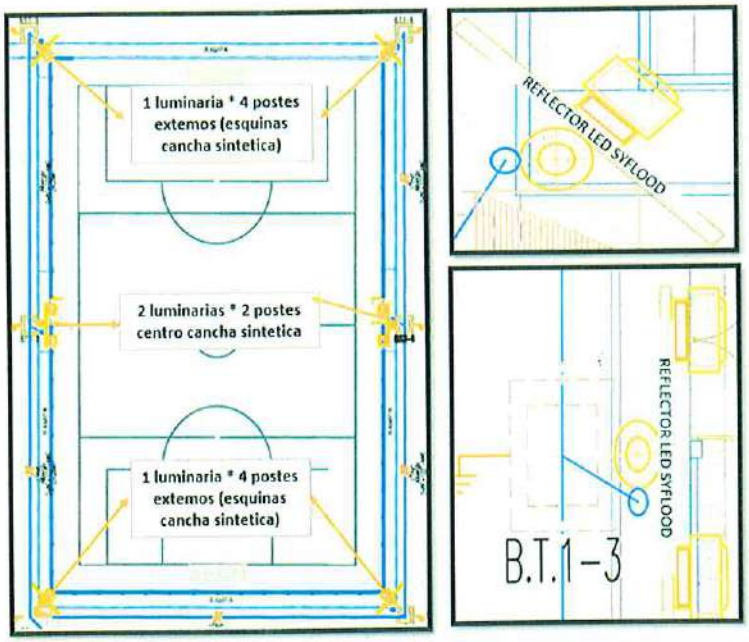


273

NP 02 Suministro e Instalación de Tablero de control de alumbrado con caja con protecciones según circuitos con contactores y botonera ON-OF.

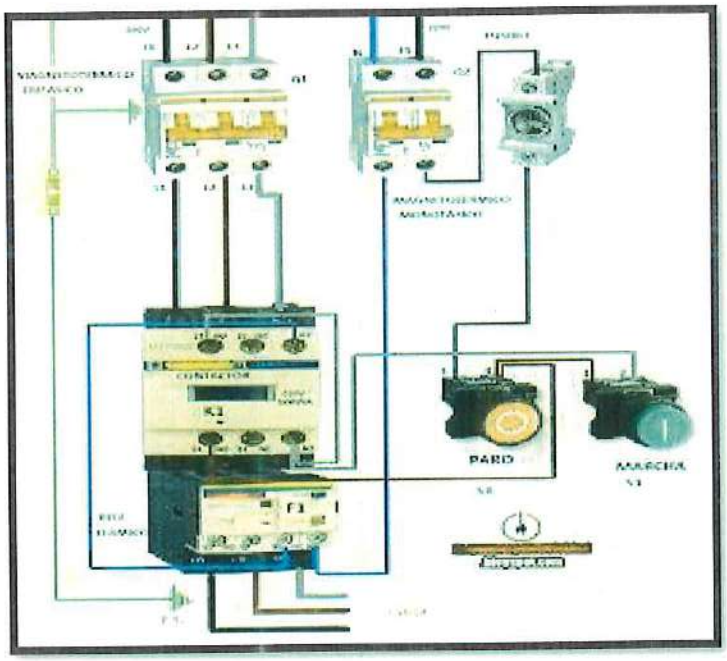


NP 03 Suministro e Instalación de Acometida 1 No 2Xfase + 1 No2xNeutro + 1No8xtierra.

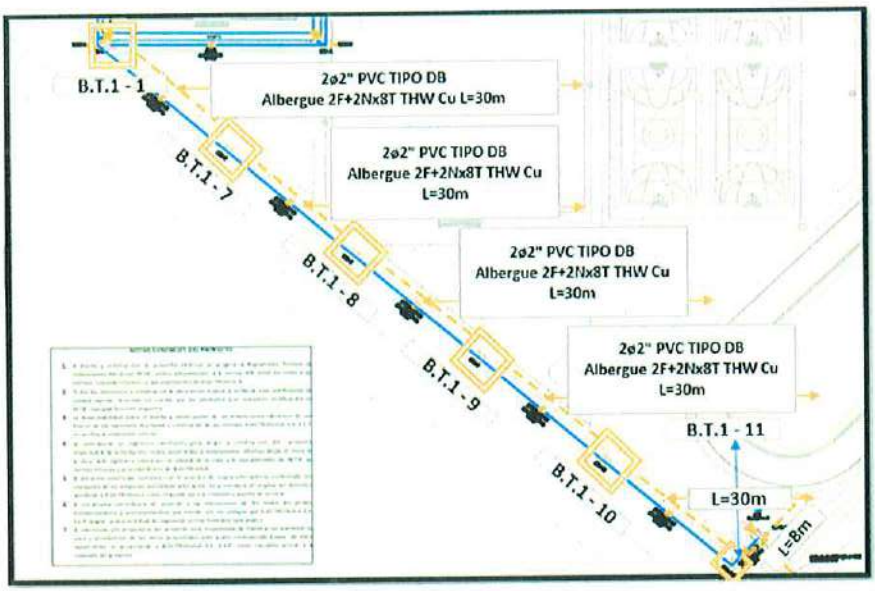


274

NP 04 Ducto de 3/4" IMC para bajante de conexión eléctrica.



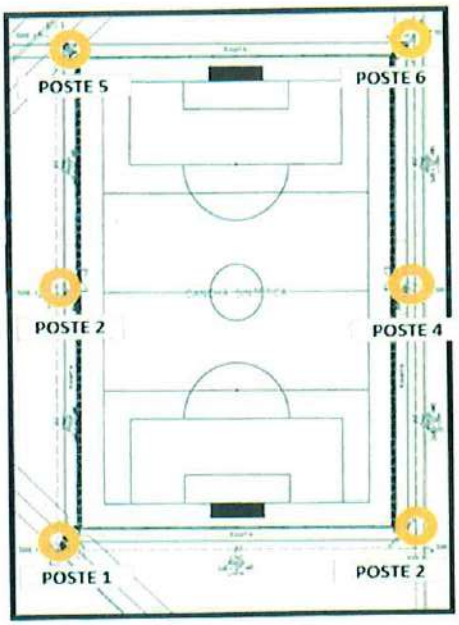


NP 05 Actividades profesionales y documentales propias del constructor con objeto de trámite de Certificación RETIE Y RETILAP (Levantamiento, elaboración de planos y entrega de formatos)

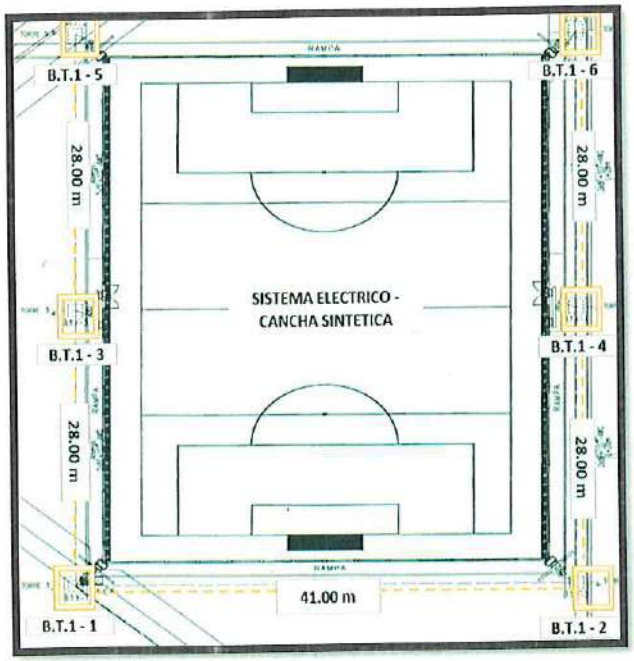


275

Trámite de inspección y certificación RETIE y RETILAP

CERTIRETIE S.A.S

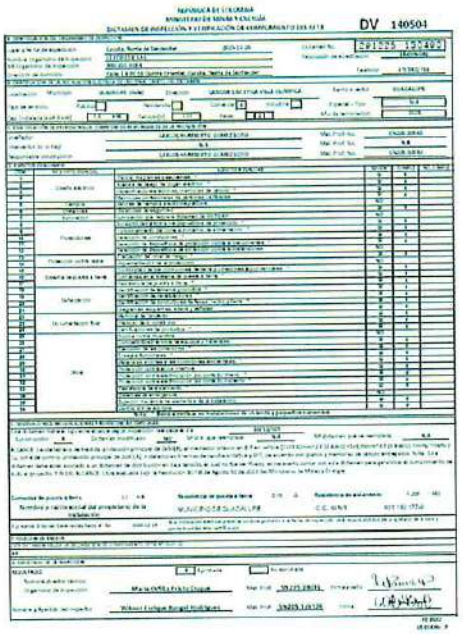

CERTIRETIE S.A.S

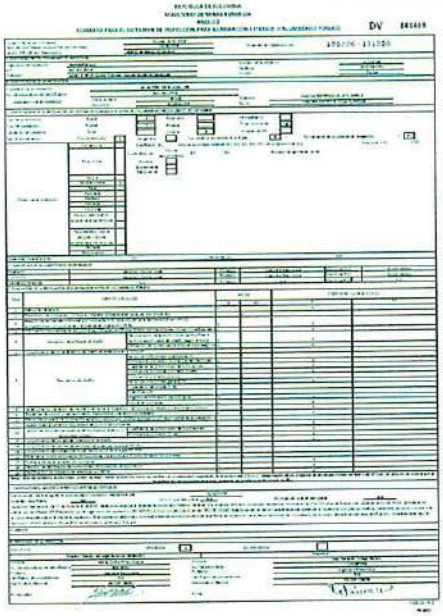

19. SEGUIMIENTO AL AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE LA OBRA

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSÍ No. 03		ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 2		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 13.460.304,00		$ 13.460.304,00		$ 15.391.200,00		$ 1.930.896,00		$ 0,00		$ 15.391.200,00
1.1	Localizacion y replanteo manual	m²	1.924,00	$ 2.226,00	$ 4.282.824,00	1924	$ 4.282.824,00	2200,00	$ 4.897.200,00	276,00	$ 614.376,00	0,00	$ 0,00	2.200,00	$ 4.897.200,00
1.2	Descapote e=0,20m a maquina incluye retiro material	m²	1.924,00	$ 4.770,00	$ 9.177.480,00	1924	$ 9.177.480,00	2200,00	$ 10.494.000,00	276,00	$ 1.316.520,00	0,00	$ 0,00	2.200,00	$ 10.494.000,00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA				$ 84.830.852,00		$ 84.830.852,00		$ 106.650.384,00		$ 21.829.532,00		$ 0,00		$ 106.650.384,00
2.1	Excavacion manual incluye retiro	m³	119,94	$ 31.545,00	$ 3.783.507,00	119,94	$ 3.783.507,00	295,67	$ 9.326.910,00	175,73	$ 5.543.403,00	0,00	$ 0,00	295,67	$ 9.326.910,00
2.2	Excavacion mecanica incluye retiro 1 Km	m³	384,80	$ 19.793,00	$ 7.616.346,00	384,8	$ 7.616.346,00	420,03	$ 8.313.654,00	35,23	$ 697.308,00	0,00	$ 0,00	420,03	$ 8.313.654,00
2.3	Rellenos con recebo compactado mecanicamente	m³	384,80	$ 190.829,00	$ 73.430.999,00	384,8	$ 73.430.999,00	466,49	$ 89.019.820,00	81,69	$ 15.588.821,00	0,00	$ 0,00	466,49	$ 89.019.820,00
3	RED DE AGUAS LLUVIAS				$ 38.483.328,00		$ 31.568.417,00		$ 44.628.666,00		$ 13.060.249,00		$ 0,00		$ 44.628.666,00
3.1	Construcción de cuneta perimetral en concreto 3000 PSI; Dimensiones: 40 cm de ancho y altura variable. incluye rejilla prefabricada en poliuretano	ml	104,00	$ 137.428,00	$ 14.292.512,00	100,54	$ 13.817.011,00	100,54	$ 13.817.011,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	100,54	$ 13.817.011,00
3.2	Caja inspeccion 1,0x 1,0 m medida interna en concreto 3000 psi para empalme sistema de drenaje, incluye tapa con marco y cañuela, altura variable	und	4,00	$ 657.029,00	$ 2.628.116,00	0	$ 0,00	2,00	$ 1.314.058,00	2,00	$ 1.314.058,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.314.058,00

19. SEGUIMIENTO AL AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE LA OBRA

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSÍ No. 03		ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 2		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
3.3	Red de aguas lluvias suministro e instalación de tubería pvc Ø 8" Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama con arena 15 cms y relleno material de la excavacion a zanjon	ml	30,00	$ 79.488,00	$ 2.384.640,00	0	$ 0,00	120,29	$ 9.561.612,00	120,29	$ 9.561.612,00	0,00	$ 0,00	120,29	$ 9.561.612,00
3.4	Construccion de filtros laterales externos en un ancho de 0.40 m, con altura variable menor a 0.50 m, recubrimiento en geotextil no tejido NT-1600, con gravilla comun o triturado de 1 1/2" a 4" + Tuberia pvc drenajes de 6"	ml	178,00	$ 99.727,00	$ 17.751.406,00	178	$ 17.751.406,00	185,60	$ 18.509.331,00	7,60	$ 757.925,00	0,00	$ 0,00	185,60	$ 18.509.331,00
3.5	Caja inspeccion 1,2x 1,2 m medida interna en concreto 3000 psi para empalme sistema de drenaje, incluye tapa con marco y cañuela, altura variable	und	2,00	$ 713.327,00	$ 1.426.654,00	0	$ 0,00	2,00	$ 1.426.654,00	2,00	$ 1.426.654,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.426.654,00
4	PLACA CANCHA				$ 741.397.052,00		$ 616.568.271,00		$ 744.440.432,00		$ 120.455.811,00		$ 7.410.227,00		$ 744.434.309,00
4.1	Placa de piso en concreto 3000 psi, e =0,07m dilatada, junta machimbreada incluye malla electrosoldada de 5mm.	m^2	1.750,00	$ 87.325,00	$ 152.818.750,00	1460,55	$ 127.542.529,00	1750,00	$ 152.818.750,00	289,45	$ 25.276.221,00	0,00	$ 0,00	1.750,00	$ 152.818.750,00

277

19. SEGUIMIENTO AL AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE LA OBRA

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSÍ No. 03		ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 2		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
4.2	Marco para microfutbol futbol 8.6mX2m, en tubo galvanizado tipo pesado de 4", según especificaciones tecnicas, incluye anclaje, malla e instalacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	und	2,00	$ 2.344.832,00	$ 4.689.664,00	0	$ 0,00	2,00	$ 4.689.664,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 4.689.664,00	2,00	$ 4.689.664,00
4.3	Suministro e instalación de césped monofilamentado rafia de 50mm de altura, con proteccion de rayos UV, con 1300 gramos por metro cuadrado de rafia, de 13200 dtx, base: backing doble capa, demarcacion de color blanco con cesped de blanco de fabrica, incluye granulo de caucho, pegamento importado.	m²	1.750,00	$ 181.076,00	$ 316.883.000,00	1460,55	$ 264.470.552,00	1750,00	$ 316.883.000,00	289,45	$ 52.412.448,00	0,00	$ 0,00	1.750,00	$ 316.883.000,00
4.4	Suministro e instalacion de almohadilla de choque shock pad 20 mm	m²	1.750,00	$ 146.659,00	$ 256.653.250,00	1460,55	$ 214.202.802,00	1750,00	$ 256.653.250,00	289,45	$ 42.450.448,00	0,00	$ 0,00	1.750,00	$ 256.653.250,00
4.5	Suministro e instalacion de bordillos prefabricado 20X50X50	ml	186,00	$ 55.658,00	$ 10.352.388,00	186,00	$ 10.352.388,00	240,68	$ 13.395.768,00	5,69	$ 316.694,00	48,88	$ 2.720.563,00	240,57	$ 13.389.645,00
5	CERRAMIENTO				$ 231.083.695,00		$ 186.603.068,00		$ 211.058.905,00		$ 13.459.026,00		$ 10.996.811,00		$ 211.058.905,00
5.1	Concreto ciclopeo 2500 psi (60% concreto- 40% piedra media zonga)para cimentacion cerramiento	m³	16,74	$ 376.028,00	$ 6.294.709,00	15,52	$ 5.835.955,00	15,52	$ 5.835.955,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	15,52	$ 5.835.955,00

19. SEGUIMIENTO AL AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE LA OBRA

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSÍ No. 03		ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 2		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
5.2	Concreto 3000 psi viga de cimentacion cerramiento 0,2x0,2m	m^3	37,40	$ 659.191,00	$ 24.653.743,00	12,41	$ 8.180.560,00	12,41	$ 8.180.560,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	12,41	$ 8.180.560,00
5.3	Muro cerramiento en ladrillo semiprensado a la vista	m^2	112,50	$ 105.765,00	$ 11.898.563,00	93,28	$ 9.865.759,00	93,28	$ 9.865.759,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	93,28	$ 9.865.759,00
5.4	Acero de refuerzo 37000 psi incluye figurado e instalacion	kg	1.057,11	$ 6.647,00	$ 7.026.597,00	1041,24	$ 6.921.122,00	1259,32	$ 8.370.700,00	218,08	$ 1.449.578,00	0,00	$ 0,00	1.259,32	$ 8.370.700,00
5.5	Tuberia galvanizada 2" cal 2mm incluye anclajes, tapa	ml	220,40	$ 44.432,00	$ 9.792.813,00	220,4	$ 9.792.813,00	316,20	$ 14.049.398,00	95,80	$ 4.256.585,00	0,00	$ 0,00	316,20	$ 14.049.398,00
5.6	Modulos cerramiento 2,5x2,5 m en angulo 1 1/2"x1/8 con varilla de 5/8" lisa cada 14 cms, diagonales en angulo 1 1/2" x 1/8 y lamina cal 16 10X10 cms de refuerzo en la esquinas (lado norte y sur)h=2,5m	m^2	200,00	$ 109.070,00	$ 21.814.000,00	196,27	$ 21.407.169,00	196,27	$ 21.407.169,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	196,27	$ 21.407.169,00
5.7	Modulos cerramiento 2,5x2,5 m en angulo 1 1/2"x1/8 con malla eslabonada cal 10 hueco 2 1/4"x2 1/4", diagonales en angulo 1 1/2" x1/8 y lamina cal 16 10X10cm de refuerzo en la esquinas (lado oriente y occidente) h=2,5m	m^2	268,75	$ 54.091,00	$ 14.536.956,00	265,92	$ 14.383.879,00	409,25	$ 22.136.742,00	143,33	$ 7.752.853,00	0,00	$ 0,00	409,25	$ 22.136.742,00
5.8	Suministro e instalacion de puerta en tuberia 2" galvanizada cal 2mm con malla eslabonada cal 10 y con portacandado, incluye pasador porta candado.	und	1,00	$ 802.805,00	$ 802.805,00	0	$ 0,00	2,00	$ 1.605.610,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.605.610,00	2,00	$ 1.605.610,00

19. SEGUIMIENTO AL AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE LA OBRA

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSÍ No. 03		ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 2		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
5.9	Concreto 3000 psi andenes perimentrales e=8cm, incluye malla electrosoldada y formaleta	m²	148,80	$ 80.868,00	$ 12.033.158,00	147,19	$ 11.902.961,00	263,32	$ 21.294.162,00	0,00	$ 0,00	116,13	$ 9.391.201,00	263,32	$ 21.294.162,00
5.10	Suministro e instalacion de malla de cerramiento en nylon 100% alta densidad con proteccion UV, ojo 13x13, calibre #4 incluye; guaya, tensores y tubo de 2"	m²	3.031,00	$ 37.545,00	$ 113.798.895,00	2408	$ 90.408.360,00	2408,00	$ 90.408.360,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2.408,00	$ 90.408.360,00
5.11	Pie de amigo en tuberia galvanizada 2" cal 2mm incluye anclajes, concreto 3000 psi 50x50x60 costados norte y sur	und	32,00	$ 263.483,00	$ 8.431.456,00	30	$ 7.904.490,00	30,00	$ 7.904.490,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	30,00	$ 7.904.490,00
6	ILUMINACÓN				$ 53.175.912,00		$ 0,00		$ 46.928.164,00		$ 0,00		$ 46.928.164,00		$ 46.928.164,00
6.1	Suministro, montaje y conexión de Proyector led 300 W SYLFLOOD, temperatura de color 5000K, vida útil 100000h, flujo luminoso 39000 lm incluye soporte	und	6,00	$ 1.718.814,00	$ 10.312.884,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00
6.2	Suministro e Instalacion de Tablero de 6 Circuitos con puerta incluye 3 breaker de 30 amp con normativa RETIE	und	1,00	$ 511.864,00	$ 511.864,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00
6.3	Suministro e Instalación de Acometida en CABLE CU AISL THHN/THWN - 2x8F+1x10T en tuberia PVC 1"	ml	50,00	$ 45.333,00	$ 2.266.650,00	0	$ 0,00	153,00	$ 6.935.949,00	0,00	$ 0,00	153,00	$ 6.935.949,00	153,00	$ 6.935.949,00
6.4	Salida Parcial Electrica (2 THHN No.10 + 1 THHN No.12)	ml	50,00	$ 42.110,00	$ 2.105.500,00	0	$ 0,00	84,00	$ 3.537.240,00	0,00	$ 0,00	84,00	$ 3.537.240,00	84,00	$ 3.537.240,00

19. SEGUIMIENTO AL AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE LA OBRA

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSÍ No. 03		ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 2		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
6.5	Suministro e instalacion de postes de concreto pretensado L= 12 m 750 kg incluye transporte e hizada	und	6,00	$ 2.884.636,00	$ 17.307.816,00	0	$ 0,00	6,00	$ 17.307.816,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 17.307.816,00	6,00	$ 17.307.816,00
6.6	Puesta a tierra en varilla coper weld cobre de 1/2" incluye conectores, cableado, soldadura y mejoramiento de tierra	und	1,00	$ 513.186,00	$ 513.186,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00
6.7	Murete para tablero de control en muro con bloque # 5	und	1,00	$ 377.230,00	$ 377.230,00	0	$ 0,00	1,00	$ 377.230,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 377.230,00	1,00	$ 377.230,00
6.8	Construcción de cajas de inspección tipo alumbrado en concreto de 30x30	und	6,00	$ 266.806,00	$ 1.600.836,00	0	$ 0,00	6,00	$ 1.600.836,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 1.600.836,00	6,00	$ 1.600.836,00
6.9	Cajas de inspeccion de 60X60 CM (medida interior)	und	8,00	$ 336.951,00	$ 2.695.608,00	0	$ 0,00	5,00	$ 1.684.755,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 1.684.755,00	5,00	$ 1.684.755,00
6.10	Suministro e Instalación de sistema de apantallamiento	und	1,00	$ 15.484.338,00	$ 15.484.338,00	0	$ 0,00	1,00	$ 15.484.338,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 15.484.338,00	1,00	$ 15.484.338,00
7	ITEMS NO PREVISTOS				$ 0,00		$ 0,00		$ 49.208.876,00		$ 0,00		$ 49.208.876,00		$ 49.208.876,00
NP 01	Suministro, montaje y conexión de Proyector led 300 W, flujo luminoso 50100 lm incluye soporte	und	0,00	$ 2.212.693,95	$ 0,00	0	$ 0,00	8,00	$ 17.701.552,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 17.701.552,00	8,00	$ 17.701.552,00
NP 02	Suministro e Instalacion de Tablero de control de alumbrado con caja con protecciones según circuitos con contactores y botonera ON-OF	und	0,00	$ 3.725.611,53	$ 0,00	0	$ 0,00	1,00	$ 3.725.612,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.725.612,00	1,00	$ 3.725.612,00

181

19. SEGUIMIENTO AL AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE LA OBRA

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSÍ No. 03		ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 2		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
NP 03	Suministro e Instalación de Acometida 1 No 2Xfase + 1 No2xNeutro + 1No8xtierra	ml	0,00	$ 131.557,19	$ 0,00	0	$ 0,00	159,00	$ 20.917.593,00	0,00	$ 0,00	159,00	$ 20.917.593,00	159,00	$ 20.917.593,00
NP 04	Ducto de 3/4" IMC para bajante de conexión electrica	ml	0,00	$ 48.355,19	$ 0,00	0	$ 0,00	72,00	$ 3.481.574,00	0,00	$ 0,00	72,00	$ 3.481.574,00	72,00	$ 3.481.574,00
NP 05	Actividades profesionales y documentales propias del contructor con objeto de tramite de Certificacion RETIE Y RETILAP (Levantamiento, elaboracion de planos y entrega de formatos)	und	0,00	$ 3.382.545,00	$ 0,00	0	$ 0,00	1,00	$ 3.382.545,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.382.545,00	1,00	$ 3.382.545,00

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 1.162.431.143,00	$ 933.030.912,00	$ 1.218.316.627,00	$ 170.735.514,00	$ 114.544.078,00	$ 1.218.310.504,00
Administración	20%	$ 232.486.229,00	$ 186.606.182,00	$ 243.663.325,00	$ 34.147.103,00	$ 22.908.816,00	$ 243.662.101,00
Imprevistos	1%	$ 11.624.311,00	$ 9.330.309,00	$ 12.183.166,00	$ 1.707.355,00	$ 1.145.441,00	$ 12.183.105,00
Utilidad	4%	$ 46.497.246,00	$ 37.321.236,00	$ 48.732.665,00	$ 6.829.421,00	$ 4.581.763,00	$ 48.732.420,00
Trámite de inspección y certificación RETIE Y RETILAP				$ 10.115.000,00		$ 10.115.000,00	$ 10.115.000,00
TOTAL COSTO		$ 1.453.038.929,00	$ 1.166.288.639,00	$ 1.533.010.783,00	$ 213.419.393,00	$ 153.295.098,00	$ 1.533.003.130,00

AMORTIZACIÓN ANTICIPO	20%		$ 233.257.727,80		$ 42.683.878,60	$ 14.666.179,40	$ 290.607.785,80
VALOR TOTAL MENOS (-) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			$ 933.030.911,20		$ 170.735.514,40	$ 138.628.918,60	$ 1.242.395.344,20
% AVANCE DE OBRA			76,07830629329 63%		13,9215845946206%	9,99960989837343%	99,9995007862903%

282

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ING YERSON FERNANDO CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA

ING. DANIELA CARRILLO TAVERA
REPRESENTANTE LEGAL

El cronograma de obra presentado por V&M INGENIERÍA S.A.S. y aprobado por esta interventoría, cumplió con los requisitos de la entidad contratante y facilitó un adecuado seguimiento del proyecto. A la fecha de corte, el contratista reporta un avance acumulado ejecutado de $1.533.003.130,00, equivalente al 99,9995007862903%, frente a un avance programado del 100% según la reprogramación del Otrosí N°3.

% avance acumulado programado	100%
	$1.533.010.783,00
% avance acumulado ejecutado	99,9995007862903%
	$1.533.003.130,00
Atraso (-) y/o Avance (+) Acumulado	0,0004992137097%
	$7.653,00

20. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Imagen 1. Marco metálico para microfutbol de la cancha sintética (con su respectiva malla)



Imagen 2. Bordillo prefabricado.



Imagen 3. Puerta metálica que hace parte del cerramiento de la cancha, con pasador y portacandado.



Imagen 4. Andenes perimetrales en concreto.



Imagen 5. Instalación de acometida eléctrica en cable de cobre.



Imagen 6. Salida parcial eléctrica.



Imagen 7. Postes en concreto para lámparas de iluminación.



Imagen 8. Murete para tablero de control en mampostería.



Imagen 9. Instalación de cajas de inspección para alumbrado.



Imagen 10. Instalación de cajas de inspección para alumbrado.



Imagen 11. Instalación de cajas de inspección para alumbrado.

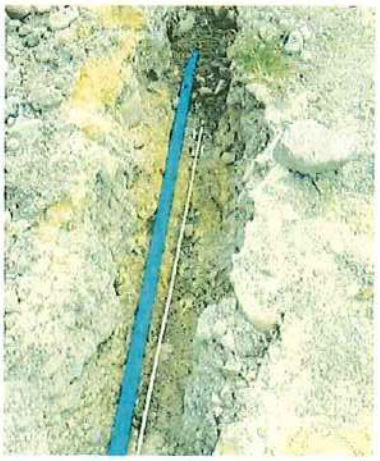


Imagen 12. Sistema de apantallamiento.



Imagen 13. Proyector led 300 W.



Imagen 14. Proyector led 300 W.



Imagen 15. Tablero de control.



Imagen 16. Instalación de Acometida 1.



Imagen 17. Ducto de 3/4" IMC



Imagen 18. Trámite certificación RETIE y RETILAP.

21. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

- El proyecto culminó con un avance físico del 99,9995007862903%, con una ejecución equivalente a $1.533.003.130,00.
- El proyecto concluyó con las adecuaciones en la placa de la cancha, que incluyeron el montaje de los marcos de microfútbol y la culminación de los bordillos. Asimismo, se finalizaron los trabajos de cerramiento con la colocación de la puerta metálica de acceso y la fundición de concreto en los andenes perimetrales. Durante este último periodo, el mayor avance se concentró en el componente de iluminación, logrando el tendido de las acometidas eléctricas, la ubicación de los postes de concreto, la construcción del murete para el tablero de

control, y el montaje de las cajas de inspección, luminarias y el sistema de apantallamiento. Finalmente, la obra se entregó respaldada por sus respectivos certificados RETIE y RETILAP.

- La interventoría ha verificado el cumplimiento técnico, aprobando las cantidades de obra, materiales y procedimientos utilizados.
- El contrato de interventoría ha cumplido con la verificación de afiliaciones, pagos de seguridad social, asistencia a comités, elaboración de actas, revisión de pólizas y documentos técnicos.
- Se llevó una bitácora diaria, informes HSEQ y control de asistencia del personal técnico, garantizando trazabilidad y control sobre el desarrollo contractual.
- Durante el periodo, no se registraron incidentes laborales ni afectaciones a terceros, y se mantuvo el cumplimiento de las condiciones ambientales, de seguridad industrial y el uso adecuado de elementos de protección personal.
- La entrega formal del espacio deportivo se llevó a cabo el 31 de marzo de 2026 en el municipio de Guadalupe, contando con la participación de las partes involucradas y la comunidad beneficiaria del proyecto.

ING. DANIELA CARRILLO TAVERA	(31/03/2026)	ING. LUIS MIGUEL CAQUIMBO
FIRMA ORIGINAL **REPRESENTANTE LEGAL**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **Vo.Bo APOYO SUPERVISIÓN**

La Interventoría deja constancia expresa de que el día 31 de marzo de 2026 se reunieron la ingeniera Daniela Carrillo Tavera, en calidad de Representante legal del Contratista de Interventoría; el ingeniero William Augusto Ramírez Salinas, en calidad de Residente de Interventoría; el ingeniero Yerson Fernando Camacho Ladino, en calidad de Director de Obra; y la ingeniera Adriana Liseth Mayorca Perdomo, en calidad de Residente de Obra, con el propósito de realizar la verificación técnica en terreno de las cantidades ejecutadas, la calidad de los materiales empleados y la revisión ocular de los ítems construidos, para efectos de la aprobación del Acta de Recibo Final de Obra suscrita el 31 de marzo del 2026.

Dicha verificación se efectuó confrontando la ejecución física de la obra: (objeto del contrato de obra) con los diseños, planos, especificaciones técnicas y alcance del objeto contractual, así como con los ítems y cantidades registrados en el Acta de Recibo Final de Obra DIH-CGID-F24.

Como resultado de la inspección en campo, la Interventoría determinó que las actividades ejecutadas corresponden a lo reportado por el contratista y que se encuentran acordes con las especificaciones establecidas en el Contrato de Obra No. CLOPIH221 DE 2024. Asimismo, se constató que la obra se encuentra en condiciones adecuadas para su entrega y recibo a satisfacción, sin observaciones pendientes que afecten su calidad, funcionalidad o estabilidad.

En mérito de lo expuesto, la Interventoría verifica y aprueba las actividades ejecutadas en el Contrato de Obra No. CLOPIH221 DE 2024.

INDERHUILA	FORMATO	CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	MAYO 2021


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCM228 DE 2024

INFORME ACTA FINAL DE SUPERVISION

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas por el Contratista desde el **4 de OCTUBRE DE 2025** hasta el **06 de OCTUBRE DE 2025.**

FINAL [X] PARCIAL [ ]

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA".

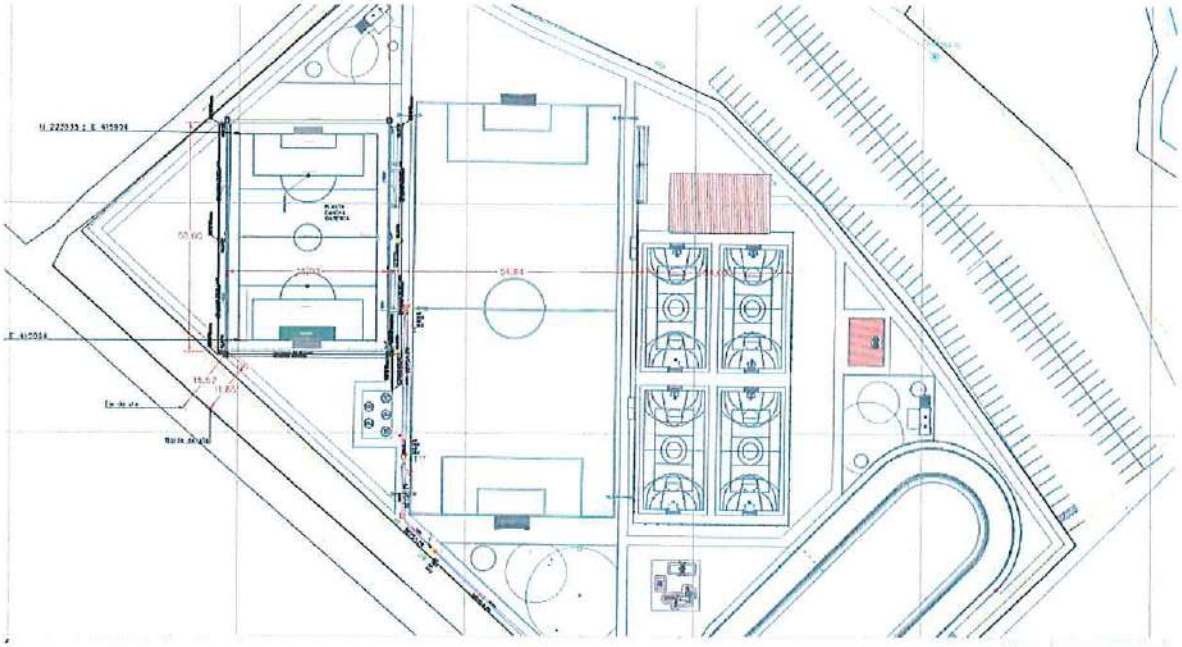

MUNICIPIO: GUADALUPE

DEPARTAMENTO: HUILA

1. PRESENTACIÓN

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas por la supervisión desde el **04 de OCTUBRE DE 2025 hasta el 06 de OCTUBRE DE 2025**, en cumplimiento del contrato general de "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Para lo cual se efectuará en Guadalupe: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA".**

Mediante los cuadros anexos y el registro fotográfico se deja constancia de los trabajos adelantados por la interventoría durante la ejecución del contrato, así como de las actividades desarrolladas en el marco del apoyo a la supervisión, hasta la culminación de las obligaciones contractuales. En el presente informe se presenta un resumen de las principales actividades ejecutadas por la obra, la interventoría y el apoyo a la supervisión, acompañado del correspondiente registro fotográfico y documental que evidencia el desarrollo y terminación del proyecto.

2. JUSTIFICACIÓN

La creación y mantenimiento de espacios urbanos de acceso libre y equitativo es un principio fundamental para la construcción de ciudades más inclusivas, saludables y cohesionadas. En un mundo cada vez más urbanizado, donde las desigualdades sociales y económicas son una realidad persistente, es esencial garantizar que todos los individuos, sin importar su nivel socioeconómico, puedan disfrutar de los mismos derechos y oportunidades en el entorno urbano. Los espacios de acceso libre, como parques, plazas y, en particular, los espacios deportivos, juegan un papel crucial en este proceso de integración social, ya que permiten que personas de diferentes orígenes y condiciones se encuentren, compartan experiencias y se relacionen sin barreras económicas.

Estos espacios, al estar diseñados para ser accesibles, son un catalizador para la interacción social entre los habitantes de una ciudad, favoreciendo la creación de redes de apoyo y fortaleciendo el tejido social. Al eliminar las barreras económicas, se asegura que todos, independientemente de su estatus socioeconómico, tengan la oportunidad de participar en actividades recreativas, deportivas y de ocio. Esto no solo promueve la cohesión social, sino que también contribuye a la reducción de tensiones y divisiones dentro de la comunidad. Las personas pueden disfrutar de momentos de esparcimiento y cooperación, lo que, a su vez, fomenta un mayor sentido de pertenencia y solidaridad.

Los espacios deportivos accesibles son particularmente importantes en este contexto, ya que, más allá de su función recreativa, contribuyen directamente a la mejora de la salud y el bienestar de la población. En un contexto donde el sedentarismo y las enfermedades relacionadas con la falta de actividad física son problemas de salud pública cada vez más comunes, ofrecer lugares donde la actividad física sea fácil y accesible es esencial para combatir estos problemas. La práctica regular de ejercicio en estos espacios no solo mejora la salud física, sino que también tiene un impacto positivo en la salud mental, reduciendo el estrés, la ansiedad y mejorando la calidad de vida de los individuos.

Además, la presencia de estos espacios en entornos urbanos puede generar una serie de beneficios indirectos, como la disminución de la delincuencia y el aumento de la seguridad. Al ofrecer espacios donde las personas pueden reunirse de manera sana y activa, se disminuye la probabilidad de que estos sean utilizados para actividades destructivas. La ocupación positiva del espacio público refuerza el sentido de comunidad y crea ambientes más seguros y amigables, donde los individuos se sienten responsables del bienestar común.

Finalmente, la creación de espacios urbanos accesibles y equitativos promueve una visión de la ciudad como un lugar de encuentro, inclusión y justicia social. Estos espacios no solo deben ser concebidos como una necesidad de esparcimiento, sino como un derecho fundamental que contribuye a la construcción de ciudades más humanas, sostenibles y equitativas, donde todos los ciudadanos puedan convivir, crecer y desarrollarse plenamente. De esta manera, la integración de espacios deportivos accesibles en el diseño urbano no solo tiene un impacto directo en la salud física, sino que también desempeña un papel vital en la construcción de comunidades más fuertes, resilientes y unidas.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto abarca un área de 1,924 m² e incluye la construcción de una cancha sintética de fútbol ocho con dimensiones de 30 x 50 m, destinada a actividades recreativas, deportivas y culturales.

La cancha tendrá un área total de 1,750 m² y estará equipada con una red de drenaje para aguas lluvias, que incluye una cuneta perimetral de concreto con resistencia de 3,000 psi, cajas de inspección y filtros laterales. Además, se construirá una placa de piso de concreto con resistencia de 3000 psi, sobre la cual se instalará césped sintético y se realizará la demarcación de la cancha con juntas de dilatación. El proyecto también contempla un cerramiento perimetral y un sistema de iluminación adecuado para su uso.

3.1. LOCALIZACIÓN

El proyecto **"CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, DEPARTAMENTO DEL HUILA"** se encuentra ubicado en el municipio de Guadalupe, Departamento del Huila. Esta localidad, situada en la región andina de Colombia, es conocida por su belleza natural y su rica herencia cultural. Guadalupe está rodeada de paisajes montañosos y ríos, lo que la convierte en un lugar atractivo tanto para residentes como para visitantes.

La cancha sintética se pretende construir dentro de las instalaciones del proyecto macro de la Villa Olímpica, un área designada para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas que busca beneficiar a la comunidad local. La construcción de la cancha sintética es parte de un esfuerzo por mejorar la infraestructura deportiva y ofrecer a los jóvenes y habitantes del municipio un espacio adecuado para la práctica de deportes.




NEIVA
Palermo
Rivera
Campoalegre
Hobo
Algeciras
Tesalia
Gigante
La Plata
Agrado
Garzón
La Argentina
Tarqui
Saladoblanco
Oporapa
Elías
Timaná
Suaza
San Agustín
Pitalito
Acevedo
Palestina

3.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La obra contempla cancha sintética para el municipio de Guadalupe, en donde tiene por objeto contractual las siguientes actividades de ejecución:

- Preliminares
- Movimiento de tierras
- Red aguas lluvias
- Estructura en concreto
- Cerramiento
- Iluminación.

4. INFORMACION GENERAL DE CONTRATOS

4.1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

Que mediante Resolución No. 118 del 03 de septiembre de 2024, la entidad dio apertura al procedimiento de contratación IHCM001 – 2024 y que mediante Resolución No. 137 del 25 de septiembre de 2024, la entidad adjudico el contrato a la empresa **CONSTRUMAC INGENIERIA SAS.**

CONTRATO No.	CIHCM228 de 2024
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA.".
CONTRATISTA:	CONSTRUMAC INGENIEROS SAS R/L ING. DANIELA CARRILLO TAVERA C.C. No. 1007750886 NIT: 900.116.571-8 Celular: 3123218077 Correo Electrónico: construmacingenierossas@gmail.com
CONTRATANTE:	INDERHUILA NIT: 813.005.578-7
VALOR INICIAL:	Ciento siete millones trescientos once mil setecientos un peso ($107.311.701,00)
VALOR ADICIONAL:	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	Ciento siete millones trescientos once mil setecientos un peso ($107.311.701,00)
FECHA SUSCRIPCIÓN:	16 DE OCTUBRE DE 2024

PLAZO INICIAL:	3 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ADICIONAL 01:	**OTROSI No. 1: 31/01/2025 Prórroga:** DOS (02) MESES.
PLAZO ADICIONAL 01:	**OTROSI No. 2: 10/04/2025 Prórroga:** DOS (02) MESES.
PLAZO TOTAL:	7 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	20 DE MAYO DE 2025
FECHA DE REINICIO 1:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACION:	06 DE OCTUBRE DE 2025

Estado Financiero del Contrato de Interventoría			CIHCM228-2024	
Objeto: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA".				
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización 30%	Valor pagado
Valor Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta Parcial No. 1	24/06/2026	$ 95.507.414,00	N/A	$ 95.507.414,00
Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
$107.311.701,00	$ 0	$107.311.701,00	$ 0	$107.311.701,00

HISTORIAL CRONOLÓGICO DEL PROYECTO				
ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION
FIRMA CONTRATO	16/10/2024			
Iniciación	12/11/2024			
Plazo adicional No. 1	31/01/2025			
Plazo adicional No. 2	10/04/2025			
Suspensión No. 1	20/05/2025			
Reiniciación No. 1	15/09/2025			
Terminación Cto.	06/10/2025			
TOTAL, DIAS		210	116	06/10/2025

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)		
Tipo de Acta	No.	Fecha
FIRMA CONTRATO		*16/10/2024*
ACTA DE INICIO		*12/11/2024*
OTROSI MODIFICATORIO No. 1		*31/01/2025*
OTROSI MODIFICATORIO No. 2		*10/04/2025*
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1		*20/05/2025*
ACTA DE REINICIO N°1		*15/09/2025*
ACTA DE TERMINACION		*06/10/2025*

4.1.1. INFORMACION PRESUPUESTAL

PROYECTO PRESUPUESTAL:	CDP	RP	VALOR	VIGENCIA
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA."	2024000271	2024000579	$ 107.311.701,00	2024
	2025000061	2025000047	$ 107.311.701,00	2025

4.1.2. RELACION PERSONAL

PROFESIONAL INTERVENTORÍA		
NOMBRE YAPELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO
DANIELA CARRILLO TAVERA	1.007.750.886	REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA
WILLIAM RAMIREZ SALINAS	12.137.865	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

4.1.3 RELACION DE POLIZAS DE GARANTIAS

Póliza legalización del CONTRATO:							
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)				No. Certificado	533058523		
					VIGENCIA		
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100032369	0	12/10/2024	Cumplimiento del contrato	16/10/2024	16/07/2025	$21.462.340,20
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/10/2024	16/01/2025	$10.731.170,10
				Calidad del Servicio	16/10/2024	16/01/2025	$21.462.340,20
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)				No. Certificado	533058543		
					VIGENCIA		
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100005879	0	17/11/2024		16/10/2024	16/01/2025	$ 260.000.000,00

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:							
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)				No. Certificado	533062221		
					VIGENCIA		
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100032369	1-2	13/11/2024	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	12/08/2025	$21.462.340,20
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/11/2024	12/02/2025	$10.731.170,10
				Calidad del Servicio	12/11/2024	12/02/2025	$21.462.340,20
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)				No. Certificado	533062223		
					VIGENCIA		
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100005879	1-2	13/11/2024		12/11/2024	12/02/2025	$ 260.000.000,00

Póliza actualizada x Otrosí No. 1 y Acta de justificación No. 1:							
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)				No. Certificado	533074976		
					VIGENCIA		
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100032369	3	06/02/2025	Cumplimiento del contrato	31/01/2025	12/10/2025	$21.462.340,20
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	31/01/2025	12/04/2028	$10.731.170,10
				Calidad del Servicio	12/04/2025	12/04/2030	$21.462.340,20
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)				No. Certificado	533074980		
					VIGENCIA		
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100005879	3	06/02/2025		12/11/2024	12/04/2025	$ 284.700.000,00

Póliza actualizada x Otrosí No. 2 y Acta de justificación No. 2:							
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)				No. Certificado	533085132		
					VIGENCIA		
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100032369	4	14/04/2025	Cumplimiento del contrato	10/04/2025	12/12/2025	$21.462.340,20
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10/04/2025	12/06/2025	$10.731.170,10
				Calidad del Servicio	12/06/2025	12/06/2030	$21.462.340,20
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)				No. Certificado	533085135		
					VIGENCIA		
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100005879	4	14/04/2025		12/11/2024	12/06/2025	$ 284.700.000,00

Póliza actualizada x Según acta de suspensión No. 1 y Acta de reinicio No. 1.							
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)				No. Certificado	533085132		
					VIGENCIA		
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100032369	5	16/09/2025	Cumplimiento del contrato	20/05/2025	09/04/2026	$21.462.340,20
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	20/05/2025	09/10/2028	$10.731.170,10
				Calidad del Servicio	12/06/2025	12/06/2030	$21.462.340,20
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)				No. Certificado	533085135		
					VIGENCIA		
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100005879	5	14/04/2025		12/11/2024	09/10/2025	$ 284.700.000,00

Póliza actualizada x Según Recibo Final:							
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)				No. Certificado	533148816		
					VIGENCIA		
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100032369	6	24/04/2026	Cumplimiento del contrato	20/05/2025	09/04/2026	$21.462.340,20
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	20/05/2025	09/10/2028	$10.731.170,10
				Calidad del Servicio	31/03/2026	31/03/2031	$21.462.340,20

Póliza actualizada x Según Final (Ampliación Amparo de cumplimiento):							
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)				No. Certificado	533148816		
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100032369	7	15/05/2026	Cumplimiento del contrato	20/05/2025	09/10/2026	$21.462.340,20
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	20/05/2025	09/10/2028	$10.731.170,10
				Calidad del Servicio	31/03/2026	31/03/2031	$21.462.340,20

4.2 CONTRATO DE OBRA

Que mediante la Resolución 079 del 6 de junio de 2024 la Entidad abrió el Proceso de Contratación No. LOPIH001 - 2024, Que por medio de la Resolución 109 del 20 de agosto de 2024 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista **V&M INGENIERIA SAS**. cuya representante legal es **FERNANDO CAMACHO LADINO**.

CONTRATO No.	CLOPIH221 DE 2024
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA".
CONTRATISTA:	V&M INGENIERIA SAS NIT: 900.062.688-7 Representante Legal: YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO Celular: 3103273184 Correo Electrónico: vymingenieriasas@gmail.com
CONTRATANTE:	INDERHUILA NIT: 813.005.578-7
VALOR INICIAL:	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS **($1.453.038.929,00)** MCTE.
VALOR ADICIONAL:	SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS **($ 79.971.854,00) MCTE.**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS **($1.533.010.783,00)** MCTE.
FECHA SUSCRIPCIÓN:	17/09/2024
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES, contados a partir del acta de inicio
PLAZO ADICIONAL 01:	**OTROSI No. 1: 31/01/2025 Prórroga:** DOS (02) MESES.
PLAZO ADICIONAL 02:	**OTROSI No. 2: 10/04/2025 Prórroga:** DOS (02) MESES.

PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO:	12 DE NOVIEMBRE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	20 DE MAYO DE 2025
FECHA DE REINICIO 1:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No.1	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACION:	06 DE OCTUBRE DE 2025

Estado Financiero del Contrato de Obra			CLOPIH221 DE 2024	
Objeto: "CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA"				
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización 20%	Valor pagado
Valor Anticipo	04/03/2025	$290.607.785.20		$290.607.785.20
Acta Parcial No. 1	14/08/2025	$1.166.288.639,00	$233.257.727,80	$933.030.911,20
Acta Parcial No. 2	09/03/2026	$213.240.785,00	$42.684.157,00	$170.736.628,00
Acta Final	EN TRAMITE	$ 153.295.098,00	$ 14.666.179,40	$ 138.628.918,60
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$1.453.038.929,00	**$ 79.971.854,00**	**$1.533.010.783,00**	**$1.533.003.130,00**	**$7.653,00**

HISTORIAL CRONOLÓGICO DEL PROYECTO				
ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION
FIRMA CONTRATO	10 de septiembre de 2024			
Iniciación	12 DE NOVIMEBRE DE 2024			
Plazo adicional No. 1	31/01/2025			
Plazo adicional No. 2	10/04/2025			
Suspensión No. 1	20/05/2025			
Reiniciación No. 1	15/09/2025			
Adicional No. 1	*17/09/2025*			
Terminación	*06/10/2025*			
TOTAL DIAS		**210**	**116**	**06/10/2025**

300

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)		
Tipo de Acta	No.	Fecha
FIRMA CONTRATO		*10/09/2024*
ACTA DE INICIO		*12/11/2024*
OTROSI MODIFICATORIO No. 1		*31/01/2025*
OTROSI MODIFICATORIO No. 2		*10/04/2025*
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1		*20/05/2025*
ACTA DE REINICIO N°1		*15/09/2025*
ACTA DE TERMINACION		*06/10/2025*

4.2.1 INFORMACION PRESUPUESTAL

PROYECTO PRESUPUESTAL:	CDP	RP	VALOR	VIGENCIA
"CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA."	2024000231	2024000480	$ 1.453.038.929,00	2024
	2025000062	2025000049	$ 1.453.038.929,00	2025
	2025000674	2025000661	$ 79.971.854,00	2025

4.2.2 RELACION PERSONAL

PROFESIONAL OBRA		
NOMBRE YAPELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO
YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO	*7.713.933*	*REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA*
YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO	*7.713.933*	*DIRECTOR DE OBRA*
ADRIANA LISETH MAYORCA PERDOMO	*1.079.409.298*	*RESIDENTE DE OBRA*
OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO	*1.075.213.839*	*PROFESIONAL SISO*
JORGE HUMBERTO ALDANA ROSERO	1.082.131.133	AYUDANTE
OSCAR OBEIMAR CABEZAS GALINDEZ	1.082.773.317	*AYUDANTE*
YILBER LEANDRO CORTES NIETO	1.007.659.754	*AYUDANTE*
JESUS OBEIMAR LOPEZ GALINDEZ	1.082.776.715	MAESTRO DE OBRA

4.2.3 RELACION DE POLIZAS DE GARANTIAS

Póliza legalización del CONTRATO:							
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)				No. Certificado	N/A		
					VIGENCIA		
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	61-44-101055753	0	27/09/2024	Cumplimiento del contrato	27/09/2024	27/06/2025	$145,303,893.00
				Buen Manejo y correcta inversión del Anticipo	27/09/2024	27/06/2025	$290,607,786.00
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	27/09/2024	27/12/2027	$72,651,946.50
				Estabilidad y Calidad de la Obra	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		$145,303,893.00
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)				No. Certificado	N/A		
					VIGENCIA		
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	61-40-101020276	0	27/09/2024		27/09/2024	27/12/2024	$ 260.000.000,00

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:							
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)							
					VIGENCIA		
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	61-44-101055753	1-2	19/11/2024	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	12/08/2025	$145,303,893.00
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	12/11/2024	12/08/2025	$290,607,786.00
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/11/2024	12/02/2028	$72,651,946.50
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 años, 0 meses y 0 dia a partir de la suscripción del acta de recibo de la obra objeto de la Interventoria.		$145,303,893.00
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)							
					VIGENCIA		
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	61-40-101020276	1-2	19/11/2024		12/11/2024	11/02/2025	$ 260.000.000,00

Póliza actualizada x PRORROGA No. 1:							
POLIZA DE CUMPLIMIENTO – OTRO SI No. 1 (31/01/2025) (Relacionar todas las actualizaciones)							
					VIGENCIA		
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO

SEGUROS DEL ESTADO	61-44-101055753	3	12/02/2025	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	12/10/2025	$145,303,893.00
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	12/11/2024	12/10/2025	$290,607,786.00
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/11/2024	12/04/2028	$72,651,946.50
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 años, 0 meses y 0 dia a partir de la suscripción del acta de recibo de la obra objeto de la Interventoría.		$145,303,893.00

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL – OTRO SI No. 1 (31/01/2025) (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	61-40-101020276	3-4	12/02/2025	12/11/2024	12/04/2025	$ 284.700.000,00

Póliza actualizada x PRORROGA No. 2:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO – OTRO SI No. 2 (31/01/2025) (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	61-44-101055753	4	16/04/2025	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	12/12/2025	$145,303,893.00
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	12/11/2024	12/12/2025	$290,607,786.00
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/11/2024	12/06/2028	$72,651,946.50
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 años, 0 meses y 0 dia a partir de la suscripción del acta de recibo de la obra objeto de la Interventoría.		$145,303,893.00

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL – OTRO SI No. 1 (31/01/2025) (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	61-40-101020276	5	16/04/2025	12/11/2024	12/06/2025	$ 284.700.000,00

Póliza actualizada x Acta de suspensión y acta de Reinicio No. 1:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO – ACTA DE SUSPENSIÓN No.1 (20/05/2025) y ACTA DE REINICIO No. 1 (17/09/2025) (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
	61-44-101055753	5-6	17/09/2025	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	09/04/2026	$145,303,893.00

308

SEGUROS DEL ESTADO				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	12/11/2024	09/04/2026	$290,607,786.00
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/11/2024	09/10/2028	$72,651,946.50
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 años, 0 meses y 0 día a partir de la suscripción del acta de recibo de la obra objeto de la Interventoria.		$145,303,893.00

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL – ACTA DE SUSPENSIÓN No.1 (20/05/2025) y ACTA DE REINICIO No. 1 (17/09/2025)
(Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA		
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	61-40-101022174	0	17/09/2025	15/09/2025	31/10/2025	$ 284.700.000,00

Póliza actualizada x ADICIONAL No.1:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO – OTRO SI No. 3 (17/09/2025) (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA		
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	61-44-101055753	7	23/09/2025	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	09/04/2026	$153,301,078.00
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	12/11/2024	09/04/2026	$306,602,156.00
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/11/2024	09/10/2028	$76,650,539.20
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 años, 0 meses y 0 día a partir de la suscripción del acta de recibo de la obra objeto de la Interventoría.		$153,301,078.40

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL – ACTA DE SUSPENSIÓN No.1 (20/05/2025) y ACTA DE REINICIO No. 1 (17/09/2025)
(Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA		
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	61-40-101022174	1	23/09/2025	15/09/2025	31/10/2025	$ 284.700.000,00

Póliza actualizada x Acta de Recibo Final:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO – Recibo Final (31/03/2026) (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA		
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	61-44-101055753	11	06/07/2026	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	09/10/2026	$153,301,078.00
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	12/11/2024	09/10/2026	$306,602,156.00

				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/11/2024	09/10/2028	$76,650,539.20
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 años, 0 meses y 0 día a partir de la suscripción del acta de recibo de la obra objeto de la Interventoría.		$153,301,078.40

5. DESIGNACIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN

- El día 14 de Agosto del 2025, la ingeniera **XIMENA ADELINDA JIMÉNEZ ZÚÑIGA** es designada mediante oficio por el Director del INDERHUILA El doctor **FELIPE VICTORIA BARRAGÁN**, como apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. **CIHCM228 – 2024** cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA", mediante proceso precontractual de selección de concurso de méritos No. 166-2024.
- El día 26 de agosto del 2025, el Ingeniero **LUIS MIGUEL CAQUIMBO GOMEZ** es designado mediante oficio por la Director del INDERHUILA El doctor **FELIPE VICTORIA BARRAGÁN**, como apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. **CIHCM228 – 2024** cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA", mediante proceso precontractual de selección de concurso de méritos No. 166-2024.

6. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO POR EL APOYO A LA SUPERVISION

Dentro de las actividades desarrolladas se tiene las siguientes:

1. El 30 de Setiembre de 2025, el ingeniero Luis Miguel Caquimbo, en calidad de apoyo a la supervisión, mediante oficio IH 2-2025-1190 Envía por el aplicativo EXTRANET Solicitud de avance de obra y convocatoria a Comité Técnico de Obra, correspondiente al Contrato de Obra Pública No. 221 de 2024 a la firma interventora Construmac Ingenieros S.A.S., representada por la ingeniera Daniela Carrillo Tavera. Y al contratista V&M ingeniería SAS, representada por el ingeniero Yerson Camacho.

2. Durante la ejecución del contrato de obra, el ingeniero Luis Miguel Caquimbo, en calidad de apoyo a la supervisión, realizó seguimiento al desarrollo de las actividades mediante visitas a la obra y revisión de la información presentada por la interventoría. En dichas visitas se pudo verificar de manera general el avance y estado de las actividades ejecutadas, las cuales fueron revisadas y avaladas por la interventoría, en cumplimiento de sus funciones de seguimiento y control técnico al contrato de obra.

   Una vez finalizadas las actividades previstas, se realizó una verificación general del estado de la obra, observando en campo las actividades ejecutadas y su correspondencia con lo reportado por la interventoría. Lo anterior, teniendo en cuenta que la interventoría realizó la respectiva verificación y aval de las actividades ejecutadas.

De igual manera, se realizó la entrega de la obra al Municipio mediante el Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción, suscrita por el contratista, el Director del INDERHUILA y el Alcalde Municipal, dejando constancia de la terminación y recibo de las obras ejecutadas. El Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción se encuentra incorporada en el expediente contractual como soporte de la entrega realizada.

7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo relacionado en el presente informe se han ejecutados las siguientes actividades:

4. PLACA CANCHA

4.2 Marco para microfutbol futbol 8 6mX2m, en tubo galvanizado tipo pesado de 4", según especificaciones técnicas, incluye anclaje, malla e instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
4.5. suministro e instalación de bordillos prefabricados 20x50x50

5. CERRAMIENTO

5.8 Suministro e instalación de puertas en tubería 2" galvanizada cal 2mm con malla eslabonada cal 10 y con portacandado, incluye pasador porta candado.
5.9 Concreto 3000 psi andenes perimetrales e=8 cm, incluye malla electrosoldada y formaleta.

6. ILUMINACION

6.3 Suministro e instalación de Acometida en CABLE CU AISL THHN/THWN – 2x8F + 1z10T en tubería PVC1".
6.4Salida Parcial Eléctrica (2 THHN No. 10 + 1 THHN No. 12).
6.5 suministro e instalación de postes de concreto pretensado L= 12 m 750 kg incluye transporte e hizada.
6.7 Murete para tablero de control en muro con bloque # 5
6.8 Construcción de cajas de inspección tipo alumbrado en concreto de 30X30
6.9 Cajas de inspección de 60X60 CM (medida interior)
6.10 Suministro e instalación de sistema de apantallamiento.

7. ITEMS NO PREVISTOS

NP 01 suministro, montaje y conexión de Proyectos led 300 W, flujo luminoso 50100 lm incluye soporte
NP 02 Suministro e instalación de Tablero de control de alumbrado con caja con protección según circuitos con contactores y botonera ON – OF.
NP 03 Suministro e instalación de Acometida 1 No. 2 X fase + 1 No. 2 x Neutro + 1 No. 8 x tierra.
NP 04 Ducto de ¾" IMC para bajante de conexión eléctrica.
NP 05 Actividades profesionales y documentales propias del constructor con objeto de trámite de certificación RETIE y RETILAP (levantamiento, elaboración de planos y entrega de formatos).

8. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSI No. 03		ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 2		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 13,460,304.00**		**$ 13,460,304.00**		**$ 15,391,200.00**		**$ 1,930,896.00**		**$ 0.00**		**$ 15,391,200.00**
1.1	Localizacion y replanteo manual	m²	1,924.00	$ 2,226.00	$ 4,282,824.00	1924	$ 4,282,824.00	2200.00	$ 4,897,200.00	276.00	$ 614,376.00	0.00	$ 0.00	$ 2,200.00	$ 4,897,200.00
1.2	Descapote e=0,20m a maquina incluye retiro material	m²	1,924.00	$ 4,770.00	$ 9,177,480.00	1924	$ 9,177,480.00	2200.00	$ 10,494,000.00	276.00	$ 1,316,520.00	0.00	$ 0.00	$ 2,200.00	$ 10,494,000.00
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				**$ 84,830,852.00**		**$ 84,830,852.00**		**$ 106,660,384.00**		**$ 21,829,532.00**		**$ 0.00**		**$ 106,660,384.00**
2.1	Excavacion manual incluye retiro	m³	119.94	$ 31,545.00	$ 3,783,507.00	119.94	$ 3,783,507.00	295.67	$ 9,326,910.00	175.73	$ 5,543,403.00	0.00	$ 0.00	$ 295.67	$ 9,326,910.00
2.2	Excavacion mecanica incluye retiro 1 Km	m³	384.80	$ 19,798.00	$ 7,616,346.00	384.8	$ 7,616,346.00	420.03	$ 8,313,654.00	35.23	$ 697,308.00	0.00	$ 0.00	$ 420.03	$ 8,313,654.00
2.3	Rellenos con recebo compactado mecanicamente	m³	384.80	$ 190,629.00	$ 73,430,999.00	384.8	$ 73,430,999.00	466.49	$ 89,019,820.00	81.69	$ 15,588,821.00	0.00	$ 0.00	$ 466.49	$ 89,019,820.00
3	**RED DE AGUAS LLUVIAS**				**$ 38,483,328.00**		**$ 31,568,417.00**		**$ 44,628,666.00**		**$ 13,060,249.00**		**$ 0.00**		**$ 44,628,666.00**
3.1	Construcción de cuneta perimetral en concreto 3000 PSI; Dimensiones: 40 cm de ancho y altura variable. Incluye rejilla prefabricada en poliuretano	ml	104.00	$ 137,429.00	$ 14,292,512.00	100.54	$ 13,817,011.00	100.54	$ 13,817,011.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ 100.54	$ 13,817,011.00
3.2	Caja inspeccion 1,0x 1,0 m medida interna en concreto 3000 psi para empalme sistema de drenaje, incluye tapa con marco y cañuela, altura variable	und	4.00	$ 657,029.00	$ 2,628,116.00	0	$ 0.00	2.00	$ 1,314,058.00	2.00	$ 1,314,058.00	0.00	$ 0.00	$ 2.00	$ 1,314,058.00

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSI No. 03		ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 2		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL
3.3	Red de aguas lluvias suministro e instalación de tubería pvc Ø 8" Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama con arena 15 cms y relleno material de la excavacion a zanjon	ml	30.00	79,488.00	$ 2,384,640.00	0	$ 0.00	120.29	$ 9,561,612.00	120.29	$ 9,561,612.00	0.00	$ 0.00	$ 120.29	$ 9,561,612.00
3.4	Construccion de filtros laterales externos en un ancho de 0.40 m, con altura variable menor a 0.50 m, recubrimiento en geotextil no tejido NT-1600, con gravilla comun o triturado de 1 1/2" a 4" + Tuberia pvc drenajes de 6"	ml	178.00	$ 99,727.00	$ 17,751,406.00	178	$ 17,751,406.00	185.60	$ 18,509,331.00	7.60	$ 757,925.00	0.00	$ 0.00	$ 185.60	$ 18,509,331.00
3.5	Caja inspeccion 1.2x 1.2 m medida interna en concreto 3000 psi para empalme sistema de drenaje, incluye tapa con marco y cañuela, altura variable	und	2.00	$ 713,327.00	$ 1,426,654.00	0	$ 0.00	2.00	$ 1,426,654.00	2.00	$ 1,426,654.00	0.00	$ 0.00	$ 2.00	$ 1,426,654.00
4	PLACA CANCHA				$ 741,397,052.00		$ 616,568,271.00		$ 744,440,432.00		$ 120,455,811.00		$ 7,410,227.00		$ 744,434,309.00
4.1	Placa de piso en concreto 3000 psi, e =0,07m dilatada, junta machimbreada incluye malla electrosoldada de 5mm.	m^2	1,750.00	87,325.00	$ 152,818,750.00	1460.55	$ 127,542,529.00	1750.00	$ 152,818,750.00	289.45	$ 25,276,221.00	0.00	$ 0.00	$ 1,750.00	$ 152,818,750.00
4.2	Marco para microfutbol futbol 8 6mX2m, en	und	2.00	$ 2,344,832.00	$ 4,689,664.00	0	$ 0.00	2.00	$ 4,689,664.00	-	$ 0.00	2.00	$ 4,689,664.00	$ 2.00	$ 4,689,664.00

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSI No. 03		ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 2		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL
	tubo galvanizado tipo pesado de 4", según especificaciones tecnicas, incluye anclaje, malla e instalacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.														
4.3	Suministro e instalación de césped monofilamentado rafia de 50mm de altura, con proteccion de rayos UV, con 1300 gramos por metro cuadrado de rafia, de 13200 dtx, base: backing doble capa, demarcacion de color blanco con cesped de blanco de fabrica, incluye granulo de caucho, pegamento importado.	m^2	1,750.00	181,076.00	$ 316,883,000.00	1460.55	$ 264,470,552.00	1750.00	$ 316,883,000.00	289.45	$ 52,412,448.00	0.00	$ 0.00	$ 1,750.00	$ 316,883,000.00
4.4	Suministro e instalacion de almohadilla de choque shock pad 20 mm	m^2	1,750.00	$ 146,659.00	$ 256,653,250.00	1460.55	$ 214,202,802.00	1750.00	$ 256,653,250.00	289.45	$ 42,450,448.00	0.00	$ 0.00	$ 1,750.00	$ 256,653,250.00
4.5	Suministro e instalacion de bordillos prefabricado 20X50X50	ml	186.00	$ 55,658.00	$ 10,352,388.00	186.00	$ 10,352,388.00	240.68	$ 13,395,768.00	5.69	$ 316,694.00	48.88	$ 2,720,563.00	$ 240.57	$ 13,389,645.00
5	**CERRAMIENTO**				**$ 231,083,695.00**		**$ 186,603,068.00**		**$ 211,058,905.00**		**$ 13,459,026.00**		**$ 10,996,811.00**		**$ 211,058,905.00**
5.1	Concreto ciclopeo 2500 psi (60% concreto-40% piedra media zonga)para	m^3	16.74	$ 376,028.00	$ 6,294,709.00	15.52	$ 5,835,955.00	15.52	$ 5,835,955.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ 15.52	$ 5,835,955.00

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSI No. 03		ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 2		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL
	cimentacion cerramiento														
5.2	Concreto 3000 psi viga de cimentacion cerramiento 0.2x0,2m	m^3	37.40	$ 659,191.00	$ 24,653,743.00	12.41	$ 8,180,560.00	12.41	$ 8,180,560.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ 12.41	$ 8,180,560.00
5.3	Muro cerramiento en ladrillo semiprensado a la vista	m^2	112.50	$ 105,765.00	$ 11,898,563.00	93.28	$ 9,865,759.00	93.28	$ 9,865,759.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ 93.28	$ 9,865,759.00
5.4	Acero de refuerzo 37000 psi incluye figurado e instalacion	kg	1,057.11	$ 6,647.00	$ 7,026,597.00	1041.24	$ 6,921,122.00	1259.32	$ 8,370,700.00	218.08	$ 1,449,578.00	0.00	$ 0.00	$ 1,259.32	$ 8,370,700.00
5.5	Tuberia galvanizada 2" cal 2mm incluye anclajes, tapa	ml	220.40	$ 44,432.00	$ 9,792,813.00	220.4	$ 9,792,813.00	316.20	$ 14,049,398.00	95.80	$ 4,256,585.00	0.00	$ 0.00	$ 316.20	$ 14,049,398.00
5.6	Modulos cerramiento 2,5x2,5 m en angulo 1 1/2"x1/8 con varilla de 5/8" lisa cada 14 cms, diagonales en angulo 1 1/2" x 1/8 y lamina cal 16 10X10 cms de refuerzo en la esquinas (lado norte y sur)h=2,5m	m^2	200.00	$ 109,070.00	$ 21,814,000.00	196.27	$ 21,407,169.00	196.27	$ 21,407,169.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ 196.27	$ 21,407,169.00
5.7	Modulos cerramiento 2,5x2,5 m en angulo 1 1/2"x1/8 con malla eslabonada cal 10 hueco 2 1/4"x2 1/4", diagonales en angulo 1 1/2" x1/8 y lamina cal 16 10X10cm de refuerzo en la esquinas (lado oriente y	m^2	268.75	$ 54,091.00	$ 14,536,956.00	265.92	$ 14,383,879.00	409.25	$ 22,136,742.00	143.33	$ 7,752,863.00	0.00	$ 0.00	$ 409.25	$ 22,136,742.00

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSI No. 03		ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 2		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL
	occidente) h=2,5m														
5.8	Suministro e instalacion de puerta en tuberia 2" galvanizada cal 2mm con malla eslabonada cal 10 y con portacandado, incluye pasador porta candado.	und	1.00	$ 802,805.00	$ 802,805.00	0	$ 0.00	2.00	$ 1,605,610.00	-	$ 0.00	2.00	$ 1,605,610.00	$ 2.00	$ 1,605,610.00
5.9	Concreto 3000 psi andenes perimentrales e=8cm, incluye malla electrosoldada y formaleta	m²	148.80	$ 80,868.00	$ 12,033,158.00	147.19	$ 11,902,961.00	263.32	$ 21,294,162.00	-	$ 0.00	116.13	$ 9,391,201.00	$ 263.32	$ 21,294,162.00
5.10	Suministro e instalacion de malla de cerramiento en nylon 100% alta densidad con proteccion UV, ojo 13x13, calibre #4 incluye; guaya, tensores y tubo de 2"	m²	3,031.00	$ 37,545.00	$ 113,798,895.00	2408	$ 90,408,360.00	2408.00	$ 90,408,360.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ 2,408.00	$ 90,408,360.00
5.11	Pie de amigo en tuberia galvanizada 2" cal 2mm incluye anclajes, concreto 3000 psi 50x50x60 costados norte y sur	und	32.00	$ 263,483.00	$ 8,431,456.00	30	$ 7,904,490.00	30.00	$ 7,904,490.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ 30.00	$ 7,904,490.00
6	ILUMINACÓN				$ 53,175,912.00		$ 0.00		$ 46,928,164.00		$ 0.00		$ 46,928,164.00		$ 46,928,164.00

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSI No. 03		ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 2		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL
6.1	Suministro, montaje y conexión de Proyector led 300 W SYLFLOOD, temperatura de color 5000K, vida útil 100000h, flujo luminoso 39000 lm incluye soporte	und	6.00	$ 1,718,814.00	$ 10,312,884.00	0	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ -	$ 0.00
6.2	Suministro e Instalacion de Tablero de 6 Circuitos con puerta incluye 3 breaker de 30 amp con normativa RETIE	und	1.00	$ 511,864.00	$ 511,864.00	0	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ -	$ 0.00
6.3	Suministro e Instalación de Acometida en CABLE CU AISL THHN/THWN - 2x8F+1x10T en tuberia PVC 1"	ml	50.00	$ 45,333.00	$ 2,266,650.00	0	$ 0.00	153.00	$ 6,935,949.00	-	$ 0.00	153.00	$ 6,935,949.00	$ 153.00	$ 6,935,949.00
6.4	Salida Parcial Electrica (2 THHN No.10 + 1 THHN No.12)	ml	50.00	$ 42,110.00	$ 2,105,500.00	0	$ 0.00	84.00	$ 3,537,240.00	-	$ 0.00	84.00	$ 3,537,240.00	$ 84.00	$ 3,537,240.00
6.5	Suministro e instalacion de postes de concreto pretensado L= 12 m 750 kg incluye transporte e hizada	und	6.00	$ 2,884,636.00	$ 17,307,816.00	0	$ 0.00	6.00	$ 17,307,816.00	-	$ 0.00	6.00	$ 17,307,816.00	$ 6.00	$ 17,307,816.00
6.6	Puesta a tierra en varilla coper weld cobre de 1/2" incluye conectores, cableado, soldadura y mejoramiento de tierra	und	1.00	$ 513,186.00	$ 513,186.00	0	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ -	$ 0.00

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSI No. 03		ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 2		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL
6.7	Murete para tablero de control en muro con bloque # 5	und	1.00	$ 377,230.00	$ 377,230.00	0	$ 0.00	1.00	$ 377,230.00	-	$ 0.00	1.00	$ 377,230.00	$ 1.00	$ 377,230.00
6.8	Construcción de cajas de inspección tipo alumbrado en concreto de 30x30	und	6.00	$ 266,806.00	$ 1,600,836.00	0	$ 0.00	6.00	$ 1,600,836.00	-	$ 0.00	6.00	$ 1,600,836.00	$ 6.00	$ 1,600,836.00
6.9	Cajas de inspeccion de 60X60 CM (medida interior)	und	8.00	$ 336,951.00	$ 2,695,608.00	0	$ 0.00	5.00	$ 1,684,755.00	-	$ 0.00	5.00	$ 1,684,755.00	$ 5.00	$ 1,684,755.00
6.10	Suministro e Instalación de sistema de apantallamiento	und	1.00	$ 15,484,338.00	$ 15,484,338.00	0	$ 0.00	1.00	$ 15,484,338.00	-	$ 0.00	1.00	$ 15,484,338.00	$ 1.00	$ 15,484,338.00
7	**ITEMS NO PREVISTOS**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 49,208,876.00**		**$ 0.00**		**$ 49,208,876.00**		**$ 49,208,876.00**
NP 01	Suministro, montaje y conexión de Proyector led 300 W, flujo luminoso 50100 lm incluye soporte	und	0.00	$ 2,212,693.95	$ 0.00	0	$ 0.00	8.00	$ 17,701,552.00	-	$ 0.00	8.00	$ 17,701,552.00	$ 8.00	$ 17,701,552.00
NP 02	Suministro e Instalacion de Tablero de control de alumbrado con caja con protecciones según circuitos con contactores y botonera ON-OF	und	0.00	$ 3,725,611.53	$ 0.00	0	$ 0.00	1.00	$ 3,725,612.00	-	$ 0.00	1.00	$ 3,725,612.00	$ 1.00	$ 3,725,612.00
NP 03	Suministro e Instalación de Acometida 1 No 2Xfase + 1 No2xNeutro + 1No8xtierra	ml	0.00	$ 131,557.19	$ 0.00	0	$ 0.00	159.00	$ 20,917,593.00	-	$ 0.00	159.00	$ 20,917,593.00	$ 159.00	$ 20,917,593.00
NP 04	Ducto de 3/4" IMC para bajante de conexión electrica	ml	0.00	$ 48,355.19	$ 0.00	0	$ 0.00	72.00	$ 3,481,574.00	-	$ 0.00	72.00	$ 3,481,574.00	$ 72.00	$ 3,481,574.00


CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSI No. 03		ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 2		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL
NP 05	Actividades profesionales y documentales propias del contructor con objeto de tramite de Certificacion RETIE Y RETILAP (Levantamiento, elaboracion de planos y entrega de formatos)	und	0.00	$ 3,382,545.00	$ 0.00	0	$ 0.00	1.00	$ 3,382,545.00	-	$ 0.00	1.00	$ 3,382,545.00	$ 1.00	$ 3,382,545.00

	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 1,162,431,143.00		$ 933,030,912.00		$ 1,218,316,627.00		$ 170,735,514.00		$ 114,544,078.00		$ 1,218,310,504.00
	Administración	20%			$ 232,486,229.00		$ 186,606,182.00		$ 243,663,325.00		$ 34,147,103.00		$ 22,908,816.00		$ 243,662,101.00
	Imprevistos	1%			$ 11,624,311.00		$ 9,330,309.00		$ 12,183,166.00		$ 1,707,355.00		$ 1,145,441.00		$ 12,183,105.00
	Utilidad	4%			$ 46,497,246.00		$ 37,321,236.00		$ 48,732,665.00		$ 6,829,421.00		$ 4,581,763.00		$ 48,732,420.00
	Tramite de inspección y certificacion RETIE Y RETILAP								$ 10,115,000.00				$ 10,115,000.00		$ 10,115,000.00
	TOTAL COSTO				$ 1,453,038,929.00		$ 1,166,288,639.00		$ 1,533,010,783.00		$ 213,419,393.00		$ 153,295,098.00		$ 1,533,003,130.00
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	20%					$ 233,257,727.80				$ 42,683,878.60		$ 14,666,179.40		$ 290,607,785.80
	VALOR TOTAL MENOS (-) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO						$ 933,030,911.20				$ 170,735,514.40		$ 138,628,918.60		$ 1,242,395,344.20
	% AVANCE DE OBRA						76.0783062932963%				13.9215845946206%		9.99960989837343%		99.9995007862903%

9. ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO

9.1. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO POR EL APOYO A LA SUPERVISION

1. Oficio IH 2-2025-1190, enviado por el aplicativo EXTRANET mediante el cual se remite la Solicitud de avance de obra y convocatoria a Comité Técnico de Obra, correspondiente al Contrato de Obra Pública No. 221 de 2024 a la firma interventora Construmac Ingenieros S.A.S. y al contratista V&M ingeniería SAS, representada por el ingeniero Yerson Camacho.

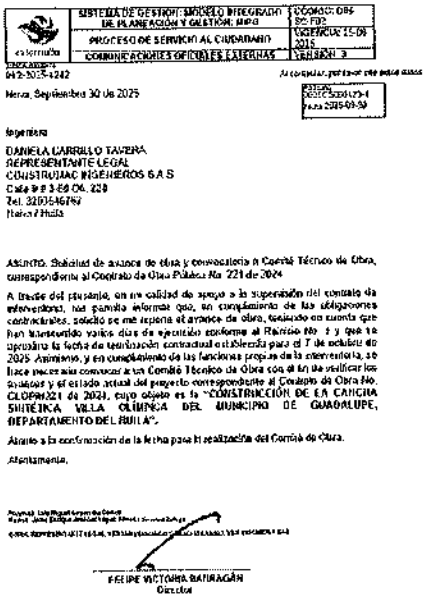

	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN: MIPG	CÓDIGO: GRS SC-F02
	PROCESO DE SERVICIO AL CIUDADANO	VIGENCIA: 15-09 2015
	COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS	VERSIÓN: 3

RADICADO
IH 2-2025-1242

Al contestar, por favor cite estos datos

Neiva, Septiembre 30 de 2025

FOLIOS
Folio 1 2025-09-30
Folio 2 2025-09-30

Señores

DANIELA CARRILLO TAVERA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S
Calle 9 # 3-66 Of. 220
Tel. 3205346762
Neiva / Huila

ASUNTO: Solicitud de avance de obra y convocatoria a Comité Técnico de Obra, correspondiente al Contrato de Obra Pública No. 221 de 2024

A través del presente, en mi calidad de apoyo a la supervisión del contrato de interventoría, me permito informar que, en cumplimiento de las obligaciones contractuales, solicito se me reporte el avance de obra, teniendo en cuenta que han transcurrido varios días de ejecución conforme al Rubro No. 1 y que la apertura la fecha de terminación contractual establecida para el 7 de octubre de 2025. Asimismo, y en cumplimiento de las funciones propias de la interventoría, se hace necesario convocar a un Comité Técnico de Obra con el fin de verificar las novedades y el estado actual del proyecto correspondiente al Contrato de Obra No. CLOPM221 de 2021, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, DEPARTAMENTO DEL HUILA".


Atento a la confirmación de la fecha para la realización del Comité de Obra.


Atentamente,

Proyectó: Luis Miguel Lozano De Gracia
Revisó: Jaime Enrique Andrade Vargas
Aprobó: Felipe Victoria Baturagá


FELIPE VICTORIA BATURAGÁ
Director


9.2. REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DE OBRA

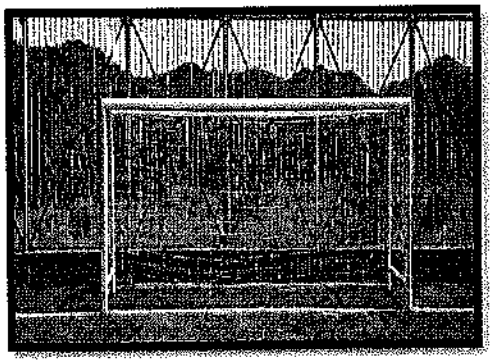

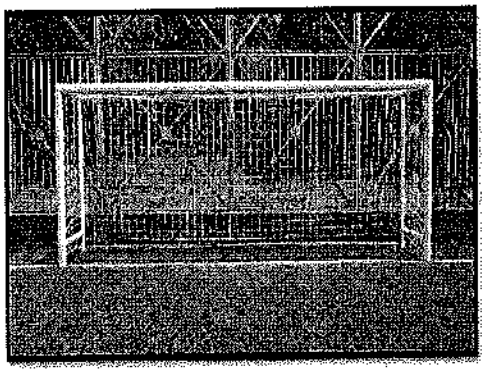



4.2 Marco para microfutbol futbol 8 6mX2m, en tubo galvanizado tipo pesado de 4", según especificaciones técnicas, incluye anclaje, malla e instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

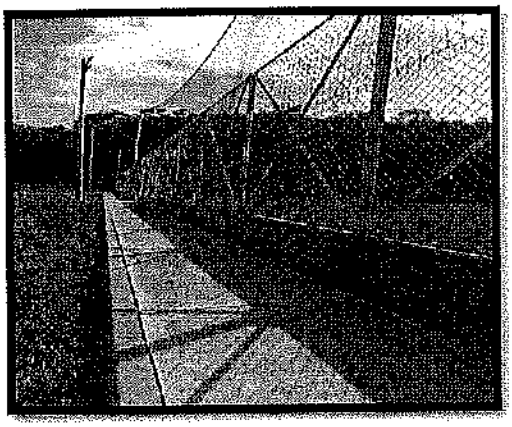

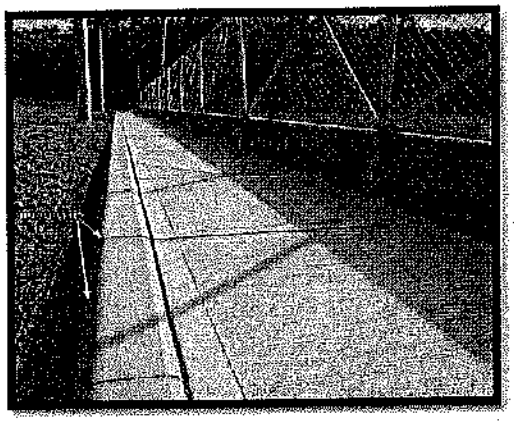

4.5. suministro e instalación de bordillos prefabricados 20x50x50

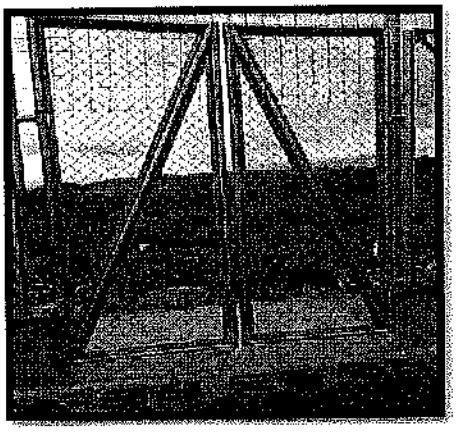

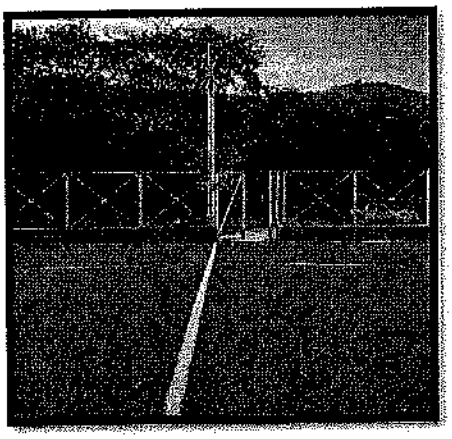

5.8 Suministro e instalación de puertas en tubería 2" galvanizada cal 2mm con malla eslabonada cal 10 y con portacandado, incluye pasador porta candado.





5.9 Concreto 3000 psi andenes perimetrales e=8 cm, incluye malla electrosoldada y formaleta.





6.3 Suministro e instalación de Acometida en CABLE CU AISL THHN/THWN – 2x8F + 1z10T en tubería PVC1".





6.4Salida Parcial Eléctrica (2 THHN No. 10 + 1 THHN No. 12).

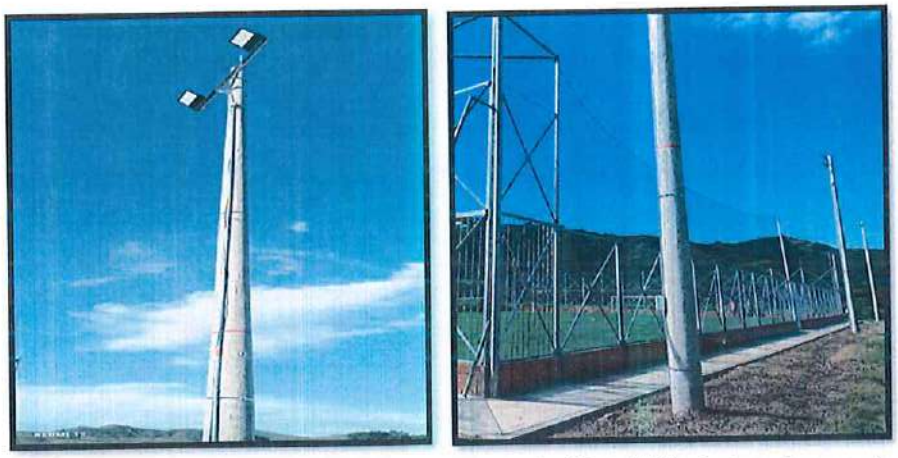

6.5 suministro e instalación de postes de concreto pretensado L= 12 m 750 kg incluye transporte e hizada.

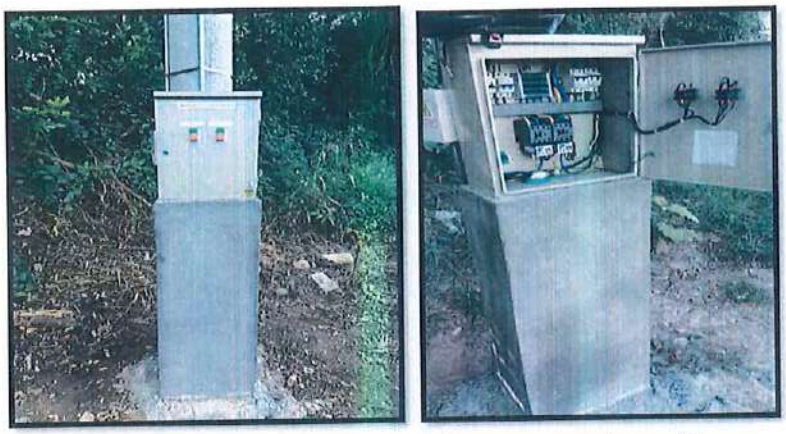

6.7 Murete para tablero de control en muro con bloque # 5

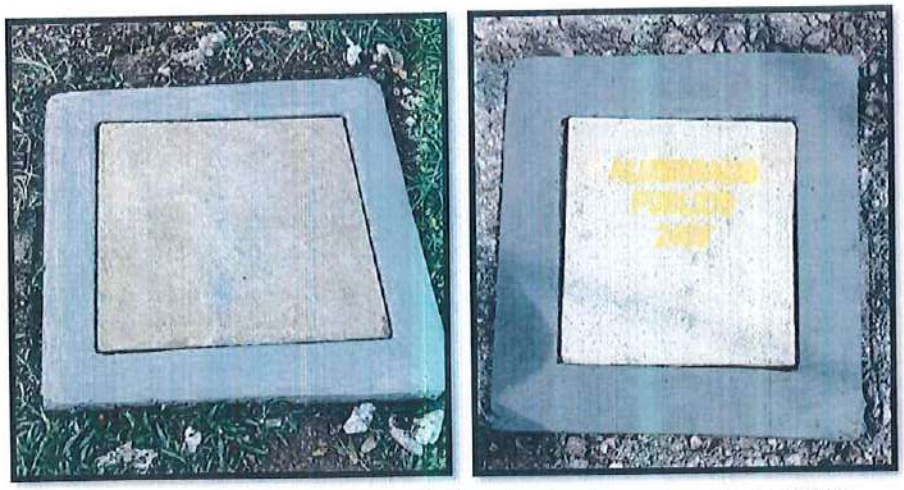

6.8 Construcción de cajas de inspección tipo alumbrado en concreto de 30X30




6.9 Cajas de inspección de 60X60 CM (medida interior)



6.10 Suministro e instalación de sistema de apantallamiento.



NP 01 suministro, montaje y conexión de Proyectos led 300 W, flujo luminoso 50100 lm incluye soporte

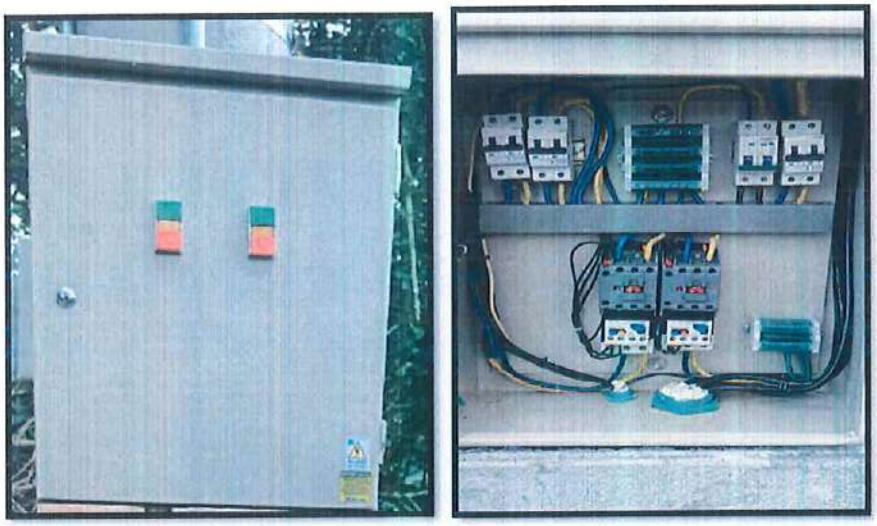

NP 02 Suministro e instalación de Tablero de control de alumbrado con caja con protección según circuitos con contactores y botonera ON – OF.



NP 03 Suministro e instalación de Acometida 1 No. 2 X fase + 1 No. 2 x Neutro + 1 No. 8 x tierra.



NP 04 Ducto de ¾" IMC para bajante de conexión eléctrica.

NP 04 Ducto de ¾" IMC para bajante de conexión eléctrica.



NP 05 Actividades profesionales y documentales propias del constructor con objeto de trámite de certificación RETIE y RETILAP (levantamiento, elaboración de planos y entrega de formatos).

10. AVANCE DE OBRAS Y TRABAJOS

El porcentaje de obra ejecutado a la fecha del presente informe es del 99.9995007862903%.

Ing. LUIS MIGUEL CAQUIMBO GOMEZ
Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría

INFORME FINAL DE OBRA. (FIRMA CONTRATISTA E INTERVENTOR)

CONTRATO DE OBRA No. CLOPIH221 de 2024

INFORME DE OBRA FINAL

PARCIAL [ ] FINAL [X]

Objeto Contrato: "CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"





MUNICIPIO: GUADALUPE

DEPARTAMENTO: HUILA

CONTRATO DE (OBRA) No. CLOPIH221 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y LA FIRMA V&M INGENIERÍA SAS

APOYO A LA SUPERVISIÓN	LUIS MIGUEL CAQUIMBO	ENTIDAD	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	CLOPIH221 DE 2024		
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"	PERIODO DEL INFORME	Entre tres (04) octubre al 06 de octubre de 2025.
CONTRATISTA	V&M INGENIERÍA SAS	NIT:	900.062.688-7
REPRESENTANTE LEGAL:	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO	C.C:	7.713.933

FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO (D/M/A):	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	31 DE ENERO DE 2025 DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL (No.2) (D/M/A):	10 DE ABRIL DE 2025 DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y CONFORME AL ADICIONAL EN TIEMPO MEDIANTE PRORROGA NO.2
ACTA DE SUSPENSIÓN (No.1) (D/M/A):	20 DE MAYO 2025
ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN (No.1) (D/M/A):	19 DE AGOSTO 2025
ACTA DE REINCIO (No.1) (D/M/A):	15 DE SEPTIEMBRE 2025
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No.1	17 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION (D/M/A):	06 DE OCTUBRE 2025
VALOR INICIAL:	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($1.453.038.929,00) MCTE
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($ 79,971,854.00) MCTE
VALOR TOTAL:	MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($1,533,010,783.00) MCTE

INTERVENTOR:	CONSTRUMAC INGENIEROS SAS	NIT:	900.116.571-8

REPRESENTANTE LEGAL:	DANIELA CARRILLO TAVERA	C.C:	1.007.750.886

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto Construcción Cancha Sintética Villa Olímpica del Municipio de Guadalupe, Departamento del Huila, se ubica en el municipio de Guadalupe, - Huila, en la región andina de Colombia.

Esta localidad se encuentra rodeada de paisajes montañosos y ríos, es conocida por su belleza natural y su enorme herencia cultural. La cancha sintética se construirá dentro de las instalaciones del proyecto macro Villa Olímpica, área designada para actividades deportivas y recreativas que beneficiarán a la comunidad local.

MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA, ESPECÍFICAMENTE EN EL KM 3 VÍA MUNICIPIO DE GUADALUPE AL MUNICIPIO DE ALTAMIRA.



Ilustración 1 Localización general del casco urbano del municipio de Guadalupe huila

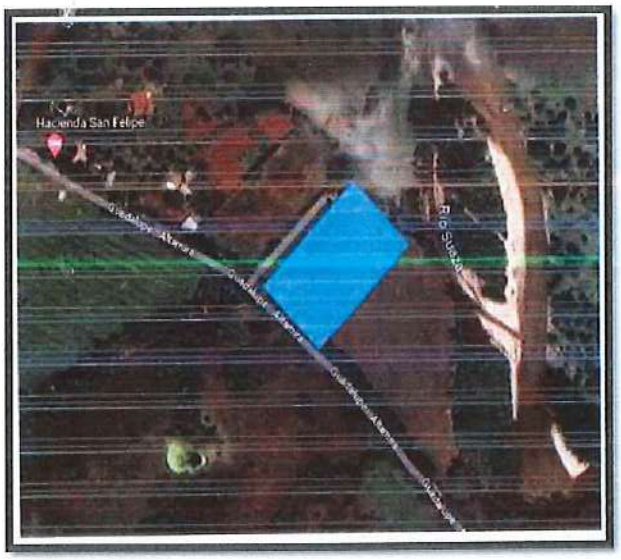


Ilustración 2 Ubicación predio Construcción cancha sintética villa olímpica Km3 vía Guadalupe - Altamira

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tuvo como objeto la construcción de una cancha sintética con un área aproximada de 1750 m², contemplando la ejecución integral de los capítulos e ítems contractuales, desde las actividades preliminares hasta la puesta en funcionamiento del escenario deportivo.

El alcance incluyó la localización y preparación del terreno, movimiento de tierras, construcción del sistema de drenaje de aguas lluvias mediante cunetas, tuberías, cajas de inspección y filtros, así como la conformación de la placa en concreto y la instalación del sistema de césped sintético con su respectiva demarcación y elementos deportivos.

De igual manera, se ejecutaron las obras de cerramiento perimetral, andenes y accesos, junto con la implementación del sistema de iluminación, incluyendo redes eléctricas, postes, luminarias, tablero de control y sistema de apantallamiento, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable. Adicionalmente, se desarrollaron ítems no previstos y actividades complementarias, necesarias para garantizar la funcionalidad, seguridad y correcta operación del escenario.

El proyecto fue ejecutado conforme a las especificaciones técnicas, diseños aprobados y lineamientos contractuales, incorporando procesos de control de calidad, seguimiento técnico y ajustes requeridos durante su desarrollo, en atención a las condiciones reales del terreno y del entorno.

Se deja constancia de que el contrato se encuentra ejecutado a cabalidad, con un cumplimiento del 100% de las actividades programadas, en concordancia con los lineamientos establecidos y bajo altos estándares de calidad, garantizando la entrega de un escenario óptimo para el uso deportivo, recreativo y comunitario.

4. INFORME CONCRETO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DURANTE EL PERIODO

En el marco de la ejecución del contrato CLOPIH221 de 2024, cuyo objeto es la *"Construcción de la cancha sintética Villa Olímpica del municipio de Guadalupe, Huila"*, se desarrollaron comités de seguimiento técnico con participación del Comité de Vigilancia y Control (Veeduría Ciudadana), la Secretaría de Planeación Municipal, la interventoría y el contratista, en cumplimiento de los principios de transparencia, control social y seguimiento a la inversión pública.

La interventoría, a cargo de CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S., junto con el contratista V&M INGENIERÍA S.A.S., presentó informes periódicos de avance, los cuales permitieron verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, las especificaciones técnicas y el avance físico de las actividades ejecutadas.

El Comité de Vigilancia y Control (Veeduría Ciudadana) ejerció sus funciones de seguimiento en el marco de lo establecido en la Ley 850 de 2003, dando cumplimiento a los principios de control social sobre la gestión pública, mediante la verificación del avance de obra, la calidad de los procesos constructivos y la adecuada ejecución de los recursos asignados.

En desarrollo de lo anterior, se efectuó seguimiento a los componentes principales del proyecto, verificando:

- La adecuada ejecución de la red de drenaje de aguas lluvias, incluyendo cuneta perimetral en concreto de 3000 psi, cajas de inspección y filtros laterales, conforme a criterios técnicos de funcionalidad.
- La construcción de la placa en concreto de 3000 psi, en condiciones de resistencia, nivelación y acabado acordes con las especificaciones.
- La instalación del césped sintético, validando cumplimiento de estándares técnicos, uniformidad y correcta instalación.
- La demarcación de la cancha conforme a la normativa deportiva aplicable.
- La ejecución del cerramiento perimetral, en condiciones de seguridad y estabilidad estructural.
- La implementación del sistema de iluminación, verificando su operatividad y cumplimiento de requisitos técnicos.

Durante los comités, la dirección de obra presentó reportes detallados sobre el estado de ejecución, evidenciando el cumplimiento progresivo de las actividades programadas y las acciones adoptadas para asegurar la calidad y eficiencia del proceso constructivo.

En consecuencia, la participación del Comité de Vigilancia y Control contribuyó al fortalecimiento del control social, la trazabilidad del proceso contractual y la toma de decisiones oportunas, contribuyendo al cumplimiento del objeto contractual bajo criterios de calidad, eficiencia y transparencia.

5. HISTORIA CRONOLÓGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa)
FECHA DE INICIO	12/11/2024			
OTROSÍ No.1 – PRORROGA	31/01/2025			
OTROSÍ No.2 - PRORROGA	10/04/2025			
SUSPENSIÓN No.1	20/05/2025	188		
PRORROGA SUSPENSION No.1	19/08/2025			
REINICIACIÓN No.1	15/09/2025		116	06/10/2025
BALANCE DE OBRA No. – MAYORES Y MENORES CANTIDADES	17/09/2025			
TERMINACIÓN CTO.	06/10/2025	22		
TOTAL DIAS		210	116	

6. ACTAS

Tipo de Acta	No.	Fecha
Acta De Inicio	1	12 de noviembre de 2024
Acta De Justificación No. 1 – Prórroga	2	31 de enero de 2025
Otrosí modificatorio No. 01 – Prórroga	3	31 de enero de 2025
Acta De Justificación No. 2 – Prórroga	4	10 de abril de 2025
Otrosí modificatorio No. 02	5	10 de abril de 2025
Acta De Justificación No. 3 Para La Suspensión No.1	6	20 de mayo de 2025
Acta De Suspensión No. 1	7	20 de mayo de 2025
Acta de prórroga No. 1 al acta de Suspensión No. 01	8	19 de junio de 2025
Acta De Prórroga No. 2 Al Acta De Suspensión No.1	9	19 de agosto de 2025
Acta de justificación No. 4 para el Reinicio No. 1	10	15 de septiembre de 2025
Acta De Reinicio No. 1	11	15 de septiembre de 2025

Acta de justificación No. 05 mayores y menores cantidades de obra, creación de nuevos ítems y adición.	12	17 de septiembre de 2025
Otrosí Modificatorio No. 03 – Adición	13	17 de septiembre de 2025
Acta de terminación	14	06 de octubre de 2025
Acta de liquidación	15	06 de octubre de 2025

7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

a). **Actividades administrativas**	Durante el periodo comprendido entre el 03 de octubre de 2025 y el 06 de octubre de 2025, correspondiente a la etapa final de ejecución del contrato, se desarrollaron las actividades administrativas orientadas al cierre técnico, financiero y documental del proyecto, garantizando el cumplimiento de los requisitos contractuales y la entrega formal del escenario deportivo ejecutado. **Gestión documental:** Actividades orientadas a la consolidación, organización y cierre de la información técnica, administrativa y contractual del proyecto, en el marco del proceso de liquidación. ➢ Registro y actualización final de la bitácora de obra, consolidando las actividades ejecutadas durante el cierre contractual. ➢ Organización revisión y compilación de soportes técnicos, administrativos y contractuales requeridos para el proceso de liquidación del contrato. ➢ Elaboración y trámite de documentos de cierre, incluyendo actas de terminación, actas de entrega y actas finales de obra. ➢ Gestión documental correspondiente al cierre de comités de veeduría y socialización de la culminación del proyecto ante las partes interesadas. ➢ Consolidación de informes finales de avance y archivo fotográfico definitivo del proyecto. ➢ Atención y respuesta a los requerimientos de la interventoría y supervisión, mediante la presentación de oficios y soportes técnicos. ➢ Entrega formal del escenario deportivo, conforme a los lineamientos establecidos por la entidad contratante. **Control financiero y presupuestal:** Actividades orientadas al seguimiento, verificación y cierre de la información financiera del contrato: ➢ Seguimiento y control financiero de las actividades ejecutadas durante la etapa final. ➢ Revisión y conciliación de cantidades de obra ejecutadas frente a las cantidades contratadas. ➢ Consolidación del balance financiero final, incluyendo mayores, menores e ítems no previstos debidamente aprobados. ➢ Preparación y presentación de la información presupuestal requerida para el proceso de liquidación contractual. **Gestión laboral y de seguridad social:**

	Actividades desarrolladas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales y legales del personal vinculado al proyecto. ➢ Cumplimiento de las obligaciones laborales del personal vinculado al proyecto durante el periodo final de ejecución. ➢ Revisión y cierre de aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal contratado conforme a la normatividad vigente. ➢ Gestión de pagos finales de salarios, prestaciones sociales y demás obligaciones para el cierre contractual. ➢ Cierre administrativo del personal y finalización de compromisos laborales derivados de la ejecución del contrato. Finalmente, el contratista, con el acompañamiento técnico de la interventoría y la entidad contratante INDER HUILA, adelantó las gestiones necesarias para la culminación del proyecto y la entrega formal del escenario deportivo, desarrollando las verificaciones finales correspondientes. Lo anterior permitió dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y alcanzar el recibo a satisfacción de las obras ejecutadas, en el marco del proceso de cierre y liquidación del contrato.
b.) **Actividades operativas**	Durante el último periodo de ejecución del contrato, el contratista desarrolló las actividades operativas orientadas a la culminación total de las obras, la verificación final de los frentes ejecutados y la consolidación de las cantidades de obra para efectos del proceso de liquidación contractual. En esta etapa se priorizó la finalización de actividades pendientes, la atención de observaciones realizadas por la interventoría y la validación de las condiciones de funcionamiento del escenario deportivo, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los estándares de calidad establecidos. En desarrollo de lo anterior, se ejecutaron y consolidaron las siguientes actividades, las cuales hacen parte del acta final de obra: **4. PLACA CANCHA** Se ejecutaron las actividades necesarias para la conformación de la superficie de juego, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones de funcionalidad requeridas. ➢ 4.2. Marco para microfutbol futbol 8 6mX2m, en tubo galvanizado tipo pesado de 4", según especificaciones técnicas, incluye anclaje, malla e instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. ➢ 4.5 Suministro e instalación de bordillos prefabricado 20X50X50 **5. CERRAMIENTO** Se ejecutaron actividades orientadas a la terminación y funcionalidad del cerramiento perimetral. ➢ 5.8. Suministro e instalación de puerta en tubería 2" galvanizada cal 2mm con malla eslabonada cal 10 y con portacandado, incluye pasador porta candado.

- 5.9. Concreto 3000 psi andenes perimetrales e=8cm, incluye malla electrosoldada y formaleta.

6. ILUMINACÓN

Se consolidó la ejecución del sistema eléctrico del proyecto, garantizando su operatividad.

- 6.3. Suministro e Instalación de Acometida en CABLE CU AISL THHN/THWN - 2x8F+1x10T en tubería PVC 1"
- 6.4 Salida Parcial Eléctrica (2 THHN No.10 + 1 THHN No.12)
- 6.5. Suministro e instalación de postes de concreto pretensado L= 12 m 750 kg incluye transporte e hizada
- 6.7. Murete para tablero de control en muro con bloque # 5
- 6.8. Construcción de cajas de inspección tipo alumbrado en concreto de 30x30
- 6.9. Cajas de inspección de 60X60 CM (medida interior)
- 6.10. Suministro e Instalación de sistema de apantallamiento.

7. ITEMS NO PREVISTOS

Se ejecutaron actividades adicionales necesarias para asegurar la correcta funcionalidad del sistema eléctrico y el cumplimiento normativo.

- NP. 01 – Suministro, montaje y conexión de Proyector led 300 W, flujo luminoso 50100 lm incluye soporte
- NP. 02 - Suministro e Instalación de Tablero de control de alumbrado con caja con protecciones según circuitos con contactores y botonera ON-OF
- NP. 03 - Suministro e Instalación de Acometida 1 No 2Xfase + 1 No2xNeutro + 1No8xtierra NP.04 - Ducto de 3/4" IMC para bajante de conexión eléctrica
- NP.05 - Actividades profesionales y documentales propias del constructor con objeto de trámite de Certificación RETIE Y RETILAP (Levantamiento, elaboración de planos y entrega de formatos).

Estas actividades fueron ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas del contrato y cuentan con los respectivos soportes de verificación, control de calidad y validación por parte de la interventoría.

Con base en las actividades operativas desarrolladas durante el último periodo de ejecución, se concluye que el contratista culminó la totalidad de las obras conforme a las especificaciones técnicas, garantizando su funcionalidad y condiciones de calidad.

En esta etapa final se realizó la verificación de las actividades ejecutadas, la atención de observaciones y la validación de las condiciones de funcionamiento del escenario deportivo, en articulación con la interventoría, permitiendo su entrega para recibo a satisfacción.

Para efectos de la liquidación del contrato, se deja constancia de que las actividades correspondientes a los capítulos 4. Placa Cancha, 5. Cerramiento, 6. Iluminación y 7. Ítems No Previstos fueron ejecutadas en su totalidad, cuentan con los respectivos soportes técnicos y han sido verificadas para su inclusión en el acta final de obra.

	En consecuencia, el proyecto se encuentra en condiciones óptimas de funcionamiento, operatividad y seguridad, conforme a su destinación, certificando la ejecución del cien por ciento (100%) del contrato y su estado para el proceso de cierre y liquidación contractual.

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO DURANTE EL PERIODO

Condiciones climáticas durante la ejecución del proyecto:

Durante la ejecución del contrato se presentó un periodo crítico caracterizado por condiciones climáticas adversas, asociadas a precipitaciones intensas y persistentes en el municipio de Guadalupe, Huila, las cuales generaron afectaciones en el normal desarrollo de algunas actividades constructivas, especialmente en frentes relacionados con movimiento de tierras y adecuación del terreno. Esta situación requirió la implementación de medidas de mitigación y ajustes en la programación de obra.

Mes de octubre de 2025 – Condiciones climáticas favorables:

Una vez superadas las condiciones adversas, durante el periodo reportado correspondiente al mes de octubre de 2025, se registraron condiciones climáticas favorables, caracterizadas por la disminución de las precipitaciones y la estabilidad del terreno en las áreas de intervención.

Estas condiciones permitieron el desarrollo continuo de las actividades, facilitando la culminación de los frentes de obra, el cumplimiento de los estándares de calidad y el avance conforme a la programación ajustada, en el marco del cierre y liquidación del contrato.

Como soporte, se anexan los reportes oficiales emitidos por el IDEAM, los cuales evidencian el comportamiento climático presentado durante el periodo.

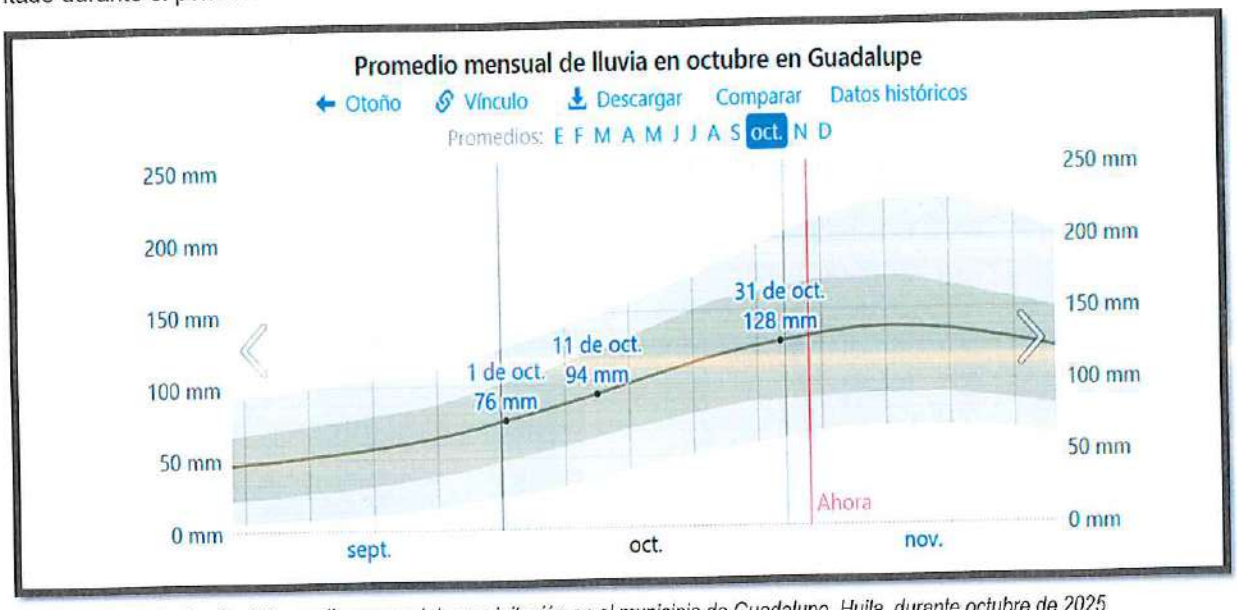


Ilustración 3 Promedio mensual de precipitación en el municipio de Guadalupe, Huila, durante octubre de 2025
Fuente: IDEAM, 2025.

301

5. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO DURANTE EL PERIODO

Tipo Prueba de Laboratorio	Resistencia concreto	Relación volumétrica concreto
Diseños de mezcla para los concretos.	2500 PSI	CANTIDADES EN VOLUMEN SUELTO PARA PREPARAR UN METRO CÚBICO DE CONCRETO (M3) 18Mpa CEMENTO: 6,78 Bulto Mixto Fuente Acopio Héctor Vargas 1,22 m3 AGUA:175 Litros
Diseños de mezcla para base.	3000 PSI	CANTIDADES EN VOLUMEN SUELTO PARA PREPARAR UN METRO CÚBICO DE CONCRETO (M3) 21Mpa CEMENTO: 7,49 Bulto Mixto Fuente Acopio Héctor Vargas 1,2 m3 AGUA:175 Litros
Compresión simple al concreto.	*2500 PSI CONCRETO CICLOPEO*	
	3000 PSI VIGA DE CIMENTACION	
	3000 PSI PLACA DE PISO	
Ensayo de compactación de campo	DENSIDAD SECA MÁXIMA (g./cm3) HUMEDAD ÓPTIMA (%) Gravedad Especifica Bulk Partículas Gruesas, K (g/cm3) R^2 = 0.9954 2.145 6.00 2.56	
Proctor compactación modificada material de relleno	DENSIDAD SECA MÁXIMA (g./cm3) HUMEDAD ÓPTIMA (%) Gravedad Especifica Bulk Partículas Gruesas, K (g/cm3) R^2 = 0.9954 2.145 6.00 2.56	

NOTA: *Las obras de concreto ejecutadas se le realiza prueba a la compresión simple, Norma Articulo 630-07 ensayo E-410, cumpliendo con las resistencias exigidas.*

Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio

DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Anden, Muro concreto	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO	RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE

ciclópeo, Cuneta)								
		02/04/2025						
Concreto ciclópeo cerramiento	28/02/2025	14/03/2025		x		2500 PSI	2438.02 PSI	NO CUMPLE
		14/03/2025		x		2500 PSI	2370.43 PSI	NO CUMPLE
		28/03/2025			x	2500 PSI	3031.89 PSI	CUMPLE
		28/03/2025			x	2500 PSI	2937.53 PSI	CUMPLE
Viga de cimentación cerramiento	11/03/2025	18/03/2025	x			2100 PSI	2568.95 PSI	CUMPLE
		18/03/2025	x			2100 PSI	2603.43 PSI	CUMPLE
		08/04/2025			x	3000 PSI	3820.44 PSI	CUMPLE
		08/04/2025			x	3000 PSI	3774.89 PSI	CUMPLE
Placa de piso polideportivo	15/03/2025	22/03/2025	x			2100 PSI	2029.94 PSI	NO CUMPLE
		22/03/2025	x			2100 PSI	1950.58 PSI	NO CUMPLE
		12/04/2025			x	3000 PSI	3080.31 PSI	CUMPLE
		12/04/2025			x	3000 PSI	3138.43 PSI	CUMPLE
Placa de piso polideportivo	18/03/2025	25/03/2025	x			2100 PSI	2123.86 PSI	CUMPLE
		25/03/2025	x			2100 PSI	2031.63 PSI	CUMPLE
		15/04/2025			x	3000 PSI	3221.44 PSI	CUMPLE
		15/04/2025			x	3000 PSI	3145.13 PSI	CUMPLE
Placa de piso polideportivo	20/03/2025	27/03/2025	x			2100 PSI	1857.42 PSI	NO CUMPLE
		27/03/2025	x			2100 PSI	1842.53 PSI	NO CUMPLE
		17/04/2025			x	3000 PSI	3022.05 PSI	CUMPLE
		17/04/2025			x	3000 PSI	3005.63 PSI	CUMPLE
Placa de piso polideportivo	22/03/2025	29/03/2025	x			2100 PSI	2215.39 PSI	CUMPLE
		29/03/2025	x			2100 PSI	2221.70 PSI	CUMPLE
		19/04/2025			x	3000 PSI	3197.64 PSI	CUMPLE
		19/04/2025			x	3000 PSI	3056.12 PSI	CUMPLE
Placa de piso polideportivo	25/03/2025	01/04/2025	x			2100 PSI	2229.13 PSI	CUMPLE
		01/04/2025	x			2100 PSI	2170.02 PSI	CUMPLE
		22/04/2025			x	3000 PSI	3045.84 PSI	CUMPLE
		22/04/2025			x	3000 PSI	3072.10 PSI	CUMPLE
Placa de piso polideportivo	27/03/2025	03/04/2025	x			2100 PSI	1947.24 PSI	NO CUMPLE

		03/04/2025	x			2100 PSI	2093.61 PSI	NO CUMPLE
		24/04/2025			x	3000 PSI	3051.59 PSI	CUMPLE
		24/04/2025			x	3000 PSI	3130.33 PSI	CUMPLE
Placa de piso polideportivo	31/03/2025	07/04/2025	x			2100 PSI	2451.60 PSI	CUMPLE
		07/04/2025	x			2100 PSI	2402.31 PSI	CUMPLE
		28/04/2025			x	3000 PSI	3565.25 PSI	CUMPLE
		28/04/2025			x	3000 PSI	3072.98 PSI	CUMPLE

DENSIDADES MÉTODO CONO DE ARENA					
No. ENSAYO	ABSCI/EJE	PROFUNDIDAD/ALTURA – DEL ENSAYO EN CM.	MATERIAL	PORCENTAJE COMPACTACIÓN (%)	CUMPLE/ NO CUMPLE
D-0001	Cancha sintética costado izquierdo	12.00	Relleno	99.26%	CUMPLE
D-0002	Cancha sintética costado izquierdo	12.00	Relleno	98.37%	CUMPLE
D-0003	Cancha sintética costado izquierdo	12.00	Relleno	98.80%	CUMPLE
D-0004	Cancha sintética costado izquierdo	12.00	Relleno	99.17%	CUMPLE
D-0005	Cancha sintética costado derecho	12.00	Relleno	98.95%	CUMPLE
D-0006	Cancha sintética costado derecho	12.00	Relleno	98.14%	CUMPLE

6. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Valor Anticipo (20%)	04/03/2025	$ 290.607.785, 80	N/a	$ 290.607.785, 80
Acta Parcial No. 1	19/05/2025	$ 1,166,288,639.00	$ 233,257,727.80	$ 933,030,911.20
Acta Parcial No. 2	03/10/2025	$ 213,419,393.00	$ 42,683,878.60	$ 170,735,514.40
Acta Recibo Final.	06/10/2025	$ 153,295,098.00	$ 14,666,179.40	$ 138,628,918.60
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 1,453,038,929.00	$ 79,971,854.00	$ 1,533,010,783.00	$ 1,533,003,130.00	$ 7,653.00

7. COMITES DE OBRA DURANTE EL PERIODO

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité
19 DE NOVIEMBRE DE 2024	Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila. (INDERHUILA)	En el municipio de Guadalupe se desarrolló socialización del contrato de obra e interventoría y se realizó constitución de veeduría ciudadana. Asistentes: Ingeniera Jimena Jiménez (apoyo a la supervisión) - Ingeniero Yerson Fernando Camacho Ladino (representante legal de V&M INGENIERÍA SAS, contratista de obra) - Ingeniera Daniela Carrillo Tavera (representante legal de CONSTRUMAC INGENIERO SAS, interventoría)
26 DE NOVIEMBRE DE 2024	Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila. (INDERHUILA)	Se lleva a cabo reunión en las instalaciones del INDER HUILA con el fin de discutir el avance del contrato de obra CLOPIH 221 de 2024. Asistentes: - Ingeniera Jimena Jiménez (apoyo a la supervisión) - Ingeniero Yerson Fernando Camacho Ladino (representante legal de V&M INGENIERÍA SAS, contratista de obra) - Ingeniera Daniela Carrillo Tavera (representante legal de CONSTRUMAC INGENIERO SAS, interventoría) Objetivo: Solicitar avances de ejecución del contrato y discutir dificultades presentadas.

23 DE DICIEMBRE 2024	Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila. (INDERHUILA)	Se lleva a cabo reunión en las instalaciones del INDER HUILA con el fin de discutir el contrato CLOPIH 221 de 2024. Asistentes: - Ingeniera Jimena Jiménez (apoyo a la supervisión) - Ingeniero Yerson Fernando Camacho Ladino Representante legal de V&M INGENIERÍA SAS, contratista de obra - Ingeniera Daniela Carrillo Tavera Representante legal de CONSTRUMAC INGENIERO SAS, interventoría Objetivo: Analizar las respuestas de la Alcaldía de Guadalupe sobre topografía y diseños, revelando una nueva localización del proyecto que difiere de la etapa precontractual.
23 DE ENERO DE 2025	Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila. (INDERHUILA)	En instalaciones de INDER Neiva se realizó comité técnico para socializar el avance de la obra hasta la fecha, que abarca actividades de localización, replanteo y descapote de la zona. Asistentes: - Ingeniera Jimena Jiménez (apoyo a la supervisión) - Ingeniero Yerson Fernando Camacho Ladino Representante legal de V&M INGENIERÍA SAS, contratista de obra - Ingeniera Daniela Carrillo Tavera Representante legal de CONSTRUMAC INGENIERO SAS, interventoría
25 DE FEBRERO DE 2025	Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila. (INDERHUILA)	Se realizó comité técnico el pasado 25 de febrero de 2025 para evaluar el desarrollo y avance de las actividades, del mismo desprendieron ciertos compromisos a evaluar por parte del ente supervisor del contrato, el contratista de obra y la evaluación y aprobación de la interventoría: En el marco del comité, se acordó revisar y actualizar los estudios y diseños del sistema eléctrico para su implementación en la cancha sintética del municipio de Guadalupe. El objetivo es realizar una cuantificación y distribución adecuada del sistema eléctrico mediante la revisión de estudios y diseños para dar cumplimiento al marco contractual de las actividades y que este sea acorde a las necesidades del escenario deportivo.
02 DE ABRIL DE 2025	Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo	Se lleva a cabo reunión en las instalaciones del INDER HUILA con el fin de discutir el contrato CLOPIH 221 de 2024. Asistentes: - Ingeniero Yerson Fernando Camacho Ladino Representante legal de V&M INGENIERÍA SAS, contratista de obra - Daniela Carrillo Tavera Representante legal de CONSTRUMAC INGENIERO SAS, interventoría - Luis Miguel Caquimbo (supervisor por parte de INDERHUILA)

336

	Libre del Huila. (INDERHUILA)	Objetivo: Revisar el avance del contrato y discutir dificultades presentadas. Se estipula que la obra se desarrolla a un ritmo inferior al estipulado debido a condiciones externas y cambios en el diseño eléctrico, por ende, se solicita y aprueba prorrogar el contrato por 2 meses, con el fin de presentar el balance de obra aprobado por interventoría y gestionar la modificación del proyecto y adición presupuestal.
15 DE MAYO 2025	Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila. (INDERHUILA)	Se llevó a cabo comité técnico en las instalaciones de la obra cuyo objeto es construcción de cancha sintética Villa olímpica del municipio de Guadalupe Huila. Asistentes: - Ingeniero Yerson Fernando Camacho Ladino Representante legal de V&M INGENIERÍA SAS, contratista de obra - Daniela Carrillo Tavera Representante legal de CONSTRUMAC INGENIERO SAS, interventoría - Luis Miguel Caquimbo (supervisor por parte de INDERHUILA) - Deiber Calderón Rojas: (secretario de planeación) Objetivo: Se realizó un análisis detallado del avance del contrato, identificando retrasos debido a condiciones externas y cambios en el diseño eléctrico. Se determinó la necesidad de suspender temporalmente el contrato para presentar el balance de obra aprobado por interventoría y gestionar la modificación del proyecto y adición presupuestal.
06 DE OCTUBRE 2025	Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila. (INDERHUILA)	Se lleva a cabo reunión en las instalaciones del INDER HUILA con el fin de discutir el contrato CLOPIH 221 de 2024. Asistentes: - Ingeniero Yerson Fernando Camacho Ladino Representante legal de V&M INGENIERÍA SAS, contratista de obra - Daniela Carrillo Tavera Representante legal de CONSTRUMAC INGENIERO SAS, interventoría - Luis Miguel Caquimbo (supervisor por parte de INDERHUILA) Objetivo: En la reunión se discutió el avance del proyecto, confirmando que la obra se encuentra ejecutada en su totalidad, excepto por la conexión final del sistema eléctrico de media tensión, que es responsabilidad del municipio de Guadalupe. Las partes involucradas coincidieron en que el proyecto está terminado y que solo resta la conexión eléctrica para su puesta en funcionamiento. Se acordó proceder con la terminación del contrato una vez se cumpla con los requisitos contractuales pendientes.

8. RELACIÓN DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS

TIPO DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA A LA ENTIDAD (dd/mm/aaaa)	No. RADICADO (Emitido por INDERHUILA)	FORMATO (Físico/Digital)

337

Copias de Bitácora de Obra (periodo del (15/09/2025) al (03/10/2025)	(03/10/2025)		Físico
Informe HSEQ periodo del (15/09/2025) al (03/10/2025)	(03/10/2025)		Físico
Registros de ensayos de calidad periodo del (15/09/2025) al (03/10/2025)	(03/10/2025)		Físico

9. RELACION DE PERSONAL DURANTE EL PERIODO

NOMBRE YAPELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION
YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO	7.713.933	REPRESENTANTE LEGAL	Indefinido
YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO	7.713.933	REPRESENTANTE LEGAL	Indefinido
ADRIANA LISETH MAYORCA PERDOMO	1.079.409.298	RESIDENTE DE OBRA	Prestación de servicios
OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO	1.075.213.839	PROFESIONAL SST	Prestación de servicios
JORGE HUMBERTO ALDANA ROSERO	1.082.131.133	AYUDANTE	Prestación de servicios
OSCAR OBEIMAR CABEZAS GALINDEZ	1.082.773.317	AYUDANTE	Obra o Labor
YILBER LEANDRO CORTES NIETO	1.007.659.754	AYUDANTE	Obra o Labor
JESUS OBEIMAR LOPEZ GALINDEZ	1.082.776.715	MAESTRO DE OBRA	Obra o Labor

10. RELACIÓN DE PAGOS

TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)	No. COMPROBANTE	FECHA
ANTICIPO	191796625 - P.A. ANT V&M INGENIERIA SAS	04/03/2025
ACTA PARCIAL No.1	202775925 - SPGR	14/08/2025
ACTA PARCIAL No.2	219506326 - SPGR	09/03/2026

11. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

MES OCTUBRE

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO
YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO	$ 455.600	$ 113.900	$ 198.200	$ 113.900	$ 0.00	34892176	09/10/2025

ADRIANA LISETH MAYORCA PERDOMO	$ 275.200	$ 215.000	$ 99.100	$ 0.00	$ 0.00	PY-35148899 PI-9494030591	28/10/2025
OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO	$ 227.800	$ 178.000	$ 52.900	$ 0.00	$ 0.00	PY-35148899 PI-34758216	07/10/2025
JORGE HUMBERTO ALDANA ROSERO	$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 0.00	35149090	27/10/2025
OSCAR OBEIMAR CABEZAS GALINDEZ	$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 0.00	35149090	27/10/2025
YILBER LEANDRO CORTES NIETO	$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 0.00	35149090	27/10/2025
JESUS OBEIMAR LOPEZ GALINDEZ	$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 0.00	35149090	27/10/2025

12. RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA

Póliza legalización del CONTRATO: CLOPIH221 DE 2024

POLIZA DE CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO DE OBRA

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S. A	61-44-10155753	ANEXO No. 0	27/09/2024	Cumplimiento del contrato	27/09/2024	27/06/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	27/09/2024	27/06/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	27/09/2024	27/12/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 años, 0 meses y 0 días a partir de la suscripción del acta de recibo de la obra.	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S. A	61-40-101020276	ANEXO No. 0	27/09/2024	27/09/2024	27/12/2024

Póliza actualizada ACTA DE INICIO: 12/11/2024

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)

SEGUROS DEL ESTADO S. A	61-44-101055753	ANEXO No. 1	19/11/2024	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	12/08/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	12/11/2024	12/08/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/11/2024	12/02/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 años, 0 meses y 0 días a partir de la suscripción del acta de recibo de la obra.	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S. A	61-40-101020276	ANEXO No. 1	19/11/2025	12/11/2024	11/02/2025

Póliza actualizada - PRORROGA No. 1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S. A	61-44-101055753	ANEXO 3	12/02/2025	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	12/10/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	12/11/2024	12/10/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/11/2024	12/04/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 años, 0 meses y 0 días a partir de la suscripción del acta de recibo de la obra.	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
		ANEXO 4	12/02/2025	12/11/2024	12/04/2025

SEGUROS DEL ESTADO S. A	61-40-101020276				

Póliza actualizada - PRORROGA No. 2

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S. A	61-44-101055753	ANEXO 4	16/04/2025	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	12/12/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	12/11/2024	12/12/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/11/2024	12/06/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 años, 0 meses y 0 días a partir de la suscripción del acta de recibo de la obra.	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S. A	61-44-101020276	ANEXO 5	16/04/2025	12/11/2024	12/06/2025

Póliza actualizada según ACTA DE REINICIO No.1

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO –REINICIO No.1 15/09/2025

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S. A	61-44-101055753	ANEXO 5 - 6	17/09/2025	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	09/04/2026
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	12/11/2024	09/04/2026
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/11/2024	09/10/2028

				Estabilidad y Calidad de Obras	5 años, 0 meses y 0 días a partir de la suscripción del acta de recibo de la obra.

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD – REINICIO No. 1 15/09/2025

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S. A	61-40-101022174	ANEXO 0	17/09/2025	15/09/2025	31/10/2025

Póliza actualizada según OTRO SI No. 3

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO – OTRO SI No. 3 23/09/2025

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (D/M/A):	HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S. A	61-44-101055753	ANEXO 7	23/09/2025	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	09/04/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	12/11/2024	09/04/2026
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/11/2024	09/10/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 años, 0 meses y 0 días a partir de la suscripción del acta de recibo de la obra.	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD OTRO SI No. 3 23/09/2025

ASEGURADORA	No	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
SEGUROS DEL ESTADO S. A	61-40-101022174	ANEXO 1	23/09/2025	15/09/2025	31/10/2025


Acta de recibo final Cancha Sintética Villa Olímpica - Guadalupe

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ACTA DE RECIBO DE OBRA –. 06/10/2025


ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (D/M/A):	HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S. A	61-44-101055753	ANEXO 8	18/12/2025	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	09/04/2026
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	12/11/2024	09/04/2026

				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/11/2024	09/10/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 años, 0 meses y 0 días a partir de la suscripción del acta de recibo de la obra	


13. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

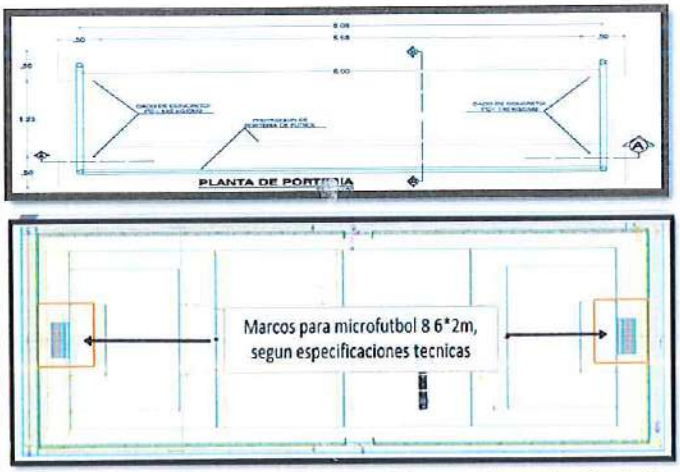


4.2 Marco para microfutbol futbol 8 6mX2m, en tubo galvanizado tipo pesado de 4", según especificaciones técnicas, incluye anclaje, malla e instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

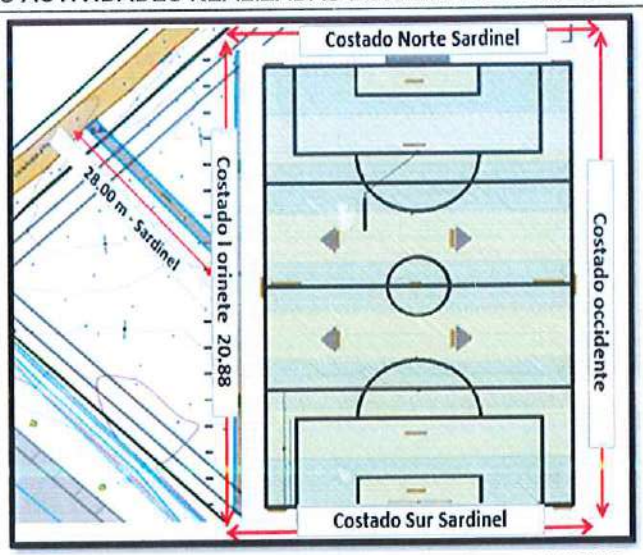

4.5. Suministro e instalación de bordillos prefabricado 20X50X50

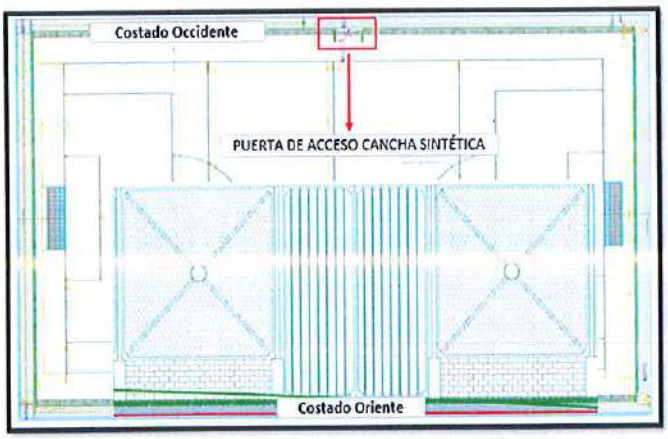


5.8. Suministro e instalación de puerta en tubería 2" galvanizada cal 2mm con malla eslabonada cal 10 y con portacandado, incluye pasador porta candado.

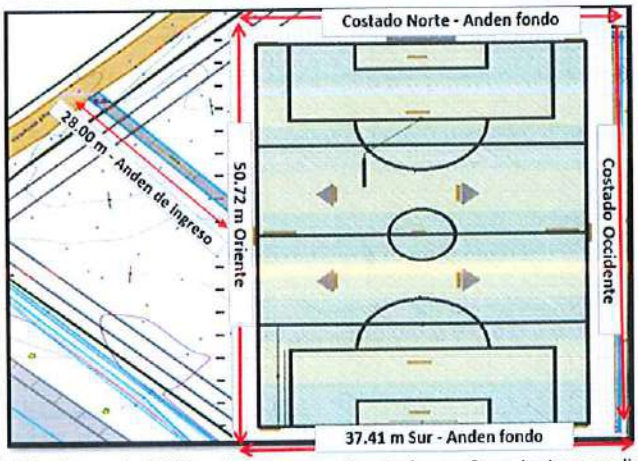


5.9. Concreto 3000 psi andenes perimetrales e=8cm, incluye malla electrosoldada y formaleta.


343

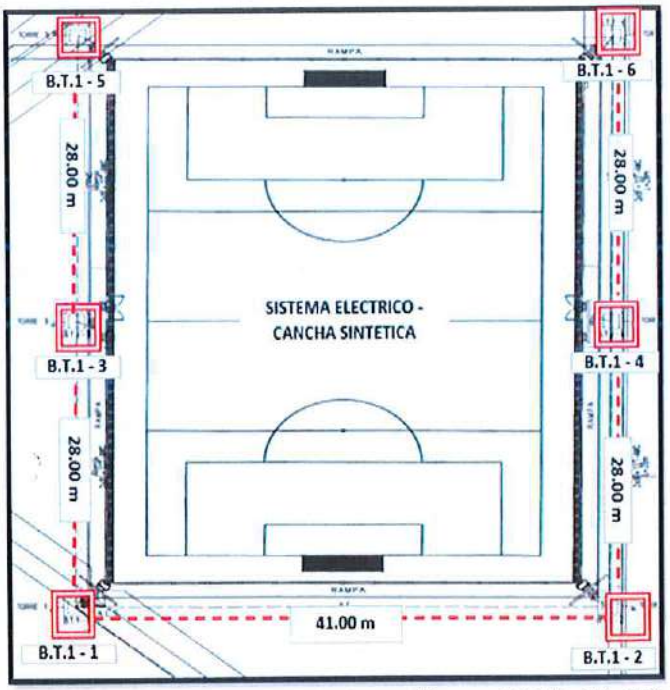


6.3. Suministro e Instalación de Acometida en CABLE CU AISL THHN/THWN - 2x8F+1x10T en tubería PVC 1"

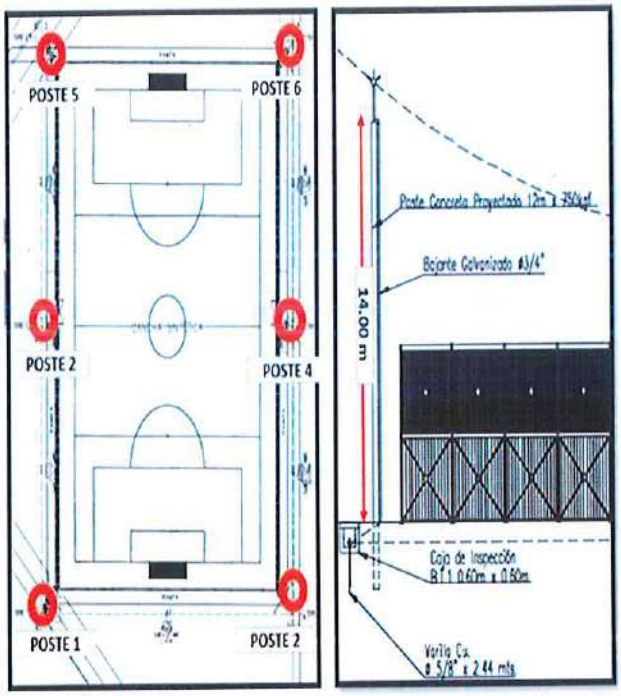


6.4. Salida Parcial Electrica (2 THHN No.10 + 1 THHN No.12)

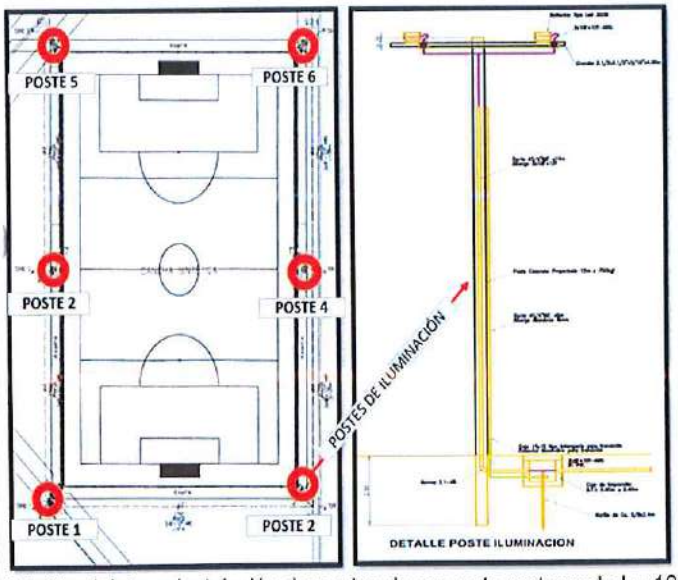


6.5. Suministro e instalación de postes de concreto pretensado L= 12 m 750 kg incluye transporte e hizada

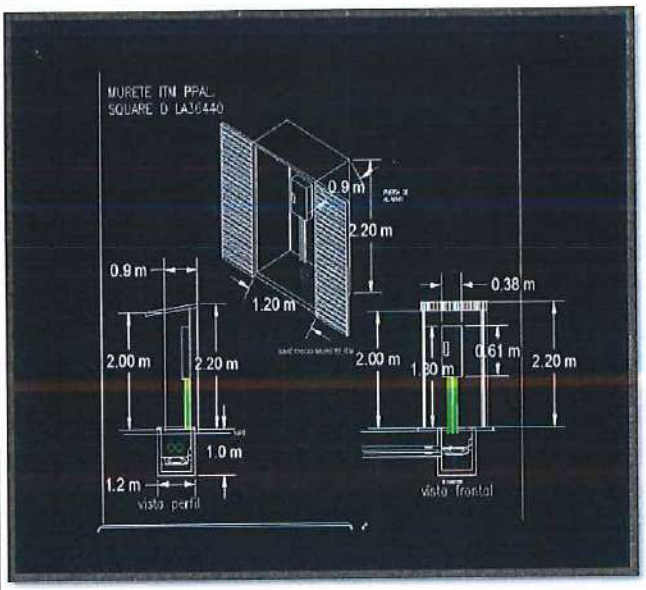


6.7. Murete para tablero de control en muro con bloque # 5

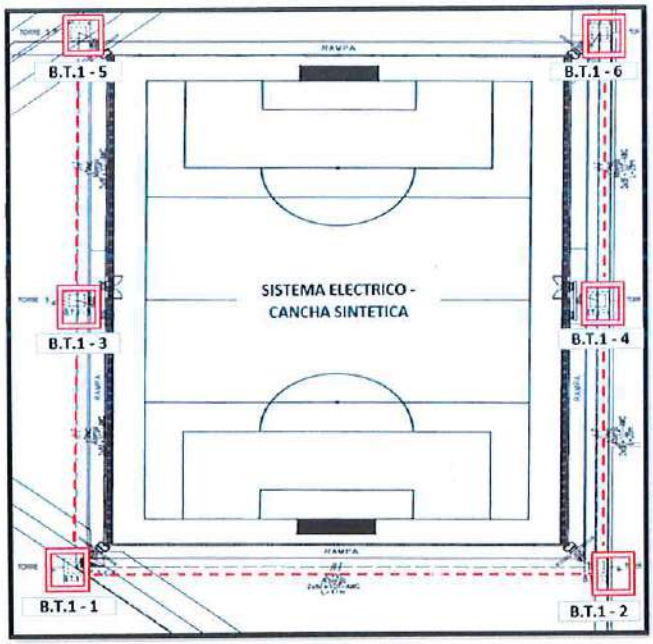


6.8. Construcción de cajas de inspección tipo alumbrado en concreto de 30x30

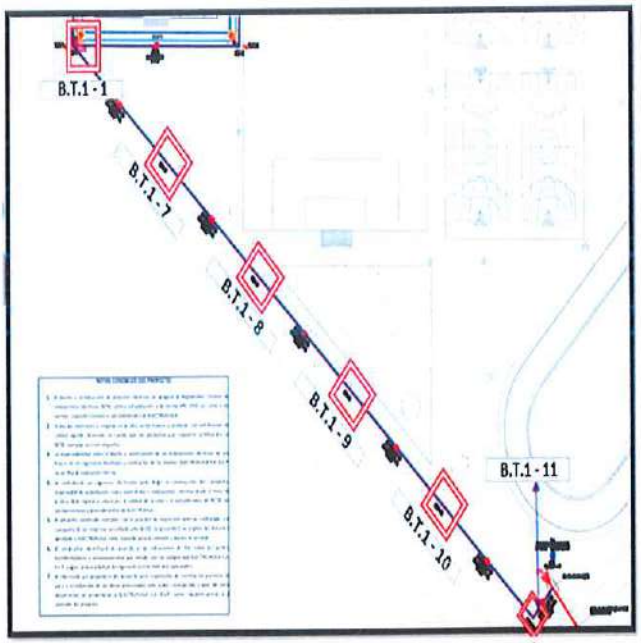


6.9.Cajas de inspección de 60X60 CM (medida interior)

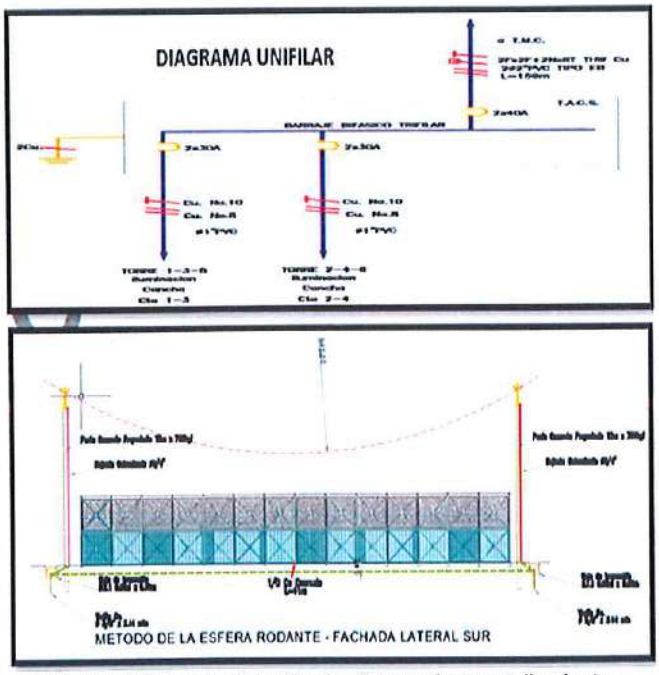


6.10. Suministro e Instalación de sistema de apantallamiento

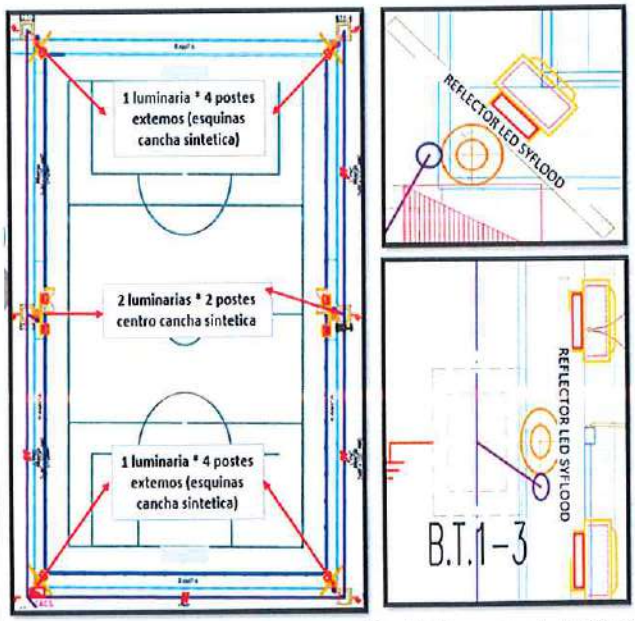


N.P 01. Suministro, montaje y conexión de Proyector led 300 W, flujo luminoso 50100 lm incluye soporte

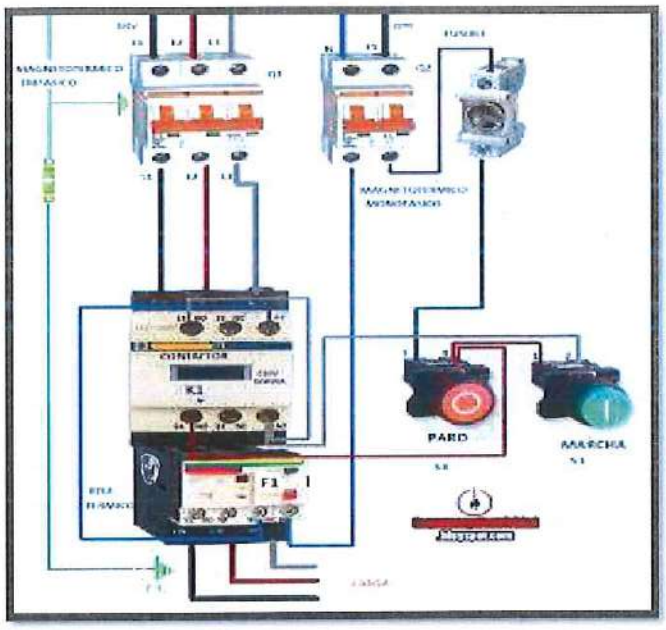


N.P 02. Suministro e Instalación de Tablero de control de alumbrado con caja con protecciones según circuitos con contactores y botonera ON-OF

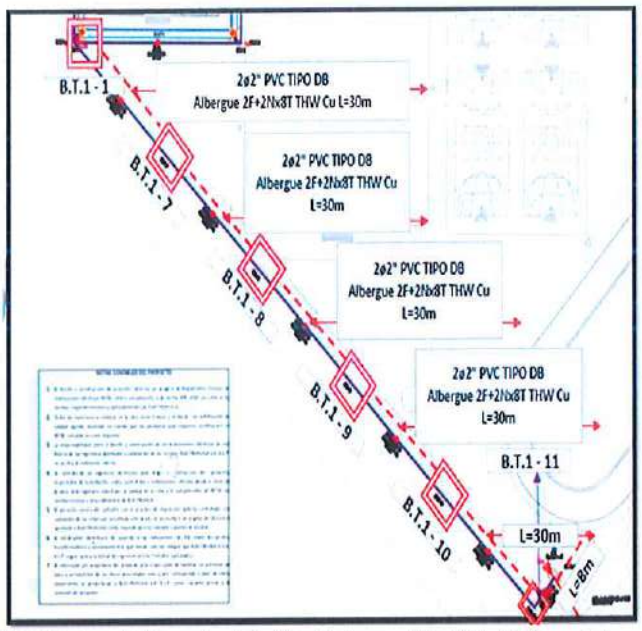

N.P 03. Suministro e Instalación de Acometida 1 No 2Xfase + 1 No2xNeutro + 1No8xtierra

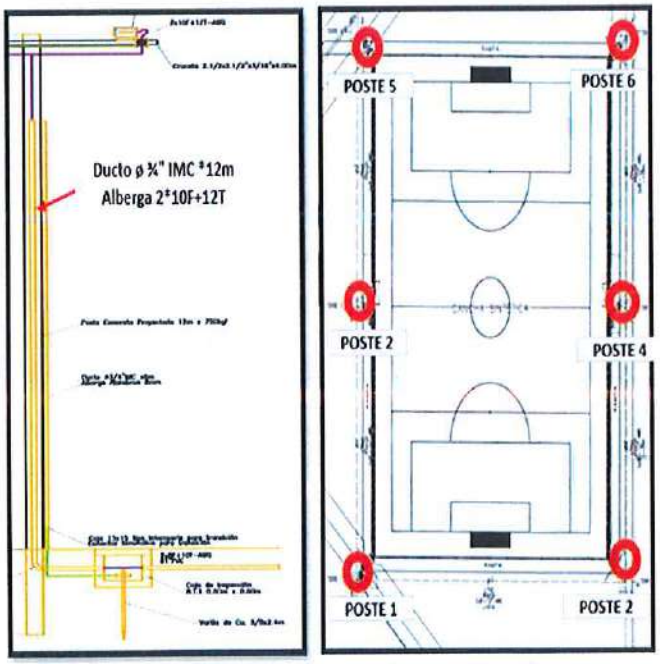

N.P 04. Ducto de 3/4" IMC para bajante de conexión eléctrica

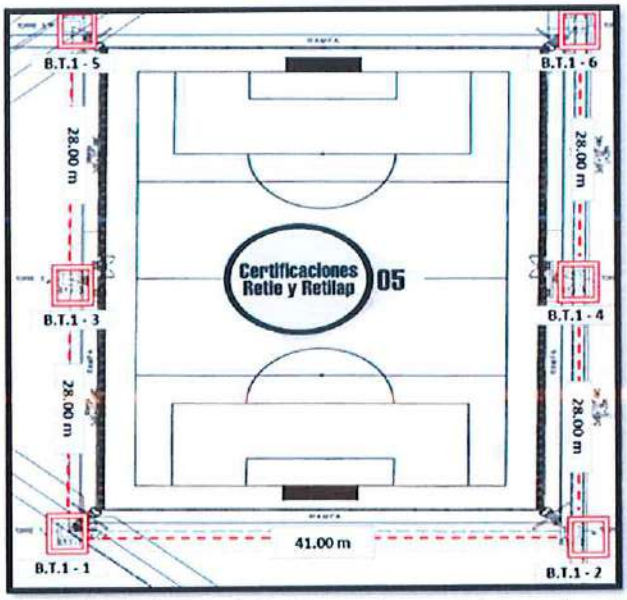

N.P 05.Actividades profesionales y documentales propias del constructor con objeto de tramite de Certificación RETIE Y RETILAP (Levantamiento, elaboración de planos y entrega de formatos).

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSI No. 03		ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 2		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 13,460,304.00**		**$ 13,460,304.00**		**$ 15,391,200.00**		**$ 1,930,896.00**		**$ 0.00**		**$ 15,391,200.00**
1.1	Localizacion y replanteo manual	m²	1,924.00	$ 2,226.00	$ 4,282,824.00	1924	$ 4,282,824.00	2200.00	$ 4,897,200.00	276.00	$ 614,376.00	0.00	$ 0.00	$ 2,200.00	$ 4,897,200.00
1.2	Descapote e=0,20m a maquina incluye retiro material	m²	1,924.00	$ 4,770.00	$ 9,177,480.00	1924	$ 9,177,480.00	2200.00	$ 10,494,000.00	276.00	$ 1,316,520.00	0.00	$ 0.00	$ 2,200.00	$ 10,494,000.00
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				**$ 84,830,852.00**		**$ 84,830,852.00**		**$ 106,660,384.00**		**$ 21,829,532.00**		**$ 0.00**		**$ 106,660,384.00**
2.1	Excavacion manual incluye retiro	m³	119.94	$ 31,545.00	$ 3,783,507.00	119.94	$ 3,783,507.00	295.67	$ 9,326,910.00	175.73	$ 5,543,403.00	0.00	$ 0.00	$ 295.67	$ 9,326,910.00
2.2	Excavacion mecanica incluye retiro 1 Km	m³	384.80	$ 19,793.00	$ 7,616,346.00	384.8	$ 7,616,346.00	420.03	$ 8,313,654.00	35.23	$ 697,308.00	0.00	$ 0.00	$ 420.03	$ 8,313,654.00
2.3	Rellenos con recebo compactado mecanicamente	m³	384.80	$ 190,629.00	$ 73,430,999.00	384.8	$ 73,430,999.00	466.49	$ 89,019,820.00	81.69	$ 15,588,821.00	0.00	$ 0.00	$ 466.49	$ 89,019,820.00
3	**RED DE AGUAS LLUVIAS**				**$ 38,483,328.00**		**$ 31,568,417.00**		**$ 44,628,666.00**		**$ 13,060,249.00**		**$ 0.00**		**$ 44,628,666.00**
3.1	Construcción de cuneta perimetral en concreto 3000 PSI; Dimensiones: 40 cm de ancho y altura variable. incluye rejilla prefabricada en poliuretano	ml	104.00	$ 137,428.00	$ 14,292,512.00	100.54	$ 13,817,011.00	100.54	$ 13,817,011.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ 100.54	$ 13,817,011.00
3.2	Caja inspeccion 1,0x 1,0 m medida interna en	und	4.00	$ 657,029.00	$ 2,628,116.00	0	$ 0.00	2.00	$ 1,314,058.00	2.00	$ 1,314,058.00	0.00	$ 0.00	$ 2.00	$ 1,314,058.00

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSI No. 03		ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 2		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL
	concreto 3000 psi para empalme sistema de drenaje, incluye tapa con marco y cañuela, altura variable														
3.3	Red de aguas lluvias suministro e instalación de tubería pvc Ø 8" Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama con arena 15 cms y relleno material de la excavacion a zanjon	ml	30.00	79,488.00	$ 2,384,640.00	0	$ 0.00	120.29	$ 9,561,612.00	120.29	$ 9,561,612.00	0.00	$ 0.00	$ 120.29	$ 9,561,612.00
3.4	Construccion de filtros laterales externos en un ancho de 0.40 m, con altura variable menor a 0.50 m, recubrimiento en geotextil no tejido NT-1600, con gravilla comun o triturado de 1 1/2" a 4" + Tuberia pvc drenajes de 6"	ml	178.00	$ 99,727.00	$ 17,751,406.00	178	$ 17,751,406.00	185.60	$ 18,509,331.00	7.60	$ 757,925.00	0.00	$ 0.00	$ 185.60	$ 18,509,331.00

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSI No. 03		ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 2		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL
3.5	Caja inspeccion 1.2x 1.2 m medida interna en concreto 3000 psi para empalme sistema de drenaje, incluye tapa con marco y cañuela, altura variable	und	2.00	$ 713,327.00	$ 1,426,654.00	0	$ 0.00	2.00	$ 1,426,654.00	2.00	$ 1,426,654.00	0.00	$ 0.00	$ 2.00	$ 1,426,654.00
4	PLACA CANCHA				$ 741,397,052.00		$ 616,568,271.00		$ 744,440,432.00		$ 120,455,811.00		$ 7,410,227.00		$ 744,434,309.00
4.1	Placa de piso en concreto 3000 psi, e =0,07m dilatada, junta machimbreada incluye malla electrosoldada de 5mm.	m²	1,750.00	87,325.00	$ 152,818,750.00	1460.55	$ 127,542,529.00	1750.00	$ 152,818,750.00	289.45	$ 25,276,221.00	0.00	$ 0.00	$ 1,750.00	$ 152,818,750.00
4.2	Marco para microfutbol futbol 8 6mX2m, en tubo galvanizado tipo pesado de 4", según especificaciones tecnicas, incluye anclaje, malla e instalacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	und	2.00	$ 2,344,832.00	$ 4,689,664.00	0	$ 0.00	2.00	$ 4,689,664.00	-	$ 0.00	2.00	$ 4,689,664.00	$ 2.00	$ 4,689,664.00
4.3	Suministro e instalación de césped monofilamenta	m²	1,750.00	181,076.00	$ 316,883,000.00	1460.55	$ 264,470,552.00	1750.00	$ 316,883,000.00	289.45	$ 52,412,448.00	0.00	$ 0.00	$ 1,750.00	$ 316,883,000.00

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSI No. 03		ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 2		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL
	do rafia de 50mm de altura, con proteccion de rayos UV, con 1300 gramos por metro cuadrado de rafia, de 13200 dtx, base: backing doble capa, demarcacion de color blanco con cesped de blanco de fabrica, incluye granulo de caucho, pegamento importado.														
4.4	Suministro e instalacion de almohadilla de choque shock pad 20 mm	m²	1,750.00	$ 146,659.00	$ 256,653,250.00	1460.55	$ 214,202,802.00	1750.00	$ 256,653,250.00	289.45	$ 42,450,448.00	0.00	$ 0.00	$ 1,750.00	$ 256,653,250.00
4.5	Suministro e instalacion de bordillos prefabricado 20X50X50	ml	186.00	$ 55,658.00	$ 10,352,388.00	186.00	$ 10,352,388.00	240.68	$ 13,395,768.00	5.69	$ 316,694.00	48.88	$ 2,720,563.00	$ 240.57	$ 13,389,645.00
5	CERRAMIENTO				$ 231,083,695.00		$ 186,603,068.00		$ 211,058,905.00		$ 13,459,026.00		$ 10,996,811.00		$ 211,058,905.00
5.1	Concreto ciclopeo 2500 psi (60% concreto- 40% piedra media zonga)para cimentacion cerramiento	m³	16.74	$ 376,028.00	$ 6,294,709.00	15.52	$ 5,835,955.00	15.52	$ 5,835,955.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ 15.52	$ 5,835,955.00

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSI No. 03		ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 2		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL
5.2	Concreto 3000 psi viga de cimentacion cerramiento 0,2x0,2m	m^3	37.40	$ 659,191.00	$ 24,653,743.00	12.41	$ 8,180,560.00	12.41	$ 8,180,560.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ 12.41	$ 8,180,560.00
5.3	Muro cerramiento en ladrillo semiprensado a la vista	m^2	112.50	$ 105,765.00	$ 11,898,563.00	93.28	$ 9,865,759.00	93.28	$ 9,865,759.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ 93.28	$ 9,865,759.00
5.4	Acero de refuerzo 37000 psi incluye figurado e instalacion	kg	1,057.11	$ 6,647.00	$ 7,026,597.00	1041.24	$ 6,921,122.00	1259.32	$ 8,370,700.00	218.08	$ 1,449,578.00	0.00	$ 0.00	$ 1,259.32	$ 8,370,700.00
5.5	Tuberia galvanizada 2" cal 2mm incluye anclajes, tapa	ml	220.40	$ 44,432.00	$ 9,792,813.00	220.4	$ 9,792,813.00	316.20	$ 14,049,398.00	95.80	$ 4,256,585.00	0.00	$ 0.00	$ 316.20	$ 14,049,398.00
5.6	Modulos cerramiento 2,5x2,5 m en angulo 1 1/2"x1/8 con varilla de 5/8" lisa cada 14 cms, diagonales en angulo 1 1/2" x 1/8 y lamina cal 16 10X10 cms de refuerzo en la esquinas (lado norte y sur)h=2,5m	m^2	200.00	$ 109,070.00	$ 21,814,000.00	196.27	$ 21,407,169.00	196.27	$ 21,407,169.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ 196.27	$ 21,407,169.00

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSI No. 03		ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 2		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL
5.7	Modulos cerramiento 2,5x2,5 m en angulo 1 1/2"x1/8 con malla eslabonada cal 10 hueco 2 1/4"x2 1/4", diagonales en angulo 1 1/2" x1/8 y lamina cal 16 10X10cm de refuerzo en la esquinas (lado oriente y occidente) h=2,5m	m²	268.75	$ 54,091.00	$ 14,536,956.00	265.92	$ 14,383,879.00	409.25	$ 22,136,742.00	143.33	$ 7,752,863.00	0.00	$ 0.00	$ 409.25	$ 22,136,742.00
5.8	Suministro e instalacion de puerta en tuberia 2" galvanizada cal 2mm con malla eslabonada cal 10 y con portacandado, incluye pasador porta candado.	und	1.00	$ 802,805.00	$ 802,805.00	0	$ 0.00	2.00	$ 1,605,610.00	-	$ 0.00	2.00	$ 1,605,610.00	$ 2.00	$ 1,605,610.00
5.9	Concreto 3000 psi andenes perimentrales e=8cm, incluye malla electrosoldada y formaleta	m²	148.80	$ 80,868.00	$ 12,033,158.00	147.19	$ 11,902,961.00	263.32	$ 21,294,162.00	-	$ 0.00	116.13	$ 9,391,201.00	$ 263.32	$ 21,294,162.00
5.10	Suministro e instalacion de malla de cerramiento en nylon 100% alta densidad con proteccion UV.	m²	3,031.00	$ 37,545.00	$ 113,798,895.00	2408	$ 90,408,360.00	2408.00	$ 90,408,360.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ 2,408.00	$ 90,408,360.00

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSI No. 03		ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 2		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL
	ojo 13x13, calibre #4 incluye; guaya, tensores y tubo de 2"														
5.11	Pie de amigo en tuberia galvanizada 2" cal 2mm incluye anclajes, concreto 3000 psi 50x50x60 costados norte y sur	und	32.00	$ 263,483.00	$ 8,431,456.00	30	$ 7,904,490.00	30.00	$ 7,904,490.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ 30.00	$ 7,904,490.00
6	ILUMINACÓN				$ 53,175,912.00		$ 0.00		$ 46,928,164.00		$ 0.00		$ 46,928,164.00		$ 46,928,164.00
6.1	Suministro, montaje y conexión de Proyector led 300 W SYLFLOOD, temperatura de color 5000K, vida útil 100000h, flujo luminoso 39000 lm incluye soporte	und	6.00	$ 1,718,814.00	$ 10,312,884.00	0	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ -	$ 0.00
6.2	Suministro e Instalacion de Tablero de 6 Circuitos con puerta incluye 3 breaker de 30 amp con normativa RETIE	und	1.00	$ 511,864.00	$ 511,864.00	0	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ -	$ 0.00

352

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSÍ No. 03		ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 2		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL
6.3	Suministro e Instalación de Acometida en CABLE CU AISL THHN/THWN - 2x8F+1x10T en tuberia PVC 1"	ml	50.00	$ 45,333.00	$ 2,266,650.00	0	$ 0.00	153.00	$ 6,935,949.00	-	$ 0.00	153.00	$ 6,935,949.00	$ 153.00	$ 6,935,949.00
6.4	Salida Parcial Electrica (2 THHN No.10 + 1 THHN No.12)	ml	50.00	$ 42,110.00	$ 2,105,500.00	0	$ 0.00	84.00	$ 3,537,240.00	-	$ 0.00	84.00	$ 3,537,240.00	$ 84.00	$ 3,537,240.00
6.5	Suministro e instalacion de postes de concreto pretensado L= 12 m 750 kg incluye transporte e hizada	und	6.00	$ 2,884,636.00	$ 17,307,816.00	0	$ 0.00	6.00	$ 17,307,816.00	-	$ 0.00	6.00	$ 17,307,816.00	$ 6.00	$ 17,307,816.00
6.6	Puesta a tierra en varilla coper weld cobre de 1/2" incluye conectores, cableado, soldadura y mejoramiento de tierra	und	1.00	$ 513,186.00	$ 513,186.00	0	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ -	$ 0.00
6.7	Murete para tablero de control en muro con bloque # 5	und	1.00	$ 377,230.00	$ 377,230.00	0	$ 0.00	1.00	$ 377,230.00	-	$ 0.00	1.00	$ 377,230.00	$ 1.00	$ 377,230.00
6.8	Construcción de cajas de inspección tipo alumbrado en concreto de 30x30	und	6.00	$ 266,806.00	$ 1,600,836.00	0	$ 0.00	6.00	$ 1,600,836.00	-	$ 0.00	6.00	$ 1,600,836.00	$ 6.00	$ 1,600,836.00
6.9	Cajas de inspeccion de 60X60 CM	und	8.00	$ 336,951.00	$ 2,695,608.00	0	$ 0.00	5.00	$ 1,684,755.00	-	$ 0.00	5.00	$ 1,684,755.00	$ 5.00	$ 1,684,755.00

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSI No. 03		ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 2		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL
	(medida interior)														
6.10	Suministro e Instalación de sistema de apantallamiento	und	1.00	$ 15,484,338.00	$ 15,484,338.00	0	$ 0.00	1.00	$ 15,484,338.00	-	$ 0.00	1.00	$ 15,484,338.00	$ 1.00	$ 15,484,338.00
7	**ITEMS NO PREVISTOS**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 49,208,876.00**		**$ 0.00**		**$ 49,208,876.00**		**$ 49,208,876.00**
NP 01	Suministro, montaje y conexión de Proyector led 300 W, flujo luminoso 50100 lm incluye soporte	und	0.00	$ 2,212,693.95	$ 0.00	0	$ 0.00	8.00	$ 17,701,552.00	-	$ 0.00	8.00	$ 17,701,552.00	$ 8.00	$ 17,701,552.00
NP 02	Suministro e Instalacion de Tablero de control de alumbrado con caja con protecciones según circuitos con contactores y botonera ON-OF	und	0.00	$ 3,725,611.53	$ 0.00	0	$ 0.00	1.00	$ 3,725,612.00	-	$ 0.00	1.00	$ 3,725,612.00	$ 1.00	$ 3,725,612.00
NP 03	Suministro e Instalación de Acometida 1 No 2Xfase + 1 No2xNeutro + 1No8xtierra	ml	0.00	$ 131,557.19	$ 0.00	0	$ 0.00	159.00	$ 20,917,593.00	-	$ 0.00	159.00	$ 20,917,593.00	$ 159.00	$ 20,917,593.00
NP 04	Ducto de 3/4" IMC para bajante de conexión electrica	ml	0.00	$ 48,355.19	$ 0.00	0	$ 0.00	72.00	$ 3,481,574.00	-	$ 0.00	72.00	$ 3,481,574.00	$ 72.00	$ 3,481,574.00

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSI No. 03		ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 2		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL
NP 05	Actividades profesionales y documentales propias del contructor con objeto de tramite de Certificacion RETIE Y RETILAP (Levantamiento , elaboracion de planos y entrega de formatos)	und	0.00	$ 3,382,545.00	$ 0.00	0	$ 0.00	1.00	$ 3,382,545.00	-	$ 0.00	1.00	$ 3,382,545.00	$ 1.00	$ 3,382,545.00

	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 1,162,431,143.00**		**$ 933,030,912.00**		**$ 1,218,316,627.00**		**$ 170,735,514.00**		**$ 114,544,078.00**		**$ 1,218,310,504.00**
	Administración	**20 %**			$ 232,486,229.00		$ 186,606,182.00		$ 243,663,325.00		$ 34,147,103.00		$ 22,908,816.00		$ 243,662,101.00
	Imprevistos	**1%**			$ 11,624,311.00		$ 9,330,309.00		$ 12,183,166.00		$ 1,707,355.00		$ 1,145,441.00		$ 12,183,105.00
	Utilidad	**4%**			$ 46,497,246.00		$ 37,321,236.00		$ 48,732,665.00		$ 6,829,421.00		$ 4,581,763.00		$ 48,732,420.00
	Tramite de inspección y certificacion RETIE Y RETILAP								$ 10,115,000.00				$ 10,115,000.00		$ 10,115,000.00
	TOTAL COSTO				**$ 1,453,038,929.00**		**$ 1,166,288,639.00**		**$ 1,533,010,783.00**		**$ 213,419,393.00**		**$ 153,295,098.00**		$ 1,533,003,130.00
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	**20%**					$ 233,257,727.80				$ 42,683,878.60		$ 14,666,179.40		$ 290,607,785.80
	VALOR TOTAL MENOS (-) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO						$ 933,030,911.20				$ 170,735,514.40		$ 138,628,918.60		$ 1,242,395,344.20

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN OTROSI No. 03		ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 2		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL
	% AVANCE DE OBRA						76.078306293296 3%				13.921584594620 6%		9.9996098983734 3%		99.999500786290 3%

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.


ING. YERSON FERNANDO CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA

ING. DANIELA CARRILLO TAVERA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

14. REGISTRO FOTOGRAFICO



4.2. Marco para microfutbol futbol 8 6mX2m, en tubo galvanizado tipo pesado de 4", según especificaciones técnicas, incluye anclaje, malla e instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

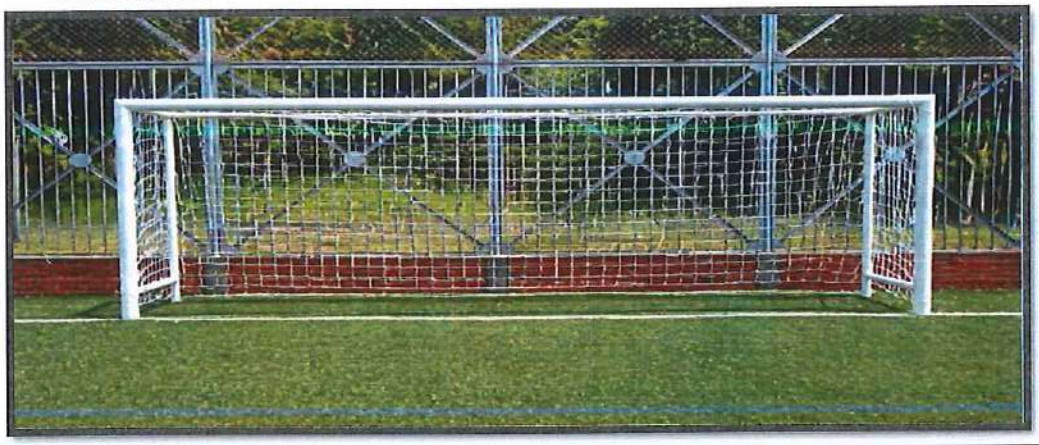







4.5 Suministro e instalación de bordillos prefabricado 20X50X50



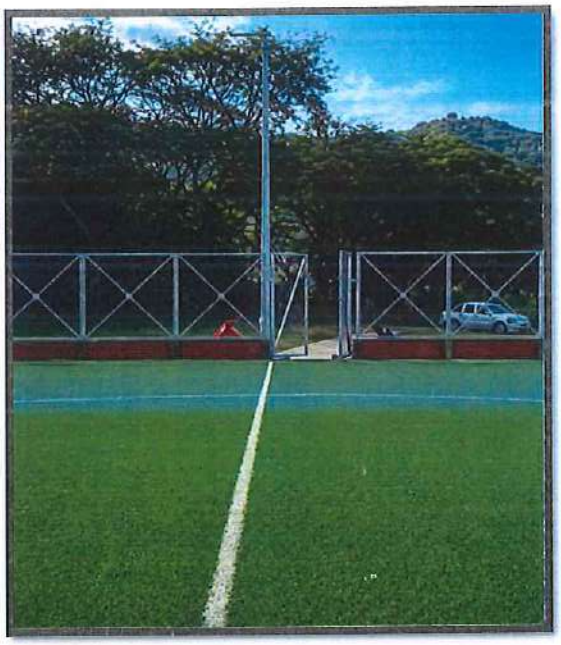

5.8.Suministro e instalación de puerta en tubería 2" galvanizada cal 2mm con malla eslabonada cal 10 y con portacandado, incluye pasador porta candado

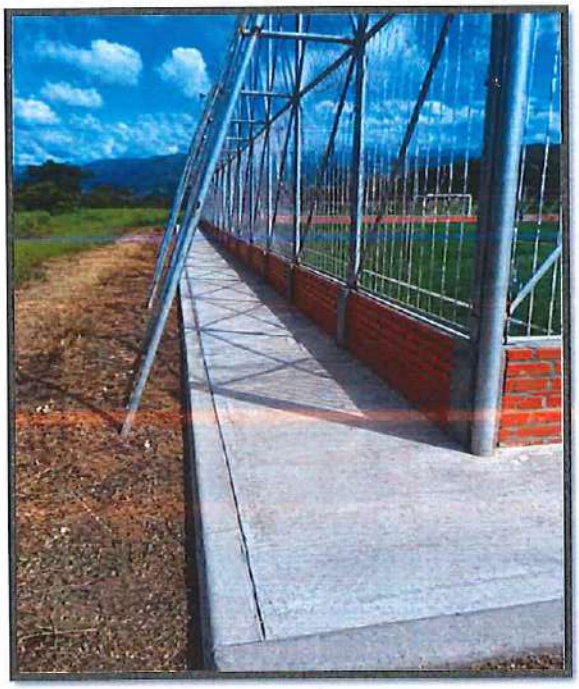





5.9. Concreto 3000 psi andenes perimetrales e=8cm, incluye malla electrosoldada y formaleta.






6.3. Suministro e Instalación de Acometida en CABLE CU AISL THHN/THWN - 2x8F+1x10T en tuberia PVC 1"

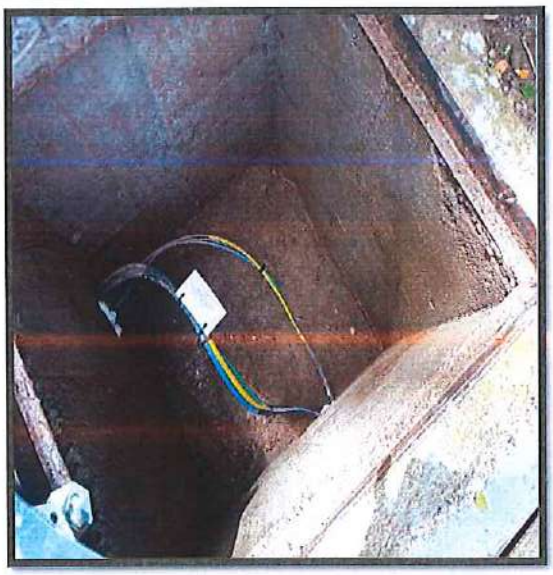

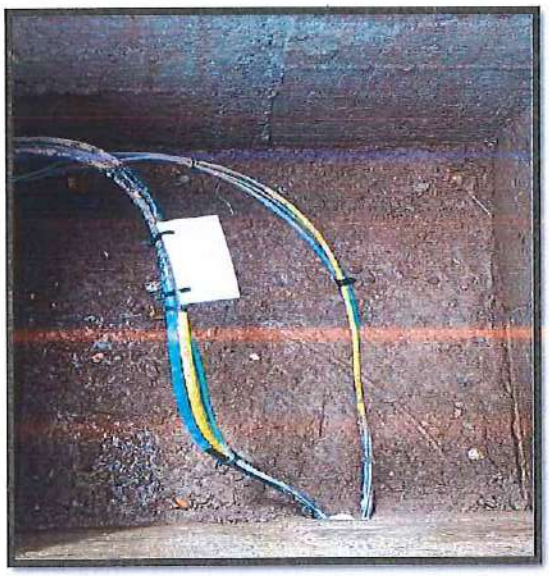

6.4 Salida Parcial Eléctrica (2 THHN No.10 + 1 THHN No.12)

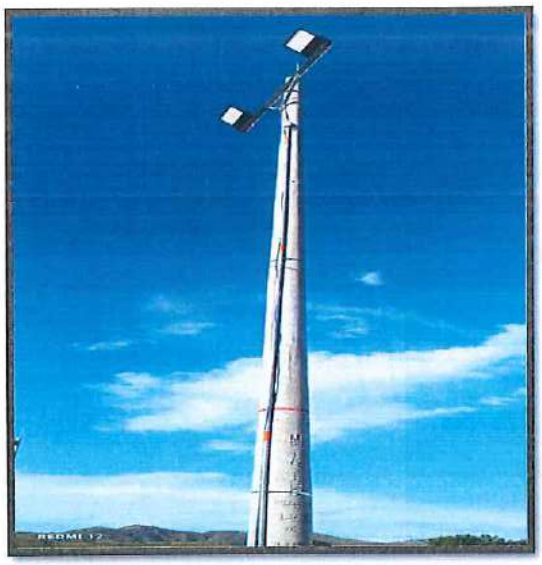




6.5. Suministro e instalación de postes de concreto pretensado L= 12 m 750 kg incluye transporte e hizada






6.7. Murete para tablero de control en muro con bloque # 5



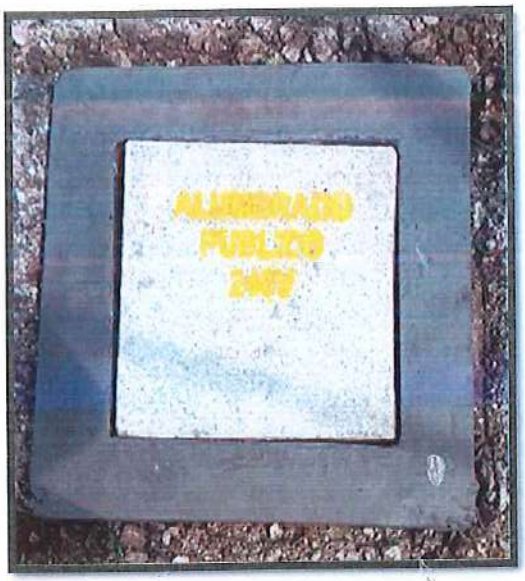

6.8. Construcción de cajas de inspección tipo alumbrado en concreto de 30x30

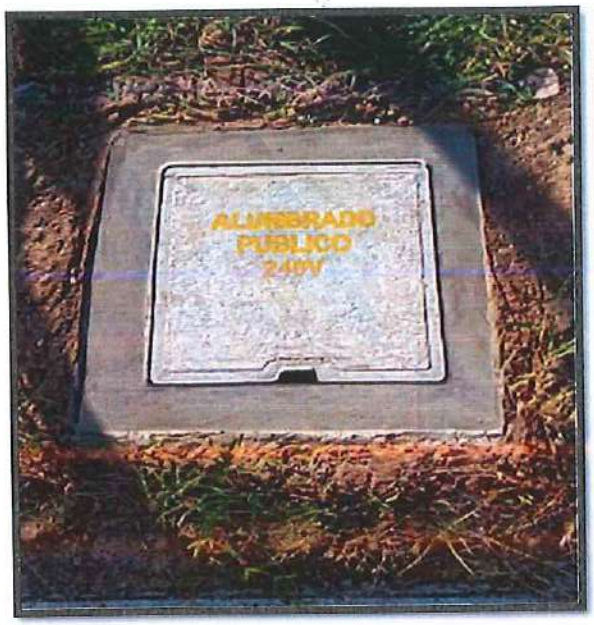





6.9. Cajas de inspección de 60X60 CM (medida interior)





6.10. Suministro e Instalación de sistema de apantallamiento.

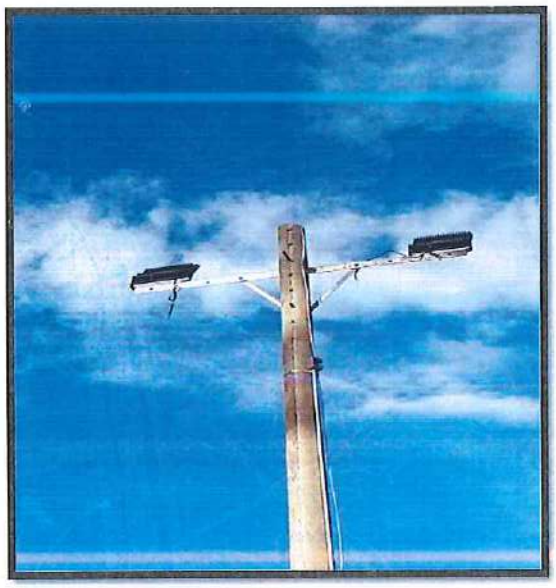

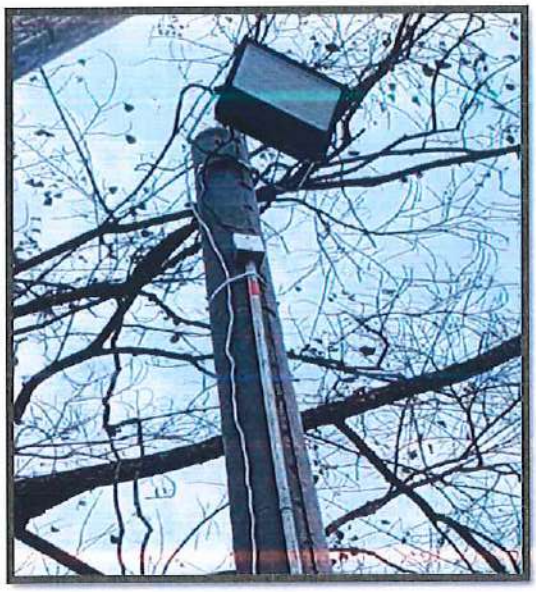

NP. 01 – Suministro, montaje y conexión de Proyector led 300 W, flujo luminoso 50100 lm incluye soporte

363






NP. 02 - Suministro e Instalación de Tablero de control de alumbrado con caja con protecciones según circuitos con contactores y botonera ON-OF






NP. 03 - Suministro e Instalación de Acometida 1 No 2Xfase + 1 No2xNeutro + 1No8xtierra NP.04 –



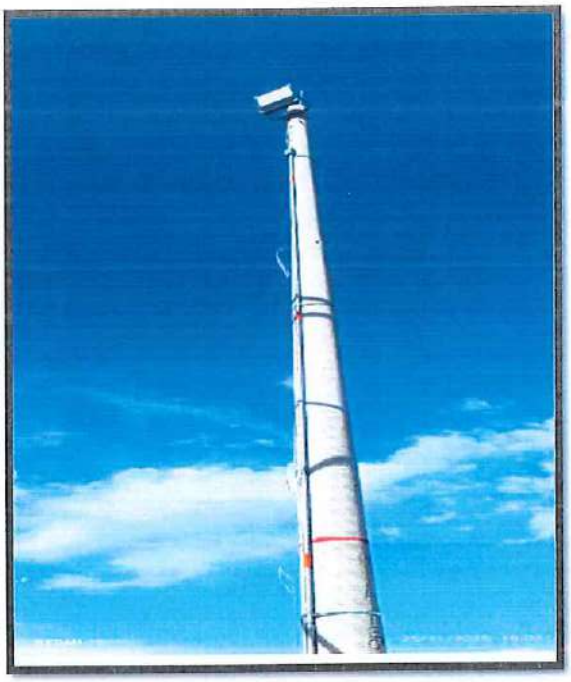

NP4. Ducto de 3/4" IMC para bajante de conexión eléctrica

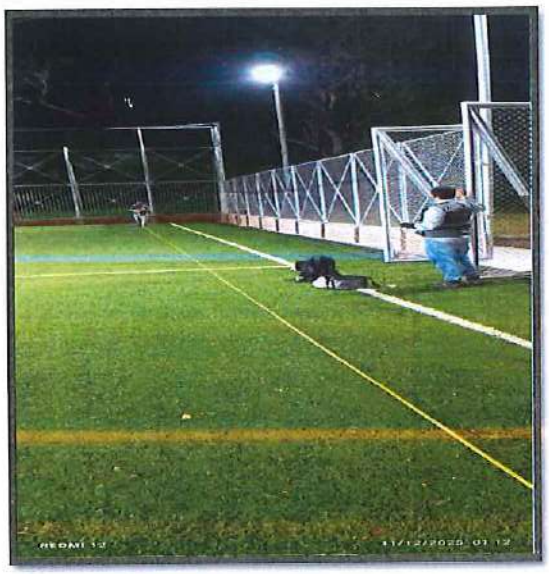



NP.05 - Actividades profesionales y documentales propias del constructor con objeto de trámite de Certificación RETIE Y RETILAP (Levantamiento, elaboración de planos y entrega de formatos).

15. ANEXOS

- INFORME HSEQ DEL PERIODO.
- ACTAS DE COMITÉS.
- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP) MES A MES.
- CORRESPONDENCIA GENERADA DURANTE EL PERIODO.
- ENTREGAR UN CD CON LA COPIA DIGITALIZADA DE TODO EL INFORME Y SUS ANEXOS

ING. YERSON FERNANDO CAMACHO	06/10/2025	ING. DANIELA CARRILLO TAVERA
FIRMA ORIGINAL **DIRECTOR DE OBRA**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **Vo.Bo DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

v&m ingeniería SAS

BITÁCORA DE OBRA ORIGINAL. (FIRMA DIRECTOR, RESIDENTE DE OBRA Y DIRECTOR, RESIDENTE DE INTERVENTORÍA)

CONTRATO DE OBRA No. CLOPIH221 de 2024

INFORME JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS
ACTA FINAL

PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 12/11/2024 AL 20/05/2025 Y DEL 15/09/2025 AL 06/11/2025

CONTRATISTA:
V&M INGENIERÍA S.A.S

INTERVENTORÍA:
CONSTRUMAC INGENIEROS SAS

CONTRATANTE:
EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA

2026

DIRECCION: CR 4 No. 11 – 188, TERUEL - HUILA
Tel: 8741735
E-MAIL: vymingenieriasas@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO 2
1 INTRODUCCIÓN 3
2 DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 4
2.1 INFORMACIÓN GENERAL 4
3 NATURALEZA DEL A.I.U. 5
4 CONCEPTO DEL IMPREVISTO 6
5 VALOR TOTAL DE IMPREVISTOS DEL CONTRATO 8
6 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LOS IMPREVISTOS DEL CONTRATO 9
6.1 Justificación Técnica y Afectación Climatológica (Periodo: 01 al 25 de Febrero de 2025) 9
6.2 Desglose Financiero de los Gastos por Imprevistos 10
6.2.1 Resumen General del Gasto de Imprevistos 10
6.2.2 Análisis Detallado de Costos por Concepto 10
7 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y EVIDENCIA DE CAMPO 11

DIRECCION: CR 4 No. 11 – 188, TERUEL - HUILA
Tel: 8741735
E-MAIL: vymingenieriasas@gmail.com

1 INTRODUCCIÓN

La contratación estatal en Colombia enfrenta un desafío constante: la falta de una valoración adecuada de los riesgos previsibles. Esta situación genera confusión entre los funcionarios de las entidades contratantes debido a conceptos contradictorios, tanto en la jurisprudencia de las altas cortes como en los pronunciamientos de los organismos de control.

En los contratos estatales de ejecución sucesiva, como los de construcción de obra, el presupuesto se elabora comúnmente bajo la modalidad de precios unitarios directos y costos indirectos. Los precios directos están ligados a actividades específicas de la obra (excavación, rellenos, concretos, etc.), mientras que los costos indirectos cubren tres aspectos clave, expresados tradicionalmente como el porcentaje de A.I.U. (Administración, Imprevistos y Utilidad):

1. Administración: Gastos de la estructura administrativa del proyecto, impuestos, seguros y financiación.
2. Imprevistos: Riesgos ordinarios y previsibles asumidos por el contratista.
3. Utilidad: Ganancia esperada por la ejecución de la obra.

El presente informe tiene como objetivo detallar y cuantificar los costos inesperados que V&M INGENIERÍA SAS ha afrontado durante la ejecución del contrato de referencia. Este análisis es fundamental para justificar la formulación del Acta Final y respaldar el equilibrio económico del proyecto.

Mediante una revisión exhaustiva de la documentación para identificar los gastos más significativos que surgieron de manera imprevista y que no se contemplaron en la propuesta inicial. Estos gastos, no contemplados inicialmente, impactan en el equilibrio económico que se busca mantener entre las partes desde el momento de la contratación hasta la conclusión exitosa del proyecto.

2 DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

A continuación, se compila la información correspondiente al estado contractual del contrato.

CONTRATO	CLOPIH221 DE 2024
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA"
CONTRATISTA	V&M INGENIERÍA SAS
NIT	900.092.688-7
REPRESENTANTE LEGAL	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO (D/M/A):	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	31 DE ENERO DE 2025 DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL (No.2) (D/M/A):	10 DE ABRIL DE 2025 DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y CONFORME AL ADICIONAL EN TIEMPO MEDIANTE PRORROGA NO.2
ACTA DE SUSPENSIÓN (No.1) (D/M/A):	20 DE MAYO 2025
ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN (No.1) (D/M/A):	19 DE AGOSTO 2025
ACTA DE REINCIO (No.1) (D/M/A):	15 DE SEPTIEMBRE 2025
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No.1	17 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION (D/M/A):	06 DE OCTUBRE 2025

VALOR INICIAL:	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($1.453.038.929,00) MCTE
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($ 79,971,854.00) MCTE
VALOR TOTAL:	MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($1,533,010,783.00) MCTE

3 NATURALEZA DEL A.I.U.

El concepto de A.I.U. (Administración, Imprevistos, Utilidad) se refiere a los costos indirectos de un contrato, y aunque no tiene una definición legal en Colombia, es un término ampliamente utilizado, especialmente para calcular el Impuesto sobre las Ventas (IVA) en ciertos servicios, la ejecución exitosa de un contrato depende en gran medida de estas actividades indirectas.

La Administración, hace referencia a los costos indirectos necesarios para el desarrollo y funcionamiento permanente del proyecto, tales como honorarios, impuestos, costos de personal, arrendamientos, costos de oficina, dotación en general, etc.

Los Imprevistos a su turno, son un rubro predispuesto para cubrir los eventuales sobrecostos en que pueda incurrir el contratista durante la ejecución de sus obligaciones, los cuales valga decir, hacen parte del aleas normal de cada contrato; pues una conclusión en sentido contrario, tergiversaría la figura y surcaríamos en ámbitos propios de la teoría de la imprevisión como hecho generador de desequilibrio económico del contrato, situación que es totalmente contraria a la que aquí se estudia, pues "imprevisión no es lo mismo que imprevisto".

Los Imprevistos dependen de la naturaleza de cada contrato y constituyen el alea del negocio, es decir los riesgos normales en que incurre el contratista, razón por la cual el "I" cubre situaciones inesperadas como: **atrasos por efecto del clima, accidentes de trabajadores, obras adicionales, deslizamientos por efecto del clima, derrumbes, entre otros**.

Finalmente, la Utilidad es el lucro perseguido por el contratista y que éste espera recibir tras la ejecución de sus obligaciones contractuales. Sobre el particular se ha sostenido por la doctrina que: "El contrato como negocio jurídico que es, tiene por objeto no solamente el cumplimiento de los fines estatales y la debida prestación de los servicios públicos, sino la percepción de una utilidad económica para el contratista que debe ser garantizada por el Estado".

4 CONCEPTO DEL IMPREVISTO

El porcentaje de Imprevistos incluido dentro del AIU es una forma de asignar y tratar un riesgo previsible dentro un proceso de contratación, en el cual la entidad estatal traslada el riesgo al contratista por los imprevistos que puedan ocurrir, correspondiendo su valor al costo de la contingencia que la entidad contratante le paga al contratista para que éste asuma el riesgo en la ocurrencia de imprevistos. Así las cosas, podría afirmarse que la entidad debe pagar el valor correspondiente a los imprevistos aun cuando no existan, pero en caso de haberse generado no podrá pagar un valor mayor al determinado por el contratista en su oferta económica para dicho aspecto.

Y aun cuando los gastos allí discriminados estén atribuidos al ejercicio, uso costumbre de la actividad de la ingeniería, el reconocimiento y pago de los imprevistos han sido objeto de debate en escenarios judiciales, administrativos y académicos con respecto a la procedencia del pago de los mismos, ante la ausencia de regulación legal sobre la materia y la inquietud revelada frente a la necesidad de contar con elementos de prueba que demuestren la causación de los riesgos imprevisibles, pero ordinarios e inherentes de la obra durante la etapa de ejecución del contrato.

Los imprevistos son entendidos por la doctrina como aquel porcentaje destinado a cubrir los gastos con los que no se contaba y que se presentan durante el alea normal de la ejecución del contrato. Y el "alea" como aquella circunstancia que puede ocurrir o no.

Así las cosas, al estarse en presencia de un gasto público que, por definición legal, debe estar debidamente justificado, surge la necesidad de definir si el porcentaje de Imprevistos que se reconoce y paga a favor del contratista durante la ejecución del contrato debe estar causado o no, con el fin de descartar un posible detrimento patrimonial o cuestionar la responsabilidad disciplinaria de los interventores o supervisores de los contratos que avalen su pago.

Indiscutiblemente, la falta de unanimidad de criterios entre los operadores judiciales y los entes de control, no dejan ver una solución de fondo a la anterior problemática y tampoco ha permitido que, en la práctica, las entidades contratantes, en especial, las entidades territoriales, decidan no pagar el porcentaje de Imprevistos, discriminado en la oferta del contratista hasta tanto se acredite la ocurrencia de los mismos.

Precisamente, porque existen pronunciamientos como el emitido por el órgano supremo de la jurisdicción administrativa, la cual menciona que:

v&m ingeniería SAS

"Es usual en la formulación de la oferta para la ejecución de un contrato de obra, la inclusión de una partida de gastos para imprevistos y esa inclusión e integración al valor de la propuesta surge como una necesidad para cubrir los posibles y eventuales riesgos que pueda enfrentar el contratista durante la ejecución del contrato. Sobre la naturaleza de esta partida y su campo de cobertura, la doctrina, buscando aclarar su sentido, destaca que la misma juega internamente en el cálculo del presupuesto total del contrato y que se admite de esa manera 'como defensa y garantía del principio de riesgo y ventura', para cubrir ciertos gastos con los que no se cuenta al formar los precios unitarios.

El porcentaje de imprevistos significa, pues, en su origen, la salvaguarda frente a los riesgos ordinarios que se producen en los contratos de obra y que, al no poder ser abonados con cargo a indemnizaciones otorgados por la Administración cuando se produzcan (ya que la técnica presupuestaria lo impediría en la mayoría de los casos), son evaluados a priori en los presupuestos del contrato. Cubre así los riesgos propios de toda obra, incluidos los casos fortuitos que podíamos llamar ordinarios. El porcentaje de imprevistos es, por tanto, una cantidad estimativa, con la que se trata de paliar el riesgo propio de todo contrato de obra. Como tal, unas veces cubrirá más y otras menos de los riesgos reales (los que, efectivamente, se realicen), y ahí radica justamente el alea del contrato. (Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección tercera. Rad. 14557(R4028), 2003)"

De igual manera, Colombia Compra Eficiente (2019) menciona que:

"En nuestro régimen de contratación estatal, nada se tiene previsto sobre la partida para gastos imprevistos y la jurisprudencia se ha limitado a reconocer el porcentaje que se conoce como A.I.U., como factor en el que se incluye ese valor, sobre todo, cuando el juez del contrato debe calcular la utilidad del contratista, a efecto de indemnizar los perjuicios reclamados por éste. Existe sí una relativa libertad del contratista en la destinación o inversión de esa partida, ya que, usualmente, no hace parte del régimen de sus obligaciones contractuales rendir cuentas sobre ella. Cita"

Es precisamente por estas posturas encontradas que, en estricto sentido, no violentan el ordenamiento jurídico, que se abre un importante aspecto de acción para el derecho disciplinario, toda vez que en muchos casos se deberá hacer un análisis exhaustivo de las particularidades de cada caso, a efectos de predicar la responsabilidad disciplinaria del interventor del contrato de obra que aprueba el pago de los imprevistos, cuya ocurrencia no se haya acreditado.

5 VALOR TOTAL DE IMPREVISTOS DEL CONTRATO.

Conforme a la estructura detallada en la oferta económica, V&M INGENIERÍA SAS delineó el desglose del AIU de la siguiente manera:

- Administración (A) = 20%
- Imprevistos (I) = 1%
- Utilidad (U) = 4%

Es esencial destacar que la suma de estos porcentajes, que asciende al 30%, representa el límite máximo del AIU establecido por la entidad contratante en el marco del proceso. Esta asignación estratégica de porcentajes no solo evidencia la transparencia y la meticulosidad en la formulación de la propuesta, sino también la conformidad con las pautas previamente establecidas para mantener la integridad del proceso contractual.

De conformidad con el acta de recibo final y el estado de ejecución real de la obra, se precisa que el contrato no alcanzó una ejecución financiera del 100% de su valor pactado, registrándose un saldo no ejecutado a favor de la Entidad Contratante. En consecuencia, y con el fin de mantener la estricta proporcionalidad del AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad) respecto a las actividades efectivamente recibidas y pagadas, se procedió a realizar el respectivo ajuste de estos componentes de acuerdo con el porcentaje de ejecución real. Con base en lo anterior, los valores definitivos a justificar para cada rubro del AIU disminuyen proporcionalmente, quedando establecidos de la siguiente manera:

Administración ajustada: $243.662.101 pesos.

Imprevistos ajustados: $12.183.105 pesos.

Utilidad ajustada: $48.732.420 pesos.

Bajo este escenario de ajuste proporcional, la bolsa de imprevistos final por valor de $12.183.105 pesos constituye el techo presupuestal sobre el cual se soportan las novedades ocurridas en la obra.

6 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LOS IMPREVISTOS DEL CONTRATO

6.1 Justificación Técnica y Afectación Climatológica (Periodo: 01 al 25 de Febrero de 2025)

Durante el periodo comprendido entre el **1 de febrero de 2025 y el 25 de febrero de 2025**, la ejecución de las obras civiles experimentó graves perturbaciones de carácter exógeno debido a condiciones hidrometeorológicas altamente adversas. La presencia de precipitaciones constantes y de gran intensidad sobre la zona del proyecto generó una alteración severa en el proceso constructivo, afectando de manera directa las actividades de movimiento de tierras, adecuación de la subestructura y estabilización de la base soporte.

Estas afectaciones se traducen técnicamente en los siguientes impactos:

- **Deterioro y Arrastre de Material:** Las escorrentías superficiales generadas por las fuertes lluvias provocaron el lavado, erosión y arrastre del material granular que ya se encontraba extendido en el campo de juego. Esto generó una pérdida directa de los niveles de diseño y obligó a realizar actividades no previstas de **reposición de material** para recuperar la geometría de la cancha.

- **Saturación del Suelo de Soporte:** El material granular de sub-base experimentó un fenómeno de saturación hídrica extrema durante sus fases de instalación y compactación. Bajo estas condiciones de exceso de humedad, el suelo pierde por completo su capacidad portante, imposibilitando el proceso de compactación técnica requerido.

- **Mitigación de Riesgos Estructurales Futuros:** De haberse continuado con la compactación sobre un suelo saturado, se habría comprometido la estabilidad de la **placa soporte de la cancha sintética**, generando asentamientos diferenciales, fallas por cortante y daños irreparables a mediano plazo en el césped sintético. Por lo tanto, fue técnicamente imperativo retirar el material saturado y reponerlo con material seco tipo recebo para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad.

Soporte en Bitácora de Obra: Conforme a los registros oficiales de la **Bitácora de Obra** correspondientes a este periodo, se constató que las condiciones climáticas adversas limitaron la ejecución normal de las actividades de campo. Ante esta imposibilidad física de trabajar en pista sin dañar la estructura de suelo, el contratista procedió a optimizar los tiempos mediante el desarrollo de actividades de carácter administrativo, planeación técnica, armado de

estructuras de acero y, en las ventanas de tiempo seco que el clima de vez en cuando permitía, se adelantaron de forma puntual labores operativas de mitigación y drenaje.

6.2 Desglose Financiero de los Gastos por Imprevistos

A continuación, se presenta el análisis detallado de los costos directos derivados de la parálisis parcial de maquinaria, personal en condición de *stand-by* (tiempo muerto) y la reposición de materiales requeridos para subsanar los daños causados por la ola invernal.

6.2.1 Resumen General del Gasto de Imprevistos

ITEM	Descripción de la Actividad Realizada	Valor Total
1	Stand-by de maquinaria pesada y transporte	$ 3,998,105
2	Stand-by de personal operativo en campo	$ 385,000
3	Suministro de materiales granulares tipo recebo	$ 7,800,000
-	**TOTAL GENERAL DE IMPREVISTOS**	**$ 12,183,105**

6.2.2 Análisis Detallado de Costos por Concepto

A. Stand-by de Maquinaria Pesada y Transporte Corresponde al costo financiero de mantener los equipos amarillos y de transporte estacionados en obra, sin operación pero devengando costo de permanencia debido a la imposibilidad de operar sobre terrenos saturados e inundados.

Maquinaria	Horas en Stand-by	Valor Hora ($)	Valor Total
Retroexcavadora	14	$ 113,722	$ 1,592,105
Motoniveladora	8	$ 125,000	$ 1,000,000
Volqueta (Viaje)	4	$ 180,000	$ 720,000
Vibrocompactador	7	$ 98,000	$ 686,000
SUBTOTAL EQUIPOS			**$ 3,998,105**

B. Stand-by de Personal Operativo en Campo Representa el costo de la mano de obra contratada que debió permanecer en el sitio para labores de control de escorrentías, drenajes

de emergencia y administración, sin poder ejecutar sus actividades contractuales programadas debido a la lluvia constante.

Profesional / Personal	Salario por Hora ($)	Horas Afectadas	Valor Total
Maestro de Obra	$ 18,125.00	14	$ 253,750.00
Ayudante de Obra	$ 9,375.00	14	$ 131,250.00
SUBTOTAL PERSONAL POR LLUVIAS			**$ 385,000.00**

C. Suministro de Materiales Granulares Tipo Recebo (Reposición) Inversión requerida para la compra y transporte de material de afirmado/recebo nuevo y seco, destinado a reemplazar los 26 m3 de material que resultaron lavados por el arrastre de lluvias o totalmente degradados por saturación hídrica extrema.

Material	Valor Unitario ($ / m3)	Cantidad (m3)	Valor Total
Material de Relleno (Recebo)	$ 300,000.00	26	$ 7,800,000.00
SUBTOTAL MATERIAL DE REPOSICIÓN			**$ 7,800,000**

7 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y EVIDENCIA DE CAMPO

Como soporte fáctico de las condiciones descritas, se anexa el registro fotográfico donde se evidencian de manera clara y contundente las siguientes situaciones:

- **Saturación e inundación de la base de soporte:** Presencia de espejos de agua superficiales acumulados sobre la sub-base del terreno de juego, lo cual demuestra físicamente el estado de saturación del suelo que impidió el rodamiento y compactación por parte de la maquinaria.
- **Inundación en excavaciones estructurales:** Acumulación severa de agua dentro de las zanjas de drenaje y vigas de confinamiento (canales perimetrales), requiriendo de bombeo constante y retrasando la fundición de concretos y la instalación de los refuerzos de acero debido al lodo.

- **Parálisis de maquinaria (Stand-by):** Equipos como el vibrocompactador y la retroexcavadora estacionados en zonas adyacentes por la total falta de tracción y el riesgo de generar fallas o deformaciones plásticas irreversibles en la estructura del suelo del campo de juego.





DIRECCION: CR 4 No. 11 – 188, TERUEL - HUILA
Tel: 8741735
E-MAIL: vymingenieriasas@gmail.com



Elaboró:

YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
VYM INGENEIRA SAS
CONTRATISTA

Aprobó:

DANIELA CARRILLO TAVERA
CONSTRUMA INGENIROS SAS
INTERVENTORIA

DIRECCION: CR 4 No. 11 – 188, TERUEL - HUILA
Tel: 8741735
E-MAIL: vymingenieriasas@gmail.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL VS FINAL

V&M INGENIERIA SAS

CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S

NIT. 900.116.571 - 8

OBJETO:	"CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"
CONTRATANTE:	V&M INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA:	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
INTERVENTORIA	CONSTRUMAC INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	DANIELA CARRILLO TAVERA
FECHA DE INICIO:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSI No.1 (PRORROGA)	31 DE ENERO DE 2025 DOS (02) MESES
OTROSI No.2 (PRORROGA)	10 DE ABRIL DE 2025 DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y CONFORME AL ADICIONAL EN TIEMPO MEDIANTE PRORROGA
ACTA DE SUSPENSION (No.1)	20 DE MAYO 2025
ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN (No.1)	19 DE AGOSTO 2025
ACTA DE REINCIO (No.1)	15 DE SEPTIEMBRE 2025
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	17 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION	06 DE OCTUBRE 2025

Socialización de proyecto de obra
19/11/2024



Conformación de veeduría ciudadana
19/11/2024



Suministro e información de valla informativa
20/11/2024



Visita inicial
20/11/2024



V&M INGENIERIA SAS

CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S

NIT. 900.116.571 - 8


OBJETO:	"CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"
CONTRATANTE:	V&M INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA:	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
INTERVENTORIA	CONSTRUMAC INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	DANIELA CARRILLO TAVERA
FECHA DE INICIO:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSI No.1 (PRORROGA)	31 DE ENERO DE 2025 DOS (02) MESES
OTROSI No.2 (PRORROGA)	10 DE ABRIL DE 2025 DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y CONFORME AL ADICIONAL EN TIEMPO MEDIANTE PRORROGA
ACTA DE SUSPENSION (No.1)	20 DE MAYO 2025
ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN (No.1)	19 DE AGOSTO 2025
ACTA DE REINCIO (No.1)	15 DE SEPTIEMBRE 2025
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	17 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION	06 DE OCTUBRE 2025

PRELIMINARES

Inicio de actividades de localización y replanteo (Levantamiento topográfico)





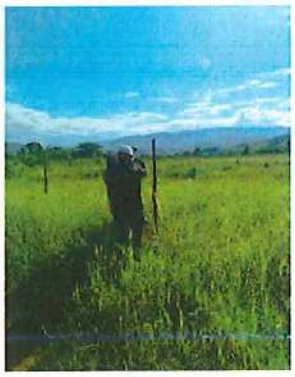

Actividades de localización y replanteo (levantamiento topográfico) 23/11/2024





V&M INGENIERIA SAS

CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S

NIT. 900.116.571 - 8

OBJETO:	"CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"
CONTRATANTE:	V&M INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA:	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
INTERVENTORIA	CONSTRUMAC INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	DANIELA CARRILLO TAVERA
FECHA DE INICIO:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSI No.1 (PRORROGA)	31 DE ENERO DE 2025 DOS (02) MESES
OTROSI No.2 (PRORROGA)	10 DE ABRIL DE 2025 DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y CONFORME AL ADICIONAL EN TIEMPO MEDIANTE PRORROGA
ACTA DE SUSPENSION (No.1)	20 DE MAYO 2025
ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN (No.1)	19 DE AGOSTO 2025
ACTA DE REINCIO (No.1)	15 DE SEPTIEMBRE 2025
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	17 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION	06 DE OCTUBRE 2025

Actividades de localización y replanteo




Actividades de localización y replanteo



Actividades de localización y replanteo (Demarcación y niveles topográfico)



Implantación de diseño establecido

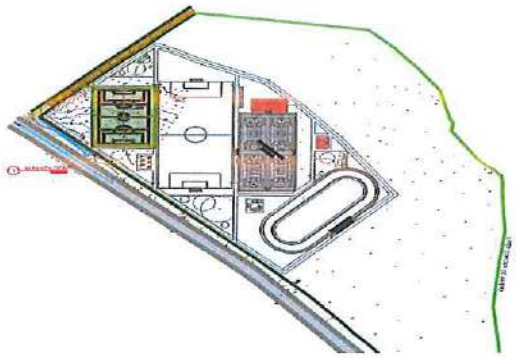

V&M INGENIERIA SAS

CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S

NIT. 900.116.571 - 8

OBJETO:	"CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"
CONTRATANTE:	V&M INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA:	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
INTERVENTORIA	CONSTRUMAC INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	DANIELA CARRILLO TAVERA
FECHA DE INICIO:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSI No.1 (PRORROGA)	31 DE ENERO DE 2025 DOS (02) MESES
OTROSI No.2 (PRORROGA)	10 DE ABRIL DE 2025 DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y CONFORME AL ADICIONAL EN TIEMPO MEDIANTE PRORROGA
ACTA DE SUSPENSION (No.1)	20 DE MAYO 2025
ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN (No.1)	19 DE AGOSTO 2025
ACTA DE REINCIO (No.1)	15 DE SEPTIEMBRE 2025
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	17 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION	06 DE OCTUBRE 2025

Descapote e=0,20m a máquina incluye retiro material



Retiro de material sobrante



Excavacion mecanica incluye retiro



Excavacion mecanica incluye retiro



V&M INGENIERIA SAS

CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S

NIT. 900.116.571 - 8

OBJETO:	"CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"
CONTRATANTE:	V&M INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA:	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
INTERVENTORIA	CONSTRUMAC INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	DANIELA CARRILLO TAVERA
FECHA DE INICIO:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSI No.1 (PRORROGA)	31 DE ENERO DE 2025 DOS (02) MESES
OTROSI No.2 (PRORROGA)	10 DE ABRIL DE 2025 DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y CONFORME AL ADICIONAL EN TIEMPO MEDIANTE PRORROGA
ACTA DE SUSPENSION (No.1)	20 DE MAYO 2025
ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN (No.1)	19 DE AGOSTO 2025
ACTA DE REINCIO (No.1)	15 DE SEPTIEMBRE 2025
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	17 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION	06 DE OCTUBRE 2025

Suministro de material de relleno Recebo



Extendida de material de relleno Recebo



Extendida y nivelacion de material de relleno Recebo



Rellenos con recebo compactado mecánicamente



v&m ingenieria SAS

CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S

NIT. 900.116.571 - 8

OBJETO:	"CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"
CONTRATANTE:	V&M INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA:	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
INTERVENTORIA	CONSTRUMAC INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	DANIELA CARRILLO TAVERA
FECHA DE INICIO:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSI No.1 (PRORROGA)	31 DE ENERO DE 2025 DOS (02) MESES
OTROSI No.2 (PRORROGA)	10 DE ABRIL DE 2025 DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y CONFORME AL ADICIONAL EN TIEMPO MEDIANTE PRORROGA
ACTA DE SUSPENSION (No.1)	20 DE MAYO 2025
ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN (No.1)	19 DE AGOSTO 2025
ACTA DE REINCIO (No.1)	15 DE SEPTIEMBRE 2025
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	17 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION	06 DE OCTUBRE 2025

Condiciones climáticas adversas



Comité técnico - Concejo Municipal



Comité de obra técnico secretaria de planeación



Excavación Manual para la construcción de concreto ciclópeo como base de soporte para el Cerramiento Perimetral



V&M INGENIERIA SAS

CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S

NIT. 900.116.571 - 8

OBJETO:	"CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"
CONTRATANTE:	V&M INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA:	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
INTERVENTORIA	CONSTRUMAC INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	DANIELA CARRILLO TAVERA
FECHA DE INICIO:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSI No.1 (PRORROGA)	31 DE ENERO DE 2025 DOS (02) MESES
OTROSI No.2 (PRORROGA)	10 DE ABRIL DE 2025 DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y CONFORME AL ADICIONAL EN TIEMPO MEDIANTE PRORROGA
ACTA DE SUSPENSION (No.1)	20 DE MAYO 2025
ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN (No.1)	19 DE AGOSTO 2025
ACTA DE REINCIO (No.1)	15 DE SEPTIEMBRE 2025
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	17 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION	06 DE OCTUBRE 2025

Excavación Manual 26/02/2025





Construcción de concreto ciclópeo 2500 PSI (60% concreto- 40% piedra media zonga) para cimentación cerramiento)
28/02/2025





V&M INGENIERIA SAS

CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S

NIT. 900.116.571 - 8

OBJETO:	"CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"
CONTRATANTE:	V&M INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA:	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
INTERVENTORIA	CONSTRUMAC INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	DANIELA CARRILLO TAVERA
FECHA DE INICIO:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSI No.1 (PRORROGA)	31 DE ENERO DE 2025 DOS (02) MESES
OTROSI No.2 (PRORROGA)	10 DE ABRIL DE 2025 DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y CONFORME AL ADICIONAL EN TIEMPO MEDIANTE PRORROGA
ACTA DE SUSPENSION (No.1)	20 DE MAYO 2025
ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN (No.1)	19 DE AGOSTO 2025
ACTA DE REINCIO (No.1)	15 DE SEPTIEMBRE 2025
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	17 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION	06 DE OCTUBRE 2025









OBJETO:	"CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"
CONTRATANTE:	V&M INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA:	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
INTERVENTORIA	CONSTRUMAC INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	DANIELA CARRILLO TAVERA
FECHA DE INICIO:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSI No.1 (PRORROGA)	31 DE ENERO DE 2025 DOS (02) MESES
OTROSI No.2 (PRORROGA)	10 DE ABRIL DE 2025 DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y CONFORME AL ADICIONAL EN TIEMPO MEDIANTE PRORROGA
ACTA DE SUSPENSION (No.1)	20 DE MAYO 2025
ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN (No.1)	19 DE AGOSTO 2025
ACTA DE REINCIO (No.1)	15 DE SEPTIEMBRE 2025
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	17 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION	06 DE OCTUBRE 2025

Instalacion de formatela para fundicion de viga de cimentación	Fundicion de viga de cimentacion cerramiento 0,2x0,2m 3000PSI
	
	

V&M INGENIERIA SAS

CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S

NIT. 900.116.571 - 8

OBJETO:	"CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"
CONTRATANTE:	V&M INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA:	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
INTERVENTORIA	CONSTRUMAC INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	DANIELA CARRILLO TAVERA
FECHA DE INICIO:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSI No.1 (PRORROGA)	31 DE ENERO DE 2025 DOS (02) MESES
OTROSI No.2 (PRORROGA)	10 DE ABRIL DE 2025 DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y CONFORME AL ADICIONAL EN TIEMPO MEDIANTE PRORROGA
ACTA DE SUSPENSION (No.1)	20 DE MAYO 2025
ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN (No.1)	19 DE AGOSTO 2025
ACTA DE REINCIO (No.1)	15 DE SEPTIEMBRE 2025
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	17 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION	06 DE OCTUBRE 2025









v&m ingeniería SAS

CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S

NIT. 900.116.571 - 8

OBJETO:	"CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"
CONTRATANTE:	V&M INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA:	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
INTERVENTORIA	CONSTRUMAC INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	DANIELA CARRILLO TAVERA
FECHA DE INICIO:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSI No.1 (PRORROGA)	31 DE ENERO DE 2025 DOS (02) MESES
OTROSI No.2 (PRORROGA)	10 DE ABRIL DE 2025 DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y CONFORME AL ADICIONAL EN TIEMPO MEDIANTE PRORROGA
ACTA DE SUSPENSION (No.1)	20 DE MAYO 2025
ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN (No.1)	19 DE AGOSTO 2025
ACTA DE REINCIO (No.1)	15 DE SEPTIEMBRE 2025
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	17 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION	06 DE OCTUBRE 2025

VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI









NIT. 900.116.571 - 8

OBJETO:	"CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"
CONTRATANTE:	V&M INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA:	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
INTERVENTORIA	CONSTRUMAC INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	DANIELA CARRILLO TAVERA
FECHA DE INICIO:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSI No.1 (PRORROGA)	31 DE ENERO DE 2025 DOS (02) MESES
OTROSI No.2 (PRORROGA)	10 DE ABRIL DE 2025 DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y CONFORME AL ADICIONAL EN TIEMPO MEDIANTE PRORROGA
ACTA DE SUSPENSION (No.1)	20 DE MAYO 2025
ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN (No.1)	19 DE AGOSTO 2025
ACTA DE REINCIO (No.1)	15 DE SEPTIEMBRE 2025
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	17 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION	06 DE OCTUBRE 2025





Acero de refuerzo 37000 psi incluye figurado e instalacion





NIT. 900.116.571 - 8

OBJETO:	"CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"
CONTRATANTE:	V&M INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA:	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
INTERVENTORIA	CONSTRUMAC INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	DANIELA CARRILLO TAVERA
FECHA DE INICIO:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSI No.1 (PRORROGA)	31 DE ENERO DE 2025 DOS (02) MESES
OTROSI No.2 (PRORROGA)	10 DE ABRIL DE 2025 DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y CONFORME AL ADICIONAL EN TIEMPO MEDIANTE PRORROGA
ACTA DE SUSPENSION (No.1)	20 DE MAYO 2025
ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN (No.1)	19 DE AGOSTO 2025
ACTA DE REINCIO (No.1)	15 DE SEPTIEMBRE 2025
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	17 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION	06 DE OCTUBRE 2025

Tuberia galvanizada 2" cal 2mm





Toma de densidades





OBJETO:	"CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"
CONTRATANTE:	V&M INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA:	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
INTERVENTORIA	CONSTRUMAC INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	DANIELA CARRILLO TAVERA
FECHA DE INICIO:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSI No.1 (PRORROGA)	31 DE ENERO DE 2025 DOS (02) MESES
OTROSI No.2 (PRORROGA)	10 DE ABRIL DE 2025 DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y CONFORME AL ADICIONAL EN TIEMPO MEDIANTE PRORROGA
ACTA DE SUSPENSION (No.1)	20 DE MAYO 2025
ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN (No.1)	19 DE AGOSTO 2025
ACTA DE REINCIO (No.1)	15 DE SEPTIEMBRE 2025
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	17 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION	06 DE OCTUBRE 2025

Instalacion de formaleta para placa en concreto de 3000 PSI









V&M INGENIERIA SAS

CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S

NIT. 900.116.571 - 8

OBJETO:	"CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"
CONTRATANTE:	V&M INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA:	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
INTERVENTORIA	CONSTRUMAC INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	DANIELA CARRILLO TAVERA
FECHA DE INICIO:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSI No.1 (PRORROGA)	31 DE ENERO DE 2025 DOS (02) MESES
OTROSI No.2 (PRORROGA)	10 DE ABRIL DE 2025 DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y CONFORME AL ADICIONAL EN TIEMPO MEDIANTE PRORROGA
ACTA DE SUSPENSION (No.1)	20 DE MAYO 2025
ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN (No.1)	19 DE AGOSTO 2025
ACTA DE REINCIO (No.1)	15 DE SEPTIEMBRE 2025
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	17 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION	06 DE OCTUBRE 2025

Placa de piso en concreto 3000 psi, e =0,07m





Muro cerramiento en ladrillo semiprensado a la vista





V&M INGENIERIA SAS

CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S

NIT. 900.116.571 - 8

OBJETO:	"CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"
CONTRATANTE:	V&M INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA:	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
INTERVENTORIA	CONSTRUMAC INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	DANIELA CARRILLO TAVERA
FECHA DE INICIO:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSI No.1 (PRORROGA)	31 DE ENERO DE 2025 DOS (02) MESES
OTROSI No.2 (PRORROGA)	10 DE ABRIL DE 2025 DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y CONFORME AL ADICIONAL EN TIEMPO MEDIANTE PRORROGA
ACTA DE SUSPENSION (No.1)	20 DE MAYO 2025
ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN (No.1)	19 DE AGOSTO 2025
ACTA DE REINCIO (No.1)	15 DE SEPTIEMBRE 2025
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	17 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION	06 DE OCTUBRE 2025





Ensayo de compactación de campo





CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S

NIT. 900.116.571 - 8

OBJETO:	"CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"
CONTRATANTE:	V&M INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA:	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
INTERVENTORIA	CONSTRUMAC INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	DANIELA CARRILLO TAVERA
FECHA DE INICIO:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSI No.1 (PRORROGA)	31 DE ENERO DE 2025 DOS (02) MESES
OTROSI No.2 (PRORROGA)	10 DE ABRIL DE 2025 DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y CONFORME AL ADICIONAL EN TIEMPO MEDIANTE PRORROGA
ACTA DE SUSPENSION (No.1)	20 DE MAYO 2025
ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN (No.1)	19 DE AGOSTO 2025
ACTA DE REINCIO (No.1)	15 DE SEPTIEMBRE 2025
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	17 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION	06 DE OCTUBRE 2025

Construcción de concreto de 3000 PSI placa de piso E: 0.07 m









V&M INGENIERIA SAS

CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S

NIT. 900.116.571 - 8

OBJETO:	"CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"
CONTRATANTE:	V&M INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA:	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
INTERVENTORIA	CONSTRUMAC INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	DANIELA CARRILLO TAVERA
FECHA DE INICIO:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSI No.1 (PRORROGA)	31 DE ENERO DE 2025 DOS (02) MESES
OTROSI No.2 (PRORROGA)	10 DE ABRIL DE 2025 DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y CONFORME AL ADICIONAL EN TIEMPO MEDIANTE PRORROGA
ACTA DE SUSPENSION (No.1)	20 DE MAYO 2025
ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN (No.1)	19 DE AGOSTO 2025
ACTA DE REINCIO (No.1)	15 DE SEPTIEMBRE 2025
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	17 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION	06 DE OCTUBRE 2025

Excavación manual con retiro de material





Construcción de filtros laterales externos en un ancho de 0.40 m, con altura variable menor a 0.50 m, recubrimiento en geotextil no tejido NT-1600, con gravilla común o triturado de 1 1/2" a 4" + Tubería PVC drenajes de 6"





NIT. 900.116.571 - 8

OBJETO:	"CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"
CONTRATANTE:	V&M INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA:	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
INTERVENTORIA	CONSTRUMAC INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	DANIELA CARRILLO TAVERA
FECHA DE INICIO:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSI No.1 (PRORROGA)	31 DE ENERO DE 2025 DOS (02) MESES
OTROSI No.2 (PRORROGA)	10 DE ABRIL DE 2025 DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y CONFORME AL ADICIONAL EN TIEMPO MEDIANTE PRORROGA
ACTA DE SUSPENSION (No.1)	20 DE MAYO 2025
ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN (No.1)	19 DE AGOSTO 2025
ACTA DE REINCIO (No.1)	15 DE SEPTIEMBRE 2025
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	17 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION	06 DE OCTUBRE 2025

Suministro e Instalación de bordillos prefabricado 20X50X50





Concreto 3000 psi pedestales cerramiento perimetral

V&M INGENIERIA SAS

CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S

NIT. 900.116.571 - 8

OBJETO:	"CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"
CONTRATANTE:	V&M INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA:	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
INTERVENTORIA	CONSTRUMAC INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	DANIELA CARRILLO TAVERA
FECHA DE INICIO:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSI No.1 (PRORROGA)	31 DE ENERO DE 2025 DOS (02) MESES
OTROSI No.2 (PRORROGA)	10 DE ABRIL DE 2025 DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y CONFORME AL ADICIONAL EN TIEMPO MEDIANTE PRORROGA
ACTA DE SUSPENSION (No.1)	20 DE MAYO 2025
ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN (No.1)	19 DE AGOSTO 2025
ACTA DE REINCIO (No.1)	15 DE SEPTIEMBRE 2025
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	17 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION	06 DE OCTUBRE 2025

Módulos cerramiento 2,5x2,5 m en Angulo 1 1/2"x1/8 con varilla de 5/8" lisa cada 14 cms, diagonales en angulo 1 1/2" x 1/8 y lamina cal 16 10X10 cms de refuerzo en las esquinas (lado norte y sur) h=2,5m









NIT. 900.116.571 - 8

OBJETO:	"CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"
CONTRATANTE:	V&M INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA:	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
INTERVENTORIA	CONSTRUMAC INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	DANIELA CARRILLO TAVERA
FECHA DE INICIO:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSI No.1 (PRORROGA)	31 DE ENERO DE 2025 DOS (02) MESES
OTROSI No.2 (PRORROGA)	10 DE ABRIL DE 2025 DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y CONFORME AL ADICIONAL EN TIEMPO MEDIANTE PRORROGA
ACTA DE SUSPENSION (No.1)	20 DE MAYO 2025
ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN (No.1)	19 DE AGOSTO 2025
ACTA DE REINCIO (No.1)	15 DE SEPTIEMBRE 2025
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	17 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION	06 DE OCTUBRE 2025

Modulos cerramiento 2,5x2,5 m en angulo 1 1/2"x1/8 con malla eslabonada cal 10 hueco 2 1/4"x2 1/4", diagonales en angulo 1 1/2" x1/8 y lamina cal 16 10X10cm de refuerzo en la esquinas (lado oriente y occidente) h=2,5m





Pie de amigo en tuberia galvanizada 2" cal 2mm incluye anclajes, concreto 3000 psi 50x50x60 costados norte y sur





Suministro e instalacion de almohadilla de choque shock pad 20 mm

CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S
NIT. 900.116.571 - 8

OBJETO:	"CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"
CONTRATANTE:	V&M INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA:	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
INTERVENTORIA	CONSTRUMAC INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	DANIELA CARRILLO TAVERA
FECHA DE INICIO:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSI No.1 (PRORROGA)	31 DE ENERO DE 2025 DOS (02) MESES
OTROSI No.2 (PRORROGA)	10 DE ABRIL DE 2025 DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y CONFORME AL ADICIONAL EN TIEMPO MEDIANTE PRORROGA
ACTA DE SUSPENSION (No.1)	20 DE MAYO 2025
ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN (No.1)	19 DE AGOSTO 2025
ACTA DE REINCIO (No.1)	15 DE SEPTIEMBRE 2025
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	17 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION	06 DE OCTUBRE 2025





Suministro e instalación de césped monofilamentado rafia de 50mm de altura, con proteccion de rayos UV, con 1300 gramos por metro cuadrado de rafia, de 13200 dtx, base: backing doble capa, demarcacion de color blanco con cesped de blanco de fabrica, incluye granulo de caucho, pegamento importado.





Suministro e instalacion de puerta en tuberia 2" galvanizada cal 2mm con malla eslabonada cal 10 y con portacandado, incluye pasador porta candado.

V&M INGENIERIA SAS

CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S

NIT. 900.116.571 - 8

OBJETO:	"CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"
CONTRATANTE:	V&M INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA:	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
INTERVENTORIA	CONSTRUMAC INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	DANIELA CARRILLO TAVERA
FECHA DE INICIO:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSI No.1 (PRORROGA)	31 DE ENERO DE 2025 DOS (02) MESES
OTROSI No.2 (PRORROGA)	10 DE ABRIL DE 2025 DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y CONFORME AL ADICIONAL EN TIEMPO MEDIANTE PRORROGA
ACTA DE SUSPENSION (No.1)	20 DE MAYO 2025
ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN (No.1)	19 DE AGOSTO 2025
ACTA DE REINCIO (No.1)	15 DE SEPTIEMBRE 2025
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	17 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION	06 DE OCTUBRE 2025





Concreto 3000 psi andenes perimentrales e=8cm, incluye malla electrosoldada y formaleta





Suministro e instalacion de malla de cerramiento en nylon 100% alta densidad con proteccion UV, ojo 13x13, calibre #4 incluye; guaya, tensores y tubo de 2"

V&M INGENIERIA SAS

CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S

NIT. 900.116.571 - 8

OBJETO:	"CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"
CONTRATANTE:	V&M INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA:	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
INTERVENTORIA	CONSTRUMAC INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	DANIELA CARRILLO TAVERA
FECHA DE INICIO:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSI No.1 (PRORROGA)	31 DE ENERO DE 2025 DOS (02) MESES
OTROSI No.2 (PRORROGA)	10 DE ABRIL DE 2025 DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y CONFORME AL ADICIONAL EN TIEMPO MEDIANTE PRORROGA
ACTA DE SUSPENSION (No.1)	20 DE MAYO 2025
ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN (No.1)	19 DE AGOSTO 2025
ACTA DE REINCIO (No.1)	15 DE SEPTIEMBRE 2025
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	17 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION	06 DE OCTUBRE 2025





Pie de amigo en tuberia galvanizada 2" cal 2mm incluye anclajes, concreto 3000 psi 50x50x60 costados norte y sur





OBJETO:	"CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"
CONTRATANTE:	V&M INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA:	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
INTERVENTORIA	CONSTRUMAC INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	DANIELA CARRILLO TAVERA
FECHA DE INICIO:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSI No.1 (PRORROGA)	31 DE ENERO DE 2025 DOS (02) MESES
OTROSI No.2 (PRORROGA)	10 DE ABRIL DE 2025 DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y CONFORME AL ADICIONAL EN TIEMPO MEDIANTE PRORROGA
ACTA DE SUSPENSION (No.1)	20 DE MAYO 2025
ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN (No.1)	19 DE AGOSTO 2025
ACTA DE REINCIO (No.1)	15 DE SEPTIEMBRE 2025
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	17 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION	06 DE OCTUBRE 2025


ILUMINACION


Suministro e instalacion de acometida en CABLE CU AISL THHN/THWN - 2x8F+1x10T en tuberia PVC 1





Salida parcial electrica (2 THHN No.10 + 1 THHN No.12)

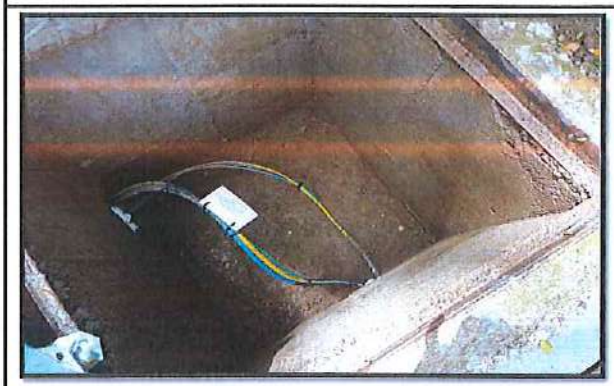

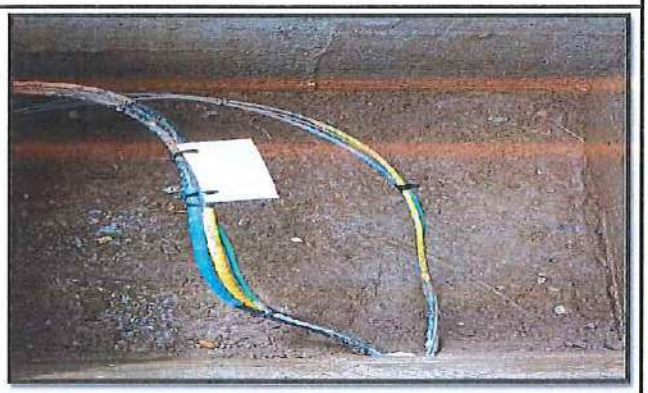

NIT. 900.116.571 - 8

OBJETO:	"CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"
CONTRATANTE:	V&M INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA:	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
INTERVENTORIA	CONSTRUMAC INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	DANIELA CARRILLO TAVERA
FECHA DE INICIO:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSI No.1 (PRORROGA)	31 DE ENERO DE 2025 DOS (02) MESES
OTROSI No.2 (PRORROGA)	10 DE ABRIL DE 2025 DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y CONFORME AL ADICIONAL EN TIEMPO MEDIANTE PRORROGA
ACTA DE SUSPENSION (No.1)	20 DE MAYO 2025
ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN (No.1)	19 DE AGOSTO 2025
ACTA DE REINCIO (No.1)	15 DE SEPTIEMBRE 2025
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	17 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION	06 DE OCTUBRE 2025

Suministro e instalacion de postes de concreto pretensado L= 12m 750kg incluye transporte e hizada





Murete para tablero de control en muro con bloque #5





v&m ingenieria SAS

CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S

NIT. 900.116.571 - 8

OBJETO:	"CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"
CONTRATANTE:	V&M INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA:	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
INTERVENTORIA	CONSTRUMAC INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	DANIELA CARRILLO TAVERA
FECHA DE INICIO:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSI No.1 (PRORROGA)	31 DE ENERO DE 2025 DOS (02) MESES
OTROSI No.2 (PRORROGA)	10 DE ABRIL DE 2025 DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y CONFORME AL ADICIONAL EN TIEMPO MEDIANTE PRORROGA
ACTA DE SUSPENSION (No.1)	20 DE MAYO 2025
ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN (No.1)	19 DE AGOSTO 2025
ACTA DE REINCIO (No.1)	15 DE SEPTIEMBRE 2025
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	17 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION	06 DE OCTUBRE 2025

construccion de cajas de inspeccion tipo alumbrado en concreto de 30x30





Cajas de inspeccion de 60x60 CM (medida interior)





OBJETO:	"CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"
CONTRATANTE:	V&M INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA:	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
INTERVENTORIA	CONSTRUMAC INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	DANIELA CARRILLO TAVERA
FECHA DE INICIO:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSI No.1 (PRORROGA)	31 DE ENERO DE 2025 DOS (02) MESES
OTROSI No.2 (PRORROGA)	10 DE ABRIL DE 2025 DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y CONFORME AL ADICIONAL EN TIEMPO MEDIANTE PRORROGA
ACTA DE SUSPENSION (No.1)	20 DE MAYO 2025
ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN (No.1)	19 DE AGOSTO 2025
ACTA DE REINCIO (No.1)	15 DE SEPTIEMBRE 2025
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	17 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION	06 DE OCTUBRE 2025


Sumistro e instalacion de sistema de apantallamiento





ITEMS NO PREVISTOS

Suminstro, montaje y conexión de proyector led 300W, flujo luminoso 50100 lm incluye soporte

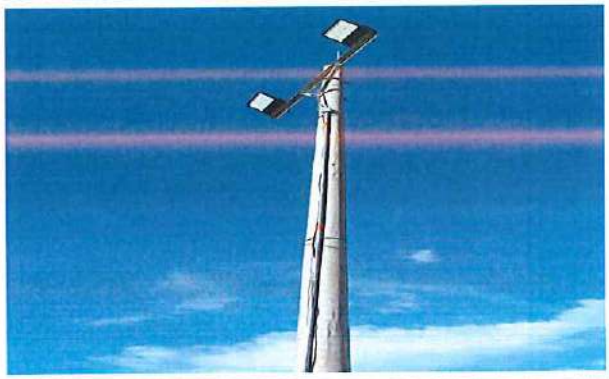




CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S
NIT. 900.116.571 - 8

OBJETO:	"CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"
CONTRATANTE:	V&M INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA:	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
INTERVENTORIA	CONSTRUMAC INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	DANIELA CARRILLO TAVERA
FECHA DE INICIO:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSI No.1 (PRORROGA)	31 DE ENERO DE 2025 DOS (02) MESES
OTROSI No.2 (PRORROGA)	10 DE ABRIL DE 2025 DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y CONFORME AL ADICIONAL EN TIEMPO MEDIANTE PRORROGA
ACTA DE SUSPENSION (No.1)	20 DE MAYO 2025
ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN (No.1)	19 DE AGOSTO 2025
ACTA DE REINCIO (No.1)	15 DE SEPTIEMBRE 2025
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	17 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION	06 DE OCTUBRE 2025

Suministro e Instalacion de tablero de control de alumbrado con caja con protecciones según circuitos con contactores y botonera ON-OF



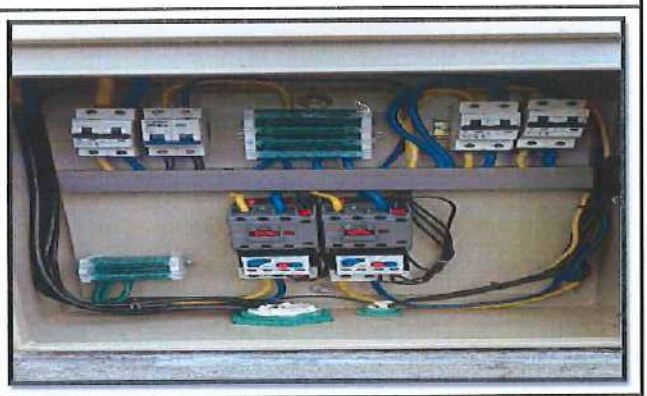

Suministro e Instalacion de acometida 1 No 2xfase + 1 No2xNeutro + 1 No8xtierra





V&M INGENIERIA SAS


CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S

NIT. 900.116.571 - 8

OBJETO:	"CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"
CONTRATANTE:	V&M INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA:	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
INTERVENTORIA	CONSTRUMAC INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	DANIELA CARRILLO TAVERA
FECHA DE INICIO:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSI No.1 (PRORROGA)	31 DE ENERO DE 2025 DOS (02) MESES
OTROSI No.2 (PRORROGA)	10 DE ABRIL DE 2025 DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y CONFORME AL ADICIONAL EN TIEMPO MEDIANTE PRORROGA
ACTA DE SUSPENSION (No.1)	20 DE MAYO 2025
ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN (No.1)	19 DE AGOSTO 2025
ACTA DE REINCIO (No.1)	15 DE SEPTIEMBRE 2025
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	17 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION	06 DE OCTUBRE 2025

Ducto 3/4" IMC para bajante de conexión electrica



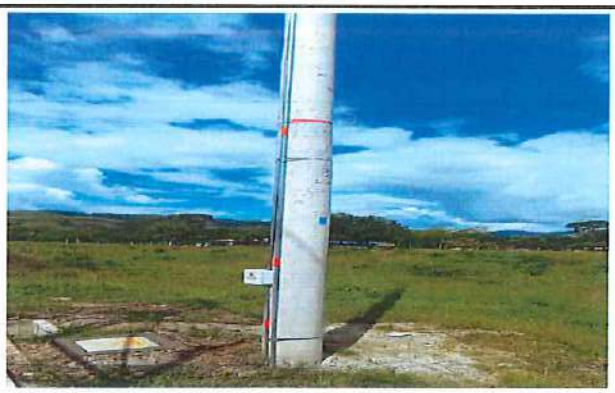

Cancha sintetica villa olimpica



v&m ingeniería SAS

CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S

NIT. 900.116.571 - 8

OBJETO:	"CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"
CONTRATANTE:	V&M INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA:	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
INTERVENTORIA	CONSTRUMAC INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR:	DANIELA CARRILLO TAVERA
FECHA DE INICIO:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSI No.1 (PRORROGA)	31 DE ENERO DE 2025 DOS (02) MESES
OTROSI No.2 (PRORROGA)	10 DE ABRIL DE 2025 DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y CONFORME AL ADICIONAL EN TIEMPO MEDIANTE PRORROGA
ACTA DE SUSPENSIÓN (No.1)	20 DE MAYO 2025
ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN (No.1)	19 DE AGOSTO 2025
ACTA DE REINCIO (No.1)	15 DE SEPTIEMBRE 2025
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	17 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACION	06 DE OCTUBRE 2025



Con ello se finaliza la jornada laboral y se suspender actividades de obra temporalmente bajo las consideraciones anteriormente expuestas.

En constancia a lo anterior firma:



RESIDENTE DE OBRA.



RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

15-09-25. Lugar: INDEE - HUILA.
Inicio: 8:00 am Fin de jornada. 10:00 am.
Asistentes: Dr. Felipe Victoria Barragan → Director INDEE-HUILA.
Ing. Luis Miguel Caquimbo Gomez → Apoyo supervision.
Ing. Yerson Fernando Camacho L. → Contratista. V&M.
Ing. Daniela Camilo Tavera → Interventoria

Acta de Reinicio No.1.

En la ciudad de Neiva, el 15 de Septiembre, se llevo a cabo acto administrativo donde se suscribe acta de reinicio No.1. del Contrato de obra publica. CIOPIH-221/2024. Con el fin de dejar Constancia de que a la fecha se han superado los eventos que originaron la suspension temporal del contrato.

Por otra parte se estipula que el contratista debe actualizar los amparos contenidos en las polizas segun el tiempo contractual, Realizar actualizacion del Cronograma de ejecución y la Reprogramación de las actividades.

Por tanto se firma acta de reinicio No.1. para dar Cumplimiento a las obligaciones y compromisos. Contractuales. - CTO. CIOPIH 221-2024.

16-09-25. Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5. am.
Condiciones climaticas: Parcialmente Soleado.
Personal en obra. (1) Residente de obra
(1) Residente de Interventoria.
(1) Maestro de obra.
(3) Ayudantes.

Actividades Realizadas.

→ De acuerdo al Acta de Reinicio, la reprogramacion de las actividades contratadas se da continuidad a las actividades y su ejecución.

→ se realiza instalación de formaleta para construccion de cajillas de inspección. 1.0 x 1.0. y 1.2. 1.2.


→ Se realiza conformación y compactacion de estructura de placa de piso, Instalación de malla electrosoldada, posteriormente vaciado de concreto de 3000 PSI $f'c = 0.07$.

→ Se continua con la instalación de bordillos prefabricados 20 x 50 x 30.

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior se firma.



RESIDENTE DE OBRA.



RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

17-09-25. Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada. 5:00 pm.
Condiciones climaticas: Parcialmente Soleada.
Personal en obra: (1) Residente de Obra, (1) Residente de Interventoría
(1) Maestro de obra, (3) Ayudantes.

Actividades Realizadas.
Se continuan con las actividades programadas

→ Se realiza Construccion de casillas de Inspeccion 1.0 x 1.0 y 1.2 * 1.2. medida interna en concreto de 3000 PSI para empalme de Sistema de drenaje incluye tapa, marco y cuneta. # variable.

→ se continua la conformacion y compactacion de estructura de placa de piso, instalacion de malla electrosoldada, posteriormente vaciado de concreto. de 3000 PSI.

→ Se realiza instalacion de bordillos prefabricados 20 * 50 * 30.

→ Se da inicio a las actividades del Sistema electrico; se realiza Suministro e instalacion de Acometida en cable Cu AISI THHN/THWN - 2 x 8F + 1 x 10T en tuberia PVC 1"

→ Se realiza excavacion para instalacion de postes de concreto pretensado l = 12 m 750 kg.; excavacion para construccion de casillas de inspeccion tipo alumbrado de 30 x 30 y 60 * 60 cm.

Con ello se finaliza la jornada laboral y en consecuencia a lo anterior se firma:

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

18-09-25. Lugar: Municipio de Guadalupe. - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climaticas: Parcialmente soleado.
Personal en obra: (1) Residente de obra
(1) Residente de Interventoria
(1) Maestro de obra.
(3) Ayudantes.

Actividades de obra.
Se continuan las actividades segun el cronograma de ejecucion

1. Se continua con la conformacion y compactacion de estructura de placa de piso, instalacion de malla electrosoldada y posteriormente vaciado de concreto de 3000 psi. E.0.07. con ello se culmina la actividad dentro los lineamientos contractuales y garantizando altos estandares de calidad.

Se realiza instalacion de bordillos prefabricados de 20 * 50 * 30.

Se continua con la excavacion manual para instalacion de postes de concreto pretensado l = 12 750 kg, excavacion casillas de inspeccion tipo alumbrado de 0.30 x 0.30 y 60 x 60 cm.

Se realiza instalacion de acero de refuerzo 37.000 psi.
Se realiza instalacion de tuberia galvanizada de 2" cal 2 mm. Incluye anclaje y tapa.
Construccion e instalacion de modulos de cerramiento de 2.5 * 2.5 Angulo 1 1/2 * 1/8 con malla eslabonada en sentido Oriente - occidente.
Se inicia construccion de puerta en tubena de 2" galvanizada Cal 2mm Con malla eslabonada.

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

19-09-25 Lugar: Municipio de Guadalupe Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: Parcialmente soleado.
Personal en obra: (1) Residente de obra.
(1) Residente de Interventoria
(1) Maestro de obra.
(3) Ayudantes.

Actividades Realizadas
Se continua la ejecucion de las actividades segun el cronograma.

* Instalación de bordillos prefabricados 20 x 50 x 50
* Se continua con la excavación para instalacion de postes de concreto pretensado 7 = 12 m 750 kg. y cajillas de inspeccion tipo alumbrado de 0.30 x 0.30 - 0.60 x 0.60.

Una vez culminada la actividad de construccion de placa en concreto de 3000 PSI. se continua con la instalación de almohadilla de Shock pad 20 mm.

Se continua con la instalacion de acero de refuerzo 37000 psi.
Instalacion de tubena galvanizada de 2" cal 2mm incluye anclaje y tapa.

Construccion de puerta en tubería 2" galvanizada cal 2mm con malla eslaborada.

Construccion de modulos de cerramiento de 2.5 * 2.5 Angulo 1/n' 1/8 con malla eslaborada en sentido oriente occidente.

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia lo anterior se firma:

20-09-21 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climaticas: Parcialmente soleado.
Personal en obra: (1) Residente de obra
(1) Residente de Interventoria.
(1) Maestro de obra.
(3) Ayudantes.

Actividades Realizadas.
Se continua la ejecución de las actividades segun el cronograma.

* Instalación de bordillos Prefabricados 20 * 50 * 50
* Se continua con la excavación para instalación de postes de concreto pretensado y cajillas de inspección tipo alumbrado de 0.30 * 0.30 - 0.60 - 0.60. libres.

* Instalación de almohadilla de choque Shock pad 20 mm
* Se inicia instalación de cesped monofilamentado rafia 50mm de altura, con proteccion de rayos UV, con 1300 gramos * m² de rafia, de 13200 dtex base: backing doble capa demarcación de color blanco, incluye granulo de caucho.

Se continua con la instalación de acero de refuerzo 37000 psi.
Instalación de tubería galvanizada de 2" cal 2mm. Incluye anclaje y tapa.

se finaliza construccion de puerta en tubería 2" galvanizada cal 2mm con malla esladonada. y con ello se procede a realizar la instalación de la misma.

se continua con la construcción de modulos de cerramiento de 2.5 * 2.5. 1/8 con malla eslaborada en sentido oriente - occidente.

22-09-25. Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climaticas: Parcialmente Soleado.
Personal en obra: (1) Residente de obra.
(1) Residente de Interventoria
(1) Maestro de obra.
(3) Ayudantes

Actividades Realizadas.
Se continua con la excavación para instalacion de porter de concreto preftensado y cajillas de inspección tipo alumbrado de 0.30 * 0.30 - 0.60 * 0.60.

→ Se culmina la instalación de bordillos prefabricados 20 * 50 * 50.
→ Se finaliza la instalación de almohadilla de choque shock pad 20 mm.
→ Se continua con la instalación de cesped monofilamentado rafia 50 mm de altura, con protección de rayos UV, con 1300 gramos * m² de rafia 13200 dux: base: backing doble capa demarcación de color blanco granulo de caucho.

Se continua la instalación de acero de refuerzo 37000 psi.
Instalacion de tuberia galvanizada de 2" cal 2mm incluye tapa.

Se continua con la construcción de modulos de cerramiento de 2.5 * 2.5 Angulo 1½ - 1/8 con malla eslabonada en sentido Oriente - Occidente.

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior. Se firma:

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

23-09-25 Lugar: Municipio de Guadalupe.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: Parcialmente Soleado.
Personal en obra: (1) Residente de obra.
(1) Residente de Interventoría
(1) Maestro de obra.
(3) Ayudantes.

Actividades Realizadas
Se continua con la ejecución de las actividades segun el cronograma. De acuerdo otrosi modificatorio No. 3. Acta de mayores y menores cantidades No. 1. se da la aprobación de adicion presupuestal con lo cual se garantiza la funcionalidad. y calidad de las actividades pendientes de ejecución.

Se culmina la actividad de instalación de cesped monofilamentado rafia 50mm de altura, con proteccion de rayos UV, con 1300 gramos * m² de rafia 13200 dux: base backing doble capa, demarcacion de color blanco granulo de caucho.

Se continua la instalacion de acero de refuerzo 37000 psi.
Instalacion de tuberia galvanizada de 2" cal 2mm incluye tapa.

Se continua con la construcción de modulos de cerramiento de 2.5 * 2.5 Angulo 1½ - 1/8 con malla eslabonada en sentido oriente occidente.

Se realiza instalacion de formaleta para fundicion de concreto de 3000 psi anderes permetrales e= 8cm.

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior se firma.

24-09-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Ocula.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: parcialmente soleado
Personal en obra: (1) Residente de obra
(1) Residente de Interventoría
(1) Maestro de obra.
(3) Ayudantes.

Actividades Realizadas.
Se continua la ejecucion de las actividades programadas.

Se continua con la excavacion manual para instalación de Postes de concreto pretensado y cajillas de inspección tipo alumbrado de 0.30 * 0.30 - 0.60 * 0.60. y demas actividades. como la excavación para Red de aguas lluvia.


Segun el acta de mayores y menores contractual No.1 se Culmina la construcción de filtros laterales externos en un ancho de 0.40m, con altura variable, recubrimiento en geotextil no tejido NT 1600 tubería PVC drenajes de 6".

Se continua con la instalacion de formaleta para Andenes perimetrales posteriormente se inicia fundicion de placa de Concreto de 3000 psi.

Se continua con la instalación de acero de refuerzo de 37000 psi. Instalacion de tubería galvanizada de 2" Cal 2mm incluye anclaje y.

Se continua la construcción de modulos de cerramiento de 2.5 * 2.5. Angulo 1 1/2 - 1/8 con malla eslabonada. en sentido Oriente - Occidente.

Firma:



25-09-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Ocula.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climaticas: Parcialmente Soleado.
Personal en obra: (1) Residente de obra.
(1) Residente de Interventoria.
(1) Maestro de obra.
(3) Ayudante.

Actividades Realizadas.

Se continua con la excavación manual para Instalación de Postes de concreto pretensado y cajillas de Inspección tipo alumbrado, excavacion para Red de aguas lluvia.

Se realiza fundicion de Andenes Perimetrales en concreto de 3000 psi. Incluye malla electrosoldada. e = 8 cm.

se continua con la instalacion de ~~Acero~~ → de refuerzo de 37000 PSI, Instalación de tubería galvanizada de 2" cal 2mm incluye anclaje y tapa.

Se continua la construcción de modulos de cerramiento de 2.5 * 2.5. Angulo 1 1/2 - 1/8 con malla eslabonada en sentido oriente - occidente. con ello se da inicio a la instalacion de los mismos.

Por tanto se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior se firma:



RESIDENTE DE OBRA.



RESIDENTE DE INT.

26-09-25 Lugar: Municipio de Guadalupe.
Inicio de jornada: 7 am Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climaticas: Parcialmente Soleado.
Personal de obra: (1) Residente de obra.
(1) Residente de Interventoria
(1) Maestro de obra.
(3) Ayudantes.

Actividades Realizadas.

Se continua con la excavacion manual para instalacion de postes de concreto pretensado de casillas de inspeccion tipo alumbrado, Excavacion para red de agua lluvia.

Se finaliza la fundicion de anclaje pentetrales en concreto de 3000 psi E=8 cm

Se continua con la instalacion de acero de refuerzo 37000 psi Instalacion de tuberia galvanizada de 2" cal 2mm incluye andope y tapa.

Se continua con la construccion de modulos de cerramiento de 2.5 * 2.5 Angulo 1½ - 1/8 con malla eslabonada en sentido Oriente - occidente y posteriormente se da inicio a la instalacion de los mismos.

Por otra parte se da inicio a las actividades del sistema electrico, realizando la instalacion de postes en concreto pretensado L= 12m 750kg.

Instalacion de acometida en cable Cu AISL THHN/THWN - 2x8FF 1x10T en tuberia PVC 1".

Instalación de salida paredal electrica (2THHN No10+1THHN No.12).

Es importante destacar que estas actividades se ejecutan en estricto cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad establecidas, con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior se firma:

RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

27-09-25 Lugar: Municipio de guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climaticas. Parcialmente Soleado.
Personal en obra: (1) Residente de obra.
(1) Residente de Interventoria
(1) Maestro de obra.
(3) Ayudantes.

Actividades Realizadas:

Se finaliza → la actividad de excavacion manual y posteriormente se continua con la instalacion de postes de concreto pretensado longitud de 12 m y 750 kg.

Construccion de Cajillas → de inspeccion tipo alumbrado, de dimensiones de 0.30x0.30 - 0.60 * 0.60 libres

Instalacion de Acometida en cable Cu AISL THHN/THWN-2x8FF 1x10T en tuberia pw 1".

Instalacion de salida paredal electrica (2THHN No.10+1THHN No.12).

se realiza instalacion de tuberia PVC de 8" con cama de arena 15 cm y conexion del sistema de drenaje.

Se finalza la instalacion de Acero de refuerzo de 37000 psi. se culmina la instalacion de tubena galvanizada de 2".

Por ultimo se continua la construccion de modulos de cerramiento de 2,5 * 2,5 Angulo 1"/2 * 1/8 con malla eslabonada en sentido oriente - occidente.

Con ello se finalza la jornada laboral y en constancia a lo anterior se firma:

RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

29-09-25. lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7 am Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climaticas: Parcialmente soleado.
Persona en obra: (1) Residente de obra
(1) Residente de Interventoria
(1) Maestro de obra.
(3) Ayudantes.

Actividades Realizadas.

Se continua con la instalacion de postes de concreto pretensado L= 12 m 750 kg.

Construccion de cajillas tipo alumbrado de 0,30 * 0.30 - 0.60 * 0.60 m. libres.

Instalación de acometida en cable Cu AISL THHN No. THHN 2 * 8F + 1 * 10T en tubena pvc 1".

Instalación de salida paral electrica (2THH No. 10 + 1THHN. No. 12).

Se continua la instalacion de tubena PVC 8" con cama de arena de 15 cm y conexion del sistema de drenaje.

Se continua la construccion de modulos de cerramiento de 2.5 * 2,5 Angulo 1"/2 * 1/8 con malla eslabonada sentido oriente - occidente.

con ello se finalza la jornada laboral y en constancia a lo anterior se firma.

RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

30-09-25. lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7 am Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climaticas: Parcialmente soleado.
Personal en obra: (1) Residente de obra.
(1) Residente de interventoria.
(1) Maestro
(3) Ayudantes.

Actividades Realizadas.

* se culmina la instalación de postes de concreto pretensado L = 12 m 750 KG.

Se realna instalación de formaleta y construccion de cajas tipo Alumbrado de 0,30 * 0,30 - 0.60 * 0.60. m libres.

Instalación de acometida en cable Cu AISL THHN No. THHN. 2 * 8F + 1 * 10T en tubena pvc 1".

Instalación de Salida paral electrica (2THH No. 10 + 1HHN No. 12).

Se colmina la construccion de modulos de cerramiento de 2,5 * 2,5 Angulo 1 1/2 - 1/8 con malla eslaborada en Sentido oriente - occidente. con ello se procede a retirar su conecta instalación.

se finaliza la instalación de tubería PVC 8" con cama de arena de 15 cm y conexion del sistema de drenaje.

con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anteriormente se firma:

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

01-10-25. Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin Jornada: 5:00 pm.
Condiciones Climaticas: Parcialmente soleado
Personal en obra: (1) Residente de obra
(1) Residente de Interventoría
(1) Maestro de obra.
(3) Ayudantes:

Actividades Realizadas:
Se continua la ejecución de las actividades programadas.

se culmina la actividad de instalacion de acometida en cable Cu AISL THHN/THWN - 2X8F + 1X10T en tubería tubería PVC 1".

Se realiza construcción de Muro para tablero de control en muro con broque #5.

Se continua en la construcción de cajillas de inspeccion tipo alumbrado de 0,30 x 0,30 - 0,60 * 0,60. m libres.

Instalación de salida parcial electrica (2 THHN NO.10 + 1 THHN NO.12).

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior se firma:

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

02-10-25. Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones Climaticas: Parcialmente soleado
Personal en obra: (1) Residente de obra
(1) Residente de interventoría
(1) Maestro de obra.
(3) Ayudantes.

Actividades Realizadas.
Se continua la ejecución de las actividades programadas para el sistema electrico.

una vez finalizado la construcción de muro para tablero de control en muro con broque #5. se realiza la instalación de tablero de control de alumbrado con caja con protecciones según circuitos con contactores y botonera ON - OF.

Se realiza montaje y conexión de proyector Led 300 w, flujo luminoso 50100 lm con soporte.

Se realiza instalación de ducto de 3/4" IMC para bajante de conexión electrica.

Suministro e instalación de sistema de apantallamiento

Se Colmina la construcción de casillal de inspección tipo alumbrado 0,30 * 0,30 - 0,60 * 0,60 m. Libres.

se colmina la instalación de salida paraal electrica (2 THHN No. 10 + 1 THHN No. 12).

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior se firma:

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

03-10-25. Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: Paracalmente soleados.
Personal en obra: (1) Residente de obra
(1) Residente de Interventoria.
(1) Maestro de obra.
(3) Ayudante de obra.

Actividades Realizadas.
Se continua la ejecución de las actividades de programación para el sistema electrico.

Se colmina la instalacion de tablero de control de alumbrado con cajd con protecciones segun circuitos con contactores y botonera ON - OF.

Se continua el montaje y conexion de proyector led 300 w, flujo luminoso 50100 lm con soporte.

se continua la instalación de ducto de 3/4" IMC para bajante de conexion electrica.

Se continua la instalación del sistema de apantallamiento.

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior se firma:

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

04-10-25. Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7 am Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climaticas: Paracalmente soleado.
Personal en obra: (1) Residente de obra.
(1) Residente de Interventoria
(1) Maestro de obra.
(3) Ayudantes.

Actividades Realizadas
Se continua la ejecución de las actividades según la programación para el sistema electrico.

Se continuan las achudades de montaje y conexión de proyector led 300 w, flujo luminoso 50100 lm con soporte.

Se continua la instalación de ducto de 3/4" IMC para bajante de conexión electrica.

se continua la instalación del sistema de apantallamiento

Se inicia la instalación de Acometida 1 No. 2x fase + 1 No. 2 Neutro + 1 No. 8 x tierra

con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior se firma:

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

06-10-25 Lugar: Municipio de Guadalupe – Huila.
Inicio de jornada: 7 am – Fin jornada – 5:00 pm
Condiciones climaticas: dia lluvioso.
Personal en obra: (1) Residente de obra
(1) Residente de Interventoria
(1) Maestro de obra
(1) Ayudante.

Actividades Realizadas.

Se finaliza la actividad de montaje y conexion de proyector led 300 w, flujo luminoso 5010,0 lm con soporte

se finaliza la la instalacion de ducto 3/4" MC para bajante de conexion electrica.

Se continua la instalación del sistema electrico Sistema de apantallamiento.

Se continua la instalacion de acometida 1 No. 2x fase 1 No. 2x Neutro + 1 No. 8 x tierra.

con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior se firma:

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

07-10-25. Lugar: Municipio de Guadalupe – Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climaticas: dia Soleado.
Personal en obra. (1) Residente de obra
(1) Residente de Interventoria
(1) Maestro de obra
(1) Ayudantes.

Actividades Realizadas:

se culmina Instalacion del sistema de apantallamiento

se culmina la instalación de acometida 1 No. 2x fase + 1 No. 2x Neutro + 1 No. 8 x tierra.

una ver culminadas las actividades previas para la instalación del sistema electrico se procede a adelantar actividades profesionales y documentales propias para la certificación RETIE y RETILAP.

por tanto es importante destacar que estas actividades se ejecutan en estricto cumplimiento de las normas tecnicas y de seguridad establecidas.

BITACORA DE OBRA.

CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA
VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE
GUADALUPE - HUILA.

CONTRATO NO: CLOPIH 221 DE 2024.

V&M INGENIERIA S.A.S.
R.L / JERSON FERNANDO C.

CONSTRUMAC INGENIEROS SAS
R.L / DANIELA CARRILLO T.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

CONTRATO No.: CLOPIH 221 DE 2024.

ENTIDAD CONTRATANTE: INDERHUILA.

OBJETO: "CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA".

CONTRATISTA: VSM INGENIERIA S.A.S.
NIT : 900.662.688.7.
R/L : YERSON FERNANDO CAMACHO.

FECHA DE SUSCRIPCION : 27 DE OCTUBRE DE 2024.
FECHA DE INICIO: 12 DE INICIO DE 2024.
PLAZO INICIAL: TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA.
PLAZO ADICIONAL: NO.1 / N.A.
PLAZO TOTAL: TRES MESES.

VALOR TOTAL:

INTERVENTOR: CONSTRUMAC INGENIERIA S.A.S.
NIT: 900.116.571.-7.
R/L: DANIELA CARRILLO TAUERA.

Acta de Inicio.

12-11-24 Lugar: Neiva - Huila.

Hora:

Asistentes: DR. FELIPE VICTORIA BARRAGAN.

INTERVENTOR: DANIELA CARRILLO TAVERA.

CONTRATISTA: YERSON FERNANDO CAMPECHO.

→Acta de Inicio del contrato de obra pública numero CLOPIH221 de 2024. - Celebrado, entre el Instituto Departamental de Deporte, la Educación Física, la Recreación y el Aprovechamiento del Tiempo libre del Huila. INDERHUILA. Y LA FIRMA UBM INGENIERIA SAS.

A los doce días del mes de Noviembre de 2024, se reunieron en la oficina + del INDERHUILA. DR. Felipe Victoria Barragan en calidad de Supervisor; Daniela Carrillo Tavera en calidad de Interventor y Yerson Fernando Campecho Ladino en calidad de Contratista, a fin de dar inicio a la ejecución del Contrato de obra No. CLOPIH221 DE 2024.

De acuerdo a lo anterior se firma previo a las consideraciones de ejecución expresadas y estipuladas por la entidad contratante.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

19-11-24 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 10:00 a.m - Fin de Jornada: 4:00 p.m.
Condiciones climaticas:
Personal en obra: Ing. Yerson Fernando Camacho.
Personal de Interventoria: Ing. Daniela Carrillo. Tavera.
Superacion:

→ Actividades Realizadas.
Se llevo a cabo una socialización del proyecto de construcción de la cancha sintetica villa olimpica del Municipio de Guadalupe - Huila, con el objetivo de informar y sensibilizar a la comunidad sobre los beneficios y alcances del proyecto,

En el mismo acto, se conformó el acta de veeduria ciudadana, mediante la cual se estableció la instancia de vigilancia y seguimiento de la ejecucion del proyecto garantizando la transparencia y la participación ciudadana en la toma de decisiones.

ING. RESIDENTE DE OBRA.


ING. RESIDENTE DE INT.

20-11-24 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de Jornada:
Condiciones Climaticas
Personal en obra: Ing Yerson Fernando Camacho Ladino
1 Oficial.
Personal de Interventoria: Ing. Daniela Carrillo.

Actividades Realizadas.

El dia 20 de Noviembre de 2024, se realizo la visita inicial al sitio de obra "Construcción de cancha sintetica villa olimpica del Municipio de Guadalupe - Huila, con el objetivo de evaluar las condiciones iniciales del terreno y verificar la disponibilidad de los recursos necesarios para la ejecución de las actividades

En el marco de la visita, se procedio con el suministro e instalación de la valla informativa, la cual contiene la información relevante sobre el proyecto: esta incluye, El nombre del proyecto, la entidad contratante, Firma contratista, Valor del contrato y plazo de ejecución, Etc.



22-11-24 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7 am. - Fin de jornada: 4:30 pm
Condiciones climaticas: Parcialmente soleado.
Personal en obra: Residente de obra:
Comision de Topografia.
Personal de Interventoria: Residente de Interventoria.

Actividades Realizadas.

Un equipo de comision topografica especializado dio inicio a las actividades de localización y replanteo, asi como el levantamiento topografico detallado, en el sitio de ejecucion de obra "Construccion de cancha sintética - villa olimpica. Esta etapa resulta crucial para definir con precisión los limites y caracteristicas del terreno

El equipo de comision topografico ejecuto el trabajo en campo conjuntamente con los profecionales del proyecto para asegurar la optima recopilación de datos y que estos fueran seguros y confiables, los cuales son necesarios para la planificación y ejecución de las actividades.

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

13-11-24 Lugar: Municipio de Guadalupe – Huila.
Inicio de jornada: 7:am Fin de jornada: 4:30 p.m
Condiciones climaticas: Parcialmente soleado
Personal en obra: (1) Residente de obra
(1) Maestro de obra
(1) oficial de obra.
(1) Comision topografica.
Personal de Interventoria: (1) Residente de Interventoria:

Actividades realizadas:
Se continuaron las actividades de localización y replantco, levantamiento topografico y redefinicion de diseño y/o reubicacion de escenarios deportivos en el sitio de obra "Construcción de cancha sintética villa olimpica del Municipio de Guadalupe - Huila.

En esta etapa se realiza verificación de los datos recopilados; posteriormente, se procedio a la implantación del diseño definitivo, teniendo en cuenta las condiciones topograficas y geotecnicas del terreno, así como los necesidades y requerimientos de los escenarios deportivos. con el fin de ser emitidos al ente contratante para su revisión y aprobación de diseño.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

25-11-24

-Se realizaron las siguientes

r:

▶ Se Culmino la actividad de localización y replanteo, como inspección inical al terreno establecido para el escenario deportivo, la cual tuvo como objetivo determinar con precisión la ubicación de la concha sintética del Municipio de Guadalupe, Huila.

Posteriormente el equipo de comision Topografica procedio a realizar diseño, ubicacion y replanteo de las areas localizadas con el fin de establecer un punto de exactitud para la ejecucion de obra.

De acuerdo a lo anterior el contratista de obra y la interventoria a cargo del contrato C1089H 221 de 2024. se han mantenido en constante comunicación con el fin de determinar y dar inicio a las actividades de obra. segun la programación establecido.

Por lo anterior firmo:

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO.

26-11-24 Revision de diseños.

15-12-24 → Una vez realizada la localizacion y replanteo inicial del terreno establecido para la ejecucion de la concha sintetica del Municipio de Gudalupe, se determino que la ubicacion inicial

no era optima debido a condiciones adversas, especificamente la amenaza de socavación del río Suaza.

Por lo tanto se requiere una nueva implantación de diseño y redistribución del espacio para la ejecución de los escenarios deportivos. Para lo cual nuevamente se desarrollan actividades de localización y replanteo del area de influencia segun nueva implantación de diseño establecido. - UBICACION DEFINITIVA PROPORCIONADA POR LA ADMINISTRACIÓN EL 19 DE DICIEMBRE.

16-12-24 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7 am Fin jornada: 3:00 p.m
Condiciones climaticas:
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Comisión de Topografia. (1).

Actividades realizadas
Nuevamente se retoman las actividades de localizacion y replanteo con el fin de realizar levantamiento topografico detallado de la nueva ubicación para implantación del diseño establecido segun revision de estudios. en el sitio de ejecucion de obra "construcción de cancha sintetica villa olimpica". Actividad crucial para determinar con precisión los limites y caracteristicas del terreno.

Firma:


RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

17-12-24 Lugar: Municipio de Guadalupe – Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 3:00 p.m.
Condiciones Climaticas:
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Comisión de Topografia (1).

Actividades realizadas.
→ Se continua con la actividad de localización y replanteo, levantamiento topografico con el fin de determinar irregularidades significativas en el terreno.

Firma:



RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE DE

18-12-24 Lugar: Municipio de Guadalupe – Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am – Fin jornada: 2:00 pm.
Condiciones Climaticas:
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Comisión de Topografia (1)

Se culmina la actividad de localización y replanteo y se determina que la nueva ubicación presenta un terreno con irregularidades, lo cual requiere ajustes de diseño para asegurar la planicidad de la cancha y la correcta cimentación de anclaje y cerramiento.

Con ello se realizo evaluación de cantidades de obra y ajustes de diseño necesarios por parte del contratista y la interventoria, sin embargo a fecha debido a las condiciones se a dado inicio a las actividades preliminares.

22-12-24. Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada:
Condiciones climaticas:
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Comision de topografia. (1).

Actividades Realizadas

luego de haber realizado la localización y replanteo del área y/o terreno delimitado para la construcción de la cancha sintética, una comisión de topografia calificada se dispuso a realizar la demarcación y toma de niveles topográficos, con el fin de dar inicio a las a las actividades de obra civil.

FIRMA:

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ACTA DE COMITE

23-12-24 Lugar: INDER - HUILA. - NEIVA.

Hora de inicio: 7:00 am Hora final: 8:00 am

ASISTENTES: • Person Fernando Camacho ladino
R.L V&M INGENIERIA S.A.S.

• Daniela Carrillo Tavera
R.L CONSTRUMAC INGENIERIA S.A.S.

• Ximena Adelinda Jiménez
APOYO a la Supervisión.

AGENDA:
→ Socialización avance del proyecto
→ Atender inquietudes respecto a los diseños y presupuesto de obra.
→ Respuesta requerimiento de INDERHUILA, respuesta Alcaldia Municipal Guadalupe, Huila.

DESARROLLO.
En las instalaciones de INDER Huila, se reunen Ing, Ximena Jiménez, como apoyo a la supervisión del contrato de interventoría, Ing. Person Camacho ladino representante legal de V&M INGENIERIA SAS, Contratista de obra e Ing Daniela camilo Tavera R.L de CONSTRUMAC INGENIEROS SAS. Con el fin de socializar las respuestas enviadas de parte de la Alcaldia de Guadalupe al oficio 2H2-2024-1455 del 06 de diciembre de 2024 por INDER HUILA. Solicita topografia y aclaración de diseños por otra parte las inquietudes presentadas en el capitulo electrico; manifiesta que el diseño actualizado de redes incluye la conexión desde un transformación de 50KVA, Considerando las condiciones de la nueva ubicación del escenario deportivo del proyecto, por lo cual se debe revisar el plano suministrado, las cantidades y costos contemplados en el presupuesto del contrato de obra para determinar su idoneidad.

ING. RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

20-01-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 p.m
Condiciones climaticas: Paradmente Soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Operador de Maquinaria: (1)
Maestro de obra (1)

Actividades Realizadas
→ Se realizo descapote Mecanico del terreno con una Profundida de 20 cm con el objetivo de eliminar la capa superfical y preparar el terreno para las siguentes etapas de construcción.

FIRMA:

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.


21-01-25 Lugar: Municipio de gudalupe, Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 p.m
Condiciones Climaticas: Paradmente Soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Operador de Maquinaria (1)
Maestro de obra (1).

Actividades realizadas
→ Se continua y Culmina la actividad de descapote mecanico de e: 20 cm.

→ Se inicia actividades de Excavación mecanica Cargeo para cancha Sintetica.

→ Toma manual de Niveles
→ Retiro de material sobrante, desarpole, excavacion.

Firma:




RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORI

22-01-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin de jornada: 5:00 pm
Condiciones Climaticas: Parcialmente Soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Operador de Maquinaria (1)
Maestro de obra (1)

Actividades realizadas

→ Se continua con la actividad de excavacion mecanica - Cargeo de cancha mecanica.
→ Retiro de material sobrante de excavación.
→ Toma de Niveles

FIRMA:

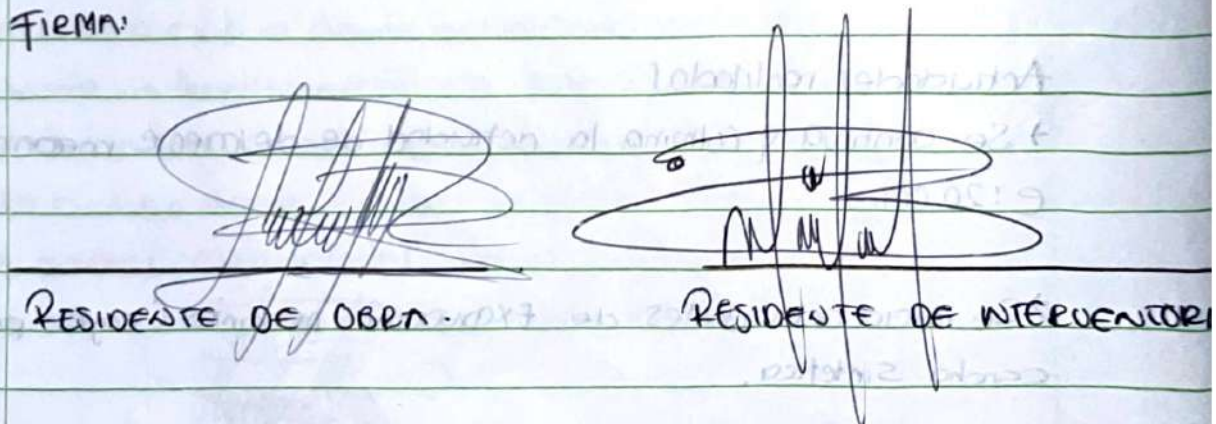

RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE DE INTERVENTORI

23-01-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin de jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: Parcialmente soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Operador Maquinaria (2).

Actividades Realizadas.

→ El dia 23 de enero de 2025, se llevaron a cabo varias actividades en la obra de la cancha sintetica:

- Se realizo cajeo para estructura de la cancha sintetica
- Se realizo cargue y retiro de material sobrante de excavación para su disposición final en un sitio autorizado.
- Se verificaron los niveles de la topografia realizada anteriormente.

Firma:

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

24-01-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 p.m.
Condiciones climaticas: Parcialmente soleado
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra
Operador Maquinaria (1)
Comision Topografica (1).
Actividades Realizadas

→ Se continua con la actividad de excavación mecanica para cajeo de estructura de la cancha Sintetica.

→ Se realiza replanteo y verificación de niveles por medio de la comisión de topografia.

→ Se realiza retiro de material sobrante de excavación para disposición final en sitio autorizado.

Firma:

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

25-01-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin de jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: Parcialmente soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Operador Maquinaria (1).

27-01-25 Lugar: Municipio de Guadalupe, Huila.
Inico de jornada: 7:00 a.m Fin de jornada 5:00 p.m
Condiciones climaticas: Parcialmente Soleado
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de Obra (1)
Operador de Maquinaria (1).

Actividades Realizadas

→ Se Continua con la actividad de excavación mecanica para cajeo de estructura de cancha sintetica, por otra parte se realiza cargue y retiro de material Sobrante de excavacion para disposición final en sitio autorizado.

Firma:

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

28-01-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin de jornada: 5:00 pm.
Condiciones climaticas: Parcialmente Soleado
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Operador Maquinaria (1).


Actividades Realizadas
→ Se Culmina la actividad de excavación mecanica para cajeo de la estructura de cancha sintetica, por otra parte se realiza cargue y retiro de material sobrante.

29-01-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 p.m.
Condiciones climaticas: Parcialmente Soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra
Maquinaria (3). Volqueta de 6m³

Actividades realizadas

→ Se realiza suministro de material de recebo granular (capa de 20cm) para relleno del terreno de la cancha sintetica, por otra parte se realiza replanteo y verificación de niveles.

Firma:



RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

30-01-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin de jornada: 5:00 p.m
Condiciones climaticas: Parcialmente Soleado
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Maquinaria y equipos
- Volqueta 6m³ (2).
- Retroexcavadora.


Actividades Realizadas:

→ Suministro de material de recebo granular (capa de 20cm) para relleno - del terreno de la cancha sintetica


→ Extendida, Nivelación y compactación de material de relleno

→ Replanteo y verificación de niveles

FIRMA:



RESIDENTE DE OBRA:



RESIDENTE DE INTERVENTORIA

31-01-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 p.m.
Condiciones climaticas: Parcialmente Soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra
Maquina y Equipo: Retroexcavadora. (1)
Volqueta 6m³ (2)


Actividades realizadas.

→ Suministro de material de recebo para relleno del área de construcción de la cancha sintetica.


→ Se realiza extencion — Nivelacion y compactacion del material de relleno (Recebo).

→ Se realiza Replanteo y verificación de Niveles.

FIRMA:



RESIDENTE DE OBRA.



RESIDENTE DE INT.

01-02-25 Durante el mes de febrero de 2025, se presentaron
28-02-25 condiciones adversas - clima que afectaron el proceso constructivo. Sin embargo, se adelantaron actividades administrativas entre las cuales se destaca.

11-02-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm
condiciones climaticas: lluvia constante.
Asistentes: Concejo Municipal de Guadalupe - Huila.
Yerson Fernando Camacho ladino R.L VSR INGENIERIA SAS
Daniela Carrillo Tavera R.L CONSTROMAC INGENIEROS SAS

Actividades desarrolladas.

→ Se realizo comite tecnico con . consejo municipal de Guadalupe Huila, la interventoria y el contratista de obra para dar respuesta del estado actual de la obra en cuanto en cuanto al porcentaje de avance en la ejecucion de las actividades, diseños y nueva ubicacion de la cancha sintetica dentro de los lineamientos contractuales.

Firma:

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

25-02-25 Lugar: Municipio de Guadalupe Huila.
Condiciones climaticas: Parcialmente Soleado.
Asistentes: Supervisión del contrato
Secretaria de planeacion.
Contratista de obra.
Interventoria.

Actividades Realizadas.

→ El dia 25 de febrero de 2025 se llevo a cabo un comite tecnico y visita de campo por parte de la entidad Contratante INDEE Huila. la cual tuvo como objetivo; "evaluar el estado de la obra en cuanto a su avance porcentual de ejecución y la calidad de las mismas, donde se realizo una visita de campo para determinar y evidenciar discrepancias en los diseños, especificamente en la distribución del sistema electrico, el cual no se ajusta a las necesidades para la instalación e implementación de iluminación del escenario deportivo.

Por lo cual se acordo verificar, estudiar y evaluar nuevamente los estudios y diseños del sistema electrico para ajustarlos. segun los lineamientos contractuales

Estas actividades se ha venido desarrollando de la mano con la interventoria del proyecto, realizando la evaluacion y ajustes del diseño acordes para garantizar el cumplimiento de los requisitos tecnicos del contrato.

Firma:

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

26-02-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 p.m
Condiciones climaticas: Fuertes lluvias.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Ayudantes de obra (2).

Actividades desarrolladas.

→ Durante el dia 26 de febrero de 2025 el personal de mano de obra se dispone a realizar excavación manual para la construccion de concreto ciclopeo, el cual servira como base de soporte para la viga de cimentación; como tambien, para el cerramiento perimetral de la cancha sintetica.

Firma:

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INT.

27-02-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 p.m.
Condiciones climaticas: Parcialmente Nublado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Ayudantes (4).

Actividades Realizadas

→ Durante el dia 27 de marzo de 2025 el personal de mano de obra no calificada continuo con la actividad de excavación manual para la construccion de concreto ciclópeo, el cual servira como base de soporte para la viga de cimentación, asi como para el cerramiento perimetral de la cancha sintetica.

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA


28-02-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Itula.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada 5:00 p.m.
Condiciones climaticas: Dia Soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Ayudantes de obra (4).

Actividades Realizadas.

→ El dia 28 de febrero de 2025 se inicia fundición de concreto ciclopeo de 2000 PSI (60% concreto - 40% piedra media zonga) para cimentación cerramiento 0.20 x 0.20. m

Por otra parte se realiza toma de muestras de concreto para resistencia a la compresion - ensayo de laboratorio.

Firma:



RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA


01-03-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Itula.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climaticas: Fuertes lluvias
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria
Maestro de obra (1)
Oficial (2)
Ayudantes (3).

Actividades realizadas


→ El personal de mano de obra se dispone a realizar figuración amarre e instalación de acero de refuerzo para viga de cimentación para el cerramiento perimetral.

Por otra parte se deja por escrito que las condiciones climaticas adversas han dificultado la ejecucion de las actividades segun la programación y Cronograma Contractual del proyecto.

Firma:



RESIDENTE DE OBRA

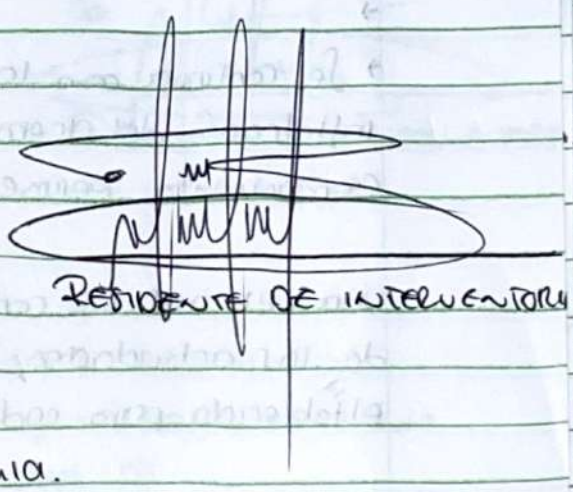


RESIDENTE DE INTERVENTORIA


03-03-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5.00 p.m
Condiciones climaticas: Dia Nublado
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Oficial (2).
Ayudantes (3).

Actividades Realizadas.

→ Se continua con la actividad de figuración amarre e instalación de acero de refuerzo para viga de cimentación para cerramiento Perimetral.



RESIDENTE DE OBRA



RESIDENTE DE INTERVENTORIA


04-03-25 Lugar: Municipio de Guadalupe. - Huila.
Inicio de jornada: 7: am Fin jornada: 5.00 p.m
Condiciones climaticas: Fuertes lluvias.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Oficial (2)
Ayudantes (3).

Actividades Realizadas.


- Se continua con la actividad de fijacion armare e instalacion del acero de refuerzo para viga de Cimentacion - cerramiento perimetral.

Una vez mas las condiciones climaticas afectan la ejecucion de las actividades, generando atrasos en la programacion establecida para cada actividad.

Firma:



RESIDENTE DE OBRA.

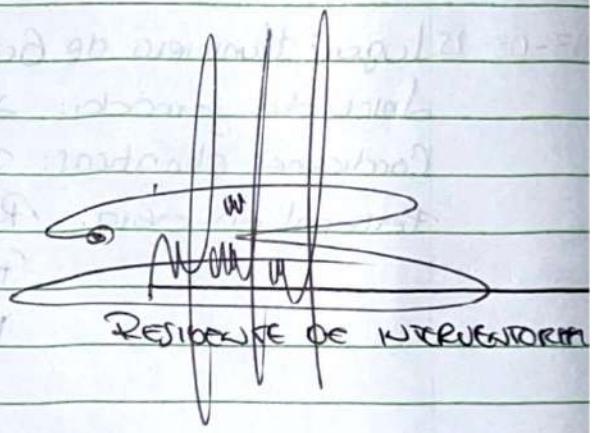

RESIDENTE DE INTERVENTORIA


05-03-25 Lugar: Municipio de Guadalupe-Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin de jornada: 5:00 pm
Condiciones Climaticas: Fuertes lluvias.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria
Maestro de obra (1)
Oficial (2).
Ayudante (3).

Actividades Realizadas:


→ Se continua con la actividad de figuracion amarre e instalacion del acero de refuerzo para viga de cimentacion - Cerramiento Perimetral.

Por otra parte continuan las condiciones climaticas adversas, fuertes lluvias que dificultan la ejecucion de las actividades.

Firma:



RESIDENTE DE OBRA.




RESIDENTE DE INTERVENTORIA

06-03-25 Lugar: Municipio Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:am Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones Climaticas: Dia nublado, con presencia de lluvia.
Personal en obra: Residente de obra. (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Oficial (2)
Ayudantes (3).


Actividades Realizadas.

→ Se continua con la actividad de figuracion amarre e instalacion de acero de refuerzo para viga de cimentacion - Cerramiento Perimetral.

Firma:



RESIDENTE DE OBRA.



RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

07-03-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7 am Fin de jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: Dia Nublado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Oficial (2)
Ayudantes (3).

Actividades Realizadas:

- Se continua con la actividad de figuracion, amarre e instalacion de acero de refuerzo para viga de Cimentacion - Cerramiento perimetral.

Por otra parte se inicia instalacion de formaleta para fundicion de viga de cimentacion. ademas Replanteo manual y toma de niveles para modulacion de placa.

Firma:

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

08-03-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7 am Fin jornada: 5:00 p.m.
Condiciones Climaticas: Dia nublado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Oficial (2).
Ayudantes (3).

Actividades Realizadas.

→ Se continua con la actividad de instalación de formaleta para fundición de viga de cimentación y toma de niveles y replanteo manual de tenero para placa en concreto de 3000 psi.

Por otra parte se realiza instalación de tubería galvanizada de 2" en costados Norte y Sur con modulación variable entre 1.90 - 2,58 metros segun diseños.

con ello se da por finalizada la jornada laboral.

Firma:

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA


)-03-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Itula.
Inicio de jornada: 7 am Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climaticas: Dia soleada
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
oficial (2)
Ayudantes (3).

Actividades Realizadas.


→ Se inicia fundicion de viga de cimentacion para cerramiento perimetral, Se culmina la instalacion de tubería galvanizada de 2" en costados norte - Sur.

Se realiza toma de muestras de concreto de los elementos estructurales, para ensayos de resistencia a la compresión.

Con ello se finalina la jornada laboral, para constancia a lo anteior se firmo:



RESIDENTE DE OBRA.



RESIDENTE DE INTERVENTORIA.


11-03-25 Lugar: Municipio de Gondalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 p.m.
Condiciones Climaticas: Dia Nublado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Oficial (2)
Ayudantes (3).

Actividades Realizadas.


→ Se continua con la actividad de fundicion de concreto de 3000 psi para viga de cimentacion necesaria para el cerramiento perimetral, de igual modo se realiza toma de muestras de concreto de los elementos estructurales para ensayos de resistencia a la compresión.

→ por otra parte se realiza visita de campo por parte del laboratorista para tomar densidades de la estructura de la placa.

Con ello se finalna la jornada laboral, para constancia de lo anteior firma:



RESIDENTE DE OBRA.



RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

12-03-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7: am Fin jornada: 5.00 pm.
Condiciones climaticas: Dia Nublado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de interventoria (1)
Maestro de obra (1)
oficial (2)
Ayudantes (3).

Actividades Realizadas:

→ Se continuo con la actividad de fundición de concreto de 3000 psi para viga de cimentación necesaria para el cerramiento perimetral, por otra parte se realiza instalación de tuberia galvanizada de 2" con modulación variable de 1.90 - 2.58 metros segun diseños para dar por terminada esta actividad.

Por constancia a lo anterior firma:

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.


13-03-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7: am Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones Climaticas: Dia lluvioso.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de interventoria (1)
Maestro de obra (1)
oficial (2).
Ayudantes (3).

Actividades Realizadas:

→ El personal de mano de obra no calificada se dispone a realizar actividades de mampostería - Muro cerramiento en ladrillo a la vista.

Por otra parte una vez culminado la actividad de replanteo y toma de niveles manuales se realiza modulacion de la placa de piso e: 7cm con secciones de 2.80* 2.50 metros, posteriormente se realiza instalacion de formaleta para fundición de placa de piso de 3000 psi.

En constancia a lo anterior firma:

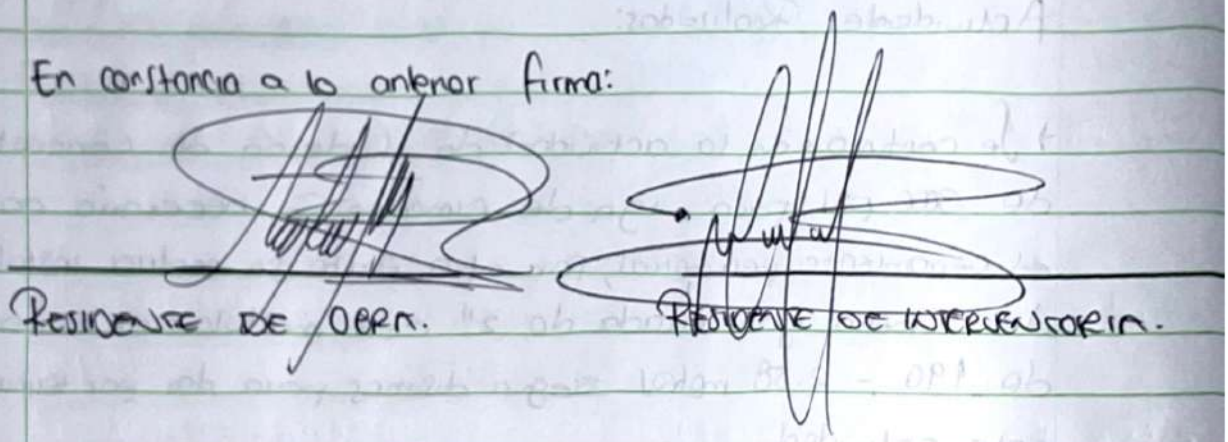

Residente de obra. Residente de interventoria.

17-03-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7 am - Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climaticas: Dia Nuboso
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Oficial (3)
Ayudantes (3).

Actividades Realizadas.

→ Se continuan con las actividades programadas segun el cronograma de ejecucion de actividades de obra en las cuales se destacan

- Mampostería - muro cerramiento en ladrillo a la vista.
- Modulación de placa de piso con secciones de 2.50 * 2.50m.
e instalacion de formaleta.

15-03-25. Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:am - Fin jornada: 5:00 Pm.
Condiciones climatoos:
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Oficial (2)
Ayudantes (3).

Actividades Realizadas.

→ Se continuan con las actividades programadas. Segun el cronograma de ejecución, el personal de maro de obra no calificada se dispone a realizar actividades de mamposteria - Muro cerramiento en ladrillo a la vista.

→ Se realiza alistamiento de materiales, herramientas y equipos para dar inicio a la fundición de dos secciones de la placa de piso en concreto de 3000 psi E: 7cm.

→ Se realiza conformación y compactacion de la estructura de la placa, instalacion de malla electrosoldada posteriormente vaciado de concreto de 3000 psi, de igual modo se realiza toma de muestras de concreto de los elementos para ensayos de resistencia a la compresión.

En constancia a lo anterior, firma:

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

17-03-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7: am Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones Climaticas: parcialmente Nublado con presencia de lluvia.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Oficial (2)
Ayudantes (5).

Actividades Realizadas.

+ Se continuan con las actividades programadas segun el cronograma de ejecución:

- Mamposteria - Muro cerramiento en ladrillo semipenetrado a la vista.
- Conformación y compactación de la estructura de la placa de piso, instalacion de la malla electrosoldada posteriormente vaciado de concreto de 3000 psi.

Por otra parte debido al atraso presentado en la ejecucion de las actividades el contratista implementa plan de contingencia para mitigar la eventualidad y atraso de obra por medio de un cronograma interno para ejecucion de los mismos con el fin de garantizar los altos estandares de calidad segun los lineamientos tecnicos del contrato.

En constancia a lo anterior, firma:

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

18-03-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7 am — Fin jornada: 5.00 pm.
Condiciones climáticas: parcialmente Nublado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoría (1)
Maestro de obra (1)
Oficial (1)
Ayudante I (3).

Actividades Realizadas.

→ Se continua con las actividades programadas segun el cronograma de ejecución:

• Mampostería - muro cerramiento en ladrillo Semipenetrado a la vista.

• Conformación y compactación de la estructura de la placa de piso, Instalación de malla electrosoldada, fatterramiento vaciado de concreto de 3000 PSI, de igual modo, se realiza toma de muestras de concreto de los elementos para ensayo de resistencia a la compresión.

En constancia a lo anterior, firma.

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

19-03-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am — Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones climáticas: Dia lluvioso.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoría (1).
Maestro de obra (1).
oficial (1)


Actividades Realizadas.

→ Se continua con las actividades programadas segun el cronograma de ejecución.


• Mampostería - muro cerramiento en ladrillo Santafereño a la vista.

• Conformación y compactación de la estructura de la placa de piso, instalación de malla electrosoldada, posteriormente vaciado de concreto de 3000 psi, de igual modo, se realiza. toma de muestras de concreto.

En Constancia a lo anterior, firma:



RESIDENTE DE OBRA.



RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

21-03-25. Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am - Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones Climaticas: parcialmente nublado con presencia de lluvia.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
oficial (2).
Ayudantes (3).


Actividades Realizadas.

→ Se continua con las actividades programadas segun el cronograma de ejecución.

Mampostería - muro cerramiento en ladrillo Santafereño a la vista.

Conformación y compactación de la estructura de la placa de piso, instalación de malla electrosoldada, posteriormente vaciado de concreto de 3000 PSI E: 07cm, de igual modo se realiza toma de muestral de concreto, para ensayo de resistencia a la compresión.

En constancia a lo anterior, firma:

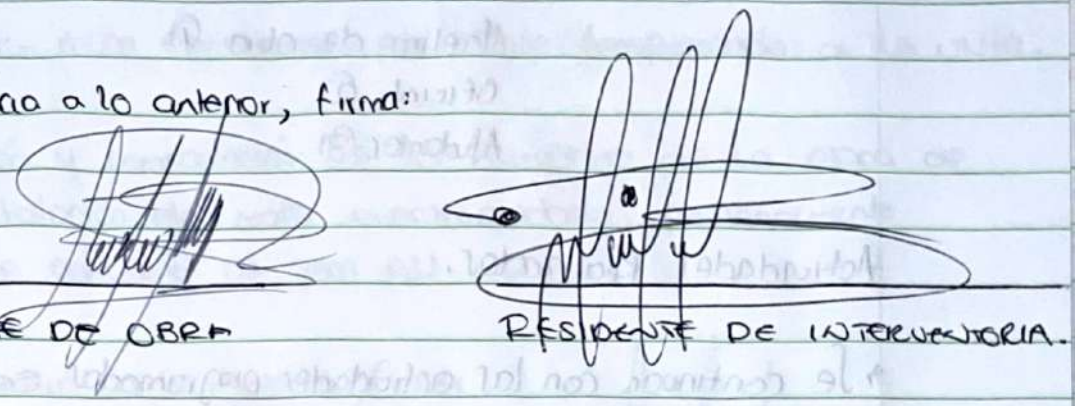

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.


12-05-25. Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:am - fin jornada: 5:00 p.m.
Condiciones climaticas: Parcialmente soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de interventoria (1).
Maestro de obra (1)
Oficial (2)
Ayudantes (3).

Actividades Realizadas

→ Se continuan las actividades programadas segun el cronograma de ejecución.

Mampostería - muro cerramiento en ladrillo Semiprensado a la vista.

Conformación y compactación de la estructura de la placa de piso, instalación de malla electrosoldada, posteriormente vaciado de concreto de 3000 PSI E: 07 cm de igual modo se realiza toma de muestras de concreto..



23-03-25. Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7 am — Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: parcialmente soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Oficial (2)
Ayudantes (3).

Actividades Realizadas.

→ Se continuan con las actividades programadas segun el cronograma de ejecucion:

Mamposteria - muro cerramiento en ladrillo santafereño a la vista

Conformación y compactación de la estructura de la placa de piso, instalación de malla electrosoldada, posteriormente vaciado de concreto de 3000 psi.

En constancia a lo anterior, firma.

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

24-03-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7 am Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climaticas: Dia lluvioso.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1).
Maestro de obra (1)
Oficial (2).
Ayudantes (3).


Actividades Realizadas:

→ Se continuan las actividades programadas segun el Cronograma de ejecución.

Mamposteria - muro cerramiento en ladrillo sompresado a la vista.

Conformación y compactación de la estructura de la placa de piso, Instalación de malla electrosoldada, posteriormente Vaciado de concreto de 3000 PSI.

En constancia a lo anterior, firma



RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

25-03-25. Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada. 7:am. - Fin jornada: 5:00pm.
Condiciones climaticas: Fuertes lluvias
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Oficial (2)
Ayudantes (3).


Actividades Realizadas.

→ Se continuan las actividades programadas segun el cronograma de ejecución.

Mamposteria - muro cerramiento en ladrillo Sompresado a la vista.

Conformación y compactación de la estructura de la placa de piso, Instalación de malla electrosoldada, posteriormente vaciado de concreto de 3000 PSI E: 09 cm, de igual modo se realiza toma de muestras de concreto para ensayo de resistencia a la compresión.

En constancia a lo anterior, firma:



RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

26-03-25. Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am - Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: Dia lluvioso.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Oficial (1)
Ayudantes (3).


Actividades realizadas.

→ Se realiza excavación manual para construccion de carcamo - Cuneta perimetral - dimensiones 40 cm de ancho y altura variable.

por otra parte se continua con las actividades programadas segun el cronograma de ejecución:

Mamposteria - muro cerramiento en ladrillo semipensado a la vista.

Conformación y compactación de la estructura de la placa de piso, instalacion de malla electrosoldada, posteriormente vaciado de concreto de 3000 PSI.



03-25. Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: Dia soleado.
Persona de obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1).
Oficial (2).
Ayudantes (3).

Actividades realizadas.

→ Se continua con la actividad de excavación manual para construccion de Cuneta perimetral - dimensiones 40 cm de ancho y altura variable.

Por otra parte se continua con las actividades programadas segun el cronograma de ejecución.

Mamposteria - muro cerramiento en ladrillo semiprensado a la vista.

Conformación y compactación de la estructura de la placa de piso, instalación de malla electrosoldada, posteriormente vaciado de concreto de 3000 PSI E: 07 cm, de igual modo se realiza toma de muestras de concreto para ensayo de resistencia a la compresión.

En Constancia a lo anterior, Firma.

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

28-03-25. Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones climáticas: parcialmente Nublado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Oficial (2)
Ayudantes (3).

Actividades realizadas.

→ Se continua con la actividad de excavacion manual para construcción de cneta perimetral - dimensiones 40 cm de ancho y altura variable.

Por otra parte se continua con las actividades programadas segun el cronograma de ejecución.

Mamposteria - muro cerramiento en ladrillo semipenetrado a la vista.

Se realiza conformación y compactacion de la estructura de placa de piso, instalación de malla electrosoldada, posteriormente vaciado de concreto de 3000 psi E: 07 cm.

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior, firma:

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

9-08-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7: am Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climaticas: Dia lluvioso.
Personal en obra: Residente de obra: (1).
Residente de Interventoria (1).
Maestro de obra (1)
Oficial (2)
Ayudante (3).

Actividades Realizadas:

→ Se continua con la actividad de excavación manual para construcción de cuneta perimetral - dimensiones 40 cm de ancho y altura variable.

por otra parte se continua con las actividades programadas segun el Cronograma de ejecución.

Mamposteria - muro cerramiento en ladrillo semiprensado a la vista.

Se realiza conformación y compactación de la estructura de placa de piso, instalación de malla electrosoldada, posteriormente vaciado de concreto de 3000 psi E: 07 cm, de igual modo se realiza toma de muestras de concreto para ensayo de resistencia a la compresión.

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior, firman.

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

: 31-03-25. Lugar: Municipio de Guadalupe - Hgo.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 p.m.
Condiciones climaticas: Dia lluvioso.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Oficial (2)
Ayudantes (3).

Actividades Realizadas

→ El personal de mano de obra no calificada culmina las actividades de mamposteria - muro ceramiento perimetral en ladrillo semiterminado a la vista. y excavacion manual para construccion de cuneta perimetral - dimensiones 40 cm de ancho y altura variable.

por otra parte se continua con la actividad de conformacion y compactacion de estructura de placa de piso, instalacion de malla electrosoldada, posteriormente vaciado de concreto de 3000 PSI E: 0.07, de igual modo se realiza toma de muestras de concreto para ensayo de resistencia a la compresion.

Con ello se finaliza la jornada laboral y en conformidad a lo anterior se firma.

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

01-04-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00m Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: Dia lluvioso
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra
Oficiales (2)
Ayudantes (3).

Actividades Realizadas

→ El personal de mano de obra se dispone a continuar con la actividad de conformación y compactación de estructura de placa de piso, instalacion de malla electrosoldada, posteriormente vaciado de concreto de 3000 psi f'c: 007.

Por otra parte se inicia excavacion manual para construcción de filtros laterales externos, recubrimiento en geotextil no tejido NT 1600, con gravilla comun o triturado de 1 1/2 a 4+ Tubería pvc 6".

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior. firma.

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

02-04-25 lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7 am - Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: Dia lluvioso
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro (1).
oficiales (2).
Ayudantes (3).


Actividades realizadas.

-Se continua con las actividades programadas segun el cronograma de ejecución:


Actividad de conformación y compactación de estructura de placa de piso, instalación de malla electrosoldada, posterior vaciado de concreto de 3000 psi e: 0.07.

Excavación manual para construccion de filtros laterales externos; recubrimiento en geotextil no tejido NT 1600, con gravilla comun o triturado de 1 1/2 a + 4 + tubería PVC drenajes de 6".

Con ello se finaliza la jornada laboral y en conformidad a lo anterior firma:



RESIDENTE DE OBRA.



RESIDENTE DE INTERVENTO

03-04-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7 am - Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: Fuertes lluvias.
Personal en obra: Residente de obra (1).
Residente de Interventoria (1).
Maestro de obra (1)
Oficiales (2)
Ayudantes (2).

Actividades Realizadas.

→ Debido a las condiciones climaticas adversas por las que atraviesa el municipio de Guadalupe. Se Suspenden

actividades operativas - ejecucion de actividades programadas.

por lo anterior es necesario resaltar. que se ~~resalta~~ acta administrativa en las instalaciones del INDER HUILA las Partes Interesadas U&M INGENIERIA SAS. R/L Yerson Fernando Camacho Ladino en calidad de contratista, CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S. R/L Daniela Camilo Tavera en calidad de Interventor y Luis Miguel Coquimbo Gómez como Apoyo a la supervisión del contrato de interventoría. con el PROPÓSITO de adelantar comite tecnico de obra para revisar el avance del contrato donde se evidencia atraso significativo en la ejecución de las actividades. como medida correctiva con el fin de mitigar el atraso presentado se ajuste el cronograma de actividades y la programación de ejecución de las mismas.

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior firma:

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

04-04-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:am Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: Dia Nublado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Oficiales (2).
Ayudante (3).

Actividades Realizadas.

El dia 04 de Abril de 2025 se emite Solicitud de prorroga mediante oficio VBM-GOA-17 como medida Correctiva con el fin de mitigar el atraso presentado considerando que, la ejecucion de las actividades se ha visto afectada por factores externos no imputables al contratista. por factores como:

Cambio de la ubicación del lote destinado para la construccion de la cancha sintetica implico nuevo levantamiento topografico e implantación de diseño.

Por otra parte, la funcionalidad del sistema electrico se encuentra supeditada a un proyecto macro externo al contratista del mismo modo el sistema electrico requiere revisión y ajuste de mayores y menores cantidades con el fin de dar Cumplimiento a la meta fisica del Contrato con ello la finalidad de emitir Balance de obra No. 1..

Finalmente. las condiciones climaticas adversas en la presente epoca invernal que afecta la region con dias de constantes lluvias torrenciales han dificultado han dificultado la ejecución de las actividades.

De acuerdo a lo anterior se esta a la espera de aval a la Solicitud de prorroga. por un plazo no mayor a 2 meses para la correcta ejecucion y Culminacion de las actividades de obra.

Para constancia de lo anterior firma.

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

05-04-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inico de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: Parcialmente Soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Oficiales (2)
Ayudantes (3).

Actividades Realizadas:

→ Se continua con las actividades programadas segun el cronograma de ejecución:

Actividad de conformacion y compactacion de estructura de placa de piso, instalacion de malla electrosoldada, posteriormente vaciado de concreto de 3000 PSI F: 0.07.

Excavación manual para construccion de filtros laterales externos; recubrimiento en geotextil no tejido NT 1600, con grava común o triturado de 1 1/2 a 4" tubería PVC. manguera perforada 6".

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior firma:

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

07-04-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climaticas: parcialmente nublado.

Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1).
Maestro de obra (1)
Oficiales (2).
Ayudantes (3).

Actividades Realizadas.

→ Se continua con las actividades programadas segun el cronograma de ejecución:

Actividad de conformación y compactación de estructura de placa de piso, instalacion de malla electrosoldada posteriormente vaciado de concreto de 3000 PSI f'c: 007. Con ello se culmina la actividad.

por otra parte se continua con la excavación manual y construccion de filtros laterales externos, recubrimiento en geotextil no tejido NT 1600, con grava comun o triturado 1 1/2 a 4" tubería PVC manguera perforada de 6".

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior firma:

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

08-04-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7 am Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climaticas: Dia lluvioso.
personal en obra: Residente de obra. (1)
Residente de Interventoria. (1).
Maestro (1). Oficiales (1).

Actividades Realizadas:

→ Se continua con las actividades programadas segun el cronograma de ejecucion:

Actividad de excavación manual y construccion de filtros laterales externos, recubrimiento en geotextil no tejido NT 1600, con gravilla común o triturada 1" /2 a 4.T + tubería PVC. manguera perforada de 8".

Construccion de pedestales - aeriamiento perimetral, instalacion de formaleta y vaciado de concreto de 3000 PSI.

con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior firma:

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

09-04-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Condiciones climaticas: Parcialmente Soleado.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm.
Personal en obra: Residente de obra: (1)
Residente de Interventoria (1).
Maestro de obra (1)
Oficiales (1).
Ayudantes (1).


Actividades Realizadas.

→ Se continua con las actividades programadas segun el Cronograma de ejecucion:

Actividad de excavacion manual y construccion de filtros laterales, recubrimiento en geotextil no tejido NT1600, con gravilla comun o triturada 1 1/2 a 4T Tuberia pvc manguera perforada de 6".

Construcción de pedestales - cerramiento perimetral, instalación de formaleta y vaciado de concreto de 3000 PSI.

Con ello se finaliza la jornada laboral, en constancia a lo anterior firma:



RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

10-04-25 Lugar: Municipio de Escalante - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada 5:00 pm
Condiciones climatologicas: parcialmente nublado.
Personal en obra: Residente de obra (1).
Residente de interventoria (1).
Maestro de obra (1).
Oficiales (2).
Ayudantes (3).

Actividades Realizadas

+Se continuan con las actividades programadas segun el cronograma de ejecucion:

Actividad de excavación manual y construccion de filtros laterales, recubrimiento en geotextil no tejido NT 1600 con gravilla común o triturada 1 1/2 Tuberia pvc drenajes 6".

Construccion de pedestales - Cerramiento perimetral

Instalacion de formaleta y vaciado de concreto de 3000 PSI.

Por otra parte se emite aval de solicitud de prorroga por un plazo no mayor a dos meses por parte de la interventoria del contrato CIOPIH 224 de 2024. bajo las consideraciones expuestas en el oficio VBM GOA-17 se firma otro Si NO2 - Prorroga.

11-04-25 lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
-Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climaticas: Parcialmente soleado.
personal en obra: Residente de obra (1).
Residente de Interventoria (1).
Maestro de obra (1).
Oficiales (2).
Ayudantes (3).

Actividades Realizadas:

→ Se continuan con las actividades programadas segun el Cronograma de ejecución.

Actividad de excavación manual y construccion de filtros laterales, recubrimiento en geotextil no tejido NT 1600 con gravilla comun o triturada 1 1/2 a 4" Tubena pvc manguera perforada.

Construccion de pedestales - cerramiento perimetral, Instalacion de formaleta y vaciado de concreto de 3000 PSI.

Con ello se finaliza la jornada laboral y en conformidad a lo a lo anteriormente firma:

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

12-04-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7 am Fin jornada 5:00 pm.
Condiciones climaticas: parcialmente soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de interventoría (1).
Maestro de obra (1)
Oficiales (2).
Ayudantes (3).

Actividades realizadas:

→ Se continua con las actividades programadas según el Cronograma de ejecución.

Actividad de excavacion manual y construccion de filtros laterales, recubrimiento en geotextil no tejido NT 1600, con grabilla común o triturado 1 1/2 a 2" tubería PVC manguera perforada. 6".

construccion de pedestales - Cerramiento perimetral, Instalacion de formaletas y vaciado de concreto de 3000 PSI.

Con ello se finaliza la ejecucion de dichas actividades y la jornada laboral. En constancia a lo anteriormente firma.

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

4-04-25 lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7 am Fin jornada 5:00 pm
Condiciones climaticas: Parcialmente soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1).
Maestro de obra (1)
Oficales (1).
Ayudantes (2)

Actividades Realizadas.

→ Se da inicio a las actividades programadas segun el cronograma de ejecucion:

Actividad de excavacion manual para construccion de red de aguas lluvias - Suministro e instalacion de tuberia PVC ⌀ 8". y Suministro de intalacion de bordillo prefabricado de 20x50x50.

Con ello se finaliza la jornada laboral y en conformidad a lo anterior firma:

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

5-04-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climaticas: parcialmente nublado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1).
Maestro de obra (1).
Oficiales (2).
Ayudantes (2)

Actividades realizadas.

→ Se continua con las actividades programadas segun el cronograma de ejecución:

Actividad de excavación manual para construcción de red de aguas lluvias – Suministro e instalacion de tubería PVC Ø 8" y Suministro e instalacion de bordillo prefabricado 20x50x50

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior firma:

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.


16-07-25 Lugar: Municipio de Guadalupe – Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climaticas: parcialmente soleado.
Personal en obra: Residente de obra. (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1).
Oficiales (2).
Ayudantes (2)

Actividades Realizadas.


→ Se continua con las actividades programadas segun el cronograma de ejecución:

Actividad de excavación manual para construcion de red de aguas lluvia – Suministro e instalacion de tubería PVC Ø 8" y Suministro e instalacion de bordillo prefabricado.

Con ello se finaliza la jornada laboral y en conformidad a lo anterior firma:



RESIDENTE DE OBRA



RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

17-04-25 Nota: A partir del 17 de abril de 2025 al 19 de abril de
al 2025 se suspenden actividades de obra durante periodo
17-04-25 de Semana Santa.

14-04-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: parcialmente soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1).
Maestro de obra (1).
Oficiales (2)
Ayudante (1).
Soldadores (2).


Actividades Realizadas:

→ Se continua con las actividades programadas segun el cronograma de ejecucion.

Actividad de excavacion manual para construccion de red de agua llena - tubería PVC Ø 8" y bordillo prefabricado.

Por otra parte se inicia construccion de cerramiento - modulos 2,5 x 2,5 m en Angulo 1 1/2" x 1/8 con varilla de 5/8 lisa.

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior se firma:



RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

22-05-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am - Fin jornada: 3:00 pm.
Condiciones climaticas: Parcialmente nublado.
Personal en obra: Residente de obra: (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Oficiales (2)
Ayudantes (1)
Soldadores (2).


Actividades Realizadas:

→ Se continua con las actividades programadas segun el cronograma de ejecución

Actividad de excavacion manual para construccion de red de aguas lluvias - suministro e instalacion de tuberia PVC 6" y suministro e instalacion de bordillo prefabricado.

Construccion de modulos de cerramiento 2,5 x 2,5 en Angulo 1 1/2 * 1/8 con canaleta de 5 1/8 Lisa.

Con ello se finaliza la jornada laboral en constancia a lo anterior firma.



RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE INTERVENTOR.

23-04-25 Lugar: Municipio de Guadalupe – Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climaticas: Parcialmente soleado
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
oficiales (2)
Ayudantes (1)
Soldadores (2).

Actividades Realizadas:

→ Se culmina la construcción de red de Aguas lluvia – Suministro e instalación de tubería PVC de ⌀ 8".

→ Se continua la actividad de excavación manual para suministro e instalación de bordillo prefabricado.

→ Se realiza construccion de modulos de cerramiento 2,5 x 2,50 en Angulo 1 1/2 x 1/8 con vanila de 5/8 liso. en sentido norte y sur.

Con ello se finaliza la jornada laboral, y en constancia a lo anterior firma:

RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA


24-04-25 Lugar: Municipio de Guadalupe – Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climaticas: Dia nublado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria. (1)
Maestro de obra (1). Oficiales (2).

Actividades Realizadas:


→ Se continua con la actividad de Suministro e instalacion de bordillo prefabricado.

→ Se realiza construccion de modulos de cerramiento 2.5 x 2.5 Angulo 1 1/2 x 1/8 con varilla de 5/8' liso en sentido norte y sur.

Con ello se finaliza la jornada laboral y en conformidad a lo anteriormente firma!



RESIDENTE DE OBRA.



RESIDENTE DE INTERVENTORIA


25-04-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 3:00 pm.
condiciones climaticas: parcialmente soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1).
Maestro de obra (1)
Oficiales (2).
Ayudantes (1)
Soldadores (0)

Actividades Realizadas.


→ Se continua con la actividad de Suministro e instalacion de bordillo prefabricado

→ Se realiza construcción de modulos de cerramiento 2.5 x 2.5 Angulo 1 1/2 x 1/8 con varilla lisa en sentido Norte y Sur.

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia de lo anterior firman:



RESIDENTE DE OBRA.



RESIDENTE INTERVENTOR.


6-09-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: parcialmente soleado.
personal en obra: Residente de obra. (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Oficiales (2)
Ayudantes (1)
Soldadores (2).

Actividades Realizadas.


→ Se continua con la actividad de suministro e instalacion de bordillo prefabricado.

→ Se realiza construcción de modelos de cerramiento 2.5 x 2.50 Angulo 1 1/2 x 1/8 con varilla 5/8 lisa en sentido norte y sur.

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia de lo anterior firma:



RESIDENTE DE OBRA.



RESIDENTE INTERVENTOR.

28-04-25 Lugar: Municipio de Guadalupe – Huila
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: parcialmente soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Oficiales (2)
Ayudantes (1).
Soldadores (2).

Actividades Realizados.

→ Se continua con la actividad de suministro e instalación de bordillo prefabricado.

→ Se realiza construccion de modulos de cerramiento 2.5 x 2.00 Angulo 1 1/2 x 1/8 con canilla Lisa 5/8 en sentido norte y sur.

Con esto se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior se firma.

RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE INTERVENTOR.

29-04-25 Lugar: Municipio de Guadalupe – Huila.
Inicio de jornada 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: parcialmente nublado
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Oficiales (2)
Ayudantes (1)
soldadores (2).

Actividades realizadas.

→ Se culmina la actividad de suministro e instalacion de Bordillo pretaboncado.

→ Se realiza construcción de modulos de cerramiento 2.5 x 2.5 Angulo 1 1/2 x 1/8 con varilla lisa 5/8 en sentido norte y sur.

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior firman:

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE INTERVENTOR


30-04-25 Lugar: Municipio de Guadalupe Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm
condiciones climaticas: Fuertes lluvias
personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de interventoria (1)
Maestro de obra (1)
oficiales (2)
Ayudantes (2)
Soldadores (..)

Actividades Realizadas:

→ Se realiza construcción de modulos de cerramiento 2.5 x 2.5 Angulo 1 1/2 x 1/8 con varilla liso 5/8 en sentido norte y sur.

→ Se inicia la actividad de construcción de Cuneta perimetral en concreto de 3000 PSI.

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior se firma:



RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA


01-05-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones Climaticas: Parcialmente Soleado:
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Oficiales (2)
Ayudantes (1)
Soldadores (2).


Actividades Realizadas:

→ Se realiza construccion e instalacion de modulos de Cerramiento 2.5 x 2.30 Angulo 1½ x 1/8 con canila lisa 5/8 en Sentido Norte y Sur.

→ Instalacion de malla electrosoldada para construccion de Cuneta perimetral en concreto de 3000 PSI

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia lo anterior firma:





RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

02-05-25 Lugar: Municipio de Guadalupe – Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: parcialmente soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Oficiales (2)
Ayudantes (1)
Soldadores (2).

Actividades Realizadas:

→ Se realiza construcción e instalación de modulos de cerramiento 2.5 x 2.50 Angulo 1½ x 1/8 con vanda lisa de 5/8 en sentido corte y fin.

Instalacion de malla electrosoldada para construccion de cuneta perimetral en concreto de 3000 PSI

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia de lo anterior firma.

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

03-05-25 Lugar: Municipio de Guadalupe – Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: parcialmente nublado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1).
Maestro de obra (1)
Oficial (1).
Soldadores (2).

Actividades Realizadas

→ Se realiza Construcción e instalación de modulos de cerramiento 2.5 x 2.5 Angulo 1 1/2 x 1/8 varilla lisa 5/8 en Sentido Norte y Sur.

→ Se continua con la actividad de construccion de cuneta perimetral, en concreto de 3000 PSI.

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia de lo anterior firma:

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE INTERVENTOR


05-05-25 Lugar: Municipio de Fusagasugá - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: Dia Nuboso.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de interventoria (1)
Maestro de obra (1).
Oficial (1).
Soldadores (2).

Actividades realizadas.

→ Se realiza Construccion e instalacion de modulos de cerramiento 2.5 x 2.5 Angulo 1 1/2 x 1/8 varilla lisa 5/8 en sentido Norte y Sur.

→ Se continua con la actividad de construccion de cuneta perimetral en concreto de 3000 PSI

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior firma.



RESIDENTE DE OBRA


RESIDENTE DE INTERVENTORIA

26-05-25 Lugar: Municipio de Guadalupe
Inico de jornada: 7:00 am Fin jornada 5:00 pm
Condiciones climaticas: parcialmente soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
oficial (1).
Soldadores (2).

Actividade Realizadas

→ Se realiza construcción e instalación de modulos de cerramiento 2.5 x 2.5 Angulo 1 1/2 * 1/8 varilla lisa 518 en sentido norte y sur.

→ Se continua con la actividad de construcción de cuneta perimetral en concreto de 3000 psi.



RESIDENTE DE OBRA.


RESIDENTE DE INTERVENTORIA

07-05-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada.
Condiciones climaticas: parcialmente soleado
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria
Maestro de obra (1)
Oficial (1).
Soldador (2).


Actividades Realizadas

→ Se realiza construcción e instalación de modulos de cerramiento 2.5 x 2.5 Angulo 1 1/2 * 1/8 Vanda lisa 5/8 en Sentido Norte y Sur.

→ Se continua la actividad - construccion de cuneta perimetral en concreto de 3000 PSI.



RESIDENTE OF OBRA



RESIDENTE INTERVENTOR

08-05-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climaticas: Parcialmente Soleada.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoría (1)
Maestro de obra (1).
Ayudante (1).

Actividades realizadas:

→ Se continua con la construcción e instalacion de modulos de cerramiento de 2,5 * 2,5. Angulo 1 1/2 * 1/8 Vanda Lisa 5/8

en Sentido Norte y Sur.

→ Se finaliza la actividad de construcción de cuneta perimetral en Concreto de 3000 PSI.

→ Se inicia construcción de filtros laterales en un ancho de 0.40 recubrimiento en geotextil no tejido NT 1600.

→ se inicia suministro e instalación de cespéd. monofilamentado rafia de 50mm.

→ Suministro e instalación de almohadilla de choque shock pad 20 mm.

→ Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior firma:

RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

24-05-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Itvila.
Inicio de jornada: 7:am - Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climatecas: Parcialmente nublado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1).
Maestro de obra.
Ayudantes.

Actividades Realizadas:

→ Se continua con la construcción e instalación de modulos de cerramiento de 2,5 * 2,5 Angulo 1 1/4 * 1/8 varilla lisa 5/8" en Sentido Norte y Sur.

→ Se continua con la actividad de suministro e instalación de almohadilla de choque shock pad 20 mm.

→ Se inicia la construcción e instalación de modulos de cerramiento 2,5 x 2,5 en angulo 1 1/2 x 1/8 con malla eslabonada en sentido oriente - occidente

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior se firma:

ING. RESIDENTE OBRA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

10-05-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am fin jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: Parcialmente soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de interventoria (1)
Maestro de obra.
Ayudante.

Actividades Realizadas:

→ Se continua con la construcción e instalación de modulos de cerramiento de 2,5 x 2,5 Angulo 1/2 x 1/8 Varilla lisa 5/8 en Sentido Norte y Sur.

→ Se continua con la construcción e instalacion de modulos de cerramiento 2,5 x 2,5 en angulo 1 1/2 x 1/8 con malla eslabonada en sentido oriente - occidente.

→ Se continua con la actividad de suministro e instalación de almohadilla de choque shock pad 20 mm

→ Se realiza suministro e instalación de césped monofilamentado rafia de 50 mm, backing doble capa, demarcación con césped color blanco, incluye granulo de caucho pegamento importados.

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior firma:

RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE DE INTERVENTORIA

11-05-25 Lugar: Municipio de Guadalupe
Inicio de jornada: 7:00 am - Fin jornada: 5.00 pm
Condiciones climaticas: Parcialmente soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1).
Residente de Interventoría (1)
Maestro de obra (1)
Estudiantes.

Actividades Realizadas:

→ Se continua con las actividades programadas segun el cronograma de ejecución

• Se continua con la construcción e instalación de modulos de cerramiento de 2,5 * 2,5 Angulo 1/2 * 1/8 varilla lisa 5/8 en sentido Norte y Sur.

• Se continua con la construcción e instalación de modulos de cerramiento en K 11/2 * 1/8 con malla eslabonada en sentido O-C.

→ Suministro e instalación de almohadilla de choque shock pad. 20mm

→ Suministro e instalación de cesped monofilamentado rafia de 50 mm, backing doble capa, demarcación con cesped color blanco. Incluye granulo de caucho, pegamento importado.

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior firma:

RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

12-05-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7 am Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: parcialmente soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra.
Ayudantes.

Actividades Realizadas:

→ Se continua con las actividades programadas segun el cronograma de ejecución:

• Construcción e instalación de modulos de cerramiento de 2,5 * 2,5 Angulo 1 1/2 * 1/8 vanilla lisa 5/8 en sentido Norte y Sur

• Construccion e instalación de modulos de cerramiento de 2,5 x 2,5 en Angulo 1 1/2 * 1/8 con malla eslabonada. en sentido oriente - occidente.

• Se realiza Suministro e Instalación de almohadilla de choque shock pad 20 mm.

• Suministro e Instalación de césped artificial rollo de 50 mm, backing doble cara, demarcación con cesped color blanco. Incluye granulo de caucho, pegamento Importado.

• Se inicio la construcción de anderes perimetrales en concreto de 3000 PSI e: 8Cm; realizando instalación de formaleta, extendido y armado de malla electrosoldada, posteriormente vaciado de concreto.

• Se realiza excavación para instalación de tubería galvanizada 2" cal 2mm - pie de amigo.

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior firma:

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

13-05-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7 am Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: parcialmente soleado.
Personal en obra: Residente de obra. (1)
Residente de Interventoria (1).
Maestro de obra (1)
Ayudantes.

Actividades Realizadas.

• Se continua con las actividades programadas segun el cronograma

• Se continua la construcción e instalación de modulos de cerramiento de 2,5 * 2,5 Angulo 1 1/2 x 1/8 Varilla lisa 1/8 en Sentido Norte y Sur.

• Construcción e instalación de modulos de cerramiento de 2,5 * 2,5 en Angulo 1 1/8 * 1/8 con malla esfabricada en Sentido oriente - occidente.

• Se realiza Suministro e instalación de: almohadilla de choque shock pad 20 mm.

• Suministro e instalación de cesped monofilamentado rafia de 50 mm, backing doble capa, demarcación con cesped color blanco. Incluye granulo de caucho.

• Se continua con la construcción de anclajes perimetrales en concreto de 3000 PSI e: 8cm; realizando instalacion de formaleta, extendido y armado de malla electrosoldada, posteriormente vaciado de concreto.

• Se continua la excavación para instalacion de tuberia galvanizada 2" Cal 2m Pie de amigo.

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior firma:

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

05-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7 am Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: parcialmente soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra.
Ayudante.

Actividades Realizadas.

Se continua con las actividades programadas segun el cronograma de ejecución.

- Construcción e instalación de modulos de cerramiento de 0,5 * 2,5 Angulo 1 1/2 * 1/8 Varilla lisa 5/8 en sentido Norte y Sur.

- Construcción e Instalación de modulos de cerramiento de 2,5 * 2,5 Angulo 1 1/2 * 1/8 Malla eslabonada en sentido Oriente - occidente.

- se realiza Suministro e instalación de almohadilla de choque shock pad 20 mm.

- Suministro e instalación de cesped monofilamentado pana de 50 mm backing doble capa, demarcación con cesped color blanco. Incluye granulo de caucho.

- Se continua con la construcción de anden perimetral en concreto de 3000 psi e: 8cm; realizando instalación de formaleta, extendido y armado de malla electrosoldada, posteriormente vaciado de concreto.

Se continua la actividad para instalación de tubería galvanizada 2" cal 2m - pie de amigo. Incluye anclajes,

Concreto de 3000 psi, dados 50 * 50 * 60 contados Norte y Sur.

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior firma:

RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

15-05-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7 am - Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climaticas: parcialmente soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoría (1)
Maestro de obra
Albañiles.

Actividades Realizadas:

+ Se continua con las actividades programadas segun el cronograma de ejecución.

• Construcción e instalación de modulos de cerramiento de 2,5 * 2,5 Angulo 1 1/2 * 1/8 Varilla lisa 5/8 en sentido Norte y Sur.

• Construcción e instalación de modulos de cerramiento de 2,5 * 2,5 Angulo 1 1/2 * 1/8 con malla eslabonada en sentido Oriente - occidente.

• Se realiza suministro e instalación de almohadilla de choque Shock pad 20 mm.

• Suministro e instalación de cesped monofilamentado rafia de 50 mm, backing doble capa, demarcación con cesped color blanco. Incluye granulo de caucho.

• Se contrata la construcción de anden perimetrales en concreto de 3000 psi e = 8cm; incluyendo instalación de formaleta, extendido y armado de malla electrosoldada, posteriormente vaciado de concreto.

• se contrata la construcción e instalación de tubería galvanizada - construcción de dados de concreto de 3000 psi en dimensiones 50*50*60. en costados Norte y Sur.

por otra parte, se realizo comite Tecnico de obra con el proposito de adelantar revisión del avance fisico del contrato y el estado del balance de obra - Mayores y menores cantidades No. 1, respecto al capitulo electrico e item no previstos. ademas aclarar aspectos técnicos sobre las redes de aguas lluvia y la instalación de red electrica.

con ello se expresa que las cantidades y actividades relacionadas con el sistema electrico requieren cantidades mayores y menores y/o la inclusión de items nuevos por lo cual se solicita aprobación urgente del balance de obra ya que el avance de ejecución se encuentra supeditado a actividades predecesoras como excavación manual e instalacion de tubería Sanitaria de 8". las cuales se encuentran en solicitud de aprobación afectando directamente el desarrollo de otras actividades y el cumplimiento del cronograma establecido.

En este sentido se propone la suspensión temporal del contrato, para evitar afectaciones al plazo restante de ejecución y permitir la revision y aprobación del balance ante el sistema General de Regalias. Medida que permitira gestionar recursos adicionales para las actividades no previstas. garantizando la

funcionalidad y calidad de la obra, presentando ante Interventoría - Solicitud de suspensión de los contratos de obra e interventoría.

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior firma:

RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

16-05-25. Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7 am Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climáticas: parcialmente soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1).
Residente de Interventoría (1)
Maestro de obra
Ayudantes.

Actividades Realizadas.

Se inicia la jornada laboral con las actividades programadas según el cronograma de ejecución, por otra parte se envía oficio de solicitud de suspensión temporal del contrato CIOPIA 221 de 2024 mediante oficio de consecutivo UBM-22.

- Se continua la construcción de muros de cerramiento de 2,5 x 2,5 Angulo 1 1/2 x 1/8 Vanda lisa 5/8 en sentido Norte y Sur.
- Construcción e instalación de muros de cerramiento de 2,5 x 2,5 Angulo 1 1/2 x 1/8 con malla eslabonada en

costado Oriente - occidente.

→ Se realiza Suministro e instalación de almohadilla de Choque. shock pad 20mm.

• Suministro e instalación de cesped monofilamentado rafia de 50 mm backing doble capa, demarcación de cesped color blanco. Incluye granulo de caucho.

• Se continua con la construcción de andenes peatonales en concreto de 3000 psi. e = 8cm.

• Se continua la instalación de pie de amigos con aclajes de dimensiones 50 * 50 * 60 en costados Norte y Sur.

con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anteria firma:

RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

24-05-23 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7 am - Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climaticas: parcialmente soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1).
Maestro de obra.
Ayudantes.

Actividades Realizados.

• Se continuan las actividades programadas segun el cronograma:

- Construccion e instalacion de modulos de cerramiento de 2,5 * 2,5 Angulo 1 1/2 * 1/8 en varilla lisa de 5/8 Sentido Norte - Sur

- Construccion e instalacion de modulos de cerramiento de 2,5 * 2,5 Angulo 1 1/2 * 1/8 con malla electrosoldada costado Oriente - Occidente.

- Se realiza suministro e instalacion de almohadilla en sentido shock pad 20mm

- Suministro e instalacion de cesped mantenimiento rafia de 50 mm, backing doble capa, demarcacion con cesped color blanco. Incluye grapas de caucho.

- Construccion de anden perimetral en concreto de 3000 PSI e=8cm.

- Se continua la instalacion de andenes de pie de amigos dados en concreto de 3000 PSI dimensiones 50 * 50 * 60.

con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anteria firma:

RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE DE INTERVENTORIA

18-05-25 Lugar: Municipio de Guadalupe:
Inicio de jornada: 7:00am Fin jornada 5:00 pm.
Condiciones climaticas: parcialmente nublado.
personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1).

Maestro de obra
-Ayudantes.

Actividades Realizadas.

→Se continuan las actividades programadas segun el Cronograma de obra

• Construccion e Instalacion de modulo de cerramiento de 2,5 * 2,5 Angulo 1 1/2 x 1/8 en varilla lisa 5/8 sentido Norte y Sur.

• Construccion e Instalacion de modulos de cerramiento de 2,5 * 2,5 Angulo 1 1/2 * 1/8 en malla elaborada costado oriente Occidente.

• Se realiza Suministro e instalacion de almohadilla de choque Shock pad 20 mm.

• Suministro e instalacion de Cesped monofilamentado rafia 50 mm, backing doble capa, demarcacion con Cesped color blanco. Incluye granulo de caucho.

• Construccion de Anclajes perimetrales en concreto de 3000 PSI e=8 cm.

• Se continua la instalacion de pie de amigo con anclajes dados de concreto de 3000 PSI dimensiones 50 * 50 * 60.

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior firma:

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INT.

19-05-25. Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7: am Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climaticas: parcialmente soleado
Personal en obra: Residente de obra: (1)
Residente de Interventoria (1).
Maestro de obra (1).
Ayudantes.

Actividades Realizadas:

→ Se continuan las actividades programadas segun el cronograma de obra.

• Construcción e instalación de modulos de cerramiento perimetral de 2,5 x 2,5 1 1/2 x 1/8 en varilla lisa de 518 en sentido Norte - Sur

• Construccion e instalacion de modulo de cerramiento perimetral de 2,5 x 2,5 1 1/2 x 1/8 en malla elaborada costado Oriente - occidente.

• Se realiza suministro e instalación de almohadilla de choque Shock pad 20 mm.

• Suministro e instalación de cesped monofilamentado rafia de 50mm backing doble capa, demarcación con cesped color blanco. Incluye granulo de caucho.

• Construccion de Andenes perimetrales en concreto de 3000 PS e = 8cm.

• Se continua la instalacion de pie de amigos con anclajes en concreto de 3000 PSI dimensiones 50 x 50 x 60.

20-05-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:am Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: parcialmente soleado.
personal en obra: Residente de obra (1).
Residente de interventoria (1).
Maestro de obra
Ayudantes.

Actividades Realizadas.

→ Se continuan las actividades programadas segun el cronograma de obra.

• Construccion e instalacion de modulos de cerramiento perimetral de 2,5 x 2,5 1 1/2 * 1/8 en vanila de 5/8 en sentidos Norte y Sur.

• Construcción e instalación de modulos de cerramiento perimetral de 2,5 * 2,5 Angulo 1½ * 1/8 en malla eslabonada. sentidos Oriente - occidente.

• Se realiza Suministro e instalación de almohadilla de choque shock pad 20mm.

• Suministro e instalación de cesped monofilamentado rafia de 50 mm backing doble capa demarcación con cesped color blanco. Incluye granulo de caucho.

• Construccion de Andenes perimetrales en concreto de 3000 psi e=.8cm.

• Instalación de pie de amigos con anclaje en concreto de 3000 psi dimensiones 50*50*60

Con ello se finaliza la jornada laboral y se suspenden actividades de obra temporalmente bajo las consideraciones anteriormente expuestas.

En constancia a lo anterior firmo:

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
