	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	**CÓDIGO:**	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	21 de julio de 2026				
INFORME No.	7	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	12/05/2026	Y EL	11/06/2026
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA OPTIMIZACION, ADECUACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE GUAPOTÀ				

ESTADO	EN EJECUCIÓN	PLAZO INICIAL CONTRATO	7 meses
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	VALOR INICIAL CONTRATO	$ 414.824.210,00
PROCESO No.:	CI-011-2025	FECHA DE INICIO:	12 de noviembre de 2025
CONTRATO No.:	01316 - 2025	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	11 de junio de 2026
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE GUAPOTÁ SANTANDER / EDISSON ARLEY CORTES VALLEGO	LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE GUAPOTÁ SANTANDER
NIT CONTRATISTA:	890.204.979-0 / 1.100.953.017 DE SAN GIL	SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ Sudirectora de Planeacion y Ordenamiento Ambiental
LINK DE PROCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9088921&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	APOYO SUPERVISIÓN	SAÚL ANTONIO CORTES DURÀN -Contratista, Subdirección de Planeación.

1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Inicio Contrato	12/11/2025	12/11/2025	11/06/2026	7 meses	0	11/06/2026	Si	Inicio del Convenio Interadministrativo No.01316 - 2025
Prórroga No. 1	11/03/2026	12/06/2026	11/09/2026	3 meses	0	11/09/2026	Si	Debido a imprevistos presentados por el municipio se celebra la Prórroga No. 1

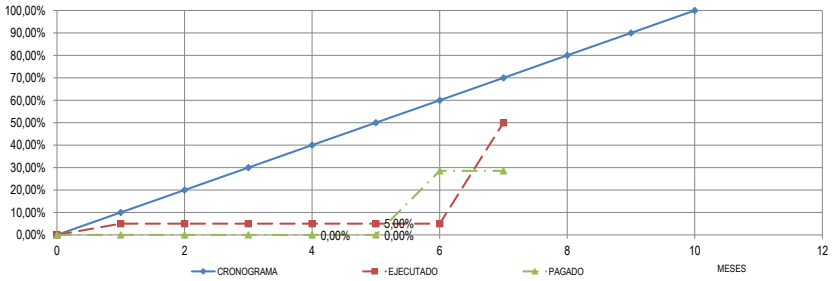
	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	**CÓDIGO:**	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 414.824.210,00				
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00				
VALOR TOTAL + ADICION(ES)	$ 414.824.210,00				
VALOR PAGADO:	$ 118.447.263,00				
VALOR POR PAGAR:	$ 296.376.947,00				
% POR PAGAR	71,45%				
% AVANCE FINANCIERO	28,55%	**TOTAL DE ADICIONES**			$ -

2.1. SITUACIÓN FINANCIERA

CONCEPTO	FECHA	VALOR
Acta Parcial No 01	17 de abril de 2026	$ 118.447.263,00
TOTAL		**$ 118.447.263,00**

3. CURVA "S"



MES/DIAS	CRONOGRAMA	EJECUTADO	PAGADO
0	0,00%	0,00%	0,00%
1	10,00%	5,00%	0,00%
2	20,00%	5,00%	0,00%
3	30,00%	5,00%	0,00%
4	40,00%	5,00%	0,00%
5	50,00%	5,00%	0,00%
6	60,00%	5,00%	28,55%
7	70,00%	50,00%	28,55%
8	80,00%		
9	90,00%		
10	100,00%		

PROGRAMADO	70,00%	
EJECUTADO	50,00%	
ATRASOS	-20,00%	
DESEMPEÑO		0,71
% PAGADO A LA FECHA	28,55%	
Pendiente por Ejecutar total	$	296.376.947,00
% POR CANCELAR A LA FECHA	71,45%	
Índice de avance financiero		0,57

Notas:

PROGRAMADO

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO A LA FECHA

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

El municipio de Guapotá da respuesta al Oficio SPL.685.2026 mediante oficio MG-SP-066-2026 anunciando la adjudicación de los Contratos de Obra e Interventoría correspondiente a las actividades establecidas en el cronograma aprobado por la CAS. Se hace la anotación que en este instante el municipio presenta un retraso como se expone en la curva S anterior.

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

El municipio de Guapotá da inicio a los derivados del convenio mediante el Contrato de Obra No.062-2026 Y el Contrato de Consultoría No.067-2026 el día 28 de mayo de 2026

Con oficio MG-SP-074-2026 con fecha del 2 de junio de 2026, el municipio de Guapotá, solicita la prórroga No.2 del Convenio Interadministrativo No.01316-2026 por un término de dos meses adicionales.

La CAS se encuentra realizando la revisión de la documentación allegada por el municipio referente a la Prórroga No2 para evaluar su viabilidad.

5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>



ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUAPOTÁ
NIT. 890.204.979 – 0
CORRESPONDENCIA
Guapotá, 15 de Mayo de 2026
Ingeniera:
EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTÍNEZ
Subdirector de planeación y ordenamiento ambiental
Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS
FICIO MG-SP-066-2026
REFERENCIA: Oficio SPL 895.2026 – Radicado 80.10.2612.2026 del 20 de abril de 2026
Cordial saludo
En atención a la comunicación de la referencia, mediante la cual solicita información y pronunciamiento respecto del desarrollo contractual del Convenio Interadministrativo N° 01316 2026, cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS PARA LA OPTIMIZACIÓN, ADECUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE GUAPOTÁ, SANTANDER"** me permito emitir respuesta detallada de las actuaciones administrativas debidamente surtidas y documentadas, conforme se expone a continuación:

OFICIO MG-SP-066-2026

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAPOTÁ
NIT 890.204.979-0
ACTA
F.220.P09.f | Versión: 04 | Fecha: Junio 2021 | Página: 1 de
ACTA DE INICIO
NOMBRE CONTRATISTA: INVERSIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA OLIVETE S.A.S.
IDENTIFICACIÓN: NIT 901.xxx.xxx-x DV: 1
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT: 4322 RESPONSABILIDAD DIAN: RÉGIMEN ESPECIAL DECLARANTE
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO
SUPERVISOR: YEFFERSON ANDRÉY ARENAS AMORICHO SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
INTERVENTOR: EDGAR ALFONSO MONTIEL PERALTA 79.734.804
TIPO DE CONTRATACIÓN: CONTRATO DE OBRA
NÚMERO DE CONTRATO: 062-2026 FECHA: 28/04/2026
OBJETO: OPTIMIZACIÓN, ADECUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE GUAPOTÁ, SANTANDER.
TERMINO DE DURACIÓN: CUATRO (04) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

Acta de Inicio Contrato de Obra No.062-2026

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>


ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAPOTÁ
NIT 890.204.979-0
ACTA
F.220.P09.f | Versión: 04 | Fecha: Junio 2021 | Página: 1 de
ACTA DE INICIO
NOMBRE CONTRATISTA: EDGAR ALFONSO MONTIEL PERALTA
IDENTIFICACIÓN: 79.734.804
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT: 7112 RESPONSABILIDAD DIAN: PERSONA NATURAL DECLARANTE
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
SUPERVISOR: YEFFERSON ANDREY ARENAS AMORICHO SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
TIPO DE CONTRATACIÓN: CONTRATO DE CONSULTORÍA
NÚMERO DE CONTRATO: 067-2026 FECHA: 14/05/2026
OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, CONTRACTUAL Y AMBIENTAL) AL PROYECTO CUYO OBJETO ES OPTIMIZACIÓN, ADECUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE GUAPOTÁ, SANTANDER

Acta de Inicio Contrato de Consultoría No.067-2026

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>


ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUAPOTÁ
NIT. 890.204.979 – 0
CORRESPONDENCIA
Guapotá, 02 de Junio de 2026
Ingeniera:
EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTÍNEZ
Subdirector de planeación y ordenamiento ambiental
Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS
OFICIO MG-SP-074-2026
ASUNTO: Solicitud de prórroga No. 02 por dos (2) meses, presentación de cronograma actualizado e informe de actuaciones realizadas, correspondiente al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 01316 DE 2025.

OFICIO MG-SP-074-2026

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre: EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTÍNEZ

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	SAUL ANTONIO CORTES DURAN	CONTRATISTA-SPL	
REVISO:			
V.B:			
