Arquitecto
WILBER HERRERA
SUDIRECCIÓN MARÍTIMA FLUVIAL FERREA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 – 31 de agosto 2026

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 18 de las RESPONSABILIDADES DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO del manual de Contratación del Instituto, y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE LA ESMERALDA Y EL MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL MUELLE EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.	1698-2022		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO PUERTO ASÍS	**NIT:**	891.200.461-3
CONFORMACIÓN:	MUNICIPIO PUERTO ASÍS		
Objeto:	**CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE LA ESMERALDA Y EL MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL MUELLE EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**		
Fecha de Inicio:	29 de diciembre del 2022	**No. de Oficio:**	SMFF 80999
Valor Inicial:	$12.086.813.197		
Valor Adiciones:	$5.800.000.000		
Adición 1:	$5.800.000.000		
Adición 2:	-		
Valor Actual:	$17. 886.813.197		
Anticipo Entregado:	$5.832.699.255		
Anticipo Amortizado:	$0		
Saldo por Amortizar:	$0		
Plazo Inicial:	31 de diciembre del 2023		
Total, Prórrogas:	N.A.		
Prórroga 1:	-		
Prórroga 2:	-		
Prórroga 5:	-		
Fecha de Fin:	01 de diciembre del 2026		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1351522	28/12/2022	11	C-2406-0600-7-0-2406008-02	1351522	$830.294.500	
107623	04/05/2023	11	C-2406-0600-7-0-2406008-02	107623	$10.902.224.197	
107623	04/05/2023	11	C-2406-0600-7-0-2406001-02	107623	$354.294.500	
1440023	20/06/2024	10	C-2406-0600-7-0-2406001-02	1440023	$5.800.000.000	

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

N.A.

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

N.A.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO – CONVENIO 1698/2022 – N.A.

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO - N.A.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-

CONTRATISTA:	CONSORCIO MUELLE LA ESMERALDA 2023	**NIT:**	901. 763.251 - 4
CONFORMACIÓN:	**CONSORCIO MUELLE LA ESMERALDA 2023**		
Objeto:	**CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE LA ESMERALDA Y EL MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL MUELLE EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**		
Fecha de Inicio:	23 de noviembre del 2023	**No. de Oficio:**	Acta de Inicio
Valor Inicial:	$11.665.398.510		
Valor Adiciones:	-		
Adición 1:	$5.832.682.528		
Valor Actual:	$17.886.813.197		
Anticipo Entregado:	$4.561.170.818 (Contractual) + 1.930.617.917 (adición)= $6.491.788.735		
Anticipo Amortizado:	$3.524.249.635,77		
Saldo por Amortizar:	$2.967.539.099,23		
Plazo Inicial:	31 de diciembre del 2023		
Total, Prórrogas:	-		
Fecha de Fin:	23 de octubre del 2026		

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
NOMBRE ASEGURADORA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	ANEXO 12 Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$1.166.539.851	37-44-101041967	23-11-2023	21-03-2027
Buen Manejo Anticipo	$5.832.699.255	37-44-101041967	23-11-2023	21-03-2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$3.499.616.207	37-44-101041967	23-11-2023	21-09-2029
Estabilidad y Calidad de la obra	$5.249.424.311	37-44-101041967	5 AÑOS O MESES 1 DÍAS	
Calidad Servicio	$44.999.815	37-44-101041967	29-01-2024	29-01-2029

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
RCE	$874.904.051,90	37-40-101026123	23/11/2023	22/04/2027

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N.A.			

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 67,0%
% Básico ejecutado acumulado: 67,0%

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	3636-2023		
CONTRATISTA:	INGEBEL SAS	**NIT:**	900.894.071-3
CONFORMACIÓN:	**INGEBEL S.A.S**		
Objeto:	**INTERVENTORÌA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE LA ESMERALDA Y EL MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL MUELLE EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**		
Fecha de Inicio:	11 de noviembre del 2023	**No. de Oficio:**	2024S-VBOG-022827
Valor Inicial:	$495.909.890		
Valor Adiciones:	$676.827.018		
Adición 1:	-		
Valor Actual:	$1.172.736.908		
Anticipo Entregado:	$0		
Anticipo Amortizado:	$0		
Saldo por Amortizar:	$0		
Plazo Inicial:	31 de diciembre del 2023		
Total, Prórrogas:	-		
Fecha de Fin:	23 de octubre del 2026		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1194523	2024	11	C-2406-0600-7-0-2406008-02	$17.150.042,00	$0	
1194523	2024	11	C-2406-0600-7-0-2406008-02 C-2406-0600-7-0-2406001-02	$78.840.415,50 $15.412.884,00	$0	
804626	2024	11	C-2406-0600-7-0-2406008-02	$32.832.064,30	$0	
805026	2025	11	C-2406-0600-7-0-2406008-02	$88.344.291,00	$0	
994026	2025	11	C-2406-0600-7-0-2406008-02	$88.958.452,38	$0	
568826	2025	11	C-2406-0600-7-0-2406008-02	$50.830.188,36	$0	
754926	2025	11	C-2406-0600-7-0-2406008-02	$46.463.150,16	$0	
1096326	2025	11	C-2406-0600-7-0-2406008-02	$28.783.000,00	$0	
1631326	2025	11	C-2406-0600-7-0-2406008-02	$29.185.999,50	$0	
2898726	2025	11	C-2406-0600-7-0-2406008-02	$19.210.812,60	$0	
	2026	10	C-2406-0600-7-51102A-2406001-02	$67.361.401,40	$0	

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No.1	$0	$0	$0
Acta Mensual de Costos No.2	$0	$0	$0
Acta Mensual de Costos No.3	$14.411.800	$2.738.242	$17.150.042
Acta Mensual de Costos No.4	$12.884.300	$2.448.017	$15.332.317
Acta Mensual de Costos No.5	$0	$0	$0
Acta Mensual de Costos No.6	$66.252.450	$12.587.965,00	$78.840.415
Acta Mensual de Costos No.7	$25.589.970	$5.242.094,00	$32.832.064
Acta Mensual de Costos No.8	$74.238.900	$14.105.391,00	$88.344.291
Acta Mensual de Costos No.9	$74.755.002	$14.203.450,00	$88.958.452
Acta Mensual de Costos No.10	$42.714.444	$8.115.744,00	$50.830.188
Acta Mensual de Costos No.11	$39.044.664	$7.418.486,00	$46.463.150
Acta Mensual de Costos No.12	$24.169.890	$4.592.277,20	$28.762.157,20
Acta Mensual de Costos No.13	$24.526.050	$4.659.949,50	$29.185.999,50
Acta Mensual de Costos No.14	$72.749.760	$13.822.454,40	$86.572.214,40

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO – N.A.

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO – N.A.

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO – N.A.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**ANEXO 19 Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$117.273.690,00	100037261	23-02-2026	23-04-2027
Buen Manejo Anticipo	$247.954.945,00	100037261	23-02-2026	23-04-2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$99.181.978,00	100037261	23-02-2026	23-10-2029
Calidad Del Servicio	$148.772.967,00	100037261	21-09-2026	23-10-2031

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA INTERVENTORÍA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
CORRESPONDENCIA INTERVENTORÍA			
INGEBEL_3636_2023_239	04/08/2026	INVIAS	Respuesta radicada 2026S-VBOG-053764
INGEBEL_3636_2023_240	06/08/2026	CONSORCIO LA ESMERALDA 2023	Revisión muro de contención metálico
INGEBEL_3636_2023_242	25/08/2026	CONSORCIO LA ESMERALDA 2023	Aprobación hojas de vida
INGEBEL_3636_2023_243	25/08/2026	CONSORCIO LA ESMERALDA 2023	Revisión soportes del anticipo
INGEBEL_3636_2023_244	25/08/2026	CONSORCIO LA ESMERALDA 2023	Verificación equipo mínimo
INGEBEL_3636_2023_245	25/08/2026	CONSORCIO LA ESMERALDA 2023	Verificación laboratorio en obra
INGEBEL_3636_2023_246	26/08/2026	CONSORCIO LA ESMERALDA 2023	Diseño emulsión asfáltica

INGEBEL_3636_2023_249	25/08/2026	CONSORCIO LA ESMERALDA 2023 / INVIAS / Alcaldía	No ajuste observaciones PAGA
INGEBEL_3636_2023_250	25/08/2026	CONSORCIO LA ESMERALDA 2023	Concepto estructural puente muelle-bongo
INGEBEL_3636_2023_252	26/08/2026	CONSORCIO LA ESMERALDA 2023	Concepto muelle flotante (Bongo 300T)
INGEBEL_3636_2023_253	25/08/2026	CONSORCIO LA ESMERALDA 2023	Plan de contingencia y recuperación
INGEBEL_3636_2023_254	26/08/2026	INVIAS	Solicitud aprobación cambio residente
INGEBEL_3636_2023_247	28/08/2026	CONSORCIO LA ESMERALDA 2023	Verificación de soportes adicionales del servicio de agua
INGEBEL_3636_2023_255	28/08/2026	CONSORCIO LA ESMERALDA 2023	Solicitud de propuesta técnica de solución – desalineación de pilotes y afectación en vigas.

DOCUMENTACIÓN INVIAS REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2026I-VBOG-054981	Jul-2026	Municipio de Puerto Asís	Rendimientos financieros Convenio 1698-2022
2026S-VBOG-053764	31/07/2026	INGEBEL SAS	Requerimiento presunta inhabilidad Director de Interventoría
2026E-VUVRAZ-082230	Ago-2026	INGEBEL SAS	Aprobación cambio director de Interventoría
2026E-VUVRAZ-091371	Ago-2026	INGEBEL SAS	Aprobación cambio Residente de Interventoría
2026I-VBOG-067021	18/08/2026	Wilber Alberto Herrera Burgos	Procedimiento reintegro rendimientos financieros
Pendiente	Ago-2026	Alcaldía Municipal de Puerto Asís	Solicitud trazabilidad actuaciones administrativas
Pendiente	Ago-2026	Municipio de Puerto Asís	Traslado procedimiento reintegro rendimientos financieros
Pendiente	Ago-2026	Mario Delfín Ortiz Jiménez	Solicitud concepto comisión bancaria devolución rendimientos

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

OFICIO 352	04 de agosto de 2026	INGEBEL S.A.S. - INTERVENTORÍA	ENTREGA DE CAPÍTULOS TÉCNICOS Y CARTOGRÁFICOS - SUBSANACIÓN INTEGRAL DE OBSERVACIONES PAGA Y RUTA DE CIERRE DE PASIVOS ANLA
CLE-354-2026	10 de agosto de 2026	INGEBEL S.A.S. - INTERVENTORÍA	SOLICITUD DE PRONTA RESPUESTA A DISEÑO ELÉCTRICO PROPUESTO
CLE-355-2026	10 de agosto de 2026	INGEBEL S.A.S. - INTERVENTORÍA	USO DE ADHESIVO PARA APLICACIÓN EN JUNTAS FRÍAS
CLE-356-2026	11 de agosto de 2026	EEBPSA; INGEBEL S.A.S.; MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS; INVIAS	TRASLADO DE POSTE ENERGIZADO Y TRANSFORMADOR PARA REUBICACIÓN DEL MUELLE PROVISIONAL ACTUAL
CLE-357-2026	14 de agosto de 2026	INGEBEL S.A.S. - INTERVENTORÍA	NUEVAMENTE, TRASLADO DE ESTUDIO E INSPECCIÓN TÉCNICA DEL MUELLE EXISTENTE
CLE-359-2026	14 de agosto de 2026	INGEBEL S.A.S. - INTERVENTORÍA	RESTRICCIÓN VEHICULAR POR FESTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CLE-360-2026	18 de agosto de 2026	INGEBEL S.A.S. - INTERVENTORÍA	REMISIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL 18 DE AGOSTO DE 2026
OFICIO 362	21 de agosto de 2026	INGEBEL S.A.S. - INTERVENTORÍA	REQUERIMIENTO PARA LA DEFINICIÓN DEL CRONOGRAMA DE REVISIÓN DEL PAGA Y MESAS DE TRABAJO
CLE-363-2026	21 de agosto de 2026	INGEBEL S.A.S.; MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS; INVIAS	RESPUESTA - REUNIÓN TÉCNICA CON ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE LA INTERVENTORÍA
CLE-365-2026	24 de agosto de 2026	INGEBEL S.A.S. - INTERVENTORÍA	REMISIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA SUBSANADO DEL 24 DE AGOSTO DE 2026
CLE-366-2026	25 de agosto de 2026	INGEBEL S.A.S. - INTERVENTORÍA	REMISIÓN DE DISEÑO PROPUESTO PARA ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN DEL PARQUEADERO
CLE-367-2026	26 de agosto de 2026	INGEBEL S.A.S. - INTERVENTORÍA	PLANO DE LOCALIZACIÓN DE PEDESTALES PARA AMARRE DE GUAYAS DEL MUELLE FLOTANTE NUEVO
CLE-368-2026	27 de agosto de 2026	INGEBEL S.A.S. - INTERVENTORÍA	REUNIÓN VIRTUAL CON ESPECIALISTAS ESTRUCTURALES PARA ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el mes se presentaron lluvias intermitentes que generaron saturación del terreno y afectaciones puntuales en las actividades de pilotaje y trabajos a cielo abierto. Estas condiciones requirieron ajustes en la programación y reorganización de los frentes de obra.

- ✓ **Condiciones climáticas adversas** En el presente mes de agosto 2026, se presentan Lluvias en el Sector de la Construcción del Muelle La Esmeralda.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco	16	18	15	4	6	12	16	10	14	17	14	12	16	9	14	4	6	3	12	14	15	12	10	11	10							290
Lluvias moderadas	5	3	3	18	14	7	3	8	8	3	6	4	5	8	8	12	14	8	7	8	3	7	8	8	11							189
Lluvias intensas	4	4	6	2	4	5	5	6	2	4	4	8	3	7	2	8	4	13	5	2	6	5	6	5	3							123
Total horas	25	25	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.



ASPECTOS JURÍDICOS.

- No se tuvieron aspectos en el período.


ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- NO se radicaron facturas de interventoría en el presente período julio 2026**.**

<u>INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)</u>

ASPECTOS TÉCNICOS.

- Se comisión al Municipio de Puerto Asís con el fin de atender la reunión citada por el Municipio de Puerto Asís, de asunto Invitación a Comité Técnico y Administrativo de Reinicio – Contrato de Obra No. 0431-2023.

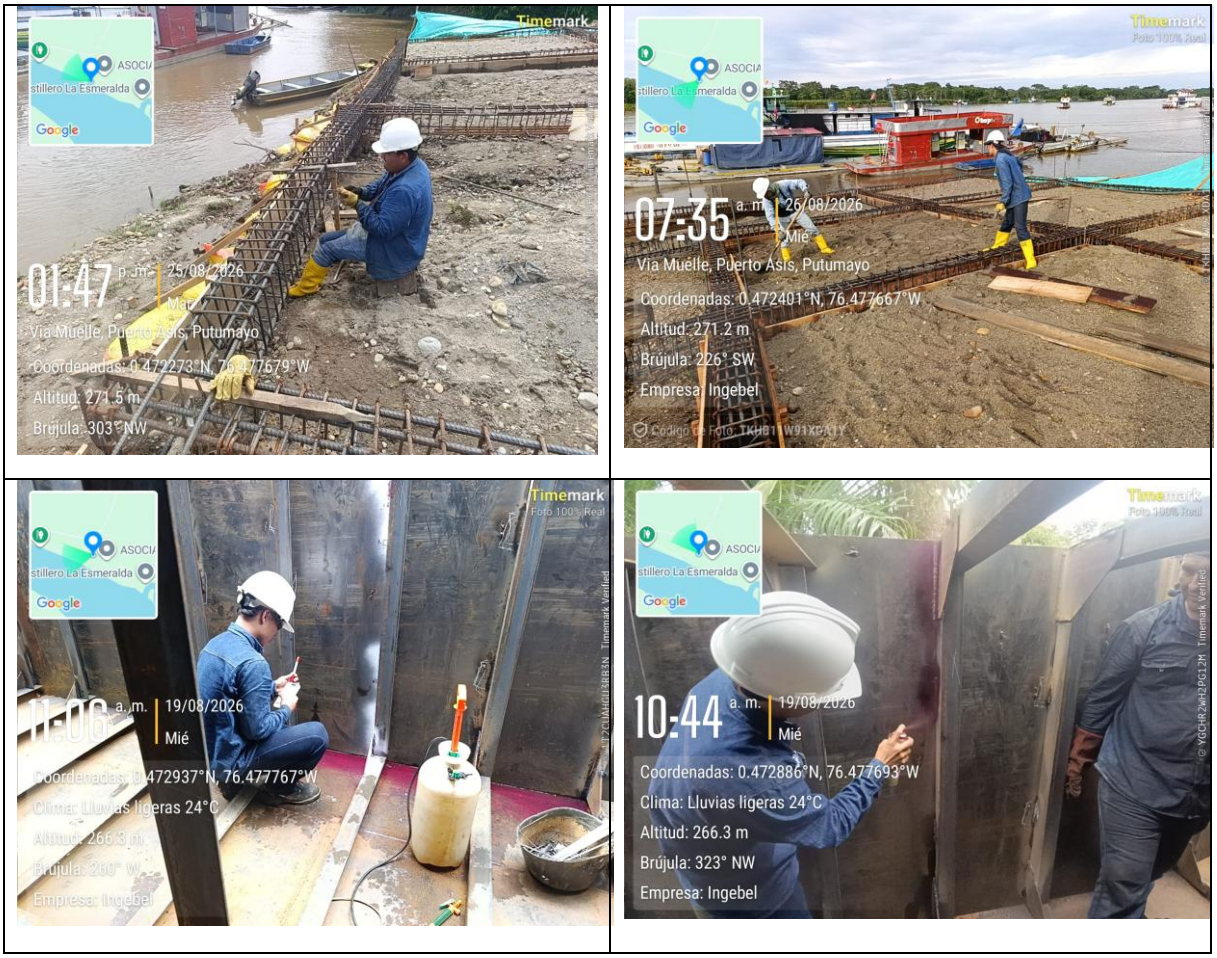

ASPECTOS JURÍDICOS.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- NO se radicaron facturas de interventoría en el presente período agosto 2026**.**

Cordialmente,

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
C.C 12.993.805 NRÑ
SUPERVISOR
