	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO: BS-FO-055 VERSIÓN: 2 FECHA: 15-11-2024

DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATISTA:	LEONEL ORLANDO JOJOA AZA			C.C. No:	1085312516
DEPENDENCIA:	GRUPO ADMINISTRATIVO YFINANCIERO TERRITORIAL NARIÑO			No CONTRATO:	NAR-52026-2026
FECHA DE INICIO DEL CTO:	03/06/2026			FECHA DE TERMINACIÓN DEL CTO:	31/12/2026
No CDP:	11526	No RP:	73026	TIPO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PRESTACION DE SERVICIOS

Número de Planilla PILA	Fecha de Pago de planilla PILA
94832478780	2026-07-18

OBJETO:

Prestación del servicio de mantenimiento preventivo mensual del ascensor marca Eurolift de la sede Territorial Nariño – Alto Putumayo de la ESAP, período julio – diciembre de 2026

PERIODO DE REPORTE					
MES PAGO:	JULIO	PAGOS TOTALES DEL CONTRATO:	6	NÚMERO DE PAGO Y/O CUENTA DE COBRO:	1

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	$ 6.780.000,00
Valor Adición:	$ 0,00
Valor Reducción:	$ 0,00
Valor Total:	$ 6.780.000,00
Valor a pagar:	$ 4.391.700,00

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES
Presentar los ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APUS firmados, correspondientes a las actividades del servicio y suministro, de acuerdo con los valores unitarios presentados en su propuesta económica: Valor costo directo, IVA, Valor total.	Costos de Servicios prestados
Cumplir con las características técnicas establecidas y coordinar junto con el supervisor los temas pertinentes para la correcta ejecución del contrato y de los elementos suministrados.	SE CUMPLE A CABALIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Cumplir con las especificaciones técnicas y condiciones del servicio de mantenimiento, según el anexo técnico.	SE CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TECNICO
Garantizar que el servicio prestado y los insumos o repuestos suministrados cumplen con la normativa y reglamentos técnicos vigentes aplicables al mantenimiento de sistemas de elevación, presentando los soportes correspondientes a la supervisión.	NUESTROS SERVICIOS, INSUMOS Y PRODUCTOS CUENTAN CON LA GARANTIA Y RESPALDO DE LA EMPRESA ALTAMENTE CALIFICADA ELEVNAR, CONTANDO CON PROVEEDORES DIRECTOS RESPALDANDO LA CALIDAD Y SERVICIO
Ejecutar el primer mantenimiento preventivo dentro de los primeros cinco (5) días calendario a partir del inicio del contrato.	Mantenimiento general del ascensor elaborado el dia 08/07/2026
Corregir las deficiencias en el servicio prestado que no satisfagan las condiciones técnicas requeridas, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la comunicación del supervisor.	SE CORREGIRA LAS DEFICIENCIAS QUE EN EL SERVICIO PRESTADO NO SATISFAGA
Asumir los costos de logística y transporte requeridos para la prestación del servicio de mantenimiento en la sede de la ESAP.	ASUMIREMOS LOS COSTOS DE LOGISTICA Y TRANSPORTE REQUERIDOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO CONTRACTUAL

Mantener los precios ofrecidos durante el término de duración del contrato.	MANTENDREMOS LOS PRECIOS OFERTADOS EN EL CONTRATO DURANTE LA DURACION DEL MISMO
Entregar en caso de ser necesario las cotizaciones de ítems no previstos que se requieran a solicitud del supervisor del contrato.	ENTREGAREMOS CON FORMALIDAD Y ANTICIPACION LAS COTIZACIONES NO PREVISTAS EN EL CONTRATO
Reparar a su costo cualquier daño causado a los inmuebles, muebles y enseres de la Escuela, durante la ejecución del objeto contractual.	SE REPARARA CONFORME A LA RESPONSABILIDAD CAUSADA Y A LOS DAÑOS MATERIALES A INMUEBLES, MUEBLES Y ENSERES
El ascensor deberá entregarse con prueba de funcionamiento total.	DENTRO DEL ACTO PROTOCOLARIO AL FINALIZAR SE ENTREGA REPORTE DE MANTENIMIENTO Y POSTERIORMENTE SU PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
Contar con personal idóneo que cuente con la experiencia y competencia suficiente, que permita garantizar el buen desarrollo del contrato conforme a las condiciones técnicas establecidas en el presente documento y la oferta económica.	ELEVNAR SE A CARACTERIZADO POR TENER UN PERSONAL IDONEAMENTE CAPACITADOS Y ALTAMENTE EXPERIMENTADOS EN TRANSPORTE VERTICAL, ESCALERAS ELECTRICAS, SALVA ESCALERAS, PORTONES ELECTRICOS Y OTROS TIPOS DE MAQUINARIAS

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
En calidad de supervisor del contrato / convenio anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas. Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

OBSERVACIONES
Se aprueba la cuenta de cobro, se considera que presenta un informe adecuado en cuanto al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

AUTORIZACIÓN DE PAGO		
SUPERVISOR:	MARIA CAMILA SEGOVIA CAICEDO	1085325176

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ELEVNAR identificado(a) con NI 1085312516-8 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LEONEL ORLANDO JOJOA AZA identificado(a) con CC 1085312516

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
94832478781	13461014	E	2026-07-18	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30							X		X									4%	$76,400
94832478781	13461014	E	2026-07-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30							X		X									16%	$305,600
94832478781	13461014	E	2026-07-18	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-06	30							X		X										$0
94832478781	13461014	E	2026-07-18	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-06	30							X		X										$0
94832478781	13461014	E	2026-07-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-06	30							X		X									0%	$0
94832478781	13461014	E	2026-07-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-06	30							X		X									0%	$0
94832478781	13461014	E	2026-07-18	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30							X		X									4.35%	$83,100
94832478781	13461014	E	2026-07-18	CCF	CCF35	COMFAMILIAR NARIÑO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30							X		X									4%	$76,400

Este certificado se expide el día 2026-07-19 a las 10:51.

1 Modificación del contrato
2 Información general
3 Condiciones
4 Bienes y servicios
5 Documentos del Proveedor
6 Documentos del contrato
7 Información presupuestal
8 Ejecución del Contrato
9 Modificaciones del Contrato
10 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.SLCNTR.17523903
Número del contrato	MC-005-2026
Versión del contrato	1
Objeto del contrato	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo mensual del ascensor marca Eurolift de la sede Territorial Nariño Alto Putumayo de la ESAP, período julio diciembre de 2026
Tipo de contrato	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato	6/07/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Duración del contrato	6 Meses
Tiempo adiciones en días	0 días
Estado del contrato	En modificación
Liquidación	Sí No
Obligaciones Ambientales	Sí No
Obligaciones Pos Consumo	Sí No
Reversión	Sí No

Entidad Estatal

San Juan De Pasto, 16 de Julio de 2026

Señora:
Elsy Janeth Melo Maya
Directora Territorial Nariño – Alto Putumayo
Escuela Superior de Administración Publica

Asunto: Informe de mantenimiento preventivo de ascensor.

Cordial saludo.

Por medio de la presente, ELEVNAR. se permite informar que se realizó el **mantenimiento preventivo** al ascensor ubicado en las instalaciones de la **Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, sede Pasto**, con el propósito de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar la vida útil de sus componentes y brindar condiciones óptimas de seguridad para los usuarios.

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Durante la intervención técnica se ejecutaron las siguientes actividades de mantenimiento, de conformidad con los procedimientos establecidos por la empresa:

- Inspección general del estado operativo del ascensor.
- Limpieza de guías de cabina y guías de contrapeso.
- Limpieza del cuarto de máquinas y del foso del ascensor.
- Revisión y ajuste del sistema de frenos de la máquina tractora.
- Verificación del funcionamiento del operador de puertas.
- Inspección de cables de tracción y poleas.
- Lubricación de los elementos mecánicos que lo requieren.
- Revisión del sistema eléctrico y electrónico de control.
- Verificación de finales de carrera, contactos de puertas y dispositivos de seguridad.
- Pruebas de funcionamiento en todos los niveles, verificando apertura y cierre de puertas, nivelación de cabina y correcto desplazamiento del equipo.

REPUESTOS REEMPLAZADOS

Como resultado de la inspección y con el fin de mantener la confiabilidad del equipo, se realizó el cambio de los siguientes componentes:

- Tres (3) inductores tipo cigarro.
- Una (1) cámara de seguridad.
- Cuatro (4) aceiteras.
- Cambio de los rodamientos del contrapeso.

Una vez finalizadas las actividades anteriormente descritas, se realizaron las respectivas pruebas de funcionamiento, evidenciando que el ascensor opera en condiciones normales y seguras para su utilización.

Correo electrónico: elevnar01@gmail.com
Contacto: 3184481050
Pasto- Nariño

San Juan De Pasto, 16 de Julio de 2026

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Mantenimiento general del ascensor dia 08/07/2026





Cambio de rodamientos 08/07/2026





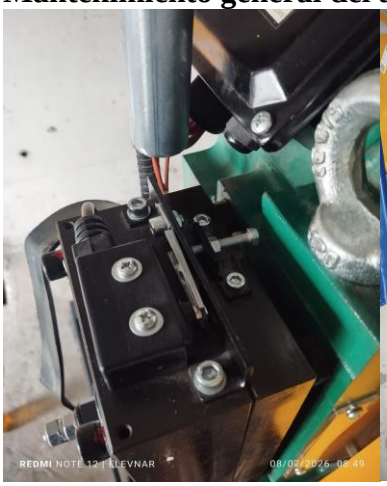

Instalacion de cámara de seguridad 10-07-2026





Correo electrónico: elevnar01@gmail.com
Contacto: 3184481050
Pasto- Nariño

San Juan De Pasto, 16 de Julio de 2026

Cambio de Aceiteras 08/07/2026





Cambio de inductores tipo cigarro 10/07/2026



Sin otro particular, agradecemos la confianza depositada en nuestra empresa y reiteramos nuestro compromiso de continuar prestando un servicio técnico oportuno y de calidad.

Atentamente,

Leonel Orlando Jojoa Aza
NIT 1085312516-8
Representante Legal – ELEVNAR

Correo electrónico: elevnar01@gmail.com
Contacto: 3184481050
Pasto- Nariño

San Juan De Pasto, 30 de Julio de 2026

Señora:
María Camila Segovia Caicedo
Supervisora
Escuela Superior de Administración Publica

Asunto: ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Objeto: Recibo a satisfacción del mantenimiento preventivo, suministro e instalación de elementos para el ascensor de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, Sede Pasto.

En la ciudad de **San Juan de Pasto**, a los treinta (30) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026), se deja constancia de que se recibió a satisfacción el mantenimiento preventivo realizado al ascensor de la **Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, Sede Pasto**, ejecutado por **ELEVNAR,** conforme al informe técnico presentado.
Durante la ejecución de las actividades se verificó el suministro e instalación de los siguientes elementos:

- Tres (3) inductores tipo cigarro.
- Una (1) cámara de seguridad tipo domo para ascensor.
- Cuatro (4) aceiteras.
- Cambio de los rodamientos correspondientes a la polea del contrapeso.

Asimismo, se constató que:

- Los elementos suministrados corresponden a las cantidades requeridas.
- La instalación fue realizada conforme a las especificaciones técnicas aplicables para sistemas de transporte vertical.
- Se efectuaron las pruebas de funcionamiento del ascensor, verificando el correcto desempeño del sistema de tracción, operador de puertas, nivelación, dispositivos de seguridad y sistema de videovigilancia.
- El ascensor quedó operando en condiciones normales, seguras y aptas para su servicio.

En consecuencia, se certifica que las actividades ejecutadas por **ELEVNAR** fueron recibidas **a satisfacción**, por cumplir con las condiciones de calidad, cantidad y correcto funcionamiento de los elementos suministrados e instalados.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, a los treinta (30) días del mes de julio de 2026.

Correo electrónico: elevnar01@gmail.com
Contacto: 3184481050 -3177700860
Pasto- Nariño

San Juan De Pasto, 30 de Julio de 2026

RECIBE A SATISFACCIÓN

María Camila Segovia Caicedo
C.C. 1085325176

Firma: _____

ENTREGA

Leonel Orlando Jojoa Aza
NIT 1085312516-8
Representante Legal - ELEVNAR

Correo electrónico: elevnar01@gmail.com
Contacto: 3184481050 -3177700860
Pasto- Nariño








BRIGADISTA

San Juan De Pasto, 30 de Julio de 2026

Señora:
Elsy Janeth Melo Maya
Directora Territorial Nariño – Alto Putumayo
Escuela Superior de Administración Publica

Asunto: CERTIFICACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, REFERENCIAS, MARCAS Y GARANTÍAS

ELEVNAR certifica que los elementos suministrados e instalados durante el mantenimiento preventivo del ascensor de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP fueron entregados nuevos y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas para equipos de transporte vertical.

Los elementos suministrados fueron:

Tres (3) inductores tipo cigarro El inductor magnético biestable tipo cigarro es un componente de conmutación de alta precisión, diseñado especialmente para el conteo de pisos, nivelación exacta y delimitación de zonas de parada en sistemas de elevación modernos, siendo plenamente compatible con tecnologías de control como Monarch (NICE) y STEP. Su estructura externa destaca por un cuerpo cilíndrico alargado fabricado en polímero sellado de alta resistencia (plástico ABS), el cual le otorga un grado de protección IP65/IP67 que garantiza un funcionamiento óptimo frente a la acumulación de polvo, grasa y humedad en el pasadizo del ascensor. Para su instalación, cuenta con un cable flexible blindado de dos o tres hilos con una longitud estándar de 1.5 a 2 metros.
En el apartado eléctrico, este sensor opera de manera segura en un rango de tensión de 12V a 24V DC (soportando picos de hasta 30V DC) y maneja una corriente de conmutación máxima de entre 100 mA y 250 mA. Gracias a su tecnología magnética biestable sin contacto mecánico, el dispositivo mantiene de forma lógica su último estado (abierto o cerrado) tras el paso del imán permanente, logrando una distancia de detección efectiva de 10 mm a 30 mm y una vida útil operativa superior a los 10 millones de ciclos. Asimismo, está diseñado para soportar entornos de trabajo exigentes, operando de manera confiable en temperaturas que van desde los -10 °C hasta los +65 °C con una humedad relativa inferior al 95%. Finalmente, su conexión típica se realiza mediante un código de colores donde el hilo azul o negro actúa como la señal de entrada común (GND) y el hilo marrón o rojo transmite la señal de salida digital hacia la tarjeta electrónica de la cabina.

una cámara tipo domo 1081 dahua dh-hac-t1a21n-0280b el producto de la serie Ultra adopta tecnología de sensor de imagen avanzada DSP y Sony de alto rendimiento, que puede proporcionar excelentes efectos de imagen para usuarios como resolución UHD, starlight y WDR súper. La serie utiliza el algoritmo de software avanzado Dahua, que es capaz de ayudar a las personas a contar y calentar mapa, trayendo valor adicional de análisis de negocios para los clientes; IP67, IK10 y el

cumplimiento del calentador permiten que el producto se aplique en un entorno más hostil. Tecnologia HDCVI La interfaz de video compuesto de alta definición (HDCVI) es un estándar en la industria de cámaras de seguridad y CCTV, que es una de las tecnologías más recientes para ofrecer soluciones de alta definición para sistemas de vigilancia analógica (CCTV). HDCVI es una tecnología de transmisión de video en alta definición a través de cable coaxial, lo que permite una transmisión HD de larga distancia confiable a un costo menor.

Como inventor de la tecnología HDCVI y propietario de la patente, Dahua lo ha convertido en un estándar abierto global, que brinda acceso abierto a cualquier tercero, incluidos los fabricantes de la competencia, para usar HDCVI modula la señal de video para nivelar y luego transmitir adoptando modulación de amplitud de banda base y cuadratura, que es también la razón de su nombre. Esta tecnología evita el diálogo cruzado de CVBS y separa por completo la señal de brillo y la señal de matiz, por lo tanto, mejora aún más la calidad del video. HDCVI ofrece dos especificaciones: 1920H (1920 × 1080) y 1280H (1280 × 720), que son compatibles con el estándar industrial 1080p (1920 × 1080) y 720p (1280×720). .

Cuatro (4) aceiteras La aceitera o lubricador automático para guías de ascensor es un componente esencial diseñado para optimizar el deslizamiento de la cabina y el contrapeso a lo largo de los rieles de la instalación [compras_industriales]. Fabricado con un cuerpo de plástico translúcido de alta densidad (como el policarbonato), este dispositivo permite inspeccionar visualmente el nivel de lubricante de forma rápida y sencilla sin necesidad de desmontar la pieza. Su mecanismo interno emplea fieltros o mechas de alta absorción que dosifican el aceite por capilaridad, garantizando un flujo continuo, uniforme y libre de goteos excesivos hacia las tres caras de contacto de la guía [compras_industriales].
En el aspecto mecánico, el lubricador cuenta con un diseño universal y flexible que se adapta magnéticamente o mediante tornillos a zapatas con un espesor de riel estándar (generalmente desde 9 mm hasta 16 mm). El depósito posee una capacidad volumétrica común de 150 ml a 300 ml, lo que reduce las frecuencias de mantenimiento preventivo. El material del fieltro es altamente resistente al desgaste por abrasión y es compatible con una amplia gama de aceites industriales de viscosidad media (ISO VG 68 a ISO VG 150) [compras_industriales]. Gracias a este sistema de lubricación pasiva y sin consumo eléctrico, el ascensor reduce drásticamente el ruido de rozamiento, previene la oxidación de las guías metálicas y minimiza el desgaste prematuro de las inserciones de las zapatas, soportando temperaturas operativas en el pasadizo de entre -10 °C y +60 °C.

Rodamientos para la polea del contrapeso son componentes mecánicos de alta fidelidad, diseñados para absorber las rigurosas cargas radiales y de empuje que experimentan los sistemas de tracción en la vertical de los ascensores. El dispositivo está fabricado con acero de aleación ultra limpio patentado por Timken, un material con propiedades metalúrgicas avanzadas que mitiga la fatiga del metal y proporciona una resistencia estructural superior bajo condiciones de uso continuo y cargas pesadas. El cuerpo dispone de geometrías de pista internas con perfiles de precisión optimizados que distribuyen de manera uniforme las presiones de contacto mecánicas, reduciendo drásticamente la fricción interna, el sobrecalentamiento operativo y el ruido en el pasadizo. Dependiendo del diseño de la polea, se suministra comúnmente en configuraciones de rodillos cónicos de alta capacidad o de bolas con ranura profunda.
En su configuración estándar para elevación, el rodamiento incorpora un sistema avanzado de sellado de doble o triple labio (versiones selladas LL, 2RS o blindadas) que retiene el lubricante

San Juan De Pasto, 30 de Julio de 2026

original y actúa como una barrera impenetrable contra las impurezas del entorno, tales como polvo de concreto, residuos metálicos y humedad abrasiva. La unidad viene lubricada de fábrica con grasas de litio de alto rendimiento para presiones extremas (clasificación NLGI #2), capaces de mantener sus propiedades cinemáticas en un rango térmico crítico que oscila entre los -30 °C y los +120 °C. Con tolerancias dimensionales estrictas bajo normas internacionales, estos rodamientos garantizan un ajuste milimétrico y concéntrico sobre el eje de la polea, asegurando una vida útil prolongada que minimiza las paradas imprevistas por mantenimiento preventivo y optimiza la seguridad del elevador.

La garantía de los elementos corresponde a la otorgada por el proveedor autorizado, aplicable por defectos de fabricación y bajo condiciones normales de uso e instalación.

Para constancia se firma en Pasto (Nariño) ***a los 30 días del mes de Julio de 2026***.

Leonel O. Jojoa A.

Leonel Orlando Jojoa Aza
NIT 1085312516-8
Representante Legal - ELEVNAR

Correo electrónico: elevnar01@gmail.com
Contacto: 3184481050 -3177700860
Pasto- Nariño

FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR MARCA EUROLIFT TERRITORIAL NARIÑO - ALTO PUTUMAYO

NOTA: El presente anexo describe las especificaciones técnicas de los ítems a contratar en el proceso MC-004-2026, correspondiente al servicio de mantenimiento preventivo mensual del ascensor marca Eurolift, período julio – diciembre de 2026, e insumos de primera intervención. Las especificaciones son de obligatorio cumplimiento para el proponente adjudicatario.

SEDE: **PASTO**

CODIGO SEGMENT	NOMBRE SEGMENTO	CODIGO FAMILIA	NOMBRE FAMILIA	CODIGO CLASE	NOMBRE DE CLASE	CODIGO PRODUCTO	NOMBRE PRODUCTO	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMAGEN DE REFERENCIA
72	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación	**72100000**	Servicios de mantenimiento de maquinaria	72101500	Mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas	72101506	**Servicios de mantenimiento de ascensores**	**1**	**Servicio de mantenimiento preventivo mensual del ascensor marca Eurolift. Incluye: lubricación general de partes móviles, ajuste de cables de tracción, revisión de sistema eléctrico (tableros, botoneras, señalización e iluminación), revisión de puertas automáticas de cabina y de piso, revisión de frenos de seguridad, verificación de contrapeso y guías, prueba de funcionamiento general. Periodicidad mensual julio – diciembre 2026 (6 intervenciones).**	Global	**6**	
24	Maquinaria, Accesorios y Suministros para Manejo y Almacenamiento de Materiales	24100000	Equipo de manejo de materiales	24101600	Elevadores y escaleras	24101601	Componentes y accesorios para ascensores	2	**Cámara tipo domo apta para equipos en movimiento, con insumos de instalación incluidos. Especificaciones mínimas: resolución HD (1080p), visión nocturna, resistente a vibraciones, compatible con ambiente de cabina de ascensor. Incluye cableado, soporte y accesorios de fijación. Se instala en la primera intervención.**	Global	1	
24	Maquinaria, Accesorios y Suministros para Manejo y Almacenamiento de Materiales	24100000	Equipo de manejo de materiales	24101600	Elevadores y escaleras	24101601	Componentes y accesorios para ascensores	3	**Aceiteras Ref GST236 para lubricación de componentes del sistema de elevación. Especificaciones: referencia GST236, capacidad mínima 500 cc, con boquilla de precisión, compatibles con lubricantes de uso en sistemas electromecánicos de ascensores. Se suministran en la primera intervención.**	Unidad	4	
24	Maquinaria, Accesorios y Suministros para Manejo y Almacenamiento de Materiales	24100000	Equipo de manejo de materiales	24101600	Elevadores y escaleras	24101601	Componentes y accesorios para ascensores	4	**Inductores tipo cigarro REF M10 para sistema de detección de posición y control del ascensor. Especificaciones: referencia M10, tipo inductivo de proximidad, voltaje de operación compatible con el sistema de control del ascensor Eurolift. Se suministran e instalan en la primera intervención.**	Unidad	3	
24	Maquinaria, Accesorios y Suministros para Manejo y Almacenamiento de Materiales	24100000	Equipo de manejo de materiales	24101600	Elevadores y escaleras	24101601	Componentes y accesorios para ascensores	5	**Cambio de rodamientos de polea de contrapeso del ascensor marca Eurolift. Incluye: desmontaje de la polea de contrapeso, retiro de rodamientos en mal estado, suministro e instalación de rodamientos nuevos según especificaciones del fabricante, prueba de funcionamiento post-instalación y registro fotográfico. Se ejecuta en la primera intervención.**	Global	1	

San Juan De Pasto, 16 de Julio de 2026

Señora:
Elsy Janeth Melo Maya
Directora Territorial Nariño – Alto Putumayo
Escuela Superior de Administración Publica

Asunto: Costos Labores realizadas

Cordial saludo

De la manera mas atenta me dirijo a usted con el fin de dar a conocer **los costos generados por los trabajos realizados anexados en el anterior informe**:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL
1	Mantenimiento preventivo de ascensor	$ 501.700	$ 501.700
3	Instalación de inductores	$ 190.000	$ 570.000
1	Instalación de cámara de seguridad	$470.000	$470.000
4	Instalación de aceiteras	$ 187.500	$750.000
1	Cambio de rodamientos	$2.100.000	$2.100.000
TOTAL			**$4.391.700**

Atentamente,

Leonel Orlando Jojoa Aza
NIT 1085312516-8
Representante Legal – ELEVNAR

Correo electrónico: elevnar01@gmail.com
Contacto: 3184481050
Pasto- Nariño
