INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL 01

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

CONTRATO CONVENIO SOLIDARIO	
NÚMERO DEL CONTRATO:	**CONV-SOL-MT-001-2026**
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, LOGÍSTICOS, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE TASCO Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (ASOJUNTAS) PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE TASCO, BOYACÁ.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	06 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TASCO
R. LEGAL:	GERMAN CAMILO MORALES RINCON C.C. N°: 1.049.628.515 DE TUNJA
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE TASCO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
NIT:	NIT. 901.501.424-8
R. LEGAL:	EDWIN JAVIER MANRIQUE GUERRERO C.C. N° 74.270.325 DE TASCO
SUPERVISOR:	FELIPE ANDRES ROMERO PINTO C.C. N°: 1.049.628.476 DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($121.857.673,32).
PLAZO EJECUCIÓN:	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO:	12 DE AGOSTO DE 2026

FECHA ACTA PARCIAL 01:	31 DE AGOSTO DE 2026		
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO	12 DE OCTUBRE DE 2026		
AVANCE FINANCIERO:	59,96%		
ESTADO ACTUAL			
VALOR TOTAL	CIENTO VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($121.857.673,32).		
EJECUTADO EN ACTA PARCIAL N°1	SETENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($ 73.068.484,00) M/CTE.		
DISPONIBILIDAD	203	FECHA: 17/07/2026	VALOR: $ 121.857.673,32
REGISTRO	666	FECHA: 06/08/2026	VALOR: $ 121.857.673,32

1) CONTROL TÉCNICO

Se realiza la Supervisión técnica del convenio CONV-SOL-MT-001-2026, AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, LOGÍSTICOS, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE TASCO Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (ASOJUNTAS) PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE TASCO, BOYACÁ, donde para la presente acta parcial 01 se realizaron las siguientes actividades:

CAP. 2: TRAMO LA CASCADA

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

Se realiza el suministro e instalación de material de afirmado compactado con vibro compactador de 50,99 m^3 para el tramo de la cascada

AREA O LUGAR	DIMENSIONES			V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO PESO				
PLACA HUELLA	16,50	4,60	0,15	11,39	1,00	M3	11,39
SOPORTE CUNETAS	16,50	1,20	0,15	19,80	2,00	M3	39,60
TOTAL PARCIAL UNO							50,99



Fuente: secretaria de planeación y obras publicas



Fuente: secretaria de planeación y obras publicas

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN

Se realiza la excavación de 0,32 m3 en material común para la instalación de riostras en el tramo de placa huella de la cascada

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
RIOSTRAS	6,30	0,20	0,05		0,06	5,00	M3	0,32



Fuente: secretaria de planeación y obras publicas



Fuente: secretaria de planeación y obras publicas

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA

Se realiza el suministro figurado y armado de acero de refuerzo 500,76 kg para el tramo de la placa huella de la cascada



Fuente: secretaria de planeación y obras publicas



Fuente: secretaria de planeación y obras publicas

CONCRETO PARA PLACA HUELLA DE 21 MPa - (3000 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS).

Se realiza el suministro de 5,45m³ concreto de 21 mpa para las huellas y riostras que conforman la estructura de placa huella del tramo de la cascada

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
RIOSTRAS	6,30	0,20	0,20		0,25	5,00	M3	1,26
HUELLAS	15,50	0,90	0,15		2,09	2,00	M3	4,19
TOTAL, PARCIAL UNO								5,45




Fuente: secretaria de planeación y obras publicas

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPA (3000 PSI) , 60% RAJON PARA PLACA HUELLAS INCLUYE SELLO DE JUNTAS

Se realiza el suministro e instalación de 6,51 m³ concreto ciclópeo de 21 MPA con 60% rajón para placa huella del tramo de la cascada.

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
PIEDRA PEGADA	15,50	2,80	0,15		6,51	1,00	M3	6,51
TOTAL, PARCIAL UNO								6,51

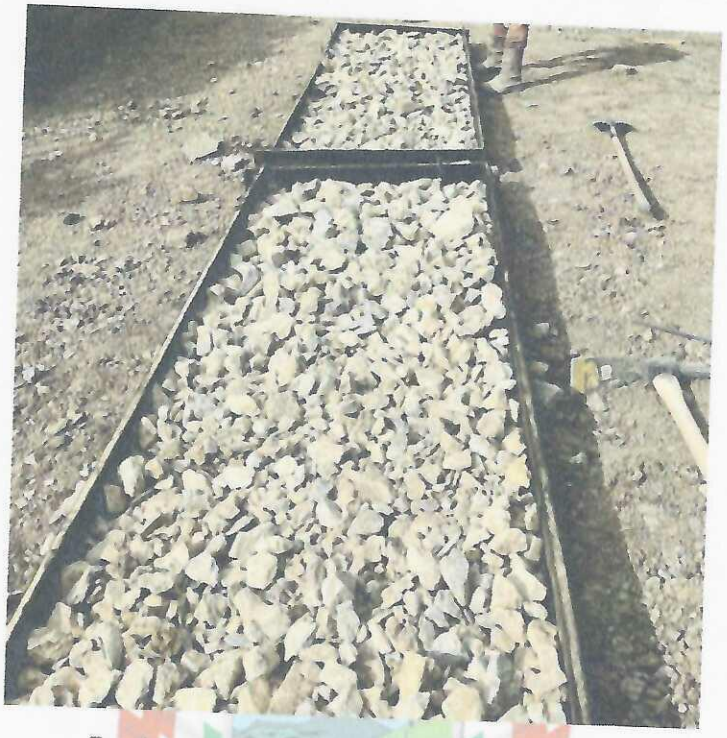

Fuente: secretaria de planeación y obras publicas

CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)

Se realiza la construcción de 6,74 m3 en cunetas revestidas en concreto de 21 MPA sin refuerzo para el tramo de placa huella de la cascada

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
CUNETA	15,50	1,20	0,15		2,79	2,00	M3	5,58
BORDILLO	15,50	0,15	0,25		0,58	2,00	M3	1,16
TOTAL, PARCIAL UNO								6,74



Fuente: secretaria de planeación y obras publicas

CAP. 3: TRAMO EL BREVO

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

Se realiza el suministro e instalación de material de afirmado compactado con vibro compactador de 117,60 m^3 para el tramo del barrio el brevo

AREA O LUGAR	DIMENSIONES			V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO PESO				
PLACA HUELLA	40,00	3,60	0,15	21,60	1,00	M3	21,60
SOPORTE CUNETAS	40,00	1,20	0,15	48,00	2,00	M3	96,00
TOTAL PARCIAL UNO							117,60



Fuente: secretaria de planeación y obras publicas



Fuente: secretaria de planeación y obras publicas

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN

Se realiza la excavación de 0,72 m3 en material común para la instalación de riostras en el tramo de placa huella barrio el brevo

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
RIOSTRAS	6,00	0,20	0,05		0,06	12,00	M3	0,72



Fuente: secretaria de planeación y obras publicas

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA

Se realiza el suministro figurado y armado de acero de refuerzo 993,66 kg para el tramo de la placa huella barrio el brevo



Fuente: secretaria de planeación y obras publicas

CONCRETO PARA PLACA HUELLA DE 21 MPa - (3000 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS).

Se realiza el suministro de 13,65 m^3 concreto de 21 mpa para las huellas y riostras que conforman la estructura de placa huella del tramo barrio el brevo

AREA O LUGAR	DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL

	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS		
RIOSTRAS	6,00	0,20	0,20		0,24	12,00	M3	2,88
HUELLAS	36,50	0,90	0,15		4,93	2,00	M3	9,86
RAMPA DE INGRESO	1,10	6,00	0,15		0,99	1,00	M3	0,99
DECUENTO POZO ALCANTIRILLADO	0,80		0,15		0,08	-1,00	M3	-0,08
TOTAL, PARCIAL UNO								**13,65**



Fuente: secretaria de planeación y obras publicas



Fuente: secretaria de planeación y obras publicas


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPA (3000 PSI) , 60% RAJON PARA PLACA HUELLAS INCLUYE SELLO DE JUNTAS

Se realiza el suministro e instalación de 9,22 m^3 concreto ciclópeo de 21 MPA con 60% rajón para placa huella del barrio el brevo.

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
PIEDRA PEGADA	36,50	2,80	0,15		9,86	1,00	M3	9,86
DESCUENTO POZO FLUVIAL	0,70		0,15		0,057	-1,00	M3	-0,06
DECUENTO POZO ALCANTIRILLADO	0,80		0,15		0,578	-1,00	M3	-0,58
TOTAL, PARCIAL UNO								9,22



Fuente: secretaria de planeación y obras publicas

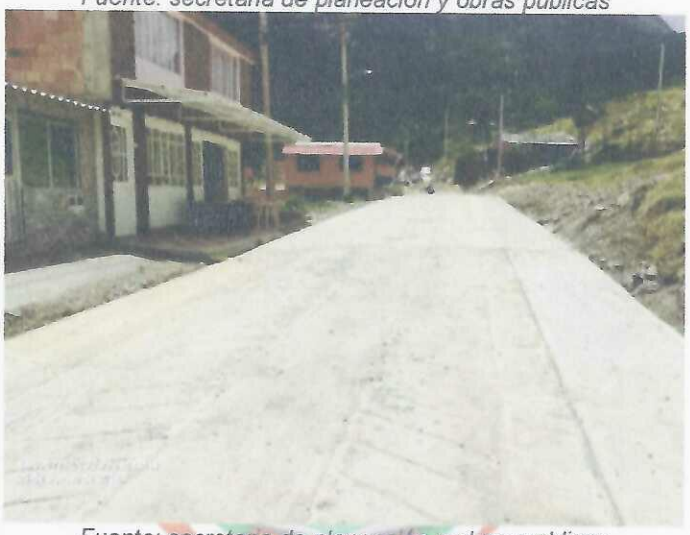

Fuente: secretaria de planeación y obras publicas

CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)

Se realiza la construcción de 13.14 m3 en cunetas revestidas en concreto de 21 MPA sin refuerzo para el tramo de placa huella del barrio el brevo

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
CUNETA	36,50	1,20	0,15		6,57	2,00	M3	13,14



Fuente: secretaria de planeación y obras publicas



Fuente: secretaria de planeación y obras publicas

2) CONTROL ECONÓMICO

DETALLE	(+)	(-)
(+) VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$121.857.673,32	
(=) VALOR TOTAL CONVENIO	$121.857.673,32	
(-) VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL 01		$ 73.068.484,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUCIÓN		$ 48.789.189,32
SUMAS IGUALES	$121.857.673,32	$121.857.673,32

VALOR POR CANCELAR PRESENTE ACTA: **SETENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($ 73.068.484,00) M/CTE.**

3) PÓLIZAS DEL CONTRATO

Que el contratista ha presentado la siguiente póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal: Póliza de seguro de cumplimiento No. **BY - 100068737** Anexo 0 expedida, por la compañía **SEGUROS MUNDIAL S.A** la cual cubre los siguientes amparos:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	12/08/2026	22/04/2027	$ 12.185.767,32
PRESTACIONES SOCIALES,	12/08/2026	22/10/2029	$ 6.092.883,66
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	12/08/2026	24/11/2030	$ 12.185.767,32

1. Que el contratista ha presentado la siguiente póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal: Póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **BY-100012203** Anexo 0 expedida, por la compañía **SEGUROS MUNDIAL S.A** la cual cubre los siguientes amparos:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Amparo básico- predios, labores y operaciones	12/08/2026	22/10/2026	$350.181.000,00
Contratistas y subcontratistas	12/08/2026	22/10/2026	$350.181.000,00
Vehículos propios y no propios	12/08/2026	22/10/2026	$350.181.000,00

Que verificados los amparos y valores porcentuales y de tiempo de la póliza, se determina que estas cumplen con lo establecido en el contrato.

4) VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE HSE

durante el desarrollo del contrato mencionado a lo largo del presente informe, se ha garantizado el uso de los elementos de seguridad de toda la mano de obra que ejecuto

las actividades dispuestas para cumplir con el objeto del contrato cumpliendo así con dichos requisitos.

5) VERIFICACION PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

durante el desarrollo del contrato mencionado a lo largo del presente informe, el contratista hace la relación de las siguientes planillas correspondiente al mes de agosto de 2026.

RELACIÓN PLANILLAS REPRESENTANTE LEGAL

EDWIN JAVIER MANRIQUE GUERRERO

MES	FECHA DE PAGO	PLANILLA	SALUD	PENSIÓN
AGOSTO	26/08/2026	9509819343	$218.900	$280.200

Para constancia de lo anterior se firma a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2026

FELIPE ANDRES ROMERO PINTO
Secretario de Planeación y obras publicas
Supervisor

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró	Deibid Arley Berdugo Araque	Apoyo Sec. Planeación	
Revisó	Felipe Andres Romero Pinto	Sec. Planeación	
Aprobó	Felipe Andres Romero Pinto	Sec. Planeación	
