INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES

CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No. CONV-SOL-MT-001-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE TASCO Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE TASCO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

DATOS GENERALES			
FECHA DE PRESENTACIÓN:	31 DE AGOSTO DE 2026	PERIODO DEL INFORME	12 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE TASCO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ** **NIT. 901.501.424-8** **REPRESENTANTE LEGAL** **EDWIN JAVIER MANRIQUE GUERRERO** **CC N° 74.270.325 DE TASCO**		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	FELIPE ANDRES ROMERO PINTO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS		
DATOS DEL CONTRATO			
NO DE CONTRATO:	**CONV-SOL-MT-001-2026**		
OBJETO DEL CONTRATO:	AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, LOGÍSTICOS, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE TASCO Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (ASOJUNTAS) PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE TASCO, BOYACÁ.		
FECHA DE INICIO:	12 DE AGOSTO DE 2026	FECHA DE TERMINACIÓN:	12 DE OCTUBRE DE 2026

1. Introducción

El presente informe tiene como objeto mostrar las diferentes actividades realizadas durante la ejecución del convenio solidario entre la alcaldía municipal de Tasco y la ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE TASCO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, donde se aunaron esfuerzos financieros, administrativos y técnicos para el mejoramiento de Los tramos viales de las veredas el brevo, la cascada, el alto y el fraile, dando cumplimento a las especificaciones técnicas de construcción de proyectos tipo placa huella.

Ubicación

El convenio solidario se está ejecutando en las veredas el brevo, la cascada, el alto y el fraile, donde se pretenden realizarlas intervenciones viales.

Imagen 1: ubicación vías



Ilustración 1: Google eart

2. Informe

Se realizan las siguientes actividades

3.01 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

Se realizo la intervención de 168,59 m3 con material de afirmado y su debida extendida y compactación.

CAP. 2: TRAMO LA CASCADA	M3	50,99
CAP. 3: TRAMO EL BREVO	M3	117,60
TOTAL	M3	168,59









FUENTE: JAC ASOJUNTAS TASCO

3.02 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN

Se realizaron las intervenciones referentes a excavaciones manuales para la conformación de vigas riostras dentro de los tramos a intervenir.

CAP. 2: TRAMO LA CASCADA	M3	0,32
CAP. 3: TRAMO EL BREVO	M3	0,72
TOTAL	M3	1,04





FUENTE: JAC ASOJUNTAS TASCO

3.03 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA

Se realizaron las actividades referentes a la compra y adecuación del material de acero de refuerzo en lo correspondiente a figurado y armada para cada una de las secciones establecidas dentro de los diseños.

CAP. 2: TRAMO LA CASCADA	M3	500,76
CAP. 3: TRAMO EL BREVO	M3	993,66
TOTAL	M3	1494,42






FUENTE: JAC ASOJUNTAS TASCO

3.04 CONCRETO PARA PLACA HUELLA DE 21 MPa - (3000 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS).

Se realizo la intervención en lo referente a mezclas de concreto de 3000 psi y la implementación del mismo dentro de los tramos de placa huella para su respectiva fundida.

CAP. 2: TRAMO LA CASCADA	M3	5,45
CAP. 3: TRAMO EL BREVO	M3	13,65
TOTAL	M3	19,10

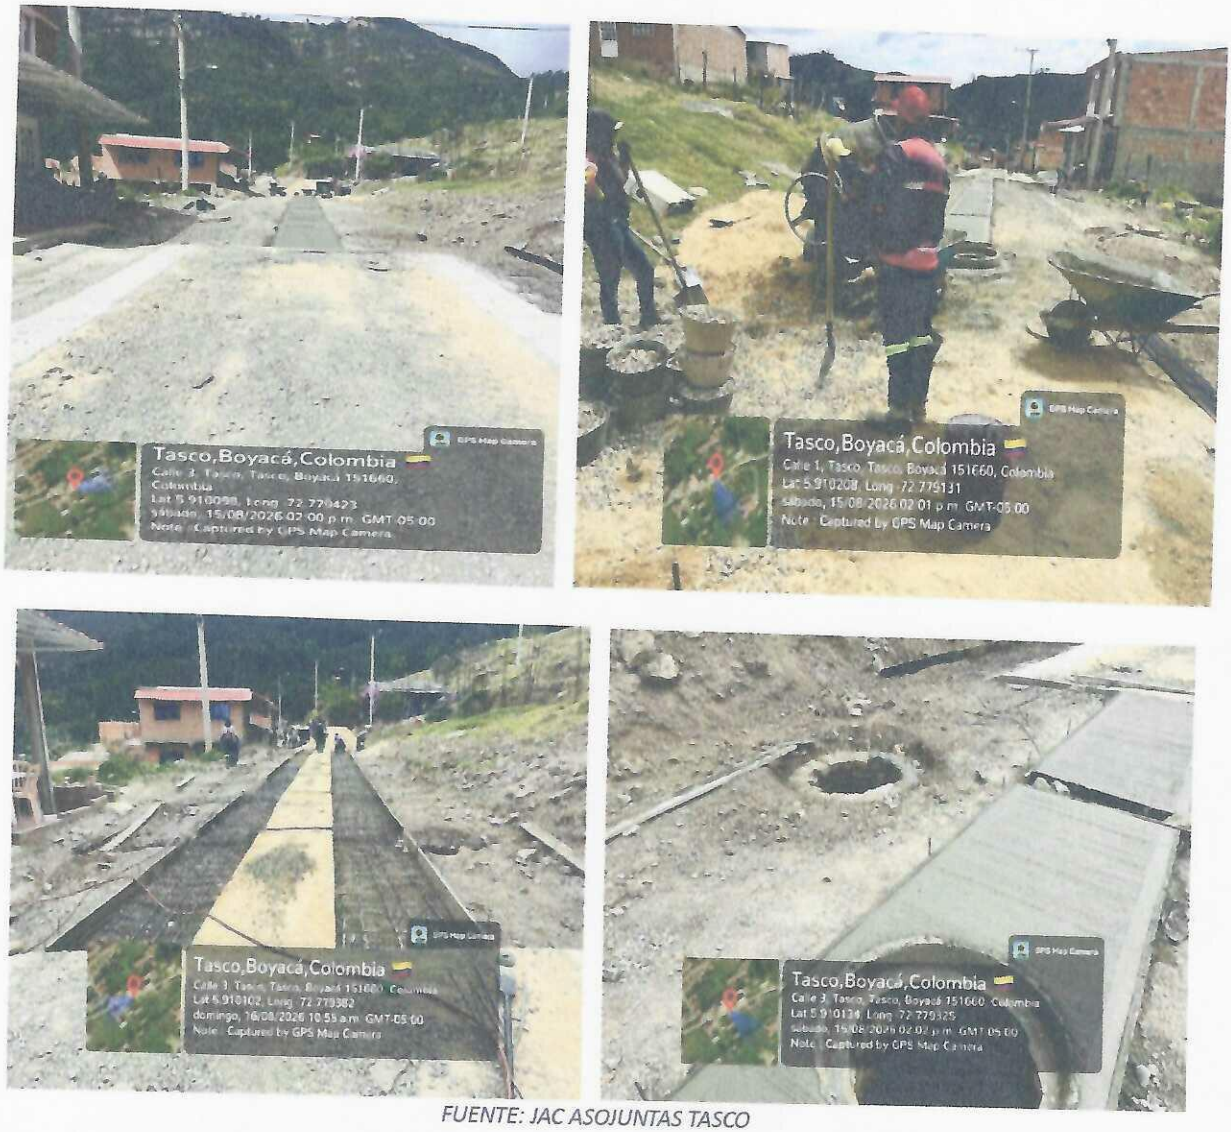


FUENTE: JAC ASOJUNTAS TASCO

3.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPA (3000 PSI), 60% RAJON PARA PLACA HUELLAS INCLUYE SELLO DE JUNTAS

Se realiza la instalación de concreto de 3000 psi con el 60 % de material de piedra rajón a fin de realizar la debida implementación del diseño tipo establecido para placa huella

CAP. 2: TRAMO LA CASCADA	M3	6,51
CAP. 3: TRAMO EL BREVO	M3	9,22
TOTAL	M3	15,73

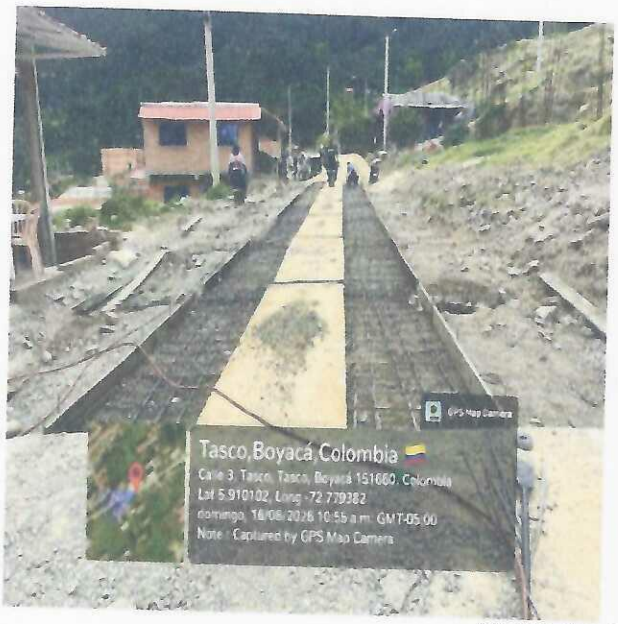




FUENTE: JAC ASOJUNTAS TASCO


3.06 CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)

Se realizo la construcción de cunetas con su debido concreto de 3000 psi incluyendo el sello de juntas para la conformación del proyecto.

CAP. 2: TRAMO LA CASCADA	M3	6,74
CAP. 3: TRAMO EL BREVO	M3	13,14
TOTAL	M3	19,88



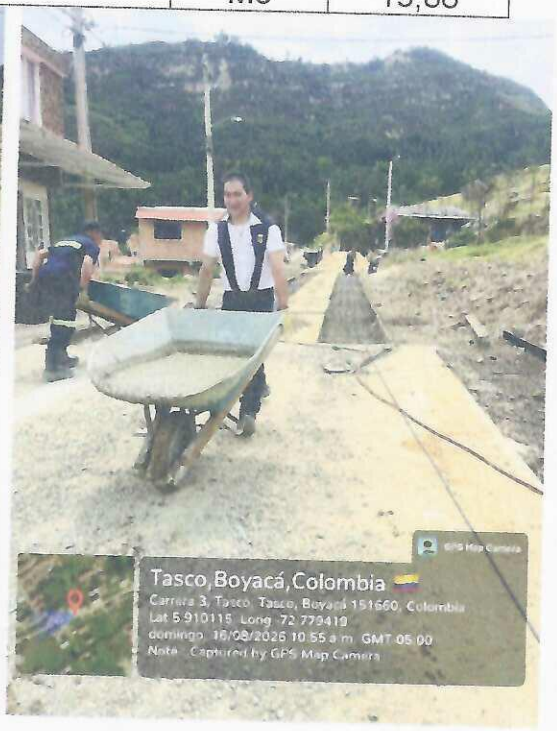

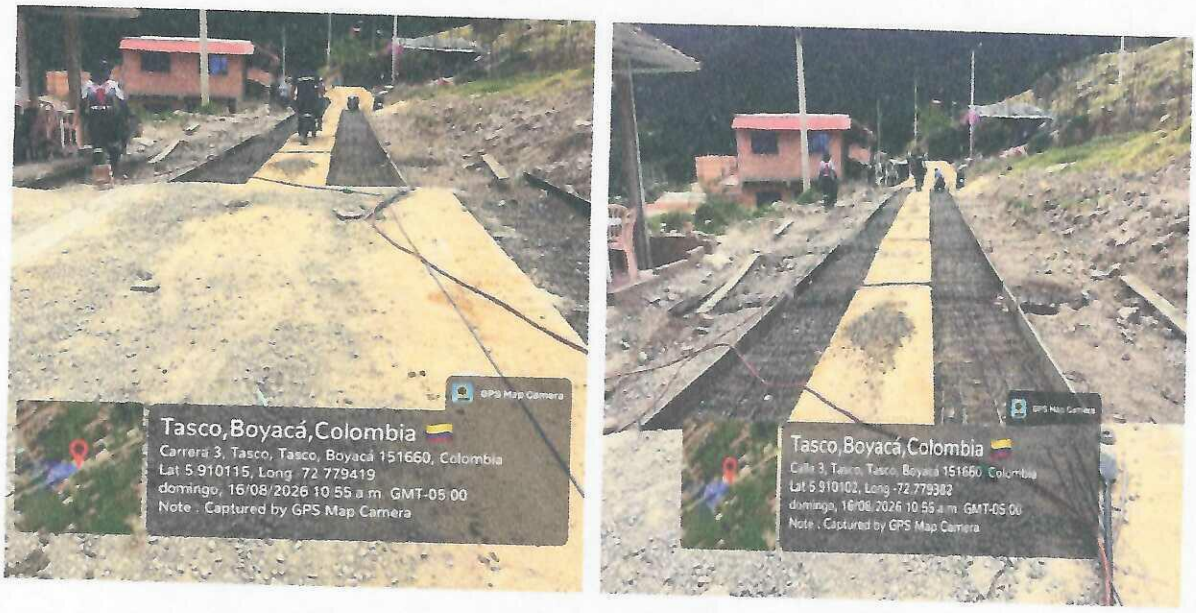

FUENTE: JAC ASOJUNTAS TASCO

ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE TASCO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
R/L EDWIN JAVIER MANRIQUE GUERRERO
C.C 74.270.325 DE TASCO
