CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1820 de 2025

INFORME DE INTERVENTORIA
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01

PARCIAL [X] **FINAL** [ ]

OBJETO CONTRATO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES EL "MANTENIMIENTO, OPTIMIZACION Y RESTAURACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA SINTETICA EN LA CIUDAD DE NEIVA HUILA"

PERIODO: 22 DE OCTUBRE DEL 2025 A 29 DE DICIEMBRE DEL 2025 – 13 DE FEBRERO DEL 2026 A 30 DE MARZO DEL 2026 – 02 DE JULIO DEL 2026 AL 23 DE JULIO DEL 2026

CONTRATISTA: CONSORCIO GRAMA NEIVA

MUNICIPIO: NEIVA

DEPARTAMENTO: HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1820 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y EL CONSORCIO GRAMA NEIVA

APOYO A LA SUPERVISIÓN	ING. JUAN CAMILO MUÑOZ LOSADA	ENTIDAD	ALCALDIA DE NEIVA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO INTERVENTORIA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1820 DE 2025		
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES EL "MANTENIMIENTO, OPTIMIZACION Y RESTAURACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA SINTETICA EN LA CIUDAD DE NEIVA HUILA"	PERIODO DEL INFORME	Entre el 22 de octubre del 2025 a 29 de diciembre del 2025 – 13 de febrero del 2026 a 30 de marzo del 2026 – 02 de julio del 2026 al 23 de julio del 2026.
CONTRATISTA	CONSORCIO GRAMA NEIVA	NIT:	901.998.389-0
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES	C.C:	1.075.248.965

FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	17 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE INICIO (D/M/A):	22 DE OCTUBRE DE 2025
ACTA DE SUSPENSION No. 1(D/M/A):	29 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE REINICIO No. 1 (D/M/A):	13 DE FEBRERO DE 2026
ACTA DE SUSPENSION No. 2(D/M/A):	30 DE MARZO DE 2026
ACTA DE REINICIO No. 2 (D/M/A):	02 DE JULIO DE 2026
OTRO SI No. 1 (D/M/A):	03 DE JULIO DE 2026

PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL MISMO Y APROBACION DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCION:	DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL DE EJECUCION:	SEIS (06) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($166.666.666,24) M/CTE
	2. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No.	1746 DE 2025
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, OPTIMIZACION Y RESTAURACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN LA CIUDAD DE NEIVA HUILA"
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA ANDINA NIT: 901.989.978-0
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIO CESAR FIERRO CEDIEL C.C. No. 79.690.978
FECHA DE SUSCRIPCION (D/M/A):	03 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE INICIO (D/M/A):	22 DE OCTUBRE DE 2025
ACTA DE SUSPENSION No. 1(D/M/A):	29 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE REINCIO No.1 (D/M/A):	13 DE FEBRERO DE 2026
ACTA DE SUSPENSION No. 2(D/M/A):	30 DE MARZO DE 2026
ACTA DE REINICIO No. 2 (D/M/A):	02 DE JULIO DE 2026
OTRO SI No. 1 (D/M/A):	03 DE JULIO DE 2026
PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION Y APROBACION DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCION:	DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL DE EJECUCION:	SEIS (06) MESES

VALOR DEL CONTRATO:	TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($3.155.318.276,77 MCTE) INCLUIDO IVA, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS SI A ELLOS HAY LUGAR.
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA CENTAVOS $ (177.980.079,30) MCTE.
VALOR TOTAL CONTRATO:	TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SIETE CENTAVOS ($ 3.333.298.356,07) MCTE.

3. LOCALIZACION DEL PROYECTO

Las obras se van a realizar en las canchas sintéticas: Cándido 27, Puertas del Sol, Peño Redondo, Cándido 51, Brisas, Parque Mirador, Canaima, Calamari, Galán, Lavoragine y Fronteras del Milenio del municipio de Neiva, departamento del Huila.

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El CONSORCIO OBRA ANDINA, realizara el "MANTENIMIENTO, OPTIMIZACION Y RESTAURACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTETICA DE LA CIUDAD DE NEIVA" de acuerdo al contrato No. 1746 de 2025.

En relación con lo anterior, se adelanta el mantenimiento y restauración de los escenarios deportivos con cancha en grama sintética de la ciudad de Neiva, con el propósito de garantizar espacios deportivos seguros, funcionales y duraderos que beneficien a toda la comunidad. Así mismo, estos escenarios promueven la práctica del deporte, fortalecen la integración social, apoyan los procesos de formación deportiva y contribuyen a la prevención de problemáticas sociales al ofrecer alternativas saludables de recreación y aprovechamiento del tiempo libre.

5. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE MENSUAL DE OBRA

A la fecha el contratista de Obra ejecuto 70% de las actividades de obra

6. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
Iniciación	22/10/2025			21/02/2026
Suspension No. 1	29/12/2025	68		
Reinicio No. 1	13/02/2026		46	04/04/2026
Suspension No. 2	30/03/2026	45		
Reinicio No. 2	02/07/2026		94	07/07/2026

Otro si No. 1	03/07/2026			07/09/2026

7. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
ACTA INICIO	01	22/10/2025
ACTA DE SUSPENSION	01	29/12/2025
ACTA DE REINICIO	01	13/02/2026
ACTA DE SUSPENSION	02	30/03/2026
ACTA DE REINICIO	02	02/07/2026
OTRO SI MODIFICATORIO	01	03/07/2026

8. ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DURANTE EL PERIODO
(Cumplimiento Obligaciones del contrato).

a). **Obligaciones de Carácter General.**	La interventoría llevó a cabo la supervisión del contratista de obra, verificando el cumplimiento de los pliegos de condiciones y garantizando la correcta ejecución de los planos y especificaciones técnicas. Asimismo, realizó el control del avance de la obra y de la calidad de los materiales utilizados, veló por la seguridad en el trabajo y supervisó que el contratista cumpliera con los tiempos establecidos para la ejecución del proyecto.
b). **Actividades Administrativas.**	• Cumplimiento contractual: la interventoría verifico que el contratista cumpla con todas las cláusulas y condiciones estipuladas en el contrato, calidad de los materiales, normativas de seguridad, entre otros. • Control de avance de la obra: la interventora superviso que a la obra se esté realizando conforme al cronograma establecido. • Calidad de los materiales: la interventoría verifico que los materiales utilizados en la obra, cumplan con las especificaciones técnicas requeridas y garanticen la durabilidad y funcionalidad adecuadas.
c). **Actividades Operativas.**	Durante el período del presente informe, la interventoría efectuó el seguimiento y control técnico permanente a la ejecución de las actividades de obra, verificando su desarrollo conforme a las especificaciones técnicas, la programación aprobada, las obligaciones contractuales y los estándares de calidad establecidos. En este marco, se realizaron las siguientes actividades operativas: • Reparación y nivelación de rasante en base granular en depresiones o puntos de desnivel: se realiza esta actividad en los escenarios de cándido 51, Canaima, puertas del sol y cándido 27. • Reparación y nivelación de rasante en concreto en depresiones o puntos de desnivel: se realiza esta actividad en los escenarios deportivos de las brisas y Mirador tres cruces.

	• Retiro y disposición de césped sintético a sitio autorizado y sustrato granular y/o para reciclar: se realiza esta actividad en los escenarios deportivos de cándido de la 51, puertas del sol, las brisas, peño redondo, mirador tres cruces, Canaima y cándido 27. • Suministro e instalación de grama sintética compuesta por monofilamento y fibrilada, altura de 50 mm, espesor de fibra entre 360 - 400 micrones en monofilamento y 100 micrones en el fibrilado, DTEX de 21000 (13000 + 8000) de 7500 puntadas por m2., hacking doble con recubrimiento en PU, uniones cosidas con hilo poliéster y máquina de doble hilo cadena 401, demarcación con banda de 40 cm y adhesivo de PU. Incluye: relleno de sílice y fibra de coco en cantidades y granulometría según recomendaciones: se realiza esta actividad en los escenarios deportivos de cándido de la 51, puertas del sol, las brisas, peño redondo, mirador tres cruces, Canaima y cándido 27. • Suministro e instalación de shock pad 10 mm, según especificación: se realiza esta actividad en los escenarios deportivos de Canaima, Puertas del Sol, Peñón redondo y Cándido 51. • Retiro temporal, mantenimiento y limpieza y reinstalación de almohadilla (shock pad) existente de 10 mm o de 20 - 23 mm de espesor: se realiza esta actividad en los escenarios deportivos de Canaima, Cándido 51, Puertas del Sol y Candido 27. • Mantenimiento, limpieza de sistema de cárcamo perimetral, incluye resanes y reparaciones: se realiza esta actividad en los escenarios deportivos de Vorágine, Calamari, Mirador tres cruces, Brisas, Candido de la 51, Puertas del Sol, Canaima y Candido 27. • Suministro e instalación tapa cárcamo hasta 1,0 mts de longitud, concreto 3000 PSI incluye perforaciones: se realiza esta actividad en los escenarios deportivos de Vorágine, Calamari, Mirador tres cruces, Brisas, Candido de la 51, Puertas del Sol, Canaima y Candido 27. • Mantenimiento, limpieza de sistema de drenaje perimetral tipo filtro de 4" y 6" dren vial pavco: se realiza esta actividad en Candido de la 51, Puertas del sol, Canaima y Cándido de la 27. • Suministro e instalación de gravilla 3/8 " - 1/2" " incluye extendida y acomodación y geotextil e imprimación conforme a especificaciones. Para adecuación de estrato filtrante para cancha - espesor de 5 cms: se realiza esta actividad en los escenarios deportivos de Canaima, Puertas del Sol y Candido de la 27. • Suministro e instalación material granulado caucho: se realiza esta actividad en los escenarios deportivos de Vorágine y Calamari. • Nivelación de canchas con base granular, incluye compactación mecánica: se realiza esta actividad en la cancha de Peño redondo. • Cargue y retiro de material granular existen o insutu: Se realiza esta actividad en la cancha de Peño redondo. • Mantenimiento de uniones de canchas sintéticas: se realiza esta actividad en los escenarios deportivos de Vorágine y Calamari. • Mantenimiento de marcación color blanca de canchas sintéticas: se realiza esta actividad en los escenarios deportivos de Vorágine y Calamari.

- Reposición de Polietileno (plástico) negro Cal. 3.5 para la estabilización de la base granular: se realiza esta actividad en los escenarios deportivos de Candido 51, Puertas del Sol y Canaima.

- Demolición de placa piso en concreto e= 0.10 m: se realiza esta actividad en Cándido de la 51.

- Placa de contrapiso en concreto de 20.7 MPa, e= 0.10 m: se realiza esta actividad en Cándido de la 51.

- Imprimación con asfalto líquido: se realiza esta actividad en Peño redondo y Candido de la 27.

- suministro e instalación de cinta para ducto en shock pad reinstalado: se realiza esta actividad en Canaima, Puertas del sol y Candido de la 51.

A la fecha del presente informe el contrato de obra tiene un avance del 70 % correspondiente a $2.333.308.849,00 quedando un saldo por ejecutar de $999.989.507,07.

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL %
PROGRAMADO																					79%
EJECUTADO																					70 %

CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

		CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	CANCHA Y GRAMA SINTETICA												
1.1	Reparacion y nivelacion de rasante en base granular en depresiones o puntos de desnivel.	M2	9,828.48	$ 866	$ 8,511,463.68	14,573.87	$ 12,620,971.42	0.00	$ 0.00	14,573.87	$ 12,620,971.42	14,573.87	$ 12,620,971.42
1.2	Reparacion y nivelacion de rasante en concreto en depresiones o puntos de desnivel.	M2	4,216.00	$ 1,664.00	$ 7,015,424.00	4,225.42	$ 7,031,098.88	0.00	$ 0.00	4,225.42	$ 7,031,098.88	4,225.42	$ 7,031,098.88
1.3	Reparacion y nivelacion de rasante en grava en depresiones o puntos de desnivel. Incluye suministro de material.	M2	6,090.00	$ 690	$ 4,202,100.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.4	Retiro y disposicion de cesped sintetico a sitio autorizado y sustrato granular y/o para reciclar	M2	20,314.82	$ 918	$ 18,649,004.76	19,915.83	$ 18,282,730.10	0.00	$ 0.00	19,915.83	$ 18,282,730.10	19,915.83	$ 18,282,730.10

1.5	Suministro e instalacion de grama sintética compuesta por monofilamento y fibrilada, altura de 50 mm, espesor de fibra entre 360 - 400 micrones en monofilamento y 100 micrones en el fibrilado, DTEX de 21000 (13000 + 8000) de 7500 puntadas por m2., backing doble con recubrimiento en PU, uniones cosidas con hilo poliester y maquina de doble hilo cadena 401, demarcación con banda de 40 cm y adhesivo de PU. incluye: relleno de sílice y fibra de coco en cantidades y granulometría según recomendaciones	M2	20,294.81	$ 102,113	$ 2,072,363,933.53	19,915.83	$ 2,033,664,944.56	0.00	$ 0.00	14,835.78	$ 1,514,926,003.14	14,835.78	$ 1,514,926,003.14
1.6	Reinstalacion de grama sintetica	M2	20.00	$ 17,457	$ 349,140.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	
Subtotal					**$ 2,111,091,065.97**		**$ 2,071,599,744.97**		**$ 0.00**		$ 1,552,860,803.54		$ 1,552,860,803.54
2	**RED DE AGUAS LLUVIAS - DRENAJE**												
2.1	Suministro e instalacion de shock pad 10 mm, según especificacion	M2	1,295.60	$ 51,623	$ 66,882,758.80	2,628.10	$ 135,670,406.30	0.00	$ 0.00	2,628.10	$ 135,670,406.30	2,628.10	$ 135,670,406.30

2.2	Retiro temporal, mantenimiento y limpieza y reinstalacion de almohadilla (shock pad) existente de 10 mm o de 20 - 23 mm de espesor.	M2	14,676.97	$ 929	$ 13,634,905.13	13,063.37	$ 12,135,870.73	0.00	$ 0.00	8,117.65	$ 7,541,299.09	8,117.65	$ 7,541,299.09
2.3	Mantenimiento, limpieza de sistema de carcamo perimetral, incluye resanes y reparaciones.	ML	1,365.13	$ 9,637	$ 13,155,757.81	1,198.63	$ 11,551,197.31	0.00	$ 0.00	1,198.63	$ 11,551,197.31	1,198.63	$ 11,551,197.31
2.4	Suministro e instalacion tapa carcamo hasta 1,0 mts de longitud, concreto 3000 PSI incluye perforaciones.	Und	133.00	$ 88,248	$ 11,736,984.00	425.00	$ 37,505,400.00	0.00	$ 0.00	425.00	$ 37,505,400.00	425.00	$ 37,505,400.00
2.5	Mantenimiento, limpieza de sistema de drenaje perimetral tipo filtro de 4" y 6" dren vial pavco	ML	420.00	$ 10,481	$ 4,402,020.00	1,128.90	$ 11,832,000.90	0.00	$ 0.00	1,128.90	$ 11,832,000.90	1,128.90	$ 11,832,000.90
2.6	Suministro e instalación de gravilla 3/8 " - 1/2" " incluye extendida y acomodacion y geotextil e imprimacion conforme a especificaciones. Para adecuacion de estrato filtrante para cancha - espesor de 5 cms.	M3	135.00	$ 181,365	$ 24,484,275.00	28.00	$ 5,078,220.00	0.00	$ 0.00	28.00	$ 5,078,220.00	28.00	$ 5,078,220.00
Subtotal					**$ 134,296,700.74**		**$ 213,773,095.24**		**$ 0.00**		**$ 209,178,523.60**		**$ 209,178,523.60**
3	**MANTENIMIENTO GENERAL**					0.00							

3.1	Suministro e Instalación de Piso en gravilla lavada	ml	1344.7	$ 27,783	$ 37,360,633.59	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3.2	Suministro e instalacion material granulado caucho	kg	2900	$ 4,369	$ 12,670,100.00	1,400.00	$ 6,116,600.00	0.00	$ 0.00	1400.00	$ 6,116,600.00	1,400.00	$ 6,116,600.00
Subtotal					**$ 50,030,733.59**	0.00	**$ 6,116,600.00**		**$ 0.00**		**$ 6,116,600.00**		$ 6,116,600.00
4	**REHABILITACION Y MODERNIZACION SISTEMA ILUMINACION**												
4.1	Desmonte de equipos de ILUMINACION NEOS-4 Equipado con Accesorios de MERCURIO HALOGENO 1000 W (HPIT) Voltaje de Operación 220 V	UND	70.00	$ 103,203.00	$ 7,224,210.00	56.00	$ 5,779,368.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
4.2	Suministro, transporte e instalación de luminaria LED tipo proyector Sylflood 400W CW 45° (Ref. PZ7763) o equivalente. Inclute herraje de fijacion. según diseño fotometrico y Voltaje de Operacion 220 V..	UND	70.00	$ 2,211,430.00	$ 154,800,100.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
4.3	Suministro, transporte e Instalación de cable de cobre encauchetado 3X14 para alimentar cada luminaria	m	105.00	$ 26,613.00	$ 2,794,365.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

4.4	Suministro, transporte e Instalación de Empalme de BT en derivacion para alimentar luminarias	UND	25.00	$ 81,957.00	$ 2,048,925.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
4.5	Certificado RETIE de la Obra	UND	1.00	$ 6,152,890.00	$ 6,152,890.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
Subtotal					**$ 173,020,490.00**		**$ 5,779,368.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		$ 0.00
5	**MANTENIMIENTO CAMERINOS**					0.00							
5.1	Suministro e instalación de lavamanos de empotrar en porcelana incl. accesorios, griferia y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UN	6.0	$ 182,215.00	$ 1,093,290.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.2	Suministro e instalación de lavamanos de incrustar incluye grifería y accesorios	UN	5.0	$ 119,551.00	$ 597,755.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.3	Mantenimiento y restitucion puntos hidraulicos lavamanos, sanitarios, duchas	UN	23.0	$ 97,511.00	$ 2,242,753.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.4	Suministro e instalación de sanitario blanco tipo I. accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UN	7.0	$ 429,633.00	$ 3,007,431.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

5.5	Suministro e instalación de orinal institucional incl. accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UN	5.0	$ 284,247.00	$ 1,421,235.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.6	Mantenimiento y pintura de puertas y ventanas metalicas.	M2	128.72	$ 36,221.00	$ 4,662,367.12	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.7	Pintura Tipo I de paredes, resanes, estuco y pintura 2 manos.	M2	2600.0	$ 16,458.00	$ 42,790,800.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
Subtotal					**$ 55,815,631.12**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**												
NP-1	Nivelacion de canchas con base granular, incluye compactacion mecanica.	M3		$ 181,932.04		64.68	$ 11,767,364.35	0.00	$ 0.00	64.68	$ 11,767,364.35	64.68	$ 11,767,364.35
NP-2	cargue y retiro de material granular existen o insutu	M2		$ 8,341.08		1,257.28	$ 10,487,073.06	0.00	$ 0.00	1,257.28	$ 10,487,073.06	1,257.28	$ 10,487,073.06
NP-3	Mantenimiento de uniones de canchas sinteticas	ML		$ 25,915.22		372.00	$ 9,640,461.18	0.00	$ 0.00	372.00	$ 9,640,461.18	372.00	$ 9,640,461.18
NP-4	Mantenimiento de marcacion color blanca de canchas sinteticas	ML		$ 19,210.31		365.40	$ 7,019,447.21	0.00	$ 0.00	365.40	$ 7,019,447.21	365.40	$ 7,019,447.21
NP-5	Reposición de Polietileno (plástico) negro Cal. 3.5 para la estabilizacion de la base granular.	M2		$ 4,568.87		1,250.00	$ 5,711,087.50	0.00	$ 0.00	1,249.91	$ 5,710,676.30	1,249.91	$ 5,710,676.30
NP-6	Demolición de placa piso en concreto e= 0.10 m	M2		$ 53,275.16		7.76	$ 413,415.24	0.00	$ 0.00	7.76	$ 413,415.24	7.76	$ 413,415.24

NP-7	Placa de contrapiso en concreto de 20.7 MPa, e= 0.10 m	M2		$ 95,551.58		7.76	$ 741,480.26	0.00	$ 0.00	7.76	$ 741,480.26	7.76	$ 741,480.26
NP-8	suministro e instalacion de shock pad 20 mm, según especificacion	M2		$ 69,085.66		1,038.00	$ 71,710,918.34	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP-9	Imprimación con asfalto líquido	M2		$ 6,709.43		7,213.66	$ 48,399,546.81	0.00	$ 0.00	7,061.56	$ 47,379,042.51	7,061.56	$ 47,379,042.51
NP-10	suministro e instalacion de cinta para ducto en shock pad reinstalado	ML		$ 1,007.14		5,326.15	$ 5,364,178.71	0.00	$ 0.00	5,294.39	$ 5,332,191.94	5,294.39	$ 5,332,191.94
NP-11	Tendido y tensionado de Cu 2(3No 4 + 4 AWG) en ducteria pvc existente	ML		$ 114,751.00		286.00	$ 32,818,786.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP-12	Suministro, transporte e instalacion de proyector de 400 w o similar 36.000 lm, 100 - 277 V, 5000 K, con eficiencia mínima de 120 lm/W, IK 08, IP 66, THD < 20% FP 0.95, para la iluminación de la cancha de futbol	UND		$ 3,839,642.00		36.00	$ 138,227,112.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

NP-13	Desmantelamiento de redes electricas existentes (Incluye retiro de conductor existente en mal estado 3(3No 4 +4 AWG), acometida desde camaras de en mastil hasta proyectores existentes.	ML		$ 6,537.00		394.00	$ 2,575,578.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP-14	Suministro e instalacion de acometida en cable encauchetado 2(3x8+8 AWG) Cu THWN 90° 600 V, desde camara CS-274 hasta proyector 400 W. ubicada en mastil de 18 mtrs en cancha de futbol.	UND		$ 2,228,155.00		6.00	$ 13,368,930.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP-15	Suministro e instalacion de cajas IP 65 con barraje de cobre para distribucion de acometidas en mastil y salida de 3 acometidas a proyector 400 W . Incluye elementos de fijacion y anclaje a la estructura.	UND		$ 730,901.00		12.00	$ 8,770,812.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP-16	Suministro e instalacion de puesta a tierra en camaras	UND		$ 392,281.00		6.00	$ 2,353,686.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
Subtotal							**$ 369,369,876.36**		**$ 0.00**		$ 98,491,152.06		$ 98,491,152.06

	SUBTOTAL OBRAS				$ 2,524,254,621.42		$ 2,666,638,684.87		$ -		$ 1,866,647,079.20		$ 1,866,647,079.20
	ADMINISTRACIÓN	%			$ 479,608,378.07		$ 506,661,350.12		$ -		$ 354,662,945.05		$ 354,662,945.05
	IMPREVISTOS	%			$ 25,242,546.21		$ 26,666,386.84		$ -		$ 18,666,470.79		$ 18,666,470.79
	UTILIDADES	%			$ 126,212,731.07		$ 133,331,934.24		$ -		$ 93,332,353.96		$ 93,332,353.96
	VALOR TOTAL				$ 3,155,318,276.77		$ 3,333,298,356.07		$ -		$ 2,333,308,849.00		$ 2,333,308,849.00
	AVANCE								0.00 %		70.00%		70.00%

d). Actividades Logísticos.	Durante el presente mes, la interventoría realizó seguimiento y verificación al suministro oportuno de los materiales por parte del contratista de obra, constatando la disponibilidad de los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades programadas y así evitar afectaciones o retrasos en la ejecución de la obra.
e). Obligaciones de Carácter Ambiental.	Gestión de residuos: la interventoría realizó seguimiento al manejo adecuado de los residuos generados durante la ejecución de las actividades, verificando su correcta recolección, separación, almacenamiento y disposición final, conforme a las buenas prácticas ambientales y a los lineamientos establecidos para la obra.
f). Actividades Financieras.	Al cierre de este informe la obra no presenta ningún pago.
g). Actividades Jurídicos.	El interventor verifico que todas las partes involucradas en el contrato cumplan con las obligaciones y responsabilidades establecidas en el acuerdo, asegurando que se respeten los términos legales y contractuales para evitar posibles conflictos o incumplimientos.

9. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante el periodo no se registraron precipitaciones ni eventos que afectaran el normal desarrollo de las actividades programadas.

10. CONTROL ESTADO FINANCIERO – CONTRATO DE OBRA

Relación de Pago (Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor Pagado
Acta Parcial No. 1	23/07/2026	$2.333.308.849,00	$0	$0

Valor contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
$3.155.318.276,77	$177.980.079,30	$3.333.298.356,07	$2.333.308.849,00	$999.989.507,07

11. RELACION DE PERSONAL (Profesional Interventoría)

NOMBRE Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACION	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION
Jairo Armando Castañeda Fierro	4.924.039	Director	Prestación de servicios
Ángel Fernando Ramírez Perdomo	12.120.877	Residente de Interventoría	Contrato por obra o labor
Luis Miguel Lasso Galindo	1.080.293.466	Asesor SST	Contrato por obra o labor

12. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA				
Relación de Pago (Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor Pagado
N/A		$0	$0	$0
Valor contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total	Valor Ejecutado	Valor No Ejecutado
$166.666.666,24	$0	$166.666.666,24	$0	$166.666.666,24

13. RELACION DE PAGOS DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL – INTERVENTORIA

Durante el periodo en ejecución del contrato se aporta copia de las planillas de pago que soportan los aportes al sistema de seguridad social integral del equipo de trabajo. A continuación, se relacionan los pagos y aportes al sistema de seguridad social integral del equipo de trabajo correspondiente.

PERSONAL	MES MARZO 2026 No. PLANILLA
Jairo Armando Castañeda Fierro	36995035
Ángel Fernando Ramírez Perdomo	37392039
Luis Miguel Lasso Galindo	37392039

14. RELACION DE POLIZAS DE GARANTIA – CONTRATO DE OBRA

PÓLIZA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	No.	FECHA DE EMISION	AMPARO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101061702	14/10/2025	Cumplimiento del contrato	03/10/2025	03/06/2026
			Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones laborales	03/10/2025	03/02/2029
			Estabilidad y Calidad de la obra	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días	
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Si ampara 1 año, 4 meses y 2 días	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

ASEGURADORA	No.	FECHA DE EMISION	AMPARO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101022430	14/10/2025	Predios, labores y Operaciones	03/10/2025	03/02/2026
			Contratista y subcontratistas	03/10/2025	03/02/2026

			Vehículos Propios y No Propios	03/10/2025	03/02/2026
PÓLIZA ACTUALIZADA SEGÚN ACTA DE INICIO:					
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (ANEXO 2):					
ASEGURADORA	No.	FECHA DE EMSION	AMPARO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101061702	29/10/2025	Cumplimiento del contrato	22/10/2025	22/06/2026
			Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones laborales	22/10/2025	22/02/2029
			Estabilidad y Calidad de la Obra	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días	
			Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes	Si ampara 1 años, 4 meses y 2 días	
POLIZA DE RESPOSABILIDAD CIVIL (ANEXO 2):					
ASEGURADORA	No.	FECHA DE EMISION	AMPARO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101022430	29/10/2025	Predios, labores y Operaciones	22/10/2025	22/02/2026
			Contratista y Subcontratistas	22/10/2025	22/02/2026
			Vehículos Propios y No Propios	22/10/2025	22/02/2026
POLIZA ACTUALIZADA SEGÚN ACTA DE SUSPENSION No. 1 Y ACTA DE REINICIO No. 1:					
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (ANEXO No. 3)					
ASEGURADORA	No.	FECHA DE EMISION	AMPARO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101061702	25/03/2026	Cumplimiento del contrato	22/10/2025	10/08/2026
			Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones laborales	22/10/2025	10/04/2029
			Estabilidad y Calidad de la Obra	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días	
			Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes	Si ampara 1 años, 4 meses y 2 días	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (ANEXO 3):					

ASEGURADORA	No.	FECHA DE EMISION	AMPARO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101022430	25/03/2026	Predios, labores y Operaciones	22/10/2025	22/02/2026
			Contratista y Subcontratistas	22/10/2025	22/02/2026
			Vehículos Propios y No Propios	22/10/2025	22/02/2026
POLIZA ACTUALIZADA SEGÚN ACTA DE SUSPENSION No. 2 Y ACTA DE REINICIO No. 2:					
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (ANEXO No. 6)					
ASEGURADORA	**No.**	**FECHA DE EMISION**	**AMPARO**	**VIGENCIA**	
				DESDE	**HASTA**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101061702	09/07/2026	Cumplimiento del contrato	22/10/2025	13/11/2026
			Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones laborales	22/10/2025	13/07/2029
			Estabilidad y Calidad de la Obra	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días	
			Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes	Si ampara 1 años, 8 meses y 21 días	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (ANEXO 7):					
ASEGURADORA	**No.**	**FECHA DE EMISION**	**AMPARO**	**VIGENCIA**	
				DESDE	**HASTA**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101022430	09/07/2026	Predios, labores y Operaciones	22/10/2025	13/07/2026
			Contratista y Subcontratistas	22/10/2025	13/07/2026
			Vehículos Propios y No Propios	22/10/2025	13/07/2026
POLIZA ACTUALIZADA SEGÚN OTRO SI No. 1:					
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (ANEXO No. 7)					

ASEGURADORA	No.	FECHA DE EMISION	AMPARO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101061702	25/03/2026	Cumplimiento del contrato	22/10/2025	13/11/2026
			Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones laborales	22/10/2025	13/07/2029
			Estabilidad y Calidad de la Obra	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días	
			Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes	Si ampara 1 años, 8 meses y 21 días	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (ANEXO 8):

ASEGURADORA	No.	FECHA DE EMISION	AMPARO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101022430	14/07/2026	Predios, labores y Operaciones	22/10/2025	13/09/2026
			Contratista y Subcontratistas	22/10/2025	13/09/2026
			Vehículos Propios y No Propios	22/10/2025	13/09/2026

15. RELACION DE POLIZAS DE GARANTIA – INTERVENTORIA

POLIZAS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	No.	FECHA DE EMISION	AMPARO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	560-47-9940000194115	20/10/2025	Cumplimiento	17/10/2025	17/08/2026
			Pago de Salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/10/2025	17/02/2029
			Calidad del servicio	17/02/2026	17/02/2031

PÓLIZA ACTUALIZADA SEGÚN ACTA DE INICIO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (ANEXO 1)					
ASEGURADORA	No.	FECHA DE EMISION	AMPARO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	560-47-9940000194115	24/10/2025	Cumplimiento	22/10/2025	22/08/2026
			Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	22/10/2025	22/02/2029
			Calidad del Servicio	17/02/2026	22/02/2031
POLIZA ACTUALIZADA SEGÚN ACTA DE SUSPENSION No. 1 Y ACTA DE REINICIO No. 1					

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (ANEXO 2)					
ASEGURADORA	**No.**	**FECHA DE EMISION**	**AMPARO**	**VIGENCIA**	
				DESDE	**HASTA**
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	560-47-994000194115	21/02/2026	Cumplimiento	22/10/2025	03/10/2026
			Pago de Salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	22/10/2025	03/04/2029
			Calidad del servicio	17/02/2026	22/02/2031
POLIZA ACTUALIZADA SEGÚN ACTA DE SUSPENSION No. 2 Y ACTA DE REINICIO No. 2 Y OTRO SI MODIFICATORIO No. 1					

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (ANEXO 4)					
ASEGURADORA	**No.**	**FECHA DE EMISION**	**AMPARO**	**VIGENCIA**	
				DESDE	**DESDE**
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	560-47-994000194115	10/07/2026	Cumplimiento	22/10/2025	10/03/2027
			Pago de Salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	22/10/2025	10/09/2029
			Calidad del servicio	17/02/2026	22/02/2031

REGISTRO FOTOGRAFICO

VISITA INICIAL ESCENARIOS DEPORTIVOS













CANCHA CALAMARI

LIMPIEZA DE CARCAMOS PERIMETRALES


















SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CÁRCAMO HASTA 1,0 MTS DE LONGITUD, CONCRETO 3000 PSI INCLUYE PERFORACIONES.





CANCHA LAVORAGINE

LIMPIEZA DE CARCAMOS PERIMETRALES

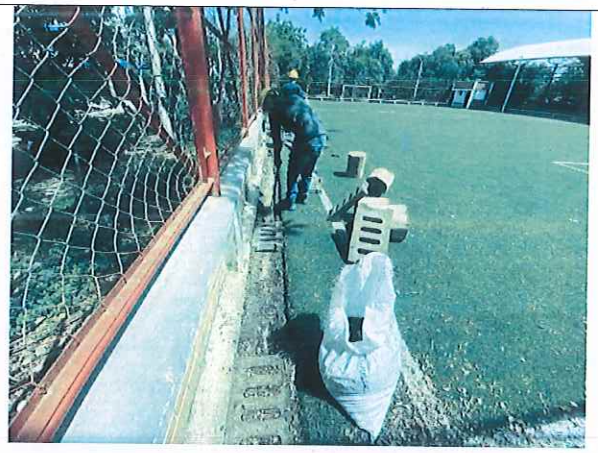







SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CÁRCAMO HASTA 1,0 MTS DE LONGITUD, CONCRETO 3000 PSI INCLUYE PERFORACIONES.





CANCHA LAS BRISAS

REPARACIÓN Y NIVELACIÓN DE RASANTE EN BASE GRANULAR EN DEPRESIONES O PUNTOS DE NIVEL.




RETIRO Y DISPOSICIÓN DE CÉSPED SINTÉTICO A SITIO AUTORIZADO Y SUSTRATO GRANULAR Y/O PARA RECICLAR.





SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA



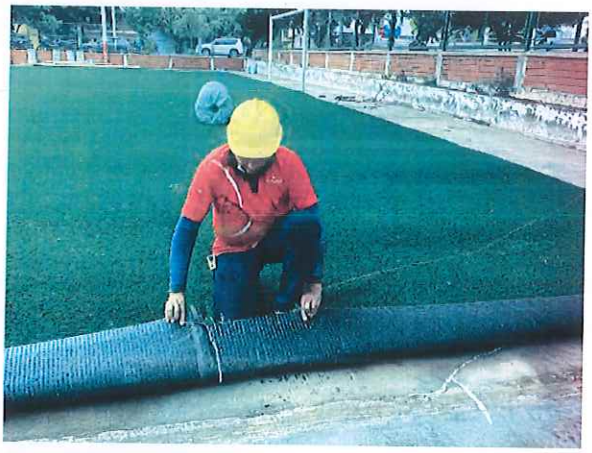






MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE SISTEMA DE CÁRCAMO PERIMETRAL, INCLUYE RESANES Y REPARACIONES



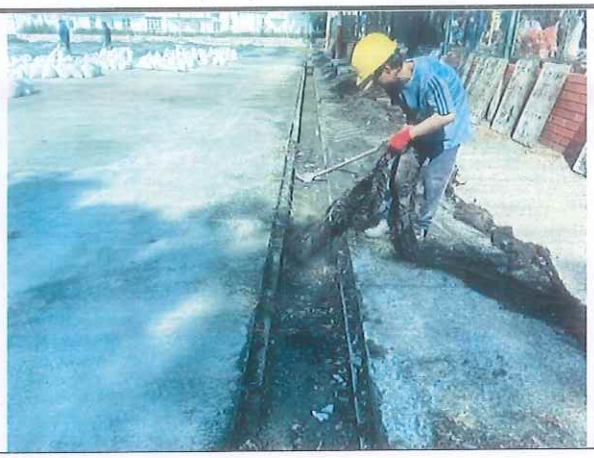


SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CÁRCAMO HASTA 1,0 MTS DE LONGITUD, CONCRETO 3000 PSI INCLUYE PERFORACIONES



INSTALACION DE RELLENO – ARENA Y FIBRA DE COCO



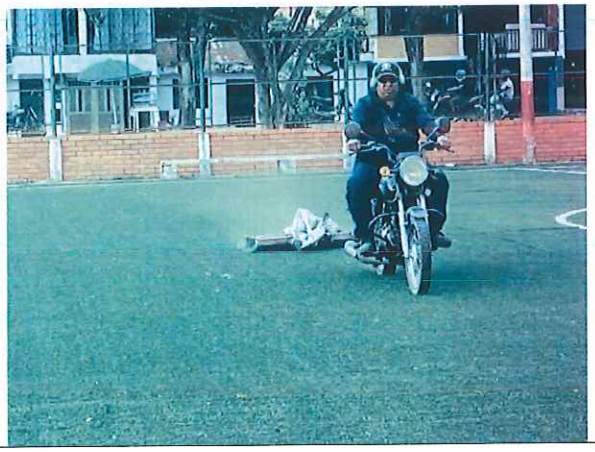





CANCHA PUERTAS DEL SOL

REPARACION Y NIVELACION DE RASANTE EN BASE GRANULAR





RETIRO Y DISPOSICIÓN DE CÉSPED SINTÉTICO A SITIO AUTORIZADO Y SUSTRATO GRANULAR Y/O PARA RECICLAR.





SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTÉTICA





SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SHOCK PAD 10 MM, SEGÚN ESPECIFICACIÓN.



RETIRO TEMPORAL, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN DE ALMOHADILLA (SHOCK PAD) EXISTENTE DE 10 MM O DE 20 - 23 MM DE ESPESOR.



MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE SISTEMA DE CÁRCAMO PERIMETRAL, INCLUYE RESANES Y REPARACIONES



SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CÁRCAMO HASTA 1,0 MTS DE LONGITUD, CONCRETO 3000 PSI INCLUYE PERFORACIONES.



MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE SISTEMA DE DRENAJE PERIMETRAL TIPO FILTRO DE 4" Y 6" DREN VIAL PAVCO





CANCHA PEÑO REDONDO

NIVELACION DE BASE GRANULAR









SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SHOCK PAD 10 MM, SEGÚN ESPECIFICACIÓN.





IMPRIMACIÓN CON ASFALTO LÍQUIDO.




SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTÉTICA







CANCHA CANDIDO LA 51

REPARACION Y NIVELACION DE RASANTE EN BASE GRANULAR

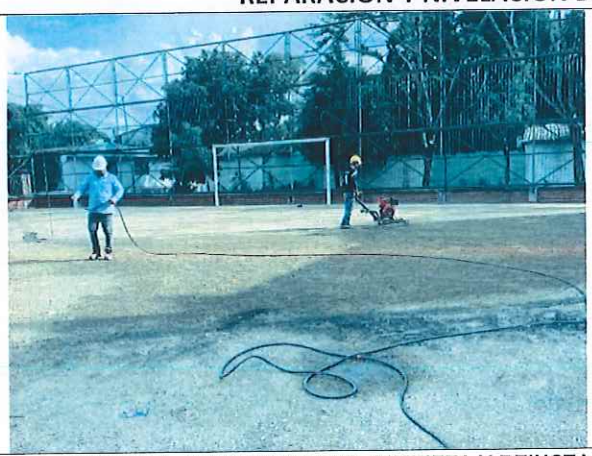


RETIRO TEMPORAL, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN DE ALMOHADILLA (SHOCK PAD) EXISTENTE DE 10 MM O DE 20 - 23 MM DE ESPESOR.

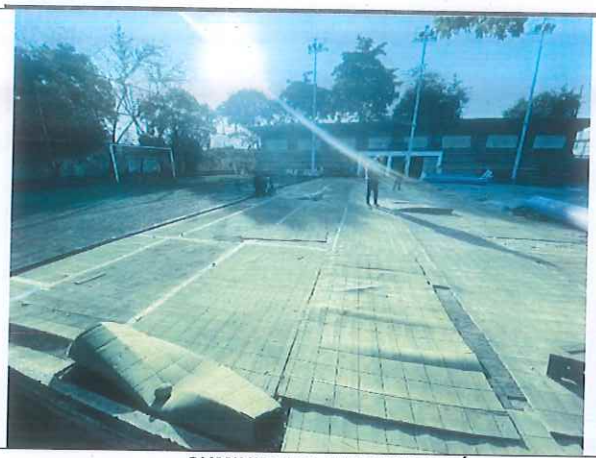


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SHOCK PAD 10 MM, SEGÚN ESPECIFICACIÓN.




MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE SISTEMA DE CÁRCAMO PERIMETRAL, INCLUYE RESANES Y REPARACIONES





SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CÁRCAMO HASTA 1,0 MTS DE LONGITUD, CONCRETO 3000 PSI INCLUYE PERFORACIONES.



SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTÉTICA









CANCHA PARQUE MIRADOR DEL SUR

RETIRO CESPED SINTETICO







MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE SISTEMA DE CÁRCAMO PERIMETRAL, INCLUYE RESANES Y REPARACIONES




SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CÁRCAMO HASTA 1,0 MTS DE LONGITUD, CONCRETO 3000 PSI INCLUYE PERFORACIONES.




INSTALACION DE GRAMA SINTETICA

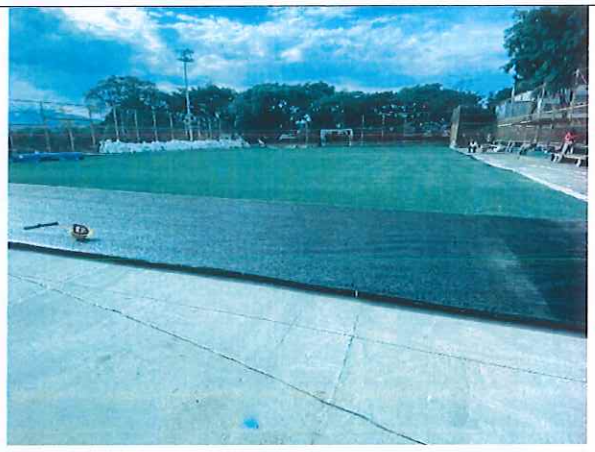

INSTALACION Y REGADA DE LA ARENA Y FIBRA DE COCO




CANCHA CANAIMA

RETIRO Y DISPOSICIÓN DE CÉSPED SINTÉTICO A SITIO AUTORIZADO Y SUSTRATO GRANULAR Y/O PARA RECICLAR.




REPARACIÓN Y NIVELACIÓN DE RASANTE EN BASE GRANULAR EN DEPRESIONES O PUNTOS DE NIVEL.




RETIRO TEMPORAL, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN DE ALMOHADILLA (SHOCK PAD) EXISTENTE DE 10 MM O DE 20 - 23 MM DE ESPESOR



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SHOCK PAD 10 MM, SEGÚN ESPECIFICACIÓN



SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTÉTICA








MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE SISTEMA DE CÁRCAMO PERIMETRAL, INCLUYE RESANES Y REPARACIONES




SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CÁRCAMO HASTA 1,0 MTS DE LONGITUD, CONCRETO 3000 PSI INCLUYE PERFORACIONES.





MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE SISTEMA DE DRENAJE PERIMETRAL TIPO FILTRO DE 4" Y 6" DREN VIAL PAVCO.



CANCHA CANDIDO LA 27

RETIRO Y DISPOSICIÓN DE CÉSPED SINTÉTICO A SITIO AUTORIZADO Y SUSTRATO GRANULAR Y/O PARA RECICLAR.



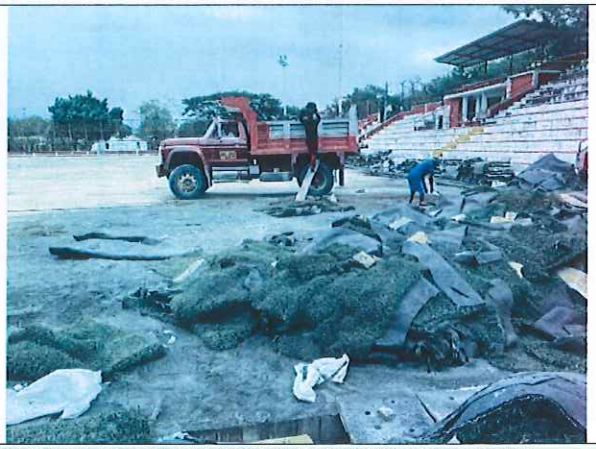

REPARACIÓN Y NIVELACIÓN DE RASANTE EN BASE GRANULAR EN DEPRESIONES O PUNTOS DE NIVEL.




RETIRO TEMPORAL, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN DE ALMOHADILLA (SHOCK PAD) EXISTENTE DE 10 MM O DE 20 - 23 MM DE ESPESOR.




MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE SISTEMA DE DRENAJE PERIMETRAL TIPO FILTRO DE 4" Y 6" DREN VIAL PAVCO




MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE SISTEMA DE CÁRCAMO PERIMETRAL, INCLUYE RESANES Y REPARACIONES





SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTÉTICA



IMPRIMACIÓN CON ASFALTO LÍQUIDO.





CANCHA MIRADOR TRES CRUCES

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE SISTEMA DE CÁRCAMO PERIMETRAL, INCLUYE RESANES Y REPARACIONES

ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO GRAMA NEIVA
