	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	GRUAL - ESTIC
Fecha del informe	Día: 10 Mes: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: Final: X
Periodo evaluado	Mes: 08 Año: 2026
Número de Contrato	022-00-M-CAMAN-GRUAL-2026
Contratista	MAKROSYSTEM COLOMBIA SAS
Objeto	LA PRESTACIÓN DE SERVICIO CON INSUMOS PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE LA RED LÓGICA CABLEADA (VOZ Y DATOS) Y ENERGÍA (NORMAL Y REGULADA) PARA ALGUNAS DEPENDENCIAS DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO
Valor del Contrato	$ 90.000.000 [NOVENTA MILLONES]
Fecha Suscripción	Día: 28 Mes: 04 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 24 Mes: 07 Año: 2026
Forma de Pago	UN (01) ÚNICO PAGO, con cargo a PAC AGOSTO DE 2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 32726 Dia: 29 Mes: 04 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 06 Mes: 05 Año: 2026 N/A
Aprobación Garantía RCE	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 28 Mes: 05 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 22 Mes: 06 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Se realiza cambios en la ficha técnica y prorroga de ejecución
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: 24 Mes: 07 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: 23 Mes: 06 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A

Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
Héctor Fabio Navarro Sierra	Técnico de Sistema	Técnico de Sistema
Omar Pico	Tecnólogo en Mantenimiento de Equipos de Cómputo, Diseño e Instalación de Cableado Estructurado	Tecnólogo en Mantenimiento de Equipos de Cómputo, Diseño e Instalación de Cableado Estructurado
Cristian Duvan Ipia Hernández	Ingeniero Electrónico	Ingeniero Electrónico

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[100] %
Avance en Tiempo	[100] %
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: X Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[90.000.000]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[90.000.000] ([100] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[0] ([0] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	24/07/2026	No.FVES 159 05/08/2026	$ 90.000.000	317523926 12/08/2026	$ 90.000.000
Total Pagos					$ 90.000.000

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

Objeto contractual	Cumple:	No cumple: X	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple: X	No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X

Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otros	No aplica

6.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha	Actividad /Hito	Observaciones
06 - agosto - 2026	Se recibe la instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de 50 puntos, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas, el correcto tendido y organización del cableado, la adecuada identificación de los puntos, las pruebas de conectividad y funcionamiento. Asimismo, se verificó la continuidad eléctrica, el desempeño de la red y el cumplimiento de las normas de seguridad y calidad aplicables (se anexan certificaciones). 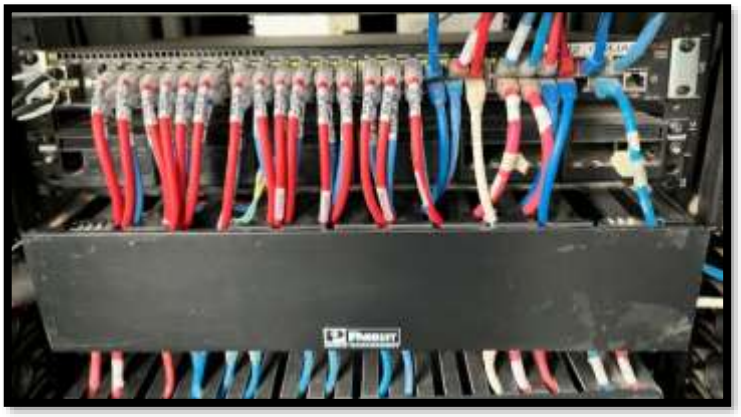 	Sin novedad.





OBLIGACIONES CONVENIDAS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
El contratista se compromete a cumplir con todas las actividades establecidas en el contrato y las especificaciones técnicas que se encuentran definidas en el archivo denominado ANEXO TÉCNICO, el cual contiene las especificaciones técnicas mínimas requeridas para el desarrollo del proceso, y harán parte del contrato, las OBLIGACIONES GENERALES, OBLIGACIONES PARTICULARES.	CUMPLE	El CONTRATISTA dio cumplimiento a las OBLIGACIONES GENERALES, OBLIGACIONES PARTICULARE.
OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS Generación de residuos peligrosos Afectaciones al suelo y a las fuentes hídricas superficiales y subterráneas Junto con la oferta, el CONTRATISTA deberá enviar el registro de generador de residuos peligrosos, trámite que se realiza anualmente ante el IDEAM. En caso de no estar obligado a estar registrado ante el IDEAM, allegar certificación subscrita por el Representante Legal donde se refleje tal condición.	CUMPLE	**1.** No generación de residuos peligrosos: En el marco de la ejecución y desarrollo del objeto estipulado en el Contrato o Convenio de la referencia, nuestra organización no genera residuos peligrosos (RESPEL) asociados a las actividades contratadas por la Fuerza Aeroespacial Colombiana. **2.** No obligatoriedad de registro: Conforme a la normatividad ambiental colombiana vigente —específicamente el Decreto 1076 de 2015— y al no superar los umbrales mínimos establecidos para los generadores de residuos peligrosos, MAKROSYSTEM

En la Ejecución del contrato deberá presentar registro de cantidad, caracterización y destino (disposición final o aprovechamiento) de los residuos peligrosos generados. Por lo tanto, deberá entregar al supervisor del contrato, copia del manifiesto de recolección, transporte y certificado otorgado para la disposición final de estos residuos, con empresas que cuenten con licencia ambiental vigente. En caso de no generar residuos peligrosos, allegar certificación subscrita por el Representante Legal donde se refleje tal condición		COLOMBIA S.A.S., NO está obligada a estar registrada ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en el Registro de Generadores de Residuos Peligrosos. **(Se anexa certificación)**

6.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

A la fecha se realizó la instalación de los 50 puntos de red con tomas regulados y no regulados. Sin novedad.

7. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: X___
Entidad	Sí: ___No: X___

Observaciones: No aplica

8. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: No aplica

9. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte N/A Fecha Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	• Torre de control: 06 puntos. • Archivo: 06 puntos. • Guardia: 04 puntos. • Incorporación: 04 puntos. • Cancillería: 02 puntos. • Fichero: 02 puntos. • Capellanía: 01 punto. • Lactancia: 01 punto.

	• Departamento de capacitaciones: 07 puntos. • Auditorio: 01 punto. • Sanidad: 02 puntos. • Instalaciones: 04 puntos. • Aviones: 06 punto. • Comando GRUAL: 03 puntos. • Cafetería: 01 punto.
Observaciones	No se han iniciados las actividades.

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

A la fecha, se realizó la instalación y adecuación de cincuenta (50) puntos de red, incluyendo sus respectivas tomas eléctricas reguladas y no reguladas, de acuerdo con los requerimientos establecidos para en la ficha técnica. Se verificó el correcto funcionamiento de la infraestructura instalada, garantizando la conectividad y disponibilidad de los servicios asociados. Durante la ejecución de las actividades no se presentaron novedades, incidentes ni contratiempos, desarrollándose los trabajos conforme a lo planeado y cumpliendo con los estándares técnicos requeridos y tiempo de ejecución.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	ST. GUERRA URIZA YUSNEIDIS MARCELA Principal	**C.C.** 1.065.834.438
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 05 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESCUADRÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	
Firma		

Nombre del Gerente del proyecto	TC. JULIO CESAR BASANTE BRAVO	**C.C.** 94.062.026
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 05 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO	
Firma		
