	ACTOS ADMINISTRATIVOS		
	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA
	F-AM-013	00	20/01/2021

NÚMERO DE INFORME	02						
SUPERVISION	X						
INTERVENTORÍA	N/A						
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	☐	**PARA PAGO**	☐X	**FINAL**	☐	
PERIODO DE INFORME	Desde:	10/05/2025		Hasta:	20/06/2025		

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO		**NÚMERO:**	112-2026	
CONVENIO	X	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	29/1/2026	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			20/04/2026	
OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN EL BARRIO EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE FREDONIA ANTIOQUIA".				
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			MUNICIPIO DE FREDONIA	
CONTRATISTA / CONVENIANTE		NOMBRE:	JAC BARRIO EL CEMENTERIO R.L: CYNDI LORENA PARRA DUQUE	
		NIT	900.033.354-0	
VALOR [$]:		INICIAL:	VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($29.953.166), Moneda Corriente, incluido tributos que se generen por la ejecución del Convenio. valor que se discrimina de la siguiente manera: • La Entidad Estatal realizará un aporte en dinero correspondiente a VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS ($ 29.000.000) equivalentes a 16.52 SMLMV. • El OAC realizara un aporte en Especie correspondiente a mano de obra no calificada por NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 953.166).	
		ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO: N/A — % DE ADICION: N/A
		VALOR TOTAL:		VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($29.953.166).
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A
PLAZO:		INICIAL		MESES

			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
			20 abril 2026	19 mayo 2026	
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
		1	Un mes y diez dias	30 de junio de 2026	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACION
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		30 de junio de 2026			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS		SI			
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO POR PARTE DEL MUNICIPIO	Lucas Edilson Muñoz Moreno			
% DE EJECUCION FISICA		30%			
% DE EJECUCION FINANCIERA		29%			

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

Alcance del Objeto: "AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN EL BARRIO EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE FREDONIA ANTIOQUIA."

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Dentro del convenio, firmado entre la junta de acción comunal de la vereda el Mango Del municipio de Fredonia se contempla la construcción de 35 metros de placa huella acordes a los diseños y especificaciones técnicas propuestas. Tramo en el cual se ha realizado actividades enfocadas en el desarrollo de la obra.

Así mismo se han entregado y recibido las actividades ejecutadas a entera satisfacción con los respectivos informes de ejecución de los recursos por parte de la JAC.

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO


FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
04/06/2026	Apoyo en Actividades realizadas en el marco de la ejecución del convenio solidario y asistencia técnica.	Se realiza acompañamiento a la comunidad y asistencia técnica en la ejecución de la obra.
17/06/2026	Apoyo en Actividades realizadas en el marco de la ejecución del convenio solidario y asistencia técnica.	Se realiza acompañamiento a la comunidad y asistencia técnica en la ejecución de la obra.

4. EJECUCION FISICA DE LA OBRA


A la fecha se cuentas con actividades enfocadas en:

- Preparación y nivelación del terreno
- Figurado de acero para vigas riostras y rieles
- Instalación de formaleta
- Vaciado de concreto de 21 Mpa, para rieles y vigas riostras.

Registro fotográfico de avance

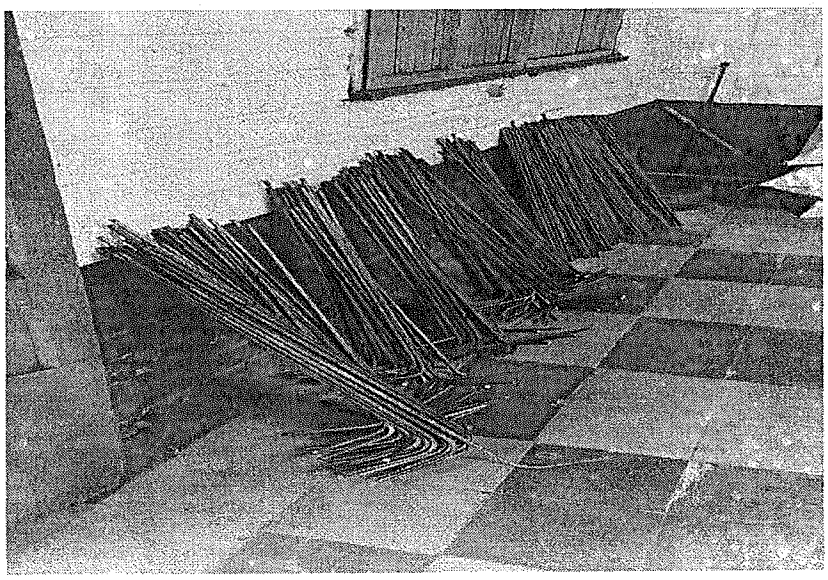



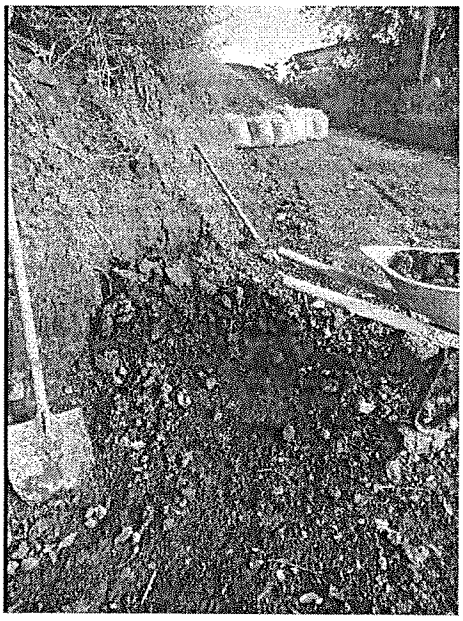



5. SEGUIMIENTO AMBIENTAL, SOCIAL y SST EN OBRA

N/A

LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO
Secretario de Desarrollo territorial
Supervisora Municipio.
