INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 23

CONTRATO NÚMERO 973 DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 4

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

PERIODO DEL INFORME
ENTRE EL 01 Y EL 31 DE JULIO DE 2024

VOLUMEN 1 DE 1

ORIGINAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

Contrato de Obra No. L.P.006 DE 2022
557 DE 2022
558 DE 2022

Contratista: CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK
CONSORCIO SAN RAFAEL
CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUÉ

Contrato de Interventoría No. 973 DE 2022

Interventoría: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

Objeto Contrato de Obra:

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORREGIMIENTO DE LOS NÍSPEROS HASTA EL CORREGIMIENTO DE SINCERIN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACHÍ – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE CASCAJAL HASTA EL CORREGIMIENTO DE LA PASCUALA DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA EL CORREGIMIENTO DE LA SAN RAFAEL DE CORTINAS DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

INFORME MENSUAL No. 23 **MES O PERIODO:** JULIO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	3
1	**INTRODUCCIÓN**		12
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		14
2.1	Localización		14
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		22
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		23
2.4	Características técnicas del proyecto		28
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		32
3.1	Información general del contrato		33
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		36
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		39
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		40
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		43
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	49
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	73
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	76
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	82
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	84
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	88
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	89
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	115
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		121
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	121
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	122
	• Seguimiento Programa de Obra		122
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	121
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	124
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	126
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	128
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		134
5.1	Información general del contrato		134
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		134
5.3	Informes especialistas y profesionales		135
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		136
5.5	Informe matriz de riesgos.		136
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		136
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		138
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	141
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	141
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	143
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	156
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	158
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		164
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	164
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	164
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	165
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	166
7	**Conclusiones y recomendaciones**		167
8	**Anexos**		168
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		168
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		169
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		171
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		173

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 2856 de fecha 22 de agosto de 2023

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Tabla de contenido

Tabla de contenido 1

1. INTRODUCCIÓN 10

2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS 11

2.1. LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS 12

2.1.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO L.P.006 DE 2022. 12

2.1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 557 DE 2022. 14

2.1.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 558 DE 2022. 18

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 20

2.2.1. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto N°L.P.006 de 2022. 20

2.2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto N°557 de 2022. 21

2.2.3. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto N°558 de 2022. 21

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA. 21

2.3.1. Inventario y estado inicial de la Vía proyecto N°L.P.006 de 2022. 21

2.3.2. Inventario y estado inicial de la vía proyecto N°557 de 2022. 23

2.3.3. Inventario y estado inicial de la vía proyecto N°558 de 2022. 26

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 26

2.4.1. Características Técnicas del proyecto N°L.P.006 de 2022. 26

2.4.2. Características técnicas del proyecto N°557 de 2022. 27

2.4.3. Características técnicas del proyecto N°558 de 2022. 28

3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA 30

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 31

3.1.1. Información general del contrato de obra L.P 006 de 2022 – municipio de Achí. 31

3.1.2. Información general del contrato de obra 557 de 2022 – municipio de Magangué 32

3.1.3. Información general del contrato de obra 558 de 2022 – municipio de Magangué 33

3.2. Descripción de las Actividades Ejecutadas en el mes. 34

3.2.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas en el mes contrato L.P.006 de 2022 34

3.2.2. Descripción de las Actividades Ejecutadas en el mes Contrato 557 de 2022. 35

3.2.3. Descripción de las Actividades Ejecutadas en el mes Contrato 558 de 2022. 36

3.3. Seguimiento Ítems No Previstos 37

3.3.1. Seguimiento Ítems No previstos contrato L.P.006 de 2022. 37

3.3.2. Seguimiento Ítems No Previstos contrato 557 de 2022. 37

3.3.3. Seguimiento Ítems No Previstos contrato 558 de 2022. 38

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 38

3.4.1. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría contrato L.P.006 de 2022. 38

3.4.2. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría contrato 557 de 2022. 39

3.4.3. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría contrato 558 de 2022. 40

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 41

4.1. INFORME SEMANAL 47

4.1.1. MUNICIPIO DE ACHÍ – BOLÍVAR CONTRATO N° L.P.006 DE 2022. 47

4.1.2. MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N° 557 DE 2022. . 55

4.1.3. MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N° 558 DE 2022..63

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 71

4.2.1. MUNICIPIO DE ACHÍ – BOLÍVAR CONTRATO N° L.P.006 DE 2022. 71

4.2.2. MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N° 557 DE 2022...72

4.2.3. MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N° 558 DE 2022...73

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 74

4.3.1. MUNICIPIO DE ACHÍ – BOLÍVAR CONTRATO N° L.P.006 DE 2022. 74

4.3.2. MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°557 DE 2022 ...75

4.3.3. MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°558 DE 2022 ...78

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 80

4.4.1. MUNICIPIO DE ACHÍ – BOLÍVAR CONTRATO N°L.P.006 DE 2022. 80

4.4.2. MUNICIPIO DE MAGANGUÉ - BOLÍVAR CONTRATO N° 557 DE 2022...81

4.4.3. MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N° 558 DE 2022..82

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.....82

4.5.1. MUNICIPIO DE ACHÍ – BOLÍVAR CONTRATO N° L.P.006 DE 2022 82

4.5.2. MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°557 DE 2022 ...83

4.5.3. MUNICPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°558 de 2022.....85

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.....86

4.6.1. MUNICIPIO DE ACHÍ – BOLÍVAR CONTRATO N°L.P.006 DE 2022 86

4.6.2. MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°557 DE 2022 ...86

4.6.3. MUNICPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°558 de 2022.....86

4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.....87

4.7.1. MUNICIPIO DE ACHÍ – BOLÍVAR CONTRATO N° L.P.006 DE 2022 87

4.7.2. MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°557 DE 2022 ... 99

4.7.3. MUNICPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°558 de 2022 ... 110

4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA ... 113

4.8.1. MUNICIPIO DE ACHÍ – BOLÍVAR CONTRATO N° L.P.006 DE 2022 ... 113

4.8.2. MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°557 DE 2022 . 115

4.8.3. MUNICPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°558 de 2022 ... 117

4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL ... 119

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA. ... 132

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO. ... 132

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor ... 132

5.2.1 Municipio De Achí - Contrato No. L.P.006 de 2022. ... 132

5.2.2. Municipio De Magangué – Contrato No. 557 de 2022. ... 132

5.2.3. Municipio de Magangué – Contrato No. 558 de 2022. ... 134

5.3. Informe del programa Anual de Caja -PAC (No aplica) ... 134

5.4. Informe matriz de riesgos ... 134

5.5. Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de obra e Interventoría (No aplica) ... 134

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. ... 134

6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría ... 136

6.2. Personal control aportes legales y seguridad social contrato de Interventoría. (Anexo formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7) ... 139

6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría ... 141

6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría ... 154

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría ... 156

6.6. Otros documentos seguimiento mensual ... 162

6.6.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo 162

6.6.2. Plan de carga o reprogramación al Plan de Cargas. 164

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 165

8. ANEXOS 166

8.2. Registro fotográfico del avance de las obras 167

8.3. Registro fotográfico de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas. 169

8.4. Copia de la Bitacora del mes correspondiente 171

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Información del estado de los Contratos de Obra 30

Tabla 2 Información Contrato de Obra L.P.006 DE 2022 Municipio de Achí. 31

Tabla 3 Información Contrato de Obra 557 de 2022 Municipio de Magangué vía que conduce desde Cascajal hasta La Pascuala. 32

Tabla 4.Información contrato de obra 558 de 2022 vía que conduce desde el municipio de Magangué hasta el corregimiento de San Rafael de Cortinas. 33

Tabla 5. Saldos de cada una de las actividades para el control de la inversión L.P.006 de 2022. 34

Tabla 6. Saldos de cada una de las actividades para el control de la inversión 557 de 2022. 36

Tabla 7. Saldos de cada una de las actividades para el control de la inversión 558 de 2022. 37

Tabla 8. Estado de avance ejecutado CTO L.P.006 de 2022. 39

Tabla 9. Estado de avance ejecutado CTO 557 de 2022. 40

Tabla 10. Estado de avance ejecutado CTO 558 de 2022. 41

Tabla 11. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA L.P 006 DE 2022 – MUNICIPIO DE ACHÍ. 42

Tabla 12. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA No. 557 DE 2022 – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – LOTE 1. 44

Tabla 13. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA No. 558 DE 2022 – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – LOTE 2. 46

Tabla 14. Personal del Consorcio VIA LOS NISPEROS JK. 74

Tabla 15. Personal del Consorcio SAN RAFAEL. 75

Tabla 16. Personal del Consorcio MEGAVIAS MAGANGUÉ. 78

Tabla 17 Información Contrato de Interventoría 973 de 2022. 132

Tabla 18 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 135

Tabla 19. Personal contrato de interventoría. 140

Tabla 20. Correspondencia generada entre contratista e interventor contrato L.P.006 de 2022. 166

Tabla 21. Correspondencia generada entre contratista e interventor contrato 557 de 2022. 166

Tabla 22. Correspondencia generada entre contratista e interventor contrato 558 de 2022. 167

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Ubicación Geográfica del Proyecto. 11

Ilustración 2 Ubicación general del municipio de Achí, Departamento de Bolívar. 13

Ilustración 3 Ubicación Geográfica del sitio Corregimiento de Los Nísperos y Sincerin. ... 14

Ilustración 4 Ubicación general de los corregimientos Cascajal, Ceibal y La Pascuala del municipio de Magangué, Departamento de Bolívar. 15

Ilustración 5 Ubicación Geográfica del sitio Corregimientos de Cascajal, Ceibal y La Pascuala. 16

Ilustración 6. Fuente de base, subbase y triturado. 16

Ilustración 7. Ubicación de la concretera. 17

Ilustración 8. Ubicación de la planta de asfalto CMV. 17

Ilustración 9 Ubicación general del corregimiento de San Rafael de Cortinas en el municipio de Magangué, Departamento de La Guajira. 18

Ilustración 10 Ubicación Geográfica del sitio San Rafael de Cortinas. 19

Ilustración 11. Fuente de base, subbase, triturado y mezcla asfáltica. 19

Ilustración 12. Fuente de material terraplén y material seleccionado. 20

Ilustración 13. Sección típica de la vía. 29

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Copias de este documento serán entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones deben ser informadas al director del Proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

INDICE DE MODIFICACIONES

INDICE VERSIÓN	CAPITULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	-	-	-

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

Con el presente informe, GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES, en su calidad de Interventor, del contrato No. 973 DE 2022, cuyo objeto es *"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTE 4*", adjudicado previo Concurso de Méritos No. CMA-DTE-SEP-196-2021, reporta a la Entidad el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por Los Contratistas a cargo de los contratos de obra que se desarrollan dentro del marco del programa *"COLOMBIA RURAL"* Mantenimiento y Mejoramiento De la Red Terciaria 2019 – 2022, cuyas obras tienen como objetivos: Garantizar la movilidad y accesibilidad de la Red Rural del país, Priorizar corredores productivos, Incrementar la productividad del campo, Conectar los territorios y Mejorar la calidad de vida de las comunidades directamente beneficiadas.

A través de este informe se presenta a la entidad contratante, INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, el seguimiento a los tres contratos de obra que se relacionan a continuación: **Municipio de Achí: Contrato de obra No. L.P.006 -2022** por Licitación Pública LP-006 DEL 2022 convocada por plataforma SECOP I, adjudicada a **CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK** por un valor de $ 8.085.806.846; **Municipio de Magangué: Contrato de obra No. 557 del 2022** por Licitación Pública No. LP-005 de 2022 convocado por plataforma SECOP I, adjudicada a **CONSORCIO SAN RAFAEL** por un valor de $ 22.888.390.685; **Municipio de Magangué: Contrato de obra pública No. 558 de 2022** por Licitación Pública No. LP-005 DE 2022 por plataforma SECOP I, adjudicada a **CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUÉ** por un valor de $ 12.301.199.730.

Se presenta el seguimiento en aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales y Bioseguridad (Covid-19) de las obras y se establece el cumplimiento de las actividades contratadas, las eventualidades que se han presentado durante el desarrollo del contrato, así como las observaciones y recomendaciones que ayuden a la correcta ejecución de los proyectos, de acuerdo al programa de trabajo.

El presente documento, detalla en forma resumida las actividades adelantadas por Los Contratistas y la Interventoría en el período comprendido entre **el 01 y el 31 de julio de 2024** que constituye el **Informe Mensual de Interventoría No. 23.** Se anexan al presente informe los registros que evidencian el seguimiento efectuado por esta Interventoría a los Contratos de Obra en ejecución.

Para el control y vigilancia el INVIAS designó a la Ingeniera **FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA** como Supervisor del Contrato de Interventoría. Así mismo, al Ingeniero **EDY ALEXANDER CAMARGO JIMÉNEZ**, como Gestor Técnico del Proyecto.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS

El contrato de Interventoría denominado *"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTE 4*" está constituido por dos (2) Municipios ubicados en el departamento de Bolívar (Achí y Magangué), como se observa en la Ilustración 1.

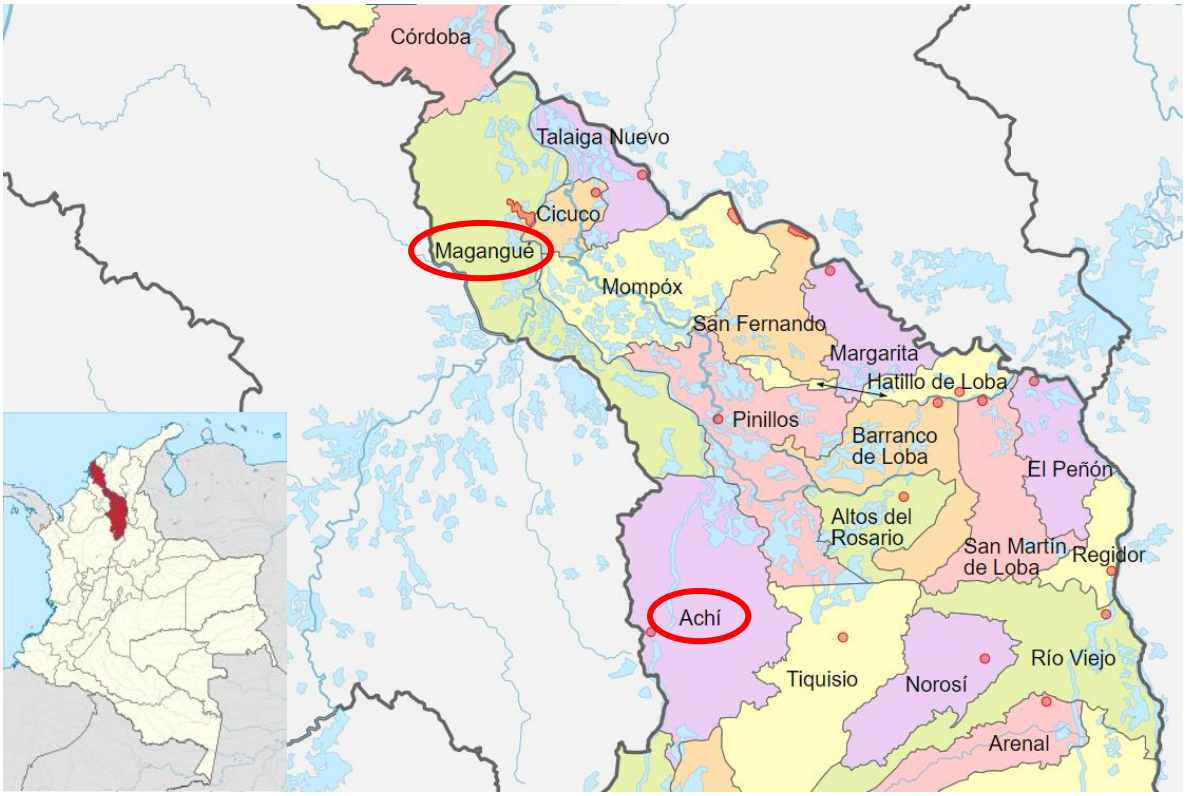


Ilustración 1 Ubicación Geográfica del Proyecto.

CONTRATO DE OBRA L.P.006 DE 2022 – MUNICIPIO DE ACHÍ

El proyecto denominado: "*CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORREGIMIENTO DE LOS NÍSPEROS HASTA EL CORREGIMIENTO DE SINCERIN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACHÍ - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR*", tiene como finalidad la construcción de placa huella en la vía que conduce de la vereda de los Nísperos hasta el corregimiento de Sincerin, Departamento De Bolívar, donde actualmente existen senderos con calzadas en terreno natural y secciones transversales mal definidas, los cuales requieren de una recuperación oportuna, identificando un eje de vía, teniendo en cuenta que la movilidad en estos tramos

genera a su vez dificultad para los vehículos al tener que recorrer una vía afectada por huecos y socavaciones que cada época de lluvias causa afectaciones en el terreno natural.

CONTRATO DE OBRA 557 DE 2022 – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ

El proyecto denominado: "MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE CASCAJAL HASTA EL CORREGIMIENTO DE LA PASCUALA DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.", tiene como finalidad el mejoramiento de 13 km en pavimento asfáltico de la vía que conduce a los corregimientos de Cascajal, La Pascuala y Ceibal en el municipio de Magangué, donde actualmente existe una vía en estado deficiente, con una rasante de bajo espesor con bajo contenido de finos, peligrosa de transitar y exigente de la conducción, caracterizada por tener zonas inestables y superficies deslizantes. En la vía hay presencia de 4 estructuras que permiten el paso sobre quebradas:

- Puente 1 ubicado en las coordenadas 9°19´9.12"N - 74°48´51.42"O
- Puente 2 ubicado en las coordenadas 9°21´13.66"N - 74°49´11.40"O
- Puente 3 ubicado en las coordenadas 9°22´2.94"N - 74°49´43.38"O
- Puente 4 ubicado en las coordenadas 9°23´31.38"N - 74°49´30.90"O

Estos se encuentran en avanzado estado de desgaste, exposición de acero de refuerzo en algunos casos y en la mayoría de los casos del agregado grueso; ninguna de estas posee señalización horizontal ni vertical.

CONTRATO DE OBRA 558 DE 2022 – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ

El proyecto denominado: "MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA EL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL DE CORTINAS DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR." Tiene como finalidad el mejoramiento de 5.5 km en pavimento asfaltico de la vía que conduce al municipio de Magangué con el corregimiento de San Rafael de Cortinas, en donde actualmente se encuentra en terreno natural destapado, el cual evidencia un gran porcentaje de áreas en mal estado, debido al deterioro provocado por las fuertes lluvias presentadas en la zona, donde no se dispone de obras de drenaje que mitiguen los efectos de las escorrentías sobre el terreno, y a la falta de mantenimiento o mejoramiento de la misma.

2.1. LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS

2.1.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO L.P.006 DE 2022.

El municipio de Achí está ubicado en la margen izquierda del Río Cauca, cerca de los límites con el departamento de Sucre en la llamada depresión Momposina, a los 8°34'09" de latitud norte y 74°33'22" de longitud oeste del meridiano de Greenwich, limitando con el municipio de Magangué al norte; los municipios de Pinillos y Tiquisio al este; Montecristo y San Jacinto del Cauca al sur; y el departamento de Sucre al oeste, con los municipios de Majagual y

Guaranda, a una distancia de 229 km de Cartagena, la capital de Bolívar. Su extensión territorial es de 1471 km² y su altitud es media de 20 metros sobre el nivel del mar.



Ilustración 2 Ubicación general del municipio de Achí, Departamento de Bolívar.

El proyecto se encuentra ubicado en el Municipio de Achí, en los límites con el departamento de Sucre.

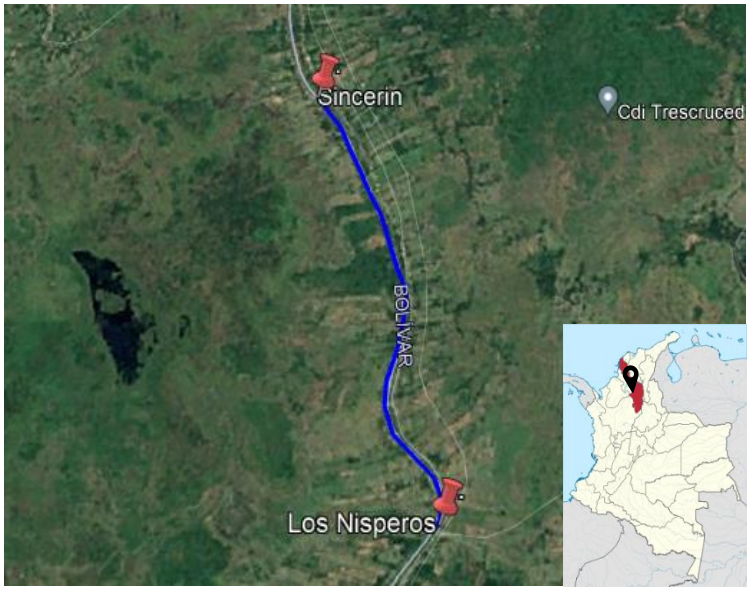


Ilustración 3 Ubicación Geográfica del sitio Corregimiento de Los Nísperos y Sincerin.

2.1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 557 DE 2022.

Los corregimientos de Cascajal, Ceibal y La Pascuala pertenecientes al municipio de Magangué que está ubicado al centro del departamento de Bolívar, situado en el extremo noroccidental de Colombia, a una distancia de 216.8 km de Cartagena, la capital de Bolívar, a los 9°14’48” de latitud norte y 74°45’34” de longitud oeste del meridiano de Greenwich. Localizado a orillas del río Magdalena y en la zona con más ciénagas del país.

Su extensión territorial es de 1568 km², su altitud media es de 49 metros sobre el nivel del mar; limita al norte con los departamentos de Córdoba y Magdalena; al sur con Achí; al oriente con Talaigua y Pinillos y al Occidente con el departamento de Sucre.

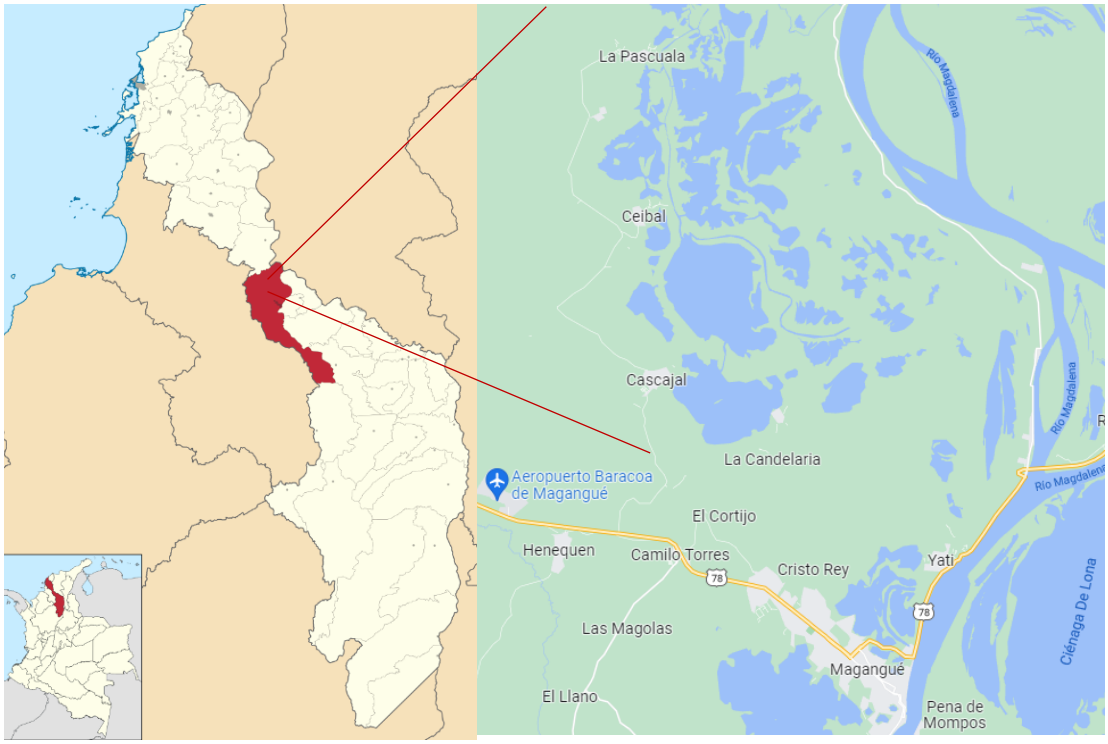


Ilustración 4 Ubicación general de los corregimientos Cascajal, Ceibal y La Pascuala del municipio de Magangué, Departamento de Bolívar.

El proyecto se encuentra ubicado en la vía que conduce a los corregimientos de Cascajal, La Pascuala y Ceibal, al centro del departamento de Bolívar, (abscisas de referencia inicio: K0+000 con coordenadas 9°18’56.56"N 74°48'29.02"O y fin K13+000 con coordenadas 9°23'44.18"n 74°49'07.57"O.)

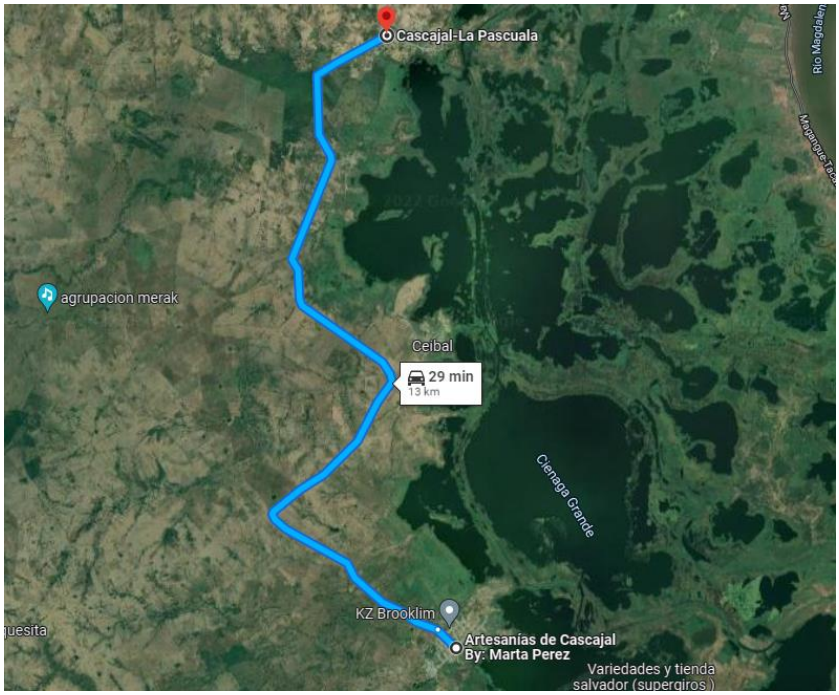


Ilustración 5 Ubicación Geográfica del sitio Corregimientos de Cascajal, Ceibal y La Pascuala.

Las fuentes de donde se tomarán los materiales son las siguientes:

- Base, subbase y triturado serán tomados de Tolú Viejo, a una distancia de 113 km del corregimiento de Ceibal como lo muestra la Ilustración 6.

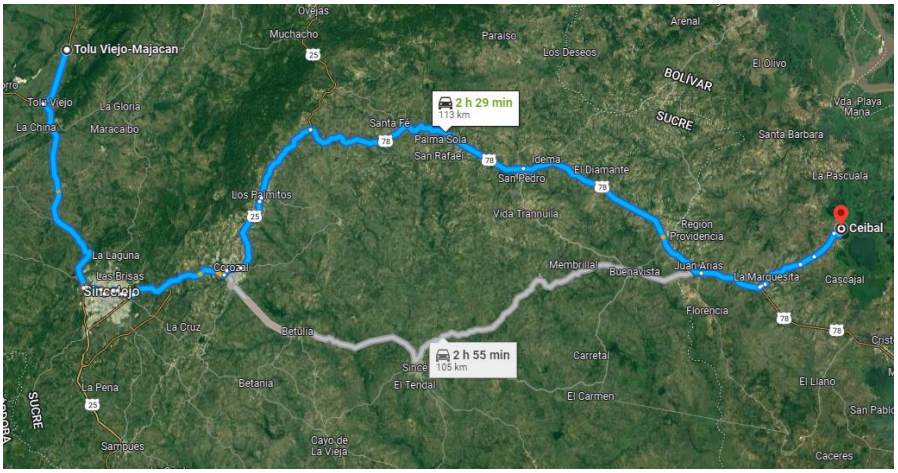


Ilustración 6. Fuente de base, subbase y triturado.

La concretera CONCRENORTE S.A.S. está ubicada a 87.6 km del corregimiento de Ceibal como lo muestra la Ilustración 7.

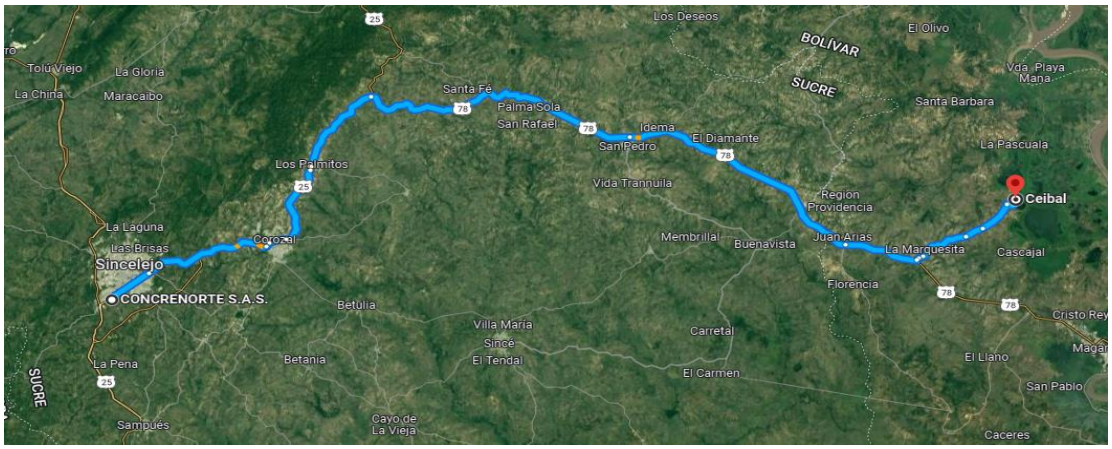


Ilustración 7. Ubicación de la concretera.

La planta de asfalto CMV se encuentra en Tolú Viejo Sucre a 111km del corregimiento de Ceibal como lo indica la Ilustración 8.

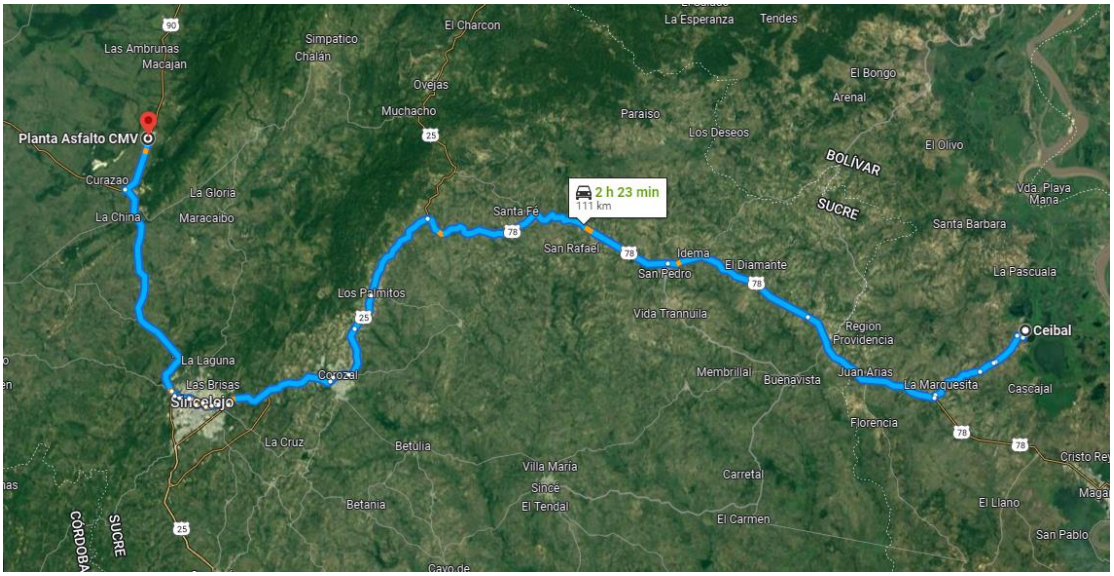


Ilustración 8. Ubicación de la planta de asfalto CMV.

2.1.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 558 DE 2022.

El corregimiento de San Rafael De Cortinas perteneciente al municipio de Magangué está ubicado al centro del departamento de Bolívar, situado en el extremo noroccidental de Colombia, a una distancia de 216.8 km de Cartagena, la capital de Bolívar, a los 9°14’48” de latitud norte y 74°45’34” de longitud oeste del meridiano de Greenwich. Localizado a orillas del río Magdalena y en la zona con más ciénagas del país.

Su extensión territorial es de 1568 km², su altitud media es de 49 metros sobre el nivel del mar; limita al norte con los departamentos de Córdoba y Magdalena; al sur con Achí; al oriente con Talaigua y Pinillos y al Occidente con el departamento de Sucre.

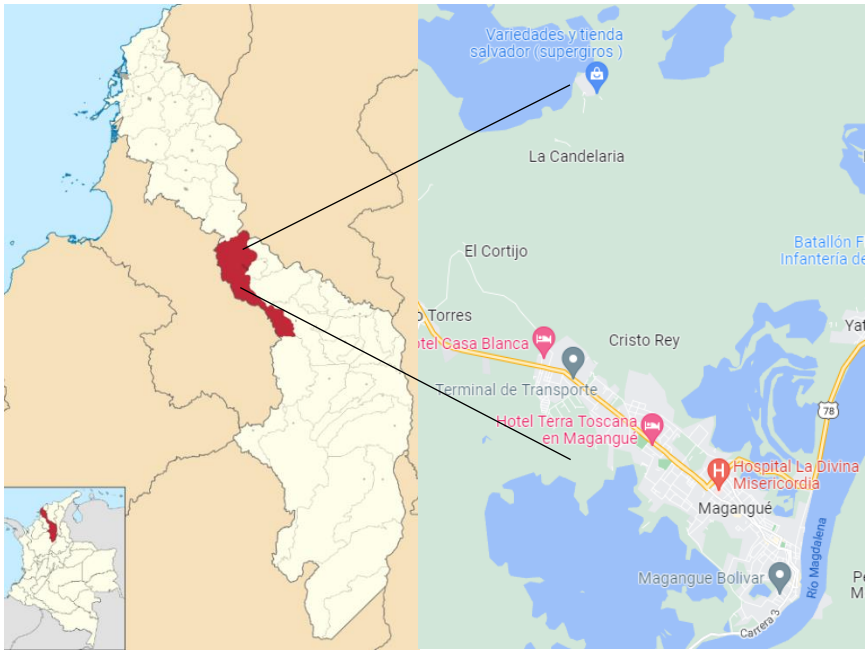


Ilustración 9 Ubicación general del corregimiento de San Rafael de Cortinas en el municipio de Magangué, Departamento de La Guajira.

El proyecto de obra objeto de vigilancia contempla la realización del trazado, diseño geométrico y señalización para el mejoramiento de la vía que conduce del municipio de Magangué al corregimiento de San Rafael de Cortinas en el departamento de Bolívar. Esta vía presenta una longitud total de 5.5 km.

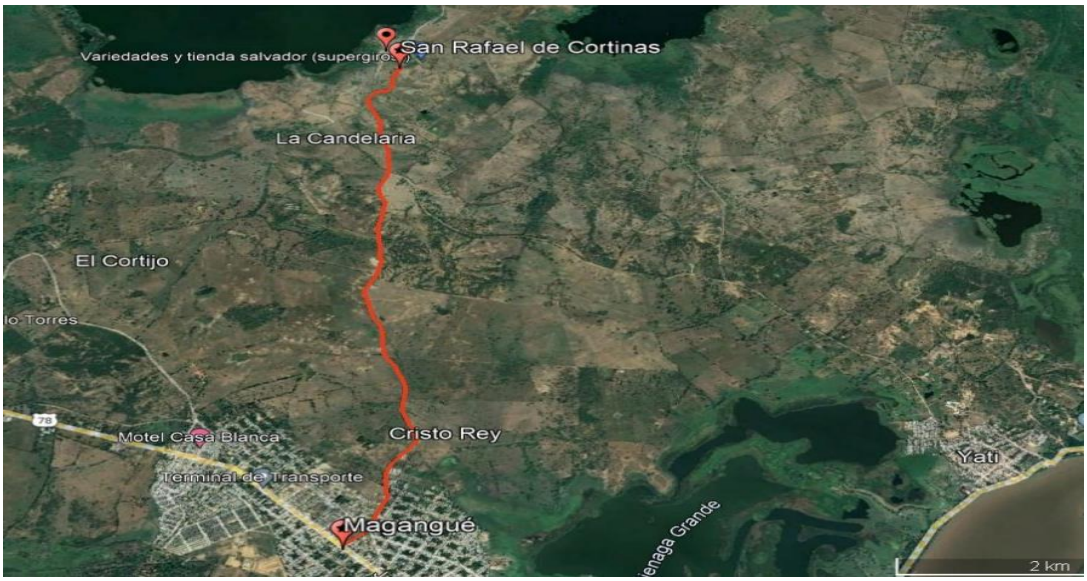


Ilustración 10 Ubicación Geográfica del sitio San Rafael de Cortinas.

Las fuentes de donde se tomarán los materiales son las siguientes:

- Base, subbase, triturado y mezcla asfáltica serán tomados de Tolú Viejo, a una distancia de 120 km del corregimiento de San Rafael de Cortina como lo muestra la Ilustración 11.

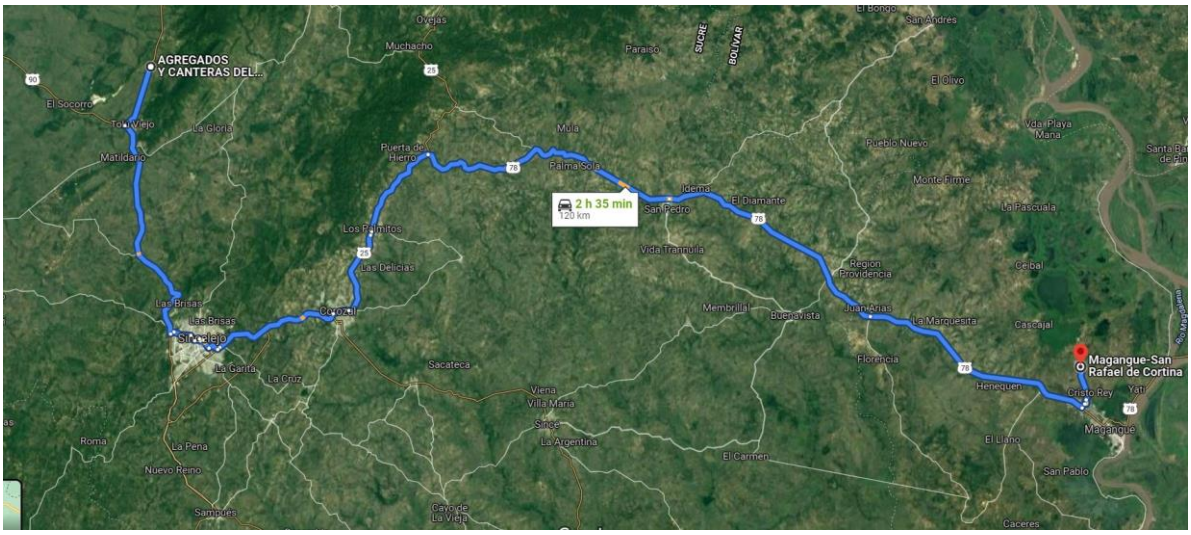


Ilustración 11. Fuente de base, subbase, triturado y mezcla asfáltica.

• El material terraplén y material seleccionado será tomado a una distancia de 17km del corregimiento de San Rafael de Cortina como lo muestra la Ilustración 12.

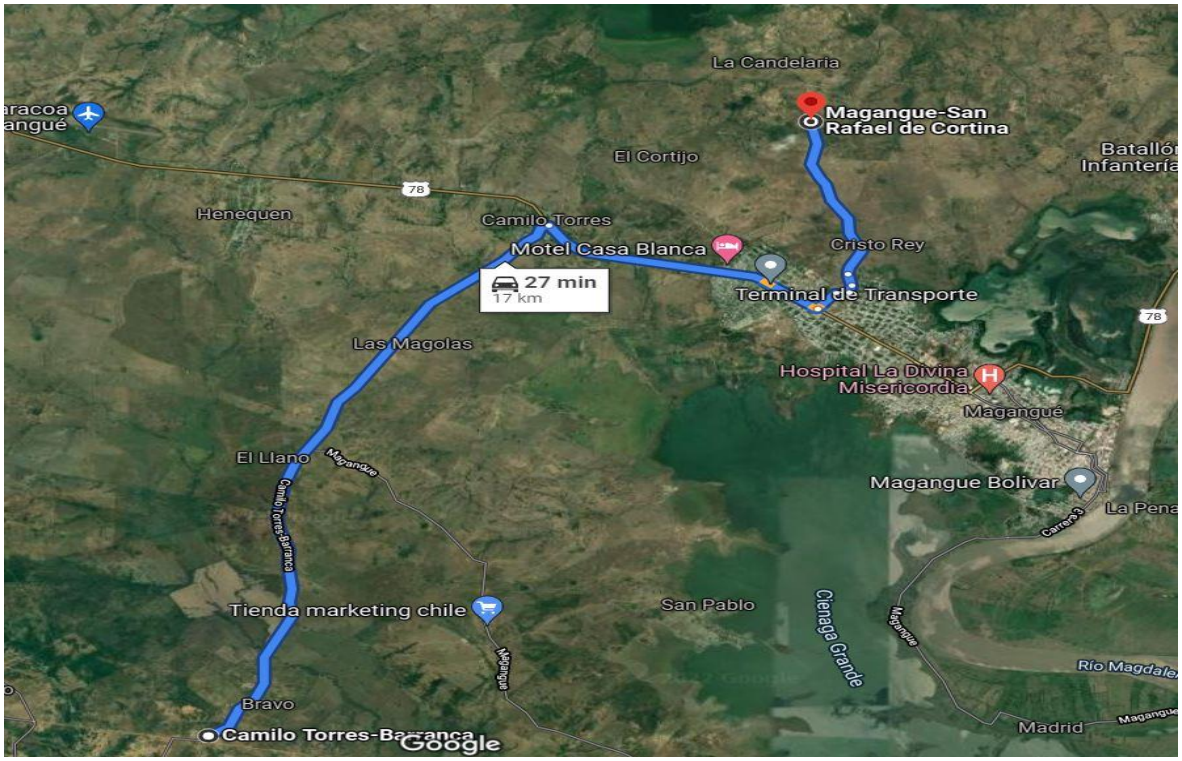


Ilustración 12. Fuente de material terraplén y material seleccionado.

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

2.2.1. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto N°L.P.006 de 2022.

La intervención por realizar comprende el mejoramiento de la infraestructura de la vía rural, para normalizar el tránsito de la población de la zona, debido a que en época de invierno se hace casi imposible transitar por dicha vía, y a su vez se garantiza un acceso idóneo a usuarios de la vía, principalmente a estudiantes pertenecientes a los corregimientos aledaños como, Concepción, Arboleda, La travesía, Paso Mantequera y demás población. Asimismo, proporciona un mejor acceso a puntos de atención médica del municipio de Achí, el puesto de salud de Arboleda y otros puntos de gran confluencia.

2.2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto N°557 de 2022.

La construcción de este proyecto permitirá la comercialización de los productos entre los centros urbanos y los de producción de la zona, el control de aguas de drenaje para evitar inundaciones en temporadas de lluvia y de esa forma facilitar el acceso de las comunidades a los diferentes centros urbanos de los municipios y una reducción significativa de costos de actividad productiva en la zona, puesto que en es un tramo en el que se cultivan y comercializan muchos productos agrícolas, posibilitando así su mercado en la capital del departamento de Sucre y otras ciudades cercanas.

2.2.3. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto N°558 de 2022.

La construcción de este proyecto permitirá la comercialización de los productos entre los centros urbanos y los de producción de la zona, el control de aguas de drenaje para evitar inundaciones en temporadas de lluvia y de esa forma facilitar el acceso de las comunidades a los diferentes centros urbanos de los municipios y una reducción significativa de costos de actividad productiva, puesto que es un tramo en el que se cultivan y comercializan muchos productos agrícolas, posibilitando así su mercado en la capital del departamento de Sucre y otras ciudades cercanas.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA.

2.3.1. Inventario y estado inicial de la Vía proyecto N°L.P.006 de 2022.

Para el reconocimiento de la vía se realizó una visita técnica el día 16 de noviembre de 2022, donde estuvieron presentes funcionarios de la Administración Municipal de Achí – Bolívar, ingenieros representantes del Contratista de la obra y la ingeniera directora de la Interventoría. Siendo las 2:30 p.m., se reunieron los invitados en el punto de encuentro, la vivienda del alcalde en el municipio de Achí, desde este punto se partió al tramo en donde se desarrollarán las obras en el marco del contrato de obra L.P.006 de 2022. El recorrido de aproximadamente 10 km se realizó en motos en la siguiente ruta Los Nísperos - Sincerin.

Se hizo reconocimiento del estado actual de la vía, evidenciándose lo imprescindible que es la realización de la obra; se encontró una vía con presencia de obras de arte, en muy mal estado producto de las lluvias provocando una difícil situación de movilidad para estas poblaciones y otros corregimientos aledaños puesto que esta es la única vía de acceso de los habitantes a sus instituciones educativas, centros de salud y el único modo para movilizarse es en moto o caminando. Se tomó registro fotográfico del tramo.



Fotografía 1. Tramo de la vía en terreno entre las abscisas K4+100 Y K4+200



Fotografía 2. Tramo de la vía en terreno entre las abscisas K5+300 Y K5+400



Fotografía 3. Tramo de la vía en terreno entre las abscisas K5+300 Y K5+400

2.3.2. Inventario y estado inicial de la vía proyecto N°557 de 2022.

Para el reconocimiento de la vía se realizó una visita técnica el día 6 de septiembre del 2022, donde estuvieron presentes funcionarios de Invias, de la Administración Municipal de Magangué – Bolívar, ingenieros representantes del Contratista de la obra y la ingeniera Directora de la Interventoría.

El recorrido fue de aproximadamente 13 kilómetros, conformada por una superficie del terreno o rasante tipo afirmado, con evidentes tramos en deterioro K6+500 – K6+700. Por otra parte, la comunidad expresa que han pasado por temporadas en las que en nivel de los cuerpos de agua sube hasta llegar a cubrir la vía, situación que no se evidenció para la temporada en la que fue realizada la visita. Además, se realizará la intervención de 4 puentes vehiculares que evidencian la carencia de barandas, exposición del acero expuesto y desportillamiento.

	
Fotografía 4. Tramo de la vía en terreno entre las abscisas K0+100 Y K1+000	*Fotografía 5. Tramo de la vía en terreno entre las abscisas k6+500 y k6+700*

	
Fotografía 7. Puente 1 ubicación 9°19´9.12" N - 74°48´51.42" O.	*Fotografía 6. Puente 1 evidencia de carencia de barandas y exposición de acero de refuerzo.*



Fotografía 8. Puente 2 barandas con presencia de desportillamiento y acero expuesto.



Fotografía 9. Puente 3 Corrosión en acero expuesto.



Fotografía 10. Puente 4, barandas con desportillamiento.

2.3.3. Inventario y estado inicial de la vía proyecto N°558 de 2022.

En la visita de obra realizada el día 7 de septiembre de 2022, se hizo reconocimiento total del tramo materia del contrato en donde estuvieron presentes ingenieros Contratistas, directora de interventoría, Alcaldía de Magangué e Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Se evidencio una vía difícil de transitar, dificultando la comunicación de la cabecera municipal hasta el municipio de San Rafael de Cortinas. Los tramos K2+100 – K2+230 y K4+300 – K4+550 evidencian ser críticos, por lo que se hace necesario la pavimentación de la vía.

	
Fotografía 11. K2+100.	*Fotografía 12. K4+300.*

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

2.4.1. Características Técnicas del proyecto N°L.P.006 de 2022.

Si bien es cierto que, existen unos diseños iniciales que comprenden un estudio de suelos, un estudio hidráulico, un diseño de pavimentos y un diseño geométrico para la placa huella, dentro de la etapa inicial del contrato, se incluyó una actividad denominada *"Revisión y/o ajuste a estudios y diseños (Placa huella, Pavimento y estructuras de drenaje)",* de cuyo resultado, surgirá la versión final de los estudios y diseños.

2.4.1.1. Parámetros de diseño

La velocidad de diseño esta entre 40 y 50 (Km/h), velocidad especifica de la curva horizontal no menor a 50 Km/h, radio de curvatura mínimo de 78.7m y un radio mínimo redondeado de 79m. El transito promedio diario (TPD) es de 30 vehículos diarios y el número de ejes acumulados de 8.2 Ton es <1’000.000 ejes. Al presentar un volumen de tránsito bajo, en cuanto al coeficiente de drenaje y de transmisión de cargas los valores son de 1.0 y 2.7 respectivamente. Un pavimento con espesor de losa de 3.4” cuyo soporte tiene un CBR igual a 2.30% y un módulo de reacción de la subrasante de 20Mpa. 3000 PSI o 32 Kg/cm^2.

2.4.1.2. Parámetros geométricos

La vía, al encontrarse dentro de zona rural, es tomada como vía terciaria, consiste en la construcción de placas huellas en concreto que constan de dos (2) huellas de 0.90 m de ancho, (8.6) centímetros de espesor y una longitud de tres (3.0) metros cada huella, separadas entre sí por tres secciones de piedra pegada, dos secciones ubicadas en los lados externos y una central de 0.90 m, construidas en concreto de 3.000 psi. Las placas están arriostradas por unas viguetas de 20 cm de ancho por 25 cm de alto, localizadas cada tres (3) metros. El desarrollo longitudinal de la vía tiene pendientes de (0.30% - 12%) de tal manera que se conserve el perfil longitudinal que actualmente tiene la vía. En tangentes se efectúa el drenaje a dos direcciones con bombeos laterales de 2%, para las secciones en curva la pendiente transversal obedece al mismo valor del bombeo ya que las velocidades son bajas.

2.4.2. Características técnicas del proyecto N°557 de 2022.

Si bien es cierto que, existen unos diseños iniciales, dentro del proyecto se incluyó una actividad denominada *“Revisión y/o ajuste a estudios y diseños (Placa huella, Pavimento y estructuras de drenaje)*”, de cuyo resultado, surgirá la versión final de los estudios y diseños.

2.4.2.1. Parámetros de diseño

La velocidad de diseño será entre 50 y 60 (Km/ h), radio de curvatura mínimo de 73 m para una velocidad de 50 km/h y de 113 m para una velocidad de 60 km/h. La distancia de visibilidad de parada mínima adoptada para el proyecto es de 65 m en los tramos de terreno ondulado y 85 m en los tramos sobre terreno plano, distancia de visibilidad de adelantamiento mínima adoptada es de 345 m y 410 en tramos sobre terreno plano. El diseño en planta de la vía consta de elementos geométricos que permiten la operación segura, entre ellos se encuentra el radio de curvatura mínimo que para este caso teniendo una velocidad de 50 km/h es de 73 m y para una velocidad de 60 km/h es de 113 m. La pendiente longitudinal mínima es de 0.3% teniendo en cuenta que la vía se ubica en un terreno plano y la pendiente longitudinal máxima es de 6%.

El transito promedio diario (TPD) es de 213 vehículos diarios y el número de ejes equivalentes de 8.2 ton para un periodo de diseño de 10 años es de 172309.

Se diseñarán 20 estructuras de drenaje box cultvers con un periodo de retorno de 20 años.

2.4.2.2. Parámetros geométricos

La vía es considerada vía terciaria, con carriles en dos direcciones cuyo ancho de calzada es de 7 m, compuesta por bermas de 0.5 m y carriles de 3.0 m. El sistema cuenta con cunetas de sección triangular de 1.0 m, distribuido 0.96 m al lado de la calzada y 0.04 m del lado del talud y 0.20 m de profundidad, obteniendo así una pendiente lateral de 20.8%

2.4.3. Características técnicas del proyecto N°558 de 2022.

Si bien es cierto que, existen unos diseños iniciales, dentro del proyecto se incluyó una actividad denominada "*Revisión y/o ajuste a estudios y diseños (Placa huella, Pavimento y estructuras de drenaje)*", de cuyo resultado, surgirá la versión final de los estudios y diseños.

2.4.3.1. Parámetros de diseño

La velocidad de diseño será de 60 km/h para los tramos en terreno plano y de 50 km/h para los tramos en terreno ondulado, el radio de curvatura mínimo de 73 m para una velocidad de 50 km/h y de 113 m para una velocidad de 60 km/h. La distancia de visibilidad de parada mínima adoptada para el proyecto es de 65 m en los tramos de terreno ondulado y 85 m en los tramos sobre terreno plano, distancia de visibilidad de adelantamiento mínima adoptada es de 345 m y 410 m en tramos sobre terreno plano. El diseño en planta de la vía consta de elementos geométricos que permiten la operación segura, entre ellos se encuentra el radio de curvatura mínimo que para este caso teniendo una velocidad de 50 km/h es de 73 m y para una velocidad de 60 km/h es de 113 m. La pendiente longitudinal mínima es de 0.3% teniendo en cuenta que la vía se ubica en un terreno plano y la pendiente longitudinal máxima es de 6%.
El transito promedio diario (TPD) es de 706 vehículos diarios y el número de ejes equivalentes de 8.2 ton para un periodo de diseño de 10 años es de 6153044 ejes.
Se diseñaron 10 estructuras de drenaje box cultvers con un periodo de retorno de 20 años cuyas dimensiones son de 1.0 m x 1.0m.

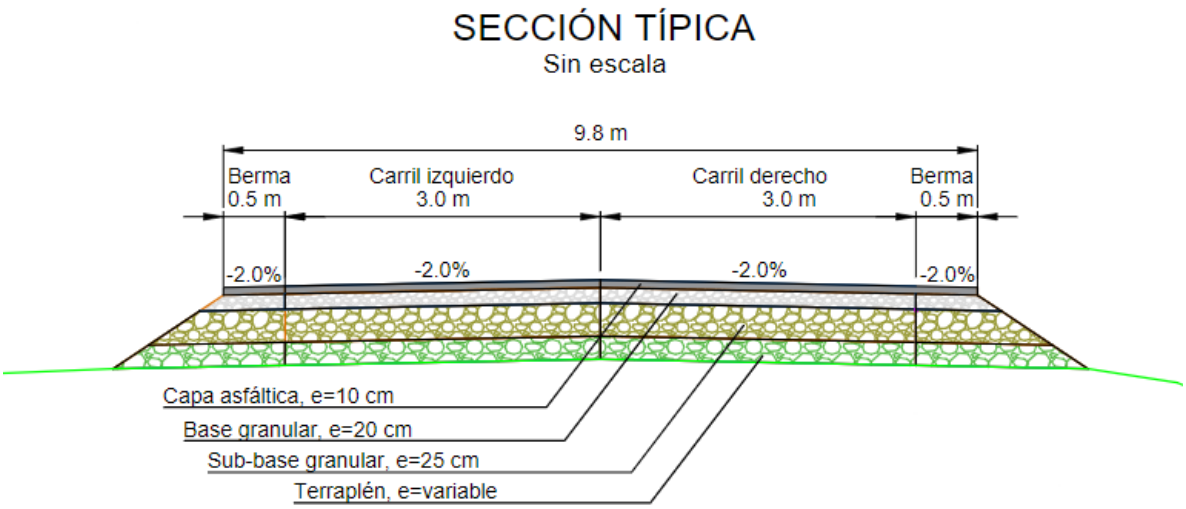


Ilustración 13. Sección típica de la vía.

2.4.3.2. Parámetros geométricos

La vía es considerada vía terciaria, con carriles en dos direcciones cuyo ancho de calzada es de 7 m, compuesta por bermas de 0.5 m y carriles de 3.0 m. El sistema cuenta con cunetas de sección triangular de 1.0 m, distribuido 0.96 m al lado de la calzada y 0.04 m del lado del talud y 0.20 m de profundidad, obteniendo así una pendiente lateral de 20.8%.

3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA

El contrato de interventoría está elaborado para dar seguimiento y control a tres contratos de obra a ejecutar en dos Municipios, Magangué (dos contratos) y Achí (Un contrato). Los cuales se encuentran en el siguiente estado a la fecha, tal como se evidencia en la siguiente tabla.

Municipio	Estado	No. Contrato	Contratista
Achí	En ejecución	L.P.006 de 2022	CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK
Magangué (Cascajal, Ceibal, La Pascuala)	En ejecución	557 de 2022	CONSORCIO SAN RAFAEL
Magangué (San Rafael de Cortina)	Finalizado	558 de 2022	CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUÉ

Tabla 1 Información del estado de los Contratos de Obra

A continuación, se hace un recuento detallado de cada uno de los contratos y su estado de ejecución contractual

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

3.1.1. Información general del contrato de obra L.P 006 de 2022 – municipio de Achí.

CONDICIONES – CONTRATO DE OBRA L.P.006 DE 2022	
Número de contrato:	L.P.006 DE 2022
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORREGIMIENTO DE LOS NÍSPEROS HASTA EL CORREGIMIENTO DE SINCERIN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACHÍ – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
Contratista:	CONSORCIO VÍA LOS NÍSPEROS JK JAVIER JOSE DOMINGUEZ 40% - KABOB EXECUTIVE GROUP S.A.S 60%
NIT	901.627.819-5
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	10 de agosto de 2022
Valor Inicial:	$8.085.806.846.00
Fecha de inicio:	29 de noviembre de 2022
Fecha de terminación contractual:	29 de mayo de 2023
Fecha de terminación actual:	29 de septiembre de 2024
Prorroga 1:	Un (1) mes a partir del 29 de mayo de 2023
Prorroga 2:	Cuatro (4) meses a partir del 29 de junio de 2023
Suspensión 1:	Un (1) mes a partir del 29 de octubre de 2023
Acta de reinicio:	25 de noviembre de 2023
Prorroga 3:	Un (1) mes a partir del 29 de noviembre de 2023
Prorroga 4:	Tres (3) meses a partir del 29 de diciembre de 2023
Prorroga 5:	Cuatro (4) meses a partir del 29 de marzo de 2024
Prorroga 6:	Dos (2) meses a partir del 29 de julio de 2024
Plazo inicial:	Seis (6) meses
Plazo total:	Veintidós (22) meses

Tabla 2 Información Contrato de Obra L.P.006 DE 2022 Municipio de Achí.

3.1.2. Información general del contrato de obra 557 de 2022 – municipio de Magangué

CONDICIONES – CONTRATO DE OBRA 557 DE 2022	
Número de contrato:	557 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE CASCAJAL HASTA EL CORREGIMIENTO DE LA PASCUALA DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
Contratista:	CONSORCIO SAN RAFAEL, conformado por, PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S 90% - A.S.S. CONSTRUCTORA S.A.S. 10%.
NIT:	901.613.519-1
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	15 de julio de 2022
Valor Inicial:	$22.888.390.685.00
Fecha de inicio:	24 de octubre de 2022
Fecha de terminación inicial:	24 de abril de 2024
Fecha de terminación actual:	24 de diciembre de 2024
Prorroga 1:	Tres (3) meses a partir del 24 de abril de 2024
Prorroga 2:	Cinco (5) meses a partir del 24 de julio de 2024
Plazo inicial:	Dieciocho (18) meses
Plazo final	Veintiséis (26) meses
Fecha adición:	29 de noviembre de 2023
Adición:	$10.180.710.000.00
Dirección:	Marbella, Cra 3# 46-57, Edificio Laguna 46, Oficina 1401
No. De teléfono:	(5) 643 6418

Tabla 3 Información Contrato de Obra 557 de 2022 Municipio de Magangué vía que conduce desde Cascajal hasta La Pascuala.

3.1.3. Información general del contrato de obra 558 de 2022 – municipio de Magangué

CONDICIONES INICIALES - CONTRATO DE OBRA 558 DE 2022	
Número de contrato:	558 DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA EL CORREGIMIENTO DE LA SAN RAFAEL DE CORTINAS DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
Contratista:	CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUÉ, conformado por: CONSTRUCSION S.A.S. 90% - SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIANOS S.A.S. 10%
NIT:	901.613.672-9
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha del Contrato:	15 de julio de 2022
Valor Inicial:	$12.301.199.730.00
Fecha de inicio:	19 de octubre de 2022
Fecha de terminación contractual:	18 de enero de 2024
Fecha de terminación actual:	30 de julio de 2024
Fecha adición:	14 de diciembre de 2023
Adición:	$5.470.830.000.00
Prorroga 1:	Tres (3) meses a partir del 18 de enero de 2023
Prorroga 2:	Dos (2) meses a partir del 18 de abril de 2024
Prorroga 3:	Cuarenta y tres (43) días a partir del 17 de junio de 2024
Plazo inicial:	Quince (15) meses
Plazo total:	Veinte (20) meses y cuarenta y tres (43) días
Dirección:	Av Pedro de Heredia Calle 31 No. 50 – 122 Edificio Torre Sion Of. 301
No. De teléfono:	(205)5091845

Tabla 4.Información contrato de obra 558 de 2022 vía que conduce desde el municipio de Magangué hasta el corregimiento de San Rafael de Cortinas.

3.2. Descripción de las Actividades Ejecutadas en el mes.

3.2.1. Descripción de las Actividades Ejecutadas en el mes contrato L.P.006 de 2022

El contratista continúa con actividades de mejoramiento de la vía de acceso a la obra, afectada a causa de las fuertes lluvias, acopio de material pétreo, vaciado de concreto para placas rígidas, ciclópeas y vigas riostras, conformación del terreno, instalación de rieles para cunetas, realiza envío de reprogramación de obra.

El contratista realizo bordillos

El municipio de Achí realiza prorroga N°6 con una duración de dos (2) meses para una fecha de terminación del contrato 29 de septiembre de 2024.

Se presentan lluvias durante el mes.

La Tabla 5 muestra el control de la inversión y de los saldos de cada una de las actividades, provisiones y gestiones.

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR ACTUALIZADO (Según última acta de modificación)	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
Sub-total básico de obra	$ 8.038.849.320	N/A	$ 960.105.258,70	$ 1.560.076.972,61	$ 6.478.772.347
Obras de compensación ambiental y/o complementarias (PAGA)	$ 16.372.622	N/A	$ 0	$ 0	$ 16.372.622
Revisión y/o ajustes a estudios y diseños (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	$ 25.701.600	N/A	$ 0	$ 20.561.280	$ 5.140.320
IVA - Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificacion y/o complementación de estudios y diseños.	$ 4.883.304	N/A	$ 0	$ 3.906.643	$ 976.661
Total estudios y diseños, revisión, ajuste y /o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños	$ 30.584.904	N/A	$ 0	$ 24.467.923	$ 6.116.981
VALOR TOTAL	**$ 8.085.806.846**		**$ 960.105.258,70**	**$ 1.584.544.895,81**	**$ 6.501.261.950**

Tabla 5. Saldos de cada una de las actividades para el control de la inversión L.P.006 de 2022.

Etapa de estudios y diseños.

La interventoría está a la espera de la respuesta a la subsanación de la revisión y/o ajustes a estudios y diseños (Geométrico, hidrológico e hidráulico, geotécnico y de pavimento) entrega del PAGA a los cuales la interventoría, mediante el comunicado GIC-INVIAS-BOL-547-22, realiza solicitud de la cartografía del área de influencia directa, planos de localización del proyecto, formatos requeridos en el manual de interventoría y anexos cartográficos.

3.2.2. Descripción de las Actividades Ejecutadas en el mes Contrato 557 de 2022.

Semana del 28 de junio al 04 de julio de 2024: armado de la formaleta de la losa del puente en el k0+780, descimbre de las formaletas de las vigas del puente en el k0+780, corte y figurado del acero de refuerzo de la placa del puente en el k0+780, construcción de cunetas, arreglo del desvío del boxcoulvert en el k6+700, habilitado el acceso de motos y vehículos livianos al boxcoulvert en abscisa k6+700, arreglos de la vía en el k9+540, fundida de los muros de boxcoulvert en el k10+470 y se realiza acopio e instalación de material de subbase y base granular.

Fuertes lluvias durante la semana.

Se reporta un atraso del 23% teniendo en cuenta la fecha de finalización 24 de julio de 2024, sin embargo, se adelanta la gestión de una prórroga para el contrato n°557 de 2022 debido a un adicional del 44% al presupuesto para dar mayor alcance.

Semana del 5 al 11 de julio de 2024: arreglo de desvió en el puente del k8+640, compactación de hombros del terraplén, excavaciones para fundir solado de alcantarilla en el k8+325, armado de acero de las vigas de refuerzo del puente en el k0+780, fundida de la losa del boxcoulvert en el k6+800, instalación de acero de refuerzo de vigas del puente en el k0+780, se realiza acopio e instalación de material de subbase y base granular y se realiza arreglo de la entrada del acopio de materiales.

El contratista dio respuesta al llamado de atención de la interventoría por deficiencias en la construcción de desvíos temporales de obras hidráulicas.

Semana del 12 al 18 de julio de 2024: limpieza de árboles caídos en la vía a causa de vendaval, relleno y compactación de los accesos y arreglo de desvío de boxcoulvert en el K6+700, fundida de guarda rueda y aletas de boxcoulvert en el k10+470, relleno y compactación de los accesos de boxcoulvert en el K6+700 con material de terraplén, construcción de cunetas, compactación de hombros del terraplén, construcción de tierra armada del puente en el K0+780 y se realiza acopio de material de subbase y base granular.

Se reporta un atraso del 26,64% teniendo en cuenta la fecha de finalización 24 de julio de 2024, sin embargo, se adelanta la gestión de una prórroga para el contrato N°557 de 2022 debido a un adicional del 44% al presupuesto para dar mayor alcance.

Semana del 19 al 25 de julio de 2024: se realiza armado de los guardarueda del puente en el k0+780, relleno y compactación de los accesos y arreglo de desvío de boxcoulvert en el k10+470, fundida de guardarueda de puente en el k0+780, relleno y compactación de los accesos de boxcoulvert en el k6+700 con material de terraplén, se convoca comité de seguimiento N°17 con la veeduría, construcción de tierra armada y dique con sacos de tierra para evitar el paso del agua lluvia en la excavación del acceso del puente en el k0+780 y se realiza acopio y extensión de material de subbase y base granular.

Se realiza prórroga de cinco (5) meses para el contrato N°557 de 2022 debido a un adicional del 44% al presupuesto para dar mayor alcance.

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR ACTUALIZADO (Según última acta de modificación)	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
Sub-total básico de obra	$ 22.790.815.161	$ 32.971.525.180	$ 2.582.516.279,00	$ 22.924.254.929	$ 10.047.270.251
Obras de compensación ambiental y/o complementarias (PAGA)	$ 21.995.505	$ 21.995.505	$ 0	$ 0	$ 21.995.505
Revisión y/o ajustes a estudios y diseños (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	$ 50.580.000	$ 50.580.000	$ 0	$ 13.595.904	$ 36.984.096
IVA - Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificacion y/o complementación de estudios y diseños.	$ 25.000.000	$ 25.000.000	$ 0	$ 2.583.221,76	$ 22.416.778
Total estudios y diseños, revisión, ajuste y /o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños	$ 75.580.000	$ 75.580.000	$ 0	$ 16.179.126	$ 59.400.874
VALOR TOTAL	**$ 22.888.390.666**	**$ 33.069.100.685**	**$ 2.582.516.279,00**	**$ 22.940.434.054,29**	**$ 10.128.666.631**

Tabla 6. Saldos de cada una de las actividades para el control de la inversión 557 de 2022.

3.2.3. Descripción de las Actividades Ejecutadas en el mes Contrato 558 de 2022.

Semana del 28 de junio al 04 de julio de 2024: continúan las actividades de fundida de cunetas, construcción de obras de protección, construcción de piedra pegada para estabilización de taludes y limpieza del corredor vial.

Semana del 05 de al 11 de julio de 2024: continúan las actividades de fundida de cunetas, construcción de obras de protección, construcción de piedra pegada para estabilización de taludes y limpieza del corredor vial.

Semana del 12 de al 18 de julio de 2024: continúan las actividades de fundida de cunetas, construcción de obras de protección, instalación de señales verticales, construcción de piedra pegada para estabilización de taludes y limpieza del corredor vial.

Semana del 19 al 25 de julio de 2024: el contratista realiza la instalación de señales verticales y demarcación con pintura en frio.

La siguiente Tabla. muestra el control de la inversión y de los saldos de cada una de las actividades, provisiones y gestiones.

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR ACTUALIZADO (Según última acta de modificación)	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
Sub-total básico de obra	$ 12.222.705.570	$ 17.693.535.570	$ 5.427.856.130	$ 16.875.132.706	$ 818.402.865
Obras de compensación ambiental y/o complementarias (PAGA)	$ 37.016.472	$ 37.016.472	$ 0	$ 0	$ 37.016.472
Revisión y/o ajustes a estudios y diseños (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	$ 34.855.200	$ 34.855.200	$ 0	$ 6.971.040	$ 27.884.160
IVA - Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificacion y/o complementación de estudios y diseños.	$ 6.622.488	$ 6.622.488	$ 0	$ 1.324.498	$ 5.297.990
Total estudios y diseños, revisión, ajuste y /o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños	$ 41.477.688	$ 41.477.688	$ 0	$ 8.295.538	$ 33.182.150
VALOR TOTAL	**$ 12.301.199.730**	**$ 17.772.029.730**	**$ 5.427.856.130,33**	**$ 16.883.428.244**	**$ 888.601.487**

Tabla 7. Saldos de cada una de las actividades para el control de la inversión 558 de 2022.

3.3. Seguimiento Ítems No Previstos

3.3.1. Seguimiento Ítems No previstos contrato L.P.006 de 2022.

Los ítems existentes en las condiciones contractuales de los contratos de obra objetos del presente informe, fueron incluidos por parte de la Entidad Estatal en la etapa de planeación y contemplados en el valor total presupuestado para el Proceso de Contratación. A la fecha del presente informe no se han contemplado ítems no previstos.

3.3.2. Seguimiento Ítems No Previstos contrato 557 de 2022.

Durante la ejecución del contrato de obra, se identificaron diversos elementos no contemplados en el presupuesto inicial, lo que ha generado la necesidad de realizar ajustes y revisiones en la gestión financiera del proyecto. A continuación, se muestran los Ítems no previstos presentados durante la ejecución del proyecto.

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				Acta No 3		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ÍTEMS NO PREVISTOS						$ 572.401.465,14		$ 572.401.465,00
OBRAS DE PROTECCIÓN								
NP56	Empradizado de taludes	m2		$ 9.953,76	3390,00	$ 33.743.229,69	3390,00	$ 33.743.230
NP57	RECUBRIMIENTO CON PIEDRA PEGADA Y MORTERO 1:4 de e= 10 cm	m2		$ 85.558,81	5564,30	$ 476.074.870,41	5564,30	$ 476.074.870
NP58	REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE	ml		$ 2.386,81	2783,06	$ 6.642.622,56	2783,06	$ 6.642.623
NP59	CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE MADERA	ml		$ 20.028,91	2793,00	$ 55.940.742,48	2793,00	$ 55.940.742
PUENTES								
NP 60	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1,0 M (incluye acero de refuerzo según	ml		$ 3.980.718,00				
NP 61	Baranda metalica para trafico vehicular	ml		$ 1.905.492,00				
NP 62	IZAJE DE VIGAS	Und		$ 79.963.421,00				

3.3.3. Seguimiento Ítems No Previstos contrato 558 de 2022.

Durante la ejecución del contrato de obra, se identificaron diversos elementos no contemplados en el presupuesto inicial, lo que ha generado la necesidad de realizar ajustes y revisiones en la gestión financiera del proyecto. A continuación, se muestran los Ítems no previstos presentados durante la ejecución del proyecto.

N. ITEM NO PREVISTOS										$ 1.155.223.844		$ 736.479.520,00		$ 736.479.520
NP1	201,16			Remoción de cerca de alambre	ml		$ 2.352,00		3654	$ 8.594.208	3145,00	$ 7.397.040,00	3145,00	$ 7.397.040
NP2	630,7			Concreto de resistencia 14Mpa (G) - Ciclópeo	m3		$ 510.392,00		81,2	$ 41.443.830		$ -		$ -
NP3	800,1			Cerca de alambre de púas con postes de madera	ml		$ 20.011,00		3654	$ 73.120.194	3145,00	$ 62.934.595,00	3145,00	$ 62.934.595
NP4	particular			Recubrimiento con piedra pegada y mortero 1:4 de e= 10 cm	m2		$ 83.137,00		4908,156301	$ 408.049.390	4125,00	$ 342.940.125,00	4125,00	$ 342.940.125
NP5	681,1			Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3		$ 556.210,00		254	$ 141.277.340	144,00	$ 80.094.240,00	144,00	$ 80.094.240
NP6	particular			Mejoramiento de la subrasante con piedra e=0.3 m	m2		$ 94.541,00		187,5	$ 17.726.438		$ -		$ -
NP7	673,1			Geotextil Tipo NT-4000 o similar no tejido	m2		$ 22.213,00		3600	$ 79.966.800	2160,00	$ 47.980.080,00	2160,00	$ 47.980.080
NP8	673,2			Material Granular Drenante	m3		$ 330.836,00		800	$ 264.670.400	480,00	$ 158.802.240,00	480,00	$ 158.802.240
NP9	particular			Tubería para filtros de 6" Perforada	ml		$ 66.552,00		1000	$ 60.552.000	600,00	$ 36.331.200,00	600,00	$ 36.331.200
NP10	particular			RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-60 (anteriormente CRR-1)	m2		$ 2.101,00		28473,7	$ 59.823.244		$ -		$ -

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

3.4.1. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría contrato L.P.006 de 2022.

A la fecha de elaboración del presente informe mensual de Interventoría No. 23 (del 1 de julio al 31 de julio de 2024), **GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**. realizó lo siguiente:

- ✓ Elaboración de informes semanales 94, 95, 96 y 97 seguimiento a las obligaciones del municipio de acuerdo con el convenio administrativo No. 1895 de 2021.
- ✓ Vigilancia y control ante el cumplimiento de los términos y condiciones del contrato.
- ✓ Control de cumplimiento de los términos y condiciones del contrato, se realiza además seguimiento a las obligaciones del municipio de acuerdo al convenio interadministrativo no. 1895 de 2021.
- ✓ Solicitud de prorroga al contrato de interventoría 973 de 2022
- ✓ Conminación al municipio sobre los estados de cuenta y reintegro de rendimientos financieros del convenio 1895 de 2021.
- ✓ Solicitud de proceso sancionatorio CTO L.P.006 de 2022.
- ✓ Se realiza comité extraordinario el 28 de junio de 2024 en invias planta central.
- ✓ Solicitud de cumplimiento de compromisos pactados en comité día 28 de junio, se realiza presencia en el corredor vial para supervisión.
- ✓ Se solicita al contratista acelerar las actividades de mejoramiento de acceso para continuar con la normalidad de actividades en obra.
- ✓ Se realizan observaciones al plan de contingencia.
- ✓ Presencia en el corredor vial para supervisión.
- ✓ De acuerdo con el comité de seguimiento realizado el 28 de junio en invias planta central y los compromisos pactados en él, la alcaldía se encuentra condicionando el acceso a la obra para que el contratista pueda continuar con el desarrollo de las actividades de obra y de acuerdo al avance de esta, el día 20 de julio de 2024 se definirá la viabilidad de una posible prórroga para el contratista.
- ✓ Replanteo topográfico de ejes y niveles.
- ✓ Se realiza observación al contratista de habilitar vías alternas para el paso de vehículos.
- ✓ La buena compactación del material y el uso de rieles en buen estado.

El estado de avance ejecutado acumulado hasta el día 31 de julio de 2024, es del 34.80%.

1 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024					
	VALOR DEL PROYECTO			$ 8.085.806.846	
MES		OBRA PROGRAMADA		OBRA EJECUTADA	
		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
JUL	%	16.2%	98.14%	0.04%	34.80%
	VALOR	$1.309.900.709,05	$7.935.410.838,66	$3.234.322,73	$2.813.860.782,4

Tabla 8. Estado de avance ejecutado CTO L.P.006 de 2022.

3.4.2. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría contrato 557 de 2022.

A la fecha de elaboración del presente informe mensual de Interventoría No. 23 (del 1 de julio al 31 de julio de 2024), **GAVINCO INGENIEROS CONSUSTORES S.A.S**. realizó lo siguiente:

- ✓ Se han adelantado actividades de elaboración de informes semanales, 96, 97, 98 y 99; vigilancia y control ante el cumplimiento de los términos y condiciones del contrato y seguimiento a las obligaciones del municipio de acuerdo con el convenio administrativo no. 1897 de 2021.
- ✓ Vigilancia y control ante el cumplimiento de los términos y condiciones del contrato.
- ✓ Inspecciones de las actividades realizadas en obra.
- ✓ Se realiza vigilancia y control ante el cumplimiento de los términos y condiciones del contrato y seguimiento a las obligaciones del municipio de acuerdo al convenio interadministrativo no. 1897 de 2021.
- ✓ Solicitud de prórroga del contrato de interventoría 973 de 2022.
- ✓ Solicitud del estado de cuenta y entrega de rendimientos financieros del convenio 1897 de 2021.
- ✓ Se realiza llamado de atención al contratista por deficiencias presentadas en la construcción de desvíos temporales de las obras hidráulicas en construcción.
- ✓ Respuesta a comunicación CSR-557-060- entrega de ajustes del PAGA, se remite paga CTO 557 de 2022 a la subdirección de sostenibilidad.

El estado de avance ejecutado acumulado hasta el día 30 de julio de 2024, es del 72.50%.

1 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024					
	VALOR DEL PROYECTO			$ 33.069.100.685	
MES		OBRA PROGRAMADA		OBRA EJECUTADA	
		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
JUL	%	72.50%	72.50%	7.17%	72.50%
	VALOR	$23.975.097.996,62	$23.975.097.996,62	$2.371.054.519,11	$23.975.097.996,62

Tabla 9. Estado de avance ejecutado CTO 557 de 2022.

3.4.3. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría contrato 558 de 2022.

A la fecha de elaboración del presente informe mensual de Interventoría No. 23 (del 1 de julio al 31 de julio de 2024), **GAVINCO INGENIEROS CONSUSTORES S.A.S**. realizó lo siguiente:

- ✓ Se han adelantado actividades de elaboración de informes semanales, 96, 97, 98 y 99; vigilancia y control ante el cumplimiento de los términos y condiciones del contrato y seguimiento a las obligaciones del municipio de acuerdo con el convenio administrativo no. 1898 de 2021.
- ✓ Seguimiento y control de avances.
- ✓ Inspecciones SST a las actividades realizadas por el contratista.
- ✓ Vigilancia y control ante el cumplimiento de los términos y condiciones del contrato.
- ✓ Seguimiento a las obligaciones del municipio de acuerdo al convenio interadministrativo No. 1897 de 2021
- ✓ Se realiza presencia en obra para control de las actividades del contratista.
- ✓ Solicitud de prórroga del contrato de interventoría.
- ✓ Interventoría, solicitud del estado de cuenta y reintegro de los rendimientos financieros del convenio 1898 de 2021.

El estado de avance ejecutado acumulado hasta el día 31 de julio de 2024, es del 99.56%.

1 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024					
	VALOR DEL PROYECTO			$ 17.772.029.730	
MES		OBRA PROGRAMADA		OBRA EJECUTADA	
		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
JUL	%	1.08%	99.56%	1.33%	99.56%
	VALOR	$191.937.921,08	$17.693.832.799,1	$236.367.995,40	$17.693.832.799,1

Tabla 10. Estado de avance ejecutado CTO 558 de 2022.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

Reportes ejecución mensual contrato de obra L.P 006 de 2022 – municipio de Achí

No.	Contenido	Formato	Observación
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	Aplica
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	Aplica
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	Aplica
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	Aplica
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	Aplica
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	Aplica
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	Aplica

4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	Aplica
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2	No aplica – El Contrato de Obra Pública L.P. 006 de 2022, no presenta anticipo ni pago por anticipado
	• Seguimiento Programa de Obra		Aplica
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	Aplica
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	Aplica
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	Aplica
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	Aplica
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		Aplica
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		Aplica
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.		Aplica
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		Aplica

Tabla 11. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA L.P 006 DE 2022 – MUNICIPIO DE ACHÍ.

Reportes ejecución mensual contrato de obra No. 557 de 2022 – municipio de Magangué – Lote 1.

No.	Contenido	Formato	Observación
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	Aplica
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	Aplica
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	Aplica
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	Aplica
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	Aplica
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	Aplica
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	Aplica
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	Aplica
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	No aplica – El Contrato de Obra Pública 557 de 2022, no presenta anticipo ni pago por anticipado
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	

	• Seguimiento Programa de Obra		Aplica
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	Aplica
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	Aplica
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	Aplica
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	Aplica
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		Aplica
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		Aplica, se anexa el registro fotográfico correspondiente a las actividades en obra.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.		Aplica, se anexa el registro fotográfico correspondiente a las actividades en obra.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		Aplica, se anexa copia de bitácora correspondiente a las actividades en obra.

Tabla 12. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA No. 557 DE 2022 – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – LOTE 1.

Reportes ejecución mensual contrato de obra no. 558 de 2022 – Municipio de Magangué – Lote2.


No.	Contenido	Formato	Observación
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	Aplica
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	Aplica
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	Aplica
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	Aplica
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	Aplica
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	Aplica
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	Aplica
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	Aplica
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	No aplica – El Contrato de Obra Pública 557 de 2022, no presenta anticipo ni pago por anticipado
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	

	• Seguimiento Programa de Obra		Aplica
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	Aplica
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	Aplica
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	Aplica
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	Aplica
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		Aplica
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		Aplica, se anexa el registro fotográfico correspondiente a las actividades en obra.
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.		Aplica, se anexa el registro fotográfico correspondiente a las actividades en obra.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		Aplica, se anexa copia de bitácora correspondiente a las actividades en obra.

Tabla 13. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA No. 558 DE 2022 – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – LOTE 2.

4.1. INFORME SEMANAL

4.1.1. MUNICIPIO DE ACHÍ – BOLÍVAR CONTRATO N° L.P.006 DE 2022.

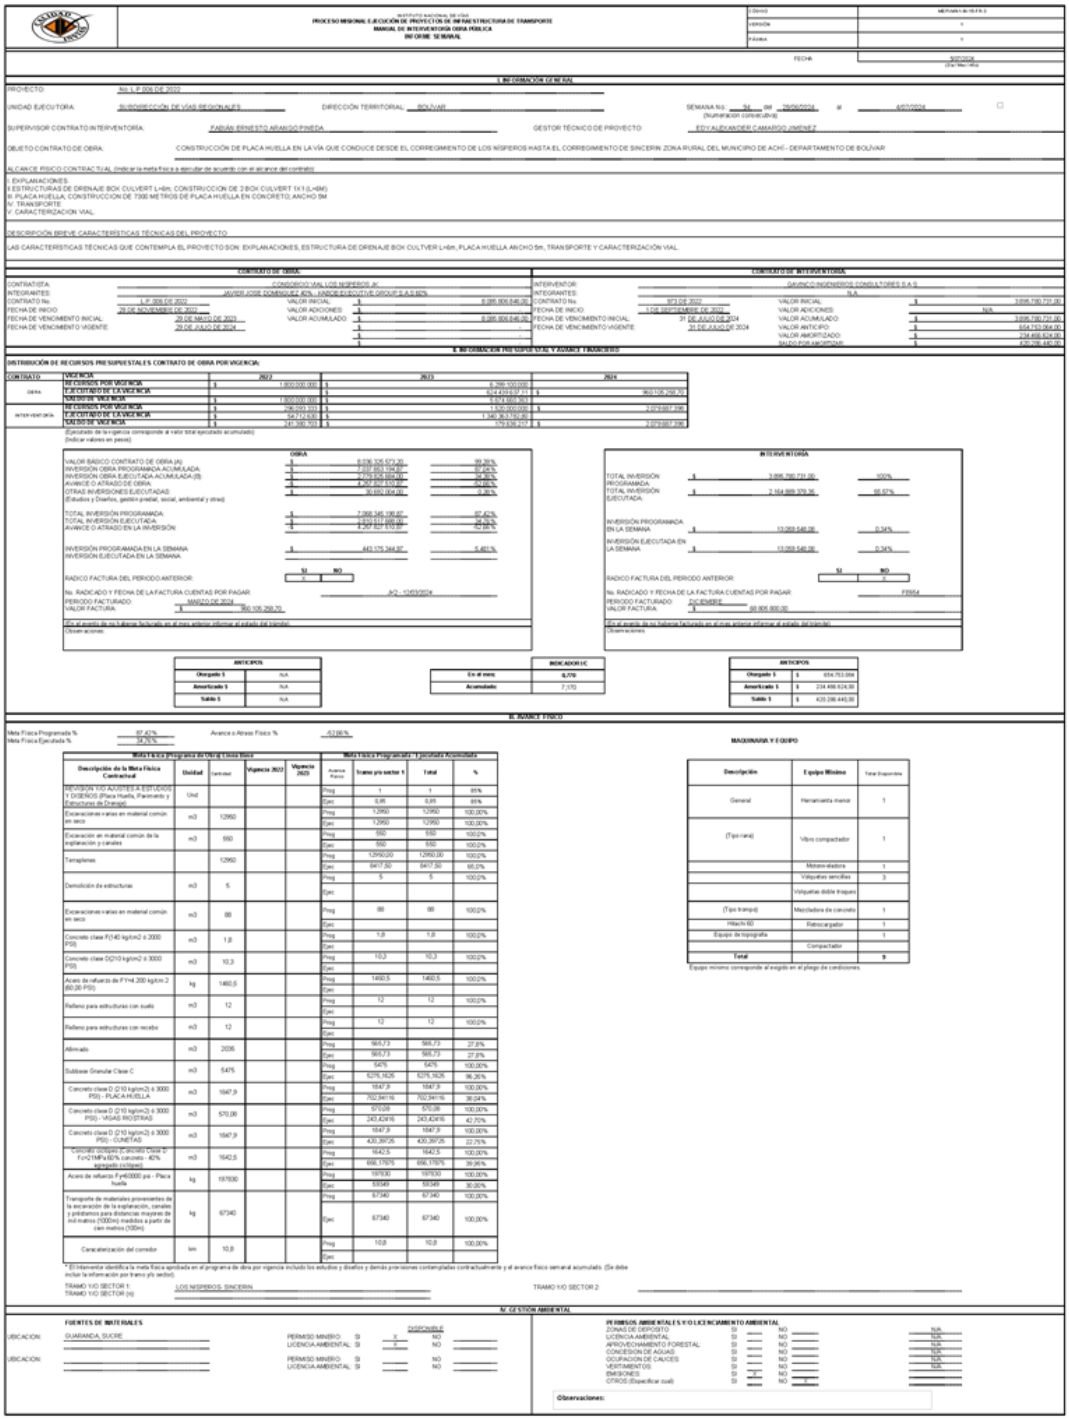

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: No L.P 006 DE 2022

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No: 94 del 29/06/2024 al 4/07/2024

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PIÑEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORREGIMIENTO DE LOS NÍSPEROS HASTA EL CORREGIMIENTO DE SINCERÍN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACHÍ - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato)

I. EXPLANACIONES
II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT L=6m; CONSTRUCCION DE 2 BOX CULVERT 1X1 (L=6M)
III. PLACA HUELLA, CONSTRUCCION DE 7300 METROS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO, ANCHO 5M
IV. TRANSPORTE
V. CARACTERIZACION VIAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE CONTEMPLA EL PROYECTO SON: EXPLANACIONES, ESTRUCTURA DE DRENAJE BOX CULTVER L=6m, PLACA HUELLA ANCHO 5m, TRANSPORTE Y CARACTERIZACIÓN VIAL.

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL LOS NISPEROS JK
INTEGRANTES: JAVIER JOSE DOMINGUEZ 40% - KINDOR EJECUTIVE GROUP S.A.S 60%
CONTRATO No: L.P. 006 DE 2022 — VALOR INICIAL: $ 8.396.906.646,26
FECHA DE INICIO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 29 DE MAYO DE 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 8.396.906.646,26
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 29 DE JULIO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES: N.A.
CONTRATO No: 973 DE 2022 — VALOR INICIAL: $ 3.896.790.731,00
FECHA DE INICIO: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 — VALOR ADICIONES: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE JULIO DE 2024 — VALOR ACUMULADO: $ 3.896.790.731,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2024 — VALOR ANTICIPO: $ 654.753.064,00
VALOR AMORTIZADO: $ 234.468.624,00
SALDO POR AMORTIZAR: $ 420.286.440,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.800.000.000	$ 6.396.100.000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$	$ 614.439.637,11	$ 960.106.268,70
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.800.000.000	$ 5.813.660.363	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 796.890.333	$ 1.530.300.000	$ 2.029.887.398
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 54.712.630	$ 140.363.732,80	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 741.360.703	$ 179.936.267	$ 2.029.887.398

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 8.236.325.573,26	99,26%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 7.207.653.194,80	87,42%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.259.305.564,00	27,39%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -4.267.897.630,80	-51,80%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otros)	$ 30.880.564,00	0,36%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 7.268.345.190,87	87,42%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.633.517.999,00	31,93%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -4.267.827.630,80	-51,75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$ 443.175.344,97	5,401%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI — NO X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2472 - 10/05/2024
PERIODO FACTURADO: MARZO DE 2024
VALOR FACTURA: $ 260.105.268,70

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.896.790.731,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.164.889.379,36	55,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$ 13.068.546,06	0,34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	$ 13.068.546,06	0,34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI — NO X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FB954
PERIODO FACTURADO: 7 DICIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 68.906.800,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS

Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I.C

En el mes:	0,370
Acumulado:	7,170

ANTICIPOS

Otorgado $	$ 654.753.064
Amortizado $	$ 234.468.624,00
Saldo $	$ 420.286.440,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 87,42% — Avance o Atraso Físico %: -12,66%
Meta Física Ejecutada %: 74,76%

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Total	%
REVISION Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	Und				Prog	1	1	85%
					Ejec	0,85	0,85	85%
Excavaciones varias en material común en seco	m3	12950			Prog	12950	12950	100,00%
					Ejec	12950	12950	100,00%
Excavación en material común de la explanación y canales	m3	550			Prog	550	550	100,0%
					Ejec	550	550	100,0%
Terraplenes		12950			Prog	12950,00	12950,00	100,0%
					Ejec	8417,50	8417,50	65,0%
Demolición de estructuras	m3	5			Prog	5	5	100,0%
					Ejec			
Excavaciones varias en material común en seco	m3	88			Prog	88	88	100,0%
					Ejec			
Concreto clase F(f'c40 kg/cm2 ó 3000 PSI)	m3	1,8			Prog	1,8	1,8	100,0%
					Ejec			
Concreto clase D(f'c10 kg/cm2 ó 3000 PSI)	m3	10,3			Prog	10,3	10,3	100,0%
					Ejec			
Acero de refuerzo de FY=4.200 kg/cm 2 (60.00 PSI)	kg	1460,5			Prog	1460,5	1460,5	100,0%
					Ejec			
Relleno para estructuras con suelo	m3	12			Prog	12	12	100,0%
					Ejec			
Relleno para estructuras con recebo	m3	12			Prog	12	12	100,0%
					Ejec			
Afirmado	m3	2035			Prog	565,73	565,73	27,8%
					Ejec	565,73	565,73	27,8%
Subbase Granular Clase C	m3	5475			Prog	5475	5475	100,00%
					Ejec	5275,1625	5275,1625	96,35%
Concreto clase D (210 kg/cm2) ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA	m3	1647,9			Prog	1647,9	1647,9	100,00%
					Ejec	702,34116	702,34116	36,04%
Concreto clase D (210 kg/cm2) ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS	m3	570,08			Prog	570,08	570,08	100,00%
					Ejec	243,42416	243,42416	42,70%
Concreto clase D (210 kg/cm2) ó 3000 PSI) - CUNETAS	m3	1647,9			Prog	1647,9	1647,9	100,00%
					Ejec	430,39725	430,39725	22,75%
Concreto ciclopeo (Concreto clase M f'c=21MPa 60% concreto - 40% agregado ciclopeo)	m3	1642,5			Prog	1642,5	1642,5	100,00%
					Ejec	656,17575	656,17575	39,96%
Acero de refuerzo Fy=60000 psi - Placa huella	kg	197630			Prog	197630	197630	100,00%
					Ejec	69349	69349	35,09%
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000m) medidos a partir de cien metros (100m).	kg	67340			Prog	67340	67340	100,00%
					Ejec	67340	67340	100,00%
Caracterización del corredor	km	10,8			Prog	10,8	10,8	100,00%
					Ejec			

(*) El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás previstos contemplados contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: LOS NISPEROS- SINCERIN — TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
General	Herramienta menor	1
(Tipo viaje)	Vibro compactador	1
	Motoniveladora	1
	Volquetas sencillas	3
	Volquetas doble troques	
(Tipo trompo)	Mezcladora de concreto	1
Hitachi 60	Retrocargador	1
Equipo de topografía		1
	Compactador	1
Total		9

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACION:	GUARANDA, SUCRE	PERMISO MINERO: SI X NO		
		LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO		
UBICACION:		PERMISO MINERO: SI NO		
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO		

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI	NO	N/A
CONCESION DE AGUAS	SI	NO	N/A
OCUPACION DE CAUCES	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS	SI	NO	N/A
EMISIONES	SI X	NO	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	

Observaciones:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: LAS OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA FUERON REMITIDAS AL CONTRATISTA, SE ESTA EN ESPERA DE SU RESPUESTA

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS UTILIZADOS DE MANO LOCAL:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:

Observaciones: El contratista a la fecha, solo ha suministrado soportes de seguridad social pagos hasta el mes de enero.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALUOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EL CONTRATISTA DURANTE LA SEMANA CONTINÚA CON ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA OBRA AFECTADA A CAUSA DE LAS FUERTES LLUVIAS, ACOPIO DE MATERIAL PETREO.
SE PRESENTAN LLUVIAS DURANTE LA SEMANA.

LA INTERVENTORÍA DURANTE LA PRESENTE SEMANA HA REALIZADO LA ELABORACIÓN DE INFORME SEMANAL No. 94, SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE INT 973 DE 2022, COMBINACION AL MUNICIPIO SOBRE LOS ESTADOS DE CUENTA Y REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO 1896 DE 2021, SOLICITUD DE PROCESO SANCIONATORIO CTO L.P.006 DE 2022, SE REALIZA COMITÉ EXTRAORDINARIO EL 28 DE JUNIO DE 2024 EN INVIAS PUERTA CENTRAL, SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS EN COMITÉ DIA 28 DE JUNIO, SE REALIZA PRESENCIA EN EL CORREDOR VIAL PARA SUPERVISIÓN, SE SOLICITA AL CONTRATISTA ACELERAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE ACCESO PARA CONTINUAR CON LA NORMALIDAD DE ACTIVIDADES EN OBRA, CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO, SE REALIZA ADEMÁS SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1896 DE 2021.


ASÍ MISMO, SE TIENE EL SIGUIENTE CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

GIC-INVIAS-BOL-556-22	3-jul-24	SOLICITU DE PRORROGA AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°973 DE 2022
GIC-INVIAS-BOL-557-22	4-jul-24	COMBINACIÓN ENTREGA DE ESTADO DE CUENTA Y REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1896 DE 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE ACHÍ, BOLÍVAR.
GIC-INVIAS-BOL-558-22	4-jul-24	COMBINACIÓNENTREGA DE ESTADO DE CUENTA Y REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1897 DE 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DEMAGANGUÉ, BOLÍVAR.
GIC-INVIAS-BOL-559-22	4-jul-24	COMBINACIÓN ENTREGA DE ESTADO DE CUENTA Y REINTEGRO DEREMDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1898 DE 2021 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DEMAGANGUÉ, BOLÍVAR.
GIC-INVIAS-BOL-560-22	4-jul-24	SOLICITUD DE ESTADO ACTUAL DE LA CUENTA BANCARIA DONDE SEMANEJAN LOS RECURSOS DEL CONVENIO ALCALDIA MVIAS
GIC-INVIAS-BOL-561-22	4-jul-24	COMBINACIÓN ENTREGA DE ESTADO DE LA CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1897 DE 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DEMAGANGUÉ, BOLÍVAR.
GIC-INVIAS-BOL-562-22	4-jul-24	COMBINACIÓNENTREGA DE ESTADO DE LA CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1898 DE 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DEMAGANGUÉ, BOLÍVAR.
GIC-INVIAS-BOL-563-22	4-jul-24	SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO SANCIONATORIO – CONTRATO DE OBRA VIVIENDA DE 2022
GIC-INVIAS-BOL-564-22	4-jul-24	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO PACTADO EN COMITÉ DE SEGUIMIENTO REALIZADO EL 28 DE JUNIO DE 2024.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ELABORACIÓN DEL INFORME SEMANAL No. 95
PRESENCIA EN OBRA PARA SEGUIMIENTO
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA
SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1895 DE 2021.
SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPUMN-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Mejoramiento de la vía de acceso a la obra.



Supervisión de la interventoría.


NOTA: las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

LA INTERVENTORÍA EMITIRÁ A TIEMPO OFICIOS AL CONTRATISTA CON LA INFORMACIÓN ESPECIFICA REQUERIDA.
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS E INVERSIÓN DEL PROYECTO.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NO. NOMBRE: ADRIANA DE CASTILLA R ARRIETA
Matrícula Profesional No.: 13202170197 ARLV

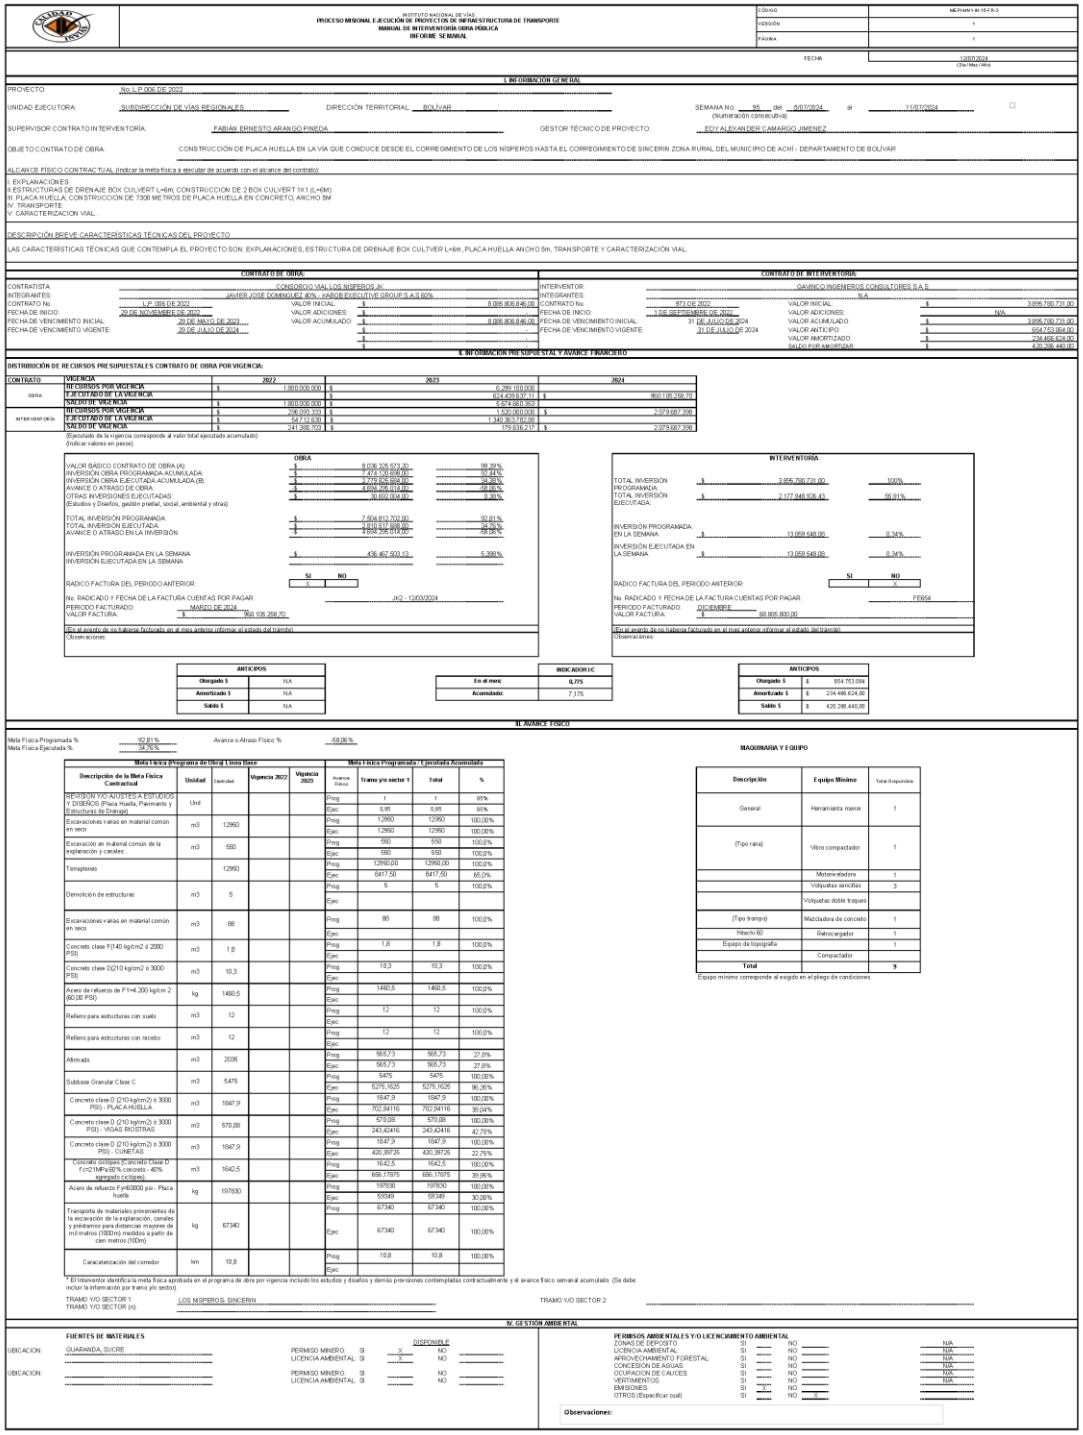

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO: MEPI-M15-15-01-2
VERSIÓN: 1
PÁGINA: 1
FECHA: 12/07/2024 (Día/Mes/Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: No L.P 006 DE 2022
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No.: 85 del 5/07/2024 al 11/07/2024 (Numeración consecutiva)
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ
OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORREGIMIENTO DE LOS NÍSPEROS HASTA EL CORREGIMIENTO DE SINCERÍN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACHÍ - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
I. EXPLANACIONES
II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT L=6m; CONSTRUCCIÓN DE 2 BOX CULVERT 1X1 (L=6M)
III. PLACA HUELLA, CONSTRUCCION DE 7308 METROS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO, ANCHO 6M
IV. TRANSPORTE
V. CARACTERIZACION VIAL.
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE CONTEMPLA EL PROYECTO SON: EXPLANACIONES, ESTRUCTURA DE DRENAJE BOX CULTVIER L=6m, PLACA HUELLA ANCHO 6m, TRANSPORTE Y CARACTERIZACIÓN VIAL.

CONTRATO DE OBRA:
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL LOS NISPEROS JK
INTEGRANTES: JAVIER JOSE DOMINGUEZ 40% - JARDIN EJECUTIVE GROUP S.A.S 60%
CONTRATO No: L.P. 006 DE 2022 — VALOR INICIAL: $ 8.895.806.846,06
FECHA DE INICIO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 29 DE MAYO DE 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 8.895.806.846,06
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 29 DE JULIO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:
INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES: N.A
CONTRATO No: 973 DE 2022 — VALOR INICIAL: $ 3.896.780.731,00
FECHA DE INICIO: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 — VALOR ADICIONES: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE JULIO DE 2024 — VALOR ACUMULADO: $ 3.896.780.731,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2024 — VALOR ANTICIPO: $ 654.753.864,00
VALOR AMORTIZADO: $ 234.468.624,00
SALDO POR AMORTIZAR: $ 420.285.440,00

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.800.000.000	$ 6.290.100.000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 624.439.637,71	$ 960.195.298,70
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.800.000.000	$ 5.674.660.363	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 206.093.353	$ 1.630.000.000	$ 2.073.687.398
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 54.712.650	$ 1.340.363.782,88	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 241.380.703	$ 179.636.217	$ 2.073.687.398

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 8.936.326.573,00	89,39%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 7.474.139.690,00	83,44%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.779.675.854,00	31,26%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 4.694.463.836,00	-52,56%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otros)	$ 80.692.004,00	0,90%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 7.504.812.702,00	92,81%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.810.637.858,00	34,76%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 4.694.174.844,00	-58,06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$ 436.467.503,13	5,398%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: JK2 - 12/03/2024
PERIODO FACTURADO: MARZO DE 2024
VALOR FACTURA: $ 760.106.258,70
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.896.780.731,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.177.948.936,43	55,91%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$ 13.059.548,09	0,34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	$ 13.059.548,09	0,34%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FE954
PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 68.805.800,00
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I.C	
En el mes:	0,775
Acumulado:	7,175

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 654.753.864
Amortizado $	$ 234.468.624,00
Saldo $	$ 420.285.440,00

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 92,81%
Meta Física Ejecutada %: 34,76%
Avance o Atraso Físico %: -58,06%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Total	%
REVISION Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	Und				Prog	1	1	85%
					Ejec	0,85	0,85	85%
Excavaciones varias en material común en seco	m3	12960			Prog	12960	12960	100,00%
					Ejec	12960	12960	100,00%
Excavación en material común de la explanación y canales	m3	550			Prog	550	550	100,0%
					Ejec	550	550	100,0%
Terraplenes		12960			Prog	12960,00	12960,00	100,0%
					Ejec	8417,50	8417,50	65,0%
Demolición de estructuras	m3	5			Prog	5	5	100,0%
					Ejec			
Excavaciones varias en material común en seco	m3	88			Prog	88	88	100,0%
					Ejec			
Concreto clase F(f'40 kg/cm2 ó 2000 PSI)	m3	1,8			Prog	1,8	1,8	100,0%
					Ejec			
Concreto clase D(210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	m3	10,3			Prog	10,3	10,3	100,0%
					Ejec			
Acero de refuerzo de FY=4.200 kg/cm 2 (60.00 PSI)	kg	1460,5			Prog	1460,5	1460,5	100,0%
					Ejec			
Relleno para estructuras con suelo	m3	12			Prog	12	12	100,0%
					Ejec			
Relleno para estructuras con recebo	m3	12			Prog	12	12	100,0%
					Ejec			
Afirmado	m3	2035			Prog	565,73	565,73	27,8%
					Ejec	565,73	565,73	27,8%
Subbase Granular Clase C	m3	5475			Prog	5475	5475	100,00%
					Ejec	5275,1625	5275,1625	96,35%
Concreto clase D (210 kg/cm2) ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA	m3	1847,9			Prog	1847,9	1847,9	100,00%
					Ejec	702,34116	702,34116	38,04%
Concreto clase D (210 kg/cm2) ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS	m3	570,88			Prog	570,88	570,88	100,00%
					Ejec	243,42416	243,42416	42,70%
Concreto clase D (210 kg/cm2) ó 3000 PSI) - CUNETAS	m3	1847,9			Prog	1847,9	1847,9	100,00%
					Ejec	420,39725	420,39725	22,75%
Concreto ciclopeo (Concreto Clase D Fc=21MPa 60% concreto - 40% agregado ciclopeo)	m3	1642,5			Prog	1642,5	1642,5	100,00%
					Ejec	656,17575	656,17575	39,96%
Acero de refuerzo Fy=60000 psi - Placa huella	kg	197830			Prog	197830	197830	100,00%
					Ejec	59349	59349	30,00%
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000m) medidos a partir de cien metros (100m)	kg	67340			Prog	67340	67340	100,00%
					Ejec	67340	67340	100,00%
Caracterización del corredor	km	10,8			Prog	10,8	10,8	100,00%
					Ejec			

* El Interventor identificará la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás previsiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: LOS NISPEROS- SINCERIN
TRAMO Y/O SECTOR (s): — TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
General	Herramienta menor	1
(Tipo rana)	Vibro compactador	1
	Motoniveladora	1
	Volquetas sencillas	3
	Volquetas doble troque	
(Tipo trompo)	Mezcladora de concreto	1
Hitachi 60	Retrocargador	1
Equipo de topografía		1
	Compactador	
Total		9

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACION: GUARANDA, SUCRE	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACION:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI	NO	N/A
CONCESION DE AGUAS	SI	NO	N/A
OCUPACION DE CAUCES	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS	SI	NO	N/A
EMISIONES	SI	NO	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	

Observaciones:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: LAS OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA FUERON REMITIDAS AL CONTRATISTA, SE ESTA EN ESPERA DE SU RESPUESTA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS CALIFICADOS EN TECNOLOGÍA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:

Observaciones: El contratista a la fecha, solo ha suministrado soportes de seguridad social pagos hasta el mes de enero.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALUOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EL CONTRATISTA DURANTE LA SEMANA REALIZA ENVÍO DE REPROGRAMACIÓN DE OBRA, CONTINÚA CON ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA OBRA, AFECTADA A CAUSA DE LAS FUERTES LLUVIAS, ACOPIO DE MATERIAL PETREO.
SE PRESENTAN LLUVIAS DURANTE LA SEMANA.

LA INTERVENTORÍA DURANTE LA PRESENTE SEMANA HA REALIZADO LA ELABORACIÓN DE INFORME SEMANAL No. 95, SE REALIZAN OBSERVACIONES AL PLAN DE CONTINGENCIA, SE REALIZA PRESENCIA EN EL CORREDOR VIAL PARA SUPERVISIÓN, SE SOLICITA AL CONTRATISTA ACELERAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE ACCESO PARA CONTINUAR CON LA NORMALIDAD DE ACTIVIDADES EN OBRA, CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO, SE REALIZA ADEMÁS SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1695 DE 2021.


ASÍ MISMO, SE TIENE EL SIGUIENTE CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA:

GIC-INVIAS-BOL-565-22	5-jul-24	RESPUESTA A COMUNICADO – ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA
GIC-INVIAS-BOL-566-22	5-jul-24	RADICACIÓN INFORME SEMANAL No. 91 DE INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DE ACHÍ, BOLÍVAR
GIC-INVIAS-BOL-567-22	5-jul-24	RADICACIÓN INFORME SEMANAL No. 91 DE INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DEMAGANGUÉ, BOLÍVAR – LOTE1
GIC-INVIAS-BOL-568-22	5-jul-24	RADICACIÓN INFORME SEMANAL No. 91 DE INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DEMAGANGUÉ, BOLÍVAR – LOTE2
GIC-INVIAS-BOL-569-22	5-jul-24	RADICACIÓN INFORME SEMANAL No. 92 DE INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DE ACHÍ, BOLÍVAR
GIC-INVIAS-BOL-570-22	5-jul-24	RADICACIÓN INFORME SEMANAL No. 94 DE INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DEMAGANGUÉ, BOLÍVAR – LOTE1
GIC-INVIAS-BOL-571-22	5-jul-24	RADICACIÓN INFORME SEMANAL No. 94 DE INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DEMAGANGUÉ, BOLÍVAR – LOTE2
GIC-INVIAS-BOL-572-22	5-jul-24	RESPUESTA A COMUNICACIÓN CGS-572-356 – ENTREGA DE AJUSTES PAGA
GIC-INVIAS-BOL-573-22	5-jul-24	RADICACIÓN PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL – PAGA – MUNICIPIO DEMAGANGUÉ, BOLÍVAR – LOTE 1. CONTRATO DE OBRA No 557 de 2022. OBJETO: "MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFÁLTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORRE

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ELABORACIÓN DEL INFORME SEMANAL No. 96
PRESENCIA EN OBRA PARA SEGUIMIENTO
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA
SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1695 DE 2021.
SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MM-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Mejoramiento de la vía de acceso a la obra.



Mejoramiento de la vía de acceso a la obra.


NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

LA INTERVENTORÍA EMITIRÁ A TIEMPO OFICIOS AL CONTRATISTA CON LA INFORMACIÓN ESPECIFICA REQUERIDA.
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS E INVERSIÓN DEL PROYECTO.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: ADRIANA CASTILLO ARRIETA
Matrícula Profesional No.: 13202120071 BLV

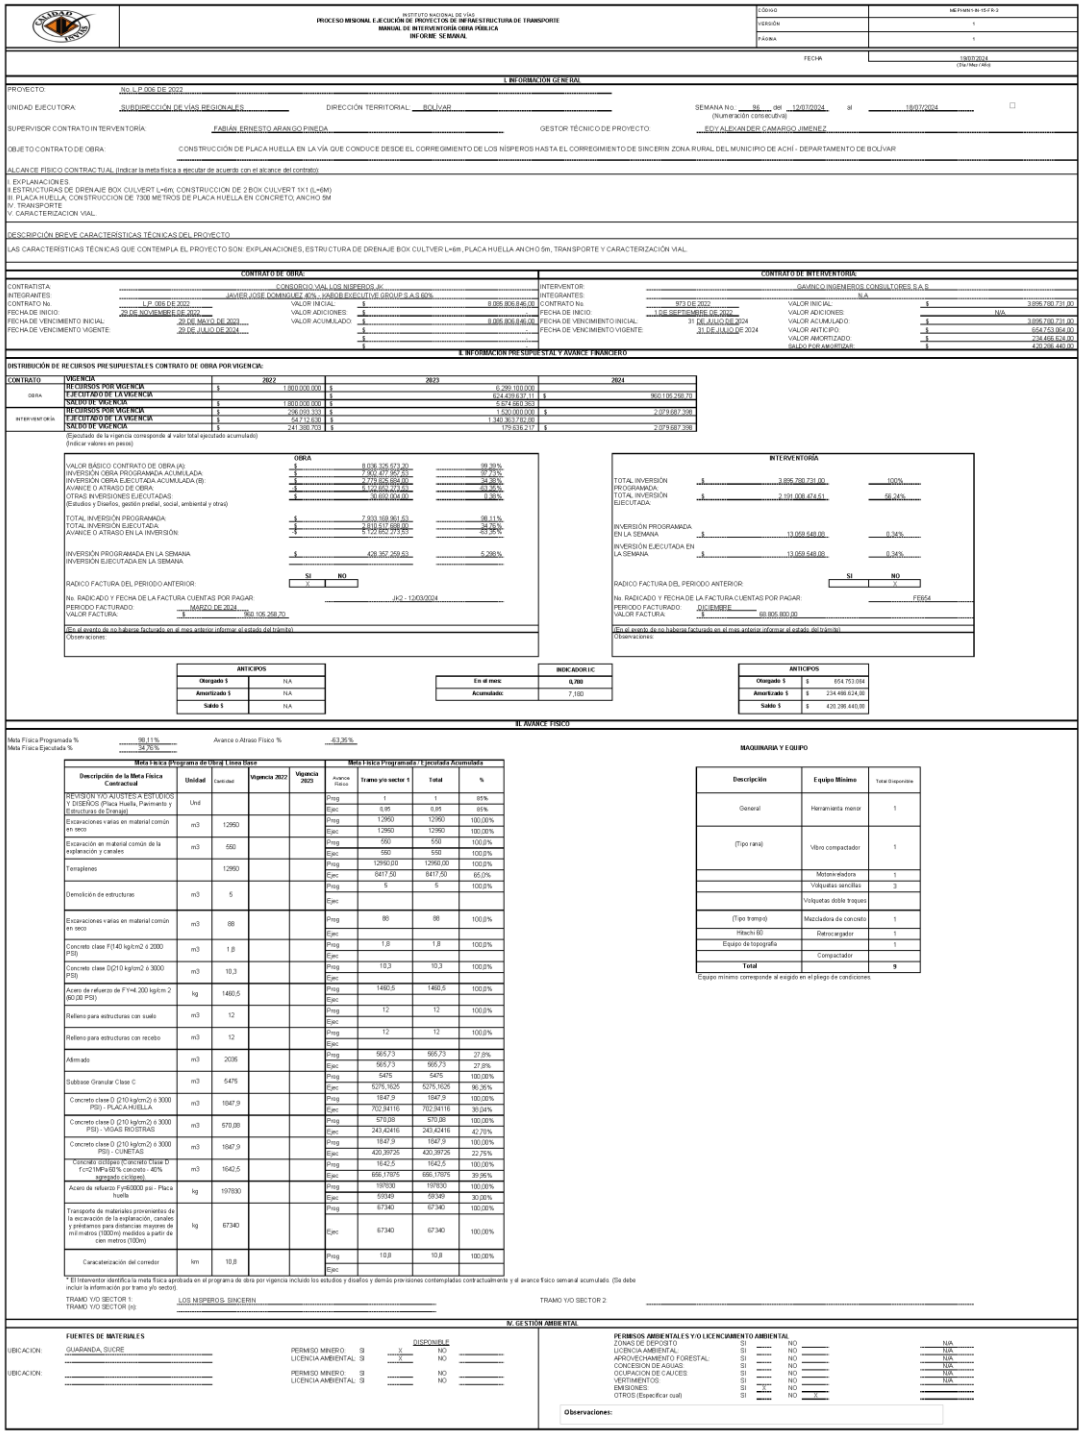

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO: MEPI-M15-15-F15-2
VERSIÓN: 1
PÁGINA: 1
FECHA: 19/07/2024 (Día/Mes/Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: No L.P 006 DE 2022
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No: 86 del 12/07/2024 al 19/07/2024 (Numeración consecutiva)
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ
OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORREGIMIENTO DE LOS NÍSPEROS HASTA EL CORREGIMIENTO DE SINCERÍN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACHÍ - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
I. EXPLANACIONES.
II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT L=6m; CONSTRUCCIÓN DE 2 BOX CULVERT 1X1 (L=6M)
III. PLACA HUELLA, CONSTRUCCION DE 7308 METROS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO, ANCHO 6M
IV. TRANSPORTE
V. CARACTERIZACION VIAL.
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE CONTEMPLA EL PROYECTO SON: EXPLANACIONES, ESTRUCTURA DE DRENAJE BOX CULTVIER L=6m, PLACA HUELLA ANCHO 6m, TRANSPORTE Y CARACTERIZACIÓN VIAL.

CONTRATO DE OBRA:
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL LOS NISPEROS JK
INTEGRANTES: JAVIER JOSE DOMINGUEZ 40% - JARDIS EJECUTIVE GROUP S.A.S 60%
CONTRATO No: L.P. 006 DE 2022 — VALOR INICIAL: $ 8.895.806.846,06
FECHA DE INICIO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 29 DE MAYO DE 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 8.895.806.846,06
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 29 DE JULIO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES: N.A
CONTRATO No: 973 DE 2022 — VALOR INICIAL: $ 3.896.780.731,00
FECHA DE INICIO: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 — VALOR ADICIONES: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE JULIO DE 2024 — VALOR ACUMULADO: $ 3.896.780.731,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2024 — VALOR ANTICIPO: $ 654.753.864,00
VALOR AMORTIZADO: $ 234.468.624,00
SALDO POR AMORTIZAR: $ 420.285.440,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.800.000.000	$ 6.299.100.000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 624.439.637,71	$ 960.195.266,70
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.800.000.000	$ 5.674.660.363	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 206.093.353	$ 1.520.000.000	$ 2.073.687.398
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 54.712.650	$ 1.340.363.782,88	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 241.380.703	$ 179.636.217	$ 2.073.687.398

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 8.636.326.573,20	89,39%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 7.904.877.990,63	97,73%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.779.625.884,00	34,36%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 5.125.252.106,63	63,36%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otros)	$ 70.692.004,00	0,86%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 7.933.169.961,63	98,11%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.810.537.888,00	34,76%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 5.122.632.073,63	63,36%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$ 426.357.359,63	5,28%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: JK2 - 12/03/2024
PERIODO FACTURADO: MARZO DE 2024
VALOR FACTURA: $ 760.106.268,70
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.896.780.731,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.191.006.474,51	56,24%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$ 13.059.548,09	0,34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	$ 13.059.548,09	0,34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FE954
PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 69.805.800,00
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I.C	
En el mes:	0,780
Acumulado:	7,180

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 654.753.864
Amortizado $	$ 234.468.624,00
Saldo $	$ 420.285.440,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 98,11% — Avance o Atraso Físico %: -63,36%
Meta Física Ejecutada %: 34,76%

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Trams y/o sector 1	Total	%
REVISION Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	Und				Prog	1	1	85%
					Ejec	0,85	0,85	85%
Excavaciones varias en material común en seco	m3	12960			Prog	12960	12960	100,00%
					Ejec	12960	12960	100,00%
Excavación en material común de la explanación y canales	m3	550			Prog	550	550	100,0%
					Ejec	550	550	100,0%
Terraplenes		12960			Prog	12960,00	12960,00	100,0%
					Ejec	8417,50	8417,50	65,0%
Demolición de estructuras	m3	5			Prog	5	5	100,0%
					Ejec			
Excavaciones varias en material común en seco	m3	88			Prog	88	88	100,0%
					Ejec			
Concreto clase F(f'40 kg/cm2 ó 2000 PSI)	m3	1,8			Prog	1,8	1,8	100,0%
					Ejec			
Concreto clase D(210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	m3	10,3			Prog	10,3	10,3	100,0%
					Ejec			
Acero de refuerzo de FY=4.200 kg/cm 2 (60.00 PSI)	kg	1460,5			Prog	1460,5	1460,5	100,0%
					Ejec			
Relleno para estructuras con suelo	m3	12			Prog	12	12	100,0%
					Ejec			
Relleno para estructuras con recebo	m3	12			Prog	12	12	100,0%
					Ejec			
Afirmado	m3	2035			Prog	565,73	565,73	27,8%
					Ejec	565,73	565,73	27,8%
Subbase Granular Clase C	m3	5475			Prog	5475	5475	100,00%
					Ejec	5275,1625	5275,1625	96,35%
Concreto clase D (210 kg/cm2) ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA	m3	1847,9			Prog	1847,9	1847,9	100,00%
					Ejec	702,34116	702,34116	38,04%
Concreto clase D (210 kg/cm2) ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS	m3	570,88			Prog	570,88	570,88	100,00%
					Ejec	243,42416	243,42416	42,70%
Concreto clase D (210 kg/cm2) ó 3000 PSI) - CUNETAS	m3	1847,9			Prog	1847,9	1847,9	100,00%
					Ejec	420,39725	420,39725	22,75%
Concreto ciclopeo (Concreto Clase D Fc=21MPa 60% concreto - 40% agregado ciclopeo)	m3	1642,5			Prog	1642,5	1642,5	100,00%
					Ejec	656,17575	656,17575	39,96%
Acero de refuerzo Fy=60000 psi - Placa huella	kg	197830			Prog	197830	197830	100,00%
					Ejec	59349	59349	30,00%
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000m) medidos a partir de cien metros (100m)	kg	67340			Prog	67340	67340	100,00%
					Ejec	67340	67340	100,00%
Caracterización del corredor	km	10,8			Prog	10,8	10,8	100,00%
					Ejec			

* El Interventor identificará la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás previsiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: LOS NISPEROS- SINCERIN
TRAMO Y/O SECTOR (s): — TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
General	Herramienta menor	1
(Tipo rana)	Vibro compactador	1
	Motoniveladora	1
	Volquetas sencillas	3
	Volquetas doble troque	
(Tipo trompo)	Mezcladora de concreto	1
Hitachi 60	Retrocargador	1
Equipo de topografía		1
	Compactador	
Total		9

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN: GUARANDA, SUCRE	PERMISO MINERO: SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI	NO	N/A
CONCESION DE AGUAS	SI	NO	N/A
OCUPACION DE CAUCES	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS	SI	NO	N/A
EMISIONES	SI	NO	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	

Observaciones:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓNA LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: LAS OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA FUERON REMITIDAS AL CONTRATISTA, SE ESTA EN ESPERA DE SU RESPUESTA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS UTILIZACIÓN DE MO LOCAL:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:

Observaciones: El contratista a la fecha, solo ha suministrado soportes de seguridad social pagos hasta el mes de enero.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EL CONTRATISTA DURANTE LA SEMANA CONTINÚA CON ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA OBRA AFECTADA A CAUSA DE LAS FUERTES LLUVIAS, ACOPIO DE MATERIAL PETREO Y VACIADO DE CONCRETO PARA PLACAS RÍGIDAS, CICLOPEAS Y VIGAS RIOSTRAS.
SE PRESENTAN LLUVIAS DURANTE LA SEMANA.

LA INTERVENTORÍA DURANTE LA PRESENTE SEMANA HA REALIZADO LA ELABORACIÓN DE INFORME SEMANAL No. 95, , SE REALIZA PRESENCIA EN EL CORREDOR VIAL PARA SUPERVISIÓN, SE SOLICITA AL CONTRATISTA ACELERAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE ACCESO, CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO, SE REALIZA ADEMÁS SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1695 DE 2021.
NOTA: DE ACUERDO CON EL COMITE DE SEGUIMIENTO REALIZADO EL DIS DE JUNIO EN INVIAS PLANTA CENTRAL, Y LOS COMPROMISOS PACTADOS EN EL, LA ALCALDIA SE ENCUENTRA CONDICIONANDO EL ACCESO A LA OBRA PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA Y DE ACUERDO AL AVANCE DE ESTA, EL DÍA 20 DE JULIO DE 2024 SE DEFINIRÁ LA VIABILIDAD DE UNA POSIBLE PRORROGA PARA EL CONTRATISTA.


ASÍ MISMO, SE TIENE EL SIGUIENTE CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

01-CINVIAS-BOL-570-22	5-jul-24	REMISION INFORME SEMANAL No. 94 DE INTERVENTORIA – MUNICIPIO DEMAGANGUE, BOLIVAR – LOTE1
01-CINVIAS-BOL-571-22	5-jul-24	REMISION INFORME SEMANAL No. 94 DE INTERVENTORIA – MUNICIPIO DEMAGANGUE, BOLIVAR – LOTE2
01-CINVIAS-BOL-572-22	5-jul-24	RESPUESTA A COMUNICACION CI-BAS-286 – ENTREGA DE AJUSTES PAGA
01-CINVIAS-BOL-573-22	5-jul-24	REMISION PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL – PAGA – MUNICIPIO DEMAGANGUE, BOLIVAR – LOTE 1, CONTRATO DE OBRA No. 557 de 2022, OBJETO: "MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CORR

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ELABORACIÓN DEL INFORME SEMANAL No. 96
PRESENCIA EN OBRA PARA SEGUIMIENTO
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA
SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1695 DE 2021.
SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPHMI-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundida de placas rigidas.



Fundida de placas rigidas.



Mejoramiento de la via de acceso a la obra.


NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

LA INTERVENTORÍA EMITIRÁ A TIEMPO OFICIOS AL CONTRATISTA CON LA INFORMACIÓN SUFICIENTE REQUERIDA.
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS E INVERSIÓN DEL PROYECTO.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JUBINSA CASTILLA ARRIETA
Matrícula Profesional No.:

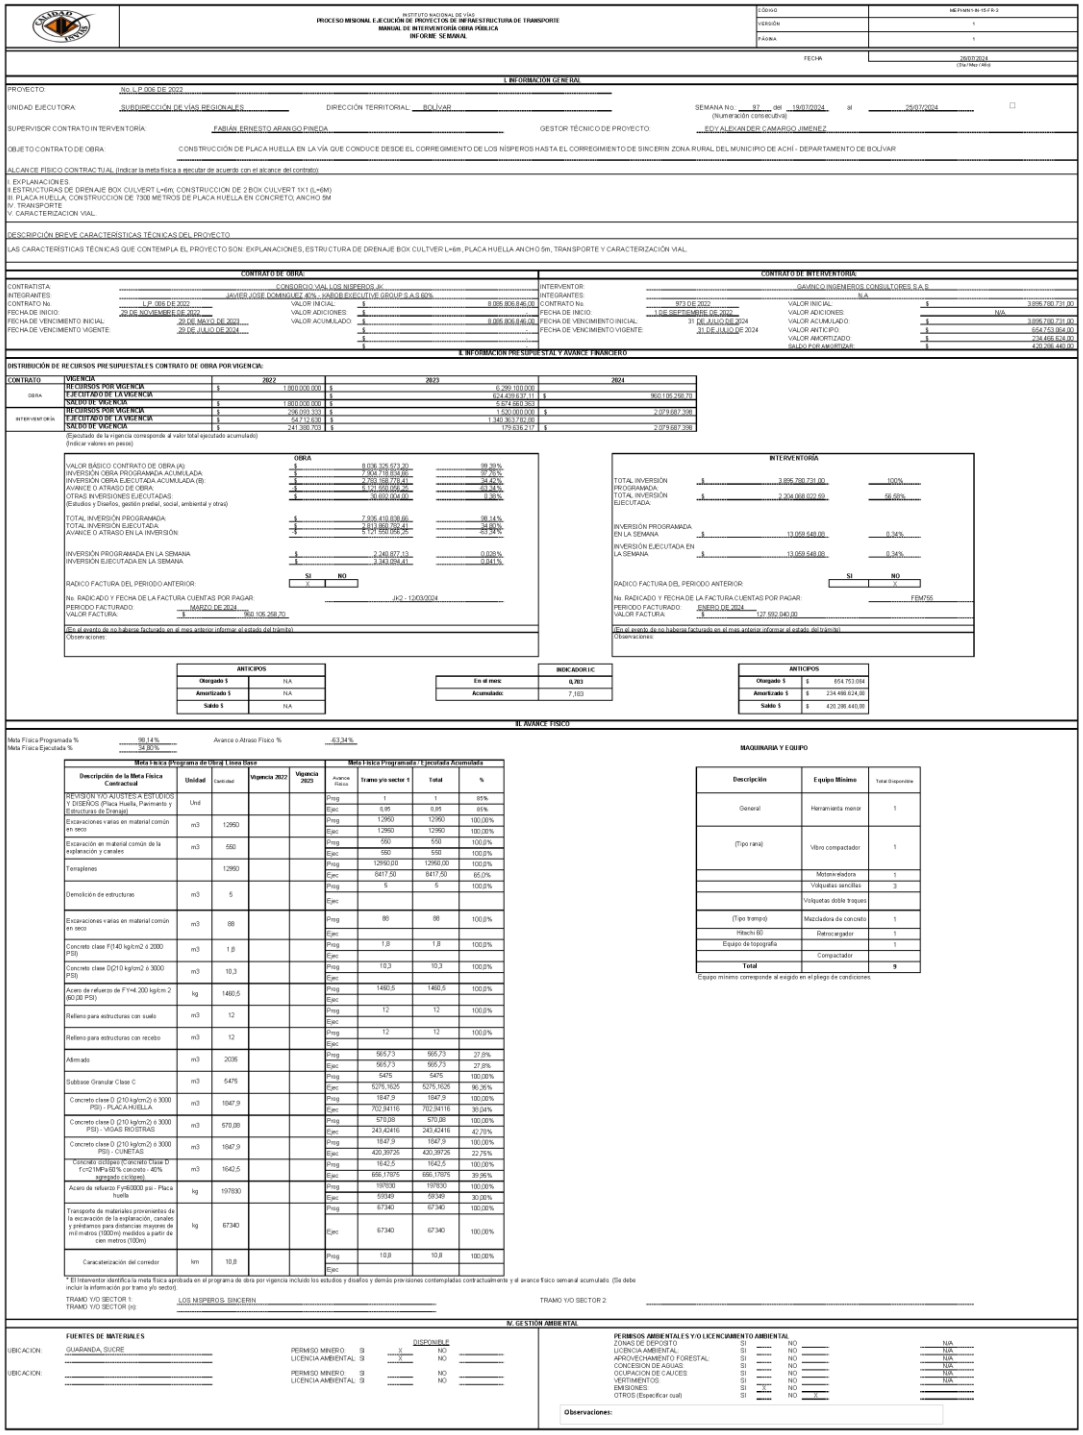

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO: MEPI-M15-15-F15-2
VERSIÓN: 1
PÁGINA: 1
FECHA: 29/07/2024 (Día/Mes/Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: No L.P 006 DE 2022
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No.: 87 del 19/07/2024 al 25/07/2024 (Numeración consecutiva)
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ
OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORREGIMIENTO DE LOS NÍSPEROS HASTA EL CORREGIMIENTO DE SINCERÍN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACHÍ - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
I. EXPLANACIONES.
II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT L=6m; CONSTRUCCIÓN DE 2 BOX CULVERT 1X1 (L=6M)
III. PLACA HUELLA, CONSTRUCCION DE 7308 METROS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO, ANCHO 6M
IV. TRANSPORTE
V. CARACTERIZACION VIAL.
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE CONTEMPLA EL PROYECTO SON: EXPLANACIONES, ESTRUCTURA DE DRENAJE BOX CULTVIER L=6m, PLACA HUELLA ANCHO 6m, TRANSPORTE Y CARACTERIZACIÓN VIAL.

CONTRATO DE OBRA:
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL LOS NISPEROS JK
INTEGRANTES: JAVIER JOSE DOMINGUEZ 40% - JARDIS EJECUTIVE GROUP S.A.S 60%
CONTRATO No: L.P. 006 DE 2022 — VALOR INICIAL: $ 8.085.806.846,06
FECHA DE INICIO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 29 DE MAYO DE 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 8.085.806.846,06
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 29 DE JULIO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:
INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES: N.A
CONTRATO No: 973 DE 2022 — VALOR INICIAL: $ 3.896.780.731,00
FECHA DE INICIO: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 — VALOR ADICIONES: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE JULIO DE 2024 — VALOR ACUMULADO: $ 3.896.780.731,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2024 — VALOR ANTICIPO: $ 654.753.864,00
VALOR AMORTIZADO: $ 234.466.624,00
SALDO POR AMORTIZAR: $ 420.287.440,00

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.800.000.000	$ 6.299.100.000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 624.439.637,71	$ 960.195.298,70
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.800.000.000	$ 5.674.660.363	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 206.093.353	$ 1.430.000.000	$ 2.073.687.398
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 54.712.650	$ 1.340.363.782,88	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 241.380.703	$ 179.636.217	$ 2.073.687.398

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 8.036.326.673,00	99,39%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 7.904.718.804,66	97,76%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.793.398.778,41	34,42%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 5.701.999.996,25	49,34%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otros)	$ 70.692.004,00	0,86%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 7.975.410.808,66	98,14%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.813.869.709,41	34,66%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 5.121.999.996,25	49,34%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$ 2.249.877,43	0,028%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	$ 3.342.094,41	0,041%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: JK2 - 12/03/2024
PERIODO FACTURADO: MARZO DE 2024
VALOR FACTURA: $ 760.106.268,70
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.896.780.731,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.204.068.022,69	56,58%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$ 13.059.548,09	0,34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	$ 13.059.548,09	0,34%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FBM795
PERIODO FACTURADO: ENERO DE 2024
VALOR FACTURA: $ 127.692.040,00
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I.C	
En el mes:	0,783
Acumulado:	7,103

ANTICIPOS	
Otorgado $	654.753.864
Amortizado $	234.466.624,00
Saldo $	420.286.440,00

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 98,14%
Meta Física Ejecutada %: 34,66%
Avance o Atraso Físico %: -63,34%

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Trams y/o sector 1	Total	%
REVISION Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	Und				Prog	1	1	85%
					Ejec	0,85	0,85	85%
Excavaciones varias en material común en seco	m3	12960			Prog	12960	12960	100,00%
					Ejec	12960	12960	100,00%
Excavación en material común de la explanación y canales	m3	550			Prog	550	550	100,0%
					Ejec	550	550	100,0%
Terraplenes		12960			Prog	12960,00	12960,00	100,0%
					Ejec	8417,50	8417,50	65,0%
Demolición de estructuras	m3	5			Prog	5	5	100,0%
					Ejec			
Excavaciones varias en material común en seco	m3	88			Prog	88	88	100,0%
					Ejec			
Concreto clase F(f'40 kg/cm2 ó 2000 PSI)	m3	1,8			Prog	1,8	1,8	100,0%
					Ejec			
Concreto clase D(210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	m3	10,3			Prog	10,3	10,3	100,0%
					Ejec			
Acero de refuerzo de FY=4.200 kg/cm 2 (60.00 PSI)	kg	1460,5			Prog	1460,5	1460,5	100,0%
					Ejec			
Relleno para estructuras con suelo	m3	12			Prog	12	12	100,0%
					Ejec			
Relleno para estructuras con recebo	m3	12			Prog	12	12	100,0%
					Ejec			
Afirmado	m3	2035			Prog	565,73	565,73	27,8%
					Ejec	565,73	565,73	27,8%
Subbase Granular Clase C	m3	5475			Prog	5475	5475	100,00%
					Ejec	5275,1625	5275,1625	96,35%
Concreto clase D (210 kg/cm2) ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA	m3	1847,9			Prog	1847,9	1847,9	100,00%
					Ejec	702,34116	702,34116	38,04%
Concreto clase D (210 kg/cm2) ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS	m3	570,88			Prog	570,88	570,88	100,00%
					Ejec	243,42416	243,42416	42,70%
Concreto clase D (210 kg/cm2) ó 3000 PSI) - CUNETAS	m3	1847,9			Prog	1847,9	1847,9	100,00%
					Ejec	420,39725	420,39725	22,75%
Concreto ciclopeo (Concreto Clase D Fc=21MPa 60% concreto - 40% agregado ciclopeo)	m3	1642,5			Prog	1642,5	1642,5	100,00%
					Ejec	656,17575	656,17575	39,96%
Acero de refuerzo Fy=60000 psi - Placa huella	kg	197830			Prog	197830	197830	100,00%
					Ejec	59349	59349	30,00%
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000m) medidos a partir de cien metros (100m)	kg	67340			Prog	67340	67340	100,00%
					Ejec	67340	67340	100,00%
Caracterización del corredor	km	10,8			Prog	10,8	10,8	100,00%
					Ejec			

* El Interventor identificará la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás previsiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por trams y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: LOS NISPEROS- SINCERIN
TRAMO Y/O SECTOR (s): — TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
General	Herramienta menor	1
(Tipo rana)	Vibro compactador	1
	Motoniveladora	1
	Volquetas sencillas	3
	Volquetas doble troque	
(Tipo trompo)	Mezcladora de concreto	1
Hitachi 60	Retrocargador	1
Equipo de topografía		1
	Compactador	
Total		9

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

IV. GESTIÓN AMBIENTAL


FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACION: GUARANDA, SUCRE	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO
UBICACION:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI	NO	N/A
CONCESION DE AGUAS	SI	NO	N/A
OCUPACION DE CAUCES	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS	SI	NO	N/A
EMISIONES	SI	NO	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	

Observaciones:

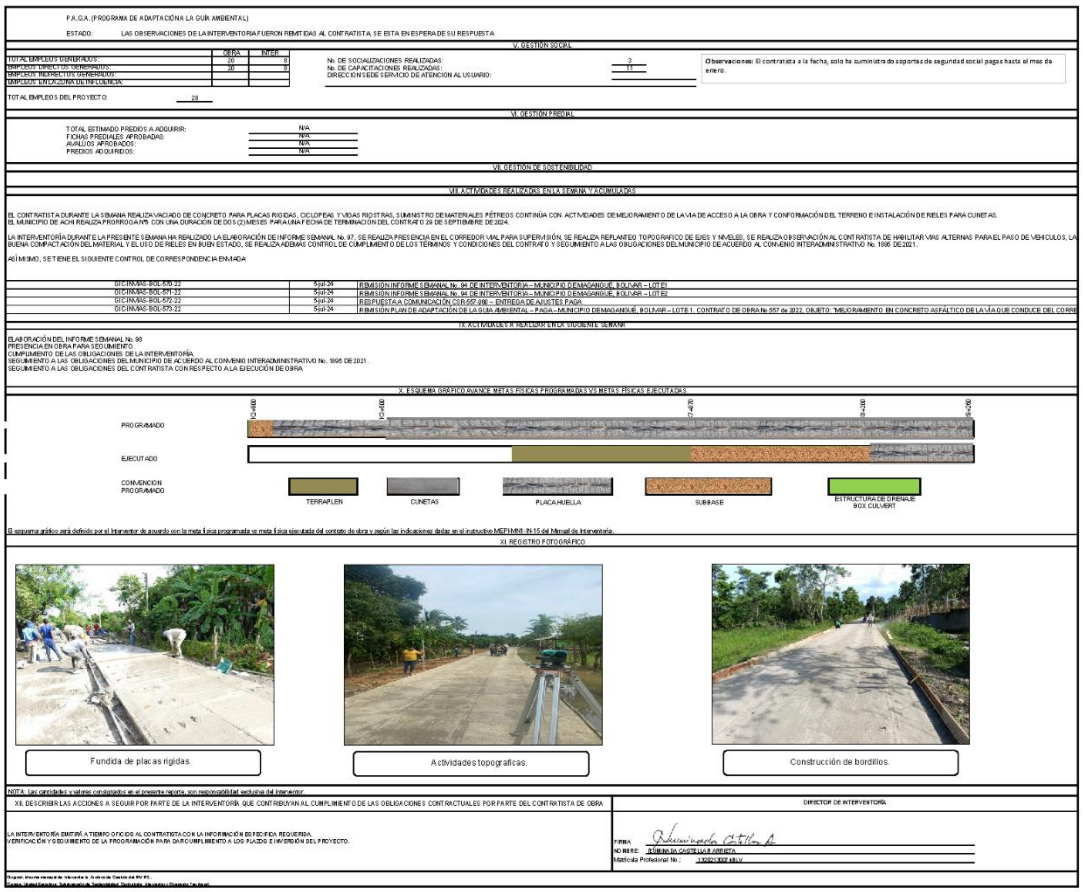

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: LAS OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA FUERON REMITIDAS AL CONTRATISTA, SE ESTA EN ESPERA DE SU RESPUESTA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	20	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	20	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS UTILIZADOS DE TECNOLOGÍA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 28

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 11
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:

Observaciones: El contratista a la fecha, solo ha suministrado soportes de seguridad social pagos hasta el mes de enero.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADO

EL CONTRATISTA DURANTE LA SEMANA REALIZA VACIADO DE CONCRETO PARA PLACAS RIGIDAS, CICLOPEAS Y VIAS RIGISTRAS, SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS CONTINÚA CON ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA OBRA Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO E INSTALACIÓN DE RIELES PARA CUNETAS.
EL MUNICIPIO DE ACHI REALIZA PROYROGA #7 CON UNA DURACION DE DOS (2) MESES PARA UNA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

LA INTERVENTORÍA DURANTE LA PRESENTE SEMANA HA REALIZADO LA ELABORACIÓN DE INFORME SEMANAL No. 97, SE REALIZA PRESENCIA EN EL CORREDOR VIAL PARA SUPERVISIÓN, SE REALIZA REPLANTEO TOPOGRAFICO DE EJES Y NIVELES, SE REALIZA OBSERVACIÓN AL CONTRATISTA DE HABILITAR VIAS ALTERNAS PARA EL PASO DE VEHICULOS; LA BUENA COMPACTACIÓN DEL MATERIAL Y EL USO DE RIELES EN BUEN ESTADO, SE REALIZA ADEMAS CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO Y SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1895 DE 2021.

ASÍ MISMO, SE TIENE EL SIGUIENTE CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

GICINVAS-BOL-569-23	Sept-24	REMISION INFORME SEMANAL No. 94 DE INTERVENTORIA – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLIVAR – LOTE1
GICINVAS-BOL-571-23	Sept-24	REMISION INFORME SEMANAL No. 94 DE INTERVENTORIA – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLIVAR – LOTE1
GICINVAS-BOL-572-23	Sept-24	RESPUESTA A COMUNICACIÓN CIR-557-996 – ENTREGA DE AJUSTES PAGA
GICINVAS-BOL-573-23	Sept-24	REMISION PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL – PAGA – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLIVAR – LOTE 1. CONTRATO DE OBRA No 557 de 2022. OBJETO: "MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORR

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ELABORACIÓN DEL INFORME SEMANAL No. 98
PRESENCIA EN OBRA PARA SEGUIMIENTO
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA
SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1895 DE 2021.
SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPIMNI-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fundida de placas rígidas.

Actividades topográficas.

Construcción de bordillos.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor


XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA


LA INTERVENTORÍA EMITIRÁ A TIEMPO OFICIOS AL CONTRATISTA CON LA INFORMACIÓN ESPECIFICA REQUERIDA.
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS DEL PROYECTO.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: ATAHUALPA CASTILLO ARRIETA
Matrícula Profesional No.: 11302-130748 ATLV

4.1.2. MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N° 557 DE 2022.

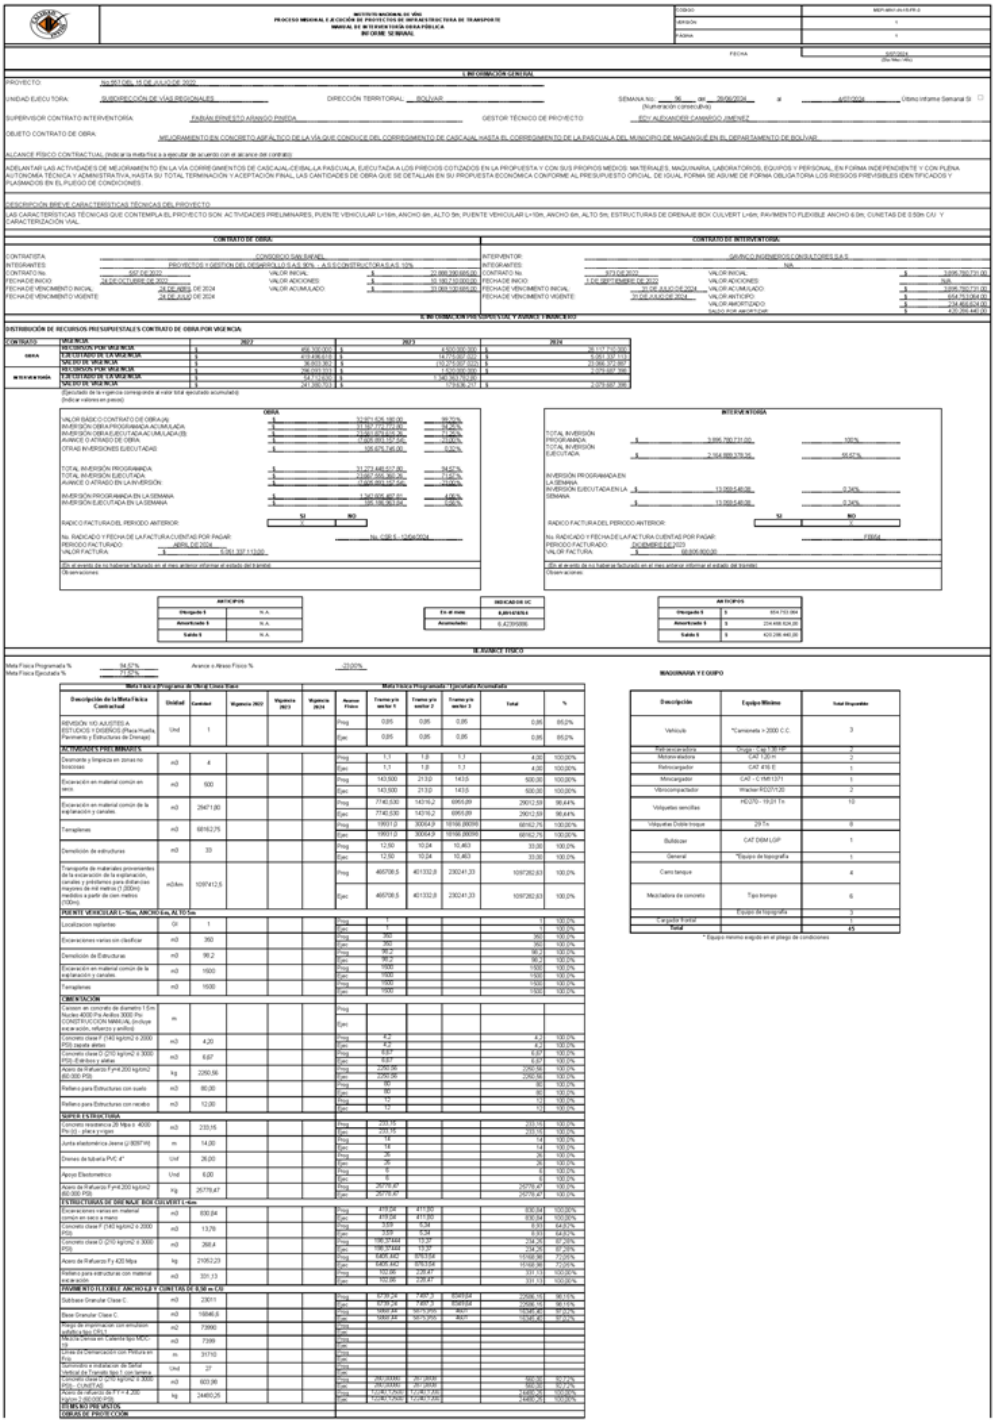


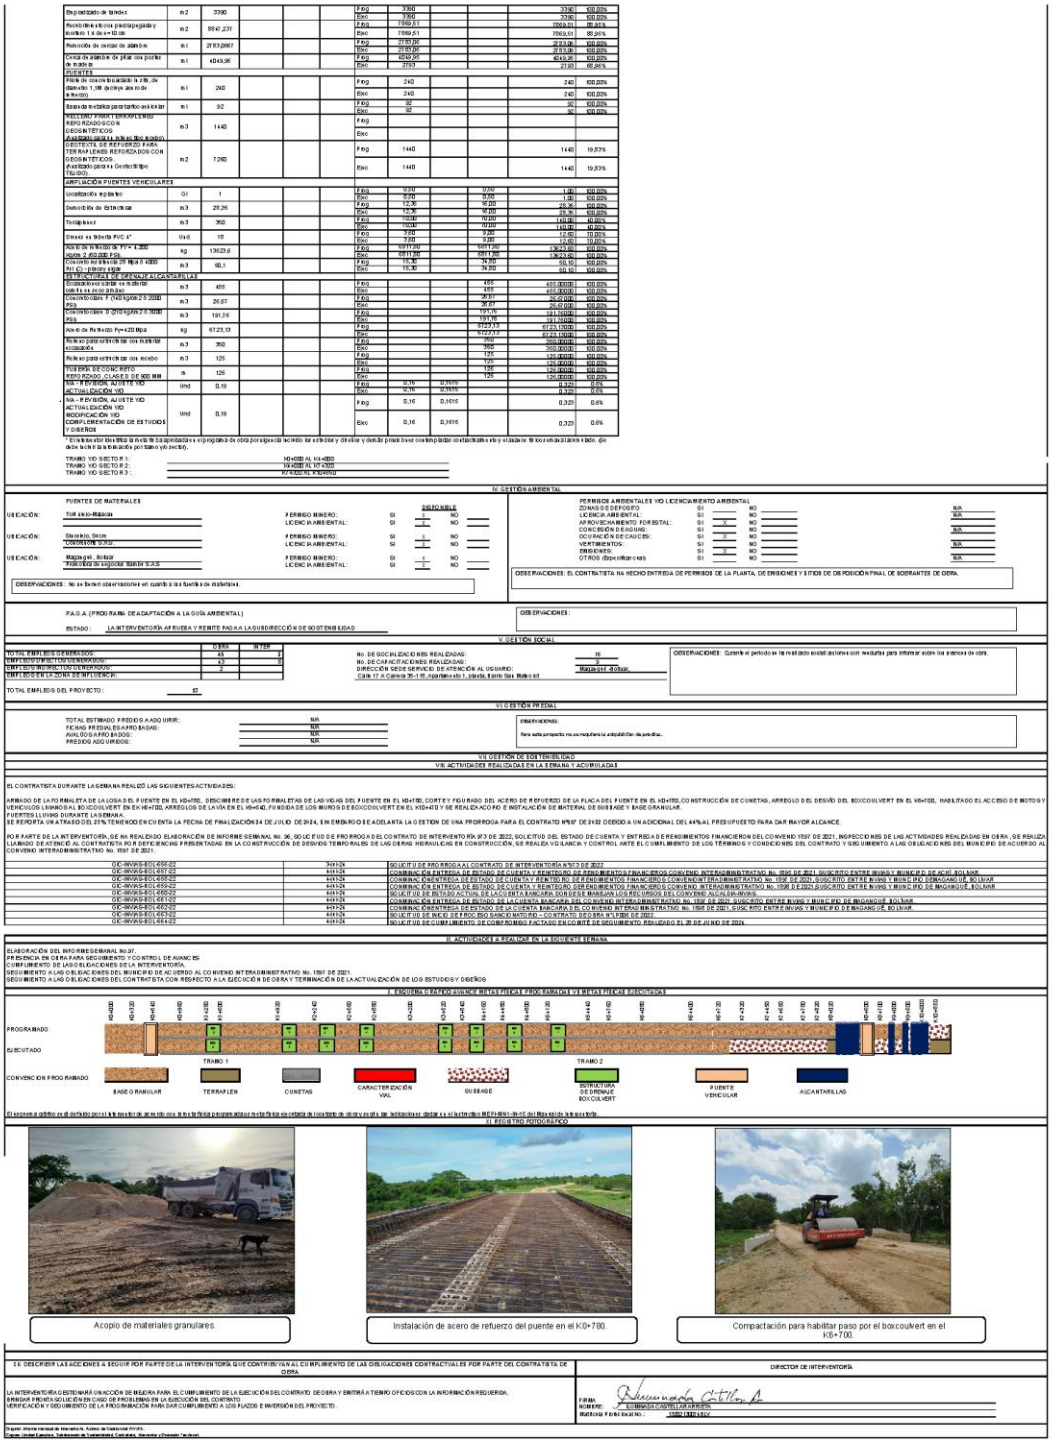

Acopio de materiales granulares.

Instalación de acero de refuerzo del puente en el K0+700.

Compactación para habilitar paso por el boxcoulvert en el K0+700.

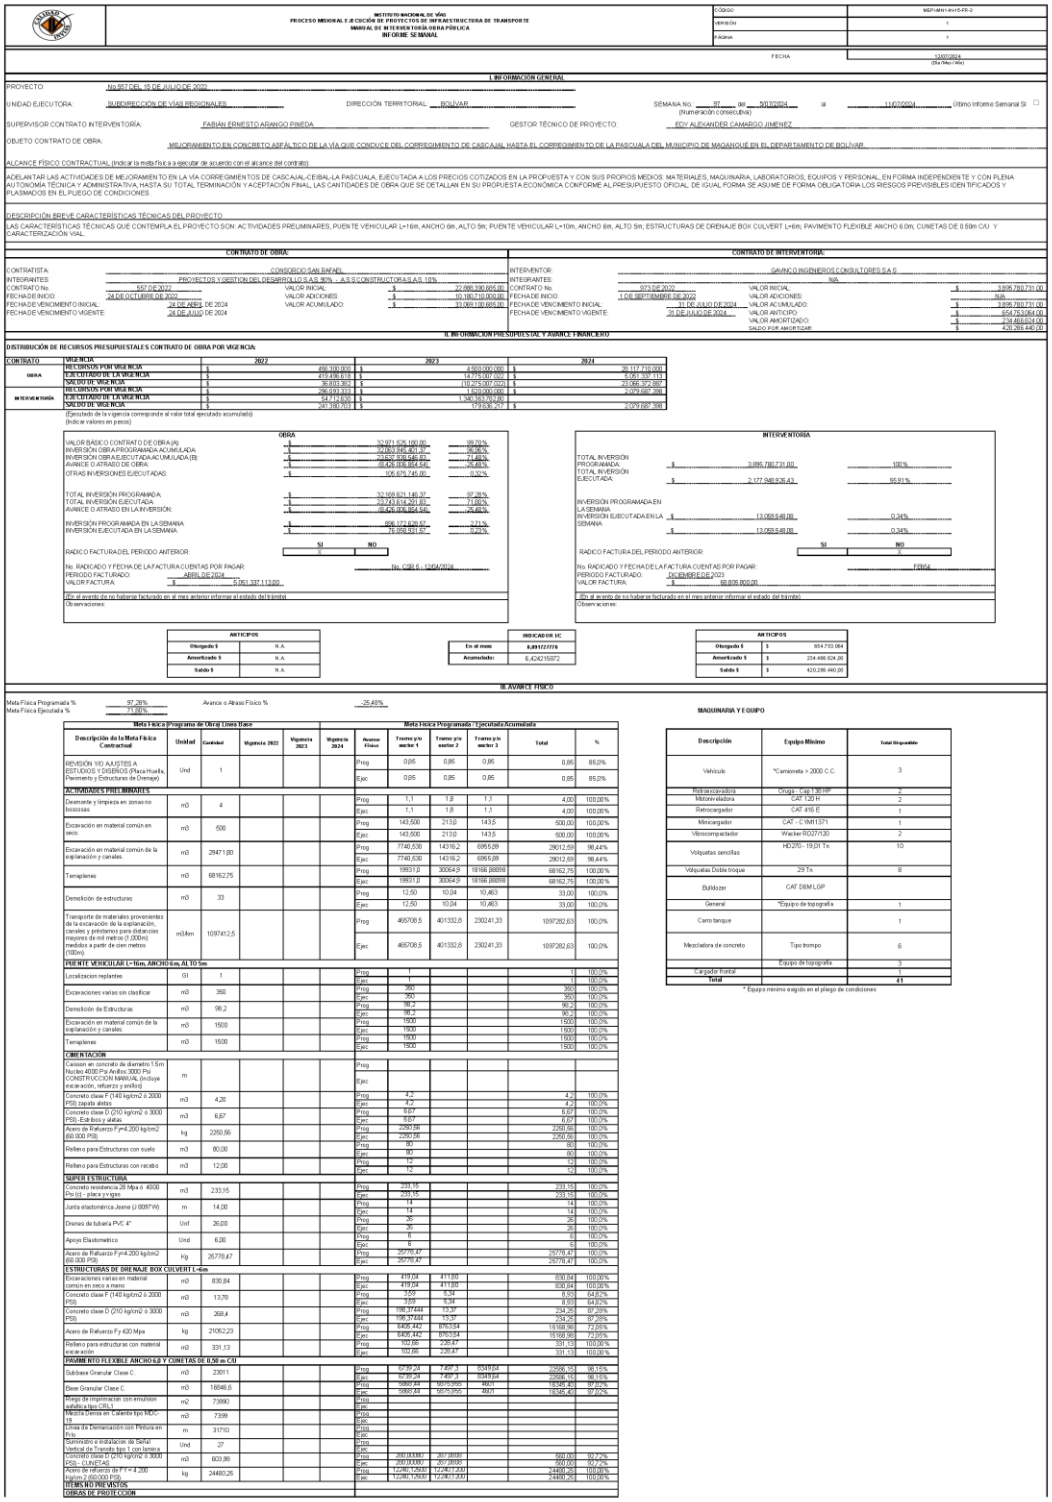

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO: MEP-MAN-I-4-V5-FR-0
VERSIÓN: 1
Adenda: 1
FECHA: 12/07/2024 (Día/Mes/Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: No.957 DEL 15 DE JULIO DE 2022
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA NO. 37 (Numeración Consecutiva) DE 2024 AL 11/07/2024 — Último Informe Semanal SI ☐
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFÁLTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE CASCAJAL HASTA EL CORREGIMIENTO DE LA PASCUALA DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato)
ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN LA VÍA CORREGIMIENTOS DE CASCAJAL-CEIBAL-LA PASCUALA, EJECUTADA A LOS PRECIOS COTIZADOS EN LA PROPUESTA Y CON SUS PROPIOS MEDIOS: MATERIALES, MAQUINARIA, LABORATORIOS, EQUIPOS Y PERSONAL, EN FORMA INDEPENDIENTE Y CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN Y ACEPTACIÓN FINAL, LAS CANTIDADES DE OBRA QUE SE DETALLAN EN SU PROPUESTA ECONÓMICA CONFORME AL PRESUPUESTO OFICIAL DE IGUAL FORMA SE ASUME DE FORMA OBLIGATORIA LOS RIESGOS PREVISIBLES IDENTIFICADOS Y PLASMADOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE CONTEMPLA EL PROYECTO SON: ACTIVIDADES PRELIMINARES, PUENTE VEHICULAR L=16m, ANCHO 6m, ALTO 5m, PUENTE VEHICULAR L=10m, ANCHO 6m, ALTO 5m, ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT L=6m; PAVIMENTO FLEXIBLE ANCHO 6.0m; CUNETAS DE 0.50m C/U Y CARACTERIZACION VIAL.

CONTRATO DE OBRA:
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN RAFAEL
INTEGRANTES: PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.A.S. 90% - A.S.S CONSTRUCTORA S.A.S. 10%
CONTRATO No. 957 DE 2022 — VALOR INICIAL: $ 32.886.390.666,00
FECHA DE INICIO: 24 DE OCTUBRE DE 2022 — VALOR ADICIONES: $ 10.182.710.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 24 DE ABRIL DE 2024 — VALOR ACUMULADO: $ 33.069.100.666,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24 DE JULIO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:
INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 973 DE 2022 — VALOR INICIAL: $ 3.895.780.731,00
FECHA DE INICIO: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 — VALOR ADICIONES: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE JULIO DE 2024 — VALOR ACUMULADO: $ 3.895.780.731,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2024 — VALOR ANTICIPO: $ 654.753.084,00
VALOR AMORTIZADO: $ 234.468.644,00
SALDO POR AMORTIZAR: $ 420.284.440,00

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 499.100.000	$ 4.669.000.000	$ 28.177.710.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 419.496.618	$ 14.775.007.002	$ 5.681.337.113
	SALDO DE VIGENCIA	$ 36.803.382	$ (10.275.007.002)	$ 23.066.372.887
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 296.093.333	$ 1.520.000.000	$ 2.079.687.398
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 54.712.826	$ 1.340.393.780,80	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 241.380.507	$ 179.606.257	$ 2.079.687.398

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 32.971.626.180,00	89,79%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 23.821.845.401,37	64,86%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 23.821.818.641,49	71,88%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (9.426.806.864,51)	-25,49%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 106.679.746,86	0,32%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 32.169.671.146,37	97,26%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 23.743.614.251,86	71,68%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (9.426.806.864,51)	-25,49%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$ 696.172.629,97	2,71%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	$ 76.958.931,67	0,23%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. CSR 6 - 12/04/2024
PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2024
VALOR FACTURA: $ 5.961.397.113,89
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,89122778
Acumulado:	0,42421597

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 3.895.780.731,00	100%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 2.177.948.926,43	55,91%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$ 13.065.548,00	0,34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	$ 13.065.548,00	0,34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FEBRERO
PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE DE 2023
VALOR FACTURA: $ 68.805.800,00
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 654.753.084
Amortizado $	$ 234.468.644,00
Saldo $	$ 420.284.440,00

III. AVANCE FISICO


Meta Física Programada %: 97,26%
Meta Física Ejecutada %: 71,88%
Avance o Atraso Físico %: -25,49%

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Vigencia 2024	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Para Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	Und	1				Prog	0,95	0,95	0,95	0,95	95,0%
						Ejec	0,95	0,95	0,95	0,95	95,0%
ACTIVIDADES PRELIMINARES											
Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	m0	4				Prog	1,1	1,8	1,1	4,00	100,00%
						Ejec	1,1	1,8	1,1	4,00	100,00%
Excavación en material común en seco.	m0	500				Prog	143,500	213,0	143,5	500,00	100,00%
						Ejec	143,500	213,0	143,5	500,00	100,00%
Excavación en material común de la explanación y canales.	m0	29471,80				Prog	7740,530	14316,2	6955,89	29012,69	98,44%
						Ejec	7740,530	14316,2	6955,89	29012,69	98,44%
Terraplenes	m0	68162,75				Prog	19931,0	30064,9	18166,85859	68162,75	100,00%
						Ejec	19931,0	30064,9	18166,85859	68162,75	100,00%
Demolición de estructuras	m0	33				Prog	12,50	10,04	10,463	33,00	100,0%
						Ejec	12,50	10,04	10,463	33,00	100,0%
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000m) medidos a partir de cien metros (100m).	m3Km	1097412,5				Prog	465706,5	401332,8	230241,33	1097282,63	100,0%
						Ejec	465706,5	401332,8	230241,33	1097282,63	100,0%
PUENTE VEHICULAR L=16m, ANCHO 6m, ALTO 5m											
Localizacion replantes	Gl	1				Prog	1			1	100,0%
						Ejec	1			1	100,0%
Excavaciones varias sin clasificar	m0	350				Prog	350			350	100,0%
						Ejec	350			350	100,0%
Demolición de Estructuras	m0	96,2				Prog	96,2			96,2	100,0%
						Ejec	96,2			96,2	100,0%
Excavación en material común de la explanación y canales.	m0	1500				Prog	1500			1500	100,0%
						Ejec	1500			1500	100,0%
Terraplenes	m0	1500				Prog	1500			1500	100,0%
						Ejec	1500			1500	100,0%
CIMENTACION											
Cassion en concreto de diametro 1.5m Nucleo 4000 Psi Anillos 3000 Psi CONSTRUCCION MANUAL (incluye excavación, refuerzo y anillo)	m					Prog					
						Ejec					
Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI) zapata aletas	m3	4,20				Prog	4,2			4,2	100,0%
						Ejec	4,2			4,2	100,0%
Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) Estribos y aletas	m3	6,67				Prog	6,67			6,67	100,0%
						Ejec	6,67			6,67	100,0%
Acero de Refuerzo Fy=4.200 kg/cm2 (60.000 PSI)	kg	2250,56				Prog	2250,56			2250,56	100,0%
						Ejec	2250,56			2250,56	100,0%
Relleno para Estructuras con suelo	m3	80,00				Prog	80			80	100,0%
						Ejec	80			80	100,0%
Relleno para Estructuras con recebo	m3	12,00				Prog	12			12	100,0%
						Ejec	12			12	100,0%
SUPER ESTRUCTURA											
Concreto resistencia 28 Mpa ó 4000 Psi (d) - placa y vigas	m3	233,15				Prog	233,15			233,15	100,0%
						Ejec	233,15			233,15	100,0%
Junta elastomérica Jeene (J 600*W)	m	14,00				Prog	14			14	100,0%
						Ejec	14			14	100,0%
Drenes de tubería PVC 4"	Und	26,00				Prog	26			26	100,0%
						Ejec	26			26	100,0%
Apoyo Elastomérico	Und	6,00				Prog	6			6	100,0%
						Ejec	6			6	100,0%
Acero de Refuerzo Fy=4.200 kg/cm2 (60.000 PSI)	Kg	25778,47				Prog	25778,47			25778,47	100,0%
						Ejec	25778,47			25778,47	100,0%
ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT L=6m											
Excavaciones varias en material común en seco a mano	m0	830,84				Prog	419,04	411,80		830,84	100,00%
						Ejec	419,04	411,80		830,84	100,00%
Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	m0	13,78				Prog	3,59	5,34		8,93	64,82%
						Ejec	3,59	5,34		8,93	64,82%
Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	m0	268,4				Prog	198,37444	13,20		234,25	87,28%
						Ejec	198,37444	13,20		234,25	87,28%
Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	kg	21052,23				Prog	8405,442	8783,64		15189,96	72,26%
						Ejec	8405,442	8783,64		15189,96	72,26%
Relleno para estructuras con material excavación	m0	331,13				Prog	102,86	228,27		331,13	100,00%
						Ejec	102,86	228,27		331,13	100,00%
PAVIMENTO FLEXIBLE ANCHO 6,0 Y CUNETAS DE 0,50 m C/U											
Subbase Granular Clase C	m0	23811				Prog	6739,24	7499,3	8549,64	22988,15	96,15%
						Ejec	6739,24	7499,3	8549,64	22988,15	96,15%
Base Granular Clase C	m0	16946,8				Prog	5860,44	9979,956	4601	18545,40	97,82%
						Ejec	5860,44	9979,956	4601	18545,40	97,82%
Riego de imprimacion con emulsion asfaltica tipo CRL1	m2	7599,0				Prog					
						Ejec					
Mezcla densa en Caliente tipo MDC-19	m3	7599				Prog					
						Ejec					
Linea de Demarcación con Pintura en frio	m	31710				Prog					
						Ejec					
Suministro e instalacion de Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina	Und	27				Prog					
						Ejec					
Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)- CUNETAS	m3	603,90				Prog	260,00000	267,39585		660,000	92,72%
						Ejec	260,00000	267,39585		660,000	92,72%
Acero de refuerzo de FY= 4.200 kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	24480,26				Prog	12280,12500	12280,12500		24480,250	100,00%
						Ejec	12280,12500	12280,12500		24480,250	100,00%
ITEMS NO PREVISTOS											
OBRAS DE PROTECCION											

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Vehículo	*Camioneta > 2000 C.C.	3
Retrocavadora	Oruga - Cap 138 HP	2
Motoniveladora	CAT 120 H	2
Retrocargador	CAT 416 E	1
Minicargador	CAT - C1M11371	1
Vibrocompactador	Wacker RD27/120	2
Volquetes sencillos	HD270 - 19.01 Tn	10
Volquetas Doble troque	29 Tn	8
Bulldozer	CAT D6M LGP	
General	*Equipo de topografía	1
Carro tanque		1
Mezcladora de concreto	Tipo trompo	6
	Equipo de topografía	3
Cargador frontal		1
Total		41

* Equipo mínimo exigido en el pliego de condiciones

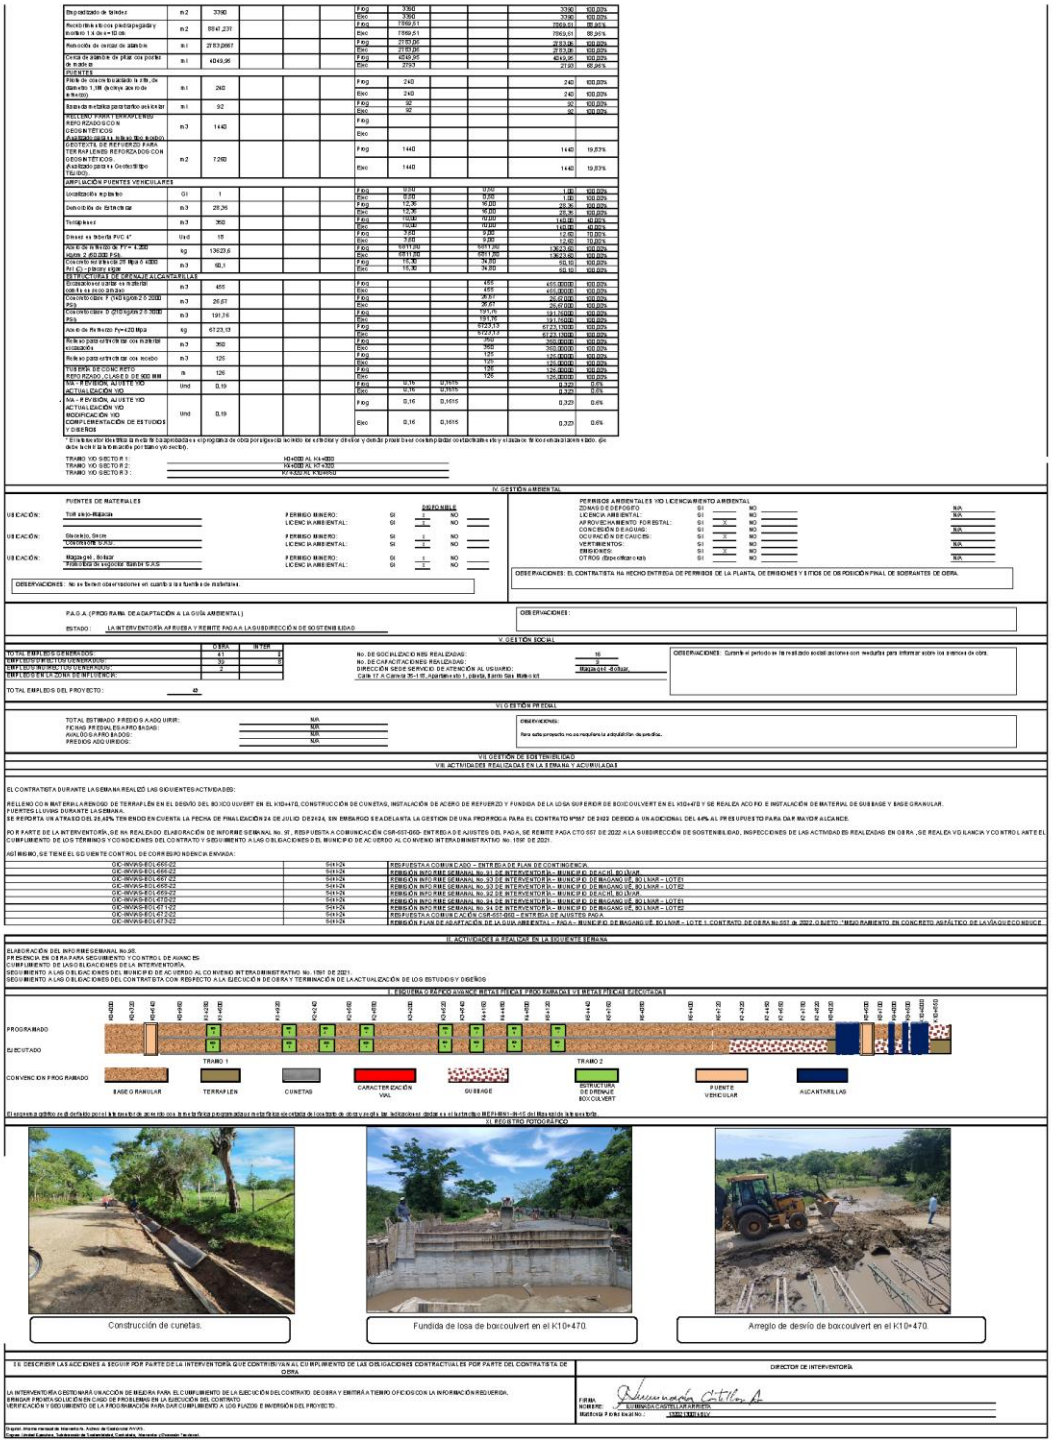

Empradizado de bordes	m2	3360				Prog	3360			3360	100,00%
						Ejec	3360			3360	100,00%
Revestimiento en concreto prefundido y pegado en sitio 1.4 de e = 10 cm	m2	8847,231				Prog	7869,51			7869,51	88,96%
						Ejec	7869,51			7869,51	88,96%
Relleno de cunetas en tierra	m3	2153,2867				Prog	2153,28			2153,28	100,00%
						Ejec	2153,28			2153,28	100,00%
Concreto premezclado de pilas con psimiento de sitio	m3	4043,95				Prog	4043,95			4043,95	100,00%
						Ejec	2753			2753	68,06%
PUENTES												
Pilote de concreto excavado in situ, de diámetro 1,00 (incluye acero de refuerzo)	m1	240				Prog	240			240	100,00%
						Ejec	240			240	100,00%
Baranda metálica para tráfico vehicular	m1	92				Prog	92			92	100,00%
						Ejec	92			92	100,00%
RELLENO PARA ESTRUCTURAS REFORZADAS CON GEOSINTÉTICOS (Actividad para el Geosintético Tipo Biaxial)	m3	1440				Prog					
						Ejec					
GEOTEXTIL DE REFUERZO PARA TERRAPLENES REFORZADOS CON GEOSINTÉTICOS (Actividad para el Geosintético Tipo Biaxial)	m2	7200				Prog	1440			1440	19,83%
						Ejec	1440			1440	19,83%
AMPLIACIÓN PUENTES VEHICULARES												
Localización replanteo	Gl	1				Prog	1,00			1,00	100,00%
						Ejec	1,00			1,00	100,00%
Demolición de Estructura	m3	28,36				Prog	12,36		16,00	28,36	100,00%
						Ejec	12,36		16,00	28,36	100,00%
Terraplenes	m3	350				Prog	150,00		200,00	350,00	100,00%
						Ejec	150,00		200,00	350,00	100,00%
Dresaje en tubería PVC 6"	Und	18				Prog	7,00		11,00	18,00	100,00%
						Ejec	7,00		11,00	18,00	100,00%
Acero de refuerzo de Fy= 4.200 kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	13623,6				Prog	6811,80		6811,80	13623,60	100,00%
						Ejec	6811,80		6811,80	13623,60	100,00%
Concreto estructural 28 Mpa (4.000 Psi) - plinto y viga	m3	68,1				Prog	34,05		34,05	68,10	100,00%
						Ejec	34,05		34,05	68,10	100,00%
ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLAS												
Excavación en cualquier clase de material	m3	455				Prog			455	455,00	100,00%
						Ejec			455	455,00	100,00%
Concreto clase Y (VIGAS) 28 Mpa (4.000 Psi)	m3	26,67				Prog			26,67	26,67	100,00%
						Ejec			26,67	26,67	100,00%
Concreto clase D (CIMENTACIÓN) 21 Mpa (3.000 Psi)	m3	191,76				Prog			191,76	191,76	100,00%
						Ejec			191,76	191,76	100,00%
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg	6123,13				Prog			6123,13	6123,13	100,00%
						Ejec			6123,13	6123,13	100,00%
Relleno para estructuras con material seleccionado	m3	350				Prog			350	350,00	100,00%
						Ejec			350	350,00	100,00%
Relleno para estructuras con recebo	m3	125				Prog			125	125,00	100,00%
						Ejec			125	125,00	100,00%
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE C DE 900 MM	m	126				Prog			126	126,00	100,00%
						Ejec			126	126,00	100,00%
N/A - P. REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O	Und	0,19				Prog	0,16	0,1615		0,323	0,6%
						Ejec	0,16	0,1615		0,323	0,6%
N/A - P. REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	Und	0,19				Prog	0,16	0,1615		0,323	0,6%
						Ejec	0,16	0,1615		0,323	0,6%

* En la tabla anterior debe incluir la cantidad de actividades a ejecutar en el programa de obra por progresiva, teniendo en cuenta el tramo o sector en el que se ejecutará la actividad. Se debe incluir la actividad por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR # 1: KM 000 AL KM 470
TRAMO Y/O SECTOR # 2: KM 000 AL KM 470
TRAMO Y/O SECTOR # 3: KM 000 AL KM 000

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	Tolva seco - Ibagué	PERMISO MINERO:	SI	X	NO		
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		
UBICACIÓN:	Chicoral - Girardot	PERMISO MINERO:	SI	X	NO		
	CONCRETOS SOLIC	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	
UBICACIÓN:	Magagual - Girardot	PERMISO MINERO:	SI	X	NO		
	Proveedores explotar Tolvita S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		

OBSERVACIONES: No se tienen observaciones en cuanto a las fuentes de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A
EMISIONES:	SI	X	NO	
OTROS (Especificar cuáles)	SI		NO	N/A

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA HA HECHO ENTREGA DE PERMISOS DE LA PLANTA, DE EMISIONES Y SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES DE OBRA.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: LA INTERVENTORÍA APRUEBA Y REMITE PAGA A LA SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	41	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	39	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 49

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 16
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Magagual -Girardot.
Calle 17 A Carrera 36 - 18, Apartamento 01, piloto, Barrio San Mateo Kit

OBSERVACIONES: Durante el periodo se ha realizado socializaciones con resultados para informar sobre los avances de obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:
Para este proyecto no se requiere la adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EL CONTRATISTA DURANTE LA SEMANA REALIZÓ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

RELLENO CON MATERIAL AREnoso, DE TERRAPLÉN EN EL DISEÑO DEL BOXCOULVERT EN EL KM+470, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO Y FUNDIDA DE LA LOSA SUPERIOR DE BOXCOULVERT EN EL KM+470 Y SE REALIZA ACOPIO E INSTALACIÓN DE MATERIAL DE SUBBASE Y BASE GRANULAR.
FUENTES LLOVIG DURANTE LA SEMANA.
SE REPORTA UN ATRASO DE 25,48% TENIENDO EN CUENTA LA FECHA DE FINALIZACIÓN 24 DE JULIO DE 2024, SIN EMBARGO SE ADELANTA LA GESTION DE UNA PRORROGA PARA EL CONTRATO N°987 DE 2022 DEBIDO A UN ADICIONAL DEL 44% AL PRESUPUESTO PARA DAR MAYOR ALCANCE.

POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, SE HA REALIZADO ELABORACIÓN DE INFORME SEMANAL No. 01, RESPUESTA A COMUNICACIÓN CSR-001-000- ENTREGA DE AJUSTES DEL PAGA, SE REMITE PAGA CTO 987 DE 2022 A LA SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD, INSPECCIONES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA , SE REALIZA VIGILANCIA Y CONTROL FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO Y SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1090 DE 2021.

ASIMISMO, SE TIENE EL SIGUIENTE CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA:

OIC-INVIAS-SEOL-665-22	5/01/24	RESPUESTA A COMUNICADO – ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA.
OIC-INVIAS-SEOL-666-22	5/01/24	REMISION INFORME SEMANAL No. 31 DE INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DE BELTRÁN BOLÍVAR
OIC-INVIAS-SEOL-667-22	5/01/24	REMISION INFORME SEMANAL No. 33 DE INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLÍVAR – LOTE1
OIC-INVIAS-SEOL-668-22	5/01/24	REMISION INFORME SEMANAL No. 33 DE INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLÍVAR – LOTE2
OIC-INVIAS-SEOL-669-22	5/01/24	REMISION INFORME SEMANAL No. 32 DE INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DE BELTRÁN BOLÍVAR
OIC-INVIAS-SEOL-670-22	5/01/24	REMISION INFORME SEMANAL No. 34 DE INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLÍVAR – LOTE1
OIC-INVIAS-SEOL-671-22	5/01/24	REMISION INFORME SEMANAL No. 34 DE INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLÍVAR – LOTE2
OIC-INVIAS-SEOL-672-22	5/01/24	RESPUESTA A COMUNICACIÓN CSR-001-000 – ENTREGA DE AJUSTES PAGA
OIC-INVIAS-SEOL-673-22	5/01/24	REMISION PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL – PAGA – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLÍVAR – LOTE 1. CONTRATO DE OBRA No.987 de 2022. OBJETO: "MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFÁLTICO DE LA VÍA QUECO NIQUE

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ELABORACIÓN DEL INFORME SEMANAL No.26.
PRESENCIA EN OBRA PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AVANCES.
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA.
SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1090 DE 2021.
SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA Y TERMINACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

X. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

El cronograma anterior es el contenido para la ejecución de las actividades restantes para completar el contrato de obra y evalúa las actividades ejecutadas en el tramo vía MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFÁLTICO DE LA VÍA QUECO NIQUE

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Construcción de cunetas.

Fundida de losa de barcoulvert en el K10+470.


Arreglo de desrío de barcoulvert en el K10+470.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

LA INTERVENTORÍA GESTIONARÁ UNA CITACIÓN DE MEJORA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Y EMITIRÁ A TIEMPO OFICIOS CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA.
EMISIÓN PRONTA SOLUCIÓN EN CASO DE PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS E INVERSIÓN DEL PROYECTO.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: EDWIN CASTELLAR ARRIETA
Matrícula Profesional No.: 13502-134214 BOY

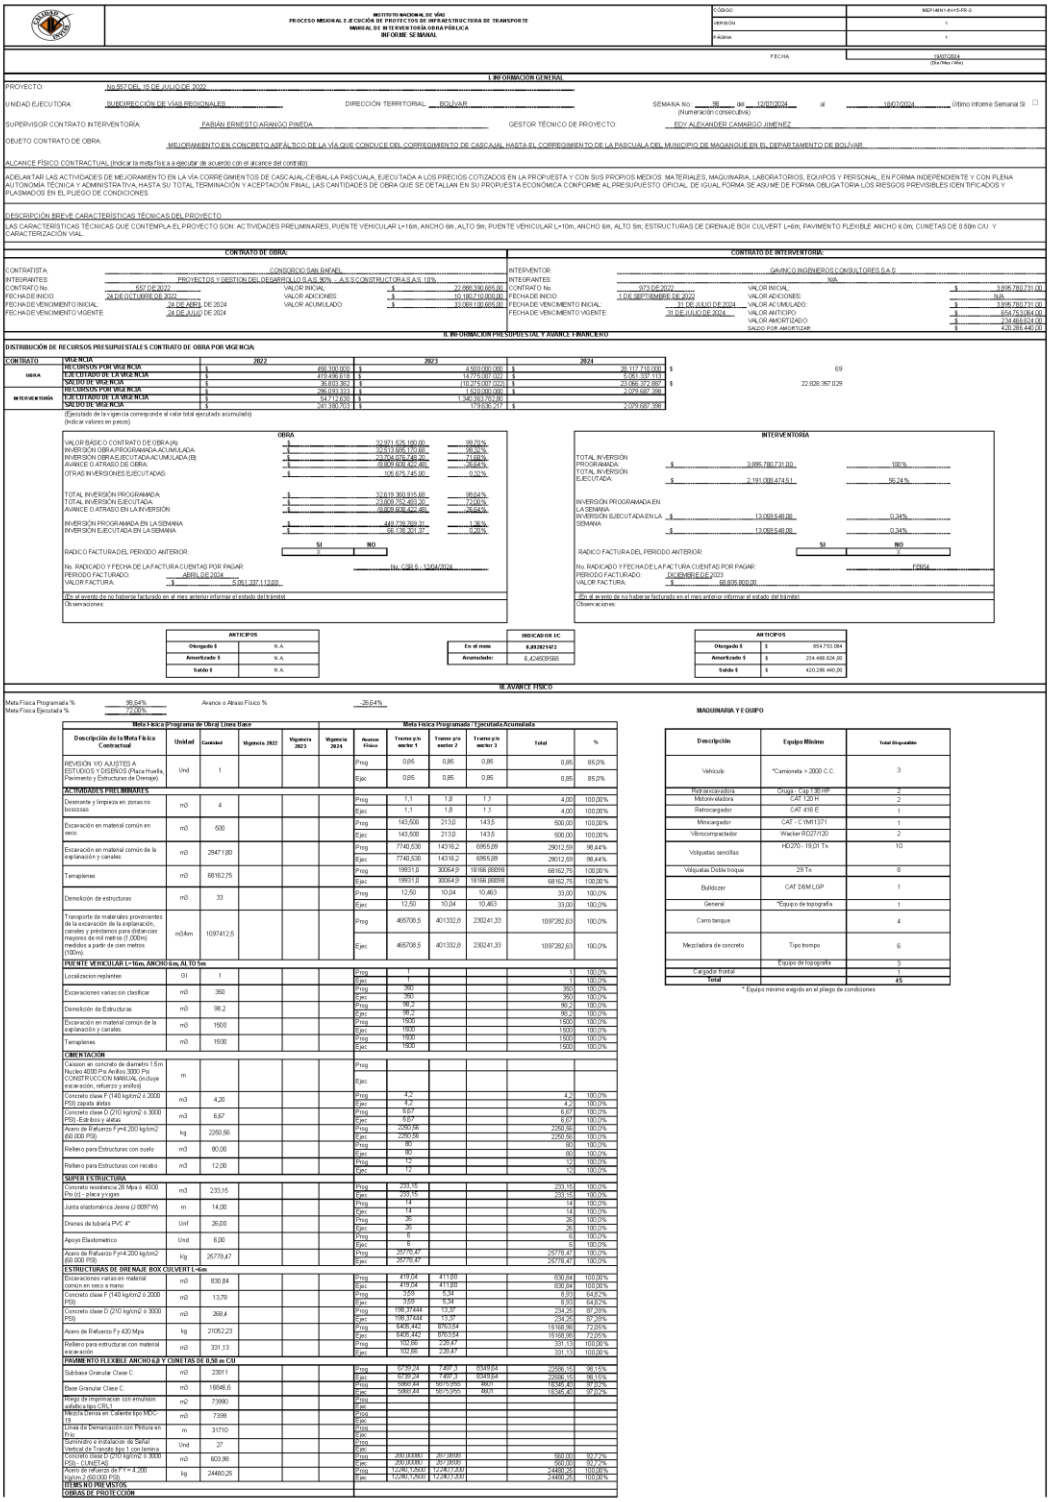

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEP-MAN1-4-V1-5-FR-0
VERSIÓN	1
# Acción	1
FECHA	19/07/2024 (Día/Mes/Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: No.957 DEL 15 DE JULIO DE 2022

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA NO. 38 (Numeración consecutiva) DE 12/07/2024 AL 19/07/2024 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFÁLTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE CASCAJAL HASTA EL CORREGIMIENTO DE LA PASCUALA DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato)

ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN LA VÍA CORREGIMIENTOS DE CASCAJAL-CEIBAL-LA PASCUALA, EJECUTADA A LOS PRECIOS COTIZADOS EN LA PROPUESTA Y CON SUS PROPIOS MEDIOS: MATERIALES, MAQUINARIA, LABORATORIOS, EQUIPOS Y PERSONAL, EN FORMA INDEPENDIENTE Y CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN Y ACEPTACIÓN FINAL, LAS CANTIDADES DE OBRA QUE SE DETALLAN EN SU PROPUESTA ECONÓMICA CONFORME AL PRESUPUESTO OFICIAL DE IGUAL FORMA SE ASUME DE FORMA OBLIGATORIA LOS RIESGOS PREVISIBLES IDENTIFICADOS Y PLASMADOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE CONTEMPLA EL PROYECTO SON: ACTIVIDADES PRELIMINARES, PUENTE VEHICULAR L=16m, ANCHO 6m, ALTO 5m, PUENTE VEHICULAR L=10m, ANCHO 6m, ALTO 5m, ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT L=6m; PAVIMENTO FLEXIBLE ANCHO 6.0m; CUNETAS DE 0.50m C/U Y CARACTERIZACION VIAL.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:	PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.A.S. 90% - A.S.S CONSTRUCTORA S.A.S. 10%	INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	957 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 32.886.390.666,00	CONTRATO No.	973 DE 2022
FECHA DE INICIO:	24 DE OCTUBRE DE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 10.190.710.000,00	FECHA DE INICIO:	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24 DE ABRIL DE 2024	VALOR ACUMULADO:	$ 33.069.100.666,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE JULIO DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24 DE JULIO DE 2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE JULIO DE 2024

VALOR INICIAL:	$	3.895.780.731,00
VALOR ADICIONES:		N/A
VALOR ACUMULADO:	$	3.895.780.731,00
VALOR ANTICIPO:	$	854.753.084,00
VALOR AMORTIZADO:	$	234.466.644,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$	420.286.440,00

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 499.100.000	$ 4.669.000.000	$ 28.177.710.000	$ 69
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 419.406.618	$ 14.775.007.002	$ 9.061.397.113	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 36.803.382	$ (10.275.007.002)	$ 23.066.372.887	$ 22.826.367.029
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 296.693.333	$ 1.520.000.000	$ 2.079.687.398	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 54.712.826	$ 1.340.393.784,80		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 241.980.507	$ 179.606.217	$ 2.079.687.398	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 32.971.626.180,00	99,79%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 32.511.806.180,00	98,40%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 24.304.876.749,80	73,68%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (8.206.929.430,20)	-25,64%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 106.679.746,00	0,32%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 32.618.360.915,80	99,04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 24.411.556.495,80	73,86%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (8.206.804.420,00)	-25,64%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$ 449.739.789,20	1,36%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	$ 86.136.201,20	0,26%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. CSR 5 - 12/04/2024
PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2024
VALOR FACTURA: $ 5.961.337.113,80

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 3.895.780.731,00	100%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 2.191.008.474,61	56,24%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$ 13.065.548,00	0,34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	$ 13.065.548,00	0,34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: PENDIENTE
PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE DE 2023
VALOR FACTURA: $ 68.805.800,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,89282102
Acumulado:	0,42482668

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 854.753.084
Amortizado $	$ 234.466.644,00
Saldo $	$ 420.286.440,00

III. AVANCE FISICO


Meta Física Programada %: 98,64%
Meta Física Ejecutada %: 72,00%
Avance o Atraso Físico %: -26,64%

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Vigencia 2024	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Para Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	Und	1				Prog	0,95	0,95	0,95	0,95	95,0%
						Ejec	0,95	0,95	0,95	0,95	95,0%
ACTIVIDADES PRELIMINARES											
Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	m0	4				Prog	1,1	1,8	1,1	4,00	100,00%
						Ejec	1,1	1,8	1,1	4,00	100,00%
Excavación en material común en seco.	m0	500				Prog	143,500	213,0	143,5	500,00	100,00%
						Ejec	143,500	213,0	143,5	500,00	100,00%
Excavación en material común de la explanación y canales.	m0	29471,80				Prog	7740,530	14316,2	6955,89	29012,69	98,44%
						Ejec	7740,530	14316,2	6955,89	29012,69	98,44%
Terraplenes	m0	68162,75				Prog	19931,0	30064,9	18166,85859	68162,75	100,00%
						Ejec	19931,0	30064,9	18166,85859	68162,75	100,00%
Demolición de estructuras	m0	33				Prog	12,50	10,04	10,463	33,00	100,0%
						Ejec	12,50	10,04	10,463	33,00	100,0%
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000m) medidos a partir de cien metros (100m).	m3Km	1097412,5				Prog	465706,5	401332,8	230241,33	1097282,63	100,0%
						Ejec	465706,5	401332,8	230241,33	1097282,63	100,0%
PUENTE VEHICULAR L=16m, ANCHO 6m, ALTO 5m											
Localizacion replantes	Gl	1				Prog	1			1	100,0%
						Ejec	1			1	100,0%
Excavaciones varias sin clasificar	m0	350				Prog	350			350	100,0%
						Ejec	350			350	100,0%
Demolición de Estructuras	m0	96,2				Prog	96,2			96,2	100,0%
						Ejec	96,2			96,2	100,0%
Excavación en material común de la explanación y canales.	m0	1500				Prog	1500			1500	100,0%
						Ejec	1500			1500	100,0%
Terraplenes	m0	1500				Prog	1500			1500	100,0%
						Ejec	1500			1500	100,0%
CIMENTACION											
Cassion en concreto de diametro 1.5m Nucleo 4000 Psi Anillos 3000 Psi CONSTRUCCION MANUAL (incluye excavación, refuerzo y anillo)	m					Prog					
						Ejec					
Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI) zapata aletas	m3	4,20				Prog	4,2			4,2	100,0%
						Ejec	4,2			4,2	100,0%
Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) Estribos y aletas	m3	6,67				Prog	6,67			6,67	100,0%
						Ejec	6,67			6,67	100,0%
Acero de Refuerzo Fy=4.200 kg/cm2 (60.000 PSI)	kg	2250,56				Prog	2250,56			2250,56	100,0%
						Ejec	2250,56			2250,56	100,0%
Relleno para Estructuras con suelo	m3	80,00				Prog	80			80	100,0%
						Ejec	80			80	100,0%
Relleno para Estructuras con recebo	m3	12,00				Prog	12			12	100,0%
						Ejec	12			12	100,0%
SUPER ESTRUCTURA											
Concreto resistencia 28 Mpa ó 4000 Psi (d) - placa y vigas	m3	233,15				Prog	233,15			233,15	100,0%
						Ejec	233,15			233,15	100,0%
Junta elastomérica Jeene (J 600*W)	m	14,00				Prog	14			14	100,0%
						Ejec	14			14	100,0%
Drenes de tubería PVC 4"	Und	26,00				Prog	26			26	100,0%
						Ejec	26			26	100,0%
Apoyo Elastomérico	Und	6,00				Prog	6			6	100,0%
						Ejec	6			6	100,0%
Acero de Refuerzo Fy=4.200 kg/cm2 (60.000 PSI)	Kg	25778,47				Prog	25778,47			25778,47	100,0%
						Ejec	25778,47			25778,47	100,0%
ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT L=6m											
Excavaciones varias en material común en seco a mano	m0	830,84				Prog	419,04	411,80		830,84	100,00%
						Ejec	419,04	411,80		830,84	100,00%
Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	m0	13,78				Prog	3,59	5,34		8,93	64,82%
						Ejec	3,59	5,34		8,93	64,82%
Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	m0	268,4				Prog	198,37444	13,88		234,25	87,28%
						Ejec	198,37444	13,88		234,25	87,28%
Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	kg	21052,23				Prog	8405,442	8783,64		19189,96	72,26%
						Ejec	8405,442	8783,64		19189,96	72,26%
Relleno para estructuras con material excavación	m0	331,13				Prog	102,86	228,27		331,13	100,00%
						Ejec	102,86	228,27		331,13	100,00%
PAVIMENTO FLEXIBLE ANCHO 6,0 Y CUNETAS DE 0,50 m C/U											
Subbase Granular Clase C	m0	2301				Prog	6739,24	7499,3	8349,24	22588,15	98,15%
						Ejec	6739,24	7499,3	8349,24	22588,15	98,15%
Base Granular Clase C	m0	16846,8				Prog	5860,44	9575,955	4601	18548,40	97,82%
						Ejec	5860,44	9575,955	4601	18548,40	97,82%
Riego de imprimacion con emulsion asfaltica tipo CRL1	m2	7599				Prog					
						Ejec					
Mezcla densa en Caliente tipo MDC-19	m3	7599				Prog					
						Ejec					
Linea de Demarcación con Pintura en frio	m	31710				Prog					
						Ejec					
Suministro e instalacion de Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina	Und	27				Prog					
						Ejec					
Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)- CUNETAS	m3	603,96				Prog	260,00000	267,39185		660,00	92,72%
						Ejec	260,00000	267,39185		660,00	92,72%
Acero de refuerzo de FY= 4.200 kg/cm2 (60.000 PSI)	kg	24480,26				Prog	12280,12500	12280,12500		24480,25	100,00%
						Ejec	12280,12500	12280,12500		24480,25	100,00%
ITEMS NO PREVISTOS											
OBRAS DE PROTECCION											

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Vehículo	*Camioneta > 2000 C.C.	3
Retroexcavadora	Oruga - Cap 138 HP	2
Motoniveladora	CAT 120 H	2
Retrocargador	CAT 416 E	1
Minicargador	CAT - C1M11371	1
Vibrocompactador	Wacker RD27/120	2
Volquetes sencillos	HD270 - 19,01 Tn	10
Volquetas Doble troque	29 Tn	8
Bulldozer	CAT D6M LGP	1
General	*Equipo de topografía	1
Carro tanque		4
Mezcladora de concreto	Tipo trompo	6
	Equipo de topografía	3
Cargador frontal		1
Total		**45**

* Equipo mínimo exigido en el pliego de condiciones

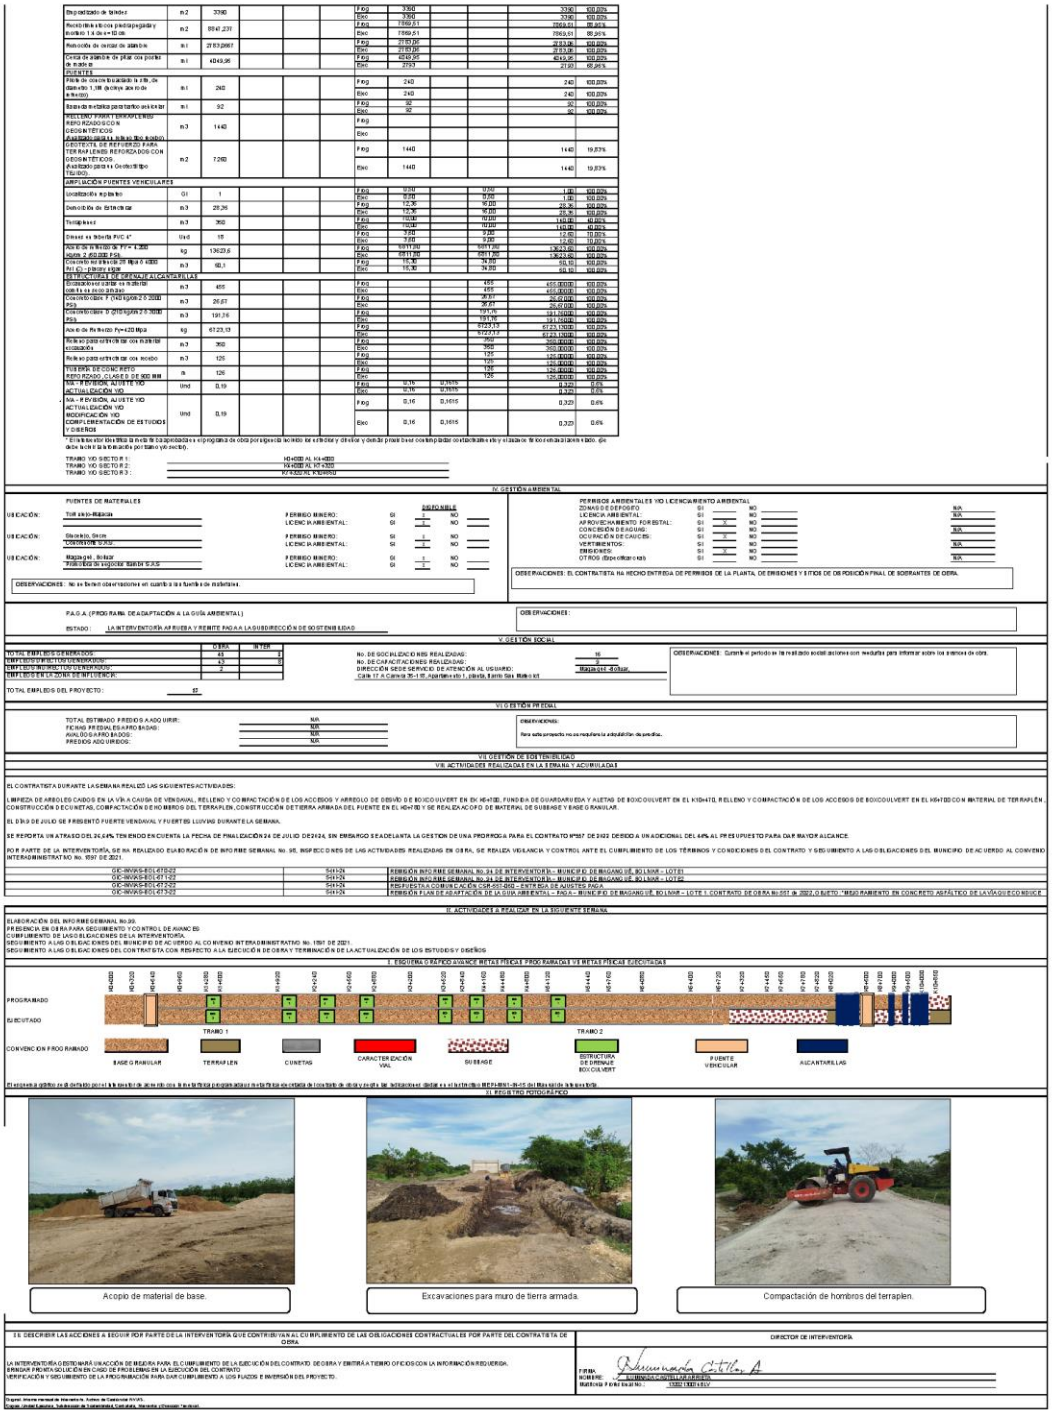

Empradizado de bolsillos	m2	3360				Prog	3360			3360	100,00%
						Ejec	3360			3360	100,00%
Revestimiento en concreto pre-fundido y pegado en sitio de 1.5 de e = 10 cm	m2	8847,239				Prog	7869,51			7869,51	88,96%
						Ejec	7869,51			7869,51	88,96%
Relleno de cunetas en piedra bola	m3	2153,2867				Prog	2153,28			2153,28	100,00%
						Ejec	2153,28			2153,28	100,00%
Concreto premezclado de pilas con psi para de muros de	m3	4043,95				Prog	4043,95			4043,95	100,00%
						Ejec	2753			2753	68,06%
PUENTES											
Pilote de concreto fundido in situ, de diámetro 1,00 (incluye acero de refuerzo)	m1	240				Prog	240			240	100,00%
						Ejec	240			240	100,00%
Baranda metálica para tráfico vehicular	m1	92				Prog	92			92	100,00%
						Ejec	92			92	100,00%
RELLENO FRENTE ESTRUCTURAS REFORZADOS CON GEOSINTÉTICOS (Actividad 3.6.1.1 a la 3.6.1.10 inclusive)	m3	1440				Prog					
						Ejec					
GEOTEXTIL DE REFUERZO PARA TERRAPLENES REFORZADOS CON GEOSINTÉTICOS (Actividad para 1 Geotextil tipo TEJIDO)	m2	7200				Prog	1440			1440	19,97%
						Ejec	1440			1440	19,97%
AMPLIACIÓN PUENTES VEHICULARES											
Localización replanteo	Gl	1				Prog	1000			1,00	100,00%
						Ejec	1000			1,00	100,00%
Demolición de Estructura	m3	28,36				Prog	16,00			28,36	100,00%
						Ejec	12,36			28,36	100,00%
Terraplenes	m3	350				Prog	10,00			140,00	40,00%
						Ejec	10,00			140,00	40,00%
Dowel en barra PVC 4"	Und	16				Prog	9,00			12,00	75,00%
						Ejec	9,00			12,00	75,00%
Acero de refuerzo de Fy= 4.200 kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	13623,6				Prog	6811,80			13623,60	100,00%
						Ejec	6811,80			13623,60	100,00%
Concreto ciclópeo 28 Mpa (4.000 Psi) (1 - piloteo viga)	m3	68,1				Prog	16,30			68,10	100,00%
						Ejec	16,30			68,10	100,00%
ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLAS											
Excavación en cualquier clase de material	m3	455				Prog			455	455,00	100,00%
						Ejec			455	455,00	100,00%
Concreto clase Y (Vr≥ 5.000 PSI)	m3	26,67				Prog			26,67	26,67	100,00%
						Ejec			26,67	26,67	100,00%
Concreto clase D (210 kg/cm 2 = 3.000 Psi)	m3	191,76				Prog			191,76	191,76	100,00%
						Ejec			191,76	191,76	100,00%
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg	6123,13				Prog			6123,13	6123,13	100,00%
						Ejec			6123,13	6123,13	100,00%
Relleno para estructuras con material seleccionado	m3	350				Prog			350	350,00	100,00%
						Ejec			350	350,00	100,00%
Relleno para estructuras con recebo	m3	125				Prog			125	125,00	100,00%
						Ejec			125	125,00	100,00%
TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II, DE 900 MM	m	126				Prog			126	126,00	100,00%
						Ejec			126	126,00	100,00%
N/A - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O	Und	0,19				Prog	0,16	0,1615		0,323	0,6%
						Ejec	0,16	0,1615		0,323	0,6%
N/A - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	Und	0,19				Prog	0,16	0,1615		0,323	0,6%
						Ejec	0,16	0,1615		0,323	0,6%

* En la tabla anterior debe incluir la capacidad y el programa de obra por lo que la actividad se refiere y describir y detallar para el buen cumplimiento contractual en el y el plazo. Si no se ha iniciado la obra, no la relacionada por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR # 1: KM 000 AL KM 000
TRAMO Y/O SECTOR # 2: KM 000 AL KM 000
TRAMO Y/O SECTOR # 3: KM 000 AL KM 000

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	Tolú viejo - Rabolo	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	Chalán, Sucre	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	COMERCIALIZADORA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:	Majagual, Sucre	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	Proveedor de material Rabolo S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	

OBSERVACIONES: No se tienen observaciones en cuanto a las fuentes de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A
EMISIONES:	SI	X	NO	
OTROS (Especificar cuál)	SI		NO	N/A

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA HA HECHO ENTREGA DE PERMISOS DE LA PLANTA, DE EMISIONES Y SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES DE OBRA.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: LA INTERVENTORÍA APRUEBA Y REMITE PAGA A LA SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	45	0
EMPLEOS DIRECTOS VENDEDORES:	43	0
EMPLEOS INDIRECTOS VENDEDORES:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 87

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 16
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Majagual - Sucre.
Calle 17 A Carrera 36 - 15, Apartamento 1, planta, Barrio San Rafael

OBSERVACIONES: Durante el periodo se ha realizado socializaciones con resultados para informar sobre los avances de obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:
Para este proyecto no se requiere la adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE LOS TERRENOS

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EL CONTRATISTA DURANTE LA SEMANA REALIZÓ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

LIMPIEZA DE ARBOLES CAIDOS EN LA VÍA A CAUSA DE VENDAVAL, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LOS ACCESOS Y ARREGLO DE DESVÍO DE BOXCOULVERT EN EL K0+120, FUNDIDA DE GUARDARUEDA Y ALETAS DE BOXCOULVERT EN EL K0+470, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LOS ACCESOS DE BOXCOULVERT EN EL K0+470 CON MATERIAL DE TERRAPLÉN , CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, COMPACTACIÓN DE HOMBROS DEL TERRAPLEN, CONSTRUCCIÓN DE TIERRA ARMADA DEL PUENTE EN EL K0+700 Y SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL DE SUBBASE Y BASE GRANULAR.

EL DÍA 9 DE JULIO SE PRESENTÓ FUERTE VENDAVAL Y FUERTES LLUVIAS DURANTE LA SEMANA.

SE REPORTA UN ATRASO DEL 24,64% TENIENDO EN CUENTA LA FECHA DE FINALIZACIÓN 24 DE JULIO DE 2024, SIN EMBARGO SE ADELANTA LA GESTION DE UNA PRORROGA PARA EL CONTRATO Nº987 DE 2022 DEBIDO A UN ADICIONAL DEL 44% AL PRESUPUESTO PARA DAR MAYOR ALCANCE.

POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, SE HA REALIZADO ELABORACIÓN DE INFORME SEMANAL No. 98, INSPECCIONES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA, SE REALIZA VIGILANCIA Y CONTROL ANTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO Y SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1097 DE 2021.

GIC-INVIAS-EDO-417-022	5/11/24	REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 94 DE INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLÍVAR – LOTE1
GIC-INVIAS-EDO-417-022	5/11/24	REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 94 DE INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLÍVAR – LOTE2
GIC-INVIAS-EDO-417-023	5/11/24	RESPUESTA COMUNICACIÓN CSR-001-0062 – ENTREGA DE AJUSTES PAGA
GIC-INVIAS-EDO-417-024	5/11/24	REMISIÓN PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL – PAGA – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLÍVAR – LOTE 1. CONTRATO DE OBRA No.987 de 2022, O SUJETO "MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFÁLTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ELABORACIÓN DEL INFORME SEMANAL No.99.
PRESENCIA EN OBRA PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AVANCES
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA.
SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1097 DE 2021.
SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA Y TERMINACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS Y METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico se diligenciará por la interventoría de acuerdo a la actividad programada en la ficha de control de obra y reporte del contratista, diligenciará en el cuadro de REPLANTEO DEL PROYECTO

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Acopio de material de base.

Excavaciones para muro de tierra armada.

Compactación de hombros del terraplen.


XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

LA INTERVENTORÍA GESTIONARÁ UNA CITACIÓN DE MESURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Y EMITIRÁ A TIEMPO OFICIOS CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA.
EMISIÓN PRONTA SOLUCIÓN EN CASO DE PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS E INVERSIÓN DEL PROYECTO.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: ALEJANDRO CASTILLO ARRIETA
Matrícula Profesional No.: 1102-178514-CAV

Original: Interventoría de Interventoría. Archivo de Contratación INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Transversales Contratista, Interventoría (Consultor Individual).

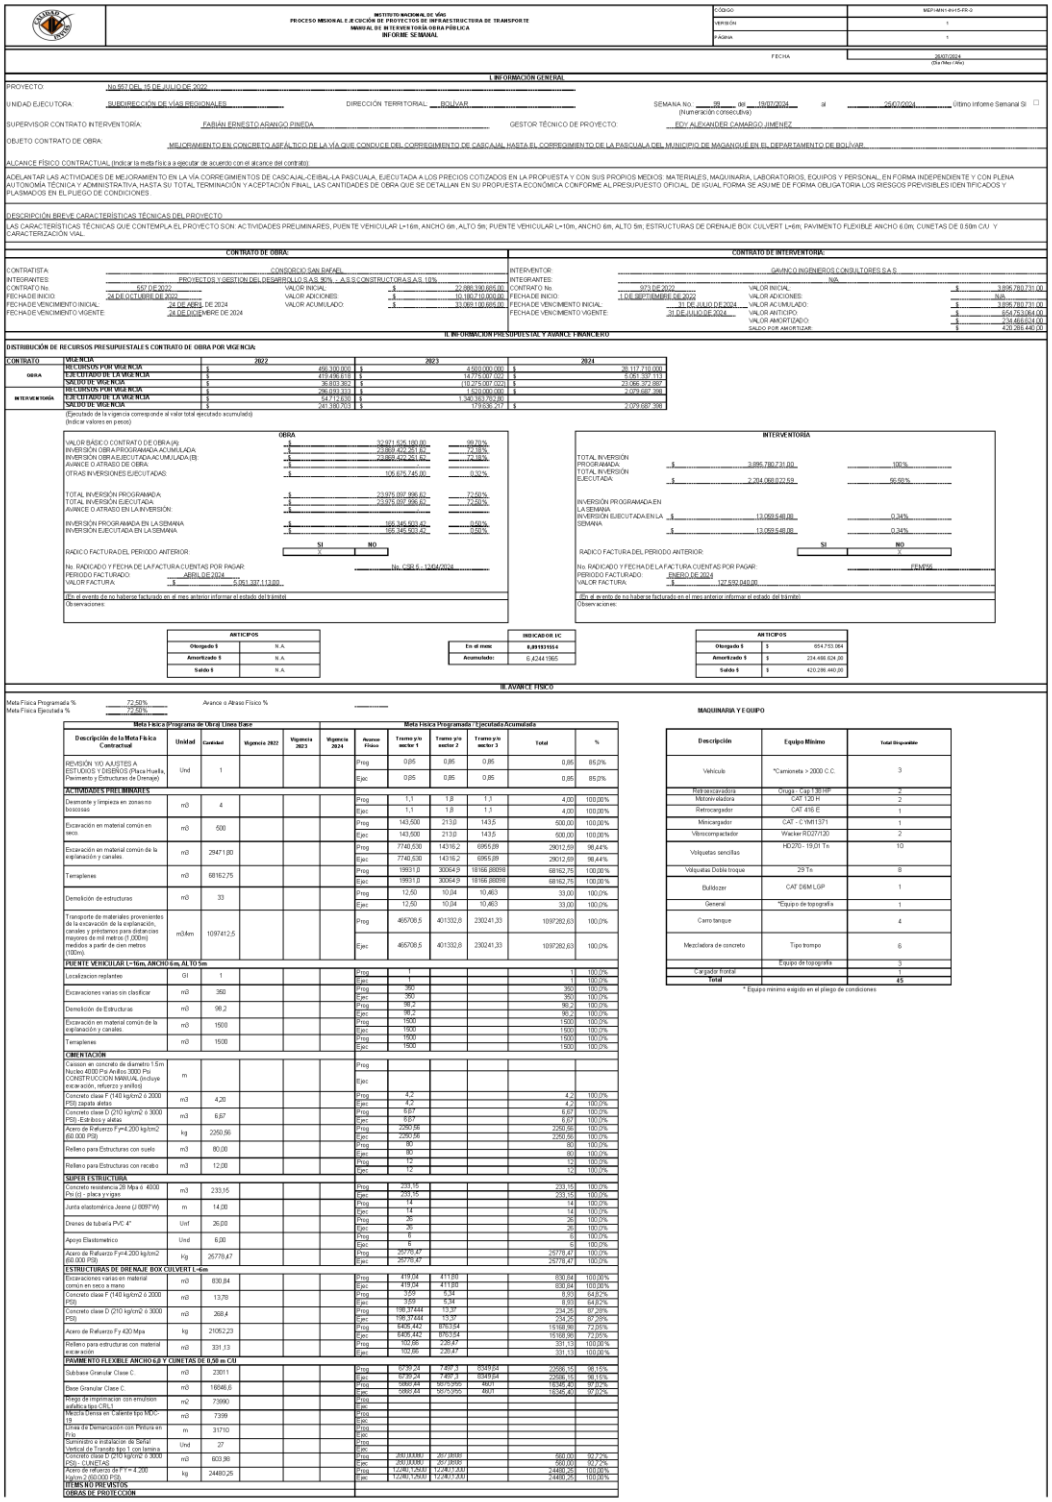

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEP-MAN1-Anx5-FR-0
VERSIÓN	1
# Acta/s	1
FECHA	26/07/2024 (Día/Mes/Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: No.997 DEL 15 DE JULIO DE 2022

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA NO. 39 (Numeración consecutiva) del 19/07/2024 al 25/07/2024 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFÁLTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE CASCAJAL HASTA EL CORREGIMIENTO DE LA PASCUALA DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato)

ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN LA VÍA CORREGIMIENTOS DE CASCAJAL-CEIBAL-LA PASCUALA, EJECUTADA A LOS PRECIOS COTIZADOS EN LA PROPUESTA Y CON SUS PROPIOS MEDIOS: MATERIALES, MAQUINARIA, LABORATORIOS, EQUIPOS Y PERSONAL, EN FORMA INDEPENDIENTE Y CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN Y ACEPTACIÓN FINAL, LAS CANTIDADES DE OBRA QUE SE DETALLAN EN SU PROPUESTA ECONÓMICA CONFORME AL PRESUPUESTO OFICIAL DE IGUAL FORMA SE ASUME DE FORMA OBLIGATORIA LOS RIESGOS PREVISIBLES IDENTIFICADOS Y PLASMADOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE CONTEMPLA EL PROYECTO SON: ACTIVIDADES PRELIMINARES, PUENTE VEHICULAR L=16m, ANCHO 6m, ALTO 5m, PUENTE VEHICULAR L=10m, ANCHO 6m, ALTO 5m, ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT L=6m; PAVIMENTO FLEXIBLE ANCHO 6.0m; CUNETAS DE 0.50m C/U Y CARACTERIZACION VIAL.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN RAFAEL
INTEGRANTES: PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.A.S. 90% - A.S.S CONSTRUCTORA S.A.S. 10%
CONTRATO No. 657 DE 2022 — VALOR INICIAL: $ 32.886.390.695,00
FECHA DE INICIO: 24 DE OCTUBRE DE 2022 — VALOR ADICIONES: $ 10.186.710.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 24 DE ABRIL DE 2024 — VALOR ACUMULADO: $ 33.069.100.695,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 973 DE 2022 — VALOR INICIAL: $ 3.895.780.731,00
FECHA DE INICIO: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 — VALOR ADICIONES: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE JULIO DE 2024 — VALOR ACUMULADO: $ 3.895.780.731,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2024 — VALOR ANTICIPO: $ 654.753.084,00
VALOR AMORTIZADO: $ 234.468.624,00
SALDO POR AMORTIZAR: $ 420.284.460,00

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 496.100.000	$ 4.669.000.000	$ 28.177.710.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 419.496.618	$ 14.775.007.002	$ 6.061.337.113
	SALDO DE VIGENCIA	$ 76.603.382	$ (10.275.007.002)	$ 23.066.372.887
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 296.033.333	$ 1.520.000.000	$ 2.079.687.398
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 54.712.826	$ 1.340.393.780,80	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 241.320.507	$ 179.606.257	$ 2.079.687.398

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO O DE OBRA (A):	$ 32.971.626.180,00	99,70%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 23.869.402.261,80	72,38%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 23.869.402.261,80	72,38%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 106.675.745,86	0,32%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 23.976.897.906,80	72,70%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 23.976.897.906,80	72,70%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$ 166.345.920,40	0,50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	$ 166.345.920,40	0,50%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. CSR 5 - 12/04/2024
PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2024
VALOR FACTURA: $ 5.961.337.113,80

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 3.895.780.731,00	100%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 2.264.068.822,59	58,09%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	$ 13.065.548,00	0,34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: PENDIENTE
PERIODO FACTURADO: ENERO DE 2024
VALOR FACTURA: $ 127.592.040,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,09193554
Acumulado:	6,4244 1965

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 654.753.084
Amortizado $	$ 234.468.624,00
Saldo $	$ 420.284.460,00

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 72,58%
Meta Física Ejecutada % 72,58%
Avance o Atraso Físico % ———

Meta Física Programa de Obra Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Vigencia 2024
REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Para Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	Und	1			
ACTIVIDADES PRELIMINARES					
Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	m0	4			
Excavación en material común en seco.	m0	500			
Excavación en material común de la explanación y canales.	m0	29471,80			
Terraplenes	m0	68162,75			
Demolición de estructuras	m0	33			
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000m) medidos a partir de cien metros (100m).	m3Km	1097462,5			
PUENTE VEHICULAR L=16m, ANCHO 6m, ALTO 5m					
Localizacion replantes	Gl	1			
Excavaciones varias sin clasificar	m0	350			
Demolición de Estructuras	m0	96,2			
Excavación en material común de la explanación y canales.	m0	1500			
Terraplenes	m0	1500			
CIMENTACION					
Cassion en concreto de diametro 1.5m Nucleo 4000 Psi Anillos 3000 Psi CONSTRUCCION MANUAL (incluye excavación, refuerzo y anillo)	m				
Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI) zapata aletas	m3	4,20			
Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) Estribos y aletas	m3	6,67			
Acero de Refuerzo Fy=4.200 kg/cm2 (60.000 PSI)	kg	2250,56			
Relleno para Estructuras con suelo	m3	80,00			
Relleno para Estructuras con recebo	m3	12,00			
SUPER ESTRUCTURA					
Concreto resistencia 28 Mpa ó 4000 Psi (d) - placa y vigas	m3	233,15			
Junta elastomérica Jeene (J 600*W)	m	14,00			
Drenes de tubería PVC 4"	Und	26,00			
Apoyo Elastomérico	Und	6,00			
Acero de Refuerzo Fy=4.200 kg/cm2 (60.000 PSI)	kg	26779,47			
ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT L=6m					
Excavaciones varias en material común en seco a mano	m0	830,84			
Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	m0	13,78			
Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	m0	368,4			
Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	kg	21062,23			
Relleno para estructuras con material excavación	m0	331,13			
PAVIMENTO FLEXIBLE ANCHO 6,0 Y CUNETAS DE 0,50 m C/U					
Subbase Granular Clase C	m0	2301			
Base Granular Clase C	m0	16946,8			
Riego de imprimacion con emulsion asfaltica tipo CRL1	m2	71990			
Mezcla densa en Caliente tipo MDC-19	m0	7399			
Linea de Demarcación con Pintura en frio	m	31710			
Suministro e instalacion de Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina	Und	27			
Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)- CUNETAS	m0	603,96			
Acero de refuerzo de FY= 4.200 kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	24480,26			
ITEMS NO PREVISTOS					
OBRAS DE PROTECCION					


Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Prog	0,85	0,85	0,85	0,85	85,0%
Ejec	0,85	0,85	0,85	0,85	85,0%
Prog	1,1	1,8	1,1	4,00	100,00%
Ejec	1,1	1,8	1,1	4,00	100,00%
Prog	143,500	213,0	143,5	500,00	100,00%
Ejec	143,500	213,0	143,5	500,00	100,00%
Prog	7740,530	14316,2	6955,89	29012,69	98,44%
Ejec	7740,530	14316,2	6955,89	29012,69	98,44%
Prog	19931,0	30064,9	18166,89859	68162,75	100,00%
Ejec	19931,0	30064,9	18166,89859	68162,75	100,00%
Prog	12,50	10,04	10,463	33,00	100,0%
Ejec	12,50	10,04	10,463	33,00	100,0%
Prog	465706,5	401332,8	230241,33	1097282,63	100,0%
Ejec	465706,5	401332,8	230241,33	1097282,63	100,0%
Prog	1			1	100,0%
Ejec	1			1	100,0%
Prog	350			350	100,0%
Ejec	350			350	100,0%
Prog	96,2			96,2	100,0%
Ejec	96,2			96,2	100,0%
Prog	1500			1500	100,0%
Ejec	1500			1500	100,0%
Prog	1500			1500	100,0%
Ejec	1500			1500	100,0%
Prog					
Ejec					
Prog	4,2			4,2	100,0%
Ejec	4,2			4,2	100,0%
Prog	6,67			6,67	100,0%
Ejec	6,67			6,67	100,0%
Prog	2250,56			2250,56	100,0%
Ejec	2250,56			2250,56	100,0%
Prog	80			80	100,0%
Ejec	80			80	100,0%
Prog	12			12	100,0%
Ejec	12			12	100,0%
Prog	233,15			233,15	100,0%
Ejec	233,15			233,15	100,0%
Prog	14			14	100,0%
Ejec	14			14	100,0%
Prog	26			26	100,0%
Ejec	26			26	100,0%
Prog	6			6	100,0%
Ejec	6			6	100,0%
Prog	26778,47			26778,47	100,0%
Ejec	26778,47			26778,47	100,0%
Prog	419,04	411,80		830,84	100,00%
Ejec	419,04	411,80		830,84	100,00%
Prog	3,59	5,34		8,93	64,82%
Ejec	3,59	5,34		8,93	64,82%
Prog	198,37444	13,32		234,25	87,28%
Ejec	198,37444	13,32		234,25	87,28%
Prog	8405,442	8783,64		19189,96	72,26%
Ejec	8405,442	8783,64		19189,96	72,26%
Prog	192,86	228,47		331,13	100,00%
Ejec	192,86	228,47		331,13	100,00%
Prog	6739,24	7499,3	8349,94	22588,15	98,15%
Ejec	6739,24	7499,3	8349,94	22588,15	98,15%
Prog	5860,44	9515,955	4601	19345,45	97,62%
Ejec	5860,44	9515,955	4601	19345,45	97,62%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog	267,38085	267,38085		660,003	92,72%
Ejec	267,38085	267,38085		660,003	92,72%
Prog	12280,12583	12280,12583		24480,25	100,00%
Ejec	12280,12583	12280,12583		24480,25	100,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Vehículo	*Camioneta > 2000 C.C.	3
Retrocargadora	Oruga - Cap 138 HP	2
Motoniveladora	CAT 120 H	2
Retrocargador	CAT 416 E	1
Minicargador	CAT - C1M11371	1
Vibrocompactador	Wacker RD27/120	2
Volquetas sencillas	HO270 - 19,01 Tn	10
Volquetas Doble troque	29 Tn	8
Bulldozer	CAT D6M LGP	1
General	*Equipo de topografía	1
Carro tanque		4
Mezcladora de concreto	Tipo trompo	6
	Equipo de topografía	3
Cargador frontal		1
Total		**45**

* Equipo mínimo exigido en el pliego de condiciones

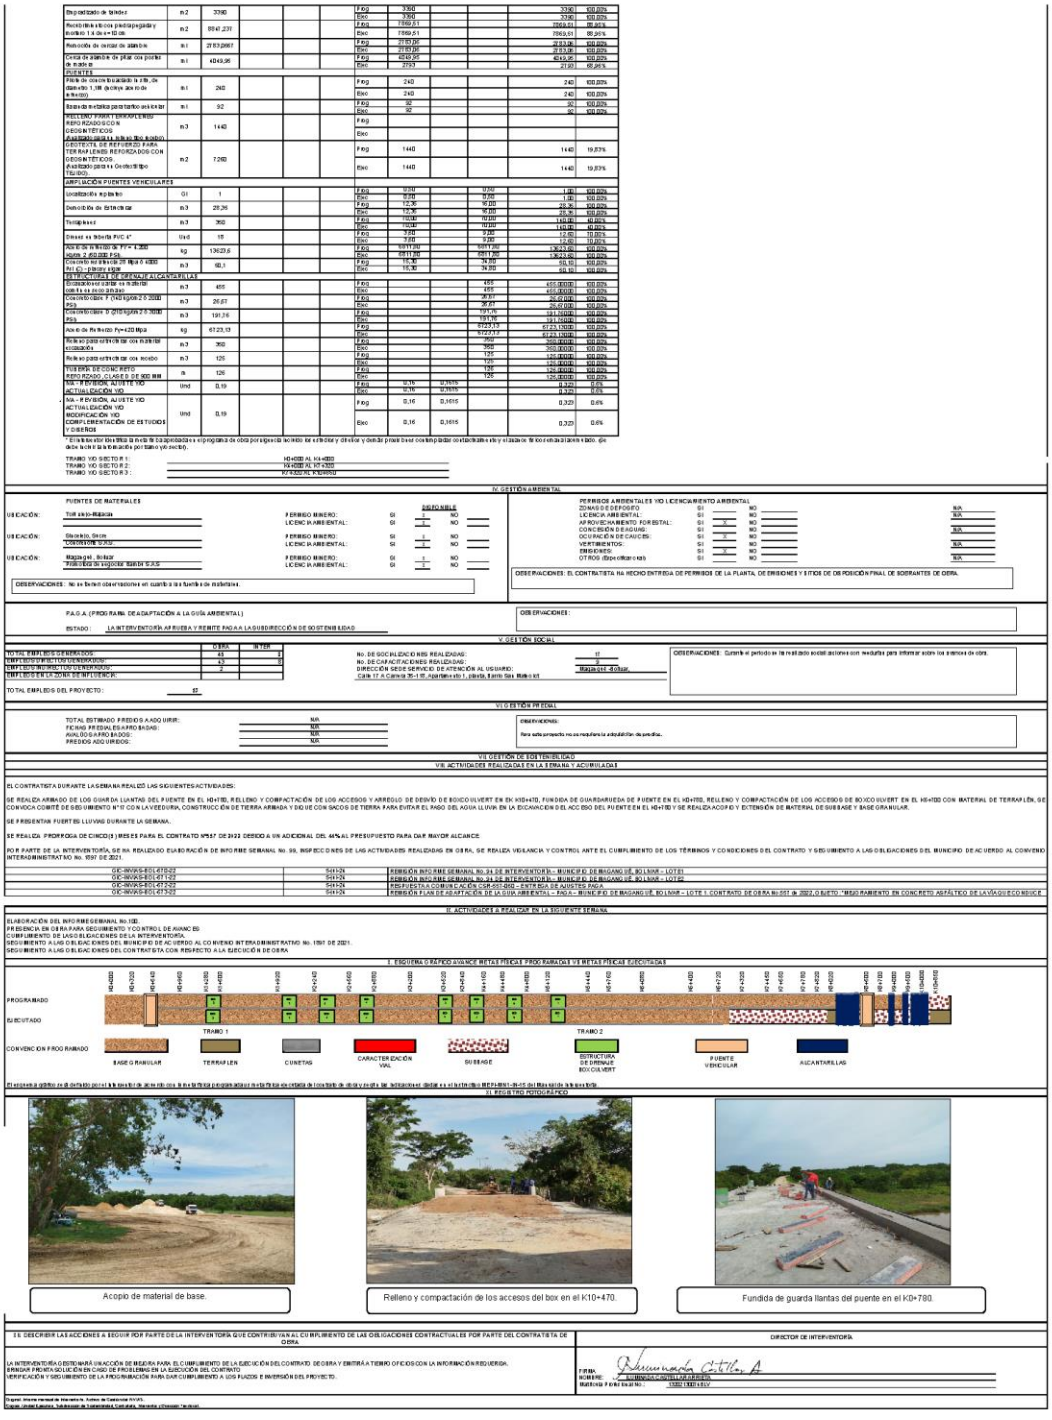

Empradizada de bolsillo	m2	3360				Prog	3360			3360	100,00%
						Ejec	3360			3360	100,00%
Revestimiento en concreto pre-fundido	m2	8847,231				Prog	7869,51			7869,51	88,96%
						Ejec	7869,51			7869,51	88,96%
Relleno de cunetas de piedra	m3	2153,2867				Prog	2153,28			2153,28	100,00%
						Ejec	2153,28			2153,28	100,00%
Concreto premezclado de pilas con pastel de anclaje	m3	4043,95				Prog	4043,95			4043,95	100,00%
						Ejec	2753			2753	68,06%
PUENTES											
Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,00 (incluye acero de refuerzo)	m1	240				Prog	240			240	100,00%
						Ejec	240			240	100,00%
Baranda metálica para tráfico vehicular	m1	92				Prog	92			92	100,00%
						Ejec	92			92	100,00%
RELLENO FORTIFICADO CON REFORZADO CON GEOSINTÉTICOS (Ajustado para 11 niveles de 1,00 m cada)	m3	1440				Prog					
						Ejec					
GEOTEXTIL DE REFUERZO PARA TERRAPLENES REFORZADOS CON GEOSINTÉTICOS (Ajustado para 11 Geotextiles 11x100)	m2	7200				Prog	1440			1440	19,87%
						Ejec	1440			1440	19,87%
AMPLIACIÓN PUENTES VEHICULARES											
Localización replanteo	Gl	1				Prog	1000			1,00	100,00%
						Ejec	1000			1,00	100,00%
Demolición de Estructura	m3	28,26				Prog	16,00			28,26	100,00%
						Ejec	12,26			28,26	100,00%
Terraplenes	m3	350				Prog	10,00			140,00	40,00%
						Ejec	10,00			140,00	40,00%
Dresaje en tubería PVC 4"	Und	18				Prog	9,00			12,00	11,00%
						Ejec	9,00			12,00	11,00%
Acero de refuerzo de Fy= 4.200 kg/cm 2 (420.000 PSI)	kg	13623,6				Prog	6811,80			13623,60	100,00%
						Ejec	6811,80			13623,60	100,00%
Concreto estructural 28 Mpa (4.000 Psi) (1 - placas) viga	m3	68,1				Prog	16,30			68,10	100,00%
						Ejec	16,30			68,10	100,00%
ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLAS											
Excavación en cortes en material común y en roca suelta	m3	455				Prog				455,00	100,00%
						Ejec				455,00	100,00%
Concreto clase 'F' (Vr210 kg/cm 2 3000 Psi)	m3	26,67				Prog				26,67	100,00%
						Ejec				26,67	100,00%
Concreto clase 'G' (210 kg/cm 2 3.000 Psi)	m3	191,76				Prog				191,76	100,00%
						Ejec				191,76	100,00%
Acero de Refuerzo Fy=420 Mpa	kg	6123,13				Prog				6123,13	100,00%
						Ejec				6123,13	100,00%
Relleno para estructuras con material seleccionado	m3	350				Prog				350,00	100,00%
						Ejec				350,00	100,00%
Relleno para estructuras con recebo	m3	125				Prog				125,00	100,00%
						Ejec				125,00	100,00%
TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE D, DE 900 MM	m	126				Prog				126,00	100,00%
						Ejec				126,00	100,00%
N/A - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O	Und	0,19				Prog	0,16	0,1615		0,323	0,6%
						Ejec	0,16	0,1615		0,323	0,6%
N/A - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	Und	0,19				Prog	0,16	0,1615		0,323	0,6%
						Ejec	0,16	0,1615		0,323	0,6%

* En la tabla anterior debe incluir la cantidad de actividades a ejecutar en el proyecto de obra por ejecutar, incluido las actividades y diseños que deban ser contratadas en el transcurso de la ejecución del proyecto. (Se debe incluir la tabla indicada por tablas y/o anexo).

TRAMO Y/O SECTOR # 1: KO+000 AL K1+400
TRAMO Y/O SECTOR # 2: K1+400 AL K1+800
TRAMO Y/O SECTOR # 3: K1+800 AL K2+000

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	Tolú viejo - Rabolo	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	Sincelejo, Sucre	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	COMERCIALIZADORA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:	Majagual, Sucre	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	Proveedores explotar Rabolo S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	

OBSERVACIONES: No se tienen observaciones en cuanto a las fuentes de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A
EMISIONES:	SI	X	NO	
OTROS (Especificar cuál)	SI		NO	N/A

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA HA HECHO ENTREGA DE PERMISOS DE LA PLANTA, DE EMISIONES Y SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES DE OBRA.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: LA INTERVENTORÍA APRUEBA Y REMITE PAGA A LA SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	45	0
EMPLEOS DIRECTOS VINCULADOS:	43	0
EMPLEOS INDIRECTOS VINCULADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 87

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 17
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Majagual -Sucre.
Calle 17 A Carrera 36-118, Apartamento 01, planta, Barrio San Rafael

OBSERVACIONES: Durante el periodo se ha realizado socializaciones con respecto para informar sobre los avances de obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:
Para este proyecto no se requiere la adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EL CONTRATISTA DURANTE LA SEMANA REALIZÓ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

SE REALIZA ARMADO DE LOS GUARDA LLANTAS DEL PUENTE EN EL HO+780, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LOS ACCESOS Y ARREGLO DE DESVIO DE BOXCO HUVERT EN EK HO+470, FUNDIDA DE GUARDARUEDA DE PUENTE EN EL HO+780, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LOS ACCESO DE BOXCO HUVERT EN EL HO+100 CON MATERIAL DE TERRAPLÉN, SE CONVOCA COMITÉ DE SEGUIMIENTO N°17 CON LA VEEDURÍA, CONSTRUCCIÓN DE TIERRA ARMADA Y DIQUE CON SACOS DE TIERRA PARA EVITAR EL PASO DEL AGUA LLUVIA EN LA EXCAVACIÓN DEL ACCESO DEL PUENTE EN EL HO+100 Y SE REALIZA ACOPIO Y EXTENSIÓN DE MATERIAL DE SUBBASE Y BASE GRANULAR.

SE PRESENTAN FUERTES LLUVIAS DURANTE LA SEMANA.

SE REALIZA PRÓRROGA DE CINCO(5) MESES PARA EL CONTRATO N°557 DE 2022 DEBIDO A UN ADICIONAL DEL 46% AL PRESUPUESTO PARA DAR MAYOR ALCANCE.

POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, SE HA REALIZADO ELABORACIÓN DE INFORME SEMANAL No. 99, INSPECCIONES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA, SE REALIZA VIGILANCIA Y CONTROL ANTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO Y SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1597 DE 2021.

GIC-INVIAS-EDO-471502	5/01/24	REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 34 DE INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLÍVAR – LOTE1
GIC-INVIAS-EDO-471102	5/01/24	REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 34 DE INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLÍVAR – LOTE2
GIC-INVIAS-EDO-472202	5/01/24	RESPUESTA COMUNICACIÓN CSR-450-0492 – ENTREGA DE AJUSTES PAGA
GIC-INVIAS-EDO-471302	5/01/24	REMISIÓN PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL – PAGA – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLÍVAR – LOTE 1. CONTRATO DE OBRA No.557 de 2022, O.SUETO "MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFÁLTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ELABORACIÓN DEL INFORME SEMANAL No.100.
PRESENCIA EN OBRA PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AVANCES
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA.
SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1597 DE 2021.
SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico se diligenciará por la interventoría de acuerdo a la actividad programada en la ficha de control de obra y pueda ser interpretada digitalmente en el sistema (REPLANTEAR con el Maganguéño la ejecución).

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Acopio de material de base.

Relleno y compactación de los accesos del box en el K10+470.

Fundida de guarda llantas del puente en el KO+780.


XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

LA INTERVENTORÍA GESTIONARÁ UNA CITACIÓN DE MEJORA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Y EMITIRÁ A TIEMPO OFICIOS CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA.
BRINDAR PRONTA SOLUCIÓN EN CASO DE PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS E INVERSIÓN DEL PROYECTO.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: EDMUNDO CASTILLO ARRIETA
Matrícula Profesional No.: 1580119821-BOY

4.1.3 MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N° 558 DE 2022.

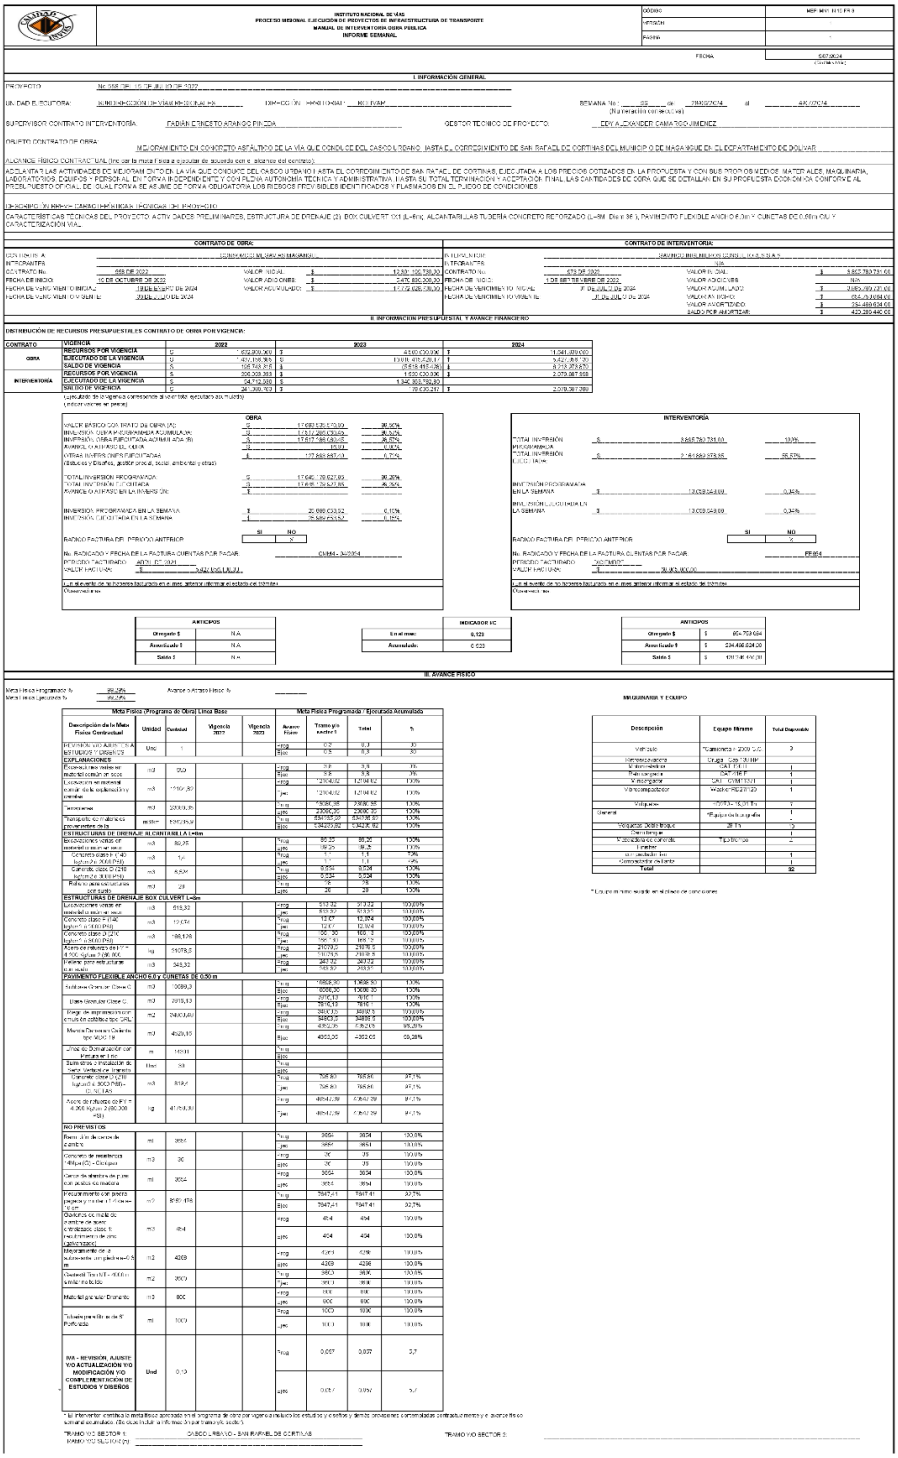



IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Tolú viejo, Sucre. Agregados y canteras del norte S.A.S.	PERMISO MINERO: SI X NO		
		LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO		
UBICACION:	Camilo Torres - Barranca Bellavista	PERMISO MINERO: SI X NO		
		LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO		
UBICACION:	Magangué, Bolívar. Promotora de Negocios Bambú S.A.S	PERMISO MINERO: SI X NO		
		LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO		

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A
CONCESION DE AGUAS	SI	NO		N/A
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A
EMISIONES:	SI X	NO		
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X		

OBSERVACIONES: El contratista realizó la entrega de permisos de la planta de emisiones y sitios de disposición final de sobrantes de obra durante las mesas de trabajo realizadas.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
EL CONTRATISTA HA HECHO ENTREGA DEL PAGA Y SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCION DE
ESTADO: SOSTENIBILIDAD

OBSERVACIONES: El contratista realizó la entrega de permisos de la planta de emisiones y sitios de disposición final de sobrantes de obra durante las mesas de trabajo realizadas.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	34	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	33	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 42

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 6
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: Magangué -Bolivar.
Calle 12 A Carrera 25-110, Apartamento 1, planta, Barrio San Matias Ist

OBSERVACIONES: Se realizaron capacitaciones de higiene postural y estilo de vida saludable.

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: Para este contratono se realizará la adquisición de predios.

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EL CONTRATISTA DURANTE LA SEMANA HA REALIZADO ACTIVIDADES DE:

CONTINUAN LAS ACTIVIDADES DE FUNDIDA DE CUNETAS, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA PEGADA PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y LIMPIEZA DEL CORREDOR VIAL.

POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, SE HA REALIZADO ELABORACIÓN DE INFORME SEMANAL No.96, SOLICITUD DE PRORROGA D LE CONTRATO DE INTERVENTORÍA, SOLICITUD DEL ESTADO DE CUENTA Y REINTEGRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO 1898 DE 2021, SE REALIZA PRESENCIA EN OBRA PARA CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA, VIGILANCIA Y CONTROL ANTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO Y SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1898 DE 2021.

ASÍ MISMO, SE TIENE EL SIGUIENTE CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA:

GIC-INVIAS-BOL566-22	3-jul-24	SOLICITU DE PRORROGA AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°973 DE 2022
GIC-INVIAS-BOL567-22	4-jul-24	COMINACIÓN ENTREGA DE ESTADO DE CUENTA Y REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1895 DE 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE ACHÍ, BOLÍVAR.
GIC-INVIAS-BOL568-22	4-jul-24	COMINACIÓNENTREGA DE ESTADO DE CUENTA Y REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIONTERADMINISTRATIVO No. 1897 DE 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DEMAGANGUÉ.
GIC-INVIAS-BOL569-22	4-jul-24	COMINACIÓN ENTREGA DE ESTADO DE CUENTA Y REINTEGRO DERENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1898 DE 2021,SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE MAGANGUÉ.
GIC-INVIAS-BOL560-22	4-jul-24	SOLICITUD DE ESTADO ACTUAL DE LA CUENTA BANCARIA DONDE SE MANEJAN LOS RECURSOS DEL CONVENIO ALCALDÍA INVIAS.
GIC-INVIAS-BOL561-22	4-jul-24	COMINACIÓN ENTREGA DE ESTADO DE LA CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1897 DE 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLÍVAR.
GIC-INVIAS-BOL562-22	4-jul-24	COMINACIONENTREGA DE ESTADO DE LA CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1898 DE 2021, SUSCRITO ENTRE INVIAS Y MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLÍVAR.
GIC-INVIAS-BOL563-22	4-jul-24	SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO SANCIONATORIO – CONTRATO DE OBRA N°1208 DE 2022.
GIC-INVIAS-BOL564-22	4-jul-24	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO PACTADO EN COMITE DE SEGUIMIENTO REALIZADO EL 20 DE JUNIO DE 2024.

ELABORACIÓN DE INFORME SEMANAL No.97.
PRESENCIA EN OBRA PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AVANCES
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA
SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1898 DE 2021.
SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA

IX. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPLMN-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Construcción de piedra pegada.

Construcción de cunetas.

Limpieza de cunetas.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.


XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL

LA INTERVENTORÍA GESTIONARÁ UN ACCIÓN DE MEJORA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Y EMITIRÁ A TIEMPO OFICIOS CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA BRINDAR PRONTA SOLUCIÓN EN CASO DE PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS E INVERSIÓN DEL PROYECTO.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: GUILLERMO CASTELLAR ARRIETA
Matrícula Profesional No.: 13221130748LV

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión de INVIAS.
Digital: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista Interventor y Supervisión Territorial.

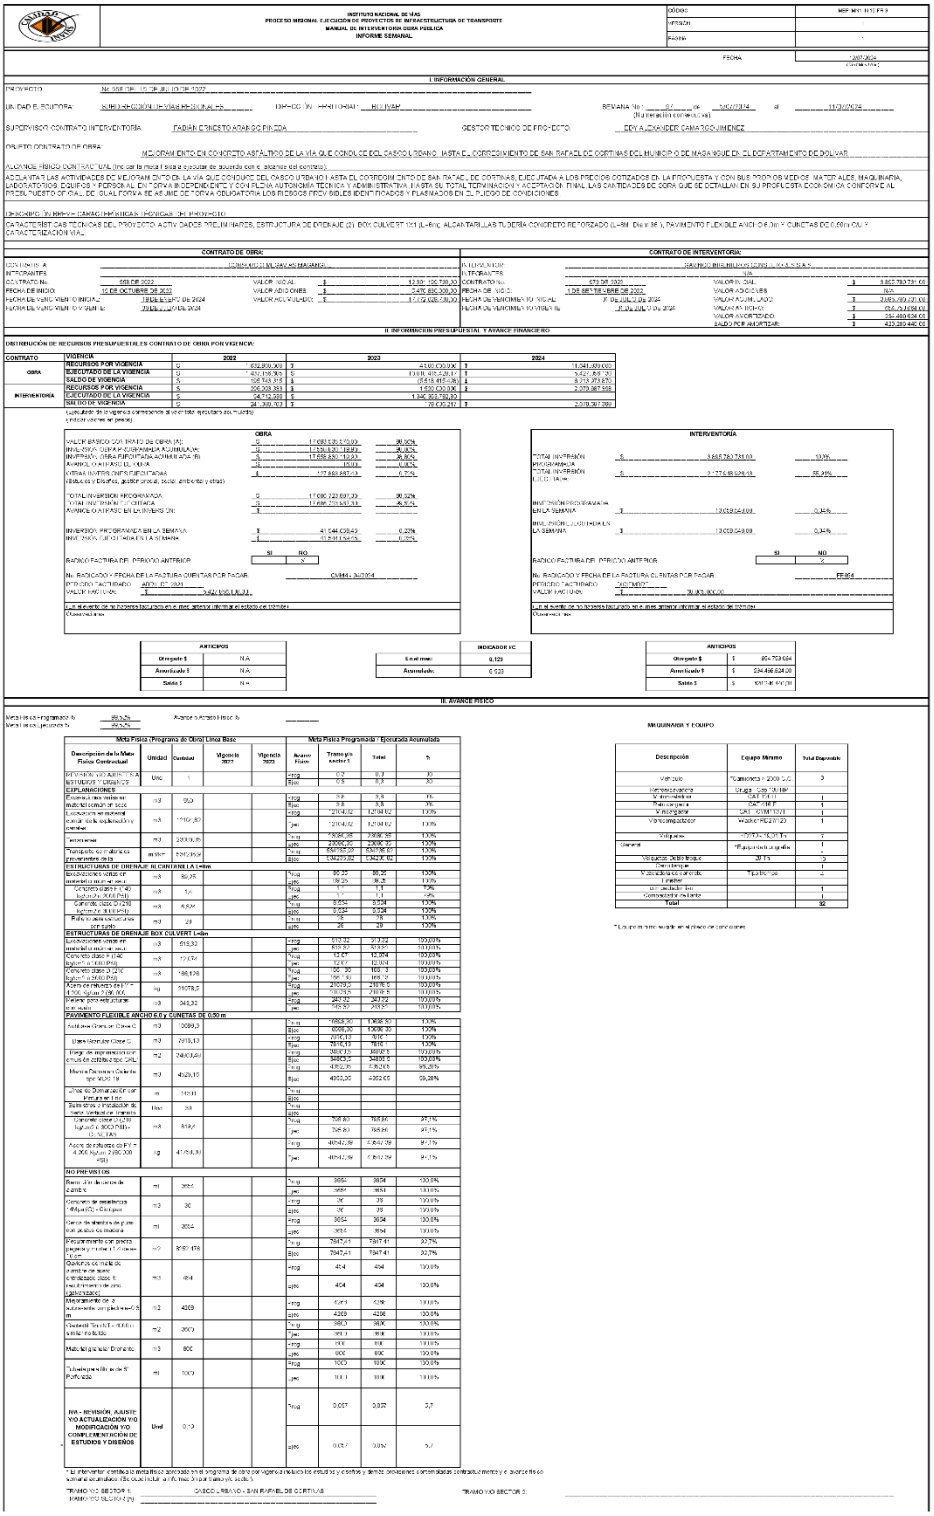

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO: MSF-MOI-IN-01-FR-5
VERSIÓN:
PÁGINA:
FECHA: 12/07/2024 (DD/MM/AAA)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: No. 958 DE 15 DE JULIO DE 2022
UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR
SEMANA No: 57 de 2024 (Ej: Semana 01 de 2024) al 12/07/2024
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN CONCETO ARARGO PINZON
GESTOR TECNICO DE PROYECTO: DEYA ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFÁLTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA EL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL DE CORTINAS DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Incluir la meta física según lo ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA EL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL DE CORTINAS, EJECUTADA A LOS PRECIOS COTIZADOS EN LA PROPUESTA Y CON SUS RESPECTIVOS MEDIOS DE MATERIALES, MAQUINARIA, LABORATORIOS, EQUIPOS Y PERSONAL EN FORMA INDEPENDIENTE Y CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, HASTA EL TOTAL TERMINACIÓN Y ACEPTACIÓN FINAL, LAS CANTIDADES DE OBRA QUE SE DETALLAN EN SU PROPUESTA ECONÓMICA CONFORME AL PRESUPUESTO OFICIAL, DE IGUAL FORMA SE AJUSTARÁ DE FORMA OBLIGATORIA LOS PRECIOS PREVIOBLES IDENTIFICADOS Y PLASMADOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
DESCRIPCIÓN TRAMO INTERVENIDO (Nombre del proyecto):
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO ACTIVIDADES PRELIMINARES, ESTRUCTURA DE DRENAJE (2) BOX CULVERT 1X1 (L=9M, ALCANTARILLAS TUBERÍA CONCRETO REFORZADO (L=9M Dia = 36"), PAVIMENTO FLEXIBLE ANCHO 6.3m Y CUNETAS DE 0.60m CON Y CARACTERIZACIÓN VIAL.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES MALAVE S.A.S.				
INTEGRANTES:					
CONTRATO No.	958 DE 2022	VALOR INICIAL	$ 12.330.100.730,30		
FECHA DE INICIO:	15 DE OCTUBRE DE 2022	VALOR ADICIONES	$ 2.470.800.000,00		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	7 DE ENERO DE 2024	VALOR ACUMULADO	$ 14.800.900.730,30		
FECHA DE VENCIMIENTO FINAL:	7 DE ENERO DE 2024				

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTEGRANTES:	CONSULTORES INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.		
CONTRATO No.	973 DE 2022	VALOR INICIAL	$ 9.867.793.791,00
FECHA DE INICIO:	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022	VALOR ADICIONES	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE JULIO DE 2024	VALOR ACUMULADO	$ 2.960.393.237,00
FECHA DE VENCIMIENTO FINAL:	31 DE JULIO DE 2024	VALOR EJECUTADO	$ 6.407.400.554,00
		VALOR AMORTIZADO	$ 2.541.489.634,00
		SALDO POR AMORTIZAR	$ 419.289.446,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 632.800.000	$ 4.600.000.000	$ 11.581.800.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 432.158.365	$ 1.918.415.426,67	$ 4.627.857.701
	SALDO DE VIGENCIA	$ 196.743.315	$ 2.681.584.573,33	$ 6.953.942.299
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 206.208.383	$ 1.500.000.000	$ 2.079.387.588
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 54.712.208	$ 1.345.303.782,83	$ 1.007.384.563
	SALDO DE VIGENCIA	$ 151.496.175	$ 154.696.217	$ 2.072.003.025

(Ejecutado de la vigencia corresponde al avance ejecutado del mismo periodo del informe anterior)

OBRA

VALOR BÁSICO CON IMPTO DE OBRA (A)	$	17.600.230.573,03	36,90%
ANALÍTICA OBRA ADICIONAL/MAYOR CANTIDAD	$	1.530.520,18	36,90%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B)	$	17.668.650,19,03	36,90%
AVANCE OBRA EJECUTADA		100%	6,70%
VIDAS INVERSIÓN EJECUTADA	$	177.881.887,03	6,70%
(Estudios y Diseños, gestor predial, social, ambiental y otros)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA	$	17.600.230.573,03	36,90%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$	17.668.650,19,03	36,90%
AVANCE OBRA EJECUTADA EN LA INVERSIÓN	$		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	41.644.439,49	0,23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	40.941.156,75	0,23%

BACHO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: CUM4 - 3u2024
PERIODO FACTURADO: ABRIL DEL 2024
VALOR FACTURADO: $ 3.427.905.134,71
(Las fechas de los números facturados en el mes anterior deberán ser el estado de cuentas)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN	$	9.867.793.791,00	100%
PROGRAMADA			
TOTAL INVERSIÓN	$	9.777.98.626,00	99,09%
EJECUTADA			
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	19.019.043,09	0,34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	19.019.043,09	0,34%

BACHO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FF864
PERIODO FACTURADO: 24/07/2024
VALOR FACTURADO: $ 30.483.800,00
(Las fechas de los números facturados en el mes anterior deberán ser el estado de cuentas)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N A
Amortizado $	N A
Saldo $	N A

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,129
Acumulado:	0,023

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 804.769.684
Amortizado $	$ 284.498.634,00
Saldo $	$ 520.271.050,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta física programada %: 99,3%
Meta física ejecutada %: 99,3%
Avance acumulado Hasta %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Total	%
REVISIÓN, VOLABILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS	Und	1			Prog	0,3	0,3	30
					Ejec	0,3	0,3	30
EXPLANACIONES								
Excavación mecánica en material común en seco	m3	0,00			Prog	3,8	3,8	3%
					Ejec	3,8	3,8	3%
Excavación mecánica en material de explanación y cuerpo	m3	1150,80			Prog	1210,82	1210,82	100%
					Ejec	1210,82	1210,82	100%
Terraplenes	m3	2300,00			Prog	2308,35	2308,35	100%
					Ejec	2308,35	2308,35	100%
Transporte de materiales provenientes de la	m3km	2301,70			Prog	6547,92	6547,92	100%
					Ejec	1342,92	1342,92	100%
ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT 1x1m								
Excavaciones varias en material común en seco	m3	80,25			Prog	80,25	80,25	100%
					Ejec	80,25	80,25	100%
Concreto clase H 21 MPa (3000 PSI)	m3	1,1			Prog	1,1	1,1	100%
					Ejec	1,1	1,1	100%
Concreto clase D 21MPa (3000 PSI)	m3	8,634			Prog	8,634	8,634	100%
					Ejec	8,634	8,634	100%
Relleno seleccionado por capas	m3	28			Prog	28	28	100%
					Ejec	28	28	100%
ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT 1x1m								
Excavaciones varias en material común en seco	m3	513,32			Prog	513,32	513,32	100,00%
					Ejec	513,32	513,32	100,00%
Concreto clase H 21MPa (3000 PSI)	m3	12,67			Prog	12,67	12,304	100,00%
					Ejec	12,67	12,304	100,00%
Concreto clase D 21MPa (3000 PSI)	m3	186,128			Prog	186,30	186,3	100,00%
					Ejec	186,30	186,3	100,00%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	16078,5			Prog	21078,5	21078,5	100,00%
					Ejec	21078,5	21078,5	100,00%
Relleno para estructuras	m3	343,30			Prog	343,32	343,32	100,00%
					Ejec	165,57	343,32	100,00%
PAVIMENTO FLEXIBLE ANCHO 6.6 y CUNETAS DE 0.60 m								
Subbase Granular Clase C	m3	3089,3			Prog	13606,20	13606,20	100%
					Ejec	6606,20	13606,20	100%
Base Granular Clase C	m3	2615,13			Prog	7615,17	7615,1	100%
					Ejec	7615,13	7615,1	100%
Riego de imprimación con emulsión asfáltica tipo CRL	m2	24800,80			Prog	36807,5	36807,5	100,00%
					Ejec	34800,5	34800,5	100,00%
Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19	m3	4629,15			Prog	4852,05	4852,05	95,38%
					Ejec	4852,05	4852,05	95,38%
Línea de Demarcación con pinturas base	m	14910			Prog			
					Ejec			
Suministro e instalación de barrera flexible de tráfico	Und	20			Prog			
					Ejec			
Concreto clase H 21MPa (3000 PSI)	m3	818,6			Prog	795,80	795,80	97,21%
					Ejec	795,80	795,80	97,21%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	47150,8			Prog	48042,58	47847,58	97,21%
					Ejec	48042,58	47847,58	97,21%
NO PREVISTOS								
Retiro de la barrera de Concreto	ml	3654			Prog	3654	3654	100,00%
					Ejec	3654	3654	100,00%
Cerramiento de madera (Malla OC) + Cinta pre	m2	36			Prog	36	36	100,00%
					Ejec	36	36	100,00%
Cerca de alambres de púas con postes de madera	ml	3654			Prog	3654	3654	100,00%
					Ejec	3654	3654	100,00%
Pavimentación por pintura (espesor 0,15 mm) + Pintura	m2	9681,478			Prog	7947,41	7947,41	82,1%
					Ejec	7947,41	7947,41	82,1%
Cuneta en concreto de cemento de aparejo de ladrillos, para transporte de aguas (GENERICO)	m3	454			Prog	454	454	100,00%
					Ejec	454	454	100,00%
Mantenimiento de subbase granular e=0,15 m	m3	4269			Prog	4269	4269	100,00%
					Ejec	4269	4269	100,00%
Geotextil Tipo NT - 4000 o similar no tejido	m2	3800			Prog	3800	3800	100,00%
					Ejec	3800	3800	100,00%
Mantenimiento Drenaje	m3	800			Prog	800	800	100,00%
					Ejec	800	800	100,00%
Señalización de Si Preventivo	ml	1000			Prog	1000	1000	100,00%
					Ejec	1000	1000	100,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	Und	0,10			Prog	0,007	0,007	7,7
					Ejec	0,007	0,007	7,7

*La interventoría certificará mensualmente el porcentaje de obra por vigencia incluyendo los estudios y diseños, demás procesos contemplados contractualmente y el acta definitiva cuando se suscriba. (Es decir incluir el 0% mes 3 y así mismo y/o sucesivamente)

*RAMO Y/O SECTOR 1: CASCO URBANO - SAN RAFAEL DE CORTINAS
*RAMO Y/O SECTOR 2:
*RAMO Y/O SECTOR 3:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Vibrador	Tamborera > 2000 LC	3
Motoniveladora	Orugas Cap. 215 HP	
Motoniveladora	CAT 120 H	1
Retroexcavadora	CAT 416 E	1
Retroexcavadora	CAT 420 F2 IT/4	1
Vibrocompactador	Walker RE 20/20	1
Volquetes	7m3 - 15 m3 Tm	7
Cisterna	4 pulgadas de capacidad	1
Volquetes Doble Troque	20 Tm	5
Retroexcavadora	Tipo Oruga	1
Motoniveladora Cat 120 H	Tipo Oruga	2
Vibrocompactador		1
Compactador de suelo		1
Total		32

* Los equipos serán acorde a las condiciones del proyecto

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Toló viejo, Sucre	PERMISO MINERO:	SI X	NO		
	Agregados y canteras del norte S.A.S.	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		
UBICACIÓN:	Camilo Torres - Barranca	PERMISO MINERO:	SI X	NO		
	Bellavista	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		
UBICACIÓN:	Magangué, Bolívar	PERMISO MINERO:	SI X	NO		
	Promotora de Negocios Bambú S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A
CONCESION DE AGUAS:	SI	NO		N/A
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A
EMISIONES:	SI X	NO		
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X		

OBSERVACIONES: El contratista realizó la entrega de permisos de la planta de emisiones y sitios de disposición final de sobrantes de obra durante las mesas de trabajo realizadas.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
EL CONTRATISTA HA HECHO ENTREGA DEL PAGA Y SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCION DE
ESTADO: SOSTENIBILIDAD

OBSERVACIONES: El contratista realizó la entrega de permisos de la planta de emisiones y sitios de disposición final de sobrantes de obra durante las mesas de trabajo realizadas.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	34	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	33	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 42

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 6
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: Magangué -Bolivar.
Calle 17 A Carrera 35-118, Apartamento 1, planta, Barrio San Mateo ld

OBSERVACIONES: Se realizaron capacitaciones de higiene postural y estilo de vida saludable.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: Para este contrato no se realizará la adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EL CONTRATISTA DURANTE LA SEMANA HA REALIZADO ACTIVIDADES DE:

CONTINUAN LAS ACTIVIDADES DE FUNDIDA DE CUNETAS, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA PEGADA PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y LIMPIEZA DEL CORREDOR VIAL.


POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, SE HA REALIZADO ELABORACIÓN DE INFORME SEMANAL No.97, SOLICITUD DE PRORROGA DLE CONTRATO DE INTERVENTORÍA, SOLICITUD DEL ESTADO DE CUENTA Y REINTEGRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO 1898 DE 2021, SE REALIZA PRESENCIA EN OBRA PARA CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA, VIGILANCIA Y CONTROL ANTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO Y SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1898 DE 2021.

ASÍ MISMO, SE TIENE EL SIGUIENTE CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA:

GIC-INVIAS-BOL-566-22	5-jul-24	RESPUESTA A COMUNICADO – ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA
GIC-INVIAS-BOL-569-22	5-jul-24	REMISIÓN INFORME SEMANAL No.91 DE INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DE ACHÍ, BOLÍVAR.
GIC-INVIAS-BOL-567-22	5-jul-24	REMISIÓN INFORME SEMANAL No.93 DE INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLÍVAR – LOTE1
GIC-INVIAS-BOL-568-22	5-jul-24	REMISIÓN INFORME SEMANAL No.93 DE INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLÍVAR – LOTE2
GIC-INVIAS-BOL-569-22	5-jul-24	REMISIÓN INFORME SEMANAL No.92 DE INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DE ACHÍ, BOLÍVAR.
GIC-INVIAS-BOL-570-22	5-jul-24	REMISIÓN INFORME SEMANAL No.94 DE INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLÍVAR – LOTE1
GIC-INVIAS-BOL-571-22	5-jul-24	REMISIÓN INFORME SEMANAL No.94 DE INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLÍVAR – LOTE2
GIC-INVIAS-BOL-572-22	5-jul-24	RESPUESTA A COMUNICACION CSR-557-060 – ENTREGA DE AJUSTES PAGA
GIC-INVIAS-BOL-573-22	5-jul-24	REMISIÓN PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL – PAGA – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLÍVAR – LOTE 1. CONTRATO DE OBRA No.557 de 2022, OBJETO: "MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA

ELABORACIÓN DE INFORME SEMANAL No.98.
PRESENCIA EN OBRA PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AVANCES
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA.
SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1898 DE 2021.
SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA

IX. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs. meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPLMN-IN-15 del Manual de Interventoría

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Limpieza del corredor vial.



Construcción de piedra pegada.



Construcción de cunetas.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.


XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL

LA INTERVENTORÍA GESTIONARÁ UN ACCIÓN DE MEJORA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Y EMITIRÁ A TIEMPO OFICIOS CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA.
BRINDAR PRONTA SOLUCIÓN EN CASO DE PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS E INVERSIÓN DEL PROYECTO.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: CLEMINSO CASTELLAR ARDILA
Matrícula Profesional No.: 13021130074BLV

Original: Informe mensual de interventoría, archivo de Gestión de INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Consultoría Interventor y Ejecutor Territorial.

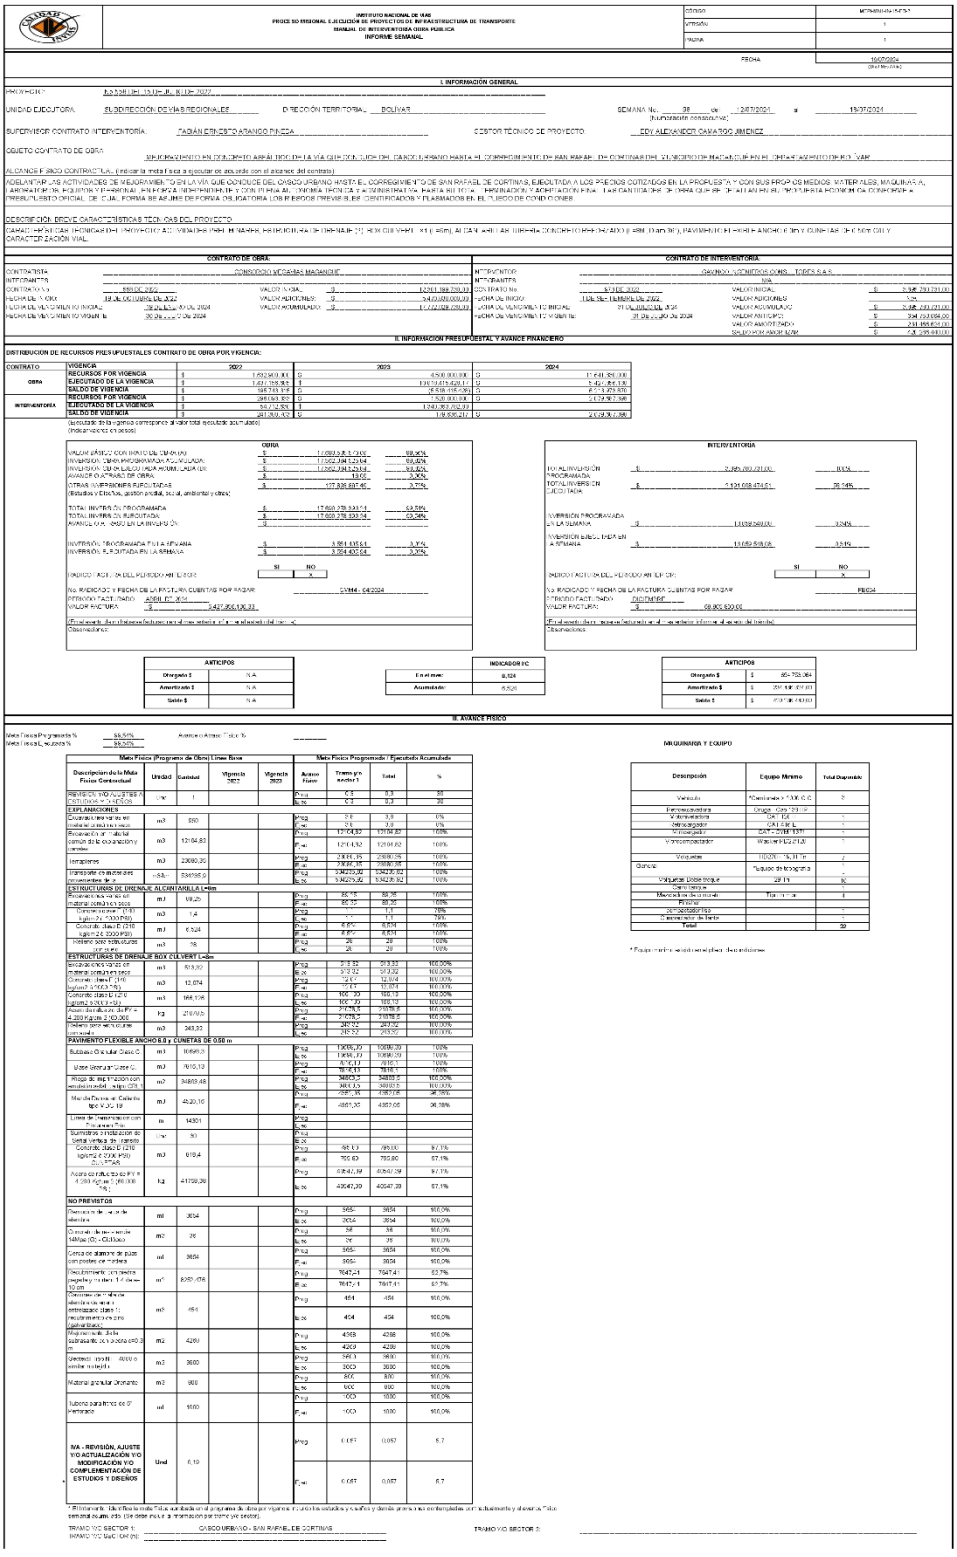

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO REGIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

Código: MTOBRA-01-FT-0021
Versión: 1
Página: 1

FECHA: 16/07/2024 (Día/Mes/Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: [illegible]

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No. 38 de 2024 (numeración consecutiva) — # 15/07/2024

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ATANGO PINEDA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA EL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL DE CORTINAS, EJECUTADA A LOS PRECIOS COTIZADOS EN LA PROPUESTA Y CON SUS PROPIOS MEDIOS: MATERIALES, MAQUINARIA, AMPLIACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL EN FORMA INDEPENDIENTE Y CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA HASTA EL TOTAL TERMINACIÓN Y ADECUACIÓN FINAL. LAS CANTIDADES DE OBRA QUE SE DETALLAN EN EL PRESENTE PROYECTO DE CONFORME A PRESUPUESTO OFICIAL DE ESTA FORMA SE ASUME DE FORMA OBLIGATORIA LOS RIESGOS PREVISIBLES CONTRATADOS Y PLASMADOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

ALCANCE BASICO CONTRACTUAL: (Describir la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato)

ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA EL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL DE CORTINAS, EJECUTADA A LOS PRECIOS COTIZADOS EN LA PROPUESTA Y CON SUS PROPIOS MEDIOS: MATERIALES, MAQUINARIA, AMPLIACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL EN FORMA INDEPENDIENTE Y CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA HASTA EL TOTAL TERMINACIÓN Y ADECUACIÓN FINAL. LAS CANTIDADES DE OBRA QUE SE DETALLAN EN EL PRESENTE PROYECTO DE CONFORME A PRESUPUESTO OFICIAL DE ESTA FORMA SE ASUME DE FORMA OBLIGATORIA LOS RIESGOS PREVISIBLES CONTRATADOS Y PLASMADOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

CARACTERIZAR TOPOGRAFICAMENTE EL PROYECTO A EJECUTAR PARA REALIZAR EL DISEÑO GEOMETRICO EN PLANTA Y PERFIL DE LA VIA (CASCO URBANO – CORREGIMIENTO SAN RAFAEL DE CORTINAS), PAVIMENTO FLEXIBLE ANCHO DE 6 Y CUNETAS DE 0.60 CADA UNA, CARACTERIZACIÓN VIAL.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA	CONSORCIO MOCARAS MADANDIE
INTEGRANTES	
CONTRATO No	[illegible] 2022
VALOR INICIAL	$ 4.241.188.280,00
FECHA DE INICIO	19 de OCTUBRE De 2022
VALOR ADICIONES	$ 940.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	28 de ENERO De 2024
VALOR ACUMULADO	$ 5.181.188.280,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE	30 de [illegible] De 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.
INTEGRANTES	N/A
CONTRATO No	973 DE 2022
VALOR INICIAL	$ 348.793.120,00
FECHA DE INICIO	11 de Noviembre De 2022
VALOR ADICIONES	$ N/A
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31 de [illegible] De 2024
VALOR ACUMULADO	$ 348.793.120,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE	31 de Julio De 2024
VALOR ANTICIPO	$ 244.153.184,00
VALOR AMORTIZADO	$ 210.855.631,00
SALDO POR AMORTIZAR	$ 33.297.553,00

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.692.940.301	$ 4.500.000.000	$ 11.641.891.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.437.755.301	$ 3.743.419.420,11	$ 1.421.841.100
	SALDO DE VIGENCIA	$ 255.185.000	$ 756.580.579,89	$ 10.220.049.900
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 286.000.000	$ 1.500.000.000	$ 2.434.987.346
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 50.712.500	$ 1.040.063.252,00	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 281.809.432	$ 1.181.936.217	$ 2.434.987.346

(actualizar en la vigencia correspondiente con los datos reales ejecutados acumulados)
(indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CON IVA DEL CONTRATO	$ 11.693.940.301,00	100,00%
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 11.562.194.123,64	98,88%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 11.562.194.123,64	98,88%
AVANCE CONTRACTUAL DE OBRA:	100%	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (estudios y diseños, gestion predial, social, ambiental y otros):	$ 137.936.697,46	1,17%
TOTAL INVERSION PROGRAMADA	$ 17.699.278.931,14	151,37%
TOTAL INVERSION EJECUTADA	$ 17.699.278.930,74	151,36%
AVANCE CONTRACTUAL DE OBRA:	0	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.981.435,61	0,03%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.204.422,64	0,03%

INDICO FACTURACIÓN DEL PERIODO INFORME: SI [ ] NO [X]

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: [illegible] 0412024
PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2024
VALOR FACTURA: $ 3.427.356.106,33

(En el evento de no haberse facturado en el mes señalar el motivo de la no facturación)
Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA	$ 2.434.987.346,00	100%
TOTAL INVERSION EJECUTADA	$ 1.101.668.474,61	45,24%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 116.666.666,00	4,79%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 116.666.666,00	4,79%

INDICO FACTURACIÓN DEL PERIODO INFORME: SI [ ] NO [X]

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: FRA24
PERIODO FACTURADO: 01/07/2024
VALOR FACTURA: $ 68.805.600,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes señalar el motivo de la no facturación)
Observaciones:

ANTICIPOS

Otorgado $	N.A
Amortizado $	N.A
Saldo $	N.A

INDICADOR IVC

En el mes:	0,124
Acumulado:	0,626

ANTICIPOS

Otorgado $	$ 85.752.064
Amortizado $	$ 39.146.457,00
Saldo $	$ 46.605.607,00

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 96,50%
Meta Ejecutada %: 96,50%
Avance o Atraso Físico %: _____

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia Inicio	Vigencia Final
PREVIOS, NO AJUSTES A CANTIDADES Y PRECIOS	Und	1		
EXPLANACIONES				
Excavación mecánica en material común de conformación y cunetas	m3	550		
Excavación en material común de conformación y cunetas	m3	12164,83		
Terraplenes	m3	23080,35		
Transporte de material excedente de la	m3-k	594385,6		
ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA L=9m				
Excavación mecánica en material común sin clasificar	m3	99,25		
Concreto clase D (18 kg/cm2 - 2.500 PSI)	m3	1,4		
Concreto clase D (18 kg/cm2 - 2.500 PSI)	m3	6,524		
Relleno con material de sitio	m3	58		
ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT L=9m				
Excavación mecánica en material común sin clasificar	m3	819,92		
Concreto clase F (210 kg/cm2 - 3.000 PSI)	m3	12,674		
Concreto clase D (18 kg/cm2 - 2.500 PSI)	m3	166,176		
Acero de refuerzo Gr Fy = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kg	27670,5		
Relleno con material de sitio compactado	m3	243,52		
PAVIMENTO FLEXIBLE ANCHO 6.0 y CUNETAS de 0.60 m				
Subbase Granular Clase C	m3	10690,2		
Base Granular Clase C	m3	7010,13		
Riego de imprimación con emulsión asfáltica tipo CRL	m2	34869,68		
Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19	m3	4520,16		
Línea de Demarcación con Pintura en Frio	m	14301		
Suministro e instalación de Señal Vertical de Tránsito	Und	30		
Concreto clase D (18 kg/cm2 - 2.500 PSI) CUNETAS	m3	619,4		
Acero de refuerzo Gr Fy = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	41709,28		
NO PREVISTOS				
Demolición de concreto de alcantarilla	ml	3654		
Demolición de concreto simple MAMPOSTERIA - Cunetas	m2	36		
Cerca en alambre de púas con postes de madera	ml	3654		
Reconformación con equipo pegador y retiro de 1 a 10 m	m3	9551,708		
Demolición de cabezote alcantarilla de entrada y descarga tipo 1 incluyendo aletas (demolición)	m3	464		
Mejoramiento de la subrasante con adición de material granular	m2	4269		
Geotextil tejido 600 lb/in sobre material	m2	3600		
Material granular Drenante	m3	900		
Tubería para filtros de 6" perforada	ml	1800		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	Und	0,19		

Meta Física Programada / Ejecutado Acumulado

Descripción de la Meta Física Contractual	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Total	%
PREVIOS, NO AJUSTES A CANTIDADES Y PRECIOS	Prog	0,3	0,3	3%
	Ejec	0,3	0,3	3%
EXPLANACIONES				
Excavación mecánica en material común de conformación y cunetas	Prog	0,0	0,0	0%
	Ejec	0,0	0,0	0%
Excavación en material común de conformación y cunetas	Prog	12164,83	12164,83	100%
	Ejec	12164,83	12164,83	100%
Terraplenes	Prog	23080,35	23080,35	100%
	Ejec	23080,35	23080,35	100%
Transporte de material excedente de la	Prog	594385,60	594385,60	100%
	Ejec	594379,92	594379,92	100%
ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA L=9m				
Excavación mecánica en material común sin clasificar	Prog	99,25	99,25	100%
	Ejec	99,25	99,25	100%
Concreto clase F (210 kg/cm2 - 3.000 PSI)	Prog	1,4	1,4	100%
	Ejec	-	1,4	0%
Concreto clase D (18 kg/cm2 - 2.500 PSI)	Prog	6,524	6,524	100%
	Ejec	6,524	6,524	100%
Relleno con material de sitio compactado	Prog	58	58	100%
	Ejec	29	29	50%
ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT L=9m				
Excavación mecánica en material común sin clasificar	Prog	819,92	819,92	100,00%
	Ejec	819,92	819,92	100,00%
Concreto clase F (210 kg/cm2 - 3.000 PSI)	Prog	12,67	12,674	100,00%
	Ejec	12,67	12,674	100,00%
Concreto clase D (18 kg/cm2 - 2.500 PSI)	Prog	166,176	166,176	100,00%
	Ejec	166,176	166,176	100,00%
Acero de refuerzo Gr Fy = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Prog	27670,5	27670,5	100,00%
	Ejec	27670,5	27670,5	100,00%
Relleno con material de sitio compactado	Prog	243,52	243,52	100,00%
	Ejec	243,52	243,52	100,00%
PAVIMENTO FLEXIBLE ANCHO 6.0 y CUNETAS de 0.60 m				
Subbase Granular Clase C	Prog	10690,20	10690,20	100%
	Ejec	10690,20	10690,20	100%
Base Granular Clase C	Prog	7010,13	7010,1	100%
	Ejec	7010,13	7010,1	100%
Riego de imprimación con emulsión asfáltica tipo CRL	Prog	34869,68	34869,7	100,00%
	Ejec	34869,68	34869,7	100,00%
Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19	Prog	4520,16	4520,16	36,78%
	Ejec	4661,35	4661,35	36,78%
Línea de Demarcación con Pintura en Frio	Prog			
	Ejec			
Suministro e instalación de Señal Vertical de Tránsito	Prog			
	Ejec			
Concreto clase D (18 kg/cm2 - 2.500 PSI) CUNETAS	Prog	601,03	789,00	97,1%
	Ejec	705,63	705,60	57,1%
Acero de refuerzo Gr Fy = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Prog	40647,39	40647,39	97,1%
	Ejec	40647,39	40647,39	57,1%
NO PREVISTOS				
Demolición de concreto de alcantarilla	Prog	3654	3654	100,0%
	Ejec	3654	3654	100,0%
Demolición de concreto simple MAMPOSTERIA - Cunetas	Prog	36	36	100,0%
	Ejec	36	36	100,0%
Cerca en alambre de púas con postes de madera	Prog	3654	3654	100,0%
	Ejec	3654	3654	100,0%
Reconformación con equipo pegador y retiro de 1 a 10 m	Prog	7647,41	7647,41	53,7%
	Ejec	7647,41	7647,41	53,7%
Demolición de cabezote alcantarilla de entrada y descarga tipo 1 incluyendo aletas (demolición)	Prog	464	464	100,0%
	Ejec	464	464	100,0%
Mejoramiento de la subrasante con adición de material granular	Prog	4269	4269	100,0%
	Ejec	4269	4269	100,0%
Geotextil tejido 600 lb/in sobre material	Prog	3600	3600	100,0%
	Ejec	3600	3600	100,0%
Material granular Drenante	Prog	900	900	100,0%
	Ejec	900	900	100,0%
Tubería para filtros de 6" perforada	Prog	1800	1800	100,0%
	Ejec	1800	1800	100,0%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	Prog	0,187	0,057	5,7
	Ejec	0,187	0,057	5,7

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Vehículo	*Camioneta > 3.500 G C	2
Retroexcavadora	Oruga - Cat 320 GC	1
Motoniveladora	CAT 120	1
Cargador	CAT 950 FL	1
Minicargador	CAT - 279D 1371	1
Vibrocompactador	Walk-behind 742 B	1
Volquetas	10 [illegible] 20 M3	2
Camión	Tanque de Imprimación	1
Vibrador Dose Bogie	28 HP	1
Cono menor		6
Mezcladora de concreto	Trompo 1 saco	1
Planta		1
2 [illegible]		1
Cizalla de hierro		1
Total		22

* Equipo mínimo requerido según el pliego de condiciones

TRAMO Y/O SECTOR 1: CASCO URBANO - SAN RAFAEL DE CORTINAS
TRAMO Y/O SECTOR 2: [illegible]
TRAMO Y/O SECTOR 3: _____

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Tolú viejo, Sucre Agregados y canteras del norte S.A.S.	PERMISO MINERO: SI X NO LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO		
UBICACION:	Camilo Torres - Barranca Ballavista	PERMISO MINERO: SI X NO LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO		
UBICACION:	Magangué, Bolívar Promotora de Negocios Bambú S.A.S	PERMISO MINERO: SI X NO LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO		

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACION DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI	X	NO		
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	

OBSERVACIONES: El contratista realizó la entrega de permisos de la planta de emisiones y sitios de disposición final de sobrantes de obra durante las mesas de trabajo realizadas.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
EL CONTRATISTA HA HECHO ENTREGA DEL PAGA Y SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCION DE
ESTADO: SOSTENIBILIDAD

OBSERVACIONES: El contratista realizó la entrega de permisos de la planta de emisiones y sitios de disposición final de sobrantes de obra durante las mesas de trabajo realizadas.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	34	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	33	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 42

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 6
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: Magangué -Bolivar.
Calle 17 A Carrera 25-110, Apartamento 1, planta, Barrio San Matias Ist

OBSERVACIONES: Se realizaron capacitaciones de higiene postural y estilo de vida saludable.

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: Para este contratono se realizará la adquisición de predios.

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EL CONTRATISTA DURANTE LA SEMANA HA REALIZADO ACTIVIDADES DE:

CONTINUAN LAS ACTIVIDADES DE FUNDIDA DE CUNETAS, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN, INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES, CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA PEGADA PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y LIMPIEZA DEL CORREDOR VIAL.


POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, SE HA REALIZADO ELABORACIÓN DE INFORME SEMANAL No.98, SOLICITUD DE PRORROGA DLE CONTRATO DE INTERVENTORÍA, SOLICITUD DEL ESTADO DE CUENTA Y REINTEGRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO 1898 DE 2021, SE REALIZA PRESENCIA EN OBRA PARA CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA, VIGILANCIA Y CONTROL ANTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO Y SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1898 DE 2021.

ASÍ MISMO, SE TIENE EL SIGUIENTE CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA:

GIC-INVIAS-BOL570-22	5-jul-24	REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 94 D E INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLIVAR – LOTE1
GIC-INVIAS-BOL571-22	5-jul-24	REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 94 D E INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLIVAR – LOTE2
GIC-INVIAS-BOL572-22	5-jul-24	RESPUESTA A COMUNICACIÓN CSR-567-080 – ENTREGA DE AJUSTES PAGA
GIC-INVIAS-BOL573-22	5-jul-24	REMISIÓN PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL – PAGA – MUNICIPIO DE MAGANGUE, BOLIVAR – LOTE 1. CONTRATO DE OBRA No.567 de 2022. OBJETO: "MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA

ELABORACIÓN DE INFORME SEMANAL No.99.
PRESENCIA EN OBRA PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AVANCES
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA
SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1898 DE 2021.
SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPLMN1.IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Construcción de piedra pegada.



Limpieza del corredor vial.



Construcción de piedra pegada.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.


XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL

LA INTERVENTORÍA GESTIONARÁ UN ACCIÓN DE MEJORA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Y EMITIRÁ A TIEMPO OFICIOS CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA.
BRINDAR PRONTA SOLUCION EN CASO DE PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS E INVERSIÓN DEL PROYECTO.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: ALMINSIDA CASTELLAR JARAMILLO
Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV

Original: Interventoría de Interventoría, Archivo Electrónico INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Director Territorial.

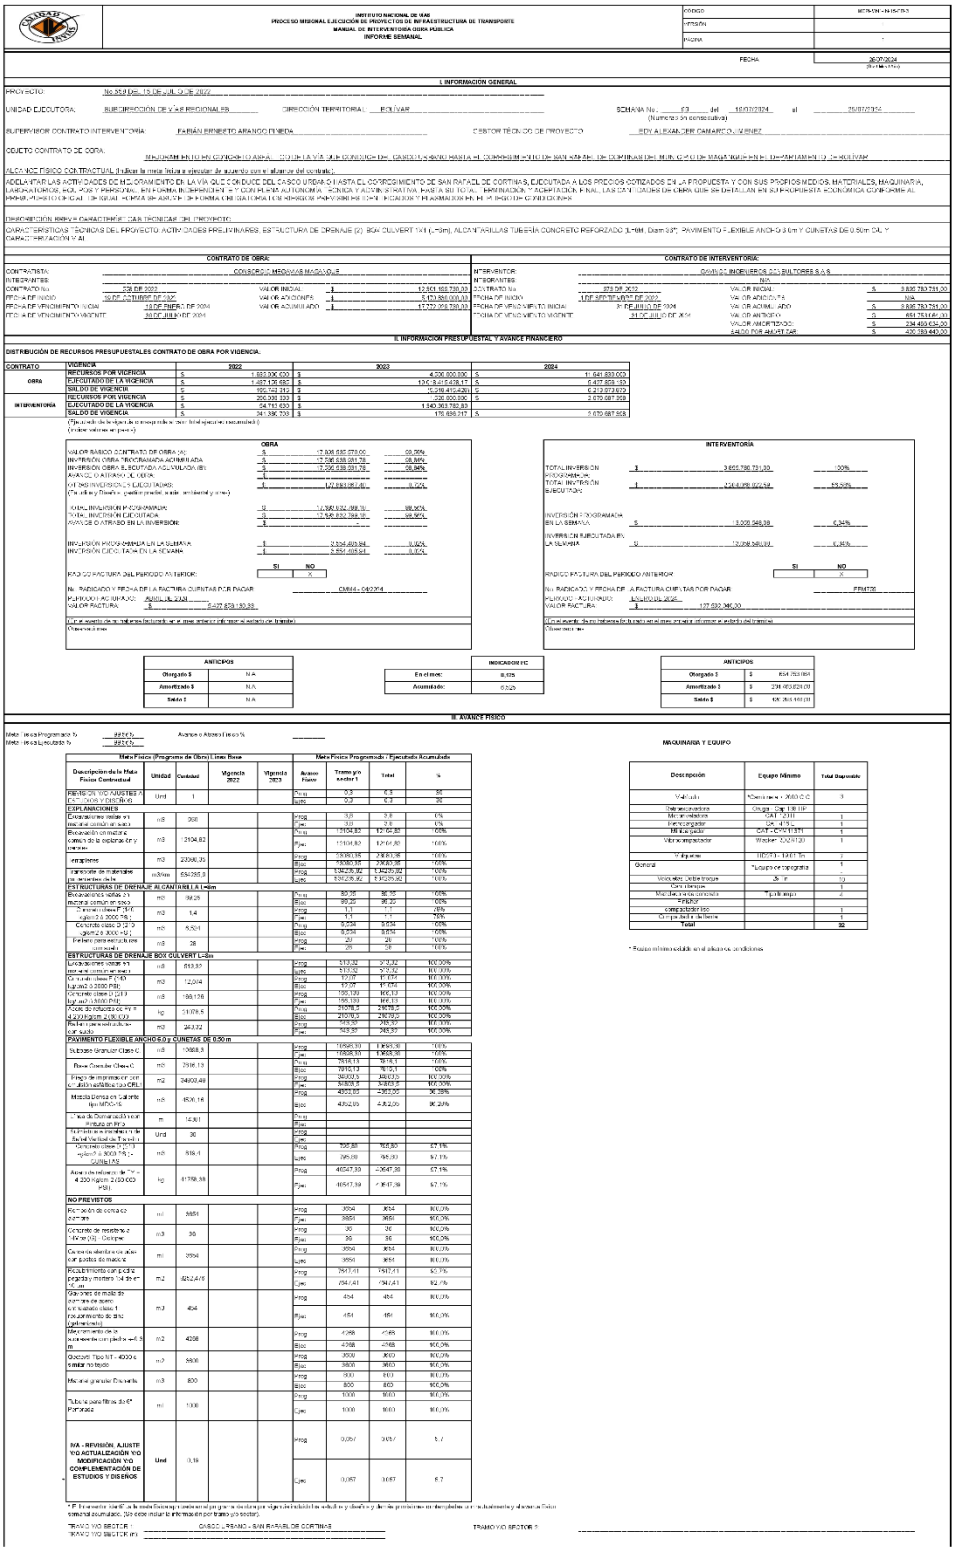

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

Código: INTVAN-INS-F-053
Versión:
Vigencia:

FECHA: 30/07/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: No 353 Del 15 DE JULIO DE 2022

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONAL RN DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR SEMANA No.: 53 del 16/07/2024 al 25/07/2024 (Numerar en forma consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: FABIAN ERNESTO ARANGO ENEDA DIRECTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDYA ELKA CERE CAMARGO JIMENEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO EN LA CARPETA ASFALTICA DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO DE SAN RAFAEL DE CORTINAS, SUCRE HASTA EL CORREGIMIENTO DE MATA DE DE CORTINAS DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato.):
ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA EL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL DE CORTINAS, EJECUTADA A LOS PRECIOS COTIZADOS EN LA PROPUESTA Y CON SUS PROPIOS MEDIOS, MATERIALES, MAQUINARIA, LABORATORIOS, EQUIPOS Y PERSONAL, EN FORMA INDEPENDIENTE Y CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN Y ACEPTACIÓN FINAL, LAS CANTIDADES DE OBRA QUE SE DETALLAN EN SUS PROPUESTA ECONÓMICA CONFORME AL PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: ACTIVIDADES PRELIMINARES, ESTRUCTURA DE DRENAJE (2) BOX CULVERT 1X1 (L=9m), ALCANTARILLAS TUBERÍA CONCRETO REFORZADO 3,=0M, Diam 36", PAVIMENTO FLEXIBLE ANCHO 6.0 m Y CUNETAS DE 0.50m CAL Y CARACTERIZACIÓN VIAL

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEDIAS MAGDALE			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No:	378 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 12.901.555.730,00	CONTRATO No:	973 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 3.835.783.751,00
FECHA DE INICIO:	16 DE OCTUBRE DE 2022	VALOR ADICIONES:	$ 4.470.844.009,00	FECHA DE INICIO:	1 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VALOR ADICIONES:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	16 DE ENERO DE 2024	VALOR ADICIONADO:	$ 17.372.399.739,00	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE JULIO DE 2024	VALOR APORTE:	$ 3.835.783.751,00
FECHA DE TERMINACIÓN VIGENTE:	30 DE JULIO DE 2024			FECHA DE TERMINACIÓN VIGENTE:	31 DE JULIO DE 2024	VALOR ADICIONADO:	$ 654.753.184
						VALOR MODIFICADO:	$ 4.490.536.935
						AJUSTE:	$ 295.369.449,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA.

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.883.000.000	$ 4.206.000.000	$ 11.641.693.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.487.126.680	$ 1.206.873.411	$ 6.477.809.132
	SALDO DE VIGENCIA	$ 395.743.310	$ 10.299.473.589	$ 5.213.973.868
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.000.000	$ 200.000.000	$ 3.670.687.958
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 24.751.600	$ 1.540.363.783,83	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 241.336.733	$ 179.636.217	$ 3.670.687.958

(Ejecución de la vigencia de corresponde a corte final ejecutado mensualidad.)
(Valor valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A)	$ 17.696.696.070,00	68,29%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 17.696.696.070,79	68,84%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B)	$ 17.696.696.070,79	68,84%
AVANCE O ATRASO EJECUCIÓN	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Predial y Diseño - gestión predial, social, ambiental y otros)	$ 147.883.185,80	0,72%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA	$ 17.696.696.070,79	68,90%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 17.696.696.070,79	68,90%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.554.469,84	0,02%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.554.469,84	0,02%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CURSTAR POR PAGAR: CM844 - 04/2024
PERIODO ACTUAL FACTURA: ABRIL AL 21AR
VALOR FACTURA: $ 5.427.679.180,88

(En el aspecto de los valores facturados que se van cobrando el porcentaje de anticipo de la obra)
Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSION	$ 3.665.786.731,20	39%
PROGRAMACION		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 14.418.882.922,58	53,53%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.208.546,88	6,24%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.098.546,88	6,24%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CURSTAR POR PAGAR: FRA735
PERIODO ACTUAL FACTURA: 1/JULIO AL 25/JUL
VALOR FACTURA: $ 177.692.346,20

(En el aspecto de los valores facturados que se van cobrando el porcentaje de anticipo de la obra)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N A
Amortizado $	N A
Saldo $	N A

INDICADOR IFC	
En el mes:	0,125
Acumulado:	0,125

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 654.753.184
Amortizado $	$ 294.953.824,00
Saldo $	$ 359.799.360,00

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 48,50%
Meta Física Ejecutada %: 48,50%
Avance o Atraso Físico %: 0,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023
PREVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (1)	Und	1		
EXPLANACIONES				
Desmonte y/o retiro vegetal manual o mecanico	m2	300		
Excavación mecánica común de la explanación y canales	m3	13104,82		
Conformación de terraplenes	m3	23000,00		
Transporte de materiales no aprovechables	m3/km	684785,8		
ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA 1-36m				
Excavaciones varias en material común en seco	m3	98,28		
Concreto clase P (14 kg/cm2 a 3000 PSI)	m3	1,4		
Concreto clase D (210 kg/cm2 a 3000 PSI)	m3	6,524		
Relleno para estructuras con suelo	m3	28		
ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT L=9m				
Excavaciones varias en material común en seco	m3	513,32		
Concreto clase P (140 kg/cm2 a 3000 PSI)	m3	12,048		
Concreto clase D (210 kg/cm2 a 3000 PSI)	m3	186,136		
Acero de refuerzo de 1/2" y 4.200 kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	31178,5		
Relleno para estructuras con suelo	m3	248,39		
PAVIMENTO FLEXIBLE ANCHO 6.0 y CUNETAS DE 0.50 m				
Subbase Granular Clase C	m3	7968,8		
Base Granular Clase C	m3	7968,18		
Riego de imprimación con cubrimiento asfáltico tipo CRL	m2	34800,48		
Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19	m3	6561,18		
Línea de Demarcación con pintura en frío	m	14361		
Señales verticales de Reglamentación de Velocidad de Tránsito	Und	36		
Concreto clase D (210 kg/cm2 a 3000 PSI) - CUNETAS	m3	936,4		
Acero de refuerzo de 1/2" y 4.200 kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	81799,58		
NO PREVISTOS				
Retención de concreto simple	ml	3681		
Concreto de resistencia f'c=3M Pa (30 - Compac	m3	36		
Concreto ciclopeo con adición de piedra de mano	m3	3564		
Acuartelamiento con pedraplen y mortero 1:4 e=0.40 m	m2	4812,478		
Gaviones de malla de acero con tratado clase 1 (recubrimiento de zinc galvanizado)	m3	464		
Mejoramiento de la subrasante con piedra e=0.8 m	m2	4098		
Geocelda Tipo NT - 400 o similar no tejido	m2	5600		
Material granular Encamado	m3	800		
Tubería para filtros 6" Perforada	ml	1000		
INA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**Und**	**0,16**		


Meta Física Programado / Ejecutado Acumulado

Avance Físico	Tiempo sector 1	Total	%
Prog	6,5	6,5	86
Ejec	6,5	6,5	86
Prog	0,0	0,0	0%
Ejec	0,0	0,0	0%
Prog	13104,82	13104,82	100%
Ejec	13104,82	13104,82	100%
Prog	23000,00	23000,00	100%
Ejec	23000,00	23000,00	100%
Prog	684785,8	684785,8	100%
Ejec	684785,8	684785,8	100%
Prog	98,28	98,28	100%
Ejec	98,28	98,28	100%
Prog	1,4	1,4	100%
Ejec	1,4	1,4	100%
Prog	6,524	6,524	100%
Ejec	6,524	6,524	100%
Prog	28	28	100%
Ejec	28	28	100%
Prog	513,32	513,32	100,00%
Ejec	513,32	513,32	100,00%
Prog	12,05	12,05	100,00%
Ejec	12,05	12,05	100,00%
Prog	186,136	186,136	100,00%
Ejec	186,136	186,136	100,00%
Prog	31178,5	31178,5	100,00%
Ejec	31178,5	31178,5	100,00%
Prog	248,39	248,39	100,00%
Ejec	248,39	248,39	100,00%
Prog	7968,8	7968,8	100%
Ejec	7968,8	7968,8	100%
Prog	7968,18	7968,18	100%
Ejec	7968,18	7968,18	100%
Prog	34800,5	34800,5	100,00%
Ejec	34800,5	34800,5	100,00%
Prog	4265,65	4265,65	65,05%
Ejec	4262,09	4262,09	99,92%
Prog			
Ejec			
Prog			
Ejec			
Prog	936,38	936,38	57,1%
Ejec	936,38	936,38	57,1%
Prog	46547,39	46547,39	57,1%
Ejec	46547,39	46547,39	57,1%
Prog	3694	3694	100,0%
Ejec	3694	3694	100,0%
Prog	36	36	100,0%
Ejec	36	36	100,0%
Prog	3694	3694	100,0%
Ejec	3694	3694	100,0%
Prog	7547,61	7547,61	92,7%
Ejec	7547,61	7547,61	92,7%
Prog	464	464	100,0%
Ejec	464	464	100,0%
Prog	4098	4098	100,0%
Ejec	4098	4098	100,0%
Prog	3600	3600	100,0%
Ejec	3600	3600	100,0%
Prog	800	800	100,0%
Ejec	800	800	100,0%
Prog	1000	1000	100,0%
Ejec	1000	1000	100,0%
Prog	0,087	3437	5,7
Ejec	0,087	3687	5,7

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Vehículo	*Camioneta > 3000 CC	3
Retroexcavadora	Oruga - Cap. 1.00 m3	
Motoniveladora	CAT 120H	1
Rodillo pequeño	CAT - CB-10	1
Rodillo pesado	CAT - CS-533 E	1
Vibro compactador	Wacker DV2132i	1
Volquetas	10 m3 - 14 m3 - 15 m3	2
Cisterna	*Equipo de carretera	1
Vehículo Doble tracción	3/4 - F	1
Cuadrimotos		1
Machetes y herramientas menores	Equipo mayor	4
Botiquín		
Computadores		1
Equipo de oficina		1
Total		32

* Podrán reforzarse según el avance y condiciones

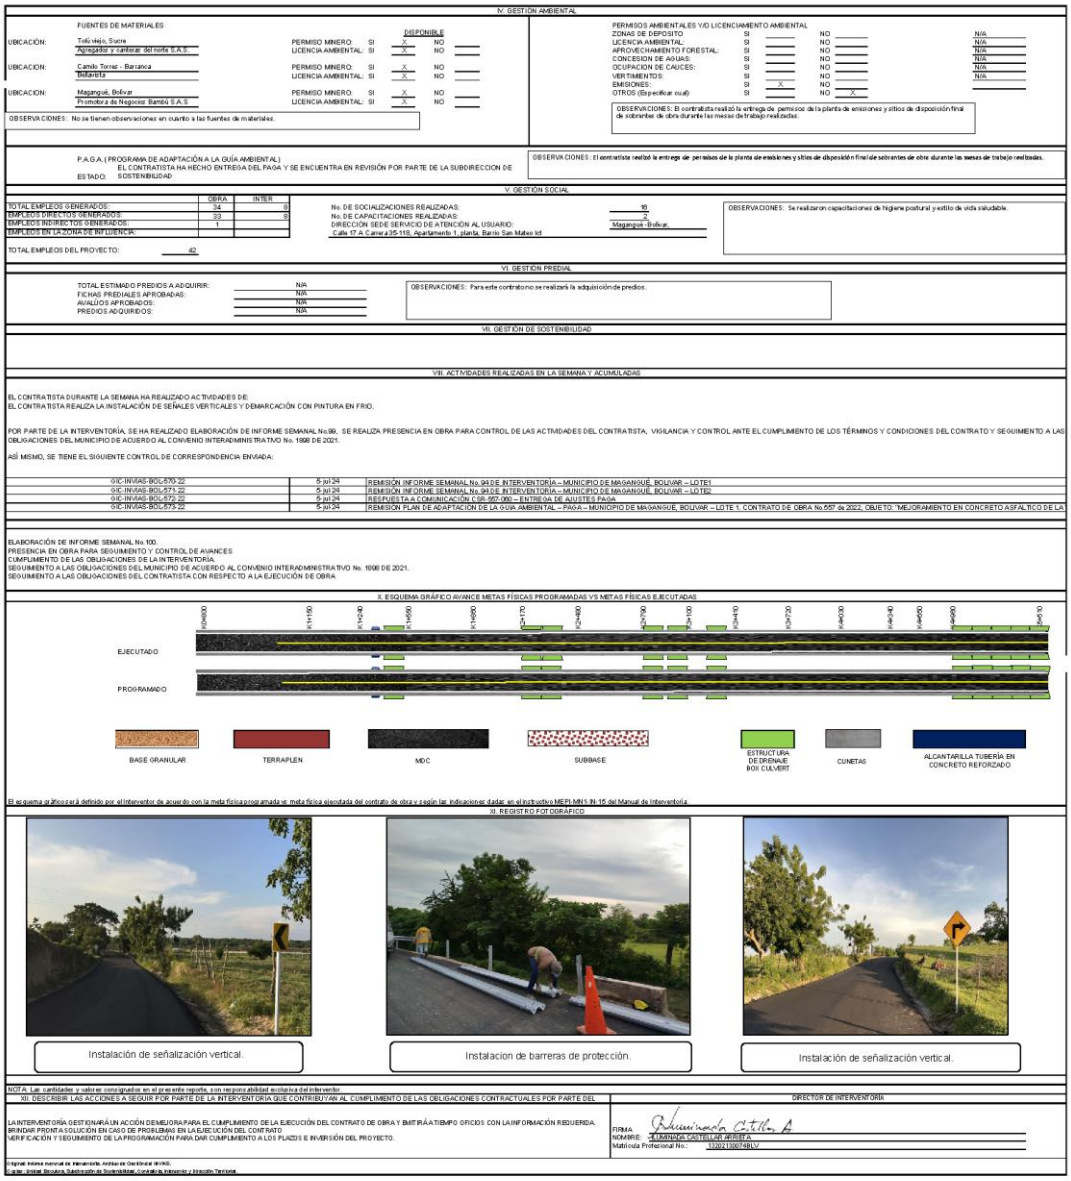

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Toló viejo, Sucre Agregados y canteras del norte S.A.S.	PERMISO MINERO: SI LICENCIA AMBIENTAL: SI	X X	NO NO	
UBICACIÓN:	Camilo Torres - Barranca Bellavista	PERMISO MINERO: SI LICENCIA AMBIENTAL: SI	X X	NO NO	
UBICACIÓN:	Magangué, Bolívar Promotora de Negocios Bambú S.A.S	PERMISO MINERO: SI LICENCIA AMBIENTAL: SI	X X	NO NO	

OBSERVACIONES: No se tienen observaciones en cuanto a las fuentes de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A
CONCESION DE AGUAS:	SI	NO		N/A
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A
EMISIONES:	SI	X	NO	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X

OBSERVACIONES: El contratista realizó la entrega de permisos de la planta de emisiones y sitios de disposición final de sobrantes de obra durante las meses de trabajo realizados.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
EL CONTRATISTA HA HECHO ENTREGA DEL PAGA Y SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCION DE
ESTADO: SOSTENIBILIDAD

OBSERVACIONES: El contratista realizó la entrega de permisos de la planta de emisiones y sitios de disposición final de sobrantes de obra durante las meses de trabajo realizados.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	34	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	33	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 42

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 16
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Magangué -Bolívar.
Calle 17 A Carrera 35-118, Apartamento 1, planta, Barrio San Mateo ld

OBSERVACIONES: Se realizaron capacitaciones de higiene postural y estilo de vida saludable.

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: Para este contrato no se realizará la adquisición de predios.

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EL CONTRATISTA DURANTE LA SEMANA HA REALIZADO ACTIVIDADES DE:
EL CONTRATISTA REALIZA LA INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES Y DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO.

POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, SE HA REALIZADO ELABORACIÓN DE INFORME SEMANAL No.99, SE REALIZA PRESENCIA EN OBRA PARA CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA, VIGILANCIA Y CONTROL ANTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO Y SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1898 DE 2021.

ASÍ MISMO, SE TIENE EL SIGUIENTE CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA:

GIC-INVIAS-BOL570-22	5-jul-24	REMISIÓN INFORME SEMANAL No.94 DE INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLIVAR – LOTE1
GIC-INVIAS-BOL571-22	5-jul-24	REMISIÓN INFORME SEMANAL No.94 DE INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLIVAR – LOTE2
GIC-INVIAS-BOL572-22	5-jul-24	RESPUESTA A COMUNICACIÓN C-08-557-090 – ENTREGA DE AJUSTES PAGA
GIC-INVIAS-BOL573-22	5-jul-24	REMISION PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL – PAGA – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLIVAR – LOTE 1, CONTRATO DE OBRA No.557 de 2022, OBJETO: "MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA

ELABORACIÓN DE INFORME SEMANAL No.100.
PRESENCIA EN OBRA PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AVANCES
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA
SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1898 DE 2021.
SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA.

IX. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPL-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

Instalación de señalización vertical.

Instalacion de barreras de protección.

Instalación de señalización vertical.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL

LA INTERVENTORÍA GESTIONARÁ UN ACCIÓN DE MEJORA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Y EMITIRÁ A TIEMPO OFICIOS CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA.
BRINDAR PRONTA SOLUCIÓN EN CASO DE PROBLEMAS EN LA EJEUCUCIÓN DEL CONTRATO
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS E INVERSIÓN DEL PROYECTO.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA:
NOMBRE: ALMINADA CASTELLAR ARRIETA
Matrícula Profesional No.: 13021360748LV

Original: Informe mensual de interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Jefatura, Dirección, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista Interventor y Supervisión Territorial.

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

4.2.1. MUNICIPIO DE ACHÍ – BOLÍVAR CONTRATO N° L.P.006 DE 2022.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** LOS NISPEROS - SINCERÍN

CONTRATO No. L.P.006 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 973 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Herramienta menor			Nisperos - Sincerín	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
Herramienta menor			Nisperos - Sincerín	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Herramienta menor			Nisperos - Sincerín	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Vibro compactador (Tipo rana)			Nisperos - Sincerín	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
Vibro compactador (Tipo rana)			Nisperos - Sincerín	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Motoniveladora			Nisperos - Sincerín	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
Motoniveladora			Nisperos - Sincerín	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Motoniveladora			Nisperos - Sincerín	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Volquetas sencillas			Nisperos - Sincerín	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
Volquetas sencillas			Nisperos - Sincerín	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
Volquetas sencillas			Nisperos - Sincerín	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
Volquetas sencillas			Nisperos - Sincerín	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Volquetas sencillas			Nisperos - Sincerín	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Volquetas sencillas			Nisperos - Sincerín	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Volquetas sencillas			Nisperos - Sincerín	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Volquetas doble troque			Nisperos - Sincerín	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Volquetas doble troque			Nisperos - Sincerín	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Volquetas doble troque			Nisperos - Sincerín	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Volquetas doble troque			Nisperos - Sincerín	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Volquetas doble troque			Nisperos - Sincerín	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Mezcladora de concreto (Tipo trompo)			Nisperos - Sincerín	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
Retrocargador			Nisperos - Sincerín	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
Mezcladora de concreto (Tipo trompo)			Nisperos - Sincerín	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Mezcladora de concreto (Tipo trompo)			Nisperos - Sincerín	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Compactador			Nisperos - Sincerín	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
Retroexcavadora	Hitachi 60		Nisperos - Sincerín	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
			TOTAL ACTIVO	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	26	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	9	34,62
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0,00
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	17	65

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: La interventoría no ha recibido información por parte del contratista acerca de la maquinaria y equipo del proyecto

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Asael Cerpa
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:13202-360133BLV

Firma
Nombre: Jose Manuel Cardenas Bolívar
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:08202097701ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.2.2. MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N° 557 DE 2022.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE CASCAJAL HASTA EL CORREGIMIENTO LA PASCUALA DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

CONTRATO No. 557 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN RAFAEL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 973 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MINICARGADOR	HYUNDAY		CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
NP300 FRONTIER	NISSAN		CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
DUSTER OROCH	RENAULT		CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
DUSTER OROCH	RENAULT		CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
VIBRO CA250D-11 # 4	DYNAPAC		CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
VIBRO CA260 # 2	DYNAPAC		CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
VIBRO # 6	INGERSOLL RAND		CAMPAMENTO OBRA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
EXCAVADORA	JOHN DEERE		CAMPAMENTO OBRA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
CARRO TANQUE			CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
CARRO TANQUE			CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
CARRO TANQUE			CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
CARRO TANQUE			CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
RETROEXCAVADORA	JOHN DEERE		CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
RETROEXCAVADORA	JOHN DEERE		CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
RETROCARGADOR	CAT 416 E		CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
BULLDOZER D5G	CARTEPILLAR		CAMPAMENTO OBRA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
BULLDOZER D6M XL	CARTEPILLAR		CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
MOTONIVELADORA 140H #2	CARTEPILLAR		CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
MOTONIVELADORA 140H #4	CARTEPILLAR		CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
VOLQUETA LJQ992	HINO	29 Tn	CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
VOLQUETA LJQ721	HINO	29 Tn	CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
VOLQUETA LJQ998	HINO	29 Tn	CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
VOLQUETA LJQ999	HINO	29 Tn	CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
VOLQUETA LJQ992	HINO	29 Tn	CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
VOLQUETA LJQ721	HINO	29 Tn	CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
VOLQUETA LJQ998	HINO	29 Tn	CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
VOLQUETA LJQ999	HINO	29 Tn	CAMPAMENTO OBRA	I	I	A	A	A	A	I	A	I	I	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	I	A	I	I
EQUIPO DE TOPOGRAFIA			CAMPAMENTO OBRA	I	I	A	A	A	A	I	I	I	I	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	I	A	I	I
MEZCLADORA DE CONCRETO			CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
MEZCLADORA DE CONCRETO			CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
MEZCLADORA DE CONCRETO			CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
MEZCLADORA DE CONCRETO			CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
MEZCLADORA DE CONCRETO			CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
MEZCLADORA DE CONCRETO			CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
VOLQUETA HD270 - 19,01 Tn	DODGE	19,01 Tn	CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
PILOTEADORA			CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
CARGADOR FRONTAL			CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
VOLQUETA HD270 - 19,01 Tn	DODGE	19,01 Tn	CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
VOLQUETA HD270 - 19,01 Tn	DODGE	19,01 Tn	CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
VOLQUETA HD270 - 19,01 Tn	DODGE	19,01 Tn	CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
VOLQUETA HD270 - 19,01 Tn	DODGE	19,01 Tn	CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
VOLQUETA HD270 - 19,01 Tn	DODGE	19,01 Tn	CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
VOLQUETA HD270 - 19,01 Tn	DODGE	19,01 Tn	CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
VOLQUETA HD270 - 19,01 Tn	DODGE	19,01 Tn	CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
VOLQUETA HD270 - 19,01 Tn	DODGE	19,01 Tn	CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
VOLQUETA HD270 - 19,01 Tn	DODGE	19,01 Tn	CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
VOLQUETA HD270 - 19,01 Tn	DODGE	19,01 Tn	CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO															47																
			TOTAL ACTIVO															45																
			TOTAL EN REPARACIÓN															0																
			TOTAL INACTIVO															2																

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	47	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	45	96%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	2	4%

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Gloria Coello Torres
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 13202178491BLV

Firma
Nombre: Edgar Alfonso Aragón Otero
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202226695CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.2.3. MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N° 558 DE 2022.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA EL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL DE CORTINAS DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATO No. 558 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUE

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 973 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																											
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA 120G	CAT	-	CAMPAMENTO OBRA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBROCOMPACTADOR 2	DYNAPAC	10 TON	CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
MOTONIVELADORA 140H #3	CAT		CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A
MINICARGADOR	CAT - CYM11371		CAMPAMENTO OBRA	A	A	I	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A
RETROCARGADORA 416C			CAMPAMENTO OBRA	A	A	I	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	I	I	I	A	I
RETROCARGADORA 416E			CAMPAMENTO OBRA	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
SPI 852	MACK	15 M3	CAMPAMENTO OBRA	A	A	I	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A
SPI 843	MACK	15 M3	CAMPAMENTO OBRA	A	A	I	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A
SPI 848	MACK	15 M3	CAMPAMENTO OBRA	A	A	I	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	I	I	I	A	I
TVB 439	KENWORTH	15 M3	CAMPAMENTO OBRA	A	A	I	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	I	I	I	A	I
TVB 440	KENWORTH	15 M3	CAMPAMENTO OBRA	A	A	I	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	I	I	I	A	I
VOLQUETA LJQ992	HINO	29 Tn	CAMPAMENTO OBRA	A	A	I	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A
VOLQUETA LJQ721	HINO	29 Tn	CAMPAMENTO OBRA	A	A	I	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A
VOLQUETA LJQ998	HINO	29 Tn	CAMPAMENTO OBRA	A	A	I	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A
VOLQUETA LJQ999	HINO	29 Tn	CAMPAMENTO OBRA	A	A	I	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A
VOLQUETA LJQ992	HINO	29 Tn	CAMPAMENTO OBRA	A	A	I	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A
VOLQUETA LJQ721	HINO	29 Tn	CAMPAMENTO OBRA	A	A	I	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A
VOLQUETA LJQ998	HINO	29 Tn	CAMPAMENTO OBRA	A	A	I	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A
VOLQUETA LJQ999	HINO	29 Tn	CAMPAMENTO OBRA	A	A	I	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A
VOLQUETA LJQ998	HINO	29 Tn	CAMPAMENTO OBRA	A	A	I	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A
VOLQUETA LJQ999	HINO	29 Tn	CAMPAMENTO OBRA	A	A	I	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A
VOLQUETA HD270 - 19,01 Tn	DODGE	19,01 Tn	CAMPAMENTO OBRA	A	A	I	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A
VOLQUETA HD270 - 19,01 Tn	DODGE	19,01 Tn	CAMPAMENTO OBRA	A	A	I	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A
VOLQUETA HD270 - 19,01 Tn	DODGE	19,01 Tn	CAMPAMENTO OBRA	A	A	I	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A
VOLQUETA HD270 - 19,01 Tn	DODGE	19,01 Tn	CAMPAMENTO OBRA	A	A	I	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A
VOLQUETA HD270 - 19,01 Tn	DODGE	19,01 Tn	CAMPAMENTO OBRA	A	A	I	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A
VOLQUETA HD270 - 19,01 Tn	DODGE	19,01 Tn	CAMPAMENTO OBRA	A	A	I	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A
TVB 441	KENWORTH	15 M3	CAMPAMENTO OBRA	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TVB 442	KENWORTH	15 M3	CAMPAMENTO OBRA	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SPR 597	MACK	15 M3	CAMPAMENTO OBRA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	A	I	I	I	I	I
TDW 605	FRIGHTLINER	15 M3	CAMPAMENTO OBRA	I	I	I	I	I	A	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TDW 604	CHEVROLET	15 M3	CAMPAMENTO OBRA	A	A	I	I	A	A	I	A	A	I	I	I	I	I	A	A	I	I	A	A	I	I	A	I	I	I	I	I	I	A	I
SPI 844	MACK	15 M3	CAMPAMENTO OBRA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
UFV 728	CHEVROLET	15 M3	CAMPAMENTO OBRA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I
UAO 636	CHEVROLET	15 M3	CAMPAMENTO OBRA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I
UFV 627	HYUNDAI	15 M3	CAMPAMENTO OBRA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	37																													
			TOTAL ACTIVO	32																													
			TOTAL EN REPARACIÓN	0																													
			TOTAL INACTIVO	5																													

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	37	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	32	86%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	5	14%

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Jesús Zapa
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-286336

Firma
Nombre: Enrique Alfonso Sanchez Troncoso
Residente de Interventoria
Matrícula Profesional No.:08202102557ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

4.3.1. MUNICIPIO DE ACHÍ – BOLÍVAR CONTRATO N° L.P.006 DE 2022.

Conforme al Anexo No. 1 – Anexo Técnico de los Pliegos de Condiciones, el personal mínimo requerido conforme a lo establecido en el numeral 6. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL – a. Requisitos del personal de dicho documento, quedo establecido y aprobado de la siguiente manera en el comunicado No. GIC-INVIAS-BOL-225-22 de la Interventoría del 19 de abril de 2023.

CARGO	PROFESIONAL
DIRECTOR DE OBRA	JAVIER JOSÉ DOMÍNGUEZ VERGARA
RESIDENTE DE OBRA	ASAEL CERPA MONTES
SUPERVISOR SST	ELIZABETH PÉREZ MELÉNDEZ

Tabla 14. Personal del Consorcio VIA LOS NISPEROS JK.

Durante el mes, el contratista CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK no ha hecho la entrega de los soportes de pago de seguridad social del personal en obra.

4.3.2. MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°557 DE 2022

Conforme al Anexo No. 1 – Anexo Técnico de los Pliegos de Condiciones, el personal mínimo requerido conforme a lo establecido en el numeral 6. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL – a. Requisitos del personal de dicho documento, quedo establecido y aprobado de la siguiente manera en el comunicado No. GIC-INVIAS-BOL-057-22 de la Interventoría del 24 de octubre de 2022. A continuación, en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 se relaciona el personal, aportes legales y seguridad social del contrato de obra.

CARGO	PROFESIONAL
DIRECTOR DE OBRA	GONZALO DE JESUS ARBELAEZ AGUIRRE
RESIDENTE DE OBRA	GLORIA ESTHER COELLO TORRES
INGENIERO ESPECIALISTA EN VÍAS	ERNESTO RAFAEL MERLANO MORALES
RESIDENTE AMBIENTAL	ETTY YULIET CALVO RAMIREZ

Tabla 15. Personal del Consorcio SAN RAFAEL.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901613979	1	CONSORCIO SAN RAFAEL	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	MARBELLA CRA 3 #6	CARTAGENA-BOLIVAR	3175128295	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	827558185	5671693010	E	2024/08/06	2024/08/06	BANCO BT OCCIDENTE		$9,290,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	12595376	BARROS SIXTO	230301	30	$1,571,600	$251,500	CCFC55	30	$1,571,600	$196,500	CCF08	30	$1,571,600	$62,900	14-11	30	$1,571,600	$804,400	30	$1,571,600	$78,700
2	CC	1012982153	CABALLERO JESUS	230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$162,500	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$665,600	30	$1,300,000	$65,000
3	CC	247 6445	CABARCAS MARCELIANO		0	$0	$0	EPS002	30	$2,376,800	$288,400	CCF08	30	$2,376,800	$92,300	14-11	30	$2,376,800	$1,160,300	30	$2,376,800	$118,900
4	CC	1052912815	CHACON LUIS	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$162,500	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$665,600	30	$1,300,000	$65,000
5	CC	1047344369	CORLLO GLORIA	231001	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$437,500	CCF08	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$1,743,500	30	$3,500,000	$175,000
6	CC	7624432	DIAZ ALVARO	230201	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$162,500	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$665,600	30	$1,300,000	$65,000
7	CC	1002487934	HERNANDEZ JESUS	230201	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$162,500	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$665,600	30	$1,300,000	$65,000
8	CC	1052749950	MERCADO RODRIGO	231001	30	$1,740,420	$278,500	ESSC24	30	$1,799,420	$223,900	CCF08	30	$1,799,420	$71,700	14-11	30	$1,799,420	$924,700	30	$1,799,420	$89,700
9	CC	1001804522	PEREZ MAURICIO	230301	30	$1,860,000	$286,000	EPS002	30	$1,860,000	$232,500	CCF08	30	$1,860,000	$72,000	14-11	30	$1,860,000	$925,200	30	$1,860,000	$93,000
10	CC	1052763488	SAMPAYO CARLOS	230301	30	$1,764,500	$274,400	CCFC55	30	$1,964,500	$245,600	CCF08	30	$1,764,500	$78,600	14-11	30	$1,764,500	$926,800	30	$1,764,500	$88,300
11	CC	1019112569	TOVAR JOHN	230301	30	$1,807,750	$281,500	EPS037	30	$1,807,750	$226,000	CCF08	30	$1,807,750	$72,400	14-11	30	$1,807,750	$925,900	30	$1,807,750	$90,300
12	CC	7564278	YUMIZO ALDEMAR	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$162,500	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$665,600	30	$1,300,000	$65,000
13	CC	1002388309	ZAPATTE GERMAN	230301	8	$480,000	$74,800	EPS010	8	$480,000	$60,000	CCF08	8	$480,000	$19,200	14-11	8	$480,000	$255,500	8	$480,000	$24,000
Total	**Afiliados(13)**					**$19,414,270**	**$3,106,500**			**$21,721,070**	**$2,715,400**			**$21,721,070**	**$869,100**			**$21,721,070**	**$1,512,300**		**$21,721,070**	**$1,086,700**

Página 1 de 2

2024/09/16 10:36 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$3,106,500	$0	$3,106,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$846,500	$0	$846,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,844,000	$0	$1,844,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$416,000	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,512,300	$0	$1,512,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$1,512,300	$0	$1,512,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$869,100	$0	$869,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	13	$869,100	$0	$869,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$2,715,400	$0	$2,715,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$604,600	$0	$604,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$711,400	$0	$711,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$60,000	$0	$60,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$162,500	$0	$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$1,176,900	$0	$1,176,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$652,000	$0	$652,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	13	$652,000	$0	$652,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$434,700	$0	$434,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	13	$434,700	$0	$434,700
TOTAL				13	$9,290,000	$0	$9,290,000

Página 2 de 2

2024/09/16 10:36 AM

4.3.3. MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°558 DE 2022

Conforme al Anexo No. 1 – Anexo Técnico de los Pliegos de Condiciones, el personal mínimo requerido conforme a lo establecido en el numeral 6. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL – a. Requisitos del personal de dicho documento, quedo establecido y aprobado de la siguiente manera en el comunicado No. GIC-INVIAS-BOL-056-22 de la Interventoría del 19 de octubre de 2022.

CARGO	PROFESIONAL
DIRECTOR DE OBRA	DIEGO ARMANDO ALVAREZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA	KEVIN JAVIER ESPELETA BRITTO
INGENIERO ESPECIALISTA EN VÍAS	JAIRO ALBERTO QUINTERO DÁBILA

Tabla 16. Personal del Consorcio MEGAVIAS MAGANGUÉ.

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	5/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No: 558 DEL 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEGAVÍAS MAGANGUÉ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFÁLTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA EL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL DE CORTINAS DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 973 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NOMBRE ARL: AXA COLPATRIA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFENALCO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	NOMBRE	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes de jul 2024 en el proyecto																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	DIEGO ARMANDO ALVAREZ HERNANDEZ	73201971	DIRECTOR	$ 6.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCSION	$ 1.300.000	$ 90.480	V	SALUD TOTAL	9469682553	$ 52.000	PROTECCION	9469682553	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
2	JAVIER ANDRIAN DE JESUS TORRES MONTES	1044938309	INGENIERO RESIDENTE	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCSION	$ 2.500.000	$ 97.500	V	MUTUALSER	9469376617	$ 56.000	PROTECCION	9469376617	$ 224.000	$ 56.000	$ -	$ -	
3	MARY MAR COGOLLO	1001973420	GESTOR HSE	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCSION	$ 1.800.000	$ 97.500	V	MUTUALSER	9469682553	$ 56.000	PROTECCION	9469682553	$ 224.000	$ 56.000	$ -	$ -	
4	JUAN GABRIEL HERNANDEZ DE LA ROSA	8866215	OFICIOS VARIOS	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO MEGAVÍAS MAGANGUÉ	$ 1.300.000	$ 90.480	V	COOSALUD	9469376617	$ 52.000	COLFONDOS	9469376617	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
5	MARIA JOSE VECINO HERRERA	1052999631	SOCIAL	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MARIA JOSE VECINO HERRERA	$ 1.300.000	$ 90.480	V	EPS MUTUAL SER	9468772028	$ 52.000	COPENCIONES	9468772028	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
6	LUIS OSVALDO GARIZAO PAREDES	1052976825	CONDUCTOR DE VOLQUETA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NAM CONSTRUCCIONES SAS	$ 1.593.731	$ 110.924	V	EPS MUTUAL SER	9469879906	$ 63.749	COPENCIONES	9469879906	$ 254.997	$ 63.749	$ -	$ -	
7	JAVIER ANDRES MUÑOZ OLIVERA	1052095745	CONDUCTOR DE VOLQUETA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NAM CONSTRUCCIONES SAS	$ 3.149.065	$ 219.175	V	MUTUAL SER	9469879906	$ 125.963	PORVENIR	9469879906	$ 503.850	$ 125.963	$ -	$ -	
8	LIZANDRO CORTINA JIMENEZ	1048212288	CONDUCTOR DE VOLQUETA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NAM CONSTRUCCIONES SAS	$ 2.133.805	$ 92.821	IV	CAJACOPI	9469879906	$ 85.352	PORVENIR	9469879906	$ 341.409	$ 85.352	$ -	$ -	
9	FERNANDO GABRIEL PINEDA MONTES	1052076168	CONDUCTOR DE VOLQUETA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NAM CONSTRUCCIONES SAS	$ 1.412.933	$ 61.463	IV	MUTUAL SER	9469879906	$ 56.517	PORVENIR	9469879906	$ 226.069	$ 56.517	$ -	$ -	
10	WILSON ENRIQUE LORDUY LLERENA	73165996	CONDUCTOR DE VOLQUETA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NAM CONSTRUCCIONES SAS	$ 1.094.665	$ 47.618	IV	SALUD TOTAL	9469879906	$ 43.787	PORVENIR	9469879906	$ 175.146	$ 43.787	$ -	$ -	
11	JUAN CARLOS MARTINEZ DIAZ	73431712	CONDUCTOR DE VOLQUETA	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NAM CONSTRUCCIONES SAS	$ 1.268.879	$ 55.196	IV	COOSALUD	9469879906	$ 50.755	PORVENIR	9469879906	$ 203.021	$ 50.755	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Diego Armando Alvarez Hernandez
Director de Obra
Matricula Profesional No.: 13202130071 BLV

Firma
Nombre: Aminada Castellar Arrieta
Director de Interventoria
Matricula Profesional h.13202130074 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor. Dirección Territorial.

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

4.4.1. MUNICIPIO DE ACHÍ – BOLÍVAR CONTRATO N°L.P.006 DE 2022.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/07/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No: L.P.006 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK

MES INFORME MENSUAL: JULIO **PROYECTO:** VÍA LOS NISPEROS - SINCERÍN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 973 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	22-00393	2402-0600-0012	-	NACIÓN	L.P.006 DE 2022	$ 1.800.000.000	N/A
2023	22-00393	2402-0600-0012	-	NACIÓN	L.P.006 DE 2022	$ 6.299.100.000	N/A
				TOTAL		$ 8.099.100.000	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 8.085.806.846,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	RECIBO PARCIAL DE OBRA	dic-23	$ 505.796.106,06	$ 118.643.531,05	$ 624.439.637,11	N/A	N/A	N/A	22-00393 DE 2022	$ 7.474.660.363	$ 7.461.367.208,89	N/A	X		
2	RECIBO PARCIAL DE OBRA	mar-24	$ 777.685.259,55	$ 182.419.999,15	$ 960.105.258,70	N/A	N/A	N/A	22-00393 DE 2022	$ 6.514.555.104	$ 6.501.261.950	N/A	X		
TOTALES			**$ 1.283.481.366**	**$ 301.063.530**	**$ 1.584.544.896**						**$ 7.461.367.209**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUB TOTAL BASICO OBRAS	$ 1.263.662.348	$ 296.414.625	**$ 1.560.076.973**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	$ -	$ -	**$ -**
REVISIÓN Y/O AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	$ 19.819.018	$ 4.648.905	**$ 24.467.923**
VALOR TOTAL	$ 1.283.481.365	$ 301.063.530	**$ 1.584.544.896**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JAVIER JOSE DOMINGUEZ VERGARA
Director de Obra
Matricula Profesional No.: 08202-095351

Firma
Nombre: LUMINADA CASTELLAR ARRIETA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.4.2. MUNICIPIO DE MAGANGUÉ - BOLÍVAR CONTRATO N° 557 DE 2022

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PAGINA	1

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No: 557 DE 2022
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN RAFAEL

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO
PROYECTO: MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE CASCAJAL HASTA EL CORREGIMIENTO DE LA PASCUALA DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 973 DE 2022
INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	2915	2402-0600-0012		PROPIOS	557 DE 2022	$ 456.300.000	N/A
2023	2915	2402-0600-0012		PROPIOS	557 DE 2022	$ 4.500.000.000	N/A
2024	2915	2402-0600-0012		PROPIOS	557 DE 2022	$ 17.937.000.000	N/A
2024	5055	2402-0600-0012		PROPIOS	Adicional N°1	$ 10.180.710.000	N/A
			TOTAL			$ 33.074.010.000	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS

PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
												N/A		X	
												N/A		X	
1	RECIBO PARCIAL DE OBRA	dic-22	$ 415.330.623,97	$ 4.165.994,03	$ 419.496.618,00	$ -	N/A	N/A	2915 DE 2022	$ 32.654.513.382,00	$ 32.649.604.067,00	N/A		X	
2	RECIBO PARCIAL DE OBRA	may-23	$ 4.535.464.462,18	$ 1.153.224	$ 4.536.617.686,18	$ -	N/A	N/A	2915 DE 2022	$ 28.117.895.695,82	$ 28.112.986.380,82	N/A		X	
3	RECIBO PARCIAL DE OBRA	nov-23	$ 7.864.871.427,70	$ 138.387	$ 7.865.009.814,58	$ -	N/A	N/A	2915 DE 2022	$ 20.252.885.881,24	$ 20.247.976.566,24	N/A		X	
4	RECIBO PARCIAL DE OBRA	dic-23	$ 2.373.241.133,65	$ 138.387	$ 2.373.379.520,53	$ -	N/A	N/A	2915 DE 2022	$ 17.879.506.360,71	$ 17.874.597.045,71	N/A		X	
5	RECIBO PARCIAL DE OBRA	abr-24	$ 5.051.337.113,59	$ -	$ 5.051.337.113,59	$ -	N/A	N/A	2915 DE 2022	$ 12.828.169.247,12	$ 12.823.259.932,12	N/A		X	
6	RECIBO PARCIAL DE OBRA	jul-24	$ 2.582.516.279,00		$ 2.582.516.279,00	$ -	N/A	N/A	2915 DE 2022	$ 10.245.652.968,12	$ 10.240.743.653,12	N/A		X	
	TOTALES		**$ 22.822.761.040,1**	**$ 5.595.992**	**$ 22.828.357.031,9**	**$ -**	**$ -**								

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUB TOTAL BASICO OBRAS	$ 20.229.661.626,42		**$ 20.229.661.626,42**
-			
-			
VALOR TOTAL	**$ 20.243.257.530,42**	**$ 2.583.221,76**	**$ 20.245.840.752,18**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: GONZALO DE JESUS ARBELÁEZ AGUIRRE
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:1320212561 9BLV

Firma
Nombre: ESMERALDA CASTELLAR ARRIETA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1320213007 4BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.4.3. MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N° 558 DE 2022

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No: 558 DE 2022 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUÉ

MES INFORME MENSUAL: JULIO — **PROYECTO:** MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFÁLTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA EL CORREGIMIENTO DE LA SAN RAFAEL DE CORTINAS DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 973 DE 2022 — **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	2916	2402-0600-0012		NACIÓN	558 de 2022	$ 1.632.900.000	N/A
2023	2916	2402-0600-0012		NACIÓN	558 de 2022	$ 4.500.000.000	N/A
2024	2916	2402-0600-0012		NACIÓN	558 de 2022	$ 6.171.000.000	N/A
2024	5056	2402-0600-0012		NACIÓN	Adicional N°1	$ 5.470.830.000	N/A
			TOTAL			$ 17.774.730.000,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 17.772.029.730,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	RECIBO PARCIAL DE OBRA	dic-22	$ 1.426.022.447,77	$ 11.134.237,23	$ 1.437.156.685,00	$ -	N/A	N/A	2916 DE 2022	$ 16.337.573.315	$ 16.334.873.045	N/A	X		
2	RECIBO PARCIAL DE OBRA	may-23	$ 4.670.546.215	$ 11.134.237	$ 4.681.680.451,92	$ -	N/A	N/A	2916 DE 2022	$ 11.655.892.863	$ 11.653.192.593	N/A	X		
3	RECIBO PARCIAL DE OBRA	dic-23	$ 5.326.262.988,02	$ 10.471.988,23	$ 5.336.734.976,25	$ -	N/A	N/A	2916 DE 2022	$ 6.319.157.887	$ 6.316.457.617	N/A	X		
4	RECIBO PARCIAL DE OBRA	abr-24	$ 5.427.856.130,33	$ -	$ 5.427.856.130,33	$ -	N/A	N/A	2916 DE 2022	$ 891.301.757	$ 888.601.487	N/A	X		
	TOTALES		**$ 16.850.687.781**	**$ 32.740.463**	**$ 16.883.428.244**	$ -	$ -	$ -	$ -						

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUB TOTAL BASICO OBRAS	$ 16.843.716.740,48	$ 31.415.964,69	**$ 16.875.132.705**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)			
REVISIÓN Y/O AJUSTES ESTUDIOS Y DISEÑOS (placa huella, pavimento y estructuras de drenaje)	$ 6.971.040,00	$ 1.324.498,00	**$ 8.295.538,00**
VALOR TOTAL	$ 16.850.687.780,48	$ 32.740.462,69	**$ 16.883.428.243,17**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: DIEGO ARMANDO ALVAREZ HERNANDEZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 13902130071BLV

Firma
Nombre: Iluminada Castellar Arrieta
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

4.5.1. MUNICIPIO DE ACHÍ – BOLÍVAR CONTRATO N° L.P.006 DE 2022

En Achí, los veranos son cortos y tórridos, los inviernos son calurosos y mojados y está opresivo y nublado todo el año. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 24 °C a 37 °C y rara vez baja a menos de 22 °C o sube a más de 40 °C.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	|
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No: L.P.006 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** VÍA LOS NISPEROS - SINCERIN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 973 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	20	18	21	21	15	24	24	24	24	13	23	22	24	24	24	24	22	16	24	24	24	24	22	18	18	18	18	24	24	18	18	657
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lluvias intensas	4	6	3	3	9	0	0	0	0	11	1	2	0	0	0	0	2	8	0	0	0	0	2	6	6	6	6	0	0	6	6	87
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
Estación IDEAM mas cercana al proyecto :BUENAVISTA [25027260].

Firma
Nombre:
Residente de Obra: Asael Cerpa
Matrícula Profesional No.:13202-360133BLV

Firma
Nombre: Jose Manuel Cardenas Bolivar
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202097701 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.5.2. MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°557 DE 2022

En Magangué, los veranos son cortos, tórridos y secos; los inviernos son cortos, calurosos y mojados y está opresivo y nublado durante todo el año. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 23 °C a 37 °C y rara vez baja a menos de 22 °C o sube a más de 39 °C.

La temporada calurosa dura 2,5 meses, del 31 de enero al 13 de abril, y la temperatura máxima promedio diaria es más de 36 °C. El mes más cálido del año en Magangué es marzo, con una temperatura máxima promedio de 37 °C y mínima de 25 °C.

La temporada fresca dura 2,7 meses, del 13 de septiembre al 2 de diciembre, y la temperatura máxima promedio diaria es menos de 33 °C. El mes más frío del año en Magangué es octubre, con una temperatura mínima promedio de 23 °C y máxima de 32 °C.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No: 557 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN RAFAEL

PROYECTO: MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE CASCAJAL HASTA EL CORREGIMIENTO DE LA PASCUALA DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 973 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	16	15	21	24	14	24	14	24	24	24	20	24	24	13	24	24	15	24	24	24	24	19	24	24	22	22	22	22	22	665
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	10
Lluvias intensas	0	0	8	9	3	0	10	0	10	0	0	0	4	0	0	11	0	0	9	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	69
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
La estación más cercana al Poryecto es MAGANGUE [25025110]

Firma
Nombre: Gloria Coello Torres
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:25202-192140 CND

Firma
Nombre: Edgar Alfonso Argon Otero
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202226695CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.5.3. MUNICPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°558 de 2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No: 558 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA EL CORREGIMIENTO DE LA SAN RAFAEL DE CORTINAS DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 973 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	20	21	17	21	21	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	19	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	719
Lluvias moderadas	0	4	2	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
Lluvias intensas	0	0	1	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
La estación más cercana al Poryecto es MAGANGUE [25025110]

Firma
Nombre: Jsus Zapa
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:22202-286336

Firma
Nombre: Enrique Alfonso Sanchez Troncoso
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202102557 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

4.6.1. MUNICIPIO DE ACHÍ – BOLÍVAR CONTRATO N°L.P.006 DE 2022

4.6.2. MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°557 DE 2022

4.6.3. MUNICPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°558 de 2022

4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

4.7.1. MUNICIPIO DE ACHÍ – BOLÍVAR CONTRATO N° L.P.006 DE 2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31 (Día) 7 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No. L.P.006 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK

OBJETO DEL CONTRATO:
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORREGIMIENTO DE LOS NÍSPEROS HASTA EL CORREGIMIENTO DE SINCERIN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACHÍ - DAPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

FECHA DE INICIO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

PLAZO INICIAL: 6 meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 8.085.806.846,00

VALOR ACUMULADO: $ 8.085.806.846,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 30.692.004,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 30.692.004,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 973 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 808.580.684,60	29 11 2022	29 6 2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 1.617.161.369,20	29 11 2022	29 6 2026
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 2.425.742.053,80	Inicio del contrato	5 años contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101395581

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	6,184	$ 500.000.000,00	29 11 2022	29 6 2023
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101197791 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	N/A	$ 808.580.684,60	29	11	2022	29	6	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	N/A	$ 1.617.161.369,20	29	11	2022	29	6	2026
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N/A	$ 2.425.742.053,80	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101395581

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 500.000,00	29	11	2022	29	6	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101197791 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre:
Director de Interventoría Iluminada Castellar Arrieta
Matrícula Profesional No.:13202130074BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 2 **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** 2 **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	N/A	$ 808.580.684,60	29	11	2022	29	10	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	N/A	$ 1.617.161.369,20	29	11	2022	29	10	2026
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N/A	$ 2.425.742.053,80	29	5	2023	29	5	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101395581

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 500.000,00	29	11	2022	29	10	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101197791 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre:
Director de Interventoría Iluminada Castellar Arrieta
Matrícula Profesional No.:13202130074BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 2 **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** 2 **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	N/A	$ 808.580.684,60	29	11	2022	29	11	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	N/A	$ 1.617.161.369,20	29	11	2022	29	11	2026
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N/A	$ 2.425.742.053,80	29	5	2023	29	5	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101395581

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 500.000,00	29	11	2022	29	11	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101197791 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre:
Director de Interventoría Iluminada Castellar Arrieta
Matrícula Profesional No.:13202130074BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 3 **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** 3 **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	N/A	$ 808.580.684,60	29	11	2022	29	2	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	N/A	$ 1.617.161.369,20	29	11	2022	28	2	2027
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N/A	$ 2.425.742.053,80	29	5	2023	29	5	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101395581

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 500.000,00	29	11	2022	29	2	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101197791 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre:
Director de Interventoría Iluminada Castellar Arrieta
Matrícula Profesional No.:13202130074BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 4 **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** 4 **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	N/A	$ 808.580.684,60	29	11	2022	29	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	N/A	$ 1.617.161.369,20	29	11	2022	28	6	2027
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N/A	$ 2.425.742.053,80	29	5	2023	29	5	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101395581

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 500.000,00	29	11	2022	29	6	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101197791 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre:
Director de Interventoría Iluminada Castellar Arrieta
Matrícula Profesional No.:13202130074BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 5 **MODIFICACIÓN No.:** 5 **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	N/A	$ 808.580.684,60	29	11	2022	29	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	N/A	$ 1.617.161.369,20	29	11	2022	29	10	2027
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N/A	$ 2.425.742.053,80	29	5	2023	29	5	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101395581

Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 5 **MODIFICACIÓN No.:** 5 **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 500.000,00	29	11	2022	29	6	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101197791 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____


OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma _____
Nombre:
Director de Interventoría Iluminada Castellar Arrieta
Matrícula Profesional No.:13202130074BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

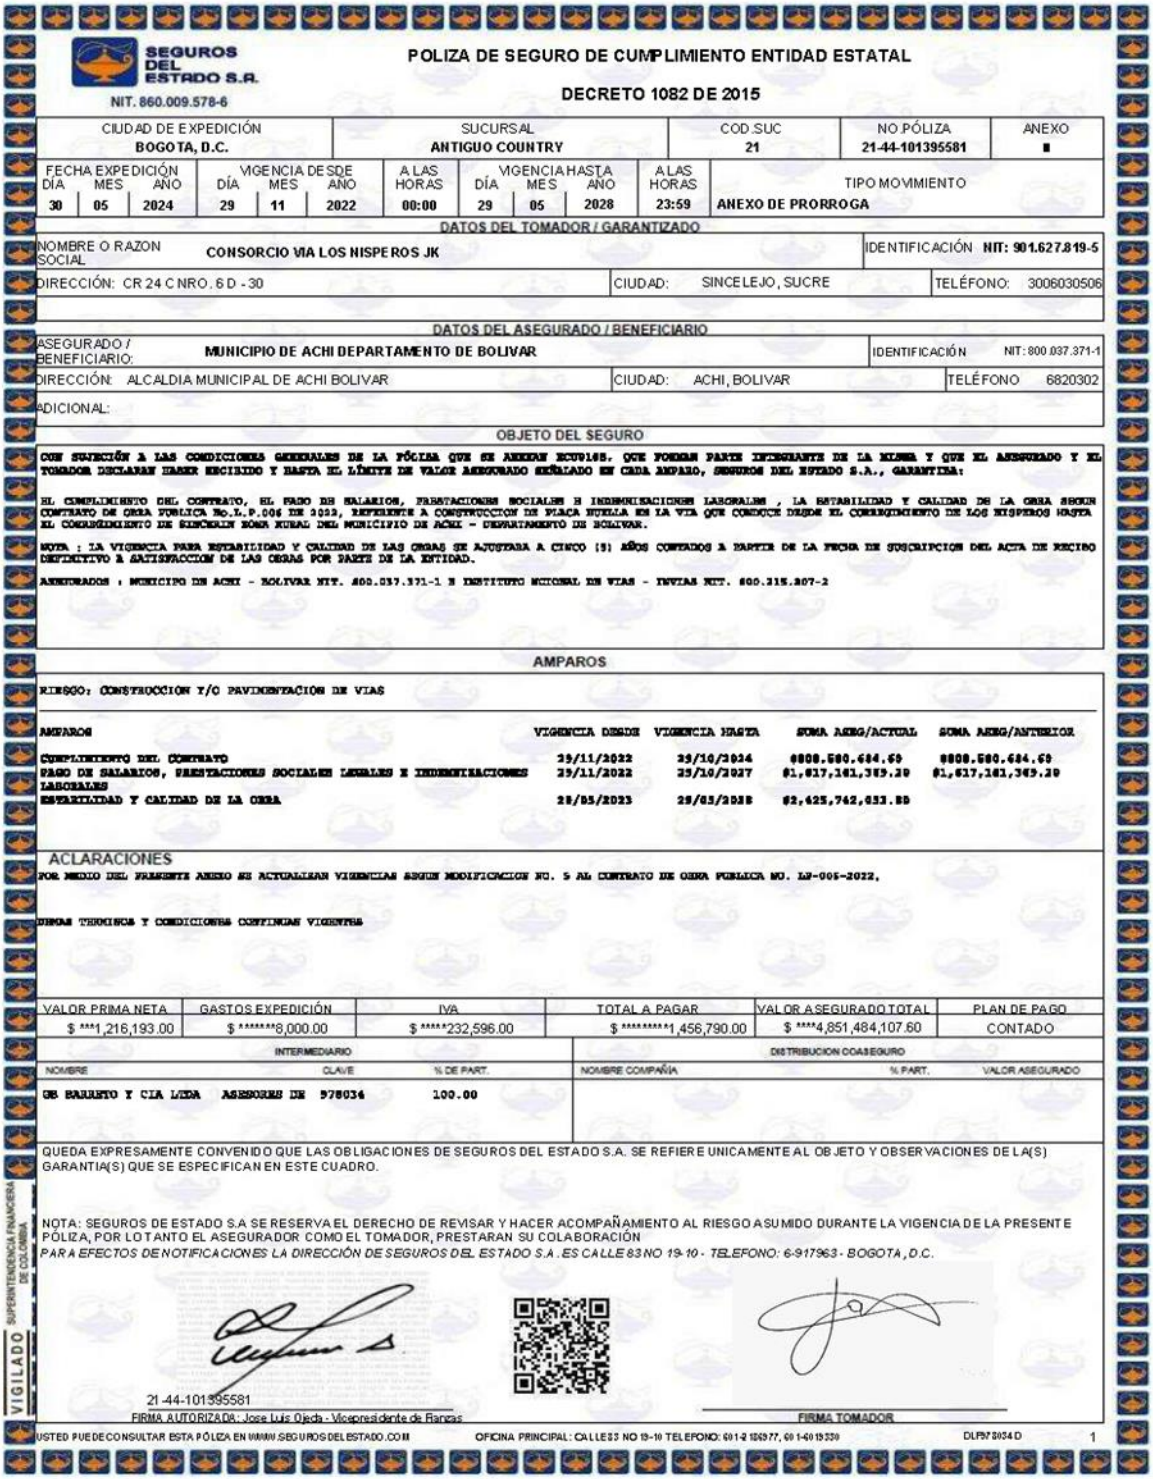

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101395581	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	05	2024	29	11	2022	00:00	29	05	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK	NIT: 901.627.819-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 24 C NRO. 6 D - 30	SINCELEJO, SUCRE	3006030506

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE ACHI DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	NIT: 800.037.371-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ALCALDIA MUNICIPAL DE ACHI BOLIVAR	ACHI, BOLIVAR	6820302

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0165, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y BASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES , LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.L.P.006 DE 2022, REFERENTE A CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CORREGIMIENTO DE LOS NISPEROS HASTA EL CORREGIMIENTO DE SINCERIN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACHI - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

NOTA : LA VIGENCIA PARA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS SE AJUSTARA A CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCION DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD.

ANEXADOS : MUNICIPIO DE ACHI - BOLIVAR NIT. 800.037.371-1 E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT. 800.215.807-2

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/11/2022	29/10/2024	$888,580,684.69	$888,580,684.69
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/11/2022	29/10/2027	$1,617,161,349.20	$1,617,161,349.20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	29/05/2023	29/05/2028	$2,425,742,033.89	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN VIGENCIAS SEGUN MODIFICACION NO. 5 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. LP-006-2022,

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,216,193.00	$ *******8,000.00	$ *****232,596.00	$ **********1,456,790.00	$ ****4,851,484,107.60	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GB BARRETO Y CIA LTDA ASESORES DE	978034	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.


21-44-101395581

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Ramas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM — OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2 1245977, 601-4015330 — DLF97 8054 D — 1

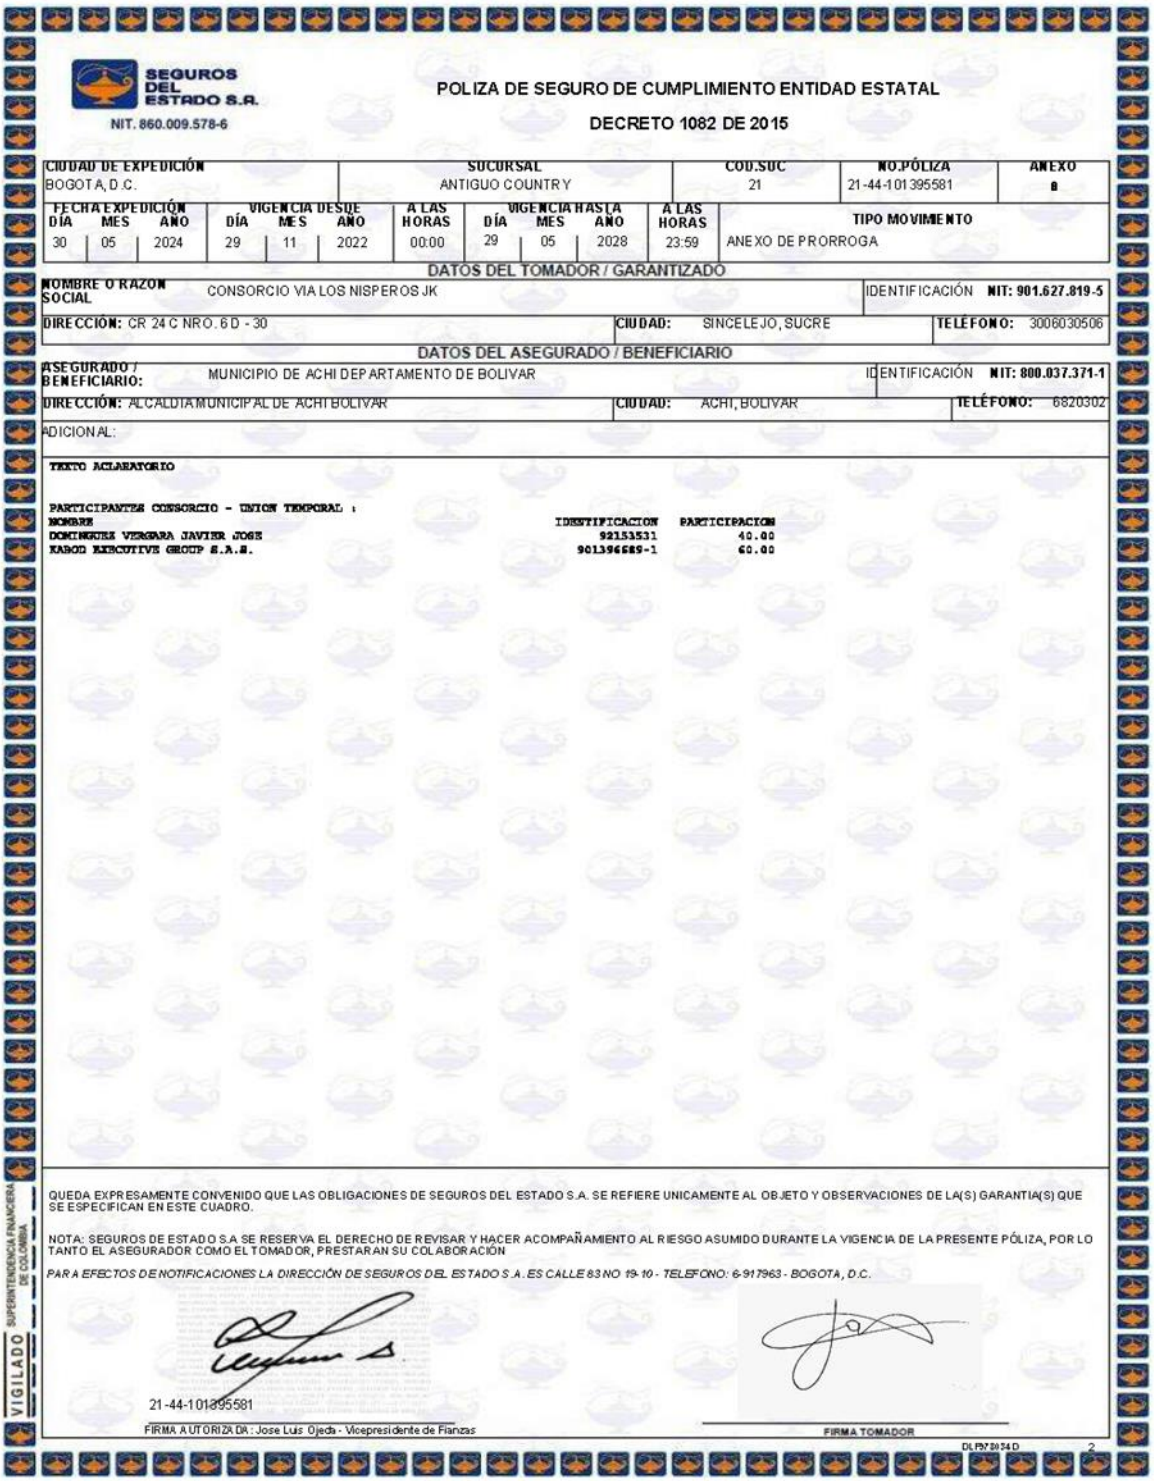

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101395581	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMENTO
30	05	2024	29	11	2022	00:00	29	05	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK — IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.627.819-5

DIRECCIÓN: CR 24 C NRO. 6 D - 30 — CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE — TELEFONO: 3006030506

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ACHI DEPARTAMENTO DE BOLIVAR — IDENTIFICACIÓN: NIT: 800.037.371-1

DIRECCIÓN: ALCALDIA MUNICIPAL DE ACHI BOLIVAR — CIUDAD: ACHI, BOLIVAR — TELÉFONO: 6820302

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DOMINGUEZ VERGARA JAVIER JOSE	92153531	40.00
XABOD EXECUTIVE GROUP S.A.S.	901396689-1	60.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101395581

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLP972034D 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101395581, anexo 8, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.


Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 30 días del mes de MAYO de 2024

21-44-101395581

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

3

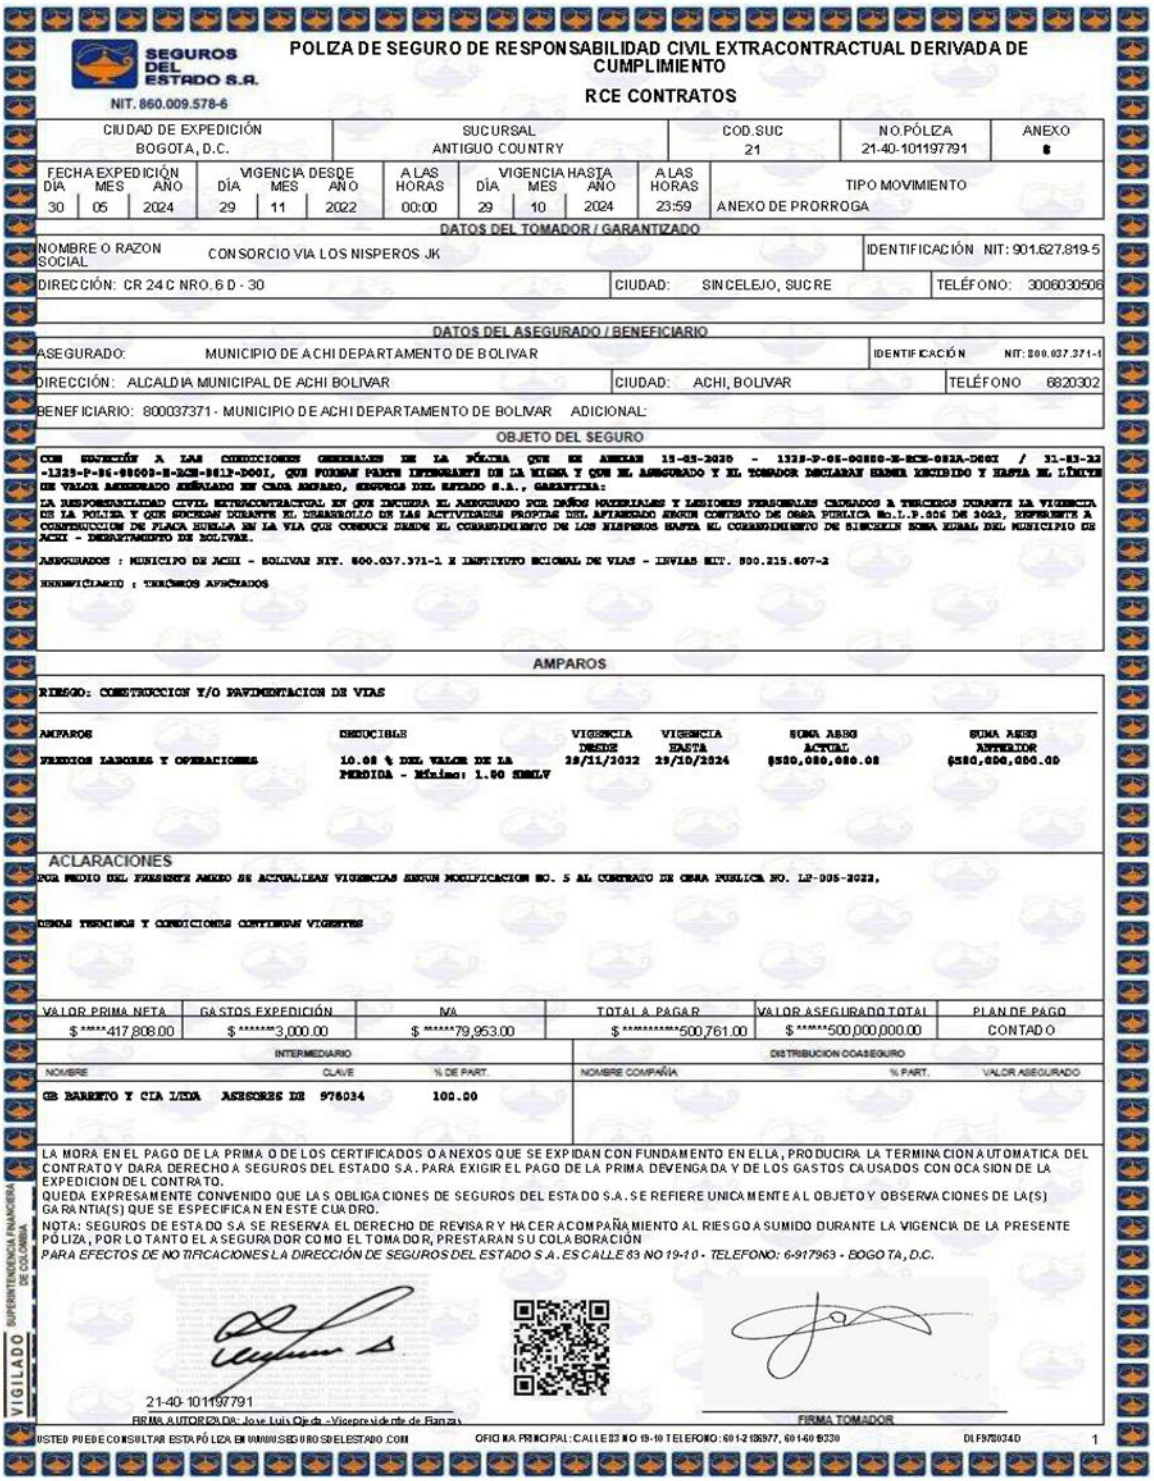

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101197791	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	05	2024	29	11	2022	00:00	29	10	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK	NIT: 901.627.819-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 24 C NRO. 6 D - 30	SINCELEJO, SUCRE	3006030506

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE ACHI DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	NIT: 800.037.371-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ALCALDIA MUNICIPAL DE ACHI BOLIVAR	ACHI, BOLIVAR	6820302

BENEFICIARIO: 800037371 - MUNICIPIO DE ACHI DEPARTAMENTO DE BOLIVAR ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 19-03-2020 - 1328-P-06-08000-H-RCE-0820-D001 / 31-03-22 -1328-P-06-08000-H-RCE-0820-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO POR DAÑOS MATERIALES Y LESIONES PERSONALES CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA Y QUE OCURRAN DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AFIANZADO SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.L.P.005 DE 2022, REFERENTE A CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CORREGIMIENTO DE LOS NISPEROS HASTA EL CORREGIMIENTO DE SINCERIN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACHI - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

ASEGURADOS : MUNICIPO DE ACHI - BOLIVAR NIT. 800.037.371-1 E INSTITUTO NCIONAL DE VIAS - INVIAS NIT. 800.215.807-2

BENEFICIARIO : TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PERDIDA LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	29/11/2022	29/10/2024	$500,000,000.00	$500,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN VIGENCIAS SEGUN MODIFICACION NO. 5 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. LP-005-2022,

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****417,808.00	$ ******3,000.00	$ *****79,953.00	$ **********500,761.00	$ ******500,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GB BARRETO Y CIA LTDA ASESORES DE	976034	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.


21-40-101197791

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2 635977, 601-60 59330 DLF970340 1

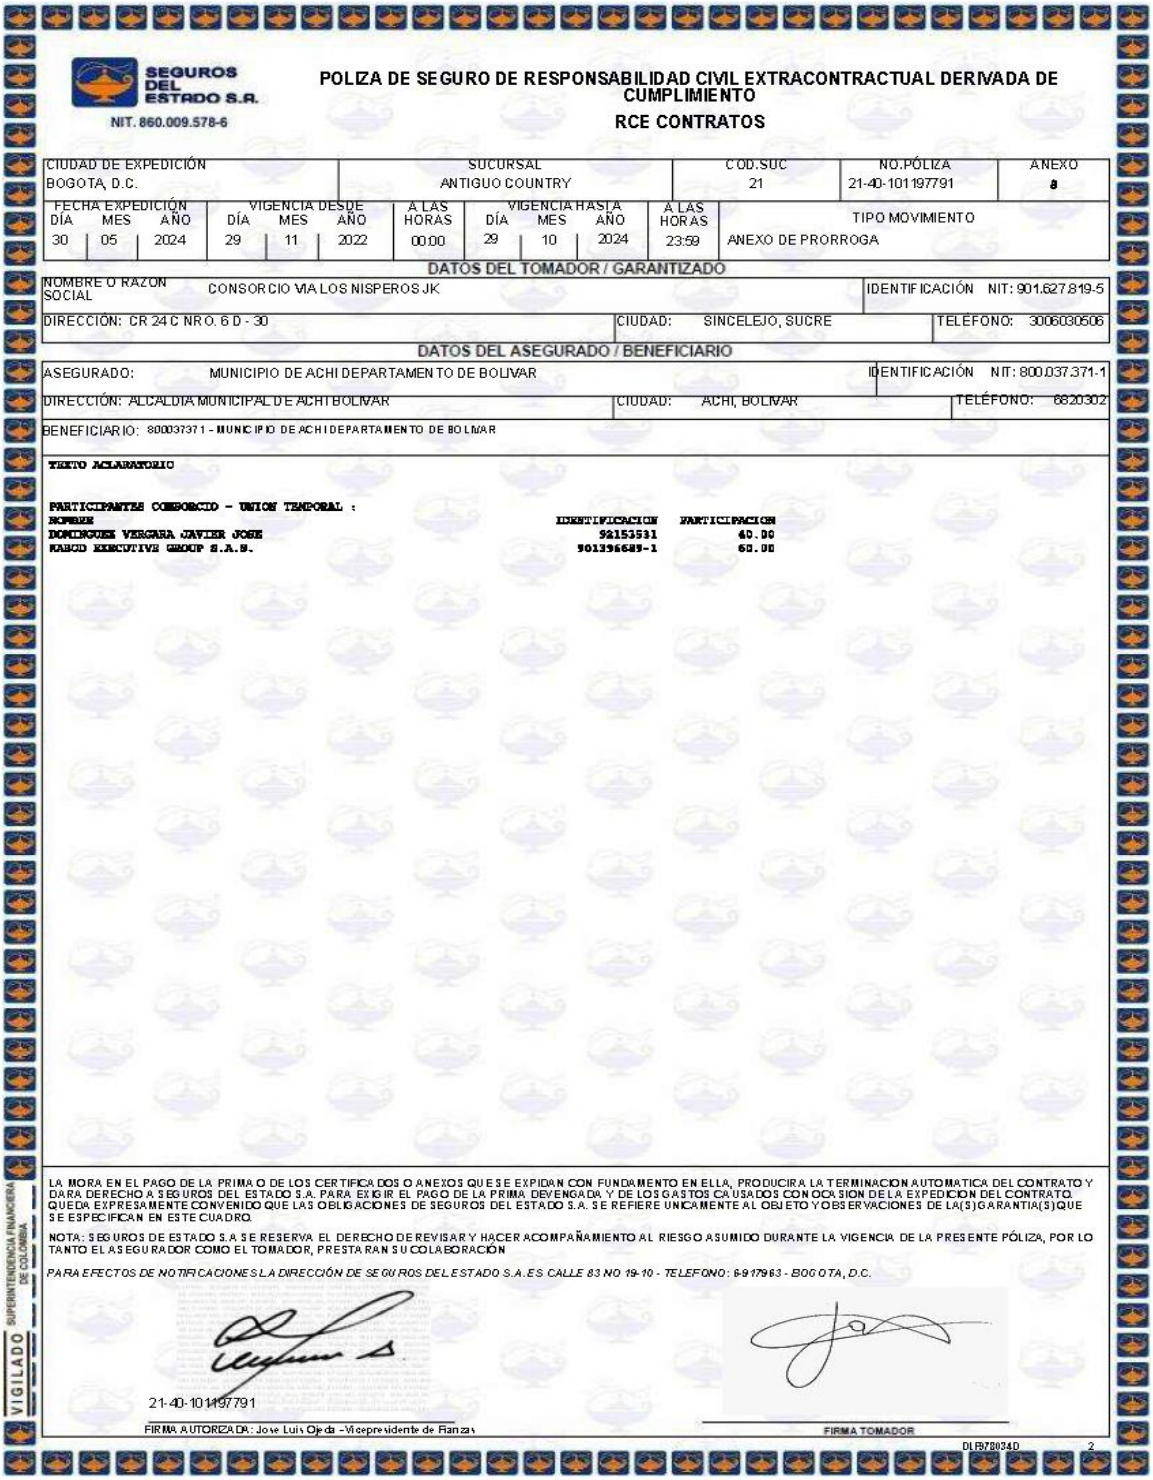

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101197791	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	05	2024	29	11	2022	00:00	29	10	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK	NIT: 901.627.819-5

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELEFONO:
CR 24 C NRO. 6 D - 30	SINCELEJO, SUCRE	3006030506

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE ACHI DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	NIT: 800.037.371-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
ALCALDIA MUNICIPAL DE ACHI BOLIVAR	ACHI, BOLIVAR	6820302

BENEFICIARIO: 800037371 - MUNICIPIO DE ACHI DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DOMINGUEZ VERGARA JAVIER JOSE	92153531	40.00
KABOD EXECUTIVE GROUP S.A.S.	901396689-1	60.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A.ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101197791

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda -Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLR780340 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

4.7.2. MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°557 DE 2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31 (Día) 7 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No. 557 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN RAFAEL

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE CASCAJAL HASTA EL CORREGIMIENTO DE LA PASCUALA DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

FECHA DE INICIO: 24 de octubre de 2022
PLAZO INICIAL: 18 meses
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24 de diciembre de 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 22.888.390.685,00
VALOR ACUMULADO: $ 33.069.100.685,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 75.580.000,00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 75.580.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 973 de 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento del contrato	10	$ 2.288.839.068,50	15/7/2022	15/7/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 1.144.419.534,25	15/7/2022	15/1/2027
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	5	$ 1.144.419.534,25	15/1/2024	15/1/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100174571

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 04 de agosto de 2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5	$ 1.144.419.534,00	15/7/2022	15/1/2024
Responsabilidad civil patronal	1,5	$ 343.325.860,00	15/7/2022	15/1/2024
Contratistas y subcontratistas	1,5	$ 343.325.860,00	15/7/2022	15/1/2024
Vehiculos propios y no propios	1,5	$ 343.325.860,00	15/7/2022	15/1/2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. M-100035544 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 4 de agosto de 2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 2 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Amparo basico - predios, labores y operaciones		$ 1.653.455.034,25	24	10	2022	25	7	2024
Patronal		$ 1.653.455.034,25	24	10	2022	25	7	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 1.653.455.034,25	24	10	2022	25	7	2024
Calidad de Estudios y Diseños		$ 1.653.455.034,25	24	10	2022	25	7	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** _____ **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 3.306.910.068,50	29	11	2023	24	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 1.653.455.034,25	29	11	2023	24	4	2027
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.653.455.034,25	24	4	2024	24	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** _____ **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 2 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 3.306.910.068,50	2	4	2024	24	1	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 1.653.455.034,25	2	4	2024	24	7	2027
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.653.455.034,25	24	7	2024	24	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** _____ **MODIFICACIÓN No.:** 2 **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 3.306.910.068,50	2	4	2024	24	1	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 6.613.820.137,00	2	4	2024	24	7	2027
Calidad del servicio		$ 22.674.000,00	24	7	2024	24	7	2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 9.920.730.205,50	24	7	2024	24	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100174571

Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** _____ **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 2 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 3.306.910.068,50	2	4	2024	24	1	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 6.613.820.137,00	2	4	2024	24	7	2027
Calidad del servicio		$ 22.674.000,00	24	7	2024	24	7	2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 9.920.730.205,50	24	7	2024	24	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100174571

Certificado de modificación o anexo No.: 9
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 2 **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 3.306.910.068,50	2	4	2024	24	1	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 6.613.820.137,00	2	4	2024	24	7	2027
Calidad del servicio		$ 22.674.000,00	24	7	2024	24	7	2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 9.920.730.205,50	24	7	2024	24	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100174571

Certificado de modificación o anexo No.: 10
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** _____ **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** 3 **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 3.306.910.068,50	2	4	2024	24	1	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 6.613.820.137,00	2	4	2024	24	7	2027
Calidad del servicio		$ 22.674.000,00	24	7	2024	24	7	2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 9.920.730.205,50	24	7	2024	24	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100174571

Certificado de modificación o anexo No.: 11
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** _____ **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

OBSERVACIONES:


NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma _____

Nombre:
Director de Interventoría Iluminada Castellar Arrieta
Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

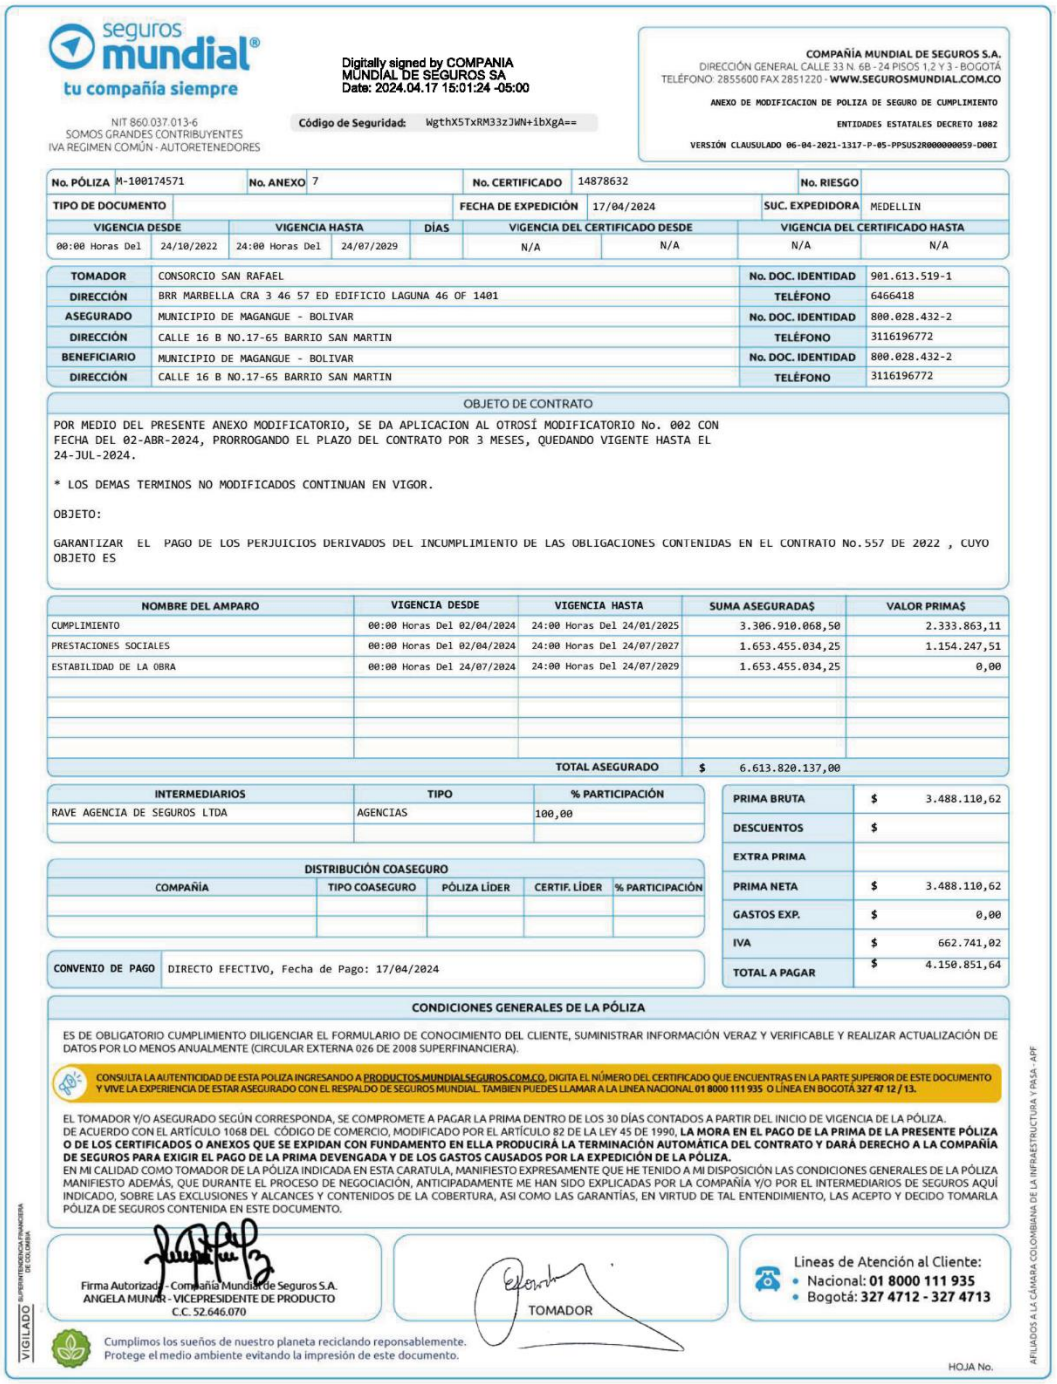

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.04.17 15:01:24 -05:00

Código de Seguridad: WgthX5TxRM33zJWN+ibXgA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100174571	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	14878632	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	24/10/2022	24:00 Horas Del	24/07/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO SAN RAFAEL	No. DOC. IDENTIDAD	901.613.519-1
DIRECCIÓN	BRR MARBELLA CRA 3 46 57 ED EDIFICIO LAGUNA 46 OF 1401	TELÉFONO	6466418
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MAGANGUE - BOLIVAR	No. DOC. IDENTIDAD	800.028.432-2
DIRECCIÓN	CALLE 16 B NO.17-65 BARRIO SAN MARTIN	TELÉFONO	3116196772
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MAGANGUE - BOLIVAR	No. DOC. IDENTIDAD	800.028.432-2
DIRECCIÓN	CALLE 16 B NO.17-65 BARRIO SAN MARTIN	TELÉFONO	3116196772

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO MODIFICATORIO, SE DA APLICACION AL OTROSÍ MODIFICATORIO No. 002 CON FECHA DEL 02-ABR-2024, PRORROGANDO EL PLAZO DEL CONTRATO POR 3 MESES, QUEDANDO VIGENTE HASTA EL 24-JUL-2024.

* LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

OBJETO:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.557 DE 2022 , CUYO OBJETO ES

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 02/04/2024	24:00 Horas Del 24/01/2025	3.306.910.068,50	2.333.863,11
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 02/04/2024	24:00 Horas Del 24/07/2027	1.653.455.034,25	1.154.247,51
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 24/07/2024	24:00 Horas Del 24/07/2029	1.653.455.034,25	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 6.613.820.137,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	3.488.110,62
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	3.488.110,62
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	662.741,02
TOTAL A PAGAR	$	4.150.851,64

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 17/04/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF



seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100174571	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	14878632	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	24/10/2022	24:00 Horas Del	24/07/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFÁLTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE CASCAJAL HASTA EL CORREGIMIENTO DE LA PASCUALA DEL MUNICIPIO DE
MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
.
NOTA: SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA TIENE VIGENCIA DE CINCO5 () AÑOS CONTADOS APARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION
POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.
.
EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.A.S. NIT: 900508212 (PART. 90 %)
INTEGRANTE 2 - A.S.S CONSTRUCTORA S.A.S. NIT: 890210939 (PART. 10 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO SAN RAFAEL)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA- APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.


Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF Asociación Panamericana de Fianzas Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **M-100174571** y endoso, **7** cuyo afianzado es: **CONSORCIO SAN RAFAEL** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE MAGANGUE - BOLIVAR / MUNICIPIO DE MAGANGUE - BOLIVAR ,** expedida por la Compañía en **17/04/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

MEDELLIN a los **17** días del mes **ABRIL** del año **2024.**



Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

4.7.3. MUNICPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°558 de 2022

En el periodo del presente informe no hubo actualización y/o modificación de las pólizas.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No. 558 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUÉ

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFÁLTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA EL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL DE CORTINAS DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

FECHA DE INICIO: 19 de octubre de 2022
PLAZO INICIAL: 15 meses
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 de julio de 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: 12.301.199.730.00
VALOR ACUMULADO: $ 17.772.029.730,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 41.477.688,00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 41.477.688,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 973 de 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento general del contrato	10	$ 1.230.119.973,00	15 7 2022	15 4 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	-	-	N.A.	N.A.
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 615.059.986,50	15 7 2022	15 10 2026
Calidad de Estudios y Diseños	-	-	N.A.	N.A.
Estabilidad y/o Calidad de Obra	5	$ 615.059.986,50	15 10 2023	15 10 2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 59779
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 8 de agosto de 2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5	$ 615.059.986,50	15 7 2022	15 10 2023
Contratistas y subcontratistas	1	$ 123.011.997,00	15 7 2022	15 10 2023
Vehiculos propios y no propios	1	$ 123.011.997,00	15 7 2022	15 10 2023
Responsabilidad civil patronal	1	$ 123.011.997,00	15 7 2022	15 10 2023
Gastos medicos	1	$ 123.011.997,00	15 7 2022	15 10 2023
Daño emergente y lucro cesante	1	$ 123.011.997,00	15 7 2022	15 10 2023
Perjuicios patrimoniales	1	$ 123.011.997,30	15 7 2022	15 10 2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 17756 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 8 de agosto de 2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 1.777.202.973,00	19	10	2022	18	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 888.601.486,50	19	10	2022	18	4	2027
Calidad de Estudios y Diseños		N/A	N/A			N/A		
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 888.601.486,50	18	4	2024	18	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 59779

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 1.777.202.973,00	19	10	2022	18	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 3.554.405.946,00	19	10	2022	18	4	2027
Calidad de Estudios y Diseños		N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 5.331.608.919,00	18	4	2024	18	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 59779

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma .....
Nombre: Iluminada Castellar Arrieta
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

4.8.1. MUNICIPIO DE ACHÍ – BOLÍVAR CONTRATO N° L.P.006 DE 2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/07/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No. L.P.006 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORREGIMIENTO DE LOS NÍSPEROS HASTA EL CORREGIMIENTO DE SINCERIN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACHÍ – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK

FECHA DE INICIO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 6 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 29 DE JULIO DE 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 973 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ---------- APROBADO: SI X NO ------ VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: **2/09/2022**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ---------- NO X No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ---------- NO X No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO X APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ - No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: -

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes:

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

No se han inciado actividades de obra

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: Javier Jose Dominguez vergara
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.: 08202-095351ATL

Firma
Nombre:N/A
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Iluminada Castellar Arrieta
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV

Firma
Nombre:Iluminada Castellar Arrieta
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:13202130074BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

4.8.2. MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°557 DE 2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/07/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No. 557 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE CASCAJAL HASTA EL CORREGIMIENTO DE LA PASCUALA DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN RAFAEL

FECHA DE INICIO: 24 de octubre de 2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 18 meses **FECHA DE VENCIMIENTO:** 24 de julio de 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 973 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: **12/10/2022**

OBSERVACIONES:
Plan de calidad acorde para el desarrollo del objeto contractual.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI X NO ____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: - FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: -

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: - FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: -

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO X

OBSERVACIONES:
No aplica

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: -

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: - No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: -

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI - NO -

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: - **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** -

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: - **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** -

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: -

OBSERVACIONES:
No aplica

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	4	**No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:**	3
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	1	**No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:**	5
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	1	**No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:**	4

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Indice de cumplimiento de cronograma	**0,286**	**Se calcula dividiendo el número de actividades completadas a tiempo entre el número total de actividades planificadas.**
IG2: Control de calidad	**0,272727273**	**Se calcula dividiendo el número de defectos o no conformidades identificados durante las inspecciones entre el número total de elementos inspeccionados.**
IG3: Cumplimiento de especificaciones	**1**	**Se calcula dividiendo el número de elementos construídos correctamente entre el número total de elementos inspeccionados.**

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: GONZALO DE JESÚS ARBELÁEZ AGUIRRE	Nombre:N/A	Nombre: Iluminada Castellar Arrieta	Nombre:Iluminada Castellar Arrieta
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202125619BLV	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV	Matrícula Profesional No.:13202130074BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

4.8.3. MUNICPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°558 de 2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/07/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No. 558 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFÁLTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA EL CORREGIMEINTO DE SAN RAFAEL DE CORTINAS DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUÉ

FECHA DE INICIO: 19 de octubre de 2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 15 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30 de julio de 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 973 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENEIROS CONSULTORES SAS

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ------ APROBADO: SI X NO ------ VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: **16/09/2022**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO X
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO X
No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: -
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: -
FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: -
FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: -

OBSERVACIONES:
La interventoría remitirá al contratista, comunicado solicitando la información requerida.

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO N/A APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: N/A No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

OBSERVACIONES:
El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: -
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: -
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: -
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: -
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: -

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	7	**No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:**	7
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:**	17
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:**	17

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Indice de cumplimiento de cronograma	**0,730**	**Se calcula dividiendo el número de actividades completadas a tiempo entre el número total de actividades planificadas.**
IG2: Control de calidad	**1**	**Se calcula dividiendo el número de defectos o no conformidades identificados durante las inspecciones entre el número total de elementos inspeccionados.**
IG3: Cumplimiento de especificaciones	**1**	**Se calcula dividiendo el número de elementos construidos correctamente entre el número total de elementos inspeccionados.**

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: DIEGO ARMANDO ALVAREZ HERNANDEZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 13202130071BLV

Firma
Nombre:N/A
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:


Firma
Nombre: Iluminada Castellar Arrieta
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV

Firma
Nombre: Iluminada Castellar Arrieta
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:13202130074BLV


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL


PROGRAMA DE INVERSIONES MUNICIPIO DE ACHÍ – BOLÍVAR CONTRATO N°L.P.006 DE 2022

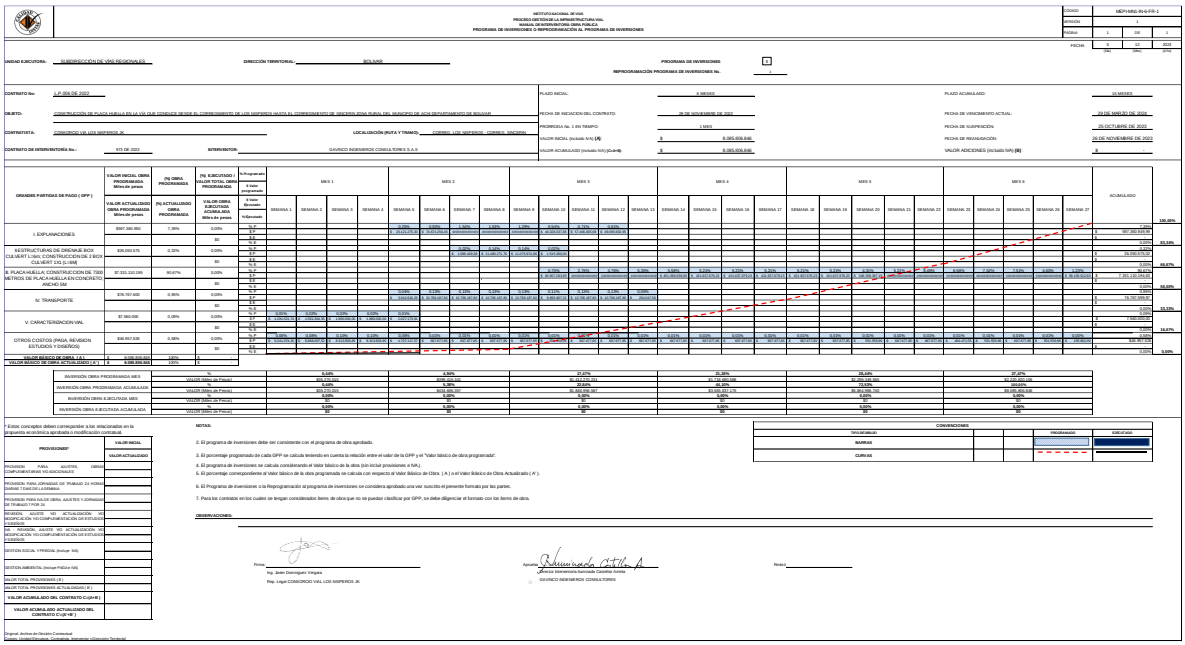

PROGRAMA DE INVERSIONES MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°557 DE 2022

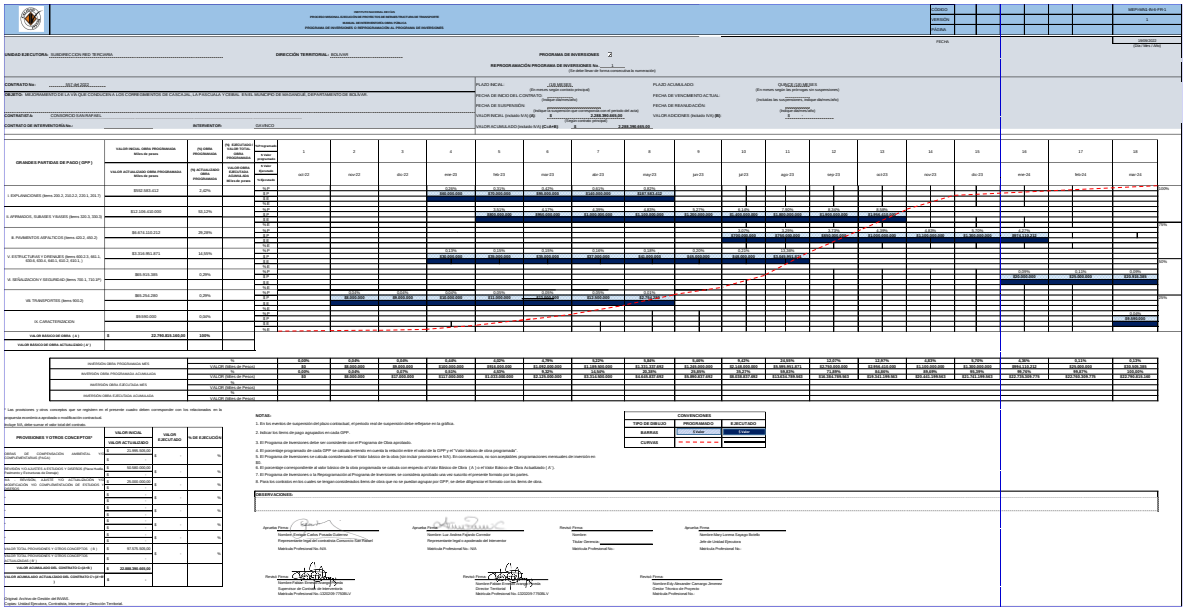

PROGRAMA DE INVERSIONES MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°558 de 2022

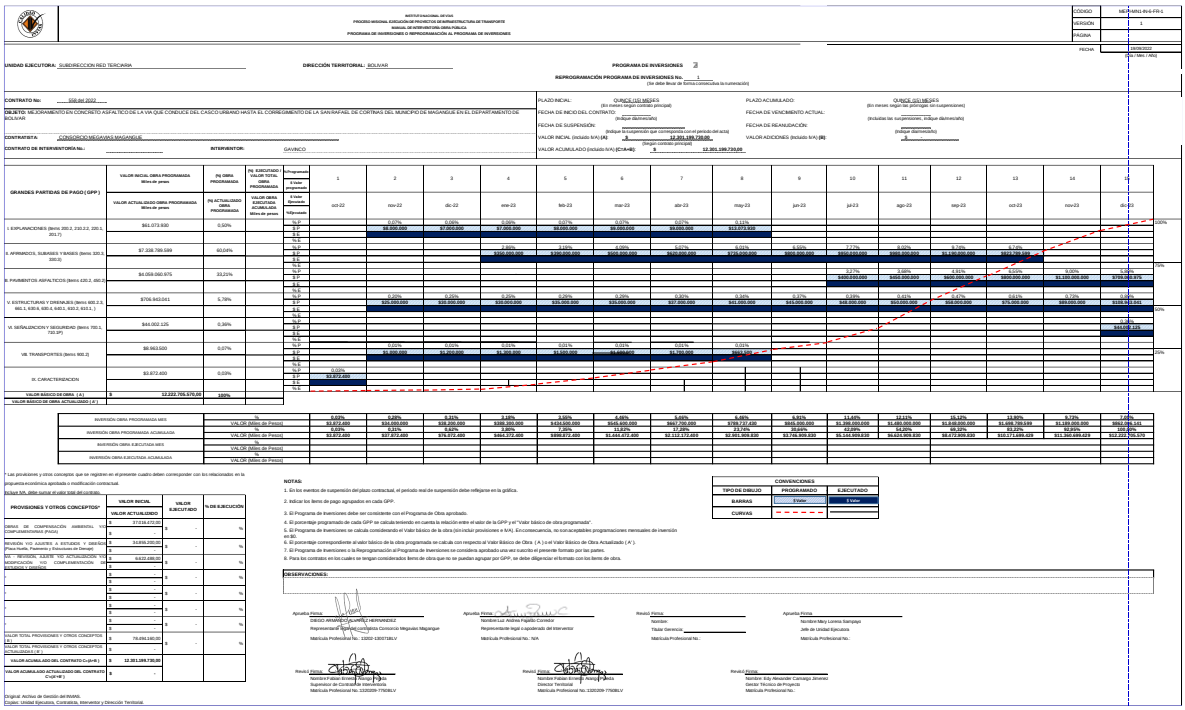

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO: MEP-MAN-IN-E-FR-1
VERSIÓN: 1
PAGINA:
FECHA: 26/08/2022 (DD / MM / AA)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA
DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR
PROGRAMA DE INVERSIONES 2
REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 558 del 2022
OBJETO: MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA EL CORREGIMIENTO DE LA SAN RAFAEL DE CORTINA DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CONTRATISTA: CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUE
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: ----------
INTERVENTOR: GAVINCO

PLAZO INICIAL: QUINCE (15) MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 12.201.199.720,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 12.201.199.720,00

PLAZO ACUMULADO: QUINCE (15) MESES (En meses según las prórrogas de suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO [GPP]	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / % Valor programado / % Ejecutado	1 oct-22	2 nov-22	3 dic-22	4 ene-23	5 feb-23	6 mar-23	7 abr-23	8 may-23	9 jun-23	10 jul-23	11 ago-23	12 sep-23	13 oct-23	14 nov-23	15 dic-23
I. EXPLANACIONES (ítems 200.2, 210.2.2, 220.1, 221.7)	$61.072.830	0,50%	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% P	0,07%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,11%							
				$ P	$8.000.000	$7.000.000	$7.000.000	$8.000.000	$8.000.000	$8.000.000	$8.000.000	$12.573.830							
				$ E															
				% E															
II. APIRANDOS, SUBASES Y BASES (ítems 300.1, 300.3)	$7.338.789.599	60,04%		% P	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	6,01%	6,00%	7,21%	6,00%	6,79%	6,79%		
				$ P	$365.000.000	$365.000.000	$365.000.000	$365.000.000	$365.000.000	$365.000.000	$365.000.000	$735.000.000	$732.000.000	$882.000.000	$732.000.000	$830.000.000	$830.000.000		
				$ E															
				% E															100%
III. PAVIMENTOS ASFALTICOS (ítems 420.2, 450.1)	$4.059.090.975	33,21%		% P										2,27%	1,68%	1,91%	3,33%	9,00%	9,00%
				$ P										$400.000.000	$300.000.000	$600.000.000	$800.000.000	$1.100.000.000	$700.000.975
				$ E															
				% E															100%
V. ESTRUCTURAS Y DRENAJES (ítems 600.2.1, 600.3, 630.6, 630.7, 630.2, 610.1,)	$706.943.041	5,79%		% P	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,30%	0,34%	0,37%	0,39%	0,41%	0,47%	0,61%	0,73%	0,50%
				$ P	$55.000.000	$55.000.000	$55.000.000	$55.000.000	$55.000.000	$55.000.000	$67.000.000	$41.000.000	$45.000.000	$48.000.000	$54.000.000	$64.000.000	$75.000.000	$80.000.000	$61.943.041
				$ E															
				% E															100%
VI. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD (ítems 700.1, 710.1P)	$44.002.125	0,36%		% P														0,36%	
				$ P														$44.002.125	
				$ E															
				% E															100%
VIII. TRANSPORTES (ítems 900.2)	$6.963.520	0,07%		% P	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,01%							
				$ P	$6.963.520	$6.963.520	$6.963.520	$6.963.520	$6.963.520	$6.963.520	$6.963.520	$6.963.520							
				$ E															
				% E															
IX. CARACTERIZACION	$3.972.400	0,03%		% P	0,03%														
				$ P	$3.972.400														
				$ E															
				% E															
VALOR BASICO DE OBRA. (A)	$ 12.222.705.570,00	100%																	
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																			

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,03%	0,25%	0,31%	3,18%	3,56%	4,46%	5,65%	6,46%	6,91%	11,44%	12,11%	15,12%	13,30%	9,72%	7,05%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$3.972.400	$41.000.000	$48.200.000	$395.000.000	$410.000.000	$545.400.000	$667.700.000	$789.737.830	$845.000.000	$1.398.000.000	$1.480.000.000	$1.848.000.000	$1.626.700.000	$1.189.000.000	$862.191.141			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,03%	0,28%	0,59%	3,78%	7,35%	11,82%	17,47%	23,74%	30,66%	42,09%	54,20%	69,32%	82,62%	92,35%	100,00%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$3.972.400	$37.972.400	$76.972.400	$864.972.400	$868.972.400	$1.414.372.400	$2.112.172.400	$2.901.909.830	$3.746.909.830	$5.144.909.830	$6.624.909.830	$8.473.909.830	$10.117.609.830	$11.306.609.830	$12.222.705.570			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																		
	VALOR (Miles de Pesos)																		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																		
	VALOR (Miles de Pesos)																		

* Los provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la respectiva economica aprobada o modificación contractual.
Incluir N/A, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL, CUMPLIMIENTOS (PGO)	$ 37.616.212,00 / $ -	$ -	%
REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Paso Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	$ 14.846.200,00 / $ -	$ -	%
AIU REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN, Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 6.610.486,00 / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 59.073.098,00 / $ -	$ -	%
ACTUALIZADO (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 12.201.199.720,00		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B')	$ -		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	-	-

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: DIEGO ARMANDO CUARTAS HERNANDEZ. Representante legal del consorcio Consorcio Megaviaz Magangue. Matrícula Profesional No.: 13202-135073ALV
Aprueba Firma: Nombre Luz Andrea Fajardo Corredor. Representante legal o apoderado del interventor. Matrícula Profesional No.: N/A
Revisó Firma: Nombre: Titular Gerencia: Matrícula Profesional No.:
Aprueba Firma: Nombre Mary Lorena Sampayo. Jefe de Unidad Ejecutora. Matrícula Profesional No.:
Revisó Firma: Nombre Fabian Andres Rojas Supervisor de Contrato de Interventoría. Matrícula Profesional No.: 1102309-776ALV
Revisó Firma: Nombre Fabian Andres Rojas Director Territorial. Matrícula Profesional No: 1102309-776ALV
Revisó Firma: Nombre Erik Alexander Camargo Jimenez. Gestor Técnico de Proyecto. Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ACTAS DE REUNIÓN Y COMITÉ DE OBRA MUNICIPIO DE ACHÍ – BOLÍVAR CONTRATO N°L.P.006 DE 2022.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 12/07/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 9
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No. L.P.006 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORREGIMIENTO DE LOS NÍSPEROS HASTA EL CORREGIMIENTO DE SINCERIN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACHÍ - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 973 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
1.INICIAR SEGUNDO PROCESO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA
2.PROGRAMACIÓN DE COMITÉ EN 15 DÍAS PARA TOMAR DECISIÓN DEFINITIVA RESPECTO AL PROYECTO
3.ACCESO A LA OBRA COMPLETAMENTE HABILITADO.
4.PLAN DE CONTINGENCIA PARA EJECUCIÓN DE OBRA.
5.COMITÉ PRESENCIAL.
6.ENTREGA DE EXTRACTOS Y SALDOS BANCARIOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
1. INTRODUCCIÓN
2. LECTURA DE COMPROMISOS DE COMITÉ ANTERIOR
3. ACTIVIDADES EN OBRA
4.CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA
PRESENTES EN COMITÉ, ILUMINADA CASTELLAR, JUAN PABLO GARCIA, JOSE CARDENAS, EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ, JAVIER JOSE DOMINGUEZ , ASAEL CERPA Y DANIER GUZMAN. 1. PROCESO SANCIONATORIO: LA ALCALDIA NO HA ADELANTADO EL PROCESO 2. SE PROPGRAMÓ COMITÉ PARA LA DECISIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO: ES EL PRESENTE COMITÉ 3.ACCESO COMPLETAMENTE HABILITADO A LA OBRA : EL ALCALDE MANIFIESTA QUE LLEVA ADELANTADO EL 95% DE LOS TRABAJOS DE HABILITACIÓN DE ACCESO. NO SE HA DADO CUMPLIMIENTO 4.PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: HACE FALTA PROGRAMACIÓN E INFORMACIÓN DE CUADRILLAS. 5.COMITE PRESENCIAL 22 DE JULIO: SE ESPERARÁ LA FECHA PARA SU PROGRAMACIÓN. 6.ENTREGAR LOS EXTRACTOS Y SALDOS BANCARIOS: LUNES 15 DE JULIO PRESENTAN INFORMACIÓN 7.AVANCE DEL 50% 22 DE JULIO. EL INGENIERO RESIDENTE DA A CONOCER EL ESTADO DE LA VÍA, EXAGERO EN DECIR QUE EL ESTADO ESTA EN UN 95%, DICE QUE REALMENTE ESTA EN UN 50% SE INGRESO MATERIALES DE RELLENO, INGRESO CUADRIILLA PARA FORMALETEAR Y FUNDIDA DE CONCRETO 11 DE JULIO, SE REALIZARON OBSERVACIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN OPTIMA DE ESAS ACTIVIDADES. LA CONCLUSION ES QUE YA SE EMPEZO A INGRESAR MATERIALM CEMENTO, MEZCLADORA, YA HAY ACTIVIDAD EN LA OBRA Y PUEDEN IR ADELANTANDO PLACA HUELLA CUNETA Y BORDILLOS, A PARTIR DE HOY 12 HASTA EL DIA 20 PUEDEN TRABAJAR SU PLAN DE CONTINGENCIA . EN TEMPORADA SECA AUN DEBEN TENER EN CUENTA EL MANTENIMIENTO CONTINUO EL INGENEIRO ASAEL MANIFIESTA QUE SE ENCUEBTRAN 10 PERSONAS ENCARGADOSE DE LAS SANJAS, ESTAN ECHANDO MATERIAL DE TERRAPELN QUE SE COMPORTA BIEN EN LLUVIAS. EL 20 SE DEBE SABER SI SE DA CUMPLIMIENTO O NO AL CONTRATO ANTES DE 22 REUNION PRESENCIAL. ESTAN UTILIZANDO CEMENTO DAÑADO PARA TEMAS DE ACCESO Y BORDILLOS. COMITE VIRTUAL 22 JULIO A LA 10 AM

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
ELABORACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA	19/02/2024	
ENTREGA DE INFORMES MENSUALES NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO	19/02/2024	
SOPORTES DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	19/02/2024	
FLUJO DE ACUERDO A NUEVA PRORROGA	19/02/2024	
RESOLUCIÓN DE VEEDURIAS ANTE PERSONERIA	19/02/2024	
CORRECCIONES AL PAGA	19/02/2024	

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 22/07/2024 (Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ASAEL CERPA	RESIDENTE OBRA	CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK	
JOSE CARDENAS	RESIDENTE INTERVENTORÍA	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	
ILUMINADA CASTELLAR	DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	
ELKIN ROYERO	SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS	ALCALDIA DE ACHÍ	
LAURA ALVAREZ	INGENIERA INTERVENTORA	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

REGISTRO FOTOGRÁFICO



	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 22/07/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 10
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No. L.P.006 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORREGIMIENTO DE LOS NÍSPEROS HASTA EL CORREGIMIENTO DE SINCERIN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACHÍ - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 973 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
1.INICIAR SEGUNDO PROCESO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA
2.PROGRAMACIÓN DE COMITÉ EN 15 DÍAS PARA TOMAR DECISIÓN DEFINITIVA RESPECTO AL PROYECTO
3.ACCESO A LA OBRA COMPLETAMENTE HABILITADO.
4.PLAN DE CONTINGENCIA PARA EJECUCIÓN DE OBRA.
5.COMITÉ PRESENCIAL.
6.ENTREGA DE EXTRACTOS Y SALDOS BANCARIOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
1. INTRODUCCIÓN
2. LECTURA DE COMPROMISOS DE COMITÉ ANTERIOR
3. ACTIVIDADES EN OBRA
4.CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA
1.PRESENTACIÓN 2.INFORMACIÓN DE TRAMITE O TRAZABILIDAD DEL PROCESO SANCIONATORIO: ALCALDE MANIFIESTA QUE CON LOS JURIDICOS SE LLEVA UN AVANCE, EL MIERCOLES 24 REUNION CON EL CONTRATISTA PARA HACER INCUMPLIMIENTO AL CONTRATISTA. 3.CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO DE ACCESO TOTAL A LA OBRA: EL ALCALDE MANIFIESTA QUE EL PASO DE MAQUINARIA PESADA DAÑA LA VIA ARREGLADA. LA INTERVENTORIA SOLICITA QUE SE ASEGURE REALIZAR LOS ARREGLOS UNA VEZ SE REALICEN EL DAÑO. 4. NO SE DIÓ CUMPLIMIENTO AL AVANCE DEL 50% PUESTO QUE LA ALCALDIA NO HA HECHO ENTREGA DEL ACCESO COMPLETO LO QUE RETRASA TAMBIEN LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA, PRESENTAN INCONVENIENTES CON MATERIAL SATURADO PARA SU INSTALACIÓN, SE REALIZAN FUNDIDA DE CONCRETO E INGRESOS DE MATERIAL. EL CONTRATISTA SOLICITA NUEVAMENTE PRORROGA PORQUE HABIA MANIFESTADO EN COMITE ANTERIOR QUE EL COMPROMISO NO ERA VIABLE CUMPLIRLO POR QUE EL COMPROMISO DE LA ALCALDIA NO FUE CUMPLIDO EN LA FECHA ESTABLECIDA. 5.EL DIA DE HOY 22 DE JULIO ESTAN FUNDIENDO CONCRETO, REALIZAN TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO Y SUBBASE. 6.EL TRAMO DE GUARANDA SUCRE 8 -10 KM EN DONDE SE ENCUENTRA LAS CANTERAS, ESTÁ EN MAL ESTADO Y NO HAY INGRESO DE VOLQUETAS PARA SACAR MATERIAL . 7.SE EVALUA PRORROGA MAXIMO 2 MESES. NO HAY EXCUSAS EL MATERIAL PUEDE SER TAPADO EN CASO DE LLUVIAS, LOS PROCESOS SANCIONATORIOS NO DEBEN TENER ATRASO PORQUE ES UNA ACTIVIDAD NUEVA PARA EL ALCALDE YA QUE HUBO UN COMPROMISO DE PLAZO DE 20 DIAS. SE SUGIERE MEJORAR LOS HORARIOS LABORALES. 8.EL CONTARTISTA EN UNA SEMANA HA AVANZADO 5% PROPONE REUNIONES DE SEGUIMIENTO PARA EVALUAR COMPROMISOS Y ACLARAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LOS COMPROMISOS ATRIBUIDOS A TODAS LAS PARTES. 9.EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR CRONOGRAMA CON CONDICIONES NORMALES DE EJECUCION, EN CASO DE IMPREVISTOS SE EVALUARAN. 10.JURIDICO SOLICITA DE MANERA CONCERTADA AL CONTRATISTA, LA REPROGRAMACION DE LA OBRA Y UN INFORME DETALLADO. 11.NO SE DEBE DESCUIDAR LA CALIDAD CON LA VELOCIDAD (EDY ALEXANDER). 12.PROXIMA REUNION LUNES 29. 13. A MAS TARDAR EL VIERNES 26 SE TIENE FINIQUITADO EL TEMA DE LA PRORROGA

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
PROCESO DE INCUMPLIMIENTO AL CONTRATISTA	24/07/2024	ALCALDIA DE ACHÍ
MEJORAR HORARIOS LABORALES		CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK
REUNION DE SEGUIMIENTO	29/07/2024	CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS ALCALDIA DE ACHÍ
EVALUACIÓN DE POSIBLE PRORROGA	26/07/2024	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES INVIAS

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 29/07/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ASAEL CERPA	RESIDENTE OBRA	CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK	
JOSE CARDENAS	RESIDENTE INTERVENTORÍA	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	
ILUMINADA CASTELLAR	DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	
ELKIN ROYERO	SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS	ALCALDIA DE ACHÍ	
LAURA ALVAREZ	INGENIERA INTERVENTORA	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	
DAINER GUZMAN	ALCALDE DE ACHÍ	ALCALDIA DE ACHÍ	
JAVIER DOMINGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK	
ALEXANDER CAMARGO	GESTOR NACIONAL	INVIAS	
JUAN CARLOS	ABOGADO	MUNICIPIO DE ACHÍ	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTAS DE REUNIÓN Y COMITÉ DE OBRA MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°557 DE 2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	7/09/2023

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 18
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No. 557 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN RAFAEL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFÁLTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE CASCAJAL HASTA EL CORREGIMIENTO DE LA PASCUALA DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 973 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
1. REVISIÓN PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL: LA INTERVENTORÍA EMITE SUS OBSERVACIONES 2. PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUSES SE ENCUENTRA EN TRAMITE 3. ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
1. PRESENTACIÓN. 2. LECTURA DE COMPROMISOS DEL COMITÉ DE OBRA ANTERIOR 3. CONCLUSIONES Y ASIGNACIÓN DE COMPROMISOS.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA
1. PRESENTES EN EL COMITÉ DE OBRA, LA DIRECCIÓN DE INTERVENTORÍA ILUMINADA CASTELLAR ARRIETA, EDGAR ARAGÓN RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, GLORIA COELLO RESIDENTE DE OBRA, SUPERVISOR DEL CONTRATO FABIAN CABRERA DIAZ, DIRECTOR DE OBRA GONZALO ARBELAEZ, INGENIERA RESIDENTE GLORIA COELLO E INGENIERAS INTERVENTORAS LAURA ALVAREZ Y SOFIA CASTELLAR. 2. LA INTERVENTORÍA HACE LLAMO DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA POR EL ATRASO PRESENTADO Y SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN, SE RECUERDA EL COMPROMISO DEL PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCES AL CUAL SE ENCUENTRA EN TRAMITE EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA, EL CONTRATISTA HA HECHO LEVANTAMIENTO DE LAS CANTIDADES EJECUTADAS, CUANTIFICADO ACTIVIDADES CRITICAS ETC. MANIFIESTAN QUE SE HAN QUEDADO SIN RECURSOS Y QUE SOLO ESTARÍAN REALIZANDO OBRAS DE PROTECCIÓN, HAN REALIZADO COMITÉS CON VEEDURIAS NOTANDOSE MENOS ASISTENCIA PERO EN GENERAL LA COMUNIDAD ESTÁ SATISFECHA CON LA VÍA, EL CONTRATISTA EXPLICÓ EL MANEJO DE LOS RECURSOS POR VIGENCIAS DANDOSE A ENTENDER EL POR QUE DE LA DISMINUCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS EN OBRA. 3. LA INTERVENTORÍA SUGIERE LA ELABORACIÓN DE UNA REPROGRAMACIÓN CON LA RESPECTIVA JUSTIFICACIÓN, TENIENDO EN CUENTA LOS ATRASOS PRESENTADOS.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCES	28/09/2023	CONSORCIO SAN RAFAEL
FORMATO MENSUAL DEL ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	28/09/2023	CONSORCIO SAN RAFAEL
JUSTIFICACIÓN DE LA DISMINUCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS	28/09/2023	CONSORCIO SAN RAFAEL

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 28/09/2023 (Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
FABIAN CABRERA DIAZ	SUPERVISOR DEL CONTRATO	MUNICIPIO DE MAGANGUÉ	
GLORIA COELLO T	RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO SAN RAFAEL	
ILUMINADA CASTELLAR	DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	
EDGAR ARAGÓN	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	
GONZALO ARBELAEZ A	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO SAN RAFAEL	
LAURA ALVAREZ BENEDETTI	INGENIERA INTERVENTORA	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	
DANIELA SOFIA CASTELLAR	INGENIERA INTERVENTORA	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ACTAS DE REUNIÓN Y COMITÉ DE OBRA MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR CONTRATO N°558 DE 2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 7/09/2023
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 18
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No. 558 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUÉ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFÁLTICO DE VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA EL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL DE CORTINAS DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 973 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
SUBSANACIÓN DE LAS OBERVACIONES SOBRE EL PAGA: SE ENCUENTRAN SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES ENVIO DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO REALIZADOS:SE REALIZÓ LA TOMA DE MUESTRAS, LOS RESULTADOS ESTAN EN PROCESO

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
1. PRESENTACIÓN. 2. DESARROLLO DEL COMITÉ Y ASIGNACIÓN DE COMPROMISOS

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. PRESENTES EN EL COMITÉ DE OBRA, LA DIRECCIÓN DE INTERVENTORÍA ILUMINADA CASTELLAR ARRIETA, ENRIQUE SANCHEZ RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, KEVIN ESPELETA RESIDENTE DE OBRA, SUPERVISOR DEL CONTRATO FABIAN CABRERA DIAZ, DIRECTOR DE OBRA DIEGO ALVAREZ E INGENIERAS INTERVENTORAS LAURA ALVAREZ Y SOFIA CASTELLAR.
2. LA INTERVENTORÍA HACE LLAMADO DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA POR EL ATRASO PRESENTADO Y SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN, SE RECUERDA EL COMPROMISO DEL PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCES AL CUAL SE ENCUENTRA EN TRAMITE
EL CONTRATISTA HA REALIZADO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN RESPUESTA AL COMUNICADO DE LA INTERVENTORÍA, SE REALIZA MODIFICACIÓN DE LAS ALETAS DEL BOZ EN LA ABSC 2+350 (COSTADO IZQUIERDO) EN EL SENTIDO QUE VA EL ABSCISADO DE LA VÍA.
EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA, EL CONTRATISTA HA HECHO LEVANTAMIENTO DE LAS CANTIDADES EJECUTADAS, CUANTIFICADO ACTIVIDADES CRITICAS ETC.
MANIFIESTAN QUE SE HAN QUEDADO SIN RECURSOS Y QUE SOLO ESTARÍAN REALIZANDO OBRAS DE PROTECCIÓN, HAN REALIZADO COMITÉS CON VEEDURIAS NOTANDOSE MENOS ASISTENCIA PERO EN GENERAL LA COMUNIDAD ESTÁ SATISFECHA CON LA VÍA, EL CONTRATISTA EXPLICÓ EL MANEJO DE LOS RECURSOS POR VIGENCIAS DANDOSE A ENTENDER EL POR QUE DE LA DISMINUCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS EN OBRA.
3. LA INTERVENTORÍA SUGIERE LA ELABORACIÓN DE UNA REPROGRAMACIÓN CON LA RESPECTIVA JUSTIFICACIÓN, TENIENDO EN CUENTA LOS ATRASOS PRESENTADOS Y DAR RESPUESTA A LOS OFICIOS ENVIADOS.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
JUSTIFICACIÓN DE LA DISMINUCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS	28/09/2023	CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUÉ
RESPUESTA A LA CORRESPONDENCIA DE LA INTERVENTORÍA	28/09/2023	CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUÉ

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 28/09/2023 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
FABIAN CABRERA DIAZ	SUPERVISOR DEL CONTRATO	MUNICIPIO DE MAGANGUÉ	
DIEGO ALVAREZ HERNANDEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUÉ	
ILUMINADA CASTELLAR ARRIETA	DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	
KEVIN ESPELETA BRITO	RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUÉ	
DANIELA SOFIA CASTELLAR	INGENIERA INTERVENTORA	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	
LAURA ALVAREZ BENEDETTI	INGENIERA INTERVENTORA	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	973 de 2022
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - LOTE 4.
Contratista:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
NIT:	900.916.608
Representante legal	LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
Fecha de Inicio:	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024
Prorroga 1:	SEIS (6) MESES
Plazo acumulado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Valor Inicial:	$3.895.780.731

Tabla 17 Información Contrato de Interventoría 973 de 2022.

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

A continuación, se muestra un resumen detallado de las actividades realizadas por el interventor por cada municipio, correspondiente a este periodo:

5.2.1 Municipio De Achí - Contrato No. L.P.006 de 2022.

A la fecha de elaboración del presente informe mensual de Interventoría No. 23 (del 1 de julio al 31 de julio de 2024), **GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**. realizó lo siguiente:

- ✓ Elaboración de informes semanales 94, 95, 96 y 97 seguimiento a las obligaciones del municipio de acuerdo con el convenio administrativo No. 1895 de 2021.
- ✓ Vigilancia y control ante el cumplimiento de los términos y condiciones del contrato.
- ✓ Control de cumplimiento de los términos y condiciones del contrato, se realiza además seguimiento a las obligaciones del municipio de acuerdo al convenio interadministrativo no. 1895 de 2021.
- ✓ Solicitud de prorroga al contrato de interventoría 973 de 2022
- ✓ Conminación al municipio sobre los estados de cuenta y reintegro de rendimientos financieros del convenio 1895 de 2021.

- ✓ Solicitud de proceso sancionatorio CTO L.P.006 de 2022.
- ✓ Se realiza comité extraordinario el 28 de junio de 2024 en invias planta central.
- ✓ Solicitud de cumplimiento de compromisos pactados en comité día 28 de junio, se realiza presencia en el corredor vial para supervisión.
- ✓ Se solicita al contratista acelerar las actividades de mejoramiento de acceso para continuar con la normalidad de actividades en obra.
- ✓ Se realizan observaciones al plan de contingencia.
- ✓ Presencia en el corredor vial para supervisión.
- ✓ De acuerdo con el comité de seguimiento realizado el 28 de junio en invias planta central y los compromisos pactados en él, la alcaldía se encuentra condicionando el acceso a la obra para que el contratista pueda continuar con el desarrollo de las actividades de obra y de acuerdo al avance de esta, el día 20 de julio de 2024 se definirá la viabilidad de una posible prórroga para el contratista.
- ✓ Replanteo topográfico de ejes y niveles.
- ✓ Se realiza observación al contratista de habilitar vías alternas para el paso de vehículos.
- ✓ La buena compactación del material y el uso de rieles en buen estado.

El estado de avance ejecutado acumulado hasta el día 31 de julio de 2024, es del 34.80%.

5.2.2. Municipio De Magangué – Contrato No. 557 de 2022.

A la fecha de elaboración del presente informe mensual de Interventoría No. 23 (del 1 de julio al 31 de julio de 2024), **GAVINCO INGENIEROS CONSUSTORES S.A.S**. realizó lo siguiente:

- ✓ Se han adelantado actividades de elaboración de informes semanales, 96, 97, 98 y 99; vigilancia y control ante el cumplimiento de los términos y condiciones del contrato y seguimiento a las obligaciones del municipio de acuerdo con el convenio administrativo no. 1897 de 2021.
- ✓ Vigilancia y control ante el cumplimiento de los términos y condiciones del contrato.
- ✓ Inspecciones de las actividades realizadas en obra.
- ✓ Se realiza vigilancia y control ante el cumplimiento de los términos y condiciones del contrato y seguimiento a las obligaciones del municipio de acuerdo al convenio interadministrativo no. 1897 de 2021.
- ✓ Solicitud de prórroga del contrato de interventoría 973 de 2022.
- ✓ Solicitud del estado de cuenta y entrega de rendimientos financieros del convenio 1897 de 2021.
- ✓ Se realiza llamado de atención al contratista por deficiencias presentadas en la construcción de desvíos temporales de las obras hidráulicas en construcción.
- ✓ Respuesta a comunicación CSR-557-060- entrega de ajustes del PAGA, se remite paga CTO 557 de 2022 a la subdirección de sostenibilidad.

El estado de avance ejecutado acumulado hasta el día 30 de junio de 2024, es del 72.50%.

5.2.3. Municipio de Magangué – Contrato No. 558 de 2022.

A la fecha de elaboración del presente informe mensual de Interventoría No. 23 (del 1 de julio al 31 de julio de 2024), **GAVINCO INGENIEROS CONSUSTORES S.A.S**. realizó lo siguiente:

- ✓ Se han adelantado actividades de elaboración de informes semanales, 96, 97, 98 y 99; vigilancia y control ante el cumplimiento de los términos y condiciones del contrato y seguimiento a las obligaciones del municipio de acuerdo con el convenio administrativo no. 1898 de 2021.
- ✓ Seguimiento y control de avances.
- ✓ Inspecciones SST a las actividades realizadas por el contratista.
- ✓ Vigilancia y control ante el cumplimiento de los términos y condiciones del contrato.
- ✓ Seguimiento a las obligaciones del municipio de acuerdo al convenio interadministrativo No. 1897 de 2021
- ✓ Se realiza presencia en obra para control de las actividades del contratista.
- ✓ Solicitud de prórroga del contrato de interventoría.
- ✓ Interventoría, solicitud del estado de cuenta y reintegro de los rendimientos financieros del convenio 1898 de 2021.

El estado de avance ejecutado acumulado hasta el día 31 de julio de 2024, es del 99.56%.

5.3. Informes especialistas y profesionales

5.4. Informe del programa Anual de Caja -PAC (No aplica)

5.5. Informe matriz de riesgos

Se envía como anexo

5.6. Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de obra e Interventoría (No aplica)

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

No.	Contenido	Formato	Anexo
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	Aplica
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	Aplica
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	Aplica
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	Aplica

6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	Aplica
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	Aplica
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	No aplica
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	Aplica
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	No aplica

Tabla 18 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORREGIMIENTO DE LOS NÍSPEROS HASTA EL CORREGIMIENTO DE SINCERIN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACHÍ - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 973 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. L.P.006 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Motocicleta	(Placa GUN16G, Suzuki, 155 c.c., 2023, incluye combustible y SOAT)	A	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
Trabajo de topografia	(incluye personal, equipo y transporte)	A	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
Ensayos de Laboratorio	Ensayos de CBR de laboratorio, con expansión (E-148) y granulométria (E-123)	A	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
Oficina/Campamento	(incluye dotación y servicios públicos)	A	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: Iluminada Castellar Arrieta
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No 13202130074BLV

Firma
Nombre: Fabian Ernesto Arango Pineda
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:1320209-7750BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/07/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFÁLTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE CASCAJAL HASTA EL CORREGIMIENTO DE LA PASCUALA DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 973 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 557 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN RAFAEL

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4	Placa EGQ668, Nissan, 2.488c.c., 2019 (Incluye conductor peajes y Combustible)	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
Motocicleta	(Placa GUN16G, Suzuki, 155 c.c., 2023, incluye combustible y SOAT)	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
Trabajo de topografia	(incluye personal, equipo y transporte)	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
Ensayos de Laboratorio	Ensayos de resistencia a la compresion de cilindros de comcreto	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
Oficina/Campamento	(incluye dotación y servicios públicos)	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: Iluminada Castellar Arrieta
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV

Firma
Nombre: Fabian Ernesto Arango Pineda
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:1320209-7750BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFÁLTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA EL CORREGIMIENTO DE LA SAN RAFAEL DE CORTINAS DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 973 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 558 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUÉ

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Camioneta o Campero	Placa LRR231, Renault, 1.333 c.c., 2023 (Incluye conductor peajes y Combustible)	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A
Motocicleta	(Placa GUN16G, Suzuki, 155 c.c., 2023, incluye combustible y SOAT)	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A
Trabajo de topografia	(incluye personal, equipo y transporte)	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A
Ensayos de Laboratorio	Ensayos de densidad y humedad en el terreno (NTC-1667/2002)	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A
Oficina/Campamento	(incluye dotación y servicios públicos)	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: Iluminada Castellar Arrieta
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV

Firma
Nombre: Fabian Ernesto Arango Pineda
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:1320209-7750BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.


6.2. Personal control aportes legales y seguridad social contrato de Interventoría. (Anexo formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7)

Conforme al Anexo No. 1 – Anexo Técnico de los Pliegos de Condiciones, el personal mínimo requerido conforme a lo establecido en el numeral 4.2. EQUIPO DE TRABAJO. Requisitos del personal de dicho documento, quedo establecido y aprobado de la siguiente manera en los comunicados.

CARGO	PROFESIONAL	APROBACIÓN INVIAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	ILUMINADA CASTELLAR ARRIETA	SVR 51450 30 DE AGOSTO DE 2022
INGENIERO AUXILIAR INTERVENTORÍA	EDGAR FABIAN PENAGOS PADILLA	SVR 55677 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ENRIQUE ALFONSO SÁNCHEZ TRONCOSO	SVR 5042 02 DE FEBRERO DE 2023
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	EDGAR ALFONSO ARAGÓN OTERO	SVR 12871 08 DE MARZO DE 2023
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO	ADOLFO ENRIQUE ARROYO ORTIZ	SVR 51450 30 DE AGOSTO DE 2022
ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA	JAIRO ALONSO ZORRO ROA	SVR 51450 30 DE AGOSTO DE 2022
PROFESIONAL DE ASEGURAMIENTO O GESTIÓN DE LA CALIDAD	ALFONSO LUIS ALVEAR MAY	SVR 51450 30 DE AGOSTO DE 2022
ESPECIALISTA AMBIENTAL Y/O SOSTENIBILIDAD	JORGE ARMANDO ORTEGÓN GARCÍA	SVR 54730 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ALEJANDRO ELJAIK SALOME	SVR 54730 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y/O VÍAS	ORLANDO ISAAC CASTELLÓN MARRUGO	SVR 52743 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y/O GEOTECNIA	EMIRO FÉLIX VANEGAS GÓMEZ	SVR 52743 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022
INSPECTOR SST	MARIO JOSÉ PRASCA DUARTE	2024S-VBOL-031605 21 DE MAYO DE 2024

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	JOSE MANUEL CARDENAS BOLIVAR	04 DE JULIO DE 2023
SECRETARIA	DEISY VICTORIA MONTAÑEZ	N/A

Tabla 19. Personal contrato de interventoría.

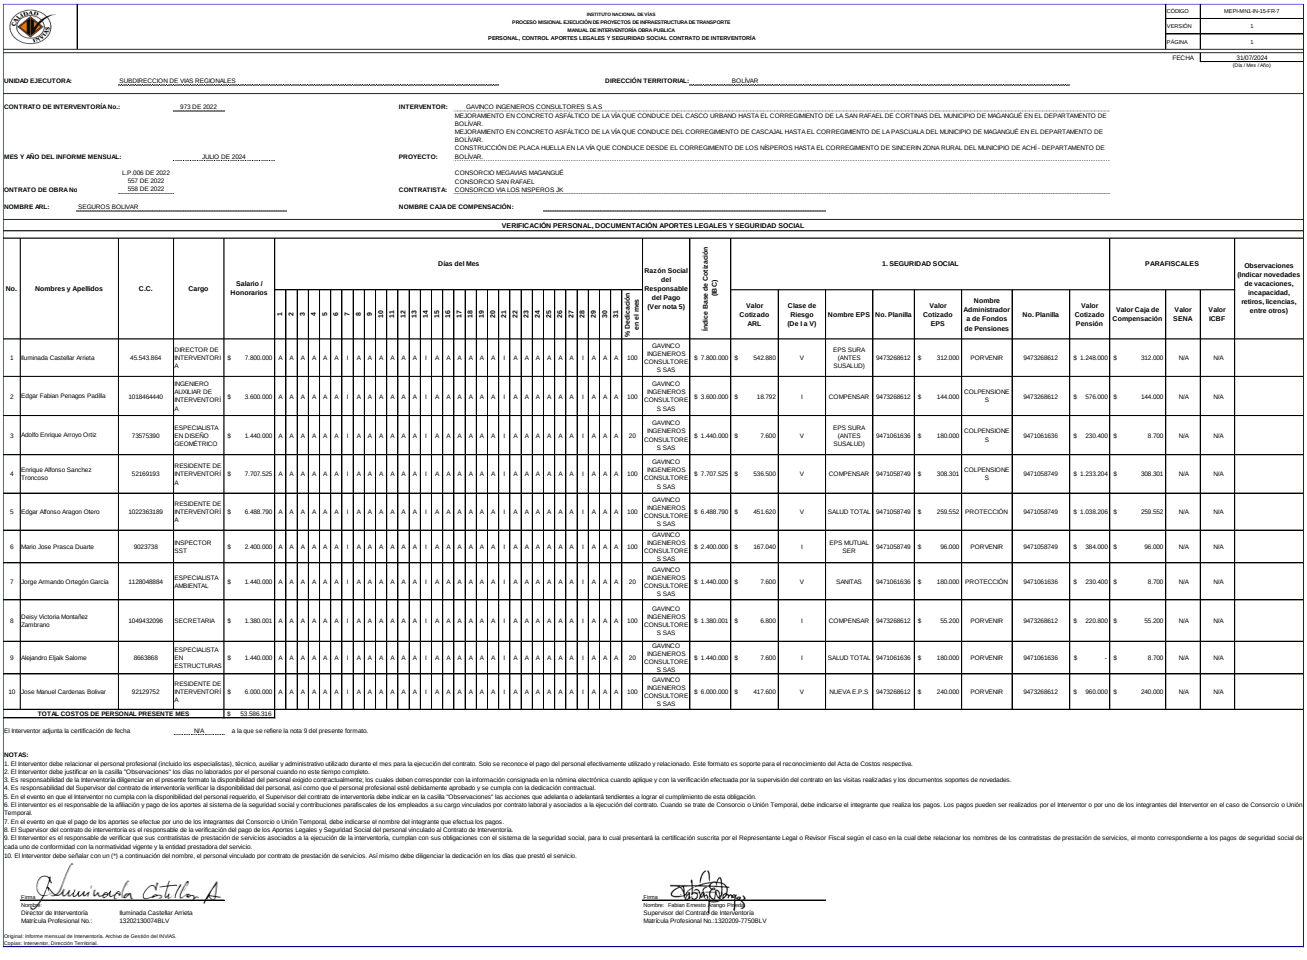

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CODIGO: MEPI-MNI-IN-15-FR-7 | VERSIÓN: 1 | PAGINA: 1 | FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 973 DE 2022
INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFÁLTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA EL CORREGIMIENTO DE LA SAN RAFAEL DE CORTINAS DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFÁLTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE CASCAJAL HASTA EL CORREGIMIENTO DE LA PASCUALA DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORREGIMIENTO DE LOS NISPEROS HASTA EL CORREGIMIENTO DE SINCERIN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACHÍ - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024
PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA No: L.P.006 DE 2022 557 DE 2022 558 DE 2022
CONTRATISTA: CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUÉ
CONSORCIO SAN RAFAEL
CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK

NOMBRE ARL: SEGUROS BOLIVAR
NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 a 30)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Iluminada Castellar Arrieta	45.543.864	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 7.800.000	A A A A A A I A A A A A A I A A A A A A A I A A A A I A A A	100	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.AS	$ 7.800.000	$ 542.880	V	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9473268612	$ 312.000	PORVENIR	9473268612	$ 1.248.000	$ 312.000	N/A	N/A	
2	Edgar Fabian Penagos Padilla	1018464440	INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORIA	$ 3.600.000	A A A A A A I A A A A A A I A A A A A A A I A A A A I A A A	100	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.AS	$ 3.600.000	$ 18.792	I	COMPENSAR	9473268612	$ 144.000	COLPENSIONES	9473268612	$ 576.000	$ 144.000	N/A	N/A	
3	Adolfo Enrique Arroyo Ortiz	73575390	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	$ 1.440.000	A A A A A A I A A A A A A I A A A A A A A I A A A A I A A A	20	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.AS	$ 1.440.000	$ 7.600	V	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9471061636	$ 180.000	COLPENSIONES	9471061636	$ 230.400	$ 8.700	N/A	N/A	
4	Enrique Alfonso Sanchez Troncoso	52169193	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 7.707.525	A A A A A A I A A A A A A I A A A A A A A I A A A A I A A A	100	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.AS	$ 7.707.525	$ 536.500	V	COMPENSAR	9471058749	$ 308.301	COLPENSIONES	9471058749	$ 1.233.204	$ 308.301	N/A	N/A	
5	Edgar Alfonso Aragon Otero	1022363189	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 6.488.790	A A A A A A I A A A A A A I A A A A A A A I A A A A I A A A	100	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.AS	$ 6.488.790	$ 451.620	V	SALUD TOTAL	9471058749	$ 259.552	PROTECCIÓN	9471058749	$ 1.038.206	$ 259.552	N/A	N/A	
6	Mario Jose Prasca Duarte	9023738	INSPECTOR SST	$ 2.400.000	A A A A A A I A A A A A A I A A A A A A A I A A A A I A A A	100	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.AS	$ 2.400.000	$ 167.040	I	EPS MUTUAL SER	9471058749	$ 96.000	PORVENIR	9471058749	$ 384.000	$ 96.000	N/A	N/A	
7	Jorge Armando Ortegón García	1128048884	ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 1.440.000	A A A A A A I A A A A A A I A A A A I A A A A I A A A I A A A	20	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.AS	$ 1.440.000	$ 7.600	V	SANITAS	9471061636	$ 180.000	PROTECCIÓN	9471061636	$ 230.400	$ 8.700	N/A	N/A	
8	Deisy Victoria Montañez Zambrano	1049432096	SECRETARIA	$ 1.380.001	A A A A A A I A A A A A A I A A A A A A A I A A A A I A A A	100	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.AS	$ 1.380.001	$ 6.800	I	COMPENSAR	9473268612	$ 55.200	PORVENIR	9473268612	$ 220.800	$ 55.200	N/A	N/A	
9	Alejandro Eljaik Salome	8663868	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 1.440.000	A A A A A A I A A A A A A I A A A A I A A A A I A A A I A A A	20	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.AS	$ 1.440.000	$ 7.600	I	SALUD TOTAL	9471061636	$ 180.000	PORVENIR	9471061636	$ -	$ 8.700	N/A	N/A	
10	Jose Manuel Cardenas Bolivar	92129752	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 6.000.000	A A A A A A I A A A A A A I A A A A A A A I A A A A I A A A	100	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.AS	$ 6.000.000	$ 417.600	V	NUEVA E.P.S	9473268612	$ 240.000	PORVENIR	9473268612	$ 960.000	$ 240.000	N/A	N/A	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 53.586.316																

El Interventor adjunta la certificación de fecha N/A a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Iluminada Castellar A
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV
Iluminada Castellar Arrieta

Firma
Nombres: Fabian Ernesto Pareja Pinto
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:1320209-77508LV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/12/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 973 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

MES INFORME MENSUAL: 1 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - LOTE 4

CONTRATO DE OBRA No: 557 de 2022, 558 de 2022 y LP.006 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN RAFAEL, CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUE Y CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	94622	2402-0600-0012	11	Nación	contrato principal	$ 296.093.333	$ 296.093.333
2023		2402-0600-0012	11	Nación	contrato principal	$ 1.520.000.000	
2024		2402-0600-0012	11	Nación	contrato principal	$ 2.079.687.398	
			TOTAL			$ 3.895.780.731	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 3.895.780.731

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 250.443.046,00		**$ 296.093.333**	**$ 3.895.780.731**		
1	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 7.102.000	$ 1.349.380	$ 8.451.380	$ 1.420.400,00	$ 7.030.980,00	$ 249.022.646,00	887122 DE 06/08/2022	$ 38.619.307	$ 3.887.329.351		EN REVISIÓN.
	TOTALES	**$ 7.102.000**	**$ 1.349.380**	**$ 8.451.380**	**$ 1.420.400**	**$ 7.030.980**	**$ 249.022.646**		**$ 38.619.307**	**$ 3.887.329.351**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = ©	$ 7.102.000,00		$ 7.102.000,00
*PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)	$ -		$ -
*SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = E	$ 7.102.000,00		$ 7.102.000,00
*IVA = 19% * (E) = (F)		$ 1.349.380,00	$ 1.349.380,00
VALOR TOTAL	**$ 7.102.000,00**	**1.349.380,00**	**$ 8.451.380,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: Iluminada castellar Arrieta
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV

Firma
Nombre: Carmen Cecilia Pérez López
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202188727 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/12/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 973 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

MES INFORME MENSUAL: 2 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - LOTE 4

CONTRATO DE OBRA No: 557 de 2022, 558 de 2022 y LP 006 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN RAFAEL, CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUE Y CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	887122	2402-0600-0012	11	Nación	contrato principal	$ 296.093.333	$ 36.639.307
2023		2402-0600-0012	11	Nación	contrato principal	$ 1.520.000.000	
2024		2402-0600-0012	11	Nación	contrato principal	$ 2.079.687.398	
			TOTAL			$ 3.895.780.731	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 3.895.780.731

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 250.443.046,00		**$ 296.093.333**	**$ 3.895.780.731**		
1	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 7.102.000	$ 1.349.380	$ 8.451.380	$ 1.420.400,00	$ 7.030.980,00	$ 249.022.646,00	887122 DE 06/08/2022	$ 38.619.307	$ 3.887.329.351		EN REVISIÓN.
2	OCTUBRE DE 2022	$ 4.602.000	$ 874.380	$ 5.476.380	$ 920.400	$ 4.555.980	$ 248.102.246,00	887122 DE 06/08/2022	$ 34.063.327	$ 3.881.852.971		EN REVISIÓN.
TOTALES		**$ 11.704.000**	**$ 2.223.760**	**$ 13.927.760**	**$ 2.340.800**	**$ 11.586.960**	**$ 248.102.246**		**$ 34.063.327**	**$ 3.881.852.971**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = ©	$ 11.704.000,00		$ 11.704.000,00
*PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)	$ -		$ -
*SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = E	$ 11.704.000,00		$ 11.704.000,00
*IVA = 19% * (E) = (F)		$ 2.223.760,00	$ 2.223.760,00
VALOR TOTAL	**$ 11.704.000,00**	**2.223.760,00**	**$ 13.927.760,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: iluminada castellar Arrieta
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV

Firma
Nombre: Carmen Cecilia Pérez López
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202188727 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/12/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 973 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

MES INFORME MENSUAL: 3 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - LOTE 4.

CONTRATO DE OBRA No: 557 de 2022, 558 de 2022 y LP.006 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN RAFAEL, CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUE Y CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	887122	2402-0600-0012	11	Nación	contrato principal	$ 296.093.333	$ 36.639.307
2023			11	Nación	contrato principal	$ 1.520.000.000	
2024			11	Nación	contrato principal	$ 2.079.687.398	
				TOTAL		$ 3.895.780.731	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 3.895.780.731

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 250.443.046,00		**$ 296.093.333**	**$ 3.895.780.731**		
1	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 7.102.000	$ 1.349.380	$ 8.451.380	$ 1.420.400,00	$ 7.030.980,00	$ 249.022.646,00	887122 DE 06/08/2022	$ 38.619.307	$ 3.887.329.351		EN REVISIÓN.
2	OCTUBRE DE 2022	$ 4.602.000	$ 874.380	$ 5.476.380	$ 920.400	$ 4.555.980	$ 248.102.246,00	887122 DE 06/08/2022	$ 34.063.327	$ 3.881.852.971		EN REVISIÓN.
3	NOVIEMBRE DE 2022	$ 16.102.000	$ 3.059.380	$ 19.161.380	$ 3.220.400	$ 15.940.980	$ 244.881.846,00	887122 DE 06/08/2022	$ 18.122.347	$ 3.862.691.591		
4												
	TOTALES	**$ 27.806.000**	**$ 5.283.140**	**$ 33.089.140**	**$ 5.561.200**	**$ 27.527.940**	**$ 248.102.246**		**$ 18.122.347**	**$ 3.862.691.591**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = ©	$ 27.806.000,00		$ 27.806.000,00
*PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)	$ -		$ -
*SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = E	$ 27.806.000,00		$ 27.806.000,00
*IVA = 19% * (E) = (F)		$ 5.283.140,00	$ 5.283.140,00
VALOR TOTAL	**$ 27.806.000,00**	**5.283.140,00**	**$ 33.089.140,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: Iluminada castellar Arrieta
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV

Firma
Nombre: Carmen Cecilia Pérez López
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202188727 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 973 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

MES INFORME MENSUAL: 4 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - LOTE 4.

CONTRATO DE OBRA No: 557 de 2022, 558 de 2022 y LP.006 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN RAFAEL, CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUE Y CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	887122	2402-0600-0012	11	Nación	contrato principal	$ 296.093.333	$ 36.639.307
2023			11	Nación	contrato principal	$ 1.520.000.000	
2024			11	Nación	contrato principal	$ 2.079.687.398	
			TOTAL			$ 3.895.780.731	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 3.895.780.731

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 250.443.046,00		**$ 296.093.333**	**$ 3.895.780.731**		
1	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 7.102.000	$ 1.349.380	$ 8.451.380	$ 1.420.400,00	$ 7.030.980,00	$ 249.022.646,00	887122 DE 06/08/2022	$ 38.619.307	$ 3.887.329.351		EN REVISIÓN.
2	OCTUBRE DE 2022	$ 4.602.000	$ 874.380	$ 5.476.380	$ 920.400	$ 4.555.980	$ 248.102.246,00	887122 DE 06/08/2022	$ 34.063.327	$ 3.881.852.971		EN REVISIÓN.
3	NOVIEMBRE DE 2022	$ 13.323.000	$ 2.531.370	$ 15.854.370	$ 2.664.600	$ 13.189.770	$ 245.437.646,00	887122 DE 06/08/2022	$ 20.873.557	$ 3.865.998.601		
4	DICIEMBRE DE 2022	$ 20.599.000	$ 3.913.810	$ 24.512.810	$ 4.119.800	$ 20.393.010	$ 241.317.846,00	887122 DE 06/08/2022	$ 480.547,00			
	TOTALES	**$ 45.626.000**	**$ 8.668.940**	**$ 54.294.940**	**$ 9.125.200**	**$ 45.169.740**	**$ 248.102.246**		**$ 480.547**	**$ 3.865.998.601**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = ©	$ 45.626.000,00		$ 45.626.000,00
*PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)	$ -		$ -
*SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = E	$ 45.626.000,00		$ 45.626.000,00
*IVA = 19% * (E) = (F)		$ 8.668.940,00	$ 8.668.940,00
VALOR TOTAL	**$ 45.626.000,00**	**8.668.940,00**	**$ 54.294.940,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: Iluminada castellar Arrieta
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV

Firma
Nombre: Carmen Cecilia Pérez López
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202188727 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	7/02/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 973 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

MES INFORME MENSUAL: 5 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - LOTE 4.

CONTRATO DE OBRA No: 557 de 2022, 558 de 2022 y LP.006 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN RAFAEL, CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUE, Y CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	887122	2402-0600-0012	11	Nación	contrato principal	$ 296.093.333	$ 36.639.307
2023	144623	2402-0600-0012	11	Nación	contrato principal	$ 1.520.000.000	
2024			11	Nación	contrato principal	$ 2.079.687.398	
				TOTAL		$ 3.895.780.731	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 3.895.780.731

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 250.443.046,00		$ 296.093.333	$ 3.895.780.731		
1	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 7.102.000,00	$ 1.349.380,00	$ 8.451.380,00	$ 1.420.400,00	$ 7.030.980,00	$ 249.022.646,00	887122 DE 06/08/2022	$ 38.619.307,00	$ 3.887.329.351,00		
2	OCTUBRE DE 2022	$ 4.602.000,00	$ 874.380,00	$ 5.476.380,00	$ 920.400,00	$ 4.555.980,00	$ 248.102.246,00	887122 DE 06/08/2022	$ 34.063.327,00	$ 3.881.852.971,00		
3	NOVIEMBRE DE 2022	$ 13.298.000,00	$ 2.526.620,00	$ 15.824.620,00	$ 2.659.600,00	$ 13.165.020,00	$ 245.442.646,00	887122 DE 06/08/2022	$ 20.898.307,00	$ 3.866.028.351,00		
4	DICIEMBRE DE 2022	$ 20.975.000,00	$ 3.985.250,00	$ 24.960.250,00	$ 4.195.000,00	$ 20.765.250,00	$ 241.247.646,00	887122 DE 06/08/2022	$ 133.057,00	$ 3.841.068.101,00		
	TOTALES	$ 45.977.000,00	$ 8.735.630,00	$ 54.712.630,00	$ 9.195.400,00	$ 45.517.230,00	$ 241.247.646,00		$ 133.057,00	$ 3.841.068.101,00		

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 241.247.646,00		$ 1.520.000.000	$ 3.841.068.101		
5	ENERO DE 2023	$ 81.028.100,00	$ 15.395.339,00	$ 96.423.439,00	$ 16.205.620,00	$ 80.217.819,00	$ 225.042.026,00	144623 DE 14/02/2023	$ 1.439.782.181,00	$ 3.744.644.662,00		
6	FEBRERO DE 2023	$ 71.043.030,00	$ 13.498.175,70	$ 84.541.205,70	$ 14.208.606,00	$ 70.332.599,70	$ 210.833.420,00	144623 DE 14/02/2023	$ 1.369.449.581,30	$ 3.660.103.456,30		
7	MARZO DE 2023	$ 101.250.300,00	$ 19.237.557,00	$ 120.487.857,00	$ 20.250.060,00	$ 100.237.797,00	$ 190.583.360,00	144623/DE 14/02/2023	$ 1.269.211.784,30	$ 3.539.615.599,30		
8	ABRIL DE 2023	$ 99.118.540	$ 18.832.523	$ 117.951.062,60	$ 19.823.708	$ 98.127.354,60	$ 170.759.652,00	144623/DE 14/02/2023	$ 1.171.084.429,70	$ 3.421.664.536,70		
	TOTALES	$ 352.439.970,00	$ 66.963.594,30	$ 419.403.564,30	$ 70.487.994,00	$ 348.915.570,30	$ 170.759.652,00		$ 1.171.084.429,70	$ 3.421.664.536,70		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO VIGENCIA 2023

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = ©	$ 352.439.970,00		$ 352.439.970,00
*PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)	$ -	1.593.031.991,68	$ 1.593.031.991,68
*SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = E	$ 352.439.970,00		$ 352.439.970,00
*IVA = 19% * (E) = (F)		$ 66.963.594,30	$ 66.963.594,30
VALOR TOTAL	$ 352.439.970,00	66.963.594,30	$ 419.403.564,30

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: Edmunda Castellar Arrieta
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV

Firma
Nombre: Carmen Cecilia Pérez López
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1302188727 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	7/02/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 973 DE 2022 — **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

MES INFORME MENSUAL: 5 — **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - LOTE 4.

CONTRATO DE OBRA No: 557 de 2022, 558 de 2022 y LP.006 2022 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN RAFAEL, CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUE, Y CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	887122	2402-0600-0012	11	Nación	contrato principal	$ 296.093.333	$ 36.639.307
2023		2402-0600-0012	11	Nación	contrato principal	$ 1.520.000.000	
2024			11	Nación	contrato principal	$ 2.079.687.398	
			TOTAL			$ 3.895.780.731	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 3.895.780.731

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 250.443.046,00		$ 296.093.333	$ 3.895.780.731		
1	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 7.102.000,00	$ 1.349.380,00	$ 8.451.380,00	$ 1.420.400,00	$ 7.030.980,00	$ 249.022.646,00	887122 DE 06/08/2022	$ 38.619.307,00	$ 3.887.329.351,00		
2	OCTUBRE DE 2022	$ 4.602.000,00	$ 874.380,00	$ 5.476.380,00	$ 920.400,00	$ 4.555.980,00	$ 248.102.246,00	887122 DE 06/08/2022	$ 34.063.327,00	$ 3.881.852.971,00		
3	NOVEMBRE DE 2022	$ 13.298.000,00	$ 2.526.620,00	$ 15.824.620,00	$ 2.659.600,00	$ 13.165.020,00	$ 245.442.646,00	887122 DE 06/08/2022	$ 20.898.307,00	$ 3.866.028.351,00		
4	DICIEMBRE DE 2022	$ 20.975.000,00	$ 3.985.250,00	$ 24.960.250,00	$ 4.195.000,00	$ 20.765.250,00	$ 241.247.646,00	887122 DE 06/08/2022	$ 133.057,00	$ 3.841.068.101,00		
	TOTALES	$ 45.977.000,00	$ 8.735.630,00	$ 54.712.630,00	$ 9.195.400,00	$ 45.517.230,00	$ 241.247.646,00		$ 133.057,00	$ 3.841.068.101,00		

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 241.247.646,00		$ 1.520.000.000	$ 3.841.068.101		
5	ENERO DE 2023	$ 81.028.100,00	$ 15.395.339,00	$ 96.423.439,00	$ 16.205.620,00	$ 80.217.819,00	$ 225.042.026,00	144623 DE 14/02/2023	$ 1.439.782.181,00	$ 3.744.644.662,00		
6	FEBRERO DE 2023	$ 71.043.030,00	$ 13.498.175,70	$ 84.541.205,70	$ 14.208.606,00	$ 70.332.599,70	$ 210.833.420,00	144623 DE 14/02/2023	$ 1.369.449.581,30	$ 3.660.103.456,30		
7	MARZO DE 2023	$ 101.250.300,00	$ 19.237.557,00	$ 120.487.857,00	$ 20.250.060,00	$ 100.237.797,00	$ 190.583.360,00	144623/DE 14/02/2023	$ 1.269.211.784,30	$ 3.539.615.599,30		
8	ABRIL DE 2023	$ 107.154.000,00	$ 20.359.260,00	$ 127.513.260,00	$ 21.430.800,00	$ 106.082.460,00	$ 169.152.560,00	144623/DE 14/02/2023	$ 1.163.129.324,30	$ 3.412.102.339,30		
9	MAYO DE 2023	$ 110.121.540,00	$ 20.923.092,60	$ 131.044.632,60	$ 22.024.308,00	$ 109.020.324,60	$ 147.128.252,00	144623/DE 14/02/2023	$ 1.054.108.999,70	$ 3.281.057.706,70		
	TOTALES	$ 470.596.970,00	$ 89.413.424,30	$ 560.010.394,30	$ 94.119.394,00	$ 465.891.000,30	$ 147.128.252,00		$ 1.054.108.999,70	$ 3.281.057.706,70		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO VIGENCIA 2023

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = ©	$ 470.596.970,00		$ 470.596.970,00
*PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)	$ -		$ -
*SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = E	$ 470.596.970,00		$ 470.596.970,00
*IVA = 19% * (E) = (F)		$ 89.413.424,30	$ 89.413.424,30
VALOR TOTAL	$ 470.596.970,00	89.413.424,30	$ 560.010.394,30

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: luminada castellar Arrieta
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV

Firma
Nombre: Carmen Cecilia Pérez López
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1302188727 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/06/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 973 DE 2022 — **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

MES INFORME MENSUAL: 9 — **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - LOTE 4.

CONTRATO DE OBRA No: 557 de 2022, 558 de 2022 y LP.006 2022 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN RAFAEL, CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUE, Y CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	887122	2402-0600-0012	11	Nación	contrato principal	$ 296.093.333	$ 36.639.307
2023	144623	2402-0600-0012	11	Nación	contrato principal	$ 1.520.000.000	
2024			11	Nación	contrato principal	$ 2.079.687.398	
				TOTAL		$ 3.895.780.731	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 3.895.780.731

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 250.443.046,00		$ 296.093.333	$ 3.895.780.731		
1	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 7.102.000,00	$ 1.349.380,00	$ 8.451.380,00	$ 1.420.400,00	$ 7.030.980,00	$ 249.022.646,00	887122 DE 06/08/2022	$ 38.619.307,00	$ 3.887.329.351,00		
2	OCTUBRE DE 2022	$ 4.602.000,00	$ 874.380,00	$ 5.476.380,00	$ 920.400,00	$ 4.555.980,00	$ 248.102.246,00	887122 DE 06/08/2022	$ 34.063.327,00	$ 3.881.852.971,00		
3	NOVEMBRE DE 2022	$ 13.298.000,00	$ 2.526.620,00	$ 15.824.620,00	$ 2.659.600,00	$ 13.165.020,00	$ 245.442.646,00	887122 DE 06/08/2022	$ 20.898.307,00	$ 3.866.028.351,00		
4	DICIEMBRE DE 2022	$ 20.975.000,00	$ 3.985.250,00	$ 24.960.250,00	$ 4.195.000,00	$ 20.765.250,00	$ 241.247.646,00	887122 DE 06/08/2022	$ 133.057,00	$ 3.841.068.101,00		
	TOTALES	$ 45.977.000,00	$ 8.735.630,00	$ 54.712.630,00	$ 9.195.400,00	$ 45.517.230,00	$ 241.247.646,00		$ 133.057,00	$ 3.841.068.101,00		

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 241.247.646,00		$ 1.520.000.000	$ 3.841.068.101		
5	ENERO DE 2023	$ 81.028.100,00	$ 15.395.339,00	$ 96.423.439,00	$ 16.205.620,00	$ 80.217.819,00	$ 225.042.026,00	144623 DE 14/02/2023	$ 1.439.782.181,00	$ 3.744.644.662,00		
6	FEBRERO DE 2023	$ 71.043.030,00	$ 13.498.175,70	$ 84.541.205,70	$ 14.208.606,00	$ 70.332.599,70	$ 210.833.420,00	144623 DE 14/02/2023	$ 1.369.449.581,30	$ 3.660.103.456,30		
7	MARZO DE 2023	$ 101.250.300,00	$ 19.237.557,00	$ 120.487.857,00	$ 20.250.060,00	$ 100.237.797,00	$ 190.583.360,00	144623/DE 14/02/2023	$ 1.269.211.784,30	$ 3.539.615.599,30		
8	ABRIL DE 2023	$ 99.118.540,00	$ 18.832.522,60	$ 117.951.062,60	$ 19.823.708,00	$ 98.127.354,60	$ 170.759.652,00	144623/DE 14/02/2023	$ 1.171.084.429,70	$ 3.421.664.536,70		
9	MAYO DE 2023	$ 109.625.940,00	$ 20.828.928,60	$ 130.454.868,60	$ 21.925.188,00	$ 108.529.680,60	$ 148.834.464,00	144623/DE 14/02/2023	$ 1.062.554.749,10	$ 3.291.209.668,10		
	TOTALES	$ 462.065.910,00	$ 87.792.522,90	$ 549.858.432,90	$ 92.413.182,00	$ 457.445.250,90	$ 148.834.464,00		$ 1.062.554.749,10	$ 3.291.209.668,10		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO VIGENCIA 2023

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = ©	$ 462.065.910,00		$ 462.065.910,00
*PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)	$ -		$ -
*SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = E	$ 462.065.910,00		$ 462.065.910,00
*IVA = 19% * (E) = (F)		$ 87.792.522,90	$ 87.792.522,90
VALOR TOTAL	$ 462.065.910,00	87.792.522,90	$ 549.858.432,90

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: Almirada castellar Arrieta
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV

Firma
Nombre: Fabián Ernesto Aranjo Pineda
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202097750

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 973 DE 2022 — **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

MES INFORME MENSUAL: 10 — **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - LOTE 4.

CONTRATO DE OBRA No: 557 de 2022, 558 de 2022 y LP.006 2022 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN RAFAEL, CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUE, Y CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	887122	2402-0600-0012	11	Nación	contrato principal	$ 296.093.333	$ 36.639.307
2023		2402-0600-0012	11	Nación	contrato principal	$ 1.520.000.000	
2024			11	Nación	contrato principal	$ 2.079.687.398	
				TOTAL		$ 3.895.780.731	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 3.895.780.731

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 250.443.046,00		$ 296.093.333	$ 3.895.780.731		
1	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 7.102.000,00	$ 1.349.380,00	$ 8.451.380,00	$ 1.420.400,00	$ 7.030.980,00	$ 249.022.646,00	887122 DE 06/08/2022	$ 38.619.307,00	$ 3.887.329.351,00		
2	OCTUBRE DE 2022	$ 4.602.000,00	$ 874.380,00	$ 5.476.380,00	$ 920.400,00	$ 4.555.980,00	$ 248.102.246,00	887122 DE 06/08/2022	$ 34.063.327,00	$ 3.881.852.971,00		
3	NOVEMBRE DE 2022	$ 13.298.000,00	$ 2.526.620,00	$ 15.824.620,00	$ 2.659.600,00	$ 13.165.020,00	$ 245.442.646,00	887122 DE 06/08/2022	$ 20.898.307,00	$ 3.866.028.351,00		
4	DICIEMBRE DE 2022	$ 20.975.000,00	$ 3.985.250,00	$ 24.960.250,00	$ 4.195.000,00	$ 20.765.250,00	$ 241.247.646,00	887122 DE 06/08/2022	$ 133.057,00	$ 3.841.068.101,00		
	TOTALES	$ 45.977.000,00	$ 8.735.630,00	$ 54.712.630,00	$ 9.195.400,00	$ 45.517.230,00	$ 241.247.646,00		$ 133.057,00	$ 3.841.068.101,00		

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 241.247.646,00		$ 1.520.000.000	$ 3.841.068.101		
5	ENERO DE 2023	$ 81.028.100,00	$ 15.395.339,00	$ 96.423.439,00	$ 16.205.620,00	$ 80.217.819,00	$ 225.042.026,00	144623 DE 14/02/2023	$ 1.439.782.181,00	$ 3.744.644.662,00		
6	FEBRERO DE 2023	$ 71.043.030,00	$ 13.498.175,70	$ 84.541.205,70	$ 14.208.606,00	$ 70.332.599,70	$ 210.833.420,00	144623 DE 14/02/2023	$ 1.369.449.581,30	$ 3.660.103.456,30		
7	MARZO DE 2023	$ 101.250.300,00	$ 19.237.557,00	$ 120.487.857,00	$ 20.250.060,00	$ 100.237.797,00	$ 190.583.360,00	144623/DE 14/02/2023	$ 1.269.211.784,30	$ 3.539.615.599,30		
8	ABRIL DE 2023	$ 99.118.540,00	$ 18.832.522,60	$ 117.951.062,60	$ 19.823.708,00	$ 98.127.354,60	$ 170.759.652,00	144623/DE 14/02/2023	$ 1.171.084.429,70	$ 3.421.664.536,70		
9	MAYO DE 2023	$ 109.625.940,00	$ 20.828.928,60	$ 130.454.868,60	$ 21.925.188,00	$ 108.529.680,60	$ 148.834.464,00	144623/DE 14/02/2023	$ 1.062.554.749,10	$ 3.291.209.668,10		Aprobada
10	JUNIO DE 2023	$ 105.321.840,00	$ 20.011.149,60	$ 125.332.989,60	$ 21.064.368,00	$ 104.268.621,60	$ 127.770.096,00	144623/DE 14/02/2023	$ 958.286.127,50	$ 3.165.876.678,50		
	TOTALES	$ 567.387.750,00	$ 107.803.672,50	$ 675.191.422,50	$ 113.477.550,00	$ 561.713.872,50	$ 148.834.464,00		$ 1.062.554.749,10	$ 3.291.209.668,10		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO VIGENCIA 2023

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = ©	$ 567.387.750,00		$ 567.387.750,00
*PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)	$ -		$ -
*SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = E	$ 567.387.750,00		$ 567.387.750,00
*IVA = 19% * (E) = (F)		$ 107.803.672,50	$ 107.803.672,50
VALOR TOTAL	**$ 567.387.750,00**	**107.803.672,50**	**$ 675.191.422,50**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: Iluminada castellar Arrieta
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV

Firma
Nombre: Fabián Ernesto Arjona Pineda
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202097750

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 973 DE 2022 — **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

MES INFORME MENSUAL: 11 — **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - LOTE 4.

CONTRATO DE OBRA No: 557 de 2022, 558 de 2022 y LP.006 2022 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN RAFAEL, CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUE, Y CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	887122	2402-0600-0012	11	Nación	contrato principal	$ 296.093.333	$ 36.639.307
2023	144623	2402-0600-0012	11	Nación	contrato principal	$ 1.520.000.000	
2024			11	Nación	contrato principal	$ 2.079.687.398	
			TOTAL			$ 3.895.780.731	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 3.895.780.731

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 250.443.046,00		$ 296.093.333	$ 3.895.780.731		
1	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 7.102.000,00	$ 1.349.380,00	$ 8.451.380,00	$ 1.420.400,00	$ 7.030.980,00	$ 249.022.646,00	887122 DE 06/08/2022	$ 38.619.307,00	$ 3.887.329.351,00		
2	OCTUBRE DE 2022	$ 4.602.000,00	$ 874.380,00	$ 5.476.380,00	$ 920.400,00	$ 4.555.980,00	$ 248.102.246,00	887122 DE 06/08/2022	$ 34.063.327,00	$ 3.881.852.971,00		
3	NOVIEMBRE DE 2022	$ 13.298.000,00	$ 2.526.620,00	$ 15.824.620,00	$ 2.659.600,00	$ 13.165.020,00	$ 245.442.646,00	887122 DE 06/08/2022	$ 20.898.307,00	$ 3.866.028.351,00		
4	DICIEMBRE DE 2022	$ 20.975.000,00	$ 3.985.250,00	$ 24.960.250,00	$ 4.195.000,00	$ 20.765.250,00	$ 241.247.646,00	887122 DE 06/08/2022	$ 133.057,00	$ 3.841.068.101,00		
	TOTALES	**$ 45.977.000,00**	**$ 8.735.630,00**	**$ 54.712.630,00**	**$ 9.195.400,00**	**$ 45.517.230,00**	**$ 241.247.646,00**		**$ 133.057,00**	**$ 3.841.068.101,00**		

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 241.247.646,00		$ 1.520.000.000	$ 3.841.068.101		
5	ENERO DE 2023	$ 81.028.100,00	$ 15.395.339,00	$ 96.423.439,00	$ 16.205.620,00	$ 80.217.819,00	$ 225.042.026,00	144623 DE 14/02/2023	$ 1.439.782.181,00	$ 3.744.644.662,00		
6	FEBRERO DE 2023	$ 71.043.030,00	$ 13.498.175,70	$ 84.541.205,70	$ 14.208.606,00	$ 70.332.599,70	$ 210.833.420,00	144623 DE 14/02/2023	$ 1.369.449.581,30	$ 3.660.103.456,30		
7	MARZO DE 2023	$ 101.250.300,00	$ 19.237.557,00	$ 120.487.857,00	$ 20.250.060,00	$ 100.237.797,00	$ 190.583.360,00	144623/DE 14/02/2023	$ 1.269.211.784,30	$ 3.539.615.599,30		
8	ABRIL DE 2023	$ 99.118.540,00	$ 18.832.522,60	$ 117.951.062,60	$ 19.823.708,00	$ 98.127.354,60	$ 170.759.652,00	144623/DE 14/02/2023	$ 1.171.084.429,70	$ 3.421.664.536,70		
9	MAYO DE 2023	$ 109.625.940,00	$ 20.828.928,60	$ 130.454.868,60	$ 21.925.188,00	$ 108.529.680,60	$ 148.834.464,00	144623/DE 14/02/2023	$ 1.062.554.749,10	$ 3.291.209.668,10		Aprobada
10	JUNIO DE 2023	$ 105.321.840,00	$ 20.011.149,60	$ 125.332.989,60	$ 21.064.368,00	$ 104.268.621,60	$ 127.770.096,00	144623/DE 14/02/2023	$ 1.066.815.808,10	$ 3.296.331.547,10		En revisión
11	JULIO DE 2023	$ 106.990.040,00	$ 20.328.107,60	$ 127.318.147,60	$ 21.398.008,00	$ 105.920.139,60	$ 106.372.088,00	144623/DE 14/02/2023	$ 956.634.609,50	$ 3.163.891.520,50		En revisión
	TOTALES	**$ 674.377.790,00**	**$ 128.131.780,10**	**$ 802.509.570,10**	**$ 134.875.558,00**	**$ 667.634.012,10**	**$ 106.372.088,00**		**$ 956.634.609,50**	**$ 3.163.891.520,50**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO VIGENCIA 2023

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = ©	$ 674.377.790,00		$ 674.377.790,00
*PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)	$		$ -
*SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = E	$ 674.377.790,00		$ 674.377.790,00
*IVA = 19% * (E) = (F)		$ 128.131.780,10	$ 128.131.780,10
VALOR TOTAL	**$ 674.377.790,00**	**128.131.780,10**	**$ 802.509.570,10**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: Armanda castellar Arrieta
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV

Firma
Nombre: Fabio Ernesto Arango Prieto
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1320503775D

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 973 DE 2022 — **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

MES INFORME MENSUAL: 12 — **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - LOTE 4.

CONTRATO DE OBRA No: 557 de 2022, 558 de 2022 y LP.006 2022 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN RAFAEL, CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUE, Y CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	887122	2402-0600-0012	11	Nación	contrato principal	$ 296.093.333	$ 36.639.307
2023	144623	2402-0600-0012	11	Nación	contrato principal	$ 1.520.000.000	
2024			11	Nación	contrato principal	$ 2.079.687.398	
				TOTAL		$ 3.895.780.731	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 3.895.780.731

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 250.443.046,00		**$ 296.093.333**	**$ 3.895.780.731**		
1	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 7.102.000,00	$ 1.349.380,00	$ 8.451.380,00	$ 1.420.400,00	$ 7.030.980,00	$ 249.022.646,00	887122 DE 06/08/2022	$ 38.619.307,00	$ 3.887.329.351,00		
2	OCTUBRE DE 2022	$ 4.602.000,00	$ 874.380,00	$ 5.476.380,00	$ 920.400,00	$ 4.555.980,00	$ 248.102.246,00	887122 DE 06/08/2022	$ 34.063.327,00	$ 3.881.852.971,00		
3	NOVEMBRE DE 2022	$ 13.298.000,00	$ 2.526.620,00	$ 15.824.620,00	$ 2.659.600,00	$ 13.165.020,00	$ 245.442.646,00	887122 DE 06/08/2022	$ 20.898.307,00	$ 3.866.028.351,00		
4	DICIEMBRE DE 2022	$ 20.975.000,00	$ 3.985.250,00	$ 24.960.250,00	$ 4.195.000,00	$ 20.765.250,00	$ 241.247.646,00	887122 DE 06/08/2022	$ 133.057,00	$ 3.841.068.101,00		
	TOTALES	**$ 45.977.000,00**	**$ 8.735.630,00**	**$ 54.712.630,00**	**$ 9.195.400,00**	**$ 45.517.230,00**	**$ 241.247.646,00**		**$ 133.057,00**	**$ 3.841.068.101,00**		

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 241.247.646,00		**$ 1.520.000.000**	**$ 3.841.068.101**		
5	ENERO DE 2023	$ 81.028.100,00	$ 15.395.339,00	$ 96.423.439,00	$ 16.205.620,00	$ 80.217.819,00	$ 225.042.026,00	144623 DE 14/02/2023	$ 1.439.782.181,00	$ 3.744.644.662,00		
6	FEBRERO DE 2023	$ 71.043.030,00	$ 13.498.175,70	$ 84.541.205,70	$ 14.208.606,00	$ 70.332.599,70	$ 210.833.420,00	144623 DE 14/02/2023	$ 1.369.449.581,30	$ 3.660.103.456,30		
7	MARZO DE 2023	$ 101.250.300,00	$ 19.237.557,00	$ 120.487.857,00	$ 20.250.060,00	$ 100.237.797,00	$ 190.583.360,00	144623/DE 14/02/2023	$ 1.269.211.784,30	$ 3.539.615.599,30		
8	ABRIL DE 2023	$ 99.118.540,00	$ 18.832.522,60	$ 117.951.062,60	$ 19.823.708,00	$ 98.127.354,60	$ 170.759.652,00	144623/DE 14/02/2023	$ 1.171.084.429,70	$ 3.421.664.536,70		
9	MAYO DE 2023	$ 109.625.940,00	$ 20.828.928,60	$ 130.454.868,60	$ 21.925.188,00	$ 108.529.680,60	$ 148.834.464,00	144623/DE 14/02/2023	$ 1.062.554.749,10	$ 3.291.209.668,10		Aprobada
10	JUNIO DE 2023	$ 105.321.840,00	$ 20.011.149,60	$ 125.332.989,60	$ 21.064.368,00	$ 104.268.621,60	$ 127.770.096,00	144623/DE 14/02/2023	$ 958.286.127,50	$ 3.165.876.678,50		En revisión
11	JULIO DE 2023	$ 106.990.040,00	$ 20.328.107,60	$ 127.318.147,60	$ 21.398.008,00	$ 105.920.139,60	$ 106.372.088,00	144623/DE 14/02/2023	$ 852.365.987,90	$ 3.038.558.530,90		En revisión
12	AGOSTO DE 2023	$ 109.854.270,00	$ 20.872.311,30	$ 130.726.581,30	$ 21.970.854,00	$ 108.755.727,30	$ 84.401.234,00	144623/DE 14/02/2023	$ 743.610.260,60	$ 2.907.831.949,60		Pendiente por enviar
	TOTALES	**$ 784.232.060,00**	**$ 149.004.091,40**	**$ 933.236.151,40**	**$ 156.846.412,00**	**$ 776.389.739,40**	**$ 84.401.234,00**		**$ 743.610.260,60**	**$ 2.907.831.949,60**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO VIGENCIA 2023

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = ©)	$ 784.232.060,00		$ 784.232.060,00
*PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)	$ -		$ -
*SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = E	$ 784.232.060,00		$ 784.232.060,00
*IVA = 19% * (E) = (F)		$ 149.004.091,40	$ 149.004.091,40
VALOR TOTAL	**$ 784.232.060,00**	**149.004.091,40**	**$ 933.236.151,40**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: Ruth Yolanda castellar Arrieta
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1320213007 4BLV

Firma
Nombre: Fabian Ernesto Arango Powell
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1320209750

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/10/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 973 DE 2022 — **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

MES INFORME MENSUAL: 13 — **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - LOTE 4.

CONTRATO DE OBRA No: 557 de 2022, 558 de 2022 y LP.006 2022 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN RAFAEL, CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUE Y CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	887122	2402-0600-0012	11	Nación	contrato principal	$ 296.093.333	$ 36.639.307
2023	144623	2402-0600-0012	11	Nación	contrato principal	$ 1.520.000.000	
2024			11	Nación	contrato principal	$ 2.079.687.398	
			TOTAL			$ 3.895.780.731	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 3.895.780.731

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 250.443.046,00		$ 296.093.333	$ 3.895.780.731		
1	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 7.102.000,00	$ 1.349.380,00	$ 8.451.380,00	$ 1.420.400,00	$ 7.030.980,00	$ 249.022.646,00	887122 DE 06/08/2022	$ 38.619.307,00	$ 3.887.329.351,00		
2	OCTUBRE DE 2022	$ 4.602.000,00	$ 874.380,00	$ 5.476.380,00	$ 920.400,00	$ 4.555.980,00	$ 248.102.246,00	887122 DE 06/08/2022	$ 34.063.327,00	$ 3.881.852.971,00		
3	NOVEMBRE DE 2022	$ 13.298.000,00	$ 2.526.620,00	$ 15.824.620,00	$ 2.659.600,00	$ 13.165.020,00	$ 245.442.646,00	887122 DE 06/08/2022	$ 20.898.307,00	$ 3.866.028.351,00		
4	DICIEMBRE DE 2022	$ 20.975.000,00	$ 3.985.250,00	$ 24.960.250,00	$ 4.195.000,00	$ 20.765.250,00	$ 241.247.646,00	887122 DE 06/08/2022	$ 133.057,00	$ 3.841.068.101,00		
	TOTALES	$ 45.977.000,00	$ 8.735.630,00	$ 54.712.630,00	$ 9.195.400,00	$ 45.517.230,00	$ 241.247.646,00		$ 133.057,00	$ 3.841.068.101,00		

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 645.557.664,00		$ 1.520.000.000	$ 3.841.068.101		
5	ENERO DE 2023	$ 81.028.100,00	$ 15.395.339,00	$ 96.423.439,00	$ 16.205.620,00	$ 80.217.819,00	$ 629.352.044,00	144623 DE 14/02/2023	$ 1.439.782.181,00	$ 3.744.644.662,00		
6	FEBRERO DE 2023	$ 71.043.030,00	$ 13.498.175,70	$ 84.541.205,70	$ 14.208.606,00	$ 70.332.599,70	$ 615.143.438,00	144623 DE 14/02/2023	$ 1.369.449.581,30	$ 3.660.103.456,30		
7	MARZO DE 2023	$ 101.250.300,00	$ 19.237.557,00	$ 120.487.857,00	$ 20.250.060,00	$ 100.237.797,00	$ 594.893.378,00	144623/DE 14/02/2023	$ 1.269.211.784,30	$ 3.539.615.599,30		
8	ABRIL DE 2023	$ 99.118.540,00	$ 18.832.522,60	$ 117.951.062,60	$ 19.823.708,00	$ 98.127.354,60	$ 575.069.670,00	144623/DE 14/02/2023	$ 1.171.084.429,70	$ 3.421.664.536,70		
9	MAYO DE 2023	$ 109.625.940,00	$ 20.828.928,60	$ 130.454.868,60	$ 21.925.188,00	$ 108.529.680,60	$ 553.144.482,00	144623/DE 14/02/2023	$ 1.062.554.749,10	$ 3.291.209.668,10		
10	JUNIO DE 2023	$ 105.321.840,00	$ 20.011.149,60	$ 125.332.989,60	$ 21.064.368,00	$ 104.268.621,60	$ 532.080.114,00	144623/DE 14/02/2023	$ 958.286.127,50	$ 3.165.876.678,50		
11	JULIO DE 2023	$ 106.990.040,00	$ 20.328.107,60	$ 127.318.147,60	$ 21.398.008,00	$ 105.920.139,60	$ 510.682.106,00	144623/DE 14/02/2023	$ 852.365.987,90	$ 3.038.558.530,90		
12	AGOSTO DE 2023	$ 109.854.270,00	$ 20.872.311,30	$ 130.726.581,30	$ 21.970.854,00	$ 108.755.727,30	$ 488.711.252,00	144623/DE 14/02/2023	$ 743.610.260,60	$ 2.907.831.949,60		En revisión
13	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 98.822.330,00	$ 18.776.242,70	$ 117.598.572,70	$ 19.764.466,00	$ 97.834.106,70	$ 468.946.786,00	144623/DE 14/02/2023	$ 645.776.153,90	$ 2.790.233.376,90		En revisión
	TOTALES	$ 883.054.390,00	$ 167.780.334,10	$ 1.050.834.724,10	$ 176.610.878,00	$ 874.223.846,10	$ 468.946.786,00		$ 645.776.153,90	$ 2.790.233.376,90		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO VIGENCIA 2023

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = ©	$ 883.054.390,00		$ 883.054.390,00
*PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)	$		$
*SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = E	$ 883.054.390,00		$ 883.054.390,00
IVA = 19% * (E) = (F)		$ 167.780.334,10	$ 167.780.334,10
VALOR TOTAL	**$ 883.054.390,00**	**167.780.334,10**	**$ 1.050.834.724,10**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año

Firma
Nombre: Iluminada Castellar Arrieta
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1320213007-BLV

Firma
Nombre: Fabián Ernesto Arango Pineda
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1320209775D

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 973 DE 2022 — **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

MES INFORME MENSUAL: 14 — **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - LOTE 4.

CONTRATO DE OBRA No: 557 de 2022, 558 de 2022 y LP.006 2022 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN RAFAEL, CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUE, Y CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	887122	2402-0600-0012	11	Nación	contrato principal	$ 296.093.333	$ 36.639.307
2023	144623	2402-0600-0012	11	Nación	contrato principal	$ 1.520.000.000	
2024			11	Nación	contrato principal	$ 2.079.687.398	
				TOTAL		$ 3.895.780.731	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 3.895.780.731

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 250.443.046,00		$ 296.093.333	$ 3.895.780.731		
1	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 7.102.000,00	$ 1.349.380,00	$ 8.451.380,00	$ 1.420.400,00	$ 7.030.980,00	$ 249.022.646,00	887122 DE 06/08/2022	$ 38.619.307,00	$ 3.887.329.351,00		
2	OCTUBRE DE 2022	$ 4.602.000,00	$ 874.380,00	$ 5.476.380,00	$ 920.400,00	$ 4.555.980,00	$ 248.102.246,00	887122 DE 06/08/2022	$ 34.063.327,00	$ 3.881.852.971,00		
3	NOVEMBRE DE 2022	$ 13.298.000,00	$ 2.526.620,00	$ 15.824.620,00	$ 2.659.600,00	$ 13.165.020,00	$ 245.442.646,00	887122 DE 06/08/2022	$ 20.898.307,00	$ 3.866.028.351,00		
4	DICIEMBRE DE 2022	$ 20.975.000,00	$ 3.985.250,00	$ 24.960.250,00	$ 4.195.000,00	$ 20.765.250,00	$ 241.247.646,00	887122 DE 06/08/2022	$ 133.057,00	$ 3.841.068.101,00		
	TOTALES	$ 45.977.000,00	$ 8.735.630,00	$ 54.712.630,00	$ 9.195.400,00	$ 45.517.230,00	$ 241.247.646,00		$ 133.057,00	$ 3.841.068.101,00		

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 645.557.664,00		$ 1.520.000.000	$ 3.841.068.101		
									$ 1.115.689.982,00			
5	ENERO DE 2023	$ 81.028.100,00	$ 15.395.339,00	$ 96.423.439,00	$ 16.205.620,00	$ 80.217.819,00	$ 629.352.044,00	144623 DE 14/02/2023	$ 1.035.472.163,00	$ 3.744.644.662,00		
6	FEBRERO DE 2023	$ 71.043.030,00	$ 13.498.175,70	$ 84.541.205,70	$ 14.208.606,00	$ 70.332.599,70	$ 615.143.438,00	144623 DE 14/02/2023	$ 965.139.563,30	$ 3.660.103.456,30		
7	MARZO DE 2023	$ 101.250.300,00	$ 19.237.557,00	$ 120.487.857,00	$ 20.250.060,00	$ 100.237.797,00	$ 594.893.378,00	144623 DE 14/02/2023	$ 864.901.766,30	$ 3.539.615.599,30		
8	ABRIL DE 2023	$ 99.118.540,00	$ 18.832.522,60	$ 117.951.062,60	$ 19.823.708,00	$ 98.127.354,60	$ 575.069.670,00	144623/DE 14/02/2023	$ 766.774.411,70	$ 3.421.664.536,70		
9	MAYO DE 2023	$ 109.625.940,00	$ 20.828.928,60	$ 130.454.868,60	$ 21.925.188,00	$ 108.529.680,60	$ 553.144.482,00	144623/DE 14/02/2023	$ 658.244.731,10	$ 3.291.209.668,10		
10	JUNIO DE 2023	$ 105.321.840,00	$ 20.011.149,60	$ 125.332.989,60	$ 21.064.368,00	$ 104.268.621,60	$ 532.080.114,00	144623/DE 14/02/2023	$ 553.976.109,50	$ 3.165.876.678,50		
11	JULIO DE 2023	$ 106.990.040,00	$ 20.328.107,60	$ 127.318.147,60	$ 21.398.008,00	$ 105.920.139,60	$ 510.682.106,00	144623/DE 14/02/2023	$ 448.055.969,90	$ 3.038.558.530,90		
12	AGOSTO DE 2023	$ 109.854.270,00	$ 20.872.311,30	$ 130.726.581,30	$ 21.970.854,00	$ 108.755.727,30	$ 488.711.252,00	144623/DE 14/02/2023	$ 339.300.242,60	$ 2.907.831.949,60		
13	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 98.822.330,00	$ 18.776.242,70	$ 117.598.572,70	$ 19.764.466,00	$ 97.834.106,70	$ 468.946.786,00	144623/DE 14/02/2023	$ 241.466.135,90	$ 2.790.233.376,90		
14	OCTUBRE DE 2023	$ 96.545.930,00	$ 18.343.726,70	$ 114.889.656,70	$ 19.309.186,00	$ 95.580.470,70	$ 449.637.600,00	144623/DE 14/02/2023	$ 145.885.665,20	$ 2.675.343.720,20		
	TOTALES	$ 979.600.320,00	$ 186.124.060,80	$ 1.165.724.380,80	$ 195.920.064,00	$ 969.804.316,80	$ 449.637.600,00		$ 145.885.665,20	$ 2.790.233.376,90		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO VIGENCIA 2023

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = ©	$ 979.600.320,00		$ 979.600.320,00
*PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)	$ -		$ -
*SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = E	$ 979.600.320,00		$ 979.600.320,00
*IVA = 19% * (E) = (F)		$ 186.124.060,80	$ 186.124.060,80
VALOR TOTAL	**$ 979.600.320,00**	**186.124.060,80**	**$ 1.165.724.380,80**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma:
Nombre: Aminadab Castellar Arrieta
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV

Firma:
Nombre: Fabian Ernesto Arango Pinzon
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1320209750

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	4/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 973 DE 2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

MES INFORME MENSUAL: 15 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - LOTE 4.

CONTRATO DE OBRA No: 557 de 2022, 558 de 2022 y LP.006 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN RAFAEL, CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUE, Y CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	887122	2402-0600-0012	11	Nación	contrato principal	$ 296.093.333	$ 36.639.307
2023		2402-0600-0012	11	Nación	contrato principal	$ 1.520.000.000	
2024			11	Nación	contrato principal	$ 2.079.687.398	
			TOTAL			$ 3.895.780.731	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 3.895.780.731

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 250.443.046,00		$ 296.093.333	$ 3.895.780.731		
1	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 7.102.000,00	$ 1.349.380,00	$ 8.451.380,00	$ 1.420.400,00	$ 7.030.980,00	$ 249.022.646,00	887122 DE 06/08/2022	$ 38.619.307,00	$ 3.887.329.351,00		
2	OCTUBRE DE 2022	$ 4.602.000,00	$ 874.380,00	$ 5.476.380,00	$ 920.400,00	$ 4.555.980,00	$ 248.102.246,00	887122 DE 06/08/2022	$ 34.063.327,00	$ 3.881.852.971,00		
3	NOVEMBRE DE 2022	$ 13.298.000,00	$ 2.526.620,00	$ 15.824.620,00	$ 2.659.600,00	$ 13.165.020,00	$ 245.442.646,00	887122 DE 06/08/2022	$ 20.898.307,00	$ 3.866.028.351,00		
4	DICIEMBRE DE 2022	$ 20.975.000,00	$ 3.985.250,00	$ 24.960.250,00	$ 4.195.000,00	$ 20.765.250,00	$ 241.247.646,00	887122 DE 06/08/2022	$ 133.057,00	$ 3.841.068.101,00		
	TOTALES	$ 45.977.000,00	$ 8.735.630,00	$ 54.712.630,00	$ 9.195.400,00	$ 45.517.230,00	$ 241.247.646,00		$ 133.057,00	$ 3.841.068.101,00		

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 645.557.664,00		$ 1.520.000.000	$ 3.841.068.101		
									$ 1.115.689.982,00			
5	ENERO DE 2023	$ 81.028.100,00	$ 15.395.339,00	$ 96.423.439,00	$ 16.205.620,00	$ 80.217.819,00	$ 629.352.044,00	144623 DE 14/02/2023	$ 1.035.472.163,00	$ 3.744.644.662,00		
6	FEBRERO DE 2023	$ 71.043.030,00	$ 13.498.175,70	$ 84.541.205,70	$ 14.208.606,00	$ 70.332.599,70	$ 615.143.438,00	144623 DE 14/02/2023	$ 965.139.563,30	$ 3.660.103.456,30		
7	MARZO DE 2023	$ 101.250.300,00	$ 19.237.557,00	$ 120.487.857,00	$ 20.250.060,00	$ 100.237.797,00	$ 594.893.378,00	144623/DE 14/02/2023	$ 864.901.766,30	$ 3.539.615.599,30		
8	ABRIL DE 2023	$ 99.118.540,00	$ 18.832.522,60	$ 117.951.062,60	$ 19.823.708,00	$ 98.127.354,60	$ 575.069.670,00	144623/DE 14/02/2023	$ 766.774.411,70	$ 3.421.664.536,70		
9	MAYO DE 2023	$ 109.625.940,00	$ 20.828.928,60	$ 130.454.868,60	$ 21.925.188,00	$ 108.529.680,60	$ 553.144.482,00	144623/DE 14/02/2023	$ 658.244.731,10	$ 3.291.209.668,10		
10	JUNIO DE 2023	$ 105.321.840,00	$ 20.011.149,60	$ 125.332.989,60	$ 21.064.368,00	$ 104.268.621,60	$ 532.080.114,00	144623/DE 14/02/2023	$ 553.976.109,50	$ 3.165.876.678,50		
11	JULIO DE 2023	$ 106.990.040,00	$ 20.328.107,60	$ 127.318.147,60	$ 21.398.008,00	$ 105.920.139,60	$ 510.682.106,00	144623/DE 14/02/2023	$ 448.055.969,90	$ 3.038.558.530,90		
12	AGOSTO DE 2023	$ 109.854.270,00	$ 20.872.311,30	$ 130.726.581,30	$ 21.970.854,00	$ 108.755.727,30	$ 488.711.252,00	144623/DE 14/02/2023	$ 339.300.242,60	$ 2.907.831.949,60		
13	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 98.822.330,00	$ 18.776.242,70	$ 117.598.572,70	$ 19.764.466,00	$ 97.834.106,70	$ 468.946.786,00	144623/DE 14/02/2023	$ 241.466.135,90	$ 2.790.233.376,90		
14	OCTUBRE DE 2023	$ 96.545.930,00	$ 18.343.726,70	$ 114.889.656,70	$ 19.309.186,00	$ 95.580.470,70	$ 449.637.600,00	144623/DE 14/02/2023	$ 145.885.665,20	$ 2.792.942.292,90		
15	NOVIEMBRE DE 2023	$ 88.935.800,00	$ 16.897.802,00	$ 105.833.602,00	$ 17.787.160,00	$ 88.046.442,00	$ 431.850.440,00	144623/DE 14/02/2023	$ 57.839.223,20	$ 2.684.399.774,90		
	TOTALES	$ 1.068.536.120,00	$ 203.021.862,80	$ 1.271.557.982,80	$ 213.707.224,00	$ 1.057.850.758,80	$ 431.850.440,00		$ 57.839.223,20	$ 2.790.233.376,90		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO VIGENCIA 2023

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = ©	$ 1.068.536.120,00		$ 1.068.536.120,00
*PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)	$ -		$ -
*SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = E	$ 1.068.536.120,00		$ 1.068.536.120,00
*IVA = 19% * (E) = (F)		$ 203.021.862,80	$ 203.021.862,80
VALOR TOTAL	**$ 1.068.536.120,00**	**203.021.862,80**	**$ 1.271.557.982,80**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: Luminarda Castellar Arrieta
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV

Firma
Nombre: Fabián Ernesto Arango Pineda
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1320209775O

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 973-2022 **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 4.

FECHA DE INICIO: 1/09/2022

PLAZO INICIAL: 31 DE JULIO 2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 3.895.780.731

VALOR ACUMULADO: $ 3.895.780.731 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING FABIAN ARANGO PINEDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	389,578,074.00	11	5	2022	31	1	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	779,156,147.00	11	5	2022	31	1	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	779,156,147.00	11	5	2022	31	7	2027
Calidad del servicio	30%	1,168,734,220.00	11	5	2022	11	5	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 15-44-101262225

Certificado de modificación o anexo No.: 0

Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 25/05/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	389,578,074.00	11	5	2022	31	1	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	779,156,147.00	11	5	2022	31	1	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	779,156,147.00	11	5	2022	31	7	2027
Calidad del servicio	30%	1,168,734,220.00	11	5	2022	11	5	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 15-44-101262225

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 27/10/2022

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: LUMINADA CASTELAR ARRIETA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV

Firma
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202097750

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 973 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS CUMINCIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - LOTE 4.

INTERVENT GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S

FECHA DE INICIO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 6 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: L.P.006 DE 2022 (Indicar número y año)

CONTRATI CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTA SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ VERSIÓN No. 0 FECHA DE VERSIÓN: **1/06/2022**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTA SI ____ NO X
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA SI ____ NO X
No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS:
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS:
FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTAD SI ____ NO X APROBADO: SI ____ NO X FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes:
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0
No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:
No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: Iluminada Castellar Arrieta
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV

Firma
Nombre:Iluminada Castellar Arrieta
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:13202130074BLV

Firma
Nombre:Fabian Ernesto Arango Pineda
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:13202097750

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 973 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 4.

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

FECHA DE INICIO: 24 DE OCTUBRE DE 2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 26 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 24 DE DICIEMBRE DE 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 557 DE 2022 (Indicar número y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN RAFAEL

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ VERSIÓN No. 0 FECHA DE VERSIÓN: **1/06/2022**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO X
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO X
No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____
FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____
FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ____ NO X APROBADO: SI ____ NO X FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO X

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 1
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 1
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 1
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: ____
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: -

OBSERVACIONES:
La comunidad de la Pascuala manifiesta inconformidades, puesto que la cobertura del proyecto no contempla la llegada hasta el corregimiento

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: ____
No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: ____
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: ____
No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: ____
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: ____
No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: ____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: Iluminada Castellar Arrieta
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.:13202130074BLV

Firma
Nombre:Iluminada Castellar Arrieta
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:13202130074BLV

Firma
Nombre:Fabian Ernesto Arango Pineda
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:13202097750

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 973 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 4.

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

FECHA DE INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 15 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30 DE JULIO DE 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 558 DE 2022 (Indicar número y año)

CONTRATISTA: COSORCIO MEGAVIA MAGANGUÉ

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ VERSIÓN No. 0 FECHA DE VERSIÓN: 1/06/2022

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO X
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO X
No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS:
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS:
FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ____ NO X APROBADO: SI ____ NO X FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO X

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes:
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:
No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:
No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:
No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: Iluminada Castellar Arrieta
Director de la Interventoría:
Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV

Firma
Nombre: Iluminada Castellar Arrieta
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202130074BLV

Firma
Nombre: Fabian Ernesto Arango Pineda
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202097750

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

6.6. Otros documentos seguimiento mensual

6.6.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-1
		VERSIÓN	1 de 1
		PÁGINA	1

FECHA: 16/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

DATOS GENERALES

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 973 DE 2022 (Indicar numero y año) **INTERVENTOR:** GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 4.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARMEN CECILIA PÉREZ LÓPEZ

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO


ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	PERSONAL PROFESIONAL	$ 10.000.000,00	$ 27.140.000,00	$ 33.223.046,00	$ 70.363.046,00	28%
2	MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS	$ 31.580.000,00	$ 50.000.000,00	$ 60.000.000,00	$ 141.580.000,00	57%
3	VIATICOS	$ 1.500.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 7.500.000,00	3%
3	COSTOS DE ALQUILER Y EQUIPO DE OFICINA	$ 5.500.000,00	$ 7.000.000,00	$ 10.500.000,00	$ 23.000.000,00	9%
4	OTROS COSTOS	$ 2.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 8.000.000,00	3%
	TOTAL	**$ 50.580.000,00**	**$ 90.140.000,00**	**$ 109.723.046,00**	**$ 250.443.046,00**	**100%**

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. **No aplica para compra ni alquiler de vehículos.**
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.
4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
Nombre: LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: N.A.

Firma: CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ (Firmado digitalmente por CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ Fecha: 2022.12.06 15:45:46 -05'00')
Nombre: CARMEN CECILIA PÉREZ LÓPEZ
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202188727 BLV

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

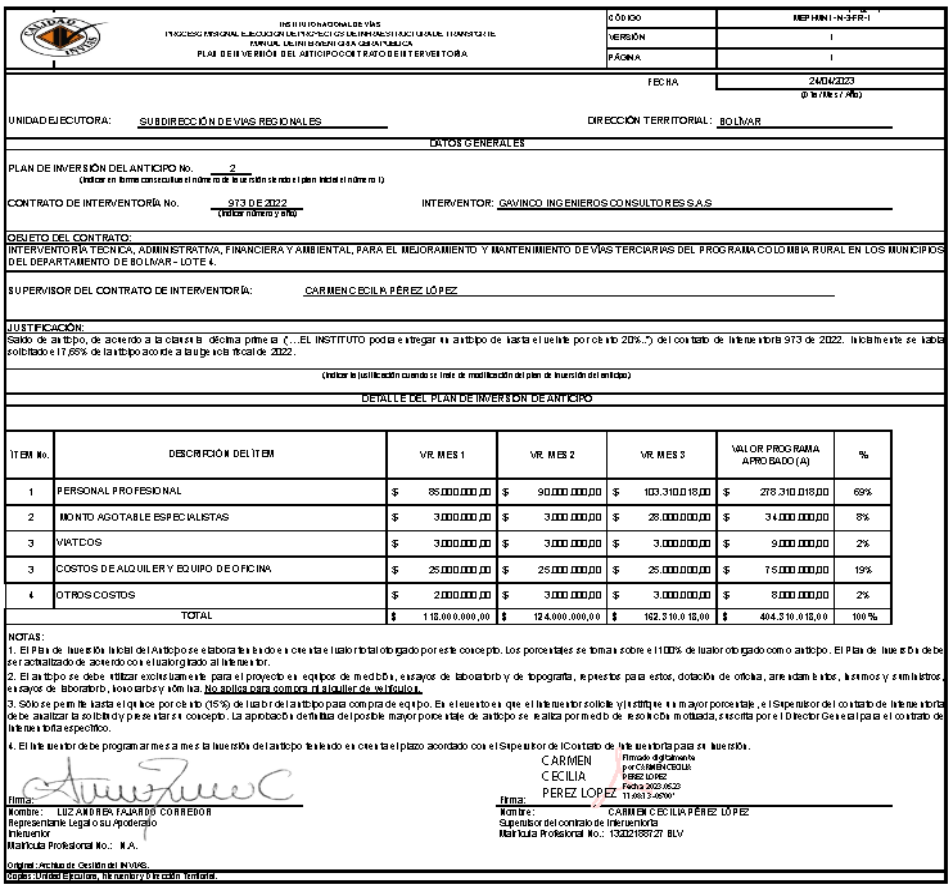

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEP-MIN-I-N-3-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1
FECHA	24/04/2023 (D Te/Mes/Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR

DATOS GENERALES

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 2
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan inicial el número 1)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 973 DE 2022
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 4.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARMEN CECILIA PÉREZ LÓPEZ

JUSTIFICACIÓN:
Saldo de anticipo, de acuerdo a la cláusula décima primera (...EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta el cuarenta por ciento 20%...) del contrato de interventoría 973 de 2022. Inicialmente se había solicitado el 17,65% de la anticipo acorde a la vigencia fiscal de 2022.

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	PERSONAL PROFESIONAL	$ 85.000.000,00	$ 90.000.000,00	$ 103.310.018,00	$ 278.310.018,00	69%
2	MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 28.000.000,00	$ 34.000.000,00	8%
3	VIATICOS	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 9.000.000,00	2%
3	COSTOS DE ALQUILER Y EQUIPO DE OFICINA	$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00	$ 75.000.000,00	19%
4	OTROS COSTOS	$ 2.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 8.000.000,00	2%
	TOTAL	$ 118.000.000,00	$ 124.000.000,00	$ 162.310.018,00	$ 404.310.018,00	100%


NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elaborará teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se tomarán sobre el 100% de valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al interventor.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y semejantes, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. No aplica para compra o alquiler de vehículos.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) de valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.
4. El interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de interventoría para su inversión.

Firma:
Nombre: LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: N.A.

Firma:
Nombre: CARMEN CECILIA PÉREZ LÓPEZ
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13002136727 BLV

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventoría y Dirección Territorial.

6.6.2. Plan de carga o reprogramación al Plan de Cargas.

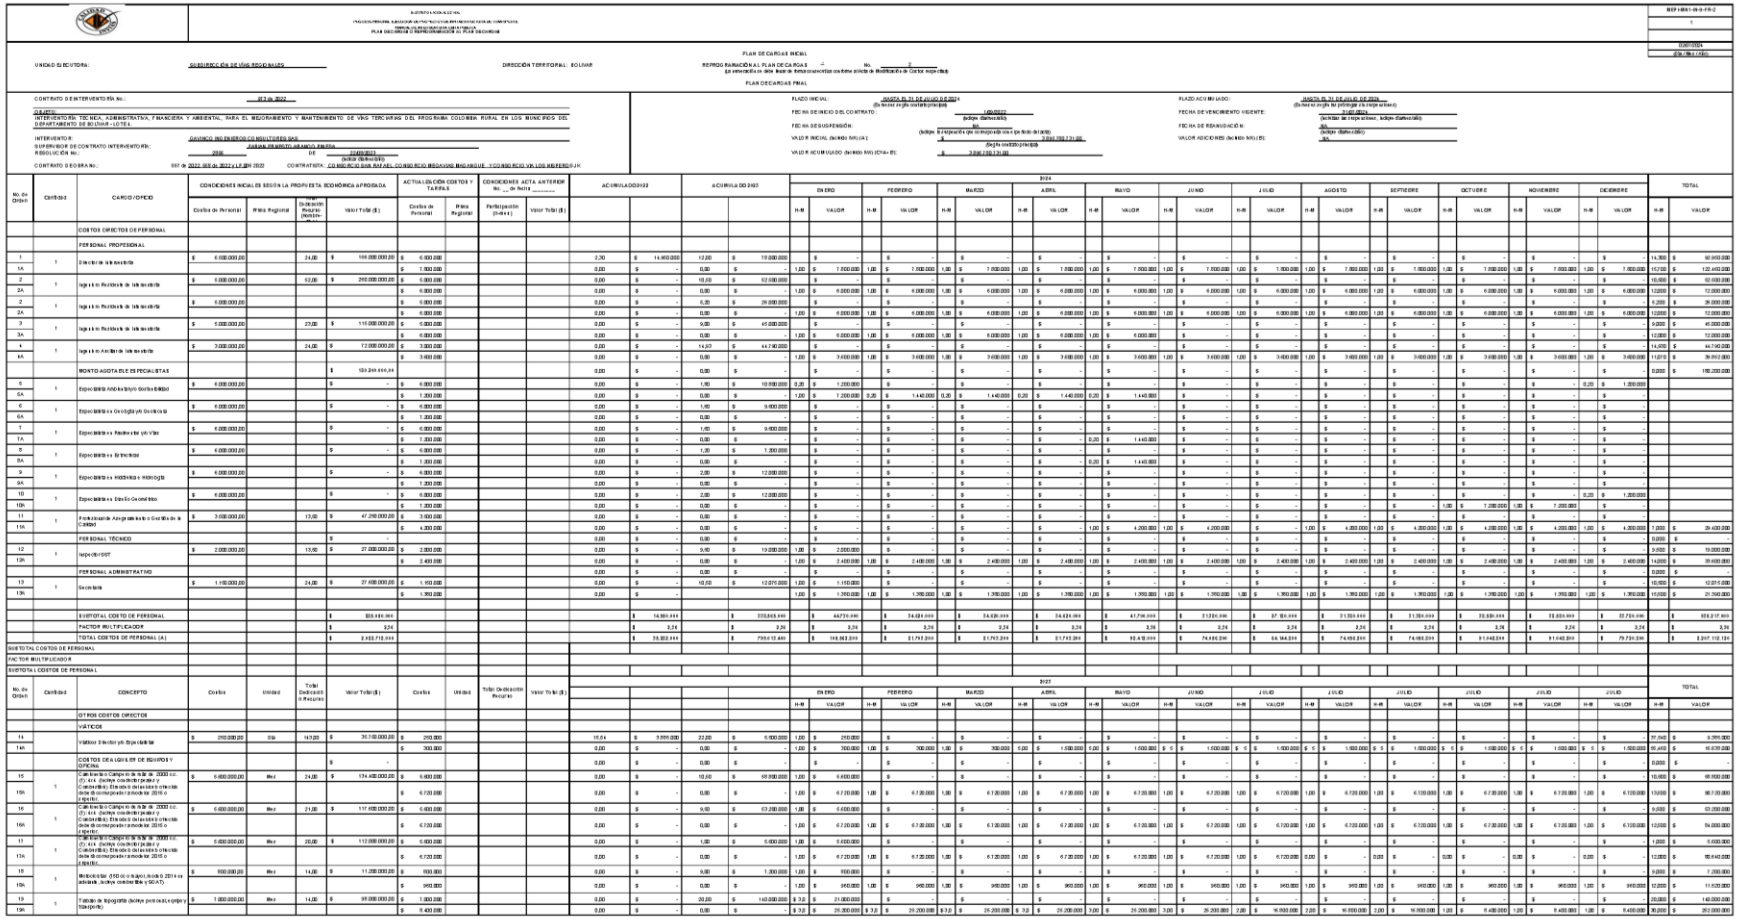

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Para el presente periodo, comprendido **del 01 al 31 de julio de 2024**, la Interventoría, Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S a cargo de los contratos de obra No, L.P.006 de 2022, No.557 de 2022 y No. 558 de 2022, ha realizado actividades para dar cumplimiento de objetivos y la correcta ejecución de cada contrato.

En concordancia con lo anterior, para el contrato 557, se ha hecho adiciones y modificaciones a los contratos debido a la aparición de ítems no previstos durante la ejecución de las actividades. Este ajuste presupuestario se realizó con el fin de darle continuidad a los proyectos sin comprometer su calidad ni su cronograma. Estas adiciones se gestionarán de manera eficiente y transparente, con una comunicación clara entre las partes interesadas y una supervisión rigurosa por parte de la interventoría. En cuanto al contrato 558, se dio la terminación del contrato el 30 de julio de 2024.

Durante el periodo, la interventoría ha realizado inspección periódica de la calidad de las actividades ejecutadas por el contratista, inspecciones SST, control topográfico, implementado medidas de control, emitido recomendaciones y observaciones mediante la realización periódica de comité de obra, en los cuales se han discutido temas de avances e inconvenientes presentados en obra; es decir la comunicación entre contratista e interventoría ha sido efectiva, lo que ha contribuido al logro de los resultados esperados.

En lo que refiere al contrato de obra No.L.P.006 de 2022, luego de la suspensión del contrato el 24 de noviembre de 2023, se dio fecha de reinicio el 24 de noviembre de 2023 y se han realizado 6 prorrogas hasta la fecha, para una fecha de terminación del contrato de 29 de septiembre de 2024. Estas prórrogas se han orientado hacia la culminación y puesta en funcionamiento efectivo de la obra, con un compromiso claro hacia la comunidad afectada.

Finalmente, tras la realización del presente Informe se manifiesta que, se ha dado cumplimiento oportuno a las obligaciones adquiridas en el Contrato de Interventoría No. 973 de 2022, se ha observado un aumento en los rendimientos de obra durante el período evaluado y se recomienda a los Contratistas asistir a los comités convocados semanalmente y atender oportunamente los comunicados enviados y dar respuesta a cada uno de ellos, para dar cumplimiento a las fechas establecidas en la programación y por consiguiente la fecha de finalización estipulada en los contratos de obra.

8. ANEXOS

8.1. Relación de correspondencia generada entre el contratista e interventor

CONTRATO L.P.006 DE 2022

CORRESPONDENCIA GENERADA CONTATISTA E INTERVENTOR - CONTRATO DE OBRA L.P.006 DE 2022				
No.	**CONSECUTIVO**	**FECHA DE REMISIÓN**	**ASUNTO**	**ESTADO**
1	GIC-INVIAS-BOL-565-22	05-jul-24	RESPUESTA A COMUNICACIÓN: “ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA”	ENVIADO

Tabla 20. Correspondencia generada entre contratista e interventor contrato L.P.006 de 2022.

CONTRATO 557 DE 2022

CORRESPONDENCIA GENERADA CONTATISTA E INTERVENTOR - CONTRATO DE OBRA 557 DE 2022				
No.	**CONSECUTIVO**	**FECHA DE REMISIÓN**	**ASUNTO**	**ESTADO**
1	GIC-INVIAS-BOL-572-22	05-jul-24	RESPUESTA A COMUNICACIÓN CSR-557-060 – ENTREGA DE AJUSTES PAGA	ENVIADO

Tabla 21. Correspondencia generada entre contratista e interventor contrato 557 de 2022

CONTRATO 558 DE 2022

CORRESPONDENCIA GENERADA CONTRATISTA E INTERVENTOR - CONTRATO DE OBRA 558 DE 2022				
No.	**CONSECUTIVO**	**FECHA DE REMISIÓN**	**ASUNTO**	**ESTADO**
1	GIC-INVIAS-BOL-546-22	14-jun-24	RESPUESTA A COMUNICADO CMM-558-064 – SOLICITUD DE PRORROGA N°3	ENVIADO

Tabla 22. Correspondencia generada entre contratista e interventor contrato 558 de 2022.

8.2. Registro fotográfico del avance de las obras

Contrato No. L.P.006 de 2022



Contrato No. 557 de 2022



Contrato No. 558 de 2022



8.3. Registro fotográfico de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.










8.4. Copia de la Bitacora del mes correspondiente

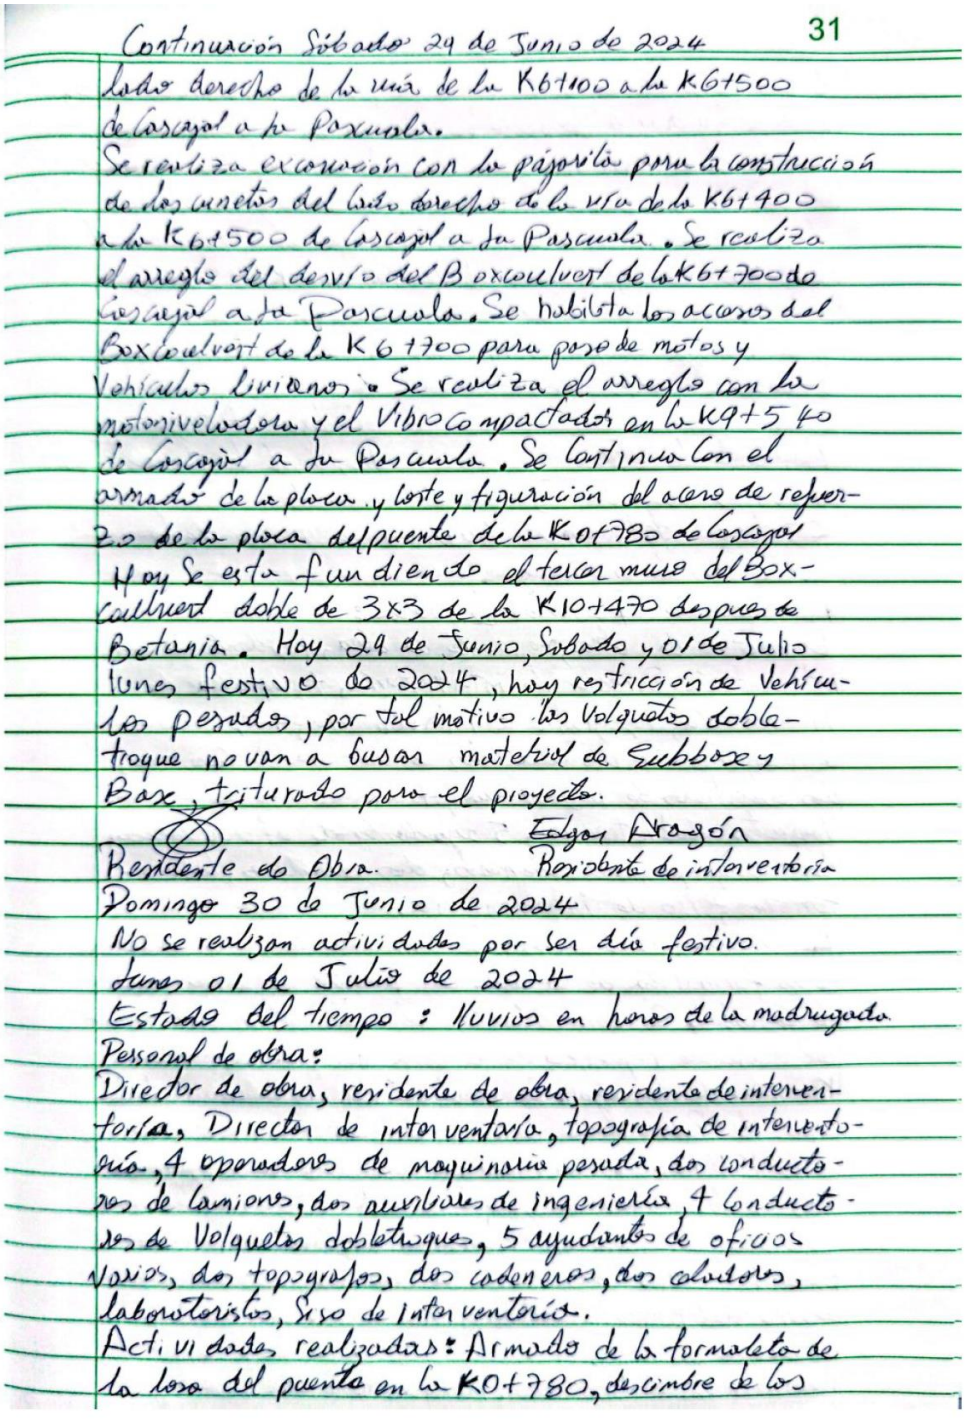

Continuación Sábado 29 de Junio de 2024 31

Lado derecho de la vía de la K61+100 a la K61+500 de Cascajal a la Pascuala.

Se realiza excavación con la pajarita para la construcción de dos cunetas del lado derecho de la vía de la K61+400 a la K61+500 de Cascajal a la Pascuala. Se realiza el arreglo del desvío del Box culvert de la K61+700 de Cascajal a la Pascuala. Se habilita los accesos del Box culvert de la K61+700 para paso de motos y vehículos livianos. Se realiza el arreglo con la motoniveladora y el Vibrocompactador en la K9+540 de Cascajal a la Pascuala. Se continua con el armado de la placa y loza y figuración del acero de refuerzo de la placa del puente de la K0+780 de Cascajal Hoy se esta fundiendo el tercer muro del Box-culvert doble de 3x3 de la K10+470 despues de Betania. Hoy 29 de Junio, Sabado y 01 de Julio lunes festivo de 2024, hay restricción de vehículos pesados, por tal motivo los Volquetas doble-troque no van a buscar material de Subbase y Base, triturado para el proyecto.

Edgar Aragón
Residente de Obra. Residente de interventoría

Domingo 30 de Junio de 2024

No se realizan actividades por ser día festivo.

Lunes 01 de Julio de 2024

Estado del tiempo: Lluvias en horas de la madrugada.

Personal de obra:

Director de obra, residente de obra, residente de interventoría, Director de interventoría, topografía de interventoría, 4 operadores de maquinaria pesada, dos conductores de camiones, dos auxiliares de ingeniería, 4 conductores de Volquetas doble troques, 5 ayudantes de oficios varios, dos topografos, dos cadeneros, dos celadores, laboratoristas, Siso de interventoría.

Actividades realizadas: Armado de la formaleta de la loza del puente en la K0+780, descimbre de los

Powered by CamScanner

32 Continuación Jueves 01 de Julio de 2024

de los formaletas de los vigas del puente en el K0+780, Corte y figurado del acero de refuerzo de la placa del puente en el K0+780, Construcción de cunetas, arreglo del desvío del Boxcoulvert en el K6+700, habilitado el acceso de motos y vehiculos livianos en el Boxcoulvert en el K6+700, Arreglos de la vía en el K9+540, fundida de los muros del Boxcoulvert en el K10+470 y se realiza acopio e instalación de material de Subase y Base granular clase "E".

Residente de obra — Residente de interventoría. Edgar Aragón

Martes 02 de Julio de 2024

Estado del tiempo: Lluvias en horas de la noche. y en la madrugada.

Actividades Personal de obra:

Director de obra, residente de obra, residente de interventoría, Director de interventoría, topografía de interventoría, topografía de interventoría, 4 operadores de maquinaria pesada, dos conductores de camiones, dos auxiliares de ingeniería, 4 conductores de Volquetas dobletroques, 5 ayudantes de oficios varios, dos topografos, dos cadeneros, dos celadores, laboratoristas, SISO de interventoría.

Actividades realizadas: Se continúa con el armado de la formaleta de la losa del puente de la K0+780 de Cascajal. Se continúa con el corte y figuración del acero de refuerzo de la losa del puente de la K0+780 de Cascajal. Se realizó la instalación de la capa de Base de la entrada de Cebal del K6+100 a la K5+620. Se realiza descimbre de los formaletas de los vigas del puente en el K0+780, Corte y figurado del acero de refuerzo de la placa del puente en el K0+780. Construcción de cunetas, arreglo del desvío del Boxcoulvert en el K6+700. Se habilita el acceso de motos y vehículos livianos en el Box-coulvert en el K6+700, Arreglos de la via en el

Powered by CamScanner

Continuación martes 02 de Julio de 2024
K9+540, fundida de los muros del Boxcoulvert en el K10+470 y Se acopio e instalación de Subbase y Base granular clase "C"

Edgar Arayán
Residente de obra. Residente de interventoría.

Miércoles 03 de Julio de 2024
Estado del tiempo: lluvias en horas de la mañana
Personal de obra:
Director de obra, residente de obra, residente de interventoría, Director de interventoría, topografía de interventoría, 4 operadores de maquinaria pesada, dos conductores de Camiones, dos auxiliares de ingeniería, 4 Conductores de Volquetes dobletroque, 3 ayudantes de oficios Varios, dos topografos, dos cadeneros, dos oficiales, laboratoristas, Siso de interventoría.
Actividades realizadas:
Armado de la formaleta de la losa del puente en el K0+780, descimbre de los formaletas de los vigas del puente en el K0+780, corte y figurado del acero de refuerzo de la placa del puente en el K0+780, Construcción de cunetas, arreglo del desvío del Box coulvert en el K6+700, habilitado el acceso de motos y livianos al Box coulvert en el K6+700, Arreglos de la vía en el K9+540, fundida de los muros del Box coulvert en el K10+470 y Se realiza Acopio e instalación de Base y Subbase granulos.

Edgar Aragón
Residente de Obra. Residente de Interventoría

Jueves 04 de Julio de 2024
Estado del tiempo: lluvias en horas de la madrugada.
Personal de obra:
Director de obra, residente de obra, residente de interventoría, Director de interventoría, topografía de interventoría, 4 operadores de maquinaria pesada, dos conductores de Camiones, dos auxiliares de ingeniería

Powered by CamScanner

34 Continuación Jueves 04 de Julio de 2024

9 Conductores de Volquetas doble troques, 5 ayudantes de oficios Varios, dos topografos, dos cadeneros, dos celadores, un laboratorista, un Siso de interventoria.

Actividades realizados:

Armado de la formaleta de la losa del puente en el K0+780, descimbre de los formaletas de las Vigas del puente en el K0+780, corte y figurado del acero de refuerzo de la placa del puente en el K0+780 Construcción de cunetas, arreglo del desvío del Box-coulvert en el K6+700, habilitado el acceso de motos y Vehiculos livianos al box coulvert en el K6+700, arreglos de la vía en el K9+540, fundida de los muros de Box coulvert en el K10+470, y se realiza Acopio e instalación de material de Base y Subbase.

Edgar Arayón
Residente de obra — Residente de interventoría

Viernes 05 de Julio de 2024

Estado del tiempo: lluvias desde la madrugada, Continuan las lluvias en la mañana


Actividades realizadas

Relleno con material arenoso de terraplen en el desvío del Box coulvert en el K10+470, construcción de cunetas, Instalación de acero de refuerzo y fundido de la losa superior de Box coulvert en el K10+470 y se realiza acopio e instalación de material de Sub-Base y Base granular.

Personal de obra:

Director de obra, residente de obra, residente de interventoria, Director de interventoría, topografía de interventoría, 4 operadores de maquinaria pesada, dos conductores de Camiones, dos auxiliares de ingeniería, 8 conductores de Volquetas doble troques, 5 ayudantes de oficios Varios, dos topografos, dos Cadeneros, dos celadores, laboratoristas, Siso

Powered by CamScanner

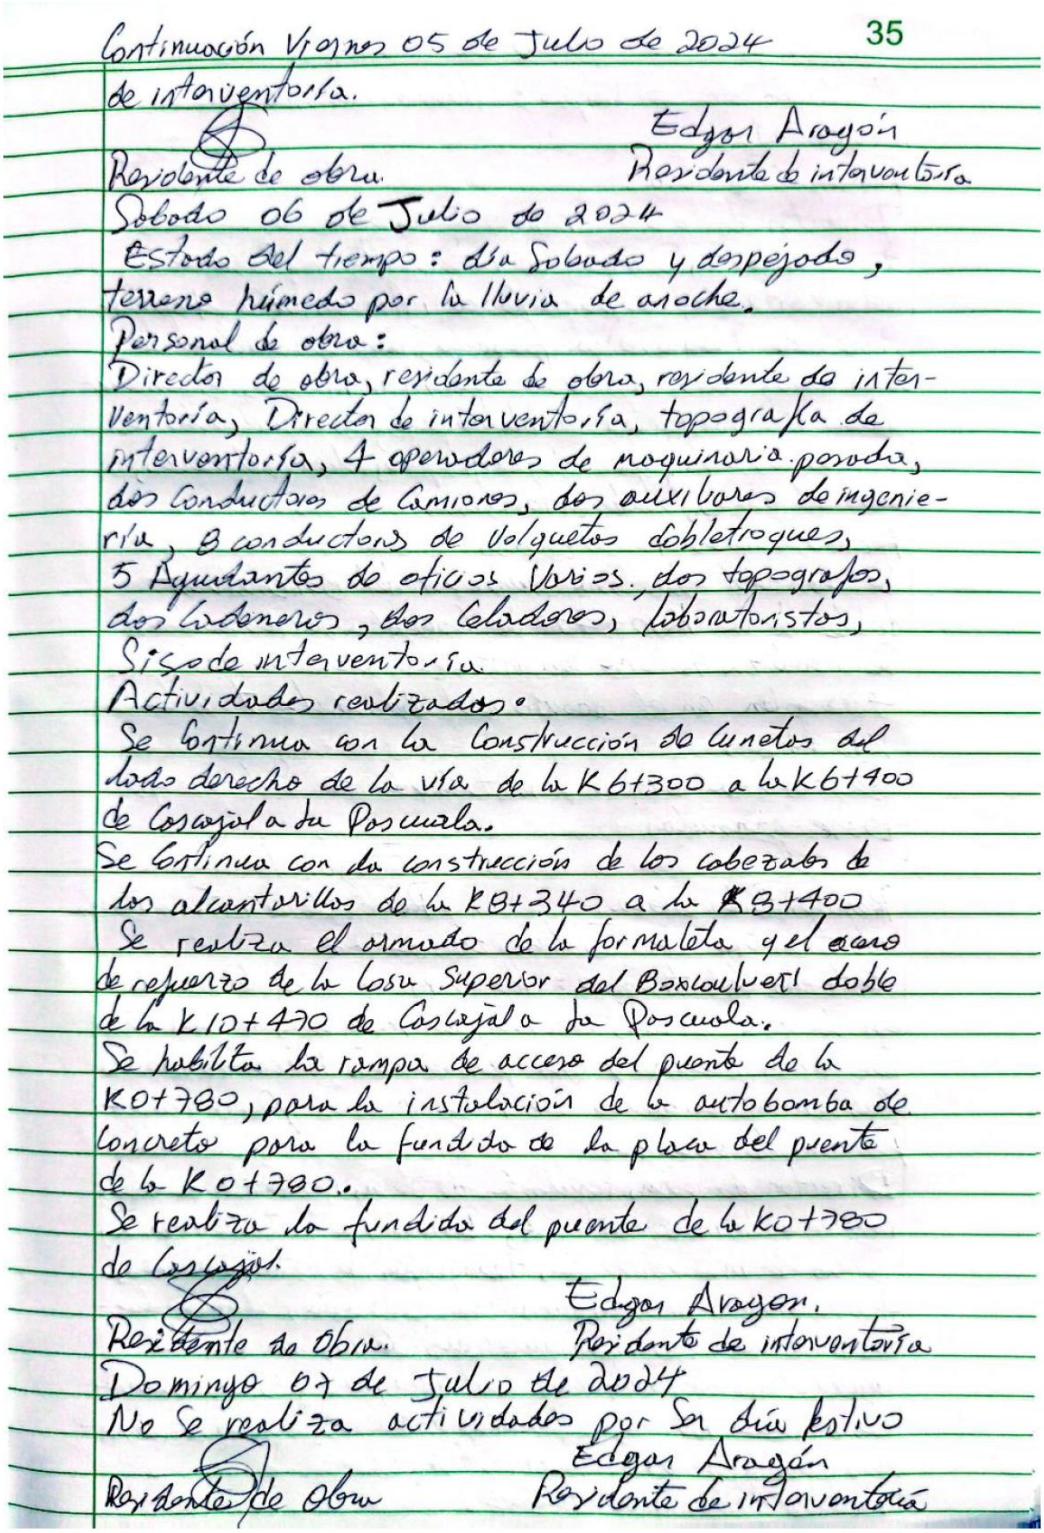

Continuación Viernes 05 de Julio de 2024 35
de interventoría.

Edgar Aragón
Residente de obra. Residente de interventoría


Sabado 06 de Julio de 2024
Estado del tiempo: día Sabado y despejado, terreno húmedo por la lluvia de anoche.
Personal de obra:
Director de obra, residente de obra, residente de interventoría, Director de interventoría, topografía de interventoría, 4 operadores de maquinaria pesada, dos Conductores de Camiones, dos auxiliares de ingeniería, 8 conductores de Volquetes Cobletroques, 5 Ayudantes de oficios Varios, dos topografos, dos Cadeneros, dos Celadores, laboratoristas, Sisoma interventoría.
Actividades realizados.
Se Continua con la Construcción de Cunetas del lado derecho de la vía de la K6+300 a la K6+400 de Cosajala de Pascuala.
Se Continua con la construcción de los cabezales de los alcantarillas de la K8+340 a la K8+400
Se realiza el armado de la formaleta y el acero de refuerzo de la Losa Superior del Boxculvert doble de la K10+470 de Cosajala de Pascuala.
Se habilita la rampa de acceso del puente de la K0+780, para la instalación de la autobomba de concreto para la fundido de la placa del puente de la K0+780.
Se realiza la fundida del puente de la K0+780 de Cosajala.

Edgar Aragon.
Residente de Obra. Residente de interventoría

Domingo 07 de Julio de 2024
No Se realiza actividades por Ser día festivo

Edgar Aragón
Residente de Obra Residente de interventoría

Powered by CamScanner

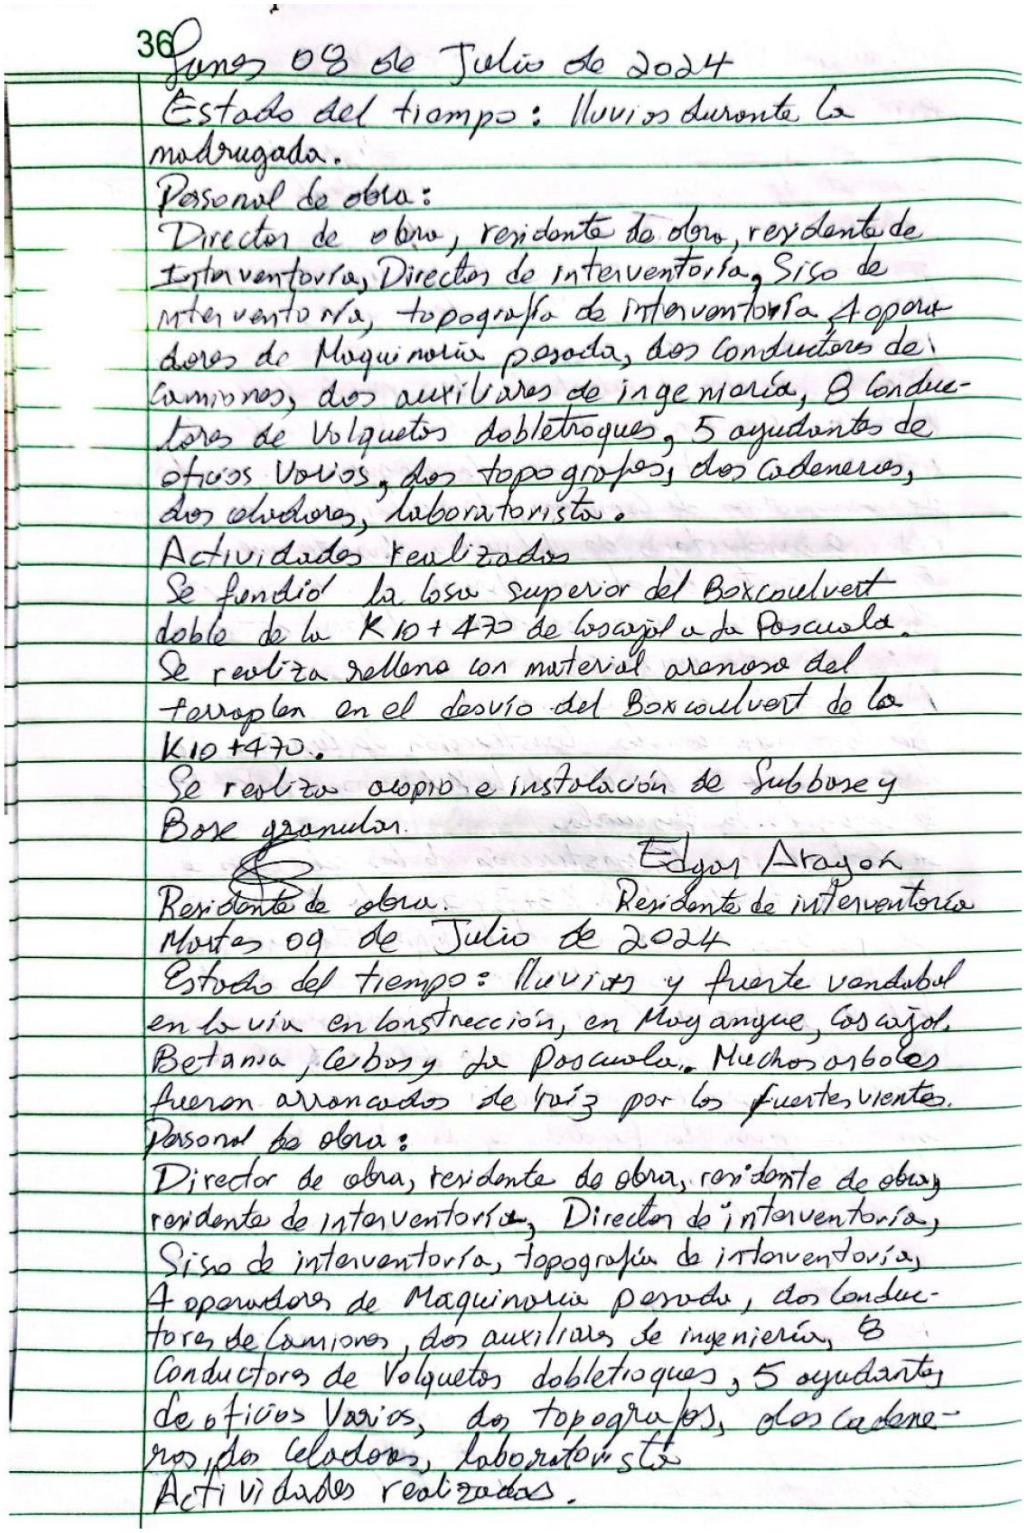


36 Lunes 08 de Julio de 2024
Estado del tiempo: lluvias durante la madrugada.
Personal de obra:
Director de obra, residente de obra, residente de interventoría, Director de interventoría, Siso de interventoría, topografía de interventoría, 4 operadores de Maquinaria pesada, dos conductores de camiones, dos auxiliares de ingeniería, 8 conductores de Volquetas dobletroques, 5 ayudantes de oficios Varios, dos topografos, dos cadeneros, dos celadores, laboratorista.
Actividades realizadas
Se fundió la losa superior del Boxcoulvert doble de la K10+470 de Cosajal a la Pascuala.
Se realiza relleno con material arenoso del terraplen en el desvío del Boxcoulvert de la K10+470.
Se realiza acopio e instalación de Subbase y Base granular.

Edgar Arayon
Residente de obra. Residente de interventoría

Martes 09 de Julio de 2024
Estado del tiempo: lluvias y fuerte vendaval en la vía en construcción, en Moyangue, Cosajal, Betania, Cebos y la Pascuala. Muchos arboles fueron arrancados de raíz por los fuertes vientos.
Personal de obra:
Director de obra, residente de obra, residente de obra, residente de interventoría, Director de interventoría, Siso de interventoría, topografía de interventoría, 4 operadores de Maquinaria pesada, dos conductores de Camiones, dos auxiliares de ingeniería, 8 Conductores de Volquetas dobletroques, 5 ayudantes de oficios Varios, dos topografos, dos cadeneros, dos celadores, laboratorista
Actividades realizadas.

Powered by CamScanner

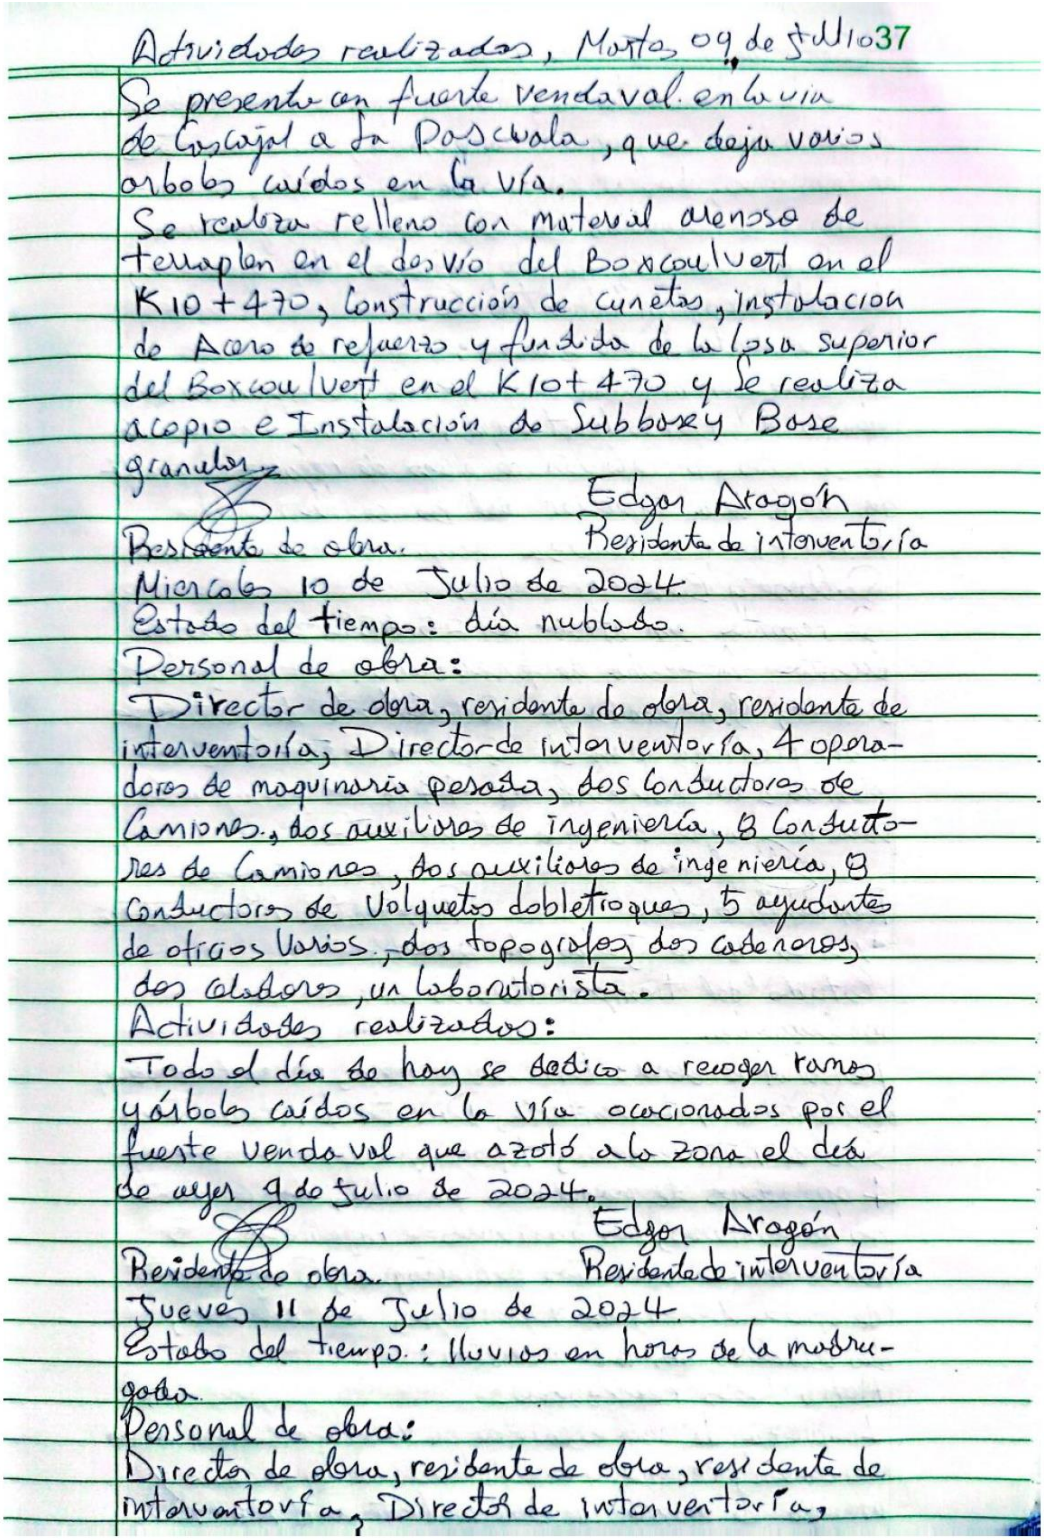

Actividades realizadas, Martes 09 de Julio 37
Se presenta un fuerte vendaval en la vía de Cascajal a la Pascuala, que deja varios arboles caídos en la vía.
Se realiza relleno con material afirmado de terraplen en el desvío del Box coulvert en el K10+470, construcción de cunetas, instalacion de Acero de refuerzo y fundida de la losa superior del Box coulvert en el K10+470 y se realiza acopio e Instalación de Subbase y Base granular.


Edgar Aragón
Residente de obra. Residente de interventoría

Miercoles 10 de Julio de 2024.
Estado del tiempo: día nublado.
Personal de obra:
Director de obra, residente de obra, residente de interventoría, Director de interventoría, 4 operadores de maquinaria pesada, dos Conductores de Camiones., dos auxiliares de ingeniería, 8 Conductores de Camiones, dos auxiliares de ingeniería, 8 Conductores de Volquetes doble troques, 5 ayudantes de otros varios., dos topografos, dos cadeneros, dos celadores, un laboratorista.
Actividades realizados:
Todo el día de hoy se dedico a recoger ramas y árboles caídos en la vía ocacionados por el fuerte vendaval que azotó a la zona el día de ayer 9 de julio de 2024.

Edgar Aragón
Residente de obra. Residente de interventoría


Jueves 11 de Julio de 2024.
Estado del tiempo: lluvias en horas de la madrugada.
Personal de obra:
Director de obra, residente de obra, residente de interventoría, Director de interventoría,

Powered by CamScanner

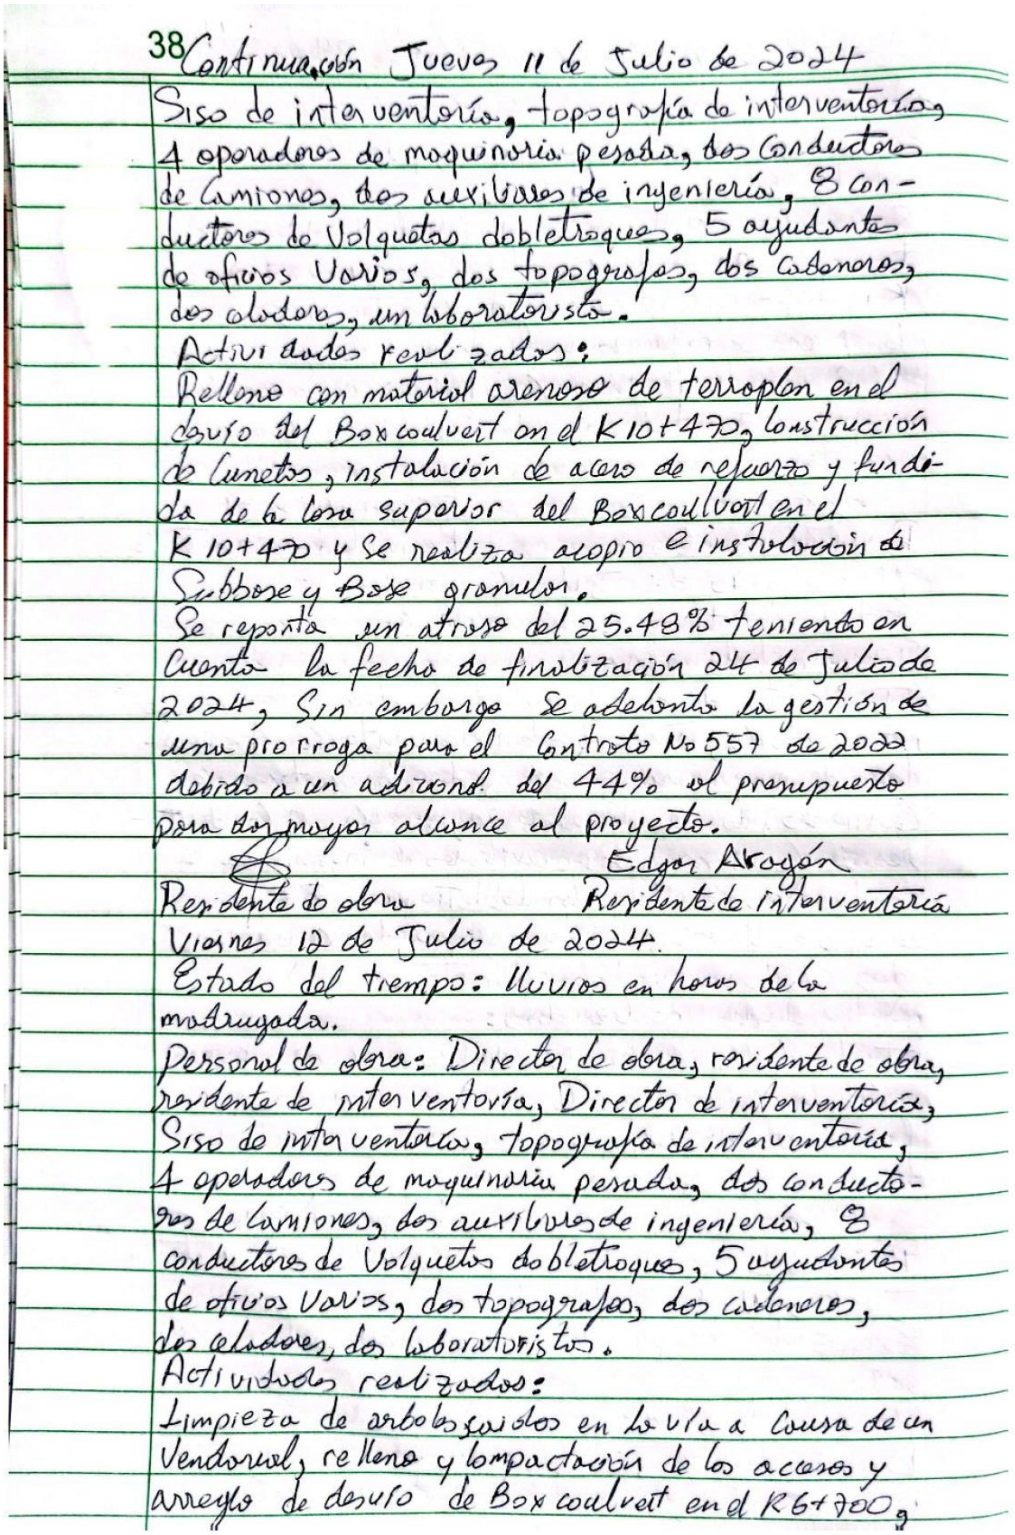

38 Continuación Jueves 11 de Julio de 2024
Siso de interventoría, topografía de interventoría, 4 operadores de maquinaria pesada, dos conductores de Camiones, dos auxiliares de ingeniería, 8 conductores de Volquetas doble troques, 5 ayudantes de oficios Varios, dos topografos, dos cadeneros, dos celadores, un laboratorista.
Actividades realizados:
Relleno con material arenoso de terroplen en el desvio del Box coulvert en el K10+470, construcción de cunetas, instalación de acero de refuerzo y fundida de la losa superior del Box coulvert en el K 10+470 y se realiza acopio e instalación de Subbase y Base granular.
Se reporta un atraso del 25.48% teniendo en Cuenta la fecha de finalización 24 de Julio de 2024, Sin embargo se adelanta la gestión de una prorroga para el Contrato No 557 de 2022 debido a un adicional del 44% al presupuesto para dar mayor alcance al proyecto.
Edgar Aragón
Residente de obra Residente de interventoría
Viernes 12 de Julio de 2024.
Estado del tiempo: lluvias en horas de la madrugada.
Personal de obra: Director de obra, residente de obra, residente de interventoría, Director de interventoría, Siso de interventoría, topografía de interventoría, 4 operadores de maquinaria pesada, dos conductores de Camiones, dos auxiliares de ingeniería, 8 conductores de Volquetas doble troques, 5 ayudantes de oficios Varios, dos topografos, dos cadeneros, dos celadores, dos laboratoristas.
Actividades realizados:
Limpieza de arboles caidos en la via a causa de un Vendaval, relleno y compactación de los accesos y arreglo de desvio de Box coulvert en el K6+700,

Powered by CamScanner

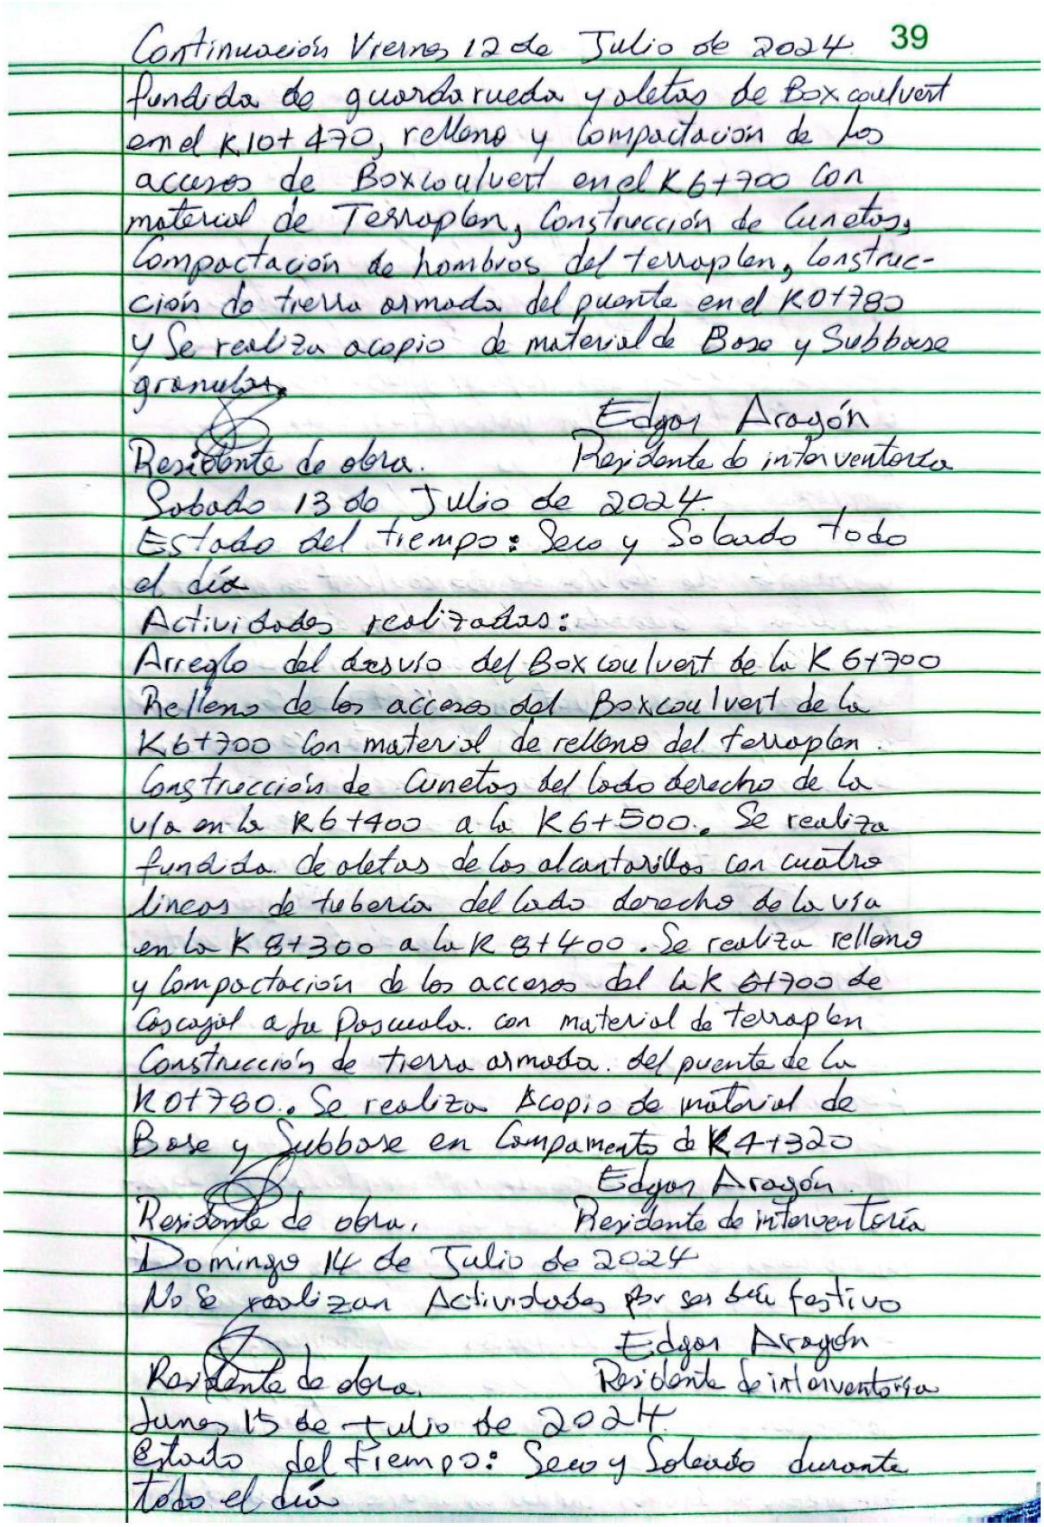

Continuación Viernes 12 de Julio de 2024 39
Fundida de guardarueda y aletas de Box coulvert en el K10+470, relleno y compactación de los accesos de Box coulvert en el K6+700 con material de Terraplen, Construcción de Cunetas, Compactación de hombros del terraplen, Construcción de tierra armada del puente en el K0+780 y Se realiza acopio de material de Base y Subbase granular.

Edgar Aragón
Residente de obra. Residente de interventoría

Sabado 13 de Julio de 2024
Estado del tiempo: Seco y Soleado todo el día
Actividades realizadas:
Arreglo del desvío del Box coulvert de la K6+700
Relleno de los accesos del Box coulvert de la K6+700 con material de relleno del terraplen.
Construcción de Cunetas del lado derecho de la v/a en la K6+400 a la K6+500. Se realiza fundida de aletas de los alcantarillas con cuatro lineas de tubería del lado derecho de la vía en la K8+300 a la K8+400. Se realiza relleno y compactación de los accesos del la K8+700 de Cascajal a la Pascuala. con material de terraplen Construcción de tierra armada del puente de la K0+780. Se realiza Acopio de material de Base y Subbase en Campamento de K4+320


Edgar Aragón
Residente de obra. Residente de interventoría

Domingo 14 de Julio de 2024
No se realizan Actividades por ser día festivo

Edgar Aragón
Residente de obra. Residente de interventoría

Lunes 15 de Julio de 2024
Estado del Tiempo: Seco y Soleado durante todo el día

Powered by CamScanner

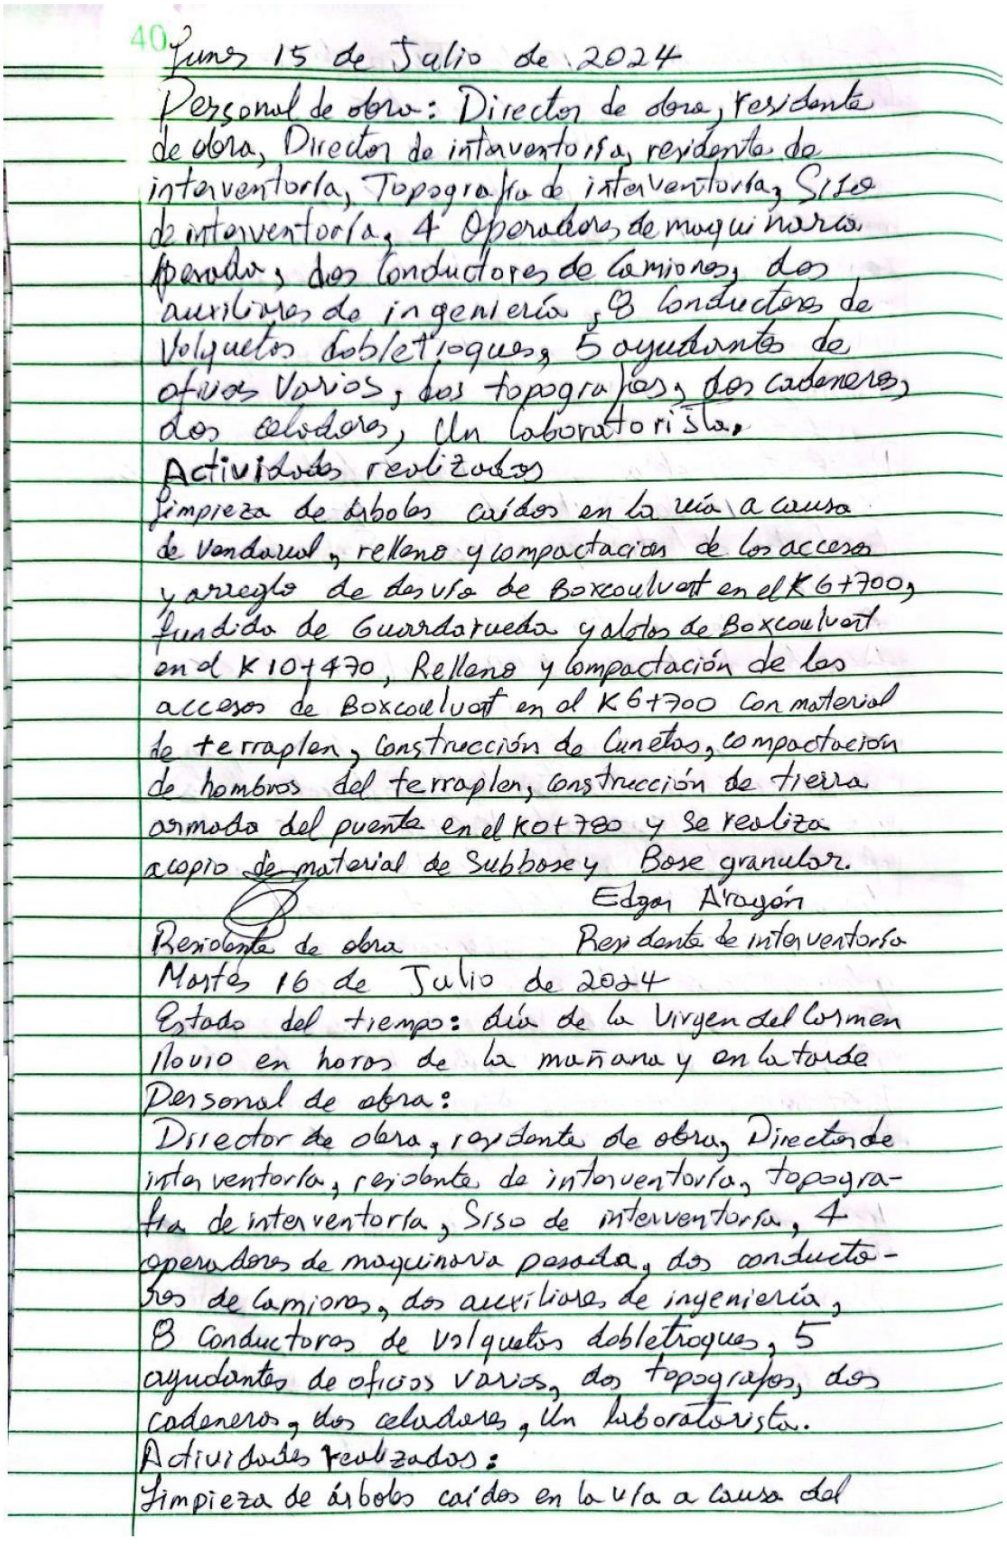

40
Lunes 15 de Julio de 2024
Personal de obra: Director de obra, residente de obra, Director de interventoría, residente de interventoría, Topografía de interventoría, Siso de interventoría, 4 Operadores de maquinaria pesada, dos Conductores de Camiones, dos auxiliares de ingeniería, 8 Conductores de Volquetes dobletroques, 5 oyudantes de oficios Varios, dos topografos, dos cadeneros, dos celadores, Un Laboratorista.
Actividades realizadas
Limpieza de árbolos caídos en la vía a causa de Vandalismo, relleno y compactacion de los accesos y arreglo de desvio de Boxcoulvert en el K6+700, fundida de Guardarueda y aletas de Boxcoulvert en el K10+470, Relleno y compactación de los accesos de Boxcoulvert en el K6+700 Con material de terraplen, Construcción de Cunetas, compactacion de hombros del terraplen, Construcción de tierra armado del puente en el K0+780 y se realiza acopio de material de Subbase y Base granular.
Edgar Arayón
Residente de obra Residente de interventoría
Martes 16 de Julio de 2024
Estado del tiempo: día de la Virgen del Carmen llovio en horas de la mañana y en la tarde
Personal de obra:
Director de obra, residente de obra, Director de interventoría, residente de interventoría, topografía de interventoría, Siso de interventoría, 4 operadores de maquinaria pesada, dos conductores de camiones, dos auxiliares de ingeniería, 8 Conductores de volquetes dobletroques, 5 ayudantes de oficios varios, dos topografos, dos cadeneros, dos celadores, Un laboratorista.
Actividades realizados:
Limpieza de árbolos caídos en la vía a causa del

Powered by CamScanner

vendaval, relleno y compactación de los accesos y arreglo de desvío de Boxcoulvert en el K6+700, fundida de Guardarueda y aletas de Boxcoulvert en el K10+470, Relleno y compactación de los accesos de Boxcoulvert en el K6+700 con material de terraplen, construcción de cunetas, compactación de hombros del terraplen, construcción de tierra armada del puente en el K0+780 y se realiza acopio de material de Subbase y Base granular.

Residente de obra. Edgar Arayón Residente de interventoría

Miercoles 17 de Julio de 2024

Estado del tiempo: lluvias en horas de la madrugada.

Personal de obra:


Director de obra, residente de obra, director de interventoría, residente de interventoría, topografo de interventoría, Siso de interventoría, 4 operadores de maquinaria pesada, dos conductores de camiones, dos auxiliares de ingeniería, 8 conductores de Volquetes doble troque, 5 ayudantes de oficios Varios, dos topografos, dos cadeneros, dos celadores, Un laboratorista.

Actividades realizadas:

Limpieza de árboles caídos en la vía a Causa del vendaval, relleno y compactación de los accesos y arreglo de desvío de Boxcoulvert en el K6+700, fundida de Guardarueda y aletas de Boxcoulvert en el K10+470, Relleno y compactación de los accesos de Box coulvert en el K6+700 con material de terraplen, Construcción de cunetas, compactación de hombros del terraplen, construcción de tierra armada del puente en el K0+780 y se realiza acopio de material de Subbase y Base granular.

Residente de obra Edgar Arayón Residente de interventoría

Powered by CamScanner

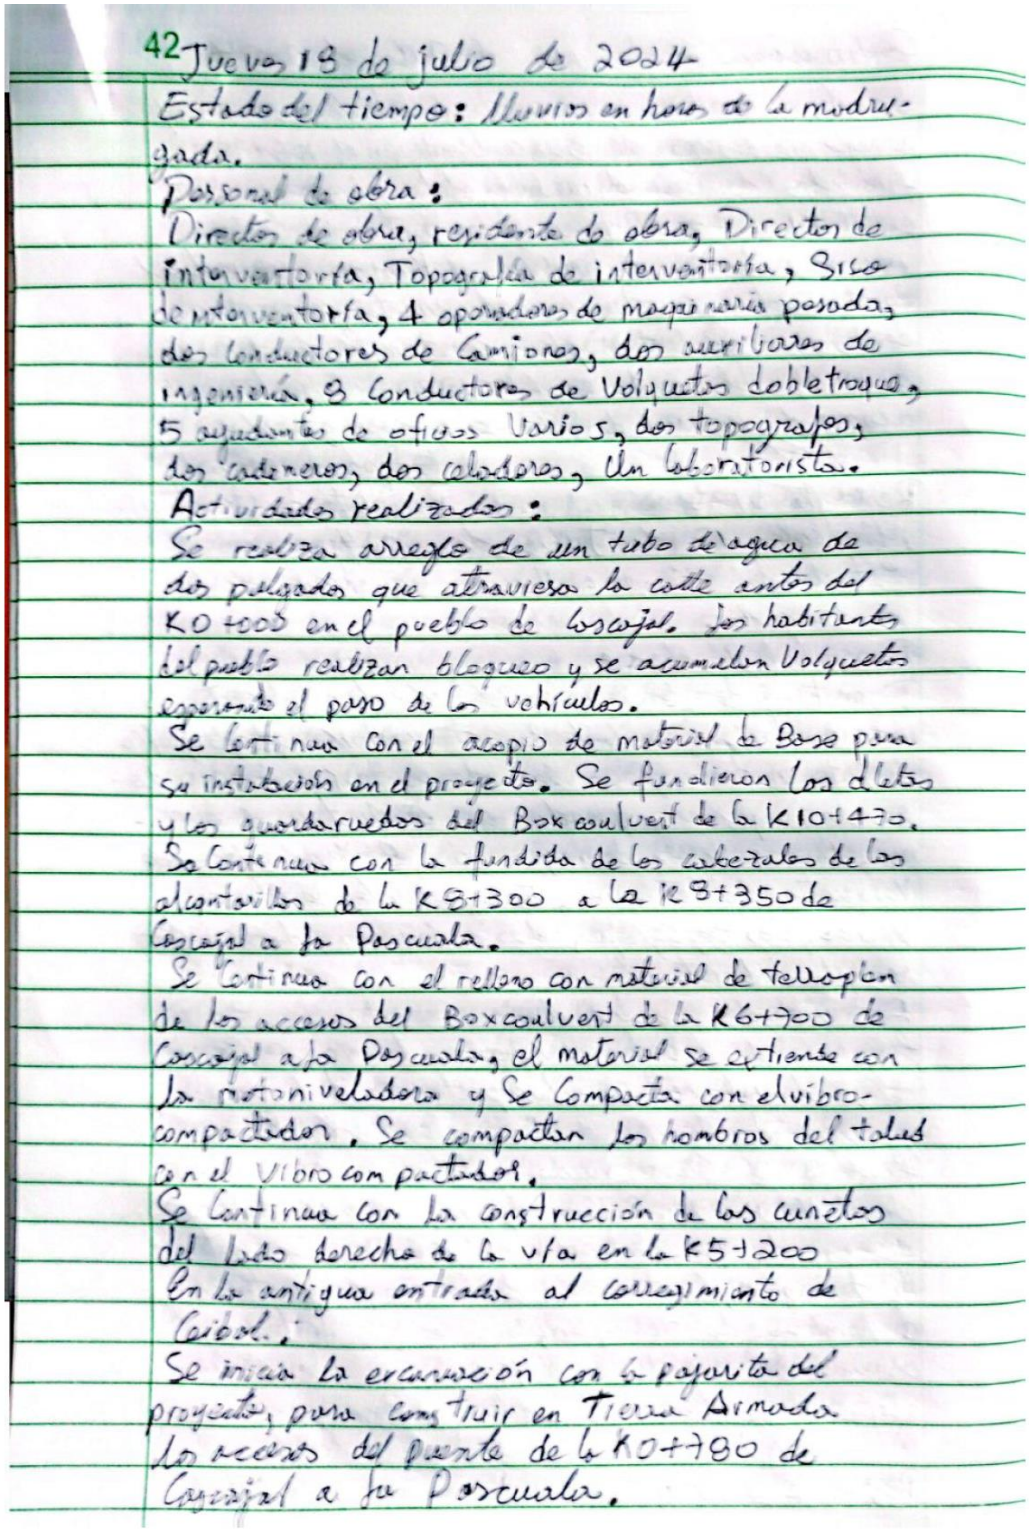

42 Jueves 18 de julio de 2024

Estado del tiempo: Llovizna en horas de la madrugada.

Personal de obra:

Director de obra, residente de obra, Director de interventoría, Topografía de interventoría, Sisa de interventoría, 4 operadores de maquinaria pesada, dos conductores de Camiones, dos auxiliares de ingeniería, 8 Conductores de Volquetas doble troque, 5 ayudantes de oficios Varios, dos topógrafos, dos cadeneros, dos celadores, Un laboratorista.

Actividades realizadas:

Se realiza arreglo de un tubo de agua de dos pulgadas que atraviesa la calle antes del K0+000 en el pueblo de Cascajal. los habitantes del pueblo realizan bloqueo y se acumulan Volquetas esperando el paso de los vehículos.

Se continua con el acopio de material de Base para su instalación en el proyecto. Se fundieron los dados y los guardaruedas del Box coulvert de la K10+470.

Se Continua con la fundida de los cabezales de los alcantarillas de la K8+300 a la K8+350 de Cascajal a la Pascuala.

Se Continua con el relleno con material de talloplón de los accesos del Box coulvert de la K6+700 de Cascajal a la Pascuala, el material se extiende con la motoniveladora y se Compacta con el vibro-compactador. Se compactan los hombros del talud con el Vibro compactador.

Se Continua con la construcción de las cunetas del lado derecha de la v/a en la K5+200 En la antigua entrada al corregimiento de Caibal.

Se inicia la excavación con la pajarita del proyecto, para construir en Tierra Armada los accesos del puente de la K0+780 de Cascajal a la Pascuala.

Powered by CamScanner

Continuación Jueves 18 de Julio de 2024 43

Se inicia la excavación para la construcción de los accesos del puente de K0+780 del lado de la Poscuala.

Residente de obra. Edgar Aragón Residente de interventoría.

Viernes 19 de Julio de 2024

Estado del tiempo: llovió en horas de la noche del 18 de julio de 2024 y amaneció lloviendo en Coscojal a la Poscuala. En horas de la mañana continua con las lluvias. En el.

Personal de obra: Directos de obra, residente de obra, Diredor de interventoría, topografía de interventoría, Siso de interventoría, 4 operadores de maquinaria pesada, dos conductores de Camiones, dos auxiliares de ingeniería, 8 Conductores de Volquetas doble troque 5 ayudantes de oficios Varios, dos topografos, dos Cadeneros, dos caladores, Un laboratorista.

Actividades realizados:

En el puente de la K0+780 de Coscojal, Se Continua con el armado de los tope llantas. Se realiza excavación para la construccion de la tierra armada en los accesos del puente de la K0+780 de Coscojal. Se Cntinua con el acopio de base en el Campamento de la K4+320 de Coscojal a la Poscuala..


Se realiza arreglo del doble vía del Boxcoulvert de la K10+470 de Coscojal a la Poscuala, con la motoniveladora. Se termino la Construccion del Boxcoulvert de la K10+470 de Coscojal a la Poscuala Se realiza arreglo de los accesos del Boxcoulvert de la K6+700 de Coscojal a la Poscuala con la motoniveladora. Se realiza la formaleta para fundir los tope llantas del puente de Coscojal de la K0+780

Residente de obra Edgar Aragón Residente de interventoría

Sabado 20 de Julio de 2024

No se realizan actividades por ser día festivo

Powered by CamScanner

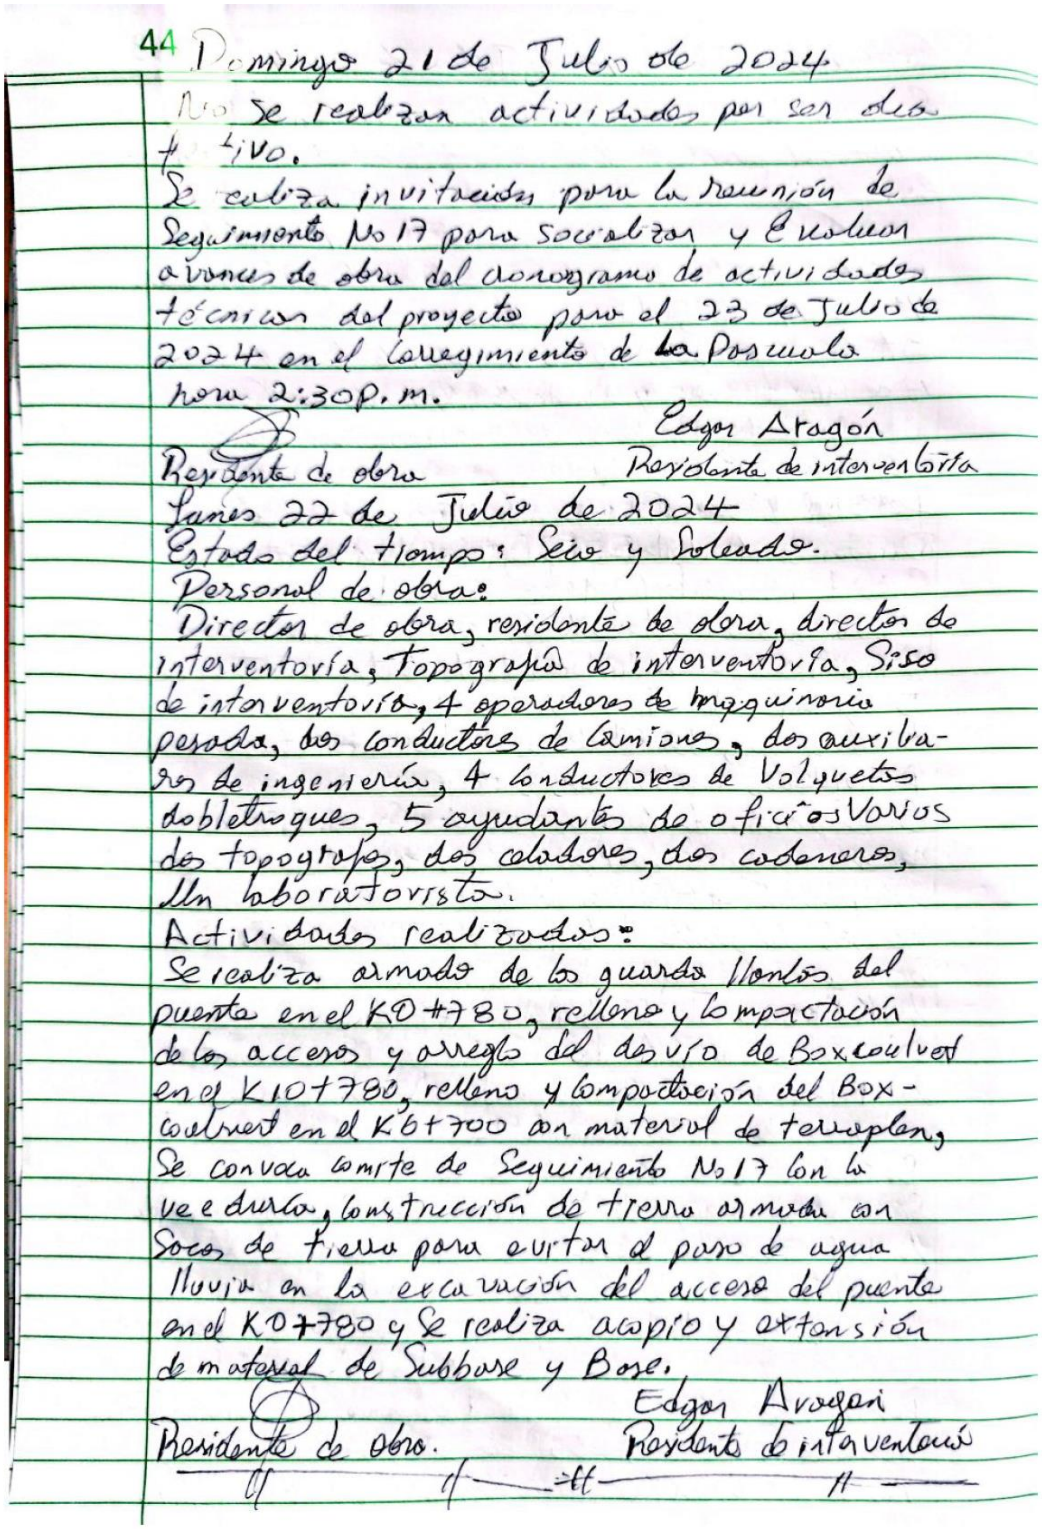


44 Domingo 21 de Julio de 2024.
No se realizan actividades por ser dia festivo.
Se cubiza invitaciones para la reunión de Seguimiento No 17 para socializar y Evaluar avances de obra del cronograma de actividades técnicas del proyecto para el 23 de Julio de 2024 en el Corregimiento de la Poseuela hora 2:30 p.m.

Residente de obra — Edgar Aragón, Residente de interventoría

Lunes 22 de Julio de 2024
Estado del tiempo: Seco y Soleado.
Personal de obra:
Director de obra, residente de obra, director de interventoría, Topografia de interventoría, Siso de interventoría, 4 operadores de maquinaria pesada, dos conductores de Camiones, dos auxiliares de ingeniería, 4 conductores de Volquetas doble troque, 5 ayudantes de oficios Varios dos topografos, dos cabadores, dos cadeneros, Un laboratorista.
Actividades realizadas:
Se realiza armado de los guarda llantas del puente en el KD+780, relleno y compactación de los accesos y arreglo del desvio de Box coulvert en el K10+780, relleno y compactación del Box-coulvert en el K6+700 con material de terraplen, Se convoca comite de Seguimiento No 17 con la vereduria, construcción de tierra armada con Sacos de tierra para evitar el paso de agua lluvia en la excavación del acceso del puente en el KD+780 y Se realiza acopio y extensión de material de Subbase y Base.

Residente de obra. — Edgar Aragon, Residente de interventoria

Powered by CamScanner

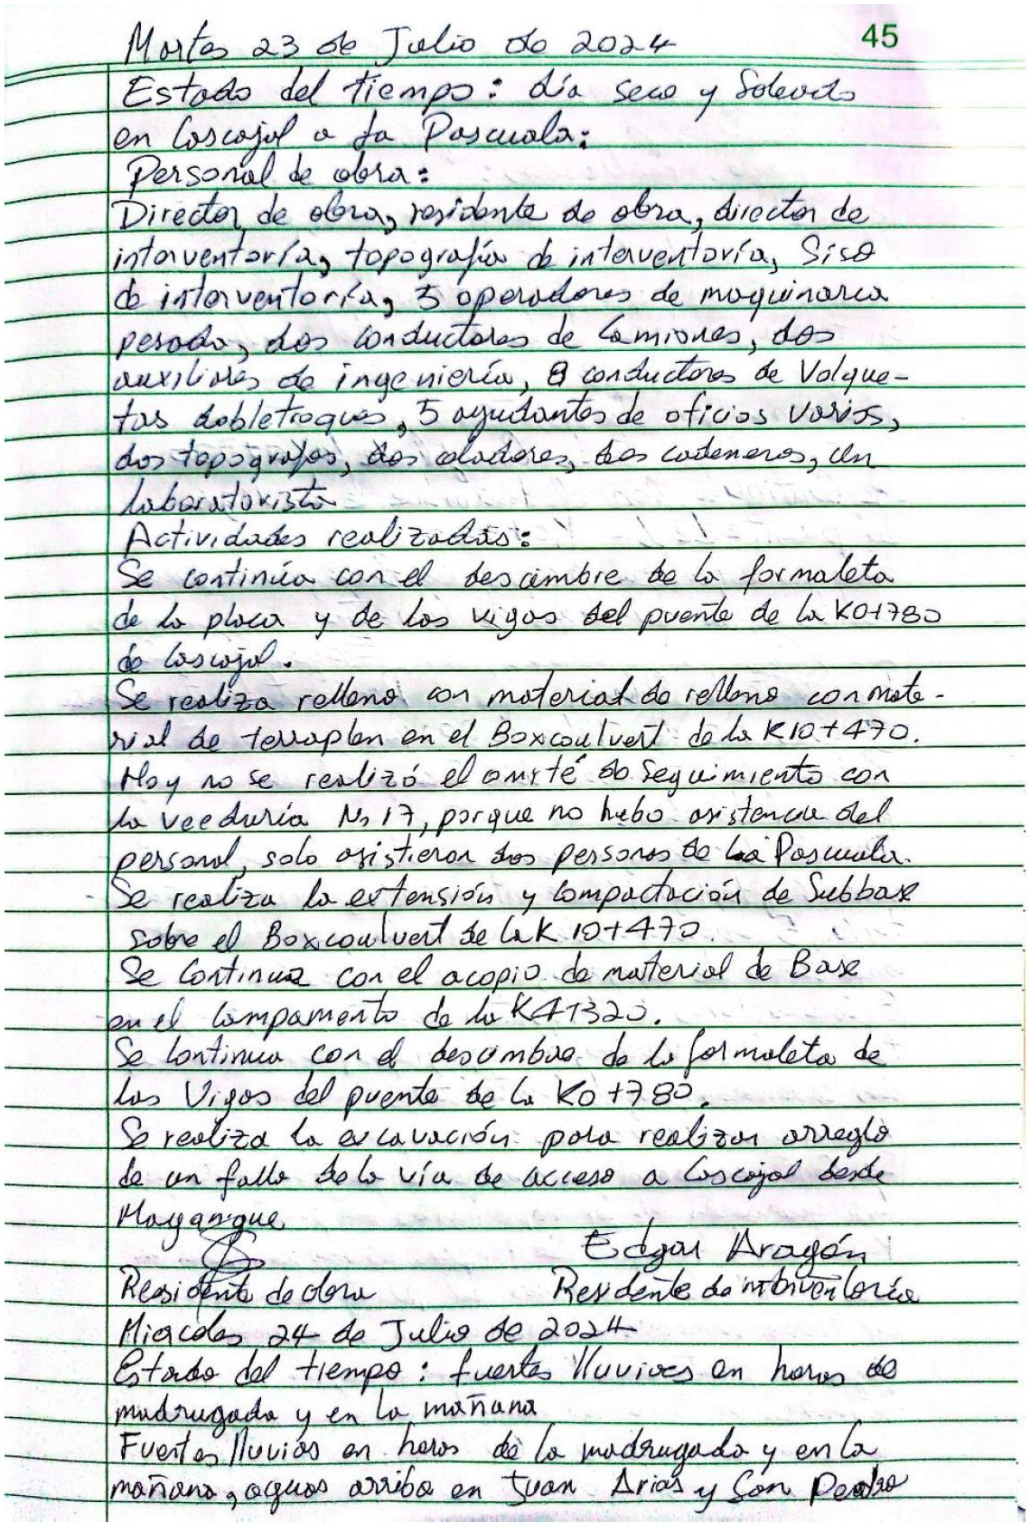


Martes 23 de Julio de 2024 45
Estado del tiempo: día seco y Soleado en Coscojal a la Pascuala:
Personal de obra:
Director de obra, residente de obra, director de interventoría, topografía de interventoría, Siso de interventoría, 3 operadores de maquinaria pesada, dos conductores de camiones, dos auxiliares de ingeniería, 8 conductores de Volquetas doble troques, 5 ayudantes de oficios varios, dos topografos, dos celadores, dos cadeneros, un laboratorista
Actividades realizadas:
Se continúa con el descimbre de la formaleta de la placa y de los vigas del puente de la K0+780 de Coscojal.
Se realiza relleno con material de relleno con material de terraplen en el Boxcoulvert de la K10+470.
Hoy no se realizó el comité de seguimiento con la veeduría No.17, porque no hubo asistencia del personal, solo asistieron dos personas de la Pascuala.
Se realiza la extensión y compactación de Subbase sobre el Boxcoulvert de la K 10+470.
Se continua con el acopio de material de Base en el campamento de la K4+320.
Se continua con el descimbre de la formaleta de los Vigas del puente de la K0+780.
Se realiza la excavación para realizar arreglo de un falla de la vía de acceso a Coscojal desde Mayangue.

Edgar Aragón
Residente de obra Residente de interventoría

Miercoles 24 de Julio de 2024
Estado del tiempo: fuertes lluvias en horas de madrugada y en la mañana
Fuertes lluvias en horas de la madrugada y en la mañana, aguas arriba en Juan Arias y San Pedro

Powered by CamScanner

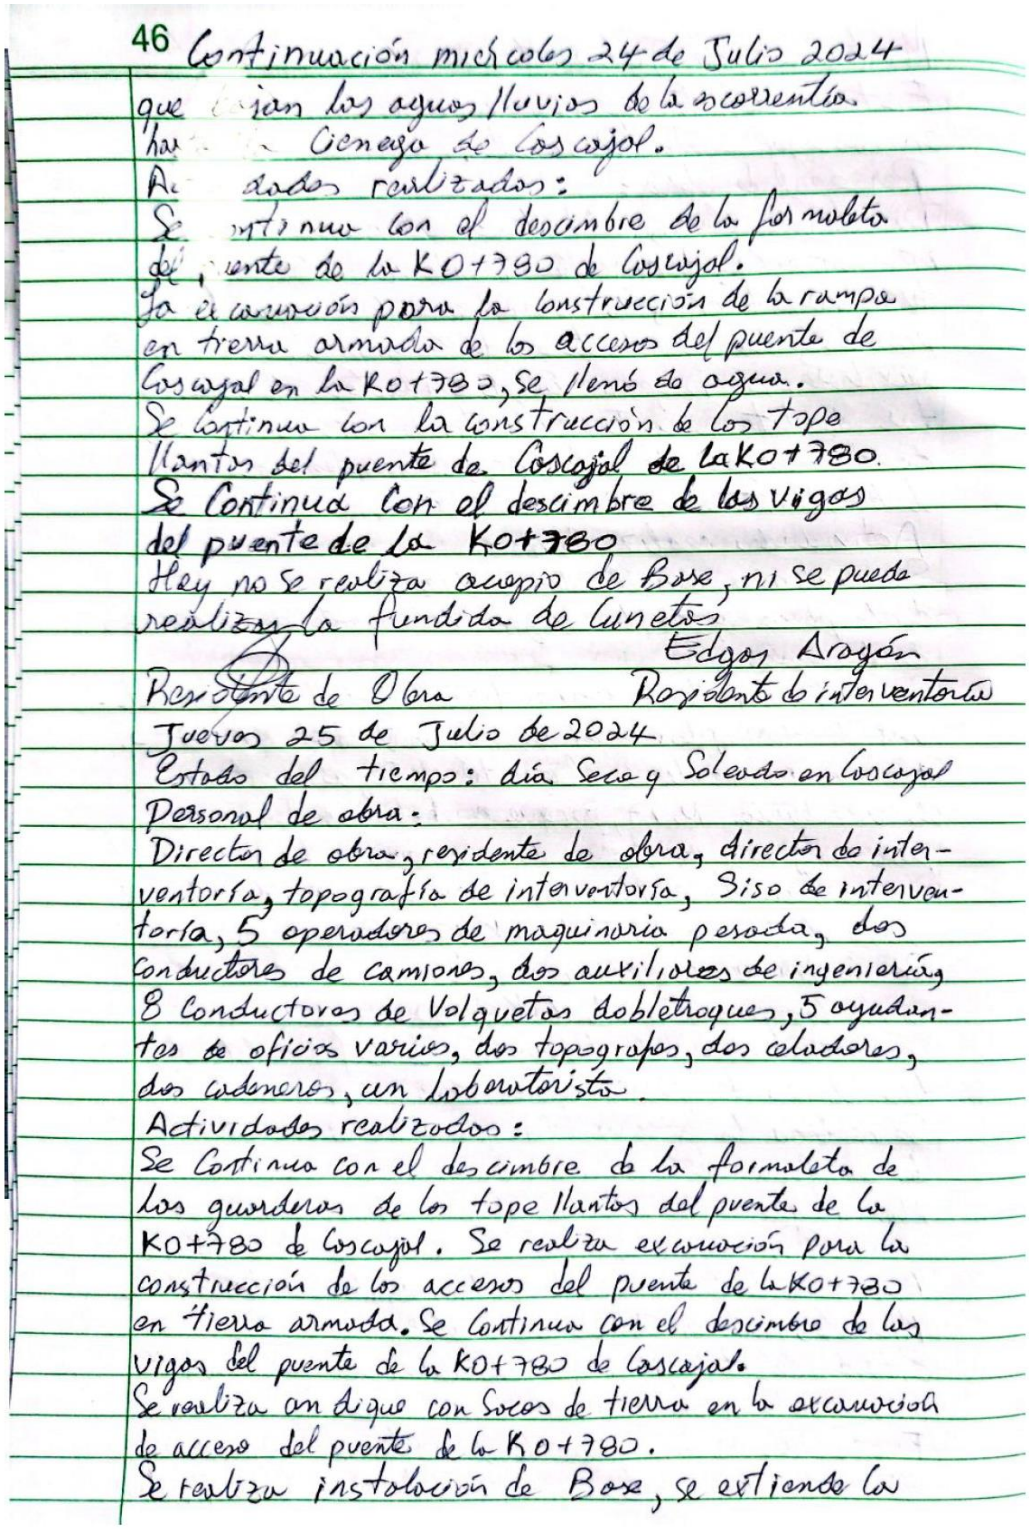

46 Continuación miércoles 24 de Julio 2024
que bajan las aguas lluvias de la escorrentía.
Hay ... Consejo de Coscajal.
Actividades realizadas:
Se continua con el descimbre de la formaleta del ... ente de la KO+780 de Coscajal.
Se realización para la construcción de la rampa en tierra armada de los accesos del puente de Coscajal en la KO+780, se llenó de agua.
Se continua con la construcción de los tope llantas del puente de Coscajal de la KO+780.
Se Continua con el descimbre de las vigas del puente de la KO+780
Hoy no se realiza acopio de Base, ni se pueda realizar la fundida de cunetas
Residente de Obra — Edgar Aragón Residente de interventoría
Jueves 25 de Julio de 2024
Estado del tiempo: día Seco y Soleado en Coscajal
Personal de obra:
Director de obra, residente de obra, director de interventoría, topografía de interventoría, Siso de interventoría, 5 operadores de maquinaria pesada, dos conductores de camiones, dos auxiliares de ingeniería, 8 conductores de Volquetas doble troques, 5 oyudantes de oficios varios, dos topografos, dos soldadores, dos cadeneros, un laboratorista.
Actividades realizadas:
Se Continua con el descimbre de la formaleta de los guarderos de los tope llantas del puente de la KO+780 de Coscajal. Se realiza excavación para la construcción de los accesos del puente de la KO+780 en tierra armada. Se Continua con el descimbre de las vigas del puente de la KO+780 de Coscajal.
Se realiza un dique con Sacos de tierra en la excavación de acceso del puente de la KO+780.
Se realiza instalación de Base, se extiende la

Powered by CamScanner

Continuación jueves 25 de Julio de 2024 47

Base con la motoniveladora y se compacta con el vibro compactador.

Edgar Aragón
Residente de obra. Residente de interventoría.

Viernes 26 de Julio de 2024

Estado del tiempo: día despejado y soleado en Coscojal a la Pascuala.

Personal de obra:

Director de obra, residente de obra, residente de obra, director de interventoría, Siso de interventoría, 5 operadores de maquinaria pesada, dos conductores de camiones, dos auxiliares de ingeniería, 8 Conductores de Volquetas doble troques, 6 ayudantes de oficios varios, dos topografos, dos celadores, dos cadeneros, un laboratorista.

Actividades realizadas:

Se continua con la instalación de la base granular clase "C" de Coscojal a la Pascuala.

Se continúa con el acopio de material de Base en el campamento del proyecto en la K4+320.

Se realiza limpieza de cunetas del lado izquierdo de la vía en la k5+470.

Se continúa con la construcción de las cunetas del lado izquierdo de la vía de la K7+600 a la K7+800 de Coscojal a la Pascuala.

Se continua con la instalación de la base granular clase "C".


Se continua con la construcción del dique con sacos de tierra, para evitar el paso del agua de la escorrentía a la excavación de los accesos con tierra armada del puente de la K0+780 de Coscojal.

Se continua con la excavación para la construcción de los accesos del puente de la K0+780.

Se continua con el descimbre de los vigas del puente de la K0+780.


Se realiza excavación para la construcción de los

Powered by CamScanner

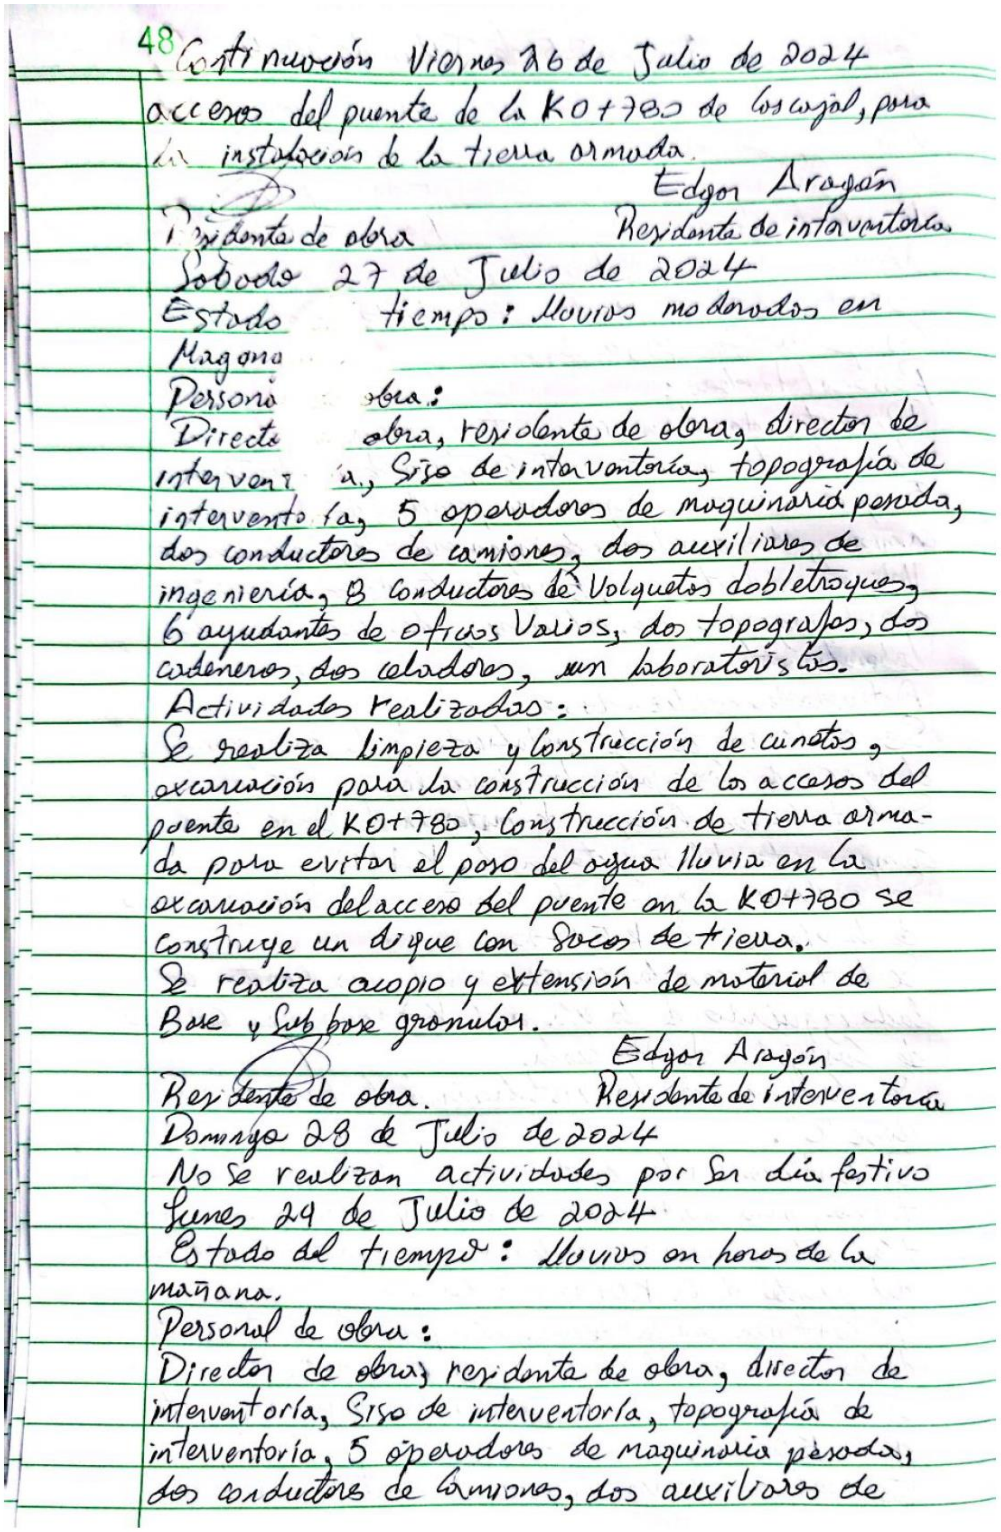


48 Continuación Viernes 26 de Julio de 2024
accesos del puente de la K0+780 de Los cajal, para la instalación de la tierra armada.
Edgar Aragón
Residente de obra Residente de interventoría.
Sabado 27 de Julio de 2024
Estado tiempo: Lluvias moderadas en Magana
Personal obra:
Director obra, residente de obra, director de interventoría, Siso de interventoría, topografía de interventoría, 5 operadores de maquinaria pesada, dos conductores de camiones, dos auxiliares de ingeniería, 8 conductores de Volquetas dobletroques, 6 ayudantes de oficios Varios, dos topografos, dos cadeneros, dos celadores, un laboratorista.
Actividades realizadas:
Se realiza limpieza y construcción de cunetas, excavación para la construcción de los accesos del puente en el K0+780, construcción de tierra armada para evitar el paso del agua lluvia en la excavación del acceso del puente en la K0+780 se construye un dique con Sacos de tierra.
Se realiza acopio y extensión de material de Base y Subbase granular.
Edgar Aragón
Residente de obra. Residente de interventoría
Domingo 28 de Julio de 2024
No se realizan actividades por ser día festivo
Lunes 29 de Julio de 2024
Estado del tiempo: Lluvias en horas de la mañana.
Personal de obra:
Director de obra; residente de obra, director de interventoría, Siso de interventoría, topografía de interventoría, 5 operadores de maquinaria pesadas, dos conductores de camiones, dos auxiliares de

Powered by CamScanner

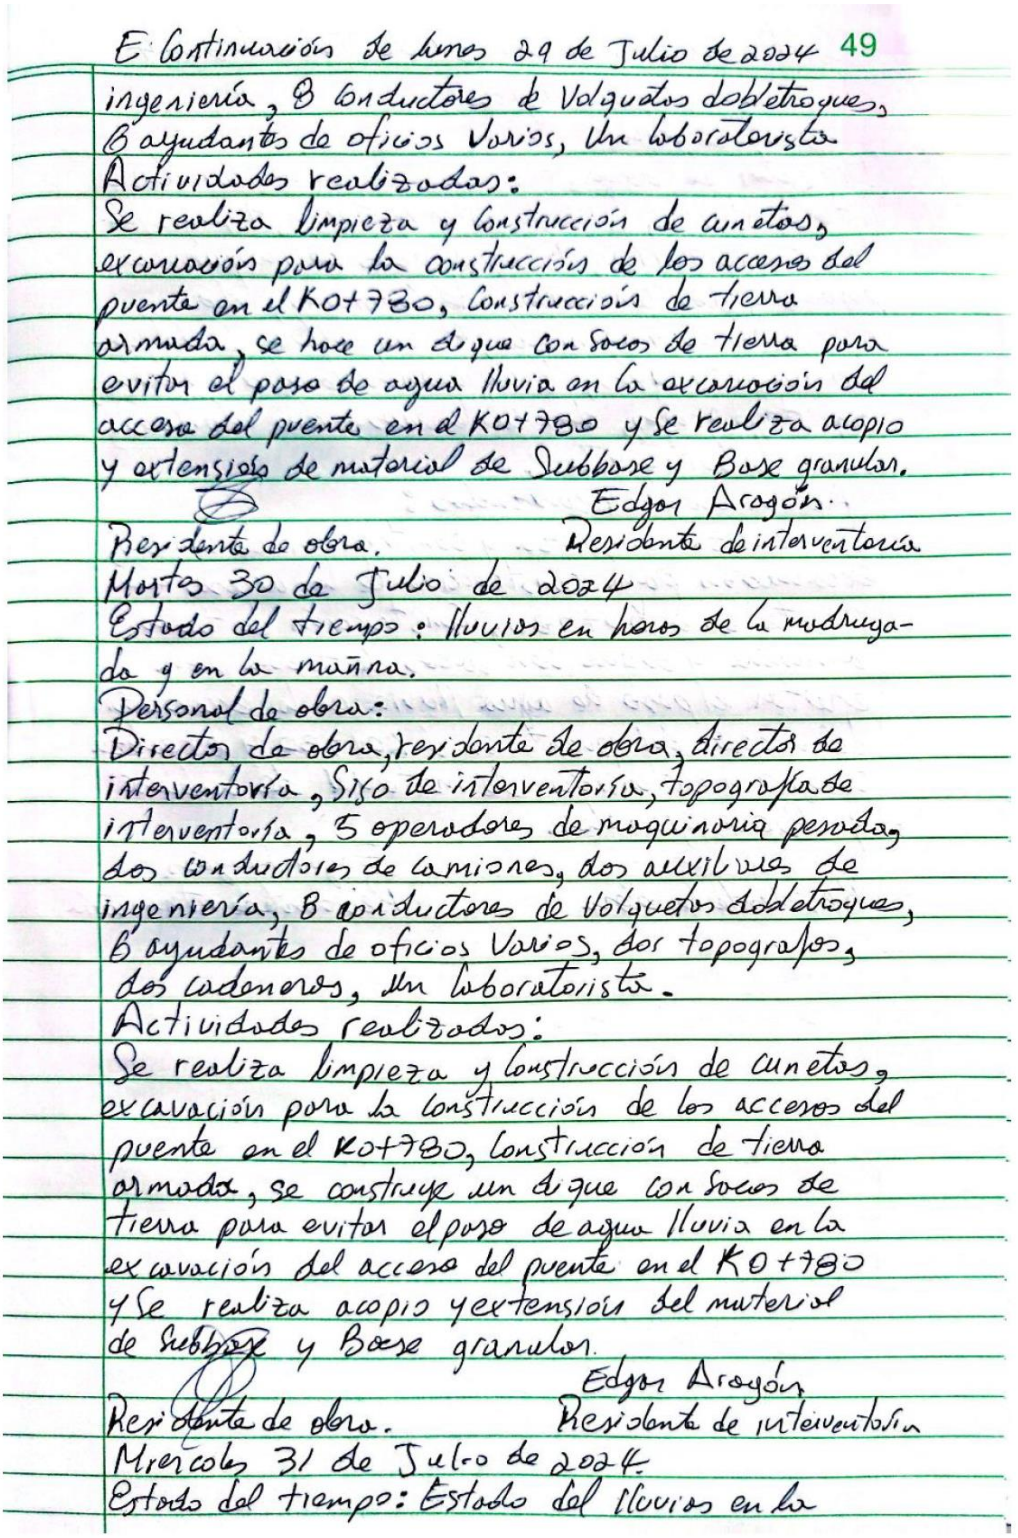

E Continuación de lunes 29 de Julio de 2024 49
ingeniería, 8 Conductores de Volquetas doble troques, 6 ayudantes de oficios Varios, Un laboratorista.
Actividades realizadas:
Se realiza limpieza y construcción de cunetas, excavación para la construcción de los accesos del puente en el K0+780, Construcción de tierra armada, se hace un dique con sacos de tierra para evitar el paso de agua lluvia en la excavación del acceso del puente en el K0+780 y se realiza acopio y extensión de material de Subbase y Base granular.
Edgar Aragón.
Residente de obra. Residente de interventoría
Martes 30 de Julio de 2024
Estado del tiempo: lluvias en horas de la madrugada y en la mañana.
Personal de obra:
Director de obra, residente de obra, director de interventoría, Siso de interventoría, topografía de interventoría, 5 operadores de maquinaria pesada, dos conductores de camiones, dos auxiliares de ingeniería, 8 conductores de Volquetas doble troques, 6 ayudantes de oficios Varios, dos topografos, dos cadeneros, un laboratorista.
Actividades realizadas:
Se realiza limpieza y construcción de cunetas, excavación para la construcción de los accesos del puente en el K0+780, construcción de tierra armada, se construye un dique con sacos de tierra para evitar el paso de agua lluvia en la excavación del acceso del puente en el K0+780 y se realiza acopio y extensión del material de Subbase y Base granular.
Edgar Aragón
Residente de obra. Residente de interventoría
Miercoles 31 de Julio de 2024
Estado del tiempo: Estado del lluvias en la

Powered by CamScanner

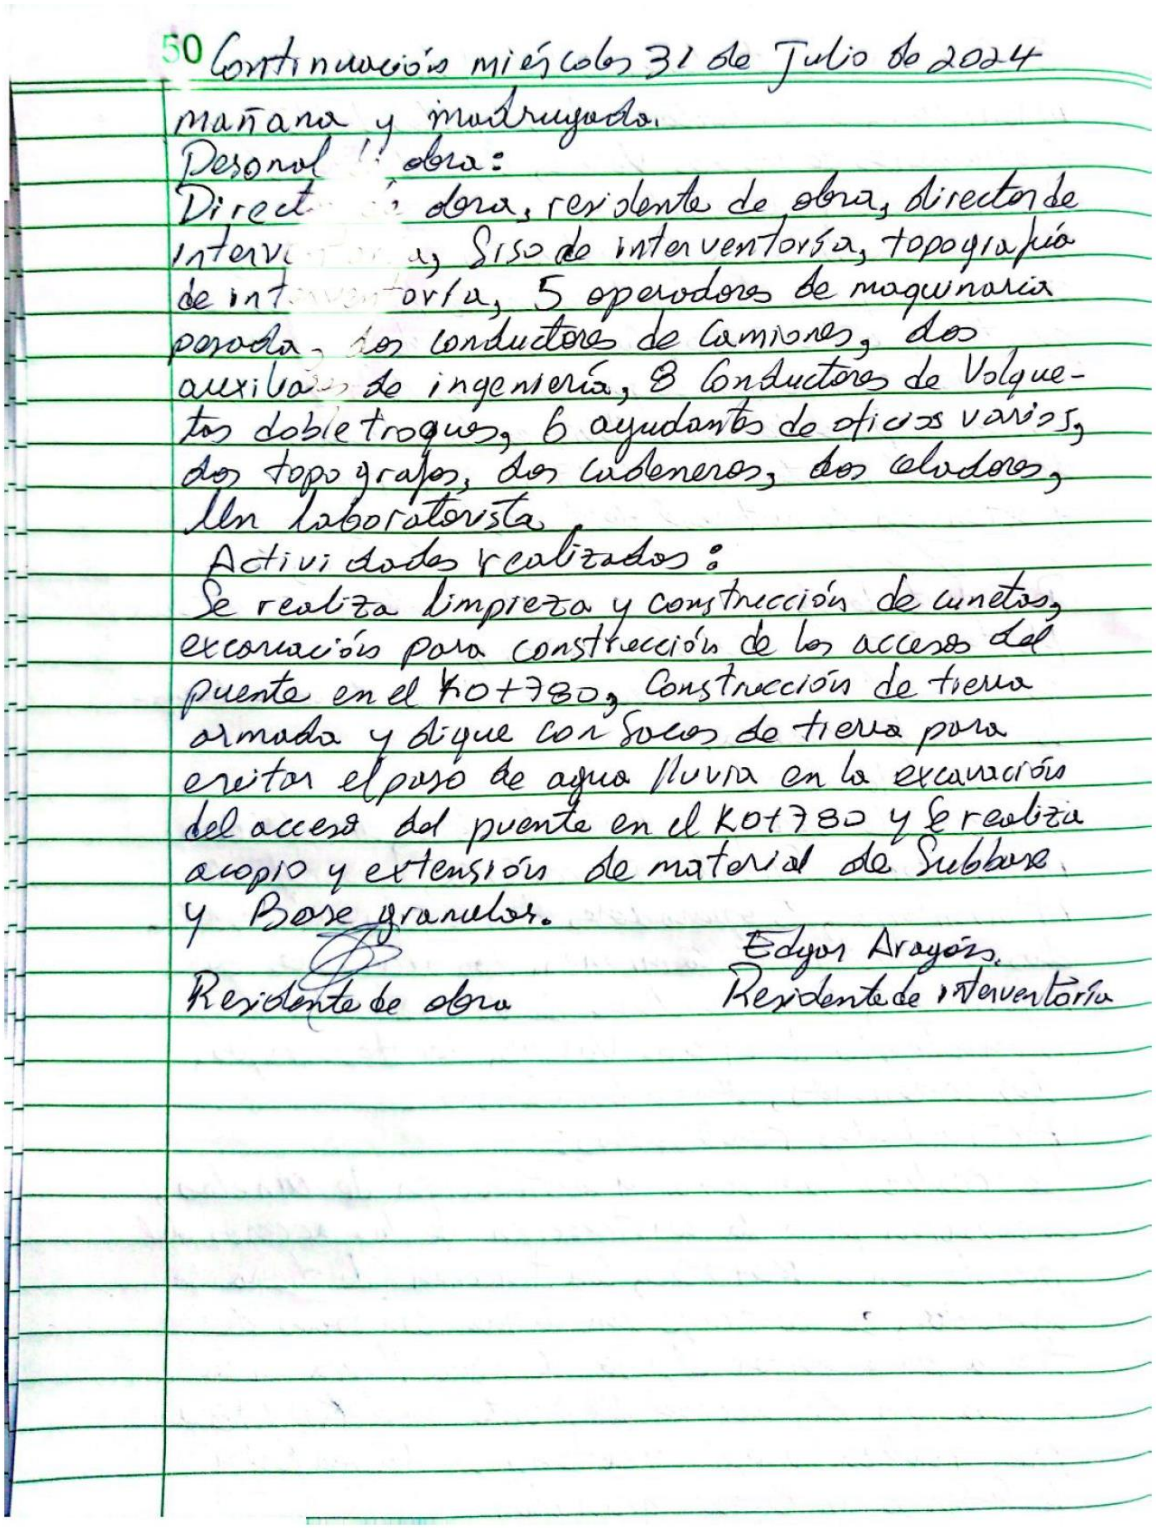

50 Continuación miércoles 31 de Julio de 2024
mañana y madrugada.
Personal de obra:
Director de obra, residente de obra, director de interventoría, Siso de interventoría, topografía de interventoría, 5 operadores de maquinaria pesada, dos conductores de camiones, dos auxiliares de ingeniería, 8 Conductores de Volquetas doble troques, 6 ayudantes de oficios varios, dos topografos, dos cadeneros, dos celadores, Un laboratorista.
Actividades realizadas:
Se realiza limpieza y construcción de cunetas, excavación para construcción de los accesos del puente en el K0+780, Construcción de tierra armada y dique con Sacos de tierra para evitar el paso de agua lluvia en la excavación del acceso del puente en el K0+780 y se realiza acopio y extensión de material de Subbase y Base granular.

Residente de obra

Edgar Arayas.
Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Lunes 1 de Julio 2024

- No se laboró este dia [Festivo]

" " " "

Martes 2 de Julio 2024

- Personal: Ing Residente, Mtro de obra, Dir. de obra, Ayudantes, Conductores, Cuadrilla topografica, Operadores y 1 siso
- Equipos: 2 volquetas dobletroque, 1 minicargador, 1 bulldozer, 2 carrotanques, 2 Mezcladoras de Concreto
- Clima: Seco
- Horario: 7am-6pm
- Actividades: Continuación fundida de Cunetas, Construcción obras de Proteccion y limpieza del Corredor vial.

Contratista " Interventoria "

Miercoles 3 de Julio 2024

- Personal: Ing residente, Mtro de obra, Dir de obra, Ayudantes, Operadores, Conductores, Cuadrilla Topografica
- Equipos: Carrotanque, 2 mezcladora de Concreto, 1 Minicargador, 1 Padorita y 1 bulldozer
- Clima: Seco
- Horario: 7am-6pm
- Actividades: Fundida de Cunetas, Construcción de obras de Proteccion.

Contratista

Interventoria.

Jueves 4 de Julio 2024

- Personal: Ing Residente, 1 Mtro de obra, 1 dir. de obra, Conductores, Operadores, Ayudantes, 1 siso, Esp en Vias.
- Equipos 1 Carrotanque, 1 Minicargador, 1 Pajarita, 2 Mezcladora de Concreto, 1 Volqueta Dobletroque.
- clima: Lluvioso, lluvia en la mañana.
- Horario: 7am - 6pm
- Actividades: Construcción Piedra Pegada Para estabilización de Taludes y limpieza del Corredor vial Por la lluvia.

Contratista _____ Interventoria _____

Viernes 5 de Julio 2024

- Personal: Ing residente, Mtro de obra, Dir de obra, 1 siso, 1 cuadrilla topografica, Operadores, Ayudantes, Conductores.
- Equipos: 2 carrotanques, 1 Minicargador, 1 bulldozer, 1 camioneta, 1 Pajarita, 2 Mezcladora de Concretos.
- Horario: 7 - 6am
- clima: Seco la mañana, fuerte lluvia en la mañana.
- Actividades: Se realizan actividades de Construcción de obras de Protección y fundida de Cunetas solo en la mañana, fuerte lluvia no Permite actividades en la tarde

Contratista _____ Interventoria _____

Sabado 6 de Julio 2024

- Personal: Ing residente, Mtro de obra, Dir de obra, 1 siso, Operadores, Ayudantes, Conductores y 1 Cuadrilla Topografico.
- Equipos: 2 carrotanques, 1 bulldozer, 2 Mezcladora de Concretos, 1 Camioneta, 1 Pajarita y 1 Minicargador
- Horarios: 7am - 6pm
- clima: Seco
- Actividades: Construcción y fundida de Cunetas, limpieza de Cunetas y Corredor Vial Por lluvias.

Contratista _____ Interventoria _____

Domingo 7 de Julio 2024

No se realizan labores este dia _____ _____

Lunes 8 de Julio 2024

- Personal: Ing residente, Dir de obra, Mtro de obra, Ayudantes, Conductores, Operadores, Esp en Vias y 1 Siso
- Equipos: 2 camionetas, 1 Minicargador, 2 volquetas Dobletroque, 1 bulldozer, 2 Mezcladoras de Concreto.
- Clima: Seco
- Horario: 7am-6pm
- Actividades: Fundida de Cunetas y Construcción de Piedra Pegada Para est. de Taludes a lo largo de Ambos margenes de la Via

Contratista // Interventoria

Martes 9 de Julio 2024

- Personal: Ing residente, Mtro de obra, Dir de obra, Conductores, Ayudantes, Operadores, Cuadrilla topografica.
- Equipos: 1 camioneta, 1 bulldozer, 2 Mezcladoras de Concreto, 1 carrotanque, 1 camioneta Dobletroque.
- clima: Seco
- Horario: 7am-6pm
- Actividades: Construcción obras de Proteccion y fundida de Cunetas.

Contratista // Interventoria

Miercoles 10 de Julio 2024

- Personal: Ing Residente, Dir de obra, Mtro de obra, Ayudantes, Conductores, Operadores, Cuadrilla Topografica y 1 Siso.
- Equipos: 1 Camioneta, 2 carrotanques, 2 Mezcladoras de Concreto, 1 Minicargador y 1 Volqueta dobletroque.
- Clima: Seco
- Horario: 7am-6pm
- Actividades: Limpieza de Cunetas y Corredor vial. Construcción de Piedra Pegada Para est. de Taludes.

Contratista // Interventoria

Jueves 11 de Julio

- Personal: Ing residente, Dir de obra, Mtro de obra, Operadores, Ayudantes y Conductor Cuadrilla Topografica, Esp Ambiental

...

... Continuación Jueves 11, 2024

- Equipos: 1 Camioneta, 2 Carrotanques, 2 Mezcladoras de Concreto, 1 Minicargador, 2 volquetas dobletroque y 1 Volqueta sencilla
- Clima: Seco
- Horario: 7am - 6pm.
- Actividades: Fundida de Cunetas, Construcción de Piedra Pegada, Construcción de Piedra Pegada Para est. de Taludes.

Contratista _____ Interventoría _____

Viernes 12 de Julio 2024

- Personal: Ing residente, Dir obra, Mtro de obra, Ayudantes, Operadores, Cuadrilla topografica, Conductores y 1 siso
- Equipos: 2 volquetas dobletroque, 2 carrotanques, 1 Minicargador, 1 bulldozer y 1 Camioneta
- clima: Seco
- Horario: 7am - 6pm
- Actividades: Fundida de Cunetas, limpieza de Cunetas y Construcción de obras de Protección.

Contratista _____ Interventoría _____

Sabado 13 de Julio 2024

- Personal: Ing residente, Mtro de obra, Ayudantes, Operadores, Cuadrilla topografica, Dir de obra, Conductores y 1 Siso,
- Equipos: 1 volqueta dobletroque, 1 Volqueta Sencilla, 2 Mezcladoras de Concreto, 1 Carrotanque, 1 bulldozer y 1 Camioneta
- clima: Seco
- Horario: 7am - 6pm
- Actividades: Fundida de Cunetas, Instalación de Señales verticales de Transito y limpieza del Corredor vial.

Contratista _____ Interventoría _____

Domingo 14 Julio 2024

- No se labora este dia, Sin embargo, Se realiza mantenimiento Preventivo a maquinaria amarilla

...

... Lunes 15 de Julio 2024

- Personal: Ing residente, Conductores, Ayudantes, Operadores, Dir. de obra y Mtro de obra, Cuadrilla topografico, 1 siso.
- Equipos: 1 camioneta, 2 volquetas doble troque, 2 Mezcladora de Concreto, 1 Carrotanque, 1 Minicargador y 1 bulldozer
- clima: Seco
- Horario: 7am - 6pm
- Actividades: Construcción de Piedra Pegada Para est de Taludes y limp. del Corredor Vial, Fundida de Cuneta en margen izquierdo de la via

Contratista // Interventoria //

Martes 16 Julio 2024

- Personal: Ing residente, Mtro de obra, Dir de obra, Ayudantes, operadores, Conductor y 1 Cuadrilla Topografica.
- Equipos: 1 camioneta, 2volquetas dobletroque, 1 Minicargador, 1 bulldozer, 1 Carrotanque y 1 Mezcladora de Concreto
- clima: Seco
- Horario: 7am - 6pm
- Actividades: Fundida de Cunetas, bordillos y Piedra Pegada Para est. de Taludes

Contratista // Interventoria //

Miercoles 17 Julio 2024

- Personal: Ing residente, Mtro de obra, Dir de obra, Ayudantes, Conductores, Operadores Cuadrilla Topográfica, 1 siso, esp en Vias.
- Equipos: 2 camionetas, 1 Minicargador, 1 carrotanque, 1 bulldozer, 2 mezcladores de Concreto y 1 volqueta dobletroque
- clima: Seco
- Horario: 7am - 6pm
- Actividades: Construcción de obras de Protección, Instalación de señales verticales de tránsito

Contratista Interventoria

Jueves 18 de Julio 2024

- Personal: Ing Residente, Mtro de obra, Dir de obra, Conductores, Operadores, Ayudantes, Cuadrilla Topografico
- Equipos: 1 bulldozer, 1 Carrotanque, 2 Mezcladoras de Concreto, 1 camioneta, 1 Volqueta doble troque, 1 Minicargador.
- Clima: Seco
- Horario: 7am-6Pm
- Actividades: Fundición de Cunetas, Construcción de Piedra Pegada Para est. de Taludes

Contratista — Interventoria

Viernes 19 de Julio 2024

- Personal: Ing residente, Dir de obra, Mtro de obra, Conductores, Ayudantes, Operador 1 Siso, esp Ambiental,
- Equipos: 1 Camioneta, 1 carrotanque, 1 minicargador, 1 volqueta sencilla y 1
- clima: Seco
- Horario: 7am-6Pm
- Actividades: Instalación de señales verticales de tránsito, E instalación de barreras de Protección.

Contratista — Interventoria

- Sabado 20 de Julio 2024
- No se laboro este dia, Festivo.

Domingo 21 de Julio 2024

- No se laboro este dia, lluvias moderadas

Lunes 22 de Julio 2024

- Personal: Ing residente, Ayudantes, Conductor y operador
- Equipos: 1 Minicargador, 1 camioneta, 1 volqueta sencilla y 1 bulldozer
- clima: Seco
- Horario: 7am-6Pm
- Actividades: instalación de señales verticales de transito E instalación de barreras de Protección

Contratista — Interventoria

Martes 23 de Julio 2024

- Personal: Ing residente, Operador, ayudante . Conductor, 1 Siso
- Equipos: 1 camioneta, 1 Volqueta sencilla y 1 minicargador
- Clima: Seco
- Horario: 7am-6Pm
- Actividades: Demarcación vial Con Pintura en frio, instalación de barreras de Protección

Contratista — Interventoria

Miercoles 24 de Julio 2024

- Personal: Ing residente, operador, ayudante, Conductor, 1 Siso
- Equipos: 1 camioneta, 1 Volqueta Sencilla y 1 minicargador
- clima: Seco
- Horario: 7am-6Pm
- Actividades: Demarcación Vial Con Pintura en frio, instalación de barreras de Protección

Contratista — Interventoria

Jueves 25 de Julio 2024

- Personal: Ing residente, operador, Ayudante, Conductor, Dir de obra, Mtro de obra.
- Equipo: 1 camioneta, 1 Volqueta Sencilla, 1 minicargador y 1 bulldozer.
- Clima: Seco
- Horario: 7am-6Pm
- Actividades: Instalación de barreras de Protección y demarcación vial Con Pintura en frio.

Viernes 26 de Julio 2024

- Personal: Ing residente, Operador, Ayudante, Conductor, Mtro de obra y 1 siso.
- Equipo: 1 camioneta, 1 Volqueta sencilla, 1 minicargador y 1 bulldozer.
- Clima: Seco
- Horario: 7am-6Pm
- Actividades: Instalación de señalización vertical, Demarcación con Pintura en frio, instalación debarreras de Protección.

Contratista — Interventoria

Sabado 27 de Julio

- Personal: Ing residente, Mtro de obra, Ayudantes, Operadores, Conductor y esp. en vias
- Equipo: 1 camioneta, 1 minicargador, 1 volqueta sencilla y 1 Pajarita.
- Clima: Seco
- Horario: 7am-6Pm
- Actividades: Demarcación Con Pintura en frio, instalación de barreras de Protección

Contratista " Interventoria "

Domingo 28 de Julio 2024

- No se laboro este dia.

" "

Lunes 29 de Julio 2024

- Personal: Ing residente, Mtro de obra, Ayudantes, Operadores, Conductor y 1 Siso
- Equipos: 1 camioneta, 1 minicargador y 1 Volqueta Sencilla
- Horario: 7am-6Pm
- Clima: Seco
- Actividades: Demarcación Con Pintura en frio einstalación de señales verticales de tránsito.

Contratista " Interventoria "

Martes 30 de Julio 2024

- Personal: Ing residente, Mtro de obra, Dir de obra, Ayudantes, Operador, 1 Siso, Conductores, Esp en Vias.
- Equipos: 3 camionetas, 1 volqueta Sencilla y 1 minicargador
- clima: Seco
- Horario: 7am - 6Pm
- Actividades: Demarcación vial Con Pintura en frio, Se finaliza instalaciones de señales de transito y barreras de Proteccion.

Contratista " Interventoria "

Miercoles 31 de Julio 2024

- Personal: Ing residente, Mtro de obra, Dir de obra, Ayudante, Operador, 1 Siso, Conductores.
- Equipos: 2 camionetas, 1 bulldozer.
- clima: Seco
- Horario: 7am-6Pm

...

... Continuación Miercoles 31 Julio 2024

Actividades: Se finaliza la demarcación vial con pintura en frio a lo largo de toda la via.

Contratista

Interventoria

Jueves 27 junio /24
Clima: Soleado.
Personal: ① Ing Residente - ① Inspector -
③ operadores - ③ conductores.
Actividades.
- Se continua con el mejoramiento de los puntos criticos dela via de acceso.

Cuad Jue FJC.

Viernes 28 junio - Domingo 30 junio.
Clima:
Fuertes lluvias en horas dela madrugada,
no se realizan actividades de mejoramiento
de puntos criticos de via de acceso.

Cuad Jue FJC.

Lunes 01 julio Festivo.
Clima:
lluvias altas en la noche anterior.
Actividades.
No se realizan actividades de mejoramiento
de puntos criticos de la via de acceso, ni de
ningún otro tipo.

Cuad Jue FJC.

Martes 02 julio /24.
Clima:
lluvias medias en la madrugada
Actividades.
- Se continua con el mejoramiento de los puntos criticos dela via de acceso.

Cuad Jue FJC.

Miercoles 03 julio.
Clima:
dia soleado.
Actividades.
- El contratista continua con el mejoramiento de los puntos criticos dela via de acceso.
- Ingresan material petreo alas obras.

Cuad Jue FJC.

Jueves 04 julio /24
Clima:
Dia: Soleado - lluviznaal finalizar la tarde,
de 4:15 - 6:30 pm.

Powered by CamScanner

Actividades:
- Recorrido a la obra por parte del residente de Interventoría.
- El contratista continua con el mejoramiento de los puntos críticos de acceso a la obra.

@ juez BL.

Viernes 05 Julio /24.
Clima:
Lluvias altas en la madrugada con llovizna hasta las 9:30 de la mañana.
- Lluvias medias en horas de la tarde, de 2 a 4
- No se pudo realizar ningun tipo de actividad.

@ juez BL.

Sabado 06 Julio /24
Clima: Nublado - Soleado
Actividades:
- Recorrido a la obra por parte del residente de Interventoría.

- No se evidencian actividades en la obra ni en la via de acceso.

@ juez BL.

Domingo 07 Julio /24.
Clima:
Lluvias medias en la madrugada.
No se realizan actividades.

@ juez BL.

Lunes 08 Julio /24.
Clima:
Mañana: Nublado con llovizna hasta las 8:30
Tarde: sol
Actividades:
- Recorrido a obra por parte de la Interventoría.
- El contratista continua con el mejoramiento de puntos críticos de la via de acceso.
- sin mas actividades.

@ juez BL.

Powered by CamScanner

Martes 09 Julio
Clima: dia soleado
Actividades.
- Recorrido alla obra por parte della Interventoria.
- El contratista continua con el mejoramiento de puntos criticos della via de acceso alla obra
- Sin mas actividades.

Jue PZ.

Miercoles 10 Julio /24.
Clima: lluvias altas la noche anterior
Mañana: Nubada - Tarde: Sol.
Actividades:
- Recorrido alla obra por parte della Interventoria.
- El contratista continua con el mejoramiento de los puntos criticos de la via de acceso alla obra.

Jue PZ.

Jueves 11 Julio /24.
Clima: lluvias medias la noche anterior
Dia: soleado.
Actividades:
- Recorrido alla obra por parte della Interventoria.
- El contratista continua con el mejoramiento de puntos criticos della via de acceso alla obra.
- Sin mas actividades.

Jue PZ.

Viernes 12 Julio /24
Clima: lluvias medias la noche anterior.
Dia: soleado.
Actividades:
- Se Realiza comité de obra con el contratista - Alcalde e Interventoria (Virtual).
- Recorrido alla obra por parte della Interventoria.
- Continuan con el mejoramiento de puntos criticos della via de acceso alla obra.
- Vaciado de concreto para placas rigidas y ciclopeas entre K8+467 — K8+940 LI, se exige el uso del Vibrador de concretos en el vaciado, pero el contratista hace caso omiso alla Interventoria.

Jue PZ.

Powered by CamScanner

Sabado 13 Julio /24.
Clima: dia Soleado
Actividades.
- Recorrido ala obra por parte dela Interventoría.
- mejoramiento de puntos críticos dela vía de acceso ala obra
- Sin mas actividades

JUEBL.

Domingo 14 Julio /24
Clima: Dia Soleado.
Actividades.
- Recorrido ala obra por parte dela Interventoría.
- Cargue y transporte de material para el mejoramiento de los puntos críticos dela vía de acceso ala obra.
- Sin mas actividades.
- Contratista manifiesta que debido a los condiciones de la vía, no ha podido ingresar materiales para la construccion (Piedra - Arena - cemento)

JUEBL.

Lunes 15 Julio /24
Clima: Dia Soleado
Actividades.
- Recorrido ala obra por parte dela Interventoría.
- Suministro de agregados petreos para elaboracion de concretos.
- Mejoramiento de puntos dela vía de acceso ala obra.
- Sin mas actividades.

JUEBL.

Martes 16 Julio /24.
Clima: Dia Soleado
Actividades.
- Recorrido a la obra por parte dela Interventoría.
- Suministro de agregados petreos para elaboracion de concretos.
- Maquinaria en Stuby.
- Sin mas actividades.

JUEBL.

Powered by CamScanner

Miercoles 17 Julio /24
Clima: Dia Soleado
Personal: ① Ing Residente - comision topografica.
① maestro - ② oficiales - ⑫ ayd^{R} - ② paleteros
① sso - ③ operadores.
Actividades.
- Recorrido alea obra por parte dela Interventoria.
- conformacion de sub base e instalacion de rieles para placas LI de la K8+850 - K8+870
- Se Requiere al contratista utilizar la rana de compactador en el material suelto que esta en la sub base.
- Se Reitera al contratista utilizar vibrador de concretos en los vaciados
- Se Requiere al contratista hacer o inducir las juntas longitudinal entre placas rigidas y ciclopeas

- Contratista informa que está haciendo la respectiva compactación a la subbase granular.

(vie) fue BL.

Jueves 18 Julio /24.
Clima: lluvias medias la noche anterior.
Personal: ① Ing Residente - comision topografica
③ operador - ① maestro - ② oficial - 12 ayd^{R} -
① paletero - ① sso.

Actividades:
- Instalacion de sub base a todo lo ancho de la calzada, con motoniveladora y vibro entre K8+750 - K8+813
- Vaciado de concreto para placas rigidas, ciclopeas y vigas postes LI entre la K8+850 - K8+870, el contratista para esta actividad no utiliza vibrador de concreto, no compacta el material suelto dela sub base, lo hace bajo su responsabilidad y riesgo.
- Se Requiere al Contratista no permitir el trafico pesado por las placas sin que hayan cumplido la resistencia maxima a los 28 dias, las placas que se vaciaron el dia 12 de Julio le están transitando vehiculos pesados del contratista. (motoniveladora - volquetas etc).
- Se Requiere al contratista hacer o inducir las juntas longitudinales entre placas rigidas y ciclopeas.

(vie) fue BL.

Viernes 19 Julio /24
Clima: lluvias altas la noche anterior - dia soleado.
Personal: ① Ing residente - ① maestro - ② Oficial - ⑫ ayd^{R} - ③ operador - ① paletero - ① sso.

Powered by CamScanner

Actividades:
- Recorrido a la obra por parte de la InterVentoría.
- Vaciado de concreto para placas rígidas - Cuelopeas y vigas riostras LI de la K8+813 - K8+850.
El Contratista continúa con los Vaciados de concretos sin utilizar Vibrador de concretos, lo hace bajo su responsabilidad y riesgo.
- Replanteo topográfico de ejes y niveles de la K8+700 - K8+813
- la Vía de acceso a la obra continúa con al menos 10 puntos por arreglar.
- se requiere al contratista hacer un mejor acabado al texturizado y a los juntos de las placas.
- se Reitera al contratista hacer o Inducir los juntos longitudinales entre placas rígidas y Cuelopeas.

Juan FIC.
Sábado 20 Julio /24 Festivo.
Clima: Día soleado
Personal:
① Ing Residente - ① maestro - ② oficiales - ⑫ ayd R -
① paletera - ① Sisa - ③ operadores
Clima: Día soleado
Personal: ① Ing Residente - ① maestro - ② oficiales - ⑫ ayd - ③ Operadores - ① paletera - ① Sisa.

Actividades:
- Se requiere al contratista no continuar con los Vaciados de concretos sin utilizar el Vibrador de concretos.
- El contratista realiza el Vaciado de concretos de placas rígidas - Cuelopeas y Vigas Riostras del K8+813 - K8+850 LD, sin acatar las recomendaciones de la InterVentoría, no usan Vibrador de concretos, lo hacen bajo su responsabilidad y riesgo.
- Se Reitera al contratista hacer o Inducir los juntos longitudinal entre placas rígidas y Cuelopeas.
- Se Requiere al contratista reparar las losas rígidas y Cuelopeas que se encuentran fracturadas entre el K8+450 — K9+100 a todo lo ancho de la calzada.

Juan FIC.
Domingo 21 Julio /24
Clima: Día Soleado.
No se realizan actividades.

Juan FIC

CamScanner
Powered by

Lunes 22 Julio /24
Clima: dia soleado
Personal: ① Ing Resid - ③ operadores - ① maestro - ② oficiales - ⑫ ayd - ① paletero - ① SSO.
Actividades:
- Recorrido alu obra por parte dela Interventoria.
- El contratista continua con los Vaciados de concretos sin acatar las recomendaciones de la Interventoria.
- Vaciado de concretos para placas rígidas, ciclopeos y vigas riostras entre K8+420 - K8+467 LI, no utilizan vibrador de concretos
- Se requiere al contratista habilitar Vias alternas
- Suministro de materiales petreos por Vaciado de concretos.
- Se Requiere al contratista Iniciar las actividades de construcción de las obras de arte (box culvert)
- Se Reitera al contratista hacer un mejor acabado al texturizado y a las juntas de las placas.
- Se Reitera al contratista señalizar la obra, limpiar la Via de la rebaba de concreto y de los materiales petreos que colocan en ella, pueden ocacionar accidentes.
- Se reitera al contratista retirar dela obra el personal q no esté afiliado, que no tenga dotacion ni EPP.
- Se Requiere al contratista la adecuado disposicion final delos residuos de bolsas de cemento mal acopiadas

Martes 23 Julio /24
Clima: lluvias medias en la madrugada
Dia: soleado.
Personal: ① maestro - ② oficial - ⑫ ayd ① paletero - ① SSO.
Actividades:
- Recorrido alu obra por parte dela Interventoria.
- Vaciado de concreto para placas rígidas - ciclopeos y vigas riostras K8+390 - K8+420 LI, No utilizan Vibrador de concretos.
- Se Reitera al contratista utilizar rieles en buen estado para brindar un mejor acabado alu placa huella.

Miercoles 24 Julio /24
Clima: lluvias altas en la madrugada
Dia: soleado
Personal: ① Ing Residente - ② operadores - ② ayd.
Actividades: Mejoramiento de puntos criticos dela Via de acceso.

Powered by CamScanner

Jueves 25 de Julio
Clima: lluvias altas en la madrugada.
mañana nublados - soleados
Tarde Sol y lluvias a partir de las 4:00
Personal: ① Ing Residente - ① maestro - ① opical
⑧ ayd - ② paleteros - ① Sisa - ② operadores.
Actividades.
- Recorrido alea obra por parte dela Interventoria
- conformacion de terreno e Instalacion de rieles para conetos K8+390 - K8+500 LI
- Se continúa con el mejoramiento de puntos críticos dela Via de acceso a la obrea.
- Se Reitera al contratista utilizar Vibrador de concretos en los Vaciados
-

Viernes 26 Julio /24
Clima: lluvias altas en la madrugada
dia: nublado - soleado
Personal:
① Ing Residente - ① maestro - ① opical - ⑧ ayd
② paleteros - ① Sisa - ② operadores.
Maquinaria - Equipos.
① Motoniveladora - ① Vibro - Herramienta menor
Actividades:

Actividades:
- Chequeo de niveles de la coneta por la topografia dela Interventoria K8+390 - K8+600 LI
- conformacion de terreno e Instalacion de rieles para conetos K8+390 - K8+600 LI
- Mejoramiento de puntos críticos dela Via de acceso a la obra

Sabado 27 Julio /24
Clima: lluvias Intensas en la madrugada hasta las 9:00 dela mañana, no se realizan actividades por las condiciones climaticas.

Domingo 28 Julio /24.
lluvias en la madrugada.
No hay actividades.

Lunes 29 Julio /24
Clima: dia Soleado.
Personal: ① Ing Residente - ① maestro - ① oficial - (12) ayd - (2) paleteros - ① SISO - (2) operadores.
Maquinaria - Equipos.
① motoniveladora (R) - ① Vibro (O).
Actividades.
- Recorrido alea obra por parte de la Interventoría.
- suministro de material para sub base
- conformacion de terreno e instalacion de rieles para cunetas K8+390 - K8+580 LI
- conformacion manual de terreno por sub base K8+700 - K8+813
- chequeo de niveles de la sub base por parte de la Interventoría K8+700 - K8+813
- se Requiere al contratista habilitar vias alternas para evitar que transiten por los lotes sin cumplir tiempo fraguado, y para el ingreso del material.
- Se Reitera al contratista Iniciar las actividades de construccion de obras de arte (box culvert)
- Se Reitera al contratista utilizar vibrador de concretos en los vaciados y utilizar la rana compactadora en la reconformacion del terreno.
- Se Reitera al contratista hacer un mejor acabado al Texturizado y a las juntas de las placas
- Se Reitera al contratista hacer o Indocir las juntas longitudinales entre placas rigidas y ciclopea
- Se Reitera al contratista reparar los lotes rigidas y ciclopeas que se encuentran fracturadas entre el K8+450 - K8+100 a todo lo ancho de la calzada, esta situacion puede ocacionar filtraciones y posteriormente la Inestabilidad de la obra.
- Se Reitera al contratista utilizar rieles en buen estado para brindar un mejor acabado a la obra.

Lunes 29 Julio /24
- Se Reitera al contratista retirar de la obra el personal que no este afiliado, que no tenga dotacion, ni EPP, si no acata la sugerencia laboran bajo responsabilidad y riesgo de contratista
- Se Reitera al contratista la adecuada disposicion Final de todos los residuos que genera la obra.

Martes 30 Julio /24
Clima: Dia soleado
Personal: ① Ing Residente - ① maestro - ① oficial - 12 ayd - ② paleteros - ① SIO - ② operadores.
Maquinaria - Equipos.
① Motoniveladora (R) - ① Vibro (d) - Paponia (R)
Actividades:
- chequeo de niveles de sub base por parte de la Interventoria de la K8+700 - K8+813
- Instalacion de rieles y acero para cunetas de la K8+390 - K8+580 LI y Vaciado de Concreto para la misma
- Vaciado de cunetas.
- El la actividad del Vaciado del concreto NO usara Vibrador de concretos.

Miercoles 31 Julio /24
Clima: lluvias altas la noche anterior
Dia soleado.
Personal: ① Ing Residente - comision topografica -
① maestro - ③ Oficiales - ⑮ ayd - ② paleteros
① Sso - ② operadores.
Maquinaria - Equipos
① motoniveladora (R) - ① Vibro (d) - ① Pajenta (o)
Actividades
- Recorrido a la obra por parte de la Interventoria K8+700 - K8+813.
- chequeo de niveles de la Sub base por parte de la Interventoria de la K8+700 - K8+813
- Conformacion de terreno e Instalacion de rieles y ac para cunetas K8+410 - K8+480 LI
- Corte - figuracion y armado de acero por placas rigidas, Cunetas, bordillos y Vigas Riostras.
- Se da Inicio a la Instalacion de formaletas para bordillos ambos lados K9+200 L K9+260.

Nota: las formaletas utilizadas para los bordillos son tablas de madera que no garantizan el alineamiento y un buen acabado para los bordillos por esta razon la Interventoria No autoriza seguir con estas formaletas, si lo hacen es bajo su responsabilidad y Riesgo.

Ing Jose B C.

Powered by CamScanner
