INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MS-MC-031-2026

1. DATOS GENERALES

Tabla 1. Datos generales tipo de informe y supervisor.

TIPO DE INFORME	**PERIÓDICO**		**FINAL**	X
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DESDE**	31-07-2026	**HASTA**	24-08-2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ			
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS			
CARGO:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS			

2. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO SUPERVISADO

Una vez la administración municipal de Sáchica inició el contrato **No. MS-MC-031-2026** y completó el proceso de evaluación, se adjudicó el contrato de mínima cuantía al proponente **H CONSTRUCOL S.A.S**. A continuación, se presentan datos relevantes del contrato adjudicado:

Tabla 2. Información del contrato de obra.

CONTRATO	MS-MC-031-2026
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SÁCHICA, BOYACÁ
CONTRATISTA:	H CONSTRUCOL S.A.S. NIT. No. 901.086.376-1 R/L: HECTOR ENRIQUE BLANCO SOLER C.C. No. 1.053.684.307 DE RONDÓN
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARALELO A LA VÍA DE LA CALLE 8 CON CARRERA 3 DEL BARRIO NUEVA ESPERANZA ETAPA 2
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TREINTA (30) DÍAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS **($12.458.200,00)** M/CTE.
VALOR TOTAL EJECUTADO	DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS **($12.458.200,00)** M/CTE.

VALOR SIN EJECUTAR	$ 0,00
FECHA FIRMA DE CONTRATO	28 DE JULIO DE 2026
FECHA DE INICIACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE AGOSTO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	24 DE AGOSTO DE 2026

3. LOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

La localización de las actividades ejecutadas por el contratista, en cumplimiento total del objeto contractual y hasta la fecha de la presente acta, se localizaron en el Casco Urbano del Municipio de Sáchica entre la **CALLE 8 CON CARRERA 3**, en el **BARRIO NUEVA ESPERANZA ETAPA 2**. Las coordenadas de la intervención se muestran a continuación.

Figura 1. Localización de las actividades desarrolladas **CALLE 8 CON CARRERA 3**, **BARRIO NUEVA ESPERANZA ETAPA 2**, municipio de Sáchica – Boyacá.



	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espitia Monroy	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

4. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. **MS-MC-031-2026** los cuales hacen parte integral del presente contrato. Todas las actividades aquí contempladas cuentan con la supervisión correspondiente, garantizando que éstas cumplan con las especificaciones y estándares establecidos.

Tabla 3. Cuadro de ítems y cantidades del presupuesto contractual.

ÍTEM	SUB ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1.1	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	6,00	$ 90.000,00	$ 540.000,00
1.2	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	6,00	$ 180.000,00	$ 1.080.000,00
1.3	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	ML	2,00	$ 1.240.000,00	$ 2.480.000,00
1.4	2.02.22	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) DE 1.00 M. < H < 2.00 M.	ML	2,95	$ 1.410.000,00	$ 4.159.500,00
1.5	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	UND	419,87	$ 10.000,00	$ 4.198.700,00
					VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 12.458.200,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A	20%
IMPREVISTO	I	5%
UTILIDAD	U	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U	30%

El contratista ejecutó las actividades asignadas como obligaciones en el objeto contractual, las cuales se mencionan a continuación:

4.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN

El siguiente registro detalla las actividades desarrolladas en la ejecución del ítem **EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN**, de acuerdo con las cantidades ejecutadas por el contratista. En la tabla se presentan las actividades realizadas, indicando su localización, dimensiones, cantidad parcial, número de elementos y la cantidad total ejecutada.

Tabla 4. Cuadro de cantidades ejecutadas, Actividad EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	CANT. TOTAL (M3)
	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)			
EXCAVACIÓN PARA MURO DE CONTENCIÓN	10,00	1,00	0,60	6,00	1,00	6,00
					TOTAL	6,00

4.2 MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

El siguiente registro detalla las actividades desarrolladas en la ejecución del ítem **MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)**, de acuerdo con las cantidades ejecutadas por el contratista. En la tabla se presentan las actividades realizadas, indicando su localización, dimensiones, cantidad parcial, número de elementos y la cantidad total ejecutada.

Tabla 5. Cuadro de cantidades ejecutadas, Actividad MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	CANT. TOTAL (M3)
	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)			
NIVELACIÓN DE PISO PARA CIMENTACIÓN	10,00	1,00	0,10	1,00	1,00	1,00
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO	10,00	0,50	1,00	5,00	1,00	5,00
					TOTAL	6,00

4.3 CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA

El siguiente registro detalla las actividades desarrolladas en la ejecución del ítem **CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA** de acuerdo con las cantidades ejecutadas por el contratista. En la tabla se presentan las actividades realizadas, indicando su localización, dimensiones, cantidad parcial, número de elementos y la cantidad total ejecutada.

Tabla 6. Cuadro de cantidades ejecutadas, Actividad CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPA (3000 PSI) + FORMALETA MADERA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	CANT. TOTAL (M3)
	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)			
CIMENTACIÓN CORRIDA PARA MURO DE CONTENCIÓN	10,00	1,00	0,20	2,00	1,00	2,00
					TOTAL	2,00

4.4 MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) DE 1.00 M. < H < 2.00 M.

El siguiente registro detalla las actividades desarrolladas en la ejecución del ítem **MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) DE 1.00 M. < H < 2.00 M** de acuerdo con las cantidades ejecutadas por el contratista. En la tabla se presentan las actividades realizadas, indicando su localización, dimensiones, volumen, y la cantidad total ejecutada.

Tabla 7. Cuadro de cantidades ejecutadas, Actividad MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) DE 1.00 M. < H < 2.00 M

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT. TOTAL (M3)
	ÁREA CARA MAYOR MURO H = 1.3M (m2)	ÁREA CARA MENOR MURO H=0.65M (m2)	ÁREA PROMEDIO (m2)	LONGITUD (m)	VOLUMEN (m3)	
MURO DE CONTENCIÓN INCLINADO H = 1.3 m a 0.65 m L=10 m	0,39	0,20	0,295	10,00	2,95	2,95
					TOTAL	2,95

4.5 SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)

El siguiente registro detalla las actividades desarrolladas en la ejecución del ítem **SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)** de acuerdo con las cantidades ejecutadas por el contratista. En la tabla se presentan las actividades realizadas, indicando su localización, dimensiones, número de elementos y la cantidad total ejecutada.

Tabla 8. Cuadro de cantidades ejecutadas, Actividad SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPA (60000 PSI)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	CANT. TOTAL (KG)
	SEPARACIÓN (m)	N° BARRA	LONGITUD (m)	PESO (KG)		
ACERO CIMENTACIÓN						
ACERO TRANSVERSAL CIMENTACIÓN CORRIDA	0,15	4,00	1,08	0,994	67,00	71,93
ACERO LONGITUDINAL CIMENTACIÓN CORRIDA	0,15	4,00	10,10	0,994	7,00	70,28
TRASLAPO ACERO LONGITUDINAL CIMENTACIÓN		4,00	0,60	0,994	7,00	4,17
ACERO MURO DE CONTENCIÓN						
ACERO TRANSVERSAL MURO DE CONTENCIÓN	0,15	4,00	3,01	0,994	67,00	200,13
ACERO LONGITUDINAL MURO BARRAS COMPLETAS	0,15	4,00	9,90	0,994	5,00	49,20
TRASLAPO ACERO LONGITUDINAL MURO BARRAS COMPLETAS		4,00	0,60	0,994	5,00	2,98
ACERO LONGITUDINAL MURO BARRAS CORTADAS	0,15	4,00	4,14	0,994	5,00	20,58
TRASLAPO ACERO LONGITUDINAL MURO BARRAS CORTADAS		4,00	0,60	0,994	1,00	0,60
					TOTAL	**419,87**

En la presente Acta Final se registra un valor ejecutado total de **DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ($12.458.200,00)** M/CTE, correspondiente a las cantidades e ítems ejecutados por el Contratista, alcanzando una ejecución total del 100 %.

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades y el valor ejecutado del contrato en la presente Acta Final.

Tabla 9. Resumen de cantidades y valor total ejecutado con la presente acta final.

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARALELO A LA VIA DE LA CALLE 8 CON CARRERA 3 DEL BARRIO NUEVA ESPERANZA ETAPA								
ITEM	SUB ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA FINAL Y/O LIQUIDACIÓN	
		DESCRIPCION	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
1.1	2.01.70	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	6,00	$ 90.000,00	$ 540.000,00	6,00	$ 540.000,00
1.2	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	6,00	$ 180.000,00	$ 1.080.000,00	6,00	$ 1.080.000,00
1,3	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	2,00	$ 1.240.000,00	$ 2.480.000,00	2,00	$ 2.480.000,00
1,4	2.02.22	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) DE 1.00 M. < H < 2.00 M.	M3	2,95	$ 1.410.000,00	$ 4.159.500,00	2,95	$ 4.159.500,00
1,5	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	419,87	$ 10.000,00	$ 4.198.700,00	419,87	$ 4.198.700,00
					TOTAL CONTRATO	$ 12.458.200,00		$ 12.458.200,00

5. BALANCE FINANCIERO

Tabla 10. Balance financiero.

VALOR DEL CONTRATO	**$ 12.458.200,00**
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 12.458.200,00**
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00
RECIBO Y LIQUIDACIÓN	**$ 12.458.200,00**
VALOR A PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL	**$ 12.458.200,00**

VALOR TOTAL A CANCELAR PRESENTE ACTA: **DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ($12.458.200,00) M/CTE.**

6. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

En el periodo de ejecución comprendido entre el 31 de julio y el 24 de agosto de 2026, el municipio recibió a satisfacción las actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto contractual, correspondientes al Contrato de Mínima Cuantía No. **MS-MC-031-2026.**

7. PROCEDE PAGO

Una vez revisados los términos del contrato y verificado que todas las condiciones han sido cumplidas adecuadamente por **H CONSTRUCOL S.A.S.** procede realizar el pago correspondiente conforme a lo acordado.

Tabla 11. Aprobación pagos.

SI	NO
X	

8. GARANTÍAS CONTRACTUALES

En cumplimiento de lo establecido en el contrato No. MS-MC-031-2026, suscrito el 28 de julio de 2026, se presentan las características de las garantías que respaldan el mencionado contrato. En ese orden de ideas, el contratista **H CONSTRUCOL S.A.S.** identificado con Nit. No. 901.086.376-1 representado legalmente por **HECTOR ENRIQUE BLANCO SOLER**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.053.684.307 de Rondón, a través del portal transaccional SECOP II público y actualizó las pólizas de cumplimiento No. 39-44-101184542 y No. 39-40-101048515 de fecha de expedición 29 de julio de 2026 respectivamente, proferido por **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, cuyos amparos, vigencias y cuantías, se relacionan a continuación:

Tabla 12. Garantías iniciales del Contrato - No. 39-44-101184542

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
PÓLIZA No.	39-44-101184542			
ANEXO No.	0			
FECHA DE EXPEDICIÓN	29/07/2026			
TIPO DE AMPARO	**DESDE**	**HASTA**	**MONTO ASEGURADO**	**CUANTÍA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/07/2026	30/12/2026	$ 1.245.820,00	10%
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	28/07/2026	30/08/2029	$ 1.245.820,00	10%
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$ 2.491.640,00	20%



Tabla 13. Garantías iniciales del Contrato - No. 39-40-101048515

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PÓLIZA No.	39-40-101048515
ANEXO No.	0
FECHA DE EXPEDICIÓN	29/07/2026

TIPO DE AMPARO	DESDE	HASTA	MONTO ASEGURADO	CUANTÍA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	28/07/2026	30/08/2026	$ 350.181.000,00	200 SMMLV


9. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Tabla 14. Descripción registro fotográfico

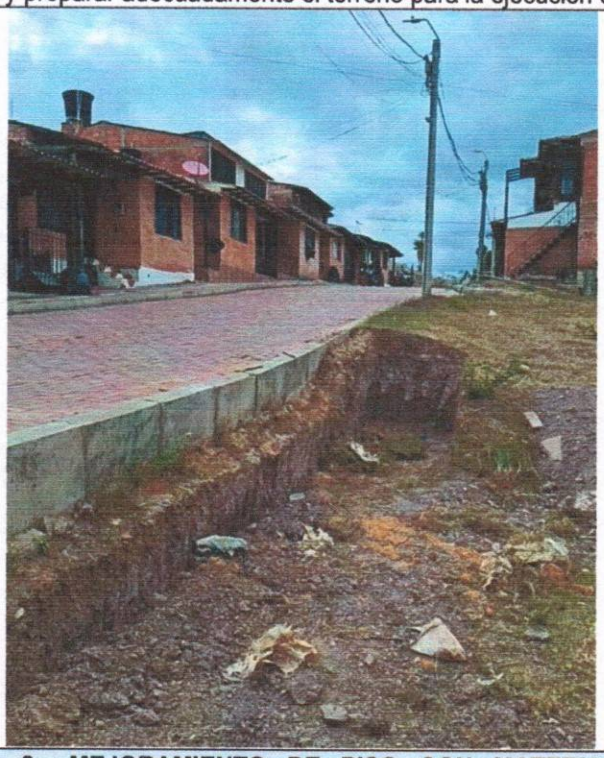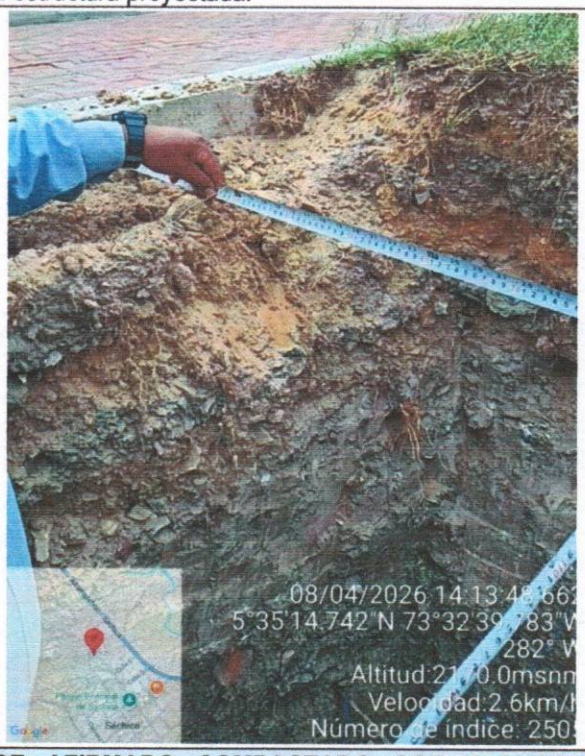CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARALELO A LA VÍA DE LA CALLE 8 CON CARRERA 3 DEL BARRIO NUEVA ESPERANZA ETAPA 2	
1. EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	
Descripción:	
La actividad consistió en la excavación manual en material común para la apertura, adecuación y perfilado del área destinada a la posterior construcción de un muro de contención. La excavación se realizó en una longitud aproximada de 10,00 m, un ancho de 1,00 m y una profundidad promedio de 0,60 m, con el propósito de conformar y preparar adecuadamente el terreno para la ejecución de la estructura proyectada.	
	
2. MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	
Descripción:	


CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARALELO A LA VÍA DE LA CALLE 8 CON CARRERA 3 DEL BARRIO NUEVA ESPERANZA ETAPA 2

La actividad consistió en el mejoramiento del piso de fundación con material de afirmado, con el fin de garantizar una correcta trabajabilidad y estabilidad del suelo sobre el cual se proyectaría la construcción del muro. El material fue debidamente compactado en una capa de 0,10 m de espesor, correspondiente al largo y ancho de la excavación. Adicionalmente, el mismo material se utilizó como relleno en la parte paralela a la vía, debidamente compactado, con el fin de garantizar la estabilidad y contención del talud. Este relleno se realizó con un ancho de 0,50 m y una altura de 1,00 m, considerando el porcentaje y factor de compactación.

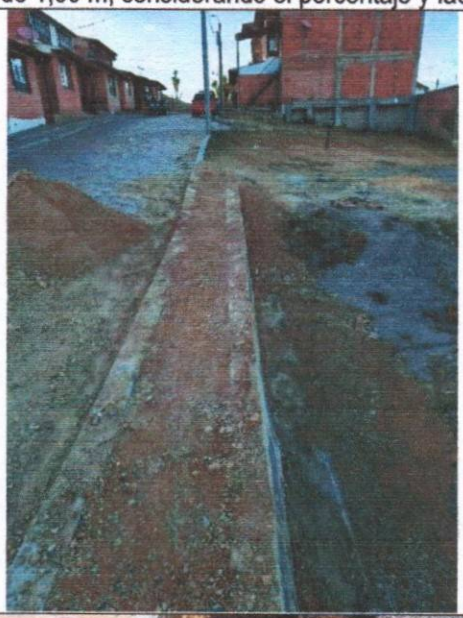

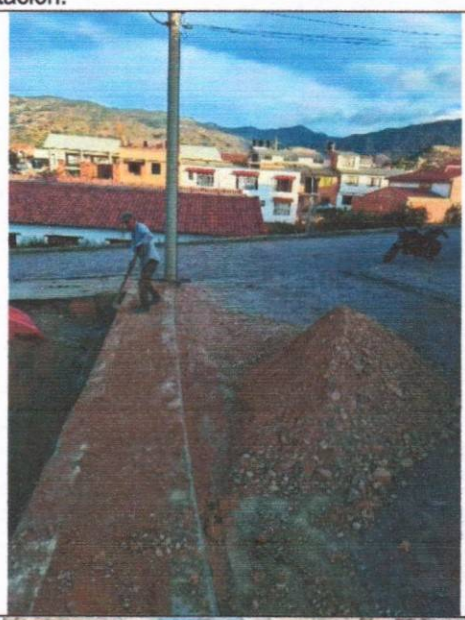



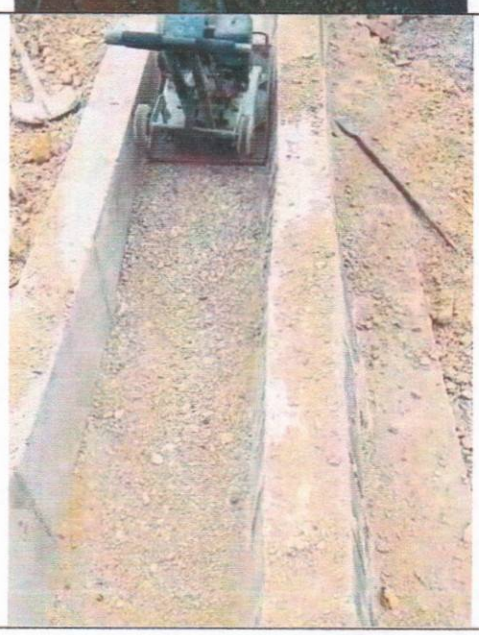

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espitia Monroy	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas


CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARALELO A LA VÍA DE LA CALLE 8 CON CARRERA 3 DEL BARRIO NUEVA ESPERANZA ETAPA 2

3. CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA

Descripción:

La actividad consistió en el suministro e instalación de concreto para la cimentación corrida del muro de contención, con una resistencia de 3.000 PSI, un largo de 10 m, un ancho de 1 m y un espesor de 0,20 m, correspondiente al talón del muro de contención. Esta actividad se realizó siguiendo las recomendaciones técnicas para garantizar una correcta colocación, vibrado, fraguado y curado del concreto de cimentación.



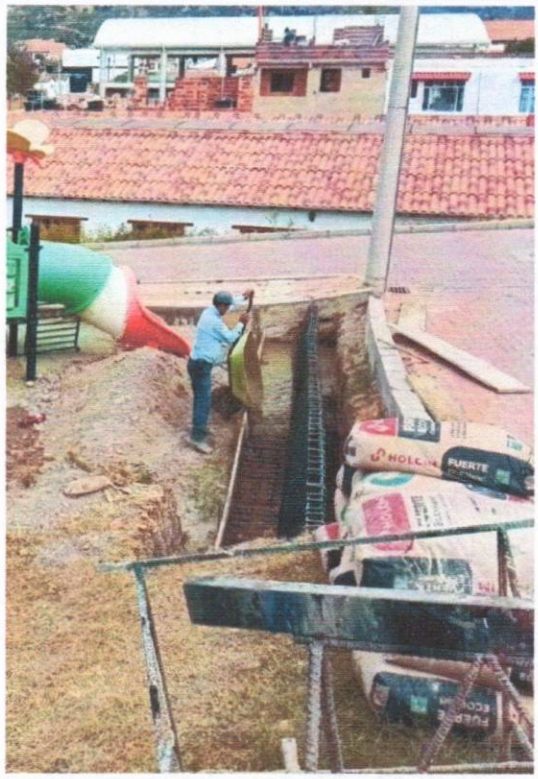


4. MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) DE 1.00 M. < H < 2.00 M.


Descripción:


La actividad consistió en el suministro e instalación de concreto de 21 MPa o 3.000 PSI para la construcción del muro de contención, con una altura variable de acuerdo con la topografía del sitio. Dicha actividad se realizó teniendo en cuenta las indicaciones presentadas y considerando la inclinación del terreno debido a la variación de altura, comenzando desde una altura aproximada de 1,30 m hasta llegar a 0,65 m en la parte inferior. Se siguieron las recomendaciones para el formaleteo, la colocación, el correcto vibrado para evitar hormigueros, así como el fraguado y curado del concreto, con el fin de alcanzar la resistencia de diseño y garantizar la estabilidad del muro.

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARALELO A LA VÍA DE LA CALLE 8 CON CARRERA 3 DEL BARRIO NUEVA ESPERANZA ETAPA 2

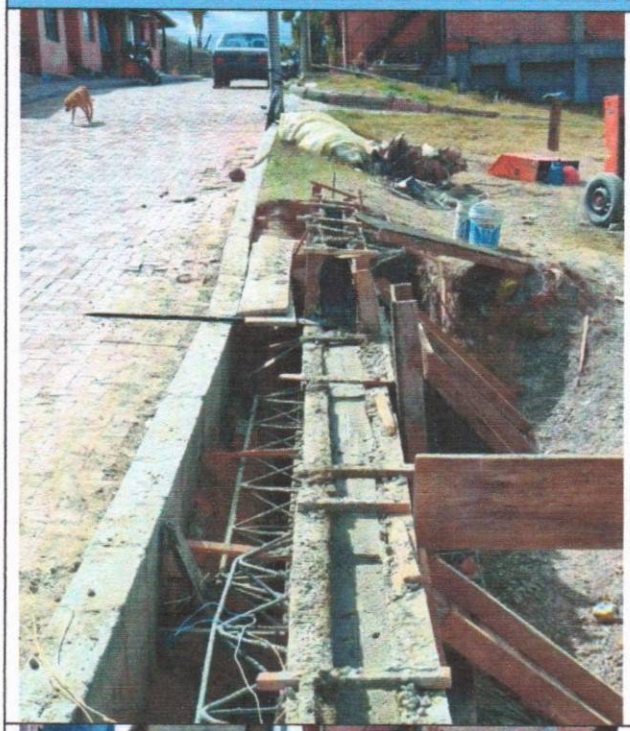



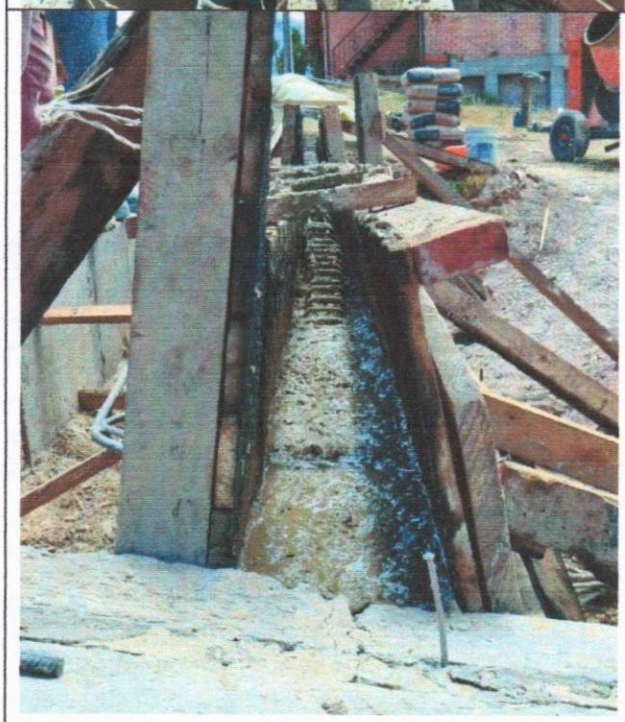

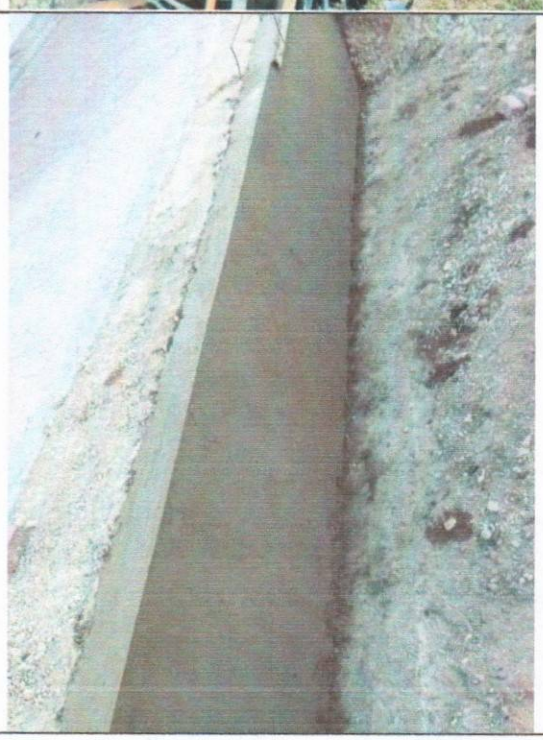


	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espitia Monroy	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas


CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARALELO A LA VÍA DE LA CALLE 8 CON CARRERA 3 DEL BARRIO NUEVA ESPERANZA ETAPA 2

5. SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)


Descripción:

La actividad consistió en el suministro e instalación de acero de refuerzo para la cimentación corrida del muro, dispuesto tanto en sentido transversal como longitudinal, con los debidos traslapos donde fue necesario. Se utilizó varilla No. 4 de ½", garantizando una separación máxima de 0,15 m, las longitudes necesarias, los ganchos y la cantidad total de elementos requeridos, distribuidos en el largo y ancho del elemento. De igual forma, se instaló el acero longitudinal y transversal para el muro de contención, compuesto por doble parrillado en ambas direcciones, debido al ancho del elemento, utilizando varilla No. 4, con separaciones máximas de 0,15 m, traslapos y ganchos establecidos en el diseño, así como las longitudes adecuadas para garantizar el correcto reforzamiento de la estructura. Dentro de la actividad se garantizó el recubrimiento necesario del acero con respecto al suelo, con el fin de garantizar su protección.

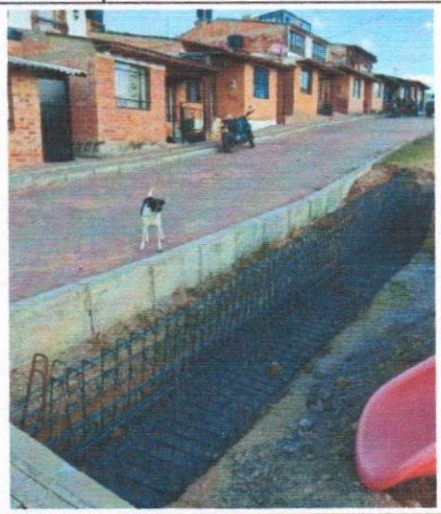

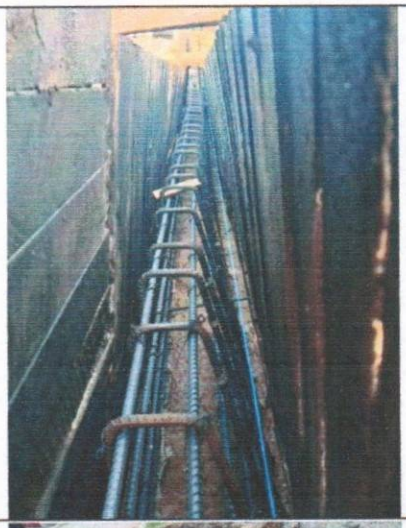



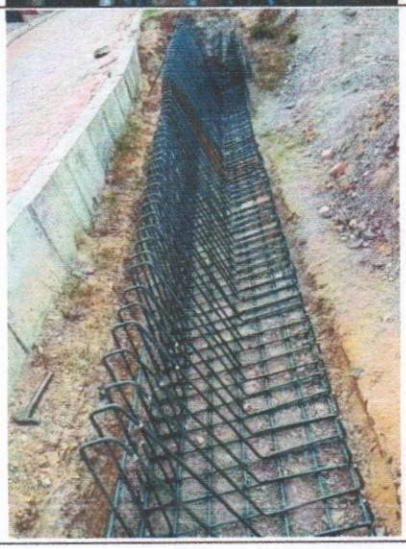

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espitia Monroy	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

10. OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR

- La ejecución de las actividades por parte del Contratista se desarrolló en condiciones óptimas y conforme a lo estipulado contractualmente, sin presentarse inconvenientes que generaran retrasos o demoras en los trabajos. La ejecución fue satisfactoria, logrando el Contratista realizar la entrega dentro del tiempo establecido y con fecha anterior al plazo contractual de un (1) mes, contando con Acta de Recibo Final de fecha 24 de agosto de 2026 y alcanzando el 100% de las actividades contempladas.

- De acuerdo con las cantidades y valores ejecutados, se registra un avance físico y presupuestal del 100% dentro del plazo contractual de treinta (30) días. Conforme al Acta de Recibo Final del 24 de agosto de 2026, se alcanzó la ejecución total del contrato por un valor de **DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ($12.458.200,00) M/CTE.**

ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

EL SECRETARIO ING. ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ de Sáchica Boyacá, y actuando como Supervisor del contrato de obra **Nº MS-MC-031-2026** cuyo objeto es **CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARALELO A LA VÍA DE LA CALLE 8 CON CARRERA 3 DEL BARRIO NUEVA ESPERANZA ETAPA 2.**

CERTIFICA

Que el contratista **H CONSTRUCOL S.A.S.** identificado con NIT: 901.086.376-1, representado por **HECTOR ENRIQUE BLANCO SOLER** identificado con numero de cedula CC: No. 1.053.684.307 DE RONDÓN, en Calidad de Contratista, ejecutó el contrato de **CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARALELO A LA VÍA DE LA CALLE 8 CON CARRERA 3 DEL BARRIO NUEVA ESPERANZA ETAPA 2** en modalidad de mínima cuantía, en el periodo comprendido el día 31 de JULIO al 24 de AGOSTO de 2026, desarrollando a satisfacción las actividades objeto del Acta Final, y certificando que la ejecución realizada hasta la fecha se anexa en la sabana presupuestal.

Esta certificación se expide a los veinticuatro (24) días del mes de AGOSTO del 2026, en el municipio de Sáchica (Boyacá).

Cordialmente,

ING. ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
Secretario de Planeación y Obras Publicas
