	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. LP-008-2022 **Contratista:** CONSORCIO CRISTO REY

Contrato de Interventoría No. 971 de 2022 **Interventoría:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

Objeto Contrato de Obra:
"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

INFORME MENSUAL No. TRECE (13) **MES O PERIODO:** DICIEMBRE DEL 2023

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	774
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	775
1	**INTRODUCCIÓN**		778
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		779
2.1	Localización		779
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		781
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		781
2.4	Características técnicas del proyecto		783
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		785
3.1	Información general del contrato		785
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		786
3.3	Seguimiento Items no previstos		787
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		788
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		789
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	790
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	800
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	802
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	813
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	816
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	822
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	824
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	833
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		838
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	839
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	842
	• Seguimiento Programa de Obra		844
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	846
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	848
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	850
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	851
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		945
5.1	Información general del contrato		945
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		946
5.3	Informes especialistas y profesionales		953
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		976
5.5	Informe matriz de riesgos.		977
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		983
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		NA
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		984
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	985
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	987
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	993
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	995
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	1002
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		1034
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	1035
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	1037
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1041
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	1048
7	**Conclusiones y recomendaciones**		858
8	**Anexos**		859
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		860
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		861
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		863
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		864

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 2723 de fecha 26/07/2022

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MEPI-MN1-IN-15-FR-2, RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 5/01/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **PERIODO MES:** dic-23

CONTRATO DE OBRA No.: LP-008-2022

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANANUEVA MUNICIPIO DE SAN PELAYO - CÓRDOBA

CONTRATISTA: CONSORCIO CRISTO REY

PLAZO INICIAL: 5 MESES
FECHA DE INICIO: 13/12/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022
PLAZO ACUMULADO: 12 MESES Y 18 DÍAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 4.170.496.742,96
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 4.170.496.742,96
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 1.251.149.022,89
ANTICIPO AMORTIZADO: $ 541.382.184,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 971 DE 2022 **INTERVENTOR:** ONSORCIO VIAL RURAL IMG **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	m	1200
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes	Und	1
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Box Coulvert	Und	3

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	m	270	680
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes	Und		
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Box Coulvert	Und		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 4.101.202.141,31	$ -	$ 4.101.202.141,31
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 33.316.757,69	$ 6.330.183,96	$ 39.646.941,65
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 24.914.000,00	$ 4.733.660,00	$ 29.647.660,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD		$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 4.159.432.899,00	$ 11.063.843,96	$ 4.170.496.742,96

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 40.926.530,00	$ -	$ 40.926.530,00	$ 1.823.382.977,00
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 29.647.660,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	$ 40.926.530,00	$ -	$ 40.926.530,00	$ 1.853.030.637,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 1.926.376.033,01
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 1.823.382.977,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 43,72%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 8
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **13**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA	5/01/2023 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalación de acero de refuerzo huella



Instalación de acero de refuerzo vigas

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN

Como resultado del concurso de méritos abierto **CMA-DTE-SEP-196-2021** y número ID del SECOP CO1.PCCNTR.3626320, El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, celebró el contrato de interventoría No. 971 del 2022, con el **CONSORCIO VIAL RURAL IMG**, el cual tiene por objeto: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 2".** Mediante comunicado SVR 49265, por la subdirectora de vías regionales de INVIAS, se impartió orden iniciación al contrato a partir del 22 de agosto de 2022. La Supervisión del Contrato es ejercida por la Ingeniera LAURA ISABELA PEÑA GARCIA, la cual fue nombrada mediante resolución No. 2723 de fecha 26 de julio de 2022. La gestión técnica del Proyecto es ejercida por el ingeniero ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON, el cual fue nombrado mediante resolución 3343 del 2 de noviembre de 2021.

Por otra parte, El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, establece lazos de cooperación con el municipio de San Pelayo, en el departamento de Córdoba, mediante convenio interadministrativo No. 1876 de 2021. Es por ello por lo que mediante el **Proceso LP-008-2022 del municipio de San Pelayo** se celebra el Contrato de Obra No. LP-003-2022, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.", El cual fue adjudicado al CONSORCIO CRISTO REY, cuyo plazo inicial es de cinco (5) meses a partir del 13 de diciembre de 2022 según acta de inicio, y tiene un valor inicial de $ 4.170.496.742,96. La entidad contratante otorgo al contratista una primera prórroga en tiempo por tres (03) meses, seguido concedió al contratista una segunda prorroga por cuatro (04) meses más, estipulando como fecha de finalización el día 13 de diciembre de 2023, conservando el valor inicial del contrato de $ 4.170.496.742,96.

El presente informe mensual de interventoría, tiene como propósito evaluar las diferentes actividades de orden técnico, administrativa, financiera y ambienta desarrolladas por el contratista durante el periodo comprendido desde el 01 al 31 de diciembre de 2023; e igualmente resumir las actividades de apoyo técnico, control y supervisión adelantadas por la interventoría durante el mismo periodo, de acuerdo con los lineamientos descritos en el Manual de Interventoría de la versión No.1 del 2022, de tal manera que la entidad contratante tenga una visión oportuna y precisa sobre el desarrollo y estado del contrato y de los diferentes proyectos que nos ocupan.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

Se realiza el mejoramiento de la vía que comunica el corregimiento de Sabana Nueva en el Municipio de San Pelayo.



Ilustración 1. Mapa de Colombia, Ubicación del departamento de Córdoba



Ilustración 2. Mapa de Córdoba, ubicación del municipio de San Pelayo.

El municipio de San Pelayo se encuentra ubicado en la parte norte del Sinú Medio en el departamento de Córdoba, entre los meridianos 8°58' de latitud Norte y 75°51'de longitud Oeste de Greenwich. Limita geográficamente por el norte con el municipio de Santa Cruz de Lorica, cuya extensión limítrofe es de 55 km, y con el municipio de Cotorra en 24,5 km; al oriente con los municipios de Chimá y Ciénaga de Oro, con linderos compartidos de 15 km para el primero y 7,25 km de longitud para el segundo; por el sur con los municipios de Cereté y Montería, límites definidos en 53,5 km de longitud para el primero y 9,25 km para el segundo; y por el occidente con el municipio de Puerto Escondido, cuyo límite presenta una longitud de 16,5 km .

El territorio municipal posee un área de 45.112 ha. Extensión área urbana: el perímetro urbano tiene un área de 352 ha, representa el 0.8 % del territorio municipal, de los cuales el 25% está construida, el 5% está dedicado a vías de comunicación y el 70% restante es área libre.

Extensión área rural: la zona rural representa el 99.2%, con un área de 447,6 km² del territorio municipal.



Ilustración 3. Vía Sabana Nueva - Municipio de San Pelayo.

2.1.1. FUENTE DE MATERIALES

El contratista presentó contrato de concesión minero, licencia ambiental, certificado de registro minero y certificación de título minero de cantera Las Balsas JOMEVE, ubicada en el Municipio de Ciénega de Oro, Kilómetro 15 de la Vía que del municipio de Cereté conduce a Ciénega de Oro, sobre la margen izquierda de la vía, la cual será utilizada como fuente de material para el proyecto de obra.



Ilustración 4. Esquema de ubicación de la fuente de materiales.

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

2.2.1. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA

El municipio de San Pelayo, gracias a la ejecución del contrato No. LP-008-2022, se beneficia principalmente la zona rural conformada por el corregimiento de Sabana Nueva.

2.2.2. BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Gracias a la ejecución del presente proyecto, los niveles de servicio de la vía serán óptimos ya que no existirá flujo interrumpido bajo ningún aspecto técnico en lo que respecta a capacidad, distribución vehicular, entre otros. Esto traerá como beneficio la calidad del servicio de los usuarios, ya que con ello se logra una disminución en los tiempos de viaje, un oportuno acceso a los servicios de salud y una mayor facilidad en la comercialización de los productos agropecuarios, entre otros aspectos.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

El objeto del contrato de obra tiene como alcance, el mejoramiento de la vía que comunica el corregimiento de Sabana Nueva, Municipio de san Pelayo Departamento de Córdoba, El mejoramiento de la vía se hará mediante la construcción de placa huella; ya que inicialmente la vía presenta dificultad en la movilidad, debido a su mal estado, el cual se ocasiona por el alto deterioro de la superficie de rodadura, el drenaje superficial que es deficiente y está construido sin consideraciones técnicas algunas.

	
Estado inicial de la Vía, 16/012/2022	Estado K0+860, 22/12/2023



Estado inicial de la Vía, 16/12/2022



Estado K1+300, 21/12/2023

Ilustración 5. Estado inicial de la vía. Cto. LP-008-2022

En el periodo que corresponde al presente informe el contratista desarrollo las siguientes actividades:

i. A fecha del presente informe se construida la placa huella incluyendo bermas, cunetas y bordillos en 410 metros lineales que van desde la abscisa K1+330 a la abscisa K1+740.

ii. Se realizó la construcción de losas de ciclópeo en ambos carriles entre abscisas K0+780 al K1+049. Se realizó la construcción de losas de huella en ambos carriles entre abscisas K0+767 al K0+980.

iii. Avance físico descrito por elementos

- ✓ **Carril izquierdo:**
  Bordillos: 409,6 ml. (K1+740 - K1+330) 128 losas.
  Cunetas: 476,8 ml. (K1+740 - K1+263) 149 losas.
  Ciclópeo: 940,8 ml. (K1+740 - K0+767) 294 losas.
  Huella: 940,8 ml. (K1+740 - K0+767) 294 losas.
- ✓ **Franja central:**
  Ciclópeo: 870,4 ml. (K1+740 - K0+838) 272 losas.
- ✓ **Carril derecho:**
  Huella: 905,6 ml. (K1+740 - K0+822) 283 losas.
  Ciclópeo: 947,2 ml. (K1+740 - K0+780) 187 losas.
  Cunetas: 409,6 ml. (K1+740 - K1+330) 128 losas.
  Bordillos: 409,6 ml. (K1+740 - K1+330) 128 losas.

iv. Se tomaron muestras de concreto ciclópeo y concreto clase D para el control de calidad por parte de la interventoría.

v. Se realizo controles de calidad y de topografía al material de afirmado y subbase granular por parte del equipo de la interventoría.

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El alcance del proyecto inicialmente propone el mejoramiento de la vía se hará mediante la construcción de 2,125 metros lineales de placa huella de 6.80 metros de ancho, incluyendo placa huella, empedrado, cunetas y bordillos en ambos lateres de la vía. Se construirá una obra de drenaje de agua tipo box Culvert con las siguientes dimensiones alto: 1.0 metros, ancho:1.5 metros y largo: 7.0 metros, también se construirá un puente de 15 metros de largo por 8.5 metros de ancho, apoyado en estribos de concreto reforzado.

En primera instancia luego de la revisión y/o actualización de los estudios y diseños y de realizado un primer balance de obra, se determina que le meta física a ejecutar es la construcción de 900 metros de placa huella, tres box Culvert de sección 2x1 y un puente de 16 metros de luz con una sección trasversal de 8,5 m, el cual estará apoyado sobre un conjunto de 28 pilotes de 10 m de longitud y 0.8 m de diámetro. Como consecuencia de lo anterior la meta física de la Placa Huella se reduce debido a que los recursos destinados inicialmente para la construcción del puente no fueron suficientes; ya que, de acuerdo con el estudio geotécnico y al diseño estructural, el puente debe quedar apoyado sobre una cimentación profunda, la cual no estaba contemplada inicialmente y debido a la necesidad de construir 2 obras de drenaje tipo Box Culvert adicionales, lo cual incremento los costos del contrato y que este no cuenta con más recursos se decidió reducir la meta física.

Luego de realizados distintos comités y mesas de trabajo entre el Consorcio Cristo Rey, La alcaldía del municipio de San Pelayo, La interventoría y funcionarios adscritos al proyecto por parte del INVIAS, teniendo en cuenta los siguientes hechos:

- ✓ El 30 de abril se evidencia el colapso del puente No 1, el cual era paso obligado para el ingreso de los materiales y maquinaria (grúa y piloteadora en la ejecución del puente No 2 que en este caso hace referencia al puente establecido en el alcance del proyecto. Una vez sucedió este hecho, el contratista de obra manifestó la necesidad de realizar una visita conjunta entre las partes para verificación en campo y así establecer la mejor alternativa técnica, jurídica y económica sobre este hecho.
- ✓ Seguidamente se realizó la visita técnica de verificación al proyecto, en la que participaron; funcionarios del INVIAS, Municipio de San Pelayo, Interventoría y contratista de obra; de la cual se pudo constatar el colapso del puente No 1, situación que imposibilita la ejecución inmediata del puente No 2, tal como se tenía establecido en el alcalde del proyecto.

Se decide aumentarla meta física en 300 metros lineales de placa huella quedando una longitud actualizada de 1200 metros.

Contrato LP-008-2022	
Sistema	Placa huella
Longitud Inicial	2.125 metros
Longitud Actualizada	1200 metros
Ancho Calzada	6.80 metros

A continuación, se presenta la estructura general de la placa huella.

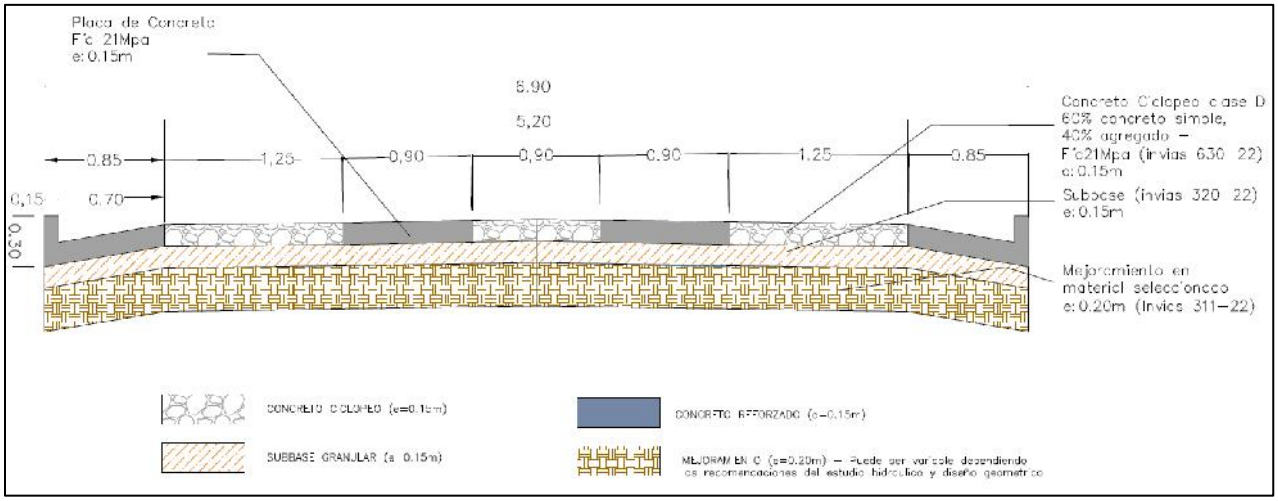


Ilustración 6. Sección típica de placa huella.

A continuación, se presenta la estructura de un puente de 15 metros de largo por 8.5 metros de ancho, apoyado en estribos de concreto reforzado el cual se encuentra en revisión.

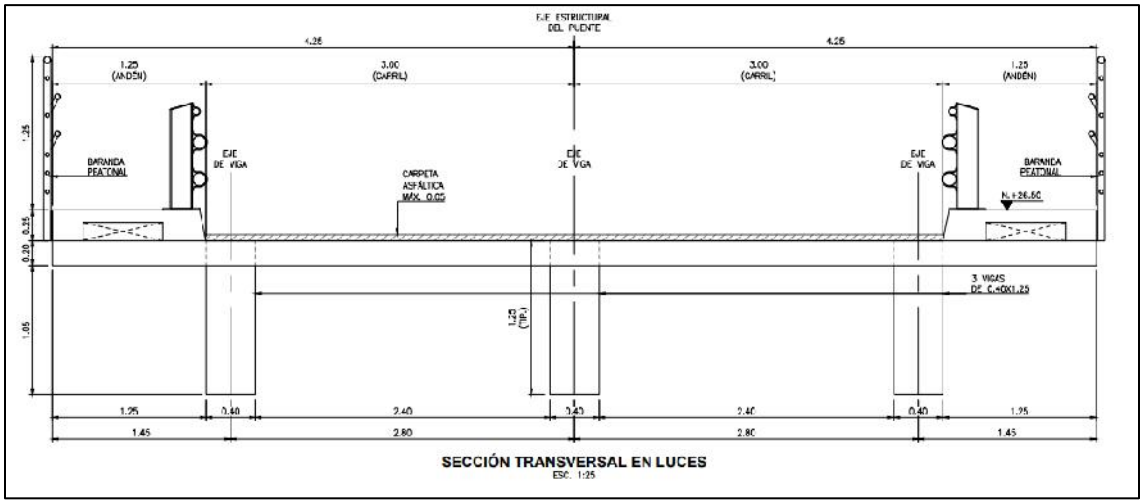


Ilustración 7. Esquema general del puente a construir.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

PROCESO No.	LP-008-2022
CONTRATO No.	LP-008-2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26/10/2022
OBJETO	"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."
CONTRATISTA	CONSORCIO CRISTO REY
NIT	NIT. 901.642.986-1
INTEGRANTES	• CONSORCIO CRISTO REY • Participación: 100%
DIRECCIÓN	Calle 14 N°6-74 OF.101 Chinú, Córdoba
TELÉFONO	3014540438
CORREO	ingerqcol@gmail.com
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4.170.496.742,96
PLAZO INICIAL	5 MESES
FECHA INICIO	13/12/2022
PRORROGA No. 1	3 MESES
PRORROGA No. 2	4 MESES
PRORROGA No. 3	2 MESES
FECHA TERMINACIÓN	29/02/2023

Tabla 1. Información Cto. LP-008-2022

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

3.2.1. GESTIÓN TÉCNICA

i. Mediante comunicado CVRIMG-1955-2023 del 11 de diciembre de 2023, se le solicita al Consorcio Cristo Rey presentar el informe de gestión ambiental – noviembre de 2023.

ii. Mediante comunicado CVRIMG- 1991-2023 del 21 de diciembre de 2023, se le solicita al Consorcio Cristo Rey presentar el informe de seguimiento social mes de noviembre 2023.

iii. Mediante comunicado CVRIMG-2050 -2023 del 29 de diciembre de 2023, Reiteración comunicado CVRIMG-1850-2023 informes sociales septiembre y octubre.

3.2.2. GESTIÓN AMBIENTAL Y/O DE SOSTENIBILIDAD

i. Se envió documento PAGA en su versión 3 al INVIAS para concepto de no objeción con radicado N°55153 del 05 de junio de 2023.

ii. A la fecha del presente informe se han revisado los informes mensuales de gestión al componente ambiental desde los meses de marzo a agosto de 2023. Los informes de los meses de septiembre y octubre fueron revisados y devueltos con observaciones que a la fecha del periodo del presente informes no han sido presentados. Los informes correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2023 no han sido presentados por parte del contratista de obra.

iii. Se le ha solicitado al Consorcio Cristo Rey mediante los siguientes comunicados la presentación de los informes de gestión ambiental y social y estos a fecha del presente informe no han tenido respuesta.

Radicado	Fecha	Asunto	Estado
CVRIMG-1955-2023	11/12/2023	Solicitud informe gestión ambiental noviembre.	**Sin respuesta**
CVRIMG-1936-2023	6/12/2023	Segunda reiteración comunicado CVRIMG-290-2023. solicitud gestión MININTERIOR e ICANH	**Sin respuesta**
CVRIMG-1991-2023	21/12/2023	SOLICITUD INFORME NOVIEMBRE 2023	**Sin respuesta**
CVRIMG-2050-2023	29/12/2023	Reiteración comunicado CVRIMG-1850-2023	**Sin respuesta**

3.2.3. GESTIÓN SOCIAL

i. Se está a la espera de la subsanación a los informes de gestión social de los meses de junio, julio y agosto del presente año.

3.2.4. GESTIÓN PREDIAL

i. A la fecha, el proyecto no requiere de adquisición de predios.

3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se han aprobados ítems no previstos, pero teniendo en cuenta que la cimentación del puente No.2 es profunda, es decir que estará apoyado sobre un conjunto de 28 pilotes de 10 m de longitud y 0.8 m de diámetro. Es necesario crear los siguientes ítems no previstos:

i. Construcción de pilotes de concreto de 28 Mpa vaciado in situ, de diámetro 0.8m, incluye excavación y acero de refuerzo.

ii. Grúa autopropulsada de brazo telescópico para izare y montaje de vigas prefabricadas.

Cabe aclarar que a la fecha no se ha definido si se llevará a cabo la construcción de dicho puente, teniendo en cuenta que el 30 de abril de 2023 se evidencia el colapso del puente No 1, lo que imposibilita el ingreso de maquinaria y materiales hasta el sitio de construcción.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

i. Realizando seguimiento a la reprogramación No.2 presentada por el contratista de obra y aprobada por la interventoría, se observa que, a fecha del 31 de diciembre de 2023, se tiene una inversión de obra programada del $ 4,099,486,945.53 correspondiente al 99.96% y una inversión de obra ejecutada acumulada de $ 1,823,382,977.00 correspondiente al 44.46% lo que representa un atraso del 55.50%.

ii. En el presente mes se tienen construidos 410 metros lineales de placa huella, incluyendo concreto ciclópeo, berma - cuneta, bordillos y viga riostra entre las abscisas K1+330 a la abscisa K1+740. Se realizó la construcción de losas de ciclópeo en el carril izquierdo entre abscisas K1+049 al K0+767 y carril derecho entre las abscisas K0+780 al K1+040. Se realizó la construcción de losas de huella en ambos carriles entre abscisas K0+760 al K0+988.

iii. Se recomienda al contratista la implementación de un plan de contingencia que permita superar el atraso y de igual modo que permita terminar la obra en el tiempo estipulado.

iv. Realizar el seguimiento a los compromisos pactados en los comités y actas de reunión realizadas.

v. Realizar la revisión de la documentación entregada por el contratista.

vi. Enviar oficios correspondientes a contratista y municipio.

vii. Elaborar informes semanales de avance del contrato de obra.

viii. Revisión de las afiliaciones a seguridad social y parafiscales del personal en obra.

ix. Supervisión de las actividades en obra.

x. Revisión de los ensayos de laboratorios.

xi. Diligenciamiento de la bitácora de obra.

xii. Revisión de niveles de los materiales de afirmado y subbase granular

xiii. Inspección y verificación de uso de los EPP.

xiv. Inspección de maquinaria en obra.

4. REPORTES DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 07/12/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 52 del 01/12/2023 al 07/12/2023 (Numeración consecutiva) **Último Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El objeto del proyecto tiene como alcance la construcción de 900 metros lineales de placa huella de 6.80 metros de ancho, incluyendo placa huella, empedrado, cunetas y bordillos en ambos laterales de la vía. Se construirá tres obra de drenaje de agua tipo box Culvert con las siguientes dimensiones alto: 1.0 metros, ancho:2.0 metros y largo: 7.0 metros. También se construirá un puente de 16 metros de luz cuyo ancho de calzada incluyendo bordillos es de 8,5 metros; la cimentación sobra la cual se apoyará el puente es tipo profunda conformada por un conjunto de 14 pilotes de 10 metros de longitud y 0,8 metros de diámetro, en cada estribo, siendo en total 28 pilotes.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del contrato de obra tiene como alcance, el mejoramiento de la vía que comunica al corregimiento de Sabana Nueva, Municipio de San Pelayo, Departamento de Córdoba, El mejoramiento de la vía se hará mediante la construcción de 900 metros lineales de placa huella de 6.80 metros de ancho, incluyendo placa huella, empedrado, cunetas y bordillos en ambos lateres de la vía.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONTRATISTA: CONSORCIO CRISTO REY CON NIT. 901.642.986-1			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7		
INTEGRANTES:	1. CONSORCIO CRISTO REY, Participación: 100%			**INTEGRANTES:**	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
CONTRATO No.	LP-008-2022	VALOR INICIAL:	$ 4.170.496.742,96	**CONTRATO No.**	971 de 2022	**VALOR INICIAL:**	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE INICIO:	13/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -	**FECHA DE INICIO:**	22/08/2022	**VALOR ADICIONES:**	$ 800.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	13/05/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.170.496.742,96	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2024	**VALOR ACUMULADO:**	$ 5.364.284.660,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ 1.251.149.022,89	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	31/12/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ 650.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 541.382.184,00			**VALOR AMORTIZADO:**	$ 580.290.355,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 709.766.838,89			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ 69.709.645,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**		$ 4.170.496.742,96		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 2.514.374.118,89		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 1.656.122.624,07		
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**		$ 399.985.204	$ 3.070.014.796,00	$ 1.894.284.660,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 399.985.204	$ 2.557.874.096,00	
	SALDO DE VIGENCIA		$ 14.796	$ 512.140.700,00	$ 1.894.284.660,00

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.101.202.321,31	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3.922.701.614,89	95,65%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.792.973.520,00	43,72%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (2.129.728.094,89)	-51,93%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.922.701.614,89	95,65%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.792.973.520,00	43,72%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (2.129.728.094,89)	-51,93%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 114.929.081,11	2,80%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10.517.073,00	0,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.564.284.660,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.888.149.655,00	63,28%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 54.373.219,80	1,19%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 54.373.219,80	1,19%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: nov-23
VALOR FACTURA: $ 144.084.884,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.251.149.022,89
Amortizado $	$ 541.382.184,00
Saldo $	$ 709.766.838,89

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 650.000.000,00
Amortizado $	$ 580.290.355,00
Saldo $	$ 69.709.645,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 95,65%
Meta Física Ejecutada % 43,72%
Avance o Atraso Físico % -51,93%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia 2022**	**Vigencia 2023**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	%	100			Prog	100			100	100,0%
					Ejec	80			80	80,0%
Explanación	m	1000		1000	Prog	977			977	97,7%
					Ejec	1000			1000	100,0%
Afirmado	m	1000		1000	Prog	1000			1000	100,0%
					Ejec	1200			1200	120,0%
Subbase Granular	m	1000		1000	Prog	1000			1000	100,0%
					Ejec	1200			1200	120,0%
Placa huella en concreto	m	1000		1000	Prog	608			608	60,8%
					Ejec	675			675	67,5%
Box Culvert 2.0mX1m	Und	3		3	Prog	3			3	100,0%
					Ejec					
Puentes	Und	1		1	Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mini retroexcavadora	1	1
Minicargador	1	1
Motoniveladora	1	1
Vibrocompactador	1	1
Carrotanque de agua	1	1
Volquetas	3	3

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio de Ciénega de Oro, Kilómetro 15 de la Vía que del municipio de Cereté conduce a Ciénega de Oro, sobre la margen izquierda de la vía.	PERMISO MINERO:	SI	x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: El contratista presentó como fuente de material la cantera Las Balsas JOMEVE con sus respectiva documentación correspondientes al título minero y licencia ambiental.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:
Documento PAGA en su versión 3, enviado a INVIAS para concepto de no objeción con Radicado N°55153 de 05/06/2023. mediante comunicado CVRIMG-810-2023 se le solito al contratista de obra presentar los informes mensuales de seguimiento al documento PAGA- última versión.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PAGA revisado y socializado, en espera de entrega con las observaciones subsanadas.

OBSERVACIONES: Documento PAGA en su versión 3, enviado a INVIAS para concepto de no objeción con Radicado N°55153 de 05/06/2023. A la fecha se encuentra pendiente:
1. la entrega del informe de seguimiento del componente ambiental correspondiente al mes de septiembre de 2023.
2. la entrega del informe de seguimiento del componente social correspondiente al mes de septiembre de 2023.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	24	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	22	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	16	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 29

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 5
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Sobre el corredor vial en el K0+950

OBSERVACIONES:
1. El contratista de obra a fecha del presente informe presentó los informes de seguimiento a la gestión social de los meses de junio, julio y agosto de 2023 los cuales fueron revisados y devueltos con observaciones que deben ser subsanadas para su aprobación.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: NA
FICHAS PREDIALES APROBADAS: NA
AVALÚOS APROBADOS: NA
PREDIOS ADQUIRIDOS: NA

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Documento PAGA en su versión 3, enviado a INVIAS para concepto de no objeción con Radicado N°55153 de 05/06/2023


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1.Escarificado y remoción de material de afirmado entre las abscisas K0+440 – K0+540
2.Se realizó extendido y compactación de material de afirmado entre abscisas K0+700 – K0+540.
3.Se realizo armado del acero de refuerzo para las bermas – cunetas carril izquierdo entre abscisas K1+295 – K1+260.
4.Se realizó fundida en concreto de berma – cunetas carril izquierdo entre abscisas K1+263 – K1+330, vigas riostras carril izquierdo entre abscisas K1+263 – K1+330 y K0+793 – K0+770.
5.Se realizó fundida con concreto premezclado de la huella en el carril derecho entre abscisas K1+139 – K1+081, concreto ciclópeo carril derecho entre abscisas K1+078 – K1+053 y ciclópeo franja central entre abscisas K1+113 – K1+052.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1.Avanzar con el armado e instalación del acero de refuerzo para las losas de huella y berma cunetas
2.Continuar con la fundida en concreto de las huellas
3.Avanzar con la instalación de concreto ciclópeo.
4.Iniciar con el armado e instalación del acero de refuerzo de los cunetas y bordillos.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

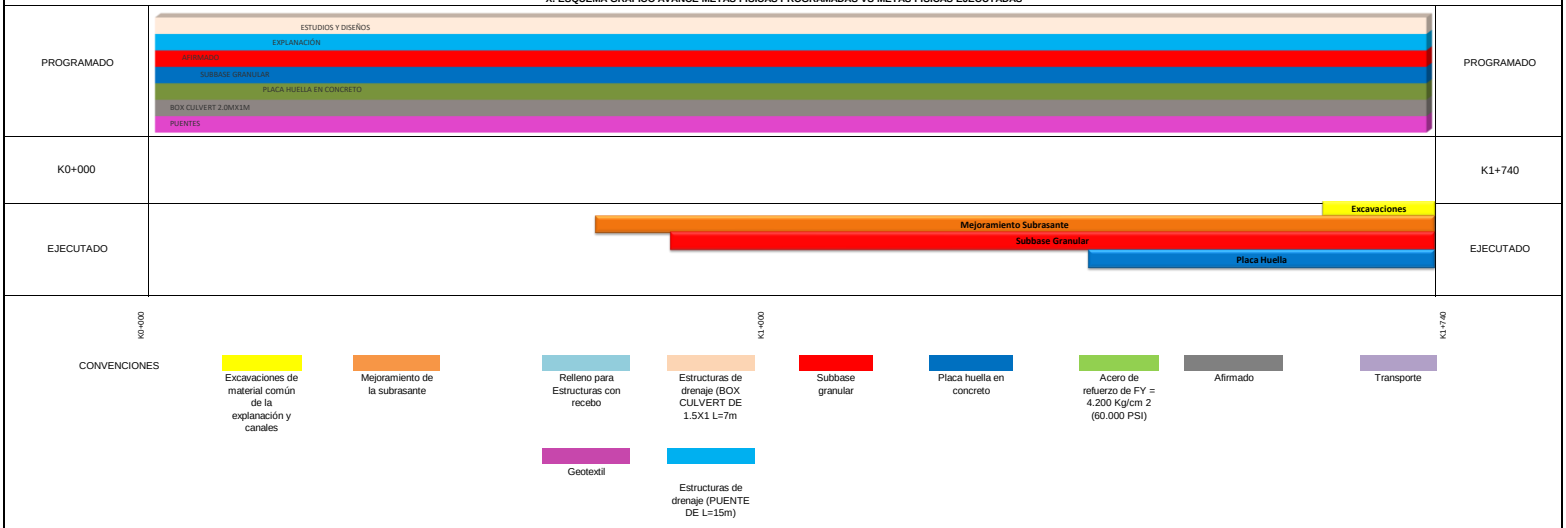

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESCARIFICACION MATERIAL DE AFIRMADO



FUNDIDA HUELLAS



FUNDIDA LOSAS DE CILOPEO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra
4. Supervisar el cumplimiento de las cláusula del contrato de obra

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/12/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 53 del 8/12/2023 al 14/12/2023 (Numeración consecutiva) **Último Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El objeto del proyecto tiene como alcance la construcción de 900 metros lineales de placa huella de 6.80 metros de ancho, incluyendo placa huella, empedrado, cunetas y bordillos en ambos laterales de la vía. Se construirá tres obra de drenaje de agua tipo box Culvert con las siguientes dimensiones alto: 1.0 metros, ancho:2.0 metros y largo: 7.0 metros. También se construirá un puente de 16 metros de luz cuyo ancho de calzada incluyendo bordillos es de 8,5 metros; la cimentación sobra la cual se apoyará el puente es tipo profunda conformada por un conjunto de 14 pilotes de 10 metros de longitud y 0,8 metros de diámetro, en cada estribo, siendo en total 28 pilotes.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del contrato de obra tiene como alcance, el mejoramiento de la vía que comunica al corregimiento de Sabana Nueva, Municipio de San Pelayo, Departamento de Córdoba, El mejoramiento de la vía se hará mediante la construcción de 900 metros lineales de placa huella de 6.80 metros de ancho, incluyendo placa huella, empedrado, cunetas y bordillos en ambos lateres de la vía.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONTRATISTA: CONSORCIO CRISTO REY CON NIT. 901.642.986-1			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7		
INTEGRANTES:	1. CONSORCIO CRISTO REY, Participación: 100%			**INTEGRANTES:**	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
CONTRATO No.	LP-008-2022	VALOR INICIAL:	$ 4.170.496.742,96	**CONTRATO No.**	971 de 2022	**VALOR INICIAL:**	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE INICIO:	13/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -	**FECHA DE INICIO:**	22/08/2022	**VALOR ADICIONES:**	$ 800.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	13/05/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.170.496.742,96	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2024	**VALOR ACUMULADO:**	$ 5.364.284.660,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ 1.251.149.022,89	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	31/12/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ 650.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 541.382.184,00			**VALOR AMORTIZADO:**	$ 580.290.355,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 709.766.838,89			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ 69.709.645,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**		$ 4.170.496.742,96		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 2.514.374.118,89		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 1.656.122.624,07		
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**		$ 399.985.204	$ 3.070.014.796,00	$ 1.894.284.660,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 399.985.204	$ 2.557.874.096,00	
	SALDO DE VIGENCIA		$ 14.796	$ 512.140.700,00	$ 1.894.284.660,00

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.101.202.321,31	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 4.026.891.834,50	98,19%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.806.624.413,00	44,05%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (2.220.267.421,50)	-54,14%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.026.891.834,50	98,19%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.806.624.413,00	44,05%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (2.220.267.421,50)	-54,14%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 104.190.219,61	2,54%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.650.893,00	0,33%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.564.284.660,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.888.149.655,00	63,28%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 54.373.219,80	1,19%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 54.373.219,80	1,19%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: nov-23
VALOR FACTURA: $ 144.084.884,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.251.149.022,89
Amortizado $	$ 541.382.184,00
Saldo $	$ 709.766.838,89

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 650.000.000,00
Amortizado $	$ 580.290.355,00
Saldo $	$ 69.709.645,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 98,19% Avance o Atraso Físico % -54,14%
Meta Física Ejecutada % 44,05%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia 2022**	**Vigencia 2023**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	%	100			Prog	100			100	100,0%
					Ejec	80			80	80,0%
Explanación	m	1000		1000	Prog	977			977	97,7%
					Ejec	1000			1000	100,0%
Afirmado	m	1000		1000	Prog	1000			1000	100,0%
					Ejec	1200			1200	120,0%
Subbase Granular	m	1000		1000	Prog	1000			1000	100,0%
					Ejec	1200			1200	120,0%
Placa huella en concreto	m	1000		1000	Prog	608			608	60,8%
					Ejec	675			675	67,5%
Box Culvert 2.0mX1m	Und	3		3	Prog	3			3	100,0%
					Ejec					
Puentes	Und	1		1	Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mini retroexcavadora	1	1
Minicargador	1	1
Motoniveladora	1	1
Vibrocompactador	1	1
Carrotanque de agua	1	1
Volquetas	3	3

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio de Ciénega de Oro, Kilómetro 15 de la Vía que del municipio de Cereté conduce a Ciénega de Oro, sobre la margen izquierda de la vía.	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El contratista presentó como fuente de material la cantera Las Balsas JOMEVE con sus respectiva documentación correspondientes al título minero y licencia ambiental.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:
Documento PAGA en su versión 3, enviado a INVIAS para concepto de no objeción con Radicado N°55153 de 05/06/2023. mediante comunicado CVRIMG-810-2023 se le solito al contratista de obra presentar los informes mensuales de seguimiento al documento PAGA- última versión.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PAGA revisado y socializado, en espera de entrega con las observaciones subsanadas.

OBSERVACIONES: Documento PAGA en su versión 3, enviado a INVIAS para concepto de no objeción con Radicado N°55153 de 05/06/2023. A la fecha se encuentra pendiente:
1. Se realizan observaciones a los informes de seguimiento del componente ambiental de los meses de septiembre y octubre de 2023.
2. Se realizan observaciones a los informes de seguimiento del componente social de los meses de septiembre y octubre de 2023.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	24	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	22	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	16	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 29

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 5
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Sobre el corredor vial en el K0+950

OBSERVACIONES:
1. El contratista de obra a fecha del presente informe presentó los informes de seguimiento a la gestión social de los meses de junio, julio y agosto de 2023 los cuales fueron revisados y devueltos con observaciones que deben ser subsanadas para su aprobación.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	NA
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	NA
AVALÚOS APROBADOS:	NA
PREDIOS ADQUIRIDOS:	NA

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Documento PAGA en su versión 3, enviado a INVIAS para concepto de no objeción con Radicado N°55153 de 05/06/2023


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1.Se realizo fundida de vigas riostras en concreto reforzado en la franja centra y carril derecho entre abscisas K1+139 – K1+081, K1+078 – K1+014
2.Se realiza céreo de material de subbase granular en el carril derecho desde la abscisa K0+921 a menores.
3.Se realizó céreo de material de afirmado entre abscisas K0+700 – K0+540.
4.Se recibe por parte de la comisión de topografía de la interventoría la capa de afirmado entre las abscisas K0+600 – K0+700.
5.Se realizo instalación de rieles en el carril derecho para ciclópeo carril derecho entre abscisas K0+982 a menores y franja central K1+001 a menores.
6.Se realizó fundida en concreto de las losas de ciclópeo carril derecho entre abscisas K0+982 – K0+892 y franja central entre abscisas K1+001 – K0+940 y K0+921 – K0+892.
7.Se realizó fundida en conceto de huella carril derecho entre abscisas K1+011 – K0+940.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1.Avanzar con el armado e instalación del acero de refuerzo para las losas de huella y berma cunetas
2.Continuar con la fundida en concreto de las huellas
3.Avanzar con la instalación de concreto ciclópeo.
4.Iniciar con el armado e instalación del acero de refuerzo de los cunetas y bordillos.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

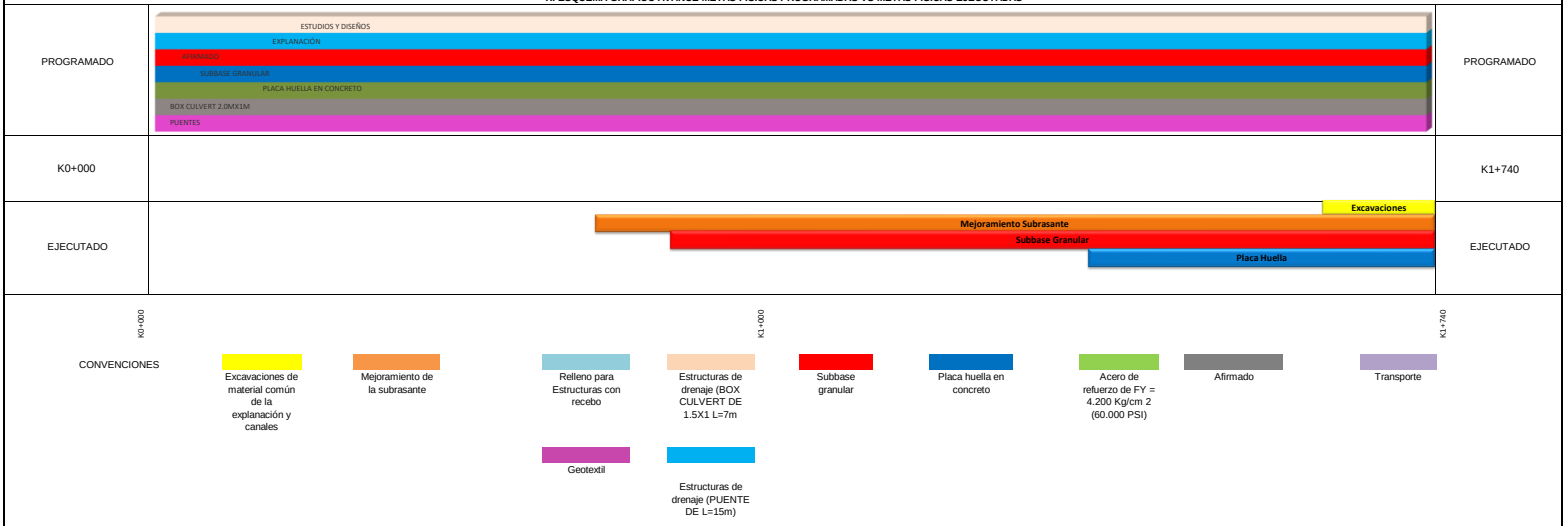

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



EXTENDIDA MATERIAL DE AFIRMADO



FUNDIDA EN CONCRETO DE LOSAS HUELLAS



FUNDIDA LOSAS EN CONCRETO CILOPEO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra
4. Supervisar el cumplimiento de las cláusula del contrato de obra

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 21/12/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 54 del 15/12/2023 al 21/12/2023 (Numeración consecutiva) **Último Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El objeto del proyecto tiene como alcance la construcción de 900 metros lineales de placa huella de 6.80 metros de ancho, incluyendo placa huella, empedrado, cunetas y bordillos en ambos laterales de la vía. Se construirá tres obra de drenaje de agua tipo box Culvert con las siguientes dimensiones alto: 1.0 metros, ancho:2.0 metros y largo: 7.0 metros. También se construirá un puente de 16 metros de luz cuyo ancho de calzada incluyendo bordillos es de 8,5 metros; la cimentación sobra la cual se apoyará el puente es tipo profunda conformada por un conjunto de 14 pilotes de 10 metros de longitud y 0,8 metros de diámetro, en cada estribo, siendo en total 28 pilotes.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del contrato de obra tiene como alcance, el mejoramiento de la vía que comunica al corregimiento de Sabana Nueva, Municipio de San Pelayo, Departamento de Córdoba, El mejoramiento de la vía se hará mediante la construcción de 900 metros lineales de placa huella de 6.80 metros de ancho, incluyendo placa huella, empedrado, cunetas y bordillos en ambos lateres de la vía.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONTRATISTA: CONSORCIO CRISTO REY CON NIT. 901.642.986-1			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7		
INTEGRANTES:	1. CONSORCIO CRISTO REY, Participación: 100%			**INTEGRANTES:**	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
CONTRATO No.	LP-008-2022	VALOR INICIAL:	$ 4.170.496.742,96	**CONTRATO No.**	971 de 2022	**VALOR INICIAL:**	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE INICIO:	13/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -	**FECHA DE INICIO:**	22/08/2022	**VALOR ADICIONES:**	$ 800.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	13/05/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.170.496.742,96	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2024	**VALOR ACUMULADO:**	$ 5.364.284.660,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ 1.251.149.022,89	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	31/12/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ 650.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 541.382.184,00			**VALOR AMORTIZADO:**	$ 580.290.355,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 709.766.838,89			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ 69.709.645,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 4.170.496.742,96		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 2.514.374.118,89		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 1.656.122.624,07		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 399.985.204	$ 3.070.014.796,00	$ 1.894.284.660,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 399.985.204	$ 2.557.874.096,00	
	SALDO DE VIGENCIA			$ 512.140.700,00	$ 1.894.284.660,00

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.101.202.321,31	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 4.083.386.699,69	99,57%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.817.329.236,00	44,31%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (2.266.057.463,69)	-55,25%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.083.386.699,69	99,57%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.817.329.236,00	44,31%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (2.266.057.463,69)	-55,25%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 56.494.865,19	1,38%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10.704.823,00	0,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.564.284.660,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.888.149.655,00	63,28%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 54.373.219,80	1,19%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 54.373.219,80	1,19%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: nov-23
VALOR FACTURA: $ 144.084.884,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.251.149.022,89
Amortizado $	$ 541.382.184,00
Saldo $	$ 709.766.838,89

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 650.000.000,00
Amortizado $	$ 580.290.355,00
Saldo $	$ 69.709.645,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 99,57%
Meta Física Ejecutada % 44,31%
Avance o Atraso Físico % -55,25%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100			Prog	100			100	100,0%
					Ejec	80			80	80,0%
Explanación	m	1200		1200	Prog	1200			1200	100,0%
					Ejec	1200			1200	100,0%
Afirmado	m	1200		1200	Prog	1200			1200	100,0%
					Ejec	1200			1200	100,0%
Subbase Granular	m	1200		1200	Prog	1200			1200	100,0%
					Ejec	1000			1000	83,3%
Placa huella en concreto	m	1200		1200	Prog	1190			1190	99,2%
					Ejec	675			675	56,3%
Box Culvert 2.0mX1m	Und	3		3	Prog	3			3	100,0%
					Ejec					
Puentes	Und	1		1	Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mini retroexcavadora	1	1
Minicargador	1	1
Motoniveladora	1	1
Vibrocompactador	1	1
Carrotanque de agua	1	1
Volquetas	3	3

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio de Ciénega de Oro, Kilómetro 15 de la Vía que del municipio de Cereté conduce a Ciénega de Oro, sobre la margen izquierda de la vía.	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El contratista presentó como fuente de material la cantera Las Balsas JOMEVE con sus respectiva documentación correspondientes al título minero y licencia ambiental.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:
Documento PAGA en su versión 3, enviado a INVIAS para concepto de no objeción con Radicado N°55153 de 05/06/2023. mediante comunicado CVRIMG-810-2023 se le solito al contratista de obra presentar los informes mensuales de seguimiento al documento PAGA- última versión.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PAGA revisado y socializado, en espera de entrega con las observaciones subsanadas.

OBSERVACIONES: Documento PAGA en su versión 3, enviado a INVIAS para concepto de no objeción con Radicado N°55153 de 05/06/2023. A la fecha se encuentra pendiente:
1. Se realizan observaciones a los informes de seguimiento del componente ambiental de los meses de septiembre y octubre de 2023.
2. Se realizan observaciones a los informes de seguimiento del componente social de los meses de septiembre y octubre de 2023.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	24	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	22	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	16	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 29

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 5
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Sobre el corredor vial en el K0+950

OBSERVACIONES:
1. El contratista de obra a fecha del presente informe presentó los informes de seguimiento a la gestión social de los meses de junio, julio y agosto de 2023 los cuales fueron revisados y devueltos con observaciones que deben ser subsanadas para su aprobación.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: NA
FICHAS PREDIALES APROBADAS: NA
AVALÚOS APROBADOS: NA
PREDIOS ADQUIRIDOS: NA

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Documento PAGA en su versión 3, enviado a INVIAS para concepto de no objeción con Radicado N°55153 de 05/06/2023


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1.Se realiza corte y figurado del acero de refuerzo para huellas, cunetas y vigas riostras.
2.Se realizar el armado y colocación del acero de refuerzo de berma – cunetas carril izquierdo entre abscisas K1+118 – K1+055.
3.Se realizo fundida de vigas riostras en concreto reforzado en la franja centra y carril derecho entre abscisas K0+943 – K1+011.
4.Se realiza céreo de material de subbase granular en el carril derecho desde la abscisa K0+540 – K0+720.
5.Se realizó céreo de material de afirmado entre abscisas K0+700 – K0+540.
6.Se realizó fundida en concreto de las losas de ciclópeo carril derecho entre abscisas K0+886 – K0+889 y franja central entre abscisas K0+886 – K0+892 y K0+921 – K0+892.
7.Se realizó fundida en conceto de huella carril derecho entre abscisas K0+892 – K0+940.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1.Continuar con el armado e instalación del acero de refuerzo para las losas de huella y berma cunetas
2.Avanzar en la fundida en concreto de las huellas
3.Seguir avanzando con la instalación de concreto ciclópeo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

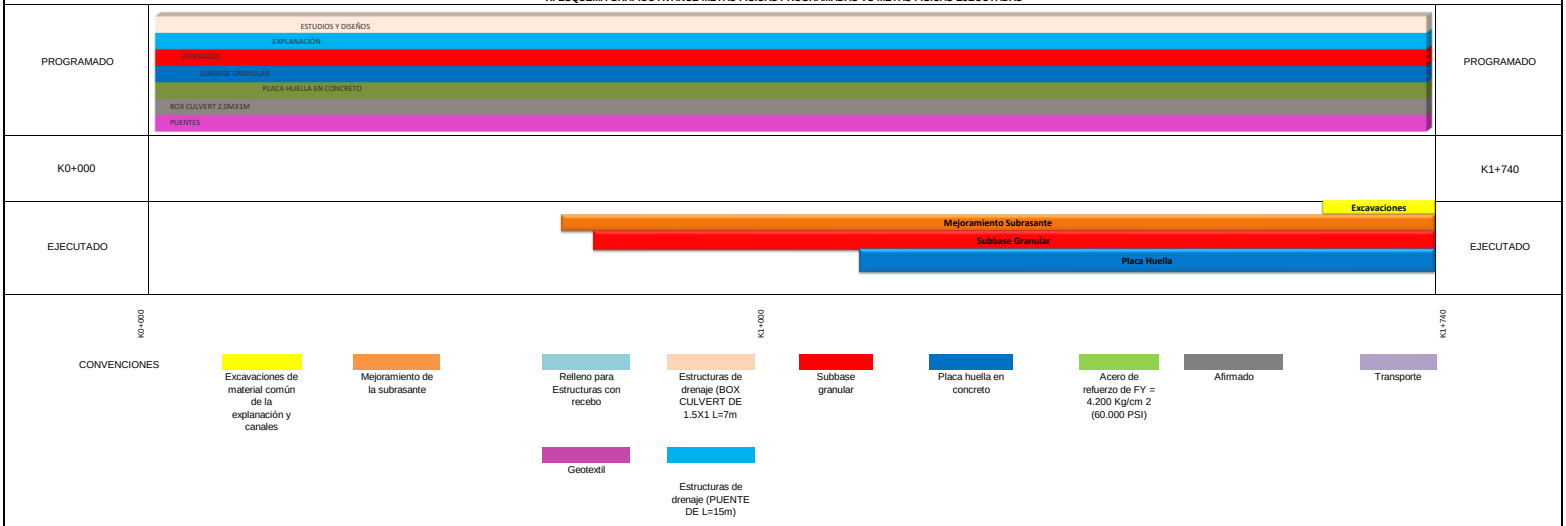

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



EXTENDIDA MATERIAL DE AFIRMADO



FUNDIDA EN CONCRETO DE VIGAS RIOSTRAS



FIGURACION ACERO DE REFUERZO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra
4. Supervisar el cumplimiento de las cláusula del contrato de obra

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER SANCHEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/12/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 55 del 22/12/2023 al 28/12/2023 (Numeración consecutiva) **Último Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El objeto del proyecto tiene como alcance la construcción de 900 metros lineales de placa huella de 6.80 metros de ancho, incluyendo placa huella, empedrado, cunetas y bordillos en ambos laterales de la vía. Se construirá tres obra de drenaje de agua tipo box Culvert con las siguientes dimensiones alto: 1.0 metros, ancho:2.0 metros y largo: 7.0 metros. También se construirá un puente de 16 metros de luz cuyo ancho de calzada incluyendo bordillos es de 8,5 metros; la cimentación sobra la cual se apoyará el puente es tipo profunda conformada por un conjunto de 14 pilotes de 10 metros de longitud y 0,8 metros de diámetro, en cada estribo, siendo en total 28 pilotes.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del contrato de obra tiene como alcance, el mejoramiento de la vía que comunica al corregimiento de Sabana Nueva, Municipio de San Pelayo, Departamento de Córdoba, El mejoramiento de la vía se hará mediante la construcción de 900 metros lineales de placa huella de 6.80 metros de ancho, incluyendo placa huella, empedrado, cunetas y bordillos en ambos lateres de la vía.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONTRATISTA: CONSORCIO CRISTO REY CON NIT. 901.642.986-1

INTEGRANTES: 1. CONSORCIO CRISTO REY, Participación: 100%

CONTRATO No.	LP-008-2022	VALOR INICIAL:	$ 4.170.496.742,96
FECHA DE INICIO:	13/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	13/05/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.170.496.742,96
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ 1.251.149.022,89
		VALOR AMORTIZADO:	$ 541.382.184,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 709.766.838,89

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

INTEGRANTES: 1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%)
2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%)
3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)

CONTRATO No.	971 de 2022	**VALOR INICIAL:**	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	**VALOR ADICIONES:**	$ 800.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	**VALOR ACUMULADO:**	$ 5.364.284.660,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ 650.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 580.290.355,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 69.709.645,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 4.170.496.742,96		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 2.514.374.118,89		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 1.656.122.624,07		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 399.985.204	$ 3.070.014.796,00	$ 1.894.284.660,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 399.985.204	$ 2.557.874.096,00	
	SALDO DE VIGENCIA			$ 512.140.700,00	$ 1.894.284.660,00

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.101.202.321,31	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 4.099.486.945,53	99,96%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.823.382.977,00	44,46%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (2.276.103.968,53)	-55,50%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.099.486.945,53	99,96%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.823.382.977,00	44,46%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (2.276.103.968,53)	-55,50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.100.245,84	0,39%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.053.741,00	0,15%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.564.284.660,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.888.149.655,00	63,28%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 54.373.219,80	1,19%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 54.373.219,80	1,19%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: nov-23
VALOR FACTURA: $ 144.084.884,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.251.149.022,89
Amortizado $	$ 541.382.184,00
Saldo $	$ 709.766.838,89

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 650.000.000,00
Amortizado $	$ 580.290.355,00
Saldo $	$ 69.709.645,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 99,96%
Meta Física Ejecutada % 44,46%
Avance o Atraso Físico % -55,50%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100			Prog	100			100	100,0%
					Ejec	80			80	80,0%
Explanación	m	1200		1200	Prog	1200			1200	100,0%
					Ejec	1200			1200	100,0%
Afirmado	m	1200		1200	Prog	1200			1200	100,0%
					Ejec	1200			1200	100,0%
Subbase Granular	m	1200		1200	Prog	1200			1200	100,0%
					Ejec	1000			1000	83,3%
Placa huella en concreto	m	1200		1200	Prog	1190			1190	99,2%
					Ejec	675			675	56,3%
Box Culvert 2.0mX1m	Und	3		3	Prog	3			3	100,0%
					Ejec					
Puentes	Und	1		1	Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mini retroexcavadora	1	1
Minicargador	1	1
Motoniveladora	1	1
Vibrocompactador	1	1
Carrotanque de agua	1	1
Volquetas	3	3

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio de Ciénega de Oro, Kilómetro 15 de la Vía que del municipio de Cereté conduce a Ciénega de Oro, sobre la margen izquierda de la vía.	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El contratista presentó como fuente de material la cantera Las Balsas JOMEVE con sus respectiva documentación correspondientes al título minero y licencia ambiental.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:
Documento PAGA en su versión 3, enviado a INVIAS para concepto de no objeción con Radicado N°55153 de 05/06/2023. mediante comunicado CVRIMG-810-2023 se le solito al contratista de obra presentar los informes mensuales de seguimiento al documento PAGA- última versión.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PAGA revisado y socializado, en espera de entrega con las observaciones subsanadas.

OBSERVACIONES: Documento PAGA en su versión 3, enviado a INVIAS para concepto de no objeción con Radicado N°55153 de 05/06/2023. A la fecha se encuentra pendiente:
1. Se realizan observaciones a los informes de seguimiento del componente ambiental de los meses de septiembre y octubre de 2023.
2. Se realizan observaciones a los informes de seguimiento del componente social de los meses de septiembre y octubre de 2023.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	24	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	22	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	16	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 29

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 5
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Sobre el corredor vial en el K0+950

OBSERVACIONES:
1. El contratista de obra a fecha del presente informe presentó los informes de seguimiento a la gestión social de los meses de junio, julio y agosto de 2023 los cuales fueron revisados y devueltos con observaciones que deben ser subsanadas para su aprobación.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: NA
FICHAS PREDIALES APROBADAS: NA
AVALÚOS APROBADOS: NA
PREDIOS ADQUIRIDOS: NA

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Documento PAGA en su versión 3, enviado a INVIAS para concepto de no objeción con Radicado N°55153 de 05/06/2023


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1.Se realiza corte y figurado del acero de refuerzo para huellas, cunetas y vigas riostras.
2.Se realiza excavación de vigas riostras carril derecho y franja central entre abscisas K0+895 – K0+940.
3.Se recibe por topografía de la interventoría la capa de subbase granular entre abscisas K0+540 – K0+700.
4.Se realizó céreo de material de afirmado entre abscisas K0+700 – K0+540.
5.Se realizó fundida en concreto de las losas de ciclópeo carril derecho entre abscisas K0+767 – K0+886 y franja central entre abscisas K0+780 – K0+841.
6.Se realizó fundida en conceto de huella carril derecho entre abscisas K0+822 – K0+892.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1.Continuar con el armado e instalación del acero de refuerzo para las losas de huella y berma cunetas
2.Avanzar en la fundida en concreto de las huellas
3.Seguir avanzando con la instalación de concreto ciclópeo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

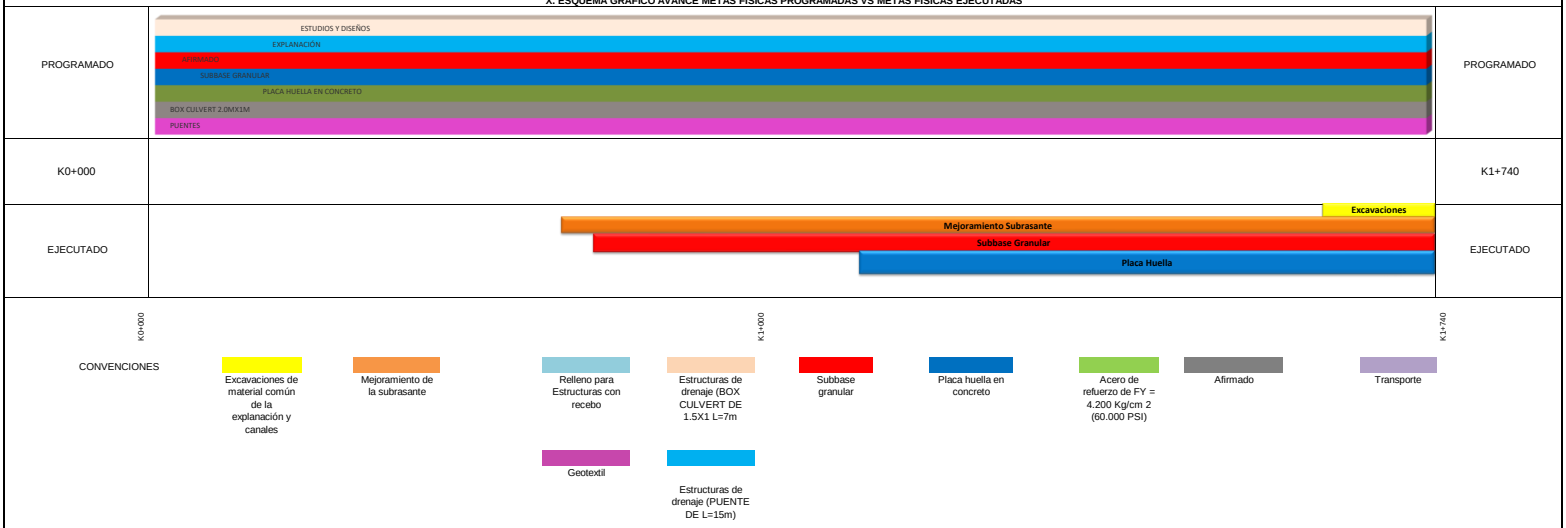

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDIDA EN CONCRETO HUELLA



FUNDIDA LOSA DE CVONCRETO CICLOPEO



CHEQUEO SUBBASE GRANULAR

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra
4. Supervisar el cumplimiento de las cláusula del contrato de obra

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 56 del 29/12/2023 al 4/01/2024 (Numeración consecutiva) **Último Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El objeto del proyecto tiene como alcance la construcción de 900 metros lineales de placa huella de 6.80 metros de ancho, incluyendo placa huella, empedrado, cunetas y bordillos en ambos laterales de la vía. Se construirá tres obra de drenaje de agua tipo box Culvert con las siguientes dimensiones alto: 1.0 metros, ancho:2.0 metros y largo: 7.0 metros. También se construirá un puente de 16 metros de luz cuyo ancho de calzada incluyendo bordillos es de 8,5 metros; la cimentación sobra la cual se apoyará el puente es tipo profunda conformada por un conjunto de 14 pilotes de 10 metros de longitud y 0,8 metros de diámetro, en cada estribo, siendo en total 28 pilotes.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del contrato de obra tiene como alcance, el mejoramiento de la vía que comunica al corregimiento de Sabana Nueva, Municipio de San Pelayo, Departamento de Córdoba, El mejoramiento de la vía se hará mediante la construcción de 900 metros lineales de placa huella de 6.80 metros de ancho, incluyendo placa huella, empedrado, cunetas y bordillos en ambos lateres de la vía.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONTRATISTA: CONSORCIO CRISTO REY CON NIT. 901.642.986-1

INTEGRANTES: 1. CONSORCIO CRISTO REY, Participación: 100%

CONTRATO No.	LP-008-2022	VALOR INICIAL:	$ 4.170.496.742,96
FECHA DE INICIO:	13/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	13/05/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 4.170.496.742,96
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/02/2024	VALOR ANTICIPO:	$ 1.251.149.022,89
		VALOR AMORTIZADO:	$ 541.382.184,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 709.766.838,89

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

INTEGRANTES: 1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%)
2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%)
3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)

CONTRATO No.	971 de 2022	**VALOR INICIAL:**	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	**VALOR ADICIONES:**	$ 800.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	**VALOR ACUMULADO:**	$ 5.364.284.660,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ 650.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 580.290.355,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 69.709.645,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**		$ 4.170.496.742,96		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 2.514.374.118,89		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 1.656.122.624,07		
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**		$ 399.985.204	$ 3.070.014.796,00	$ 1.894.284.660,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 399.985.204	$ 2.557.874.096,00	
	SALDO DE VIGENCIA		$ 14.796	$ 512.140.700,00	$ 1.894.284.660,00

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.101.202.321,31	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.433.134.940,25	59,33%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1.824.696.891,00	44,49%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (608.438.049,25)	-14,84%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.433.134.940,25	59,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.824.696.891,00	44,49%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (608.438.049,25)	-14,84%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 75.270.646,69	1,84%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.313.914,00	0,03%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.564.284.660,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.888.149.655,00	63,28%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 54.373.219,80	1,19%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 54.373.219,80	1,19%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: nov-23
VALOR FACTURA: $ 144.084.884,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.251.149.022,89
Amortizado $	$ 541.382.184,00
Saldo $	$ 709.766.838,89

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 650.000.000,00
Amortizado $	$ 580.290.355,00
Saldo $	$ 69.709.645,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 59,33%
Meta Física Ejecutada % 44,49%
Avance o Atraso Físico % -14,84%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia 2022**	**Vigencia 2023**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	%	100			Prog	100			100	100,0%
					Ejec	80			80	80,0%
Explanación	m	1200		1200	Prog	1200			1200	100,0%
					Ejec	1200			1200	100,0%
Afirmado	m	1200		1200	Prog	1200			1200	100,0%
					Ejec	1200			1200	100,0%
Subbase Granular	m	1200		1200	Prog	1200			1200	100,0%
					Ejec	1000			1000	83,3%
Placa huella en concreto	m	1200		1200	Prog	1190			1190	99,2%
					Ejec	675			675	56,3%
Box Culvert 2.0mX1m	Und	3		3	Prog	3			3	100,0%
					Ejec					
Puentes	Und	1		1	Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mini retroexcavadora	1	1
Minicargador	1	1
Motoniveladora	1	1
Vibrocompactador	1	1
Carrotanque de agua	1	1
Volquetas	3	3

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio de Ciénega de Oro, Kilómetro 15 de la Vía que del municipio de Cereté conduce a Ciénega de Oro, sobre la margen izquierda de la vía.	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El contratista presentó como fuente de material la cantera Las Balsas JOMEVE con sus respectiva documentación correspondientes al título minero y licencia ambiental.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:
Documento PAGA en su versión 3, enviado a INVIAS para concepto de no objeción con Radicado N°55153 de 05/06/2023. mediante comunicado CVRIMG-810-2023 se le solito al contratista de obra presentar los informes mensuales de seguimiento al documento PAGA- última versión.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PAGA revisado y socializado, en espera de entrega con las observaciones subsanadas.

OBSERVACIONES: Documento PAGA en su versión 3, enviado a INVIAS para concepto de no objeción con Radicado N°55153 de 05/06/2023. A la fecha se encuentra pendiente:
1. Se realizan observaciones a los informes de seguimiento del componente ambiental de los meses de septiembre y octubre de 2023.
2. Se realizan observaciones a los informes de seguimiento del componente social de los meses de septiembre y octubre de 2023.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	24	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	22	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	16	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 29

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 5
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Sobre el corredor vial en el K0+950

OBSERVACIONES:
1. El contratista de obra a fecha del presente informe presentó los informes de seguimiento a la gestión social de los meses de junio, julio y agosto de 2023 los cuales fueron revisados y devueltos con observaciones que deben ser subsanadas para su aprobación.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: NA
FICHAS PREDIALES APROBADAS: NA
AVALÚOS APROBADOS: NA
PREDIOS ADQUIRIDOS: NA

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Documento PAGA en su versión 3, enviado a INVIAS para concepto de no objeción con Radicado N°55153 de 05/06/2023


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1.Se realiza corte y figurado del acero de refuerzo para huellas, cunetas y vigas riostras.
2.Se realiza instalación del acero de refuerzo y posteriormente fundida en concreto de vigas riostras carril derecho y franja central entre abscisas K0+873 – K0+940.
3.Se realizó fundida en concreto de las losas de ciclópeo carril derecho entre abscisas K0+783 – K0+870 y franja central entre abscisas K0+767 – K0+831.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1.Continuar con el armado e instalación del acero de refuerzo para las losas de huella y berma cunetas
2.Avanzar en la fundida en concreto de las huellas
3.Seguir avanzando con la instalación de concreto ciclópeo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

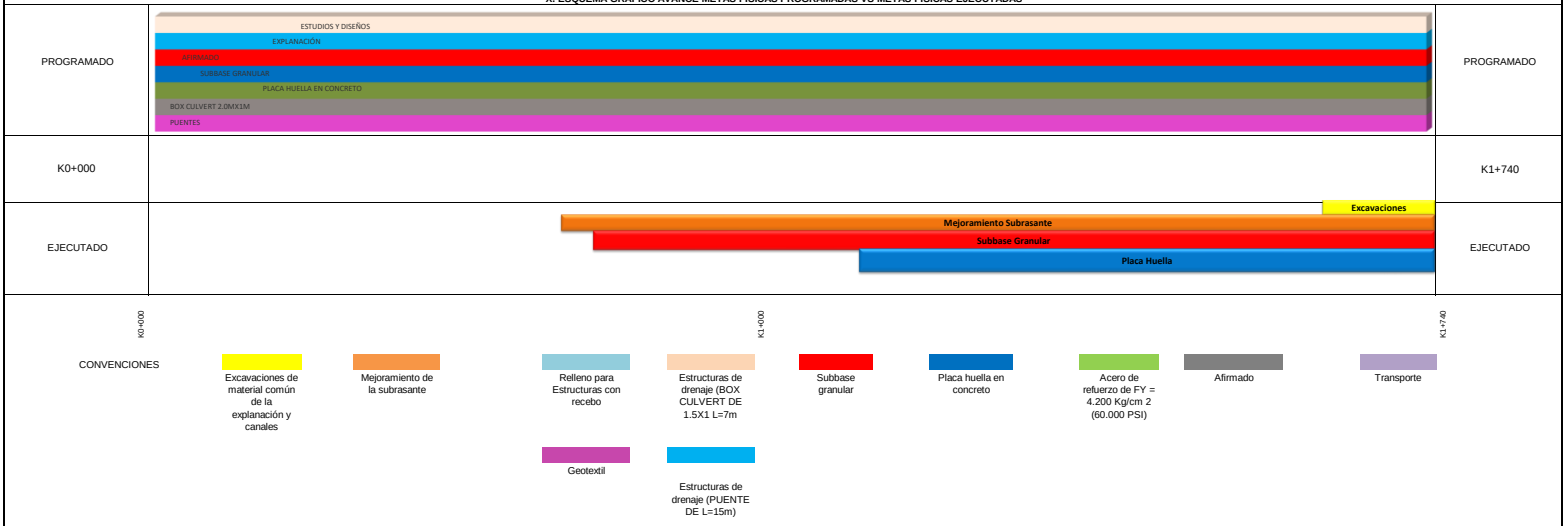

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDIDA LOSA DE CICLOPEO



CORTE ACERO DE REFUERZO



INSTALACION REFUERZO HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra
4. Supervisar el cumplimiento de las cláusula del contrato de obra

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.3. MEPI-MN1-IN-15-FR-4. MAQUINARIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: diciembre-2023 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO No. LP-008-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CRISTO REY CON NIT. 901.642.986-1

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 971 de 2022 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Mini retroexcavadora	KOBELCO		Sabana Nueva	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Minicargador	WACKER NEUSON		Sabana Nueva	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I
Motoniveladora			Sabana Nueva	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I
Vibrocompactador			Sabana Nueva	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I
Carro Tanque			Sabana Nueva	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5
			TOTAL ACTIVO	4	4	0	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	0	0	4	4	4	4		0
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			TOTAL INACTIVO	1	1	5	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	5	5	1	1	1	1		5

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5	100,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	4	80,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	1	20,00%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: LUIS FERNANDO PLAZA BUELVAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 05202-170303

Firma
Nombre: AMAURY BENITEZ MARTINEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202 - 273006 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3. MEPI-MN1-IN-15-FR-6. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	5/01/204 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: LP-008-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CRISTO REY CON NIT. 901.642.986-1

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: diciembre-2023 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACOR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	HERNANDEZ LECLERC ERNESTO JOSE	1003157586	DIRECTOR	$ 4.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO CRISTO REY	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	5	Sanitas EPS	68061425	$ 145.000,00	Porvenir	66551669	$ 185.600,00	$ 46.400,00	$ 23.200	$ 34.800	DEDICACIÓN DEL 50%
2	BETTIN BARCENAS BLANCA MARGARITA	35143426	T. SOCIAL	$ 1.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO CRISTO REY	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	5	Nueva EPS	68061425	$ 145.000,00	Porvenir	66551669	$ 185.600,00	$ 46.400,00	$ 23.200	$ 34.800	DEDICACIÓN DEL 100%
3	PLAZA BUELVAS LUIS FERNANDO	7383979	RESIDENTE	$ 2.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO CRISTO REY	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	5	EPS-S Mutual Ser	68061425	$ 145.000,00	Porvenir	66551669	$ 185.600,00	$ 46.400,00	$ 23.200	$ 34.800	DEDICACIÓN DEL 25%
4	PASTRANA HERNANDEZ RODRIGO JOSE	78038034	SISO SG SST	$ 1.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO CRISTO REY	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	5	Nueva EPS	68061425	$ 145.000,00	Porvenir	66551669	$ 185.600,00	$ 46.400,00	$ 23.200	$ 16.300	DEDICACIÓN DEL 50%
5	DORIA DORIA RAMON JOSE	1073821676	OPERADOR	$ 1.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO CRISTO REY	$ 116.000,00	$ 8.100,00	5	EPS-S Mutual Ser	68061425	$ 14.500	Porvenir	66551669	$ 18.600,00	$ 4.700	$ 2.400	$ 3.500	DEDICACIÓN DEL 100%
6	BURGOS CANTERO CARLOS ENRIQUE	1073822917	OPERADOR	$ 1.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO CRISTO REY	$ 116.000,00	$ 8.100,00	5	EPS-S Cajacopi	68061425	$ 14.500	Porvenir	66551669	$ 18.600,00	$ 4.700	$ 2.400	$ 3.500	DEDICACIÓN DEL 100%
7	CAMPO PARRA GERLEI ANTONIO	10776980	OPERADOR	$ 1.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO CRISTO REY	$ 116.000,00	$ 8.100,00	5	Salud Total EPS	68061425	$ 14.500	Porvenir	66551669	$ 18.600,00	$ 4.700	$ 2.400	$ 3.500	DEDICACIÓN DEL 100%
8	MARTINEZ DORIA JAIRO MIGUEL	1148145215	OPERADOR	$ 1.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO CRISTO REY	$ 116.000,00	$ 8.100,00	5	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	68061425	$ 14.500	Porvenir	66551669	$ 18.600,00	$ 4.700	$ 2.400	$ 3.500	DEDICACIÓN DEL 100%
9	CAMPO PARRA YANITH ANTONIO	15645896	OPERADOR	$ 1.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO CRISTO REY	$ 116.000,00	$ 8.100,00	5	EPS-S Mutual Ser	68061425	$ 14.500	Porvenir	66551669	$ 18.600,00	$ 4.700	$ 2.400	$ 3.500	DEDICACIÓN DEL 100%
10	PETRO VIDAL JAIRO ALFREDO	7377762	OPERADOR	$ 1.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO CRISTO REY	$ 116.000,00	$ 8.100,00	5	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	68061425	$ 14.500	Porvenir	66551669	$ 18.600,00	$ 4.700	$ 2.400	$ 3.500	DEDICACIÓN DEL 100%
11	DORIA ALTAMIRANDA LUIS ALFONSO	7380804	OPERADOR	$ 1.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO CRISTO REY	$ 116.000,00	$ 8.100,00	5	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	68061425	$ 14.500	Porvenir	66551669	$ 18.600,00	$ 4.700	$ 2.400	$ 3.500	DEDICACIÓN DEL 100%
12	PETRO PEREZ RUGERO ANTONIO	7381234	OPERADOR	$ 1.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO CRISTO REY	$ 116.000,00	$ 8.100,00	5	EPS-S Mutual Ser	68061425	$ 14.500	Porvenir	66551669	$ 18.600,00	$ 4.700	$ 2.400	$ 3.500	DEDICACIÓN DEL 100%

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
A la fecha del presente informe el contratista no ha presentado la planilla de seguridad social del mes de mayo de 2023.

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del paqo de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: ERNESTO JOSE HERNANDEZ LECLERC
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-259564COR

Firma
Nombre: FREDY ROBERTO RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	CONSORCIO CRISTO REY	**Nit:**	901642986
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Septiembre 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Octubre 2023
Número de radicación:	72461524	**Total a pagar:**	$2,600,600
Fecha de vencimiento:	20/10/2023	**Total de empleados:**	7
Fecha de pago:	23/11/2023	**Número de administradoras:**	9

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número de aprobación:**	294365724
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	7		$0.00	$585,000
230301	800224808	Porvenir	6		$0.00	$1,151,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		$0.00	$192,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	7		$0.00	$335,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0.00	$48,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0.00	$48,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		$0.00	$96,000
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		$0.00	$48,000
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	2		$0.00	$96,000
						$2,600,600

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos**

»Ver planillas pagadas

Le informamos que el pago de la planilla No. 72461524, fue posterior a la fecha límite establecida e
embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley
establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo
que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando
además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

Hola soy Pili, ¿en qué te puedo ayudar?

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com

[x] Cerrar

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados © 2023 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente

certicámara. Acerca de los certificados SSL

icontec ISO / IEC 27001 CO-SI006-1 icontec ISO 9001 CO-SC5892-16

Powered by Cenet Edinet

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901642986-1	CONSORCIO CRISTO REY	CALL N14 NRO 6 74 OF101	7821332	hernandonarvaez@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CÓRDOBA	CHINÚ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	23/11/2023	72461524	$2.600.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	46.400	0		0		0	34	1.600	0	48.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	46.400	0		0		0	34	1.600	0	48.000	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	92.800	0		0		0	34	3.200	0	96.000	2
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	46.400	0		0		0	34	1.600	0	48.000	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	92.800	0		0		0	34	3.200	0	96.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.113.600	0	0	0	0	34	38.100	0	1.151.700	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	34	6.400	0	192.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	565.600				565.600	34	19.400	585.000			5.656	585.000	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF16	Comfacor	891080005-1	324.800	34	11.100	335.900	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	324.800	336.000
Pensión	2	1.299.200	1.343.700
Riesgos Laborales	1	565.600	585.000
CCF	1	324.800	335.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	2.514.400	2.600.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901642986-1	CONSORCIO CRISTO REY		CALL N14 NRO 6 74 OF101	7821332	hernandonarvaez@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			CÓRDOBA	CHINÚ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	23/11/2023	72461524	$2.600.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003157586	HERNANDEZ LECLERC ERNESTO JOSE	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF16	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	1148145215	MARTINEZ DORIA JAIRO MIGUEL	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF16	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	7376760	PETRO HERNANDEZ FELIPE MIGUEL	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC07	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF16	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
4	CC	7383979	PLAZA BUELVAS LUIS FERNANDO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS048	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF16	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
5	CC	78038034	PASTRANA HERNANDEZ RODRIGO JOSE	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF16	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
6	CC	49693411	GALVAN DORIA KETY DEL ROSARIO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC07	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF16	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
7	CC	7384747	HERNANDEZ ROMERO LUIS FERNANDO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF16	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	CONSORCIO CRISTO REY	**Nit:**	901642986
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Octubre 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Noviembre 2023
Número de radicación:	72473233	**Total a pagar:**	$3,838,800
Fecha de vencimiento:	22/11/2023	**Total de empleados:**	17
Fecha de pago:	23/11/2023	**Número de administradoras:**	12

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número de aprobación:**	294370786
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	17		$0.00	$863,500
230301	800224808	Porvenir	11		$0.00	$1,455,600
231001	800227940	Colfondos	1		$0.00	$68,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	5		$0.00	$458,500
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	17		$0.00	$496,300
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	2		$0.00	$34,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		$0.00	$34,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0.00	$46,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0.00	$46,500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4		$0.00	$127,200
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		$0.00	$46,500
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	6		$0.00	$161.400

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

Hola soy Pili, ¿en qué te puedo ayudar?

»Ver planillas pagadas

Le informamos que el pago de la planilla No. 72473233, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com

[x] Cerrar

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados © 2023 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente

certicámara. Acerca de los certificados SSL

Powered by Cenet Edinet

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901642986-1	CONSORCIO CRISTO REY	CALL N14 NRO 6 74 OF101	7821332	hernandonarvaez@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CÓRDOBA	CHINÚ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	23/11/2023	72473233	$3.838.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	34.200	0		0		0	1	100	0	34.300	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	34.200	0		0		0	1	100	0	34.300	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	46.400	0		0		0	1	100	0	46.500	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	46.400	0		0		0	1	100	0	46.500	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	127.000	0		0		0	1	200	0	127.200	4
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	46.400	0		0		0	1	100	0	46.500	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	161.200	0		0		0	1	200	0	161.400	6

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.454.100	0	0	0	0	1	1.500	0	1.455.600	11
231001	Colfondos	800227940-6	68.100	0	0	0	0	1	100	0	68.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	458.000	0	0	0	0	1	500	0	458.500	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	862.600				862.600	1	900	863.500			8.626	863.500	17

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF16	Comfacor	891080005-1	495.800	1	500	496.300	17

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901642986-1	CONSORCIO CRISTO REY	CALL N14 NRO 6 74 OF101	7821332	hernandonarvaez@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CÓRDOBA	CHINÚ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	23/11/2023	72473233	$3.838.800	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	495.800	496.700
Pensión	3	1.980.200	1.982.300
Riesgos Laborales	1	862.600	863.500
CCF	1	495.800	496.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	3.834.400	3.838.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901642986-1	CONSORCIO CRISTO REY		CALL N14 NRO 6 74 OF101	7821332	hernandonarvaez@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			CÓRDOBA	CHINÚ	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 17 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-11	2023-10	E	23/11/2023	72473233	$3.838.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003157586	HERNANDEZ LECLERC ERNESTO JOSE	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF16	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	1148145215	MARTINEZ DORIA JAIRO MIGUEL	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF16	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	7376760	PETRO HERNANDEZ FELIPE MIGUEL	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC07	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF16	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
4	CC	7383979	PLAZA BUELVAS LUIS FERNANDO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS048	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF16	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
5	CC	78038034	PASTRANA HERNANDEZ RODRIGO JOSE	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF16	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
6	CC	49693411	GALVAN DORIA KETY DEL ROSARIO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC07	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF16	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
7	CC	1073811461	PEREZ LOPEZ JESUS ALFREDO	1	0			S	X																25-14	425.334	68.100	0	0	0	0	EPS002	425.334	17.100	14-11	425.334	5	29.700	CCF16	425.334	17.100	0	0	0	0	0
8	CC	1073812114	PETRO CHICA PEDRO LUIS	1	0			S	X																230301	425.334	68.100	0	0	0	0	EPS002	425.334	17.100	14-11	425.334	5	29.700	CCF16	425.334	17.100	0	0	0	0	0
9	CC	7380126	MORALES PETRO ROBIN LUIS	1	0			S	X																25-14	425.334	68.100	0	0	0	0	EPS041	425.334	17.100	14-11	425.334	5	29.700	CCF16	425.334	17.100	0	0	0	0	0
10	CC	7381234	PETRO PEREZ RUGERO ANTONIO	1	0			S	X																230301	425.334	68.100	0	0	0	0	ESSC07	425.334	17.100	14-11	425.334	5	29.700	CCF16	425.334	17.100	0	0	0	0	0
11	CC	7382489	GUERRA GUERRA JONY YIMIS	1	0			S	X																25-14	425.334	68.100	0	0	0	0	ESSC07	425.334	17.100	14-11	425.334	5	29.700	CCF16	425.334	17.100	0	0	0	0	0
12	CC	7382675	OROZCO SUAREZ ORLIN OCTAVIO	1	0			S	X																230301	425.334	68.100	0	0	0	0	CCFC55	425.334	17.100	14-11	425.334	5	29.700	CCF16	425.334	17.100	0	0	0	0	0
13	CC	7384243	HERNANDEZ DE ARCO MANUEL RAMON	1	0			S	X																230301	425.334	68.100	0	0	0	0	ESSC07	425.334	17.100	14-11	425.334	5	29.700	CCF16	425.334	17.100	0	0	0	0	0
14	CC	7384710	PETRO HOYOS TONY ALTRANSITO	1	0			S	X																231001	425.334	68.100	0	0	0	0	EPS041	425.334	17.100	14-11	425.334	5	29.700	CCF16	425.334	17.100	0	0	0	0	0
15	CC	7385989	DORIA PEREZ MANUEL JOSE	1	0			S	X																230301	425.334	68.100	0	0	0	0	CCFC55	425.334	17.100	14-11	425.334	5	29.700	CCF16	425.334	17.100	0	0	0	0	0
16	CC	78710213	CANTERO LOPEZ CARLOS ANDRES	1	0			S	X																25-14	425.334	68.100	0	0	0	0	ESSC07	425.334	17.100	14-11	425.334	5	29.700	CCF16	425.334	17.100	0	0	0	0	0
17	CC	7384747	HERNANDEZ ROMERO LUIS FERNANDO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF16	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

4.4. MEPI-MN1-IN-15-FR-8. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL OBRA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: LP-008-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CRISTO REY CON NIT. 901.642.986-1

MES INFORME MENSUAL: diciembre-2023 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	523	Vias Terciarias Mejoradas	1131	Recursos no apropiados-Combenio 1876 de INVIAS	LP-008-2022	$ 4.170.496.742,96	
			TOTAL			$ 4.170.496.743	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 4.170.496.742,96**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
	ANTICIPO		$ 1.251.149.022,89												
1	PARCIAL	sep-23	$ 1.260.022.932,00	$ -	$ 1.260.022.932,00	$ 378.006.879,60	$ 882.016.052,40	$ 873.142.143,29	523 del 26 de octubre de 2022	$ 2.037.331.668	$ 2.910.473.811	NA	NA	NA	
2	PARCIAL	nov-23	$ 544.584.348,00		$ 544.584.348,00	$ 163.375.304,40	$ 381.209.043,60	$ 709.766.838,89	523 del 26 de octubre de 2022	$ 1.656.122.624	$ 2.365.889.463	NA	NA	NA	
TOTALES			**$ 1.804.607.280,00**	**$ -**	**$ 1.804.607.280,00**	**$ 541.382.184,00**	**$ 1.263.225.096,00**	**$ 709.766.838,89**	**523 del 26 de octubre de 2022**	**$ 1.656.122.624,07**	**$ 2.365.889.462,96**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 1.804.607.280,00	$ -	**$ 1.804.607.280,00**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS			
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 24.914.000,00	$ 4.733.660,00	**$ 29.647.660,00**
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 1.829.521.280,00	$ 4.733.660,00	**$ 1.834.254.940,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes. EL CONSORCIO CRISTO REY, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales previas a la ejecución de obra, con el contrato de obra en mención no ha realizado actividades en campo.

Firma
Nombre: ERNESTO JOSE HERNANDEZ LECLERC
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-259564COR

Firma
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5. MEPI-MN1-IN-15-FR-10. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: LP-008-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CRISTO REY CON NIT. 901.642.986-1

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: diciembre-2023 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23,7	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	21	21	24	737,7
Lluvias moderadas																0,3													3	3		6,3
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: LUIS FERNANDO PLAZA BUELVAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 05202-170303

Firma
Nombre: AMAURY BENITEZ MARTINEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202 - 273006 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CodigoEstacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal

Entidad	AreaOperativa	Departamento
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba

Municipio	FechaInstalacion	FechaSuspension	IdParametro	Etiqueta	DescripcionSerie	Frecuencia
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria

Fecha	Valor	Grado	Calificador	NivelAprobacion
1/11/2023 0:00	30.5	50		900
2/11/2023 0:00	0	50		900
3/11/2023 0:00	21	50		900
4/11/2023 0:00	0	50		900
5/11/2023 0:00	20.3	50		900
6/11/2023 0:00	0	50		900
7/11/2023 0:00	6.5	50		900
8/11/2023 0:00	0	50		900
9/11/2023 0:00	0	50		900
10/11/2023 0:00	0	50		900
11/11/2023 0:00	17.4	50		900
12/11/2023 0:00	0	50		900
13/11/2023 0:00	1.9	50		900
14/11/2023 0:00	11.8	50		900
15/11/2023 0:00	0	50		900
16/11/2023 0:00	0.5	50		900
17/11/2023 0:00	0.9	50		900
18/11/2023 0:00	19.5	50		900
19/11/2023 0:00	1.2	50		900
20/11/2023 0:00	1.9	50		900
21/11/2023 0:00	8.7	50		900
22/11/2023 0:00	0	50		900
23/11/2023 0:00	0	50		900
24/11/2023 0:00	1.7	50		900
25/11/2023 0:00	0	50		900
26/11/2023 0:00	0	50		900
27/11/2023 0:00	0	50		900
28/11/2023 0:00	0	50		900
29/11/2023 0:00	0	50		900
30/11/2023 0:00	0	50		900

4.6. MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS LABORATORIO.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 9/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No.: LP-008-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CRISTO REY CON NIT. 901.642.986-1

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: diciembre-2023 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año) TOMA	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: ERNESTO JOSE HERNANDEZ LECLERC
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-259564COR

Firma

Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7. MEPI-MN1-IN-15-FR-12. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5 (Día) 1 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-008-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CRISTO REY CON NIT. 901.642.986-1

OBJETO DEL CONTRATO:

"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."

FECHA DE INICIO: 13/12/2022

PLAZO INICIAL: 5 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/12/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.170.496.742,96

VALOR ACUMULADO: $ 4.170.496.742,96
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 29.647.660,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 29.647.660,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 417.049.674,30	13	12	2022	14	9	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.251.149.022,89	13	12	2022	14	9	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 834.099.348,59	13	12	2022	15	5	2026
Calidad de Estudios y Diseños	100%	$ 1.251.149.022,89	13	5	2023	13	5	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 1.251.149.022,89	13	5	2023	13	5	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 75-44-101125121

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 400.000.000,00	13	12	2022	15	5	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 75-40-101046581 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	5	12	2023
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 417.049.674,30	13	12	2022	13	12	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.251.149.022,89	13	12	2022	13	12	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 834.099.348,59	13	12	2022	13	8	2026
Calidad de Estudios y Diseños	100%	$ 1.251.149.022,89	13	8	2023	13	8	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 1.251.149.022,89	13	8	2023	13	8	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 75-44-101125121

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	11,13%	$ 464.000.000,00	13	12	2022	16	8	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 75-40-101046581 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

A la fecha el contratista no realiza la entrega de las polizas actualizadas según la prorroga No.2.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-44-101125121	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	05	2023	13	12	2022	00:00	13	08	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO CRISTO REY		NIT: 901.642.986-1
DIRECCIÓN: CALLE 14 NO. 6-74 OF 101	**CIUDAD:** CHINU, CORDOBA	**TELÉFONO:**	3014540438

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE SAN PELAYO - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS		NIT: 800.096.805-6
DIRECCIÓN: ALCALDIA DE SAN PELAYO	**CIUDAD:** SAN PELAYO, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7630309

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CABARCAS BUELVAS ALFREDO ANTONIO	10770721	10.00
ISABELLA DAVID INGENIERIA SAS	900588551-5	5.00
INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA INGE	901346516-2	85.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

75-44-101125121

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

MARIAALVAREZ

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-44-101125121	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	05	2023	13	12	2022	00:00	13	08	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO CRISTO REY	NIT: 901.642.986-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 14 NO. 6-74 OF 101	CHINU, CORDOBA	3014540438

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE SAN PELAYO - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT: 800.096.805-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
ALCALDIA DE SAN PELAYO	SAN PELAYO, CORDOBA	7630309

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard Diners Club International AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito Gana Gana COOPROGRESO

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****5,004,596,091.56	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-44-101125121	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	05	2023	13	12	2022	00:00	13	08	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CRISTO REY	NIT: 901.642.986-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 14 NO. 6-74 OF 101	CHINU, CORDOBA	3014540438

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SAN PELAYO - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT: 800.096.805-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
ALCALDIA DE SAN PELAYO	SAN PELAYO, CORDOBA	7630309

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. LP-008-2022 CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/12/2022	13/12/2023	$417,049,674.30	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	13/12/2022	13/12/2023	$1,251,149,022.89	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$1,251,149,022.89	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/12/2022	13/08/2026	$834,099,348.59	
CALIDAD DEL SERVICIO	13/08/2023	13/08/2028	$1,251,149,022.89	$1,251,149,022.89

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CON LA FECHA FINAL DEL CONTRATO SEGUN PRRROGA No. 1 AL DE FECHA 04/05/2023.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES PERMANECEN IGUAL Y SIN MODIFICACION.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****5,004,596,091.56	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-44-101125121

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-44-101125121	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	05	2023	13	12	2022	00:00	13	06	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO CRISTO REY		**NIT: 901.642.986-1**
DIRECCIÓN: CALLE 14 NO. 6-74 OF 101	**CIUDAD:** CHINU, CORDOBA	**TELÉFONO:**	3014540438

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE SAN PELAYO - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS		**NIT: 800.096.805-6**
DIRECCIÓN: ALCALDIA DE SAN PELAYO	**CIUDAD:** SAN PELAYO, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7630309

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CABARCAS BUELVAS ALFREDO ANTONIO	10770721	10.00
ISABELLA DAVID INGENIERIA SAS	900588551-5	5.00
INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA INGE	901346516-2	85.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

75-44-101125121

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

MARIAALVAREZ

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-44-101125121	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	05	2023	13	12	2022	00:00	13	06	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CRISTO REY	NIT: 901.642.986-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 14 NO. 6-74 OF 101	CHINU, CORDOBA	3014540438

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SAN PELAYO - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT: 800.096.805-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
ALCALDIA DE SAN PELAYO	SAN PELAYO, CORDOBA	7630309

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard Diners Club International AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito Gana Gana CA COOPDROGAS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****5,004,596,091.56	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-44-101125121	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	05	2023	13	12	2022	00:00	13	06	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO CRISTO REY		NIT: 901.642.986-1
DIRECCIÓN: CALLE 14 NO. 6-74 OF 101	CIUDAD: CHINU, CORDOBA	TELÉFONO:	3014540438

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE SAN PELAYO - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS		NIT: 800.096.805-6
DIRECCIÓN: ALCALDIA DE SAN PELAYO	CIUDAD: SAN PELAYO, CORDOBA	TELÉFONO	7630309

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. LP-008-2022 CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/12/2022	13/12/2023	$417,049,674.30	$417,049,674.30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	13/12/2022	13/12/2023	$1,251,149,022.89	$1,251,149,022.89
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$1,251,149,022.89	$1,251,149,022.89
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/12/2022	13/08/2026	$834,099,348.59	$834,099,348.59
CALIDAD DEL SERVICIO	13/08/2023	13/06/2028	$1,251,149,022.89	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CON LA FECHA FINAL DEL CONTRATO SEGUN PRRROGA No. 1 AL DE FECHA 04/05/2023.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES PERMANECEN IGUAL Y SIN MODIFICAR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****5,004,596,091.56	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-44-101125121

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

4.8. MEPI-MN1-IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5 (Dia) 1 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-008-2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATISTA: CONSORCIO CRISTO REY

FECHA DE INICIO: 13/12/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 5 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/12/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO APROBADO: SI NO X VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: 16/12/2022

OBSERVACIONES: No presenta información suficiente para la ejecución del proyecto, garantizando recursos y calidad. Este plan es en sí una intención de cumplir los requisitos de la ISO9001 e ISO10005 pero no establece como lo realizará. No presentan información básica a la que se debe hacer seguimiento como plan de inspeción y ensayo, planeación metrológica, plan ante productos no conformes, defectuosos o control de quejas entre otros.
Se solicita presentar un plan de calidad con mayor detalle de como el contratista cumplira los requisitos de la entidad controtante, normativas y sus necesidades internas de Sistema de Gestión de Calidad.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI NO X
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI NO

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: NA
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: NA
FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: NA
FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: NA

OBSERVACIONES:
No se presento programa de auditoria.

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI **X** NO APROBADO: NO **X** FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 43
No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 0

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI NO **X**

OBSERVACIONES:
El plan de inspección y ensayo no presenta cuáles son los ensayos a realizar, sus frecuencias, responsable y parámetros de recibo. La descripción de las inspecciones es adecuada.
Presentan indicadores de gestión pero no tiene en cuenta los principales a controlar por el cliente que son lops avances fisicos y facturación.
Se solicita que se complementen los planes de inspección y ensayo, sin embargo se hace seguminiento al cumplimiento de las especificaciones del INVIAS.

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 1
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 1
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 37
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 25
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 12

OBSERVACIONES:
Ver anexo de No Conformidades

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0
No. Acumulado de quejas y reclamos recibidas por el contrato: 2
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0
No. Acumulado de quejas y reclamos atendidas en el contrato: 2

OBSERVACIONES:
Para el mes de octubre no se recibieron PQR, que son basicamente situaciones con los propietarios y las comunidades que intervienen en la ejecucion de la obra.
Ver anexo de quejas

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =	**39%**	**Cumplimiento en ejecución de inversión:** $Ejecutado / $Programado * 100
IG2: Índice de gestión 2 =	**NA**	**Satisfacción del cliente:** No. De encuestas sobresalientes y adecuadas / No. Encuestas efectuadas *100
IG3: Índice de gestión 3 =	**39%**	**Cumplimiento en el avance de obra física:** Cantidad de obra ejecutada / Total de obra programada * 100
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

En el mes de octubre se tuvo un aproximado una ejecución del 30,30% con un atraso considerable respecto a lo programado. Ver anexo de Indicadores.
El contratista no ha aplicado encuestas de satisfacción durante el desarrollo del contrato.

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	INSTRUMENTO DE PESAJE NO AUTOMÁTICO	LEXUS	YS134076	11/07/2022	M-26651-005 R0	11/07/2023	
2	INSTRUMENTO DE PESAJE NO AUTOMÁTICO	TRUMAX	YS001	11/07/2022	M-26651-002 R0	11/07/2023	
3	INSTRUMENTO DE PESAJE NO AUTOMÁTICO	LEXUS	YS140527	12/07/2022	M-26651-004 R0	12/07/2023	
4	MÁQUINA DE ENSAYO A COMPRESIÓN	LEXUS	2305D23982	11/07/2022	F-26651-001 R0	11/07/2023	
5	ESTACIÓN TOTAL	TOPCON	KN0201	13/03/2023	3825	12/09/2023	

OBSERVACIONES:

En el mes de octubre se presentar un certificado de calibración de equipo de topografía que esta proximo a vencer se recomienda su calibración inmediata conjunto a los de laboratorio que se vencieron a mitad de mes.

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma:
Nombre: JOSE GREGORIO DOMINGUEZ DIAZ
Representante legal o apoderado del Contratista

Firma:
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Firma
Nombre: DIANA MARIA MONTANO ORTIZ
Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.: 7620282844VLL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ID	MES	Especificación	Descripción	unidad	Cantidad ejecutada	Material/ Insumo	Ensayos	Frecuencia	Cant. Esperada	Cant. Presentada	Observación
	Total Inicio								0	0	
	Total abr-23								17	0	
	Total may-23								64	17	
	Total jun-23								42	0	
	Total jul-23								13	0	
	Total ago-23								64	0	
	Total sep-23								61	0	
355	oct-23	311	Afirmado 15cm (Material para Mejoramiento, utilizar CBR de acuerdo a la guía, CBR ≤3%)	m3	56						
356	oct-23	311				Afirmado	Desgaste	Por fuente	1	0	
357	oct-23	311				Afirmado	Solidez	Por fuente	1	0	
358	oct-23	311				Afirmado	Límite líquido	Por fuente	1	0	
359	oct-23	311				Afirmado	Indice de plasticidad	Por fuente	1	0	
360	oct-23	311				Afirmado	contenido de terrones	Por fuente	1	0	
361	oct-23	311				Afirmado	contracción lineal	Por fuente	1	0	
362	oct-23	311				Afirmado	CBR	Por fuente	1	0	
363	oct-23	311				Afirmado	Granulometría	Por fuente	1	0	
364	oct-23	311				Afirmado	Granulometría	1 vez por jornada	1	0	
365	oct-23	311				Afirmado	Límite líquido	1 vez por jornada	1	0	
366	oct-23	311				Afirmado	Indice de plasticidad	1 vez por jornada	1	0	
367	oct-23	311				Afirmado	contracción lineal	1 vez por jornada	1	0	
368	oct-23	311				Afirmado	Proctor modificado	1 vez por jornada	1	0	
369	oct-23	311				Afirmado	Densidad	cada 500 ml, 3500 m2 o 1 vez por jornada	1	0	
370	oct-23	220	Terraplenes (Material de corona para mejoramiento)	m3	63						
371	oct-23	220				Suelos seleccionados	Tamaño Máx	Por fuente	1	0	
372	oct-23	220				Suelos seleccionados	Pasa No 10	Por fuente	1	0	
373	oct-23	220				Suelos seleccionados	Pasa 200	Por fuente	1	0	
374	oct-23	220				Suelos seleccionados	Cont. Materia Orgánica	Por fuente	1	0	
375	oct-23	220				Suelos seleccionados	LL	Por fuente	1	0	
376	oct-23	220				Suelos seleccionados	IP	Por fuente	1	0	
377	oct-23	220				Suelos seleccionados	CBR Lab	Por fuente	1	0	
378	oct-23	220				Suelos seleccionados	Expansión CBR	Por fuente	1	0	
379	oct-23	220				Suelos seleccionados	Índice de Colapso	Por fuente	1	0	
380	oct-23	220				Suelos seleccionados	Contenido de sales soluble	Por fuente	1	0	
381	oct-23	220				Suelos seleccionados	Granulometría	1 por jornada	1	0	
382	oct-23	220				Suelos seleccionados	Cont. Materia Orgánica	1 por semana	4	0	
383	oct-23	220				Suelos seleccionados	LL	1 por jornada	1	0	
384	oct-23	220				Suelos seleccionados	IP	1 por jornada	1	0	
385	oct-23	220				Suelos seleccionados	CBR Lab	1 por mes	1	0	
386	oct-23	220				Suelos seleccionados	Expansión CBR	1 por mes	1	0	
387	oct-23	220				Suelos seleccionados	Índice de Colapso	1 por mes	1	0	
388	oct-23	220				Suelos seleccionados	Proctor modificado	1 por semana	4	0	
389	oct-23	220				Suelos seleccionados	Contenido de sales soluble	1 por semana	4	0	
390	oct-23	220				Suelos seleccionados	Compactación	500 m, 3500 m2 en corona o 5000 m2 en otras capas	1	0	
	Total oct-23								43	0	
	Total general								304	17	

ANEXO DE NO CONFORMIDADES

NO CONFORMIDADES

MES	CONTRATISTA	OFICIO/ NOTA BITÁCORA	NO CONFORMIDAD	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO	CERRADO EN EL MES?	CERRADO?	MES CIERRE
jun-23	Consorcio Cristo Rey	CVRIMG-798-2023	Reiteración de comunicado cvrimg-290-2023.	Cumple parcialmente			
jun-23	Consorcio Cristo Rey	CVRIMG-859-2023	Reiteración solicitud de presencia del inspector sst 100% en obra	No se presenta en obra			
jun-23	Consorcio Cristo Rey	CVRIMG-862-2023	Reiteración comunicado cvrimg-290-2023	No presento			
jun-23	Consorcio Cristo Rey	CVRIMG-886-2023	Reiteración oficio cvrimg-853-2023	No se presenta en obra			
jul-23	Consorcio Cristo Rey	CVRIMG-975-2023	Reiteración oficios cvrimg-853-2023 y cvrimg-886-2023 solicitud de presencia del inspector sst 100% en obra	No se presenta en obra			
ago-23	Consorcio Cristo Rey	CVRIMG-1235-2023	Reiteración comunicado CVRIMG-1186-2023. "Solicitud plan de contingencia":	No ha presentado			
ago-23	Consorcio Cristo Rey	CVRIMG-1294-2023	Reiteración oficio cvrimg-1166-2023 solicitud investigación accidente de trabajo.	No ha presentado informe			
sep-23	Consorcio Cristo Rey	CVRIMG-1365-2023	Reiteración comunicado CVRIMG-1179-2023 con asunto: Traslado de comunicado SS 37586 (observaciones– PAGA.)	Presento correciones			
sep-23	Consorcio Cristo Rey	CVRIMG-1418-2023	Segunda reiteración comunicado CVRIMG-1179-2023 con asunto: Traslado de comunicado SS 37586 (observaciones– PAGA.)	Presento correciones			
sep-23	Consorcio Cristo Rey	CVRIMG-1458-2023	Reiteracion solicitud legalizacion del anticipo	Entrega parcial			
sep-23	Consorcio Cristo Rey	CVRIMG-1509-2023	Tercera reiteración comunicado CVRIMG-1179-2023 con asunto: Traslado de comunicado SS 37586 (observaciones– PAGA.).	Presento correciones			
oct-23	Consorcio Cristo Rey	CVRIMG-1605-2023	Cuarta reiteración comunicado CVRIMG-1179-2023 con asunto: Traslado de comunicado SS 37586 (observaciones– PAGA.).	PRESENTO CORRECCIONES			

4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	FECHA	27 de febrero de 2023	CONSORCIO CRISTO REY
CONTRATO DE OBRA	LP - 008-2022		
OBJETO	"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN LETRAS.	CUATRO MIL CIENTO SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (4170496742,96)		
VALOR	$ 4.170.496.742,96		
CONTRATISTA	CONSORCIO CRISTO REY		
INVERVENTORIA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG		
PLAZO	CINCO (05) MESES.		
PORCENTAJE - VALOR ANTICIPO	30%		$ 1.251.149.022,89

DATOS ESPECIFICOS

No.	Descripción		Mes 1 Valor ($)	% parcial Mes 1	Mes 2 Valor ($)	% parcial Mes 1	Valor Total	Porcentaje total
1	Compra y suministro de materiales		$ 420.000.000,00	34%	$ 180.000.000,00	14%	$ 600.000.000,00	47,96%
2	Alquiler de maquinaria,equipos y herramientas.		$ 175.804.316,02	14%	$ 75.344.706,87	6%	$ 251.149.022,89	20,07%
4	Pago de mano de obra		$ 280.000.000,00	22%	$ 120.000.000,00	10%	$ 400.000.000,00	31,97%
TOTAL			***$ 875.804.316,02***	***70%***	***$ 375.344.706,87***	***30%***	***$ 1.251.149.022,89***	100,00%

Nota:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones.
b) Esta es la proyección inicial del programa de inversión del anticipo, es suceptible a cambios de acuerdo a las necesidades de la obra, previa autorización de la interventoría.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

Firma

Nombre: JOSE DOMINGUEZ DIAZ
R.L CONSORCIO CRISTO REY
CONTRATISTA

Firma

Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
CONSORCIO VIAL RURAL IMG
INTERVENTOR

MODIFICACION Nº1 DEL PLAN DE INVERSION Nº1 DEL ANTICIPO	FECHA	15 de mayo de 2023	CONSORCIO CRISTO REY
CONTRATO DE OBRA	LP - 008-2022		
OBJETO	"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN LETRAS.	CUATRO MIL CIENTO SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (4170496742,96)		
VALOR	$ 4.170.496.742,96		
CONTRATISTA	CONSORCIO CRISTO REY		
INVERVENTORIA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG		
PLAZO	TRES (05) MESES.		
PORCENTAJE - VALOR ANTICIPO	30%		$ 1.251.149.022,89

DATOS ESPECIFICOS

No.	Descripción		Mes 1 Valor ($)	% parcial Mes 1	Mes 2 Valor ($)	% parcial Mes 1	Valor Total	Porcentaje total
1	Compra, suministro y transporte de materiales		$ 420.000.000,00	34%	$ 242.144.706,87	19%	$ 662.144.706,87	52,92%
2	Alquiler de maquinaria, compra de equipos menores y herramientas.		$ 175.804.316,02	14%	$ 13.200.000,00	1%	$ 189.004.316,02	15,11%
3	Pago de mano de obra		$ 280.000.000,00	22%	$ 120.000.000,00	10%	$ 400.000.000,00	31,97%
TOTAL			***$ 875.804.316,02***	***70%***	***$ 375.344.706,87***	***30%***	***$ 1.251.149.022,89***	100,00%

Nota:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones.

b) Esta es la proyección inicial del programa de inversión del anticipo, es suceptible a cambios de acuerdo a las necesidades de la obra, previa autorización de la interventoría.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

Firma

Nombre: JOSE DOMINGUEZ DIAZ
R.L CONSORCIO CRISTO REY
CONTRATISTA

Firma

Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
CONSORCIO VIAL RURAL IMG
INTERVENTOR

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 11 **MES:** nov-23 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

CONTRATO DE OBRA No. LP-008-2022 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. 15798 **DE** 2022 ENTIDAD FINANCIERA: FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 61011094 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL:
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 30 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 1.251.149.022,89** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATISTA: CONSORCIO CRISTO REY

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 DE 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	Compra, suministro y transporte de materiales	$ 662.144.706,87			$ -	$ 662.144.706,87
2	Alquiler de maquinaria,equipos y herramientas.	$ 189.004.316,02			$ -	$ 189.004.316,02
3	Pago de mano de obra	$ 400.000.000,00			$ -	$ 400.000.000,00
	TOTALES	$ 1.251.149.022,89	$ -	$ -	$ -	$ 1.251.149.022,89

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre: JOSE DOMINGUEZ DIAZ
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- **SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA**

CONSORCIO ORIENTE

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA MUNICIPIO DE SAN PELAYO - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**PROYECTO SABANA NUEVA**	**208.13 días**	**mar 13/12/22**	**lun 14/08/23**
2		**DISEÑOS**	104 días	**mar 13/12/22**	**sáb 15/04/23**
3		REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	104 días	mar 13/12/22	sáb 15/04/23
4		**EXPLANACIONES**	**6 días**	**lun 17/04/23**	**sáb 22/04/23**
5		Excavaciones varias en material común en seco.	3 días	mié 19/04/23	sáb 22/04/23
6		Excavación en material común de la explanación y canales	3 días	lun 17/04/23	mié 19/04/23
7		**CONSTRUCCIÓN DE 1 BOX CULVERT 1,5X1(L =7m)**	**12 días**	**sáb 20/05/23**	**vie 2/06/23**
8		Excavaciones varias en material común en seco a mano.	1 día	lun 22/05/23	mar 23/05/23
9		Demolicion de estructuras	1 día	sáb 20/05/23	lun 22/05/23
10		Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	1 día	mar 23/05/23	mié 24/05/23
11		CONCRETO CLASE C (280 kg/cm2 ó 4000PSI)	4 días	lun 29/05/23	jue 1/06/23
12		Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	4 días	mié 24/05/23	lun 29/05/23
13		Relleno para Estructuras con recebo	1 día	jue 1/06/23	vie 2/06/23
14		**CONSTRUCCIÓN DE 1 PUENTE DE 15 M**	**64 días**	**jue 1/06/23**	**sáb 12/08/23**
15		Demolicion de estructuras	3 días	jue 1/06/23	lun 5/06/23
16		Excavaciones varias en material común bajo agua a maquina	5 días	lun 5/06/23	vie 9/06/23
17		Terraplenes	4 días	mié 2/08/23	lun 7/08/23
18		Revestimiento en Piedra pegada para taludes	2 días	lun 7/08/23	mar 8/08/23
19		Concreto clase C (280 kg/cm2 ó 4000 PSI)- ZAPATAS, ESTRIBOS, ALETAS, TABLERO, BORDILLOS Y LOSA DE APROXIMACION	42 días	mar 13/06/23	lun 31/07/23
20		Material Granular drenante	1 día	lun 7/08/23	lun 7/08/23
21		Geotextil Tipo No Tejido 2500	2 días	mar 8/08/23	jue 10/08/23
22		Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	44 días	lun 5/06/23	mar 25/07/23
23		Junta de dilatación elastómera reforzada (incluye suministro e instalación)	1 día	jue 10/08/23	vie 11/08/23
24		Apoyos elastometricos	1 día	lun 31/07/23	mar 1/08/23
25		Baranda metalica para trafico vehicular	2 días	mar 8/08/23	jue 10/08/23
26		Conformación de la calzada existente - Accesos	1 día	lun 7/08/23	lun 7/08/23
27		Subbase Granular Clase C.- Accesos	1 día	mar 8/08/23	mié 9/08/23
28		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	1 día	mar 8/08/23	mar 8/08/23
29		Prueba de Carga	1 día	vie 11/08/23	sáb 12/08/23
30		Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	2 días	jue 27/07/23	lun 31/07/23
31		Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	3 días	mar 25/07/23	jue 27/07/23
32		Construcción de pilotes de concreto de 28 Mpa con diametro de 0.8m, incluye excavación, acero de refuerzo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento cumpliendo con las cotas y diseños.	46 días	lun 5/06/23	mié 26/07/23
33		Grúa autopropulsada de brazo telescópico para Izaje y Montaje de Vigas Prefabricadas.	2 días	lun 31/07/23	mar 1/08/23
34		**PLACA HUELLA, ANCHO 6,8m**	**98 días**	**lun 17/04/23**	**lun 7/08/23**
35		Subbase Granular Clase C.	10 días	mar 16/05/23	vie 26/05/23
36		Afirmado (Material para Mejoramiento)	12 días	mar 2/05/23	mar 16/05/23
37		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA	35 días	jue 25/05/23	mar 4/07/23
38		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS	20 días	lun 5/06/23	mar 27/06/23
39		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	36 días	mar 27/06/23	lun 7/08/23
40		Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).	38 días	mié 14/06/23	jue 27/07/23
41		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	35 días	mié 19/04/23	mié 31/05/23
42		Terraplenes	12 días	mié 19/04/23	jue 4/05/23
43		Conformación de la calzada existente	3 días	lun 17/04/23	mié 19/04/23
44		**TRANSPORTE**	**68 días**	**sáb 15/04/23**	**mar 4/07/23**
45		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).	68 días	sáb 15/04/23	mar 4/07/23
46		**CARACTERIZACIÓN VIAL**	**1 día**	**lun 14/08/23**	**lun 14/08/23**
47		Caracaterización del corredor	1 día	lun 14/08/23	lun 14/08/23
48		**OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS**	**90 días**	**sáb 15/04/23**	**vie 28/07/23**
49		OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	90 días	sáb 15/04/23	vie 28/07/23

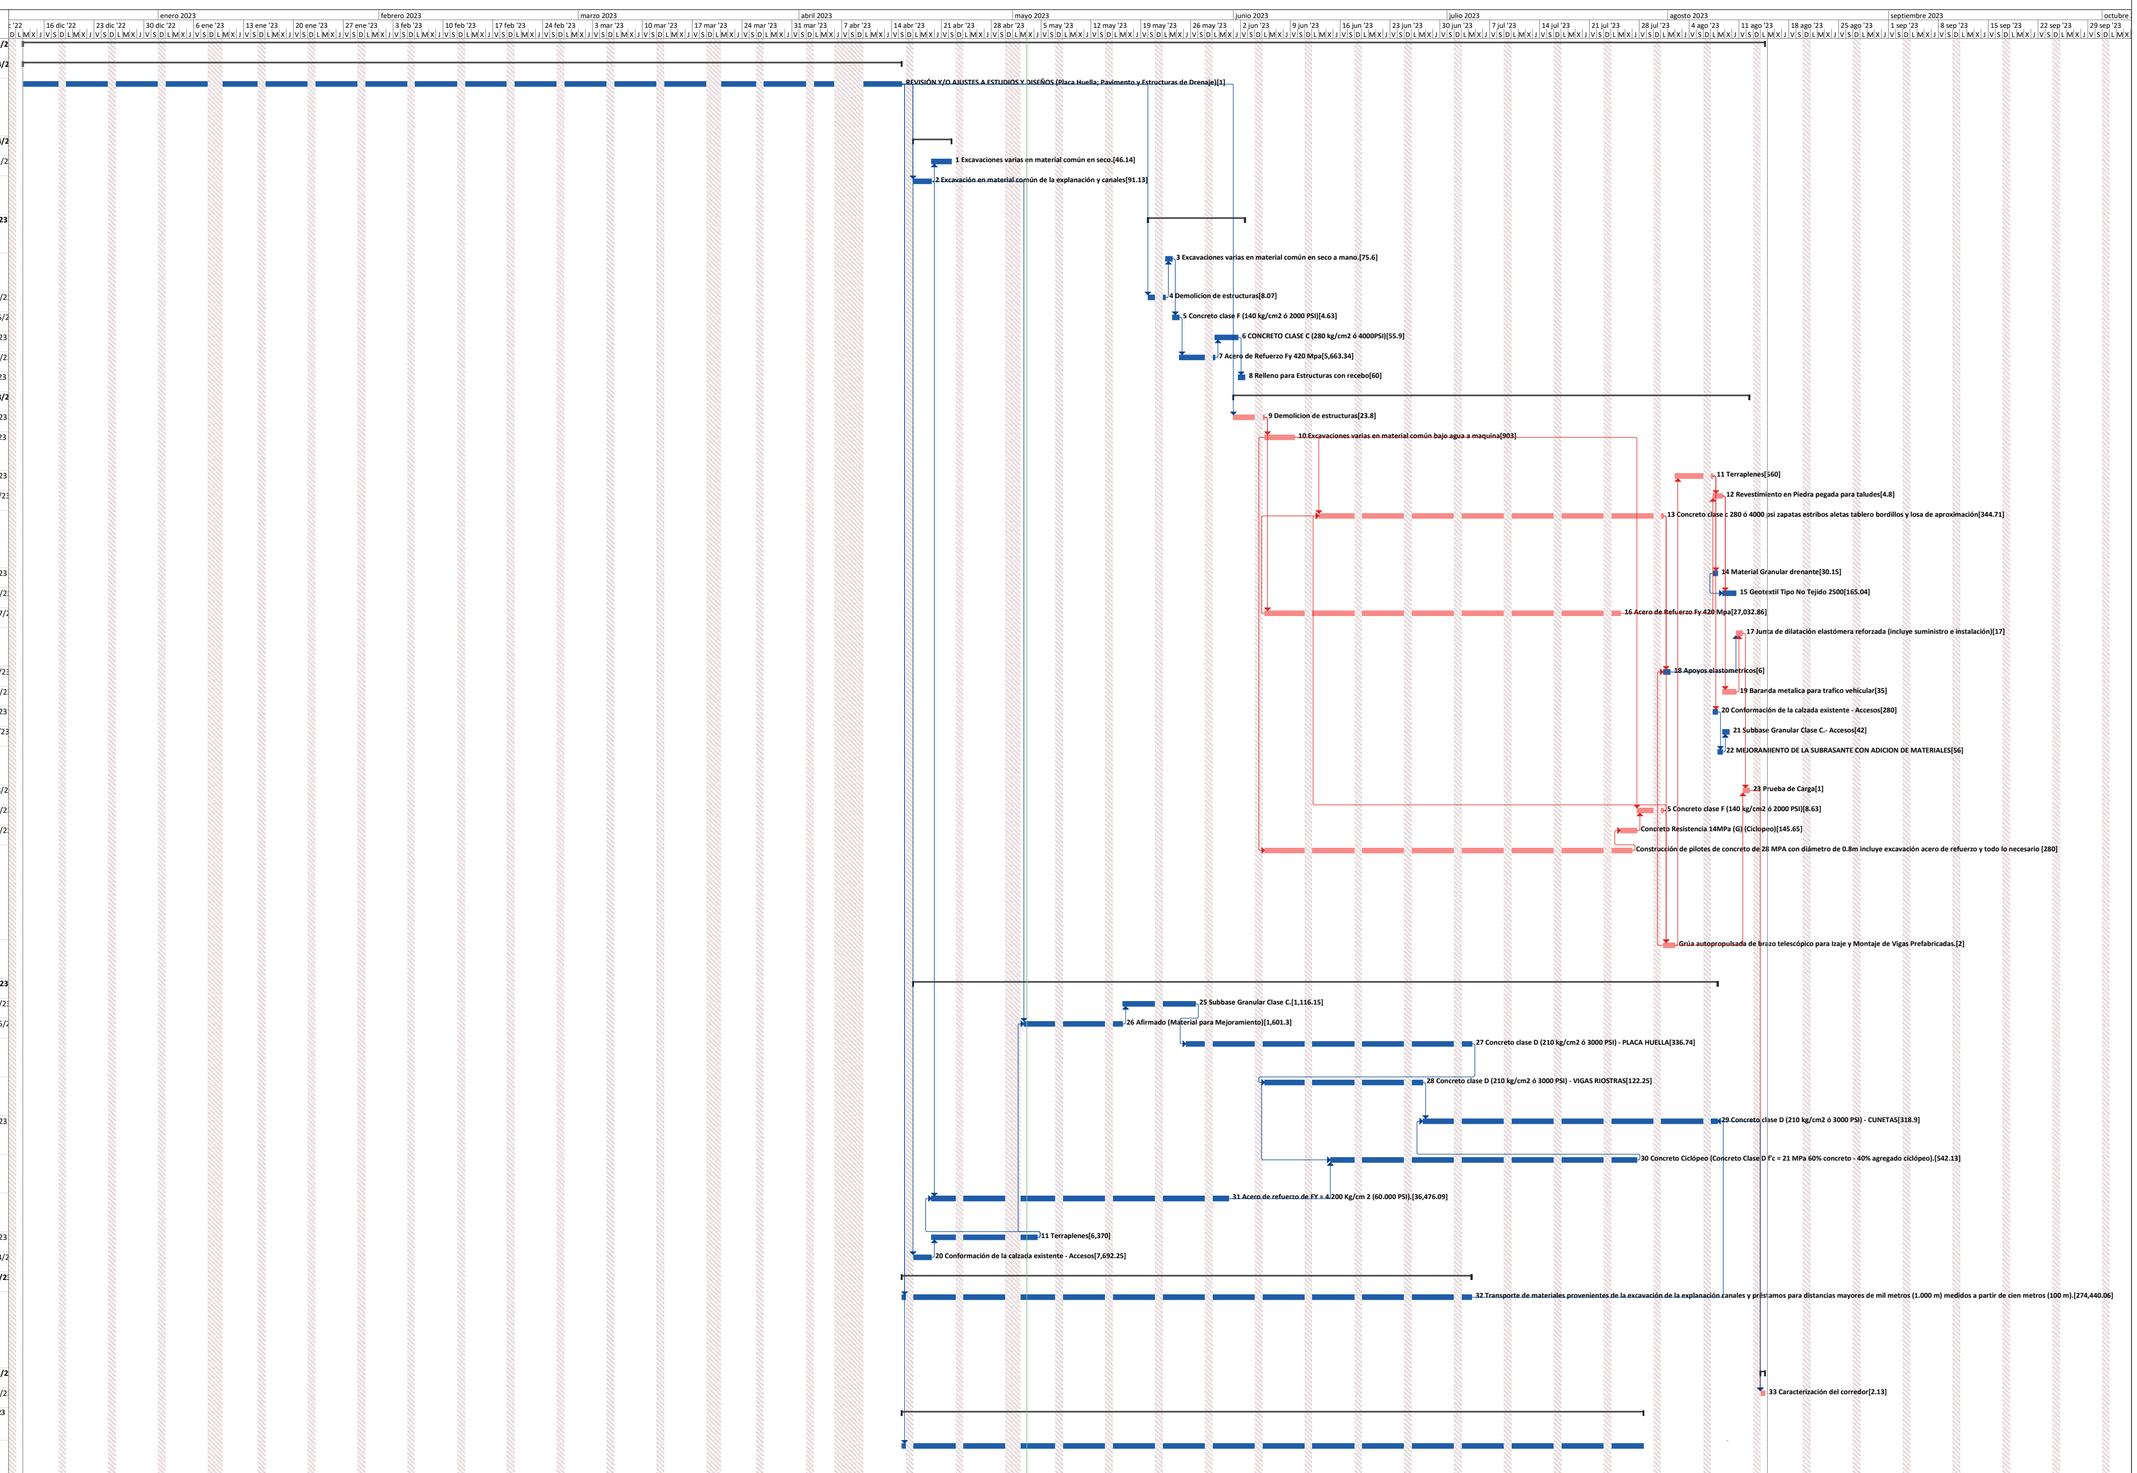

- **MEPI-MN-IN-6-FR-1 PROGRAMA DE INVERSIONES.**

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

29	12	2023
(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 4 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: LP-008-2022

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANANUEVA MUNICIPIO DE SAN PELAYO-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATISTA: CONSORCIO CRISTO REY

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

PLAZO INICIAL: 5 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **13/12/2022** (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 4.170.496.922.960,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)** **$ 4.170.496.922.960,00**

PLAZO ACUMULADO: 14 MESES Y 18 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **29/02/2024** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	Del 01 al 04 de mayo de 2023 / Del 05 al 31 de mayo de 2023	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24
I. GPP																			
GPP 1 EXPLANACIONES	$ 59.101,8740	1,44%	0,08%	% P		1,32%	0,12%			0,11%	0,55%	0,77%	0,60%	0,59%	0,23%	0,18%	0,02%	0,04%	0,00%
	$ 5.007,7710	0,12%	$3.201	$ P		$54.120,21	$4.981,66			$4.456,22	$22.432,95	$31.406,14	$24.533,81	$24.093,10	$9.369,54	$94,95	$864,51	$1.806,45	$0,00
				$ E					$807	$299			$738	$396		$1.162			
				% E					0,02%	0,01%			0,02%	0,00%		0,03%			
II. GPP																			
GPP 2 CONSTRUCCIÓN DE 1 BOX CULVERT 1,5X1(L =7m)	$ 32.259,1936	0,79%	0,00%	% P		0,44%	0,35%			0,15%	0,64%		0,65%	0,14%	0,00%	0,00%	0,01%	0,85%	0,66%
	$ 105.902,5743	2,58%	$0	$ P		$17.858,60	$14.400,60			$6.080,79	$26.178,41	$0,00	$26.713,24	$5.545,95	$0,00	$0,00	$547,12	$35.001,11	$39.130,69
				$ E															
				% E															
III. GPP																			
GPP 3 CONSTRUCCIÓN DE 1 PUENTE DE 15 M	$ 874.288,5411	21,32%	0,00%	% P			1,57%	10,39%	4,51%	1,87%		6,98%	11,63%	0,00%	0,00%	2,76%	0,00%	0,22%	10,00%	19,49%
	$ 1.728.237,3080	42,14%	$0	$ P			$64.479,90	$426.212,23	$184.987,51	$76.682,10	$0,00	$286.214,71	$476.865,96	$0,00	$0,00	$236.108,26	$0,00	$8.928,49	$410.264,20	$799.501,91
				$ E															
				% E															
IV. GPP																			
GPP 4 PLACA HUELLA, ANCHO 6,8m	$ 2.906.735,2882	70,88%	33,18%	% P			28,71%	24,55%	15,21%	1,42%	4,12%	13,90%	29,57%	6,11%	8,32%	11,97%	9,77%	4,83%	4,77%	2,40%
	$ 1.679.954,4176	40,96%	$1.360.743	$ P			$1.177.641,47	$1.006.842,95	$623.876,30	$58.057,13	$168.837,70	$570.193,73	$1.217.859,65	$250.456,12	$341.111,94	$490.848,04	$400.744,11	$198.186,57	$195.779,59	$98.265,97
				$ E					$283.822	$53.663	$262.964	$381.465	$93.562	-$214.985	$46.023	$7.956	$44.252		
				% E					6,92%	1,31%	6,41%	9,30%	2,28%	-5,24%	1,12%	0,19%	10,80%		
V. GPP																			
GPP 5 TRANSPORTE.	$ 227.433,1800	5,55%	10,20%	% P		1,30%	2,47%	1,78%			0,54%	2,39%	2,49%	2,14%	1,92%	1,36%	5,81%	1,99%	3,30%	0,66%
	$ 580.715,8260	14,16%	$418.512	$ P		$53.240,04	$101.311,14	$72.882,00			$22.013,63	$97.947,45	$101.401,49	$87.612,86	$78.603,03	$55.758,69	$238.177,07	$81.803,30	$135.169,73	$27.033,95
				$ E					$5.459					$231.064	$85.410	$4.463	$92.416		
				% E					0,13%					5,63%	2,08%	0,11%	2,26%		
VI. GPP																			
GPP 6 CARACTERIZACIÓN VIAL.	$ 1.384,2444	0,03%	0,00%	% P										0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%
	$ 1.384,2444	0,03%	$0	$ P							$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$1.384,24	$0,00	$1.384,24
				$ E															
				% E															
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 4.101.202,32	100,00%	43,46%							Reprogramación No.1			Reprogramación No.2			Reprogramación No.3		Reprogramación No.4	
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 4.101.202,32	100,00%	$ 1.782.456,44																

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	3,05%	33,23%	36,72%	19,72%	3,29%	4,91%	24,46%	44,45%	9,49%	10,96%	19,31%	15,60%	7,11%	18,97%	23,54%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$125.218,85	$1.362.814,77	$1.505.997,18	$808.863,80	$134.739,23	$201.388,35	$1.002.967,25	$1.823.145,23	$389.316,02	$449.354,02	$792.084,53	$639.958,13	$291.714,23	$778.021,09	$965.316,76
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	3,05%	36,28%	73,00%	92,73%	96,01%	23,29%	47,75%	92,20%	46,97%	57,93%	77,24%	92,85%	99,96%	76,46%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$125.218,85	$1.488.033,62	$2.994.030,80	$3.802.894,60	$3.937.633,83	$955.258,80	$1.958.226,05	$3.781.371,28	$1.926.376,03	$2.375.730,06	$3.167.814,58	$3.807.772,71	$4.099.486,94	$3.135.885,56	$4.101.202,32
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,07%	1,31%	6,42%	9,30%	2,28%	0,41%	3,21%	0,30%	13,16%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$290.087	$53.663	$263.283	$381.465	$93.562	$16.818	$131.528	$12.420	$539.631			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,07%	8,38%	14,80%	24,10%	26,38%	26,79%	30,00%	30,30%	43,46%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$290.087	$343.750	$607.033	$988.498	$1.082.060	$1.098.878	$1.230.406	$1.242.826	$1.782.456			

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	$ 4.101.202.321,31	$ 1.782.456.444	43,46%
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	NA / NA	NA	NA
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	NA / NA	NA	NA
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	NA / NA	NA	NA
VALOR IVA (OBRA) (E)	NA	NA	NA
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E)	NA / NA	NA	NA
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 24.914.000,00		0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.733.660,00		0,00%
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 39.646.941,65	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 69.294.601,65	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 4.170.496.922,96**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')		**$ 1.782.456.444,00**	**43,46%**

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES: Reprogramación No. 4 de acuerdo a la prorroga No.4

Aprueba Firma:
Nombre: JOSE GREGORIO DOMINGUEZ DIAZ
Representante legal o apoderado del Contratista

Aprueba Firma:
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- **MEPI-MN-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ..... **DE** ..... (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. 13 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: LP-008-2022

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANANUEVA MUNICIPIO DE SAN PELAYO-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATISTA: CONSORCIO CRISTO REY

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

PLAZO INICIAL: 5 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 13/12/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 4.170.496.922.960,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 4.170.496.922.960,00

PLAZO ACUMULADO: 14 MESES Y 18 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/02/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	Del 01 al 04 de mayo de 2023	Del 05 al 31 de mayo de 2023	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24
I. GPP																				
GPP 1 EXPLANACIONES	$ 59.101,8740	1,44%	0,08%	% P		1,32%	0,12%				0,11%	0,59%	0,77%	0,60%	0,59%	0,29%	0,12%	0,04%	0,04%	0,00%
			$3.201	$ P		$54.120,21	$4.981,66				$4.456,22	$22.432,95	$31.406,14	$24.533,81	$24.093,10	$11.662,54	$4.965,46	$864,31	$1.806,45	$0,00
				$ E					$807		$299			$738	$96		$1.162			
				% E					0,02%		0,01%			0,02%	0,00%		0,03%			
II. GPP																				
GPP 2 CONSTRUCCIÓN DE 1 BOX CULVERT 1,5X1(L =7m)	$ 32.259,1936	0,79%	0,00%	% P		0,44%	0,35%				0,15%	0,64%	0,00%	0,65%	0,14%	0,00%	0,00%	0,01%	0,85%	0,95%
			$0	$ P		$17.858,60	$14.400,60				$6.080,79	$26.178,41	$0,00	$26.713,24	$5.545,95	$0,00	$0,00	$547,12	$35.001,11	$39.130,69
				$ E																
				% E																
III. GPP																				
GPP 3 CONSTRUCCIÓN DE 1 PUENTE DE 15 M	$ 874.288,5411	21,32%	0,00%	% P			1,57%	10,39%	4,51%	1,87%		6,98%	11,63%	0,00%	0,00%	5,76%	0,00%	0,22%	10,00%	19,49%
			$0	$ P			$64.479,90	$426.272,23	$184.987,51	$76.882,10	$0,00	$286.214,71	$476.865,96	$0,00	$0,00	$236.108,26	$0,00	$8.928,49	$410.264,20	$799.501,91
				$ E																
				% E																
IV. GPP																				
GPP 4 PLACA HUELLA, ANCHO 6,8m	$ 2.906.735,2882	70,88%	34,18%	% P			28,71%	24,55%	15,21%	1,42%	4,12%	13,99%	29,57%	6,11%	8,32%	11,97%	9,73%	4,82%	4,77%	2,40%
			$1.401.670	$ P			$1.177.641,47	$1.006.842,95	$623.878,80	$58.057,13	$168.837,70	$570.193,73	$1.212.669,65	$250.456,12	$341.111,04	$490.838,04	$400.144,11	$198.385,00	$195.779,59	$98.265,97
				$ E					$683.922	$53.068	$262.894	$381.146	$43.502	$214.995	$46.021	$7.656	$40.927			
				% E					6,92%	1,31%	6,41%	9,30%	2,28%	-5,24%	1,12%	1,56%	10,23%	1,00%		
V. GPP																				
GPP 5 TRANSPORTE.	$ 227.433,1800	5,55%	10,20%	% P		1,30%	2,47%	1,78%			0,54%	2,39%	2,49%	2,40%	1,92%	1,36%	5,81%	1,99%	3,30%	0,66%
			$418.512	$ P		$53.240,04	$101.311,14	$72.882,00			$22.013,63	$97.947,45	$102.078,49	$97.612,86	$78.603,03	$55.758,69	$238.122,07	$81.803,30	$135.169,73	$27.033,95
				$ E					$5.459					$231.004	$85.410	$4.403	$92.116			
				% E					0,13%					5,63%	2,08%	0,11%	2,24%			
VI. GPP																				
GPP 6 CARACTERIZACIÓN VIAL.	$ 1.384,2444	0,03%	0,00%	% P										0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%
			$0	$ P							$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$1.384,24	$0,00	$1.384,24
				$ E																
				% E																
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 4.101.202,32	100,00%	44,46%																	
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			$ 1.823.382,97																	

Reprogramación No.1 **Reprogramación No.2** **Reprogramación No.3** **Reprogramación No.4**

1. Indicar los ítems de pago agrupad
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	3,05%	33,23%	36,72%	19,72%	3,29%	4,91%	24,46%	44,45%	9,49%	10,96%	19,31%	15,60%	7,11%	18,97%	23,54%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$125.218,85	$1.362.814,77	$1.505.997,18	$808.863,80	$134.739,23	$201.388,35	$1.002.967,25	$1.823.145,23	$389.316,02	$449.354,02	$792.084,53	$639.958,13	$291.714,23	$778.021,09	$965.316,76
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	3,05%	36,28%	73,00%	92,73%	96,01%	23,29%	47,75%	92,20%	46,97%	57,93%	77,24%	92,85%	99,96%	76,46%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$125.218,85	$1.488.033,62	$2.994.030,80	$3.802.894,60	$3.937.633,83	$955.258,80	$1.958.226,05	$3.781.371,28	$1.926.376,03	$2.375.730,06	$3.167.814,58	$3.807.772,71	$4.099.486,94	$3.135.885,56	$4.101.202,32
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,07%	1,31%	6,42%	9,30%	2,28%	0,41%	3,21%	0,30%	13,16%	1,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$290.087	$53.663	$263.283	$381.465	$93.562	$16.818	$131.528	$12.420	$539.631	$40.927		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,07%	8,38%	14,80%	24,10%	26,38%	26,79%	30,00%	30,30%	43,46%	44,46%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$290.087	$343.750	$607.033	$988.498	$1.082.060	$1.098.878	$1.230.406	$1.242.826	$1.782.456	$1.823.383		

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	$ 4.101.202.321,31	$ 1.823.382.974	44,46%
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	NA / NA	NA	NA
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	NA / NA	NA	NA
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	NA / NA	NA	NA
VALOR IVA (OBRA) (E)	NA /	NA	NA
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)	NA / NA	NA	NA
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 24.914.000,00	$ 24.914.000,00	0,60%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.733.660,00	$ 4.733.660,00	0,11%
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 39.646.941,65	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 69.294.601,65	**$ 29.647.660,00**	**0,71%**
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 4.170.496.922,96**	**$ 1.853.030.634,00**	**44,43%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')			

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: JOSE GREGORIO DOMINGUEZ DIAZ
Representante legal o apoderado del Contratista

Aprueba Firma:
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

- **MEPI-MN-IN-14-FR-1 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA.**

- **MEPI-MN-IN-14-FR-2 ACTAS DE REUNIÓN**

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/12/2023
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 46
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-008-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONTRATISTA: CONSORCIO CRISTO REY CON NIT. 901.642.986-1

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Revisar el estado actual de avance de obra y otros varios inherentes a la ejecución del proyecto de la referencia.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Seguimiento a la ejecución del contrato de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/12/2023
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Seguimiento a la ejecución del contrato de obra:

Se llevó a cabo fundida con trompo, para estructura de secciones de Vigas Riostra, y míxer, entre las abscisas K1+011 - K0+886, para lo cual lleva el avance evidenciado en el siguiente cuadro, según abscisado intervenido y número de losas realizadas, así:

	Izquierda				Centro	Derecha					
Avance Obra	Bordillo	Cunata (0,7)	Ciclopeo (1,25)	Huella (0,9)	Ciclopeo (0,9)	Huella (0,9)	Ciclopeo (1,25)	Cunata (0,7)	Bordillo	Vigas Riostra	Observación
15-dic-2023					2	15	1				Tarde: **Huella CD.** K0+940 - K0+892 (15). **Ciclópeo CD.** K0+889 - K0+886 (1). **Ciclópeo FC.** K0+892 - K0+886 (2).
18-dic-2023											Mañana: Vigas Riostra CD - FC K1+011 - K0+943 (22). Secciones.
Total	0	0	0	0	2	15	1	0	0	0	

Las secciones de vigas riostra, se relacionarán como completas, una vez se fundan los 6,9 metros lineales de ancho, correspondientes a cada una, de manera transversal a los módulos de bordillos, berma-cunetas, ciclópeo y huella de los distintos carriles.

En aras de llevar control y claridad de lo ejecutado, semanalmente se estará registrando de manera conjunta los mediciones y avances de las actividades ejecutadas.

Se viene adelantando conformación de capa de afirmado y de subbase granular del K0+700 - K0+540.

El viernes 15/12/2023, se llevó a cabo ensayo de densidades en capa de afirmado K0+700 - K0+540.

Se recuerda al contratista la importancia de realizar un buen proceso de consolidación y compactación de hombros y bordes de la vía, que garantice la estabilidad de la misma.

Para las actividades de fundición de concreto producido en obra, se debe garantizar las dosificaciones del diseño aprobado para 3.000 PSI.

Se sugiere así mismo que, para la eventualidad en la que la programación con fundida con míxer de concreto pre mezclado se retrasen, se pueda contar con luminarias que permitan la correcta instalación del concreto y la realización de sus acabados, en horas nocturnas.

Frente a la señalización, es importante mantener y mejorar el control de tráfico, y la correcta disposición de señales y avisos que indiquen a los usuarios de la vía, el estado de la misma, así como el no uso de la misma y bloqueos parciales, por actividades de obra que lo requieran, más aun teniendo en cuenta las festividades de fin e inicio de año.

Se recuerda al contratista, la importancia de entrega de plan de contingencia, respecto a la metá física actual, y del cumplimiento del mismo, con el objetivo de garantizar los rendimientos en las actividades, que posibiliten la obtención de las metas trazadas, en cuanto a ejecución, discutidas en el último comité de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/12/2023 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES


FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 28/12/2023 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LUIS FERNANDO PLAZA BUELVAS	RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO CRISTO REY	
FREDY RODRIGUEZ GIRALDO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	
AMAURY BENITEZ MARTINEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/12/2023
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 47
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-008-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONTRATISTA: CONSORCIO CRISTO REY CON NIT. 901.642.986-1

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Revisar el estado actual de avance de obra y otros varios inherentes a la ejecución del proyecto de la referencia.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Seguimiento a la ejecución del contrato de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/12/2023
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Seguimiento a la ejecución del contrato de obra:

	Izquierda				Centro	Derecha					
Avance Obra	Bordillo	Cuneta (0,7)	Ciclopeo (1,25)	Huella (0,9)	Ciclopeo (0,9)	Huella (0,9)	Ciclopeo (1,25)	Cuneta (0,7)	Bordillo	Vigas Riostra	Observación
22-dic-2023					14		20				Mañana: **Ciclópeo CD:** K0+886 - K0+841 (14). Tarde: **Ciclópeo CD:** K0+841 - K0+822 (6). **Ciclópeo FC:** K0+886 - K0+841 (14).
26-dic-2023					1	22	13				Mañana: **Huella CD:** K0+860 - K0+831 (19). Tarde: **Ciclópeo CD:** K0+822 - K0+780 (13). **Ciclópeo FC:** K0+841 - K0+838 (1). **Huella CD:** K0+831 - K0+822 (3). CILINDRO H - MAÑANA.
27-dic-2023					2	13	4				Tarde: **Ciclópeo CD:** K0+780 - K0+767 (4). **Ciclópeo FC:** K0+838 - K0+832 (2). **Huella CD:** K0+822 - K0+780 (13).
Total	0	0	0	0	17	35	37	0	0	0	

Las secciones de vigas riostra, se relacionarán como completas, una vez se fundan los 6,9 metros lineales de ancho, correspondientes a cada una, de manera transversal a los módulos de bordillos, berma-cunetas, ciclópeo y huella de los distintos carriles.

En aras de llevar control y claridad de lo ejecutado, semanalmente se estará registrando de manera conjunta los mediciones y avances de las actividades ejecutadas.

Se viene adelantando conformación de capa de afirmado y de subbase granular del K0+700 - K0+540.

El viernes 22/12/2023, la comisión de topografía de la interventoría llevó a cabo verificación de niveles de capa deafirmado del K0+600 - K0+540, y de capa de subbase granular K0+700 - K0+540. De igual forma, ese mismo día salió de obra la motoniveladora.

El miércoles 27/12/2023, se llevó a cabo reunión de veeduría, así como reunión de comité de obra, en cuyas actas se encuentra descrito los detalles de los temas tratados.

Se recuerda al contratista la importancia de realizar un buen proceso de consolidación y compactación de hombros y bordes de la vía, que garantice la estabilidad de la misma.

Para las actividades de fundición de concreto producido en obra, se debe garantizar las dosificaciones del diseño aprobado para 3.000 PSI.

Se sugiere así mismo que, para la eventualidad en la que la programación con fundida con míxer de concreto pre mezclado se retrasen, se pueda contar con luminarias que permitan la correcta instalación del concreto y la realización de sus acabados, en horas nocturnas.

Frente a la señalización, es importante mantener y mejorar el control de tráfico, y la correcta disposición de señales y avisos que indiquen a los usuarios de la vía, el estado de la misma, así como el no uso de la misma y bloqueos parciales, por actividades de obra que lo requieran, más aun teniendo en cuenta las festividades de fin e inicio de año.

Se recuerda al contratista, la importancia de entrega de plan de contingencia, respecto a la metá física actual, y del cumplimiento del mismo, con el objetivo de garantizar los rendimientos en las actividades, que posibiliten la obtención de las metas trazadas, en cuanto a ejecución, discutidas en el último comité de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/12/2023 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES



FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 04/01/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LUIS FERNANDO PLAZA BUELVAS	RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO CRISTO REY	
FREDY RODRIGUEZ GIRALDO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	
AMAURY BENITEZ MARTINEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

i. Realizando seguimiento a la reprogramación No.2 presentada por el contratista de obra y aprobada por la interventoría, se observa que, a fecha del 31 de diciembre de 2023, se tiene una inversión de obra programada del $ 4,099,486,945.53 correspondiente al 99.96% y una inversión de obra ejecutada acumulada de $ 1,823,382,977.00 correspondiente al 44.46% lo que representa un atraso del 55.50%. Si bien la interventoría reconoce que el retraso presentado puede deberse en parte a que el costo del puente afecta directamente en la reprogramación de obra debido a que este se encuentra implícito en la reprogramación de obra No.2, Sin embargo, el desempeño general de la obra durante los últimos meses ha venido disminuyendo notoriamente. Por lo anterior recomendamos al contratista de obra implementar un plan de contingencia de manera urgente para terminar el contrato dentro del tiempo estipulado en la prórroga No.3 solicitada por el Consorcio Cristo Rey.

ii. Para la conformación de la estructura de la placa de huella, se recomienda aumentar los rendimientos de las actividades de instalación de materiales granulares hasta completar los 1200 metros lineales desde la abscisa K1+740 a la abscisa K0+540, contemplados para la construcción de la placa huella.

iii. La interventoría invita al contratista a presentar dentro de los primeros cinco (05) días de cada mes los informes de los componentes SST, Seguimiento ambiental y social, lo anterior para evitar posibles sanciones o apremio de multa a los cuales se puede ver sometido el Consorcio Cristo Rey.

iv. Se le recomienda al contratista presentar cada mes de manera oportuna los soportes de pago de la seguridad social y aportes parafiscales del personal adscrito a Consorcio Cristo Rey.

v. Se le recomienda al contratista presentar de forma oportuna los resultados de los ensayos de laboratorio de los materiales utilizados en obra.

vi. Se recomienda al contratista la implementación de un plan de contingencia que permita superar el atraso registrado.

8. ANEXOS

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

8.1.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-1936-2023	6/12/2023	CONSORCIO CRISTO REY	Segunda reiteración comunicado CVRIMG-290-2023.
CVRIMG-1943-2023	6/12/2023	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1955-2023	11/12/2023	CONSORCIO CRISTO REY	Solicitud de informe de gestión ambiental – noviembre de 2023.
CVRIMG-1977-2023	15/12/2023	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1991-2023	21/12/2023	CONSORCIO CRISTO REY	Solicitud informe de seguimiento social mes de noviembre 2023.
CVRIMG-2014-2023	22712/2023	CONSORCIO CRISTO REY	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-2050-2023	29/12/2023	CONSORCIO CRISTO REY	Reiteración comunicado CVRIMG-1850-2023 informes sociales septiembre y octubre
CVRIMG-2054-2023	29/12/2023	CONSORCIO CRISTO REY	Mejoramiento señalización por fiestas de fin de año.

8.1.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

REMITENTE	CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO / REFERENCIA
CONSORCIO CRISTO REY	116-15-12-2023	2023-12-15	SOLICITUD DE PRÓRROGA

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

				FECHA ELABORACIÓN	9 (Día)	1 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO CRISTO REY	**CONTRATO N°**	LP-008-2022	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	**CONTRATO N°**	971 de 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.**				



Descripción: fundida ciclopeo franja central



Descripción:instalacion acero de refuerzo viga riostra



Descripción: armado de acero de refuerzo berma cuneta



Descripción: texturizado huella carril derecho



Descripción: fundida vigas riostras



Descripción: corte y figurado de acero



Descripción: cereo capa subbase granular



Descripción:compactacion capa subbase granular

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS.

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE.

- Fundida con Trompo: Mañana:
  - Vigas Riostra franja central y carril derecho K1+193 - K1+142 (17) secciones
  - Vigas Riostra carril izquierdo K0+841 - K0+796 (15) secciones.
- Maquinaria y Equipos: Motoniveladora, Minicargador, Vibrocompactador, Carro tanque de agua, equipos de topografía, herramientas menores.
- Personal del Contratista: Residente, Paleteros (2), Topógrafo, Cadenero, Maestro, oficiales (3), Ayudantes (9), operadores (2), Conductor.
- Clima: Mañana y Tarde = Soleada, Noche = Despejada.

Viernes 1 de Diciembre de 2023.

- Escarificado y remoción de material de afirmado K0+440 - K0+540.
- Alistamiento Pista y armado acero de refuerzo Para Berma - Cunetas Carril izquierdo K1+245 - K1+260.
- Fundida con Trompo: Fundida Monolítica.
  - Berma - cunetas carril izquierdo K1+263 - K1+330 (21).
  - Vigas Riostra Carril izquierdo Sección K0+263 - K1+330 (21).

  Total losas fundidas día: 21.
- Nota: En vista de la fundida monolítica de los elementos de vigas Riostra y Berma-Cunetas, el contratista debe garantizar el corte de las dilataciones en los tiempos y profundidades correctas. En ocasiones anteriores, durante visita en campo, desde el Invías se realizó la indicación de llevar a cabo las fundidas de estos elementos de manera separada, en aras de evitar fisuramiento. Esta es la posición de la Interventoría, por lo que se reitera al contratista, tener en cuenta esta recomendación. Sin embargo, el Contratista tiene la posibilidad de elegir los métodos y procesos constructivos que considere pertinentes, asumiendo la responsabilidad que esto conlleva, debiendo garantizar, en cualquier caso, la calidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, contractualmente pactadas.
- Maquinaria y Equipos: Minicargador, vibrocompactador, Motoniveladora, Carro tanque de agua, Trompo, equipos de topografía, herramientas menores
- Personal del Contratista: Residente, Topógrafo, Cadenero, Paleteros (2), Maestro, oficiales (4), Ayudantes (8), Operadores (2), Conductor.
- Clima: Mañana y Tarde = Soleada, Noche = Despejada.

Sábado 2 de Diciembre de 2023.

- Corte de dilataciones de Secciones de vigas Riostra en Berma - Cunetas del Carril izquierdo K1+330 - K1+263.
- Fundida con trompo sección Vigas Riostra Carril izquierdo K0+793 - K0+770 (8)]K0+886(2)
- Escarificado y remoción material de afirmado K0+440 - K0+540.
- Maquinaria y Equipos: Minicargador, vibrocompactador, Motoniveladora, Carro tanque de agua, herramientas menores.
- Personal del Contratista: Residente, Paleteros (2), Maestro, oficiales (4), Ayudantes (8), Operadores (2), Conductor.
- Clima: Mañana y Tarde = Soleada, Noche = Despejada.
-

Domingo 3 de Diciembre de 2023.

- Día no laboral
- Clima: Mañana y Tarde = Soleada, Noche = Despejada.

Lunes 4 de Diciembre de 2023

- Corte y figurado de acero.
- Fundida con Mixer:
  { Huella Carril derecho K1+139 - K1+087 (18). Mañana.]* NO.
  • Ciclópeo carril derecho K1+078 - K1+129 (16). Mañana
  • Ciclópeo franja central K1+113 - K1+052 (19). Tarde
  Total losas fundidas día: 35.
- Maquinaria y Equipos: Minicargador, Motoniveladora, vibrocompactador, Carro tanque de agua, Mixer Concreto Premezclado, equipos topografía, herramientas menores.
- Personal del Contratista: Residente, Topógrafo, Cadenero, Paleteros (2), Maesho, oficiales (4), Ayudantes (7), Operadores (2), Conductor.
- Clima: Mañana y Tarde = Soleada, Noche = Despejada.

Martes 5 de Diciembre de 2023

- Corte y figurado de acero
- Alistamiento pista Ciclópeo Carril derecho K1+078 a menores.
- Extendido, Compactación y humectación material de afirmado K0+700 - K0+540.

- Fundida con mixer:
  - Huella carril derecho K1+139 - K1+081 (18). Mañana.
  - Ciclópeo carril derecho K1+078 - K1+033 (14). Tarde. Total losas fundidas día: 32.
- Maquinaria y Equipos: Minicargador, vibrocompactador, motoniveladora, carro tanque de agua, Mixer concreto premezclado, equipos topografía, herramientas menores
- Personal del contratista: Residente, Paleteros (2), Topógrafo, Cadenero, Maestro, oficiales (4), Ayudantes (8), operadores (2), Conductor.
- clima: Mañana y Tarde = Soleada, Noche = Despejada.
- Nota: Durante la fundida, por retraso en la llegada del Mixer de la tarde, se hizo de noche Poco antes de culminar la actividad. Por ende, se ajusta al Contratista a disponer de luminarias que faciliten las labores de los obreros en vaciado, y se pueda garantizar la correcta ejecución del Concreto con sus acabados, lo anterior, ante la eventualidad que se vuelva a presentar estas situaciones.

Miércoles 6 de Diciembre de 2023

- Corte y figurado de acero.
- Alistamiento para Ciclópeo carril derecho K1+033 a menores y ciclópeo franja central K1+053 a menores.
- extendido, compactación y humectación material de afirmado K1+700 - K1+540.
- Fundida con Mixer:
  - Ciclópeo franja central K1+052 - K1+007 (14).
  - Ciclópeo carril derecho K1+033 - K1+014 (6). Tarde. Total losas fundidas día: 20.
- Maquinaria y Equipos: Minicargador, Motoniveladora, vibrocompactador, Carro tanque de agua, Mixer concreto pre mezclado, equipos topografía, herramientas menores
- Personal del contratista: Residente, Paleteros (2), Topógrafo, Cadenero, Maestro, oficiales (4), Ayudantes (8), operadores (2), Conductor.
- clima: Mañana y Tarde = Soleada, Noche = Despejada.

Jueves 7 de Diciembre de 2023.

- Corte y figurado de acero.
- extendido, compactación y humectación material de afirmado K1+700 - K1+540.
- Alistamiento hasta ciclópeo carril derecho K1+011 a menores y ciclópeo

Franja central K1+005 a menores.

- Fundida con Mixer:
  - Huella carril derecho K1+081 - K1+027 (17) Mañana. / K1+027 - K1+011 (5). Tarde
  - Ciclópeo carril derecho K1+014 - K1+011 (1) Mañana. / K1+011 - K0+982 (9). Tarde
  - Ciclópeo franja central K1+007 - K1+004 (1) Mañana. / K1+004 - K1+001 (1). Tarde.
- Maquinaria y Equipos: Motoniveladora, Minicargador, vibrocompactador, Carro tanque de agua, Mixer concreto pre mezclado, equipos topografía, herramientas menores.
- Personal del Contratista: Residente, Paleteros (2), Topógrafo, Cadenero, Maestro, oficiales (4), Ayudantes (9), operadores (2), Conductor.
- Clima: Mañana y Tarde = Soleada, Noche = Despejada.

Viernes 8 de Diciembre de 2023.

- Fundida con trompo vigas Riostra franja central y carril derecho K1+139 - K1+081 (19) secciones.
- Maquinaria y Equipos: Minicargador, Motoniveladora, vibrocompactador, Carro tanque de agua, herramientas menores.
- Personal del Contratista: Residente, Paleteros (2), Maestro, oficiales (4), Ayudantes (7), operador, Conductor.
- Clima: Mañana y Tarde = Soleada, Noche = Despejada

Sábado a de Diciembre de 2023

- Corte y figurado de acero
- Cero capa Subbase granular Carril Derecho K0+921 a menores.
- Instalación rieles y Alistamiento de pista Ciclópeo Carril derecho K0+982 a menores y ciclópeo franja central K1+001 a menores.
- Se habilitó carril izquierdo de K0+921 - K0+767, Para Paso de tránsito de Vehículos livianos.
- Maquinaria y Equipos: Motoniveladora, vibrocompactador, Minicargador, Carro tanque de agua, equipos topografía, herramientas menores.
- Personal del Contratista: Director, Residente, Topógrafo, Cadenero, Paleteros (2), Maestro, oficiales (4), Ayudantes (8), Operadores (2), Conductor.
- Clima: Mañana y tarde = Soleada, Noche = Despejado.

Domingo 10 de Diciembre de 2023

- Día no laboral
- clima: Mañana y Tarde = Soleada, Noche = Despejada.

Lunes 11 de Diciembre de 2023.

- Nivelación terreno para cercó por comisión de topografía K0+700 - K0+540.
- Cercó capa afirmado K0+700 - K0+540.
- Maquinaria y Equipos: Motoniveladora, Carrotanque de agua, equipos de topografía, herramientas menores, Minicargador, vibrocompactador.
- Personal del contratista: Residente, Paleteros (2), Topógrafo, Cadeneros, operador, conductor.
- Clima: Mañana y Tarde = Soleada, Noche = Despejada.

Martes 12 de Diciembre de 2023.

- Excavación e instalación acero de refuerzo vigas riostra carril derecho y franja central K1+081 a menores.
- Cercó capa de afirmado K0+700 - K0+540.
- Verificación niveles capa de afirmado por parte de la interventoría y su comisión de topografía K0+700 - K0+600.
- Corte y figurado de acero.
- Fundida con Mixer:
  - Ciclópeo carril derecho K0+982 - K0+943 (12) / K0+943 - K0+940 (1) / K0+915 - K0+892 (7). Mañana / Tarde / Tarde.
  - Ciclópeo franja central K1+001 - K0+982 (6). Mañana / K0+982 - K0+940 (13) Tarde.

  Total losas fundidas día: 39
- Maquinaria y Equipos: Minicargador, vibrocompactador, Motoniveladora, Carrotanque de agua, Mixer concreto pre mezclado, equipos topografía, herramientas menores.
- Personal del contratista: Residente, Paleteros (2), Topógrafo, Cadenero, Maestro, oficiales (4), Ayudantes (10), operadores (2), Conductor.
- Clima: Mañana y Tarde = Soleada, Noche = Despejada.
- Nota: Revisar y fortalecer esfuerzos para compactación de hombros y bordes de la vía.

Miércoles 13 de Diciembre de 2023.

- Corte y figurado de acero
- Cereo, humectación y compactación capa de afirmado K0+700 - K0+540.
- Armado acero de refuerzo Huella Carril derecho K1+011 a menores.
- Fundida con trompo:
  - Vigas Riostra: Secciones Carril derecho y franja central K1+078 - K9+014 (21).
- Maquinaria y Equipos: Motoniveladora, vibrocompactador, Minicargador, carro tanque de agua, trompo, equipos topografía, herramientas menores.
- Personal del Contratista: Residente, Topógrafo, Cadenero, Paleteros (2), Maestro, oficiales (4), Ayudantes (10), operadores (2), Conductor.
- Clima: Mañana y Tarde = Soleada, Noche = Despejada.

Jueves 14 de Diciembre de 2023

- Corte y figurado de acero
- Cereo, humectación y compactación capa de afirmado K0+700 - K0+540.
- Fundida con mixer:
  - Huella Carril derecho K1+011 - K0+946 (20). Mañana | K0+946 - K0+940 (2). Tarde.
  - Ciclópeo franja central K0+921 - K0+892 (9). Tarde.
  - Ciclopeo Carril derecho K0+940 - K0+914 (8) | K0+892 - K0+889 (1). Tarde.

  Total losas fundidas día: 40.
- Maquinaria y Equipos: Motoniveladora, vibrocompactador, Minicargador, Carro tanque de agua, Mixer concreto Premezclado, equipos topografía, herramientas menores.
- Personal del Contratista: Residente, Topógrafo, Cadenero, Paleteros (2), Maestro, oficiales (4), Ayudantes (10), operadores (2), Conductor.
- Clima: Mañana y Tarde = Soleada, Noche = Despejada.
- Nota: Se recuerda al contratista la importancia de revisar y fortalecer los esfuerzos para lograr una compactación óptima de bombeos y bordes de la vía.

Viernes 15 de Diciembre de 2023.

- Corte y figurado de acero.
- Armado acero de refuerzo Huella Carril Derecho K0+940 a menores.
- Alistamiento de Pista Ciclóle Carril derecho K0+889 a menores y Ciclópeo

franja central K0+892 a menores.
- Extendido y humectación material de afirmado K0+700 - K0+540.
- Toma de muestras de densidades Capa afirmado K0+700 - K0+540.
- Fundida con Mixer: Tarde.
  - Huella carril derecho K0+940 - K0+892 (15).
  - Ciclópeo carril derecho K0+889 - K0+886 (1).
  - Ciclópeo franja central K0+892 - K0+886 (2).

  Total losas fundidas día: 18.
- Maquinaria y Equipos: Motoniveladora, Vibrocompactador, Minicargador, Carro tanque de agua, Mixer Concreto Pie mezclado, equipos topografía, herramientas menores.
- Personal del Contratista: Residente, Paleteros (2), Topógrafo, Cadenero, Maestro, oficiales (4), Ayudantes (10), Operadores (2), Conductor.
- Clima: Mañana y Tarde = Soleada, Noche = Despejada.
- Nota: Acondicionar tramos para eventualidad de poca iluminación en obra por fundidas.

Sábado 16 de Diciembre de 2023.
- Corte y figurado de acero
- Extendido de material de Subbase granular K0+700 - K0+540.
- Desencofrado módulos fundidos día anterior.
- Maquinaria y Equipos: Minicargador, vibrocompactador, Motoniveladora, Carro tanque de agua, equipos topografía, herramientas menores.
- Personal del Contratista: Residente, Paleteros (2), Topógrafo, Cadenero, Maestro, oficiales (4), Ayudantes (10), Operadores (2), Conductor.
- Clima: Mañana: nublada con lluvia de 9:15 - 9:45 am, Tarde = Soleada, Noche = Despejada,

Domingo 17 de Diciembre de 2023.
- Día no laboral.
- Clima: Mañana y Tarde = Soleada, Noche = Despejada.

Lunes 18 de Diciembre de 2023
- Corte y figurado de acero.
- Alistamiento de pista ciclópeo carril derecho K0+889 a menores y ciclópeo franja central K0+892 a menores.

- Fundida con trompo vigas riostra carril derecho y franja central K1+011 a K0+943 (22) secciones. Tarde, libre.
- Maquinaria y Equipos: Motoniveladora, vibrocompactador, Minicargador, Carro tanque de agua, Trompo, equipos de topografía, herramientas menores.
- Personal del contratista: Residente, Paleteros (2), Topógrafo, Cadenero, Maestro, oficiales (4), Ayudantes (9), operadores (2), Conductor.
- Clima: Mañana y Tarde = Soleada, Noche = Despejada.
- Nota: En la tarde se enfocó esfuerzos en cereo de capa de Subbase granular K0+720 - K0+540.
  - Se insta al Contratista a redoblar esfuerzos en la compactación de hombros y bordes de la vía para que no queden débiles.

Martes 19 de Diciembre de 2023

- Cereo material de capa de subbase granular K0+720 - K0+540.
- Topografía de Interventoría estuvo en campo revisando avances en conformación de capas de afirmado y Subbase granular.
- Maquinaria y Equipos: Motoniveladora, Carro tanque de agua, equipos de topografía, herramientas menores
- Personal del Contratista: Residente, Paleteros (2), Topógrafo, Cadenero, operador, Conductor.
- Clima: Mañana y Tarde = Soleada, Noche = Despejado.
- Nota: Se insta al contratista a no descuidar el ritmo de fundidas de Concreto, con el ánimo de continuar con la implementación adecuada de plan de contingencia.

Miércoles 20 de Diciembre de 2023.

- Humectación material de subbase granular K0+720 - K0+540.
- Armado acero de refuerzo Berma - cuneta Carril izquierdo K1+247 a menores.
- Maquinaria y Equipos: Equipos de topografía, herramientas menores, Carro tanque de agua.
- Personal del Contratista: Residente, Paleteros (2), Topógrafo, Maestro, oficial, Ayudantes (2), Conductor.
- Clima: Mañana y Tarde = Soleada, Noche = Despejada.

Jueves 21 de Diciembre de 2023.

- Corte y figurado de acero
- Armado acero de refuerzo Berma - Cuneta Carril izquierdo K1+180 - K0+055.
- Maquinaria y Equipos: Minicargador, equipos de topografía, herramientas menores.
- Personal del Contratista: Residente, Paleteros (2), Topógrafo, Cadenero, Maestro, oficiales (4), Ayudantes (10), operador.
- clima: Mañana y Tarde = Soleada, Noche = Despejada.

Viernes 22 de Diciembre de 2023.

- corte y figurado de acero.
- Excavación vigas Riostra sección carril derecho y franja central K0+940 - K0+895
- fundida con Mixer:
  - ciclópeo Carril derecho K0+886 - K0+841 (14). Mañana. / K0+841 - K0+822 (6). Tarde
  - ciclopeo franja central K0+886 - K0+841 (14). Tarde.

  Total losas fundidas día: 34.
- Salida de Motoniveladora de obra.
- Verificación topografía interventoría niveles Capa de afirmado K0+600 - K0+540, y de Capa de Subbase granular K0+700 - K0+540.
- Maquinaria y Equipos: Minicargador, Mixer Concreto Premezclado, equipos de topografía, herramientas menores.
- Personal del Contratista: Residente, Topógrafo, Cadenero, Paleteros (2), Maestro, oficiales (4), Ayudantes (10), operador
- Clima: Mañana y Tarde: Soleada, Noche = Despejada

Sábado 23 de Diciembre de 2023

- Compactación subbase de granular K0+720 - K0+
- Armado acero de refuerzo huella carril derecho K0+892 - K0+822.
- Maquinaria y Equipos: Vibrocompactador, Minicargador, herramientas menores
- Personal del Contratista: Residente, Paleteros (2), Maestro, oficiales (3), Ayudantes (7), operador
- clima: Mañana y Tarde = Soleada, Noche = Despejada.
- Nota: Tener cuidado con la señalización en obra para el fuente festivo de navidad.

Domingo 24 de Diciembre de 2023.
- Día no laboral.
- clima: Mañana y Tarde = Soleada, Noche = Despejada.

Lunes 25 de Diciembre de 2023
- Día no laboral por festivo.
- Clima: Mañana y Tarde = Soleada, Noche = Despejada

Martes 26 de Diciembre de 2023.
- Humectación y compactación capa de Subbase granular KO+720 + KO+740.
- Fundida con mixer:
  - Huella Carril derecho KO+892 - KO+831 (19). Mañana. / KO+831 - KO+822 (3). Tarde.
  - Ciclópeo Carril derecho KO+822 - KO+780 (13). Tarde.
  - Ciclópeo franja central KO+841 - KO+838 (1). Tarde.
- Maquinaria y Equipos: Minicargador, vibrocompactador, Mixer concreto Premezclado, carro tanque de agua, equipos de topografía, herramientas menores.
- Personal del contratista: Residente, Paleteros (2), Topógrafo, Maestro, oficiales (4), Ayudantes (2), operador, conductor.
- Clima: Mañana y Tarde = Soleado, Noche = Despejada.

Miércoles 27 de Diciembre de 2023.
- Corte y figurado de acero.
- Alistamiento pista Huella Carril derecho KO+822 a menores, ciclópeo carril derecho KO+780 a menores y ciclópeo franja central KO+838 a menores.
- Fundida con Mixer: (Tarde).
  - Ciclópeo Carril derecho KO+780 - KO+767 (4).
  - Ciclópeo franja central KO+838 - KO+832 (2).
  - Huella Carril derecho KO+822 - KO+780 (13).

  Total cosas fundidas día: 19.
- Excavación vigas hasta sección Carril derecho y franja central KO+895 a menores.
- Maquinaria y Equipos: Minicargador, vibrocompactador, Mixer concreto Premezclado, equipos topografía, herramientas menores.

- Personal del Contratista: Residente, Paleteros (2), Topógrafo, Cadenero, Maestro, oficiales (4), operador, Ayudantes (10).
- Clima: Mañana: nublada, Tarde = Soleada, Noche = Despejada.
- Nota: se llevó a cabo reunión de veeduría, así como de Comité de obra, en cuyas actas se encuentran los detalles tratados.

Jueves 28 de Diciembre de 2023

- Corte y figurado de acero.
- Humectación y Compactación capa Subbase granular K0+720 - K0+540.
- Alistamiento pista Huella Carril derecho K0+780 a menores y ciclópeo franja Central K0+832 a menores.
- Excavación vigas Riostra Sección carril derecho y franja Central K0+895 a menores.
- [Fundida con Mixer: (Tarde).
  - ciclópeo franja Central K0+832 - K0+780 (16).
  - Huella carril derecho K0+780 - K0+767 (4).

  Total losas fundidas día: 20.]* ESTA ANOTACIÓN SE ANULA POR CONTENER ERROR.
- Maquinaria y Equipos: Minicargador, vibrocompactador, Carro tanque de agua, Mixer de Concreto Pre-mezclado, equipos topografía, herramientas menores.
- Personal del Contratista: Residente, Paleteros (2), Maestro, Ayudantes (10), oficiales (4), operador, Conductor.
- Clima: Mañana = Parcialmente nublada, Tarde = Nublada, Noche = Despejada.
- Nota: Aunque se tenía Programado realizar vaciado en concreto Pre mezclado con Mixer, finalmente desde la Planta no se habilitó equipo.

Viernes 29 de Diciembre de 2023.

- Corte y figurado de acero.
- Compactación Capa Subbase granular K0+720 - K0+540.
- Instalación acero de refuerzo vigas Riostra sección Carril derecho y franja central K0+940 a menores.
- Fundida con trompo de vigas Riostra sección carril derecho y franja Central K0+940 - K0+873 (22).
- Maquinaria y Equipos: Minicargador, vibrocompactador, Trompo, Herramientas menores.

- Personal del contratista: Paleteros (2), Maestro, oficiales (3), Ayudantes (9), operador
- clima: Mañana: Lluvias durante la mañana nublado, Tarde = Soleado, Noche = Despejada.

Sábado 30 de Diciembre de 2023

- Fundida con trompo.
- Ciclópeo franja central K0+831 - K0+767 (20).
- Maquinaria y Equipos: Minicargador, Trompo, equipos topografía, herramientas menores.
- Personal del Contratista: Residente, Topógrafo, Paleteros (2), Maestro, oficiales (3), Ayudantes (10), operador.
- Clima: Mañana: Parcialmente nublada con lluvias de madrugada, Tarde = Soleada, Noche = Despejada.
- Nota: se recuerda la importancia de dejar debidamente señalizada la obra, por las festividades de fin de año.

Domingo 31 de Diciembre de 2023

- Aseo general obra
- Excavación vigas Riostra carril derecho y franja central K0+840 a menores.
- Maquinaria y Equipos: Herramientas menores
- Personal del contratista: oficial, Ayudantes (4), Paletero.
- clima: Mañana y Tarde = Soleada, Noche = Despejada
