	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 2269 de 202 **Contratista:** INCOPAV S.A.S

Contrato de Interventoría No. 223 de 202 **Interventoría:** INGEVAL S.A.S

Objeto Contrato de Obra:
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA.

INFORME MENSUAL No. 10 **MES O PERIODO:** ene-23

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2-3
1	**INTRODUCCIÓN**		5
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		6-7
2.1	Localización		8
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		8
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		9-72
2.4	Características técnicas del proyecto		73
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		75
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		76
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		76 - 90
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		90
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	90-98
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	100
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	102
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	104
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	106
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	110
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	16
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	128
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	130- 137
	• Seguimiento Programa de Obra		139
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	141-142
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	146-149
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		150
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		151 - 155
5.3	Informes especialistas y profesionales		156 - 480
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		481
5.5	Informe matriz de riesgos.		482
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		483
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		484
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	485
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	487
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	489
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	491-495
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	497-498
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	501
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	503 -533
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	535
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	537
7	**Conclusiones y recomendaciones**		538 - 539
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		541 -818
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		819 - 821
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		822 - 827
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		827 - 849

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: 

Escriba el texto aquí

Nombre:LUIS MIGUEL OZUNA GONZALES
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _4433____ de fecha _____25/11/2022_

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	Pagina 1 de 2

FECHA: 31/01/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **PERIODO MES:** ENERO

CONTRATO DE OBRA No.: 2269-2021

OBJETO: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

CONTRATISTA: INCOPAV S.A.S

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2022
FECHA DE INICIO: 22/02/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO: HASTA 05 DE JUNIO DE 2023
PLAZO ACUMULADO: 11 meses

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 8,622,782,704.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): N/A
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 8,622,782,704.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 2,566,556,103.00
ANTICIPO AMORTIZADO: $0

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2263 DE 2021 **INTERVENTOR:** INGEVAL S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
EXPLANACIONES	EXCAVACION MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN	M3	4.641,00
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE SIN ADICIÓN DE MATERIAL (MEZCLA DE MATERIAL FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE CON GRANULARES EXISTENTES)	M3	3.388,00
AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES	SUBBASE GRANULAR CLASE A	M3	1.116,00
	BASE GRANULAR CLASE A	M3	1.988,00
	BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	M3	6.961,00
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	M2	33.061
	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	21.696,00
	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	M3	3.934,00
	MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO MSC-25	M3	1.878,00
	FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	M3	998
	GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACION	M2	22750
	EXCAVACIÓN PARA REPARACION DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS Y DE LAS SUBYACENTES	M3	5425
	SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFALTICO SIN RUTEO	M	13200
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	60,00
	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	65,00
	CONCRETO REFORZADO f'c = 21MPa	M3	36,00
	CONCRETO SIMPLE f'c = 14MPa	M3	29,00
	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	Kg	2.500,00
	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	70
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO.	M	56.628,00
	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	3.952,00
	TACHA REFLECTIVA (Bidireccional)	UND	3.200,00
	REDUCTORES DE VELOCIDAD PLASTICOS (Resalto Portatil .- Manual de Señalización vial 2015)	UND	80,00
	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IX O SUPERIOR (75 X 75) CM	UND	156,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
EXPLANACIONES	EXCAVACION MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN	M3	541	1086
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE SIN ADICIÓN DE MATERIAL (MEZCLA DE MATERIAL FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE CON GRANULARES EXISTENTES)	M3	0	0
AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES	SUBBASE GRANULAR CLASE A	M3		
	BASE GRANULAR CLASE A	M3	0	0
	BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	M3	0	155.97
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	M2	0	557.02
	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	0	1994.34
	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	M3	0	162.55
	MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO MSC-25	M3	0	55.7
	FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	M3	0	0
	GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACION	M2	0	0
	EXCAVACIÓN PARA REPARACION DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS Y DE LAS SUBYACENTES	M3	404.3	615.97
	SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFALTICO SIN RUTEO	M	0	0
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	0	0
	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	0	0
	CONCRETO REFORZADO f'c = 21MPa	M3	0	0
	CONCRETO SIMPLE f'c = 14MPa	M3	0	0
	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	Kg	0	0
	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	0	0
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO.	M	0	0
	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	0	0
	TACHA REFLECTIVA (Bidireccional)	UND	0	0
	REDUCTORES DE VELOCIDAD PLASTICOS (Resalto Portatil .- Manual de Señalización vial 2015)	UND	0	0
	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IX O SUPERIOR (75 X 75) CM	UND	0	0

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	Pagina 2 de 2

FECHA: 31/01/2023 (Día / Mes / Año)

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 7,114,919,471.00	$ 51,993,642.00	$ 7,166,913,113.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 1,360,470,538.00	$ 9,941,900.00	$ 1,370,412,438.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 37,447,001.00	$ 273,652.00	$ 37,720,653.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 28,000,000.00	$ 5,320,000.00	$ 33,320,000.00
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD	$ 14,350,000.00	$ 66,500.00	$ 14,416,500.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 8,555,187,010.00	$ 67,595,694.00	$ 8,622,782,704.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 37,022,552	$ 270,549	$ 37,293,101	$ 257,543,587
AJUSTES	$0,00	$0,00	$0,00	$ 15,767,479
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
VALOR EJECUTADO	$ 37,022,552	$ 270,549	$ 37,293,101	$ 273,311,066

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 236,356,991.11
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 257,543,587
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 108.96%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 10
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 21
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **31**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1





Se tramito y se aprobo prorroga del con de junio 2023, el pasado 2 de diciembre, reprogramando el proyecto. Durante el mes se realizo excavaciones en los tramos 1 y 3.

Firma

Nombre WILLIAM VALENCIA CAMPOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 2520239413 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

INFORME N. 8

INTERVENTORÍA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CÓRDOBA.

CONTRATO N. 2263 DE 2021



INTERVENTOR
INGEVAL S.A.S.

INFORME PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023

COVEÑAS – SABANETA

FECHA DE PRESENTACIÓN: 5 DE FEBRERO DEL 2023

administracion@ingevalsas.com.co
interventoriasucrecordoba@gmail.com
Cl 38 No. 32-41 of 806 Ed. Parque Santander
Tel 6628119
Villavicencio -Meta

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene la información, registros, novedades y/o sucesos a razón de la ejecución del contrato de obra N°. 2269 de 2021, entre el 1 al 31 de Diciembre de 2022, de acuerdo al seguimiento realizado en el contrato de Interventoría N°. 2263 de 2021 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA"; dicha interventoría fue adjudicada mediante Resolución Número 4449 del 27 de diciembre de 2021, previo Concurso de Méritos No. CMA-DO-SRN-181-2021 cuyo valor es NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($999.999.999,00), MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA.

El contrato de obra No. 2269 de 2021 tiene por objeto el "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA", ejecutado por el INCOPAV S.A., adjudicado por Resolución 4448 del 27 de diciembre de 2021, previa Licitación Pública Número LP-DO-SRN-049-2021, por un valor de OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS ($8.622.782.704) M/CTE, INCLUIDO IVA., con un plazo contractual hasta el 31 de julio de 2022.

El ingeniero civil LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA, identificado con Cédula de ciudadanía No.1.103.101.402 de Corozal, con matrícula profesional No. 22202-204005 COR del Consejo Profesional de Nacional de Ingeniería, quien desempeña el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 13, nombrado mediante Resolución No. 6871 del 30 de septiembre de 2016 y Acta de Posesión No.0276 del 9 de noviembre de 2016, asignado a la Dirección Territorial Córdoba mediante Resolución N°4433 de 25 de NOVIEMBRE de 2022 como SUPERVISOR del Contrato de interventoría No.2263 del 2021 cuyo objeto es: "INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA" a cargo de l Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales.

La ingeniera Liliana Lizeth García Meza mediante oficio DEO 5979 del 08 de febrero de 2022 de acuerdo con el objeto del contrato de prestación de servicios profesionales No. 2438 de 2021, fue designada como gestor técnico de proyecto para las etapas contractual y post contractual para el contrato de obra N°. 2269 de 2021 y el contrato de interventoría N°. 2263 de 2021.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

A esta vía corresponde el paso nacional por el municipio de Coveñas del PR0+0000 al PR2+0300), y los centros poblados de los corregimientos: El Reparo (Km 4), el Mamey (Km 5), Aserradero (Km 6), El hueso (Km 10) y corregimiento de Sabaneta (Km 16), en los cuales se evidencian fallas de la estructura del pavimento.
En los sectores clasificados en mal estado, se presentan deficiencias en la estructura del pavimento y su carpeta de rodadura, por fatiga de la misma reflejado en fallas tipo bache, piel de cocodrilo, fisuras longitudinales, abultamientos, ahuellamientos, desplazamiento y deformaciones, así como fuertes desniveles entre cunetas y carpeta asfáltica lo cual repercute en la disminución de la velocidad de operación normal del tránsito vehicular y representa alto riesgo de accidentalidad para los usuarios.
Inicialmente se pretendia realizar al mantenimiento y/o rehabilitación de los sectores de la vía que se encuentran regular y mal estado, se realizo la anotación de que los tramos iniciales a intervenir dentro del contrato de obra N. 2269 de 2021 fueron determinados por el Ingeniero Mario Caballero, Director Territoria Sucre (primer supervisor), en el acta de reunión de visita inicial del 25 de febrero de 2022 con presencia de la interventoria y el contratista de obra del proyecto, estos tramos son:

* PR 0+0000 AL PR 1+0200 (1.200 M)
*PR2+0200 AL PR2+02800
*PR2+0473 AL PR2+0800
*PR10+0400 AL PR12+0400.

Adicional a los tramos establecidos por el supervisor el dia 25 de Febrero del 2022 la direccion territorial por solicitud del contratista de obra y de interventoria asigna los siguientes tramos adiciones al contrato por medio de DT-SUC 43774 del 1 de agosto de 2022.

*PR 2+0800 AL PR 3+0400
*PR4+0500 AL PR 5+0200

Por otra parte, para mejorar la seguridad vial de este corredor se tiene previsto la demarcación horizontal de todo el corredor vial así: Entre los PR0+0000 al PR16+0000, excepto el tramo PR3+0400 al PR3+0500 los cuales se van a intervenir dentro del convenio interadministrativo N. 915 de 2021 entre la Gobernanción de Sucre y el INVIAS.

Según estudio de Bateman Ingeniería S.A., se determinó que se deberá rehabilitar los tramos a intervenir empleando lo indicado en la "tabla 9.6.1 Alternativa de rehabilitación tramo Coveñas – Sabaneta", donde establecen que la estructura de pavimento para los sectores PR0+0000 al PR1+0200, del PR2+0200 al PR2+0260, del PR2+.473 al PR2+0800 y del PR10+0400 al PR12+0400 deberá estar compuesta por una capa de material seleccionado de espesor de 20 cms, una base

granular clase A de espesor de 28 cms y una carpeta asfáltica MDC-19 de 10 cms, adicionalmente, en el mismo estudio (TABLA 9.5.1 REFUERZO DEL PAVIMENTO BASADOS EN DEFLEXIONES) se sugiere realizar una sobre carpeta de refuerzo de 6 cms para toda la Vía Coveñas - Sabaneta; lo anterior fue analizado, verificado y/o estudiado por el contratista de obra en la etapa de estudios y diseños.

Posterior a la adición de los nuevos tramos y a la revisión de los estudios y diseños el contratista presenta la siguiente alternativa de diseño para los diferentes tramos la cual es aprobada por la interventoría.

• **TRAMO 1- PR 0+0000 AL PR 1+0200 (1.200 M)** Con el fin de garantizar que la intervención satisfaga las necesidades de la comunidad en el tramo uno se realizara una intervención de mejoramiento de estructura donde se realizara la instalación de: 1 capa de material de mejoramiento, una capa de base tratada con cemento R 3.5 y posterior una losa de concreto reforzado.

• **TRAMO 2- PR 2+0200 AL PR 2+0260, PR 2+0800 AL PR 3+0400, PR 2+0473 AL PR 3+0400, PR 4+0500 AL PR 5+0200, (1.687 M)**

Para el sector se ha establecido la implementación de una intervención integral a lo largo de todo el corredor, para el caso se toma en consideración la estructura presentada en el documento de Bateman para este sector y presentados en la tabla 9.6.1 del documento de Bateman Ingeniería, y se optimizan los espesores de la estructura de pavimento, en razón de ello se determina que para el Corredor en el sector 2 se podrá implementar una estructura de pavimento equivalente, la cual se presenta bajo las siguientes características: El primer material instalado consistirá en una capa de material de plataforma, las segunda capa consistirá en base estabilizada con cemento y una capa de mezcla asfáltica.

• **TRAMO 3- PR 10+0400 AL PR 11+0206 PR 11+0206 AL PR 11+0708 , 11+0708 AL PR 12+0400 (2.000 M)**


La alternativa para el Sector 3 consiste en la ejecución de actividades de mantenimiento a la carpeta asfáltica y posterior a esto la instalación de una sobre carpeta con los espesores propuestos anteriormente.

NOTA: Sin detrimento de lo anterior es importante tener en cuenta que al momento de las reparaciones y al evaluar la intervención en caso de que se requiera retiro de materiales granulares, se tendrá que implementar la siguiente estructura en tal sentido, y cuando sean parcheos y bacheos.

Comentario: Esta reposición se hará en los mismos espesores retirados siendo importante destacar que éstos en lo posible no serán menores de 10 cm para la mezcla asfáltica y 20 cm para la Base Granular y que se recomienda la colocación de un geotextil para generar la separación y la protección entre la capa de mejoramiento y los granulares de reposición.

2.1 LOCALIZACIÓN

Los tramos a intervenir corresponden a la vía Coveñas – Sucre (paso nacional – PR0+0000) hasta el corregimiento de Sabaneta (PR16+0000) del Municipio de Momil - Córdoba; esta vía pertenece a la Ruta 90, código 90SC02 es un ramal a la transversal del Caribe y esta ubicada en el departamento de Sucre y Córdoba.

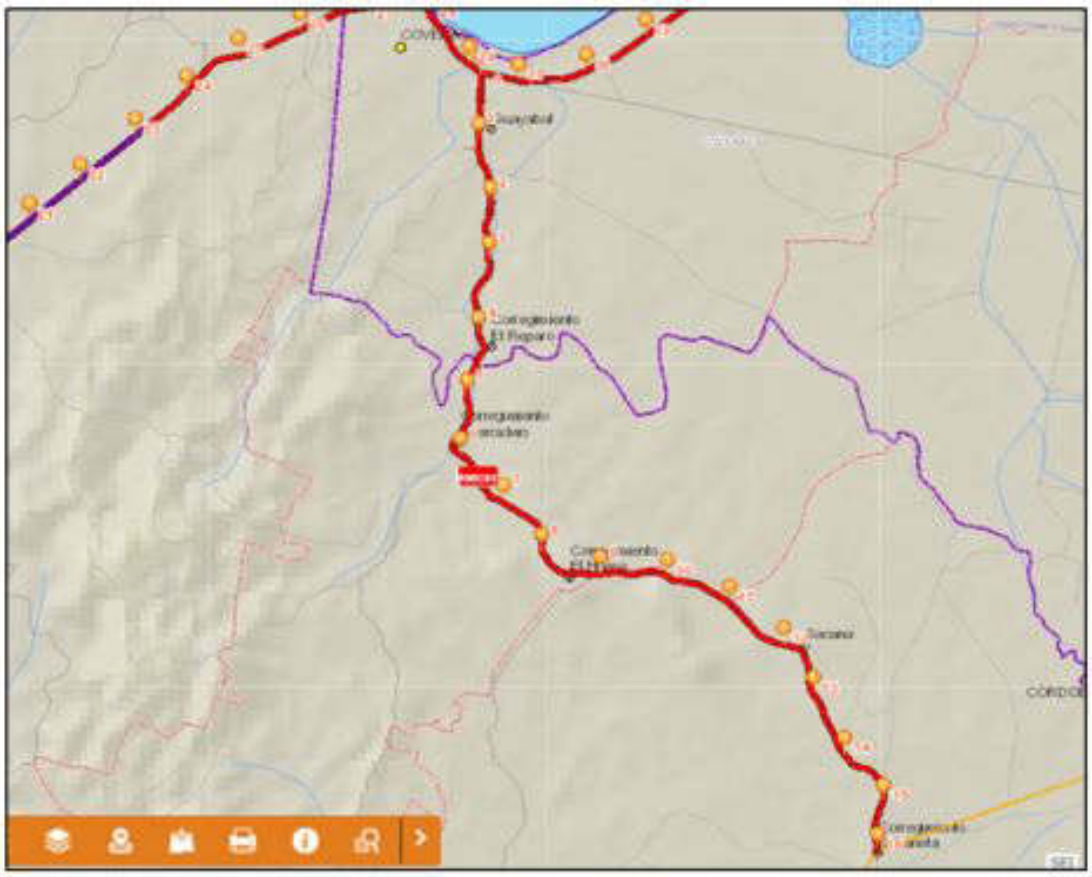

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

El tramo se ubica en jurisdicción de los departamentos de Sucre desde PR0+000 al PR6+000 (aproximadamente 5,5 km), en dicho tramo se encuentran localizados el puente el reparo en el PR4+0445 y el puente El mamey en el PR5+0311. Lo anteriror pertenece al Municipio de Coveñas Sucre.
Luego continua en el Municipio de Purisima - Cordobá con el corregimiento de Aserradero sobre el PR6+0000 y el Hueso a partir del PR9+0000 al PR11+0000.
Sigue en el municipio de Momil – Cordoba a partir del PR12+0000 (Sacana) hasta el corregimiento de Sabaneta – Momil sobre el PR16+0000.

La totalidad de la vía cuenta con una calzada bidireccional con ancho promedio de 6,0 m y con estructura de pavimento flexible en toda su longitud.

2.3 **Inventario y estado inicial de la vía –** se anexa inventario del estado inicial según inspección realizada por la interventoría.

	FORMATO PARA EVALUACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE	

FECHA:	31/03/2022					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**K10+400**	
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	**K12+400**	
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**	

CARRIL	TIPO	PATOLOGIA						FOTO	ACLARACIONES
			DAÑO			REPARACION			
		SEVERIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	PROF	LARGO (m)	ANCHO (m)		
PR0+0005									
D	BCH	ALTA	65	5.9	0.1				
PR0+0050									
D	BCH	ALTA	2.9	2.2	0.08				
PR0+0042									
D	BCH - PC	A	2.5	3	0.07				

	FORMATO PARA EVALUACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE	

FECHA:	31/03/2022								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA							
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA							
TERRRITORIAL	SUCRE		**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**K10+400**			
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02		**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	**K12+400**			
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA				**HOJA N°**	**___ DE ___**			

PR0+0050									
I	DC	M	10.2	2.9	0.015				
PR0+0080									
E	DC	A	1	0.2	0.13				
PR0+0170									
D	DC	A	1.1	0.5	0.05				

	FORMATO PARA EVALUACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE	

FECHA:	31/03/2022								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA							
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA							
TERRRITORIAL	SUCRE		**FECHA**	8/03/2022		**PR INICIAL**	**K10+400**		
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02		**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA		**PR FINAL**	**K12+400**		
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA					**HOJA N°**	**___ DE ___**		

PR0+0185									
D	PCH	B	1.8	0.7					
PR0+0200									
D	DC	A	20	1.5	0.06				
PR0+0215									
D	PC	A	5.5	0.9	0.03				

	FORMATO PARA EVALUACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE	

FECHA:	31/03/2022					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**K10+400**	
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	**K12+400**	
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**	

PR0+0230									
D	PCH	A	0.4	2.5	0.6				
PR0+0238									
D	BCH	A	0.4	0.4	0.06				
PR0+0248									
D	DC	A	1.2	0.4	0.08				

	FORMATO PARA EVALUACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE	

FECHA:	31/03/2022				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA			
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA			
TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**K10+400**
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	**K12+400**
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**

PR0+0270									
D	PC	A	1	2	0.006				
PR0+0282									
D	DC	A	38	2.2	0.008				
PR0+0292									
I	DC	A	15	0.4	0.05				

	FORMATO PARA EVALUACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE	

FECHA:	31/03/2022								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA							
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA							
TERRRITORIAL	SUCRE		**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**K10+400**			
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02		**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	**K12+400**			
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA				**HOJA N°**	**___ DE ___**			

PR0+0380									
I	PCH	M	20	1.5					
PR0+0400									
D	PCH	M	5	1.5					
PR0+0498									
I	C	A	1.1	3	0.025				

	FORMATO PARA EVALUACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE	

FECHA:	31/03/2022					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**K10+400**	
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	**K12+400**	
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**	

PR0+0597									
I	PCH	B	0.9	4.6					
PR0+0617									
I	PC	A	1.8	0.3	0.015				
PR0+0720									
D	DC	A	8	0.3	0.06				

	FORMATO PARA EVALUACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE	

FECHA:	31/03/2022	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**K10+400**
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	**K12+400**
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**

PR0+0750									
I	DC	A	18	0.4	0.1				
PR0+0800									
I	PC	A	2.1	5	0.05				
PR0+0825									
I	PCH	M	1.9	2.1					

	FORMATO PARA EVALUACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE	

FECHA:	31/03/2022									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA								
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA								
TERRRITORIAL	SUCRE			**FECHA**	8/03/2022		**PR INICIAL**	**K10+400**		
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02			**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA		**PR FINAL**	**K12+400**		
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA						**HOJA N°**	**___ DE ___**		

PR0+0854									
D	FBD	A	3.1	0.005					
PR0+0900									
D	FBD	A	10	0.005					
PR0+0975									
D	FBD	A	8	0.004					
PR1+0025									
I	HUN	A	5.1	2.6	0.3				

	FORMATO PARA EVALUACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE	

FECHA:	31/03/2022						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA					
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA					
TERRRITORIAL	SUCRE		**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**K10+400**	
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02		**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	**K12+400**	
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA				**HOJA N°**	**___ DE ___**	

PR1+0035								
I	PC	A	4.5	2.1	0.01			
PR1+0060								
D	FL	A	2.5	0.005				
PR1+0090								
D	FL	A	12	0.003				
PR1 + 0150								
D	SB	A	6	0.07				

	FORMATO PARA EVALUACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE	

FECHA:	31/03/2022						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA					
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA					
TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**K10+400**		
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	**K12+400**		
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**		

PR1+0170									
I	DC	M	30	0.7	0.005				
PR0+0000 AL PR1+0200									
C	CD	N/A	1200	6					Toda la via presenta
PR2+0200									
C	PA	B	60						
PR2+0473									
C	PA	B	47						

	FORMATO PARA EVALUACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE	

FECHA:	31/03/2022				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA			
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA			
TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**K10+400**
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	**K12+400**
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**

PR2+0520									
D	FBD	A	30						
PR2+0570									
D	FL	B	5						
PR2+0730									
C	PC	A	5	5.9					BACHEO Y FISURAS LONGITUDINALES CON SEVERIDAD ALTA
PR2+0735									
C	PC	A	10	5.9					BACHEO Y FISURAS LONGITUDINALES CON SEVERIDAD ALTA


	FORMATO PARA EVALUACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE	

FECHA:	31/03/2022					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**K10+400**	
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	**K12+400**	
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**	

PR2+0750									
C	PC	A	38	5.9					BACHEO Y FISURAS LONGITUDINALES CON SEVERIDAD ALTA
PR2+0788									
C	PA	A	12						
PR10+0400									
D	FL	A	35						
PR10+0420									
I	FL	A	9						

	FORMATO PARA EVALUACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE	

FECHA:	31/03/2022					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**K10+400**	
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	**K12+400**	
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**	

PR10+0490									
E	FL	A	10.5						SE PRESENTA PERDIDA DEL AGREGADO EN TODA LA CALZADA SEVERIDAD ALTA
PR10+0518									
D	FL	A	9.05						
PR10+0525									
I	FL	A	7.1						
PR10+0533									
D	FL	A	7.8						

	FORMATO PARA EVALUACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE	



FECHA:	31/03/2022					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**K10+400**	
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	**K12+400**	
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**	

PR10+0540									
I	FL	A	52						CON FISURA DE BORDE CON SEVERIDAD ALTA
PR10+0600									
I	FL	A	8.5						
PR10+0615									
I	FL	A	12						
PR10+0620									
D	FL	A	8						

	FORMATO PARA EVALUACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE	

FECHA:	31/03/2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA	
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA	

TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**K10+400**
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	**K12+400**
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**

PR10+0650									
I	FL	A	5.2						CON HUNDIMENTO SEVERIDAD MEDIA
PR10+0680									
D	FL	A	30						CON HUNDIMENTO SEVERIDAD MEDIA
PR10+0720									
D	FL	A	8.2						
PR10+0739									
I	FL	A	7.5						

	FORMATO PARA EVALUACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE	

FECHA:	31/03/2022					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**K10+400**	
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	**K12+400**	
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**	

PR10+0775									
I	FL	A	10.5						
PR10+0805									
D	FL	A	12.8						
PR10+0819									
C	PA	B	105	4.8					
PR10+0930									
D	PA	A	8	3					


	FORMATO PARA EVALUACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE	

FECHA:	31/03/2022						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA					
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA					
TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**K10+400**		
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	**K12+400**		
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**		

PR10+0932									
D	CD	A	8	3					
PR10+0945									
I	FBD	A	12						
PR10+0945									
D	FBD	A	4	1					
PR10+0962									
D	FL	A	6.2						

	FORMATO PARA EVALUACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE	

FECHA:	31/03/2022					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**K10+400**	
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	**K12+400**	
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**	

PR10+0965									
C	FL	A	35						SE PRESENTA PERDIDA DEL AGREGADO EN TODA LA CALZADA SEVERIDAD ALTA
PR11+0000									
C	PA	A	30	4.85					FISURAS LONGITUDINALES SEVERIDAD ALTA
PR11+0006									
D	FL	A	10						

	FORMATO PARA EVALUACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE	

FECHA:	31/03/2022					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**K10+400**	
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	**K12+400**	
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**	

PR11+0010								
I	FL	A	15					
PR11+0025								
D	FML	A	5					
PR11+0025								
D	FL	A	6.3	0.007				

	FORMATO PARA EVALUACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE	

FECHA:	31/03/2022					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**K10+400**	
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	**K12+400**	
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**	

PR11+0030									
D	FL	A	15	0.005					
PR11+0030									
D	FL	A	5.6	0.008					
PR11+0150									
I	FML	A	30	0.016					CON FISURAS LONGITUDINALES Y HUNDIMINENTO CON SEVERIDAD ALTA

	FORMATO PARA EVALUACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE	

FECHA:	31/03/2022					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**K10+400**	
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	**K12+400**	
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**	

PR11+0150								
D	FL	M	9.5	0.01				
PR11+0225								
D	FL	A	2.5	0.006				
PR11+0260								
D	FL	A	3.6	0.02				

	FORMATO PARA EVALUACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE	

FECHA:	31/03/2022						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA					
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA					
TERRRITORIAL	SUCRE		**FECHA**	8/03/2022		**PR INICIAL**	**K10+400**
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02		**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA		**PR FINAL**	**K12+400**
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA					**HOJA N°**	**___ DE ___**

PR11+0250									
I	FML	A	9.5	0.011					
PR11+0420									
E	PC	M	2.5	0.3					
PR11+0450									
D	FML	M	4.65	0.01					

	FORMATO PARA EVALUACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE	

FECHA:	31/03/2022						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA					
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA					
TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**K10+400**		
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	**K12+400**		
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**		

PR11+0375									
I	FML	M	6	0.008					CON HUNDIMIENTO Y SEVERIDAD MEDIA
PR11+0420									
C	CD	A	30	4.6					
PR11+0450									
C	CD	A	50	4.7					
PR11+0550									
C	CD	A	50	4.7					

	FORMATO PARA EVALUACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE	

FECHA:	31/03/2022					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**K10+400**	
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	**K12+400**	
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**	

PR11+0600									
D	FBD	A	8						
PR11+0620									
C	CD	A	30	4.8					SE PRESENTAN FISURAS LONGITUDINALES CON SEVERIDAD ALTA
PR11+0650									
C	CD	A	50	4.75					
PR11+0700									
C	CD	A	50	4.75					SE PRESENTAN FISURAS LONGITUDINALES SEVERIDAD ALTA

	FORMATO PARA EVALUACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE	

FECHA:	31/03/2022					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**K10+400**	
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	**K12+400**	
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**	

PR11+0750								
C	CD	A	50	4.85				
PR11+0800								
C	CD	A	50	4.7				
PR11+0850								
C	CD	A	50	4.7				
PR11+0900								
C	CD	A	50	4.7				

	FORMATO PARA EVALUACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE	

FECHA:	31/03/2022				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA			
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA			
TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**K10+400**
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	**K12+400**
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**

PR11+0950									
C	CD	A	40	4.7					SE PRESENTAN FISURAS LONGITUDINALES SEVERIDAD ALTA
PR11+0950									
D	FL	A	10						
PR11+0990									
C	FL	A	30						FISURA LONGITUDINAL CON HUNDIMIENTO CON SEVERIDAD ALTA

	FORMATO PARA EVALUACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE	

FECHA:	31/03/2022					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**K10+400**	
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	**K12+400**	
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**	

PR12+0020									
E	FL	A	3						
PR12+0023									
I	FBD	A	5						


	FORMATO PARA EVALUACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE	

FECHA:	31/03/2022					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**K10+400**	
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	**K12+400**	
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**	

PR12+0025									
C	PA	A	25	4.7					
PR12+0050									
C	PA	A	30	4.28					
PR12+0080									
C	FL	A	30						
PR12+0150									
C	PA	B	100	5					

	FORMATO PARA EVALUACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE	

FECHA:	31/03/2022				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA			
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA			
TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**K10+400**
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	**K12+400**
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**

PR12+0196								
D	FL	A	10					
PR12+0250								
C	PA	B	50	4.8				
PR12+0300								
C	PA	B	50	4.8				
PR12+0350								
C	PA	B	25	4.8				

	FORMATO PARA EVALUACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE	

FECHA:	31/03/2022					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**K10+400**	
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	**K12+400**	
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**	

PR12+0375									
C	CD	B	26	4.8					
PR12+0400									
C	PA	B	30	4.8					

FORMATO PARA INSPECCION DE ALCANTARILLAS

FECHA:	**17/03/2022**					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**0**	
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**		
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**	

TIPO DE ALCANTARILLA

CAJON	x	ANCHO (m)	ALTURA (m)
TUBERIA		DIAMETRO (m	90 cm
SIMPLE			
DOBLE			
MULTIPLE	x	N° DUCTOS	2
OTRA		CUAL	

CARACTERISTICAS DE DUCTOS

LONGITUD (m) 8m
ANGULO DE DESVIAJE
MATERIAL DE TUBERIA

CONCRETO	x
METALICA	
OTRA	
CUAL	

ELEMENTOS DE LA ALCANTARILLA

	ENTRADA	SALIDA
ESTRUCTURA DE CONDUCCION	SI	SI
(ENCOLE-DESCOLE)	SI	SI
MURO CABEZAL	SI	SI
GUARDARUEDAS	SI	SI
ALETAS	SI	SI
MURO ACOMPAÑAMIENTO	NO	NO
POCETA DE LAVADERO	NO	NO
SOLADO	NO	NO

ABSCISA *PR11+0042*

ELEMENTOS	FOTOGRAFIA	CUANTIFICACION CANT	CUANTIFICACION UND	REGISTRO DE DAÑOS
ESTRUCTURA DE ENTRADA **ENCOLE** Longitud 8 m Seccion **MURO CABEZAL** Espesor 0.31m Longitud 2.76m Altura 2.42m **GUARDA RUEDAS** N/A Epesor Longitud Altura **ALETAS** Altura inicial 2.1m Longitud 2.3m Altura fnal 1.8m **MURO DE ACOMPAÑAMIEN** N/A Longitud Espesor **POCETA** N/A Altura Ancho Largo **SOLADO**	 	1	1	Buen estado
ESTRUCTURA DE SALIDA **DUCTO** Longitud 8 m Seccion **MURO CABEZAL** Espesor 0.31m Longitud 2.76m Altura 2.42m **GUARDA RUEDAS** N/A Epesor Longitud Altura **ALETAS** Altura inicial 2.1m Longitud 2.3m Altura fnal 1.8m **MURO DE ACOMPAÑAMIEN** N/A Longitud Espesor **POCETA** N/A Altura Ancho Largo **SOLADO**	 	1	1	Buen estado
DUCTO				

FORMATO PARA INSPECCION DE ALCANTARILLAS

FECHA:	**17/03/2022**					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**0**	
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**		
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**	

TIPO DE ALCANTARILLA

CAJON	x	ANCHO (m)	1	ALTURA (m)	1
TUBERIA		DIAMETRO (m)			
SIMPLE					
DOBLE					
MULTIPLE		N° DUCTOS			
OTRA		CUAL			

CARACTERISTICAS DE DUCTOS

LONGITUD (m)	
ANGULO DE DESVIAJE	
MATERIAL DE TUBERIA	
CONCRETO	x
METALICA	
OTRA	
CUAL	

ELEMENTOS DE LA ALCANTARILLA

	ENTRADA	SALIDA
ESTRUCTURA DE CONDUCCION (ENCOLE-DESCOLE)	SI	SI
MURO CABEZAL	NO	NO
GUARDARUEDAS	SI	SI
ALETAS	NO	SI
MURO ACOMPAÑAMIENTO	SI	NO
POCETA DE LAVADERO	NO	NO
SOLADO	NO	NO

ABSCISA *PR12+0003*

ELEMENTOS					FOTOGRAFIA	CUANTIFICACION CANT	CUANTIFICACION UND	REGISTRO DE DAÑOS
ESTRUCTURA DE ENTRADA	**ENCOLE**				 	1	1	Buen estado
	Longitud		Seccion					
	MURO CABEZAL		Espesor	0.4m				
	Longitud	7m	Altura	0.4m				
	GUARDA RUEDAS	N/A	Epesor					
	Longitud		Altura					
	ALETAS		Altura inicial	1.2m				
	Longitud	1.2m	Altura fnal	0.5m				
	MURO DE ACOMPAÑAMIEN	N/A						
	Longitud		Espesor					
	POCETA	N/A	Altura					
	Ancho		Largo					
	SOLADO							
ESTRUCTURA DE SALIDA	**DUCTO**				 	1	1	Buen estado
	Longitud		Seccion					
	MURO CABEZAL		Espesor	0.2m				
	Longitud	7m	Altura	6.33m				
	GUARDA RUEDAS		Epesor	0.25 m				
	Longitud	2,1m	Altura	0.27 m				
	ALETAS	N/A	Altura inicial					
	Longitud		Altura fnal					
	MURO DE ACOMPAÑAMIEN	N/A						
	Longitud		Espesor					
	POCETA	N/A	Altura					
	Ancho		Largo					
	SOLADO							
	DUCTO							

FORMATO PARA INSPECCION DE ALCANTARILLAS

FECHA:	**17/03/2022**				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA			
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA			
TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**0**
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**

TIPO DE ALCANTARILLA

CAJON	x	ANCHO (m)	1	ALTURA (m)	0.5
TUBERIA		DIAMETRO (m)			
SIMPLE					
DOBLE					
MULTIPLE		N° DUCTOS			
OTRA		CUAL			

CARACTERISTICAS DE DUCTOS

LONGITUD (m)	
ANGULO DE DESVIAJE	
MATERIAL DE TUBERIA	
CONCRETO	x
METALICA	
OTRA	
CUAL	

ELEMENTOS DE LA ALCANTARILLA

	ENTRADA	SALIDA
ESTRUCTURA DE CONDUCCION (ENCOLE-DESCOLE)	SI	SI
MURO CABEZAL	NO	NO
GUARDARUEDAS	SI	SI
ALETAS	NO	SI
MURO ACOMPAÑAMIENTO	SI	NO
POCETA DE LAVADERO	NO	NO
SOLADO	NO	NO

ABSCISA *PR12+0300*

ELEMENTOS					FOTOGRAFIA	CUANTIFICACION CANT	CUANTIFICACION UND	REGISTRO DE DAÑOS
ESTRUCTURA DE ENTRADA	**ENCOLE**					1	1	Buen estado
	Longitud		Seccion					
	MURO CABEZAL		Espesor	0.4m				
	Longitud	6m	Altura	0.37m				
	GUARDA RUEDAS	N/A	Epesor					
	Longitud		Altura					
	ALETAS		Altura inicial	0.7m				
	Longitud	1.2m	Altura fnal	0.3m				
	MURO DE ACOMPAÑAMIEN	N/A						
	Longitud		Espesor					
	POCETA	N/A	Altura					
	Ancho		Largo					
	SOLADO							
ESTRUCTURA DE SALIDA	**DUCTO**					1	1	Buen estado
	Longitud		Seccion					
	MURO CABEZAL		Espesor					
	Longitud	1m	Altura	0.7m				
	GUARDA RUEDAS	N/A	Epesor					
	Longitud		Altura					
	ALETAS		Altura inicial	0.9m				
	Longitud	1.2m	Altura fnal	0.6m				
	MURO DE ACOMPAÑAMIEN	N/A						
	Longitud		Espesor					
	POCETA	N/A	Altura					
	Ancho		Largo					
	SOLADO							
	DUCTO							

FORMATO PARA INSPECCION DE ALCANTARILLAS

FECHA:	**28/02/2022**					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**0**	
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**		
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**	

TIPO DE ALCANTARILLA

CAJON	X	ANCHO (m)	ALTURA (m)
TUBERIA		DIAMETRO (m)	
SIMPLE			
DOBLE			
MULTIPLE		N° DUCTOS	
OTRA		CUAL	

CARACTERISTICAS DE DUCTOS

LONGITUD (m)	
ANGULO DE DESVIAJE	
MATERIAL DE TUBERIA	
CONCRETO	
METALICA	
OTRA	
CUAL	

ELEMENTOS DE LA ALCANTARILLA

	ENTRADA	SALIDA
ESTRUCTURA DE CONDUCCION (ENCOLE-DESCOLE)		
MURO CABEZAL		
GUARDARUEDAS		
ALETAS		
MURO ACOMPAÑAMIENTO		
POCETA DE LAVADERO		
SOLADO		

ABSCISA *PR2+520*

ELEMENTOS	FOTOGRAFIA	CUANTIFICACION CANT	CUANTIFICACION UND	REGISTRO DE DAÑOS
ESTRUCTURA DE ENTRADA **ENCOLE** Longitud 26m Seccion **MURO CABEZAL** Espesor 0.40m Longitud 1m Altura 1m **GUARDA RUEDAS** 1.53 Epesor Longitud Altura 0.40 **ALETAS** Altura inicial 1.26-1.20 Longitud 1.73 1.68 Altura fnal 0.57-0.60 **MURO DE ACOMPAÑAMIEN** N/A Longitud Espesor **POCETA** N/A Altura Ancho 3.40 Largo **SOLADO**	 	1	1	
ESTRUCTURA DE SALIDA **DUCTO** Longitud Seccion **MURO CABEZAL** Espesor 49 Longitud 1m Altura 1.03 **GUARDA RUEDAS** Epesor 0.20 Longitud 1.51 Altura 0.49 **ALETAS** Altura inicial 1.51 Longitud 0.77 Altura fnal 0.75 **MURO DE ACOMPAÑAMIEN** Longitud Espesor **POCETA** Altura Ancho Largo **SOLADO**		1	1	Buen estado
DUCTO				

	FORMATO PARA INSPECCION VISUAL CUNETAS	

FECHA:	**31/03/2022**					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**0**	
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**		
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**	

PR INICIAL	LADO		LONGITUD		FORMA	DAÑO				OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA
	D	I	TOTAL	MODULO		TIPO	SEV	CANT	UN		
PR0+0200	**X**		**4.5**	**1.5**	V	**OBS**	**B**	**3**	**ML**		
PR0+0220	**X**		**3**	**1.5**	V	**OBS**	**B**	**2**	**ML**		
PR0+0300	**X**		**0.2**	**1.5**	V	**OBS**	**B**	**1**	**ML**		

	FORMATO PARA INSPECCION VISUAL CUNETAS	

FECHA:	**31/03/2022**	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**0**
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**

PR0+0340	**X**		**0.15**	**1.5**	V	**OBS**	**B**	**1**	**ML**		
PR0+0400	**X**		**0.3**	**1.5**	V	**FRAC**	**A**	**1**	**ML**		
PR0+0420	**X**		**0.9**	**1.5**	V	**OBS**	**A**	**1**	**ML**		

	FORMATO PARA INSPECCION VISUAL CUNETAS	

FECHA:	**31/03/2022**	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**0**
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**

PR0+630		**X**	**6**	**1.5**	V		**A**	**1**	**ML**	 
PR0+0675	**X**		**3.5**	**1.5**	V	**FRAC**	**A**	**3**	**ML**	

	FORMATO PARA INSPECCION VISUAL CUNETAS	INVIAS


FECHA:	**31/03/2022**	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**0**
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**

PR0+0900		**X**	**18**	**1.5**	V	**FRAC**	**A**	**12**	**ML**		
PR0+0920		**X**	**3**	**1.5**	V	**GR**	**A**	**2**	**ML**		
PR0+0952		**X**	**21**	**1.5**	V	**FRAC**	**A**	**14**	**ML**		

	FORMATO PARA INSPECCION VISUAL CUNETAS	

FECHA:	**31/03/2022**										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA									
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA									
TERRRITORIAL	SUCRE					**FECHA**	8/03/2022		**PR INICIAL**	**0**	
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02					**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA		**PR FINAL**		
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA								**HOJA N°**	**___ DE ___**	

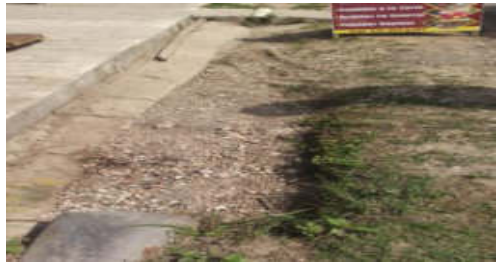PR0+0980		**X**	**10**	**1.5**	V	**OBS**	**A**	**N.A**	**ML**	
PR1+0074 al PR1+0083		**X**	**9**	**C**	V	**OBS**	**A**	**N.A**	**ML**	
PR1+0100		**X**	**6**	**1.5**	V	**FRAC**	**A**	**4**	**ML**	

	FORMATO PARA INSPECCION VISUAL CUNETAS	

FECHA:	**31/03/2022**										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA									
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA									
TERRRITORIAL	SUCRE					**FECHA**	8/03/2022		**PR INICIAL**	**0**	
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02					**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA		**PR FINAL**		
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA								**HOJA N°**	**___ DE ___**	

PR2+0700	**X**		**100**	**2**	V	**GR**	**A**	**10**	**MM**	
PR10+0460	**X**		**4**	**2**	V	**OBS**	**A**	**50**	**%**	
PR10+0475	**X**		**6**	**2**	V	**DSU**	**A**	**1**	**M2**	


	FORMATO PARA INSPECCION VISUAL CUNETAS	

FECHA:	**31/03/2022**					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**0**	
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**		
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**	

PR10+0533	**X**		**6**	**2**	V	**GR**	**M**	**5**	**MM**	
PR10+0608	**X**		**8**	**2**	V	**GR**	**A**	**10**	**MM**	
PR10+0623	**X**		**4**	**2**	V	**GR**	**A**	**10**	**MM**	

	FORMATO PARA INSPECCION VISUAL CUNETAS	

FECHA:	**31/03/2022**										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA									
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA									
TERRRITORIAL	SUCRE					**FECHA**	8/03/2022		**PR INICIAL**	**0**	
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02					**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA		**PR FINAL**		
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA								**HOJA N°**	**___ DE ___**	

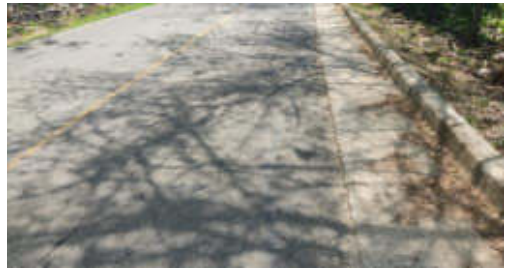PR10+0725	**X**		**8**	**2**	V	**GR**	**A**	**10**	**MM**	
PR10+0807	**X**		**6**	**2**	V	**GR**	**M**	**6**	**MM**	
PR10+902	**X**		**4**	**2**	V	**DSU**	**A**	**1**	**M2**	

	FORMATO PARA INSPECCION VISUAL CUNETAS	

FECHA:	**31/03/2022**	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**0**
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**

PR11+0000	**X**		**4**	**2**	V	**SC**	**A**		**ML**		
PR11+0006	**X**		**2**	**1**	V	**DSU**	**A**	**2**	**M2**		

	FORMATO PARA INSPECCION VISUAL CUNETAS	

FECHA:	**31/03/2022**	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA


TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**0**
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**

PR11+0074	**X**		**4**	**2**	V	**GR-DSU**	**A**	**11 0.135**	**MM M2**		
PR11+0188	**X**		**4**	**2**	V	**GR**	**A**	**18**	**MM**		

	FORMATO PARA INSPECCION VISUAL CUNETAS	

FECHA:	**31/03/2022**	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**0**
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**

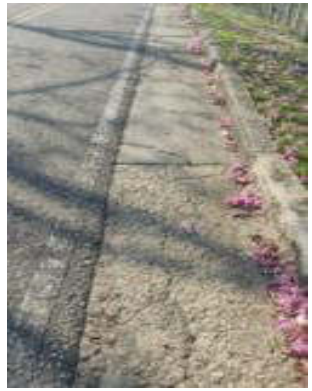PR11+0225	**X**		**8**	**4**	V	**GR**	**M**	**8**	**MM**		
PR11+0275	**X**		**6**	**3**	V	**GR**	**M**	**12**	**MM**		

	FORMATO PARA INSPECCION VISUAL CUNETAS	

FECHA:	**31/03/2022**										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA									
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA									
TERRRITORIAL	SUCRE					**FECHA**	8/03/2022		**PR INICIAL**	**0**	
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02					**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA		**PR FINAL**		
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA								**HOJA N°**	**___ DE ___**	

PR11+0275	**X**		**6**	**3**	V	**DSU**	**A**				
PR11+0300	**X**		**8**	**4**	V	**FRAC**	**A**	**0.1**	**M2**	Se presenta perdida de concreto	

	FORMATO PARA INSPECCION VISUAL CUNETAS	

FECHA:	**31/03/2022**	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

TERRRITORIAL	SUCRE						**FECHA**	8/03/2022		**PR INICIAL**	**0**		
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02						**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA		**PR FINAL**			
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA									**HOJA N°**	**___ DE ___**		
PR11+0350	**X**		**6**	**3**	V	**GR**	**A**	**11**	**MM**				
PR11+0370	**X**		**6**	**3**	V	**GR**	**A**	**8**	**MM**				

	FORMATO PARA INSPECCION VISUAL CUNETAS	

FECHA:	**31/03/2022**	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**0**
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**

PR11+0420	**X**		**4**	**2**	V	**GR**	**A**	**9**	**MM**		
PR11+0430	**X**		**6**	**3**	V	**GR**	**A**	**11**	**MM**		

	FORMATO PARA INSPECCION VISUAL CUNETAS	INVIAS

FECHA:	**31/03/2022**	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

TERRRITORIAL	SUCRE					**FECHA**	8/03/2022		**PR INICIAL**	**0**		
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02					**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA		**PR FINAL**			
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA								**HOJA N°**	**___ DE ___**		
PR10+0460	**X**		**4**	**2**	V	**OBS**	**A**	**50**	**%**			
PR10+0475	**X**		**6**	**2**	V	**DSU**	**A**	**1**	**M2**			
PR10+0533	**X**		**6**	**2**	V	**GR**	**M**	**5**	**MM**			

	FORMATO PARA INSPECCION VISUAL CUNETAS	

FECHA:	**31/03/2022**	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**0**
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**

PR10+0608	**X**		**8**	**2**	V	**GR**	**A**	**10**	**MM**		
PR11+0620	**X**		**8**	**4**	V	**EJ**	**M**	**12**	**MM**		

	FORMATO PARA INSPECCION VISUAL CUNETAS	

FECHA:	**31/03/2022**										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA									
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA									
TERRRITORIAL	SUCRE						**FECHA**	8/03/2022		**PR INICIAL**	**0**
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02						**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA		**PR FINAL**	
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA									**HOJA N°**	**___ DE ___**

PR11+0650		**X**	**10**	**2**	V	**DSU**	**A**	**10**	**M2**	

	FORMATO PARA INSPECCION VISUAL CUNETAS	


FECHA:	**31/03/2022**										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA									
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA									
TERRRITORIAL	SUCRE						**FECHA**	8/03/2022		**PR INICIAL**	**0**
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02						**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA		**PR FINAL**	
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA									**HOJA N°**	**___ DE ___**

PR11+0700		**X**	**5**	**2**	V	**DSU**	**A**	**5**	**M2**		

	FORMATO PARA INSPECCION VISUAL CUNETAS	

FECHA:	**31/03/2022**	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**0**
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**

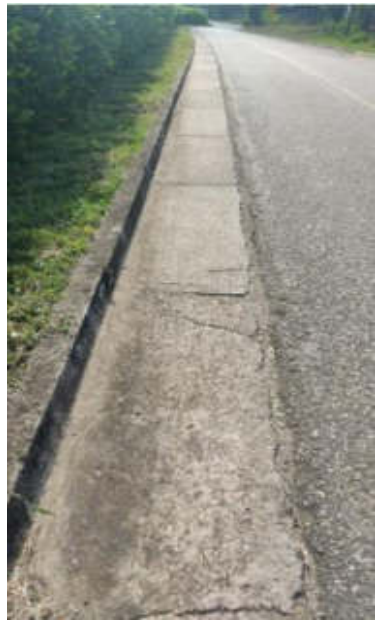PR11+0760		**X**	**14**	**2**	V	**DSU**	**A**	**14**	**M2**		

	FORMATO PARA INSPECCION VISUAL CUNETAS	

FECHA:	**31/03/2022**	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**0**
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**

PR11+0760	**X**		**8**	**2**	V	**DSU**	**A**	**8**	**M2**		

	FORMATO PARA INSPECCION VISUAL CUNETAS	

FECHA:	**31/03/2022**											
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA										
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA										
TERRRITORIAL	SUCRE						**FECHA**	8/03/2022		**PR INICIAL**	**0**	
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02						**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA		**PR FINAL**		
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA									**HOJA N°**	**___ DE ___**	

PR11+0800		**X**	**12**	**2**	V	**DSU**	**A**	**12**	**M2**		

	FORMATO PARA INSPECCION VISUAL CUNETAS	

FECHA:	**31/03/2022**	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**0**
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**

PR11+0850		**X**	**10**	**2**	V	**DSU**	**A**	**10**	**M2**		

	FORMATO PARA INSPECCION VISUAL CUNETAS	

FECHA:	**31/03/2022**	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA


TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**0**
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**

PR11+0850	**X**		**10**	**2**	V	**DSU**	**A**	**10**	**M2**	



	FORMATO PARA INSPECCION VISUAL CUNETAS	

FECHA:	**31/03/2022**											
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA										
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA										
TERRRITORIAL	SUCRE					**FECHA**	8/03/2022		**PR INICIAL**	**0**		
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02					**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA		**PR FINAL**			
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA								**HOJA N°**	**___ DE ___**		

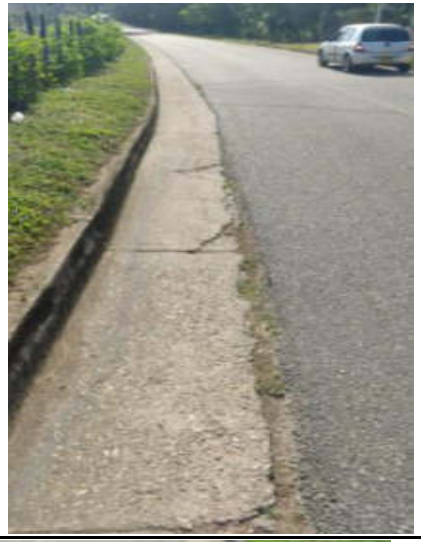PR11+0940		**X**	**5**	**2**	V	**DSU**	**A**	**5**	**M2**		
PR11+0940	**X**		**5**	**2**	V	**DSU**	**A**	**5**	**M2**		

	FORMATO PARA INSPECCION VISUAL CUNETAS	

FECHA:	**31/03/2022**	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

TERRRITORIAL	SUCRE						**FECHA**	8/03/2022		**PR INICIAL**	**0**		
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02						**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA		**PR FINAL**			
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA									**HOJA N°**	**___ DE ___**		
PR11+0950		**X**	**8**	**2**	V	**GR**	**A**	**10**	**MM**				

	FORMATO PARA INSPECCION VISUAL CUNETAS	

FECHA:	**31/03/2022**	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**0**
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**

PR12+0060		**X**	**12**	**2**	V	**GR**	**A**	**10**	**MM**	

	FORMATO PARA INSPECCION VISUAL CUNETAS	

FECHA:	**31/03/2022**	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA


TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**0**
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**

PR12+0100	**X**		**12**	**2**	V	**GR**	**A**	**10**	**MM**		

	FORMATO PARA INSPECCION VISUAL CUNETAS	

FECHA:	**31/03/2022**	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**0**
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**

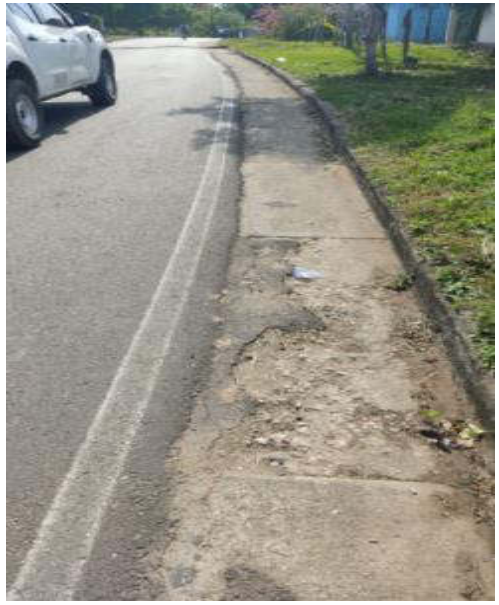PR12+0180	**X**		**8**	**2**	V	**DSU**	**A**	**8**	**UN**	

	FORMATO PARA INSPECCION VISUAL CUNETAS	

FECHA:	**31/03/2022**										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA									
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA									
TERRRITORIAL	SUCRE						**FECHA**	8/03/2022		**PR INICIAL**	**0**
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02						**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA		**PR FINAL**	
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA									**HOJA N°**	**___ DE ___**

PR12+0250	**X**									NO EXISTE CUNETA	

	FORMATO PARA INSPECCION VISUAL CUNETAS	

FECHA:	**31/03/2022**	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2263 -2021	**OBJETO:** INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA
CONTRATO DE OBRA N°	2269-2021	**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

TERRRITORIAL	SUCRE	**FECHA**	8/03/2022	**PR INICIAL**	**0**
CODIGO DE LA VIA	RUTA 90SC02	**LEVANTADO POR**	INTERVENTORIA	**PR FINAL**	
NOMBRE	CARRETERA COVEÑAS-SABANETA			**HOJA N°**	**___ DE ___**

PR12+0250		**X**								NO EXISTE CUNETA	

2.4 Características técnicas del proyecto

Las principales actividades y/o obras a ejecutar son las siguientes:

a. Remplazo de pavimento flexible por losas en concreto rigido y mejoramiento de la estructura vial en 1.200 M en el sector poblado de Coveñas el cual corresponde a las siguientes abscisas:

   - TRAMO 1- PR 0+0000 AL PR 1+0200

b. Rehabilitación de pavimento flexible existente y obras de mantenimiento en una longitud de 3.687 metros, en secciones priorizadas en los siguientes sectores:

   - TRAMO 2- PR 2+0200 AL PR 2+0260, PR 2+0800 AL PR 3+0400, PR 2+0473 AL PR 3+0400, PR 4+0500 AL PR 5+0200
   - TRAMO 3- PR 10+0400 AL PR 11+0206 PR 11+0206 AL PR 11+0708 , 11+0708 AL PR 12+0400

c. Demolición de elementos en estructuras de drenaje (aletas, cunetas, disipadores), a lo largo de la vía, para reparación y mantenimiento, que garanticen eficiencia en funcionamiento.

d. Construcción de cunetas en concreto en sectores puntuales.

e. Demarcación vial entre los PR00+0000 al PR16+0000, excepto el tramo PR3+0400 al PR3+0500 los cuales se van a intervenir dentro del convenio interadministrativo N. 915 de 2021 entre la Gobernanción de Sucre y el INVIAS.

f. Señalización en sectores con Instituciones Educativas y paso por centros poblados a lo largo de la vía objeto, excepto el tramo PR3+0400 al PR3+0500 los cuales se van a intervenir dentro del convenio interadministrativo N. 915 de 2021 entre la Gobernanción de Sucre y el INVIAS.

g. Suministro e instalación de señalización vertical, en la vía entre PR00+0000 al PR16+0000, excepto el tramo PR3+0400 al PR3+0500 los cuales se van a intervenir dentro del convenio interadministrativo N. 915 de 2021 entre la Gobernanción de Sucre y el INVIAS.

Los principales Ítems de pago:
• Explanaciones,
• Subbases, Bases, Afirmados
• Pavimentos Asfalticos

• Estructuras y Drenajes.
• Señalización y Seguridad.

El INVIAS entrega 2 documentos con los estudios para el Mejoramiento y Rehabilitación de las carreteras Coveñas-Sabaneta (Ruta 90SC02 realizados por la firma BATEMAN INGENIERIA SA y otro estudio Elaborado por el ingeniero José David Pastrana, los cuales fueron revisados y se definieron las actividades de intervención de rehabilitación y/o mantenimiento en cada uno de los sectores del proyecto.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1 Información general del contrato

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA	
N°. DEL CONTRATO:	2269 DE 2021
OBJETO CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA.
VALOR DEL CONTRATO:	OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS ($8.622.782.704) M/CTE, INCLUIDO IVA.
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS ($8.622.782.704) M/CTE, INCLUIDO IVA.
ANTICIPO:	30% DEL VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, ES DECIR DE $8.555´187.010,oo, SE CALCULA EL PORCENTAJE AUTORIZADO, EQUIVALENTE A **$2.566´556.103,oo**
FECHA ORDEN DE INICIO:	22 DE FEBRERO DE 2022
SUSPENSION N° 1	15 DE JULIO DEL 2022 (15 DIAS)
AMPLIACION N° 1 A LA SUSPENSION N° 1	1 DE AGOSTO DEL 2022 (31 DIAS)
AMPLIACION N° 2 A LA SUSPENSION N° 1	1 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (15 DIAS)
AMPLIACION N° 3 A LA SUSPENSION N° 1	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (1 MES)
REINICIO N° 1	18 DE OCTUBRE DEL 2022
SUSPENSION N° 2	27 DE OCTUBRE DEL 2022 (20 DIAS)
AMPLIACION N° 1 A LA SUSPENSION N° 2	17 DE NOVIEMBRE DEL 2022 (10 DIA)
REINICIO N° 2	18 DE OCTUBRE DEL 2022
PRORROGA N° 1	2 DE DICIEMBRE DEL 2022 (6 MESES)
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022

PLAZO ACTUALIZADO:	HASTA EL 5 DE JUNIO DEL 2023
CONTRATISTA:	INCOPAV S.A. con NIT. 830.063.087-1
CORREO ELECTRONICO:	mfmarcelo@incopav.com

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

210.1.3P EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN

- Se realiza la excavación, remoción, cargue y transporte hasta el límite de acarreo libre, los materiales provenientes de los cortes requeridos para los trabajos de mejoramiento de las capas granulares y sub rasante, incluyendo, la conformación y compactación de estas, todo de acuerdo con los alineamientos pendientes y cotas indicadas.
- Durante la ejecución de las excavaciones, antes y durante su relleno, la interventoría verifico que el contratista proveyera todos los medios de señalización y ordenamiento del tránsito que fueran necesarios para garantizar la circulación segura.
- Los trabajos para la excavación de material común, se acometieron considerando la protección del medio ambiente y todas las disposiciones vigentes sobre el particular.
- La interventoría verifica que los escombros de la excavación no sean depositados en las zonas del derecho de vía, en cursos o láminas de agua o en áreas ecológicamente sensibles.
- Se realiza la excavación correspondiente a este ítem en las abscisas K0+020 al K0+0300

465.1 465-13 EXCAVACIÓN PARA REPARACION DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS Y DE LAS SUBYACENTES


- Se realiza corte, excavación, compactación, cargue, transporte y descargue pavimento asfaltico de acuerdo a los documentos técnicos del proyecto.
- Se realiza la excavación correspondiente a este ítem en las abscisas k10+968.15 al K11+632.50 y en las abscisas K0+020 al K0+0300

3.3 Seguimiento ítems no previstos

1. Primera entrega del contratista de obra el 17 de noviembre de 2022 por medio del INC-INVIAS-2269-INT-121.***El contratista no toma en cuenta los formatos ni el instructivo del Invias entregando dos documentos así, uno donde entrega los APU descargados del INVIAS como se muestra a continuación y un segundo documento con propuesta de presupuesto.***

ÍNDICE DE ÍTEMS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU

#	ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	SUBTOTAL EQUIPOS	SUBTOTAL MATERIALES	SUBTOTAL TRANSPORTE	SUBTOTAL MANO DE OBRA	COSTO DIRECTO	PRECIO UNITARIO TOTAL ($ COP)
44	231.1	m2	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	$ 2,55	$ 7.218,22	$ 0,00	$ 254,90	$ 7.475,67	**$ 9.718,38**
49	235.1	m3	SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CEMENTO (INCLUYE SUMINISTRO DEI CEMENTO)	$ 10.719,88	$ 43.768,30	$ 0,00	$ 910,36	$ 55.398,55	**$ 72.018,11**
97	351.1	m3	BASE TRATADA CON CEMENTO RESISTENCIA R-3.5 (INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO)	$ 13.497,61	$ 134.383,93	$ 856,81	$ 1.062,09	$ 149.800,43	**$ 194.740,56**
209	500.2	m3	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FRAGUADO RÁPIDO (FAST TRACK)	$ 9.023,68	$ 741.642,79	$ 933,69	$ 7.492,03	$ 759.092,18	**$ 986.819,84**
256	630.3.1	m3	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - MEZCLA IN SITU	$ 395.374,92	$ 371.413,86	$ 883,17	$ 66.308,81	$ 833.980,76	**$ 1.084.174,98**
368	900.2.1	m3/km	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL	$ 2.188,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.188,80	**$ 2.845,44**

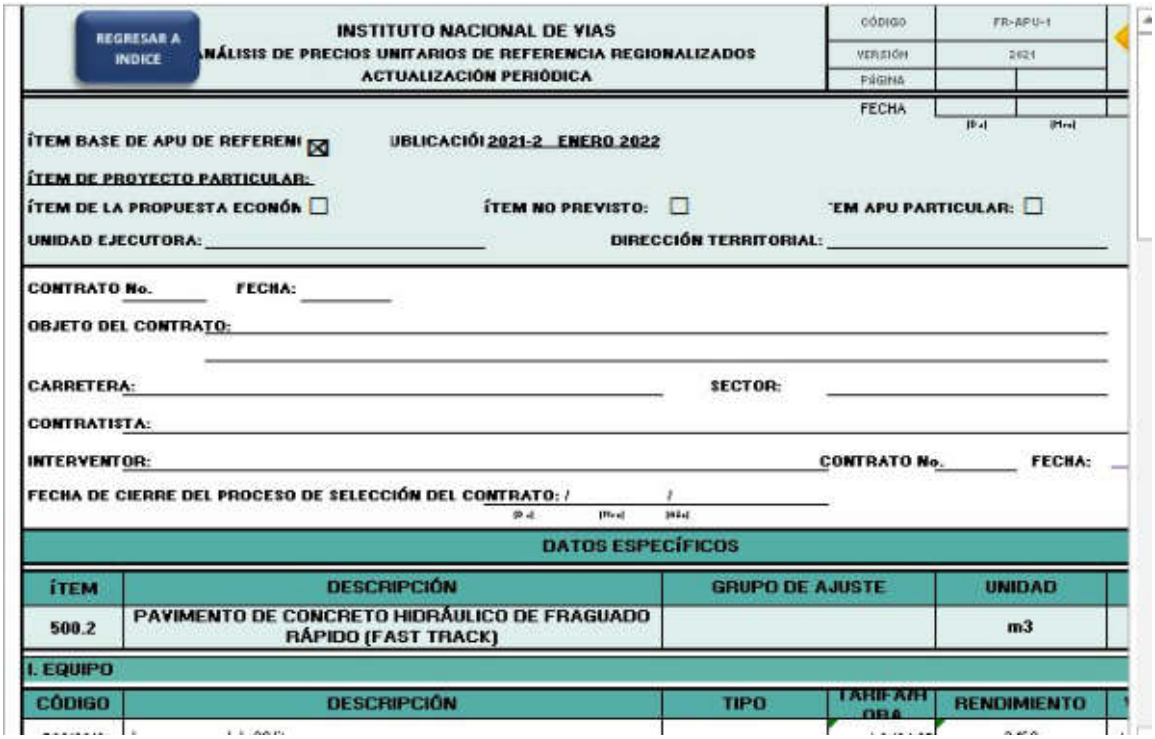

REGRESAR A INDICE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA REGIONALIZADOS
ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA

CÓDIGO FR-APU-1
VERSIÓN 2021
PÁGINA
FECHA

ÍTEM BASE DE APU DE REFERENI ☒ UBLICACIÓI 2021-2 ENERO 2022
ÍTEM DE PROYECTO PARTICULAR:
ÍTEM DE LA PROPUESTA ECONÓN ☐ ÍTEM NO PREVISTO: ☐ EM APU PARTICULAR: ☐
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:
CONTRATO No. FECHA:
OBJETO DEL CONTRATO:
CARRETERA: SECTOR:
CONTRATISTA:
INTERVENTOR: CONTRATO No. FECHA:
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATO: / /

DATOS ESPECÍFICOS


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD
500.2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FRAGUADO RÁPIDO (FAST TRACK)		m3

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/H OBA	RENDIMIENTO

2. La interventoría envía al enlace dispuesto del área de Licitaciones de INCOPAV S.A.S., la profesional Viviana Rodríguez, en horas de la tarde del 17 de noviembre, por medio de Whatsapp, el ejemplo suministrado por la Ingeniera Liliana García con la información completa a relacionar para adelantar el trámite de aprobación de APU's.

3. El 28 de noviembre al no recibir ningún documento, interventoría solicita por medio de oficio CI-N°2263-2021-OFI N°183, el envío de la información según lo enviado el 17 de noviembre y se reenvía el ejemplo enviado por la Ingeniera Liliana.

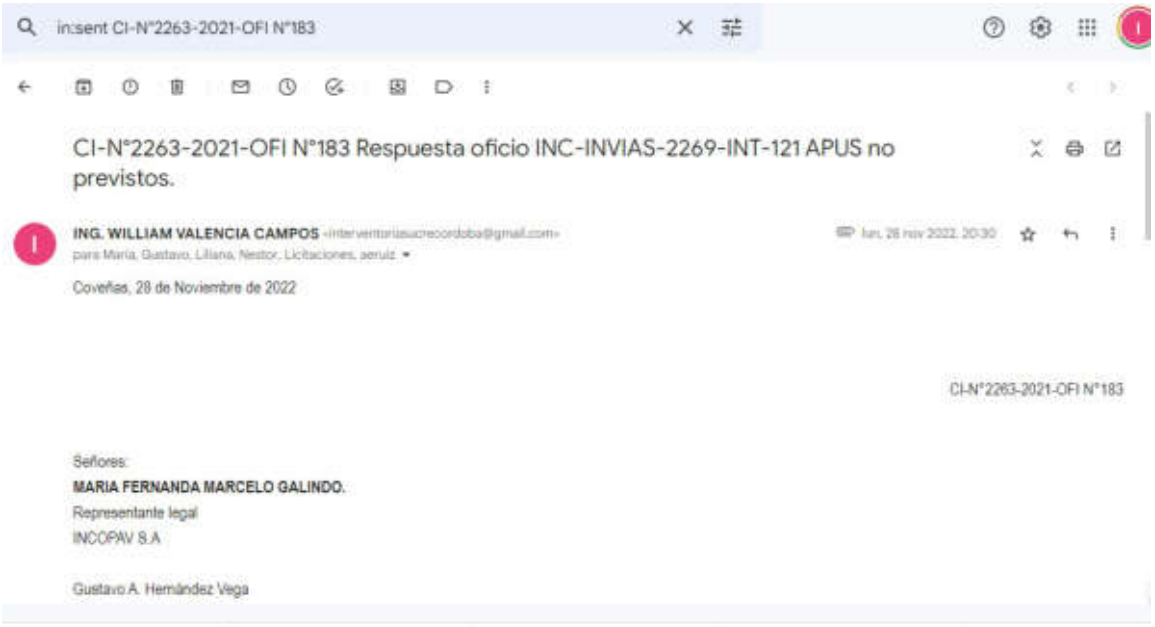
in:sent CI-N°2263-2021-OFI N°183

CI-N°2263-2021-OFI N°183 Respuesta oficio INC-INVIAS-2269-INT-121 APUS no previstos.

ING. WILLIAM VALENCIA CAMPOS <interventoriasucrecordoba@gmail.com>
para María, Gustavo, Liliana, Nestor, Licitaciones, aeruiz

Coveñas, 28 de Noviembre de 2022

CI-N°2263-2021-OFI N°183

Señores:
MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO.
Representante legal
INCOPAV S.A

Gustavo A. Hernández Vega

4. El 30 de noviembre el contratista remite la información de los APU's nuevamente.


Coveñas 2269 - Oficio solicitud aprobación APU

Fredy Andrade <fredy.andrade@incopav.com>
para mí, Gustavo, Bernardo, Licitaciones

Buen día

Dando alcance al asunto, y cumplimiento con el compromiso adquirido, remitimos para su revisión y aprobación los análisis de precios unitarios resultantes del diseño.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Saludos cordiales.

Edber Fredy Andrade

La actividad se encuentra dentro del visor del precio del INVIAS, por tal motivo y en desarrollo del presente contrato el contratista se acoge al precio tope, a continuación, se indica el item de de identificación de la actividad.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN - SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA REGIONALIZADOS 2021

ÍNDICE DE ÍTEMS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU

#	ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	SUBTOTAL EQUIPOS	SUBTOTAL MATERIALES	SUBTOTAL TRANSPORTE	SUBTOTAL MANO DE OBRA	COSTO DIRECTO	PRECIO UNITARIO TOTAL ($ COP)
368	300.2.3	m3/m	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	$ 2,188.80	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,188.80	$ 2,885.44

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN - SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA REGIONALIZADOS 2021

ÍNDICE DE ÍTEMS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU

#	ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	SUBTOTAL EQUIPOS	SUBTOTAL MATERIALES	SUBTOTAL TRANSPORTE	SUBTOTAL MANO DE OBRA	COSTO DIRECTO	PRECIO UNITARIO TOTAL ($ COP)
256	630.3.1	m3	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - MEZCLA IN SITU	$ 395,027.18	$ 371,413.86	$ 883.17	$ 59,354.17	$ 826,678.38	$ 1,074,681.89

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN - SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA REGIONALIZADOS 2021

ÍNDICE DE ÍTEMS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU

#	ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	SUBTOTAL EQUIPOS	SUBTOTAL MATERIALES	SUBTOTAL TRANSPORTE	SUBTOTAL MANO DE OBRA	COSTO DIRECTO	PRECIO UNITARIO TOTAL ($ COP)
45	230.1	m3	SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CEMENTO (INCLUYE SUMINISTRO DEL CEMENTO)	$ 10,717.97	$ 43,766.30	$ 0.00	$ 814.88	$ 55,301.16	$ 71,891.50

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN - SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA REGIONALIZADOS 2021

ÍNDICE DE ÍTEMS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU

#	ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	SUBTOTAL EQUIPOS	SUBTOTAL MATERIALES	SUBTOTAL TRANSPORTE	SUBTOTAL MANO DE OBRA	COSTO DIRECTO	PRECIO UNITARIO TOTAL ($ COP)
44	233.1	m2	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	$ 2.28	$ 7,218.22	$ 0.00	$ 228.17	$ 7,448.67	$ 9,683.27

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN - SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA REGIONALIZADOS 2021

ÍNDICE DE ÍTEMS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU

#	ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	SUBTOTAL EQUIPOS	SUBTOTAL MATERIALES	SUBTOTAL TRANSPORTE	SUBTOTAL MANO DE OBRA	COSTO DIRECTO	PRECIO UNITARIO TOTAL ($ COP)
97	260.3	m3	BASE TRATADA CON CEMENTO RESISTENCIA R-3.5 (INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO)	$ 13,497.61	$ 134,383.93	$ 856.81	$ 950.69	$ 149,689.04	$ 194,595.75


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN - SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA REGIONALIZADOS 2021

ÍNDICE DE ÍTEMS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU

#	ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	SUBTOTAL EQUIPOS	SUBTOTAL MATERIALES	SUBTOTAL TRANSPORTE	SUBTOTAL MANO DE OBRA	COSTO DIRECTO	PRECIO UNITARIO TOTAL ($ COP)
209	500.2	m3	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FRAGUADO RÁPIDO (FAST TRACK)	$ 8,945.10	$ 741,642.79	$ 933.69	$ 6,706.25	$ 758,227.82	$ 985,696.16

administracion@ingevalsas.com.co
interventoriasucrecordoba@gmail.com
Cl 38 No. 32-41 of 806 Ed. Parque Santander
Tel 6628119
Villavicencio -Meta

4. El 2 de diciembre la supervisión INVIAS, de manera extraoficial, le indica a la interventoría que el contratista debe entregar cotizaciones de los ítems incluidos en los APU's, así estos se ajusten a los precios del INVIAS (propuesta inicial del contratista para los ítems), la interventoría se comunica con el contratista y le solicita las cotizaciones de los materiales incluyendo los ítems pendientes, así mismo, la ingeniera Liliana envía un segundo ejemplo de la entrega de los APU

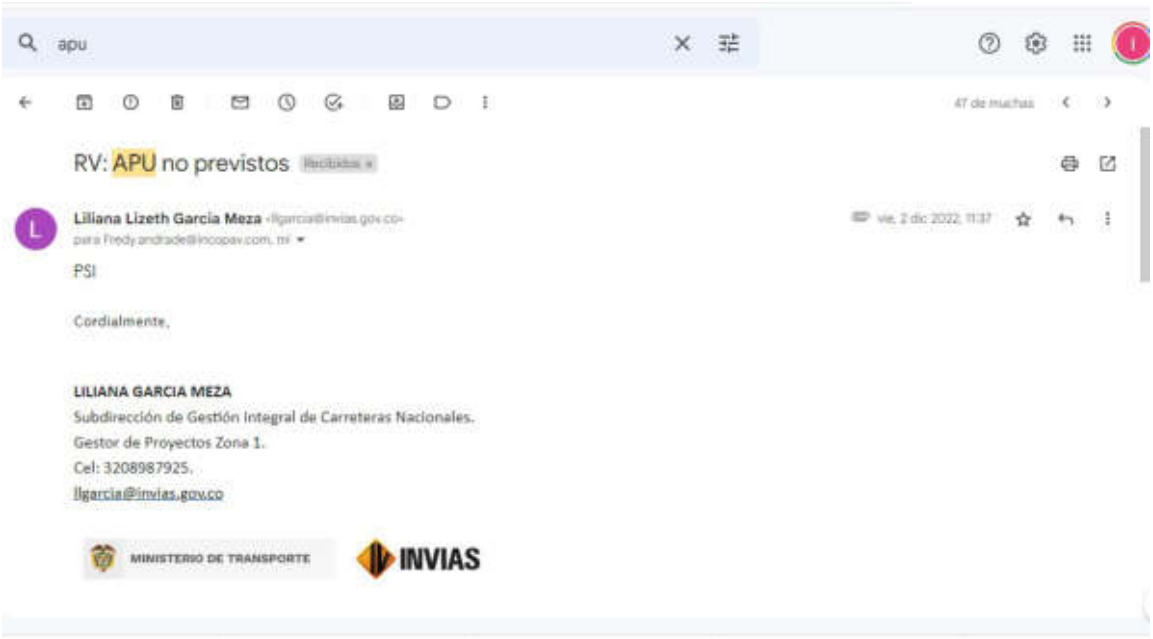

5. El 6 de diciembre la Interventoría mediante correo electrónico solicita la remisión de los APU'S de acuerdo a lo que se ha conversado en diferentes oportunidades.



6. El 14 de diciembre el contratista realiza la entrega de los APU's mediante oficio INC-INVIAS-2269-INT-132 RADICACION APUS.

43 de muchas

OFICIO INC-INVIAS-2269-INT-132 RADICACION APUS Recibidos ×

Bernardo Castañeda <bcastaneda@incopav.com>
para mí, Gustavo, Fernando, Licitaciones, GREYS

mié, 14 dic 2022, 20:27

Saludos Ing. William

Adjunto nos permitimos anexar el oficio del asunto con los anexos para su revisión.

Agradecemos su atención y quedamos atentos.

Bernardo Castañeda Moreno
Director de obra
INCOPAV S.A.
Cel. 314 4452266
Carrera 77 No. 128 A – 85
Teléfonos (57-1) 7428326
Bogotá-Colombia

www.incopav.com

Descripción: Descripción: Descripción: C:\Users\COORTIC\Pictures\INCOPAV-logo3.jpg

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
235.1	SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CEMENTO (INCLUYE SUMINISTRO DEL CEMEN		m3	

Página 1

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Carrotanque de agua(1000 Galones)		$ 70.000,00	20,000	$ 3.500,00
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton		$ 180.000,00	20,000	$ 9.000,00
Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton		$ 180.000,00	20,000	$ 9.000,00
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.		$ 140.000,00	20,000	$ 7.000,00
HERRAMIENTA MENOR (%)			2%	$ 48,56
			SUBTOTAL	$ 28.548,56

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Agua	L	25,00	$ 12,50	$ 312,50
Cemento hidraulico NTC 121 tipo UG	kg	63,60	$ 500,00	$ 31.800,00
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL	$ 32.112,50

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de material seleccionado para relleno	m3-km	1,30	5	6,500	$ 847,00	$ 5.505,50

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Oficial	$ 70.000,00	185	$ 129.500,00	160	$ 809,38
Obrero (2)	$ 70.000,00	185	$ 129.500,00	160	$ 809,38
Obrero (2)	$ 70.000,00	185	$ 129.500,00	160	$ 809,38
			Precio Unitario Total Aproximado al peso		$ 89.173,09

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
235.1	SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CEMENTO (INCLUYE SUMINISTRO DEL CEMENTO)		m3	
			Precio Unitario Total Aproximado al peso	$ 89.173,09

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
351.1	BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO 5% (INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO)		m3	

Página 1

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Carrotanque de agua(1000 Galones)		$ 70.000,00	20,000	$ 3.500,00
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 16 ton.		$ 180.000,00	20,000	$ 9.000,00
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.		$ 180.000,00	20,000	$ 9.000,00
Retroexcavadora sobre orega, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.		$ 140.000,00	20,000	$ 7.000,00
HERRAMIENTA MENOR (%)			5%	$ 288,37
			SUBTOTAL	$ 28.788,37

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Base granular Clase A	m3	1,30	$ 70.000,00	$ 91.000,00
Agua	L	24,00	$ 12,50	$ 300,00
Cemento hidraulico NTC 121 tipo UG	kg	90,00	$ 500,00	$ 45.000,00
				$ -
			SUBTOTAL	$ 136.300,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD - DISTANCIA	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de material de base	m3-km	1,30	41	53,30	$ 846,00	$ 45.091,80
Transporte de material seleccionado para relleno	m3-km	1,30	5	6,500	$ 847,00	$ 5.505,50
					SUBTOTAL	$ 50.597,30

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Oficial	$ 70.000,00	185	$ 129.500,00	160	$ 809,38
Obrero (2)	$ 70.000,00	185	$ 129.500,00	160	$ 809,38
Obrero (2)	$ 70.000,00	185	$ 129.500,00	160	$ 809,38
Topógrafo	$ 148.000,00	185	$ 273.800,00	160	$ 1.711,25
Cadeneros (2)	$ 141.833,00	185	$ 262.391,05	160	$ 1.639,94
			SUBTOTAL		$ 5.779,32
			Precio Unitario Total Aproximado al peso		$ 287.905,25

administracion@ingevalsas.com.co
interventoriasucrecordoba@gmail.com
Cl 38 No. 32-41 of 806 Ed. Parque Santander
Tel 6628119
Villavicencio -Meta

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
500.1.1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 ACELERADO A 7 DÍAS.(Incluye asero)		m3	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Arporzar manual		$ 1.900,00	1,875	$ 1.013,33
Cortadora de pavimento, Máxima profundidad de corte: 160 mm. Capacidad de disco: desde 12" hasta 18" de diámetro. Para operacional: 135 kg, 13.5 hp de		$ 17.000,00	1,875	$ 9.066,67
Formaleta metálica		$ 3.500,00	1,875	$ 1.866,67
Regla vibratoria de concreto, de longitud de 3 a 5 m, potencia de 6 a 9 HP		$ 13.800,00	1,875	$ 7.360,00
Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Manguera de 4 mt		$ 5.400,00	1,875	$ 2.880,00
HERRAMIENTA MENOR (%)			5%	$ 4.377,30
			SUBTOTAL	$ 26.563,97

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Barrar de transferencia de carga (1/2")	kg	3,528	$ 5.432,36	$ 19.163,56
Para juntar (11/4")	kg	48,726	$ 5.432,36	$ 264.697,65
Sella de poliuretano en cinta para juntar en pavimentar de concreto hidraulica.	m	1,808	$ 1.135,00	$ 2.052,08
Sella de silicona autonivelante	m	1,290	$ 8.174,00	$ 10.544,46
Antisol blanco (presentacion 20 kg)	kg	1,000	$ 10.739,00	$ 10.739,00
Concreto hidráulico para pavimento MR-42 acelerado a 7 dias	m3	1,010	$ 575.770,00	$ 581.527,70
				$ -
			SUBTOTAL	$ 888.724,45

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de concreto	m3-km	1	26	26,00	$ 846,00	$ 21.996,00
					SUBTOTAL	$ 21.996,00


IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Obrero (8)	########	185	$ 518.000,00	15	$ 34.533,33
Oficial	$ 70.000,00	185	$ 129.500,00	15	$ 8.633,33
Oficial	$ 70.000,00	185	$ 129.500,00	15	$ 8.633,33
Topógrafo	$ 148.000,00	185	$ 273.800,00	15	$ 18.253,33
Cadenero (2)	$ 141.833,00	185	$ 262.391,05	15	$ 17.492,74
				SUBTOTAL	$ 87.546,07
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.024.830,49
				Precio Unitario Total Aproximado al Peso	$ 1.332.279,63

Página 1

7. El 22 de diciembre, posterior a la revisión de la información entregada por el contratista, la interventoría emite el oficio CI-N°2263-2021-OFI N°. 201 con la revisión correspondiente, solicitando ajustar la mano de obra según los APU's del INVIAS

- ***Se elimine el cobro de la Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3, en el ítem de equipo ya que en base al APU del Invias al que ustedes hacen referencia no se relaciona este equipo.(Ver imagen 1)***
- ***Se entregaran memorias de cálculo y se entregaran cotizaciones faltantes***

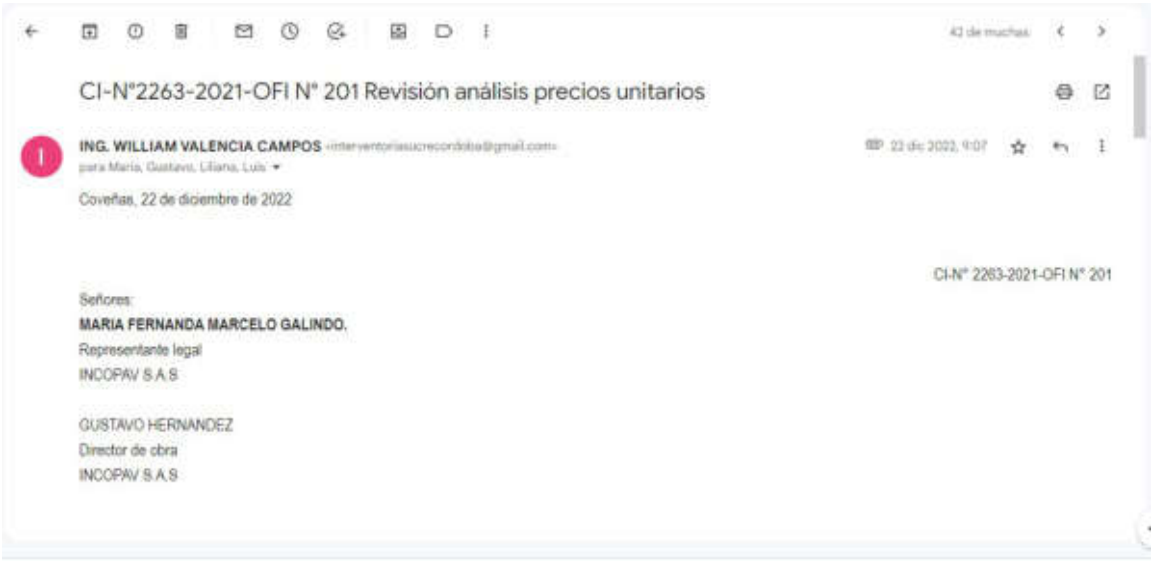

CI-N°2263-2021-OFI N° 201 Revisión análisis precios unitarios

ING. WILLIAM VALENCIA CAMPOS <interventoriasucrecordoba@gmail.com>
para María, Gustavo, Liliana, Luis

Coveñas, 22 de diciembre de 2022

CI-N° 2263-2021-OFI N° 201

Señores:
MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO.
Representante legal
INCOPAV S.A.S

GUSTAVO HERNANDEZ
Director de obra
INCOPAV S.A.S

8. El 23 de diciembre realiza un comité de seguimiento, respondiendo a lo solicitado por el ing. Luis Gonzales, en el cual hace recomendaciones para ajustar el precio según lo establecido por parte del INVIAS



RV: CI-N°2263-2021-OFI N° 201 Revisión análisis precios unitarios

Luis Miguel Gonzalez Ozuna <lmgonzalez@invias.gov.co>
para mi, mfmarcelo@incopav.com, ghernandez@incopav.com, Liliana

Cordial saludo,

En atención a este tema recomiendo nuevamente se realice mesa de trabajo conjunta entre Contratista e Interventoría, con el fin de que se avance con mayor celeridad con este tramite que debió haberse surtido hace dias.

Solicito a Interventoría Programar para mañana 23 dic comité de seguimiento entre las 9 y las 11 de la mañana con el fin de tratar este y otros temas.

Cordialmente,

LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA.
Profesional Especializado Grado 13
Instituto Nacional De Vías
Territorial Córdoba
Correo Electrónico: lmgonzalez@invias.gov.co

9. El 25 de diciembre del 2022, el contratista radica los APU's mediante oficio INC-INVIAS-2269-INT-138. Justificando las observaciones, sin embargo, no atiende lo correspondiente a los cambios solicitados por la interventoría.



INC-INVIAS-2269-INT-138 Respuesta oficio CI-N°2263-2021-OFI N° 201 Revisión análisis precios unitarios

Licitaciones Incopav <licitaciones@incopav.com>
para mí, GREYS, Bernardo, Freddy, Gustavo, Johan

INC-INVIAS-2269-INT-138

Bogotá D.C.,26 de diciembre 2022

Señor(es):
CLAUDIA MILENA TRUJILLO ANGEL
REPRESENTANTE LEGAL
INGEVAL S.A.S
Ciudad
Ref.: CONTRATO OBRA N°. 2269 DE 2021 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA".

Asunto: Respuesta oficio CI-N° 2263-2021- OFI N° 201- REVISION ANALISIS NO PREVISTOS

Cordial saludo,

235.1 SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CEMENTO (INCLUYE SUMINISTRO Del CEMENTO)

1.

En relación a este ítem solicitamos lo siguiente:

a. Se elimine el cobro de la Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3, en el ítem de equipo ya que en base al APU del Invias al que ustedes hacen referencia no se relaciona este equipo.(Ver imagen 1)

RESPUESTA:

De acuerdo a lo solicitado el equipo que se incluyo se estimo para la mezcla del material en sitio, a pesar de tomar un APU de referencia las actividades a realizar son diferentes a las estipuladas por lo que se requieren modificar los equipos y por eso como se puede verificar en obra la preparación del material y por las condiciones se requiere establecer modificaciones que se ajustan al caso particular del proyecto. Ya que según el manual de interventoría los APU publicados son de referencia mas no, su estructura es de total acogimiento por el contratista, por tal motivo para efectos de la actividad que se requiere en el caso puntual del proyecto, solicitamos a la interventoría reevalúe su concepto, puesto que como se ha evidenciado dentro del proceso constructivo se requiere este equipo para la

c. Se elimine en mano de obra topógrafo, cadeneros y dos obreros como lo indica el análisis de precios unitarios del Invias, se sugiere cobrar topógrafo y cadeneros este personal por administración.

RESPUESTA:

De acuerdo a lo solicitado aclaramos que el motivo de incluir estos cargos dentro de la actividad es debido a que dentro de los requisitos establecidos en los términos de condiciones no se solicitaron estos cargos, por lo que no es posible estimar estos costos dentro del desglose del A. Respecto a los obreros su inclusión se estima de acuerdo a que se requiere agilizar la ejecución de la actividad incluyendo la movilización y adición de cemento y garantizar un rendimiento adecuado para las necesidades contractuales. Adicionalmente aumentar el rendimiento diario y optimizar la ejecución del proyecto.

b. Se elimine el ítem de transporte de material seleccionado para relleno

RESPUESTA:

De acuerdo a lo solicitado se elimina el ítem de transporte de la actividad, ya que esta actividad se contemplaba para la movilización interna de material para su preparación, ya que se debe llevar al sitio donde se procede a añadir el material de fresado y la adición de cemento.

10. La interventoría informa la situación a la supervisión INVIAS, quien convoca a una mesa de trabajo para el 12 de enero del 2023, de la cual se acuerda una nueva entrega por parte del contratista.

11. El 16 de enero la interventoría mediante oficio CI-N°. 2263-2021-OFI N°. 222, recuerda al contratista el compromiso adquirido en la reunión del 12 de enero, debido al incumplimiento de este a la fecha en mención.



Entrega de APU no Previstos

ING. WILLIAM VALENCIA CAMPOS <interventoriasucrecordoba@gmail.com>
para Maria, Gustavo, Luis

Coveñas, 16 de Enero de 2023

CI-N° 2263-2021-OFI N° 222

Señores:

MARÍA FERNANDA MARCELO GALINDO
Representante legal
INCOPAV S.A.S


GUSTAVO HERNÁNDEZ
Director de obra
INCOPAV S.A.S


Ref.: CONTRATO OBRA N °. 2269 DE 2021 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CÓRDOBA"

Asunto: Solicitud Entrega APU no Previstos.

De acuerdo al comité realizado el 12 de Enero del 2023, me permito recordar el compromiso pactado en relación a la entrega de los análisis de precios unitarios no previstos, dado a que se había pactado la radicación de este al INVIAS el día de hoy 16 de Enero del 2023 y a la fecha se no se ha recibido respuesta por parte de INCOPAV S.A.S a esta interventoría de las observaciones realizadas en mesa de trabajo del

12. El 16 de enero el contratista hace entrega mediante oficio de los APU's solicitados, información que se complementa el 18 de enero mediante el oficio INC-INVIAS-2269-INT-152, emitiendo un nuevo alcance el 21 de enero del 2023 mediante oficio INC-INVIAS-2269-INT-138.

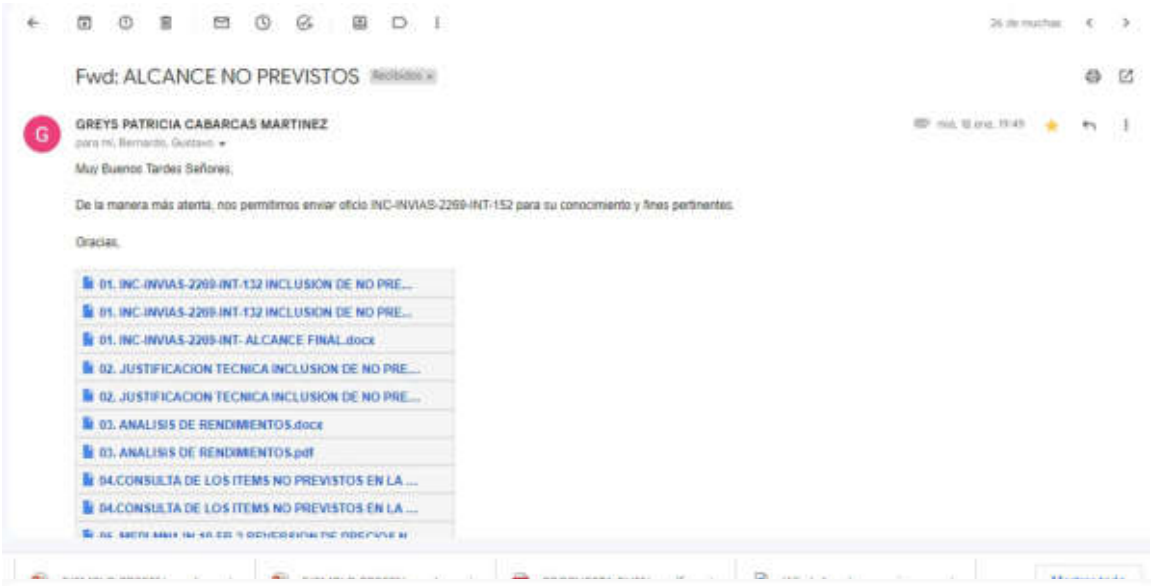
Fwd: ALCANCE NO PREVISTOS
GREYS PATRICIA CABARCAS MARTINEZ
Muy Buenos Tardes Señores,
De la manera más atenta, nos permitimos enviar oficio INC-INVIAS-2269-INT-152 para su conocimiento y fines pertinentes.
Gracias,
01. INC-INVIAS-2269-INT-132 INCLUSION DE NO PRE...
01. INC-INVIAS-2269-INT-132 INCLUSION DE NO PRE...
01. INC-INVIAS-2269-INT- ALCANCE FINAL.docx
02. JUSTIFICACION TECNICA INCLUSION DE NO PRE...
02. JUSTIFICACION TECNICA INCLUSION DE NO PRE...
03. ANALISIS DE RENDIMIENTOS.docx
03. ANALISIS DE RENDIMIENTOS.pdf
04.CONSULTA DE LOS ITEMS NO PREVISTOS EN LA ...
04.CONSULTA DE LOS ITEMS NO PREVISTOS EN LA ...

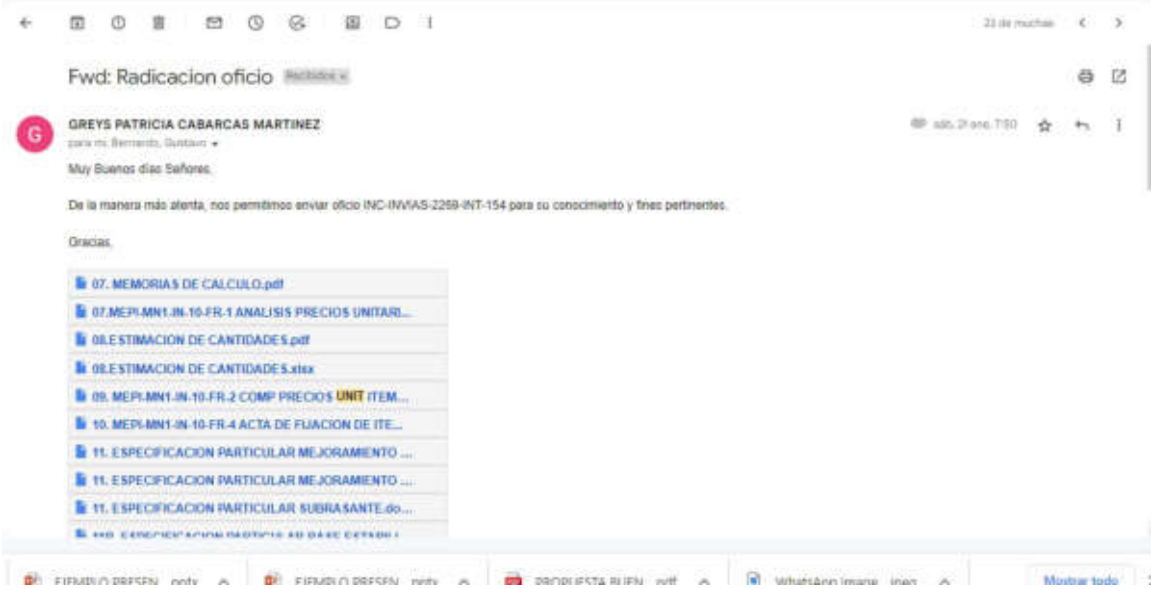
Fwd: Radicacion oficio
GREYS PATRICIA CABARCAS MARTINEZ
Muy Buenos días Señores,
De la manera más atenta, nos permitimos enviar oficio INC-INVIAS-2269-INT-154 para su conocimiento y fines pertinentes.
Gracias,
07. MEMORIAS DE CALCULO.pdf
07.MEPI-MN1-IN-10-FR-1 ANALISIS PRECIOS UNITARI...
08.ESTIMACION DE CANTIDADES.pdf
08.ESTIMACION DE CANTIDADES.xlsx
09. MEPI-MN1-IN-10-FR-2 COMP PRECIOS UNIT ITEM...
10. MEPI-MN1-IN-10-FR-4 ACTA DE FIJACION DE ITE...
11. ESPECIFICACION PARTICULAR MEJORAMIENTO ...
11. ESPECIFICACION PARTICULAR MEJORAMIENTO ...
11. ESPECIFICACION PARTICULAR SUBRASANTE.do...
Mostrar todo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
NP-001	MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE RECUPERACIÓN MEJORADA CON CEMENTO AL 4%		m3	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Carrotanque de agua(1000 Galones)		$ 70.000,00	16,000	$ 4.375,00
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton		$ 180.000,00	16,000	$ 11.250,00
Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton		$ 180.000,00	16,000	$ 11.250,00
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.		$ 140.000,00	16,000	$ 8.750,00
HERRAMIENTA MENOR (%)			5%	$ 101,17
			SUBTOTAL	$ 35.726,17

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Agua	L	25,00	$ 12,50	$ 312,50
Cemento hidraulico NTC 121 tipo UG	kg	81,64	$ 500,00	$ 40.820,00

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACION	JORNAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Oficial	$ 70.000,00	185	$ 129.500,00	128	$ 1.011,72
Obrero (2)	$ 70.000,00	185	$ 129.500,00	128	$ 1.011,72
				SUBTOTAL	$ 2.023,44
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 78.882,11

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	20%	$ 15.776,42
IMPREVISTOS	5%	$ 3.944,11
UTILIDAD	5%	$ 3.944,11
	SUBTOTAL	$ 23.664,63
	Precio Unitario Total Aproximado al peso	$ 102.546,74

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
NP-002	BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO 5% (INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO)		m3	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Carrotanque de agua(1000 Galones)		$ 70.000,00	25,000	$ 2.800,00
Motoniveladora potencia 215 HP, ancha de cuchilla 4,27 m, para 18 ton.		$ 180.000,00	25,000	$ 7.200,00
Vibrocompactador, potencia 153 HP, para 10 Ton.		$ 180.000,00	25,000	$ 7.200,00
HERRAMIENTA MENOR (%)			5%	$ 64,75
			SUBTOTAL	$ 17.264,75

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Base granular Clase A	m3	1,30	$ 70.000,00	$ 91.000,00
Agua	L	24,00	$ 12,50	$ 300,00
Cemento hidraulico NTC 121 tipo UG	kg	105,35	$ 500,00	$ 52.925,00
			SUBTOTAL	$ 144.225,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de material de base	m3-km	1,30	52	67,60	$ 846,00	$ 57.189,60
					SUBTOTAL	$ 57.189,60

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Oficial	$ 70.000,00	185	$ 129.500,00	200	$ 647,50
Obrero (2)	$ 70.000,00	185	$ 129.500,00	200	$ 647,50
				SUBTOTAL	$ 1.295,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 219.974,35

Página 1

administracion@ingevalsas.com.co
interventoriasucrecordoba@gmail.com
Cl 38 No. 32-41 of 806 Ed. Parque Santander
Tel 6628119
Villavicencio -Meta

NP-003	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 ACELERADO A 7 DÍAS.(Incluye acero)		m3	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Arporzar manual		$ 1.900,00	1,500	$ 1.266,67
Cortadora de pavimento, Máxima profundidad de corte: 160 mm. Capacidad de disco: desde 12" hasta 18" de diámetro. Para operacional: 135 kg, 13,5 hp de potencia		$ 17.000,00	1,500	$ 11.333,33
Formaleta metálica		$ 5.000,00	1,500	$ 3.333,33
Regla vibratoria de concreto, de longitud de 3 a 5 m, potencia de 6 a 9 HP		$ 13.800,00	1,500	$ 9.200,00
Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Manguera de 4 mt		$ 5.400,00	1,500	$ 3.600,00
HERRAMIENTA MENOR (%)			5%	$ 2.697,92
			SUBTOTAL	$ 31.431,25

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Barrar de transferencia de carga (1/2")	kg	3,528	$ 4.900,00	$ 17.285,57
Para juntar (11/4")	kg	48,726	$ 4.900,00	$ 238.757,83
Sello de poliuretano en cinta para juntar en pavimentar de concreto hidraulico.	m	1,808	$ 58.807,00	$ 106.323,06
Sello de silicona autonivelante	m	1,290	$ 6.691,00	$ 8.631,39
Antiral blanca (presentacion 20 kg)	kg	1,000	$ 10.739,00	$ 10.739,00
Concreto hidráulico para pavimento MR-42 acelerado a 7 dias	m3	1,050	$ 575.770,00	$ 604.558,50
				$ -
			SUBTOTAL	$ 986.295,35

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de concreto	m3-km	1	22	22,00	$ 846,00	$ 18.612,00
					SUBTOTAL	$ 18.612,00

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Obrero (8)	$ 280.000,00	185	$ 518.000,00	12	$ 43.166,67
Oficial	$ 70.000,00	185	$ 129.500,00	12	$ 10.791,67
			SUBTOTAL		$ 53.958,33
			TOTAL COSTO DIRECTO		$ 1.090.296,93
			Precio Unitario Total Aproximado al peso		$ 1.417.386,01

13. Al ver que el contratista se acoge medianamente a las observaciones de la interventoría se envían para su revisión los documentos correspondientes a la supervisión INVIAS el 28 de enero del 2023, derivando así, en la citación de una mesa técnica para la revisión de los mismos.



14. El 30 de enero se realiza revisión en de la información en la territorial Córdoba del INVIAS, con la presencia de la Supervisión, Contratista e Interventoría, de la cual, el contratista se

compromete a realizar la entrega de la información actualizada.



DT-COR 4345

Monteria, 31 de enero de 2023

Ing
WILLIAM VALENCIA CAMPOS
Director de interventoría
INGEVAL
3123045003
interventoriasucrecordoba@gmail.com
Coveñas - Sucre

Asunto: Respuesta a Entrada No. 7426 con Fecha 26/01/2023

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el oficio del asunto con numero radicado interno 7426 del 06 de enero de 2023 y una vez revisados los anexos correspondientes, se informa que no se continua con el tramite de aprobación en la Territorial ya que se encontraron algunas observaciones y errores que indican la necesidad de ajustar toda la documentación, por lo que se solicita adelantar las revisiones, ajustes y correcciones conforme fue tratado en mesa de trabajo realizada en la Territorial en el día 30 de enero de 2023 con el supervisor del contrato. Página 1 de 1

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

El avance ejecutado de la obra a la fecha del presente informe es del 3,71 % en relación a un avance programado del 4,58% (según reprogramación prorroga N°1), se presenta un atraso en obra del 0.87%.
El contratista se reprogramara dado al tiempo de prórroga.
El contratista lleva a cabo la reprogramación al plan de inversiones y a la programación de obra
La interventoría solicita al contratista realizar las respectivas correcciones para dar tramite a los APU no previstos con el fin de optimizar la ejecución de las actividades.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Informe Semanal - SE ANEXA FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/01/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: COVEÑAS-SABANETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA — SEMANA No.: 27 del 29/12/2022 al 5/01/2023 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. LILIANA LIZETH GARCIA MEZA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE 4978 ML DE VIA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
REHABILITACION DE LOS TRAMOS PR0+0000 AL PR1+0200 Y MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOS PR 2+0200 AL PR 2+0260, PR 2+0800 AL PR 3+0400, PR 2+0473 AL PR 3+0400, PRPR 2+0200 AL PR 2+0260, PR 2+0800 AL PR 3+0400, PR 2+0473 AL PR 3+0400, PR4+0500 AL PR 5+0200, (1.687 M) , PR 10+0400 AL PR 11+0206 PR 11+0206 AL PR 11+0708 , 11+0708 AL PR 12+0400 (2.000 M) , 4+0500 AL PR 5+0200, (1.687 M PR 10+0400 AL PR 11+0206 PR 11+0206 AL PR 11+0708 , 11+0708 AL PR 12+0400 (2.000 M)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	INCOPAV S.A.S NIT. 830.063.087-1		
INTEGRANTES:	INCOPAV S.A.S		
CONTRATO No.	2269 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 8.622.782.704,00
FECHA DE INICIO:	22/02/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 8.662.782.704,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	5/06/2023		$ 2.566.556.103,00
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	INGEVAL S.A.S. NIT. 822.004.859-1		
INTEGRANTES:	INGEVAL S.A.S.		
CONTRATO No.	2263 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 999.999.999,00
FECHA DE INICIO:	22/02/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 999.999.999,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	5/06/2023	VALOR ANTICIPO:	$ 252.400.840,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 8.622.782.704			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 0			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 8.622.782.704			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 999.999.999			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 0			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 999.999.999			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 7.114.919.471,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 234.611.639,00	3,30%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 219.429.251,00	3,08%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (15.182.388,00)	-0,21%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 0	0%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 234.611.639,00	3,30%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 219.429.251,00	3,08%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (15.182.388,00)	-0,21%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14.052.042	0,20%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 513.171,00	0,01%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 145613 de 31/12/2022
PERIODO FACTURADO: dic-22
VALOR FACTURA: $ 7.899.989,00

789,9989

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista entrego la reprogramacion actualizada según prorroga N° 1.

$ 120,00 318

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 999.999.999,00	100,00%
	$ 483.282.097,00	48,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 483.282.097,00	48,33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 483.282.097,00	48,33%
	$ 23.969.325,00	2,40%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 23.969.325,00	2,40%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 141899 DE 23/12/2022
PERIODO FACTURADO: dic-22
VALOR FACTURA: $ 36.635.070,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:La interventoria realiza la reprogramacion del plan de cargas según prorroga N° 1

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 2.562.251.103
Amortizado $	$ 103.253.080
Saldo $	$ 2.458.998.023

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 252.100.840
Amortizado $	$ 115.636.480
Saldo $	$ 136.464.360

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 3,30% — Avance o Atraso Físico % -0,21%
Meta Física Ejecutada % 3,08%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (3)	Total	%
*	EXPLANACIONES	KM	4,97	4,97		Prog					
						Ejec	300			498	
*	AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES	KM	4,97	4,97		Prog					
						Ejec					
*	PAVIMENTOS ASFALTICOS	KM	4,97	4,97		Prog					
						Ejec					
*	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	M3	4,97	4,97		Prog					
						Ejec					
	SEÑALIZACION Y SEGURARDAD	KM	70	70		Prog					
						Ejec					
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	KM	4,97	4,97		Prog					
						Ejec					
						Prog					
*						Ejec					
						Prog					
*						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: 0+0000 AL PR1+0200
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR2+200 AL PR2+260 ; PR2+0382 AL PR3+0400; PR4+0500 al PR5+0200
TRAMO Y/O SECTOR 3: +0400 AL PR12+0400
TRAMO Y/O SECTOR n:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Terminadora de Asfalto Finisher	1	
Compactador Neumático	1	1
Compactador de Rodillo	1	1
Compresor (barrido y soplado)	1	
Compresor con martillo	2	
Carrotanque de agua	1	
Carrotanque de asfalto	1	
Fresadora de pavimento	1	
Cortadora de pavimento	2	1
Cargador de potencia	2	
Volquetas	3	3
Mezcladora de concreto	2	
Vibrador de concreto	2	
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: km 5 via tolu viejo San Onofre	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:Triturados y pavimentos del caribe km 5 via tolu viejo San Onofre. aprobada para Mezcla Densa en Caliente

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: NO SE REQUIERE

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La interventoria solicito correcciones según observaciones del Invias el 30/11/2022

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	17	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 24

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza el levantamiento de actas de vecindad

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: NO SE REQUIEREN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El contratista lleva a cabo la ejecucion del item EXCAVACION MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN en el tramo numero 1 en las abscisas desde PR0+0170 al PR0+0250 con una profundidad de0,53 cm segun los estudios y diseños.Tambien se lleva a cabo esta actividad en las abscisas desde PR0+0266 al PR0+0300 con una profundidad de0,20 cm
El contratista de obra realiza la preparacion de la subrasante con cement en obra para la instaacion en el tramo 1.
Se realiza recorrido en el tramo 3 para verificar los sectores de bacheo y de instalacion de sobre carpeta
Se presenta fallo en PR 0+210 y hasta el PR 0+220. Se realiza retiro del fallo (0,53m *11m*3,37m)
Se inicia con corte en la carpeta asfaltica PR11+360 AL PR11+300
La comision topografica de la interventoria verifica los nivelesde excavacion y de instalacion de subrasante mejorada con cemento.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continua con corte de pavimento en el tramo 3
Se iniciara con demolicion y excavacion de pavimento de las abscisas PR0+020 AL PR0+060

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

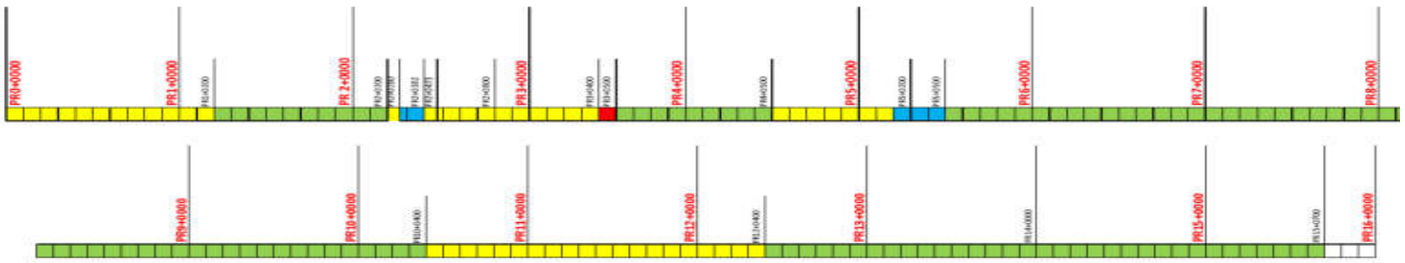

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



VERIFICACION DE EXCAVACIONES EN EL TRAMO PR0+0170 al PR0+0250



CARGUE MATERIAL SUBRASANTE PREPARADO PARA INSTALACION



VERIFICACION PREPARACION SUBRASANTE CON % CEMENTO SEGÚN ESTUDIOS APROBADOS EN CAMPO Y ACOPIO DE BASE

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
La interventoria realiza la solicitud de las correcciones del PAGA mediante oficio . El contratista realiza ajustes a la programaciondе obra El contratista realiza la entrega de la documentación de maquinaria. Se encuentravarios fallos generados por un material de relleno sobre una tuberia del alcantarillado	FIRMA NOMBRE: William valencia Campos Matrícula Profesional No.: 2520239413 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/01/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: COVEÑAS-SABANETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

SEMANA No.: 28 del 5/01/2023 al 12/01/2023 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. LILIANA LIZETH GARCIA MEZA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE 4978 ML DE VIA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

REHABILITACION DE LOS TRAMOS PR0+0000 AL PR1+0200 Y MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOS PR 2+0200 AL PR 2+0260, PR 2+0800 AL PR 3+0400, PR 2+0473 AL PR 3+0400, PRPR 2+0200 AL PR 2+0260, PR 2+0800 AL PR 3+0400, PR 2+0473 AL PR 3+0400, PR4+0500 AL PR 5+0200, (1.687 M) , PR 10+0400 AL PR 11+0206 PR 11+0206 AL PR 11+0708 , 11+0708 AL PR 12+0400 (2.000 M) , 4+0500 AL PR 5+0200, (1.687 M PR 10+0400 AL PR 11+0206 PR 11+0206 AL PR 11+0708 , 11+0708 AL PR 12+0400 (2.000 M)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	INCOPAV S.A.S NIT. 830.063.087-1		
INTEGRANTES:	INCOPAV S.A.S		
CONTRATO No.	2269 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 8.622.782.704,00
FECHA DE INICIO:	22/02/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 8.662.782.704,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	5/06/2023		$ 2.566.556.103,00
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	INGEVAL S.A.S. NIT. 822.004.859-1		
INTEGRANTES:	INGEVAL S.A.S.		
CONTRATO No.	2263 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 999.999.999,00
FECHA DE INICIO:	22/02/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 999.999.999,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	5/06/2023	VALOR ANTICIPO:	$ 252.400.840,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 8.622.782.704			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 0			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 8.622.782.704			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 999.999.999			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 0			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 999.999.999			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 7.114.919.471,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 264.998.035,00	3,72%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 223.068.823,23	3,14%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (41.929.211,77)	-0,59%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 0	0%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 264.998.035,00	3,72%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 223.068.823,23	3,14%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (41.929.211,77)	-0,59%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 38.981.290	0,55%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.639.572,23	0,05%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 145613 de 31/12/2022
PERIODO FACTURADO: dic-22
VALOR FACTURA: $ 7.899.989,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista entrego la reprogramacion actualizada según prorroga N° 1.

$ 120,00 318

789,9989

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 999.999.999,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 497.567.583,00	49,76%
	$ 497.567.583,00	49,76%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.237.163,00	2,52%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 23.969.325,00	2,40%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 141899 DE 23/12/2022
PERIODO FACTURADO: dic-22
VALOR FACTURA: $ 36.635.070,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:La interventoria realiza la reprogramacion del plan de cargas según prorroga N° 1

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 2.562.251.103
Amortizado $	$ 103.253.080
Saldo $	$ 2.458.998.023

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 252.100.840
Amortizado $	$ 115.636.480
Saldo $	$ 136.464.360

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 3,72%
Meta Física Ejecutada % 3,14%
Avance o Atraso Físico % -0,59%

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada: Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (3)	Total	%
*	EXPLANACIONES	KM	4,97	4,97		Prog					
						Ejec	300			498	
*	AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES	KM	4,97	4,97		Prog					
						Ejec					
*	PAVIMENTOS ASFALTICOS	KM	4,97	4,97		Prog					
						Ejec					
*	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	M3	4,97	4,97		Prog					
						Ejec					
	SEÑALIZACION Y SEGURARDAD	KM	70	70		Prog					
						Ejec					
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	KM	4,97	4,97		Prog					
						Ejec					
						Prog					
*						Ejec					
						Prog					
*						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:)+0000 AL PR1+0200
TRAMO Y/O SECTOR 3: +0400 AL PR12+0400
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR2+200 AL PR2+260 ; PR2+0382 AL PR3+0400; PR4+0500 al PR5+0200
TRAMO Y/O SECTOR n:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Terminadora de Asfalto Finisher	1	
Compactador Neumático	1	1
Compactador de Rodillo	1	1
Compresor (barrido y soplado)	1	
Compresor con martillo	2	
Carrotanque de agua	1	
Carrotanque de asfalto	1	
Fresadora de pavimento	1	
Cortadora de pavimento	2	1
Cargador de potencia	2	
Volquetas	3	3
Mezcladora de concreto	2	
Vibrador de concreto	2	
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	km 5 via tolu viejo San Onofre	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:Triturados y pavimentos del caribe km 5 via tolu viejo San Onofre. aprobada para Mezcla Densa en Caliente

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A X
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: NO SE REQUIERE

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La interventoria solicito correcciones según observaciones del Invias el 30/11/2022

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	17	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 24

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza el levantamiento de actas de vecindad

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: NO SE REQUIEREN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se presenta fallo en PR 0+210 y hasta el PR 0+220. Se realiza retiro del fallo (0,53m *11m*3,37m)
Se inicia continua con el corte en la carpeta asfaltica PR11+360 AL PR11+300
La comision topografica de la interventoria verifica los nivelesde excavacion y de instalacion de subrasante mejorada con cemento.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continua con corte de pavimento en el tramo 3
Se iniciara con demolicion y excavacion de pavimento de las abscisas PR0+020 AL PR0+060

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

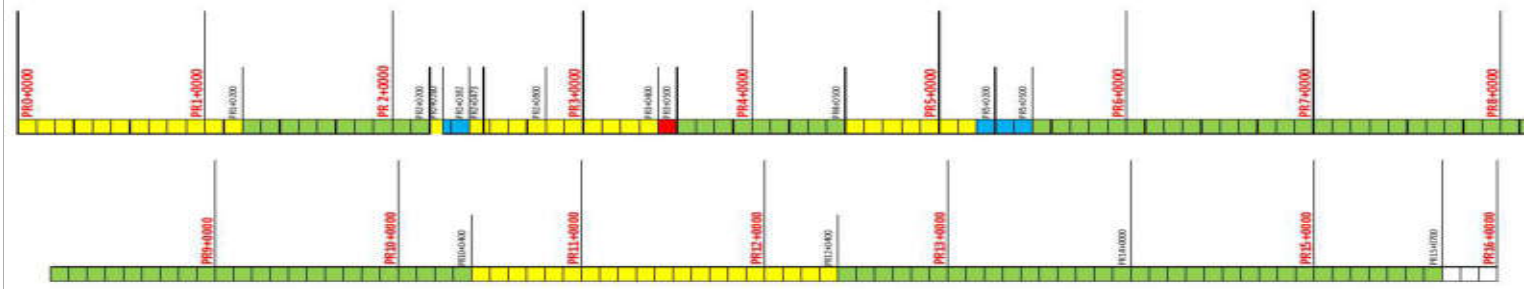

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



VERIFICACION DE EXCAVACIONES EN EL TRAMO PR0+0170 al PR0+0250



Verificacion de la interventoria a la implementacion del PMT y a las excavaciones por parte de la comision topografica



Levantamiento de actas de vecindad, Vereda el Mamey

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La interventoria realiza la solicitud de las correcciones del PAGA mediante oficio .
El contratista realiza ajustes a la programaciónde obra
El contratista realiza la entrega de la documentación de maquinaria.
Se encuentravarios fallos generados por un material de relleno sobre una tuberia del alcantarillado

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: William valencia Campos
Matrícula Profesional No.: 2520239413 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/01/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: COVEÑAS-SABANETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

SEMANA No.: 29 del 12/01/2023 al 19/01/2023 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. LILIANA LIZETH GARCIA MEZA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE 4978 ML DE VIA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

REHABILITACION DE LOS TRAMOS PR0+0000 AL PR1+0200 Y MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOS PR 2+0200 AL PR 2+0260, PR 2+0800 AL PR 3+0400, PR 2+0473 AL PR 3+0400, PRPR 2+0200 AL PR 2+0260, PR 2+0800 AL PR 3+0400, PR 2+0473 AL PR 3+0400, PR4+0500 AL PR 5+0200, (1.687 M) , PR 10+0400 AL PR 11+0206 PR 11+0206 AL PR 11+0708 , 11+0708 AL PR 12+0400 (2.000 M) , 4+0500 AL PR 5+0200, (1.687 M PR 10+0400 AL PR 11+0206 PR 11+0206 AL PR 11+0708 , 11+0708 AL PR 12+0400 (2.000 M)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	INCOPAV S.A.S NIT. 830.063.087-1		
INTEGRANTES:	INCOPAV S.A.S		
CONTRATO No.	2269 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 8.622.782.704,00
FECHA DE INICIO:	22/02/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 8.662.782.704,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	5/06/2023		$ 2.566.556.103,00
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	INGEVAL S.A.S. NIT. 822.004.859-1		
INTEGRANTES:	INGEVAL S.A.S.		
CONTRATO No.	2263 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 999.999.999,00
FECHA DE INICIO:	22/02/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 999.999.999,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	5/06/2023	VALOR ANTICIPO:	$ 252.400.840,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 8.622.782.704			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 0			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 8.622.782.704			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 999.999.999			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 0			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 999.999.999			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 7.114.919.471,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 295.384.430,08	4,15%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 228.655.032,00	3,21%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (66.729.398,08)	-0,94%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 0	0%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 295.384.430,08	4,15%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 228.655.032,00	3,21%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (66.729.398,08)	-0,94%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 64.886.522	0,91%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.586.209,55	0,08%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 145613 de 31/12/2022
PERIODO FACTURADO: dic-22
VALOR FACTURA: $ 7.899.989,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista entrego la reprogramacion actualizada según prorroga N° 1.

$ 120,00 318

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 999.999.999,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 483.282.097,00	48,33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 483.282.097,00	48,33%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 23.969.325,00	2,40%
	$ 23.969.325,00	2,40%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 141899 DE 23/12/2022
PERIODO FACTURADO: dic-22
VALOR FACTURA: $ 36.635.070,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:La interventoria realiza la reprogramacion del plan de cargas según prorroga N° 1

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 2.562.251.103
Amortizado $	$ 103.253.080
Saldo $	$ 2.458.998.023

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 252.100.840
Amortizado $	$ 115.636.480
Saldo $	$ 136.464.360

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 4,15%
Meta Física Ejecutada % 3,21%
Avance o Atraso Físico % -0,94%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (3)	Total	%
*	EXPLANACIONES	KM	4,97	4,97		Prog					
						Ejec	300		348,3	648	
*	AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES	KM	4,97	4,97		Prog					
						Ejec					
*	PAVIMENTOS ASFALTICOS	KM	4,97	4,97		Prog					
						Ejec					
*	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	M3	4,97	4,97		Prog					
						Ejec					
	SEÑALIZACION Y SEGURARDAD	KM	70	70		Prog					
						Ejec					
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	KM	4,97	4,97		Prog					
						Ejec					
						Prog					
*						Ejec					
						Prog					
*						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR0+0000 AL PR1+0200
TRAMO Y/O SECTOR 3: PR10+0400 AL PR12+0400
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR2+200 AL PR2+260 ; PR2+0382 AL PR3+0400; PR4+0500 al PR5+0200
TRAMO Y/O SECTOR n:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Terminadora de Asfalto Finisher	1	
Compactador Neumático	1	1
Compactador de Rodillo	1	1
Compresor (barrido y soplado)	1	
Compresor con martillo	2	
Carrotanque de agua	1	
Carrotanque de asfalto	1	
Fresadora de pavimento	1	
Cortadora de pavimento	2	1
Cargador de potencia	2	
Volquetas	3	3
Mezcladora de concreto	2	
Vibrador de concreto	2	
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN: km 5 via tolu viejo San Onofre	PERMISO MINERO: SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES:Triturados y pavimentos del caribe km 5 via tolu viejo San Onofre. aprobada para Mezcla Densa en Caliente

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A X
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: NO SE REQUIERE

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La interventoria solicito correcciones según observaciones del Invias el 30/11/2022

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	17	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 28

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza el levantamiento de actas de vecindad

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: NO SE REQUIEREN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realiza compactacion de la subrasante mejorada y estabilizada con cemento y el contratista de obra procede a realizar la toma de las densidades entre las abscisas PR0+020 al PR0+0180. La densidades tomadas en campo no cumplen a lo cual el contratista expresa que es por causa del mal calculo del CBR y que procedera a la revision de los resultados
El contratista realiza la revision del proctor y comunica a la interventoria que se evidencia un error en el proctor el contratistta emite concepto tecnico con la correccion del proctor, posterior a esto se corrigen los calculos de las densidades las cuales dan cumplimiento a la norma INVIAS
Se dio inicio al tratamiento del fallo ubicado entre las abscisas PR0+0190 al PR0+300 con adicion de la primera cpa de zahorra mejorada con cemento al 4%
Se inicia la instalacion de base granular mejorada con cemento en el sector PR0+180 al PR0+130 como tramo de prueba.
Se identifica que en el tramo PR2+200 AL PR2+260 no presenta daños que requieran una intervencion.
Se realiza levantamiento de las actas de vecindad en el sector del Mamey
Se realiza comite en obra donde participa el INVIAS INGEVAL SAS E INCOPAV SAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

EXCAVACIÓN PARA REPARACION DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS Y DE LAS SUBYACENTES
INSTALACION DE BASE GRANULAR ESTABILIADA CON CEMENTO AL 5%

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

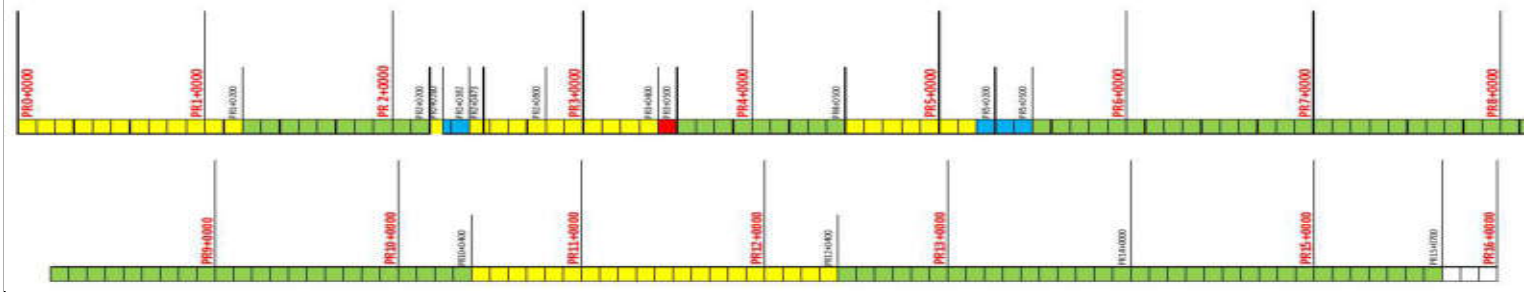

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



SEGUIMIENTO A LA TOMA DE DENSIDADES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA
SEGUIMIENTO AL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL TRAMO 2



PREPARACION SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 3%



COMITÉ TECNICO EN OBRA REALIZADO EL 19 DE ENERO DEL 2023
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LLEVADO A CABO POR LA INTERVENTORIA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se encontraron pozos de insoeccion de alcantarillado y se han averiado ya que se enciontraban enterrados en la zona de trabajo y no se tenia conocimiento de su exixtencia
Se encontro una tuberia del alcantarillado la cual es la que genero el fallo encontrado a partir de la abscisa PR0+190

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: William valencia Campos
Matrícula Profesional No.: 2520239413 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/02/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: COVEÑAS-SABANETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA — SEMANA No.: 31 del 26/01/2023 al 2/02/2023 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. LILIANA LIZETH GARCIA MEZA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE 4978 ML DE VIA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
REHABILITACION DE LOS TRAMOS PR0+0000 AL PR1+0200 Y MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOS PR 2+0200 AL PR 2+0260, PR 2+0800 AL PR 3+0400, PR 2+0473 AL PR 3+0400, PRPR 2+0200 AL PR 2+0260, PR 2+0800 AL PR 3+0400, PR 2+0473 AL PR 3+0400, PR4+0500 AL PR 5+0200, (1.687 M) , PR 10+0400 AL PR 11+0206 PR 11+0206 AL PR 11+0708 , 11+0708 AL PR 12+0400 (2.000 M) , 4+0500 AL PR 5+0200, (1.687 M PR 10+0400 AL PR 11+0206 PR 11+0206 AL PR 11+0708 , 11+0708 AL PR 12+0400 (2.000 M)

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	INCOPAV S.A.S NIT. 830.063.087-1			INTERVENTOR:	INGEVAL S.A.S. NIT. 822.004.859-1		
INTEGRANTES:	INCOPAV S.A.S			INTEGRANTES:	INGEVAL S.A.S.		
CONTRATO No.	2269 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 8.622.782.704,00	CONTRATO No.	2263 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 999.999.999,00
FECHA DE INICIO:	22/02/2022	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	22/02/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 8.662.782.704,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022	VALOR ACUMULADO:	$ 999.999.999,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	5/06/2023		$ 2.566.556.103,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	5/06/2023	VALOR ANTICIPO:	$ 252.400.840,00
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 8.622.782.704			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 0			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 8.622.782.704			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 999.999.999			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 0			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 999.999.999			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 7.114.919.471,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 325.770.825,00	4,58%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 264.130.590,93	3,71%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (61.640.234,07)	-0,87%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 0	0%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 325.770.825,00	4,58%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 264.130.590,93	3,71%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (61.640.234,07)	-0,87%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 90.791.754	1,28%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.586.209,55	0,08%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 145613 de 31/12/2022
PERIODO FACTURADO: dic-22
VALOR FACTURA: $ 7.899.989,00
789,9989

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contratista entrego la reprogramacion actualizada según prorroga N° 1.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 999.999.999,00	100,00%
	$ 573.279.072,00	57,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 483.282.097,00	48,33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 573.279.072,00	57,33%
	$ 23.385.626,00	2,34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 19.745.730,00	1,97%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 141899 DE 23/12/2022
PERIODO FACTURADO: dic-22
VALOR FACTURA: $ 36.635.070,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:La interventoria realiza la reprogramacion del plan de cargas según prorroga N° 1

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 2.562.251.103
Amortizado $	$ 103.253.080
Saldo $	$ 2.458.998.023

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 252.100.840
Amortizado $	$ 115.636.480
Saldo $	$ 136.464.360

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 4,58% — Avance o Atraso Físico % -0,87%
Meta Física Ejecutada % 3,71%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (3)	Total	%
*	EXPLANACIONES	KM	4,97	4,97		Prog					
						Ejec	300		640,05	940	
*	AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES	KM	4,97	4,97		Prog					
						Ejec					
*	PAVIMENTOS ASFALTICOS	KM	4,97	4,97		Prog					
						Ejec					
*	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	M3	4,97	4,97		Prog					
						Ejec					
	SEÑALIZACION Y SEGURARDAD	KM	70	70		Prog					
						Ejec					
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	KM	4,97	4,97		Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Terminadora de Asfalto Finisher	1	
Compactador Neumático	1	1
Compactador de Rodillo	1	1
Compresor (barrido y soplado)	1	
Compresor con martillo	2	
Carrotanque de agua	1	
Carrotanque de asfalto	1	
Fresadora de pavimento	1	
Cortadora de pavimento	2	1
Cargador de potencia	2	
Volquetas	3	3
Mezcladora de concreto	2	
Vibrador de concreto	2	
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR0+0000 AL PR1+0200
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR2+200 AL PR2+260 ; PR2+0382 AL PR3+0400; PR4+0500 al PR5+0200
TRAMO Y/O SECTOR 3: PR10+0400 AL PR12+0400
TRAMO Y/O SECTOR n:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: km 5 via tolu viejo San Onofre	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:Triturados y pavimentos del caribe km 5 via tolu viejo San Onofre. aprobada para Mezcla Densa en Caliente

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: NO SE REQUIERE

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La interventoria solicito correcciones según observaciones del Invias el 30/11/2022

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	17	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 28

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza el levantamiento de actas de vecindad

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: NO SE REQUIEREN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se icontinua con la EXCAVACIÓN PARA REPARACION DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS Y DE LAS SUBYACENTES
Se continua con la instalacion de geocelda y geotextil para el tratamiento del fallo ubicado en el PRO+0190 al PR0+290
Se realiza reunion de veduriaa ciudadana
Se realiza comite tecnico en la oficina del Invias territorial Cordoba con el fin de llevar a cabo la revision de los analisis de precios unitarios no previstos

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

EXCAVACIÓN PARA REPARACION DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS Y DE LAS SUBYACENTES
INSTALACION DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5%

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalacion de geomalla en el sector 1 de acuerdo a la alternativa para manejo de faalo en las abscisas PR0+020 al PR0+190



La intervent

La interventoria realiza seguimiento a la topografia y a la señalizacion del contratista de obra



+

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se verifica el cumplimiento de los compromisos pactados en el acta de reunion del 19/01/2023

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: William valencia Campos
Matrícula Profesional No.: 2520239413 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra - SE ANEXA FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-4.

administracion@ingevalsas.com.co
interventoriasucrecordoba@gmail.com
Cl 38 No. 32-41 of 806 Ed. Parque Santander
Tel 6628119
Villavicencio -Meta

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/01/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Gestion Integral de Carreteras Nacionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CORDOBA**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ene-23 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) DE LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

CONTRATO No. 2269 DE 2021 **CONTRATISTA:** INCOPAV S.A

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2263 de 2021 **INTERVENTORÍA:** INGEVAL S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RETRO ORUGAS	VOLVO/ EC210B	1,8m3	PR 0+ 0000 AL PR 1 + 0200	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A
RETRO CARGADOR	CAT /2013	,96 m3	PR 0+ 0000 AL PR 12 + 0400	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A
VIBROCOMPACTADOR	BOMAG/2007	7,2 Ton	PR 0+ 0000 AL PR 1 + 0200	I	I	I	I	A	I	A	I	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	R	R	R	R	R	R	R
MOTONIVELADORA	FIATALLIS FG-85	2.817m	PR 0+ 0000 AL PR 1 + 0200	I	I	I	I	A	I	A	I	I	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I
VOLQUETA BWC 949	INTERNATIONAL	14 m3	PR 0+ 0000 AL PR 12 + 0400	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A
VOLQUETA BWC 947	INTERNATIONAL	14 m3	PR 0+ 0000 AL PR 12 + 0400	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A
VOLQUETA UPO 342	MACK / 2007	14 m3	PR 0+ 0000 AL PR 12 + 0400	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A
CAMION 3 TON	JMC	N/A	PR 0+ 0000 AL PR 12 + 0400	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A
CAMIONETA 4X4	NISSAN	N/A	PR 0+ 0000 AL PR 12 + 0400	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A
ESTACION TOTAL	SOUTH/ 2021	N/A	PR 0+ 0000 AL PR 12 + 0400	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A
NIVEL AUTOMATICO	SOUTH/ 2022	N/A	PR 0+ 0000 AL PR 12 + 0400	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A
CORTADORA ASFALTO	ASTROEQUIPOS	N/A	PR 0+ 0000 AL PR 12 + 0400	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
TOTAL ACTIVO				0	0	7	7	9	7	9	0	0	8	9	9	8	7	0	9	9	9	9	9	9	0	6	6	8	8	8	8	0	6	7
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL INACTIVO				9	9	2	2	0	2	0	9	9	1	0	0	1	2	9	0	0	0	0	0	0	9	3	3	0	0	0	0	8	2	1

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	279	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	191	68%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	7	3%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	81	29%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: **BERNARDO CASTAÑEDA MORENO**
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 2520255035 CND

Firma

Nombre: **ALLAN FERNANDO MONROY DUQUE**
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-255957 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra - SE ANEXA FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1
FECHA	5/01/2023 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 2269-2021 **CONTRATISTA:** INCOPAV S.A

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-23 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA COVEÑAS -SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2263-2021 **INTERVENTOR:** INGEVAL S.A.S

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFASUCRE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indica Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	GUSTAVO ANTONIO HERNANDEZ VEGA	19269097	DIRECTOR DE OBRA	$ 4.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INCOPAV S.A	$ 4.000.000		V	SANITAS			ALFA	0			N.A	N.A	PENSIONADO
2	GREYS PATRICIA CABARCAS MARTINEZ	23217745	ADMINISTRADORA DE OBRA	$ 2.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INCOPAV S.A	$ 2.500.000		V	CAJACOPI			PORVENIR	0			N.A	N.A	
3	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	1123411378	TRABAJADORA SOCIAL	$ 3.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INCOPAV S.A	$ 2.400.000		V	NUEVA EPS			PORVENIR	0			N.A	N.A	
4	BERNARDO CASTAÑEDA MORENO	79456242	ING. RESIDENTE DE OBRA	$ 7.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INCOPAV S.A	$ 7.000.000		V	SANITAS			COLPENSIONES	0			N.A	N.A	
5	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	11052258	ESP. AMBIENTAL Y SST	$ 3.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INCOPAV S.A	$ 2.400.000		V	NUEVA EPS			COLPENSIONES	0			N.A	N.A	
6	SANDRA MILENA CASALLAS	52745769	AUXILIAR DE OFICINA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INCOPAV S.A	$ 1.160.000		V	SANITAS			COLPENSIONES	0			N.A	N.A	
7	HENRY ROJAS MARTINEZ	4164835	CONDUCTOR	$ 1.010.656	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INCOPAV S.A	$ 1.010.656		V	MEDIMAS EPS			PORVENIR	0			N.A	N.A	
8	HEIDY BETANCOURT DIAZ	52451460	PROF. EN GESTION DE CALIDAD	$ 3.250.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INCOPAV S.A	$ 3.250.000		V	SURA			PORVENIR	0			N.A	N.A	
9	ADRIAN FERNANDO ORTIZ VILLERO	1193110426	INSPECTOR HSE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INCOPAV S.A	$ 1.343.333		V	NUEVA EPS			PORVENIR	0			N.A	N.A	
10	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	45561087	INGENIERO AUX	$ 2.500.000	X X X X X	INCOPAV S.A	$ 2.500.000		V	NUEVA EPS			PORVENIR	0			N.A	N.A	
11	WILLIAN LUNA URANGO	92450611	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INCOPAV S.A	$ 1.198.667		V	MUTUAL SER			PROTECCIÓN	0			N.A	N.A	
12	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	1131107444	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INCOPAV S.A	$ 1.198.667		V	SALUD TOTAL			PORVENIR	0			N.A	N.A	
13	ARNULFO NAVARRO PADILLA	92519256	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INCOPAV S.A	$ 1.198.667		V	CAJACOPI			PORVENIR	0			N.A	N.A	
14	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	1131107117	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INCOPAV S.A	$ 1.198.667		V	SURA			COLPENSIONES	0			N.A	N.A	
15	LORELEY LADEUS MENDOZA	64820236	GUIA VIAL	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INCOPAV S.A	$ 1.198.667		V	CAJACOPI			COLPENSIONES	0			N.A	N.A	
16	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	4020770	OP. VIBROCOMPACTADOR	$ 1.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INCOPAV S.A	$ 1.550.000		V	CAJACOPI			COLFONDOS	0			N.A	N.A	
17	DIEGO ANDRES RESTREPO MESTRA	1003342991	OP. MAQ. PESADA	$ 1.600.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INCOPAV S.A	$ 1.653.333		V	MUTUAL SER			PORVENIR	0			N.A	N.A	
18	JOSE AURELIO DIAZ VELASQUEZ	74856439	INSPECTOR CIVIL	$ 1.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INCOPAV S.A	$ 1.756.667		V	FAMILIAR DE COLOMBIA			PROTECCIÓN	0			N.A	N.A	
19	NELLYS DEL SOCORRO ESPITIA RUIZ	26116999	AUX SERVICIOS GENERALES	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INCOPAV S.A	$ 1.160.000		V	NUEVA EPS			PORVENIR	0			N.A	N.A	
20	JORGE LUIS CASTRO LADEUTH	15617821	CONDUCTOR	$ 1.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INCOPAV S.A	$ 1.240.000		V	FOSYGA			PENSION MILITAR	0			N.A	N.A	PENSIONADO
21	LUIS MARIA VEGA GODOY	5935279	OP. MAQ. PESADA	$ 1.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INCOPAV S.A	$ 1.756.667		V	FAMISANAR			PORVENIR	0			N.A	N.A	
22	JUAN GABRIEL FONSECA SOTELO	79915484	CONDUCTOR DE VOLQUETA	$ 1.650.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INCOPAV S.A	$ 1.650.000		V	FAMISANAR			COLPENSIONES	0			N.A	N.A	
23	YESID TORRES FLORES	13525591	CONDUCTOR DE VOLQUETA	$ 1.650.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INCOPAV S.A	$ 1.650.000		V	COOSALUD			COLFONDOS	0			N.A	N.A	
24	FRANCISCO CASTRO	4052850	CONDUCTOR DE VOLQUETA	$ 1.650.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INCOPAV S.A	$ 1.650.000		V	NUEVA EPS			COLPENSIONES	0			N.A	N.A	
25	IVAN ANDRES PESTANA RAMOS	1065373311	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INCOPAV S.A	$ 1.121.333		V	CAJACOPI			PORVENIR				N.A	N.A	
26	WILSON JOSE PESTANA AVILA	15704543	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INCOPAV S.A	$ 1.121.333		V	NUEVA EPS			PORVENIR				N.A	N.A	
27	CATIA MILENA HERRERA RAMOS	1065374919	GUIA VIAL	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INCOPAV S.A	$ 1.121.333		V	NUEVA EPS			PORVENIR				N.A	N.A	
28	JENNYFER QUIÑONES PESTANA	1065372819	GUIA VIAL	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INCOPAV S.A	$ 1.121.333		V	NUEVA EPS			PORVENIR				N.A	N.A	
29	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	3804393	OP. MAQ. PESADA	$ 1.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INCOPAV S.A	$ 1.260.000		V	MUTUAL SER			PROTECCIÓN				N.A	N.A	
30	JUAN PABLO RODRIGUEZ RINCON	11202089	OP. MAQ. PESADA	$ 2.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INCOPAV S.A	$ 1.100.000		V	SALUD TOTAL			PORVENIR				N.A	N.A	
31	CHRISTIAN BERNARDO GIL ALVARADO	1049629878	GERENTE DE PROYECTOS	$ 1.160.000	X	INCOPAV S.A	$ 38.667		V	SANITAS			PORVENIR				N.A	N.A	
32																			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (") a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: GUSTAVO HERNANDEZ VEGA
Director de Obra
Matricula Profesional No.: 25202-18375 CND

Firma
Nombre:WILLIAM VALENCIA CAMPOS
Director de Interventoría
Matricula Profesional No.:2520239413 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra - SE ANEXA FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-8

administracion@ingevalsas.com.co
interventoriasucrecordoba@gmail.com
Cl 38 No. 32-41 of 806 Ed. Parque Santander
Tel 6628119
Villavicencio -Meta

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 14/02/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 2269 DE 2021

CONTRATISTA: INCOPAV S.A.S

MES INFORME MENSUAL: 1 al 31 de enero

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y RAHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 2263 DE 2021

INTERVENTOR: INGEVAL S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
31/07/2022	79822	C-2401-0600-82-0-2401020-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 4,132,163,526	$ 2,707,686,834
		C-2401-0600-82-0-2401023-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 4,490,619,178	$ 3,156,236,260
			TOTAL			$ 8,622,782,704	$ 5,863,923,094

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 8,622,782,704.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
INC-22-001	ANTICIPO	mayo-2022	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	2,562,251,103.00	No 79882 del 31/07/2022	8,622,782,704.00	8,622,782,704.00	NA			
1	Parcial	febrero-2022	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	2,562,251,103.00	No 79882 del 31/07/2022	6,060,531,601.00	8,622,782,704.00	NA			
2	Parcial	marzo-2022	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	2,562,251,103.00	No 79882 del 31/07/2022	6,060,531,601.00	8,622,782,704.00	NA			
3	Parcial	abril-2022	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	2,562,251,103.00	No 79882 del 31/07/2022	6,060,531,601.00	8,622,782,704.00	NA			
4	Parcial	mayo-2022	$ 13,579,477.00	$ 99,235.00	$ 13,678,712.00	$ 4,073,843.00	9,604,869.00	2,558,177,260.00	No 79882 del 31/07/2022	6,050,926,732.00	8,609,103,992.00				Tramite
4	Ajuste Definitiva	mayo-2022	$ 1,043,881.00	$ 7,628.00	$ 1,051,509.00	$ 0.00	1,051,509.00	2,558,177,260.00	No 79882 del 31/07/2022	6,049,875,223.00	8,608,052,483.00				Tramite
5	Parcial	Junio de 2022	$ 63,291,776.00	$ 462,517.00	$ 63,754,293.00	$ 18,987,533.00	44,766,760.00	2,539,189,727.00	No 79882 del 31/07/2022	6,005,108,463.00	8,544,298,190.00				Tramite
5	Ajuste Definitiva	Junio de 2022	$ 3,844,789.00	$ 28,097.00	$ 3,872,886.00	$ 0.00	3,872,886.00	2,539,189,727.00	No 79882 del 31/07/2022	6,001,235,577.00	8,540,425,304.00				Tramite
6	Parcial	julio-2022	$ 130,612,287.00	$ 954,474.00	$ 131,566,761.00	$ 39,183,686.00	92,383,075.00	2,500,006,041.00	No 79882 del 31/07/2022	5,908,852,502.00	8,408,858,543.00				Tramite
6	Ajuste Definitiva	julio-2022	$ 10,040,428.00	$ 73,372.00	$ 10,113,800.00	$ 0.00	10,113,800.00	2,500,006,041.00	No 79882 del 31/07/2022	5,898,738,702.00	8,398,744,743.00				Tramite
7	Parcial	octubre-2022	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	-	2,500,006,041.00	No 79882 del 31/07/2022	5,898,738,702.00	8,398,744,743.00				Tramite
8	Parcial	noviembre-2022	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	-	2,500,006,041.00	No 79882 del 31/07/2022	5,898,738,702.00	8,398,744,743.00				Tramite
9	Parcial	diciembre-2022	$ 11,169,099.00	$ 81,620.00	$ 11,250,719.00	$ 3,350,730.00	7,899,989.00	2,496,655,311.00	No 79882 del 31/07/2022	5,890,838,713.00	8,387,494,024.00				Tramite
9	Ajuste Definitiva	diciembre-2022	$ 723,993.00	$ 5,291.00	$ 729,284.00	$ 0.00	729,284.00	2,496,655,311.00	No 79882 del 31/07/2022	5,890,109,429.00	8,386,764,740.00				Tramite
10	Parcial	diciembre-2022	$ 37,022,552.00	$ 270,549.00	$ 37,293,101.00	$ 11,106,766.00	26,186,335.00	2,485,548,545.00	No 79882 del 31/07/2022	5,863,923,094.00	8,349,471,639.00				Tramite
	Totales		$ 271,328,282.00	$ 1,982,783.00	$ 273,311,065.00	$ 76,702,558.00	$ 196,608,507.00	$ 2,485,548,545.00		$ 5,863,923,094.00	$ 8,349,471,639.00				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

CONCEPTO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* OBRAS	$ 255,675,191.00	$ 1,868,396.00	**$ 257,543,587.00**
* PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y/O AJUSTES (INCLUYE POSIBLES OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) (ACTA DE AJUSTES DE JULIO DEL 2022)	$ 15,653,091.00	$ 114,388.00	**$ 15,767,479.00**
* PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24X7	$ -	$ -	**$ -**
* VALOR BASICO REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ -	$ -	**$ -**
* COSTOS DIRECTOS PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.	$ -	$ -	**$ -**
VALOR TOTAL	**$ 271,328,282.00**	**$ 1,982,784.00**	**$ 273,311,066.00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: GUSTAVO HERNANDEZ VEGA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 2520218375 CND

Firma

Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520239413 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5 Estado General del Tiempo - SE ANEXA FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-10

administracion@ingevalsas.com.co
interventoriasucrecordoba@gmail.com
Cl 38 No. 32-41 of 806 Ed. Parque Santander
Tel 6628119
Villavicencio -Meta

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/01/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CORDOBA**

CONTRATO DE OBRA No: 2269 DE 2021 **CONTRATISTA:** INCOPAV S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01/01/2023 AL 31/01/2023 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVENAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2263 DE 2021 **INTERVENTOR:** INGEVAL S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	24	21	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	742
Lluvias moderadas											1																					1
Lluvias intensas											1		3																			4
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre: BERNARDO CASTAÑEDA MORENO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No. 25202-55035 CND

Firma

Nombre: ALLAN FERNANDO MONROY DUQUE
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-255957 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio - MEPI-MN1-IN-15-FR-11: En el presente periodo no se realizaron ensayos de laboratorio.

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra - SE ANEXA FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 8

FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	23 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 2269 DE 2021 **CONTRATISTA:** INCOPAV S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO Y RAHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA.

FECHA DE INICIO: 22/02/2022
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2022
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 05 DE JUNIO DE 2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 8,622,782,704.00
VALOR ACUMULADO: $ 8,622,782,704.00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 33,320,000.00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 33,320,000.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2263 DE 2021 **INTERVENTOR:** INGEVAL S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 862,278,270.40	29/12/2021	Nota de Vigencia: Hasta la liquidación del Contrato.
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30%	$ 2,566,556,103.00	29/12/2021	Nota de Vigencia: Hasta la liquidación del Contrato.
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 1,724,556,540.80	29/12/2021	31/7/2025
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	$ 9,996,000.00	Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.	Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 2,586,834,811.20	Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.	Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 54509
Certificado de modificación o anexo No.: Endoso No. 0 del 03/01/2022
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 25/02/2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5%	$ 454,263,000.00	29/12/2021	31/7/2022

FECHA 31 (Día) 1 (Mes) 23 (Año)

Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 16366 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: Endoso No. 0 del 03/01/2022

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 25/02/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N/A **PRÓRROGA No.:** N/A **MODIFICACIÓN No.:** N/A **SUSPENSIÓN No.:** N/A

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 862,278,270.40	29 12 2021	Nota de Vigencia: Hasta la liquidación del Contrato.
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30%	$ 2,566,556,103.00	29 12 2021	Nota de Vigencia: Hasta la liquidación del Contrato.
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 1,724,556,540.80	29 12 2021	31 7 2025
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	$ 9,996,000.00	Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.	Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 2,586,834,811.20	Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.	Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 54509

Certificado de modificación o anexo No.: Endoso No. 1 del 08/02/2022

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 25/02/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N/A **PRÓRROGA No.:** N/A **MODIFICACIÓN No.:** N/A **SUSPENSIÓN No.:** N/A

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 862,278,270.40	29 12 2021	Nota de Vigencia: Hasta la liquidación del Contrato.
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30%	$ 2,566,556,103.00	29 12 2021	Nota de Vigencia: Hasta la liquidación del Contrato.
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 1,724,556,540.80	29 12 2021	31 7 2025

Calidad de Estudios y Diseños	N/A	$ 9,996,000.00	Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.	Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 2,586,834,811.20	Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.	Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 54509

Certificado de modificación o anexo No.: Endoso No. 2 del 14/02/2022

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 25/02/2022

ADICIONAL No.: N/A **PRÓRROGA No.:** N/A **MODIFICACIÓN No.:** N/A **SUSPENSIÓN No.:** N/A

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 862,278,270.40	29 12 2021	Nota de Vigencia: Hasta la liquidación del Contrato.
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30%	$ 2,566,556,103.00	29 12 2021	Nota de Vigencia: Hasta la liquidación del Contrato.
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 1,724,556,540.80	29 12 2021	31 7 2025
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	$ 9,996,000.00	Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.	Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 2,586,834,811.20	Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.	Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 54509

Certificado de modificación o anexo No.: Endoso No. 3 del 24/02/2022

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 25/02/2022

ADICIONAL No.: N/A **PRÓRROGA No.:** N/A **MODIFICACIÓN No.:** N/A **SUSPENSIÓN No.:** N/A

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 862,278,270.40	29 12 2021	Nota de Vigencia: Hasta la liquidación del Contrato.
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30%	$ 2,566,556,103.00	29 12 2021	Nota de Vigencia: Hasta la liquidación del Contrato.
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 1,724,556,540.80	29 12 2021	31 7 2025

Calidad de Estudios y Diseños	N/A	$ 9,996,000.00	Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.	Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 2,586,834,811.20	Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.	Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 54509

Certificado de modificación o anexo No.: Endoso No. 4 del 10/11/2022

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 25/02/2022

ADICIONAL No.: N/A **PRÓRROGA No.:** N/A **MODIFICACIÓN No.:** N/A **SUSPENSIÓN No.:** N/A

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 862,278,270.40	29 12 2021	Nota de Vigencia: Hasta la liquidación del Contrato.
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30%	$ 2,566,556,103.00	29 12 2021	Nota de Vigencia: Hasta la liquidación del Contrato.
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 1,724,556,540.80	29 12 2021	31 7 2025
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	$ 9,996,000.00	Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.	Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 2,586,834,811.20	Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.	Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 54509

Certificado de modificación o anexo No.: Endoso No. 5 del 15/11/2022

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 25/02/2022

ADICIONAL No.: N/A **PRÓRROGA No.:** N/A **MODIFICACIÓN No.:** N/A **SUSPENSIÓN No.:** N/A

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 862,278,270.40	29 12 2021	Nota de Vigencia: Hasta la liquidación del Contrato.
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30%	$ 2,566,556,103.00	29 12 2021	Nota de Vigencia: Hasta la liquidación del Contrato.
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 1,724,556,540.80	29 12 2021	31 7 2025

Calidad de Estudios y Diseños	N/A	$ 9,996,000.00	Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.	Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 2,586,834,811.20	Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.	Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 54509

Certificado de modificación o anexo No.: Endoso No. 6 del 02/12/2022

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 25/02/2022

ADICIONAL No.: N/A **PRÓRROGA No.:** N/A **MODIFICACIÓN No.:** N/A **SUSPENSIÓN No.:** N/A

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 862,278,270.40	29 12 2021	Nota de Vigencia: Hasta la liquidación del Contrato.
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30%	$ 2,566,556,103.00	29 12 2021	Nota de Vigencia: Hasta la liquidación del Contrato.
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 1,724,556,540.80	29 12 2021	31 7 2025
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	$ 9,996,000.00	Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.	Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 2,586,834,811.20	Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.	Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 54509

Certificado de modificación o anexo No.: Endoso No. 7 del 13/12/2022

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 25/02/2022

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N/A **PRÓRROGA No.:** N/A **MODIFICACIÓN No.:** N/A **SUSPENSIÓN No.:** N/A

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta

FECHA 31 (Día) 1 (Mes) 23 (Año)

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5%	$ 454,263,000.00	29	12	2021	5	12	2022
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 16366 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No. Endoso No. 1 del 08/02/2022

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 25/02/2022

ADICIONAL No.: N/A **PRÓRROGA No.:** N/A **MODIFICACIÓN No.:** N/A **SUSPENSIÓN No.:** N/A

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5%	$ 454,263,000.00	29	12	2021	5	12	2022
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 16366 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No. Endoso No. 2 del 14/02/2022

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 25/02/2022

ADICIONAL No.: N/A **PRÓRROGA No.:** N/A **MODIFICACIÓN No.:** N/A **SUSPENSIÓN No.:** N/A

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5%	$ 454,263,000.00	29	12	2021	5	12	2022
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 16366 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No. Endoso No. 3 del 24/02/2022

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 25/02/2022

ADICIONAL No.: N/A **PRÓRROGA No.:** N/A **MODIFICACIÓN No.:** N/A **SUSPENSIÓN No.:** N/A

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5%	$ 454,263,000.00	29	12	2021	5	12	2022
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 16366 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No. Endoso No. 4 del 10/11/2022

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 25/02/2022

ADICIONAL No.: N/A **PRÓRROGA No.:** N/A **MODIFICACIÓN No.:** N/A **SUSPENSIÓN No.:** N/A

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5%	$ 454,263,000.00	29	12	2021	5	12	2022
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 16366 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No. Endoso No. 5 del 15/11/2022

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 25/02/2022

ADICIONAL No.: N/A **PRÓRROGA No.:** N/A **MODIFICACIÓN No.:** N/A **SUSPENSIÓN No.:** N/A

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5%	$ 454,263,000.00	29	12	2021	5	12	2022
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 16366 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No. Endoso No. 6 del 02/12/2022

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 25/02/2022

ADICIONAL No.: N/A **PRÓRROGA No.:** N/A **MODIFICACIÓN No.:** N/A **SUSPENSIÓN No.:** N/A

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5%	$ 454,263,000.00	29	12	2021	5	12	2022
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 16366 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No. Endoso No. 7 del 13/12/2022

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 25/02/2022

FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	23 (Año)

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-39413CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
INCOPAV S A	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	54509 / 7

CR 77 128 A 85
BOGOTÁ, D.C.
BOGOTA
NIT: 8300630871 Teléf. 7428326

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

BOGOTÁ, D.C., 13/12/2022.

VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 07/12/2022,
VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/06/2028.

NUMERO DE FACTURA	05 - 0054509 / 007

ASEGURADO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

CALLE 25G NO. 73B-90
BOGOTÁ, D.C.
BOGOTA
NIT: 8002158072 Teléf. 7056000

BENEFICIARIO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

CALLE 25G NO. 73B-90
BOGOTÁ, D.C.
BOGOTA
NIT: 8002158072 Teléf. 7056000

MODIFICACION CON VALOR

CODIGO DE VERIFICACION :

050005450900071BOG202212131411273

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICIÓN	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 3.370.178,00	COP 10.000,00	COP 642.234,00	COP 4.022.412,00	12/01/2023

INTERMEDIARIOS :
AGENCIA DE SEGUROS GUIBBONS LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 600502

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 27072021-1347-P-05-CUES06-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN
PRESIDENTE
Firma Autorizada

Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO
Fecha: 2022.11.23 17:12:58 -05'00'
EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 27072021-1347-NTP-05-CUES05-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
INCOPAV S A	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	54509 / 7
CR 77 128 A 85 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 13/12/2022. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 07/12/2022, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/06/2028.	
NIT: 8300630871 Teléf. 7428326	NUMERO DE FACTURA	05 - 0054509 / 007

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN PRORROGA No. 01 DE 2022 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0006 EMITIDO EN FECHA 02/12/2022 Y SEGUN ACTA DE SUSPENSION No. 1 DE FECHA 15/07/2022, EL ACTA AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 1, ACTA AMPLIACION 2 A LA SUSPENSION 1, ACTA SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0003 EMITIDO EN FECHA 24/02/2022 Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 22/02/2022 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0002 EMITIDO EN FECHA 14/02/2022 Y SEGUN AJUSTE AMPARO DE SALARIOS SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 08/02/2022 Y SEGUN MEMORANDO NO SPSC5344 SE INCLUYE COBERTURA/S DE LA POLIZA.

GARANTIZAR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 2269 DE 2021 CUYO OBJETO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

LA GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL CONTRATANTE.

LA GARANTIA DE ESTABILIDAD TENDRA UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL CONTRATANTE

SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ---------- COP 862.278.270,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 29/12/2021, hasta las 0 hs del 05/12/2023
Prima de la Cobertura : COP 566.978,00

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ---------- COP 2.566.556.103,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 29/12/2021, hasta las 0 hs del 05/12/2023
Prima de la Cobertura : COP 1.687.599,00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 1.724.556.541,00

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 27072021-1347-NTP-05-CUES05-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
INCOPAV S A	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	54509 / 7
CR 77 128 A 85 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 13/12/2022. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 07/12/2022, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/06/2028.	
NIT: 8300630871 Teléf. 7428326	NUMERO DE FACTURA	05 - 0054509 / 007

CARATULA

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 29/12/2021, hasta las 0 hs del 05/06/2026
Prima de la Cobertura : COP 1.115.056,00

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ---------- COP 2.586.834.811,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/06/2023, hasta las 0 hs del 05/06/2028
Prima de la Cobertura : COP 541,00

CALIDAD DEL SERVICIO ---------- COP 9.996.000,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/06/2023, hasta las 0 hs del 05/06/2028
Prima de la Cobertura : COP 4,00

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 27072021-1347-NTP-05-CUES05-000I

COMPROBANTE DE PAGO

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA

NIT: 900.814.916-1

No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

TOMADOR	INCOPAV S A	Identificación	NIT: 8300630871
POLIZA DE SEGURO DE	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	PÓLIZA / ENDOSO	54509 / 7

Referencia de Pago	050054509007
Valor Total a Pagar: $	4.022.412,00
Fecha límite de pago	12/01/2023

Para efectuar su pago utilice nuestra cuenta de ahorros 049 250 012 del Banco de Bogotá

- CLIENTE -

COMPROBANTE DE PAGO

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA

NIT: 900.814.916-1

No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

TOMADOR	INCOPAV S A	Identificación	NIT: 8300630871
POLIZA DE SEGURO DE	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	PÓLIZA / ENDOSO	54509 / 7

Detalle del Pago en Cheque		
Código Banco	Cheque N°	Valor $

Referencia de Pago	050054509007
Valor Total a Pagar: $	4.022.412,00
Fecha límite de pago	12/01/2023

Total medios de pago	Valor $
Efectivo	
Cheques	

(415)7709998724754(8020)050054509007(3902)0000040224120 0(96)20230112

- BANCO -

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Disfransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co ***www.berkley.com.co***

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
INCOPAV S A	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	54509 / 7

CR 77 128 A 85
BOGOTÁ, D.C.
BOGOTA
NIT: 8300630871 Teléf. 7428326

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

BOGOTÁ, D.C., 13/12/2022.

VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 07/12/2022,
VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/06/2028.

NUMERO DE FACTURA	05 - 0054509 / 007

ASEGURADO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

CALLE 25G NO. 73B-90
BOGOTÁ, D.C.
BOGOTA
NIT: 8002158072 Teléf. 7056000

BENEFICIARIO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

CALLE 25G NO. 73B-90
BOGOTÁ, D.C.
BOGOTA
NIT: 8002158072 Teléf. 7056000

MODIFICACION CON VALOR

CODIGO DE VERIFICACION :

050005450900071BOG202212131411273

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICIÓN	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 3.370.178,00	COP 10.000,00	COP 642.234,00	COP 4.022.412,00	12/01/2023

INTERMEDIARIOS :
AGENCIA DE SEGUROS GUIBBONS LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 600502

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 27072021-1347-P-05-CUES06-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN
PRESIDENTE
Firma Autorizada

Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO
Fecha: 2022.11.23 17:12:58 -05'00'
EL TOMADOR

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
INCOPAV S A	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	54509 / 7
CR 77 128 A 85 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 13/12/2022. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 07/12/2022, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/06/2028.	
NIT: 8300630871 Teléf. 7428326	NUMERO DE FACTURA	05 - 0054509 / 007

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN PRORROGA No. 01 DE 2022 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0006 EMITIDO EN FECHA 02/12/2022 Y SEGUN ACTA DE SUSPENSION No. 1 DE FECHA 15/07/2022, EL ACTA AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 1, ACTA AMPLIACION 2 A LA SUSPENSION 1, ACTA SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0003 EMITIDO EN FECHA 24/02/2022 Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 22/02/2022 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0002 EMITIDO EN FECHA 14/02/2022 Y SEGUN AJUSTE AMPARO DE SALARIOS SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 08/02/2022 Y SEGUN MEMORANDO NO SPSC5344 SE INCLUYE COBERTURA/S DE LA POLIZA.

GARANTIZAR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 2269 DE 2021 CUYO OBJETO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

LA GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL CONTRATANTE.

LA GARANTIA DE ESTABILIDAD TENDRA UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL CONTRATANTE

SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ---------- COP 862.278.270,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 29/12/2021, hasta las 0 hs del 05/12/2023
Prima de la Cobertura : COP 566.978,00

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ---------- COP 2.566.556.103,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 29/12/2021, hasta las 0 hs del 05/12/2023
Prima de la Cobertura : COP 1.687.599,00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 1.724.556.541,00

CONTINUA

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
INCOPAV S A	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	54509 / 7
CR 77 128 A 85 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 13/12/2022. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 07/12/2022, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/06/2028.	
NIT: 8300630871 Teléf. 7428326	NUMERO DE FACTURA	05 - 0054509 / 007

CARATULA

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 29/12/2021, hasta las 0 hs del 05/06/2026
Prima de la Cobertura : COP 1.115.056,00

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ---------- COP 2.586.834.811,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/06/2023, hasta las 0 hs del 05/06/2028
Prima de la Cobertura : COP 541,00

CALIDAD DEL SERVICIO ---------- COP 9.996.000,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/06/2023, hasta las 0 hs del 05/06/2028
Prima de la Cobertura : COP 4,00

COMPROBANTE DE PAGO

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA

NIT: 900.814.916-1

No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

TOMADOR	INCOPAV S A	Identificación	NIT: 8300630871
POLIZA DE SEGURO DE	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	PÓLIZA / ENDOSO	54509 / 7

Referencia de Pago	050054509007
Valor Total a Pagar: $	4.022.412,00
Fecha límite de pago	12/01/2023

Para efectuar su pago utilice nuestra cuenta de ahorros 049 250 012 del Banco de Bogotá

- CLIENTE -

COMPROBANTE DE PAGO

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA

NIT: 900.814.916-1

No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511. No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

TOMADOR	INCOPAV S A	Identificación	NIT: 8300630871
POLIZA DE SEGURO DE	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	PÓLIZA / ENDOSO	54509 / 7

Detalle del Pago en Cheque		
Código Banco	Cheque N°	Valor $

Referencia de Pago	050054509007
Valor Total a Pagar: $	4.022.412,00
Fecha límite de pago	12/01/2023

Total medios de pago	Valor $
Efectivo	
Cheques	

(415)7709998724754(8020)050054509007(3902)0000040224120(96)20230112

- BANCO -

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

Berkley International Seguros Colombia S.A NIT 900.814.916-1

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Disfransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co **www.berkley.com.co**

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra - MEPI-MN-1IN-15-FR-14. N/A

administracion@ingevalsas.com.co
interventoriasucrecordoba@gmail.com
Cl 38 No. 32-41 of 806 Ed. Parque Santander
Tel 6628119
Villavicencio -Meta

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPIMIN-IN-11-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 31/12/31-1-23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 2289 DE 2021 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 9505CD02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CÓRDOBA.

CONTRATISTA: INCOPAV S.A.S

FECHA DE INICIO: 22/12/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** HASTA EL 31 DE JULIO **FECHA DE VENCIMIENTO:** HASTA EL 05 DE JUNIO DE 2023 (Incluir prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2283-2021 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: INGEVAL S.A.S

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ...X... NO ..... APROBADO: SI ...X... NO ..... VERSIÓN No. ...1... FECHA DE VERSIÓN: 6/03/2022

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI X NO .....
PRESENTO INFORME DE AUDITORIA: SI ..... NO X

No. DE AUDITORIAS PROGRAMADAS: 0 FECHA ULTIMA AUDITORIA: N/A
No. DE AUDITORIAS REALIZADAS: 0 FECHA PROXIMA AUDITORIA: abr-23

OBSERVACIONES:
Debido a las suspensiones y reinicio del contrato, se debe reprogramar el plan de auditorias a partir del mes de enero de 2023

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ...X... NO ..... APROBADO: SI ...X... NO ..... FECHA DE APROBACIÓN: DIC 29-2022

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: ...14... No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES: ...14...

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ...X... NO .....

OBSERVACIONES:
En el mes de Diciembre de 2022, se realizaron caracterizacion de los materiales a emplear en el proyecto

El plan de inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecuta.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y a la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:
No se elaboraron reportes de No conformidad, ya que estamos en el proceso de selección de fuentes de materiales

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos pendientes de atención: 0
No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0
No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES:
No se presentan quejas y reclamos asociados al proyecto o al contratista INCOPAV S.A.S

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

FECHA 31/12/21-1-23 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

Título Indicador de Gestión:	Valor del El mes	Comentarios sobre indicador de gestión (Anexar formula y consideraciones en la definición del El)
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	N/A	% Que otorga el cliente o el arrojado tra una encuesta de satisfacción
AVANCE DE OBRA	100.0%	% de obra ejecutada / %de obra programada
ACPM	N/A	ACPM CERRADAS / TOTAL DE ACPM
CUMPLIMIENTO PLAN DE CAPACITACIÓN	N/A	No se programaron capacitaciones en el periodo

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:
Durante el periodo no se adelantaron encuestas de satisfacción del cliente, ya que no está programado realizar dicha encuesta, debido a que el avance del proyecto en este caso es igual al (3,58%) un el acumulado.

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	ESTACIÓN TOTAL	SOUTH	NR= 1341348	9/12/2022	9/12/2022 No 100	9/06/2022	Ninguno

OBSERVACIONES:
No se realizaron ensayos de laboratorio en campo porque no hubo actividades que lo requirieran, los ensayos de caracterización son realizados en el laboratorio certificado.
Se adjunta el certificado de calibración de la estación total que se compro en el mes de diciembre año 2022.

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el interventor debe iniciar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: GUSTAVO HERNANDEZ
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.: 252021837S CND

Firma
Nombre: HEIDY BETANCOURT DIAZ
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.: 2520213430S CND

Firma
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 252023041J CND

Firma
Nombre: JAIME ROBINSZON VARGAS
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2523826639 CND

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del Área.
Copia: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

4.9 Otros documentos seguimiento mensual

4.9.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo - SE ANEXA FORMATO MEPI-MN-IN-2-FR-1 - MEPI-MN-IN-2-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
		VERSIÓN	1 de 1
		PÁGINA	1

FECHA: 23/02/2022
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 2269 DE 2021 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** INCOPAV S.A.

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2263 DE 2021 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** INGEVAL S.A.S

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	Compra equipos	$ 150.000.000,00	$ 200.000.000,00	$ 34.337.665,45		$ 384.337.665,45	15%
2	Compra de Materiales	$ 480.000.000,00	$ 673.012.996,35			$ 1.153.012.996,35	45%
3	Transporte de equipos o materiales	$ 200.000.000,00	$ 200.000.000,00	$ 112.450.220,60		$ 512.450.220,60	20%
4	Mano de obra no calificada	$ 20.000.000,00	$ 150.000.000,00	$ 200.000.000,00	$ 142.450.220,60	$ 512.450.220,60	20%
TOTAL						$ 2.562.251.103,00	100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
MARIA FERNANDA MARCELO
Representante Legal
Contratista: INCOPAV S.A.

Firma:
CLAUDIA MILENA TRUJILLO ANGEL
Representante Legal
Interventor: INGEVAL SAS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 28/02/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 4 **MES:** FEBRERO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO**

CONTRATO DE OBRA No. 2269 DE 2021 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. 3/01/7453 **DE** 2022 ENTIDAD FINANCIERA: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 256126533 **BANCO** BANCO DE OCCIDENTE SUCURSAL: BOGOTA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 30 %

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: $ 2,562,251,103.00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MANTENIMIENTO Y RAHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA.

CONTRATISTA: INCOPAV SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2263 DE 2021 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: INGEVAL SAS

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
FACTURA	MM-14	3-ene-23	MM ULTRA SERVICES SAS	$ 245,000,000.00	1	Compra o arriendo de equipos
CUENTA DE COBRO	00-1	22-jul-22	INCOPAV SAS	$ 80,000,000.00	2	Compra de Materiales
FACTURA	FP0004	19-dic-22	KOLCEM SAS	$ 48,739,149.00	2	Compra de Materiales
FACTURA	00-8	20-dic-22	AGREGADOS Y CANTERAS DEL NORTE SAS	$ 17,416,320.00	2	Compra de Materiales
FACTURA	00-2	20-dic-22	TRITURADOS Y PAVIMENTOS DEL CARIBE SAS	$ 400,000,000.00	2	Compra de Materiales
FACTURA	1202	3-ene-23	AGREGADOS Y CANTERAS DEL NORTE SAS	$ 54,426,000.00	2	Compra de Materiales
FACTURA	17	20-ene-23	CONCRETOS DE LORICA SAS	$ 250,000,000.00	2	Compra de Materiales
FACTURA	4	20-ene-23	TECNOLOGIA DE MATERIALES COLOMBIA SAS	$ 11,444,328.00	2	Compra de Materiales
FACTURA	50462-V7T5	20-ene-23	GEOMATRIX SAS	$ 3,847,184.00	2	Compra de Materiales
FACTURA	001	11-ago-22	INVERSIONES MG IGENIEROS SAS	$ 130,000,000.00	3	Transporte de equipos o materiales
CUENTA DE COBRO	004	12-ago-22	HERNAN JOSE CHICA BENAVIDEZ	$ 3,431,750.00	3	Transporte de equipos o materiales
FACTURA	FP155	20-dic-22	INVERSIONES MG INGENIEROS SAS	$ 106,472,880.00	3	Transporte de equipos o materiales
FACTURA	070	20-ene-23	CERAMICAS DE SUCRE SAS	$ 2,510,080.00	3	Transporte de equipos o materiales
CUENTA DE COBRO	00-2	22-jul-22	INCOPAV SAS	$ 19,306,176.00	4	Mano de obra no calificada
CUENTA DE COBRO	00-3	12-ago-22	INCOPAV SAS	$ 2,938,652.00	4	Mano de obra no calificada
CUENTA DE COBRO	00-4	4-ene-23	INCOPAV SAS	$ 12,847,065.00	4	Mano de obra no calificada
CUENTA DE COBRO	00-5	3-ene-23	INCOPAV SAS	$ 7,297,300.00	4	Mano de obra no calificada
FACTURA	1005	14-feb-23	MAQUISTORE SAS	$ 11,641,382.00	1	Compra o arriendo de equipos
CUENTA DE COBRO	20111	14-feb-23	BRAND CENTER SAS	$ 1,209,040.00	1	Compra o arriendo de equipos
CUENTA DE COBRO	00-5	2-feb-23	TECNOLOGIA DE MATERIALES COLOMBIA SAS	$ 2,479,960.00	2	Compra de Materiales
FACTURA	10713152	14-feb-23	DIACO SA	$ 37,173,696.00	2	Compra de Materiales
FACTURA	20111	14-feb-23	CASTELLON LTDA	$ 5,982,824.00	2	Compra de Materiales
FACTURA	00-1	17-feb-23	AGREGADOS DE SUCRE SAS	$ 30,345,000.00	2	Compra de Materiales
CUENTA DE COBRO	00-1	16-feb-23	CEMENTOS ARGOS SA	$ 60,799,480.00	2	Compra de Materiales
CUENTA DE COBRO	007-2023	14-feb-23	E Y H INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES SAS	$ 15,000,000.00	3	Transporte de equipos o materiales
FACTURA	FP175	14-feb-23	INVERSIONES MG INGENIEROS SAS	$ 98,000,000.00	3	Transporte de equipos o materiales
FACTURA	00-1	20-feb-23	CONSTRUCCIONES Y MOVIMIENTOS DE SUCRE SAS	$ 25,500,000.00	3	Transporte de equipos o materiales
CUENTA DE COBRO	00-6	2-feb-23	INCOPAV SAS	$ 10,760,828.00	4	Mano de obra no calificada
CUENTA DE COBRO	00-7	14-feb-23	INCOPAV SAS	$ 13,667,699.00	4	Mano de obra no calificada
CUENTA DE COBRO	00-8	14-feb-23	INCOPAV SAS	$ 3,805,400.00	4	Mano de obra no calificada

** Indicar el número del Item según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	COMPRA DE EQUIPOS	$ 384,337,665.45	$ 245,000,000.00	$ 12,850,422.00	$ 257,850,422.00	$ 126,487,243.45
2	COMPRA DE MATERIALES	$ 1,153,012,996.35	$ 865,872,981.00	$ 136,780,960.00	$ 1,002,653,941.00	$ 150,359,055.35
3	TRANSPORTE DE EQUIPOS O MATERIALES	$ 512,450,220.60	$ 242,414,710.00	$ 138,500,000.00	$ 380,914,710.00	$ 131,535,510.60
4	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	$ 512,450,220.60	$ 42,389,193.00	$ 28,233,927.00	$ 70,623,120.00	$ 441,827,100.60
	TOTALES	$ 2,562,251,103.00	$ 1,395,676,884.00	$ 316,365,309.00	$ 1,712,042,193.00	$ 850,208,910.00

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (__N/A___) : $ 2,161,136.86
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 20,522,839.17
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
7	N/A	N/A	JULIO	JULIO	$ 2,346,821.00
8	N/A	N/A	AGOSTO	AGOSTO	$ 2,874,868.05
9	N/A	N/A	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	$ 2,659,726.58
10	N/A	N/A	OCTUBRE	OCTUBRE	$ 3,520,341.12
11	N/A	N/A	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	$ 3,598,312.13
12	N/A	N/A	DICIEMBRE	DICIEMBRE	$ 3,361,633.43
N/A	N/A	N/A	ENERO	ENERO	$ 2,161,136.86

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:
Los rendimiento del mes de Frebrero los envia la Fiducia despues del 15 de cada mes, por lo cual no se relaciona en este informe.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre: MARIA FERNANDA MARCELO
Representante Legal
Contratista INCOPAV SAS

Firma:
Nombre: CLAUDIA MILENA TRUJILLO ANGEL
Representante Legal
Interventor INGEVAL SAS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FO-DGN-MC - 2023 - 01
Bogotá D.C., 15 de Febrero de 2023

Doctora
MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO
Representante Legal
INCOPAV S.A.
Carrera 77 # 128 – 85
Bogotá

ASUNTO : PATRIMONIO AUTÓNOMO 317453 - FID 317453 INCOPAV S.A. INVIAS

INFORME MENSUAL - ENERO DE 2023

Respetada Doctora:

De conformidad con lo pactado en la cláusula "Obligaciones de la Fiduciaria", del contrato de Fiducia del asunto, de manera atenta adjuntamos informe mensual con corte al 31 de Enero de 2023 en el cual encontrará la siguiente documentación:

- Informe Mensual
- Estados Financieros
- Extracto(s) Cuenta (s) Bancaria (s) y/o FIC´s
- Relación de Recaudos y/o Pagos
- Resumen de Recursos Administrados PMA

Así mismo, en cumplimiento a lo establecido contractualmente, solicitamos nos remitan la información de los datos de la cuenta bancaria de la Entidad Estatal y certificación bancaria, a donde deberá efectuarse el giro de rendimientos financieros generados durante la ejecución del negocio fiduciario.

De otra parte, nos permitimos recordar el pago de las comisiones fiduciarias, cuyo valor a la fecha de corte del presente informe se encuentra relacionado en la cuenta contable 78 cuentas de orden o 725 comisiones del Informe Financiero del Fideicomiso, valor que debe ser consignado en cuenta de ahorros del Banco de Occidente N° 256909680 a nombre de la Fiduciaria de Occidente S.A Nit: 800.143.157-3 , antes de finalizar el presente mes para lo cual solicitamos remitir el respectivo soporte.

En caso de haber remitido la información y los soportes anteriormente descritos, hacer caso omiso a la presente solicitud.

Agradecemos que una vez revisado el informe, nos comuniquen por escrito cualquier observación o aclaración dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación del mismo, de no ser así, la Fiduciaria dará por aceptado el informe.

Cordialmente,



HANCY PILAR CORONADO RAMIREZ
Directora de Gestion de Mercados de Empresas 2
hcoronado@fiduoccidente.com.co

Elaboró: Jhon Edison Pinto Mora
Revisó: Diana Patricia Benvides Jimenez

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS
317453 - FID 317453 INCOPAV S.A. INVIAS
INFORME MENSUAL
Fecha corte al 31 de Enero de 2023

Cifras en Pesos $

SALDO INICIAL		$1.753.394.757,12
INGRESOS		$2.185.051,52
Rendimientos acreedores fiduciarios	$2.161.136,86	
Rendimientos Fondos de Inversión Colectivos FIC´s	$23.914,66	
EGRESOS		$586.925.890,05
Pago con aportes	$316.781.525,05	
Reembolsos	$20.144.365,00	
Pago con aportes anticipos	$250.000.000,00	
TOTAL FIDEICOMITIDO		$1.170.436.087,59
TOTAL ACTIVO		$1.170.436.087,59
DISPONIBLE		$1.170.436.087,59
Saldo cuentas bancarias	$1.168.534.335,04	
Saldo Fondos de Inversión Colectivos - FIC´s	$1.901.752,55	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		$0,00
CUENTAS POR COBRAR		$0,00
OTROS ACTIVOS		$0,00
TOTAL PASIVO		$3.943.305,86
Rendimientos acreedores fiduciarios	$2.161.136,86	
Ing. recibidos para Revisoría Fiscal	$1.782.169,00	
TOTAL ACTIVO - PASIVO		$1.166.492.781,73

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
317453 - FID 317453 INCOPAV S.A. INVIAS
Periodo : 2023 - Enero

Cifras en Pesos $

Cuenta	Nombre de la Cuenta PUC	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO	1.758.545.256,55	5.044.917,52	-593.154.086,48	1.170.436.087,59
11	EFECTIVO	1.756.667.418,66	5.014.305,86	-593.147.389,48	1.168.534.335,04
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	1.756.667.418,66	5.014.305,86	-593.147.389,48	1.168.534.335,04
111505	BANCOS NACIONALES	1.756.667.418,66	5.014.305,86	-593.147.389,48	1.168.534.335,04
11150523	BANCO DE OCCIDENTE	1.756.667.418,66	5.014.305,86	-593.147.389,48	1.168.534.335,04
13	INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	1.877.837,89	23.914,66	0,00	1.901.752,55
1302	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBI	1.877.837,89	23.914,66	0,00	1.901.752,55
130205	EMISORES NACIONALES	1.877.837,89	23.914,66	0,00	1.901.752,55
13020503	PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDIN	1.877.837,89	23.914,66	0,00	1.901.752,55
16	CUENTAS POR COBRAR	0,00	6.697,00	-6.697,00	0,00
1690	DIVERSAS	0,00	6.697,00	-6.697,00	0,00
169095	DIVERSAS	0,00	6.697,00	-6.697,00	0,00
16909501	DIVERSAS	0,00	6.697,00	-6.697,00	0,00
2	PASIVO	-5.150.499,43	596.955.089,86	-595.747.896,29	-3.943.305,86
25	CUENTAS POR PAGAR	-3.368.330,43	594.101.920,86	-592.894.727,29	-2.161.136,86
2511	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	0,00	590.733.590,43	-590.733.590,43	0,00
251105	PROVEEDORES	0,00	590.733.590,43	-590.733.590,43	0,00
25110501	PROVEEDORES	0,00	590.733.590,43	-590.733.590,43	0,00
2519	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	-6.697,00	6.697,00	0,00	0,00
251905	RETENCIONES EN LA FUENTE	-6.697,00	6.697,00	0,00	0,00
25190501	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-6.697,00	6.697,00	0,00	0,00
2570	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-3.361.633,43	3.361.633,43	-2.161.136,86	-2.161.136,86
257000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-3.361.633,43	3.361.633,43	-2.161.136,86	-2.161.136,86
25700000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-3.361.633,43	3.361.633,43	-2.161.136,86	-2.161.136,86
29	OTROS PASIVOS	-1.782.169,00	2.853.169,00	-2.853.169,00	-1.782.169,00
2907	INGRESOS ANTICIPADOS	-1.782.169,00	2.853.169,00	-2.853.169,00	-1.782.169,00
290795	OTROS	-1.782.169,00	2.853.169,00	-2.853.169,00	-1.782.169,00
29079516	OTROS ING.REC. POR ANTICIPAD	-1.782.169,00	2.853.169,00	-2.853.169,00	-1.782.169,00
3	PATRIMONIO	-1.753.394.757,12	590.378.382,32	-3.476.406,93	-1.166.492.781,73
35	PATRIMONIO ESPECIALES	-1.753.299.088,23	590.282.713,43	-3.356.823,38	-1.166.373.198,18
3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS	-2.562.251.103,00	2.853.169,00	-2.853.169,00	-2.562.251.103,00
350505	APORTES EN DINERO	-2.562.251.103,00	2.853.169,00	-2.853.169,00	-2.562.251.103,00
35050501	APORTES EN DINERO	-2.562.251.103,00	2.853.169,00	-2.853.169,00	-2.562.251.103,00
3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITI	808.952.014,77	587.429.544,43	-503.654,38	1.395.877.904,82
351005	RESTITUCIONES DE APORTES	6.697,00	0,00	0,00	6.697,00
35100501	DEVOLUCION DE APORTES	6.697,00	0,00	0,00	6.697,00
351010	PAGOS A TERCEROS	808.945.317,77	587.429.544,43	-503.654,38	1.395.871.207,82
35101001	PAGO CON APORTES	808.945.317,77	587.429.544,43	-503.654,38	1.395.871.207,82
39	GANANCIAS O PÉRDIDAS	-95.668,89	95.668,89	-119.583,55	-119.583,55
3905	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIO	0,00	0,00	-95.668,89	-95.668,89
390500	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIO	0,00	0,00	-95.668,89	-95.668,89
39050001	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIO	0,00	0,00	-95.668,89	-95.668,89
3915	GANANCIA DEL EJERCICIO	-95.668,89	95.668,89	-23.914,66	-23.914,66
391500	GANANCIA DEL EJERCICIO	-95.668,89	95.668,89	-23.914,66	-23.914,66
39150000	GANANCIA DEL EJERCICIO	-95.668,89	95.668,89	-23.914,66	-23.914,66
4	INGRESOS DE OPERACIONES	0,00	0,00	-23.914,66	-23.914,66
41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENEI	0,00	0,00	-23.914,66	-23.914,66
4108	POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RA	0,00	0,00	-23.914,66	-23.914,66
410805	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	0,00	0,00	-23.914,66	-23.914,66
41080501	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (	0,00	0,00	-23.914,66	-23.914,66
5	GASTOS	0,00	2.373.429,28	-2.349.514,62	23.914,66
51	GASTOS DE OPERACIONES	0,00	2.349.514,62	-2.349.514,62	0,00
5140	IMPUESTOS Y TASAS	0,00	2.349.514,62	-2.349.514,62	0,00
514005	IMPUESTOS Y TASAS	0,00	2.349.514,62	-2.349.514,62	0,00
51400503	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	2.349.514,62	-2.349.514,62	0,00
59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	0,00	23.914,66	0,00	23.914,66
5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	0,00	23.914,66	0,00	23.914,66
590500	GANANCIAS Y PERDIDAS	0,00	23.914,66	0,00	23.914,66
59050001	GANANCIAS	0,00	23.914,66	0,00	23.914,66
8	CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FIN	0,00	828.240,00	-828.240,00	0,00
82	ACREEDORAS	0,00	0,00	-828.240,00	-828.240,00
8295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	-828.240,00	-828.240,00
829500	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	-828.240,00	-828.240,00
82950000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	-828.240,00	-828.240,00
84	ACREEDORAS POR CONTRA	0,00	828.240,00	0,00	828.240,00
8405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00	828.240,00	0,00	828.240,00
840500	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00	828.240,00	0,00	828.240,00
84050000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00	828.240,00	0,00	828.240,00

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 256-12653-3
FECHA DE CORTE: 31/01/2023

FID 317453 INCOPAV SA INVIAS
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG218132

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,20%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,90%
De $20.000.001	a	$50.000.000	1,10%
De $50.000.001	a	$100.000.000	1,45%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	1.90%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,20%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,20%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,20%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,20%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,20%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Enero del 2023.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	1,756,667,418.66
+ 35 CREDITOS	5,014,305.86
- 17 DEBITOS	593,147,389.48
SALDO ACTUAL	1,168,534,335.04
SALDO PROMEDIO	1,353,460,510.15

Recuerda que puedes pagar los servicios públicos, obligaciones, administración, instituciones educativas y otros servicios por el Portal AvalPay Center. ¡Ingresa a www.avalpaycenter.com y realiza tus pagos de forma fácil y segura!

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A685207	0.00	1,379,000.00	1,758,046,418.66
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	90,480.40	1,758,136,899.06
03	PAGO TERCERO ACH	A100480	7,297,300.00	0.00	1,750,839,599.06
03	PAGO TERCERO ACH	A071092	54,426,000.00	0.00	1,696,413,599.06
03	PAGO TERCERO ACH	A071315	245,000,000.00	0.00	1,451,413,599.06
03	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	90,556.09	1,451,504,155.15
03	GMF	0000000	1,226,893.20	0.00	1,450,277,261.95
04	PAGO TERCERO ACH	A890365	12,847,065.00	0.00	1,437,430,196.95
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	74,699.21	1,437,504,896.16
04	GMF	0000000	51,388.26	0.00	1,437,453,507.90
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	74,038.70	1,437,527,546.60
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	74,042.51	1,437,601,589.11
10	TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA SIN GMF	M256760	3,361,633.43	0.00	1,434,239,955.68
10	COMISION TRANSFER ENVIADA VIA SEBRA	M256427	48,200.00	0.00	1,434,191,755.68
10	IVA COBRADO	M256427	9,158.00	0.00	1,434,182,597.68
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	74,046.33	1,434,256,644.01
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	74,050.14	1,434,330,694.15
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	74,053.96	1,434,404,748.11
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	74,057.77	1,434,478,805.88
10	GMF	0000000	229.43	0.00	1,434,478,576.45
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	73,885.47	1,434,552,461.92
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	73,889.28	1,434,626,351.20
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	73,893.08	1,434,700,244.28
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	73,896.89	1,434,774,141.17
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	73,900.70	1,434,848,041.87
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	73,904.50	1,434,921,946.37
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	73,908.31	1,434,995,854.68
18	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A874461	0.00	1,171,206.00	1,436,167,060.68
18	CARGO POR TRANSACCIONES VARIAS	M256234	6,697.00	0.00	1,436,160,363.68
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	73,912.12	1,436,234,275.80
18	GMF	0000000	26.79	0.00	1,436,234,249.01
19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A712333	0.00	200,000.00	1,436,434,249.01
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	73,975.90	1,436,508,224.91
20	PAGO TERCERO ACH	A493901	2,510,080.00	0.00	1,433,998,144.91
20	PAGO TERCERO ACH	A520112	11,444,328.00	0.00	1,422,553,816.91
20	PAGO TERCERO ACH	A493903	3,847,184.00	0.00	1,418,706,632.91
20	PAGO TERCERO ACH	A492114	250,000,000.00	0.00	1,168,706,632.91
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	73,990.01	1,168,780,622.92
20	GMF	0000000	1,071,206.37	0.00	1,167,709,416.55
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	60,145.03	1,167,769,561.58
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	60,148.13	1,167,829,709.71
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	60,151.23	1,167,889,860.94

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
Impreso por dispapeles SAS NIT 860028580-2

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EBG218132 113692 1/1

CUENTA No. 256-12653-3
FECHA DE CORTE: 31/01/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	60,154.33	1,167,950,015.27
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	60,157.43	1,168,010,172.70
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	60,160.52	1,168,070,333.22
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	60,163.62	1,168,130,496.84
30	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A815932	0.00	102,963.00	1,168,233,459.84
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	60,166.72	1,168,293,626.56
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	60,169.82	1,168,353,796.38
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	60,172.92	1,168,413,969.30
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	60,181.32	1,168,474,150.62
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	60,184.42	1,168,534,335.04

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier Inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Fax. 3121024, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Resumen del Portafolio

FiduOccidente
NIT 800.143.157-3


INCOPAV S.A. INVIAS

-

Número Id del inversionista
317453

Período: 01/Ene/2023 AL 31/Ene/2023

Estimado inversionista, a continuación encontrará el resumen del portafolio de inversiones que tiene actualmente.

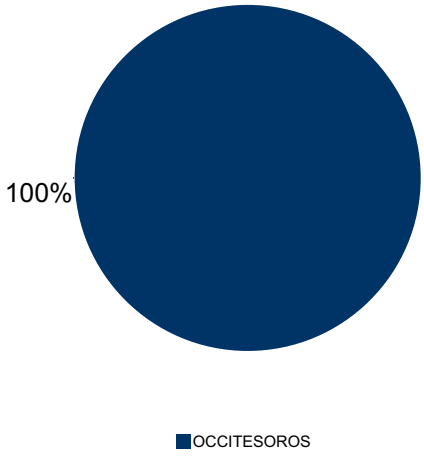

Rentabilidad Portafolio
16.07%

Volatilidad
0.205%

	Portafolio Consolidado
Saldo Inicial (COP)	$ 1,877,837.89
Balance de Movimientos (COP)	$ 0.00
Rendimientos (COP)	$ 23,914.66
Saldo Final (COP)	$ 1,901,752.55
Rentabilidad (Mensual)	16.07%

	Saldo Inicial (COP)	Balance de Movimientos (COP)	Rendimientos (COP)	Saldo Final (COP)	Rentabilidad (Mensual)
OCCITESOROS	$ 1,877,837.89	$ 0.00	$ 23,914.66	$ 1,901,752.55	16.07%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Distribuidora De Papeles S.A. Dispapeles, Nit 860028580

Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia Occitesoros

FiduOccidente

NIT 800.143.157-3

INCOPAV S.A. INVIAS

-

Número Id del inversionista
317453

EXTRACTO DE CUENTA **Período** 01/Ene/2023 AL 31/Ene/2023 **No. Inversión** 1101210001313

RESUMEN DE LA INVERSIÓN

Saldo inicial a 31/Dic/2022 :	$	1,877,837.89
Aportes	$	0.00
Retiros	$	0.00
Ajustes	$	0.00
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)	$	0.00
Rendimientos	$	23,914.66
Retención en la Fuente	$	0.00
Saldo final a 31/Ene/2023 :	$	1,901,752.55

Detalle movimientos del mes

Fecha	Detalle	Rendimientos a la fecha $	Valor $	Valor unidad	Saldo unidades	Saldo en $
01012023	SALDO INICIAL		1,877,837.89	10,655.725141	176.228071	1,877,837.89
01012023	RENDIMIENTOS NETOS	653.91		10,659.435746	176.228071	1,878,491.80
02012023	RENDIMIENTOS NETOS	804.07		10,663.998396	176.228071	1,879,295.87
03012023	RENDIMIENTOS NETOS	405.61		10,666.300036	176.228071	1,879,701.48
04012023	RENDIMIENTOS NETOS	741.68		10,670.508666	176.228071	1,880,443.16
05012023	RENDIMIENTOS NETOS	637.88		10,674.128267	176.228072	1,881,081.04
06012023	RENDIMIENTOS NETOS	615.78		10,677.622490	176.228072	1,881,696.82
07012023	RENDIMIENTOS NETOS	668.83		10,681.417748	176.228071	1,882,365.65
08012023	RENDIMIENTOS NETOS	667.79		10,685.207126	176.228071	1,883,033.44
09012023	RENDIMIENTOS NETOS	669.68		10,689.007174	176.228071	1,883,703.12
10012023	RENDIMIENTOS NETOS	631.19		10,692.588822	176.228072	1,884,334.31
11012023	RENDIMIENTOS NETOS	448.88		10,695.135988	176.228072	1,884,783.19
12012023	RENDIMIENTOS NETOS	577.96		10,698.415581	176.228072	1,885,361.15
13012023	RENDIMIENTOS NETOS	749.23		10,702.667043	176.228072	1,886,110.38
14012023	RENDIMIENTOS NETOS	662.51		10,706.426437	176.228072	1,886,772.89
15012023	RENDIMIENTOS NETOS	667.71		10,710.215311	176.228072	1,887,440.60
16012023	RENDIMIENTOS NETOS	979.53		10,715.773608	176.228073	1,888,420.13
17012023	RENDIMIENTOS NETOS	906.75		10,720.918928	176.228073	1,889,326.88
18012023	RENDIMIENTOS NETOS	1,022.05		10,726.718511	176.228073	1,890,348.93
19012023	RENDIMIENTOS NETOS	1,050.96		10,732.682141	176.228073	1,891,399.89
20012023	RENDIMIENTOS NETOS	1,459.36		10,740.963240	176.228073	1,892,859.25
21012023	RENDIMIENTOS NETOS	705.56		10,744.966925	176.228072	1,893,564.81
22012023	RENDIMIENTOS NETOS	720.30		10,749.054229	176.228073	1,894,285.11
23012023	RENDIMIENTOS NETOS	751.16		10,753.316656	176.228073	1,895,036.27
24012023	RENDIMIENTOS NETOS	1,055.13		10,759.303978	176.228072	1,896,091.40
25012023	RENDIMIENTOS NETOS	853.76		10,764.148610	176.228072	1,896,945.16
26012023	RENDIMIENTOS NETOS	912.03		10,769.323903	176.228072	1,897,857.19
27012023	RENDIMIENTOS NETOS	656.09		10,773.046841	176.228073	1,898,513.28
28012023	RENDIMIENTOS NETOS	736.92		10,777.228454	176.228073	1,899,250.20
29012023	RENDIMIENTOS NETOS	718.72		10,781.306799	176.228073	1,899,968.92
30012023	RENDIMIENTOS NETOS	914.90		10,786.498357	176.228073	1,900,883.82
31012023	RENDIMIENTOS NETOS	868.73		10,791.427952	176.228073	1,901,752.55
31012023	SALDO FINAL		1,901,752.55	10,791.427952	176.228073	1,901,752.55

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Distribuidora De Papeles S.A. Dispapeles, Nit 860028580

Notas de Interés

El Defensor del Consumidor Financiero Principal es la doctora LINA MARÍA ZORRO CERÓN y su Suplente es la doctora BERTHA GARCÍA MEZA. Podrá dirigirse a ellas a las direcciones electrónicas: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co.
También están dispuestos los siguientes medios: Dirección física Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá - Teléfono 601 7462060 Ext. 15311 o a cualquier oficina de Fiduoccidente en el horario de lunes a viernes 8 a.m. a 12 pm / 2:00 p.m. a 5:00 p.m., o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

La Fiduciaria de Occidente tiene a su disposición los siguientes canales para la atención de sus PQR's:

- Línea de atención: en Bogotá: (601) 2973060 y en el resto del país: 018000521144
- Formulario PQR's que lo encontrará en la página web https://www.fiduoccidente.com/ en la parte superior derecha opción "Contacto"

EXTRACTO DE CUENTA

Período 01/Ene/2023 AL 31/Ene/2023 **No. Inversión** 1101210001313

Rentabilidad neta tipo de participación	Retención en la fuente cobrada	Remuneración fiduciaria del tipo de participación	Valor promedio del fondo
16.07 %	$ 0.00	0.00 %	$ 1,584,651,440,599.77

Rentabilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
5	16.07%	11.10%	16.07%	7.54%	0.00%	0.00%

Volatilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
5	0.204%	0.230%	0.204%	0.262%	%	%

Notas de Interés

Los clientes de la Fiduciaria de Occidente cuentan con un Defensor del Consumidor Financiero: la Doctora Lina María Zorro Cerón es el Defensor del Consumidor Financiero Principal, podrá dirigirse a ella a la dirección electrónica: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o a lzorro@bancodeoccidente.com.co, o defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co, o en Bogotá D.C., a la CR 7 No. 71-52 Torre A, Piso 1, teléfono 601 7462060 ext. 15318, fax 3121024 o a cualquier oficina de Fiduoccidente, o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 am. a 3:30 pm.

"Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora la obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respetivo Fondo de Inversión Colectiva"

Estado Cuentas Pagadas
317453 FID 317453 INCOPAV S.A. INVIAS

Periodo Desde 01/01/2023 hasta 31/01/2023

SFI - Sistema Financiero Integrado
Módulo Cuentas por Pagar

10/02/2023 09:11:40
Programa: CPMRRERA
Yeimy Tatiana Rincon Sabogal

Vigencia : 2023

Nit	Descripción	Recu	OrPa	V.doc	TpDo	NroDoc	Vr. Bruto	Iva	DESCUENTOS				Reintegros	Vr. Neto
									Rete Fuente	Rete Iva	Rete ICA	Otros		
800021390	GEOMATRIX S.A.S.		8				3,847,184.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,847,184.00
800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		5				3,361,633.43	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,361,633.43
830063087	INCOPAV S.A.		1				7,297,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,297,300.00
830063087	INCOPAV S.A.		4				12,847,065.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	12,847,065.00
900349441	CERAMICAS DE SUCRE SAS		6				2,510,080.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,080.00
900473048	AGREGADOS Y CANTERAS DEL NORTI		2				54,426,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	54,426,000.00
900487988	TECNOLOGIA DE MATERIALES COLOMI		7				11,444,328.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	11,444,328.00
900963542	CONCRETOS DE LORICA SAS		9				250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00
901560406	MM ULTRA SERVICES SAS		3				245,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	245,000,000.00
						Totales	590,733,590.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,733,590.43

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO
317453 INCOPAV INVIAS

VALOR PMA	$ 2.566.556.103,00	DIFERENCIA PMA Y CONSIG	$ 4.305.000,00	TOTAL PAGADO	
VALOR ENTREGADO	$ 2.562.251.103,00	TOTAL DISPONIBLE	$ 2.316.271.103,00		$ 245.980.000,00

1, Compra equipos							$ 384.983.415,45
TERCERO	NIT	CONCEPTO	MES	ORDEN	VALOR	GMF	TOTAL
MM ULTRA SERVICES SAS	901560406	DESEMBOLSO	ENERO	13	245.000.000,00	980.000,00	245.980.000,00
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
TOTAL PAGOS					$ 245.000.000,00	$ 980.000,00	$ 245.980.000,00
							$ 139.003.415,45

2, Compra de Materiales							$ 1.154.950.246,35
TERCERO	NIT	CONCEPTO	MES	ORDEN	VALOR	GMF	TOTAL
INCOPAV S.A.S	830063087	REEMBOLSO	JULIO	1	80.000.000,00	320.000,00	80.320.000,00
KOLCEM SAS	901082283	DESEMBOLSO	DICIEMBRE	7	48.739.149,00	194.956,60	48.934.105,60
AGREGADOS Y CANTERAS DEL NORTE	900473048	DESEMBOLSO	DICIEMBRE	8	17.416.320,00	69.665,28	17.485.985,28
TRITURADOS Y PAVIMENTOS DEL CARIBE SAS	901267748	ANTICIPO	DICIEMBRE	10	400.000.000,00	1.600.000,00	401.600.000,00
AGREGADOS Y CANTERAS DEL NORTE	900473048	DESEMBOLSO	ENERO	12	54.426.000,00	217.704,00	54.643.704,00
CONCRETO DE LORICA	900.963.542	DESEMBOLSO	ENERO	17	250.000.000,00	1.000.000,00	251.000.000,00
TECNOLOGIA DE MATERIALES COLOMBIA SAS	900.487.988	DESEMBOLSO	ENERO	18	11.444.328,00	45.777,31	11.490.105,31
GEOMATRIX SAS	800.021.390	DESEMBOLSO	ENERO	18	3.847.184,00	15.388,74	3.862.572,74
FENIX ENTERPRISE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	901.467.485	DESEMBOLSO	ENERO	18	2.204.832,00	8.819,33	2.213.651,33
TECNOLOGIA DE MATERIALES COLOMBIA SAS	900.487.988	DESEMBOLSO	ENERO	19	2.479.960,00	9.919,84	2.489.879,84
						-	-
					-	-	-
TOTAL PAGOS					$ 870.557.773,00	$ 3.482.231,09	$ 874.040.004,09
							$ 280.910.242,26

3, Transporte de equipos o materiales							$ 513.311.220,60
TERCERO	NIT	CONCEPTO	MES	ORDEN	VALOR	GMF	TOTAL
HERNAN JOSE CHICA BENAVIDEZ	10.892.583	DESEMBOLSO	AGOSTO	4	3.431.750,00	13.727,00	3.445.477,00
INVERSIONES MG INGENIEROS S.A.S	900.456.426	ANTICIPO	AGOSTO	3	130.000.000,00	520.000,00	130.520.000,00
INVERSIONES MG INGENIEROS S.A.S	900.456.426	DESEMBOLSO	DICIEMBRE	6	106.472.880,00	425.891,52	106.898.771,52
CERAMICAS DE SUCRE SAS	900.349.441	DESEMBOLSO	ENERO	16	2.510.080,00	10.040,32	2.520.120,32
						-	-
						-	-
TOTAL PAGOS					$ 242.414.710,00	$ 969.658,84	$ 243.384.368,84
							$ 269.926.851,76

4, Mano de obra no calificada							$ 513.311.220,60
	NIT	CONCEPTO	MES	ORDEN	VALOR	GMF	TOTAL
INCOPAV S.A.S	830063087	REEMBOLSO	JULIO	2	19.306.176,00	77.224,70	19.383.400,70
INCOPAV S.A.S	830063087	REEMBOLSO	AGOSTO	5	2.938.652,00	11.754,61	2.950.406,61
INCOPAV S.A.S	830063087	REEMBOLSO	ENERO	11	12.847.065,00	51.388,26	12.898.453,26
INCOPAV S.A.S	830063087	REEMBOLSO	ENERO	14	7.297.300,00	29.189,20	7.326.489,20
INCOPAV S.A.S	830063087	REEMBOLSO	ENERO	20	10.760.828,00	43.043,31	10.803.871,31
						-	-
TOTAL PAGOS					$ 53.150.021,00	$ 212.600,08	$ 53.362.621,08
							$ 459.948.599,52

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 256-12653-3
FECHA DE CORTE: 29/12/2022

FID 317453 INCOPAV SA INVIAS
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG219140

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,20%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,90%
De $20.000.001	a	$50.000.000	1,10%
De $50.000.001	a	$100.000.000	1,45%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	1.90%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,20%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,20%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,20%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,20%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,20%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 29 de Diciembre del 2022.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	2,329,480,547.19
+ 33 CREDITOS	5,761,633.43
- 10 DEBITOS	578,574,761.96
SALDO ACTUAL	1,756,667,418.66
SALDO PROMEDIO	2,105,317,029.21

Señor Contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto ReteICA correspondiente al sexto bimestre con fecha limite del 23 al 27 de enero según último digito, aplican T&C. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente en Bogotá o a través del botón PSE https://nuevaoficinavirtual.shd.gov.co/bogota/es/login

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	119,984.20	2,329,600,531.39
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	119,990.38	2,329,720,521.77
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	119,996.56	2,329,840,518.33
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	120,002.74	2,329,960,521.07
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	120,008.93	2,330,080,530.00
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	120,015.11	2,330,200,545.11
09	TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA SIN GMF	M256428	3,598,312.13	0.00	2,326,602,232.98
09	COMISION TRANSFER ENVIADA VIA SEBRA	M256422	48,200.00	0.00	2,326,554,032.98
09	IVA COBRADO	M256422	9,158.00	0.00	2,326,544,874.98
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	120,021.29	2,326,664,896.27
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	120,027.47	2,326,784,923.74
09	GMF	0000000	229.43	0.00	2,326,784,694.31
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	119,845.35	2,326,904,539.66
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	119,851.52	2,327,024,391.18
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	119,857.69	2,327,144,248.87
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	119,863.87	2,327,264,112.74
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	119,870.04	2,327,383,982.78
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	119,876.22	2,327,503,859.00
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	119,882.39	2,327,623,741.39
19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A142042	0.00	1,854,000.00	2,329,477,741.39
19	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A066766	48,739,149.00	0.00	2,280,738,592.39
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	119,888.57	2,280,858,480.96
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	119,894.74	2,280,978,375.70
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	119,900.92	2,281,098,276.62
19	GMF	0000000	194,956.60	0.00	2,280,903,320.02
20	PAGO TERCERO ACH	A811315	17,416,320.00	0.00	2,263,487,000.02
20	PAGO TERCERO ACH	A813509	106,472,880.00	0.00	2,157,014,120.02
20	PAGO TERCERO ACH	A815682	400,000,000.00	0.00	1,757,014,120.02
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	117,482.14	1,757,131,602.16
20	GMF	0000000	2,095,556.80	0.00	1,755,036,045.36
21	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A725535	0.00	546,000.00	1,755,582,045.36
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	90,396.38	1,755,672,441.74
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	90,429.16	1,755,762,870.90
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	90,433.81	1,755,853,304.71
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	90,438.47	1,755,943,743.18
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	90,443.13	1,756,034,186.31
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	90,447.79	1,756,124,634.10
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	90,452.45	1,756,215,086.55
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	90,457.11	1,756,305,543.66
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	90,461.76	1,756,396,005.42
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	90,466.42	1,756,486,471.84
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	90,471.08	1,756,576,942.92

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
Impreso por dispapeles SAS NIT 860028580-2

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EBG219140 114184 1/1

CUENTA No. 256-12653-3
FECHA DE CORTE: 29/12/2022

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	90,475.74	1,756,667,418.66

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Fax. 3121024, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia Occitesoros

FiduOccidente
NIT 800.143.157-3

INCOPAV S.A. INVIAS

-

Número Id del inversionista
317453

EXTRACTO DE CUENTA **Período** 01/Dic/2022 AL 31/Dic/2022 **No. Inversión** 1101210001313

RESUMEN DE LA INVERSIÓN

Saldo inicial a 30/Nov/2022 :	$	1,839,275.73
Aportes	$	546,000.00
Retiros	$	-546,000.00
Ajustes	$	0.00
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)	$	0.00
Rendimientos	$	38,562.16
Retención en la Fuente	$	0.00
Saldo final a 31/Dic/2022 :	$	1,877,837.89

Detalle movimientos del mes

Fecha	Detalle	Rendimientos a la fecha $	Valor $	Valor unidad	Saldo unidades	Saldo en $
01122022	SALDO INICIAL		1,839,275.73	10,540.112370	174.502478	1,839,275.73
01122022	RENDIMIENTOS NETOS	874.86		10,545.125820	174.502478	1,840,150.59
02122022	RENDIMIENTOS NETOS	664.15		10,548.931760	174.502479	1,840,814.74
03122022	RENDIMIENTOS NETOS	588.36		10,552.303380	174.502479	1,841,403.10
04122022	RENDIMIENTOS NETOS	595.06		10,555.713446	174.502479	1,841,998.16
05122022	RENDIMIENTOS NETOS	496.94		10,558.561189	174.502479	1,842,495.10
06122022	RENDIMIENTOS NETOS	428.48		10,561.016615	174.502479	1,842,923.58
07122022	RENDIMIENTOS NETOS	936.21		10,566.381659	174.502479	1,843,859.79
08122022	RENDIMIENTOS NETOS	609.18		10,569.872592	174.502479	1,844,468.97
09122022	RENDIMIENTOS NETOS	479.89		10,572.622666	174.502479	1,844,948.86
10122022	RENDIMIENTOS NETOS	623.86		10,576.197716	174.502479	1,845,572.72
11122022	RENDIMIENTOS NETOS	616.10		10,579.728315	174.502479	1,846,188.82
12122022	RENDIMIENTOS NETOS	587.35		10,583.094184	174.502479	1,846,776.17
13122022	RENDIMIENTOS NETOS	648.88		10,586.812616	174.502479	1,847,425.05
14122022	RENDIMIENTOS NETOS	671.17		10,590.658814	174.502479	1,848,096.22
15122022	RENDIMIENTOS NETOS	392.52		10,592.908153	174.502480	1,848,488.74
16122022	RENDIMIENTOS NETOS	602.01		10,596.358042	174.502479	1,849,090.75
17122022	RENDIMIENTOS NETOS	644.51		10,600.051442	174.502480	1,849,735.26
18122022	RENDIMIENTOS NETOS	634.28		10,603.686210	174.502480	1,850,369.54
19122022	RENDIMIENTOS NETOS	581.84		10,607.020475	174.502480	1,850,951.38
19122022	APORTE CAPITAL ESPECIFICO X TRSLDO DEL G		546,000.00	10,607.020475	225.977822	2,396,951.38
19122022	TRSLDO RENDIM. + DEL GENERICO AL ESPECI	17,834.72		10,607.020475	227.659229	2,414,786.10
20122022	RENDIMIENTOS NETOS	1,034.59		10,611.564938	227.659229	2,415,820.69
21122022	RETIROS CLIENTES CARTERAS		-546,000.00	10,616.132919	176.130113	1,869,820.69
21122022	RENDIMIENTOS NETOS	1,039.94		10,616.132919	176.228071	1,870,860.63
22122022	RENDIMIENTOS NETOS	752.49		10,620.402887	176.228072	1,871,613.12
23122022	RENDIMIENTOS NETOS	839.88		10,625.168759	176.228072	1,872,453.00
24122022	RENDIMIENTOS NETOS	657.07		10,628.897296	176.228071	1,873,110.07
25122022	RENDIMIENTOS NETOS	663.15		10,632.660345	176.228071	1,873,773.22
26122022	RENDIMIENTOS NETOS	437.38		10,635.142247	176.228071	1,874,210.60
27122022	RENDIMIENTOS NETOS	850.54		10,639.968620	176.228070	1,875,061.14
28122022	RENDIMIENTOS NETOS	572.10		10,643.214954	176.228071	1,875,633.24
29122022	RENDIMIENTOS NETOS	898.53		10,648.313608	176.228071	1,876,531.77
30122022	RENDIMIENTOS NETOS	655.75		10,652.034636	176.228071	1,877,187.52
31122022	RENDIMIENTOS NETOS	650.37		10,655.725141	176.228071	1,877,837.89
31122022	SALDO FINAL		1,877,837.89	10,655.725141	176.228071	1,877,837.89

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Distribuidora De Papeles S.A. Dispapeles, Nit 860028580

Notas de Interés

El Defensor del Consumidor Financiero Principal es la doctora LINA MARÍA ZORRO CERÓN y su Suplente es la doctora BERTHA GARCÍA MEZA. Podrá dirigirse a ellas a las direcciones electrónicas: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co.
También están dispuestos los siguientes medios: Dirección física Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá - Teléfono 601 7462060 Ext. 15311 o a cualquier oficina de Fiduoccidente en el horario de lunes a viernes 8 a.m. a 12 pm / 2:00 p.m. a 5:00 p.m., o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

La Fiduciaria de Occidente tiene a su disposición los siguientes canales para la atención de sus PQR's:

- Línea de atención: en Bogotá: (601) 2973060 y en el resto del país: 018000521144
- Formulario PQR's que lo encontrará en la página web https://www.fiduoccidente.com/ en la parte superior derecha opción "Contacto"

EXTRACTO DE CUENTA

Período 01/Dic/2022 AL 31/Dic/2022 **No. Inversión** 1101210001313

Rentabilidad neta tipo de participación	Retención en la fuente cobrada	Remuneración fiduciaria del tipo de participación	Valor promedio del fondo
13.71 %	$ 0.00	0.00 %	$ 1,331,086,678,018.28

Rentabilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
5	13.71%	9.21%	6.50%	6.50%	0.00%	0.00%

Volatilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
5	0.140%	0.227%	0.231%	0.231%	%	%

Notas de Interés

Los clientes de la Fiduciaria de Occidente cuentan con un Defensor del Consumidor Financiero: la Doctora Lina María Zorro Cerón es el Defensor del Consumidor Financiero Principal, podrá dirigirse a ella a la dirección electrónica: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o a lzorro@bancodeoccidente.com.co, o defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co, o en Bogotá D.C., a la CR 7 No. 71-52 Torre A, Piso 1, teléfono 601 7462060 ext. 15318, fax 3121024 o a cualquier oficina de Fiduoccidente, o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 am. a 3:30 pm.

"Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora la obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respetivo Fondo de Inversión Colectiva"

CUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCION		SAL. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**2,331,319,822.92**	**6,346,195.59**	**579,120,761.96**	**1,758,545,256.55**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**2,329,480,547.19**	**5,761,633.43**	**578,574,761.96**	**1,756,667,418.66**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**2,329,480,547.19**	**5,761,633.43**	**578,574,761.96**	**1,756,667,418.66**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**2,329,480,547.19**	**5,761,633.43**	**578,574,761.96**	**1,756,667,418.66**
11150523		**BANCODEOCCIDENTE**	**NAPL**	**2,329,480,547.19**	**5,761,633.43**	**578,574,761.96**	**1,756,667,418.66**
11150523002		CUENTAS DE AHORROS	NAPL	2,329,480,547.19	5,761,633.43	578,574,761.96	1,756,667,418.66
13		**INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS**	**NAPL**	**1,839,275.73**	**584,562.16**	**546,000.00**	**1,877,837.89**
1302		**INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS -**	**NAPL**	**1,839,275.73**	**584,562.16**	**546,000.00**	**1,877,837.89**
130205		**EMISORES NACIONALES**	**NAPL**	**1,839,275.73**	**584,562.16**	**546,000.00**	**1,877,837.89**
13020503		**PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS**	**NAPL**	**1,839,275.73**	**584,562.16**	**546,000.00**	**1,877,837.89**
13020503001		FIDUOCCIDENTE	NAPL	1,839,275.73	584,562.16	546,000.00	1,877,837.89
2		**PASIVO**	**NAPL**	**-5,380,481.13**	**582,224,973.26**	**581,994,991.56**	**-5,150,499.43**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-3,598,312.13**	**579,824,973.26**	**579,594,991.56**	**-3,368,330.43**
2511		**PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR**	**NAPL**	**.00**	**576,226,661.13**	**576,226,661.13**	**.00**
251105		**PROVEEDORES**	**NAPL**	**.00**	**576,226,661.13**	**576,226,661.13**	**.00**
25110501		**PROVEEDORES**	**NAPL**	**.00**	**576,226,661.13**	**576,226,661.13**	**.00**
25110501001		PROVEEDORES	NAPL	.00	576,226,661.13	576,226,661.13	.00
2519		**RETENCIONES Y APORTES LABORALES**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**6,697.00**	**-6,697.00**
251905		**RETENCIONES EN LA FUENTE**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**6,697.00**	**-6,697.00**
25190501		**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**6,697.00**	**-6,697.00**
25190501001		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7%	NAPL	.00	.00	6,697.00	-6,697.00
2570		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-3,598,312.13**	**3,598,312.13**	**3,361,633.43**	**-3,361,633.43**
257000		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-3,598,312.13**	**3,598,312.13**	**3,361,633.43**	**-3,361,633.43**
25700000		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-3,598,312.13**	**3,598,312.13**	**3,361,633.43**	**-3,361,633.43**
25700000001		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-3,598,312.13	3,598,312.13	3,361,633.43	-3,361,633.43
29		**OTROS PASIVOS**	**NAPL**	**-1,782,169.00**	**2,400,000.00**	**2,400,000.00**	**-1,782,169.00**
2907		**INGRESOS ANTICIPADOS**	**NAPL**	**-1,782,169.00**	**2,400,000.00**	**2,400,000.00**	**-1,782,169.00**
290795		**OTROS**	**NAPL**	**-1,782,169.00**	**2,400,000.00**	**2,400,000.00**	**-1,782,169.00**
29079516		**OTROS ING.REC. POR ANTICIPAD**	**NAPL**	**-1,782,169.00**	**2,400,000.00**	**2,400,000.00**	**-1,782,169.00**
29079516003		ING. REC. PARA REVISORÍA FISCALNEG. ANTICIPOS LEY 1474	NAPL	-1,782,169.00	.00	.00	-1,782,169.00
29079516004		ING. REC. PARA GASTOS BANCARIOSNEG. ANTICIPOS LEY 1474	NAPL	.00	2,400,000.00	2,400,000.00	.00
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-2,325,939,341.79**	**575,092,633.43**	**2,548,048.76**	**-1,753,394,757.12**
35		**PATRIMONIO ESPECIALES**	**NAPL**	**-2,325,882,235.06**	**575,092,633.43**	**2,509,486.60**	**-1,753,299,088.23**
3505		**ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-2,562,251,103.00**	**2,400,000.00**	**2,400,000.00**	**-2,562,251,103.00**
350505		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-2,562,251,103.00**	**2,400,000.00**	**2,400,000.00**	**-2,562,251,103.00**
35050501		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-2,562,251,103.00**	**2,400,000.00**	**2,400,000.00**	**-2,562,251,103.00**
35050501001		APORTES EN DINERO	NAPL	-2,562,251,103.00	2,400,000.00	2,400,000.00	-2,562,251,103.00
3510		**PAGOS(DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS**	**NAPL**	**236,368,867.94**	**572,692,633.43**	**109,486.60**	**808,952,014.77**
351005		**RESTITUCIONES DE APORTES**	**NAPL**	**.00**	**6,697.00**	**.00**	**6,697.00**
35100501		**DEVOLUCION DE APORTES**	**NAPL**	**.00**	**6,697.00**	**.00**	**6,697.00**
35100501002		RETEFUENTE SOBRE UTILIDADES	NAPL	.00	6,697.00	.00	6,697.00
351010		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**236,368,867.94**	**572,685,936.43**	**109,486.60**	**808,945,317.77**
35101001		**PAGO CON APORTES**	**NAPL**	**236,368,867.94**	**572,685,936.43**	**109,486.60**	**808,945,317.77**
35101001001		PAGO CON APORTES	NAPL	3,431,750.00	172,628,349.00	.00	176,060,099.00
35101001029		REEMBOLSO	NAPL	102,244,828.00	.00	.00	102,244,828.00

CUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCION		SAL. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
35101001032		GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	397,883.94	229.43	109,486.60	288,626.77
35101001033		GASTOS BANCARIOS	NAPL	294,406.00	57,358.00	.00	351,764.00
35101001037		PAGO CON APORTES ANTICIPOS	NAPL	130,000,000.00	400,000,000.00	.00	530,000,000.00
39		**GANANCIAS O PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-57,106.73**	**.00**	**38,562.16**	**-95,668.89**
3915		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-57,106.73**	**.00**	**38,562.16**	**-95,668.89**
391500		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-57,106.73**	**.00**	**38,562.16**	**-95,668.89**
39150000		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-57,106.73**	**.00**	**38,562.16**	**-95,668.89**
39150000001		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-57,106.73	.00	38,562.16	-95,668.89
4		**INGRESOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**-57,687.47**	**.00**	**38,562.16**	**-96,249.63**
41		**INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES**	**NAPL**	**-57,687.47**	**.00**	**38,562.16**	**-96,249.63**
4108		**POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO**	**NAPL**	**-57,687.47**	**.00**	**38,562.16**	**-96,249.63**
410805		**POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO**	**NAPL**	**-57,687.47**	**.00**	**38,562.16**	**-96,249.63**
41080501		**POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)**	**NAPL**	**-57,687.47**	**.00**	**38,562.16**	**-96,249.63**
41080501001		RENDIMIENTOS CARTERA COLECTIVA ABIERTA INTERNA	NAPL	-57,687.47	.00	38,562.16	-96,249.63
5		**GASTOS**	**NAPL**	**57,687.47**	**2,329,075.56**	**2,290,513.40**	**96,249.63**
51		**GASTOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**580.74**	**2,290,513.40**	**2,290,513.40**	**580.74**
5108		**VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.**	**NAPL**	**580.74**	**.00**	**.00**	**580.74**
510805		**POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**580.74**	**.00**	**.00**	**580.74**
51080501		**POR DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO (DB)**	**NAPL**	**580.74**	**.00**	**.00**	**580.74**
51080501001		CARTERA COLECTIVA ABIERTA OCCIRENTA	NAPL	580.74	.00	.00	580.74
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**2,290,513.40**	**2,290,513.40**	**.00**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**2,290,513.40**	**2,290,513.40**	**.00**
51400503		**GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF**	**NAPL**	**.00**	**2,290,513.40**	**2,290,513.40**	**.00**
51400503001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	.00	2,290,513.40	2,290,513.40	.00
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**57,106.73**	**38,562.16**	**.00**	**95,668.89**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**57,106.73**	**38,562.16**	**.00**	**95,668.89**
590500		**GANANCIAS Y PERDIDAS**	**NAPL**	**57,106.73**	**38,562.16**	**.00**	**95,668.89**
59050001		**GANANCIAS**	**NAPL**	**57,106.73**	**38,562.16**	**.00**	**95,668.89**
59050001001		GANANCIAS	NAPL	57,106.73	38,562.16	.00	95,668.89
8		**CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL**	**NAPL**	**.00**	**1,904,000.00**	**1,904,000.00**	**.00**
82		**ACREEDORAS**	**NAPL**	**-1,904,000.00**	**1,904,000.00**	**.00**	**.00**
8295		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-1,904,000.00**	**1,904,000.00**	**.00**	**.00**
829500		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-1,904,000.00**	**1,904,000.00**	**.00**	**.00**
82950000		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-1,904,000.00**	**1,904,000.00**	**.00**	**.00**
82950000005		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	-1,904,000.00	1,904,000.00	.00	.00
84		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**1,904,000.00**	**.00**	**1,904,000.00**	**.00**
8405		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**1,904,000.00**	**.00**	**1,904,000.00**	**.00**
840500		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**1,904,000.00**	**.00**	**1,904,000.00**	**.00**
84050000		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**1,904,000.00**	**.00**	**1,904,000.00**	**.00**
84050000001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	1,904,000.00	.00	1,904,000.00	.00
			Total	.00	1,167,896,877.84	1,167,896,877.84	.00

CUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCION	SAL. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL

Estado Cuentas Pagadas
317453 FID 317453 INCOPAV S.A. INVIAS

Periodo Desde 01/07/2022 hasta 31/12/2022

SFI - Sistema Financiero Integrado
Módulo Cuentas por Pagar

20/01/2023 17:39:39
Programa: CPMRRERA
Paula Gissell Paez Muñoz

Vigencia : 2022


Nit	Descripción	Recu	OrPa	V.doc	TpDo	NroDoc	Vr. Bruto	Iva	DESCUENTOS				Reintegros	Vr. Neto
									Rete Fuente	Rete Iva	Rete ICA	Otros		
10892583	CHICA BENAVIDEZ HERNAN JOSE		5				3,431,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,431,750.00
800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		1				140,399.24	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	140,399.24
800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		4				2,346,821.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,346,821.00
800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		8				2,874,868.05	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,874,868.05
800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		9				2,659,726.58	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,659,726.58
800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		10				3,520,341.12	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,520,341.12
800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		11				3,598,312.13	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,598,312.13
830063087	INCOPAV S.A.		2				80,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00
830063087	INCOPAV S.A.		3				19,306,176.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	19,306,176.00
830063087	INCOPAV S.A.		6				2,938,652.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,938,652.00
900456426	INVERSIONES MG INGENIEROS SAS		7				130,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00
900456426	INVERSIONES MG INGENIEROS SAS		14				106,472,880.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	106,472,880.00
900473048	AGREGADOS Y CANTERAS DEL NORTI		13				17,416,320.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	17,416,320.00
901082283	KOLCEM SAS		12				48,739,149.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	48,739,149.00
901267748	TRITURADOS Y PAVIMENTOS DEL CAR		15				400,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00
						Totales	823,445,395.12	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	823,445,395.12

4.9.2 Seguimiento Programa de Obra: Se solicita la reprogramación al contratista de obra

administracion@ingevalsas.com.co
interventoriasucrecordoba@gmail.com
Cl 38 No. 32-41 of 806 Ed. Parque Santander
Tel 6628119
Villavicencio -Meta

CONTRATO COVEÑAS 2269

Id	EDT	Texto12	Texto13	Nombre de tarea	UND	CANT
1	1			**CONTRATO COVEÑAS**		
2	1.1			Acta de Inicio		
3	1.59			Ajuste diseños		0
4	1.57			Supensión 1	M3	3456.00
5	1.61			Ajuste diseños		0
6	1.58			Supensión 2	M3	1080.00
7	1.2			Actividades de socialización y vinculación de personal		
8	1.3			**TRAMO 1- PR 0+0000 AL PR 1+0200 (1.200 M)**		
9	1.3.1	1	210.1.3	EXCAVACION MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN	M3	540
10	1.3.6	1	210.1.3	EXCAVACION MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN	M3	2916
11	1.3.6	10	460.1P	FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	M3	540.00
12	1.3.6	20	700.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO.	M	3600.00
13	1.3.6	21	700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	1500.00
14	1.3.6	22	701.1	TACHA REFLECTIVA (Bidireccional)	UND	600.00
15	1.3.7	23	P	REDUCTORES DE VELOCIDAD PLASTICOS (Resalto Portatil .- Manual de Señalización vial 2015)	UND	150.00
16	1.3.7	24	710.1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IX O SUPERIOR (75 X 75) CM	UND	150.00
17	1.3.7		900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/K	58968.00
18	1.3.7		235.1	SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CEMENTO (INCLUYE SUMINISTRO DEI CEMENTO)	M3	1440.00
19	1.3.7		351.1	BASE TRATADA CON CEMENTO RESISTENCIA R-3.5 (INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO)	M3	1440.00
20	1.3.7		500.2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FRAGUADO RÁPIDO (FAST TRACK)	M3	1656.00
21				Fin tramo 1 .		
22	1.54			**TRAMO 2- PR 2+0200 AL PR 2+0260,PR 2+0800 AL PR 3+0400, PR 2+0473 AL PR 3+0400, PR 4+0500 AL PR**		
23	1.54.1	1	210.1.3	EXCAVACION MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN	M3	2826
24	1.54.6		420.2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTIC	M2	5334
25	1.54.7		421.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR::1	M2	5334
26	1.54.8		450.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC::19	M3	320.04
27	1.54.9		450.10I	MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO MSC-25	M3	320.04
28	1.54.1	10	460.1P	FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	M3	533.4
29	1.54.1	18	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 MPa	KG	10152.48
30	1.54.2	20	700.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO.	M	2667
31	1.54.2	21	700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	1750
32	1.54.2	22	701.1	TACHA REFLECTIVA (Bidireccional)	UND	400
33	1.54.2	23	P	REDUCTORES DE VELOCIDAD PLASTICOS (Resalto Portatil .- Manual de Señalización vial 2015)	UND	111.13
34	1.54.3		900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/K	45165.6
35	1.54.3		630.3.1	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - MEZCLA IN SITU	M3	145.99689
36	1.54.3		235.1	SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CEMENTO (INCLUYE SUMINISTRO DEI CEMENTO)	M3	1066.8
37	1.54.3		231.1	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M3	5422.9
38	1.54.3		351.1	BASE TRATADA CON CEMENTO RESISTENCIA R-3.5 (INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO)	M3	1066.8
39	1.54.1	1	210.1.3	EXCAVACION MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN	M3	2826
40	1.54.6		420.2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTIC	M2	5334
41	1.54.7		421.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR::1	M2	5334
42	1.54.8		450.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC::19	M3	320.04
43	1.54.9		450.10I	MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO MSC-25	M3	320.04
44	1.54.1	10	460.1P	FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	M3	533.4
45	1.54.1	18	640.1	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 MPa	KG	10152.48
46	1.54.2	20	700.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO.	M	2667
47	1.54.2	21	700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	1750
48	1.54.2	22	701.1	TACHA REFLECTIVA (Bidireccional)	UND	400
49	1.54.2	23	P	REDUCTORES DE VELOCIDAD PLASTICOS (Resalto Portatil .- Manual de Señalización vial 2015)	UND	111.13
50	1.54.3		900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/K	45165.6
51	1.54.3		630.3.1	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - MEZCLA IN SI	M3	145.99689
52	1.54.3		235.1	SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CEMENTO (INCLUYE SUMINISTRO DEI CEMENTO)	M3	1066.8
53	1.54.3		231.1	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	5422.9
54	1.54.3		351.1	BASE TRATADA CON CEMENTO RESISTENCIA R-3.5 (INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO)	M3	1066.8
55				fin tramo 2		
56	1.55			**TRAMO 3- PR 10+0400 AL PR 11+0206 PR 11+0206 AL PR 11+0708 11+0708 AL PR 12+0400 (2.000 M)**		
57	1.55.1		465.1	EXCAVACIÓN PARA REPARACION DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS Y DE LAS SUBYACENTES (codigo ICOCIV 11603)	M3	211.67
58	1.55.1		330.4	BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A (codigo ICOCIV 11602)	M3	155.97
59	1.55.1		420.2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL::1 (codigo ICOCIV 11603)	M2	146.65
60	1.55.1		421.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR::1 (codigo ICOCIV 11603)	M2	312.50
61	1.55.1		450.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC::19 (codigo ICOCIV 11603)	M3	23.44
62	1.55.1		450.10P	MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO MSC-25 (codigo ICOCIV 11603)	M3	28.16
63	1.55.1		420.2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL::1 (codigo ICOCIV 11603)	M2	410.37
64	1.55.1		421.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR::1 (codigo ICOCIV 11603)	M2	1,681.84
65	1.55.1		450.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC::19 (codigo ICOCIV 11603)	M3	139.11
66	1.55.1		450.10P	MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO MSC-25 (codigo ICOCIV 11603)	M3	27.54
67	1.55.			**Fase 2**		
68	1.55.1	12	465.1	EXCAVACIÓN PARA REPARACION DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS Y DE LAS SUBYACENTES	M3	1,938.33
69	1.55.1	5	330.4	BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	M3	844.03
70	1.55.1	6	420.2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL::1	M2	4,442.98
71	1.55.1	9	450.10P	MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO MSC-25	M3	544.30
72	1.55.1	7	421.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR::1	M2	10,005.66
73	1.55.1	8	450.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC::19	M3	1,301.45
74	1.55.1	20	700.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO.	M	8,000.00
75	1.55.1	21	700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	675.00
76	1.55.1	22	701.1	TACHA REFLECTIVA (Bidireccional)	UND	750.00
77	1.55.1	23	P	REDUCTORES DE VELOCIDAD PLASTICOS (Resalto Portatil .- Manual de Señalización vial 2015)	UND	250.00
78	1.55.1		900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	MSKM	3,120.00
79	1.55.1			Fin tramo 3		
80				Fin		

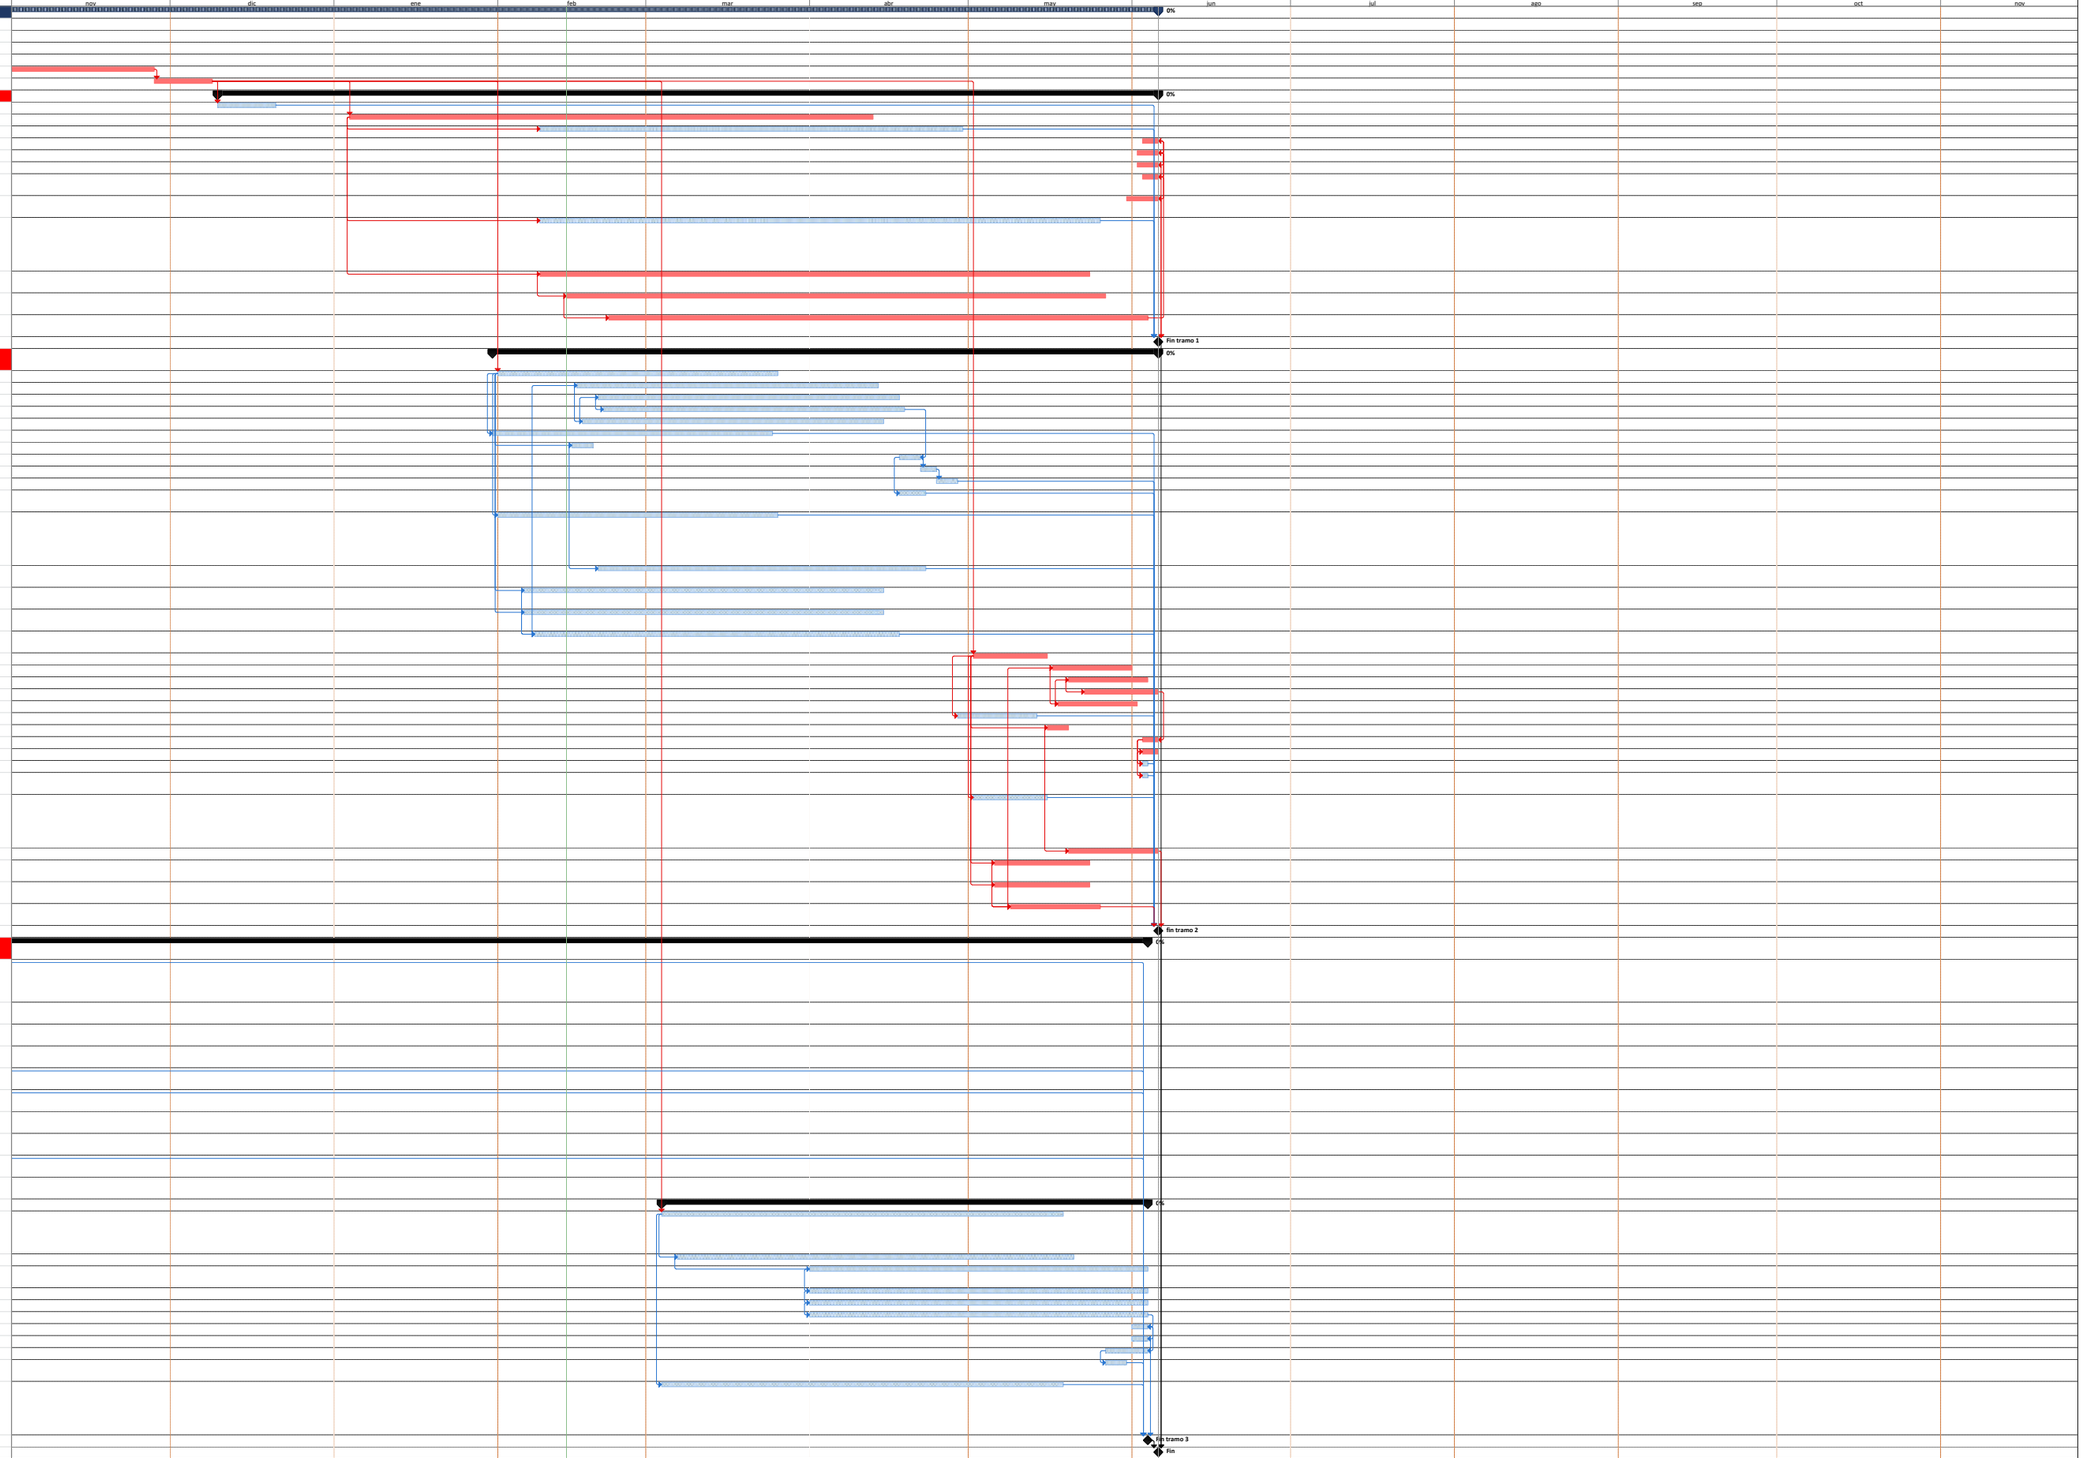

4.9.3 Seguimiento Programa de Inversiones - SE ANEXA FORMATO MEPI-MN-IN-6-FR-1 - MEPI-MN-IN-6-FR-2.Se debe realizar la reprogramación por parte del contratista de obra

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	02/12/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 2269 DE 2021

OBJETO: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA.

CONTRATISTA: INCOPAV S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2263 DE 2021 **INTERVENTOR:** INGEVAL S.A.S

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 11 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/02/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 05 DE JUNIO DE 2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/10/2022 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 28-nov-22 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 8,622,782,704.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** N/A
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 8,622,782,704.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor programado / % Ejecutado $ Valor Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					28 FEBRERO 20	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23
EXPLANACIONES (Items de pago 210.1.3P, 230P)	$973,379.110	13.68%	0.00%	% P	15.67%	58.21%	26.12%								1.14%	1.76%	22.51%	25.81%	9.99%	38.79%	
			$ -	$ P	$ 23,776.24	$ 88,305.41	$ 39,622.54								$ 11,064.60	$ 17,177.79	$ 219,094.42	$ 251,246.67	$ 97,238.71	$ 377,556.92	
				$ E																	
				% E											0.00%						
AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES (Item de pago 320.1, 330.1, 330,4)	$844,481.372	11.87%	1.65%	% P	9.18%	29.62%	37.66%	19.06%	4.47%						0.00%	0.00%	13.31%	27.36%	19.28%	37.30%	
			$23,251	$ P	$ 129,713.01	$ 418,362.37	$ 531,926.93	$ 269,235.93	$ 63,122.70						$ -	$ -	$ 112,364.88	$ 231,023.29	$ 162,834.43	$ 315,007.69	
				$ E				$ 23,251.07													
				% E				1.65%													
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (Items de pago 420.2, 421.1, 450.2P, 450.10P, 460.1P, 464.1, 465.1, 466.1)	$4,484,403.855	63.03%	3.58%	% P	4.04%	29.96%	32.24%	21.46%	12.30%						0.00%	0.01%	5.32%	19.77%	27.81%	37.42%	5.56%
			$184,232	$ P	$ 207,802.95	$ 1,542,344.68	$ 1,659,518.04	$ 1,104,998.97	$ 633,429.53						$ -	$ 631.06	$ 238,746.24	$ 886,472.00	$ 1,247,123.79	$ 1,677,959.61	$ 249,238.69
				$ E			$ 13,579.48	$ 40,040.70	$ 130,612.29												
				% E			0.26%	0.78%	2.54%												
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items de pago 600.1.1, 610.2, 630.4, 630.6, 640.1, 671.3,	$457,194.056	6.43%	0.00%	% P			11.13%	43.57%	45.30%						0.00%	0.00%	21.17%	17.85%	10.98%	39.44%	10.56%
			$ -	$ P			$ 9,990.87	$ 39,099.64	$ 40,653.74						$ -	$ -	$ 96,800.85	$ 81,586.11	$ 50,208.07	$ 180,320.04	$ 48,276.99
				$ E																	
				% E																	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items de pago700.1, 700.3, 701.1, P, 710.1)	$355,461.078	5.00%	0.00%	% P			5.95%	7.09%	86.97%										20.69%	14.41%	64.90%
			$ -	$ P			$ 18,621.47	$ 22,178.38	$ 272,216.15										$ 73,559.99	$ 51,212.12	$ 230,688.97
				$ E																	
				% E																	
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$7,114,919.47	100%	2.92%																		
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			$ 207,483.540																		

SUSPENSION No.1
AMPLIACIÓN No 1 SUSPENSION No. 1
AMPLIACIÓN No 2 SUSPENSION No. 1
AMPLIACIÓN No3 SUSPENSION No. 1
SUSPENSION No. 2
AMPLIACIÓN No 1 SUSPENSION No. 2

Reprogramacion No 1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		5%	29%	32%	20%	14%	0%	0%	0%	0%	0%	0.3%	9.4%	20.4%	22.9%	36.6%	7.4%
	VALOR (Miles de Pesos)		$361,292.201	$2,049,012.451	$2,259,679.836	$1,435,512.908	$1,009,422.073	$0.000	$0.000	$0.000	$0.000	$11,064.600	$17,808.851	$667,006.397	$1,450,330.072	$1,630,964.991	$2,602,056.378	$528,204.642
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		5.08%	33.88%	65.64%	85.81%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	3.07%	3.32%	12.70%	33.08%	56.00%	92.58%	100.00%
	VALOR (Miles de Pesos)		$361,292.201	$2,410,304.652	$4,669,984.488	$6,105,497.396	$7,114,919.469	$7,114,919.469	$7,114,919.469	$7,114,919.469	$7,114,919.469	$218,548.140	$236,356.991	$903,363.388	$2,353,693.460	$3,984,658.451	$6,586,714.829	$7,114,919.471
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		0.000%	0.000%	0.191%	0.890%	1.836%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%						
	VALOR (Miles de Pesos)		$0.000	$0.000	$13,579.477	$63,291.776	$130,612.287	$0.000	$0.000	$0.000	$0.000	$0.000						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		0.000%	0.000%	0.191%	1.080%	2.916%	2.916%	2.916%	2.916%	2.916%	2.916%						
	VALOR (Miles de Pesos)		$0.000	$0.000	$13,579.477	$76,871.253	$207,483.540	$207,483.540	$207,483.540	$207,483.540	$207,483.540	$207,483.540						

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y/OALISTES (INCLUYE POSIBLES OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)	$ 1,360,470.54	$ 14,929.10	1.10%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 7 X 24	$ 37,447.00	$ 0.00	$ 0.00
VALOR IVA (OBRA) (19%SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 62,209.19	$ 1,706.94	2.74%
VALOR BÁSICO REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAINFRAESTRUCTURA VIAL	$ 28,000.00	$ 0.00	0%
IVA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION, Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAINFRAESTRUCTURA VIAL	$ 5,320.00	$ 0.00	0%
TOTAL IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (Incluye IVA)	$ 14,416.50	$ 0.00	0%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 1,507,863.23	$ 16,636.04	1.10%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 8,622,782.70**	**$ 224,119.581**	**2.60%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')			

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
María Fernanda Mercelo
Representante legal obra
INCOPAV S.A.
C.C.: 52.812.081 DE BOGOTA

Aprueba Firma:
Nombre:CLAUDIA MILENA TRUJILLO ANGEL
Representante legal Interventoria
INGEVAL S.A.S.
C.C.: 40.442.830 de San Jose DE Guaviare

Revisó Firma:
Nombre: N.A
Titular Gei N.A.
Matrícula Profesional N.A.

Aprueba Firma:
Nombre: ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202212088 CND

Revisó Firma:
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor de Contrato de Interventoria- Director Territorial
Matricula profesional No.: 22202-204005 COR

Revisó Firma:
Nombre: DIEGO JOSÉ ABAD DURANGO
DIRECTOR TERRITORIAL
Matricula profesional No.: 08202-093534 ATL

Revisó Firma:
Nombre: Liliana Lizeth Garcia Meza
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 68202-328766 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2
FECHA	22/02/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10 **DE** 1 al 31 de enero (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 10
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 37,022,552

CONTRATO No: 2269 DE 2021

OBJETO:
MANTENIMIENTO Y RAHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA.


CONTRATISTA: INCOPAV S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2263 DE 2021 **INTERVENTOR:** INGEVAL S.A.S

PLAZO INICIAL: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022** (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **22/02/2022** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/10/2022 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ **8,622,782,704.00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ **8,622,782,704.00**

PLAZO ACUMULADO: **11 meses** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **HASTA EL 05 DE JUNIO DE 2023** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 28/11/2022 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** N/A

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		22-28 FEBRERO 2022	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23
EXPLANACIONES (Items de pago 210.1.3P,230P)	$973,379.11	13.68%	0.00%	% P		15.67%	58.21%	26.12%							1.14%	1.76%	22.51%	25.81%	9.99%	38.79%	
				$ P		$ 23,776.24	$ 88,305.41	$ 39,622.54							$ 11,064.60	$ 17,177.79	$ 219,094.42	$ 251,246.67	$ 97,238.71	$ 377,556.92	
			$22,254.19	$ E											$ 11,169.10	$ 11,085.09					
				% E											1.15%	1.14%					
AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES (Item de pago 320.1, 330,1, 330,4)	$844,481.37	11.87%	2.75%	% P		9.18%	29.62%	37.66%	19.06%	4.47%					0.00%	0.00%	13.31%	27.36%	19.28%	37.30%	
				$ P		$ 129,713.01	$ 418,362.37	$ 531,926.93	$ 269,235.93	$ 63,122.70					$ -	$ -	$ 112,364.88	$ 231,023.29	$ 162,834.43	$ 315,007.69	
			$23,251.07	$ E					$ 23,251.07												
				% E					1.65%												
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (Items de pago 420.2, 421.1, 450.2P, 450.10P, 460.1P, 464.1, 465.1, 466.1)	$4,484,403.85	63.03%	4.69%	% P		4.04%	29.96%	32.24%	21.46%	12.30%					0.00%	0.01%	5.32%	19.77%	27.81%	37.42%	5.56%
				$ P		$ 207,802.95	$ 1,542,344.68	$ 1,659,518.04	$ 1,104,998.97	$ 633,429.53					$ -	$ 631.06	$ 238,746.24	$ 886,472.00	$ 1,247,123.79	$ 1,677,959.61	$ 249,238.69
			$210,169.93	$ E				$ 13,579.48	$ 40,040.70	$ 130,612.29						$ 25,937.46					
				% E				0.26%	0.78%	2.54%						2.66%					
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items de pago 600.1.1, 610.2, 630.4, 630.6, 640.1, 671.3)	$457,194.06	6.43%	0.00%	% P				11.13%	43.57%	45.30%					0.00%	0.00%	21.17%	17.85%	10.98%	39.44%	10.56%
				$ P				$ 9,990.87	$ 39,099.64	$ 40,6[illegible]					$ -	$ -	$ 96,800.85	$ 81,588.11	$ 50,208.07	$ 180,320.04	$ 48,276.99
			$0.00	$ E																	
				% E																	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items de pago700.1, 700.3, 701.1, P, 710.1)	$355,461.08	5.00%	0.00%	% P				5.95%	7.09%	86.97%									20.69%	14.41%	64.90%
				$ P				$ 18,621.47	$ 22,178.38	$ 272,2[illegible]9									$ 73,559.99	$ 51,212.12	$ 230,688.97
			$0.00	$ E																	
				% E																	
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$7,114,919.47	100%	3.59%																		
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			$ 255,675.19																		

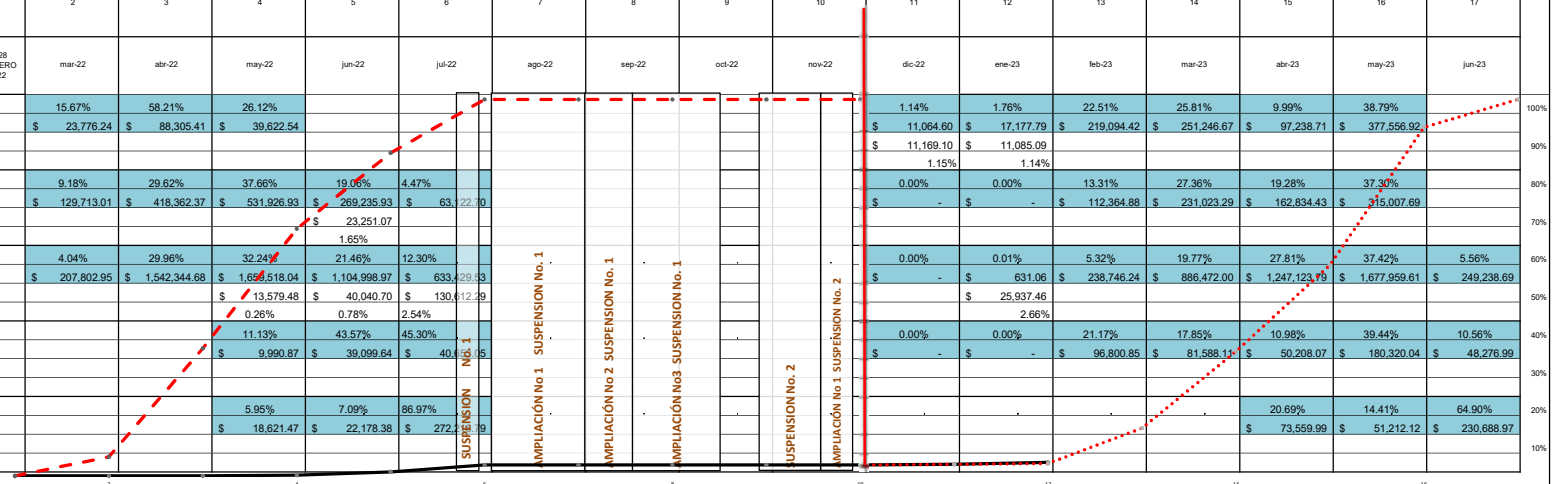

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$0	$0
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0%	5%	29%	32%	20%	14%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9%	20%	23%	37%	7%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.000	$361,292.201	$2,049,012.451	$2,259,679.836	$1,435,512.908	$1,009,422.073	$0.000	$0.000	$0.000	$0.000	$11,064.600	$17,808.851	$667,006.397	$1,450,330.072	$1,630,964.991	$2,602,056.378	$528,204.642
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	5.08%	33.88%	65.64%	85.81%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.16%	3.32%	12.70%	33.08%	56.01%	92.58%	100.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.000	$361,292.201	$2,410,304.652	$4,669,984.488	$6,105,497.396	$7,114,919.469	$7,114,919.469	$7,114,919.469	$7,114,919.469	$7,114,919.469	$218,548.14	$236,356.99	$903,363.39	$2,353,693.46	$3,984,658.45	$6,586,714.83	$7,114,919.47
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.000%	0.000%	0.000%	0.191%	0.890%	1.836%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.157%	0.520%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.000	$0.000	$0.000	$13,579.477	$63,291.776	$130,612.287	$0.000	$0.000	$0.000	$0.000	$11,169.099	$37,022.55					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.000%	0.000%	0.000%	0.191%	1.080%	2.916%	2.916%	2.916%	2.916%	2.916%	3.073%	3.594%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.000	$0.000	$0.000	$13,579.477	$76,871.253	$207,483.540	$207,483.540	$207,483.540	$207,483.540	$207,483.540	$218,652.639	$255,675.191					

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 2
FECHA	22/02/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10 **DE** 1 al 31 de enero (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 10
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 37,022,552

CONTRATO No: 2269 DE 2021

OBJETO:
MANTENIMIENTO Y RAHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA.

CONTRATISTA: INCOPAV S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2263 DE 2021 **INTERVENTOR:** INGEVAL S.A.S

PLAZO INICIAL: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022** (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: **11 meses** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **22/02/2022** (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **HASTA EL 05 DE JUNIO DE 2023** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/10/2022 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 28/11/2022 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** **$ 8,622,782,704.00** (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** N/A
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** **$ 8,622,782,704.00**

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES / VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN MES / % DE EJECUCIÓN ACUMULADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 1,360,470.54	$ 0.00	0.00%
		$ 15,625.64	1.15%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 37,447.00	$ 0.00	0.00%
		$ 0.00	0.00%
VALOR IVA (OBRA) (19%SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 62,209.19	$ 270,549.00	434.90%
		$ 1,982.58	3.19%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 28,000.00	$ 0.00	0.00%
		$ 0.00	0.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5,320.00	$ 0.00	0.00%
		$ 0.00	0.00%
TOTAL IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (Incluye IVA)	$ 14,416.50	$ 0.00	0.00%
		$ 0.00	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	**$ 1,507,863.23**	**$ 17,608.22**	**1.17%**
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 8,622,782.70**	**$ 273,283.41**	**3.17%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')			

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

Nombre: MARIA FERNANDA MARCELO
Representante legal obra
INCOPAV S.A.S
C.C.: 52.812.081 DE BOGOTA

Nombre: CLAUDIA MILENA TRUJILLO ANGEL
Representante legal Interventoria
INGEVAL S.A.S.
C.C.: 40.442.830 de San Jose DE Guaviare

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.9.4 Actas de Comité de Obra MEPI-MN-IN-14-FR-1

administracion@ingevalsas.com.co
interventoriasucrecordoba@gmail.com
Cl 38 No. 32-41 of 806 Ed. Parque Santander
Tel 6628119
Villavicencio -Meta

4.9.5 Actas de Reunión MEPI-MN-IN-14-FR-2.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 19/01/2023 (Dia / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 18
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DECARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 2269 DE 2021
(Indicar numero de contrato y año)

CONTRATISTA: INCOPAV S.A

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2263 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: INGEVAL S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE OBRA Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
AVANCE DE OBRA
ESTADO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se realiza la lectura de los compromisos del acta de reunion del 12 de enero del 2023.
El primer compromiso corresponde a la entrega de los apu no previstos los cuales se encuentran en revision de la interventoriay se proyecta la entrega para el dia martes 24 de enero .
El compromiso de l a maquinaria ya fue cumplido
Se inicia recorrido de obra en la abscisas PR12+400 donde el contratista propone la demolicion y construccion de cunetas , la interventoria y el INVIAS solicitan la entrega de la propuesta formal por medio de oficio del presupuesto y el alcance para los nuevos items no previstos y la ejecucion de las mismas.
En el tramo 2 el INVIAS solicita que se evalue y se presente concepto tecnico de el manejo hidraulico en la zona de la bomba .
Se solicita al contratista que realice la revision y se priorice el balance del presupuesto del contrato.
La interventoria solicita que se le de premura a la ejecucion de los diferentes tramos.
El programado a la fecha es de 4.05 % y el ejecutado de 3,08 para un atraso de 0,97 %

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 19/01/2023 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS | **FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)** | **RESPONSABLES**

Presenatr el balance del contrato	24/01/2023	INCOPAV
APU no previstos	24/01/2023	INCOPAV - INGEVAL
Inclio trabajos tramo 3	viernes, 20 de enero de 2023	INCOPAV
Concepto tecnico especialista hidraulico tramo 2	viernes, 3 de febrero de 2023	INCOPAV - INGEVAL

FECHA PROXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
DIEGO ABAD	DIRECTOR TERRITORIAL	INVIAS	
LUIS MIGUEL GONZALES OZUNA	SUPERVISOR	INVIAS	
WILLIAM VALENCIA CAMPOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	INGEVAL S.A.S	
BERNARDO CASTAÑEDA	RESIDENTE DE OBRA	INCOPAV S.A.S	
GUSTAVO HERNANDEZ	DIRECTOR DE OBRA	INCOPAV S.A.S	
ELIANA VILLALBA TORRES	RESIDENTE AUXILIAR	INGEVAL S.A.S	
KADERINNE MARIMÓN ARAGON	TRABJADORA SOCIAL	INGEVAL S.A.S	
ZULLY LOPERENA REDONDO	TRABJADORA SOCIAL	INCOPAV S.A.S	
RAFAEL VERGARA DE LA OSA	PROFESIONAL AMBIENTAL	INCOPAV S.A.S	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 12/01/2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 17
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DECARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 2269 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: INCOPAV S.A

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2263 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: INGEVAL S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE OBRA Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

AVANCE DE OBRA
ESTADO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia comite tecnico virtual a las 4 pm con sistencia de INGEVAL S.A.S, INCOPAV S.A.S y el INVIAS S.A.S.La interventoria informa que la meta Física Programada % 3,30% meta Física Ejecutada % 3,08% se evidencia un atraso Físico % -0,21% .Se informa al supervisor tecnico que se estan ejecutando actividades de excavacion en el tramo N° 1, se realiza preparación e instalacion de la subrasante con un 4% de cement.
La interventoría verifica instalación con vibrocompactador y riego.
Se encontró fallo en la abscisa PR0+190 al PR0+300 con un ancho de 2.70 y profundidad de 0.50
El fallo se evidencia sobre una tubería por lo cual el contratista de obra el día 6 de enero presenta propuesta para la solución de la problemática el uso de geocelda la cual es aprobada por la interventoría el 11 de enero del 2023 posterior a la evaluación del especialista en geotecnia
El dia 9 de enero se inicio con las excavaciones del PRO+020 AL PR0+060 dado a que este tramo no se había intervenido para minimizar la afectación en época de sembrinas los comerciantes
La interventoría realizo acompañamiento a la socialización de las intervenciones el sábado 7 de enero del 2023 con los comerciantes de la zona 2. TRAMO N°2
La interventoría junto con el contratista el 10 y 11 de enero están realizando la marcación de los sectores a intervenir definiendo cuales son los sectores críticos con el fin de establecer las abscisas definidas para el uso del geotextil y una evaluación respecto a los tramos que requieres manejo de aguas con cunetas
Se continúa con el levantamiento de actas de vecindad en los nuevos tramos asignados

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 12/01/2023 (Día / Mes / Año)

3. TRAMO N° 3 El día 11 de enero se terminó con el corte de pavimento el contratista proyecta iniciar con el retiro de la carpeta asfáltica en los tramos que requieren bacheo.
TRAMITES ADMINISTRATIVO:
1. Mediante oficio CI-N° 2263-2021-OFI N° 206 el 29/12/2022 se da aprobación del plan de inspección
2. Mediante oficio CI-N° 2263-2021-OFI N° 209 el 3/01/2023 se da aprobación de la programación y plan de inversiones
3. Mediante oficio CI-N° 2263-2021-OFI N° 213 del 6/01/2023 se da aprobación de maquinaria y se solicita que se anexe la documentación faltante del equipo mínimo y la presencia en obra de la maquinaria mínima según anexo técnico del contrato
4. Mediante oficio CI-N° 2263-2021-OFI N° 214 SE DA APROBACION TECNICA PARA EL USO DE GEOCELDA PARA EL FALLO DEL TRAMO 1

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Se realizara la entrega de los APU no previstos.	16/01/2023	INCOPAV S.A.S E INGEVAL S.A.S
Presentacion documentacion de la maquinaria	16/01/2023	INCOPAV S.A.S

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
LUIS MIGUEL GONZALES OZUNA	SUPERVISOR	INVIAS	
FERNANDO MARCELO CASAS	REPRESENTANTE LEGAL	INCOPAV S.A.S	
WILLIAM VALENCIA CAMPOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	INGEVAL S.A.S	
BERNARDO CASTAÑEDA	RESIDENTE DE OBRA	INCOPAV S.A.S	
ANGELA RODRIGUEZ CRUZ	CORDINADORA TECNICA	INGEVAL S.A.S	
GUSTAVO HERNANDEZ	DIRECTOR DE OBRA	INCOPAV S.A.S	
VIVIANA RODRIGUEZ		INCOPAV S.A.S	
ELIANA VILLALBA TORRES	RESIDENTE AUXILIAR	INGEVAL S.A.S	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
N°. DEL CONTRATO:	2263 DE 2021
OBJETO CONTRATO:	INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA
VALOR DEL CONTRATO:	NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($999.999.999,00), MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA.
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($999.999.999,00), MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA.
ANTICIPO:	CORRESPONDE AL 30% DEL VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, ES DECIR DE $840´336.134,oo BÁSICO DE INTERVENTORÍA, SE CALCULA EL PORCENTAJE AUTORIZADO, EQUIVALENTE A $252.100.840,oo
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	HASTA EL 5 DE JUNIO DEL 2023
PLAZO:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022
FECHA DE ORDEN DE INICIO:	22 DE FEBRERO DE 2022
SUSPENSION N° 1	15 DE JULIO DEL 2022 (15 DIAS)
AMPLIACION N° 1 A LA SUSPENSION N° 1	1 DE AGOSTO DEL 2022 (31 DIAS)
AMPLIACION N° 2 A LA SUSPENSION N° 1	1 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (15 DIAS)
AMPLIACION N° 3 A LA SUSPENSION N° 1	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (1 MES)
REINICIO N° 1	18 DE OCTUBRE DEL 2022
SUSPENSION N° 2	27 DE OCTUBRE DEL 2022 (20 DIAS)
AMPLIACION N° 1 A LA SUSPENSION N° 2	17 DE NOVIEMBRE DEL 2022 (10 DIA)
REINICIO N° 2	18 DE OCTUBRE DEL 2022
PRORROGA N° 1	5 DE DICIEMBRE DEL 2022 (6 MESES)
CONTRATISTA:	INGEVAL SAS identificado con NIT. 822004859-1.

CORREO ELECTRONICO:	administracion@ingevalsas.com.co *interventoriasucrecordoba@gmail.com*

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

- Mediante oficio CI-N° 2263-2021-OFI N° 208 con fecha 02 de enero de 2023, se aprueba orden de desembolso para la compra de COMPACTADOR DE LLANTA DYNAPAC CP 132 - REPOTENCIADA A 2011 MOTONIVELADORA FG85A - REPOTENCIADA A 2015) por un valor de $ 245.000.000

- Se entrega respuesta mediante CI-N° 2263-2021-OFI N° 209 a la solicitud probación programa de inversiones y cronograma de obra. Se informa que posterior a la revisión de los mismos se da aprobación ya que cumplen con los lineamientos establecidos por el Invias.

- El día 03 de enero de 2023 se remite oficio CI-N° 2263-2021-OFI N° 211, para el cual se solicita al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, sea revisado y ajustados los valores de salario del personal adscrito a la ejecución contractual conforme la expedición del decreto Nacional 2613 de 2021

- Mediante el oficio CI-N° 2263-2021-OFI N° 212 con fecha 05 de enero 2023 enviado por esta interventoría en atención a la visita realizada el pasado 27 de diciembre de 2022, con objeto del inicio de actividades para la ejecución del objeto del contrato de la referencia, se presenta el siguiente informe y evaluación de los tramos visitados: TRAMO 1- PR 0+0000 AL PR 1+0200 (1.200 M) – en ejecución 300m, TRAMO 2 - • TRAMO 2- PR 2+0200 AL PR 2+0260, PR 2+0800 AL PR 3+0400, PR 2+0473 AL PR 3+0400, PR 4+0500 AL PR 5+0200, (1.687 M), oficio emitido por Gustavo Adolfo Gamboa Beltrán, Esp. Diseño y construcción de vías y aeropistas

- El día 06 de enero de 2023 se solicitó mediante oficio CI-N° 2263-2021-OFI N° 213 al contratista Incopav SAS los documentos faltantes y presencia en obra del equipo mínimo requerido en el anexo técnico del proyecto

- Mediante el oficio CI-N° 2263-2021-OFI N° 214 con fecha 1 de enero de 2023, en el cual el especialista Gustavo Adolfo Gamboa Beltrán, Esp. Diseño y construcción de vías y aeropistas, emite concepto técnico Teniendo en cuenta las asignaciones oficiales de los tramos de obra de acuerdo a lo siguiente:
    - TRAMO 1- en el PR 0+180 AL PR 0+230 (1.200 M) Consideración ajuste al diseño de pavimento del tramo 1 K0+000 AL K1+200: donde se presenta un ajuste al diseño de pavimento, bajo la consideración manifestada de la no obtención "(…) del material de concreto en losa MR 43 Fast Track, el material que se produce con mayor facilidad en la zona y que tiene una similitud al presentado corresponde al MR 42 Acelerado a 7 días (…)", así las cosas, se valida que no existe variación en los otros parámetros de diseño y el cambio de un concreto MR43 a MR42, no implica una variación significativa se adjunta la validación del cálculo de la estructura de pavimento con la variación antes señalada, utilizando el método de diseño AASHTO - GUIA DE 1993 – RÍGIDO,

- En atención al comunicado No. INC-INVIAS-2269-INT-142 del 06 de enero de 2022 Se responde mediante oficio CI-N° 2263-2021-OFI N° 215, donde se remite propuesta de tratamiento para mejorar Sub Rasante por presencia de materiales inadecuados tramo 1: TRAMO 1- en el PR 0+180 AL PR 0+300 (120 M). Consideración al tratamiento de la estructura de pavimento del tramo 1 K0+1800 AL K0+300:
  - Deficiencia del material de soporte y protección de la tubería de alcantarillado del municipio
  - Se realiza excavación de 63 cm para remplazo de la estructura de pavimento y una sobre excavación 50 cm adicionales a la cota rasante del terreno donde se ubica la tubería de alcantarillado.
  - No es posible implementar una estabilización de la estructura con piedra rajón ya que el rajón puede afectar la tubería de 14" Novafort.
  - Se hace la revisión a la alternativa presentada y se evidencia que fueron tenidas en cuentas las recomendaciones informadas preliminarmente al contratista sobre el material de soporte (piedra rajon). Se evidencia que la estructura planteada es un complemento a la estructura de 63 cm que soporta un tráfico de 3.740.000 de ejes equivalentes de 8.2 toneladas en un periodo de diseño de 20 años. Se plantea la estabilización del material del terreno con el diseño ya aprobado estabilización con cemento al 3% el cual en ningún caso podrá ser inferior a ese 3%.

- Se envía oficio CI-N° 2263-2021-OFI N° 216 con fecha de 12 de enero 2023 a la contratista Incopav SAS en el cual se realiza la revisión del cronograma de actividades sociales del mes de enero del 2023 correspondiente al componente social, emitiendo por parte de la interventoría visto bueno para el desarrollo del mismo.

- Se radica oficio CI-N° 2263-2021-OFI N° 217 con fecha 12 de enero de 2023 dónde se oficializan las observaciones realizadas por el profesional social al informe mensual correspondiente al mes de noviembre y diciembre de 2022

- El día 13 de enero de 2023 mediante el oficio CI-N° 2263-2021-OFI N° 218 emitido por la interventoría mediante el concepto del Esp. Diseño y construcción de vías y aeropistas, en el cual se lleva a cabo la justificación técnica y su impacto y/o afectación en el alcance de las metas físicas del proyecto, por la generación de actividades no previstas y que son necesarias para la ejecución del contrato de la referencia solicitando la inclusión y aprobación de los ítems

  - NP 001- m3- SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CEMENTO (INCLUYE SUMINISTRO DEL CEMENTO;
  - NP 002- m3- BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO 5% (INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO) ;
  - NP 003- m3- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR-42 ACELERADO A 7 DÍAS.(Incluye acero) ,

- De lo anterior es preciso señalar que los mismo fueron evaluados en la propuesta de ajuste de pavimento presentada por INCOPAV SAS

- NP-001 235.1 SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CEMENTO (INCLUYE SUMINISTRO DEL CEMENTO)
- NP-002 351.1 BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO 5% (INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO)
- NP-003 500.1 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR-42 ACELERADO A 7 DÍAS. (Incluye acero)

- En el oficio CI-N° 2263-2021-OFI N° 2021 con fecha de 14 de enero 2023, se evidencia Traslado de observaciones realizadas por el Supervisor de Interventoría a la Programación de Obra y Plan de Inversiones.

- El día 16 de enero 2023 se emite oficio al contratista Incopav SAS CI-N° 2263-2021-OFI N° 2021, ejecutado la entrega de los APU no previstos

- Oficio CI-N° 2263-2021-OFI N° 2021con fecha 17de enero 2023, mediante el cual se entrega Revisión, aclaración resultado densidades sector PR 0+020 al PR 0+180 subrasante estabilizada con cemento presentada por INCOPAV SAS - vía COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02)

- El día 17 de enero 2023 mediante oficio CI-N° 2263-2021-OFI N° 224 dirigido a LUIS MIGUEL GONZALES, SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA INVIAS, en el cual se radican de hojas de vida personal Interventoría. Profesional Ambiental INGRID VICTORIA GUTIÉRREZ Especialista en Hidráulica e hidrología NATHALIA BUITRAGO Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad ROBINSON VARGAS

- Mediante oficio CI-N° 2263-2021-OFI N° 225 con fecha 18 de enero de 2023, se envía la Aprobación orden desembolso de anticipo N° 16, 17 y 18

- Oficio CI-N° 2263-2021-OFI N° 226 radicado el día 24 de enero de 2023 enviado al contratita Incopav SAS, mediante el cual de acuerdo a la visita realizada la Interventoría recomienda adelantar los siguientes estudios para inclusión en el alcance del Contrato: estudio de patología estructural, revisión por parte de un especialista en puentes, revisión por parte de especialista hidráulico, estudio de estabilidad en las bases de las aletas de entrada y salida del pontón, se recomienda verificar el estado de las barreras de seguridad a lado y lado de la estructura para así definir si es posible hacer uso de las mismas en el momento en que se realicen las actividades de rehabilitación de la estructura.

- Mediante el oficio CI-N° 2263-2021-OFI N° 226, con fecha de 25 de enero de 2023, el cual se radica la aprobación del programa de inversiones y cronograma de obra.

- El día 27 de enero de 2023 se radicó oficio CI-N° 2263-2021-OFI N° 228 al contratista Incopav SAS dando respuesta a solicitudes de pago ordenes de desembolso de anticipo N.o 19, 20, 21 y 22.

- El oficio CI-N° 2263-2021-OFI N° 230 con fecha 27 enero 2023 radicada al contratista, mediante al cual se responde al oficio INC-INVIAS-2269-INT- 157, en el cual manifiestan Inconvenientes suministro de materiales por bloqueos viales. La interventoría solicita que se allegue copia escrita de lo manifestado por el proveedor del contratista, toda vez que, es necesario tener los soportes correspondientes que justifiquen la situación que afecta directamente el cronograma de ejecución del Contrato de Obra N.° 2269 de 2021.

- Mediante el CI-N° 2263-2021-OFI N° 231 con fecha de 30 de enero de 2023, desde la interventoría se solicita la presencia en sitio de obra de la máquina denominada Recicladora de Pavimentos, toda vez que, esta hace parte de los equipos a usar para adelantar las actividades correspondientes a los diferentes tramos que comprenden el alcance del Contrato de Obra N.° 2269 de 2021. Lo anterior, es un factor que influye en el atraso de 1.18% en el cronograma de ejecución de obra que se evidencia desde la interventoría, razón por la cual se solicita tomar las medidas necesarias que permitan aumentar la ejecución de las actividades programadas en cada uno de los tramos y eliminar el atraso y cumplir con los plazos establecidos en el Contrato de Obra.

- El día 30 de enero del 2023, se radico oficio CI-N° 2263-2021-OFI N° 232 remitido al DIEGO JOSE ABAD, DIRECTOR TERRIOTORIAL CORDOBA INVIA, en asunto a la interferencias por ejecución de señalización tramo 1 Se ha recibido el comunicado del asunto, de parte del Contratista INCOPAV S.A.S., por medio del cual manifiesta lo siguiente:

  - "El pasado viernes 27 de enero en horas de la noche realizaron trabajos de demarcación, instalación de tachas y reductores de velocidad en el tramo 1 desde el PR 1+000 al PR 1+225. Es de aclarar que estas actividades están dentro de los alcances de nuestro contrato, razón por la cual solicitamos se nos indique si se debe realizar el retiro de estos elementos para poder acometer las obras necesarias. Se están haciendo averiguaciones para poder verificar quien ejecuto éstas actividades.
  - Por lo anterior, esta interventoría solicita amablemente al INVIAS de indicaciones formales y precisas sobre el proceder al respecto, puesto que la demarcación y elementos instalados por "PEQUEÑAS GRANDES OBRAS", serian retirados por el contratista de obra INCOPAV S.AS., una vez el avance de ejecución alcance la abscisa del sitio en mención, ya que las intervenciones del contrato de obra N. 2269 de 2021 son en toda la estructura sobre este tramo y que además el alcance de nuestro contrato contempla la señalización y demarcación de la totalidad del corredor vial Coveñas- Sabaneta.

- Con el fin de seguir con la trascendencia del tema anterior, mediante el oficio CI-N° 2263-2021-OFI N° 233 enviado el día 31 de enero de 2023 al contratista Incopav SAS, manifestado que Se ha recibido el comunicado ARMCS-506-2023, de parte del ARM Consulting Ltda – Administrador vial de las carreteras a cargo de INVIAS Dirección Territorial Sucre, por medio del cual manifiesta lo siguiente: Estado Señalización de las Obras del Contrato 2269 de 2021 (Sector Coveñas– Sabaneta). Por lo anteriormente expuesto se solicita al contratista subsanar esta situación lo antes posible y así evitar hechos que lamentar." el cual Estado Señalización de las Obras del Contrato 2269 de 2021 (Sector Coveñas– Sabaneta). Por lo anterior se solicita que mediante la implementación del PMT para el tramo 3, se instale la señalética necesaria que advierta a los

u

suarios del corredor vial del desnivel existente en los 50 metros de vía con el fin de garantizar la seguridad operacional de todos los actores viales, esto hasta tanto se garantice la superficie uniforme en el tramo 3 luego de terminar las intervenciones que se encuentran dentro del alcance contractual.

- Mediante el oficio CI-N° 2263-2021-OFI N° 234 enviado el día 31 de enero de 2023 al contratista Incopav SAS, mediante esta interventoría el realiza las respectivas observaciones en cuanto a la solicitud de aprobación e inclusión de los precios visor INVIAS- para la alternativa de diseño y solicitud de aprobación de ítems no previstos

- Mediante el SGI 1470 del 17 de enero de 2023 el Invias aprueba la hoja de vida el ingeniero ALLAN FERNANDO MONROY DUQUE identificado con cédula de ciudadanía No. 1.094.246.741 y matricula profesional 68202-255957STD, la interventoría procede con la integración del profesional al equipo de trabajo.

5.3 Informes especialistas y profesionales: se adjunta informe del DIRECTOR DE INTERVENTORIA y PROFESIONAL SOCIAL

Contrato N° 2263 DE 2021

Objeto: "INTERVENTORÍA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CÓRDOBA.".

Profesional: William Valencia Campos

Director de Interventoría

M.P: No. 25202-39413 CND

Tipo de documento: *** Informe N° _____** ☒ **10**

*** Otro _____** ☐

Periodo: Enero del 2023

Fecha: Enero del 2023

Contenido

1. **INTRODUCCIÓN** 3
2. **CONTENIDO** 3
3. **CONCLUSIONES** 6
4. **REGISTRO FOTOGRAFICO** 7

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene las actividades llevadas a cabo por el director de interventoría en la ejecución del contrato de obra N°. 2269 de 2021, entre el 1 al 31 de enero de 2023, de acuerdo con el seguimiento realizado en el contrato de Interventoría N°. 2263 de 2021 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CÓRDOBA".

2. CONTENIDO

2.1. Descripción del proyecto

A esta vía corresponde el paso nacional por el municipio de Coveñas del PR0+0000 al PR2+0300), y de los centros poblados de los corregimientos: El Reparo (Km 4), el Mamey (Km 5), Aserradero (Km 6), El hueso (Km 10) y corregimiento de Sabaneta (Km 16), en los cuales se evidencian fallas de la estructura del pavimento.

En los sectores clasificados en mal estado, se presentan deficiencias en la estructura del pavimento y su carpeta de rodadura, por fatiga de la misma reflejado en fallas tipo bache, piel de cocodrilo, fisuras longitudinales, abultamientos, ahuellamientos, desplazamiento y deformaciones, así como fuertes desniveles entre cunetas y carpeta asfáltica lo cual repercute en la disminución de la velocidad de operación normal del tránsito vehicular y representa alto riesgo de accidentalidad para los usuarios.

Se pretende realizar al mantenimiento y/o rehabilitación de los sectores de la vía que se encuentran regular y mal estado, se hace la anotación de que los tramos iniciales a intervenir dentro del contrato de obra N. 2269 de 2021 fueron determinados por el Ingeniero Mario Caballero, Director Territorial Sucre, en el acta de reunión de visita inicial del 25 de febrero de 2022 con presencia de la interventoría y el contratista de obra del proyecto, por otra parte tras varios comités y en respuesta a la solicitud del contratista de ampliar el alcance del contrato según oficio DT-SUC 43774 del 1 de agosto de 2022 se asignan a este contrato nuevos tramos los cuales eran objeto de ejecución del Convenio N. 915 de 2021 con la gobernación de Sucre para dar un alcance total de 4978 metros los cuales se dividen en los siguientes tramos:

• TRAMO 1- PR 0+0000 AL PR 1+0200 (1.200 M)

• TRAMO 2- PR 2+0200 AL PR 2+0260, PR 2+0800 AL PR 3+0400, PR 2+0473 AL PR 3+0400, PR 4+0500 AL PR 5+0200, (1.687 M)

• TRAMO 3- PR 10+0400 AL PR 11+0206 PR 11+0206 AL PR 11+0708 , 11+0708 AL PR 12+0400

(2.000 M)

Por otra parte, para mejorar la seguridad vial de este corredor se tiene previsto la demarcación horizontal de todo el corredor vial así: Entre los PR0+0000 al PR16+0000.

1.1 Características técnicas del proyecto

Las principales actividades y/o obras a ejecutar son las siguientes:

a. Rehabilitación del pavimento flexible y obras de mantenimiento en una longitud de 3.587 metros, en secciones priorizadas en los siguientes sectores:

• TRAMO 1- PR 0+0000 AL PR 1+0200 (1.200 M)

• TRAMO 2- PR 2+0200 AL PR 2+0260, PR 2+0800 AL PR 3+0400, PR 2+0473 AL PR 3+0400, PR

4+0500 AL PR 5+0200, (1.687 M)

• TRAMO 3- PR 10+0400 AL PR 11+0206 PR 11+0206 AL PR 11+0708 , 11+0708 AL PR 12+0400

(2.000 M)

b. Demolición de elementos en estructuras de drenaje (aletas, cunetas, disipadores), a lo largo de la vía, para reparación y mantenimiento, que garanticen eficiencia en funcionamiento.

c. Construcción de cunetas en concreto en sectores puntuales.

d. Demarcación vial entre los PR00+0000 al PR16+0000.

e. Señalización en sectores con Instituciones Educativas y paso por centros poblados a lo largo de la vía objeto, excepto los tramos que se intervendrán en la ejecución del convenio N. 915 de 2021 con la Gobernación de Sucre los cuales son del PR4+0500 al PR5+0000 y del PR2+0800 al PR3+0570.

f. Suministro e instalación de señalización vertical, en la vía entre PR00+0000 al PR16+0000

Los principales Ítems de pago:
- Explanaciones,
- Subbases, Bases, Afirmados
- Pavimentos Asfalticos
- Estructuras y Drenajes.
- Señalización y Seguridad.

El INVIAS entrega 2 documentos con los estudios para el Mejoramiento y Rehabilitación de las carreteras Coveñas-Sabaneta (Ruta 90SC02 realizados por la firma BATEMAN INGENIERIA SA y otro estudio Elaborado por el ingeniero José David Pastrana, los cuales fueron revisados para definir

las actividades de intervención de rehabilitación y/o mantenimiento en cada uno de los sectores del proyecto. De acuerdo a la revisión de estos estudios y diseños INCOPAV S.A.S se encuentra realizando las alternativas de diseño actualizadas de acuerdo a las necesidades actuales del proyecto.


2.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes por el director de interventoría:

- Representar a INGEVAL SAS, en todo lo referente a la relación contractual, ante las entidades estatales y privadas.
  - Se participa presencial en los comités realizados por el INVIAS los días 18 y 19 de enero del 2023.
- Supervisar los asuntos para que la interventoría cumpla a cabalidad con sus objetivos.
  - Se realiza seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista de obra.
- Vigilar todas las funciones y actividades de la interventoría referente a la buena ejecución de los trabajos, tramitación de los documentos ante la entidad, actualización de estudios y diseños.
  - Se solicita al contratista de obra en el comité del 18 y 19 de enero del 2023 realizar la entrega de los análisis de precios unitarios no previstos
- Supervisar que el contratista de obra cumpla con sus obligaciones contractuales
  - Se solicitan compromisos mediante el acta de comité realizada el 19 de enero del 2023 con el fin de que el contratista realice la entrega de la siguiente información
    - Presentar el Balance del Contrato
    - Presentación de APU no previstos
    - Iniciar trabajos en Tramo 3
    - Entrega concepto hidráulico tramo 2
- Realizar la revisión de los diseños estructurales de pavimento correspondientes a las obras a desarrollar por el contratista en la ejecución del proyecto.
  - Se solicita al contratista entregar una alternativa de diseño diferente para la falla encontrada en el tramo 1 a base de rajón, esta se realizó mediante el oficio N. CI-N° 2263-2021-OFI N° 214 del 10 de enero de 2023.
  - Se aprueba propuesta de diseño a la alternativa sobre el fallo encontrado entre el K0+180 al K0+300, por medio del oficio OFICIO N. CI-N° 2263-2021-OFI N° 215.
- Velar porque los recursos del contrato de obra se ejecuten de conformidad al presupuesto y demás obligaciones que le sean asignadas en virtud de la interventoría.
  - Se realiza visita a obra para evaluar el avance que lleva el contratista de obra de las actividades a ejecutar, así como la revisión del alcance del proyecto en conjunto con el supervisor de la entidad contratante.
- Seleccionar al personal de interventoría, verificando el cumplimiento de los requisitos del contrato y la organización.

- La interventoría cuenta con un personal calificado en cumplimiento a los requisitos del anexo técnico del contrato
- Supervisar el cumplimiento de las funciones del personal de la interventoría
- Cumplir instrucciones y demás obligaciones establecidas por el INVIAS
- En cumplimiento a la solicitud del Invias y en cumplimiento de las obligaciones de la interventoría el ingeniero director de interventoría realizo visita a obra para verificar el avance de las actividades del proyecto.

3. CONCLUSIONES

- La interventoría solicita al contratista agilizar los trámites para la aprobación de los análisis de precios unitarios no previstos.
- La interventoría solicita al contratista el inicio de actividades en el Tramo 3 – Sector Sacana
- La interventoría solicita al contratista entregar concepto hidráulico por parte de especialista, que permita definir solución al fallo de la vía en el tramo 2 entre el PR4+0700 la PR5+0200
-



Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

N° Matrícula Profesional: 25202-39413 CND

4. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS









Contrato N° 2263 DE 2021

Objeto: "INTERVENTORÍA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CÓRDOBA.".

Profesional: Allan Fernando Monroy Duque

Residente de Interventoría

M.P: No. 68202-255957 STD

Tipo de documento: *** Informe N°** _____ **6**

*** Otro** _____ ☐

Periodo: 19 al 31 de enero del 2023

Fecha: febrero del 2023

Contenido

1.INTRODUCCIÓN 3
2.CONTENIDO 3

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene las actividades llevadas a cabo por el residente de interventoría en la ejecución del contrato de obra N°. 2269 de 2021, entre el 1 de enero de 2023 al 31 de enero de 2023, de acuerdo con el seguimiento realizado en el contrato de Interventoría N°. 2263 de 2021 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CÓRDOBA".

2. CONTENIDO

2.1. Descripción del proyecto

A esta vía corresponde el paso nacional por el municipio de Coveñas del PR0+0000 al PR2+0300), y los centros poblados de los corregimientos: El Reparo (Km 4), el Mamey (Km 5), Aserradero (Km 6), El hueso (Km 10) y corregimiento de Sabaneta (Km 16), en los cuales se evidencian fallas de la estructura del pavimento.

En los sectores clasificados en mal estado, se presentan deficiencias en la estructura del pavimento y su carpeta de rodadura, por fatiga de la misma reflejado en fallas tipo bache, piel de cocodrilo, fisuras longitudinales, abultamientos, ahuellamientos, desplazamiento y deformaciones, así como fuertes desniveles entre cunetas y carpeta asfáltica lo cual repercute en la disminución de la velocidad de operación normal del tránsito vehicular y representa alto riesgo de accidentalidad para los usuarios.

Inicialmente se pretendía realizar al mantenimiento y/o rehabilitación de los sectores de la vía que se encuentran regular y mal estado, se realizó la anotación de que los tramos iniciales a intervenir dentro del contrato de obra N. 2269 de 2021 fueron determinados por el Ingeniero Mario Caballero, Director Territorial Sucre (primer supervisor), en el acta de reunión de visita inicial del 25 de febrero de 2022 con presencia de la interventoría y el contratista de obra del proyecto, estos tramos son:

* PR 0+0000 AL PR 1+0200 (1.200 M)

*PR2+0200 AL PR2+02800

*PR2+0473 AL PR2+0800

*PR10+0400 AL PR12+0400.

Adicional a los tramos establecidos por el supervisor el 25 de febrero del 2022 la dirección territorial por solicitud del contratista de obra y de interventoría asigna los siguientes tramos adiciones al contrato por medio de DT-SUC 43774 del 1 de agosto de 2022.

*PR 2+0800 AL PR 3+0400

*PR4+0500 AL PR 5+0200

Por otra parte, para mejorar la seguridad vial de este corredor se tiene previsto la demarcación horizontal de todo el corredor vial así: Entre los PR0+0000 al PR16+0000, excepto el tramo PR3+0400 al PR3+0500 los cuales se van a intervenir dentro del convenio interadministrativo N. 915 de 2021 entre la Gobernación de Sucre y el INVIAS.

2.2. Características técnicas del proyecto

Las principales actividades u obras por ejecutar son las siguientes:

a. Remplazo de pavimento flexible por losas en concreto rigido y mejoramiento de la estructura vial en 1.200 M en el sector poblado de Coveñas el cual corresponde a las siguientes abscisas:
   - TRAMO 1- PR 0+0000 AL PR 1+0200

b. Rehabilitación de pavimento flexible existente y obras de mantenimiento en una longitud de 3.687 metros, en secciones priorizadas en los siguientes sectores:

   - TRAMO 2- PR 2+0200 AL PR 2+0260, PR 2+0800 AL PR 3+0400, PR 2+0473 AL PR 3+0400, PR 4+0500 AL PR 5+0200
   - TRAMO 3- PR 10+0400 AL PR 11+0206 PR 11+0206 AL PR 11+0708 , 11+0708 AL PR 12+0400

c. Demolición de elementos en estructuras de drenaje (aletas, cunetas, disipadores), a lo largo de la vía, para reparación y mantenimiento, que garanticen eficiencia en funcionamiento.
d. Construcción de cunetas en concreto en sectores puntuales.
e. Demarcación vial entre los PR00+0000 al PR16+0000, excepto el tramo PR3+0400 al PR3+0500 los cuales se van a intervenir dentro del convenio interadministrativo N. 915 de 2021 entre la Gobernación de Sucre y el INVIAS.
f. Señalización en sectores con Instituciones Educativas y paso por centros poblados a lo largo de la vía objeto, excepto el tramo PR3+0400 al PR3+0500 los cuales se van a intervenir dentro del convenio interadministrativo N. 915 de 2021 entre la Gobernación de Sucre y el INVIAS.
g. Suministro e instalación de señalización vertical, en la vía entre PR00+0000 al PR16+0000, excepto el tramo PR3+0400 al PR3+0500 los cuales se van a intervenir dentro del convenio interadministrativo N. 915 de 2021 entre la Gobernación de Sucre y el INVIAS.

2.3. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes por el residente de interventoría:

- Se realiza acompañamiento en campo para verificación de actividades de mejoramiento de subbase y base en el Tramo 1 entre el PR0+190 y el PR0+290.
- Se realiza acompañamiento en las diferentes actividades realizadas en campo en los tramos 1 y Tramo 3.
- Se realizó visita in situ al puente ubicado en el PR6+150 con el fin de verificar el estado estructural, atendiendo solicitud del administrador vial, sobre la inclusión del mantenimiento de esta estructura en el alcance del contrato.
- Se realiza verificación preliminar de los tramos establecidos en el alcance y definidos anteriormente con el Supervisor INVIAS Mario Caballero. Se programa verificación para definición final de los mismos con el nuevo supervisor Luis Gonzalez.
- Se asiste a reunión en la territorial de Córdoba para verificación de contenido de formatos para inclusión de nuevos ítems de obra.
- Se acompaña las reuniones de seguimiento a las veedurías del sector Sacana y Guayabal realizadas el 31 de enero de 2023.



Nombre: ALLAN FERNANDO MONROY DUQUE

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

INGEVAL S.A.S.

N° Matrícula Profesional: 68202-255957 STD

Contrato N° 2263 DE 2021

Objeto: "INTERVENTORÍA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CÓRDOBA.".

Especialidad: Geotecnia y/o pavimentos

Profesional: Gustavo Adolfo Gamboa Beltrán

Tarjeta Profesional: 25202-329211CND

Tipo de documento: *** Informe N° 8** ☐

*** Otro** _____ ☐

Periodo: 1 al 31 de enero del 2023

Fecha: 6 de febrero del 2023

Tabla de contenido

1. 1.INTRODUCCIÓN 3
1.1 Información Del Proyecto 3
1.1.1 Localización 4
1.1.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 5
2. 2.Desarrollo de actividades 6
2.1 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes por el especialista de Geotecnia y/o pavimentos 17
3. 3.CONCLUSIONES 17

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al **informe No. 3** realizado por el especialista en geotecnia y/o pavimentos de la interventoría en la ejecución del contrato de obra N°. 2269 de 2021, entre el 1 de enero de 2023 al 31 de enero de 2023, de acuerdo al seguimiento realizado en el contrato de Interventoría N°. 2263 de 2021 cuyo objeto es "**INTERVENTORÍA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CÓRDOBA".**

El periodo del presente informe comprende las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el **1 de enero del 2023 al 31 de enero de 2023**, donde se brindó asesoría a la empresa INGEVAL SAS en el seguimiento a los estudios y diseños recibidos, la revisión de estos y propuesta de actualización de la estructura de pavimento, al igual que el proceso constructivo, en el desarrollo del contrato de interventoría.

Inicialmente se describe el reconocimiento del corredor y de sus características, paso básico para la programación de las etapas subsiguientes; posteriormente se presenta un resumen de cada uno de los temas concernientes a la estructura de pavimentos e intervenciones de mantenimiento o rehabilitación, de acuerdo a los estudios que se aprueben para adelantar los trabajos en el marco del proyecto, para así mismo de manera seguida definir unas conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta por parte de la interventoría y el contratista de obra.

1.1 Información Del Proyecto

A esta vía corresponde el paso nacional por el municipio de Coveñas del PR0+0000 al PR2+0300), y de los centros poblados de los corregimientos: El Reparo (Km 4), el Mamey (Km 5), Aserradero (Km 6), El hueso (Km 10) y corregimiento de Sabaneta (Km 16), en los cuales se evidencian fallas de la estructura del pavimento.

En los sectores clasificados en mal estado, se presentan deficiencias en la estructura del pavimento y su carpeta de rodadura, por fatiga de la misma reflejado en fallas tipo bache, piel de cocodrilo, fisuras longitudinales, abultamientos, ahuellamientos, desplazamiento y deformaciones, así como fuertes desniveles entre cunetas y carpeta asfáltica lo cual repercute en la disminución de la velocidad de operación normal del tránsito vehicular y representa alto riesgo de accidentalidad para los usuarios.

Se pretende realizar al mantenimiento y/o rehabilitación de los sectores de la vía que se encuentran regular y mal estado, se hace la anotación de que los tramos a intervenir dentro del contrato de obra N. 2269 de 2021 fueron determinados por el Ingeniero Mario Caballero, director Territorial Sucre, en el acta de reunión de visita inicial del 25 de febrero de 2022 con presencia de la interventoría y el contratista de obra del proyecto, estos tramos son:


- PR0+0000 AL PR1+0200
- PR2+0200 AL PR2+02800
- PR2+0473 AL PR2+0800
- PR10+0400 AL PR12+0400.

Por otra parte, para mejorar la seguridad vial de este corredor se tiene previsto la demarcación horizontal de todo el corredor vial así: Entre los PR0+0000 al PR16+0000, excepto los tramos del PR2+0800 al PR3+0570 y del PR4+0500 al PR5+0000 los cuales se van a intervenir dentro del convenio interadministrativo N. 915 de 2021 entre la Gobernación de Sucre y el INVIAS.

De acuerdo con el alcance del proyecto, fundamentado en las visitas y el desarrollo de los trabajos, así como al tener en cuenta los sectores en garantía del contrato 1192 de 2016 se relacionan tres sectores para el desarrollo los cuales son los definidos en el desarrollo de este proyecto, estos corresponden a 1) PR0+000 AL PR1+200, 2) PR2+200 al PR2+800 y 3) PR10+400 al PR12+400.

1.1.1 Localización

El tramo a intervenir corresponde a la vía Coveñas – Sucre (paso nacional – PR0+0000) hasta el corregimiento de Sabaneta (PR16+0000) del Municipio de Momil - Córdoba; esta vía pertenece a la Ruta 90, código 90SC02 es un ramal a la transversal del Caribe y está ubicada en el departamento de Sucre y Córdoba.

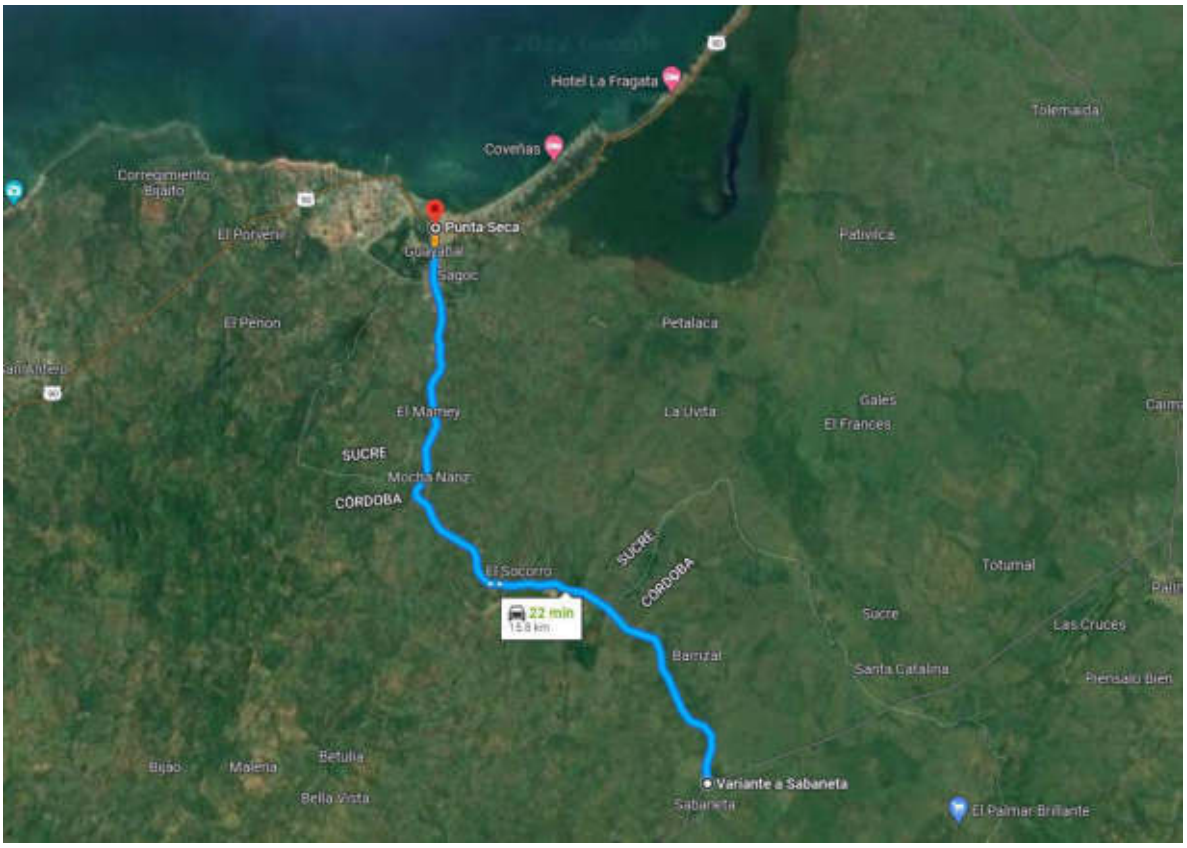

1.1.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

El tramo se ubica en jurisdicción de los departamentos de Sucre desde PR0+000 al PR6+000 (aproximadamente 5,5 km), en dicho tramo se encuentran localizados el puente el reparo en el PR4+045 y el puente El mamey en el PR5+0311. Lo anterior pertenece al Municipio de Coveñas Sucre.

Luego continua en el Municipio de Purísima - Córdoba con el corregimiento de Aserradero sobre el PR6+000 y el Hueso a partir del PR9+000 al PR11+000.

Sigue en el municipio de Momil – Córdoba a partir del PR12+000 (Sacana) hasta el corregimiento de Sabaneta – Momil sobre el PR16+000.

La totalidad de la vía cuenta con una calzada bidireccional con ancho promedio de 6,0 m y con estructura de pavimento flexible en toda su longitud.

1.2. Desarrollo de actividades

En comunicado No. INC-INVIAS-2269-INT-140 del 30 de diciembre de 2022, el contratista INCOPAV S.A.S. remite propuesta de tratamiento para mejorar sub rasante por presencia de materiales inadecuados tramo 1A dado que a partir del PR 0+180 y hasta el PR 0+250, se encuentra la presencia de un estrato Limo Arcilloso con muy baja consistencia que nos está causando inconvenientes para poder soportar las capas de materiales, adicional a esto se evidencia la presencia de una red de alcantarillado existente.



FALLAS SECTOR PR 0+180 AL PR 0+250

lo cual esta interventoría en OFICIO N. CI-N° 2263-2021-OFI N° 214, del 10 de enero de 2023 emite concepto solicitando una alternativa diferente dado que el rajon puede afectar la red de alcantarillado, en los siguientes términos:

"(…)

- ***TRAMO 1****- en el PR 0+180 AL PR 0+230 (1.200 M)*

Consideración ajuste al diseño de pavimento del tramo 1 K0+000 AL K1+200:

Con base en lo señalado en correo del contratista del 14 de diciembre de 2022, donde se presenta un ajuste al diseño de pavimento, bajo la consideración manifestada de la no obtención "(…) del material de concreto en losa MR 43 Fast Track, el material que se produce con mayor facilidad en la zona y que tiene una similitud al presentado corresponde al MR 42 Acelerado a 7 días (…)", así las cosas, se valida que no existe variación en los otros parámetros de diseño y el cambio de un concreto MR43 a MR42, no implica una variación significativa se adjunta la validación del cálculo de la estructura de pavimento con la variación antes señalada, utilizando el método de diseño AASHTO - GUIA DE 1993 – RÍGIDO,

- *Con lo cual se presenta alternativa a la estructura de pavimento rígido para el tramo 1 K0+180 AL K0+230 de la vía Coveñas-Sabaneta (RUTA 90SC02).*

  - ***Losa de concreto MR-42*** ***23 cm.***
  - ***Base tratada con cemento R3.5*** ***20 cm***
  - ***subrasante mejorada con cemento al 3%*** ***20 cm***
  - ***Geotextil***
  - ***Piedra Rajón*** ***50 cm***

Se hace la revisión a la alternativa presentada y se hacen las siguientes consideraciones:

1. *Complementar la solicitud allegando lo siguientes ensayos del material, con el fin de determinar la caracterización del material encontrado:*

   a. *CBR*
   b. *Limites de Atterberg*
   c. *Modulo de Reacción*
   d. *Ensayo de expansión*

   Cabe resaltar que el tratamiento de piedra rajón para la estabilización de subrasantes es empleado en suelos con CBR bajos y de alta plasticidad.

2. *Si bien a priori la inspección visual del material y conforme a la prueba realizada en campo señala que es un material de baja capacidad portante dado las deformaciones evidenciadas con la prueba de la volqueta, la estabilización con piedra rajón podría ser una alternativa, se debe pensar también en la presencia de la red de alcantarillado, la cual podría ser afectada por la piedra rajón, por lo cual se debe presentar una alternativa que mitigue la afectación a esta tubería y tener en cuenta la norma que aplique en sector la empresa pública prestadora del servicio con la cual que garantice la protección de la mismas, por lo cual se recomienda revisar el recubrimiento de la misma con material granular seleccionado y competente, para soportar la estructura de pavimento y futuro transito sobre la misma.*

(…)”

En este sentido INCOPAV SAS da alance en comunicado INC-INVIAS-2269-INT-142 presentado una alternativa para la protección de la tubería en este sector en base a la instalación de materiales granulares y una geomalla con celdas que permite una mejor transmisibilidad de cargas, y separando los esfuerzos que actúan sobre la tubería, generando un mayor soporte de las estructuras en este sector.

En este sentido se emitió concepto mediante el OFICIO N. CI-N° 2263-2021-OFI N° 215 COVEÑAS, del 11 de enero de 2023, aprobando la alternativa propuesta en los siguientes términos:


"(…)

En atención a su comunicado No. INC-INVIAS-2269-INT-142 del 06 de enero de 2022, donde se remite propuesta de tratamiento para mejorar Sub Rasante por presencia de materiales inadecuados tramo 1: ***TRAMO 1****- en el PR 0+180 AL PR 0+300 (120 M)*

Consideración al tratamiento de la estructura de pavimento del tramo 1 K0+1800 AL K0+300:

- *Deficiencia del material de soporte y protección de la tubería de alcantarillado del municipio*
- *Se realiza excavación de 63 cm para remplazo de la estructura de pavimento y una sobre excavación 50 cm adicionales a la cota rasante del terreno donde se ubica la tubería de alcantarillado.*
- *No es posible implementar una estabilización de la estructura con piedra rajón ya que el rajón puede afectar la tubería de 14" Novafort.*

- *Con lo cual se presenta propuesta a la estructura de pavimento rígido para el tramo 1 del K0+180 AL K0+300 de la vía Coveñas-Sabaneta (RUTA 90SC02) así:*

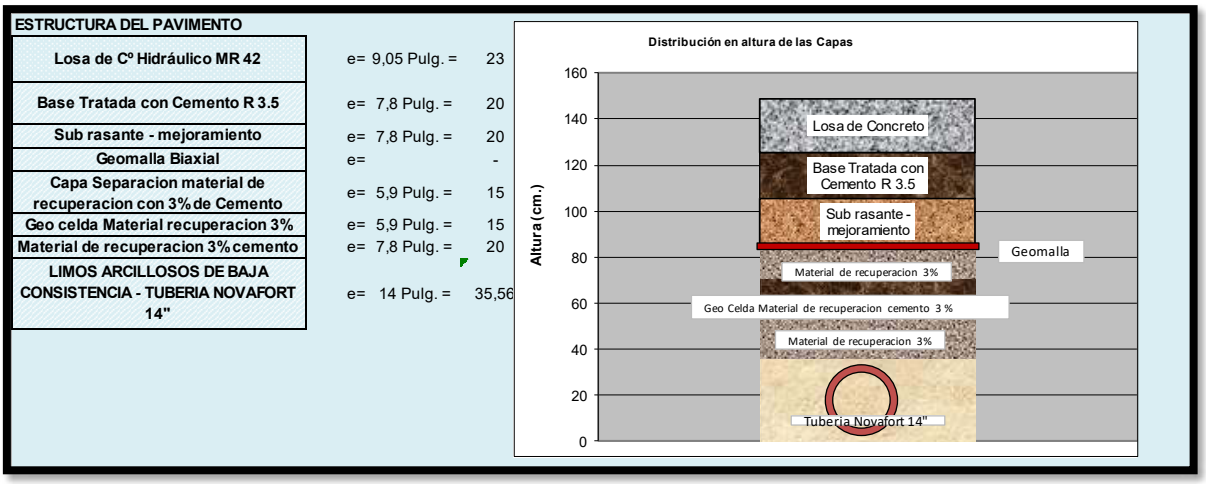

Se hace la revisión a la alternativa presentada y se evidencia que fueron tenidas en cuentas las recomendaciones informadas preliminarmente al contratista sobre el material de soporte (piedra rajon).

Se evidencia que la estructura planteada es un complemento a la estructura de 63 cm que soporta un tráfico de 3.740.000 de ejes equivalentes de 8.2 toneladas en un periodo de diseño de 20 años.

Se plantea la estabilización del material del terreno con el diseño ya aprobado estabilización con cemento al 3% el cual en ningún caso podrá ser inferior a ese 3%.

La GEOCELDA conforman un sistema de CONFINAMIENTO DEL SUELOS, lo cual permite la colocación de un material de mejor manipulación, la colocación de la geomalla biaxial funciona como refuerzo y mitigación de los esfuerzos sobre la estructura conformada para protección de la tubería dando una mayor rigidez con el fin de evitar cargas puntuales sobre la tubería del alcantarillado.

De igual mañanera se debe tener en cuenta las recomendaciones generales técnicas que se han presentado en comunicaciones anteriores por parte del consultor y la interventoría, en este orden de ideas se considera viable la estructura planteada.

Por las anteriores consideraciones se considera viable, la implementación del sistema presentado por INCOPAV SAS.

(…)"

Por otra parte, el contratista INCOPAV en comunicado del 14 de diciembre de 2022, remite la justificación técnica y su impacto y/o afectación en el alcance de las metas físicas del proyecto, por la generación de actividades no previstas y que son necesarias para la ejecución del contrato de la referencia.

En el cual se solicita la inclusión y aprobación de los ítems

- NP 001- m3- SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CEMENTO (INCLUYE SUMINISTRO DEL CEMENTO;
- NP 002- m3- BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO 5% (INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO);
- NP 003- m3- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR-42 ACELERADO A 7 DÍAS. (Incluye acero) ,

En este sentido, se emitió concepto técnico en relación a los 3 APU´s en los siguientes términos:

"(…)


Consideración ajuste al diseño de pavimento del tramo 1 K0+000 AL K1+200:

1. ***NP-001 235.1 SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CEMENTO (INCLUYE SUMINISTRO DEL CEMENTO)***


De acuerdo a los cálculos y propuestas de intervención de diseño presentada por INCOPAV SAS, y aprobados por esta interventoría, para garantizar la estabilidad, funcionalidad y duración de la intervención en los tramos, se requiere una estabilización de la subrasante que aporte una correcta plataforma de soporte para lo estructura a construir, situación determinada en los diseños propuestos

para la intervención de los tramos, siendo importante destacar que al momento de la ejecución se podrá presentar algunos sectores de muy bajas resistencias y en razón de ello se recomendaría la mejora de estas áreas, empleando el material de fresado al 50%, mezclado con el material existente (fresado 50%-material existente 50%) Pavimento asfáltico reciclado (RAP, por sus siglas en inglés) y la utilización de Cemento al 4%, se hace la salvedad que el diseño se realizó con el 3 % de la masa seca del material por estabilizar, se considera por parte del contratista 1% adicional en base al desperdicio, así las cosas se recomienda que en ningún caso la subrasante puede contener menos del 3% de cemento, no es recomendable usar cementos con tiempo de fraguado menor a una hora, ni mayor a diez horas, con el fin de que sea manejable la mezcla.

Por consiguiente, se proyectó la mejora de la condición de capacidad de soporte y la manejabilidad de la capa actividad especificada en el CAPITULO 2 ***Artículo 235 – 22, ESTABILIZACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y TERRAPLÉN CON CEMENTO*** *capa que se encuentra considerada en un espesor de 20 cm en cada uno de los sectores a intervenir:*

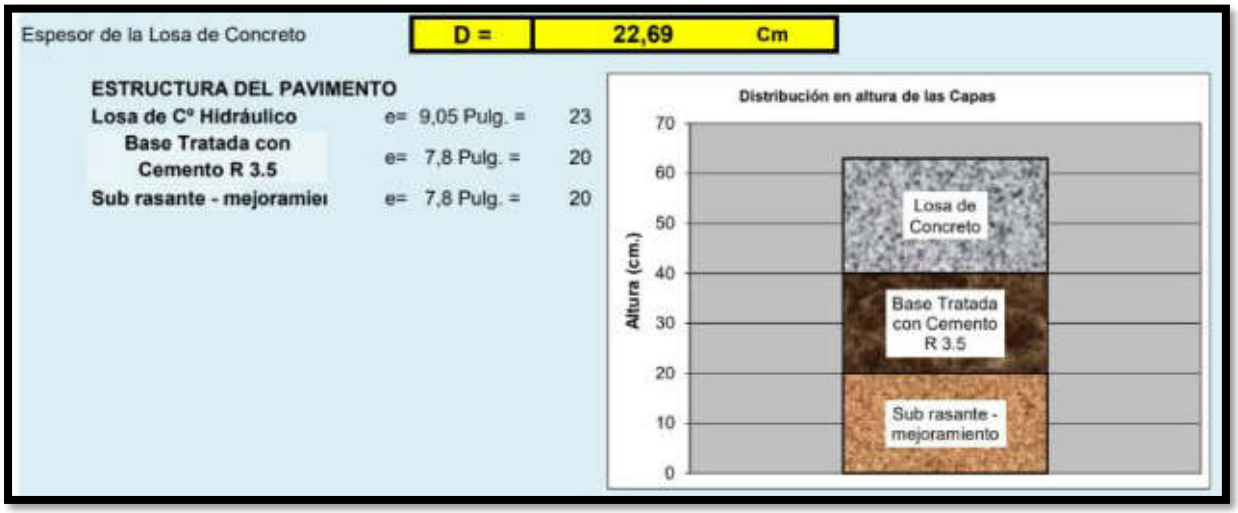

Esquema No 1 – Estructura de pavimento tramo 1 Autor Especialista Gustavo Gamboa – fecha 21-Dic-2022

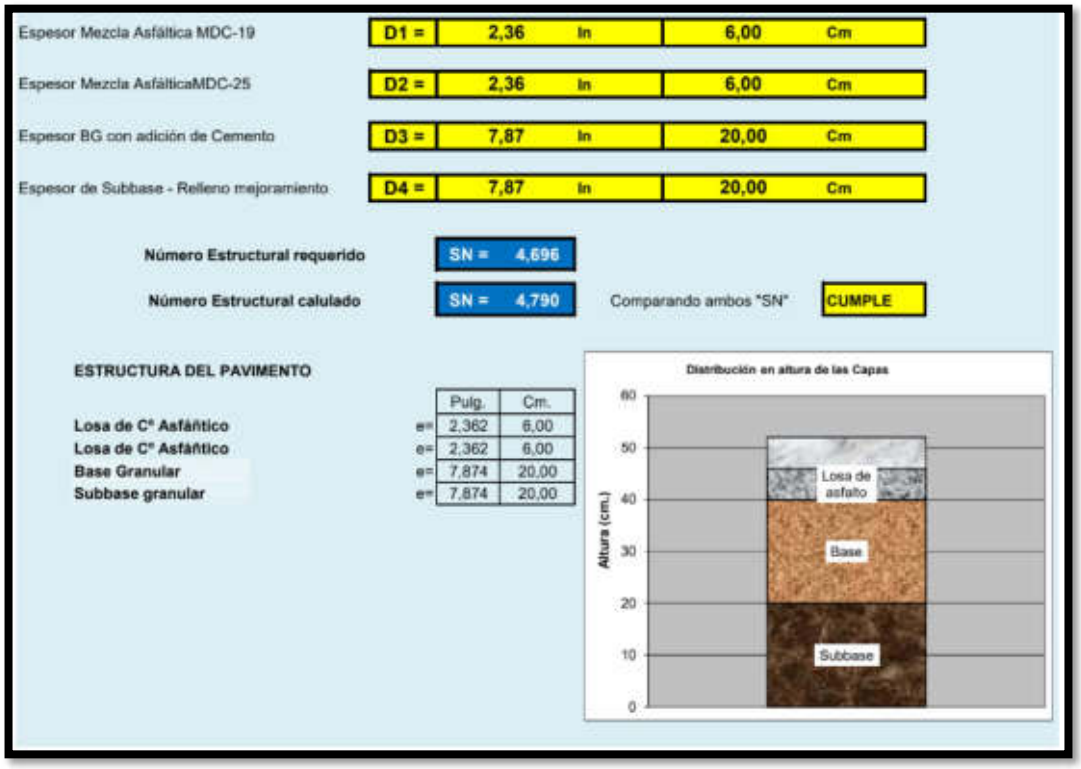


Esquema No 2 – Alternativa tramo 2 Autor Especialista Gustavo Gamboa – fecha 12-Nov-2022

Sector	Alternativa
2	**Alternativa Sector 2** / **Espesor (cm)** Mezcla Asfáltica: 12 Base Estabilizada con Cemento: 20 Material de Plataforma: 20
3	La alternativa para el Sector 3 consiste en la ejecución de actividades de mantenimiento a la carpeta asfáltica y posterior a esto la instalación de una sobrecarpeta con los espesores propuestos en la tabla **Alternativa Sector 3** / **Espesor (cm)** Mezcla Asfáltica - Sobrecarpeta: 12 Mezcla Asfáltica Actual: ---- **NOTA**: Sin detrimento de lo anterior es importante tener en cuenta que al momento de las reparaciones y al evaluar la intervención en caso de que se requiera retiro de materiales granulares, se tendrá que implementar la siguiente estructura en tal sentido, y cuando sean parcheos y bacheos. **Alternativa Sector 3** / **Espesor (cm)** Mezcla Asfáltica - Sobrecarpeta: 12 Mezcla Asfáltica y Granulares de Reposición: Ver Comentario Geotextil: Ver Comentario Material de Plataforma: 20 **Comentario**: Esta reposición se hará en los mismos espesores retirados siendo importante destacar que éstos en lo posible no serán menores de 10 cm para la mezcla asfáltica y 20 cm para la Base Granular y que se recomienda la colocación de un geotextil para generar la separación y la protección entre la capa de mejoramiento y los granulares de reposición.

Esquema No 3 – Autor Especialista Carlos Yidi Villarreal – fecha 01-nov 2022

2. NP-002 351.1 BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO 5% (INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO)

De acuerdo a los cálculos y propuestas de intervención de diseño por ICOPAV SAS, y aprobado por esta interventoría, de acuerdo a la propuesta de la implementación de una base estabilizada con cemento para garantizar la estabilidad, funcionalidad y duración de la intervención en los tramos y así logrando una plataforma de trabajo y soporte de la estructura de pavimento, tomando como referencia las especificaciones en el Capítulo 3 – AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES ***Art. 350 Materiales granulares tratados con cemento como capa estructural*** *Artículo 350 – 22 Deben ser construidas de acuerdo a los criterios de establecidos para garantizar el mejoramiento de la capa base y mejore el desempeño del tramo a intervenir, según lo indicado por los especialistas, por lo que se recomienda el contenido de cemento no debe ser inferior a tres por ciento (3 %) de la masa seca del material por estabilizar.*

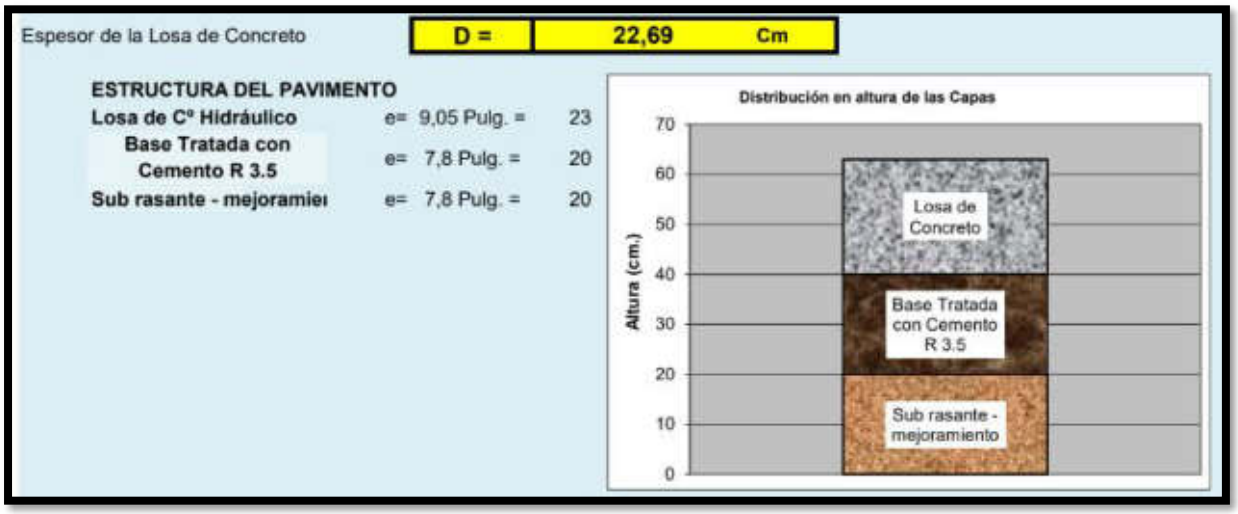

Esquema No 1 – Estructura de pavimento tramo 1 Autor Especialista Gustavo Gamboa – fecha 21-Dic-2022


Sector	Alternativa	
	Alternativa Sector 2	Espesor (cm)
2	Mezcla Asfáltica	12
	Base Estabilizada con Cemento	20
	Material de Plataforma	20

Esquema No 3 – Autor Especialista Carlos Yidi Villarreal – fecha 01-nov 2022

3. NP-003 500.1 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR-42 ACELERADO A 7 DÍAS. (Incluye acero)

De acuerdo a los cálculos y propuestas de intervención de diseño presentado por INCOPAV SAS, y aprobada por esta interventoría, por la condición presentada en la zona urbana del municipio de

Coveñas y al tener en cuenta que el manejo de tráfico se deberá en gran medida realizar mediante la utilización del mismo corredor como vía de desvió a partir del cierre parcial de carriles, ("Broches Pare-Siga) se hace fundamental la utilización de HIDRÁULICO MR-42 ACELERADO A 7 DÍAS con la finalidad de generar el menor traumatismo a la circulación vehicular, tal y como se especifica en Capítulo 5 – ***PAVIMENTOS DE CONCRETO Art. 500 Pavimento de concreto hidráulico Artículo 500 – 22,***

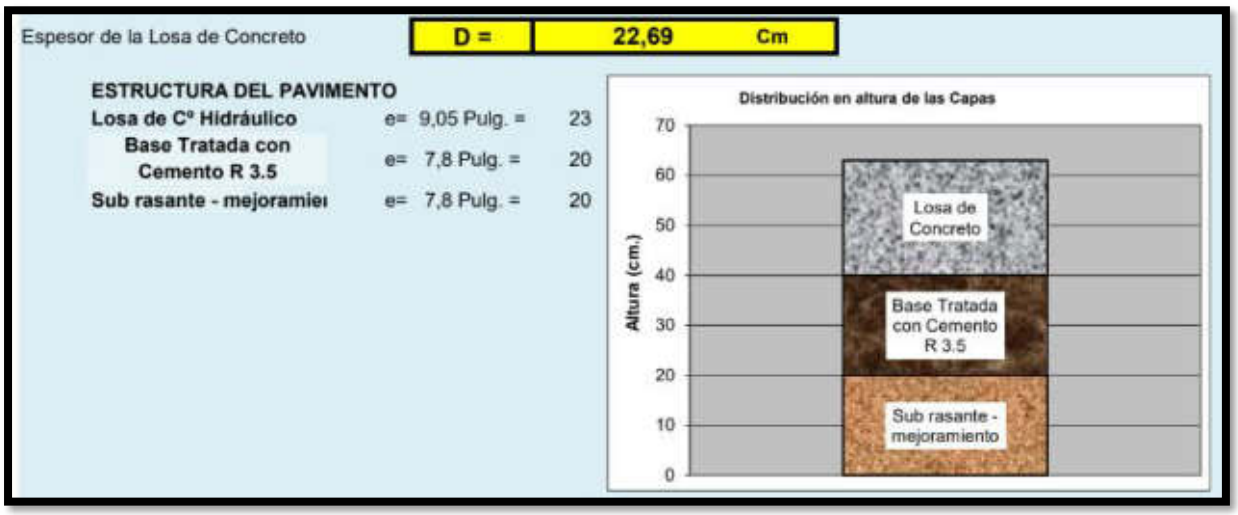

Esquema No 5 – Autor Especialista Gustavo Gamboa – fecha 21-Dic-2022

Por lo anterior se valida técnicamente, la presentación de estos tres nuevos ítems no previstos considerando viable su implementación en las estructuras de pavimento aprobadas.

(…)"

En consecuencia el contratista INCOPAV SAS, en comunicado INC-INVIAS-2269-INT-145 del 14 de enero de 2023, presento aclaración resultado densidades sector Pr 0+020 Al Pr 0+180 subrasante estabilizada con cemento Fórmula de Trabajo Numeral 235.4.1.2 y Compactación Numeral 235.5.3.1, aclarando el peso unitario de la base estabilizada mediante el valor del diseño 125 (lb/pie3).

En este sentido se procede a emitir concepto, validando la formula de trabajo y los valores de diseño señalando lo siguiente:

"(…)

En atención a su comunicado del 14 de enero de 2022, donde se remite "(…) aclaración por parte de nuestro especialista referente a los resultados obtenidos de las densidades de campo tomadas en pasado 13 de enero en

el sector del asunto, como complemento a la información entregada por INCOPAV S.A. referente a las alternativas de mejoramiento para el contrato de referencia. Es de aclarar que para la capa de Base Granular estabilizada con cemento los criterios de aceptación y se deben ajustar al Proctor estándar tal cual como se realizo en la etapa de diseño.(…)"

De lo anterior es preciso señalar que los resultados fueron evaluados con respecto a la aclaración de presentada por INCOPAV SAS y su especialista en tanto la normativa INVIAS permite la utilización de dos ensayos para determinar la compactación INV-E-141 (ENSAYO NORMAL DE COMPACTACIÓN) y INV-E-142 (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN), en este sentido es pertinente, señalar que en tanto el criterios de recibo se deberá adoptar el INV-E-141 (ENSAYO NORMAL DE COMPACTACIÓN) dado que como bien lo señala el especialista de INCOPAV S.A fue el adoptado en el diseño de mezcla, así las cosas el artículo 235 de Numeral 235.4.1.2 Fórmula de Trabajo Señala:




fórmula de trabajo establecida como resultado del diseño de la mezcla debe indicar, como mínimo, lo siguiente:

- La clasificación del suelo por estabilizar (granulometría y límites de Atterberg).
- El tipo y la marca de cemento empleado en el diseño.
- El contenido de agua del suelo inmediatamente antes de la mezcla y el de la mezcla en el momento de la compactación.
- El contenido óptimo de cemento (*CFT* %).
- El valor de densidad máxima de la mezcla, de acuerdo con lo definido en los documentos del proyecto o en su defecto lo aprobado por el interventor, con el método de ensayo INV E-141 o INV E-142.
- El porcentaje óptimo de agua para mezcla y compactación, de acuerdo con lo definido en los documentos del proyecto o en su defecto lo aprobado por el interventor, con el método de ensayo INV E-141 o INV E-142.
- CBR y expansión, de acuerdo con el método de ensayo INV E-148.
- Cada uno de los valores de todos los criterios de diseño establecidos en los documentos del proyecto.

ECIFICACIONES INVIAS 2022

Numeral 235.4.1.2 Fórmula de Trabajo

y numeral 235.5.3.1 Compactación de la Especificación del INVIAS, indica lo siguiente:

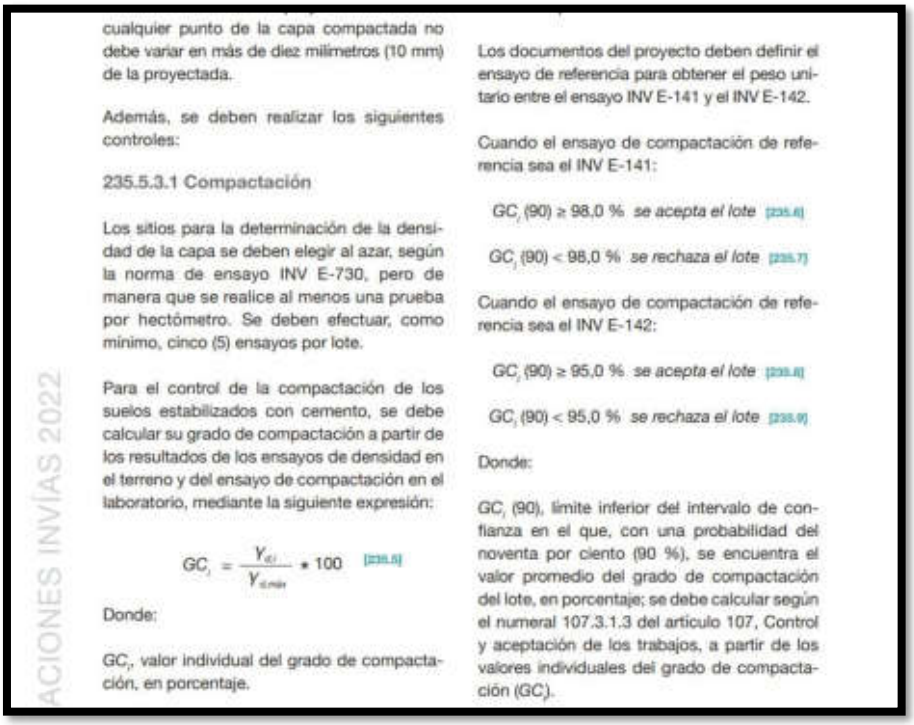

cualquier punto de la capa compactada no debe variar en más de diez milímetros (10 mm) de la proyectada.

Además, se deben realizar los siguientes controles:

235.5.3.1 Compactación

Los sitios para la determinación de la densidad de la capa se deben elegir al azar, según la norma de ensayo INV E-730, pero de manera que se realice al menos una prueba por hectómetro. Se deben efectuar, como mínimo, cinco (5) ensayos por lote.

Para el control de la compactación de los suelos estabilizados con cemento, se debe calcular su grado de compactación a partir de los resultados de los ensayos de densidad en el terreno y del ensayo de compactación en el laboratorio, mediante la siguiente expresión:

$$GC_i = \frac{\gamma_{d,i}}{\gamma_{d,máx}} * 100 \quad [235.5]$$

Donde:

GC_i, valor individual del grado de compactación, en porcentaje.

Los documentos del proyecto deben definir el ensayo de referencia para obtener el peso unitario entre el ensayo INV E-141 y el INV E-142.

Cuando el ensayo de compactación de referencia sea el INV E-141:

$GC_i(90) \geq 98{,}0\ \%$ *se acepta el lote* [235.6]

$GC_i(90) < 98{,}0\ \%$ *se rechaza el lote* [235.7]

Cuando el ensayo de compactación de referencia sea el INV E-142:

$GC_i(90) \geq 95{,}0\ \%$ *se acepta el lote* [235.8]

$GC_i(90) < 95{,}0\ \%$ *se rechaza el lote* [235.9]

Donde:

$GC_i(90)$, límite inferior del intervalo de confianza en el que, con una probabilidad del noventa por ciento (90 %), se encuentra el valor promedio del grado de compactación del lote, en porcentaje; se debe calcular según el numeral 107.3.1.3 del artículo 107, Control y aceptación de los trabajos, a partir de los valores individuales del grado de compactación (GC_i).

ACIONES INVÍAS 2022

Numeral 235.5.3.1 Compactación

Por lo anterior, se debe tener en cuenta el ***valor de aceptación del GC_i, (90), Valor individual del grado de compactación es ≥ 98%****, en consecuencia, como quiera que, de las 5 muestras tomadas del lote de estudio, arrojen un rechazado del lote, el constructor debe retirar la capa y reponerla hasta ser aprobada por el interventor, sin costo adicional para INVÍAS. La capa de reposición debe mantener las rasantes del proyecto y debe garantizar unas propiedades de capacidad y estabilidad equivalentes a las contempladas en los documentos del proyecto para la capa estabilizada. El material retirado es de propiedad del constructor.*

(…)"

El contratista INCOPAV SAS, en comunicado INC-INVIAS-2269-INT-146, del 16 de Enero de 2023, remite a la interventoría a manera de información el inicio de la instalación de la base granular de la base granular estabilizada con cemento al 5% de acuerdo al diseño de mezcla aprobado por esta interventoría en comunicado CI-N°2263-2021-OFI N°115 del 28 de junio de 2022, considerando lo siguiente:

"(…)


Observación	Cumple	Acción
1. ***Metodología informe.*** *Mejorar presentación de informe indicando una descripción del contexto, referencia de tablas y calidad de estas, existen textos deformados que son ilegibles*	*Sí*	*Atendido*
2. ***Elaboración del ensayo.*** *Indicar cuáles fueron las condiciones de falla de las briquetas, condiciones de curado y tratamiento de las briquetas*	*Sí*	*Atendido, se complementó informe con descripción e indicación de normatividad aplicable*
3. ***Cemento usado.*** *Indicar clasificación del cemento usado y características.*	*Sí*	*Atendido, se complementó informe*
4. ***Procedimiento implementado y condiciones de ensayos.*** *Referenciar e indicar las condiciones en las cuales se realizó en el ensayo de laboratorio.*	*Sí*	*Atendido, se complementó informe con descripción*
5. ***Contenido de materia orgánica.*** *El resultado de laboratorio para el contenido de materia orgánica es 1% estando en el límite máximo según la recomendación 350*	*Sí*	*Atendido, se realizaron ensayos adicionales*

Observación	Cumple	Acción
del INVIAS, se realizó únicamente un ensayo es pertinente realizar mas ensayos.		
6. ***Registro fotográfico.*** *Se recomienda presentar un registro fotográfico para dar mayor claridad y validez a los cálculos.*	*Sí*	*Se incorporó anexo con registro forográfico*
7. Muestra complementaria. *Es pertinente realizar el ensayo a otra muestra debido a que la mayoría de las propiedades evaluadas se encuentran cercanas al límite admisible.*	*Sí*	*Atendido, se realizaron ensayos adicionales*

conclusiones

Acorde a la revisión de los estudios y diseños para la estabilización del suelo cemento presentadas mediante informe 2022 y complemento de informe, es importante destacar:

1- Respecto a las recomendaciones generadas por el Instituto Nacional de Vías mediante correo electrónico el día 6 de junio de 2022: "Si la cal se va a usar en materiales granulares, ellos deben tener entre un 10y un 25% de suelos arcillosos, y el porcentajes a usar podrían ser de tan solo 20 a 30% de las dosis anteriormente recomendada. Si los suelos a estabilizar presentan dosis altas de yeso (o sulfato de calcita) la estabilización con cal o con cemento podría no llegar a ser viable(Ver valores admisibles de sulfatos en artículos INV 235-22 y y 236-22)" Cabe destacar que en la consultoría inicial suministrada por el mismo INVIAS para adjudicación se evidencia que el suelo sí presenta contenido de arcillas y limos con potencial de expansión mediante exploraciones realizadas cada 500m clasificándolos según siguientes parámetros:

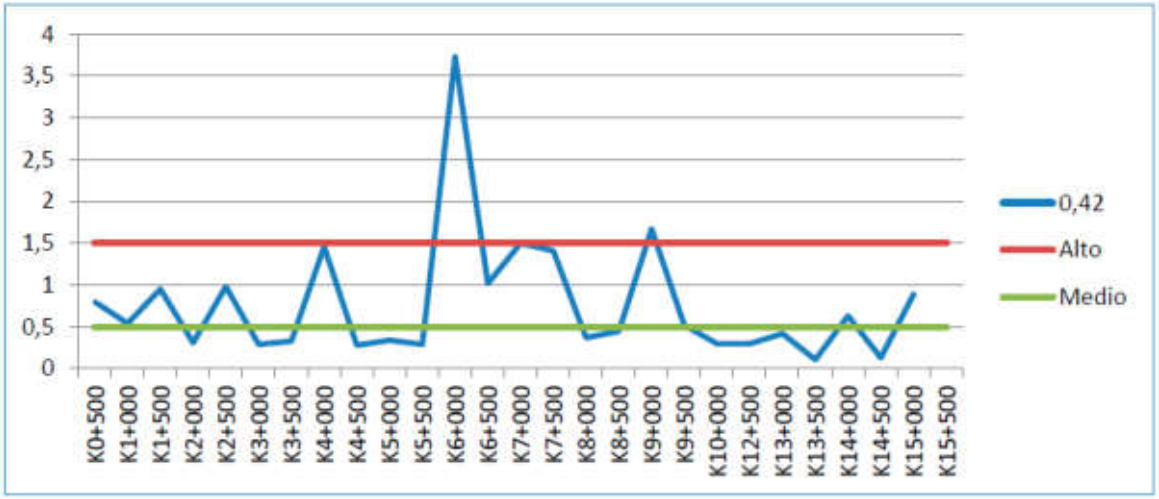

Grafica No. 5.6-1 Potencial de expansión de los resultados de CBR.

# Apique	Abscisa	Profundidad (m)		Espesor (m)	Profundidad media (m)	Descripción	Clasificación		PDC	CBR LABO
							AASHTO	USCS		
AP 1	K0+250	0.00	0.50	0.50	0.25	ARENA ARCILLOSA	A-1-a	SC		50.0
		0.50	1.50	1.00	0.50	ARCILLA	A-1-6	CH	2.3	
AP 2	K0+500	0.00	0.50	0.50	0.25	ARENA ARCILLOSA	A-1-a	SC	70.3	
		0.50	1.50	1.00	0.50	ARCILLA	A-1-5	CH	2.2	
AP 3	K0+750	0.00	0.50	0.50	0.25	GRAVA ARCILLOSA	A-2-4	GC	50.9	
		0.50	1.50	1.00	0.50	LIMO	A-2-7	MH		3.0
AP 4	K1+000	0.00	0.50	0.50	0.25	ARENA LIMOSA	A-1-b	SM	73.7	
		0.50	1.50	1.00	0.50	LIMO	A-7-6	MH	2.0	
AP 5	K2+600	0.00	0.50	0.50	0.25	ARENA ARCILLOSA	A-1-b	SC-SW	58.8	
		0.50	1.50	1.00	0.50	ARCILLA	A-7-6	CH	1.5	

Acorde a lo anterior expuesto y a la atención de comentarios realizados por interventoría se da aval a los espesores de diseño y memorias de cálculo establecidas para el diseño de la estabilización con cemento con un 5% para mitigar el potencial de hinchamiento y mejorar la capacidad portante de la subrasante acorde a lo establecido y recomendado por el ART 350-13 SUELO-CEMENTO del INVIAS

Cabe destacar que durante construcción se recomienda tener control y realizar ensayos periódicos del material que se esté estabilizando para garantizar la idoneidad y aplicación correcta de la mezcla de diseño en cuando a condiciones normales cambiantes que pueden diferenciarse de los apiques realizados y tomados como referencia para el diseño.

(…)”

2.1 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes por el especialista de Geotecnia y/o pavimentos

- Representar a INGEVAL SAS, en todo lo referente a la relación contractual, ante las entidades estatales y privadas.
- Validar los resultados de los laboratorio de las capas instaladas en el TRAMO 1- en el PR 0+180 AL PR 0+300 (120 M), los cuales se ajustaron a la norma invias de especificaciones de Estabilización de suelos de subrasante y terraplén con cemento Artículo 235 – 22 (subrasante estabilizada con cemento al 3%+1% de desperdicio) y Materiales granulares tratados con cemento como capa estructural Artículo 350 – 22 (base granular estabilizada con cemento al 5%)

- Gestionar el sistema para lograr una óptima calidad en la obra ejecutada y el cumplimiento del programa de inversiones
- Revisar y analizar detalladar os documentos relacionados en el contrato.

- Revisión de las alternativas de nto presentado por contratista de obra

  - Para tratamiento del sector con presencia de red de alcantarillado y materiales poco competentes
  - Revisión cambio de concreto MR43 a MR42 fast track
  - Concepto técnico APU´s de ítems no previstos
  - Aclaración valor de peso unitario seco máximo de subrasante de diseño 125 (lb/pie3), en cumplimiento del artículo 235-13 del INVIAS.

- Vigilar todas las funciones y actividades de la interventoría referente a la buena ejecución de los trabajos, tramitación de los documentos ante la entidad, actualización de estudios y diseños.
- Supervisar que el contratista de obra cumpla con sus obligaciones contractuales
- Realizar la revisión de los diseños urbanísticos, arquitectónicos, estructurales de redes eléctricas, alcantarillados y acueducto correspondientes a las obras a desarrollar por el contratista en la ejecución del proyecto.
- Velar porque los recursos del contrato de obra se ejecuten de conformidad al presupuesto y demás obligaciones que le sean asignadas en virtud de la interventoría.

2. CONCLUSIONES


- La interventoría durante la ejecución del 1 al 31 de enero de 2023 realizó las revisiones, a los ajustes que se presentaron sobre la marcha con motivo de la ejecución de los trabajos del tramo 1, donde se identificó la interferencia de una red de alcantarillado, cubierta con materiales poco competentes, los cuales no garantizaban la estabilidad de la estructura de pavimento, en razón a esto se evaluó el diseño de la protección de dicha red y su aislamiento mediante una geomalla y la estructura de pavimiento, con materiales estabilizados
- Se evaluó técnicamente la necesidad de la incorporación de los itemns no previstos:
    - NP 001- m3- SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CEMENTO (INCLUYE SUMINISTRO DEL CEMENTO;
    - NP 002- m3- BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO 5% (INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO);
    - NP 003- m3- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR-42 ACELERADO A 7 DÍAS. (Incluye acero) ,

  Los cuales se ajustan a los diseñados y aprobados por esta interventoría en OFICIO N. 172 COVEÑAS

- Se evalúa la adición de cemento en base al peso unitario en seco del terreno, de acuerdo al diseño presentado al 3% contratista en campo informo que se esta aplicando un 1% adicional como desperdicio, se recomendó, que en ningún caso la estabilización de la subrasante con cemento puede ser inferior al 3%
- Se evidencia en campo el mal estado de las cunetas ubicadas en el tramo 3, se sugiere al contratista de obra considerarlas dentro de las alternativas de intervención.
- Se recibió por parte del contratista de obra, documento técnico con la revisión y los ajustes a la propuesta de intervención definitiva sobre la vía, incluyendo

los análisis necesarios, así como los ensayos, que permitieran establecer un criterio adecuado y proceder con la aprobación respectiva, ante esto, esta interventoría realizó la aprobación con algunos comentarios que correspondían y que fueron atendidas, quedando pendiente la remisión de especificaciones y la modulación de las losas de concreto en el tramo 1.

- El contratista en comunicado INC-INVIAS-2269-INT-155 del 24 de Enero de 2023, aclara la estructura de pavimento a utilizar en el tramo 3, en los sectores donde no solo se implementa una sobre carpeta sino que halla la necesidad de remplazar toda la estructura de pavimento, reflejando el siguiente diagrama:

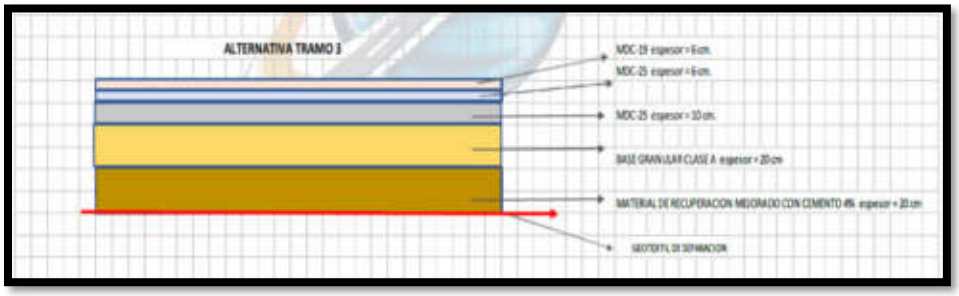

Fuente: INCOPAV SAS

El cual se ajusta a los diseños aprobados y tiene en cuenta las recomendaciones del especialista del contratista.

Nombre: GUSTAVO ADOLFO GAMBOA BELTRAN

Esp. Diseño y construcción de vías y aeropistas

Msc Infraestructura vial

N° Matrícula Profesional: 25202-329211 CND

Contrato N° 2263-2021

Objeto:

INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA.

Especialidad: Componente Social

Especialista: KADERINNE JANILETH MARIMON ARAGON

TP No: 239451114-1

Tipo de documento: Informe del mes de ENERO

Periodo: Del 1 al 31 de Enero 2023

Fecha: 1 de febrero del 2023.

Contenido

1. Introducción……...3
2. Seguimiento informe anterior……..3
3. Seguimiento y verificación periodo del 1 al 30 de junio 2022…….4
3.1 Proyecto 1 Atención a la comunidad ……..…4
3.2 Proyecto 2 Información y divulgación…….....7
3.3 Proyecto 3 Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos...8
3.4 Proyecto 4 Cultura y participación comunitaria……..…8
3.5 Proyecto 5 Contratación mano de obra ……...…9
3.6 Mecanismos de Protección a Grupos étnicos, Patrimonio Arqueológico y Cultural……..…10
4. Registro fotográfico……...10
5. Trazabilidad de acciones realizadas desde la interventoría social…….....16
5.1 Gestión Social Interventoría…….....16
5.2 Acciones desde la Interventoría social……....16
6. Conclusiones……..17

1. Introducción

INGEVAL S.A.S, en su calidad de interventor, presenta al Instituto Nacional de Vías - INVIAS, el informe parcial de las actividades realizadas en el componente social, en el marco de la ejecución del Contrato N° 2269-2021 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA, a cargo de **INCOPAV SA,** contratista de la obra.

Con este informe se certifica la realización y cumplimiento de las actividades programadas en los diferentes proyectos que conforman el Programa de Gestión Social, en el periodo comprendido del 1 al 31 de enero del 2023.

2. Seguimiento informe anterior.

El seguimiento del informe social correspondiente al periodo del 1 al 31 de diciembre del 2022, permite evidenciar lo siguiente:

- ✓ El contratista reporto avances en el proyecto de servicio atención al usuario enmarcado en la articulación social con los actores directamente vinculados a la ejecución del contrato, dicho proyecto funcionando como herramienta o mecanismo de comunicación directa y asertiva con la comunidad y sus representantes (presidentes de las JAC), lo anterior permite evidenciar el uso y conocimiento de los canales de atención e información al usuario en las comunidades directamente beneficiarias.

- ✓ La contratista continúa levantamiento de actas de vecindad en la comunidad el Mamey del municipio de Coveñas, departamento de sucre.

- ✓ La contratista oferto a través de la agencia pública de empleo Comfasucre vacantes para los cargos de Ingeniero auxiliar residente, auxiliar SISO, operador de vibrocompactador, servicios generales, ayudante de Obra y auxiliar vial, los cuales fueron seleccionados de la zona de influencia directa del proyecto (Comunidad Guayabal y Punta Seca).

- ✓ El contratista desde el área social reporta acompañamiento por parte de la interventoría al desarrollo de las actividades concernientes al componente social.

- ✓ Se evidencia que la contratista cuenta con un 67 % de vinculación laboral de personal de Mano de Obra No Calificada del área de influencia directa del proyecto.

3. Seguimiento y verificación periodo del 1 al 31 de enero del 2022

La revisión del informe social correspondiente al periodo del 1 al 31 del mes de enero del 2022, en el cual la contratista reporta avances del Plan de Gestión Social de acuerdo a los proyectos que se formularon ejecutar, permitiendo evidenciar lo siguiente:

3.1 Proyecto 1. Atención a la comunidad.

El presente proyecto tiene como objeto recibir, atender y dar respuesta oportuna a todos los requerimientos que las autoridades y comunidad presenten y se tramitan desde las siguientes acciones:

- **Instalación y adecuación de un punto de información y atención a la Comunidad.**

Para el periodo relacionado se reactivaron los puntos de Servicio de Atención al Usuario - SAU, el contratista reporta que actualmente dispone de dos puntos de atención en el Corregimiento de Sacana y en el municipio de Coveñas, zona de influencia directa del proyecto.

- **Ubicación de los puntos de Servicio de Atención al Usuario-SAU:**

Los SAU son los puntos de enlace para brindar información y atender todas las manifestaciones ciudadanas que presenten las comunidades, continúan encontrándose localizados en puntos estratégicos, con el propósito de facilitar su ubicación, estos se encuentran en las siguientes direcciones:

- SAU principal: Municipio de Coveñas del departamento de Sucre, Comunidad de Guayabal en la Carrera 2 Calle 8B -25 Sector Guayabal.

- SAU Satelital: Municipio de Momil, Corregimiento de Sacana, Sector Sacana arriba lateral izquierdo.

En relación con los puntos de Servicio de Atención al Usuario-SAU, arriba mencionados se observa, que:

- Los puntos de Servicio de Atención al Usuario, brindan asistencia en las direcciones arriba mencionadas.

- No se evidencio pendón visible con días y horarios de atención.

- Actualmente no disponen de un buzón de sugerencias visible

- Cuentan con una línea telefónica de atención, la cual corresponde al siguiente número: 3106159633.

- Mantienen disponible un SAU virtual con una cuenta de correo electrónico así: social.invias@incopav.com. Exclusiva para el contrato y dispuesta para la comunidad del área de influencia directa e indirecta, como mecanismo de comunicación con el usuario que prefiere el uso de la tecnología y al cual puede acudir desde la comodidad de su casa las 24 horas del día.

- Disponen del archivo de las actas de vecindad.

- Para el ingreso a los SAU, actualmente, el contratista aplica los respectivos protocolos de bioseguridad, con el fin de prevenir el contagio con el COVID 19.

- **Servicio de atención al usuario-SAU.**

- El contratista INCOPAV SA, continúa contando con una profesional Social encargada de servir de canal de comunicación entre el contratista y los diferentes actores sociales y comunitarios, facilitando su interacción y contribuyendo para que se fortalezcan los lazos de vecindad, la resolución pacífica de conflictos y buscando que tengan una convivencia pacífica. Además, la profesional social, es quien se encarga de la recepción y trámite de las diferentes peticiones, quejas y reclamos presentados por la comunidad.

- En el presente periodo, se evidencio atención en Coveñas - sucre los días lunes, miércoles y viernes de 1:00 a 4:00 pm y en Sacana – Córdoba los martes y jueves de 2:00 pm a 4:30 pm.

Recepción de PQRS.

- **Apertura de una solicitud ciudadana (petición).**

En el mes de enero del 2023, el contratista reporta la apertura de cinco (5) solicitud ciudadana, así:

- **Implementación de buzón satélite.**

Con el fin de permitir que la comunidad cuente con buzón donde puedan depositar sus inquietudes o sugerencias, el contratista dispone de buzón satelital ubicado en el corregimiento de Sacana, como zona de influencia directa del proyecto.

En el presente periodo el contratista reporta recepción de cinco depósitos de solicitudes ciudadanas.

PQRS PRESENTADAS POR LAS COMUNIDADES			
N°	**FECHA DE RECEPCION**	**USUARIOS**	**DESCRIPCION**
1	4/01/2023	Gladys Bracho	Su queja es relacionada con el atropellamiento de su mascota el día 3 enero de 2023. Un perro que se encontraba en el andén y la volqueta conducida por el señor Yesith Torres, adscrita en la contratista es el supuesto causante del accidente. Solicita
2	5/01/2023	Julio Colina	El señor reporta las afectaciones económicas que ha tenido a causa de la ejecución de obra y argumenta que no ve avances en las actividades con maquinarias. Solicita se habilite el acceso peatonal para que los estudiantes de la institución Educativa Ismael Contreras Meneses puedan ir a su local (papelería los socios) a utilizar todos los servicios ofrecidos como: copias, impresiones, compra de útiles escolares a lo que manifiesta que enero es la época de más ganancia en su local comercial y no quiere verse con más perdidas.
3	7/01/2023	Luz Leyda Montes	La arrendataria del local farmacia Droguería y accesoria Guayabal, manifiesta su poco ingreso en las ventas y lo afectada económicamente “no hago el ahorro suficiente para el pago del arriendo”.
4	16/01/2023	Heriberto Gaviria	El señor Heriberto Gaviria Granado comenta de manera verbal las afectaciones en las ventas en el puente festivo más productivo del mes de enero en Coveñas en la tienda Mercatodo. Lo anterior, debido a que los vehículos transitaban por la calle los tramposos y al estar cerrado el acceso por la casa de la cultura. El señor solicita que se cierre el acceso vehicular, desde la iglesia centro familiar cristiano y no desde el área casa de la cultura así los vehículos pasarán por su local a comprar
5	12/01/2023	Luis Luna	El señor se encuentra preocupado debido a que ha escuchado unos comentarios relacionados con la disminución de las calzadas de la vía del

			corregimiento de Sacana y solicita a nombre de los pobladores de su sector se realice una reunión informativa con fines de dar claridad al tema.

El contratista reporta cierre o respuesta de las PQRS de acuerdo al anterior consecutivo, de la siguiente manera:

1. El caso se elevó ante la inspección de policía del municipio de Coveñas debido a que el esposo de la señora Gladys fue intolerante y se acercó a la oficina con conductas no apropiadas amenazando de muerte al conductor, dicho lo anterior, el caso queda en manos de esa instancia.

2. En cuanto a la respuesta, dada por la ingeniera auxiliar se presentó un fallo en el terreno ejecutado, lo cual desvió la programación a lo que se espera que el INVIAS apruebe la propuesta enviada por el contratista en el tipo de material a utilizar en la zona PR0 +0190 al PR0 +0300.

Por otro lado, cuando regresen los estudiantes al colegio el día 23 de enero 2023 el contratista habilitara el tramo para el acceso peatonal en los horarios concurridos

3. En su respuesta asignada: El contratista está ejecutando la obra de acuerdo a la programación establecida y en el alcance no está la indemnización de inmuebles. Se requiere de paciencia debido a que toda obra genera un impacto y largo plazo se verán los beneficios de una vía en buenas condiciones.

4. Su respuesta está siendo evaluada por el profesional del área de seguridad y salud en el trabajo que de acuerdo al plan de manejo de tráfico el INVIAS aprobó el cerramiento puntual en el tramo caso de la cultura y que hasta la fecha están habilitadas las carreras de intersección del sector Guayabal para hacer menos incomodo el tránsito por el sector. Además, es necesario describir que las señalizaciones instaladas en el tramo PR 1+0200 muchas veces son rodadas por los mototaxistas u otros medios de transportes, invitando a los usuarios a respetar las medidas de seguridad implementadas por el contratista INCOPAV S.A.S.

5. La respuesta dada el día 17 enero de 2023, El contratista de manera oportuna realiza en presencia del ingeniero residente, interventoría social y así mismo, los veedores del contrato dándole respuesta a todas sus inquietudes se realiza una reunión presencial informativa.

3.2 Proyecto 2. Información y divulgación.

El objetivo de proyecto es brindar información clara, veraz, oportuna y suficiente a la población del área de influencia directa, a las autoridades locales, Juntas de Acción Comunal y líderes comunitarios y mantener informados a todas las autoridades del área de influencia del proyecto.

- **Estrategias de comunicación y divulgación reportadas por el contratista:**

- El día 17 de enero se realizó una reunión con miembros de la comunidad de Sacana para darle respuesta a todas las dudas presentadas por los usuarios. Dentro del evento los pobladores pudieron expresar sus inquietudes al ingeniero residente de la obra y temores frente a las actividades técnicas.

Finalizada la reunión queda el compromiso de elevar la petición ante el INVIAS por parte del contratista INCOPAV S.A y se realiza un recorrido para realizar un registro fotográfico de las condiciones actuales de la vía.

3.3 Proyecto 3. Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos.

El objetivo de este proyecto, es registrar el estado físico de las viviendas y predios aledaños al corredor vial que puedan verse afectados por el desarrollo de las obras, previo al inicio de las actividades constructivas y así tener los soportes para cotejar evidencias, en el caso de presentarse reclamaciones por posibles daños ocasionados.

El contratista reporta en el periodo del 1 al 31 de enero del 2023, levantamiento de 43 actas de vecindad en su fase inicial, durante el proceso de levantamiento del MASPS-MN1-IN-3-FR-4 ACTA DE VECINDAD, 3 usuarios manifestaron no estar de acuerdo con la actividad, por lo que se tomaran las medidas que estipula el manual de interventoría.

SECTOR 2	COMUNIDAD	FECHA	N° TOTAL DILIGENCIADAS
PR4+0500 al PR 5+0200	Vereda el Mamey del Municipio de Coveñas, Departamento de Sucre.	11, 12, 13, 14, 18 Y 28 de enero de 2023.	43 actas de Vecindad.

- ✓ **Verificación de afectación de la infraestructura de servicios públicos**

  La contratista no reporta solicitud de verificación por afectaciones.

3.4 Proyecto 4. Cultura vial y participación comunitaria.

Concientizar a las comunidades educativas, población en general a través del desarrollo o realización de talleres pedagógicos, con el objetivo de informar, educar y hacer tomar conciencia en temas ambientales, de biodiversidad, de seguridad vial y la consolidación del comité de participación ciudadana.

- La contratista no reporta acciones ni actividades relacionadas con la realización o desarrollo de talleres.
- Reporta consolidación del comité de participación ciudadana, a través de reunión desarrollada el día 17 de enero del presente año, en el corregimiento de Sacana.

- El día 31 de enero 2023 se realizaron dos reuniones:

  1. Corregimiento de Sacana, departamento de Córdoba con el objetivo del seguimiento al plan de gestión social con la veeduría ciudadana. En el evento, estaban presente algunos miembros de la comunidad, la señora Ana Cecilia Álvarez como la nueva capitana del cabildo indígena zenú del corregimiento, reconocida por la alcaldía de Momil, actualmente está a la espera de la certificación del ministerio del interior.

  2. Municipio de Coveñas, departamento de Sucre en este evento estuvieron presentes los presidentes el personero del municipio de Coveñas, juntas de acciones comunales del corredor vial específicamente barrio Guayabal, barrio punta Seca, vereda el Mamey, caserío puente del sol y también hicieron presencia en su gran mayoría el gremio de comerciantes del sector Guayabal. La reunión tuvo como objetivo la creación nuevamente del comité de veeduría ciudadana debido a que la conformada el pasado 13 de mayo de 2022, algunos miembros presentaron la renuncia para participar en las convocatorias laborales del contratista INCOPAV S.A.

  Los asistentes pudieron manifestar sus inquietudes, dudas y quejas relacionadas con el avance de la obra y se escogieron a los nuevos veedores.

  RUPERTO PADILLA DIAZ, FERNANDO ARRIETA TURIZO, LIS LEONEL LUBO, CASTRO, JULIO CESAR COLINA, WILLIAM GIRALDO

3.5 Proyecto 5. Contratación mano de obra.

El objeto de este proyecto es generar empleo y por ende ingresos en los hogares de las personas residentes en el AID y evitar conflictos con la comunidad, relacionados con este aspecto.

De acuerdo con información reportada por el contratista, en el periodo del 1 al 31 de enero del 2023, se vincularon 4 trabajadores de mano de obra no calificada, para un total 20 personas de las comunidades beneficiadas del mantenimiento y rehabilitación de la carretera Coveñas Sabaneta.

- MONC: Para el periodo 1 al 31 enero de 2023 se vincularon 4 personas del corregimiento de Sacana.

PERSONAL CONTRATADO DE LA COMUNIDAD INFLUENCIA DIRECTA DEL CONTRATO							
N°	NOMBRE	COMUNIDAD	DEPARTAMENTO	ESTADO DE VINCULACIÓN	CARGO	MOC	MONC
1	ADRIAN FERNANDO ORTIZ VILLERO	BARRIO GUAYABAL	SUCRE	CONTRATADO 5/12/2022	AUXILIAR SST	X	
2	JAIME LUIS CAVADIA PUENTE	SACANA	CÓRDOBA	LABORÓ DEL 5/5/2022 AL 9/7/2022	AYUDANTE DE OBRA		X
3	NORIS MARÍA ARROYO TORRES	SACANA	CÓRDOBA	LABORÓ DEL 5/5/2022 AL 9/7/2022	AUXILIAR VIAL		X
4	YORMARIS MORENO MORENO	SACANA	CÓRDOBA	LABORÓ DEL 23/05/2022 al 9/7/2022	AUXILIAR VIAL		X
5	JUAN DAVID RODRÍGUEZ TRUAQUERO	SACANA	CÓRDOBA	LABORÓ DEL 23/05/2022 al 9/7/2022	AYUDANTE DE OBRA		X
6	CARMEN CONTRERAS SUAREZ	BARRIO GUAYABAL	SUCRE	CONTRATADO 5/12/2022	INGENIERA AUXILIAR RESIDENTE	X	
7	MERARDO SUAREZ ZUÑIGA	BARRIO GUAYABAL	SUCRE	CONTRATADO 5/12/2022	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	X	
8	LORELEYS LADEUS MENDOZA	BARRIO GUAYABAL	SUCRE	CONTRATADO 5/12/2022	AUXILIAR VIAL		X
9	ARNULFO NAVARRO PADILLA	BARRIO GUAYABAL	SUCRE	CONTRATADO 5/12/2022	AYUDANTE DE OBRA		X
10	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	BARRIO GUAYABAL	SUCRE	CONTRATADO 5/12/2022	AYUDANTE DE OBRA		X
11	JAIME ANDRES SISERRA LADEUS	BARRIO GUAYABAL	SUCRE	CONTRATADO 5/12/2022	AYUDANTE DE OBRA		X
12	WILLIAM LUNA URANGO	BARRIO GUAYABAL	SUCRE	CONTRATADO 5/12/2022	AYUDANTE DE OBRA		X
15	NELYS ESPITIA DIAZ	BARRIO GUAYABAL	SUCRE	CONTRATADO 14/12/2022	SERVICIOS GENERALES		X
16	MANUEL BELLO CARDENAS	BARRIO GUAYABAL	SUCRE	CONTRATADO 9/12/2022 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	VIGILANTE		X
17	IVÁN PESTANA RAMOS	SACANA	CÓRDOBA	CONTRATADO 3/01/2023	AYUDANTE DE OBRA		X
18	WILSON PESTANA ÁVILA	SACANA	CÓRDOBA	CONTRATADO 3/01/2023	AYUDANTE DE OBRA		X
19	JENIFER QUIÑONES PESTANA	SACANA	CÓRDOBA	CONTRATADO 3/01/2023	AUXILIAR VIAL		X
20	CATIA HERRERA RAMOS	SACANA	CÓRDOBA	CONTRATADO 3/01/2023	AUXILIAR VIAL		X

3.6 Mecanismos de Protección a Grupos étnicos, Patrimonio Arqueológico y Cultural

La contratista no reporta acciones o actividades de consulta a entidades nacionales como mecanismo de protección a grupos étnicos, en el periodo del 1 al 31 de enero del presente año, a la fecha se espera de respuesta del ministerio del interior para la certificación de la existencia o no de comunidades indígenas en los tramos a ejecutar el contrato 2269 de 2021. Por su parte el contratista emitió un oficio el 15 junio 2022 el siguiente oficio **INC-INVIAS-2269-C-032**- a lo que remite el siguiente recibido de la información **EXTMI2022-10693** el día 15 junio de 2022.

4. Registro Fotográfico - TRAZABILIDAD DE ACCIONES

- Conformación del comité de participación ciudadana la comunidad de Sacana, Córdoba.





- Acompañamiento de la Interventoría al Levantamiento de las Actas de Vecindad, Mamey, Coveñas – Sucre.









- Supervisión, Revisión y Aprobación al Levantamiento de las Actas de Vecindad.



- Seguimiento y Supervisión al Componente Social.



- Comité de obra













- Revisión parcial de Actas de vecindad.







- Seguimiento al componente social.





- Conformación comité participación ciudadana.





5. TRAZABILIDAD DE ACCIONES DESDE LA INTERVENTORIA SOCIAL

5.1 Gestión Social Interventoría

Toda vez que es responsabilidad de la Interventoría social la revisión y aprobación de los documentos relacionados con la gestión social y remitirlos una vez aprobados a la Subdirección de Sostenibilidad para su revisión y visto bueno, desde la interventoría social se velara porque todas las actividades se desarrollen acorde con los lineamientos que para tal fin haya establecido la Constitución, la Ley, Decretos y Resoluciones aplicables a la misma, así como con los parámetros establecidos por la Subdirección de Sostenibilidad en el pliego de condiciones y demás aplicativos.

5.2 Desde la Interventoría social se realizaron las siguientes acciones:

- ✓ Para garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y previsiones contenidos en el pliego de condiciones, en el contrato, en los requerimientos técnicos, sus anexos y todos los documentos que hacen parte del proyecto, la interventoría social realiza vigilancia general, integral y permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Contratista en el área social.
- ✓ Desde la interventoría social y de acuerdo al manual de interventoría, en todo momento se veló porque, los productos entregados por el contratista de la Obra, cumplieran con los requerimientos de contenido, metodología y las especificaciones generales y particulares aplicables, antes de emitir concepto de aprobación a través de seguimiento, acompañamiento y revisión.
- ✓ La interventoría social recomendó por escrito a través de correos electrónicos las acciones necesarias para la mejor ejecución de los programas y/o proyectos del componente social derivados de la ejecución del contrato apuntando a su optimización social.
- ✓ A través de observaciones y recomendaciones formuladas por la interventoría social se realizó control integral de todas las actividades inherentes al plan de gestión social.
- ✓ Desde la interventoría social se revisó y superviso la proyección y archivo parcial de las actas de vecindad levantadas hasta la fecha.
- ✓ Se acompañó y superviso levantamiento de las actas de vecindad desarrolladas a la fecha.
- ✓ Participación y acompañamiento a los diferentes comités.

6. CONCLUSIONES

- ✓ El contratista cumple con la ejecución de las actividades proyectadas en los programas de la gestión social, en el mes de enero.
- ✓ Se evidencia que el contratista proyecta acciones para vincular laboralmente personal de Mano de Obra No Calificada del área de influencia directa del proyecto.
- ✓ En cuanto al proyecto Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos, aún se encuentran en levantamiento de actas de vecindad en su fase inicial.
- ✓ Se imparte desde la interventoría social las instrucciones de carácter obligatorio para que en todo momento las acciones derivadas del componente social cumplan con las indicaciones del manual de interventoría.
- ✓ Desde la interventoría social se desarrolla seguimiento constante a todos los programas derivados del componente social, por lo cual se realizó vigilancia general, integral y permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Contratista en el área social.
- ✓ El contratista cumple con los espacios requeridos y adecuados para la atención a la comunidad.
- ✓ En cuanto al servicio de atención al usuario-SAU, se observa celeridad en las respuestas a la comunidad, considerando que en el mes de enero se recibieron y tramitaron solicitudes ciudadanas, las cuales ya fue cerradas.
- ✓ El contratista utiliza diferentes estrategias para la información y divulgación de temas concernientes al proyecto.

Firma:



Nombre: KADERINNE JANILETH MARIMON ARAGON

Profesional social – Interventoría INGEVAL SAS.

TP: 239451114-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE INFORME	PARCIAL	BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO No. (Informe No.)	6	TIPO DE PROYECTO	No licenciado	FECHA	31 ENERO 2023 (Día / Mes / Año)

1. INFORMACION GENERAL

PERIODO	DEL	1 ENERO 2023 (Día / Mes / Año)	AL	5 JUNIO 2023 (Día / Mes / Año)	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	2269 de 2021	No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA / AÑO	2263 de 2021
UNIDAD EJECUTORA	Subdirección Gestión Integral de Carreteras		OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA				
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Sucre							

2. TRAZABILIDAD DE LA GESTION SOCIAL

		Aprobación Interventoría oficio entrada No.	Fecha (Día / Mes / Año)	No objeción INVIAS	Fecha (Día / Mes / Año)	Observaciones
2.1.	Programa de Gestión Social del PAGA	CI-N°2263-2021-OFI N°057	11 ABRIL 2022	EN ESPERA		CUENTA CON RADICADO N° 37079 POR PARTE DEL INVIAS.
	Modificación No. 1 Programa de Gestión Social del PAGA:	N/A				N/A
2.2.	Plan de Inversión Social	CI-N°2263-2021-OFI N°057	11 ABRIL 2022	NO APLICA		CUENTA CON RADICADO N° 37079 POR PARTE DEL INVIAS.
	Modificación No. 1. Plan de Inversión Social	N/A				N/A

3. REPORTE DE AVANCE DE PROYECTOS DE GESTION SOCIAL

3.1. Atención a la Comunidad

3.1.1. Tipo de petición	No. Recibidas		No. Abiertas		No. Cerradas		3.1.2. Asunto de las peticiones	Periodo	Acumulado	3.1.3. Canal de recepción peticiones	Periodo	Acumulado
	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado						
Denuncia							Ambiental			Buzón satelite		
Petición	1	4			1	4	Laboral		1	Electrónico		
Queja	3	9			3	9	Predial			Presencial escrito	4	19
Reclamo		1				1	Social	3	14	Presencial verbal	1	
Solicitud información	1	5			1	5	Técnica (obra)	2	4	Telefónico		
Sugerencia							Otro:			Otro:		
TOTAL	5	19			5	19	TOTAL	5	19	TOTAL	5	19

3.1.4. Concepto de la interventoría acerca del proyecto Atención a la Comunidad (máximo 200 palabras)

Aprueba / No aprueba (Justificación): **APRUEBA,** Toda vez que El contratista cumple con los espacios requeridos y adecuados para la atención a la comunidad, en los cuales se pueden visibilizar un pendón con días y horarios de atención, lo que hace que la comunidad los reconozca y esté familiarizada con los mismos, disponen de un buzón de sugerencias, una línea telefónica de atención y una SAU virtual con una cuenta de correo electrónico exclusiva para el contrato y dispuesta para la comunidad del área de influencia directa e indirecta, como mecanismo de comunicación, aunque no disponen del archivo de las actas de vecindad, se observa celeridad en las respuestas a la comunidad pues cuenta con una profesional Social encargada de servir de canal de comunicación entre el contratista y los diferentes actores sociales y comunitarios, facilitando su interacción y contribuyendo para que se fortalezcan los lazos de vecindad, la resolución pacífica de conflictos y buscando que tengan una convivencia pacífica. Para el ingreso a los SAU, actualmente, el contratista aplica los respectivos protocolos de bioseguridad, con el fin de prevenir el contagio con el COVID 19.

3.2. Información y Divulgación

3.2.1. Estrategias de información							3.2.2. Medios de divulgación						
Estrategias de información	Cantidad		No. asistentes		No. Anexos	No. Folios	Medios de Divulgación	No. piezas		No. personas informadas		No. Anexos	No. Folios
	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado				Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		
Reuniones de inicio	N/A	2	N/A	94	N° 13	34	Oficio	3	31	10	106	N° 8	106
Reuniones extraordinarias	2	5	34	70	N° 8	15	Plegable	3	3	COMUNIDAD EN GENERAL	COMUNIDAD EN GENERAL	N° 8	29
Reuniones de avance	1	1	12	12	N° 8	7	Cuña radial	N/A	1	COMUNIDAD EN GENERAL	COMUNIDAD EN GENERAL	N° 8	7
Reuniones de cierre							Perifoneo	N/A	3	N/A	COMUNIDAD EN GENERAL	N° 3, 4,5	N/A
TOTAL	3	8	46	176			TOTAL	6	38	10	106		

3.2.3 Acciones afirmativas en las actividades de Información y Divulgación

Para este proyecto se han implementado estrategias para la divulgación e informacion como lo son el megáfono y/o perifoneo, volantes informativos, invitaciones formales, llamadas telefónicas, mensajería a traves de la aplicacion WhatsApp, estrategias que han permitido el desarrollo oportuno para los pobladores frente a la ejecución del contrato 2269 de 2021

3.2.4. Concepto de la interventoría acerca del proyecto Información y Divulgación (máximo 200 palabras)

Aprueba / No aprueba (Justificación): **APRUEBA,** Toda vez que se ha evidenciado que en el desarrollo del proyecto se brindar información clara y oportuna a la población del área de influencia directa, autoridades locales, Juntas de Acción y demas integrantes de la comunidad, manteniendolos informados a traves de diferentes estrategias como el perifoneo, pendones y volantes informativos, entre otros..

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE INFORME	PARCIAL	BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO No. (Informe No.)	6	TIPO DE PROYECTO	No licenciado	FECHA	31 ENERO 2023 (Día / Mes / Año)

1. INFORMACION GENERAL

PERIODO	DEL 1 ENERO 2023 (Día / Mes / Año)	AL 5 JUNIO 2023 (Día / Mes / Año)	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	2269 de 2021	No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA / AÑO	2263 de 2021
UNIDAD EJECUTORA	Subdirección Gestión Integral de Carreteras	OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA			
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Sucre					

3.3. Manejo de Predios y Redes de Servicios Públicos

3.3.1. No. de predios aledaños a las actividades de obra	200
3.3.2. No. de predios aledaños a instalaciones temporales	20

3.3.3. Tipo de soporte levantado	Periodo (No.)		Acumulado (No.)		No. Anexos	No. Folios
	Diligenciadas	Aprobadas	Diligenciadas	Aprobadas		
Actas de vecindad - inicio	43	14	322	237	70	1610
TOTAL	43	14	322	237		

3.3.4. Medidas de acompañamiento social para el levantamiento y cierre de actas de vecindad

Aspectos administrativos, como medida de acompañamiento al registro del estado físico de las viviendas y predios aledaños al corredor vial que puedan verse afectados por el desarrollo de las obras, previo al inicio de las actividades constructivas y así tener los soportes para cotejar evidencias, en el caso de presentarse reclamaciones por posibles daños ocasionados.

3.3.5. Concepto de la interventoría acerca del proyecto Manejo de Predios y Redes de Servicios Públicos (máximo 200 palabras).

Aprueba, teniendo en cuenta que la información reportada por el contratista es idonea y corresponde al levantamiento de actas de vecindad, a la fecha se han levantado 322 inciales, de manera parcial han sido entregado copias a sus propietarios en la medida en que se han aprobado.

3.4. Recuperación del Derecho de Vía

No. Actividades económicas en derecho de vía	N/A	No. Actividades	No. Anexos	No. Folios
Actividades de información y sensibilización con la comunidad involucrada		N/A		
Actividades interinstitucionales de recuperación del derecho de vía		N/A		

3.4.1. Concepto de la interventoría acerca del proyecto Recuperación del Derecho de Vía (máximo 200 palabras)

Aprueba / No aprueba (Justificación) NO APLICA

3.5. Cultura Vial y Participación Comunitaria

3.5.1. Mecanismos de participación

			No. Anexos	No. Folios
Comité de Participación Comunitaria	Se conformó Comité	Sí / No		
	Acta de conformación	No. 1	17 ENERO 2023 (Día / Mes / Año)	
	Acta de clausura	No.	(Día / Mes / Año)	
Veeduría Ciudadana	Se conformó o existe	Sí / No	No. Anexos N° 13	No. Folios 12
	Acta de conformación	No. 2	13 MAYO 2022; 31 ENERO 2023 (Día / Mes / Año)	
	Entidad que realizó el registro	PERSONERIA MUNICIPAL COVEÑAS, SUCRE Y MOMÍL CÓRDOBA.		
	Objeto de la Veeduría Ciudadana	VIGILANCIA Y CONTROL AL CONTRATO 2269 DE 2021		
	Acta reunión de cierre del proyecto	No. N/A	(Día / Mes / Año)	

3.5.2. Actividades con participación comunitaria TALLERES PEDAGÓGICOS

Detalle de las actividades	Tema	Cantidad Periodo	Cantidad Acumulado	No. asistentes Periodo	No. asistentes Acumulado	No. Anexos	No. Folios
TOTAL							

3.5.3. Actividades con participación comunitaria COMITÉS Y VEEDURÍAS

Detalle de las actividades	Cantidad de informes / actividades Periodo	Cantidad de informes / actividades Acumulado	No. personas informadas / asistentes Periodo	No. personas informadas / asistentes Acumulado	No. Anexos	No. Folios
Reunión comité	2	3	30	114	N° 13	22
TOTAL	2	3	30	114		

3.5.4. Concepto de la interventoría acerca del proyecto Cultura Vial y Participación Comunitaria (máximo 200 palabras para cada tema)

Talleres pedagógicos: Aprueba / No aprueba (Justificación): **NO APRUEBA**, teniendo en cuenta que hasta la fecha no se han desarrollado talleres pedagogicos de ninguna indole.

APRUEBA, para el periodo de 1 al 31 de enero la contratista reporta la reunión de seguimiento al plan de gestión social con la veeduría de Sacana (Córdoba) a sí **mismo, la conformación del comité de participación ciudadana para esta población. En cuanto al departamento de Sucre se restructuró el comité de veeduría ciudadana ante la personería municipal de Coveñas.**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE INFORME	PARCIAL	BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO No. (Informe No.)	6	TIPO DE PROYECTO	No licenciado	FECHA	31 ENERO 2023 (Día / Mes / Año)

1. INFORMACION GENERAL

PERIODO	DEL 1 ENERO 2023 (Día / Mes / Año)	AL 5 JUNIO 2023 (Día / Mes / Año)	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	2269 de 2021	No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA / AÑO	2263 de 2021
UNIDAD EJECUTORA	Subdirección Gestión Integral de Carreteras	OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA			
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Sucre					

3.6 Contratación y Sensibilización del Personal de Obra

3.6.1. Mano de obra vinculada al proyecto según procedencia

Tipo de mano de obra y procedencia	Contrato de obra				Contrato de interventoría			
	No.		%		No.		%	
	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado
MONC* del AIP*	4	9	100%	100%	1	1	33%	33%
MONC foránea					2	2	67%	67%
TOTAL MONC	**4**	**9**	**100%**	**100%**	**3**	**3**	**100%**	**100%**
MOC* del AIP		3		20%	1	2	50%	25%
MOC foránea	2	12	100%	80%	1	6	50%	75%
TOTAL MOC	**2**	**15**	**100%**	**100%**	**2**	**8**	**100%**	**100%**

Nota: AIP: Área de Influencia del Proyecto. MONC: Mano de obra no calificada. MOC: Mano de obra calificada


3.6.2. Sujetos de protección constitucional vinculados al proyecto

Tipo de población	Contrato de obra				Contrato de interventoría			
	MONC No.		MOC No.		MONC No.		MOC No.	
	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado
Madres cabeza de hogar	**2**	**5**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**
Comunidades étnicas	**4**	**4**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Talento jóven 18-28	**N/A**	**N/A**	**2**	**2**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**1**
ARN	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Otro:								

3.6.3. Actividades de sensibilización a trabajadores

Detalle de las actividades	Tema	Cantidad Periodo	Cantidad Acumulado	No. asistentes Periodo	No. asistentes Acumulado	No. Anexos	No. Folios
TOTAL							

3.6.4. Análisis gráfico de la contratación de mano de obra.



Total contratación mano de obra	35	Total contratación mano de obra INDIRECTA en el proyecto	12

3.6.5. Concepto de la interventoría acerca del proyecto Contratación de Mano de Obra (máximo 200 palabras)

Aprueba / No aprueba (Justificación): APRUEBO, en el periodo del 1 al 30 diciembre de 2022, se vincularon 4 trabajadores MOC de mano de obra calificada, y 10 MONC mano de obra no calificada para un total de personas 14 personas vinculadas laboralmente.
8 personas del barrio Guayabal – Coveñas- Sucre. 2 San Antero- Córdoba. 3 Bogotá- Cundinamarca.

3.7. Proyectos Productivos Sostenibles, Obras con Participación Comunitaria y/o Restitución de Equipamientos Públicos

3.7.1. Monto asignado en el Plan de Inversión Social

Proyectos productivos	N/A	Obras con participación comunitaria y/o Restitución de equipamientos públicos	$

3.7.2. Seguimiento

3.7.2.1. Proyectos Productivos -PP-

Fase	Seguimiento	Cantidad	No. Anexos	No. Folios
a. Formulación	Ideas de negocio			
	Iniciativas con estudio de pre factibilidad			
	Planes de negocios			
	Proyectos seleccionados			
b. Ejecución	Proyectos en fase de ejecución			

3.7.2.2. Obras con Participación Comunitaria -OPC-

Fase	Seguimiento	Cantidad	No. Anexos	No. Folios
a. Formulación	Iniciativas			
	Proyectos de obra formulados			
	Proyectos de obra con componentes viabilizados			
	Obras seleccionadas			
b. Ejecución	Obras en fase de ejecución			

3.7.3. Beneficio a la comunidad

Nombre PP	Unidades sociales beneficiadas	Personas beneficiadas	Valor inversión ($)	Nombre OPC	Unidades sociales beneficiadas	Personas beneficiadas	Valor inversión ($)

3.7.4. Actividades complementarias

Detalle de las actividades PP	Cantidad Periodo	Cantidad Acumulado	No. asistentes Periodo	No. asistentes Acumulado	No. Anexos	No. Folios	Detalle de las actividades OPC	Cantidad Periodo	Cantidad Acumulado	No. asistentes Periodo	No. asistentes Acumulado	No. Anexos	No. Folios
TOTAL							**TOTAL**						

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE INFORME	PARCIAL	BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO No. (Informe No.)	6	TIPO DE PROYECTO	No licenciado	FECHA	31 ENERO 2023 (Día / Mes / Año)

1. INFORMACION GENERAL

PERIODO	DEL 1 ENERO 2023 (Día / Mes / Año)	AL 5 JUNIO 2023 (Día / Mes / Año)	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	2269 de 2021	No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA / AÑO	2263 de 2021

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección Gestión Integral de Carreteras	OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Sucre		

3.7.5. Concepto de la interventoría acerca de los Proyectos Productivos Sostenibles, Obras con Participación Comunitaria y/o Restitución de Equipamento Público (máximo 200 palabras)

Aprueba / No aprueba (Justificación): **No Aplica**

3.8. Protección del Patrimonio Cultural y Natural de la Nación

3.8.1. Seguimiento a procesos de consulta previa

Origen de la CP	Grupo Étnico	Comunidad	Etapa del proceso	Fecha de protocolización de acuerdos (Día / Mes / Año)	No. de Acuerdos Protocoli.	No. de Acuerdos Cumplidos	Inversión Proyectada ($)	Inversión Ejecutada ($) Periodo	Inversión Ejecutada ($) Acumulado	Fecha de cierre de la consulta previa (Día / Mes / Año)	No. Anexos	No. Folios
							$ -	$ -	$ -			
							$ -	$ -	$ -			
							$ -	$ -	$ -			

3.8.2. Protección al patrimonio arqueológico

De acuerdo a la normatividad vigente el Contratista debe:

- ☐ Implementar un "Protocolo de manejo de hallazgos fortuitos de patrimonio arqueológico".
- ☐ Luego de la verificación de antecedentes, ejecutar las medidas de manejo derivadas de un Plan de Manejo Arqueológico, previamente suscrito ante el ICANH, en una etapa constructiva precedente.
- ☐ Adelantar la ejecución de un Programa de Arqueología Preventiva.

3.8.3. Descripción de actividades reguladas por el ICANH, para la protección del patrimonio arqueológico

Descripción de actividades programadas y ejecutadas en el periodo, para el Programa de Arqueología Preventiva (sí aplica).
No Aplica

3.8.4. Hallazgo fortuito de patrimonio arqueológico

Hallazgo Fortuito	Sí ☐ No ☐	(Día / Mes / Año)	Reporto hallazgo fortuito al ICANH	Sí ☐ No ☐	Inicio protocólo de hallazgo	Sí ☐ No ☐	No. Anexos	No. Folios

3.8.5. Caracterización de los hallazgos arqueológicos

3.8.6. Actividades de arqueología pública

Bienes patrimonio arqueológico	No. Piezas	Material predominante	Cultura	Periodo	Estado	Medios de divulgación de resultados	Cantidad de documentos / actividades Periodo	Cantidad de documentos / actividades Acumulado	No. personas informadas / asistentes Periodo	No. personas informadas / asistentes Acumulado	No. Anexos	No. Folios
Lote 1												
Lote 2												
Lote 3												
Lote 4												
Lote 5						TOTAL						

3.8.7. Descripción de actividades para la protección del patrimonio cultural

Descripción de actividades programadas y ejecutadas en el periodo, para la protección del patrimonio cultural (sí aplica).

No Aplica

3.8.8. Hallazgo fortuito de patrimonio geológico y/o paleontológico

Hallazgo Fortuito	Sí ☐ No ☐	(Día / Mes / Año)	Reporto hallazgo fortuito al SGC	Sí ☐ No ☐	Inicio protocólo de hallazgo	Sí ☐ No ☐	No. Anexos	No. Folios

3.8.9. Concepto de la interventoría acerca del proyecto Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural (máximo 200 palabras para cada tema)

Consulta previa: Aprueba / No aprueba (Justificación): **APRUEBO,** para el mes de marzo se elevo solicitud de pertinencia para la consulta previa ante el Ministerio del Interior, del cual la contratista reporta respuesta para el mes de mayo, en el cual el ministerio solicita el desarrollo y diligenciamiento de un formato Institucional, hasta le fecha este no ha sido tramitado.

Patrimonio: Aprueba / No aprueba (Justificación): **NO APRUEBO;** Aunque la contratista para el mes de marzo reporto que elevo solicitud ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH y que posteriormente ajusto solicitud según requerimiento del mencionado ente, quien solicito aclarar la verificación con coordenadas del sector a intervenir, para posteriormente poder emitir un concepto de la existencia o no de territorios ancestrales u arqueológicos, por segunda vez solicitan ampliar la descripcion del proyecto a nivel tecnico esto ultimo no ha sido ejecutado por la

3.9. Gestión Sociopredial

3.9.1. Actividades de la gestión Sociopredial

¿El proyecto tiene un diseño definitivo?	Sí ☐ No ☐	¿Hay sabana predial?	Sí ☐ No ☐	¿Hay diagnóstico sociopredial?	Sí ☐ No ☐	No. Anexos	No. Folios

No. Resolución vigente gestión sociopredial		(Día / Mes / Año)	Fichas prediales		Mejoratarios		El proyecto requiere el reconocimiento de Factores de Compensación Social	Sí ☐ No ☐

3.9.3. Relación de Factores de Compensación Social (FCS)

Factor de Compensación Social	No. Proyectados	No. Reconocidos Periodo	No. Reconocidos Acumulado	Valor total reconocimientos $	No. Faltan por reconocer	No. Anexos	No. Folios
				$ -			
				$ -			
				$ -			
TOTAL				$ -			

3.9.2. Concepto de la interventoría acerca del proyecto Gestión Sociopredial (máximo 200 palabras)

Aprueba / No aprueba (Justificación) **NO APLICA**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE INFORME	PARCIAL	**BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO No.** (Informe No.)	**6**	**TIPO DE PROYECTO**	No licenciado	FECHA	31 ENERO 2023 (Día / Mes / Año)

1. INFORMACION GENERAL

PERIODO	**DEL** 1 ENERO 2023 (Día / Mes / Año)	**AL** 5 JUNIO 2023 (Día / Mes / Año)	**No. CONTRATO DE OBRA / AÑO**	**2269 de 2021**	**No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA / AÑO**	**2263 de 2021**	
UNIDAD EJECUTORA	**Subdirección Gestión Integral de Carreteras**		**OBJETO DEL PROYECTO**	**MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA**			
DIRECCIÓN TERRITORIAL	**Sucre**						

3.10. Reporte de avance otras fichas PMA y/o PAGA

NOMBRE FICHA PMA Y/O PAGA	ACTIVIDADES REALIZADAS	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
No Aplica	NO APLICA	NO APLICA

4. CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION SOCIAL

	CONCLUSIONES		ACCIONES DE MEJORA
1	El contratista cumple con los espacios requeridos y adecuados para la atención a la comunidad.	1	Dar cumpliento con las recepciòn de P.Q.R.S en la mayor brevedad posible
2	En cuanto al servicio de atención al usuario-SAU, se observa celeridad en las respuestas a la comunidad, considerando que en el mes de Enero se recibieron 3 quejas 1 solicitud las cuales fueron cerradas.	2	El contratista INCOPAV S.A adecuó el SAU de acuerdo a las especificaciones estipuladas en el plan de gestion social, dispondra de estrategias de celeridad para dar respuesta en los tiempos establecidos.
3	El contratista utiliza diferentes estrategias para la información y divulgación de temas concernientes al proyecto megafoneo, oficios, casa a casa de manera personal por parte de la social de obra.	3	Continuar con las estrategias de informar de manera oportuna a las comunidades directamente influenciadas con la ejecusiòn del contrato.
4	Se evidencia que la contratista realizó la vinculación de (4) personas de Mano de Obra no Calificada del sector. En cuanto vinculación a mano de obra calificada (2) personas foránea.	4	El contratista INCOPAV S.A seguira vinculando al personal de la zona de acuerdo a la necesidad laboral y avances de las actividades tecnicas.
5	En cuanto al proyecto Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos, el contratista avanza en el levantamiento de actas de vecindad reporta 43 levantadas en la vereda el Mamey Departamento de Sucre.	5	Priorizar la actividad levantameinto de actas de vecindad y dar avances eficientes para terminar el proceso.
6	Se evidencia que el contratista proyecta acciones para vincular laboralmente personal de Mano de Obra No Calificada del área de influencia directa del proyecto.	6	acuerdo a los perfiles requeridos y por medio de los presidentes de juntas de acciones comunales del sector que conocen la necesidad laboral de su población.
7	El contratista cumple parcialmente con la ejecución de las actividades proyectadas en los programas de la gestión social, en el mes de Enero 2023.	7	Seguimiento a los proyectos estipulados en el plan de gestion social.
8	La contratista no ha culminado consulta ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH	8	El contratista INCOPAV S.A ha emitido en dos ocasiones la solicitud al ICANH, respondiendo esta entidad en la verificaciòn de los datos suministrados. El contratista hara la validaciòn de informacion y coordenadas con fines de que se complete el proceso ante el Instituto Colombiano de Antropoligia e Historia.
9	La contratista no reporta talleres pedagogicos.	9	Implementar la tematica de los talleres a desarrollar en las poblaciones proyectadas para este proyecto.

5. ACCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN MATERIA SOCIAL

AUTORIDAD	INTERVENTORIA
NO APLICA	NO APLICA

6. ACTIVIDADES PENDIENTES A LA TERMINACION DEL CONTRATO

ORIGEN DE LA OBLIGACIÓN	ARTÍCULO / NUMERAL / CÓDIGO FICHA PMA Y/O PAGA	OBLIGACIÓN	ITEM ACTIVIDAD	META	UNIDAD	CANTIDAD EJECU.	CANTIDAD POR	COSTO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD NO EJECUTADA	JUSTIFICACIÓN DE LA NO EJECUCIÓN	IMPUTABILIDAD AL CONTRATISTA	CONCEPTO INTERVENTORÍA ACTIVIDADES SIN EJECUTAR
		N/A	N/A								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE INFORME	PARCIAL	**BALANCE DE ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO No.** (Informe No.)	**6**	**TIPO DE PROYECTO**	No licenciado	FECHA	31 ENERO 2023 (Día / Mes / Año)

1. INFORMACION GENERAL

PERIODO	**DEL**	1 ENERO 2023 (Día / Mes / Año)	**AL**	5 JUNIO 2023 (Día / Mes / Año)	**No. CONTRATO DE OBRA / AÑO**	**2269 de 2021**	**No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA / AÑO**	**2263 de 2021**
UNIDAD EJECUTORA	**Subdirección Gestión Integral de Carreteras**			**OBJETO DEL PROYECTO**	**MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA**			
DIRECCIÓN TERRITORIAL	**Sucre**							

7. ANEXOS SOCIALES

ANEXOS	CONTENIDO	No. de folios
Anexo No. 1	Formato MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta de Radicación y Actualización Social de Proyectos	5
Anexo No. 2	Formato MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Matriz de Cumplimiento Actividades Sociales	2
Anexo No. 3	Formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-4 Acta de Vecindad	N/A
Anexo No. 4	Formatos y soportes relacionadas con manifestaciones ciudadanas	5
Anexo No. 5	Copia formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social y soportes	5
Anexo No. 6	Copia formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto y soportes	1
Anexo No. 7	Copia de formatos y soportes en uso del Instructivo para la Gestión Sociopredial MASPS-MN1-IN-4.	N/A
Anexo No. 8	Copia de formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance Estado Social del Proyecto entregado mensualmente por el Contratista y formatos de Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) presentados semestralmente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), para el componente social.	N/A
Anexo No. 9	Anexos por ficha o proyecto no incluidos antes	N/A
Anexo No. 10	Copia de actos administrativos generados durante la ejecución del proyecto	N/A
Anexo No. 11	Oficios sociales generados por el Contratista y la Interventoría	5
Anexo No. 12	Copia de formatos MEPI-MN1-IN-14-FR-2 Acta de Reunión, de todo comité que incluya al componente social.	5
Anexo No. 13	Otros	3

8. FIRMAS

Firma:
Nombre: **GUSTAVO HERNANDEZ VEGA**
DIRECTOR DE OBRA INCOPAV S.A
Matrícula Profesional No.: 25202-18375

Firma:
Nombre: **ZULLY LOPERENA REDONDO**
PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA INCOPAV S.A
Matrícula Profesional No.: 349771121

Firma:
Nombre: WILLIAN VALENCIA CAMPOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA INGEVAL S.A.S
Matrícula Profesional No.: 25202-39413 CND

Firma:
Nombre: KADERINNE MARIMON ARAGÓN
PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORÍA INGEVAL S.A.S
Matrícula Profesional No.: 239451114-1

Nota: En los numerales 2 a 6 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RADICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-1
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

PERIODO	**DEL**	1 ENERO 2023 (Día / Mes / Año)	**AL**	31 ENERO 2023 (Día / Mes / Año)	FECHA	31 ENERO 2023 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA		Subdirección Gestión Integral de Carreteras	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	Dirección Territorial Sucre	**ACTA No.** (coincide con Balance de Estado Social de Proyecto)		6

1. DATOS DEL PROYECTO

TIPO DE PROYECTO	No licenciado	**RESOLUCIÓN No.** (aplica para proyectos licenciados)	No aplica	FECHA (Día / Mes / Año)	
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA COVEÑAS -SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA.			**No. PROCESO SECOP**	IP-DO-SRN-049 2021
RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA	INCOPAV S.A				

TIPO DE PERSONA JURÍDICA	Otra:	**PARTICIPANTES**	**RAZON SOCIAL**	**NIT**	**Participación**
			INCOPAV S.A	830.063.087-1	100%
			Sumatoria ∑		**100%**

NIT	830.063.087-1	**Registro de cambios:**	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO	INCLUSIÓN DE TRAMOS DEPARTAMENTO DE SUCRE, MUNICIPIO DE COVEÑAS PR 0473 AL PR2 0473 (BARRIO PUNTA SECA) PR2+0800 AL PR3 + 0400 (VEREDA PUENTE EL SOL) PR4 + 0500 AL PR5 +0200 (VEREDA MAMEY)	
NOMBRE DEL DIRECTOR DE OBRA	FERNANDO MARCELO CASAS		
CONTRATO (No. / año)	Contrato 2269-2021		
FECHA DE ORDEN DE INICIO (Día / Mes / Año)	22/02/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN	Del 28 novimebre Hasta el 5 de junio 2023		
PLAZO (meses)	N/A		
DIRECCIÓN	Carrera 2 Calle 8B -25 Sector Guayabal		
TELÉFONOS	3152948151		
CORREO ELECTRÓNICO	dmin.invias@incopav.com		
AIU	**30%**	**A** **%**	**i** **%** **U** **%**
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO	$ 8.555.187.010,00	**RELACIÓN DE VALORES ACUMULADOS QUE INCLUYEN ADICIONES**	$ -
VALOR IVA DEL CONTRATO	$ 67.595.694,00		$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 8.622.782.704,00		$ -
VALOR PROVISIÓN CONTRACTUAL AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	N/A		$ -
VALOR PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL	N/A		$ -

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA COVEÑAS -SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA.**			**No. PROCESO SECOP**	SMA-DO-SRN-181-2021
RAZÓN SOCIAL INTERVENTORÍA	INGEVAL S.A.S				

TIPO DE PERSONA JURÍDICA	Otra:	**PARTICIPANTES**	**RAZON SOCIAL**	**NIT**	**Participación**
			INGEVAL S.A.S	8220048591	100%
			Sumatoria ∑		**100%**

NIT	8220048591	**Registro de cambios: No Aplica**	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CLAUDIA MILENA TRUJILLO		
NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	WILLIAM VALENCIA CAMPO		
CONTRATO (No. / año)	2263 de 2021		
FECHA DE ORDEN DE INICIO (Día / Mes / Año)	22/02/2022		
PLAZO (meses)	Del 28 novimebre Hasta el 5 de junio 2023	INCLUSIÓN DE TRAMOS DEPARTAMENTO DE SUCRE, MUNICIPIO DE COVEÑAS PR 0473 AL PR2 0473 (BARRIO PUNTA SECA) PR2+0800 AL PR3 + 0400 (VEREDA PUENTE EL SOL) PR4 + 0500 AL PR5 +0200 (VEREDA MAMEY)	
DIRECCIÓN	Cl. 38 #32 – 41, Villavicencio, Meta		
TELÉFONOS	(8) 6623159		
CORREO ELECTRÓNICO	interventoriasucrecordoba@gmail.com		
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO	$ 840.336.134,00	**RELACIÓN DE VALORES ACUMULADOS QUE INCLUYEN ADICIONES**	$ -
VALOR IVA DEL CONTRATO	$ 159.663.865,00		$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 999.999.999,00		$ -
VALOR PROVISIÓN ACTIVIDADES DE VIGILANCIA A LA GESTIÓN PÚBLICA (Veedurías Ciudadanas)	N/A		$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RADICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-1
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

PERIODO	**DEL**	1	ENERO	2023	**AL**	31	ENERO	2023	FECHA	31	ENERO	2023
		(Día / Mes / Año)				(Día / Mes / Año)				(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA Subdirección Gestión Integral de Carreteras **DIRECCIÓN TERRITORIAL** Dirección Territorial Sucre **ACTA No.** (coincide con Balance de Estado Social de) **6**

2. PERSONALSOCIAL VINCULADO AL PROYECTO

Nombre	Profesión	Cargo	% de Dedicación	No. Celular	Dirección electrónica	Personal aprobado mediante (No. Oficio / Fecha):
Zully Karen Loperena Redondo	Trabajadora Social	Profesional social contratista	100%	3106159633	social.invias@incopav.com	CI-N° 2263-2021-OFI N° 007 1/02/2022
Kaderinne Janileth Marimón Aragón	Trabajadora Social	Gestor Social de INVIAS	100%	3217273107	interventoriasucrecordoba@gmail.com	CGI 5359 4/02/2022
Sara Lobo Lopez	Trabajadora Social	Gestor Técnico de INVIAS	100%	3202828752	slobo@invias.gov.co	
Lilliana Liceth Garcia Meza	Ingeniero Civil	Gestor Técnico de INVIAS	100%	3182379944	mcaballero@invias.gov.co	
Luis Gonzales Ozuna	Ingeniero Civil	Supervisor Dirección Territorial INVIAS	100%	3107136678	lmgonzalez@invias.gov.co	

3. DESCRIPCION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA A EJECUTAR

La Gestión Social busca principalmente establecer espacios de comunicación, participación, interacción y atención oportuna entre la comunidad, usuarios del corredor vial, buscando mitigar, prevenir o fortalecer los impactos generados por el proyecto en los municipios, veredas, corregimientos y demás espacios donde se van a ejecutar las obras; mediante el desarrollo de los diferentes programas que contempla el área de Gestión Social, por lo cual se crearán acciones que efectivamente generen bienestar y progreso, dentro de las cuales se desarrollaran: Punto servicio de atencion al usuario, buzon satelite y en general atencion de todas las manifestciones ciudadanas, se realizaran reuniones informativas antes, durante y al finalizar la obra como estrategia de informacion y divulgacion, en cuento al manejo de la infraestructura de predios y servicios publicos, se levantaran actas de vecindad en las contrucciones aledañas a las actividades de obra, en relacion a la cultura vial y participacion comunitaria se creara el comite de veeduria ciudadana y se realizara concientacion con las comunidades educativas, poblacion en general y aquellos sectores del area de influencia directa y se indagara y conocera disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada a contratar para el desarrollo de la obra trayendo a las comunidades aledañas oportunidades de trabajo que aporten al mejoramiento de su calidad de vida y que mitiguen los diferentes impactos que esta obra pueda generar.

4. GESTIÓN SOCIAL APROBADA POR LA INTERVENTORIA

No.	Proyectos de gestión social - PAGA	APROBACIÓN	Justificación:
PGS - 6.1 - 18	Proyecto de servicio de Atención al usuario.	Aprobado	Se instalará y adecuará un punto SAU-servicio atención al usuario en el cual se brindará información y atención a las comunidades y en general para atender todas las manifestaciones ciudadanas.
PGS - 6.2 - 19	Información y Divulgación	Aprobado	Se realizarán reuniones informativas antes de inicio de la obra, durante todo el proceso constructivo hasta finalizar la ejecusión. La información debe ser clara veraz y oportuna por medio de una comunicación asertiva.
PGS - 6.3 - 20	Manejo de la Infraestructura de Predios y Servicios Públicos	Aprobado	Este proyecto consta de tres (3) actividades: una primera relacionada con el levantamiento de Actas de Vecindad en todas las construcciones aledañas a las actividades de obra y en los sitios de uso temporal por parte del contratista; la segunda con la elaboración de Actas de Compromiso entre el contratista y el responsable o el propietario del predio de uso temporal y la tercera en relación a la afectación de la infraestructura de servicios públicos
PGS - 6.5 - 22	Cultura Vial y Participación Comunitaria	Aprobado	Concientización con las comunidades educativas, población en general para realizar talleres pedagógicos, con el objetivo de informar, educar y hacer tomar conciencia en temas ambientales, de biodiversidad, de seguridad vial y la consolidación del comité de participación ciudadana.
PGS - 6.6 - 23	Contratación de Mano de Obra	Aprobado	La línea de base del componente socioeconómico y cultural debe indicar la dinámica del empleo en el los perfiles laborales que hay en el área y en fin conocer la disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada. Con esta información, el contratista establecerá el porcentaje de mano de obra a contratar para el desarrollo de la obra.
No aplica.	Otros proyectos:	No aplica	No aplica.

No.	Obligaciones relacionados con el medio socioeconómico - Licencia Ambiental	Descripción de principales actividades:
N/A	N/A	N/A

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RADICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-1
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

PERIODO	**DEL**	1	ENERO	2023	**AL**	31	ENERO	2023	FECHA	31	ENERO	2023
		(Día / Mes / Año)				(Día / Mes / Año)				(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección Gestión Integral de Carreteras	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	Dirección Territorial Sucre	**ACTA No.** (coincide con Balance de Estado Social de	**6**

5. DELIMITACION AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Tramo	Nombre tramo	Rango PR	Municipio	Departamento	Otras áreas de intervención	Municipio	Departamento
tramo 1	Barrio Guayabal	PR0 +0000 AL PR1+0200	COVEÑAS	SUCRE	Zona de tráfico frecuente de vehículos pesados	COVEÑAS	SUCRE
Tramo 2	Barrio Punta seca	PR 2 +0200 AL PR 2 +260 DEL PR 2 +0382 al PR2 +0473 Y PR 0382 AL PR 2 +0800	COVEÑAS	SUCRE	Zona de tráfico frecuente de vehículos pesados	PURÍSIMA	CORDOBA
Tramo 2	Vereda Puente el Sol	PR2 + 0800 al PR 03 +0400	COVEÑAS	SUCRE			
	Corregimiento El Reparo	NO HACE PARTE DEL CONTRATO	COVEÑAS	SUCRE	**Zona de manejo de escombros y material de excavación**	COVEÑAS	SUCRE
Tramo 2	Vereda El Mamey	PR4 + 0500 al PR 5 +0200	COVEÑAS	SUCRE	**Centro de operación y/o acopio**	COVEÑAS	SUCRE
	Corregimiento el Aserradero	NO HACE PARTE DEL CONTRATO	PURÍSIMA	CORDOBA	**Fuente de materiales**	LORICA	CORDOBA
	Vereda Mocha Nariz	NO HACE PARTE DEL CONTRATO	PURÍSIMA	CORDOBA			
	Corregimiento El hueso	NO HACE PARTE DEL CONTRATO	PURÍSIMA	CORDOBA			
Tramo 3	Corregimiento Sacana	PR10 + 0400 al PR 12 +0400	MOMIL	CORDOBA			
	Corregimiento Sabaneta	NO HACE PARTE DEL CONTRATO	MOMIL	CORDOBA			

6. CARACTERIZACIÓN SOCIAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

6.1. Identificación de Equipamientos o Servicios Públicos

TIPO DE EQUIPAMIENTO O SERVICIO PÚBLICO	No. Total	Descripción	Nombre	Tramo	PR
Equipamientos deportivos, recreativos y servicios básicos	1	Parque y/o instalación recreativa	Polideportivo El Hueso	Tramo 7	km 10
Equipamientos educativos	6	Escuela o colegio	**Institución Educativa Ismael Contreras Meneses,** Centro Educativo El Reparo, centro Educativo Santa Fé, **Centro Educativo el Mamey,** Centro Educativo El Hueso, **Institución Educativa Sacana.**	TRAMO 1 - TRAMO 2 - TRAMO 3	km 1, km 3, km 2, km 6, Km 10, Km 11
Equipamientos sanitarios		Otro:			
Equipamientos culturales	1	Casa de cultura	Casa de la Cultura Humberto Hernandez	Tramo 1	Km 1
Equipamientos de bienestar social	1	Otro:	Centro Lúdico	Tramo 1	Km 1
Equipamientos de servicios públicos comunitarios		Otro:	Cuerpo de Bomberos voluntarios de Coveñas	Tramo 1	Km 1

6.2. Matriz de Identificación de Actores y Organizaciones Estratégicos

NOMBRE ACTOR U ORGANIZACIÓN	Teléfono	Correo electrónico	Sector	Nivel	Municipio	Departamento	Observaciones
Dairo Paternina López	3125282133	asocomunalcovenas2022@gmail.com	Público	Municipal	COVEÑAS	SUCRE	Presidente de la ASOCOMUNAL Municipio de Coveñas
Manuel Bello Mercado	3154258829	manuelbellocardenas1@gmail.com	Público	Municipal	COVEÑAS	SUCRE	Presidente de la JAC barrio Guayabal 3ra etapa
Maria Cristina Monterrosa Coneo	3113937401		Público	Municipal	COVEÑAS	SUCRE	Presidente de la JAC barrio Punta Seca
Yenis Padilla Diaz	3145895441	yunispadilladiaz@gmail.com	Público	Municipal	COVEÑAS	SUCRE	Presidente de la JAC barrio Guayabal 2da etapa
Loreleys Ladeus Mendoza	3003213249	lollaveus@gmail.com	Público	Municipal	COVEÑAS	SUCRE	Presidente de la JAC barrio Guayabal 4ta etapa
Merardo Suarez Zuñiga	3135956972		Público	Municipal	COVEÑAS	SUCRE	Presidente de la JAC barrio Guayabal 1ra etapa
Alfredo Zuñiga Hernandez	3113391507	**No tiene**	Público	Municipal	COVEÑAS	SUCRE	Presidente de la JAC Vereda Puente del sol
Jhon Jairo Cardenas Alvarez	3107486523		Público	Municipal	COVEÑAS	SUCRE	presidente JAC corregimiento El Reparo
Nicolas Peñate	3114255909		Público	Municipal	COVEÑAS	SUCRE	capitan cabildo indigena corregimiento El Reparo
Fernando Arrieta Turizo	3106656115	**No tiene**	Público	Municipal	COVEÑAS	SUCRE	presidente JAC corregimiento Vereda El Mamey
Sulenis Zapata Rocha	3217727327		Público	Municipal	COVEÑAS	SUCRE	Capitan cabildo indigena Vereda El Mamey
Wilintón Blanquicet Blanquicett	3136143672	blanquicetwilintonantonio@gmail.com	Público	Municipal	MOMIL	CORDOBA	Capitan cabildo indigena corregimiento de Sacana
Keny Blanco Donado	3105753057	garciavelezkellyyenifer@hotmail.com	Público	Municipal	PURÍSIMA	CORDOBA	Presidente JAC corregimiento El Hueso
Miguel Castellano	3104355632	cabildomenorsabaneta@gmail.com	Público	Municipal	MOMIL	CORDOBA	Capitán Cabildo indigena Zenú sabaneta
Levis Moreno Mercado	3104355632	mercdo99@gmail.com	Público	Municipal	MOMIL	CORDOBA	Cacique del cabildo Zenú alcantará cordoba y Sucre
Jose Antonio Zurita Mejia	3204746221	No tiene	Público	Municipal	PURÍSIMA	CORDOBA	Capitán cabildo indigena Zenú Aserradero

7. OBLIGACIONES SOCIALES CEDIDAS DE OTROS CONTRATOS DE OBRA

NO APLICA

Contrato del cual surge la obligación (No. / año)	Obligación	Entidad que lo requiere	Documento soporte de la obligación (No. / fecha)	Actividades requeridas		Actividades pendientes		Periodo de cumplimiento de las actividades (Mes / Año)		Costo estimado de las actividades ($)	Revisado y aprobado Interventoría (Sí / No)	Justificación de la aprobación
				Cantida	Unidad	Cantidad	Unidad	Inicio	Cierre			
										$ -		
										$ -		
										$ -		
										$ -		
										$ -		

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RADICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-1
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

PERIODO	**DEL**	1	ENERO	2023	**AL**	31	ENERO	2023	FECHA	31	ENERO	2023
		(Día / Mes / Año)				(Día / Mes / Año)				(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA Subdirección Gestión Integral de Carreteras **DIRECCIÓN TERRITORIAL** Dirección Territorial Sucre **ACTA No.** (coincide con Balance de Estado Social de **6**

8. MECANISMOS DE PROTECCION DE COMUNIDADES ETNICAS Y PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y CULTURAL

8.1. Consulta Previa a Comunidades Étnicas

N°. de radicación ante MinInterior presencia de comunidades étnicas INC-INVIAS-2269-C-005 **FECHA** 15 MARZO 2022 (Día / Mes / Año)

N°. de respuesta de MinInterior presencia de comunidades étnicas EXTMI2022- 10693 **FECHA** 15 JUNIO 2022 (Día / Mes / Año)

Presencia de comunidades étnicas

Acuerdos protocolizados de Consulta Previa

Grupo étnico	Pueblo	Nombre de las comunidad	Requiere consulta previa

8.2. Protección al Patrimonio Arqueológico

Para proteger el patrimonio arqueológico, el Contratista opta por:

- ☐ Implementar un "Protocolo de manejo de hallazgos fortuitos de patrimonio arqueológico".
- ☐ Luego de la verificación de antecedentes, ejecutar las medidas de manejo derivadas de un Plan de Manejo Arqueológico, previamente suscrito ante el ICANH, en una etapa constructiva precedente.
- ☐ Adelantar la ejecución de un Programa de Arqueología Preventiva.

Revisado y aprobado Interventoría (Si / No)	Justificación de la aprobación

8.3. Presencia de Patrimonio Cultural

Presencia de bienes de Interés cultural

Nombre del bien	Grupo patrimonial	Tipo de patrimonio cultural	Municipio	PR	Nivel declaratoria patrimonio cultural
HUMBERTO HERNANDEZ SANCHEZ	Material inmueble	Patrimonio urbano -Centro histórico	COVEÑAS	KM 1	Distrital o municipal

9. SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO

Punto de atención	Municipio	Departamento	Dirección y/o ubicación	Días y horarios de atención
Otro:	COVEÑAS	SUCRE	Carrera 2 Calle 8B -25 Sector Guayabal	Lunes - Miercoles- Sabado 8:00 am - 4:00 Pm
Punto Satélite	MOMIL	CÓRDOBA	Corregimiento de Sacana, Parque Principal	Martes y Jueves 1:00 pm - 4:00 Pm

Nombre responsable de atención al usuario ZULLY LOPERENA REDONDO

Teléfono: 3106159633 - 3007547338 **Correo electrónico:** Social.invias@incopav.com

10. ACTAS DE VECINDAD

10.1. Predios Aledaños a los Frentes de Obra 400

10.2. Predios Aledaños a Otras Áreas de Intervención 100

Tramo	No. predios por tramo	Otras áreas de intervención	No. predios por área
Tramo 1, 2, 3 y 4	250	Otra:	
Tramo 5, 6 y 7	150	Otra:	
Tramo 8 y 9	100	Otra:	
		Otra:	
		Otra:	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RADICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-1
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

PERIODO	**DEL**	1	ENERO	2023	**AL**	31	ENERO	2023	FECHA	31	ENERO	2023
		(Día / Mes / Año)				(Día / Mes / Año)				(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección Gestión Integral de Carreteras	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	Dirección Territorial Sucre	**ACTA No.** (coincide con Balance de Estado Social de	6

11. MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS E IMPACTOS SOCIALES SIGNIFICATIVOS

Descripción del riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Impacto del riesgo
Accidentalidad vial	Frecuentemente	Moderado
Conflictividad social	Frecuentemente	Moderado
Incidencia del proyecto en áreas sensibles	Frecuentemente	Moderado
Daño a equipamientos públicos y/o comunitarios	Frecuentemente	Moderado
Externalidades negativas del proyecto	Frecuentemente	Moderado

12. ANEXOS

1. Plano de localización político administrativa del proyecto con delimitación de área de influencia del medio socioeconómico.
2. Registro fotográfico inicial.
3. Gestiones realizadas ante el MININTERIOR.
4. Actas de protocolización y/o seguimiento de acuerdos de Consulta Previa (si aplica).
5. Gestiones realizadas ante el ICANH.
6. Plan de Manejo Arqueológico aprobado por el ICANH (si aplica).
7. Plan de trabajo.
8. MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Matriz de Cumplimiento Actividades Sociales (formatos anexos que incluyen actividades relacionadas con pasivos sociales de otros proyectos, indicadores de cumplimiento de gestión social y/o actos administrativos).
9. MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social (en versión 1)

Para proyectos licenciados
Estudio de Impacto Ambiental.
Acto administrativo mediante el cual se otorgó Licencia Ambiental.
Fichas del medio socioeconómico con plan de trabajo actualizados.

Para proyectos no licenciados
Plan de Adaptación de la Guía Ambiental.

Para proyectos de mínimo impacto
Certificación de no afectación a territorios colectivos o al patrimonio arqueológico y cultural de la Nación, por la ejecución de las obras.

13. FIRMAS

Firma:		Firma:		Firma:		Firma:	
Nombre:	**GUSTAVO HERNANDEZ VEGA**	Nombre:	**ZULLY LOPERENA REDONDO**	Nombre:	**WILLIAM VALENCIA CAMPO**	Nombre:	**KADERINNE MARIMON ARAGÓN**
DIRECTOR DE OBRA	CONTRATISTA **INCOPAV S.A**	PROFESIONAL	TRABAJADORA SOCIAL CONTRATISTA **INCOPAV S.A.S**	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**INGEVAL S.A.S**	PROFESIONAL	TRABAJADORA SOCIAL INTERVENTORÍA INGEVAL S.A.S
Matrícula Profesional No.:	25202-18375	Matrícula Profesional No.:	349771121	Matrícula Profesional No.:	25202-39413 CND	Matrícula Profes	239451114-1

Nota: En los numerales 2 a 11 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MATRIZ DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-2-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA COVEÑAS -SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA.							FECHA	31 ENERO 2022 (Día / Mes / Año)
No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	**2269 de 2021**	**No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA / AÑO**	**2263 de 2021**	**PERIODO**	**DEL** 1 ENERO 2023 (Día / Mes / Año)	**AL** 31 ENERO 2023 (Día / Mes / Año)	**MATRIZ No.** (coincide con Balance de Estado Social de Proyecto)	**6**	

1. MATRIZ DE ACTIVIDADES SOCIALES

No.	TIPO DE DOCUMENTO OBLIGANTE	ORÍGEN DE LA OBLIGACIÓN	ACTO ADMINISTRATIVO / ACTA DE PROTOCOLIZACIÓN / FICHA PMA O PAGA	OBLIGACIÓN	ÍTEM ACTIVIDAD	FORMULA DEL INDICADOR	RELACIÓN DE SOPORTES		
							Medio	No. Anexos	No. Folios
1	Ficha PAGA	Contratista	PGS - 6.1 - 18	Proyecto Servicio de Atención al usuario.	Se instalará y adecuará un punto SAU-servicio atención al usuario en el cual se brindará información y atención a las comunidades y en general para atender todas las manifestaciones ciudadanas.	No. de atenciones realizadas / No. P.Q.R.S aplicados *100	Digital y fisico	12	12
2	Ficha PAGA	Contratista	PGS - 6.2 - 19	Información y Divulgación	Reuniones programadas de inicio, seguimiento y al finalizar la ejecución del contrato. Conformación del comité de participación ciudadana.	No. de reuniones realizadas / No. reuniones programadas *100	Fisico	8	56
3	Ficha PAGA	Contratista	PGS - 6.3 - 20	Manejo de infraesuctura de predios	Acta de vecindad ,incluye levantamiento de inventario del predio ,visita tecnica,elaboracion formato y levantamiento de archivo filmico y fotografico	No. De actas vecindad realizadas / No. Actas vecindad programadas *200	Digital y fisico	322	1610
4	Ficha PAGA	Contratista	PGS - 6.5 - 22	Cultura Vial y Participación Comunitaria	Conformacion y comité de veeduria ciudadana	No. de comité programado/ No. Comité desarrollados x 100	Digital y fisico	3	50
					Entrega de Cartilla Educativa Cultura Vial en los colegios e instituciones educativas laterales sobre la via a intervenir.	No. de cartillas entregadas / No. Cartillas programadas *700			
					Capacitaciones sobre cultura vial y participación comunitaria.	No. de capacitaciones realizadas / No. capacitaciones programadas *100			
5	Ficha PAGA	Contratista	PGS-6.6-23	Proyecto de contratación de mano de obra	Divulgación mecanismo de selección del personal a contratar.	N° de vacantes ofertadas/ N° de socializaciones	Digital y fisico	2	2
					Contratación del personal	N° de personas Contratadas N° de personas convocadas *100			
		Contratista							

3. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

El contratista reporta avances de los proyectos del plan de gestion social, a excepcion del proyecto de cultura vial y participacion comunitaria el cual se encuentra en ejecucion parcialmente.
La interventoria en el cumplimiento de sus obliagciones reviso y superviso el desarrollo y ejecucion de los proyectos del componente social
Desde la interventoria se orienta la celeridad que necesita el levantamiento de las actas de vecindad y el desarrollo de las actividades concernientes a la cultura vial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MATRIZ DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-2-FR-3
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA COVEÑAS -SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA.					FECHA	31 ENERO 2023 (Día / Mes / Año)
No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	**2269 de 2021**	**No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA / AÑO**	**2263 de 2021**	**PERIODO DEL**	1 ENERO 2023 (Día / Mes / Año) **AL** 31 ENERO 2023 (Día / Mes / Año)	**MATRIZ No.** (coincide con Balance de Estado Social de Proyecto)	**6**

2. AVANCE DE CUMPLIMIENTO

No.	ARTÍCULO / NUMERAL / LITERAL / CÓDIGO FICHA PMA Y/O PAGA	ESTADO DE EJECUCIÓN	META (cantidad)	UNIDAD	AVANCE (periodo)			AVANCE (acumulado)			ACTIVIDADES POR EJECUTAR	COSTO CON CARGO A	TRÁMITE	CONCEPTO REPORTADO POR INTERVENTORÍA
					EJECUTADO	PLANEADO	INDICADOR (%)	EJECUTADO	PLANEADO	INDICADOR (%)				
1	7.3 Proyecto 1 Página 86	En ejecución	Todas acciones necesarias derivadas de la atencion al usuario.	Plan de Gestión social	3	N/A		3	N/A	100%	Todas acciones necesarias derivadas de la atencion al usuario.	Presupuesto General de Obra	Administración General del Contrato	Cumplimiento
2	7.3 Proyecto 2 Página 88	En ejecución	6	Plan de Gestión social	3	6	50%	3	6	50%	3	Presupuesto General de Obra	Administración General del Contrato	Cumplimiento
3	7.3 Proyecto 3 Página 89	En ejecución	380	Plan de Gestión social	43	380	11%	322	380	85%	58	Presupuesto General de Obra	Administración General del Contrato	Cumplimiento
4	7.3 Proyecto 4 Página 92	Sin iniciar	6	Plan de Gestión social	3	6	50%	3	6	50%	3	Presupuesto General de Obra	Administración General del Contrato	Cumplimiento
			700			700		700		#¡DIV/0!	700			
			3			3		3		#¡DIV/0!	3			
5	7.3 Proyecto 5 Página 93	En ejecución	8	Plan de Gestión social	2	8	25%	18	8	63%	3	Presupuesto General de Obra	Administración General del Contrato	Cumplimiento

3. FIRMAS

Firma
Nombre: **ZULLY LOPERENA REDONDO**
Profesional Social - CONTRATISTA INCOPAV S.A
Matrícula profesional 349771121

Firma
Nombre: **KADERINNE MARIMON ARAGÓN**
Profesional Social - INTERVENTORIA INGEVAL S.A.S
Matrícula profesional No.: 239451114-1

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

¿FÚE RADICADO PLAN DE INVERSIÓN, VERSIÓN 1?	**Es la versión 1**	**PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL No.** (No. versión actualizada)	**6**		FECHA	**31 ENERO 2023** (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección Gestión Integral de Carreteras	**OBJETO DEL CONTRATO**	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA COVEÑAS -SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA.
DIRECCIÓN TERRITORIAL	**Dirección Territorial Sucre**		

PROVISIONES CONTRACTUALES:	VALOR INICIAL	VALOR ACTUALIZADO	PROVISIONES SOCIALES:	VALOR INICIAL	VALOR ACTUALIZADO		
AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ -	$ -	**SOCIAL**		$ -	**No. CONTRATO DE OBRA / AÑO**	**2269 de 2021**
AMBIENTAL	$ -	$ -	**SOCIOAMBIENTAL**		$ -	**No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO**	**2263 de 2021**
PREDIAL	$ -	$ -	**SOCIOPREDIAL**		$ -		
SOSTENIBILIDAD	$ -	$ -	¿El proyecto tiene asignados recursos para la vigilancia de la gestión pública (Veedurías Ciudadanas) ?			SÍ	No

2. COSTOS DE ACTIVIDADES SOCIOAMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM				MEDIDA A EJECUTAR					DESCRIPCIÓN DE COSTOS				TRÁMITE Marcar con una X		OBSERVACIONES
CÓDIGO / FICHA	**PROGRAMA**	**PROYECTO**	**ACTIVIDAD**	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL ($)**	**REEMBOLSO DE GASTOS**	**ÍTEM NO PREVISTO**	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En caso de que se generen actos administrativos, de indole social dentro del PAGA, los costos de la misma seran asigndados a un nuevo plan de inversión para el rembolso respectivo de la entidad previo a la aprobación por parte de la interventoria.

3. COSTOS DE ACTIVIDADES SOCIOPREDIALES DELCONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM				MEDIDA A EJECUTAR					DESCRIPCIÓN DE COSTOS				TRÁMITE Marcar con una X		OBSERVACIONES
CÓDIGO / FICHA	**PROGRAMA**	**PROYECTO**	**ACTIVIDAD**	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL ($)**	**REEMBOLSO DE GASTOS**	**ÍTEM NO PREVISTO**	
N/A	N/A	N/A	N/A						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4. RESUMEN

A	VALOR TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -	E	VALOR TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$ -
B	VALOR BASICO	$ -	F	OTROS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS	
C	VALOR IVA	$ -	G	VALOR BASICO TOTAL GESTION SOCIOAMBIENTAL	$ -
D	VALOR PROVISION SOCIAL INCLUIDO IVA	$ -	H	VALOR BASICO TOTAL GESTION SOCIOPREDIAL	$ -

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: **GUSTAVO HERNANDEZ VEGA**
Representante Legal Contratista INCOPAV S.A **Apoderado**
Matrícula Profesional No.: **25202-18375**

Firma
Nombre: **ZULLY LOPERENA REDONDO**
Profesional Social Contratista INCOPAV S.A
Matrícula Profesional No.: **349771121**

Firma
Nombre: **CLAUDIA MILENA TRUJILLO ANGEL**
Representante Legal Interventoría INGELVAL S.A.S **Apoderado**
Matrícula Profesional No.: **40.442.830**

Firma
Nombre: **KADERINNE MARIMON ARAGON**
Profesional Social Interventoría INGEVAL S.A. S
Matrícula Profesional No.: **239451114-1**

NOTA:
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Social son responsabilidad del Contratista y del Interventor, de acuerdo a sus competencias respectivas .
2. A partir del Plan de Inversión Social No. 2, la Interventoría debe aprobar las actividades, cantidades y precios.
3. La aprobación del Plan de Inversión Social esta sujeta tanto a los recursos asignados como al cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Gestión Social
4. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

PROTEGE-T
tu Vida Valel

NIT: 806006774-3

EXAMEN MÉDICO DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

Cra 12 # 13-39 Edif. SAN DIEGO Sahagun - Cord.

Fecha	C.C.
13/01/2023	11.202.089

CONCEPTO

DATOS PERSONALES

Nombre Completo	Fecha de Nacimiento	Rh
JUAN PABLO RODRIGUEZ RINCON	20/09/1978	AB+

Profesión	Fondo de Pensión	EPS
NO	PORVENIR	SALUD TOTAL

Ciudad	Dirección	Móvil	Correo Electrónico
MONTERIA	BRR MOGANBO	3166256806	juamparr@hotmail.com

PROYECTO Y SEDE

EMPRESA	ENFASIS	Cargo	Municipio
INCOPAV	OSTEOMUSCULAR	OP. DE MOTO NIVELADORA	COVEÑAS

DICTAMEN

APTO	X	APLAZADO	

Apto para trabajo en alturas		Apto para trabajo en excavaciones		Apto para trabajo en espacios confinados	

PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE LE APLICAN

Fenomenos naturales	Biológico	Auditivo	Visual	Fisico
Prevalente				Prevalente

Osteomuscular	Psicosocial	Biomecánico	Químico
Prevalente	Prevalente	Prevalente	

RECOMENDACIONES

DIETA SANA Y EJERCICIOS
BAJAR DE PESO - CITA CON NUTRICIONISTA POR EPS
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

EXAMENES PARACLINICOS REALIZADOS

Audiometría	X	Glicemia Basal		KOH, Coprológico, Frotis Faringeo	
Visiometría	X	Perfil Hepático		Rx Columna Dinámica	
Espirometría	X	Test de Fobias		RX Columna Lumbosacra	
Cuadro Hemático		Electrocardiograma		Psicosensométrico	x
Perfil Lipídico		Rx Tórax		Parcial de Orina	

Se aplico encuesta de parametrizacion de riesgo para COVID-19. La cual arrojò un puntaje total de 12. Por lo cual se sugiere, reforzar medidas de higiene, uso de EPP que apliquen, recomendaciones de aislamiento de acuerdo a las normas generales. Aplico encuesta de autoevaluacion de sintomas de COVID-19, la cual arrojo un puntaje bajo cuya sintomatologia corresponde a tomar medidas y cuidados generales.

Otros: PSICOSENSOMETRICO = NORMAL

LEGALIDAD

Este documento hace parte de la historia clínica electrónica ocupacional y su contenido pleno es inmodificable. El trabajador manifiesta conocer el contenido registrado en el "Examen Médico de Ingreso"; el cual cumple con lo dispuesto en la Resolución 2346 de 2007. Se manifiesta informado de las medidas preventivas y correctivas en el cuidado de su salud. Autoriza al suscrito Médico para que custodie su Historia Clínica Ocupacional cumpliendo con el ordenamiento de la Resolución 1918 de 2009 y la Resolución 0839 de 2017. Su uso y copias solo pueden ser divulgadas en el momento y modo descritos por la Ley.



Firma del Paciente



Firma Médico Especialista en SO

I.P.S UMB
UNIDAD MÉDICA EL BOSQUE S.A.S.



CONCEPTO DE APTITUP OCUPACIONAL

EMPRESA CONTRATANTE:	UNIDIAGNOSTICO S.A.S	**FECHA:**	diciembre 29, 2022
TIPO DE EXAMEN	[X] INGRESO [ ] REINTEGRO [ ] REUBICACIÓN [ ] RETIRO [ ] PERIÓDICO [ ] OTRO		
NOMBRES	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	**IDENTIFICACION:**	CC 3804393
CARGO	OPERARIO ME MAQUINARIA PESADA	**CIUDAD**	MAGANGUE -

A QUIEN SE LE REALIZAN LOS SIGUIENTES EXÁMENES

[X] Exámen médico ocupacional	[X] Laboratorios clínicos	[X] EKG
[ ] Espirometría	[X] Optometría	[X] Psicotécnica
[ ] Visiometría	[X] Audiometría	[ ] Rayos X

Otro Prueba psicosensometrica:Apto

CONCEPTO DE VALORACIÓN MÉDICA

INGRESO	Apto para desempeñar el cargo	[ ] Sin patología aparente	
		[X] Con patología que no limita labor	
	[ ] Apto con restricción	**Por motivo de:**	
	[ ] Aplazado	**Por motivo de:**	
PERIÓDICO	[ ] Puede continuar con su labor		
	[ ] Se sugiere reubicación laboral	[ ] Temporal	[ ] Permanente
	Por motivo de:		
EGRESO	[ ] Examen de egreso sin patología ocupacional aparente		
	[ ] Examen de egreso con patología ocupacional aparente		
EXAMEN ESPECIAL	[ ] Puede continuar con su labor		
	[ ] Se sugiere reubicación laboral	[ ] Temporal	[ ] Permanente
	Por motivo de:		
TRABAJO EN ALTURAS	[ ] Apto para trabajar en alturas		
	[ ] No apto para trabajar en alturas	**Por motivo de:**	
	[ ] Aplazado	**Por motivo de:**	
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	[ ] Apto para manipular alimentos		
	[ ] No apto para manipular alimentos	**Por motivo de:**	
	[ ] Aplazado	**Por motivo de:**	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES MEDICAS .

1.Induccion al sitio de trabajo
2.Pausas activas
3.Dieta baja en grasa , harinas , azucares y ejercicio regular
4.Continuar con sus medidas de bioseguridad
5.Uso de epp
6.Higiene postural
7.Bajar de peso
8.Uso de lentes de sol
9.Uso de lentes permanente

Claudia Sierra Gomez

CLAUDIA ISABEL SIERRA GOMEZ

Federico Buldon

Firma del trabajador

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE CONCEPTO ES COPIA FIEL DE LOS DATOS CONTENIDOS EN LA HISTORIA OCUPACIONAL

Fecha y hora de impresión: 06/01/2023 11.16 AM

Contrato N° 2263 DEL 2021 **Objeto: "INTERVENTORÍA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA.**

Especialidad: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Inspector:



Vanessa Sanchez Benítez

Resolución Lic. SST No. 4562 **S.S. BOLIVAR**

Tipo de documento: *** Informe N°** 6

*** Otro** ☐

Periodo: 01 al 30 Enero del 2023

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. Objetivos 3
2.1. Objetivo general 3
2.2. Objetivos específicos 3
3. PERSONAL 3
3.1 Personal Obra 3
3.2 Personal Interventoría 6
4. RESUMEN DE ACTIVIDADES SST DESARROLLADAS EN ENERO 2023 7
4.1. Seguimiento protocolo de bioseguridad 7
4.1.1. Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo y desarrollo de actividades realizadas por el contratista e interventoría 7
4.2. Seguimiento SST 13
4.2.2. Gestión siso interventoría, verificación soportes de contratista 13
BRIGADAS DE EMERGENCIAS 21
Antes de una emergencia 21
HORAS HOMBRES TRABAJADAS 22
5. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 22

TABLA DE ANEXOS

Ver anexo 1. Afiliaciones-formatos control aportes leg. y SSI. -certificado paz y salvo y certificación interventoría revisión doc. pagos SSI.
Ver anexo 2. La relación de inducciones y consentimiento informado del protocolo de bioseguridad de obra
Ver Anexo 3. Conceptos médicos de ingreso del mes de enero de 2023 en el contrato de obra.
Ver anexo 4. Charlas y capacitaciones
Ver anexo 5. Notificación de riesgos del personal de obra.
Ver anexo 6 Control maquinaria, y equipo. Interventoría.
Ver anexo 7. Inspecciones
Ver anexo 8. Conformación brigadas de emergencia
Ver anexo 9. Entrega de EPP obra e interventoría
Ver anexo 10. Planilla control síntomas colaboradores del contratista de obra y asistencia de personal.

1. INTRODUCCIÓN

Informe de seguimiento de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y protocolo COVID 19, realizado por interventoría a las actividades ejecutadas por el contratista INCOPAV S.A.S del proyecto mantenimiento y rehabilitación de la vía que conduce del municipio de Coveñas al corregimiento de Sabaneta, en los departamentos de Sucre y Córdoba, obras entre K0+000 al K16+000, actividades comprendidas entre el 1 al 31 de enero del 2023.

El presente informe evidencia las actividades llevadas a cabo por INCOPAV S.A.S en cumplimiento a la legislación colombiana en seguridad y salud en el trabajo, con el fin de mitigar los riesgos y peligros a los que se exponen los trabajadores al momento de ejecutar sus labores cotidianas, mediante la programación segura de verificación de cumplimiento de actividades planeadas, que contenga el alcance de seguridad industrial acorde a la actividad.

Toda la gestión de seguridad y salud en el trabajo es verificada constantemente mediante inspecciones y seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo SST y aquella legislación vigente y aplicable al objeto y alcance del Contrato; tomando en cuenta lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Establecer actividades que protejan la integridad de los colaboradores del contratista, subcontratista e interventoría, dentro de los parámetros de la seguridad y salud en el trabajo, durante la ejecución de la construcción de obras para el mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de las vías.

2.2. Objetivos específicos

- Garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones SST del contratista, subcontratista e interventoría.
- Supervisar que el personal del proyecto trabaje de manera segura durante la ejecución del proyecto.

3. PERSONAL

3.1 Personal Obra

Personal del contratista que se encuentra laborando en obra entre el periodo comprendido del 01 al 31 de enero de 2023 se relaciona a:

PERSONAL DE OBRA VINCULADO AL PROYECTO 2269 DE 2021			
N°	**NOMBRE**	**CARGO**	**CANTIDAD**
1	Gustavo Antonio Hernández Vega	Director de Obra	1
2	Bernardo Castañeda Moreno	Ingeniero Residente de Obra	1
3	Carmen Cecilia Contreras Suarez	Ingeniero Auxiliar	1
4	Zully Loperena Redondo	Profesional Social	1
5	Carlos Reyes	Especialista Estructural	1
6	Cristian Gil	Gerente de Proyecto	1
7	Robinson Villamil Rojas	Especialista en Geotecnia	1
8	Rafael Darío Vergara De La Ossa	Especialista ambiental	1
9	Sandra Milena Casallas	Auxiliar de Oficina	1
10	José Díaz Velázquez	Topógrafo	1
11	Teofilo Carlos Yidi Villareal	Especialista en Pavimentos	1
12	Adrian Ortiz Villero	Inspector HSE	1
13	Medardo Suarez Zúñiga	Operador	1
14	Federico José Buldin Téllez	Operador	1
15	Diego Andrés Restrepo Mestra	Operador	1
16	Luis María Vega	Operador	1

17	Greys Cabarcas Martínez	Administradora de Obra	1
18	Jaime Andrés Sierra Ladeuth	Obrero	1
19	Arnulfo Navarro Padilla	Obrero	1
20	William Luna Urango	Obrero	1
21	Edwin José Suarez de Hoyos	Obrero	1
22	Juan Fonseca Sotel	Conductor	1
23	Yesid Torres	Conductor	1
24	Jorge Luis Castro Ladeuth	Conductor	1
25	Francisco Castro	Conductor	1
26	Loreley Ladeuth Mendoza	Guía Vial	1
27	Jennifer Quiñonez Pestana	Guía Vial	1
28	Katia Herrera Ramos	Guía Vial	1

3.2 Personal Interventoría

PERSONAL DE INTERVENTORÍA VINCULADO AL PROYECTO 2263 DE 2021			
N°	**NOMBRE**	**CARGO**	**CANTIDAD**
1	William Valencia Campos	Director de Interventoría	1
2	Allan Fernando Monroy Duque	Ingeniero Residente	1
3	Eliana Villalba Torres	Ingeniero Auxiliar	1
4	Kaderinne Marimon Aragón	Profesional Social	1
5	Yunaira Patricia Ortiz Laverde	Topógrafa	1
6	María Constanza Lancheros Barreneche	Auxiliar de Oficina	1
7	Vanessa Sanchez Benítez	Inspector SISO	1
8	Karen Andrea Arias Arrieta	Secretaria	1
9	Diego Luis Quintero Alviz	Cadenero	1
10	Ingrid Victoria Gutiérrez Barón	Ing. Ambiental	1

Personal que se encuentra laborando en el contrato de interventoría en el periodo comprendido entre 01 AL 31 de enero del 2023

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES SST DESARROLLADAS EN ENERO 2023



.

- ✓ Seguimiento protocolo de bioseguridad
- ✓ Inspecciones SST

4.1. Seguimiento protocolo de bioseguridad

4.1.1. Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo y desarrollo de actividades realizadas por el contratista e interventoría.

Protocolo bioseguridad	  Las señalizaciones son un control administrativo según el decreto 1072 el cual va atado al protocolo de bioseguridad como medidas de prevención y control en el cual se puede apreciar los pasos correctos para un adecuado lavado de manos. Estas señalizaciones se encuentran disponibles en la oficina principal del contratista.
Protocolo de bioseguridad	  El personal se realiza limpíeza y desinfección con agua y jabon cumpliendo con lo establecido en el protocolo.

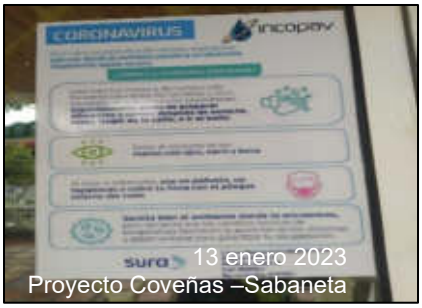Protocolo de Bioseguridad.	  Se mantiene senalizacion de recomencion de distanciamiento fisico Para recordar al Personal en obra que deben evitar aglomeraciones aun estando en espacios abiertos. También se pudo evidenciar que se cuenta con jabón líquido y gel antibacterial disponible para todos los colaboradores.
Protocolo de bioseguridad.	  Una de las medidas de prevención para propagación del COVID-19 que aplica el contratista, el cual hace parte de los controles administrativos según Decreto 1072 es ubicar señalizaciones. INCOPAV S.A.S. tiene publicado en la entrada de la oficina de Guayabal dichas señalizaciones para evitar el contagio por el virus antes mencionado.

Inspección en obra.	  Jornada de orden y aseo realizada por los colaboradores de INCOPAV S.A.S. para mantener rutas de acceso despejadas de residuos sólidos y objetos que pueda causar caídas a nivel.
Inspección diaria de SST.	  Inspección realizada por interventoría donde se verificó que el contratista contara con los equipos de emergencia disponibles en caso de alguna eventualidad de riesgo o siniestro dentro de la empresa. Por otra parte, se evidenció que se tiene ubicado un punto de hidratación para los colaboradores que se encuentran desarrollando sus actividades en los tramos actualmente intervenidos.

Inspección SST obra	  Se utiliza cinta de seguridad con el fin de delimitar la zona en que se realiza el mantenimiento y rehabilitación de las vías con el fin de indicar a los peatones que transitan diariamente por la zona, la prohibición del paso al área de actividades.

Inspección SST obra	  Se verifica la instalación de señalizaciones de ruta de evacuación el cual cumple la función de indicar al personal la acción de desocupar un lugar de manera ordenada y planificadamente. Esto por razones de seguridad ante un peligro potencial o contingencias con el fin de proteger vidas y evitar lesiones.

Inspección SST obra	  *Divulgación de política integral, Política de convivencia labora, política de prevención de alcohol y drogas, Misión y visión de INGEVAL S.A.S. *Revisión de la última acta de reunión del COPASST de INCOPAV S.A.S. El cual fue en el mes de diciembre cumpliendo con lo estipulado en la resolución 2013 del 1986, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo se debe reunir por lo menos una vez al mes para llevar seguimiento y control en materia de promoción y vigilancia de SST en la empresa.

Inspección SST obra	  Se hace revisión de los preoperacionales de las maquinarias y equipos utilizados en obra con el fin de verificar que los operadores reporten adecuadamente el estado real o condición de dichos equipos o maquinarias. También se evidencia cumplimiento del capítulo 14 del PMT donde se especifica que se cuenta con equipos de comunicación con el propósito de responder de forma oportuna a un hecho contingente que afecte la operación del flujo vehicular o que represente una situación de emergencia.

4.2. Seguimiento SST

4.2.2. Gestión SST interventoría, verificación soportes de contratista

Se realiza revisión de los soportes entregados por el responsable del SG-SST del contratista.

- Soporte De afiliaciones de seguridad social.
- Inducciones realizadas en este periodo.
- Conceptos médicos ocupacionales pertenecientes al mes de enero del 2023.
- Formato control de síntomas.
- Consentimiento informado sobre medidas de prevención del COVID-19
- Planilla condiciones de salud.
- Plan de trabajo.
- Cumplimiento plan de capacitaciones.
- Perfil sociodemográfico actualizado.
- Control entrega de EPP
- Notificación de riesgos.
- Indicadores de accidentalidad.

Entrega de EPP	  Se hace entrega de EPP al personal del contratista de obra e interventoria de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 Medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores, con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo.
	Ver anexo 9: Entrega de EPP

AFILIACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

La interventoría realiza la verificación de las afiliaciones al sistema de seguridad social integral del personal de obra vinculado en el contrato 2269 de 2021, inspeccionando el personal en oficina que participa en el proyecto de obra, para lo cual se presenta formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 diligenciado por el contratista.

A la fecha del presente, no se cuenta con la información necesaria, debido a los plazos establecidos por la normativa nacional Nro. 1990 de 2016, titulo 2, articulo 3.2.2.1, según NIT de INCOPAV S.A.S **830063087-1** que otorga plazo de pago de los parafiscales hasta el 14 día hábil de cada mes.

Una vez se realice el pago de las planillas, el contratista presentará certificación del revisor fiscal de paz y salvo por concepto de pagos al sistema general de SSI y salarios, éste será presentado una vez hagan el pago de la planilla.

En cuanto al personal vinculado en el contrato de interventoría 2263 de 2021 se anexan los soportes de afiliación a la EPS, ARL, PENSIÓN Y CAJA DE OMPENSACIÓN.

Como soporte del cumplimiento a esta obligación, la interventoría entrega el “formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7” y la "Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal de la empresa Interventoría (de acuerdo a la naturaleza de la misma), donde se expresa Paz y Salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios”.

Adjunto certificación de interventoría de revisión de los documentos soporte de pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a la nómina del mes de enero del 2023 de INCOPAV S.A.

Ver anexo 1. Afiliaciones, formatos control aportes leg. y SSI. -certificado paz y salvo y certificación interventoría revisión doc. pagos SSI.

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1 INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RIESGOS A LOS TRABAJADORES/CAPACITACIONES

Se evidencia que el contratista proporcionó a su personal de nuevo ingreso, y de manera previa al inicio de sus labores, una inducción en los aspectos generales y específicos de las actividades a realizar, incluyendo la identificación, control de peligros y riesgos en su

trabajo y la prevención de accidentes laborales y enfermedades de acuerdo con lo indicado en la Resolución 0312; como también se realiza inducción sobre el protocolo de bioseguridad para prevención del COVID 19.

Ver anexo 2. La relación de inducciones y consentimiento informado del protocolo de bioseguridad obra.

EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

Los exámenes médicos ocupacionales serán de acuerdo con los peligros y riesgos a los que se encuentre expuesto el trabajador, además de cumplir con un requisito legal, deberán contribuir al diagnóstico temprano, antes que aparezcan las manifestaciones clínicas de enfermedades de posible origen laboral y de enfermedades de origen común que pudieran ser agravadas por las condiciones de trabajo por lo tanto se revisó los soportes de exámenes ocupacionales para identificar el estado de salud de los trabajadores que ingresarían a laborar en el proyecto.

PLAN DE TRABAJO

El proyecto de obra cuenta con un Plan anual de Trabajo para el cumplimiento del Sistema de Gestión de SST como lo indica la Resolución 0312, en el que se establecen las diferentes actividades a ejecutar en cada periodo.

PLAN DE CAPACITACIÓN

Según el decreto 1072 de 2015, el empleador debe estipular los requisitos de conocimiento y práctica en SST necesarios para sus trabajadores, también debe adoptar y mantener métodos para que estos los cumplan en todos los aspectos de la ejecución de sus deberes y obligaciones, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Para ello, debe desarrollar un programa de capacitación que proporcione conocimiento para identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo incluyendo en dichas capacitaciones la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo los cuales deben hacer parte de dichas ellas para el cumplimiento de la Resolución 2013 puesto que es una de las funciones del COPASST.

El contratista cuenta con un plan de capacitaciones ajustado a las necesidades del proyecto **Ver anexo 4.** Capacitaciones obra.

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA

Se verifica que el contratista determina y actualiza las características socioculturales de la población trabajadora cada que ingresa un trabajador por primera vez al equipo de

INCOPAV S.A.S, con el fin de identificar qué población es más vulnerable a ciertos factores de riesgo.
Este cuenta con soporte donde plasma la información que indica el decreto 1072 del 2015 **Artículo 2.2.4.6.2. *Definiciones*:**

"13. Perfil sociodemográfico de la población trabajadora, que incluye la descripción de las características sociales y demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo".

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Se verifica que el contratista cuenta con la matriz de identificación peligros, evaluación, valoración y control de riesgos disponible para los trabajadores para lo cual anexa la notificación de riesgos del trabajador ingresado en el mes de enero del 2023.

Ver anexo 5. Notificación de riesgos del personal de obra.

ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD ENERO 2023

CONCEPTO	ENERO
Total, accidentes reportados	0

Durante este periodo se realiza medición de indicadores SST, entre los cuales se determina: Frecuencia de accidentalidad, severidad de accidentalidad, proporción de accidentes de trabajos mortales, prevalencia de la enfermedad laboral, incidencia de la enfermedad laboral y ausentismo por causa médica.

En el mes de enero del 2023 no se han presentado incidentes ni accidentes de trabajo. Para la prevención de estos sucesos repentinos no deseados, se cuenta con un plan de trabajo para las capacitaciones en el cual se tendrá participación de la administradora de riesgos laborales pertinente quienes brindaran apoyo para fomentar el autocuidado, incrementar el conocimiento al equipo de trabajo con respecto a la promoción y prevención de riesgos laborales y brindar asesoría para el procedimiento y debido manejo en caso que llegase a suceder un accidente laboral.

El contratista deberá realizar el reporte e investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo y enfermedades laborales con el equipo investigador el cual está conformado por los integrantes del COPASST, jefe inmediato del área donde ocurrió el accidente y el encargado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El reporte de accidente de trabajo y enfermedad laboral, lo hará el contratista a la ARL, la EPS y al ente Gestor en el término de dos (2) días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente o al diagnóstico de las enfermedades.

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO OBRA

Para el mes de enero el contratista de obra realizo labores con los siguientes equipos y maquinarias:

MAQUINARIA	MARCA	LOCALIZACION
RETROEXCAVDORA DE LLANTAS	CAT420D	PR 0 + 0000 AL PR 1 + 0200 (GUAYABAL) PR 10+200 al PR 12 + 400 (SACANA)
RETROEXCAVADORA DE ORUGA	VOLVO	PR 0 + 0000 AL PR 1 + 0200
MOTONIVELADORA	FIAT	PR 0 + 0000 AL PR 1 + 0200
VIBROCOMPACTADOR	BOMAG	PR 0 + 0000 AL PR 1 + 0200
VOLQUETA BWC 949	INTERNACIONAL 7600	PR 0 + 0000 AL PR 1 + 0200
VOLQUETA BWC 947	INTERNACIONAL 7600	PR 0 + 0000 AL PR 1 + 0200
VOLQUETA UPO 342	MACK GRANTTE	PR 0 + 0000 AL PR 1 + 0200
CAMION	SMI 919 JMC	PR 0 + 0000 AL PR 1 + 0200
ESTACIÓN TOTAL	SOUTH 2021	PR 0 + 0000 AL PR 1 + 0200
NIVEL AUTOMATICO	SOUTH 2022	PR 0 + 0000 AL PR 1 + 0200

los cuales intervinieron desde el PR 0+ 0000 al PR 1+ 0200, la retroexcavadora de llantas realizó también actividades en el PR 10 + 0200 al PR 12 + 0400 dicho control quedó plasmado en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Para el contrato de interventoría aplica el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

Ver anexo 6 Control maquinaria, y equipo de interventoría.

Maquinaria y Equipo	  La interventoria realizo seguimiento de los equipos y maquinarias que se encuentran en obra, en el formato queda por escrito aquellos que estuvieron en reparación, los dias activos o inactivos.
Maquinaria y equipo	  La interventoria realizo seguimiento de los equipos y maquinarias que se encuentran en obra, en el formato queda por escrito aquellos que estuvieron en reparación, los dias activos o inactivos.

INSPECCIONES

En el periodo comprendido de este informe se realizaron inspecciones en obra como lo son la revisión del estado de los EPP, de equipos de primeros auxilios, (botiquín, camilla y extintor), inspección de condiciones de salud según lo estipula el protocolo de bioseguridad, de maquinaria y equipo. Llevé control y revisión diaria de los preoperacionales de los

equipos, los cuales eran solicitados al inspector HSE de obra. Para el mes de enero hice inspección de orden y aseo, del suministro de agua potable, de señalizaciones alusivas al uso de EPP, al área de trabajo para verificar que se encontrara debidamente señalizada según el PMT aprobado, comprobar que al finalizar la jornada quede toda la zona intervenida delimitada.

Ver anexo 7. Inspecciones

PERMISOS DE TRABAJO Y/O PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO – ATS

Se diligencia ATS para identificación de riesgos de una tarea o actividad, en los siguientes casos:

- Cuando no se pueden asegurar que todos los controles han sido aplicados adecuadamente y no son suficientes para controlar el riesgo.
- Cuando un permiso de trabajo es requerido para realizar la tarea o labor.
- Cuando no se ha realizado una evaluación de riesgo para la tarea o labor.
- Cuando se realiza una tarea rutinaria.

En el periodo del presente informe no fue necesario la implementación de ATS.

PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS

El contratista cuenta con un plan de emergencias y contingencias, el cual se estableció en el Programa de adaptación de la guía ambiental “PAGA”, donde se verifica que existen los procedimientos según los diferentes tipos de contingencia. Se realizo vinculación del personal en obra para conformar las brigadas.

SUSTANCIAS QUÍMICAS

En la ejecución del proyecto se controlará y verificará el uso, almacenamiento y manipulación de los materiales y sustancias químicas. Una vez se inicien los trabajos en obra el contratista debe tener un listado de las sustancias químicas utilizadas, el cual se anexará a los informes mensuales respectivos. Se evidenció que los galones de combustibles cumplen con etiqueta y rotulación.

Sustancias químicas	  El contratista presenta barril de combustible con la identificación del producto químico que contiene y todas las precauciones para el uso del mismo.

PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO.

SEÑALIZACIONES POR FRENTE DE TRABAJO.

PMT	  Con el propósito de dar correcta regulación al transito al momento de la ejecución de obra se implementaron piezas comunicativas, preventivas, reglamentarias e informativas donde el objetivo es ofrecer a la comunidad el conocimiento de las actividades y el correcto flujo vehicular.

PMT	  Se verificó presencia de los bandereros en el proceso de construcción o zona intervenida como lo estipula el PMT cada una de ellas cuenta con radio de comunicación y paletas pare y siga.
PMT	  Inspección de las señalizaciones instaladas propuestas en el PMT para el tramo que comprende desde el PR 0 + 0000 al PR 1+0200

BRIGADAS DE EMERGENCIAS:

El principal objetivo de las brigadas es identificar, evaluar, prevenir y controlar situaciones de riesgo para minimizar pérdida de vidas y bienes.

Antes de una emergencia

- Cumplir los reglamentos de la empresa y las normas sobre Emergencias y Prevención de accidentes.
- Controlar que los funcionarios hagan buen uso de los equipos de prevención y control de emergencias e informar cualquier anomalía.
- Asistir y tomar parte activa en las instrucciones y entrenamientos.
- Informar oportunamente toda condición o acto inseguro que se observe en las instalaciones.
- Dentro de los entrenamientos, maniobras y atención de emergencias ceñirse a lo estipulado en los planes previamente elaborados y a las instrucciones.

- Efectuar las revisiones y mantenimientos permitidos a los equipos de atención de emergencias, en la forma y periodicidad recomendada, de tal forma que se garantice la permanente disponibilidad y buen estado de los mismos.

Ver anexo 8. Conformación de Brigadas de emergencia

HORAS HOMBRES TRABAJADAS.

Número de trabajadores en el periodo (XT)	Horas trabajadas día (HDT)	Días trabajados al mes (DTM)	Número de horas de incapacidad (NHE)	Número de Horas de Ausentismo (NHA)
28	8	24	0	0

Horas Hombre Trabajadas (HHT= (XT*HTD*DTM) +NHE-NHA	HHT **5376**

El proyecto para el mes de enero del 2023 el contratista tuvo 5376 HHT acumuladas en el “Mejoramiento de la vía en el sector de Guayabal, Coveñas-Sucre. obras entre PR 0+0000 al PR 1+0200

Ver anexo 3: Indicadores SST

5. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

El contratista INCOPAV S.A.S. viene cumpliendo con las medidas y programas establecidos en el programa de seguridad y salud en el trabajo establecido en el PAGA y en el Sistema de gestión de SST propio de la Empresa cumpliendo también con las observaciones que se le hagan.

Se destaca en el periodo el inicio de las actividades constructivas del proyecto, en las cuales se implementó las medidas de seguridad correspondiente garantizando el bienestar de los trabajadores como de la obra y los transeúntes estipuladas en el PMT.

En cuanto a las estadísticas de accidentalidad hasta la fecha se ha mantenido en cero.

ANEXOS INFORME SST

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que HEIDY BETANCOURT DIAZ identificado(a) con CC 52451460 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INCOPAV S A NI 830063087

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-03	2022-04	28492476	9434420799	E	2022-05-02																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$3,250,000	$520,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$3,250,000	$226,200
CCF	COMPENSAR	30	4%	$3,250,000	$130,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$3,250,000	$130,000

Este certificado se expide el día 2022-05-02 a las 02:28.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 822004859	1	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSULTORIA DISEÑO Y CONSTRUCCION - INGEVAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRO	CLL 38 N° 32-41 PISO 8	VILLAVICENCIO-META	6623159	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	46883847	9446883847	E	2023/02/14	2023/02/15	BANCO AV VILLAS	1	$2,880,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CENTRO (1 Afiliados)						$9,000,000	$1,530,000			$9,000,000	$360,000			$9,000,000	$360,000			$9,000,000		$626,400		$0	$0		$2,876,400
Centro de Trabajo: TECNICA (1 Afiliados)						$9,000,000	$1,530,000			$9,000,000	$360,000			$9,000,000	$360,000			$9,000,000		$626,400		$0	$0		$2,876,400
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$9,000,000	$1,530,000			$9,000,000	$360,000			$9,000,000	$360,000			$9,000,000		$626,400		$0	$0		$2,876,400
1	CC 79366850	VALENCIA CAMPOS WILLIAM	X	23030 1	30	$9,000,000	$1,530,000	EPS005	30	$9,000,000	$360,000	CCF34	30	$9,000,000	$360,000	14-7	30	$9,000,000	6.960%	$626,400	30	$0	$0	Si	$2,876,400
Total	**Afiliados(1)**					$9,000,000	$1,530,000			$9,000,000	$360,000			$9,000,000	$360,000			$9,000,000		$626,400		$0	$0		$2,876,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 822004859	1	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSULTORIA DISEÑO Y CONSTRUCCION - INGEVAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRO	CLL 38 N° 32-41 PISO 8	VILLAVICENCIO-META	6623159	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	46883847	9446883847	E	2023/02/14	2023/02/15	BANCO AV VILLAS	1	$2,880,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,530,000	$2,000	$0	$1,532,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$1,530,000	$2,000	$0	$1,532,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$626,400	$800	$0	$627,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$626,400	$800	$0	$627,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$360,000	$500	$0	$360,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$360,000	$500	$0	$360,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$360,000	$500	$0	$360,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$360,000	$500	$0	$360,500
TOTAL				**1**	**$2,876,400**	**$3,800**	**$0**	**$2,880,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 822004859	1	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSULTORIA DISEÑO Y CONSTRUCCION - INGEVAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRO	CLL 38 N° 32-41 PISO 8	VILLAVICENCIO-META	6623159	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	9446898143	9446898143	E	2023/02/14	2023/02/15	BANCO BOGOTA	1	$1,601,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CENTRO (5 Afiliados)																							$6,530,001	$1,044,900			$6,530,001	$261,300			$6,530,001	$261,300			$6,530,001		$31,700		$0	$0		$1,599,200
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (5 Afiliados)																							$6,530,001	$1,044,900			$6,530,001	$261,300			$6,530,001	$261,300			$6,530,001		$31,700		$0	$0		$1,599,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (5 Afiliados)																							$6,530,001	$1,044,900			$6,530,001	$261,300			$6,530,001	$261,300			$6,530,001		$31,700		$0	$0		$1,599,200
1	CC	52017892	BARRENECHE LANCHEROS MARIA CONSTANZA							X											25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
2	CC	1032496114	CRUZ UMAÑA DANIEL FELIPE							X											25-14	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
3	CC	1094938837	GARCIA TORRES ALEXIS													X					230301	12	$500,001	$80,100	EPS005	12	$500,001	$20,100	CCF34	12	$500,001	$20,100	14-7	12	$500,001	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$120,300
4	CC	1094938837	GARCIA TORRES ALEXIS																		230301	18	$750,000	$120,000	EPS005	18	$750,000	$30,000	CCF34	18	$750,000	$30,000	14-7	18	$750,000	0.522%	$4,000	18	$0	$0	Si	$184,000
5	CC	1121857252	NARANJO RONDON NIDIA JOHANA																		230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF34	30	$1,800,000	$72,000	14-7	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
6	CC	1122653003	VERGARA AGUILERA DANIELA							X											230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
Total			**Afiliados(5)**																				$6,530,001	$1,044,900			$6,530,001	$261,300			$6,530,001	$261,300			$6,530,001		$31,700		$0	$0		$1,599,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 822004859	1	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSULTORIA DISEÑO Y CONSTRUCCION - INGEVAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRO	CLL 38 N° 32-41 PISO 8	VILLAVICENCIO-META	6623159	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	9446898143	9446898143	E	2023/02/14	2023/02/15	BANCO BOGOTA	1	$1,601,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,044,900	$1,300	$0	$1,046,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$371,200	$500	$0	$371,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$673,700	$800	$0	$674,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$31,700	$100	$0	$31,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	5	$31,700	$100	$0	$31,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$261,300	$400	$0	$261,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	5	$261,300	$400	$0	$261,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$261,300	$500	$0	$261,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$46,400	$100	$0	$46,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$46,400	$100	$0	$46,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,400	$100	$0	$46,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$122,100	$200	$0	$122,300
TOTAL				**5**	**$1,599,200**	**$2,300**	**$0**	**$1,601,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 822004859	1	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSULTORIA DISEÑO Y CONSTRUCCION - INGEVAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRO	CLL 38 N° 32-41 PISO 8	VILLAVICENCIO-META	6623159	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	46898554	9446898554	E	2023/02/14	2023/02/15	BANCO AV VILLAS	1	$471,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CENTRO (1 Afiliados)																						$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$60,800			$1,520,000	$60,800			$1,520,000		$105,800		$0	$0		$470,600
Centro de Trabajo: TECNICA (1 Afiliados)																						$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$60,800			$1,520,000	$60,800			$1,520,000		$105,800		$0	$0		$470,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$60,800			$1,520,000	$60,800			$1,520,000		$105,800		$0	$0		$470,600
1	CC	40328389 GUTIERREZ BARON INGRID VICTORIA	X	X																25-14	12	$1,520,000	$243,200	EPS005	12	$1,520,000	$60,800	CCF34	12	$1,520,000	$60,800	14-7	12	$1,520,000	6.960%	$105,800	12	$0	$0	Si	$470,600
Total	**Afiliados(1)**																					$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$60,800			$1,520,000	$60,800			$1,520,000		$105,800		$0	$0		$470,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 822004859	1	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSULTORIA DISEÑO Y CONSTRUCCION - INGEVAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRO	CLL 38 N° 32-41 PISO 8	VILLAVICENCIO-META	6623159	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	46898554	9446898554	E	2023/02/14	2023/02/15	BANCO AV VILLAS	1	$471,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$243,200	$300	$0	$243,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$243,200	$300	$0	$243,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$105,800	$200	$0	$106,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$105,800	$200	$0	$106,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,800	$100	$0	$60,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$60,800	$100	$0	$60,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,800	$100	$0	$60,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$60,800	$100	$0	$60,900
TOTAL				**1**	**$470,600**	**$700**	**$0**	**$471,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 822004859	1	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSULTORIA DISEÑO Y CONSTRUCCION - INGEVAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRO	CLL 38 N° 32-41 PISO 8	VILLAVICENCIO-META	6623159	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	46883781	9446883781	E	2023/02/14	2023/02/15	BANCO AV VILLAS	1	$3,245,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SUCRE (7 Afiliados)																							$10,464,668	$1,674,600			$10,464,668	$418,800			$10,464,668	$418,800			$10,464,668		$728,700		$0	$0		$3,240,900
Centro de Trabajo: TECNICA (7 Afiliados)																							$10,464,668	$1,674,600			$10,464,668	$418,800			$10,464,668	$418,800			$10,464,668		$728,700		$0	$0		$3,240,900
Ciudad: COVEÑAS Depto: SUCRE (7 Afiliados)																							$10,464,668	$1,674,600			$10,464,668	$418,800			$10,464,668	$418,800			$10,464,668		$728,700		$0	$0		$3,240,900
1	CC	1108764055	ALVIZ SALCEDO ANDRES ENRIQUE	X	X																230301	5	$193,334	$31,000	CCFC55	5	$193,334	$7,800	CCF41	5	$193,334	$7,800	14-7	5	$193,334	6.960%	$13,500	5	$0	$0	Si	$60,100
2	CC	1131107160	ARIAS ARRIETA KAREN ANDREA	X																	231001	27	$1,044,000	$167,100	EPS002	27	$1,044,000	$41,800	CCF41	27	$1,044,000	$41,800	14-7	27	$1,044,000	6.960%	$72,700	27	$0	$0	Si	$323,400
3	CC	1118822751	MARIMON ARAGON KADERINNE JANILETH																		230301	30	$3,800,000	$608,000	EPS002	30	$3,800,000	$152,000	CCF41	30	$3,800,000	$152,000	14-7	30	$3,800,000	6.960%	$264,500	30	$0	$0	Si	$1,176,500
4	CC	1094246741	MONROY DUQUE ALLAN FERNANDO	X																	231001	11	$1,650,000	$264,000	EPS005	11	$1,650,000	$66,000	CCF41	11	$1,650,000	$66,000	14-7	11	$1,650,000	6.960%	$114,900	11	$0	$0	Si	$510,900
5	CC	49717933	ORTIZ LAVERDE YUNAIRA PATRICIA	X																	230301	28	$1,960,000	$313,600	EPS037	28	$1,960,000	$78,400	CCF41	28	$1,960,000	$78,400	14-7	28	$1,960,000	6.960%	$136,500	28	$0	$0	Si	$606,900
6	CC	1108759636	QUINTERO ALVIZ DIEGO LUIS	X																	230201	20	$773,334	$123,800	ESSC07	20	$773,334	$31,000	CCF41	20	$773,334	$31,000	14-7	20	$773,334	6.960%	$53,900	20	$0	$0	Si	$239,700
7	CC	1131108761	SANCHEZ BENITEZ VANESSA	X																	230301	27	$1,044,000	$167,100	ESSC24	27	$1,044,000	$41,800	CCF41	27	$1,044,000	$41,800	14-7	27	$1,044,000	6.960%	$72,700	27	$0	$0	Si	$323,400
Total			**Afiliados(7)**																				$10,464,668	$1,674,600			$10,464,668	$418,800			$10,464,668	$418,800			$10,464,668		$728,700		$0	$0		$3,240,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 822004859	1	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSULTORIA DISEÑO Y CONSTRUCCION - INGEVAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRO	CLL 38 N° 32-41 PISO 8	VILLAVICENCIO-META	6623159	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	46883781	9446883781	E	2023/02/14	2023/02/15	BANCO AV VILLAS	1	$3,245,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,674,600	$2,200	$0	$1,676,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$431,100	$600	$0	$431,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,119,700	$1,400	$0	$1,121,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$123,800	$200	$0	$124,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$728,700	$900	$0	$729,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	7	$728,700	$900	$0	$729,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$418,800	$500	$0	$419,300
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	$418,800	$500	$0	$419,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				7	$418,800	$800	$0	$419,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$7,800	$100	$0	$7,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$41,800	$100	$0	$41,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$31,000	$100	$0	$31,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$78,400	$100	$0	$78,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$193,800	$300	$0	$194,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$66,000	$100	$0	$66,100
TOTAL				**7**	**$3,240,900**	**$4,400**	**$0**	**$3,245,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 822004859	1	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSULTORIA DISEÑO Y CONSTRUCCION - INGEVAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRO	CLL 38 N° 32-41 PISO 8	VILLAVICENCIO-META	6623159	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	46883683	9446883683	E	2023/02/14	2023/02/15	BANCO AV VILLAS	1	$1,598,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CENTRO (2 Afiliados)																							$5,900,000	$944,000			$5,900,000	$236,000			$3,800,000	$152,000			$5,900,000		$264,500		$0	$0		$1,596,500
Centro de Trabajo: TECNICA (2 Afiliados)																							$5,900,000	$944,000			$5,900,000	$236,000			$3,800,000	$152,000			$5,900,000		$264,500		$0	$0		$1,596,500
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																							$5,900,000	$944,000			$5,900,000	$236,000			$3,800,000	$152,000			$5,900,000		$264,500		$0	$0		$1,596,500
1	CC	1121923202	GUTIERREZ LOZADA YESIKA ANDREA												X						230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF34	0	$0	$0	14-7	30	$2,100,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$420,000
2	CC	1121940754	VILLALBA TORRES ELIANA																		230201	30	$3,800,000	$608,000	EPS005	30	$3,800,000	$152,000	CCF34	30	$3,800,000	$152,000	14-7	30	$3,800,000	6.960%	$264,500	30	$0	$0	Si	$1,176,500
Total	**Afiliados(2)**																						$5,900,000	$944,000			$5,900,000	$236,000			$3,800,000	$152,000			$5,900,000		$264,500		$0	$0		$1,596,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 822004859	1	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSULTORIA DISEÑO Y CONSTRUCCION - INGEVAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRO	CLL 38 N° 32-41 PISO 8	VILLAVICENCIO-META	6623159	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	46883683	9446883683	E	2023/02/14	2023/02/15	BANCO AV VILLAS	1	$1,598,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$944,000	$1,200	$0	$945,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$336,000	$400	$0	$336,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$608,000	$800	$0	$608,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$264,500	$400	$0	$264,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	2	$264,500	$400	$0	$264,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$152,000	$200	$0	$152,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$152,000	$200	$0	$152,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$236,000	$300	$0	$236,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$236,000	$300	$0	$236,300
TOTAL				**2**	**$1,596,500**	**$2,100**	**$0**	**$1,598,600**

ASISTENCIA DE PERSONAL INTERVENTORIA

CONTRATO # 2263 DE 2021	OBJETO:	INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA RUTA (90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA
FECHA	17-01-23	
LUGAR	Obra - Oficina	

No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Vanessa Sanchez	1.131.108.761	Insp. SISO	
2	Diego Quintero P.	1108759636	Gadanero	
3	[illegible]	1118827751	Profesional social.	
4	Karen Diaz B.	1131107160	Ttec Diaz	
5	Eliana Villalba T.	1121940754	Residente auxiliar	
6		49737933	topografo	
	FECHA:	18-01-23		
1	Karen Diaz Arnet	1131107160	Secretaria	
2	Diego Quintero Ruiz	1108759636	Gadanero	
3	[illegible]	1-1132227751	Profesional social.	
4		49737933	topografo	
5	Eliana Villalba T.	1 131. 940. 754	Ing. Residente.	
6				
	FECHA:			
1				
2				
3				
4				

Powered by CamScanner

ingeval S.A.S.	**ASISTENCIA DE PERSONAL INTERVENTORIA**

CONTRATO # 2263 DE 2021	OBJETO:	INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA RUTA (90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA
FECHA	19- Enero -2023	
LUGAR:	Oficina	

No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Karen Arias Arrieta	1131107160	Secretaria	
2	KATERINNE MARIMON.	1.115.322.751	Profesional Social.	
3	Vanessa Sanchez	1131108761	Inspector SI 80	
4	Diego Quintero Ruiz	1108759636	cadenero	
5	[illegible] Ortiz	49717933	TOPOGRAFA	
6	Eliana Villalba	1121940754	Residente auxiliar	
7				
8				
	FECHA:	20-01-2023	LUGAR:	Obra - Oficina.
1	Diego Luis Quintero A.	1108759636	cadenero	
2	KATERINNE MARIMON.	1.118577751	Profesional Social.	
3	Karen Arias A.	1131107160	Secretaria	
4	[illegible]	49717933	TOPOGRAFA	
5	Eliana Villalba	1121940754	Residente auxiliar	
6				
7				
8				
9				
10				

Powered by CamScanner

ingeval S.A.S	**ASISTENCIA DE PERSONAL INTERVENTORIA**

CONTRATO # 2263 DE 2021	OBJETO:	INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA RUTA (90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA
		23- Enero -2023
FECHA		
LUGAR:		Oficina Coveñas

No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Eliana Villalba	1121940754	Residente auxiliar	
2	[illegible]	49717933	Topografo	
3	Katherine Marimon	1.118.827.751	Profesional Social	
4	Allan Fernando Monroy Rojas	1.094.246.741	Ingeniero Residente	
5	Karen Diaz S.	1131107160	Secretaria	Karen Diaz
6	Diego Quintero Alvis	1108759636	cadenero	Diego Quintero
7				
8				
	FECHA:	24- Enero -2023	LUGAR:	
1	Eliana Villalba Torres	1121940754	Residente auxilial	
2	Allan Fernando Monroy Rojas	1.094.246.741	Ingeniero Residente	
3	Karen Diaz S.	1131107160	Secretaria	Karen
4	Diego Quintero Alvis	1108759636	cadenero	Diego Quintero Alvis
5	Yurmanis [illegible]	49717933	Topografa	Yurmanis [illegible]
6	Katerinne Marimón	1. 118. 827. 751	Prof. Social	K M. M.
7				
8				
9				
10				

Powered by CamScanner

ASISTENCIA DE PERSONAL INTERVENTORIA

CONTRATO # 2263 DE 2021	OBJETO:	INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA RUTA (90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA
FECHA	14 - Enero - 2023	
LUGAR:	Obra - Oficina.	

No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Vanessa Sanchez B.	1.131.108.761	Insp. SISO	
2	Karen Dias Ameth	1131107160	Resi Dnos	
3	Eliana Villalba Flores	1121940754	Residente auxiliar	
4	Diego Quintero Ariz	1108759636	cadenero	
5	Yurnira D ortiz L	49717933	Topografa	
6	Kaderinne Marimón	1.118.822.751	Prof. Social.	
	FECHA:	16 - Enero - 2023		
1	Vanessa Sanchez	1.131.108.761	Insp. SISO	
2	Eliana Villalba	1121940754	Auxiliar residente Secretaria	
3	Karn Dias A.	1131107160		
4	Diego Quintero Ariz	1108759636	cadenero	
5	KADERINNE MARIMON	1118822751	Profesional social	
6	Yurnira Ortiz	49717937	TOPOGRAFA	
	FECHA:			
1				
2				
3				
4				

Powered by CamScanner

ASISTENCIA DE PERSONAL INTERVENTORIA

CONTRATO # 2263 DE 2021	OBJETO:	INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA RUTA (90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FECHA :	12-Enero-2023
LUGAR:	Oficina - Obra.

No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Karen Arias A.	1131107160	Secretaria	
2	Yunaira Ortiz L.	49717933	Topografa	
3	Diego Quintero Alv.	1108759636	residente	
4	Eliana Villalba T.	1.121.940.954	Ing. Residente	
5	Vanessa Sanchez B.	1.131.108.761	Insp. HSE	
6	Katerinne Herrera	1.118.822.751	Prof. Social	
	FECHA:	13-Enero-2023		
1	Vanessa Sanchez B.	1.131.108.761	Insp. SISO	
2	Karen Arias A.	1131 107 160	Secretaria	
3	KATERINNE MARTINEZ A.	1.118822751	Profesional Soc Amb	
4	Diego Quintero Alvarez	1108759636	residente	
5	Eliana Villalba Tous	1121940754	Residente auxiliar	
6	Yunaira Ortiz L.	49717933	Topografa	
	FECHA:			
1				
2				
3				
4				

Powered by CamScanner

ASISTENCIA DE PERSONAL INTERVENTORIA

CONTRATO # 2263 DE 2021	OBJETO:	INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA RUTA (90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA
FECHA	10 - 01 - 2023	
LUGAR:	Obra - Oficina.	

No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Vanessa Sanchez	1.131.108.761	Insp. SISO	
2	[illegible]	1.118822751	Profesional Social	
3	Karen Arias Arneto	1131107160	Secretaria	
4	Eliana Villalba T	1121940754	Ing residente auxiliar	
5	Yurara [illegible]	49717933	Topografa	
6				
	FECHA:	11 - 01 - 2023		
1	Vanessa Sanchez B.	1. 131. 108. 761	Insp SISO	
2	Eliana Villalba T	1121940754	Ing residente aux	
3	Karen Arias A.	1131107160	Secretaria	
4	[illegible]	1.118822751	Profesional Social.	
5	Diego Quintero	1108759636	cadenero	
6	Yurara [illegible]	49717933	Topografa	
	FECHA:	12 - 01 - 2023		
1	Vanessa Sanchez B.	1.131.108.761	Insp. SISO	
2	Eliana Villalba Torres	1121940754	Ing residente auxiliar	
3	[illegible]	1.118822751	Profesional Social.	
4	Diego Quintero	1108759636	cadenero	

Powered by CamScanner

ingeval S.A.S.	**ASISTENCIA DE PERSONAL INTERVENTORIA**

CONTRATO # 2263 DE 2021	OBJETO:	INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA RUTA (90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FECHA	07 / 01 / 23
LUGAR:	Oficina - Obra

No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Vanessa Sanchez	1.131.108.761	Insp. SST.	
2	Eliana Villalba	1121940754	Residente auxiliar	
3	Katerin Arias D.	1131107160	Secretaria	
4	Yuneira Ortiz L.	49717933	Topografa	
5	Kadershe Marimon	1.118.822.751	Prof. Social.	

Powered by CamScanner

ingeval	**ASISTENCIA DE PERSONAL INTERVENTORIA**

CONTRATO # 2263 DE 2021	OBJETO:	INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA RUTA (90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FECHA	06 - 01 - 2023
LUGAR:	Obra - Oficina

No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Vanessa Sanchez B.	1.131.108.761	Insp. SISO	
2	Andres E. Muñoz Sa	1109764955	residente	
3	Karen Doris Arrieta	1131107160	Secretaria	Karen Pneo
4	Yuraima Ortiz L	49717933	topografica	
5	Madelinne M.	1.118.822.751	Prof. Social	R. P. B.
6	Eliana Villalba	1.121.940.754	Ing. Residente.	Eliana Villalba.

Powered by CamScanner

ingeval S.A.S.	**ASISTENCIA DE PERSONAL INTERVENTORIA**

CONTRATO # 2263 DE 2021	OBJETO:	INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA RUTA (90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA
FECHA	5/01/2023	
LUGAR:	Obra - Oficina	

No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Vanessa Sanchez	1.131.108.761	INSP. SISO	
2	Andres Eduardo	1'108764055	Cadenero	
3	Karen Dayis Ameta	1131107160	Secretaria	
4	Yurmaica Ortiz	49717933	TOPOGRAFO	
5	Elicura Villalba J.	1121940754	Residente Auxiliar	
6	Katerinne M.	1.118.822.751	Prof. Social.	FIRMA.

Powered by CamScanner

ingeval S.A.S	**ASISTENCIA DE PERSONAL INTERVENTORIA**

CONTRATO # 2263 DE 2021	OBJETO:	INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA RUTA (90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA
FECHA	9/01/2023	
LUGAR:	Ingeval SAS	

No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Elena V. Molina Torres	1121940356	Residente Ambiental	
2	Karen Dayis Angeta	1131107160	Secretaria	
3	Andrés E. Muñoz Salcedo	1108764055	Coderenzo	
4		49717933	Topografo	
5	Vanessa Sanchez	1. 131. 108. 761	Insp. SISO	
6	Moderinne Harmon	1. 118. 822. 751	Prof Social	

Powered by CamScanner

ASISTENCIA DE PERSONAL INTERVENTORIA

CONTRATO # 2263 DE 2021	OBJETO:	INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA RUTA (90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA
FECHA	26- Enero -2023	
LUGAR:	Oficina Ingeval Coveñas	

No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Karen Diaz Arrieta	1131107160	Secretaria	
2	[illegible]	1.118322751	Profesional Social	
3	Alba Fernando Monroy Rojas	1.034.246.741	Ing. Residente	
4	Eliana Villalba T	1121940754	Residente auxiliar	
5	Diego Quintero Alvarez	1108759636	cadenero	
6	Yunaira Ortiz Lavende	49777933	Topografa	
7				
8				

	FECHA:	26- Enero 2023	LUGAR:	
1	Diego Quintero Alvarez	1108759636	cadenero	
2	Yunaira Ortiz L	49777933	Topografa	
3	Karen Diaz A	1131107160	Secretaria	
4	[illegible]	1.118322751	Profesional Social	
5	Alba Fernando Monroy Rojas	1.034.246.741	Ing. Residente	
6	Eliana Villalba T	1.121.940.754	Ing. Aux Residente	
7				
8				
9				
10				

Powered by CamScanner

ASISTENCIA DE PERSONAL INTERVENTORIA

CONTRATO # 2263 DE 2021	OBJETO:	INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA RUTA (90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA
FECHA	27 Enero 2023	
LUGAR:	Oficina	

No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Karen Dias D.	1121107160	Secretaria	
2	[illegible]	1.118.522.751	[illegible]	
3	Allan Fernando Monroy Duque	1.094.246.941	Ing. Residente	
4	[illegible]	4971797J	Topografo	
5	Diego Quintero Alvis	1108759636	cadenero	
6	Eliana Villalba Toro	1121940754	Residente auxiliar	
7	Karen D			
8				
	FECHA:	28 Enero 2023	LUGAR:	Oficina
1	[illegible]	4971797J	Topografo	
2	Diego Quintero Alvis	1108759636	cadenero	
3	Eliana Villalba Toro	1121940754	Residente auxiliar	
4	Allan Fernando Monroy Duque	1.094.246.941	Ing. Residente	
5	Karen Dias	1121107160	Secretaria	
6	[illegible]	1118807751	P. Social	
7				
8				
9				
10				

Powered by CamScanner

ASISTENCIA DE PERSONAL INTERVENTORIA

CONTRATO # 2263 DE 2021	OBJETO:	INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA RUTA (90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA
FECHA	30 - Enero - 2023	
LUGAR:	Oficina	

No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Allan Fernando Monsalvo Pinto	1.094.246.941	Ing. Residente	
2	KAREINNE MADRIGAL	1.115522.751	Profesional Social	
3	Diego Quintero Alvis	1108759636	cadenero	Diego Quintero
4	Yunaira Ortiz L.	49717933	Topografa	
5	Karen Pérez D.	1131107160	Secretaria	
6	Eliana Villalba T.	1.121.940.754	Ing. Residente	Eliana Villalba.
7				
8				
	FECHA:	31 - Enero 2023	LUGAR:	Oficina
1	Allan Fernando Monsalvo Pinto	1.094.246.941	Ing. Residente	
2	KAREINNE MADRIGAL	1.118822754	Profesional Social	
3	Diego Quintero Alvis	1108759636	Cadenero	Diego Quintero
4	Yunaira Ortiz L.	49717933	Topografa	
5	Karen Pérez D.	1131107160	Secretaria	
6	Eliana Villalba T.	1.121.940.754	Ing. Residente.	Eliana Villalba.
7				
8				
9				
10				

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PR 0 +000 0 AL PR 170+200 FECHA: 03-01-2023

UBICACIÓN: Guaranda DIA: MARTES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
	GREYS PATRICIA CABARCAS MARTÍNEZ	23217745	Administradora de obra		X		7:AM		X		4:PM	
	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	1123411378	Trabajadora Social		X		7:AM		X		4:PM	
	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	11052258	Residente SSTMA		X		7:AM		X		4:PM	
	ADRIAN ORTIZ VILLERO	1193110426	INSPECTOR HSE		X		7:AM		X		4:PM	
	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	45561087	INGENIERA AUXILIAR		X		7:AM		X		4:PM	
	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	1131107117	OBRERO		X		7:AM		X		4:PM	
	ARNULFO NAVARRO PADILLA	92519256	OBRERO		X		7:AM		X		4:PM	
	LORELEY LADEUS MENDOZA	64920236	GUIA VIAL		X		7:AM		X		4:PM	
	WILLIAM LUNA URANGO	92450611	OBRERO		X		7:AM		X		4:PM	
	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	1131107444	OBRERO		X		7:AM		X		4:PM	
	BERNARDO CASTEÑADA MORENO	79456242	Residente de obra		X		7:AM		X		4:PM	
	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	40020770	OPERADOR		X		7:AM		X		4:PM	
	FRANCISCO CASTRO	4052850	CONDUCTOR		X		7:AM		X		4:PM	
	DIEGO RESTREPO MESTRA	100342991	OPERADOR		X		7:AM		X		4:PM	
	JUAN FONSECA SOTEL	79915484	CONDUCTOR		X		7:AM		X		4:PM	
	JOSE DIAZ VELASQUEZ	74856439	TOPOGRAFO		X		7:AM		X		4:PM	
	YESID TORRES	13525591	CONDUCTOR		X		7:AM		X		4:PM	

ERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA FECHA: 03-01-2023

FRENTE: DIA:

UBICACIÓN:

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgá perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	15617821	CONDUCTOR		X		Firm		✓		Firm	
2												
3												
4												
5												
6												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
16												
17												
18												
19												

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PR 0 + 0000 AL PR 17 + 0200 FECHA: 04-01-2023

UBICACIÓN: GUAYABAL DIA: MIERCOLES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del dia de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	GREYS PATRICIA CABARCAS MARTÍNEZ	23217745	Administradora de obra		X		7:AM		X		4:PM	
2	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	1123411378	Trabajadora Social		X		7:AM		X		4:PM	
3	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	11052258	Residente SSTMA		X		7:AM		X		4:PM	
4	ADRIAN ORTIZ VILLERO	1193110426	INSPECTOR HSE		X		7:AM		X		4:PM	
5	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	45561087	INGENIERA AUXILIAR		X		7:AM		X		4:PM	
6	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	1131107117	OBRERO		X		7 AM		X		4:PM	
8	ARNULFO NAVARRO PADILLA	92519256	OBRERO		X		7:AM		X		4:PM	
9	LORELEY LADEUS MENDOZA	64920236	GUIA VIAL		X		7:AM		X		4:PM	
10	WILLIAM LUNA URANGO	92450611	OBRERO		X		7:AM	WILLIAM. LUNA.	X		4:PM	
11	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	1131107444	OBRERO		X		7:AM	EDWIN	X		4:PM	
12	BERNARDO CASTEÑADA MORENO	79456242	Residente de obra		X		7:AM		X		4:PM	
13	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	40020770	OPERADOR		X		7:AM		X		4:PM	
14	FRANCISCO CASTRO	4052850	CONDUCTOR		X		7:AM	F.C	X		4:PM	
16	DIEGO RESTREPO MESTRA	100342991	OPERADOR		X		7:AM	D. Rest	X		4:PM	
17	JUAN FONSECA SOTEL	79915484	CONDUCTOR		X		7:AM		X		4:PM	
18	JOSE DIAZ VELASQUEZ	74856439	TOPOGRAFO		X		7:AM		X		4:PM	
19	YESID TORRES	13525591	CONDUCTOR		X		7:AM		X		4:PM	

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS- SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PR 0+0000 AL PR 1+0200 FECHA: 05-01-2023

UBICACIÓN: GUACHARAL DIA: JUEVES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	15617821	CONDUCTOR		X		7:am		✓		4:pm	
2	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	30804393	OPERADOR		X		7:am		✓		4:pm	
3												
4												
5												
6												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
16												
17												
18												
19												

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 9505) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PR 0+000 AL PR 17+200

UBICACIÓN: GUAYABAL

FECHA: 05-01-2023

DIA: JUEVES

A través de mi firma en este reporte declaro que durante mi jornada de trabajo del dia de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	GREYS PATRICIA CABARCAS MARTINEZ	23217745	Administradora de obra		X		7:00am		X		4:00pm	
2	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	1123411378	Trabajadora Social		X		7:00am		X		4:00pm	
3	RAFAEL DAÑO VERGARA DE LA OSSA	11052258	Residente SSTMA		X		7:00am		X		4:00pm	
4	ADRIAN ORTIZ VILLERO	1193110426	INSPECTOR HSE		X		7:00am		X		4:00pm	
5	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	45561087	INGENIERA AUXILIAR		X		7:00am		X		4:00pm	
6	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	1131107117	OBRERO		X		7:00am		X		4:00pm	
8	ARNULFO NAVARRO PADILLA	92519256	OBRERO		X		7:00am		X		4:00pm	
9	LORELEY LADEUS MENDOZA	64920236	GUIA VIAL		X		7:00am		X		4:00pm	
10	WILLIAM LUNA URANGO	92450611	OBRERO		X		7:00am		X		4:00pm	
11	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	1131107444	OBRERO		X		7:00am		X		4:00pm	
12	BERNARDO CASTEÑADA MORENO	79456242	Residente de obra		X		7:00am		X		4:00pm	
13	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	40020770	OPERADOR		X		7:00am		X		4:00pm	
14	FRANCISCO CASTRO	4052850	CONDUCTOR		X		7:00am		X		4:00pm	
16	DIEGO RESTREPO MESTRA	100342991	OPERADOR		X		7:00am		X		4:00pm	
17	JUAN FONSECA SOTEL	79915484	CONDUCTOR				7:00am		X		4:00pm	
18	JOSE DIAZ VELASQUEZ	74856439	TOPOGRAFO		X		7:00am		X		4:00pm	
19	YESID TORRES	13525591	CONDUCTOR		X		7:00am		X		4:00pm	

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE:

UBICACIÓN: Guaranda

FECHA: 06-01-2023

DIA: VIERNES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgán perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	15617821	CONDUCTOR		X				/		6. PM	
2	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	30804393	OPERADOR		X				/		6:PM	
3												
4												
5												
6												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
16												
17												
18												
19												

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PR 0+0000 AL PR 17+0200

UBICACIÓN: Covenas

FECHA: 06-01-2023

DIA: VIERNES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	GREYS PATRICIA CABARCAS MARTÍNEZ	23217745	Administradora de obra		X		7:AM		✓		6:PM	
2	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	1123411378	Trabajadora Social		X		7:AM		✓		6:PM	
3	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	11052258	Residente SSTMA		X		7:AM		✓		6:PM	
4	ADRIAN ORTIZ VILLERO	1193110426	INSPECTOR HSE		X		7:AM		✓		6:PM	
5	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	45561087	INGENIERA AUXILIAR		X		7:AM		✓		6:PM	
6	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	1131107117	OBRERO		X		7 AM		✓		6:PM	
8	ARNULFO NAVARRO PADILLA	92519256	OBRERO		X		7:AM		✓		6:PM	
9	LORELEY LADEUS MENDOZA	64920236	GUIA VIAL		X		7:AM		✓		6:PM	
10	WILLIAM LUNA URANGO	92450611	OBRERO		X		7:AM		✓		6:PM	
11	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	1131107444	OBRERO		X		7:AM		✓		6:PM	
12	BERNARDO CASTEÑADA MORENO	79456242	Residente de obra		X		7:AM		✓		6:PM	
13	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	40020770	OPERADOR		X		7:AM		✓		6:PM	
14	FRANCISCO CASTRO	4052850	CONDUCTOR		X		7:AM		✓		6:PM	
16	DIEGO RESTREPO MESTRA	100342991	OPERADOR		X		7:AM		✓		6:PM	
17	JUAN FONSECA SOTEL	79915484	CONDUCTOR		X		7:AM		✓		6:PM	
18	JOSE DIAZ VELASQUEZ	74856439	TOPOGRAFO		X		7:AM		✓		6:PM	
19	YESID TORRES	13525591	CONDUCTOR		X		7:AM		✓		6:PM	

OBSERVACIONES 2 Horas de Compensación por el dia 31 de diciembre

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PR 0 + 0000 AL PR 1 + 0200 FECHA: 07-01-2023

UBICACIÓN: CUNAYABAL DIA: JABADO

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	15617821	CONDUCTOR		X		9:AM		✓		4:PM	
2	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	30804393	OPERADOR		X		7:AM		✓		4:PM	
3												
4												
5												
6												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
16												
17												
18												
19												

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PR 0+0000 AL PR 1+0200

UBICACIÓN: GUAYABAL

FECHA: 07-01-2023

DIA: SABADO

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	GREYS PATRICIA CABARCAS MARTÍNEZ	23217745	Administradora de obra		X		7:AM	Greys	X		4:PM	Greys
2	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	1123411378	Trabajadora Social		X		7:AM	Zully	X		4:PM	Zully
3	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	11052258	Residente SSTMA		X		7:AM	Rafael Vergara O.	X		4:PM	Rafael Vergara
4	ADRIAN ORTIZ VILLERO	1193110426	INSPECTOR HSE		X		7:AM	ADRIAN ORTIZ	X		4:PM	Adrian
5	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	45561087	INGENIERA AUXILIAR		X		7:AM	Carmen Contreras	X		4:PM	Carmen Contreras
6	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	1131107117	OBRERO		X		7 AM	Jaime Sierra	X		4PM	Jaime
8	ARNULFO NAVARRO PADILLA	92519256	OBRERO		X		7:AM	Arnulfo	X		4PM	Arnulfo
9	LORELEY LADEUS MENDOZA	64920236	GUIA VIAL		X		7:AM		X		4:PM	
10	WILLIAM LUNA URANGO	92450611	OBRERO		X		7:AM	WILLIAM LUNA	X		4:PM	William
11	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	1131107444	OBRERO		X		7:AM	EDWIN	X		4:PM	EDWIN
12	BERNARDO CASTEÑADA MORENO	79456242	Residente de obra		X		7:AM		X		4:PM	
13	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	40020770	OPERADOR		X		7:AM		X		4:PM	
14	FRANCISCO CASTRO	4052850	CONDUCTOR		X		7:AM	F. C	X		4:PM	F. C
16	DIEGO RESTREPO MESTRA	100342991	OPERADOR				7 AM	D. Restrepo.	X		4:PM	D. Restrepo
17	JUAN FONSECA SOTEL	79915484	CONDUCTOR		X		7:AM	Juan Fonseca	X		4:PM	Juan Fonseca
18	JOSE DIAZ VELASQUEZ	74856439	TOPOGRAFO		X		7:AM		X		4:PM	
19	YESID TORRES	13525591	CONDUCTOR		X		7:AM	Yesid Torres	X		4:PM	Yesid Torres

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PR 0 + 0000 AL PR 1 + 0200 FECHA: 10-01-2023

UBICACIÓN: GUARROSAL DIA: MARTES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	15617821	CONDUCTOR		X		7:AM		√		4:PM	
2	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	30804393	OPERADOR		X		7:AM		√		4:PM	
3												
4												
5												
6												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
16												
17												
18												
19												

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav

REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PR 0 + 0200 A PR 1 + 0200 FECHA: 10-01-2023

UBICACIÓN: GUAYABAL DIA: MARTES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	GREYS PATRICIA CABARCAS MARTÍNEZ	23217745	Administradora de obra		X		7:AM		✓		4:PM	
2	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	1123411378	Trabajadora Social		X		7:AM		✓		4:PM	
3	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	11052258	Residente SSTMA		X		7:AM		✓		4:PM	
4	ADRIAN ORTIZ VILLERO	1193110426	INSPECTOR HSE		X		7:AM		✓		4:PM	
5	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	45561087	INGENIERA AUXILIAR		X		7:AM		✓		4:PM	
6	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	1131107117	OBRERO		X		7:AM		✓		4:PM	
8	ARNULFO NAVARRO PADILLA	92519256	OBRERO		X		7:AM		✓		4:PM	
9	LORELEY LADEUS MENDOZA	64920236	GUIA VIAL		X		7:AM		✓		4:PM	
10	WILLIAM LUNA URANGO	92450611	OBRERO		X		7:AM		✓		4:PM	
11	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	1131107444	OBRERO		X		7:AM		✓		4:PM	
12	BERNARDO CASTEÑADA MORENO	79456242	Residente de obra		X		7:AM					
13	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	40020770	OPERADOR									
14	FRANCISCO CASTRO	4052850	CONDUCTOR		X		7:AM		✓		4:PM	
16	DIEGO RESTREPO MESTRA	100342991	OPERADOR		X		7:AM		✓		4:PM	
17	JUAN FONSECA SOTEL	79915484	CONDUCTOR		X		7:AM		✓		4:PM	
18	JOSE DIAZ VELASQUEZ	74856439	INSPECTOR CIVIL		X		7:AM		✓		4:PM	
19	YESID TORRES	13525591	CONDUCTOR		X		7:AM		✓		4:PM	

OBSERVACIONES Via 10 De enero 2023 el Señor Medardo Suarez Operador de Vibrocompactador. NO asistió Sin Justa Causa.

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PR 0+0000 AL PR 7+0200

UBICACIÓN: COVEÑAS

FECHA: 11-01-2025

DIA:

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	15617821	CONDUCTOR		X		7:00 am		X		4:00 pm	
2	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	30804393	OPERADOR		X		7:00 am		✓		4:00 pm	Federico Buldin
3												
4												
5												
6												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
16												
17												
18												

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PR 0+000 M PR 1+020D

UBICACIÓN: GENERAL

FECHA 11-01-2023

DIA MIERCOLES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del dia de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	GREYS PATRICIA CABARCAS MARTÍNEZ	23217745	Administradora de obra		X		7:AM		✓		A PM	
2	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	1123411378	Trabajadora Social		X		7:AM		X		A PM	
3	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	11052258	Residente SSTMA		X		7:AM		X		A PM	
4	ADRIAN ORTIZ VILLERO	1193110426	INSPECTOR HSE		X		7:AM		X		4:PM	
5	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	45561087	INGENIERA AUXILIAR		X		7:AM		X		4 PM	
6	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	1131107117	OBRERO		X		7:AM		X		4 PM	
8	ARNULFO NAVARRO PADILLA	92519256	OBRERO		X		7:AM		X		4 PM	
9	LORELEY LADEUS MENDOZA	64920236	GUIA VIAL		X		7:AM		X		4:PM	
10	WILLIAM LUNA URANGO	92450611	OBRERO		X	WILIAM,	7:AM		X		4:PM	
11	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	1131107444	OBRERO		X		7:AM		X		4:PM	
12	BERNARDO CASTEÑADA MORENO	79456242	Residente de obra		X		7:AM		X		4:PM	
13	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	40020770	OPERADOR		X		7:AM		X		4:PM	
14	FRANCISCO CASTRO	4052850	CONDUCTOR		X		7:AM		X		4:PM	
16	DIEGO RESTREPO MESTRA	100342991	OPERADOR		X		7:AM		X		4:PM	
17	JUAN FONSECA SOTEL	79915484	CONDUCTOR		X		7:AM		X		4:PM	
18	JOSE DIAZ VELASQUEZ	74856439	TOPOGRAFO		X		7:AM		X		4:PM	
19	YESID TORRES	13525591	CONDUCTOR		X		7:AM		X		4:PM	

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PR 0 + 0000 AL PR 7 + 0200

UBICACIÓN: GUAYABAL

FECHA: 12-01-2023

DIA: JUEVES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánica perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	15617821	CONDUCTOR		X		7:11pm		√		4:pm	
2	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	30804393	OPERADOR		X		7:Am	Federico Buldin	√		4:pm	Federico Buldin
3												
4												
5												
6												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
16												
17												
18												
19												

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PR 0 + 0000 M PR 1 + 0200

UBICACIÓN: CORDOBA

FECHA: 12-01-2023

DIA: JUEVES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	GREYS PATRICIA CABARCAS MARTÍNEZ	23217745	Administradora de obra		X		7:AM		✓		4:PM	
2	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	1123411378	Trabajadora Social		X		7:AM		✓		4:PM	
3	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	11052258	Residente SSTMA		X		7:AM		✓		4:PM	
4	ADRIAN ORTIZ VILLERO	1193110426	INSPECTOR HSE		X		7:AM		✓		4:PM	
5	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	45561087	INGENIERA AUXILIAR		X		7 AM		✓		4:PM	
6	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	1131107117	OBRERO		X		7 AM		✓		4:PM	
8	ARNULFO NAVARRO PADILLA	92519256	OBRERO		X		7:AM		✓		4:PM	
9	LORELEY LADEUS MENDOZA	64920236	GUIA VIAL		X		7:AM		✓		4:PM	
10	WILLIAM LUNA URANGO	92450611	OBRERO		X		7:AM		✓		4:PM	
11	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	1131107444	OBRERO		X		7:AM		✓		4:PM	
12	BERNARDO CASTEÑADA MORENO	79456242	Residente de obra		X		7:AM		✓		4:PM	
13	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	40020770	OPERADOR		X		7:AM		✓		4:PM	
14	FRANCISCO CASTRO	4052850	CONDUCTOR		X		7:AM		✓		4:PM	
16	DIEGO RESTREPO MESTRA	100342991	OPERADOR		X		7:AM		✓		4:PM	
17	JUAN FONSECA SOTEL	79915484	CONDUCTOR		X		7:AM		✓		4:PM	
18	JOSE DIAZ VELASQUEZ	74856439	INSPECTOR CIVIL		X		7:AM		✓		4:PM	
19	YESID TORRES	13525591	CONDUCTOR		X		7:AM		✓		4:PM	

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PR 0 +0000 AL PR 1 +0200

UBICACIÓN: CUNYABAL.

FECHA: 13-01-2023

DIA: VIERNES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgán perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	15617821	CONDUCTOR		X		7:AM		✓		4:PM	
2	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	30804393	OPERADOR		X		7:AM		✓		4:PM	
3												
4												
5												
6												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
16												
17												
18												
19												

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PR 0+0000 A PR 17+0200

UBICACIÓN: GUAYABAL

FECHA: 13-01-2023

DIA: VIERNES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	GREYS PATRICIA CABARCAS MARTÍNEZ	23217745	Administradora de obra		X		7:AM		✓		4:PM	
2	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	1123411378	Trabajadora Social		X		7:AM		✓		4:PM	
3	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	11052258	Residente SSTMA		X		7:AM		✓		4:PM	
4	ADRIAN ORTIZ VILLERO	1193110426	INSPECTOR HSE		X		7:AM		✓		4:PM	
5	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	45561087	INGENIERA AUXILIAR		X		7:AM		✓		4:PM	
6	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	1131107117	OBRERO		X		7:AM		✓		4:PM	
8	ARNULFO NAVARRO PADILLA	92519256	OBRERO		X		7:AM		✓		4:PM	
9	LORELEY LADEUS MENDOZA	64920236	GUIA VIAL		X		7:AM		✓		4:PM	
10	WILLIAM LUNA URANGO	92450611	OBRERO		X		7:AM		✓		4:PM	
11	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	1131107444	OBRERO		X		7:AM		✓		4:PM	
12	BERNARDO CASTEÑADA MORENO	79456242	Residente de obra		X		7:AM		✓		4:PM	
13	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	40020770	OPERADOR		X		7:AM		✓		4:PM	
14	FRANCISCO CASTRO	4052850	CONDUCTOR		X		7:AM		✓		4:PM	
16	DIEGO RESTREPO MESTRA	100342991	OPERADOR		X		7:AM		✓		4:PM	
17	JUAN FONSECA SOTEL	79915484	CONDUCTOR		X		7:AM		✓		4:PM	
18	JOSE DIAZ VELASQUEZ	74856439	INSPECTOR CIVIL		X		7:AM		✓		4:PM	
19	YESID TORRES	13525591	CONDUCTOR		X		7:AM		✓		4:PM	

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PR 0+000 AL PR 7+600

UBICACIÓN: SAMPUES

FECHA: 14-01-2023

DIA: SABADO

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	15617821	CONDUCTOR		X		7:AM		✓		4PM	
2	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	30804393	OPERADOR		X		7:AM		✓		4PM	
3												
4												
5												
6												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
16												
17												
18												
19												

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PR 0+0000 AL PR 17+020 D

UBICACIÓN: GUAYABAL

FECHA: 14: 01 - 2023

DIA: SABADO

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	GREYS PATRICIA CABARCAS MARTÍNEZ	23217745	Administradora de obra		X		7:Am		✓		4:Pm	
2	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	1123411378	Trabajadora Social		X		7:Am		✓		4:Pm	
3	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	11052258	Residente SSTMA		X		7:Am		✓		4:Pm	
4	ADRIAN ORTIZ VILLERO	1193110426	INSPECTOR HSE		X		7:Am		✓		4:Pm	
5	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	45561087	INGENIERA AUXILIAR		X		7:Am		✓		4:Pm	
6	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	1131107117	OBRERO		X		7:Am		✓		4:Pm	
8	ARNULFO NAVARRO PADILLA	92519256	OBRERO		X		7:Am		✓		4:Pm	
9	LORELEY LADEUS MENDOZA	64920236	GUIA VIAL		X		7:Am		✓		4:Pm	
10	WILLIAM LUNA URANGO	92450611	OBRERO		X		7:Am		✓		4:Pm	
11	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	1131107444	OBRERO		X		7:Am		✓		4:Pm	
12	BERNARDO CASTEÑADA MORENO	79456242	Residente de obra		X		7:Am		✓		4:Pm	
13	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	40020770	OPERADOR		X		7:Am		✓		4:Pm	
14	FRANCISCO CASTRO	4052850	CONDUCTOR		X		7:Am		✓		4:Pm	
16	DIEGO RESTREPO MESTRA	100342991	OPERADOR		X		7:Am		✓		4:Pm	
17	JUAN FONSECA SOTEL	79915484	CONDUCTOR		X		7:Am		✓		4:Pm	
18	JOSE DIAZ VELASQUEZ	74856439	INSPECTOR CIVIL		X		7:Am		✓		4:Pm	
19	YESID TORRES	13525591	CONDUCTOR		X		7:Am		✓		4:Pm	

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 9505C02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PR 0+0000 AL PR 1+024000 FECHA 16-05-2023

UBICACIÓN: CONTROL DIA LUNES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del dia de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánica perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	15617821	CONDUCTOR		X		7:00		✓		4:00	
2	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	30804393	OPERADOR		X		7:00		✓		4:00	
3												
4												
5												
6												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
16												
17												
18												
19												

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PR 0 + 0000 A PR 170200

UBICACIÓN: CUNJABAL

FECHA: 16-01-2023

DIA: LUNES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	GREYS PATRICIA CABARCAS MARTÍNEZ	23217745	Administradora de obra		X		7:AM				4:PM	
2	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	1123411378	Trabajadora Social		X		7:AM				4:PM	
3	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	11052258	Residente SSTMA		X		7:AM				4:PM	
4	ADRIAN ORTIZ VILLERO	1193110426	INSPECTOR HSE		X		7:AM				4:PM	
5	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	45561087	INGENIERA AUXILIAR		X		7:AM				4:PM	
6	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	1131107117	OBRERO		X		7 AM				4:PM	
8	ARNULFO NAVARRO PADILLA	92519256	OBRERO		X		7:AM				4:PM	
9	LORELEY LADEUS MENDOZA	64920236	GUIA VIAL		X		7:AM				4:PM	
10	WILLIAM LUNA URANGO	92450611	OBRERO		X		7:AM				4:PM	
11	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	1131107444	OBRERO		X		7:AM				4:PM	
12	BERNARDO CASTEÑADA MORENO	79456242	Residente de obra		X		7:AM				4:PM	
13	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	40020770	OPERADOR		X		7:AM				4:PM	
14	FRANCISCO CASTRO	4052850	CONDUCTOR		X		7:AM				4:PM	
16	DIEGO RESTREPO MESTRA	100342991	OPERADOR		X		7:AM				4:PM	
17	JUAN FONSECA SOTEL	79915484	CONDUCTOR		X		7:AM				4:PM	
18	JOSE DIAZ VELASQUEZ	74856439	INSPECTOR CIVIL		X		7:AM				4:PM	
19	YESID TORRES	13525591	CONDUCTOR		X		7:AM				4:PM	

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PR 3 +0000 AL PR 7+0200 FECHA: 1-31-2023

UBICACIÓN: Guaranda DIA: MARTES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánica perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	GREYS PATRICIA CABARCAS MARTÍNEZ	1 23217745	Administradora de obra		X		7:AM		✓		4:PM	
2	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	1123411378	Trabajadora Social		X		7:AM		✓		4:PM	
3	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	11052258	Residente SSTMA		X		7:AM		✓		4:PM	
4	ADRIAN ORTIZ VILLERO	1193110426	INSPECTOR HSE		X		7:AM		✓		5:30	
5	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	45561087	INGENIERA AUXILIAR		X		7:AM		✓		4:PM	
6	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	1131107117	OBRERO		X		7:AM		✓		11 PM	
8	ARNULFO NAVARRO PADILLA	92519256	OBRERO		X		7:AM		✓		5:30	
9	LORELEY LADEUS MENDOZA	64920236	GUIA VIAL		X		7:AM		✓		5:30	
10	WILLIAM LUNA URANGO	92450611	OBRERO		X		7:AM		✓		5:30	
11	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	1131107444	OBRERO		X		7:AM		✓		5:30	
12	BERNARDO CASTEÑADA MORENO	79456242	Residente de obra		X				✓		4:PM	
13	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	40020770	OPERADOR		X		7:AM		✓		8:PM	
14	FRANCISCO CASTRO	4052850	CONDUCTOR		X		7:AM		✓		4:PM	
16	DIEGO RESTREPO MESTRA	100342991	OPERADOR		X		6:AM		✓		5:30	
17	JUAN FONSECA SOTEL	79915484	CONDUCTOR		X		7:AM		✓		4:PM	
18	JOSE DIAZ VELASQUEZ	74856439	INSPECTOR CIVIL		X		7:AM		✓		4:PM	
19	YESID TORRES	13525591	CONDUCTOR		X		7:AM		✓		4:PM	

OBSERVACIONES Operador de Vibrocompactador (Medardo Suarez) Labo. P hasta las 5pm debido a que fue necesario realizar el Sellado de la base estabilizada que se dejaron en Obra al final de la jornada

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PR 0+0000 M PR 1+0200 FECHA: 17-01-2023

UBICACIÓN: GUARIGUA DIA: MARTES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del dia de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánica perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	15617821	CONDUCTOR		X		7:AM		✓		5:30	
2	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	30804393	OPERADOR		X		7:AM	Federico Buldin	✓		5:30	Federico Buldin
3												
4												
5												
6												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
16												
17												
18												
19												

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PR 0 + 0000 AL PR 1 + 0200 FECHA: 18-01-2023

UBICACIÓN: COVEÑAS DIA: MIERCOLES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	GREYS PATRICIA CABARCAS MARTÍNEZ	23217745	Administradora de obra		X		7:am	Greys	X		4pm	Greys
2	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	1123411378	Trabajadora Social		X		7:am	Zully	X		4:pm	Zully
3	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	11052258	Residente SSTMA		X		7:am	Rafael Vergara D.	X		4:pm	Rafael Vergara D
4	ADRIAN ORTIZ VILLERO	1193110426	INSPECTOR HSE		X		7:am	Adrian	X		5:30	Adrian
5	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	45561087	INGENIERA AUXILIAR		X		7:Am	Carmen Contreras	X		4:pm	Carmen Contreras
6	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	1131107117	OBRERO		X		7 Am	Jaime Sierra	X		5:30	Jaime
8	ARNULFO NAVARRO PADILLA	92519256	OBRERO		X		7:am	Arnulfo	X		5:30	Arnulfo
9	LORELEY LADEUS MENDOZA	64920236	GUIA VIAL		X		7:am	Loreley	X		5:30	Loreley
10	WILLIAM LUNA URANGO	92450611	OBRERO		X		7:am	William Luna	X		5:30	William
11	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	1131107444	OBRERO		X		7:am	Edwin Suarez	X		5:30	Edwin
12	BERNARDO CASTEÑADA MORENO	79456242	Residente de obra				7:am		X		4:pm	
13	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	40020770	OPERADOR		X		7:am		X		8:pm	
14	FRANCISCO CASTRO	4052850	CONDUCTOR		X		7:am	F. C	X		4:pm	F. C
16	DIEGO RESTREPO MESTRA	100342991	OPERADOR		X		7:am	D. Restrepo	X		5:30	D. Restrepo
17	JUAN FONSECA SOTEL	79915484	CONDUCTOR		X		7:am		X		4:pm	
18	JOSE DIAZ VELASQUEZ	74856439	INSPECTOR CIVIL		X		7:am		X		4:pm	
19	YESID TORRES	13525591	CONDUCTOR		X		7:am	Yesid Torres	X		4:pm	Yesid Torres

OBSERVACIONES El Operador del Vibrocompactador, (Medardo Suarez) Laboro hasta las 8:pm debido a que fue necesario Realizar el Sellado de la base estabilizada que se dispuso en obra en actividad de la tarde.

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PR 0+0000 AL PR 1+0200 FECHA: 19 - 01 - 2023

UBICACIÓN: GUAJABAL DIA: MIERCOLES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgán perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	15617821	CONDUCTOR		X		7:am		✓		4:pm	
2	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	30804393	OPERADOR		X		7:am		✓		4:pm	
3	Juan Pablo Rodriguez	1120208 9	Operador		x		7:am		✓		4:pm	
4												
5												
6												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
16												
17												
18												
19												

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PR 0 + 0000 AL PR 7 + 0200 FECHA: 19 - 01 - 2023

UBICACIÓN: CAMPAMENTO DIA: JUEVES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	GREYS PATRICIA CABARCAS MARTÍNEZ	23217745	Administradora de obra		X		7:00		/		4:PM	
2	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	1123411378	Trabajadora Social		X		7:AM		/		4:PM	
3	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	11052258	Residente SSTMA		X		7:AM		/		4:PM	
4	ADRIAN ORTIZ VILLERO	1193110426	INSPECTOR HSE		X		7:AM		/		4:PM	
5	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	45561087	INGENIERA AUXILIAR		X		7:AM		/		4:PM	
6	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	1131107117	OBRERO		X		7:AM		/		4:PM	
8	ARNULFO NAVARRO PADILLA	92519256	OBRERO		X		7:AM		/		4:PM	
9	LORELEY LADEUS MENDOZA	64920236	GUIA VIAL		X		7:AM		/		4:PM	
10	WILLIAM LUNA URANGO	92450611	OBRERO		X		7:AM		/		4:PM	
11	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	1131107444	OBRERO		X		7:AM		/		4:PM	
12	BERNARDO CASTEÑADA MORENO	79456242	Residente de obra		X		7:AM		/		4:PM	
13	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	40020770	OPERADOR		X		7:AM		/		4:PM	
14	FRANCISCO CASTRO	4052850	CONDUCTOR		X		7:AM		/		4:PM	
16	DIEGO RESTREPO MESTRA	100342991	OPERADOR		X		7:AM		/		4:PM	
17	JUAN FONSECA SOTEL	79915484	CONDUCTOR		X		7:AM		/		4:PM	
18	JOSE DIAZ VELASQUEZ	74856439	INSPECTOR CIVIL		X		7:AM		/		4:PM	
19	YESID TORRES	13525591	CONDUCTOR		X		7:AM		/		4:PM	

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PR 0 + 0000 M PR 1 + 0200 FECHA: 19-01-2023

UBICACIÓN: GUAJABAL. DIA: JUEVES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	15617821	CONDUCTOR		X		7:AM		✓		6:PM	
2	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	30804393	OPERADOR		X		7:AM		✓		4:PM	
3	JUAN PABLO RODRIGUEZ	11202089	OPERADOR		X		7:AM		✓		4:PM	
4												
5												
6												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
16												
17												
18												
19												

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS , SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PR 0 + 0000 M PR 7 + 0200 FECHA: 20-01-2023

UBICACIÓN: GUARABAL DIA: VIERNES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	GREYS PATRICIA CABARCAS MARTÍNEZ	23217745	Administradora de obra		X		7:am		✓		4:pm	
2	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	1123411378	Trabajadora Social		X		7:am		✓		4:pm	
3	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	11052258	Residente SSTMA		X		7:am		✓		4:pm	
4	ADRIAN ORTIZ VILLERO	1193110426	INSPECTOR HSE		X		7:am		✓		4:pm	
5	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	45561087	INGENIERA AUXILIAR		X		7:Am		✓		4:pm	
6	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	1131107117	OBRERO		X		7 Am		✓		4:pm	
8	ARNULFO NAVARRO PADILLA	92519256	OBRERO		X		7:am		✓		4:pm	
9	LORELEY LADEUS MENDOZA	64920236	GUIA VIAL		X		7:am		✓		4:pm	
10	WILLIAM LUNA URANGO	92450611	OBRERO		X		7:am		✓		4:pm	
11	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	1131107444	OBRERO		X		7:am		✓		4:pm	
12	BERNARDO CASTEÑADA MORENO	79456242	Residente de obra		X		7:am		✓		4:pm	
13	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	40020770	OPERADOR		X		7:am		✓		4:pm	
14	FRANCISCO CASTRO	4052850	CONDUCTOR		X		7:am		✓		4:pm	
16	DIEGO RESTREPO MESTRA	100342991	OPERADOR		X		7:am		✓		4:pm	
17	JUAN FONSECA SOTEL	79915484	CONDUCTOR		X		7:am		✓		4:pm	
18	JOSE DIAZ VELASQUEZ	74856439	INSPECTOR CIVIL		X		7:am		✓		4:pm	
19	YESID TORRES	13525591	CONDUCTOR		X		7:am		✓		4:pm	

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PR 0+000 AL PR 1+020 FECHA: 20-01-2023

UBICACIÓN: GALERAS DIA: VIERNES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	15617821	CONDUCTOR		X				✓		4:pm	
2	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	30804393	OPERADOR		X		7:am		✓		4:pm	
3	JUAN PABLO RODRIGUEZ	11202089	OPERADOR		X		7:am		✓		4:pm	
4												
5												
6												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
16												
17												
18												
19												

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PR 0 +000 AL PR 87+000

UBICACIÓN: GUAJARAL

FECHA: 21-01-2023

DIA: SABADO

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	GREYS PATRICIA CABARCAS MARTÍNEZ	23217745	Administradora de obra		X		7:am				12:pm	
2	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	1123411378	Trabajadora Social		X		7:am				12:pm	
3	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	11052258	Residente SSTMA		X		7:am				12:pm	
4	ADRIAN ORTIZ VILLERO	1193110426	INSPECTOR HSE		X		7:am				12:pm	
5	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	45561087	INGENIERA AUXILIAR		X		7:am				1:pm	
6	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	1131107117	OBRERO		X		7am				12:pm	
8	ARNULFO NAVARRO PADILLA	92519256	OBRERO		X		7:am				12:pm	
9	LORELEY LADEUS MENDOZA	64920236	GUIA VIAL		X		7:am				12pm	
10	WILLIAM LUNA URANGO	92450611	OBRERO		X		7:am				12pm	
11	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	1131107444	OBRERO		X		7:am				12pm	
12	BERNARDO CASTEÑADA MORENO	79456242	Residente de obra		X		7:am				12:pm	
13	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	40020770	OPERADOR		X		7:am				12:pm	
14	FRANCISCO CASTRO	4052850	CONDUCTOR		X		7:am				12:pm	
16	DIEGO RESTREPO MESTRA	100342991	OPERADOR		X		7:am				4:pm	
17	JUAN FONSECA SOTEL	79915484	CONDUCTOR								12pm	
18	JOSE DIAZ VELASQUEZ	74856439	INSPECTOR CIVIL		X		7:am				12:pm	
19	YESID TORRES	13525591	CONDUCTOR								1:pm	

OBSERVACIONES Compensación de 4 horas

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PR 0 + 0000 AL PR 1 + 0600

UBICACIÓN: GUAIMARAL

FECHA: 27-01-2023

DIA: SABADO

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del dia de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	15617821	CONDUCTOR		X		7:00				12:00	
2	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	30804393	OPERADOR		X		7:00				12:00	
3	JUAN PABLO RODRIGUEZ	11202089	OPERADOR		X		7:00				12:00	
4												
5												
6												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
16												
17												
18												
19												

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PR 0 + 0000 AL PR 1 + 0200

UBICACIÓN: CUADRILLA

FECHA: 23-01-2023

DIA: LUNES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	GREYS PATRICIA CABARCAS MARTÍNEZ	23217745	Administradora de obra		X		7:AM		✓		4:PM	
2	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	1123411378	Trabajadora Social		X		7:AM		✓		4:PM	
3	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	11052258	Residente SSTMA		X		7:AM		✓		4:PM	
4	ADRIAN ORTIZ VILLERO	1193110426	INSPECTOR HSE		X		7:AM		✓		5:PM	
5	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	45561087	INGENIERA AUXILIAR		X		7:AM		✓		4:PM	
6	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	1131107117	OBRERO		X		7AM		✓		5:PM	
8	ARNULFO NAVARRO PADILLA	92519256	OBRERO		X		7:AM		✓		5:PM	
9	LORELEY LADEUS MENDOZA	64920236	GUIA VIAL		X		7:AM		✓		5:PM	
10	WILLIAM LUNA URANGO	92450611	OBRERO		X		7:AM		✓		5:PM	
11	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	1131107444	OBRERO		X		7:AM		✓		5:PM	
12	BERNARDO CASTEÑADA MORENO	79456242	Residente de obra									
13	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	40020770	OPERADOR									
14	FRANCISCO CASTRO	4052850	CONDUCTOR		X		7AM		✓		4:PM	
16	DIEGO RESTREPO MESTRA	100342991	OPERADOR		X		7:AM		✓		5:PM	
17	JUAN FONSECA SOTEL	79915484	CONDUCTOR						✓		4:PM	
18	JOSE DIAZ VELASQUEZ	74856439	INSPECTOR CIVIL		X		7:AM		✓		4:PM	
19	YESID TORRES	13525591	CONDUCTOR						✓		4:PM	

OBSERVACIONES Medardo Suarez Operador de Vibro Compactador NO se presento a trabajar

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PR 0 + 0000 AL PR 1 + 0200 FECHA: 23-04-2022

UBICACIÓN: Guayabal DIA:

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	15617821	CONDUCTOR		X		7:am		✓		4:pm	
2	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	30804393	OPERADOR		X	Fedro	7:am	Federico Buldin	✓		4:pm	Federico Buldin
3	JUAN PABLO RODRIGUEZ	11202089	OPERADOR		X		7:am		✓		4:Pm	
4												
5												
6												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
16												
17												
18												
19												

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: DEO 70000 AL PE 170200 FECHA: 24-01-2023

UBICACIÓN: Guajira DIA: MARTES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	GREYS PATRICIA CABARCAS MARTÍNEZ	23217745	Administradora de obra		X		7 am		✓		4:pm	
2	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	1123411378	Trabajadora Social		X		7 AM		✓		4:pm	
3	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	11052258	Residente SSTMA		X		7 am		✓		4:pm	
4	ADRIAN ORTIZ VILLERO	1193110426	INSPECTOR HSE		X		7 am		✓		6:pm	
5	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	45561087	INGENIERA AUXILIAR		X		7:Am		✓		4:pm	
6	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	1131107117	OBRERO		X		7 AM		✓		6:pm	
8	ARNULFO NAVARRO PADILLA	92519256	OBRERO		X		7 AM		✓		6:pm	
9	LORELEY LADEUS MENDOZA	64920236	GUIA VIAL		X		7 am		✓		6:pm	
10	WILLIAM LUNA URANGO	92450611	OBRERO		X		7 am		✓		6:pm	
11	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	1131107444	OBRERO		X		7 am		✓		6:pm	
12	BERNARDO CASTEÑADA MORENO	79456242	Residente de obra		X		7:AM		✓			
13	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	40020770	OPERADOR		X		7 AM		✓		4:PM	
14	FRANCISCO CASTRO	4052850	CONDUCTOR		X		7 am		✓		4:pm	
16	DIEGO RESTREPO MESTRA	100342991	OPERADOR		X				✓			
17	JUAN FONSECA SOTEL	79915484	CONDUCTOR		X		7 am		✓		4:pm	
18	JOSE DIAZ VELASQUEZ	74856439	INSPECTOR CIVIL		X		7 am		✓		4:p	
19	YESID TORRES	13525591	CONDUCTOR		X		7 am		✓		4:pm	

OBSERVACIONES Diego Mestra NO asistió Por motivo de Cita Medica.

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PR 0 + 0000 AL PR 1 + 0200

UBICACIÓN: CUATABAL

FECHA: 24-01-2023

DIA: MARTES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una le perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	F
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	15617821	CONDUCTOR		X		7:AM		✓		5:PM	
2	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	30804393	OPERADOR		X		7:AM		✓		5:PM	
3	JUAN PABLO RODRIGUEZ	11202089	OPERADOR		X		7:AM		✓		4:PM	
4												
5												
6												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
16												
17												
18												
19												

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PR 0 + 0000 AL PR 1 + 0200 O

UBICACIÓN: Guafabal.

FECHA: 25-01-2023

DIA: MIERCOLES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	GREYS PATRICIA CABARCAS MARTÍNEZ	23217745	Administradora de obra		X		7:AM		✓		4:PM	
2	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	1123411378	Trabajadora Social		X		7:AM		✓		4:PM	
3	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	11052258	Residente SSTMA		X		7:AM	Rafael Vergara	✓		4:PM	Rafael Vergara
4	ADRIAN ORTIZ VILLERO	1193110426	INSPECTOR HSE		X		7:AM		✓		5:PM	
5	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	45561087	INGENIERA AUXILIAR		X		7:AM		✓		4:PM	
6	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	1131107117	OBRERO		X		7:AM		✓		5:PM	
8	ARNULFO NAVARRO PADILLA	92519256	OBRERO		X		7:AM		✓		5:PM	
9	LORELEY LADEUS MENDOZA	64920236	GUIA VIAL		X		7:AM		✓		5:PM	
10	WILLIAM LUNA URANGO	92450611	OBRERO					William	✓		5:PM	
11	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	1131107444	OBRERO		X		7:AM	Edwin	✓		5:PM	Edwin
12	BERNARDO CASTEÑADA MORENO	79456242	Residente de obra		X		7:AM		✓			
13	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	40020770	OPERADOR		X		7:AM		✓			
14	FRANCISCO CASTRO	4052850	CONDUCTOR		X		7:AM		✓		4:PM	
16	DIEGO RESTREPO MESTRA	100342991	OPERADOR		X		7:AM	D. Restrepo	✓		5:40	D. Restrepo
17	JUAN FONSECA SOTEL	79915484	CONDUCTOR		X		7:AM	Juan Fonseca	✓		4:PM	Juan Fonseca
18	JOSE DIAZ VELASQUEZ	74856439	INSPECTOR CIVIL						✓		4:PM	
19	YESID TORRES	13525591	CONDUCTOR		X		7:AM	Yesid Torres	✓		4:PM	Yesid Torres

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PR 0+0000 AL PR 1+02000

UBICACIÓN: CAJIBIO

FECHA: 25-01-2023

DIA: MIERCOLES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del dia de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	15617821	CONDUCTOR		X		7:am				5:pm	
2	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	30804393	OPERADOR		X		7:am				5:pm	
3	JUAN PABLO RODRIGUEZ	11202089	OPERADOR		X		7:am				5:pm	
4												
5												
6												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
16												
17												
18												
19												

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: Pr 0 + 0000 AL Pr 1 + 0200

UBICACIÓN: GUAYABAL

FECHA: 26 - 01 - 2023

DIA: JUEVES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánica perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	GREYS PATRICIA CABARCAS MARTÍNEZ	23217745	Administradora de obra		X		7:AM		✓		4:PM	
2	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	1123411378	Trabajadora Social		X		7:AM		✓		4:PM	
3	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	11052258	Residente SSTMA		X		7:AM		✓		4:PM	
4	ADRIAN ORTIZ VILLERO	1193110426	INSPECTOR HSE		X		7:AM		✓		4:PM	
5	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	45561087	INGENIERA AUXILIAR		X		7:AM		✓		4:PM	
6	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	1131107117	OBRERO		X		7:AM		✓		4:PM	
8	ARNULFO NAVARRO PADILLA	92519256	OBRERO		X		7:AM		✓		4:PM	
9	LORELEY LADEUS MENDOZA	64920236	GUIA VIAL		X		7:AM		✓		4:PM	
10	WILLIAM LUNA URANGO	92450611	OBRERO		X		7:AM		✓		4:PM	
11	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	1131107444	OBRERO		X		7:AM		✓		4:PM	
12	BERNARDO CASTEÑADA MORENO	79456242	Residente de obra		X		7:AM		✓		4:PM	
13	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	40020770	OPERADOR		X		7:AM		✓		4:PM	
14	FRANCISCO CASTRO	4052850	CONDUCTOR		X		7:AM		✓		4:PM	
16	DIEGO RESTREPO MESTRA	100342991	OPERADOR				7:AM		✓		5:30	
17	JUAN FONSECA SOTEL	79915484	CONDUCTOR		X		7:AM		✓		4:PM	
18	JOSE DIAZ VELASQUEZ	74856439	INSPECTOR CIVIL		X				✓		4:PM	
19	YESID TORRES	13525591	CONDUCTOR		X		7:AM		✓		5:30	

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PR 0 +0000 AL PR 1 +0200

UBICACIÓN: Covaneras

FECHA: 26-01-2023

DIA: Jueves

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	15617821	CONDUCTOR		X		7:Am		✓		4:Pm	
2	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	30804393	OPERADOR		X		7:Am		✓		4 Pm	
3	JUAN PABLO RODRIGUEZ	11202089	OPERADOR		X		7:Am		✓		4:Pm	
4												
5												
6												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
16												
17												
18												
19												

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PR 07 0000 AL PR 1 + 0200

UBICACIÓN: GUAJABAL

FECHA: 27-01-2023

DIA: V. VIERNES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	GREYS PATRICIA CABARCAS MARTÍNEZ	23217745	Administradora de obra		X		7:AM		V		4:PM	
2	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	1123411378	Trabajadora Social		X		7:AM				4:PM	
3	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	11052258	Residente SSTMA		X		7:AM				4:PM	
4	ADRIAN ORTIZ VILLERO	1193110426	INSPECTOR HSE		X		7:AM				4:PM	
5	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	45561087	INGENIERA AUXILIAR		X		7:AM				4:PM	
6	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	1131107117	OBRERO		X		7AM				4:PM	
8	ARNULFO NAVARRO PADILLA	92519256	OBRERO		X		7:AM				4:PM	
9	LORELEY LADEUS MENDOZA	64920236	GUIA VIAL		X		7:AM				4:PM	
10	WILLIAM LUNA URANGO	92450611	OBRERO		X		7:AM				4:PM	
11	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	1131107444	OBRERO				7:AM				4:PM	
12	BERNARDO CASTEÑADA MORENO	79456242	Residente de obra								4:PM	
13	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	40020770	OPERADOR		X		7:AM				4:PM	
14	FRANCISCO CASTRO	4052850	CONDUCTOR		X		7:AM					
16	DIEGO RESTREPO MESTRA	100342991	OPERADOR		X		7:AM				5:PM	
17	JUAN FONSECA SOTEL	79915484	CONDUCTOR									
18	JOSE DIAZ VELASQUEZ	74856439	INSPECTOR CIVIL				7:AM				4:PM	
19	YESID TORRES	13525591	CONDUCTOR		X		7:AM				5:PM	

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PR 0 + 0000 AL PR 1 + 0200 FECHA: 27 - 07 - 2023

UBICACIÓN: DIA: VIERNES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánica perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	15617821	CONDUCTOR		X		7:00		✓		4:00	
2	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	30804393	OPERADOR		X		7:00		✓		4:00	
3	JUAN PABLO RODRIGUEZ	11202089	OPERADOR		X		7:00		✓		4:00	
4												
5												
6												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
16												
17												
18												
19												

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PR 070000 AL PR 17+0200 FECHA: 28-01-2023

UBICACIÓN: GUARABAL DIA: SABADO

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	GREYS PATRICIA CABARCAS MARTÍNEZ	23217745	Administradora de obra		X		7:Am		✓		4:Pm	
2	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	1123411378	Trabajadora Social		X		7:Am		✓		4:Pm	
3	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	11052258	Residente SSTMA		X		7:Am				12:Pm	
4	ADRIAN ORTIZ VILLERO	1193110426	INSPECTOR HSE		X		7:Am				12:Pm	
5	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	45561087	INGENIERA AUXILIAR		X		7:Am				4pm	
6	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	1131107117	OBRERO		X		7 Am				1:Pm	
8	ARNULFO NAVARRO PADILLA	92519256	OBRERO		X		7:Am				4:Pm	
9	LORELEY LADEUS MENDOZA	64920236	GUIA VIAL		X		7:Am				12:Pm	
10	WILLIAM LUNA URANGO	92450611	OBRERO		X		7:Am				4:Pm	
11	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	1131107444	OBRERO		X		7:Am				12:Pm	
12	BERNARDO CASTEÑADA MORENO	79456242	Residente de obra		X		7:Am				4:Pm	
13	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	40020770	OPERADOR		X		7:Am				12:Pm	
14	FRANCISCO CASTRO	4052850	CONDUCTOR		X		7:Am				12pm	
16	DIEGO RESTREPO MESTRA	100342991	OPERADOR		X		7:Am				4:Pm	
17	JUAN FONSECA SOTEL	79915484	CONDUCTOR		X		7:Am				12:Pm	
18	JOSE DIAZ VELASQUEZ	74856439	INSPECTOR CIVIL		X		7:Am				4:Pm	
19	YESID TORRES	13525591	CONDUCTOR		X		7:Am					

OBSERVACIONES Convocación 4 horas

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PE 07 0000 AL PE 17 0200

UBICACIÓN: CUMBRE

FECHA: 28-01-2023

DIA: SABADO

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	15617821	CONDUCTOR		X		7:00				3:00 pm	Federico Buldin
2	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	30804393	OPERADOR		X		7:00	Federico Buldin			12:00	
3	JUAN PABLO RODRIGUEZ	11202089	OPERADOR		X		7:00				12:00 pm	
4												
5												
6												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
16												
17												
18												
19												

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PE 0 + 0000 M PE 1 + 0200

UBICACIÓN: Guantabal

FECHA: 30-01-2023

DIA: LUNES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	GREYS PATRICIA CABARCAS MARTÍNEZ	23217745	Administradora de obra		X		7:am	Greys C	✓		4:pm	Greys C
2	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	1123411378	Trabajadora Social		X		7:AM	Zully	✓		4:pm	Zully
3	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	11052258	Residente SSTMA		X		7am	Rafael Vergara	✓		4:PM	Rafael Vergara
4	ADRIAN ORTIZ VILLERO	1193110426	INSPECTOR HSE		X		7am	ADRIAN	✓		4:pm	ADRIAN
5	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	45561087	INGENIERA AUXILIAR		X		7:AM	Carmen Contreras	✓		4:pm	Carmen Contreras
6	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	1131107117	OBRERO		X		7 Am		✓		4:pm	
8	ARNULFO NAVARRO PADILLA	92519256	OBRERO		X		7:AM		✓		4:pm	
9	LORELEY LADEUS MENDOZA	64920236	GUIA VIAL		X		7:Am		✓		4:pm	
10	WILLIAM LUNA URANGO	92450611	OBRERO		X		7:AM	William Luna	✓		4:pm	William
11	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	1131107444	OBRERO		X		7:AM	Edwin Suarez	✓		4:pm	Edwin
12	BERNARDO CASTEÑADA MORENO	79456242	Residente de obra		X		7:am		✓		4:pm	
13	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	40020770	OPERADOR		X		7:AM		✓		4:pm	
14	FRANCISCO CASTRO	4052850	CONDUCTOR		X		7:am		✓		1	
16	DIEGO RESTREPO MESTRA	100342991	OPERADOR		X		7:am		✓		5:20	
17	JUAN FONSECA SOTEL	79915484	CONDUCTOR		X		7:AM	Juan Fonseca	✓			Juan Fonseca
18	JOSE DIAZ VELASQUEZ	74856439	INSPECTOR CIVIL		X		7:AM		✓		4:pm	
19	YESID TORRES	13525591	CONDUCTOR		X		7:AM	Yesid T	✓			Yesid T

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE:

UBICACIÓN: Guaranda

FECHA: 30-01-2023

DIA: LUNES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	15617821	CONDUCTOR		X		7:AM				4:PM	
2	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	30804393	OPERADOR		X		7:AM				4:PM	
3	JUAN PABLO RODRIGUEZ	11202089	OPERADOR		X		7:AM				4:PM	
4												
5												
6												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
16												
17												
18												
19												

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PE 0 + 0000 M PE 1 + 0200 FECHA: 31-07-2023

UBICACIÓN: Covaj*Bm DIA: MARTES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	GREYS PATRICIA CABARCAS MARTÍNEZ	23217745	Administradora de obra		X		7:00	Greys	✓		4:PM	Greys
2	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	1123411378	Trabajadora Social		X		7:AM	Zully	✓		4:PM	Zully
3	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	11052258	Residente SSTMA		X		7:00	Rafael Vergara	✓		4:PM	Rafael Vergara
4	ADRIAN ORTIZ VILLERO	1193110426	INSPECTOR HSE		X		7:00	Adrian	✓		4:PM	Adrian
5	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	45561087	INGENIERA AUXILIAR		X		7 AM	Carmen Contreras	✓		4:PM	Carmen
6	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	1131107117	OBRERO		X		7 AM	JAS	✓		4:PM	JAS
8	ARNULFO NAVARRO PADILLA	92519256	OBRERO		X		7:00	Arnulfo	✓		4:PM	Arnulfo
9	LORELEY LADEUS MENDOZA	64920236	GUIA VIAL		X		7:00	Loreley	✓		4:PM	Loreley
10	WILLIAM LUNA URANGO	92450611	OBRERO				7 AM	William	✓		4:PM	William
11	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	1131107444	OBRERO		X		7:00	Edwin	✓		4:PM	Edwin
12	BERNARDO CASTEÑADA MORENO	79456242	Residente de obra				7:AM		✓		4:PM	
13	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	40020770	OPERADOR		X		7:00	Medardo	✓		4:PM	Medardo
14	FRANCISCO CASTRO	4052850	CONDUCTOR		X		7:00	Francisco	✓		4:PM	Francisco
16	DIEGO RESTREPO MESTRA	100342991	OPERADOR		X		7:00	Diego Restrepo	✓		4:30	Diego Restrepo
17	JUAN FONSECA SOTEL	79915484	CONDUCTOR		X		7:00	Juan Fonseca	✓		4:PM	Juan Fonseca
18	JOSE DIAZ VELASQUEZ	74856439	INSPECTOR CIVIL		X		7:00	Jose Diaz	✓		4:PM	Jose Diaz
19	YESID TORRES	13525591	CONDUCTOR		X		7:00	Yesid	✓		4:PM	Yesid

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE:

UBICACIÓN: GUAJABAL

FECHA: 31-01-2023

DIA: MARTES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	15617821	CONDUCTOR		X		7:am		✓		4:pm	
2	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	30804393	OPERADOR		X		7:am	Federico Buldin	✓		4:pm	Federico Buldin
3	JUAN PABLO RODRIGUEZ	11202089	OPERADOR		X		7:am		✓		4:pm	
4												
5												
6												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
16												
17												
18												
19												

OBSERVACIONES

ELABORADO POR:
FIRMA: ADRIAN F
NOMBRE:
CARGO:

Vo.Bo. DIRECTOR DE OBRA / RESIDENTE:
FIRMA:
NOMBRE:
CARGO:

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 9505C02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: TRAMO #3

UBICACIÓN: SABANETA

FECHA: 05-01-2022

DIA: MARTES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánica perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	Juan Vega	5935279	Operador		X		7:AM		✓		4 PM	
2	JUAN PESTANA	7.065.773.311	Ayudante de obra		X		7:AM	JUAN PESTANA	✓		4PM	JUAN PESTANA.
3	Jennifer Quiñonez Pestana	1065592819	Paletera		X		7:AM		✓		4PM	
4	Katia Herrera Ramos	7.065374919	Paletera		X		7 AM		✓		4PM	
5												
6												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
16												
17												
18												
19												

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: Tramo #3

UBICACIÓN: Sabanete

FECHA: 04-01-2023

DIA: MIERCOLES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	LUIS VEGA	5935279	OPERADOR		X		7:AM	Luis Vega	✓		4:PM	Luis Vega
2	JUAN PESTANA	1065373311	OBRERO		X		7:AM	Juan Pestana	✓		4:PM	Juan Pestana
3	JENNIFER QUIÑONEZ PESTANA	1063372819	PALETERA		X		7:AM	Jennifer Quiñonez	✓		4:PM	Yennifer Quiñonez
4	KATIA HERRERA RAMOS	1065374919	PALETERA		X		7:AM	Katia Herrera	✓		4:PM	Katia Herrera
5	Wilson Pestana	15704543	OBRERO		X		7:AM	Wilson Pestana	✓		4:PM	Wilson
6												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
16												
17												
18												
19												

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: TRAMO #3 FECHA: 05-01-2023

UBICACIÓN: SAHAGUN DIA: JUEVES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del dia de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	LUIS MARIA VEGA	5935279	OPERADOR		X		7:Am	Luis Vega	✓		4:Pm	Luis Vega
2	IVAN PESTANA	1065373311	OBRERO		X		7:Am	Ivan Pestana	/		4:Pm	Ivan pestano
3	JENNIFER QUIÑONEZ PESTANA	1063372819	PALETERA		X		7:Am	wilson Pestana	✓		4:PM	wilson
4	KATIA HERRERA RAMOS	1065374919	PALETERA		X		7:Am	Jennifer Quiñonez	✓		4:PM	Jennifer Quiñonez
5					X		7:Am	Katia Herrera	/		4:Pm	Katia Herrera
6												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
16												
17												
18												
19												

OBSERVACIONES

ELABORADO POR:

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: TRAMO 3

UBICACIÓN: SACAN

FECHA: 06-01-2023

DIA: VIERNES

través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del dia de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. y que me haya producido una lesión orgánic erturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	LUIS MARIA VEGA	5935279	OPERADOR		X		7:AM	Luis Vega	✓		4:PM	Luis Vega
2	IVAN PESTANA	1065373311	OBRERO		X		7:AM	Ivan Pestana	✓		4:PM	Ivan Pestana
3	JENNIFER QUIÑONEZ PESTANA	1063372819	PALETERA		X		7:AM	Quiñonez Pestana	✓		4:PM	Quiñonez
4	KATIA HERRERA RAMOS	1065374919	PALETERA		X		7:AM	Jennifer Quiñonez	✓		4:PM	Jennifer Qu
5					X		7:AM	Katia Herrera	✓		4:PM	Katia Herrera
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
17												
18												
19												

BSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: TRAMO #3 FECHA: 07-01-2023

UBICACIÓN: SACAN DIA: SABADO

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgáni perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	LUIS MARIA VEGA	5935279	OPERADOR		X		7:AM	Luis Vega	✓		4:PM	Luis Vega
2	IVAN PESTANA	1065373311	OBRERO		X		7:AM	Ivan pestana	✓		4:PM	Ivan pestana.
3	JENNIFER QUIÑONEZ PESTANA	1063372819	PALETERA		X		7:AM	Jennifer Quiñonez	✓		4:PM	Jennifer Qu-ñonez
4	KATIA HERRERA RAMOS	1065374919	PALETERA		X		7:AM	Katia Herrera	✓		4:PM	Katia Herrera
5	WILSON PESTANA	15704543	OBRERO		X		7:AM	wilson pesta	✓		4:PM	wilson
6												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
16												
17												
18												
19												

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: Tramo #3 FECHA: 20-04-2023

UBICACIÓN: Sincelejo DIA: Viernes

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	LUIS MARIA VEGA	5935279	OPERADOR		X		7:00	Luis Vega	✓		4:00	Luis Vega
2	IVAN PESTANA	1065373311	OBRERO		X		7:00	Ivan Pestana	✓		4:00	Ivan Pestana
3	JENNIFER QUIÑONEZ PESTANA	1063372819	PALETERA		X		7:00	Jennifer P e	✓		4:00	Jennifer P
4	KATIA HERRERA RAMOS	1065374919	PALETERA		X		7:00	Katia Herrera	✓		4:00	Katia Herr
5	WILSON PESTANA	15704543	OBRERO		X		7:00	Jennifer Quiñonez P	✓		4:00	Jennifer Quiñ
6												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
16												
17												
18												
19												

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: TRAMO #3 FECHA: 23-01-2023

UBICACIÓN: SAN CARLOS DIA: LUNES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del dia de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	LUIS MARIA VEGA	5935279	OPERADOR		X		7:AM	Luis Vega	✓		5:PM	Luis Vega
2	IVAN PESTANA	1065373311	OBRERO		X		7:AM	Ivan Pestana	✓		5:PM	Ivan Pestaña
3	JENNIFER QUIÑONEZ PESTANA	1063372819	PALETERA		X		7:AM	Wilson	✓		5:PM	Wilson
4	KATIA HERRERA RAMOS	1065374919	PALETERA		X		7:AM	Katia Herrera	✓		5:PM	Katia Herrera
5	WILSON PESTANA	15704543	OBRERO		X		7:AM	Jennifer Quiñonez	✓		5:PM	Jennifer Quiñ
6												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
16												
17												
18												
19												

OBSERVACIONES

ELABORADO POR: Vo Bo. DIRECTOR DE OBRA / RESIDENTE:

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: Tramo #3

UBICACIÓN: Sincelejo

FECHA: 24-01-2023

DIA: Martes

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	LUIS MARIA VEGA	5935279	OPERADOR		X		7am	Luis Vega	✓		5pm	Luis Vega
2	IVAN PESTANA	1065373311	OBRERO		X		7am	Ivan Pestana	✓		5pm	Ivan Pestana
3	JENNIFER QUIÑONEZ PESTANA	1063372819	PALETERA		X		7am	Jennifer Quiñonez	✓		5pm	Jennifer Quiñonez
4	KATIA HERRERA RAMOS	1065374919	PALETERA		X		7am	Katia Herrera	✓		5pm	Katia Herrera
5	WILSON PESTANA	15704543	OBRERO		X		7am	Wilson	✓		5pm	Wilson
6												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
16												
17												
18												
19												

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: TRAMO 3 FECHA: 25-01-2023

UBICACIÓN: Sabanta DIA: MIERCOLES

A través de mi firma en este reporte declaro que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	LUIS MARIA VEGA	5935279	OPERADOR		X		Firma	Luis Vega	/		5:40	Luis Vega
2	IVAN PESTANA	1065373311	OBRERO		X		Firma	Ivan Pestana	/		5:40	Ivan Pestana
3	JENNIFER QUIÑONEZ PESTANA	1063372819	PALETERA		X		Firma	Jennifer Quiñonez	/		5:40	Jennifer Quiñonez
4	KATIA HERRERA RAMOS	1065374919	PALETERA		X		Firma	Katia Herrera	/		5:40	Katia Herrera
5	WILSON PESTANA	15704543	OBRERO		X		Firma	Wilson P	/		5:40	Wilson P
6												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
16												
17												
18												
19												

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: TRAMO #3 FECHA: 26-01-2023

UBICACIÓN: SINCELEJO DIA: JUEVES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	LUIS MARIA VEGA	5935279	OPERADOR		X			Luis Vega	✓		5:30	Luis Vega
2	IVAN PESTANA	1065373311	OBRERO		X			Ivan Pestana	✓		5:30	Ivan Pestana
3	JENNIFER QUIÑONEZ PESTANA	1065372819	PALETERA		X			Jennifer Quiñonez	✓		5:30	Jennifer Quiñonez
4	KATIA HERRERA RAMOS	1065374919	PALETERA		X			Katia Herrera	✓		5:30	KATIA HERRERA
5	WILSON PESTANA	15704543	OBRERO		X			Wilson P	✓		5:30	Wilson
6												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
16												
17												
18												
19												

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: PR 0+0000 AL PR 17+0200 FECHA: 27-01-2023

UBICACIÓN: SINCELEJO DIA: VIERNES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del dia de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	LUIS MARIA VEGA	5935279	OPERADOR		X		7:Am	Luis Vega	✓		5:pm	Luis Vega
2	IVAN PESTANA	1065373311	OBRERO		X		7:Am	Ivan Pestana	✓		5:pm	Ivan Pestana
3	JENNIFER QUIÑONEZ PESTANA	1065372819	PALETERA		X		7:Am	Jennifer Quiñonez	✓		5:pm	Jennifer Quiñ
4	KATIA HERRERA RAMOS	1065374919	PALETERA		X		7:Am	KATIA HERRERA	✓		5:Pm	KATIA HERRE
5	WILSON PESTANA	15704543	OBRERO		X		7:Am	Wilson Pestana	✓		5:pm	Wilson
6												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
16												
17												
18												
19												

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: TRAMO 3

UBICACIÓN: SABANA

FECHA: 28-04-2023

DIA: SABADO

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	LUIS MARIA VEGA	5935279	OPERADOR		X		7:00	Luis Vega	✓		4:00	Luis Vega
2	IVAN PESTANA	1065373311	OBRERO		X		7:00	Ivan Pestana	/		4:00	Ivan Pestana
3	JENNIFER QUIÑONEZ PESTANA	1065372819	PALETERA		X		7:00	Jennifer Quiñonez	/		4:00	Jennifer Quiñonez
4	KATIA HERRERA RAMOS	1065374919	PALETERA		X		7:00	Katia Herrera	/		4:00	Katia Herrera
5	WILSON PESTANA	15704543	OBRERO		X		7:00	Wilson Pestana	/		4:00	Wilson
6												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
16												
17												
18												
19												

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: Frente #3 FECHA: 30-01-2023

UBICACIÓN: SAHAGUN DIA: Lunes

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	LUIS MARIA VEGA	5935279	OPERADOR		X		7:00	Luis Vega	✓		5:20	Luis Vega
2	IVAN PESTANA	1065373311	OBRERO		X		7:00	Ivan Pestana	✓		5:20	Ivan Pestana
3	JENNIFER QUIÑONEZ PESTANA	1065372819	PALETERA		X		7:00	Jennifer Quiñonez	✓		5:20	Jennifer Quiñ
4	KATIA HERRERA RAMOS	1065374919	PALETERA		X		7:00	Katia Herrera	✓		5:20	Katia Herrera
5	WILSON PESTANA	15704543	OBRERO		X		7:00	Wilson Pestana	✓		5:20	Wilson
6												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
16												
17												
18												
19												

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: Tramo 3

UBICACIÓN: Sabana

FECHA: 30-01-2023

DIA: MARTES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	LUIS MARIA VEGA	5935279	OPERADOR		X		7:00	Luis Vega	✓		4:30	Luis Vega
2	IVAN PESTANA	1065373311	OBRERO		X		7:00	Ivan Pestana	✓		4:30	Ivan Pestana
3	JENNIFER QUIÑONEZ PESTANA	1065372819	PALETERA		X		7:00	Jennifer Quiñonez	✓		4:30	Jennifer Quiñonez
4	KATIA HERRERA RAMOS	1065374919	PALETERA		X		7:00	Katia Herrera	✓		4:30	Katia Herrera
5	WILSON PESTANA	15704543	OBRERO		X		7:00	Wilson Pestana	✓		4:30	Wilson
6												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
16												
17												
18												
19												

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: SACAVA - TRAMO 3

UBICACIÓN: SACAVA

FECHA: 29-04-2023

DIA: SABADO

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánica perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	LUIS MARIA VEGA	5935279	OPERADOR		X		7:am	Luis Vega				Luis Vega
2	IVAN PESTANA	1065373311	OBRERO		X		7:am	Ivan Pestana				Ivan Pestana
3	JENNIFER QUIÑONEZ PESTANA	1063372819	PALETERA		X		7:am	Jennifer Quiñonez				Jennifer Quiñonez
4	KATIA HERRERA RAMOS	1065374919	PALETERA		X		7:am	Katia Herrera				Katia Herrera
5	WILSON PESTANA	15704543	OBRERO		X		7:am	Wilson P				Wilson
6												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
16												
17												
18												
19												

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: TRAMO #3 FECHA: 11-01-2023

UBICACIÓN: SAHAGUN DIA: MIERCOLES

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	LUIS MARIA VEGA	5935279	OPERADOR		X		7:Am	Luis Vega	/		4:Pm	Luis Vega
2	IVAN PESTANA	1065373311	OBRERO		X		7:Am	Ivan Pestana	/		4:Pm	Ivan Pestana
3	JENNIFER QUIÑONEZ PESTANA	1063372819	PALETERA		X		7:Am	Jennifer Quiñonez	/		4:Pm	Jennifer Quiñonez
4	KATIA HERRERA RAMOS	1065374919	PALETERA		X		7:Am	Katia Herrera	/		4:Pm	Katia Herrera
5	WILSON PESTANA	15704543	OBRERO		X		7:Am	Wilson P	/		4:Pm	Wilson
6												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
16												
17												
18												
19												

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	REPORTE DIARIO DE PERSONAL		
	Código: PP-P-01 R-03	Versión: 8	Fecha de emisión: 05/04/2022

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

FRENTE: Sabanta TRAMO #3 FECHA: 10-01-2023

UBICACIÓN: Sabanta DIA: Martes

A través de mi firma en este reporte declaró que durante mi jornada de trabajo del día de hoy no he sufrido suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que me haya producido una lesión orgánic perturbación funcional o psiquiátrica, circunstancias que por lo tanto no le he reportado a mi superior inmediato.

MARQUE X EN (NO), SI NO PRESENTA NINGÚN SINTOMA O X EN (SI), SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA E INDIQUE CUAL O CUALES. (REVISAR EL LISTADO DE SINTOMAS QUE SE TIENE PUBLICADO)

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SINTOMAS DE COVID-19			HORA INICIO	FIRMA	HORA ALMUERZO		HORA FINAL	FIRMA
				SI	NO	SINTOMAS			SI	NO		
1	LUIS MARIA VEGA	5935279	OPERADOR		X		7:Am	Luis Vega	✓		4:Pm	Luis Vega
2	IVAN PESTANA	1065373311	OBRERO		X		7:Am	Ivan pestana	✓		4:Pm	Ivan pestana
3	JENNIFER QUIÑONEZ PESTANA	1063372819	PALETERA		X		7:Am	Jennifer Quiñonez	✓		4:Pm	Jennifer Quiñonez
4	KATIA HERRERA RAMOS	1065374919	PALETERA		X		7:Am	Katia Herrera	✓		4:Pm	Katia Herrera
5	WILSON PESTANA	15704543	OBRERO		X		7:Am	Wilson P	✓		4:Pm	Wilson
6												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
16												
17												
18												
19												

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	INDUCCIÓN DE PERSONAL		
	Código: AD-P-01 R-02	Versión: 5	Fecha de emisión: 06/01/2022

PROYECTO: 2269-2021

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Juan Pablo Rodriguez

CARGO: Operador CÉDULA DE CIUDADANÍA: 30804393

FECHA DE REALIZACIÓN DE LA INDUCCIÓN: 16-01-2023 FECHA DE INGRESO: 17-01-2023

INDUCCIÓN CORPORATIVA

Se ha realizado la divulgación tomando como material de divulgación la presentación corporativa, la cual incluye los siguientes temas:

- Presentación de la empresa, actividades y estructura organizacional, generalidades.
- Políticas Corporativas (HSEQ, No alcohol, drogas y tabaquismo, Seguridad Vial, Derechos Humanos, No Acoso Laboral, Cliente).
- Presentación del Sistema Integrado de Gestión.
- Control y distribución de documentación.
- Aspectos legales en seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.
- Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales.
- Peligros para la Seguridad y Salud en el Trabajo presentes en la labor, así como sus medidas de prevención y control.
- Formación prevención peligros de orden público en la zona.
- Aspecto e Impactos Ambientales presentes en la labor, así como sus medidas de prevención y control.
- Uso adecuado y mantenimiento de los Elementos de Protección Personal.
- Programas del Sistema Integrado de Gestión (Gestión de Riesgos, Programas Vigilancia Epidemiológica).
- Plan estratégico de seguridad vial (PSEV) y Gestión Ambiental.
- Reglamento de higiene y seguridad industrial (ARL de la empresa).
- Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.
- Comité de convivencia laboral.
- Planes de emergencia en la empresa y procedimiento en caso de accidente de trabajo
- Funciones y Responsabilidades especificas en HSE de acuerdo a su cargo, descritas en el Manual de Funciones y Descripción del Puesto de Trabajo.

SI* ✓

NO

*Se deben adjuntar la evaluación correspondiente.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Dictada por:	Adrian Ortiz	Inspector HSE	Adrian F
Recibida por:	Juan Pablo Rodriguez	Operador	

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Se le han notificado los riesgos a los cuales está expuesto al realizar su labor y las medidas de prevención que debe cumplir en el desarrollo de las mismas. Así mismo, declara que ha comprendido, le han evaluado a satisfacción, todos los temas tratados y es consciente de la importancia que tiene que cumplir con todas las disposiciones y normas establecidas por la empresa.

SI ✓ NO

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Dictada por:	Adrian Ortiz	Inspector HSE	Adrian F
Recibida por:	Juan Pablo Rodriguez	Operador	

INDUCCIÓN DE GESTIÓN HUMANA

Se ha socializado y entregado al trabajador el Contrato de Trabajo firmado por las partes dando a conocer especialmente las siguientes condiciones de trabajo: Jefe inmediato y conducto regular, Horarios trabajo (ingreso, salida, almuerzo y descansos), Sitios y horas de descanso, Salarios y formas de pago, Turnos de trabajo de la empresa (si aplica).	SI	✓	NO	
Se ha socializado al trabajador los Medios de transporte para llegar a la empresa (si aplica), Permisos personales y calamidad doméstica y presentación personal.	SI	✓	NO	
Se ha entregado y socializado con el trabajador el Manual de Funciones y Descripción del Puesto de Trabajo.	SI	✓	NO	
Se ha realizado la Presentación al jefe inmediato y compañeros.	SI	✓	NO	
Se ha socializado el Reglamento Interno de Trabajo (especialmente derechos y deberes del trabajador y faltas graves).	SI	✓	NO	
Se ha verificado la conformidad de las afiliaciones de la EPS y Fondo de Pensiones, indicados por el trabajador. Se ha dado a conocer la ARL junto con la entrega del carné. Se ha dado a conocer la Caja de Compensación Familiar a la cual la empresa se encuentra afiliada. Se han entregado las copias de las afiliaciones de la seguridad social respectivas.	SI	✓	NO	
Se ha socializado con el trabajador las recomendaciones del concepto de aptitud laboral resultado del examen médico de ingreso y el trabajador se compromete a cumplir con las recomendaciones médicas.	SI	✓	NO	
Se ha entregado el carné de identificación de la empresa.	SI	✓	NO	

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Dictada por:	Greys Cabarcas	Administradora	
Recibida por:	Juan Pablo Rodriguez	Operador	

Powered by CamScanner

incopav	INDUCCIÓN DE PERSONAL		
	Código: AD-P-01 R-02	Versión: 5	Fecha de emisión: 06/01/2022

PROYECTO: 226-2021

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Federico José Buldin Tuñez

CARGO: Operador

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 2050 4393

FECHA DE REALIZACIÓN DE LA INDUCCIÓN: 10-01-2023

FECHA DE INGRESO: 11-01-2023

INDUCCIÓN CORPORATIVA

Se ha realizado la divulgación tomando como material de divulgación la presentación corporativa, la cual incluye los siguientes temas:

- Presentación de la empresa, actividades y estructura organizacional, generalidades.
- Políticas Corporativas (HSEQ, No alcohol, drogas y tabaquismo, Seguridad Vial, Derechos Humanos, No Acoso Laboral, Cliente).
- Presentación del Sistema Integrado de Gestión.
- Control y distribución de documentación.
- Aspectos legales en seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.
- Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales.
- Peligros para la Seguridad y Salud en el Trabajo presentes en la labor, así como sus medidas de prevención y control.
- Formación prevención peligros de orden público en la zona.
- Aspecto e Impactos Ambientales presentes en la labor, así como sus medidas de prevención y control.
- Uso adecuado y mantenimiento de los Elementos de Protección Personal.
- Programas del Sistema Integrado de Gestión (Gestión de Riesgos, Programas Vigilancia Epidemiológica).
- Plan estratégico de seguridad vial (PSEV) y Gestión Ambiental.
- Reglamento de higiene y seguridad industrial (ARL de la empresa).
- Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.
- Comité de convivencia laboral.
- Planes de emergencia en la empresa y procedimiento en caso de accidente de trabajo
- Funciones y Responsabilidades especificas en HSE de acuerdo a su cargo, descritas en el Manual de Funciones y Descripción del Puesto de Trabajo.

SI* [✓]

NO [ ]

*Se deben adjuntar la evaluación correspondiente.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Dictada por:	Adrian Ortiz	Inspector HSE	
Recibida por:	Federico Buldin	Operador	

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Se le han notificado los riesgos a los cuales está expuesto al realizar su labor y las medidas de prevención que debe cumplir en el desarrollo de las mismas. Así mismo, declara que ha comprendido, le han evaluado a satisfacción, todos los temas tratados y es consciente de la importancia que tiene que cumplir con todas las disposiciones y normas establecidas por la empresa.

SI [✓] NO [ ]

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Dictada por:	Adrian Ortiz	Inspector HSE	
Recibida por:	Federico Buldin	Operador	

INDUCCIÓN DE GESTIÓN HUMANA

Se ha socializado y entregado al trabajador el Contrato de Trabajo firmado por las partes dando a conocer especialmente las siguientes condiciones de trabajo: Jefe inmediato y conducto regular, Horarios trabajo (ingreso, salida, almuerzo y descansos), Sitios y horas de descanso, Salarios y formas de pago, Turnos de trabajo de la empresa (si aplica).	SI [✓]	NO [ ]
Se ha socializado al trabajador los Medios de transporte para llegar a la empresa (si aplica), Permisos personales y calamidad doméstica y presentación personal.	SI [✓]	NO [ ]
Se ha entregado y socializado con el trabajador el Manual de Funciones y Descripción del Puesto de Trabajo.	SI [✓]	NO [ ]
Se ha realizado la Presentación al jefe inmediato y compañeros.	SI [✓]	NO [ ]
Se ha socializado el Reglamento Interno de Trabajo (especialmente derechos y deberes del trabajador y faltas graves).	SI [✓]	NO [ ]
Se ha verificado la conformidad de las afiliaciones de la EPS y Fondo de Pensiones, indicados por el trabajador. Se ha dado a conocer la ARL junto con la entrega del carné. Se ha dado a conocer la Caja de Compensación Familiar a la cual la empresa se encuentra afiliada. Se han entregado las copias de las afiliaciones de la seguridad social respectivas.	SI [✓]	NO [ ]
Se ha socializado con el trabajador las recomendaciones del concepto de aptitud laboral resultado del examen médico de ingreso y el trabajador se compromete a cumplir con las recomendaciones médicas.	SI [✓]	NO [ ]
Se ha entregado el carné de identificación de la empresa.	SI [✓]	NO [ ]

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Dictada por:	Greys Cabarcas	Administradora	
Recibida por:	Federico Buldin	Operador	

Powered by CamScanner

incopav	INDUCCIÓN DE PERSONAL		
	Código: AD-P-01 R-02	Versión: 5	Fecha de emisión: 06/01/2022

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: CHRISTIAN B. GIL ALVARADO

CARGO: DIRECTOR DE PROYECTO **CÉDULA DE CIUDADANÍA:** 1049629878

FECHA DE REALIZACIÓN DE LA INDUCCIÓN: 30/01/2023 **FECHA DE INGRESO:** 30/01/2023

INDUCCIÓN CORPORATIVA

Se ha realizado la divulgación tomando como material de divulgación la presentación corporativa, la cual incluye los siguientes temas:

- Presentación de la empresa, actividades y estructura organizacional, generalidades.	SI* x NO *Se deben adjuntar la evaluación correspondiente.
- Políticas Corporativas (HSEQ, No alcohol, drogas y tabaquismo, Seguridad Vial, Derechos Humanos, No Acoso Laboral, Cliente).	
- Presentación del Sistema Integrado de Gestión.	
- Control y distribución de documentación.	
- Aspectos legales en seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.	
- Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales.	
- Peligros para la Seguridad y Salud en el Trabajo presentes en la labor, así como sus medidas de prevención y control.	
- Formación prevención peligros de orden público en la zona.	
- Aspecto e Impactos Ambientales presentes en la labor, así como sus medidas de prevención y control.	
- Uso adecuado y mantenimiento de los Elementos de Protección Personal.	
- Programas del Sistema Integrado de Gestión (Gestión de Riesgos, Programas Vigilancia Epidemiológica).	
- Plan estratégico de seguridad vial (PSEV) y Gestión Ambiental.	
- Reglamento de higiene y seguridad industrial (ARL de la empresa).	
- Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.	
- Comité de convivencia laboral.	
- Planes de emergencia en la empresa y procedimiento en caso de accidente de trabajo	
- Funciones y Responsabilidades especificas en HSE de acuerdo a su cargo, descritas en el Manual de Funciones y Descripción del Puesto de Trabajo.	

Dictada por:	HEIDY BETANCOURT DIAZ	DIRECTOR SIG	
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Recibida por:	CHRISTIAN GIL	DIRECTOR DE PROYECTOS	Christian Gil
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Se le han notificado los riesgos a los cuales está expuesto al realizar su labor y las medidas de prevención que debe cumplir en el desarrollo de las mismas. Así mismo, declara que ha comprendido, le han evaluado a satisfacción, todos los temas tratados y es consciente de la importancia que tiene que cumplir con todas las disposiciones y normas establecidas por la empresa.	SI	X	NO	

Dictada por:	HEIDY BETANCOURT DIAZ	DIRECTOR SIG	
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Recibida por:	CHRISTIAN GIL	DIRECTOR DE PROYECTOS	Christian Gil
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

INDUCCIÓN DE GESTIÓN HUMANA

Se ha socializado y entregado al trabajador el Contrato de Trabajo firmado por las partes dando a conocer especialmente las siguientes condiciones de trabajo: Jefe inmediato y conducto regular, Horarios trabajo (ingreso, salida, almuerzo y descansos), Sitios y horas de descanso, Salarios y formas de pago, Turnos de trabajo de la empresa (si aplica).	SI	x	NO	
Se ha socializado al trabajador los Medios de transporte para llegar a la empresa (si aplica), Permisos personales y calamidad doméstica y presentación personal.	SI	x	NO	
Se ha entregado y socializado con el trabajador el Manual de Funciones y Descripción del Puesto de Trabajo.	SI	x	NO	
Se ha realizado la Presentación al jefe inmediato y compañeros.	SI	x	NO	
Se ha socializado el Reglamento Interno de Trabajo (especialmente derechos y deberes del trabajador y faltas graves).	SI	x	NO	
Se ha verificado la conformidad de las afiliaciones de la EPS y Fondo de Pensiones, indicados por el trabajador. Se ha dado a conocer la ARL junto con la entrega del carné. Se ha dado a conocer la Caja de Compensación Familiar a la cual la empresa se encuentra afiliada. Se han entregado las copias de las afiliaciones de la seguridad social respectivas.	SI	x	NO	
Se ha socializado con el trabajador las recomendaciones del concepto de aptitud laboral resultado del examen médico de ingreso y el trabajador se compromete a cumplir con las recomendaciones médicas.	SI	x	NO	
Se ha entregado el carné de identificación de la empresa.	SI	x	NO	

Dictada por:			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Recibida por:	CHRISTIAN GIL	DIRECTOR DE PROYECTOS	Christian Gil
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

Powered by CamScanner

incopav	INSCRIPCIÓN VOLUNTARIA DE BRIGADAS		
	Código: SIG-PL-03 R-02	Versión: 1	Fecha de emisión: 02/12/2019

FECHA: 11-09-2023 UBICACIÓN / PROYECTO: Quetame / 2269-2029

INFORMACION GENERAL

NOMBRES: JOSE AURELIO APELLIDOS: DIAZ VELASQUEZ

CEDULA No.: 7A856439 EDAD 43 GENERO F/M M

CARGO ACTUAL: Inspector civil No. CELULAR: 3235909593 No. TELEFONO:

CONDUCE VEHICULO SI ( ) NO ( ) PASE No. CATEGORIA:

EN CASO DE EMERGENCIA

AVISAR A: 310 Ximena Lopez TELEFONO DE CONTACTO: 3104095656

EPS: ARL: RH:

INFORMACION CONOCIMIENTOS Y HABITOS

¿HA PERTENECIDO A BRIGADAS DE EMERGENCIA ANTES? SI (X) NO ( ) CUAL:

PRIMEROS AUXILIOS (X) CONTROL DE INCENDIOS ( ) EVACUACION Y RESCATE ( ) ANTIDERRAME ( )

GRUPOS DE SOCORRO Y/O BRIGADAS EN OTRAS EMPRESAS A LOS QUE HAYA PERTENECIDO

NOMBRE	CIUDAD O EMPRESA	CARGO EN EL GRUPO	TIEMPO EN MESES
Diaz Ingeniería	Coveñas	Topógrafo	20 Meses

CAPACITACIÓN - CURSOS O FORMACIÓN QUE HA REALIZADO

CURSO	DURACIÓN (HORAS)	TIENE CERTIFICADO	CURSO	DURACIÓN (HORAS)	TIENE CERTIFICADO
Primeros Auxilios	20	SI	Primeros Auk	10	SI

*SI TIENE REGISTROS DE CAPACITACIÓN FAVOR ANEXAR**

¿HA PARTICIPADO EN SIMULCROS? SI (X) NO ( ) DE QUE TIPO:

¿PRACTICA ALGUN DEPORTE? SI ( ) NO ( ) FRECUENCIA:

RESTRICCIONES

ALERGIAS: ENFERMEDADES CRÓNICAS:

TOMA ALGUN MEDICAMENTO SI ( ) NO (X) CUAL:

SUFRE DE ALGUNA FOBIA: (P.E. SANGRE, ALTURAS, ESPACIOS CERRADOS, ETC)

SELECCIÓN

¿A CUAL BRIGADA DESEA PERETENECER?

PRIMEROS AUXILIOS (X) CONTROL DE INCENDIOS ( ) EVACUACION Y RESCATE ( ) ANTIDERRAME ( )

POR MEDIO DEL PRESENTE EXPRESO MI DESEO EN PARTICIPAR VOLUNTARIAMENTE A LA BRIGADA DE EMERGENCIA DE LA ORGANIZACION

JOSE AURELIO DIAZ V

NOMBRE

C.C.: 7A.856439

FIRMA

NOTIFICACION Y ACEPTACIÓN DEL JEFE INMEDIATO

ESTOY ENTERADO(A) Y ACEPTO LA PARTICIPACIÓN DE MI SUBORDINADO EN LA BRIGADA DE EMERGENCIA DE INCOPAV

Bernardo Castaneda

NOMBRE

CARGO: Res. de Obra

FIRMA

APROBACIÓN Y CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA / ÁREA MEDICINA

SIN RESTRICCIONES PARA COMPONER LA BRIGADA DE EMERGENCIAS ( )

CON RESTRICCIONES PARA COMPONER LA BRIGADA DE EMERGENCIAS ( )

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	INSCRIPCIÓN VOLUNTARIA DE BRIGADAS		
	Código: SIG-PL-03 R-02	Versión: 1	Fecha de emisión: 02/12/2019

FECHA: 19-01-2023 UBICACIÓN / PROYECTO: Gungabal / 2269 - 2021

INFORMACION GENERAL

NOMBRES: Loreley Lades. Mendoza. APELLIDOS: Lades. Mendoza.

CEDULA No.: 64920236. EDAD 54. GENERO F/M: Femenino

CARGO ACTUAL: Guia Vial. No. CELULAR: 3003213249 No. TELEFONO: 3003213249

CONDUCE VEHICULO: SI ( ) NO (x) PASE No. _____ CATEGORIA: _____

EN CASO DE EMERGENCIA

AVISAR A: Marcia. Siniestra. L. TELEFONO DE CONTACTO: 3173397137

EPS: caja capi ARL: Sura. RH: O+

INFORMACION CONOCIMIENTOS Y HABITOS

¿HA PERTENECIDO A BRIGADAS DE EMERGENCIA ANTES? SI (x) NO ( ) CUAL:

PRIMEROS AUXILIOS (X) CONTROL DE INCENDIOS ( ) EVACUACION Y RESCATE ( ) ANTIDERRAME ( )

GRUPOS DE SOCORRO Y/O BRIGADAS EN OTRAS EMPRESAS A LOS QUE HAYA PERTENECIDO

NOMBRE	CIUDAD O EMPRESA	CARGO EN EL GRUPO	TIEMPO EN MESES
Defensa civil. c.	coveñas.	Presidente.	3 años.

CAPACITACIÓN - CURSOS O FORMACIÓN QUE HA REALIZADO

CURSO	DURACIÓN (HORAS)	TIENE CERTIFICADO	CURSO	DURACIÓN (HORAS)	TIENE CERTIFICADO
Primeros Auxilio.	60. H.	si			
Soporte Vital.	120 H	Si			

*SI TIENE REGISTROS DE CAPACITACIÓN FAVOR ANEXAR**

¿HA PARTICIPADO EN SIMULCROS? SI (si) NO ( ) DE QUE TIPO: Ocensa. Hidrocarburo.

¿PRACTICA ALGUN DEPORTE? SI (x) NO ( ) FRECUENCIA: _____

RESTRICCIONES

ALERGIAS: Suscapina Compuesta ENFERMEDADES CRÓNICAS: _____

TOMA ALGUN MEDICAMENTO SI ( ) NO ( ) CUAL: _____

SUFRE DE ALGUNA FOBIA: (P.E. SANGRE, ALTURAS, ESPACIOS CERRADOS, ETC)

SELECCIÓN

¿A CUAL BRIGADA DESEA PERETENECER?

PRIMEROS AUXILIOS (x) CONTROL DE INCENDIOS ( ) EVACUACION Y RESCATE ( ) ANTIDERRAME ( )

POR MEDIO DEL PRESENTE EXPRESO MI DESEO EN PARTICIPAR VOLUNTARIAMENTE A LA BRIGADA DE EMERGENCIA DE LA ORGANIZACION

Loreley Lades. M. _____

NOMBRE FIRMA

c.c.: 64920236

NOTIFICACION Y ACEPTACIÓN DEL JEFE INMEDIATO

ESTOY ENTERADO(A) Y ACEPTO LA PARTICIPACIÓN DE MI SUBORDINADO EN LA BRIGADA DE EMERGENCIA DE INCOPAV:

Bernardo Castaneda _____

NOMBRE FIRMA

CARGO: Res. de Obra

APROBACIÓN Y CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA / ÁREA MEDICINA

SIN RESTRICCIONES PARA COMPONER LA BRIGADA DE EMERGENCIAS ( )

CON RESTRICCIONES PARA COMPONER LA BRIGADA DE EMERGENCIAS ( )

OBSERVACIONES _____

Powered by CamScanner

incopav	INSCRIPCIÓN VOLUNTARIA DE BRIGADAS		
	Código: SIG-PL-03 R-02	Versión: 1	Fecha de emisión: 02/12/2019

FECHA: 19-09-2021 UBICACIÓN / PROYECTO: 2264-2021

INFORMACION GENERAL

NOMBRES: WILLIAM LUNA APELLIDOS: OYOLA

CEDULA No.: 92450611 EDAD: 39 GENERO F/M: MASCULINO

CARGO ACTUAL: OFICIAL No. CELULAR: 3136366639 No. TELEFONO:

CONDUCE VEHICULO: SI (X) NO ( ) PASE No. X CATEGORIA:

EN CASO DE EMERGENCIA

AVISAR A: VALDYS MARROQUIN TELEFONO DE CONTACTO: 3215621264

EPS: MUTUAL SER. ARL: SURA RH: O+

INFORMACION CONOCIMIENTOS Y HABITOS

¿HA PERTENECIDO A BRIGADAS DE EMERGENCIA ANTES? SI ( ) NO (X) CUAL:

PRIMEROS AUXILIOS ( ) CONTROL DE INCENDIOS ( ) EVACUACION Y RESCATE ( ) ANTIDERRAME ( )

GRUPOS DE SOCORRO Y/O BRIGADAS EN OTRAS EMPRESAS A LOS QUE HAYA PERTENECIDO

NOMBRE	CIUDAD O EMPRESA	CARGO EN EL GRUPO	TIEMPO EN MESES

CAPACITACIÓN - CURSOS O FORMACIÓN QUE HA REALIZADO

CURSO	DURACIÓN (HORAS)	TIENE CERTIFICADO	CURSO	DURACIÓN (HORAS)	TIENE CERTIFICADO

*SI TIENE REGISTROS DE CAPACITACIÓN FAVOR ANEXAR**

¿HA PARTICIPADO EN SIMULCROS? SI (X) NO ( ) DE QUE TIPO: Emergencias

¿PRACTICA ALGUN DEPORTE? SI ( ) NO ( ) FRECUENCIA:

RESTRICCIONES

ALERGIAS: ENFERMEDADES CRÓNICAS:

TOMA ALGUN MEDICAMENTO SI ( ) NO (X) CUAL:

SUFRE DE ALGUNA FOBIA: (P.E. SANGRE, ALTURAS, ESPACIOS CERRADOS, ETC)

SELECCIÓN

¿A CUAL BRIGADA DESEA PERETENECER?

PRIMEROS AUXILIOS ( ) CONTROL DE INCENDIOS ( ) EVACUACION Y RESCATE ( ) ANTIDERRAME (X)

POR MEDIO DEL PRESENTE EXPRESO MI DESEO EN PARTICIPAR VOLUNTARIAMENTE A LA BRIGADA DE EMERGENCIA DE LA ORGANIZACION

WILLIAM LUNA — NOMBRE — FIRMA

C.C: 92450611

NOTIFICACION Y ACEPTACIÓN DEL JEFE INMEDIATO

ESTOY ENTERADO(A) Y ACEPTO LA PARTICIPACIÓN DE MI SUBORDINADO EN LA BRIGADA DE EMERGENCIA DE INCOPAV:

Bernardo Castañeda — NOMBRE — FIRMA

CARGO: Res de Obra

APROBACIÓN Y CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA / ÁREA MEDICINA

SIN RESTRICCIONES PARA COMPONER LA BRIGADA DE EMERGENCIAS ( )

CON RESTRICCIONES PARA COMPONER LA BRIGADA DE EMERGENCIAS ( )

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	INSCRIPCIÓN VOLUNTARIA DE BRIGADAS		
	Código: SIG-PL-03 R-02	Versión: 1	Fecha de emisión: 02/12/2019

FECHA: 14-01-2025 UBICACIÓN / PROYECTO: Covenas / ZKA-2200

INFORMACION GENERAL

NOMBRES: Edwin Jose Suarez APELLIDOS: De Hoyos

CEDULA No.: 1131-107444 EDAD 33 GENERO F/M: M

CARGO ACTUAL: Ayudante No. CELULAR: 3001028162 No. TELEFONO:

CONDUCE VEHICULO: SI ( ) NO (X) PASE No. CATEGORIA:

EN CASO DE EMERGENCIA

AVISAR A: TELEFONO DE CONTACTO:

EPS: Salud total ARL: SURA RH: O+

INFORMACION CONOCIMIENTOS Y HABITOS

¿HA PERTENECIDO A BRIGADAS DE EMERGENCIA ANTES? SI (X) NO ( ) CUAL:

PRIMEROS AUXILIOS (X) CONTROL DE INCENDIOS ( ) EVACUACION Y RESCATE ( ) ANTIDERRAME ( )

GRUPOS DE SOCORRO Y/O BRIGADAS EN OTRAS EMPRESAS A LOS QUE HAYA PERTENECIDO

NOMBRE	CIUDAD O EMPRESA	CARGO EN EL GRUPO	TIEMPO EN MESES
Primeros Auxilios	Covenas	Camillero	03 Meses

CAPACITACIÓN - CURSOS O FORMACIÓN QUE HA REALIZADO

CURSO	DURACIÓN (HORAS)	TIENE CERTIFICADO	CURSO	DURACIÓN (HORAS)	TIENE CERTIFICADO

*SI TIENE REGISTROS DE CAPACITACIÓN FAVOR ANEXAR**

¿HA PARTICIPADO EN SIMULCROS? SI (X) NO ( ) DE QUE TIPO: Emergencia

¿PRACTICA ALGUN DEPORTE? SI (X) NO ( ) FRECUENCIA: 1 vez a la Semana

RESTRICCIONES

ALERGIAS: ENFERMEDADES CRÓNICAS:

TOMA ALGUN MEDICAMENTO SI ( ) NO (X) CUAL:

SUFRE DE ALGUNA FOBIA: (P.E. SANGRE, ALTURAS, ESPACIOS CERRADOS, ETC)

SELECCIÓN

¿A CUAL BRIGADA DESEA PERETENECER?

PRIMEROS AUXILIOS ( ) CONTROL DE INCENDIOS ( ) EVACUACION Y RESCATE ( ) ANTIDERRAME (X)

POR MEDIO DEL PRESENTE EXPRESO MI DESEO EN PARTICIPAR VOLUNTARIAMENTE A LA BRIGADA DE EMERGENCIA DE LA ORGANIZACION

Edwin Jose Suarez — NOMBRE

c.c.: 1131 107 444

Edwin — FIRMA

NOTIFICACION Y ACEPTACIÓN DEL JEFE INMEDIATO

ESTOY ENTERADO(A) Y ACEPTO LA PARTICIPACIÓN DE MI SUBORDINADO EN LA BRIGADA DE EMERGENCIA DE INCOPAV

Bernardo Castaneda — NOMBRE

CARGO: Res. de Obra

FIRMA

APROBACIÓN Y CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA / ÁREA MEDICINA

SIN RESTRICCIONES PARA COMPONER LA BRIGADA DE EMERGENCIAS ( )

CON RESTRICCIONES PARA COMPONER LA BRIGADA DE EMERGENCIAS ( )

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	INSCRIPCIÓN VOLUNTARIA DE BRIGADAS		
	Código: SIG-PL-03 R-02	Versión: 1	Fecha de emisión: 02/12/2019

FECHA: 19-09-2023 UBICACIÓN / PROYECTO: Compras / 2264-2023

INFORMACION GENERAL

NOMBRES: Arnaldo APELLIDOS: Navarro Padilla

CEDULA No.: 97519756 EDAD 50 GENERO F/M: M

CARGO ACTUAL: Obrero No. CELULAR: 3205424706 No. TELEFONO:

CONDUCE VEHICULO: SI ( ) NO (X) PASE No. CATEGORIA:

EN CASO DE EMERGENCIA

AVISAR A: Yaneris Cantero TELEFONO DE CONTACTO: 3023820610

EPS: Coju Copi ARL: Sura RH: O+

INFORMACION CONOCIMIENTOS Y HABITOS

¿HA PERTENECIDO A BRIGADAS DE EMERGENCIA ANTES? SI ( ) NO (X) CUAL:

PRIMEROS AUXILIOS ( ) CONTROL DE INCENDIOS ( ) EVACUACION Y RESCATE ( ) ANTIDERRAME ( )

GRUPOS DE SOCORRO Y/O BRIGADAS EN OTRAS EMPRESAS A LOS QUE HAYA PERTENECIDO

NOMBRE	CIUDAD O EMPRESA	CARGO EN EL GRUPO	TIEMPO EN MESES

CAPACITACIÓN - CURSOS O FORMACIÓN QUE HA REALIZADO

CURSO	DURACIÓN (HORAS)	TIENE CERTIFICADO	CURSO	DURACIÓN (HORAS)	TIENE CERTIFICADO

*SI TIENE REGISTROS DE CAPACITACIÓN FAVOR ANEXAR**

¿HA PARTICIPADO EN SIMULCROS? SI ( ) NO (X) DE QUE TIPO:

¿PRACTICA ALGUN DEPORTE? SI ( ) NO (X) FRECUENCIA:

RESTRICCIONES

ALERGIAS: ENFERMEDADES CRÓNICAS:

TOMA ALGUN MEDICAMENTO SI ( ) NO (X) CUAL:

SUFRE DE ALGUNA FOBIA: (P.E. SANGRE, ALTURAS, ESPACIOS CERRADOS, ETC)

SELECCIÓN

¿A CUAL BRIGADA DESEA PERETENECER?

PRIMEROS AUXILIOS ( ) CONTROL DE INCENDIOS (X) EVACUACION Y RESCATE ( ) ANTIDERRAME ( )

POR MEDIO DEL PRESENTE EXPRESO MI DESEO EN PARTICIPAR VOLUNTARIAMENTE A LA BRIGADA DE EMERGENCIA DE LA ORGANIZACION

Arnaldo Navarro P — NOMBRE

c.c.: 97519750

Arnaldo — FIRMA

NOTIFICACION Y ACEPTACIÓN DEL JEFE INMEDIATO

ESTOY ENTERADO(A) Y ACEPTO LA PARTICIPACIÓN DE MI SUBORDINADO EN LA BRIGADA DE EMERGENCIA DE INCOPAV

Bernardo Castaneda — NOMBRE

CARGO: Res. de Obra

FIRMA

APROBACIÓN Y CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA / ÁREA MEDICINA

SIN RESTRICCIONES PARA COMPONER LA BRIGADA DE EMERGENCIAS ( )

CON RESTRICCIONES PARA COMPONER LA BRIGADA DE EMERGENCIAS ( )

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	INSCRIPCIÓN VOLUNTARIA DE BRIGADAS		
	Código: SIG-PL-03 R-02	Versión: 1	Fecha de emisión: 02/12/2019

FECHA: 27-01-2023 UBICACIÓN / PROYECTO: Coveñas / 2269-2021

INFORMACION GENERAL

NOMBRES: Hedardo Suarez Z APELLIDOS: Zuñiga

CEDULA No.: 4020770 EDAD 56 GENERO F/M: M

CARGO ACTUAL: Operador No. CELULAR: 3135956962 No. TELEFONO:

CONDUCE VEHICULO: SI (X) NO ( ) PASE No. _____ CATEGORIA: 2

EN CASO DE EMERGENCIA

AVISAR A: Marina Vides TELEFONO DE CONTACTO: 3145259901

EPS: _____ ARL: Sura RH: O+

INFORMACION CONOCIMIENTOS Y HABITOS

¿HA PERTENECIDO A BRIGADAS DE EMERGENCIA ANTES? SI (X) NO ( ) CUAL:

PRIMEROS AUXILIOS (X) CONTROL DE INCENDIOS (X) EVACUACION Y RESCATE ( ) ANTIDERRAME ( )

GRUPOS DE SOCORRO Y/O BRIGADAS EN OTRAS EMPRESAS A LOS QUE HAYA PERTENECIDO

NOMBRE	CIUDAD O EMPRESA	CARGO EN EL GRUPO	TIEMPO EN MESES
	ZH	Rescatista	6 meses

CAPACITACIÓN - CURSOS O FORMACIÓN QUE HA REALIZADO

CURSO	DURACIÓN (HORAS)	TIENE CERTIFICADO	CURSO	DURACIÓN (HORAS)	TIENE CERTIFICADO

*SI TIENE REGISTROS DE CAPACITACIÓN FAVOR ANEXAR**

¿HA PARTICIPADO EN SIMULCROS? SI ( ) NO ( ) DE QUE TIPO: _____

¿PRACTICA ALGUN DEPORTE? SI ( ) NO (X) FRECUENCIA: _____

RESTRICCIONES

ALERGIAS: _____ ENFERMEDADES CRÓNICAS: _____

TOMA ALGUN MEDICAMENTO SI ( ) NO (X) CUAL: _____

SUFRE DE ALGUNA FOBIA: (P.E. SANGRE, ALTURAS, ESPACIOS CERRADOS, ETC)

SELECCIÓN

¿A CUAL BRIGADA DESEA PERETENECER?

PRIMEROS AUXILIOS ( ) CONTROL DE INCENDIOS (X) EVACUACION Y RESCATE ( ) ANTIDERRAME ( )

POR MEDIO DEL PRESENTE EXPRESO MI DESEO EN PARTICIPAR VOLUNTARIAMENTE A LA BRIGADA DE EMERGENCIA DE LA ORGANIZACION

Hedardo Suarez Z — NOMBRE — FIRMA

c.c.: 4020770

NOTIFICACION Y ACEPTACIÓN DEL JEFE INMEDIATO

ESTOY ENTERADO(A) Y ACEPTO LA PARTICIPACIÓN DE MI SUBORDINADO EN LA BRIGADA DE EMERGENCIA DE INCOPAV:

Bernardo Castaneda — NOMBRE — FIRMA

CARGO: Res. de Obra

APROBACIÓN Y CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA / ÁREA MEDICINA

SIN RESTRICCIONES PARA COMPONER LA BRIGADA DE EMERGENCIAS ( )

CON RESTRICCIONES PARA COMPONER LA BRIGADA DE EMERGENCIAS ( )

OBSERVACIONES _____

Powered by CamScanner

incopav	INSCRIPCIÓN VOLUNTARIA DE BRIGADAS		
	Código: SIG-PL-03 R-02	Versión: 1	Fecha de emisión: 02/12/2019

FECHA: 19-01-2023 UBICACIÓN / PROYECTO: Covinas / 2269-2021

INFORMACION GENERAL

NOMBRES: Jaime Andres APELLIDOS: Ospina Laban

CEDULA No.: 1131107117 EDAD 31 GENERO F/M: M

CARGO ACTUAL: Obrero No. CELULAR: 3042300014 No. TELEFONO: 3042300014

CONDUCE VEHICULO: SI (X) NO ( ) PASE No. 1131107117 CATEGORIA: A2

EN CASO DE EMERGENCIA

AVISAR A: Yenifer Ruz Surez TELEFONO DE CONTACTO: 3043944403

EPS: Sura ARL: colpatria RH: o+

INFORMACION CONOCIMIENTOS Y HABITOS

¿HA PERTENECIDO A BRIGADAS DE EMERGENCIA ANTES? SI (X) NO ( ) CUAL:

PRIMEROS AUXILIOS ( ) CONTROL DE INCENDIOS ( ) EVACUACION Y RESCATE (X) ANTIDERRAME ( )

GRUPOS DE SOCORRO Y/O BRIGADAS EN OTRAS EMPRESAS A LOS QUE HAYA PERTENECIDO

NOMBRE	CIUDAD O EMPRESA	CARGO EN EL GRUPO	TIEMPO EN MESES
Segunda Atempi	Medellin	Recarga	2 AÑOS 4 Meses

CAPACITACIÓN - CURSOS O FORMACIÓN QUE HA REALIZADO

CURSO	DURACIÓN (HORAS)	TIENE CERTIFICADO	CURSO	DURACIÓN (HORAS)	TIENE CERTIFICADO

*SI TIENE REGISTROS DE CAPACITACIÓN FAVOR ANEXAR**

¿HA PARTICIPADO EN SIMULCROS? SI (X) NO ( ) DE QUE TIPO: Evacuation

¿PRACTICA ALGUN DEPORTE? SI (X) NO ( ) FRECUENCIA: 1 Vez A la Semana

RESTRICCIONES

ALERGIAS: ENFERMEDADES CRÓNICAS:

TOMA ALGUN MEDICAMENTO SI ( ) NO (X) CUAL:

SUFRE DE ALGUNA FOBIA: (P.E. SANGRE, ALTURAS, ESPACIOS CERRADOS, ETC)

SELECCIÓN

¿A CUAL BRIGADA DESEA PERETENECER?

PRIMEROS AUXILIOS ( ) CONTROL DE INCENDIOS ( ) EVACUACION Y RESCATE (X) ANTIDERRAME ( )

POR MEDIO DEL PRESENTE EXPRESO MI DESEO EN PARTICIPAR VOLUNTARIAMENTE A LA BRIGADA DE EMERGENCIA DE LA ORGANIZACION

Jaime Andres Ospina

NOMBRE Jaime Andres FIRMA

C.C.: 1131107117

NOTIFICACION Y ACEPTACIÓN DEL JEFE INMEDIATO

ESTOY ENTERADO(A) Y ACEPTO LA PARTICIPACIÓN DE MI SUBORDINADO EN LA BRIGADA DE EMERGENCIA DE INCOPAV:

Bernardo Castañeda

NOMBRE FIRMA

CARGO: Res. de Obra

APROBACIÓN Y CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA / ÁREA MEDICINA

SIN RESTRICCIONES PARA COMPONER LA BRIGADA DE EMERGENCIAS ( )

CON RESTRICCIONES PARA COMPONER LA BRIGADA DE EMERGENCIAS ( )

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

incopav	INSCRIPCIÓN VOLUNTARIA DE BRIGADAS		
	Código: SIG-PL-03 R-02	Versión: 1	Fecha de emisión: 02/12/2019

FECHA: 19-01-2023 UBICACIÓN / PROYECTO: Covenas / 2269 - 2021

INFORMACION GENERAL

NOMBRES: Adrian Fernando APELLIDOS: Ortiz Villeo

CEDULA No.: 1113110426 EDAD 22 GENERO F/M: M

CARGO ACTUAL: Inspector Hse No. CELULAR: 3127950288 No. TELEFONO:

CONDUCE VEHICULO: SI ( ) NO (X) PASE No. CATEGORIA:

EN CASO DE EMERGENCIA

AVISAR A: Maribel Villeo TELEFONO DE CONTACTO: 3174865332

EPS: Nueva Eps ARL: Sura RH: A+

INFORMACION CONOCIMIENTOS Y HABITOS

¿HA PERTENECIDO A BRIGADAS DE EMERGENCIA ANTES? SI ( ) NO (X) CUAL:

PRIMEROS AUXILIOS ( ) CONTROL DE INCENDIOS ( ) EVACUACION Y RESCATE ( ) ANTIDERRAME ( )

GRUPOS DE SOCORRO Y/O BRIGADAS EN OTRAS EMPRESAS A LOS QUE HAYA PERTENECIDO

NOMBRE	CIUDAD O EMPRESA	CARGO EN EL GRUPO	TIEMPO EN MESES

CAPACITACIÓN - CURSOS O FORMACIÓN QUE HA REALIZADO

CURSO	DURACIÓN (HORAS)	TIENE CERTIFICADO	CURSO	DURACIÓN (HORAS)	TIENE CERTIFICADO

*SI TIENE REGISTROS DE CAPACITACIÓN FAVOR ANEXAR**

¿HA PARTICIPADO EN SIMULCROS? SI ( ) NO (X) DE QUE TIPO:

¿PRACTICA ALGUN DEPORTE? SI (X) NO ( ) FRECUENCIA: 1 Semana

RESTRICCIONES

ALERGIAS: ENFERMEDADES CRÓNICAS:

TOMA ALGUN MEDICAMENTO SI ( ) NO (X) CUAL:

SUFRE DE ALGUNA FOBIA: (P.E. SANGRE, ALTURAS, ESPACIOS CERRADOS, ETC)

SELECCIÓN

¿A CUAL BRIGADA DESEA PERETENECER?

PRIMEROS AUXILIOS ( ) CONTROL DE INCENDIOS ( ) EVACUACION Y RESCATE (X) ANTIDERRAME ( )

POR MEDIO DEL PRESENTE EXPRESO MI DESEO EN PARTICIPAR VOLUNTARIAMENTE A LA BRIGADA DE EMERGENCIA DE LA ORGANIZACION

Adrian Ortiz Villeo — NOMBRE

c.c.: 1113110426

Adrian — FIRMA

NOTIFICACION Y ACEPTACIÓN DEL JEFE INMEDIATO

ESTOY ENTERADO(A) Y ACEPTO LA PARTICIPACIÓN DE MI SUBORDINADO EN LA BRIGADA DE EMERGENCIA DE INCOPAV:

Bernardo Castañeda — NOMBRE

CARGO: Res. de Obra

Bernardo — FIRMA

APROBACIÓN Y CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA / ÁREA MEDICINA

SIN RESTRICCIONES PARA COMPONER LA BRIGADA DE EMERGENCIAS ( )

CON RESTRICCIONES PARA COMPONER LA BRIGADA DE EMERGENCIAS ( )

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

	ENTREGA DOTACION PERSONAL	Código:	FTO.GA.12
		Versión	2
		Fecha:	23/05/2019
		Página:	1

NOMBRE: Diego Luis Quintero Alv2 CEDULA: 1108759636

CARGO: Cadenero de interventoria

YO Diego Luis Quintero Alv2 TRABAJADOR DE INGEVAL SAS CERTIFICO QUE HE RECIBIDO CAPACITACIÓN DEL USO Y CUIDADO DE LA DOTACION Y EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, QUE HE RECIBIDO PARA LA LABOR CONTRATADA En constancia

Firmo Diego Quintero C.C 1108759636 DE Tolu viejo

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	FECHA RECIBIDO	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA ENTREGA
1	1	casco de seguridad	19-01-23	Diego Quintero	Valentina Londoño
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL TRABAJADOR:

" Conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos y utiles que le hayan sido facilitados.....Art 58: 3 CST"

El Trabajador será responsable del buen uso de los elementos aquí relacionados y en caso de perdida, hurto o daño intencional, autoriza el descuento del valor comercial de dicho elemento.

ENTREGA

CARGO NUEVO	1	2	3

APROBADO POR:

OBSERVACIONES:

Valentina Londoño
QUIEN ENTREGA

Diego Quintero
QUIEN RECIBE

Powered by CamScanner

ingeval SAS	ENTREGA DOTACION PERSONAL	Código:	FTO.GA.12
		Versión	2
		Fecha:	23/05/2019
		Página:	1

NOMBRE: Yuliana Patricia Ortiz CEDULA: 49717933

CARGO:

YO Yuliana Patricia Laverde TRABAJADOR DE INGEVAL SAS CERTIFICO QUE HE RECIBIDO CAPACITACION DEL USO Y CUIDADO DE LA DOTACION Y EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, QUE HE RECIBIDO PARA LA LABOR CONTRATADA En constancia

Firma Yuliana CC 49717933 DE Ipar

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	FECHA RECIBIDO	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA ENTREGA
1	1	Casco de seguridad	19-01-23	Yuliana	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL TRABAJADOR:

" Conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos y utiles que le hayan sido facilitados.....Art 58: 3 CST"

El Trabajador será responsable del buen uso de los elementos aquí relacionados y en caso de perdida, hurto o daño intencional, autoriza el descuento del valor comercial de dicho elemento.

ENTREGA CARGO NUEVO [1] [2] [3] **APROBADO POR:**

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

Powered by CamScanner

	ENTREGA DOTACION PERSONAL	Código:	FTO.GA.12
		Versión	2
		Fecha:	23/05/2019
		Página:	1

NOMBRE: Allan Fernando Monroy Pugue

CEDULA: 1.094.246.741

CARGO: Ingeniero Residente

YO Allan Fernando Monroy Pugue TRABAJADOR DE INGEVAL SAS CERTIFICO QUE HE RECIBIDO CAPACITACION DEL USO Y CUIDADO DE LA DOTACION Y EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, QUE HE RECIBIDO PARA LA LABOR CONTRATADA. En constancia

Firmo. _____ C.C. 1094.246.741 DE Pamplona

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	FECHA RECIBIDO	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA ENTREGA
1	1	Casco	23/01/23		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL TRABAJADOR:

" Conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos y utiles que le hayan sido facilitados.....Art 58: 3 CST"

El Trabajador será responsable del buen uso de los elementos aquí relacionados y en caso de perdida, hurto o daño intencional, autoriza el descuento del valor comercial de dicho elemento.

ENTREGA

CARGO NUEVO	1	2	3

APROBADO POR:

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

Powered by CamScanner

incopav	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y/O DOTACIÓN		
	Código: SIG-P-13 R-02	Versión: 7	Fecha de emisión: 10/12/2019

NOMBRE: FERNELO BUHAN **C.C.:** 3804393 **CARGO:** Operario

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 9505CS) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

RESPONSABLE DE ENTREGA (HSE / ADMINISTRADOR):

Los elementos de protección personal EPPs y dotación serán entregados a cada uno de los trabajadores de acuerdo con la Matriz Cargos Vs EPP SIG-P-13 R-03.

Se debe colocar debajo de cada ítem la cantidad entregada a cada colaborador, los espacios en blanco deben ser diligenciados con un guión.

No.	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO DEL TRABAJADOR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL*																														DOTACION**	
			Protección extremidades				Protección extremidades						Protección Cabeza			Protección auditiva		Protección Respiratoria					Protectores faciales					Protección de cuerpo								Otros			
			Calzado antideslizante	Botas de seguridad punteras de acero	Botas Dieléctricas	Botas de caucho	Guantes Carnaza	Guantes Vaqueta cortos	Guantes Vaqueta largos	Guante Nitrilo	Kit Guantes Dieléctricos (Latex Cat. 0)		Casco	Casco Dieléctrico	Cofia	Tapaoido de inserción	Tapaoido de copa	Tapabocas	Tapabocas material particulado	Mascara media cara	Cartuchos para vapores orgánicos	Cartuchos para humos metálicos		Gafas lente claro	Gafas lente oscuro	Gafas lente gris tipo espejo	Careta para esmerilar	Respirador careta para esmerilar	Overol	Camisa	Pantalon	Kits en vaqueta	Kits en PVC	Capa Tyvek	Impermeable de una pieza	Impermeable de camisa y pantalon			Zapatos	
1	10-01-2023	FERNELO B.		X									X			X								X					X								
2																																						
3																																						
4																																						

OBSERVACIONES:

DECLARACIÓN:

Entrega de Elementos de Protección Personal - EPP: El trabajador declara que ha recibido los EPP descritos en este documento. Así mismo, declara que ha recibido la instrucción y/o capacitación procedente referente a naturaleza, normas de uso, conservación y mantenimiento de los EPP, contando con las herramientas válidas y suficientes para preservar la salud propia, del equipo de trabajo y salvaguardar la operación. Al recibir los elementos relacionados certifico conocer el uso de los mismos y me comprometo a utilizarlos como técnicamente corresponde y de manera permanente durante mi jornada laboral.

Entrega de dotación: Por medio de la presente dejo constancia expresa y escrita del recibido total y a entera satisfacción de mi dotación legal, al recibir los elementos relacionados certifico conocer el uso de los mismos y me comprometo a utilizarlo como técnicamente corresponde y de manera permanentemente. Por lo anterior acepto que es adecuada para desempeñar mis funciones y doy fe del cabal cumplimiento de INCOPAV S.A. de las obligaciones contenidas en el artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo o de la obligación contenida en los pliegos de la empresa cliente y concordantes, en su caso.

Powered by CamScanner

incopav	CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y/O DOTACIÓN		
	Código: SIG-P-13 R-02	Versión: 7	Fecha de emisión: 10/12/2019

NOMBRE: Juan Pablo Rodriguez **C.C.:** 1122020897 **CARGO:** Operador

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA

RESPONSABLE DE ENTREGA (HSE / ADMINISTRADOR): Adrian Ochoa

Los elementos de protección personal EPPs y dotación serán entregados a cada uno de los trabajadores de acuerdo con la Matriz Cargos Vs EPP SIG-P-13 R-03.

Se debe colocar debajo de cada ítem la cantidad entregada a cada colaborador, los espacios en blanco deben ser diligenciados con un guión.

No.	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO DEL TRABAJADOR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL*																															DOTACIÓN**
			Protección extremidades				Protección extremidades					Protección Cabeza			Protección auditiva		Protección Respiratoria					Protectores faciales					Protección de cuerpo								Otros		
			Calzado antideslizante	Botas de seguridad puntera de acero	Botas Dieléctricas	Botas de caucho	Guantes Carnaza	Guantes Vaqueta bordos	Guantes Vaqueta largos	Guante Nitrilo	Xseo (Latex Cal. 85)	Casco	Casco Dieléctrico	Cofia	Tapaoido de inserción	Tapaoido de copa	Tapabocas	Tapabocas material particulado	Máscara media cara	Cartuchos para vapores orgánicos	Cartuchos para humos metálicos	Gafas lente claro	Gafas lente oscuro	Gafas lente gris (tipo espejo)	Careta para esmerilar	Repuesto careta para esmerilar	Overol	Camisa	Pantalón	Peto en vaqueta	Peto en PVC	Traje Tivek	Impermeable de carga	Impermeable de camisa y pantalón			Vestido
1	19-ene-23			X								X			X								X					X	X							
2																																				
3																																				
4																																				

OBSERVACIONES:

DECLARACIÓN:

***Entrega de Elementos de Protección Personal - EPP:** El trabajador declara que ha recibido los EPP descritos en este documento. Así mismo, declara que ha recibido la instrucción y/o capacitación procedente referente a naturaleza, normas de uso, conservación y mantenimiento de los EPP, contando con las herramientas válidas y suficientes para preservar la salud propia, del equipo de trabajo y salvaguardar la operación. Al recibir los elementos relacionados certifico conocer uso de los mismos y me comprometo a utilizarlos como técnicamente corresponde y de manera permanente durante mi jornada laboral.

****Entrega de dotación:** Por medio de la presente dejo constancia expresa y escrita del recibido total y a entera satisfacción de mi dotación legal; al recibir los elementos relacionados certifico conocer el uso de los mismos y me comprometo a utiliza como técnicamente corresponde y de manera permanentemente. Por lo anterior acepto que es adecuada para desempeñar mis funciones y doy fe del cabal cumplimiento de INCOPAV S.A. de las obligaciones contenidas en el artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo o de la obligación contenida en los pliegos de la empresa cliente y concordantes, en su caso

Powered by CamScanner

ingeval S.A.S.	**ASISTENCIA CHARLAS DE SEGURIDAD (PREOPERACIONAL)**	**Codigo: FTO.GI.30** **Version No 2** **Fecha: 04/03/2022** **pagina 1/1**
TEMAS TRATADOS:	Divulgación Misión - Visión.	

CONTRATO # 2263	OBJETO:	INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA RUTA (90SC02) EN LOS
FECHA	17/01/23	
EXPOSITOR:	Vanessa Sanchez	
LUGAR:	Oficina.	

No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Yunaira [illegible]	49717933	TOPOGRAFO	
2	Diego Luis Quintero [illegible]	1108754636	cadenero	
3	Vanessa Sanchez	1.131.108.761	Insp. SISO	
4	[illegible]	1.115.877.751	Profesional [illegible]	
5	Karen Arias Arrieta	1113110716O	Secretaria	
6	Eliana Villalba	1121940754	Residente auxiliar	

Powered by CamScanner

ingeval S.A.S.	**ASISTENCIA CHARLAS DE SEGURIDAD (PREOPERACIONAL)**	**Codigo: FTO.GI.30** **Version No 2** **Fecha: 04/03/2022** **pagina 1/1**
TEMAS TRATADOS:	Divulgación Política Integral - Política de Convivencia laboral y Política de Prevención de alcohol y drogas.	

CONTRATO # 2263	OBJETO:	INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA RUTA (90SC02) EN LOS
FECHA	16-01-23	
EXPOSITOR:	Vanessa Sanchez Benitez	
LUGAR:	Oficina.	

No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Gliana Villalba T	1121949754	Residente auxiliar	
2	Karen Diaz A.	1131167160	Secretaria	
3	Diego Luis Quintero Ruiz	1108757636	cadenero	Diego Quintero
4	Yurimina Ortiz	49717933	topografa	
5	Vanessa Sanchez B	1.131.708.761	Insp. SISO	

Powered by CamScanner

incopav	CONTROL DE ASISTENCIA		
	Código No. AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	Fecha de emisión: 01/ 08/ 2013

PROYECTO: 2204-2021

LUGAR / FRENTE: Guayabal.

NOMBRE DEL EVENTO: Protección Lumbar y manos

FECHA: 03-01-2023 DURACIÓN: 10 min

DICTADO POR:

NOMBRE: Adrian Ortiz Villero

CARGO / ENTIDAD: Inspector HSE

FIRMA: Adrian F.

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☑ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	Trabajadora Social	1123411378	
2	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	Residente SSTMA	11052258	
3	ADRIAN ORTIZ VILLERO	INSPECTOR HSE	1193110426	
4	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	INGENIERA AUXILIAR	45561087	
5	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	OBRERO	1131107117	
6	ARNULFO NAVARRO PADILLA	OBRERO	92519256	
7	LORELEY LADEUS MENDOZA	GUIA VIAL	64920236	
8	WILLIAM LUNA URANGO	OBRERO	92450611	
9	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	OBRERO	1131107444	
10	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	OPERADOR	40020770	
11	FRANCISCO CASTRO	CONDUCTOR	4052850	
12	DIEGO RESTREPO MESTRA	OPERADOR	100342991	
13	JUAN FONSECA SOTEL	CONDUCTOR	79915484	
14	JOSE DIAZ VELASQUEZ	TOPOGRAFO	74856439	
15	YESID TORRES	CONDUCTOR	13525591	
16	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	CONDUCTOR	15617821	
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	CONTROL DE ASISTENCIA		
	Código No. AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	Fecha de emisión: 01/ 08/ 2013

PROYECTO: 2269-2021

LUGAR / FRENTE: Bungalow

NOMBRE DEL EVENTO: USO EPP

FECHA: 04-01-2023 DURACIÓN:

DICTADO POR:

NOMBRE: ADRIAN F. OCT. V. MEDO

CARGO / ENTIDAD: INSPECTOR HSE

FIRMA: ADRIAN F.

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☑ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	Trabajadora Social	1123411378	
2	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	Residente SSTMA	11052258	
4	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	INGENIERA AUXILIAR	45561087	
5	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	OBRERO	1131107117	
6	ARNULFO NAVARRO PADILLA	OBRERO	92519256	
7	LORELEY LADEUS MENDOZA	GUIA VIAL	64920236	
8	WILLIAM LUNA URANGO	OBRERO	92450611	
9	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	OBRERO	1131107444	
10	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	OPERADOR	40020770	
11	FRANCISCO CASTRO	CONDUCTOR	4052850	
12	DIEGO RESTREPO MESTRA	OPERADOR	100342991	
13	JUAN FONSECA SOTEL	CONDUCTOR	79915484	
14	JOSE DIAZ VELASQUEZ	TOPOGRAFO	74856439	
15	YESID TORRES	CONDUCTOR	13525591	
16	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	CONDUCTOR	15617821	
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav

CONTROL DE ASISTENCIA

Código No. AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	Fecha de emisión: 01/ 08/ 2013

PROYECTO: 2269 - 2023

LUGAR / FRENTE: Guayabal

NOMBRE DEL EVENTO: Protección respiratoria

FECHA: 05-01-2023 **DURACIÓN:** 10 min

DICTADO POR:

NOMBRE: Adrian Ortiz V Ulloa

CARGO / ENTIDAD: Inspector HSE

FIRMA:

TEMA:

- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☑ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	Trabajadora Social	1123411378	
2	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	Residente SSTMA	11052258	
4	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	INGENIERA AUXILIAR	45561087	
5	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	OBRERO	1131107117	
6	ARNULFO NAVARRO PADILLA	OBRERO	92519256	
7	LORELEY LADEUS MENDOZA	GUIA VIAL	64920236	
8	WILLIAM LUNA URANGO	OBRERO	92450611	
9	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	OBRERO	1131107444	
10	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	OPERADOR	40020770	
11	FRANCISCO CASTRO	CONDUCTOR	4052850	
12	DIEGO RESTREPO MESTRA	OPERADOR	100342991	
13	JUAN FONSECA SOTEL	CONDUCTOR	79915484	
14	JOSE DIAZ VELASQUEZ	TOPOGRAFO	74856439	
15	YESID TORRES	CONDUCTOR	13525591	
16	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	CONDUCTOR	15617821	
17	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	OPERADOR	30804393	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav

CONTROL DE ASISTENCIA

Código No. AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	Fecha de emisión: 01/ 08/ 2013

PROYECTO: 2264-2021

LUGAR / FRENTE: General.

NOMBRE DEL EVENTO: Seguridad vial.

FECHA: 06-01-2023 DURACIÓN:

DICTADO POR:

NOMBRE: Arnaldo Ortiz Nuñez

CARGO / ENTIDAD: Inspector HSE

FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☑ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	Trabajadora Social	1123411378	
2	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	Residente SSTMA	11052258	
4	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	INGENIERA AUXILIAR	45561087	
5	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	OBRERO	1131107117	
6	ARNULFO NAVARRO PADILLA	OBRERO	92519256	
7	LORELEY LADEUS MENDOZA	GUIA VIAL	64920236	
8	WILLIAM LUNA URANGO	OBRERO	92450611	
9	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	OBRERO	1131107444	
10	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	OPERADOR	40020770	
11	FRANCISCO CASTRO	CONDUCTOR	4052850	
12	DIEGO RESTREPO MESTRA	OPERADOR	100342991	
13	JUAN FONSECA SOTEL	CONDUCTOR	79915484	
14	JOSE DIAZ VELASQUEZ	TOPOGRAFO	74856439	
15	YESID TORRES	CONDUCTOR	13525591	
16	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	CONDUCTOR	15617821	
17	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	OPERADOR	3080393	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	CONTROL DE ASISTENCIA		
	Código No. AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	Fecha de emisión: 01/ 08/ 2013

PROYECTO: 2269-2021

LUGAR / FRENTE: Contratos

NOMBRE DEL EVENTO: Proteccion de Cabeza

FECHA: 07-07-2023 DURACIÓN:

DICTADO POR:

NOMBRE: ADRIAN ORTIZ VILLAMIL

CARGO / ENTIDAD: INSPECTOR HSE.

FIRMA: ADRIAN F

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☑ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	Trabajadora Social	1123411378	
2	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	Residente SSTMA	11052258	
4	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	INGENIERA AUXILIAR	45561087	
5	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	OBRERO	1131107117	
6	ARNULFO NAVARRO PADILLA	OBRERO	92519256	
7	LORELEY LADEUS MENDOZA	GUIA VIAL	64920236	
8	WILLIAM LUNA URANGO	OBRERO	92450611	
9	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	OBRERO	1131107444	
10	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	OPERADOR	40020770	
11	FRANCISCO CASTRO	CONDUCTOR	4052850	
12	DIEGO RESTREPO MESTRA	OPERADOR	100342991	
13	JUAN FONSECA SOTEL	CONDUCTOR	79915484	
14	JOSE DIAZ VELASQUEZ	TOPOGRAFO	74856439	
15	YESID TORRES	CONDUCTOR	13525591	
16	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	CONDUCTOR	15617821	
17	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	OPERADOR	30804393	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	CONTROL DE ASISTENCIA		
	Código No. AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	Fecha de emisión: 01/ 08/ 2013

PROYECTO: 2269-2021
LUGAR / FRENTE: Guajaral
NOMBRE DEL EVENTO: Protección para ojos
FECHA: 10-01-2023 **DURACIÓN:**

DICTADO POR:
NOMBRE: Adrian Ortiz Villero
CARGO / ENTIDAD: Inspector Hsi
FIRMA: Adrian F.

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☑ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	Trabajadora Social	1123411378	
2	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	Residente SSTMA	11052258	
4	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	INGENIERA AUXILIAR	45561087	
5	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	OBRERO	1131107117	
6	ARNULFO NAVARRO PADILLA	OBRERO	92519256	
7	LORELEY LADEUS MENDOZA	GUIA VIAL	64920236	
8	WILLIAM LUNA URANGO	OBRERO	92450611	
9	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	OBRERO	1131107444	
10	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	OPERADOR	40020770	
11	FRANCISCO CASTRO	CONDUCTOR	4052850	
12	DIEGO RESTREPO MESTRA	OPERADOR	100342991	
13	JUAN FONSECA SOTEL	CONDUCTOR	79915484	
14	JOSE DIAZ VELASQUEZ	TOPOGRAFO	74856439	
15	YESID TORRES	CONDUCTOR	13525591	
16	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	CONDUCTOR	15617821	
17	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	OPERADOR	30804393	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	CONTROL DE ASISTENCIA		
	Código No. AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	Fecha de emisión: 01/ 08/ 2013

PROYECTO: 2269 - 2021

LUGAR / FRENTE: Guayabal

NOMBRE DEL EVENTO: Dolo la mano a la Seguridad

FECHA: 11-01-2023 DURACIÓN: 10 min

DICTADO POR:

NOMBRE: Adriana Ospina V. Moreno

CARGO / ENTIDAD: Inspectora HSE

FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☑ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	Trabajadora Social	1123411378	
2	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	Residente SSTMA	11052258	
4	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	INGENIERA AUXILIAR	45561087	
5	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	OBRERO	1131107117	
6	ARNULFO NAVARRO PADILLA	OBRERO	92519256	
7	LORELEY LADEUS MENDOZA	GUIA VIAL	64920236	
8	WILLIAM LUNA URANGO	OBRERO	92450611	
9	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	OBRERO	1131107444	
10	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	OPERADOR	40020770	
11	FRANCISCO CASTRO	CONDUCTOR	4052850	
12	DIEGO RESTREPO MESTRA	OPERADOR	100342991	
13	JUAN FONSECA SOTEL	CONDUCTOR	79915484	
14	JOSE DIAZ VELASQUEZ	TOPOGRAFO	74856439	
15	YESID TORRES	CONDUCTOR	13525591	
16	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	CONDUCTOR	15617821	
17	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	OPERADOR	30804393	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	CONTROL DE ASISTENCIA		
	Código No. AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	Fecha de emisión: 01/ 08/ 2013

PROYECTO: 2269-2021

LUGAR / FRENTE: Guayabal

NOMBRE DEL EVENTO: Golpes de Calor

FECHA: 12-01-2023 **DURACIÓN:** 10 min

DICTADO POR:

NOMBRE: Adrian Ochoa Villero

CARGO / ENTIDAD: Inspector HSE

FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☑ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	Trabajadora Social	1123411378	
2	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	Residente SSTMA	11052258	
4	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	INGENIERA AUXILIAR	45561087	
5	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	OBRERO	1131107117	
6	ARNULFO NAVARRO PADILLA	OBRERO	92519256	
7	LORELEY LADEUS MENDOZA	GUIA VIAL	64920236	
8	WILLIAM LUNA URANGO	OBRERO	92450611	
9	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	OBRERO	1131107444	
10	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	OPERADOR	40020770	
11	FRANCISCO CASTRO	CONDUCTOR	4052850	
12	DIEGO RESTREPO MESTRA	OPERADOR	100342991	
13	JUAN FONSECA SOTEL	CONDUCTOR	79915484	
14	JOSE DIAZ VELASQUEZ	INSPECTOR CIVIL	74856439	
15	YESID TORRES	CONDUCTOR	13525591	
16	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	CONDUCTOR	15617821	
17	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	OPERADOR	30804393	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	CONTROL DE ASISTENCIA		
	Código No. AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	Fecha de emisión: 01/ 08/ 2013

PROYECTO: 2269 - 2023

LUGAR / FRENTE: Cuaternal.

NOMBRE DEL EVENTO: Riesgos Biológicos

FECHA: 13- 01 - 2023 **DURACIÓN:** 15 min

DICTADO POR:

NOMBRE: Oscar Vilorio

CARGO / ENTIDAD: Inspector SST

FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☑ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	Trabajadora Social	1123411378	
2	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	Residente SSTMA	11052258	
4	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	INGENIERA AUXILIAR	45561087	
5	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	OBRERO	1131107117	
6	ARNULFO NAVARRO PADILLA	OBRERO	92519256	
7	LORELEY LADEUS MENDOZA	GUIA VIAL	64920236	
8	WILLIAM LUNA URANGO	OBRERO	92450611	
9	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	OBRERO	1131107444	
10	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	OPERADOR	40020770	
11	FRANCISCO CASTRO	CONDUCTOR	4052850	
12	DIEGO RESTREPO MESTRA	OPERADOR	100342991	
13	JUAN FONSECA SOTEL	CONDUCTOR	79915484	
14	JOSE DIAZ VELASQUEZ	INSPECTOR CIVIL	74856439	
15	YESID TORRES	CONDUCTOR	13525591	
16	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	CONDUCTOR	15617821	
17	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	OPERADOR	30804393	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	CONTROL DE ASISTENCIA		
	Código No. AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	Fecha de emisión: 01/ 08/ 2013

PROYECTO: 2269 - 2021

LUGAR / FRENTE: Guayabal

NOMBRE DEL EVENTO: Programa de gestión para Riesgo Mecanico

FECHA: 11-01-2023 DURACIÓN: 10 min

DICTADO POR:

NOMBRE: Adrian Ortiz Villero

CARGO / ENTIDAD: Inspector HSE

FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☑ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	Trabajadora Social	1123411378	
2	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	Residente SSTMA	11052258	
4	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	INGENIERA AUXILIAR	45561087	
5	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	OBRERO	1131107117	
6	ARNULFO NAVARRO PADILLA	OBRERO	92519256	
7	LORELEY LADEUS MENDOZA	GUIA VIAL	64920236	
8	WILLIAM LUNA URANGO	OBRERO	92450611	
9	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	OBRERO	1131107444	
10	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	OPERADOR	40020770	
11	FRANCISCO CASTRO	CONDUCTOR	4052850	
12	DIEGO RESTREPO MESTRA	OPERADOR	100342991	
13	JUAN FONSECA SOTEL	CONDUCTOR	79915484	
14	JOSE DIAZ VELASQUEZ	INSPECTOR CIVIL	74856439	
15	YESID TORRES	CONDUCTOR	13525591	
16	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	CONDUCTOR	15617821	
17	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	OPERADOR	30804393	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	CONTROL DE ASISTENCIA		
	Código No. AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	Fecha de emisión: 01/ 08/ 2013

PROYECTO: 2269-2021

LUGAR / FRENTE: Generalc

NOMBRE DEL EVENTO: Li. Planificación de la seguridad

FECHA: 16-01-2023 **DURACIÓN:**

DICTADO POR:

NOMBRE: Adrian Dario V. Slee

CARGO / ENTIDAD: Inspector HSE

FIRMA: Adrian T.

TEMA:

- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☑ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	Trabajadora Social	1123411378	
2	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	Residente SSTMA	11052258	
4	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	INGENIERA AUXILIAR	45561087	
5	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	OBRERO	1131107117	
6	ARNULFO NAVARRO PADILLA	OBRERO	92519256	
7	LORELEY LADEUS MENDOZA	GUIA VIAL	64920236	
8	WILLIAM LUNA URANGO	OBRERO	92450611	
9	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	OBRERO	1131107444	
10	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	OPERADOR	40020770	
11	FRANCISCO CASTRO	CONDUCTOR	4052850	
12	DIEGO RESTREPO MESTRA	OPERADOR	100342991	
13	JUAN FONSECA SOTEL	CONDUCTOR	79915484	
14	JOSE DIAZ VELASQUEZ	INSPECTOR CIVIL	74856439	
15	YESID TORRES	CONDUCTOR	13525591	
16	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	CONDUCTOR	15617821	
17	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	OPERADOR	30804393	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	CONTROL DE ASISTENCIA		
	Código No. AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	Fecha de emisión: 01/ 08/ 2013

PROYECTO: 2269-2021
LUGAR / FRENTE: Guayacal
NOMBRE DEL EVENTO: Dian de emergencia
FECHA: 17-01-2023 DURACIÓN:

DICTADO POR:
NOMBRE: Rafael Vergara De La Ossa
CARGO / ENTIDAD: RLS-SSTMA
FIRMA: Rafael Vergara De

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTION SOCIAL
- ☐ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	Jaider Tadeos Mendoza	Guia vial	64920236	
2	Edwin Jose Suarez	Ayudante	1131107444	Edwin
3	Alcides Simon	Op grader	4020470	
4	Juan Pablo Rodriguez	grader	1120700589	
5	Jose A. Ruiz	Inspector	74856439	
6	Ernesto Navarro	Obrero	92514758	
7	William Zuñiga	obrero	92450614	
8	Jaime A. Suarez L	Obrero	1131107117	
9	Luis Vega	operador	5036279	Luis Vega
10	Juan Restrepo Ramos	ayudante de obra	7.065.373.311	Juan Restrepo
11	Wilson Restrepo	ayudante obras	T.I. 1004...	Wilson
12	Katia Herrera Ramos	Guia vial	7.065374919	Katia Herrera
13	Jennifer Quiñones Cespedes	Guia vial	1065572879	Jennifer Quiñones
14	Zully Lopera Redondo	trabajadora S.	1123411378	
15	Carlos Contreras G.	Ingeniero Aux.	9556108	Carlos Contreras
16	Arcian Ortiz V.	Inspector HSE	1193110476	
17	Jesus Restrepo M.	Operador	1065547991	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	CONTROL DE ASISTENCIA		
	Código No. AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	Fecha de emisión: 01/ 08/ 2013

PROYECTO: 2269-2021
LUGAR / FRENTE: Guayacanal
NOMBRE DEL EVENTO: Actos y Condiciones inseguras
FECHA: 17-01-2023 **DURACIÓN:** 1 hora

DICTADO POR:
NOMBRE: Rafael Vergara De La Ossa
CARGO / ENTIDAD: Res. SST
FIRMA: Rafael Vergara D.

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☐ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☑ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	Lorena Cadena Mendoza	Guia. Vial.	64920236	
2	Edwin Jose Suarez	Ayudante	1131107444	Edwin
3	Eduardo Suarez	Operador	4070480	
4	Juan Pablo Rodriguez	operador	1120089	
5	Jose A. Diaz	Encargado	74826639	
6	Romulo Navarro	Obrero	92819256	
7	William Luna	obrero	92456611	
8	Jaime A. Luna	obrero	1131107117	
9	Luis Vega	operador	5435279	Luis Vega
10	Juan Pestana Ramos	ayudante de obra	7.065.373.311	Juan Pestana
11	Quilson Pestana	Ayudante de	1070215213	Quilson
12	Katia Herrera Ramos	Guia Vial	7.065374914	Katia Herrera
13	Jonathan Quintanes Pestana	Guia vial	1065372814	Jonathan Quintanes
14	Zully Lopgena Redondo	Trabajadora Social	1123411348	
15	Carmen Contreras Suarez	Ingeniero Ambi	45561087	
16	Adrian Ortiz Tirado	Inspector HSE	1193110466	
17	Juan Gabriel Fonseca S	Conductor	79915484	Juan G Fonseca S
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	CONTROL DE ASISTENCIA		
	Código No. AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	Fecha de emisión: 01/ 08/ 2013

PROYECTO: 2269-2021
LUGAR / FRENTE: General
NOMBRE DEL EVENTO: Contaminación Ambiental
FECHA: 18-01-2023 **DURACIÓN:**

DICTADO POR:
NOMBRE: Rafael Vergara De La Ossa
CARGO / ENTIDAD: Res. SSTMA
FIRMA: Rafael Vergara D.

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☒ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	Trabajadora Social	1123411378	
2	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	Residente SSTMA	11052258	
4	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	INGENIERA AUXILIAR	45561087	
5	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	OBRERO	1131107117	
6	ARNULFO NAVARRO PADILLA	OBRERO	92519256	
7	LORELEY LADEUS MENDOZA	GUIA VIAL	64920236	
8	WILLIAM LUNA URANGO	OBRERO	92450611	
9	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	OBRERO	1131107444	
10	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	OPERADOR	40020770	
11	FRANCISCO CASTRO	CONDUCTOR	4052850	
12	DIEGO RESTREPO MESTRA	OPERADOR	100342991	
13	JUAN FONSECA SOTEL	CONDUCTOR	79915484	
14	JOSE DIAZ VELASQUEZ	INSPECTOR CIVIL	74856439	
15	YESID TORRES	CONDUCTOR	13525591	
16	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	CONDUCTOR	15617821	
17	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	OPERADOR	30804393	
18	Jorge Pablo Arrieta	operador	1192020897	
19	Alexis Ortiz Villero	Inspector HSE	1193170426	
20				
21				
22				
23				
24				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	CONTROL DE ASISTENCIA		
	Código No. AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	Fecha de emisión: 01/ 08/ 2013

PROYECTO: 2661 - 2021

LUGAR / FRENTE: Guayabal.

NOMBRE DEL EVENTO: Almacenamiento Adecuado de materiales

FECHA: 11-01-2023 **DURACIÓN:**

DICTADO POR:

NOMBRE: Rafael Vergara De La Ossa

CARGO / ENTIDAD: Res. SST MA

FIRMA: Rafael Vergara O.

TEMA:

- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☑ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	Trabajadora Social	1123411378	
2	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	Residente SSTMA	11052258	
4	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	INGENIERA AUXILIAR	45561087	
5	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	OBRERO	1131107117	
6	ARNULFO NAVARRO PADILLA	OBRERO	92519256	
7	LORELEY LADEUS MENDOZA	GUIA VIAL	64920236	
8	WILLIAM LUNA URANGO	OBRERO	92450611	
9	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	OBRERO	1131107444	
10	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	OPERADOR	40020770	
11	FRANCISCO CASTRO	CONDUCTOR	4052850	
12	DIEGO RESTREPO MESTRA	OPERADOR	100342991	
13	JUAN FONSECA SOTEL	CONDUCTOR	79915484	
14	JOSE DIAZ VELASQUEZ	INSPECTOR CIVIL	74856439	
15	YESID TORRES	CONDUCTOR	13525591	
16	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	CONDUCTOR	15617821	
17	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	OPERADOR	30804393	
18	Juan Pablo Rodriguez	Operador	1120289	
19	ADELSON OCHOA VILLERO	INSPECTOR HSE	1193110426	
20				
21				
22				
23				
24				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	CONTROL DE ASISTENCIA		
	Código No. AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	Fecha de emisión: 01/ 08/ 2013

PROYECTO: 2269- 2021

LUGAR / FRENTE: Cuaymaral.

NOMBRE DEL EVENTO: Prevención de los Actos inseguros

FECHA: 20- 01- 2023 DURACIÓN: 10

DICTADO POR:

NOMBRE: Adrian Ortiz Villarreal

CARGO / ENTIDAD: Inspector H.S.E

FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☑ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	Trabajadora Social	1123411378	
2	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	Residente SSTMA	11052258	
4	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	INGENIERA AUXILIAR	45561087	
5	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	OBRERO	1131107117	
6	ARNULFO NAVARRO PADILLA	OBRERO	92519256	
7	LORELEY LADEUS MENDOZA	GUIA VIAL	64920236	
8	WILLIAM LUNA URANGO	OBRERO	92450611	
9	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	OBRERO	1131107444	
10	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	OPERADOR	40020770	
11	FRANCISCO CASTRO	CONDUCTOR	4052850	
12	DIEGO RESTREPO MESTRA	OPERADOR	100342991	
13	JUAN FONSECA SOTEL	CONDUCTOR	79915484	
14	JOSE DIAZ VELASQUEZ	INSPECTOR CIVIL	74856439	
15	YESID TORRES	CONDUCTOR	13525591	
16	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	CONDUCTOR	15617821	
17	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	OPERADOR	30804393	
18	JUAN PABLO RODRIGUEZ	OPERADOR	11202089	
19				
20				
21				
22				
23				
24				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	CONTROL DE ASISTENCIA		
	Código No. AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	Fecha de emisión: 01/ 08/ 2013

PROYECTO: 226-2023

LUGAR / FRENTE: Guayabal

NOMBRE DEL EVENTO: Prevención Riesgos Laborales

FECHA: 27-07-2023 **DURACIÓN:** 10 min

DICTADO POR:

NOMBRE: Adrian Ortiz V. Ulloa

CARGO / ENTIDAD: Inspector HSE

FIRMA: Adrian

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☑ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	Trabajadora Social	1123411378	
2	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	Residente SSTMA	11052258	
4	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	INGENIERA AUXILIAR	45561087	
5	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	OBRERO	1131107117	
6	ARNULFO NAVARRO PADILLA	OBRERO	92519256	
7	LORELEY LADEUS MENDOZA	GUIA VIAL	64920236	
8	WILLIAM LUNA URANGO	OBRERO	92450611	
9	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	OBRERO	1131107444	
10	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	OPERADOR	40020770	
11	FRANCISCO CASTRO	CONDUCTOR	4052850	
12	DIEGO RESTREPO MESTRA	OPERADOR	100342991	
13	JUAN FONSECA SOTEL	CONDUCTOR	79915484	
14	JOSE DIAZ VELASQUEZ	INSPECTOR CIVIL	74856439	
15	YESID TORRES	CONDUCTOR	13525591	
16	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	CONDUCTOR	15617821	
17	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	OPERADOR	30804393	
18	JUAN PABLO RODRIGUEZ	OPERADOR	11202089	
19				
20				
21				
22				
23				
24				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav

CONTROL DE ASISTENCIA

Código No.	Versión No.	Fecha de emisión:
AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	01/ 08/ 2013

PROYECTO: 2269-2021

LUGAR / FRENTE:

NOMBRE DEL EVENTO: Manejo de residuos, Aspectos e impactos Ambientales.

FECHA: 28-01-2023 **DURACIÓN:** 1 hora

DICTADO POR:

NOMBRE: Rafael Vergara De La Ossa

CARGO / ENTIDAD: Res SSTMA

FIRMA: Rafael Vergara D.

TEMA:

- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☐ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☑ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	Trabajadora Social	1123411378	
2	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	Residente SSTMA	11052258	
4	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	INGENIERA AUXILIAR	45561087	
5	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	OBRERO	1131107117	
6	ARNULFO NAVARRO PADILLA	OBRERO	92519256	
7	LORELEY LADEUS MENDOZA	GUIA VIAL	64920236	
8	WILLIAM LUNA URANGO	OBRERO	92450611	
9	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	OBRERO	1131107444	
10	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	OPERADOR	40020770	
11	FRANCISCO CASTRO	CONDUCTOR	4052850	
12	DIEGO RESTREPO MESTRA	OPERADOR	100342991	
13	JUAN FONSECA SOTEL	CONDUCTOR	79915484	
14	JOSE DIAZ VELASQUEZ	INSPECTOR CIVIL	74856439	
15	YESID TORRES	CONDUCTOR	13525591	
16	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	CONDUCTOR	15617821	
17	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	OPERADOR	30804393	
18	JUAN PABLO RODRIGUEZ	OPERADOR	11202089	
19	Adeimy Ortiz Villero	Inspector HSE	1193110426	
20				
21				
22				
23				
24				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	CONTROL DE ASISTENCIA		
	Código No. AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	Fecha de emisión: 01/ 08/ 2013

PROYECTO: 2269-2021

LUGAR / FRENTE: Guajaral

NOMBRE DEL EVENTO: Manejo de Escombros

FECHA: 24-01-2023 **DURACIÓN:** 10 min

DICTADO POR:

NOMBRE: Rafael Vergara De La Ossa

CARGO / ENTIDAD: Res. SSTMA

FIRMA: Rafael Vergara.

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☑ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	Trabajadora Social	1123411378	
2	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	Residente SSTMA	11052258	
4	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	INGENIERA AUXILIAR	45561087	
5	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	OBRERO	1131107117	
6	ARNULFO NAVARRO PADILLA	OBRERO	92519256	
7	LORELEY LADEUS MENDOZA	GUIA VIAL	64920236	
8	WILLIAM LUNA URANGO	OBRERO	92450611	
9	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	OBRERO	1131107444	
10	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	OPERADOR	40020770	
11	FRANCISCO CASTRO	CONDUCTOR	4052850	
12	DIEGO RESTREPO MESTRA	OPERADOR	100342991	
13	JUAN FONSECA SOTEL	CONDUCTOR	79915484	
14	JOSE DIAZ VELASQUEZ	INSPECTOR CIVIL	74856439	
15	YESID TORRES	CONDUCTOR	13525591	
16	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	CONDUCTOR	15617821	
17	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	OPERADOR	30804393	
18	JUAN PABLO RODRIGUEZ	OPERADOR	11202089	
19	ADRIAN ORTIZ VILLAO	INSPECTOR HSE	1193110426	
20				
21				
22				
23				
24				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	CONTROL DE ASISTENCIA		
	Código No. AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	Fecha de emisión: 01/ 08/ 2013

PROYECTO: 2269-2023

LUGAR / FRENTE: Guajaral

NOMBRE DEL EVENTO: Prevención trabajo en asfaltos

FECHA: 25-01-2023 DURACIÓN: 10 min

DICTADO POR:

NOMBRE: Adriana Ortiz Villero

CARGO / ENTIDAD: Inspector HSE

FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☑ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatoria evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	Trabajadora Social	1123411378	
2	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	Residente SSTMA	11052258	
4	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	INGENIERA AUXILIAR	45561087	
5	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	OBRERO	1131107117	
6	ARNULFO NAVARRO PADILLA	OBRERO	92519256	
7	LORELEY LADEUS MENDOZA	GUIA VIAL	64920236	
8	WILLIAM LUNA URANGO	OBRERO	92450611	
9	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	OBRERO	1131107444	
10	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	OPERADOR	40020770	
11	FRANCISCO CASTRO	CONDUCTOR	4052850	
12	DIEGO RESTREPO MESTRA	OPERADOR	100342991	
13	JUAN FONSECA SOTEL	CONDUCTOR	79915484	
14	JOSE DIAZ VELASQUEZ	INSPECTOR CIVIL	74856439	
15	YESID TORRES	CONDUCTOR	13525591	
16	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	CONDUCTOR	15617821	
17	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	OPERADOR	30804393	
18	JUAN PABLO RODRIGUEZ	OPERADOR	11202089	
19				
20				
21				
22				
23				
24				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav

CONTROL DE ASISTENCIA

Código No. AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	Fecha de emisión: 01/ 08/ 2013

PROYECTO: 2269-2021

LUGAR / FRENTE: Guayabal

NOMBRE DEL EVENTO: Orden y Aseo en Obra

FECHA: 26-01-2023 **DURACIÓN:** 10 min

DICTADO POR:

NOMBRE: Rafael Vergara De la Ossa

CARGO / ENTIDAD: Res. SSTMA

FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☑ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	Trabajadora Social	1123411378	
2	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	Residente SSTMA	11052258	
4	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	INGENIERA AUXILIAR	45561087	
5	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	OBRERO	1131107117	
6	ARNULFO NAVARRO PADILLA	OBRERO	92519256	
7	LORELEY LADEUS MENDOZA	GUIA VIAL	64920236	
8	WILLIAM LUNA URANGO	OBRERO	92450611	
9	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	OBRERO	1131107444	
10	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	OPERADOR	40020770	
11	FRANCISCO CASTRO	CONDUCTOR	4052850	
12	DIEGO RESTREPO MESTRA	OPERADOR	100342991	
13	JUAN FONSECA SOTEL	CONDUCTOR	79915484	
14	JOSE DIAZ VELASQUEZ	INSPECTOR CIVIL	74856439	
15	YESID TORRES	CONDUCTOR	13525591	
16	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	CONDUCTOR	15617821	
17	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	OPERADOR	30804393	
18	JUAN PABLO RODRIGUEZ	OPERADOR	11202089	
19	Jhonier Oeth V. Moreno	1193110466		
20				
21				
22				
23				
24				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	CONTROL DE ASISTENCIA		
	Código No. AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	Fecha de emisión: 01/ 08/ 2013

PROYECTO: 2269 - 2023
LUGAR / FRENTE: Cuatro Bocas
NOMBRE DEL EVENTO: Socialización procedimiento prueba alcoholemia
FECHA: 27-01-2023 **DURACIÓN:**

DICTADO POR:
NOMBRE: Rafael Vergara De La Ossa
CARGO / ENTIDAD: Res. SSTMA
FIRMA: Rafael Vergara D.

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☑ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	Trabajadora Social	1123411378	
2	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	Residente SSTMA	11052258	
4	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	INGENIERA AUXILIAR	45561087	
5	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	OBRERO	1131107117	
6	ARNULFO NAVARRO PADILLA	OBRERO	92519256	
7	LORELEY LADEUS MENDOZA	GUIA VIAL	64920236	
8	WILLIAM LUNA URANGO	OBRERO	92450611	
9	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	OBRERO	1131107444	
10	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	OPERADOR	40020770	
11	FRANCISCO CASTRO	CONDUCTOR	4052850	
12	DIEGO RESTREPO MESTRA	OPERADOR	100342991	
13	JUAN FONSECA SOTEL	CONDUCTOR	79915484	
14	JOSE DIAZ VELASQUEZ	INSPECTOR CIVIL	74856439	
15	YESID TORRES	CONDUCTOR	13525591	
16	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	CONDUCTOR	15617821	
17	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	OPERADOR	30804393	
18	JUAN PABLO RODRIGUEZ	OPERADOR	11202089	
19				
20				
21				
22				
23				
24				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	CONTROL DE ASISTENCIA		
	Código No. AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	Fecha de emisión: 01/ 08/ 2013

PROYECTO: 2269-2021

LUGAR / FRENTE: SAGUNTA

NOMBRE DEL EVENTO: Socializacion Procedimiento Prueba de alcoholemia.

FECHA: 27-01-2023 DURACIÓN: 10 min

DICTADO POR:

NOMBRE: Rafael Vegara De La Ossa

CARGO / ENTIDAD: Res. SSSMA

FIRMA: Rafael Vegara

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☑ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	LUIS MARIA VEGA	OPERADOR	5935279	Luis Vega
2	IVAN PESTANA	AYUDANTE	1065373311	Ivan Pestana
4	JENNIFER QUIÑONEZ PESTANA	PALETERA	1065372819	Jennifer Quiñonez Pestana
5	KATIA HERRERA RAMOS	PALETERA	1065374919	Katia Herrera
6	WILSON PESTANA	AYUDANTE	15704543	Wilson Pestana
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	CONTROL DE ASISTENCIA		
	Código No. AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	Fecha de emisión: 01/ 08/ 2013

PROYECTO: 226 – 2021

LUGAR / FRENTE: GUAYABAL

NOMBRE DEL EVENTO: Beber y Conducir

FECHA: 28-01-2023 **DURACIÓN:**

DICTADO POR:

NOMBRE: ADEIMA OSTOS VILLEGO

CARGO / ENTIDAD: INSPECTOR HSE

FIRMA:

TEMA:

- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☑ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	Trabajadora Social	1123411378	
2	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	Residente SSTMA	11052258	
4	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	INGENIERA AUXILIAR	45561087	
5	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	OBRERO	1131107117	
6	ARNULFO NAVARRO PADILLA	OBRERO	92519256	
7	LORELEY LADEUS MENDOZA	GUIA VIAL	64920236	
8	WILLIAM LUNA URANGO	OBRERO	92450611	
9	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	OBRERO	1131107444	
10	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	OPERADOR	40020770	
11	FRANCISCO CASTRO	CONDUCTOR	4052850	
12	DIEGO RESTREPO MESTRA	OPERADOR	100342991	
13	JUAN FONSECA SOTEL	CONDUCTOR	79915484	
14	JOSE DIAZ VELASQUEZ	INSPECTOR CIVIL	74856439	
15	YESID TORRES	CONDUCTOR	13525591	
16	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	CONDUCTOR	15617821	
17	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	OPERADOR	30804393	
18	JUAN PABLO RODRIGUEZ	OPERADOR	11202089	
19				
20				
21				
22				
23				
24				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav

CONTROL DE ASISTENCIA

Código No. AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	Fecha de emisión: 01/ 08/ 2013

PROYECTO: 2269-2021

LUGAR / FRENTE: Control Polvo y

NOMBRE DEL EVENTO: Control Polvo y Material Particulado

FECHA: 30-01-2023 DURACIÓN: 10 Min

DICTADO POR:

NOMBRE: Rafael Vergara De La Ossa

CARGO / ENTIDAD: Res-SSTMA

FIRMA: Rafael Vergara

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☑ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	Trabajadora Social	1123411378	
2	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	Residente SSTMA	11052258	
4	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	INGENIERA AUXILIAR	45561087	
5	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	OBRERO	1131107117	
6	ARNULFO NAVARRO PADILLA	OBRERO	92519256	
7	LORELEY LADEUS MENDOZA	GUIA VIAL	64920236	
8	WILLIAM LUNA URANGO	OBRERO	92450611	
9	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	OBRERO	1131107444	
10	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	OPERADOR	40020770	
11	FRANCISCO CASTRO	CONDUCTOR	4052850	
12	DIEGO RESTREPO MESTRA	OPERADOR	100342991	
13	JUAN FONSECA SOTEL	CONDUCTOR	79915484	
14	JOSE DIAZ VELASQUEZ	INSPECTOR CIVIL	74856439	
15	YESID TORRES	CONDUCTOR	13525591	
16	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	CONDUCTOR	15617821	
17	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	OPERADOR	30804393	
18	JUAN PABLO RODRIGUEZ	OPERADOR	11202089	
19	ADEIMY ORTIZ VILLERO	INSPECTOR HSE	1193110426	
20				
21				
22				
23				
24				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	CONTROL DE ASISTENCIA		
	Código No. AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	Fecha de emisión: 01/ 08/ 2013

PROYECTO: 2269-2021

LUGAR / FRENTE: Guajaral

NOMBRE DEL EVENTO: Contaminación del Aire

FECHA: 31-01-2023 **DURACIÓN:** 10 min

DICTADO POR:

NOMBRE: Rafael Vergara De La Ossa

CARGO / ENTIDAD: Res. SSTMA

FIRMA: Rafael Vergara

TEMA:

- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☑ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	ZULLY KAREN LOPERENA REDONDO	Trabajadora Social	1123411378	
2	RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA	Residente SSTMA	11052258	
4	CARMEN CECILIA CONTRERAS SUAREZ	INGENIERA AUXILIAR	45561087	
5	JAIME ANDRES SIERRA LADEUN	OBRERO	1131107117	
6	ARNULFO NAVARRO PADILLA	OBRERO	92519256	
7	LORELEY LADEUS MENDOZA	GUIA VIAL	64920236	
8	WILLIAM LUNA URANGO	OBRERO	92450611	
9	EDWIN JOSE SUAREZ DE HOYOS	OBRERO	1131107444	
10	MEDARDO SUAREZ ZUÑIGA	OPERADOR	40020770	
11	FRANCISCO CASTRO	CONDUCTOR	4052850	
12	DIEGO RESTREPO MESTRA	OPERADOR	100342991	
13	JUAN FONSECA SOTEL	CONDUCTOR	79915484	
14	JOSE DIAZ VELASQUEZ	INSPECTOR CIVIL	74856439	
15	YESID TORRES	CONDUCTOR	13525591	
16	JORGE LUIS CASTRO LEDEUTH	CONDUCTOR	15617821	
17	FEDERICO JOSE BULDIN TELLEZ	OPERADOR	30804393	
18	JUAN PABLO RODRIGUEZ	OPERADOR	11202089	
19	Adolfo Otto Villero	Inspector HSE	1113110446	
20				
21				
22				
23				
24				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	CONTROL DE ASISTENCIA		
	Código No. AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	Fecha de emisión: 01/ 08/ 2013

PROYECTO: 2269 - 2021

LUGAR / FRENTE: Semana

NOMBRE DEL EVENTO: Riesgos en Obra

FECHA: 05 - 01 - 2022 DURACIÓN:

DICTADO POR:

NOMBRE: Adrian Ortiz V. Lizcano

CARGO / ENTIDAD: Inspector HSE

FIRMA: Adrian F

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☑ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	Luis Vega	OP. Incopav	5935279	
2	Juan Pestana	Ayudante de obra Incopav	7.065.373.311	Juan Pestana
3	Jennifer Quiñones Restrepo	Parcheros	1065372879	Jennifer Quiñones
4	Katia Herrera Ramos	Pulidora	7.065374914	Katia Herrera
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	CONTROL DE ASISTENCIA		
	Código No. AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	Fecha de emisión: 01/ 08/ 2013

PROYECTO: 226-2021
LUGAR / FRENTE: SACANA
NOMBRE DEL EVENTO: USO EPP
FECHA: 04-01-2023 DURACIÓN:

DICTADO POR:
NOMBRE: ADRIAN F. ORTIZ V.
CARGO / ENTIDAD: INSPECTOR HSE
FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☑ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	Ivan Pestana Ramos	ayudante de obra incopav	1.065.373.311	Ivan Pestana
2	Jennifer Quiñones Pestana	Paletera	1065372819	Yennifer Quiñones
3	Katia Herrera Ramos	Paletera	1.065374914	Katia Herrera
4	Wilson Pestana	obrero	15 204 543	Wilson
5	Luis Vega	Op	5935279	Luis Vega
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	CONTROL DE ASISTENCIA		
	Código No. AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	Fecha de emisión: 01/ 08/ 2013

PROYECTO: 2169 - 2021

LUGAR / FRENTE: Contrato Sikania

NOMBRE DEL EVENTO: Protección Respiratoria

FECHA: 05-01-2023 DURACIÓN: 10 min

DICTADO POR:

NOMBRE: Yovanny Ortiz Alfonso

CARGO / ENTIDAD: Inspector de HSE

FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☑ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	Luis Vega	OP.	5935279	Luis Vega
2	Samuel Arizmendi	Tractora	1065372878	Samuel Arizmendi
3	Katia Herrera	Paletera	1.065374914	Katia Herrera
4	Ivan Pestana	ayudante de Obra	1.065373371	Ivan Pestana
5	Wilson Pestana	Obrero	1570543	Wilson
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	CONTROL DE ASISTENCIA		
	Código No. AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	Fecha de emisión: 01/ 08/ 2013

PROYECTO: 2269-2021
LUGAR / FRENTE: Salamanca
NOMBRE DEL EVENTO: Seguridad Vial
FECHA: 06-01-2023 DURACIÓN: 10 Min

DICTADO POR:
NOMBRE: Adriana Ortiz V.
CARGO / ENTIDAD: Inspectora HSE
FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☑ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	Juan Pestana Ramos	ayudante de obra Incopav	7.065373.311	Juan Pestana
2	Wilson Pestana	ayudante de obra Incopav	15'704543	Wilson
3	Jennifer Quiroz Pestana	Paletera	7065372879	Jennifer Quiroz
4	Katiu Herrera Ramos	Paletera	7.065374914	Katiu Herrera
5	Luis Vega	OP	5935279	Luis Vega
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	CONTROL DE ASISTENCIA		
	Código No. AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	Fecha de emisión: 01/ 08/ 2013

PROYECTO: 2269-2021

LUGAR / FRENTE: Sacaca / Tramo #3

NOMBRE DEL EVENTO: Protección de Cabeza

FECHA: 04-01-2023 DURACIÓN: 10 min

DICTADO POR:

NOMBRE: Adrian Ortiz V.

CARGO / ENTIDAD: Inspector HSE

FIRMA: Adrian

TEMA:

- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☑ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	Jennifer Quiroz Restrepo	Paletera	7065372919	Jennifer Quiroz
2	Katia Herrera Ramos	Paletera	7.065374919	Katia Herrera
3	Ivan andres Pestana Ramos	ayudante de obra Incopav	7.065373311	Ivan Pestana
4	wilson pestana	obrero de o	13 70H 543	wilson
5	Luis Vega	OP	5935279	Luis Vega
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	CONTROL DE ASISTENCIA		
	Código No. AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	Fecha de emisión: 01/ 08/ 2013

PROYECTO: 2069 - 2024

LUGAR / FRENTE: SACAMA

NOMBRE DEL EVENTO: Inducción de los actos integros

FECHA: 20-07-2023 DURACIÓN: 1D

DICTADO POR:

NOMBRE: ADRIAN DOTA VILLEGA

CARGO / ENTIDAD: INSPECTOR HSE

FIRMA: ADRIAN

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☑ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	JUAN PESTANA RAMOS	AUXILIAR DE OBRA INCOPAV	7.065.373.311	JUAN PESTANA
2	WILSON PESTANA	AYUDANTE	1570451213	WILSON
3	LUIS VEGA	OPERADOR	5935278	LUIS VEGA
4	KATIA HERRERA RAMOS	PALETERA	7.065374914	KATIA HERRERA
5	YENNIFER QUIÑONES PESTANA	PALETERA	7065372819	YENNIFER QUIÑONES
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	CONTROL DE ASISTENCIA		
	Código No. AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	Fecha de emisión: 01/ 08/ 2013

PROYECTO: 2264-2021

LUGAR / FRENTE: Sincawa

NOMBRE DEL EVENTO: Manejo de escombros

FECHA: 24-01-2023 DURACIÓN: 10 M.M

DICTADO POR:

NOMBRE: Rafael Vergara De La Ossa

CARGO / ENTIDAD: Res. SSTMA

FIRMA: Rafael Vergara

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☑ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☐ OTRO

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	Wilson Pestana	Ayudante de obra	1570415	Wilson
2	Juan Pestana Ramos	ayudante de obra incopav	7.065.323.311	Juan Pestana
3	Jennifer Quiñones Pertuz	Paletera	1065372819	Jennifer Quiñones
4	Katia Herrera Ramos	Paletera	7.065314.919	Katia Herrera
5	Luis Vega	operador	5935279	Luis Vega
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	CONTROL DE ASISTENCIA		
	Código No. AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	Fecha de emisión: 01/ 08/ 2013

PROYECTO: 2264-2021

LUGAR / FRENTE: Tramo 3 Sacapana

NOMBRE DEL EVENTO: Prevención Trabajo en altura

FECHA: 25-01-2023 DURACIÓN: 10 min

DICTADO POR:

NOMBRE: Adrian Ortiz Valero

CARGO / ENTIDAD: Inspector HSE

FIRMA: Adrian

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☑ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	LUIS MARIA VEGA	OPERADOR	5935279	Luis Vega
2	IVAN PESTANA	AYUDANTE	1065373311	Ivan Pestana
4	JENNIFER QUIÑONEZ PESTANA	PALETERA	1063372819	Jennifer Quiñonez Pestana
5	KATIA HERRERA RAMOS	PALETERA	1065374919	Katia Herrera
6	WILSON PESTANA	AYUDANTE	15704543	Wilson Pestana
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav

CONTROL DE ASISTENCIA

Código No. AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	Fecha de emisión: 01/ 08/ 2013

PROYECTO: 2269-2021

LUGAR / FRENTE: SACAVA

NOMBRE DEL EVENTO: Orden y aseo en Obra

FECHA: 26-01-2023 **DURACIÓN:**

DICTADO POR:

NOMBRE: Rafael Vergara De La Ossa

CARGO / ENTIDAD: Res. SSTMA

FIRMA: Rafael Vergara

TEMA:

- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☑ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	LUIS MARIA VEGA	OPERADOR	5935279	Luis Vega
2	IVAN PESTANA	AYUDANTE	1065373311	Ivan pestana
4	JENNIFER QUIÑONEZ PESTANA	PALETERA	1065372819	Jennifer Quiñonez
5	KATIA HERRERA RAMOS	PALETERA	1065374919	Katia Herrera
6	WILSON PESTANA	AYUDANTE	15704543	Wilson Pestana
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	CONTROL DE ASISTENCIA		
	Código No. AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	Fecha de emisión 01/ 08/ 2013

PROYECTO: 2269-2021

LUGAR / FRENTE: SAMARIA

NOMBRE DEL EVENTO: Reporte de Condiciones

FECHA: 29-01-2023 DURACIÓN: 1 hora

DICTADO POR:

NOMBRE: ADELMO ORTIZ VILLEGO

CARGO / ENTIDAD: INSPECTOR HSE

FIRMA: ADELMO

TEMA:

- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☑ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	LUIS MARIA VEGA	OPERADOR	5935279	Luis Vega
2	IVAN PESTANA	AYUDANTE	1065373311	Ivan Pestana
4	JENNIFER QUIÑONEZ PESTANA	PALETERA	1065372819	Jennifer Quiñonez Pestana
5	KATIA HERRERA RAMOS	PALETERA	1065374919	KATIA HERRERA
6	WILSON PESTANA	AYUDANTE	15704543	Wilson Pestana
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	CONTROL DE ASISTENCIA		
	Código No. AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	Fecha de emisión: 01/ 08/ 2013

PROYECTO: 2269-2021

LUGAR / FRENTE: Sincuya

NOMBRE DEL EVENTO: Control Polvo & Material Particulado

FECHA: 30-01-2023 **DURACIÓN:** 10 Minutos

DICTADO POR:

NOMBRE: Rafael Vergara De La Ossa

CARGO / ENTIDAD: Res. SST/MA

FIRMA: Rafael Vergara

TEMA:

- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☑ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	LUIS MARIA VEGA	OPERADOR	5935279	Luis Vega
2	IVAN PESTANA	AYUDANTE	1065373311	Ivan Pestana
4	JENNIFER QUIÑONEZ PESTANA	PALETERA	1065372819	Jennifer Quiñonez Pestana
5	KATIA HERRERA RAMOS	PALETERA	1065374919	Katia Herrera
6	WILSON PESTANA	AYUDANTE	15704543	Wilson Pestana
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	CONTROL DE ASISTENCIA		
	Código No. AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	Fecha de emisión: 01/ 08/ 2013

PROYECTO: 2269-2021

LUGAR / FRENTE: Sabana

NOMBRE DEL EVENTO: Contaminación del Oido

FECHA: 31-01-2023 **DURACIÓN:** 10min

DICTADO POR:

NOMBRE: Rafael Vergara De La Ossa

CARGO / ENTIDAD: Res. SST

FIRMA: Rafael Vergara

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☑ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	LUIS MARIA VEGA	OPERADOR	5935279	Luis Vega
2	IVAN PESTANA	AYUDANTE	1065373311	Ivan Pestana
4	JENNIFER QUIÑONEZ PESTANA	PALETERA	1065372819	Jennifer Quiñonez
5	KATIA HERRERA RAMOS	PALETERA	1065374919	Katia Herrera
6	WILSON PESTANA	AYUDANTE	15704543	Wilson Pestana
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	CONTROL DE ASISTENCIA		
	Código No. AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	Fecha de emisión: 01/ 08/ 2013

PROYECTO: 2269-2021
LUGAR / FRENTE: Shaw n
NOMBRE DEL EVENTO: Prevención Riesgos Laborales
FECHA: 27-01-2023 DURACIÓN: 10

DICTADO POR:
NOMBRE: Adrian Ortiz V. Ulloa
CARGO / ENTIDAD: INSPECTOR HSE
FIRMA: Adrian T

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☑ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatoria evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	Juan Pestana Ramos	ayudante de obra Incopav	7.065.373.311	Juan Pestano
2	Jennifer Quintero Pestana	Guia vial	7065312814	Jennifer Quintero
3	Luis Vega	operador	5975279	Luis Vega
4	Katia Herrera Ramos	Paletera	7.065374914	Katia Herrera
5	Wilson Pestana	ayudante	7045243	Wilson
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav

CONTROL DE ASISTENCIA

Código No. AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	Fecha de emisión: 01/ 08/ 2013

PROYECTO: 2269-2023
LUGAR / FRENTE: Sacara Termo #3
NOMBRE DEL EVENTO: Protección para Ojos
FECHA: 10-01-2023 **DURACIÓN:** 10min

DICTADO POR:
NOMBRE: Adrian Ortiz V. Moreno
CARGO / ENTIDAD: Inspector HSE
FIRMA: Adrian

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☑ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	Jennefer Quiñones Pestana	Paletera	1065372819	Jennefer Quiñones
2	Katia Herrera Ramos	paletera	1.065374919	Katia Herrera
3	Juan Pestana Ramos	ayudante de obra Incopav	1.065.373.311	Juan Pestana
4	Luis Vega	Op.	5935279	Luis Vega
5	Quilson Pestana	oficios Varios	1.70145213	Quilson
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav

CONTROL DE ASISTENCIA

Código No.	Versión No.	Fecha de emisión:
AD-P-01 / R-04	Versión No. 2	01/ 08/ 2013

PROYECTO: 2269-2021

LUGAR / FRENTE: Sección Tramo #3

NOMBRE DEL EVENTO: Vale la pena a la Seguridad

FECHA: 11-01-2023 DURACIÓN: 10 min

DICTADO POR:

NOMBRE: Adrian Ortiz V. Vasco

CARGO / ENTIDAD: Inspector HSE

FIRMA: Adrian F.

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☑ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	Jennifer Quiñones Restrepo	Paletera	7065372819	Jennifer Quiñones
2	Katia Hoyos Ramos	Paletera	7065374944	Katia Hoyos
3	Juan Restrepo Ramos	ayudante de obra incopav	7.065.373.311	Juan Restrepo
4	Luis Vega	OP.	5135279	Luis Vega
5	Wilson Persona	oficios varios	15704543	Wilson
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OBRA	Codigo:	FTO.GI.15
		Version:	1
		Fecha:	22/05/2019
		Hoja:	1 de 1

Proyecto:	Int. Paso Mto y retiro de las Carretas Gtv	Empresa:	INDEVAL S.A.S
Contrato No.:	2263 de 2021	Responsable HSE:	Vanessa Sanchez B.
Municipio:	Cuevas - Scie	Fecha:	17 01 23

Convenciones: N/A: No aplica B: Bien M: Mal

Item	Descripción	B	M	N/A	OBSERVACIONES
1	Permisos de trabajo completamente diligenciados, abiertos y en sitio. (Cuando Aplique)			NA	
2	Monitoreo de atmósferas requerido y efectuado. (Si se requiere)			NA	
3	Se cuenta en campo/sitio diligenciado y divulgados			NA	
4	Se realizó la Charla diaria de seguridad (Registro)	B			
5	Inspección de Elementos de Protección personal básicos	B			
6	Inspección diaria de maquinaria, equipos	B			
7	Áreas de trabajo señalizadas y demarcadas	B			
8	Se cuenta con el suministro de agua potable en campo	B			
9	Se cuenta con sanitarios (uno (1) por cada quince (15) trabajadores) y en condiciones higiénicas	B			
10	Se tiene disponible en campo/sitio los equipos de emergencias (Extintores, camilla, botiquín, inmovilizadores, otros)	B			
11	Se cuenta con los equipos (Extintores)para la extinción de incendios incipientes de acuerdo al material combustible identificado	B			
12	Se cuenta con vehículo en campo/sitio y/o equipos de comunicación para emergencias.	B			
13	El personal que ejecuta la actividad entiende su función dentro del plan de emergencias y/o contingencias.		M		Pendiente Capacitar personal.
14	Se tiene señalizada y despejada las rutas de accesos y de escape ante alguna eventualidad.	B			
15	Se tiene en campo registros de reportes e investigación de accidentes/incidentes y divulgación lección aprendida			N/A	
16	Se cuenta en campo/sitio avisos de promoción y prevención de la seguridad.	B			
17	Se tienen en campo/sitio canecas señalizadas para la segregación de residuos (Institucionales y/o Industriales) de acuerdo al PMIR.	B			
18	Se realizara la remoción frecuente de escombros generados	B			
19	Andamios identificados, bien armados y seguros.			NA	
20	Escaleras y accesos seguros			NA	
21	Energía temporal bien instalada, tableros y equipos aterrizados.			NA	
22	Extensiones eléctricas en buen estado.			NA	
23	Uso de herramientas en buen estado (Se cuenta con registros de Inspección mensual).				
24	Protección de varillas salientes y/o retiro de las mismas.			NA	
25	Excavaciones seguras	B			
26	El área de trabajo se encuentra en orden y aseo.	B			
27	Se establecieron los requisitos de seguridad para trabajos en alturas.			NA	
28	Se identificaron los requisitos de seguridad para trabajos en espacios confinado.			NA	
29	Para los trabajos nocturnos, Se cuenta la iluminación suficiente.			NA	
30	Se realiza la inspección de seguridad permanente por parte del supervisor HSE del contratista de los trabajos a realizar	B			
31	Se diligencian los registros preoperacionales de equipos, maquinaria y herramientas previo al inicio de cadad actividad	B			

Observaciones/Comentarios:

	Nombre	Firma
Contratista	Adrian Ortiz	Adrian Ortiz
Interventoría HSE	Vanessa Sanchez Benitez	

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OBRA	Codigo:	FTO.GI.15
		Version:	1
		Fecha:	22/05/2019
		Hoja:	1 de 1

Proyecto:	Interv. Para Mtto y rehab. carretera COV-SAB	Empresa:	INGEVAL SAS
Contrato No.:	2263 - 2021	Responsable HSE:	Vanessa Sanchez B.
Municipio:	Covenas - Sucre.	Fecha:	13 01 23

Convenciones: **N/A:** No aplica **B:** Bien **M:** Mal

Item	Descripción	B	M	N/A	OBSERVACIONES
1	Permisos de trabajo completamente diligenciados, abiertos y en sitio. (Cuando Aplique)			NA	
2	Monitoreo de atmósferas requerido y efectuado (Si se requiere)			NA	
3	Se cuenta en campo/sitio diligenciado y divulgados			NA	
4	Se realizó la Charla diaria de seguridad (Registro)	B			Riesgo Biológico
5	Inspección de Elementos de Protección personal básicos				Planeada Insp. Prox semana
6	Inspección diaria de maquinaria, equipos	B			
7	Áreas de trabajo señalizadas y demarcadas	B			
8	Se cuenta con el suministro de agua potable en campo.	B			
9	Se cuenta con sanitarios (uno (1) por cada quince (15) trabajadores) y en condiciones higiénicas.	B			
10	Se tiene disponible en campo/sitio los equipos de emergencias (Extintores, camilla, botiquín, inmovilizadores, otros).	B			
11	Se cuenta con los equipos (Extintores)para la extinción de incendios incipientes de acuerdo al material combustible identificado.	B			
12	Se cuenta con vehículo en campo/sitio y/o equipos de comunicación para emergencias.	B			
13	El personal que ejecuta la actividad entiende su función dentro del plan de emergencias y/o contingencias.		M		Divulgar plan Emergencia
14	Se tiene señalizada y despejada las rutas de accesos y de escape ante alguna eventualidad.	B			
15	Se tiene en campo registros de reportes e investigación de accidentes/incidentes y divulgación lección aprendida			NA	
16	Se cuenta en campo/sitio avisos de promoción y prevención de la seguridad.				cuenta con algunos. planeado instalación prox sem.
17	Se tienen en campo/sitio canecas señalizadas para la segregación de residuos (Institucionales y/o Industriales) de acuerdo al PMIR.	B			
18	Se realizara la remoción frecuente de escombros generados.	B			
19	Andamios identificados, bien armados y seguros.			NA	
20	Escaleras y accesos seguros			NA	
21	Energía temporal bien instalada, tableros y equipos aterrizados.			NA	
22	Extensiones eléctricas en buen estado.			NA	
23	Uso de herramientas en buen estado (Se cuenta con registros de Inspección mensual).	B			
24	Protección de varillas salientes y/o retiro de las mismas.			NA	
25	Excavaciones seguras.	B			
26	El área de trabajo se encuentra en orden y aseo.	B			
27	Se establecieron los requisitos de seguridad para trabajos en alturas.			NA	
28	Se identificaron los requisitos de seguridad para trabajos en espacios confinado.			NA	
29	Para los trabajos nocturnos, Se cuenta la iluminación suficiente.			NA	
30	Se realiza la inspección de seguridad permanente por parte del supervisor HSE del contratista de los trabajos a realizar	B			
31	Se diligencian los registros preoperacionales de equipos, maquinaria y herramientas previo al inicio de cadad actividad	B			

Observaciones/Comentarios:

	Nombre	Firma
Contratista	Adrian Ortiz Villero	ADRIAN
Interventoría HSE	Vanessa Sanchez Benitez	

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OBRA	Codigo:	FTO.GI.15
		Version:	1
		Fecha:	22/05/2019
		Hoja:	1 de 1

Proyecto:	Int. para Mto de las carreteras Cev-Schanata.	Empresa:	INGEVAL S.A.S.
Contrato No.:	2263 del 2021	Responsable HSE:	Vanessa Sanchez Benitez
Municipio:	Covenas	Fecha:	16 01 23

Convenciones: **N/A:** No aplica. **B:** Bien. **M:** Mal

Item	Descripción	B	M	N/A	OBSERVACIONES
1	Permisos de trabajo completamente diligenciados, abiertos y en sitio. (Cuando Aplique)			NA.	
2	Monitoreo de atmósferas requerido y efectuado. (Si se requiere)			N.A	
3	Se cuenta en campo/sitio diligenciado y divulgados			N.A	
4	Se realizó la Charla diana de seguridad (Registro).	B			
5	Inspección de Elementos de Protección personal básicos.	B			
6	Inspección diana de maquinaria, equipos	B			
7	Áreas de trabajo señalizadas y demarcadas.	B			
8	Se cuenta con el suministro de agua potable en campo.	B			
9	Se cuenta con sanitarios (uno (1) por cada quince (15) trabajadores) y en condiciones higiénicas.	B			
10	Se tiene disponible en campo/sitio los equipos de emergencias (Extintores, camilla, botiquín, inmovilizadores, otros).	B			
11	Se cuenta con los equipos (Extintores)para la extinción de incendios incipientes de acuerdo al material combustible identificado.	B			
12	Se cuenta con vehículo en campo/sitio y/o equipos de comunicación para emergencias.	B			
13	El personal que ejecuta la actividad entiende su función dentro del plan de emergencias y/o contingencias.		M		Capacitacion Pendiente.
14	Se tiene señalizada y despejada las rutas de accesos y de escape ante alguna eventualidad.	B			
15	Se tiene en campo registros de reportes e investigación de accidentes/incidentes y divulgación lección aprendida			NA	
16	Se cuenta en campo/sitio avisos de promoción y prevención de la seguridad.	B			
17	Se tienen en campo/sitio canecas señalizadas para la segregación de residuos (Institucionales y/o Industriales) de acuerdo al PMIR.	B			
18	Se realizara la remoción frecuente de escombros generados	B			
19	Andamios identificados, bien armados y seguros.			NA	
20	Escaleras y accesos seguros.			NA	
21	Energía temporal bien instalada, tableros y equipos aterrizados.			NA	
22	Extensiones eléctricas en buen estado.			NA	
23	Uso de herramientas en buen estado (Se cuenta con registros de Inspección mensual).				
24	Protección de varillas salientes y/o retiro de las mismas.			NA	
25	Excavaciones seguras	B			
26	El area de trabajo se encuentra en orden y aseo.	B			
27	Se establecieron los requisitos de seguridad para trabajos en alturas.			NA	
28	Se identificaron los requisitos de seguridad para trabajos en espacios confinado.			NA	
29	Para los trabajos nocturnos, Se cuenta la iluminación suficiente.			NA	
30	Se realiza la inspección de seguridad permanente por parte del supervisor HSE del contratista de los trabajos a realizar				
31	Se diligencian los registros preoperacionales de equipos, maquinaria y herramientas previo al inicio de cadad actividad				

Observaciones/Comentarios:

	Nombre	Firma
Contratista	Adrian Ortiz Villero	Adrian Ortiz
Interventoria HSE	Vanessa Sanchez B.	

Powered by CamScanner

incopav	PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS		
	Código: PP-P-02 R-47	Versión: 5	Fecha de emisión: 02/12/2019

PROYECTO: 2269-2021	FECHA: Del 03 Al 07 De Enero 2022
RESPONSABLE: Adrian Ortiz V. Lugo	INSPECCIONADO POR: Edwin Suarez

HERRAMIENTAS	REVISIÓN	L		M		MI		J		V		S		D	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Biseladora	Pines, cadena, manivela, ajuste de boquilla, resorte, seguro, piñón, (zunchos carrito)														
Diferencial	Pin de tuerca, tuercas apretadas, cadena pasando bien, estado del burro														
Gatos hidráulicos	Fugas														
Boquillas para calentar	Uniones														
Caretas para soldar	Estado general														
Caretas para esmerilar	Acetato, tafilete														
Cilindros de gas	Revisar si tienen golpes, estado de la válvula			·											
Cinta métrica	Estado general			/				/		/		/			
Alicates	Mango, aislamiento			/				/		/		/			
Destornilladores	Mango														
Llave expansiva	Estado general														
Juego de llaves	Estado general														
Caja de Herramientas	Estado general														
Niveles	Estado general														
Llana metálica	Estado general														
Lima plana	Estado general														
Serrucho	Estado general, dientes en buen estado														
Seguetas	Estado general, dientes en buen estado														
Machete	Mango			·											
Cinceles - Punteros	Estado general														
Barretones	Ajuste del mango, astillas														
Barras	Ajuste del mango, astillas			/		/		/		/		/			
Palas	Ajuste del mango, astillas			/		/		/		/		/			
Picas	Ajuste del mango, astillas			/		/		/		/		/			
Paladragas	Mango, resorte, ejes														
Palustre	Mango														
Espátulas	Mango														
Monas de Bronce	Mango														
Maceta	Mango														
Pisones	Mango														

Powered by CamScanner

incopav	PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS		
	Código: PP-P-02 R-47	Versión: 5	Fecha de emisión: 02/12/2019

HERRAMIENTAS	REVISIÓN	L		M		MI		J		V		S		D	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Martillos	Mango			✓		✓				✓		✓			
Gratas	Estado general														
Carretillas	Llantas – Estado general			✓		✓				✓		✓			
Termos para agua	Limpios y en buen estado														
Eslingas, estrobos	Estado general														
Linterna	Estado general														
Manilas	Buen estado														
Reflectores	Instalación eléctrica, línea a tierra														
Extensiones	Toma, estado de cables														
Bichiroque	Sin esquirlas														
Porros	Mango														
Villamartín	Mandrin que ajuste bien														
Villamartín	Bien colocada la broca														
Almádanas	Mango														
Azuela	Mango bien encabado														
Hacha	Mango														
Inspeccionado por:	Edwin Suarez			EDW.		EDW.		EDW.		EDW.		EDW.		EDW.	
Revisado por:	Adrian Ortiz V. Vera														
APROBADO:		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

CON RESTRICCIÓN:

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS		
	Código: PP-P-02 R-47	Versión: 5	Fecha de emisión: 02/12/2019

PROYECTO: 2269 - 2021	FECHA: Del 10 al 14 Febrero 2023
RESPONSABLE: Deimar Otero Villero	INSPECCIONADO POR: Edwin Suarez

HERRAMIENTAS	REVISIÓN	L		M		MI		J		V		S		D	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Biseladora	Pines, cadena, manivela, ajuste de boquilla, resorte, seguro, piñón, (zunchos carrito)														
Diferencial	Pin de tuerca, tuercas apretadas, cadena pasando bien, estado del burro														
Gatos hidráulicos	Fugas														
Boquillas para calentar	Uniones														
Caretas para soldar	Estado general														
Caretas para esmerilar	Acetato, tafilete														
Cilindros de gas	Revisar si tienen golpes, estado de la válvula														
Cinta métrica	Estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
Alicates	Mango, aislamiento			✓		✓		✓		✓		✓			
Destornilladores	Mango														
Llave expansiva	Estado general														
Juego de llaves	Estado general														
Caja de Herramientas	Estado general														
Niveles	Estado general														
Llana metálica	Estado general														
Lima plana	Estado general														
Serrucho	Estado general, dientes en buen estado														
Seguetas	Estado general, dientes en buen estado														
Machete	Mango			✓		✓		✓		✓		✓			
Cinceles - Punteros	Estado general														
Barretones	Ajuste del mango, astillas														
Barras	Ajuste del mango, astillas			✓		✓		✓		✓		✓			
Palas	Ajuste del mango, astillas			✓		✓		✓		✓		✓			
Picas	Ajuste del mango, astillas			✓		✓		✓		✓		✓			
Paladragas	Mango, resorte, ejes														
Palustre	Mango														
Espátulas	Mango														
Monas de Bronce	Mango														
Maceta	Mango														
Pisones	Mango														

Powered by CamScanner

incopav	PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS		
	Código: PP-P-02 R-47	Versión: 5	Fecha de emisión: 02/12/2019

HERRAMIENTAS	REVISIÓN	L		M		MI		J		V		S		D	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Martillos	Mango			✓		✓		✓		✓		✓			
Gratas	Estado general														
Carretillas	Llantas – Estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
Termos para agua	Limpios y en buen estado														
Eslingas, estrobos	Estado general														
Linterna	Estado general														
Manilas	Buen estado														
Reflectores	Instalación eléctrica, línea a tierra														
Extensiones	Toma, estado de cables														
Bichiroque	Sin esquirlas														
Porros	Mango														
Villamartín	Mandrin que ajuste bien														
Villamartín	Bien colocada la broca														
Almádanas	Mango														
Azuela	Mango bien encabado														
Hacha	Mango														
Inspeccionado por:	Edwin Suarez			edwin		EDWIN		EDWIN		EDWIN		EDWIN			
Revisado por:	Adriana F. Ortiz			Adriana T		Adriana T		Adriana T		Adriana T		Adriana H			
	APROBADO:	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

CON RESTRICCIÓN:

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS		
	Código: PP-P-02 R-47	Versión: 5	Fecha de emisión: 02/12/2019

PROYECTO: 2264-2017	FECHA: Del 16 al 21 Febrero 2023
RESPONSABLE: Andres Ocha Ulloa	INSPECCIONADO POR: Edwin Suarez

HERRAMIENTAS	REVISIÓN	L		M		MI		J		V		S		D	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Biseladora	Pines, cadena, manivela, ajuste de boquilla, resorte, seguro, piñón, (zunchos carrito)														
Diferencial	Pin de tuerca, tuercas apretadas, cadena pasando bien, estado del burro														
Gatos hidráulicos	Fugas														
Boquillas para calentar	Uniones														
Caretas para soldar	Estado general														
Caretas para esmerilar	Acetato, tafilete														
Cilindros de gas	Revisar si tienen golpes, estado de la válvula														
Cinta métrica	Estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alicates	Mango, aislamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Destornilladores	Mango														
Llave expansiva	Estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Juego de llaves	Estado general														
Caja de Herramientas	Estado general														
Niveles	Estado general														
Llana metálica	Estado general														
Lima plana	Estado general														
Serrucho	Estado general, dientes en buen estado														
Seguetas	Estado general, dientes en buen estado														
Machete	Mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinceles - Punteros	Estado general														
Barretones	Ajuste del mango, astillas														
Barras	Ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palas	Ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Picas	Ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Paladragas	Mango, resorte, ejes														
Palustre	Mango														
Espátulas	Mango														
Monas de Bronce	Mango														
Maceta	Mango														
Pisones	Mango														

Powered by CamScanner

incopav	PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS		
	Código: PP-P-02 R-47	Versión: 5	Fecha de emisión: 02/12/2019

HERRAMIENTAS	REVISIÓN	L		M		MI		J		V		S		D
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B
Martillos	Mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Gratas	Estado general													
Carretillas	Llantas – Estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Termos para agua	Limpios y en buen estado													
Eslingas, estrobos	Estado general													
Linterna	Estado general													
Manilas	Buen estado													
Reflectores	Instalación eléctrica, línea a tierra													
Extensiones	Toma, estado de cables													
Bichiroque	Sin esquirlas													
Porros	Mango													
Villamartín	Mandrin que ajuste bien													
Villamartín	Bien colocada la broca													
Almádanas	Mango													
Azuela	Mango bien encabado													
Hacha	Mango													
Inspeccionado por:	Edwin Suarez	EDWIN		EDWIN		EDWIN		EDWIN		EDWIN		EDWIN		
Revisado por:	ADRIAN ORTIZ	ADRIAN F		ADRIAN		ADRIAN F		ADRIAN F		ADRIAN F		ADRIAN		
APROBADO:		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI

CON RESTRICCIÓN:

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS		
	Código: PP-P-02 R-47	Versión: 5	Fecha de emisión: 02/12/2019

PROYECTO: 226-2024	FECHA: Del 23 al 29 Enero 2025
RESPONSABLE: Pedro Ortiz	INSPECCIONADO POR: Edwin Suarez

HERRAMIENTAS	REVISIÓN	L		M		MI		J		V		S		D	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Biseladora	Pines, cadena, manivela, ajuste de boquilla, resorte, seguro, piñón, (zunchos carrito)														
Diferencial	Pin de tuerca, tuercas apretadas, cadena pasando bien, estado del burro														
Gatos hidráulicos	Fugas														
Boquillas para calentar	Uniones														
Caretas para soldar	Estado general														
Caretas para esmerilar	Acetato, tafilete														
Cilindros de gas	Revisar si tienen golpes, estado de la válvula														
Cinta métrica	Estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alicates	Mango, aislamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Destornilladores	Mango														
Llave expansiva	Estado general														
Juego de llaves	Estado general														
Caja de Herramientas	Estado general														
Niveles	Estado general														
Llana metálica	Estado general														
Lima plana	Estado general														
Serrucho	Estado general, dientes en buen estado														
Seguetas	Estado general, dientes en buen estado														
Machete	Mango														
Cinceles - Punteros	Estado general														
Barretones	Ajuste del mango, astillas														
Barras	Ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palas	Ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Picas	Ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Paladragas	Mango, resorte, ejes														
Palustre	Mango														
Espátulas	Mango														
Monas de Bronce	Mango														
Maceta	Mango														
Pisones	Mango														

Powered by CamScanner

incopav	PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS		
	Código: PP-P-02 R-47	Versión: 5	Fecha de emisión: 02/12/2019

HERRAMIENTAS	REVISIÓN	L		M		MI		J		V		S		D	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Martillos	Mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Gratas	Estado general														
Carretillas	Llantas – Estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Termos para agua	Limpios y en buen estado														
Eslingas, estrobos	Estado general														
Linterna	Estado general														
Manilas	Buen estado														
Reflectores	Instalación eléctrica, línea a tierra														
Extensiones	Toma, estado de cables														
Bichiroque	Sin esquirlas														
Porros	Mango														
Villamartín	Mandrin que ajuste bien														
Villamartín	Bien colocada la broca														
Almádanas	Mango														
Azuela	Mango bien encabado														
Hacha	Mango														
Inspeccionado por:	Edwin Suarez	EDWI		EDWI		EDWI		EDWI		EDWI		EDWI			
Revisado por:	ADRIAN ORTIZ														
APROBADO:		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

CON RESTRICCIÓN:

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS		
	Código: PP-P-02 R-47	Versión: 5	Fecha de emisión: 02/12/2019

PROYECTO: 2269 – 2023	FECHA: Del 30 enero al 4 Febrero 2023
RESPONSABLE: Adrian Ortiz	INSPECCIONADO POR: Edwin Suarez

HERRAMIENTAS	REVISIÓN	L		M		MI		J		V		S		D	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Biseladora	Pines, cadena, manivela, ajuste de boquilla, resorte, seguro, piñón, (zunchos carrito)														
Diferencial	Pin de tuerca, tuercas apretadas, cadena pasando bien, estado del burro														
Gatos hidráulicos	Fugas														
Boquillas para calentar	Uniones														
Caretas para soldar	Estado general														
Caretas para esmerilar	Acetato, tafilete														
Cilindros de gas	Revisar si tienen golpes, estado de la válvula														
Cinta métrica	Estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alicates	Mango, aislamiento	✓		✓		✓				✓		✓			
Destornilladores	Mango														
Llave expansiva	Estado general														
Juego de llaves	Estado general														
Caja de Herramientas	Estado general														
Niveles	Estado general														
Llana metálica	Estado general														
Lima plana	Estado general														
Serrucho	Estado general, dientes en buen estado														
Seguetas	Estado general, dientes en buen estado														
Machete	Mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinceles - Punteros	Estado general														
Barretones	Ajuste del mango, astillas														
Barras	Ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palas	Ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Picas	Ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Paladragas	Mango, resorte, ejes														
Palustre	Mango														
Espátulas	Mango														
Monas de Bronce	Mango														
Maceta	Mango														
Pisones	Mango														

Powered by CamScanner

incopav	PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS		
	Código: PP-P-02 R-47	Versión: 5	Fecha de emisión: 02/12/2019

HERRAMIENTAS	REVISIÓN	L		M		MI		J		V		S		D	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Martillos	Mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Gratas	Estado general														
Carretillas	Llantas – Estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Termos para agua	Limpios y en buen estado														
Eslingas, estrobos	Estado general														
Linterna	Estado general														
Manilas	Buen estado														
Reflectores	Instalación eléctrica, línea a tierra														
Extensiones	Toma, estado de cables														
Bichiroque	Sin esquirlas														
Porros	Mango														
Villamartín	Mandrin que ajuste bien														
Villamartín	Bien colocada la broca														
Almádanas	Mango														
Azuela	Mango bien encabado														
Hacha	Mango														
Inspeccionado por:	Edwin Suárez	EOW.r		EOW.r		EOW.r		EOW.r		EOW.r		EOW.r			
Revisado por:															
APROBADO:		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

CON RESTRICCIÓN:

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA		
	Código: PP-P-02 R-26	Versión: 3	Fecha de emisión: 02/12/2019

PROYECTO: 22692021				FECHA: 03 01 023 AL 08-01-023			
CONDUCTOR: Ramiro Castro				CEDULA 4052850			
MODELO: 2006		COLOR: Blanco		MARCA: INTERNATIONAL			
LICENCIA DE TRANSITO (Categoría): C3	SOAT (Vigencia):			SEG. RESP.CIVIL (Vigencia): NA			PLACA: Bwc 949
	DD: 23	MM: 07	AÑO: 2023	DD:	MM:	AÑO:	
REGISTRO NAL. TRANP. CARGA	CERTIFICADO DE GASES (Vigencia):			KILOMETRAJE:			
SI / NO	DD: 14	MM: 2	AÑO: 2023	INICIAL: 523124		FINAL:	

B: Buen estado ; M: Mal estado.

ÍTEM		L		M		MI		J		V		S		D	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
EQUIPO DE SEGURIDAD	Botiquín	✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor Cargado	✓		✓		✓		✓		✓					
	Gato	✓		✓		✓		✓		✓					
	Cruceta o copa	✓		✓		✓		✓		✓					
	Triángulos (2)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Tacos O Cuñas (2)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Llanta De Repuesto Inflada Y En Buen Estado	✓		✓		✓		✓		✓					
	Herramientas (Llave Expansiva, Destornilladores(Pala Y Estrella), Llaves Fijas, Alicate, Linterna) Pág. 39 Ley 769/02	✓		✓		✓		✓		✓					
	Chaleco Reflectivo	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL	Defensa o Bompers	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la cabina	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del volco	✓		✓		✓		✓		✓					
	Guardabarros (2)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Sujeción guardabarros	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado De La Compuerta Del Volco	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado Del Seguro De La Compuerta	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado Del Gato O Botella De Levante Del Volco.(Golpes O Fugas)	✓		-		-		✓		✓					
	Pasadores Completos Y En Buen Estado	✓		✓		✓		✓		✓					
	Control De Fugas De Aire	✓		✓		✓		✓		✓					
	Control De Fugas Hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Sistema Eléctrico Aislado	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado Y Fijación De Asientos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Espejos Retrovisores Ext. Izq.,Ext. Der. E Interior	✓		✓		✓		✓		✓					
	Pisos De La Cabina(Estado Y Seguridad)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Cardan Con Seguros (cadena)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Cinturones De Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓					
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL	Sistema Deposito Combustible (Tanque, Tubería, Conexiones, Carburador)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Escaleras Y Apoyos Seguros.	✓		✓		✓		✓		✓					
	Batería En Buen Estado	✓		✓		✓		✓		✓					
	Cables Y Conexiones De La Batería	✓		✓		✓		✓		✓					
	Alarma De Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓					

Powered by CamScanner

incopav	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA		
	Código: PP-P-02 R-26	Versión: 3	Fecha de emisión: 02/12/2019

ÍTEM		L		M		MI		J		V		S		D	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN	Balanceo De Llantas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Alineación de ruedas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Chasis (Paralelismo – Estado)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificación Juegos Y Deterioros En La Suspensión (Muelles, Soportes, Topes, Amortiguadores)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificación Juegos En La Dirección (Barras, Brazos De Dirección, Columna De Dirección, Terminales, Rótulas Y Bujes, Fugas)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado De la bomba de dirección	✓		✓		✓		✓		✓					
FRENOS	Freno De Servicio	✓		✓		✓		✓		✓					
	Tubos Y Mangueras Del Circuito De Freno	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado De Las Cámaras	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado De Los Pasadores De Las Cámaras	✓		✓		✓		✓		✓					
	Eficiencia del Freno	✓		✓		✓		✓		✓					
	Sujeción de las cámaras	✓		✓		✓		✓		✓					
	Freno de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓					
INSTRUMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD	Limpia Parabrisas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Parabrisas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado Del Vidrio Trasero De La Cabina	✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicadores (Temperatura, Hidráulico, Fluidos, Voltímetro, Tacómetro)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador Nivel del Combustible.	✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador De Presión De Aire	✓		✓		✓		✓		✓					
CONTAMINANTES	Sistema De Escape (Exosto – Silenciadores)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Aislamiento Térmico En El Exosto	✓		✓		✓		✓		✓					
LUCES	Emanación De Gases	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luces De Posición Delanteras (Cocuyos)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luces De Posición Traseras (2)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luces Bajas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luces Plenas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luces De Freno (2)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luces Direccionales O De Giro Delanteras	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luces Direccionales O De Giro Traseras	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luces De Emergencia (Estacionarias)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luces De Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luz Para Placa	✓		✓		✓		✓		✓					
	Dispositivo Reflectante Trasero	✓		✓		✓		✓		✓					
LLANTAS	Llantas Traseras Izquierda (Labrado 3 mm)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Llanta Trasera Derecha (Labrado 3 mm)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Llanta delantera Izquierda.(Labrado 3 mm)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Llanta Delantera Derecha.(Labrado 3 mm)	✓		✓		✓		✓		✓					
Inspeccionado por:	Francisco Castro	F.C		F.C		F.C		F.C		F.C					
Revisado por:	Adrian Dario Rincon	ADRIANT		ADRIANT		ADRIANT		ADRIANT		ADRIANT					
APROBADO:		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CON RESTRICCIÓN:															
OBSERVACIONES:															

Powered by CamScanner

incopav	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA		
	Código: PP-P-02 R-26	Versión: 3	Fecha de emisión: 02/12/2019

PROYECTO: 2269-2024				FECHA: Del 10 M 14 ENERO 2023		
CONDUCTOR: Francisco Castro				CEDULA 4052850		
MODELO: 2006		COLOR: Blanco		MARCA: Internacional		
LICENCIA DE TRANSITO (Categoría): C3	SOAT (Vigencia):			SEG. RESP.CIVIL (Vigencia): NA		PLACA: BWC949
	DD: 22	MM: 9	AÑO: 2023	DD:	MM:	AÑO:
REGISTRO NAL. TRANP. CARGA NA	CERTIFICADO DE GASES (Vigencia):			KILOMETRAJE:		
SI / NO	DD: 14	MM: 2	AÑO: 2023	INICIAL:		FINAL:

B: Buen estado ; M: Mal estado.

ÍTEM		L		M		MI		J		V		S		D	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
EQUIPO DE SEGURIDAD	Botiquín			X		X		X		X					
	Extintor Cargado			X		X		X		X					
	Gato			X		X		X		X					
	Cruceta o copa			X		X		X		X					
	Triángulos (2)			X		X		X		X					
	Tacos O Cuñas (2)			X		X		X		X					
	Llanta De Repuesto Inflada Y En Buen Estado			X		X		X		X					
	Herramientas (Llave Expansiva, Destornilladores(Pala Y Estrella), Llaves Fijas, Alicate, Linterna) Pág. 39 Ley 769/02			X		X		X		X					
	Chaleco Reflectivo			X		X		X		X					
ESTADO GENERAL	Defensa o Bompers			X		X		X		X					
	Estado de la cabina			X		X		X		X					
	Estado del volco			X		X		X		X					
	Guardabarros (2)			X		X		X		X					
	Sujeción guardabarros			X		X		X		X					
	Estado De La Compuerta Del Volco			X		X		X		X					
	Estado Del Seguro De La Compuerta			X		X		X		X					
	Estado Del Gato O Botella De Levante Del Volco.(Golpes O Fugas)			X		X		X		X					
	Pasadores Completos Y En Buen Estado			X		X		X		X					
	Control De Fugas De Aire			X		X		X		X					
	Control De Fugas Hidráulicas			X		X		X		X					
	Sistema Eléctrico Aislado			X		X		X		X					
	Estado Y Fijación De Asientos			X		X		X		X					
	Espejos Retrovisores Ext. Izq.,Ext. Der. E Interior			X		X		X		X					
	Pisos De La Cabina(Estado Y Seguridad)			X		X		X		X					
	Cardan Con Seguros (cadena)			X		X		X		X					
	Cinturones De Seguridad			X		X		X		X					
	Pito			X		X		X		X					
ESTADO GENERAL	Sistema Deposito Combustible (Tanque, Tubería, Conexiones, Carburador)			X		X		X		X					
	Escaleras Y Apoyos Seguros.			X		X		X		X					
	Batería En Buen Estado			X		X		X		X					
	Cables Y Conexiones De La Batería			X		X		X		X					
	Alarma De Retroceso			X		X		X		X					

Powered by CamScanner

incopav	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA		
	Código: PP-P-02 R-26	Versión: 3	Fecha de emisión: 02/12/2019

ÍTEM		L		M		MI		J		V		S		D	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN	Balanceo De Llantas			X		X		X		X					
	Alineación de ruedas			X		X		X		X					
	Chasis (Paralelismo – Estado)			X		X		X		X					
	Verificación Juegos Y Deterioros En La Suspensión (Muelles, Soportes, Topes, Amortiguadores)			X		X		X		X					
	Verificación Juegos En La Dirección (Barras, Brazos De Dirección, Columna De Dirección, Terminales, Rótulas Y Bujes, Fugas)			X		X		X		X					
	Estado De la bomba de dirección			X		X		X		X					
FRENOS	Freno De Servicio			X		X		X		X					
	Tubos Y Mangueras Del Circuito De Freno			X		X		X		X					
	Estado De Las Cámaras			X		X		X		X					
	Estado De Los Pasadores De Las Cámaras			X		X		X		X					
	Eficiencia del Freno			X		X		X		X					
	Sujeción de las cámaras			X		X		X		X					
	Freno de Seguridad			X		X		X		X					
INSTRUMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD	Limpia Parabrisas			X		X		X		X					
	Parabrisas			X		X		X		X					
	Estado Del Vidrio Trasero De La Cabina			X		X		X		X					
	Indicadores (Temperatura, Hidráulico, Fluidos, Voltímetro, Tacómetro)			X		X		X		X					
	Indicador Nivel del Combustible.			X		X		X		X					
	Indicador De Presión De Aire			X		X		X		X					
CONTAMINANTES	Sistema De Escape (Exosto – Silenciadores)			X		X		X							
	Aislamiento Térmico En El Exosto			X		X		X		X					
LUCES	Emanación De Gases			X		X		X		X					
	Luces De Posición Delanteras (Cocuyos)			X		X		X		X					
	Luces De Posición Traseras (2)			X		X		X		X					
	Luces Bajas			X		X		X		X					
	Luces Plenas			X		X		X		X					
	Luces De Freno (2)			X		X		X		X					
	Luces Direccionales O De Giro Delanteras			X		X		X		X					
	Luces Direccionales O De Giro Traseras			X		X		X		X					
	Luces De Emergencia (Estacionarias)			X		X		X		X					
	Luces De Retroceso			X		X		X		X					
	Luz Para Placa			X		X		X		X					
	Dispositivo Reflectante Trasero			X		X		X		X					
LLANTAS	Llantas Traseras Izquierda (Labrado 3 mm)			X		X		X		X					
	Llanta Trasera Derecha (Labrado 3 mm)			X		X		X		X					
	Llanta delantera Izquierda.(Labrado 3 mm)			X		X		X		X					
	Llanta Delantera Derecha.(Labrado 3 mm)			X		X		X		X					
Inspeccionado por:	Francisco Castro			F.C		F.C		F.C		F.C					
Revisado por:	Adrian Ortiz			Adrian F		Adrian F		Adrian F		Adrian F					
APROBADO:		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

CON RESTRICCIÓN:

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA		
	Código: PP-P-02 R-26	Versión: 3	Fecha de emisión: 02/12/2019

PROYECTO: 2264-2020				FECHA: Del 16 al 19 De enero 2023			
CONDUCTOR: Francisco Castro				CEDULA 4052850			
MODELO: 2006			COLOR: Blanco			MARCA: Internacional	
LICENCIA DE TRANSITO (Categoría): C3		SOAT (Vigencia):			SEG. RESP.CIVIL (Vigencia): NA		PLACA: BWC 949
		DD: 23	MM: 4	AÑO: 2023	DD:	MM:	AÑO:
REGISTRO NAL. TRANP. CARGA NA		CERTIFICADO DE GASES (Vigencia):			KILOMETRAJE:		
SI	NO	DD: 14	MM: 2	AÑO: 2023	INICIAL:		FINAL:

B: Buen estado ; M: Mal estado.

ÍTEM		L		M		MI		J		V		S		D	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
EQUIPO DE SEGURIDAD	Botiquín	X		X		X		X		X		X			
	Extintor Cargado	X		X		X		X		X		X			
	Gato	X		X		X		X		X		X			
	Cruceta o copa	X		X		X		X		X		X			
	Triángulos (2)	X		X		X		X		X		X			
	Tacos O Cuñas (2)	X		X		X		X		X		X			
	Llanta De Repuesto Inflada Y En Buen Estado	X		X		X		X		X		X			
	Herramientas (Llave Expansiva, Destornilladores(Pala Y Estrella), Llaves Fijas, Alicate, Linterna) Pág. 39 Ley 769/02	X		X		X		X		X		X			
	Chaleco Reflectivo	X		X		X		X		X		X			
ESTADO GENERAL	Defensa o Bompers	X		X		X		X		X		X			
	Estado de la cabina	X		X		X		X		X		X			
	Estado del volco	X		X		X		X		X		X			
	Guardabarros (2)	X		X		X		X		X		X			
	Sujeción guardabarros	X		X		X		X		X		X			
	Estado De La Compuerta Del Volco	X		X		X		X		X		X			
	Estado Del Seguro De La Compuerta	X		X		X		X		X		X			
	Estado Del Gato O Botella De Levante Del Volco.(Golpes O Fugas)	X		X		X		X		X		X			
	Pasadores Completos Y En Buen Estado	X		X		X		X		X		X			
	Control De Fugas De Aire	X		X		X		X		X		X			
	Control De Fugas Hidráulicas	X		X		X		X		X		X			
	Sistema Eléctrico Aislado	X		X		X		X		X		X			
	Estado Y Fijación De Asientos	X		X		X		X		X		X			
	Espejos Retrovisores Ext. Izq.,Ext. Der. E Interior	X		X		X		X		X		X			
	Pisos De La Cabina(Estado Y Seguridad)	X		X		X		X		X		X			
	Cardan Con Seguros (cadena)	X		X		X		X		X		X			
	Cinturones De Seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Pito	X		X		X		X		X		X			
ESTADO GENERAL	Sistema Deposito Combustible (Tanque, Tubería, Conexiones, Carburador)	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras Y Apoyos Seguros.	X		X		X		X		X		X			
	Batería En Buen Estado	X		X		X		X		X		X			
	Cables Y Conexiones De La Batería	X		X		X		X		X		X			
	Alarma De Retroceso	X		X		X		X		X		X			

Powered by CamScanner

incopav	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA		
	Código: PP-P-02 R-26	Versión: 3	Fecha de emisión: 02/12/2019

ÍTEM		L		M		MI		J		V		S		D	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN	Balanceo De Llantas														
	Alineación de ruedas														
	Chasis (Paralelismo – Estado)														
	Verificación Juegos Y Deterioros En La Suspensión (Muelles, Soportes, Topes, Amortiguadores)														
	Verificación Juegos En La Dirección (Barras, Brazos De Dirección, Columna De Dirección, Terminales, Rótulas Y Bujes, Fugas)														
	Estado De la bomba de dirección														
FRENOS	Freno De Servicio														
	Tubos Y Mangueras Del Circuito De Freno														
	Estado De Las Cámaras														
	Estado De Los Pasadores De Las Cámaras														
	Eficiencia del Freno														
	Sujeción de las cámaras														
	Freno de Seguridad														
INSTRUMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD	Limpia Parabrisas														
	Parabrisas														
	Estado Del Vidrio Trasero De La Cabina														
	Indicadores (Temperatura, Hidráulico, Fluidos, Voltímetro, Tacómetro)														
	Indicador Nivel del Combustible.														
	Indicador De Presión De Aire														
CONTAMINANTES	Sistema De Escape (Exosto – Silenciadores)														
	Aislamiento Térmico En El Exosto														
LUCES	Emanación De Gases														
	Luces De Posición Delanteras (Cocuyos)														
	Luces De Posición Traseras (2)														
	Luces Bajas														
	Luces Plenas														
	Luces De Freno (2)														
	Luces Direccionales O De Giro Delanteras														
	Luces Direccionales O De Giro Traseras														
	Luces De Emergencia (Estacionarias)														
	Luces De Retroceso														
	Luz Para Placa														
	Dispositivo Reflectante Trasero														
LLANTAS	Llantas Traseras Izquierda (Labrado 3 mm)														
	Llanta Trasera Derecha (Labrado 3 mm)														
	Llanta delantera Izquierda.(Labrado 3 mm)														
	Llanta Delantera Derecha.(Labrado 3 mm)														
Inspeccionado por:		F.C		F.C		F.C		F.C		F.C		F.C			
Revisado por:		ADRIAN		ADRIAN		ADRIAN		ADRIAN		ADRIAN		ADRIAN			
APROBADO:		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

CON RESTRICCIÓN:

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA		
	Código: PP-P-02 R-26	Versión: 3	Fecha de emisión: 02/12/2019

PROYECTO: 2164-2021						FECHA: Del 23 al 28 De enero 2025		
CONDUCTOR: Francisco Castro						CEDULA 4052 850		
MODELO: 2009			COLOR: Blanco			MARCA: International		
LICENCIA DE TRANSITO (Categoría): C3		SOAT (Vigencia):			SEG. RESP.CIVIL (Vigencia):			PLACA: BWC 949
		DD: 24	MM: 4	AÑO: 2025	DD:	MM:	AÑO:	
REGISTRO NAL. TRANP. CARGA		CERTIFICADO DE GASES (Vigencia):			KILOMETRAJE:			
SI	NO	DD: 14	MM: 2	AÑO: 2025	INICIAL:		FINAL:	

B: Buen estado ; M: Mal estado.

ÍTEM		L		M		MI		J		V		S		D	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
EQUIPO DE SEGURIDAD	Botiquín	X		X		X		X		X		X			
	Extintor Cargado	X		X		X		X		X		X			
	Gato	X		X		X		X		X		X			
	Cruceta o copa	X		X		X		X		X		X			
	Triángulos (2)	X		X		X		X		X		X			
	Tacos O Cuñas (2)	X		X		X		X		X		X			
	Llanta De Repuesto Inflada Y En Buen Estado	X		X		X		X		X		X			
	Herramientas (Llave Expansiva, Destornilladores(Pala Y Estrella), Llaves Fijas, Alicate, Linterna) Pág. 39 Ley 769/02	X		X		X		X		X		X			
	Chaleco Reflectivo	X		X		X		X		X		X			
ESTADO GENERAL	Defensa o Bompers	X		X		X		X		X		X			
	Estado de la cabina	X		X		X		X		X		X			
	Estado del volco	X		X		X		X		X		X			
	Guardabarros (2)	X		X		X		X		X		X			
	Sujeción guardabarros	X		X		X		X		X		X			
	Estado De La Compuerta Del Volco	X		X		X		X		X		X			
	Estado Del Seguro De La Compuerta	X		X		X		X		X		X			
	Estado Del Gato O Botella De Levante Del Volco.(Golpes O Fugas)	X		X		X		X		X		X			
	Pasadores Completos Y En Buen Estado	X		X		X		X		X		X			
	Control De Fugas De Aire	X		X		X		X		X		X			
	Control De Fugas Hidráulicas	X		X		X		X		X		X			
	Sistema Eléctrico Aislado	X		X		X		X		X		X			
	Estado Y Fijación De Asientos	X		X		X		X		X		X			
	Espejos Retrovisores Ext. Izq.,Ext. Der. E Interior	X		X		X		X		X		X			
	Pisos De La Cabina(Estado Y Seguridad)	X		X		X		X		X		X			
	Cardan Con Seguros (cadena)	X		X		X		X		X		X			
	Cinturones De Seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Pito	X		X		X		X		X		X			
ESTADO GENERAL	Sistema Deposito Combustible (Tanque, Tubería, Conexiones, Carburador)	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras Y Apoyos Seguros.	X		X		X		X		X		X			
	Batería En Buen Estado	X		X		X		X		X		X			
	Cables Y Conexiones De La Batería	X		X		X		X		X		X			
	Alarma De Retroceso	X		X		X		X		X		X			

Powered by CamScanner

incopav	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA		
	Código: PP-P-02 R-26	Versión: 3	Fecha de emisión: 02/12/2019

ÍTEM		L		M		MI		J		V		S		D	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN	Balanceo De Llantas														
	Alineación de ruedas														
	Chasis (Paralelismo – Estado)														
	Verificación Juegos Y Deterioros En La Suspensión (Muelles, Soportes, Topes, Amortiguadores)														
	Verificación Juegos En La Dirección (Barras, Brazos De Dirección, Columna De Dirección, Terminales, Rótulas Y Bujes, Fugas)														
	Estado De la bomba de dirección														
FRENOS	Freno De Servicio														
	Tubos Y Mangueras Del Circuito De Freno														
	Estado De Las Cámaras														
	Estado De Los Pasadores De Las Cámaras														
	Eficiencia del Freno														
	Sujeción de las cámaras														
	Freno de Seguridad														
INSTRUMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD	Limpia Parabrisas														
	Parabrisas														
	Estado Del Vidrio Trasero De La Cabina														
	Indicadores (Temperatura, Hidráulico, Fluidos, Voltímetro, Tacómetro)														
	Indicador Nivel del Combustible.														
	Indicador De Presión De Aire														
CONTAMINANTES	Sistema De Escape (Exosto – Silenciadores)														
	Aislamiento Térmico En El Exosto														
LUCES	Emanación De Gases														
	Luces De Posición Delanteras (Cocuyos)														
	Luces De Posición Traseras (2)														
	Luces Bajas														
	Luces Plenas														
	Luces De Freno (2)														
	Luces Direccionales O De Giro Delanteras														
	Luces Direccionales O De Giro Traseras														
	Luces De Emergencia (Estacionarias)														
	Luces De Retroceso														
	Luz Para Placa														
	Dispositivo Reflectante Trasero														
LLANTAS	Llantas Traseras Izquierda (Labrado 3 mm)														
	Llanta Trasera Derecha (Labrado 3 mm)														
	Llante delantera Izquierda.(Labrado 3 mm)														
	Llanta Delantera Derecha.(Labrado 3 mm)														
Inspeccionado por:	Francisco Castro	F.C		F.C		F.C		F.C		F.C		F.C			
Revisado por:	Adriana Ortiz	Adriana		Adriana		Adriana		Adriana		Adriana		Adriana			
APROBADO:		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

CON RESTRICCIÓN:

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA		
	Código: PP-P-02 R-26	Versión: 3	Fecha de emisión: 02/12/2019

PROYECTO: 2264-2021						FECHA: Del 30 Enero al 4 Febrero 2023		
CONDUCTOR: Francisco Cuero						CEDULA 4052850		
MODELO: 2007			COLOR: Blanco			MARCA: Internacional		
LICENCIA DE TRANSITO (Categoría): C3		SOAT (Vigencia):			SEG. RESP.CIVIL (Vigencia):			PLACA:
		DD: 29	MM: 4	AÑO: 2023	DD:	MM:	AÑO:	Bwc 944
REGISTRO NAL. TRANP. CARGA NA		CERTIFICADO DE GASES (Vigencia):			KILOMETRAJE:			
SI	NO	DD: 14	MM: 2	AÑO: 2023	INICIAL:		FINAL:	

B: Buen estado ; M: Mal estado.

ÍTEM		L		M		MI		J		V		S		D	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
EQUIPO DE SEGURIDAD	Botiquín	X		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor Cargado	X		✓		✓		✓		✓		✓			
	Gato	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cruceta o copa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Triángulos (2)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tacos O Cuñas (2)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta De Repuesto Inflada Y En Buen Estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Herramientas (Llave Expansiva, Destornilladores(Pala Y Estrella), Llaves Fijas, Alicate, Linterna) Pág. 39 Ley 769/02	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Chaleco Reflectivo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL	Defensa o Bompers	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la cabina	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del volco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardabarros (2)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sujeción guardabarros	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado De La Compuerta Del Volco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Del Seguro De La Compuerta	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Del Gato O Botella De Levante Del Volco.(Golpes O Fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores Completos Y En Buen Estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control De Fugas De Aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control De Fugas Hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema Eléctrico Aislado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Y Fijación De Asientos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos Retrovisores Ext. Izq.,Ext. Der. E Interior	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pisos De La Cabina(Estado Y Seguridad)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cardan Con Seguros (cadena)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones De Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL	Sistema Deposito Combustible (Tanque, Tubería, Conexiones, Carburador)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras Y Apoyos Seguros.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Batería En Buen Estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cables Y Conexiones De La Batería	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma De Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

incopav	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA		
	Código: PP-P-02 R-26	Versión: 3	Fecha de emisión: 02/12/2019

ÍTEM		L		M		MI		J		V		S		D	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN	Balanceo De Llantas														
	Alineación de ruedas														
	Chasis (Paralelismo – Estado)														
	Verificación Juegos Y Deterioros En La Suspensión (Muelles, Soportes, Topes, Amortiguadores)														
	Verificación Juegos En La Dirección (Barras, Brazos De Dirección, Columna De Dirección, Terminales, Rótulas Y Bujes, Fugas)														
	Estado De la bomba de dirección														
FRENOS	Freno De Servicio														
	Tubos Y Mangueras Del Circuito De Freno														
	Estado De Las Cámaras														
	Estado De Los Pasadores De Las Cámaras														
	Eficiencia del Freno														
	Sujeción de las cámaras														
	Freno de Seguridad														
INSTRUMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD	Limpia Parabrisas														
	Parabrisas														
	Estado Del Vidrio Trasero De La Cabina														
	Indicadores (Temperatura, Hidráulico, Fluidos, Voltímetro, Tacómetro)														
	Indicador Nivel del Combustible.														
	Indicador De Presión De Aire														
CONTAMINANTES	Sistema De Escape (Exosto – Silenciadores)														
	Aislamiento Térmico En El Exosto														
LUCES	Emanación De Gases														
	Luces De Posición Delanteras (Cocuyos)														
	Luces De Posición Traseras (2)														
	Luces Bajas														
	Luces Plenas														
	Luces De Freno (2)														
	Luces Direccionales O De Giro Delanteras														
	Luces Direccionales O De Giro Traseras														
	Luces De Emergencia (Estacionarias)														
	Luces De Retroceso														
	Luz Para Placa														
	Dispositivo Reflectante Trasero														
LLANTAS	Llantas Traseras Izquierda (Labrado 3 mm)														
	Llanta Trasera Derecha (Labrado 3 mm)														
	Llanta delantera Izquierda.(Labrado 3 mm)														
	Llanta Delantera Derecha.(Labrado 3 mm)														
Inspeccionado por:	Francisco Castro	FC		FC		FC		FC		FC		FC			
Revisado por:	Adrian Ortiz Velasco														
APROBADO:		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

CON RESTRICCIÓN:	
OBSERVACIONES:	

Powered by CamScanner

incopav	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA		
	Código: PP-P-02 R-26	Versión: 3	Fecha de emisión: 02/12/2019

PROYECTO: Covenas					FECHA: Del 3 al 7 de Enero 2023			
CONDUCTOR: Juan Fonseca Sotelo					CEDULA 79915482			
MODELO: 2007		COLOR: Rojo			MARCA: Mack			
LICENCIA DE TRANSITO (Categoría): B3, C3		SOAT (Vigencia):			SEG. RESP.CIVIL (Vigencia):			PLACA:
		DD: 16	MM: 4	AÑO: 2023	DD:	MM:	AÑO:	UB342
REGISTRO NAL. TRANP. CARGA		CERTIFICADO DE GASES (Vigencia):			KILOMETRAJE:			
SI	NO	DD: 28	MM: 3	AÑO: 2023	INICIAL:		FINAL:	

B: Buen estado ; M: Mal estado.

ÍTEM		L		M		MI		J		V		S		D	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
EQUIPO DE SEGURIDAD	Botiquín	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor Cargado	✓		✓		✓		✓		✓					
	Gato	✓		✓		✓		✓		✓					
	Cruceta o copa	✓		✓		✓		✓		✓					
	Triángulos (2)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Tacos O Cuñas (2)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Llanta De Repuesto Inflada Y En Buen Estado	✓		✓		✓		✓		✓					
	Herramientas (Llave Expansiva, Destornilladores(Pala Y Estrella), Llaves Fijas, Alicate, Linterna) Pág. 39 Ley 769/02	✓		✓		✓		✓		✓					
	Chaleco Reflectivo	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL	Defensa o Bompers	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la cabina	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del volco	✓		✓		✓		✓		✓					
	Guardabarros (2)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Sujeción guardabarros	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado De La Compuerta Del Volco	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado Del Seguro De La Compuerta	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado Del Gato O Botella De Levante Del Volco.(Golpes O Fugas)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Pasadores Completos Y En Buen Estado	✓		✓		✓		✓		✓					
	Control De Fugas De Aire	✓		✓		✓		✓		✓					
	Control De Fugas Hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Sistema Eléctrico Aislado	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado Y Fijación De Asientos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Espejos Retrovisores Ext. Izq.,Ext. Der. E Interior	✓		✓		✓		✓		✓					
	Pisos De La Cabina(Estado Y Seguridad)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Cardan Con Seguros (cadena)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Cinturones De Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓					
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL	Sistema Deposito Combustible (Tanque, Tubería, Conexiones, Carburador)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Escaleras Y Apoyos Seguros.	✓		✓		✓		✓		✓					
	Batería En Buen Estado	✓		✓		✓		✓		✓					
	Cables Y Conexiones De La Batería	✓		✓		✓		✓		✓					
	Alarma De Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓					

Powered by CamScanner

incopav	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA		
	Código: PP-P-02 R-26	Versión: 3	Fecha de emisión: 02/12/2019

ÍTEM		L		M		MI		J		V		S		D	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN	Balanceo De Llantas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Alineación de ruedas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Chasis (Paralelismo – Estado)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificación Juegos Y Deterioros En La Suspensión (Muelles, Soportes, Topes, Amortiguadores)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificación Juegos En La Dirección (Barras, Brazos De Dirección, Columna De Dirección, Terminales, Rótulas Y Bujes, Fugas)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado De la bomba de dirección	✓		✓		✓		✓		✓					
FRENOS	Freno De Servicio	✓		✓		✓		✓		✓					
	Tubos Y Mangueras Del Circuito De Freno	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado De Las Cámaras	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado De Los Pasadores De Las Cámaras	✓		✓		✓		✓		✓					
	Eficiencia del Freno	✓		✓		✓		✓		✓					
	Sujeción de las cámaras	✓		✓		✓		✓		✓					
	Freno de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓					
INSTRUMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD	Limpia Parabrisas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Parabrisas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado Del Vidrio Trasero De La Cabina	✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicadores (Temperatura, Hidráulico, Fluidos, Voltímetro, Tacómetro)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador Nivel del Combustible.	✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador De Presión De Aire	✓		✓		✓		✓		✓					
CONTAMINANTES	Sistema De Escape (Exosto – Silenciadores)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Aislamiento Térmico En El Exosto	✓		✓		✓		✓		✓					
LUCES	Emanación De Gases	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luces De Posición Delanteras (Cocuyos)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luces De Posición Traseras (2)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luces Bajas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luces Plenas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luces De Freno (2)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luces Direccionales O De Giro Delanteras	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luces Direccionales O De Giro Traseras	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luces De Emergencia (Estacionarias)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luces De Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luz Para Placa	✓		✓		✓		✓		✓					
	Dispositivo Reflectante Trasero	✓		✓		✓		✓		✓					
LLANTAS	Llantas Traseras Izquierda (Labrado 3 mm)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Llanta Trasera Derecha (Labrado 3 mm)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Llanta delantera Izquierda.(Labrado 3 mm)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Llanta Delantera Derecha.(Labrado 3 mm)	✓		✓		✓		✓		✓					
Inspeccionado por:	Juan Gabriel Fonseca	Juan Gabriel		Juan Gabriel		Juan Gabriel		Juan Gabriel		Juan Gabriel					
Revisado por:	ADRIAN ORTIZ	ADRIAN F		ADRIAN F		ADRIAN F		ADRIAN F		ADRIAN F					
APROBADO:		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

CON RESTRICCIÓN:

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA		
	Código: PP-P-02 R-26	Versión: 3	Fecha de emisión: 02/12/2019

PROYECTO: Coveñas				FECHA: 10-01-2023 Hasta 14-01-23			
CONDUCTOR: Juan Gabriel Fonseca Sotelo				CEDULA 79715481 21			
MODELO: 2007		COLOR: Roja.		MARCA: VB 392			
LICENCIA DE TRANSITO (Categoría):		SOAT (Vigencia):			SEG. RESP.CIVIL (Vigencia): no		PLACA:
		DD: 16	MM: 4	AÑO: 2023	DD:	MM:	AÑO:
REGISTRO NAL. TRANP. CARGA no		CERTIFICADO DE GASES (Vigencia):			KILOMETRAJE:		
SI	NO	DD: 28	MM: 2	AÑO: 2023	INICIAL:		FINAL:

B: Buen estado ; M: Mal estado.

ÍTEM		L		M		MI		J		V		S		D	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
EQUIPO DE SEGURIDAD	Botiquín			X		X		X		X		X			
	Extintor Cargado			X		X		X		X		X			
	Gato			X		X		X		X		X			
	Cruceta o copa			X		X		X		X		X			
	Triángulos (2)			X		X		X		X		X			
	Tacos O Cuñas (2)			X		X		X		X		X			
	Llanta De Repuesto Inflada Y En Buen Estado			X		X		X		X		X			
	Herramientas (Llave Expansiva, Destornilladores(Pala Y Estrella), Llaves Fijas, Alicate, Linterna) Pág. 39 Ley 769/02			X		X		X		X		X			
	Chaleco Reflectivo			X		X		X		X		X			
ESTADO GENERAL	Defensa o Bompers			X		X		X		X		X			
	Estado de la cabina			X		X		X		X		X			
	Estado del volco			X		X		X		X		X			
	Guardabarros (2)			X		X		X		X		X			
	Sujeción guardabarros			X		X		X		X		X			
	Estado De La Compuerta Del Volco			X		X		X		X		X			
	Estado Del Seguro De La Compuerta			X		X		X		X		X			
	Estado Del Gato O Botella De Levante Del Volco.(Golpes O Fugas)			X		X		X		X		X			
	Pasadores Completos Y En Buen Estado			X		X		X		X		X			
	Control De Fugas De Aire			X		X		X		X		X			
	Control De Fugas Hidráulicas			X		X		X		X		X			
	Sistema Eléctrico Aislado			X		X		X		X		X			
	Estado Y Fijación De Asientos			X		X		X		X		X			
	Espejos Retrovisores Ext. Izq.,Ext. Der. E Interior			X		X		X		X		X			
	Pisos De La Cabina(Estado Y Seguridad)			X		X		X		X		X			
	Cardan Con Seguros (cadena)			X		X		X		X		X			
	Cinturones De Seguridad			X		X		X		X		X			
	Pito			X		X		X		X		X			
ESTADO GENERAL	Sistema Deposito Combustible (Tanque, Tuberia, Conexiones, Carburador)			X		X		X		X		X			
	Escaleras Y Apoyos Seguros.			X		X		X		X		X			
	Batería En Buen Estado			X		X		X		X		X			
	Cables Y Conexiones De La Batería			X		X		X		X		X			
	Alarma De Retroceso			X		X		X		X		X			

Powered by CamScanner

incopav	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA		
	Código: PP-P-02 R-26	Versión: 3	Fecha de emisión: 02/12/2019

ÍTEM		L		M		MI		J		V		S		D	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN	Balanceo De Llantas			X		X		X		X		X			
	Alineación de ruedas			X		X		X		X		X			
	Chasis (Paralelismo – Estado)			X		X		X		X		X			
	Verificación Juegos Y Deterioros En La Suspensión (Muelles, Soportes, Topes, Amortiguadores)			X		X		X		X		X			
	Verificación Juegos En La Dirección (Barras, Brazos De Dirección, Columna De Dirección, Terminales, Rótulas Y Bujes, Fugas)			X		X		X		X		X			
	Estado De la bomba de dirección			X		X		X		X		X			
FRENOS	Freno De Servicio			X		X		X		X		X			
	Tubos Y Mangueras Del Circuito De Freno			X		X		X		X		X			
	Estado De Las Cámaras			X		X		X		X		X			
	Estado De Los Pasadores De Las Cámaras			X		X		X		X		X			
	Eficiencia del Freno			X		X		X		X		X			
	Sujeción de las cámaras			X		X		X		X		X			
	Freno de Seguridad			X		X		X		X		X			
INSTRUMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD	Limpia Parabrisas			X		X		X		X		X			
	Parabrisas			X		X		X		X		X			
	Estado Del Vidrio Trasero De La Cabina			X		X		X		X		X			
	Indicadores (Temperatura, Hidráulico, Fluidos, Voltímetro, Tacómetro)			X		X		X		X		X			
	Indicador Nivel del Combustible.			X		X		X		X		X			
	Indicador De Presión De Aire			X		X		X		X		✓			
CONTAMINANTES	Sistema De Escape (Exosto – Silenciadores)			X		X		X		X		X			
	Aislamiento Térmico En El Exosto			X		X		X		X		X			
LUCES	Emanación De Gases			X		X		X		X		X			
	Luces De Posición Delanteras (Cocuyos)			X		X		X		X		X			
	Luces De Posición Traseras (2)			X		X		X		X		X			
	Luces Bajas			X		X		X		X		X			
	Luces Plenas			X		X		X		X		X			
	Luces De Freno (2)			X		X		X		X		X			
	Luces Direccionales O De Giro Delanteras			X		X		X		X		X			
	Luces Direccionales O De Giro Traseras			X		X		X		X		X			
	Luces De Emergencia (Estacionarias)			X		X		X		X		X			
	Luces De Retroceso			X		X		X		X		X			
	Luz Para Placa			X		X		X		X		X			
	Dispositivo Reflectante Trasero			X		X		X		X		X			
LLANTAS	Llantas Traseras Izquierda (Labrado 3 mm)			X		X		X		X		X			
	Llanta Trasera Derecha (Labrado 3 mm)			X		X		X		X		X			
	Llanta delantera Izquierda.(Labrado 3 mm)			X		X		X		X		X			
	Llanta Delantera Derecha.(Labrado 3 mm)			X		X		X		X		X			
Inspeccionado por:	Juan Fonseca			Juan Fonseca		Juan Fonseca		Juan Fonseca		Juan Fonseca		Juan Fonseca			
Revisado por:	Adrian Ortiz			Adrian		Adrian		Adrian		Adrian		Adrian			
APROBADO:		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

CON RESTRICCIÓN:

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

incopav	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA		
	Código: PP-P-02 R-26	Versión: 3	Fecha de emisión: 02/12/2019

PROYECTO: C26a - 2049				FECHA: Del 16 al 21 Enero 2023			
CONDUCTOR: Juan Gabriel Fonseca				CEDULA 79915484			
MODELO: 2007		COLOR: BLANCO		MARCA: MACK			
LICENCIA DE TRANSITO (Categoría): B3,C3	SOAT (Vigencia):			SEG. RESP.CIVIL (Vigencia): NN			PLACA: OPO 342
	DD: 16	MM: 4	AÑO: 2023	DD:	MM:	AÑO:	
REGISTRO NAL. TRANP. CARGA NN	CERTIFICADO DE GASES (Vigencia):			KILOMETRAJE:			
SI / NO	DD: 28	MM: 3	AÑO: 2023	INICIAL:		FINAL:	

B: Buen estado ; M: Mal estado.

ÍTEM		L		M		MI		J		V		S		D	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
EQUIPO DE SEGURIDAD	Botiquín	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor Cargado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Gato	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cruceta o copa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Triángulos (2)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tacos O Cuñas (2)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta De Repuesto Inflada Y En Buen Estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Herramientas (Llave Expansiva, Destornilladores(Pala Y Estrella), Llaves Fijas, Alicate, Linterna) Pág. 39 Ley 769/02	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Chaleco Reflectivo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL	Defensa o Bompers	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la cabina	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del volco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardabarros (2)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sujeción guardabarros	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado De La Compuerta Del Volco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Del Seguro De La Compuerta	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Del Gato O Botella De Levante Del Volco.(Golpes O Fugas)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Pasadores Completos Y En Buen Estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control De Fugas De Aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control De Fugas Hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema Eléctrico Aislado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Y Fijación De Asientos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos Retrovisores Ext. Izq.,Ext. Der. E Interior	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pisos De La Cabina(Estado Y Seguridad)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cardan Con Seguros (cadena)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones De Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL	Sistema Deposito Combustible (Tanque, Tubería, Conexiones, Carburador)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras Y Apoyos Seguros.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Batería En Buen Estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cables Y Conexiones De La Batería	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma De Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner
