
ANEXO 2- FORMATO DE DIAGNOSTICO SUPERFICIAL DE DRENAJE LONGITUDINAL - REGISTRO FOTOGRAFICO
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE."



DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LAS OBRAS DE ARTE (CUNETAS) DE LA VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	9/03/2025



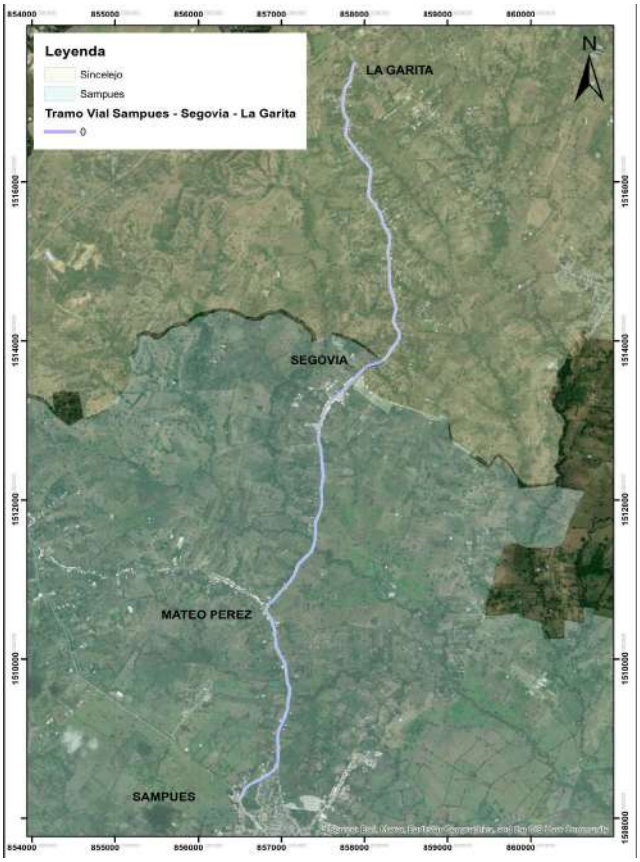





FOTOGRAFÍA	N°1
LOCALIZACIÓN:	**LADO IZQUIERDO**

DIMENSIONES Y CONDICIONES ACTUALES:	**SECCIÓN**		TRIANGULAR		**DIMENCIONES**		0.80 m x 0.30 m		**ABSCISA INICIAL**		**ABSCISA FINAL**	
	ESTRUCTURA DE ENTREGA SI		NO	X	**BORDILLOS SI:**	X	NO		**K1+195**		**K1+410**	
	REQUIERE LIMPIEZA: SI	X	NO		**OBSTRUCCIÓN BAJA**		**OBSTRUCCIÓN MEDIA**			**OBSTRUCCIÓN ALTA**		X
ESCALONAMIENTO	NO				**GRIETAS**	NO			**DESGASTE**	NO		
	SI	Baja: e < 6,0 mm.				SI	Baja: g < 3,0 mm			BAJA		
		Media: 6,0 < e < 25,0 mm.		X			Media: 3,0 < g < 10,0 mm..			MEDIA		X
		Alta: e > 25,0 mm.					Alta: g > 10,0 mm	X		ALTA		
DESPORTILLAMIENTO	NO				**FRACTRURAMIENTO DE LA ESTRUCTURA**	NO			**SEPERACIÓN DE LA CUNETA**	NO		
	SI	Baja: d < 5,0 cm.				SI	BAJA			Baja: SC < 3,0 mm		
		Media: 5,0 < d < 15,0 cm.		X			MEDIA	X		Media: 3,0 < SC < 10,0 mm		X
		Alta: d > 15,0 cm.					ALTA			Alta: SC > 10,0 mm		

OBSERVACIONES:	SE EVIDENCIAN GRIETAS FRACTURAS QUE COMPROMETEN LA ESTRUCTURA. TOTALMENTE TAPADA EN TRAMOS Y NO HAY ZONA DE DESCARGA.
RECOMENDACIONES:	DEMOLICION Y REECONSTRUCCION DE LAS CUNETAS Y ZONAS DE DESCARGA

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LAS OBRAS DE ARTE (CUNETAS) DE LA VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.	
NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	9/03/2025









FOTOGRAFÍA	N°2												
LOCALIZACIÓN:	**LADO DERECHO**												
DIMENSIONES Y CONDICIONES ACTUALES:	**SECCIÓN**		TRIANGULAR		**DIMENCIONES**		0.80 m x 0.30 m		**ABSCISA INICIAL**		**ABSCISA FINAL**		
	ESTRUCTURA DE ENTREGA SI		NO	**X**	**BORDILLOS SI:**	**X**	NO		**K1+180**		**K1+410**		
	REQUIERE LIMPIEZA: SI	**X**	NO		**OBSTRUCCIÓN BAJA**	**X**	**OBSTRUCCIÓN MEDIA**			**OBSTRUCCIÓN ALTA**		X	
ESCALONAMIENTO	NO				**GRIETAS**	NO			**DESGASTE**	NO			
	SI	Baja: e < 6,0 mm.				SI	Baja: g < 3,0 mm			BAJA			
		Media: 6,0 < e < 25,0 mm.		**X**			Media: 3,0 < g < 10,0 mm..			MEDIA		**X**	
		Alta: e > 25,0 mm.					Alta: g > 10,0 mm	**X**		ALTA			
DESPORTILLAMIENTO	NO				**FRACTRURAMIENTO DE LA ESTRUCTURA**	NO			**SEPERACIÓN DE LA CUNETA**	NO			
	SI	Baja: d < 5,0 cm.				SI	BAJA			Baja: SC < 3,0 mm			
		Media: 5,0 < d < 15,0 cm.		**X**			MEDIA	**X**		Media: 3,0 < SC < 10,0 mm		**X**	
		Alta: d > 15,0 cm.					ALTA			Alta: SC > 10,0 mm			
OBSERVACIONES:	SE EVIDENCIAN GRIETAS FRACTURAS QUE COMPROMETEN LA ESTRUCTURA. TOTALMENTE TAPADA EN TRAMOS Y NO HAY ZONA DE DESCARGA.												
RECOMENDACIONES:	DEMOLICION Y REECONSTRUCCION DE LAS CUNETAS Y ZONAS DE DESCARGA												

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LAS OBRAS DE ARTE (CUNETAS) DE LA VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.														
NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**													
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.													
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	9/03/2025													
														
FOTOGRAFÍA	N°3													
LOCALIZACIÓN:	**LADO IZQUIERDO**													
DIMENSIONES Y CONDICIONES ACTUALES:	**SECCIÓN**		TRIANGULAR		**DIMENCIONES**		**0.80 m x 0.30 m**		**ABSCISA INICIAL**		**ABSCISA FINAL**			
	ESTRUCTURA DE ENTREGA SI		NO	X	**BORDILLOS SI:**		NO	X	K1+590		K1+800			
	REQUIERE LIMPIEZA: SI	X	NO		**OBSTRUCCIÓN BAJA**		**OBSTRUCCIÓN MEDIA**			**OBSTRUCCIÓN ALTA**		X		
ESCALONAMIENTO	NO				**GRIETAS**	NO			**DESGASTE**	NO				
	SI	Baja: e < 6,0 mm.		X		SI	Baja: g < 3,0 mm			BAJA				
		Media: 6,0 < e < 25,0 mm.					Media: 3,0 < g < 10,0 mm..	X		MEDIA		X		
		Alta: e > 25,0 mm.					Alta: g > 10,0 mm			ALTA				
DESPORTILLAMIENTO	NO				**FRACTRURAMIENTO DE LA ESTRUCTURA**	NO			**SEPERACIÓN DE LA CUNETA**	NO				
	SI	Baja: d < 5,0 cm.				SI	BAJA			Baja: SC < 3,0 mm				
		Media: 5,0 < d < 15,0 cm.		X			MEDIA	X		Media: 3,0 < SC < 10,0 mm		**X**		
		Alta: d > 15,0 cm.					ALTA			Alta: SC > 10,0 mm				
OBSERVACIONES:	SE EVIDENCIAN GRIETAS FRACTURAS QUE COMPROMETEN LA ESTRUCTURA. TOTALMENTE TAPADA EN TRAMOS Y NO HAY ZONA DE DESCARGA.													
RECOMENDACIONES:	DEMOLICION Y REECONSTRUCCION DE LAS CUNETAS Y ZONAS DE DESCARGA													

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LAS OBRAS DE ARTE (CUNETAS) DE LA VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.	
NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	9/03/2025





FOTOGRAFÍA	N°4												
LOCALIZACIÓN:	**LADO DERECHO**												
DIMENSIONES Y CONDICIONES ACTUALES:	**SECCIÓN**		TRIANGULAR		**DIMENCIONES**		0.80m x 0.30m		**ABSCISA INICIAL**		**ABSCISA FINAL**		
	ESTRUCTURA DE ENTREGA SI		NO	X	**BORDILLOS SI:**	X	NO		K1+590		K1+800		
	REQUIERE LIMPIEZA: SI	X	NO		**OBSTRUCCIÓN BAJA**	X	**OBSTRUCCIÓN MEDIA**		**OBSTRUCCIÓN ALTA**				
ESCALONAMIENTO	NO				**GRIETAS**	NO			**DESGASTE**	NO			
	SI	Baja: e < 6,0 mm.		X		SI	Baja: g < 3,0 mm			BAJA			
		Media: 6,0 < e < 25,0 mm.					Media: 3,0 < g < 10,0 mm..	X		MEDIA	**X**		
		Alta: e > 25,0 mm.					Alta: g > 10,0 mm			ALTA			
DESPORTILLAMIENTO	NO				**FRACTRURAMIENTO DE LA ESTRUCTURA**	NO			**SEPERACIÓN DE LA CUNETA**	NO			
	SI	Baja: d < 5,0 cm.				SI	BAJA			Baja: SC < 3,0 mm			
		Media: 5,0 < d < 15,0 cm.		X			MEDIA	X		Media: 3,0 < SC < 10,0 mm	**X**		
		Alta: d > 15,0 cm.					ALTA			Alta: SC > 10,0 mm			
OBSERVACIONES:	SE EVIDENCIAN GRIETAS FRACTURAS QUE COMPROMETEN LA ESTRUCTURA. TOTALMENTE TAPADA EN TRAMOS Y NO HAY ZONA DE DESCARGA.												
RECOMENDACIONES:	DEMOLICION Y REECONSTRUCCION DE LAS CUNETAS Y ZONAS DE DESCARGA												

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LAS OBRAS DE ARTE (CUNETAS) DE LA VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.	
NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	9/03/2025





FOTOGRAFÍA	N°5
LOCALIZACIÓN:	**LADO IZQUIERDO**

DIMENSIONES Y CONDICIONES ACTUALES:	**SECCIÓN**		TRIANGULAR		**DIMENCIONES**		**0.50 m x 0.20 m**		**ABSCISA INICIAL**		**ABSCISA FINAL**			
	ESTRUCTURA DE ENTREGA SI		NO	X	**BORDILLOS SI:**	X	NO		K1+800		K2+000			
	REQUIERE LIMPIEZA: SI	X	NO		**OBSTRUCCIÓN BAJA**		**OBSTRUCCIÓN MEDIA**			**OBSTRUCCIÓN ALTA**			X	
ESCALONAMIENTO	NO			**X**	**GRIETAS**	NO				**DESGASTE**	NO			
	SI	Baja: e < 6,0 mm.				SI	Baja: g < 3,0 mm	**X**			BAJA	**X**		
		Media: 6,0 < e < 25,0 mm.					Media: 3,0 < g < 10,0 mm..				MEDIA			
		Alta: e > 25,0 mm.					Alta: g > 10,0 mm				ALTA			
DESPORTILLAMIENTO	NO			**X**	**FRACTRURAMIENTO DE LA ESTRUCTURA**	NO		**X**		**SEPERACIÓN DE LA CUNETA**	NO	**X**		
	SI	Baja: d < 5,0 cm.				SI	BAJA				Baja: SC < 3,0 mm			
		Media: 5,0 < d < 15,0 cm.					MEDIA				Media: 3,0 < SC < 10,0 mm			
		Alta: d > 15,0 cm.					ALTA				Alta: SC > 10,0 mm			

OBSERVACIONES:	SE TRATA DE LAS CUNETAS DE A BERMA DE UNA PLACA HUELLA. SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO CON OBSTRUCCIONES MEDIAS Y FOCALIZADA EN ALGUNOS PUNTOS.
RECOMENDACIONES:	LIMPIEZA Y REMOCION DE LOS RESIDUOS Y MATERIALES QUE ESTAN SOBRE LAS CUNETAS.

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LAS OBRAS DE ARTE (CUNETAS) DE LA VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.	
NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	9/03/2025





FOTOGRAFÍA	N°6												
LOCALIZACIÓN:	**LADO DERECHO**												
DIMENSIONES Y CONDICIONES ACTUALES:	**SECCIÓN**		TRIANGULAR		**DIMENCIONES**		0.50m x 0.20m		**ABSCISA INICIAL**		**ABSCISA FINAL**		
	ESTRUCTURA DE ENTREGA SI		NO	X	**BORDILLOS SI:**	X	NO		K1+800		K2+000		
	REQUIERE LIMPIEZA: SI	X	NO		**OBSTRUCCIÓN BAJA**		**OBSTRUCCIÓN MEDIA**		**X**	**OBSTRUCCIÓN ALTA**			
ESCALONAMIENTO	NO				**GRIETAS**	NO			**DESGASTE**	NO			
	SI	Baja: e < 6,0 mm.		**X**		SI	Baja: g < 3,0 mm	**X**		BAJA	**X**		
		Media: 6,0 < e < 25,0 mm.					Media: 3,0 < g < 10,0 mm..			MEDIA			
		Alta: e > 25,0 mm.					Alta: g > 10,0 mm			ALTA			
DESPORTILLAMIENTO	NO			**X**	**FRACTRURAMIENTO DE LA ESTRUCTURA**	NO			**SEPERACIÓN DE LA CUNETA**	NO	**X**		
	SI	Baja: d < 5,0 cm.				SI	BAJA	**X**		Baja: SC < 3,0 mm			
		Media: 5,0 < d < 15,0 cm.					MEDIA			Media: 3,0 < SC < 10,0 mm			
		Alta: d > 15,0 cm.					ALTA			Alta: SC > 10,0 mm			
OBSERVACIONES:	SE TRATA DE LAS CUNETAS DE A BERMA DE UNA PLACA HUELLA. SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO CON OBSTRUCCIONES MEDIAS Y FOCALIZADA EN ALGUNOS PUNTOS.												
RECOMENDACIONES:	LIMPIEZA Y REMOCION DE LOS RESIDUOS Y MATERIALES QUE ESTAN SOBRE LAS CUNETAS.												

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LAS OBRAS DE ARTE (CUNETAS) DE LA VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	9/03/2025





FOTOGRAFÍA	N°7
LOCALIZACIÓN:	**LADO IZQUIERDO**

DIMENSIONES Y CONDICIONES ACTUALES:	**SECCIÓN**		TRIANGULAR		**DIMENCIONES**		**0.80 m x 0.30 m**		**ABSCISA INICIAL**		**ABSCISA FINAL**	
	ESTRUCTURA DE ENTREGA SI		NO	X	**BORDILLOS SI:**		NO	X	K2+000		K2+260	
	REQUIERE LIMPIEZA: SI	X	NO		**OBSTRUCCIÓN BAJA**		**OBSTRUCCIÓN MEDIA**			**OBSTRUCCIÓN ALTA**		**X**
ESCALONAMIENTO	NO				**GRIETAS**	NO			**DESGASTE**		NO	
	SI	Baja: e < 6,0 mm.				SI	Baja: g < 3,0 mm				BAJA	
		Media: 6,0 < e < 25,0 mm.		**X**			Media: 3,0 < g < 10,0 mm..				MEDIA	
		Alta: e > 25,0 mm.					Alta: g > 10,0 mm	**X**			ALTA	**X**
DESPORTILLAMIENTO	NO				**FRACTRURAMIENTO DE LA ESTRUCTURA**	NO			**SEPERACIÓN DE LA CUNETA**		NO	
	SI	Baja: d < 5,0 cm.				SI	BAJA				Baja: SC < 3,0 mm	
		Media: 5,0 < d < 15,0 cm.		**X**			MEDIA				Media: 3,0 < SC < 10,0 mm	**X**
		Alta: d > 15,0 cm.					ALTA	**X**			Alta: SC > 10,0 mm	

OBSERVACIONES:	CUNETAS TOTALMENTE DESTRUIDAS. LAS QUE SE EVIDENCIAN ESTAN ENTERRADAS. NO CUENTA CON BORDILLOS. SE EVIDENCIA SOCAVACION EN LA VIA
RECOMENDACIONES:	DEMOLICION Y REECONSTRUCCION DE LAS CUNETAS Y ZONAS DE DESCARGA Y CONTOL DE SOCAVACIONES

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LAS OBRAS DE ARTE (CUNETAS) DE LA VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	9/03/2025





FOTOGRAFÍA	N°8
LOCALIZACIÓN:	**LADO DERECHO**

DIMENSIONES Y CONDICIONES ACTUALES:	**SECCIÓN**		TRIANGULAR		**DIMENCIONES**		0.80m x 0.30m		**ABSCISA INICIAL**		**ABSCISA FINAL**	
	ESTRUCTURA DE ENTREGA SI		NO	X	**BORDILLOS SI:**	X	NO		K2+000		K2+260	
	REQUIERE LIMPIEZA: SI	X	NO		**OBSTRUCCIÓN BAJA**		**OBSTRUCCIÓN MEDIA**		**X**	**OBSTRUCCIÓN ALTA**		
ESCALONAMIENTO	NO				**GRIETAS**	NO			**DESGASTE**	NO		
	SI	Baja: e < 6,0 mm.				SI	Baja: g < 3,0 mm			BAJA		
		Media: 6,0 < e < 25,0 mm.		**X**			Media: 3,0 < g < 10,0 mm..			MEDIA		
		Alta: e > 25,0 mm.					Alta: g > 10,0 mm		**X**	ALTA		**X**
DESPORTILLAMIENTO	NO				**FRACTRURAMIENTO DE LA ESTRUCTURA**	NO			**SEPERACIÓN DE LA CUNETA**	NO		
	SI	Baja: d < 5,0 cm.				SI	BAJA			Baja: SC < 3,0 mm		
		Media: 5,0 < d < 15,0 cm.					MEDIA			Media: 3,0 < SC < 10,0 mm		**X**
		Alta: d > 15,0 cm.		**X**			ALTA		**X**	Alta: SC > 10,0 mm		

OBSERVACIONES:	SE EVIDENCIAN GRIETAS FRACTURAS QUE COMPROMETEN LA ESTRUCTURA. TOTALMENTE TAPADA EN TRAMOS Y NO HAY ZONA DE DESCARGA. SE EVIDENCIA SOCAVACION DE LA VIA Y LAS CUNETAS
RECOMENDACIONES:	DEMOLICION Y REECONSTRUCCION DE LAS CUNETAS Y ZONAS DE DESCARGA Y CONTOL DE LA SOCAVACIN DE LA VIA

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LAS OBRAS DE ARTE (CUNETAS) DE LA VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	9/03/2025





FOTOGRAFÍA	N°9
LOCALIZACIÓN:	**LADO IZQUIERDO**

DIMENSIONES Y CONDICIONES ACTUALES:	**SECCIÓN**		TRIANGULAR		**DIMENCIONES**		**0.80 m x 0.30 m**		**ABSCISA INICIAL**		**ABSCISA FINAL**	
	ESTRUCTURA DE ENTREGA SI		NO	X	**BORDILLOS SI:**		NO	X	K2+610		K2+810	
	REQUIERE LIMPIEZA: SI	X	NO		**OBSTRUCCIÓN BAJA**		**OBSTRUCCIÓN MEDIA**		**X**	**OBSTRUCCIÓN ALTA**		
ESCALONAMIENTO	NO				**GRIETAS**	NO			**DESGASTE**	NO		
	SI	Baja: e < 6,0 mm.		**X**		SI	Baja: g < 3,0 mm			BAJA		
		Media: 6,0 < e < 25,0 mm.					Media: 3,0 < g < 10,0 mm..			MEDIA		**X**
		Alta: e > 25,0 mm.					Alta: g > 10,0 mm		**X**	ALTA		
DESPORTILLAMIENTO	NO				**FRACTRURAMIENTO DE LA ESTRUCTURA**	NO			**SEPERACIÓN DE LA CUNETA**	NO		
	SI	Baja: d < 5,0 cm.				SI	BAJA			Baja: SC < 3,0 mm		
		Media: 5,0 < d < 15,0 cm.		**X**			MEDIA		**X**	Media: 3,0 < SC < 10,0 mm		**X**
		Alta: d > 15,0 cm.					ALTA			Alta: SC > 10,0 mm		

OBSERVACIONES:	SE EVIDENCIAN GRIETAS FRACTURAS QUE COMPROMETEN LA ESTRUCTURA. TOTALMENTE TAPADA EN TRAMOS Y NO HAY ZONA DE DESCARGA.
RECOMENDACIONES:	DEMOLICION Y REECONSTRUCCION DE LAS CUNETAS Y ZONAS DE DESCARGA

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LAS OBRAS DE ARTE (CUNETAS) DE LA VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	9/03/2025





FOTOGRAFÍA	N°10
LOCALIZACIÓN:	**LADO DERECHO**

DIMENSIONES Y CONDICIONES ACTUALES:	**SECCIÓN**		TRIANGULAR		**DIMENCIONES**		0.80m x 0.30m		**ABSCISA INICIAL**		**ABSCISA FINAL**	
	ESTRUCTURA DE ENTREGA SI		NO	X	**BORDILLOS SI:**	X	NO		K2+610		K2+810	
	REQUIERE LIMPIEZA: SI	X	NO		**OBSTRUCCIÓN BAJA**		**OBSTRUCCIÓN MEDIA**	**X**	**OBSTRUCCIÓN ALTA**			
ESCALONAMIENTO	NO				**GRIETAS**	NO			**DESGASTE**	NO		
	SI	Baja: e < 6,0 mm.				SI	Baja: g < 3,0 mm			BAJA		
		Media: 6,0 < e < 25,0 mm.	**X**				Media: 3,0 < g < 10,0 mm..			MEDIA	**X**	
		Alta: e > 25,0 mm.					Alta: g > 10,0 mm	**X**		ALTA		
DESPORTILLAMIENTO	NO				**FRACTRURAMIENTO DE LA ESTRUCTURA**	NO			**SEPERACIÓN DE LA CUNETA**	NO		
	SI	Baja: d < 5,0 cm.				SI	BAJA			Baja: SC < 3,0 mm		
		Media: 5,0 < d < 15,0 cm.	**X**				MEDIA			Media: 3,0 < SC < 10,0 mm	**X**	
		Alta: d > 15,0 cm.					ALTA	**X**		Alta: SC > 10,0 mm		

OBSERVACIONES:	SE EVIDENCIAN GRIETAS FRACTURAS QUE COMPROMETEN LA ESTRUCTURA. TOTALMENTE TAPADA EN TRAMOS Y NO HAY ZONA DE DESCARGA.
RECOMENDACIONES:	DEMOLICION Y REECONSTRUCCION DE LAS CUNETAS Y ZONAS DE DESCARGA

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LAS OBRAS DE ARTE (CUNETAS) DE LA VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.	
NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	9/03/2025





FOTOGRAFÍA	N°9
LOCALIZACIÓN:	**LADO IZQUIERDO**

DIMENSIONES Y CONDICIONES ACTUALES:	**SECCIÓN**		TRIANGULAR		**DIMENCIONES**		**0.80 m x 0.30 m**		**ABSCISA INICIAL**		**ABSCISA FINAL**	
	ESTRUCTURA DE ENTREGA SI		NO	X	**BORDILLOS SI:**		NO	X	K2+810		K3+000	
	REQUIERE LIMPIEZA: SI	X	NO		**OBSTRUCCIÓN BAJA**		**OBSTRUCCIÓN MEDIA**		**X**	**OBSTRUCCIÓN ALTA**		
ESCALONAMIENTO	NO				**GRIETAS**	NO			**DESGASTE**		NO	
	SI	Baja: e < 6,0 mm.		**X**		SI	Baja: g < 3,0 mm				BAJA	
		Media: 6,0 < e < 25,0 mm.					Media: 3,0 < g < 10,0 mm..		**X**		MEDIA	**X**
		Alta: e > 25,0 mm.					Alta: g > 10,0 mm				ALTA	
DESPORTILLAMIENTO	NO				**FRACTRURAMIENTO DE LA ESTRUCTURA**	NO			**SEPERACIÓN DE LA CUNETA**		NO	
	SI	Baja: d < 5,0 cm.		**X**		SI	BAJA				Baja: SC < 3,0 mm	
		Media: 5,0 < d < 15,0 cm.					MEDIA		**X**		Media: 3,0 < SC < 10,0 mm	**X**
		Alta: d > 15,0 cm.					ALTA				Alta: SC > 10,0 mm	

OBSERVACIONES:	SE EVIDENCIAN GRIETAS FRACTURAS QUE COMPROMETEN LA ESTRUCTURA. TOTALMENTE TAPADA EN TRAMOS Y NO HAY ZONA DE DESCARGA.
RECOMENDACIONES:	DEMOLICION Y REECONSTRUCCION DE LAS CUNETAS Y ZONAS DE DESCARGA

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LAS OBRAS DE ARTE (CUNETAS) DE LA VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	9/03/2025





FOTOGRAFÍA	N°10
LOCALIZACIÓN:	**LADO DERECHO**

DIMENSIONES Y CONDICIONES ACTUALES:	**SECCIÓN**		TRIANGULAR		**DIMENCIONES**		**0.80 m x 0.30 m**		**ABSCISA INICIAL**		**ABSCISA FINAL**	
	ESTRUCTURA DE ENTREGA SI		NO	X	**BORDILLOS SI:**	X	NO		K2+810		K3+000	
	REQUIERE LIMPIEZA: SI	X	NO		**OBSTRUCCIÓN BAJA**		**OBSTRUCCIÓN MEDIA**		**X**	**OBSTRUCCIÓN ALTA**		
ESCALONAMIENTO	NO				**GRIETAS**	NO				**DESGASTE**	NO	
	SI	Baja: e < 6,0 mm.		**X**		SI	Baja: g < 3,0 mm				BAJA	
		Media: 6,0 < e < 25,0 mm.					Media: 3,0 < g < 10,0 mm..				MEDIA	**X**
		Alta: e > 25,0 mm.					Alta: g > 10,0 mm		**X**		ALTA	
DESPORTILLAMIENTO	NO				**FRACTRURAMIENTO DE LA ESTRUCTURA**	NO				**SEPERACIÓN DE LA CUNETA**	NO	
	SI	Baja: d < 5,0 cm.		**X**		SI	BAJA				Baja: SC < 3,0 mm	**X**
		Media: 5,0 < d < 15,0 cm.					MEDIA		**X**		Media: 3,0 < SC < 10,0 mm	
		Alta: d > 15,0 cm.					ALTA				Alta: SC > 10,0 mm	

OBSERVACIONES:	SE EVIDENCIAN GRIETAS FRACTURAS QUE COMPROMETEN LA ESTRUCTURA. TOTALMENTE TAPADA EN TRAMOS Y NO HAY ZONA DE DESCARGA.
RECOMENDACIONES:	DEMOLICION Y REECONSTRUCCION DE LAS CUNETAS Y ZONAS DE DESCARGA

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LAS OBRAS DE ARTE (CUNETAS) DE LA VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.														
NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**													
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.													
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	9/03/2025													
														
FOTOGRAFÍA	N°11													
LOCALIZACIÓN:	**LADO IZQUIERDO**													
DIMENSIONES Y CONDICIONES ACTUALES:	**SECCIÓN**		TRIANGULAR		**DIMENCIONES**		**0.50m x 0.15 m**		**ABSCISA INICIAL**		**ABSCISA FINAL**			
	ESTRUCTURA DE ENTREGA SI		NO	X	**BORDILLOS SI:**	X	NO		K3+000		K3+250			
	REQUIERE LIMPIEZA: SI	X	NO		**OBSTRUCCIÓN BAJA**		**OBSTRUCCIÓN MEDIA**		**X**	**OBSTRUCCIÓN ALTA**				
ESCALONAMIENTO	NO			**X**	**GRIETAS**	NO				**DESGASTE**	NO			
	SI	Baja: e < 6,0 mm.				SI	Baja: g < 3,0 mm		**X**		BAJA	**X**		
		Media: 6,0 < e < 25,0 mm.					Media: 3,0 < g < 10,0 mm..				MEDIA			
		Alta: e > 25,0 mm.					Alta: g > 10,0 mm				ALTA			
DESPORTILLAMIENTO	NO			**X**	**FRACTRURAMIENTO DE LA ESTRUCTURA**	NO			**X**	**SEPERACIÓN DE LA CUNETA**	NO	**X**		
	SI	Baja: d < 5,0 cm.				SI	BAJA				Baja: SC < 3,0 mm			
		Media: 5,0 < d < 15,0 cm.					MEDIA				Media: 3,0 < SC < 10,0 mm			
		Alta: d > 15,0 cm.					ALTA				Alta: SC > 10,0 mm			
OBSERVACIONES:	SE TRATA DE LAS CUNETAS DE LA BERMA DE UNA PLACA HUELLA. SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO CON OBSTRUCCIONES MEDIAS Y FOCALIZADA EN ALGUNOS PUNTOS.													
RECOMENDACIONES:	LIMPIEZA Y REMOCION DE LOS RESIDUOS Y MATERIALES QUE ESTAN SOBRE LAS CUNETAS.													

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LAS OBRAS DE ARTE (CUNETAS) DE LA VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.	
NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	9/03/2025





FOTOGRAFÍA	N°12												
LOCALIZACIÓN:	**LADO DERECHO**												
DIMENSIONES Y CONDICIONES ACTUALES:	**SECCIÓN**		TRIANGULAR		**DIMENCIONES**		1.1m x 0.30m		**ABSCISA INICIAL**		**ABSCISA FINAL**		
	ESTRUCTURA DE ENTREGA SI		NO	X	**BORDILLOS SI:**	X	NO		K3+000		K3+250		
	REQUIERE LIMPIEZA: SI	X	NO		**OBSTRUCCIÓN BAJA**	X	**OBSTRUCCIÓN MEDIA**		**OBSTRUCCIÓN ALTA**		X		
ESCALONAMIENTO	NO				**GRIETAS**	NO			**DESGASTE**	NO			
	SI	Baja: e < 6,0 mm.		**X**		SI	Baja: g < 3,0 mm	**X**		BAJA	**X**		
		Media: 6,0 < e < 25,0 mm.					Media: 3,0 < g < 10,0 mm..			MEDIA			
		Alta: e > 25,0 mm.					Alta: g > 10,0 mm			ALTA			
DESPORTILLAMIENTO	NO			**X**	**FRACTRURAMIENTO DE LA ESTRUCTURA**	NO			**SEPERACIÓN DE LA CUNETA**	NO	**X**		
	SI	Baja: d < 5,0 cm.				SI	BAJA	**X**		Baja: SC < 3,0 mm			
		Media: 5,0 < d < 15,0 cm.					MEDIA			Media: 3,0 < SC < 10,0 mm			
		Alta: d > 15,0 cm.					ALTA			Alta: SC > 10,0 mm			
OBSERVACIONES:	SE TRATA DE LAS CUNETAS DE LA BERMA DE UNA PLACA HUELLA. SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO CON OBSTRUCCIONES MEDIAS Y FOCALIZADA EN ALGUNOS PUNTOS.												
RECOMENDACIONES:	LIMPIEZA Y REMOCION DE LOS RESIDUOS Y MATERIALES QUE ESTAN SOBRE LAS CUNETAS.												

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LAS OBRAS DE ARTE (CUNETAS) DE LA VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	9/03/2025





FOTOGRAFÍA	N°12
LOCALIZACIÓN:	**LADO IZQUIERDO**

DIMENSIONES Y CONDICIONES ACTUALES:	**SECCIÓN**		TRIANGULAR		**DIMENCIONES**		**0.50m x 0.15 m**		**ABSCISA INICIAL**		**ABSCISA FINAL**	
	ESTRUCTURA DE ENTREGA SI	X	NO		**BORDILLOS SI:**	X	NO		K3+250		K3+627	
	REQUIERE LIMPIEZA: SI	X	NO		**OBSTRUCCIÓN BAJA**		**OBSTRUCCIÓN MEDIA**			**OBSTRUCCIÓN ALTA**		**X**
ESCALONAMIENTO	NO			**X**	**GRIETAS**	NO				**DESGASTE**	NO	
	SI	Baja: e < 6,0 mm.				SI	Baja: g < 3,0 mm	**X**			BAJA	**X**
		Media: 6,0 < e < 25,0 mm.					Media: 3,0 < g < 10,0 mm..				MEDIA	
		Alta: e > 25,0 mm.					Alta: g > 10,0 mm				ALTA	
DESPORTILLAMIENTO	NO			**X**	**FRACTRURAMIENTO DE LA ESTRUCTURA**	NO		**X**		**SEPERACIÓN DE LA CUNETA**	NO	**X**
	SI	Baja: d < 5,0 cm.				SI	BAJA				Baja: SC < 3,0 mm	
		Media: 5,0 < d < 15,0 cm.					MEDIA				Media: 3,0 < SC < 10,0 mm	
		Alta: d > 15,0 cm.					ALTA				Alta: SC > 10,0 mm	

OBSERVACIONES:	SE TRATA DE LAS CUNETAS DE LA BERMA DE UNA PLACA HUELLA. SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO CON OBSTRUCCIONES MEDIAS Y FOCALIZADA EN ALGUNOS PUNTOS. ENTREGA EN EL PORTON 2 (K3+627)
RECOMENDACIONES:	LIMPIEZA Y REMOCION DE LOS RESIDUOS Y MATERIALES QUE ESTAN SOBRE LAS CUNETAS.

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LAS OBRAS DE ARTE (CUNETAS) DE LA VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.	
NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	9/03/2025





FOTOGRAFÍA	N°13												
LOCALIZACIÓN:	**LADO DERECHO**												
DIMENSIONES Y CONDICIONES ACTUALES:	**SECCIÓN**		TRIANGULAR		**DIMENCIONES**		**0.50m x 0.15 m**		**ABSCISA INICIAL**		**ABSCISA FINAL**		
	ESTRUCTURA DE ENTREGA SI		NO	X	**BORDILLOS SI:**	X	NO		K3+250		K3+627		
	REQUIERE LIMPIEZA: SI	X	NO		**OBSTRUCCIÓN BAJA**		**OBSTRUCCIÓN MEDIA**			**OBSTRUCCIÓN ALTA**		**X**	
ESCALONAMIENTO	NO				**GRIETAS**	NO			**DESGASTE**		NO		
	SI	Baja: e < 6,0 mm.		**X**		SI	Baja: g < 3,0 mm	**X**			BAJA	**X**	
		Media: 6,0 < e < 25,0 mm.					Media: 3,0 < g < 10,0 mm..				MEDIA		
		Alta: e > 25,0 mm.					Alta: g > 10,0 mm				ALTA		
DESPORTILLAMIENTO	NO				**FRACTRURAMIENTO DE LA ESTRUCTURA**	NO			**SEPERACIÓN DE LA CUNETA**		NO	**X**	
	SI	Baja: d < 5,0 cm.		**X**		SI	BAJA	**X**			Baja: SC < 3,0 mm		
		Media: 5,0 < d < 15,0 cm.					MEDIA				Media: 3,0 < SC < 10,0 mm		
		Alta: d > 15,0 cm.					ALTA				Alta: SC > 10,0 mm		
OBSERVACIONES:	SE TRATA DE LAS CUNETAS DE LA BERMA DE UNA PLACA HUELLA. SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO CON OBSTRUCCIONES MEDIAS Y FOCALIZADA EN ALGUNOS PUNTOS. ENTREGA EN EL PORTON 2 (K3+627)												
RECOMENDACIONES:	LIMPIEZA Y REMOCION DE LOS RESIDUOS Y MATERIALES QUE ESTAN SOBRE LAS CUNETAS.												

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LAS OBRAS DE ARTE (CUNETAS) DE LA VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	9/03/2025









FOTOGRAFÍA	N°14
LOCALIZACIÓN:	**LADO IZQUIERDO**

DIMENSIONES Y CONDICIONES ACTUALES:	**SECCIÓN**		TRIANGULAR		**DIMENCIONES**		**0.50m x 0.15 m**		**ABSCISA INICIAL**		**ABSCISA FINAL**					
	ESTRUCTURA DE ENTREGA SI		NO	**X**	**BORDILLOS SI:**	**X**	NO		**K3+640**		**K4+700**					
	REQUIERE LIMPIEZA: SI	**X**	NO		**OBSTRUCCIÓN BAJA**		**OBSTRUCCIÓN MEDIA**			**OBSTRUCCIÓN ALTA**		**X**				
ESCALONAMIENTO	NO			**X**	**GRIETAS**	NO				**DESGASTE**	NO					
	SI	Baja: e < 6,0 mm.				SI	Baja: g < 3,0 mm		**X**		BAJA	**X**				
		Media: 6,0 < e < 25,0 mm.					Media: 3,0 < g < 10,0 mm..				MEDIA					
		Alta: e > 25,0 mm.					Alta: g > 10,0 mm				ALTA					
DESPORTILLAMIENTO	NO			**X**	**FRACTRURAMIENTO DE LA ESTRUCTURA**	NO			**X**	**SEPERACIÓN DE LA CUNETA**	NO	**X**				
	SI	Baja: d < 5,0 cm.				SI	BAJA				Baja: SC < 3,0 mm					
		Media: 5,0 < d < 15,0 cm.					MEDIA				Media: 3,0 < SC < 10,0 mm					
		Alta: d > 15,0 cm.					ALTA				Alta: SC > 10,0 mm					

OBSERVACIONES:	SE TRATA DE LAS CUNETAS DE LA BERMA DE UNA PLACA HUELLA. SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO CON OBSTRUCCIONES MEDIAS Y FOCALIZADA EN ALGUNOS PUNTOS.
RECOMENDACIONES:	LIMPIEZA Y REMOCION DE LOS RESIDUOS Y MATERIALES QUE ESTAN SOBRE LAS CUNETAS.

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LAS OBRAS DE ARTE (CUNETAS) DE LA VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.	
NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	9/03/2025









FOTOGRAFÍA	N°15												
LOCALIZACIÓN:	**LADO DERECHO**												
DIMENSIONES Y CONDICIONES ACTUALES:	**SECCIÓN**		TRIANGULAR		**DIMENCIONES**		**0.50m x 0.15 m**		**ABSCISA INICIAL**		**ABSCISA FINAL**		
	ESTRUCTURA DE ENTREGA SI		NO	**X**	**BORDILLOS SI:**	**X**	NO		**K3+640**		**K4+700**		
	REQUIERE LIMPIEZA: SI	**X**	NO		**OBSTRUCCIÓN BAJA**		**OBSTRUCCIÓN MEDIA**		**OBSTRUCCIÓN ALTA**		**X**		
ESCALONAMIENTO	NO				**GRIETAS**	NO			**DESGASTE**	NO			
	SI	Baja: e < 6,0 mm.		**X**		SI	Baja: g < 3,0 mm	**X**		BAJA		**X**	
		Media: 6,0 < e < 25,0 mm.					Media: 3,0 < g < 10,0 mm..			MEDIA			
		Alta: e > 25,0 mm.					Alta: g > 10,0 mm			ALTA			
DESPORTILLAMIENTO	NO				**FRACTRURAMIENTO DE LA ESTRUCTURA**	NO			**SEPERACIÓN DE LA CUNETA**	NO		**X**	
	SI	Baja: d < 5,0 cm.		**X**		SI	BAJA	**X**		Baja: SC < 3,0 mm			
		Media: 5,0 < d < 15,0 cm.					MEDIA			Media: 3,0 < SC < 10,0 mm			
		Alta: d > 15,0 cm.					ALTA			Alta: SC > 10,0 mm			
OBSERVACIONES:	SE TRATA DE LAS CUNETAS DE LA BERMA DE UNA PLACA HUELLA. SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO CON OBSTRUCCIONES MEDIAS Y FOCALIZADA EN ALGUNOS PUNTOS.												
RECOMENDACIONES:	LIMPIEZA Y REMOCION DE LOS RESIDUOS Y MATERIALES QUE ESTAN SOBRE LAS CUNETAS.												

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LAS OBRAS DE ARTE (CUNETAS) DE LA VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.																	
NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**																
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.																
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	9/03/2025																
																	
FOTOGRAFÍA	N°14																
LOCALIZACIÓN:	**LADO IZQUIERDO**																
DIMENSIONES Y CONDICIONES ACTUALES:	**SECCIÓN**		TRIANGULAR		**DIMENCIONES**		**0.40m x 0.25 m**		**ABSCISA INICIAL**		**ABSCISA FINAL**						
	ESTRUCTURA DE ENTREGA SI		NO	**X**	**BORDILLOS SI:**	**X**	NO		K5+550		K5+580						
	REQUIERE LIMPIEZA: SI	**X**	NO		**OBSTRUCCIÓN BAJA**	**X**	**OBSTRUCCIÓN MEDIA**				**OBSTRUCCIÓN ALTA**						
ESCALONAMIENTO	NO			**X**	**GRIETAS**	NO		**X**	**DESGASTE**		NO	**X**					
	SI	Baja: e < 6,0 mm.				SI	Baja: g < 3,0 mm				BAJA						
		Media: 6,0 < e < 25,0 mm.					Media: 3,0 < g < 10,0 mm..				MEDIA						
		Alta: e > 25,0 mm.					Alta: g > 10,0 mm				ALTA						
DESPORTILLAMIENTO	NO			**X**	**FRACTRURAMIENTO DE LA ESTRUCTURA**	NO		**X**	**SEPERACIÓN DE LA CUNETA**		NO						
	SI	Baja: d < 5,0 cm.				SI	BAJA				Baja: SC < 3,0 mm						
		Media: 5,0 < d < 15,0 cm.					MEDIA				Media: 3,0 < SC < 10,0 mm						
		Alta: d > 15,0 cm.					ALTA				Alta: SC > 10,0 mm						
OBSERVACIONES:	SE TRATA DE LAS CUNETAS ALREDEDOR DEL PARQUE DE SEGOVIA																
RECOMENDACIONES:	LIMPIEZA Y REMOCION DE LOS RESIDUOS																

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LAS OBRAS DE ARTE (CUNETAS) DE LA VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.	
NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	9/03/2025





FOTOGRAFÍA	N°15												
LOCALIZACIÓN:	**LADO IZQUIERDO**												
DIMENSIONES Y CONDICIONES ACTUALES:	**SECCIÓN**		TRIANGULAR		**DIMENCIONES**		**0.70m x 0.30 m**		**ABSCISA INICIAL**		**ABSCISA FINAL**		
	ESTRUCTURA DE ENTREGA SI		NO	**X**	**BORDILLOS SI:**		NO	**X**	K7+500		K7+860		
	REQUIERE LIMPIEZA: SI	**X**	NO		**OBSTRUCCIÓN BAJA**		**OBSTRUCCIÓN MEDIA**		**X**	**OBSTRUCCIÓN ALTA**			
ESCALONAMIENTO	NO				**GRIETAS**	NO			**DESGASTE**	NO			
	SI	Baja: e < 6,0 mm.		**X**		SI	Baja: g < 3,0 mm		**X**		BAJA		
		Media: 6,0 < e < 25,0 mm.					Media: 3,0 < g < 10,0 mm..				MEDIA		**X**
		Alta: e > 25,0 mm.					Alta: g > 10,0 mm				ALTA		
DESPORTILLAMIENTO	NO				**FRACTRURAMIENTO DE LA ESTRUCTURA**	NO			**SEPERACIÓN DE LA CUNETA**	NO			
	SI	Baja: d < 5,0 cm.		**X**		SI	BAJA				Baja: SC < 3,0 mm		**X**
		Media: 5,0 < d < 15,0 cm.					MEDIA		**X**		Media: 3,0 < SC < 10,0 mm		
		Alta: d > 15,0 cm.					ALTA				Alta: SC > 10,0 mm		
OBSERVACIONES:	SE TRATA DE LAS CUNETAS AL BORDE DEL PAVIMENTO RIGIDO. OBSTRUIDO EN TRAMOS PUNTUALES CON DESGASTE MEDIO Y FRACTURAS												
RECOMENDACIONES:	LIMPIEZA Y REMOCION DE LOS RESIDUOS. REHABILITACION DE LOSAS AFECTADAS Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE ENTREGA												

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LAS OBRAS DE ARTE (CUNETAS) DE LA VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.	
NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	9/03/2025





FOTOGRAFÍA	N°16												
LOCALIZACIÓN:	**LADO DERECHO**												
DIMENSIONES Y CONDICIONES ACTUALES:	**SECCIÓN**		TRIANGULAR		**DIMENCIONES**		**0.70m x 0.30 m**		**ABSCISA INICIAL**		**ABSCISA FINAL**		
	ESTRUCTURA DE ENTREGA SI		NO	**X**	**BORDILLOS SI:**		NO	**X**	K7+500		K7+860		
	REQUIERE LIMPIEZA: SI	**X**	NO		**OBSTRUCCIÓN BAJA**		**OBSTRUCCIÓN MEDIA**		**X**	**OBSTRUCCIÓN ALTA**			
ESCALONAMIENTO	NO				**GRIETAS**	NO				**DESGASTE**	NO		
	SI	Baja: e < 6,0 mm.		**X**		SI	Baja: g < 3,0 mm		**X**		BAJA		
		Media: 6,0 < e < 25,0 mm.					Media: 3,0 < g < 10,0 mm..				MEDIA		**X**
		Alta: e > 25,0 mm.					Alta: g > 10,0 mm				ALTA		
DESPORTILLAMIENTO	NO				**FRACTRURAMIENTO DE LA ESTRUCTURA**	NO				**SEPERACIÓN DE LA CUNETA**	NO		
	SI	Baja: d < 5,0 cm.		**X**		SI	BAJA				Baja: SC < 3,0 mm		**X**
		Media: 5,0 < d < 15,0 cm.					MEDIA		**X**		Media: 3,0 < SC < 10,0 mm		
		Alta: d > 15,0 cm.					ALTA				Alta: SC > 10,0 mm		
OBSERVACIONES:	SE TRATA DE LAS CUNETAS AL BORDE DEL PAVIMENTO RIGIDO. OBSTRUIDO EN TRAMOS PUNTUALES CON DESGASTE MEDIO Y FRACTURAS												
RECOMENDACIONES:	LIMPIEZA Y REMOCION DE LOS RESIDUOS. REHABILITACION DE LOSAS AFECTADAS Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE ENTREGA												

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LAS OBRAS DE ARTE (CUNETAS) DE LA VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.	
NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	9/03/2025









FOTOGRAFÍA	N°17														
LOCALIZACIÓN:	**LADO DERECHO**														
DIMENSIONES Y CONDICIONES ACTUALES:	**SECCIÓN**		TRIANGULAR		**DIMENCIONES**		0.60 m x 0.30 m		**ABSCISA INICIAL**		**ABSCISA FINAL**				
	ESTRUCTURA DE ENTREGA SI		NO	X	**BORDILLOS SI:**		NO	X	**K8+160**		**K8+290**				
	REQUIERE LIMPIEZA: SI	X	NO		**OBSTRUCCIÓN BAJA**		**OBSTRUCCIÓN MEDIA**			**OBSTRUCCIÓN ALTA**		X			
ESCALONAMIENTO	NO				**GRIETAS**	NO			**DESGASTE**		NO				
	SI	Baja: e < 6,0 mm.				SI	Baja: g < 3,0 mm				BAJA				
		Media: 6,0 < e < 25,0 mm.		X			Media: 3,0 < g < 10,0 mm..				MEDIA	X			
		Alta: e > 25,0 mm.					Alta: g > 10,0 mm		X		ALTA				
DESPORTILLAMIENTO	NO				**FRACTRURAMIENTO DE LA ESTRUCTURA**	NO			**SEPERACIÓN DE LA CUNETA**		NO				
	SI	Baja: d < 5,0 cm.				SI	BAJA				Baja: SC < 3,0 mm				
		Media: 5,0 < d < 15,0 cm.		X			MEDIA		X		Media: 3,0 < SC < 10,0 mm	X			
		Alta: d > 15,0 cm.					ALTA				Alta: SC > 10,0 mm				
OBSERVACIONES:	SE EVIDENCIAN GRIETAS FRACTURAS QUE COMPROMETEN LA ESTRUCTURA. TOTALMENTE TAPADA EN TRAMOS Y NO HAY ZONA DE DESCARGA.														
RECOMENDACIONES:	DEMOLICION Y REECONSTRUCCION DE LAS CUNETAS Y ZONAS DE DESCARGA														

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LAS OBRAS DE ARTE (CUNETAS) DE LA VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.	
NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	9/03/2025









FOTOGRAFÍA	N°18														
LOCALIZACIÓN:	**LADO DERECHO**														
DIMENSIONES Y CONDICIONES ACTUALES:	**SECCIÓN**		TRIANGULAR		**DIMENCIONES**		0.60 m x 0.30 m		**ABSCISA INICIAL**		**ABSCISA FINAL**				
	ESTRUCTURA DE ENTREGA SI		NO	X	**BORDILLOS SI:**		NO	X	**K8+290**		**K8+640**				
	REQUIERE LIMPIEZA: SI	X	NO		**OBSTRUCCIÓN BAJA**		**OBSTRUCCIÓN MEDIA**			**OBSTRUCCIÓN ALTA**		X			
ESCALONAMIENTO	NO				**GRIETAS**	NO			**DESGASTE**		NO				
	SI	Baja: e < 6,0 mm.				SI	Baja: g < 3,0 mm				BAJA				
		Media: 6,0 < e < 25,0 mm.	X				Media: 3,0 < g < 10,0 mm..				MEDIA	X			
		Alta: e > 25,0 mm.					Alta: g > 10,0 mm	X			ALTA				
DESPORTILLAMIENTO	NO				**FRACTRURAMIENTO DE LA ESTRUCTURA**	NO			**SEPERACIÓN DE LA CUNETA**		NO				
	SI	Baja: d < 5,0 cm.				SI	BAJA				Baja: SC < 3,0 mm				
		Media: 5,0 < d < 15,0 cm.	X				MEDIA	X			Media: 3,0 < SC < 10,0 mm	X			
		Alta: d > 15,0 cm.					ALTA				Alta: SC > 10,0 mm				
OBSERVACIONES:	SE EVIDENCIAN GRIETAS FRACTURAS QUE COMPROMETEN LA ESTRUCTURA. TOTALMENTE TAPADA EN TRAMOS Y NO HAY ZONA DE DESCARGA.														
RECOMENDACIONES:	DEMOLICION Y REECONSTRUCCION DE LAS CUNETAS Y ZONAS DE DESCARGA														

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LAS OBRAS DE ARTE (CUNETAS) DE LA VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	9/03/2025









FOTOGRAFÍA	N°19
LOCALIZACIÓN:	**LADO DERECHO**

DIMENSIONES Y CONDICIONES ACTUALES:	**SECCIÓN**		**TRIANGULAR**		**DIMENCIONES**		**0.60 m x 0.30 m**		**ABSCISA INICIAL**		**ABSCISA FINAL**				
	ESTRUCTURA DE ENTREGA SI		NO	**X**	**BORDILLOS SI:**		NO	**X**	**K8+820**		**K8+940**				
	REQUIERE LIMPIEZA: SI	**X**	NO		**OBSTRUCCIÓN BAJA**		**OBSTRUCCIÓN MEDIA**			**OBSTRUCCIÓN ALTA**		**X**			
ESCALONAMIENTO	NO				**GRIETAS**	NO			**DESGASTE**		NO				
	SI	Baja: e < 6,0 mm.				SI	Baja: g < 3,0 mm				BAJA				
		Media: 6,0 < e < 25,0 mm.		**X**			Media: 3,0 < g < 10,0 mm..				MEDIA	**X**			
		Alta: e > 25,0 mm.					Alta: g > 10,0 mm	**X**			ALTA				
DESPORTILLAMIENTO	NO				**FRACTRURAMIENTO DE LA ESTRUCTURA**	NO			**SEPERACIÓN DE LA CUNETA**		NO				
	SI	Baja: d < 5,0 cm.				SI	BAJA				Baja: SC < 3,0 mm				
		Media: 5,0 < d < 15,0 cm.		**X**			MEDIA				Media: 3,0 < SC < 10,0 mm	**X**			
		Alta: d > 15,0 cm.					ALTA	**X**			Alta: SC > 10,0 mm				

OBSERVACIONES:	SE EVIDENCIAN GRIETAS FRACTURAS QUE COMPROMETEN LA ESTRUCTURA. TOTALMENTE TAPADA EN TRAMOS Y NO HAY ZONA DE DESCARGA.
RECOMENDACIONES:	DEMOLICION Y REECONSTRUCCION DE LAS CUNETAS Y ZONAS DE DESCARGA

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LAS OBRAS DE ARTE (CUNETAS) DE LA VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	9/03/2025









FOTOGRAFÍA	N°20																		
LOCALIZACIÓN:	**LADO DERECHO**																		
DIMENSIONES Y CONDICIONES ACTUALES:	**SECCIÓN**		**TRIANGULAR**		**DIMENCIONES**		**0.60 m x 0.30 m**		**ABSCISA INICIAL**		**ABSCISA FINAL**								
	ESTRUCTURA DE ENTREGA SI	**X**	NO		**BORDILLOS SI:**		NO	**X**	**K9+450**		**K9+750**								
	REQUIERE LIMPIEZA: SI	**X**	NO		**OBSTRUCCIÓN BAJA**		**OBSTRUCCIÓN MEDIA**				**OBSTRUCCIÓN ALTA**		**X**						
ESCALONAMIENTO	NO				**GRIETAS**	NO			**DESGASTE**		NO								
	SI	Baja: e < 6,0 mm.				SI	Baja: g < 3,0 mm				BAJA								
		Media: 6,0 < e < 25,0 mm.	**X**				Media: 3,0 < g < 10,0 mm..				MEDIA		**X**						
		Alta: e > 25,0 mm.					Alta: g > 10,0 mm	**X**			ALTA								
DESPORTILLAMIENTO	NO				**FRACTRURAMIENTO DE LA ESTRUCTURA**	NO			**SEPERACIÓN DE LA CUNETA**		NO								
	SI	Baja: d < 5,0 cm.				SI	BAJA				Baja: SC < 3,0 mm								
		Media: 5,0 < d < 15,0 cm.	**X**				MEDIA				Media: 3,0 < SC < 10,0 mm		**X**						
		Alta: d > 15,0 cm.					ALTA	**X**			Alta: SC > 10,0 mm								
OBSERVACIONES:	SE EVIDENCIAN GRIETAS FRACTURAS QUE COMPROMETEN LA ESTRUCTURA. TOTALMENTE TAPADA EN TRAMOS Y ESTRUCTURA DE DESCARGAD ESTÁ DESTRUIDAD																		
RECOMENDACIONES:	DEMOLICION Y REECONSTRUCCION DE LAS CUNETAS Y ZONAS DE DESCARGA																		

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LAS OBRAS DE ARTE (CUNETAS) DE LA VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	9/03/2025









FOTOGRAFÍA	N°20												
LOCALIZACIÓN:	**LADO IZQUIERDO**												
DIMENSIONES Y CONDICIONES ACTUALES:	**SECCIÓN**		**TRIANGULAR**		**DIMENCIONES**		**0.60 m x 0.30 m**		**ABSCISA INICIAL**		**ABSCISA FINAL**		
	ESTRUCTURA DE ENTREGA SI	**X**	NO		**BORDILLOS SI:**		NO	**X**	**K9+450**		**K9+750**		
	REQUIERE LIMPIEZA: SI	**X**	NO		**OBSTRUCCIÓN BAJA**		**OBSTRUCCIÓN MEDIA**			**OBSTRUCCIÓN ALTA**		**X**	
ESCALONAMIENTO	NO				**GRIETAS**	NO			**DESGASTE**		NO		
	SI	Baja: e < 6,0 mm.				SI	Baja: g < 3,0 mm				BAJA		
		Media: 6,0 < e < 25,0 mm.		**X**			Media: 3,0 < g < 10,0 mm..				MEDIA	**X**	
		Alta: e > 25,0 mm.					Alta: g > 10,0 mm	**X**			ALTA		
DESPORTILLAMIENTO	NO				**FRACTRURAMIENTO DE LA ESTRUCTURA**	NO			**SEPERACIÓN DE LA CUNETA**		NO		
	SI	Baja: d < 5,0 cm.				SI	BAJA				Baja: SC < 3,0 mm		
		Media: 5,0 < d < 15,0 cm.		**X**			MEDIA				Media: 3,0 < SC < 10,0 mm	**X**	
		Alta: d > 15,0 cm.					ALTA	**X**			Alta: SC > 10,0 mm		
OBSERVACIONES:	SE EVIDENCIAN GRIETAS FRACTURAS QUE COMPROMETEN LA ESTRUCTURA. TOTALMENTE TAPADA EN TRAMOS Y ESTRUCTURA DE DESCARGAD ESTÁ DESTRUIDAD												
RECOMENDACIONES:	DEMOLICION Y REECONSTRUCCION DE LAS CUNETAS Y ZONAS DE DESCARGA												

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LAS OBRAS DE ARTE (CUNETAS) DE LA VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	9/03/2025









FOTOGRAFÍA	N°21												
LOCALIZACIÓN:	**LADO DERECHO**												
DIMENSIONES Y CONDICIONES ACTUALES:	**SECCIÓN**		**TRIANGULAR**		**DIMENCIONES**		**0.60 m x 0.30 m**		**ABSCISA INICIAL**		**ABSCISA FINAL**		
	ESTRUCTURA DE ENTREGA SI	**X**	NO		**BORDILLOS SI:**		NO	**X**	**K9+750**		**K10+354**		
	REQUIERE LIMPIEZA: SI	**X**	NO		**OBSTRUCCIÓN BAJA**		**OBSTRUCCIÓN MEDIA**	**X**	**OBSTRUCCIÓN ALTA**				
ESCALONAMIENTO	NO				**GRIETAS**	NO			**DESGASTE**	NO			
	SI	Baja: e < 6,0 mm.		**X**		SI	Baja: g < 3,0 mm			BAJA			
		Media: 6,0 < e < 25,0 mm.					Media: 3,0 < g < 10,0 mm..	**X**		MEDIA	**X**		
		Alta: e > 25,0 mm.					Alta: g > 10,0 mm			ALTA			
DESPORTILLAMIENTO	NO				**FRACTRURAMIENTO DE LA ESTRUCTURA**	NO			**SEPERACIÓN DE LA CUNETA**	NO			
	SI	Baja: d < 5,0 cm.		**X**		SI	BAJA			Baja: SC < 3,0 mm			
		Media: 5,0 < d < 15,0 cm.					MEDIA	**X**		Media: 3,0 < SC < 10,0 mm	**X**		
		Alta: d > 15,0 cm.					ALTA			Alta: SC > 10,0 mm			
OBSERVACIONES:	SE EVIDENCIAN GRIETAS FRACTURAS QUE COMPROMETEN LA ESTRUCTURA. TOTALMENTE TAPADA EN TRAMOS Y ESTRUCTURA DE DESCARGAD ESTÁ DESTRUIDA. EN ESTA ZONA												
RECOMENDACIONES:	DEMOLICION Y REECONSTRUCCION DE LAS ZONAS DE DESCARGA. SE DEBERÁ CONSTRUIR UN EMPEDRADO DE PROTECCION AL TALUD ILUSTRADO PARA GARANTIZAR ESTABILIDAD. REHABILITACION DE CUNETAS Y CAMBIOS EN LUGARES CRITICOS												

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LAS OBRAS DE ARTE (CUNETAS) DE LA VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	9/03/2025









FOTOGRAFÍA	N°22
LOCALIZACIÓN:	**LADO IZQUIERDO**

DIMENSIONES Y CONDICIONES ACTUALES:	**SECCIÓN**		**TRIANGULAR**		**DIMENCIONES**		**0.60 m x 0.30 m**		**ABSCISA INICIAL**		**ABSCISA FINAL**		
	ESTRUCTURA DE ENTREGA SI	**X**	NO		**BORDILLOS SI:**		NO	**X**	**K9+750**		**K10+354**		
	REQUIERE LIMPIEZA: SI	**X**	NO		**OBSTRUCCIÓN BAJA**		**OBSTRUCCIÓN MEDIA**			**OBSTRUCCIÓN ALTA**		**X**	
ESCALONAMIENTO	NO				**GRIETAS**	NO			**DESGASTE**	NO			
	SI	Baja: e < 6,0 mm.				SI	Baja: g < 3,0 mm			BAJA			
		Media: 6,0 < e < 25,0 mm.		**X**			Media: 3,0 < g < 10,0 mm..			MEDIA		**X**	
		Alta: e > 25,0 mm.					Alta: g > 10,0 mm	**X**		ALTA			
DESPORTILLAMIENTO	NO				**FRACTRURAMIENTO DE LA ESTRUCTURA**	NO			**SEPERACIÓN DE LA CUNETA**	NO			
	SI	Baja: d < 5,0 cm.				SI	BAJA			Baja: SC < 3,0 mm			
		Media: 5,0 < d < 15,0 cm.		**X**			MEDIA			Media: 3,0 < SC < 10,0 mm		**X**	
		Alta: d > 15,0 cm.					ALTA	**X**		Alta: SC > 10,0 mm			

OBSERVACIONES:	SE EVIDENCIAN GRIETAS FRACTURAS QUE COMPROMETEN LA ESTRUCTURA. TOTALMENTE TAPADA EN TRAMOS Y ESTRUCTURA DE DESCARGAD ESTÁ DESTRUIDA. EN ESTA ZONA
RECOMENDACIONES:	DEMOLICION Y REECONSTRUCCION DE LAS CUNETAS Y ZONAS DE DESCARGA.

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LAS OBRAS DE ARTE (CUNETAS) DE LA VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.	
NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	VIA SAMPUES-SEGOVIA-SINCELEJO.
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	9/03/2025







FOTOGRAFÍA	N°23																		
LOCALIZACIÓN:	**LADO DERECHO**																		
DIMENSIONES Y CONDICIONES ACTUALES:	**SECCIÓN**		**TRIANGULAR**		**DIMENCIONES**		**0.60 m x 0.30 m**		**ABSCISA INICIAL**		**ABSCISA FINAL**								
	ESTRUCTURA DE ENTREGA SI	**X**	NO		**BORDILLOS SI:**		NO	**X**	**K10+430**		**K10+620**								
	REQUIERE LIMPIEZA: SI	**X**	NO		**OBSTRUCCIÓN BAJA**		**OBSTRUCCIÓN MEDIA**			**OBSTRUCCIÓN ALTA**		**X**							
ESCALONAMIENTO	NO				**GRIETAS**	NO			**DESGASTE**		NO								
	SI	Baja: e < 6,0 mm.				SI	Baja: g < 3,0 mm				BAJA								
		Media: 6,0 < e < 25,0 mm.	**X**				Media: 3,0 < g < 10,0 mm..	**X**			MEDIA								
		Alta: e > 25,0 mm.					Alta: g > 10,0 mm				ALTA	**X**							
DESPORTILLAMIENTO	NO				**FRACTRURAMIENTO DE LA ESTRUCTURA**	NO			**SEPERACIÓN DE LA CUNETA**		NO								
	SI	Baja: d < 5,0 cm.				SI	BAJA				Baja: SC < 3,0 mm								
		Media: 5,0 < d < 15,0 cm.	**X**				MEDIA	**X**			Media: 3,0 < SC < 10,0 mm	**X**							
		Alta: d > 15,0 cm.					ALTA				Alta: SC > 10,0 mm								
OBSERVACIONES:	SE EVIDENCIAN GRIETAS FRACTURAS QUE COMPROMETEN LA ESTRUCTURA. TOTALMENTE TAPADA EN TRAMOS Y ESTRUCTURA DE DESCARGAD ESTÁ DESTRUIDA. EN ESTA ZONA																		
RECOMENDACIONES:	DEMOLICION Y REECONSTRUCCION DE LAS ZONAS DE DESCARGA.																		
