
fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 04				INGEBYP NIT 830.121.597-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	1 DE 2	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	**OBJETO:**	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			**ACTA PARCIAL**	4	**FECHA** 30/09/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	1.5.	**DESCRIPCION ITEM:**	Desmonte puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el Fondo Nacional del Ahorro S.A. indique.		**UNIDAD:**	Und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

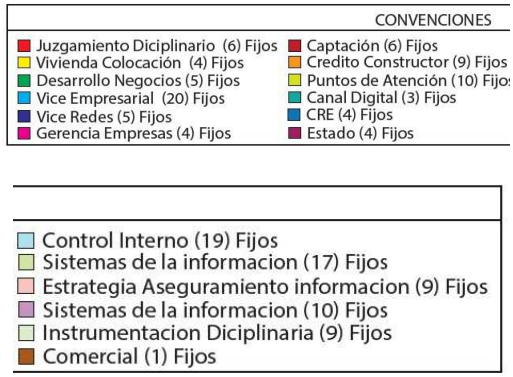

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	UNIDADES	MEDIDA TOTAL
Cuarto PISO edificio Convenciones					-
Juzgamiento Diciplinario (6) Fijos				6,00	6,00
Vivienda Colocación (4) Fijos				4,00	4,00
Desarrollo Negocios (5) Fijos				5,00	5,00
Vice Empresarial (20) Fijos				20,00	20,00
Vice Redes (5) Fijos				5,00	5,00
Gerencia Empresas (4) Fijos				4,00	4,00
Captación (6) Fijos				6,00	6,00
Credito Constructor (9) Fijos				9,00	9,00
Puntos de Atención (10) Fijos				10,00	10,00
Canal Digital (3) Fijos				3,00	3,00
CRE (4) Fijos				4,00	4,00
Estado (4) Fijos				4,00	4,00
Control Interno (19) Fijos				19,00	19,00
Sistemas de la informacion (17) Fijos				17,00	17,00
Estrategia Aseguramiento informacion (9) Fijos				9,00	9,00
Sistemas de la informacion (10) Fijos				10,00	10,00
Instrumentacion Diciplinaria (9) Fijos				4,00	4,00
Comercial (1) Fijos				1,00	1,00
MESAS DE REUNIONES				10,00	10,00
					-
				SUBTOTAL	150,00
				VIENE	-
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADO	150,00
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3	79,00
				PRESENTE ACTA	71,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO **COORDINADOR DE PROYECTO**	**ING. FABIAN BOHORQUEZ** **GERENTE DE OBRA**	**ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN** **COORDINADOR DE INTERVENTORIA**

	ACTA PARCIAL No. 04			
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA			
	PERIODO	**01-09-2025 AL 30-09-2025**	**HOJA**	**2 DE 2**

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	**OBJETO:**	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			**ACTA PARCIAL**	4	**FECHA** 30/09/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	1.5.	**DESCRIPCION ITEM:**	Desmonte puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el Fondo Nacional del Ahorro S.A. indique.		**UNIDAD:**	UND

REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO






OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. [illegible] **COORDINADOR DE PROYECTO**	**ING. FABIAN BOHORQUEZ** **GERENTE DE OBRA**	**ING. [illegible]N MUÑOZ GAITAN** **[illegible]ER DE INTERVENTORIA**


fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**ACTA PARCIAL No. 04**				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	**01-09-2025 AL 30-09-2025**	**HOJA**	**1 DE 2**	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	**OBJETO:**	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			**ACTA PARCIAL**	4	**FECHA**	30/09/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	4.1.	**DESCRIPCION ITEM:**	Suministro e instalación de cielo raso en Drywall de 1/2" en diferentes niveles a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo y pintura a 3 manos. A todo costo.		**UNIDAD:**	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	**LOCALIZACION**	**DIMENSIONES**			**No. DE ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL**
		ALTO	**ANCHO**	**LARGO**		
						-
	Convenciones cuarto piso					-
	Area total		25,54	43,20	0,50	551,66
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	551,66
					VIENE	-
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADO	551,66
					COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3	-
					PRESENTE ACTA	551,66

REGISTRO FOTOGRÁFICO

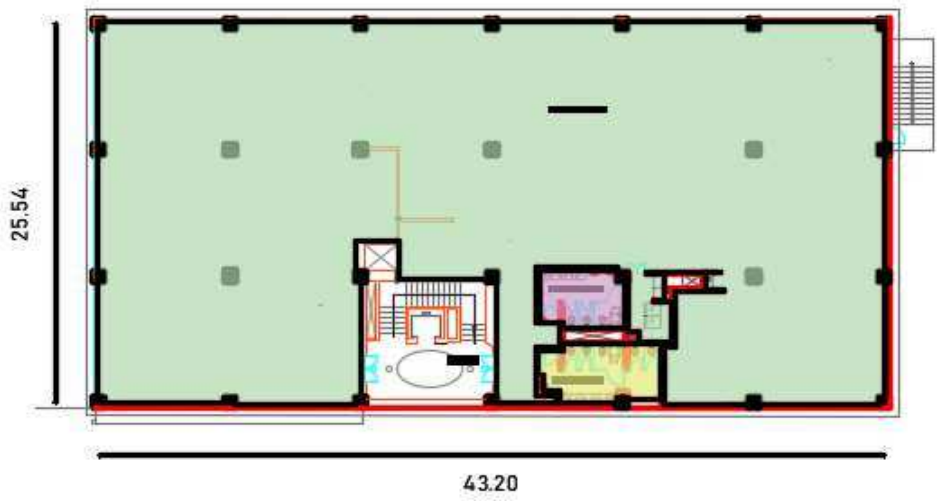

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. [illegible] **COORDINADOR DE PROYECTOS**	**ING. FABIAN BOHORQUEZ** **GERENTE DE OBRA**	**ING. [illegible] MUÑOZ GAITAN** **COORDINADOR DE INTERVENTORIA**

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**ACTA PARCIAL No. 04**				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	**01-09-2025 AL 30-09-2025**	**HOJA**	**2 DE 2**	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	**OBJETO:**	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			**ACTA PARCIAL**	4	**FECHA**	30/09/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	4.1.	**DESCRIPCION ITEM:**	Suministro e instalación de cielo raso en Drywall de 1/2" en diferentes niveles a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo y pintura a 3 manos. A todo costo.			**UNIDAD:**	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO




OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS **COORDINADOR DE PROYECTOS**	**ING. FABIAN BOHORQUEZ** **GERENTE DE OBRA**	**ING. ANDRES MUÑOZ GAITAN** **COORDINADOR DE INTERVENTORIA**


fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 04				INGEBYP NIT 830.124.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	1 DE 2	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	**OBJETO:**	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			**ACTA PARCIAL**	4	**FECHA** 30/09/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-01	**DESCRIPCION ITEM:**	Demolición placa maciza 0.15 mt en horarios autorizado por la entidad (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).		**UNIDAD:**	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	Nº ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
						-
	Cubierta edificio convenciones					-
						-
						-
			6,87	21,69	1,00	149,01
			19,02	6,96	1,00	132,38
			3,28	5,21	1,00	17,09
			14,15	21,69	1,00	306,91
			1,12	7,89	1,00	8,84
			14,41	6,87	1,00	99,00
			7,09	7,57	1,00	53,67
			0,74	3,01	1,00	2,23
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	769,13
					VIENE	46,23
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADO	815,36
					COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3	46,23
					PRESENTE ACTA	769,13

REGISTRO FOTOGRÁFICO

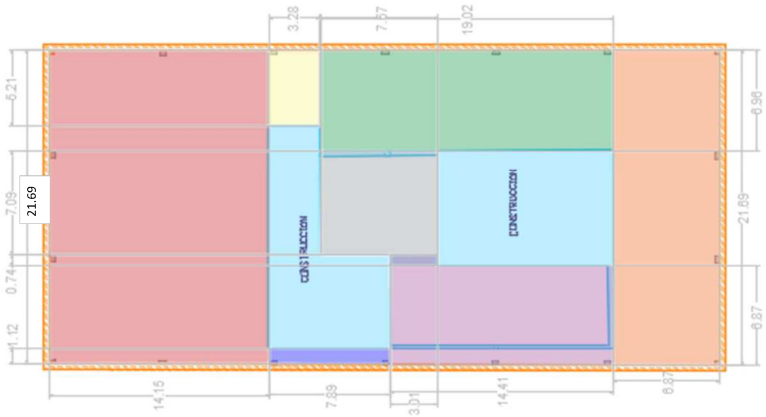

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	V°. Bo.:
ING. RODOLFO [illegible] ARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN OHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. ADOLFO MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 04				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	2 DE 2	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	**OBJETO:**	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			**ACTA PARCIAL**	4	**FECHA**	30/09/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	NP-01	**DESCRIPCION ITEM:**	Demolición placa maciza 0.15 mt en horarios autorizacio por la entidad (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).			**UNIDAD:**	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. [illegible] JARRETO VAR[illegible] COORD[illegible]ADOR DE PROYEC[illegible]	ING. FA[illegible]AN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AS[illegible]H [illegible]JROZ GAITAN COORDI[illegible]E INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 04				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS PISO 2 CNA - FNA				
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	1 DE 1	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	**OBJETO:**	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			**ACTA PARCIAL**	4	**FECHA** 30/09/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-03	**DESCRIPCION ITEM:**	Demolición baldosa muro en horarios autorizados por la ENTIDAD (incluye retiro de material desde frente de obra al sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).		**UNIDAD:**	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	Nº ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
Baños CNA P2					-
corresponde a piso de PASILLO	1,96		6,63	1,00	12,99
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	12,99
				VIENE	139,95
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADO	152,94
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3	- 139,95
				PRESENTE ACTA	12,99

REGISTRO FOTOGRAFICO








OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTOS	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	[illegible] GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 04				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS CNA PISO 2 FNA				
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	1 DE 3	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	**OBJETO:**	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			**ACTA PARCIAL**	4	**FECHA** 30/09/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-04	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	Baldosa cerámica pared 30x60.			**UNIDAD:** M2

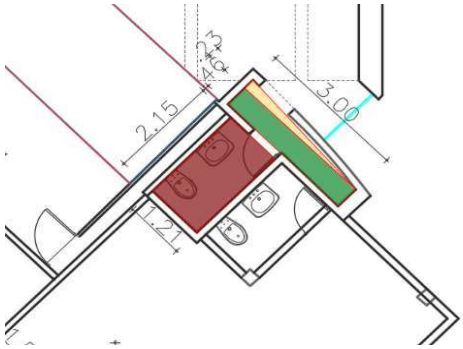PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
						-
	Baño Recepcion					-
						-
		2,20	2,15		2,00	9,46
		2,20	1,21		2,00	5,32
	puerta	2,00	0,60		- 1,00	- 1,20
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	13,58
					VIENE	133,54
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADO	147,12
					COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3	- 105,00
					PRESENTE ACTA	42,12

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO COORDINADOR DE PROYECTOS	ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE INTERVENTORÍA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 04				INGEBYP NIT. 830.121.597-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS CNA PISO 2 FNA				
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	2 DE 3	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	**OBJETO:**	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			**ACTA PARCIAL**	4	**FECHA** 30/09/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-04	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	Baldosa cerámica pared 30x60.		**UNIDAD:**	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

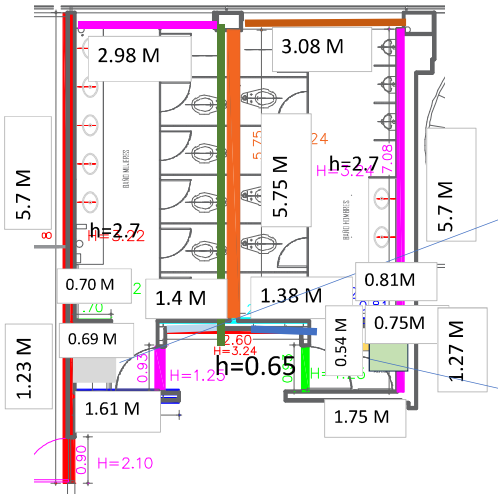

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
baños CNA piso 2					-
baño mujeres					-
muro lavamanos	2,70		5,70	1,00	15,39
muro sanitario	2,70		5,75	1,00	15,53
muro ventana	1,50		2,98	1,00	4,47
muro contra pasillo	2,70		1,40	1,00	3,78
muro contra bodega	2,70		0,70	1,00	1,89
bodega interna	2,70		1,23	1,00	3,32
bodega interna	2,70		1,61	1,00	4,35
bodega interna	2,70		0,69	1,00	1,86
SUPERIOR DE PUERTA	0,65		1,61	2,00	2,09
					-
baño de hombre					-
muro lavamanos y orinales	2,70		5,70	1,00	15,39
muro sanitario	2,70		5,75	1,00	15,53
muro lavamanos	2,70		0,81	1,00	2,19
muro fachada ventana	1,50		3,08	1,00	4,62
muro contra pasillo	2,70		1,38	1,00	3,73
poceta de aseo	2,70		1,75	1,00	4,73
poceta de aseo	2,70		0,75	1,00	2,03
poceta de aseo	2,70		1,27	1,00	3,43
poceta de aseo	2,70		0,54	2,00	2,92
SUPERIOR DE PUERTA	0,65		1,27	2,00	1,65
					-
Cantidad contemplada en pusch sanitario	1,00		0,30	- 10,00	- 3,00
Cantidad contemplada en pusch orinal	1,00		0,30	- 4,00	- 1,20
Cantidad contemplada en pusch lavamanos	1,00		0,30	- 8,00	- 2,40
			71,24	- 1,00	- 71,24
					-
				SUBTOTAL	31,06
				VIENE	102,48
				SUBTOTAL ACUMULADO	133,54

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Validó:
ING. ROBERTO BARRETO VARGAS **COORDINADOR DE PROYECTO**	**ING. FABIAN BOHORQUEZ** **GERENTE DE OBRA**	**ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITÁN** **COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA**

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 04			INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS CNA PISO 2 FNA			
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	3 DE 3


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	**OBJETO:**	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			**ACTA PARCIAL**	**4**	**FECHA** 30/09/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	**NP-04**	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	Baldosa cerámica pared 30x60.		**UNIDAD:**	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO





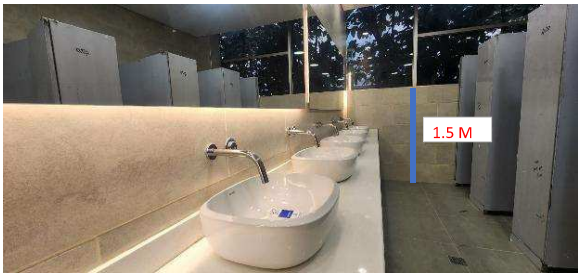



OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	V°. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS **COORDINADOR DE PROYECTO**	**ING. FABIAN BOHÓRQUEZ** **GERENTE DE OBRA**	**ING. ANDRÉS FELIPE MUÑOZ GAITÁN** **COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA**

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 04				INGEBYP NIT. 830.121.501-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS CNA PISO 2 FNA				
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	1 DE 4	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	**OBJETO:**	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			**ACTA PARCIAL**	4	**FECHA** 30/09/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-05	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	Baldosa ceramica piso 60x60.		**UNIDAD:**	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

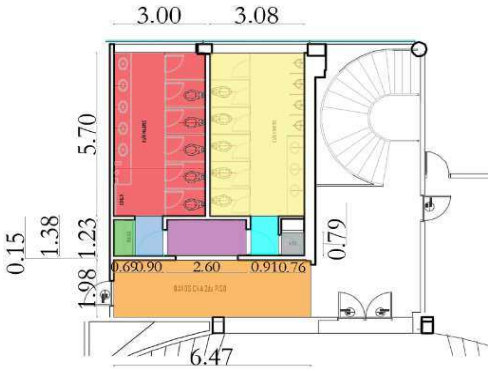

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
baños CNA piso 2					-
baño mujeres	3,00		5,70	1,00	17,10
Bodega	1,23		0,69	1,00	0,85
Pasillo acceso	0,90		1,38	1,00	1,24
					-
Baño hombres	3,08		5,70	1,00	17,56
Aseo	0,79		0,76	1,00	0,60
Pasillo	1,38		0,91	1,00	1,26
					-
Corredor externo	2,60		1,23	1,00	3,20
Corredor externo	1,98		6,47	1,00	12,81
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					54,62
VIENE					23,24
CANTIDAD TOTAL ACUMULADO					77,86
COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3					-
PRESENTE ACTA					77,86

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS **COORDINADOR DE PROYECTO**	**ING. FABIAN BOHÓRQUEZ** **GERENTE DE OBRA**	**ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN** **COORDINADOR PROYECTO INTERVENTORÍA**

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 04				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS CNA PISO 2 FNA				
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	2 DE 4	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	**OBJETO:**	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			**ACTA PARCIAL**	4	**FECHA** 30/09/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-05	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	Baldosa ceramica piso 60x60.		**UNIDAD:**	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO










OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO CASTRO **COORDINADOR DE PROYECTO**	**ING. FABIAN BLANCO VÁSQUEZ** **GERENTE DE OBRA**	**ING. AUGUSTO MUÑOZ GAITÁN** **COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA**

	ACTA PARCIAL No. 04				
	MEMORIAS DE CANTIDADES - RECEPCION - FNA				
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	3 DE 4	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	**OBJETO:**	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			**ACTA PARCIAL**	4	**FECHA** 30/09/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-05	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	Baldosa ceramica piso 60x60.		**UNIDAD:**	M2

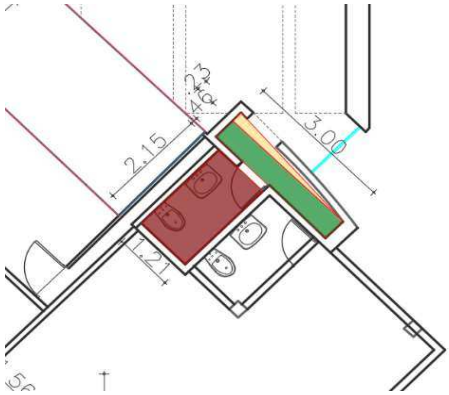PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
						-
			2,15	1,21	1,00	2,60
			0,46	3,00	1,00	1,38
			0,23	3,00	0,50	0,35
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	4,33
					VIENE	18,91
					SUBTOTAL ACUMULADO	23,24

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO [illegible] COORDINADOR DE PROYECTOS	ING. FABIAN BERMÚDEZ GERENTE DE OBRA	ING. [illegible] MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORÍA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 04				INGEBYP NIT 830.121.557-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES – RECEPCION – FNA				
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	4 DE 4	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	**OBJETO:**	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			**ACTA PARCIAL**	4	**FECHA** 30/09/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-05	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	Baldosa ceramica piso 60x60.		**UNIDAD:**	M2


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

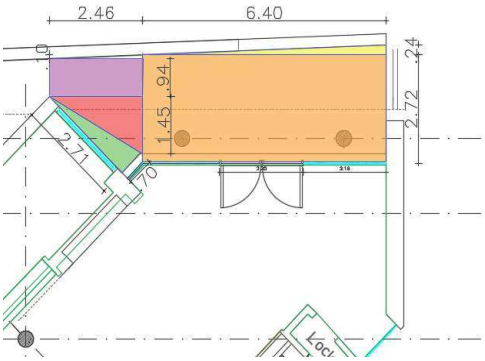

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
RECEPCIÓN					-
Area piso Acceso Ppal					-
		2,72	6,40	1,00	17,41
		2,46	0,94	1,00	2,31
		2,71	0,70	0,50	0,95
		1,45	2,46	0,50	1,78
		6,40	0,24	0,50	0,77
DESCUENTO COLUMNAS		0,60	3,14	- 2,00	- 3,77
Descuento gravilla lavada		0,10	2,72	- 2,00	- 0,54
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	18,91
				VIENE	-
				SUBTOTAL ACUMULADO	18,91

REGISTRO FOTOGRÁFICO



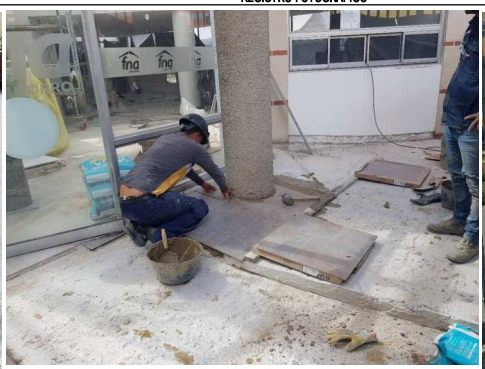



OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. [illegible]	ING. FABIAN B[illegible]HORQUEZ	[illegible]NG. AGU[illegible]UÑOZ GAITAN
COORD[illegible]ADOR DE PRO[illegible]	GERENTE DE O[illegible]A	[illegible]OORDIN[illegible]E INTERVENTORIA

	ACTA PARCIAL No. 04		
	MEMORIAS DE CANTIDADES - RECEPCIÓN FNA		
	PERIODO	**01-09-2025 AL 30-09-2025**	**HOJA** 1 DE 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	**OBJETO:**	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			**ACTA PARCIAL**	4	**FECHA**	30/09/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	NP-09	**DESCRIPCION ITEM:**	Demolición de guardaescoba, (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).			**UNIDAD:**	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

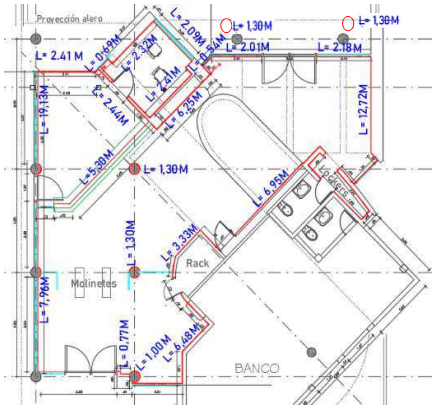

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
Recepción					-
Acceso a lockers vigilancia			12,72	1,00	12,72
Lockers vigilancia a Cuarto electrico			6,95	1,00	6,95
Cuarto electrico a Cuarto de Rack			3,33	1,00	3,33
Cuarto de Rack a acceso Interno			6,48	1,00	6,48
Columna circular Acceso interno			1,00	1,00	1,00
mocheta puerta Acceso interno			0,77	1,00	0,77
Socalo acceso interno a barra atencion			7,96	1,00	7,96
Barra atencion a puerta acceso Ppal.			6,25	1,00	6,25
Columnas circulares			1,30	4,00	5,20
bajo barra atención interior			5,30	1,00	5,30
PARTE INTERNA RECEPCION			2,41	1,00	2,41
PARTE INTERNA RECEPCION			0,69	1,00	0,69
PARTE INTERNA RECEPCION			2,32	1,00	2,32
PARTE INTERNA RECEPCION			2,09	1,00	2,09
PARTE INTERNA RECEPCION			0,54	1,00	0,54
PARTE INTERNA RECEPCION			2,01	1,00	2,01
PARTE INTERNA RECEPCION			2,18	1,00	2,18
PARTE INTERNA RECEPCION			2,41	1,00	2,41
PARTE INTERNA RECEPCION			2,44	1,00	2,44
					-
VER OBSERVACION			50,92	-1	- 50,92
					-
				SUBTOTAL	22,13
				VIENE	120,00
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADO	142,13
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3	- 120,00
				PRESENTE ACTA	22,13

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES: **Se descuenta pago parcial realizado en acta de cobro 3**

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS **COORDINADOR DE PROYECTO**	**ING. FABIAN BAHORQUEZ** **GERENTE DE OBRA**	**ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN** **COORDINADOR DE INTERVENTORIA**

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 04				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS CNA PISO 2 FNA				
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	1 DE 1	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	**OBJETO:**	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			**ACTA PARCIAL**	4	**FECHA** 30/09/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-15	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	Suministro e instalación de revestimiento interior de fachada en WPC Panel Casino, de acuerdo a muestra seleccionada.		**UNIDAD:**	M2


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CNA					-
BAÑOS CNA PISO 2					-
PASILLO EXTERIOR	2,70	0,94		2,00	5,08
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	5,08
				VIENE	33,70
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADO	38,78
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3	33,70
				PRESENTE ACTA	5,08

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.
ING. RODOLFO BARRIOS PEÑA COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BORRÓQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 04				INGEBYP NIT. 830.121.591-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS CNA PISO 2 FNA				
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	1 DE 2	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	**OBJETO:**	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			**ACTA PARCIAL**	4	**FECHA** 30/09/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-18	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	Suministro e instalación de sensor de presencia Infrarrojo 360° de cobertura, montaje en techo, detección de movimiento hasta 4 metros radiales a una altura de instalación de 2.4 metros.		**UNIDAD:**	Und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

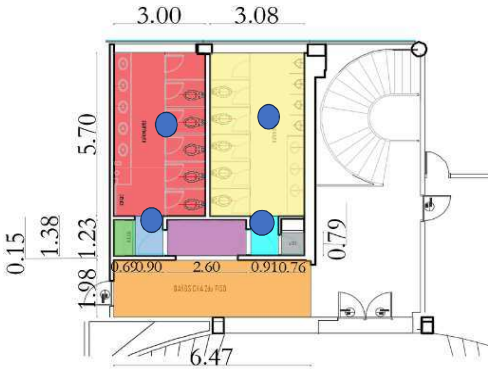


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
baños CNA piso 2					-
baño mujeres				2,00	2,00
					-
Baño hombres				2,00	2,00
					-
					-
					-

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 04				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES – RECEPCION – FNA				
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	2 DE 2	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	**OBJETO:**	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			**ACTA PARCIAL**	**4**	**FECHA** 30/09/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	**NP-18**	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	Suministro e instalación de sensor de presencia Infrarrojo 360° de cobertura, montaje en techo, detección de movimiento hasta 4 metros radiales a una altura de instalación de 2.4 metros.		**UNIDAD:**	Und

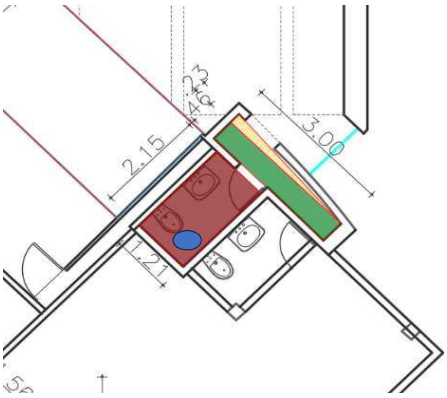PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Nº ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Baño Recepcion					-
					1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	1,00
					VIENE	-
					SUBTOTAL ACUMULADO	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO






OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO	**ING. FABIAN BOHÓRQUEZ**	**ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN**
COORDINADOR DE PROYECTOS	**GERENTE DE OBRA**	**COORDINADOR DE INTERVENTORÍA**

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 04				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS CNA PISO 2 FNA				
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	1 DE 1	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	**OBJETO:**	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			**ACTA PARCIAL**	4	**FECHA** 30/09/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-22	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	Suministro e instalación registro 1/2" agua potable		**UNIDAD:**	und

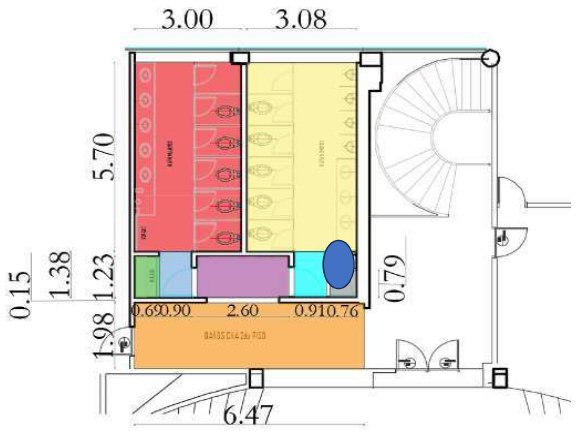PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Nº ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	**EDIFICIO CNA**					-
	BAÑOS CNA PISO 2					-
	POCETA DE ASEO				1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	1,00
					VIENE	2,00
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADO	3,00
					COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3	- 2,00
					PRESENTE ACTA	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. ROBERTO GARRETO [illegible]	ING. FABIAN BOHÓRQUEZ	ING. AGUSTÍN [illegible]DOZ GAITÁN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 04				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS CNA PISO 2 FNA				
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	1 DE 1	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	4	FECHA	30/09/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ÍTEM No.	NP-23	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Jardineras artificiales de acuerdo a render incluye amarre plástico			UNIDAD:	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

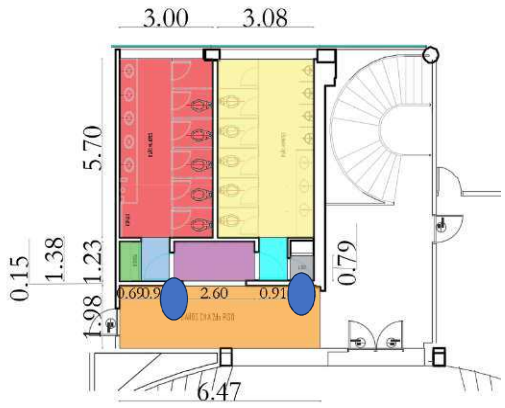

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CNA					-
BAÑOS CNA PISO 2					-
PASILLO EXTERIOR	2,70			2,00	5,40
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	5,40
				VIENE	15,06
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADO	20,46
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3	15,06
				PRESENTE ACTA	5,40

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. [illegible] BARRAGÁN COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR PROYECTO INTERVENTORÍA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 04				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS CNA PISO 2 FNA				
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	1 DE 2	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	**OBJETO:**	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			**ACTA PARCIAL**	4	**FECHA** 30/09/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-24	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	Suministro e instalacion de extractor para cocina y baños (16 x 16 x 9 cm)		**UNIDAD:**	und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

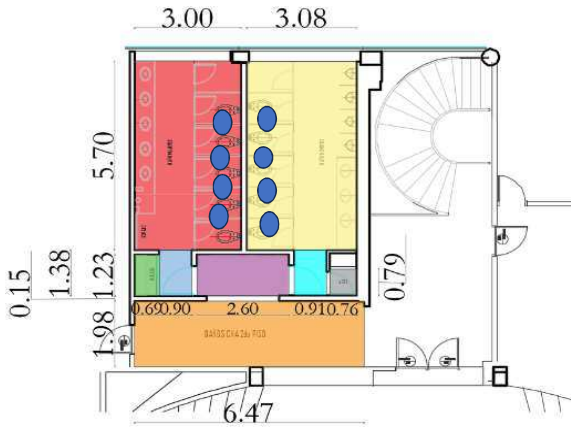

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CNA					-
BAÑOS CNA PISO 2					-
BAÑO MUJERES				4,00	4,00
BAÑO HOMBRES				4,00	4,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	8,00
				VIENE	1,00
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADO	9,00
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3	-
				PRESENTE ACTA	9,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO










OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO CARRILLO COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 04				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - COCINA PRESIDENCIA- FNA				
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	2 DE 2	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	**OBJETO:**	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			**ACTA PARCIAL**	4	**FECHA** 30/09/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-24	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	Suministro e instalacion de extractor para cocina y baños (16 x 16 x 9 cm)		**UNIDAD:**	und

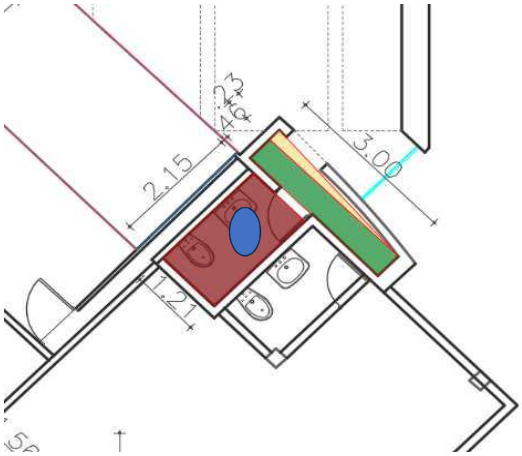PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	**EDIFICIO RECEPCION**					-
	BAÑO RECEPCION				1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	1,00
					VIENE	-
					SUBTOTAL ACUMULADO	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. [illegible] BARRIOS VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 04				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS CNA PISO 2 FNA				
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	1 DE 1	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	**OBJETO:**	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			**ACTA PARCIAL**	4	**FECHA** 30/09/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-30	**DESCRIPCION ITEM:**	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"			**UNIDAD:** und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

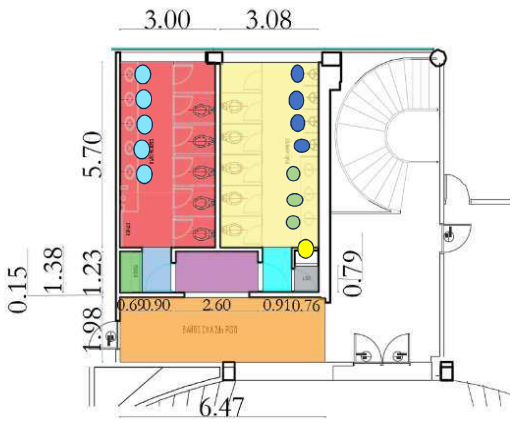

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CNA					-
BAÑOS CNA PISO 2					-
BAÑO MUJERES					-
LAVAMANOS				5,00	5,00
					-
					-
BAÑO HOMBRES					-
ORINALES				4,00	4,00
LAVAMANOS				3,00	3,00
					-
					-
POCETA DE ASEO				1,00	1,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
			SUBTOTAL		13,00
			VIENE		3,00
			CANTIDAD TOTAL ACUMULADO		16,00
			COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3		- 3,00
			PRESENTE ACTA		13,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO










OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	V°B°:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	**ING. FABIAN BOHÓRQUEZ**	**ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITÁN**
COORDINADOR DE PROYECTO	**GERENTE DE OBRA**	**COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA**

	ACTA PARCIAL No. 04				
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS CNA PISO 2 FNA				
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	1 DE 2	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	**OBJETO:**	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			**ACTA PARCIAL**	4	**FECHA** 30/09/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-31	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"		**UNIDAD:**	und

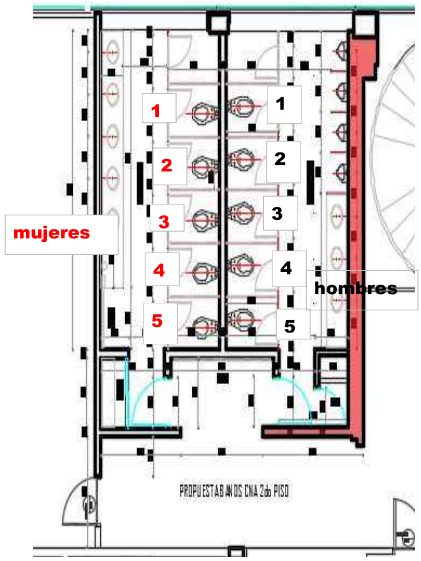PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Nº ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
						-
	BAÑOS CNA PISO 2					-
	Baño hombres				5,00	5,00
						-
	Baño mujeres				5,00	5,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	10,00
					VIENE	1,00
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADO	11,00
					COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3	- 1,00
					PRESENTE ACTA	10,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	V. Bo.:
ING. [illegible] BARRETO V[illegible]	ING. FABIAN BOHÓRQUEZ	ING. [illegible] MUÑOZ GAITÁN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 04				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS PISO 2 CNA - FNA				
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	2 DE 2	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	**OBJETO:**	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal – CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			**ACTA PARCIAL**	4	**FECHA**	30/09/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ÍTEM No.	NP-31	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"			**UNIDAD:**	und

REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.
ING. [illegible]	**ING. FABIAN BOHÓRQUEZ**	**ING. AGUSTÍN [illegible]DOZ GAITÁN**
COORDINADOR DE PROYECTO	**GERENTE DE OBRA**	**COORDINADOR DEL PROYECTO INTERVENTORÍA**

	ACTA PARCIAL No. 04				
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS CNA PISO 2 FNA				
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	1 DE 2	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	**OBJETO:**	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			**ACTA PARCIAL**	4	**FECHA** 30/09/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-32	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"		**UNIDAD:**	und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

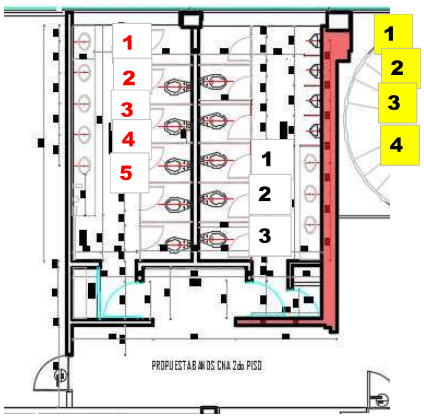

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
BAÑOS CNA PISO 2					-
Baño de Mujeres					-
LAVAMANOS				5,00	5,00
Baño hombres					-
LAVAMANOS				3,00	3,00
ORINALES				4,00	4,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	12,00
				VIENE	2,00
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADO	14,00
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3	- 2,00
				PRESENTE ACTA	12,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo:
ING. ROBERTO BARRETO V...	ING. FABIAN BOHÓRQUEZ	...Z GAITÁN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 04				INGEBYP NIT 830.121.567-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS CNA PISO 2 FNA				
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	2 DE 2	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	**OBJETO:**	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			**ACTA PARCIAL**	4	**FECHA** 30/09/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-32	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"		**UNIDAD:**	und

REGISTRO FOTOGRÁFICO







REGISTRO FOTOGRÁFICO








OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.
ING. ROBERTO BARRETO	**ING. FABIAN BOHÓRQUEZ**	**ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN**
COORDINADOR DE PROYECTO	**GERENTE DE OBRA**	**COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA**


fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 04				INGEBYP NIT. 830.121.537-7
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS CNA PISO 2 FNA				
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	1 DE 3	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	**OBJETO:**	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			**ACTA PARCIAL**	4	**FECHA** 30/09/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-44	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	Registro PVC-P 1 - 1/4"		**UNIDAD:**	und

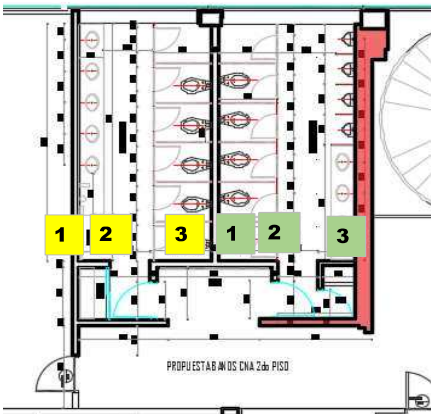PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	**EDIFICIO CNA**					-
						-
	BAÑOS CNA PISO 2					-
	Baño mujeres				3,00	3,00
	Baño hombres				3,00	3,00
						-
	Bodega				2,00	2,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	8,00
					VIENE	-
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADO	8,00
					COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3	-
					PRESENTE ACTA	8,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

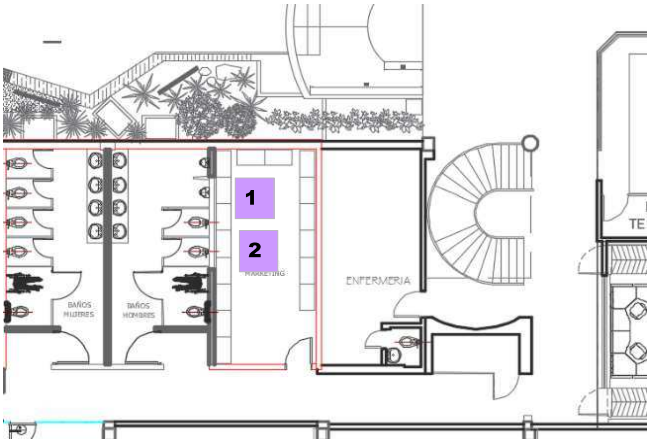

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo
ING. RO[illegible] BARRETO V[illegible]	ING. FABIAN BO[illegible]ÓRQUE[illegible]	ING. [illegible]TÍN MUÑOZ GAITÁN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBI[illegible]	C[illegible]ADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA

	ACTA PARCIAL No. 04				
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS CNA PISO 2 FNA				
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	2 DE 3	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	**OBJETO:**	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			**ACTA PARCIAL**	4	**FECHA** 30/09/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-44	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	Registro PVC-P 1 - 1/4"		**UNIDAD:**	und

REGISTRO FOTOGRÁFICO









REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VERGEL COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHÓRQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN PEÑUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA


	ACTA PARCIAL No. 04				
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS CNA PISO 2 FNA				
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	3 DE 3	

INGEBYP NIT: 830.121.507-2

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	**OBJETO:**	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			**ACTA PARCIAL**	4	**FECHA** 30/09/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-44	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	Registro PVC-P 1 - 1/4"		**UNIDAD:**	und

REGISTRO FOTOGRÁFICO

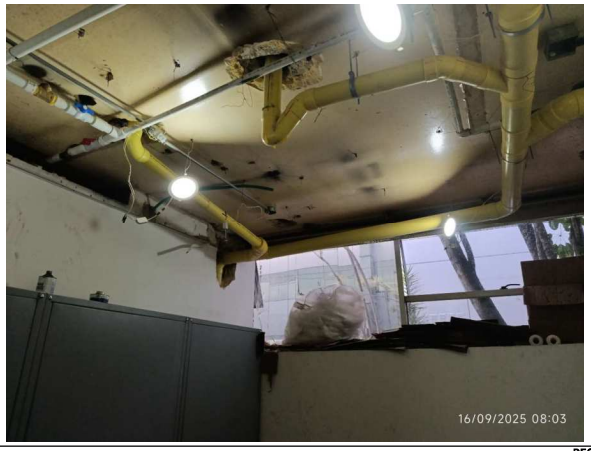



REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO PAREJO VARGAS	ING. FABIAN BOHÓRQUEZ	ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 04				INGEBYP NIT: 830.124.507-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS CNA PISO 2 FNA				
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	1 DE 1	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	**OBJETO:**	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			**ACTA PARCIAL**	4	**FECHA** 30/09/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-48	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	Suministro e instalación orinal tipo gotta o similar de entrada posterior no incluye grigeria ni incluye pusch		**UNIDAD:**	und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

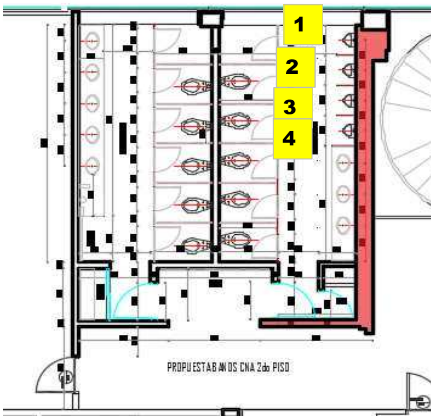

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
EDIFICIO CNA					-
					-
BAÑOS CNA PISO 2					-
Baño hombres				4,00	4,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	4,00
				VIENE	-
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADO	4,00
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3	-
				PRESENTE ACTA	4,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo:
ING. ROBERTO BARRETO	ING. FABIAN BORRÓQUEZ	ING. AGUSTIN [illegible] GAITÁN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 04				INGEBYP NIT. 830.121.537-2
	MEMORIAS DE CANTIDADES - BAÑOS CNA PISO 2 FNA				
	PERIODO	01-09-2025 AL 30-09-2025	HOJA	1 DE 1	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	**OBJETO:**	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			**ACTA PARCIAL**	4	**FECHA** 30/09/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-49	**DESCRIPCION ITEM:**	Desmonte de cubierta en lamina de zinc en cubierta de convenciones incluye estructura metalica de soporte, incluye retiro a sitio de acopio y disposición final.		**UNIDAD:**	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

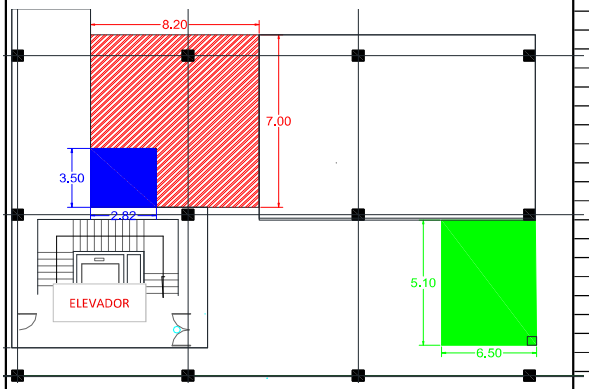

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	AREA	MEDIDA TOTAL
					-
Placa cubierta Edificio Convenciones Z. Sur		8,20	7,00		57,40
Placa cubierta Edificio Convenciones Z. Sur		2,82	3,50		9,87
Placa cubierta Edificio Convenciones Z. Sur		6,50	5,10		33,15
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	100,42
				VIENE	-
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADO	100,42
				COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 3	-
				PRESENTE ACTA	100,42

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo...
ING. RODOLFO BARRETO V... **COORDINADOR DE PROYECTO**	**ING. FABIAN B...MÓRQUEZ** **GERENTE DE OBRA**	**ING. ... MUÑOZ GAFIÁN** **COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA**

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.

ACTA DE COBRO 5

NUMERO PROCESO	FNA-VIPA-CP-316-2024
CONTRATISTA	FNA - 186 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	$ 5.142.932.904,88
VALOR CORTE 05	$ 728.299.826,05
Viernes, 31 de octubre de 2025	

1-10-2025 AL 31-10-2025

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 05			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (+)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (+)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
	REPARACIONES LOCATIVAS CENTRALES SEDE PRINCIPAL				521.444.328,37	-	-	-	12.909.064,04	-	104.786.999,00	-	49.697.308,27	-	-	-	166.540.241,67			354.998.087,30
1.1.	Retiro, reparación y reposición puntual de junta entre baldas (junta con factor forma 2cmx1cm), mediante el uso de fondo de junta tipo sika rod y sello elastomérico de poliuretano en color negro, con alta resistencia a la intemperie incluye andamio colgante o toda instalación provisional que permita el cumplimiento de la actividad.	ml	20,00	15.908,00	318.160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	15.908,00	318.160,00
1.2.	Pintura exterior tipo coraza para muros sobre pañete incluye toda instalación provisional que permita el cumplimento de la actividad.	m2	300,00	42.081,00	12.624.300,00	-	-	-	-	100,11	4.212.643,00	-	-	-	-	100,11	4.212.642,64	199,89	42.081,00	8.411.657,36
2.1.	Retiro de impermeabilización existente y mortero de nivelación, Incluye el retiro y disposición final de escombros (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").	m2	1.491,74	29.570,00	44.110.765,68	-	-	214,26	6.336.258,60		-	1.018,73	30.123.946,10	-	-	1.233,01	36.460.105,70	258,73	29.570,00	7.650.659,98
2.2.	Instalación de mortero de nivelación con materiales de SIKA o similares características, previo a la instalación de la impermeabilización (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").	m2	-	62.971,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.971,00	-
2.3.	Impermeabilización de placa de cubierta altura translúcida, no ventilada, con piso fijo, tipo convencional, para tráfico peatonal privado, Tipo Sika o de similares características con uso de mantos asfálticos, tipo bicapa (Edificio Convenciones y Edificio CNA zona "L").	m2	232,42	126.524,00	29.406.709,68	-	-	-	-	162,38	20.544.967,00	-	-	-	-	162,38	20.544.967,12	70,04	126.524,00	8.861.740,56
2.4.	Desmonte de ventanería con vidrios en celosía ubicados en cubta de cubierta en el edificio CNA.	m2	320,00	52.493,00	16.797.760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320,00	52.493,00	16.797.760,00
2.5.	Suministro e instalación de sistema de ventanas en vidrio fijos (sin bloqueante) en reemplazo de las ventanas en vidrio retiradas, ubicados en cubta de cubierta en el edificio CNA	m2	320,00	297.836,00	95.307.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320,00	297.836,00	95.307.200,00
2.6.	Retiro de canaletas existentes y suministro e instalación de canaletas metálicas de sección trapezoidal elaboradas en acero galvanizado calibre 16 de acuerdo con las necesidades técnicas de la cubierta de aguas lluvia, Incluye la instalación de la soportería para el anclaje de la canaleta en el edificio CNA.	ml	201,00	121.951,00	24.512.151,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,00	121.951,00	24.512.151,00
2.7.	Retiro de instalación existente y suministro e instalación de sosocs para la bajante de agua lluvia a 4" en PVC con su respectivo sifón para evitar malos olores, incluye la instalación de la soportería para el anclaje en el edificio CNA.	und	50,00	86.553,00	4.327.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	86.553,00	4.327.650,00
2.8.	Limpieza y mantenimientos de tubería bajante de agua lluvia a 4" en PVC, en el edificio CNA.	und	50,00	94.430,00	4.721.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	94.430,00	4.721.500,00
3.1.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros.	m2	190,00	37.322,00	6.737.360,00	-	-	80,00	2.985.760,00		-	33,21	1.239.463,62	-	-	113,21	4.225.223,62	66,79	37.322,00	2.492.736,38
3.2.	Mantenimiento de cielo raso en fibra mineral, Incluye cambio, pintura y/o resalitzación de láminas en fibra mineral, Instalación de anclajes y arreglo de periferia desalojada y colocación de soportes.	m2	300,00	34.073,00	10.221.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	34.073,00	10.221.900,00
3.3.	Suministro e instalación cielo raso PVC de 10 mm de espesor, incluye estructura, perforaciones para las luminarias, A todo costo.	m2	80,00	94.144,00	7.531.520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,00	94.144,00	7.531.520,00
3.4.	Suministro e instalación cielo raso en drywall de 1/2" de espesor a una sola cara, incluye estructura, perforaciones luminarias, A todo costo.	m2	136,02	127.042,00	17.280.252,84	-	-	8,32	1.056.985,44		-	127,70	16.223.263,40	-	-	136,02	17.280.252,84	-	127.042,00	-
4.1.	Cambio de válvula antivandálica de empotrar tipo push para sanitarios institucionales de consumo de agua 4,85 lpf (1,28 gpf) tipo corona o similar, Incluye desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios, A todo costo con la instalación de un enchape de similares características a las originales.	und	40,00	1.200.516,00	48.020.640,00	-	-	-	-	11,00	13.205.676,00	-	-	-	-	11,00	13.205.676,00	29,00	1.200.516,00	34.814.964,00
4.2.	Cambio de grifería para lavamanos de empotrar a muro tipo push aplicación institucional de consumo 0,4 - 1,0 litros, tipo corona o similar incluye desmonte y reinstalación de aparatos, A todo costo con la instalación de un enchape de similares características a las originales.	und	30,00	729.335,00	21.880.050,00	-	-	-	-	9,00	6.564.015,00	-	-	-	-	9,00	6.564.015,00	21,00	729.335,00	15.316.035,00
4.3.	Cambio de válvula antivandálica de empotrar tipo push para orinales institucionales de consumo de agua 0,5 a 1,0 lpf (0,13 a 0,5 gpf), tipo corona o similar, Incluye desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios, A todo costo con la instalación de un enchape de similares características a las originales.	und	20,00	1.209.112,00	24.182.240,00	-	-	-	-	4,00	4.836.448,00	-	-	-	-	4,00	4.836.448,00	16,00	1.209.112,00	19.345.792,00
4.4.	Desmonte de divisiones metálicas para baños, Incluye soportería, tornillos, herrajes, retiro y disposición final.	m2	125,00	39.579,00	4.947.375,00	-	-	45,00	1.781.055,00		-	15,25	603.579,75	-	-	60,25	2.384.634,75	64,75	39.579,00	2.562.740,25
4.5.	Suministro e instalación de divisiones de baño en acero inoxidable por ambas caras calibre 22, aleación 304 acabado satinado tipo SCOTCH o similar, Con puerta, anclajes y accesorios necesarios para su instalación y correcto funcionamiento.	m2	125,00	1.205.111,00	125.638.875,00	-	-	-	-	45,00	45.229.995,00	1,40	1.407.155,40	-	-	46,40	46.637.150,40	78,60	1.205.111,00	78.001.724,60
4.6.	Limpieza con sonda de tubería sanitaria en diferentes diámetros, actividad para ejecutar por punto.	und	175,00	109.625,00	19.184.375,00	-	-	-	-	93,00	10.195.125,00	-	-	-	-	93,00	10.195.125,00	82,00	109.625,00	8.989.250,00
5.1.	Desmonte de puerta en madera de 1,44 m x2,47 m, incluye marco y retiro.	und	1,00	127.673,00	127.673,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	127.673,00	127.673,00
5.2.	Suministro e instalación de puerta de acceso a cubierta en aluminio de dos hojas: una de 0,90 m x 2,47 m y otra de 0,54 m x 2,47 m, Incluye bisagras cerradura, cantonera marco y accesorios necesarios para su funcionamiento.	und	-	1.162.269,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.162.269,00	-
6.1.	Resanes y pintura vinilo primera calidad tipo 1 a tres manos, aplica para muros interiores color blanco sobre pañete o repello liso, A todo costo.	m2	196,25	33.744,00	3.585.272,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196,25	33.744,00	3.585.272,77
	TOTAL REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CNA - PISO 2				1.156.887.648,85	-	71.974.262,52	-	10.754.525,00	-	7.859.740,00	-	7.114.659,60	-	-	-	97.703.187,12	-		1.101.484.461,60
1.1.	Demolición muros Drywall incluye la disposición final de los escombros.	m2	257,87	47.734,00	12.309.004,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257,87	47.734,00	12.309.004,58
1.2.	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	m2	66,97	49.324,00	3.303.277,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,97	49.324,00	3.303.277,60
1.3.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros.	m2	1.397,62	35.224,00	49.229.907,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.397,62	35.224,00	49.229.907,70
1.4.	Desmonte de redes eléctricas aeréreas, Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	glb	1,00	12.717.035,00	12.717.035,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	12.717.035,00	12.717.035,00

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.

ACTA DE COBRO 5

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-016-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

1-10-2025 AL 31-10-2025

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACION	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	$ 5,142,932,904.88
VALOR CORTE 05	$ 728,299,628.05
viernes, 31 de octubre de 2025	

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 05			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
1.5.	Desmonte de puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	und	181,00	93,796,00	16,975,266,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,00	93,796,00	16,975,266,00
1.6.	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo.	m2	89,42	92,676,00	8,287,468,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,42	92,676,00	8,287,468,92
2.1.	Suministro e instalación de columnetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre 12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye placa soldada a la base y anclajes a placa de piso y retiro de escombros.	ml	136,80	198,521,00	27,157,672,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,80	198,521,00	27,157,672,80
2.2.	Suministro e instalación de viguetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye soldadura a columnetas y retiro de escombros.	ml	123,92	181,351,00	22,473,015,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,92	181,351,00	22,473,015,92
3.1.	Suministro e instalación de muro en Superboard de 6 mm, altura 2,40 m a dos caras. Incluye estructura metálica, anclaje, cinta, estuco y fondeo de acabado en pintura en vinilo tipo 1.	m2	38,45	199,697,00	7,677,950,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,45	199,697,00	7,677,950,29
4.1.	Suministro e instalación de cielorraso en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, caja fondeo y pintura. A todo costo.	m2	1,661,68	128,125,00	212,902,750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,661,68	128,125,00	212,902,750,00
4.2.	Suministro e instalación de Fibracasa Eco Sin Papel 3 1/2" para cielorraso en Drywall. A todo costo.	m2	1,420,09	32,499,00	46,151,504,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,420,09	32,499,00	46,151,504,91
5.1.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 880 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad. Incluye plástico aislante y zumbadon de acuerdo a las características técnicas y el guardaescobas.	m2	1,019,41	189,748,00	193,431,609,68	379,32	71,974,262,62	-	-	-	-	-	-	-	-	379,32	71,974,262,62	640,10	189,748,00	121,456,746,06
6.1.	Suministro e instalación de alimentador 1N°12 Fase+1N°12 Neutro+1N°12 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	2,400,00	19,944,00	47,865,600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400,00	19,944,00	47,865,600,00
6.2.	Suministro e instalación de alimentador a tableros en 3N°2/0 Fase+1N°2/0 Neutro+1N°12 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	200,00	363,569,00	72,713,800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	363,569,00	72,713,800,00
6.3.	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en caño No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble, cumpliendo norma RETIE.	und	310,00	153,691,00	47,644,210,00	-	-	43,00	6,608,713,00	-	-	-	-	-	-	43,00	6,608,713,00	267,00	153,691,00	41,035,497,00
6.4.	Suministro e instalación de salida interruptor sencillo doble 3m prom en caño No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH40 3/4", elementos de fijación y conductores, Cumpliendo norma RETIE.	und	60,00	173,282,00	10,396,920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	173,282,00	10,396,920,00
6.5.	Suministro e instalación de lámpara de techo colgante lineal estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 128x47cm. Largo de la guaya: 100cm, incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	82,00	318,520,00	26,118,640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,00	318,520,00	26,118,640,00
6.6.	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	140,00	224,564,00	31,438,960,00	3,00	673,692,00	35,00	7,859,740,00	-	-	-	-	35,00	8,533,432,00	102,00	224,564,00	22,905,528,00		
6.7.	Suministro e instalación de panel LED de gran formato redondo de 24W, luz neutra 4000K, dimensiones 100 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	7,00	190,825,00	1,335,775,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	190,825,00	1,335,775,00
6.8.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	22,00	176,599,00	3,885,178,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,00	176,599,00	3,885,178,00
6.9.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia de aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	10,00	195,508,00	1,955,080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	195,508,00	1,955,080,00
6.10.	Suministro e instalación de salida tomacorriente doble polo a tierra (red normal), monofásico 120V 15A, 3m prom en caño No 12 LSHF AWG, elementos de fijación y conductores.	und	83,00	173,606,00	14,409,298,00	20,00	3,472,120,00	-	-	-	-	-	-	20,00	3,472,120,00	63,00	173,606,00	10,937,178,00		
6.11.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH-80 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. Cumpliendo norma RETIE.	m	300,00	16,035,00	4,810,500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	16,035,00	4,810,500,00
6.12.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit EMT ø 3" oculta sobre cielo o en muros.	ml	180,00	155,392,00	27,970,560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,00	155,392,00	27,970,560,00
6.13.	Suministro e instalación de ducto cerrado de 40X8 galvanizado o con pintura electrostática.	ml	220,00	293,413,00	64,550,860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,00	293,413,00	64,550,860,00
6.14.	Suministro e instalación de tablero de 42 circuitos trifásico tetrafilar con espacio para totalizador y barraje neutro y tierra. Incluye totalizador y protecciones.	und	2,00	3,460,340,00	6,920,680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	3,460,340,00	6,920,680,00
7.1.	Suministro e instalación de Vidrios Templado 8 mm para divisiones de oficina incluye accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento. A todo costo.	m2	100,00	830,386,00	83,038,600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	830,386,00	83,038,600,00
7.2.	Suministro e instalación de Puerta en Vidrio Templado 8 mm con Pivote, incluye topes de piso, accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento a todo costo.	m2	33,12	856,303,00	28,360,755,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,12	856,303,00	28,360,755,36
7.3.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucida solido de 1,2 m de ancho a todo costo de uso interior y exterior.	ml	103,40	85,101,00	8,796,443,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,40	85,101,00	8,796,443,40
7.4.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucida solido de 1,2 m de ancho de uso interior y exterior, con corte de letras para identificar las oficinas en vidrio. A todo costo.	und	15,00	139,113,00	2,086,695,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	139,113,00	2,086,695,00
8.1.	Suministro e instalación de Puerta en madecor entamborada de 0,90 m de ancho por 2,20 m de alto, incluye marcos, chapa, cantonera y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	und	1,00	1,145,405,00	1,145,405,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,145,405,00	1,145,405,00
9.1.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos muros interiores blancos. A todo costo, incluye brandas.	m2	930,28	37,195,00	34,601,801,00	-	-	-	-	-	-	191,28	7,114,659,60	-	-	191,28	7,114,659,60	739,00	37,195,00	27,487,142,20
9.2.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos cielo falsos blanco. A todo costo, incluye brandas.	m2	1,661,68	40,033,00	66,522,035,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,661,68	40,033,00	66,522,035,44
	REPARACIONES LOCATIVAS CASINO - EDIFICIO CONVENCIONES				86,430,194.12		76,297,346.28		-		-		-		-		76,297,346.28			7,132,847.84

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.

ACTA DE COBRO 5

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-016-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CMA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

1-10-2025 AL 31-10-2025

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	$ 5.142.932.604,88
VALOR CORTE 05	$ 728.299.626,05

viernes, 31 de octubre de 2025

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 05			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
5.5.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgrs x cm3 y resistencia a la humedad, para la zona de mesas del restaurante Incluye nivelación en zonas puntuales, plástico adelante, yumbolón de acuerdo con las características técnicas y el guardaescobas.	m2	360,00	189.748,00	68.309.280,00	352,36	66.859.605,28		-		-		-		-	352,36	66.859.605,28	7,64	189.748,00	1.449.674,72
9.1.	Suministro e instalación de estructura decorativa para plantas colgantes de 0,65m ancho x 1,00 m de profundo con viguetas cada 0,75 m en tubería metálica cuadrada 50x50x2,0mm con acabado en pintura electrostática negro mate incluye 6 puntos de apoyo en guaya de tipo colgante, incluye 3 lámparas según imagen.	und	2,00	3.245.844,00	6.491.688,00	1,00	3.245.844,00		-		-		-		-	1,00	3.245.844,00	1,00	3.245.844,00	3.245.844,00
9.2.	Suministro e instalación de estructura para microondas con módulos de 0,71 m de largo 0,56 m de profundo y 0,40 m de alto en tubería metálica cuadrada 50x50x2,0mm en pintura electrostática negro mate incluye 2 superficies en madera tipo madecor RH de 1" cada módulo y anclajes a la pared no vistos.	und	11,00	835.827,00	9.191.897,00	11,00	9.191.897,00		-		-		-		-	11,00	9.191.897,00	-	835.827,00	-
11.1.	Resanes y pintura vinilo primera calidad tipo 1 a tres manos, sellos para muros interiores color blanco sobre pañete o repello liso. Incluyen andamios, escaleras y sistemas de seguridad de operación. A todo costo.	m2	72,23	33.744,00	2.437.329,12	-	-		-		-		-		-	-	-	72,23	33.744,00	2.437.329,12
	REPARACIONES LOCATIVAS - EDIFICIO CONVENCIONES - PISO 4				1.210.975.029,11		190.540.084,68		23.656.562,35		850.169,00		107.089.414,86		57.326.417,60	-	374.574.648,79	-		836.300.380,32
1.1.	Demolición muros Drywall incluye la disposición final de los escombros.	m2	461,58	47.734,00	22.033.059,72	47,71	2.277.389,14	8,25	393.955,50		-	137,80	6.577.938,40		-	193,76	9.249.283,04	268,02	47.734,00	12.793.868,68
1.2.	Desmonte de divisiones y puertas en vidrio incluye la disposición final o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	m2	246,96	95.354,00	23.549.673,84	125,23	11.941.181,42	3,68	350.902,72		-	118,05	11.256.539,70		-	246,96	23.548.623,84	-	95.354,00	-
1.3.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall incluye desmonte luminarias, retiro y disposición final de escombros	m2	888,84	35.224,00	31.308.500,16	455,25	16.035.726,00		-		-	433,59	15.272.774,16		-	888,84	31.308.500,16	-	35.224,00	-
1.4.	Desmonte de redes eléctricas existentes. Incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	glb	1,00	6.775.716,00	6.775.716,00	1,00	6.775.716,00		-		-		-		-	1,00	6.775.716,00	-	6.775.716,00	-
1.5.	Desmonte puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el Fondo Nacional del Ahorro S.A. indique.	und	150,00	93.786,00	14.067.900,00	79,00	7.409.094,00		-		-	71,00	6.658.806,00		-	150,00	14.067.900,00	-	93.786,00	-
1.6.	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo	m2	75,55	92.576,00	7.001.857,15	18,00	1.666.368,00		-		-		-		-	18,00	1.666.168,00	57,55	92.576,00	5.333.689,15
2.1.	Suministro e instalación de columnetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre 12 acabado en pintura color negro semi-mate, Incluye placa soldada a la base y anclajes a placa de piso y retiro de escombros.	ml	163,20	198.521,00	32.398.627,20	-	-		-		-		-		-	-	-	163,20	198.521,00	32.398.627,20
2.2.	Suministro e instalación de viguetas metálicas en tubería cuadrada estructural de 100mmx100mm, calibre12 acabado en pintura color negro semi-mate. Incluye soldadura a columnetas y retiro de escombros.	ml	122,50	181.351,00	22.215.497,50	-	-		-		-		-		-	-	-	122,50	181.351,00	22.215.497,50
2.3.	Suministro e instalación perfiles WPC textura madera. Para instalar en muros divisorios de dimensiones 10 cm x 5 cm. Incluye estructura anclajes y retiro de escombros.	m2	28,44	294.409,00	8.373.591,96	-	-		-		-		-		-	-	-	28,44	294.409,00	8.373.591,96
3.1.	Suministro e instalación de muro en Superboard, altura 2,40 m, a dos caras incluye estructura, anclaje, cinta, estuco y fondeo de acabado en pintura en vinilo tipo 1.	m2	29,23	196.903,00	4.596.588,50	-	-		-		-		-		-	-	-	29,23	196.903,00	4.596.588,50
4.1.	Suministro e instalación de cielo raso en Drywall de 1/2" en diferentes niveles a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo y pintura a 3 manos. A todo costo.	m2	873,26	113.010,00	98.689.372,60	-	-		-		-	551,66	62.343.096,60	320,46	36.215.184,00	872,12	98.558.281,20	1,14	113.010,00	131.091,40
5.1.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 890 a 900 Kgrs x cm3 y resistencia a la humedad Incluye plástico adelante y yumbolón, de acuerdo a las características técnicas y el guardaescobas.	m2	1.058,64	189.748,00	200.912.772,32	315,09	59.788.414,57	120,76	22.913.854,63		-		-		-	435,85	82.702.269,20	622,99	189.748,00	118.210.503,12
6.1.	Suministro e instalación de alimentador 1N°12 Fase-1N°12 Neutro-1N°12 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	1.800,00	19.842,00	35.715.600,00	-	-		-		-		-		-	-	-	1.800,00	19.842,00	35.715.600,00
6.2.	Suministro e instalación de alimentador a tableros en 3N°2/0 Fase-1N°2/0 Neutro-1N°2 Puesta a tierra. Cable de cobre LSHF, AWG. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	50,00	220.320,00	11.016.000,00	-	-		-		-		-		-	-	-	50,00	220.320,00	11.016.000,00
6.3.	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en calibre No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	191,00	147.631,00	28.192.284,00	-	-		-		-		-	143,00	21.111.233,00	143,00	21.111.233,00	8,00	147.631,00	1.181.048,00
6.4.	Suministro e instalación de salida interruptor sencillo o doble 3m prom en calibre No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH40 3/4", elementos de fijación y conductores. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	32,00	166.320,00	5.322.240,00	-	-		-		-		-		-	-	-	32,00	166.320,00	5.322.240,00
6.5.	Suministro e instalación de Lámpara de techo colgante tipo estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 120x80x70h. Largo de la guaya: 100cm incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	40,00	300.264,00	12.010.560,00	-	-		-		-		-		-	-	-	40,00	300.264,00	12.010.560,00
6.6.	Reinstalación de panel LED cuadrado de dimensiones 60x60 cm preexistentes. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	99,00	103.354,00	9.172.506,00	-	-		-		-		-		-	-	-	99,00	103.354,00	9.172.506,00
6.7	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm. Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	22,00	209.700,00	4.613.400,00	-	-		-		-		-		-	-	-	22,00	209.700,00	4.613.400,00
6.8.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	22,00	220.546,00	4.852.012,00	-	-		-		-		-		-	-	-	22,00	220.546,00	4.852.012,00
6.9.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	14,00	198.472,00	2.778.608,00	-	-		-		-		-		-	-	-	14,00	198.472,00	2.778.608,00
6.10.	Suministro e instalación Salida tomacorriente doble polo a tierra (red normal), monofásico 120/ 15A, 3m prom en calibre No 12 LSHF AWG, elementos de fijación y conductores. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	33,00	173.606,00	5.728.998,00	-	-		-		-		-		-	-	-	33,00	173.606,00	5.728.998,00
6.11.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit PVC SCH40 ø 3/4" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	150,00	16.035,00	2.405.250,00	-	-		-		-		-		-	-	-	150,00	16.035,00	2.405.250,00

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.
ACTA DE COBRO 5

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CK-016-2024
CONTRATISTA	FNA - 169 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CMA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

1-10-2025 AL 31-10-2025

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	$ 5,142,932,804.88
VALOR CORTE 05	$ 728,299,626.05
viernes, 31 de octubre de 2025	

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 05			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
6.12.	Suministro e instalación de canalización en tubería conduit EMT ø 3" oculta sobre cielo o en muros. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	50,00	155,392,00	7,769,600,00	-	-		-		-		-		-	-	-	50,00	155,392,00	7,769,600,00
6.13.	Suministro e instalación de ducto cerrado de 40X8 galvanizado o con pintura electrostática. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	ml	120,00	317,627,00	38,115,240,00	-	-		-		-		-		-	-	-	120,00	317,627,00	38,115,240,00
6.14.	Suministro e instalación de tablero de 42 circuitos trifásico tetrafilar con espacio para totalizador y barraje neutro y tierra, incluye totalizador y protectores. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	1,00	3,460,340,00	3,460,340,00	-	-		-		-		-		-	-	-	1,00	3,460,340,00	3,460,340,00
7.1.	Suministro e instalación de barra de cornisa en acero inoxidable calibre 22, de 45 cms de ancho incluye soporte en estructura metálica a pared.	ml	3,22	1,416,162,00	4,560,041,64	-	-		-		-		-		-	-	-	3,22	1,416,162,00	4,560,041,64
7.2.	Suministro e instalación de muestra de cocina de 1.60x0.60x0.80m en madera RH y en acero inoxidable, incluye griferia y accesorios de desagüe.	und	1,00	2,569,025,00	2,569,025,00	-	-		-		-		-		-	-	-	1,00	2,569,025,00	2,569,025,00
8.1.	Suministro e instalación de vidrio templado 8 mm para divisiones de oficina incluye accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento. A todo costo.	m2	317,09	856,266,00	271,511,673,41	99,20	84,944,295,75		-		-		-		-	99,20	84,944,295,75	217,88	856,266,00	186,567,377,66
8.2.	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado 8 mm con pivote, incluye topes de piso, accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento a todo costo.	m2	47,52	856,737,00	40,907,182,24	-	-		-		-		-		-	-	-	47,52	856,737,00	40,907,182,24
8.3.	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de 8 mm con sistema antipanico, incluye topes de piso y accesorios para su correcto funcionamiento. A todo costo.	m2	7,68	1,607,888,00	12,348,579,84	-	-		-		-		-		-	-	-	7,68	1,607,888,00	12,348,579,84
8.4.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho, de uso interior y exterior. A todo costo.	ml	60,00	82,644,00	4,958,640,00	-	-		-		-		-		-	-	-	60,00	82,644,00	4,958,640,00
8.5.	Suministro e instalación de película de sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho, de uso interior y exterior, con corte de letras para identificar las oficinas en vidrio. A todo costo.	und	17,00	139,113,00	2,364,921,00	-	-		-		-		-		-	-	-	17,00	139,113,00	2,364,921,00
9.1.	Suministro e instalación de puerta en madecor entamborada de 0,90 m de ancho por 2,20 m de alto, incluye marcos chapa, cantonera y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	und	1,00	1,145,405,00	1,145,405,00	-	-		-		-		-		-	-	-	1,00	1,145,405,00	1,145,405,00
9.2.	Suministro e instalación de superficie de madera ancho 40cm y 3 cm de espesor, para instalar en muros bajos, correspondientes a la barra para computadores y zonas de estancia.	ml	30,00	354,159,00	10,624,770,00	-	-		-		-		-		-	-	-	30,00	354,159,00	10,624,770,00
10.1.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores blancos. A todo costo, incluye brochas.	m2	320,38	32,772,00	10,499,362,27	-	-		-		-		-		-	-	-	320,38	32,772,00	10,499,362,27
10.2.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos cielo falsos blanco. A todo costo, incluye brochas.	m2	320,38	39,990,00	12,813,886,58	-	-		-		-		-		-	-	-	320,38	39,990,00	12,813,886,58
10.3.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores azul institucional. A todo costo, incluye brochas.	m2	40,00	37,195,00	1,487,800,00	-	-		-	17,48	650,168,60		-		-	17,48	650,168,60	22,52	37,195,00	837,631,40
10.4.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno a tres manos en muros interiores verde institucional. A todo costo, incluye brochas.	m2	-	37,195,00	-	-	-		-		-		-		-	-	-	-	37,195,00	-
	REPARACIONES LOCATIVAS - TORRE DE TECNOLOGÍA - PISO 2				284,982,205,00		57,849,827,36		-		-		-		-	-	57,849,827,37	-		206,732,177,63
1.1.	Desmonte de cielo raso en fibra mineral o en drywall, incluye desmonte de 113 luminarias tipo panel Led de 60 x 60 luz neutra 4000K y retiro con su disposición final de escombros.	m2	860,00	37,322,00	32,096,920,00	-	-		-		-		-		-	-	-	860,00	37,322,00	32,096,920,00
1.2.	Desmonte de puestos de trabajo tales como divisiones metálicas, superficies, cajoneras etc. Adicionalmente, incluye la disposición final de los escombros o la disposición que el fondo Nacional del Ahorro indique.	und	260,00	93,786,00	24,384,360,00	-	-		-		-		-		-	-	-	260,00	93,786,00	24,384,360,00
1.3.	Suministro e instalación de muro provisional en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco. A todo costo.	m2	4,00	92,676,00	370,704,00	-	-		-		-		-		-	-	-	4,00	92,676,00	370,704,00
2.1.	Suministro e instalación de cielorraso en Drywall de 1/2" a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco y capa fondeo pintura. A todo costo.	m2	476,71	127,159,00	60,618,002,00	-	-		-		-		-		-	-	-	476,71	127,159,00	60,618,002,00
3.1.	Suministro e instalación de piso laminado de alto tráfico de alta densidad (HDF) de 800 a 900 Kgms x cm3 y resistencia a la humedad. Incluye plástico aislante y zumbador de acuerdo a las características técnicas y el guardaescobas.	m2	560,00	169,748,00	105,258,880,00	304,88	57,849,827,36		-		-		-		-	304,88	57,849,827,37	255,12	169,748,00	48,409,052,63
4.1.	Suministro e instalación de lámpara de techo colgante lineal estilo cortina de luz, acabado negro y luz neutra. Dimensiones: 120x4x7cm, Largo de la guaya: 100cm, incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	20,00	311,065,00	6,221,300,00	-	-		-		-		-		-	-	-	20,00	311,065,00	6,221,300,00
4.2.	Suministro e instalación de panel LED de incrustar redondo acabado blanco, 24 w, luz neutra 4000K, dimensiones : diámetro 30 cm, Incluye acometida eléctrica y accesorios.	und	20,00	227,693,00	4,553,860,00	-	-		-		-		-		-	-	-	20,00	227,693,00	4,553,860,00
4.3.	Reinstalación de panel LED cuadrado de dimensiones 60x60 cm luz neutra 4000K preexistentes, A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	und	113,00	96,211,00	10,871,843,00	-	-		-		-		-		-	-	-	113,00	96,211,00	10,871,843,00
4.4.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	8,00	210,033,00	1,680,264,00	-	-		-		-		-		-	-	-	8,00	210,033,00	1,680,264,00
4.5.	Suministro e instalación de luminaria de emergencia de aviso de evacuación con autonomía de 90 minutos certificada RETILAP.	und	4,00	195,508,00	782,032,00	-	-		-		-		-		-	-	-	4,00	195,508,00	782,032,00
5.1.	Suministro e instalación de Puerta en madecor entamborada de 0,90 m de ancho por 2,20 m de alto, incluye marcos, chapa, cantonera y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	und	-	997,838,00	-	-	-		-		-		-		-	-	-	-	997,838,00	-
6.1.	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos muros interiores blancos. A todo costo, incluye brochas.	m2	480,00	34,893,00	16,748,640,00	-	-		-		-		-		-	-	-	480,00	34,893,00	16,748,640,00
	BOLSA DE ITEMS NO PREVISTOS (10%)					-	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-
	SALDO BOLSA NP's					-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-
	TOTAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS - NPs				1,287,535,864,13	-	-		56,476,181,73		72,685,866,00		77,394,016,42		531,202,794,55	-	738,705,974,15	-	-	548,829,875,98
NP1-01	Demolición placa maciza 0,15 mt en horarios autorizado por la entidad incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	m2	1.100,00	49,331,00	54,264,100,00	-	-	46,23	2,280,646,13		-	769,13	37,941,992,00	21,55	1,063,093,06	836,91	41,285,681,21	263,09	49,331,00	12,978,418,79

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.

ACTA DE COBRO 5

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CP-016-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

1-10-2025 AL 31-10-2025

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	$ 5,142,932,604.88
VALOR CORTE 05	$ 728,299,626.05
viernes, 31 de octubre de 2025	

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 05			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (+)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (+)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
N/A-02	Suministro e instalación de mortero premezclado de nivelación bombeable, acelerado a 7 días con baja permeabilidad para zona de cubiertas, garantizando pendientes de desagües hacia los sifones.	m2	266,00	104.277,00	26.990.655,00	-	-	137,79	14.366.967,67	-	-	-	-	-	-	137,79	14.366.967,67	117,21	104.277,00	12.222.067,33
N/A-03	Demolición baldosa muro en horarios autorizados por la ENTIDAD (incluye retiro de material desde frente de obra al sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	m2	225,00	27.852,00	6.266.700,00	-	-	140,63	3.993.912,12	-	-	12,99	363.096,48	-	-	153,62	4.294.008,60	71,38	27.852,00	1.988.191,40
N/A-04	Baldosa cerámica pared 30x60.	m2	356,43	142.571,00	50.813.966,53	-	-	31,15	4.441.713,90	73,76	10.516.807,00	42,12	6.005.280,52	-	-	147,04	20.963.411,73	209,39	142.571,00	29.850.554,80
N/A-05	Baldosa cerámica piso 60x60.	m2	170,00	154.546,00	26.272.820,00	-	-	-	-	-	-	77,86	12.032.351,56	-	-	77,86	12.032.351,56	92,14	154.546,00	14.240.468,44
N/A-06	Suministro e instalacion de cinta led en parte baja de gabinete superior de mueble de cocina.	und	1,00	260.334,00	260.334,00	-	-	1,00	260.334,00	-	-	-	-	-	-	1,00	260.334,00	-	260.334,00	-
N/A-07	Desmonte y reinstalacion de rejillas de extraccion aire en cocina presidencia.	und	8,00	45.000,00	360.000,00	-	-	3,00	135.000,00	-	-	-	-	-	-	3,00	135.000,00	5,00	45.000,00	225.000,00
N/A-08	Desmonte redes eléctricas existentes, incluye la disposición final fondo Nacional del Ahorro indique. (Zona de recepcion).	und	1,00	930.686,00	930.686,00	-	-	-	-	1,00	930.686,00	-	-	-	-	1,00	930.686,00	-	930.686,00	-
N/A-09	Demolición de guardaescoba, (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	ml	220,00	14.785,00	3.252.700,00	-	-	120,00	1.774.200,00	-	-	22,13	327.192,05	-	-	142,13	2.101.392,05	77,87	14.785,00	1.151.307,95
N/A-10	Desmonte espejo.	und	10,00	23.790,00	237.900,00	-	-	4,00	95.160,00	-	-	-	-	-	-	4,00	95.160,00	6,00	23.790,00	142.740,00
N/A-11	Desmonte de cubierta en policarbonato.	m2	35,00	52.335,00	1.831.725,00	-	-	29,92	1.565.863,20	-	-	-	-	-	-	29,92	1.565.863,20	5,08	52.335,00	265.861,80
N/A-12	Suministro e instalación de Policarbonato alveolar 8 mm para cubierta curva, incluye conectores y accesorios para su correcta instalación. No incluye estructura de soporte.	m2	25,00	443.800,00	11.095.000,00	-	-	25,00	11.093.002,90	-	-	-	-	-	-	25,00	11.093.002,90	0,00	443.800,00	1.997,10
N/A-13	Mantenimiento marquesina cubierta de vidrio acceso, incluye: Revisión general, limpieza perimetral y limpieza de vidrios.	m2	45,00	58.150,00	2.616.750,00	-	-	-	-	17,45	1.014.747,00	-	-	-	-	17,45	1.014.747,00	27,55	58.150,00	1.602.003,00
N/A-14	Lavado e hidrofugado de fachadas, muros en piedra y/o acabado absorvido	m2	232,00	51.032,00	11.839.424,00	-	-	216,78	11.062.716,96	-	-	-	-	-	-	216,78	11.062.716,96	15,22	51.032,00	776.707,04
N/A-15	Suministro e instalacion de revestimiento interior de fachada en WPC Panel Casino, de acuerdo a muestra seleccionada.	m2	50,00	249.587,00	12.499.350,00	-	-	13,18	3.294.578,87	20,52	5.130.293,00	5,08	1.269.393,06	-	-	38,78	9.694.745,85	11,22	249.587,00	2.804.604,15
N/A-16	Desmonte de aparatos sanitarios (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio (hasta 50 m) y desde sitio de acopio a escombrera).	und	50,00	40.607,00	2.035.350,00	-	-	25,00	1.015.175,00	-	-	-	-	-	-	25,00	1.015.175,00	25,00	40.607,00	1.015.175,00
N/A-17	Desmonte de muro fachada imitacion madera (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).	m2	12,00	16.161,00	193.932,00	-	-	9,92	160.317,12	-	-	-	-	-	-	9,92	160.317,12	2,08	16.161,00	33.614,88
N/A-18	Suministro e instalación de sensor de presencia (rango 360° de cobertura, montaje en techo, detección de movimiento hasta 4 metros radiales y una altura de instalación de 2,4 metros.	und	20,00	210.035,00	4.200.700,00	-	-	-	-	-	-	5,00	1.050.175,00	-	-	5,00	1.050.175,00	15,00	210.035,00	3.150.525,00
N/A-19	Suministro e instalación de enseres modelo de inferior 220 X 90 X 65 y superior de 200*60X35 incluye campana extractora, puertas, manijas en acero tubular, bisagras de poche, entrepaños, patas de 8 cm y manija en acero tubular. Modulo torre hornos de 200 X 60 X 60 con dos puertas parte alta y dos cajones parte baja central para horno. Tapa barra de 130 x 60 con patas en acero de 100 cm y anclaje a la pared. Todo elaborado en melamina de 15mm, color arena o glacial fabricado e instalado.	UND	1,00	12.900.000,00	12.900.000,00	-	-	-	-	1,00	12.900.000,00	-	-	-	-	1,00	12.900.000,00	-	12.900.000,00	-
N/A-20	Mesón en cuarzotone blanco polar con bacso para estufa y lavaplatos, incluye pulida, poceta, salpicadero 8 cm y estaño x 4 puestos challenger para uso con gas propano.	UND	1,00	6.850.000,00	6.850.000,00	-	-	-	-	1,00	6.850.000,00	-	-	-	-	1,00	6.850.000,00	-	6.850.000,00	-
N/A-21	Suministro e instalación punto de gas propano para estufa de presidencia, en tubería pe al pa de 1/2" , con consta de protección a la vista y accesorios de conexión con pases por muros, incluye suministro de 2 cilindros de 100 libras en gas propano, con válvula reguladora para cada cilindro, base (jaula) soporte para cilindros y caja metálica de protección de cilindros para la intemperie.	GLB	1,00	6.155.883,00	6.155.883,00	-	-	-	-	1,00	6.155.883,00	-	-	-	-	1,00	6.155.883,00	-	6.155.883,00	-
N/A-22	Suministro e instalacion registro 1/2" agua potable	UND	5,00	88.688,00	443.440,00	-	-	-	-	2,00	179.376,00	1,00	89.688,00	-	-	3,00	269.064,00	2,00	88.688,00	179.376,00
N/A-23	Jardineras artificiales de acuerdo a render incluye amare plastico	ml	40,00	141.213,00	5.648.520,00	-	-	-	-	15,06	2.126.668,00	5,40	762.593,20	-	-	20,46	2.889.261,20	19,54	141.213,00	2.759.302,80
N/A-24	Suministro e instalacion de extractor para cocina y baños (16 x 16 x 9 cm)	UND	20,00	196.410,00	3.928.200,00	-	-	-	-	-	-	9,00	1.767.690,00	-	-	9,00	1.767.690,00	11,00	196.410,00	2.160.510,00
N/A-25	Demolicion de reseen en grano de marmol de ventanilla bancofamiliar	UND	1,00	89.351,00	89.351,00	-	-	1,00	89.351,00	-	-	-	-	-	-	1,00	89.351,00	-	89.351,00	-
N/A-26	Desmonte de avisa de fachada en recepcion	UND	1,00	283.054,00	283.054,00	-	-	1,00	283.054,00	-	-	-	-	-	-	1,00	283.054,00	-	283.054,00	-
N/A-27	Suministro e instalación de sanitario blanco institucional tipo adriatica o similar de entrada posterior no incluye susch	UND	30,00	1.146.999,00	34.409.970,00	-	-	-	-	11,00	12.616.989,00	-	-	-	-	11,00	12.616.989,00	19,00	1.146.999,00	21.792.981,00
N/A-28	Suministro e instalación lavamanos blanco tipo cascada de bano o similar, no incluye griferia no incluye push	UND	32,00	613.653,00	19.636.896,00	-	-	-	-	9,00	5.522.877,00	-	-	-	-	9,00	5.522.877,00	23,00	613.653,00	14.114.019,00
N/A-29	Suministro e instalacion de carga en lleno para control de acceso en zona de recepcion	UND	1,00	3.605.351,00	3.605.351,00	-	-	-	-	1,00	3.605.351,00	-	-	-	-	1,00	3.605.351,00	-	3.605.351,00	-
N/A-30	PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	32,00	121.212,00	3.878.784,00	-	-	-	-	3,00	363.636,00	13,00	1.575.756,00	-	-	16,00	1.939.392,00	16,00	121.212,00	1.939.392,00
N/A-31	PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UND	30,00	163.414,00	4.902.420,00	-	-	-	-	1,00	163.414,00	10,00	1.634.140,00	-	-	11,00	1.797.554,00	19,00	163.414,00	3.104.866,00
N/A-32	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	24,00	109.459,00	2.627.016,00	-	-	-	-	2,00	218.918,00	12,00	1.313.508,00	-	-	14,00	1.532.426,00	10,00	109.459,00	1.094.590,00
N/A-33	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UND	8,00	129.358,00	1.034.864,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	129.358,00	1.034.864,00
N/A-34	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UND	52,00	145.932,00	7.587.264,00	-	-	-	-	10,00	1.459.320,00	-	-	-	-	10,00	1.459.320,00	52,00	145.932,00	7.727.184,00
N/A-35	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UND	18,00	109.645,00	1.973.610,00	-	-	-	-	4,00	438.580,00	-	-	-	-	4,00	438.580,00	14,00	109.645,00	1.535.030,00
N/A-36	RED SANITARIA PVC-S 4"	ml	410,00	74.903,00	30.710.230,00	-	-	-	-	17,80	1.333.273,40	-	-	-	-	17,80	1.333.273,40	392,20	74.903,00	29.376.956,60
N/A-37	RED SANITARIA PVC-S 3"	ml	80,00	61.047,00	3.882.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,00	61.047,00	3.882.850,00
N/A-38	RED SANITARIA PVC-S 2"	ml	80,00	49.310,00	3.944.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,00	49.310,00	3.944.800,00
N/A-39	RED SANITARIA PVC-VENTILACION 2"	ml	60,00	31.024,00	1.861.440,00	-	-	-	-	24,70	766.293,00	-	-	-	-	24,70	766.293,00	35,30	31.024,00	1.095.147,20
N/A-40	Red suministro 1 1/4"	ml	35,00	36.089,00	1.263.115,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,00	36.089,00	1.263.115,00
N/A-41	Red suministro 1"	ml	50,00	27.219,00	1.360.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	27.219,00	1.360.950,00
N/A-42	Red suministro 3/4"	ml	50,00	25.852,00	1.292.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	25.852,00	1.292.600,00
N/A-43	Red suministro 1/2"	ml	60,00	18.245,00	1.094.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	18.245,00	1.094.700,00
N/A-44	Registro PVC-P 1 - 1/4"	UND	17,00	145.520,00	2.473.840,00	-	-	-	-	-	-	8,00	1.164.160,00	-	-	8,00	1.164.160,00	9,00	145.520,00	1.309.680,00
N/A-45	Registro PVC-P 1"	UND	10,00	111.417,00	1.114.170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	111.417,00	1.114.170,00
N/A-46	Trasiego incluye traslado a sitio de acopio en bolsas de aproximadamente 25 kilos	m3	50,00	52.788,00	2.639.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	52.788,00	2.639.400,00
N/A-47	Construccion de Media caña en mortero 1:3	ml	350,00	47.206,00	16.522.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	47.206,00	16.522.100,00
N/A-48	Suministro e instalación orinal tipo gotta o similar de entrada posterior no incluye griferia si incluye push	un	6,00	1.037.619,00	6.225.714,00	-	-	-	-	-	-	4,00	4.150.476,00	-	-	4,00	4.150.476,00	2,00	1.037.619,00	2.075.238,00
N/A-49	Desmonte de cubierta en lamina de zinc en cubierta de convenciones incluye estructura metalica de soporte, incluye retiro a sitio de acopio y disposición final.	m2	120,00	58.611,00	7.033.320,00	-	-	-	-	-	-	100,42	5.885.716,62	-	-	100,42	5.885.716,62	19,58	58.611,00	1.147.603,38

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.
ACTA DE COBRO 5

NUMERO PROCESO	FNA-VGHA-CR-016-2024
CONTRATISTA	FNA - 166 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CAN del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

1-10-2025 AL 31-10-2025

DURACION CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	$ 5,142,932,804.88
VALOR CORTE 05	$ 728,299,626.05
viernes, 31 de octubre de 2025	

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 05			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
N/A-50	Desmonte de ductos de aire acondicionado (incluye fibra de vidrio, transporte y disposición final)	ml	350,00	49.313,00	17.259.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	49.313,00	17.259.550,00
N/A-51	Desmonte de ductos de red contraincendio en tubería CPVC de varios diámetros incluye soportería. (Incluye traslado y disposición final)	ml	380,00	17.183,00	6.529.540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,00	17.183,00	6.529.540,00
N/A-52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Impermeabilización de placa peatonal para RESISTENTE A RAYOS UV DANOCOAT 250 incluye suministro y aplicación de POLIUREA en 60 MILS +-10%, ESPESOR TOTALIZADA PREVIA IMPRIMACION EPOXICA INCORPONENTE CON ARENA DE CUARZO EN UNA CAPA (si se requieren más se cotizarán por aparte), INCLUYE REACTOR GRACO, MATERIALES Y EQUIPOS CERTIFICADOS, PREVIO tratamiento de fisuras existentes. Acabado original gris cemita por rayos UV. Suministro y aplicación esmalte uretano gris o blanco resistente a Rayos UV color homogéneo como protección del sistema Poliurea.	M2	1.136,80	225.935,00	256.842.908,00	-	-	-	-	-	-	-	-	994,57	224.708.172,95	994,57	224.708.172,95	142,23	225.935,00	32.134.735,05
N/A-53	Suministro e instalación de estrato en mortero fabricado en sitio para zona de cubiertas, garantizando pendientes de desagües hacia los sifones con materiales. H prom 8 cm	M2	1.100,00	138.690,00	152.559.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	768,71	106.606.131,90	768,71	106.606.131,90	331,29	138.690,00	45.952.868,10
N/A-54	Demolicion de dados de concreto de 0,3 x 0,3 x 0,25 m, los cuales se encuentran en zona de cubierta Incluye traslado y disposición final.	Und	80,00	57.437,00	4.594.960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	80,00	4.594.960,00	80,00	4.594.960,00	-	57.437,00	-
N/A-55	Desmonte de ducto de extractor incluye retiro 2 extractores tipo hongo incluye retiro y disposición final.	Und	3,00	223.054,00	669.162,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	223.054,00	669.162,00
N/A-56	Desmonte de bandeja tipo escalera incluye calibado estructurado, calibado normal, calibado regulado y var y datos correspondiente a alimentación de puestos de trabajo existentes (incluye clasificación, traslado y entrega a la Entidad) puestos de trabajo existentes (incluye clasificación y entrega a la Entidad)	ml	160,00	50.217,00	8.034.720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00	50.217,00	8.034.720,00
N/A-57	Suministro e instalación de bandeja eléctrica tipo ducto cerrado de 30 x 10 x 1 m galvanizado con separador incluye curvas, soportería y conductor de tierra para bandeja.	ml	252,00	151.533,00	38.188.316,00	-	-	-	-	-	-	-	-	251,62	38.128.733,46	251,62	38.128.733,46	0,38	151.533,00	57.582,54
N/A-58	Suministro e instalación de bandeja eléctrica tipo ducto cerrado de 15 x 10 x 1 m galvanizado, incluye curvas, soportería y conductor de tierra para bandeja.	ml	252,00	129.570,00	32.639.640,00	-	-	-	-	-	89.951,00	-	-	88,42	11.452.158,40	88,42	11.452.158,40	163,58	129.570,00	21.187.481,60
N/A-59	Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada calibre 16 " según diseño desarrollo de hasta 1m	ML	132,00	165.000,00	21.780.000,00	-	-	-	-	-	283.054,00	-	-	129,04	21.291.600,00	129,04	21.291.600,00	2,96	165.200,00	488.400,00
N/A-60	Punto hidraulico para rociador automatico de 1/2"	Und	75,00	114.984,00	8.623.800,00	-	-	-	-	-	12.616.869,00	-	-	75,00	8.623.800,00	75,00	8.623.800,00	-	114.984,00	-
N/A-61	Rociador automatico 1/2" k=5,6 pendiente UL-FM	Und	75,00	63.827,00	4.787.025,00	-	-	-	-	-	5.972.977,00	-	-	75,00	4.787.025,00	75,00	4.787.025,00	-	63.827,00	-
N/A-62	Suministro e instalación TEE mecánica ranurada de 3" x 1 1/2"	Und	23,00	60.791,00	1.398.193,00	-	-	-	-	-	3.805.351,00	-	-	17,00	1.033.447,00	17,00	1.033.447,00	6,00	60.791,00	364.746,00
N/A-63	Suministro e instalacion STRAP DE 3" X 1"	Und	35,00	52.687,00	1.844.045,00	-	-	-	-	-	383.036,00	-	-	30,00	1.580.610,00	30,00	1.580.610,00	5,00	52.687,00	263.435,00
N/A-64	Suministro e instalación de soporte tipo pera con varilla 3/8" con perno bean clamb para tubería 1"	Und	76,00	33.022,00	2.509.672,00	-	-	-	-	-	163.414,00	-	-	76,00	2.509.672,00	76,00	2.509.672,00	-	33.022,00	-
N/A-65	Suministro e instalación de soporte tipo pera con varilla 3/8" con perno bean clamb para tubería 1-1/2"	Und	26,00	31.784,00	826.384,00	-	-	-	-	-	216.910,00	-	-	26,00	826.384,00	26,00	826.384,00	-	31.784,00	-
N/A-66	Suministro e instalación de soporte tipo pera con varilla 3/8" con perno bean clamb para tubería 3"	Und	95,00	33.033,00	3.138.135,00	-	-	-	-	-	-	-	-	95,00	3.138.135,00	95,00	3.138.135,00	-	33.033,00	-
N/A-67	Suministro e instalación de soporte transversal sismoresistente para tubería 3"	Und	22,00	234.807,00	5.165.754,00	-	-	-	-	-	1.486.000,00	-	-	16,00	3.756.912,00	16,00	3.756.912,00	6,00	234.807,00	1.408.842,00
N/A-68	Suministro e instalación de soporte LONGITUDINAL sismoresistente para tubería 3"	Und	20,00	202.663,00	4.053.260,00	-	-	-	-	-	486.560,00	-	-	20,00	4.053.260,00	20,00	4.053.260,00	-	202.663,00	-
N/A-69	Soporte Antisismico 4 Vias	Und	6,00	389.851,00	2.339.106,00	-	-	-	-	-	1.333.773,40	-	-	6,00	2.339.106,00	6,00	2.339.106,00	-	389.851,00	-
N/A-70	Tuberia AC Roscada 1" Sch-40 (Incluye Accesorios Y Pintura)	ml	134,20	66.346,00	8.903.633,20	-	-	-	-	-	-	-	-	134,20	8.903.633,20	134,20	8.903.633,20	-	66.346,00	-
N/A-71	Tubería de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A53 SCH 40 diámetro 1-1/2", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.	ml	52,25	100.995,00	5.276.988,75	-	-	-	-	-	-	-	-	28,55	2.883.407,25	28,55	2.883.407,25	23,70	100.995,00	2.393.581,50
N/A-72	Tubería de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A53 SCH 40 diámetro 3", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.	ml	293,50	224.347,00	45.884.614,50	-	-	-	-	-	786.292,80	-	-	192,71	43.233.910,37	192,71	43.233.910,37	10,79	224.347,00	2.420.784,13
N/A-73	Suministro e instalacion codo ranurado acero al Carbono ASTM-A53 SCH 40 diametro 3", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.	Und	10,00	98.325,00	983.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00	884.925,00	9,00	884.925,00	1,00	98.325,00	98.325,00
N/A-74	Suministro e instalacion TEE ranurado acero al Carbono ASTM-A53 SCH 40 diametro 3", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.	Und	9,00	144.525,00	1.300.725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	1.156.200,00	8,00	1.156.200,00	1,00	144.525,00	144.525,00
N/A-75	Suministro e instalación de estación de control para red contra incendios	Und	1,00	3.271.755,00	3.271.755,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3.271.755,00	1,00	3.271.755,00	-	3.271.755,00	-
N/A-76	Suministro e instalación de Gabinete Tipo 3 para red contra incendios	Und	1,00	2.442.914,00	2.442.914,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.442.914,00	1,00	2.442.914,00	-	2.442.914,00	-
N/A-77	Suministro e instalación de ventosa automatica para red contra incendios	Und	2,00	707.363,00	1.414.726,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	1.414.726,00	2,00	1.414.726,00	-	707.363,00	-
N/A-78	Suministro e instalacion AVISO 1 - INGRESO DE FUNCIONARIOS: Suministro e instalación de aviso tipo caja de luz, 15 cm de cantonera, logo en relieve acrílico, cantonera de 4 cm - iluminación LED - Textos en acrílico 4m sobre puestas con interruptor encendido y apagado. (7m*60cm)	Und	1,00	10.729.783,00	10.729.783,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	10.729.783,00	1,00	10.729.783,00	-	10.729.783,00	-

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

SEDE PRINCIPAL - BOGOTA D.C.

ACTA DE COBRO 5

NUMERO PROCESO	FNA-VSHA-CR-015-2024
CONTRATISTA	FNA - 188 - 2024 / INGEBYP S.A.S
INTERVENTOR	FNA - 022 - 2025 / CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC
OBJETO	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

DURACIÓN CONTRATO	12 MESES
ACTA DE INICIO	viernes 7 de marzo de 2025
FECHA TERMINACIÓN	viernes 6 de marzo de 2026
VALOR CONTRATO	$ 5,142,932,604.88
VALOR CORTE 05	$ 728,299,828.05
	viernes, 31 de octubre de 2025

1-10-2025 AL 31-10-2025

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 05			CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT. (-)	SUBTOTAL	CANT.	SUBTOTAL	CANT.	V / UNITARIO	SUBTOTAL
N/A-79	Suministro e Instalacion AVISO 2 INTERNO - AVISO TEXTO - JUNTOS HACEMOS REALIDAD EL HOGAR DE LOS COLOMBIANOS - Suministro e instalación de aviso en acrílico 3mm letra a letra volumentrico - contorno de 5 cm - . (8,2m*40cm)	Und	1,00	8,652,770.00	8,652,770.00		-	-	-	-	-	-	-	1,00	8,652,770.00	1,00	8,652,770.00	-	8,652,770.00	-
N/A-80	Suministro e Instalacion AVISO 3 - LOGO INTERNO FNA - Suministro e instalación de aviso en acrílico 3mm letra a letra volumentrico - contorno de 5 cm - (60cm*180cm)	Und	1,00	4,130,770.00	4,130,770.00		-	-	-	-	-	-	-	1,00	4,130,770.00	1,00	4,130,770.00	-	4,130,770.00	-
N/A-81	Suministro e Instalacion AVISO 4 - LOGO INTERNO FNA - Suministro e instalación de aviso en acrílico 3mm letra a letra Volumentrico - contorno de 5 cm - (120cm*120cm)	Und	1,00	4,844,770.00	4,844,770.00		-	-	-	-	-	-	-	1,00	4,844,770.00	1,00	4,844,770.00	-	4,844,770.00	-
N/A-82	Suministro e instalación de señales en acrílico cal 3m + impresión digital full color + corte laser + instalación -(Opciones: hole, empaq, rack, baños mixtos, Ref Entrada FNA (11cm*29 cm))	Und	15,00	116,946.00	1,754,190.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	116,946.00	1,754,190.00
	TOTAL COSTO DIRECTO				4,170,056,099.58		389,861,271.14		102,251,338.62		185,989,734.00		236,145,459.15		590,529,172.18		1,514,677,225.49		COSTO DTO	2,655,380,874.11
	ADMINISTRACIÓN	12,00%			500,406,967.15	A.U.I.	46,783,352.54	A.U.I.	12,270,160.75	A.U.I.	22,318,768.08	A.U.I.	28,337,455.10	A.U.I.	70,863,500.66	A.U.I.	181,761,267.06	A.U.I.	ADMON.	318,645,700.09
	IMPREVISTOS	3,00%			125,101,741.79		11,695,845.63		3,067,540.19		5,579,692.02		7,083,363.77		17,715,875.17		45,440,316.76		IMPREVISTOS	79,661,425.02
	UTILIDAD	7,00%			291,904,064.17		27,397,306.48		7,157,593.77		13,019,281.36		16,530,182.14		41,337,042.05		106,027,466.75		UTILIDAD	185,876,666.39
	IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%			55,481,772.19		5,319,495.23		1,391,282.82		2,473,283.48		3,140,734.81		7,854,037.99		20,145,297.10		IVA / UTILIDAD	35,316,395.09
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				972,874,545.30		93,311,022.88		23,886,577.53		43,391,424.94		55,092,736.82		137,770,455.87		353,374,196.70		INDIRECTOS	619,500,348.59
	AJUSTE AL PESO						0,01												AJUSTE / CENTAVOS	- 1,11
	VALOR TOTAL PROYECTO				5,142,932,604.88		493,272,544.03		126,246,917.15		229,381,158.94		291,238,194.77		728,299,628.05		1,868,051,422.19		VALOR TOTAL	3,274,881,183.01
							CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 05		CORTE 01		CORTE 02		CORTE 03		CORTE 04		CORTE 05		ACUMULADO CORTES		VALOR POR EJECUTAR

ESTADO DE PAGOS DE CONTRATISTA

ACTA No.	PERIODO	ESTADO	VALOR CORTES	PORCENTAJE	PAGADO	SALDO
	VALOR CONTRATO		$ 5,142,932,605		-	$ 5,142,932,605
1	(07 MARZO AL 30 ABRIL DE 2025)	PAGADO	$ 493,272,544.03	9,59%	$ 493,272,544.03	$ 4,649,660,061.97
2	(01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2025)	PAGADO	$ 125,859,917.15	2,45%	$ 619,132,461.18	$ 4,023,800,144.82
3	(01 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2025)	PAGADO	$ 229,381,338.94	4,46%	$ 848,513,800.12	$ 4,294,418,065.88
4	(01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025)	TRAMITE	$ 291,238,194.77	5,66%	$ 1,139,751,794.89	$ 4,003,180,811.11
5	(01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025)	TRAMITE	$ 728,299,828	14,16%	$ 1,868,051,422.94	$ 3,274,881,183.06
	TOTAL		$ 1,868,051,423	36,32%	$ 4,968,721,823.16	

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 590,529,172.18
ADMINISTRACIÓN	12,00%	$ 70,863,500.66
IMPREVISTOS	3,00%	$ 17,715,875.17
UTILIDAD	7,00%	$ 41,337,042.05
IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%	$ 7,854,037.99
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 137,770,455.87
VALOR TOTAL CORTE 05 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE		$ 728,299,628.05

ING. JEFFERSON BOHORQUEZ LESMA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA
INGEBYP S.A.S. / CTO FNA - 188 - 2024

ING. RODOLFO [illegible] NETO VARGAS
COORDINADOR OBC
INGEBYP S.A.S. / CTO FNA - 188 - 2024


ING. JEFFERSON [illegible] INTERVENTORIA
INGEBYP S.A.S. / CTO FNA - 022 - 2025

ING. ADOLFO [illegible] DUARTE GAITAN
DIRECTOR INTERVENTORIA
INGEBYP S.A.S. / CTO FNA - 022 - 2025


Dr. VANESA PACHECO GOMEZ
GERENTE ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR CTO INTERVENTORIA FNA 022 2025
FONDO NACIONAL DEL AHORRO FNA SA

ING. JAIME HERNANDO PRIETO
PROFESIONAL EJECUTIVO NIVEL 2
APOYO SUPERVISOR CTO INTERVENTORIA FNA 022 2025
FONDO NACIONAL DEL AHORRO FNA SA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 05					INGEBYP	
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA						
	PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025		HOJA	1 DE 2		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	4.1.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de cielo raso en Drywall de 1/2" en diferentes niveles a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo y pintura a 3 manos. A todo costo.			UNIDAD:	M2

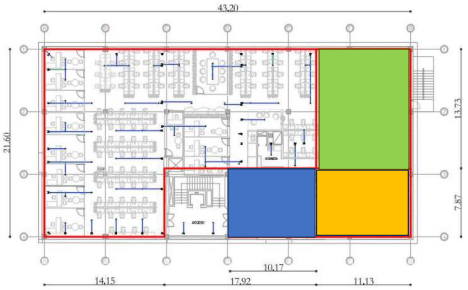PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
						-
	Convenciones cuarto piso					-
			11,13	13,73		152,81
						-
			7,87	11,13		87,59
						-
			7,87	10,17		80,04
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	320,44
					VIENE	551,68
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	872,12
					COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 4	- 551,66
					PRESENTE ACTA	320,46

REGISTRO FOTOGRÁFICO

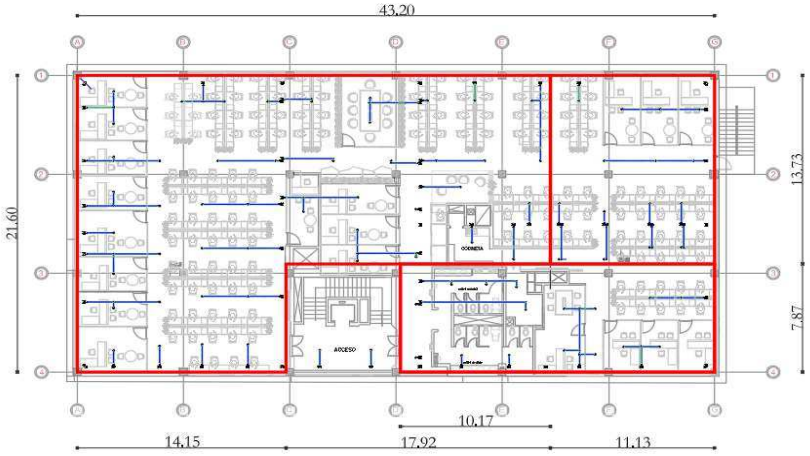

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. [illegible]	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MU[illegible]
COOR[illegible]ADOR DE PRO[illegible]	GERENTE DE OBRA	COOR[illegible] PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 05					INGEBYP	
	MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA						
	PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025		HOJA	2 DE 2		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	4.1.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de cielo raso en Drywall de 1/2" en diferentes niveles a una sola cara, incluye estructura, cinta, estuco, capa fondeo y pintura a 3 manos. A todo costo.			UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN [illegible]
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 05

MEMORIAS DE CANTIDADES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA


PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA	1 DE 2

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.		
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S	ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO				
ITEM No.	6.3.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	UNIDAD:	Und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
						-
	CONVENCIONES CUARTO PISO					-
	LUMINARIA DE 60 X 60					-
	ENTRE EJE (A - B) - (1-4)				25,00	25,00
	ENTRE EJE (B - C) - (1-4)				18,00	18,00
	ENTRE EJE (C - D) - (1-4)				11,00	11,00
	ENTRE EJE (D - E) - (1-4)				6,00	6,00
	ENTRE EJE (E - F) - (1-4)				16,00	16,00
	ENTRE EJE (F - G) - (1-4)				21,00	21,00
						-
	LUMINARIA REDONDA					-
	BAÑOS				20,00	20,00
	COCINETA				14,00	14,00
	CUARTO ELECTRICO				4,00	4,00
	OFICINAS CENTRALES				8,00	8,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				SUBTOTAL		143,00
				VIENE		-
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA		143,00
				PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4		-
				PRESENTE ACTA		143,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

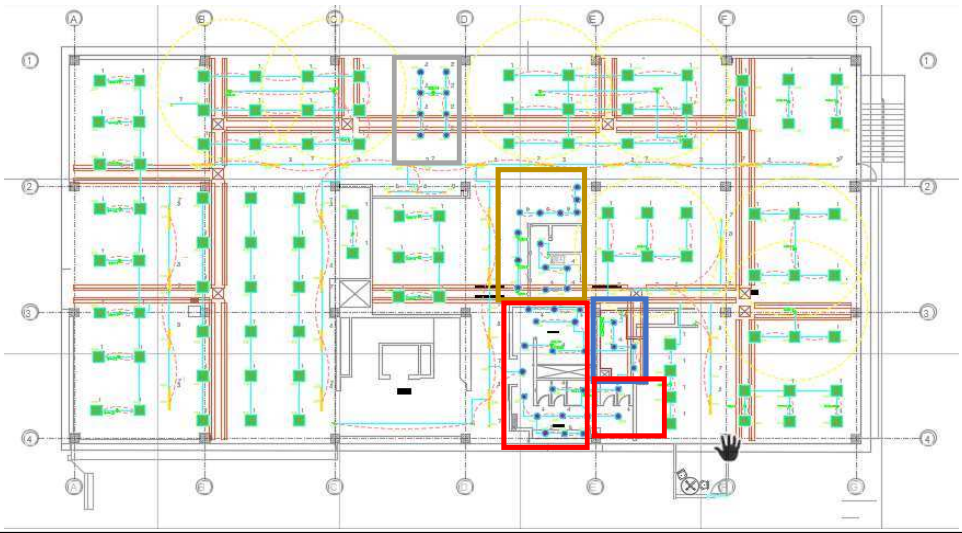

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 05

MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA	2 DE 2

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.

CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S	ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO				


ITEM No.	6.3.	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de salida de alumbrado 3m prom en cable No 12 LSHF AWG y Tubería PVC SCH 40 3/4", elementos de fijación, conductores y tomacorriente doble. A todo costo, cumpliendo norma RETIE.	UNIDAD:	Und

REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO MARTINEZ	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE INTERVENTORIA


ACTA PARCIAL No. 05

MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA


PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA	1 DE 2

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	NP-01	DESCRIPCION ITEM:	Demolición placa maciza 0.15 mt en horarios autorizado por la entidad (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).			UNIDAD:	M2

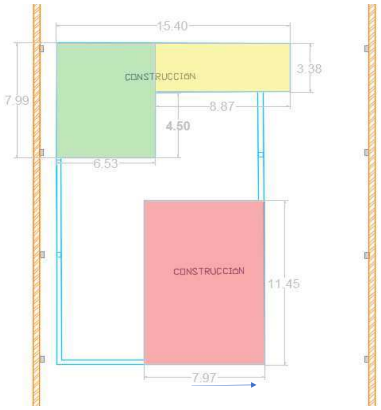PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	Nº ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
						-
	Cubierta edificio convenciones					-
	Media caña					-
			0,10	7,97	2,00	1,59
			0,10	11,45	2,00	2,29
			0,10	6,53	1,00	0,65
			0,10	4,50	1,00	0,45
			0,10	8,87	1,00	0,89
			0,10	3,38	1,00	0,34
			0,10	15,40	1,00	1,54
			0,10	7,99	1,00	0,80
			0,10	43,32	2,00	8,66
			0,10	21,69	2,00	4,34
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	21,55
					VIENE	815,36
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	836,91
					COBRADO HASTA ACTA DE COBRO 4	- 815,36
					PRESENTE ACTA	21,55

REGISTRO FOTOGRÁFICO

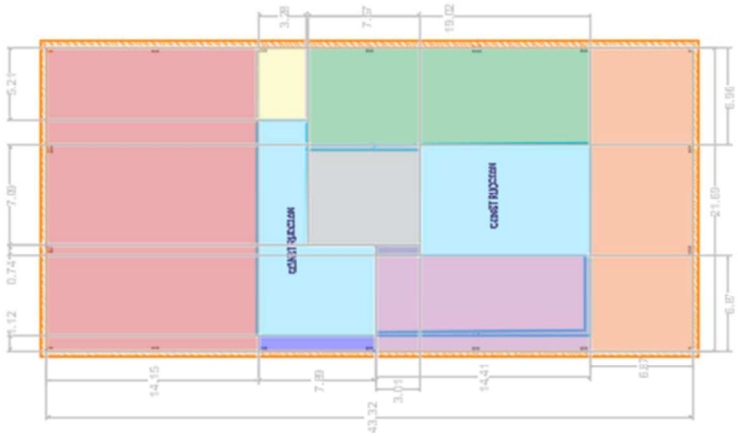

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO [illegible] COORDINADOR DE PR[illegible]	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN M[illegible]Z GAITAN COORDINADOR [illegible] PROYECTO [illegible]ATORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 05					INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA					
	PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025		HOJA	2 DE 2	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA 31/10/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-01	DESCRIPCION ITEM:	Demolición placa maciza 0.15 mt en horarios autorizado por la entidad (incluye retiro de material desde frente de obra a sitio de acopio y desde sitio de acopio a escombrera).		UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO




REGISTRO FOTOGRÁFICO




REGISTRO FOTOGRÁFICO




OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. ROGELIO BARRETO V...	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN ...
COORDINADOR DE PROY...	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE INTERVENTORIA


ACTA PARCIAL No. 05

MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA


PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA	1 DE 3

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	NP-52	DESCRIPCION ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Impermeabilización de placa poliurea pura RESISTENTE A RAYOS UV DANOCOAT 250 incluye suministro y aplicación de POLIUREA en 80 MILS +-10%, ESPESOR TEXTURIZADA PREVIA IMPRIMACION EPOXICA BICOMPONENTE CON ARENA DE QUARZO EN UNA CAPA (si se requieren más se cobrarán por aparte), INCLUYE REACTOR GRACO, MATERIALES Y EQUIPOS CERTIFICADOS, PREVIO tratamiento de fisuras existentes. Acabado original gris cambia por rayos UV. Suministro y aplicación esmalte uretano gris o blanco resistente a Rayos UV color homogéneo como protección del sistema Poliurea.	UNIDAD:		M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	Nº ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
						-
	Cubierta edificio convenciones					-
						-
						-
			6,87	21,69	1,00	149,01
			19,02	6,96	1,00	132,38
			3,28	5,21	1,00	17,09
			14,15	21,66	1,00	306,49
			1,12	7,89	1,00	8,84
			14,41	6,87	1,00	99,00
			7,09	7,57	1,00	53,67
			0,74	3,01	1,00	2,23
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	768,71
					VIENE	225,86
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	994,57
					PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4	-
					PRESENTE ACTA	994,57

REGISTRO FOTOGRÁFICO

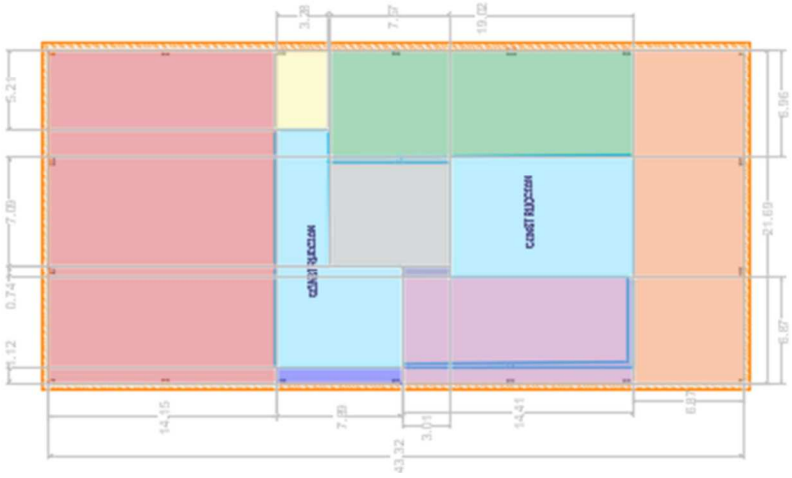

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO [illegible] COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GA[illegible] COORDINADOR PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 05

MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA	2 DE 3


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO		

ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025


ITEM No.	NP-52	DESCRIPCION ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Impermeabilización de placa poliurea pura RESISTENTE A RAYOS UV DANOCOAT 250 incluye suministro y aplicación de POLIUREA en 80 MILS +-10%, ESPESOR TEXTURIZADA PREVIA IMPRIMACION EPOXICA BICOMPONENTE CON ARENA DE QUARZO EN UNA CAPA (si se requieren más se cobrarán por aparte), INCLUYE REACTOR GRACO, MATERIALES Y EQUIPOS CERTIFICADOS, PREVIO tratamiento de fisuras existentes. Acabado original gris cambia por rayos UV. Suministro y aplicación esmalte uretano gris o blanco resistente a Rayos UV color homogéneo como protección del sistema Poliurea.	UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

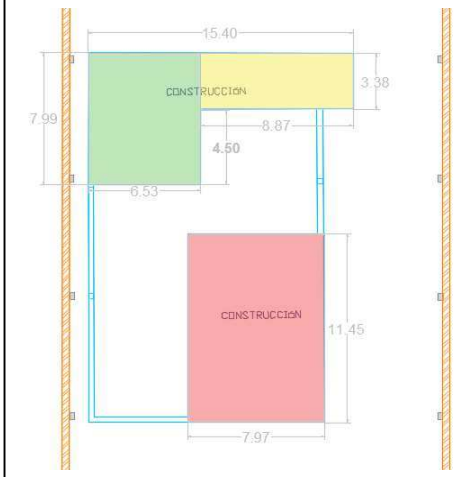

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	ANCHO	LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					-
Cubierta edificio convenciones					-
					-
		3,38	8,87	1,00	29,98
		6,53	7,99	1,00	52,17
		11,45	7,97	1,00	91,26
					-
Media caña					-
		0,20	43,32	2,00	17,33
		0,20	21,70	2,00	8,68
		0,20	7,97	2,00	3,19
		0,20	11,45	2,00	4,58
		0,20	6,53	2,00	2,61
		0,20	4,50	2,00	1,80
		0,20	8,87	2,00	3,55
		0,20	3,38	2,00	1,35
		0,20	15,40	2,00	6,16
		0,20	7,99	2,00	3,20
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	225,86
				VIENE	
				SUBTOTAL ACUMULADO	225,86

REGISTRO FOTOGRAFICO

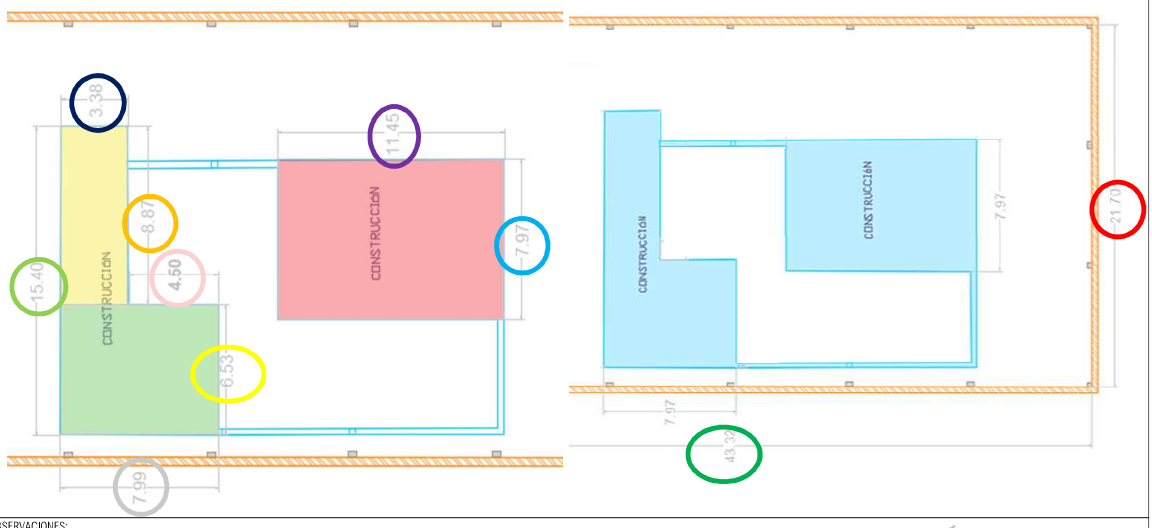

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ [illegible] COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 05

MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA	3 DE 3

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S		
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO		

ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025		
ITEM No.	NP-52	DESCRIPCION ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Impermeabilización de placa poliurea pura RESISTENTE A RAYOS UV DANOCOAT 250 incluye suministro y aplicación de POLIUREA en 80 MILS +-10%, ESPESOR TEXTURIZADA PREVIA IMPRIMACION EPOXICA BICOMPONENTE CON ARENA DE QUARZO EN UNA CAPA (si se requieren más se cobrarán por aparte), INCLUYE REACTOR GRACO, MATERIALES Y EQUIPOS CERTIFICADOS, PREVIO tratamiento de fisuras existentes. Acabado original gris cambia por rayos UV. Suministro y aplicación esmalte uretano gris o blanco resistente a Rayos UV color homogéneo como protección del sistema Poliurea.	UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 05


MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA	1 DE 2

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA 31/10/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-53	DESCRIPCION ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRATO EN MORTERO FABRICADO EN SITIO para zona de cubiertas, grantizando pendientes de desagues hacia los sifonescon materiales. H prom 8 cm		UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

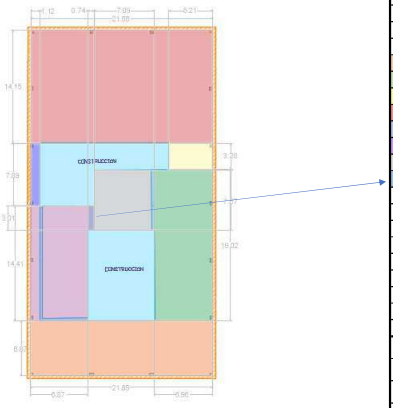

LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	Nº ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					-
Cubierta edificio convenciones					-
					-
					-
		6,87	21,69	1,00	149,01
		19,02	6,96	1,00	132,38
		3,28	5,21	1,00	17,09
		14,15	21,86	1,00	306,48
		1,12	7,89	1,00	8,84
		14,41	6,87	1,00	99,00
		7,09	7,57	1,00	53,67
		0,74	3,01	1,00	2,23
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					768,71
VIENE					-
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					768,71
PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4					-
PRESENTE ACTA					768,71

REGISTRO FOTOGRAFICO

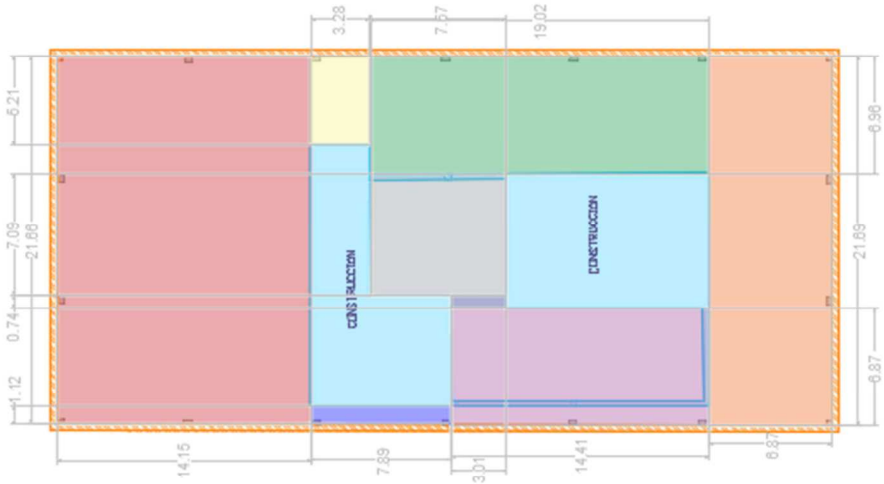

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO ARCO	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 05

MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA	2 DE 2

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	NP-53	DESCRIPCION ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRATO EN MORTERO FABRICADO EN SITIO para zona de cubiertas, grantizando pendientes de desagues hacia los sifonescon materiales. H prom 8 cm		UNIDAD:		M2

REGISTRO FOTOGRAFICO





REGISTRO FOTOGRAFICO









OBSERVACIONES:


Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. [illegible] BARRETO [illegible]	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN [illegible] UÑOZ GAITA
COORDINADOR DE PROYEC[illegible]	GERENTE DE OBRA	COORDINADO[illegible] DE [illegible] INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 05					INGEBYP	
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA						
	PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025		HOJA	1 DE 2		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.				
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	NP - 54	DESCRIPCION ITEM:	Demolicion de dados de concreto de 0.3 x 0.3 x 0.25 m, los cuales se encuentran en zona de cubierta incluye trasiego y disposición final.			UNIDAD:	Und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
	Cubierta edificio convenciones				80,00	80,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	80,00
					VIENE	-
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	80,00
					PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4	-
					PRESENTE ACTA	80,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

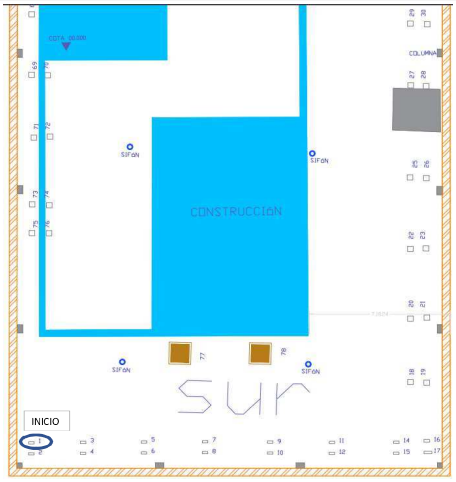

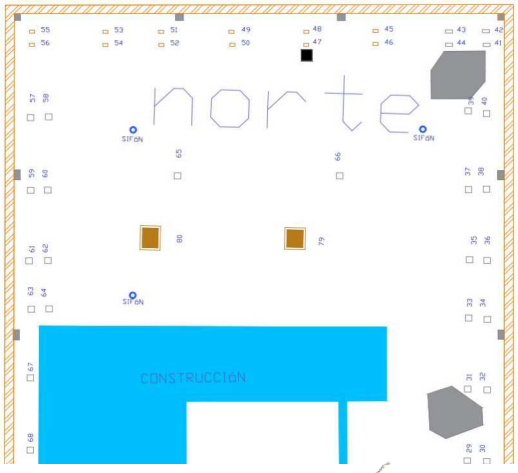

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. [illegible] MARCELO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTOS	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN [illegible] DIAZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTOS - INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 05					INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA					
	PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025		HOJA	2 DE 2	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	NP - 54	DESCRIPCION ITEM:	Demolicion de dados de concreto de 0.3 x 0.3 x 0.25 m, los cuales se encuentran en zona de cubierta incluye trasiego y disposición final.			UNIDAD:	Und

REGISTRO FOTOGRÁFICO









REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. [illegible] CORRETO VAR[illegible] COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑO[illegible] COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA


ACTA PARCIAL No. 05

MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA	1 DE 2

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.		
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S	ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO				
ITEM No.	NP-57	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de bandeja eléctrica tipo ducto cerrado de 30 x 10 x 1 m galvanizada con separador incluye curvas, soportería y conductor de tierra para bandeja.	UNIDAD:	ML

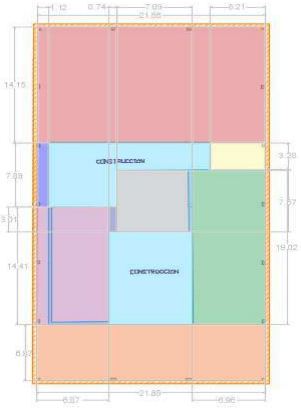PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	Nº ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
						-
	EDIFICIO DE CONVENCIONES CUARTO PISO					-
				8,05	4,00	32,20
				22,05	4,00	88,20
				30,07	2,00	60,14
				21,07	2,00	42,14
				4,27	4,00	17,08
				5,93	2,00	11,86
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				SUBTOTAL		251,62
				VIENE		-
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA		251,62
				PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4		-
				PRESENTE ACTA		251,62

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAVIRIA
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 05				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025		HOJA	2 DE 2

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	NP-57	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de bandeja eléctrica tipo ducto cerrado de 30 x 10 x 1 m galvanizada con separador incluye curvas, soportería y conductor de tierra para bandeja.			UNIDAD:	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO





REGISTRO FOTOGRAFICO




OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ
COORDINADOR DE PROYECTOS	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA


ACTA PARCIAL No. 05

MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA


PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA	1 DE 2

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA 31/10/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-58	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de bandeja eléctrica tipo ducto cerrado de 15 x 10 x 1 m galvanizada, incluye curvas, soportería y conductor de tierra para bandeja.		UNIDAD:	ML

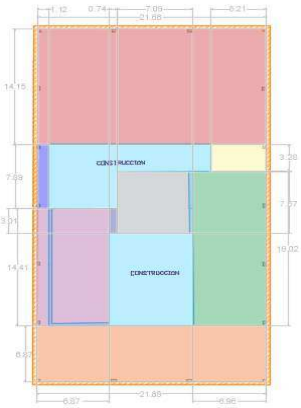PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
						-
	EDIFICIO DE CONVENCIONES CUARTO PISO					-
				29,84	1,00	29,84
				18,47	2,00	36,94
				21,64	1,00	21,64
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				SUBTOTAL		88,42
				VIENE		-
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA		88,42
				PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4		-
				PRESENTE ACTA		88,42

REGISTRO FOTOGRÁFICO

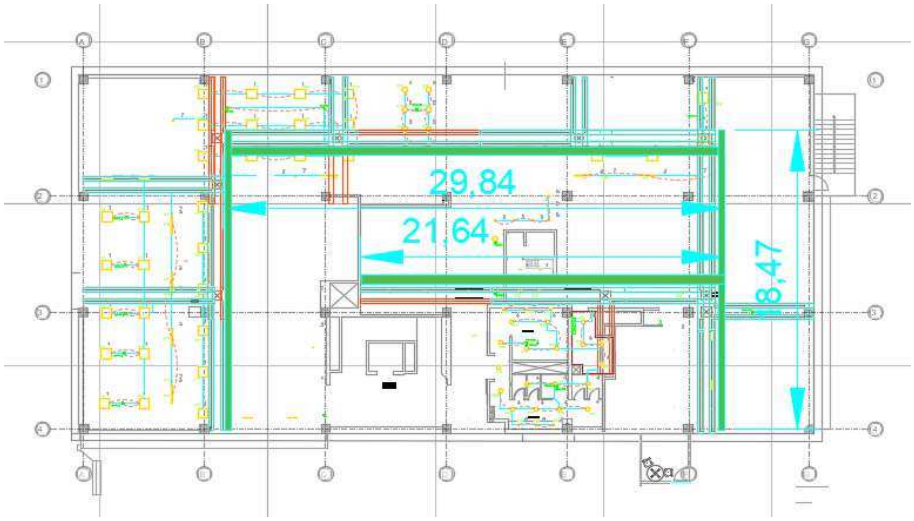

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. ROCIO BARRETO V.	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 05

MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA	2 DE 2

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	NP-58	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de bandeja eléctrica tipo ducto cerrado de 15 x 10 x 1 m galvanizada, incluye curvas, soporteria y conductor de tierra para bandeja.			UNIDAD:	ML

REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. ROBERTO GARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GOMEZ
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 05


MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA	1 DE 2

A. DATOS GENERALES


CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA 31/10/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ITEM No.	NP-53	DESCRIPCION ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRATO EN MORTERO FABRICADO EN SITIO para zona de cubiertas, granlizando pendientes de desagues hacia los sifonescon materiales. H prom 8 cm		UNIDAD:	MI

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					-
Cubierta edificio convenciones					-
					-
					-
			21,70	2,00	43,40
			43,32	2,00	86,64
VANO ACCESO			1,00	- 1,00	- 1,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	129,04
				VIENE	-
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	129,04
				PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4	-
				PRESENTE ACTA	129,04

REGISTRO FOTOGRÁFICO

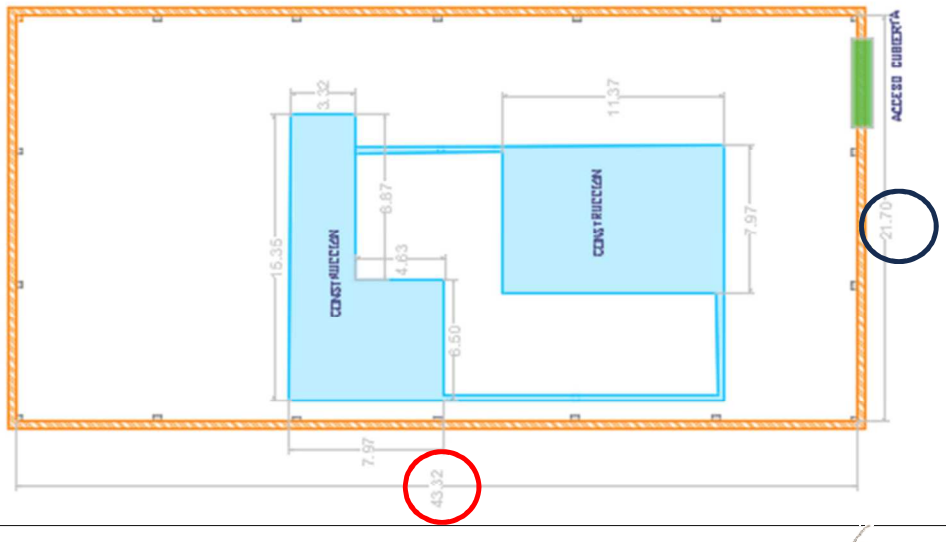

OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 05				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUBIERTA - CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025		HOJA	2 DE 2

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ITEM No.	NP-53	DESCRIPCION ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRATO EN MORTERO FABRICADO EN SITIO para zona de cubiertas, grantizando pendientes de desagues hacia los sifonescon materiales. H prom 8 cm		UNIDAD:	MI

REGISTRO FOTOGRAFICO





REGISTRO FOTOGRAFICO








OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS	ING. FABIAN BOHORQUEZ	ING. AGUSTIN [illegible]
COORDINADOR DE PROYECTO	GERENTE DE OBRA	COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 05		INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA		
	PERIODO: 1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA: 1 DE 1	


A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA: 31/10/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-60	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Punto hidraulico para rociador automatico de 1/2"		UNIDAD:	Und

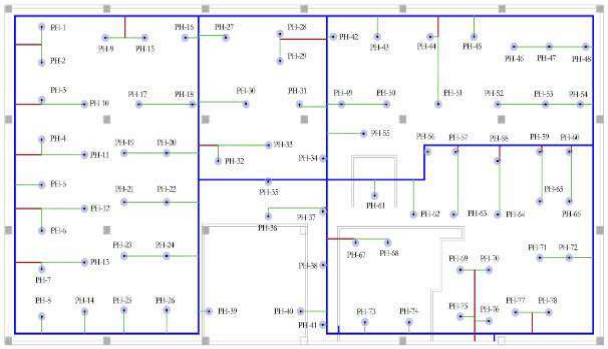PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
						-
	Piso cuarto - Convenciones					-
						-
	Puntos hidraulicos totales				75,00	75,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	75,00
					VIENE	-
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	75,00
					PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4	-
					PRESENTE ACTA	75,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





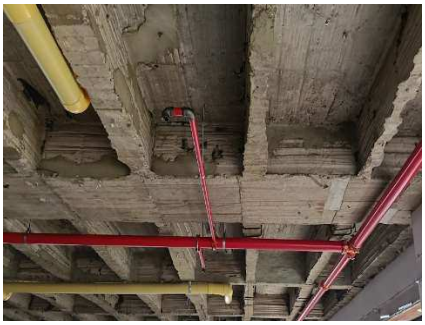


OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 05			INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA			
	PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA	1 DE 1

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA 31/10/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-61	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Rociador Automático 1/2" K=5.6 Pendiente UL-FM			UNIDAD: Und

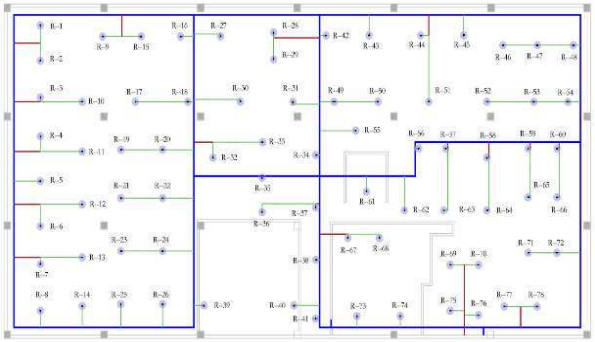PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
						-
	Piso cuarto - Convenciones					-
						-
	Rociador				75,00	75,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	75,00
					VIENE	-
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	75,00
					PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4	-
					PRESENTE ACTA	75,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO








OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 05		INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA		
PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA	1 DE 1

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA 31/10/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-62	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	Suministro e instalación TEE mecanica ranurada de 3" X 1 1/2"		**UNIDAD:**	Und

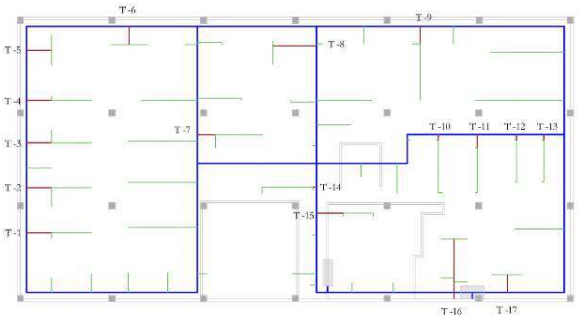PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
						-
						-
	Piso cuarto - Convenciones					-
						-
	TEE Red principal 3" a 1-1/2"				17,00	17,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	17,00
					VIENE	-
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	17,00
					PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4	-
					PRESENTE ACTA	17,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO








OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VILLAS **COORDINADOR DE PROYECTO**	**ING. FABIAN BOHORQUEZ** **GERENTE DE OBRA**	**ING. AGUSTIN MUNOZ GAITAN** **COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA**

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 05			INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA			
	PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA	1 DE 1

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura fisica de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ÍTEM No.	NP-63	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalacion STRAP DE 3" X 1"			UNIDAD:	Und

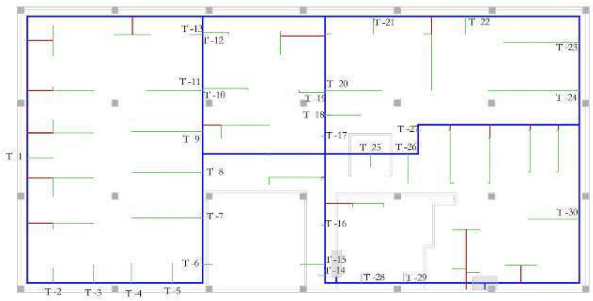PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
						-
	Piso cuarto - Convenciones				30,00	30,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	30,00
					VIENE	-
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	30,00
					PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4	-
					PRESENTE ACTA	30,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO






OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 05		INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA		
	PERIODO: 1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA: 1 DE 1	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA: 31/10/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-64	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalación de soporte tipo pera con varilla 3/8" con perno bean clamb para tubería 1"		UNIDAD:	Und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

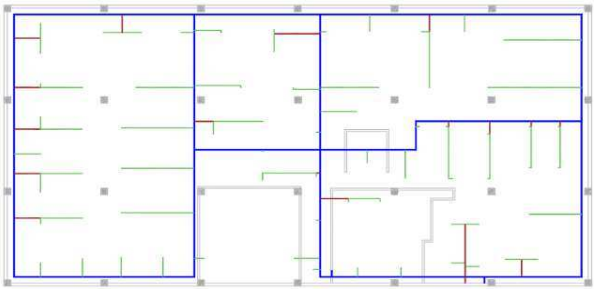

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
					-
Piso cuarto - Convenciones					-
					-
Malla 1				25,00	25,00
					-
Malla 2				14,00	14,00
					-
Malla 3				19,00	19,00
					-
Malla 4				18,00	18,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	76,00
				VIENE	-
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	76,00
				PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4	-
				PRESENTE ACTA	76,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO






OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTOS INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 05		INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA		
	PERIODO: 1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA: 1 DE 1	


A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA: 31/10/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-65	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalación de soporte tipo pera con varilla 3/8" con perno bean clamb para tubería 1-1/2"			UNIDAD: Und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

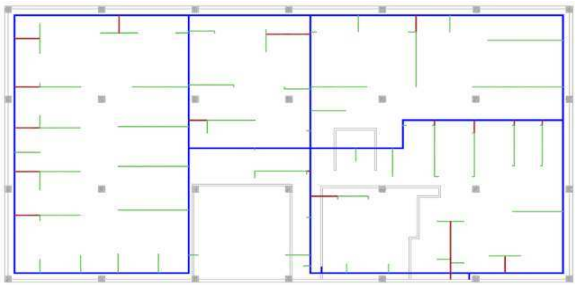

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
					-
Piso cuarto - Convenciones					-
					-
Malla 1				10,00	10,00
					-
Malla 2				7,00	7,00
					-
Malla 3				7,00	7,00
					-
Malla 4				2,00	2,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	26,00
				VIENE	-
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	26,00
				PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4	-
				PRESENTE ACTA	26,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

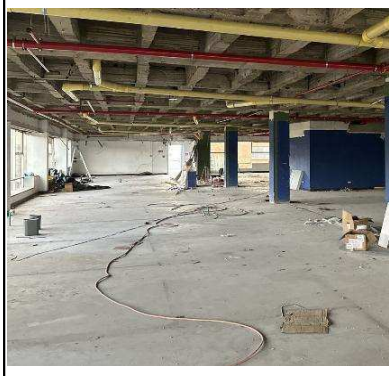





OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ CATAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No. 05


MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA	1 DE 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA 31/10/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-66	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalación de soporte tipo pera con varilla 3/8" con perno bean clamb para tubería 3"		UNIDAD:	Und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

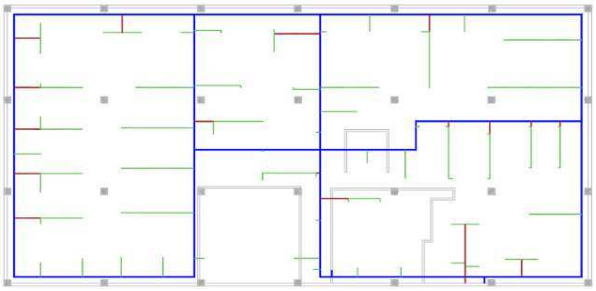

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
					-
Piso cuarto - Convenciones					-
					-
Malla 1				31,00	31,00
					-
Malla 2				18,00	18,00
					-
Malla 3				18,00	18,00
					-
Malla 4				28,00	28,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	95,00
				VIENE	-
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	95,00
				PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4	-
				PRESENTE ACTA	95,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO COORDINADOR DE PROYECTOS	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ COORDINADOR PROYECTO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 05


MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA	1 DE 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA 31/10/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-67	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalación de soporte transversal sismoresitente para tubería 3"		UNIDAD:	Und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

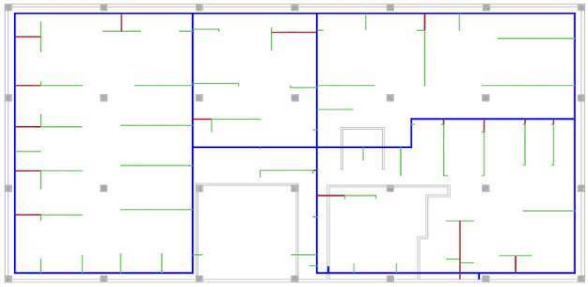

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
					-
Piso cuarto - Convenciones					-
					-
					-
Malla 1				4,00	4,00
					-
Malla 2				4,00	4,00
					-
Malla 3				6,00	6,00
					-
Malla 4				2,00	2,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	16,00
				VIENE	-
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	16,00
				PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4	-
				PRESENTE ACTA	16,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO








OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO V... COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑO... IAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 05		INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA		
	PERIODO: 1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA: 1 DE 1	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA: 31/10/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-68	**DESCRIPCIÓN ÍTEM:**	Suministro e instalación de soporte longitudinal sismoresitente para tubería 3"		**UNIDAD:**	Und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

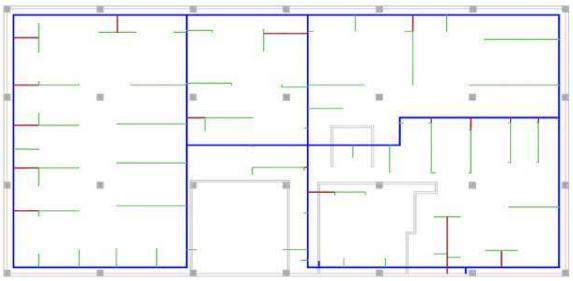

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
					-
Piso cuarto - Convenciones					-
					-
Malla 1				8,00	8,00
					-
Malla 2				4,00	4,00
					-
Malla 3				6,00	6,00
					-
Malla 4				2,00	2,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	20,00
				VIENE	-
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	20,00
				PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4	-
				PRESENTE ACTA	20,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO








OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS **COORDINADOR DE PROYECTO**	**ING. FABIAN BOHORQUEZ** **GERENTE DE OBRA**	**ING. AGUSTIN MUÑOZ DAZA** **COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA**

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 05		INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA		
	PERIODO: 1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA: 1 DE 1	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA: 31/10/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-69	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Soporte antisísmico 4 vías		UNIDAD:	Und

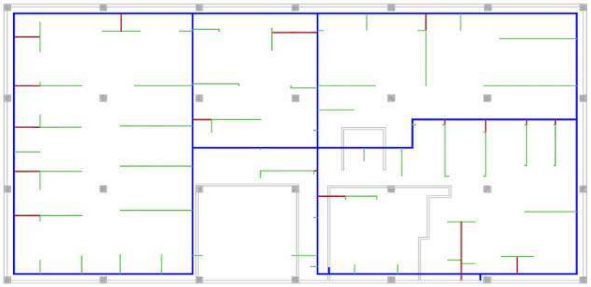PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
						-
	Piso cuarto - Convenciones					-
						-
	Malla 1				2,00	2,00
						-
	Malla 2				1,00	1,00
						-
	Malla 3				1,00	1,00
						-
	Malla 4				2,00	2,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	6,00
					VIENE	-
					CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	6,00
					PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4	-
					PRESENTE ACTA	6,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO








OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAITAN COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 05			INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA			
	PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA	1 DE 1

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA 31/10/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-70	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Tubería ACC roscada 1" sch-40 (incluye accesorios y pintura)			UNIDAD: ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

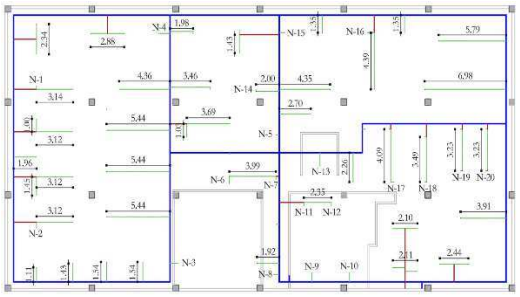

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
Piso cuarto - Convenciones					-
Por cobrar próximo balance			- 12,41	1,00	- 12,41
Red distribución 1 "			2,34	1,00	2,34
Red distribución 1 "			2,88	1,00	2,88
Red distribución 1 "			4,36	1,00	4,36
Red distribución 1 "			3,14	1,00	3,14
Red distribución 1 "			5,44	1,00	5,44
Red distribución 1 "			3,12	1,00	3,12
Red distribución 1 "			1,00	1,00	1,00
Red distribución 1 "			5,44	1,00	5,44
Red distribución 1 "			1,96	1,00	1,96
Red distribución 1 "			1,45	1,00	1,45
Red distribución 1 "			3,12	1,00	3,12
Red distribución 1 "			5,44	1,00	5,44
Red distribución 1 "			3,12	1,00	3,12
Red distribución 1 "			1,11	1,00	1,11
Red distribución 1 "			1,43	1,00	1,43
Red distribución 1 "			1,54	2,00	3,08
Red distribución 1 "			1,98	1,00	1,98
Red distribución 1 "			1,43	1,00	1,43
Red distribución 1 "			3,46	1,00	3,46
Red distribución 1 "			2,00	1,00	2,00
					-
				SUBTOTAL	44,89
				VIENE	89,31
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	134,20
				PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4	-
				PRESENTE ACTA	134,20

REGISTRO FOTOGRÁFICO








OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO MENESES COORDINADOR DE PROYECTOS	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAVIRIA COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 05				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA	1 DE 1	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA 31/10/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-70	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Tubería ACC roscada 1" sch-40 (incluye accesorios y pintura)		UNIDAD:	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

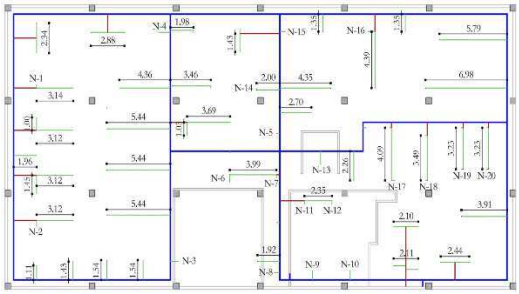

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
Piso cuarto - Convenciones					-
					-
Red distribución 1 "			3,69	1,00	3,69
Red distribución 1 "			1,03	1,00	1,03
Red distribución 1 "			3,99	1,00	3,99
Red distribución 1 "			1,92	1,00	1,92
Red distribución 1 "			1,35	2,00	2,70
Red distribución 1 "			4,39	1,00	4,39
Red distribución 1 "			5,79	1,00	5,79
Red distribución 1 "			6,98	1,00	6,98
Red distribución 1 "			2,70	1,00	2,70
Red distribución 1 "			2,26	1,00	2,26
Red distribución 1 "			4,09	1,00	4,09
Red distribución 1 "			3,49	1,00	3,49
Red distribución 1 "			3,23	2,00	6,46
Red distribución 1 "			2,35	1,00	2,35
Red distribución 1 "			2,10	1,00	2,10
Red distribución 1 "			3,91	2,00	7,82
Red distribución 1 "			2,11	1,00	2,11
Red distribución 1 "			2,44	1,00	2,44
Niples red distribución 1 "			1,00	23,00	23,00
					-
					-
				SUBTOTAL	89,31
				VIENE	-
				SUBTOTAL ACUMULADO	89,31

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. ROBERTO BARRETO MOJICA COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN [illegible] UÑOZ GAITAN COORDINADOR DE [illegible] INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 05


MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA	1 DE 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA 31/10/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-71	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Tuberia de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A53 SCH 40 diametro 1-1/2", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.		UNIDAD:	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

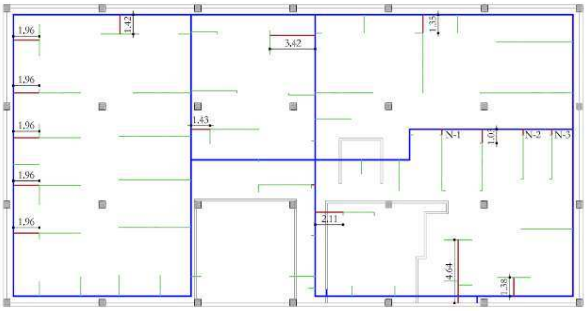


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
Piso cuarto - Convenciones					-
					-
Niples Red secundaria 1 - 1/2"			1,00	3,00	3,00
Red secundaria 1 - 1/2"			1,96	5,00	9,80
Red secundaria 1 - 1/2"			1,42	1,00	1,42
Red secundaria 1 - 1/2"			1,43	1,00	1,43
Red secundaria 1 - 1/2"			3,42	1,00	3,42
Red secundaria 1 - 1/2"			2,11	1,00	2,11
Red secundaria 1 - 1/2"			1,35	1,00	1,35
Red secundaria 1 - 1/2"			4,64	1,00	4,64
Red secundaria 1 - 1/2"			1,38	1,00	1,38
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUBTOTAL					28,55
VIENE					-
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA					28,55
PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4					-
PRESENTE ACTA					28,55

REGISTRO FOTOGRÁFICO





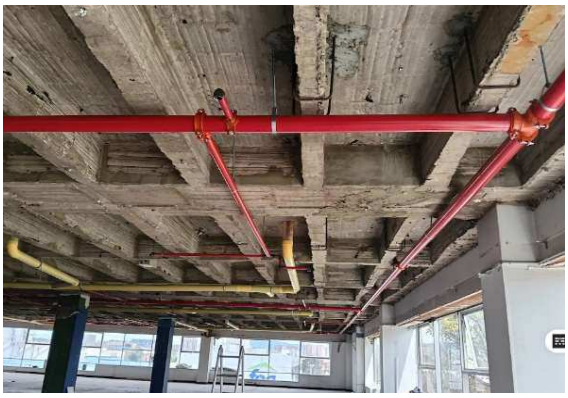


OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN [illegible] COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 05				INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA				
	PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA	1 DE 1	

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA 31/10/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-72	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Tuberia de Acero al Carbono Con Costura ASTM-A53 SCH 40 diametro 3", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.		UNIDAD:	ml


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

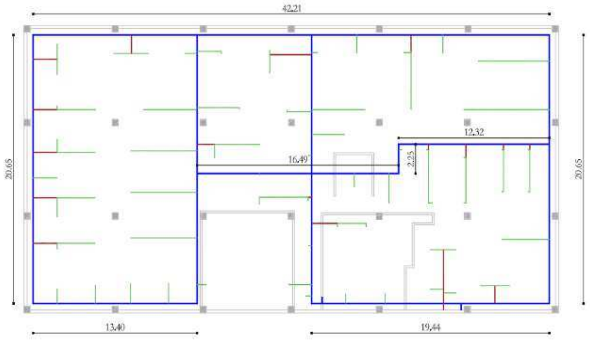

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
					-
Piso cuarto - Convenciones					-
					-
Red principal 3"			20,65	1,00	20,65
Red principal 3"			20,65	1,00	20,65
Red principal 3"			20,65	1,00	20,65
Red principal 3"			20,65	1,00	20,65
Red principal 3"			42,21	1,00	42,21
Red principal 3"			13,40	1,00	13,40
Red principal 3"			19,44	1,00	19,44
Red principal 3"			16,49	1,00	16,49
Red principal 3"			2,25	1,00	2,25
Red principal 3"			12,32	1,00	12,32
Niple 3" conexión gabinete			1,00	1,00	1,00
Niple 3" estación de control			1,00	3,00	3,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	192,71
				VIENE	-
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	192,71
				PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4	-
				PRESENTE ACTA	192,71

REGISTRO FOTOGRÁFICO



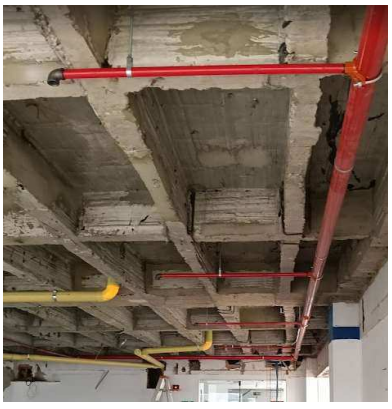



OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VILLAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GALAN COORDINADOR DE INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 05


MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA

PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA	1 DE 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA 31/10/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-73	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalacion codo ranurado acero al Carbono ASTM-A53 SCH 40 diametro 3", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.		UNIDAD:	und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

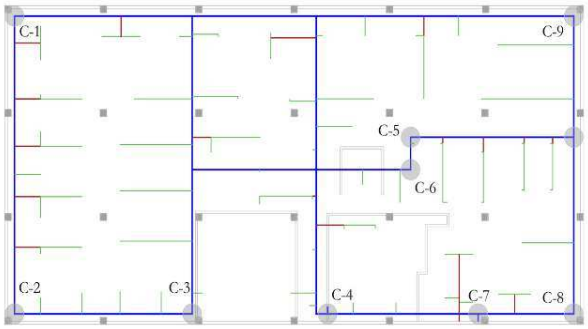

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
					-
Piso cuarto - Convenciones					-
					-
Codo red principal				9,00	9,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	9,00
				VIENE	-
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	9,00
				PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4	-
				PRESENTE ACTA	9,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO








OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 05		INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA		
PERIODO	1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA	1 DE 1


A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA	31/10/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO						
ÍTEM No.	NP-74	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalacion TEE ranurado acero al Carbono ASTM-A53 SCH 40 diametro 3", Incluye limpieza mecánica, dos capas de pintura esmalte rojo vivo y una capa de anticorrosivo.		UNIDAD:		und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

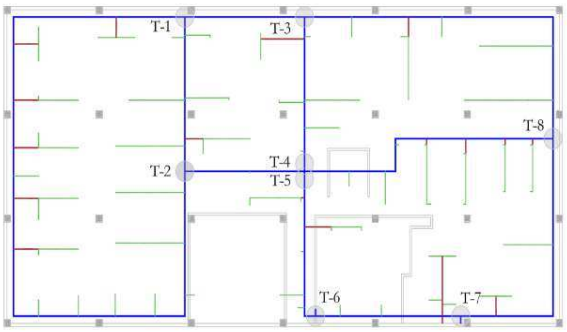


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
					-
Piso cuarto - Convenciones					-
					-
Tee red principal				8,00	8,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	8,00
				VIENE	-
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	8,00
				PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4	-
				PRESENTE ACTA	8,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

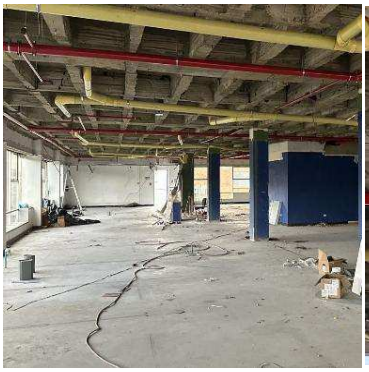



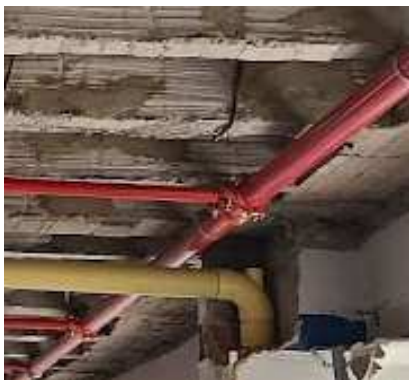


OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ [illegible] COORDINADOR DE PROYECTO INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 05		INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA		
	PERIODO: 1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA: 1 DE 1	


A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA: 31/10/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-75	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalación de estación de control para red contra incendios		UNIDAD:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

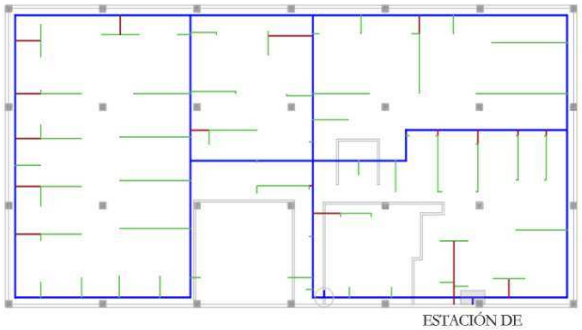

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
					-
Piso cuarto - Convenciones					-
					-
Estación de control				1,00	1,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	1,00
				VIENE	-
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	1,00
				PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4	-
				PRESENTE ACTA	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

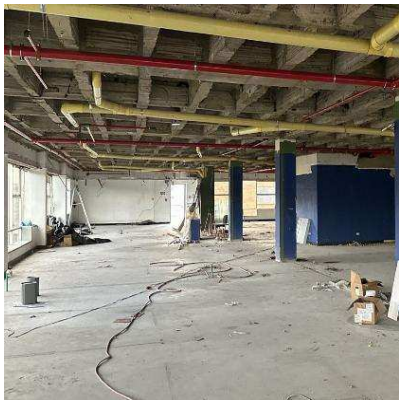




OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTIN MUÑOZ GAZ... COORDINADOR ... INTERVENTORIA

fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA PARCIAL No. 05		INGEBYP
	MEMORIAS DE CANTIDADES - LOCATIVAS GENERALES - CUARTO PISO - CONVENCIONES FNA		
	PERIODO: 1-10-2025 AL 31-10-2025	HOJA: 1 DE 1	


A. DATOS GENERALES						
CONTRATO No:	FNA-166-2024	OBJETO:	Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.			
CONTRATISTA:	INGEBYP S.A.S			ACTA PARCIAL	5	FECHA: 31/10/2025
INTERVENTORÍA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC - BIODECCO					
ÍTEM No.	NP-76	DESCRIPCIÓN ÍTEM:	Suministro e instalación de Gabinete Tipo 3 para red contra incendios		UNIDAD:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

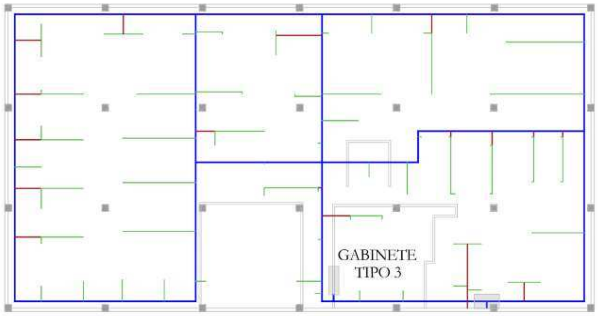

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
					-
Piso cuarto - Convenciones					-
					-
Gabinete tipo 3				1,00	1,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	1,00
				VIENE	-
				CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	1,00
				PAGADO HASTA ACTA DE COBRO 4	-
				PRESENTE ACTA	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

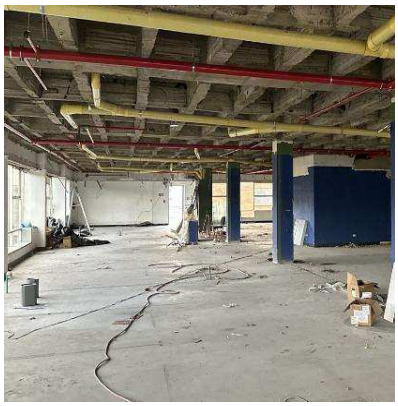





OBSERVACIONES:

Elaboró:	Revisó:	Vo. Bo.:
ING. RODOLFO BARRETO VARGAS COORDINADOR DE PROYECTO	ING. FABIAN BOHORQUEZ GERENTE DE OBRA	ING. AGUSTÍN MUÑOZ GAITÁN COORDINADOR DE INTERVENTORIA
