CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026

NIT: 902.058.961-5

5898

San Martin, 1 de septiembre de 2026

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
Atn: Ing. JAIRO ABDUL RICO ENCISO
Secretario de Obras Públicas
Dirección: Carrera 5 No. 4 – 75 Barrio Fundadores
San Martín - Meta

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA 08/09/2026 HORA 2:40 PM
RECIBIDO Sebastian V.

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No. 109 DE 2026.**Objeto: **"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 - 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META DE LOS LLANOS, META"**

ASUNTO: **INFORME MENSUAL No. 3 DEL CONTRATO DE OBRA**

Respetados señores:

Reciban un cordial saludo del CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026. firma interventora del Contrato de Obra No. 109 de 2026 "Mejoramiento de la carrera 5 entre calles 10 - 20 del Municipio de San Martín, Meta de los Llanos, Meta"

Por medio de la presente hago entrega de la documentación revisada y avalada del Informe Mensual No. 3 del Contrato de la referencia, periodo de ejecución desde el **7 de julio de 2026 al 6 de agosto de 2026.**

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración, comentario o aprobación.

Cordialmente,

NELSON ORLANDO BARRERA TORRES
C.C. 9.396.784 expedida en Sogamoso
R.L. CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026

312 522 4011
ingeollanos@gmail.com
Carrera 16 No. 18-23 Barrio El Remanso

CONSORCIO CARRERA 5EG

5894

Villavicencio, 31 de agosto de 2026.

CCRA5-CE-023-2026

Señores:

Recibí: Jhon Gonzalez 31/08/26

MUNICIPIO DE SAN MARTIN - META
Secretaria de Infraestructura
Supervisor del contrato de Obra Publica No 109 de 2026

REFERENCIA: CONTRATO N° 109 DE 2026 MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10- 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN. META.

ASUNTO: Respuesta oficio del 28 de agosto de 2026 "Observaciones al informe mensual No 3 del contrato de obra – Errores aritméticos en cantidades y porcentaje de ejecución".

Cordial saludo,

Por medio del presente, nos permitimos remitir nuevamente el Informe Mensual No. 3, correspondiente al periodo comprendido entre el 07 de julio y el 06 de agosto de 2026, incorporando las correcciones y ajustes correspondientes a las observaciones realizadas.

La documentación se remite nuevamente para su revisión, verificación y aprobación, según corresponda, una vez atendidas y subsanadas las observaciones formuladas, con el propósito de dar continuidad al desarrollo y ejecución de las actividades contempladas en el proyecto.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier observación, comentario o requerimiento adicional que se derive de la revisión de la documentación presentada.

Atentamente,

ING. LEONARDO ANDRES BORDA
DIRECTOR DE OBRA

5900

INFORME MENSUAL

CONSORCIO CARRERA 5 EG

CONTRATO DE OBRA NO. 109 DE 2026

"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"

INFORME MENSUAL No. 3

El siguiente documento describe el avance de las obras del Contrato de Obra No. 109 de 2026, durante el periodo comprendido entre el 07 de JULIO de 2026 hasta el día 06 de AGOSTO de 2026.

AGOSTO DE 2026

INDICE

1. INTRODUCCION 3
2. OBJETIVOS 4
2.1 OBJETIVO GENERAL 4
3. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO 4
3.1 DESCRIPCION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO 4
3.1.1 DESCRIPCION 4
3.1.2 LOCALIZACION 4
3.1.3 UBICACIÓN DE LA OBRA 5
4. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL 5
4.1 CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA No. 109 DE 2026 5
4.2 RELACION DE ACTAS 6
4.3 CONTROL DE POLIZAS 6
4.4 ORGANIGRAMA GENERAL DEL PROYECTO 8
4.5 PERSONAL EN OBRA 9
4.6 PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD Y PARAFISCALES PERSONAL EN OBRA 10
4.7 AVANCE FINANCIERO 12
4.8 AVANCE FISICO 12
4.9 AVANCE EN TIEMPO 12
4.10 MAQUINARIA Y EQUIPO 13
5. ACTIVIDADES EJECUTADAS HASTA LA FECHA SEGÚN CONDICIONES ACTUALIZADAS 13
6. PROGRAMADO VS EJECUTADO 15
7. REGISTRO FOTOGRAFICO 16
8. REGISTRO DE LLUVIAS 17
9. ENSAYOS DE LABORATORIO 18
10. CONCLUSIONES 19

1. INTRODUCCION

El Municipio de San Martin de los Llanos-Meta, suscribió el Contrato de Obra No. 109 de 2026, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" con la empresa CONSORCIO CARRERA 5 EG, Actuando como Representante Legal ESTEFANY GERALDINE TORRES VANEGAS, por un valor de "CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($5.278´148.553.00) M/CTE".

El presente documento corresponde al informe mensual No. 3, describiendo el avance de las actividades del Contrato de Obra No. 109 de 2026, durante el periodo comprendido entre el 07 de JULIO de 2026 hasta el día 06 de AGOSTO de 2026.

El presente informe contendrá los siguientes aspectos:

- Generalidades del proyecto.
- Condiciones del Contrato.
- Relación de actas.
- Control de pólizas.
- Maquinaria y equipo Utilizados.
- Personal en obra.
- Avance del proyecto.
- Registro de lluvias.
- Registro Fotográfico.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

- Dar a conocer y entregar por medio de este informe las actividades de obra durante el periodo comprendido entre el 07 de JULIO de 2026 hasta el día 06 de AGOSTO de 2026.

3. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

3.1 DESCRIPCION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO

3.1.1 DESCRIPCION

El contrato contempla el "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META".

3.1.2 LOCALIZACION

El Municipio de San Martin (Meta), se encuentra localizado en la parte centro oriental del territorio colombiano, a 3°41'49" latitud Norte 73°41'55" Longitud Oriente del meridiano de Greenwich. En extensión, ocupa el 6.959% del territorio del Departamento. Situado a 70 km aproximadamente del casco urbano de la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta.

Limita al norte con Guamal, Castilla La Nueva, San Carlos de Guaroa y Puerto López, al Oriente con Puerto Gaitán, al occidente con Granada, El Castillo, El Dorado y Cubarral, y al sur con Fuente de Oro, Puerto Lleras y Mapiripán.

Las áreas donde se realizará el "**CONTRATO DE OBRA No. 109 DE 2026**" cuyo objeto es "**MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META**", están localizadas en el casco urbano del municipio de San Martin-Meta.

3.1.3 UBICACIÓN DE LA OBRA

Los sectores donde actualmente se adelanta las actividades del proyecto están en la carrera 5 entre las calles 10 y calle 20 del casco urbano.

4. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

4.1 CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA No. 109 DE 2026

Contrato No.	109 de 2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2026000179 del 16 de febrero de 2026
Objeto del Contrato:	MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META
Valor Total del Contrato:	CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($5.278´148.553.00) M/CTE
Nombre Del Contratista:	CONSORCIO CARRERA 5 EG NIT No.902.054.725 - 5 Rep. Legal ESTEFANY GERALDINE TORRES VANEGAS C.C.No.1.006.776.424 de VILLAVICENCIO Meta
Fecha Del Contrato:	TRECE (13) DE ABRIL DE 2026
Nombre Del Supervisor:	ING. JAIRO ABDUL RICO ENCISO
Cargo Del Supervisor:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Plazo De Ejecución:	CINCO (5) MESES
Fecha de Inicio:	07 DE MAYO DE 2026
Fecha de Terminación:	06 DE OCTUBRE DE 2026

4.2 RELACION DE ACTAS

ACTAS / CONTRATOS	FECHA	CAUSAL
Acta de Inicio	07/05/2026	Inicio de Actividades de Obra

4.3 CONTROL DE POLIZAS

INFORMACION DE POLIZAS – CONTRATO DE OBRA

Estas pólizas fueron expedidas en la Compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, siendo asegurado MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META, de la siguiente forma:

SEGÚN CONTRATO DE OBRA

No. de Póliza 360 47 994000064883– Anexo 0

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/04/2026	13/01/2027	$1055,629,710.60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	AMPARA 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL		$1055,629,710.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/04/2026	13/09/2029	$1055,629,710.60

No. De Póliza 360 74 994000014331– Anexo 0

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	13/04/2026	13/09/2026	$700,362,000.00

CONSORCIO CARRERA 5 EC	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	INFORME MENSUAL

SEGÚN ACTA DE INICIO

No. de Póliza 360 47 994000064883 – Anexo 2


AMPAROS	VIGENCIA DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/05/2026	06/02/2027	$1055,629,710.60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	AMPARA 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL		$1055,629,710.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/05/2026	06/10/2029	$1055,629,710.60

No. De Póliza 360 74 994000014331– Anexo 1

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	13/09/2026	06/10/2026	$700,362,000.00

4.4 ORGANIGRAMA GENERAL DEL PROYECTO

En el desarrollo del Proyecto se cuenta con una estructura de dirección con base en la Alcaldía de san Martín de los llanos.

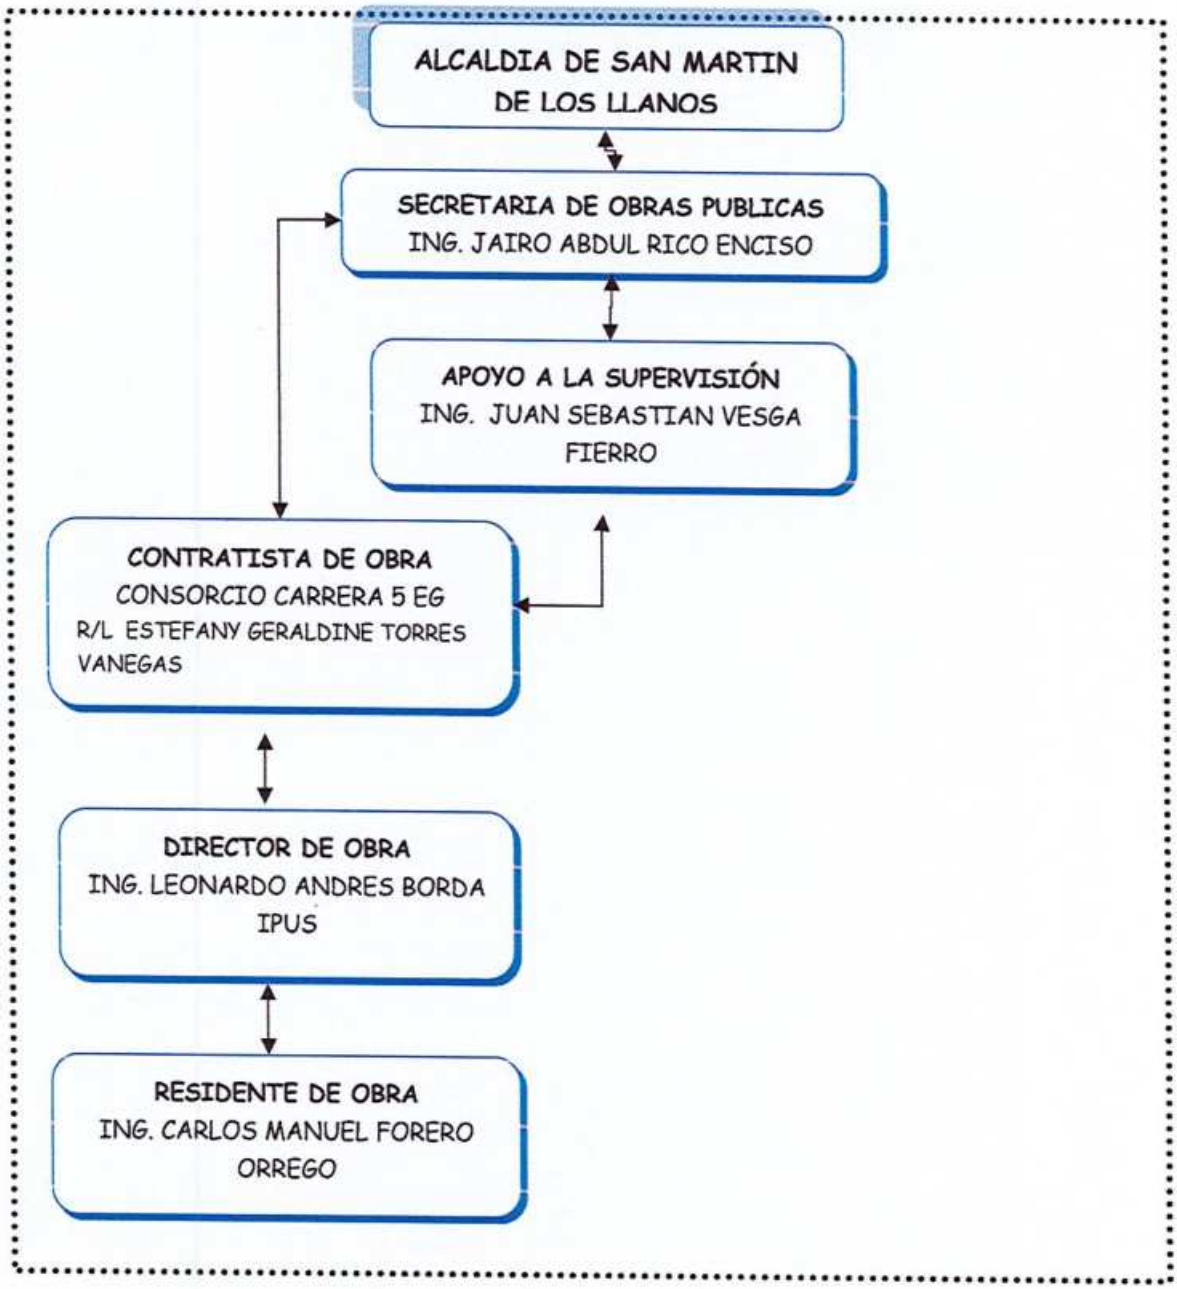

4.5 PERSONAL EN OBRA

PERSONAL PROFESIONAL


No.	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO
1	Ing. LEONARDO ANDRES BORDA IPUS	Director de obra
2	Ing. CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	Ingeniero Residente de obra
3	MARLLY BEJARANO ENCISO.	Profesional en Salud Ocupacional
4	Ing. MARÍA FERNANDA QUEVEDO GUTIERREZ	Especialista hidráulica
5	ING. JAIME ANDRES CAÑON DONCEL	Especialista en vías
6	Ing. PAULA ANDREA PARDO REDONDO	profesional ambiental

PERSONAL TECNICO

No.	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO
1	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	Oficial
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	oficial
3	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	Ayudante de obra
4	CESAR TULIO CESPEDES BAQUERO	Ayudante de obra
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITÁN	Ayudante de obra
6	YEISON ALIRIO HERNÁNDEZ MENDOZA	Ayudante de obra
7	JUAN PABLO MANCERA BEJARANO	Ayudante de obra
8	JUAN DAVID MANRIQUE VASQUEZ	Ayudante de obra
9	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	Ayudante de obra
10	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	Ayudante de obra
11	JHON SEBASTIAN POTES FRANCO	Ayudante de obra
12	LUIS EDILSON PULIDO PEÑA	Ayudante de obra
13	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	almacenista
14	CAROLINA RESTREPO	Ayudante de obra
15	JHON JAIDER RESTREPO MARQUEZ	Ayudante de obra
16	LUIS CARLOS REY OLAYA	Ayudante de obra
17	JHONNY ALEXANDER ROJAS BULLA	Ayudante de obra
18	JOSE UBALDO ROJAS LEON	Ayudante de obra
19	CRISTIAN DAVID SÁNCHEZ RINCÓN	Ayudante de obra
20	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	Ayudante de obra

4.6 PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD Y PARAFISCALES PERSONAL EN OBRA

Se adjunta la planilla de pago de la seguridad social y parafiscal de los trabajadores en el periodo comprendido del mes de JUNIO de 2026.

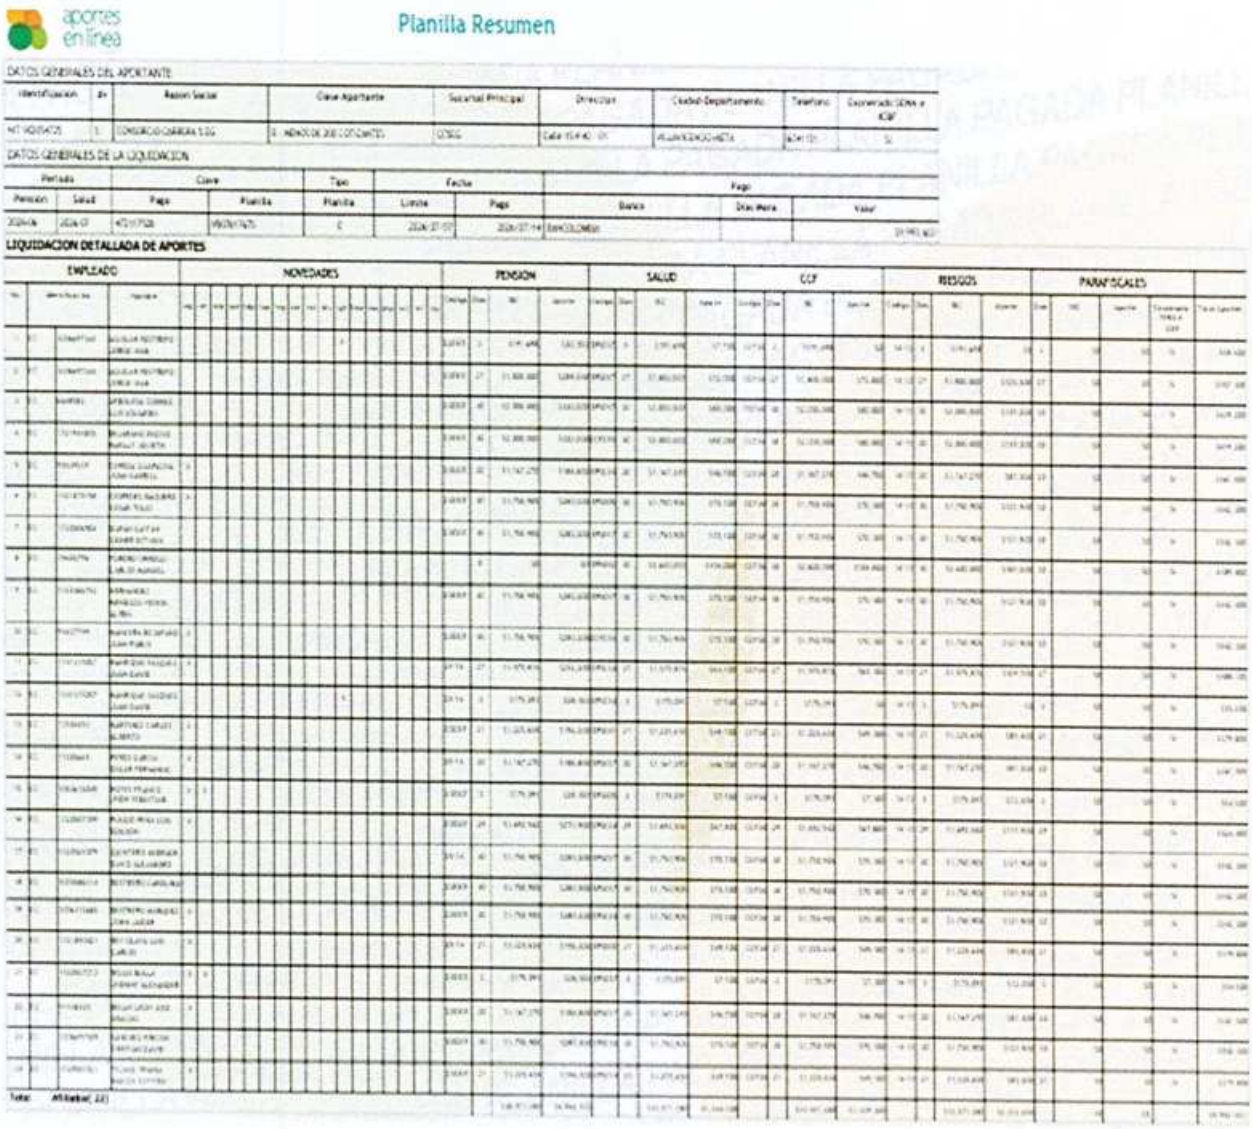

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	D.v.	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901154725	1	CONSORCIO CARRERA 5 EG	1 - APORTE 20 O MAS COTIZANTES	OTROS	Calle 15 # 4C - 01	VILLAVICENCIO-META	6741111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Oficina	Valor
2026-06	2026-07	472117128	1902167475	E	2026-07-07	2026-07-14	BANCOLOMBIA		$1.945.400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.																																													
1	CC	1094977xxx	JAVIER ROMERO GOMEZ																					1	1.000	1	175.400	175.400	1	1.000	1	175.400	175.400	1	1.000	1	175.400	175.400	1	1.000	1	175.400	175.400	1	0	0	0	0
2	CC	1094977xxx	JAVIER ROMERO GOMEZ																					27	27.000	27	4.735.800	4.735.800	27	27.000	27	4.735.800	4.735.800	27	27.000	27	4.735.800	4.735.800	27	27.000	27	4.735.800	4.735.800	27	0	0	0	0
3	CC	1095811	ANDRES FELIPE GOMEZ SUAREZ																					30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	0	0	0	0
4	CC	1121xxxxxx	MAURICIO PEREZ RAMIREZ																					30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	0	0	0	0
5	CC	1122xxxxxx	CARLOS EDUARDO LOPEZ MUÑOZ																					30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	0	0	0	0
6	CC	1123xxxxxx	ANDRES MAURICIO TORRES RUIZ																					30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	0	0	0	0
7	CC	1124xxxxxx	DANIEL SANTIAGO CASTRO VELEZ																					30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	0	0	0	0
8	CC	1125xxxxxx	FABIAN ORTEGA LUNA																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	CC	1126xxxxxx	ADRIANA MARCELA PEREZ TORRES																					30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	0	0	0	0
10	CC	1127xxxxxx	MARTHA ELENA SUAREZ LOPEZ																					30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	0	0	0	0
11	CC	1128xxxxxx	RAMIRO DIAZ VARGAS																					27	27.000	27	4.735.800	4.735.800	27	27.000	27	4.735.800	4.735.800	27	27.000	27	4.735.800	4.735.800	27	27.000	27	4.735.800	4.735.800	27	0	0	0	0
12	CC	1129xxxxxx	JUAN DAVID MORENO CRUZ																					1	1.000	1	175.400	175.400	1	1.000	1	175.400	175.400	1	1.000	1	175.400	175.400	1	1.000	1	175.400	175.400	1	0	0	0	0
13	CC	1130xxxxxx	CAMILO ANDRES RIOS PEÑA																					30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	0	0	0	0
14	CC	1131xxxxxx	DIEGO ALEJANDRO VARGAS MORA																					30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	0	0	0	0
15	CC	1132xxxxxx	LUIS FERNANDO PEREZ TORRES																					1	1.000	1	175.400	175.400	1	1.000	1	175.400	175.400	1	1.000	1	175.400	175.400	1	1.000	1	175.400	175.400	1	0	0	0	0
16	CC	1133xxxxxx	JOSE MANUEL GARCIA RUIZ																					29	29.000	29	5.087.600	5.087.600	29	29.000	29	5.087.600	5.087.600	29	29.000	29	5.087.600	5.087.600	29	29.000	29	5.087.600	5.087.600	29	0	0	0	0
17	CC	1134xxxxxx	CRISTIAN MORALES DIAZ																					30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	0	0	0	0
18	CC	1135xxxxxx	ANDRES FELIPE MORENO																					30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	0	0	0	0
19	CC	1136xxxxxx	DANIEL ALEJANDRO CASTRO LOPEZ																					30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	0	0	0	0
20	CC	1137xxxxxx	MARIO ENRIQUE SUAREZ PEREZ																					27	27.000	27	4.735.800	4.735.800	27	27.000	27	4.735.800	4.735.800	27	27.000	27	4.735.800	4.735.800	27	27.000	27	4.735.800	4.735.800	27	0	0	0	0
21	CC	1138xxxxxx	JOSE LUIS GARCIA MORENO																					1	1.000	1	175.400	175.400	1	1.000	1	175.400	175.400	1	1.000	1	175.400	175.400	1	1.000	1	175.400	175.400	1	0	0	0	0
22	CC	1139xxxxxx	ANDRES FELIPE RUIZ																					30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	0	0	0	0
23	CC	1140xxxxxx	DANIEL SANTIAGO CASTRO VELEZ																					30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	0	0	0	0
24	CC	1141xxxxxx	PEDRO PABLO GOMEZ RIOS																					30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	30.000	30	5.262.000	5.262.000	30	0	0	0	0
Total:		Afiliados: 22																								146.971.000	34.944.400				146.971.000	35.119.400				146.971.000	35.119.400				146.971.000	35.119.400					

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901354725	5	CONSORCIO CARRERA 5 EC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CCSC5	CRA 15 # 40 - 01	VILLAVICENCIO-META	6741121	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Sucursal	Valor
2026-06	2026-07	472117528	95376175	E	2026-07-07	2026-07-14	BANCOLOMBIA		$9,993,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				21	$4,956,700	$0	$4,982,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$943,500	$0	$948,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$2,434,700	$0	$2,447,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,578,500	$0	$1,586,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$2,312,000	$0	$2,323,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	22	$2,312,000	$0	$2,323,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,329,300	$0	$1,336,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	22	$1,329,300	$0	$1,336,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				22	$1,344,100	$0	$1,351,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	6	$374,000	$0	$376,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$0	$70,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$470,500	$0	$473,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$49,100	$0	$49,400
PROTECCER	CCFC55	901,543,211	6	2	$150,100	$0	$150,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$153,100	$0	$153,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$77,200	$0	$77,600
TOTAL				**22**	**$9,942,100**	**$0**	**$9,993,600**

4.7 AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO	CONTRATO DE OBRA No. 109 DE 2026
Valor Proyecto	$5.278´148.553.00
Anticipo	N. A
Avance Financiero	32,52%

4.8 AVANCE FISICO

AVANCE FISICO	CONTRATO DE OBRA No. 109 DE 2026
Valor Inicial Proyecto	$5.278´148.553.00
Valor Actualizado Proyecto	$5.278´148.553.00
Valor ejecutado en el periodo	$ 228.720.112
Porcentaje ejecutado en el periodo	4,34%
Valor Ejecutado acumulado	$ 1.945.277.356,00
Porcentaje Ejecutado acumulado	36,86%

4.9 AVANCE EN TIEMPO

AVANCE EN TIEMPO	CONTRATO DE OBRA No. 109 DE 2026
Tiempo Proyecto Inicial	CINCO (5) MESES
Tiempo de ejecución a la fecha	TRES (3) MESES
Avance Porcentual	60%

4.10 MAQUINARIA Y EQUIPO

TIPO MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1
MINICARGADOR	1
MOTONIVELADORA	1
VIBROCOMPACTADOR	1
HERRAMIENTA MENOR	GL
PLANTA ELÉCTRICA	1
VIBRADOR DE CONCRETO	1
COMPACTADOR MANUAL	2

5974

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	INFORME MENSUAL

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO


Para el presente informe se han ejecutado las siguientes cantidades de obra:

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						II. TOTAL ACUMULADO					
						PROGRAMADO			EJECUTADO		
				TOTAL CONTRATO	$ 5.278.148.553	PROGRAMADO HASTA LA FECHA	$ 2.617.604.552 49,59%		EJECUTADO HASTA LA FECHA		$ 1.947.246.496 36,89%
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR ACTIVIDAD	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	PORCENTAJE ACUMULADO SOBRE EL TOTAL
1.6	**BORDILLOS Y ANDENES**										
1.6.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	576,00	$ 140.000	$ 80.640.000	360,00	$ 50.400.000	62,5%	576,00	$ 80.640.000,00	100,0%
1.6.2	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	216,00	$ 160.000	$ 34.560.000	135,00	$ 21.600.000	62,5%	216,00	$ 34.560.000,00	100,0%
1.6.3	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	1.266,30	$ 165.000	$ 208.939.500	791,44	$ 130.587.188	62,5%	688,00	$ 113.520.000,00	54,3%

5915

5. PROGRAMADO VS EJECUTADO

El avance físico ejecutado en el periodo es del 4,34%, el avance físico acumulado equivale a un 36.86% de obra ejecutada y el avance físico programado acumulado es del 49,59%.

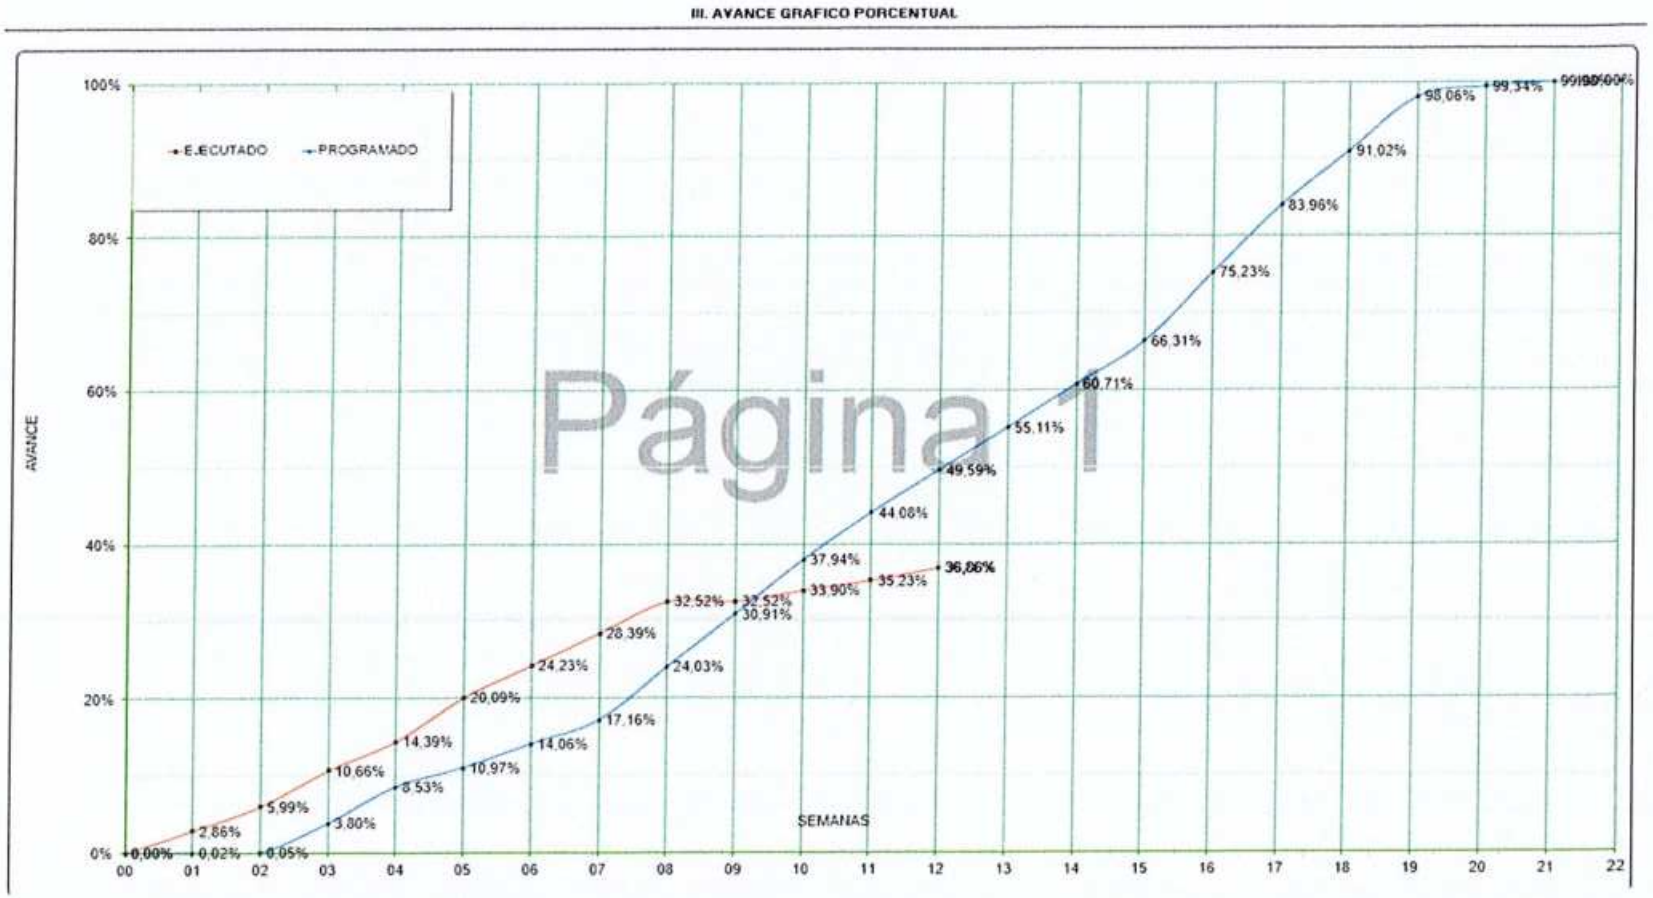

Página 1

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO		
1.6	**BORDILLOS Y ANDENES**	
1.6.1	**BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO**	
1.6.2	**BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO**	

1.6.3	**SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO**	

7. REGISTRO DE LLUVIAS

REGISTRO DE LLUVIAS

No. Contrato: **109 de 2026**

Objeto: **"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"**

JULIO DE 2026

DIA	1			2			3			4			5			6			7			8			9			TOTAL HORAS LLUVIA
*	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	
HORAS				2	2	3													1	1				2				11,00
DIA	10			11			12			13			14			15			16			17			18			
*	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	
HORAS												2	1	2							3	2		3	1			14,00
DIA	19			20			21			22			23			24			25			26			27			
*	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	
HORAS											1	2	1	2				2			2	1					1	12,00
DIA	28			29			30			31																		
*	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N																
HORAS				2				1																				3,00
																											TOTAL HORAS LLUVIA EN EL MES=	40,00
																											TOTAL DIAS LLUVIA EN EL MES=	5

REGISTRO DE LLUVIAS

No. Contrato: **109 de 2026**

Objeto: **"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"**

AGOSTO DE 2026

DIA	1			2			3			4			5			6			7			8			9			TOTAL HORAS LLUVIA
*	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	
HORAS						2																						2,00
DIA	10			11			12			13			14			15			16			17			18			
*	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	
HORAS																												0,00
DIA	19			20			21			22			23			24			25			26			27			
*	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	
HORAS																												0,00
DIA	28			29			30			31																		
*	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N																
HORAS																												0,00
TOTAL HORAS LLUVIA EN EL MES=																												2,00
TOTAL DIAS LLUVIA EN EL MES=																												0

8. ENSAYOS DE LABORATORIO

Anexo resultados de los ensayos de laboratorio realizados en el periodo para la construcción de sardineles prefabricados y para la caracterización de subbase granular.

9. CONCLUSIONES

Durante el periodo correspondiente se ejecutó el 4,34 % de las actividades contratadas, alcanzando un porcentaje de ejecución acumulada del 36,86 %, frente al 49,59 % programado para el mismo periodo, presentándose una diferencia de 12,73 puntos porcentuales respecto a la programación contractual.

El atraso presentado se encuentra asociado principalmente a la ejecución de reprocesos derivados de fallos identificados durante el desarrollo de las actividades en diferentes sectores de la obra, los cuales han requerido actividades adicionales de excavación, retiro de material, adecuación y posterior conformación de las zonas afectadas, con el fin de garantizar las condiciones técnicas requeridas para la construcción de la estructura vial. Entre los sectores intervenidos se encuentran las áreas correspondientes a Calle 13 (K0+382,49–K0+392,49), Calle 14 (K0+514,99–K0+524,99), Calle 15 (K0+574,13–K0+584,13), Calle 16 (K0+701,10–K0+711,10) y Calle 17 (K0+803,52–K0+815,35), donde se han presentado condiciones que han requerido la ejecución de dichos reprocesos.

De igual manera, en las intersecciones viales sobre la Carrera 5, particularmente en los sectores correspondientes a las calles 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, se han desarrollado actividades de intervención y adecuación que han incidido en los rendimientos previstos inicialmente, debido a las condiciones encontradas durante la ejecución y a la necesidad de garantizar la correcta conformación de las áreas intervenidas antes de continuar con las actividades posteriores.

Adicionalmente, durante el periodo se presentaron jornadas con condiciones climáticas adversas, principalmente lluvias, que afectaron el desarrollo normal de las actividades programadas, especialmente aquellas relacionadas con excavaciones, conformación y compactación de materiales y demás actividades que requieren condiciones adecuadas de humedad y estabilidad del terreno. En estos casos fue necesario suspender o reprogramar temporalmente las actividades, con el propósito de evitar afectaciones en la calidad de los trabajos ejecutados y garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

En consecuencia, aunque se presenta un desfase frente a la programación prevista, este se encuentra relacionado principalmente con las condiciones encontradas durante

la ejecución, los reprocesos necesarios para corregir los fallos identificados y las restricciones ocasionadas por las condiciones climáticas durante algunas jornadas de trabajo. Estas situaciones han incidido en los rendimientos previstos para el periodo; no obstante, se ha priorizado la correcta ejecución técnica y la calidad de las actividades sobre el cumplimiento estricto de los rendimientos inicialmente programados.

LEONARDO ANDRES BORDA IPUS
DIRECTOR DE OBRA

5921

ESTADO DEL TIEMPO

7. REGISTRO DE LLUVIAS

REGISTRO DE LLUVIAS

No. Contrato: **109 de 2026**

Objeto: **"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"**

JULIO DE 2026

DIA	1			2			3			4			5			6			7			8			9			TOTAL HORAS LLUVIA
*	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	
HORAS				2	2	3													1	1				2				11,00
DIA	10			11			12			13			14			15			16			17			18			
*	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	
HORAS												2	1	2							3	2		3	1			14,00
DIA	19			20			21			22			23			24			25			26			27			
*	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	
HORAS											1	2	1	2				2			2	1					1	12,00
DIA	28			29			30			31																		
*	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N																
HORAS				2				1																				3,00

TOTAL HORAS LLUVIA EN EL MES=	40,00
TOTAL DIAS LLUVIA EN EL MES=	5

REGISTRO DE LLUVIAS

No. Contrato: **109 de 2026**

Objeto: **"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"**

AGOSTO DE 2026

DIA	1			2			3			4			5			6			7			8			9			TOTAL HORAS LLUVIA
*	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	
HORAS						2																						2,00
DIA	10			11			12			13			14			15			16			17			18			
*	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	
HORAS																												0,00
DIA	19			20			21			22			23			24			25			26			27			
*	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	
HORAS																												0,00
DIA	28			29			30			31																		
*	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N																
HORAS																												0,00

TOTAL HORAS LLUVIA EN EL MES=	2,00
TOTAL DIAS LLUVIA EN EL MES=	0

5923

BITACORA DE OBRA

5924

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	7	7	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA MAÑANA Y EN LA TARDE
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 20 A LA CALLE 19 DE LA ABSCISA K1+053 A LA ABSCISA K0+973 COSTADO DERECHO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 20 A LA CALLE 19 DE LA ABSCISA K1+053 A LA ABSCISA K0+973 COSTADO DERECHO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 20 A LA CALLE 19 DE LA ABSCISA K1+053 A LA ABSCISA K0+973 COSTADO DERECHO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

5925

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	8	7	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA NOCHE
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 20 A LA CALLE 19 DE LA ABSCISA K1+053 A LA ABSCISA K0+973 COSTADO DERECHO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 20 A LA CALLE 19 DE LA ABSCISA K1+053 A LA ABSCISA K0+973 COSTADO DERECHO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 20 A LA CALLE 19 DE LA ABSCISA K1+053 A LA ABSCISA K0+973 COSTADO DERECHO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

5926

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	9	7	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 20 A LA CALLE 19 DE LA ABSCISA K1+053 A LA ABSCISA K0+973 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 20 A LA CALLE 19 DE LA ABSCISA K1+053 A LA ABSCISA K0+973 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 20 A LA CALLE 19 DE LA ABSCISA K1+053 A LA ABSCISA K0+973 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

5927

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	10	7	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACIÓN TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISIÓN	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 20 A LA CALLE 19 DE LA ABSCISA K1+053 A LA ABSCISA K0+973 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 20 A LA CALLE 19 DE LA ABSCISA K1+053 A LA ABSCISA K0+973 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 20 A LA CALLE 19 DE LA ABSCISA K1+053 A LA ABSCISA K0+973 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

5928

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	11	7	2026	7:30:00 a. m.	12:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACIÓN TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 19 A LA CALLE 18 DE LA ABSCISA K0+885 A LA ABSCISA K0+960 COSTADO DERECHO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 19 A LA CALLE 18 DE LA ABSCISA K0+885 A LA ABSCISA K0+960 COSTADO DERECHO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 19 A LA CALLE 18 DE LA ABSCISA K0+885 A LA ABSCISA K0+960 COSTADO DERECHO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

5929

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	12	7	2026		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

DOMINGO NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

5930.

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	13	7	2026		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA NOCHE
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

LUNES FESTIVO NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

5931

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	14	7	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA MAÑANA Y EN LA TARDE
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 19 A LA CALLE 18 DE LA ABSCISA K0+885 A LA ABSCISA K0+960 COSTADO DERECHO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 19 A LA CALLE 18 DE LA ABSCISA K0+885 A LA ABSCISA K0+960 COSTADO DERECHO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 19 A LA CALLE 18 DE LA ABSCISA K0+885 A LA ABSCISA K0+960 COSTADO DERECHO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

5932

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	15	7	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 19 A LA CALLE 18 DE LA ABSCISA K0+885 A LA ABSCISA K0+960 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 19 A LA CALLE 18 DE LA ABSCISA K0+885 A LA ABSCISA K0+960 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 19 A LA CALLE 18 DE LA ABSCISA K0+885 A LA ABSCISA K0+960 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante las actividades de seguimiento y control de la estructura vial, posterior a la ejecución de la excavación y colocación del material granular de 3", se evidencia la presencia de un fallo en la capa conformada, aproximadamente entre las abscisas K0+514,99 y K0+524,99, con una longitud de 10,00 m. Debido a la condición identificada, se requiere realizar el retiro del material afectado y efectuar nuevamente las actividades de adecuación y conformación del sector, generando un reproceso previo a la continuidad de las actividades posteriores.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

5933

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	16	7	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA NOCHE
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 19 A LA CALLE 18 DE LA ABSCISA K0+885 A LA ABSCISA K0+960 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 19 A LA CALLE 18 DE LA ABSCISA K0+885 A LA ABSCISA K0+960 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 19 A LA CALLE 18 DE LA ABSCISA K0+885 A LA ABSCISA K0+960 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

En el sector de la intersección de la Carrera 5 con Calle 11, entre las abscisas K0+102,15 y K0+118,97, se realizan apiques exploratorios con el propósito de establecer las condiciones del material existente. Como resultado de la exploración se evidencia la necesidad de mejorar y/o sustituir el material que presenta condiciones desfavorables,

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

5934

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	17	7	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA MAÑANA Y EN LA NOCHE
TORMENTA				
LLUVIOSO	X		X	
SOLEADO		X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
ORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 18 A LA CALLE 17 DE LA ABSCISA K0+860 A LA ABSCISA K0+760 COSTADO DERECHO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 18 A LA CALLE 17 DE LA ABSCISA K0+860 A LA ABSCISA K0+760 COSTADO DERECHO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 18 A LA CALLE 17 DE LA ABSCISA K0+860 A LA ABSCISA K0+760 COSTADO DERECHO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Debido a los fallos presentados en puntos localizados de la estructura vial en la intersección de la Carrera 5 con Calle 12, entre las abscisas K0+229,69 y K0+249,02, se ejecutan apiques exploratorios para verificar las condiciones del material existente y determinar la causa del comportamiento desfavorable observado.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

5935

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	18	7	2026	7:30:00 a. m.	12:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA MAÑANA
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO		X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 18 A LA CALLE 17 DE LA ABSCISA K0+860 A LA ABSCISA K0+760 COSTADO DERECHO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 18 A LA CALLE 17 DE LA ABSCISA K0+860 A LA ABSCISA K0+760 COSTADO DERECHO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 18 A LA CALLE 17 DE LA ABSCISA K0+860 A LA ABSCISA K0+760 COSTADO DERECHO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

En la intersección con la Calle 13, entre las abscisas K0+339,54 y K0+353,12, se realizan apiques exploratorios con el fin de verificar las condiciones de las capas que conforman la estructura. La exploración permite identificar condiciones desfavorables del material, por lo que se determina la necesidad de realizar mejoramiento y/o reemplazo del material afectado, generando actividades adicionales y reprocesos en el sector.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

5936.

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	19	7	2026		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoría N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoría	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

DOMINGO NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

5937

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	20	7	2026		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA NOCHE
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

LUNES FESTIVO NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

5938

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	21	7	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoría N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoría	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUBBASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE ACOPIO DE MATERIAL DE LA CALLE 20 A LA CALLE 19 DE LA ABSCISA K1+053 A LA ABSCISA K0+973	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 18 A LA CALLE 17 DE LA ABSCISA K0+860 A LA ABSCISA K0+760 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 18 A LA CALLE 17 DE LA ABSCISA K0+860 A LA ABSCISA K0+760 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 18 A LA CALLE 17 DE LA ABSCISA K0+860 A LA ABSCISA K0+760 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

5939.

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	22	7	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA TARDE Y EN LA NOCHE
TORMENTA				
LLUVIOSO		X	X	
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUBBASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE ACOPIO DE MATERIAL DE LA CALLE 20 A LA CALLE 19 DE LA ABSCISA K1+053 A LA ABSCISA K0+973	SI	SI
ORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 18 A LA CALLE 17 DE LA ABSCISA K0+860 A LA ABSCISA K0+760 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 18 A LA CALLE 17 DE LA ABSCISA K0+860 A LA ABSCISA K0+760 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 18 A LA CALLE 17 DE LA ABSCISA K0+860 A LA ABSCISA K0+760 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Una vez ejecutada la excavación correspondiente y colocado el material granular de 3", durante la verificación de la capa se evidencia un fallo en el sector comprendido aproximadamente entre las abscisas K0+574,13 y K0+584,13, con una longitud de 10,00 m. Se requiere intervenir el área afectada mediante retiro del material que presenta la condición desfavorable, seguido de la adecuación y nueva conformación del sector, con el propósito de garantizar las condiciones técnicas necesarias para continuar con la estructura vial.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

5140

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	23	7	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA MAÑANA Y EN LA TARDE
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUBBASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE ACOPIO DE MATERIAL DE LA CALLE 19 A LA CALLE 18 DE LA ABSCISA K0+885 A LA ABSCISA K0+960	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 17 A LA CALLE 16 DE LA ABSCISA K0+735 A LA ABSCISA K0+655 COSTADO DERECHO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 17 A LA CALLE 16 DE LA ABSCISA K0+735 A LA ABSCISA K0+655 COSTADO DERECHO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 17 A LA CALLE 16 DE LA ABSCISA K0+735 A LA ABSCISA K0+655 COSTADO DERECHO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

entre las abscisas K0+450,62 y K0+457,58, se realizan apiques exploratorios para determinar las condiciones del material existente. Como resultado se evidencia la necesidad de intervenir el material que presenta condiciones desfavorables y realizar su correspondiente mejoramiento, antes de continuar con las actividades posteriores de la estructura vial.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

5941

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	24	7	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoría N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoría	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA NOCHE
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUBBASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE ACOPIO DE MATERIAL DE LA CALLE 19 A LA CALLE 18 DE LA ABSCISA K0+885 A LA ABSCISA K0+960	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 17 A LA CALLE 16 DE LA ABSCISA K0+735 A LA ABSCISA K0+655 COSTADO DERECHO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 17 A LA CALLE 16 DE LA ABSCISA K0+735 A LA ABSCISA K0+655 COSTADO DERECHO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 17 A LA CALLE 16 DE LA ABSCISA K0+735 A LA ABSCISA K0+655 COSTADO DERECHO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

5942

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	25	7	2026	7:30:00 a. m.	12:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA NOCHE
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUBBASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE ACOPIO DE MATERIAL DE LA CALLE 18 A LA CALLE 17 DE LA ABSCISA K0+860 A LA ABSCISA K0+760	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 17 A LA CALLE 16 DE LA ABSCISA K0+735 A LA ABSCISA K0+655 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 17 A LA CALLE 16 DE LA ABSCISA K0+735 A LA ABSCISA K0+655 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 17 A LA CALLE 16 DE LA ABSCISA K0+735 A LA ABSCISA K0+655 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

En la intersección de la Carrera 5 con Calle 15, entre las abscisas K0+542,46 y K0+550,31, se ejecutan apiques exploratorios para establecer las condiciones del material existente.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:			

5943

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	26	7	2026		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoría N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoría	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA MAÑANA
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO		X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

DOMINGO NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

5944

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	27	7	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA NOCHE
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 17 A LA CALLE 16 DE LA ABSCISA K0+735 A LA ABSCISA K0+655 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 17 A LA CALLE 16 DE LA ABSCISA K0+735 A LA ABSCISA K0+655 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 17 A LA CALLE 16 DE LA ABSCISA K0+735 A LA ABSCISA K0+655 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

5945

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	28	7	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUBBASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE ACOPIO DE MATERIAL DE LA CALLE 17 A LA CALLE 16 DE LA ABSCISA K0+735 A LA ABSCISA K0+655	SI	SI
RDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+635 A LA ABSCISA K0+560 COSTADO DERECHO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+635 A LA ABSCISA K0+560 COSTADO DERECHO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+635 A LA ABSCISA K0+560 COSTADO DERECHO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Debido a los fallos presentados en puntos específicos de la estructura vial en la intersección con la Calle 16, entre las abscisas K0+641,398 y K0+660,89, se realizan apiques exploratorios para verificar las condiciones del material existente.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

5146

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	29	7	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoría N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoría	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA MAÑANA
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO		X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUBBASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE ACOPIO DE MATERIAL DE LA CALLE 17 A LA CALLE 16 DE LA ABSCISA K0+735 A LA ABSCISA K0+655	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+635 A LA ABSCISA K0+560 COSTADO DERECHO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+635 A LA ABSCISA K0+560 COSTADO DERECHO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+635 A LA ABSCISA K0+560 COSTADO DERECHO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

5947

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	29	7	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoría N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoría	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA MAÑANA
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO		X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUBBASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE ACOPIO DE MATERIAL DE LA CALLE 17 A LA CALLE 16 DE LA ABSCISA K0+735 A LA ABSCISA K0+655	SI	SI
RDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+635 A LA ABSCISA K0+560 COSTADO DERECHO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+635 A LA ABSCISA K0+560 COSTADO DERECHO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+635 A LA ABSCISA K0+560 COSTADO DERECHO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante el seguimiento a la estructura vial, y posterior a las actividades de excavación y colocación del material granular de 3", se identifica un fallo en la capa conformada en el sector comprendido aproximadamente entre las abscisas K0+701,10 y K0+711,10, con una longitud de 10,00 m. Se determina la necesidad de ejecutar un reproceso en el área afectada, consistente en el retiro del material comprometido, adecuación del sector y posterior reconformación, antes de continuar con las actividades previstas.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

5943

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	30	7	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA TARDE
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUBBASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE ACOPIO DE MATERIAL DE LA CALLE 17 A LA CALLE 16 DE LA ABSCISA K0+735 A LA ABSCISA K0+655	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+635 A LA ABSCISA K0+560 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+635 A LA ABSCISA K0+560 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+635 A LA ABSCISA K0+560 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Entre las abscisas K0+743,89 y K0+750,74, se ejecutan apiques exploratorios para determinar las condiciones de los materiales existentes y establecer las acciones requeridas para su recuperación.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHÒN FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

5949

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	31	7	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA MAÑANA
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO		X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
OTRO	1	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUBBASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE ACOPIO DE MATERIAL DE LA CALLE 17 A LA CALLE 16 DE LA ABSCISA K0+735 A LA ABSCISA K0+655	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+635 A LA ABSCISA K0+560 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+635 A LA ABSCISA K0+560 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+635 A LA ABSCISA K0+560 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

5950

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	1	8	2026	7:30:00 a. m.	12:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+560 A LA ABSCISA K0+430 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+560 A LA ABSCISA K0+430 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+560 A LA ABSCISA K0+430 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

5951

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	2	8	2026		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoría N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoría	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA MAÑANA Y EN LA TARDE
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

DOMINGO NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

5952

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	3	8	2026	7:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACIÓN TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+560 A LA ABSCISA K0+430 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+560 A LA ABSCISA K0+430 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+560 A LA ABSCISA K0+430 COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
SUBBASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

En la intersección con la Calle 18, entre las abscisas K0+864,15 y K0+871,06, se realizan apiques exploratorios con el fin de verificar las condiciones de los materiales que conforman la estructura.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

5953

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	4	8	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoría N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+430 A LA ABSCISA K0390+ COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+430 A LA ABSCISA K0390+ COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+430 A LA ABSCISA K0390+ COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
SUBBASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la verificación de la estructura vial, una vez ejecutada la excavación y colocada la capa de material granular de 3", se evidencia un fallo en el sector localizado aproximadamente entre las abscisas K0+803,52 y K0+815,35, con una longitud aproximada de 11,83 m.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274751 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

5954

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	5	8	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+430 A LA ABSCISA K0390+ COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+430 A LA ABSCISA K0390+ COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+430 A LA ABSCISA K0390+ COSTADO IZQUIERDO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Debido a los fallos evidenciados en puntos localizados de la vía en la intersección con la Calle 19, entre las abscisas K0+964,41 y K0+971,41, se realizan apiques exploratorios para determinar las condiciones del material existente.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

5955

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	109 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	6	8	2026	7:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Contratista	CONSORCIO INTERVIAL URBANO SAN MARTIN 2026
Contrato Obra N°	109 DE 2026	Contrato Interventoria N°	111 DE 2026
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"	Objeto Interventoria	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META" EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META".
Tiempo de Ejecución	5 MESES	Tiempo de Ejecución	5 MESES

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA				ESTACION TOTAL	1	
MAESTRO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
OPERARIO	5	SI		HERRAMIENTA MENOR		
AYUDANTE	15	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		MINICARGADOR	1	
CADENERO	1	SI		MEZCLADORA DE CONCRETO	1	
OTRO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	1	
				VIBROCOMPACTADOR	1	
				MOTONIVELADORA	1	
				VIBRADOR DE CONCRETO	1	
				VOLQUETAS	10	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+430 A LA ABSCISA K0390+ COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+430 A LA ABSCISA K0390+ COSTADO IZQUIERDO	SI	SI
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LA CALLE 16 A LA CALLE 15 DE LA ABSCISA K0+430 A LA ABSCISA K0390+ COSTADO IZQUIERDO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
CARLOS MANUEL FORERO ORREGO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-41733 CND	
JHON FREDY GONZALEZ BARRERA	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202-274761 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

REGISTRO DE LLUVIAS

5956

No. Contrato: **109 de 2026**

Objeto: **"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10-20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"**

AGOSTO DE 2026

DIA	1			2			3			4			5			6			7			8			9			TOTAL HORAS LLUVIA
*	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	9,00
HORAS						2	1	2	1			2	1															
DIA	10			11			12			13			14			15			16			17			18			
*	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	0,00
HORAS																												
DIA	19			20			21			22			23			24			25			26			27			
*	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N	0,00
HORAS																												
DIA	28			29			30			31																		
*	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N																0,00
HORAS																												
																											TOTAL HORAS LLUVIA EN EL MES=	9,00
																											TOTAL DIAS LLUVIA EN EL MES=	1

M: MAÑANA 6:00 A.M A 12:00 M

T: TARDE 12:00 M A 6:00 P.M.

N: NOCHE 6:00 P.M. A 6:00 A.M.

DIAS FERIADOS

Ing. CARLOS MANUEL FORERO ORREGO
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202 – 41733 CND

5957

CONSORCIO CARRERA 5 EG

INFORME HIDRÁULICO MES DE JULIO DE 2026

N° 3

"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"

Informe Hidráulico Del Contrato De Obra No. 109 De 2026

Periodo Comprendido Entre El 07 De Julio De 2026 Hasta El Día 06 De Agosto De 2026.

INDICE

1. INTRODUCCION 3
2. OBJETIVOS 3
3. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO 4
3.1 DESCRIPCION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO 4
3.1.1 DESCRIPCION 4
3.1.2 LOCALIZACIÓN 4
4. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL 5
4.1 CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA 5
No. 109 DE 2026 5
7. CONTROL TÉCNICO Y CRITERIOS DE EJECUCIÓN 7
CONCLUSIONES 8
REGISTRO FOTOGRÁFICO 9

1. INTRODUCCION

El presente informe hidráulico consolida el seguimiento técnico efectuado durante el periodo reportado al componente de drenaje superficial de la Obra No. 109 de 2026, cuyo objeto corresponde al "***MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META***". Durante este periodo, la actividad constructiva con incidencia directa sobre el comportamiento hidráulico de la vía correspondió a la instalación de bordillos en los sectores intervenidos.

En calidad de especialista en Ingeniería Hidráulica y Ambiental, se realizó acompañamiento y verificación técnica a la disposición de estos elementos, considerando su función dentro del drenaje superficial de la vía. El seguimiento se orientó a comprobar que la sección transversal, los niveles de los bordillos y las pendientes superficiales permitieran conducir adecuadamente la escorrentía de aguas lluvias hacia los sumideros del sistema pluvial, evitando depresiones, empozamientos o trayectorias de flujo no previstas.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Reportar el seguimiento hidráulico mensual realizado durante la instalación de bordillos, verificando que la conformación de la sección vial, los niveles y las pendientes superficiales favorezcan la adecuada conducción de las aguas de escorrentía hacia los sumideros dispuestos a lo largo del corredor vial.

Objetivos específicos

- Verificar la correcta instalación, alineamiento, continuidad y niveles de los bordillos ejecutados durante el periodo.
- Comprobar que la sección transversal de la vía mantenga una configuración favorable para el escurrimiento superficial de las aguas lluvias hacia los bordes de la calzada.
- Revisar la relación entre los niveles de la calzada, los bordillos y los sumideros, procurando que la escorrentía sea dirigida hacia los puntos de captación previstos.

• Identificar posibles depresiones, contrapendientes o discontinuidades que puedan generar acumulaciones de agua o afectar la continuidad del drenaje superficial.
• Dejar registro del seguimiento técnico realizado desde la especialidad hidráulica y formular recomendaciones para conservar la funcionalidad del sistema durante las etapas posteriores de construcción.

3. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

3.1 DESCRIPCION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO

3.1.1 DESCRIPCION

El contrato contempla el ***"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META".***

3.1.2 LOCALIZACIÓN

El Municipio de San Martin (Meta), se encuentra localizado en la parte centro oriental del territorio colombiano, a 3°41'49" latitud Norte 73°41'55" Longitud Oriente del meridiano de Greenwich. En extensión, ocupa el 6.959% del territorio del Departamento. Situado a 70 km aproximadamente del casco urbano de la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta.
Limita al norte con Guamal, Castilla La Nueva, San Carlos de Guaroa y Puerto López, al Oriente con Puerto Gaitán, al occidente con Granada, El Castillo, El Dorado y Cubarral, y al sur con Fuente de Oro, Puerto Lleras y Mapiripán.
Las áreas donde se realizará el ***"CONTRATO DE OBRA No. 109 DE 2026" cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META",*** están localizadas en el casco urbano del municipio de San Martin-Meta.

4. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL

4.1 CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA No. 109 DE 2026

Contrato No.	109 De 2026
Certificado De Disponibilidad Presupuestal	2026000179 Del 16 De Febrero De 2026
Objeto Del Contrato:	Mejoramiento De La Carrera 5 Entre Calles 10 A 20 Del Municipio De San Martin, Meta
Valor Total Del Contrato:	Cinco Mil Doscientos Setenta Y Ocho Millones Ciento Cuarenta Y Ocho Mil Quinientos Cincuenta Y Tres Pesos ($5.278´148.553.00) M/Cte
Nombre Del Contratista:	CONSORCIO CARRERA 5 EG Nit No.902.054.725 - 5 Rep. Legal Stefany Geraldin Torres Vanegas.
Fecha Del Contrato:	Trece (13) De Abril De 2026
Nombre Del Supervisor:	Ing. Jairo Abdul Rico Enciso
Cargo Del Supervisor:	Secretaria De Obras Publicas
Plazo De Ejecución:	Cinco (5) Meses
Fecha De Inicio:	07 De Mayo De 2026
Fecha De Terminación:	06 De Octubre De 2026

5. MARCO NORMATIVO Y TÉCNICO DE REFERENCIA

El seguimiento hidráulico se desarrolló tomando como referencia el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS, adoptado mediante la Resolución 0330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y modificado, entre otras disposiciones, por la Resolución 0799 de 2021. Para el análisis del drenaje superficial vial también se consideraron los criterios técnicos del Manual de Drenaje para Carreteras del INVÍAS,

particularmente los relacionados con el efecto de las pendientes longitudinal y transversal sobre la trayectoria de la escorrentía superficial.

La aplicación de estos referentes se complementó con los planos aprobados del proyecto, las instrucciones de la interventoría o supervisión y las condiciones reales observadas en campo. El control realizado se concentró en verificar la interacción entre la sección de la vía, los bordillos y los puntos de captación, de manera que el agua superficial pueda desplazarse por gravedad hacia los sumideros sin generar zonas de empozamiento.

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el periodo reportado, la actividad constructiva relacionada con el componente de drenaje superficial correspondió a la instalación de bordillos. Desde la especialidad hidráulica se efectuó seguimiento a estos elementos y a la conformación de la sección vial, verificando su incidencia sobre la trayectoria de las aguas lluvias hacia los sumideros previamente dispuestos en el corredor.

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
Instalación de bordillos	Se realizó seguimiento a la instalación de bordillos en los sectores intervenidos, verificando su alineamiento, continuidad y niveles respecto de la sección vial. Estos elementos contribuyen al confinamiento lateral de la escorrentía y a su direccionamiento hacia los puntos de captación.
Verificación de la sección transversal	Se revisó la conformación transversal de la vía con el fin de comprobar que la superficie favoreciera el desplazamiento del agua desde la calzada hacia sus bordes y posteriormente hacia los sumideros, sin generar depresiones o zonas susceptibles a empozamiento.

Control de niveles y pendientes superficiales	Se verificó la correspondencia entre los niveles de la superficie vial y los bordillos, revisando la continuidad de las pendientes superficiales para evitar contrapendientes o interrupciones en la trayectoria prevista de la escorrentía.
Revisión de conducción hacia sumideros	Se inspeccionó la relación hidráulica entre la sección vial, los bordillos y los sumideros existentes/construidos previamente, verificando que la escorrentía superficial pueda ser dirigida hacia los puntos de captación del sistema pluvial.

7. CONTROL TÉCNICO Y CRITERIOS DE EJECUCIÓN

Durante la ejecución de los bordillos se realizó seguimiento técnico desde la especialidad hidráulica, orientado a verificar que la geometría superficial de la vía mantuviera condiciones adecuadas para la evacuación de las aguas lluvias. La revisión se concentró en la interacción entre pendientes, niveles de bordillos y localización de sumideros, teniendo en cuenta los siguientes criterios de control:

- Verificación del alineamiento, continuidad y niveles de los bordillos instalados, evitando quiebres o irregularidades que puedan interrumpir la conducción superficial del agua.

- Revisión de la sección transversal de la vía, comprobando que su configuración permita conducir la escorrentía desde la calzada hacia los bordes y los puntos de captación.

- Control de las pendientes superficiales en los sectores intervenidos, identificando posibles depresiones o contrapendientes que puedan favorecer la acumulación de aguas lluvias.

- Verificación de la correspondencia entre las cotas de la superficie vial, los bordillos y los sumideros, buscando asegurar que el flujo superficial alcance adecuadamente las estructuras de captación.
- Seguimiento a la continuidad hidráulica del drenaje superficial, procurando que los bordillos orienten la escorrentía hacia los sumideros sin crear barreras, puntos muertos o cambios desfavorables en la trayectoria del flujo.

• Recomendación de mantener libres de material de obra, residuos y sedimentos las zonas próximas a los sumideros y de conservar los niveles verificados durante la ejecución de las capas y acabados finales de la vía.

CONCLUSIONES

• Durante el periodo reportado, la actividad constructiva con incidencia directa sobre el componente hidráulico correspondió a la instalación de bordillos, por lo cual el seguimiento de la especialidad se concentró en verificar su correcta disposición y su interacción con la geometría superficial de la vía.

• Se verificaron el alineamiento, continuidad y niveles de los bordillos, así como la conformación de la sección vial, evidenciando la necesidad de conservar pendientes que permitan orientar la escorrentía superficial hacia los sumideros y evitar la formación de zonas de empozamiento.

• Se recomienda mantener el control topográfico de cotas y pendientes durante la ejecución de las capas y acabados finales, y realizar una verificación final de continuidad hidráulica entre la superficie de rodadura, los bordillos y los sumideros antes de la puesta en servicio del corredor vial.

REGISTRO FOTOGRÁFICO









MARÍA FERNANDA QUEVEDO GUTIÉRREZ
Esp. En Ingeniería Hidráulica y Ambiental
M.P 25202-314639 CND

5966

CONSORCIO CARRERA 5 EG

INFORME ESPECIALISTA EN VIAS

"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"

Contrato de Obra No. 109 de 2026



7 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2026

INDICE

1. INTRODUCCION 3
2. DESCRIPCION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO 3
2.1.1 DESCRIPCION 3
2.1.2 LOCALIZACION 4
3. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL 4
3.1 CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA 4
No. 109 DE 2026 4
4. OBJETO 5
5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 6
6. SEGUIMIENTO A LA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y SARDINELES 6
7. RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL MATERIAL DE SUBBASE 8
8. CONTROL Y SEGUIMIENTO TÉCNICO 9
9. CONCLUSIONES 9

1. INTRODUCCION

El presente informe tiene como finalidad presentar las actividades de seguimiento, acompañamiento y verificación técnica desarrolladas durante el mes de julio de 2026, en el marco del proyecto **"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META"**, correspondiente al Contrato de Obra No. 109 de 2026.

Durante el periodo objeto del presente informe, las actividades desarrolladas en el componente vial estuvieron principalmente relacionadas con la instalación de bordillos y sardineles prefabricados en diferentes sectores del proyecto, realizando el seguimiento a los trabajos ejecutados, su ubicación y las condiciones generales del proceso constructivo.

De igual manera, se realizó el acompañamiento a la recepción de material de subbase en obra, efectuando la revisión y verificación de sus condiciones y del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto, como parte de las actividades de control de calidad de los materiales destinados a las obras viales.

En este sentido, el informe consolida las principales actividades objeto de seguimiento durante el periodo, identificando los sectores y abscisas intervenidos, las verificaciones técnicas realizadas y las observaciones derivadas del acompañamiento efectuado por el Especialista de Vías, con el propósito de contribuir al adecuado desarrollo y control de las actividades contempladas dentro del componente vial del proyecto.

2. DESCRIPCION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO

2.1.1 DESCRIPCION

El contrato contempla el "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META".

2.1.2 LOCALIZACION

El Municipio de San Martin (Meta), se encuentra localizado en la parte centro oriental del territorio colombiano, a 3°41'49" latitud Norte 73°41'55" Longitud Oriente del meridiano de Greenwich. En extensión, ocupa el 6.959% del territorio del Departamento. Situado a 70 km aproximadamente del casco urbano de la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta.

Limita al norte con Guamal, Castilla La Nueva, San Carlos de Guaroa y Puerto López, al Oriente con Puerto Gaitán, al occidente con Granada, El Castillo, El Dorado y Cubarral, y al sur con Fuente de Oro, Puerto Lleras y Mapiripán.

Las áreas donde se realizará el **"CONTRATO DE OBRA No. 109 DE 2026"** cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META"**, están localizadas en el casco urbano del municipio de San Martin-Meta.

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL

3.1 CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA No. 109 DE 2026

Contrato No.	109 De 2026
Certificado De Disponibilidad Presupuestal	2026000179 Del 16 De Febrero De 2026
Objeto Del Contrato:	MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META
Valor Total Del Contrato:	Cinco Mil Doscientos Setenta Y Ocho Millones Ciento Cuarenta Y Ocho Mil Quinientos Cincuenta Y Tres Pesos ($5.278´148.553.00) M/Cte

Contrato No.	109 De 2026
Nombre Del Contratista:	CONSORCIO CARRERA 5 EG NIT No.902.054.725 - 5 Rep. Legal ESTEFANY GERALDINE TORRES VANEGAS C.C.No.1.006.776.424 de VILLAVICENCIO Meta
Fecha Del Contrato:	Trece (13) De Abril De 2026
Nombre Del Supervisor:	Ing. Jairo Abdul Rico Enciso
Cargo Del Supervisor:	Secretaria De Obras Publicas
Plazo De Ejecución:	Cinco (5) Meses
Fecha De Inicio:	07 De Mayo De 2026
Fecha De Terminación:	06 De Octubre De 2026

4. OBJETO

El presente informe tiene como objeto presentar las actividades de seguimiento, acompañamiento y verificación técnica desarrolladas durante el periodo correspondiente al mes de julio de 2026, en el marco del proyecto **"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 A 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META"**, en desarrollo del Contrato de Obra No. 109 de 2026.

El informe comprende el seguimiento realizado por el Especialista de Vías a las actividades relacionadas con el componente vial ejecutadas durante el periodo, principalmente la instalación de bordillos y sardineles prefabricados, así como la recepción y verificación del material de subbase ingresado a obra, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.

De igual manera, se busca dejar registro de los sectores y abscisas en los cuales se desarrollaron las actividades, las verificaciones técnicas efectuadas y las observaciones derivadas del seguimiento realizado, como parte del control y acompañamiento al adecuado desarrollo de las actividades viales del proyecto.

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el presente periodo se realizó seguimiento y acompañamiento técnico a las actividades relacionadas con el componente vial del proyecto.

Las principales actividades objeto de seguimiento fueron:

- Seguimiento a la instalación de bordillos prefabricados de concreto.
- Seguimiento a la instalación de sardineles prefabricados de concreto.
- Verificación de los sectores y abscisas intervenidos.
- Seguimiento a la ubicación y alineamiento de los elementos instalados.
- Verificación de las condiciones generales del proceso constructivo.
- Seguimiento al apoyo de las actividades de localización y control topográfico.
- Recepción de material de subbase en obra.
- Verificación de las condiciones del material de subbase recibido.
- Revisión del cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables al material de subbase.
- Seguimiento general a las condiciones de ejecución de las actividades correspondientes al componente vial.

6. SEGUIMIENTO A LA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y SARDINELES

Durante el periodo se realizó seguimiento a la instalación de elementos prefabricados de concreto correspondientes a bordillos y sardineles, verificando los sectores intervenidos y las condiciones generales de ejecución de los trabajos.

De acuerdo con los registros consignados en la bitácora de obra, los trabajos se desarrollaron en los siguientes sectores:

Actividad	Abscisa	Costado
Instalación de bordillos y sardineles prefabricados	K1+053 – K0+973	Derecho
Instalación de bordillos y sardineles prefabricados	K1+053 – K0+973	Izquierdo
Instalación de bordillos y sardineles prefabricados	K0+885 – K0+960	Derecho
Instalación de bordillos y sardineles prefabricados	K0+885 – K0+960	Izquierdo
Instalación de bordillos y sardineles prefabricados	K0+860 – K0+760	Derecho
Instalación de bordillos y sardineles prefabricados	K0+860 – K0+760	Izquierdo
Instalación de bordillos y sardineles prefabricados	K0+735 – K0+655	Derecho
Instalación de bordillos y sardineles prefabricados	K0+735 – K0+655	Izquierdo
Instalación de bordillos y sardineles prefabricados	K0+635 – K0+560	Derecho
Instalación de bordillos y sardineles prefabricados	K0+635 – K0+560	Izquierdo

Los elementos instalados corresponden a los tipos registrados en la bitácora de obra, incluyendo bordillo prefabricado de concreto tipo A-80, bordillo prefabricado de concreto tipo A-100 y sardinel prefabricado de concreto tipo A-10.

Durante el seguimiento se verificaron las condiciones generales de instalación, la ubicación de los elementos y su alineamiento, teniendo en cuenta los controles requeridos para garantizar una adecuada ejecución de las actividades.

Así mismo, se contó con el apoyo de las actividades de topografía para la localización y verificación de los sectores intervenidos.

La bitácora de obra utilizada como soporte del presente informe permite identificar los sectores y abscisas de intervención.

7. RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL MATERIAL DE SUBBASE

Durante el periodo objeto de seguimiento se registró la recepción en obra de material destinado a la conformación de la subbase granular.

Como parte de las actividades desarrolladas por el Especialista de Vías, se realizó el acompañamiento y verificación del material recibido, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.

La revisión estuvo orientada a verificar las condiciones generales del material y su correspondencia con los requisitos técnicos aplicables, considerando los controles de calidad requeridos para su utilización dentro de las actividades relacionadas con la estructura vial.

De acuerdo con las verificaciones realizadas, el material recibido fue revisado previo a su utilización en obra, como parte del control de calidad y seguimiento técnico de los materiales incorporados al proyecto.

Se considera necesario mantener el control de calidad durante las diferentes etapas de utilización del material, incluyendo los ensayos correspondientes y la verificación de las condiciones de colocación, extendido, humectación y compactación, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto.

8. CONTROL Y SEGUIMIENTO TÉCNICO

Como parte de las funciones de seguimiento desarrolladas durante el periodo, se realizó control sobre las actividades correspondientes al componente vial, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Verificación de los sectores de trabajo de acuerdo con las abscisas registradas en la bitácora.
- Seguimiento a la instalación de bordillos y sardineles prefabricados.
- Verificación de la ubicación y alineamiento de los elementos instalados.
- Seguimiento a las condiciones generales del procedimiento constructivo.
- Acompañamiento a las actividades de control y localización topográfica.
- Seguimiento a la recepción del material de subbase.
- Verificación de las condiciones generales del material recibido.
- Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables al material de subbase.
- Seguimiento a las condiciones de calidad de los materiales empleados en las actividades viales.

Las actividades anteriores permitieron efectuar un seguimiento permanente a los trabajos desarrollados durante el periodo y establecer los sectores intervenidos de acuerdo con los registros consignados en la bitácora de obra.

9. CONCLUSIONES

Durante el mes de julio de 2026 se realizó seguimiento y acompañamiento técnico a las actividades correspondientes al componente vial del proyecto, principalmente a la instalación de bordillos y sardineles prefabricados, desarrolladas en diferentes sectores y costados, de acuerdo con las abscisas registradas en la bitácora de obra.

El seguimiento efectuado permitió verificar las condiciones generales de ejecución de los trabajos, así como aspectos relacionados con la ubicación, alineamiento y procedimiento constructivo de los elementos instalados.

Se recomienda continuar con el seguimiento técnico y control de calidad de las actividades y materiales correspondientes al componente vial, especialmente durante las etapas posteriores de ejecución, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las condiciones de calidad requeridas para el proyecto.

JAIME ANDRÉS CAÑON DONCEL
M.P. No. 01114-10719

5976

CERTIFICADOS DE CALIDAD

INTRODUCCIÓN

El presente estudio está encaminado a determinar algunas de las principales propiedades físico-mecánicas del material SUBBASE GRANULAR SBG-50, procedente de la Mina MH Ingenieria S.A.S

La caracterización de materiales consta de ensayos a nivel de laboratorio que son exigidos por el INVIAS en el manual de ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 2022, para verificar las propiedades mecánicas de los agregados pétreos que se utilicen en la construcción de los diferentes proyectos de infraestructura vial de la región. Para este fin, se trajeron muestras al laboratorio procedentes de esta planta.

Estas muestras fueron procesadas en el laboratorio de suelos con el fin de determinar los parámetros que se utilizan en la caracterización de materiales de construcción. Dichos parámetros geotécnicos se establecieron siguiendo los procedimientos reglamentados por el INVIAS y la NORMA TÉCNICA COLOMBIANA para clasificación de Agregados.

En este informe se presentan los resultados de los ensayos de laboratorio realizados a los materiales granulares procedentes de la mina MH Ingenieria S.A.S, municipio de Guamal departamento del Meta.

CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES

Sobre la totalidad de las muestras traída por el contratista se efectuó un programa de laboratorio de suelos, que permita establecer las propiedades índices de los agregados y clasificarlos con fines de ingeniería.

Dicho programa de laboratorio incluyó análisis granulométrico para agregados finos y gruesos a través del tamizado mecánico, límites de consistencia líquido y plástico, Proctor Modificado y Relación de Soporte de Carga en inmersión (CBR), equivalente de arena de suelos y agregados finos, resistencia al desgaste en la máquina de los Ángeles, sanidad de los agregados frente a la acción de las soluciones de sulfato de sodio o de magnesio, contenido de materia orgánica (Ver anexos análisis de laboratorio).

RESULTADOS

PARÁMETROS OBTENIDOS EN EL LABORATORIO		
ENSAYO	RESULTADO	INVÍAS ART.320-13
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS I.N.V. E - 213	% GRAVA: 50.6 % ARENA: 42.2 % FINOS: 7.2 USC: GP	La curva granulométrica de la muestra se ajusta al huso SBG-50
RESISTENCIA AL DESGASTE DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES DE 37.5 mm (1½") POR MEDIO DE LA MAQUINA DE LOS ÁNGELES I.N.V. E - 218 - 219	38.1 %	50% máx.
SANIDAD DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCIÓN DE LAS SOLUCIONES DE SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO I.N.V. E - 220	FINO: 5.8 % GRUESO: 7.6 %	12% máx.
RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO EN EL LABORATORIO (CBR INMERSION) I.N.V. E - 148	68.88 %	30 % mín.
DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS I.N.V. E - 125	No plástico	<=25
LIMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD I.N.V. E - 126	No plástico	<=6

EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS I.N.V. E - 133	62 %	25% min.
CONTENIDO APROXIMADO DE MATERIA ORGANICA EN ARENAS- I.N.V. E.212	Color claro cercano al Gardner N° 11. Indica un contenido de materia orgánica muy bajo	El contenido de materia orgánica debe ser bajo
RELACIONES DE PESO UNITARIO-HUMEDAD EN LOS SUELOS EQUIPO MODIFICADO I.N.V. E - 142	Densidad máxima seca 2.055 gr/cm^3 Humedad Óptima 7.5 %	

FUENTE: Datos Ensayos de Laboratorio

- El material caracterizado procedente de la Mina Murillos Río Camelias, municipio de Guamal - Meta, cumple con los parámetros mínimos exigidos por el INVIAS para Subbase Granular SBG-50.

- Se recomienda realizar control durante el proceso constructivo con el fin de conservar el ajuste granulométrico, el porcentaje de compactación y demás características propias de la subbase con una verificación periódica según la especificación 320-22.

- Para el control de compactación se recomienda hacer uso de los dispuesto en el numeral 320.5.2.2.2 Compactación del artículo 320 de las ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 2022

Atentamente,

WILLIAM A. BARAJAS T.
Ingeniero Civil UCC
Esp. Geotecnia Vial y Pavimentos
M.P. 25202-181878 CND

5980

W&H
INGENIERÍA LTDA.

RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO

Carrera 15 6A - 29 Barrio Macunaima. Tel. 6713408 Cel. 3132942914
Villavicencio - Meta

5981.

W&H
INGENIERÍA LTDA.

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

PROYECTO CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN EL DEPARTAMENTO DEL META

MUESTRA 1 **PROFUNDIDAD** N/A

FECHA JULIO DE 2026

GRADACION DE LA MUESTRA


TAMIZ		Peso Ret. Gr	% Retenid	% Ret. Acumul	% pasa	Especificación INV	
No.	Abert. (mm)					Min	Máx
2"	50.8	0.0	0.0	0.0	100.0	100	100
1"	25.4	2218.0	12.2	12.2	87.8	70	95
3/4"	19.0	2784.0	15.3	27.5	72.5	60	90
1/2"	12.5	2325.0	12.8	40.3	59.7	45	75
No 4	4.76	1884.0	10.4	50.6	49.4	40	70
No 10	2.0	2141.0	11.8	62.4	37.6	25	55
No 40	0.425	2020.0	11.1	73.5	26.5	15	40
No 80	0.180	2044.0	11.2	84.7	15.3	6	25
No 200	0.074	1466.0	8.1	92.8	7.2	2	15
pasa 200		1311.0	7.2				
total		18193.0					

% GRAVA	50.6
% ARENA	42.2
% FINOS	7.2
CU:	137.44
CC:	9.21
USC:	GP

DETERMINACIÓN DEL PESO UNITARIO Y CONTENIDO DE HUMEDAD DE LA MUESTRA

Peso muestra húm.	Peso muestra parafina.	W. sumerg.	P.U.H.	Peso Muestra seca	% humed.	P.U.S.

CURVA GRANULOMETRICA

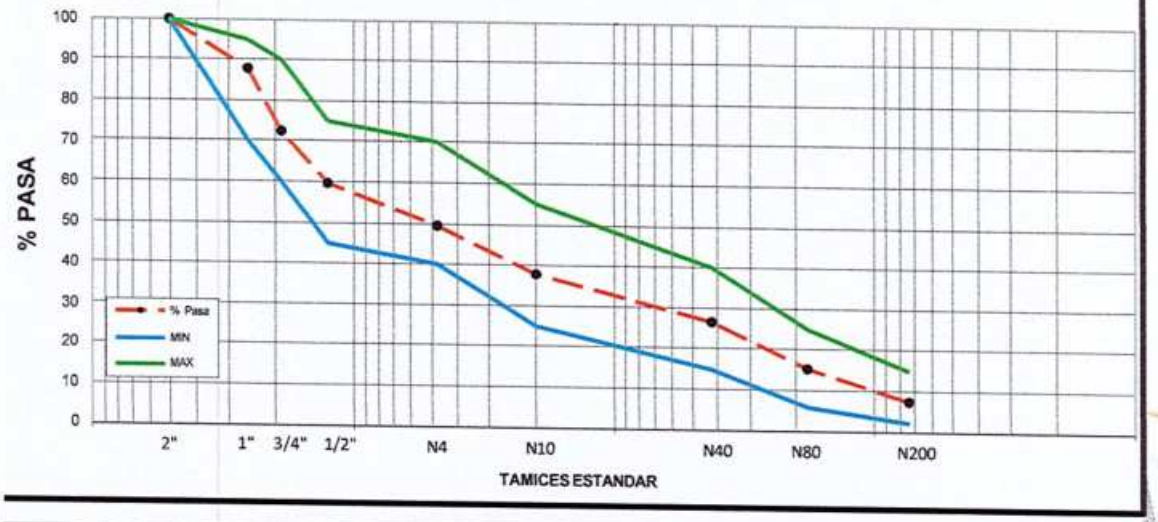

Observaciones. LA MUESTRA CORRESPONDE A UNA GRAVA SUBREDONDEADA CON ARENA MEDIA A FINA. CLASIFICA COMO **GRAVA MAL GRADADA - GP**

Elaboró:

WILLIAM ALFONSO BARAJAS
I.C. Esp. Geotecnia Vial y Pavimentos

5982.

W&H
INGENIERÍA LTDA.

RESISTENCIA AL DESGASTE EN MÁQUINA DE LOS ÁNGELES

PROYECTO CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN EL DEPARTAMENTO DEL META

MUESTRA 1 PROFUNDIDAD **N/A**

FECHA JULIO DE 2026

DESGASTE EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES

ENSAYO	1	2	3
Gradación usada	**A**		
Numero de revoluciones	500		
Peso muestra inicial (Pi)	5007.0		
Peso muestra despues del ensayo (Pf)	3097.8		
% Desgaste = Pi - Pf / Pi * 100	**38.1**		
Coeficiente de uniformidad			

Gradación A	Peso de cada fracción
2" - 1 1/2"	0
1 1/2" - 1"	1250
1" - 3/4"	1250
3/4" - 1/2"	1250
1/2" - 3/8"	1250
3/8" - 1/4"	0
Total muestra	5000 +/- 10
Numero esferas	12
Nº revoluciones	500

Observaciones.	EL MATERIAL PRESENTÓ UN DESGASTE DEL **38.1%**	Elabc WILLIAM ALEGRIA BARAJAS I.C. Esp. Geotecnia Vial y Pavimentos

5983

SANIDAD DE LOS AGREGADOS GRUESOS FRENTE A LA ACCIÓN DE LAS SOLUCIONES DE SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO

PROYECTO CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN EL DEPARTAMENTO DEL META

FUENTE MATERIAL SUBBASE TIPO SBG-50

MUESTRA Nº 1 **FECHA** JULIO DE 2026

ANALISIS CUANTITATIVO

Fracciones		Peso Inicial	Peso despues de	% Perdida P1	Granulometria	% de perdida
1 1/2"	3/4"	500	491	1.8	8.87%	0.16
3/4"	1/2"	670	650	3.0	19.24%	0.59
1/2"	3/8"	330	296	10.3	33.69%	3.55
3/8"	No. 4	300	273	9.0	35.96%	3.31

Perdida total corregida: $\Sigma =$ 7.6

ANALISIS CUALITATIVO

Fracciones		No. Inicial de particulas	Numero de particulas despues del ensayo				
Pasa	Retenido		Enteras	Partidas	Agrietadas	Porosas	Falladas
2 1/2"	1 1/2"						
1 1/2"	3/4"						
3/4"	1/2"	150	124	5	12	9	0
Otras Fracciones				Si:	Si:	Si:	Si:
				No: -	No: -	No: -	No: -

Soluccion utilizada: SULFATO DE SODIO (Na2 SO4)

Observacciones:

Fracciones que se deben tomar y sus pesos

2 1/2" - 2" = 3000 grs	1 1/2" - 1" = 1000 grs	3/4" - 1/2" = 670 grs	3/8" - No. 4 = 300 grs
2" - 1 1/2" = 2000 grs	1" - 3/4" = 500 grs	1/2" - 3/8" = 330 grs	
1	2	3	4

Observaciones : EL PORCENTAJE DE PÉRDIDA ES DE 7.6 %

WILLIAM ALFONSO BARAJAS
I.C. Esp. Geotecnia Vial y Pavimentos

Realizó

5984

W&H
INGENIERÍA LTDA.

SANIDAD DE LOS AGREGADOS FINOS FRENTE A LA ACCIÓN DE LAS SOLUCIONES DE SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO

PROYECTO CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN EL DEPARTAMENTO DEL META

FUENTE MATERIAL SUBBASE TIPO SBG-50

MUESTRA Nº 1 **FECHA** JULIO DE 2026

ANALISIS CUANTITATIVO

Fracciones		Peso Inicial P1 (grs)	Peso despues de ensayo P2 (grs)	% Perdida P1 - P2 x 100 / P1	Granulometria original	% de perdida Corregida
Pasa	Retenido					
3/8"	Nº 4	100	93	7.0	7.04%	1.3
Nº 4	Nº 8	100	95	5.0	8.87%	1.2
Nº 8	Nº 16	100	91	9.0	7.80%	1.8
Nº 16	Nº 30	100	94	6.0	5.00%	0.8
Nº 30	Nº 50	100	97	3.0	9.29%	0.7
Perdida total corregida:					Σ=	5.8

Soluccion utilizada: SULFATO DE SODIO (Na2 SO4)

Observaciones : EL PORCENTAJE DE PÉRDIDA ES DE 5.8 %

WILLIAM ALFONSO BARAJAS
I.C. Esp. Geotecnia Vial y Pavimentos
Elaboró:

5185

W&H
INGENIERÍA LTDA

RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO EN EL LABORATORIO (CBR INMERSIÓN)


PROYECTO: CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN EL DEPARTAMENTO DEL META

FUENTE: MATERIAL SUBBASE TIPO SBG-50 FECHA: JULIO DE 2026

UBICACIÓN: MH Ingenieria S.A.S

PROFUNDIDAD DE LA MUESTRA = N/A

DEFORMACIÓN [0.001"]	CARGA [Libras]	ESFUERZO [PSI]
0.005	319.60	106.53
0.010	575.20	191.73
0.025	937.40	312.47
0.050	1384.80	461.60
0.075	1704.40	568.13
0.100	2066.50	688.83
0.125	2300.90	766.97
0.150	2514.00	838.00
0.175	2982.70	994.23
0.200	3186.30	1062.10
0.250	3962.70	1320.90
0.300	4410.10	1470.03
0.350	4665.70	1555.23
0.400	5198.40	1732.80
0.500	5794.90	1931.63

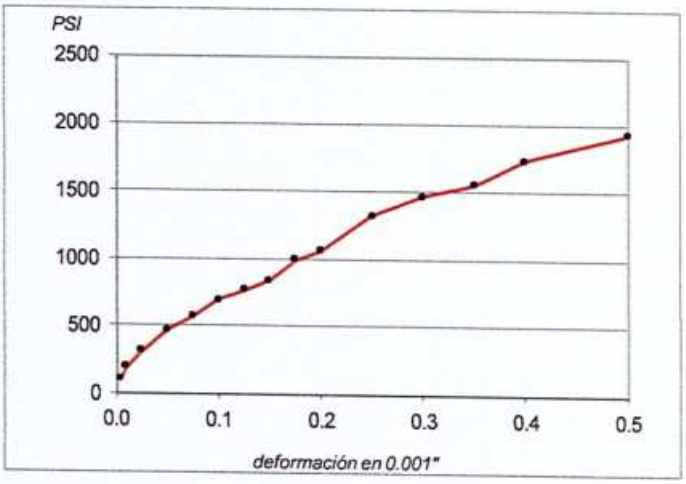

CBR A 0.10"	68.88%
CBR A 0.20"	70.81%

DATOS MOLDE	
Diámetro	15.0 cm.
Altura	18.1 cm.
Peso Molde	5976 gr.

Peso Muestra húm. + molde	12071 gr.
Humedad Natural	9.3%

PESO UNIT. HÚMEDO	1.906 gr/cm3

PESO UNIT. SECO	1.743 gr/cm3

WILLIAM ALFONSO BARAJAS
I.C. Esp. Geotecnia Vial y Pavimentos

Elaboró:

5986

W&H
INGENIERÍA LTDA

DETERMINACIÓN DEL LIMITE LÍQUIDO DE LOS SUELOS LIMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD

PROYECTO: CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN EL DEPARTAMENTO DEL META

FUENTE: MATERIAL SUBBASE TIPO SBG-50 FECHA: JULIO DE 2026

UBICACIÓN: MH Ingenieria S.A.S

LÍMITE LÍQUIDO

MUESTRA	1	2	3
NÚMERO DE GOLPES			
NÚMERO DE RECIPIENTE			
PESO DEL RECIPIENTE			
PESO DEL RECIP. + M Hum			
PESO DEL RECIP. + M Sec			
CONTENIDO DE AGUA (%)			

LÍMITE PLÁSTICO

MUESTRA	1	2	3
NÚMERO DE RECIPIENTE			
PESO DEL RECIPIENTE			
PESO DEL RECIP. + M Hum			
PESO DEL RECIP. + M Sec			
CONTENIDO DE AGUA (%)			


LÍMITE LÍQUIDO (LL)	0.00	%
LÍMITE PLÁSTICO (LP)	0.00	%
ÍNDICE DE PLASTICIDAD (IP)	0.00	%

CLASIFICACIÓN DEL SUELO (SUCS)	**N.P.**

OBSERVACIONES:

LA MUESTRA ANALIZADA NO PRESENTÓ PLASTICIDAD

Elaboró: WILLIAM ALEGANDO BARAJAS
I.C. Esp. Geotecnia Vial y Pavimentos



5987

W&H
INGENIERÍA LTDA.

EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS

PROYECTO: CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN EL DEPARTAMENTO DEL META

FUENTE: MATERIAL SUBBASE TIPO SBG-50 FECHA: JULIO DE 2026

UBICACIÓN: MH Ingenieria S.A.S

ENSAYO DE EQUIVALENTE DE ARENA

ENSAYO N°	1	2	3	PROMEDIO
LECTURA DEL NIVEL DE ARENA LS	3.4	3.5	3.5	
LECTURA DEL NIVEL DE ARCILLA LC	5.4	5.5	5.7	
EQUIVALENTE DE ARENA (LS/LC)X100	62.96	63.64	61.40	
	62	63	61	**62**

Condiciones de la arena para el ensayo:

Humeda _____ Seca al aire ___*___ seca al horno _____

Observaciones. LA MUESTRA PRESENTA UN EQUIVALENTE DE ARENA DEL 62%	Elaboró: WILLIAM ALFONSO BARAJAS I.C. Esp. Geotecnia Vial y Pavimentos

5188

W&H
INGENIERÍA LTDA.

CONTENIDO APROXIMADO DE MATERIA ORGÁNICA EN ARENAS

PROYECTO: CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVILES EN EL DEPARTAMENTO DEL META

FUENTE: MATERIAL SUBBASE TIPO SBG-50

UBICACIÓN: MH Ingenieria S.A.S

Color de la solucion a las 24 horas con respecto al color patron

Más oscura	Igual	Más claro
1		*
2		*
3		*
4		*

Condiciones de la arena al realizarse el ensayo:

humeda _____ Seca al aire ___*___ Seca al horno _____

Observaciones.	Elaboró:
Color claro, cercano al color Gardner N° 11 El material presenta un contenido de materia organica aceptable	WILLIAM ALFONSO BARAJAS I.C. Esp. Geotecnia Vial y Pavimentos

CONSORCIO CARRERA 5 EG 902.054.725-6	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

CONTRATO DE OBRA No. 109 DE 2026

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META.

CONTRATISTA:
CONSORCIO CARRERA 5 EG

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 03
(07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2026)

DATOS PRINCIPALES DE LA OBRA	
PERIODO REPORTADO:	07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATO NÚMERO	109 DE 2026
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CONTRATANTE	**ALCALDIA DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS – META** NIT N.° 892.099.548-6
CONTRATISTA	**CONSORCIO CARRERA 5 EG** Nit: 902.054.725-5
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META".
VALOR	CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($5.278.148.553,00) M/CTE

OBJETIVO

Dar a conocer las actividades desarrolladas en el periodo 07 de julio al 06 de agosto de 2026 en seguridad y salud en el trabajo, del contrato cuyo objeto "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META".

5991


CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Las obras que comprenden el desarrollo del Contrato de obra N° 109 de 2026, cuyo objeto es la "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META", se ejecutará en:

MUNICIPIO: San Martin, Meta

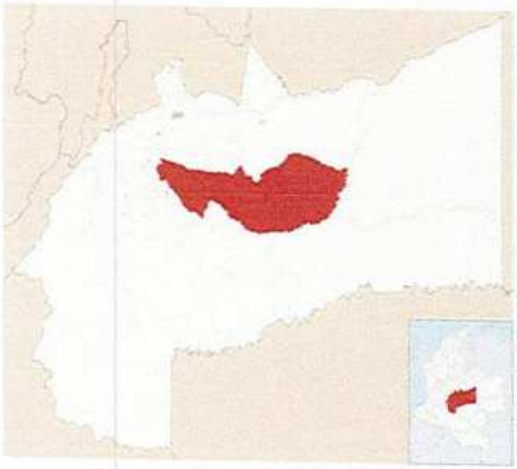



2. ORGANIGRAMA GENERAL DE LA OBRA

PERSONAL PROPUESTO	
Nº DE TRABAJADORES	1. Director de obra 2. Residente de obra 3. Especialista hidráulica 4. Especialista ambiental 5. Especialista vial 6. Profesional en salud ocupacional

3. RELACIÓN DE PERSONAL

Durante el periodo del 07 de agosto al 06 de agosto de 2026, se realizó afiliación al sistema de seguridad personal de obra:

1. Afiliación a la ARL
2. Afiliación a la EPS
3. Afiliación a la AFP

El CONSORCIO CARRERA 5 EG, se compromete con el cumplimiento de lo estipulado por la normatividad legal vigente, realizando las respectivas afiliaciones y aportes al Sistema General de Riesgos Laborales (EPS, ARL, AFP) de cada uno de los trabajadores que laboran en la obra, además supervisa que los contratistas y su personal cuenten de igual manera con las correspondientes cotizaciones a SGRL a fin de garantizar la cobertura del sistema en caso de cualquier eventualidad.

A continuación, se relaciona el personal, que ha intervenido en la obra ejecutada del CONSORCIO CARRERA 5 EG, dando cumplimiento a la legislación vigente en torno a la afiliación del personal al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales. EPS, ARL, AFP y CCF.

3.1 PERSONAL MINIMO REQUERIDO

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	NO. DE CEDULA	CARGO	EPS	AFP	ARL	RAZÓN SOCIAL
1	LEONARDO ANDRES BORDA IPUZ	80.229.941	DIRECTOR DE OBRA	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	INDEPENDIENTE
2	CARLOS MANUEL FORERO	19.405.796	RESIDENTE DE OBRA	SALUD TOTAL	FOSYGA	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
3	MARIA FERNANDA QUEVEDO	1.121.862.487	ESPECIALISTA HIDRAULICO	SANITAS	PORVENIR	SURA	INDEPENDIENTE
	JAIME ANDRES CAÑON DONCEL	1.049.630.249	ESPECILISTA VIAS	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	INDEPENDIENTE
4	PAULA ANDREA PARDO REDONDO	1.121.889.444	ESPECIALISTA AMBIENTAL	SANITAS	PROTECCIÓN	SURA	INDEPENDIENTE
5	MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	1.121.944.835	PROFESIONAL EN SST	PROTEGER	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG

3.2 PERSONAL OPERATIVO

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	NO. DE CEDULA	CARGO	EPS	AFP	ARL	RAZÓN SOCIAL
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	NO. DE CEDULA	CARGO	EPS	AFP	ARL	RAZÓN SOCIAL
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	PROTECCION	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	PROTECCION	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	PROTEGER	PROTECCION	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.057	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.158	AYUDANTE	SANITAS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
16	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
17	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	PROTECCION	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
18	JOSE UBALDO ROJAS LEON	93.338.325	AYUDANTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG

Anexo 1 Reporte diario de ingreso y salida

3.2.1 PERSONAL OPERATIVO SUBCONTRATISTA

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	NO. DE CEDULA	CARGO	EPS	AFP	ARL	RAZÓN SOCIAL
1	LUIS GUILLERMO SEPULVEDA PUERTA	1.006.796.279	OPERADOR	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	APEX INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SAS
2	NICSON HERNAN HURTADO REYES	79.359.266	OPERADOR	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	DANIEL ARTURO VANEGAS
3	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	NUEVA EPS	COLPESIONES	SURA	PRISMA DAV INGENIERIA S.AS.

3.3 INGRESOS

Durante el presente periodo se presentaron 1 ingreso bajo la razón social del CONSORCIO CARRERA 5 EG.

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	NO. DE CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO
1	LEONARDO ANDRES BORDA IPUZ	80.229.941	DIRECTOR DE OBRA	07/07/2026

3.4 RETIROS

Durante el presente periodo se presentó 3 retiros bajo la razón social el CONSORCIO CARRERA 5 EG.

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	NO. DE CEDULA	CARGO	FECHA DE RETIRO
1	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.057	AYUDANTE	15/07/2026
2	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	25/07/2026
3	NICSON HERNAN HURTADO REYES	79.359.266	OPERADOR	30/07/2026

Anexo 2 Retiros

1. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Es importante mencionar que al presente informe se anexan planillas de pago de aportes a seguridad social y parafiscales correspondientes al presente periodo. Debido a que como las obligaciones de seguridad social de algunos empleados se les imputan a las personas naturales y jurídicas que integran el CONSORCIO CARRERA 5 EG, tal como lo establece la Ley 80 de 1993. Y teniendo en cuenta, que el decreto 780 de 2016 en su artículo 3.2.2.1 señala los plazos que se tienen para pagar los aportes a seguridad social y aportes parafiscales cuando haya lugar a ellos, tal y como se muestra a continuación:

DESCRIPCIÓN	NIT	FECHA DE PAGO
DANIEL ARTURO VANEGAS	86.071.812-0	05/08/2026
LEONARDO ANDRES BORDA IPUZ	80.229.941-1	12/08/2026
MARIA FERNANDA QUEVEDO ESP. HIDRAULICO	1.121.862.487-1	24/08/2026
JAIME ANDRES CAÑON DONCEL ESP. VIAS	1.049.630.249-9	13/0872026
PAULA ANDREA PARDO REDONDO ESP. AMBIENTAL	1.121.889.444-2	13/08/2026
CONSORCIO CARRERA 5 EG	902.054.725-5	10/08/2026
APEX INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SAS	901882346-5	13/08/2026

DESCRIPCIÓN	NIT	FECHA DE PAGO
PRISMA DAV INGENIERIA SAS	900.862.112-1	05/08/2026

2. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) abarca una disciplina que trata de prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, además de la protección y promoción de la salud de los empleados. Tiene el objetivo de mejorar las condiciones laborales y el ambiente en el trabajo, además de la salud en el trabajo, que conlleva la promoción del mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los empleados. La Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por objetivos prevenir las enfermedades profesionales, proteger a los trabajadores de los riesgos a su salud presentes en el ambiente laboral donde se desempeñan, y establecer condiciones del medio ambiente adaptadas a las condiciones y capacidades físicas y psicológicas de los trabajadores.

Este informe mensual de SST proporciona una visión general de las actividades y resultados clave relacionados con la seguridad y salud en el trabajo durante el mes específico. Se espera que este documento sea utilizado para la toma de decisiones informadas y para fortalecer constantemente las prácticas de SST en la empresa o proyecto.

- Mantener y promover la salud y la capacidad de trabajo.
- Mejorar las condiciones de trabajo para favorecer la salud y la seguridad de los trabajadores.
- Desarrollar culturas y sistemas organizacionales que favorezcan la salud y la seguridad en el trabajo, promoviendo un clima organizacional positivo, una eficiencia mayor y la optimización de la productividad de la empresa.

2.1 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

La Medicina Preventiva y del Trabajo tiene como objetivo principal promover, prevenir y controlar la salud de los trabajadores frente a los factores de riesgo laborales presentes en su entorno laboral. Este enfoque integral busca reducir la incidencia de enfermedades laborales y accidentes de trabajo, mejorando así el bienestar general de los empleados y optimizando la productividad en el consorcio.

2.1.1 EXAMENES DE INGRESO

Teniendo en cuenta que los exámenes médicos laborales pre- ocupacionales o de Ingreso, evalúan la salud física, mental y social del candidato a trabajar, determinando su capacidad o no para la ejecución de la labor a realizar, sin que ponga en riesgo su salud y/o la de terceros, de acuerdo con las demandas del trabajo y los riesgos a los que va a estar expuesto.

Resolución 2346 de 2007 *"Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales"* ***Artículo 16.*** *Reserva de la historia clínica ocupacional.*

Resolución 1918 de 2009 *"Por la cual se modifican los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007 y se dictan otras disposiciones"* ***Articulo 17.*** *Custodia y entrega de las evaluaciones medicas ocupacionales y de las historias clínicas ocupacionales.*

Resolución 1843 de 2025 *"Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales, y se dictan otras disposiciones".* ***Artículo 30. Custodia y entrega de la historia clínica ocupacional*** *... Para la custodia y entrega de las evaluaciones médicas ocupacionales y de las historias clínicas ocupacionales se aplicarán las siguientes disposiciones: ... b) En ningún caso, los empleadores podrán tener, conservar o anexar copia de la historia clínica ocupacional a la hoja de vida del trabajador salvo que cuenten con autorización expresa de este y tengan vinculado un médico especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo o el servicio de medicina laboral habilitado.*

2.1.2 EXAMEN DE EGRESO

Los Exámenes de Egreso se debe realizar cuando se termina la relación laboral y es una evaluación de cierre ocupacional, que debe permitir evaluar y conocer las condiciones de salud del trabajador y establecer la existencia o no de un daño a la salud asociada a las tareas definidas en el trabajo habitual, o una condición que impida su desempeño.

Resolución 1843 de 2025 *"Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales, y se dictan otras disposiciones".* ***Artículo 11. Evaluaciones médicas ocupacionales de egreso.*** *Son aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas. En atención a los establecido en el numeral 7 del artículo 57 del código sustantivo del trabajo, el empleador o contratante deberá informar al trabajador sobre el proceso para la realización de la evaluación médica ocupacional de egreso, la cual deberá ser realizada*

dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la terminación de la relación laboral o contractual y deberá dejar constancia de la respectiva notificación.

2.1.3 INDUCCIÓN AL PERSONAL

La inducción en SST es el proceso mediante el cual al trabajador nuevo se le informa sobre aquellos temas relevantes en seguridad y salud en el trabajo que debe tener en cuenta en el cargo que va a ocupar. Durante el presente periodo se realizó inducción a los trabajadores que ingresaron a laborar en la ejecución de la obra, con el fin de brindar orientación y de que el personal a cargo tenga la debida información sobre los riesgos a los que está expuesto y asistan a los planes de capacitación y entrenamiento orientados a mejorar sus habilidades para la solución de problemas y la adopción de hábitos seguros.

Anexo 3 Inducción del personal

2.1.4 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – COPASST

El Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo, también conocido como COPASST es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa, se encuentra reglamentado por el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 2013 de 1986. En cumplimiento de lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015, la empresa conformó el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), el cual está integrado de manera equitativa por representantes del empleador y de los trabajadores, quienes fueron designados mediante elección democrática. Este comité tiene como objetivo principal la promoción y vigilancia del cumplimiento de las normas y programas de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la organización.

La obligación de contar con actas de reunión del COPASST está establecida en la Resolución 2013 de 1986, que en su artículo 11 sobre las funciones del COPASST dice: *«j) Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se desarrollen, el cual estará en cualquier momento a disposición del empleador, los trabajadores y las autoridades competentes»*. Se realizo la respectiva reunión con los miembros del COPASST.

Anexo 4 Acta de reunión mensual COPASST

2.1.5 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 3461 de 2025, el consorcio tiene conformado el Comité de Convivencia Laboral, el cual se encuentra integrado por representantes del empleador y de los trabajadores. El objetivo principal de este Comité es prevenir el acoso laboral, promover un entorno de trabajo sano y

respetuoso, así como gestionar de manera oportuna los conflictos que puedan afectar la convivencia y el bienestar psicosocial de todos nuestros colaboradores. La participación activa de este Comité reafirma el compromiso de la organización con el respeto, la equidad y la construcción de un clima laboral positivo y seguro para todos.

Anexo 5 Acta de reunión mensual COCOLAB

2.1.6 BRIGADAS DE EMERGENCIA

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, se llevó a cabo la conformación de la brigada de emergencia integral de la empresa, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad y la salud de los trabajadores, contratistas, visitantes o las instalaciones. La brigada está integrada por personal voluntario que ha sido seleccionado para cumplir funciones en áreas clave como evacuación, primeros auxilios, control de incendios y búsqueda y rescate.

2.2 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Los Elementos de Protección Personal (EPP) son dispositivos, accesorios y prendas diseñados para ser llevados o utilizados por una persona con el propósito de brindar protección frente a uno o varios riesgos que puedan comprometer su seguridad o salud en el entorno laboral. En el contexto de la industria de la construcción, donde los riesgos laborales son múltiples y constantes, el uso adecuado de los EPP es una medida esencial para prevenir incidentes y enfermedades profesionales.


Desde el momento en que el personal ingresa a laborar en la obra, se le suministran los elementos de protección personal necesarios para el desarrollo seguro de sus actividades. Estos EPP son reemplazados de manera oportuna cada vez que se evidencie su deterioro o pérdida de funcionalidad, garantizando así su eficacia y la seguridad continua del trabajador.

Adicionalmente, el Código Sustantivo del Trabajo- *Artículo 230. Suministro de calzado y vestido de labor. Todo patrono que habitualmente ocupe uno (1) o más trabajadores permanentes, deberá suministrar cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un (1) par de zapatos y un (1) vestido de labor al trabajador, cuya remuneración mensual sea hasta dos (2) veces el salario mínimo más alto vigente. Tiene derecho a esta prestación el trabajador que en las fechas de entrega de calzado y vestido haya cumplido más de tres (3) meses al servicio del empleador.*

Este marco legal complementa las acciones que desde la Seguridad y Salud en el Trabajo se adelantan para promover ambientes laborales seguros y saludables,

reafirmando la obligación de los empleadores y el derecho de los trabajadores a contar con condiciones dignas y seguras para el ejercicio de sus funciones.

Anexo 6 Formato entrega de EPP

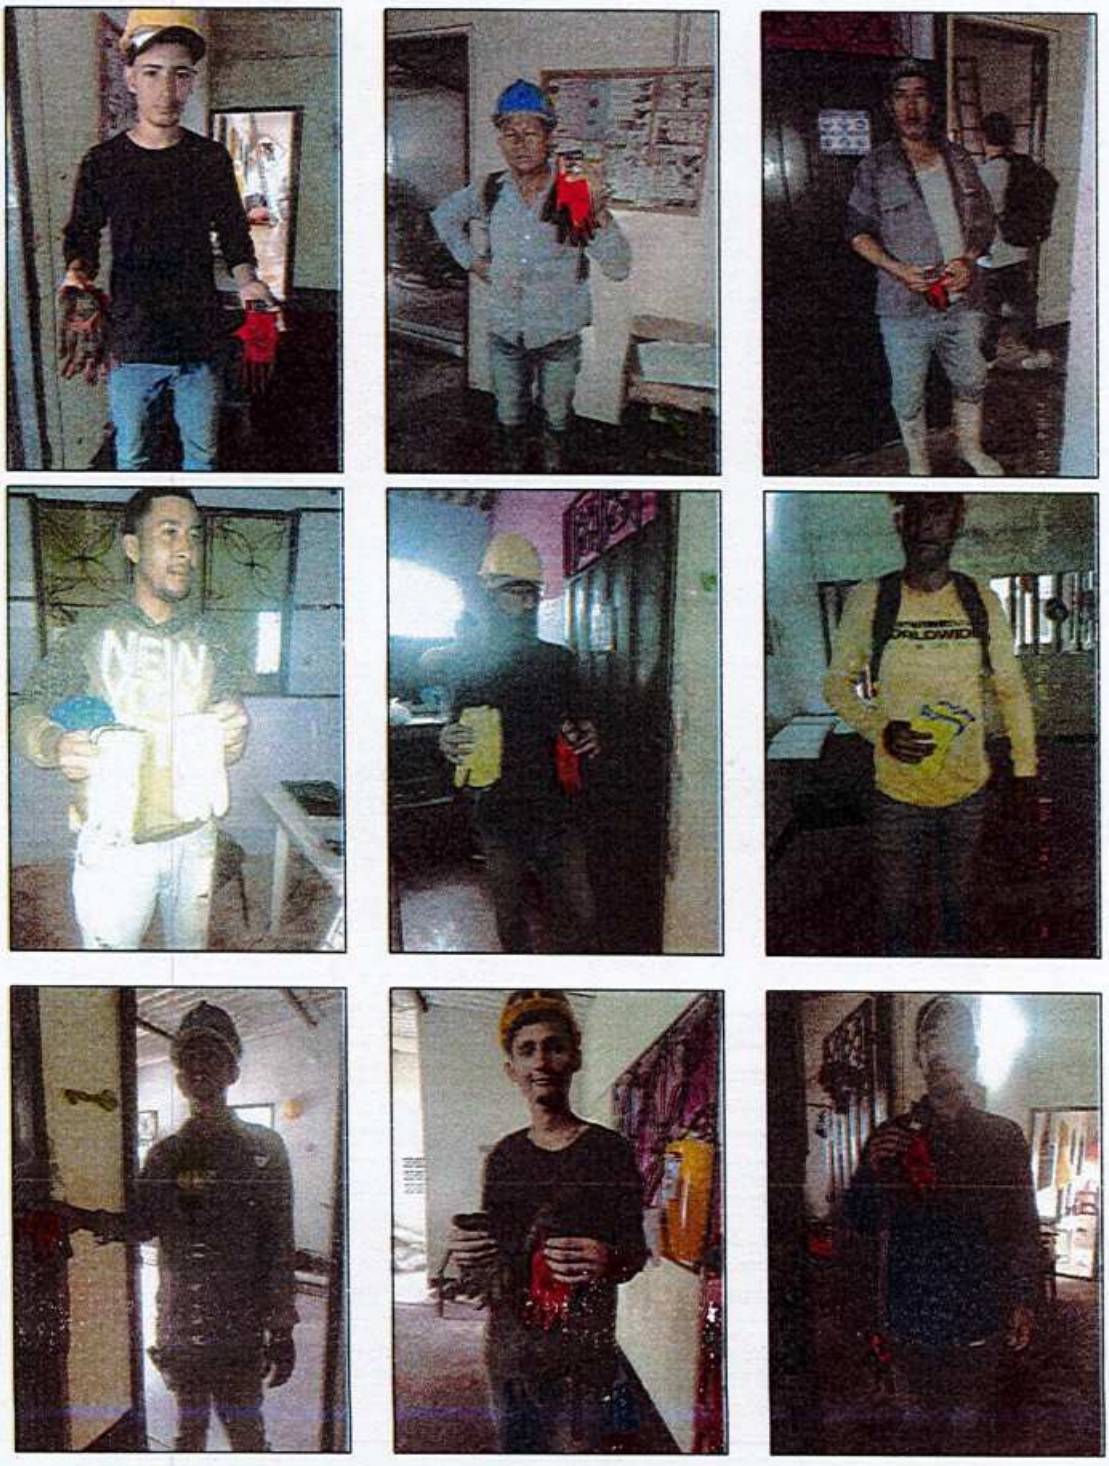








2.3 SEÑALIZACIÓN DE OBRA


La señalización de obra es un elemento esencial dentro de las medidas de prevención y control de riesgos en los entornos de trabajo del sector construcción. Su función principal es informar, advertir, prohibir o guiar a los trabajadores y visitantes sobre los peligros existentes, las rutas de evacuación, zonas restringidas, uso obligatorio de EPP, y demás aspectos relevantes para la seguridad.

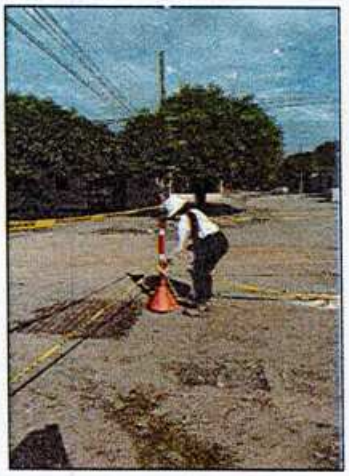




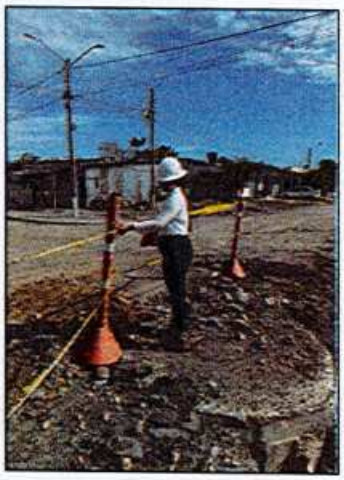

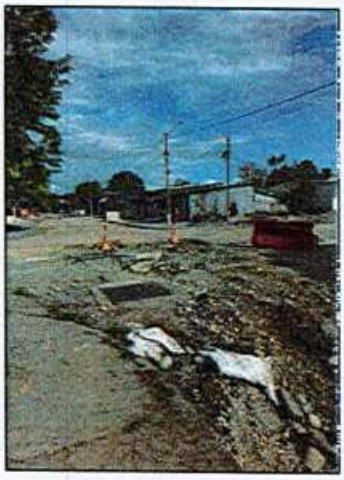

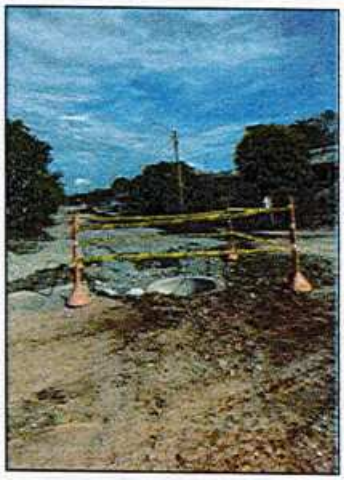

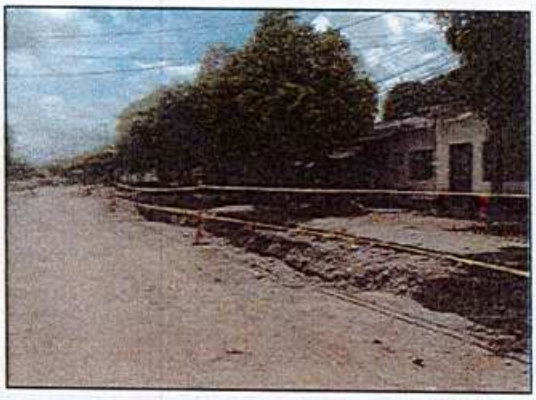

2.4 INSPECCIONES


La inspección de seguridad y salud en el trabajo es una herramienta basada en un proceso de análisis visual que busca verificar que las actividades se ejecuten de

manera saludable y segura, acorde con los procedimientos, estándares y políticas, e identifiquen la mejora dentro de los procesos o espacios laborales, por el bien y protección de los trabajadores y el consorcio.


2.4.1 INSPECCIÓN DE EPP


Una inspección de EPP o elementos de protección personal es un proceso que se debe realizar en el lugar de trabajo para garantizar la calidad, el estado y buen funcionamiento de estos equipos. Se deben inspeccionar antes de cada uso de tal manera que asegure el buen funcionamiento de todas las partes que conforman el elemento de protección personal, finalizada su uso o jornada laboral realizar la limpieza, desinfección y asegure su almacenamiento en lugares y condiciones adecuadas.

Anexo 7 Inspección de EPP

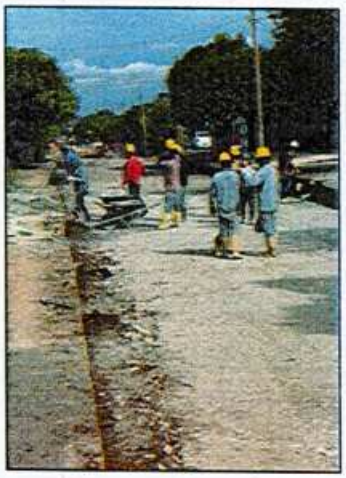



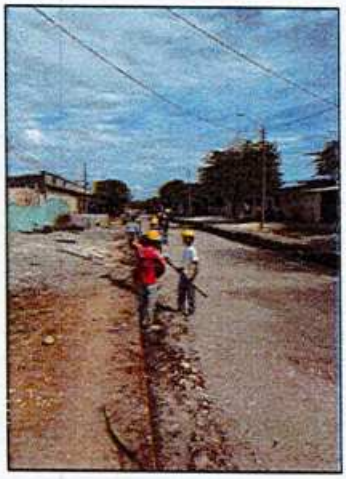

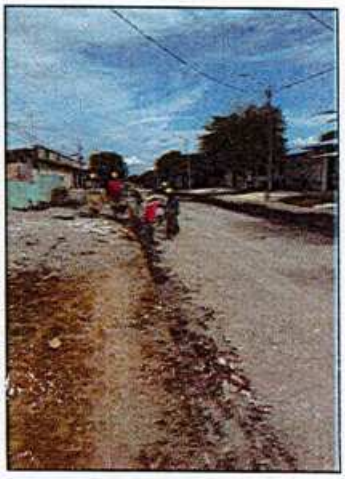

2.4.2 INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN

El botiquín de primeros auxilios es el recurso básico para la prestación y atención en primeros auxilios, ya que en él se encuentran los elementos indispensables para dar atención primaria a los trabajadores que pueden sufrir alguna lesión o fractura y en muchos casos pueden ser decisivos para evitar complicaciones y salvar vidas. Por ende, en el mes de julio 2026, se realizó una inspección para verificar el estado en el que se encontraban los implementos de atención primaria y que no le faltara nada para así darle cumplimiento a lo establecido.

Anexo 8 Inspección de botiquín y camilla





2.4.3 INSPECCIÓN DE EXTINTOR

La inspección del extintor es un recurso básico para las actividades laborales de los trabajadores, la realización periódica de inspecciones garantiza que los extintores estén en condiciones óptimas y listos para su uso en caso de un incendio. Para el mes de julio 2026, se realizó una inspección completa y se evidencia que el extintor está en buen estado, cumple con lo requerido y se encuentra vigente.

Anexo 9 Inspección de extintor





2.4.4 INSPECCIÓN DE CAMILLA

La camilla de primeros auxilios es el recurso básico para la prestación y atención en primeros auxilios, ya que en él se encuentra para dar atención inicial a los trabajadores que pueden sufrir alguna lesión o evento y en muchos casos pueden ser decisivas para evitar complicaciones y salvar vidas. Se evidencia camilla de emergencia en buen estado, para primeros auxilios fabricada en polietileno traslucida rayos X flotante color naranja con varias manijas de transporte, para la atención primaria de un trabajador en caso de AT, existe un botiquín de primeros auxilios, camilla e inmovilizadores y para prevención de incendios extintor multipropósito.






2.4.5 INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO EN OBRA


El orden y el aseo en el trabajo son factores de gran importancia para la salud, la seguridad, la calidad de los productos y en general para la eficiencia del sistema

productivo. El orden es fundamental en el área de la seguridad, la falta de él puede contribuir a diferentes tipos de accidentes como caídas y choques u originar algún incendio por su inadecuado almacenamiento.


Las inspecciones realizadas pretenden verificar que todas las cosas se encuentren en el lugar en el que realmente deben estar y en correcto estado de limpieza, tanto de los sitios de trabajo como de los objetos. CONSORCIO CARRERA 5 EG procura el mantenimiento del orden y aseo con la finalidad de encontrar despejados los espacios de circulación, evitando así riesgos adicionales por cuenta de las condiciones del lugar de trabajo.

Anexo 10 Inspección de orden y aseo

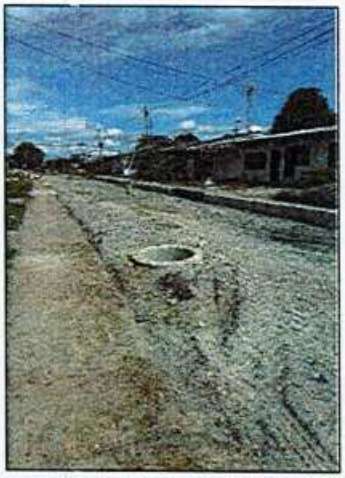

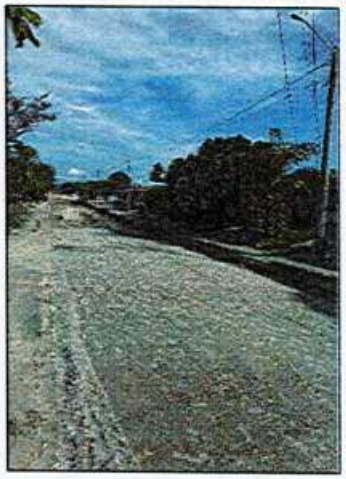



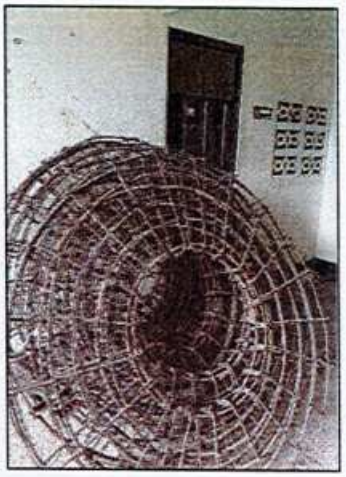

Anexo 11 Inspección gerencial HSE

2.4.6 INSPECCIONES LOCATIVAS

Con las inspecciones locativas se pretende verificar que se encuentre en buen estado las rutas de evacuación, salidas de emergencia, los elementos de atención de emergencia y que estén señalizadas, legibles y en buen estado. También se inspecciona los lugares o áreas de trabajo que estén en ordenados y aseados, los elementos de trabajo se encuentren bien dispuestos en archivos o estantes, los puntos ecológicos estén ubicados y que le den un uso adecuado, que la iluminación y la ventilación del área o lugar de trabajo sea la adecuada, que las instalaciones eléctricas estén en buenas condiciones que no generen ningún riesgo al trabajador.

Anexo 12 Inspecciones locativas













2.4.7 INSPECCIÓN SEMANAL- HERRAMIENTA MENOR

La inspección de herramienta menor constituye una medida preventiva esencial para garantizar la seguridad de los trabajadores y la eficiencia en la ejecución de las actividades operativas en el sector de la construcción. En el CONSORCIO CARRERA 5 EG, esta práctica se desarrolla de manera sistemática antes y después del uso de las herramientas manuales, con el propósito de:

- Verificar su estado físico y condiciones de seguridad.
- Comprobar su funcionalidad y correcto desempeño.
- Identificar oportunamente posibles deficiencias o fallas que puedan generar incidentes.

El cumplimiento de esta medida permite reducir riesgos de accidente, garantizar la calidad en las labores ejecutadas y fomentar una cultura de autocuidado y responsabilidad compartida en el lugar de trabajo.

Anexo 13 Inspección semanal- herramienta menor






2.4.8 INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS MENORES

La inspección preoperacional de equipos menores consiste en revisar antes de su uso el estado físico y funcional del equipo para garantizar condiciones seguras de operación. Esta verificación incluye confirmar que cuente con su guarda de seguridad correctamente instalada, que el cableado no presente peladuras ni empates, y que el disco o accesorio esté en óptimas condiciones sin fisuras ni desgaste.

Adicionalmente, se debe realizar una prueba en vacío para comprobar su funcionamiento normal. Este procedimiento es obligatorio para prevenir accidentes como amputaciones, proyecciones de fragmentos y descargas eléctricas, proteger la integridad del trabajador y evitar daños en los equipos.

Anexo 14 Inspección preoperacional de equipos menores

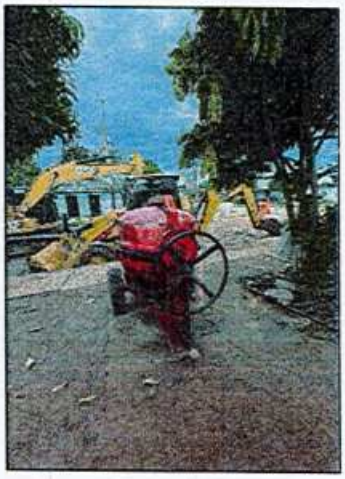



2.4.9 INSPECCIÓN DE MAQUINARIA

La inspección de maquinaria es una actividad fundamental para garantizar que los equipos y máquinas empleados en las operaciones cumplan con condiciones óptimas de funcionamiento y seguridad. Esta práctica permite identificar de manera temprana fallos, desgastes o anomalías que puedan afectar la operación segura, facilitando la adopción de medidas preventivas o correctivas oportunas para evitar accidentes, paradas no programadas, daños mayores o incumplimientos normativos.

Anexo 15 Inspección de maquinaria














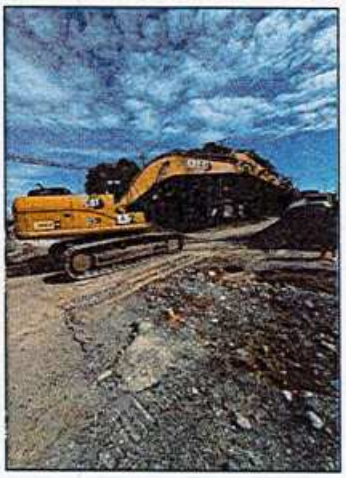



3. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE SST

3.1 INDICADORES DE GESTIÓN

Los indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) son herramientas fundamentales para evaluar de manera objetiva y sistemática los resultados obtenidos en materia de prevención y control de riesgos laborales.


En el consorcio carrera 5 EG, estos indicadores permiten analizar y resumir el comportamiento de las acciones implementadas en Seguridad y Salud en el Trabajo durante el mes de julio 2026, facilitando la toma de decisiones y el mejoramiento continuo del sistema.

3.1.1 ACCIDENTES DE TRABAJO


Durante el presente periodo se presentó 1 accidente de trabajo bajo la razón social del consorcio.




3.1.2 HORAS HOMBRE TRABAJADAS HHT

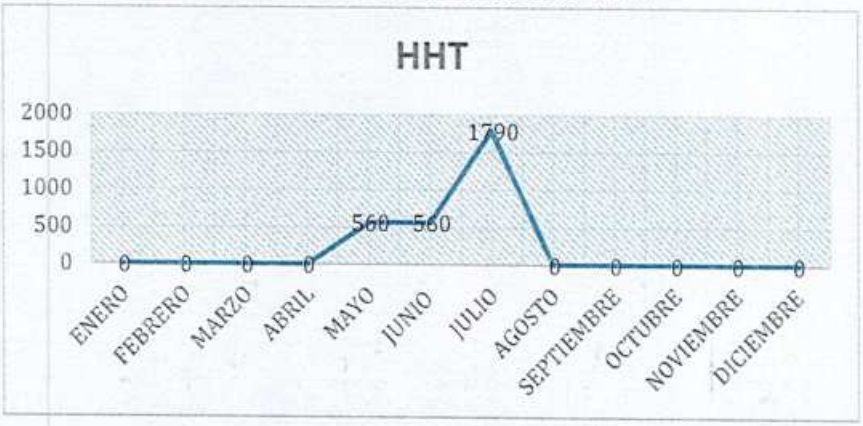


3.1.3 INDICE DE FRECUENCIA

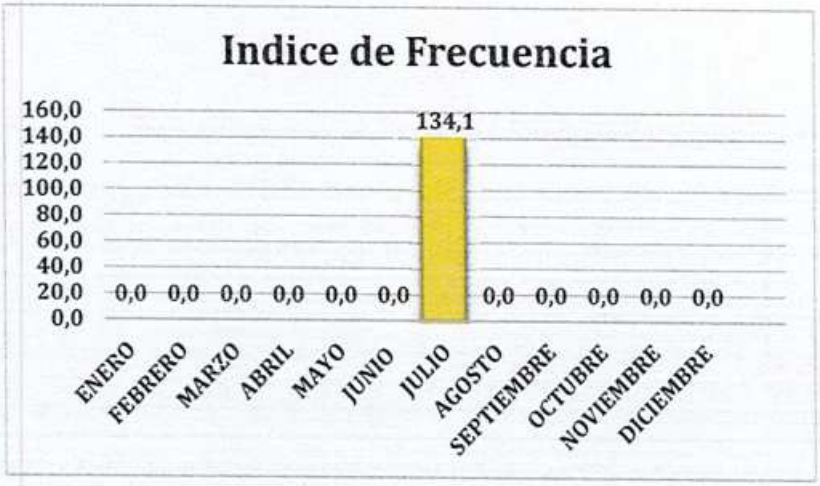


3.1.4 INDICE DE SEVERIDAD

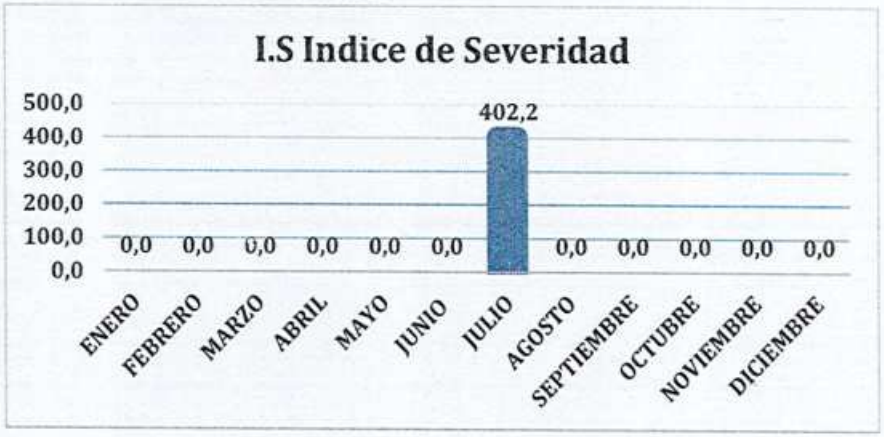

3.1.5 INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES

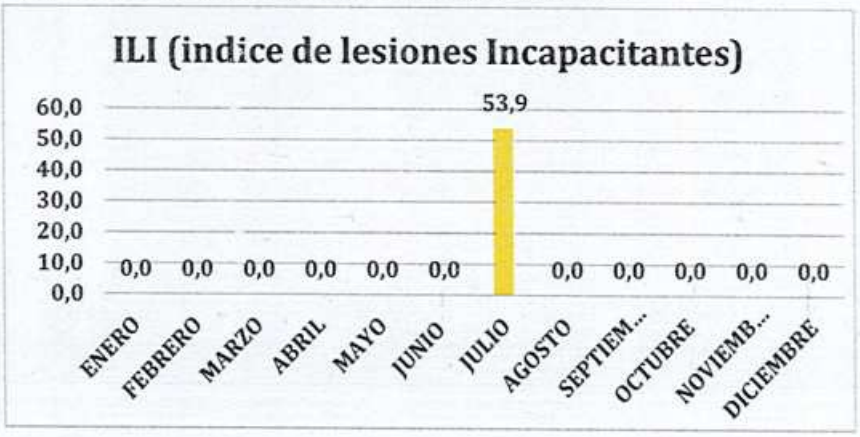

3.1.6 TASA DE ACCIDENTABILIDAD

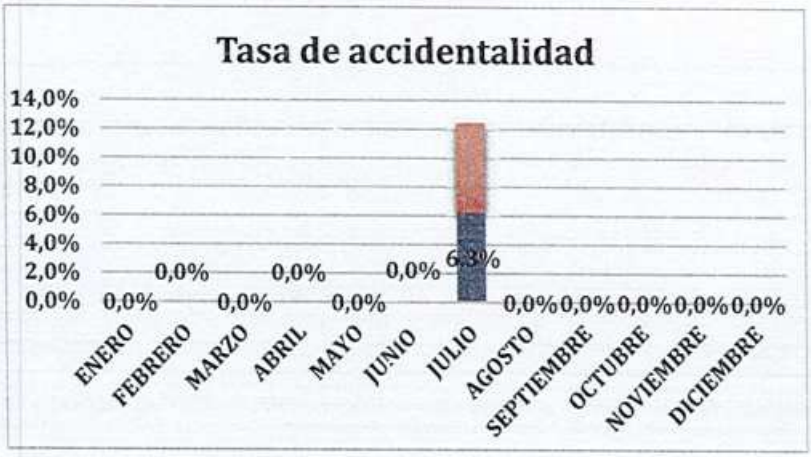

4. REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

Durante el periodo del 07 de julio al 06 de agosto de 2026, se presentó 1 accidente laboral bajo la razón social del consorcio carrera 5 EG.

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa CONSORCIO CARRERA 5 EG, NIT N902054725, ha reportado 1 accidente(s) de trabajo ocurrido(s) a sus trabajadores dependientes desde las fechas 07 de julio de 2026 hasta el 06 de agosto de 2026, con un total de 0 día(s) de incapacidad pagados y una tasa de accidentalidad de 5.88%.

Anexo 16 Certificado de accidentalidad emitido por ARL
Anexo 17 FURAT, Investigación de AT y lección aprendida

5. CHARLAS DIARIAS

Se realizan las charlas preoperacionales, dirigida por el Profesional en seguridad y salud en el trabajo, al personal operativo de perteneciente al CONSORCIO CARRERA 5 EG, estas se ejecutan con la finalidad de concientizar a los trabajadores sobre la importancia de verificar siempre las condiciones de seguridad en el sitio de trabajo y cumplir con las normas seguridad y recomendaciones para la prevención de accidentes.

ITEM	TEMA	FECHA	RESPONSABLE
1	Protección de maquinaria	07/07/2026	Profesional SST
2	Riesgo de ruido	08/07/2026	Profesional SST
3	Equipo de protección personal	09/07/2026	Profesional SST
4	Autocuidado	10/07/2026	Profesional SST
5	Resolución de conflictos	11/07/2026	Profesional SST
6	Control de sustancias peligrosas	14/07/2026	Profesional SST
7	Conducción defensiva	15/07/2026	Profesional SST
8	Seguridad ocular	16/07/2026	Profesional SST
9	Lección aprendida accidente de trabajo	17/07/2026	Profesional SST
10	Manipulación manual	18/07/2026	Profesional SST

ITEM	TEMA	FECHA	RESPONSABLE
11	Accidente de trabajo	21/07/2026	Profesional SST
12	Exposición al ruido	22/07/2026	Profesional SST
13	Cuidado personal y conducta	23/07/2026	Profesional SST
14	Roles y responsabilidades COPASST	24/07/2026	Profesional SST
15	Roles y responsabilidades COCOLAB	25/07/2026	Profesional SST
16	Señales de seguridad	27/07/2026	Profesional SST
17	Cuidado del medio ambiente	28/07/2026	Profesional SST
18	Estiramiento	29/07/2026	Profesional SST
19	Inhalación pasiva de humo	30/07/2026	Profesional SST
20	Protección de la piel	31/07/2026	Profesional SST
21	Urgencia vs emergencia	01/08/2026	Profesional SST
22	Seguridad vial laboral	03/08/2026	Profesional SST
23	Factores de riesgo psicosocial	04/08/2026	Profesional SST
24	Cultura de seguridad y autocuidado	05/08/2026	Profesional SST
25	Pausas activas	06/08/2026	Profesional SST

Anexo 18 Listado de asistencia

















Anexo 19 ATS y permisos de trabajo

Los diferentes subcontratistas realizan seguimiento a las actividades realizadas en obra. Entre las cuales se destacan la realización de charlas de sensibilización dirigidas a los trabajadores, con el objetivo de fortalecer la cultura de seguridad y promover comportamientos seguros. Asimismo, lleva a cabo inspecciones preoperacionales para verificar que las condiciones, herramientas y equipos cumplan con los requisitos técnicos y normativos antes de iniciar cualquier actividad. De igual manera, realiza inspecciones en campo de forma periódica para identificar condiciones y actos inseguros, garantizando la aplicación de medidas correctivas y preventivas que contribuyan al bienestar de los trabajadores y al cumplimiento de la normatividad vigente.

6. CONCLUSIONES

- En el presente informe describe el compromiso de implementación de la seguridad y salud en el trabajo en los trabajadores, el riesgo siempre va a existir en el ámbito laboral para esto se ejecutan actividades en las cuales se concientice al personal ayudando a la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud.
- La seguridad y la salud en el trabajo (SST) es una disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo en el proyecto **"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META".** Con el fin de mostrar el máximo compromiso por parte de la dirección y todos los trabajadores en el periodo de la ejecución del contrato.
- Durante la ejecución de la obra, a la fecha, solo se ha presentado un accidente de trabajo.
- Para el **CONSORCIO CARRERA 5 EG** es primordial velar por la seguridad de los trabajadores, es por ello por lo que se diseña un sistema de Gestión que le permite identificar y minimizar los riesgos a los cuales se encuentran expuestos en las diferentes actividades previas a ejecutarse. Este proyecto abre las perspectivas y expone múltiples opciones que se tienen para el desarrollo de esta obra, es un eje fundamental para la construcción de la sociedad en materia de sostenibilidad ambiental y social.

7. ANEXOS

Anexo 1 Reporte diario de ingreso y salida
Anexo 2 Soportes de afiliación
Anexo 3 Induccion de personal
Anexo 4 Acta de reunión mensual COPASST
Anexo 5 Acta de reunión mensual COCOLAB
Anexo 6 Formato entrega de EPP
Anexo 7 Inspección de EPP
Anexo 8 Inspección de botiquín y camilla
Anexo 9 Inspección de extintor
Anexo 10 Inspección de orden y aseo
Anexo 11 Inspección gerencial HSE
Anexo 12 Inspecciones locativas
Anexo 13 Inspección semanal- herramienta menor
Anexo 14 Inspección preoperacional de equipos menores
Anexo 15 Inspección de maquinaria
Anexo 16 Certificado de accidentalidad emitido por ARL
Anexo 17 FURAT – AT- Leccion aprendida
Anexo 18 Listado de asistencia
Anexo 19 ATS y permisos de trabajo

Marlly Bejarano E.

MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Reporte diario de ingreso y salida

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	09/07/2025

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que terminó mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	3:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Aguilar
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	3:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	3:00	Geiner Duran G	Geiner D
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7.30	3:00.		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	3:00	Paisa Quintero	David Quinteri
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	3:00	Carolina Restrepo	Carolina R
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	7:30	3:00	asi:n	asi:n
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	3:00		
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	15:00		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	15:00		
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.056	AYUDANTE	7:30	3:00		
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	3:00		
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	3:00	Luis carlos Rey olaya	Luis carlos Rey
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:30	Carlos M.	Carlos M
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	3:00		TILANO
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	3:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Roja
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	3:00		
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7.30	3:00	Juan Cepeda	Juan cepeda
19	Hernan Hurtado	7435928	OP	730	1130	Hernan H	Hernan H
20	William	17278594	conducto	730	3:00		
21							
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

6021

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	08/09/25

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30		Jorge Ivan A	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:30		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7 30	4:30	Geiner D	Geiner D
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7.30.	4.30.		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:30	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:30	Carolina Restrepo	Carolina R
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	7:30	4:30	Cristian	Cristian
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:30	Luis Edilson Pulido	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	16:30		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:30		
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.056	AYUDANTE	7:30	4:30		
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:30	Cesar	Cesar
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:30	Luis carlos Rey olaya	Luis carlos Rey
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:30	Carlos M.	Carlos M.
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:30	TILANO	TILANO
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:30	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:30		
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:30	Juan cepeda	Juan cepeda
19	William	1122126148	CCH	730	4:30		
20	Ricardo Rincon	1122126148	OP	7:30	4:30	Rincon	Rincon
21	Hernan Andres	1122126148	OP	7:30	4:30	Hernan A	Hernan A
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

6022

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	09/07/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:30	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Aguilar
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:30		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:30	Geiner Duran	Geiner D
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:30	4:30		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:30	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:30	Carolina Restrepo	Carolina R
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	7:30	4:30	cristian	cristian
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:30	Luis Pulido	Luis Pulido
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	16:30		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	16:30		
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.056	AYUDANTE			Incapacitado.	
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:30	Cesar	Cesar
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	16:30	Luis carlos Rey olaya	Luis Carlos Rey
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:30	Carlos M.	Carlos M.
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:30		
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:30	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:30		
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:30	Juan cepeda	Juan cepeda
19	Hernan Hurtado	79-359266	OP	8:00	4:30	Hernan H	Hernan H
20	William	1122785987	conductor	7:30	4:30		
21							
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

6023

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	10/07/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan A.	Jorge Ivan A
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:30	Geiner Duran G	Geiner
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	—	—	NO FIRMO	NO FIRMO
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina Restrepo	Carolina
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	7:30	4:00	Cristian	Cristian
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Edilson	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	16:00		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.056	AYUDANTE			Incapacitado	
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis carlos Rey olaya	Luis carlos Rey
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M.	Carlos M
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.510	AYUDANTE	7:30	4:00		
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00		
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan cepeda	Juan cepeda
19	Hernan Hortal	74354266	OP	7:30	4:00		
20	Ricardo Rincon	1122126148	OP	7:30	4:00		
21							
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

6024

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	11/07/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	12:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Aguilar
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	12:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	12:00	Geiner D	Geiner D
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:30	12:00		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	12:00	Daviq Quintero	Daviq Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	12:00	Carolina Restrepo	Carolina Restrepo
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	7:30	12:00	as fin	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	12:00	Luis Eder	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	12:00		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30		Juez	
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.056	AYUDANTE			Incapacitado	
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	12:00		
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	12:00	Luis Carlos Rey olaya	Luis Carlos Rey
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	12:00	Carlos M.	Carlos M.
15	MAICOL ESTIVEN TRIANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30 AM	12:00		
16	JOSE UBALDO ROJAS LEON	93.338.325	AYUDANTE	7:30		Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	12:00		
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	12:00	Juan Cepeda	Juan Cepeda
19	Hernan Hortua	74354246	OP	730	12:00	Hernan H	Hernan H
20	William	7728594823	OP	730			
21	Ricardo Rincon	1122126482	OP	7:30	12:00		
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

6025

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	14/07/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4.30	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7.30	4:30		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4 30	Geiner Duran G	Geiner D
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7.30	4.30		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:30	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:30	Carolina Restrepo	Carolina Restrepo
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	7:30	4:30	ostos	gestion
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:30	Luis Eduardo Pulido	LEPP
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	16:30		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	16:30		
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.056	AYUDANTE			Incapacitado	
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	16:50	Cesar	Cesar
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:30	Luis carlos Rey olaya	Luis carlos Rey
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:30	Carlos M.	Carlos M.
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:30		
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:30	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7.30	4.30		
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	730	4:30	Juan cepeda	Juan cepeda
19	William	7727859487	conductor	7.30	4:30		
20	Horacio Hurtado	79354268	OP	730	430	Horacio Hurtado	Horacio Hurtado
21							
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

6026

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	15/09/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan A	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7.30	4.00.		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner D	Geiner D
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7.30.	4.00.		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30			
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	7:30	4:00	aSTin	aSTin
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	1.30	4:00	Luis Edilson.	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:36	16:00		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.056	AYUDANTE				
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis carlos Rey	Luis carlos Rey
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M.	Carlos M.
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00		
18	Hernan H	74359266	OP	7:30	4:00	Hernan H	Hernan H
19	Juan Cepeda	9.364.953	coepedonta	7:30	4:00	Juan cepeda	Juan Cepeda
20	Ricardo Rincon	1122126148	OP	7:30	4:00		
21							
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

6027

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	16/07/20

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan A	Jorge Ivan A
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	400	Geiner D	Geiner D
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:30	4:00		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R.	Carolina R
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	7:30	4:00	cristian	cristian
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	9:30	4:00	Luis	Luis
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	16:00		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	16:00		
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.056	AYUDANTE	—	—		
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis carlos Rey	Luis Carlos
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M.	Carlos M.
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:30		
18	Hernan Hurtado	7433426	OP	730	4:00	Hernan H	Hernan H
19	Juan Carada	93439539	ayudante	7:30	4:00	Juan Carada	Juan Carada
20	William	1122859487	ayudante	730	4:00		
21	Ricardo Rincon	1122126148	OP	7:30	4:00		
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

6078

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	17/06/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan A	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7.30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7 30	4 00	Geiner D	Geiner
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7.30	4.00		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:06	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	7:30	4:00	Cristian	Cristian
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis	Luis
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	16:00		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.056	AYUDANTE				
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:00	4:00	Carlos M.	Carlos M.
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	Incapacitado			
18	William	1127859461	conjuta	7:30	4:00		
19	Juan Carlos	93634534	conductor	7:30	4:00	Juan Carlos	Juan Carlos
20	Hermes Hurtado	74254266	OP	7:30	4:00	Hermes H	
21							
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EC	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

6029

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	18/08/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	12:00	Jorge A.	Jorge A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	12:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	12:00		
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7.30	12.00		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	12:00		
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	12:00	Carolina R	Carolina R
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	7:30	12:00		
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	12:00		
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	12:00		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	12:00		
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.056	AYUDANTE	—	—		
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	12:00		
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	12:00	Luis Carlos Rey	Luis carlos Rey
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	12:00	Carlos M	Carlos M.
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	12:00		
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	12:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	Incapacitado.			
18	Juan Cupada	93439539	Ayudante	7:30	12:00	Juan cupada	Juan cupada
19	WILIA M'	1127[illegible]	Conductor	7.3	12		
20							
21							
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	5/5/2025

6030

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	21/07/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan A.	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7.30	4.00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	730	400	Geiner D	Geiner D
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7.30	4.00		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7130	4:00	David Quinteo	David Quinteo
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	7:30	4:00	CSRM	CSRM
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	400	Luis Edilson	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7130	16:00		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00	Jaider	
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.056	AYUDANTE				
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M.	Carlos M.
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7.30	4:00		
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7.30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00		
18	Juan Cañada	cp1088579	ayudante	730	4:00	Juan cañada	Juan cañada
19	Hernan Hernandez	74354266	op	730	500	Hernan H	Hernan H
20							
21							
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

6031

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	22/07/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan A	Jorge Ivan A
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner D	Geiner D
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:30	4:00		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00		
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R.
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	7:30	4:00	Cristian	Cristian
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00		
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	16:00		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	16:00		
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.056	AYUDANTE	—	—		
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis carlos Rey	Luis carlos Rey
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M.	Carlos M.
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00		
18	Hernan Horta	79354266	OP	730	400	Hernan H	Hernan H
19	Juan Cepeda	93459539	ayudante	7:30	4:00	Juan Cepeda	Juan Cepeda
20							
21							
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

6032

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	23/07/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan A	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner D	Geiner D
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:30	4:00		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R.	Carolina R
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	7:30	4:00	asha	asha
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Edilson	Luis Edilson
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	16:00		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.056	AYUDANTE				
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	16:00	Luis carlos Rey	Luis carlos Rey
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M.	Carlos M
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00		
18	Hermin Hoyos		OP	730	4:00	Hermin H	Hermin H
19	Juan Cepeda	93639574	colaborante	7:30	4:00	Juan Cepeda	Juan Cepeda
20							
21							
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

6033

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	24/07/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan A	Jorge Ivan A
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7,30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7 30	4:06	Geiner D	Geiner D
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7.20	4:00		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	7:30	4:00		
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Edilson	Luis Edilson
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	16:00		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	16:00		
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.056	AYUDANTE				
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis carlos Rey	Luis carlos Rey
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M	Carlos M.
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00		
18	Hernan Hurtado		OP	730	400	Hernan H	Hernan H
19	Juan Cepada	93639539	Ayudante	730	4:00	Juan cepada	Juan Cepada
20							
21							
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

6034

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	25/07/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	12:00	Jorge Ivan A	Jorge Ivan A
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	12:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	12:00		
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:30	12:00		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	12:00		
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	12:00	Carolina R	Carolina R
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	7:30	12:00		
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	12:00	Luis Edilson	Luis Edilson
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	12:00		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	12:00		
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.056	AYUDANTE				
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	12:00		
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	12:00	Luis carlos Rey	Luis carlos Rey
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	12:00	Carlos M.	Carlos M.
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	12:00		
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	12:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	12:00		
18	Juan Cepeda	93439539	ayudante	730	1200	Juan cepeda	Juan cepeda
19							
20							
21							
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

6035

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	27/07/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30		Jorge Ivan A	Jorge ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL		finca California		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7 30	400	Geiner D	Geiner D
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE		finca California		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quinteo	
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina	Carolina.
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	—	—	—	—
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	400	Luis Edilson	Luis Edilson
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	16:00		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE		finca California.		—
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.056	AYUDANTE	—	—		
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00	Cesar	Cesar
13	Jose Obaldo Mayes	93338325	Ayudante	7:30	4:00	Obaldo Mayes	Obaldo Mayes
14	Juan Caseda	93439539	ayudante	7:30	4:00	Juan caseda	Juan caseda
15	Oscar F Perez	1120566	Ayudan	7:30	4:00		
16	Angel G. Tolaro T	1120503527	AY.	7:30	4:00		
17	Carlos Martinez	1735453	Ayudante	7:30	4:00	Carlos M.	Carlos M.
18	Luis carlos Reyes	1121850127	Ayudante	7:30	4:00	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
19							
20							
21							
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

6036

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	28/07/25

ITEM	Nombre del trabajador	N° de identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan A	Jorge Ivan A
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		Luis
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner D	Geiner D
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:30	4:00		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00		
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	—	—	—	—
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Edilson	Luis Edilson
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	16:00		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	finca			
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.056	AYUDANTE	—	—		
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis carlos Rey	Luis carlos Rey
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M.	Carlos M.
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00		
18	Juan Cepeda	93639.539	ayudante	7:30	4:00	Juan Cepeda	Juan Cepeda
19							
20							
21							
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	STEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

6037

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	24/07/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00	[illegible]	Luis
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7 30	4 00	Geiner D	Geiner D
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:30	4:00	[illegible]	[illegible]
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4.00	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina R	Carolina R
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	—	—	—	—
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Edilson	Luis Edilson
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:00	[illegible]	[illegible]
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00	[illegible]	[illegible]
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.056	AYUDANTE	—	—	—	—
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00	[illegible]	[illegible]
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis carlos Rey olaya	Luis carlos Rey
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M.	Carlos M.
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00	[illegible]	[illegible]
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00	[illegible]	[illegible]
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan Cepeda	Juan Cepeda
19							
20							
21							
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	TEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

6038

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	31/07/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00	Ø	Ø
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner D	Geiner D
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:30	4:00		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30		David Quinteri	David Quinteri
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina Restrepo	Carolina Restrepo
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	—	—	—	—
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Edilson P	Luis Edilson P.
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	16:00		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	16:00		
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.056	AYUDANTE	—	—		
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis carlos Rey olaya	Luis Carlos Rey
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M.	Carlos M.
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00		
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan cepeda	Juan cepeda
19							
20							
21							
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

6039

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	01/08/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	12:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A.
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	12:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7 30	12:00	Geiner D	Geiner D
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:30	12:00		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	12:00		David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	12:00	Carolina Restrepo	Carolina R.
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	—	—	—	—
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	12:00	Luis Edilson	Luis Edilson
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	12:00		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	12:00		
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.056	AYUDANTE	—	—	—	—
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	12:00		
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	12:00	Luis carlos Rey olaya	Luis carlos Rey
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	12:00	Carlos M.	Carlos M.
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	12:00		
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	12:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	12:00		
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	12:00	Juan Cepeda	Juan Cepeda
19							
20							
21							
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

6040

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	03/08/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7.30	400	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	400		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	730	400	Geiner D	Geiner D
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:20	4:00		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	Davi Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina Restrepo	Carolina R.
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	—	—	—	—
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.607.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Edilson	Luis Edilson P.
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:26	16:00		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	16:00		
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.056	AYUDANTE	—	—	—	—
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	400	Luis carlos Rey olaya	Luis carlos Rey
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M.	Carlos M.
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	730	4:00		
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	16:00		
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan Cepeda	Juan Cepeda
19							
20							
21							
22							
23							

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

6041

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	04/08/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:00	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:00		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:00	Geiner D	Geiner D
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:30	4:00		
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:00	David Quintero	
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:00	Carolina Restrepo	Carolina R
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	—	—		
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis Edilson P.	Luis Edilson P.
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	16:00		
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:00		
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.056	AYUDANTE	—	—		
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:00		
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:00	Luis carlos Rey olaya	Luis carlos Rey
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:00	Carlos M.	Carlos M.
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:00		
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:00	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:00		
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:00	Juan Cepeda	Juan Cepeda
19							
20							
21							
22							
23							

6042

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	05/08/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de Identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:30	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:30		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:30	Geiner Q	Geiner Q.
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:30	4:30		
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:30	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:30	Carolina Restrepo	Carolina R
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:30	Luis Edilson pulido	Luis Edilson P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:30		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:30		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:30		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:30	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:30	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:30		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:30	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	7:30	4:30		
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:30	Juan cepeda	Juan cepeda
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:30	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:30	Ricardo Rincon	Ricardo Rincon
19							
20							

6043

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-SST-FO-94
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	REPORTE DIARIO DE INGRESO Y SALIDA	FECHA	6/5/2025

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	LUGAR	SAN MARTIN	FECHA	06/02/26

ITEM	Nombre del trabajador	N° de identificación	Cargo	Hora Entrada	Hora salida	Declaro que inicio mi jornada laboral en buen estado de salud	Declaro que termino mi jornada laboral, libre de accidente
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	7:30	4:30	Jorge Ivan Aguilar	Jorge Ivan A
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	7:30	4:30		
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	7:30	4:30	Geiner D	Geiner D
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	7:30	4:30		
5	QUINTERO ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	7:30	4:30	David Quintero	David Quintero
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	7:30	4:30	Carolina Restrepo	Carolina R
7	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	7:30	4:30	Luis edilson P.	Luis edilson P.
8	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	7:30	4:30		
9	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	7:30	4:30		
10	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.157	AYUDANTE	7:30	4:30		
11	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	7:30	4:30	Luis Carlos Rey	Luis Carlos Rey
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	7:30	4:30	Carlos M	Carlos M
13	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	7:30	4:30		
14	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93.338.325	AYUDANTE	7:30	4:30	Ubaldo Rojas	Ubaldo Rojas
15	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.666	AYUDANTE	7:30	4:30		
16	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	7:30	4:30	Juan Cepeda	Juan Cepeda
17	LUIS SEPULVEDA	1.006.796.279	OPERADOR	7:30	4:30	Luis Sepulveda	Luis Sepulveda
18	RICARDO RINCON TRIANA	1.122.126.548	OPERADOR	7:30	4:30	Ricardo Rincon	Ricardo Rincon
19							
20							

Inducción del personal

6045

CONSORCIO CARRERA 5 EG	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CÓDIGO: SIG-TH-FO-21
	PROCESO TALENTO HUMANO	VERSIÓN: 1
	Evaluación - De La Inducción	FECHA: 06/05/2026

FECHA:	07/02/2026		
NOMBRE:	Leonardo Andres Borda	CC.	80229941
CARGO:	Director de obra	CALIFICACION:	15/15

1. ¿Une con una linea los residuos que correspondan al color?



2. ¿Cuál de los siguientes crees que es un efecto del cambio climático?

A) Que las herramientas se desgasten más rápido

(X) Que haya lluvias más intensas y frecuentes fuera de temporada y golpes de calor

C) Que se usen más equipos eléctricos y aire acondicionado

3. ¿Cuál de las siguientes consideras que son prácticas es sostenibles?

A) Tirar los residuos mezclados en cualquier contenedor

B) Lavar herramientas directamente en el suelo

(X) Usar el agua energia y papel necesario, separar residuos adecuadamente.

4. ¿En cual de las siguientes normas esta certificada la empresa?

A) Seguridad y Salud en el Trabajo 45000.

(X) Politica integral (Calidad 9001, Seguridad 45000, Ambiental 14001)

C) Energia (50001)

5. Para prevenir las lesiones y enfermedades, usted:

(X) Utiliza los elementos de protección personal

B. Trabaja rápido sin tomar medidas de precaucion para salir temprano

6. Si un compañero de trabajo no cumple con las normas de seguridad, usted:

A. Sigue trabajando sin preocuparse por lo que le pase

(X) Le recomienda cumplir con las normas de seguridad

7. La politica de alcohol, drogas y tabaquismo prohibe:



8. Como trabajadores de CONSORCIO CARRERA 5 EG nos comprometemos a cumplir con:

A. Cumplir con el horario laboral

B. Acatar las instrucciones del encargado y/o lider de proceso

(X) Todas las Anteriores

9. Seleccione los elementos de proteccion personal para realizar actividades al interior de la empresa y en su lugar de trabajo (Marque con una X)



6646

10.Cuales de las siguientes actividades requieren permiso de trabajo? (Marque con una X)

X Demoliciones X Trabajo en alturas X Excavaciones d. Trabajos eléctricos

11. En caso de presentarse un accidente de trabajo que se debe Hacer:

A. Salir corriendo B. Buscar al gerente de la empresa X Reportarlo al area de SST y/o jefe inmediato

12. Marque con X los riesgos a los que está expuesto durante su trabajo.



13. Con sus palabras escriba que es y que hace el Copasst

Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo

14. ¿Cuáles son las consecuencias de incumplir las normas de seguridad en el trabajo? (Por ejemplo no utilizar los EPPS, incumplir las instrucciones del SISO, dañar la señalización, etc.)

Accidentes, enfermedades laborales, muerte

15 ¿Para que sirve el comité de convivencia?

Comité de convivencia laboral previene el acoso laboral

CONSORCIO CARRERA 5 EG 900.814.725-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Acta de reunión mensual COPASST

6048

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: SIG-CAL-FO-02
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN 1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 06/05/2026

EMPRESA:	**CONSORCIO CARRERA 5 EG**				
FECHA:	30/7/2026	**HORA INICIO:**	10:00 a. m.	**HORA FINAL:**	11:00 a. m.
LUGAR:	Oficina	**PROYECTO:**	Administrativo	**PROCESO:**	SIG
TEMA A DESARROLLAR:	Acta de reunión mensual COPASST (Julio 2026)				

ASPECTOS TRATADOS / AGENDA DE TRABAJO

Verificación de asistencia
Revisión de condiciones de seguridad e higiene en el área
Reporte de actos y condiciones inseguras
Seguimiento a actividades de SST
Próxima reunión

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación de asistencia:
Se confirma la presencia de los integrantes del COPASST y del Profesional SST, así como de los asistentes convocados.
2. Revisión de condiciones de seguridad:
Se informó sobre las inspecciones realizadas en la zona de trabajo, destacando los siguientes puntos:
Se evidencia buen uso de EPP en la mayoría de los trabajadores.
Se evidencia orden y aseo en obra.
Se realizo señalización de los puntos de la obra.
3. Reporte de actos y condiciones inseguras:
Se reporto 1 accidente de trabajo, se realizo la investigacion y la leccion aprendia
4. Seguimiento a campañas y actividades SST:
Se realizaron todas las actividades programadas.

ACCIONES /TAREAS A SEGUIR Y/O COMPROMISOS

ACCIONES / TAREAS	RESPONSABLE	FECHA
PROXIMA REUNIÓN	COPASST	31/8/2026

PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO	C.C.	CARGO	FIRMA
DAVID QUINTERO	1.120.501.079	ALMACENISTA	David Quintero
CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	AYUDANTE	CAROLINA RESTREPO
MARLLY BEJARANO	1.121.944.835	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano E.

CONSORCIO CARRERA 5 EG 901.054.725-6	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Acta de reunión mensual COCOLAB

6050

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: SIG-CAL-FO-02
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN 1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 06-05-2026

EMPRESA:	CONSORCIO CARRERA 5 EG				
FECHA:	30/7/2026	**HORA INICIO:**	11:00 a. m.	**HORA FINAL:**	12:00 p. m.
LUGAR:	Oficina	**PROYECTO:**	Administrativo	**PROCESO:**	SIG
TEMA A DESARROLLAR:	Acta de reunión mensual COCOLAB (Julio 2026)				

ASPECTOS TRATADOS / AGENDA DE TRABAJO

Verificación del quórum
Revisión de compromisos del comité anterior
Informe de capacitación realizada
Revisión del buzón de sugerencias y nuevos casos
Actividades del comité
Programación de la próxima reunión

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación del quórum: Se confirma asistencia de los miembros del comité para dar inicio a la reunión.
2. Revisión de compromisos del comité anterior: Se revisan las tareas asignadas en la reunión anterior y su nivel de cumplimiento.
3. Informe de capacitación realizada: Se realizo charla de resolucion de conflictos, roles y responsabilidades del COCOLAB, factores de riesgo psicosocial.
4. Revisión del buzón de sugerencias y nuevos casos: Se realizó la revisión del buzón de sugerencias correspondiente al periodo actual.
No se reportaron casos nuevos de presunta situación de acoso laboral o conflicto interpersonal.
Se recuerda a los trabajadores la disponibilidad del buzón como canal confidencial para reportar inquietudes, quejas o sugerencias relacionadas con la convivencia laboral.
5. Actividades del comité: Se realizó seguimiento al buzón de sugerencias y no se identificaron casos que requieran intervención.
6. Programación de la próxima reunión: Se establece la fecha tentativa para el siguiente encuentro del comité.

ACCIONES /TAREAS A SEGUIR Y/O COMPROMISOS

ACCIONES / TAREAS	RESPONSABLE	FECHA
PROXIMA REUNIÓN	COCOLAB	31/8/2026

PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO	C.C.	CARGO	FIRMA
DAVID QUINTERO	1.120.501.079	ALMACENISTA	David Quintero
CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	AYUDANTE	CAROLINA RESTREPO
MARLLY BEJARANO	1.121.944.835	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano E.

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Formato entrega de EPP

6052

CONSORCIO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	6/5/2026

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Jhon Cesar Julio Cespedes Barrero	No. CEDULA	1.121.875.157
CARGO		FECHA DE INGRESO	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	EPP														DOTACIÓN					Motivo entrega		Firma de recibido
	Casco	Cantidad													Botas		Otros					
		Camiseta	Bata	Etiqueta	Guante	Mascarilla de filtro	Tapabocas Nasobuco	Gafas	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oidos inserción	Tapa oidos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cual?	Caucho	Material	Camisa	Pantalón	Impermeable (Gaban)	Suministro	Reposición	
30/01/26			X						X							X	X					

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Código Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Art. 230. Ley 9 de 1979, Art. 88. Decreto 1295 de 1994: Art. 22.

6053

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
CONSORCIO	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	6/5/2026

EMPRESA:	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA:	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO:	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO:	Jorge Ivan Aguilar	No. CEDULA	1006997319
CARGO:	Oficial	FECHA DE INGRESO	20/05/26

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	Casco	EPP: Cantidad: Camisa	Mitones	Vaqueta	Caucho	Mascarilla de filtro	Tapabocas Mascarilla	Gafas	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oidos insercion	Tapa oidos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cual?	DOTACIÓN: Botas: Caucho	Material	Otros: Camisa	Pantalón	Impermeable (Gaban)	Motivo entrega: Suministro	Reposición	Firma de recibido
20/05/26									X													Jorge Ivan A.
28/05/26				X			X															Jorge Ivan A
30/05/26			X				X		X							X	X					Jorge Ivan A.

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyan a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Codigo Sustantivo del Trabajo Articulo 7 Art.230; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994; Art. 22.

6054

consorcio	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	6/5/2026

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Gainer Doran	No. CEDULA	1120806904
CARGO	Ayudante de obra	FECHA DE INGRESO	25/08/26

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	EPP														DOTACIÓN					Motivo entrega		Firma de recibido
	Casco	Gafas													Botas		Otros					
		Gafas Pantalla	Gafas Visión	Gafas Vaqueta	Gafas Gluchó	Mascarilla de filtro	Tapabocas Mascarilla	Careta	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oídos inserción	Tapa oídos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cuál?	Gaucho	Material	Camisa	Pantalón	Impermeable (Gaban)	Suministro	Reposición	
15/09/26			X						X													"Gainer D
30/09/26			X						X							X	X					Gainer D

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.

Código Sustantivo del Trabajo Art. 57 y Art. 58 numeral 7; Art. 230; Ley 9 de 1979, Art. 88; Decreto 1295 de 1994, Art. 22.

6055

CONSORCIO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	6/5/2020

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	David Alejandro Quintero Andrade	No. CEDULA	1120581079
CARGO	Almacenista	FECHA DE INGRESO	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	EPP: Casco	Gafas	Tapabocas Mascarilla	Careta	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oidos inserción	Tapa oidos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cual?	DOTACIÓN: Botas Caucho	Botas Material	Otros: Camisa	Pantalón	Impermeable (Gaban)	Motivo entrega: Suministro	Reposición	Firma de recibido
30/01/20		X			X							X	X					David Quintero

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos. Código Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Art. 230; Ley 9 de 1979; Art. 86; Decreto 1295 de 1994; Art. 22.

6056

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	6/5/2026

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Carolina Restrepo	No. CEDULA	1070386114
CARGO	Ayudante de obra	FECHA DE INGRESO	23/05/26

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	ERP														DOTACIÓN							Motivo entrega		Firma de recibido
	Casco	Guantes				Manchilla de cuero	Capa hombros Manga larga	Gafas	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oidos inserción	Tapa oidos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cuál?	Botas		Otros							
		Camisa	Pitaza	Chaqueta	Caucho										Caucho	Material	Camisa	Pantalón	Impermeable (Gaban)	Suministro	Reposición			
30/05/26			X						X							X	X							Carolina R.

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a cuidar adecuadamente durante la forma de labora los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Código Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 58 numeral 7; Art. 230; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994; Art. 22.

6057

CONSORCIO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	9/5/2025

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Luis edison Valdo Pena	No. CEDULA	1.120.507.359
CARGO	Ayudante de obra	FECHA DE INGRESO	01/06/26

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	EPP													DOTACIÓN					Motivo entrega		Firma de recibido
	Casco	Gafas	Guantes: Nitrilo	Guantes: Vaqueta	Guantes: Caucho	Mascarilla de polvo	Tapabocas Mascarilla	Careta	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oídos tipo copa	Tapa oídos tipo inserción	Barbuquejo	Otros ¿Cuál?	Botas: Caucho	Botas: Material	Otros: Camisa	Otros: Pantalón	Otros: Impermeable (Gaban)	Suministro	Reposición	
30/05/26			X						X							X	X					Luis Edison Valdo P

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a cuidarlos adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Código Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Art. 230, Ley 9 de 1979, Art. 88, Decreto 1295 de 1994, Art. 22.

6058

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Fecha	6/5/2026

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	[illegible]	No. CEDULA	93437999
CARGO	AUXILIAR	FECHA DE INGRESO	1/06/26

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	Casco	EPP													DOTACIÓN					Motivo entrega		Firma de recibido
		Careta	Filtros	Vincula	Caucho	Mascarilla de filtro	Tapabocas Mascarilla	Gafas	Monogafa oscura	Monogafa transparente	Tapa oido tipo inserción	Tapa oidos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cual?	Botas		Otros					
															Caucho	Material	Camisa	Pantalón	Impermeable (Gaban)	Suministro	Reposición	
03/06/26				X																		
30/05/26			X						X							X	X					

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Código Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 58 numeral 2; Art. 230; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994; Art. 22.

6059

CONSORCIO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	8/5/2026

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Luis Carlos Rey Ebala	No. CEDULA	1121850421
CARGO	Ayudante	FECHA DE INGRESO	9/06/26

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	EPP: Casco	Guantes: Carnaza	Guantes: Nitrilo	Guantes: Caucho	Mascarilla de filtros	Tapa oídos Mecanix	Camisa	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oídos inserción	Tapa oídos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cuál?	DOTACIÓN: Botas: Caucho	Botas: Material	Otros: Camisa	Otros: Pantalón	Otros: Impermeable (Gaban)	Motivo entrega: Suministro	Motivo entrega: Reposición	Firma de recibido
07/07/26		X																			Luis Carlos Rey Ebala
30/07/26		X						X							X	X					Luis Carlos Rey Ebala

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a cuidar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen al bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Codigo Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Art. 230; Ley 9 de 1979, Art. 86; Decreto 1295 de 1994, Art. 22.

6060

CONSORCIO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-21
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	6/5/2026

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Oscar Julian Tabano Triana	No. CEDULA	1120838521
CARGO		FECHA DE INGRESO	9-06-26

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	EPP													DOTACIÓN					Motivo entrega		Firma de recibido
	Cantidad	Guantes		Casco	Protección auditiva	Tapabocas Media cara	Gafas	Monogafas de gas	Monogafas Transparentes	Tapa oidos insercion	Tapa oidos tipo copa	Barbiquejo	Otros ¿Cuál?	Botas		Otros			Suministro	Reposición	
														Caucho	Material	Camisa	Pantalón	Impermeable (Gabán)			
9/06/26	1																				
15/07/26								X													
30/09/26		X						X							X	X					

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional de la compañía. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Codigo Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 57 numeral 2, Art. 230 Ley 9 de 1979, Art. 88, Decreto 1295 de 1994, Art. 22.

6067

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	SIG-SST-FO-21
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	6/5/2026

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Rubaldo Rojas Leon	No. CEDULA	9333832S
CARGO	Ayudante de obra	FECHA DE INGRESO	11 Enero

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	Cargo	EPP: Casco				Mascara de filtros	Tapabocas Natural	Careta	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oidos inserción	Tapa oidos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cual?	DOTACIÓN: Botas		Otros			Motivo entrega		Firma de recibido
		Cachucha	Alleta	Vincha	Balaclava										Caucho	Material	Camisa	Pantalón	Impermeable (Gaban)	Suministro	Reposición	
11 Enero									X													Rubaldo Rojas
30/01/26			X											X		X	X					Rubaldo Rojas

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Mi compromiso es utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyan a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Código Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Art. 230; Ley 9 de 1979; Art. 88; Decreto 1295 de 1994; Art. 22.

6062

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	SIG-SST-FO-21
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Fecha	6/5/2026

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Jhon Fernando Perez	No. CEDULA	1120566S
CARGO	Ayudante	FECHA DE INGRESO	11 06 26

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	EPP													DOTACIÓN					Motivo entrega		Firma de recibido
	Casco	Cantidad	Filtros	Cantidad	Caucho	Mascarilla de fuelle	Tapabocas Mascarilla	Careta	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oidos inserción	Tapa oidos tipo copa	Barbuquejo	Otros ¿Cual?	Botas		Otros					
															Caucho	Material	Camisa	Pantalón	Impermeable (Gaban)	Suministro	Reposición	
06/06/26				1												/						
30/06/26			1													X	X					

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Código Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 58 numeral 1. Art. 230 Ley 9 de 1979. Art. 88 Decreto 1295 de 1994 Art. 22.

6063

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	SIG-SST-FO-21
consorcio	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión	1
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha	6/5/2026

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	RESPONSABLE DE ENTREGA	MARLLY J. BEJARANO ENCISO
PROYECTO	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CARGO	COORDINADORA SST

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO	Juan Cepeda	No. CEDULA	93439539
CARGO	Asistente	FECHA DE INGRESO	11/06/26

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha de entrega	Cargo	EPP: Guantes: Cuero	Nitrilo	Vaqueta	Caucho	Mascarilla de filtro	Tapabocas Mascarilla	Careta	Monogafas oscuras	Monogafas transparentes	Tapa oidos Insercion	Tapa oidos tipo copa	Barbiquejo	Otros ¿Cual?	DOTACIÓN: Botas: Caucho	Material	Otros: Camisa	Pantalón	Impermeable (Gaban)	Motivo entrega: Suministro	Reposición	Firma de recibido
16/06/26									X													
30/06/26			X						X							Y	X					Juan Cepeda
																						Juan Cepeda

COMPROMISO DEL TRABAJADOR

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
Código Sustantivo del Trabajo Art. 56 y Art. 58 numeral 1°, Art. 230; Ley 9 de 1979, Art. 88; Decreto 1295 de 1994, Art. 22.

Inspección de EPP

CONSORCIO CARRERA 5 EG		Codigo	SIG-SST-FO-30
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión	01
	Inspección de EPP	Fecha	6/5/2025

6065

FECHA: 29. 07. 2026

UGAR DE INSPEECIO: SAN MARTIN – OBRA

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CASCO DE SEGURIDAD		LENTES DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		RESPIRADOR		GUANTES		BOTAS PUNTA DE ACERO		DOTACIÓN		METODOS DE CONTROL	FIRMA
		USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO		
1	JORGE AGUILAR	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
3	GEINER DURAN GAITAN	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
4	YEISON HERNANDEZ	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
5	DAVID QUINTERO	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
6	CAROLINA RESTREPO	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
7	LUIS PULIDO	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
8	JUAN PABLO MANCERA	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
9	JOHN MARQUEZ	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
10	CESAR BAQUERO	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
11	LUIS CARLOS REY	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
12	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
13	MAICOL ESTIVEN TILANO	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
14	OSCAR FERNANDO PEREZ	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
15	JUAN GABRIEL CEPEDA	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		
16	JOSE UBALDO ROJAS LEON	SI	B	SI	B	SI	B	NO	NR	SI	B	SI	B	SI	B		

INSTRUCCIONES:

USO: (SI) El trabajador SI usa el EPP, (NO) El trabajador NO usa el EPP

ESTADO: (B) Bueno, (M) Malo, (NR) No Requiere

METODOS DE CONTROL: (1) Instrucción, (2) Motivación, (3) Cambio de EPP, (4) Capacitación, (5) Otra

COMENTARIOS:

Holly Bolivar E

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR

Inspección de botiquín y camilla

6067

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-27
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	INSPECCION A BOTIQUIN Y CAMILLA	Fecha	6/5/2026

EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG		
NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA	MARLLY BEJARANO ENCISO	**CARGO**	PROFESIONAL SST
UBICACIÓN DEL BOTIQUIN	ALMACEN	**FECHA DE INSPECCION**	22/07/2026
UBICACIÓN CAMILLA	ALMACEN		

INSPECCION A BOTIQUIN

No	DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS	CUMPLE			CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIÓN
		SI	NO	N/A			
1	Estado del botiquín	X			1 UND		
2	Señalización	X			1 UND		
3	Gasas limpias paquete	X			1 CAJA		
4	Esparadrapo de tela rollo de 4"	X			1 UND		
5	Bajalenguas	X			17 UND		
6	Guantes de latex para examen	X			1 CAJA		
7	Venda elástica 2 x 5 yardas	X			1 UND		
8	Venda elástica 3 x 5 yardas	X			1 UND		
9	Venda elástica 5 x 5 yardas	X			1 UND		
10	Venda de algodón 3 x 5 yardas	X			1 UND		
11	Venda de algodón 5 x 5 yardas	X			1 UND		
12	Yodopovidona (jabón quirúrgico)	X			1 UND		120 ml
13	Solución salina 250 cc ó 500 cc	X			2 UND		500 ml
14	Termómetro de mercurio o digital	X			1 UND		DIGITAL
15	Alcohol antiséptico frasco por 275 ml	X			1 UND		350 ml

** Nota: Los elementos mencionados anteriormente son basados según Resolución No. 705 de 2007 - Botiquín Tipo A*

No	DESCRIPCIÓN DE OTROS ELEMENTOS DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS	CUMPLE			CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIÓN
		SI	NO	N/A			
1							
2							
3							
4							
5							

** Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)*

INSPECCIÓN DE CAMILLA

No	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CUMPLE			CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIÓN
		SI	NO	N/A			
1	Instalación (Sitio de ubicación)	X				N/A	
2	Señalización	X				N/A	
3	Estado del soporte	X				N/A	
4	Correas de seguridad	X				N/A	
5	Sujetadores para agarre	X				N/A	

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA	Marlly Bejarano E.

Inspección de extintor

6069

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo	SIG-SST-FO-26
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version	1
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Fecha	6/5/2026

EMPRESA: CONSORCIO CARRERA 5 EG

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: MARLLY BEJARANO ENCISO | **FECHA DE INSPECCIÓN:** 22/07/2026

No.	UBICACIÓN	TIPO						CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN ESTADO GENERAL												FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
		PQS								CILINDRO													
		BC	ABC	CO_2	SOLKAFLAM 123	AGUA	OTROS			PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO	MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS		
1	ALMACEN		X					20 LB	NA	B	NT	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	may-27	
2	MINICARGADOR		X					10 LB	NA	B	NT	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	may-27	
3	RETROEXCAVADORA		X					10 LB	NA	B	NT	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	feb-27	
4	EXCAVADORA		X					10 LB	NA	B	NT	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	ago-26	
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								

B	BUENO
R	REGULAR
M	MALO

NT	NO TIENE
NA	NO APLICA
NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE

FIRMA RESPONSABLE DE INSPECCIÓN Marlly Bejarano E.

Inspección de orden y aseo

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SIG-SST-FO-15
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN:	1
	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	FECHA	6/5/2026

EMPRESA: CONSORCIO CARRERA 5 EG

LUGAR: SAN MARTIN - META **FECHA DE INSPECCIÓN:** 20/07/2026 6071

MARQUE CON X SEGÚN CORRESPONDA, C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA).

1. CONDICIONES GENERALES		C	NC	N/A	OBSERVACIONES
1,1	Politicas y reglamentos de la empresa publicados en sitio con acceso a todo el personal.	X			
1.2	Sistema de alertamiento en caso de emergencia.	X			
1.3	Rutas de evacuación debidamente señalizadas, incluye rutas de manejo y disposición de residuos.	X			
1.4	Salida de emergencia señalizada y libre de obstáculos.	X			
1.5	Botiquín debidamente equipado e identificado.	X			
1.6	Brigada de emergencia constituida y conocida por todo el personal.	X			
1.7	MEDEVAC publicado y actualizado.	X			
1.8	Extintores suficientes y del tipo adecuado, con fecha de recarga vigente y señalización respectiva.	X			
1.9	Kit ambiental para respuesta a contingencias	X			
2. ESTRUCTURA		**C**	**NC**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
2.1	Iluminación adecuada y suficiente.	X			
2.2	Equipos eléctricos con conexión a tierra.	X			
2.3	Conexiones eléctricas en buen estado.	X			
2.4	Ventilación suficiente y adecuada.	X			
3. ÁREA - PUESTOS DE TRABAJO		**C**	**NC**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
3.1	Espacio de trabajo adecuado.	X			
3.2	Mesas y sillas de trabajo cómodas, ajustables y de dimensiones adecuadas.	X			
3.3	Vías de movilización despejadas.	X			
3.4	Iluminación y ventilación adecuada y suficiente.	X			
3.5	Limpieza, orden y aseo.	X			
3.6	Estado de las escaleras del área	X			
4. SERVICIOS SANITARIOS		**C**	**NC**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
4.1	Baterías sanitarias: cantidad, dotación y estado de acuerdo a numero de personas.	X			
4.2	Conexiones sanitarias (Ausencia de fugas).	X			
4.3	Se da cumplimiento con el programa de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico	X			
4.4	Orden y aseo.	X			
5. MANEJO DE RESIDUOS		**B**	**M**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
5.1	Adecuada separación de residuos de acuerdo con el plan integral de gestión de residuos.	X			
5.2	Rotulado.	X			
5.3	Orden y aseo.	X			
5.4	El centro de acopio cumple con las condiciones de infraestructura requerida por la normatividad vigente.	X			
6. INFRAESTRUCTURA		**B**	**M**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
6.1	Cunetas perimetrales y desarenadores en buen estado y libres de residuos.	X			
6.2	Ausencia de fugas de agua en red hidráulica.	X			
6.3	Se da cumplimiento con el programa de ahorro y uso eficiente de la energía.	X			
7. CONDICIONES GENERALES DE LA SEÑALIZACIÓN		**C**	**NC**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
7,1	Señalización de Ingreso a la locación para induccion de seguridad.	X			
7,2	Señalización de seguridad, y salud en el trabajo en areas operativas de la locación.	X			
7,3	Señalización ambiental en vias de acceso a la locación, de acuerdo a licencia Ambiental.	X			
7,4	Señalización vial en vias de acceso a locación.	X			
8. CONDICIONES GENERALES DE LA DEMARCACIÓN		**C**	**NC**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
8.1	Salidas, puertas de acceso y de emergencia.	X			
8.2	Instalaciones para almacenamiento, incluyendo las necesarias para sustancias peligrosas.	X			
8.3	Vías de circulación interna.	X			

10. OBSERVACIONES GENERALES

INSPECCIONADO POR:	Marlly Julieth Bejarano Enciso	FIRMA:	Marlly Bejarano E.

6072

Inspección gerencial HSE

6073

CONSORCIO CARRERA 5 E.C.	PRISMA DAV INGENIERIA S.A.S.	CÓDIGC:	SIG-SST-FO-69
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN:	1
	INSPECCIÓN GERENCIAL HSE	FECHA:	6/5/2026

ÁREA - PROYECTO: Consorcio Carrera 5 E6 FECHA: 24/07/26 HORA INICIO: 10:00 am HORA FIN: 10:20 am

RESPONSABLE: MARLLY BEJARANO ENCISO CARGO: PROFESIONAL SST

NO	ASPECTO	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
ORDEN Y ASEO					
1	Se tiene sitios adecuados para el almacenamiento de equipos y herramientas	X			
2	Las condiciones de orden y aseo de la oficina son adecuadas y agradables para el trabajador	X			
3	Se tiene recipiente para disposición y clasificación de residuos en el área de oficinas	X			
4	Las condiciones de orden y aseo de la zona del comedor son apropiadas	X			
5	Las zonas de construcción se encuentran en optimo estado de orden y aseo	X			
6	Las zonas de construcción y campamento cuentan con recipientes para disposición y clasificación de residuos.	X			
7	Los pasillos o zonas de transito de personal, se encuentran libres de obstáculos	X			
	SEÑALIZACIÓN	**SI**	**NO**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
8	Las zonas de trabajo de alto riesgo se encuentran debidamente señalizadas	X			
9	Las zonas de transito de personal se encuentra señalizada	X			
10	Las zonas de peligro se encuentran debidamente señalizadas para evitar el paso del personal	X			
11	Las rutas de evacuación están debidamente señalizadas	X			
12	El punto de encuentro esta debidamente señalizado	X			
13	Las zonas cuentan con señalización informativa que guie al visitante en su recorrido por la locación	X			
14	Las barandas se encuentran debidamente pintadas con color de contraste (Amarillo-negro)	X			
15	Las líneas de flujo se encuentran pintadas según el contenido	X			
16	El sentido de las líneas de flujo se encuentra debidamente señalizado en la tubería	X			
17	Las zonas de trabajo riesgoso, equipos, y zonas peligrosas se encuentran	X			
	BIENESTAR DEL PERSONAL	**SI**	**NO**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
18	Se cuenta con equipos de comunicación y telecomunicación (TV, Radio, Teléfono, Celular)		X		
19	Se cuenta con botellones de agua apta para el consumo humano, disponibles	X			
20	La cantidad de baños es suficiente para el personal, mínimo 1 por cada 15 personas	X			
21	los lavamanos funcionan correctamente	X			
22	Los mobiliarios de los contenedores se encuentran en optimas condiciones (escritorios, sillas...)	X			

6024

	SEGURIDAD INDUSTRIAL	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
23	Los equipos y Elementos de Protección personal son los adecuados para el trabajo que debe desempeñarse	X			
24	Se encuentra completo y limpio y cumple con las normas técnicas	X			
25	Se llevan los registros de asistencia de todas las charlas y actividades realizadas	X			
26	Se tienen registros de inducción y reinducción al día	X			
27	Disponen de cartelera informativa de HSE	X			
28	Los trabajadores conocen y comprenden las políticas de la Organización	X			
29	El personal está informado sobre los riesgos inherentes a la actividad que	X			
30	Hay registro de afiliación al Sistema de Seguridad Social de todos los empleados ubicados en la facilidad	X			
31	Utilizan los trabajadores el equipo de protección personal disponible	X			
32	**El Equipo y los elementos de Protección Personal incluye:**				
33	Casco para protección de la cabeza	X			
34	Protectores para los oídos	X			
35	Protectores para los ojos	X			
36	Máscaras y equipo respiratorio	X			
37	Guantes para los diferentes tipos de actividad y riesgo	X			
38	Calzado de seguridad para los pies	X			
39	Ropa de trabajo	X			
40	Equipo de protección contra caída en buen estado	X			
41	Se cuenta con pararrayos en la locación	X			
42	Se mantienen protegidos los circuitos	X			
43	Se mantienen en buen estado los conductores eléctricos, enchufes, maquinas eléctricas portátiles	X			
44	**Tableros Eléctricos se mantuvieren en buenas condiciones en cuanto a:**				
45	Limpieza	X			
46	Pintura	X			
47	Ubicación	X			
48	Empotrado	X			
49	Conexiones	X			
50	Funcionamiento	X			
51	Alambrado	X			
52	**Enchufes e Interruptores están en buen estado en cuanto a:**				
53	Correcto alambrado y ajuste de contactos	X			
54	Cuenta con canalización de instalaciones eléctricas o están entubadas	X			
	RESPUESTA ANTE EMERGENCIA	**SI**	**NO**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
55	Se encuentran los extintores en condiciones de usarse	X			
56	Los extintores se encuentran debidamente señalizados	X			
57	Han sido capacitados los trabajadores para utilizar ese equipo.	X			
58	Se tienen las actas de conformación de brigada de emergencia, capacitación y reuniones periódicas de la brigada	X			
59	Hay una persona encargada del mantenimiento e inspección.	X			
60	Los trabajadores conocen los números de los teléfonos de emergencia.	X			
61	Conocen los trabajadores las rutinas y ejercicios de emergencia en caso de incendio	X			
62	Se cuenta con material de respuesta ante emergencias.	X			

6075

63	Se cuenta con un sistema de alarma de emergencia	X			
64	se cuenta con un botiquín de primeros auxilios con material suficiente para una respuesta a emergencia; basarse en el formato de inspección de botiquines	X			
	REPORTE DE INCIDENTES, ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS.				
	PERMISOS DE TRABAJO Y AST	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
65	Existen ATS para la realización de actividades críticas	X			
66	Los Trabajadores reportan actos y condiciones inseguras	X			
67	Se reportan los incidentes presentados en la locación	X			
68	Los trabajadores entienden la importancia de los reportes.	X			
69	Los trabajadores comunican sus inquietudes en salud y seguridad al COPASST	X			
70	Se tienen las actas de reunión y actividades del COPASST, al día.	X			
	PROCEDIMIENTOS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
71	Está disponible el programa de mantenimiento de equipos.	X			
72	Se llevan los registros de las verificaciones y mantenimientos	X			
73	Los procedimientos de los equipos se encuentran disponibles en el sitio de trabajo y tienen peligros identificados	X			
74	Los trabajadores están capacitados en el manejo de equipos y herramientas críticas.	X			
75	Existen registros de inspección de equipos y evidencia de seguimiento de las acciones generadas	X			
76	Fueron identificados y está disponible el stock de repuestos críticos	X			
	EQUIPOS OPERACIONALES	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
81	Líneas y conexionado con soportes adecuados, sin fugas y señalizadas correctamente	X			
82	Compresores en correcto funcionamiento(con sus mangueras), conexionado adecuado, empalmes en buen estado	X			
83	Bombas de transferencia en optimo funcionamiento, sin fugas e instalación adecuada. Conexionado eléctrico adecuado, empalmes en buen estado	X			
85	Tanques de almacenamiento con spool de medición	X			
86	Todos los equipos tienen puesta a tierra	X			
87	Generadores en correcto funcionamiento, sin fugas y con mantenimiento al día. Conexionado eléctrico adecuado, empalmes en buen estado	X			
88	Iluminación perimetral en buen estado (limpieza e instalación, con empalmes y conexionado eléctrico adecuado.	X			

PARTICIPANTES DE LA INSPECCION		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
MARLLY BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano E
CAROLINA RESTREPO	MIEMBRO COPASST	CAROLINA RESTREPO

6076

Inspecciones locativas

CONSORCIO CARRERA 5 EG	CONSORCIO CARRERA 5 EG	Código	SIG-SST-FO-24
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Versión	1
	Inspecciones Locativas	Fecha	6/5/2026

Sede/Obra: SAN MARTIN

Fecha inspección: 20/07/2026

6077

Item	Aspectos a inspeccionar	SI	NO	NA	Observaciones
1	SEÑALIZACIÓN				
1.1	Las rutas de evacuación se encuentran señalizadas	X			
1.2	Las salidas de emergencia se encuentran señalizadas	X			
1.3	Los elementos de atención de emergencia se encuentran señalizados	X			
1.4	La señalización es clara, legible y se encuentra en buen estado	X			
2	ORDEN Y ASEO				
2.1	Las áreas de trabajo están ordenadas y aseadas	X			
2.2	Los elementos se encuentran bien dispuestos en archivos o estantes	X			
2.3	Existen recipientes para disposición de residuos	X			
2.4	El nivel de iluminación es adecuado	X			
2.5	La ventilación es adecuada	X			
3	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
3.1	La instalación cuenta con polo a tierra	X			
3.2	Ausencia de empalmes defectuosos	X			
3.3	No existen cables sueltos en el piso	X			
3.4	Los interruptores y tomacorrientes se encuentran en buen estado	X			
3.5	Los bombillos y luminarias funcionan adecuadamente	X			
3.6	Tomas o multitomas recargadas	X			
4	EQUIPO DE EMERGENCIA				
4.1	Se cuenta con botiquines en un número suficiente	X			
4.2	Se cuenta con extintores en un número suficiente	X			
4.3	Se cuenta con un sistema de alarma en caso de emergencia	X			

Inspeccionó:

Nombre: Yarlly Bejarano Enciso

Firma: Yarlly Bejarano E.

Cargo: Profesional SST

Inspección semanal- herramienta menor

CONSORCIO CARRERA S EG	PRISMA DAV INGENIERIA S.A.S.	CÓDIGO: SIG-SST-FO-68
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN SEMANAL - HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 06/05/2026

6079

Fecha:	09/07/26	**Área/Proyecto:**	CONSORCIO CARRERA 5 EG
Ubicación del equipo	SAN MARTIN	**Inspeccionado por:**	MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO
Cargo:	PROFESIONAL SST	**Marca del equipo**	—
Id kit herramienta	←		Marlly Bejarano E.

HERRAMIENTA	CONCEPTO A REVISAR	ESTADO		OBSERVACIONES
		BUENO	MALO	
Alicates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción	X		
Barras/ Barretones	Estado general	X		
Cinceles	Cabeza libre de rebabas, no achatada, cóncava o poco afilada	X		
	Filos de corte redondeados	X		
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar / desenrollar.	X		
	Visibilidad de la escala de medición	X		
Destornilladores	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto	—		
	Punta que no sea roma, rota o malformada	—		
Llaves fijas, mixtas, expansivas	Estado del cuadrante y tornillo sinfin	—		
	Estado de muescas de la estrella	—		
Juego de copas	Estrías de copa	—		
	Cuadrante y anclaje	—		
Rachet	Estrías de copa	—		
	Cuadrante y anclaje	—		
Grapas de alinear	Estado general	—		
Limas	Estado de superficie estriada y del mango	—		
Llaves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfin estriado.	—		
Machetes	Estado del mango y la funda	—		
Martillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas	X		
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.	X		
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	X		
Paladragas	Mangos, resortes, ejes	X		
Picas	Mango	X		
Porras	Mango	X		
Prensas	Estado general	X		
Carretillas	Llanta y pasador en buen estado	X		
	Mangos y platón	X		

Nota: * Punto crítico que inhabilita el equipo para operar.
Nota I: La inspección de los equipos en uso se debe hacer todos los días lunes de cada semana, o en su defecto el primer día de la semana en que se vaya a utilizar.
Nota II. El equipo debe ser verificado cada vez que se vaya a utilizar, si en ese proceso se identifica que el equipo o sus componentes no están en buen estado, la anomalía deberá ser registrada en el presente formato y reportarla al jefe inmediato.
Nota III. Es responsabilidad del Jefe inmediato gestionar y asegurar la corrección de las fallas identificadas en el equipo.

Observaciones:

CONSORCIO CARRERA 5 EG	PRISMA DAV INGENIERIA S.A.S.	CÓDIGO: SIG-SST-FO-68
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN SEMANAL - HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 06/05/2026

Fecha:	16/07/26	Área/Proyecto:	CONSORCIO CARRERA 5 EG
Ubicación del equipo	SAN MARTIN	Inspeccionado por:	MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO
Cargo:	PROFESIONAL SST	Marca del equipo	—
Kit herramienta	—		

6080

Marlly Bejarano E.

HERRAMIENTA	CONCEPTO A REVISAR	ESTADO		OBSERVACIONES
		BUENO	MALO	
licates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción	X		
arras/ Barretones	Estado general	X		
	Cabeza libre de rebabas, no achatada, cóncava o poco afilada	X		
inceles	Filos de corte redondeados	X		
	Estado del dispositivo de enrollar / desenrollar.	X		
inta métrica	Visibilidad de la escala de medición	X		
	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto	—		
estornilladores	Punta que no sea roma, rota o malformada	—		
aves fijas, mixtas, pansivas	Estado del cuadrante y tornillo sinfin	—		
	Estado de muescas de la estrella	—		
	Estrías de copa	—		
ego de copas	Cuadrante y anclaje	—		
	Estrías de copa	—		
achet	Cuadrante y anclaje	—		
apas de alinear	Estado general	—		
nas	Estado de superficie estriada y del mango	—		
aves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfin estriado.	—		
achetes	Estado del mango y la funda	—		
artillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas	X		
	Mango, revisar dientes trabados.	X		
las	Revisar ajuste del mango, astillas	X		
ladragas	Mangos, resortes, ejes	X		
as	Mango	X		
rras	Mango	X		
nsas	Estado general	X		
	Llanta y pasador en buen estado	X		
rretillas	Mangos y platón	X		

a: * Punto critico que inhabilita el equipo para operar.
a I: La inspección de los equipos en uso se debe hacer todos los días lunes de cada semana, o en su defecto el primer día de la semana en que se vaya a utilizar.
a II. El equipo debe ser verificado cada vez que se vaya a utilizar, si en ese proceso se identifica que el equipo o sus componentes no están en buen estado, la malía deberá ser registrada en el presente formato y reportarla al jefe inmediato.
a III. Es responsabilidad del Jefe inmediato gestionar y asegurar la corrección de las fallas identificadas en el equipo.

servaciones:

CONSORCIO CARRERA 5 EG	PRISMA DAV INGENIERIA S.A.S.	CÓDIGO: SIG-SST-FO-68
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN SEMANAL - HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 06/05/2026

6081

Fecha:	23/07/26	Área/Proyecto:	CONSORCIO CARRERA 5 EG
Ubicación del equipo	SAN MARTIN	Inspeccionado por:	MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO
Cargo:	PROFESIONAL SST	Marca del equipo	———
Nº kit herramienta	———		Marlly Bejarano E

HERRAMIENTA	CONCEPTO A REVISAR	ESTADO		OBSERVACIONES
		BUENO	MALO	
icates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción	X		
arras/ Barretones	Estado general	X		
	Cabeza libre de rebabas, no achatada, cóncava o poco afilada	X		
nceles	Filos de corte redondeados	X		
	Estado del dispositivo de enrollar / desenrollar.	X		
nta métrica	Visibilidad de la escala de medición	X		
[redacted]	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto	—		
estornilladores	Punta que no sea roma, rota o malformada	—		
aves fijas, mixtas, pansivas	Estado del cuadrante y tornillo sinfin	—		
	Estado de muescas de la estrella	—		
	Estrías de copa	—		
ego de copas	Cuadrante y anclaje	—		
	Estrías de copa	—		
chet	Cuadrante y anclaje	—		
apas de alinear	Estado general	—		
nas	Estado de superficie estriada y del mango	—		
ves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfin estriado.	—		
chetes	Estado del mango y la funda	—		
rtillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas	X		
[redacted]	Mango, revisar dientes trabados.	X		
las	Revisar ajuste del mango, astillas	X		
ladragas	Mangos, resortes, ejes	X		
as	Mango	X		
rras	Mango	X		
nsas	Estado general	X		
	Llanta y pasador en buen estado	X		
retillas	Mangos y platón	X		

a: * Punto critico que inhabilita el equipo para operar.
a I: La inspección de los equipos en uso se debe hacer todos los dias lunes de cada semana, o en su defecto el primer día de la semana en que se vaya a utilizar.
a II. El equipo debe ser verificado cada vez que se vaya a utilizar, si en ese proceso se identifica que el equipo o sus componentes no están en buen estado, la omalia deberá ser registrada en el presente formato y reportarla al jefe inmediato.
a III. Es responsabilidad del Jefe inmediato gestionar y asegurar la corrección de las fallas identificadas en el equipo.

servaciones:

CONSORCIO CARRERA 5 EG	PRISMA DAV INGENIERIA S.A.S.	CÓDIGO: SIG-SST-FO-68
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN SEMANAL - HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 06/05/2026

6082

Fecha:	30/04/26	**Área/Proyecto:**	CONSORCIO CARRERA 5 EG
Ubicación del equipo	SAN MARTIN	**Inspeccionado por:**	MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO
Cargo:	PROFESIONAL SST	**Marca del equipo**	—
Id kit herramienta	—		Marlly Bejarano E

HERRAMIENTA	CONCEPTO A REVISAR	ESTADO		OBSERVACIONES
		BUENO	MALO	
Alicates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción	X		
Barras/ Barretones	Estado general	X		
Cinceles	Cabeza libre de rebabas, no achatada, cóncava o poco afilada	X		
	Filos de corte redondeados	X		
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar / desenrollar.	X		
	Visibilidad de la escala de medición	X		
Destornilladores	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto	—		
	Punta que no sea roma, rota o malformada	—		
Llaves fijas, mixtas, expansivas	Estado del cuadrante y tornillo sinfin	—		
	Estado de muescas de la estrella	—		
Juego de copas	Estrías de copa	—		
	Cuadrante y anclaje	—		
Rachet	Estrías de copa	—		
	Cuadrante y anclaje	—		
Grapas de alinear	Estado general	—		
Limas	Estado de superficie estriada y del mango	—		
Llaves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfin estriado.	—		
Machetes	Estado del mango y la funda	—		
Martillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas	X		
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.	X		
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	X		
Paladragas	Mangos, resortes, ejes	X		
Picas	Mango	X		
Porras	Mango	X		
Prensas	Estado general	X		
Carretillas	Llanta y pasador en buen estado	X		
	Mangos y platón	X		

Nota: * Punto critico que inhabilita el equipo para operar.
Nota I: La inspección de los equipos en uso se debe hacer todos los días lunes de cada semana, o en su defecto el primer día de la semana en que se vaya a utilizar.
Nota II. El equipo debe ser verificado cada vez que se vaya a utilizar, si en ese proceso se identifica que el equipo o sus componentes no están en buen estado, la anomalía deberá ser registrada en el presente formato y reportarla al jefe inmediato.
Nota III. Es responsabilidad del Jefe inmediato gestionar y asegurar la corrección de las fallas identificadas en el equipo.

Observaciones:

Inspección preoperacional de equipos menores

6054

CONSORCIO CARRERA 5 EG	CODIGO: SIG-SST-FO-63
PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSIÓN: 1
INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS MENORES	FECHA: 06-05-2026

PROYECTO: CARRERA 5 EG

B	Bueno	M	Malo	C	Cambio	Otro	N.A.

EQUIPO MENOR CRÍTICO	FECHA	N° de serial	Estado del cableado	Estado del disco	Estado de la guarda	Estado de la broca	Estado de la pipeta de oxigeno	Estado de la pipeta de acetileno	Estado de la boquilla	Estado de las mangueras	Estado del manómetro	Estado de los reguradores	Estado de los manoreductores	Nivel de aceite	Estado switc-interruptor	Estado del martillo / empuñadoras	Estado silenciador de escape de aire	Estado de la manguera neumática	Observaciones
MEZCLADORA	24-jul		B	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

Contratista _____ **Nombre de quien realiza la inspeccion:** Marlly Bejarano E **Cargo:** Profesional SST **Firma** Marlly Bejarano

Inspección de maquinaria

CONSORCIO CARRERA 5 EG		CODIGO:	SIG-SST-FO-96
CONSORCIO CARRERA 5 EG	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	1
	Preoperacional Retroexcavadora	FECHA:	6/05/2026

6086

SEMANA DEL 06/07/26 AL 12/07/26 MARCA CAT MODELO 2026 SERIE 416

OPERADOR HERNAN HURTADO PROYECTO CONSORCIO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL — FINAL —

Instrucciones: En cada casilla marque con una **X**: **B**: Bueno **M**: Malo o escriba **N.A** cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras	X		X		X		X		X		X			
	De Stop y señal trasera	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano	X		X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion	X		X		X		X		X		X			
	Bateria y cables	X		X		X		X		X		X			
	Pedales	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**	X		X		X		X		X		X			
	Estado pasadores	X		X		X		X		X		X			
	*** Gatos estabilizadores**	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	X		X		X		X		X		X			
	*** Funcion hidraulica en buen estado (mangueras)**	X		X		X		X		X		X			
	*** Freno de servicio**	X		X		X		X		X		X			
	*** Mando de estacionamiento**	X		X		X		X		X		X			
	Estado general desgarrador (balde)	X		X		X		X		X		X			
	Mandos de levante del brazo	X		X		X		X		X		X			
	*** Cilindros en buen estado**	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X			
	Tubo de escape (Exhosto)	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aire	X		X		X		X		X		X			
	Separador de agua	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras progundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X		X			
	Huellas en buen estado	X		X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	X		X		X		X		X		X			
	Kit ambiental	X		X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	X		X		X		X		X		X		—	—
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Hernan		Hernan		Hernan		Hernan		Hernan		Hernan		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	Marlyn B		Marlyn B		Marlyn B		Marlyn B		Marlyn B		Marlyn B		—	

OBSERVACIONES

CONSORCIO CARRERA 5 EG			
CONSORCIO CARRERA 5 EG	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CODIGO:	SIG-SST-FO-96
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	1
	Preoperacional Retroexcavadora	FECHA:	6/05/2026

6089

SEMANA DEL 13/07/26 AL 19/07/26 MARCA CAT MODELO 2026 SERIE 416

OPERADOR HERNAN HURTADO PROYECTO CONSORCIO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL — FINAL —

Instrucciones: En cada casilla marque con una X: B: Bueno M: Malo o escriba N.A cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras			X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras			X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras			X		X		X		X		X			
	De Stop y señal trasera			X		X		X		X		X			
CABINA	Cinturon de seguridad			X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito			X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado			X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores			X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado			X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)			X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso			X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano			X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion			X		X		X		X		X			
	Bateria y cables			X		X		X		X		X			
	Pedales			X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**			X		X		X		X		X			
	Estado pasadores			X		X		X		X		X			
	*** Gatos estabilizadores**			X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)			X		X		X		X		X			
	*** Funcion hidraulica en buen estado (mangueras)**			X		X		X		X		X			
	*** Freno de servicio**			X		X		X		X		X			
	*** Mando de estacionamiento**			X		X		X		X		X			
	Estado general desgarrador (balde)			X		X		X		X		X			
	Mandos de levante del brazo			X		X		X		X		X			
	*** Cilindros en buen estado**			X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado			X		X		X		X		X			
	Tubo de escape (Exhosto)			X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor			X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión			X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible			X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite			X		X		X		X		X			
	Filtro de aire			X		X		X		X		X			
	Separador de agua			X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras progundas y sin abultamientos)			X		X		X		X		X			
	Huellas en buen estado			X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios			X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio			X		X		X		X		X			
	Kit ambiental			X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCION

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	X		X		X		X		X		X		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR	—		Hernan		Hernan		Hernan		Hernan		Hernan		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	—		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		—	

OBSERVACIONES

CONSORCIO CARRERA 5 EG	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CODIGO:	SIG-SST-FO-96
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	1
	Preoperacional Retroexcavadora	FECHA:	6/05/2026

6088

SEMANA DEL 20/07/26 AL 26/07/26 MARCA CAT MODELO 2026 SERIE 416

OPERADOR HERNAN HURTADO PROYECTO CONSORCIO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL — FINAL —

Instrucciones: En cada casilla marque con una X: B: Bueno M: Malo o escriba N.A cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras			X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras			X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras			X		X		X		X		X			
	De Stop y señal trasera			X		X		X		X		X			
CABINA	Cinturon de seguridad			X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito			X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado			X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores			X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado			X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)			X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso			X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano			X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion			X		X		X		X		X			
	Bateria y cables			X		X		X		X		X			
	Pedales			X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**			X		X		X		X		X			
	Estado pasadores			X		X		X		X		X			
	*** Gatos estabilizadores**			X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)			X		X		X		X		X			
	*** Funcion hidraulica en buen estado (mangueras)**			X		X		X		X		X			
	*** Freno de servicio**			X		X		X		X		X			
	*** Mando de estacionamiento**			X		X		X		X		X			
	Estado general desgarrador (balde)			X		X		X		X		X			
	Mandos de levante del brazo			X		X		X		X		X			
	*** Cilindros en buen estado**			X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado			X		X		X		X		X			
	Tubo de escape (Exhosto)			X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor			X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión			X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible			X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite			X		X		X		X		X			
	Filtro de aire			X		X		X		X		X			
	Separador de agua			X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras progundas y sin abultamientos)			X		X		X		X		X			
	Huellas en buen estado			X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios			X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio			X		X		X		X		X			
	Kit ambiental			X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCION

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	X	—	X		X		X		X		X		—	—
FIRMA	FIRMA OPERADOR	—		Hernan		Hernan		Hernan		Hernan		Hernan		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	—		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		—	

OBSERVACIONES

CONSORCIO CARRERA 5 EG			
	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CODIGO:	SIG-SST-FO-96
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	1
	Preoperacional Retroexcavadora	FECHA:	6/05/2026

6089

SEMANA DEL 27/07/26 AL 02/07/26 MARCA CAT MODELO 2026 SERIE 416

OPERADOR HERNAN HURTADO PROYECTO CONSORCIO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL — FINAL —

Instrucciones: En cada casilla marque con una X: B: Bueno M: Malo o escriba N.A cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras	X		X		X		X		X		X			
	De Stop y señal trasera	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano	X		X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion	X		X		X		X		X		X			
	Bateria y cables	X		X		X		X		X		X			
	Pedales	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**	X		X		X		X		X		X			
	Estado pasadores	X		X		X		X		X		X			
	*** Gatos estabilizadores**	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	X		X		X		X		X		X			
	*** Funcion hidraulica en buen estado (mangueras)**	X		X		X		X		X		X			
	*** Freno de servicio**	X		X		X		X		X		X			
	*** Mando de estacionamiento**	X		X		X		X		X		X			
	Estado general desgarrador (balde)	X		X		X		X		X		X			
	Mandos de levante del brazo	X		X		X		X		X		X			
	*** Cilindros en buen estado**	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X			
	Tubo de escape (Exhosto)	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aire	X		X		X		X		X		X			
	Separador de agua	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras progundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X		X			
	Huellas en buen estado	X		X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	X		X		X		X		X		X			
	Kit ambiental	X		X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCION

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	X		X		X		X		X		X		—	—
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Hernan		Hernan		Hernan		Hernan		Hernan		Hernan		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	Marly B		Marly B		Marly B		Marly B		Marly B		Marly B		—	

OBSERVACIONES

CONSORCIO CARRERA 5 EG	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CODIGO:	SIG-SST-FO-98
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	2
	Preoperacional Excavadora	FECHA:	14/07/2025

6090

SEMANA DEL 06/07/26 AL 12/07/26 MARCA CAT MODELO — SERIE —

OPERADOR RICARDO RINCON PROYECTO CONSORCIO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL — FINAL —

Instrucciones: En cada casilla marque con una X: B: Bueno M: Malo o escriba N.A cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	Direccionales delanteras		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	Direccionales traseras		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	De Stop y señal trasera		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
CABINA	Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano	X		X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion	X		X		X		X		X		X			
	Bateria y cables	X		X		X		X		X		X			
	Pedales	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X			
	Estado pasadores	X		X		X		X		X		X			
	* Gatos estabilizadores	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	X		X		X		X		X		X			
	* Funcion hidraulica en buien estado (mangueras)	X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	* Mando de estacionamiento		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	Estado del balde y brazo en movimiento	X		X		X		X		X		X			
	Estado de las puertas y tapa superior del motor	X		X		X		X		X		X			
	Estado de la tapa radiador	X		X		X		X		X		X			
	* Cilindros en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X			
	Motor (sin fugas, aseo, sin ruidos raros, etc)	X		X		X		X		X		X			
	Estado motor de traslación	X		X		X		X		X		X			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor)	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aire	X		X		X		X		X		X			
	Separador de agua	X		X		X		X		X		X			
ORUGAS	Orugas (zapatas, sprokets, pasadores)	X		X		X		X		X		X			
	Rotación y giro de orugas	X		X		X		X		X		X			
	En buen estado	X		X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	X		X		X		X		X		X			
	Kit ambiental	X		X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCION

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	X		X		X		X		X		X		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Ricardo		Ricardo		Ricardo		Ricardo		Ricardo		Ricardo		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		—	

OBSERVACIONES

CONSORCIO CARRERA 5 EG			
CONSORCIO CARRERA 5 EG	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	2
	Preoperacional Excavadora	FECHA:	14/07/2025

6091

SEMANA DEL 13/07/26 AL 19/07/26 MARCA CAT MODELO — SERIE —

OPERADOR RICARDO RINCON PROYECTO CONSORCIO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL — FINAL —

Instrucciones: En cada casilla marque con una X: B: Bueno M: Malo o escriba N.A cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras				NA		NA		NA		NA		NA		
	Direccionales delanteras				NA		NA		NA		NA		NA		
	Direccionales traseras				NA		NA		NA		NA		NA		
	De Stop y señal trasera				NA		NA		NA		NA		NA		
CABINA	Cinturon de seguridad			X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito			X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado			X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores			X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado			X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)			X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso			X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano			X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion			X		X		X		X		X			
	Bateria y cables			X		X		X		X		X			
	Pedales			X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**			X		X		X		X		X			
	Estado pasadores			X		X		X		X		X			
	*** Gatos estabilizadores**			X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)			X		X		X		X		X			
	*** Funcion hidraulica en buien estado (mangueras)**			X		X		X		X		X			
	*** Freno de servicio**				NA		NA		NA		NA		NA		
	*** Mando de estacionamiento**				NA		NA		NA		NA		NA		
	Estado del balde y brazo en movimiento			X		X		X		X		X			
	Estado de las puertas y tapa superior del motor			X		X		X		X		X			
	Estado de la tapa radiador			X		X		X		X		X			
	*** Cilindros en buen estado**			X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado			X		X		X		X		X			
	Motor (sin fugas, aseo, sin ruidos raros, etc)			X		X		X		X		X			
	Estado motor de traslación			X		X		X		X		X			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)			X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor)			X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión			X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible			X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite			X		X		X		X		X			
	Filtro de aire			X		X		X		X		X			
	Separador de agua			X		X		X		X		X			
ORUGAS	Orugas (zapatas, sprokets, pasadores)			X		X		X		X		X			
	Rotación y giro de orugas			X		X		X		X		X			
	En buen estado			X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios			X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio			X		X		X		X		X			
	Kit ambiental			X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCION

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	—		X		X		X		X		X		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR	—		Ricardo		Ricardo		Ricardo		Ricardo		Ricardo		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	—		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		—	

OBSERVACIONES

CONSORCIO CARRERA 5 EG	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CODIGO:	SIG-SST-FO-98
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	2
	Preoperacional Excavadora	FECHA:	14/07/2025

6092

SEMANA DEL 20/07/26 AL 26/07/26 MARCA CAT MODELO — SERIE —

OPERADOR RICARDO RINCON PROYECTO CONSORCIO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL — FINAL —

Instrucciones: En cada casilla marque con una **X**: **B**: Bueno **M**: Malo o escriba **N.A** cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras				NA		NA		NA		NA		NA		
	Direccionales delanteras				NA		NA		NA		NA		NA		
	Direccionales traseras				NA		NA		NA		NA		NA		
	De Stop y señal trasera				NA		NA		NA		NA		NA		
CABINA	Cinturon de seguridad			X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito			X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado			X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores			X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado			X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)			X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso			X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano			X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion			X		X		X		X		X			
	Bateria y cables			X		X		X		X		X			
	Pedales			X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**			X		X		X		X		X			
	Estado pasadores			X		X		X		X		X			
	*** Gatos estabilizadores**			X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)			X		X		X		X		X			
	*** Funcion hidraulica en buien estado (mangueras)**			X		X		X		X		X			
	*** Freno de servicio**				NA		NA		NA		NA		NA		
	*** Mando de estacionamiento**				NA		NA		NA		NA		NA		
	Estado del balde y brazo en movimiento			X		X		X		X		X			
	Estado de las puertas y tapa superior del motor			X		X		X		X		X			
	Estado de la tapa radiador			X		X		X		X		X			
	*** Cilindros en buen estado**			X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado			X		X		X		X		X			
	Motor (sin fugas, aseo, sin ruidos raros, etc)			X		X		X		X		X			
	Estado motor de traslación			X		X		X		X		X			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)			X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor)			X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión			X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible			X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite			X		X		X		X		X			
	Filtro de aire			X		X		X		X		X			
	Separador de agua			X		X		X		X		X			
ORUGAS	Orugas (zapatas, sprokets, pasadores)			X		X		X		X		X			
	Rotación y giro de orugas			X		X		X		X		X			
	En buen estado			X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios			X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio			X		X		X		X		X			
	Kit ambiental			X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	—		X		X		X		X		X		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR	—		Ricardo		Ricardo		Ricardo		Ricardo		Ricardo		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	—		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		—	

OBSERVACIONES

CONSORCIO CARRERA 5 EG	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CODIGO:	SIG-SST-FO-98
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	2
	Preoperacional Excavadora	FECHA:	14/07/2025

6093

SEMANA DEL 27/07/26 AL 02/08/26 MARCA CAT MODELO - SERIE -

OPERADOR RICARDO RINCON PROYECTO: CONSORCIO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL - FINAL -

Instrucciones: En cada casilla marque con una X: B: Bueno M: Malo o escriba N.A cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	Direccionales delanteras		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	Direccionales traseras		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	De Stop y señal trasera		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
CABINA	Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano	X		X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion	X		X		X		X		X		X			
	Bateria y cables	X		X		X		X		X		X			
	Pedales	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**	X		X		X		X		X		X			
	Estado pasadores	X		X		X		X		X		X			
	*** Gatos estabilizadores**	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	X		X		X		X		X		X			
	*** Funcion hidraulica en buien estado (mangueras)**	X		X		X		X		X		X			
	*** Freno de servicio**		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	*** Mando de estacionamiento**		NA		NA		NA		NA		NA		NA		
	Estado del balde y brazo en movimiento	X		X		X		X		X		X			
	Estado de las puertas y tapa superior del motor	X		X		X		X		X		X			
	Estado de la tapa radiador	X		X		X		X		X		X			
	*** Cilindros en buen estado**	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X			
	Motor (sin fugas, aseo, sin ruidos raros, etc)	X		X		X		X		X		X			
	Estado motor de traslación	X		X		X		X		X		X			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor)	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aire	X		X		X		X		X		X			
	Separador de agua	X		X		X		X		X		X			
ORUGAS	Orugas (zapatas, sprokets, pasadores)	X		X		X		X		X		X			
	Rotación y giro de orugas	X		X		X		X		X		X			
	En buen estado	X		X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	X		X		X		X		X		X			
	Kit ambiental	X		X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCION

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	X		X		X		X		X		X		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Ricardo		Ricardo		Ricardo		Ricardo		Ricardo		Ricardo		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		—	

OBSERVACIONES

CONSORCIO CARRERA 5 EG			
	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CODIGO:	SIG-SST-FO-99
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	1
	Preoperacional Minicargador	FECHA:	6/5/2026

6094

SEMANA DEL 06/07/26 AL 12/07/26 MARCA CAT MODELO 2023 SERIE R3CD3

OPERADOR LUIS SEPULVEDA PROYECTO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL — FINAL —

Instrucciones: En cada casilla marque con una X: B: Bueno M: Malo o escriba N.A cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo frontales	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras	X		X		X		X		X		X			
	De Stop y señal trasera	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano	X		X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion	X		X		X		X		X		X			
	Bateria y cables	X		X		X		X		X		X			
	Pedales	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO	Direccion	X		X		X		X		X		X			
	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X			
	Pasadores, suspensión	X		X		X		X		X		X			
	Grapas y anclaje de chasis	X		X		X		X		X		X			
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X			
	Proteccion antivuelco	X		X		X		X		X		X			
	Mangueras	X		X		X		X		X		X			
	Exsosto porosidad, hendeduras	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X			
	Motor (sin fugas, aseo, sin ruidos raros, etc)	X		X		X		X		X		X			
	Frenos principales	X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aire	X		X		X		X		X		X			
	Separador de agua	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras progundas y sin abultamientos)		NA	X	NA		NA		NA		NA		NA		
	Huellas en buen estado	X		X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	X		X		X		X		X		X			
	Kit ambiental	X		X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	X		X		X		X		X		X		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Luis		Luis		Luis		Luis		Luis		Luis		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	Marly		Marly		Marly		Marly		Marly		Marly		—	

OBSERVACIONES

CONSORCIO CARRERA 5 EG			
	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CODIGO:	SIG-SST-FO-99
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	1
	Preoperacional Minicargador	FECHA:	6/5/2026

6095

SEMANA DEL 13/07/26 AL 19/07/26 MARCA CAT MODELO 2023 SERIE R3CD3

OPERADOR LUIS SEPULVEDA PROYECTO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL FINAL

Instrucciones: En cada casilla marque con una X: B: Bueno M: Malo o escriba N.A cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo frontales			X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras			X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras			X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras			X		X		X		X		X			
	De Stop y señal trasera			X		X		X		X		X			
CABINA	Cinturon de seguridad			X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito			X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado			X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores			X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado			X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)			X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso			X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano			X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion			X		X		X		X		X			
	Bateria y cables			X		X		X		X		X			
	Pedales			X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Direccion			X		X		X		X		X			
	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X		X			
	Pasadores, suspensión			X		X		X		X		X			
	Grapas y anclaje de chasis			X		X		X		X		X			
	Estado de correas			X		X		X		X		X			
	Proteccion antivuelco			X		X		X		X		X			
	Mangueras			X		X		X		X		X			
	Exsosto porosidad, hendeduras			X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado			X		X		X		X		X			
	Motor (sin fugas, aseo, sin ruidos raros, etc)			X		X		X		X		X			
	Frenos principales			X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia			X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor			X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión			X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible			X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite			X		X		X		X		X			
	Filtro de aire			X		X		X		X		X			
	Separador de agua			X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras progundas y sin abultamientos)			X	NA		NA		NA		NA		NA		
	Huellas en buen estado			X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios			X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio			X		X		X		X		X			
	Kit ambiental			X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	—		X		X		X		X		X		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR	—		Luis		Luis		Luis		Luis		Luis		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	—		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		—	

OBSERVACIONES

CONSORCIO CARRERA 5 EG		CODIGO:	SIG-SST-FO-99
CONSORCIO CARRERA 5 EG	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	1
	Preoperacional Minicargador	FECHA:	6/5/2026

6096

SEMANA DEL 20/07/26 AL 26/07/26 MARCA CAT MODELO 2023 SERIE R3CD3

OPERADOR LUIS SEPULVEDA PROYECTO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL FINAL

Instrucciones: En cada casilla marque con una X: B: Bueno M: Malo o escriba N.A cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo frontales			X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras			X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras			X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras			X		X		X		X		X			
	De Stop y señal trasera			X		X		X		X		X			
CABINA	Cinturon de seguridad			X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito			X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado			X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores			X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado			X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)			X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso			X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano			X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion			X		X		X		X		X			
	Bateria y cables			X		X		X		X		X			
	Pedales			X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Direccion			X		X		X		X		X			
	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X		X			
	Pasadores, suspensión			X		X		X		X		X			
	Grapas y anclaje de chasis			X		X		X		X		X			
	Estado de correas			X		X		X		X		X			
	Proteccion antivuelco			X		X		X		X		X			
	Mangueras			X		X		X		X		X			
	Exsosto porosidad, hendeduras			X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado			X		X		X		X		X			
	Motor (sin fugas, aseo, sin ruidos raros, etc)			X		X		X		X		X			
	Frenos principales			X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia			X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor			X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión			X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible			X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite			X		X		X		X		X			
	Filtro de aire			X		X		X		X		X			
	Separador de agua			X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras progundas y sin abultamientos)			X	NA		NA		NA		NA		NA		
	Huellas en buen estado			X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios			X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio			X		X		X		X		X			
	Kit ambiental			X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	—		X		X		X		X		X		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR	—		Luis		Luis		Luis		Luis		Luis		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	—		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		—	

OBSERVACIONES

CONSORCIO CARRERA	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CODIGO:	SIG-SST-FO-99
	PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	VERSION:	1
	Preoperacional Minicargador	FECHA:	6/5/2026

6097

SEMANA DEL 27/07/26 AL 02/07/26 MARCA CAT MODELO 2023 SERIE R3CD3

OPERADOR LUIS SEPULVEDA PROYECTO CARRERA 5 EG

UBICACIÓN SAN MARTIN HORÓMETRO INICIAL FINAL

Instrucciones: En cada casilla marque con una X: B: Bueno M: Malo o escriba N.A cuando No aplica

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo frontales	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras	X		X		X		X		X		X			
	De Stop y señal trasera	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso y Pito	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales y retrovisores	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite, motor)	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando o de mano	X		X		X		X		X		X			
	Aire /Calefaccion	X		X		X		X		X		X			
	Bateria y cables	X		X		X		X		X		X			
	Pedales	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Direccion	X		X		X		X		X		X			
	Control de fugas hidraulicas	X		X		X		X		X		X			
	Pasadores, suspensión	X		X		X		X		X		X			
	Grapas y anclaje de chasis	X		X		X		X		X		X			
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X			
	Proteccion antivuelco	X		X		X		X		X		X			
	Mangueras	X		X		X		X		X		X			
	Exsosto porosidad, hendeduras	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X			
	Motor (sin fugas, aseo, sin ruidos raros, etc)	X		X		X		X		X		X			
	Frenos principales	X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de enfriamiento (Aceite hidraulico y/o aceite de motor	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de transmisión	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de aire	X		X		X		X		X		X			
	Separador de agua	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (Sin cortaduras progundas y sin abultamientos)		NA	X	NA		NA		NA		NA		NA		
	Huellas en buen estado	X		X		X		X		X		X			
OTROS	Botiquin de primeros auxilios	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	X		X		X		X		X		X			
	Kit ambiental	X		X		X		X		X		X			

ESTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
-	Apto para operar	X		X		X		X		X		X		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Luis		Luis		Luis		Luis		Luis		Luis		—	
	FIRMA ENCARGADO SST	Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		Marlly		—	

OBSERVACIONES

CONSORCIO CARRERA 5 EC 901.054.725-5	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Certificado de accidentalidad emitido por ARL

ARL | sura

6099

Medellín, 6 de agosto de 2026

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa CONSORCIO CARRERA 5 EG, NIT N902054725, ha reportado 1 accidente(s) de trabajo ocurrido(s) a sus trabajadores dependientes desde las fechas 07 de julio de 2026 hasta el 06 de agosto de 2026, con un total de 0 día(s) de incapacidad pagados y una tasa de accidentalidad de 5.88%.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51 1414.

Atentamente,

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 181.51.34.168, 107.154.191.4, 172.16.42.57.

DE COLOMBIA

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FURAT- Investigación de AT - Lección aprendida

INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

ARL | SURA

6101

EPS a la que está afiliado	Código EPS	ARL a la que está afiliado	Código ARL
NUEVA EPS S.A.	037	ARL SURA	40

AFP a la que está afiliado: COLPENSIONES — Código AFP: 031

Identificación general de la empresa

Tipo de vinculador laboral: (●) Empleador ( ) Contratante ( ) Cooperativa de trabajo asociado

Nombre de la actividad económica

CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES. SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

Nombre o razón social: CONSORCIO CARRERA 5 EG

Tipo de identificación: (●) NI ( ) CC ( ) CE ( ) NU ( ) PA — Número: 902054725

Dirección	Teléfono	Fax
CR 32 # 38 - 70 ED ROMARCO OF 1302	3103069962	

Correo electrónico	Departamento	Municipio	Zona
CONSORCIOCARRERA5EG@GMAIL.COM	META	VILLAVICENCIO	(●) U ( ) R

Centro de trabajo donde labora el trabajador

Son los datos del centro de trabajo son los mismos de la sede principal? (●) Si ( ) No

Nombre de la actividad económica del centro de trabajo — Código de la actividad económica del centro de trabajo: 5429001

CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE

Dirección	Teléfono	Fax
CR 32 # 38 - 70 ED ROMARCO OF 1302	3103069962	

Departamento	Municipio	Zona
META	SAN MARTIN	(●) U ( ) R

Identificación de la persona que se accidentó

Tipo de vinculación: (●) Planta ( ) Misión ( ) Cooperado ( ) Estudiante o aprendíz ( ) Independiente — Código

Primer apellido	Segundo apellido	Nombres
PEREZ	GARCIA	OSCAR FERNANDO

Tipo de identificación: ( ) NI (●) CC ( ) CE ( ) NU ( ) PA — Número: 11205665

Fecha de nacimiento	Sexo
01081984	(●) M ( ) F

Dirección	Teléfono	Fax
CR 2 # 16 B - 37	3108586432	

Departamento	Municipio	Zona	Cargo
META	SAN MARTIN	(●) U ( ) R	AYUDANTE DE OBRA

Ocupación habitual	Tiempo de ocupación habitual al momento del accidente
OBREROS DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO: CARRETERAS, PRESAS Y OBRAS SIMILARES	1:5

Fecha de ingreso a la empresa	Salario u honorarios (mensual)	Jornada de trabajo habitual
11062026	1750905	(●) Diurna ( ) Nocturna ( ) Mixto ( ) Turnos

Información sobre el accidente

Fecha del accidente	Estaba dentro de la empresa?	Día de la semana en el que ocurrio el accidente
16072026 10:40:00	S	Jueves

Jornada en que sucede	¿Estaba realizando su labor habitual?	¿Cuál?
(●) Normal ( ) Extra	(●) Si ( ) No	

¿Causó la muerte al trabajador?	Departamento del accidente	Municipio del accidente	Zona donde ocurrio el accidente
( ) Si (●) No	META	SAN MARTIN	(●) U ( ) R

Total tiempo laborado previo al accidente	Tipo de accidente
3:0	( ) Violencia ( ) Tránsito ( ) Deportivo ( ) Recreativo o cultural (●) Propios del trabajo

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

6102

Lugar donde ocurrió el accidente (•) Dentro de la empresa ( ) Fuera de la empresa

Indique cuál sitio

( ) Almacenes o depósitos
( ) Áreas de producción
( ) Áreas recreativas o deportivas
( ) Corredores o pasillos
( ) Escaleras
( ) Parqueaderos o áreas de circulación vehicular
( ) Oficinas
( ) Otras áreas comunes
(•) Otro
OBRA

Parte del cuerpo aparentemente afectado

(•) Cabeza
( ) Ojo
( ) Cuello
( ) Tronco (incluye espalda, columna vertebral, médula espinal, pélvis)
( ) Tórax
( ) Abdomen
( ) Miembros superiores
( ) Manos
( ) Miembros inferiores
( ) Pies
( ) Ubicaciones múltiples
( ) Lesiones generales u otras

Tipo de Lesión

( ) Fractura
( ) Luxación
( ) Torcedura o esguince, desgarro muscular, hernia o laceración de tendón sin herida
( ) Conmoción o trauma interno
( ) Amputación o enucleación
( ) Herida
( ) Trauma superficial
(•) Golpe contusión o aplastamiento
( ) Quemadura
( ) Envenenamiento o intoxicación aguda o alergia
( ) Efecto del tiempo, del clima u otro relacionado con el ambiente
( ) Asfixia
( ) Efecto de la electricidad
( ) Efecto nocivo de la radiación
( ) Lesiones múltiples
( ) Otro

Agente del accidente (con que se lesionó el trabajador)

(•) Máquinas y/o equipos
( ) Medios de transporte
( ) Aparatos
( ) Herramientas, implementos o utensilios
( ) Materiales o sustancias
( ) Radiaciones
( ) Ambiente de trabajo (incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, tejados, en el exterior, interior o subterráneos)
( ) Otros agentes no clasificados
( ) Animales (vivos o productos animales)
( ) Agentes no clasificados por falta de datos

Mecanismos o forma del accidente

( ) Caída de personas
( ) Caída de objetos
( ) Pisadas, choques o golpes
( ) Atrapamientos
( ) Sobreesfuerzo, esfuerzo excesivo o falso movimiento
( ) Exposición o contacto con temperatura extrema
( ) Exposición o contacto con la electricidad
( ) Exposición o contacto con sustancias nocivas o radiaciones o salpicaduras
(•) Golpes por o contra objetos
( ) Otro

Descripción del accidente

SIENDO LAS 10:40 AM DEL DIA 16/07/2026 EL SEÑOR OSCAR FERNANDO SE ENCONTRABA TRABAJANDO Y SE AGACHO A RECOGER UN METRO CERCA A LA RETROEXCAVADORA, EL SEÑOR HERNAN OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA PRENDIO LA MAQUINA Y GIRO SIN PERCATARSE LE PEGO PRESUNTAMENTE CON EL VALDE DE LA MAQUINA

Personas que presenciaron el accidente — Hubo personas que presenciaron el accidente? (•) Si ( ) No

Apellidos y nombres: JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO
Cargo: OFICIAL DE OBRA
Documento de identidad: (•) CC ( ) TI ( ) CE ( ) NU ( ) PA — No. 1006697344

Apellidos y nombres:
Cargo:
Documento de identidad: CC TI CE NU PA — No.

Persona responsable del informe (Representante o delegado)

Apellidos y nombres: BEJARANO ENCISO MARLLY
Cargo: PROFESIONAL SST
Documento de identidad: (•) CC ( ) TI ( ) CE ( ) NU ( ) PA — No. 1121944835

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | SURA
16-07-2026 11:26:11
16-07-2026 11:26:09
RECIBIDO

Fecha de diligenciamiento del informe del accidente
Fecha de recibido en ARL SURA

Fecha Impresión 16-07-2026 11:26:19

6103

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: SIG-SST-FO-11
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 1
	INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO (AT)	FECHA: 06/05/2026

INCIDENTE		ACCIDENTE	X	ACCIDENTE LEVE		ACCIDENTE GRAVE		ACCIDENTE MORTAL	

DATOS DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO CARRERA 5 EG	NIT.	902054725-5
ACTIVIDAD ECONÓMICA	MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META.	CÓDIGO ACTIVIDAD	5429001
PROFESIONAL SST	MARLLY BEJARANO ENCISO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1,1121,944,835

DATOS DEL CENTRO O PLANTA EN LA QUE LABORA EL TRABAJADOR

DEPARTAMENTO	META	MUNICIPIO	SAN MARTIN	DIRECCIÓN	CRA 32 #38-70	TEL.	3103069962

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA				DOCUMENTO DE IDENTIDAD	112081984	
FECHA DE NACIMIENTO	1/08/1984	EDAD	41	FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA	11/06/2026	TIEMPO LABORADO	1,5
TIPO DE VINCULACIÓN	OBRA O LABOR	OCUPACIÓN	AYUDANTE DE OBRA	SALARIO	1,750,905	TIEMPO LABORADO ANTES DEL ACCIDENTE	3:00
EPS	NUEVA EPS	ARL	SURA	DIRECCIÓN	CRA 2 #16B - 37	TEL.	3108586432

INFORMACIÓN DEL ACCIDENTE

FECHA DEL ACCIDENTE	16/07/2026	HORA DEL ACCIDENTE	10:40 a. m.	DÍA EN QUE OCURRIO	JUEVES	JORNADA	DIURNA
ACTIVIDAD	OBRA	¿LABOR HABITUAL?	SI	LUGAR DONDE OCURRIO	DENTRO DE LA EMPRESA		

LESIÓN

PARTE DEL CUERPO AFECTADA	CABEZA	TIPO DE LESIÓN	GOLPE CONTUNSION O APLASTAMIENTO

AGENTE DEL ACCIDENTE		MECANISMO O FORMA DEL ACCIDENTE	
MÁQUINAS Y/O EQUIPOS	X	CAÍDA DE PERSONAS	
MEDIOS DE TRANSPORTE		CAÍDA DE OBJETOS	
APARATOS		PISADAS, CHOQUES O GOLPES	
HERRAMIENTAS, IMPLEMENTOS O UTENSILIOS		ATRAPAMIENTOS	
MATERIALES O SUSTANCIAS		SOBREESFUERZO, ESFUERZO EXCESIVO O FALSO MOVIMIENTO	
RADIACIONES		EXPOSICIÓN O CONTACTO CON TEMPERATURA EXTREMA	
AMBIENTE DE TRABAJO (Incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, tejados, en el exterior, interior o subterráneos)		EXPOSICIÓN O CONTACTO CON LA ELECTRICIDAD	
OTROS AGENTES NO CLASIFICADOS		EXPOSICIÓN O CONTACTO CON SUSTANCIAS NOCIVAS, RADIACIONES O SALPICADURAS	
ANIMALES (Vivos o productos animales)		OTRO.(Especifique)_____GOLPE POR O CONTRA OBJETOS	X
AGENTES NO CLASIFICADOS POR FALTA DE DATOS			

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (RELATADOS POR EL TRABAJADOR ACCIDENTADO)

siendo las 10:40 am del dia 16/07/2026 el señor Oscar Fernando se encontraba trabajando y se agacho a recoger un metro cerca de la retroexcavadora, el señor Hernán operador de la retroexcavadora prendió la maquina y giro sin percatarse le pego presuntamente con el belde de la maquina

ANALISIS DE CAUSAS

CAUSAS BASICAS

FACTORES PERSONALES	FACTORES DE TRABAJO
Posible incumplimiento del procedimiento de permanencia fuera del radio de acción de maquinaria pesada. Percepción inadecuada del riesgo al ingresar o permanecer dentro del área de operación de la retroexcavadora. Posible falta de comunicación con el operador antes de ingresar al área de influencia del equipo. Exceso de confianza al desarrollar una actividad rutinaria cerca de maquinaria en operación.	Deficiencias en la planificación y control de las actividades simultáneas entre personal de piso y maquinaria pesada. Ausencia o insuficiencia de un procedimiento para controlar la interacción entre trabajadores y equipos móviles. Posible ausencia de un sistema efectivo de comunicación entre operador y personal en tierra antes del movimiento del equipo.

6104

CAUSAS INMEDIATAS

ACTO INSEGURO	CONDICIÓN INSEGURA
Del operador de la retroexcavadora Poner en funcionamiento la retroexcavadora sin verificar completamente que el área estuviera libre de personas. Girar el equipo sin confirmar visualmente los puntos ciegos o sin apoyo de un señalero cuando era requerido. **Del trabajador lesionado** Ingresar o permanecer dentro del radio de acción de la retroexcavadora para recoger una herramienta sin asegurarse de que el equipo estuviera detenido y fuera de operación.	Presencia de un punto ciego propio de la operación de la retroexcavadora que limitaba la visibilidad del operador. Falta o insuficiencia de demarcación física de la zona de exclusión alrededor de la maquinaria. Ausencia de barreras o controles que impidieran el ingreso de personal al área de operación del equipo.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

METODOLOGÍA UTILIZADA | ARBOL DE CAUSAS



DESCRIPCIÓN DE CAUSA RAIZ DETERMINADA

Falta de verificación mutua del área de trabajo antes del inicio de la maniobra de la retroexcavadora.

FOTOGRAFIAS O DIBUJOS



OBSERVACIONES DEL EQUIPO INVESTIGADOR

Se identifica la necesidad de fortalecer las medidas de coordinación y comunicación entre el operador y el personal que desarrolla actividades en las proximidades de maquinaria pesada, así como reforzar la verificación del área de maniobra antes del inicio de cualquier movimiento del equipo. Se recomienda continuar promoviendo el cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro y las actividades de sensibilización sobre los riesgos asociados a la operación de maquinaria, con el fin de prevenir la ocurrencia de eventos similares.

PLAN DE ACCIÓN (ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA)

ACTIVIDAD	TIPO DE ACCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO
accidente y las lecciones aprendidas con todo el personal operativo.	Administrativa	17/07/2026	PROFESIONAL SST	27/07/2026
Delimitar y señalizar las zonas de operación de la retroexcavadora mediante conos, cinta o barreras temporales.	Administrativa	17/07/2026	PROFESIONAL SST	27/07/2026
Implementar la verificación del área y comunicación entre operador y personal antes de iniciar cualquier maniobra.	Administrativa	17/07/2026	PROFESIONAL SST	27/07/2026
Verificar la eficacia del plan de acción mediante inspección y observación de tareas en campo.	Administrativa	24/07/2026	PROFESIONAL SST	27/07/2026

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN

FECHA DE REALIZACIÓN	16/07/2026	HORA	3:00	LUGAR	OBRA

6105

EQUIPO INVESTIGADOR			
NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
MARLLY BEJARANO E.	1.121.944.835	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano E.
CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	MIEMBRO DEL COPASST	CAROLINA RESTREPO

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.			
GERENTE GENERAL		LÍDER SST	
FIRMA		Marlly Bejarano E FIRMA	
NOMBRE	RAFAEL FERNANDO BAQUERO	NOMBRE	MARLLY BEJARANO ENCISO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	17.329.108	No LICENCIA SST	7899 de 2022

6106

CONSORCIO CARRERA 5 EG	CONSORCIO CARRERA 5 EG	CÓDIGO:	SIG-SST-FO-78
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	Lección Aprendida	FECHA:	06/05/2026

TÍTULO:	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA

¿QUÉ SUCEDIÓ?

Siendo las 10:40 am del día 16/07/2026 el señor Oscar Fernando se encontraba trabajando y se agacho a recoger un metro cerca de la retroexcavadora, el señor Hernán operador de la retroexcavadora prendió la maquina y giro sin percatarse le pego presuntamente con el balde de la maquina

CAUSAS ORIGINADORAS DEL EVENTO:

El trabajador ingresó al radio de acción de la retroexcavadora para recoger una herramienta mientras el equipo se encontraba próximo a iniciar maniobras.
El operador inició el movimiento de la retroexcavadora sin advertir la presencia del trabajador en el área de operación.
La comunicación entre el operador y el personal en tierra no fue suficiente para garantizar una maniobra segura.
No se verificó de manera efectiva que el área estuviera completamente libre de personal antes del desplazamiento del equipo.

RECOMENDACIONES:

Reforzar la socialización del procedimiento de trabajo seguro para la operación de maquinaria pesada y la interacción con personal en tierra.
Delimitar y señalizar permanentemente el radio de acción de la maquinaria durante su operación.
Exigir la verificación visual completa del área antes de iniciar cualquier movimiento de la retroexcavadora.
Fortalecer la comunicación entre el operador y el personal mediante instrucciones claras antes del inicio de las maniobras.
Realizar inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento de los controles establecidos durante la operación de maquinaria.

Marlly Bejarano E.

ELABORÓ

CONSORCIO CARRERA 5 EG 900.894.725-5	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Listado de asistencia

6108

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	09/07/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☑
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Protección de maquinaria

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Barreras fisicas y dispositivos de seguridad para impedir que el cuerpo humano acceda a zonas de peligro

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	DavidQuintero
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Aguilar
4	CRISTIAN DAVID SANCHEZ RINCON	1.006.697.509	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Cristian
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner D
6	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina
7	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Edison.
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1141315056	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Ubaldo
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan Cepeda
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

6109

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	08/07/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro

TEMA

Riesgo de Ruido

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

PELIGRO FISICO QUE AFECTA GRAVEMENTE LA SALUD HUMANA Y EL ENTORNO

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
4	CRISTIAN DAVID SANCHEZ RINCON	1.006.697.509	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
6	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
7	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1141315056	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

6110

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	09/09/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Equipo de protección personal

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Equipos, piezas o dispositivos que eviten que una persona tengan contacto con los peligros del ambiente

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Quintero
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge A
4	CRISTIAN DAVID SANCHEZ RINCON	1.006.697.509	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
6	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina
7	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Edilson
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1141315056	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Incapacit
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Ubaldo
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan Cepeda
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

6111.

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	10/07/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción [ ] Reinducción [ ] Reunión de SIG [ ] Capacitación [ ] Charla [x]
Socializacion [ ] Otro _____

TEMA

Autocuidado

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Acciones voluntarias que realizas para promover la salud.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
4	CRISTIAN DAVID SANCHEZ RINCON	1.006.697.509	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
6	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
7	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1141315056	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

6112

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	11/07/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Resolución de conflictos

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Procedimientos utilizados para encontrar una solución pacifica y viable a los acuerdos.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
4	CRISTIAN DAVID SANCHEZ RINCON	1.006.697.509	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
6	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
7	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1141315056	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

6113

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	14/07/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☑
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Control de sustancias peligrosas

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Si las sustancias peligrosas no se controlan causan daño en la salud.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Quintero
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge A
4	CRISTIAN DAVID SANCHEZ RINCON	1.006.697.509	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Cristian
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner D
6	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina.
7	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1141315056	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	—
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan Cepeda
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

6114

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	15/07/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Conducción defensiva

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Estar Alerta mientras manejamos un Vehiculo

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Quintero
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge A.
4	CRISTIAN DAVID SANCHEZ RINCON	1.006.697.509	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Cristian
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner D
6	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina
7	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1141315056	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Ubaldo
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan Cepeda
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

6115

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	16/07/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Seguridad ocular

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Uso de proteccion ocular en el lugar de trabajo

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
4	CRISTIAN DAVID SANCHEZ RINCON	1.006.697.509	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
6	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
7	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1141315056	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

6116

CONSORCIO CARRERA SSC	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	17/07/26	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro

TEMA

Leccion aprendida del accidente de trabajo del Señor oscar fernando perez ocurrida el 16/07/26

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

furat investigación y leccion aprendida.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Jonathan Herrera	93437799	Carrera 5	Ayudante	
2	CESAR CESPEDES	1121895158	CA 5	AYUDANTE	
3	Carolina Restrepo	1047586114	Cr 5	Ayudante	Carolina
4	MAICOL E. TEJADA TABORDA	1128503527	CA 5	AYDANTE	
5	Luis edilson pulido Rey	1120307359	CR 5	Ayudante	
6	Jorge Ivan Aguilar	1006947304	CR 5	OFICIAL	Jorge A
7	Luis carlos Reyes Reyes	1121850472	CR 5	Ayudante	Luis carlos
8	Yerson Hernandez	1120366710	Cra 5	AY	
9	Cristian [illegible]	1205069064	CR 5	AY	Cristian
10	Jhon Restrepo	1006515685	CR 5	AY	
11	Juan Cepeda	93479579	Cr. 5	oy.	Juan cepeda
12	Carlos Martinez	79555453	Cra 5	Ayudante	Carlos M
13	[illegible]	6648587	CR 5	OFICIAL	
14	David Quintero Arango	1220501679	CR 5	Almacenista	David Quintero
15	Jose Ubaldo Mejia leon	93338325	Cr 5	Ayudante	Ubaldo
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
Marlly Yoleth Betancur Enciso	Profesional SST	Marlly Betancur E.

617

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	18/07/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Manipulación manual

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Desordenes musculoesqueleticos

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
4	CRISTIAN DAVID SANCHEZ RINCON	1.006.697.509	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
6	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
7	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1141315056	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

6118

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	21/07/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro

TEMA

Accidente de trabajo

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Suceso repentino por causa o con ocasión del trabajo.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
4	CRISTIAN DAVID SANCHEZ RINCON	1.006.697.509	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
6	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
7	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1141315056	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	

6119

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	22/07/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Exposición al Ruido

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Puede causar perdida auditiva permanente

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge A
4	CRISTIAN DAVID SANCHEZ RINCON	1.006.697.509	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner
6	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina.
7	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1141315056	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M.
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Ubaldo
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan Cepeda
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

6120

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	24/07/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Roles y Responsabilidades COPASST

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Proporer controlar y vigilar las normas de seguridad.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
4	CRISTIAN DAVID SANCHEZ RINCON	1.006.697.509	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
6	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
7	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1141315056	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

6121

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	25/07/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☑
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Roles y Responsabilidades COCOLAB

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Recepcion y tramite de quejas
Mediacion
Planes de mejora

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
4	CRISTIAN DAVID SANCHEZ RINCON	1.006.697.509	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
6	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
7	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1141315056	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

6122

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	27/07/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción [ ] Reinducción [ ] Reunión de SIG [ ] Capacitación [ ] Charla [x]
Socializacion [ ] Otro

TEMA

Señales de seguridad

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Elemento fundamentales en cualquier entorno laboral

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
4	CRISTIAN DAVID SANCHEZ RINCON	1.006.697.509	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
6	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
7	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1141315056	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	

6123

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	28/07/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro

TEMA

Cuidado del medio ambiente

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Preservar los recursos naturales y garantizar nuestra propia supervivencia.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
4	CRISTIAN DAVID SANCHEZ RINCON	1.006.697.509	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
6	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
7	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1141315056	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	

6124

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-f
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	29/07/2020	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Estramentos

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Si se realiza con regularidad el estramento puede compensar las posturas incomodas.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
4	CRISTIAN DAVID SANCHEZ RINCON	1.006.697.509	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
6	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
7	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1141315056	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	

6125

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	30/03/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción [ ] Reinducción [ ] Reunión de SIG [ ] Capacitación [ ] Charla [x]
Socializacion [ ] Otro _____

TEMA

Inhalación pasiva de humo

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Cualquier persona que inhale humo puede experimentar irritación en los ojos, estornudos y dolores de cabeza

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
4	CRISTIAN DAVID SANCHEZ RINCON	1.006.697.509	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
6	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
7	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1141315056	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

6126

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	31/07/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción [ ] Reinducción [ ] Reunión de SIG [ ] Capacitación [ ] Charla [x]
Socializacion [ ] Otro _____

TEMA

Protección de la piel

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Peligros relacionados con la piel y saber como protegerse

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
4	CRISTIAN DAVID SANCHEZ RINCON	1.006.697.509	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
6	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
7	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1141315056	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
16	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
18	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano

6127

CONSORCIO CARRERAS SC	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	01/08/26	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Emergencia Vs Urgencia.

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Urgencia - problema de salud que requiere atención medica en tiempo corto
Emergencia - Situación en que la vida esta en peligro inmediato.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Carolina Reyes	1070586114	Carreras	Ayudante	Carolina R.
2	Jose Ubaldo Montalvo	93338325	Carrera 5	Ayudante	Ubaldo
3	David Quintero Andrade	1120501070	Correos	Aprendiz sto	David Quintero
4	Miguel Tejada Ferrer	1120533527	CR5	Ay.	Miguel Tejada
5	Carlos Martinez	17355453	CR 5	Ayudante	Carlos M
6	Juan Caballero	9343475739	Cra 5	ayudante	Juan Caballero
7	CESAR CESPEDES	1121875158	CRA 5	AYUDANTE	Cesar
8	Luis Edison Pacheco	1120207334	CRAS	Ayudante.	Luis
9	Juan Pablo Arcos	9747799	CRAS	Ayudante	
10	Luis Carlos Reyes Goya	1121850411	CRA 5	Ayudante	Luis Carlos
11	Oscar F. Perez	1120566 5	CRA 5	Ayudante	
12	Jorge Ivan Arvilos	1006947300	CRAS	oficial	Jorge A.
13	Garner Duran	1120506904	CR5	Ayudante	Garner
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
Marlly Bejarano Ericso	Profesional SST	Marlly Bejarano

6129

CONSORCIO CARRERA 5 SC	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	03/08/26.	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Seguridad vial laboral

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Prevenir accidentes durante el desplazamiento laboral

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Carolina Restrepo	1070586114	Carrera 5	Ayudante	Carolina R
2	Jose Ubaldo Angarita	93338325	Carrera 5	Ayudante	Ubaldo
3	Luis Carlos Reyelaya	1121873421	Carrera 5	Ayudante	Luis Carlos Reyelaya
4	David Quintero Andrade	1120501078	Carrera 5	Almacenista	David Quintero
5	Germer Duran G	1120508900	CRS	Ayudante	Germer D
6	Miguel G. Tejada Tejada	1120503527	CRS	AYUDANTE	Miguel G. Tejada
7	Juan Cupeda	93479539	Cra 5	ayudante	Juan Cupeda
8	Luis Edison Pulido P	1120527359	Cra 5	ayudante.	Luis Edison
9	CESAR CESPEDES	1121873158	CR 5	AYUDANTE	Cesar
10	Oscar F. Perez	1120536765	CR 5	Ayudante	
11	Carlos Alberto Martinez	1733545J3	CR 5	Ayudante	Carlos M
12	Juan pablo Duran	9347999	CRS	Ayudante	
13	Juan Cupeda		CRS	Ayudante	Juan Cupeda
14	Jorge Ivan Agudelo	1006697366	CRS	oficia	Jorge A.
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
Marlly Bejarano Enciso	Profesional SST	Marlly Bejarano

6129

CONSORCIO CARRERA 3 EC	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	04/05/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro

TEMA

Factores de riesgo psicosocial

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

importancia de mantener un ambiente de trabajo sano

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Jorge Ivan Aguilar	1006697344	CRS	OFICIOL	Jorge A.
2	Jose Isaias Ordaz Leon	93338325	Carres	Ayudante	Gerardo
3	Luis Carlos Restrepo	1121850421			Luis Carlos
4	Gerardo Duran G	1120506904	CRS	AYUDANTE	Gerardo G
5	Oscar Perez	1120566S	CRS	Ayudante	
6	CESAR CESPEDES	1128751S8	CRS	AYUDANTE	
7	Ruben Cuadro	93429539	Carres	ayudante	Ruben Cuadro
8	Miguel C. Tejada Tejada	1120503521	CRS	A-D.	
9	David Quintero Arevalo	1120501070	CRS	Anocenista	David
10	Carlos Alberto Martinez	1735545 3	Carrera 3	Ayudante	Carlos M
11	Luis Edison Pardo P.	1110507358	CRAS	Ayudante.	Luis
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
Marlly Lileth Bejarano Ararco	Profesional SST	Marlly Bejarano

6130

CONSORCIO CARRERA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha:	06/08/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☐ Charla ☒
Socializacion ☐ Otro _____

TEMA

Pausas Activas

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Pausas - Estiramientos y movimientos.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Quinto
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Geiner D
6	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina
7	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Edilson
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
11	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos
13	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M
14	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	UbaldoR
16	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
17	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan Cepeda
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano E

CONSORCIO CARMENA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

6131

Fecha:	05/08/2026	Hora inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción [ ] Reinducción [ ] Reunión de SIG [ ] Capacitación [ ] Charla [x]
Socializacion [ ] Otro

TEMA

Cultura de seguridad y autocuidado

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Acciones y decisiones realizadas para proteger la salud física.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	DAVID ALEJANDRO QUINTERO ANDRADE	1.120.501.079	CARRERA 5 EG	ALMACENISTA	David Quin
2	LUIS EDUARDO ARBOLEDA CORREA	6648582	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	
3	JORGE IVAN AGUILAR RESTREPO	1.066.697.344	CARRERA 5 EG	OFICIAL DE OBRA	Jorge Ivan
5	GEINER ESTIVEN DURAN GAITAN	1.120.506.904	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Gáner D
6	CAROLINA RESTREPO	1.070.586.114	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carolina
7	YEISON ALIRIO HERNANDEZ	120.366.743	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1120507359	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis edilson
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93437799	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1006315685	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
11	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1121875157	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
12	LUIS CARLOS REY OLAYA	1121850421	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Luis Carlos
13	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Carlos M
14	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1120503519	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	
15	JOSE UBALDO ROJAS LEÓN	93338325	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Ubaldo R
16	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11205665	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Oscar
17	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93439539	CARRERA 5 EG	AYUDANTE DE OBRA	Juan cepeda
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	PROFESIONAL SST	Marlly Bejarano E

6132

ATS y permisos de trabajo

6133

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SIG-SST-FO-28
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN:	1
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	FECHA:	6/5/2026

NOMBRE DE EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG						ATS No.	7	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FIGURADO DE ACERO - Excavación mecánica - Fundida de concreto						FECHA PT ASOCIADO		
ÁREA O LUGAR	SAN MARTIN META	FECHA DE ELABORACIÓN	06/07/2026	FECHA INICIAL	06/07/2026	FECHA FINAL	11/07/2026		

TIPO DE PERMISO DE TRABAJO (Diligencie con una X segun aplique)												
	SI		IZAJE DE CARGAS		TRABAJO EN CALIENTE		EXCAVACIONES		SUSTANCIAS PELIGROSAS			
	NO		ESPACIOS CONFINADOS		TRABAJO EN ALTURAS		TRABAJOS ELECTRICOS		OTRO			

Equipo, Herramientas y Materiales (Especifique):

PALA - PICA - CARRETILLA - Herramienta menor

EPP requerido para el trabajo:						Otros Equipos o EPP (Especifique):
Casco	X	Prot. Caidas 100%	Cartucho Resp.	Peto Mezcla de Quimicos		N/A
Botas de Seg.	X	Monogafa	Suministro de Aire	Ropa para Quimicos		
Gafas de Seg.	X	Protector facial	Guantes Quimica	Traje antifluidos		
Guantes	X	Prot. De Oidos X	Botas de caucho	Otros		

SECUENCIA DE PASOS BÁSICOS (Qué, Cómo, Cuando, Para, Dónde)	PELIGROS (Fuente, Situación, Acto)	RIESGOS (Suceso o Exposición peligrosa)	ASPECTO AMBIENTAL (Elemento que interactúa con el medio ambiente) marque con una x.	IMPACTO AMBIENTAL (Efecto en las personas, el ambiente, equipos, otros) marque según el codigo asignado a cada impacto	CONTROL OPERACIONAL SST Y AMBIENTAL
Localización, trazado y replanteo topográfico	Tránsito vehicular, terreno irregular, radiación solar	Atropellamiento, caídas al mismo nivel, golpe de calor	Agua; X Comunidad; X Suelo; R. Naturales; Aire; Paisaje; X Flora; otro.; Fauna	Interferencia con movilidad y afectación menor del terreno	Señalización temporal, uso de chaleco reflectivo, hidratación, delimitación del área, respeto por zonas verdes
Demolición de concreto y pavimento	Maquinaria pesada, proyección de partículas, ruido, vibraciones	Golpes, atrapamientos, lesiones oculares, pérdida auditiva	Agua; X Comunidad; X Suelo; R. Naturales; X Aire; Paisaje; Flora; otro.; Fauna	Emisión de polvo, ruido elevado, generación de escombros	Humectación permanente, barreras de protección, manejo adecuado de RCD, protección auditiva y visual, rutas autorizadas para transporte
Cargue y transporte de escombros	Equipos móviles, maniobras de cargue, tránsito	Atropellamiento, choques, caída de materiales	Agua; X Comunidad; X Suelo; R. Naturales; X Aire; Paisaje; Flora; otro.; Fauna	Material particulado, derrames, congestión vial	Cubrimiento de volquetas, inspección mecánica, señalero, velocidad controlada, disposición en sitio autorizado
Excavación mecánica para vias y alcantarillado	Derrumbe de taludes, maquinaria, redes enterradas	Sepultamiento, atrapamiento, electrocución, golpes	Agua; Comunidad; Suelo; R. Naturales; Aire; Paisaje; Flora; otro.; Fauna	Alteración de drenajes, erosión y remoción de cobertura vegetal	Permiso de excavación, localización de redes, estabilización de taludes, monitoreo permanente, manejo de aguas superficiales

Excavación manual	Herramientas manuales, sobreesfuerzos, terreno inestable	Cortes, lesiones musculares, derrumbes	X	Agua		Comunidad	Alteración de drenajes, erosión y remoción de cobertura vegetal	Capacitación en ergonomía, inspección de herramientas, delimitación del área
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
			X	Flora		otro.		
			X	Fauna				
Transporte y disposición de material sobrante	Vehículos y maquinaria	Colisiones, atropellamientos		Agua	X	Comunidad	Polvo, contaminación por disposición inadecuada	Transporte cubierto, rutas autorizadas, disposición en sitios licenciados
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Extendido y compactación de rellenos	Compactadores, vibraciones, polvo	Atrapamientos, afectaciones respiratorias, golpes		Agua		Comunidad	Emisión de material particulado, compactación excesiva del suelo	Humectación del material, mantenimiento de equipos, uso de protección respiratoria
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de subbase y base granular	Equipos pesados, polvo	Golpes, atropellamientos, enfermedades respiratorias		Agua		Comunidad	Generación de polvo y ruido	Control de velocidad, humectación, uso de mascarillas y señalización
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Riego de imprimación asfáltica	Emulsiones asfálticas, sustancias químicas, calor	Quemaduras, irritación dérmica, inhalación de vapores		Agua		Comunidad	Derrames y contaminación química	Fichas SDS disponibles, kits de derrames, EPP químico, almacenamiento seguro
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Colocación y compactación de mezcla asfáltica	Altas temperaturas, maquinaria, tránsito	Quemaduras, atropellamiento, estrés térmico		Agua		Comunidad	Emisión de vapores y ruido	Delimitación del área, protección térmica, control de emisiones, monitoreo de condiciones climáticas
				Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de bordillos y sardineles	Manipulación de cargas, herramientas manuales	Golpes, atrapamientos, lesiones lumbares		Agua		Comunidad	Generación de residuos y ocupación temporal de áreas	Ayudas mecánicas, técnicas de levantamiento seguro, orden y aseo
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Demarcación y señalización vial	Tránsito vehicular, pinturas y solventes	Atropellamiento, inhalación de vapores		Agua	X	Comunidad	Olores y afectación temporal a la movilidad	Plan de manejo de tráfico, EPP respiratorio, señalización preventiva
				Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Renivelación de pozos y sumideros	Espacios confinados, herramientas, tránsito	Caídas, atmósferas peligrosas, golpes	X	Agua		Comunidad	Contaminación por residuos de excavación	manejo adecuado de residuos
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de tuberías de alcantarillado	Zanjas profundas, izaje de tubería, maquinaria	Sepultamiento, atrapamiento, golpes	X	Agua		Comunidad	Alteración de escorrentías y posible sedimentación	Entibados, control de aguas, inspección de izaje, delimitación
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				

Colocación de concreto para cimentaciones y estructuras	Contacto con cemento, equipos de vibrado	Dermatitis, atrapamientos, golpes	X	Agua		Comunidad	Derrames de concreto y lavado de equipos	Uso de guantes impermeables, zonas de lavado controladas, recolección de residuos
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Armado e instalación de acero de refuerzo	Elementos cortopunzantes, manipulación de cargas	Cortes, golpes, lesiones osteomusculares		Agua		Comunidad	Residuos metálicos	Protección de puntas, guantes anticorte, almacenamiento ordenado
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de pozos de inspección y estructuras	Trabajo en excavaciones, alturas, herramientas	Caídas, golpes, atrapamientos	X	Agua		Comunidad	Alteración temporal del terreno	control de acceso
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Excavación manual para andenes, pozos y sumideros	Derrumbe, herramientas manuales, tránsito vehicular	Golpes, cortes, sepultamiento, atropellamiento	X	Agua	X	Comunidad	Alteración del terreno, generación de material sobrante	Delimitar área, señalización, inspección de excavación, manejo adecuado de material excavado
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de pozos de inspección (placa base, cilindro, placa cubierta y cañuelas)	Trabajo en excavación, manipulación de acero y concreto	Caídas, golpes, atrapamientos, sobreesfuerzos	X	Agua		Comunidad	Residuos de concreto, afectación temporal del terreno	Uso de EPP, entibación cuando aplique, orden y aseo, control de vertimientos
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de sumideros	Herramientas, concreto, excavaciones	Golpes, caídas, atrapamientos	X	Agua		Comunidad	Alteración de drenajes y generación de residuos	Manejo adecuado de residuos, control de sedimentos y aguas de escorrentía
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de adoquín ecológico y conformación de andenes	Manipulación manual de cargas, compactación	Lesiones osteomusculares, golpes, atrapamientos		Agua		Comunidad	Generación de polvo y compactación del terreno	Técnicas de levantamiento seguro, humectación del material, uso de guantes
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de bordillos fundidos en sitio	Manejo de concreto y herramientas	Dermatitis, golpes, cortes	X	Agua		Comunidad	Derrames de concreto y residuos de obra	EPP adecuado, áreas controladas para preparación y limpieza
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de ciclo-parqueaderos y mobiliario urbano	Herramientas manuales, manipulación de elementos metálicos	Cortes, golpes, sobreesfuerzos		Agua	X	Comunidad	Intervención temporal del espacio público	Delimitación del área, manejo adecuado de residuos y almacenamiento de materiales
				Suelo		R. Naturales		
				Aire	X	Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Excavación y fundición de bases	Herramientas manuales, concreto	Golpes, cortes, sobreesfuerzos		Agua		Comunidad	Generación de residuos y polvo	EPP completo, señalización, manejo adecuado de residuos
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				

6136

Instalación de canecas, bolardos, bancas y protectores	Manipulación de cargas y herramientas	Golpes, atrapamientos, lesiones musculares	Agua	X	Comunidad	Generación de residuos y polvo	Técnicas de levantamiento seguro, delimitación del área y orden de materiales
			Suelo		R. Naturales		
			Aire	X	Paisaje		
			Flora		otro.		
			Fauna				

Autorizacion

FIRMAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Responsable de la actividad.		Carlos Forero	Carlos Forero	Carlos Forero	Carlos Forero	Carlos Forero	
Responsable Ambiental.		Paula Pardo	Paula Pardo	Paula Pardo	Paula Pardo	Paula Pardo	
Responsable SST.		Marlly B.	Marlly B.	Marlly B	Marlly B	Marlly B	

SOCIALIZACIÓN ATS GRUPO EJECUTOR

NOMBRE	No. DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	CARGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DAVID ALEJANDRO QUINTERO	1120501079	ALMACENISTA							
LUIS EDUARDO ARBOLEDA	6648582	OFICIAL							
JORGE IVAN AGUILAR	1006697509	OFICIAL							
CRISTIAN SANCHEZ	1006697509	AYUDANTE							
GEINER ESTIVEN DURAN	1120506904	AYUDANTE							
CAROLINA RESTREPO	1070586114	AYUDANTE							
YEISON ALIRIO HERNANDEZ	1120366743	AYUDANTE							
LUIS PULIDO PEÑA	1120507359	AYUDANTE							
JUAN PABLO MANCERA	93437799	AYUDANTE							
JHON JAIDER RESTREPO	1006315685	AYUDANTE							
JUAN DAVID MANRIQUE	1141315056	AYUDANTE							
CESAR TULIO CESPEDES	1121875157	AYUDANTE							
LUIS CARLOS REY	1121850421	AYUDANTE							
CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	AYUDANTE							
MAICOL ESTIVEN TILANO	1120503519	AYUDANTE							
JOSE UBALDO ROJAS	93338325	AYUDANTE							
OSCAR FERNANDO PEREZ	11205665	AYUDANTE							
JUAN GABRIEL CEPEDA	93439539	AYUDANTE							

6137

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SIG-SST-FO-28
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN:	1
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	FECHA:	6/5/2026

NOMBRE DE EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG								
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FIGURADO DE ACERO FUNDIDA DE ACERO EXCAVACIÓN MECANICO	Remoción de concreto Vaciado de concreto				ATS No.	8		
						FECHA PT ASOCIADO	—		
ÁREA O LUGAR	SAN MARTIN META	FECHA DE ELABORACIÓN	13/07/2026	FECHA INICIAL	13/07/2026	FECHA FINAL	19/07/2026		

TIPO DE PERMISO DE TRABAJO (Diligencie con una X segun aplique)												
	SI		IZAJE DE CARGAS		TRABAJO EN CALIENTE		EXCAVACIONES		SUSTANCIAS PELIGROSAS	
	NO		ESPACIOS CONFINADOS		TRABAJO EN ALTURAS		TRABAJOS ELECTRICOS		OTRO	

Equipo, Herramientas y Materiales (Especifique):

Herramienta menor

EPP requerido para el trabajo:					Otros Equipos o EPP (Especifique):
Casco	Prot. Caídas 100%	Cartucho Resp.	Peto Mezcla de Químicos		
Botas de Seg.	Monogafa	Suministro de Aire	Ropa para Químicos		
Gafas de Seg.	Protector facial	Guantes Química	Traje antifluidos		NA
Guantes	Prot. De Oídos X	Botas de caucho	Otros		

SECUENCIA DE PASOS BÁSICOS (Qué, Cómo, Cuando, Para, Dónde)	PELIGROS (Fuente, Situación, Acto)	RIESGOS (Suceso o Exposición peligrosa)	ASPECTO AMBIENTAL (Elemento que interactúa con el medio ambiente) marque con una x.	IMPACTO AMBIENTAL (Efecto en las personas, el ambiente, equipos, otros) marque según el codigo asignado a cada impacto	CONTROL OPERACIONAL SST Y AMBIENTAL
Localización, trazado y replanteo topográfico	Tránsito vehicular, terreno irregular, radiación solar	Atropellamiento, caídas al mismo nivel, golpe de calor	Agua; X Comunidad; X Suelo; R. Naturales; Aire; Paisaje; X Flora; otro.; Fauna	Interferencia con movilidad y afectación menor del terreno	Señalización temporal, uso de chaleco reflectivo, hidratación, delimitación del área, respeto por zonas verdes
Demolición de concreto y pavimento	Maquinaria pesada, proyección de partículas, ruido, vibraciones	Golpes, atrapamientos, lesiones oculares, pérdida auditiva	Agua; X Comunidad; X Suelo; R. Naturales; X Aire; Paisaje; Flora; otro.; Fauna	Emisión de polvo, ruido elevado, generación de escombros	Humectación permanente, barreras de protección, manejo adecuado de RCD, protección auditiva y visual, rutas autorizadas para transporte
Cargue y transporte de escombros	Equipos móviles, maniobras de cargue, tránsito	Atropellamiento, choques, caída de materiales	Agua; X Comunidad; X Suelo; R. Naturales; X Aire; Paisaje; Flora; otro.; Fauna	Material particulado, derrames, congestión vial	Cubrimiento de volquetas, inspección mecánica, señalero, velocidad controlada, disposición en sitio autorizado
Excavación mecánica para vías y alcantarillado	Derrumbe de taludes, maquinaria, redes enterradas	Sepultamiento, atrapamiento, electrocución, golpes	Agua; Comunidad; Suelo; R. Naturales; Aire; Paisaje; Flora; otro.; Fauna	Alteración de drenajes, erosión y remoción de cobertura vegetal	Permiso de excavación, localización de redes, estabilización de taludes, monitoreo permanente, manejo de aguas superficiales

Excavación manual	Herramientas manuales, sobreesfuerzos, terreno inestable	Cortes, lesiones musculares, derrumbes	X	Agua		Comunidad	Alteración de drenajes, erosión y remoción de cobertura vegetal	Capacitación en ergonomía, inspección de herramientas, delimitación del área
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
			X	Flora		otro.		
			X	Fauna				
Transporte y disposición de material sobrante	Vehículos y maquinaria	Colisiones, atropellamientos		Agua	X	Comunidad	Polvo, contaminación por disposición inadecuada	Transporte cubierto, rutas autorizadas, disposición en sitios licenciados
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Extendido y compactación de rellenos	Compactadores, vibraciones, polvo	Atrapamientos, afectaciones respiratorias, golpes		Agua		Comunidad	Emisión de material particulado, compactación excesiva del suelo	Humectación del material, mantenimiento de equipos, uso de protección respiratoria
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de subbase y base granular	Equipos pesados, polvo	Golpes, atropellamientos, enfermedades respiratorias		Agua		Comunidad	Generación de polvo y ruido	Control de velocidad, humectación, uso de mascarillas y señalización
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Riego de imprimación asfáltica	Emulsiones asfálticas, sustancias químicas, calor	Quemaduras, irritación dérmica, inhalación de vapores		Agua		Comunidad	Derrames y contaminación química	Fichas SDS disponibles, kits de derrames, EPP químico, almacenamiento seguro
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Colocación y compactación de mezcla asfáltica	Altas temperaturas, maquinaria, tránsito	Quemaduras, atropellamiento, estrés térmico		Agua		Comunidad	Emisión de vapores y ruido	Delimitación del área, protección térmica, control de emisiones, monitoreo de condiciones climáticas
				Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de bordillos y sardineles	Manipulación de cargas, herramientas manuales	Golpes, atrapamientos, lesiones lumbares		Agua		Comunidad	Generación de residuos y ocupación temporal de áreas	Ayudas mecánicas, técnicas de levantamiento seguro, orden y aseo
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Demarcación y señalización vial	Tránsito vehicular, pinturas y solventes	Atropellamiento, inhalación de vapores		Agua	X	Comunidad	Olores y afectación temporal a la movilidad	Plan de manejo de tráfico, EPP respiratorio, señalización preventiva
				Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Renivelación de pozos y sumideros	Espacios confinados, herramientas, tránsito	Caídas, atmósferas peligrosas, golpes	X	Agua		Comunidad	Contaminación por residuos de excavación	manejo adecuado de residuos
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de tuberías de alcantarillado	Zanjas profundas, izaje de tubería, maquinaria	Sepultamiento, atrapamiento, golpes	X	Agua		Comunidad	Alteración de escorrentías y posible sedimentación	Entibados, control de aguas, inspección de izaje, delimitación
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				

| | | |

Instalación de canecas, bolardos, bancas y protectores	Manipulación de cargas y herramientas	Golpes, atrapamientos, lesiones musculares	Agua	X	Comunidad	Generación de residuos y polvo	Técnicas de levantamiento seguro, delimitación del área y orden de materiales
			Suelo		R. Naturales		
			Aire	X	Paisaje		
			Flora		otro.		
			Fauna				

Autorizacion						
FIRMAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Responsable de la actividad.	Carlos Forero	Carlos Forero	Carlos Forero	Carlos Forero	Carlos Forero	Carlos Forero	
Responsable Ambiental.							
Responsable SST.	Marlly B	Marlly B	Marlly B	Marlly B	Marlly B	Marlly B	

SOCIALIZACIÓN ATS GRUPO EJECUTOR

NOMBRE	No. DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	CARGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DAVID ALEJANDRO QUINTERO	1120501079	ALMACENISTA							
LUIS EDUARDO ARBOLEDA	6648582	OFICIAL							
JORGE IVAN AGUILAR	1006697509	OFICIAL							
CRISTIAN SANCHEZ	1006697509	AYUDANTE							
GEINER ESTIVEN DURAN	1120506904	AYUDANTE							
CAROLINA RESTREPO	1070586114	AYUDANTE							
YEISON ALIRIO HERNANDEZ	1120366743	AYUDANTE							
LUIS PULIDO PEÑA	1120507359	AYUDANTE							
JUAN PABLO MANCERA	93437799	AYUDANTE							
JHON JAIDER RESTREPO	1006315685	AYUDANTE							
JUAN DAVID MANRIQUE	1141315056	AYUDANTE							
CESAR TULIO CESPEDES	1121875157	AYUDANTE							
LUIS CARLOS REY	1121850421	AYUDANTE							
CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	AYUDANTE							
MAICOL ESTIVEN TILANO	1120503519	AYUDANTE							
JOSE UBALDO ROJAS	93338325	AYUDANTE							
OSCAR FERNANDO PEREZ	11205665	AYUDANTE							
JUAN GABRIEL CEPEDA	93439539	AYUDANTE							

6141

CONSORCIO CARRERA 5 EG	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SIG-SST-FO-28
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN:	1
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	FECHA:	6/5/2026

NOMBRE DE EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG								
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Figurado de acero vaciado de concreto Amarre de acero compactación de terreno						ATS No.	9	
							FECHA PT ASOCIADO	—	
ÁREA O LUGAR	SAN MARTIN META	FECHA DE ELABORACIÓN	DD/MM/AAAA	FECHA INICIAL	29/04/26	FECHA FINAL	26/07/26		

TIPO DE PERMISO DE TRABAJO (Diligencie con una X segun aplique)												
	SI		IZAJE DE CARGAS		TRABAJO EN CALIENTE		EXCAVACIONES		SUSTANCIAS PELIGROSAS	
	NO		ESPACIOS CONFINADOS		TRABAJO EN ALTURAS		TRABAJOS ELECTRICOS		OTRO	

Equipo, Herramientas y Materiales (Especifique):

Herramienta menor

EPP requerido para el trabajo:					Otros Equipos o EPP (Especifique):
Casco	Prot. Caidas 100%	Cartucho Resp.	Peto Mezcla de Químicos		N/A
Botas de Seg.	Monogafa	Suministro de Aire	Ropa para Químicos		
Gafas de Seg.	Protector facial	Guantes Química	Traje antifluidos		
Guantes	Prot. De Oidos	Botas de caucho	Otros		

SECUENCIA DE PASOS BÁSICOS (Qué, Cómo, Cuando, Para, Dónde)	PELIGROS (Fuente, Situación, Acto)	RIESGOS (Suceso o Exposición peligrosa)	ASPECTO AMBIENTAL (Elemento que interactúa con el medio ambiente) marque con una x.	IMPACTO AMBIENTAL (Efecto en las personas, el ambiente, equipos, otros) marque según el codigo asignado a cada impacto	CONTROL OPERACIONAL SST Y AMBIENTAL
Localización, trazado y replanteo topográfico	Tránsito vehicular, terreno irregular, radiación solar	Atropellamiento, caídas al mismo nivel, golpe de calor	Agua; X Comunidad; X Suelo; R. Naturales; Aire; Paisaje; X Flora; otro.; Fauna	Interferencia con movilidad y afectación menor del terreno	Señalización temporal, uso de chaleco reflectivo, hidratación, delimitación del área, respeto por zonas verdes
Demolición de concreto y pavimento	Maquinaria pesada, proyección de partículas, ruido, vibraciones	Golpes, atrapamientos, lesiones oculares, pérdida auditiva	Agua; X Comunidad; X Suelo; R. Naturales; X Aire; Paisaje; Flora; otro.; Fauna	Emisión de polvo, ruido elevado, generación de escombros	Humectación permanente, barreras de protección, manejo adecuado de RCD, protección auditiva y visual, rutas autorizadas para transporte
Cargue y transporte de escombros	Equipos móviles, maniobras de cargue, tránsito	Atropellamiento, choques, caída de materiales	Agua; X Comunidad; X Suelo; R. Naturales; X Aire; Paisaje; Flora; otro.; Fauna	Material particulado, derrames, congestión vial	Cubrimiento de volquetas, inspección mecánica, señalero, velocidad controlada, disposición en sitio autorizado
Excavación mecánica para vías y alcantarillado	Derrumbe de taludes, maquinaria, redes enterradas	Sepultamiento, atrapamiento, electrocución, golpes	Agua; Comunidad; Suelo; R. Naturales; Aire; Paisaje; Flora; otro.; Fauna	Alteración de drenajes, erosión y remoción de cobertura vegetal	Permiso de excavación, localización de redes, estabilización de taludes, monitoreo permanente, manejo de aguas superficiales

| | | |

Colocación de concreto para cimentaciones y estructuras	Contacto con cemento, equipos de vibrado	Dermatitis, atrapamientos, golpes	X	Agua		Comunidad	Derrames de concreto y lavado de equipos	Uso de guantes impermeables, zonas de lavado controladas, recolección de residuos
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Armado e instalación de acero de refuerzo	Elementos cortopunzantes, manipulación de cargas	Cortes, golpes, lesiones osteomusculares		Agua		Comunidad	Residuos metálicos	Protección de puntas, guantes anticorte, almacenamiento ordenado
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de pozos de inspección y estructuras	Trabajo en excavaciones, alturas, herramientas	Caídas, golpes, atrapamientos	X	Agua		Comunidad	Alteración temporal del terreno	control de acceso
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Excavación manual para andenes, pozos y sumideros	Derrumbe, herramientas manuales, tránsito vehicular	Golpes, cortes, sepultamiento, atropellamiento	X	Agua	X	Comunidad	Alteración del terreno, generación de material sobrante	Delimitar área, señalización, inspección de excavación, manejo adecuado de material excavado
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de pozos de inspección (placa base, cilindro, placa cubierta y cañuelas)	Trabajo en excavación, manipulación de acero y concreto	Caídas, golpes, atrapamientos, sobreesfuerzos	X	Agua		Comunidad	Residuos de concreto, afectación temporal del terreno	Uso de EPP, entibación cuando aplique, orden y aseo, control de vertimientos
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de sumideros	Herramientas, concreto, excavaciones	Golpes, caídas, atrapamientos	X	Agua		Comunidad	Alteración de drenajes y generación de residuos	Manejo adecuado de residuos, control de sedimentos y aguas de escorrentía
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de adoquín ecológico y conformación de andenes	Manipulación manual de cargas, compactación	Lesiones osteomusculares, golpes, atrapamientos		Agua		Comunidad	Generación de polvo y compactación del terreno	Técnicas de levantamiento seguro, humectación del material, uso de guantes
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Construcción de bordillos fundidos en sitio	Manejo de concreto y herramientas	Dermatitis, golpes, cortes	X	Agua		Comunidad	Derrames de concreto y residuos de obra	EPP adecuado, áreas controladas para preparación y limpieza
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Instalación de ciclo-parqueaderos y mobiliario urbano	Herramientas manuales, manipulación de elementos metálicos	Cortes, golpes, sobreesfuerzos		Agua	X	Comunidad	Intervención temporal del espacio público	Delimitación del área, manejo adecuado de residuos y almacenamiento de materiales
				Suelo		R. Naturales		
				Aire	X	Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Excavación y fundición de bases	Herramientas manuales, concreto	Golpes, cortes, sobreesfuerzos		Agua		Comunidad	Generación de residuos y polvo	EPP completo, señalización, manejo adecuado de residuos
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				

Instalación de canecas, bolardos, bancas y protectores	Manipulación de cargas y herramientas	Golpes, atrapamientos, lesiones musculares	Agua	X	Comunidad	Generación de residuos y polvo	Técnicas de levantamiento seguro, delimitación del área y orden de materiales
			Suelo		R. Naturales		
			Aire	X	Paisaje		
			Flora		otro.		
			Fauna				

Autorizacion							
FIRMAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Responsable de la actividad.	Carlos Forero	Carlos Forero	Carlos Forero	Carlos Forero	Carlos Forero	Carlos For	—
Responsable Ambiental.	—	—	—	—	—	—	—
Responsable SST.	Marlly B	Marlly B	Marlly B	Marlly B	Marlly B	Marlly B	—

SOCIALIZACIÓN ATS GRUPO EJECUTOR

NOMBRE	No. DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	CARGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Carolina Restrepo	1070588114	Ayudante	Carolina	Carolina	Carolina	Carlona	Carolina	Carolina	
Carlos Martinez	77355453	Ayudante	Carlos M	Carlos M	Carlos M	Carlos M	Carlos M	Carlos M	
Oscar E. Perez	11205665	Ayudante							
Yeison Urrego	1120267713	Ayte							
Jose Ubaldo Ospina	9333835	Ayud	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	Ubaldo	
David Quintero Andrade	1120501070	Ayudante	David Quintero	David Quintero	David Quintero	David quintero	David quintero	David quintero	
MARCOS E. TEJADA TEJADA	1120503527	AYUDANTE							
Juan Cepeda	93439539	ayudante	Juan cepeda	Juan cepeda	Juan cepeda	Juan Cepeda	Juan cepeda	Juan Cepeda	
JOHN RESTREPO	1006315685	Ayudante							
Geiner Durán G	1120506906	Ayudante	Geiner D	Geiner D	Geiner D	Geiner	Geiner	Geiner	
Luis Carlos Rezolaza	1121895461	AY	Luis carlos	Luis carlos	Luis carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	Luis Carlos	
Lw Edison Pulido	1120507359	ay							
Jorge Ivan Aguirre	1006973462	OFICIO	Jorge A	Jorge A	Jorge A	Jorge A	Jorge A	Jorge A	
Luis Eduardo Arboleda	664858	OFICIAL							
Aslin Sanchez Rincon	1006697509	Ayudante	Aslin	Aslin	Aslin	Cristian	Cristian	Cristian	
Juan David Restrepo V	1141345059	Ayudante				—	—	—	

G145

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:	SIG-SST-FO-28
CONSORCIO CARRERA 5 EG	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN:	1
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	FECHA:	6/5/2026

NOMBRE DE EMPRESA	CONSORCIO CARRERA 5 EG								
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Figurado Acero compactación de terreno Excavación mecánica Fundido de concreto						ATS No.	10	
							FECHA PT ASOCIADO	———	
ÁREA O LUGAR	SAN MARTIN META		FECHA DE ELABORACIÓN	24/07/26	FECHA INICIAL	24/07/26	FECHA FINAL	31/07/26	

TIPO DE PERMISO DE TRABAJO (Diligencie con una X segun aplique)												
	SI		IZAJE DE CARGAS		TRABAJO EN CALIENTE		EXCAVACIONES		SUSTANCIAS PELIGROSAS	
	NO		ESPACIOS CONFINADOS		TRABAJO EN ALTURAS		TRABAJOS ELECTRICOS		OTRO	

Equipo, Herramientas y Materiales (Especifique):

Herramienta menor

EPP requerido para el trabajo:					Otros Equipos o EPP (Especifique):
Casco	Prot. Caidas 100%	Cartucho Resp.	Peto Mezcla de Químicos		N/A
Botas de Seg.	Monogafa	Suministro de Aire	Ropa para Químicos		
Gafas de Seg.	Protector facial	Guantes Química	Traje antifluidos		
Guantes	Prot. De Oidos	Botas de caucho	Otros		

SECUENCIA DE PASOS BÁSICOS (Qué, Cómo, Cuando, Para, Dónde)	PELIGROS (Fuente, Situación, Acto)	RIESGOS (Suceso o Exposición peligrosa)	ASPECTO AMBIENTAL (Elemento que interactúa con el medio ambiente) marque con una x.				IMPACTO AMBIENTAL (Efecto en las personas, el ambiente, equipos, otros) marque según el codigo asignado a cada impacto	CONTROL OPERACIONAL SST Y AMBIENTAL
Localización, trazado y replanteo topográfico	Tránsito vehicular, terreno irregular, radiación solar	Atropellamiento, caídas al mismo nivel, golpe de calor		Agua	X	Comunidad	Interferencia con movilidad y afectación menor del terreno	Señalización temporal, uso de chaleco reflectivo, hidratación, delimitación del área, respeto por zonas verdes
			X	Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
			X	Flora		otro.		
				Fauna				
Demolición de concreto y pavimento	Maquinaria pesada, proyección de partículas, ruido, vibraciones	Golpes, atrapamientos, lesiones oculares, pérdida auditiva		Agua	X	Comunidad	Emisión de polvo, ruido elevado, generación de escombros	Humectación permanente, barreras de protección, manejo adecuado de RCD, protección auditiva y visual, rutas autorizadas para transporte
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Cargue y transporte de escombros	Equipos móviles, maniobras de cargue, tránsito	Atropellamiento, choques, caída de materiales		Agua	X	Comunidad	Material particulado, derrames, congestión vial	Cubrimiento de volquetas, inspección mecánica, señalero, velocidad controlada, disposición en sitio autorizado
			X	Suelo		R. Naturales		
			X	Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				
Excavación mecánica para vías y alcantarillado	Derrumbe de taludes, maquinaria, redes enterradas	Sepultamiento, atrapamiento, electrocución, golpes		Agua		Comunidad	Alteración de drenajes, erosión y remoción de cobertura vegetal	Permiso de excavación, localización de redes, estabilización de taludes, monitoreo permanente, manejo de aguas superficiales
				Suelo		R. Naturales		
				Aire		Paisaje		
				Flora		otro.		
				Fauna				

| | | |

| | | |

6148

Instalación de canecas, bolardos, bancas y protectores	Manipulación de cargas y herramientas	Golpes, atrapamientos, lesiones musculares	Agua	X Comunidad	Generación de residuos y polvo	Técnicas de levantamiento seguro, delimitación del área y orden de materiales
			Suelo	R. Naturales		
			Aire	X Paisaje		
			Flora	otro.		
			Fauna			

Autorizacion

FIRMAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Responsable de la actividad.	Carlos Forero	Carlos Forero	Carlos Forero	Carlos Forero	Carlos Forero	Carlos Forero	—
Responsable Ambiental.	—	—	—	—	—	—	—
Responsable SST.	Marlly B	Marlly B	Marlly B	Marlly B	Marlly B	Marlly B	—

SOCIALIZACIÓN ATS GRUPO EJECUTOR

NOMBRE	No. DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	CARGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DAVID ALEJANDRO QUINTERO	1120501079	ALMACENISTA							
LUIS EDUARDO ARBOLEDA	6648582	OFICIAL							
JORGE IVAN AGUILAR	1006697509	OFICIAL							
CRISTIAN SANCHEZ	1006697509	AYUDANTE	—	—	—	—	—	—	
GEINER ESTIVEN DURAN	1120506904	AYUDANTE							
CAROLINA RESTREPO	1070586114	AYUDANTE							
YEISON ALIRIO HERNANDEZ	1120366743	AYUDANTE							
LUIS PULIDO PEÑA	1120507359	AYUDANTE							
JUAN PABLO MANCERA	93437799	AYUDANTE							
JHON JAIDER RESTREPO	1006315685	AYUDANTE							
JUAN DAVID MANRIQUE	1141315056	AYUDANTE	—	—	—	—	—	—	
CESAR TULIO CESPEDES	1121875157	AYUDANTE							
LUIS CARLOS REY	1121850421	AYUDANTE							
CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17355451	AYUDANTE							
MAICOL ESTIVEN TILANO	1120503519	AYUDANTE							
JOSE UBALDO ROJAS	93338325	AYUDANTE							
OSCAR FERNANDO PEREZ	11205665	AYUDANTE							
JUAN GABRIEL CEPEDA	93439539	AYUDANTE							

CONSORCIO CARRERA 5 EG 902.054.725-5	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	INFORME COMPONENTE AMBIENTAL

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA)

PERIODO DEL INFORME
(07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2026)

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META.

CONTRATO DE OBRA No. 109 DE 2026

2026

TABLA DE CONTENIDO.

1. GENERALIDADES 3
2. ALCANCE. 4
3. OBJETIVOS. 5
4.1 Objetivo General. 5
4.2 Objetivos Específicos. 5
4. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO. 6
7. ASPECTOS AMBIENTALES. 9
8. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERMISOS. 10
9. SEGUIMIENTO AL CUMPIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 10
10. Desarrollo de fichas de manejo ambiental. 11
Ficha N 1: Información y Comunicación a la Comunidad. 11
Ficha N2. Licencias, Permisos y Trámites Ambientales. 12
- Ficha N 3. Manejo y Disposición de Material Sobrante. 14
- Ficha N 4. Capacitación ambiental. 14
- Ficha N 5. Manejo Maquinaria equipos y vehículos. 14
- Ficha N 6. Manejo integral de materiales de construcción. 15
- Ficha N 7. Manejo y disposición de residuos sólidos. 15
- Ficha N8. Señalización Frentes de obra y Sitios Temporales. 16
- Ficha N9. Control de emisión de ruido. 16
- Ficha N 10. Manejo de descapote y cobertura vegetal. 16
- Ficha N 11.Instalación, Funcionamiento y Desmantelamiento de campamentos y sitios temporales. 17
- Ficha N 12. Protección de fauna. 17
- Ficha N 13 Atención a la comunidad. 18
- Ficha N 14 Contratación mano de obra. 18
- Ficha N 15 Conformación grupo ambiental. 18
- Ficha N 16 Manejo de aguas superficiales 18
- Ficha N 17 Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales 18
- Ficha N 18 Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos. 19

11. CONCLUSIÓN. 20
12. ANEXOS. 20

1. GENERALIDADES

El programa de implementación de medidas ambientales es un componente básico del proyecto, que comprende las medidas de manejo ambiental necesarias respecto a las actividades constructivas con el fin de prevenir, mitigar, compensar y controlar los impactos negativos que se puedan presentar en el desarrollo del proyecto. Es la principal herramienta de gestión ambiental y social de obligatorio cumplimiento por los responsables del proyecto en la cual interviene un profesional ambiental encargado de dar cumplimiento a estas actividades durante toda la ejecución del proyecto. **MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META.**

2. ALCANCE.

Mediante la presentación del Plan de Adaptación a la guía Ambiental - PAGA, se espera la ejecución de las actividades del proyecto **MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META.** , así mismo dar a conocer las características del área de trabajo (factores físicos y bióticos) las generalidades del proyecto y el potencial de impacto de las diversas acciones que implica su ejecución, así como las posibilidades de adelantar acciones o actividades de prevención, control, mitigación o compensación; todo ello amparado en las normas ambientales legales vigentes que propenden por un desarrollo sostenible de los proyectos de infraestructura.

El presente informe, integra los conceptos de la ingeniería con los lineamientos de la Gestión Ambiental. Igualmente, pretende identificar y valorar los impactos y las acciones a desarrollar con el fin de contribuir a la conservación del medio natural donde se desarrollan las obras, alterando al mínimo las condiciones ambientales y socioeconómicas preexistentes.

Este tendrá una repercusión directa y mejora continua en el desarrollo de la parte operativa del proyecto, garantizando un flujo de recursos por parte del contratista y la participación activa de la comunidad asociada al proyecto; de ello dependerá el buen desarrollo de las obras de manera ambientalmente segura respetando los principios de protección y conservación de un ambiente sano y la elevación de la calidad de vida de los habitantes del municipio de puerto concordia y vecinos beneficiarios del proyecto.

3. OBJETIVOS.

4.1 Objetivo General.

Implementación y puesta en marcha del plan de medidas ambientales PAGA para el proyecto **MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META.**

4.2 Objetivos Específicos.

- Ejecución y puesta en marcha de las fichas ambientales del Programa.
- Prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos negativos a cada uno de los componentes ambientales.
- Cumplimiento con lo establecido en la legislación ambiental vigente que aplique en cada una de las etapas de construcción.
- Implementar y mantener medidas preventivas y de control que minimicen el riesgo de ocurrencia de derrames y contingencias ambientales, asegurando la correcta gestión de los materiales peligrosos y el cumplimiento de los procedimientos de respuesta ante emergencias.

4. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO.

Las obras que comprenden el desarrollo del Contrato de obra N° 109 de 2026 suscrito 28 de diciembre de 2023, cuyo objeto es la "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META", se ejecutará en:

MUNICIPIO: San Martín, Meta.





DATOS PRINCIPALES DE LA OBRA	
PERIODO REPORTADO:	07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATO NÚMERO	109 DE 2026
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CONTRATANTE	ALCALDÍA DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS – META NIT N.° 892.099.548-6
CONTRATISTA	CONSORCIO CARRERA 5 EG Nit: 902.054.725-5
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META".
VALOR	CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($5.278.148.553,00) M/CTE
OBJETIVO	
Dar a conocer las actividades desarrolladas en el contrato cuyo objeto es desarrollar el "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META".	

5. ASPECTOS AMBIENTALES.


Se describen los aspectos ambientales del proyecto que aplican al presente periodo evaluado a fin de conocer los posibles impactos asociados a la ejecución normal de las actividades en obra de MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META". La evaluación de los impactos ambientales identificados muestra que los más significativos y de mayor importancia, afectarán principalmente el Recurso suelo .

Contamos con 26 impactos identificados en un total de 15 corresponde a carácter medio, 10 a carácter bajo, y uno (1) de carácter alto, el impacto significativo que se presenta corresponde a al uso del suelo y emisiones atmosféricas.





Frente a los impactos positivos observamos mejoras en la calidad de vida de los habitantes del sector y mejoras en la estructura principal de la vía , en cuanto a los impactos derivados por emergencias se encuentran 1 por movimientos de tierras o sismos en el área urbana, 14 situaciones anormales relacionadas con (desastres naturales) y 7 situaciones consideradas como normales.

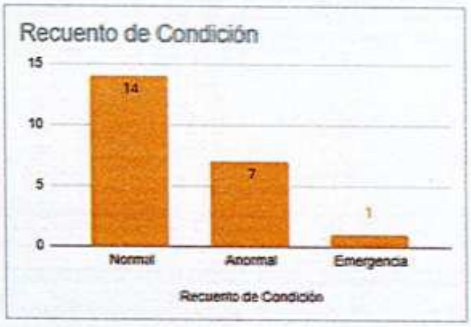

Este análisis sugiere que, si bien existen eventos imprevistos y condiciones inusuales, la mayor parte del tiempo el entorno se mantiene en condiciones aceptables, lo cual favorece la percepción positiva del proyecto por parte de la comunidad.

5. SEGUIMIENTO AL CUMPIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

Como herramienta básica para la aplicación de medidas y acciones para la prevención y mitigación de impactos ambientales negativos se da cumplimiento a las actividades propuestas en las Fichas de Manejo Ambiental para el desarrollo de proyecto durante el respectivo periodo a continuación se relaciona el avance de las fichas evaluadas.

Tabla 1. Descripción de las fichas ambientales.

Programa	Proyecto	Código
1. Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental	Conformación del grupo de gestión ambiental.	DAGA-1.1-01
	Capacitación ambiental al personal de obra.	DAGA-1.2-02
2. Programa Actividades Constructivas	Proyecto de manejo integral de materiales de construcción.	PAC-2.1-04
	Proyecto de señalización de frentes de obras y sitios temporales.	PAC-2.3-06
	Proyecto de manejo y disposición final de escombros y lodos.	PAC-2.4-07
	Proyecto de manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales.	PAC-2.5-08
3. Programa Gestión Hídrica	Proyecto de manejo de aguas superficiales.	PGH-3.1-09
	Proyecto de manejo de residuos líquidos domésticos e industriales.	PGH-3.2-10
4. Programa Manejo de Instalaciones Temporales, de Maquinaria y Equipo	Proyecto Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y acopio temporal.	PMIT -5.1-15
	Proyecto de manejo de maquinaria, equipos y vehículos.	PMIT- 5.3-17
5. Programas de Gestión Social.	Proyecto de Atención a la Comunidad.	PGS-6.1-18
	Proyecto de Contratación Mano de Obra	PGS-6.6-23

6. DESARROLLO DE FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL.

A continuación, se describen las actividades realizadas frente a lo dispuesto en cada una de las fichas relacionadas en pro de la mitigación de impactos ambientales negativos.

1. Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental

DAGA-1.1-01 Conformación del grupo de gestión ambiental.

Durante el periodo evaluado se encuentra en funcionamiento el Grupo de Gestión Ambiental del proyecto, responsable de liderar y apoyar la implementación de las medidas ambientales establecidas para la obra.

Nombre	Cargo
Paula andrea pardo redondo	Profesional ambiental
Carlos Forero	Residente de obra

DAGA-1.2-02 Capacitación ambiental al personal de obra.

Durante el periodo evaluado se llevó a cabo una jornada de capacitación y sensibilización dirigida al personal de obra, sobre orden y aseo en el lugar de trabajo.

Imagen 1. *Capacitación en obra.*




con el propósito de fortalecer la cultura ambiental y promover prácticas responsables durante la ejecución del proyecto. En la actividad se destacó la importancia de optimizar el consumo de agua, energía y demás recursos, contribuyendo a la reducción de impactos ambientales, la conservación de los ecosistemas y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Asimismo, se fomenta el compromiso individual y colectivo de los colaboradores con la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

2. Programa Actividades Constructivas

PAC-2.1-04 Proyecto de manejo integral de materiales de construcción.

Durante el periodo reportado se realizaron actividades orientadas al manejo adecuado de los materiales de construcción utilizados en la obra, garantizando su almacenamiento, organización y conservación en condiciones apropiadas.Se efectuó el ordenamiento de materiales en las áreas destinadas para su acopio, facilitando el control de inventarios, la optimización de los espacios de trabajo y la prevención de pérdidas o deterioro de los insumos, **Gravicon** es la empresa encargada del material granular.

Imagen 2. *Manejo de materiales en obra.*

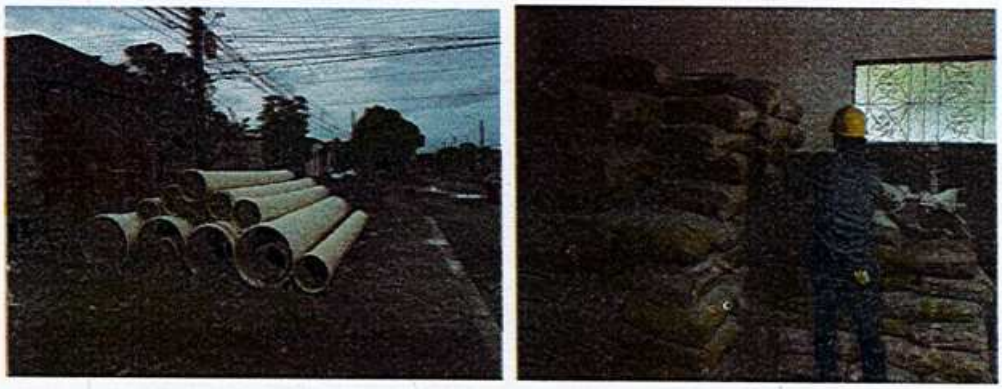


PAC-2.3-06 Proyecto de señalización de frentes de obras y sitios temporales.

Durante el periodo reportado se realizó la instalación de la señalización en los diferentes frentes de trabajo y áreas temporales del proyecto, garantizando la identificación de zonas de riesgo, áreas de trabajo, puntos de acopio y vías de circulación. Asimismo, se verificó periódicamente su estado y visibilidad, contribuyendo a la seguridad del personal y al adecuado desarrollo de las actividades de obra.

Imagen 3. *Señalización en obra*



Imagen 4. *Señalización en obra*

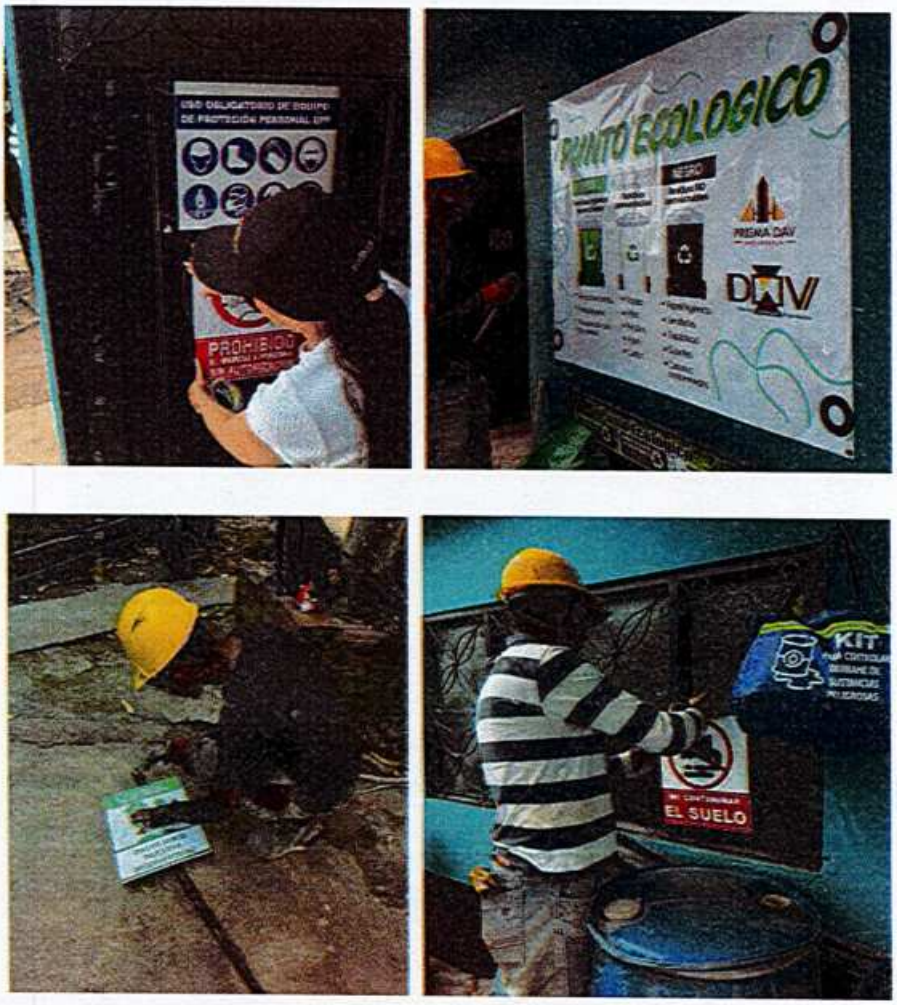

PAC-2.4-07 Proyecto de manejo y disposición final de escombros y lodos.

Se garantizó que los materiales transportados, incluidos escombros, material sobrante de excavación y lodos, fueran movilizados en vehículos debidamente acondicionados y cubiertos con lonas, con el fin de prevenir la dispersión de partículas, la generación de material particulado, los derrames durante el transporte y posibles afectaciones a las vías y al entorno. Asimismo, se verificó que la disposición final de estos materiales se realizará en sitios autorizados, conforme a la normatividad ambiental vigente.

Imagen 5. *Manejo de escombros en obra.*





Por parte de la Alcaldía Municipal se otorgó viabilidad para el uso del lote destinado al acopio temporal y disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), de acuerdo con las condiciones y lineamientos establecidos por la administración municipal.

Imagen 5. *Predio RCD para disposición final.*

IDENTIFICACIÓN PREDIAL ÁREA POTENCIAL PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD		
Nombre Predio	**Cedula catastral**	**Área ha**
Lote	50689000200040125000	48,01

PAC-2.5-08 Proyecto de manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales.

Durante el periodo reportado se realizó la adecuada gestión de los residuos sólidos convencionales y especiales generados en la obra, mediante la separación en la fuente y el uso de puntos ecológicos debidamente identificados. Se verificó la correcta disposición temporal de los residuos y su entrega a gestores autorizados empresa de servicios públicos **CAFUCHES**, promoviendo el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y la minimización de impactos al entorno.

Imagen 6. Instalación de pendón *Manejo de residuos en obra.*



Imagen 7. *Manejo de residuos en obra.*




3. Programa Gestión Hídrica

PGH-3.1-09 Proyecto de Manejo de Aguas Superficiales

Durante el periodo reportado se implementaron medidas orientadas al uso eficiente y controlado del recurso hídrico en la obra. Para el consumo del personal se suministró agua potable mediante la adquisición de agua envasada por la empresa AGUA DEL META, garantizando condiciones adecuadas de calidad e higiene para los trabajadores y evitando afectaciones a las fuentes hídricas del área de influencia.


Imagen 8. *Agua potable en obra.*

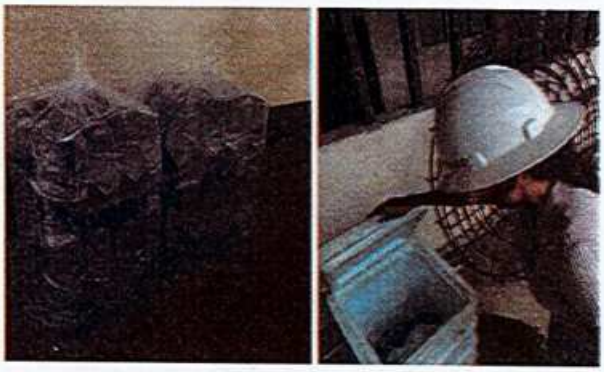

PGH-3.2-10 Proyecto de Manejo de Residuos Líquidos Domésticos e Industriales

Durante el periodo reportado se adecuaron unidades sanitarias para hombres y mujeres destinadas al personal de obra en las instalaciones de la oficina del proyecto. Debido a que el predio cuenta con disponibilidad de los servicios de acueducto y alcantarillado, las aguas residuales domésticas generadas son conducidas y dispuestas a través de la red de alcantarillado existente por la empresa de servicios públicos **CAFUCHES**, garantizando condiciones sanitarias adecuadas y previniendo impactos ambientales

Imagen 9. *Baños en obra.*

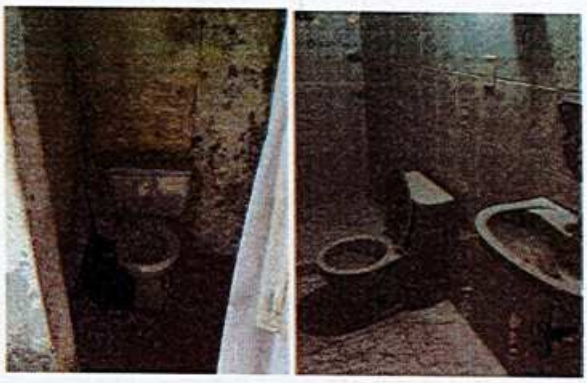

5. **Programa Manejo de Instalaciones Temporales, de Maquinaria y Equipo**

PMIT-5.1-15 Instalación, funcionamiento desmantelamiento de campamentos y acopio temporal.

Durante el periodo reportado se realizó la adecuación y puesta en funcionamiento de la oficina del proyecto, la bodega para almacenamiento de herramientas, equipos e insumos, así como la instalación de unidades sanitarias para el personal de obra. De igual forma, se habilitaron las áreas destinadas al acopio temporal de materiales granulares, garantizando condiciones adecuadas de orden, organización y protección de los materiales, con el fin de prevenir afectaciones al entorno y facilitar el desarrollo de las actividades constructivas.

Imagen 10. *Acopio de materiales en obra.*



PMIT-5.3-17 Proyecto de manejo de maquinaria, equipos y vehículos.

Durante el periodo reportado se realizaron inspecciones periódicas a la maquinaria, equipos y vehículos vinculados al proyecto, con el fin de verificar sus condiciones operativas y ambientales. Como resultado de las inspecciones efectuadas, no se evidenciaron fugas de combustibles, aceites u otros fluidos, contribuyendo a la prevención de la contaminación del suelo y al cumplimiento de las medidas ambientales establecidas para la obra.

Imagen 11. *Inspección kit ambiental.*



Imagen 12. *Recomendaciones para operario de maquinaria.*



Imagen 13. *Inspección de acopio de combustibles.*



6. Programas de Gestión Social.

PGS-6.1-18 Proyecto de Atención a la Comunidad.

Durante el periodo evaluado no se recibieron PQRS por parte de la comunidad, sin embargo se mantienen los canales de comunicación abiertos al público y con el personal para la atención oportuna de las necesidades de la comunidad aledaña al área del proyecto.

Canales de comunicación:
oficina de atención a la comunidad ubicada al interior de la obra.
Formato de atención a PQRS.
Correo electrónico: **consorciocalle5ta@gmail.com**

- **Seguimiento a indicadores.**

Indicador	Resultado	Observaciones
N de PQRS resueltas / N de PQRS recibidas.	0 / 0 = 0 %	No se presentaron PQRS durante el periodo evaluado.
N de reuniones realizadas / N de reuniones propuestas.	2 / 2 = 100%	Reunión veeduría 26-06-26 Capacitación comunidad 26-06-26

PGS-6.6-23 Proyecto de Contratación Mano de Obra

Durante el presente periodo se cuenta con el personal mínimo para la ejecución de las actividades y con el personal operativo.

1.1 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	NO. DE CÉDULA	CARGO
1	LEONARDO ANDRES BORDA IPUZ	80.229.941	DIRECTOR DE OBRA
2	CARLOS MANUEL FORERO	19.405.796	RESIDENTE DE OBRA
3	MARIA FERNANDA QUEVEDO	1.121.862.487	ESPECIALISTA HIDRAULICO
	JAIME ANDRES CAÑON DONCEL	1.049.630.249	ESPECIALISTA VÍAS
4	PAULA ANDREA PARDO REDONDO	1.121.889.444	ESPECIALISTA AMBIENTAL
5	MARLLY JULIETH BEJARANO ENCISO	1.121.944.835	PROFESIONAL EN SST

1.2 PERSONAL OPERATIVO

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	NO. DE CÉDULA	CARGO	EPS	AFP	ARL	RAZÓN SOCIAL
1	AGUILAR RESTREPO JORGE IVAN	1.006.697.344	OFICIAL	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
2	ARBOLEDA CORREA LUIS EDUARDO	6.648.582	OFICIAL	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
3	DURAN GAITAN GEINER ESTIVEN	1.120.506.904	AYUDANTE	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
4	HERNANDEZ MENDOZA YEISON ALIRIO	1.120.366.743	AYUDANTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
5	QUINTERI ANDRADE DAVID ALEJANDRO	1.120.501.079	ALMACENISTA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
6	RESTREPO CAROLINA	1.070.586.114	AYUDANTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
7	SANCHEZ RINCON CRISTIAN DAVID	1.006.697.509	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	PROTECCION	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
8	PULIDO PEÑA LUIS EDILSON	1.120.507.359	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	PROTECCION	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
9	MANCERA BEJARANO JUAN PABLO	93.437.799	AYUDANTE	PROTEGER	PROTECCION	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
10	RESTREPO MARQUEZ JOHN JAIDER	1.006.315.685	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
11	MANRIQUE VASQUEZ JUAN DAVID	1.141.315.057	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
12	CESPEDES BAQUERO CESAR TULIO	1.121.875.158	AYUDANTE	SANITAS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
13	LUIS CARLOS REY OLAYA	1.121.850.421	AYUDANTE	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG

14	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	17.355.451	AYUDANTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
15	MAICOL ESTIVEN TILANO TRIANA	1.120.503.519	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
16	OSCAR FERNANDO PEREZ GARCIA	11.205.665	AYUDANTE	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
17	JUAN GABRIEL CEPEDA GUAPACHA	93.439.539	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	PROTECCION	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG
18	JOSE UBALDO ROJAS LEON	93.338.325	AYUDANTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CONSORCIO CARRERA 5 EG

Registro Fotografico.



inspección señalización ambiental



inspecciones señalización en obra



Manejo adecuado maquinaria



Instalación señalización



mejoramiento acopio de combustible



instalacion de señalizacion fauna


PROHIBIDO
ARROJAR BASURA


CAMILLA DE EMERGENCIA
PELIGRO
EXCAVACIÓN PROFUNDA
PROHIBIDO









7. CONCLUSIÓN.

Durante el periodo comprendido entre el **07 de julio** al **06 de agosto del 2026** , en el marco del proyecto **MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META.** , no se presentaron afectaciones al medio ambiente derivadas de los procesos constructivos, ni se materializaron incidentes ambientales relacionados con derrames o contingencias sobre la fuente hídrica.

Se dio cumplimiento a la normatividad ambiental colombiana vigente, particularmente al Decreto 1076 de 2015, en lo referente a los lineamientos del Plan de adaptación a la guía Ambiental (PAGA), y a la Resolución 2184 de 2019, que establece el nuevo código de colores para la clasificación y disposición final de los residuos sólidos.

En línea con el compromiso institucional frente al cambio climático y en cumplimiento de la **Enmienda de 2015 de la Norma ISO 14001**, se continuó con la identificación y gestión de riesgos y oportunidades asociados a condiciones climáticas extremas, buscando fortalecer la resiliencia del proyecto frente a los efectos del cambio climático.

8. ANEXOS.

Anexo 1. Inspección Puntos ecológicos

Anexo 2. Inspección de kit de emergencias ambientales

Anexo 3. Acopio de combustible.

Anexo 4. Listado asistencia capacitación ambiental

Paula Andrea Pardo Redondo
Profesional Ambiental
Consorcio Carrera 5ta. EG

Anexo 1.
Inspección Puntos ecológicos

6172

	CONSORCIO CARRERA 5TA. EG	CÓDIGO:	SIG-FO-137
CONSORCIO CARRERA S.A.S.	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN:	1
	Inspección Acopios y puntos ecologicos	FECHA:	17/1/2025

CHA	24/7/2026
OBRA	mejoramiento de la carrera 5ta.
LUGAR	san martin

Ítem	Criterio de Verificación	si	no	Descripción.
Ubicación	El punto ecologico está en el sitio designado, de fácil acceso y seguro.	x		n.a
	los acopios de residuos se encuentran es sitios adecuados y seguros?	x		n.a
Señalización	Colores y rótulos según código de colores de la Resolución 2184 de 2019 (verde, blanco, negro, etc.).	x		n.a
Estado fisico	Recipientes en buen estado, sin roturas, con tapas y limpios.	x		n.a
	Recipiente con bolsa	X		n.a
Separación correcta	Residuos dispuestos de acuerdo con su categoría (aprovechables, no aprovechables, orgánicos, peligrosos).	x		n.a
Limpieza del área	Zona libre de residuos fuera de los contenedores, sin olores ni lixiviados.	x		n.a
Frecuencia de recolección	Retiro de residuos según plan establecido, evitando sobreacumulación.	x		se realiza semanal y de forma quinsenal por parte del la empresa de aseo
Contención de lixiviados	El punto cuenta con bandejas o medidas para evitar derrames.		x	N.a
Protección contra plagas	se evidencian insectos, roedores u otros vectores.		x	N.a
Capacitación del personal	Usuarios conocen y aplican el código de colores y la correcta disposición.	x		N.a
Manejo de residuos peligrosos	En caso de existir, están almacenados y rotulados según normatividad.	x		N.a

Conclusiones y Recomendaciones:

Estado general de punto ecologicos : x Bueno ☐ Regular ☐ Malo

Estado general de Acopios : x Bueno ☐ Regular ☐ Malo

Recomendaciones específicas:
Continuar con el buen uso de los acopios y de los puntos ecologicos

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO.



Inspeccionado Por:	Paula Andrea Pardo Redondo.	**Firma:**	

Anexo 2.

Inspección de kit de emergencias ambientales

G174

CONSORCIO CARRERA 5 EG	CONSORCIO CARRERA 5TA. EG	CÓDIGO: SIG-FO-67
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN KIT ANTIDERRAME AMBIENTAL	FECHA: 18/07/2022
	NTC 4532 De 2010 Sección 7	

PROYECTO:	san martin carrera 5ta	**FECHA:**	24-jul-26
UBICACIÓN DEL KIT:	Area de bodega	**INSPECTOR:**	Paula pardo

DATOS BÁSICOS

N° IDENTIFICACIÓN DEL KIT / UBICACIÓN/PROYECTO:	kit n1 area de bodega
FECHA INSPECCIÓN:	24/7/2026

				KIT ANTIDERRAME			/ KIT ANTIDERRAME EN VEHÍCULOS											
N°	COMPONENTES	Unidad	Cantidad Mínima	B	M	F	B	M	F	B	M	F	B	M	F	B	M	F
1	Ubicación (Protegido de condiciones ambientales)	N/A	1	x														
2	Señalización y visibilidad	N/A	1	x														
3	Acceso (facilidad de uso - no candados; no obstáculos en el área para acceso)	N/A	1	x														
4	Estado de empaque (maletín o barril...)	N/A	1	X														
5	Maletín / Contenedor (N.A. para Kit en Vehículos)	Und	1	X														
6	Bolsas Rojas	Und	1	x														
7	Paño Absorbente tela Oleofilica (N.A. para Kit en Vehículos)	Und	10	x														
8	Pala plástica (debe ser pequeña para Kit en vehículos)	Und	1	x														
9	Barrera Absorbente Pequeña tipo Gusano (N.A. para Kit en Vehículos)	Und	2	x														
10	Cinta de Señalización	mt	50	x														
11	Etiquetas de residuos peligrosos	Und	1	x														
12	Paleta Pare - Siga (aplica solo para Kit en Vehículos)	Und	n.a															
13	Overol Tyvek	Und	n.a															
14	Gafas de seguridad	Und	1	x														
15	Guantes de Nitrilo	Par	1	x														
16	Mascarilla protección vapores orgánicos	Und	1	x														
17	Otros	N/A	N/A															

Convenciones: B : Bueno; M: Malo o defectuoso; F: Faltante.
* En caso de que algún componente no exista debido a que no es parte constituyente del tipo de kit antiderrame, marcar N.A. (No Aplica) en la casilla B

FIRMA DE INSPECTOR:

OBSERVACIONES: Se realizo la instalacion del kit en el area visible de la boega

durante la inspeccion en el mes se observa que el estado geneal del kit se encuentra optimo.

Anexo 3.
Acopio de combustible.

6176

	CONSORCIO CARRERA 5TA. EG	CÓDIGO:	SIG-FO-95
CONSORCIO CARRERA 5EC	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN:	2
	Inspección de Acopio de combustible	FECHA:	10/7/2024

CHA	24/07/2026
OBRA	mejoramiento de la carrera 5ta
LUGAR	san martin

1. ETIQUETADO		SI	NO	OBSERVACIONES
1.1	Todos los envases del acopio están etiquetados bajo el sistema SGA.	X		N.A
1.2	Las etiquetas de los productos son legibles y están en idioma español.	X		N.A
2. FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD		**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES**
2.1	Estan disponibles las fichas de datos de seguridad de las sustancias almacenadas en el acopio de combustibles	X		N.A
2.2	Las fichas de datos de seguridad se encuentran en un lugar visible y en buen estado	X		N.A
3. ACOPIO DE COMBUSTIBLES.		**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES**
3.9	¿El combustible está almacenado en contenedores adecuados y rotulados?	x		N.A
4.1	¿Se cuenta con kits de respuesta a derrames disponibles y en buen estado?	x		N.A
4.2	¿Existen sistemas de contención (bandejas, diques, paños) para evitar derrames?	x		N.A
4.3	¿El área de almacenamiento de combustible está claramente señalizada y es de acceso restringido?	x		N.A
4.4	¿El personal está familiarizado con el plan de emergencia y ha participado en simulacros?	x		N.A
4.5	El acerrin y dique de contencion se encuentra en buen estado?	x		N.A
4.6	¿El área de almacenamiento cuenta con una ventilación adecuada para prevenir la acumulación de vapores inflamables?	x		N.A
4.7	El diques de contención garantiza el almacenamiento de 110% del tanque con mayor capacidad	x		N.A

4. OBSERVACIONES GENERALES Y O REGISTRO FOTOGRAFICO.



Inspeccionado Por:	Paula Andrea Pardo	Firma:	

6177

CONSORCIO CARRERA 5 EG 902.054.725-5	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	INFORME CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

FORMATO 14 – FACTOR DE CALIDAD CRITERIOS ADICIONALES AMBIENTALES Y SOCIALES

MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 – 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META

CIUDAD
VILLAVICENCIO META

2026

1. INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento de lo establecido en la Resolución 142 de 2023 y conforme a los criterios ambientales y sociales aplicables a procesos contractuales de obra pública, se presenta el presente documento de Factores de Calidad y Criterios Ambientales y Sociales, mediante el cual se establecen las acciones, programas, indicadores y compromisos ambientales y sociales adicionales a los contemplados dentro del Plan de Adaptación a la Guía ambiental PAGA.

El presente documento tiene como finalidad fortalecer la sostenibilidad ambiental, el uso eficiente de los recursos naturales, la participación comunitaria y las buenas prácticas ambientales durante la ejecución del proyecto.

2. OBJETIVO

Establecer las acciones, estrategias y compromisos ambientales y sociales adicionales al PAGA, orientados al cumplimiento de los criterios de sostenibilidad establecidos en la Resolución 142 de 2023 durante la ejecución del proyecto.

3. ALCANCE

El presente documento aplica a todas las actividades constructivas desarrolladas dentro del proyecto de mejoramiento vial de la Carrera 5 entre calles 10 y 20 del municipio de San Martín – Meta, incluyendo personal operativo, administrativo, contratistas, visitantes y comunidad del área de influencia.

4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

4.1 Indicador ambiental adicional al PMA.

Se implementará un indicador adicional orientado al fortalecimiento de la gestión ambiental del proyecto:

Meta: Aprovechar mínimo el 40% de los residuos reciclables generados durante la ejecución del proyecto.

Frecuencia: Mensual.

Responsable: Área Ambiental del proyecto.

Evidencias: Registros de entrega a gestor autorizado, Registro fotográfico, Informes mensuales.

ACTIVIDADES REALIZADAS JUNIO.
Durante el mes de julio se ejecutaron las siguientes actividades en cumplimiento del indicador de gestión de residuos sólidos: • Se realizó la instalación y correcta rotulación del punto ecológico en obra, con el fin de facilitar la adecuada separación de los residuos en la fuente y promover su correcta disposición. • Se implementó una estrategia para incentivar el aprovechamiento de papel y cartón, promoviendo la reutilización de hojas impresas por una sola cara como borradores y su almacenamiento en cajas de cartón limpias para su posterior entrega al gestor o reciclador autorizado. • Se realizó inspección al control y registro de los residuos generados en obra.
Seguimiento Indicador.
% Aprovechamiento = 1 kg / 2kg = 66%

Registro Fotografico.









4.2 Programa de movilidad sostenible: Con el fin de promover prácticas sostenibles y disminuir emisiones atmosféricas, el contratista garantizará espacios y acciones para incentivar medios de transporte alternativos.

Actividades:

- Adecuación de zona para parqueo de bicicletas.
- Promoción del uso compartido de transporte.
- Jornadas de sensibilización sobre movilidad sostenible.
- Flexibilización de horarios para facilitar transporte alternativo.

Evidencias:

- Registro fotográfico.
- Señalización instalada.

ACTIVIDADES REALIZADAS JUNIO.
Durante el periodo evaluado se adecuó un espacio destinado al parqueo de bicicletas, con el propósito de incentivar el uso de medios de transporte sostenibles entre el personal de obra. De manera complementaria, se promovió el uso compartido del transporte contribuyendo a la reducción de emisiones atmosféricas, la disminución de la congestión vehicular.
Seguimiento Indicador.
N° actividades proyectadas/ N°actividades ejecutadas= 1 /1= 100%
Registro Fotografico.





4.3 Capacitaciones y educación ambiental: Se ejecutarán actividades adicionales de educación ambiental y sostenibilidad dirigidas al personal de obra y comunidad a fin de fortalecer la cultura ambiental.

Actividades propuestas:

- Separación adecuada de residuos
- Economía circular.
- Jornada comunitaria sobre ahorro de agua y manejo responsable de residuos posconsumo.
- Medición de huella hídrica

Evidencias: Actas de capacitación, Registro fotográfico, Listados de asistencia.

ACTIVIDADES REALIZADAS JUNIO.
Durante el mes de julio se realizó una jornada de capacitación ambiental dirigida al personal de obra, La actividad tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos del personal y promover una cultura ambiental orientada a la adecuada gestión de los residuos sólidos. Durante la capacitación se abordaron temas relacionados con cambio climático y economía circular.
Seguimiento Indicador.
N° actividades proyectadas/ N°actividades ejecutadas= 1 /1= 100%
Registro Fotografico.
 

4.4 Programa de uso eficiente y ahorro de agua: Se implementarán medidas adicionales orientadas a la reducción del consumo de agua durante la ejecución del proyecto.

Acciones:

- Inspecciones periódicas para detección de fugas.
- Instalación de señalización de ahorro de agua.
- Reutilización de agua para control de material particulado cuando sea técnicamente viable.
- Jornadas de sensibilización al personal.

Evidencias: Inspecciones, Registro Fotográfico.

ACTIVIDADES REALIZADAS JUNIO.
Durante el mes de julio se realizó la instalación de señalización para el ahorro y uso eficiente del agua en los diferentes puntos de consumo de la obra. Esta actividad tuvo como propósito sensibilizar al personal sobre la importancia de hacer un uso responsable del recurso hídrico, promoviendo buenas prácticas orientadas a prevenir el desperdicio de agua y fortalecer el cumplimiento de las medidas ambientales establecidas para el proyecto.
Seguimiento Indicador.
Per cápita = Consumo total de agua (m^3) / Número de trabajadores= **0.67 m^3/trabajador**.
Registro Fotografico.
 

4.5 Programa de reducción de plásticos de un solo uso

El proyecto implementará acciones para disminuir el consumo de plásticos de un solo uso dentro del área de obra.

Actividades:

- Eliminación progresiva de vasos y botellas desechables.
- Uso de termos reutilizables por parte del personal.
- Instalación de puntos ecológicos.
- Campañas de sensibilización ambiental.

4.6 Gestión de residuos posconsumo con participación comunitaria

Se desarrollarán actividades de sensibilización y recolección de residuos posconsumo con participación de la comunidad.

Actividades:

- Jornadas de recolección de residuos electrónicos y pilas.
- Sensibilización sobre disposición adecuada de residuos especiales.
- Entrega de residuos a gestores autorizados.

Evidencias:

- Certificados de disposición.
- Registro fotográfico.
- Actas de entrega.

ACTIVIDADES REALIZADAS JUNIO.
Durante el mes de julio se promovió el uso de termos reutilizables por parte del personal de obra, con el propósito de disminuir el consumo de vasos y botellas plásticas de un solo uso, fomentando hábitos de consumo responsable. De manera complementaria, se realizó la instalación de puntos ecológicos debidamente rotulados para facilitar la separación de los residuos en la fuente, fortaleciendo la gestión integral de residuos sólidos y el cumplimiento de las medidas ambientales establecidas para el proyecto

5. SEGUIMIENTO Y CONTROL

Durante el mes de julio, el área ambiental del proyecto realizó el seguimiento al cumplimiento de las actividades e indicadores establecidos en el presente documento, verificando la ejecución de las acciones programadas en materia de gestión ambiental y sostenibilidad. Como soporte de las actividades desarrolladas, se cuenta con los respectivos registros documentales y evidencia fotográfica, los cuales permiten demostrar el cumplimiento de las estrategias implementadas durante el periodo evaluado.

6. CONCLUSIONES

Durante el mes de julio se dio cumplimiento a las actividades ambientales y sociales programadas, evidenciando el compromiso del proyecto con el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y el fortalecimiento de la cultura ambiental tanto del personal de obra como de la comunidad. Las acciones implementadas contribuyeron al uso eficiente de los recursos naturales, la adecuada gestión de los residuos sólidos y la promoción de prácticas de movilidad sostenible, aportando al mejoramiento ambiental y social del municipio de San Martín – Meta durante la ejecución del proyecto.

7. Anexos.

Anexo 1: Listado de capacitación.
Anexo 2 : Certificado de disposición final material aprovechable

Paula Andrea Pardo Redondo
Profesional Ambiental
Consorcio carrera 5ta. EG .

Anexo 1:
Listado de capacitacion

6187

CONSORCIO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	1
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	6/5/2026

Fecha: 24/07/2026 Hora Inicio: 8:00 Hora Final: 8:30 nm.

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción ☐ Reinducción ☐ Reunión de SIG ☐ Capacitación ☒ Charla ☐
Socialización ☐ Otro

TEMA

Economía circular - Cambio climático

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Como aportar con nuestras acciones sostenibles al medio ambiente, influencia con el cambio climático.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Carolina Restrepo	1070586114	Correa S	Ayudante	
2	Jose Isaias Angarita	93338325	Correa S	Ayudante	
3	Luis Carlos Reyes Plaza	1171831491	Correa S	Ayudante	
4	David Ramirez Andrade	1120501078	CARCS	Ayudante	
5	Geiner Duran G	1120568900	CRS	Ayudante	
6	Miguel Angel Tarazona	1120503527	CLS	AYUDANTE	
7	Juan Cepeda	93679574	CYC S	ayudante	
8	Luis Edison Pulido P	1120387359	CRA S	ayudante	
9	CESAR CESPEDES	1120351568	CR S	AYUDANTE	
10	Oscar Perez	1120576665	CR S	Ayudante	
11	Carlos Alberto Martinez	1735754353	CR S	Ayudante	
12	Luis Pablo Rivera	93477999	CRS	Ayudante	
13	Juan Cepeda				
14	Jorge Ivan Agudelo	1006697366	CRS	oficio	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
Paula Pardo	Ambiental	

Anexo 2 :
Certificado de disposición final material aprovechable

6189

ASOCIACÓN DE RECICLADORES DEL META UNIDOS POR EL DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL "ECALLANOS"

NIT: 901293746-0
San Martin de los Llanos
3222081130
aprovechaminetosanmartin@gmail.com
Carrera 5 # 11-51 Barro: El Libertador

La empresa ECALLANOS, identificada con Nit 901293746-0 con sede en San Martin- Meta, legalmente constituida, certifica que el día 26 de junio del año 2026, recibió por parte de CONSORCIO CARRERA 5 EG, identificado con numero de Nit 902054725-5, el material reciclable para su respectivo aprovechamiento y/o disposición final:

Tipo de material	Cantidad(kg/ton)
Archivo	1 kg
Total	**1 kg**

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado en **San Martin**, a los **24** días del mes de **julio** de **2026**.

Cordialmente,

Jimmy Ricardo Parrado Rodríguez
Representante Legal
ECALLANOS
3222081130
