ESTRUCTECNIA S.A.S.

INFORME SALUD OCUPACIONAL

DEL 1 DE MARZO AL 31 MARZO 2026

OBJETO
INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA
EN LA FASE DE SST.

MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJO UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DE LA RAMA JUDICIAL ADSCRITOS A LA SECCIONAL DE MANIZALES CALDAS Y SEDES JUDICIALES EN COMODATO.

GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Realizado por:

Jaime Cardona Marulanda
Profesional Salud Ocupacional
T.P S.0. 077

ESTRUCTECNIAS S.A.S.
CARRERA 24 NO 20 – 48 OFICINA 11- 01
TELEFONO 606 893 4261
MANIZALES CALDAS

INTRODUCCION

El presente Informe mensual de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo y ambiente consolida los avances acumulados en prevención y promoción en cuanto a Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y ambiental en la empresa **ESTRUC-TECNIA S.A.S,** mediante la fase SST, para con la rama judicial.
MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJO UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DE LA RAMA JUDICIAL ADSCRITOS A LA SECCIONAL DE MANIZALES CALDAS Y SEDES JUDICIALES EN COMODATO
Este informe se estructura de la siguiente forma:

Las actividades que se realizaron en seguridad se centran en seguir los lineamientos del SG-SST (sistema de gestión), recolección y verificación de documentos de seguridad social, realización de inspecciones y abordajes a los diferentes frentes de trabajo, de emergencia, estadísticas de personal presente en obra, consolidado de ASPT, ACPT, ACDM y Desviaciones de seguridad. Los documentos citados en el presente se archivarán en físico en las A-Z de gestión HSEQ especifican.

OBJETIVOS

General

Adecuar y aplicar procedimientos basados en el sistema de gestión de
Salud y seguridad en el trabajo (SG-SST) según las necesidades de la empresa.

Específicos

- Identificar los Factores de Riesgo existentes, y poner en práctica medidas de control que mejoren las condiciones de trabajo y salud de todos los colaboradores en las obras y en la empresa.

- Crear estándares de seguridad y vigilancia que ayuden a evitar accidentes laborales y enfermedades laborales de acuerdo al procedimiento de seguridad y al análisis preliminar de riesgos (APR).

- Planear, organizar y desarrollar eventos de instrucción y capacitación y entrenamientos que sirvan de elementos de formación integral en el trabajo y fomente la participación activa de los trabajadores en general.

- Realizar y divulgar procedimientos de emergencias en procura de una adecuada y oportuna atención médica en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional.

- Se capacitaron a todos los colaboradores de acuerdo a los riesgos existentes en la obra

PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA:

RECURSO HUMANO

EMPRESA	PROYECTO	TRABAJADORES
ESTRUCTECNIA S.A.S.	**MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJO UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DE LA RAMA JUDICIAL ADSCRITOS A LA SECCIONAL DE MANIZALES CALDAS Y SEDES JUDICIALES EN COMODATO.**	5
INGENIERA RESIDENTE	OBRA CIVIL	1
PROFESIONAL SST	GESTION DEL SISTEMA	1
OFICIAL	OBRA CIVIL	1
AYUDANTES	OBRA CIVIL	2

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO A DESARROLLAR EN LA OBRA:

1. **Recepción y verificación de documentos.**

En una carpeta reposan los siguientes documentos:

- Copia de la cedula del trabajador
- Certificados EPS, AFP, ARL. Y otros
- Copia de formato inducción
- Copia de pagos seguridad social
- Copia certificado médico laboral
- Formatos permiso trabajos en alturas
- Formatos capacitaciones
- Formatos inspecciones

2. **Permisos para tareas de extremo cuidado**:

Durante este periodo NO **se** realizaron tareas de alto riesgo:

	AREA DONDE SE REALIZO EL TRABAJO	ACTIVIDAD
	OBRA RAMA JUDICIAL RIOSUCIO	-Demolición de enchape paredes y pisos de los baños de hombres. -Desmonte de unidades sanitarias e instalación. -Desmonte de puertas e instalación en baños y oficinas. -Nivelación de morteros -Resane y pintura en general del baño. -Retiro de escombros.

Procedimientos de Seguridad.

Se realizó inspección de seguridad de rutina en la obra, donde se corrigieron actos y condiciones inseguros en el instante.

- Inspecciones de seguridad
- Se verificaron las condiciones seguras en proceso de:
  - Pagos de la seguridad social de los colaboradores tanto de la empresa, como de los contratistas
  - Se verificaron los comportamientos seguros y la utilización de los elementos de protección personal en los procesos de:
  - Manipulación de herramientas menores
  - Se realizaron las pausas activas

Procedimientos de Seguridad.

Se realizaron inspecciones de seguridad de rutina en la obra, donde se corrigieron actos y condiciones inseguros en el instante.

- La utilización de los epp requeridos para las labores en obra como manipulación de herramientas menores.
- En lo corrido de este periodo se entregaron los epp al personal, de acuerdo al riesgo existente y a la actividad a realizar.

ABORDAJES.

PROCESOS DISCIPLINARIOS.

- **Durante este periodo no se recibieron conductas disciplinarias por parte de las personas encargadas de la obra a nuestros trabajadores.**
  - Se realizaron capacitaciones sobre.

CAPACITACIONES DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2026		
FECHA	**TEMAS**	**ASISTENTES**
4/03/2026	**UTILIZACION DE LOS EPPs, DE ACUERDO A LA LABOR A REALIZAR EN LA OBRA**	**3**
4/03/2026	**NORMAS DE SEGURIDAD EN EL SITIO DE TRABAJO**	**3**
4/03/2026	**RIESGOS EN MANIPULACION DE HERRAMIENTAS MENORES**	**3**

SE DILIGENCIARON LOS SUGUIENTES FORMATOS DE ACUERDO AL SG SST DE LA EMPRESA

7-3-2026 PERMISO TRABAJO EN ALTURAS
4-3-2026 DOTACION DE EPP
4-3-2026 ATS TRABAJO EN ALTURAS
4-3-2026 FORMATO CAPACITACION
4-3-2026 INSPECCION PULIDORA
27-3-2026 ATS INSTALACION MANTO ASFALTICO ESCALAS PALACIO NACIONAL MANIZALES

MEDICINA PREVENTIVA

No se atendieron incidentes menores laborales
incapacidades por enfermedad general y accidente laboral

Durante este periodo **no** se presentaron eventos:
PRIMEROS AUXILIOS.
No se atendieron incidentes laborales.

EVENTOS

ACPT (Accidente con pérdida de tiempo)	=	0
ASPT (Accidente sin pérdida de tiempo)	=	0
ACDM (Accidentes con pérdida de material)	=	0
FIRST AID (Primeros auxilios)	=	0
ENFERMEDAD GENERAL	=	0

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

1. Inspección de seguridad en la obra a cargo del profesional en Salud Ocupacional asignado por la empresa **JAIME CARDON MARULANDA**,
2. Se verifico la buena utilización de los elementos de protección personal a los colaboradores tales como:

- **Gafas, guantes de Palma látex, casco de seguridad, botas de seguridad, tapabocas, protectores auditivos siliconados.**
- **Así mismo su reposición en cuanto a su desgaste**

3. Se fortaleció la importancia del orden y el aseo en los lugares de trabajo.
4. Se les realizo pausas activas,

RECOMENDACIONES QUE SE DIERON

- Inspeccionar las áreas de trabajo antes de iniciar labores.
- Orden y aseo en sitios de trabajo
- Continuar con los acompañamientos en obra utilizar adecuadamente los EPP, para las labores requeridas en obra
- Tips de seguridad en los procesos
- Buena utilización de los EPP
- Puntos de encuentro en caso de siniestro

- **7. ASPECTOS AMBIENTALES.**

- Se les recomendó la buena utilización de los servicios sanitarios, la utilización de los mismos para los trabajadores y personal administrativo
- El agua que se destina para este proyecto es tomada del acueducto de la dorada caldas
- El servicio de luz que se destina para este proyecto es suministrado de la empresa Chec las doradas caldas.

INDICADORES

- **DE ACCIDENTE E INCIDENTE LABORAL**: En lo corrido del mes no se presentaron eventos de seguridad,

SOPORTES


Informe
Registros fotográficos
Formatos diligenciados

REGISTROS FOTOGRAFICOS





INDUCCION SST, AL PERSONAL NUEVO A INGRESAR OBRA RAMA JUDICIAL RIOSUCIO

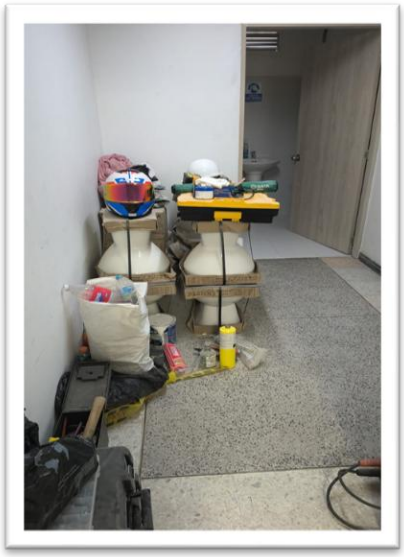

ORDEN Y ASEO EN OBRA RAMA JUDICIAL RIOSUCIO

ESTRUCTECNIAS S.A.S.
CARRERA 24 NO 20 – 48 OFICINA 11- 01
TELEFONO 606 893 4261
MANIZALES CALDAS



INSPECCION DE PULIDORA CON GUARDA DE SEGURIDAD



FIRMA DE PERMISO PARA MANIPULACION DE MAQUINA PULIDORA OBRA RAMA JUDICIAL RIOSUCIO

ESTRUCTECNIAS S.A.S.
CARRERA 24 NO 20 – 48 OFICINA 11- 01
TELEFONO 606 893 4261
MANIZALES CALDAS



SITIO DE ACOPIO DE ESCOMBROS OBRA RAMA JUDICIAL RIOSUCIO




GARANTIA DE ULISO JUNTAS EN RAMA JUDICUAL MANIZALES PALACIO NACIONAL



ESTRUCTECNIAS S.A.S.
CARRERA 24 NO 20 – 48 OFICINA 11- 01
TELEFONO 606 893 4261
MANIZALES CALDAS

CAMBIO DE EPPs, A LOS TRABAJADORES OBRA RAMA JUDICIAL RIOSUCIO




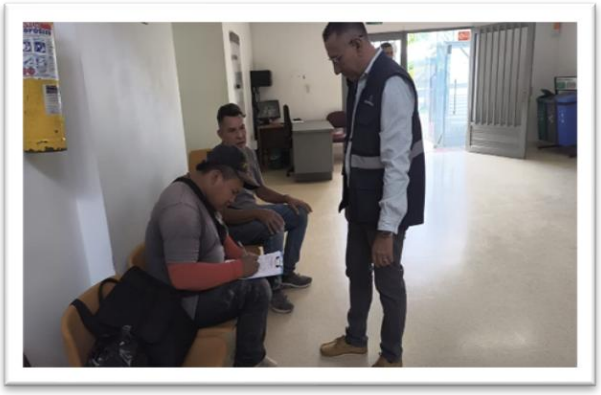

CAPACITACION A LOS COLABORADORES OBRA RAMA JUDICIAL RIOSUCIO



ENTREGA DE EPPs, OBRA RAMA JUDICIAL RIOSUCIO



Jaime Cardona Marulanda
Profesional en Salud Ocupacional
T.P. S.O. 077

ESTRUCTECNIAS S.A.S.
CARRERA 24 NO 20 – 48 OFICINA 11- 01
TELEFONO 606 893 4261
MANIZALES CALDAS

ESTRUCTECNIAS S.A.S.	SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:
		Versión: 1
	PERMISO TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 10/12/2021
		Página: 1 de 1

1 Generalidades

FECHA DE INICIO: DÍA (dd): 4 | MES (mm): 3 | AÑO (aa): 26

FECHA TERMINACIÓN TAREA: DÍA (dd): 7 | MES (mm): 3 | AÑO (aa): 26 | HORA INICIO: 7 | HORA FIN: 5P

EMPRESA EJECUTORA: Estructecnias S.A.S.

ÁREA O LUGAR: Rama Judicial Rio. Sucio

Nº PERSONAS EJECUTORAS: 1

TIPO DE TRABAJO: RUTINARIO [✓] OCASIONAL [ ]

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA

Impermeabilizacion de canales

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: manuales, equipos para Trabajos en alturas

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 5 mts

2 Elementos de Protección personal (EPP) requeridos para la tarea	SI	NO	N/A
Casco tipo II con barbuquejo	✓		
Gafas de seguridad	✓		
Guantes (Dieléctricos u otros)	✓		
Proteccion auditiva	✓		
Proteccion respiratoria	✓		
Botas de seguridad	✓		
2.1 Elementos de proteccion contra caidas			
Arnes cuerpo completo	✓		
Eslinga de seguridad con doble gancho y absorbedor de energia			
Eslinga de posicionamiento	✓		
Tie-off			
Mosquetones de Acero			
Otro: Atestador de caida	✓		

3 Lista de verificación trabajos en alturas	SI	NO	N/A
Existe línea de Vida y puntos de anclaje en buen estado con resistencia de 5000 lbs. por persona	✓		
Está la línea de seguridad anclada a un soporte diferente a la estructura donde se van a parar los trabajadores	✓		
Los puntos de anclaje están certificados	✓		
Hay posibilidad de caída de herramienta u objetos de partes altas? Y la herramienta a utilizar esta en adecuadas condiciones de operación.	✓		
Existe Baranda y rodapies a partir de un 1,00m			✓
Se cuenta con un procedimiento de rescate en caso de emergencia	✓		
Las condiciones ambientales y tecnológicas permiten la realización del trabajo? (vientos fuertes, ausencia de lluvia).	✓		
En caso de realizar soldaduras en alturas, cortes con oxicorte y trabajos con pulidora se han aislado los niveles inferiores			✓
El sitio donde se ejecutarán los trabajos se han aislado completamente (mamparas, cinta, conos) para no permitir el paso de personas	✓		

4 Trabajos con andamios: (Sistema de acceso)	SI	NO	N/A
La estructura del andamio es estable y metálica?			✓
Esta en buenas condiciones, completo y ha sido nivelado?			✓
Todos los parales están debidamente anclados y arriostrados?			✓
El piso de apoyo esta firme y bien nivelado?			✓
Si el andamio es mayor a tres secciones, tiene vientos instalados?			✓
Si el andamio es rodante tiene el seguro en posición de bloqueo?			✓
La plataforma de trabajo esta completa y cubre la dimensión del andamio?			✓
La plataforma de trabajo tiene barandas a (110 y 55 cm)?			✓
Existe línea de vida asegurada e independiente al andamio?			✓
Las instalaciones eléctricas cercanas han sido aisladas/aterrizadas?			✓
En caso de usar andamio colgante, están las poleas lubricadas y en buen estado?			✓
El sistema de sujeción del andamio colgante esta bien asegurado?			✓
Están instalados los guardapiès?			✓
Se certifico adecuadamente el andamio y se coloco la tarjeta de autorización?			✓

5 Trabajos con escalera sin extensión y/o escalera tipo tijera: (Sistema de acceso)	SI	NO	N/A
La distancia entre escalones es la misma y máx. 40 cm?	✓		
Están los pasos en buen estado?	✓		
Los largueros son máximo de 5 m.?	✓		
Sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior?	✓		
Están colocadas frente a ventanas o puertas?	✓		
Están las uniones optimas entre paso y paral?	✓		
Es posible amarrar la escalera?	✓		
Escalera de tijera con tensores en optimo estado?	✓		

6 Trabajos con escalera de extensión: (Sistemas de acceso)	SI	NO	N/A
Están las huellas en buen estado?	✓		
Están las uniones optimas entre paso y paral?	✓		
Están los puntos de agarre en buen estado?	✓		
Es la escalera de material dieléctrico?	✓		
El extremo superior sobresale 100 cm del borde de la superficie a trabajar?	✓		
La cuerda para la extensión esta amarrada y en buen estado?	✓		
Si no es posible amarrar hay un ayudante para sostener la escalera?	✓		

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

La distancia pared a base de la escalera es 1/4 de longitud?			
7 Trabajos en techos	**SI**	**NO**	**N/A**
Están las tablas colocadas en forma adecuada sobre los tejados?	✓		
Están la tablas en buenas condiciones?	✓		
El personal que labora en el área tiene conocimiento del trabajo que se va ha realizar.	✓		
Esta el área debidamente aislada y señalizada?	✓		
Se verifico si la estructura (cerchas y correas) se encuentran en buen estado?	✓		
Se ha inspeccionado líneas de energía cerca de las estructuras y se han bloqueado y desenergizado si no están aisladas?	✓		

8 Medidas de prevención contra caídas en alturas	**SI**	**NO**
Se han revisado las constancias de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas.	✓	
Se han analizado todos los posibles sistemas de ingeniería para prevención de caída	✓	
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Delimitación del área)	✓	
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Señalización del área)		
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso)	✓	
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Ayudante de seguridad)	✓	

9 Requerimiento de documentos anexos	**SI**	**NO**
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas.	✓	
Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador para trabajos en alturas vigente.	✓	
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección)	✓	

10 Afectaciones (Determinados por el coordinador de trabajo en alturas)

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? Si ☐ No ☑
¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? Si ☐ No ☑
¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique) _____

11 Firmas Emisión y Revalidaciones

TRABAJADOR: He verificado con el coordinador de trabajo en alturas la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajar.

COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS: He verificado en campo con los trabajadores la aplicación del permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo

NOMBRE Y APELLIDO	APELLIDO	FIRMA	CLASE DE DOCUMENTO	CEDULA	VERIFICACION PUNTO DE ANCLAJE
Juan Diego	lopez		C.C.	1053814541	

OBSERVACIONES:

FIRMAS INICIO DE LA TAREA:

AUTORIZO:
NOMBRE, APELLIDO: Cesar A. ospina
FIRMA: 4/10/16

RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS:
NOMBRE, APELLIDO: Carlos A lago
FIRMA:

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS:
NOMBRE, APELLIDO: Jaime cardona
FIRMA:

AYUDANTE DE SEGURIDAD:
NOMBRE, APELLIDO: Paulo A Rivera
FIRMA: Paulo Rivera.

FIRMAS FINALIZACION DE LA TAREA:

AUTORIZO:
NOMBRE, APELLIDO: Cesar A. ospina
FIRMA: 4/10/16

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS:
NOMBRE, APELLIDO: Jaime Cardona
FIRMA:

Powered by CamScanner

DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

PÁGINA 1

Nombre Completo	Cédula	ELEMENTO								OTROS			Fecha	Firma
		Casco	Gafas de seguridad	Guantes de vaqueta	Protección facial	Protectores auditivos	Botas de seguridad	Guantes de carnaza	Arnés	Tapabocas	Guantes de nitrilo	Chaleco		
Paulo A Rivera Y	75.072.858	✓	✓			✓					✓		4-3-26	Paulo Rivera.
			✓			✓					✓			
Carlos Alberto Lagos	75107.568	✓	✓			✓					✓		4-3-26	
Juan Diego LOPEZ	1037[illegible]	✓	✓			✓			✓		✓		4-3-26	

Declaro haber recibido de la empresa, en su carácter de empleador los elementos que para el caso se señalan en la línea correspondiente a mi firma. Igualmente consiento en que al ser éste un elemento de trabajo no constituye salario en los términos del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Autorizo expresamente a la empresa a deducir de mi salario el valor de los elementos recibidos, en caso de perdida o deterioro irreparable o comercialización de los mismos por causas atribuibles al mal uso que pueda hacer de ellos.

Al momento de mi retiro de la empresa, me comprometo a devolver todos los elementos aquí relacionados, de no ser así, autorizo a la empresa a deducir de la liquidación de mis prestaciones sociales y de mi salario el valor correspondiente a dichos elementos.

Powered by CamScanner


	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)			

Título del ATS: TRABAJO EN ALTURAS		Responsable del ATS: JAIME CARDONA MARULANDA		ATS No: 10	
Descripción del Trabajo: Inspaccion y reparacion goteras en cubierta		Área: PRODUCCION		Permiso de Trabajo No: 10	
Sitio RAMA JUDICIAL Rio Sucio Caldas		Depto./Contratista: ESTRUCTECNIAS S.A.S.		Fecha: Del 4-3-26 al 7-3-26	
No DE TAREA:	**PASOS BASICOS**	**PELIGROS**	**CONSECUENCIAS**	**MEDIDAS DE CONTROL**	**RESPONSABLES**
1	-instalación líneas de vida	-Caída de altura	-Golpes contusiones, lesiones graves	-Utilizar epp, equipos para trabajos en alturas, autocuidado	SST
2	-verificación sobre cubierta,	-Pérdida de equilibrio / tropiezo	-Golpes contusiones, lesiones graves	-Utilizar epp, equipos para trabajos en alturas, autocuidado --Utilizar camisa de manga larga y pantalón en tela yean	SST
3	-Trabajo en la cubierta	-Cansancio por malas posturas	-Dolores lumbares	-Pausas activas	SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)			

4	-Carga y descarga de materiales -Uso de herramientas eléctricas -ubicación de piezas (tejas)	-Golpes, cortes -Electrocución, proyección de partículas	-Lesiones musculares o heridas -Quemaduras, cortes, lesiones oculares	Uso de guantes, correcta manipulación -EPP completo, verificación del equipo	SST
5	-Clima (trabajo exterior)	-Insolación o lluvia	-Golpes de calor o resbalones	-Hidratación, suspender si el clima lo requiere	SST



T.P. S.O. 077

PROFESIONAL SST

Juan Diego lopez

FIRMAS COLABORADORES

1.053.814.54

Powered by CamScanner

ESTRUCTECNIAS S.A.S.

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO CAPACITACIÓN

Fecha: 4-3-26

Capacitador: Jaime Cardona Marulanda

Tema :
- Utilizacion de los EPP de acuerdo a la labor a realizar en la obra
- Normas de seguridad en el Trabajo
- Riesgos en manipulación de Herramientas menores

PÁGINA 1 DE 1

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Paulo A Rivera	75072.858	Ayudante	Paulo Rivera.
Carlos A. Tayos	75.107568	Ayudante	
Juan Diego LOPEZ	1053814341	OFICIAL	

De acuerdo con los contenidos de la capacitación que he recibido, me comprometo a cumplir con las políticas de seguridad de la empresa, estipuladas en las normas de seguridad industrial y en la resolución 1295 de 1994.

Powered by CamScanner



	INSPECCION DE PULIDORA Y GRATA	Código
	Proceso: Remodelacion Baño hombres Rama Judicial Rio Sucio	Versión

Lugar/Proyecto:

Nombre Operario: Carlos Vargas Cédula: 75175756 Firma:

Paulo Rivera Cédula: 75072858 Firma: Paulo Rivera.

Juan Diego lopez Cédula: 1053814541 Firma:

Fecha del 4/3 2026 Hasta: 7/3 2026

ITEMS	Día 1		Día 2		Día 3		Día 4		Día 5		Día 6		Día 7	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Switch de Encendido							✓		✓		✓		✓	
Clavija con Polo a Tierra							✓		✓		✓		✓	
Cable de Alimentación (110 Voltios)							✓		✓		✓		✓	
Extensión Eléctrica							✓		✓		✓		✓	
Carcaza							✓		✓		✓		✓	
Mango de Sujeción							✓		✓		✓		✓	
Guarda Protectora							✓		✓		✓		✓	
Disco de Corte							✓		✓		✓		✓	
Disco de Pulir							✓		✓		✓		✓	
Llave para cambio de Discos							✓		✓		✓		✓	
El operario posee los EPP adecuados							✓		✓		✓		✓	
Orden y aseo del área de la maquina							✓		✓		✓		✓	
Otros														

FIRMAS DE APROBACIÓN		T.P. S.O. 077

ESTADO DE LA MAQUINA

Mantenimiento	X	Si		No
Reparación		Si	X	No

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)			

Título del ATS: Instalación manto asfaltico palacio nacional	Responsable del ATS: JAIME CARDONA MARULANDA	ATS No:
Descripción del Trabajo: Instalación manto asfaltico palacio nacional, entrada principal. Con cilindro GLP	Área: Entrada principal Palacio Nacional	Permiso de Trabajo No:
Sitio Palacio Nacional Manizales,	Depto./Contratista: ESTRUCTECNIAS S.A.S.	Fecha(27-03-26

No DE TAREA:	PASOS BASICOS	PELIGROS	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL	RESPONSABLES
1	- Inspección del área	- Superficie húmeda o sucia	- Caídas al mismo nivel	-Verificar superficie seca y limpia	SST
2	- Transporte del cilindro	- Fatiga muscular - Mala manipulación	- Laceraciones - Lesiones lumbares - Caídas al mismo nivel	- Aplicar técnica adecuada de levantamiento - Uso correcto de EPP - Orden y aseo permanente	SST
3	- Conexión del cilindro	-Fuga de gas	-Incendio / explosión	-Prueba con agua jabonosa antes de iniciar - Uso correcto de EPP	SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)			



T.P. S.O. 077

PROFESIONAL SST

1053814542

FIRMAS COLABORADORES CON N0 CEDULAS

Powered by CamScanner

PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE CON GAS GLP - ESTRUCTECNIAS S.A.S.

EMPRESA:	ESTRUCTECNIAS S.A.S.		FECHA:	27-3-26		
LUGAR / ÁREA: PALACIO NACIONAL	Produccion		RESPONSABLE:	JAIME CRDONA MARULANDA		
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO.	Instalación manto asfaltico palacio nacional, entrada		HORA INICIO:	8 A.M	HORA FINAL:	S. P. M.
RIESGOS POTENCIALES:	PELIGROS	MEDIDAS DE CONTROL	RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
- Explosión o incendio por fuga de gas GLP	N.A	EXTINTOR ABC	SST	TRABAJO AL AIRE LIBRE EN ESCALAS PALACIO NACIONAL		
- Quemaduras por contacto o radiación térmica	N.A		SST	TRABAJO AL AIRE LIBRE EN ESCALAS PALACIO NACIONAL		
- Inhalación de gases tóxicos	SI	UTILIZAR EPP	SST	TRABAJO AL AIRE LIBRE EN ESCALAS PALACIO NACIONAL		
- Daños a equipos o estructuras cercanas	N.A		SST	TRABAJO AL AIRE LIBRE EN ESCALAS PALACIO NACIONAL		
MEDIDAS PREVENTIVAS:	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	TRABAJO AL AIRE LIBRE EN ESCALAS		
- Verificar ausencia de fugas de gas GLP antes de iniciar.	OK		SST	TRABAJO AL AIRE LIBRE EN ESCALAS PALACIO NACIONAL		
- Mantener extintor de PQS o CO_2 disponible y operativo.	OK		SST	TRABAJO AL AIRE LIBRE EN ESCALAS PALACIO NACIONAL		
- Usar EPP: careta facial, guantes de cuero, delantal y botas dieléctricas.	OK		SST	TRABAJO AL AIRE LIBRE EN ESCALAS PALACIO NACIONAL		
- Delimitar el área con cinta y señalización visible.	N.A		SST	TRABAJO AL AIRE LIBRE EN ESCALAS PALACIO NACIONAL		
- Contar con ventilación adecuada y salida de emergencia libre.	N.A		SST	TRABAJO AL AIRE LIBRE EN ESCALAS PALACIO NACIONAL		
- Supervisión permanente durante la actividad.	OK		SST	TRABAJO AL AIRE LIBRE EN ESCALAS PALACIO NACIONAL		
LISTA DE CHEQUEO PREVIA AL TRABAJO:						
ITEM	CUMPLE (SÍ/NO)	OBSERVACIONES				
1. Se verificó ausencia de fugas de gas.	SI		SST	TRABAJO AL AIRE LIBRE EN ESCALAS PALACIO NACIONAL		
2. Se dispone de extintor operativo.	SI		SST	TRABAJO AL AIRE LIBRE EN ESCALAS PALACIO NACIONAL		
3. Se delimitó y señalizó el área de trabajo.	N.A		SST	TRABAJO AL AIRE LIBRE EN ESCALAS PALACIO NACIONAL		
4. Personal con EPP completo.	SI		SST	TRABAJO AL AIRE LIBRE EN ESCALAS PALACIO NACIONAL		
5. Se cuenta con plan de emergencia y brigadista presente.	SI		SST	TRABAJO AL AIRE LIBRE EN ESCALAS PALACIO NACIONAL		
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN:						
TRABAJADOR EJECUTOR	FIRMA	1053843447				
SUPERVISOR SST	FIRMA	T.P. S.O. 077				
JEFE INMEDIATO	FIRMA					
BRIGADISTA / EMERGENCIAS	FIRMA					
OBSERVACIONES ADICIONALES:						

Powered by CamScanner
