	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: ___**DIFRA**_____

FECHA INFORME: Día: _04____ Mes: ___11___. Año: ___2025___

CONTRATO N°. ____ CONTRATO 145-00-A-COFAC-DIFRA-2025_____

CONTRATISTA: ____PABLO JUEZ CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA SAS___

VALOR DEL CONTRATO: _____$ 24,553,933_____

FORMA DE PAGO: _PAGO ÚNICO, correspondiente al presupuesto total contratado en pesos, de acuerdo con el informe de ejecución, para ser cancelados con cargo al PAC DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, _____

FECHA FIRMA CONTRATO: Día __18____. Mes __07_____. Año __2025___.

OBJETO DEL CONTRATO:
DISEÑO SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA 03 AREAS DE LA TORRE DE CONTROL EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: _____**N/A**_____

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: __**N/A**_____

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el __08/08/2025____ hasta el ___30/09/2025_____

Porcentaje Avance en tiempo: __100____%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): ____100__%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: _____0___%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: ____100___%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
PABLO ANDRÉS JUEZ PIRACHICAN	Director de Operaciones	15202-170581BYC Ingeniero Civil
Marlen Roció Juez Pirachican	Profesional Proyectos	041037-0576322BYC Ingeniero Civil

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X__ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

___N/A_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

__N/A___

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ Sí _X___

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

Proyecto:	DISEÑO SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA 03 ÁREAS DE LA TORRE DE CONTROL EN ELCOMANDO AÉREO DE COMBATE No.1,		
Cliente	FUERZA AEROESPACAL COLOMBIANA		
Cod proyecto:	2025-016	Contrato #	145-00-A-COFAC-DIFRA-2025
Fecha Acta inicio:	8/08/2025	Plazo Ejecución:	11 Semanas
Firma Contrato	18/07/2025	Firma Acta Inicio	8/08/2025

ITEM	ACTIVIDAD	DUR.	UND	PORCENTAJE DE AVANCE	INICIO	FIN	C
0	DISEÑO SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS FUERZA AÉREA	75	días		18/07/2025	30/09/2025	
1	ADMINISTRATIVO	22	días		18/07/2025	8/08/2025	
1,1	Firma de contrato.	1	días		18/07/2025	18/07/2025	
1,2	Presentación del proyecto	1	días		6/08/2025	6/08/2025	
1,3	Acta de Inicio	1	días		8/08/2025	8/08/2025	
2	OPERATIVO	45	días	80%	12/08/2025	25/09/2025	
2,01	Recepción de la información	1	días		12/08/2025	12/08/2025	
2,02	Analisis de la información entregada por el cliente	9	días		12/08/2025	21/08/2025	0
2,03	Visita a campo	1	días	10%	22/08/2025	22/08/2025	1
2,03,1	Entrega de informe visita técnica	3	días	10%	26/08/2025	29/08/2025	
2,04	Generación de cálculos	3	días	10%	25/08/2025	5/09/2025	3
2,05	Elaboración de planos	8	días	10%	29/08/2025	5/09/2025	1
2,06	1. Envio de información a la entidad para revisión y comentarios	7	días	20%	5/09/2025	15/09/2025	0
2,06,1	Memoria de cálculos				5/09/2025	11/09/2025	
2,06,2	Planos de diseño del sistema de agente limpio				5/09/2025	11/09/2025	
2,07	***Resolución de comentarios y observaciones por parte de la entidad***	***4***	***días***		12/09/2025	15/09/2025	1
2,08	Generación de informes de la red de agente	5	días	20%	8/09/2025	12/09/2025	3
2,09	2. Envio de información a la entidad para revisión y comentarios	6	días	20%	12/09/2025	19/09/2025	3
2,09,1	Informes técnicos de la red de agente limpio				12/09/2025	17/09/2025	
2,1	***Resolución de comentarios y observaciones por parte de la entidad***	***2***	***días***		18/09/2025	19/09/2025	1
2,11	Elaboración de presupuestos, extracción de cantidades de obra, estudios de mercado	7	días	20%	12/09/2025	18/09/2025	0
2,12	3. Envio de información a la entidad para revisión y comentarios	5	días	20%	19/09/2025	25/09/2025	1
2,12,1	Presupuesto oficial del diseño, estudio de mercado y cotizaciones				19/09/2025	23/09/2025	
2,13	***Resolución de comentarios y observaciones por parte de la entidad***	***2***	***días***		24/09/2025	25/09/2025	1
3	DOSSIER Y ENTREGA	5	días	20%	26/09/2025	30/09/2025	
3,01	DOCUMENTACIÓN	5	días		26/09/2025	30/09/2025	
3,02	Presentación y Entrega de Dossier y planos record.	1	días	20%	26/09/2025	26/09/2025	0
3,03	Acta de recibo final	1	días		30/09/2025	30/09/2025	3
	TOTAL DISEÑO			100%			

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí _X____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:


N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

A la fecha se ha cumplido a cabalidad el cronograma propuesto para este contrato por parte del contratista, para lo cual se ha realizado reuniones semanales con el contratista como se relacionan a continuación:

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 29 AGOSTO AL 11 SEPTIEMBRE:

- Se recibe informe de la visita realizada por el contratista de acuerdo al plazo estipulado en el cronograma sin novedad.
- Con fecha 01 de septiembre se realiza la revisión del informe del levantamiento de la información obtenida en el sitio encontrando los siguientes hallazgos:
- Cuarto planta eléctrica: no cuenta con la hermeticidad suficiente, ya que cuenta con una rejilla de ventilación, recomiendan cambio por una ventana de vidrio, con el fin de garantizar el nivel de hermeticidad requerido.
- Subestación Eléctrica: Cuenta con mayor hermeticidad sin embargo, se requiere realizar prueba Door Fan Test (Prueba de hermeticidad del recinto).
- De acuerdo a plazo establecido se recibe primer entrega preliminar de la información con plazo 05 de septiembre
- se revisa:
- Memorias de cálculo en Excel. Se revisan no tienen novedad, se informa que para la entrega final se requieren en archivo PDF, ya que fue así como quedo en las especificaciones y debidamente firmada por el contratista.
- Planos: los cuales son revisados por el área de dibujo con el fin de garantizar cumplimiento a las especificaciones técnicas.

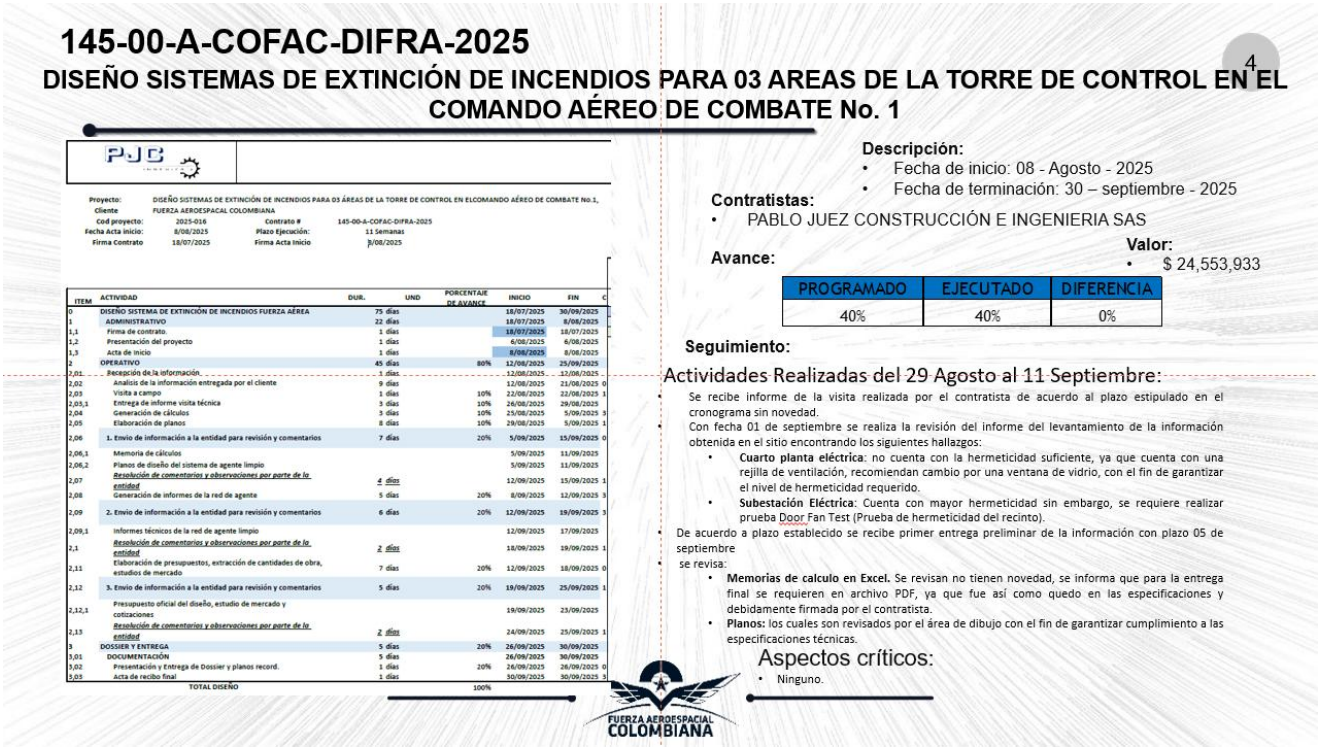

145-00-A-COFAC-DIFRA-2025

DISEÑO SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA 03 AREAS DE LA TORRE DE CONTROL EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1

4

PJC

Proyecto: DISEÑO SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA 03 ÁREAS DE LA TORRE DE CONTROL EN ELCOMANDO AÉREO DE COMBATE No.1,
Cliente FUERZA AEROESPACAL COLOMBIANA
Cod proyecto: 2025-016 Contrato # 145-00-A-COFAC-DIFRA-2025
Fecha Acta inicio: 8/08/2025 Plazo Ejecución: 11 Semanas
Firma Contrato 18/07/2025 Firma Acta Inicio 8/08/2025

ITEM	ACTIVIDAD	DUR.	UND	PORCENTAJE DE AVANCE	INICIO	FIN
0	DISEÑO SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS FUERZA AÉREA	75 días			18/07/2025	30/09/2025
1	ADMINISTRATIVO	22 días			18/07/2025	8/08/2025
1,1	Firma de contrato.	1 días			18/07/2025	18/07/2025
1,2	Presentación del proyecto	1 días			6/08/2025	6/08/2025
1,3	Acta de inicio	1 días			8/08/2025	8/08/2025
2	OPERATIVO	45 días		80%	12/08/2025	25/09/2025
2,01	Recepción de la información.	1 días			12/08/2025	12/08/2025
2,02	Analisis de la información entregada por el cliente	9 días			12/08/2025	21/08/2025 0
2,03	Visita a campo	1 días		10%	22/08/2025	22/08/2025 1
2,03,1	Entrega de informe visita técnica	3 días		10%	26/08/2025	29/08/2025
2,04	Generación de cálculos	5 días		10%	25/08/2025	5/09/2025 3
2,05	Elaboración de planos	8 días		10%	29/08/2025	5/09/2025 1
2,06	1. Envio de información a la entidad para revisión y comentarios	7 días		20%	5/09/2025	15/09/2025 0
2,06,1	Memoria de cálculos				5/09/2025	11/09/2025
2,06,2	Planos de diseño del sistema de agente limpio				5/09/2025	11/09/2025
2,07	*Resolución de comentarios y observaciones por parte de la entidad*	*4 días*			12/09/2025	15/09/2025 1
2,08	Generación de informes de la red de agente	5 días		20%	8/09/2025	12/09/2025 3
2,09	2. Envio de información a la entidad para revisión y comentarios	6 días		20%	12/09/2025	19/09/2025 3
2,09,1	Informes técnicos de la red de agente limpio				12/09/2025	17/09/2025
2,1	*Resolución de comentarios y observaciones por parte de la entidad*	*2 días*			18/09/2025	19/09/2025 1
2,11	Elaboración de presupuestos, extracción de cantidades de obra, estudios de mercado	7 días		20%	12/09/2025	18/09/2025 0
2,12	3. Envio de información a la entidad para revisión y comentarios	5 días		20%	19/09/2025	25/09/2025 1
2,12,1	Presupuesto oficial del diseño, estudio de mercado y cotizaciones				19/09/2025	23/09/2025
2,13	*Resolución de comentarios y observaciones por parte de la entidad*	*2 días*			24/09/2025	25/09/2025 1
3	DOSSIER Y ENTREGA	5 días		20%	26/09/2025	30/09/2025
3,01	DOCUMENTACIÓN	5 días			26/09/2025	30/09/2025
3,02	Presentación y Entrega de Dossier y planos record.	1 días		20%	26/09/2025	26/09/2025 0
3,03	Acta de recibo final	1 días			30/09/2025	30/09/2025 3
	TOTAL DISEÑO			100%		

Descripción:
- Fecha de inicio: 08 - Agosto - 2025
- Fecha de terminación: 30 – septiembre - 2025

Contratistas:
- PABLO JUEZ CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA SAS

Valor:
- $ 24,553,933

Avance:

PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
40%	40%	0%

Seguimiento:

Actividades Realizadas del 29 Agosto al 11 Septiembre:

- Se recibe informe de la visita realizada por el contratista de acuerdo al plazo estipulado en el cronograma sin novedad.
- Con fecha 01 de septiembre se realiza la revisión del informe del levantamiento de la información obtenida en el sitio encontrando los siguientes hallazgos:
  - **Cuarto planta eléctrica**: no cuenta con la hermeticidad suficiente, ya que cuenta con una rejilla de ventilación, recomiendan cambio por una ventana de vidrio, con el fin de garantizar el nivel de hermeticidad requerido.
  - **Subestación Eléctrica**: Cuenta con mayor hermeticidad sin embargo, se requiere realizar prueba Door Fan Test (Prueba de hermeticidad del recinto).
- De acuerdo a plazo establecido se recibe primer entrega preliminar de la información con plazo 05 de septiembre
- se revisa:
  - **Memorias de calculo en Excel.** Se revisan no tienen novedad, se informa que para la entrega final se requieren en archivo PDF, ya que fue así como quedo en las especificaciones y debidamente firmada por el contratista.
  - **Planos:** los cuales son revisados por el área de dibujo con el fin de garantizar cumplimiento a las especificaciones técnicas.


Aspectos críticos:
- Ninguno.

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 18 SEPTIEMBRE AL 25 SEPTIEMBRE:

- Se realiza coordinaciones para visita de verificación y replanteo de medidas para entrega final de información, la cual se realizara el Próximo 26 de septiembre de 2025.
- Con fecha 19 de septiembre se recibe ofertas económicas para el estudio de mercado conformadas así:
- Ofertas económicas de los 2 primeros proveedores que realizaron el estudio de mercado para el sistema de Agente Limpio y Detección de Incendios, cabe aclarar que estas solo consideran el suministro de los elementos, dispositivos y demás componentes, que serán empleados en la instalación del sistema.
- El tercer proveedor ya está trabajando en el estudio de mercado, considerando no solamente el suministro sino también la instalación del mismo.

- Con el fin de dar cumplimiento al cronograma establecido entre las partes, se ha venido trabajando en la terminación de los planos, teniendo en cuenta las observaciones emitidas por el área de dibujo. De igual manera se está adelantando el presupuesto final junto con el Análisis de Precios Unitarios. La fecha de entrega con los documentos finales, será el día 26 de septiembre del presente año.
- las observaciones del área de dibujo, han tomado más tiempo de lo esperado, por temas de optimización de trazado y mejor operación en el sistema.

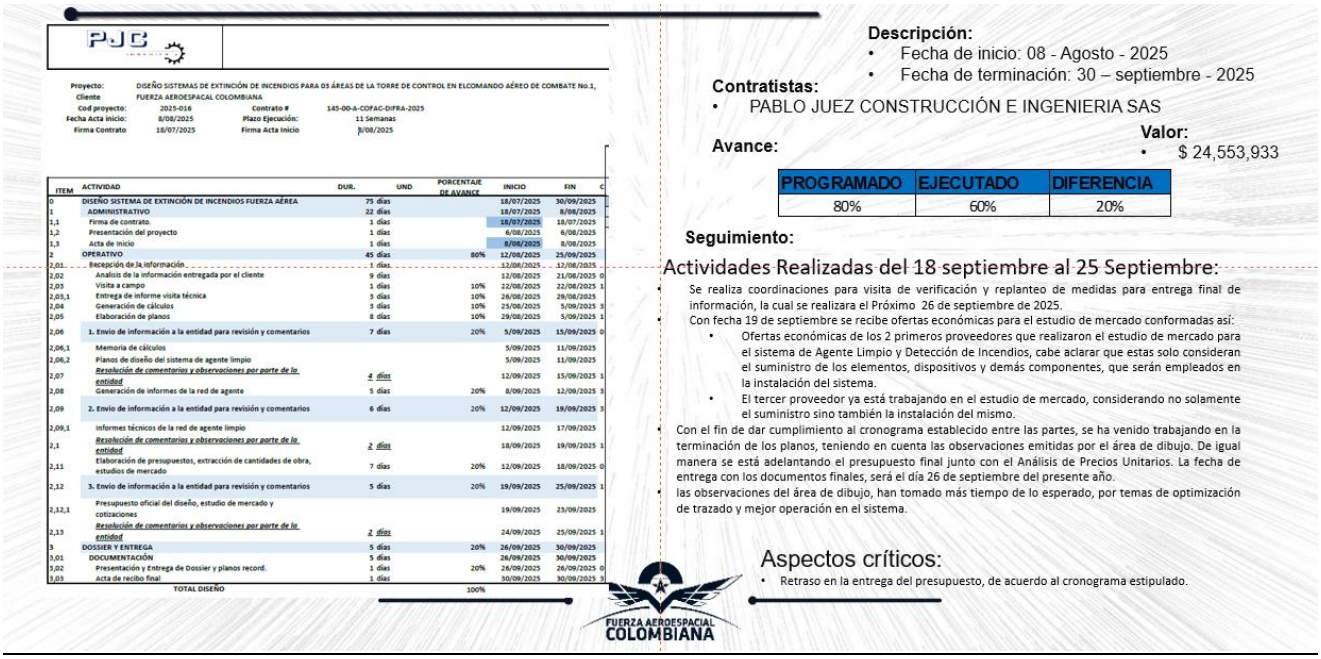

PJC

Proyecto: DISEÑO SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA 05 ÁREAS DE LA TORRE DE CONTROL EN ELCOMANDO AÉREO DE COMBATE No.1,
Cliente: FUERZA AEROESPACAL COLOMBIANA
Cod proyecto: 2025-016 Contrato # 145-00-A-COFAC-DIFRA-2025
Fecha Acta Inicio: 8/08/2025 Plazo Ejecución: 11 Semanas
Firma Contrato 18/07/2025 Firma Acta Inicio 8/08/2025

ITEM	ACTIVIDAD	DUR.	UND	PORCENTAJE DE AVANCE	INICIO	FIN
0	DISEÑO SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS FUERZA AÉREA	75 días			18/07/2025	30/09/2025
1	ADMINISTRATIVO	22 días			18/07/2025	8/08/2025
1,1	Firma de contrato	1 días			18/07/2025	18/07/2025
1,2	Presentación del proyecto	1 días			6/08/2025	6/08/2025
1,3	Acta de inicio	1 días			8/08/2025	8/08/2025
2	OPERATIVO	45 días		80%	12/08/2025	25/09/2025
2,01	Recepción de la información	1 días			12/08/2025	12/08/2025
2,02	Análisis de la información entregada por el cliente	9 días			12/08/2025	21/08/2025 0
2,03	Visita a campo	1 días		10%	22/08/2025	22/08/2025 1
2,03,1	Entrega de informe visita técnica	3 días		10%	26/08/2025	29/08/2025
2,04	Generación de cálculos	3 días		10%	25/08/2025	5/09/2025 3
2,05	Elaboración de planos	8 días		10%	29/08/2025	5/09/2025 1
2,06	1. Envio de información a la entidad para revisión y comentarios	7 días		20%	5/09/2025	15/09/2025 0
2,06,1	Memoria de cálculos				5/09/2025	11/09/2025
2,06,2	Planos de diseño del sistema de agente limpio				5/09/2025	11/09/2025
2,07	*Resolución de comentarios y observaciones por parte de la entidad*	4 días			12/09/2025	15/09/2025 1
2,08	Generación de informes de la red de agente	5 días		20%	8/09/2025	12/09/2025 3
2,09	2. Envio de información a la entidad para revisión y comentarios	6 días		20%	12/09/2025	19/09/2025 3
2,09,1	Informes técnicos de la red de agente limpio				12/09/2025	17/09/2025
2,1	*Resolución de comentarios y observaciones por parte de la entidad*	2 días			18/09/2025	19/09/2025 1
2,11	Elaboración de presupuestos, extracción de cantidades de obra, estudios de mercado	7 días		20%	12/09/2025	18/09/2025 0
2,12	3. Envio de información a la entidad para revisión y comentarios	5 días		20%	19/09/2025	25/09/2025 1
2,12,1	Presupuesto oficial del diseño, estudio de mercado y cotizaciones				19/09/2025	23/09/2025
2,13	*Resolución de comentarios y observaciones por parte de la entidad*	2 días			24/09/2025	25/09/2025 1
3	DOSSIER Y ENTREGA	5 días		20%	26/09/2025	30/09/2025
3,01	DOCUMENTACIÓN	5 días			26/09/2025	30/09/2025
3,02	Presentación y Entrega de Dossier y planos record.	1 días		20%	26/09/2025	26/09/2025 0
3,03	Acta de recibo final	1 días			30/09/2025	30/09/2025 3
	TOTAL DISEÑO			100%		

Descripción:
- Fecha de inicio: 08 - Agosto - 2025
- Fecha de terminación: 30 – septiembre - 2025

Contratistas:
- PABLO JUEZ CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA SAS

Valor:
- $ 24,553,933

Avance:

PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
80%	60%	20%

Seguimiento:

Actividades Realizadas del 18 septiembre al 25 Septiembre:

- Se realiza coordinaciones para visita de verificación y replanteo de medidas para entrega final de información, la cual se realizara el Próximo 26 de septiembre de 2025.
- Con fecha 19 de septiembre se recibe ofertas económicas para el estudio de mercado conformadas así:
  - Ofertas económicas de los 2 primeros proveedores que realizaron el estudio de mercado para el sistema de Agente Limpio y Detección de Incendios, cabe aclarar que estas solo consideran el suministro de los elementos, dispositivos y demás componentes, que serán empleados en la instalación del sistema.
  - El tercer proveedor ya está trabajando en el estudio de mercado, considerando no solamente el suministro sino también la instalación del mismo.
- Con el fin de dar cumplimiento al cronograma establecido entre las partes, se ha venido trabajando en la terminación de los planos, teniendo en cuenta las observaciones emitidas por el área de dibujo. De igual manera se está adelantando el presupuesto final junto con el Análisis de Precios Unitarios. La fecha de entrega con los documentos finales, será el día 26 de septiembre del presente año.
- las observaciones del área de dibujo, han tomado más tiempo de lo esperado, por temas de optimización de trazado y mejor operación en el sistema.

Aspectos críticos:
- Retraso en la entrega del presupuesto, de acuerdo al cronograma estipulado.

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

ACTIVIDADES RELACIONADAS DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE

- Se realiza Visita de verificación y revisión de medidas del primer levantamiento de la información en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No.1 (CACOM-1), con fecha 26 de Septiembre de 2025.
- Se recibe paquete final con los documentos solicitados, cumpliendo con el estipulado en el presente contratro.
- Con fecha 30 de septiembre se recibe: planos, especificaciones técnicas, presupuesto, aiu, de acuerdo a pliego de condiciones.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Se recibe a satisfacción y se encuentra tramite de pago

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: ____X__

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: Subteniente MATEUS GUERRERO YEIMY SAMANTA

FIRMA:

C.C. No. 1.101.174.993

DEPENDENCIA: DIFRA

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias,	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	**X**		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo		**X**	Ninguna
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		**X**	Aún no está liquidado
