DISEÑO - CONSTRUCCIÓN
&
COMERCIALIZADORA

PROYECTO:

ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REPARACIÓN FÍSICA DE CENTRO RURAL MIXTA MATECAÑA, CENTRO DOCENTE LA CASCADA, CENTRO DOCENTEMESOPOTAMIA ALTO RICO, CENTRO DOCENTE SIMON BOLIVAR, CENTRO DOCENTE CERRO DEL DAMIAN, CENTRO EDUCATIVO SANTA ANA, CENTRO DOCENTE EL PARAISO, CENTRO DOCENTE AGUA BLANCA, CENTRO DOCENTE AGUA CLARA - SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SUAREZ.

INFORME TÉCNICO DE OBRA

DICIEMBRE 2025

ELABORÓ

JUAN CARLOS CHILITO SANCHEZ
Representante Legal CHG
M.P 19202-313563 CAU

SUAREZ - CAUCA

2025

INFORME DE CONTRATISTA

DICIEMBRE 2025

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO		PERIODO DEL INFORME	
						DESDE (dd/mm/año)	HASTA (dd/mm/año)
PARCIAL		FINAL X			01 DE 2025	20/07/2025	28/01/2026
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA MUNICIPIO DE SUAREZ -DEPARTAMENTO DEL CAUCA						
N° PROCESO CONTRATACION SECOP	001						
CONTRATISTA	DISEÑO CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA CHG S.A.S						
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT. 901645964-1					EXPEDIDA EN	Popayán Cauca
No. TELÉFONO y/o CELULAR	310839393993						
SUPERVISOR	LUZ ENITH VALENCIA HERNANDEZ						
	RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA Rectora Institucion Educativa Agroambiental Agua Clara						
INTERVENTOR	N/A						
No. DE IDENTIFICACIÓN	N/A					EXPEDIDA EN	N/A
No. TELÉFONO y/o CELULAR	N/A						
CDP No.	002-003					CRP No.	002
FORMA DE PAGO	Se otorgará un anticipo correspondiente al 30% del valor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y jurídicos por parte de la Institución Educativa. • El 70% restantes serán pagados por medio de actas parciales que se elaborarán de acuerdo con las cantidades de obras ejecutadas por el sistema de precios unitarios, las cuales deberán ser autorizadas y aprobadas por la interventoría y/o supervisión. • El último pago, se efectuará con el Acta de Liquidación Final del contrato y no podrá ser por un valor menor del diez por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir acompañada del informe final de Interventoría, donde se certifique el recibo a satisfacción de la construcción, de acuerdo con los términos de la propuesta económica presentada por el Contratista.• En forma previa a la autorización de cada pago y de la entrega del anticipo, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda.• Para que se haga efectivo el último pago, el Contratista deberá anexar la póliza de estabilidad de la obra.					PAGO PARCIAL No.	PARCIAL N° 2 Y FINAL
VALOR CONTRATO INICIAL	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($179.909.873)						
VALOR ADICIONAL OTRO SI	SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS M/CTE. ($72.466.929)						

INFORME DE CONTRATISTA

DICIEMBRE 2025

VALOR TOTAL CONTRATO	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES, PESOS M/CTE ($ 179.909.873)

OBJETO DEL CONTRATO

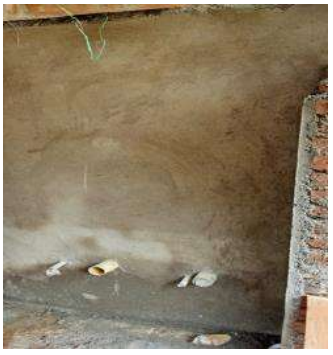
"Adecuación de infraestructura y reparación física de Centro Rural Mixta Matecaña, Centro Docente la Cascada, Centro Docente Mesopotamia Alto Rico, Centro Docente Simon Bolivar, Centro Docente Cerro del Damian, Centro Educativo Santa Ana, Centro Docente el Paraiso, Centro Docente Agua Blanca, Centro Docente Agua Clara - Sede Principal del Municipio de Suarez."

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el periodo comprendido entre el 20 de junio de 2025 y el 28 de enero de 2026 el contratista desarrollo las siguientes actividades:

N°		**SEDE**	**AGUA BLANCA**		
ITEM	1	**UNIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**12,00**
DESCRIPCION	Suministro e instalación de luminarias led 0.6x0.6				
ACTIVIDADES	En el presente, se ejecutó el suministro e instalación de doce (12) luminarias led. • Replanteo y verificación de puntos de instalación de luminarias. • Instalación de soportes y elementos de fijación. • Montaje de luminarias LED 0.60 x 0.60 m. • Conexión eléctrica de luminarias instaladas. • Verificación de funcionamiento y encendido. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	         				

INFORMEDECONTRATISTA
DICIEMBRE 2025

N°		**SEDE**	**AGUA BLANCA**		
ITEM	**3**	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**43,60**
DESCRIPCION	Repello muro 1:3				
ACTIVIDADES	En el presente período se ejecutó la ejecucion de repello muro, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto. • Limpieza y preparación de superficie. • Humedecimiento de muro para aplicación de mortero. • Elaboración y transporte de mortero. • Aplicación de repello en muro. • Limpieza de excedentes de boquilla. • Revisión de nivel, alineación, juntas y acabado final. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	    				
N°		**SEDE**	**AGUA BLANCA**		
ITEM	4	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**43,60**
DESCRIPCION	Estuco muro semiplastico (listo)				
ACTIVIDADES	En el presente período se ejecutó el estuco muro semiplastico: • Limpieza y preparación de superficie. • Resane de imperfecciones. • Aplicación de primera capa de estuco semiplástico. • Lijado de superficie. • Aplicación de segunda capa de estuco semiplástico. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	 				

INFORMEDECONTRATISTA
DICIEMBRE 2025

N°		**SEDE**	**AGUA BLANCA**		
ITEM	5	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**43,60**
DESCRIPCION	Pintura interiores (3m)				
ACTIVIDADES	En el presente período se ejecutó la pintura de 3 metros cuadrados. • Preparación y protección de áreas de trabajo. • Aplicación de primera mano de pintura. • Aplicación de segunda mano de pintura. • Corrección de detalles y retoques. • Limpieza y entrega de áreas pintadas. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	 				
N°		**SEDE**	AGUA BLANCA		
ITEM	6	**UNIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**2,00**
DESCRIPCION	Suministro e instalacion de sanitario incluye accesorios				
ACTIVIDADES	En el presente período se ejecutó la instalacion de sanitario incluye accesorios, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto. • Suministro de sanitario y accesorios. • Verificación de puntos hidráulicos y sanitarios. • Instalación de sanitario blanco. • Pruebas de funcionamiento y estanqueidad. • Limpieza del área intervenida. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				

INFORMEDECONTRATISTA
DICIEMBRE 2025

<table>
<tr><td>REGISTRO FOTOGRAFICO</td><td colspan="5"> </td></tr>
<tr><td>N°</td><td></td><td>SEDE</td><td colspan="3">AGUA BLANCA</td></tr>
<tr><td>ITEM</td><td>7</td><td>UNIDAD</td><td>UND</td><td>CANTIDAD</td><td>2,0</td></tr>
<tr><td>DESCRIPCION</td><td colspan="5">Suministro e instalacion de lavamanos colgar color blanco incluye accesorios y grifo monocontrol corto</td></tr>
<tr><td>ACTIVIDADES</td><td colspan="5">En el presente período se ejecutó instalacion de lavamanos, incluye accesorios, de acuerdo con las especificaciones técnicas.
• Transporte y acopio de materiales.
• Verificación de puntos hidráulicos y de desagüe.
• Instalación de lavamanos de colgar.
Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.</td></tr>
<tr><td>REGISTRO FOTOGRAFICO</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

INFORMEDECONTRATISTA

DICIEMBRE 2025025

N°		**SEDE**	**AGUA BLANCA**		
ITEM	8	**UNIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	-
DESCRIPCION	Suministro e Instalacion Orinal blanco incluye accesorios				
ACTIVIDADES	En el presente período se ejecutó el suministro e instalación Orinal blanco incluye accesorios, de acuerdo con las especificaciones técnicas. • Transporte y acopio de materiales. • Verificación de puntos hidráulicos y de desagüe. • Instalación de lavamanos de colgar. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
N°		**SEDE**	**BAGUA BLANCA**		
ITEM	9	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**90,0**
DESCRIPCION	Suministro e instalacion de teja en fibrocemento				
ACTIVIDADES	En el presente período se ejecutó la construcción de Suministro e instalacion de teja en fibrocemento, de acuerdo con las especificaciones técnicas. • Suministro de tejas de fibrocemento. • Transporte y acopio de materiales. • Izaje y distribución de tejas. • Instalación de tejas de fibrocemento. • Fijación de elementos de cubierta. • Verificación de alineación y ajuste. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO					

INFORMEDECONTRATISTA

DICIEMBRE 2025



N°		**SEDE**	**AGUA BLANCA**		
ITEM	NP-1	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**22,60**
DESCRIPCION	Suministro e instalacion enchape para pared				
ACTIVIDADES	En el presente período se ejecutó la instalacion enchape para pared, de acuerdo con las especificaciones técnicas. • Preparación y limpieza de superficies. • Trazado y replanteo de áreas a enchapar. • Preparación de mortero o adhesivo. • Instalación de enchape en pared. • Nivelación y alineación de piezas. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	     				
N°		**SEDE**	**AGUA BLANCA**		

INFORMEDECONTRATISTA
DICIEMBRE 2025

ITEM	NP-2	**UNIDAD**	**ML**	**CANTIDAD**	**14,21**
DESCRIPCION	Suministro e instalacion cenefa para baño				
ACTIVIDADES	En el presente período se ejecutó la instalación de cenefa para bañol, especificaciones técnicas. • Preparación y limpieza de superficies. • Trazado y replanteo de ubicación de cenefa. • Aplicación de adhesivo. • Instalación y alineación de cenefa. • Emboquillado y acabado final. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	 				
N°		**SEDE**	**AGUA BLANCA**		
ITEM	NP-3	**UNIDAD**	M2	**CANTIDAD**	**6,4**
DESCRIPCION	Suministro e instalacion de piso para aulas-trafico 5				
ACTIVIDADES	En el presente período se ejecutó la instalación instalacion de piso para aulas, especificaciones técnicas. • Preparación y limpieza de la superficie. • Replanteo y trazado de áreas a intervenir. • Aplicación de mortero o adhesivo de instalación. • Instalación de piso tráfico 5. • Nivelación y ajuste de piezas. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				

INFORMEDECONTRATISTA

DICIEMBRE 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO					
N°		**SEDE**	**AGUA BLANCA**		
ITEM	NP-4	**UNIDAD**	UND	**CANTIDAD**	**1,00**
DESCRIPCION	Suministro e Instalacion de puerta metalica bateria sanitaria				
ACTIVIDADES	En el presente periodo se realizó la instalacion de puerta metalica, siguiendo especificaciones técnicas. • Transporte y acopio de materiales. • Verificación y preparación del vano. • Montaje y nivelación de puerta metálica. • Ajuste y alineación de hoja y marco.				
REGISTRO FOTOGRAFICO					

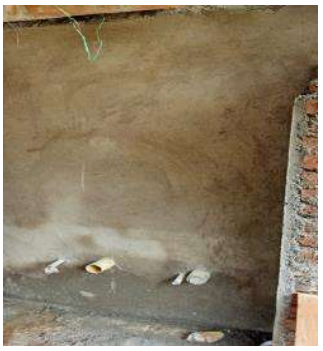
INFORMEDECONTRATISTA
DICIEMBRE 2025

N°		**SEDE**	**AGUA BLANCA**		
ITEM	NP-5	**UNIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**4,00**
DESCRIPCION	Mantenimiento puerta con pintura y anticorrosivo				
ACTIVIDADES	• Inspección y diagnóstico del estado de la puerta. • Limpieza de superficie metálica. • Retiro de pintura deteriorada y óxido. • Lijado y preparación de superficie. • Aplicación de pintura de acabado.				
REGISTRO FOTOGRAFICO					

N°		**SEDE**	**AGUA BLANCA**		
ITEM	NP-6	**UNIDAD**	GBL	**CANTIDAD**	**-**
DESCRIPCION	Adecuacion sistema hidraulico y sanitario inc tuberia 1/2" - 2", codos, tee, uniones, pegante				
ACTIVIDADES	En el presente periodo se realizó la excavación en material conglomerado en las siguientes zonas: • Corte y adecuación de tuberías. • Instalación de tubería hidráulica y sanitaria. • Instalación de codos, tees y uniones. • Pegado y ensamblaje de accesorios. • Conexión a redes existentes. • Pruebas de funcionamiento y estanqueidad. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				

INFORMEDECONTRATISTA

DICIEMBRE 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO	  				
N°		**SEDE**	**AGUA BLANCA**		
ITEM	NP-7	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**9,48**
DESCRIPCION	Contrapiso reforzado e=10cm 3.000psi				
ACTIVIDADES	En el presente periodo se realizó la ejecución de Contrapiso reforzado e=10cm 3.000psi, con espesor E = 0,04 m en las siguientes áreas: • Instalación de formaletas de confinamiento. • Mezclado y transporte de concreto. • Vaciado de concreto de 3.000 psi. • Nivelación y acabado de superficie. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	 				

INFORMEDECONTRATISTA
DICIEMBRE 2025

N°		**SEDE**	**AGUA BLANCA**		
ITEM	NP-8	**UNIDAD**	GBL	**CANTIDAD**	–
DESCRIPCION	Demoliciones y limpiezas en general				
ACTIVIDADES	En el presente periodo se realizó las demoliciones y limpiezas en general. • Demolición de elementos existentes. • Retiro de materiales y escombros. • Cargue y disposición de material producto de demolición. • Limpieza general de áreas intervenidas. • Vaciado de concreto de 3000 PSI. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	     				
N°		**SEDE**	**AGUA BLANCA**		
ITEM	NP-10	**UNIDAD**	**ML**	**CANTIDAD**	**6,30**
DESCRIPCION	Canal en ccto 21Mpa ancho 0.42 hpromedio 7cm				
ACTIVIDADES	En el presente período se ejecutó el suministro e instalación de canal en ccto 21Mpa ancho 0.42 hpromedio 7cm, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto. • Excavación y conformación de la sección. • Preparación y nivelación de la base. • Mezclado y vaciado de concreto de 21 MPa. • Conformación y acabado del canal. • Limpieza del área intervenida Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				

INFORMEDECONTRATISTA

DICIEMBRE 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO					
N°		**SEDE**	**ALTO RICO**		
ITEM	1	**UNIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**10,00**
DESCRIPCION	Suministro e instalacion de luminarias led 0.6x0.6				
ACTIVIDADES	En el presente período se ejecutó instalacion de luminarias led 0.6x0.6 • Suministro de luminarias LED tipo panel 0.60 x 0.60 m. • Instalación de soportes y elementos de fijación. • Montaje de luminarias LED 0.60 x 0.60 m. • Conexión eléctrica de luminarias instaladas. • Ajuste y aseguramiento de luminarias. • Limpieza del área intervenida. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO	     				

INFORMEDECONTRATISTA
DICIEMBRE 2025

N°		**SEDE**	**ALTO RICO**		
ITEM	12	**UNIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**1,00**
DESCRIPCION	Suministro e instalacion de lavatraperos mas grifo				
ACTIVIDADES	En el presente período se ejecutó la instalacion de lavatraperos mas grifo • Verificación de puntos hidráulicos y de desagüe. • Instalación de lavamanos de colgar. • Instalación de accesorios y elementos de fijación. • Conexión a redes hidráulicas y sanitarias. • Pruebas de funcionamiento y estanqueidad. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
N°		**SEDE**	**AGUA CLARA**		
ITEM	NP-1	**UNIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**1,0**
DESCRIPCION	Suministro e instalacion de sanitario blanco incluye accesorios				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la instalación de sanitario blanco incluye accesorios. • Suministro de sanitario blanco y accesorios. • Verificación de puntos hidráulicos y sanitarios. • Instalación y fijación del sanitario. • Instalación de accesorios de conexión. • Conexión a redes hidráulicas y sanitarias. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO					

INFORMEDECONTRATISTA
DICIEMBRE 2025

N°		**SEDE**	**ALTO RICO**		
ITEM	NP-2	**UNIDAD**	M2	**CANTIDAD**	**53,7**
DESCRIPCION	Suministro e instalacion de piso - trafico 5				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la instalacion de piso: • Replanteo y distribución de piezas. • Aplicación de adhesivo o mortero de pega. • Instalación de piso tráfico 5. • Nivelación y ajuste de piezas. • Emboquillado de juntas. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
N°		**SEDE**	**ALTO RICO**		
ITEM	NP-3	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**31,0**
DESCRIPCION	Construcción de piso primario en concreto, e=0.05 m				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la construcción de piso primario en concreto, e=0.05 m, en las siguientes áreas : • Preparación y limpieza de la superficie. • Replanteo y nivelación del área. • Compactación del terreno. • Mezclado y vaciado de concreto. • Extendido y nivelación del concreto. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				

IINFORMEDECONTRATISTA

DICIEMBRE 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO	 				
N°		**SEDE**	**ALTO RICO**		
ITEM	NP-4	**UNIDAD**	**ML**	**CANTIDAD**	**108,80**
DESCRIPCION	Mantenimiento perlines Inc. Lijado, anticorrosivo y pintura en aceite				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la instalación de lavamanos empotrar línea corriente color blanco. • Transporte de lavamanos. • Revisión de puntos hidráulicos existentes. • Instalación del lavamanos en la superficie. • Fijación del lavamanos. • Instalación del desagüe y sifón. • Sellado perimetral con silicona para evitar filtraciones.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	 				

INFORMEDECONTRATISTA
DICIEMBRE 2025


N°		**SEDE**	**ALTO RICO**		
ITEM	NP-5	**UNIDAD**	**ML**	**CANTIDAD**	**58,00**
DESCRIPCION	Mantenimiento porticos en cajon Inc. Lijado, anticorrosivo y pintura en aceite				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo mantenimiento porticos en cajon. • Limpieza de superficies. • Lijado de pórticos en cajón. • Aplicación de anticorrosivo. • Retoques y acabado final. • Limpieza del área intervenida. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO	  				
N°		**SEDE**	**ALTO RICO**		
ITEM	NP-6	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**40,6**
DESCRIPCION	Mantenimiento Puertas metálica y rejas incluye marco, lijado, anticorrosivo, pintura esmalte.				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo el mantenimiento Puertas metálica • Limpieza de superficies metálicas. • Retiro de óxido y pintura deteriorada. • Lijado de elementos metálicos. • Aplicación de pintura esmalte. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO	    				

INFORMEDECONTRATISTA
DICIEMBRE 2025

N°		**SEDE**	**ALTO RICO**		
ITEM	NP-7	**UNIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**15,0**
DESCRIPCION	Construccion bancas restaurante 0.24x0.07m inc acero de refuerzo y formaleta				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la instalación de ducha. • Instalación de formaleta. • Colocación de acero de refuerzo. • Mezclado y vaciado de concreto. • Vibrado y nivelación del concreto. • Desencofrado. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO	  				
N°		**SEDE**	**CERRO DAMIAN**		
ITEM	1	**UNIDAD**	UND	**CANTIDAD**	**14,0**
DESCRIPCION	Suministro e instalacion de luminarias led 0.6x0.6				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo las instalaciones eléctricas • Instalaciones eléctricas. • Ejecución de instalaciones eléctricas. • Adecuación de instalaciones eléctricas. • Montaje de instalaciones eléctricas. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO	   				

INFORMEDECONTRATISTA

DICIEMBRE 2025

N°		**SEDE**	**CERRO DAMIAN**		
ITEM	5	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**50,00**
DESCRIPCION	Pintura interiores[3m]				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la realizacion de Pintura interiores • Preparación de superficie. • Lijado de muros. • Resane de imperfecciones. • Aplicación de pintura en interiores. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO	   				
N°		**SEDE**	**CERRO DAMIAN**		
ITEM	9	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**24,3**
DESCRIPCION	Suministro e instalacion de piso para aulas- trafico 5, incluye mortero				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la instalación de de piso para aulas- trafico 5, incluye mortero • Preparación de superficie. • Aplicación de mortero de nivelación. • Suministro de piso tráfico 5. • Instalación de piso en aulas. • Colocación y ajuste de piezas Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO	   				

IINFORMEDECONTRATISTA

DICIEMBRE 2025

N°		**SEDE**	**CERRO DAMIAN**		
ITEM	11	**UNIDAD**	UND	**CANTIDAD**	**1,00**
DESCRIPCION	Suministro e instalacion de lavamanos colgar color blanco incluye accesorios y grifo monocontrol corto				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la instalación de lavamanos: • Suministro de lavamanos. • Instalación de lavamanos colgante. • Instalación de grifería monocontrol. • Colocación de accesorios sanitarios. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
N°		**SEDE**	**CEDE CERRO DAMIAN**		
ITEM	NP-1	**UNIDAD**	UND	**CANTIDAD**	**5,00**
DESCRIPCION	Suministro e instalacion Punto electrico de iluminacion sencilla Inc. Accesorios				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó la instalacion unto electrico de iluminacion • Instalación de tubería conduit. • Instalación de caja eléctrica. • Conexión de punto de iluminación. • Montaje de accesorios eléctricos. • Aislamiento y aseguramiento de conexiones. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO	 				

INFORMEDECONTRATISTA
DICIEMBRE 2025

N°		**SEDE**	**CERRO DAMIAN**		
ITEM	NP-2	**UNIDAD**	**ML**	**CANTIDAD**	28,60
DESCRIPCION	Suministro e instalacion de canal en lamina galvanizada				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la ejecución de Piso primario E= 5 cm • Replanteo de canalización. • Corte de lámina galvanizada. • Armado de canal en lámina galvanizada. • Fijación de canal metálico. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO	  				
N°		**SEDE**	CERRO DAMIAN		
ITEM	NP-3	**UNIDAD**	**ML**	**CANTIDAD**	**14,40**
DESCRIPCION	Suministro e instalacion Bajante aguas lluvias pvc 4"				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la Instalación de tejas termo acústicas. • Replanteo de bajante. • Corte de tubería PVC 4". • Instalación de bajante en PVC. • Fijación de tubería a estructura Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO	   				
N°	34	**SEDE**	**MESON**		

INFORMEDECONTRATISTA

DICIEMBRE 2025025

ITEM	NP-4	**UNIDAD**	M2	**CANTIDAD**	**60,10**
DESCRIPCION	Suministro e instalacion cielo falso PVC inc. Estructura				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo suministro e instalacion cielo falso PVC inc. Estructura • Replanteo de cielo falso. • Instalación de estructura metálica. • Suministro de láminas PVC. • Colocación de cielo falso en PVC. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO	 				
N°		**SEDE**	**MATECAÑA**		
ITEM	NP-1	**UNIDAD**	M2	**CANTIDAD**	**57,90**
DESCRIPCION	Construcción de piso primario en concreto, e=0.05 m				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la construccion de piso primario en concreto, e=0.05 m • Replanteo de área. • Compactación de base. • Instalación de formaleta. • Vaciado de concreto. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO	 				
N°		**SEDE**	**MATECAÑA**		

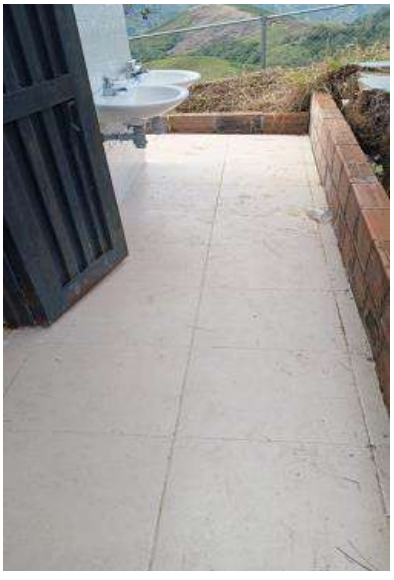
IINFORMEDECONTRATISTA

DICIEMBRE 2025

ITEM	NP-2	**UNIDAD**	M2	**CANTIDAD**	**116,1**
DESCRIPCION	Suministro e instalacion tablon gress Inc fragua con arena cemento				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la instalacion tablon gress Inc fragua con arena cemento • Preparación de superficie. • Replanteo de área. • Suministro de tablón gres. • Emboquillado con fragua. • Mezcla de arena y cemento. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
N°		**SEDE**	**SIMON BOLIVAR**		
ITEM	**8**	**UNIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**2,00**
DESCRIPCION	Suministro e instalacion de lavamanos colgar color blanco incluye accesorios y grifo monocontrol corto				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la ejecución de lavamanos • Replanteo de ubicación. • Anclaje de lavamanos. • Instalación de lavamanos colgante. • Instalación de grifo monocontrol. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
N°		**SEDE**	**MESON**		

IINFORMEDECONTRATISTA

DICIEMBRE 2025025

ITEM	NP-1	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**9,4**
DESCRIPCION	Suministro e instalacion de Vidrio incoloro				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la instalación de vidrio incoloro. • Toma de medidas. • Suministro de vidrio incoloro. • Corte de vidrio. • Instalación de vidrio. • Fijación de paños de vidrio. • Sellado y acabado de juntas. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO	     				
N°		**SEDE**	SIMON BOLIVAR		
ITEM	NP-2	**UNIDAD**	M2	**CANTIDAD**	**7,9**
DESCRIPCION	Suministro e instalacion de piso para aulas- trafico 5				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la instalacion de piso para aulas- trafico 5 • Replanteo de áreas. • Preparación de superficie. • Nivelación de piso. • Corte de piezas. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO	 				
N°		**SEDE**	**HONDURAS**		

IINFORMEDECONTRATISTA

DICIEMBRE 2025

ITEM	NP-3	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**9,0**
DESCRIPCION	Construcción de piso primario en concreto, e=0.5 m				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la construcción construcción de piso primario en concreto, e=0.5 m • Replanteo de área. • Compactación de subbase. • Instalación de formaleta. • Nivelación de superficie. • Acabado del piso. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO	  				
N°		**SEDE**	**SIMON BOLI**		
ITEM	7	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**3,68**
DESCRIPCION	Suministro e instalacion enchape para pared				
ACTIVIDADES	En el presente, se ejecutó el suministro e instalación de vidrio incoloro. • Replanteo de superficie. • Suministro de enchape. • Corte de piezas. • Instalación de enchape en pared. • Alineación de piezas. • Emboquillado de juntas. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	     				

IINFORMEDECONTRATISTA

DICIEMBRE 2025

N°		**SEDE**	**SIMON BOLIVAR**		
ITEM	NP-5	**UNIDAD**	GBL	**CANTIDAD**	**1,00**
DESCRIPCION	Adecuacion y traslado puntos sanitarios orinales y lavamanos				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la ejecucion de traslado puntos sanitarios orinales y lavamanos • Desmonte de aparatos sanitarios. • Traslado de puntos sanitarios. • Instalación de tuberías. • Reubicación de orinales. • Reubicación de lavamanos. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	  				

N°		**SEDE**	**SIMON BOLIVAR**		
ITEM	NP-6	**UNIDAD**	GBL	**CANTIDAD**	**1,00**
DESCRIPCION	Desmonte y reinstalacion de lavamanos, ducha, sanitaria Inc suministro de acoples, accesorios tanques, ducha y griferia				
ACTIVIDADES	• Desmonte de aparatos sanitarios. • Reinstalación de lavamanos. • Reinstalación de ducha. • Reinstalación de sanitario. • Suministro de acoples y accesorios. • Instalación de grifería. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				

INFORMEDECONTRATISTA
DICIEMBRE 2025025

REGISTRO FOTOGRAFICO	  				
N°		**SEDE**	**SIMON BOLIVAR**		
ITEM	NP-7	**UNIDAD**	UND	**CANTIDAD**	**2,00**
DESCRIPCION	Suministro e instalacion teja arquitecnonica inc amarras				
ACTIVIDADES	• Replanteo de cubierta. • Suministro de teja arquitectónica. • Instalación de estructura de soporte. • Colocación de tejas. • Fijación con amarras. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO	 				
N°		**SEDE**	**HONDURAS**		
ITEM	NP-9	**UNIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**1,00**
DESCRIPCION	Suministro e instalacion chapa para puerta Inc mantenimiento con pintura				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la instalación de puerta. • Retiro de chapa existente. • Suministro de chapa nueva. • Instalación de chapa en puerta. • Ajuste de mecanismo. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				

IINFORMEDECONTRATISTA

DICIEMBRE 2025025

REGISTRO FOTOGRAFICO					
N°		**SEDE**	**HONDURAS**		
ITEM	NP-10	**UNIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**1,00**
DESCRIPCION	Suministro e instalalcion de tapa-asiento				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la instalalcion de tapa-asiento • Suministro de tapa-asiento. • Retiro de tapa existente. • Instalación de tapa-asiento. • Ajuste de fijaciones. • Verificación de funcionamiento. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
N°		**SEDE**	**SIMON BOLIVAR**		
ITEM	NP-12	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**2,80**
DESCRIPCION	Muro en ladrillo farol				
ACTIVIDADES	• Replanteo de muro. • Preparación de mortero. • Colocación de ladrillo farol. • Alineación de hiladas. • Levante de muro.				

IINFORMEDECONTRATISTA

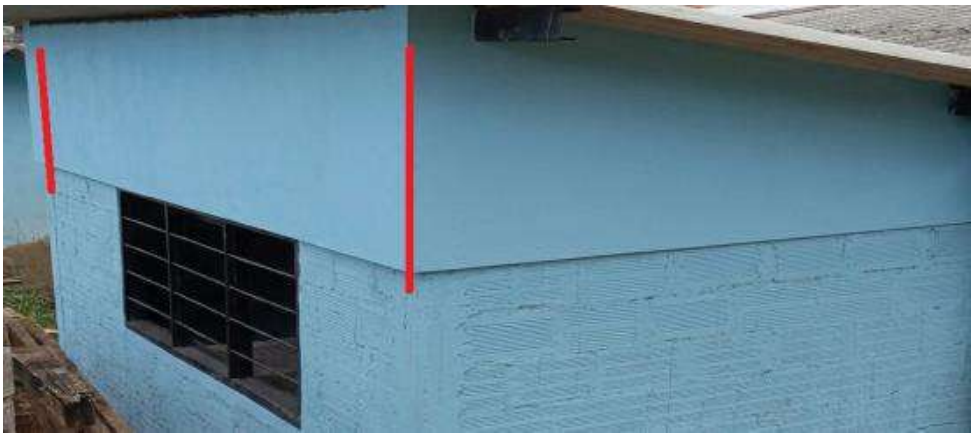
DICIEMBRE 2025

	Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO	 				
N°		**SEDE**	**EL PARAISO**		
ITEM	**3**	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**42,9**
DESCRIPCION	Repello muro 1:3				
ACTIVIDADES	• Preparación de mezcla 1:3. • Aplicación de mortero. • Repello de muro. • Nivelación de superficie. • Afinado de acabado. • Curado del repello. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO	      				
N°		**SEDE**	**EL PARAISO**		
ITEM	**4**	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**23**
DESCRIPCION	Estuco muro semiplastico (listo)				

IINFORMEDECONTRATISTA

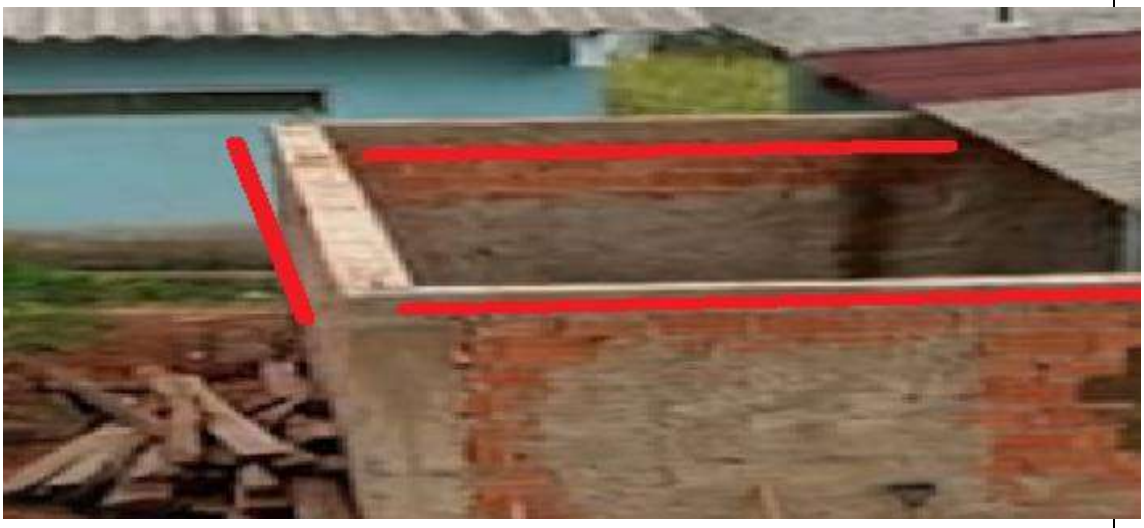
DICIEMBRE 2025

ACTIVIDADES	• Preparación de muro. • Aplicación de estuco semiplástico. • Afinado de superficie. • Lijado de muro. • Acabado final. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO	  				
N°		**SEDE**	**EL PARAISO**		
ITEM	5	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**56,4**
DESCRIPCION	Pintura interiores[3m]				
ACTIVIDADES	• Preparación de superficie. • Resane de muro. • Lijado de superficie. • Aplicación de sellador. • Aplicación de pintura interior. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas				
REGISTRO FOTOGRAFICO	     				
N°		**SEDE**	**EL PARAISO**		
ITEM	NP-1	**UNIDAD**	**GBL**	**CANTIDAD**	**1,00**
DESCRIPCION	Desmote cubierta existente				

<table>
<tr><td>ACTIVIDADES</td><td colspan="5">• Retiro de tejas existentes.
• Retiro de tejas existentes.
• Desarme de elementos de fijación.
• Clasificación de material reutilizable.</td></tr>
<tr><td>REGISTRO FOTOGRAFICO</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>N°</td><td></td><td>SEDE</td><td colspan="3">EL PARAISO</td></tr>
<tr><td>ITEM</td><td>NP-3</td><td>UNIDAD</td><td>ML</td><td>CANTIDAD</td><td>2,40</td></tr>
<tr><td>DESCRIPCION</td><td colspan="5">Columna concreto reforzado 3000psi 0.12x0.20m inc formaleta y acero de refuerzo</td></tr>
<tr><td>ACTIVIDADES</td><td colspan="5">En el presente período se llevó a cabo la construccion de columna concreto reforzado
• Replanteo de columna.
• Armado de acero de refuerzo.
• Instalación de formaleta.
• Alineación y plomeo.
• Fundida de concreto 3000 psi y vibrado.
Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas</td></tr>
<tr><td>REGISTRO FOTOGRAFICO</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>N°</td><td></td><td>SEDE</td><td colspan="3">SIMON BOLIVAR</td></tr>
<tr><td>ITEM</td><td>NP-4</td><td>UNIDAD</td><td>ML</td><td>CANTIDAD</td><td>9,50</td></tr>
<tr><td>DESCRIPCION</td><td colspan="5">Viga aerea concreto reforzado 3000psi 0.12x0.20m inc formaleta y acero de refuerzo</td></tr>
</table>

IINFORMEDECONTRATISTA

DICIEMBRE 2025

ACTIVIDADES	En el presente, se ejecutó la construccion de viga aerea concreto reforzado 3000psi • Replanteo de viga. • Armado de acero de refuerzo. • Instalación de formaleta. • Fundida de concreto 3000 psi. • Vibrado de concreto. • Desencofrado. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
N°		**SEDE**	**SIMON BOLIVAR**		
ITEM	NP-5	**UNIDAD**	**ML**	**CANTIDAD**	**7,50**
DESCRIPCION	Cinta confinamiento concreto reforzado 3000psi 0.12x0.12m inc formaleta y acero de refuerzo				
ACTIVIDADES	En el presente período se llevó a cabo la construccion de cinta confinamiento concreto reforzado 3000psi • Replanteo de cinta de confinamiento. • Armado de acero de refuerzo. • Instalación de formaleta. • Fundida de concreto 3000 psi. • Vibrado de concreto.				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
N°		**SEDE**	**EL PARAISO**		
ITEM	NP-6	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**5,2**
DESCRIPCION	Muro en ladrillo farol				

IINFORMEDECONTRATISTA

DICIEMBRE 2025

ACTIVIDADES	En el presente, se ejecutó la construccion de muro en ladrillo • Replanteo de muro. • Preparación de mortero. • Colocación de ladrillo farol. • Alineación y plomeo. • Junteo de mampostería. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	 				
N°		**SEDE**	**EL PARAISO**		
ITEM	NP-8	**UNIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**1,00**
DESCRIPCION	Suministro e Instalacion de puerta metalica				
ACTIVIDADES	En el periodo de llevo a cabo la Instalacion de puerta metalica • Replanteo de ubicación. • Suministro de puerta metálica. • Instalación de marco metálico. • Montaje de puerta. • Alineación y nivelación. • Fijación de elementos de anclaje. • Instalación de herrajes. • Verificación de funcionamiento.				

REGISTRO FOTOGRAFICO						
N°		**SEDE**	**EL PARAISO**			
ITEM	NP-9	**UNIDAD**	**ML**	**CANTIDAD**	**4,40**	
DESCRIPCION	Suministro e instalacion Canal lamina galv Cal 20. D= 0,61m Inc. Pintura anticorrosiva y de aceite, tapas, boquilla					
ACTIVIDADES	En el presente, se ejecutó la instalacion Canal lamina galv Cal 20 • Replanteo de canal. • Suministro de canal galvanizada. • Instalación de canal metálica. • Fijación de soportes. • Aplicación de pintura anticorrosiva. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.					

IINFORMEDECONTRATISTA

DICIEMBRE 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO	 				
N°		**SEDE**	**LOS QUINGOS**		
ITEM	NP-10	**UNIDAD**	**ML**	**CANTIDAD**	**6,00**
DESCRIPCION	Suministro e instalacion Bajante aguas lluvias pvc 4"				
ACTIVIDADES	• Replanteo de bajante. • Suministro de tubería PVC 4”. • Corte de tubería. • Instalación de bajante. • Fijación a estructura. • Conexión de uniones. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	 				
N°		**SEDE**	**EL PARAISO**		
ITEM	NP-11	**UNIDAD**	**ML**	**CANTIDAD**	**12,00**
DESCRIPCION	Suministro e instalacion perfil C 120x60x 2mm inc anticorrosivo				

INFORMEDECONTRATISTA
DICIEMBRE 2025

ACTIVIDADES	En el presente período se ejecutó el la instalacion de instalacion perfil C • Replanteo de estructura. • Corte de perfiles. • Instalación de perfil estructural. • Fijacion de elementos				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
N°		**SEDE**	**EL PARAISO**		
ITEM	NP-12	**UNIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**7,00**
DESCRIPCION	Suministro e instalacion teja fibrocemento No.10 Inc amarras				
ACTIVIDADES	• Replanteo de cubierta. • Suministro de teja fibrocemento. • Instalación de estructura de soporte. • Colocación de tejas. • Fijación con amarras. • Alineación de cubierta. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
N°		**SEDE**	**LOS QUINGOS**		
ITEM	NP-13	**UNIDAD**	**GBL**	**CANTIDAD**	**1,00**
DESCRIPCION	Meson 2X0.90m inc acero de refuerzo, enchape, lavaplatos instalaciones hidraulicas				

INFORMEDECONTRATISTA
DICIEMBRE 2025

ACTIVIDADES	• Armado de acero de refuerzo. • Fundida de estructura en concreto. • Enchape de superficie. • Instalación de lavaplatos. • Instalación hidráulica. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	  				
ITEM	NP-15	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**3,80**
DESCRIPCION	Construcción de piso en concreto, e=0.08m Inc formaleta				
ACTIVIDADES	En el presente período se ejecutó el armado y figurado de acero de refuerzo Fy= 4200 PSI, No.3, de acuerdo con las especificaciones técnicas. • Preparación de subbase • Instalación de formaleta. • Compactación de terreno. • Fundida de concreto. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	 				
N°		**SEDE**	**SEDE SANTA ANA**		
ITEM	1	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**2,1**
DESCRIPCION	Suministro e instalacion enchape para pared				
ACTIVIDADES	En el presente periodo se realizó el suministro e instalacion enchape para pared • Replanteo de superficie. • Preparación de muro. • Suministro de enchape. • Corte de piezas.				

INFORMEDECONTRATISTA
DICIEMBRE 2025

ACTIVIDADES	• Alineación de piezas. • Emboquillado de juntas. Actividad ejecutada al 100%y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	  				
ITEM	NP-17	**UNIDAD**	**GBL**	**CANTIDAD**	**1,00**
DESCRIPCION	Adecuacion electrica inc cables, bombillos led e interructores				
ACTIVIDADES	• Replanteo de puntos eléctricos. • Tendido de cableado eléctrico. • Instalación de interruptores. • Instalación de bombillos LED.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	 				
N°		**SEDE**	**SANTA ANA**		
ITEM	1	**UNIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**10,00**
DESCRIPCION	Suministro e instalacion de luminarias led 0.6x0.6				
ACTIVIDADES	• Replanteo de área. • Preparación de superficie. • Suministro de piso tráfico 5.				

INFORMEDECONTRATISTA
DICIEMBRE 2025

ACTIVIDADES	• Alineación y ajuste. • Emboquillado de juntas. • Limpieza final. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
ITEM	3	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**39,1**
DESCRIPCION	**Re**pello Muro 1:3				
ACTIVIDADES	• Preparación de superficie. • Resane de muros. • Lijado de superficie. • Aplicación de pintura interior. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
N°		**SEDE**	**SANTA ANA**		
ITEM	4	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**20,4**
DESCRIPCION	Suministro e instalacion enchape para pared				
ACTIVIDADES	En el presente periodo se realizó el suministro e instalacion enchape para pared • Replanteo de superficie. • Preparación de muro. • Suministro de enchape. • Corte de piezas.				

INFORMEDECONTRATISTA
DICIEMBRE 2025

ACTIVIDADES	• Armado de acero de refuerzo. • Fundida de estructura en concreto. • Enchape de superficie. • Instalación de lavaplatos. • Instalación hidráulica. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	  				
ITEM	4	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	20,4
DESCRIPCION	Estuco muro semiplastico (listo)				
ACTIVIDADES	En el presente período se ejecutó el armado y figurado de acero de refuerzo Fy= 4200 PSI, No.3, de acuerdo con las especificaciones técnicas. • Preparación de subbase • Instalación de formaleta. • Compactación de terreno. • Fundida de concreto. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	     				
N°		**SEDE**	**SANTA ANA**		
ITEM	5	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**20,4**
DESCRIPCION	Pintura Interiotres (3m)				
ACTIVIDADES	• Preparación de superficie. • Resane de muros. • Lijado de superficie. • Aplicación de sellador.				

INFORMEDECONTRATISTA
DICIEMBRE 2025

ACTIVIDADES	• Aplicación de pintura interior. • Acabado final. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	   				
ITEM	12	**UNIDAD**	UND	**CANTIDAD**	1,00
DESCRIPCION	Suministro e instalacion de sanitario blanco incluye accesorios				
ACTIVIDADES	• Replanteo de ubicación. • Suministro de sanitario. • Fijación al piso. • Conexión hidráulica. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
N°		**SEDE**	**SANTA ANA**		
ITEM	14	**UNIDAD**	UND	**CANTIDAD**	3,00
DESCRIPCION	Suministro e Instalacion Orinal blanco incluye accesorios				
ACTIVIDADES	• Replanteo de ubicación. • Suministro de orinal. • Conexión hidráulica.				

ACTIVIDADES	• Prueba de funcionamiento. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
ITEM	NP-1	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**1,00**
DESCRIPCION	Demoliciones y resanes				
ACTIVIDADES	• Demolición de elementos existentes. • Retiro de escombros • Resane de muros. • Relleno de fisuras y huecos. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	   				
N°		**SEDE**	**SEDE EL PARAISO**		
ITEM	NP-16	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**2,1**
DESCRIPCION	Suministro e instalacion enchape para pared				
ACTIVIDADES	• Replanteo de superficie. • Preparación de muro. • Suministro de enchape. • Corte de piezas.				

INFORMEDECONTRATISTA
DICIEMBRE 2025

ACTIVIDADES	• Aplicación de adhesivo. • Instalación de enchape. • Alineación de piezas. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	    				
ITEM	NP-3	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**23,60**
DESCRIPCION	Suministro e instalacion de piso para aulas-trafico 5				
ACTIVIDADES	• Replanteo de área. • Preparación de superficie. • Suministro de material. • Emboquillado de juntas. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	      				
N°		**SEDE**	**SANTA ANA**		
ITEM	NP-4	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**20,79**
DESCRIPCION	Construcción de piso primario en concreto, e=0.08m Inc malla electrosoldada y formaleta				
ACTIVIDADES	• Replanteo de área. • Preparación de terreno. • Compactación de subbase. • Instalación de formaleta.				

INFORMEDECONTRATISTA
DICIEMBRE 2025

ACTIVIDADES	• Colocación de malla electrosoldada. • Fundida de concreto. • Nivelación de superficie • Acabado de piso. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
ITEM	NP-5	**UNIDAD**	GBL	**CANTIDAD**	**1,00**
DESCRIPCION	Instalaciones hidrosanitarias para sanitario y orinales Inc tuberia, codos, uniones, tee, pegante				
ACTIVIDADES	• Replanteo de red hidrosanitaria. • Tendido de tubería PVC. • Instalación de codos y tees. • Unión de accesorios hidráulicos. • Conexión a sanitarios y orinales. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	  				
N°		**SEDE**	**SANTA ANA**		
ITEM	NP-6	**UNIDAD**	UND	**CANTIDAD**	3,00
DESCRIPCION	Suministro e Instalacion de puerta metalica				
ACTIVIDADES	• Replanteo de ubicación. • Suministro de puerta metálica. • Instalación de marco. • Fijación de anclajes.				

INFORMEDECONTRATISTA
DICIEMBRE 2025

ACTIVIDADES	• Instalación de herrajes. • Prueba de funcionamiento. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
ITEM	NP-7	**UNIDAD**	**ML**	**CANTIDAD**	**12,00**
DESCRIPCION	Suministro e instalacion perfil C 120x60x 2mm inc anticorrosivo				
ACTIVIDADES	• Suministro de perfil C. • Instalación de estructura metálica. • Fijación de elementos. • Aplicación de anticorrosivo. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
N°		**SEDE**	**SANTA ANA**		
ITEM	NP-16	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**2,1**
DESCRIPCION	Suministro e instalacion enchape para pared				
ACTIVIDADES	En el presente periodo se realizó el suministro e instalacion enchape para pared • Replanteo de superficie. • Preparación de muro. • Suministro de enchape. • Corte de piezas.				

INFORME DE CONTRATISTA

DICIEMBRE 2025

ACTIVIDADES	• Instalación de herrajes. • Prueba de funcionamiento. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
ITEM	NP-7	**UNIDAD**	**ML**	**CANTIDAD**	**12,00**
DESCRIPCION	Suministro e instalacion perfil C 120x60x 2mm inc anticorrosivo				
ACTIVIDADES	• Suministro de perfil C. • Instalación de estructura metálica. • Fijación de elementos. • Aplicación de anticorrosivo. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
N°		**SEDE**	**SANTA ANA**		
ITEM	NP-10	**UNIDAD**	UND	**CANTIDAD**	4,50
DESCRIPCION	Suministro e instalacion cubierta Zinc arquitectonica inc tornillos				
ACTIVIDADES	• Replanteo de cubierta. • Suministro de láminas de zinc. • Instalación de estructura de soporte. • Colocación de láminas.				

INFORME DE CONTRATISTA
DICIEMBRE 2025

ACTIVIDADES	• Fijación con tornillos. • Alineación de cubierta. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	 				
ITEM	NP-11	**UNIDAD**	GBL	**CANTIDAD**	**1,00**
DESCRIPCION	Construccion lavatrapero 1,35x0,56 inc Ccto 21 Mpa, acero, puntos hidraulicos enchapes, tuberia, conexion a caja				
ACTIVIDADES	• Armado de acero de refuerzo. • Fundida de concreto 21 MPa. • Instalación de puntos hidráulicos. • Tendido de tubería. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	 				
N°		**SEDE**	**SANTA ANA**		
ITEM	NP-12	**UNIDAD**	**ML**	**CANTIDAD**	12,00
DESCRIPCION	Suministro e instalacion tubo galvanizado 1.1/2" CaL2mm Inc tornillos y anclaje				
ACTIVIDADES	• Replanteo de estructura • Suministro de tubo galvanizado. • Corte de tubería.				

ACTIVIDADES	• Fijación con tornillos y anclajes. • Alineación y nivelación. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
ITEM	1	**UNIDAD**	**ML**	**CANTIDAD**	**2,00**
DESCRIPCION	Suministro e instalacion de luminarias led 0.6x0.6				
ACTIVIDADES	• Replanteo de puntos de luz. • Suministro de luminarias LED. • Fijación de elementos. • Aplicación de anticorrosivo. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	 				
N°		**SEDE**	**LA CASCADA**		
ITEM	3	**UNIDAD**	M2	**CANTIDAD**	**30,00**
DESCRIPCION	Repello muro 1:3				
ACTIVIDADES	• Replanteo de superficie. • Preparación de mezcla 1:3. • Nivelación de superficie. • Afinado de acabado.				

INFORME DE CONTRATISTA
DICIEMBRE 2025

ACTIVIDADES					
REGISTRO FOTOGRAFICO	 				
ITEM	4	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	40
DESCRIPCION	Estuco semiplastico (listo)				
ACTIVIDADES	• Preparación de superficie. • Resane de muros. • Aplicación de estuco semiplástico. • Afinado de superficie. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	 				
N°		**SEDE**	**LA CASCADA**		
ITEM	5	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	90,0
DESCRIPCION	Pintura interiores (3m)				
ACTIVIDADES	• Preparación de superficie. • Resane de muros. • Lijado de superficie. • Aplicación de pintura interior.				

INFORME DE CONTRATISTA
DICIEMBRE 2025

ACTIVIDADES					
REGISTRO FOTOGRAFICO	   				
ITEM	NP-1	**UNIDAD**	GBL	**CANTIDAD**	**1,00**
DESCRIPCION	Demoliciones, resanes Inc regatas regatas				
ACTIVIDADES	• Demolición de elementos existentes. • Ejecución de regatas en muro. • Retiro de escombros. • Limpieza de área intervenida. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	  				
N°		**SEDE**	**LA CASCADA**		
ITEM	NP-2	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	33,5
DESCRIPCION	Construcción de piso primario en concreto, e=0.05 m				
ACTIVIDADES	• Replanteo de área. • Instalación de formaleta. • Fundida de concreto. • Nivelación de superficie.				

INFORME DE CONTRATISTA
DICIEMBRE 2025

ACTIVIDADES	• Acabado de piso. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	  				
ITEM	NP-3	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	34,5
DESCRIPCION	Suministro e instalacion de piso para aulas- trafico 5				
ACTIVIDADES	• Preparación de superficie. • Replanteo de área. • Nivelación de piso. • Instalación de piso tráfico 5. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	    				
N°		**SEDE**	**LA CASCADA**		
ITEM	NP-4	**UNIDAD**	**ML**	**CANTIDAD**	30,40
DESCRIPCION	Suministro e instalación de guardaescoba h=0,10 m beige.				
ACTIVIDADES	• Preparación de superficie. • Replanteo de áreas. • Corte de piezas. • Instalación de guardaescoba.				

INFORME DE CONTRATISTA
DICIEMBRE 2025

ACTIVIDADES	• Alineación y ajuste. • Emboquillado de juntas. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	   				
ITEM	NP-5	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**2,6**
DESCRIPCION	Suministro e instalacion de Vidrio incoloro				
ACTIVIDADES	• Toma de medidas. • Corte de vidrio. • Fijación de paños. • Ajuste y nivelación. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO	 				
N°		**SEDE**	**LA CASCADA**		
ITEM	NP-6	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	31,70
DESCRIPCION	Construcción de piso en concreto, e=0.08m Inc formaleta				
ACTIVIDADES	• Replanteo de área. • Preparación de terreno. • Compactación de base. • Instalación de formaleta.				

INFORME DE CONTRATISTA
DICIEMBRE 2025

ACTIVIDADES	• Fundida de concreto. • Nivelación de superficie. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
ITEM	NP-7	**UNIDAD**	**M2**	**CANTIDAD**	**2,6**
DESCRIPCION	Suministro e instalacion de ventana metalica. incluye vidrio 4 mm				
ACTIVIDADES	• Replanteo de ventana. • Fabricación y suministro de ventana. • Instalación de marco metálico. • Instalación de vidrio 4 mm. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.				
REGISTRO FOTOGRAFICO					
N°		**SEDE**	**LA CASCADA**		
ITEM	NP-8	**UNIDAD**	**ML**	**CANTIDAD**	**4,00**
DESCRIPCION	Caballete teja fibro cemento				
ACTIVIDADES	• Replanteo de caballete. • Suministro de caballete. • Instalación de caballete fibrocemento. • Fijación a cubierta.				

INFORME DE CONTRATISTA
DICIEMBRE 2025

ACTIVIDADES	• Alineación y ajuste. • Sellado de uniones. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.
REGISTRO FOTOGRAFICO	

ITEM	NP-9	**UNIDAD**	GBL	**CANTIDAD**	**1,00**
DESCRIPCION	Suministro en instalacion sistema electrico Inc cable, tuberia, terminales, cajas, codos, 6 tomacorrientes, tablero				

ACTIVIDADES	• Replanteo de puntos eléctricos. • Instalación de tubería eléctrica. • Fijación de elementos. • Instalación de tablero eléctrico. Actividad ejecutada al 100% y conforme a especificaciones técnicas y de calidad requeridas.
REGISTRO FOTOGRAFICO	

Juan Carlos Chilito Sanche z
R.L Diseño Construccion y Comercializadora CHG SA S
Nit:901645904-1

INFORME DE CONTRATISTA

DICIEMBRE 2025
