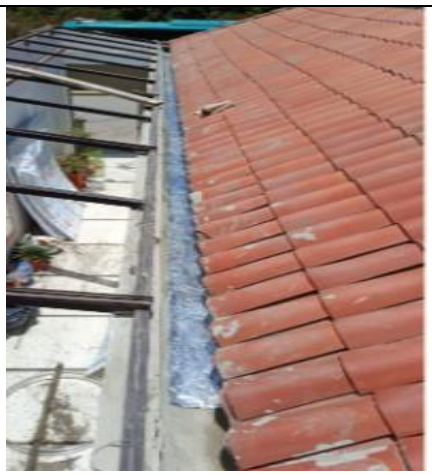
INFORME SEMANAL Nº3



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO: "Contratar en nombre de LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, el mejoramiento y mantenimiento de infraestructura física propia en las sedes judiciales de Chiquinquirá, Pauna y Ráquira, en el departamento de Boyacá."	
CONTRATO	028 DE 2026
INFORME NÚMERO	4
PERIODO	Del 7 al 04 de septiembre
ELABORO	PALOMA ARRAZOLA
TOTAL, PERSONAL DE OBRA	5
MAQUINARIA EN OBRA	ANDAMIOS- ARNES- ESLINGAS Y HERRAMIENTA MENOR
CLIMA	
LUNES	SOLEADO
MARTES	SOLEADO
MIERCOLES	SOLEADO
JUEVES	SOLEADO
VIERNES	SOLEADO
SABADO	SOLEADO
ACTIVIDADES DE OBRA	
DESCRIPCIÓN	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
1. Desmonte, limpieza e impermeabilización de canal Se realizó el desmonte de la cubierta existente en policarbonato, seguido de la limpieza del canal central del Juzgado Promiscuo de Pauna. Posteriormente, se ejecutaron actividades de impermeabilización mediante la instalación de cinta asfáltica, con el fin de mejorar las condiciones de protección frente a filtraciones de agua.	

	
2. Adecuación de estructura metálica Se realizaron actividades de adecuación, soldadura y ajuste de la estructura metálica existente, incluyendo la aplicación de pintura anticorrosiva en la perfilería, como preparación para la instalación de la nueva cubierta.	
3. Instalación de cubierta en policarbonato Se realizó la instalación de las láminas de policarbonato sobre la estructura metálica previamente adecuada, efectuando los trabajos de ajuste y fijación correspondientes para la conformación de la cubierta.	

	
4. Suministro e instalación de iluminación Se realizó el suministro e instalación de panel LED redondo de sobreponer de 24 W, como parte de las actividades de mejoramiento y adecuación de la iluminación de la edificación.	
5. Suministro de pintura y preparación de superficies Se realizó el suministro de pintura para las áreas interiores de la edificación y se inició la preparación de superficies en la sala de audiencias mediante el pelado y raspado de la pintura existente, dejando las áreas listas para continuar con las actividades de acabado.	

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios

ELABORO: PALOMA ARRAZOLA	REVISO: FERNANDO BOHORQEZ	APROBO: RAFAEL MATHEUS
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 
RESIDENTE DE OBRA	R/L FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS	R/L CONSORCIO INTERVENTORIA 2026
