UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

HOJA DE VIDA GENERADOR ELÉCTRICO

RG-UTSIT-2025-16
Versión: 1
Fecha: Noviembre 2025

N° INVENTARIO:3

1. DATOS DEL EQUIPO

MARCA: ELITE

REFERENCIA NOM 2G65

SERIAL: 056250400002G650275

FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN: 3 | 12 | 25

FECHA FIN DE OPERACIÓN: DD | MM | AA

PGE-03



2. REGISTRO DE MANTENIMIENTO

#	FECHA (DD / MM / AA)	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO
1	18 / 12 / 25	Cambio de Aceite	Angelo G
	10 / 01 / 26	Cambio de Aceite	Angelo G
	DD / MM / AA		Angelo G
2	30 / 01 / 26	Cambio de Aceite	Angelo G
	13 / 02 / 26	Cambio de Aceite	Angelo G
	30 / 02 / 26	Cambio de Aceite	Angelo G
3	9 / 03 / 26	Cambio de Aceite	Angelo G
	25 / 03 / 26	Cambio de Aceite	Angelo G
	30 / 04 / 26	Cambio de Aceite	Angelo G
4	13 / 05 / 26	Cambio de Aceite.	Taller & Alquiler
	10 / 07 / 26	Se Hace Mantenimiento Preventivo, Cambio de Empaques, Bujia, Aceite	JM.
	DD / MM / AA	Se Cambia Cuerda de Arranque, Cambio de Voltimetro	
5	7 / 08 / 26	Cambio de Aceite - Revisión de Filtro - Bujia - carburador	
	17 / 08 / 26	Cambio de Aceite - Limpieza de Filtro - Revision Gral	
	DD / MM / AA		
6	24 / 08 / 26	Cambio de Aceite - Limpieza de Filtro - Revisión Gral	
	DD / MM / AA		
7			
	DD / MM / AA		
8			
	DD / MM / AA		

PERIODO DE MANTENIMIENTO

Antes de realizar el mantenimiento, apague el generador, desconecte todas las cargas eléctricas y baterías (si las contiene), y deje enfriar completamente el generador.
Realice el mantenimiento en un recinto limpio, seco y en una super□cie plana para que las ruedas del generador se encuentren frenadas y prevenir movimiento inesperado en el generador.

Observe los intervalos de mantenimiento descritos en la siguiente tabla. Cuando el generador se encuentre operando bajo condiciones extremas, debe aumentar la frecuencia de tiempos. Si los usuarios necesitan ayuda en el mantenimiento del equipo, por favor contacte a su distribuidor local.

		Antes de cada uso	Después de 10H o del primer mes	Después de 30H o de 3 meses	Después de 50H o de 6 meses	Después de 100H o cada año
Aceite del motor	Revisar	X				
	Reemplazar		X	X	X	
Filtro de aire	Revisar	X				
	Limpiar			X+		
Bujía	Calibrar				X	
	Reemplazar					X
Ralentí Automático	Calibrar					X 0
Holgura de válvula	Calibrar					X 0
Canister de carbón	Revisar			Cada 2 años 0		
Tubería de combustible de baja permeabilidad	Revisar			Cada 2 años 0		
Tubería de combustible	Revisar			Cada 2 años 0		

* Lo que primero ocurra de las dos - **o** Sólo personal experto debe realizar estos procedimientos
+ Aumente la frecuencia bajo condiciones extremas de polvo

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	**HOJA DE VIDA GENERADOR ELÉCTRICO**	RG-UTSIT-2025-16
		Versión: 1
	N° INVENTARIO: 2	Fecha: Noviembre 2025

1. DATOS DEL EQUIPO

MARCA: ELITE

REFERENCIA NOM 2G65 PGE-02

SERIAL: 056241100002g650151

FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN 26 | 9 | 25

FECHA FIN DE OPERACIÓN DD | MM | AA



2. REGISTRO DE MANTENIMIENTO

#	FECHA			DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO
1	26 DD	10 MM	25 AA		
2	19	11	25	Cambio de Aceite	Arnoldo G
	20	12	25	Cambio de Aceite	Arnoldo G
	DD	MM	AA		Arnoldo G
3	19	01	26	Cambio de Aceite	Arnoldo G
	20	02	26	Cambio de Aceite	Arnoldo G
	16 DD	03 MM	26 AA	Cambio de Aceite	Arnoldo G
4	19	04	26	Cambio de Aceite	Arnoldo G.
	13	05	26	Mantenimiento (Correctivo) O.T 228493 Suiche roto, Cerrar Gral. Cambio tapa filtro.	Arnoldo (cuna 3)
	6 DD	MM	AA		
5	3	06	26	Mantenimiento Gral (correctivo) Factura 58584048 Cambio de cabezal de la bujia	Fixer (Taller)
	16	06	26	Cambio de Aceite.	
	DD	MM	AA		
6	26	07	26	Cambio de Aceite	Arnoldo (cuna 3)
	07	08	26	Cambio de Aceite - Revisión de Filtro - Revisión Gral	
	DD	MM	AA		
7	17	08	26	Cambio de Aceite - Limpieza de Filtro - Revisión	
	24	08	26	Cambio de Aceite - Limpieza de Filtro - Revisión	
	DD	MM	AA		
8	DD	MM	AA		

PERIODO DE MANTENIMIENTO

Antes de realizar el mantenimiento, apague el generador, desconecte todas las cargas eléctricas y baterías (si las contiene), y deje enfriar completamente el generador.
Realice el mantenimiento en un recinto limpio, seco y en una super☒cie plana para que las ruedas del generador se encuentren frenadas y prevenir movimiento inesperado en el generador.

Observe los intervalos de mantenimiento descritos en la siguiente tabla. Cuando el generador se encuentre operando bajo condiciones extremas, debe aumentar la frecuencia de tiempos. Si los usuarios necesitan ayuda en el mantenimiento del equipo, por favor contacte a su distribuidor local.

		Antes de cada uso	Después de 10H o del primer mes	Después de 30H o de 3 meses	Después de 50H o de 6 meses	Después de 100H o cada año
Aceite del motor	Revisar	X				
	Reemplazar		X	X	X	
Filtro de aire	Revisar	X				
	Limpiar			X+		
Bujía	Calibrar				X	
	Reemplazar					X
Ralentí Automático	Calibrar					X o
Holgura de válvula	Calibrar					X o
Canister de carbón	Revisar			Cada 2 años o		
Tubería de combustible de baja permeabilidad	Revisar			Cada 2 años o		
Tubería de combustible	Revisar			Cada 2 años o		

* Lo que primero ocurra de las dos - **o** Sólo personal experto debe realizar estos procedimientos
+ Aumente la frecuencia bajo condiciones extremas de polvo

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

HOJA DE VIDA GENERADOR ELÉCTRICO

RG-UTSIT-2025-16
Versión: 1
Fecha: Noviembre 2025

N° INVENTARIO: 1

1. DATOS DEL EQUIPO

MARCA:

REFERENCIA 2665

SERIAL: 056250400002460052.

PGE-01



FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN | | | |

FECHA FIN DE OPERACIÓN | DD | MM | AA |

2. REGISTRO DE MANTENIMIENTO

#	FECHA			DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO
1	26	9	25	Cambio de aceite	Anyelo Gómez
2	19	11	25	Cambio de aceite	Anyelo Gómez
3	20	12	25	Cambio de Aceite	Anyelo Gomez
	19	01	26	Mantenimiento Gral (Correctivo) O.T = 2291684 Cambio de filtros aceite y revisión Gral.	Anyelo Gomez
	20	02	26	Cambio de Aceite	Anyelo Gomez
	DD	MM	AA		
4	16	03	26	Cambio de Aceite	Anyelo Gomez
	12	04	26	Cambio de Aceite.	Anyelo Gomez
	20	05	26	Cambio de Aceite	Anyelo Gomez
	DD	MM	AA		
5	3	06	26	Mantenimiento Gral (Correctivo) O.T = 2329193 Cambio de Bujías Revisión del Arranque	Pixer (taller)
	15	06	26	Cambio de Aceite	Anyelo G...
	DD	MM	AA		
6	26	06	26	Cambio de Aceite	Anyelo Gomez
	07	07	26	Cambio de Aceite - Revisión Gral.	
	DD	MM	AA		
7	20	07	26	Cambio de Aceite - Revisión Gral - Limpieza Filtro	
	07	08	26	Cambio de Aceite - Revisión Gral - Limpieza Filtro	
	DD	MM	AA		
8	17	08	26	Cambio de Aceite - Limpieza Gral - Filtros	
	24	08	26	Cambio de Aceite - Revisión Gral - Limpieza Filtros	
	DD	MM	AA		

PERIODO DE MANTENIMIENTO

Antes de realizar el mantenimiento, apague el generador, desconecte todas las cargas eléctricas y baterías (si las contiene), y deje enfriar completamente el generador.
Realice el mantenimiento en un recinto limpio, seco y en una super□cie plana para que las ruedas del generador se encuentren frenadas y prevenir movimiento inesperado en el generador.

Observe los intervalos de mantenimiento descritos en la siguiente tabla. Cuando el generador se encuentre operando bajo condiciones extremas, debe aumentar la frecuencia de tiempos. Si los usuarios necesitan ayuda en el mantenimiento del equipo, por favor contacte a su distribuidor local.


		Antes de cada uso	Después de 10H o del primer mes	Después de 30H o de 3 meses	Después de 50H o de 6 meses	Después de 100H o cada año
Aceite del motor	Revisar	X				
	Reemplazar		X	X	X	
Filtro de aire	Revisar	X				
	Limpiar			X+		
Bujía	Calibrar				X	
	Reemplazar					X
Ralentí Automático	Calibrar					X 0
Holgura de válvula	Calibrar					X 0
Canister de carbón	Revisar			Cada 2 años 0		
Tubería de combustible de baja permeabilidad	Revisar			Cada 2 años 0		
Tubería de combustible	Revisar			Cada 2 años 0		

* Lo que primero ocurra de las dos - **o** Sólo personal experto debe realizar estos procedimientos
+ Aumente la frecuencia bajo condiciones extremas de polvo

UNIDAD TEMPORAL SIT MEDELLÍN	HOJA DE VIDA GENERADOR ELÉCTRICO	RG-UTSIT-2025-16
	N° INVENTARIO:4	Versión: 1
		Fecha: Noviembre 2025

1. DATOS DEL EQUIPO

FECHA DE COMPRA	4	3	26	
MARCA:	ELITE			
REFERENCIA	2G40	P6E-04		
SERIAL:	027241000002G400263			
FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN	5	3	26	
FECHA FIN DE OPERACIÓN	DD	MM	AA	

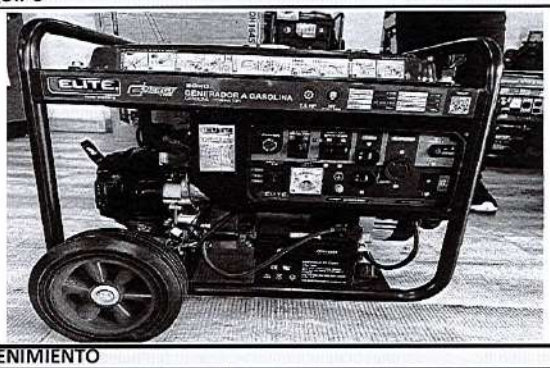

2. REGISTRO DE MANTENIMIENTO

#	FECHA			DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	RESPONSABLE DEL
1	20	02	26	Cambio de Aceite	Angelo G
	30 DD	02 MM	26 AA	Cambio de Aceite	Angelo G
2	12	04	26	Cambio de Aceite	Angelo G
	30 DD	04 MM	26 AA	Cambio de Aceite	Angelo G
3	20	05	26	Cambio de Aceite	Angelo G
	26 DD	05 MM	26 AA	Cambio de Aceite	Angelo G
4	15	06	26	Cambio de Aceite	Angelo G
	DD	MM	AA		
5	26	06	26	Cambio de Aceite	Angelo G
	DD	MM	AA		
6	15	07	26	Mantenimiento preventivo, Cambio de aceite, Limpieza de Filtros, Bujia, y todo General	Fixer (taller)
	DD	MM	AA		
7	07	08	26	Cambio de Aceite - Limpieza Filtros - Revisión	
	DD	MM	AA		
8	24	08	26	Cambio de Aceite - Limpieza Filtros - Revisión	
	DD	MM	AA		

PERIODO DE MANTENIMIENTO

Antes de realizar el mantenimiento, apague el generador, desconecte todas las cargas eléctricas y baterías (si las contiene), y deje enfriar completamente el generador.
Realice el mantenimiento en un recinto limpio, seco y en una superficie plana para que las ruedas del generador se encuentren frenadas y prevenir movimiento inesperado en el generador.

Observe los intervalos de mantenimiento descritos en la siguiente tabla. Cuando el generador se encuentre operando bajo condiciones extremas, debe aumentar la frecuencia de tiempos. Si los usuarios necesitan ayuda en el mantenimiento del equipo, por favor contacte a su distribuidor local.

		Antes de cada uso	Después de 10H o del primer mes	Después de 30H o de 3 meses	Después de 50H o de 6 meses	Después de 100H o cada año
Aceite del motor	Revisar	X				
	Reemplazar		X	X	X	
Filtro de aire	Revisar	X				
	Limpiar			X+		

Bujía	Calibrar		X	
	Reemplazar			X
Ralentí Automático	Calibrar			X 0
Holgura de válvula	Calibrar			X 0
Canister de carbón	Revisar	Cada 2 años 0		
Tubería de combustible de baja permeabilidad	Revisar	Cada 2 años 0		
Tubería de combustible	Revisar	Cada 2 años 0		

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	HOJA DE VIDA PULIDORA	RG-UTSIT-2025-17
		Versión: 1
	N° INVENTARIO:3	Fecha: Noviembre 2025

1. DATOS DEL EQUIPO

FECHA DE COMPRA	23	9	25

MARCA: ELITE

MODELO: MAEL2G65 6500

SERIAL: 22070303

FECHA DE INICIO DE OPERACION	23	9	25
FECHA FIN DE OPERACION	DD	MM	AA

2. REGISTRO DE MANTENIMIENTO

#	FECHA			DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO
1	6	1	26	Mantenimiento (garantía)	TOOLSTORE
2	3 DD	08 MM	26 AA	Revisión de Partes funcionales - Limpieza Gral	
3	24 DD	08 MM	26 AA	Revisión de Partes funcionales - Limpieza Gral	
4	DD	MM	AA		
5	DD	MM	AA		
6	DD	MM	AA		
7	DD	MM	AA		
8	DD	MM	AA		
9	DD	MM	AA		
10	DD	MM	AA		

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

HOJA DE VIDA PULIDORA

N° INVENTARIO:1

RG-UTSIT-2025-17	
Versión: 1	
Fecha: Noviembre 2025	


1. DATOS DEL EQUIPO

FECHA DE COMPRA	23	9	25

MARCA: ELITE

MODELO: NOM AGII65

SERIAL: 102250200AG11650375



FECHA DE INICIO DE OPERACION	23	9	25
FECHA FIN DE OPERACION	DD	MM	AA

2. REGISTRO DE MANTENIMIENTO

#	FECHA			DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO
1	3 DD	08 MM	26 AA	Revisión de Partes funcionales - Limpieza Gral	
2	24 DD	08 MM	26 AA	Revisión de Partes funcionales - Limpieza Gral.	
3	DD	MM	AA		
4	DD	MM	AA		
5	DD	MM	AA		
6	DD	MM	AA		
7	DD	MM	AA		
8	DD	MM	AA		
9	DD	MM	AA		
10	DD	MM	AA		

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

HOJA DE VIDA PULIDORA

N° INVENTARIO:2

RG-UTSIT-2025-17
Versión: 1
Fecha: Noviembre 2025

1. DATOS DEL EQUIPO

FECHA DE COMPRA	23	9	25

MARCA: ELITE

MODELO: HEELAG1165

SERIAL: 102250200AG11650092

FECHA DE INICIO DE OPERACION	23	9	25
FECHA FIN DE OPERACION	DD	MM	AA

2. REGISTRO DE MANTENIMIENTO

#	FECHA			DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO
1	6	1	26	Mantenimiento	Toolstore
2	3 DD	08 MM	26 AA	Revisión de Partes funcionales – Limpieza Gral	
3	24 DD	08 MM	26 AA	Revisión de Partes funcionales – Limpieza Gral	
4	DD	MM	AA		
5	DD	MM	AA		
6	DD	MM	AA		
7	DD	MM	AA		
8	DD	MM	AA		
9	DD	MM	AA		
10	DD	MM	AA		

HOJA DE VIDA PULIDORA

N° INVENTARIO:4

RG-UTSIT-2025-17
Versión: 1
Fecha: Noviembre 2025

1. DATOS DEL EQUIPO

FECHA DE COMPRA	4	3	26

MARCA: ELITE

MODELO: AG1420

SERIAL: 8944



FECHA DE INICIO DE OPERACION	23	9	25
FECHA FIN DE OPERACION	DD	MM	AA

2. REGISTRO DE MANTENIMIENTO

#	FECHA			DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	RESPONSABLE DEL
1	3 DD	08 MM	26 AA	Revisión de partes funcionales - Limpieza Gral	
2	24 DD	08 MM	26 AA	Revisión de Partes funcionales - Limpieza Gral	
3	DD	MM	AA		
4	DD	MM	AA		
5	DD	MM	AA		
6	DD	MM	AA		
7	DD	MM	AA		

	HOJA DE VIDA PULIDORA N° INVENTARIO:6	RG-UTSIT-2025-17 Versión: 1 Fecha: Noviembre 2025

1. DATOS DEL EQUIPO

FECHA DE COMPRA: DD / MM / AA

MARCA: ELITE

MODELO/REFERENCIA: AG2320

SERIAL: 9004



FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN: DD / MM / AA

FECHA FIN DE OPERACIÓN: DD / MM / AA

2. REGISTRO DE MANTENIMIENTO

#	FECHA			DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	RESPONSABLE DEL
1	8 DD	07 MM	26 AA	Mantenimiento preventivo O.T 237409 Lubricación - Revisión General	fixer
2	3 DD	08 MM	26 AA	Revisión General - Limpieza General	
3	24 DD	08 MM	26 AA	Revisión General - Limpieza General	
4	DD	MM	AA		
5	DD	MM	AA		
6	DD	MM	AA		
7	DD	MM	AA		
8	DD	MM	AA		
9	DD	MM	AA		
10	DD	MM	AA		
11	DD	MM	AA		
12	DD	MM	AA		
13	DD	MM	AA		
14	DD	MM	AA		
15	DD	MM	AA		
16	DD	MM	AA		
17	DD	MM	AA		
18	DD	MM	AA		
19	DD	MM	AA		
20	DD	MM	AA		
21	DD	MM	AA		

NOTA: CADA VEZ QUE SE EJECUTE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO, SE DEBE CONTAR CON EL RESPECTIVO REGISTRO

UNION TEMPORAL EP MEDELLIN	**HOJA DE VIDA PULIDORA** **N° INVENTARIO:5**	RG-UTSIT-2025-17 Versión: 1 Fecha: Noviembre 2025

1. DATOS DEL EQUIPO

FECHA DE COMPRA	10	11	2025

MARCA: BOSCH

MODELO/REFERENCIA: 3601-HF 20G1

SERIAL: 521020520



FECHA DE INICIO DE OPERACION	11	11	25
FECHA FIN DE OPERACION	DD	MM	AA

2. REGISTRO DE MANTENIMIENTO

#	FECHA			DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO
1	16	4	26	GARANTIA (Cambio en el nucleo del inducido por corto)	J.H CENTHER S.A.S
2	3 DD	08 MM	26 AA	Revision General – Limpieza General- Engrase	
3	24 DD	08 MM	26 AA	Revision General - Limpieza General	
4	DD	MM	AA		
5	DD	MM	AA		
6	DD	MM	AA		
7	DD	MM	AA		
8	DD	MM	AA		

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

HOJA DE VIDA TALADRO DEMOLEDOR

N° INVENTARIO: 1

RG-UTSIT-2025-15
Versión: 1
Fecha: Noviembre 2025

1. DATOS DEL EQUIPO

FECHA DE COMPRA	DD	MM	AA
MARCA:	ELITE		
REFERENCIA O MODELO	RM9026		
SERIAL:	8966		
FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN	DD	MM	AA
FECHA FIN DE OPERACIÓN	DD	MM	AA



2. REGISTRO DE MANTENIMIENTO

#	FECHA			DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO
1	3 DD	08 MM	26 AA	Revisión General - Limpieza completa	
2	24 DD	08 MM	26 AA	Revisión General - Limpieza completa	
3	DD	MM	AA		
4	DD	MM	AA		
5	DD	MM	AA		
6	DD	MM	AA		
7	DD	MM	AA		
8	DD	MM	AA		
9	DD	MM	AA		
10	DD	MM	AA		

HOJA DE VIDA TALADRO DEMOLEDOR

RG-UTSIT-2025-15
Versión: 1
Fecha: Noviembre 2025

N° INVENTARIO: 6

1. DATOS DEL EQUIPO

MARCA: ELITE

REFERENCIA: DH164515

SERIAL: 8755 (#1)

FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN: 15 | 1 | 2026

FECHA FIN DE OPERACIÓN: DD | MM | AA #VALUE!

2. REGISTRO DE MANTENIMIENTO

#	FECHA			DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO
1	21 (DD)	05 (MM)	26 (AA)	Mantenimiento Correctivo OT = 232613 { Falla Mecanica / Falla de Vibracion }	Angel Gomez
2	3 (DD)	08 (MM)	26 (AA)	Revisión de partes funcionales Lubricación de Motor. Limpieza General	
3	24 (DD)	8 (MM)	26 (AA)	Revisión General de partes Limpieza General.	
4	DD	MM	AA		
5	DD	MM	AA		
6	DD	MM	AA		
7	DD	MM	AA		
8	DD	MM	AA		

HOJA DE VIDA TALADRO DEMOLEDOR

RG-UTSIT-2025-15
Versión: 1
Fecha: Noviembre 2025

N° INVENTARIO: 5

1. DATOS DEL EQUIPO

FECHA DE COMPRA	26	9	2025
MARCA:	ELITE		
REFERENCIA O MODELO	DH164515		
SERIAL:	8755 (#2)		
FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN	DD	MM	AA
FECHA FIN DE OPERACIÓN	DD	MM	AA

2. REGISTRO DE MANTENIMIENTO

#	FECHA			DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO
1	15 DD	07 MM	2026 AA	Mantenimiento preventivo (# = 23768) Lubricación Limpieza, Revisión de piezas funcionales	fixer Angelo Gómez
2	3 DD	08 MM	2026 AA	Revisión General Limpieza General - Engrase de Motor	
3	24 DD	08 MM	2026 AA	Revisión General Limpieza General	
4	DD	MM	AA		
5	DD	MM	AA		
6	DD	MM	AA		
7	DD	MM	AA		
8	DD	MM	AA		
9	DD	MM	AA		
10	DD	MM	AA		

HOJA DE VIDA TALADRO DEMOLEDOR

RG-UTSIT-2025-15
Versión: 1
Fecha: Noviembre 2025

N° INVENTARIO: 5

1. DATOS DEL EQUIPO

FECHA DE COMPRA	26	9	2025
MARCA:	ELITE Martillo Demoledor		
REFERENCIA O MODELO	DH164515		
SERIAL:	8755 (#3)		
FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN	26	9	2025
FECHA FIN DE OPERACIÓN	DD	MM	AA

2. REGISTRO DE MANTENIMIENTO

#	FECHA			DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO
1	03 DD	08 MM	26 AA	Mantenimiento Correctivo (O.T-232170) - Falta Mecanizar Falta de lubricación Revisión General - Limpieza Gral -	Jampier Gómez
2	24 DD	08 MM	26 AA	Revisión General Limpieza General Engrase de Motor	
3	DD	MM	AA		
4	DD	MM	AA		
5	DD	MM	AA		
6	DD	MM	AA		
7	DD	MM	AA		
8	DD	MM	AA		

HOJA DE VIDA TALADRO DEMOLEDOR

RG-UTSIT-2025-15
Versión: 1
Fecha: Noviembre 2025

N° INVENTARIO: 5

1. DATOS DEL EQUIPO

FECHA DE COMPRA	4	3	26
MARCA:	ELITE Martillo Demoledor.		
REFERENCIA O MODELO	DH164515 (#4)		
SERIAL:	9025		
FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN	5	3	2026
FECHA FIN DE OPERACIÓN	DD	MM	AA



2. REGISTRO DE MANTENIMIENTO

#	FECHA			DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	RESPONSABLE DEL
1	13 DD	05 MM	26 AA	Mantenimiento Correctivo OT=231401? Falla Mecanica Falta Lubricacion	Empleado General
	3 DD	08 MM	26 AA	Revisión General – Limpieza Gral.	
2	24 DD	08 MM	26 AA	Revisión General Limpieza General Engrase de Motor	
3	DD	MM	AA		
4	DD	MM	AA		
5	DD	MM	AA		
6	DD	MM	AA		
7	DD	MM	AA		
8	DD	MM	AA		

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

HOJA DE VIDA TALADRO DEMOLEDOR

RG-UTSIT-2025-15
Versión: 1
Fecha: Noviembre 2025


N° INVENTARIO: 5

1. DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	SIEFKEN
REFERENCIA O MODELO	SD28 Martillo Demoledor
SERIAL:	03322020000SD280049

	DD	MM	AA
FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN	26	9	2025
FECHA FIN DE OPERACIÓN	DD	MM	AA

2. REGISTRO DE MANTENIMIENTO

#	FECHA			DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO
1	6	1	26	Sin tapa de inducido y empuñadura	J&M TALLER & ALQUILER
2	3 DD	08 MM	26 AA	Revisión General Limpieza General	
3	24 DD	08 MM	26 AA	Limpieza General Revisión General Engrase de Motor	
4	DD	MM	AA		
5	DD	MM	AA		
6	DD	MM	AA		
7	DD	MM	AA		
8	DD	MM	AA		

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

HOJA DE VIDA TALADRO PERCUTOR

RG-UTSIT-2025-15
Versión: 1
Fecha: Noviembre 2025

N° INVENTARIO: 7

1. DATOS DEL EQUIPO

FECHA DE COMPRA	23	9	25
REFERENCIA	RD1390 (Taladro de Rotación)		
SERIAL:	077250100RD13900483		
FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN	16	10	25
FECHA FIN DE OPERACIÓN	DD	MM	AA

2. REGISTRO DE MANTENIMIENTO

#	FECHA			DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO
1	3 DD	08 MM	26 AA	Se revisan las partes funcionales, Se hace limpieza General	
2	DD	MM	AA		
3	DD	MM	AA		
4	DD	MM	AA		
5	DD	MM	AA		
6	DD	MM	AA		
7	DD	MM	AA		
8	DD	MM	AA		

HOJA DE VIDA TALADRO PERCUTOR

RG-UTSIT-2025-15
Versión: 1
Fecha: Noviembre 2025

N° INVENTARIO: 8

1. DATOS DEL EQUIPO

FECHA DE COMPRA	23	9	25

MARCA: ELITE

REFERENCIA ID850 taladro Percutor Manual (1/2")

SERIAL: 8771

FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN	26	10	25
FECHA FIN DE OPERACIÓN	DD	MM	AA

2. REGISTRO DE MANTENIMIENTO

#	FECHA			DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO
1	3 D	08 MM	26 AA	Revisión de partes funcionales, se hace Limpieza General	
2	DD	MM	AA		
3	DD	MM	AA		
4	DD	MM	AA		
5	DD	MM	AA		
6	DD	MM	AA		
7	DD	MM	AA		
8	DD	MM	AA		

UNION TEMPORAL
SIT MEDELLIN

ANEXO 20

REGISTRO DE PAUSAS ACTIVAS

MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN
DE LA RED SEMAFÓRICA DE MEDELLÍN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						Código: RG-UTSIT-2025-30 Versión 1	
	FORMATO ASISTENCIA A PAUSAS ACTIVAS						Fecha: 07/04/2026	
FIRMA DEL LIDER PAUSAS ACTIVAS	Edwin Santos							
DEL	10	AL	14	MES	08	AÑO	2026	

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
SIMEON FERNANDO VIVAS	1065913019	Fernando Vivas	Fernando Vivas	Fernando Vivas	Fernando Vivas	—		
Edwin david Santos	1038810427	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin		
Yaison Galeano	1039594832	—	Yaison G	—	—	—		
Willian Chavarro	9868171	—	—	Wi-C.	—	—		
Laura Marcela Parra G	1077221586	—	—	Lauramp6	—	Lauramp6		
LUIS JOZANO	9141724	—	—	—	Luis L	—		

Realizado por: Jenifer Altamiranda Diaz.
Revisado y aprobado por: Lina Maria Giraldo

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						Código: RG-UTSIT-2025-30 Versión 1	
	FORMATO ASISTENCIA A PAUSAS ACTIVAS						Fecha: 07/04/2026	
FIRMA DEL LIDER PAUSAS ACTIVAS	Franklin Barbosa							
DEL	10	AL	17	MES	08	AÑO	2026	

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Franklin Barbosa P.	16791906							
Carlos M. Gonzalez	10493486			—	—	—	—	—
					—			
Luis Lozano	91452201	—		—	—		—	—
Laura Marcela Padilla G	1017225580	—	—	—		—	—	—
	1000531976	—	—	—			—	—
Cristian Mena	1076817116	—	—	—	—			—

Realizado por: Jenifer Altamiranda Diaz.
Revisado y aprobado por: Lina Maria Giraldo

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: RG-UTSIT-2025-30 Versión 1
	FORMATO ASISTENCIA A PAUSAS ACTIVAS	Fecha: 07/04/2026

FIRMA DEL LIDER PAUSAS ACTIVAS	Juan Rua						
DEL	10	AL	19	MES	Agosto	AÑO	2026

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Juan José Roa Silva	1xxxx3 1976							
Yeison Galeano	1035454832							
Charleen Barbosa Yepes	1.151.966.78							
Cristian Mena cordoba	1076 817 776		cristóan					

Realizado por: Jenifer Altamiranda Diaz.
Revisado y aprobado por: Lina Maria Giraldo

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: RG-UTSIT-2025-30 Versión 1
	FORMATO ASISTENCIA A PAUSAS ACTIVAS	Fecha: 07/04/2026

FIRMA DEL LIDER PAUSAS ACTIVAS	Laura Padilla.						
DEL 10		AL 15		MES		AÑO 0	2026

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Laura Marcela padilla	1017215586	LauraMP6	LauraMP6	—	—	—	—	—
LUIS LOTANO	9145220	LUIS.L	—	—	—	—	—	—
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—
		L6	LauraMP6					

Realizado por: Jenifer Altamiranda Diaz.
Revisado y aprobado por: Lina Maria Giraldo

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: RG-UTSIT-2025-30 Versión 1
	FORMATO ASISTENCIA A PAUSAS ACTIVAS	Fecha: 07/04/2026

FIRMA DEL LIDER PAUSAS ACTIVAS	Brayan Palacio							
DEL	10	AL 14		MES 08		AÑO	2026	

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Brayan Palacio	1096243533	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan		
Andres Bedoya	1037326890	AndresB	AndresB	AndresB	AndresB	AndresB		
moises Flores	1094848824	moises	moises	moises	moises	moises		
Carlos Zuñiga	1096247524	Carlos	Carlos	Carlos				
Stiven Palacio	1096216404			Stiven	Stiven	Stiven		
Eric Acosta	5036864				Eric	Eric		

Realizado por: Jenifer Altamiranda Diaz.
Revisado y aprobado por: Lina Maria Giraldo

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: RG-UTSIT-2025-30 Versión 1
	FORMATO ASISTENCIA A PAUSAS ACTIVAS	Fecha: 07/04/2026

FIRMA DEL LIDER PAUSAS ACTIVAS	Carlos Mario Gonzalez						
DEL	12	AL	16	MES	08	AÑO	2026

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Carlos Gonzalez	1049894088	Carlos G		Carlos G	Carlos G	Carlos G		
cristian mena	1068817116			cristhan				
Yeison Galeano	1039547802			Yeison G.	Yeison			

Realizado por: Jenifer Altamiranda Diaz.
Revisado y aprobado por: Lina Maria Giraldo

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: RG-UTSIT-2025-30 Versión 1
	FORMATO ASISTENCIA A PAUSAS ACTIVAS	Fecha: 07/04/2026

FIRMA DEL LIDER PAUSAS ACTIVAS	Angelo Daniel Gómez Mejía						
DEL	16	AL	16	MES	Agosto	AÑO	2026

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Eduar David Santos	1038810427	edwin.						
Carlos Alberto Diaz.	1017144470	[illegible]						
Angelo Gomez Mejia	1152187124	[illegible]						

Realizado por: Jenifer Altamiranda Diaz.
Revisado y aprobado por: Lina Maria Giraldo

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: RG-UTSIT-2025-30 Versión 1
	FORMATO ASISTENCIA A PAUSAS ACTIVAS	Fecha: 07/04/2026

FIRMA DEL LIDER PAUSAS ACTIVAS: Angelo David Gómez Mejía.

DEL: 17 AL: 17 MES: Agosto AÑO: 2026.

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Angelo Gómez Mejía	1152187124							
Carlos Alberto Diaz P	1017144470							
William Alberto Altamiranda B	98681775							

Realizado por: Jenifer Altamiranda Diaz.
Revisado y aprobado por: Lina Maria Giraldo

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: RG-UTSIT-2025-30 Versión 1
	FORMATO ASISTENCIA A PAUSAS ACTIVAS	Fecha: 07/04/2026

FIRMA DEL LIDER PAUSAS ACTIVAS	Angelo Daniel Gomez Mejia						
DEL	23	AL	23	MES	Agosto	AÑO	2026

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Edwin David Santos H.	1038810427	—	—	—	—	—	—	E. David
Angelo Gomez Mejia	1152187164	—	—	—	—	—	—	
Carlos Alberto Diaz P.	1017144470	—	—	—	—	—	—	

Realizado por: Jenifer Altamiranda Diaz.
Revisado y aprobado por: Lina Maria Giraldo

UNION TEMPORAL
SIT MEDELLIN

ANEXO 21

INSPECCIÓN DEL BOTIQUÍN

MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN
DE LA RED SEMAFÓRICA DE MEDELLÍN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	**INSPECCIÓN DEL BOTIQUÍN**	RG-UTSIT-2025-20 Versión: 2 Fecha: Octubre 2025

FECHA	**REVISADO POR**	**UBICACIÓN DEL BOTIQUIN**
28/08/2026	Jenifer Altamiranda Diaz	Bodega 2do Piso

INDIQUE ESTADO_ B:BUENO_M:MALO_NT:NO TIENE

CONTENIDO	ESTADO			CANTIDAD		OBSERVACIONES
	B	M	NT	Cant exist	faltan	
1. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN						
Guantes de látex desechables: 2 pares talla 8 y 2 pares talla 10	B			4		Ok
Tapabocas: 2 unidades desechables	B			4		Ok
Gafas: 1 par con visor transparente	B			1		Ok
2. ELEMENTOS PARA MANEJO DE HERIDAS						
Elementos de protección (nral. 1)	—	—	—	-	—	— —
Gasas estériles en sobres individuales: 10 sobres.	B			10		Ok
Solución salina: 1 bolsa	B			1		Vence: Octubre 2028
Tijeras todo uso de punta roma.	B			1		Ok
Microporo de 2 cm de ancho: 1 carreta	B			1		Ok
Vendas adhesivas (curitas): 10 unidades.	B			10		Ok
Venda en rollo de gasa no elástica: 1 rollo.	B			2		Ok
Venda de tela triangular de tela: 2 unidades	B			1		Ok
3. ELEMENTOS CUERPOS EXTRAÑOS EN OJOS						
Elementos de protección (nral. 1)	—		—		—	—
Copitos o aplicadores: 10 estériles.	B			10		Ok
Apósito ocular (parche): 4 en sobre individual.	B			4		Ok
Gotas naturales para ojos: 1 frasco.	N/A			N/A		N/A
4. OTROS ELEMENTOS						
Bolsa roja (desechos biológicos): 2 bolsas	B			2		Ok
Bolsa transparente con cierre hermético: 5 und	B			5		Ok
Linterna de bombillos led.	B			1		Ok
Pilas para linterna (mantenerlas por fuera de la linterna)	N/A			N/A		N/A
Libreta para apuntes o registros	B			1		Ok
Lapicero y/o lápiz.	B			1		Ok
Manual de primeros auxilios o instrucciones mínimas de manejo de los elementos del botiquín	B			1		Ok

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	INSPECCIÓN DEL BOTIQUÍN	RG-UTSIT-2025-20
		Versión: 2
		Fecha: Octubre 2025

Baja lenguas.	B			10		OK
Termómetro de mercurio o digitla	B			1		Ok

HALLAZGOS Y PLAN DE ACCIÓN

HALLAZGO	PLAN DE ACCIÓN	FECHA	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN	FECHA

EL BOTIQUÍN ESTA UBICADO EN UN LUGAR VISIBLE (SI) NO

EL BOTIQUIN ESTA EN BUEN ESTADO (SI) NO

Registro fotográfico (SI) NO

FIRMA RESPONSABLE AREA SST

FIRMA REPRESENTANTE COPASST

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	**INSPECCIÓN DEL BOTIQUÍN** **CUADRILLAS**	RG-UTSIT-2025-20 Versión: 2 Fecha: Octubre 2025

FECHA	REVISADO E INSPECCIONADO POR	UBICACIÓN DEL BOTIQUIN
28/08/2026	Jenifer Altamiranda	Grupo Carlos M. Gonzalez

INDIQUE ESTADO_ B:BUENO_M:MALO_NT:NO TIENE

CONTENIDO	ESTADO			CANTIDAD		OBSERVACIONES
	B	M	NT	EXISTENTE	FALTAN	
1. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN						
Guantes de látex desechables: 2 pares	B			2		Ok
Tapabocas: 2 unidades desechables	B			2		Ok
2. ELEMENTOS PARA MANEJO DE HERIDAS						
Gasas estériles en sobres individuales: 5 sobres.	B			5		Ok
Solución salina: 1 bolsa	B			1		Vence: Enero 2028
Tijeras todo uso de punta roma.	B			1		Ok
Microporo de 2 cm de ancho: 1 carreta	B			1		Ok
Vendas adhesivas (curitas): 5 unidades.	B			10		Ok
Venda en rollo de gasa no elástica: 1 rollo.	B			1		Ok
Bajalenguas (5)	B			5		Ok
3. ELEMENTOS CUERPOS EXTRAÑOS EN OJOS						
Copitos o aplicadores: 10 estériles.	B			10		ok
Apósito ocular (parche): 2 en sobre individual.	B			3		ok

HALLAZGOS Y PLAN DE ACCIÓN

HALLAZGO	PLAN DE ACCIÓN	FECHA	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN	FECHA

EL BOTIQUÍN ESTA UBICADO EN UN LUGAR VISIBLE (SI) NO

EL BOTIQUIN ESTA EN BUEN ESTADO (SI) NO

FIRMA AREA SST

FIRMA REPRESENTANTE COPASST

Registro fotográfico (SI) NO

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	**INSPECCIÓN DEL BOTIQUÍN** **CUADRILLAS**	RG-UTSIT-2025-20 Versión: 1 Fecha: Octubre 2025
FECHA 28/08/2026	**REVISADO E INSPECCIONADO POR** Jenifer Alfaro Miranda Diaz	**UBICACIÓN DEL BOTIQUIN** Grupo Edwin Santos

INDIQUE ESTADO_ B:BUENO_M:MALO_NT:NO TIENE

CONTENIDO	ESTADO			CANTIDAD		OBSERVACIONES
	B	M	NT	EXISTENTE	FALTAN	
1. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN						
Guantes de látex desechables: 2 pares	B			2		Ok
Tapabocas: 2 unidades desechables	B			2		
2. ELEMENTOS PARA MANEJO DE HERIDAS						
Gasas estériles en sobres individuales: 5 sobres.	B			5		ok
Solución salina: 1 bolsa	B			1		Vencimiento enero 2028
Tijeras todo uso de punta roma.	B			1		ok
Microporo de 2 cm de ancho: 1 carreta	B			1		ok
Vendas adhesivas (curitas): 5 unidades.	B			6		ok
Venda en rollo de gasa no elástica: 1 rollo.	B			1		ok
Bajalenguas	B			5		ok
3. ELEMENTOS CUERPOS EXTRAÑOS EN OJOS						
Copitos o aplicadores: 10 estériles.	B			10		ok
Apósito ocular (parche): 2 en sobre individual.	B			3		ok

HALLAZGOS Y PLAN DE ACCIÓN

HALLAZGO	PLAN DE ACCIÓN	FECHA	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN	FECHA

EL BOTIQUÍN ESTA UBICADO EN UN LUGAR VISIBLE (SI) NO

EL BOTIQUIN ESTA EN BUEN ESTADO (SI) NO

FIRMA AREA SST

FIRMA REPRESENTANTE COPASST

Registro fotográfico (SI) NO

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	**INSPECCIÓN DEL BOTIQUÍN** **CUADRILLAS**	RG-UTSIT-2025-20 Versión: 2 Fecha: Octubre 2025

FECHA	**REVISADO E INSPECCIONADO POR**	**UBICACIÓN DEL BOTIQUIN**
28/08/2026	Jenifer Altamiranda Diaz.	Grupo Franklin Barbosa

INDIQUE ESTADO_ B:BUENO_M:MALO_NT:NO TIENE

CONTENIDO	ESTADO			CANTIDAD		OBSERVACIONES
	B	M	NT	EXISTENTE	FALTAN	
1. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN						
Guantes de látex desechables: 2 pares	B			2		ok
Tapabocas: 2 unidades desechables	B			2		ok
2. ELEMENTOS PARA MANEJO DE HERIDAS						
Gasas estériles en sobres individuales: 5 sobres.	B			5		ok
Solución salina: 1 bolsa	B			1		ok
Tijeras todo uso de punta roma.	B			1		ok
Microporo de 2 cm de ancho: 1 carreta	B			1		ok
Vendas adhesivas (curitas): 5 unidades.	B			8		ok
Venda en rollo de gasa no elástica: 1 rollo.	B			1		ok
Bajo lenguas	B			5		ok
3. ELEMENTOS CUERPOS EXTRAÑOS EN OJOS						
Copitos o aplicadores: 10 estériles.	B			10		ok
Apósito ocular (parche): 2 en sobre individual.	B			2		ok

HALLAZGOS Y PLAN DE ACCIÓN

HALLAZGO	PLAN DE ACCIÓN	FECHA	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN	FECHA

EL BOTIQUÍN ESTA UBICADO EN UN LUGAR VISIBLE — (SI) NO

EL BOTIQUIN ESTA EN BUEN ESTADO — (SI) NO

FIRMA AREA SST

FIRMA REPRESENTANTE COPASST

Registro fotográfico (SI) NO

UNION TEMPORAL
SIT MEDELLIN


ANEXO 22

INSPECCIÓN DEL EXTINTOR

MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN
DE LA RED SEMAFÓRICA DE MEDELLÍN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RG-UTSIT-2025-19
		Version 2
	FORMATO DE INSPECCION DE EXTINTORES	Fecha: Octubre 2025

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Jenifer Altamiranda Diaz
CARGO: Auxiliar SST/ambiental
SEDE: Medellin - Antioquia
FECHA: 28-08-2025



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO NA: NO APLICA

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA O VÁLVULA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	ABC Multiproposito	1er PISO Bodega	10 Libras	Junio 2027	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	Ok
2	ABC Multiproposito	Frentes de Trabajo	10 Libras	Abril 2027	B	B	N/A	B	B	B	R	N/A	B	B	ok
3	ABC Multiproposito	Frentes de Trabajo	10 Libras	Julio 2027	B	B	N/A	B	B	B	B	N/A	B	B	ok
4	ABC Multiproposito	Frentes de Trabajo	10 Libras	Mayo 2027	B	B	N/A	B	B	B	B	N/A	B	B	ok
5	ABC Multi proposito	Bodega	10 Libras	Junio 2027	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	ok
6	ABC Multiproposito	Bodega	10 Libras	febrero 2027	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	Ok
7															
8															
9															
10															

	HALLAZGO	PLAN DE ACCIÓN	FECHA	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN	FECHA
1						
2						
3						

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN

Si

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Carlos G.
FIRMA INTEGRANTE DEL COPASST

UNION TEMPORAL
SIT MEDELLIN

ANEXO 23

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN
DE LA RED SEMAFÓRICA DE MEDELLÍN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RG-UTSIT-2025-24
	FORMATO INSPECCIÓN EPP COTIDIANOS	Versión:2
		Fecha: Abril 2026

FECHA: 20/08/2026 ACTIVIDAD INSPECCIONADA: Instalacion de cable

DIRECCIÓN DEL AREA INSPECCIONADA: C280-C11 650R NOMBRE DE QUIEN LIDERA LA INSPECCIÓN: Jenifer Alfumiranda D

1. INSPECCIÓN DE EPP Y MEDIDAS DE CONTROL

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	CONDICIÓN	casco (A)	Guantes (B)	Botas (C)	protección respiratoria (D)	Protectores auditivos (E)	Gafas protectoras (F)	Barbuquejo (G)	Monjas(H)	Rodilleras(I)	Otros(J). Indique:	MEDIDAS DE CONTROL 1	2	3	4	5	FIRMA TRABAJADOR
1	Christian Barbosa	7151 966785	Conductor Aux. Mantenim.	U	B	B	B	B	B	B	B	B	NR			X			X	
				E	B	B	B	B	B	B	B	B	NR			X			X	
2	Franklin Barbosa	76791 906	Conductor Aux. Mantenimi	U	B	B	B	B	B	B	B	B	B		X					
				E	B	B	B	B	B	B	B	B	B		X					
3	Juan José Roa	7000 537976	Tecnico electricista	U	B	B	B	N/A	B	B	B	B	NT					X		
				E	B	B	B	N/A	B	B	B	B	NT					X		
4	José Andrade	77222 857	Auxiliar Mantenimiento	U	B	B	B	N/A	B	R	B	B	NT				X	X		
				E	B	R	B	N/A	B	R	B	B	NT				X	X		
5				U																
				E																
6				U																
				E																
7				U																
				E																
8				U																
				E																
9				U																
				E																
10				U																
				E																

2. PLAN DE ACCIÓN Y CONVENCIONES GENERALES

EPP FALTANTE POR PERSONA

No	NOMBRE	EPP A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	FECHA ENTREGA
1	— o —											
2	— o —											
3	Juan José Roa									4		21/08/26
4	José Andrade		3			3				4		21/08/26
5												
6												
7												
8												
9												
10												

CONVENCIONES GENERALES PARA DESARROLLO DEL FORMATO

INFORMACIÓN EPP	ESTADO	MEDIDAS DE CONTROL
U - USO E - ESTADO	B - BUENO R - REGULAR M - MALO NT - NO TIENE NR - NO REQUIERE	1: INSTRUCCIÓN 2: MOTIVACIÓN 3: CAMBIO DE EPP 4: FALTANTE 5: OTRAS
USO SI- (El trabajador si usa el EPP) NO- (El trabajador no usa el EPP		

OBSERVACIONES GENERALES

RESPONSABLE DEL AREA Y FIRMA

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN Y FIRMA

REPRESENTANTE DEL COPASST:

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RG-UTSIT-2025-24
	FORMATO INSPECCIÓN EPP COTIDIANOS	Versión:2
		Fecha: Abril 2026

FECHA: 24/08/2026 ACTIVIDAD INSPECCIONADA: Apuesta de semaforos - obras civiles

DIRECCIÓN DEL AREA INSPECCIONADA: CE80-CA25 NOMBRE DE QUIEN LIDERA LA INSPECCIÓN: Jenifer Atehortua

1. INSPECCIÓN DE EPP Y MEDIDAS DE CONTROL

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	CONDICIÓN	casco (A)	Guantes (B)	Botas (C)	protección respiratoria	Protectores auditivos	Gafas protectoras (F)	Barbuquejo (G)	Monjas(H)	Rodilleras(I)	Otros(I). indique:	MEDIDAS DE CONTROL 1	2	3	4	5	FIRMA TRABAJADOR
1	Laura Padilla	1017 221 580	Aux Mantenimiento	U	B	B	B	NR	B	R	R	B	NR			X		X		Laurapa
				E	B	B	B	NR	B	R	B	B	NR							
2	Jose Andrade	77222 857	Aux Mantenimiento	U	B	B	B	NR	B	B	B	B	B			X				Jose Andrade
				E	B	B	B	NR	B	B	B	B	B							
3	Cristian Mena	7076. 8/2876	Aux Mantenimiento	U	B	B	B	NR	NT	B	B	B	B			X		X		Cristian
				E	B	B	B	NR	NT	B	B	B	B							
4	William Chavarriaga	98681 775	Aux Mantenimiento	U	B	R	B	NR	B	R	B	B	NR			X		X		
				E	B	R	B	NR	B	R	B	B	NR							
5				U																
				E																
6				U																
				E																
7				U																
				E																
8				U																
				E																
9				U																
				E																
10				U																
				E																

2. PLAN DE ACCIÓN Y CONVENCIONES GENERALES

EPP FALTANTE POR PERSONA

No.	NOMBRE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	FECHA ENTREGA
1	Laura Marcela Padilla						3					25/08/26
2	Jose Andrade						3					20/08/26
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

CONVENCIONES GENERALES PARA DESARROLLO DEL FORMATO

INFORMACIÓN EPP	ESTADO	MEDIDAS DE CONTROL
U - USO E - ESTADO	B - BUENO R - REGULAR M - MALO NT - NO TIENE NR - NO REQUIERE	1: INSTRUCCIÓN 2: MOTIVACIÓN 3: CAMBIO DE EPP 4: FALTANTE 5: OTRAS
USO		
SI- (El trabajador si usa el EPP) NO- (El trabajador no usa el EPP		

OBSERVACIONES GENERALES

RESPONSABLE DEL AREA Y FIRMA

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN Y FIRMA

REPRESENTANTE DEL COPASST:

UNION TEMPORAL
SIT MEDELLIN

ANEXO 24

INSPECCIÓN DE LAS ESCALERAS

MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN
DE LA RED SEMAFÓRICA DE MEDELLÍN

UNION TEMPORAL IST MEDELLIN	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: RG-UTSIT-2025-12 Versión 1
	F-25 PREOPERACIONAL ESCALERA	Fecha 11 sep 2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del operador-trabajador	Franklin Bedoya				Tipo de escalera		Extensible y Tijera
Fecha de inicio del Trabajo (dd/mm/aaaa):	01-08-2026	Hora de Inicio (a.m./p.m.):	7am	Hora de Finalización (a.m./p.m.):		Grupo #	
Fecha de final del Trabajo (dd/mm/aaaa):	31-08-2026					Descripción de la tarea a realizar:	

II. INSPECCIÓN

Serial		Marca:	

Marque según corresponda: C: cumple NC: no cumple NA: no aplica

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Largueros	C	C	C	C	C	C	C			C	C		C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			
Peldaños	C	C	C	C	C	C	C			C	C		C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			
Unión de peldaños y largueros	C	C	C	C	C	C	C			C	C		C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			
Zapatas antideslizantes	C	C	C	C	C	C	C			C	C		C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	C	C	C	C	C	C	C			C	C		C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			
Tope de escalera	C	C	C	C	C	C	C			C	C		C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			
Bandeja escalera	C	C	C	C	C	C	C			C	C		C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			
Aseo de escalera	C	C	C	C	C	C	C			C	C		C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			
Identificación legible en la escalera	C	C	C	C	C	C	C			C	C		C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			
Señalización de seguridad en peldaño	C	C	C	C	C	C	C			C	C		C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	C	C	C	C	C	C	C			C	C		C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	C	C	C	C	C	C	C			C	C		C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			
Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)	C	C	C	C	C	C	C			C	C		C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			
General	C	C	C	C	C	C	C			C	C		C	C	V	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			

NOTA: Esta lista se deberá diligenciar y mantener diariamente en el sitio de trabajo

YO COMO TRABAJADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Observaciones:

Firma diaria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Operador o trabajador:																															
Lider de trabajo:																															

Creado por: Jenifer Altamiranda Diaz

Aprobado por: Lina Maria Giraldo Botero

RECOMENDACIONES DURANTE OPERACIONES CON ESCALERAS

a. Si la tarea a realizar está relacionada con sistemas eléctricos, no utilice escaleras metálicas

b. La escalera debe ser sostenida por alguien en su parte inferior hasta que sea asegurada adecuadamente en su parte superior a una estructura fija y resistente.

c. Todo trabajo con escaleras de hasta 8 metros debe ser realizado por mínimo dos personas, escaleras mas largas deben ser izadas por mínimo 3 personas.

d. Escaleras de cuatro a ocho metros deben estar aseguradas con cuerdas en la parte inferior y superior.

e. Escaleras de 8 a 18 metros, deben asegurarse con cuerdas de la parte inferior y superior y deben tener como mínimo dos vientos laterales con cuerdas.

f. La escalera está bien izada si la distancia entre la pared o eje vertical de la escalera y las zapatas de seguridad es un cuarto (1/4) de la altura; es decir por cada metro de [illegible] er a un superficie superior la escalera deberá sobresalir un metro de esta.

g. No ubique escaleras detrás de puertas, de ser necesario asegurarse que esta no va a ser operada (Señalización y aseguramiento físico).


h. Permita solo una perosna sobre la escalera, que suba con las manos libres.

i. A la escalera se debe subir y bajar siempre de frente a ella, con las manos libres.

j. El arnés debe ser asegurado a una superficie resistente y fija, nunca a la esacalera

k. Si es una escalera de tijera:

* Verifique que todas sus partes están en buenas condiciones.
* Asegurese que esta completamente abierta, los travesaños asegurados y sostenida por otro trabajador.
* Las patas deben descanzar sobre una superficie nivelada y no resbalosa.
* No trabaje sobre el último peldaño.
* No la utilice sin abrir, de ser necesario utilice una escalera de extensión.

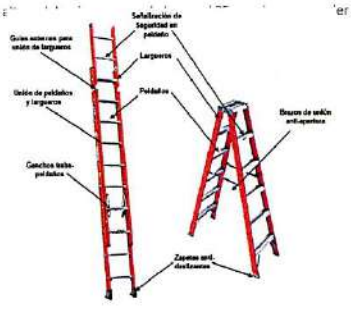

RECOMENDACIONES DURANTE OPERACIONES CON ESCALERAS

a. Si la tarea a realizar está relacionada con sistemas eléctricos, no utilice escaleras metálicas

b. La escalera debe ser sostenida por alguien en su parte inferior hasta que sea asegurada adecuadamente en su parte superior a una estructura fija y resistente.

c. Todo trabajo con escaleras de hasta 8 metros debe ser realizado por mínimo dos personas, escaleras mas largas deben ser izadas por mínimo 3 personas.

d. Escaleras de cuatro a ocho metros deben estar aseguradas con cuerdas en la parte inferior y superior.

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: RG-UTSIT-2025-12 Versión 1
	F-25 PREOPERACIONAL ESCALERA	Fecha 11 sep 2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del operador-trabajador	Edwin Santos				Tipo de escalera	Tijera - Extensibles	
Fecha de inicio del Trabajo (dd/mm/aaaa):	06-08-2026	Hora de Inicio (a.m./p.m.):	7:00 Am	Hora de Finalización (a.m./p.m.):	5:00 pm	Grupo #	1
Fecha de final del Trabajo (dd/mm/aaaa):	31-08-2026					Descripción de la tarea a realizar:	

II. INSPECCIÓN

Serial		Marca:	Escaleras de colombia

Marque según corresponda: C: cumple NC: no cumple NA: no aplica

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Largueros						C							C							C	C			C	C		C	C			
Peldaños						C							C							C	C			C	C		C	C			
Unión de peldaños y largueros						C							C							C	C			C	C		C	C			
Zapatas antideslizantes						C							C							C	C			C	C		C	C			
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)						C							C							C	C			C	C		C	C			
Tope de escalera						C							C							C	C			C	C		C	C			
Bandeja escalera						C							C							C	C			C	C		C	C			
Aseo de escalera						C							C							C	C			C	C		C	C			
Identificación legible en la escalera						C							C							C	C			C	C		C	C			
Señalización de seguridad en peldaño						C							C							C	C			C	C		C	C			
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)						C							C							C	C			C	C	P	C			
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)						C							C							C	C			C	C		C	C			
Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)						C							C							C	C			C	C		C	C			
General						C							C							C	C			C	C		C	C			

NOTA: Esta lista se deberá diligenciar y mantener diariamente en el sitio de trabajo

YO COMO TRABAJADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Observaciones:

Firma diaria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Operador o trabajador: Edwin Santos						Edwin							Edwin							Edwin	Edwin			Fernando Rivas	Fernando Rivas		Fernando Rivas	Fernando Rivas			
Lider de trabajo: Edwin Santos						Edwin							Edwin							Edwin	Edwin			Edwin	Edwin		Edwin	Edwin			

Creado por: Jenifer Altamiranda Diaz

Aprobado por: Lina Maria Giraldo Botero

RECOMENDACIONES DURANTE OPERACIONES CON ESCALERAS

a. Si la tarea a realizar está relacionada con sistemas eléctricos, no utilice escaleras metálicas

b. La escalera debe ser sostenida por alguien en su parte inferior hasta que sea asegurada adecuadamente en su parte superior a una estructura fija y resistente.

c. Todo trabajo con escaleras de hasta 8 metros debe ser realizado por mínimo dos personas, escaleras mas largas deben ser izadas por mínimo 3 personas.

d. Escaleras de cuatro a ocho metros deben estar aseguradas con cuerdas en la parte inferior y superior.

e. Escaleras de 8 a 18 metros, deben asegurarse con cuerdas de la parte inferior y superior y deben tener como mínimo dos vientos laterales con cuerdas.

f. La escalera está bien izada si la distancia entre la pared o eje vertical de la escalera y las zapatas de seguridad es un cuarto (1/4) de la altura; es decir por cada metro de [illegible] er a un superficie superior la escalera deberá sobresalir un metro de esta.

g. No ubique escaleras detrás de puertas, de ser necesario asegurarse que esta no va a ser operada (Señalización y aseguramiento físico).


h. Permita solo una perosna sobre la escalera, que suba con las manos libres.

i. A la escalera se debe subir y bajar siempre de frente a ella, con las manos libres.

j. El arnés debe ser asegurado a una superficie resistente y fija, nunca a la esacalera

k. Si es una escalera de tijera:

* Verifique que todas sus partes están en buenas condiciones.
* Asegurese que esta completamente abierta, los travesaños asegurados y sostenida por otro trabajador.
* Las patas deben descanzar sobre una superficie nivelada y no resbalosa.
* No trabaje sobre el último peldaño.
* No la utilice sin abrir, de ser necesario utilice una escalera de extensión.

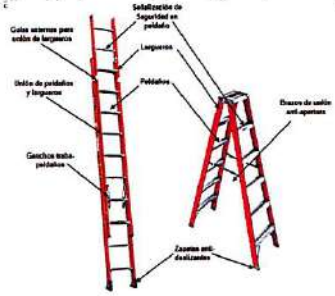

RECOMENDACIONES DURANTE OPERACIONES CON ESCALERAS

a. Si la tarea a realizar está relacionada con sistemas eléctricos, no utilice escaleras metálicas

b. La escalera debe ser sostenida por alguien en su parte inferior hasta que sea asegurada adecuadamente en su parte superior a una estructura fija y resistente.

c. Todo trabajo con escaleras de hasta 8 metros debe ser realizado por mínimo dos personas, escaleras mas largas deben ser izadas por mínimo 3 personas.

d. Escaleras de cuatro a ocho metros deben estar aseguradas con cuerdas en la parte inferior y superior.

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: RG-UTSIT-2025-12 Versión 1
	F-25 PREOPERACIONAL ESCALERA	Fecha 11 sep 2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del operador-trabajador	Juan Rua				Tipo de escalera		
Fecha de inicio del Trabajo (dd/mm/aaaa):	05/09/25	Hora de Inicio (a.m./p.m.):	7:00 am	Hora de Finalización (a.m./p.m.):	5:00 pm	Grupo #	
Fecha de final del Trabajo (dd/mm/aaaa):	31/09/25					Descripción de la tarea a realizar:	Mantenimiento

II. INSPECCIÓN

Serial		Marca:	Escaleras de colombia

Marque según corresponda: C: cumple NC: no cumple NA: no aplica

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Largueros			C	C	C	C																					C	C			
Peldaños			C	C	C	C																					C	C			
Unión de peldaños y largueros			C		C	C																					C	C			
Zapatas antideslizantes			NC	NC	NC	NC																					NC	NC			
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)			C	C	C	C																					C	C			
Tope de escalera			C	C	C	C																					C				
Bandeja escalera			C	C	C	C																					C	C			
Aseo de escalera			C	C	C	C																					C	C			
Identificación legible en la escalera			C	C	C	C																					C	C			
Señalización de seguridad en peldaño			C	C	C	C																					C	C			
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)			C	C	C	C																					C	C			
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)			C	C	C	C																					C	C			
Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)			C	C	C	C																					C	C			
General			C	C	C	C																						C			

NOTA: Esta lista se deberá diligenciar y mantener diariamente en el sitio de trabajo

YO COMO TRABAJADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Observaciones:

Firma diaria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Operador o trabajador: Juan Rua																															
Lider de trabajo: Juan Rua																															

Creado por: Jenifer Altamiranda Diaz

Aprobado por: Lina Maria Giraldo Botero

RECOMENDACIONES DURANTE OPERACIONES CON ESCALERAS

a. Si la tarea a realizar está relacionada con sistemas eléctricos, no utilice escaleras metálicas

b. La escalera debe ser sostenida por alguien en su parte inferior hasta que sea asegurada adecuadamente en su parte superior a una estructura fija y resistente.

c. Todo trabajo con escaleras de hasta 8 metros debe ser realizado por mínimo dos personas, escaleras mas largas deben ser izadas por mínimo 3 personas.

d. Escaleras de cuatro a ocho metros deben estar aseguradas con cuerdas en la parte inferior y superior.

e. Escaleras de 8 a 18 metros, deben asegurarse con cuerdas de la parte inferior y superior y deben tener como mínimo dos vientos laterales con cuerdas.

f. La escalera está bien izada si la distancia entre la pared o eje vertical de la escalera y las zapatas de seguridad es un cuarto (1/4) de la altura; es decir por cada metro de [illegible] er a un superficie superior la escalera deberá sobresalir un metro de esta.

g. No ubique escaleras detrás de puertas, de ser necesario asegurarse que esta no va a ser operada (Señalización y aseguramiento físico).

h. Permita solo una perosna sobre la escalera, que suba con las manos libres.

i. A la escalera se debe subir y bajar siempre de frente a ella, con las manos libres.

j. El arnés debe ser asegurado a una superficie resistente y fija, nunca a la esacalera

k. Si es una escalera de tijera:

* Verifique que todas sus partes están en buenas condiciones.
* Asegurese que esta completamente abierta, los travesaños asegurados y sostenida por otro trabajador.
* Las patas deben descanzar sobre una superficie nivelada y no resbalosa.
* No trabaje sobre el último peldaño.
* No la utilice sin abrir, de ser necesario utilice una escalera de extensión.



RECOMENDACIONES DURANTE OPERACIONES CON ESCALERAS

a. Si la tarea a realizar está relacionada con sistemas eléctricos, no utilice escaleras metálicas

b. La escalera debe ser sostenida por alguien en su parte inferior hasta que sea asegurada adecuadamente en su parte superior a una estructura fija y resistente.

c. Todo trabajo con escaleras de hasta 8 metros debe ser realizado por mínimo dos personas, escaleras mas largas deben ser izadas por mínimo 3 personas.

d. Escaleras de cuatro a ocho metros deben estar aseguradas con cuerdas en la parte inferior y superior.

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: RG-UTSIT-2025-12 Versión 1
	F-25 PREOPERACIONAL ESCALERA	Fecha 11 sep 2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del operador-trabajador	William Chavarria				Tipo de escalera		
Fecha de inicio del Trabajo (dd/mm/aaaa):	1/agos/26	Hora de Inicio (a.m./p.m.):	am 8:00	Hora de Finalización (a.m./p.m.):	pm 4:00	Grupo #	8
Fecha de final del Trabajo (dd/mm/aaaa):	30/ago/26					Descripción de la tarea a realizar:	Lavado

II. INSPECCIÓN

Serial		Marca:	

Marque según corresponda: C: cumple NC: no cumple NA: no aplica

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Largueros																								C	C	C	C				
Peldaños																								C	C	C	C				
Unión de peldaños y largueros																								C	C	C	C				
Zapatas antideslizantes																								C	C	C	C				
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)																								C	C	C	C				
Tope de escalera																								C	C	C	C				
Bandeja escalera																								C	C	C	C				
Aseo de escalera																								C	C	C	C				
Identificación legible en la escalera																								C	C	C	C				
Señalización de seguridad en peldaño																								C	C	C					
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)																								C	C	C	C				
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)																								C	C	C	C				
Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)																								C	C	C	C				
General																								C	C	C	C				

NOTA: Esta lista se deberá diligenciar y mantener diariamente en el sitio de trabajo

YO COMO TRABAJADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Observaciones:

Firma diaria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Operador o trabajador: William Chavarria																								W.C.	W.C.	W.C.	W.C.				
Lider de trabajo: Laura Marcela Padilla																								Laura M.	Laura M.	Laura M.	Laura M.				

Creado por: Jenifer Altamiranda Diaz

Aprobado por: Lina Maria Giraldo Botero

RECOMENDACIONES DURANTE OPERACIONES CON ESCALERAS

a. Si la tarea a realizar está relacionada con sistemas eléctricos, no utilice escaleras metálicas

b. La escalera debe ser sostenida por alguien en su parte inferior hasta que sea asegurada adecuadamente en su parte superior a una estructura fija y resistente.

c. Todo trabajo con escaleras de hasta 8 metros debe ser realizado por mínimo dos personas, escaleras mas largas deben ser izadas por mínimo 3 personas.

d. Escaleras de cuatro a ocho metros deben estar aseguradas con cuerdas en la parte inferior y superior.

e. Escaleras de 8 a 18 metros, deben asegurarse con cuerdas de la parte inferior y superior y deben tener como mínimo dos vientos laterales con cuerdas.

f. La escalera está bien izada si la distancia entre la pared o eje vertical de la escalera y las zapatas de seguridad es un cuarto (1/4) de la altura; es decir por cada metro de [illegible] er a un superficie superior la escalera deberá sobresalir un metro de esta.

g. No ubique escaleras detrás de puertas, de ser necesario asegurarse que esta no va a ser operada (Señalización y aseguramiento físico).

h. Permita solo una perosna sobre la escalera, que suba con las manos libres.

i. A la escalera se debe subir y bajar siempre de frente a ella, con las manos libres.

j. El amés debe ser asegurado a una superficie resistente y fija, nunca a la esacalera

k. Si es una escalera de tijera:

* Verifique que todas sus partes están en buenas condiciones.
* Asegurese que esta completamente abierta, los travesaños asegurados y sostenida por otro trabajador.
* Las patas deben descanzar sobre una superficie nivelada y no resbalosa.
* No trabaje sobre el último peldaño.
* No la utilice sin abrir, de ser necesario utilice una escalera de extensión.



RECOMENDACIONES DURANTE OPERACIONES CON ESCALERAS

a. Si la tarea a realizar está relacionada con sistemas eléctricos, no utilice escaleras metálicas

b. La escalera debe ser sostenida por alguien en su parte inferior hasta que sea asegurada adecuadamente en su parte superior a una estructura fija y resistente.

c. Todo trabajo con escaleras de hasta 8 metros debe ser realizado por mínimo dos personas, escaleras mas largas deben ser izadas por mínimo 3 personas.

d. Escaleras de cuatro a ocho metros deben estar aseguradas con cuerdas en la parte inferior y superior.

UNION TEMPORAL
SIT MEDELLIN

ANEXO 25

INSPECCIÓN PLANTA ELECTRÍCA

MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN
DE LA RED SEMAFÓRICA DE MEDELLÍN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: RG-UTSIT-2025-10 Versión 1
	PREOPERACIONAL PLANTA ELECTRICA	Fecha 11 sep 2025

II. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del operador-trabajador	Jose andrade						
Fecha de inicio del Trabajo (dd/mm/aaaa):	01 08 2026	Hora de Inicio (a.m./p.m.):	07 am	Hora de Finalización (a.m./p.m.):	05 pm	Grupo #	
Fecha de final del Trabajo (dd/mm/aaaa):	09 08 2026					Descripción de la tarea a realizar:	mantenimiento de la red semaforica.

III. INSPECCIÓN

Equipo No.		Marca:	

Marque según corresponda: C: cumple NC: no cumple

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Inspeccion general de planta.	C	C	C	C	C	C	C			C			C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			
Tanque de combustible	C	C	C	C	C	C	C			C			C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			
Boton de encendido o arranque manual.	C	C	C	C	C	C	C			C			C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			
Estado de la pintura	C	C	C	C	C	C	C			C			C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			
Agarraderas	C	C	C	C	C	C	C			C			C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			
Uso de EPP adecuados para la labor	C	C	C	C	C	C	C			C			C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			
Estado general de la planta electrica (fisura,ropturas,aseo,etc)	C	C	C	C	C	C	C			C			C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			
Limpieza y estado del filtro de aire	C	C	C	C	C	C	C			C			C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			
Se utiliza accesorios apropiados	C	C	C	C	C	C	C			C			C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			
sistema electrico-cableado	C	C	C	C	C	C	C			C			C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			
Revisión de fugas de combustible.	C	C	C	C	C	C	C			C			C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			
El operador cumple con instrucciones de operatividad.	C	C	C	C	C	C	C			C			C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			
Estado de tuercas y tornillos.	C	C	C	C	C	C	C			C			C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			

NOTA: Esta lista se deberá diligenciar y mantener diariamente en el sitio de trabajo

YO COMO TRABAJADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Observaciones:

Firma diaria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Operador o trabajador: Jose Andrade.																															
Lider de trabajo:																															

Creado por: Jenifer Altamiranda Diaz
Aprobado por: Lina Maria Giraldo Botero

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: RG-UTSIT-2025-10 Versión 1
	PREOPERACIONAL PLANTA ELECTRICA	Fecha 11 sep 2025

II. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del operador-trabajador	Edwin santos						
Fecha de inicio del Trabajo (dd/mm/aaaa):	18-08-2026	Hora de Inicio (a.m./p.m.):	7:00am	Hora de Finalización (a.m./p.m.):	3:00 pm	Grupo #	7
Fecha de final del Trabajo (dd/mm/aaaa):	31-08-2026					Descripción de la tarea a realizar:	Mantenimiento red semaforica

III. INSPECCIÓN

Equipo No.	0263	Marca:	ELITE

Marque según corresponda: C: cumple NC: no cumple

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Inspeccion general de planta.			C	C		C			C			C		C				C		C	C			C	C	C	C	C			
Tanque de combustible			C	C		C			C			C		C				C		C	C			C	C	C	C	C			
Boton de encendido o arranque manual.			C	C		C			C			C		C				C		C	C			C	C	C	C	C			
Estado de la pintura			C	C		C			C			C		C				C		C	C			C	C	C	C	C			
Agarraderas			C	C		C			C			C		C				C		C	C			C	C	C	C	C			
Uso de EPP adecuados para la labor			C	C		C			C			C		C				C		C	C			C	C	C	C	C			
Estado general de la planta electrica (fisura,ropturas,aseo,etc)			C	C		C			C			C		C				C		C	C			C	C	C	C	C			
Limpieza y estado del filtro de aire			C	C		C			C			C		C				C		C	C			C	C	C	C	C			
Se utiliza accesorios apropiados			C	C		C			C			C		C				C		C	C			C	C	C	C	C			
sistema electrico-cableado			C	C		C			C			C		C				C		C	C			C	C	C	C	C			
Revisión de fugas de combustible.			C	C		C			C			C		C				C		C	C			C	C	C	C	C			
El operador cumple con instrucciones de operatividad.			C	C		C			C			C		C				C		C	C			C	C	C	C	C			
Estado de tuercas y tornillos.			C	C		C			C			C		C				C		C	C			C	C	C	C	C			

NOTA: Esta lista se deberá diligenciar y mantener diariamente en el sitio de trabajo

YO COMO TRABAJADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Observaciones:

Firma diaria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Operador o trabajador: Edwin Santos			Edwin	Edwin		Edwin			Edwin			Edwin		Edwin				Edwin		Edwin	Edwin			Edwin	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin			
Lider de trabajo: Edwin Santos			Edwin	Edwin		Edwin			Edwin			Edwin		Edwin				Edwin		Edwin	Edwin			Edwin	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin			

Creado por: Jenifer Altamiranda Diaz
Aprobado por: Lina Maria Giraldo Botero

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: RG-UTSIT-2025-10 Versión 1
	PREOPERACIONAL PLANTA ELECTRICA	Fecha 11 sep 2025

II. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del operador-trabajador	Yvan Ruiz						
Fecha de inicio del Trabajo (dd/mm/aaaa):	01/08/26	Hora de Inicio (a.m./p.m.):	7:00 am	Hora de Finalización (a.m./p.m.):	5:00 pm	Grupo #	
Fecha de final del Trabajo (dd/mm/aaaa):	31/08/26					Descripción de la tarea a realizar:	Mantenimiento

III. INSPECCIÓN

Equipo No.		Marca:	

Marque según corresponda: C: cumple NC: no cumple

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Inspeccion general de planta.	C		C	C	C	C																									
Tanque de combustible	C		C	C	C	C																									
Boton de encendido o arranque manual.	C		C	C	C	C																									
Estado de la pintura	C		C	C	C	C																									
Agarraderas	C		C	C	C	C																									
Uso de EPP adecuados para la labor	C		C	C	C	C																									
Estado general de la planta electrica (fisura,ropturas,aseo,etc)	C		C	C	C	C																									
Limpieza y estado del filtro de aire	C		C	C	C	C																									
Se utiliza accesorios apropiados	C		C	C	C	C																									
sistema electrico-cableado	C		C	C	C	C																									
Revisión de fugas de combustible.	C		C	C	C	C																									
El operador cumple con instrucciones de operatividad.	C		C	C	C	C																									
Estado de tuercas y tornillos.	C		C	C	C	C																									

NOTA: Esta lista se deberá diligenciar y mantener diariamente en el sitio de trabajo

YO COMO TRABAJADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Observaciones:

Firma diaria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Operador o trabajador: Yvan Ruiz																															
Lider de trabajo: Yvan Ruiz																															

Creado por: Jenifer Altamiranda Diaz
Aprobado por: Lina Maria Giraldo Botero

UNION TEMPORAL
SIT MEDELLIN

ANEXO 26

INSPECCIÓN DE PULIDORA

MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN
DE LA RED SEMAFÓRICA DE MEDELLÍN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: RG-UTSIT-2025-08 Versión 1
	PREOPERACIONAL PULIDORA	Fecha 11 sep 2025

II. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del operador-trabajador	Jose Andrade						
Fecha de inicio del Trabajo (dd/mm/aaaa):	01 08 2026	Hora de Inicio (a.m./p.m.)	07 am	Hora de Finalización (a.m./p.m.):	05 pm	Grupo #	
Fecha de final del Trabajo (dd/mm/aaaa):	31 08 2026					Descripción de la tarea a	

III. INSPECCIÓN

Equipo No.		Marca:	

Marque según corresponda: C: cumple NC: no cumple

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	C	C	C	C	C								C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			
Estado de instalación del disco (insertacion)	C	C	C	C	C								C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			
Acoples adecuados para los accesorios	C	C	C	C	C								C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			
Estado e instalación del mango	C	C	C	C	C								C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			
Estado del disco	C	C	C	C	C								C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			
Uso de EPP adecuados para la labor	C	C	C	C	C								C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			
Estado general de la pulidora (fisura,ropturas,aseo,etc)	C	C	C	C	C								C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			
Estado de la guía del disco	C	C	C	C	C								C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			
Se utiliza accesorios apropiados	C	C	C	C	C								C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	C	C	C	C	C								C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			
Disco adecuado para la tarea	C	C	C	C	C								C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			
Estado de interruptor de encendido y su seguro	C	C	C	C	C								C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			
Clavija de conexión a tierra	C	C	C	C	C								C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			
Cuenta con la guarda de seguridad correctamente instalada	C	C	C	C	C								C	C	C	C		C		C	C	C		C	C	C	C	C			

NOTA: Esta lista se deberá diligenciar y mantener diariamente en el sitio de trabajo

YO COMO TRABAJADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Observaciones:

Firma diaria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Operador o trabajador: Jose Andrade																															
Lider de trabajo:																															

Creado por: Jenifer Altamiranda Diaz
Lina Maria Giraldo Botero

Aprobado por:

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: RG-UTSIT-2025-08 Versión 1
	PREOPERACIONAL PULIDORA	Fecha 11 sep 2025

II. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del operador-trabajador	Edwin david santos						
Fecha de inicio del Trabajo (dd/mm/aaaa):	14-08-2026	Hora de Inicio (a.m./p.m.)	7:00Am	Hora de Finalización (a.m./p.m.):	5:00pm	Grupo #	1
Fecha de final del Trabajo (dd/mm/aaaa):	31-08-2026					Descripción de la tarea a	corte de soldadura

III. INSPECCIÓN

Equipo No.	8944	Marca:	ELITE

Marque según corresponda: C: cumple NC: no cumple

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)														C				C			C			C	C	C	C	C			
Estado de instalación del disco (insertacion)														C				C			C			C	C	C	C	C			
Acoples adecuados para los accesorios														C				C			C			C	C	C	C	C			
Estado e instalación del mango														C				C			C			C	C	C	C	C			
Estado del disco														C				C			C			C	C	C	C	C			
Uso de EPP adecuados para la labor														C				C			C			C	C	C	C	C			
Estado general de la pulidora (fisura,ropturas,aseo,etc)														C				C			C			C	C	C	C	C			
Estado de la guía del disco														C				C			C			C	C	C	C	C			
Se utiliza accesorios apropiados														C				C			C			C	C	C	C	C			
Estado del interruptor de encendido y su seguro														C				C			C			C	C	C	C	C			
Disco adecuado para la tarea														C				C			C			C	C	C	C	C			
Estado de interruptor de encendido y su seguro														C				C			C			C	C	C	C	C			
Clavija de conexión a tierra														C				C			C			C	C	C	C	C			
Cuenta con la guarda de seguridad correctamente instalada														C				C			C			C	C	C	C	C			

NOTA: Esta lista se deberá diligenciar y mantener diariamente en el sitio de trabajo

YO COMO TRABAJADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Observaciones:

Firma diaria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Operador o trabajador: Edwin santos														Edwin				Edwin			Edwin			Edwin	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin			
Lider de trabajo: Edwin santos														Edwin				Edwin			Edwin			Edwin	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin			

Creado por: Jenifer Altamiranda Diaz
Lina Maria Giraldo Botero

Aprobado por:

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: RG-UTSIT-2025-08 Versión 1
	PREOPERACIONAL PULIDORA	Fecha 11 sep 2025

II. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del operador-trabajador	Juan Ro						
Fecha de inicio del Trabajo (dd/mm/aaaa):	01/08/25	Hora de Inicio (a.m./p.m.)	7:00 am	Hora de Finalización (a.m./p.m.):	5:00 pm	Grupo #	
Fecha de final del Trabajo (dd/mm/aaaa):	31/08/25					Descripción de la tarea a	Mantenimiento

III. INSPECCIÓN

Equipo No.		Marca:	Elite

Marque según corresponda: C: cumple NC: no cumple

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)			C	C	C	C																									
Estado de instalación del disco (insertacion)			C	C	C	C																									
Acoples adecuados para los accesorios			C	C	C	C																									
Estado e instalación del mango			C	C	C	C																									
Estado del disco			C	C	C	C																									
Uso de EPP adecuados para la labor			C	C	C	C																									
Estado general de la pulidora (fisura,ropturas,aseo,etc)			C	C	C	C																									
Estado de la guía del disco			C	C	C	C																									
Se utiliza accesorios apropiados			C	C	C	C																									
Estado del interruptor de encendido y su seguro			C	C	C	C																									
Disco adecuado para la tarea			C	C	C	C																									
Estado de interruptor de encendido y su seguro			C	C	C	C																									
Clavija de conexión a tierra			C	C	C	C																									
Cuenta con la guarda de seguridad correctamente instalada			C	C	C	C																									

NOTA: Esta lista se deberá diligenciar y mantener diariamente en el sitio de trabajo

YO COMO TRABAJADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Observaciones:

Firma diaria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Operador o trabajador: Juan Ro																															
Lider de trabajo: Juan Ro																															

Creado por: Jenifer Altamiranda Diaz
Lina Maria Giraldo Botero

Aprobado por:

UNION TEMPORAL
SIT MEDELLIN

ANEXO 27

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULO

MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN
DE LA RED SEMAFÓRICA DE MEDELLÍN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RG-UTSIT-2025-18
		Version 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULO	Fecha: Abril 2026

Nombre del Conductor	Christian Barbosa Yepes	Mes y año inspeccionado	1/8/26
No de Cédula	1.151.966.785	Placa del Vehículo	DXT928
NUMERO SOAT:	FECHA VENCIMIENTO: 27/11/26	NÚMERO TARJETA PROPIEDAD:	39101407
NUMERO TECNOMECANICA:	FECHA VENCIMIENTO: 23/11/26	FECHA VENCIMIENTO LICENCIA CONDUCCIÓN:	11/3/2031

ITEM		DÍA																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTOR	Estado de Motor				✓	✓	✓				✓		✓	✓														✓	✓			
ELECTRICO	Encendido y apagado del equipo				✓	✓	✓				✓		✓	✓														✓	✓			
	Luces delanteras y traseras				R	R	R				R		R	R														R	R			
	Stops y direccionales				R	R	R				R		R	R														R	R			
	Pito y alarma de reversa				✓	✓	✓				✓		✓	✓														✓	✓			
FRENOS	Actuación de las bombas de freno				✓	✓	✓				✓		✓	✓														✓	✓			
	Operación de freno de parqueo				✓	✓	✓				✓		✓	✓														✓	✓			
L.P	Estado de Latonería y Pintura				R	R	R				R		R	R														R	R			
TREN DE FUERZA	Muelles delanteros y traseros				✓	✓	✓				✓		✓	✓														✓	✓			
	Soportes y bujes				✓	✓	✓				✓		✓	✓														✓	✓			
	Transmisión-Caja (ruidos anormales)				R	R	R				R		R	R														R	R			
DIRECCIÓN, LLANTAS, RODAJE	Terminales de barra de dirección				✓	✓	✓				✓		✓	✓														✓	✓			
	Estado de llantas (huella, deformaciones, cortes)				✓	✓	✓				✓		✓	✓														✓	✓			
	Pasadores de llantas				✓	✓	✓				✓		✓	✓														✓	✓			
CABINA	Vidrios completos				✓	✓	✓				✓		✓	✓														✓	✓			
	Retrovisor central				✓	✓	✓				✓		✓	✓														✓	✓			
	Retrovisores laterales				✓	✓	✓				✓		✓	✓														✓	✓			
	Cinturon de seguridad				✓	✓	✓				✓		✓	✓														✓	✓			
	Indicadores hidráulicos, refrigerantes, horómetro, corriente, aceite motor				✓	✓	✓				✓		✓	✓														✓	✓			
	Estado general de la carrocería				✓	✓	✓				✓		✓	✓														✓	✓			
	Limpia brisas				✓	✓	✓				✓		✓	✓														✓	✓			
	Escaleras y apoyos de acceso				✓	✓	✓				✓		✓	✓														✓	✓			
	Baterias y cables				✓	✓	✓				✓		✓	✓														✓	✓			
OTRO	Equipo de carretera				R	R	R				R		R	R														R	R			
	Liquidos (Liquidos de frenos, aceites, refrigerantes, liquidos de la dirección				✓	✓	✓				✓		✓	✓														✓	✓			
	Vigencia de documentos				✓	✓	✓				✓		✓	✓														✓	✓			
	Botiquín				R	R	R				R		R	R														R	R			
	Extintor				✓	✓	✓				✓		✓	✓														✓	✓			

NOTA	Llene en cada casilla el estado en el que se encuentre el item a evaluar BUENO (✔), MALO (X), NO APLICA (N/A)

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RG-UTSIT-2025-18
		Version 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULO	Fecha: Abril 2026

KILOMETRAJE							
SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4	
INICIAL	45638	INICIAL		INICIAL		INICIAL	
FINAL	46715	FINAL		FINAL		FINAL	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO			
FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN PREVENTIVA/CORRECTIVA	RESPONSABLE

REGISTRO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO						
FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	RELACIÓN DE REPUESTOS EMPLEADOS	LUGAR
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				
1/8/26		X	45539	Cambio de Aceite		Medellín

FIRMA DEL CONDUCTOR	
FIRMA PERSONA QUE VERIFICA	Jennifer Alexandra Diez

Aclaraciones del diligenciamiento de los formatos

Cada hoja es para registro de inspección mensual, por tanto es responsabilidad de cada uno de los conductores de motos y carros diligenciarla y preservarla para ser entregada una vez concluido el periodo. (El formato de motos favor imprimir en ambas caras para que ahorremos papel).

Deben diligenciarse en su totalidad los campos Nombre del conductor, placa del vehículo, Número de cédula y se debe indicar el mes y el año de la inspección que se está realizando. En el ítem de hallazgos diligenciar las no conformidades

La casilla día corresponde al periodo calendario en que se realiza la inspección

En cada casilla correspondiente a la inspección diaria se indica Bueno,regular o malo de acuerdo a lo evidenciado

En el ítem de hallazgos se debe describir toda falla o no conformidad encontrada en el vehículo, describir la acción preventiva o correctiva que se llevará a cabo, el responsable de ejecutar la corrección y la fecha en que se realizará

Todos los formatos deben concluir con la firma del conductor

En el registro de mantenimientos se debe diligenciar cada uno de los ítems descritos

Una vez terminado el mes al que corresponde el formato debe ser entregado a el personal encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo

En el caso de no tener posibilidad de imprimir los formatos por favor solicitarlos al personal de seguridad y salud en el Trabajo o líder de área

EL FORMATO ES DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RG-UTSIT-2025-18
		Version 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULO	Fecha: Abril 2026

Nombre del Conductor	Franklin Bobosa	Mes y año inspeccionado	
No de Cédula	16791906	Placa del Vehículo	MTN 502
NUMERO SOAT: 4308007378555000	FECHA VENCIMIENTO: 30 / 11 / 2026	NÚMERO TARJETA PROPIEDAD: 10045588 98	
NUMERO TECNOMECANICA: 18518 4769	FECHA VENCIMIENTO: 11 / 11 / 2026	FECHA VENCIMIENTO LICENCIA CONDUCCIÓN:	16 / 02 / 2034

	ITEM	DÍA																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTOR	Estado de Motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
ELECTRICO	Encendido y apagado del equipo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
	Luces delanteras y traseras	R	R	R	R	R	R	R			R	R	R	R	R	R	R		R		R	R	R		R	R	R	R	R			
	Stops y direccionales	R	R	R	R	R	R	R			R	R	R	R	R	R	R		R		R	R	R		R	R	R	R	R			
	Pito y alarma de reversa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
FRENOS	Actuación de las bombas de freno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
	Operación de freno de parqueo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
L/P	Estado de Latonería y Pintura	R	R	R	R	R	R	R			R	R	R	R	R	R	R		R		R	R	R		R	R	R	R	R			
TREN DE FUERZA	Muelles delanteros y traseros	R	R	R	R	R	R	R			R	R	R	R	R	R	R		R		R	R	R		R	R	R	R	R			
	Soportes y bujes	R	R	R	R	R	R	R			R	R	R	R	R	R	R		R		R	R	R		R	R	R	R	R			
	Transmisión-Caja (ruidos anormales)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
DIRECCIÓN, LLANTAS, RODAJE	Terminales de barra de dirección	R	R	R	R	R	R	R			R	R	R	R	R	R	R		R		R	R	R		R	R	R	R	R			
	Estado de llantas (huella, deformaciones, cortes)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
	Pasadores de llantas	R	R	R	R	R	R	R			R	R	R	R	R	R	R		R		R	R	R		R	R	R	R	R			
CABINA	Vidrios completos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
	Retrovisor central	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
	Retrovisores laterales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
	Cinturon de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
	Indicadores hidráulicos, refrigerantes, horómetro, corriente, aceite motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
	Estado general de la carrocería	R	R	R	R	R	R	R			R	R	R	R	R	R	R		R		R	R	R		R	R	R	R	R			
	Limpia brisas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X		X	X	X	X	X			
	Baterias y cables	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
OTRO	Equipo de carretera	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
	Liquidos (Liquidos de frenos, aceites, refrigerantes, liquidos de la dirección	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
	Vigencia de documentos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
	Botiquín	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
	Extintor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			

NOTA	Llene en cada casilla el estado en el que se encuentre el item a evaluar BUENO (✔), MALO (X), NO APLICA (N/A)

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RG-UTSIT-2025-18
		Version 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULO	Fecha: Abril 2026

KILOMETRAJE							
SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4	
INICIAL		INICIAL		INICIAL		INICIAL	
FINAL		FINAL		FINAL		FINAL	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO			
FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN PREVENTIVA/CORRECTIVA	RESPONSABLE
01 08 2026	Tren delantero con ruidos puertas - rotulos -		
	Terminales - pronos - rodamiento conocerna en regla cit-de.		
	Luz stop - lamina y pintura. chapa vidrios electricos.		
	mantenimiento.		

REGISTRO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO						
FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	RELACIÓN DE REPUESTOS EMPLEADOS	LUGAR
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				

FIRMA DEL CONDUCTOR	
FIRMA PERSONA QUE VERIFICA	Jenifer Altamiranda Diaz

Aclaraciones del diligenciamiento de los formatos

Cada hoja es para registro de inspección mensual, por tanto es responsabilidad de cada uno de los conductores de motos y carros diligenciarla y preservarla para ser entregada una vez concluido el periodo. (El formato de motos favor imprimir en ambas caras para que ahorremos papel).

Deben diligenciarse en su totalidad los campos Nombre del conductor, placa del vehiculo, Número de cèdula y se debe indicar el mes y el año de la inspección que se está realizando.
En el item de hallazgos diligenciar las no conformidades

La casilla dia corresponde al periodo calendario en que se realiza la inspección

En cada casilla correspondiente a la inspección diaria se indica Bueno,regular o malo de acuerdo a lo evidenciado.

En el item de hallazgos se debe describir toda falla o no conformidad encontrada en el vehiculo, describir la acción preventiva o correctiva que se llevará a cabo, el responsable de ejecutar la corrección y la fecha en que se realizará

Todos los formatos deben concluir con la firma del conductor.

En el registro de mantenimientos se debe diligenciar cada uno de los items descritos

Una vez terminado el mes al que corresponde el formato debe ser entregado a el personal encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo

En el caso de no tener posibilidad de imprimir los formatos por favor solicitarlos al personal de seguridad y salud en el Trabajo o lider de área

EL FORMATO ES DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RG-UTSIT-2025-18
		Version 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULO	Fecha: Abril 2026

Nombre del Conductor	Brayan Palacio	Mes y año inspeccionado	Agosto - 2026
No de Cédula	1096247535	Placa del Vehículo	VDT008
NUMERO SOAT: 4839853100	FECHA VENCIMIENTO: 23/12/2026	NÚMERO TARJETA PROPIEDAD:	
NUMERO TECNOMECANICA:	FECHA VENCIMIENTO: ____/____/____	FECHA VENCIMIENTO LICENCIA CONDUCCIÓN:	____/____/____

	ITEM	DÍA																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTOR	Estado de Motor			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
ELECTRICO	Encendido y apagado del equipo			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
	Luces delanteras y traseras			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
	Stops y direccionales			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
	Pito y alarma de reversa			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
FRENOS	Actuación de las bombas de freno			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
	Operación de freno de parqueo			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
L.P	Estado de Latonería y Pintura			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
TREN DE FUERZA	Muelles delanteros y traseros			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
	Soportes y bujes			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
	Transmisión-Caja (ruidos anormales)			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
DIRECCIÓN, LLANTAS, RODAJE	Terminales de barra de dirección			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
	Estado de llantas (huella, deformaciones, cortes)			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
	Pasadores de llantas			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
CABINA	Vidrios completos			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
	Retrovisor central			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
	Retrovisores laterales			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
	Cinturon de seguridad			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
	Indicadores hidráulicos, refrigerantes, horómetro, corriente, aceite motor			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
	Estado general de la carrocería			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
	Limpia brisas			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
	Escaleras y apoyos de acceso			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
	Baterias y cables			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
OTRO	Equipo de carretera			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
	Liquidos (Liquidos de frenos, aceites, refrigerantes, liquidos de la dirección			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
	Vigencia de documentos			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
	Botiquín			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
	Extintor			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			

NOTA	Llene en cada casilla el estado en el que se encuentre el item a evaluar BUENO (✔), MALO (X), NO APLICA (N/A)

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RG-UTSIT-2025-18
		Version 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULO	Fecha: Abril 2026

KILOMETRAJE

SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4	
INICIAL	3 agosto	INICIAL	10 agosto	INICIAL	18 agosto	INICIAL	24 agosto
FINAL	6 agosto	FINAL	14 agosto	FINAL	21 agosto	FINAL	28 agosto

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN PREVENTIVA/CORRECTIVA	RESPONSABLE

REGISTRO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO

FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	RELACIÓN DE REPUESTOS EMPLEADOS	LUGAR
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				

FIRMA DEL CONDUCTOR	Braian Palacio
FIRMA PERSONA QUE VERIFICA	Jennifer Altamiranda Diez

Aclaraciones del diligenciamiento de los formatos

Cada hoja es para registro de inspección mensual, por tanto es responsabilidad de cada uno de los conductores de motos y carros diligenciarla y preservarla para ser entregada una vez concluido el periodo. (El formato de motos favor imprimir en ambas caras para que ahorremos papel)

Deben diligenciarse en su totalidad los campos Nombre del conductor, placa del vehículo, Número de cédula y se debe indicar el mes y el año de la inspección que se está realizando.
En el item de hallazgos diligenciar las no conformidades

La casilla día corresponde al periodo calendario en que se realiza la inspección

En cada casilla correspondiente a la inspección diaria se indica Bueno,regular o malo de acuerdo a lo evidenciado

En el item de hallazgos se debe describir toda falla o no conformidad encontrada en el vehiculo, describir la acción preventiva o correctiva que se llevará a cabo, el responsable de ejecutar la corrección y la fecha en que se realizara

Todos los formatos deben concluir con la firma del conductor

En el registro de mantenimientos se debe diligenciar cada uno de los items descritos

Una vez terminado el mes al que corresponde el formato debe ser entregado a el personal encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo

En el caso de no tener posibilidad de imprimir los formatos por favor solicitarlos al personal de seguridad y salud en el Trabajo o lider de área

EL FORMATO ES DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO.

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RG-UTSIT-2025-18
		Version 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULO	Fecha: Abril 2026

Nombre del Conductor	Kleiber torres	Mes y año inspeccionado	Agosto / 2024
No de Cédula	1236447409	Placa del Vehículo	ESR 528
NUMERO SOAT: 9377862	FECHA VENCIMIENTO: 28/10/2024	NÚMERO TARJETA PROPIEDAD:	10026398259
NUMERO TECNOMECANICA: 184870108	FECHA VENCIMIENTO: 25/10/2026	FECHA VENCIMIENTO LICENCIA CONDUCCIÓN:	10/08/2029

	ITEM	DÍA																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTOR	Estado de Motor																									V	V	V	V			
ELECTRICO	Encendido y apagado del equipo																									V	V	V	V			
	Luces delanteras y traseras																									V	V	V	V			
	Stops y direccionales																									V	V	V	V			
	Pito y alarma de reversa																									X	X	X	X			
FRENOS	Actuación de las bombas de freno																									V	V	V	V			
	Operación de freno de parqueo																									V	V	V	V			
L.P	Estado de Latonería y Pintura																									V	V	V	V			
TREN DE FUERZA	Muelles delanteros y traseros																									V	V	V	V			
	Soportes y bujes																									V	V	V	V			
	Transmisión-Caja (ruidos anormales)																									V	V	V	V			
DIRECCIÓN, LLANTAS, RODAJE	Terminales de barra de dirección																									V	V	V	V			
	Estado de llantas (huella, deformaciones, cortes)																									V	V	V	V			
	Pasadores de llantas																									V	V	V	V			
CABINA	Vidrios completos																									V	V	V	V			
	Retrovisor central																									V	V	V	V			
	Retrovisores laterales																									V	V	V	V			
	Cinturon de seguridad																									V	V	V	V			
	Indicadores hidráulicos, refrigerantes, horómetro, corriente, aceite motor																									V	V	V	V			
	Estado general de la carrocería																									V	V	V	V			
	Limpia brisas																									V	V	V	V			
	Escaleras y apoyos de acceso																									V	V	V	V			
	Baterias y cables																									V	V	V	V			
OTRO	Equipo de carretera																									V	V	V	V			
	Liquidos (Liquidos de frenos, aceites, refrigerantes, liquidos de la dirección																									V	V	V	V			
	Vigencia de documentos																									V	V	V	V			
	Botiquín																									V	V	V	V			
	Extintor																									V	V	V	V			

NOTA	Llene en cada casilla el estado en el que se encuentre el item a evaluar BUENO (✔), MALO (X), NO APLICA (N/A)

UNION TEMPORAL DIT MEDELLIN	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RG-UTSIT-2025-18
		Version 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULO	Fecha: Abril 2026

KILOMETRAJE							
SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4	
INICIAL	247020	INICIAL		INICIAL		INICIAL	
FINAL		FINAL		FINAL		FINAL	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO			
FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN PREVENTIVA/CORRECTIVA	RESPONSABLE

REGISTRO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO						
FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	RELACIÓN DE REPUESTOS EMPLEADOS	LUGAR
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				

FIRMA DEL CONDUCTOR	Kleiber

FIRMA PERSONA QUE VERIFICA Kleiber – Jaime Altamirano.

Aclaraciones del diligenciamiento de los formatos

Cada hoja es para registro de inspección mensual, por tanto es responsabilidad de cada uno de los conductores de motos y carros diligenciarla y preservarla para ser entregada una vez concluido el periodo. (El formato de motos favor imprimir en ambas caras para que ahorremos papel).

Deben diligenciarse en su totalidad los campos Nombre del conductor, placa del vehículo, Número de cédula y se debe indicar el mes y el año de la inspección que se está realizando. En el ítem de hallazgos diligenciar las no conformidades

La casilla día corresponde al periodo calendario en que se realiza la inspección

En cada casilla correspondiente a la inspección diaria se indica Bueno,regular o malo de acuerdo a lo evidenciado.

En el ítem de hallazgos se debe describir toda falla o no conformidad encontrada en el vehículo, describir la acción preventiva o correctiva que se llevará a cabo, el responsable de ejecutar la corrección y la fecha en que se realizará

Todos los formatos deben concluir con la firma del conductor.

En el registro de mantenimientos se debe diligenciar cada uno de los ítems descritos

Una vez terminado el mes al que corresponde el formato debe ser entregado a el personal encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo

En el caso de no tener posibilidad de imprimir los formatos por favor solicitarlos al personal de seguridad y salud en el Trabajo o líder de área

EL FORMATO ES DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO.

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RG-UTSIT-2025-18
		Version 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULO	Fecha: Abril 2026

Nombre del Conductor	Wiston Alexander	Mes y año inspeccionado	Agosto - 2026
No de Cédula	71 755 158	Placa del Vehículo	WHL 737
NUMERO SOAT:	FECHA VENCIMIENTO: 02/10/2027	NÚMERO TARJETA PROPIEDAD:	
NUMERO TECNOMECANICA:	FECHA VENCIMIENTO: 10/30/2026	FECHA VENCIMIENTO LICENCIA CONDUCCIÓN:	29/11/2027

	ITEM	DÍA																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTOR	Estado de Motor	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B				B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
ELECTRICO	Encendido y apagado del equipo	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Luces delanteras y traseras	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Stops y direccionales	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Pito y alarma de reversa	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		
FRENOS	Actuación de las bombas de freno	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Operación de freno de parqueo	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		
LP	Estado de Latonería y Pintura	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		
TREN DE FUERZA	Muelles delanteros y traseros	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Soportes y bujes	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Transmisión-Caja (ruidos anormales)	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		
DIRECCIÓN, LLANTAS, RODAJE	Terminales de barra de dirección	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Estado de llantas (huella, deformaciones, cortes)	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Pasadores de llantas	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		
CABINA	Vidrios completos	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Retrovisor central	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Retrovisores laterales	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Cinturon de seguridad	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Indicadores hidráulicos, refrigerantes, horómetro, corriente, aceite motor	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Estado general de la carrocería	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Limpia brisas	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Escaleras y apoyos de acceso	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Baterias y cables	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		
OTRO	Equipo de carretera	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Liquidos (Liquidos de frenos, aceites, refrigerantes, liquidos de la dirección	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Vigencia de documentos	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Botiquín	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		
	Extintor	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		

NOTA	Llene en cada casilla el estado en el que se encuentre el item a evaluar BUENO (✔), MALO (X), NO APLICA (N/A)

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RG-UTSIT-2025-18
		Version 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULO	Fecha: Abril 2026

KILOMETRAJE							
SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4	
INICIAL		INICIAL		INICIAL		INICIAL	
FINAL		FINAL		FINAL		FINAL	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO			
FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN PREVENTIVA/CORRECTIVA	RESPONSABLE

REGISTRO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO						
FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	RELACIÓN DE REPUESTOS EMPLEADOS	LUGAR
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				

FIRMA DEL CONDUCTOR	
FIRMA PERSONA QUE VERIFICA	Jenifer Altamiranda Pico

Aclaraciones del diligenciamiento de los formatos

Cada hoja es para registro de inspección mensual, por tanto es responsabilidad de cada uno de los conductores de motos y carros diligenciarla y preservarla para ser entregada una vez concluido el periodo. (El formato de motos favor imprimir en ambas caras para que ahorremos papel)

Deben diligenciarse en su totalidad los campos Nombre del conductor, placa del vehiculo, Numero de cédula y se debe indicar el mes y el año de la inspección que se está realizando
En el item de hallazgos diligenciar las no conformidades

La casilla dia corresponde al periodo calendario en que se realiza la inspección

En cada casilla correspondiente a la inspección diaria se indica Bueno,regular o malo de acuerdo a lo evidenciado

En el item de hallazgos se debe describir toda falla o no conformidad encontrada en el vehiculo, describir la acción preventiva o correctiva que se llevará a cabo, el responsable de ejecutar la corrección y la fecha en que se realizará

Todos los formatos deben concluir con la firma del conductor.

En el registro de mantenimientos se debe diligenciar cada uno de los items descritos

Una vez terminado el mes al que corresponde el formato debe ser entregado a el personal encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo

En el caso de no tener posibilidad de imprimir los formatos por favor solicitarlos al personal de seguridad y salud en el Trabajo o lider de área

EL FORMATO ES DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO.

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RG-UTSIT-2025-18
		Version 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULO	Fecha: Abril 2026

Nombre del Conductor	Gustavo Angel	Mes y año inspeccionado	Agosto - 2026
No de Cédula	71631142	Placa del Vehículo	LKO 061
NUMERO SOAT:	FECHA VENCIMIENTO: 24,04,27	NÚMERO TARJETA PROPIEDAD:	
NUMERO TECNOMECANICA:	FECHA VENCIMIENTO: 24,04,27	FECHA VENCIMIENTO LICENCIA CONDUCCIÓN:	07,09,27

ITEM		DÍA																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTOR	Estado de Motor			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
ELECTRICO	Encendido y apagado del equipo			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
	Luces delanteras y traseras			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
	Stops y direccionales			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
	Pito y alarma de reversa			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
FRENOS	Actuación de las bombas de freno			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
	Operación de freno de parqueo			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
LP	Estado de Latonería y Pintura			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
TREN DE FUERZA	Muelles delanteros y traseros			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
	Soportes y bujes			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
	Transmisión-Caja (ruidos anormales)			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				
DIRECCIÓN, LLANTAS, RODAJE	Terminales de barra de dirección			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				
	Estado de llantas (huella, deformaciones, cortes)			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
	Pasadores de llantas			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
CABINA	Vidrios completos			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
	Retrovisor central			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
	Retrovisores laterales			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
	Cinturon de seguridad			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
	Indicadores hidráulicos, refrigerantes, horómetro, corriente, aceite motor			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
	Estado general de la carrocería			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
	Limpia brisas			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
	Escaleras y apoyos de acceso			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
	Baterias y cables			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
OTRO	Equipo de carretera			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
	Liquidos (Liquidos de frenos, aceites, refrigerantes, liquidos de la dirección			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
	Vigencia de documentos			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
	Botiquin			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
	Extintor			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			

NOTA	Llene en cada casilla el estado en el que se encuentre el item a evaluar BUENO (✔), MALO (X), NO APLICA (N/A)

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RG-UTSIT-2025-18
		Version 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULO	Fecha: Abril 2026

KILOMETRAJE

SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4	
INICIAL	83584	INICIAL	83803	INICIAL	84086	INICIAL	84284
FINAL	83786	FINAL	84069	FINAL	84267	FINAL	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN PREVENTIVA/CORRECTIVA	RESPONSABLE

REGISTRO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO

FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		KILOMETRAJE	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	RELACIÓN DE REPUESTOS EMPLEADOS	LUGAR
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				

FIRMA DEL CONDUCTOR	Gustavo A.
FIRMA PERSONA QUE VERIFICA	Jenifer Altamiranda Diaz

Aclaraciones del diligenciamiento de los formatos

Cada hoja es para registro de inspección mensual, por tanto es responsabilidad de cada uno de los conductores de motos y carros diligenciarla y preservarla para ser entregada una vez concluido el periodo. (El formato de motos favor imprimir en ambas caras para que ahorremos papel)

Deben diligenciarse en su totalidad los campos Nombre del conductor, placa del vehículo. Número de cédula y se debe indicar el mes y el año de la inspección que se está realizando. En el ítem de hallazgos diligenciar las no conformidades

La casilla día corresponde al periodo calendario en que se realiza la inspección

En cada casilla correspondiente a la inspección diaria se indica Bueno,regular o malo de acuerdo a lo evidenciado

En el ítem de hallazgos se debe describir toda falla o no conformidad encontrada en el vehículo, describir la acción preventiva o correctiva que se llevará a cabo, el responsable de ejecutar la corrección y la fecha en que se realizará

Todos los formatos deben concluir con la firma del conductor.

En el registro de mantenimientos se debe diligenciar cada uno de los ítems descritos

Una vez terminado el mes al que corresponde el formato debe ser entregado a el personal encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo

En el caso de no tener posibilidad de imprimir los formatos por favor solicitarlos al personal de seguridad y salud en el Trabajo o líder de área

EL FORMATO ES DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO.

UNION TEMPORAL
SIT MEDELLIN

ANEXO 28

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO

MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN
DE LA RED SEMAFÓRICA DE MEDELLÍN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: RG-UTSIT-2025-09 Versión 1
	F-22 PREOPERACIONAL TALADRO	Fecha 11 sep 2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del operador-trabajador							
Fecha de inicio del Trabajo (dd/mm/aaaa):	01 08 2026	Hora de Inicio (a.m./p.m.):	07 am	Hora de Finalización (a.m./p.m.):	05 pm	Grupo #	
Fecha de final del Trabajo (dd/mm/aaaa):	31 08 2026					Descripción de la tarea a realizar:	
Equipo No.		Marca:					

II. INSPECCIÓN

Marque según corresponda: C: cumple NC: no cumple

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)			C											C	C	C		C		C	C							C			
Acoples adecuados para los accesorios			C											C	C	C		C		C	C							C			
Estado e instalación del mango			C											C	C	C		C		C	C							C			
Uso de EPP adecuados para la labor			C											C	C	C		C		C	C							C			
Estado general del taladro (fisura,ropturas,aseo,etc)			C											C	C	C		C		C	C							C			
Se utiliza accesorios apropiados			C											C	C	C		C		C	C							C			
Estado del interruptor de encendido y su seguro			C											C	C	C		C		C	C							C			
Estado de las brocas (insertación)			C											C	C	C		C		C	C							C			

NOTA: Esta lista se deberá diligenciar y mantener diariamente en el sitio de trabajo

YO COMO TRABAJADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Observaciones:

Firma diaria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Operador o trabajador: Jose Andrade																															
Lider de trabajo:																															

Creado por: Jenifer Altamiranda Diaz
Aprobado por: Lina Maria Giraldo Botero

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: RG-UTSIT-2025-09 Versión 1
UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN	F-22 PREOPERACIONAL TALADRO	Fecha 11 sep 2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del operador-trabajador	Edwin santos						
Fecha de inicio del Trabajo (dd/mm/aaaa):	03-08-2026	Hora de Inicio (a.m./p.m.):	7:00am	Hora de Finalización (a.m./p.m.):	5:00pm	Grupo #	1
Fecha de final del Trabajo (dd/mm/aaaa):	31-08-2026					Descripción de la tarea a realizar:	mantenimiento de la red sismo forica
Equipo No.		Marca:					

II. INSPECCIÓN

Marque según corresponda: C: cumple NC: no cumple

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)			C	C		C			C			C		C				C						C	C	C		C			
Acoples adecuados para los accesorios			C	C		C			C			C		C				C						C	C	C		C			
Estado e instalación del mango			C	C		C			C			C		C				C						C	C	C		C			
Uso de EPP adecuados para la labor			C	C		C			C			C		C				C						C	C	C		C			
Estado general del taladro (fisura,ropturas,aseo,etc)			C	C		C			C			C		C				C						C	C	C		C			
Se utiliza accesorios apropiados			C	C		C			C			C		C				C						C	C	C		C			
Estado del interruptor de encendido y su seguro			C	C		C			C			C		C				C						C	C	C		C			
Estado de las brocas (insertación)			C	C		C			C			C		C				C						C	C	C		C			

NOTA: Esta lista se deberá diligenciar y mantener diariamente en el sitio de trabajo

YO COMO TRABAJADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Observaciones:

Firma diaria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Operador o trabajador: Edwin santos			Edwin	Edwin		Edwin			Edwin			Edwin		Edwin				Edwin						Edwin	Edwin	Edwin		Edwin			
Lider de trabajo: Edwin santos			Edwin	Edwin		Edwin			Edwin			Edwin		Edwin				Edwin						Edwin	Edwin	Edwin		Edwin			

Creado por: Jenifer Altamiranda Diaz
Aprobado por: Lina Maria Giraldo Botero

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: RG-UTSIT-2025-09 Versión 1
	F-22 PREOPERACIONAL TALADRO	Fecha 11 sep 2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del operador-trabajador	Juan Ros						
Fecha de inicio del Trabajo (dd/mm/aaaa):	03/08/26	Hora de Inicio (a.m./p.m.):	7:00 am	Hora de Finalización (a.m./p.m.):	5:00 pm	Grupo #	
Fecha de final del Trabajo (dd/mm/aaaa):	31/08/26					Descripción de la tarea a realizar:	Mantenimiento
Equipo No.		Marca:					

II. INSPECCIÓN

Marque según corresponda: C: cumple NC: no cumple

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)			C	C	C	C																									
Acoples adecuados para los accesorios			C	C	C	C																									
Estado e instalación del mango			C	C	C	C																									
Uso de EPP adecuados para la labor			C	C	C	C																									
Estado general del taladro (fisura,ropturas,aseo,etc)			C	C	C	C																									
Se utiliza accesorios apropiados			C	C	C	C																									
Estado del interruptor de encendido y su seguro			C	C	C	C																									
Estado de las brocas (insertación)			C	C	C	C																									

NOTA: Esta lista se deberá diligenciar y mantener diariamente en el sitio de trabajo

YO COMO TRABAJADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Observaciones:

Firma diaria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Operador o trabajador: Juan Ros																															
Lider de trabajo: Juan Ros																															

Creado por: Jenifer Altamiranda Diaz
Aprobado por: Lina Maria Giraldo Botero

UNION TEMPORAL
SIT MEDELLIN

ANEXO 29

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA CAÍDAS

MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN
DE LA RED SEMAFÓRICA DE MEDELLÍN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

Código: RG-UTSIT-2025-13
Versión: 2
Fecha: 19 septiembre 2025

LUGAR: Medellin
RESPONSABLE DEL EQUIPO: Yeison Galeano
FECHA O PERIODO: 03-08-2028 - 06-08-26

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS

SERIAL: 08 —
LOTE: 4996 4 —
FECHA FABRICACION: Nov 2025
MARCA: Insafe

		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo.													
			Lunes		Martes		Miercoles		jueves		viernes		sábado		Domingo	
			B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA														
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	/						/							
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	/						/							
	1.3	GRIETAS	/						/							
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	/						/							
	1.5	DETERIORO GENERAL	/						/							
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS	/						/							
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS	/						/							
		PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.	/						/							
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL	/						/							
	1.9	PRESENCIA DE MOHO	/						/							
	1.10	OTROS	/						/							
	2	COSTURAS														
	2.1	CORTADURAS	/						/							
	2.2	DESHILACHAMIENTO	/						/							
	2.3	HILOS FALTANTES	/						/							
	2.4	QUEMADURAS	/						/							
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	/						/							
	2.6	OTROS	/						/							
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES														
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO	/						/							
	3.2	PICADURAS, GRIETAS	/						/							
	3.3	DETERIORO GENERAL	/						/							
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO	/						/							
	3.5	CORROSIÓN	/						/							
	3.6	OTROS	/						/							
ADAPTADOR DE ANCLAJE	SERIAL:		FECHA FABRICACIÓN:													
	LOTE:		MARCA:													
	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS														
	4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS														
	4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD														
	4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO														
	4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)														
	4.6	PIEZAS FALTANTES														
	4.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS														
		PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.														
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS														
	4.9	OTROS														
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	SERIAL:	FECHA FABRICACIÓN:	Lunes		Martes		Miercoles		jueves		viernes		sábado		Domingo	
	LOTE:	MARCA:	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R
	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS														
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS														
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD														
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO														
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)														
	5.6	PIEZAS FALTANTES														
	5.7	z														
		PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.														
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS														
	5.9	OTROS														
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	SERIAL:	FECHA FABRICACIÓN:	Lunes		Martes		Miercoles		jueves		viernes		sábado		Domingo	
	LOTE:	MARCA:	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R
	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	/						/							
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	/						/							
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	/						/							
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	/						/							
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	/						/							
	6.6	PIEZAS FALTANTES	/						/							
	6.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS	/						/							
		PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.														
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	/						/							
	6.9	OTROS	/						/							

	SERIAL:	FECHA FABRICACION:	Lunes		Martes		Miercoles		jueves		viernes		sábado		Domingo	
	LOTE:	MARCA:	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R
MOSQUETONES	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)														
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD														
	7.3	GRIETAS O PICADURAS														
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)														
	7.5	FRENO AUTOMATICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)														
	7.5	DETERIORO GENERAL														
	7.6	CORROSIÓN														
	7.7	PRESENCIA DE MOHO														
	7.8	OTROS														
CASCO, GAFAS, GUANTES	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO	/						/							
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO	/						/							
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO	/						/							
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS	/						/							
	8.5	ROTOS EN GUANTES	/						/		/					
	8.6	OTROS	/						/							

	SERIAL:	FECHA FABRICACION:	Lunes		Martes		Miercoles		jueves		viernes		sábado		Domingo	
	LOTE:	MARCA:	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R
LÍNEA DE VIDA	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)														
	9.2	PICADURAS, GRIETAS														
	9.3	PRESENTA DESGASTE														
	9.4	CORROSIÓN U OXIDACION														
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS														
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS														
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD														
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO														
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)														
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS														
	9.11	PUNTOS O AREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.														
	9.12	CORROSIÓN EN PARTES METALICAS														
	9.13	PRESENCIA DE MOHO														
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS														
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN														
	9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)														

Coordinador de alturas certificado	Nombre y cedula: Jennifer Altamirando Ovz. CC 1052982270	Firma:

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

Código:	RG-UTSIT-2025-13
Versión:	2
Fecha:	19 septiembre 2025

LUGAR:	Medellín
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Juan Ruiz
FECHA O PERIODO:	03/08/2026 - 06/08/26

CONDICION ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS

SERIAL:	10	**FECHA FABRICACION:**	Noviembre 2025
LOTE:	49169	**MARCA:**	Insafe

		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo.													
			Lunes		Martes		Miercoles		jueves		viernes		sábado		Domingo	
			B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA														
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	✓		✓		✓		✓							
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	✓		✓		✓		✓							
	1.3	GRIETAS	✓		✓		✓		✓							
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	✓		✓		✓		✓							
	1.5	DETERIORO GENERAL	✓		✓		✓		✓							
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS	✓		✓		✓		✓							
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS	✓		✓		✓		✓							
		PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.	✓		✓		✓		✓							
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL	✓		✓		✓		✓							
	1.9	PRESENCIA DE MOHO	✓		✓		✓		✓							
	1.10	OTROS														
	2	COSTURAS														
	2.1	CORTADURAS	✓		✓		✓		✓							
	2.2	DESHILACHAMIENTO	✓		✓		✓		✓							
	2.3	HILOS FALTANTES	✓		✓		✓		✓							
	2.4	QUEMADURAS	✓		✓		✓		✓							
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	✓		✓		✓		✓							
	2.6	OTROS														
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES			✓											
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO	✓		✓		✓		✓							
	3.2	PICADURAS, GRIETAS	✓		✓		✓		✓							
	3.3	DETERIORO GENERAL	✓		✓		✓		✓							
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO	✓		✓		✓		✓							
	3.5	CORROSIÓN	✓		✓											
	3.6	OTROS														
ADAPTADOR DE ANCLAJE	SERIAL:		FECHA FABRICACION:													
	LOTE:		MARCA:													
	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS														
	4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS														
	4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD														
	4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO														
	4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)														
	4.6	PIEZAS FALTANTES														
	4.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS														
		PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.														
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS														
	4.9	OTROS														
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	SERIAL:	FECHA FABRICACION:	Lunes		Martes		Miercoles		jueves		viernes		sábado		Domingo	
	LOTE:	MARCA:	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R
	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS														
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS														
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD														
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO														
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)														
	5.6	PIEZAS FALTANTES														
	5.7	z														
		PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.														
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS														
	5.9	OTROS														
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	SERIAL:	29 FECHA FABRICACION: Octubre 2025	Lunes		Martes		Miercoles		jueves		viernes		sábado		Domingo	
	LOTE:	2709 2601 MARCA: Almadan	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R
	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	✓		✓		✓		✓							
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	✓		✓		✓		✓							
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓							
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	✓		✓		✓		✓							
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	✓		✓		✓		✓							
	6.6	PIEZAS FALTANTES	✓		✓		✓		✓							
	6.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS	✓		✓		✓		✓							
		PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.														
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	✓		✓		✓		✓							
	6.9	OTROS														

	SERIAL:	FECHA FABRICACION:	Lunes		Martes		Miercoles		jueves		viernes		sábado		Domingo	
	LOTE:	MARCA:	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R
MOSQUETONES	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)														
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD														
	7.3	GRIETAS O PICADURAS														
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)														
	7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)														
	7.5	DETERIORO GENERAL														
	7.6	CORROSIÓN														
	7.7	PRESENCIA DE MOHO														
	7.8	OTROS														
CASCO, GAFAS, GUANTES	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO	/		/		/		/							
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO	/		/		/		/							
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO	/		/		/		/							
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS	/		/		/		/							
	8.5	ROTOS EN GUANTES	/		/		/		/							
	8.6	OTROS														

	SERIAL:	FECHA FABRICACION:	Lunes		Martes		Miercoles		jueves		viernes		sábado		Domingo	
	LOTE:	MARCA:	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R
LÍNEA DE VIDA	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)														
	9.2	PICADURAS, GRIETAS														
	9.3	PRESENTA DESGASTE														
	9.4	CORROSIÓN U OXIDACIÓN														
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS														
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS														
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD														
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO														
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)														
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS														
	9.11	PUNTOS O AREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.														
	9.12	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS														
	9.13	PRESENCIA DE MOHO														
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUIMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS														
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN														
	9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)														

Coordinador de alturas certificado	Nombre y cedula: Simeon Fernando Vivas Mendoza 1065913019	Firma: Fernando Vivas

UNION TEMPORAL SST MEDELLIN	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: RG-UTSIT-2025-13
		Versión: 2
	FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 19 septiembre 2025

LUGAR:	Medellin
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Christian D. Bozo
FECHA O PERIODO:	3/8/26 8/8/26

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS

SERIAL:	10	**FECHA FABRICACION:**	NOV – 2025
LOTE:	49164	**MARCA:**	insafe

		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo.													
			Lunes		Martes		Miercoles		jueves		viernes		sábado		Domingo	
			B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA														
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS			✓				✓							
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS			✓				✓							
	1.3	GRIETAS			✓				✓							
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO			✓				✓							
	1.5	DETERIORO GENERAL			✓				✓							
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS			✓				✓							
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS			✓				✓							
		PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.			✓				✓							
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL			✓				✓							
	1.9	PRESENCIA DE MOHO			✓				✓							
	1.10	OTROS			✓				✓							
	2	COSTURAS														
	2.1	CORTADURAS			✓				✓							
	2.2	DESHILACHAMIENTO			✓				✓							
	2.3	HILOS FALTANTES			✓				✓							
	2.4	QUEMADURAS			✓				✓							
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS			✓				✓							
	2.6	OTROS			✓				✓							
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES														
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO			✓				✓							
	3.2	PICADURAS, GRIETAS			✓				✓							
	3.3	DETERIORO GENERAL			✓				✓							
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO			✓				✓							
	3.5	CORROSIÓN			✓				✓							
	3.6	OTROS			✓				✓							
ADAPTADOR DE ANCLAJE	SERIAL:		FECHA FABRICACIÓN:													
	LOTE:		MARCA:													
	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS														
	4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS														
	4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD														
	4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO														
	4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)														
	4.6	PIEZAS FALTANTES														
	4.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS														
		PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.														
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS														
	4.9	OTROS														
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	SERIAL:	FECHA FABRICACIÓN:	Lunes		Martes		Miercoles		jueves		viernes		sábado		Domingo	
	LOTE:	MARCA:	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R
	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS														
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS														
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD														
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO														
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)														
	5.6	PIEZAS FALTANTES														
	5.7	z														
		PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.														
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS														
	5.9	OTROS														
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	SERIAL:	29 FECHA FABRICACIÓN:	Lunes		Martes		Miercoles		jueves		viernes		sábado		Domingo	
	LOTE:	7704 7201 MARCA: Armadura	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R
	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS			✓				✓							
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS			✓				✓							
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD			✓				✓							
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO			✓				✓							
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)			✓				✓							
	6.6	PIEZAS FALTANTES			✓				✓							
	6.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS			✓				✓							
		PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.			✓				✓							
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS			✓				✓							
	6.9	OTROS			✓				✓							

	SERIAL:	FECHA FABRICACION:	Lunes		Martes		Miercoles		jueves		viernes		sábado		Domingo	
	LOTE:	MARCA:	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R
MOSQUETONES	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)							✓							
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD							/							
	7.3	GRIETAS O PICADURAS							/							
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)							/							
	7.5	FRENO AUTOMATICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)							/							
	7.5	DETERIORO GENERAL							/							
	7.6	CORROSION							/							
	7.7	PRESENCIA DE MOHO							/							
	7.8	OTROS														
CASCO, GAFAS, GUANTES	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO			/				/							
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO			/				/							
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO			/				/							
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS			/				/							
	8.5	ROTOS EN GUANTES			/				/							
	8.6	OTROS			/				/							

	SERIAL:	FECHA FABRICACION:	Lunes		Martes		Miercoles		jueves		viernes		sábado		Domingo	
	LOTE:	MARCA:	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R
LÍNEA DE VIDA	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)							✓							
	9.2	PICADURAS, GRIETAS							/							
	9.3	PRESENTA DESGASTE							/							
	9.4	CORROSION U OXIDACION							/							
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS							/							
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS							/							
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD							/							
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO							/							
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)							/							
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS							/							
	9.11	PUNTOS O AREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.							/							
	9.12	CORROSION EN PARTES METÁLICAS							/							
	9.13	PRESENCIA DE MOHO							/							
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS							/							
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN							/							
	9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)							/							

Coordinador de alturas certificado	Nombre y cedula: Jenifer Altamiranda Diaz CC 1052482270	Firma:

UNION TEMPORAL SST MEDELLIN

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

Código: RG-UTSIT-2025-13
Versión: 2
Fecha: 19 septiembre 2025

LUGAR:	Medellin
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Frankelin Barbosa
FECHA O PERIODO:	01 08 2026 — 09-08-2026

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS

SERIAL:	**FECHA FABRICACION:**
LOTE:	**MARCA:**

		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo.													
			Lunes		Martes		Miercoles		jueves		viernes		sábado		Domingo	
			B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA														
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	✓		✓		✓		✓		✓					
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	✓		✓		✓		✓		–					
	1.3	GRIETAS	✓		✓		✓		✓		✓					
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	✓		✓		✓		✓		✓					
	1.5	DETERIORO GENERAL	✓		✓		✓		✓		✓					
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS	✓		✓		✓		✓		✓					
		PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.	✓		✓		✓		–		✓					
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL	✓		✓		✓		✓		✓					
	1.9	PRESENCIA DE MOHO	✓		✓		✓		✓		✓					
	1.10	OTROS														
	2	COSTURAS														
	2.1	CORTADURAS	✓		✓		✓		✓		✓					
	2.2	DESHILACHAMIENTO	✓		✓		✓		✓		✓					
	2.3	HILOS FALTANTES	✓		✓		✓		✓		✓					
	2.4	QUEMADURAS	✓		✓		✓		✓		✓					
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	2.6	OTROS	✓		✓		✓		✓		✓					
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES														
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO	✓		✓		✓		✓		✓					
	3.2	PICADURAS, GRIETAS	✓		✓		✓		✓		✓					
	3.3	DETERIORO GENERAL	✓		✓		✓		✓		✓					
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO	✓		✓		✓		✓		✓					
	3.5	CORROSIÓN	✓		✓		✓		✓		✓					
	3.6	OTROS	✓		✓		✓		✓		✓					
ADAPTADOR DE ANCLAJE	SERIAL:		FECHA FABRICACION:													
	LOTE:		MARCA:													
	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS														
	4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS														
	4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD														
	4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO														
	4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)														
	4.6	PIEZAS FALTANTES														
	4.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS														
		PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.														
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS														
	4.9	OTROS														
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	SERIAL:	FECHA FABRICACION:	Lunes		Martes		Miercoles		jueves		viernes		sábado		Domingo	
	LOTE:	MARCA:	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R
	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS														
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS														
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD														
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO														
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)														
	5.6	PIEZAS FALTANTES														
	5.7	z														
		PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.														
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS														
	5.9	OTROS														
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	SERIAL:	FECHA FABRICACION:	Lunes		Martes		Miercoles		jueves		viernes		sábado		Domingo	
	LOTE:	MARCA:	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R
	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	✓		✓		✓		✓		✓					
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	✓		✓		✓		✓		✓					
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓					
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	✓		✓		✓		✓		✓					
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓					
	6.6	PIEZAS FALTANTES	✓		✓		✓		✓		✓					
	6.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS	✓		✓		✓		✓		✓					
		PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.														
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	✓		✓		✓		✓		✓					
	6.9	OTROS														

	SERIAL:	FECHA FABRICACION:	Lunes		Martes		Miercoles		jueves		viernes		sábado		Domingo	
	LOTE:	MARCA:	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R
MOSQUETONES	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)														
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD														
	7.3	GRIETAS O PICADURAS														
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)														
	7.5	FRENO AUTOMATICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)														
	7.5	DETERIORO GENERAL														
	7.6	CORROSIÓN														
	7.7	PRESENCIA DE MOHO														
	7.8	OTROS														
CASCO, GAFAS, GUANTES	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO	✓		✓		✓		✓		✓					
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO	✓		✓		✓		✓		✓					
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO	✓		✓		✓		✓		✓					
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓					
	8.5	ROTOS EN GUANTES	✓		✓		✓		✓		✓					
	8.6	OTROS	✓		✓		✓		✓		✓					

	SERIAL:	FECHA FABRICACION:	Lunes		Martes		Miercoles		jueves		viernes		sábado		Domingo	
	LOTE:	MARCA:	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R
LÍNEA DE VIDA	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)														
	9.2	PICADURAS, GRIETAS														
	9.3	PRESENTA DESGASTE														
	9.4	CORROSIÓN U OXIDACIÓN														
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS														
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS														
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD														
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO														
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)														
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS														
	9.11	PUNTOS O AREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.														
	9.12	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS														
	9.13	PRESENCIA DE MOHO														
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUIMICAS EN PARTES METALICAS Y EN LAS REATAS														
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN														
	9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)														

Coordinador de alturas certificado	Nombre y cedula: Franklin Balsa P.	Firma:

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: RG-UTSIT-2025-13
		Versión: 2
	FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 19 septiembre 2025

LUGAR:	Vía Publica
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	William Alberto Quevedo Bustos
FECHA O PERIODO:	09 - Agosto - 2026

CONDICION ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS

SERIAL:	PT 2023. 57400004.	**FECHA FABRICACION:**	
LOTE:	Reparacion A 00 A D.	**MARCA:**	msafe

			EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo.													
				Lunes		Martes		Miercoles		jueves		viernes		sábado		Domingo	
				B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R
ARNÉS	1		TEJIDO O CORREA														
	1.1		FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS														
	1.2		CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS														
	1.3		GRIETAS														
	1.4		ESTIRAMIENTO EXCESIVO														
	1.5		DETERIORO GENERAL														
	1.6		CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS														
	1.7		QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS														
			PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.														
	1.8		DECOLORACIÓN DEL MATERIAL														
	1.9		PRESENCIA DE MOHO														
	1.10		OTROS														
	2		COSTURAS														
	2.1		CORTADURAS														
	2.2		DESHILACHAMIENTO														
	2.3		HILOS FALTANTES														
	2.4		QUEMADURAS														
	2.5		EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUIMICOS														
	2.6		OTROS														
	3		ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES														
	3.1		CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO														
	3.2		PICADURAS, GRIETAS														
	3.3		DETERIORO GENERAL														
	3.4		DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO														
	3.5		CORROSIÓN														
	3.6		OTROS														
ADAPTADOR DE ANCLAJE	SERIAL:			FECHA FABRICACION:													
	LOTE:			MARCA:													
	4.1		FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS														
	4.2		CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS														
	4.3		AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD														
	4.4		ESTIRAMIENTO EXCESIVO														
	4.5		DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)														
	4.6		PIEZAS FALTANTES														
	4.7		QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS														
			PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.														
	4.8		PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS														
	4.9		OTROS														
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	SERIAL:		FECHA FABRICACION:	Lunes		Martes		Miercoles		jueves		viernes		sábado		Domingo	
	LOTE:		MARCA:	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R
	5.1		FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS														
	5.2		CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS														
	5.3		AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD														
	5.4		ESTIRAMIENTO EXCESIVO														
	5.5		DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)														
	5.6		PIEZAS FALTANTES														
	5.7		z														
			PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.														
	5.8		PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSION EN PARTES METALICAS														
	5.9		OTROS														
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	SERIAL:		FECHA FABRICACION:	Lunes		Martes		Miercoles		jueves		viernes		sábado		Domingo	
	LOTE:		MARCA:	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R
	6.1		FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS														
	6.2		CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS														
	6.3		AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD														
	6.4		ESTIRAMIENTO EXCESIVO														
	6.5		DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)														
	6.6		PIEZAS FALTANTES														
	6.7		QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS														
			PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.														
	6.8		PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS														
	6.9		OTROS														

			Lunes		Martes		Miercoles		jueves		viernes		sábado		Domingo	
	SERIAL:	FECHA FABRICACION:														
	LOTE:	MARCA:	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R
MOSQUETONES	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)													✓	✓
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD													✓	✓
	7.3	GRIETAS O PICADURAS													✓	✓
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)													✓	✓
	7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)													✓	✓
	7.5	DETERIORO GENERAL													✓	✓
	7.6	CORROSIÓN													✓	✓
	7.7	PRESENCIA DE MOHO													✓	✓
	7.8	OTROS													✓	✓
CASCO, GAFAS, GUANTES	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO													✓	✓
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO													✓	✓
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO													✓	✓
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS													✓	✓
	8.5	ROTOS EN GUANTES													✓	✓
	8.6	OTROS													✓	✓

			Lunes		Martes		Miercoles		jueves		viernes		sábado		Domingo	
	SERIAL:	FECHA FABRICACION:														
	LOTE:	MARCA:	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R
LÍNEA DE VIDA	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)														
	9.2	PICADURAS, GRIETAS														
	9.3	PRESENTA DESGASTE														
	9.4	CORROSIÓN U OXIDACION														
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS														
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS														
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD														
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO														
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)														
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS														
	9.11	PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.														
	9.12	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS														
	9.13	PRESENCIA DE MOHO														
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METALICAS Y EN LAS REATAS														
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN														
	9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)														

Coordinador de alturas certificado	Nombre y cedula: Angelo Daniel Gomez Mejia	Firma:



ANEXO 30

PERMISOS Y ATS

MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN
DE LA RED SEMAFÓRICA DE MEDELLÍN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: RG-UTSIT-2025-06
Versión 2

F-03 PERMISO DE ALTO RIESGO

Fecha: 17 julio 2026

Lugar de trabajo:	Medellin	Ciudad:	Medellin	Hora inicio:	7:00 am
Fecha de inicio:	18/08/2026	Fecha de cierre:	21/08/2026	Hora final:	5:00pm

Descripción detallada del trabajo: Mantenimiento Red Semaforica

ELC: Eléctrico - CAL: Caliente - ALT: Altura

1. PERSONAL AUTORIZADO PARA TRABAJAR

Nombres y Apellidos	Número de identificación	Cargo	Trabajos en			Experiencia en el Trabajo (Si/No)	Firma (Comprendo los peligros y riesgos asociados al trabajo)
			ELC	CAL	ALT		
Juan José Ruiz Silva	1000539976	Técnico	/	/	/	Si	
Jhonier Fernando Vivas	1065913019	Técnico	/	/	/	Si	
Luis Lozano	94852201	Conductor	X	/	X	Si	
Carlos Mario Gonzalez	1049894058	Aux	X	X	X	Si	

2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- [x] Casco de seguridad
- [x] Lentes de seguridad
- [x] Botas de seguridad
- [x] Botas dieléctricas
- [x] Guantes de soldadura
- [x] Guantes de maniobra
- [x] Barbiquejo
- [x] Arnés de cuerpo completo
- [ ] Otros

- [x] Tapaoidos / orejeras
- [ ] Careta de esmerilar
- [x] Careta de soldar
- [x] Mangas de soldar
- [x] Delantal de soldar
- [ ] Escarpines / Polainas
- [ ] Mascarilla antipolvo
- [ ] Mascarilla vapores orgánicos

HERRAMIENTAS, EQUIPOS

- [ ] Escaleras
- [ ] Andamios
- [ ] Polipasto
- [ ] Amoladora Esmeriladora
- [ ] Sierra circular
- [ ] Carretilla
- [ ] Máq. soldar eléctrica
- [ ] Máq. de oxicorte
- [ ] Otros

- [x] Pala / pico
- [x] Martillo / comba
- [ ] Puntas / cinceles
- [ ] Taladro
- [x] Llaves / desarmadores
- [x] Extensiones eléctricas
- [x] Alicates / tenazas
- [ ] Multitéster

PROTECCIÓN COLECTIVA

- [ ] Barandas
- [ ] Conos / cachacos
- [x] Señalización / letreros
- [ ] Cintas de amarilla/malla de seguridad
- [ ] Mampara
- [ ] Cubiertas temporales
- [ ] Líneas de vida
- [ ] Luminarias / lámparas o reflectores
- [ ] Otros

3. VERIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN Y ACCIONES PREVENTIVAS

Acciones preventivas (SI, NO, N/A)	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Los trabajadores se encuentran bien de salud (Aptitud médica)?	Si	Si	Si	Si	Si		
Los trabajadores cuentan con la certificación actualizada de capacitación y/o competencia laboral para trabajo en alturas, trabajo en caliente y electricos?	Si	Si	Si	Si	Si		
Se les explico a los trabajadores las actividades a realizar?	Si	Si	Si	Si	Si		
Se realiza previo analisis de trabajo seguro y se socializa al personal?	Si	Si	Si	Si	Si		
Los trabajadores saben a quien llamar en caso de emergencia?	Si	Si	Si	Si	Si		
Limpiar y organizar el área de trabajo?	Si	Si	Si	Si	Si		
Cuenta con los elementos de protección personal necesarios para realizar la actividad?	Si	Si	Si	Si	Si		
Delimitar, señalizar y aislar el área	Si	Si	Si	Si	Si		
Herramientas y/o equipos se encuentran en buen estado y asegurados?	Si	Si	Si	Si	Si		

Observaciones:

4. VERIFICACIÓN DE MEDIDAS PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS

Lista de verificación (SI, NO, N/A)	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Se retiró o desalojó el área o aisló todo el material combustible	Si	Si	Si	Si	Si		
Se corto la energía (Desenergizado del equipo) antes de empezar el trabajo	Si	Si	Si	Si	Si		
Se ha hecho la respectiva puesta a tierra	Si	Si	Si	Si	Si		
Hay cables aéreos cercanos al área de trabajo que se está realizando	Si	NO	NO	NO	NO		
Se verificó que la capacidad del voltaje del equipo es suficiente para el voltaje suministrado	Si	Si	Si	Si	Si		
Los riesgos identificados se encuentran controlados antes de iniciar la labor?	Si	Si	Si	Si	Si		
Las tomas eléctricas cuentan con tomas industriales	Si	N/A	N/A	N/A	N/A		
Los tableros y/o equipos están protegidos de alcance de agua	Si	N/A	N/A	N/A	N/A		
Se cuenta con el extintor adecuado, cerca al punto de trabajo	Si	Si	Si	Si	Si		
El personal que realiza trabajos electricos es calificado, tecnico electricista con certificación CONTE, CONALTEL O COPNIA?	Si	Si	Si	Si	Si		
Los colaboradores que realizan la actividad no portan accesorios o elementos conductores (anillos, relojes, cadenas, otros ?	Si	Si	Si	Si	Si		
Se está utilizando EPP adecuados para la tarea	Si	Si	Si	Si	Si		
Las herramientas y/o equipos a utilizar son dielectricos?	Si	Si	Si	Si	Si		
El personal es apto e idoneo y calificado para realizar trabajos electricos?	Si	Si	Si	Si	Si		

Tipo de tensión

- Muy baja tensión menor 25 v [ ]
- Baja tensión <25v y >1000v [x]

Lider electricista que autoriza la labor

Nombres y Apellidos	Cedula	Firma
Juan José Ruiz	1000539976	

Observaciones:

5. VERIFICACIÓN DE MEDIDAS PARA TRABAJOS EN CALIENTE

Tipo de actividad a realizar, marque con una X:	Corte,pulido de metal:	✓	Soldadura	✓	Perforacion con taladro	Otros:

Lista de verificación (SI, NO, N/A)	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Los portaelectrodos cuentan con soporte de manutención aislante	Si	Si	Si	Si	Si		
Se retiró, desalojó el área o aisló todo el material combustible	Si	Si	Si	Si	Si		
Red eléctrica con toma de tierra	Si	Si	Si	Si	Si		
Los accesorios (cables, uniones, etc) están en buenas condiciones	Si	Si	Si	Si	Si		
El observador inspeccionó el área de trabajo 30 minutos despues de la actividad en caliente	Si	Si	Si	Si	Si		
El personal que realiza trabajo en caliente es competente y está autorizado?	Si	Si	Si	Si	Si		
El personal cuentya con los EPP adecuados para la tarea?	Si	Si	Si	Si	Si		
Los equipos de corte, soldadura y otros equipos utilizados se encuentran completos, sin escapes, con sus	Si	Si	Si	Si	Si		
Se cuenta con extintor cerca al lugar de trabajo?	Si	Si	Si	Si	Si		
Se retiró o desalojó el área o aisló todo el material combustible	Si	Si	Si	Si	Si		

Observaciones:

6. VERIFICACIÓN DE MEDIDAS PARA TRABAJOS EN ALTURA

Lista de verificación (SI, NO, N/A)	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Los riesgos identificados se encuentran controlados antes de iniciar labores?	Si	Si	Si	Si	Si		
Los trabajadores se encuentran bien de salud?	Si	Si	Si	Si	Si		
Han consumido algún tipo de medicamento o tratamiento médico que le produzca sueño, mareo, otros?	Si	Si	Si	NO	NO		
El lugar donde se realizará la tarea tiene instalada la linea de vida o se cuenta con un punto de anclaje?	Si	Si	Si	N/A	N/A		
Las condiciones climáticas son favorables para realizar la labor?	Si	Si	Si	Si	Si		
Los sistemas de acceso se encuentran en buen estado?	Si	Si	Si	Si	Si		
Se cuentan con los equipos de protección personal adecuados y certificados para la tarea?	Si	Si	Si	Si	Si		
Se mantiene una distancia segura entre el trabajo y lineas o equipos electricos energizados minimo 90 centimetros?	Si	Si	Si	Si	Si		
El personal tiene certificación vigente de la seguridad social?	Si	Si	Si	Si	Si		
El sistema de anclaje se encuentra en buen estado?	Si	Si	Si	Si	Si		
El trabajo en alturas mínimo lo van a realizar dos trabajadores o ejecutores.	Si	Si	Si	Si	Si		
Se cuenta con el plan de rescate claro y entendible?	Si	Si	Si	Si	Si		
Cuenta con un medio de comunicación disponible?	Si	Si	Si	Si	Si		
Se ha instalado señalización preventiva que delimite el área de trabajo (cinta, conos, señales tubulares o poli sombras).	Si	Si	Si	Si	Si		

Una vez inspeccionada el area de trabajo, comprobado el cumpliento de los requisitos indicados, y verificado los elementos d protección personal necesarios para la ejecución del trabajo, certifico que se ha efectuado correctamente los trabajos preparatorios indicados y que se puede realizar el trabajo en aturas.

Observaciones generales:

Verificaciones

Altura aproximada a trabajar:	Menciona el tipo de acceso (Escalera tipo tijera o de extensión, carro canasta, otros):
4 MTS	Escalera Tipo Tijera

Estado del sistema de acceso (Bueno,regular, malo): Bueno

Sistema de restricción, posicionamiento o detención de caidas a utilizar:

arnés de cuerpo completo:	✓	Eslinga de posicionamiento:	✓	Freno de seguridad:		Sistema de ascenso y descenso:	
Eslinga con absorbedor de impact:		Tie off o anclaje:		Linea de vida:		Otros: _____	

Nombre completo y cedula del AYUDANTE DE SEGURIDAD:	Activo en seguridad social:	Firma:
Juan Roa	SI ✓ NO	

Coordinador de trabajo en alturas:

Nombre y Apellido	Cedula	Firma
SIMEON FERNANDO VIVAS MANDON	1065913019	Fernando Vivas
—	—	—

CALCULO DE DISTANCIA DE CAIDA LIBRE

VARIABLE	Ingrese valores
A: Altura del trabajador	
B: Longitud de la Eslinga	
C: Absorvedor de choque	1,06
E: Factor de seguridad	0,9
D: Distancia de caída	
F=Distancia de Caída libre	



¿La distancia anclaje-obstáculo es mayor o igual a la distancia libre de caída?		Sí		No		Si la respuesta es NO, la configuración del sistema utilizado no es segura. Evalué el uso de un sistema de restricción.

7.PLAN DE EMERGENCIAS.

Nombre y firma de quien activa el plan de emergencia: Juan Ruiz

8.FIRMA DEL EMISOR QUE AUTORIZA EL INICIO Y CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

Nombres y apellidos:	Número de identificación	Firma - Inicio	Firma - Cierre
Carlos Alberto Diaz	1017144440	Carlos D.	Carlos D.

9. AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

PERSONAL AUTORIZADO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Firma trabajador							
Firma trabajador	Fernando Vivas	Fernando Vivas	Fernando Vivas	Fernando Vivas	Fernando Vivas		
Firma trabajador	Luis L			Carlos G.			
Firma trabajador							
Firma trabajador							
Firma coordinador de alturas	Fernando Vivas	Fernando Vivas	Fernando Vivas	Fernando Vivas	Fernando Vivas		
Firma lider de trabajo							

Suspensión del trabajo:

9. FINALIZACIÓN DEL TRABAJO

PERSONAL AUTORIZADO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Firma trabajador							
Firma trabajador	Fernando Vivas	Fernando Vivas	Fernando Vivas	Fernando Vivas	Fernando Vivas		
Firma trabajador	Luis L						
Firma trabajador				Carlos G			
Firma trabajador							
Firma coordinador de alturas	Fernando Vivas	Fernando Vivas	Fernando Vivas	Fernando Vivas	Fernando Vivas		
Firma lider de trabajo				Fernando Vivas			

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: RG-UTSIT-2025-06
Versión 2

F-03 PERMISO DE ALTO RIESGO

Fecha: 17 julio 2026

Lugar de trabajo:		**Ciudad:**	Medellin	**Hora inicio:**	8 AM
Fecha de inicio:	Martes 18-08-26	**Fecha de cierre:**	Viernes 21	**Hora final:**	5 PM

Descripción detallada del trabajo: Mantenimiento Red Semaforica

ELC: Eléctrico - CAL: Caliente - ALT: Altura

1. PERSONAL AUTORIZADO PARA TRABAJAR

Nombres y Apellidos	Número de identificación	Cargo	Trabajos en ELC	Trabajos en CAL	Trabajos en ALT	Experiencia en el Trabajo (Si/No)	Firma (Comprendo los peligros y riesgos asociados al trabajo)
Brayan Palacio	1096247535	AUX		✓		Si	Brayan P
MOISES [illegible]	1069[illegible]	AUX		✓		Si	[illegible]
Andres Bedoya Valencia.	1037368900	ACT		✓		Si	Andres B
Eric Acosta	503 6864	AUX		✓		Si	Eric
Carlos Zuñiga	1096247524	AUX		✓		Si	Carlos

2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- [x] Casco de seguridad
- [x] Lentes de seguridad
- [x] Botas de seguridad
- [ ] Botas dieléctricas
- [ ] Guantes de soldadura
- [x] Guantes de maniobra
- [x] Barbiquejo
- [ ] Arnés de cuerpo completo
- [ ] Otros
- [x] Tapaoidos / orejeras
- [ ] Careta de esmerilar
- [ ] Careta de soldar
- [ ] Mangas de soldar
- [ ] Delantal de soldar
- [ ] Estarpines / Polainas
- [x] Mascarilla antipolvo
- [ ] Mascarilla vapores orgánicos

HERRAMIENTAS, EQUIPOS

- [ ] Escaleras
- [ ] Andamios
- [ ] Polipasto
- [ ] Amoladora Esmeriladora
- [ ] Sierra circular
- [ ] Carretilla
- [ ] Máq. soldar eléctrica
- [ ] Máq. de oxicorte
- [ ] Otros
- [x] Pala / pico
- [ ] Martillo / comba
- [x] Puntas / cinceles
- [ ] Taladro
- [ ] Llaves / desarmadores
- [x] Extensiones eléctricas
- [ ] Alicates / tenazas
- [ ] Multitéster

PROTECCIÓN COLECTIVA

- [ ] Barandas
- [x] Conos / cachacos
- [x] Señalización / letreros
- [x] Cintas de amarilla/malla de seguridad
- [ ] Mampara
- [ ] Cubiertas temporales
- [ ] Líneas de vida
- [ ] Luminarias / lámparas o reflectores
- [ ] Otros

3. VERIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN Y ACCIONES PREVENTIVAS

Acciones preventivas (SI, NO, N/A)	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Los trabajadores se encuentran bien de salud (Aptitud médica)?		Si	Si	Si	Si		
Los trabajadores cuentan con la certificación actualizada de capacitación y/o competencia laboral para trabajo en alturas, trabajo en caliente y electricos?		Si	Si	Si	Si		
Se les explico a los trabajadores las actividades a realizar?		Si	Si	Si	Si		
Se realiza previo analisis de trabajo seguro y se socializa al personal?		Si	Si	Si	Si		
Los trabajadores saben a quien llamar en caso de emergencia?		Si	Si	Si	Si		
Limpiar y organizar el área de trabajo?		Si	Si	Si	Si		
Cuenta con los elementos de protección personal necesarios para realizar la actividad?		Si	Si	Si	Si		
Delimitar, señalizar y aislar el área		Si	Si	Si	Si		
Herramientas y/o equipos se encuentran en buen estado y asegurados?		Si	Si	Si	Si		

Observaciones:

4. VERIFICACIÓN DE MEDIDAS PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS

Lista de verificación (SI, NO, N/A)	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Se retiró o desalojó el área o aisló todo el material combustible		NA	NA	NA	NA		
Se corto la energía (Desenergizado del equipo) antes de empezar el trabajo		NA	NA	NA	NA		
Se ha hecho la respectiva puesta a tierra		NA	NA	NA	NA		
Hay cables aéreos cercanos al área de trabajo que se está realizando		NA	NA	NA	NA		
Se verificó que la capacidad del voltaje del equipo es suficiente para el voltaje suministrado		NA	NA	NA	NA		
Los riesgos identificados se encuentran controlados antes de iniciar la labor?		NA	NA	NA	NA		
Las tomas eléctricas cuentan con tomas industriales		NA	NA	NA	NA		
Los tableros y/o equipos están protegidos de alcance de agua		NA	NA	NA	NA		
Se cuenta con el extintor adecuado, cerca al punto de trabajo		NA	NA	NA	NA		
El personal que realiza trabajos electricos es calificado, tecnico electricista con certificación CONTE, CONALTEL O COPNIA?		NA	NA	NA	NA		
Los colaboradores que realizan la actividad no portan accesorios o elementos conductores (anillos, relojes, cadenas, otros ?		NA	NA	NA	NA		
Se está utilizando EPP adecuados para la tarea		NA	NA	NA	NA		
Las herramientas y/o equipos a utilizar son dielectricos?		NA	NA	NA	NA		
El personal es apto e idoneo y calificado para realizar trabajos electricos?		NA	NA	NA	NA		

Tipo de tensión	Lider electricista que autoriza la labor		
	Nombres y Apellidos	Cedula	Firma
Muy baja tensión menor 25 v ☐			
Baja tensión <25v y >1000v ☐	N/A	N/A	N/A

Observaciones:

5. VERIFICACIÓN DE MEDIDAS PARA TRABAJOS EN CALIENTE

Tipo de actividad a realizar, marque con una X:	Corte,pulido de metal:		Soldadura		Perforacion con taladro	Otros:	

Lista de verificación (SI, NO, N/A)	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Los portaelectrodos cuentan con soporte de manutención aislante		NA	NA	NA	NA		
Se retiró, desalojó el área o aisló todo el material combustible		NA	NA	NA	NA		
Red eléctrica con toma de tierra		NA	NA	NA	NA		
Los accesorios (cables, uniones, etc) están en buenas condiciones		NA	NA	NA	NA		
El observador inspeccionó el área de trabajo 30 minutos despues de la actividad en caliente		SI	SI	SI	SI		
El personal que realiza trabajo en caliente es competente y está autorizado?		NA	NA	NA	NA		
El personal cuentya con los EPP adecuados para la tarea?		SI	SI	SI	SI		
Los equipos de corte, soldadura y otros equipos utilizados se encuentran completos, sin escapes, con sus		NA	NA	NA	NA		
Se cuenta con extintor cerca al lugar de trabajo?		SI	SI	SI	SI		
Se retiró o desalojó el área o aisló todo el material combustible		NA	NA	NA	NA		

Observaciones:

6. VERIFICACIÓN DE MEDIDAS PARA TRABAJOS EN ALTURA

Lista de verificación (SI, NO, N/A)	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Los riesgos identificados se encuentran controlados antes de iniciar labores?							
Los trabajadores se encuentran bien de salud?							
Han consumido algún tipo de medicamento o tratamiento médico que le produzca sueño, mareo, otros?							
El lugar donde se realizará la tarea tiene instalada la linea de vida o se cuenta con un punto de anclaje?							
Las condiciones climáticas son favorables para realizar la labor?							
Los sistemas de acceso se encuentran en buen estado?							
Se cuentan con los equipos de protección personal adecuados y certificados para la tarea?							
Se mantiene una distancia segura entre el trabajo y lineas o equipos electricos energizados minimo 90 centimetros?							
El personal tiene certificación vigente de la seguridad social?							
El sistema de anclaje se encuentra en buen estado?							
El trabajo en alturas mínimo lo van a realizar dos trabajadores o ejecutores.							
Se cuenta con el plan de rescate claro y entendible?							
Cuenta con un medio de comunicación disponible?							
Se ha instalado señalización preventiva que delimite el área de trabajo (cinta, conos, señales tubulares o poli sombras).							

Una vez inspeccionada el area de trabajo, comprobado el cumpliento de los requisitos indicados, y verificado los elementos d protección personal necesarios para la ejecución del trabajo, certifico que se ha efectuado correctamente los trabajos preparatorios indicados y que se puede realizar el trabajo en aturas.

Observaciones generales:

Verificaciones

Altura aproximada a trabajar:	Menciona el tipo de acceso (Escalera tipo tijera o de extensión, carro canasta, otros):

Estado del sistema de acceso (Bueno,regular, malo):

Sistema de restricción, posicionamiento o detención de caidas a utilizar:

arnés de cuerpo completo: ☐ Eslinga de posicionamiento: ☐ Freno de seguridad: ☐ Sistema de ascenso y descenso: ☐

Eslinga con absorbedor de impact ☐ Tie off o anclaje: ☐ Linea de vida: ☐ Otros: _____ ☐

Nombre completo y cedula del AYUDANTE DE SEGURIDAD:	Activo en seguridad social: SI NO	Firma:

Coordinador de trabajo en alturas:

Nombre y Apellido	Cedula	Firma

CALCULO DE DISTANCIA DE CAIDA LIBRE

VARIABLE	Ingrese valores
A: Altura del trabajador	
B: Longitud de la Eslinga	
C: Absorvedor de choque	1,06
E: Factor de seguridad	0,9
D: Distancia de caída	
F=Distancia de Caída libre	



¿La distancia anclaje-obstáculo es mayor o igual a la distancia libre de caída?		Sí		No		Si la respuesta es NO, la configuración del sistema utilizado no es segura. Evalué el uso de un sistema de restricción.

7.PLAN DE EMERGENCIAS.

Nombre y firma de quien activa el plan de emergencia:

8.FIRMA DEL EMISOR QUE AUTORIZA EL INICIO Y CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

Nombres y apellidos:	Número de identificación	Firma - Inicio	Firma - Cierre
Maria Victoria Durango	42683289		

9. AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

PERSONAL AUTORIZADO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Firma trabajador		Brayan	Brayan	Brayan	Brayan		
Firma trabajador		moises	moises	moises	moises		
Firma trabajador		Andres B	Andres B	Andres B	Andres B		
Firma trabajador		Eric	Nesta	Eric	Eric		
Firma trabajador		Carlos	Carlos	Carlos	Carlos		
Firma coordinador de alturas							
Firma lider de trabajo		Brayan	Brayan	Brayan	Brayan		

Suspensión del trabajo:

9. FINALIZACIÓN DEL TRABAJO

PERSONAL AUTORIZADO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Firma trabajador		Brayan	Brayan	Brayan	Brayan		
Firma trabajador		moises	moises	moises	moises		
Firma trabajador		Andres B	Andres B	Andres B	Andres B		
Firma trabajador		Eric	Eric	Eric	Eric		
Firma trabajador		Carlos	Carlos	Carlos	Carlos		
Firma coordinador de alturas							
Firma lider de trabajo		Brayan	Brayan	Brayan	Brayan		

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: RG-UTSIT-2025-06
Versión 2

F-03 PERMISO DE ALTO RIESGO

Fecha: 17 julio 2026

Lugar de trabajo:	Medellin	Ciudad:	Medellin	Hora inicio:	07 am
Fecha de inicio:	18/08/26	Fecha de cierre:	23 08 2026	Hora final:	05 pm

Descripción detallada del trabajo: mantenimiento Señalizacion.

ELC: Eléctrico - CAL: Caliente - ALT: Altura

1. PERSONAL AUTORIZADO PARA TRABAJAR

Nombres y Apellidos	Número de identificación	Cargo	Trabajos en			Experiencia en el Trabajo (Si/No)	Firma (Comprendo los peligros y riesgos asociados al trabajo)
			ELC	CAL	ALT		
Carlos Gonzales	1044894058	Auxiliar	X	+	—	Si	Carlos G.
Yeisun Galeano.	1039597832	Auxiliar	X	X	—	Si	Yeisun.
Franklin Barbosa	16791906	Conductor 1.	—	—	—	Si	Franklin.
Juan José Rua Silva	1000537976	Tecnico	—	—	—	Si	
W. J. Chavarro Duque	9568171	Auxiliar	X	X	X	Si	W. J.

2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- [x] Casco de seguridad
- [x] Lentes de seguridad
- [x] Botas de seguridad
- [ ] Botas dieléctricas
- [x] Guantes de soldadura
- [x] Guantes de maniobra
- [x] Barbiquejo
- [x] Arnés de cuerpo completo
- [ ] Otros _____
- [ ] Tapaoidos / orejeras
- [x] Careta de esmerilar
- [x] Careta de soldar
- [x] Mangas de soldar
- [ ] Delantal de soldar
- [ ] Escarpines / Polainas
- [ ] Mascarilla antipolvo
- [x] Mascarilla vapores orgánicos

HERRAMIENTAS, EQUIPOS

- [x] Escaleras
- [ ] Andamios
- [ ] Polipasto
- [x] Amoladora Esmeriladora
- [x] Sierra circular
- [x] Carretilla
- [x] Máq. soldar eléctrica
- [x] Máq. de oxicorte
- [x] Otros _____
- [ ] Pala / pico
- [ ] Martillo / comba
- [ ] Puntas / cinceles
- [ ] Taladro
- [ ] Llaves / desarmadores
- [x] Extensiones eléctricas
- [ ] Alicates / tenazas
- [ ] Multitéster

PROTECCIÓN COLECTIVA

- [ ] Barandas
- [x] Conos / cachacos
- [x] Señalización / letreros
- [x] Cintas de amarilla/malla de seguridad
- [ ] Mampara
- [ ] Cubiertas temporales
- [ ] Líneas de vida
- [ ] Luminarias / lámparas o reflectores
- [ ] Otros _____

3. VERIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN Y ACCIONES PREVENTIVAS

Acciones preventivas (SI, NO, N/A)	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Los trabajadores se encuentran bien de salud (Aptitud médica)?		✓		✓	✓	✓	
Los trabajadores cuentan con la certificación actualizada de capacitación y/o competencia laboral para trabajo en alturas, trabajo en caliente y electricos?		✓		✓	✓	✓	
Se les explico a los trabajadores las actividades a realizar?		✓		✓	✓	✓	
Se realiza previo analisis de trabajo seguro y se socializa al personal?		✓		✓	✓	✓	
Los trabajadores saben a quien llamar en caso de emergencia?		✓		✓	✓	✓	
Limpiar y organizar el área de trabajo?		✓		✓	✓	✓	
Cuenta con los elementos de protección personal necesarios para realizar la actividad?		✓		✓	✓	✓	
Delimitar, señalizar y aislar el área		✓		✓	✓	✓	
Herramientas y/o equipos se encuentran en buen estado y asegurados?		✓		✓	✓	✓	

Observaciones:

4. VERIFICACIÓN DE MEDIDAS PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS

Lista de verificación (SI, NO, N/A)	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Se retiró o desalojó el área o aisló todo el material combustible		✓		✓	✓	✓	
Se corto la energia (Desenergizado del equipo) antes de empezar el trabajo		✓		✓	✓	✓	
Se ha hecho la respectiva puesta a tierra		✓		✓	✓	✓	
Hay cables aéreos cercanos al área de trabajo que se está realizando		✓		✓	✓	✓	
Se verificó que la capacidad del voltaje del equipo es suficiente para el voltaje suministrado		✓		✓	✓	✓	
Los riesgos identificados se encuentran controlados antes de iniciar la labor?		✓		✓	✓	✓	
Las tomas eléctricas cuentan con tomas industriales		✓		✓	✓	✓	
Los tableros y/o equipos están protegidos de alcance de agua		✓		✓	✓	✓	
Se cuenta con el extintor adecuado, cerca al punto de trabajo		✓		✓	✓	✓	
El personal que realiza trabajos electricos es calificado, tecnico electricista con certificación CONTE, CONALTEL O COPNIA?		✓		✓	✓	✓	
Los colaboradores que realizan la actividad no portan accesorios o elementos conductores (anillos, relojes, cadenas, otros ?		✓		✓	✓	✓	
Se está utilizando EPP adecuados para la tarea		✓		✓	✓	✓	
Las herramientas y/o equipos a utilizar son dielectricos?		✓		✓	✓	✓	
El personal es apto e idoneo y calificado para realizar trabajos electricos?		✓		✓	✓	✓	

Tipo de tensión

- Muy baja tensión menor 25 v [ ]
- Baja tensión <25v y >1000v [X]

Lider electricista que autoriza la labor

Nombres y Apellidos	Cedula	Firma
Franklin Barbosa	16791906	Franklin.

Observaciones:

5. VERIFICACIÓN DE MEDIDAS PARA TRABAJOS EN CALIENTE

Tipo de actividad a realizar, marque con una X:	Corte,pulido de metal:	✓	Soldadura	✓	Perforacion con taladro	Otros:

Lista de verificación (SI, NO, N/A)	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Los portaelectrodos cuentan con soporte de manutención aislante	✓	✓		✓	✓	✓	
Se retiró, desalojó el área o aisló todo el material combustible		✓		✓	✓	✓	
Red eléctrica con toma de tierra		✓		✓	✓	✓	
Los accesorios (cables, uniones, etc) están en buenas condiciones		✓		✓	✓	✓	
El observador inspeccionó el área de trabajo 30 minutos despues de la actividad en caliente		✓		✓	✓	✓	
El personal que realiza trabajo en caliente es competente y está autorizado?		✓		✓	✓	✓	
El personal cuentya con los EPP adecuados para la tarea?		✓		✓	✓	✓	
Los equipos de corte, soldadura y otros equipos utilizados se encuentran completos, sin escapes, con sus		✓		✓	✓	✓	
Se cuenta con extintor cerca al lugar de trabajo?		✓		✓	✓	✓	
Se retiró o desalojó el área o aisló todo el material combustible		✓		✓	✓	✓	

Observaciones:

6. VERIFICACIÓN DE MEDIDAS PARA TRABAJOS EN ALTURA

Lista de verificación (SI, NO, N/A)	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Los riesgos identificados se encuentran controlados antes de iniciar labores?		✓		✓	✓	✓	
Los trabajadores se encuentran bien de salud?		✓		✓	✓	✓	
Han consumido algún tipo de medicamento o tratamiento médico que le produzca sueño, mareo, otros?		✓		✓	✓	✓	
El lugar donde se realizará la tarea tiene instalada la linea de vida o se cuenta con un punto de anclaje?		✓		✓	✓	✓	
Las condiciones climáticas son favorables para realizar la labor?		✓		✓	✓	✓	
Los sistemas de acceso se encuentran en buen estado?		✓		✓	✓	✓	
Se cuentan con los equipos de protección personal adecuados y certificados para la tarea?		✓		✓	✓	✓	
Se mantiene una distancia segura entre el trabajo y lineas o equipos electricos energizados minimo 90 centimetros?		✓		✓	✓	✓	
El personal tiene certificación vigente de la seguridad social?		✓		✓	✓	✓	
El sistema de anclaje se encuentra en buen estado?		✓		✓	✓	✓	
El trabajo en alturas mínimo lo van a realizar dos trabajadores o ejecutores.		✓		✓	✓	✓	
Se cuenta con el plan de rescate claro y entendible?		✓		✓	✓	✓	
Cuenta con un medio de comunicación disponible?		✓		✓	✓	✓	
Se ha instalado señalización preventiva que delimite el área de trabajo (cinta, conos, señales tubulares o poli sombras).		✓		✓	✓	✓	

Una vez inspeccionada el area de trabajo, comprobado el cumpliento de los requisitos indicados, y verificado los elementos d protección personal necesarios para la ejecución del trabajo, certifico que se ha efectuado correctamente los trabajos preparatorios indicados y que se puede realizar el trabajo en aturas.

Observaciones generales:

Verificaciones

Altura aproximada a trabajar: 7 metros

Menciona el tipo de acceso (Escalera tipo tijera o de extensión, carro canasta, otros): Tijera Extención.

Estado del sistema de acceso (Bueno,regular, malo):

Sistema de restricción, posicionamiento o detención de caidas a utilizar:

arnés de cuerpo completo: ✓ Eslinga de posicionamiento: ✓ Freno de seguridad: ✓ Sistema de ascenso y descenso: ☐

Eslinga con absorbedor de impacto ☐ Tie off o anclaje: ☐ Linea de vida: ✓ Otros: _____ ☐

Nombre completo y cedula del AYUDANTE DE SEGURIDAD:	Activo en seguridad social:	Firma:
Franklin Barbosa P.	SI X NO	

Coordinador de trabajo en alturas:

Nombre y Apellido	Cedula	Firma
Franklin Barbosa P.	16791906	

CALCULO DE DISTANCIA DE CAIDA LIBRE

VARIABLE	Ingrese valores
A: Altura del trabajador	
B: Longitud de la Eslinga	
C: Absorvedor de choque	1,06
E: Factor de seguridad	0,9
D: Distancia de caída	
F=Distancia de Caída libre	



¿La distancia anclaje-obstáculo es mayor o igual a la distancia libre de caída?		Sí		No		Si la respuesta es NO, la configuración del sistema utilizado no es segura. Evalué el uso de un sistema de restricción.

7.PLAN DE EMERGENCIAS.

Nombre y firma de quien activa el plan de emergencia: Franklin Barbosa P.

8.FIRMA DEL EMISOR QUE AUTORIZA EL INICIO Y CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

Nombres y apellidos:	Número de identificación	Firma - Inicio	Firma - Cierre
Maria Victoria Durango	42'683.289		

9. AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

PERSONAL AUTORIZADO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Firma trabajador	—	Carlos G.	Carlos G.	—	—	—	—
Firma trabajador	—	Yeison G.	Yeison G.	—	—	—	—
Firma trabajador	—	—	—	—	—	—	—
Firma trabajador	—	—	—	Jose Anibal	Jose Anibal	Jose Anibal	—
Firma trabajador	—	—	—	—	—	—	—
Firma coordinador de alturas	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—
Firma lider de trabajo	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—

Suspensión del trabajo:

9. FINALIZACIÓN DEL TRABAJO

PERSONAL AUTORIZADO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Firma trabajador	—	Carlos G.	Carlos G	—	—	—	—
Firma trabajador	—	Yeison G.	Yeism G	—	—	—	—
Firma trabajador	—	—	—	—	—	—	—
Firma trabajador	—	—	—	Jose Anibal	Jose Anibal	Jose Anibal	—
Firma trabajador	—	—	—	—	—	—	—
Firma coordinador de alturas	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—
Firma lider de trabajo	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: RG-UTSIT-2025-06 Versión 2
	F-03 PERMISO DE ALTO RIESGO	Fecha: 17 julio 2026

Lugar de trabajo:	medellín	Ciudad:	medellín	Hora inicio:	7:00 am
Fecha de inicio:	18-08-2026	Fecha de cierre:	23-08-26	Hora final:	5:00 pm

Descripción detallada del trabajo: mantenimiento de la red de semaforos y sonido

ELC: Eléctrico - CAL: Caliente - ALT: Altura

1. PERSONAL AUTORIZADO PARA TRABAJAR

Nombres y Apellidos	Número de identificación	Cargo	Trabajos en			Experiencia en el Trabajo (Si/No)	Firma (Comprendo los peligros y riesgos asociados al trabajo)
			ELC	CAL	ALT		
Edwin david Santos	1038810427	Electrico	✓	✓	✓	SI	Edwin
William Cheverria Suarez	76077~	Auxiliar	SI	SI	SI	S-	
Yeison Galeano	1038547032	Auxiliar	✓	✓	✓	Se	

2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- [x] Casco de seguridad
- [x] Lentes de seguridad
- [x] Botas de seguridad
- [x] Botas dieléctricas
- [x] Guantes de soldadura
- [x] Guantes de maniobra
- [x] Barbiquejo
- [x] Arnés de cuerpo completo
- [ ] Otros
- [x] Tapaoidos / orejeras
- [x] Careta de esmerilar
- [x] Careta de soldar
- [x] Mangas de soldar
- [x] Delantal de soldar
- [x] Escarpines / Polainas
- [x] Mascarilla antipolvo
- [x] Mascarilla vapores orgánicos

HERRAMIENTAS, EQUIPOS

- [x] Escaleras
- [ ] Andamios
- [ ] Polipasto
- [x] Amoladora Esmeriladora
- [x] Sierra circular
- [x] Carretilla
- [x] Máq. soldar eléctrica
- [x] Máq. de oxicorte
- [ ] Otros
- [x] Pala / pico
- [x] Martillo / comba
- [x] Puntas / cinceles
- [x] Taladro
- [x] Llaves / desarmadores
- [x] Extensiones eléctricas
- [x] Alicates / tenazas
- [x] Multitéster

PROTECCIÓN COLECTIVA

- [ ] Barandas
- [ ] Conos / cachacos
- [x] Señalización / letreros
- [x] Cintas de amarilla/malla de seguridad
- [ ] Mampara
- [ ] Cubiertas temporales
- [x] Líneas de vida
- [ ] Luminarias / lámparas o reflectores
- [ ] Otros

3. VERIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN Y ACCIONES PREVENTIVAS

Acciones preventivas (SI, NO, N/A)	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Los trabajadores se encuentran bien de salud (Aptitud médica)?		SI		SI	SI		
Los trabajadores cuentan con la certificación actualizada de capacitación y/o competencia laboral para trabajo en alturas, trabajo en caliente y electricos?		SI		SI	SI		
Se les explico a los trabajadores las actividades a realizar?		SI		SI	SI		
Se realiza previo analisis de trabajo seguro y se socializa al personal?		SI		SI	SI		
Los trabajadores saben a quien llamar en caso de emergencia?		SI		SI	SI		
Limpiar y organizar el área de trabajo?		SI		SI	SI		
Cuenta con los elementos de protección personal necesarios para realizar la actividad?		SI		SI	SI		
Delimitar, señalizar y aislar el área		SI		SI	SI		
Herramientas y/o equipos se encuentran en buen estado y asegurados?		SI		SI	SI		

Observaciones:

4. VERIFICACIÓN DE MEDIDAS PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS

Lista de verificación (SI, NO, N/A)	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Se retiró o desalojó el área o aisló todo el material combustible		SI		SI	SI		
Se corto la energía (Desenergizado del equipo) antes de empezar el trabajo		SI		SI	SI		
Se ha hecho la respectiva puesta a tierra		SI		SI	SI		
Hay cables aéreos cercanos al área de trabajo que se está realizando		SI		SI	SI		
Se verificó que la capacidad del voltaje del equipo es suficiente para el voltaje suministrado		SI		SI	SI		
Los riesgos identificados se encuentran controlados antes de iniciar la labor?		SI		SI	SI		
Las tomas eléctricas cuentan con tomas industriales		SI		SI	SI		
Los tableros y/o equipos están protegidos de alcance de agua		SI		SI	SI		
Se cuenta con el extintor adecuado, cerca al punto de trabajo		SI		SI	SI		
El personal que realiza trabajos electricos es calificado, tecnico electricista con certificación CONTE, CONALTEL O COPNIA?		SI		SI	SI		
Los colaboradores que realizan la actividad no portan accesorios o elementos conductores (anillos, relojes, cadenas, otros ?		NO		NO	NO		
Se está utilizando EPP adecuados para la tarea		SI		SI	SI		
Las herramientas y/o equipos a utilizar son dielectricos?		SI		SI	SI		
El personal es apto e idoneo y calificado para realizar trabajos electricos?		SI		SI	SI		

Tipo de tensión

- [ ] Muy baja tensión menor 25 v
- [x] Baja tensión <25v y >1000v

Lider electricista que autoriza la labor

Nombres y Apellidos	Cedula	Firma
Edwin Santos	1038810427	Edwin

Observaciones:

5. VERIFICACIÓN DE MEDIDAS PARA TRABAJOS EN CALIENTE

Tipo de actividad a realizar, marque con una X:	Corte,pulido de metal:		Soldadura		Perforacion con taladro	Otros:

Lista de verificación (SI, NO, N/A)	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Los portaelectrodos cuentan con soporte de manutención aislante		SI		SI	SI		
Se retiró, desalojó el área o aisló todo el material combustible		SI		SI	SI		
Red eléctrica con toma de tierra		SI		SI	SI		
Los accesorios (cables, uniones, etc) están en buenas condiciones		SI		SI	SI		
El observador inspeccionó el área de trabajo 30 minutos despues de la actividad en caliente		SI		SI	SI		
El personal que realiza trabajo en caliente es competente y está autorizado?		SI		SI	SI		
El personal cuentya con los EPP adecuados para la tarea?		SI		SI	SI		
Los equipos de corte, soldadura y otros equipos utilizados se encuentran completos, sin escapes, con sus		SI		SI	SI		
Se cuenta con extintor cerca al lugar de trabajo?		SI		SI	SI		
Se retiró o desalojó el área o aisló todo el material combustible		SI		SI	SI		

Observaciones:

6. VERIFICACIÓN DE MEDIDAS PARA TRABAJOS EN ALTURA

Lista de verificación (SI, NO, N/A)	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Los riesgos identificados se encuentran controlados antes de iniciar labores?		SI		SI	SI		
Los trabajadores se encuentran bien de salud?		SI		SI	SI		
Han consumido algún tipo de medicamento o tratamiento médico que le produzca sueño, mareo, otros?		NO		NO	NO		
El lugar donde se realizará la tarea tiene instalada la linea de vida o se cuenta con un punto de anclaje?		SI		SI	SI		
Las condiciones climáticas son favorables para realizar la labor?		SI		SI	SI		
Los sistemas de acceso se encuentran en buen estado?		SI		SI	SI		
Se cuentan con los equipos de protección personal adecuados y certificados para la tarea?		SI		SI	SI		
Se mantiene una distancia segura entre el trabajo y lineas o equipos electricos energizados minimo 90 centimetros?		SI		SI	SI		
El personal tiene certificación vigente de la seguridad social?		SI		SI	SI		
El sistema de anclaje se encuentra en buen estado?		SI		SI	SI		
El trabajo en alturas mínimo lo van a realizar dos trabajadores o ejecutores.		N/A		N/A	N/A		
Se cuenta con el plan de rescate claro y entendible?		SI		SI	SI		
Cuenta con un medio de comunicación disponible?		NO		NO	NO		
Se ha instalado señalización preventiva que delimite el área de trabajo (cinta, conos, señales tubulares o poli sombras).		SI		SI	SI		

Una vez inspeccionada el area de trabajo, comprobado el cumpliento de los requisitos indicados, y verificado los elementos d protección personal necesarios para la ejecución del trabajo, certifico que se ha efectuado correctamente los trabajos preparatorios indicados y que se puede realizar el trabajo en aturas.

Observaciones generales:

Verificaciones

Altura aproximada a trabajar: 3 metros

Menciona el tipo de acceso (Escalera tipo tijera o de extensión, carro canasta, otros): Escalera Tipo Tijera

Estado del sistema de acceso (Bueno,regular, malo): Bueno

Sistema de restricción, posicionamiento o detención de caidas a utilizar:

arnés de cuerpo completo: ✓ Eslinga de posicionamiento: ✓ Freno de seguridad: ✓ Sistema de ascenso y descenso: ✓

Eslinga con absorbedor de impact: ☐ Tie off o anclaje: ☐ Linea de vida: ✓ Otros: _____ ☐

Nombre completo y cedula del AYUDANTE DE SEGURIDAD:	Activo en seguridad social:	Firma:
Edwin Santos	SI X NO	Edwin

Coordinador de trabajo en alturas:

Nombre y Apellido	Cedula	Firma
Jenifer Altamiranda Diaz	1052982270	

CALCULO DE DISTANCIA DE CAIDA LIBRE

VARIABLE	Ingrese valores
A: Altura del trabajador	
B: Longitud de la Eslinga	
C: Absorvedor de choque	1,06
E: Factor de seguridad	0,9
D: Distancia de caída	
F=Distancia de Caída libre	



¿La distancia anclaje-obstáculo es mayor o igual a la distancia libre de caída?		Sí		No		Si la respuesta es NO, la configuración del sistema utilizado no es segura. Evalué el uso de un sistema de restricción.

7.PLAN DE EMERGENCIAS.

Nombre y firma de quien activa el plan de emergencia: Edwin Santos

8.FIRMA DEL EMISOR QUE AUTORIZA EL INICIO Y CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

Nombres y apellidos:	Número de identificación	Firma - Inicio	Firma - Cierre
Carlos Alberto Diaz Peña	1094444470	Carlos D	Carlos D

9. AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

PERSONAL AUTORIZADO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Firma trabajador		Edwin		Edwin	Edwin		
Firma trabajador		W-1.6					
Firma trabajador		Yeison		Yeison G.			
Firma trabajador		—					
Firma trabajador							
Firma coordinador de alturas							
Firma lider de trabajo		Edwin		Edwin	Edwin		

Suspensión del trabajo:

9. FINALIZACIÓN DEL TRABAJO

PERSONAL AUTORIZADO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Firma trabajador		Edwin		edwin	Edwin		
Firma trabajador		W-1.6		—	—		
Firma trabajador		—		—	—		
Firma trabajador		Yeison		Yeison G.	—		
Firma trabajador		—		—	—		
Firma coordinador de alturas							
Firma lider de trabajo		Edwin		Edwin	Edwin		

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: RG-UTSIT-2025-06
Versión 2

F-03 PERMISO DE ALTO RIESGO

Fecha: 17 julio 2026

Lugar de trabajo:	Medellin	Ciudad:	Medellin	Hora inicio:	7:00 am
Fecha de inicio:	18/8/26	Fecha de cierre:	22/8/26	Hora final:	5:00 pm

Descripción detallada del trabajo: Mantenimiento Red Semaforica de Medellin

ELC: Eléctrico - CAL: Caliente - ALT: Altura

1. PERSONAL AUTORIZADO PARA TRABAJAR

Nombres y Apellidos	Número de identificación	Cargo	Trabajos en ELC	Trabajos en CAL	Trabajos en ALT	Experiencia en el Trabajo (Si/No)	Firma (Comprendo los peligros y riesgos asociados al trabajo)
Christian Barbosa Yepes	1.151.966.781	Cad-Aux-Tec-Elc	✓	✓	✓	SI	
Luis Lozano	91.452.701	CatAux			✓	SI	Luis L

2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- [x] Casco de seguridad
- [x] Lentes de seguridad
- [x] Botas de seguridad
- [x] Botas dieléctricas
- [x] Guantes de soldadura
- [x] Guantes de maniobra
- [x] Barbiquejo
- [ ] Arnés de cuerpo completo
- [ ] Otros

- [x] Tapaoidos / orejeras
- [x] Careta de esmerilar
- [x] Careta de soldar
- [ ] Mangas de soldar
- [ ] Delantal de soldar
- [ ] Escarpines / Polainas
- [x] Mascarilla antipolvo
- [ ] Mascarilla vapores orgánicos

HERRAMIENTAS, EQUIPOS

- [x] Escaleras
- [ ] Andamios
- [ ] Polipasto
- [x] Amoladora Esmeriladora
- [ ] Sierra circular
- [ ] Carretilla
- [x] Máq. soldar eléctrica
- [x] Máq. de oxicorte
- [ ] Otros

- [x] Pala / pico
- [x] Martillo / comba
- [x] Puntas / cinceles
- [x] Taladro
- [ ] Llaves / desarmadores
- [x] Extensiones eléctricas
- [x] Alicates / tenazas
- [x] Multitéster

PROTECCIÓN COLECTIVA

- [ ] Barandas
- [x] Conos / cachacos
- [x] Señalización / letreros
- [x] Cintas de amarilla/malla de seguridad
- [ ] Mampara
- [ ] Cubiertas temporales
- [ ] Líneas de vida
- [ ] Luminarias / lámparas o reflectores
- [ ] Otros

3. VERIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN Y ACCIONES PREVENTIVAS

Acciones preventivas (SI, NO, N/A)	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Los trabajadores se encuentran bien de salud (Aptitud médica)?		✓	✓	✓	✓		
Los trabajadores cuentan con la certificación actualizada de capacitación y/o competencia laboral para trabajo en alturas, trabajo en caliente y electricos?		✓	✓	✓	✓		
Se les explico a los trabajadores las actividades a realizar?		✓	✓	✓	✓		
Se realiza previo analisis de trabajo seguro y se socializa al personal?		✓	✓	✓	✓		
Los trabajadores saben a quien llamar en caso de emergencia?		✓	✓	✓	✓		
Limpiar y organizar el área de trabajo?		✓	✓	✓	✓		
Cuenta con los elementos de protección personal necesarios para realizar la actividad?		✓	✓	✓	✓		
Delimitar, señalizar y aislar el área		✓	✓	✓	✓		
Herramientas y/o equipos se encuentran en buen estado y asegurados?		✓		✓	✓		

Observaciones:

4. VERIFICACIÓN DE MEDIDAS PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS

Lista de verificación (SI, NO, N/A)	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Se retiró o desalojó el área o aisló todo el material combustible		✓	✓	✓	✓		
Se corto la energía (Desenergizado del equipo) antes de empezar el trabajo		✓	✓	✓	✓		
Se ha hecho la respectiva puesta a tierra		✓	✓	✓	✓		
Hay cables aéreos cercanos al área de trabajo que se está realizando		✓	✓	✓	✓		
Se verificó que la capacidad del voltaje del equipo es suficiente para el voltaje suministrado		✓	✓	✓	✓		
Los riesgos identificados se encuentran controlados antes de iniciar la labor?		✓	✓	✓	✓		
Las tomas eléctricas cuentan con tomas industriales		✓	✓	✓	✓		
Los tableros y/o equipos están protegidos de alcance de agua		✓	✓	✓	✓		
Se cuenta con el extintor adecuado, cerca al punto de trabajo		✓	✓	✓	✓		
El personal que realiza trabajos electricos es calificado, tecnico electricista con certificación CONTE, CONALTEL O COPNIA?		✓	✓	✓	✓		
Los colaboradores que realizan la actividad no portan accesorios o elementos conductores (anillos, relojes, cadenas, otros ?		✓	✓	✓	✓		
Se está utilizando EPP adecuados para la tarea		✓	✓	✓	✓		
Las herramientas y/o equipos a utilizar son dielectricos?		✓	✓	✓	✓		
El personal es apto e idoneo y calificado para realizar trabajos electricos?		✓	✓	✓	✓		

Tipo de tensión	Lider electricista que autoriza la labor		
	Nombres y Apellidos	Cedula	Firma
Muy baja tensión menor 25 v ☐	Christian Barbosa Y	1.151.966.781	
Baja tensión <25v y >1000v ☒			

Observaciones:

5. VERIFICACIÓN DE MEDIDAS PARA TRABAJOS EN CALIENTE

Tipo de actividad a realizar, marque con una x:	Corte,pulido de metal:		Soldadura		Perforacion con taladro	Otros:

Lista de verificación (SI, NO, N/A)	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Los portaelectrodos cuentan con soporte de manutención aislante							
Se retiró, desalojó el área o aisló todo el material combustible							
Red eléctrica con toma de tierra							
Los accesorios (cables, uniones, etc) están en buenas condiciones							
El observador inspeccionó el área de trabajo 30 minutos despues de la actividad en caliente							
El personal que realiza trabajo en caliente es competente y está autorizado?							
El personal cuentya con los EPP adecuados para la tarea?							
Los equipos de corte, soldadura y otros equipos utilizados se encuentran completos, sin escapes, con sus							
Se cuenta con extintor cerca al lugar de trabajo?							
Se retiró o desalojó el área o aisló todo el material combustible							

Observaciones:

6. VERIFICACIÓN DE MEDIDAS PARA TRABAJOS EN ALTURA

Lista de verificación (SI, NO, N/A)	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Los riesgos identificados se encuentran controlados antes de iniciar labores?							
Los trabajadores se encuentran bien de salud?							
Han consumido algún tipo de medicamento o tratamiento médico que le produzca sueño, mareo, otros?							
El lugar donde se realizará la tarea tiene instalada la linea de vida o se cuenta con un punto de anclaje?							
Las condiciones climáticas son favorables para realizar la labor?							
Los sistemas de acceso se encuentran en buen estado?							
Se cuentan con los equipos de protección personal adecuados y certificados para la tarea?							
Se mantiene una distancia segura entre el trabajo y lineas o equipos electricos energizados minimo 90 centimetros?							
El personal tiene certificación vigente de la seguridad social?							
El sistema de anclaje se encuentra en buen estado?							
El trabajo en alturas minimo lo van a realizar dos trabajadores o ejecutores.							
Se cuenta con el plan de rescate claro y entendible?							
Cuenta con un medio de comunicación disponible?							
Se ha instalado señalización preventiva que delimite el área de trabajo (cinta, conos, señales tubulares o poli sombras).							

Una vez inspeccionada el area de trabajo, comprobado el cumpliento de los requisitos indicados, y verificado los elementos d protección personal necesarios para la ejecución del trabajo, certifico que se ha efectuado correctamente los trabajos preparatorios indicados y que se puede realizar el trabajo en aturas.

Observaciones generales:

Verificaciones

Altura aproximada a trabajar:	Menciona el tipo de acceso (Escalera tipo tijera o de extensión, carro canasta, otros):
7m	tijera y extension

Estado del sistema de acceso (Bueno,regular, malo):

Sistema de restricción, posicionamiento o detención de caidas a utilizar:

arnés de cuerpo completo:	☑	Eslinga de posicionamiento:	☑	Freno de seguridad:	☐	Sistema de ascenso y descenso:	☑
Eslinga con absorbedor de impact:	☐	Tie off o anclaje:	☑	Linea de vida:	☐	Otros: _____	☐

Nombre completo y cedula del AYUDANTE DE SEGURIDAD:	Activo en seguridad social:	Firma:
Cristian Barbosa	SI X NO	Christian

Coordinador de trabajo en alturas:

Nombre y Apellido	Cedula	Firma
Jenifer Altamiranda Diaz	1052482270	

CALCULO DE DISTANCIA DE CAIDA LIBRE

VARIABLE	Ingrese valores
A: Altura del trabajador	
B: Longitud de la Eslinga	
C: Absorvedor de choque	1,06
E: Factor de seguridad	0,9
D: Distancia de caída	
F=Distancia de Caída libre	



¿La distancia anclaje-obstáculo es mayor o igual a la distancia libre de caída?		Sí		No		Si la respuesta es NO, la configuración del sistema utilizado no es segura. Evalué el uso de un sistema de restricción.

7.PLAN DE EMERGENCIAS.

Nombre y firma de quien activa el plan de emergencia: Cristian Barbosa

8.FIRMA DEL EMISOR QUE AUTORIZA EL INICIO Y CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

Nombres y apellidos:	Número de identificación	Firma - Inicio	Firma - Cierre
Carlos Alberto Diaz	1017[illegible]30	Carlos D	Carlos D

9. AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

PERSONAL AUTORIZADO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Firma trabajador			LUIS L				
Firma trabajador							
Firma trabajador							
Firma trabajador							
Firma trabajador							
Firma coordinador de alturas							
Firma lider de trabajo						—	—

Suspensión del trabajo:

9. FINALIZACIÓN DEL TRABAJO

PERSONAL AUTORIZADO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Firma trabajador			LUIS L				
Firma trabajador							
Firma trabajador							
Firma trabajador							
Firma trabajador							
Firma coordinador de alturas							
Firma lider de trabajo						—	—

UNION TEMPORAL
SIT MEDELLIN

ANEXO 31

MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA MEJORA CONTINUA

MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN
DE LA RED SEMAFÓRICA DE MEDELLÍN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: RG-UTSIT-2025-37


Fecha: Julio 31 del 2026

MATRIZ DE MEJORA CONTINUA

Versión 1


ESTADO DE ACCIONES

TOTAL DE ACCIONES	61
ACCIONES ABIERTAS	16
ACCIONES CERRADAS	45




CUMPLIMIENTO VS ATRASO

TOTAL DE ACCIONES	61
CUMPLE	46
EN PROCESO	9
ATRASO	6



ACCIONES POR FUENTE

INVESTIGACIÓN ACCIDENTE DE TRABAJO	15
INSPECCIONES	28
ACTUALIZACIÓN MATRIZ IPVR	2
REUNIÓN COPASST	11



	DESCRIPCIÓN					PLAN DE ACCIÓN						SEGUIMIENTO O VERIFICACIÓN						
No.	Fecha	Fuente	Proceso / Área	Tipo de Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Tipo de Acción	Análisis de Causa	Medida de intervención	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Presupuesto	Fecha Ejecución	Cumplimiento	Retraso (días)	Justificación del Retraso / Observaciones	Eficacia	Estado	Fecha de Cierre
1	30/10/25	INSPECCIÓN DEL BOTIQUÍN	Operativa	No conformidad	Faltan elementos botiquín	Correctiva	Falta control inventario	Inspección mensual y reposición	SST	15/11/25	Bajo	28/12/25	Cumple	0	NA	Eficaz	Cerrado	28/12/25
2	31/10/25	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Operativa	No conformidad	Extintor activado	Correctiva	Falta verificación	Recarga extintor	SST	14/11/25	Bajo	28/12/25	Cumple	0	NA	Eficaz	Cerrado	28/12/25
3	15/11/25	ACTUALIZACIÓN MATRIZ IPVR	Operativa	No conformidad	Sin botiquines en frentes	Correctiva	Falta planificación recursos	Compra botiquines	SST	30/11/25	Medio	28/12/25	Cumple	0	NA	Eficaz	Cerrado	28/12/25
4	15/11/25	ACTUALIZACIÓN MATRIZ IPVR	Operativa	No conformidad	Falta herramientas dieléctricas	Correctiva	Falta dotación adecuada	Compra herramientas	SST	15/12/25	Medio	28/12/25	Cumple	0	NA	Eficaz	Cerrado	28/12/25
5	20/11/25	INSPECCIÓN LOCATIVA	Operativa	No conformidad	Sin señalización	Correctiva	Falta gestión compras	Compra señalización	SST	30/11/25	Medio	30/11/25	Cumple	0	NA	Eficaz	Cerrado	30/11/25
6	20/11/25	INSPECCIÓN LOCATIVA	Operativa	No conformidad	Sin botiquines	Correctiva	Falta planificación	Compra botiquines	SST	15/12/25	Medio	28/12/25	Cumple	0	NA	Eficaz	Cerrado	28/12/25
7	20/11/25	INSPECCIÓN LOCATIVA	Operativa	Observación	Sin números emergencia	Mejora	Falta comunicación	Entregar directorio	SST	15/11/25	Bajo	30/11/25	Cumple	0	NA	Eficaz	Cerrado	30/11/25
8	26/11/25	INSPECCIÓN DE BODEGA	Operativa	No conformidad	Sin estantería química	Correctiva	Falta infraestructura	Compra estantería	SST	26/12/25	Alto	30/04/26	Atraso	-131	En gestión compra	Parcial	Abierto	—
9	26/11/25	INSPECCIÓN DE BODEGA	Operativa	No conformidad	Sin matriz compatibilidad	Correctiva	Falta documentación	Elaborar matriz	SST	26/12/25	Bajo	30/04/26	Cumple	0	No se requería uso	Eficaz	Cerrado	30/04/26
10	9/12/25	Investigación AT	Operativa	No conformidad	Atrapamiento dedo por cierre de escalera de tijera en vehículo DTX928	Correctiva	Falta de capacitación, baja percepción del riesgo, confianza y distracción	Charla en uso seguro de escaleras portátiles y riesgos de atrapamiento	Lina María Giraldo / SST	20/01/26	Bajo	20/01/26	Cumple	0	N/A	Eficaz	Cerrado	20/01/26
11	9/12/25	Investigación AT	Operativa	No conformidad	Atrapamiento por manipulación insegura de escalera	Correctiva	Mano en zona de atrapamiento, cierre inadecuado de escalera, falta de control visual	Retroalimentación directa al trabajador sobre manipulación segura de escaleras	Lina María Giraldo / SST	15/01/26	Bajo	15/01/26	Cumple	0	N/A	Eficaz	Cerrado	15/01/26
12	9/12/25	Investigación AT	Operativa	No conformidad	Riesgo de atrapamiento por apertura/cierre de escalera	Correctiva	Falta de control técnico del equipo y aseguramiento de la escalera	Implementar amarre de escalera para asegurar bloqueo y disminuir riesgo	Lina María Giraldo / Supervisor	20/01/26	Bajo	20/01/26	Cumple	0	N/A	Eficaz	Cerrado	20/01/26
13	29/12/25	Investigación AT	Operativa	No conformidad	Dolor lumbar por manipulación manual de carga (30 kg)	Correctiva	Manejo inadecuado de materiales y falta de capacitación en manipulación de cargas	Capacitación en manejo seguro de cargas y uso de ayudas mecánicas	Lina María Giraldo / SST	24/02/26	Bajo	24/02/26	Cumple	0	N/A	Eficaz	Cerrado	24/02/26
14	29/12/25	Investigación AT	Operativa	No conformidad	Sobreesfuerzo por manipulación de carga sin apoyo	Correctiva	Transporte inadecuado de materiales y esfuerzo excesivo	Retroalimentación del accidente y sensibilización en manipulación manual de cargas	Lina María Giraldo / SST	20/01/26	Bajo	20/01/26	Cumple	0	N/A	Eficaz	Cerrado	20/01/26
15	22/01/26	Inspección botiquín	Operativa	No conformidad	Faltan bolsas herméticas y termómetro	Correctiva	Falta control de inventario	Compra de insumos	SST	22/02/26	Bajo	28/02/26	Cumple	0	Ajuste logístico compra	Eficaz	Cerrado	28/02/26
16	11/02/26	Investigación AT	Operativa	No conformidad	Lumbago por sobreesfuerzo y manipulación de carga	Correctiva	Fatiga muscular, subestimación del riesgo biomecánico, manejo inadecuado de cargas	Capacitación en manejo seguro de cargas y uso de ayudas mecánicas	Lina María Giraldo / SST	24/02/26	Bajo	24/02/26	Cumple	0	N/A	Eficaz	Cerrado	24/02/26
17	11/02/26	Investigación AT	Operativa	No conformidad	Exposición a posturas forzadas y trabajo a nivel de piso	Correctiva	Trabajo prolongado en cuclillas, falta de apoyo ergonómico	Verificar y suministrar rodilleras como apoyo ergonómico	Lina María Giraldo / SST	15/02/26	Medio	15/02/26	Cumple	0	N/A	Eficaz	Cerrado	15/02/26
18	11/02/26	Investigación AT	Operativa	No conformidad	Sobrecarga física por jornadas prolongadas y falta de rotación	Correctiva	Falta de planificación, jornadas extendidas, ausencia de pausas activas	Implementar pausas activas (mañana y tarde) y rotación de actividades	Lina María Giraldo / SST	23/02/26	Bajo	23/02/26	Cumple	0	N/A	Eficaz	Cerrado	23/02/26
19	28/02/26	Inspección vehículos	Operativa	No conformidad	Vehículo DTX928 requiere mantenimiento	Correctiva	Falta mantenimiento preventivo	Programar mantenimiento	SST	16/03/26	Alto	30/04/26	Cumple	-131	En gestión taller	Parcial	Abierto	—
20	28/02/26	Inspección vehículos	Operativa	No conformidad	Vehículo CLW189 requiere mantenimiento	Correctiva	Falta mantenimiento oportuno	Programar mantenimiento	SST	16/03/26	Alto	31/03/26	Cumple	0	Agenda de taller	Eficaz	Cerrado	31/03/26
21	31/03/26	Inspección botiquín	Operativa	No conformidad	Faltan elementos botiquín	Correctiva	Falta reposición periódica	Compra y dotación	SST	15/04/26	Bajo	—	Cumple	—	Pendiente compra	Parcial	Cerrado	—
22	30/03/26	Inspección extintores	Operativa	No conformidad	Extintor sin carga	Correctiva	Falta control recarga	Recarga extintor	SST	8/04/26	Medio	—	Cumple	—	En gestión proveedor	Parcial	Cerrado	—
23	31/03/26	Inspección planta	Operativa	Observación	Planta sin llantas	Mejora	Falta adecuación transporte	Gestionar compra e instalación	SST	15/04/26	Medio	—	Cumple	—	Gestión administrativa	Parcial	Cerrado	—
24	14/04/26	Investigación AT	Operativa	No conformidad	Corte en dedo por uso de pulidora	Correctiva	Falta de experiencia y capacitación en uso de herramienta	Capacitación en uso seguro de pulidora y herramientas eléctricas	Lina María Giraldo / SST	20/02/26	Bajo	20/02/26	Cumple	0	N/A	Eficaz	Cerrado	20/02/26
25	14/04/26	Investigación AT	Operativa	No conformidad	Encendido de pulidora sin verificar posición de manos	Correctiva	Falta de atención y evaluación deficiente del riesgo	Realizar observación comportamental en campo con COPASST	Lina María Giraldo / SST	22/02/26	Bajo	22/02/26	Cumple	0	N/A	Eficaz	Cerrado	22/02/26
26	14/04/26	Investigación AT	Operativa	No conformidad	Riesgo por manipulación insegura de herramienta eléctrica	Mejora	Falta de socialización de riesgos operativos	Socializar accidente como lección aprendida al personal operativo	Lina María Giraldo / SST	25/02/26	Bajo	25/02/26	Cumple	0	N/A	Eficaz	Cerrado	25/02/26
27	30/04/26	Inspección vehículos	Operativa	No conformidad	El vehículo de placa MTN502, reporta necesidad de mantenimiento correctivo en los siguientes aspectos: Direccional trasera funciona ocasionalmente, freno de emergencia deficiente, tacometro no funciona, velocimetro no funciona, nivel de combustible no funciona, el medidor de la temperatura no funciona, carrocería en mal estado, sillas traseras en mal estado, close esta muy corto a veces no entran los cambios.	Correctiva	Falta mantenimiento preventivo	Mantenimiento correctivo	Supervisor	4/05/26	Alto	—	Atraso	119	31/8/26 Se realiza tensión de frenos	Parcial	Abierto	—
28	30/04/26	Inspección vehículos	Operativa	No conformidad	El vehículo de placa CWB189, Reporta necesidad de mantenimiento en los siguientes aspectos: Direccional trasera funciona ocasionalmente, freno de emergencia deficiente, tacometro no funciona, velocimetro no funciona, nivel de combustible no funciona, el medidor de la temperatura no funciona, carrocería en mal estado, sillas traseras en mal estado, close esta muy corto a veces no entran los cambios.	Correctiva	Deterioro por uso	Mantenimiento correctivo	Supervisor	—	Alto	—	Cumple	—	el vehículo sale de opoeración de manera indefinida, debido al ingreso al taller para atención de necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo.	Parcial	Cerrado	—
29	30/04/26	Inspección botiquín	Operativa	Mejora	Botiquín de oficina presenta los siguientes faltantes: Micropore, curitas, linterna	Preventiva	Falta control preventivo	Reposición de elementos	SST	15/05/26	Bajo	—	Cumple	—	Pendiente compra	Eficaz	Cerrado	1/06/26
30	30/04/26	Inspección bodega	Operativa	Observación	Las pinturas y solventes se almacenan en estanterías improvisadas en madera, considerado inadecuado dado lo combustible del material	Preventiva	Uso de estantería no apta	Gestionar compra estantería	SST	30/05/26	Alto	—	En Proceso	—	En gestión gerencia	Parcial	Abierto	—
31	13/04/26	Inspección SST	Operativo – Frentes de trabajo	Condición insegura	Presencia de extensiones eléctricas con empalmes y adaptaciones en campo	Correctiva	Falta de control en la verificación de herramientas eléctricas y uso de elementos no certificados	Retiro de extensiones en mal estado y reposición por elementos certificados	Área SST / Supervisor	14/04/26	No requiere	14/04/26	Cumple	0	N/A	Eficaz	Cerrado	16/04/26
32	27/04/26	Inspección SST	Operativa	Condición insegura	Extintor con etiqueta poco visible, dificultando la identificación de características y control de mantenimiento	Correctiva	Desgaste por uso y condiciones ambientales, sin reposición oportuna del elemento de identificación	Cambio de etiqueta del extintor y verificación de información visible	Área SST	10/05/26	No requiere	10/05/26	Cumple	0	N/A	Eficaz	Cerrado	8/06/26

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: RG-UTSIT-2025-37


Fecha: Julio 31 del 2026

MATRIZ DE MEJORA CONTINUA

Versión 1


ESTADO DE ACCIONES

TOTAL DE ACCIONES	61
ACCIONES ABIERTAS	16
ACCIONES CERRADAS	45




CUMPLIMIENTO VS ATRASO

TOTAL DE ACCIONES	61
CUMPLE	46
EN PROCESO	9
ATRASO	6



ACCIONES POR FUENTE

INVESTIGACIÓN ACCIDENTE DE TRABAJO	15
INSPECCIONES	28
ACTUALIZACIÓN MATRIZ IPVR	2
REUNIÓN COPASST	11



33	27/04/26	Inspección SST	Operativa	Condición insegura	Extintor sin boquilla, afectando su operatividad en caso de emergencia	Correctiva	Falta de verificación detallada del estado del equipo previo a su uso en campo	Compra y reposición de boquilla para garantizar funcionamiento de lequipo	Área SST	10/05/26	Bajo	10/05/26	Cumple	0	N/A	Eficaz	Cerrado	26/05/26		
34	9/04/26	Investigación AT	Operativo	Acto inseguro	Manipulación manual de carga sin técnica adecuada	Correctiva	Falta de aplicación de técnicas seguras de levantamiento	Restricción de manipulación manual de cargas pesadas	SST / Supervisor	13/04/26	No requiere		Cumple	0	N/A	Eficaz	Cerrado	30/04/26		
35	9/04/26	Investigación AT	Operativo	Condición insegura	Manipulación de planta eléctrica sin apoyo suficiente	Correctiva	Deficiente planeación de la tarea	Definir mínimo 3 personas para cargue/descargue	SST / Operaciones	13/04/26	No requiere		Cumple	0	N/A	Eficaz	Cerrado	30/04/26		
36	9/04/26	Investigación AT	Operativo	Condición insegura	Ausencia de ayudas mecánicas para manipulación de cargas	Correctiva	Falta de infraestructura para manipulación segura	Instalación de rampa para manipulación de cargas	SST / Logística	20/04/26	bajo		Cumple	0	N/A	Eficaz	Cerrado	30/04/26		
37	9/04/26	Investigación AT	SG-SST	Mejora	Necesidad de fortalecer cultura preventiva	Preventiva	Falta de retroalimentación de eventos	Socialización de lección aprendida	SST	29/04/26	No requiere		Cumple	0	N/A	Eficaz	Cerrado	30/04/26		
38	28/05/26	Inspección de Botiquines	Operativa	No conformidad	Faltantes de gasas estériles, apósitos oculares, micoporo y otros elementos en botiquines de cuadrillas.	Correctiva	Consumo de insumos durante la operación y falta de reposición oportuna.	Realizar reposición de elementos faltantes y actualizar inventario de control de botiquines.	SST / Supervisión	26/06/26	Bajo	15/06/26	Cumple	0	N.A.	Eficaz	Cerrado	23/06/26		
39	28/05/26	Inspección de Extintores	Operativa	Observación	Se evidencia etiqueta de identificación poco legible en un extintor multipropósito ubicado en frente de trabajo.	Correctiva	Deterioro de la etiqueta por exposición a condiciones ambientales y manipulación durante la operación.	Reemplazar la etiqueta de identificación y verificar la legibilidad de la información contenida en el extintor.	SST	30/06/26	Bajo	15/06/26	Cumple	0	N.A.	Eficaz	Cerrado	8/06/26		
40	26/05/26	Inspección Locativa	Operativa	Acto Inseguro / Documental	No se evidencian las Hojas de Datos de Seguridad (HDS) del cemento utilizadas en la actividad dentro de la tabla de permisos del frente de trabajo.	Correctiva	Falta de verificación previa de la documentación requerida para el manejo seguro de sustancias químicas empleadas en la actividad.	Gestionar, entregar e incorporar las HDS del cemento a la documentación del frente de trabajo y socializar su contenido con el personal involucrado.	Área SST / Ambiental	27/05/26	N/A	15/06/26	Cumple	0	N/A	Eficaz	Cerrado	8/06/26		
41	26/05/26	Inspección EPP	Operativa	Condición Subestándar	Se identificó personal con faltantes de EPP requeridos para la ejecución segura de la actividad de pintura.	Correctiva	Desgaste de elementos y falta de reposición oportuna por parte del trabajador.	Gestionar y realizar entrega inmediata de los EPP faltantes, reforzando la inspección preoperacional de elementos de protección personal.	Área SST / Supervisor	27/05/26	N/A	30/05/26	Cumple	0	N/A	Eficaz	Cerrado	27/05/26		
42	7/05/26	Inspección EPP	SST– Instalación de Semáforo de Piso	Condición Subestándar	Se evidenció faltante de elemento de protección personal requerido para un trabajador durante la actividad inspeccionada.	Correctiva	Deterioro del elemento y ausencia de reposición previa al inicio de actividades.	Entrega de EPP faltante y verificación del uso adecuado antes de reiniciar labores.	Área SST / Supervisor	8/05/26	N/A	30/05/26	Cumple	0	N/A	Eficaz	Cerrado	8/05/26		
43	28/05/26	Reunión COPASST	Operativa	No conformidad	La pulidora amarilla presenta reparación provisional del cable eléctrico mediante cinta aislante, condición que no cumple los requisitos de seguridad para herramientas eléctricas portátiles.	Correctiva	Deterioro del cable por uso continuo y ausencia de reposición oportuna.	Gestionar cambio completo del cable eléctrico y verificar condiciones generales de la herramienta antes de su uso.	Supervisor / SST	30/06/26	Bajo	Pendiente	Cumple	0	la puidora es dada de baja de operación, temporalmente, hasta dar solución a los requerimientos técnicos identificados	Por verificar	Cerrado	Pendiente		
44	28/05/26	Reunión COPASST	Operativa	No conformidad	El vehículo DTX928 presenta elementos faltantes en el kit de carretera reglamentario.	Correctiva	Pérdida, deterioro o reposición pendiente de elementos obligatorios.	Completar la totalidad de los elementos faltantes del kit de carretera.	Supervisor	30/06/26	Bajo	Pendiente	Atraso	0	N.A.	Por verificar	Abierto	Pendiente		
45	28/05/26	Reunión COPASST	Operativa	Oportunidad de mejora	El vehículo DTX928 cumplió la vigencia programada para mantenimiento preventivo.	Preventiva	Cumplimiento del periodo de mantenimiento establecido por el fabricante y la organización.	Gestionar mantenimiento preventivo del vehículo.	Supervisor	15/06/26	Medio	Pendiente	Cumple	0	Se realiza cambio de aceite	Eficaz	Cerrado	Pendiente		
46	28/05/26	Reunión COPASST	Operativa	No conformidad	La rampa utilizada para cargue y descargue presenta deterioro y requiere ser reinstalada y asegurada.	Correctiva	Desgaste por uso continuo.	Reinstalar, asegurar y verificar la estabilidad de la rampa.	Supervisor / SST	15/06/26	Bajo	Pendiente	Atraso	77	N.A.	Por verificar	Abierto	Pendiente		
47	28/05/26	Reunión COPASST	Operativa	No conformidad	La carretilla utilizada para transporte de materiales presenta deterioro significativo.	Correctiva	Desgaste por uso continuo y falta de mantenimiento correctivo.	Realizar mantenimiento correctivo o reposición del equipo.	Supervisor	30/06/26	Medio	Pendiente	Cumple	0	N.A.	Eficaz	Cerrado	31/07/27		
48	31/05/26	Inspección Preoperacional Vehículo	Operativa	Condición Subestándar	El vehículo MTN502 se identifican necesidades de mantenimiento asociadas a muelles, amortiguadores, espejos retrovisores, rodamientos y sistema de frenos.	Correctiva	Desgaste normal de componentes debido al uso continuo del vehículo en actividades operativas y desplazamientos diarios.	Programar mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo revisión y ajuste de suspensión, cambio de amortiguadores, mantenimiento de rodamientos, revisión del sistema de frenos y reposición o ajuste de espejos retrovisores.	Supervisor Operativo / Área Administrativa	15/06/26	Según cotización del taller	Programada	En Proceso	N/A	Actividad incluida dentro del plan de mantenimiento vehicular.	Pendiente verificar	Abierto	N/A		
49	26/06/26	Reunión COPASST	Operaciones	Oportunidad de mejora	Continúa pendiente la devolución de la sonda dieléctrica prestada por Electroservicios.	Correctiva	Falta de gestión administrativa para coordinar la devolución.	Gestionar la devolución de la sonda y verificar disponibilidad del equipo propio para la operación.	Supervisor	31/07/26	N/A	Pendiente	Cumple	0	N/A	Pendiente	Cerrado			
50	26/06/26	Inspección Preoperacional Vehículo	Transporte	Hallazgo	Vehículo Duster Oroch DTX928 presenta múltiples pendientes de mantenimiento (kit de carretera, espejo, bumper, stop, defensa, luz diurna y mantenimiento preventivo vencido).	Correctiva	Aplazamiento del mantenimiento preventivo y correctivo.	Ejecutar mantenimiento integral del vehículo y verificar cierre mediante inspección.	Coordinación / Supervisor	31/07/26	Según cotización	Pendiente	En Proceso	0	Se realiza cambio de aceite , cambio de pastas de frenos	Pendiente	Abierto			
51	26/06/26	Reunión COPASST	Bodega	Oportunidad de mejora	La carretilla utilizada es provisional y pertenece a otra cuadrilla.	Correctiva	No se dispone de una carretilla exclusiva para la bodega.	Adquirir una carretilla destinada exclusivamente a las actividades de cargue y descargue.	Supervisor	4/07/26	Según compra	31/07/26	Cumple	0	N/A	Eficaz	Cerrado			
52	26/06/26	Reunión COPASST	SST	Hallazgo	Se evidencian desviaciones en el uso de EPP durante actividades de pintura, especialmente por no utilizar monja y exponer la piel a sustancias químicas.	Correctiva	Relajación en el cumplimiento de los procedimientos de seguridad.	Sensibilizar al personal, reforzar supervisión y realizar seguimiento mediante inspecciones planeadas.	SST	15/07/26	Sin costo	Pendiente	Cumple	0	N/A	Pendiente	Cerrado			
53	26/06/26	Reunión COPASST	SST	Oportunidad de mejora	Los recipientes para hidratación entregados al personal se encuentran deteriorados y prácticamente agotados.	Preventiva	Fin de la vida útil por uso continuo.	Gestionar reposición de recipientes para garantizar una adecuada hidratación durante las jornadas de trabajo.	SST	15/07/26	Según compra	Pendiente	Atraso	47	N/A	Pendiente	Abierto			
54	26/06/26	Reunión COPASST	Operaciones	Oportunidad de mejora	Los vehículos no cuentan con jabón para higiene de manos al finalizar las actividades de campo.	Preventiva	No existe dotación estándar para este insumo.	Incluir jabón para lavado de manos dentro de la dotación obligatoria de cada vehículo y verificar durante las inspecciones mensuales.	SST	15/07/26	Bajo	Pendiente	Atraso	47	N/A	Pendiente	Abierto			
55	26/06/26	Reunión COPASST	Gestión SST	Oportunidad de mejora	Se propone fortalecer la cultura de cuidado de vehículos, herramientas y equipos.	Preventiva	Se identifican oportunidades para mejorar el sentido de pertenencia y el reporte oportuno de fallas.	Programar charla de sensibilización sobre cuidado de vehículos, herramientas, limpieza, lubricación y reporte oportuno de daños.	SST	31/07/26	Sin costo	Pendiente	Cumple	0	N/A	Pendiente	Cerrado			
56	13/08/26	Simulacro de sismo	Todas las áreas	Oportunidad de mejora	Se requiere fortalecer la divulgación de los resultados y las lecciones aprendidas obtenidas durante el simulacro.	Correctiva	No se había definido una actividad formal para comunicar a todo el personal los resultados, aspectos positivos y oportunidades de mejora identificadas.	Socializar con todo el personal los resultados y las lecciones aprendidas del ejercicio, dejando registro de asistencia y evidencia de la actividad.	Responsable SG-SST / Auxiliar SST	5/09/26	Recursos internos	Pendiente de registrar	En Proceso		Diligenciar si aplica	Pendiente de verificar	Abierto	Pendiente		
57	13/08/26	Simulacro de sismo	Todas las áreas	Oportunidad de mejora	Se evidenció la necesidad de reforzar las conductas de autoprotección y la actuación segura antes, durante y después de un sismo.	Preventiva	El personal requiere mayor entrenamiento práctico sobre autoprotección, especialmente en la protección de cabeza y cuello y en las fases de respuesta ante un movimiento sísmico.	Realizar práctica específica sobre autoprotección, protección de cabeza y cuello y actuación antes, durante y después de un sismo.	Responsable SG-SST / Auxiliar SST	11/09/26	Recursos internos	Pendiente	En Proceso	—	No aplica mientras esté vigente el plazo	Pendiente de verificar	Abierto	Pendiente		
58	13/08/26	Simulacro de sismo	Todas las áreas	No conformidad	Si bien durante el ejercicio se asigno de forma especifica el cargo de coordinador de evacuación, la persona designada no cumplio con el rol especifico, por tanto, se debe socializar de las funciones especificas y protocolos de actuación.	Correctiva	instrucción especifica sobre funciones y protocolos de actuación	Designar formalmente al coordinador de evacuación y su suplente; definir la alarma, el orden de salida y los criterios para su activación, y divulgar esta información al personal.	Dirección / Responsable SG-SST	7/09/26	Recursos internos	Pendiente de registrar	En Proceso		Diligenciar si aplica	Pendiente de verificar	Abierto	Pendiente		
59	13/08/26	Simulacro de sismo / Inspección locativa	Todas las áreas	Condición insegura	Se identificaron materiales almacenados cerca de las rutas y áreas de circulación, con posibilidad de obstaculizar el desplazamiento durante una emergencia.	Correctiva	Ubicación inadecuada o falta de aseguramiento de materiales próximos a las rutas de circulación y evacuación.	Reubicar o asegurar los materiales almacenados próximos a las rutas y áreas de circulación, garantizando que permanezcan libres de obstáculos.	Almacén / Supervisor / SST	4/09/26	Recursos internos	Pendiente de registrar	En Proceso		Diligenciar si aplica	Pendiente de verificar	Abierto	Pendiente		

| | | |


UNION TEMPORAL
SIT MEDELLIN


ANEXO 32

INDICADORES DE AUSENTISMO

MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN
DE LA RED SEMAFÓRICA DE MEDELLÍN


UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	**SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**RG-UTSIT-2025-38**
		Fecha: 31/5/26
	AUSENTISMO LABORAL	**Versión 1**

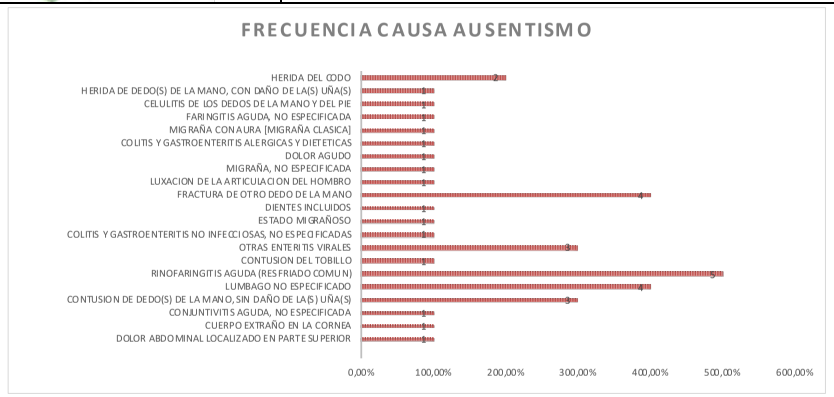


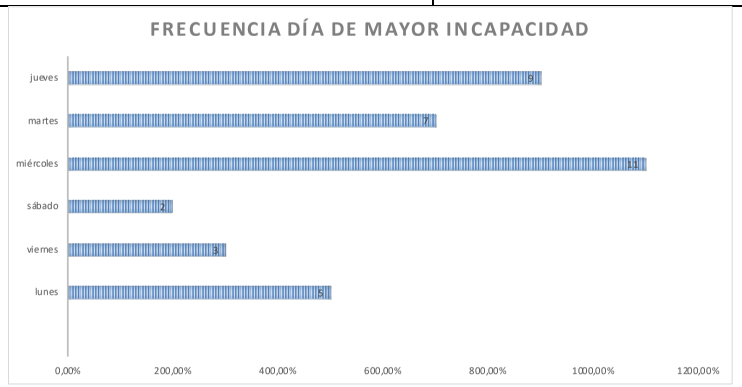

CLASE DE EVENTO	NOMBRES Y APELLIDOS DEL EMPLEADO		SEXO	CARGO	LOCALIDAD DONDE LABORA	FECHA INICIO INCAPACIDAD (dd/mm/aaaa)	DÍA INICIO INCAPACIDAD	FECHA FINAL INCAPACIDAD (dd/mm/aaaa)	DIAS DE INCAPACIDAD EMPRESA	DIAS DE INCAPACIDAD EPS	DIAS DE INCAPACIDAD -ARL	DIAS PERMISOS REVISIONES	NÚMERO TOTAL DE DIAS	CÓDIGO CIE10	DIAGNOSTICO MÉDICO
EG	JHON JAIRO SUÁREZ PERTUZ	1.047.494.355	MASCULINO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	MEDELLÍN	1/12/25	lunes	2/12/25	2				2	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR
EG	LUIS DANOVER LOZANO ROJAS	91.452.201	MASCULINO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	MEDELLÍN	5/12/25	viernes	6/12/25	2				2	T150	CUERPO EXTRAÑO EN LA CORNEA
EG	LUIS DANOVER LOZANO ROJAS	91.452.201	MASCULINO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	MEDELLÍN	6/12/25	sábado	10/12/25		5			5	H103	CONJUNTIVITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA
AT	CHRISTIAN BARBOSA YEPES	1.151.966.785	MASCULINO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	MEDELLÍN	10/12/25	miércoles	12/12/25			3		0	S600	CONTUSION DE DEDO(S) DE LA MANO, SIN DAÑO DE LA(S) UÑA(S)
AT	YEISON ALEJANDRO GALEANO PARRA	1.039.597.832	MASCULINO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	MEDELLÍN	30/12/25	martes	30/12/25			1		0	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO
EG	YEISON ALEJANDRO GALEANO PARRA	1.039.597.832	MASCULINO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	MEDELLÍN	3/02/26	martes	4/02/26	2				2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)
EG	HERNAN DARIO ACOSTA SIMANCA	1.001.025.750	MASCULINO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	MEDELLÍN	5/02/26	jueves	9/02/26	2	3			5	S900	CONTUSION DEL TOBILLO
EG	CHRISTIAN BARBOSA YEPES	1.151.966.785	MASCULINO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	MEDELLÍN	10/02/26	martes	10/02/26	1				1	A083	OTRAS ENTERITIS VIRALES
EG	CHRISTIAN BARBOSA YEPES	1.151.966.785	MASCULINO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	MEDELLÍN	11/02/26	miércoles	12/02/26	2				2	K529	COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS, NO ESPECIFICADAS
AT	CARLOS MARIO GONZÁLEZ MORA	1.049.894.058	MASCULINO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	MEDELLÍN	12/02/26	jueves	14/02/26			3			M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO
AT	CARLOS MARIO GONZÁLEZ MORA	1.049.894.058	MASCULINO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	MEDELLÍN	17/02/26	martes	21/02/26			5		0	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO
EG	LINA MARIA GIRALDO BOTERO	32.220.126	FEMENINO	PROFESIONAL SST	MEDELLÍN	18/02/26	miércoles	19/02/26	2				2	G432	ESTADO MIGRAÑOSO
EG	FRANKLIN BARBOSA PALOMINO	16.791.906	MASCULINO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	MEDELLÍN	4/03/26	miércoles	5/03/26	2				2	k010	DIENTES INCLUIDOS
EG	CARLOS ANDRÉS ZUÑIGA BENAVIDES	1.096.247.524	MASCULINO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	MEDELLÍN	14/03/26	sábado	14/03/26	1				1	S600	CONTUSION DE DEDO(S) DE LA MANO, SIN DAÑO DE LA(S) UÑA(S)
EG	CARLOS ANDRÉS ZUÑIGA BENAVIDES	1.096.247.524	MASCULINO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	MEDELLÍN	11/03/26	miércoles	9/04/26	2	28			30	S626	FRACTURA DE OTRO DEDO DE LA MANO
EG	JOHAN RAMIREZ LOPERA	1.015.166.405	MASCULINO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	MEDELLÍN	2/03/26	lunes	2/03/26	1				1	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO
EG	GINA PAOLA MARTINEZ VELASQUEZ	1.214.743.297	MASCULINO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	MEDELLÍN	18/03/26	miércoles	19/03/26	2				2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)
AT	CHRISTIAN BARBOSA YEPES	1.151.966.785	MASCULINO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	MEDELLÍN	18/03/26	miércoles	31/03/26	14				14	S430	LUXACION DE LA ARTICULACION DEL HOMBRO
EG	GINA PAOLA MARTINEZ VELASQUEZ	1.214.743.297	FEMENINO	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	MEDELLÍN	7/04/26	martes	8/04/26	2				2	G439	MIGRAÑA, NO ESPECIFICADA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	**SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**RG-UTSIT-2025-38**
		Fecha: 31/5/26
	AUSENTISMO LABORAL	**Versión 1**

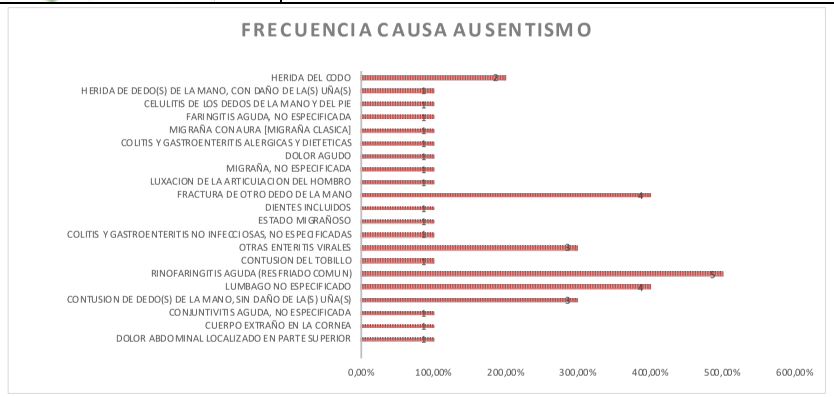

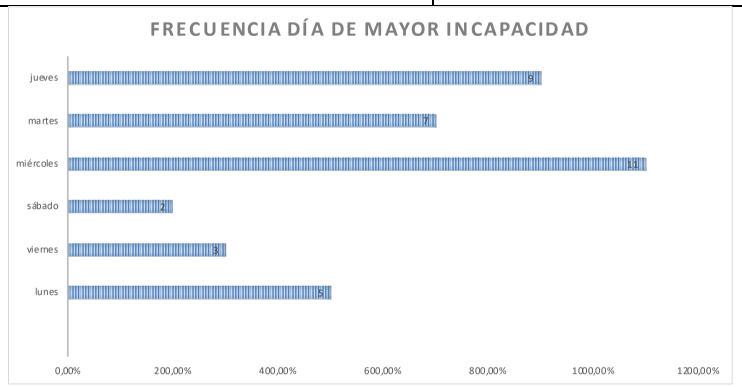

CLASE DE EVENTO	NOMBRES Y APELLIDOS DEL EMPLEADO		SEXO	CARGO	LOCALIDAD DONDE LABORA	FECHA INICIO INCAPACIDAD (dd/mm/aaaa)	DÍA INICIO INCAPACIDAD	FECHA FINAL INCAPACIDAD (dd/mm/aaaa)	DIAS DE INCAPACIDAD EMPRESA	DIAS DE INCAPACIDAD EPS	DIAS DE INCAPACIDAD -ARL	DIAS PERMISOS REVISIONES	NÚMERO TOTAL DE DIAS	CÓDIGO CIE10	DIAGNOSTICO MÉDICO
AT	EDWIN SANTO HERNANDEZ	1.038.810.427	MASCULINO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	MEDELLÍN	9/04/26	jueves	11/04/26			3		0	R520	DOLOR AGUDO
EG	CARLOS ANDRÉS ZUÑIGA BENAVIDES	1.096.247.524	MASCULINO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	MEDELLÍN	10/04/26	viernes	16/04/26		7			7	S626	FRACTURA DE OTRO DEDO DE LA MANO
EG	LUIS DANOVER LOZANO ROJAS	91.452.201	MASCULINO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	MEDELLÍN	15/04/26	miércoles	15/04/26	1				1	K522	COLITIS Y GASTROENTERITIS ALERGICAS Y DIETETICAS
EG	CARLOS ANDRÉS ZUÑIGA BENAVIDES	1.096.247.524	MASCULINO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	MEDELLÍN	17/04/26	viernes	26/04/26		10			10	S626	FRACTURA DE OTRO DEDO DE LA MANO
EG	CARLOS ANDRÉS ZUÑIGA BENAVIDES	1.096.247.524	MASCULINO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	MEDELLÍN	27/04/26	lunes	6/05/26		10			10	S626	FRACTURA DE OTRO DEDO DE LA MANO
EG	GINA PAOLA MARTINEZ VELASQUEZ	1.214.743.297	FEMENINO	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	MEDELLÍN	6/05/26	miércoles	7/05/26	2				2	G431	MIGRAÑA CON AURA [MIGRAÑA CLASICA]
EG	CARLOS MARIO GONZÁLEZ MORA	1.049.894.058	MASCULINO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	MEDELLÍN	12/02/26	jueves	14/02/26	2				2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)
EG	CHRISTIAN BARBOSA YEPES	1.151.966.785	MASCULINO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	MEDELLÍN	14/05/26	jueves	15/05/26	2				2	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)
EG	LUIS DANOVER LOZANO ROJAS	91.452.201	MASCULINO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	MEDELLÍN	14/05/26	jueves	15/05/26	2				2	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA
EG	CARLOS MARIO GONZÁLEZ MORA	1.049.894.058	MASCULINO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	MEDELLÍN	1/06/26	lunes	2/06/26	2				2	A083	OTRAS ENTERITIS VIRALES
EG	YEISON ALEJANDRO GALEANO PARRA	1.039.597.832	MASCULINO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	MEDELLÍN	16/06/26	martes	16/06/26	1				1	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)
EG	EDWIN SANTO HERNANDEZ	1.038.810.427	MASCULINO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	MEDELLÍN	25/06/26	jueves	25/06/26	1				1	A083	OTRAS ENTERITIS VIRALES
EG	LAURA MARCELA PADILLA	1.017.221.580	FEMENINO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	MEDELLÍN	30/07/26	jueves	31/07/26	2				2	L030	CELULITIS DE LOS DEDOS DE LA MANO Y DEL PIE
AT	JESÚS MOISÉS FLOREZ ACERO	1.069.484.054	MASCULINO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	MEDELLÍN	29/07/26	miércoles	31/07/26			3		3	S600	CONTUSION DE DEDO(S) DE LA MANO, SIN DAÑO DE LA(S) UÑA(S)
EG	CARLOS MARIO GONZÁLEZ MORA	1.049.894.058	MASCULINO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	MEDELLÍN	4/08/26	martes	5/08/26	2				2	K529	COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS, NO ESPECIFICADAS
AT	JAIME ESTIVEN PALACIO ACEVEDO	1.096.218.904	MASCULINO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	MEDELLÍN	5/08/26	miércoles	11/08/26			7		7	S611	HERIDA DE DEDO(S) DE LA MANO, CON DAÑO DE LA(S) UÑA(S)
EG	LAURA MARCELA PADILLA	1.017.221.580	FEMENINO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	MEDELLÍN	17/08/26	lunes	19/08/26	2	1			3	S510	HERIDA DEL CODO
EG	LAURA MARCELA PADILLA	1.017.221.580	FEMENINO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	MEDELLÍN	20/08/26	jueves	23/08/26		4			4	S510	HERIDA DEL CODO

UNION TEMPORAL
SIT MEDELLIN

ANEXO 33

INCAPACIDADES

MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN
DE LA RED SEMAFÓRICA DE MEDELLÍN

EPS SURAMERICANA S.A. 800088702

CERTIFICADO DE INCAPACIDAD / LICENCIA Nro. 0 - 44203756

Fecha	04/08/2026 09:31:18		**IPS Atiende**	890900841 - CIS COMFAMA LOPEZ DE MESA - 050010556843 - MEDELLIN	
Afiliado	CC - 1049894058 CARLOS MARIO GONZALEZ MORA		**IPS Afiliado**	890900841 - CIS COMFAMA LOPEZ DE MESA - 050010556843	
Diagnóstico principal	K529		**Diagnóstico relacionado**		
Origen	ENFERMEDAD GENERAL	**Tipo de prestación económica**		AMBULATORIO	**Clasificación** INICIAL
Fecha Inicio	MARTES 04 DE AGOSTO DE 2026	**Duración**	2 - DOS		**Fecha Fin** MIÉRCOLES 05 DE AGOSTO DE 2026
Tipo Generación	GENERACION		**Nro. Prescripción a Sustituir**		
Modalidad de la prestación del servicio	Intramural		**Incapacidad retroactiva**	N	

INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL

Profesional Responsable	CC - 98590112 LUIS FERNANDO GARCIA GOMEZ
Registro Médico	98590112 - MEDICO GENERAL

Afiliado:	Le sugerimos presentar el formato de incapacidad que está recibiendo a su empleador para justificar su ausencia laboral.
Empleador o Trabajador Independiente:	Para la solicitud de reconocimiento económico, el empleador deberá tener una cuenta bancaria inscrita en la cual se realizará el desembolso en caso de que se cumplan las condiciones para la liquidación y radicar la incapacidad a través de nuestra página www.epssura.com.co opción empleadores, transacciones y radicación de incapacidades. Para la radicación deberá indicarse el número del certificado de este formato.

INCAPACIDAD ARL AXACOLPATRIA

AXA COLPATRIA
relevantando / los seguros

DATOS DE IMPRESIÓN		
Fecha	**Hora**	**Usuario**
11/08/2026	15 : 39	RAGOMEZJ
REGIONAL MEDELLIN		

Incapacidad No.: 192853

Trabajador: JAIME ESTIVEN PALACIO ACEVEDO **Documento:** 1096218904

Fecha de expedición: 2026/08/11

INFORMACIÓN DE LA INCAPACIDAD					
Fecha Inicial	2026/08/05	**Fecha final**	2026/08/11	**Días Incapacidad Acumulados**	0
Clase de Incapacidad	Prórroga	**Origen de Incapacidad**		AT	
Días de Incapacidad	7	**Días Incapacidad Letras**		SIETE DÍAS	
Código	**Diagnóstico**				
S611	HERIDA DE DEDO(S) DE LA MANO, CON DA¥O DE LA(S) U¥				
Observaciones					
HERIDA DE DEDO(S) DE LA MANO, CON DAÑO DE LA(S) UÑA(S)					

R Gomez J

FIRMA MÉDICO TRATANTE RM

RICARDO ARTURO GOMEZ JIMENEZ
MEDICINA LABORAL
REGIONAL MEDELLIN
DR.

VIRREY SOLIS IPS S.A.
NIT - 800003765 - 1
Virrey Solis IPS
Carrera 43 A # 31 - 183 - 4473535 - Medellin - Colombia

Orden N° 1092749 **Orden Incapacidades y/o licencias** **Código**: OR009 **Fecha y hora**: 20/08/2026 09:32

Vigencia: 20/08/2026 - 23/08/2026 **EAPB**: 901037916 ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-ADRES COE-20-NAL060 CONVENIO VS ADRES S A SOAT **Paciente**: CC 1017221580 LAURA MARCELA PADILLA GIRALDO **Fecha de Nacimiento**: 29/07/1994 **Edad**: 32 Años/0 Meses/22 Dias **Sexo**: Femenino **Teléfono**: 0
Dirección: CR 9 A 56 56 SUR SEC CEN **Tipo de usuario**: SOAT **Via de ingreso**: Atención inicial de urgencias **Categoria**: SOAT

Diagnósticos
Principal Ingreso: S510 **Tipo principal**: Impresión Diagnóstica.

Causa externa: Accidente de tránsito de origen común **Ocupación**: No aplica **Tipo vinculación**: SOAT

Dias de incapacidad: 4 **Prórroga**: No
Observaciones:
Especialidad: MEDICINA GENERAL MEDICINA GENERAL
Código Entidad Prestadora: 100112529701 **Grupo De Servicios**: 05 Atención Inmediata **Modalidad De La Prestación Del Servicio**: 01 Intramural **Origen De La Incapacidad**: Común

Cristian David Anaya Ortiz CC 1143469821
N° de registro:
MEDICINA GENERAL MEDICINA GENERAL

Firma usuario

Powered by CamScanner

VIRREY SOLIS IPS

VIRREY SOLIS IPS S.A.
NIT - 800003765 - 1
Virrey Solis IPS
Carrera 43 A # 31 - 183 - 4473535 - Medellin - Colombia

Orden N° 1089527 **Orden Incapacidades y/o licencias** **Código:** OR009 **Fecha y hora:** 17/08/2026 13:29

Vigencia: 17/08/2026 - 19/08/2026 **EAPB:** 901037916 ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-ADRES COE-20-NAL060 CONVENIO VS ADRES S.A SOAT **Paciente:** CC 1017221580 LAURA MARCELA PADILLA GIRALDO **Fecha de Nacimiento:** 29/07/1994 **Edad:** 32 Años/0 Meses/19 Dias **Sexo:** Femenino **Teléfono:** 0
Dirección: CR 9 A 56 56 SUR SEC CEN **Tipo de usuario:** SOAT **Vía de ingreso:** Atención inicial de urgencias **Categoria:** SOAT

Diagnósticos
Principal Ingreso: S510 **Tipo principal:** Impresión Diagnóstica,

Causa externa: Accidente de tránsito de origen común **Ocupación:** No aplica **Tipo vinculación:** SOAT

Dias de incapacidad: 3 **Prórroga:** No
Observaciones:
Especialidad: MEDICINA GENERAL MEDICINA GENERAL
Código Entidad Prestadora: 100112529701 **Grupo De Servicios:** 05 Atención Inmediata **Modalidad De La Prestación Del Servicio:** 01 Intramural **Origen De La Incapacidad:** Común

Milagros Martinez Gaviria CC 1144073985
N° de registro:
MEDICINA GENERAL MEDICINA GENERAL

Firma usuario

Milagros Martínez Gavir
Médico Genera
RM. 1144073985

UNION TEMPORAL
SIT MEDELLIN

ANEXO 34

INDICADORES DEL SGSST

MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN
DE LA RED SEMAFÓRICA DE MEDELLÍN

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FICHA TÉCNICA INDICADOR EPP

OBJETIVO:	Medir el grado de cumplimiento en la entrega de los elementos de protección personal requeridos por los trabajadores, de acuerdo con los riesgos asociados a su labor y la matriz de EPP.	**NOMBRE DEL INDICADO**	Entrega de EPP




MEDICIÓN

FÓRMULA	(Número de epp entregados/Número de epp requeridos) * 100	**META**	100%
		RESPONSABLE	Profesional SST
FUENTE DE DATOS	Formato entrega de epp, SG-SST	**FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN**	**Mensual**
		PARTES INTERESADAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO	**Gerencia**

SEGUIMIENTO — **AÑO 2026**

PERIODO	No EPP ENTREGADOS	No. Epp REQUERIDOS	CUMPLIM.	META
ENERO	127	127	100%	100%
FEBRERO	93	93	100%	100%
MARZO	119	119	100%	100%
ABRIL	93	93	100%	100%
MAYO	67	67	100%	100%
JUNIO	55	55	100%	100%
JULIO	77	77	100%	100%
AGOSTO	78	78	100%	100%
SEPTIEMBRE			#DIV/0!	100%
OCTUBRE			#DIV/0!	100%
NOVIEMBRE			#DIV/0!	100%
DICIEMBRE			#DIV/0!	100%
TOTAL	709	709	100%	

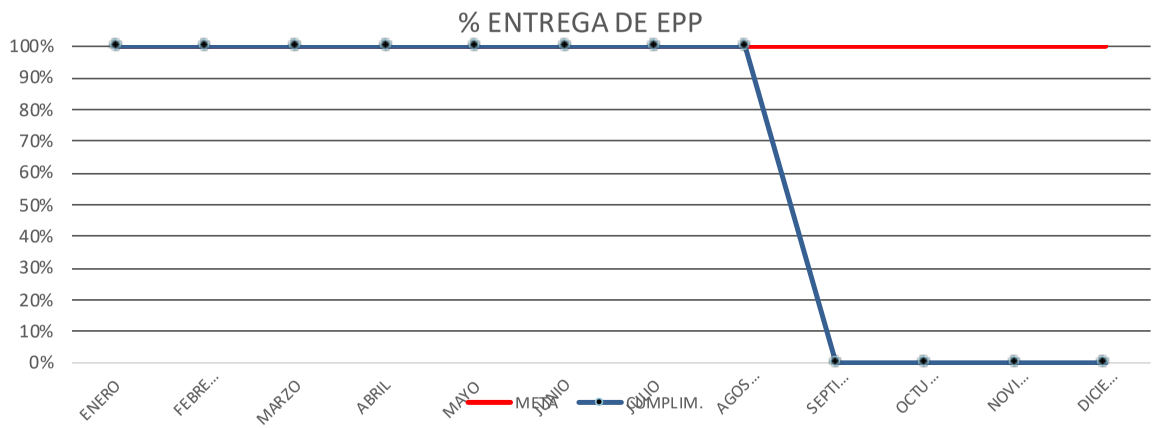


PLAN DE ACCION


PERIODO	ANALISIS	INICIATIVAS
ENERO	Se realizó la entrega del 100% de los elementos de protección personal requeridos por los trabajadores, conforme a la matriz de EPP y los riesgos asociados a cada cargo.	Mantener actualizado el inventario de EPP y verificar la entrega oportuna al personal de ingreso y al personal operativo.
FEBRERO	Se mantiene un cumplimiento del 100% en la entrega de los elementos de protección personal requeridos para el desarrollo seguro de las actividades.	Realizar seguimiento permanente al estado de los EPP y gestionar oportunamente su reposición cuando sea requerida.

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	**SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	
	FICHA TÉCNICA INDICADOR EPP	
MARZO	La entrega de EPP se efectuó conforme a las necesidades identificadas y a los riesgos de cada actividad, alcanzando el 100% de cumplimiento.	Fortalecer el control documental de los registros de entrega y la trazabilidad de los elementos suministrados.
ABRIL	Durante el período se dio cumplimiento a la entrega de los elementos de protección personal requeridos, garantizando la protección de los trabajadores.	Continuar verificando la disponibilidad de existencias y la oportunidad en la entrega de los EPP.
MAYO	Se mantiene el cumplimiento del indicador con la entrega total de los EPP requeridos durante el período evaluado.	Verificar periódicamente el estado de conservación de los EPP e identificar necesidades de reposición por desgaste o deterioro.
JUNIO	Se alcanzó un cumplimiento del 100% en la entrega de los elementos de protección personal requeridos, evidenciando un adecuado control del suministro y de los registros documentales asociados.	Mantener el seguimiento al inventario, garantizar la disponibilidad de existencias y continuar fortaleciendo el control documental de las entregas, reposiciones y cambios de EPP conforme a la matriz de elementos de protección personal.
JULIO	Se alcanzó un cumplimiento del 100% en la entrega de los elementos de protección personal requeridos, evidenciando un adecuado control del suministro y de los registros documentales asociados.	Mantener el seguimiento al inventario, garantizar la disponibilidad de existencias y continuar fortaleciendo el control documental de las entregas, reposiciones y cambios de EPP conforme a la matriz de elementos de protección personal.
AGOSTO	Se alcanzó un cumplimiento del 100% en la entrega de los elementos de protección personal requeridos, evidenciando un adecuado control del suministro y de los registros documentales asociados.	Mantener el seguimiento al inventario, garantizar la disponibilidad de existencias y continuar fortaleciendo el control documental de las entregas, reposiciones y cambios de EPP conforme a la matriz de elementos de protección personal.

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	**SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**
	FICHA TÉCNICA INDICADOR AUSENTISMO POR ENFERMEDA GENERAL

OBJETIVO:	Gestionar y controlar los peligros y riesgos		
MEDICIÓN			
FÓRMULA	EL= N° casos nuevos de Enfermedad Laboral en año / Nº de Incidentes reportados	**NOMBRE DEL INDICADOR**	Índice de Frecuencia Enfermedad general
		META	100%
FÓRMULA	I. S = No. de días perdidos por causa de ATEL durante el periodo x 100 / No. de Horas hombre trabajadas durante el periodo	**NOMBRE DEL INDICADOR**	Indice de Severidad
		META	100%
FUENTE DE DATOS	Caracterización EG	**RESPONSABLE**	Coordinadora SG-SST
		FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN	Mensual

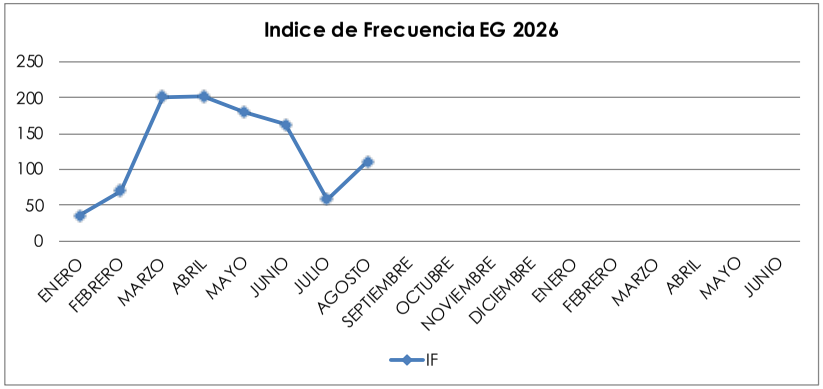

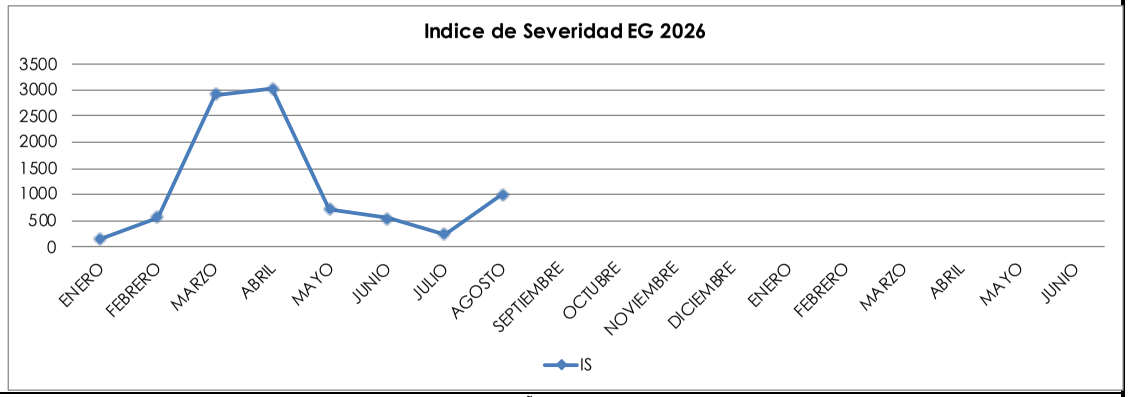

SEGUIMIENTO — **AÑO: 2026**

MES	No TRABAJADORES INCAPACITADOS	N° TRABAJADORES	DIAS DE INCAP.	DIAS PRORROGA	TOTAL DIAS INCAP.	DIAS CARGADOS	TOTAL DIAS TRABAJADOS	TOTAL HORAS EXTRAS	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	INDICES	
										IF	IS
ENERO	1	33	2	0	2	2	25	0	6.584	36	146
FEBRERO	2	33	6	2	8	8	26	0	6.800	71	565
MARZO	5	30	36	0	36	36	26	0,0	5.952	202	2903
ABRIL	4	26	30	0	30	30	24	0,0	4.752	202	3030
MAYO	4	28	8	0	8	8	24	0,0	5.312	181	723
JUNIO	3	28	5	0	5	5	20	0,0	4.440	162	541
JULIO	1	27	2	0	2	2	19	0,0	4.088	59	235
AGOSTO	2	29	9	0	9	9	19	0,0	4.336	111	996
SEPTIEMBRE											
OCTUBRE											
NOVIEMBRE											

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN			SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
			FICHA TÉCNICA INDICADOR AUSENTISMO POR ENFERMEDA GENERAL								
DICIEMBRE											
ENERO											
FEBRERO											
MARZO											
ABRIL											
MAYO											
JUNIO											
2026	**22**	**29**	**98**	**2**	**76**	**0**	**183**	**0**	**24.088**	**219**	**757**


ANÁLISIS	
ENERO	Durante el mes de enero de 2026 se presentó incapacidad por enfermedad general en un (1) colaborador, con un total de dos (2) días de incapacidad. El comportamiento de los índices de frecuencia y severidad corresponde al evento registrado y no evidencia un impacto significativo sobre el ausentismo del período.
FEBRERO	Durante el mes de febrero de 2026 se presentaron incapacidades por enfermedad general en dos (2) colaboradores, acumulando ocho (8) días de incapacidad. El incremento de los indicadores frente al mes anterior obedece al mayor número de casos reportados y de días de ausencia; no obstante, corresponde al comportamiento normal de enfermedad común y no evidencia tendencias asociadas a condiciones laborales.
MARZO	Durante el mes de marzo de 2026 se reportaron incapacidades por enfermedad general en cinco (5) colaboradores, para un total de treinta y seis (36) días de incapacidad. El incremento de los índices de frecuencia y severidad estuvo influenciado principalmente por un caso de incapacidad prolongada de treinta (30) días derivada de una fractura del dedo meñique, condición de origen común. Los demás eventos correspondieron a incapacidades de corta duración, entre uno (1) y dos (2) días.
ABRIL	Durante el mes de abril de 2026 se registraron incapacidades por enfermedad general en cuatro (4) colaboradores, con un total de treinta (30) días de incapacidad. El comportamiento de los indicadores continúa influenciado por la incapacidad prolongada del trabajador con fractura del dedo meñique, mientras que los demás casos presentaron incapacidades de corta duración. No se identifican comportamientos atípicos adicionales durante el período.
MAYO	Durante el mes de mayo de 2026 se registraron incapacidades por enfermedad general en cuatro (4) colaboradores, acumulando ocho (8) días de incapacidad. Los casos correspondieron a incapacidades de corta duración, con un promedio de dos (2) días por trabajador, reflejando un comportamiento de baja severidad y sin afectación significativa sobre la operación del contrato.
JUNIO	Durante el mes de junio de 2026 se presentaron incapacidades por enfermedad general en tres (3) colaboradores, con un total de cinco (5) días de incapacidad. El comportamiento del indicador muestra una disminución tanto en el número de trabajadores incapacitados como en los días de ausencia respecto a los meses anteriores, evidenciando un comportamiento estable
JULIO	Durante el mes de julio de 2026 se presento ausentimo de colaboradora con un (1) día de incapacidad. El comportamiento del indicador muestra una disminución tanto en el número de trabajadores incapacitados como en los días de ausencia respecto a los meses anteriores, evidenciando un comportamiento estable
AGOSTO	En el mes de agosto se presentan dos colaboradores incapacitados por enfermedad general, el indicador revela una pequeño aumento en la frecuencia y severidad, esta última asociada a incapacidad a manos de colaboradora con seis (6) días cargados

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN 01
	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO PROGRAMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS 2026	ENERO 20 DEL 2026

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Cumplimiento del Plan de Trabajo Programa de Protección Contra Caídas
Objetivo	Medir el cumplimiento de las actividades programadas dentro del programa.
fórmula	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas) × 100
Tipo de indicador	Gestión
Proceso	Seguridad y Salud en el Trabajo
Frecuencia:	Mensual
Responsable:	Profesional SST
Meta:	≥ 85%
Fuente de información: Plan	Plan de trabajo, registros de inspección, actas, hojas de vida, permisos de trabajo, simulacros y demás evidencias.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

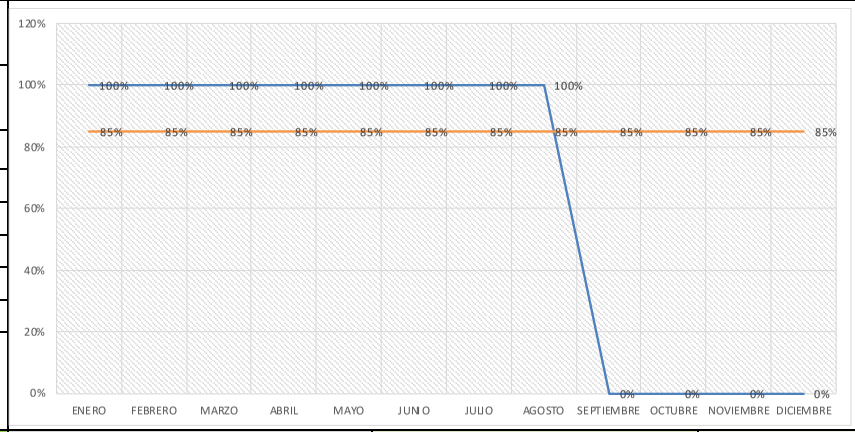

RESUMEN MENSUAL DEL INDICADOR

MES	PGMADO	EJCUTADO	CUMPLMIENTO	ESTADO
ENERO	3	3	100%	●
FEBRERO	3	3	100%	●
MARZO	5	5	100%	●
ABRIL	4	4	100%	●
MAYO	5	5	100%	●
JUNIO	2	2	100%	●
JULIO	2	2	100%	●
AGOSTO	2	2	100%	
SEPTIEMBRE	4	0	0%	
OCTUBRE	3	0	0%	
NOVIEMBRE	2	0	0%	
DICIEMBRE	2	0	0%	

SEMAFORO DE INTERPRETACIÓN

●	>=85%	Cumple
●	70%-84%	Requiere seguimiento
●	<70%	Requiere acción correctiva

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJEUCTADAS	CUMPLIMIENTO ACUMULADO	META
26	26	100%	85%

DETALLE DEL PLAN DE TRABAJO-PROGRAMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

#	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS FINANCIEROS	RECURSOS TÉCNICOS	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
						P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1	Actualización del Programa de Protección Contra Caídas	Revisión y actualización documental del programa conforme a las actividades ejecutadas en la red semafórica.	Responsable SST	Recursos SG-SST	Normatividad, computador, formatos							X	X	X	X														
2	Inventario de equipos de protección contra caídas	Actualización y control de inventario de equipos y elementos certificados.	SST / Almacén	Presupuesto operativo	Inventario y formatos					X	X			X	X														
3	Inspección preoperacional de equipos	Verificación diaria de equipos antes del uso operativo.	Trabajador usuario	Recursos operativos	Check list y formatos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X		X	
4	Inspección periódica documentada	Inspección anual documentada de equipos para trabajo en alturas y rescate.	Persona competente	Recursos SG-SST	Formatos e inventarios																	X		X					
5	Capacitación en protección contra caídas	Capacitación y reinducción sobre uso seguro de equipos y control de riesgos.	SST / ARL	Recursos capacitación	Ayudas audiovisuales y EPP																								
6	Capacitación en procedimientos de rescate	Formación teórico-práctica en rescate en alturas y espacios confinados.	SST / Brigada	Recursos capacitación	Trípode, ID, poleas, líneas					X	X																		
7	Verificación de certificados y conceptos médicos	Seguimiento a vigencia de certificados de alturas y aptitud médica ocupacional.	SST / Talento Humano	Recursos administrativos	Base documental																								

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN 01
UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	**INDICADOR DE CUMPLIMIENTO** PLAN DE TRABAJO PROGRAMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS 2026	ENERO 20 DEL 2026

#	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS FINANCIEROS	RECURSOS TÉCNICOS	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
						P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
8	Verificación y actualización de hojas de vida	Gestión de mantenimiento, reposición y retiro de servicio de equipos deteriorados o vencidos.	SST / Almacén	Presupuesto compras	Inventario y hojas de vida																								
9	Inspecciones en campo	Verificación del cumplimiento operativo en actividades con escaleras y estructuras.	Supervisores / SST	Recursos operativos	Vehículo, formatos, cámara																								
10	Seguimiento a permisos de trabajo	Control y validación de permisos para actividades en alturas.	Coordinador TA	Recursos administrativos	Formatos físicos o digitales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X		X	
11	Simulacro de rescate	Ejecución de simulacros de atención y rescate de trabajadores suspendidos.	SST / Brigada	Recursos emergencias	Equipos de rescate																	X							
12	Seguimiento de indicadores del programa	Control de cumplimiento de inspecciones, capacitaciones y acciones correctivas.	Responsable SST	Recursos SG-SST	Indicadores y bases de datos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														

ANÁLISIS DEL INDICADOR	ACCIONES/PLAN DE MEJORA	RESPONSABLE	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
Durante el mes de enero se ejecutaron las tres (3) actividades programadas, alcanzando un cumplimiento del 100%. Se evidencia el inicio oportuno de la implementación del Programa de Protección Contra Caídas, conforme al cronograma establecido.	Mantener la ejecución de las actividades programadas y asegurar el registro oportuno de las evidencias documentales.	Profesional SST	30/01/26
En el mes de febrero se ejecutaron las tres (3) actividades programadas, manteniendo un cumplimiento del 100%. Se verificó la continuidad de las inspecciones, el seguimiento documental y las actividades definidas en el programa.	Continuar el seguimiento al cronograma y fortalecer el control de registros e inspecciones programadas.	Profesional SST	28/02/26
Durante marzo se ejecutaron las cinco (5) actividades programadas, alcanzando nuevamente un cumplimiento del 100%. Se desarrollaron las actividades de capacitación y procedimientos de rescate conforme a lo programado.	Mantener la ejecución de las actividades programadas y verificar permanentemente la vigencia de certificados y competencias del personal autorizado.	Profesional SST	30/03/26
En abril se ejecutaron las cuatro (4) actividades programadas, manteniendo el cumplimiento del 100%. El programa continúa desarrollándose conforme al cronograma, sin evidenciar desviaciones que afecten su ejecución.	Continuar el seguimiento documental y operativo del programa, garantizando la trazabilidad de las evidencias.	Profesional SST	30/04/26
Durante mayo se ejecutaron las cinco (5) actividades programadas, logrando un cumplimiento del 100%. Se dio continuidad a las inspecciones, permisos de trabajo, seguimiento de indicadores y controles establecidos para la prevención de caídas.	Mantener el seguimiento periódico al cumplimiento del programa y consolidar los soportes documentales generados durante la ejecución.	Profesional SST	30/05/26
Con corte al 30 de junio de 2026, el Programa de Protección Contra Caídas presenta un cumplimiento acumulado del 100%, correspondiente a la ejecución de las veintidós (22) actividades programadas para el primer semestre. El resultado supera la meta establecida (85%) y evidencia una adecuada implementación del programa, mediante el desarrollo de actividades de prevención y protección contra caídas, control documental, inspecciones de equipos, seguimiento a permisos de trabajo, capacitación en procedimientos de rescate y monitoreo de indicadores. No se identifican desviaciones que afecten el desempeño del programa durante el período evaluado.	•Mantener el seguimiento periódico al cumplimiento del cronograma del programa. • Ejecutar oportunamente las actividades programadas para el segundo semestre de la vigencia. • Continuar fortaleciendo las inspecciones de equipos y el control documental de certificados y hojas de vida.	Profesional SST	30/06/26
Durante el mes de julio se cumple con la ejecucón del 100% de las actividades programadas, encontrándose por encima de la meta planteada, acto que evidencia una adecuada implementación del programa, mediante el desarrollo de controles operativos y administrativos que pretenden disminuir el riesgo de la actividad involucrada	•Mantener el seguimiento periódico al cumplimiento del cronograma del programa. • Ejecutar oportunamente las actividades programadas para el segundo semestre de la vigencia. • Continuar fortaleciendo las inspecciones de equipos y el control documental de certificados y hojas de vida.	Profesional SST	30/07/26
Durante el mes de agosto se cumple con la ejecucón del 100% de las actividades programadas, encontrándose por encima de la meta planteada, acto que evidencia una adecuada implementación del programa, mediante el desarrollo de controles operativos y administrativos que pretenden disminuir el riesgo de la actividad involucrada	•Mantener el seguimiento periódico al cumplimiento del cronograma del programa. • Ejecutar oportunamente las actividades programadas para el segundo semestre de la vigencia. • Continuar fortaleciendo las inspecciones de equipos y el control documental de certificados y hojas de vida.	Profesional SST	30/08/26

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FICHA TÉCNICA INDICADOR AUSENTISMO AT


OBJETIVO:	Gestionar y controlar los peligros y riesgos


MEDICIÓN

FÓRMULA	IF = No. de casos reportados en el periodo x K(200.000) / Total Horas hombre trabajadas en el periodo	NOMBRE DEL INDICADOR	Índice de Frecuencia Accidentalidad
		META	100%
FÓRMULA	I.L.I= Indice de Frecuencia IF * Indice de Severidad IS / 1000	NOMBRE DEL INDICADOR	Indice de Severidad
		META	100%
FÓRMULA	I. S = No. de días perdidos por causa de ATEL durante el periodo 2016 x 100 / No. de Horas hombre trabajadas durante el periodo	NOMBRE DEL INDICADOR	Índice de Lesiones Incapacitantes
		META	100%
FÓRMULA	(N° AT / N° promedio de trabajadores)*100	NOMBRE DEL INDICADOR	Tasa de accidentalidad
		META	100%
FUENTE DE DATOS	Caracterización AT	RESPONSABLE	Coordinadora SG-SST
		FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN	Mensual

SEGUIMIENTO	AÑO	2026

MES	N° ACCIDENTES			N° TRABAJADORES	DIAS DE INCAP.	DIAS PRORROGA	TOTAL DIAS INCAP.	DIAS CARGADOS	TOTAL DIAS TRABAJADOS	TOTAL HORAS EXTRAS	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	INDICES			
	CI	SI	TOTAL									IF	IS	ILI	TASA DE ACCIDENTALIDAD
ENERO	0	0	0	33	0				24		6.336	0	0	0,0	0,0
FEBRERO	1	0	1	33	3	5	8	8	26		6.800	35	565	19,9	3,0
MARZO	2	0	2	30	14		17	17	26		6.104	79	1337	105,1	6,7
ABRIL	1	0	1	26	3		3	3	20		4.136	58	348	20,2	3,8
MAYO	0	0	0	28	0				24		5.376	0	0	0,0	0,0
JUNIO	0	0	0	28	0				20		4.480	0	0	0,0	0,0
JULIO	1	0	1	27	3		3		19		4.080	59	176	10,4	3,7
AGOSTO	1	0	1	29	7		7		19		4.352	55	386	21,3	3,4
SEPTIEMBRE											0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
OCTUBRE											0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
NOVIEMBRE											0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
DICIEMBRE											0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2026	**4**	**0**	**4**	**30**	**20**	**5**	**28**	**0**	**72**	**0**	**17.040**	**56**	**394**	**22,22**	**13,48**

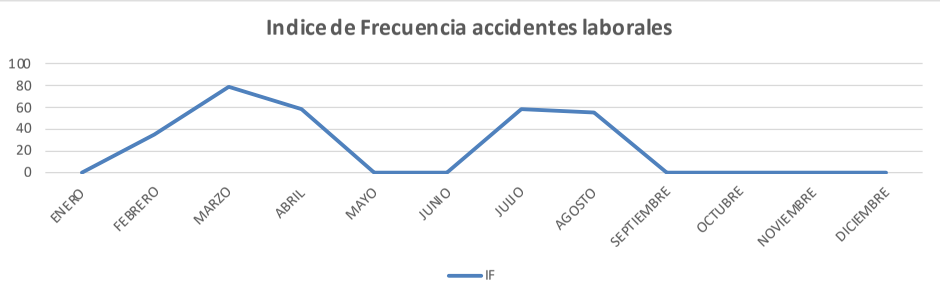

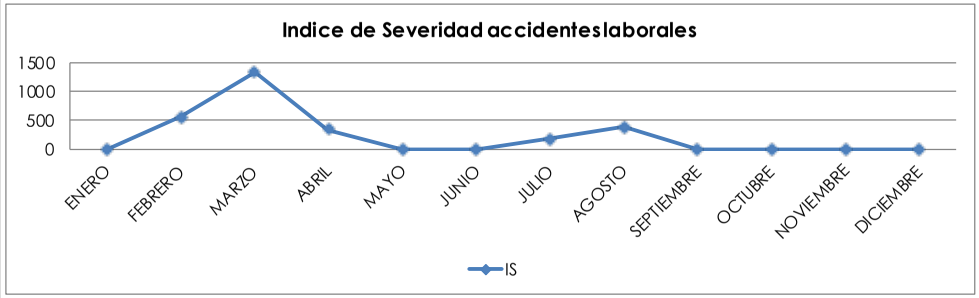

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FICHA TÉCNICA INDICADOR AUSENTISMO AT


ANÁLISIS	
ENERO	Durante el mes de enero de 2026 no se registraron accidentes de trabajo ni días de incapacidad asociados a eventos laborales. En consecuencia, los índices de frecuencia, severidad, lesiones incapacitantes y la tasa de accidentalidad permanecen en cero, evidenciando un adecuado comportamiento preventivo durante el período.
FEBRERO	Durante el mes de febrero se registró un accidente de trabajo con incapacidad temporal. El evento fue reportado e investigado conforme al procedimiento establecido, realizándose seguimiento médico y definiendo las acciones correctivas orientadas a prevenir la ocurrencia de eventos similares.
MARZO	Durante el mes de marzo se registraron los eventos reportados para el período, realizándose la respectiva investigación de accidentes de trabajo y seguimiento a las incapacidades generadas. Los indicadores reflejan un incremento en la frecuencia debido a la ocurrencia de los eventos; sin embargo, se implementaron las acciones correctivas y preventivas derivadas de la investigación para controlar la recurrencia.
ABRIL	Durante abril se presentó un accidente de trabajo que fue reportado e investigado de acuerdo con el procedimiento institucional. Aunque se evidencia afectación en el índice de frecuencia, la severidad del evento fue baja frente al total de horas hombre trabajadas. Se reforzaron las medidas preventivas y los controles operacionales asociados a la actividad desarrollada.
MAYO	Durante el mes de mayo no se registraron accidentes de trabajo ni ausentismo asociado a eventos laborales. Los indicadores de frecuencia, severidad, lesiones incapacitantes y tasa de accidentalidad permanecen en cero, evidenciando la efectividad de las medidas preventivas implementadas.
JUNIO	Durante el mes de junio de 2026 no se registraron accidentes de trabajo ni ausentismo derivado de accidentes laborales. El comportamiento de los indicadores refleja un adecuado control de los riesgos ocupacionales y la continuidad de las actividades de prevención implementadas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
JULIO	Durante el mes de julio se registra un accidente de trabajo, relacionado con traumatismo de mano, se adelantan actividades de entrevista a testigos, recolección de evidencias
AGOSTO	Durante el mes de agossto se registra un accidente de trabajo, relacionado con traumatismo de mano, Se realiza investigación y se diseña plan de acción

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	**SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	
	FICHA TÉCNICA INDICADOR CAPACITACIONES 2026	

FICHA TÉCNICA INDICADOR CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES

OBJETIVO:	Medir el grado de cumplimiento de las actividades de capacitación programadas en el cronograma anual del SG-SST, verificando su ejecución dentro de los tiempos establecidos.				
MEDICIÓN					
FÓRMULA	(No. Trabajadores asistentes/No. trabajadores programados) *100	**NOMBRE DEL INDICADOR**	Cumplimiento Asistecia Capacitaciones	**PARTES INTERESADAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO**	Gerencia, COPASST, Comité de Convivencia Laboral, Interventoría y Responsable SG-SST
FUENTE DE DATOS	Cronograma anual de capacitaciones, registros de ejecución, listas de asistencia, actas y evidencias fotográficas.	**FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN**	Mensual	**RESPONSABLE**	Líder SGSST
META	85%	**INTERPRETACIÓN**	A mayor porcentaje, mayor cumplimiento de las actividades de capacitación programadas en el periodo evaluado, evidenciando una adecuada gestión del programa de formación y entrenamiento.		


GRÁFICO

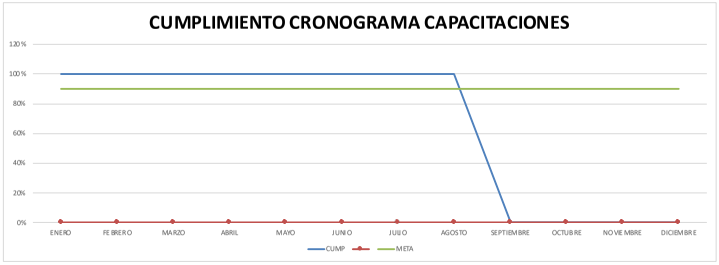

FICHA TÉCNICA INDICADOR COBERTURA CAPACITACIONES

OBJETIVO:	Medir el porcentaje de participación de los trabajadores convocados a las actividades de capacitación programadas, con el fin de verificar el alcance y efectividad de las estrategias de formación implementadas por el SG-SST.				
MEDICIÓN					
FÓRMULA	(Número de trabajadores asistentes / Número de trabajadores convocados) × 100	**NOMBRE DEL INDICADOR**	Cobertura de Capacitaciones	**PARTES INTERESADAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO**	Gerencia, COPASST, Comité de Convivencia Laboral, Supervisores y Trabajadores
FUENTE DE DATOS	Cronograma de capacitaciones, listas de asistencia, registros fotográficos y actas de capacitación	**FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN**	Mensual	**RESPONSABLE**	Líder SGSST
META	85%	**INTERPRETACIÓN**	A mayor porcentaje, mayor cobertura y participación de los trabajadores en las actividades de capacitación programadas. *La población convocada se determina para cada actividad de capacitación de acuerdo con la temática, el perfil del cargo y los riesgos asociados, considerando únicamente el personal al que aplica la formación programada.*		

GRÁFICO

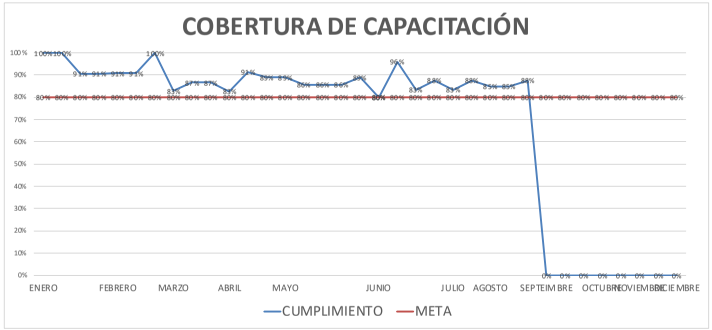

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES-- 2026

#	TEMA	Objetivo	Dirigido a	Responsable	Indicador de Cumplimiento	N CONVOCADOS	N ASISTENTES	CUMPLIMIENTO	META	Evidencia	ENERO P	ENERO E	FEBRERO P	FEBRERO E	MARZO P	MARZO E	ABRIL P	ABRIL E	MAYO P	MAYO E	JUNIO P	JUNIO E	JULIO P	JULIO E	AGOSTO P	AGOSTO E	SEPTIEMBRE P	SEPTIEMBRE E	OCTUBRE P	OCTUBRE E	NOVIEMBRE P	NOVIEMBRE E	DICIEMBRE P	DICIEMBRE E	OBSERVACIONES DE
ENERO	Capacitación por reinducción del personal	Reforzar conocimientos en políticas, normas y procedimientos de SG-SST	Todos los trabajadores	Responsable SG-SST/Auxiliar SST	% de cobertura de capacitación	16	16	100%	80%	Listas de asistencia, Registro fotográfico	X	X																						
	Certificación trabajador autorizado- Trabajador en alturas	Reforzar conocimientos sobre normatividad y prácticas seguras en trabajo en alturas.	Personal que requiere realizar trabajo en alturas	Área SST/Entidad formadora	% de trabajadores certificados	2	2	100%	80%	Certificados de asistencia	X	X																						
	Deberes y derechos de los trabajadores en SG-SST	Fortalecer la cultura de autocuidado y cumplimiento normativo	Todos los trabajadores	Responsable SG-SST/Auxiliar SST	% de cobertura de capacitación	32	29	91%	80%	Listas de asistencia, Registro fotográfico	X	X																						
	Normas de tránsito, inteligencia vial y protocolo de señalización en vía pública	Sensibilizar sobre el cumplimiento de normas viales y señalización segura	Trabajadores principalmente del área operativa	Responsable SG-SST	% de cobertura de capacitación	32	29	91%	80%		X	X																						
FEBRERO	Manejo de cargas, ergonomía y pausas activas.	Prevenir trastornos musculoesqueléticos y lesiones laborales	Todos los trabajadores	Responsable SG-SST	% de cobertura de capacitación	33	30	91%	80%	Listas de asistencia, Registro fotográfico			X	X																				
	Prevención de afección del túnel carpiano y manguito rotador	Sensibilizar y capacitar a los trabajadores sobre los factores de riesgo biomecánicos, movimientos repetitivos y la importancia de las pausas activas	Trabajadores expuestos a movimientos repetitivos, manipulación de cargas, labores administrativas y operativas.	Responsable SG-SST/Auxiliar SST	% de trabajadores capacitados	33	30	91%	80%	Listas de asistencia, Registro fotográfico			X	X																				
	Capacitación por reinducción del personal	Reforzar conocimientos en políticas, normas y procedimientos de SG-SST	Todos los trabajadores	Responsable SG-SST/Auxiliar SST	% de cobertura de capacitación	1	1	100%	80%	Listas de asistencia, Registro fotográfico			X	X																				
MARZO	Capacitación en perfiles por cargo	Capacitar al personal en los perfiles por cargo, asegurando el conocimiento de sus funciones, riesgos y responsabilidades, para un desempeño seguro y acorde con el SG-SST.	Todos los trabajadores	Responsable SG-SST/Auxiliar SST	% de trabajadores capacitados	29	24	83%	80%	Listas de asistencia, Registro fotográfico					X	X																		
	Socialización del Reglamento Interno de Trabajo	Dar a conocer al personal las disposiciones, deberes, derechos y normas internas establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo.	Personal de la empresa	Profesional SST / Talento Humano	**% de personal capacitado**	30	26	87%	80%	Listas de asistencia, Registro fotográfico					X	X																		

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FICHA TÉCNICA INDICADOR CAPACITACIONES 2026

| | | |

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FICHA TÉCNICA INDICADOR CAPACITACIONES 2026

| | | |

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FICHA TÉCNICA INVESTIGACIÓN AT

FICHA TÉCNICA

OBJETIVO:	Identificar, evaluar e intervenir los agentes y factores de riesgo derivados de las condiciones de trabajo y actos inseguros presentes en los lugares de trabajo, que puedan ocasionar accidentes o alterar la salud de los colaboradores


MEDICIÓN

FÓRMULA	(No. De accidentes, incidentes ocurridos/No. Accidentes, incidentes investigados) *100	**NOMBRE DEL INDICADOR**	Investigación de Accidentes de Trabajo
		META	100%
FUENTE DE DATOS	Registro de accidentes, Furat	**RESPONSABLE**	Líder SST
		FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN	Mensual
		PARTES INTERESADAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO	Personal involucrado en el accidente laboral, gerencia

SEGUIMIENTO

AÑO:2026

PERIODO	N° AT INVESTIGADOS.	N° AT	CUMPLIM.	META
ENERO	0	0	N/A	100%
FEBRERO	1	1	100%	100%
MARZO	2	2	100%	100%
ABRIL	1	1	100%	100%
MAYO	0	0	N/A	100%
JUNIO	0	0	N/A	100%
JULIO	1	1	100%	100%
AGOSTO	1	1	100%	100%
SEPTIEMBRE				100%
OCTUBRE				100%
NOVIEMBRE				100%
DICIEMBRE				100%

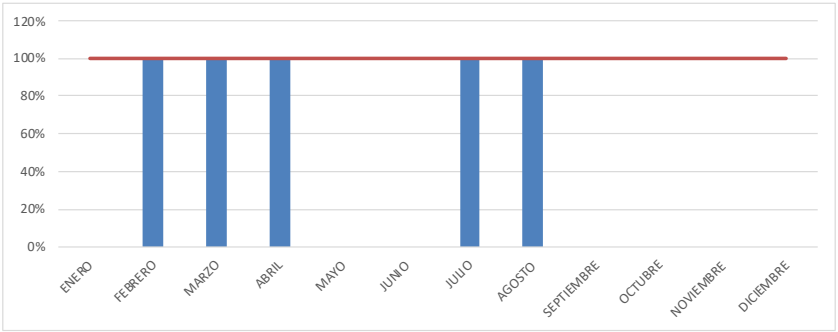

PLAN DE ACCION

PERIODO	ANÁLISIS	INICIATIVAS
ENERO	Durante el mes de enero de 2026 no se registraron accidentes de trabajo, por lo que no fue necesario adelantar investigaciones de eventos laborales.	Mantener las actividades de prevención, inspecciones de seguridad y reporte oportuno de actos y condiciones inseguras para conservar la accidentalidad en cero.
FEBRERO	Durante el mes de febrero se registró un (1) accidente de trabajo, el cual fue reportado e investigado conforme a lo establecido en la Resolución 1401 de 2007 y el procedimiento interno del SG-SST, alcanzando un cumplimiento del 100% en la investigación de los eventos ocurridos durante el período.	Realizar seguimiento al plan de acción derivado de la investigación, verificando la implementación y eficacia de las acciones correctivas y preventivas establecidas.
MARZO	Durante el mes de marzo de 2026 se registraron dos (2) accidentes de trabajo. Ambos eventos fueron reportados e investigados oportunamente, alcanzando un cumplimiento del 100% en las investigaciones realizadas. Como resultado de las investigaciones se definieron acciones correctivas y preventivas orientadas al fortalecimiento de los controles operacionales y la prevención de la recurrencia de eventos similares.	Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas derivadas de las investigaciones, fortalecer las inspecciones de seguridad y reforzar las capacitaciones relacionadas con los riesgos identificados.
ABRIL	Durante el mes de abril de 2026 se presentó un (1) accidente de trabajo, el cual fue investigado dentro de los términos establecidos, alcanzando un cumplimiento del 100%. La investigación permitió identificar las causas del evento y establecer las acciones de mejora correspondientes para reducir la probabilidad de recurrencia.	Verificar la eficacia de las acciones implementadas, realizar seguimiento a los compromisos derivados de la investigación y fortalecer los controles operacionales asociados a la actividad donde ocurrió el evento.
MAYO	Durante el mes de mayo de 2026 no se registraron accidentes de trabajo; por tanto, no fue necesario realizar investigaciones de eventos laborales.	Mantener las actividades de prevención, inspecciones planeadas, observaciones de comportamiento seguro y seguimiento a los riesgos críticos identificados en la matriz IPVR.
JUNIO	Durante el mes de junio de 2026 no se registraron accidentes de trabajo, por lo que no se requirió adelantar investigaciones. Se mantiene el seguimiento a la eficacia de las acciones implementadas en las investigaciones realizadas durante los meses anteriores.	Continuar verificando el cierre y eficacia de las acciones correctivas y preventivas derivadas de las investigaciones realizadas, promoviendo la mejora continua del SG-SST.
JULIO	Finalizando el mes de julio se presenta accidente de trabajo por atrapamiento de mano, se inicia con la recolección de registro fotográfico, indagación de personal testigo, se continuara en el mes de agosto	Ejecutar el plan de acción derivado de la investigación; socializar la lección aprendida; reforzar el manejo seguro de tapas y cargas pesadas; y capacitar al personal en prevención de atrapamientos y ubicación de las manos fuera de la línea de fuego.
AGOSTO	Durante el mes de agosto se presenta AT, por atrapamiento de mano, se realiza investsigación de acuerdo a los tiempos y términos establecidos en la normativa Colombiana vigente	Capacitar al personal en cuidado y protección de las manos, líneas de fuego y prevención de atrapamientos; fortalecer los análisis de trabajo seguro y verificar las condiciones del área y del equipo antes de iniciar la actividad.

UNION TEMPORAL
SIT MEDELLIN

ANEXO 35

DOCUMENTOS DEL PERSONAL

MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN
DE LA RED SEMAFÓRICA DE MEDELLÍN



REPÚBLICA DE COLOMBIA
PERMISO POR PROTECCIÓN TEMPORAL

MIGRACIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

No. 5036864

COL

ACOSTA SUAREZ
APELLIDOS

ERIC EDUARDO
NOMBRES

VEN
NACIONALIDAD

M
SEXO

22096266
DNI Nro.

20-04-1995
FECHA DE NACIMIENTO

03-02-2022 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

30-05-2031
FECHA DE VENCIMIENTO

VISIBLES

FIRMA



E0242369

INDICE DERECHO

El titular de este documento debe notificar a Migración Colombia cualquier cambio en la condición o información migratoria.

Juan Francisco Espinosa Palacios
Director General de Migración Colombia

MIGRACIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

www.migracioncolombia.gov.co

IPCOL5036864<<8<<<<<<<<<<<<<<<
9504202M3105308VENE0242369<<<6
ACOSTA<SUAREZ<<ERIC<EDUARDO<<<

Fecha Impresión: **14/08/2026 12:54:14 pm**	**CONCEPTO MÉDICO DE APTITUD LABORAL**	susmédicos Conciencia laboral y valoración **800.113.024-4**

Nro. Ingreso: **201799**	Fecha del Exámen: **16/07/2026**	Tipo de Exámen: **Ingreso**

Información SUS MEDICOS S.A.S

Dirección: Calle 29 AA # 50-09	**Teléfono:** (604) 4486363	**Correo:** susmedicosinfo@gmail.com

Exámenes practicados: CONCEPTO ESPACIO CONFINADO, CALIENTE Y ALTURA

DATOS PERSONALES





Nombres: ERIC EDUARDO		Apellidos: ACOSTA SUAREZ	
Tipo de documento: Permiso Especial de Trabajo		Número de documento: 5.036.864	
Fecha Nacimiento: 1995/04/20	Edad: 31 años	Sexo: Masculino	
Dirección Domicilio: LA CAPILLA EL MANZANILLO		Teléfono Domicilio:	
Lugar Residencia: MEDELLIN		Grupo Sanguíneo: O+	
Profesión/ocupación: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO			
Nombre Acompañante: NINGUNO		Teléfono Acompañante: NINGUNO	
Persona Responsable: STIVEN PALACIO (AMIGO)		Teléfono Persona R: 3235992533	
EPS: Sura	ARL: Otro	Pensiones: Porvenir S.A.	Cesantias: Porvenir S.A.
Tipo Vinculación EPS: Contributivo cotizante		Estado Civil: Soltero(a)	

INFORMACIÓN EMPRESA

Empresa: UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN		Actividad Económica: Construccion de proyectos de servicio publico	
Cargo: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	Perfil Biológico: Adecuada audicion , Adecuada vision, Adecuado sistema osteomuscular general	Factores de Riesgo: Locativo en el puesto de trabajo, Posturas prolongadas, Mecanico, Ruido, Esfuerzos, Alturas, Publico por desplazamiento , electrico .	Medidas de Protección: Proteccion auditiva y respiratoria, Guantes, Monogafas, casco, proteccion auditiva y respiratoria, arnes, lineas de vida, vestimenta adecuada.

CONCEPTO MÉDICO DE APTITUD LABORAL

S.V.E	RECOMENDACIONES	RESTRICCIONES	INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO PARA EL CARGO
AUDIOMETRÍA	Control periódico teniendo en cuenta: Sensibilidad auditiva periférica bilateral normal.	Ninguna.	Resultado normal y adecuado para el cargo
ESPIROMETRÍA	Control periódico teniendo en cuenta: Patrón espirométrico normal.	Ninguna.	Resultado normal y adecuado para el cargo
VISIOMETRÍA	Control periódico teniendo en cuenta: Agudeza visual mixta bilateral normal, Discriminación del color normal, Percepción de profundidad normal.	Ninguna.	Resultado normal y adecuado para el cargo
TAMIZAJE OSTEOMUSCULAR	Control periódico teniendo en cuenta que el examen físico osteomuscular que se le realizó hoy, es normal. Se le recomienda hacer las pausas activas durante su jornada de trabajo. Realizar los movimientos corporales y adoptar las posturas del cuerpo de manera adecuada. Manipular cargas de acuerdo a las recomendaciones ergonómicas propias de su oficio y de su puesto de trabajo.	Ninguna.	Resultado normal y adecuado para el cargo

HEMOLEUCOGRAMA	Control periódico, teniendo en cuenta que el resultado del examen de hemoleucograma que se le realizó hoy, es normal.	Ninguna.	Resultado normal y adecuado para el cargo
GLICEMIA	Control periódico, teniendo en cuenta que el resultado del examen de glicemia que se le realizó hoy, es normal.	Ninguna.	Resultado normal y adecuado para el cargo
PERFIL LIPÍDICO	Control periódico, teniendo en cuenta que el resultado del examen de perfil lipídico que se le realizó hoy, es normal.	Ninguna.	Resultado normal y adecuado para el cargo
ELECTROCARDIOGRAMA	Control periódico, teniendo en cuenta que el resultado del examen del electrocardiograma que se le realizó hoy, sin lectura por cardiólogo, es normal.	Ninguna.	Resultado normal y adecuado para el cargo
TAMIZAJE PSICOLÓGICO	Control periódico teniendo en cuenta, el resultado adecuado en el tamizaje psicológico para su cargo en sus esferas mental, social y emocional.	Ninguna.	Resultado normal y adecuado para el cargo
EXAMEN MÉDICO	Control periódico teniendo en cuenta examen físico clínicamente normal Cumplir las normas de higiene y seguridad ocupacional en su trabajo, correspondientes al cargo u oficio que va a desempeñar en la empresa. Mantener un estilo de vida saludable.	Ninguna.	Resultado normal y adecuado para el cargo

CONCEPTO MÉDICO DE APTITUD LABORAL	
Concepto	Apto para trabajo en espacio confinado y alta temperatura

	
PROFESIONAL: JUAN GONZALO SOTO VELEZ	PACIENTE: ERIC EDUARDO ACOSTA SUAREZ
CC 3353871	Documento: PET: 5036864
Medico	
Licencia: 5700	
Especialista en: ESPECIALISTA EN SO	
Registro: 4802	

Certifico con la firma de este documento que la información es cierta y autorizo a SUS MEDICOS S.A.S; para almacenar y usar mis datos personales para el registro de operaciones en el termino de la relación contractual y comercial que se origina en el registro de la base de datos de usuarios y para reportar información
CERTIFICO QUE LAS RECOMENDACIONES Y LAS RESTRICCIONES DADAS, FUERON EXPLICADAS AL USUARIO PARA QUE LAS TENGA EN CUENTA.

comfama

Registro de afiliación individual

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN | NIT 9019793961 | Envío exitoso No. 4142198

La solicitud de afiliación de tu grupo familiar se ha enviado exitosamente con el número de **radicado 4142198.**
Recuerda que este es el primer paso; en máximo **24 horas** recibirás a tu correo electrónico el estado final de la afiliación.

Datos del trabajador

Información general

Documento:	Nombre:	Fecha de nacimiento:	Género:	Estado civil:
PPT 5036864	ERIC EDUARDO ACOSTA SUAREZ	20/04/1995	Masculino	Soltero/a

Residencia y contacto

Departamento:	Municipio:	Dirección:	Teléfono celular:	Correo electrónico:
Antioquia	Medellin	CR 76A # 32 - 39	3174802825	ee22096266@gmail.com

Datos laborales

Tipo de contrato:	Tipo de salario:	Salario:	Horas contratadas al dia:	Horas contratadas al mes:	Fecha de ingreso a la empresa:
Fijo	Fijo	$1,750,905	7	210	10/08/2026

Vigilado Supersubsidio

Archivos adjuntos

Trabajador: ERIC EDUARDO ACOSTA SUAREZ

Tipo de documento	Archivo	Tamaño
Permiso de Protección Temporal	5036864.pdf	201 KB

Vigilado Supersubsidio

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que el afiliado relacionado a continuación se encuentra vinculado con nuestra compañía bajo la afiliación No. 9030475 correspondiente a la empresa Union Temporal Sit Medellin.

Nombre	T. I	Número de Identificacion	Fecha de inicio cobertura
ERIC EDUARDO SUAREZ ACOSTA	PT	5,036,864	10/08/2026

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el jueves 6 de agosto de 2026 a las 03:43:06 p. m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps
gente cuidando gente
NIT. 900.156.264-2

FECHA DE RADICACIÓN DÍA 12 MES 08 AÑO 2026

Lea atentamente las instrucciones antes de diligenciar este formulario

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. TIPO DE TRÁMITE: A. AFILIACIÓN [ ] B. REPORTE DE NOVEDADES [X]
2. TIPO DE AFILIACIÓN: A. Individual: a) Cotizante o cabeza de familia [X] b) Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]
3. RÉGIMEN: A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]
4. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA: SI [ ] NO [X]
5. TIPO DE AFILIADO: A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ] D. Afiliado adicional [ ]
6. TIPO DE COTIZANTE: A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
7. CÓDIGO

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (Del cotizante o cabeza de familia)

8. APELLIDOS Y NOMBRES
PRIMER APELLIDO: ACOSTA | SEGUNDO APELLIDO: SUAREZ | PRIMER NOMBRE: ERIC | SEGUNDO NOMBRE: EDUARDO

9. TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	10. NÚMERO DE IDENTIDAD	11. SEXO BIOLÓGICO	12. SEXO IDENTIFICACIÓN
	5036864	F: X	F: X, T, NB, Otro. Cual?

13. NACIONALIDAD	14. LUGAR DE NACIMIENTO: PAÍS	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	15. FECHA NACIMIENTO: DÍA	MES	AÑO
VENEZOLANO	VENEZUELA			20	04	1995

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

16. ETNIA	17. COMUNIDAD INDÍGENA	18. DISCAPACIDAD	CAT. DE DISCAPACIDAD	19. TIENE ENCUESTA SISBÉN?	20. CLASIFICACIÓN SISBÉN	NIVEL	GRUPO	21. GRUPO POBLACIÓN ESPECIAL	22. ARL
		SI [ ] NO [X]	N/A	SI [ ] NO [X]					AXA COLPATRIA

23. AFP	24. IBC	25. TARIFA CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA	26. RESIDENCIA	TELÉFONO CELULAR	TELÉFONO FIJO
PORVENIR	$ 1.750.905			3174802825	

DIRECCIÓN	COMPLEMENTO DIRECCIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	DEPARTAMENTO
CR 76A # 32 - 39		EE22096266@GMAIL.COM	ANTIOQUIA

MUNICIPIO/ DISTRITO	LOCALIDAD/COMUNA	ZONA	IPS
MEDELLIN	CENTRO	CABECERA MUNICIPAL [X] CENTRO POBLADO [ ] RURAL DISPERSO [ ] RESTO RURAL [ ]	

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR – Datos de identificación del beneficiario (Cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante)

27. APELLIDOS Y NOMBRES
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE

28. TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	29. NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	30. SEXO BIOLÓGICO	31. SEXO IDENTIFICACIÓN
		F / M	F, M, T, NB, Otro. Cual?

32. NACIONALIDAD	33. LUGAR DE NACIMIENTO: PAÍS	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	34. FECHA NACIMIENTO: DÍA	MES	AÑO
	ANTIOQUIA	MEDELLIN				

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	35. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DE LOS BENEFICIARIOS	36. TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	37. NÚMERO DE IDENTIDAD	38. NACIONALIDAD	39. SEXO F	39. SEXO M	40. SEXO IDENTIFICACIÓN F	M	T	NB	Otro?	41. LUGAR DE NACIMIENTO: PAÍS	DEPART.	MUNICIPIO	42. FECHA DE NACIMIENTO: DÍA	MES	AÑO
B1																	
B2																	
B3																	
B4																	
B5																	

	Datos complementarios del Beneficiario 43. PARENTESCO	44. ETNIA	45. COMUNIDAD	46. GRUPO DE POBLACIÓN ESPECIAL	47. TIENE ENCUESTA SISBÉN? SI	NO	48. CLASIFICACIÓN SISBÉN NIVEL	GRUPO	49. DISCAPACIDAD SI	NO	CATEGORÍA DE DISCAPACIDAD	50. INCAPACIDAD PERMANENTE SI	NO	51. Datos de residencia DEPARTAMENTO	MUNICIPIO/ DISTRITO	ZONA CABECERA MUNICIPAL	CENTRO POBLADO	RURAL DISPERSO	RESTO RURAL
B1							I. II.												
B2							I. II.												
B3							I. II.												
B4							I. II.												
B5							I. II.												

	TELÉFONO FIJO Y/O CELULAR	52. VALOR DE LA UPC DEL AFILIADO ADICIONAL	DIRECCIÓN	LOCALIDAD/ COMUNA	CORREO ELECTRÓNICO	53. IPS	54. CÓDIGO DE LA IPS (A REGISTRAR POR LA EPS)
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES Y/O INDEPENDIENTE POR PRESTACIÓN DE SERVICIO O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

55. Nombre o razón social	56. Tipo documento de identificación	57. Número del documento de identificación	TELÉFONO FIJO O CELULAR	58. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	NIT	901979396	3125486349	

59. Dirección	CORREO ELECTRÓNICO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO/DISTRITO
DG 62 43 151	UNIONTEMPORALSITMEDELLIN@GMAIL.COM	BOGOTA	BOGOTA

B. REPORTE DE NOVEDADES

59. TIPO DE NOVEDAD
1. MODIFICACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN
2. CORRECCIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN
3. ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD
4. ACTUALIZACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE DATOS COMPLEMENTARIOS
5. TERMINACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN LA EPS Código:
6. REPORTE DE PAGO A TRAVÉS DE UN TERCERO Código:
7. INCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES
8. EXCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES
9. INICIO DE RELACIÓN LABORAL O ADQUISICIÓN DE CONDICIONES PARA COTIZAR
10. TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL O PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES PARA SEGUIR COTIZANDO
11. INSCRIP CIÓN EPS RETORNO AL PAÍS.1. RETIRO DE CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA.
12. VINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS
13. DESVINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS
14. MOVILIDAD A) AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO [X] B) AL RÉGIMEN SUBSIDIADO
15. TRASLADO A) MISMO RÉGIMEN B) DIFERENTE RÉGIMEN
16. REPORTE DE FALLECIMIENTO
17. REPORTE DEL TRÁMITE DE PROTECCIÓN AL CESANTE
18. REPORTE DE LA CALIDAD DE PREPENSIONADO
19. REPORTE DE LA CALIDAD DE PENSIONADO
20. INGRESO A CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA.
21. RETIRO DE CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

61. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN
PRIMER APELLIDO: ACOSTA | SEGUNDO APELLIDO: SUAREZ | PRIMER NOMBRE: ERIC | SEGUNDO NOMBRE: EDUARDO

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	62. SEXO BIOLÓGICO	62. SEXO IDENTIFICACIÓN
	5036864		F: X, T, NB, Otro.

64. FECHA NACIMIENTO	65. EPS ANTERIOR	66. FECHA DE NOVEDAD	67. MOTIVO DE TRASLADO	CÓDIGO	68. PAGADOR DE PENSIONES
DÍA 20 MES 04 AÑO 1995	S	DÍA 08 MES 08 AÑO 2026	6		

RECIBIDO
PARA ESTUDIO

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

69. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales: Declaro bajo la gravedad de juramento que el(los) Beneficiario(s) reportado(s) [X]
70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. Anexo soporte de la Entidad
72. Declaración de no intermediación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
75. Autorizo para que la EPS realice el manejo de los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
76. a). Autorizo mi consentimiento explícito para que Nueva EPS establezca comunicación a través de SMS, EMAIL, Página Web, Notificaciones App, Llamadas Telefónicas, WhatsApp y otros canales, para recibir mensajes informativos.
b). Autorización para que la EPS me contacte con fines netamente informativos sobre la prestación de servicios de salud dentro de los horarios regulares, incluso si estoy registrado en el "Registro de Números Excluidos" (RNE).
77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes.
78. Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según la encuesta del Sisbén vigente.

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD

IX. FIRMAS

80. El cotizante, cabeza de familia, beneficiario cuando aplique o afiliado adicional	81. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio
Eric	

X. ANEXOS

82. Anexo copia del documento de identidad:

	CN	MS	RC	TI	CC	CE	SC	PA	CD	AS	PT
Cantidad:								X			

Total

83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
84. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
87. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
88. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
89. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud numeral 4 y 5 del artículo 2.1.7.3 del Decreto 780 de 2016
90. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
91. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en las que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

Total Anexos

XI. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIONES RESPONSABLES DE POBLACIONES ESPECIALES

92. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD TERRITORIAL — Código del Municipio | Código del departamento | 93. NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

XII. DATOS DE LA INSTITUCIÓN Y DEL FUNCIONARIO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN.

94. APELLIDOS Y NOMBRES
Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Número del documento de identidad	95. FIRMA DEL FUNCIONARIO	96. FECHA DE RADICACIÓN: DÍA	MES	AÑO	97. FECHA DE VALIDACIÓN: DÍA	MES	AÑO

OBSERVACIONES:

Validado Supersalud

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

- ORIGINAL: E.P.S. -

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.
En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR
NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

El (La) Señor(a) **ERIC EDUARDO ACOSTA SUAREZ,** identificado(a) con Permiso de Proteccion Temporal **5.036.864**, se encuentra afiliado(a) al **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR con VINCULACION INICIAL** desde el 29 de noviembre de 2022.

La presente certificación se expide el 27 de julio de 2026.

Cordialmente,

Gerente de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: RG-UTSIT-2025-02 Versión:1
	FORMATO DIVULGACIÓN DE POLITICAS	Fecha: Sep. 2025

Nombre colaborador: Eric Eduardo Acosta Suarez
Cedula: 503.6864
Cargo: Auxiliar operativo
Fecha de divulgación: 10-08-2026

Por medio del cual se deja constancia de la divulgación de la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tabaco alcohol y droga y sus requisitos al personal de la empresa.

Yo, Eric Eduard Acosta Suarez con CC: 503 6864
Manifiesto conocer, respetar y cumplir las políticas de la empresa UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN, además de autorizar de forma libre y espontánea pruebas de detección de alcohol y/o sustancias psicoactivas.

Firma: 

Creado por: Jenifer Altamiranda Diaz
Aprobado por: Lina María Giraldo Botero


UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: RG-UTSIT-2025-01 Versión:1
	FORMATO DE INDUCCIÓN DE REINDUCCIÓN	Fecha: sep 2025
Nombre colaborador: Eric Eduardo Acosta Suarez		Inducción: X
Cedula de ciudadania: 5036864		Reinducción:
Cargo: Auxiliar de mantenimiento		Fecha de inducción: 10/08/2026
Nombre responsable inducción: Lina Giraldo		

Certifico que he recibido y entendido el temario de la inducción y reinducción en **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,** garantizando el cumplimiento de los lineamientos internos de la compañía , todos en pro de mi bienestar fisico-mental y de mis compañeros.

Los temas divulgados en esta inducción fueron:

- Políticas de gestión SST, medio ambiente y calidad.
- Política en libre de alcohol, tabaco y droga.
- Reglamento de higiene y seguridad industrial.
- Uso y mantenimiento adecuado de los EPP.
- Identificación de peligros y evaluación de riesgos.
- Reporte de incidentes, accidentes, actos y condiciones inseguras.
- Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.
- Comité de convivencia laboral.
- Derechos y deberes en SST.
- Uso adecuado de equipos y herramientas.
- Plan de emergencias.
- Programa de capacitaciones.
- Manejo de sustancias químicas.
- PMT.
- Manejo de residuos solidos.

Con mi firma me comprometo a cumplir todo lo divulgado anteriormente.



Firma colaborador:



Firma del responsable de inducción:

Creado por: Jenifer Altamiranda Diaz
por: Lina Maria Giraldo Botero

Aprobado

UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLIN

NIT 901.979.396-1

CONTRATO No 4600105555-2025

REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE MEDELLIN

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO FIJO

NOMBRE DEL EMPLEADOR: UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLIN	**DIRECCION DEL EMPLEADOR:** DIAGONAL 62 No. 43-151 B. LAS GRANJAS
NOMBRE DEL TRABAJADOR: ERIC EDUARDO ACOSTA SUAREZ	**DIRECCION DEL TRABAJADOR:** Cll 2b # 81B 163 Belen rincón
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: 5036864	**CARGO:** AUXILIAR MANTENIMIENTO
SALARIO MENSUAL: $ 1.750.905	**SUDSIDIO DE TRANSPORTE:** $249.095
FECHA INICIAL DE LABORES: Jueves, 13 de agosto 2026	**FECHA FINAL DE LABORES:** Viernes 30 de octubre de 2026
LUGAR DONDE DESEMPEÑA LAS LABORES: CALLE 54# 77D-74 - ZONA URBANA DISTRITO DE MEDELLIN	**CIUDAD DEL CONTRATO:** MEDELLIN, ANTIOQUIA
LABOR CONTRATADA: **Auxiliar de mantenimiento** para el proyecto cuyo objeto "realizar el mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el distrito de Medellín", cuyos alcances contemplan todas las actividades competentes para el perfil y demás que el jefe inmediato solicite concernientes a la ejecución del presente objeto.	

Las partes que suscribimos el presente Contrato de Trabajo a Término Fijo, lo hacemos fundamentados en la Buena Fe, y en especial en el respeto a los principios del Derecho de Trabajo el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. El empleador contrata los servicios personales del trabajador y este se obliga: a) A poner al servicio del empleador toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, y b) A no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato.

SEGUNDA. El empleador pagará al trabajador por la prestación de sus servicios un salario básico mensual según condiciones iniciales acordadas, pagaderos quincenalmente. Dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo.

PARÁGRAFO PRIMERO. Las partes hacen constar que en esta remuneración queda incluido el pago de los servicios que EL TRABAJADOR se obliga a realizar durante el tiempo estipulado en el presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Si EL TRABAJADOR prestare su servicio en día dominical o festivo, sin previa autorización por escrito del EMPLEADOR, no tendrá derecho a reclamar remuneración alguna por este día laborado.

PARÁGRAFO TERCERO. EL EMPLEADOR no suministra ninguna clase de salario en especie.

PARÁGRAFO CUARTO. Cuando por causa emanada directa o indirectamente de la relación contractual existan obligaciones de tipo económico a cargo del TRABAJADOR y a favor del EMPLEADOR, éste procederá a efectuar las deducciones a que hubiere lugar en cualquier tiempo y, más concretamente, a la terminación del presente contrato, así lo autoriza desde ahora EL TRABAJADOR, entendiendo expresamente las partes que la presente autorización cumple las condiciones, de orden escrita previa, aplicable para cada caso.

TERCERA. Las partes en el citado contrato acuerdan expresamente que lo entregado en dinero o en especie por parte del EMPLEADOR al TRABAJADOR por concepto de beneficios cualquiera sea su denominación de acuerdo al artículo 15 de la ley 50 de 1990 no constituyen salario, en especial: los auxilios o contribuciones que otorgue el empleador por concepto de alimentación para el trabajador, de bonificaciones extraordinarias y demás auxilios otorgados por mera liberalidad del empleador.

PARÁGRAFO PRIMERO. Cualquier beneficio que se entregue al trabajador sólo se le otorgará como mera liberalidad del empleador, por tanto no constituye salario, ni pago laboral que sea base para el cálculo y pago de prestaciones sociales, aportes parafiscales, a cajas de compensación, SENA, o ICBF, entre otros; como tampoco es base para la determinación de las contribuciones o aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, tales como: salud, pensión, riesgos profesionales, fondo de solidaridad, etc. Las partes acuerdan desde ahora que en ningún caso los pagos que se entreguen como auxilios o beneficios constituyen salario o son base para las cotizaciones, contribuciones o aportes antes descritos.

CUARTA. Todo trabajo suplementario o en horas extras y todo trabajo en día domingo o festivo en los que legalmente debe concederse descanso, se remunerará conforme a la ley, así como los correspondientes recargos nocturnos. Para el reconocimiento y pago del trabajo suplementario, dominical o festivo, EL EMPLEADOR o sus representantes deben autorizarlo previamente por escrito. Cuando la necesidad de este trabajo se presente de manera imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de el por escrito o en forma verbal, a la mayor brevedad al EMPLEADOR o a sus representantes. EL EMPLEADOR, en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo suplementario o en días de descanso legalmente obligatorio que no haya sido autorizado previamente o avisado inmediatamente, como queda dicho

QUINTA. EL TRABAJADOR se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas señalados por EL EMPLEADOR, pudiendo hacer éste ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas de la jornada ordinaria en la forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 ibídem. Así mismo el empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta y cuatro (44) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis (6) días a la semana con un (1) día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. En éste, el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana y podrá ser de mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez (10) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y cuatro (44) horas semanales dentro de la jornada ordinaria de 6 a.m. a 10 p.m.

SEXTA. Este contrato es un contrato a término fijo según condiciones iniciales acordadas y permanecerá mientras subsistan las causas que le dieron origen a ese contrato.

PARÁGRAFO. Los primeros dos (2) meses del presente contrato se consideran como período de prueba y, durante este período tanto el empleador como el trabajador, podrán terminar el contrato en cualquier momento en forma unilateral, de conformidad con el artículo 78 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 7° de la ley 50 de 1990.

SEPTIMA. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato por cualquiera de las partes, las enumeradas en los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo; y, además, por parte del empleado, las faltas que para el efecto se califiquen como graves en el espacio reservado para las cláusulas adicionales en el presente contrato.

OCTAVA. - En relación con la actividad propia del EL EMPLEADO, éste la ejecutará dentro de las siguientes modalidades que implican claras obligaciones para EL EMPLEADO así:
• Observar rigurosamente las normas que le fije la empresa para la realización de la labor a que se refiere el presente contrato.
• Guardar absoluta reserva, salvo autorización expresa de la empresa, de todas aquellas informaciones que lleguen a su conocimiento, en razón de su trabajo, y que sean por naturaleza privadas.
• Ejecutar por sí mismo las funciones asignadas y cumplir estrictamente las instrucciones, manuales, procesos y procedimientos que le sean dadas por la empresa, o por quienes la representen, respecto del desarrollo de sus actividades.
• Cuidar permanentemente los intereses, instalaciones, muebles y equipos de oficina, de cómputo, enseres, vehículos, maquinaria, herramientas, materias primas, material de empaque y productos elaborados de la empresa.
• Dedicar la totalidad de su jornada de trabajo a cumplir a cabalidad con las funciones establecidas de acuerdo al cargo.
• Programar y elaborar diariamente su trabajo de forma eficiente.
• Utilizar única y exclusivamente los medios magnéticos de información como herramienta de trabajo, no para ocio o distracción laboral.
• Asistir puntualmente a las reuniones y capacitaciones programadas por el empleador en aras de mejorar la formación del trabajador, la productividad y calidad de la empresa.
• Conservar completa armonía y comprensión con los clientes, proveedores, autoridades de vigilancia y control, con sus superiores y compañeros de trabajo, en sus relaciones personales y en la ejecución de su labor.
• Cumplir permanentemente sus labores con espíritu de lealtad, compañorismo, colaboración y disciplina con la empresa.
• Dar aviso oportuno y por escrito a la empresa, todo cambio en su dirección, teléfono o ciudad de residencia.
• Los trabajadores que tengan a su cargo un vehículo, están obligados a mantenerlo en óptimas condiciones de limpieza y deberán estar atentos tanto de su parte mecánica como de la documentación requerida con el fin de dar aviso de manera inmediata y por escrito de cualquier novedad que ese presente.

PARÁGRAFO: Si como consecuencia de una mala operación, descuido, negligencia, impericia o por falta de notificación en debido tiempo se presenta alguna falla mecánica o sanción pecuniaria, este deberá ser asumido por el trabajador.

NOVENA. -PROHIBICIONES DEL TRABAJADOR. Durante la vigencia del presente contrato, le queda estrictamente prohibido al trabajador:
• Ejecutar actividades diferentes a las propias de su oficio en horas de trabajo, para terceros ya fueren remuneradas o no, o para su provecho personal.
• Pedir o recibir dinero de los clientes de la EMPRESA y darles un destino diferente a ellos o no entregarlo en su debida oportunidad en la oficina de la EMPRESA.
• Todo acto de violencia, deslealtad, injuria, malos tratos o grave indisciplina en que incurra EL TRABAJADOR en sus labores contra LA EMPRESA, el personal directivo, sus compañeros de trabajo o sus superiores, clientes o proveedores.
• Los retrasos reiterados en la iniciación de la jornada de trabajo sin una justa causa que lo amerite.
• La inasistencia a laborar sin una excusa suficiente que lo justifique.

DECIMA. Las invenciones, innovaciones o descubrimientos que realice el trabajador en ejecución de sus funciones pertenecen al empleador, de conformidad con el artículo 539 del Código de Comercio, así como el artículo 20 y concordantes de la ley 23 de 1982 sobre derechos de autor.

DECIMA PRIMERA. Las partes podrán convenir que el trabajo se preste en lugar distinto al inicialmente contratado, siempre que tales traslados no desmejoren las condiciones laborales o de remuneración del trabajador, o impliquen perjuicios para él. Los gastos que se originen con el traslado serán cubiertos por el empleador de conformidad con el numeral 8° del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. El trabajador se obliga a aceptar los cambios de oficio que decida el empleador dentro de su poder subordinante, siempre que se respeten las condiciones laborales del trabajador y no se le causen perjuicios. Todo ello sin que se afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador, de conformidad con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley 50 de 1990.

DÉCIMA SEGUNDA. - CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: EL TRABAJADOR se obliga a guardar absoluta reserva de la información y documentación de la cual llegare a tener conocimiento en cumplimiento de las funciones para las cuales fue contratado, en especial no entregará ni divulgará a terceros salvo autorización previa y expresa de la Gerencia, información calificada por EL EMPLEADOR como confidencial, reservada o estratégica. No podrá bajo ninguna circunstancia revelar información a persona natural o jurídica que afecte los intereses de EL EMPLEADOR, durante su permanencia en el cargo ni después de su retiro, so pena de incurrir en las acciones legales pertinentes consagradas para la protección de esta clase de información.

DECIMA TERCERA. Este contrato ha sido redactado estrictamente de acuerdo con la ley y la jurisprudencia y será interpretado de buena fe y en consonancia con el Código Sustantivo del Trabajo cuyo objeto, definido en su artículo 1°, es lograr la justicia en las relaciones entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social.

DÉCIMO CUARTA. El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto alguno cualquier otro contrato verbal o escrito celebrado entre las partes con anterioridad. Cualquier modificación al presente acuerdo, deberá realizarse mediante documento escrito suscrito por ambas partes, de lo contrario carecerá de cualquier valides.

Para constancia se firma en dos ejemplares del mismo tenor y valor,

CIUDAD:	FECHA:
MEDELLIN, ANTIOQUIA	Agosto 13 de 2020

EL EMPLEADOR:
UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLIN
NIT.:
901.979.396-1

EL TRABAJADOR:
ERIC EDUARDO ACOSTA SUAREZ
PPT.: 5036884

UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: RG-UTSIT-2025-04
		Fecha: 12/09/2025
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión: 01

Área/Dependencia:	Eric Eduardo Acosta	Cargo:	Aux. Mantenimiento
Trabajador:		Documento de Identidad:	5036864

Ítem	Elemento de Protección Personal	Cantidad	Estado (Nuevo/Reposición)	Fecha de Entrega	Firma de Recibido
1	Camisa	2	Nuevo	Agosto 13/26	x
2	Pantalon	1	Nuevo	Agosto 13/26	x
3	Botas	1	Nuevo	Agosto 13/26	x
4	Gafas oc	1	Nuevo	Agosto 13/26	x
5	Gafas	1	Nuevo	Agosto 13/26	x
6	Guantes Vaqueta	1	Nuevo	Agosto 13/26	x
7	Guantes Nylon	1	Nuevo	Agosto 13/26	x
8	Bloqueador	1	Nuevo	Agosto 13/26	x
9	Proteccion auditiva	1	Nuevo	Agosto 13/26	x
10	Mascarilla	1	Nuevo	Agosto 13/26	
11	Moyra	1	Nuevo	Agosto 13/26	x
12	Casco	1	Nuevo	Agosto 13/26	x
13	Guantes caucho	1	Nuevo	Agosto 13/26	x
14	Barbarquejo	1	Nuevo	Agosto 13/26	x
15					
16					
17					
18					
19					

Declaración del trabajador:

Declaro haber recibido los elementos de protección personal relacionados en el presente formato, en buen estado y en la cantidad indicada.
Me comprometo a darles el uso adecuado, mantenerlos en condiciones de higiene y reportar cualquier daño o pérdida para su reposición.

Firma del trabajador:


Fecha: 13/08/2026

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: RG-UTSIT-2025-02 Versión:1
	FORMATO DIVULGACIÓN DE POLITICAS	Fecha: Sep. 2025

Nombre colaborador: Eric Eduardo Acosta Suarez
Cedula: 503.6864
Cargo: Auxiliar operativo
Fecha de divulgación: 10-08-2026

Por medio del cual se deja constancia de la divulgación de la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tabaco alcohol y droga y sus requisitos al personal de la empresa.

Yo, Eric Eduard Acosta Suarez con CC: 503 6864
Manifiesto conocer, respetar y cumplir las políticas de la empresa UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN, además de autorizar de forma libre y espontánea pruebas de detección de alcohol y/o sustancias psicoactivas.

Firma: 

Creado por: Jenifer Altamiranda Diaz
Aprobado por: Lina María Giraldo Botero

Powered by CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 92.539.526
CONEO OJEDA
APELLIDOS
HAYDEN EDUARDO
NOMBRES
HAYDEN E
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 08-FEB-1980
SANTA CATALINA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.69 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
28-ABR-1999 SINCELEJO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-0509100-01104868-M-0092539526-20191020 0068405934A 1 9910511124

Fecha Impresión: **21/08/2026 11:20:18 am**	**CONCEPTO MÉDICO DE APTITUD LABORAL**	susmédicos Conciencia laboral y valoración **800.113.024-4**

Nro. Ingreso: **204156**	Fecha del Exámen: **19/08/2026**	Tipo de Exámen: **Ingreso**

Información SUS MEDICOS S.A.S

Dirección: Calle 29 AA # 50-09	**Teléfono:** (604) 4486363	**Correo:** susmedicosinfo@gmail.com

Exámenes practicados: Ficha medica integral 2

DATOS PERSONALES





Nombres: HAYDEN EDUARDO		Apellidos: CONEO OJEDA	
Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía		Número de documento: 92.539.526	
Fecha Nacimiento: 1980/02/08	Edad: 46 años	Sexo: Masculino	
Dirección Domicilio: CALLE 49 CARRERA 2 # 31 BUENOS AIRES		Teléfono Domicilio: 3014765580	
Lugar Residencia: MEDELLIN		Grupo Sanguíneo: O+	
Profesión/ocupación: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO			
Nombre Acompañante: NINGUNO		Teléfono Acompañante: NINGUNO	
Persona Responsable: NARLY ZUÑIGA (PAREJA)		Teléfono Persona R: 3015952019	
EPS: Coosalud EPS-S	ARL: Otro	Pensiones: No sabe	Cesantias: No sabe
Tipo Vinculación EPS: Contributivo cotizante		Estado Civil: Union libre	


INFORMACIÓN EMPRESA

Empresa: UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN		Actividad Económica: Construccion de proyectos de servicio publico	
Cargo: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	Perfil Biológico: Adecuada audicion , Adecuada vision, Adecuado sistema osteomuscular general	Factores de Riesgo: Locativo en el puesto de trabajo, Posturas prolongadas, Mecanico, Ruido, Esfuerzos, , Publico por desplazamiento , electrico .	Medidas de Protección: Proteccion auditiva y respiratoria, Guantes, Monogafas, casco, proteccion auditiva y respiratoria, vestimenta adecuada.

CONCEPTO MÉDICO DE APTITUD LABORAL

S.V.E	RECOMENDACIONES	RESTRICCIONES	INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO PARA EL CARGO
AUDIOMETRÍA	Uso protección auditiva en área con ruido mayor a 85 dB Hipoacusia bilateral leve moderada de 3 a 8 khtz. Las frecuencias conversacionales permanecen normales.	Ninguna	Resultado alterado cumpliendo recomendaciones, es adecuado para el cargo.
ESPIROMETRÍA	Control periódico teniendo en cuenta: Patrón espirométrico normal	Ninguna	Resultado normal y adecuado para el cargo
VISIOMETRÍA	Control periódico teniendo en cuenta: Agudeza visual lejana bilateral normal, Alteración visual cercana bilateral moderada, Discriminación del color normal, Percepción de profundidad normal. Uso de lentes para vision de cerca.	Ninguna	Resultado alterado cumpliendo recomendaciones, es adecuado para el cargo.
EXAMEN MÉDICO	Control periódico teniendo en cuenta examen físico clínicamente normal Educacion y vigilancia en las normas de higiene, seguridad y riesgos relacionados con su cargo	Ninguna	Resultado normal y adecuado para el cargo
Osteomuscular	Control Periodico teniendo en cuenta Bajo Riesgo osteomuscular para su cargo	Ninguna	Resultado normal y adecuado para el cargo

CONCEPTO MÉDICO DE APTITUD LABORAL	
Concepto	Apto para el Cargo con Recomendación

	
PROFESIONAL: JORGE IVAN MEJIA FLOREZ	PACIENTE: HAYDEN EDUARDO CONEO OJEDA
CC 8353225	Documento: CC: 92539526
Medico	
Licencia: 2017060106932	
Especialista en: Salud Ocupacional	
Registro: 12229-82	

Certifico con la firma de este documento que la información es cierta y autorizo a SUS MEDICOS S.A.S; para almacenar y usar mis datos personales para el registro de operaciones en el termino de la relación contractual y comercial que se origina en el registro de la base de datos de usuarios y para reportar información
CERTIFICO QUE LAS RECOMENDACIONES Y LAS RESTRICCIONES DADAS, FUERON EXPLICADAS AL USUARIO PARA QUE LAS TENGA EN CUENTA.

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: RG-UTSIT-2025-01 Versión:1
	FORMATO DE INDUCCIÓN DE REINDUCCIÓN	Fecha: sep 2025

Nombre colaborador:	HAY Dein Cano O	Inducción:	X
Cedula de ciudadania:	42.534.526	Reinducción:	
Cargo:	OFICIAL	Fecha de inducción:	21/08/2026
Nombre responsable inducción:	Jenifer Altamiranda Diaz		

Certifico que he recibido y entendido el temario de la inducción y reinducción en **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**, garantizando el cumplimiento de los lineamientos internos de la compañía , todos en pro de mi bienestar fisico-mental y de mis compañeros.


Los temas divulgados en esta inducción fueron:

- Políticas de gestión SST, medio ambiente y calidad.
- Política en libre de alcohol, tabaco y droga.
- Reglamento de higiene y seguridad industrial.
- Uso y mantenimiento adecuado de los EPP.
- Identificación de peligros y evaluación de riesgos.
- Reporte de incidentes, accidentes, actos y condiciones inseguras.
- Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.
- Comité de convivencia laboral.
- Derechos y deberes en SST.
- Uso adecuado de equipos y herramientas.
- Plan de emergencias.
- Programa de capacitaciones.
- Manejo de sustancias químicas.
- PMT.
- Manejo de residuos solidos.

Con mi firma me comprometo a cumplir todo lo divulgado anteriormente.

Firma colaborador: HAY Dein Cano O

Firma del responsable de inducción:



Creado por: Jenifer Altamiranda Diaz
por: Lina Maria Giraldo Botero

Aprobado

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: RG-UTSIT-2025-02 Versión:1
	FORMATO DIVULGACIÓN DE POLITICAS	Fecha: Sep. 2025

Nombre colaborador: HAYDEN CONCO
Cedula: 42534526
Cargo: OFICIAL
Fecha de divulgación: 21 08 2026

Por medio del cual se deja constancia de la divulgación de la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tabaco alcohol y droga y sus requisitos al personal de la empresa.

Yo, HAYDEN CONCO con CC: 42534526
Manifiesto conocer, respetar y cumplir las políticas de la empresa UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN, además de autorizar de forma libre y espontánea pruebas de detección de alcohol y/o sustancias psicoactivas.

Firma: HAYDEN CONCO

Creado por: Jenifer Altamiranda Diaz
Aprobado por: Lina María Giraldo Botero

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901979396
Número Afiliación:	9030475
Razón social:	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	92539526
Nombre:	HAYDEN EDUARDO CONEO OJEDA
Fecha Ingreso:	22/08/2026
Salario básico:	1,750,905
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	5
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	21/08/2026 10:21:13 a. m.

COOSALUD EPS S.A.

NIT 900226715-3

HACE CONSTAR

Que el(la) señor(a) HAYDEN EDUARDO CONEO OJEDA identificado(a) con CC 92539526, se encuentra Afiliado en el Plan de Beneficios en Salud PBS, de COOSALUD EPS S.A. por UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN NI 901979396 en calidad de Dependiente según información contenida a la fecha en nuestra base de datos.

Fecha inicio relación laboral	Fecha fin relación laboral
21/ago./2026	

Informacion beneficiarios:

No hay beneficiarios en el grupo familiar.

El presente certificado se expide a solicitud de el(la) interesado(a) a los 21 días del mes de ago. de 2026.

Observaciones

Con destino a: Solicitud del Interesado

Información sujeta a verificación por parte de COOSALUD EPS S.A., cualquier aclaración con gusto será atendida en la línea - Documento no válido como autorización de traslado - No es válido para aclarar situación de duplicidad en el SGSSS. Semanas de cotización según LEY 1122/07.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO TORRES SALAZAR

Director de Aseguramiento Nacional

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

HAYDEN EDUARDO CONEO OJEDA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **92.539.526**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 21 de Agosto del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

comfama

Registro de afiliación individual

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN | NIT 9019793961 | Envío exitoso No. 4179171

La solicitud de afiliación de tu grupo familiar se ha enviado exitosamente con el número de **radicado 4179171.**
Recuerda que este es el primer paso; en máximo **24 horas** recibirás a tu correo electrónico el estado final de la afiliación.

Datos del trabajador

Información general

Documento:	Nombre:	Fecha de nacimiento:	Género:	Estado civil:
CC 92539526	HAYDEN EDUARDO CONEO OJEDA	08/02/1980	Masculino	Soltero/a

Residencia y contacto

Departamento:	Municipio:	Dirección:	Teléfono celular:	Correo electrónico:
Antioquia	Medellin	CL 49 # 2AB - 22	3018771864	hayderconeoojeda@gmail.com

Datos laborales

Tipo de contrato:	Tipo de salario:	Salario:	Horas contratadas al dia:	Horas contratadas al mes:	Fecha de ingreso a la empresa:
Fijo	Fijo	$1,750,905	7	210	21/08/2026

Vigilado Supersubsidio

Archivos adjuntos

Trabajador: HAYDEN EDUARDO CONEO OJEDA

Tipo de documento	Archivo	Tamaño
Cédula de Ciudadanía	92539526.pdf	42 KB

Vigilado Supersubsidio

Radicado a través de: Empleador
Fecha y hora de Radicado 21/08/2026, 10:16:51
Por: Mayerli Paola Giraldo Olaya

Vigilado Supersubsidio

UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLIN

NIT 901.979.396-1

CONTRATO No-4600105655-2025

REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACION Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE MEDELLIN

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO FIJO

NOMBRE DEL EMPLEADOR: UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLIN	**DIRECCION DEL EMPLEADOR:** DIAGONAL 62 No. 43-151 B. LAS GRANJAS
NOMBRE DEL TRABAJADOR: HAYDEN EDUARDO CONEO OJEDA	**DIRECCION DEL TRABAJADOR:** CLL 49ª CRR 2AB 31 2 - 22
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: 92.539.526	**CARGO:** AUXILIAR MANTENIMIENTO
SALARIO MENSUAL: $ 1.750.905	**SUDSIDIO DE TRANSPORTE:** $249.095
FECHA INICIAL DE LABORES: Lunes, 24 de agosto 2026	**FECHA FINAL DE LABORES:** Viernes 30 de octubre de 2026
LUGAR DONDE DESEMPEÑA LAS LABORES: CALLE 54# 77D-74 - ZONA URBANA DISTRITO DE MEDELLIN	**CIUDAD DEL CONTRATO:** MEDELLIN, ANTIOQUIA
LABOR CONTRATADA: **Auxiliar de mantenimiento** para el proyecto cuyo objeto "realizar el mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el distrito de Medellín", cuyos alcances contemplan todas las actividades comprendidas para tal perfil y demás que el jefe inmediato solicite concernientes a la ejecución del proyecto objeto	

Las partes que suscribimos el presente Contrato de Trabajo a Término Fijo, lo hacemos fundamentados en la Buena Fe, y en especial en el respeto a los principios del Derecho de Trabajo el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. El empleador contrata los servicios personales del trabajador y este se obliga: a) A poner al servicio del empleador toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, y b) A no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato.

SEGUNDA. El empleador pagará al trabajador por la prestación de sus servicios un salario básico mensual según condiciones iniciales acordadas, pagaderos quincenalmente. Dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo.

PARÁGRAFO PRIMERO. Las partes hacen constar que en esta remuneración queda incluido el pago de los servicios que EL TRABAJADOR se obliga a realizar durante el tiempo estipulado en el presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Si EL TRABAJADOR prestare su servicio en día dominical o festivo, sin previa autorización por escrito del EMPLEADOR, no tendrá derecho a reclamar remuneración alguna por este día laborado.

PARÁGRAFO TERCERO. EL EMPLEADOR no suministra ninguna clase de salario en especie.

PARÁGRAFO CUARTO. Cuando por causa emanada directa o indirectamente de la relación contractual existan obligaciones de tipo económico a cargo del TRABAJADOR y a favor del EMPLEADOR, éste procederá a efectuar las deducciones a que hubiere lugar en cualquier tiempo y, más concretamente, a la terminación del presente contrato, así lo autoriza desde ahora EL TRABAJADOR, entendiendo expresamente las partes que la presente autorización cumple las condiciones, de orden escrita previa, aplicable para cada caso.

TERCERA. Las partes en el citado contrato acuerdan expresamente que lo entregado en dinero o en especie por parte del EMPLEADOR al TRABAJADOR por concepto de beneficios cualquiera sea su denominación de acuerdo al artículo 15 de la ley 50 de 1990 no constituyen salario, en especial: los auxilios o contribuciones que otorgue el empleador por concepto de alimentación para el trabajador, de bonificaciones extraordinarias y demás auxilios otorgados por mera liberalidad del empleador.

PARÁGRAFO PRIMERO. Cualquier beneficio que se entregue al trabajador sólo se le otorgará como mera liberalidad del empleador, por tanto no constituye salario, ni pago laboral que sea base para el cálculo y pago de prestaciones sociales, aportes parafiscales, a cajas de compensación, SENA, o ICBF, entre otros; como tampoco es base para la determinación de las contribuciones o aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, tales como: salud, pensión, riesgos profesionales, fondo de solidaridad, etc. Las partes acuerdan desde ahora que en ningún caso los pagos que se entreguen como auxilios o beneficios constituyen salario o son base para las cotizaciones, contribuciones o aportes antes descritos.

CUARTA. Todo trabajo suplementario o en horas extras y todo trabajo en día domingo o festivo en los que legalmente debe concederse descanso, se remunerará conforme a la ley, así como los correspondientes recargos nocturnos. Para el reconocimiento y pago del trabajo suplementario, dominical o festivo, EL EMPLEADOR o sus representantes deben autorizarlo previamente por escrito. Cuando la necesidad de este trabajo se presente de manera imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de el por escrito o en forma verbal, a la mayor brevedad al EMPLEADOR o a sus representantes. EL EMPLEADOR, en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo suplementario o en días de descanso legalmente obligatorio que no haya sido autorizado previamente o avisado inmediatamente, como queda dicho

QUINTA. EL TRABAJADOR se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas señalados por EL EMPLEADOR, pudiendo hacer éste ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas de la jornada ordinaria en la forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 ibidem. Así mismo el empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta y cuatro (44) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis (6) días a la semana con un (1) día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. En éste, el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana y podrá ser de mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez (10) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y cuatro (44) horas semanales dentro de la jornada ordinaria de 6 a.m. a 10 p.m.

SEXTA. Este contrato es un contrato a término fijo según condiciones iniciales acordadas y permanecerá mientras subsistan las causas que le dieron origen a ese contrato.

PARÁGRAFO. Los primeros dos (2) meses del presente contrato se consideran como período de prueba y, durante este periodo tanto el empleador como el trabajador, podrán terminar el contrato en cualquier momento en forma unilateral, de conformidad con el artículo 78 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 7° de la ley 50 de 1990.

SEPTIMA. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato por cualquiera de las partes, las enumeradas en los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo; y, además, por parte del empleado, las faltas que para el efecto se califiquen como graves en el espacio reservado para las clausulas adicionales en el presente contrato.

OCTAVA. - En relación con la actividad propia del EL EMPLEADO, éste la ejecutará dentro de las siguientes modalidades que implican claras obligaciones para EL EMPLEADO así:
• Observar rigurosamente las normas que le fije la empresa para la realización de la labor a que se refiere el presente contrato.
• Guardar absoluta reserva, salvo autorización expresa de la empresa, de todas aquellas informaciones que lleguen a su conocimiento, en razón de su trabajo, y que sean por naturaleza privadas.
• Ejecutar por sí mismo las funciones asignadas y cumplir estrictamente las instrucciones, manuales, procesos y procedimientos que le sean dadas por la empresa, o por quienes la representen, respecto del desarrollo de sus actividades
• Cuidar permanentemente los intereses, instalaciones, muebles y equipos de oficina, de cómputo, enseres, vehículos, maquinaria, herramientas, materias primas, material de empaque y productos elaborados de la empresa.
• Dedicar la totalidad de su jornada de trabajo a cumplir a cabalidad con las funciones establecidas de acuerdo al cargo.
• Programar y elaborar diariamente su trabajo de forma eficiente.
• Utilizar única y exclusivamente los medios magnéticos de información como herramienta de trabajo, no para ocio o distracción laboral.
• Asistir puntualmente a las reuniones y capacitaciones programadas por el empleador en aras de mejorar la formación del trabajador, la productividad y calidad de la empresa.
• Conservar completa armonía y comprensión con los clientes, proveedores, autoridades de vigilancia y control, con sus superiores y compañeros de trabajo, en sus relaciones personales y en la ejecución de su labor.
• Cumplir permanentemente sus labores con espíritu de lealtad, compañerismo, colaboración y disciplina con la empresa.
• Dar aviso oportuno y por escrito a la empresa, todo cambio en su dirección, teléfono o ciudad de residencia.
• Los trabajadores que tengan a su cargo un vehículo, están obligados a mantenerlo en óptimas condiciones de limpieza y deberán estar atentos tanto de su parte mecánica como de la documentación requerida con el fin de dar aviso de manera inmediata y por escrito de cualquier novedad que ese presente

PARÁGRAFO: Si como consecuencia de una mala operación, descuido, negligencia, impericia o por falta de notificación en debido tiempo se presenta alguna falla mecánica o sanción pecuniaria, este deberá ser asumido por el trabajador.

NOVENA. -PROHIBICIONES DEL TRABAJADOR. Durante la vigencia del presente contrato, le queda estrictamente prohibido al trabajador:
• Ejecutar actividades diferentes a las propias de su oficio en horas de trabajo, para terceros ya fueren remuneradas o no, o para su provecho personal.
• Pedir o recibir dinero de los clientes de la EMPRESA y darles un destino diferente a ellos o no entregarlo en su debida oportunidad en la oficina de la EMPRESA.
• Todo acto de violencia, deslealtad, injuria, malos tratos o grave indisciplina en que incurra EL TRABAJADOR en sus labores contra LA EMPRESA, el personal directivo, sus compañeros de trabajo o sus superiores, clientes o proveedores.
• Los retrasos reiterados en la iniciación de la jornada de trabajo sin una justa causa que lo amerite.
• La inasistencia a laborar sin una excusa suficiente que lo justifique.

DECIMA. Las invenciones, innovaciones o descubrimientos que realice el trabajador en ejecución de sus funciones pertenecen al empleador, de conformidad con el artículo 539 del Código de Comercio, así como el artículo 20 y concordantes de la ley 23 de 1982 sobre derechos de autor.

DECIMA PRIMERA. Las partes podrán convenir que el trabajo se preste en lugar distinto al inicialmente contratado, siempre que tales traslados no desmejoren las condiciones laborales o de remuneración del trabajador, o impliquen perjuicios para él. Los gastos que se originen con el traslado serán cubiertos por el empleador de conformidad con el numeral 8° del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. El trabajador se obliga a aceptar los cambios de oficio que decida el empleador dentro de su poder subordinante, siempre que se respeten las condiciones laborales del trabajador y no se le causen perjuicios. Todo ello sin que se afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador, de conformidad con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley 50 de 1990.

DÉCIMA SEGUNDA. - CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: EL TRABAJADOR se obliga a guardar absoluta reserva de la información y documentación de la cual llegare a tener conocimiento en cumplimiento de las funciones para las cuales fue contratado, en especial no entregaré ni divulgará a terceros salvo autorización previa y expresa de la Gerencia, información calificada por EL EMPLEADOR como confidencial, reservada o estratégica. No podrá bajo ninguna circunstancia revelar información a persona natural o jurídica que afecte los intereses de EL EMPLEADOR, durante su permanencia en el cargo ni después de su retiro, so pena de incurrir en las acciones legales pertinentes consagradas para la protección de esta clase de información.

DECIMA TERCERA. Este contrato ha sido redactado estrictamente de acuerdo con la ley y la jurisprudencia y será interpretado de buena fe y en consonancia con el Código Sustantivo del Trabajo cuyo objeto, definido en su artículo 1°, es lograr la justicia en las relaciones entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social.

DÉCIMO CUARTA. El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto alguno cualquier otro contrato verbal o escrito celebrado entre las partes con anterioridad. Cualquier modificación al presente acuerdo, deberá realizarse mediante documento escrito suscrito por ambas partes, de lo contrario carecerá de cualquier validez.

Para constancia se firma en dos ejemplares del mismo tenor y valor.

CIUDAD:	FECHA:
MEDELLIN, ANTIOQUIA	[illegible]

EL EMPLEADOR
UNIÓN TEMPORAL SEMEDELLIN
NIT.
901.879.396-1

EL TRABAJADOR:
HAYDEN EDUARDO CONEO MEJIA
C.C. 92.538.626

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: RG-UTSIT-2025-04
		Fecha: 12/09/2025
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión: 01

Área/Dependencia:	Medellin	Cargo:	Aux. Mantenimiento
Trabajador:	Hayden Cano Ojeda	Documento de Identidad:	92.139.526

Ítem	Elemento de Protección Personal	Cantidad	Estado (Nuevo/Reposición)	Fecha de Entrega	Firma de Recibido
1	Guantes de Nylon	1	Nuevo	21/08/2026	HAYDEN
2	Guantes de vaqueta	1	Nuevo	21/08/2026	HAYDEN
3	Gafas oscuras	1	Nuevo	21/08/2026	HAYDEN
4	Protección Auditiva	1	Nuevo	21/08/2026	HAYDEN
5	Casco de seguridad	1	Nuevo	21/08/2026	HAYDEN
6	Bloqueador solar	1	Nuevo	21/08/2026	HAYDEN
7	Monjas	1	Nuevo	21/08/2026	HAYDEN
8	Barbuquejo	1	Nuevo	21/08/2026	HAYDEN
9	Camisa alcaldia	2	Nuevo	21/08/2026	HAYDEN
10	Pantalon	1	Nuevo	21/08/2026	HAYDEN
11	Botas dielectricas #40	1	Nuevo	21/08/2026	HAYDEN
12	Guantes de caucho	1	Nuevo	21/08/2026	HAYDEN
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Declaración del trabajador:

Declaro haber recibido los elementos de protección personal relacionados en el presente formato, en buen estado y en la cantidad indicada.
Me comprometo a darles el uso adecuado, mantenerlos en condiciones de higiene y reportar cualquier daño o pérdida para su reposición.

Firma del trabajador: HAYDEN CANO C Fecha: 21/08/2026



DATOS PERSONALES

HAYDEN HEDUARDO CONEO

DIRECCIÓN: calle 49ª cra 2ª 31

TELÉFONOS: 3014765580

FECHA DE NACIMIENTO: 08 DE FEBRERO 1980

CEDULA DE CIUDADANÍA: **92.539.526**

ESTADO CIVIL: unión libre

CORREO ELECTRÓNICO: hayderconeoojeda@gmail.com

PERFIL

Responsabilidad en la ejecución de las funciones asignadas soy una persona respetuosa, puntual, organizada y segura. Con un alto sentido de responsabilidad, poseo un buen manejo en las relaciones interpersonales, coordinación y desarrollo de actividades con el cargo de mi competencia

ESTUDIOS REALIZADOS

Bachillerato (grado 6)
Institución educativa bolivariana bolívar

EXPERIENCIA LABORAL

Empresa: construcciones y acabados ip
Cargo: OFICIAL DE CONSTRUCION
Teléfono: 3228703537
Tiempo laborado: 24 MESES

Empresa: JP
Cargo: OFICIAL DE CONSTRUCION
Teléfono: 3022963658
Tiempo laborado: 36 MESES

REFERENCIAS PERSONALES Y FAMILIARES

JORGE POLO
Cargo: maestro de construcción
Cel: 3022963652

DAGOBERTO MARRUGO
Cargo: OBRA BLANCA
Cel: 3001521879


_____

HAYDEN HEDUARDO CONEO
C.C. 92.539.526

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.025.642.866

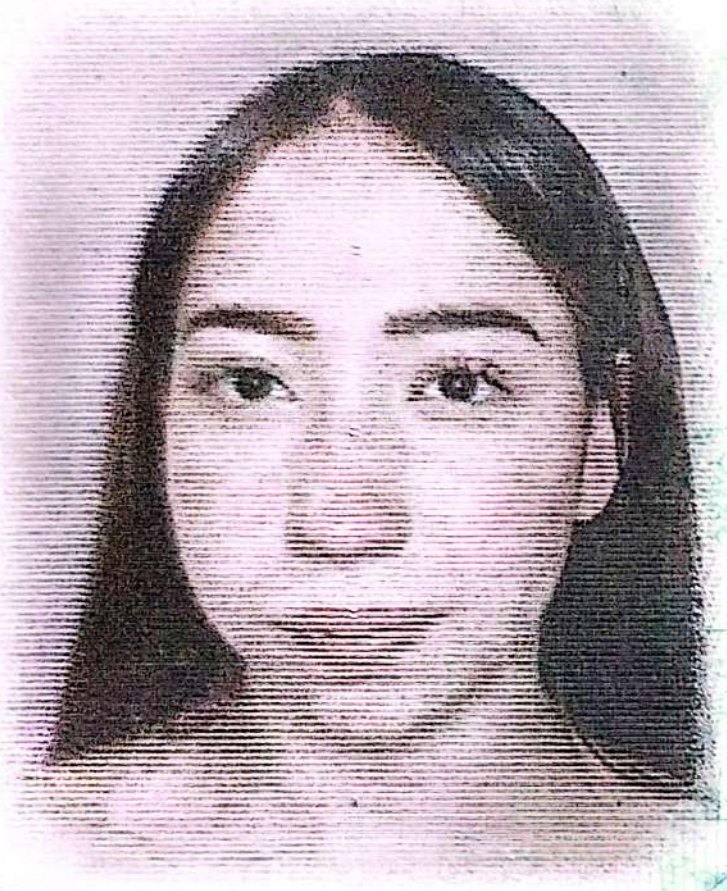

Apellidos
CASTAÑEDA CALLE

Nombres
KATHERIN TATIANA

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.55	F

Fecha de nacimiento
05 NOV 2004

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
MEDELLIN (ANTIOQUIA)



Fecha y lugar de expedición
10 NOV 2022, MEDELLIN

Firma
Katherin Castañeda

Fecha de expiración
10 NOV 2032

Powered by CamScanner

.00

0073275 80



REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL0073275800010O1<<<<<<<<<<<<
0411055F3211108COL1025642866<4
CASTANEDA<CALLE<<KATHERIN<TATI

Powered by CamScanner

Fecha Impresión: 10/08/2026 03:54:26 pm	**CONCEPTO MÉDICO DE APTITUD LABORAL**	susmédicos Conciencia laboral y valoración 800.113.024-4

Nro. Ingreso: **202877**	Fecha del Exámen: **30/07/2026**	Tipo de Exámen: **Ingreso**

Información SUS MEDICOS S.A.S

Dirección: Calle 29 AA # 50-09	**Teléfono:** (604) 4486363	**Correo:** susmedicosinfo@gmail.com

Exámenes practicados: Ficha medica integral 1

DATOS PERSONALES





Nombres: KATHERIN TATIANA		Apellidos: CASTAÑEDA CALLE	
Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía		Número de documento: 1.025.642.866	
Fecha Nacimiento: 2004/11/05	Edad: 21 años	Sexo: Femenino	
Dirección Domicilio: CRA 2AH # 46-37 BUENOS AIRES		Teléfono Domicilio: 3246886085	
Lugar Residencia: MEDELLIN		Grupo Sanguíneo: A+	
Profesión/ocupación: AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A)			
Nombre Acompañante: DORIS ELENA CALLE ARANGO		Teléfono Acompañante: 3015777732	
Persona Responsable: DORIS ELENA CALLE ARANGO (MADRE)		Teléfono Persona R: 3015777732	
EPS: Sura	ARL: Otro	Pensiones: Colpensiones	Cesantias: Protección
Tipo Vinculación EPS: Contributivo cotizante		Estado Civil: Soltero(a)	

INFORMACIÓN EMPRESA

Empresa: UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN		Actividad Económica: Construccion de proyectos de servicio publico	
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A)	Perfil Biológico: Adecuado estado de Órganos y Sentidos, Adecuado sistema osteomuscular énfasis en miembros superiores y muñecas	Factores de Riesgo: Locativo en el puesto de trabajo, Posturas prolongadas, Exigencia visual pantalla del computador	Medidas de Protección: Educación en normas de higiene postural, pausas activas y ergonomía visual relacionados con su cargo

CONCEPTO MÉDICO DE APTITUD LABORAL

S.V.E	**RECOMENDACIONES**	**RESTRICCIONES**	**INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO PARA EL CARGO**
AUDIOMETRÍA	Control periódico teniendo en cuenta: Sensibilidad auditiva periférica bilateral normal.	NINGUNA	Resultado normal y adecuado para el cargo
VISIOMETRÍA	Control periódico teniendo en cuenta: Agudeza visual mixta bilateral normal, Discriminación del color normal, Percepción de profundidad normal	NINGUNA	Resultado normal y adecuado para el cargo
EXAMEN MÉDICO	Control periódico teniendo en cuenta examen físico clínicamente normal	NINGUNA	Resultado normal y adecuado para el cargo
OSTEOMUSCULAR	Control periódico teniendo en cuenta bajo riesgo osteomuscular para su cargo. No se evidencian signos o síntomas de trastornos osteomusculares	NINGUNA	Resultado normal y adecuado para el cargo

CONCEPTO MÉDICO DE APTITUD LABORAL

Concepto	Apto para el Cargo

	
PROFESIONAL: MARTHA LUCIA CARDONA MARZIGLIA	PACIENTE: KATHERIN TATIANA CASTAÑEDA CALLE
CC 32646795	Documento: CC: 1025642866
Medico	
Licencia: 2026060053018	
Especialista en: Salud Ocupacional y Medicina del Trabajo	
Registro: 1501/87	

Certifico con la firma de este documento que la información es cierta y autorizo a SUS MEDICOS S.A.S; para almacenar y usar mis datos personales para el registro de operaciones en el termino de la relación contractual y comercial que se origina en el registro de la base de datos de usuarios y para reportar información
CERTIFICO QUE LAS RECOMENDACIONES Y LAS RESTRICCIONES DADAS, FUERON EXPLICADAS AL USUARIO PARA QUE LAS TENGA EN CUENTA.

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: RG-UTSIT-2025-01 Versión:1
	FORMATO DE INDUCCIÓN DE REINDUCCIÓN	Fecha: sep 2025

Nombre colaborador: Katherin Tatiana Castañeda Calle.	Inducción:	X
Cedula de ciudadania: 1.025.642.866.	Reinducción:	
Cargo: Auxiliar Administrativa	Fecha de inducción:	
Nombre responsable inducción: Jenifer Altamiranda - Lina Giraldo	4/Agosto/2026.	

Certifico que he recibido y entendido el temario de la inducción y reinducción en **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,** garantizando el cumplimiento de los lineamientos internos de la compañía , todos en pro de mi bienestar fisico-mental y de mis compañeros.

Los temas divulgados en esta inducción fueron:

- Políticas de gestión SST, medio ambiente y calidad.
- Política en libre de alcohol, tabaco y droga.
- Reglamento de higiene y seguridad industrial.
- Uso y mantenimiento adecuado de los EPP.
- Identificación de peligros y evaluación de riesgos.
- Reporte de incidentes, accidentes, actos y condiciones inseguras.
- Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.
- Comité de convivencia laboral.
- Derechos y deberes en SST.
- Uso adecuado de equipos y herramientas.
- Plan de emergencias.
- Programa de capacitaciones.
- Manejo de sustancias químicas.
- PMT.
- Manejo de residuos solidos.

Con mi firma me comprometo a cumplir todo lo divulgado anteriormente.

Firma colaborador: Katherin Castañeda

Firma del responsable de inducción:

Creado por: Jenifer Altamiranda Diaz
por: Lina Maria Giraldo Botero

Aprobado

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: RG-UTSIT-2025-02 Versión:1
	FORMATO DIVULGACIÓN DE POLITICAS	Fecha: Sep. 2025

Nombre colaborador: Katherin Tatiana Castañeda Calle
Cedula: 1.025.642.866.
Cargo: Auxiliar Administrativa
Fecha de divulgación: 4 de Agosto / 2026

Por medio del cual se deja constancia de la divulgación de la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tabaco alcohol y droga y sus requisitos al personal de la empresa.

Yo, Katherin Tatiana Castañeda Calle. con CC: 1.025.642.866.
Manifiesto conocer, respetar y cumplir las políticas de la empresa UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN, además de autorizar de forma libre y espontánea pruebas de detección de alcohol y/o sustancias psicoactivas.

Firma: Castañeda

Creado por: Jenifer Altamiranda Diaz
Aprobado por: Lina María Giraldo Botero

Resultados del registro de novedades de reingreso

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.

Número de Solicitud **6I_8360018**

Por favor imprima este comprobante como constancia de la novedad reportada.

Reingreso 1	
Empleador	NI 901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Afiliado	CC 1025642866 KATHERIN TATIANA CASTAÑEDA CALLE
Tipo de trabajador	1 Dependiente
Salario Base	$ 2,000,000
Cargo	OTRO
Sucursal	MEDELLIN DIAGONAL 62 N. 43-151
Fecha de ingreso	03/08/2026
Fecha de radicación	06/08/2026 03:34:49 p.m.
Código de Transacción	221784243
Resultado del Reingreso 1	
Novedad aplicada con éxito	El período de inicio de pago es 09/2026

Fecha de generación 06/08/2026

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **1025642866,** *no está registrado/a* en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 05 de agosto de 2026.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901979396
Número Afiliación:	9030475
Razón social:	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1025642866
Nombre:	KATHERIN TATIANA CASTAÑEDA CALLE
Fecha Ingreso:	03/08/2026
Salario básico:	2,000,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	1
Tasa:	0.522
Fecha hora transacción:	01/08/2026 10:13:00 a. m.

comfama

Registro de afiliación individual

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN | NIT 9019793961 | Envío exitoso No. 4136201

La solicitud de afiliación de tu grupo familiar se ha enviado exitosamente con el número de **radicado 4136201.**
Recuerda que este es el primer paso; en máximo **24 horas** recibirás a tu correo electrónico el estado final de la afiliación.

Datos del trabajador

Información general

Documento:	Nombre:	Fecha de nacimiento:	Género:	Estado civil:
CC 1025642866	KATHERIN TATIANA CASTAÑEDA CALLE	05/11/2004	Femenino	Soltero/a

Residencia y contacto

Departamento:	Municipio:	Dirección:	Teléfono celular:	Correo electrónico:
Antioquia	Medellin	CR 2 # 46 - 37	3246886085	katherincalle05@outlook.com

Datos laborales

Tipo de contrato:	Tipo de salario:	Salario:	Horas contratadas al dia:	Horas contratadas al mes:	Fecha de ingreso a la empresa:
Fijo	Fijo	$2,000,000	7	210	03/08/2026

Vigilado Supersubsidio

Archivos adjuntos

Trabajador: KATHERIN TATIANA CASTAÑEDA CALLE

Tipo de documento	Archivo	Tamaño
Cédula de Ciudadanía	El documento soporte se encuentra en nuestra base de datos.	

Vigilado Supersubsidio

Radicado a través de: Empleador
Fecha y hora de Radicado 06/08/2026, 13:52:05
Por: Mayerli Paola Giraldo Olaya

Vigilado Supersubsidio

UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLIN

NIT 901.979.396-1

CONTRATO No 4600105555-2025

REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE MEDELLIN

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO FIJO

NOMBRE DEL EMPLEADOR: UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLIN	**DIRECCION DEL EMPLEADOR:** DIAGONAL 62 No. 43-151 B. LAS GRANJAS
NOMBRE DEL TRABAJADOR: KATHERIN TATIANA CASTAÑEDA CALLE	**DIRECCION DEL TRABAJADOR:** cr 2ah #46 - 37
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: 1025642866	**CARGO:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SALARIO MENSUAL: $ 2.000.000	**SUDSIDIO DE TRANSPORTE:** $249.095
FECHA INICIAL DE LABORES: Lunes, 03 de agosto de 2026	**FECHA FINAL DE LABORES:** jueves, 3 de diciembre de 2026
LUGAR DONDE DESEMPEÑA LAS LABORES: CALLE 54# 77D-74 - ZONA URBANA DISTRITO DE MEDELLIN	**CIUDAD DEL CONTRATO:** MEDELLIN, ANTIOQUIA
LABOR CONTRATADA: **MAESTRO DE OBRA EN CUADRILLA** PARA EL PROYECTO CUYO OBJETO "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE MEDELLIN " CUYOS ALCANCES CONTEMPLAN TODAS LAS ACTIVIDADES COMPETENTES PARA EL PERFIL Y DEMÁS QUE EL JEFE INMEDIATO SOLICITE CONCERNIENTES A LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE OBJETO.	

Las partes que suscribimos el presente Contrato de Trabajo a Término Fijo, lo hacemos fundamentados en la Buena Fe, y en especial en el respeto a los principios del Derecho de Trabajo el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. El empleador contrata los servicios personales del trabajador y este se obliga: a) A poner al servicio del empleador toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, y b) A no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato.

SEGUNDA. El empleador pagará al trabajador por la prestación de sus servicios un salario básico mensual según condiciones iniciales acordadas, pagaderos quincenalmente. Dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo.

PARÁGRAFO PRIMERO. Las partes hacen constar que en esta remuneración queda incluido el pago de los servicios que EL TRABAJADOR se obliga a realizar durante el tiempo estipulado en el presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Si EL TRABAJADOR prestare su servicio en día dominical o festivo, sin previa autorización por escrito del EMPLEADOR, no tendrá derecho a reclamar remuneración alguna por este día laborado.

PARÁGRAFO TERCERO. EL EMPLEADOR no suministra ninguna clase de salario en especie.

PARÁGRAFO CUARTO. Cuando por causa emanada directa o indirectamente de la relación contractual existan obligaciones de tipo económico a cargo del TRABAJADOR y a favor del EMPLEADOR, éste procederá a efectuar las deducciones a que hubiere lugar en cualquier tiempo y, más concretamente, a la terminación del presente contrato, así lo autoriza desde ahora EL TRABAJADOR, entendiendo expresamente las partes que la presente autorización cumple las condiciones, de orden escrita previa, aplicable para cada caso.

TERCERA. Las partes en el citado contrato acuerdan expresamente que lo entregado en dinero o en especie por parte del EMPLEADOR al TRABAJADOR por concepto de beneficios cualquiera sea su denominación de acuerdo al artículo 15 de la ley 50 de 1990 no constituyen salario, en especial: los auxilios o contribuciones que otorgue el empleador por concepto de alimentación para el trabajador, de bonificaciones extraordinarias y demás auxilios otorgados por mera liberalidad del empleador.

PARÁGRAFO PRIMERO. Cualquier beneficio que se entregue al trabajador sólo se le otorgará como mera liberalidad del empleador, por tanto no constituye salario, ni pago laboral que sea base para el cálculo y pago de prestaciones sociales, aportes parafiscales, a cajas de compensación, SENA, o ICBF, entre otros; como tampoco es base para la determinación de las contribuciones o aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, tales como: salud, pensión, riesgos profesionales, fondo de solidaridad, etc. Las partes acuerdan desde ahora que en ningún caso los pagos que se entreguen como auxilios o beneficios constituyen salario o son base para las cotizaciones, contribuciones o aportes antes descritos.

CUARTA. Todo trabajo suplementario o en horas extras y todo trabajo en día domingo o festivo en los que legalmente debe concederse descanso, se remunerará conforme a la ley, así como los correspondientes recargos nocturnos. Para el reconocimiento y pago del trabajo suplementario, dominical o festivo, EL EMPLEADOR o sus representantes deben autorizarlo previamente por escrito. Cuando la necesidad de este trabajo se presente de manera imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de el por escrito o en forma verbal, a la mayor brevedad al EMPLEADOR o a sus representantes. EL EMPLEADOR, en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo suplementario o en días de descanso legalmente obligatorio que no haya sido autorizado previamente o avisado inmediatamente, como queda dicho

QUINTA. EL TRABAJADOR se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas señalados por EL EMPLEADOR, pudiendo hacer éste ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas de la jornada ordinaria en la forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 ibídem. Así mismo el empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta y cuatro (44) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis (6) días a la semana con un (1) día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. En éste, el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana y podrá ser de mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez (10) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y cuatro (44) horas semanales dentro de la jornada ordinaria de 6 a.m. a 10 p.m.

Powered by CamScanner

SEXTA. Este contrato es un contrato a término fijo según condiciones iniciales acordadas y permanecerá mientras subsistan las causas que le dieron origen a ese contrato.

PARÁGRAFO. Los primeros dos (2) meses del presente contrato se consideran como periodo de prueba y, durante este periodo tanto el empleador como el trabajador, podrán terminar el contrato en cualquier momento en forma unilateral, de conformidad con el artículo 78 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 7° de la ley 50 de 1990.

SEPTIMA. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato por cualquiera de las partes, las enumeradas en los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo; y, además, por parte del empleado, las faltas que para el efecto se califiquen como graves en el espacio reservado para las cláusulas adicionales en el presente contrato.

OCTAVA. - En relación con la actividad propia del EL EMPLEADO, éste la ejecutará dentro de las siguientes modalidades que implican claras obligaciones para EL EMPLEADO así:
• Observar rigurosamente las normas que le fije la empresa para la realización de la labor a que se refiere el presente contrato.
• Guardar absoluta reserva, salvo autorización expresa de la empresa, de todas aquellas informaciones que lleguen a su conocimiento, en razón de su trabajo, y que sean por naturaleza privadas.
• Ejecutar por sí mismo las funciones asignadas y cumplir estrictamente las instrucciones, manuales, procesos y procedimientos que le sean dadas por la empresa, o por quienes la representen, respecto del desarrollo de sus actividades.
• Cuidar permanentemente los intereses, instalaciones, muebles y equipos de oficina, de cómputo, enseres, vehículos, maquinaria, herramientas, materias primas, material de empaque y productos elaborados de la empresa.
• Dedicar la totalidad de su jornada de trabajo a cumplir a cabalidad con las funciones establecidas de acuerdo al cargo.
• Programar y elaborar diariamente su trabajo de forma eficiente.
• Utilizar única y exclusivamente los medios magnéticos de información como herramienta de trabajo, no para ocio o distracción laboral.
• Asistir puntualmente a las reuniones y capacitaciones programadas por el empleador en aras de mejorar la formación del trabajador, la productividad y calidad de la empresa.
• Conservar completa armonía y comprensión con los clientes, proveedores, autoridades de vigilancia y control, con sus superiores y compañeros de trabajo, en sus relaciones personales y en la ejecución de su labor.
• Cumplir permanentemente sus labores con espíritu de lealtad, compañerismo, colaboración y disciplina con la empresa.
• Dar aviso oportuno y por escrito a la empresa, todo cambio en su dirección, teléfono o ciudad de residencia.
• Los trabajadores que tengan a su cargo un vehículo, están obligados a mantenerlo en óptimas condiciones de limpieza y deberán estar atentos tanto de su parte mecánica como de la documentación requerida con el fin de dar aviso de manera inmediata y por escrito de cualquier novedad que ese presente.

PARÁGRAFO: Si como consecuencia de una mala operación, descuido, negligencia, impericia o por falta de notificación en debido tiempo se presenta alguna falla mecánica o sanción pecuniaria, este deberá ser asumido por el trabajador.

NOVENA. -PROHIBICIONES DEL TRABAJADOR. Durante la vigencia del presente contrato, le queda estrictamente prohibido al trabajador:
• Ejecutar actividades diferentes a las propias de su oficio en horas de trabajo, para terceros ya fueren remuneradas o no, o para su provecho personal.
• Pedir o recibir dinero de los clientes de la EMPRESA y darles un destino diferente a ellos o no entregarlo en su debida oportunidad en la oficina de la EMPRESA.
• Todo acto de violencia, deslealtad, injuria, malos tratos o grave indisciplina en que incurra EL TRABAJADOR en sus labores contra LA EMPRESA, el personal directivo, sus compañeros de trabajo o sus superiores, clientes o proveedores.
• Los retrasos reiterados en la iniciación de la jornada de trabajo sin una justa causa que lo amerite.
• La inasistencia a laborar sin una excusa suficiente que lo justifique.

DECIMA. Las invenciones, innovaciones o descubrimientos que realice el trabajador en ejecución de sus funciones pertenecen al empleador, de conformidad con el artículo 539 del Código de Comercio, así como el artículo 20 y concordantes de la ley 23 de 1982 sobre derechos de autor.

DECIMA PRIMERA. Las partes podrán convenir que el trabajo se preste en lugar distinto al inicialmente contratado, siempre que tales traslados no desmejoren las condiciones laborales o de remuneración del trabajador, o impliquen perjuicios para él. Los gastos que se originen con el traslado serán cubiertos por el empleador de conformidad con el numeral 8° del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. El trabajador se obliga a aceptar los cambios de oficio que decida el empleador dentro de su poder subordinante, siempre que se respeten las condiciones laborales del trabajador y no se le causen perjuicios. Todo ello sin que se afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador, de conformidad con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley 50 de 1990.

DÉCIMA SEGUNDA. - CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: EL TRABAJADOR se obliga a guardar absoluta reserva de la información y documentación de la cual llegare a tener conocimiento en cumplimiento de las funciones para las cuales fue contratado, en especial no entregará ni divulgará a terceros salvo autorización previa y expresa de la Gerencia, información calificada por EL EMPLEADOR como confidencial, reservada o estratégica. No podrá bajo ninguna circunstancia revelar información a persona natural o jurídica que afecte los intereses de EL EMPLEADOR, durante su permanencia en el cargo ni después de su retiro, so pena de incurrir en las acciones legales pertinentes consagradas para la protección de esta clase de información.

DECIMA TERCERA. Este contrato ha sido redactado estrictamente de acuerdo con la ley y la jurisprudencia y será interpretado de buena fe y en consonancia con el Código Sustantivo del Trabajo cuyo objeto, definido en su artículo 1°, es lograr la justicia en las relaciones entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social.

DÉCIMO CUARTA. El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto alguno cualquier otro contrato verbal o escrito celebrado entre las partes con anterioridad. Cualquier modificación al presente acuerdo, deberá realizarse mediante documento escrito suscrito por ambas partes, de lo contrario carecerá de cualquier valides.

Para constancia se firma en dos ejemplares del mismo tenor y valor,

CIUDAD:	FECHA
MEDELLIN, ANTIOQUIA	Agosto 03 de 2020

EL EMPLEADOR:
UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLIN
NIT.:
901.979.396-1

EL TRABAJADOR:
KATHERIN TATIANA CASTAÑEDA CALLE
C.C.: 1025642866

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	**CARTA NOTIFICACION RESULTADOS EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES**	**Código:** F-049
		Versión: 01 Fecha: septiembre 2025

Medellín, 11 agosto de 2026

CI- UTSIT-2025-065

Señor:
Katherin Tatiana Castañeda Calle
C.C: 1.025.642.866

ASUNTO EXAMEN MÉDICO DE INGRESO.

Cordial Saludo:

Me permito informarle que acorde con las políticas de la empresa y aspectos del Sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo usted debe consultar por su EPS para iniciar tratamiento según la recomendación dada por parte del médico especialista en Seguridad y salud en el trabajo en su examen de **INGRESO** realizado el día **30/07/2026** por el profesional MARTHA LUCIA CARDONA MARZIGLIA.

Usted debe cumplir con las siguientes recomendaciones:

- usar el tipo de protección adecuada para la tarea según los riesgos del oficio, Realizar inducción en higiene postural y pausas activas con énfasis en estiramiento y descanso de las zonas involucradas, verificación de las condiciones ergonómicas del puesto de trabajo.

La empresa le informa que, como parte del cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, líder de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, hará un seguimiento al cumplimiento de las anteriores recomendaciones.

ANEXO: copia de exámenes médicos ocupacionales

FIRMA SST

FIRMA DEL TRABAJADOR

ANEXO 3.

INFORME DE CALIDAD.

INFORME DE GESTIÓN DE CALIDAD

Contrato 4600105555 de 2025

Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín

Secretaría de Suministros y Servicios del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 5

2 OBJETIVOS 5

2.1 Objetivo general: 5

3 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6

4 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 7

5 ELEMENTOS DE ENTRADA 8

FUENTE: Elaboración propia 9

6 ACTIVIDADES EJECUTADAS 9

6.1 Obras civiles 9

6.2 Suministro, transporte e instalación de elementos semafóricos 10

6.3 Red de comunicaciones 11

6.4 Suministro de materiales y elementos semafóricos 11

6.5 Retiros de elementos de amoblamiento semafórico 11

6.6 Instalación de elementos de amoblamiento semafórico 12

6.7 Pintura de elementos semafóricos 13

6.8 Lavada de elementos semafóricos 13

6.9 Varios 13

7 CONTROL DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 14

7.1 Cumplimiento de las especificaciones técnicas de los suministros 14

7.1.1 Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal estático. 18

7.1.2 Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal estático, ITEM 70 20

7.1.3 Suministro, transporte e instalación de discos direccionales, para postes de semáforos ITEM 83 21

7.2 Cumplimiento con el Procedimiento para el aseguramiento de la calidad en la fabricación de estructuras semafóricas (postes y ménsulas) 23

7.3 Cumplimiento en el Procedimiento para el Cumplimiento de Atenciones de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Red de Semáforos 28

7.3.1 Mantenimiento Preventivo 28

Tabla 15. Relación de elementos instalados 31

7.3.2 Mantenimiento correctivo 44

7.3.3 Comportamiento de la atención de daños y solicitudes de mantenimiento 53

7.4 Cumplimiento Procedimiento para el Control de Calidad en la Construcción de Intersecciones Semafóricas, Obras Civiles Asociadas y/o obras menores 56

7.4.1 Instalación de marco y tapa metálicos para cajas de hasta 60x60 cm interna. Ítem 13 57

7.4.2 Construcción Canalización en Zona verde. ITEM 25 59

8 COMUNICACIONES 60

8.1.1 Desarrollo y seguimiento 60

9 Gestión del Mantenimiento y Aseguramiento Metrológico de Equipos 63

10 GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES 65

11 INDICADORES 65

11.1 ANÁLISIS INDICADORES 68

11.1.1 Atención de intersecciones apagadas o en intermitencia (Prioridad Alta y Media Alta) – Mensual 68

11.1.2 Atención de intersecciones apagadas o en intermitencia (Prioridad Alta y Media Alta) – Acumulado 68

11.1.3 Atención de intersecciones funcionales con elementos defectuosos (Prioridad Media-Baja y Baja) – Mensual 68

11.1.4 Atención de intersecciones funcionales con elementos defectuosos (Prioridad Media y Baja) – Acumulado 69

11.1.5 Aseguramiento de la calidad 69

11.1.6 Indicador económico y financiero 69

11.1.7 Identificación y tratamiento de no conformidades 70

11.1.8 Comunicaciones 70

12 CONCLUSIONES 70

13 ANEXOS 71

1 INTRODUCCIÓN

La Unión Temporal SIT Medellín suscribió el Contrato No. 4600105555 de 2025 con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Suministros y Servicios, cuyo objeto corresponde a la ejecución de actividades de mantenimiento, obras de ampliación y reposición de la red de semáforos.

En cumplimiento de los lineamientos contractuales y de las disposiciones establecidas en el Plan de Gestión de Calidad de la Unión Temporal, se presenta el Informe de Calidad Nº12, correspondiente al mes de Agosto de 2026, en el cual se detallan las actividades desarrolladas, los controles de calidad implementados, y las acciones de seguimiento y verificación ejecutadas durante el periodo.

El propósito de este informe es evidenciar el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos para el proyecto, garantizando que los suministros de equipos críticos y las actividades sujetas de control, se desarrollen bajo estándares técnicos, normativos y contractuales, promoviendo la mejora continua y el fortalecimiento de los procesos operativos asociados al mantenimiento y modernización de la red semafórica del Distrito.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL:

Evidenciar la gestión y el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos para el desarrollo de las actividades de mantenimiento, ampliación y reposición de la red de semáforos del Distrito de Medellín, durante el mes de Agosto de 2026.

3 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO	
Número de contrato	4600105555 del 2025
Contratante	Distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín - secretaría de suministros y servicios
Representante legal del cliente	Esteban Ramírez Vélez Secretaria de suministros y servicios del distrito especial de ciencia, Tecnología E Innovación De Medellín
Plazo	865 días calendario
Ejecutante	Unión temporal sit Medellín
Objeto del proyecto	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.
Justificación general del proyecto	Mantenimiento constante, obras de ampliación y la reposición de algunos de los elementos de la red semafórica y las obras civiles asociadas en el distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín. Las obras se ejecutaran en jurisdicción de la ciudad
Área de ejecución	Las obras se ejecutarán en el distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín donde se ubique cualquiera de las 703 intersecciones que integran la red semafórica de la ciudad, tanto en zona urbana como rural.
Fecha de inicio	05 de septiembre del 2025

4 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Las obras se ejecutaran en el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín donde se ubique cualquiera de las 710 intersecciones que integran la red semafórica de la ciudad, tanto en zona urbana como rural. Ver imagen 1.

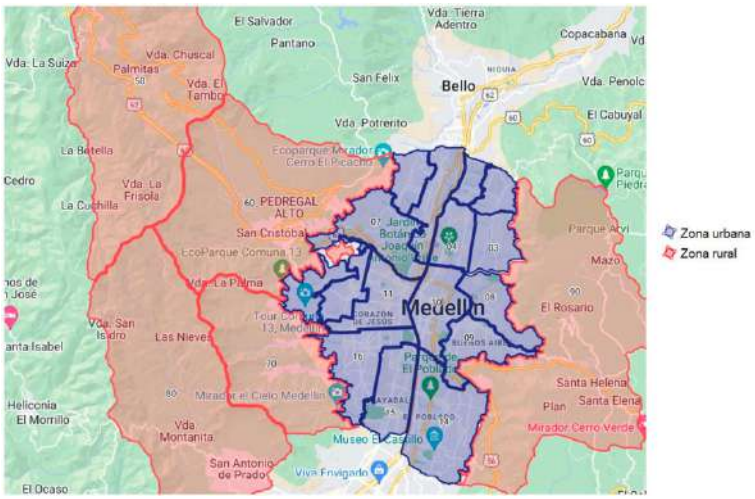


imagen 1: Localización general del proyecto

5 ELEMENTOS DE ENTRADA

Los elementos de entrada corresponden al conjunto de documentos, normas técnicas, especificaciones y requisitos contractuales que orientan la planificación, ejecución y control de las actividades del proyecto. Estos insumos constituyen la base técnica y documental para garantizar que los procesos desarrollados cumplan con los estándares de calidad establecidos, asegurando la conformidad de los productos, materiales y servicios suministrados.

En este apartado se relacionan las normas técnicas aplicables, los documentos contractuales de referencia y demás disposiciones que sirven como guía para la verificación, inspección y evaluación de la calidad durante la ejecución del contrato.

Tabla 1: Relación de los elementos de entrada

NOMBRE	ENTIDAD	TIPO DE DOCUMENTO	VIGENCIA
CONTRATO	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN	LEGALES DEL PROYECTO	2025
NTC ISO 9001	ICONTEC	NORMA	2015
ANEXO TÉCNICO Licitación Pública de infraestructura de transporte No. 70007743 de 2025	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN	TÉCNICO DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN	2025
NTC 1 Métodos de ensayo de doblado de material para ductilidad	ICONTEC	NORMA	2019
NTC 307 (ASTM B 8) (Cables concéntricos de cobre duro, semiduro y blando para usos eléctricos)	ICONTEC	NORMA	2012
NORMAS ICEA, NTC, ICEA - NEMA y ASTM para cables de control	INSULATED CABLE ENGINEERS ASSOCIATION	NORMA	2022
ICONTEC (NTC 3942-2022)	ICONTEC	NORMA	2022
ISO/IEC 11801 para cable UTP	INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION	Norma	2017
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1	AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE	Norma	2009
Norma ISO 9001, ISO 14001 y ROHS óptica, IEC 60794, ANSI/ICEA S-87-640 para fibra óptica	INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION	Norma	2015
NORMAS NEMA , para equipos eléctricos	NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION	NORMA	2022
ASTM A-123 o NTC 3320.para galvanizados en caliente por inmersión	AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALES	Norma	2014

NOMBRE	ENTIDAD	TIPO DE DOCUMENTO	VIGENCIA
especificación D 1.1 – 72 para soldaduras	AMERICAN WELDING SOCIETY	Norma	2000
NORMAS ASTEM para pinturas y recubrimientos	AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALES	NORMA	2022
NORMAS AASHTO M 111 para galvanizado	AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIALS	NORMA	2019
ITE 2005/ETL/Caltrans	INSTITUTE OF. TRANSPORTATION. ENGINEERING.	NORMA	2005
Reglamento técnico de instalaciones eléctricas – RETIE 2024	Ministerio de Minas y Energía	Norma	2024
Código eléctrico Nacional – ICONTEC 2050	ICONTEC	NORMA	2020
Normas Técnica de , REDES	EPM	NORMA	
MANUAL DE ESPACIO PUBLICO - MEP	ICPC Y LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIIVARIANA		2012
Manual de señalización vial.	Ministerio de Transporte	Norma	2015
REQUSITOS SST: DECRETO 1072 RESOLUCIÓN ESTANDARES MINIMOS 0312	MINTRABAJO		2015 2019

FUENTE: Elaboración propia

6 ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el periodo correspondiente al mes de Agosto, se desarrollaron las actividades establecidas en el contrato, abarcando labores de suministro, instalación, mantenimiento y actividades complementarias asociadas al proyecto de ampliación y reposición de la red semafórica del Distrito, descritas a continuación.

6.1 OBRAS CIVILES

- Demolición de andén hasta 20 cm, incluye corte con disco de concreto, cargue, transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales
- Demolición base controlador local.
- Suministro e instalación de bordillo en concreto de 0.45 m (espesor 0.15)

- Suministro de marco de 50 × 50 cm, en ángulo de 2" × 2" × 1/4" y acabado en pintura anticorrosiva.
- Suministro de marco de 60 × 60 cm, en ángulo de 2" × 2" × 1/4" y acabado en pintura anticorrosiva.
- Instalación de marco y tapa metálicos para cajas de hasta 60 × 60 cm interna.
- Suministro de tornillos de 5/8" para cajas de hasta 60 × 60 cm, según especificaciones de la Secretaría de Movilidad de Medellín
- Suministro e instalación de concreto de 21 MPa hecho en obra.
- Construcción de canalización en zona dura de 0.40 m
- Construcción de canalización en zona verde, incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalación de dos tubos eléctricos DB de 2", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente.
- Construcción de canalización en zona dura o zona verde de hasta 30 cm de profundidad.
- Construcción de cajas de 60 × 60 cm internas en concreto de 21 MPa, paredes de 0.15 m y profundidad hasta 1 m.
- Construcción de andenes en concreto de 21 MPa, de espesor 8 cm, incluye acero de refuerzo #2 (2 kg/m²)
- Suministro e instalación de acometida eléctrica para controlador local.
- Suministro, transporte e instalación de bajantes metálicos de 2", incluye accesorios de fijación.
- Suministro, transporte e instalación de bajantes metálicos de 1 1/2", incluye elementos de fijación.
- Limpieza de caja de inspección de hasta 60 × 80 cm y hasta 1 m de profundidad.

6.2 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS SEMAFÓRICOS

- Suministro, transporte e instalación de semáforo vehicular a poste recto, incluye elementos de fijación.
- Suministro, transporte e instalación de semáforo vehicular de conteo regresivo a ménsula, tres aspectos.
- Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal estático.
- Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG 2 × 12 de potencia, tipo fuerza, para semaforización.

- Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG 2 × 10 de potencia, tipo fuerza, para semaforización.
- Suministro, transporte e instalación de discos direccionales para postes de semáforos.
- Suministro de protector de sobrecargas eléctricas para controlador local.
- Suministro, transporte e instalación de empalme para cables eléctricos AWG 4 × 18, 2 × 16, 3 × 18 y 4 × 12
- Suministro, transporte e instalación de empalme con conector en “C” de cable AWG 8 o 10
- Suministro e instalación de 50 cm de cinta Bandit para semáforo vehicular o peatonal a poste recto.

6.3 RED DE COMUNICACIONES

- Suministro e instalación de fibra óptica armada de 24 hilos.
- Suministro, transporte e instalación de placa identificadora de fibra óptica
- Suministro de switch capa 3 de fibra óptica
- Suministro e instalación de módulo SFP de 1,25 Gbps dúplex LC/APC 1310 nm
- Instalación, configuración y puesta en funcionamiento de switch capa 3 de fibra óptica

6.4 SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS SEMAFÓRICOS

- Suministro de ménsula galvanizada (poste recto con platina y brazo de L = 4.5 m), con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla normas para espesores de tubería, pintura y adherencia.
- Suministro de poste recto de enterramiento directo, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla la norma para espesores de tubería, pintura y adherencia.
- Suministro de gabinete para controlador local, en lámina calibre 16.
- Suministro de fusible de cerámica L = 3/4", diámetro 3/16" y 3.15 A
- Suministro de borneras para gabinete de controlador local.

6.5 RETIROS DE ELEMENTOS DE AMOBLAMIENTO SEMAFÓRICO

- Retiro de controlador local.
- Retiro de ménsula metálica, incluye brazo y poste.
- Retiro de brazo de ménsula metálica.
- Retiro de poste recto de enterramiento directo.

- Retiro de semáforo vehicular a ménsula.
- Retiro e instalación de semáforo vehicular a ménsula.
- Retiro de semáforo vehicular, peatonal o de ciclista a poste recto.
- Retiro de cable AWG 4 × 16, 4 × 18 y cable de comunicación.
- Retiro de pulsador peatonal.
- Retiro de disco direccional o disco pulse, espere y pase.
- Retiro de señal informativa de motos.
- Retiro de perno en platina de poste.
- Retiro de soldadura en tapa-marco en caja de inspección
- Retiro de herraje metálico (marco y tapa) de cajas de inspección en concreto.
- Retiro de lámpara vehicular o peatonal a poste recto.
- Retiro de lámpara vehicular a ménsula.
- Retiro e instalación (aplome o nivelación) de poste recto de enterramiento directo.
- Retiro de visera a poste recto.
- Retiro de contraste a poste.

6.6 INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE AMOBLAMIENTO SEMAFÓRICO

- Instalación de ménsula metálica con brazo de 4,5 o 5,50 m
- Instalación de poste recto de enterramiento directo.
- Instalación de semáforo vehicular a ménsula.
- Instalación de semáforo vehicular o peatonal a poste recto.
- Instalación de semáforo peatonal de piso de 1 m de longitud que cumpla con la norma IP67
- Instalación de pulsador.
- Instalación de cable AWG 4 × 16, cable 2 × 16, cable 4 × 18 o neopreno, o telefónico de 10 pares.
- Instalación de controlador local.
- Instalación de lámpara vehicular o peatonal a poste recto
- Instalación de lámpara vehicular a ménsula
- Instalación de disco direccional.

- Calibración y mantenimiento de los planeamientos de tráfico en los controladores locales de la red semafórica de la Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Medellín

6.7 PINTURA DE ELEMENTOS SEMAFÓRICOS

- Pintura de poste recto en sitio, colores blanco y negro en poliuretano, sin retiro total de pintura (rasqueteada).

6.8 LAVADA DE ELEMENTOS SEMAFÓRICOS

- Lavada de brazo de ménsula
- Lavada de poste recto
- Lavada de semáforo peatonal o ciclista
- Lavada de sonorizadores o pulsador
- Lavada de avisos de motos
- Lavado de semáforo vehicular a poste
- Lavado de semáforo vehicular a ménsula de tres o cuatro aspectos
- Lavada de disco direccional

6.9 VARIOS

- Sondeo de canalizaciones, búsqueda de cajas, halado de cables y levantamiento actual georreferenciado de la intersección completa en software SIG.
- Suministro, transporte e instalación de platina especial para realce de anclaje de ménsula.
- Perforación de 1-1/8" de poste o ménsula.
- Adecuación de controlador local existente.
- Enderezada de cara de semáforo vehicular a ménsula
- Enderezada de cara de semáforo vehicular, peatonal o de ciclistas a poste
- Enderezada o ajustada de visera a poste
- Diagnóstico, verificación y reparación de cruce con problemas de corto o fracturas en el cableado que impiden el servicio.
- Soldada de cajas de inspección.
- Suministro e instalación de concreto (e = 15 cm) de 21 MPa para sellado de caja de inspección

7 CONTROL DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

El control de calidad definido para el contrato de “Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín”, se fundamenta en la verificación y seguimiento de los suministros y de los procesos considerados críticos. Entendiéndose como aquellos cuya importancia técnica, impacto en la operación o valor económico, ya sea de manera individual o acumulada, corresponde a montos iguales o superiores a tres millones de pesos.

Dicho control busca garantizar que los materiales, equipos y actividades ejecutadas cumplan con las especificaciones técnicas, los estándares de calidad establecidos y las condiciones contractuales, reduciendo así riesgos de incumplimiento y asegurando la satisfacción del cliente y demás partes interesadas.

En relación con los aspectos técnicos del control de la calidad, se desarrollaron las siguientes actividades:

7.1 CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SUMINISTROS

Durante el periodo evaluado se realizó el control de calidad correspondiente a los suministros entregados en el marco del proyecto y que en algunos casos tienen implícita su instalación, verificando la conformidad técnica de cada elemento con las disposiciones contractuales, normativas y las condiciones establecidas en el Anexo Técnico del Contrato N. º4600105555 de 2025.

De conformidad con los criterios definidos en el Plan de Calidad del contrato, el presente control comprende los suministros cuyo valor individual o acumulado por adquisición es igual o superior a tres millones de pesos ($3.000.000), así como aquellos que, independientemente de su valor, son considerados críticos para la correcta operación de la infraestructura semafórica, debido a su incidencia en la seguridad, funcionalidad y desempeño del sistema, razón por la cual requieren la aplicación de controles específicos de calidad y trazabilidad.

Como parte del proceso de aseguramiento de la calidad, previo a cada adquisición se efectuó la revisión de los requerimientos técnicos, fichas de especificaciones y demás documentación suministrada por el fabricante o proveedor, verificando la compatibilidad de

los elementos con los requisitos establecidos por la entidad contratante. Con base en esta información se elaboró y actualizó la matriz de cumplimiento de especificaciones técnicas, la cual permite documentar la trazabilidad, la conformidad y la aceptación de los suministros antes de su instalación.

En consecuencia, para el período correspondiente al mes de Agosto de 2026 se presentan en la Tabla 2 los suministros que cumplen los criterios definidos en el Plan de Calidad para ser objeto de control de calidad, junto con los respectivos registros y evidencias que soportan la verificación de su conformidad.

Tabla 2: Elementos suministrados en el mes de Agosto, objeto de calidad, dentro del proceso de cumplimiento de especificaciones técnicas

#	Elemento / Actividad	Cantidad	Medidas de calidad aplicables	Numeral ISO 9001:2015 aplicable	Informe / Evidencia de conformidad
1	Discos direccionales, para postes de semáforos, ITEM 83	12 und	Verificación de material, dimensiones, tipo de reflectividad y sistema de fijación. Inspección visual de instalación y validación de cumplimiento de especificaciones contractuales.	8.4 / 8.5 – Control del suministro externo y producción y provisión del servicio.	Informe N.4
2	Semáforo peatonal estático, incluye dos soportes en poliuretano ITEM 70	18 und	Verificación de ficha técnica, inspección visual del equipo y soportes, validación dimensional y funcional del sistema semafórico.	8.4 / 8.6 – Control y liberación de equipos eléctricos.	Informe N.4
3	Semáforo vehícular y de conteo regresivo Housing (caja y puerta)	12 und	• Verificación de conformidad del material (policarbonato) según ficha técnica aprobada.• Inspección dimensional y visual del housing, puerta y elementos de cierre.• Revisión de integridad estructural y ausencia de fisuras o deformaciones.• Verificación del sistema de sellado (empaque contra humedad, polvo y moho).• Comprobación del correcto funcionamiento del mecanismo de ajuste de visera.• Validación contra requisitos del anexo técnico y normas aplicables.	• 8.4.2 Control de productos y servicios suministrados externamente.• 8.6 Liberación de productos y servicios. 7.5 Información documentada	Informe N.5
4	Switch capa 3	64 und	Verificación de ficha técnica del fabricante. Validación de características técnicas (puertos Ethernet y SFP, capacidad de procesamiento, memoria RAM, consumo energético). Inspección visual del equipo suministrado y validación de compatibilidad con la red de fibra óptica instalada.	8.4 – Control de los productos y servicios suministrados externamente. 8.6 – Liberación de equipos tecnológicos.	Informe N.5. Ficha técnica del fabricante y registro fotográfico del equipo.

#	Elemento / Actividad	Cantidad	Medidas de calidad aplicables	Numeral ISO 9001:2015 aplicable	Informe / Evidencia de conformidad
5	Suministro de fusible cerámico de 3.15 A para controlador local	500 und	Verificación de la referencia del producto; revisión de ficha técnica del fabricante; inspección del cuerpo cerámico y marcación; comprobación de corriente nominal de 3.15 A; medición de longitud y diámetro; verificación de tensión nominal y capacidad de interrupción; prueba de compatibilidad con el portafusible; control de cantidad, estado físico y trazabilidad del suministro.	8.4.2 y 8.4.3:control e información para proveedores externos. 8.6:liberación de productos y servicios. 8.7:control de las salidas no conformes. 7.5:información documentada.	Informe N.12 Ficha técnica del fabricante

FUENTE: Elaboración propia

Los elementos relacionados en la tabla 2, cuentan con los respectivos registros de conformidad en referencia al cumplimiento de las especificaciones técnicas, soportadas con evidencia de cumplimiento en los informes relacionados en la columna N.5

Los elementos que hacen referencia al presente informe. (N.12), el registro de conformidad se adjunta en el anexo descrito a continuación:

Anexo 1: Ficha técnica fusible

En atención a lo anterior, se presenta matriz de cumplimiento de especiaciones técnicas de los ítems suministrados durante el periodo correspondiente entre el 29 de julio y el 31 de agosto de 2026.

La matriz que se presenta a continuación integra la evaluación técnica, documental y normativa de los suministros y actividades ejecutadas, garantizando la trazabilidad de los controles de calidad implementados y evidenciando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2015.

Tabla 3: Correspondencia de requisitos ISO 9001 Aplicados a la matriz

Requisito ISO 9001:2015	**Aplicación en la matriz y proceso**	**Evidencia generada**	**Responsable**
8.4.1 Control de productos suministrados externamente	Se documenta la verificación técnica y de conformidad antes de la adquisición e instalación de cada suministro.	Certificados de conformidad, fichas técnicas.	Director del proyecto / Ingeniero Residente

Requisito ISO 9001:2015	Aplicación en la matriz y proceso	Evidencia generada	Responsable
8.5.1 Control de producción y prestación del servicio	Los materiales son inspeccionados y liberados únicamente tras verificar su cumplimiento técnico.	Remisiones de entrada de materiales con observaciones si aplica/ Registro del ingreso del producto en el Kardex	Almacenista / Ingeniero Residente del proyecto
8.6 Liberación de productos y servicios	Solo los elementos conformes (columna "Cumple") son autorizados para instalación en campo.	Matriz de Cumplimiento, registros fotográficos, reportes de aprobación	Ingeniero Residente
7.5 Información documentada	La matriz, fichas técnicas, certificados y actas son registros de calidad controlados bajo Plan de calidad	Control documental interno (Código, versión, archivo)	Responsable de calidad

FUENTE: Elaboración propia

Anexo 2: Matriz de cumplimiento de especificaciones técnicas

Cada suministro fue sometido a un proceso de inspección documental y física, el cual comprendió las siguientes etapas y amplia lo relacionado en la tabla 3:

1. **Verificación documental:** revisión de certificados de conformidad, fichas técnicas y garantías de fábrica, corroborando el cumplimiento de las normas técnicas aplicables (RETIE, NTC, ICONTEC y demás especificaciones complementarias), las cuales se presentan a continuación:

2. **Inspección física y recepción en campo:** comprobación del estado de los materiales al momento de la entrega, confirmando que no presentaran deterioro, alteraciones o defectos visibles, y que su presentación correspondiera a la referencia aprobada.

3. **Control de trazabilidad y registro de seriales:** Para los suministros considerados críticos por su naturaleza eléctrica, electrónica o de comunicaciones tales como, tarjetas electrónicas, routers, switches, radares, equipos de fibra óptica, protectores de sobretensión y demás equipos que disponen de identificación individual se implementó un control específico de trazabilidad mediante el registro de marca, referencia, modelo y número de serie (serial). Este control permite identificar cada equipo desde su recepción, almacenamiento e instalación hasta su puesta en servicio y facilita el seguimiento de garantías, mantenimientos y futuras intervenciones. La información se

consolida en el Kardex de Control de Suministros, el cual es actualizado permanentemente y remitido semanalmente a la Interventoría.

Anexo 3: Control de calidad recepción equipos de comunicación

4. **Aprobación para instalación:** solo tras la validación de la conformidad técnica, los materiales fueron autorizados para su instalación en campo, asegurando la trazabilidad del proceso y la calidad final de las obras ejecutadas, la trazabilidad de la instalación se registra en el formato de registro de mantenimiento y ejecución de obra diario y registro fotográfico compartido de forma semanal a la Interventoría

Anexo 4: Registro de mantenimiento y ejecución de obra diario

Como parte de los mecanismos de trazabilidad, control y aseguramiento de la calidad definidos en el Plan de Calidad, se establece el seguimiento sistemático de los suministros y de los procesos considerados críticos durante la ejecución del proyecto y que adicional se ejecuta la instalación..

En coherencia con lo anterior, se amplía la información correspondiente a los equipos suministrados e instalados durante el periodo, consolidando una tabla de control en la que se registran la fecha de instalación, cantidad, dirección, barrio, cuadrilla responsable, tipo de mantenimiento, complementada con evidencia fotográfica aleatoria de las actividades desarrolladas.

Durante el periodo reportado se efectuó el suministro e instalación de los siguientes ítems:

- Suministro, transporte e instalación de semáforo vehicular a poste recto. ITEM 65
- Suministro, transporte e instalación de semáforo vehicular a poste recto, incluye elementos de fijación. ITEM 70
- Suministro, transporte e instalación de discos direccionales, para postes de semáforos. ITEM 83

7.1.1 Suministro, transporte e instalación de semáforo vehicular a poste recto.

Durante el periodo correspondiente al mes de agosto se registran las siguientes instalaciones:

Tabla 4: Relación de elementos instalados

ITEM	FECHA	DIRECCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COMUNA	BARRIO	TIPO DE ACTIVIDAD	CUADRILLA
1	5/08/26	CR 36 A x CL 47	1	Un	9	Buenos Aires	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
2	10/08/26	CR 46 x CL 52	1	Un	10	La Candelaria	INCIDENTES DE TRANSITO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
3	11/08/26	CR 51 x CL 49	1	Un	10	La Candelaria	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
4	13/08/26	CR 70 x CL 51	1	Un	11	Cuarta Brigada	ACTOS DE VANDALISMO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
5	18/08/26	CR 64 A x CL 33 PASO SEGURO SAMEIN	1	Un	11	Los Conquistadores	INCIDENTES DE TRANSITO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
6	19/08/26	CR 49 x CL 73	1	Un	4	San Pedro	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
7	19/08/26	CR 76 x CL 30	1	Un	16	Granada	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
8	20/08/26	CR 77 x CL 30	2	Un	16	Belén	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
9	27/08/26	CR 76 x CL 25	1	Un	16	San Bernardo	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
10	27/08/26	CR 76 x CL 30	1	Un	16	Granada	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
11	28/08/26	CR 66 B x CL 34 A UNICENTRO 2 (Cost. NORTE)	1	Un	11	U.P.B.	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN

FUENTE: Datos extraídos de memorias y acta N.12

	
Fotografía 1: Instalación semáforo	***Fotografía 2: Instalación semáforo***

7.1.2 Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal estático, ITEM 70

Durante el periodo se realizó el suministro y la instalación de semáforo peatonal estático, el respectivo registro de instalación se relaciona a continuación

Tabla 5: Relación de elementos instalados

ITEM	FECHA	DIRECCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COMUNA	BARRIO	TIPO DE ACTIVIDAD	CUADRILLA
1	5/08/26	CR 36 A x CL 47	1	Un	9	Buenos Aires	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
2	11/08/26	CR 46 x CL 49	12	Un	10	Barrio Colón	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
3	18/08/26	CR 64 A x CL 33 PASO SEGURO SAMEIN	1	Un	11	Los Conquistadores	INCIDENTES DE TRANSITO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
4	27/08/26	AV 80 x CL 65 Colpisos	1	Un	7	San Germán	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
5	28/08/26	CR 45 x CL 67 (Cost Sur)	2	Un	3	Manrique central No. 2	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN

ITEM	FECHA	DIRECCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COMUNA	BARRIO	TIPO DE ACTIVIDAD	CUADRILLA
6	28/08/26	CR 66 B x CL 34 A UNICENTRO 2 (Cost. NORTE)	1	Un	11	U.P.B.	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN

FUENTE: Datos extraídos de memorias y acta N.12



Fotografía 3: Instalación semáforo



Fotografía 4: Instalación semáforo

El suministro de semáforos vehiculares y peatonales tienen establecido como control de calidad el control de seriales para ejecución de garantías, en cumplimiento de dicho control se presenta el archivo con los registros de seriales.

Anexo 5: Seriales de lámparas

7.1.3 Suministro, transporte e instalación de discos direccionales, para postes de semáforos ITEM 83

Durante el mes de Agosto de 2026 se ejecutaron actividades correspondientes al suministro, transporte e instalación de discos direccionales para postes de semáforos, en diferentes intersecciones de la ciudad de Medellín, como parte de las labores de mantenimiento y reposición de la infraestructura semafórica. se realizaron intervenciones en 12 ubicaciones, distribuidas en diferentes comunas y barrios de la ciudad. En total, fueron instalados 29 discos direccionales.

Tabla 6: Relación de elementos instalados

ITEM	FECHA	DIRECCIÓN	CANT	UN	COMNA	BARRIO	TIPO DE ACTIVIDAD	CUADRILLA
1	29/07/26	TV 73 x CR 69 RINCONCITO ECUATORIANO	5	Un	7	Cerro El Volador	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
2	29/07/26	CR 64 C x CL 67 CARABINEROS GLORIETA Ext NOROCCIDENTAL	1	Un	5	Caribe	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
3	29/07/26	CR 55 x CL 67	2	Un	10	El Chagualo	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
4	29/07/26	CR 51 x CL 67 COST. NORTE	4	Un	4	Sevilla	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
5	29/07/26	CR 45 x CL 66 A	3	Un	10	Prado	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
6	30/07/26	CR 25 x CL 49 (C.C. la central)	3	Un	9	Diego Echavarría	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
7	30/07/26	CR 26 X CL 49 (C.C. la central)	4	Un	9	Diego Echavarría	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
8	2/08/26	CR 70 x CL 53	2	Un	11	Cuarta Brigada	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
9	2/08/26	CR 73 x CL 53	1	Un	11	Cuarta Brigada	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
10	3/08/26	CR 49 x CL 45	1	Un	10	Guayaquil	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
11	3/08/26	CR 50 x CL 49	2	Un	10	La Candelaria	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
12	6/08/26	CR 46 x CL 86	1	Un	4	Las Esmeraldas	REPOSICIÓN MÉNSULAS	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN

FUENTE: Datos extraídos de memorias y acta N.12

		
Fotografía 5: Instalación de discos direccionales	***Fotografía 6: Instalación de discos direccionales***	***Fotografía 7: Instalación de discos direccionales***

7.2 CUMPLIMIENTO CON EL PROCEDIMIENTO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS SEMAFÓRICAS (POSTES Y MÉNSULAS)

Durante el mes de Agosto de 2026 se dio cumplimiento al Procedimiento para el Aseguramiento de la Calidad en la Fabricación de Estructuras Metálicas, aplicable al suministro de ménsulas.

El control y seguimiento de estas actividades se desarrolló conforme a los lineamientos establecidos en el Plan de Calidad del contrato y en cumplimiento de los numerales 8.4 y 8.6 de la norma ISO 9001:2015, relacionados con el control de los productos y servicios suministrados externamente y la liberación de productos conformes, respectivamente.

Durante el periodo se realizaron verificaciones asociadas a la revisión de especificaciones técnicas, validación del proveedor, control documental de certificados y fichas técnicas del acero, supervisión del proceso de fabricación y soldadura, aplicación del recubrimiento anticorrosivo, condiciones de embalaje, recepción de los elementos y control de cantidades suministradas.

Tabla 7: Elementos suministrados en el mes de Agosto, objeto de calidad, dentro del proceso de fabricación de elementos

#	Elemento / Actividad	Cantidad	Medidas de calidad aplicables	Numeral ISO 9001:2015 aplicable	Informe / Evidencia de conformidad
1	Poste recto de enterramiento directo/poste recto con platina, con pintura electrostática y/o poliuretano	10 und	• Verificación del tipo de acero y espesor. • Control dimensional conforme a plano aprobado. • Inspección de soldaduras. • Verificación del acabado superficial.	8.4 – Control de productos y servicios suministrados externamente. 8.6 – Liberación de productos y servicios.	Informe N.1 Certificados de calidad del acero, ficha técnica de pintura.
2	Marco de 50x50 y/o de 60x60 cm, en ángulo de 2”x2”x1/4” y acabado en pintura anticorrosiva.	46 und	Verificación dimensional del marco, validación del material (acero estructural) y revisión del acabado superficial con recubrimiento anticorrosivo conforme a especificaciones técnicas.	8.4 – Control de los productos y servicios suministrados externamente.	Informe N.2
3	**Tapa de seguridad en hierro dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12 (50x50 cm y 60x60 cm)**	46 und	Verificación del cumplimiento de la especificación técnica (ASTM A536 Grado 65-45-12 y EN 124 Clase B125); revisión de dimensiones, acabado superficial, sistema antideslizante, perforaciones para bisagra y tornillos de seguridad, ajuste al marco, nivelación, ausencia de fisuras o deformaciones y verificación documental del fabricante.	**8.4.2** Control de productos y servicios suministrados externamente; **8.5.1**Control de la prestación del servicio; **8.6**Liberación de los productos y servicios.	Informe N.2 Certificado de conformidad y/o ficha técnica del fabricante, certificado del material.

#	Elemento / Actividad	Cantidad	Medidas de calidad aplicables	Numeral ISO 9001:2015 aplicable	Informe / Evidencia de conformidad
4	Gabinetes	7 und	• Control de dimensiones y tolerancias según plano. • Verificación del tipo de lámina, espesor y tratamiento anticorrosivo. • Prueba de cierres, bisagras y hermeticidad. • Revisión del acabado superficial (pintura / recubrimiento). • Prueba funcional del sistema de apertura y cierre.	8.4 – Control de productos y servicios suministrados externamente. 8.6 – Liberación de productos.	Informe N.3 Certificado de materiales, registro fotográfico del gabinete terminado, acta de inspección final.
5	Ménsula galvanizada (poste recto con platina y brazo de L= 5.5 m).	10 und	• Verificación del tipo de acero y espesor según diseño aprobado. • Control dimensional y tolerancias. • Inspección visual de soldaduras. • Verificación del tratamiento anticorrosivo y acabado superficial. • Revisión de cumplimiento de planos y especificaciones técnicas.	8.5 – Producción y provisión del servicio. 8.6 – Liberación de productos y servicios.	Informe N.3 Certificados de calidad del acero, ficha técnica de pintura, registro fotográfico del proceso y producto terminado

FUENTE: Elaboración propia

Para la fabricación de los elementos relacionados anteriormente se llevó a cabo el siguiente procedimiento:

Tabla 8: Seguimiento al Procedimiento para el Aseguramiento de la Calidad en la Fabricación de Estructuras – Agosto 2026



Etapa	Actividad	Responsable	Registro / Evidencia	Resultado del Seguimiento
1. Revisión de requisitos	Se analizaron los planos y especificaciones técnicas correspondientes a los, postes y ménsulas.	Ingeniero Residente / Responsable de Calidad	Matriz de cumplimiento de especificaciones técnicas actualizada.	Se comparten planos al proveedor seleccionado
2. Validación de proveedores	Se verificó que el proveedor contará con la experiencia suficiente en la fabricación de estos elementos	Ingeniero Residente	Cotizaciones del proveedor	Proveedor validado conforme a los criterios de calidad establecidos. Cumple.
3. Verificación del proceso de adquisición del acero	Se revisa que las fichas técnicas y certificados de calidad cumplan con el criterio establecido en el anexo técnico	Asistente Administrativa / Calidad	Fichas técnicas, certificados de calidad de acero RS-003 EPM	Material conforme a especificaciones técnicas.
4. Verificación del cumplimiento del proveedor en el proceso de soldadura	Se verifica que el proveedor cuente con la competencia en la ejecución de soldadura	Ingeniero Residente	Certificación de soldador, registro fotográfico del proceso.	Cumple con requisitos del procedimiento.
5. Pintura electrostática (si aplica)	Se revisan colores y acabados adecuados	Ingeniero Residente	Registro de aplicación, certificado de pintura.	Colores y acabado cumplen
6. Embalaje y entrega	Los postes, ménsulas y gabinetes deben ser forrados inicialmente con papel tipo cartulina, posterior papel corrugado y por ultimo papel vinil, con el objetivo de proteger su acabado	Ingeniero Residente	remisión de entrega.	Embalaje conforme
7. Recepción en obra	Se inspeccionó aleatoriamente el embalaje y los acabados de los elementos entregados, asegurando integridad durante el transporte.	Almacenista	Remisión de entrega, registro fotográfico.	Recepción conforme. No se evidencian daños ni defectos visibles.
8. Instalación de elementos	Se verifica en campo la correcta instalación	Ingeniero Residente	Registro fotográfico antes, durante y después	Ménsulas instalados adecuadamente

FUENTE: Elaboración propia

Durante el período fueron objeto de este procedimiento de aseguramiento de las estructuras descritas en la tabla 12.

Durante el proceso de fabricación se realizó inspección en taller, verificando el desarrollo de las diferentes etapas del proceso productivo

	
Fotografía 8: Soldada de postes	***Fotografía 9: Galvanizado de postes***

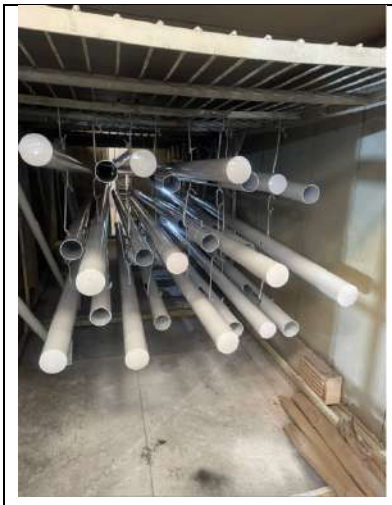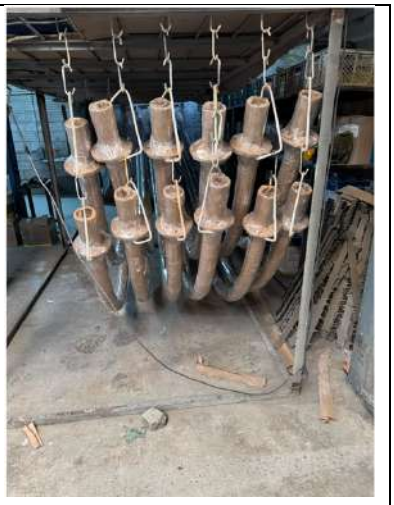	
Fotografía 10: Pintura de postes	***Fotografía 11: Embalaje***

	
Fotografía 12: Fabricación herrajes y tapas	***Fotografía 13: Fabricación herrajes y tapas***

Durante el periodo solo se ejecuta la fabricación y suministro de estructuras relacionadas en la tabla 12.

7.3 CUMPLIMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ATENCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE SEMÁFOROS

En el marco del Contrato N.º 4600105555 de 2025, y conforme a las directrices del Plan de Calidad del Proyecto, se implementaron controles orientados a garantizar la calidad y continuidad operativa de la red semafórica del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

Durante el periodo evaluado, se ejecutaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los protocolos operativos y los requisitos contractuales establecidos.

7.3.1 Mantenimiento Preventivo

El mantenimiento preventivo tuvo como propósito garantizar la continuidad operativa y la funcionalidad de la red semafórica, y visualmente estética, mediante la ejecución de actividades programadas en coordinación con la Interventoría y la entidad contratante.

En el marco de sus funciones de supervisión técnica, dichas entidades identifican y reportan necesidades de intervención durante recorridos rutinarios y no rutinarios, los cuales son

comunicados a través de los canales de comunicación establecido por las partes (grupo de WhatsApp y correo electrónico), para su posterior programación y atención por parte del contratista dentro de las actividades de mantenimiento.

Si bien las acciones son requeridas por la Interventoría y la entidad contratante, se clasifican para efectos del presente informe como mantenimiento preventivo, en la medida en que la clasificación del mantenimiento no depende exclusivamente del origen del requerimiento, sino de la naturaleza técnica de la actividad y su finalidad de prevenir el deterioro o pérdida de funcionalidad del sistema.

En coherencia con la **ISO 9001:2015**, la gestión del mantenimiento preventivo se desarrolló bajo los siguientes lineamientos:

Tabla 9: Correspondencia del procedimiento de mantenimiento preventivo con los requisitos de la norma ISO9001

Requisito ISO 9001:2015	Aplicación en el proceso de mantenimiento	Evidencia generada	Responsable
8.1 – Planificación y control operacional	Las actividades de mantenimiento fueron planificadas y controladas mediante la programación diaria comunicada en el grupo de coordinación, donde se consolidan los reportes de campo, se priorizan las atenciones y se asignan los recursos técnicos y logísticos necesarios.	Programación diaria, reportes de atención, comunicaciones internas (grupo de WhatsApp y correo electrónico).	Ingeniero Residente / Tecnóloga Auxiliar de residencia
7.5 – Información documentada	Todas las acciones de mantenimiento se registraron en el formato “Control de daños y atenciones reportadas, programadas y atendidas”, asegurando trazabilidad, control documental y evidencia de conformidad. Informes de calidad	Formatos SIT-FO-CA-001, listados de atención, control de versiones, registros de trazabilidad y carpetas digitales del SGC.	Ingeniero Residente / Tecnóloga Auxiliar de residencia / Responsable de calidad

Requisito ISO 9001:2015	Aplicación en el proceso de mantenimiento	Evidencia generada	Responsable
8.6 – Liberación de productos y servicios	Cada intervención contó con registros de ejecución, del servicio, soportados en evidencia fotográfica antes, durante y después de la intervención, conforme a lo establecido en el anexo técnico del contrato. Estos registros fueron presentados semanalmente a la Interventoría, junto con las memorias de atención.	Registro fotográfico antes, durante y después; memorias de atención; actas de validación; reportes de cierre aprobados por la Interventoría.	Ingeniero Residente / Tecnóloga Auxiliar de residencia

FUENTE: Elaboración propia

Las principales actividades susceptibles de ejecución de control de calidad desarrolladas durante el periodo incluyeron:

- Retiro e instalación de Semáforo vehicular a ménsula. Incluye utilización de equipo de altura, retiro de placa de constraste, girada de viseras y ubicación del semáforo de manera horizontal. ITEM 171
- Soldada de cajas de inspección. Mínimo 15 cm de cordón en cada lado de la caja. ITEM 262.

Cada intervención fue verificada por la supervisión y respaldada con evidencia fotográfica, formatos de control y actas de ejecución, asegurando la trazabilidad, conformidad y control de calidad del servicio, de acuerdo con el Plan de Calidad y los requisitos contractuales del contrato No. 4600105555 de 2025.

Los ítems de mantenimiento susceptibles de control de acuerdo con la propuesta de seguimiento de productos y procesos críticos para el presente procedimiento se presentan a continuación:

7.3.1.1 Retiro e instalación de Semáforo vehicular a ménsula. ITEM 171

Durante el periodo correspondiente al mes de agosto, se realizo el retiro e instalación de semáforo vehicular a ménsula, el cual incluye la utilización de equipo de altura, retiro de placa de contraste, girada de viseras y ubicación del semáforo de manera horizontal.

De acuerdo con los registros de ejecución, se realizaron 142 intervenciones en diferentes comunas y barrios de la ciudad de Medellín, con una cantidad total acondicionada de 242 unidades.

En la siguiente tabla se presenta la relación de las actividades ejecutadas, indicando fecha, dirección, cantidad, comuna, barrio, tipo de actividad y cuadrilla responsable.

Tabla 15. Relación de elementos instalados

ITEM	FECHA	DIRECCIÓN	CANT	UND	COMNA	BARRIO	TIPO DE ACTIVIDAD	CUADRILLA
1	2/08/26	CR 59 x CL 44	1	Un	10	Corazón de Jesús	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
2	2/08/26	CR 57 x CL 54	1	Un	10	San Benito	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
3	2/08/26	CR 57 x CL 58/59 Fatelares Norte	2	Un	10	Jesús Nazareno	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
4	2/08/26	CR 51 x CL 61	1	Un	10	Prado	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
5	2/08/26	CR 45 x CL 67 (Cost Norte)	2	Un	3	Manrique Central No. 2	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
6	2/08/26	CR 39 x CL 58	2	Un	10	Boston	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
7	2/08/26	CR 32 x CL 50	1	Un	9	Barrio Caicedo	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
8	2/08/26	CR 30 x CL 47	2	Un	9	Buenos Aires	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
9	2/08/26	CR 32 x CL 45	2	Un	9	Gerona	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
10	2/08/26	CR 30 x CL 45	1	Un	9	La Milagrosa	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
11	2/08/26	CR 36 x CL 47	3	Un	9	Buenos Aires	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
12	2/08/26	CR 36 A x CL 47	1	Un	9	Buenos Aires	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
13	2/08/26	CR 36 A x CL 54	3	Un	10	Boston	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
14	2/08/26	CR 36 A x CL 51	3	Un	10	Boston	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
15	2/08/26	CR 36 A x CL 50	3	Un	10	Boston	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
16	2/08/26	CR 36 x CL 45 (I. E. F. OZANAM)	2	Un	9	Gerona	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN

ITEM	FECHA	DIRECCIÓN	CANT	UND	COMNA	BARRIO	TIPO DE ACTIVIDAD	CUADRILLA
17	2/08/26	CR 36 A x CL 40	3	Un	9	El Salvador	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
18	2/08/26	CR 36 x CL 36	2	Un	9	El Salvador	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
19	2/08/26	CR 54 x CL 46	2	Un	10	Guayaquil	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
20	2/08/26	CR 57 x CL 48	2	Un	10	Guayaquil	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
21	9/08/26	CR 43 C x CL 11	2	Un	14	Manila	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
22	9/08/26	CR 43 F x CL 11	1	Un	14	Manila	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
23	9/08/26	CR 55 x CL 52 A	1	Un	10	San Benito	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
24	9/08/26	CR 65 X CL 59 A	1	Un	7	Universidad Nacional	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
25	9/08/26	CR 64 C x CL 57 Unal.	1	Un	7	Universidad Nacional	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
26	9/08/26	CR 65 x CL 43	2	Un	11	San Joaquín	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
27	9/08/26	CR 65 x CL 47 D	1	Un	11	Naranjal	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
28	9/08/26	CR 64 B x CL 50 (PASO SEGURO)	3	Un	11	Suramericana	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
29	9/08/26	CR 65 x CL 50	1	Un	11	Suramericana	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
30	9/08/26	CR 70 x CL 50	1	Un	11	U.D. Atanasio Girardot	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
31	9/08/26	CR 65 x CL 25	2	Un	15	Trinidad	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
32	9/08/26	CR 43 C x CL 10	1	Un	14	Astorga	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
33	9/08/26	CR 41 x CL 10	2	Un	14	El Poblado	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
34	9/08/26	CR 40 x CL 10	1	Un	14	El Poblado	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
35	9/08/26	CR 35 x CL 10 A	2	Un	14	Las Lomas No.1	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN

ITEM	FECHA	DIRECCIÓN	CANT	UND	COMNA	BARRIO	TIPO DE ACTIVIDAD	CUADRILLA
36	9/08/26	CR 35 x CL 10	1	Un	14	El Poblado	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
37	9/08/26	CR 32 x CL 10	1	Un	14	Las Lomas No.1	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
38	9/08/26	CR 32 D x CL 10 (C.C. Vizcaya)	1	Un	14	Las Lomas No.1	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
39	9/08/26	CR 32 x CL 1 SUR	2	Un	14	Los Naranjos	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
40	9/08/26	CR 37 B x CL 1 SUR (Loma de los Parras)	2	Un	14	El Poblado	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
41	9/08/26	CR 32 x CL 9 SUR	3	Un	14	El Castillo	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
42	9/08/26	CR 27 x CL 20 SUR (San Lucas)	1	Un	14	San Lucas	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
43	9/08/26	CR 25 x CL 12 SUR	2	Un	14	Los Balsos No.1	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
44	9/08/26	CR 25 x CL 12 SUR	1	Un	14	Los Balsos No.1	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
45	9/08/26	CR 25 x CL 5 SUR	2	Un	14	Los Naranjos	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
46	9/08/26	CR 25 x CL 2 SUR (TV SUP x CL 2 SUR)	3	Un	14	Los Naranjos	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
47	9/08/26	CR 25 x CL 10 (Cola del Zorro)	1	Un	14	Altos del Poblado	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
48	9/08/26	CR 32 x CL 10	1	Un	14	Las Lomas No.1	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
49	9/08/26	CR 34 x CL 10	3	Un	14	El Poblado	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
50	9/08/26	CR 35 x CL 10	1	Un	14	El Poblado	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
51	9/08/26	CR 36 x CL 10	1	Un	14	El Poblado	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
52	16/08/26	CR 108 BB x CL 62 D (Ye VIA AL MAR)	2	Un	7	Santa Margarita	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN

ITEM	FECHA	DIRECCIÓN	CANT	UND	COMNA	BARRIO	TIPO DE ACTIVIDAD	CUADRILLA
53	16/08/26	CR 91 x CL 64 (peatonal via al mar, I.E. Rafael Garcia H.)	2	Un	7	Robledo	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
54	16/08/26	CR 85 x CL 76 FERRINI	2	Un	7	Palenque	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
55	16/08/26	AV 80 x CL 75 Linda Pinta	3	Un	7	Palenque	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
56	16/08/26	AV 80 x CR 78 Fac. Minas	1	Un	7	Facultad de Minas U. Nacional	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
57	16/08/26	CR 78 x CL 65 Col. Mayor	2	Un	7	Facultad de Minas U. Nacional	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
58	16/08/26	CR 72A x CL 73 (ENTRADA PILARICA)	5	Un	7	B. Cerro El Volador	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
59	16/08/26	CR 65 x CL 71 A (CC LA FLORIDA)	2	Un	5	El Progreso	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
60	16/08/26	CR 64 C x CL 78 TERMINAL NORTE cost NORORIENTAL	5	Un	5	Terminal de Transporte	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
61	16/08/26	CR 64 C x CL 67 CARABINEROS GLORIETA Ext NOROCCIDENTAL	1	Un	5	Caribe	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
62	16/08/26	CR 72 A x CL 78 B	2	Un	7	Bosques de San Pablo	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
63	16/08/26	CR 75 x CL 80 ALTAMIRA	3	Un	7	Altamira	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
64	16/08/26	AV 80 x CL 78	2	Un	7	El Diamante	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
65	16/08/26	DIAG 80 x CL 77 B U. SANTO TOMAS	2	Un	7	La Pilarica	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
66	16/08/26	AV 80 x CL 45 G	1	Un	12	La América	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN

ITEM	FECHA	DIRECCIÓN	CANT	UND	COMNA	BARRIO	TIPO DE ACTIVIDAD	CUADRILLA
67	16/08/26	CR 84 x CL 44	5	Un	12	La América	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
68	16/08/26	AV 80 x CL 33 NOR-ORIE	1	Un	11	Las Acacias	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
69	16/08/26	AV 80 x CL 19 Col. Sn. CARLOS	1	Un	16	La Gloria	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
70	16/08/26	AV 80 x CL 2 CLINICA LAS AMERICAS PEATONAL	1	Un	16	La Mota	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
71	16/08/26	AV 80 x CR 70 NORTE iss	2	Un	15	El Rodeo	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
72	16/08/26	CR 50 FF x CL 8 SUR	1	Un	15	Guayabal	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
73	17/08/26	CR 43 A X CL 18 SUR	1	Un	14	Santa María de Los Ángeles	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
74	17/08/26	CR 43 A x CL 16 A SUR	1	Un	14	Santa María de Los Ángeles	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
75	17/08/26	CR 43 A x CL 9 SUR	1	Un	14	La Aguacatala	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
76	17/08/26	CR 43 A x CL 1 SUR	2	Un	14	Patio Bonito	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
77	17/08/26	CR 43 A x CL 9	1	Un	14	Astorga	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
78	17/08/26	CR 66 x CL 94	2	Un	5	Castilla	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
79	17/08/26	CR 65 x CL 94	1	Un	5	Castilla	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
80	17/08/26	CR 55 x CL 93 glorieta madre Laura cost. Occidental	3	Un	4	Palermo	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
81	17/08/26	CR 55 x CL 92	2	Un	4	Moravia	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
82	17/08/26	CR 52 x CL 80	1	Un	4	Moravia	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN

ITEM	FECHA	DIRECCIÓN	CANT	UND	COMNA	BARRIO	TIPO DE ACTIVIDAD	CUADRILLA
83	17/08/26	CR 43 C x CL 6 SUR (POMONA)	2	Un	14	La Aguacatala	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
84	17/08/26	CR 43 C x CL 7 SUR (SHERATON)	3	Un	14	La Aguacatala	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
85	17/08/26	CR 43 A x CL 7 SUR PEATONAL CC SANTAFE	1	Un	14	Los Balsos No.2	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
86	17/08/26	CR 43 A X CL 18 SUR	1	Un	14	Santa María de Los Ángeles	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
87	17/08/26	CR 62 x CL 90 (CURVA DE LA Virgen, Madre laura)	1	Un	4	Moravia	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
88	17/08/26	CR 60 x CL 92 (Asfaltadora, Madre laura)	1	Un	4	Moravia	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
89	17/08/26	CR 53 x CL 93	3	Un	4	Palermo	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
90	17/08/26	CR 51 A x CL 92	4	Un	4	Aranjuez	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
91	17/08/26	CR 53 x CL 94	2	Un	4	Palermo	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
92	17/08/26	CR 55 x CL 93 glorieta madre Laura cost. Peatonal Norte	2	Un	4	Palermo	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
93	17/08/26	CR 55 x CL 97 TRICENTENARIO	3	Un	4	Palermo	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
94	17/08/26	CR 55 x CL 93 glorieta madre Laura cost. Oriental	2	Un	4	Palermo	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
95	17/08/26	CR 43 x CL 66F	1	Un	3	Campo Valdes No. 2	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
96	17/08/26	CR 49 x CL 73	5	Un	4	San Pedro	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
97	17/08/26	CR 49 x CL 78	1	Un	4	Brasilia	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN

ITEM	FECHA	DIRECCIÓN	CANT	UND	COMNA	BARRIO	TIPO DE ACTIVIDAD	CUADRILLA
98	17/08/26	CR 47 x CL 69	1	Un	4	Manrique Central No. 1	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
99	17/08/26	AV 80 x CL 33 NOR-OCCI STA. GEMA	3	Un	11	La Castellana	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
100	17/08/26	AV 80 x CL 33 SUR-ORIE	1	Un	11	Las Acacias	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
101	17/08/26	AV 80 x CL 30	2	Un	16	Belén	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
102	17/08/26	AV 80 X CL 28	2	Un	16	La Palma	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
103	17/08/26	AV 80 x CL 21	3	Un	16	La Gloria	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
104	17/08/26	AV 80 x CL 20 A	3	Un	16	La Gloria	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
105	17/08/26	AV 80 x CL 9 Cost. SUR	2	Un	7	Robledo	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
106	17/08/26	CR 43 A x CL 10	1	Un	14	El Poblado	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
107	23/08/26	CR 52 x CL 53 AV DE GREIFF	1	Un	10	La Candelaria	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
108	23/08/26	CR 36 x CL 40	2	Un	9	El Salvador	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
109	23/08/26	CR 17 B x CL 49	2	Un	9	Los Cerros El Vergel	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
110	23/08/26	CR 51 x CL 56	2	Un	10	Villa Nueva	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
111	23/08/26	CR 53 x CL 54	1	Un	10	Estación Villa	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
112	23/08/26	CR 53 x CL 59	1	Un	10	Jesús Nazareno	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
113	23/08/26	CR 65 x CL 94	1	Un	5	Castilla	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
114	23/08/26	CR 50 x CL 4 SUR (Apolo)	1	Un	15	Cristo Rey	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
115	23/08/26	CR 66 B x CL 30 A	1	Un	16	Rosales	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
116	23/08/26	CR 48 x CL 4 SUR PUENTE cost norte	1	Un	14	La Aguacatala	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN

ITEM	FECHA	DIRECCIÓN	CANT	UND	COMNA	BARRIO	TIPO DE ACTIVIDAD	CUADRILLA
117	23/08/26	CR 48 x CL 16 A SUR	1	Un	14	Santa María de Los Ángeles	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
118	23/08/26	CR 43 A x CL 11 B	1	Un	14	Manila	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
119	23/08/26	CR 43 A x CL 14	1	Un	14	Manila	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
120	23/08/26	CR 43 A x CL 25	1	Un	14	Castropol	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
121	23/08/26	CR 50 FF x CL 8 SUR	1	Un	15	Guayabal	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
122	23/08/26	CR 52 x CL 4 SUR (PEAT Rodeo)	1	Un	15	Cristo Rey	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
123	23/08/26	CR 70 x CL 9	6	Un	16	Diego Echavarría	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
124	23/08/26	CR 70 x CL 14	1	Un	16	Las Playas	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
125	23/08/26	CR 70 x CL 16	1	Un	16	Las Playas	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
126	23/08/26	CR 70 x CL 19	1	Un	16	Las Playas	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
127	23/08/26	CR 70 x CL 24	1	Un	16	San Bernardo	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
128	23/08/26	CR 79 AA x CL 44	1	Un	11	Lorena	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
129	23/08/26	TV 41 x DG 74 A - TV 41 x AV NUTIBARA	1	Un	11	Lorena	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
130	23/08/26	AV 80 x CL 45 G	1	Un	12	La América	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
131	23/08/26	CR 81 x CL 54 EMAUS	3	Un	12	Ferrini	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
132	23/08/26	CR 74 B x CL 65 (Peat. Monseñor Cano)	1	Un	7	San Germán	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
133	23/08/26	AV 80 x CL 76 Doña Maria	1	Un	7	Palenque	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
134	23/08/26	AV 80 x CL 55	1	Un	11	Los Colores	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN

ITEM	FECHA	DIRECCIÓN	CANT	UND	COMNA	BARRIO	TIPO DE ACTIVIDAD	CUADRILLA
135	23/08/26	AV 80 x CL 35 ORIENTAL	1	Un	11	Los Colores	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
136	23/08/26	AV 80 x CL 78	1	Un	7	El Diamante	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
137	23/08/26	AV 80 x CL 2 CLINICA LAS AMERICAS PEATONAL	1	Un	16	La Mota	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
138	23/08/26	AV 80 x CL 19 Col. Sn. CARLOS	1	Un	16	La Gloria	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
139	23/08/26	AV 80 X CL 28	1	Un	16	La Palma	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
140	23/08/26	CR 82 A x CL 30 A (los molinos)	2	Un	11	Los Colores	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
141	23/08/26	AV 80 x CL 32 SUR MIMOS	1	Un	11	Los Colores	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
142	23/08/26	CR 84 x CL 34 (Corazonista)	2	Un	11	La Castellana	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN

FUENTE: Datos extraídos de memorias y acta N.12



Fotografía 14: Giro semáforos



Fotografía 15: Giro semáforos



Fotografía 16: Giro semáforos

7.3.1.2 Soldada de Cajas de Inspección

Durante el período evaluado se ejecutaron actividades de soldadura y aseguramiento de tapas y marcos de cajas de inspección pertenecientes a la infraestructura semafórica del


Distrito de Medellín, con el propósito de garantizar prevenir la vandalización o manipulación sin autorización de la red de semáforos.

Tabla 10: Relación de direcciones

ITEM	FECHA	DIRECCIÓN	CANT	UND	COMNA	BARRIO	TIPO DE ACTIVIDAD	CUADRILLA
1	30/07/26	CR 52 x CL 82 Cuatro Bocas	2	Un	4	Bermejal-Los Alamos	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
2	30/07/26	CR 49 x CL 50	3	Un	10	La Candelaria	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
3	3/08/26	CR 64 B x CL 50 (PASO SEGURO)	6	Un	11	Suramericana	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
4	3/08/26	CR 46 x CL 54	2	Un	10	La Candelaria	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
5	4/08/26	CR 51 x CL 36	6	Un	10	Perpetuo Socorro	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
6	4/08/26	CR 51 x CL 38	12	Un	10	Calle Nueva	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
7	5/08/26	CR 72 A x CL 78 B	3	Un	7	Bosques de San Pablo	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
8	5/08/26	CR 32 x CL 12	2	Un	14	Las Lomas No.2	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
9	5/08/26	CR 46 x CL 49	18	Un	10	Barrio Colón	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
10	8/08/26	CR 52 x CL 14	1	Un	15	Santa Fé	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
11	10/08/26	CR 50 x CL 35	4	Un	10	Perpetuo Socorro	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
12	13/08/26	CR 36 A x CL 45	1	Un	9	Buenos Aires	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
13	18/08/26	CR 65 x CL 80	3	Un	5	Cementerio Universal	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
14	20/08/26	CR 46 x CL 49	6	Un	10	Barrio Colón	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
15	20/08/26	CR 47 x CL 52	3	Un	10	La Candelaria	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN

ITEM	FECHA	DIRECCIÓN	CANT	UND	COMNA	BARRIO	TIPO DE ACTIVIDAD	CUADRILLA
16	26/08/26	CR 65 x CL 80	1	Un	5	Cementerio Universal	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
17	15/07/26	CR 46 x CL 48	1	Un	10	Barrio Colón	COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN

FUENTE: Datos extraídos de memorias y acta N.12

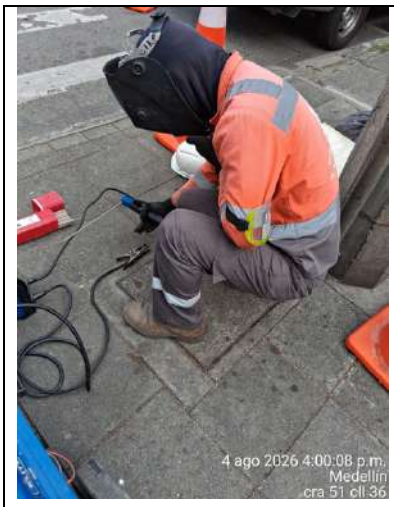

Fotografía 17: Soldada de cajas de inspección



Fotografía 18: Soldada de cajas de inspección

7.3.1.3 Lavado de semáforos

En cumplimiento del programa de mantenimiento de la red semafórica se ejecutaron actividades de lavado y limpieza de los elementos que conforman las intersecciones semaforizadas, con el propósito de retirar suciedad, polvo, residuos ambientales, material particulado y demás agentes contaminantes que afectan la visibilidad de las señales luminosas y el adecuado estado de conservación de la infraestructura, en la siguiente tabla se consolida las actividades de lavado representativas por ítem, durante el periodo.

Tabla 11: Relación de elementos lavados

FECHA	DIRECCIÓN	COMUNA	BARRIO	POSTE RECTO	SEMÁFORO PEATONAL O CICLISTA	SEMÁFORO VEHICULAR A POSTE
29/07/26	CR 52 x CL 25	15	Santa Fé	8	16	5

FECHA	DIRECCIÓN	COMUNA	BARRIO	POSTE RECTO	SEMÁFORO PEATONAL O CICLISTA	SEMÁFORO VEHICULAR A POSTE
29/07/26	CR 52 x CL 10	15	Campo Amor	2	8	2
29/07/26	CR 52 x CL 5 – Paso Seguro Noel	15	Campo Amor	2	2	2
29/07/26	CR 52 x CL 2 Sur	15	Cristo Rey	12	12	3
30/07/26	CR 50 x CL 37	10	Perpetuo Socorro	4	8	3
30/07/26	CR 48 x CL 37	10	Perpetuo Socorro	5	8	3
30/07/26	CR 43 A x CL 36/37 – Glorieta de San Diego, costado oriental	10	San Diego	5	4	5
30/07/26	CR 44 x CL 80	3	Campo Valdés N.º 2		1	2
30/07/26	CR 48 x CL 31 – Tierragro	10	Perpetuo Socorro	3	2	3
30/07/26	CR 48 x CL 30	10	Perpetuo Socorro	2	4	1
30/07/26	CR 48 x CL 27 – Peatonal Bancolombia	14	Barrio Colombia	2		2
30/07/26	CR 48 x CL 24	14	Villa Carlota	5	5	2
30/07/26	CR 48 x CL 19 A – CLOFAN	14	Villa Carlota	5	5	5
30/07/26	CR 48 x CL 18 A – Peatonal Ciudad del Río	14	Villa Carlota	6	9	3
31/07/26	CR 43 A x CL 36/37 – Glorieta de San Diego, costado oriental	10	San Diego	8	6	6
31/07/26	CR 48 x CL 17	10	La Alpujarra	4	8	4
31/07/26	CR 48 x CL 16 A	10	La Alpujarra	3	3	3
31/07/26	CR 48 x CL 14	14	Villa Carlota	4	9	3
31/07/26	CR 48 x CL 10 – Costado norte	14	Manila	12	11	12
2/08/26	CR 73 x CL 50	11	U. D. Atanasio Girardot	2	2	2
2/08/26	CR 81 A x CL 50	12	Calasanz	8	9	7
2/08/26	CR 77 B x CL 50	11	Los Colores	2	2	2
2/08/26	CR 74 x CL 50	11	U. D. Atanasio Girardot	1	2	1
2/08/26	CR 70 x CL 50	11	U. D. Atanasio Girardot	1	1	1
2/08/26	CR 67 x CL 50	11	Carlos E. Restrepo	1	1	1
3/08/26	CR 52 x CL 2 Sur	15	Cristo Rey	10	19	3
3/08/26	CR 50 E x CL 2 Sur	15	Cristo Rey	5	8	2
3/08/26	CR 50 x CL 4 Sur – Apolo	15	Cristo Rey	3	1	2

FECHA	DIRECCIÓN	COMUNA	BARRIO	POSTE RECTO	SEMÁFORO PEATONAL O CICLISTA	SEMÁFORO VEHICULAR A POSTE
3/08/26	CR 51 x CL 2 Sur	15	Cristo Rey	2	3	1
3/08/26	CR 44 x CL 78	3	Campo Valdés N.º 2			1
4/08/26	CR 46 x CL 80	4	Campo Valdés N.º 1		1	2
5/08/26	CR 46 x CL 86	4	Las Esmeraldas		1	2
6/08/26	CR 52 x CL 21 A – Paso Seguro Zoológico	15	Santa Fé	7	4	4
6/08/26	CR 52 x CL 10	15	Campo Amor	3	3	3
6/08/26	CR 46 x CL 86	4	Las Esmeraldas		1	2
11/08/26	CR 50 x CL 67	4	San Pedro		1	2
12/08/26	CR 48 x CL 10 – Costado norte	14	Manila	2	1	2
12/08/26	CR 48 x CL 7 D – Paso Seguro Politécnico	14	Patio Bonito	2	4	2
12/08/26	CR 48 B x CL 5 – Paso Seguro INEM	14	Patio Bonito	4	6	2
12/08/26	CR 48 x CL 1 Sur	14	Patio Bonito	6	6	4
12/08/26	CR 46 x CL 78	4	Campo Valdés N.º 1		1	2
14/08/26	CR 48 x CL 4 Sur – Puente, costado norte	14	La Aguacatala	10	13	8
25/08/26	TV 41 x DG 74 A – TV 41 x AV Nutibara	11	Lorena	10	10	2
25/08/26	DG 74 A x TV 40 B – AV Nutibara x TV 40 B	11	Lorena	7	9	3
25/08/26	DG 74 A x TV 40 – AV Nutibara	11	Laureles	6	6	2
26/08/26	DG 74 A x TV 40 – AV Nutibara	11	Laureles	3	3	

FUENTE: Datos extraídos de memorias y acta N.12



Fotografía 19: Lavado de semáforos



Fotografía 20: Lavado de semáforos

7.3.2 Mantenimiento correctivo

El mantenimiento correctivo tuvo como propósito restablecer la operatividad y funcionalidad del sistema semafórico, mediante la atención oportuna de fallas, daños o deterioros detectados en campo y reportados por la Interventoría y la entidad contratante.

Estas actividades se vienen atendiendo de manera inmediata o programada, según la criticidad del evento y la disponibilidad de recursos técnicos y logísticos, en cumplimiento de las premisas establecidas en el anexo técnico del contrato No. 4600105555 de 2025, el cual define los siguientes niveles de prioridad de atención:

Alta: Intersecciones apagadas.
Media-Alta: Intersecciones en intermitencia.
Media: Intersecciones funcionales con algún elemento defectuoso.
Baja: Actividades de mantenimiento preventivo.
No prioritaria: Intervenciones sin afectación funcional, principalmente de carácter estético.

Las intervenciones correctivas comprendieron la reparación, sustitución o ajuste de componentes, garantizando que cada elemento del sistema recuperara sus condiciones normales de funcionamiento conforme a las especificaciones técnica y los requisitos contractuales.

En coherencia con la **ISO 9001:2015**, la gestión del mantenimiento correctivo se desarrolló bajo los siguientes lineamientos:

Tabla 12: Correspondencia del procedimiento de mantenimiento correctivo con los requisitos de la norma ISO9001

Requisito ISO 9001:2015	Aplicación en el proceso de mantenimiento correctivo	Evidencia generada	Responsable
8.1 – Planificación y control operacional	Cada atención fue evaluada, priorizada y registrada en el formato SIT-FO-CA-001 Control de daños y atenciones reportadas, programadas y atendidas, conforme a la criticidad del evento y la disponibilidad de recursos técnicos y logísticos. *(Ver Anexo 4)*	Formato SIT-FO-CA-001, reportes de atención, comunicaciones internas	Ingeniero Residente / Auxiliar de residencia
8.5.1 – Control de producción y prestación del servicio	Las actividades fueron ejecutadas por personal competente, de acuerdo con los procedimientos documentados	Listado de personal autorizado por la Interventoría, registros de capacitación y competencias, Registro de obra diario	Ingeniero Residente / Auxiliar de residencia
8.6 – Liberación de productos y servicios	Ninguna atención fue cerrada hasta completar el proceso de verificación de operatividad y el registro fotográfico respectivo. Esta información se compartió con la Interventoría de forma semanal, junto con las memorias de obra.	Registro fotográfico antes, durante y después de la intervención, memorias de atención, actas de validación técnica y comunicaciones enviadas.	Auxiliar de Residencia
7.5 – Información documentada	Todos los registros de atención fueron consolidados en los formatos de Registro de mantenimiento de obra diario y registro fotográfico. *(Ver Anexo 3)*	Registro de mantenimiento diario, carpetas digitales del plan de calidad, informes de gestión de calidad	Ingeniero Residente / Auxiliar de residencia

Durante el periodo evaluado se ejecutaron actividades de mantenimiento correctivo orientadas a restablecer las condiciones operativas del sistema semafórico mediante la atención de daños, fallas y requerimientos reportados por la Interventoría y la entidad contratante.

Buena parte de estas intervenciones requieren de la ejecución de empalmes eléctricos, para restituir el servicio y las acciones correctivas del respectivo mantenimiento, razón por la que se realiza descripción de las acciones en materia de empalmes realizadas.

7.3.2.1 Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos AWG 4x18, 2x16, 3x18 y 4x12. ITEM 94

ITEM	FECHA	DIRECCIÓN	CANT	UND	COMNA	BARRIO	TIPO DE ACTIVIDAD	CUADRILLA
1	29/07/26	CR 65 x CR 66B - CR 65 x AV BOLIVARIANA	8	Un	11	San Joaquín	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
2	29/07/26	CR 63 C x TV 42 C La Picacha	1	Un	11	Los Conquistadores	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
3	30/07/26	CR 52 x CL 82 Cuatro Bocas	1	Un	4	Bermejal-Los Alamos	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
4	30/07/26	CR 49 x CL 50	1	Un	10	La Candelaria	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
5	30/07/26	CR 55 x CL 67	1	Un	10	El Chagualo	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
6	30/07/26	CR 49 x CL 67	2	Un	4	San Pedro	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
7	30/07/26	CR 44 x CL 78	2	Un	3	Campo Valdes No. 2	REPOSICIÓN MÉNSULAS	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
8	30/07/26	CR 44 x CL 80	3	Un	3	Campo Valdes No. 2	REPOSICIÓN MÉNSULAS	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
9	31/07/26	CR 44 x CL 78	2	Un	3	Campo Valdes No. 2	REPOSICIÓN MÉNSULAS	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
10	2/08/26	CR 59 x CL 44	1	Un	10	Corazón de Jesús	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
11	2/08/26	CR 57 x CL 54	1	Un	10	San Benito	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
12	2/08/26	CR 57 x CL 58/59 Fatelares Norte	1	Un	10	Jesús Nazareno	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
13	2/08/26	CR 30 x CL 47	2	Un	9	Buenos Aires	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
14	2/08/26	CR 32 x CL 45	2	Un	9	Gerona	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
15	2/08/26	CR 30 x CL 45	1	Un	9	La Milagrosa	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
16	2/08/26	CR 36 x CL 47	3	Un	9	Buenos Aires	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
17	2/08/26	CR 36 A x CL 47	1	Un	9	Buenos Aires	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN

ITEM	FECHA	DIRECCIÓN	CANT	UND	COMNA	BARRIO	TIPO DE ACTIVIDAD	CUADRILLA
18	2/08/26	CR 36 A x CL 50	1	Un	10	Boston	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
19	2/08/26	CR 36 x CL 45 (I. E. F. OZANAM)	2	Un	9	Gerona	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
20	2/08/26	CR 54 x CL 46	1	Un	10	Guayaquil	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
21	2/08/26	CR 66 B x CL 30	7	Un	15	Parque Juan Pablo II	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
22	3/08/26	CR 64 B x CL 50 (PASO SEGURO)	3	Un	11	Suramericana	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
23	3/08/26	CR 36 A x CL 54	3	Un	10	Boston	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
24	3/08/26	CR 44 x CL 78	1	Un	3	Campo Valdes No. 2	REPOSICIÓN MÉNSULAS	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
25	3/08/26	CR 46 x CL 49	2	Un	10	Barrio Colón	REPOSICIÓN MÉNSULAS	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
26	3/08/26	CR 46 x CL 54	18	Un	10	La Candelaria	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
27	4/08/26	CR 46 x CL 80	3	Un	4	Campo Valdés No. 1	REPOSICIÓN MÉNSULAS	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
28	5/08/26	CR 48 x CL 10 COST. SUR	1	Un	14	Patio Bonito	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
29	5/08/26	CR 36 A x CL 47	2	Un	9	Buenos Aires	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
30	5/08/26	CR 64 A x CL 33 PASO SEGURO SAMEIN	9	Un	11	Los Conquistadores	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
31	5/08/26	CR 72 A x CL 78 B	2	Un	7	Bosques de San Pablo	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
32	5/08/26	CR 32 x CL 12 A	8	Un	14	Las Lomas No.1	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
33	5/08/26	CR 51 x CL 67 COST. NORTE	2	Un	4	Sevilla	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
34	5/08/26	CR 46 x CL 86	3	Un	4	Las Esmeraldas	REPOSICIÓN MÉNSULAS	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
35	6/08/26	CR 46 x CL 49	2	Un	10	Barrio Colón	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
36	6/08/26	CR 40 x CL 52	2	Un	10	Boston	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN

ITEM	FECHA	DIRECCIÓN	CANT	UND	COMNA	BARRIO	TIPO DE ACTIVIDAD	CUADRILLA
37	6/08/26	CR 46 x CL 86	3	Un	4	Las Esmeraldas	REPOSICIÓN MÉNSULAS	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
38	6/08/26	CR 25 x CL 49 (C.C. la central)	2	Un	9	Diego Echavarría	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
39	7/08/26	CR 52 x CL 14	4	Un	15	Santa Fé	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
40	8/08/26	CR 52 x CL 14	7	Un	15	Santa Fé	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
41	9/08/26	CR 43 C x CL 11	2	Un	14	Manila	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
42	9/08/26	CR 43 F x CL 11	1	Un	14	Manila	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
43	9/08/26	CR 65 x CL 43	1	Un	11	San Joaquín	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
44	9/08/26	CR 65 x CL 47 D	1	Un	11	Naranjal	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
45	9/08/26	CR 65 x CL 50	1	Un	11	Suramericana	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
46	9/08/26	CR 70 x CL 50	1	Un	11	U.D. Atanasio Girardot	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
47	9/08/26	CR 65 x CL 25	2	Un	15	Trinidad	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
48	9/08/26	CR 43 C x CL 10	1	Un	14	Astorga	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
49	9/08/26	CR 41 x CL 10	1	Un	14	El Poblado	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
50	9/08/26	CR 40 x CL 10	1	Un	14	El Poblado	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
51	9/08/26	CR 35 x CL 10 A	1	Un	14	Las Lomas No.1	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
52	9/08/26	CR 35 x CL 10	1	Un	14	El Poblado	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
53	9/08/26	CR 32 x CL 10	1	Un	14	Las Lomas No.1	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
54	9/08/26	CR 25 x CL 12 SUR	1	Un	14	Los Balsos No.1	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
55	9/08/26	CR 25 x CL 5 SUR	1	Un	14	Los Naranjos	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN

ITEM	FECHA	DIRECCIÓN	CANT	UND	COMNA	BARRIO	TIPO DE ACTIVIDAD	CUADRILLA
56	9/08/26	CR 25 x CL 2 SUR (TV SUP x CL 2 SUR)	2	Un	14	Los Naranjos	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
57	9/08/26	CR 34 x CL 10	3	Un	14	El Poblado	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
58	9/08/26	CR 35 x CL 10	1	Un	14	El Poblado	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
59	9/08/26	CR 36 x CL 10	1	Un	14	El Poblado	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
60	10/08/26	CR 72 A x CL 78 B	4	Un	7	Bosques de San Pablo	ACTOS DE VANDALISMO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
61	10/08/26	CR 46 x CL 52	1	Un	10	La Candelaria	INCIDENTES DE TRANSITO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
62	10/08/26	CR 65 x CL 43	1	Un	11	San Joaquín	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
63	10/08/26	CR 50 x CL 35	2	Un	10	Perpetuo Socorro	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
64	10/08/26	CR 36 x CL 45 (I. E. F. OZANAM)	1	Un	9	Gerona	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
65	11/08/26	CR 51 x CL 49	1	Un	10	La Candelaria	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
66	11/08/26	CR 36 x CL 36	1	Un	9	El Salvador	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
67		CR 65 x CL 5	2	Un	15	Campo Amor	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
68	11/08/26	CR 46 x CL 49	12	Un	10	Barrio Colón	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
69	11/08/26	CR 43 C x CL 10	1	Un	14	Astorga	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
70	11/08/26	CR 41 x CL 10	1	Un	14	El Poblado	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
71	11/08/26	CR 32 x CL 9 SUR	1	Un	14	El Castillo	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
72	11/08/26	CR 50 x CL 67	3	Un	4	San Pedro	REPOSICIÓN MÉNSULAS	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
73	12/08/26	CR 43 A x CL 9 SUR	1	Un	14	La Aguacatala	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
74	12/08/26	CR 36 x CL 10 A	1	Un	14	El Poblado	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN

ITEM	FECHA	DIRECCIÓN	CANT	UND	COMNA	BARRIO	TIPO DE ACTIVIDAD	CUADRILLA
75	12/08/26	CR 46 x CL 78	3	Un	4	Campo Valdés No. 1	REPOSICIÓN MÉNSULAS	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
76	13/08/26	CR 50 x CL 53	2	Un	10	La Candelaria	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
77	13/08/26	CR 70 x CL 51	1	Un	11	Cuarta Brigada	ACTOS DE VANDALISMO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
78	13/08/26	CR 36 A x CL 45	1	Un	9	Buenos Aires	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
79	14/08/26	CR 36 A x CL 45	2	Un	9	Buenos Aires	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
80	14/08/26	CR 48 x CL 10 COST. NORTE	1	Un	14	Manila	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
81	16/08/26	CR 78 x CL 65 Col. Mayor	2	Un	7	Facultad de Minas U. Nacional	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
82	16/08/26	CR 84 x CL 44	2	Un	12	La América	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
83	16/08/26	AV 80 x CL 33 NOR-ORIE	1	Un	11	Las Acacias	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
84	16/08/26	AV 80 x CL 19 Col. Sn. CARLOS	1	Un	16	La Gloria	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
85	16/08/26	AV 80 x CR 70 NORTE iss	2	Un	15	El Rodeo	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
86	17/08/26	CR 43 A X CL 18 SUR	1	Un	14	Santa María de Los Ángeles	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
87	17/08/26	CR 43 A x CL 16 A SUR	1	Un	14	Santa María de Los Ángeles	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
88	17/08/26	CR 43 A x CL 1 SUR	1	Un	14	Patio Bonito	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
89	17/08/26	CR 43 A x CL 9	1	Un	14	Astorga	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
90	17/08/26	CR 43 A X CL 18 SUR	1	Un	14	Santa María de Los Ángeles	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
91	17/08/26	CR 49 x CL 73	4	Un	4	San Pedro	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
92	17/08/26	AV 80 x CL 33 NOR-OCCI STA. GEMA	3	Un	11	La Castellana	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
93	17/08/26	AV 80 x CL 33 SUR-ORIE	1	Un	11	Las Acacias	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN

ITEM	FECHA	DIRECCIÓN	CANT	UND	COMNA	BARRIO	TIPO DE ACTIVIDAD	CUADRILLA
94	17/08/26	AV 80 x CL 9 Cost. SUR	2	Un	7	Robledo	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
95	17/08/26	CR 43 A x CL 10	1	Un	14	El Poblado	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
96	18/08/26	CR 64 A x CL 33 PASO SEGURO SAMEIN	5	Un	11	Los Conquistadores	INCIDENTES DE TRANSITO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
97	18/08/26	CR 52 x CL 54	3	Un	10	La Candelaria	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
98	18/08/26	CR 65 x CL 80	1	Un	5	Cementerio Universal	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
99	18/08/26	CR 51 x CL 49	2	Un	10	La Candelaria	INCIDENTES DE TRANSITO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
100	19/08/26	CR 49 x CL 73	1	Un	4	San Pedro	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
101	19/08/26	CR 76 x CL 30	1	Un	16	Granada	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
102	20/08/26	CR 77 x CL 30	2	Un	16	Belén	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
103	20/08/26	CR 47 x CL 52	2	Un	10	La Candelaria	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
104	20/08/26	CR 64 C x CL 67 CARABINEROS GLORIETA Ext NOROCCIDENTAL	1	Un	5	Caribe	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
105	23/08/26	CR 50 x CL 4 SUR (Apolo)	1	Un	15	Cristo Rey	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
106	23/08/26	CR 43 A x CL 11 B	1	Un	14	Manila	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
107	23/08/26	CR 43 A x CL 14	1	Un	14	Manila	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
108	23/08/26	CR 50 FF x CL 8 SUR	1	Un	15	Guayabal	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
109	23/08/26	CR 70 x CL 19	1	Un	16	Las Playas	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
110	23/08/26	AV 80 x CL 45 G	1	Un	12	La América	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
111	23/08/26	AV 80 x CL 55	1	Un	11	Los Colores	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN

ITEM	FECHA	DIRECCIÓN	CANT	UND	COMNA	BARRIO	TIPO DE ACTIVIDAD	CUADRILLA
112	23/08/26	CR 84 x CL 34 (Corazonista)	1	Un	11	La Castellana	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
113	23/08/26	AV 80 x CL 35 ORIENTAL	1	Un	11	Los Colores	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
114	23/08/26	CR 82 A x CL 30 A (los molinos)	2	Un	11	Los Colores	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
115	23/08/26	AV 80 x CL 32 SUR MIMOS	1	Un	11	Los Colores	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
116	24/08/26	CR 55 x CL 50	2	Un	10	San Benito	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
117	25/08/26	CR 66 B x CQ 1 - AV BOLIVARIANA x CQ 1	4	Un	11	U.P.B.	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
118	26/08/26	CR 43 A x CL 10	1	Un	14	El Poblado	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
119	26/08/26	CR 65 x CL 80	2	Un	5	Cementerio Universal	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
120	26/08/26	CR 46 x CL 49	1	Un	10	Barrio Colón	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
121	27/08/26	CR 64 C x CL 67 CARABINEROS GLORIETA Ext SUROCCIDENTAL	1	Un	7	Universidad Nacional	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
122	27/08/26	CR 76 x CL 25	1	Un	16	San Bernardo	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
123	27/08/26	CR 76 x CL 30	1	Un	16	Granada	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
124	27/08/26	AV 80 x CL 65 Colpisos	1	Un	7	San Germán	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
125	27/08/26	CR 51 x CL 61	1	Un	10	Prado	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
126	27/08/26	CR 39 x CL 55	1	Un	10	Boston	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
127	27/08/26	CR 45 x CL 67 (Cost Sur)	1	Un	3	Manrique central No. 2	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
128	28/08/26	AV 80 x CL 25	2	Un	16	La Palma	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
129	28/08/26	CR 45 x CL 67 (Cost Sur)	2	Un	3	Manrique central No. 2	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN

ITEM	FECHA	DIRECCIÓN	CANT	UND	COMNA	BARRIO	TIPO DE ACTIVIDAD	CUADRILLA
130	28/08/26	CR 66 B x CL 34 A UNICENTRO 2 (Cost. NORTE)	2	Un	11	U.P.B.	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN

FUENTE: Datos extraídos de memorias y acta N.12



Fotografía 21:Instalación empalmes eléctricos

7.3.3 Comportamiento de la atención de daños y solicitudes de mantenimiento

En el consolidado histórico de las atenciones clasificadas como Prioridad Alta se registraron 350 solicitudes, de las cuales 339 fueron atendidas, equivalente a un cumplimiento acumulado del 97 %. Al cierre del periodo permanecían 11 actividades pendientes, razón por la cual no se alcanzó la meta del 100 %.

La diferencia frente a la meta no obedece a una causa única, sino a condiciones técnicas y administrativas particulares. Algunas fallas de comunicación requieren intervenir cableado de la red semafórica alojado en cámaras pertenecientes a EPM, cuyo acceso está condicionado a la formalización del cobro y a la coordinación previa de su apertura. El Contratista continúa adelantando las gestiones necesarias ante dicha entidad para programar el ingreso y ejecutar las intervenciones.

Otros casos corresponden a canalizaciones en pavimento, zonas duras y zonas verdes. Estas actividades se programan conforme a la directriz de priorización impartida por la Entidad contratante, según la cual deben atenderse inicialmente los cruces nuevos, posteriormente los complementos peatonales y, finalmente, las canalizaciones requeridas en cruces existentes. En consecuencia, dichas solicitudes permanecen pendientes dentro de la programación, sin que ello implique falta de seguimiento.

Para las actividades clasificadas como Prioridad Media-Alta, asociadas principalmente con intersecciones en estado de intermitencia y otros eventos que requieren atención prioritaria para restablecer las condiciones normales de operación, se registraron 135 solicitudes, de las cuales 134 fueron atendidas, alcanzando un cumplimiento acumulado del 99 %.
Al cierre del periodo permanecían dos actividades pendientes. Una de ellas quedó programada para ejecución durante septiembre; la otra corresponde a la puesta en funcionamiento de semáforos peatonales y requiere intervenir cableado alojado en cámaras pertenecientes a EPM. Como se indicó anteriormente, el acceso a esta infraestructura depende de la formalización del cobro y de la coordinación de su apertura con dicha entidad, gestiones que actualmente adelanta el Contratista.

En las actividades clasificadas como Prioridad Media, correspondientes a intersecciones operativas que presentan elementos defectuosos o requerimientos parciales de mantenimiento, se registraron 139 solicitudes, de las cuales 137 fueron atendidas, alcanzando un cumplimiento acumulado del 99 %.

Al cierre del periodo permanecían pendientes dos solicitudes, relacionadas con el ajuste y enderezamiento de semáforos vehiculares instalados en ménsulas. Su ejecución requiere la disponibilidad de equipo autorizado para trabajo en alturas, por lo cual fueron incluidas en la programación operativa para los primeros días de septiembre.

En términos generales, durante el periodo histórico se registraron 762 solicitudes de atención de daños y mantenimiento, de las cuales 747 fueron atendidas, alcanzando un cumplimiento global aproximado del 98 %. Permanecen 15 actividades pendientes: 11 de Prioridad Alta, dos de Prioridad Media-Alta y dos de Prioridad Media.

Respecto a agosto de 2026, se registraron 40 solicitudes de Prioridad Alta, de las cuales 36 fueron atendidas, alcanzando un cumplimiento del 90 %. Al cierre del periodo quedaron cuatro actividades pendientes, las cuales continúan bajo seguimiento operativo. En la intersección de la carrera 57 con calle 57, la atención de la falla de comunicación depende de la programación realizada directamente desde la sede de semáforos de la Secretaría de Movilidad. La falla de comunicación reportada en la carrera 32 con calle 16A Sur permanece pendiente de atención y seguimiento con la entidad. Por su parte, la impermeabilización de los gabinetes nuevos instalados se encuentra en gestión y se prevé iniciar durante septiembre. Finalmente, la instalación del pulsador en la carrera 74B con calle 65 fue programada para los primeros días de septiembre de 2026.

Para la Prioridad Media-Alta, durante agosto de 2026 se registraron tres solicitudes, de las cuales dos fueron atendidas, alcanzando un cumplimiento del 67 %. Al cierre del periodo permaneció una actividad pendiente, cuya atención fue programada para septiembre de 2026.

En cuanto a la Prioridad Media, se registraron cinco solicitudes, de las cuales tres fueron atendidas, obteniendo un cumplimiento del 60 %. Las dos atenciones pendientes se programan para inicios del mes de septiembre.

Para la Prioridad Baja, se solicitaron y atendieron dos actividades, alcanzando un cumplimiento del 100 %. Durante agosto no se registraron solicitudes clasificadas como No Prioritarias.

En términos generales, durante agosto se registraron 51 solicitudes, de las cuales 41 fueron atendidas, alcanzando un cumplimiento global del 80 %. Las siete actividades pendientes corresponden a cuatro solicitudes de Prioridad Alta, una de Prioridad Media-Alta y dos de Prioridad Media.

Desde la perspectiva del control de calidad, se verificó que las intervenciones ejecutadas contaran con la correspondiente trazabilidad documental, incluyendo el diligenciamiento de los formatos establecidos, los registros fotográficos del estado inicial, durante la ejecución y al finalizar cada intervención.

Para garantizar el control de la información documentada y la trazabilidad de las actividades ejecutadas, las solicitudes acumuladas y las correspondientes a agosto fueron registradas en el formato “Control de Reporte y Atención de Daños”. Este instrumento permite consolidar cada evento reportado, facilitar su programación, verificar su estado de atención y efectuar seguimiento a los tiempos de respuesta y al cierre de los requerimientos operativos.

Anexo 6: Control de atención de daños acumulado

Anexo 7: Control de atención de daños del mes de Agosto

7.4 CUMPLIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS, OBRAS CIVILES ASOCIADAS Y/O OBRAS MENORES

Con el propósito de garantizar la conformidad técnica, la trazabilidad de los procesos constructivos y la mejora continua del Plan de calidad, la Unión Temporal SIT Medellín implementa el Procedimiento para el Control de Calidad en Obras Civiles Menores, aplicable a actividades tales como el cambio de herrajes, sustitución o instalación de postes y la construcción de bases de controladores.

Este procedimiento tiene como finalidad asegurar que las intervenciones ejecutadas cumplan con los requisitos técnicos y normativos establecidos en el anexo técnico del contrato, así como con las especificaciones de materiales, mezclas y procesos constructivos aprobados.

En concordancia con los requisitos de la ISO 9001:2015, se realiza seguimiento al cumplimiento del procedimiento mediante la aplicación de controles documentados, inspecciones en campo y validación por parte de la Interventoría, garantizando:

Tabla 13: Correspondencia del procedimiento para el control de la calidad en la construcción de obras menores con los requisitos de la norma ISO9001

Requisito ISO 9001:2015	Aplicación en el Procedimiento	Responsable	Periodo de Verificación	Evidencia Generada
8.1 – Planificación y control operacional	Se programan las actividades de cambio de herrajes, construcción de bases de controladores, canalizaciones conforme a los reportes de mantenimiento y al plan de trabajo	Ingeniero Residente de obra	Según programación semanal de mantenimiento	Cronograma de actividades, registros fotográficos previos
8.5.1 – Control de producción y prestación del servicio	Se ejecutan las actividades conforme al diseño aprobado, utilizando mezcla según diseño de mezcla autorizado	Cuadrillas de trabajo	Durante la ejecución de la actividad	Diseño de mezcla aprobado, registros fotográficos de ejecución, formatos de control de obra
7.5 – Información documentada	Todos los registros de ejecución son archivados en el sistema documental del proyecto, garantizando trazabilidad y control. Informes de gestión de calidad	Responsable de calidad	Semanal	Formatos de registro de mantenimiento, actas de cierre, carpeta digital de seguimiento. Informe de calidad

FUENTE: Elaboración propia

El Plan de Calidad establece de manera específica el alcance de los controles de calidad aplicables a los equipos y procesos del proyecto, fundamentándose en la verificación y seguimiento de los suministros y de los procesos considerados críticos.

A continuación se listan las actividades de obra civil que por su costo en ejecución requieren de su desarrollo y soporte con registro fotográfico

7.4.1 Instalación de marco y tapa metálicos para cajas de hasta 60x60 cm interna. Ítem 13

Durante el periodo se realizó la instalación de 32 herrajes metálicos, las fechas direcciones y lugares de instalación se describen en la siguiente tabla.

Tabla 14: Relación de elementos instalados

ITEM	FECHA	DIRECCIÓN	CANT	UND	COMNA	BARRIO	TIPO DE ACTIVIDAD	CUADRILLA
1	31/07/26	CR 79 x CL 50 NOR	3	Un	11	Los Colores	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN

ITEM	FECHA	DIRECCIÓN	CANT	UND	COMNA	BARRIO	TIPO DE ACTIVIDAD	CUADRILLA
2	3/08/26	CR 36 A x CL 54	2	Un	10	Boston	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
3	5/08/26	CR 32 x CL 12 A	1	Un	14	Las Lomas No.1	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
4	8/08/26	CR 52 x CL 82 Cuatro Bocas	2	Un	4	Bermejal-Los Alamos	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
5	10/08/26	CR 72 A x CL 78 B	1	Un	7	Bosques de San Pablo	ACTOS DE VANDALISMO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
6	10/08/26	CR 65 x CL 43	2	Un	11	San Joaquín	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
7	14/08/26	CR 25 x CL 2 SUR (TV SUP x CL 2 SUR)	2	Un	14	Los Naranjos	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
8	18/08/26	CR 64 A x CL 33 PASO SEGURO SAMEIN	1	Un	11	Los Conquistadores	INCIDENTES DE TRANSITO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
9	19/08/26	CR 53 x CL 6 SUR CC EL RODEO	2	Un	15	Cristo Rey	ACTOS DE VANDALISMO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
10	20/08/26	AV 80 x CL 79	3	Un	7	El Diamante	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
11	24/08/26	CR 55 x CL 50	1	Un	10	San Benito	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
12	24/08/26	CR 66 B x CL 30	1	Un	15	Parque Juan Pablo II	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
13	26/08/26	CR 32 x CL 51	1	Un	9	Barrio Caicedo	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
14	27/08/26	CR 64 C x CL 67 CARABINEROS GLORIETA Ext SUROCCIDENTAL	1	Un	7	Universidad Nacional	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
15	28/08/26	CR 48 x CL 18 A (Peat. Ciudad del Rio)	4	Un	14	Villa Carlota	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
16	28/08/26	CR 65 x CL 50	2	Un	11	Suramericana	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
17	31/08/26	CR 46 x CL 49	3	Un	10	Barrio Colón	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN

FUENTE: Datos extraídos de las memorias y acta N.12



Fotografía 22: Instalación de marco



Fotografía 23: Instalación tapa

7.4.2 Construcción Canalización en Zona verde. ITEM 25

Durante el mes de Agosto de 2026 se ejecutó la actividad correspondiente a la construcción de canalización en zona verde, descrita en la siguiente tabla.

Tabla 15: Relación de canalización ejecutada

ITEM	FECHA	DIRECCIÓN	CANT	UND	COMNA	BARRIO	TIPO DE ACTIVIDAD	CUADRILLA
1	19/08/26	CR 53 x CL 6 SUR CC EL RODEO	24	m	15	Cristo Rey	ACTOS DE VANDALISMO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
2	28/08/26	CR 48 x CL 18 A (Peat. Ciudad del Rio)	7,4	m	14	Villa Carlota	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
3	28/08/26	CR 65 x CL 50	5,3	m	11	Suramericana	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN

FUENTE: Datos extraídos de memorias y acta N.12



Fotografía 24: Construcción de canalización en zona verde

8 COMUNICACIONES

En cumplimiento de lo establecido en el Plan de Calidad del Proyecto y conforme a los lineamientos de la norma ISO 9001:2015, cláusula 7.4 Comunicación, durante el mes de Agosto se realizó el seguimiento a las actividades de comunicación interna y externa, garantizando que la información pertinente al control de calidad sea transmitida de manera oportuna y documentada a las partes interesadas correspondientes.

El proceso de comunicación continúa siendo un pilar fundamental para asegurar la trazabilidad de la información y el cumplimiento de los compromisos contractuales establecidos entre la Unión Temporal SIT Medellín, la interventoría y el cliente.

8.1.1 Desarrollo y seguimiento

Durante el periodo evaluado se realizaron las siguientes acciones de comunicación, de acuerdo con la programación establecida en el plan:

- **Remisión del presente informe de gestión de calidad mensual** con evidencias de control y cumplimiento de los procedimientos técnicos.
- **Entrega y comunicación de informes mensuales de gestión SST y ambiental**, según los requerimientos de interventoría.
- **Comunicación de avances de obra** mediante la participación en el comité quincenal, con registro en las respectivas actas.

- **Reportes de mantenimiento preventivo y correctivo de semáforos** comunicados por los canales establecidos (grupo de WhatsApp del contrato y correo electrónico).

Todas las comunicaciones fueron registradas en el control de correspondencia del proyecto, garantizando su trazabilidad documental y respaldo conforme al procedimiento interno de gestión de la información y se relacionan en las siguientes tablas:

Tabla 16: Correspondencia enviada

No.	Fecha de envío	N. consecutivo	Destinatario	Asunto / Descripción breve	Medio de envío	Responsable del envío	Área
159	5/08/26	N/A	MARTA LUCÍA SUÁREZ GÓMEZ Directora de Interventoría Consorcio int Farol Med 2025	ENTREGA APUS OBRAS EXTRAS	Correo electrónico	MIGUEL ANGEL OSORIO Director Unión Temporal Sit Medellín	Técnico-Administrativo
163	14/08/26	152-2026	MARTA LUCÍA SUÁREZ GÓMEZ Directora de Interventoría Consorcio int Farol Med 2025	Remisión del Programa de Trabajo para la vigencia 2026 – Contrato de Obra N.° 4600105555 de 2025.	Carta digital	JORGE TRUJILLO NIÑO C.C 13.893.413 de Barrancabermeja R/L. UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	Técnico
164	18/08/26		MARTA LUCÍA SUÁREZ GÓMEZ Directora de Interventoría Consorcio int Farol Med 2025	Remisión del Informe N° 11 de gestión técnica financiera y de ejecución del periodo comprendido entre el 01 de Julio de 2026 al 31 de Julio de 2026 para la ejecución del Contrato de Obra N° 4600105555, cuyo objeto es la ejecución de la obra mantenimiento	Correo electrónico	JORGE TRUJILLO NIÑO C.C 13.893.413 de Barrancabermeja R/L. UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	Técnico

FUENTE. Elaboración propia

Tabla 17: Correspondencia recibida

N.	Fecha de recepción	Consc	Remitente	Asunto / Descripción breve	Area	Medio de recepción	Responsable de recepción
87	4/08/26	N/A	José David Cortes Álvarez Tecnólogo Socio ambiental Consorcio Farolmed.	Observaciones informe socioambiental	Ambiental	Correo electrónico	Tatiana Moriano Tecnologa socio-ambiental
88	12/08/26	N/A	José David Cortes Alvarez Tecnólogo Socioambiental Consorcio Farolmed.	Aprobación informe socio-ambiental	Correo electrónico	TATIANA MORIANO ASISTENTE ADM UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN Cel. 320 553 7525.	Ambiental
89	23/08/26	N/A	Cindy Johana Morales Monsalve Interventoría SST Consorcio Farolmed Marta Lucía Suárez Directora Interventoría Interventoría Consorcio Farolmed	aprobación para ingreso a obra del señor HAYDEN EDUARDO	SST	Correo electrónico	Lina Maria Giraldo Botero Profesional SST Unión Temporal Sit Medellín Miguel Angel Osorio Director de obra Unión Temporal Sit Medellín

FUENTE. Elaboración propia

9 GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y ASEGURAMIENTO METROLÓGICO DE EQUIPOS

Durante el periodo se continuó con la implementación y seguimiento del Programa para la Gestión del Mantenimiento y Control Metrológico de Equipos, mediante el cual se establecen los controles necesarios para garantizar la disponibilidad, confiabilidad, seguridad y adecuado funcionamiento de los equipos, herramientas y vehículos utilizados durante la ejecución del contrato.

Se actualizó el Cronograma Operativo para el Control de Mantenimiento, Inspecciones y Gestión Metrológica de Equipos, herramienta mediante la cual se realiza el seguimiento mensual de las actividades programadas y ejecutadas para equipos de medición, equipos eléctricos, herramientas eléctricas y vehículos. El cronograma permite diferenciar las actividades correspondientes a inspección, mantenimiento y gestión metrológica, así como identificar su frecuencia, responsable y evidencia documental asociada.

Durante el mes de Agosto se dio continuidad a las inspecciones preoperacionales y periódicas de los equipos, verificando sus condiciones físicas, funcionales y de seguridad.

En materia de aseguramiento metrológico, se mantiene el control sobre los equipos de medición que requieren calibración o verificación funcional, entre ellos los analizadores de gases, multímetros digitales y equipo OTDR. Para cada uno se encuentran definidas las frecuencias de control y los correspondientes registros de soporte, tales como certificados de calibración, hojas de vida y registros de verificación funcional.

Para los equipos y herramientas cuyo mantenimiento se determina por horas de operación, recomendaciones del fabricante o condición del equipo, se mantiene el seguimiento mediante inspecciones y verificaciones periódicas. En el caso de las plantas eléctricas, el control contempla la revisión por horas de uso y la programación del mantenimiento de acuerdo con las horas de operación y las recomendaciones del fabricante; para herramientas como pulidoras, taladros y martillos demoledores, las necesidades de mantenimiento correctivo se determinan a partir de los resultados de las inspecciones y del estado funcional observado.

La matriz maestra de equipos, cronogramas operativos y las hojas de vida de maquinaria, equipos y vehículos, junto con los registros de los mantenimientos preventivos y correctivos efectuados y demás soportes asociados a su control operacional, se presentan como parte del Informe de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, en el cual se consolida la evidencia correspondiente al seguimiento realizado durante el periodo.

De esta manera, la gestión desarrollada permite mantener la trazabilidad entre el inventario de equipos, las inspecciones realizadas, las actividades de mantenimiento y los controles metrológicos aplicables, contribuyendo a que los equipos empleados en la ejecución del contrato se encuentren bajo condiciones controladas de operación y con los soportes documentales requeridos para demostrar su seguimiento.

10 GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES

Se considera como producto no conforme todo aquel que no cumple con los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas, las necesidades operativas del proyecto o las obligaciones definidas en los documentos contractuales y la normatividad aplicable. Cualquier desviación frente a estos requisitos constituye una no conformidad y debe ser gestionada de acuerdo con el procedimiento de Control del Producto No Conforme del Sistema de Gestión de la Calidad.

Durante el mes de Agosto se continuó con la implementación y seguimiento de las acciones pendientes y se genera una nueva conformidad a la cual se le realiza el respectivo análisis de ocurrencia, plan de acción y seguimiento

Anexo 8: No conformidad

Anexo 9: Registro, seguimiento mejora continua

11 INDICADORES

Proceso	Objetivo	Indicador de cumplimiento	Meta	Ecuación	Resultado	Frecuencia de medición
Mantenimiento operativo de los equipos relacionados con semáforos	Garantizar la continuidad operativa de la red de semáforos mediante mantenimiento preventivo y correctivo.	Atención y puesta en funcionamiento de intersecciones apagadas o en intermitencia reportadas por el cliente, para efectos de seguimiento calificadas como de prioridad Alta y Media Alta	100%	$\frac{37}{43}x100$	86%	Mensual
Mantenimiento operativo de los equipos relacionados con semáforos	Garantizar la continuidad operativa de la red de semáforos mediante mantenimiento preventivo y correctivo.	Atención y puesta en funcionamiento de intersecciones apagadas o en intermitencia reportadas por el cliente, para efectos de seguimiento calificadas como de prioridad Alta y Media Alta	100%	$\frac{486}{473}x100$	97%	Acumulado mensual

Proceso	Objetivo	Indicador de cumplimiento	Meta	Ecuación	Resultado	Frecuencia de medición
Mantenimiento operativo de los equipos relacionados con semáforos	Garantizar la continuidad operativa de la red de semáforos mediante mantenimiento preventivo y correctivo.	Atención y puesta en funcionamiento de intersecciones funcionales, pero con algún elemento defectuoso/con requerimiento de mantenimiento preventivo para efectos de seguimiento calificadas como de prioridad media y baja	80%	$\frac{5}{7}x100$	71%	Mensual
Mantenimiento operativo de los equipos relacionados con semáforos	Garantizar la continuidad operativa de la red de semáforos mediante mantenimiento preventivo y correctivo.	Atención y puesta en funcionamiento de intersecciones funcionales, pero con algún elemento defectuoso/con requerimiento de mantenimiento preventivo para efectos de seguimiento calificadas como de prioridad media y baja	80%	$\frac{204}{206}x100$	99%	Acumulado Mensual
Aseguramiento de la calidad	Asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en el suministro e instalación de equipos.	Equipos suministrados/Equipos que cuentan con las especificaciones verificados en fichas técnicas	100%	$\frac{34}{34}x100$	100%	Mensual
Económico y financiero	Asegurar el cumplimiento de la inversión proyectada en el contrato, de conformidad con la programación financiera presentada y aprobada por el cliente, garantizando la correcta ejecución y control de los recursos asignados	Inversión ejecutada /Inversión proyectada	> 80%	$\frac{634.385.961}{521.643.444}x100$	122%	Mensual

Proceso	Objetivo	Indicador de cumplimiento	Meta	Ecuación	Resultado	Frecuencia de medición
Identificación y tratamiento de no conformidades	Ejecutar la identificación, registro, control y tratamiento de los productos no conformes, con el fin de asegurar la implementación de acciones correctivas y evitar recurrencias de no conformidades	N° de productos no conformes atendidos No de productos No conformes presentados	> 80%	$\frac{9}{11}\ x100$	82%	Mensual
Comunicaciones	Garantizar una comunicación clara, oportuna y efectiva con el cliente y las partes interesadas.	N. de comunicaciones atendidas/N. de comunicaciones generadas por el cliente	90%	$\frac{3}{3}\ x100$	100%	Mensual

FUENTE: Elaboración propia

11.1 ANÁLISIS INDICADORES

11.1.1 Atención de intersecciones apagadas o en intermitencia (Prioridad Alta y Media Alta) – Mensual

Durante el mes evaluado se registraron 43 solicitudes clasificadas como Prioridad Alta y Media-Alta, de las cuales 38 fueron atendidas, alcanzando un cumplimiento del 88 %, frente a la meta establecida del 100 %.

El resultado evidencia que, aunque se atendió la mayoría de los eventos críticos reportados, el indicador se ubicó 12 puntos porcentuales por debajo de la meta.

Los factores que inciden en el incumplimiento se encuentran asociados principalmente con actividades que requieren programaciones complementarias y, en algunos casos, la intervención o gestión de terceros para completar las acciones necesarias para el restablecimiento de las condiciones normales de operación.

11.1.2 Atención de intersecciones apagadas o en intermitencia (Prioridad Alta y Media Alta) – Acumulado

De manera acumulada se registraron 486 solicitudes clasificadas como Prioridad Alta y Media-Alta, de las cuales 473 fueron atendidas, alcanzando un cumplimiento del 97 %, frente a la meta establecida del 100 %.

Aunque el resultado se encuentra tres puntos porcentuales por debajo de la meta, evidencia un nivel favorable de atención de los eventos críticos y la continuidad de la gestión operativa orientada al restablecimiento de las intersecciones afectadas.

Las 13 actividades pendientes continúan bajo seguimiento técnico.

11.1.3 Atención de intersecciones funcionales con elementos defectuosos (Prioridad Media-Baja y Baja) – Mensual

Durante el periodo se registraron siete solicitudes correspondientes a intersecciones funcionales con elementos defectuosos o requerimientos de mantenimiento preventivo, clasificadas como Prioridad Media y Baja. De estas, cinco fueron atendidas, alcanzando un cumplimiento del 71 %, frente a la meta mínima establecida del 80 %.

11.1.4 Atención de intersecciones funcionales con elementos defectuosos (Prioridad Media y Baja) – Acumulado

En el resultado acumulado se registraron 206 solicitudes de Prioridad Media y Baja, de las cuales 204 fueron atendidas, alcanzando un cumplimiento del 99 %, resultado que supera en 19 puntos porcentuales la meta mínima establecida del 80 %.
Las dos actividades pendientes continúan incorporadas en la programación operativa hasta completar su atención y cierre.

11.1.5 Aseguramiento de la calidad

Durante el periodo se verificó que la totalidad de los 34 equipos suministrados e instalados contaran con las especificaciones técnicas requeridas, alcanzando un cumplimiento del 100% frente a la meta establecida.
La verificación se realizó mediante la revisión de fichas técnicas, certificados de conformidad y demás soportes documentales exigidos contractualmente, garantizando que los materiales y equipos utilizados cumplen con las especificaciones técnicas establecidas por el contrato.

11.1.6 Indicador económico y financiero

Durante el periodo, la relación entre la inversión ejecutada y la inversión proyectada alcanzó un resultado del 122 %, superando la meta mínima establecida del 80 %.

El comportamiento del indicador evidencia un nivel de ejecución financiera acorde con la programación prevista para el contrato, con una ejecución superior a la proyectada para el periodo.

El resultado permite evidenciar el adecuado avance en la utilización de los recursos asociados a la ejecución de las actividades contractuales y su correspondencia con las necesidades operativas presentadas durante el periodo.

11.1.7 Identificación y tratamiento de no conformidades

El indicador de identificación y tratamiento de productos o servicios no conformes alcanzó un cumplimiento del 82 %, superando en dos puntos porcentuales la meta mínima establecida del 80 %.

El resultado evidencia una gestión favorable de las no conformidades identificadas; sin embargo, aún permanecen casos pendientes de tratamiento o cierre, principalmente relacionados con acabados de obra civil y observaciones formuladas por la Interventoría.

11.1.8 Comunicaciones

Durante el periodo, el indicador de atención de comunicaciones alcanzó un cumplimiento del 100 %, superando la meta establecida del 90 %.

El resultado evidencia que la totalidad de las comunicaciones y requerimientos generados por el cliente durante el periodo recibió la correspondiente atención, contribuyendo a mantener una comunicación clara, oportuna y efectiva con la Interventoría y las demás partes interesadas.

Para garantizar la trazabilidad se conservaron los registros de recepción, respuesta y seguimiento de las comunicaciones, junto con los soportes de la gestión realizada..

12 CONCLUSIONES

Con la información consignada en el presente Informe de Calidad, se evidencia el cumplimiento de las especificaciones técnicas, La Unión Temporal SIT Medellín garantiza que las actividades desarrolladas se ajustan a los criterios de calidad definidos en el Plan de Calidad, así como a los requisitos contractuales y normativos aplicables.

13 ANEXOS

Anexo 1: Ficha técnica fusible 16
Anexo 2: Matriz de cumplimiento de especificaciones técnicas 17
Anexo 3: Control de calidad recepción equipos de comunicación 18
Anexo 4: Registro de mantenimiento y ejecución de obra diario 18
Anexo 5: Seriales de lámparas 21
Anexo 6: Control de atención de daños acumulado 56
Anexo 7: Control de atención de daños del mes de Agosto 56
Anexo 8: No conformidad 65
Anexo 9: Registro, seguimiento mejora continua 65

Elaborado por:



Lina María Giraldo Botero

Responsable de Calidad

ANEXO 4.

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD LABORAR.

MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	Código: IVC-PD-05-AN-01-F-02 Versión: 4.0 Fecha: Marzo 09 de 2022 Página 1 de 1

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL VALLE DEL CAUCA

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2026717600100005599
FECHA RADICADO:	31-03-2026
NOMBRE - RAZÓN SOCIAL:	SOLUTRAFFIC INGENIERÍA SAS
IDENTIFICACIÓN:	900564496-4

A. NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	10
B. NÚMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)*	01
C. NÚMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: *Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997* *Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)*	01
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.*	10.00


ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato.
Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

OBSERVACIONES: ……..
……

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dada en Santiago de Cali, a los trece (13) días del mes de Abril del Año Dos Mil Veintiséis (2026)





SOLY ACOSTA
Coordinadora del Grupo de Atención al Ciudadano y Trámites

Verificó y Elaboró: GA Colonia T.
Revisó/Aprobó: Soly A.

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-05-05, 02:28:04 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1081789941

Periodo Cotización 202604 **Periodo Servicio** 202605

Cliente: NI900564496 SOLUTRAFFIC INGENIERIA S A S

PAGADA 2026-05-05

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOLUTRAFFIC INGENIERIA S A S				
Documento	NI 900564496	**Dirección**	CR 19A #15 A - 41		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4893017		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	RUIZ QUINTERO JUAN CARLOS	**Identificación**	CC 13890310		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1020837485		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					DUARTE RUIZ MARIA DE LOS ANGELES	11001000 - 11	000000001	BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.927.200	25-14		16 %	$ 1.927.200	$ 308.400	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.927.200	$ 77.100	$ 0	14-11	1	0,522 %	$ 1.927.200	$ 10.100	CCF22	4 %	$ 1.927.200	$ 77.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 308.400	$ 0	$ 0	$ 77.100	$ 10.100	$ 77.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-10, 03:56:43 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1079549685

Periodo Cotización 202601 **Periodo Servicio** 202602

Cliente: NI900564496 SOLUTRAFFIC INGENIERIA S A S

PAGADA 2026-02-10

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOLUTRAFFIC INGENIERIA S A S				
Documento	NI 900564496	**Dirección**	CR 19A #15 A - 41		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4893017		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	RUIZ QUINTERO JUAN CARLOS	**Identificación**	CC 13890310		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1020837485		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					DUARTE RUIZ MARIA DE LOS ANGELES	11001000 - 11	000000001	BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30					F	$ 1.927.200	25-14		16 %	$ 1.927.200	$ 308.400	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.927.200	$ 77.100	$ 0	14-11	1	0,522 %	$ 1.927.200	$ 10.100	CCF22	4 %	$ 1.927.200	$ 77.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 308.400	$ 0	$ 0	$ 77.100	$ 10.100	$ 77.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-03-02, 08:49:07 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1080004421

Periodo Cotización 202602 **Periodo Servicio** 202603

Cliente: NI900564496 SOLUTRAFFIC INGENIERIA S A S

PAGADA 2026-03-02

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOLUTRAFFIC INGENIERIA S A S				
Documento	NI 900564496	**Dirección**	CR 19A #15 A - 41		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4893017		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	RUIZ QUINTERO JUAN CARLOS	**Identificación**	CC 13890310		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1020837485		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					DUARTE RUIZ MARIA DE LOS ANGELES	11001000 - 11	000000001	BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30				25-14		16 %	$ 1.927.200	$ 308.400	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.927.200	$ 77.100	$ 0	14-11	1	0,522 %	$ 1.927.200	$ 10.100	CCF22	4 %	$ 1.927.200	$ 77.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 308.400	$ 0	$ 0	$ 77.100	$ 10.100	$ 77.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-04-01, 02:17:50 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1080884008

Periodo Cotización 202603 **Periodo Servicio** 202604

Cliente: NI900564496 SOLUTRAFFIC INGENIERIA S A S

PAGADA 2026-04-01

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOLUTRAFFIC INGENIERIA S A S				
Documento	NI 900564496	**Dirección**	CR 19A #15 A - 41		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4893017		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	RUIZ QUINTERO JUAN CARLOS	**Identificación**	CC 13890310		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1020837485		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					DUARTE RUIZ MARIA DE LOS ANGELES	11001000 - 11	000000001	BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	10	10	10	10			$ 1.927.200	25-14		16 %	$ 642.400	$ 102.800	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 642.400	$ 25.700	$ 0	14-11	1	0,522 %	$ 642.400	$ 3.400	CCF22	4 %	$ 642.400	$ 25.700	0 %	$ 0	0 %	$ 0
												X			0	20	20	20	20			$ 1.927.200	25-14		16 %	$ 1.284.800	$ 205.600	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.284.800	$ 51.400	$ 0	14-11		0,000 %	$ 1.284.800	$ 0	CCF22	4 %	$ 1.284.800	$ 51.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 308.400	$ 0	$ 0	$ 77.100	$ 3.400	$ 77.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 466.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-01, 04:16:18 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1082430104

Periodo Cotización 202605 **Periodo Servicio** 202606

Cliente: NI900564496 SOLUTRAFFIC INGENIERIA S A S

PAGADA 2026-06-01

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOLUTRAFFIC INGENIERIA S A S				
Documento	NI 900564496	**Dirección**	CR 19A #15 A - 41		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4893017		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	RUIZ QUINTERO JUAN CARLOS	**Identificación**	CC 13890310		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1020837485		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					DUARTE RUIZ MARIA DE LOS ANGELES	11001000 - 11	000000001	BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.927.200	25-14		16 %	$ 1.927.200	$ 308.400	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.927.200	$ 77.100	$ 0	14-11	1	0,522 %	$ 1.927.200	$ 10.100	CCF22	4 %	$ 1.927.200	$ 77.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 308.400	$ 0	$ 0	$ 77.100	$ 10.100	$ 77.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

ANEXO 5.

FICHAS TECNICAS

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagûi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**FERROSVEL S A S**	Fecha Impresión	**25/09/13**	Informe N°:	**120568**
Dirección:	**CL 31 B 89 E 140 MEDELLIN**	No. Remisión:	**187234532**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**3136838991**	Página:	**1 de 2**	Centro:	**Centro Itagui**

DATOS GENERALES | **PROPIEDADES QUIMICAS**

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PROD	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Cr	% Ni	% Cu	% V	% Mo
C8000080	ANGULO 2 1/2"x1/4" 6m A572/G50	A011997814	NTC 4537	Ternium	0.22	0.81	0.16	0.019	0.018	0.132	0.063	0.170	0.019	0.029
C8000075	ANGULO 2 1/2"x3/16" 6m A572/G50	A011892915	NTC 4537	Ternium	0.20	0.70	0.16	0.028	0.010	0.119	0.063	0.148	0.019	0.018
C8000061	ANGULO 2"x1/4" 6m A572/G50	A011976216	NTC 4537	Ternium	0.21	0.72	0.16	0.023	0.022	0.234	0.083	0.162	0.018	0.026
C8000061	ANGULO 2"x1/4" 6m A572/G50	A011976217	NTC 4537	Ternium	0.21	0.72	0.16	0.023	0.022	0.234	0.083	0.162	0.018	0.026

DATOS GENERALES | **PROPIEDADES QUIMICAS**

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PROD	FABRICANTE	% Nb
C8000080	ANGULO 2 1/2"x1/4" 6m A572/G50	A011997814	NTC 4537	Ternium	0.001
C8000075	ANGULO 2 1/2"x3/16" 6m A572/G50	A011892915	NTC 4537	Ternium	0.002
C8000061	ANGULO 2"x1/4" 6m A572/G50	A011976216	NTC 4537	Ternium	0.002
C8000061	ANGULO 2"x1/4" 6m A572/G50	A011976217	NTC 4537	Ternium	0.002

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagûi**
Página Web: **www.ternium.com.co**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**FERROSVEL S A S**	Fecha Impresión	**25/09/13**	Informe N°:	**120568**
Dirección:	**CL 31 B 89 E 140 MEDELLIN**	No. Remisión:	**187234532**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**3136838991**	Página:	**2 de 2**	Centro:	**Centro Itagui**

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS					
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PROD	FABRICANTE	Resistencia Fluencia MPa	Resistencia Tracción MPa	Alargamiento %	Resiste. Tracción2 MPa	Alargamiento 2 %	Resist. Fluencia2 MPa
C8000080	ANGULO 2 1/2"x1/4" 6m A572/G50	A011997814	NTC 4537	Ternium	409	561	24	556	24	404
C8000075	ANGULO 2 1/2"x3/16" 6m A572/G50	A011892915	NTC 4537	Ternium	393	519	24	523	23	396
C8000061	ANGULO 2"x1/4" 6m A572/G50	A011976216	NTC 4537	Ternium	389	528	20	517	21	375
C8000061	ANGULO 2"x1/4" 6m A572/G50	A011976217	NTC 4537	Ternium	389	528	20	517	21	375

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

ACEROS AREQUIPA

CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A.
AV. ANTONIO MIRO QUESADA 425
PISO 17, MAGDALENA DEL MAR
LIMA 17, PERÚ.

CERTIFICADO DE CALIDAD

N° E-5103624405-5172373125-90005-1_1

PRODUCTO :ANGULO
PROCEDENCIA :AA Cali Yumbo
CLIENTE :DOBLAMOS SAS

NORMAS TÉCNICAS :ASTM A36/A36M - A572/A572M G50
NORMA DE ENSAYO :ASTM A370/E8/E415
FACTURA N° :5103624405

DIMENSIÓN NOMINAL	N° DE COLADA	COMPOSICIÓN QUÍMICA (*)																LÍMITE DE FLUENCIA MPa	RESIST TRACCIÓN MPa	ALARGAM. EN 200 mm %
		C (%)	Mn (%)	Si (%)	P (%)	S (%)	Cr (%)	Ni (%)	Mo (%)	Cu (%)	Sn (%)	Al (%)	V (%)	Ti (%)	Nb (%)	B (ppm)	N (ppm)			
2" X 2" x 1/4" x 6M	B00030444	0.15	0.83	0.22	0.021	0.019	0.16	0.11	0.02	0.28	0.014	0.003	0.003	0.001	0.010	2	97	386.0	518.0	29.7
2" X 2" x 1/8" x 6M	B00030438	0.14	0.79	0.23	0.014	0.021	0.13	0.12	0.03	0.27	0.021	0.002	0.003	0.001	0.011	2	102	423.0	539.0	26.5

(*) Análisis en la Cuchara.

DIMENSIÓN NOMINAL	N° DE COLADA	PESO MÉTRICO	
		kg/m	%
2" X 2" x 1/4" x 6M	B00030444	4.737	
2" X 2" x 1/8" x 6M	B00030438	2.453	

/ GUIA:

DESPACHO N°

YUMBO, 09/10/2025

CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A

Ing. Ricardo Gutiérrez Lara, CIP 57087
SUPERINTENDENTE DE METALURGIA

ACEROS AREQUIPA

CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A.
AV. ANTONIO MIRO QUESADA 425
PISO 17, MAGDALENA DEL MAR
LIMA 17, PERÚ.

CERTIFICADO DE CALIDAD

N° E-5103624405-5172373125-90005-1_1

PRODUCTO :ANGULO
PROCEDENCIA :AA Cali Yumbo
CLIENTE :DOBLAMOS SAS

NORMAS TÉCNICAS :ASTM A36/A36M - A572/A572M G50
NORMA DE ENSAYO :ASTM A370/E8/E415
FACTURA N° :5103624405

DIMENSIÓN NOMINAL	N° DE COLADA	COMPOSICIÓN QUÍMICA (*)																LÍMITE DE FLUENCIA MPa	RESIST TRACCIÓN MPa	ALARGAM. EN 200 mm %
		C (%)	Mn (%)	Si (%)	P (%)	S (%)	Cr (%)	Ni (%)	Mo (%)	Cu (%)	Sn (%)	Al (%)	V (%)	Ti (%)	Nb (%)	B (ppm)	N (ppm)			
2" X 2" x 1/4" x 6M	B00030444	0.15	0.83	0.22	0.021	0.019	0.16	0.11	0.02	0.28	0.014	0.003	0.003	0.001	0.010	2	97	386.0	518.0	29.7
2" X 2" x 1/8" x 6M	B00030438	0.14	0.79	0.23	0.014	0.021	0.13	0.12	0.03	0.27	0.021	0.002	0.003	0.001	0.011	2	102	423.0	539.0	26.5

(*) Análisis en la Cuchara.

DIMENSIÓN NOMINAL	N° DE COLADA	PESO MÉTRICO	
		kg/m	%
2" X 2" x 1/4" x 6M	B00030444	4.737	
2" X 2" x 1/8" x 6M	B00030438	2.453	

/ GUIA:

DESPACHO N°

YUMBO, 09/10/2025

CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A

Ing. Ricardo Gutiérrez Lara, CIP 57087
SUPERINTENDENTE DE METALURGIA

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**DOBLAMOS BODEGA LA 33**	Fecha Impresión	**25/03/18**	Informe N°:	
Dirección:	**CR 52 36 65 CARABOBO CON LA 3 MEDELLIN**	No. Remisión:	**187139382**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**2882044**	Página:	**1 de 4**	Centro:	**Centro Itagui**

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PROD	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu	% V
C8014228	TUBO EST REC 2.5x150x50mm 6m NTC4526/C	PZS078810Z	NTC 4526 GRC	Ternium	0.14	0.88	0.013	0.01	0.011				0.03	
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	A011781614	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.86	0.16	0.015	0.013	0.44	0.185	0.058	0.197	0.004

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PROD	FABRICANTE	% Mo
C8014228	TUBO EST REC 2.5x150x50mm 6m NTC4526/C	PZS078810Z	NTC 4526 GRC	Ternium	
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	A011781614	NTC 2289 GR60	Ternium	0.021

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	DOBLAMOS BODEGA LA 33	Fecha Impresión	25/03/18	Informe N°:	
Dirección:	CR 52 36 65 CARABOBO CON LA 3 MEDELLIN	No. Remisión:	187139382	Informe Ant N°:	
Teléfono:	2882044	Página:	3 de 4	Centro:	Centro Itagui

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PROD	FABRICANTE	Espaciamiento	Peso Metro (Masa)	Altura Resalte	Separación Extremos
					mm	Kg/m	mm	mm
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	A011781614	NTC 2289 GR60	Ternium	10.3	1.511	1.15	3.8

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PROD	FABRICANTE	Angulo Resalte
					°
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	A011781614	NTC 2289 GR60	Ternium	59

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	DOBLAMOS BODEGA LA 33	Fecha Impresión	25/03/18	Informe N°:	
Dirección:	CR 52 36 65 CARABOBO CON LA 3 MEDELLIN	No. Remisión:	187139382	Informe Ant N°:	
Teléfono:	2882044	Página:	4 de 4	Centro:	Centro Itagui

Material	Ensayo	Método	Fecha Ensayo
C8014228	TRACCIÓN	NTC 3353	18.02.2025
C8014228	TRACCIÓN	NTC 3353	18.02.2025
C8014228	TRACCIÓN	NTC 3353	18.02.2025

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	DOBLAMOS BODEGA LA 33	Fecha Impresión	25/03/18	Informe N°:	
Dirección:	CR 52 36 65 CARABOBO CON LA 3 MEDELLIN	No. Remisión:	187139382	Informe Ant N°:	
Teléfono:	2882044	Página:	2 de 4	Centro:	Centro Itagui

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS				
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PROD	FABRICANTE	Resistencia Fluencia MPa	Resistencia Tracción MPa	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF
C8014228	TUBO EST REC 2.5x150x50mm 6m NTC4526/C	PZS078810Z	NTC 4526 GRC	Ternium	470	546	20.3		
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	A011781614	NTC 2289 GR60	Ternium	451	605	15	SinGrieta	1.34

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

DESTINATARIO

NOMBRE	DIRECCIÓN	N° ORDEN DE COMPRA
SOLDAMOS Y PINTAMOS S.A.S.	CL 56 54 106	PV/1787520

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

P-SGI-16-R01
Versión 5
30/08/2024

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE:	Agofer S.A.S.	**No. INTERNO**	54,963	**REPORTE DE PRODUCTO**	RPT5307	**FECHA DE PRODUCCIÓN**	2024-04-10
N.I.T.	800.216.499-1	**PLANTA**	**Malambo**	**N° ORDEN DE PRODUCCIÓN**	PO3305	**UNIDADES PRODUCIDAS**	258.0
DIRECCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN		KM 3-100 Vía a Caracolí					

DATOS DEL PRODUCTO

PRODUCTO		Lámina HR Alfajor 2.5mm x 1.20m x 3.00m												
N°	**NORMA DE FABRICACIÓN**	**N° DE TRAZABILIDAD DE LA MATERIA PRIMA**	**PROPIEDADES QUÍMICAS (%)**										**RECUBRIMIENTO**	**PROPIEDADES MECÁNICAS**		
			C	**Si**	**Mn**	**P**	**S**	**Al**	**Cu**	**Ni**	**Cr**	**Mo**		**Fluencia (F/Y)**	**Tracción (F/T)**	**Elongación (%)**
1	ASTM A36	2318168	0.1907	0.0650	0.3600	0.0070	0.0134	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	No aplica	339.0	490.0	29.0
2	ASTM A36	803011-2	0.0170	0.0160	0.3200	0.0160	0.0200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	No aplica	318.0	421.0	31.0

NOTA: Certificamos que los datos descritos de la composición química y de las propiedades mecánicas son una fiel copia de los certificados de calidad emitidos por el fabricante de la materia prima utilizada, en caso que la propiedades mecánicas estén con valor 0 significa que el fabricante no lo certifica ya que la norma de fabricación no lo exige como aspecto obligatorio.

ENSAYOS REALIZADOS

PRUEBAS DESTRUCTIVAS			
Abocardado	NA	**Doblado**	NA
Aplastamiento	NA		

PRUEBAS DIMENSIONALES					
Diámetro	NA	**Espesor**	Conforme	**Radios**	NA
Dimensiones	Conforme	**Longitud**	Conforme	**Rectitud**	Conforme


Certificamos que el material aquí descrito fue producido, revisado y aprobado en la fecha escrita en nuestras instalaciones. Si requiere trazabilidad adicional puede solicitarla al personal de Agofer S.A.S. con el número interno.

Isabelly Angulo Suaréz
Directora del S.I.G.

Declaración generada en **Bogotá** el **12/04/2024**

本钢板材股份有限公司
BENGANG STEEL PLATES Co., LTD

产 品 质 量 证 明 书
INSPECTION CERTIFICATE



辽宁省本溪市平山区钢铁路 邮编117000
Gangtie Road ,Pingshan District,117000
Benxi City,Liaoning Province,P.R.CHINA
联系电话/TEL NO：024-47830097

制 造 厂：本钢板材股份有限公司热连轧厂
Manufacturer: BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD. HOT ROLLING MILL

订货单位 Buyer	鞍钢集团国际经济贸易有限公司本溪分公司	产品名称 Product	热轧花纹板 Hot rolled checker steel sheet	证明书编号 Certificate No.	B02505300328
收货单位 Consignee	鞍钢集团国际经济贸易有限公司本溪分公司	交货状态 Delivery Condition	热轧 AS ROLLED	合同编号 Contract No.	B2550021001
客户名称 Customer	鞍钢集团国际经济贸易有限公司本溪分公司	计重方式 Weight Mode	实际重量 Actual Weight	购单号 Purchase No.	R2505BC312BX
标准 Specification	Q/BB 273-2022	发货日期 Date of Delivery	20250530	商检批次号 Ins.Lot.No.	
牌号 Grade	ASTM A36	车号	辽EA6555		

序号 No.	物料号 Pack No.	熔炼号 Heat No.	重量(kg) Weight	张数 Sheets	化学成分 Chemical Composition (%) 成分类型 C. C. T.	C 10 -2	Si 10 -2	Mn 10 -2	P 10 -3	S 10 -3	Als 10 -3
1	D250449101J11	5C13378	3915	66	0	16	15	22	9	10	28
2	D250449101J12	5C13378	3915	66	0	16	15	22	9	10	28
3	D250449101J13	5C13378	3915	66	0	16	15	22	9	10	28
合计Total		总重量Total Weight	11745	总毛重Total Gross Weight	11745	总张数 Total Sheets	198				

序号 No.	物料号 Pack No.	规格 Size 厚度 Thick mm	宽度 Width mm	长度 Length m	取样位置 Sample Location	拉伸试验 Tensile Test 标距: 方向 Direction	屈服 Y.S. MPa	抗拉 T.S. MPa	伸长率 EL (%)	屈强比 Y.S./T.S.	冷弯试验 Bend Test a= ° d=	冲击试验 Impact Test 方向 Direction	温度 C°	冲击功 (J) Impact Energy 1	2	3	Ave	冲击剪切面积 Impact SA % 1	2	3	Ave	冲击试样尺寸 Sample Size(mm)	落锤试验 DWTT 方向 Direction	温度 C°	剪切比 SA % 1	2	Ave	硬度 Hardness
1	D250449101J11	2.51	1002	3			276	428																			
2	D250449101J12	2.51	1002	3			276	428																			
3	D250449101J13	2.51	1002	3			276	428																			

备注 Remarks	上述元素仅列出参与复合公式的有意添加元素，但复合元素结果是严格按公式计算得出。	说明 Description	兹证明本表所列产品，均按标准进行制造和试验，并且符合规范之要求。本产品质量证明书盖章有效。 WE HEREBY CERTIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HEREIN, WAS BEEN MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULTS IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD TECHNIQUE.EFFECTIVELY SEAL THE PRODUCT QUALITY CERTIFICATE.
注释 Notes	成分类型 (C.C.T.=Chemical Composition Type)： 0:熔炼分析 Heat Analysis 1:产品分析Product Analysis; 拉伸试验 (Tensile Test)：Y.S.=Yield Strength T.S.=Tensile Strength EL=Elongation G.L.=Gauge Length; 取样位置(Sample Location): B=Bottom 尾部 T= Top 头部 M= Middle 中部; 方向(Direction): L= Longi(纵向) T= Trans(横向) 3= 30° To The Rolling Direction(与轧制方向成30°) 8= Z向 9= 纵向+横向 0= 与纵向成60度 D= 45° To The Rolling Direction(与轧制方向成45°)。	质量保证负责人 Quality Manager	热轧产品合格专用章

天津市新宇彩板有限公司
Tianjin Xinyu Color Plate Co.,Ltd

产品质量证明书
MILL TEST CERTIFICATE

品名 COMMODITY	HOT DIPPED ZN-AL-MG COATED STEEL SHEET		标准 Specification
订货单位 CUSTOMER	TIANJIN HAOYU STEEL CO., LTD.	交货地 Delivery Place	TIANJIN XINYU COLOR PLATE CO.,LTD.	证书编号 Certificate No.	HY
收货单位 CONSIGNEE	CUMIC STEEL LIMITED	合同号 Contract No.	HYW8-250104	发货日期 Date of Delivery	

钢卷号	钢种	锌层重量 Coat Mass g/㎡	规格及重量 Material			化学成分（熔炼分析） Chemical Composistion %					拉伸测试 Tensile Test			性能 Properties			
BUNDLE No.	Grade		厚度*宽度*长度 Size mm	片数 Pieces	重量 N.W. (kg)	C	Si	Mn	P	S	屈服强度 Y.S MPa	抗拉强度 T.S MPa	延伸率 EL %	锌花 Spangle	硬度 HRB0T	表面级别 Surface	弯曲性能 Bend
20250305001	CS-B	ZM120	0.85*1000*2000	350	4395	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	332	402	25	正常	62	FA	OK
20250305002	CS-B	ZM120	0.85*1000*2000	350	4395	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	332	402	25	正常	62	FA	OK
20250305003	CS-B	ZM120	0.85*1000*2000	350	4390	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	332	412	28	正常	62	FA	OK
20250305004	CS-B	ZM120	0.85*1000*2000	351	4400	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	332	412	28	正常	62	FA	OK
20250305005	CS-B	ZM120	0.55*1219*2438	327	3875	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	332	402	25	正常	62	FA	OK
20250305006	CS-B	ZM120	0.55*1219*2438	327	3875	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	332	402	25	正常	62	FA	OK
20250305007	CS-B	ZM120	0.55*1219*2438	327	3875	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	332	402	25	正常	62	FA	OK
20250305008	CS-B	ZM120	0.55*1219*2438	327	3875	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	332	402	25	正常	62	FA	OK
20250305009	CS-B	ZM120	0.55*1219*2438	327	3882	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	332	402	25	正常	62	FA	OK
20250305010	CS-B	ZM120	0.55*1219*2438	327	3882	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	332	402	25	正常	62	FA	OK
20250305011	CS-B	ZM120	0.7*1219*2438	273	4185	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	332	402	25	正常	62	FA	OK
20250305012	CS-B	ZM120	0.7*1219*2438	273	4185	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	334	401	27	正常	61	FA	OK
20250305013	CS-B	ZM120	0.7*1219*2438	273	4185	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	334	401	27	正常	61	FA	OK
20250305014	CS-B	ZM120	0.7*1219*2438	273	4175	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	330	396	28	正常	63	FA	OK
20250305015	CS-B	ZM120	0.7*1219*2438	273	4175	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	330	396	28	正常	63	FA	OK
20250305016	CS-B	ZM120	0.7*1219*2438	273	4195	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	330	396	28	正常	63	FA	OK
20250305017	CS-B	ZM120	0.7*1219*2438	273	4190	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	330	396	28	正常	63	FA	OK
20250305018	CS-B	ZM120	0.7*1219*2438	273	4190	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	334	401	27	正常	61	FA	OK
20250305019	CS-B	ZM120	0.7*1219*2438	273	4175	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	334	401	27	正常	61	FA	OK
20250305020	CS-B	ZM120	0.7*1219*2438	273	4180	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	330	396	28	正常	63	FA	OK
20250305021	CS-B	ZM120	0.7*1219*2438	268	4190	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	330	396	28	正常	63	FA	OK
20250305022	CS-B	ZM120	0.85*1219*2438	223	4185	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	334	401	27	正常	61	FA	OK
20250305023	CS-B	ZM120	0.85*1219*2438	223	4185	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	329	391	28	正常	64	FA	OK
20250305024	CS-B	ZM120	0.85*1219*2438	223	4180	0.046	0.046	0.17	0.015	0.011	329	391	28	正常	64	FA	OK
合计 (Total)					99419								数量	24		Quantity	24

备注 Remarks

本产品已按上述标准要求制造和检验，其结果符合要求，特此证明，贵方查询有关问题，请与我公司联系。
We hereby certify that material described here in has manufactured and tested with satisfactory results in accordance with the requirements of the above material

日期 Date:

新宇品质管理部
XINYU Quality Management

Powered by CamScanner

ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

ArcelorMittal

Usina / Plant: ArcelorMittal Tubarão

Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 526, Polo Industrial Tubarão, Serra-ES,
CEP 29160-904 CNPJ: 17.469.701/0104-82
Telefone:+55(27)3348-1240/ 3348-2220 Fax:+55(27)3348-1482/ 3348-2271

Certificado de Qualidade / Mill Sheet / Quality Certificate

Ordem de Venda / Order No:	Nº do pedido do cliente / Buyer ref. No:	Nº pedido do consumidor / Customer Ref. No:	Nº do certificado / Certificate	Data de emissão / Issue Date:
197171016 / 000001	0006000315/000005		004651001301	20.06.2022

Consumidor / Customer:	Cliente final / End user:
ARCELORMITTAL INTERNATIONAL LUXEMBO	CENTRO ACEROS DEL CARIBE

Aplicação / Aplication:	Produto / Product:	Norma do Produto / Product Standard:	Part Number:
DISTRIBUIÇÃO E CENTROS DE SERVIÇOS - CORTE EM CHAPAS /SERVICE AND DISTRIBUTION CENTERS - CUT TO LENGTH	Bobina Laminada a Quente / Hot Rolled Coil	ASTM A1011SS36-2	CONFORME NORMA

Espessura / Thickness: (MM)	Largura / Width: (MM)	Borda / Edge:	Tipo de dimensão / type of dimension:	Óleo / Oil:	Aspecto Superficial / Surface Aspect	Cond. Especial / Special Cond.	Nº Protocolo / No Protocol:
2,50	1.200	Natural	Nominal	Não/No	X	NORMAL	CO0042-00-16

Composição Química/ Chemical Composition (%) - L = Análise de Panela / Ladle Analysis - P = Análise de Produto / Product Analysis

Corrida	Cód.	C	Si	Mn	P	S	Al	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Nb	N	H	Sn	Ti	B	Ca							
1545344	L	0,12	0,013	0,520	0,014	0,0105	0,038	0,012	0,007	0,022	0,001	0,000	0,0001	0,0021		0,0010	0,000	0,0000	0,0000							

Nº da amostra / Sample No:	Tração/ Tensile Unidade / Unit = MPa Base / Basis = GL=50mm, W=12,5mm						Dobramento / Bending W = 40 mm		Dureza/ Hardness Test:		BH		Impacto / Charpy Unid. Temp. / Temp. Unit: Unid. Energ. / Energy Unit: CP/TS:								DWTT Unid. Temp. / Temp. Unit: CP/TS :								T. Grão / Grain Size		Embutimento / Cupping test (mm)	Inclusões / Inclusion				Anisotropia / Anisotropy				Expansão de furo / hole expansion
	Pos - Dir / Position - Direction	LE / YS	LR / TS	Razão E/ / Yield Ratio (%)	Along / Elong (%)	Red. Área (%) Area Reduc.	Pos - Dir / Position - Direction	Julg / Judgment (Ângulo / Ratio)	Posição / Position	Média/ Average	BH1	BH2	Pos - Dir / Position - Direction	Temperatura/ Temperature	TRS / TRE	Energia/ Energy F. Dúctil/Ductile F: Frágil Exp. Lateral/ L. Expansion 1	2	3	Méd/ Ave	Pos - Dir / Position - Direction	Temperatura/ Temperature	Área ductil % / Ductile Área % 1	2	3	Méd/ Ave.	TGF / FGS	TGA / AGS						n	n	r	r	
T0676496T	T4L	301	431	70	35		T4L	A 90 2,0							/																					
T0676496T	T4L	301	431	70	35		T4L	A 90 2,0							/																					

Número do lote / lot ID	Nº da nota fiscal / Issue Number	Peso liq. / Net weight t	Corrida / Heat No	Comprimento Real / Real Length(m)	Amostra 1 / Sample 1	Amostra 2 / Sample 2	Amostra 3 / Sample 3
L5165451	005843065	12,740	1545344	541,00	T0676496T		
L5165452	005843065	12,300	1545344	521,00	T0676496T		
L5169141	005843065	12,800	1545344	542,00	T0676496T		
L5169142	005843065	12,300	1545344	520,00	T0676496T		
L5169151	005843065	12,750	1545344	541,00	T0676496T		
L5169152	005843065	12,130	1545344	514,00	T0676496T		

Códigos / Codes

(1) POSIÇÃO / POSITION
T - Topo / Head
2 - ¼ Largura / ¼ Width
M - Meio / Body
4 - ¾ Largura / ¾ Width
C - Cauda / Tail
DIREÇÃO / DIRECTION
L - Longitudinal
A - 45°
T - Transversal
DOBRAMENTO / BEND
A - Aprovado / Aproved

(2) INCLUSÕES
TIPO / TYPE
A - Sulfeto / Sulphide
B - Aluminato / Aluminate
C - Silicato / Silicate
D - Óxido / Oxide
T - Total / Total
SÉRIE
F - Fina / Thin
G - Grossa / Heavy

Obs.

CERTIFICAMOS QUE O MATERIAL AQUI DESCRITO, FOI INSPECIONADO E APROVADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUE NÃO ESTÁ CONTAMINADO POR RADIOATIVIDADE ACIMA DOS LIMITES NORMAIS E QUE O MATERIAL NÃO SOFREU CONTAMINAÇÃO POR MERCÚRIO DURANTE O SEU PROCESSO DE FABRICAÇÃO. / WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN SATISFACTORY INSPECTED IN ACCORDANCE WITH THE SPECIFICATIONS, HAS NOT BEEN CONTAMINATED BY ANY RADIOACTIVITY ABOVE NORMAL BACKGROUND LEVELS AND HAS NOT COME INTO CONTACT WITH ANY MERCURY BEARING INSTRUMENTS OR MERCURE CONTAMINANTS DURING ITS PRODUCTIVE PROCESS.
PROCESSO DE FABRICAÇÃO: ACIARIA LD - LINGOTAMENTO CONTÍNUO - LAMINAÇÃO A QUENTE CONTÍNUO / MANUFACTURING PROCESS: BASIC OXYGEN LD, CONTINUOUS CASTING, HOT STRIP MILL (as rolled). LICENÇA PARA USO DA MARCA ABNT DE QUALIDADE AMBIENTAL - RÓTULO ECOLÓGICO ABNT - PARA EMPRESAS (BOBINA LAMINADA A QUENTE). LICENSE FOR USING ABNT ENVIRONMENTAL MARK - ABNT ECOLABEL - TO THE COMPANY (HOT ROLLED COIL)
CERTIFICAÇÕES NAVAIS / SHIPBUILDING CERTIFICATIONS: ABS, BV, DNV GL, LR, RINA, CCS, NKK, KRS.

André Carvalho Prado
Gerência de Assistência Técnica a Clientes
Customer Technical Support Manager

ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

Usina / Plant: ArcelorMittal Tubarão

leiro Eduardo Gomes, 526, Polo Industrial Tubarão, Serra-ES,
)-904 CNPJ: 17.469.701/0104-82
-55(27)3348-1240/ 3348-2220 Fax:+55(27)3348-1482/ 3348-2271

Certificado de Qualidade / Mill Sheet / Quality Certificate

Ordem de Venda / Order No:	Nº do pedido do cliente / Buyer ref. No:	Nº pedido do consumidor / Customer Ref. No:	Nº do certificado / Certificate	Data de emissão / Issue Date:
9750465 / 000003	0009749214/000007		003684852901	16.08.2021

Consumidor / Customer:	Cliente final / End user:
ARCELORMITTAL INTERNATIONAL LUXEMBO	CENTRO ACEROS DEL CARIBE

Aplication:	Produto / Product:	Norma do Produto / Product Standard:	Part Number:
IÇÃO E CENTROS DE SERVIÇOS - CORTE EM CHAPAS /SERVICE RIBUTION CENTERS - CUT TO LENGTH	Bobina Laminada a Quente / Hot Rolled Coil	ASTM A1011SS36-2	CONFORME NORMA

Thickness: (MM)	Largura / Width: (MM)	Borda / Edge:	Tipo de dimensão / type of dimension:	Óleo / Oil:	Aspecto Superficial / Surface Aspect	Cond. Especial / Special Cond.	Nº Protocolo / No Protocol:
3,00	1.200	Natural	Nominal	Não/No	X	NORMAL	CO0042-00-14

Composição Química/ Chemical Composition (%) - L = Análise de Panela / Ladle Analysis - P = Análise de Produto / Product Analysis

Cód.	C	Si	Mn	P	S	Al	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Nb	N	H	Sn	Ti	B	Ca
L	0,12	0,010	0,510	0,027	0,0089	0,039	0,005	0,004	0,023	0,000	0,000	0,0001	0,0023		0,0000	0,000	0,0000	0,0003

	Tração/ Tensile Unidade / Unit = MPa Base / Basis = GL=50mm, W=12,5mm						Dobramento / Bending W = 40 mm		Dureza/ Hardness Test:		BH		Impacto / Charpy Unid. Temp. / Temp. Unit: Unid. Energ. / Energy Unit: CP/TS:								DWTT Unid. Temp. / Temp. Unit: CP/TS :						T. Grão / Grain Size		Embutimento / Cupping test (mm)	Inclusões / Inclusion				Anisotropia / Anisotropy				Expansão de furo / hole expansion
	Pos - Dir / Position - Direction	LE / YS	LR / TS	Razão El / Yield Ratio (%)	Along / Elong (%)	Red. Área (%) Area Reduc.	Pos - Dir / Position - Direction	Julg / Julgment (Ângulo / Ratio)	Posição / Position	Média/ Average	BH1	BH2	Pos - Dir / Position - Direction	Temperatura/ Temperature	TRS / TRE	Energia/ Energy F. Dúctil/Ductile F: Frágil Exp. Lateral/ L. Expansion 1	2	3	Méd/ Ave	Pos - Dir / Position - Direction	Temperatura/ Temperature	Área dúctil % / Ductile Área % 1	2	3	Méd/ Ave.	TGF / FGS	TGA / AGS						n	n	r	r	
T	T4L	326	456	71	33		T4L	A 90 2,0							/																				
T	T4L	308	432	71	35		T4L	A 90 2,0							/																				

te /	Nº da nota fiscal / Issue Number	Peso liq. / Net weight t	Corrida / Heat No	Comprimento Real / Real Length(m)	Amostra 1 / Sample 1	Amostra 2 / Sample 2	Amostra 3 / Sample 3
1	005147787	12,670	3896189	447,00	T0623783T		
2	005147787	12,210	3896189	433,00	T0623783T		
1	005147787	12,500	3896189	442,00	T0623783T		
2	005147787	12,310	3896189	436,00	T0623783T		
1	005147803	12,670	3896189	447,00	T0623783T		
2	005147803	12,250	3896189	433,00	T0623783T		
1	005147787	12,640	3896189	445,00	T0623783T		
2	005147787	12,320	3896189	435,00	T0623783T		
1	005147787	12,550	3896189	448,00	T0623783T		
2	005147787	12,410	3896189	443,00	T0623783T		
1	005147787	12,620	3896189	444,00	T0623783T		
2	005147787	12,080	3896189	426,00	T0623783T		
1	005147787	12,580	3896189	446,00	T0623784T		

Códigos / Codes

(1) POSIÇÃO / POSITION
T - Topo / Head
2 - ¼ Largura / ¼ Width
M - Meio / Body
4 - ¾ Largura / ¾ Width
C - Cauda / Tail
DIREÇÃO / DIRECTION
L - Longitudinal
A - 45°
T - Transversal
DOBRAMENTO / BEND
A - Aprovado / Aproved

(2) INCLUSÕES
TIPO / TYPE
A - Sulfeto / Sulphide
B - Aluminato / Aluminate
C - Silicato / Silicate
D - Óxido / Oxide
T - Total / Total
SÉRIE
F - Fina / Thin
G - Grossa / Heavy

Obs.

CERTIFICAMOS QUE O MATERIAL ACIMA DESCRITO, FOI INSPECIONADO E APROVADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUE NÃO ESTÁ CONTAMINADO POR RADIOATIVIDADE ACIMA DOS LIMITES NORMAIS E QUE O MATERIAL NÃO SOFREU CONTAMINAÇÃO POR MERCÚRIO DURANTE O SEU PROCESSO DE FABRICAÇÃO. / WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN SATISFACTORY INSPECTED IN ACCORDANCE WITH THE SPECIFICATIONS, HAS NOT BEEN CONTAMINATED BY ANY RADIOACTIVITY ABOVE NORMAL BACKGROUND LEVELS AND HAS NOT COME INTO CONTACT WITH ANY MERCURY BEARING INSTRUMENTS OR MERCURE CONTAMINANTS DURING ITS PRODUCTIVE PROCESS

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: ACIARIA LD - LINGOTAMENTO CONTÍNUO - LAMINAÇÃO A QUENTE CONTÍNUO / MANUFACTURING PROCESS: BASIC OXYGEN LD, CONTINUOUS CASTING, HOT STRIP MILL (as rolled). LICENÇA PARA USO DA MARCA ABNT DE QUALIDADE AMBIENTAL - ROTULO ECOLÓGICO ABNT - PARA EMPRESAS (BOBINA LAMINADA A QUENTE). LICENSE FOR USING ABNT ENVIRONMENTAL MARK - ABNT ECOLABEL - TO THE COMPANY (HOT ROLLED COIL)

CERTIFICAÇÕES NAVAIS / SHIPBUILDING CERTIFICATIONS: ABS, BV, DNV GL, LR, RINA, CCS, NKK, KRS

André Carvalho Prado
Gerência de Assistência Técnica a Clientes
Customer Technical Support Manager

CERTIFICADO DE CALIDAD

PINTURA ELECTROSTÁTICA

Fecha de análisis: 29/10/2025
Código del Producto: 1019003425
Descripción del Producto: Blanco Dynamic Liso Sb Pol
Tipo de pintura: Poliéster
Lote del Producto: **A11013235**
Este lote se compone de las cajas: #1 a la #158 por 25Kg
Cantidad de producto certificado: 3950 Kg

PROPIEDADES*	UNIDADES	ESPECIFICACIÓN	NORMA	LOTE A11013235
Tamaño de partícula (D4,3)	µm	38 - 44	NTC 2682/Cilas 990	40.1
Curado (Temperatura/tiempo)	°C/min	190/12	---	190/12
Espesor de película	µm	60 - 70	NTC 591	67
Color	dE* (CIE 2000)	0.0 - 0.8	ASTM D2244	0.36
Brillo	u.b	60 - 80	NTC 592	80
Flexibilidad - (Mandril Cónico)	pulg	1/8”	NTC 1115	1/8”.
Impacto Directo	Kg-cm	Pasa 60 Kg-cm	NTC 877	Pasa.
Impacto Reverso	Kg-cm	Pasa 60 Kg-cm	NTC 877	Pasa.
Test de polimerización: Xileno.	Frotes	50 Frotes	ASTM D5402	Pasa 50 frotes
PRODUCTO CONFORME	---	**SI/NO**	---	**SI.**
FECHA DE MANUFACTURA				**29/10/2025**
FECHA DE VENCIMIENTO				**28/10/2026**
*Sustrato: Lámina de Acero Cold Rolled de 0.9 mm de espesor y pretratada con fosfato de hierro.				
OBSERVACIONES				

Jorge Mario Muñoz
Analista de Calidad
Departamento de Calidad RECYA S.A.S

ANEXO 6.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICADO DE PAGO.

Certificado de Aportes

Se certifica que KLEIBER EDUARDO TORRES HERNANDEZ identificado(a) con CC 1236441409 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

TRANSPORTADORES SIGLO XXI S.A.S. NI 900231104

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-08	2026-09	619589453	9510698998	E	2026-09-02	X																

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	11	16%	$641,999	$102,800
ARL	COLMENA	11	4.35%	$641,999	$28,000
CCF	COMFENALCO ANTIOQUIA	11	4%	$641,999	$25,700
EPS	SALUD TOTAL	11	4%	$641,999	$25,700

Este certificado se expide el día 2026-09-02 a las 03:40.

Certificado de Aportes

Se certifica que GUSTAVO HERNAN ANGEL ISAZA identificado(a) con CC 71631142 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVITRAVEL GROUP SAS NI 900421154

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-08	2026-09	625233710	9510766567	E	2026-09-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,750,905	$121,900
CCF	COMFAMA	30	4%	$1,750,905	$70,100
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$1,750,905	$70,100

Este certificado se expide el día 2026-09-07 a las 07:32.

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-04, 04:08:16 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1084934191

Periodo Cotización 202608 **Periodo Servicio** 202609

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-09-04

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 92539526		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CONEO OJEDA HAYDEN EDUARDO	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
X															0	10	10	10	10		F	$ 1.750.905	230301		16 %	$ 583.635	$ 93.400	$ 0	$ 0	ESSC24		4 %	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 583.635	$ 40.700	CCF04	4 %	$ 583.635	$ 23.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS-S COOSALUD	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 93.400	$ 0	$ 0	$ 23.400	$ 40.700	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-04, 04:08:16 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1084934191

Periodo Cotización 202608 **Periodo Servicio** 202609

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-09-04

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 91452201		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					LOZANO ROJAS LUIS DANOVER	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30		F	$ 2.812.024	230301		16 %	$ 2.812.024	$ 450.000	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 2.812.024	$ 112.500	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 2.812.024	$ 195.800	CCF04	4 %	$ 2.812.024	$ 112.500	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 450.000	$ 0	$ 0	$ 112.500	$ 195.800	$ 112.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 870.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-04, 04:08:16 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1084934191

Periodo Cotización 202608 **Periodo Servicio** 202609

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-09-04

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 42683289		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					DURANGO ARENAS MARIA VICTORIA	5001000 - 5	000000004	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30		F	$ 5.255.000	25-14		16 %	$ 5.255.000	$ 840.800	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 5.255.000	$ 210.200	$ 0	14-4	4	4,350 %	$ 5.255.000	$ 228.600	CCF04	4 %	$ 5.255.000	$ 210.200	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 840.800	$ 0	$ 0	$ 210.200	$ 228.600	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.489.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-04, 04:08:16 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1084934191

Periodo Cotización 202608 **Periodo Servicio** 202609

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-09-04

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 32220126		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GIRALDO BOTERO LINA MARIA	5001000 - 5	000000004	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
								X							0	30	30	30	30			F	$ 5.255.000	25-14		16 %	$ 5.255.000	$ 840.800	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 5.255.000	$ 210.200	$ 0	14-4	4	4,350 %	$ 5.255.000	$ 228.600	CCF04	4 %	$ 5.255.000	$ 210.200	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 840.800	$ 0	$ 0	$ 210.200	$ 228.600	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.489.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-04, 04:08:16 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1084934191

Periodo Cotización 202608 **Periodo Servicio** 202609

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-09-04

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 16791906		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					BARBOSA PALOMINO FRANKLIN	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30		F	$ 4.087.364	231001		16 %	$ 4.087.364	$ 654.000	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 4.087.364	$ 163.500	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 4.087.364	$ 284.500	CCF04	4 %	$ 4.087.364	$ 163.500	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 654.000	$ 0	$ 0	$ 163.500	$ 284.500	$ 163.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.265.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-04, 04:08:16 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1084934191

Periodo Cotización 202608 **Periodo Servicio** 202609

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-09-04

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1098736267		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					TRUJILLO VANEGAS JORGE LUIS	5001000 - 5	000000002	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	30	30			F	$ 1.750.905	230301		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-4	2	1,044 %	$ 1.750.905	$ 18.300	CCF04	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 18.300	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-04, 04:08:16 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1084934191

Periodo Cotización 202608 **Periodo Servicio** 202609

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-09-04

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1098701110		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CARO TRUJILLO OSCAR RAUL	5001000 - 5	000000004	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
								X							0	30	30	30	30			F	$ 4.038.092	230301		16 %	$ 4.038.092	$ 646.100	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 4.038.092	$ 161.600	$ 0	14-4	4	4,350 %	$ 4.038.092	$ 175.700	CCF04	4 %	$ 4.038.092	$ 161.600	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS S.A.	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 646.100	$ 0	$ 0	$ 161.600	$ 175.700	$ 161.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.145.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-04, 04:08:16 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1084934191

Periodo Cotización 202608 **Periodo Servicio** 202609

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-09-04

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1096247535		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					PALACIO ACEVEDO BRAYAN ESMID	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30		F	$ 1.849.915	230201		16 %	$ 1.849.915	$ 296.000	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 1.849.915	$ 74.000	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 1.849.915	$ 128.800	CCF04	4 %	$ 1.849.915	$ 74.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 296.000	$ 0	$ 0	$ 74.000	$ 128.800	$ 74.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 572.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-04, 04:08:16 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1084934191

Periodo Cotización 202608 **Periodo Servicio** 202609

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-09-04

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1096247524		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					ZUÑIGA BENAVIDES CARLOS ANDRES	5088000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30			F	$ 1.849.915	230301		16 %	$ 1.849.915	$ 296.000	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 1.849.915	$ 74.000	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 1.849.915	$ 128.800	CCF04	4 %	$ 1.849.915	$ 74.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 296.000	$ 0	$ 0	$ 74.000	$ 128.800	$ 74.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 572.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-04, 04:08:16 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1084934191

Periodo Cotización 202608 **Periodo Servicio** 202609

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-09-04

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1096218904		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					PALACIO ACEVEDO JAIME ESTIVEN	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30		F	$ 1.849.915	230301		16 %	$ 1.849.915	$ 296.000	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 1.849.915	$ 74.000	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 1.849.915	$ 128.800	CCF04	4 %	$ 1.849.915	$ 74.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 296.000	$ 0	$ 0	$ 74.000	$ 128.800	$ 74.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 572.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-04, 04:08:16 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1084934191

Periodo Cotización 202608 **Periodo Servicio** 202609

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-09-04

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1076817116		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					MENA CORDOBA CRISTIAN	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30		F	$ 2.285.765	230301		16 %	$ 2.285.765	$ 365.800	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 2.285.765	$ 91.500	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 2.285.765	$ 159.100	CCF04	4 %	$ 2.285.765	$ 91.500	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 365.800	$ 0	$ 0	$ 91.500	$ 159.100	$ 91.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 707.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-04, 04:08:16 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1084934191

Periodo Cotización 202608 **Periodo Servicio** 202609

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-09-04

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1069484054		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					FLOREZ ACERO MOISES JESUS	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30		F	$ 1.782.171	230201		16 %	$ 1.782.171	$ 285.200	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 1.782.171	$ 71.300	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 1.782.171	$ 124.100	CCF04	4 %	$ 1.782.171	$ 71.300	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 285.200	$ 0	$ 0	$ 71.300	$ 124.100	$ 71.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-04, 04:08:16 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1084934191

Periodo Cotización 202608 **Periodo Servicio** 202609

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-09-04

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1065913019		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					VIVAS MANDON SIMEON FERNANDO	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**						**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30			F	$ 2.458.571	230201		16 %	$ 2.458.571	$ 393.400	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 2.458.571	$ 98.400	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 2.458.571	$ 171.200	CCF04	4 %	$ 2.458.571	$ 98.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 393.400	$ 0	$ 0	$ 98.400	$ 171.200	$ 98.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 761.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-04, 04:08:16 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1084934191

Periodo Cotización 202608 **Periodo Servicio** 202609

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-09-04

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1052982270		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					ALTAMIRANDA DIAZ JENIFER DEL CARMEN	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
								X							0	30	30	30	30			F	$ 2.669.540	230201		16 %	$ 2.669.540	$ 427.200	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 2.669.540	$ 106.800	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 2.669.540	$ 185.800	CCF04	4 %	$ 2.669.540	$ 106.800	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 427.200	$ 0	$ 0	$ 106.800	$ 185.800	$ 106.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 826.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-04, 04:08:16 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1084934191

Periodo Cotización 202608 **Periodo Servicio** 202609

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-09-04

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1049894058		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GONZALEZ MORA CARLOS MARIO	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30		F	$ 1.779.461	230301		16 %	$ 1.779.461	$ 284.800	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.779.461	$ 71.200	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 1.779.461	$ 123.900	CCF04	4 %	$ 1.779.461	$ 71.200	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 284.800	$ 0	$ 0	$ 71.200	$ 123.900	$ 71.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-04, 04:08:16 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1084934191

Periodo Cotización 202608 **Periodo Servicio** 202609

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-09-04

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1039597832		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GALEANO PARRA YEISON ALEJANDRO	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**						**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30		F	$ 1.779.461	230201		16 %	$ 1.779.461	$ 284.800	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.779.461	$ 71.200	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 1.779.461	$ 123.900	CCF04	4 %	$ 1.779.461	$ 71.200	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 284.800	$ 0	$ 0	$ 71.200	$ 123.900	$ 71.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-04, 04:08:16 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1084934191

Periodo Cotización 202608 **Periodo Servicio** 202609

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-09-04

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1038810427		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					SANTOS HERNANDEZ EDWIN DAVID	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
								X							0	30	30	30	30			F	$ 2.590.786	25-14		16 %	$ 2.590.786	$ 414.600	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 2.590.786	$ 103.700	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 2.590.786	$ 180.400	CCF04	4 %	$ 2.590.786	$ 103.700	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 414.600	$ 0	$ 0	$ 103.700	$ 180.400	$ 103.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 802.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-04, 04:08:16 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1084934191

Periodo Cotización 202608 **Periodo Servicio** 202609

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-09-04

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1037368900		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					BEDOYA VALENCIA ANDRES FERLEY	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
														0	24	24	24	24			F	$ 1.839.492	230301		16 %	$ 1.471.593	$ 235.500	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 1.471.593	$ 58.900	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 1.471.593	$ 102.500	CCF04	4 %	$ 1.471.593	$ 58.900	0 %	$ 0	0 %	$ 0
									X					0	6	6	6	6			F	$ 1.839.492	230301		16 %	$ 367.898	$ 58.900	$ 0	$ 0	EPS002		0 %	$ 367.898	$ 0	$ 0	14-4		0,000 %	$ 367.898	$ 0	CCF04	0 %	$ 367.898	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 294.400	$ 0	$ 0	$ 58.900	$ 102.500	$ 58.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 514.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-04, 04:08:16 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1084934191

Periodo Cotización 202608 **Periodo Servicio** 202609

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-09-04

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1025642866		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CASTAÑEDA CALLE KATHERIN TATIANA	5001000 - 5	000000001	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**						**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
X															0	28	28	28	28			F	$ 2.000.000	230201		16 %	$ 1.866.666	$ 298.700	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.866.666	$ 74.700	$ 0	14-4	1	0,522 %	$ 1.866.666	$ 9.800	CCF04	4 %	$ 1.866.666	$ 74.700	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 298.700	$ 0	$ 0	$ 74.700	$ 9.800	$ 74.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 457.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-04, 04:08:16 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1084934191

Periodo Cotización 202608 **Periodo Servicio** 202609

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-09-04

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1017221580		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					PADILLA GIRALDO LAURA MARCELA	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	24	24	24	24			F	$ 1.756.116	230201		16 %	$ 1.404.892	$ 224.800	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 1.404.892	$ 56.200	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 1.404.892	$ 97.800	CCF04	4 %	$ 1.404.892	$ 56.200	0 %	$ 0	0 %	$ 0
										X					0	6	6	6	6			F	$ 1.756.116	230201		16 %	$ 351.223	$ 56.200	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 351.223	$ 14.100	$ 0	14-4		0,000 %	$ 351.223	$ 0	CCF04	0 %	$ 351.223	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 281.000	$ 0	$ 0	$ 70.300	$ 97.800	$ 56.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 505.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-04, 04:08:16 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1084934191

Periodo Cotización 202608 **Periodo Servicio** 202609

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-09-04

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1017144470		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					DIAZ PEÑA CARLOS ALBERTO	5001000 - 5	000000004	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
							X							0	30	30	30	30			F	$ 10.011.429	230301		16 %	$ 10.011.429	$ 1.601.900	$ 50.100	$ 50.100	EPS010		4 %	$ 10.011.429	$ 400.500	$ 0	14-4	4	4,350 %	$ 10.011.429	$ 435.500	CCF04	4 %	$ 10.011.429	$ 400.500	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.601.900	$ 50.100	$ 50.100	$ 400.500	$ 435.500	$ 400.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.938.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-04, 04:08:16 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1084934191

Periodo Cotización 202608 **Periodo Servicio** 202609

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-09-04

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1000537976		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					ROA SILVA JUAN JOSE	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**						**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
							X							0	30	30	30	30		F	$ 2.125.000	230201		16 %	$ 2.125.000	$ 340.000	$ 0	$ 0	EPS040		4 %	$ 2.125.000	$ 85.000	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 2.125.000	$ 147.900	CCF04	4 %	$ 2.125.000	$ 85.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 340.000	$ 0	$ 0	$ 85.000	$ 147.900	$ 85.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 657.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-04, 04:08:16 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1084934191

Periodo Cotización 202608 **Periodo Servicio** 202609

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-09-04

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 98681775		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CHAVARRIA BUILES WILLIAN ALBEIRO	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30		F	$ 2.300.750	231001		16 %	$ 2.300.750	$ 368.200	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 2.300.750	$ 92.100	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 2.300.750	$ 160.200	CCF04	4 %	$ 2.300.750	$ 92.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 368.200	$ 0	$ 0	$ 92.100	$ 160.200	$ 92.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 712.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-04, 04:08:16 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1084934191

Periodo Cotización 202608 **Periodo Servicio** 202609

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-09-04

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1152187124		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GOMEZ MEJIA ANYELO DANIEL	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30		F	$ 3.036.705	230201		16 %	$ 3.036.705	$ 485.900	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 3.036.705	$ 121.500	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 3.036.705	$ 211.400	CCF04	4 %	$ 3.036.705	$ 121.500	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 485.900	$ 0	$ 0	$ 121.500	$ 211.400	$ 121.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 940.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-04, 04:08:16 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1084934191

Periodo Cotización 202608 **Periodo Servicio** 202609

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-09-04

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1151966785		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					BARBOSA YEPES CHRISTIAN	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**						**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30			F	$ 2.387.897	230301		16 %	$ 2.387.897	$ 382.100	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 2.387.897	$ 95.600	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 2.387.897	$ 166.200	CCF04	4 %	$ 2.387.897	$ 95.600	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 382.100	$ 0	$ 0	$ 95.600	$ 166.200	$ 95.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 739.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-04, 04:08:16 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1084934191

Periodo Cotización 202608 **Periodo Servicio** 202609

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-09-04

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1098752603		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					OSORIO GOMEZ MIGUEL ANGEL	5001000 - 5	000000004	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
								X							0	30	30	30	30			F	$ 1.750.905	230301		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-4	4	4,350 %	$ 1.750.905	$ 76.200	CCF04	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 76.200	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-04, 04:08:16 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1084934191

Periodo Cotización 202608 **Periodo Servicio** 202609

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-09-04

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 11222857		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					ANDRADE GARCIA JOSE ALCIBIADES	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30		F	$ 2.743.501	230301		16 %	$ 2.743.501	$ 439.000	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 2.743.501	$ 109.800	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 2.743.501	$ 191.000	CCF04	4 %	$ 2.743.501	$ 109.800	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 439.000	$ 0	$ 0	$ 109.800	$ 191.000	$ 109.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 849.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-04, 04:08:16 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1084934191

Periodo Cotización 202608 **Periodo Servicio** 202609

Cliente: NI901979396 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

PAGADA 2026-09-04

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN				
Documento	NI 901979396	**Dirección**	DG 62 #43 - 151		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	312548643		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	TRUJILLO NIÑO JORGE	**Identificación**	CC 13893413		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	PT 5036864		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					ACOSTA SUAREZ ERIC EDUARDO	5001000 - 5	000000005	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**						**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X								X							0	21	21	21	21			F	$ 1.849.915	230301		16 %	$ 1.294.940	$ 207.200	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 1.294.940	$ 51.800	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 1.294.940	$ 90.200	CCF04	4 %	$ 1.294.940	$ 51.800	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS S.A.	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 207.200	$ 0	$ 0	$ 51.800	$ 90.200	$ 51.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 401.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-01, 03:53:34 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1084791055

Periodo Cotización 202608 **Periodo Servicio** 202609

Cliente: NI900564496 SOLUTRAFFIC INGENIERIA S A S

PAGADA 2026-09-01

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOLUTRAFFIC INGENIERIA S A S				
Documento	NI 900564496	**Dirección**	CR 19A #15 A - 41		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4893017		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	RUIZ QUINTERO JUAN CARLOS	**Identificación**	CC 13890310		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1144190459		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					MORIANO POLINDARA ANGIE TATIANA	76892000 - 76	000000001	VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	12	12	12	12		F	$ 4.400.000	230301		16 %	$ 1.760.000	$ 281.600	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.760.000	$ 70.400	$ 0	14-11	1	0,522 %	$ 1.760.000	$ 9.200	CCF57	4 %	$ 1.760.000	$ 70.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0
												X			0	18	18	18	18		F	$ 4.400.000	230301		16 %	$ 2.640.000	$ 422.400	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 2.640.000	$ 105.600	$ 0	14-11		0,000 %	$ 2.640.000	$ 0	CCF57	4 %	$ 2.640.000	$ 105.600	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 704.000	$ 0	$ 0	$ 176.000	$ 9.200	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.065.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que WISTON ALEXANDER COCK ESPINOSA identificado(a) con CC 71755158 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVITRAVEL GROUP SAS NI 900421154

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-08	2026-09	625233710	9510766567	E	2026-09-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,750,905	$280,200
ARL	COLMENA	30	4.35%	$1,750,905	$76,200
CCF	COMFAMA	30	4%	$1,750,905	$70,100
EPS	SANITAS	30	4%	$1,750,905	$70,100

Este certificado se expide el día 2026-09-07 a las 07:33.

Medellín, Antioquia, 10 de septiembre de 2026

Ingenieros

MARIO ALFONSO PÉREZ LINARES
Profesional Especializado - Unidad de circulación - Secretaría de Movilidad
Supervisor Contrato de Obra N° 4600105555 de 2025
Correo: marioa.perez@medellin.gov.co

MARTA LUCÍA SUÁREZ GÓMEZ
Directora de interventoría

CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
R/L CONSORCIO INT FAROL MED 2025
Correo: consorciofarolmed@kalpaingenieria.com.co
Interventoria - Contrato de Interventoria N° 4600105599 de 2025.

Asunto. Aclaración sobre diferencia en número de personas reportadas – ELECTROSERVICIOS GILBERTO VALENCIA S.A.S (PROVEEDOR ESTRATEGICO) para la ejecución del Contrato de Obra N° 4600105555, cuyo objeto es la ejecución de la obra mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín.

En atención a la observación de la Interventoría, mediante la cual se indica que en el reporte de seguridad social de **ELECTROSERVICIOS GILBERTO VALENCIA S.A.S** aparecen relacionadas **veintidós (22) personas**, mientras que el listado de personal aportado para la ejecución contractual presenta una cantidad diferente, nos permitimos efectuar la siguiente aclaración:

Si bien en el reporte general de seguridad social de **ELECTROSERVICIOS GILBERTO VALENCIA S.A.S** se encuentran afiliadas y reportadas un total de **veintidós (22)) personas**, este número corresponde a la totalidad del personal vinculado a dicha empresa para el desarrollo de sus diferentes actividades y obligaciones laborales.

No obstante, para la ejecución de las actividades asociadas al **Contrato de Obra N.° 4600105555**, cuyo objeto es la **"Ejecución de la obra mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín"**, únicamente se encuentran asignadas **diez y siete (17) personas** pertenecientes a Electro Servicios.

En consecuencia, la diferencia evidenciada entre las **veintidós (22) personas reportadas en la seguridad social** y las personas incluidas en el listado aportado para el contrato obedece a que el reporte de seguridad social corresponde al **personal total de la empresa**, mientras que el listado presentado ante la Interventoría contempla exclusivamente al


personal efectivamente asignado y que adelanta actividades en el marco del Contrato de Obra N.° 4600105555.

Por lo anterior, se aclara que de las veintiuna (21) personas relacionadas en el reporte de seguridad social de **ELECTROSERVICIOS GILBERTO VALENCIA S.A.S**, **solo diez y siete (17) corresponden al personal que participa directamente en la ejecución de las actividades del contrato referido**, razón por la cual no existe inconsistencia entre ambos documentos, sino una diferencia derivada del alcance de la información contenida en cada uno de ellos.

Quedamos muy atentos y prestos a atenderse oportunamente los requerimientos y observaciones adicionales a que haya lugar.

Dada en Medellín, Antioquia, se expide el presente documento a los **Diez (10)** días del mes de **septiembre** de **2026**.

Cordialmente,



JORGE TRUJILLO NIÑO
C.C 13.893.413 de Barrancabermeja
R/L. UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-09-08, 02:16:00 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 88052703

Periodo Cotización: agosto de 2026 **Periodo Servicio:** septiembre de 2026

PAGADO 08/09/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ELECTROSERVICIOS GILBERTO VALENCIA SAS	**Nombre Sucursal**	ELECTROSERVICIOS	**Código Sucursal**	01
Documento	NI901393630	**Dirección**	CR 46 #63 - 22 BARRIO PRADO CENTRO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2548085		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	VALENCIA HERNANDEZ GILBERTO ANTONIO	**Identificación**	CC 70082636		
Total Afiliados	22	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1017162399	NORELA VIVIANA SALDARRIAGA PINTO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.558.934	$ 409.500	(EPS010) EPS SURA	$ 2.558.934	$ 102.400	6,960	$ 2.558.934	$ 178.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.558.934	$ 102.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 792.500
CC 1017166581	VIVIANA CATALINA ESCOBAR GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.059.200	$ 329.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.059.200	$ 82.400	0,522	$ 2.059.200	$ 10.800	(CCF04) COMFAMA	$ 2.059.200	$ 82.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 505.100
CC 1017202572	JOHN FREDY VALENCIA MOLINA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.239.716	$ 358.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.239.716	$ 89.600	6,960	$ 2.239.716	$ 155.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.239.716	$ 89.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 693.500
CC 1018229962	MIGUEL ANGEL VILLEGAS PEREZ	01	00												X					0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 58.364	$ 9.400	(EPS010) EPS SURA	$ 58.364	$ 2.400	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 39.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.800
CC 1018229962	MIGUEL ANGEL VILLEGAS PEREZ	01	00										X							0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 1.850.529	$ 296.100	(EPS010) EPS SURA	$ 1.850.529	$ 74.100	6,960	$ 1.850.529	$ 128.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.850.529	$ 74.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 573.100
CC 1028030487	ERMIS TORRES GUERRERO	01	00											X						0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 66.000	$ 10.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 66.000	$ 0	0,000	$ 66.000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.600
CC 1028030487	ERMIS TORRES GUERRERO	01	00										X							0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 2.098.771	$ 335.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.098.771	$ 84.000	6,960	$ 2.098.771	$ 146.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.098.771	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 650.000
CC 1038806300	CESAR MANUEL SANTOS HERNANDEZ	01	00														L			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 94.600	$ 15.200	(MIN002) ADRES MIN002	$ 94.600	$ 3.800	0,000	$ 94.600	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 94.600	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.800
CC 1038806300	CESAR MANUEL SANTOS HERNANDEZ	01	00																	0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 2.743.400	$ 439.000	(MIN002) ADRES MIN002	$ 2.743.400	$ 109.800	6,960	$ 2.743.400	$ 191.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.743.400	$ 109.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 849.600
CC 1038815518	EDINSON MANUEL SANTOS HERNANDEZ	01	00	X							X		X							0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 1.548.936	$ 247.900	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.548.936	$ 62.000	6,960	$ 1.548.936	$ 107.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.548.936	$ 62.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 479.800
CC 1070807034	LUIS FERNANDO GUERRERO ARROYO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.762.179	$ 442.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.762.179	$ 110.500	6,960	$ 2.762.179	$ 192.300	(CCF04) COMFAMA	$ 2.762.179	$ 110.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 855.300
CC 1214729941	YANCARLOS USUGA OQUENDO	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 116.727	$ 18.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 116.727	$ 4.700	0,000	$ 116.727	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 83.355	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.400
CC 1214729941	YANCARLOS USUGA OQUENDO	01	00										X							0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.906.094	$ 305.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.906.094	$ 76.300	6,960	$ 1.906.094	$ 132.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.906.094	$ 76.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 590.300
CC 1216720900	JHON EDISSON HENAO HERRERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.464.732	$ 554.400	(EPS010) EPS SURA	$ 3.464.732	$ 138.600	6,960	$ 3.464.732	$ 241.200	(CCF04) COMFAMA	$ 3.464.732	$ 138.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.072.800
CC 13461111	EBERTO RICARDO CADRAZCO LEON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.356.218	$ 377.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.356.218	$ 94.300	6,960	$ 2.356.218	$ 164.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.356.218	$ 94.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 729.600
CC 15485477	LEON ALBERTO OQUENDO URREGO	01	00														L			0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 198.000	$ 31.700	(EPS010) EPS SURA	$ 198.000	$ 8.000	0,000	$ 198.000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 198.000	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.700
CC 15485477	LEON ALBERTO OQUENDO URREGO	01	00														X			0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 396.000	$ 63.400	(EPS010) EPS SURA	$ 396.000	$ 15.900	0,000	$ 396.000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 396.000	$ 15.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.200
CC 15485477	LEON ALBERTO OQUENDO URREGO	01	00										X							0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 1.491.323	$ 238.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.491.323	$ 59.700	6,960	$ 1.491.323	$ 103.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.491.323	$ 59.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 461.900
CC 39179190	SANDRA MARCELA ECHEVERRY	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.315.851	$ 370.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.315.851	$ 92.700	0,522	$ 2.315.851	$ 12.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.315.851	$ 92.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 568.100

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 08/09/2026 | **Empresa NI901393630 ELECTROSERVICIOS GILBERTO VALENCIA SAS** | **Planilla Nro: 88052703** | **Periodo Cotización: agosto de 2026** | **Periodo Servicio: septiembre de**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 43048067	PATRICIA ELENA ZAPATA CARMONA	01	04																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1.872.000	$ 74.900	0,522	$ 1.872.000	$ 9.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.872.000	$ 74.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.600
CC 70082636	GILBERTO ANTONIO VALENCIA HERNANDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.220.004	$ 995.300	(EPS010) EPS SURA	$ 6.220.004	$ 248.900	6,960	$ 6.220.004	$ 433.000	(CCF04) COMFAMA	$ 6.220.004	$ 248.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.926.100
CC 71295492	JUAN CAMILO RESTREPO MONSALVE	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.626.724	$ 580.300	(EPS010) EPS SURA	$ 3.626.724	$ 145.100	6,960	$ 3.626.724	$ 252.500	(CCF04) COMFAMA	$ 3.626.724	$ 145.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.123.000
CC 71480675	JAIME HUMBERTO CIFUENTES CEBALLOS	01	00											X						0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 189.200	$ 30.300	(EPS010) EPS SURA	$ 189.200	$ 0	0,000	$ 189.200	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 189.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.300
CC 71480675	JAIME HUMBERTO CIFUENTES CEBALLOS	01	00										X							0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.011.098	$ 481.800	(EPS010) EPS SURA	$ 3.011.098	$ 120.500	6,960	$ 3.011.098	$ 209.600	(CCF04) COMFAMA	$ 3.011.098	$ 120.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 932.400
CC 71708197	LUIS FERNANDO USUGA FLOREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.347.990	$ 375.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.347.990	$ 94.000	6,960	$ 2.347.990	$ 163.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.347.990	$ 94.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 727.200
CC 98470473	ABLIO ANTONIO MARIN AVENDAÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.751.000	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.751.000	$ 70.100	6,960	$ 1.751.000	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.751.000	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
PT 1137342	JORGE LUIS RODRIGUEZ COLINA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.188.149	$ 350.200	(EPS010) EPS SURA	$ 2.188.149	$ 87.600	6,960	$ 2.188.149	$ 152.300	(CCF04) COMFAMA	$ 2.188.149	$ 87.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 677.700
PT 4350715	LEOMAR JOSE RIERA FRANCO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.904.828	$ 304.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.904.828	$ 76.200	6,960	$ 1.904.828	$ 132.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.904.828	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 589.800
PT 5240599	JOSE EDUARDO PÉREZ GARCIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.805.596	$ 288.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.805.596	$ 72.300	6,960	$ 1.805.596	$ 125.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.805.596	$ 72.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 559.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 53.370.163	$ 55.242.163	$ 55.242.163	$ 55.189.427	$ 8.540.500	$ 2.200.800	$ 3.365.700	$ 2.193.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.300.700	$ 0	$ 16.300.700

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ANEXO 7.

CERTIFICADO DE REVISOR FISCAL.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

El suscrito, **SERGIO ANDRES DIAZ MONTAÑEZ,** identificado con **C.C. No. 1.098.609.537 de Bucaramanga** en mi condición de **CONTADOR PÚBLICO** de la **UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN** identificada con **NIT 901.979.396 - 1**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983) cuando a ello tuvo lugar, fueron* pagados por la compañía desde el periodo comprendido entre el **01 de Agosto de 2026 al 31 de Agosto de 2026** para la ejecución del **CONTRATO DE OBRA N° 4600105555 DE 2025, CUYO OBJETO ES REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN,** Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en **Medellín, Antioquia**, a los **Tres (03)** días del mes de **Septiembre** de **2026**.

SERGIO ANDRES DIAZ MONTAÑEZ
C.C. 1.098.609.537 de Bucaramanga
Contador Público - T.P 187097-T
UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

Cordialmente,

JORGE TRUJILLO NIÑO
C.C 13.893.413 de Barrancabermeja
R/L. UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.098.609.537
DIAZ MONTAÑEZ
APELLIDOS
SERGIO ANDRES
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 01-FEB-1986
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.77
ESTATURA
B+
G.S. RH
M
SEXO
01-MAR-2004 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
A-2701900-00326728-M-1098609537-20110825
0027835625A 1
36171416


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
187097-T
SERGIO AMORES
DIAZ MONTAÑEZ
C.C. 1098609537
RESOLUCION INSCRIPCION 110
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FECHA 26/02/2014
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
198121


187681
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

ANEXO 8.

PAGO DE NOMINA.

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260801 - 20260830**
Comprobante Número:**304**
Fecha y hora de generación: **02/09/2026 - 04:06 PM**
Fecha y hora de expedición: **02/09/2026 - 04:18 PM**

Empleado: **Carlos Andres Zuñiga Benavides**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **1096247524**
Cargo: **Auxiliar de Mantenimiento**
Salario básico: **$1.750.905**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 1.750.904
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 249.096
Horas extras diurnas 125%			25.0	9	$ 99.010
Provisión de Cesantías*				0	$ 174.848
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 20.982
Provisión de Prima*				0	$ 174.848
Provisión de Vacaciones*				0	$ 73.013
				Total Ingresos	**$ 2.542.701**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 73.997
Fondo de pensión	4.00	$ 73.997
	Total Deducciones	**$ 147.994**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 2.394.707**

Observaciones:

Carlos Zuñiga
1096247524

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 2.394.707

Soporte de pago: DNE304
CUNE:
e9e7d8ba0bfb1908725adc3d59b86d8011e3019cf0ea96124c9a90baa60fb7e632881e8d42bc44d892b76563f7e4217d

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260816 - 20260830**
Comprobante Número:**315**
Fecha y hora de generación: **02/09/2026 - 04:06 PM**
Fecha y hora de expedición: **02/09/2026 - 04:18 PM**

Empleado: **Hayden Eduardo Coneo Ojeda**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **92539526**
Cargo: **Auxiliar de Mantenimiento**
Salario básico: **$1.750.905**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				7	$ 408.544
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				7	$ 58.122
Provisión de Cesantías*				0	$ 38.873
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 4.665
Provisión de Prima*				0	$ 38.873
Provisión de Vacaciones*				0	$ 17.036
				Total Ingresos	**$ 566.113**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 16.342
Fondo de pensión	4.00	$ 16.342
	Total Deducciones	**$ 32.684**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 533.429**

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo $ 533.429

HAYDEN CONEO
92539526

Soporte de pago: DNE315
CUNE:
f053ec33ad4576478487fbee5bbbc532154113c433cc9637cb3fc96d14a0bf7b27a8eb1292a3c15a2c4948700dd1071f

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260801 - 20260830**
Comprobante Número:**303**
Fecha y hora de generación: **02/09/2026 - 04:06 PM**
Fecha y hora de expedición: **02/09/2026 - 04:18 PM**

Empleado: **Jaime Stiven Palacio Acevedo**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **1096218904**
Cargo: **Auxiliar de Mantenimiento**
Salario básico: **$1.750.905**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				23	$ 1.342.360
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				23	$ 190.973
Horas extras diurnas 125%			25.0	9	$ 99.010
Incapacidad por enfermedad profesional	05/08/2026	11/08/2026		7	$ 408.544
Provisión de Cesantías*				0	$ 170.006
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 20.401
Provisión de Prima*				0	$ 170.006
Provisión de Vacaciones*				0	$ 73.013
			Total Ingresos		**$ 2.474.313**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 73.997
Fondo de pensión	4.00	$ 73.997
	Total Deducciones	**$ 147.994**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 2.326.319**

Observaciones:

1096218904
Stiven Palacio

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 2.326.319

Soporte de pago: DNE303
CUNE:
2cde0e157212cde26fea349af34e80110f81a8afad2a3c1a6fc2fc45c156aaba594bfa777cd7e52537c6d7afc8e7699d

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260801 - 20260830**
Comprobante Número:**302**
Fecha y hora de generación: **02/09/2026 - 04:06 PM**
Fecha y hora de expedición: **02/09/2026 - 04:18 PM**

Empleado: **Cristian Mena Cordoba**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **1076817116**
Cargo: **Auxiliar de Mantenimiento**
Salario básico: **$1.750.905**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				28	$ 1.634.178
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				28	$ 232.488
Horas extras diurnas 125%			25.0	5	$ 52.110
Hora extra diurna dominical o festiva			115.0	22	$ 394.370
Horas extras nocturnas dominical o festiva			165.0	4	$ 88.379
Licencia remunerada	19/08/2026	19/08/2026		1	$ 58.364
Auxilio de baño				0	$ 72.000
Provisión de Cesantías*				0	$ 204.909
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 24.589
Provisión de Prima*				0	$ 204.909
Provisión de Vacaciones*				0	$ 70.579
			Total Ingresos		**$ 3.036.875**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 89.096
Fondo de pensión	4.00	$ 89.096
	Total Deducciones	**$ 178.192**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**
Licencia no remunerada	10/08/2026	10/08/2026	1

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 2.858.683**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 2.858.683 Cristian Mena Cordoba

Soporte de pago: DNE302
CUNE:
c1d1df30770e6a173fc20eabe7ad94e9a9518167957217beb91e9526eaf08412cf6e38913792a7ea95679b6d9d432d78

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260801 - 20260830**
Comprobante Número:**298**
Fecha y hora de generación: **02/09/2026 - 04:06 PM**
Fecha y hora de expedición: **02/09/2026 - 04:18 PM**

Empleado: **Carlos Mario Gonzalez Mora**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **1049894058**
Cargo: **Auxiliar de Mantenimiento**
Salario básico: **$1.750.905**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				28	$ 1.634.178
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				28	$ 232.489
Horas extras diurnas 125%			25.0	0	$ 5.211
Recargo nocturno			35.0	8	$ 23.345
Incapacidad por enfermedad general al 100%	04/08/2026	05/08/2026		2	$ 116.727
Auxilio de baño				0	$ 64.000
Provisión de Cesantías*				0	$ 167.595
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 20.111
Provisión de Prima*				0	$ 167.595
Provisión de Vacaciones*				0	$ 73.986
			Total Ingresos		**$ 2.505.237**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 71.178
Fondo de pensión	4.00	$ 71.178
	Total Deducciones	**$ 142.356**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 2.362.881**

Observaciones:

Carlos Mario Gonzalez
1049894058

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 2.362.881

Soporte de pago: DNE298
CUNE:
22256b089c2f5438840c49266e0e26310fdeb18c20d26e15aaf99cc6c0cd9c7bf502edbeef59a80d750d3b40b6ef2b8b

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260801 - 20260830**
Comprobante Número:**309**
Fecha y hora de generación: **02/09/2026 - 04:06 PM**
Fecha y hora de expedición: **02/09/2026 - 04:18 PM**

Empleado: **Anyelo Daniel Gomez Mejia**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **1152187124**
Cargo: **Almacenista**
Salario básico: **$2.791.456**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 2.791.456
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 249.096
Horas extras diurnas 125%			25.0	1	$ 16.616
Hora extra diurna dominical o festiva			115.0	8	$ 228.634
Provisión de Cesantías*				0	$ 273.707
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 32.845
Provisión de Prima*				0	$ 273.707
Provisión de Vacaciones*				0	$ 116.404
				Total Ingresos	**$ 3.982.465**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 121.468
Fondo de pensión	4.00	$ 121.468
	Total Deducciones	**$ 242.936**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 3.739.529**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 3.739.529

Soporte de pago: DNE309
CUNE:
b2d8e495ec4e95818838786a9a111a3fd6d23982f052c6350a342b12cf6713c4974917e6b9c3621e5dd135773292160c

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260801 - 20260830**
Comprobante Número:**305**
Fecha y hora de generación: **02/09/2026 - 04:06 PM**
Fecha y hora de expedición: **02/09/2026 - 04:18 PM**

Empleado: **Brayan Esmid Palacio Acevedo**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **1096247535**
Cargo: **Auxiliar de Mantenimiento**
Salario básico: **$1.750.905**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 1.750.904
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 249.096
Horas extras diurnas 125%			25.0	9	$ 99.010
Provisión de Cesantías*				0	$ 174.848
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 20.982
Provisión de Prima*				0	$ 174.848
Provisión de Vacaciones*				0	$ 73.013
				Total Ingresos	**$ 2.542.701**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 73.997
Fondo de pensión	4.00	$ 73.997
	Total Deducciones	**$ 147.994**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 2.394.707**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 2.394.707

Brayan P
1096247535

Soporte de pago: DNE305
CUNE:
bacaed365da64d970e645ef174b0b826668c17a1ef84df659183a19d30973c7e593ff3f73a410b4c6373d68bc688035a

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260801 - 20260830**
Comprobante Número:**301**
Fecha y hora de generación: **02/09/2026 - 04:06 PM**
Fecha y hora de expedición: **02/09/2026 - 04:18 PM**

Empleado: **Moises Jesús Florez Acero**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **1069484054**
Cargo: **Auxiliar de Mantenimiento**
Salario básico: **$1.750.905**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 1.750.904
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 249.096
Horas extras diurnas 125%			25.0	3	$ 31.266
Provisión de Cesantías*				0	$ 169.204
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 20.305
Provisión de Prima*				0	$ 169.204
Provisión de Vacaciones*				0	$ 73.013
				Total Ingresos	**$ 2.462.992**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 71.287
Fondo de pensión	4.00	$ 71.287
	Total Deducciones	**$ 142.574**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 2.320.418**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 2.320.418

1069484954

Soporte de pago: DNE301
CUNE:
0ae6e172f0876b7c2843f80e15a01bc14c4016c99c456344373792a901ffe968bc825a8edc89b91287eea9e400169e40

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260801 - 20260830**
Comprobante Número:**313**
Fecha y hora de generación: **02/09/2026 - 04:06 PM**
Fecha y hora de expedición: **02/09/2026 - 04:18 PM**

Empleado: **Eric Eduardo Suarez Acosta**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **5036864**
Cargo: **Operativo**
Salario básico: **$1.750.905**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				18	$ 1.050.542
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				18	$ 149.458
Horas extras diurnas 125%			25.0	9	$ 99.010
Provisión de Cesantías*				0	$ 108.208
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 12.985
Provisión de Prima*				0	$ 108.208
Provisión de Vacaciones*				0	$ 43.808
			Total Ingresos		**$ 1.572.219**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 45.982
Fondo de pensión	4.00	$ 45.982
	Total Deducciones	**$ 91.964**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 1.480.255**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.480.255

503 6864

Soporte de pago: DNE313
CUNE:
33f683ba6396c65ac59b165ce78d957af31e616165db9c4f18776bdc148dfe44a3c8200c252871147403a2b3287fdc64

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260801 - 20260830**
Comprobante Número:**295**
Fecha y hora de generación: **02/09/2026 - 04:06 PM**
Fecha y hora de expedición: **02/09/2026 - 04:18 PM**

Empleado: **Andres Ferley Bedoya Valencia**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **1037368900**
Cargo: **Auxiliar de Mantenimiento**
Salario básico: **$1.750.905**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				24	$ 1.400.724
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				24	$ 199.276
Horas extras diurnas 125%			25.0	8	$ 88.587
Provisión de Cesantías*				0	$ 140.659
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 16.879
Provisión de Prima*				0	$ 140.659
Provisión de Vacaciones*				0	$ 58.410
			Total Ingresos		**$ 2.045.194**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 59.572
Fondo de pensión	4.00	$ 59.572
	Total Deducciones	**$ 119.144**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**
Licencia no remunerada	19/08/2026	19/08/2026	1
Licencia no remunerada	26/08/2026	30/08/2026	5

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 1.926.050**

Andres Bedoya
1037368900

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.926.050

Soporte de pago: DNE295
CUNE:
44fecfa81d412fd713a524a3e0732c489fd6e3c7a89e6ae4c663e3eea6b1cad8280d9068852930048f80cbde9fdc66b7

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260801 - 20260830**
Comprobante Número:**299**
Fecha y hora de generación: **02/09/2026 - 04:06 PM**
Fecha y hora de expedición: **02/09/2026 - 04:18 PM**

Empleado: **Jenifer del Carmen Altamiranda Diaz**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **1052982270**
Cargo: **Tecnóloga Ambiental**
Salario básico: **$2.522.400**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 2.522.400
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 249.096
Horas extras nocturnas 175%			75.0	7	$ 147.140
Provisión de Cesantías*				0	$ 243.122
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 29.175
Provisión de Prima*				0	$ 243.122
Provisión de Vacaciones*				0	$ 105.184
				Total Ingresos	**$ 3.539.239**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 106.782
Fondo de pensión	4.00	$ 106.782
	Total Deducciones	**$ 213.564**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 3.325.675**

Observaciones:

Condiciones de pago: Trámite simple (Recarga o envío) $ 3.325.675

Soporte de pago: DNE299
CUNE:
7741c92d27d66450a54753de0488f62198162e7eff334281663ead6f33bbc095a71f6a690149c2b4b63f793d86820ab6

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

Jenifer Altamiranda Diaz
CC: 1052982270

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260801 - 20260830**
Comprobante Número:**307**
Fecha y hora de generación: **02/09/2026 - 04:06 PM**
Fecha y hora de expedición: **02/09/2026 - 04:18 PM**

Empleado: **José Alcibíades Andrade Garcia**
Ciudad: **Colombia**
Identificación: **11222857**
Cargo: **Maestro de Obra**
Salario básico: **$1.750.905**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 1.750.904
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 249.096
Horas extras diurnas 125%			25.0	4	$ 41.688
Horas extras nocturnas 175%			75.0	1	$ 14.591
Recargo nocturno			35.0	8	$ 23.345
Hora extra diurna dominical o festiva			115.0	46	$ 824.593
Horas extras nocturnas dominical o festiva			165.0	4	$ 88.379
Auxilio de baño				0	$ 88.000
Provisión de Cesantías*				0	$ 249.283
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 29.914
Provisión de Prima*				0	$ 249.283
Provisión de Vacaciones*				0	$ 73.986
				Total Ingresos	**$ 3.683.062**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 109.740
Fondo de pensión	4.00	$ 109.740
	Total Deducciones	**$ 219.480**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 3.463.582**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 3.463.582

Soporte de pago: DNE307
CUNE:
ea3895ad4623ad75bfc36da31eacabb94c4c737d14b206d542b51bf0362d1e7aaa8c72e024b158208869106f08116f3c

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260801 - 20260830**
Comprobante Número:**296**
Fecha y hora de generación: **02/09/2026 - 04:06 PM**
Fecha y hora de expedición: **02/09/2026 - 04:18 PM**

Empleado: **Edwin David Santos Hernández**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **1038810427**
Cargo: **Auxiliar de Mantenimiento**
Salario básico: **$2.300.000**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 2.300.000
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 249.096
Horas extras diurnas 125%			25.0	1	$ 13.690
Recargo nocturno			35.0	8	$ 30.667
Hora extra diurna dominical o festiva			115.0	8	$ 188.381
Horas extras nocturnas dominical o festiva			165.0	2	$ 58.048
Auxilio de baño				0	$ 80.000
Provisión de Cesantías*				0	$ 236.562
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 28.387
Provisión de Prima*				0	$ 236.562
Provisión de Vacaciones*				0	$ 97.189
				Total Ingresos	**$ 3.518.582**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 103.631
Fondo de pensión	4.00	$ 103.631
	Total Deducciones	**$ 207.262**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) **$ 3.311.320**

Observaciones:

Edwin Santos
C-C 1038810427

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 3.311.320

Soporte de pago: DNE296

CUNE:
f36d25aea49bc529602dc1f593bc3c931b756773aef2dc2d8f145f113ce1ee42322d9f7df4b11782f016983d50ccbaa5

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260801 - 20260830**
Comprobante Número:**314**
Fecha y hora de generación: **02/09/2026 - 04:06 PM**
Fecha y hora de expedición: **02/09/2026 - 04:18 PM**

Empleado: **Luis Danover Lozano Rojas**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **91452201**
Cargo: **Auxiliar de Mantenimiento**
Salario básico: **$2.300.000**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 2.300.000
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				15	$ 249.096
Horas extras diurnas 125%			25.0	1	$ 13.690
Recargo nocturno			35.0	8	$ 30.667
Hora extra diurna dominical o festiva			115.0	10	$ 235.476
Horas extras nocturnas dominical o festiva			165.0	8	$ 232.190
Auxilio de baño				0	$ 80.000
Provisión de Cesantías*				0	$ 254.991
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 30.599
Provisión de Prima*				0	$ 254.991
Provisión de Vacaciones*				0	$ 97.189
				Total Ingresos	**$ 3.778.889**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 112.481
Fondo de pensión	4.00	$ 112.481
	Total Deducciones	**$ 224.962**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 3.553.927**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 3.553.927

Soporte de pago: DNE314

CUNE:
4db920557c016ac27a5d52aa3451590c16e6b986233a831910785cc5415f712386b5e3048424a3f6195a262e592580ea

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260801 - 20260830**
Comprobante Número:**293**
Fecha y hora de generación: **02/09/2026 - 04:06 PM**
Fecha y hora de expedición: **02/09/2026 - 04:18 PM**

Empleado: **Laura Marcela Padilla Giraldo**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **1017221580**
Cargo: **Auxiliar Operativa**
Salario básico: **$1.750.905**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				24	$ 1.400.724
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				24	$ 199.276
Horas extras diurnas 125%			25.0	0	$ 5.211
Incapacidad por enfermedad general al 66%	20/08/2026	23/08/2026		4	$ 233.454
Incapacidad por enfermedad general al 100%	18/08/2026	19/08/2026		2	$ 116.727
Auxilio de baño				0	$ 56.000
Provisión de Cesantías*				0	$ 162.884
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 19.546
Provisión de Prima*				0	$ 162.884
Provisión de Vacaciones*				0	$ 73.013
			Total Ingresos		**$ 2.429.719**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 70.245
Fondo de pensión	4.00	$ 70.245
	Total Deducciones	**$ 140.490**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 2.289.229**

Observaciones:

Condiciones de pago: Trámite simple (Recarga o envío) $ 2.289.229 LauraMP6

Soporte de pago: DNE293
CUNE:
2ae434c59747679977c243194beb36602fc8a6db743fbb6846d581a4b8ae24ca89d1eea10cebb6216d9f00809b55c358

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260801 - 20260830**
Comprobante Número:**294**
Fecha y hora de generación: **02/09/2026 - 04:06 PM**
Fecha y hora de expedición: **02/09/2026 - 04:18 PM**

Empleado: **Katherin Tatiana Castañeda Calle**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **1025642866**
Cargo: **Auxiliar Administrativo**
Salario básico: **$2.000.000**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				28	$ 1.866.667
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				28	$ 232.489
Provisión de Cesantías*				0	$ 174.860
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 20.983
Provisión de Prima*				0	$ 174.860
Provisión de Vacaciones*				0	$ 77.840
			Total Ingresos		**$ 2.547.699**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 74.667
Fondo de pensión	4.00	$ 74.667
	Total Deducciones	**$ 149.334**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 2.398.365**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 2.398.365

Katherin Castañeda
1.025.642.866.

Soporte de pago: DNE294
CUNE:
8e7596316a54dca0d649de89c40ce11f2964ae148550fb3ae69c932650e3124f2c37ca0c25e7d9cdd9a8b7516670c2f9

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260801 - 20260830**
Comprobante Número:**310**
Fecha y hora de generación: **02/09/2026 - 04:06 PM**
Fecha y hora de expedición: **02/09/2026 - 04:18 PM**

Empleado: **Franklin Barbosa Palomino**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **16791906**
Cargo: **Conductor - Aux. Mantenimiento**
Salario básico: **$2.312.200**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 2.312.200
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 249.096
Horas extras diurnas 125%			25.0	27	$ 378.485
Recargo nocturno			35.0	16	$ 61.658
Hora extra diurna dominical o festiva			115.0	49	$ 1.159.954
Horas extras nocturnas dominical o festiva			165.0	6	$ 175.067
Auxilio de baño				0	$ 88.000
Provisión de Cesantías*				0	$ 361.227
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 43.347
Provisión de Prima*				0	$ 361.227
Provisión de Vacaciones*				0	$ 98.990
				Total Ingresos	**$ 5.289.251**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 163.495
Fondo de pensión	4.00	$ 163.495
	Total Deducciones	**$ 326.990**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 4.962.261**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 4.962.261

Soporte de pago: DNE310

CUNE:
537e3d4c0e9b37d981280e6ac8c6c0ab5013ac4f556d71c4efce317244a09decae40927b72d7165998a9e1fda310d5db

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260801 - 20260830**
Comprobante Número:**306**
Fecha y hora de generación: **02/09/2026 - 04:06 PM**
Fecha y hora de expedición: **02/09/2026 - 04:18 PM**

Empleado: **Oscar Raul Caro Trujillo**
Ciudad: **Piedecuesta**
Identificación: **1098701110**
Cargo: **Administrador**
Salario básico: **$3.153.000**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 3.153.000
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 249.096
Horas extras diurnas 125%			25.0	5	$ 93.839
Horas extras nocturnas 175%			75.0	6	$ 157.650
Hora extra diurna dominical o festiva			115.0	11	$ 355.088
Horas extras nocturnas dominical o festiva			165.0	7	$ 278.515
Provisión de Cesantías*				0	$ 357.123
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 42.855
Provisión de Prima*				0	$ 357.123
Provisión de Vacaciones*				0	$ 131.480
				Total Ingresos	**$ 5.175.769**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 161.524
Fondo de pensión	4.00	$ 161.524
	Total Deducciones	**$ 323.048**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 4.852.721**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 4.852.721

Soporte de pago: DNE306
CUNE:
05e47beb097c5a7657014e3a451f27f7fc1c13d742d3f93911deb9762ba93ff1f6a362dfd74fcdcdf3571471fd6a0293

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260801 - 20260830**
Comprobante Número:**316**
Fecha y hora de generación: **02/09/2026 - 04:06 PM**
Fecha y hora de expedición: **02/09/2026 - 04:18 PM**

Empleado: **William Albeiro Chavarria Builes**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **98681775**
Cargo: **Auxiliar de Mantenimiento**
Salario básico: **$2.100.000**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 2.100.000
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 249.096
Horas extras diurnas 125%			25.0	3	$ 43.750
Recargo nocturno			35.0	8	$ 28.000
Hora extra diurna dominical o festiva			115.0	6	$ 129.000
Auxilio de baño				0	$ 80.000
Provisión de Cesantías*				0	$ 212.402
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 25.488
Provisión de Prima*				0	$ 212.402
Provisión de Vacaciones*				0	$ 88.738
				Total Ingresos	**$ 3.168.876**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 92.030
Fondo de pensión	4.00	$ 92.030
	Total Deducciones	**$ 184.060**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 2.984.816**

Observaciones:

W- U.I-
98681775

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 2.984.816

Soporte de pago: DNE316
CUNE:
f8c6978ce26faa4baf413430b51370b011267f594477d86dd36f0bdc8632af9b261aa87efb4e1d24b3ff0b4534f7c7dd

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260801 - 20260830**
Comprobante Número:**300**
Fecha y hora de generación: **02/09/2026 - 04:06 PM**
Fecha y hora de expedición: **02/09/2026 - 04:18 PM**

Empleado: **Simeon Fernando Vivas Mandon**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **1065913019**
Cargo: **Auxiliar de Mantenimiento**
Salario básico: **$2.000.000**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				29	$ 1.933.333
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				29	$ 240.792
Horas extras diurnas 125%			25.0	1	$ 11.904
Recargo nocturno			35.0	12	$ 40.000
Hora extra diurna dominical o festiva			115.0	10	$ 204.762
Horas extras nocturnas dominical o festiva			165.0	8	$ 201.905
Auxilio de baño				0	$ 76.000
Provisión de Cesantías*				0	$ 219.304
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 26.316
Provisión de Prima*				0	$ 219.304
Provisión de Vacaciones*				0	$ 82.288
				Total Ingresos	**$ 3.255.908**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 95.676
Fondo de pensión	4.00	$ 95.676
	Total Deducciones	**$ 191.352**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**
Licencia no remunerada	14/08/2026	14/08/2026	1

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 3.064.556**

Observaciones:

Fernando vivas
1065913019

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 3.064.556

Soporte de pago: DNE300

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260801 - 20260830**
Comprobante Número:**308**
Fecha y hora de generación: **02/09/2026 - 04:06 PM**
Fecha y hora de expedición: **02/09/2026 - 04:18 PM**

Empleado: **Christian Barbosa Yepes**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **1151966785**
Cargo: **Conductor - Aux. Mantenimiento**
Salario básico: **$2.312.200**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 2.312.200
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 249.096
Horas extras diurnas 125%			25.0	5	$ 75.697
Auxilio de baño				0	$ 72.000
Provisión de Cesantías*				0	$ 219.662
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 26.359
Provisión de Prima*				0	$ 219.662
Provisión de Vacaciones*				0	$ 96.419
				Total Ingresos	**$ 3.271.095**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 95.516
Fondo de pensión	4.00	$ 95.516
	Total Deducciones	**$ 191.032**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 3.080.063**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 3.080.063

Soporte de pago: DNE308
CUNE:
26551199094fac894bc9ddaad7268fb11c79f841b22c27ef7e0ddfb6108f985b24e4f051b2e47bdaaddbe7583835408c

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260801 - 20260830**
Comprobante Número:**291**
Fecha y hora de generación: **02/09/2026 - 04:06 PM**
Fecha y hora de expedición: **02/09/2026 - 04:18 PM**

Empleado: **Juan José Roa Silva**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **1000537976**
Cargo: **Auxiliar de Mantenimiento**
Salario básico: **$2.100.000**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 2.100.000
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 249.096
Horas extras diurnas 125%			25.0	2	$ 25.000
Auxilio de baño				0	$ 72.000
Provisión de Cesantías*				0	$ 197.762
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 23.731
Provisión de Prima*				0	$ 197.762
Provisión de Vacaciones*				0	$ 87.570
				Total Ingresos	**$ 2.952.921**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 85.000
Fondo de pensión	4.00	$ 85.000
	Total Deducciones	**$ 170.000**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 2.782.921**

Observaciones:

Juan José Roa Silva
1000537976

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 2.782.921

Soporte de pago: DNE291
CUNE:
529f52b516965897b5f44c318209d2e53e384bcb363ba51c96c9bd3ec499f3be0713192d7324206c8a60e7e5ec97035b

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260801 - 20260830**
Comprobante Número:**297**
Fecha y hora de generación: **02/09/2026 - 04:06 PM**
Fecha y hora de expedición: **02/09/2026 - 04:18 PM**

Empleado: **Yeison Alejandro Galeano Parra**
Ciudad: **Bello**
Identificación: **1039597832**
Cargo: **Oficial**
Salario básico: **$1.750.905**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 1.750.904
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 249.096
Horas extras diurnas 125%			25.0	0	$ 5.211
Recargo nocturno			35.0	8	$ 23.345
Auxilio de baño				0	$ 72.000
Provisión de Cesantías*				0	$ 168.979
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 20.277
Provisión de Prima*				0	$ 168.979
Provisión de Vacaciones*				0	$ 73.986
				Total Ingresos	**$ 2.532.777**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 71.178
Fondo de pensión	4.00	$ 71.178
	Total Deducciones	**$ 142.356**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 2.390.421**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 2.390.421

1039597832
Yeison Galeano

Soporte de pago: DNE297
CUNE:
d013b8f83ba9a0f193175f3753df2f6539a1fcdf7d3c1a9e802a580bd7aa1e4415016560fdeab7af67c4995f683cddae

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260801 - 20260830**
Comprobante Número:**292**
Fecha y hora de generación: **02/09/2026 - 04:06 PM**
Fecha y hora de expedición: **02/09/2026 - 04:18 PM**

Empleado: **Carlos Alberto Diaz Peña**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **1017144470**
Cargo: **Residente Técnico**
Salario básico: **$7.300.000**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 7.300.000
Horas extras diurnas 125%			25.0	4	$ 173.810
Horas extras nocturnas 175%			75.0	21	$ 1.277.500
Hora extra diurna dominical o festiva			115.0	7	$ 523.166
Horas extras nocturnas dominical o festiva			165.0	8	$ 736.952
Bonificaciones ocasionales				0	$ 400.000
Provisión de Cesantías*				0	$ 833.952
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 100.074
Provisión de Prima*				0	$ 833.952
Provisión de Vacaciones*				0	$ 304.410
			Total Ingresos		**$ 12.483.816**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 400.457
Fondo de pensión	4.00	$ 400.457
Fondo de solidaridad pensional	1.00	$ 100.114
Retefuente		$ 352.884
	Total Deducciones	**$ 1.253.912**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 11.229.904**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 11.229.904

Soporte de pago: DNE292

CUNE:
8aa679d5786e609476f10c8656f45f9fa51aec96740957e0ba6ead6a8714809d0ce0588d821554960bb42d4595d8bd28

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396
DG 62 43 151
Tel: 6073125486349
Barrancabermeja - Colombia
uniontemporalsitmedellin@gmail.com

Periodo de Pago: **20260801 - 20260830**
Comprobante Número:**312**
Fecha y hora de generación: **02/09/2026 - 04:06 PM**
Fecha y hora de expedición: **02/09/2026 - 04:18 PM**

Empleado: **Maria Victoria Durango Arenas**
Ciudad: **Medellín**
Identificación: **42683289**
Cargo: **Auxiliar de residencia**
Salario básico: **$5.255.000**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 5.255.000
Provisión de Cesantías*				0	$ 437.742
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 52.529
Provisión de Prima*				0	$ 437.742
Provisión de Vacaciones*				0	$ 219.134
				Total Ingresos	**$ 6.402.147**

*Las provisiones hacen parte del valor total a pagar al empleado.

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 210.200
Fondo de pensión	4.00	$ 210.200
	Total Deducciones	**$ 420.400**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 5.981.747**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 5.981.747

Soporte de pago: DNE312
CUNE:
b89fca9ee5856229d79e2872a2ba038fcb44e9ffcbc46168b022f8f1b8120f50e0ca5cbd7da9f2f5d86c0e2ed169e259

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

Maria Victoria Durango
CC 42683289

ANEXO 9.

PAGO A PROVEEDORES

SOLDAMOS Y PINTAMOS S.A.S.

Nit 901674840 - 0

CL 56 54 106 , MEDELLIN
Tel. 3216876696 Cel. 3216876696
SOLDAMOSYPINTAMOS@GMAIL.COM
AUTORIZACION 18764079345431 DE 2024-09-11 DE FSYP1 HASTA FSYP10000 VIGENCIA 24 MESES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FSYP-1130

CLIENTE
UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN Nit: 901979396 - 1 DG 62 43 151, BARRANCABERMEJA Tel. 3125486349 3188087109 Mail. uniontemporalsitmedellin@gmail.com

PEDIDO No.	BODEGA
	Bod 4001 **VENTAS CLIENTES AL DETAL TARIFA GENERAL**
ORDEN COMPRA	**VENDEDOR**
OC278	2 RONNY JAVIER HERNANDEZ RINCON
FORMA DE PAGO	**MEDIO DE PAGO**
CREDITO	INSTRUMENTO NO DEFINIDO
OBSERVACIÓN	
CORTE OC278 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCION DEL 1 AL 31 AGOSTO 2026.	

FECHA FACTURA
2026/09/01 10:54 AM
FECHA VALIDACIÓN
2026/09/01 10:54 AM
FECHA VENCIMIENTO
2026/09/01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VAL. UNITARIO	IVA%	VAL. TOTAL
1	41206001	Suministro Tapa en lámina alfajor CAL- 18 de 050 x 050cm medidas exteriores. Acabado en pintuta electrostatica	36	221,299	19	9,480,449.16
2	41206001	Suministo Marco-STapa 050 x 050cm 2 x 14. Incluye anclaje en varillas de 14 para fijación y acabado en pintuta electrostatica	36	112,608	19	4,824,126.72
3	41206001	Suministro Tapa en lámina alfajor CAL- 18 de 060 x 060cm medidas exteriores. Acabado en pintuta electrostatica	10	237,946	19	2,831,557.40
4	41206001	Suministo Marco-STapa 060 x 060cm 2 x 14. Incluye anclaje en varillas de 14 para fijación y acabado en pintuta electrostatica	10	164,506	19	1,957,621.40
5	41206001	Suministro de Gabinete para controlador local en lámina HR CAL-3mm. Con sus debidos rals internos en CR Cal - 18	7	3,302,600	19	27,510,658
6	41206001	Realces	10	360,000	19	4,284,000
7	41206001	Suministro de ménsula galvanizada 4.5m	10	2,167,152	19	25,789,108.80
8	41206001	Suministro de poste recto de enterramiento directo	10	1,130,000	19	13,447,000

Autorizo ampliamente a SOLDAMOS Y PINTAMOS S.A.S. para que en forma permanente, reporte, procese, consulte, conserve, suministre y actualice la información relacionada con el nivel de endeudamiento y manejo crediticio, lo cual podrá realizar con la Asociación Bancaria, Asociación de Entidades Financieras de Colombia, cualquier entidad del sector Financiero y con cualquier fuente o central de información legalmente autorizada. Información que se reflejará en la base de datos, de las mencionadas entidades, en las cuales se consignará de manera completa, todos los datos referentes a mi actual y pasada trayectoria comercial frente a SOLDAMOS Y PINTAMOS S.A.S..

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORROS DE DAVIVIENDA NÚMERO 550037400244630

Factura enviada al email: uniontemporalsitmedellin@gmail.com

TOTAL ITEMS	8
TOTAL UNIDADES	129
SUBTOTAL	75,734,892
IVA 19%	14,389,629.48
RETENCIÓN 2.5%	1,893,372.30
VALOR TOTAL	88,231,149.18

CUFE



66e5374da2e79b2e04d32ea9b161e73c633b08bf4360b296a9d286560d41963a62d149e44a0bbfb9ea563496cf860fa7

SOLDAMOS Y PINTAMOS S.A.S. 901674840 - 0. Software Propio

SYPMARICELA
01 / 09 / 2026 10:54:04

Esta factura fue generada por EQUILIBRIUM.
www.begranda.com | NIT: 901215368-7

Número del registro
1

Fecha de aplicación
31 Ago 2026

Nombre del destinatario
Indumecanizados In

Identificación destinatario
901197070

Producto destino
60997143968

Tipo de producto
Ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 3.273.250,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Referencia
O C 290 INDUMECANIZA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 10.

SUMINISTROS DE AGOSTO

Solicitud de Elementos de Amoblamiento de la red de semaforos
Contrato No. 4600105555 de 2025

Objeto:
Ampliación, Reposición Y Mantenimiento de La Red de Semáforos

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

DE: SECRETARIA DE MOVILIDAD

PARA: UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

31 de Agosto 2026			
Descripción	**Medida**	**Cant.**	**Fecha**
Suministros			
Suministro de ménsula galvanizada (poste recto con platina y brazo de L= 4,5m), con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla normas para espesores de tubería, pintura y adherencia. Incluye elementos de fijación y tapones.	und	10	31/08/2026

Mario A. Ruiz L.
Supervisor
SMM

Contratista

Interventoría

Solicitud de Elementos de Amoblamiento de la red de semaforos
Contrato No. 4600105555 de 2025

Objeto:
Ampliación, Reposición Y Mantenimiento de La Red de Semáforos

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

DE: SECRETARIA DE MOVILIDAD

PARA: UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

31 de Agosto 2026			
Descripción	**Medida**	**Cant.**	**Fecha**
Suministros			
suministro de protector de sobre cargas electricas para controlador local	und	8	31/08/2026

Mario A. Ruiz L.
Supervisor
SMM

Contratista

Interventoría

Solicitud de Elementos de Amoblamiento de la red de semaforos
Contrato No. 4600105555 de 2025

Objeto:
Ampliación, Reposición Y Mantenimiento de La Red de Semáforos

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

DE: SECRETARIA DE MOVILIDAD

PARA: UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

31 de Agosto 2026			
Descripción	**Medida**	**Cant.**	**Fecha**
Suministros			
suministro de switch capa 3 de fibra optica	und	64	31/08/2026

Mario A. Ruiz L.

Supervisor
SMM

Contratista

Interventoría

Solicitud de Elementos de Amoblamiento de la red de semaforos

Contrato No. 4600105555 de 2025

Objeto:

Ampliación, Reposición Y Mantenimiento de La Red de Semáforos

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

DE: SECRETARIA DE MOVILIDAD

PARA: UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

31 de Agosto 2025			
Descripción	**Medida**	**Cant.**	**Fecha**
Suministros			
Suministro de poste recto de enterramiento directo, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores de tubería y pintura y lo mismo que adherencia.	und	10	31/08/2026

Mario A. Ruiz L.

Supervisor
SMM

Contratista

Interventoría

Solicitud de Elementos de Amoblamiento de la red de semaforos
Contrato No. 4600105555 de 2025

Objeto:
Ampliación, Reposición Y Mantenimiento de La Red de Semáforos

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

DE: SECRETARIA DE MOVILIDAD

PARA: UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

31 de Agosto 2026			
Descripción	**Medida**	**Cant.**	**Fecha**
Suministros			
Suministro de Tornillos de 5/8 " para cajas de hasta 60 x 60 cm, según especificaciones de la Secretaría de Movilidad de Medellín	und	92	31/08/2026

Mario A. Ruiz L.

Supervisor
SMM

Contratista

Interventoría

Solicitud de Elementos de Amoblamiento de la red de semaforos
Contrato No. 4600105555 de 2025

Objeto:
Ampliación, Reposición Y Mantenimiento de La Red de Semáforos

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

DE: SECRETARIA DE MOVILIDAD

PARA: UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

31 de Agosto 2026			
Descripción	**Medida**	**Cant.**	**Fecha**
Suministros			
Suministro de marco de 60x60 cm, en ángulo de 2"x2"x1/4" y acabado en pintura anticorrosiva. Incluye tapa de seguridad en lámina de alfajor calibre 1/8" de 60x60 cm medida exterior anclajes en varillas de 1/4" para fijación del marco	und	10	31/08/2026

Mario A. Ruiz L.
Supervisor
SMM

Contratista

Interventoría

Solicitud de Elementos de Amoblamiento de la red de semaforos

Contrato No. 4600105555 de 2025

Objeto:

Ampliación, Reposición Y Mantenimiento de La Red de Semáforos

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

DE: SECRETARIA DE MOVILIDAD

PARA: UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

31 de Agosto 2026			
Descripción	**Medida**	**Cant.**	**Fecha**
Suministros			
Suministro de tapa de 60x60 cm, en ángulo de 2"x2"x1/4" y acabado en pintura anticorrosiva.	und	10	31/08/2026

Mario A. Ruiz L.

Supervisor
SMM

Contratista

Interventoría

Solicitud de Elementos de Amoblamiento de la red de semaforos
Contrato No. 4600105555 de 2025

Objeto:
Ampliación, Reposición Y Mantenimiento de La Red de Semáforos

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

DE: SECRETARIA DE MOVILIDAD

PARA: UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

31 de Agosto 2026			
Descripción	**Medida**	**Cant.**	**Fecha**
Suministros			
suministro de marco de 50x50 cm, en angulo de 2"x2"x1/4" y acabado en pintura anticorrosiva. Incluye tapa de seguridad de alfajor calibre 1/8" de 50x50 cm medida exterior y anclajes.	und	36	31/08/2026

Mario A. Pérez L.
_____
Supervisor
SMM

_____
Contratista

_____
Interventoría

Solicitud de Elementos de Amoblamiento de la red de semaforos

Contrato No. 4600105555 de 2025

Objeto:

Ampliación, Reposición Y Mantenimiento de La Red de Semáforos

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

DE: SECRETARIA DE MOVILIDAD

PARA: UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

31 de Agosto 2026			
Descripción	**Medida**	**Cant.**	**Fecha**
Suministros			
suministro de tapa de 50x50 cm, en angulo de 2"x2"x1/4" y acabado en pintura anticorrosiva.	und	36	31/08/2026

Mario A. Ruiz L.

Supervisor
SMM

Contratista

Interventoría

Solicitud de Elementos de Amoblamiento de la red de semaforos
Contrato No. 4600105555 de 2025

Objeto:
Ampliación, Reposición Y Mantenimiento de La Red de Semáforos

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

DE: SECRETARIA DE MOVILIDAD

PARA: UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

31 de Agosto 2026			
Descripción	**Medida**	**Cant.**	**Fecha**
Suministros			
Suministro de gabinete para controlador local, en lámina calibre 16. Incluye pintura anticorrosiva y esmalte gris mate. El gabinete debe incluir dos chapas adicionales para seguridad en la puerta con llave maestra.	und	7	31/08/2026

Mario A. Ruiz L.
_____
Supervisor
SMM

_____
Contratista

_____
Interventoría

ANEXO 11.

REINTEGRO DE AGOSTO

	PLAN DE CALIDAD	
		VERSIÓN 1
	REINTEGRO DE ELEMENTOS	1/09/2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBJETO: MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD
NÚMERO DEL CONTRATO	4600105555 de 2025 (UNION TEMPORAL SIT)

Entregado por: ANYELO GOMEZ M. | **Recibido por:** FRANK GARCIA

FECHA	ELEMENTO	CANTIDAD	UND	OBSERVACIÓN
6/8/2026	PLACAS DE CONTRASTES	36	UND	SINIESTROS
6/8/2026	BRAZOS DE MENSULA	10	UND	SINIESTROS
6/8/2026	DISCOS DIRECCIONALES	14	UND	SINIESTROS
6/8/2026	DISCOS PEP	2	UND	SINIESTROS
6/8/2026	ARAÑAS	10	UND	SINIESTROS
6/8/2026	FLAUTAS	10	UND	SINIESTROS
6/8/2026	CARCAZAS VEHICULARES	13	UND	SINIESTROS
6/8/2026	CARCAZAS PEATONALES	4	UND	SINIESTROS

VERIFICACIÓN

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA:		FIRMA PERSONA QUE RECIBE	
nombre	ANYELO DANIEL GOMEZ MEJIA	nombre	FRANK GARCIA
cargo	ALMACENISTA	cargo	CIOS

Scanned with CamScanner

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	PLAN DE CALIDAD	
		VERSIÓN 1
	REINTEGRO DE ELEMENTOS	1/09/2025
NOMBRE DEL PROYECTO:	OBJETO: MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD	
NÚMERO DEL CONTRATO	4600105555 de 2025	(UNION TEMPORAL SIT)

Entregado por: ANYELO GOMEZ M. **Recibido por:** FRANK GARCIA

FECHA	ELEMENTO	CANTIDAD	UND	OBSERVACIÓN
12/8/2026	CABLE ENCAUCHETADO 4X16/4X18	186	MTS	SINIESTROS
12/8/2026	SONORIZADOR CON CANASTILLA	1	UND	SINIESTROS
12/8/2026	PULSADORES DIGITAL	2	UND	REVISAR PARA UTILIZAR
12/8/2026	PULSADOR DE BOTON	2	UND	REVISAR PARA UTILIZAR
12/8/2026	BASE DE PULSADOR	1	UND	SINIESTROS
12/8/2026	SEÑAL DE MOTOS	1	UND	SINIESTROS
12/8/2026	SEÑAL PEATONAL (INFORMATIVA DESECHABLE)	1	UND	SINIESTROS
12/8/2026	POSTE DE ENTERRAMIENTO	1	UND	SINIESTROS
12/8/2026	POSTE DE MENSULA	4	UND	SINIESTROS
12/8/2026	CARCAZA DE UN ASPECTO	1	UND	SINIESTROS
12/8/2026	BRAZO DE MENSULA	1	UND	SINIESTROS
12/8/2026	BAJANTE IMC 2"	3	UND	SINIESTROS
12/8/2026	ANTENAS DE COMUNICACIÓN 192,168,100,1	1	UND	S/N (23BPTUAHU0019)
12/8/2026	ANTENAS DE COMUNICACIÓN 192,168,100,1	1	UND	S/N (23BPTUAHU0018)
12/8/2026	ANTENAS DE COMUNICACIÓN 192,168,100,1	1	UND	S/N (23BPTUAHU0016)
12/8/2026	PLACAS DE CONTRASTE	37	UND	SINIESTROS
12/8/2026	ARAÑAS	1	UND	SINIESTROS
12/8/2026	FLAUTAS	2	UND	SINIESTROS
12/8/2026	DISCOS DIRECCIONALES	1	UND	SINIESTROS

VERIFICACIÓN

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA:		FIRMA PERSONA QUE RECIBE	
nombre	ANYELO DANIEL GOMEZ MEJIA	nombre	FRANK GARCIA
cargo	ALMACENISTA	cargo	CIOS

Scanned with CamScanner

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	PLAN DE CALIDAD	
		VERSIÓN 1
	REINTEGRO DE ELEMENTOS	1/09/2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBJETO: MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600105555 de 2025 (UNION TEMPORAL SIT)

Entregado por: ANYELO GOMEZ M. | **Recibido por: FRANK GARCIA**

FECHA	ELEMENTO	CANTIDAD	UND	OBSERVACIÓN
20/8/2026	PLACAS DE CONTRASTE	82	UND	SINIESTROS
20/8/2026	MARCO CON TAPA METALICO 50X50	2	UND	SINIESTROS
20/8/2026	MARCO METALICO SIN TAPA 50X50	4	UND	SINIESTROS
20/8/2026	MARCO CON TAPA POLIPROPILENO	3	UND	SINIESTROS
20/8/2026	MARCO CON CONCRETO Y/O TAPA CONCRETO	12	UND	SINIESTROS
20/8/2026	POSTE DE ENTERRAMIENTO	5	UND	SINIESTROS
20/8/2026	POSTE DE MENSULA	1	UND	SINIESTROS
20/8/2026	BRAZO DE MENSULA	4	UND	SINIESTROS
20/8/2026	DISCO PEP	1	UND	SINIESTROS
20/8/2026	CABLE ENCAUCHETADO 4X164X18	135	MTS	SINIESTROS
20/8/2026	TAPA DE CONCRETO 50X50	2	UND	SINIESTROS

VERIFICACIÓN

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA:		FIRMA PERSONA QUE RECIBE	
nombre	ANYELO DANIEL GOMEZ MEJIA	nombre	FRANK GARCIA
cargo	ALMACENISTA	cargo	CIOS

Scanned with CamScanner

	PLAN DE CALIDAD	VERSIÓN 1
	REINTEGRO DE ELEMENTOS	1/09/2025
NOMBRE DEL PROYECTO:	OBJETO: MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD	
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600105555 de 2025	(UNION TEMPORAL SIT)

Entregado por: ANYELO GOMEZ M. **Recibido por: FRANK GARCIA**

FECHA	ELEMENTO	CANTIDAD	UND	OBSERVACIÓN
28/8/2026	PLACAS DE CONTRASTE	17	UND	SINIESTROS
28/8/2026	MARCO CON TAPA METALICO 50X50	2	UND	SINIESTROS
28/8/2026	MARCO METALICO SIN TAPA 50X50	1	UND	SINIESTROS
28/8/2026	GABINETE DE CONTROL SIN TARJETAS	2	UND	
28/8/2026	MARCO CON CONCRETO Y/O TAPA CONCRETO	2	UND	SINIESTROS
28/8/2026	HERRAJE CON TAPA 60X60 CONCRETO	1	UND	SINIESTROS
28/8/2026	DISCO PEP	1	UND	SINIESTROS
28/8/2026	CABLE ENCAUCHETADO 4X164X18	171	MTS	SINIESTROS
28/8/2026	LAMPARA PEATONAL VERDE MALAS	31	UND	SINIESTROS
28/8/2026	LAMPARA PEATONAL ROJA MALAS	26	UND	SINIESTROS
28/8/2026	LAMPARA CICLISTA VERDE MALA	6	UND	SINIESTROS
28/8/2026	LAMPARA CICLISTA ROJA MALA	6	UND	SINIESTROS
28/8/2026	CARCAZA DE SEMAFORO VEHICULAR	4	UND	SINIESTROS
28/8/2026	CARCAZA DE SEMAFORO PEATONAL	5	UND	SINIESTROS

VERIFICACIÓN

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA:		FIRMA PERSONA QUE RECIBE	
nombre	ANYELO DANIEL GOMEZ MEJIA	nombre	FRANK GARCIA
cargo	ALMACENISTA	cargo	CIOS

Scanned with CamScanner

ANEXO 12.

PLANILLAS

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTERVIAL MED 2025 · DMV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	29 07 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miercoles		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:	MTN 502		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Barbosa	1679i906			Hernan Londoño	71775731
Cristian mena					
Cristian Barbosa					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
# Cr 65	W	SN	Reporte por corte en el Grupo 5	07am		
Av Bolivariana			Instalación de 7 MTNS de Cableado			215 -
			4X18 nuevo. en poste de mensula.			
			Construcion de 8 empalmes en cajas de paso.			94 -
			Instalacion de dos lamparas de flecha (~~Roja~~ Amarilla - Verde)			218 -
		Nota:	Ductería obstruida - cajas de paso perdidas.			
& Cr 48 cll 5			Reporte por falla en acometida.			
			Vandalismo de acometida			
			Sondeo de 4 Cajas de paso por instalacion de acometida (Pendiente instalacion)			
$ Cr 51 cll 67			Retiro de Semaforo Vehicular por Vandalismo			172 -
			Retiro de Constructe			199 -
			Retiro de Constructe.		05pm	199 -

EQUIPO EN OBRA:

Hte menor - Escalera - Slinga - Hte menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Yuleny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

PLAN DE CALIDAD

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA RUTINARIO

Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4[illegible]5599 de 2025

SIT-SGC-I-001 | VERSIÓN 1 | ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA: 29 Julio 2025 DIA: Martes VEHÍCULOS:	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	X	UNIFORMES	CUMPLE SI / NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI / NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Julian Yosi Ruiz Alvarez	1000537926			Alvaro Londoño	71775731
Jaime Fernando Chivas	1003918019				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CARRERA 69- CALLE 73	SEMAFORO CENTRAL	N - S	• Suministro e instalacion de disco direccional nuevo (Frente ↑)	A		83
CARRERA 69- CALLE 73	SEMAFORO CENTRAL	E - W	• Suministro e instalacion de disco direccional nuevo (Frente ↑)	A		83
CARRERA 69- CALLE 73	SEMAFORO	S - N	• Retiro de disco direccional en mal estado • Suministro e instalacion de disco direccional nuevo (Frente ↑)	A A		179 83
CARRERA 69- CALLE 73	SEMAFORO CENTRAL	S - N	• Suministro e instalacion de disco direccional nuevo (Frente ↑)	A		83
CARRERA 69- CALLE 73	SEMAFORO CENTRAL	W - E	• Retiro de disco direccional en mal estado • Suministro e instalacion de disco direccional nuevo (Frente ↑)	A A		179 83

EQUIPO EN OBRA: Slinga Arnes Mpe Menor - Escalera

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Dueny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN 2025 BMV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	29 julio 2025	TIEMPO	SECO	✓	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miercoles		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Juan Jose Rios Silva	1001539776			Alvaro Londoño	71775731
Edwin Fernando Urrea	1065913610				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CARRERA 69 - CALLE 67	E	S-N	• Suministro e instalación de disco direccional nuevo (Frente ↑)	A		83
CARRERA 53 - CALLE 67	Separador central	S-N	• Retiro de disco direccional en mal estado • Suministro e instalación de disco direccional nuevo (Giro derecha ↱)	A A		179 83
CARRERA 53 - CALLE 67	Separador central	W-E	• Retiro de disco direccional en mal estado • Suministro e instalación de disco direccional nuevo (Frente ↑)	A A		179 83
CARRERA 51 - CALLE 67	S-W	N-S	• Retiro de disco direccional en mal estado • Suministro e instalación de disco direccional nuevo (Frente ↑)	A A		179 83
CARRERA 51 - CALLE 67	W-N	E-W	• Retiro de disco direccional en mal estado • Suministro e instalación de disco direccional nuevo (Frente ↑)	A A		179 83

EQUIPO EN OBRA:

Arnes - eslinga - llave menor - Escalera

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO MTTO SEMAF. MED 2025 / RAY	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA / ...IARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoria No. 4[illegible] 5599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA: 29 Julio 2025 DIA: Martes VEHÍCULOS:	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN		UNIFORMES	CUMPLE SI NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Juan Jose Rua Silva	1000[illegible]946			Alvaro Londoño	71775771
Jhoan Fernando Uribe	1065915014				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CARRERA 51 - CALLE 67	N - E	S - N	• Retiro de disco direccional mal estado • Suministro e instalación de disco direccional nuevo (Frente ↑)			179 83
CARRERA 51 - CALLE 67	W - S	E - W	• Retiro de disco direccional en mal estado • Suministro e instalación de disco direccional nuevo (Frente ↑)			179 83
CARRERA 45 - CALLE 66	W - S	W - E	• Retiro de disco direccional en mal estado • Suministro e instalación de disco direccional nuevo (Frente izquierda ↰)			179 83
CARRERA 45 - CALLE 66	W - N	E - W	• Retiro de disco direccional en mal estado • Suministro e instalación de disco direccional nuevo (Frente ↑)			179 83
CARRERA 45 - CALLE 66	W - N	E - W	• Retiro de disco direccional en mal estado Suministro e instalación de disco direccional nuevo (Giro derecha ↱)			179 83

EQUIPO EN OBRA:

Slinga - Arnex - Ute Menor - Escalera

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Gleny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSTRUCCIÓN AVE. FARO MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	29/07/2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miercoles		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Carlos Gonzalez	1049894058			Jose D. Cortes	109572 733
Laura Padilla	1017227500				
Yeison galeano	1039597032				
Jose Andrade	11222857				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
C52-C1125	S-E	S-N	lavado de Semaforo Vehicular de Poste	08:30		234
			lavado de semaforo Peatonal de Poste			231
			lavado de disco direccional			236
			lavado de poste recto.			230
	W-N	E-W	lavado de Semaforo Vehicular de 4 aspectos			234
			lavado de Semaforo Peatonal de poste			231
			lavado de disco direccional			236
			lavado de poste recto			230
	Carril Central	S-N	lavado de Semaforo Vehicular de Poste			234
			lavado de Semaforo Peatonal #2			231
			lavado de semaforo ciclista			231
			lavado de disco direccional			236
			lavado de poste recto			230
	W-N	W-E	lavado de Semaforo Peatonal de Poste			231
			lavado de poste recto			230

EQUIPO EN OBRA:

Arnes - Eslinga - Escalera - Alta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA

ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	RESPONSABLE INTERVENTORÍA APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Dueny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO SEMAFOROS MED 2025 · UNIÓN TEMPORAL SEMAFOROS MEDELLÍN · RAV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	29/07/26	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miercoles		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Carlos Gonzalez	1049894958			Jose D. Cortes	109
Laura Padilla	1017227580				
Neison Galeano	1039597932				
Jose Andrade	1122[illegible]057				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 52- C1125	N-W	S-N	lavado de Semaforo Peatonal de Poste			231
			lavado de semaforo ciclista #2			231
			lavado de Poste recto			230
	Central	S-N	lavado de semaforo ciclista de poste			231
			lavado de semaforo Peatonal de Poste #2			231
			lavado de Poste recto			230
	S-W	N-S	lavado de Semaforo vehicular de poste			234
			lavado de Semaforo Peatonal de Poste			231
			lavado de Poste recto			230
	Central	N-S	lavado de Semaforo vehicular de Poste			234
			lavado de semaforo Peatonal #2			231
			lavado de Semaforo ciclista			231
			lavado de disco direccional			236
			lavado de Poste recto.		12:00	230

EQUIPO EN OBRA:

Slinp - Aveo - Ita menor - Escalera

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	VERSIÓN 1
	Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	29/07/2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	Miercoles		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Carlos Gonzalez	1049894058			Jose Daniel Cortes	1098727131
Laura Padilla	1017221580				
Yerson Galeano	1039597832				
Jose Andrade	11222857				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr52-Cl177	Costado	S-N	lavado de semaforo vehicular #2	07:00		231
			lavado de semaforo Peatonal #2			231
			lavado de semaforo vehicular de Poste			234
			lavado de disco direccional			236
			lavado de Poste recto.			230
	S-W	N-S	lavado de semaforo vehicular de poste			234
			lavado de semaforo Peatonal #2			231
			lavado de semaforo ciclista #2			231
			lavado de disco direccional			236
			lavado de Poste recto			230
Cr52-Cl19A	N-E	S-N	lavado de semaforo vehicular de poste			234
			lavado de semaforo Peatonal de Poste			231
			lavado de disco direccional			236
			lavado de disco de pulsador			236
			lavado de pulsador			232
			lavado de Poste recto			230

EQUIPO EN OBRA:

Dumper - slinga - Mc menor - Escalera

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	29/07/26	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miercoles		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Carlos Gonzalez	1049894058			Jose D Cortes	108 822 783
Laura Padilla	1017227580				
Nelson Galeano	1039597832				
Jose Andrade	11222857				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
C52-C114A	S-W	N-S	lavado de semaforo Vehicular de Poste			234
			lavado de Semaforo Peatonal de Poste			231
			lavado de disco direccional			236
			lavado de disco de Pulsador			236
			lavado de Pulsador			232
			lavado de poste recto			230
C52-C112Sur	W-N	E-W	Lavado de semaforo Vehicular de Poste			234
			lavado de semaforo Peatonal de poste			231
			lavado de disco direccional			236
			lavado de Poste recto			230
	W-N	N-S	lavado de semaforo vehicular de poste			234
			lavado de Semaforos vici usuario #2			231
			lavado de semaforo Peatonal de Poste			231
			lavado de disco direccional			236
			lavado disco boton para Peatones			236
			lavado de Sonorizador			232
			lavado de poste recto			230

EQUIPO EN OBRA:

Slinga - Arnes - Hte mar - Escalera

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

617

PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	29/07/2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miercoles		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VÉHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Carlos Gonzalez	1049894058			Jose David Cubi	1037822713
Laura Padilla	1017277580				
Yeison galeano	1059597832				
Jose Andrade	71222857				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 52	Carril C	N-S	lavado de disco boton para Peatones			236
Cll 2 Sur			lavado de sonorizador			232
			lavado de Poste de sonorizador.			230
	Carril C	S-N	lavado de semaforo peatonal de poste #2			231
			lavado de semaforo vehicular de poste			234
			lavado de disco direccional			236
			lavado de disco boton para Peatones			236
			lavado de sonorizador			232
			lavado de poste recto			230
	Carril C	N-S	lavado de disco boton para Peatones			236
			lavado de sonorizador			232
			lavado de Poste de sonorizador			230
	W-S	S-N	lavado de disco boton para Peatones			236
			lavado de sonorizador			232
			lavado de Poste de sonorizador			230

EQUIPO EN OBRA:

Arnes eslinga Ala Menor - Escalera

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	29/07/2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miercoles		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Carlos Gonzalez	1049894058			Jose D. Cortes	109 812 737
Laura Padilla	1017221580				
Yeison Galeano	1039597832				
José Andrade	71222857				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 52	N-E	E-W	lavado de Semaforo Peatonal de Poste			231
Cll 2Sur			lavado de disco bolau Para Peatones			236
			lavado de sonorizador			2325
			lavado de Poste recto			230
	S-W	N-S	lavado de semaforo Peatonal			231
			lavado de Poste recto			230
	S-W	N-S	lavado de Semaforo Peatonal			231
			lavado de Poste recto			230
	Cont IC	N-S	lavado de semaforo Peatonal de Poste #2			231
			lavado de disco bolau Para Peatones			236
			lavado de sonorizador			2325
			lavado de Poste recto.			230

EQUIPO EN OBRA:

Bimex slinga Hha Acmor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

217

PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	29/07/2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miercoles		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VÉHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Carlos Gonzalez	1049894038			Jose D Cortes	1053827131
Laura Padilla	1017221580				
Yeison galeano	1039597032				
Jose Andrade	11222857				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cll 52	E-S	W-E	lavado de Semaforo Peatonal			231
Cll 2Sur			lavado de disco boton para Peatones			236
			lavado de Sonorizador			232
			lavado de Poste recto			230
	E-S Par-Sur	W-E	lavado de disco boton para Peatones			236
			lavado de Sonorizador			232
			lavado de Poste de Sonorizador		16:00	230

EQUIPO EN OBRA:

Grua - eslinga - Ute Mixer - Escalera

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	29-07-2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miercoles		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:	WLY 892		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Cesar Sanchez	1038806800			Alexis Londoño	71785731
Miguel Villegas	1018229962				
Jean carlos usuga	1214729945				
Ernes Torres	1028030487				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* CR 63AA CL 43C.			Revisión de cruce con Problemas	14:30		
			Revisión y medición de tensión en acometida			
			electrica : 108 V "AC" fase caida en acometida			261
			de alumbrado Publico.			
			Se le realiza seguimiento a cable de acometida			
			electrica de controlador local. Por caso sordo.			
			Se localiza empalme en caja sorso de alum			
			brado Publico se realizan nuevamente mediciones			
			a las dos fases y efectivamente la fase			
			donde esta conectada la acometida de semá			
			foro esta caida			
			Construcción de 1 empalme electrico en caja			94
			sorso para acometida electrica			
			Notele medida final con el controlador			
			funcionando : 117 V AC		15:45	
			Nota: Programar Soldadura de caja de puesta a			
			tierra cable y soldadura reventada			

EQUIPO EN OBRA:

Soldador - Ote Menor - Escalera

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTEPATOL MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	30-07-2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	JUEVES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	WHL737		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin santos	1038810427			Bivano londoño	71775731
simeon vilvas	1065913019				
cristian mena	1076817166				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
AV. 80 x cll 50	N-E	E-W	cambio de pulsador digital malo	7:50am		
			retiro de 1 pulsador digital a poste			177
			estalacion de 1 pulsador digital de segunda a poste		8:00Am	214
cra 52 x cll 82	N-W	N-S	cambio de cable de acometida del poste al controlador por caida de voltaje.	9:36Am		
			retiro de 4 cordones en tapa de 60x60			183
			retiro de 40 mts de cable encauchetado 2x12 para reintegro			193
			demolicion de tapa concretada de 50x50			1
			suministro estalacion de 50 mts de cable encauchetado 2x10 nuevo del poste al controlador			80
			construccion de 1 empalme electrico en conectores pivcin a poste			94
			soldada de 4 cordones en tapa de 60x80			262
			soldada de 4 cordones en tapa de 60x60			262
			concretada de 1 tapa de 50x50		7:00Pm	263

EQUIPO EN OBRA:

Soldador - 1Ppa Menor - Escalera

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Quenly Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO SIT FABOL MED 2025 DAV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	30-07-2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	JUEVES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	WHL737		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1038916427			Alvaro Londoño	7717731
Simeon Vivas	1065913019				
Cristian Mena	1076817116				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
X cvv 22 x cll 49	N-W	W-E	retiro de 1 disco direccional ↑ a poste	2:36pm		179
			suministro instalacion de 1 disco direccional ↑ nuevo a poste			83
	S-E	S-N	suministro instalación de 1 disco direccional ↑ nuevo a poste			83
	N-W	W-E	suministro instalación de 1 disco direccional ↑ nuevo a poste		3:00pm	83
✓ cvv 26 x cll 49	separador central	E-W	retiro de 1 disco direccional ↑ a poste	3:08pm		179
			suministro instalacion de 1 disco direccional ↑ nuevo a poste			83
	N-W	N-S	retiro de 1 disco direccional ↱ a poste			179
			suministro instalacion de 1 disco direccional ↱ nuevo a poste			83
	separador central	W-E	retiro de 1 disco direccional ↑ a poste			179
			suministro instalación de 1 disco direccional ↱ nuevo a poste			83
			retiro de 1 disco direccional ↑ a poste			179
			suministro instalación de 1 disco direccional ↱ nuevo a poste		4:00pm	83

EQUIPO EN OBRA:

Sinx - slinga - Ute Menor - Escalera

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA

ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	RESPONSABLE INTERVENTORÍA APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	30 07 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	MTN 502		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Barbosa	1674 1906			Alvaro Londoño	71775771
Cristian Barbosa					
Jose Roa					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 48 Cl 50	Separador	S N N S	Epm realiza el arreglo en alumbrado público.	10 am		
			Se construye empalme de acometida para la alimentación de Equipo controlaro.			94
			Se concretica cajas de paso 50 x 50 y se Tapan con pasto.			263
			Soldadura en 3 cajas 50 x 50		12 pm	262
* Cr 55 Cl 67	N	EW	Retiro de lampara Verde en mal estado peatonal			195
			Instalacion de lampara Verde Peatonal			218
			Construcion de Empalme.			94
* Cr 55 Cl 65	Separador	EW	Enderezada de Semaforo Peatonal (Golpeado)			258
* Cr 53 Cl 70	E	SN	Enderezada de Semaforo Vehicular (Golpeado)			258
Cr 49 Cl 67	N	EW	Enderezada de Semaforo Peatonal			258
			Retiro de lampara roja peatonal en mal estado			195
Cr 49 Cl 68	N	EW	Instalacion de lampara roja - construccion de Empalme			218 x 4
			Retiro de lampara Verde en mal estado			195
			Instalacion de lampara Verde dinamica - construccion Empalme			218 x 4

EQUIPO EN OBRA:

Escalera. Brocas - slings. Retroexcavadora

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

114

CONSORCIO SIT CARGIL MED 2025	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1
		ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	30/07/2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Carlos Gonzalez	1049894038			Jose D. Carlos	1098729731
Yeison Saldarriaga	1039342836				
Jose Andrade	71222857				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
C 50	E-S	S-N	lavado de Semaforo Vehicular de Poste	08:30		234
C 1137			lavado de Semaforo Peatonal de Poste			231
AV 33			lavado de disco direccional			236
			lavado de Poste recto.			230
	Carril Central	W-E	lavado de Semaforo Vehicular de Poste			234
			lavado de Semaforo Peatonal #2			231
			lavado de Poste recto.			230
	W-N	S-N	lavado de Semaforo Ciclista			231
			lavado de Semaforo Peatonal #2			231
			lavado de Poste recto			230
	Carril Central	E-W	lavado de Semaforo vehicular de Poste			234
			lavado de semaforo Peatonal #2			231
			lavado de disco direccional			236
			lavado de Poste recto			230

EQUIPO EN OBRA:

Escalera - eslinga - arnex - Llave Mayor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Odeny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

214

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	30/07/2026	TIEMPO	SECO	V	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Carlos Gonzalez	1049894058			Josep Cote	1098727131
Yeison Galeano	1039597832				
Jose Andrade	1122857				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 48-C1137	E-S	N-S	lavado de Semaforo peatonal de poste #2			231
AV - 33			lavado de poste recto			230
	Carril central	W-E	lavado de Semaforo vehicular de poste			234
			lavado de Semaforo peatonal #2			231
			lavado de disco direccional.			236
			lavado de poste recto.			230
	W-N	E-W	lavado de Semaforo peatonal de poste			231
			lavado de poste recto			230
	E-N	N-S	lavado de Semaforo vehicular de poste			234
			lavado de Semaforo peatonal			231
			lavado de disco direccional			236
			lavado de poste recto			230

EQUIPO EN OBRA:

Escalera - eslinga - arnes - Herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Ginny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTEGRAL MED 2025 · UNIÓN TEMPORAL	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	30/07/2026	TIEMPO	SECO	K	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Carlos Gonzalez	1049894058			Jose David Cortes	1097672731
Yeison Galeano	1039597852				
Jose Andrade	77222857				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 48 - Cl 137	Central	E-W	lavado de Semaforo Peatonal #2			231
AV - 33			lavado de Semaforo vehicular de Poste			234
			lavado de disco direccional			236
			lavado de Poste recto			230
Cr 45 - Cl 137	W-E	N-S	lavado de Semaforo vehiculos de Poste			234
AV. 33			lavado de disco direccional			236
			lavado de Poste recto			230
	E-S	W-E	lavado de Semaforo vehicular de poste			234
			lavado de Semaforo Peatonal			231
			lavado de disco direccional			236
			lavado de Poste recto			230

EQUIPO EN OBRA:

Eslinga - arnex - escalera - Hta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

414

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO SIT CAROL MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	30/07/26	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE		SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	jueves		LLUVIOSO			SI	✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO			NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Carlos Gonzalez	1040894058			Jose David Colis	1095727137
Yeison Galeano	1039597832				
Jose Andrade	1122B57				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 45-C137	Carril	E-W	lavado de semaforo vehicular de poste			234
AV 33	Central		lavado de semaforo peatonal			231
			lavado de disco direccional			236
			lavado de poste recto			230
	Carril	N-S	lavado de semaforo vehicular de poste			234
	Central		lavado de semaforo peatonal de poste			231
			lavado de disco direccional			236
			lavado de poste recto			230
	W-N	N-S	lavado de semaforo vehicular de poste			234
			lavado de semaforo peatonal de poste			231
			lavado de disco direccional			236
			Lavado de poste recto		16:00	230

EQUIPO EN OBRA:

Eslinga - arnex - Hta Menor - Escalera

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Gueny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	30-07-2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves		LLUVIOSO			SI		SI /		SI
VEHÍCULOS:	WLY 897.		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Cesar Santos	1038806300			Jose Cortes	709[illegible]
Miguel Villegas	1018922962				
Emiliano	1028030487				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CRA 4C L78	S-E	S-N	Retiro de 1 semaforo Vehicular en mensula	8-00		170
			Retiro de 1 semaforo Vehicular en Poste			172
			Retiro de 1 semaforo Peatonal			172
			Retiro de 1 disco direccional			179
			Retiro de 5m de cable 4x16 Semaforico			173
			Cortada de 4 cabezas de roscar en Platina de mensula.			
			Nota: Al aflojar los tuercas de la Platina de mensula se revienta 1 perno por tal motivo se vuelben a instalar los semaforos y Progra mar la instalación de 1 escuadra de Platina de mensula			
			Reinstalación de 1 semaforo Vehicular en poste			208
			Reinstalación de 1 semaforo Peatonal			208
			Reinstalación de 1 disco direccional.			220
			Retiro de 1 brazo de mensula 6.5 mtr			-
			Construcción de 42 empalmes electricos			94
					9-45	

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	30-07-2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	WLT897		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Cesar Santes	1038806300			Jose Cortes	1098727131
Miguel Villegas	1018229962				
Emis Torres	1028030487				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CRA 65 CL 80	S-E	S-N	Retiro de 1 Semaforo Vehicular a mensula	7-50		170
			Retiro de 1 Semaforo Vehicular a poste			172
			Retiro de 1 Semaforo Peatonal			178
			Retiro de 1 disco direccional "↑" Para rentrego			179
			Retiro de (3Ex4m+9m) = 21m de cable 4x16			173
			Corte de 4 conector de Pernos en Retiro de mensula			182
			Retiro de 1 mensula de 5.5m para reutilizar			166
			lavado de 2 Semaforos Vehicular			234
			lavado de 1 Semaforo Peatonal			231
			Suministro e instalación de 1 mensula de 5.5m			203
			Suministro de Arandela de tapillas para el			
			flanche de la mensula (Electroservicios)			
			Suministro de Arandela y de cuadrado para			
			destino de mensula (Electroservicios)			
			Reinstalación de 21m de cable 4x16			215
			Reinstalación de 1 Semaforo Vehicular a mensula			207
			Reinstalación de 1 Semaforo Vehicular a poste			208
			Reinstalación de 1 Semaforo Peatonal	14-00		208

EQUIPO EN OBRA:
Plataforma, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105539 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	30-07-2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Juev-s		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	WLT 897		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Cesar Sanchez	1038806300			Jose cortes	1098727731
Miguel Villegas	1018229862				
Ermis Torres	1028030887				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CRA 8 CL 80	S-E	S-N	Construcción de 3 empalmes electricos	9-30		94
			Nota: Programar la instalación de ladisco direccional "A"		14-00	
CR 63 A CL 83C			Corte de 1 Varilla soperwell natNo	15-10		
			Para poder realizar Soldadura de cable			
			Soldada de cable de puesta a tierra			
			se encuentra revestida en caso de			
			inspección de controlador local.		15-50	
CRA 7 CL 53	S-W	W-E	Enderezada de 1 semaforo Peatonal	16-10		258
			Solicitado.			
					16-35	

EQUIPO EN OBRA:
Pulidora, Planta electrica, equipo soldador, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	30 07 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	JUEVES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	ESO 669		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jonny Cifuentes	71480675	Fredy valencia	1010202372	Jose cortes	1098727191
Jose Perez	5940599	Viviana Pinto	1007162399		
Yan carlos usuga	1214729941				
Leo mar	4350715				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cra 48 x 31	S. oc	S. N	lavado de 1 poste. lavado de 1 semaforo vehicular. lavado de 1 disco	7. AM	7.20 AM	230-234-236
cra 48 x 31	S. oc	oc. oc	lavado de 1 poste. lavado de 1 semaforo vehicular. lavado de 1 semaforo peatonal lavado de 1 semaforo ciclista. lavado de 1 disco	7.20 AM	7.40 AM	230-234 / 231-236
cra 48 x 31	S. oc	S. N	lavado de 1 poste. lavado de 1 semaforo vehicular. lavado de 1 semaforo peatonal. lavado de 1 semaforo ciclista. lavado de 1 disco	7.40 AM	8. AM	230-234 / 231-236
cra 48 x 30	N. or	S. or	lavado de 1 poste. lavado de 1 semaforo peatonal. lavado de 1 semaforo ciclista	8 AM	8.20 AM	230-231
cra 48 x 30	S. oc	S-N	lavado de 1 poste. lavado de 1 semaforo vehicular. lavado de 1 semaforo peatonal. lavado de 1 semaforo ciclista. lavado de 1 disco	8.20 AM	8.40 AM	230-234 / 231-236
cra 48 x 25	N. or	N. S	lavado de 1 poste. lavado de 1 semaforo vehicular. lavado de 1 disco	8.40 AM	9. AM	230-234-236
cra 48 x 25	S. oc	S. N	lavado de 1 poste. lavado de 1 semaforo vehicular. lavado de 1 disco	9. AM	9.20 AM	230-234-236

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, ova, esfiaga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Juany Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTERVIAL EIG 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2026 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	30 07 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	ESQ 669		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime cifuentes	71480675	Fredi valencia	1017202572	Jose cortes	1098777091
Jose perez	52405 99	Viviana pinto	1017167399		
Yan carlos usuga	1214729941				
leo may	4350715				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cra 48 X 24	N-OV	S-N	lavado de 1 poste lavado de 1 semaforo peatonal	9:20 AM	9:40 AM	230-231
cra 48 X 24	S-OV	OR-OC	lavado de 1 poste. lavado de 1 semaforo vehicular. lavado de 1 semaforo peatonal, lavado de 1 disco	9:40 AM	10 AM	230-234 231-236
cra 48 X 24	S-OV	OR-OC	lavado de 1 poste. lavado de 1 semaforo ciclista	10 AM	10:40 AM	230-231
cra 48 X 24	S-OC	N-S	lavado de 1 poste. lavado de 1 semaforo peatonal	10:40 AM	11 AM	230-231
cra 48 X 24	N-OV	S-N	lavado de 1 poste, lavado de 1 semaforo vehicular, lavado de 1 semaforo peatonal. lavado de 1 disco, lavado de 1 sonorizador lavo de 1 disco PEC	11. AM	11.20 AM	230-234 231-236-232 236
cra 48 X 19A	N-OV	S-N	lavado de 1 poste, lavado de 1 semaforo vehicular, lavado de 1 ..... lavado de 1 semaforo peatonal, disco, lavado de 1 sonorizador, lavado de 1 disco PEC	11.20 AM	11:40 AM	230-234 231-236 232-236

EQUIPO EN OBRA: Escalera, arnes, eslinga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTERVIAL MEDELLÍN 2025 — DESV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	30 07 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	CSQ 669		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime espinoza	71480675	Fredi valencia	1017202572	Jose ortiz	1098772431
Jose perez	5240599	Viviana Pinto	1017623997		
Yancarlos useda	1214729941				
Leo mor	43507885				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
cra 48 X 19A	Mor	S-N	lavado de 1 Poste. lavado de 1 semaforo vehicular lavado de 1	11:40 AM	12 PM	230-234
			semaforo peatonal lavado de 1 disco, lavado de 1 sonorizador			231-236-232
			lavado de 1 disco PEC			236
cra 48 X 19A	Moc	S-N	lavado de 1 Poste. lavado de 1 semaforo vehicular, lavado de 1	1 PM	1:30 PM	230-234
			semaforo peatonal, lavado de 1 disco, lavado de 1 sonorizador			231-236-232
			lavado de 1 disco PEC			236
cra 48 X 19A	Moc	N-S	lavado de 1 Poste. lavado de 1 semaforo vehicular, lavado de 1	1:30 PM	2 PM	230-234
			semaforo peatonal, lavado de 1 disco, lavado de 1 sonorizador			231-236-232
			lavado de 1 disco PEC			236
cra 48 X 19A	Moc	N-S	lavado de 1 Poste. lavado de 1 semaforo vehicular, lavado de 1	2 PM	2:30 PM	230-234
			semaforo peatonal lavado de 1 disco, lavado de 1 sonorizador			231-236-232
			lavado de 1 disco PEC			236
cra 48 X 16A	S.oc	N-S	lavado de 1 Poste. lavado de 1 semaforo peatonal	2:30 PM	3 PM	230-231
			lavado de 1 sonorizador			232

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, arnes, eslinga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTEGRAL MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	30 07 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	JUEVES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	ESQ 669		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime Cifuentes	71480675	Freddy Valencia	1017202572	Jose Cortes	1020827491
Jose Perez	92405999	Viviana Pinto	1017202399		
Yan carlos osoba	1214729941				
Leo Mar	4350715				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
cra 48 x 18A	S-oc	S-N	lavado de 1 poste, lavado de 1 semaforo vehicular, lavado de 2 semaforos peatonales lavado de 1 disco, lavado de 1 sonorizador	8:30am	9:30pm	230-234 ✓ 231-236-232 ✓
cra 48 x 18A	S-or	or-oc	lavado de 1 poste, lavado de 1 semaforo vehicular, lavado de 1 disco lavado de 1 semaforo peatonal	8:30pm	9:50pm	230-234-236 ✓ 231 ✓
cra 48 x 18A	Nor	or-oc	lavado de 1 poste, lavado de 1 semaforo vehicular, lavado de 1 semaforo peatonal lavado de 1 disco	9:50pm	11:10pm	230-234 ✓ 231-236 ✓
cra 48 x 18A	Nor	S-N	lavado de 1 poste, lavado de 1 semaforo peatonal, lavado de 1 semaforo celesta	11:10pm	11:30pm	230-231 ✓ 231 ✓
cra 48 x 18A	Nor	S-N	lavado de 1 poste, lavado de 2 semaforo peatonales lavado de 1 sonorizador	11:30pm	11:50pm	230-231 ✓ 232 ✓

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, arnes, eslinga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Qweny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CRUCERO INTERNACIONAL 2026 | RMV

PLAN DE CALIDAD

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO

Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025

SIT-SGC-F-001
VERSIÓN 1
ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	31-07-2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	VIERNES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI ✓
VEHÍCULOS:	WHL 737		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin santos	1038810427			Jose cortes	1098727131
simon vivas	1065913019				
cristian mena	1076817716				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
X cra 79 x cll 50	N-W	N-S	cambio de herrajes en mal estado	9:00 Am		
			retiro de 2 herrajes metalicos de 50x50 en zona verde			187 -
			suministro instalacion de 2 herrajes de 50x50 nuevos			13 -
	N-E	N-S	retiro de 7 herrajes metalico de 50x50 en zona verde			187 -
			suministro instalacion de 7 herrajes de 50x50 nuevo		12:30pm	13 -

EQUIPO EN OBRA:

Planta electrica, taladro demoledor, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INTERVIAL MEDELLÍN 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	25/7/26	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Viernes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	DXT928		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Frankl. Barbosa				Jose colltes	1098727731
Christian Barbosa					
Juan Roa					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr44x C178	C	S N	Se realiza retiro conpono vehicular	7:06		172
			Se retira semaforo peatonal			172
			Se retira poste de norsula			166
			Se retira 8 Metros de cable			173
			Suministro e instalacion de realce			239
			Se instala poste de norsula nuevo.			—
			Se reinstala conpo peatonal			208
			Se reinstala semaforo vehicular			208
			Se reinstala 8 Metros de cable			215
			Se realizan 2 empalmes		1:00	94

EQUIPO EN OBRA:

herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO SIT FAROL MED 2025 · DMV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	31/07/2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Viernes		LLUVIOSO			SI X		SI X		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Carlos Gonzalez	1049894088			Jose cortes	70187471
Yelson Saleano	1039597832				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 45 - C1137	E-S	S-N	lavado de Semaforo vehicular de Poste	08:00		234
AV 33			lavado de Semaforo Peatonal			231
			lavado de disco direccional			236
			lavado de Poste recto			230
	E-S	W-E	lavado de semaforo vehicular de Poste			234
			lavado de Semaforo Peatonal			231
			lavado de disco direccional			236
			lavado de Poste recto			230
	carril central	N-S	lavado de Semaforo Peatonal de Poste			231
			lavado de Poste recto			230
	carril Central	N-S	lavado de semaforo vehicular de Poste			234
			lavado de semaforo Peatonal de Poste			231
			lavado de disco direccional			236
			lavado de Poste recto			230

EQUIPO EN OBRA:

Escalera arnes, eslinga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTEGRAL MED 2025 RyV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	31/07/26	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Viernes		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Carlos Gonzalez	1049894058			Jose cortes	1098727131
Yeison Galeano	1039597832				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 45 - C1137	Carril	S-N	lavado de semaforo Peatonal de Poste			231
AV 33	Central		lavado de Poste recto			230
	Carril	E-W	lavado de semaforo vehicular de Poste			234
	Central		lavado de semaforo Peatonal de Poste			231
			lavado de disco direccional			236
			lavado de poste recto			230
	Carril	W-E	lavado de semaforo vehicular de poste			234
	Central		lavado de disco direccional			236
			lavado de Poste recto			230
	Carril	W-E	lavado de semaforo vehicular de Poste			234
	Central		lavado de disco direccional			236
			lavado de Poste recto			230

EQUIPO EN OBRA:

Escalera tijera, eslinga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

1/4

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105566 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	31-07-2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	VIERNES		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	6		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime difunto	71480678			Jose Soltes	1095822191
Jose Perez	52405.99				
Yan carlos ospina	1214729941				
Leo Mar	43507315				

DIRECCIÓN	SENTIDO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
cra48x17	S-OC	N-S	lavado de 1 POSTE, lavado de 1 SEMAFORO VEHICULAR, lavado de 1 SEMAFORO PEATONAL, lavado de 1 SEMAFORO CICLISTA, lavado de 1 DISCO	7:10 Am	7:30 Am	230-234 231-236
cra48x17	S-OC	OC-OC	lavado de 1 POSTE, lavado de 1 SEMAFORO VEHICULAR, lavado de 1 SEMAFORO PEATONAL, lavado de 1 DISCO	7:20 Am	7:40 Am	230-234 231-236
Cra48x17	N-OC	OC-OC	lavado de 1 POSTE, lavado de 1 SEMAFORO VEHICULAR, lavado de 2 SEMAFOROS PEATONALES, lavado de 1 DISCO	7:40 Am	8 Am	230-234 231-236
Cra48x17	N-OC	N-S	lavado de 1 POSTE, lavado de 1 SEMAFORO VEHICULAR, lavado de 2 SEMAFOROS PEATONALES, lavado de 1 SEMAFORO CICLISTA, lavado de 1 DISCO	8 Am	8:20 Am	230-234 231-236
cra48x16A			lavado de 1 POSTE, lavado de 1 SEMAFORO VEHICULAR, lavado de 1 SEMAFORO PEATONAL, lavado de 1 DISCO	8:20 Am	8:40 Am	230-234 231-236
cra48x16A	N-OC	OC-OC	lavado de 1 POSTE, lavado de 1 SEMAFORO VEHICULAR, lavado de 1 SEMAFORO CICLISTA, lavado de 1 DISCO	8:40 Am	9:00 Am	230-234 231-236

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, cones, conos

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA:

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Querly Patricia Barrenechea
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

2/4

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTEGRAL MED 2025 | PHV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105535 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	31 07 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	VIERNES		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:	ESQ 669		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime Cifuentes	71480675	Fredi valencia	1017902572	Jose carter	1098727931
Jose Perez	5246599				
Yan carla useda	1214729941				
Leo Mar	4350715				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cra 48 X 16A	S-or	N-S	lavado de 1 POSTE. lavado de 1 Semaforo vehicular. lavado de 1 Semaforo	9. AM	9.20 AM	230-234
			Peatonal. lavado de 1 disco			231-236
Cra 48 X 14	S-oc	S-N	lavado de 1 POSTE lavado de 1 Semaforo vehicular. lavado de 2 semaforos	9.20 AM	9.40 AM	230-234
			Peatonales. lavado de 1 Semaforo ciclista. lavado de 1 disco			231-236
Cra 48 X 14	S-or	or-oc	lavado de 1 POSTE. lavado de 2 Semaforos Peatonales	9.40 AM	10 AM	230-231
Cra 48 X 14	N-or	N-S	lavado de 1 POSTE. lavado de 1 Semaforo vehicular. lavado de 1	10. AM	10.40 AM	230-234
			Semaforo Peatonal. lavado de 1 disco. lavado de 1 Semaforo			231-236
			ciclista. lavado de 1 disco			231-236
Cra 48 X 14	N-oc	oc-or	lavado de 1 POSTE. lavado de 1 1 Semaforo vehicular. lavado de 2	10.40 AM	11. AM	230-234
			Semaforos Peatonales. lavado de 1 disco			231-236
Cra 48 X 10	S-oc	oc-or	lavado de 1 POSTE. lavado de 1 Semaforo vehicular. lavado de 1	11 AM	11.20 AM	230-234
			Semaforo Peatonal. lavado de 1 disco			231-236

EQUIPO EN OBRA:

ES Cabrera, ayudes, est. 098

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105589 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	31 07 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	VIERNES		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	ESQ 669		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime cifuentes	71 480 675	Fredi valencia	1017202572	Jose cortes	1098777351
JOSE PAEZ	5240599				
Yan carlos usuga	1214729941				
leo mar	43507 15				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
cra 48 x 10	S-oc	oc-oc	lavado de 1 POSTE, lavado de 1 semaforo vehicular, lavado de 1 semaforo	11.20 AM	11.40 AM	230-234
			PEATONAL, lavado de 1 disco			231-236
cra 48 x 10	N-oc	oc-oc	lavado de 1 poste, lavado de 1 semaforo vehicular, lavado de 1	11.40 AM	1:50 PM	230-234
			semaforo peatonal, lavado de 1 disco cerco de 1 placa			231-236-199
cra 48 x 10	N-oc	oc-oc	lavado de 1 POSTE, lavado de 1 semaforo vehicular, lavado de 1 semaforo	11:50 AM	12 PM	230-234
			PEATONAL, lavado de 1 disco, cerco de 1 placa			231-236-199
cra 48 x 10	S-oc separador	N-S	lavado de 1 POSTE, lavado de semaforo vehicular, lavado de 1 disco	1 PM	1:10 PM	230-234-236
cra 48 x 10	S-oc	N-S	lavado de 1 poste, lavado de 1 semaforo vehicular, lavado de 1 semaforo			230-234
			PEATONAL, lavado de 1 disco			231-236
cra 48 x 10	S-oc	N-S	lavado de 1 POSTE, lavado de 1 semaforo vehicular, lavado de 1	1.10 PM	1.20 PM	230-234
			semaforo peatonal, lavado de 1 disco			231-236
cra 48 x 10	S-oc	S-N	lavado de 1 POSTE, lavado de 1 semaforo vehicular, lavado de 2 semaforos	1.20 PM		230-234

EQUIPO EN OBRA:

PEATONALES, lavado de 1 disco — 231-236

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

Escalera, andes, cuerda

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Dueny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105598 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	31.07.2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	VIERNES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	ESO 669		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime cifuentes	71480675	Fredi valencia	1017202578	Jose cortes	1098727191
Jose Perez	52405 99				
Yan carlo usuga	1214729941				
Leo mar	43507 15				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
cra48x10	S-oc	N-S	lavado de 1 POSTE. lavado de 1 semaforo vaicular, lavado de 1 disco	1:30pm	1:40pm	230-234-236
	separador					
cra48x10.	Mar	or.oc	lavado de 1 POSTE. lavado de 1 semaforo vaicular, lavado de 1	1:40pm	1:50pm	230-234
			semaforo Peatonal. lavado de 1 disco			231-236
cra48x10						
	Mar	or.oc	lavado de 1 POSTE. lavado de 1 semaforo vaicular, lavado de 1	1:50pm	2pm	230-234
	separador	-	semaforo Peatonal. lavado de 1 disco			231-236
cra48x10	Mar	S-N	lavado de 1 POSTE. lavado de 1 semaforo vaicular. lavado de 1	2pm	2:10pm	230-234
	separador		semaforo ciclista. lavado de 1 disco			231-236

EQUIPO EN OBRA:

F Scalera (ARDE) - esperando

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	VERSIÓN 1
	REINTEGRO DE ELEMENTOS	1/09/2025
NOMBRE DEL PROYECTO:	OBJETO: MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD	
NÚMERO DEL CONTRATO	4600105555 de 2025	(UNION TEMPORAL SIT)

Entregado por: ANYELO GOMEZ M. | **Recibido por: FRANK GARCIA**

FECHA	ELEMENTO	CANTIDAD	UND	OBSERVACIÓN
31/7/2026	PLACAS DE CONTRASTES	24	UND	SINIESTROS
31/7/2026	POSTE DE MENSULA	4	UND	SINIESTROS
31/7/2026	CABLE ENCAUCHETADO 4X16-4X18	562	MTS	SINIESTROS
31/7/2026	CABLE ENCAUCHETADO 2X12	33	MTS	SINIESTROS
31/7/2026	CABLE UTP NEGRO	60	MTS	SINIESTROS
31/7/2026	POSTE DE ENTERRAMIENTO	5	UND	SINIESTROS
31/7/2026	SEÑAL DE MOTOS	2	UND	SINIESTROS
31/7/2026	DISCO DIRECCIONAL	20	UND	SINIESTROS

VERIFICACIÓN

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA		FIRMA PERSONA QUE RECIBE	
nombre	ANYELO DANIEL GOMEZ MEDIA	nombre	FRANK GARCIA
cargo	ALMACENISTA	cargo	CIOS

CONEXIÓN VIAL RÁPIDO MED 2026 / BOY	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	01 08 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Sabado		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:	MTN 502		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Frantdin Bahora	16701900			Jose cortes	1098727131
Cristian mena	1076817116				
Jose Andrade	1122857				

	DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
K	Cr 51 cll 50	E	SN	Enderezada de semaforo bicicleta	6:4am		258
K	Cr 53 cll 50	E	SN	Enderezada de semaforo Peatonal			258
		W	SN	Enderezada de semaforo Peatonal			258
*	Cr 46 cll 54	W	NS	Enderezada de semaforo peatonal			258
✓	Cr 47 cll 53	E	NS	Enderezada de semaforo peatonal		07am	258
K	Cr 26A cll 49	N	WE	Construccion de caja completa de 60x60			
				Instalacion de Tapa metalica de 60x60			—
				construccion de anden		1:30 pm	

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, arnes, eslinga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Dueny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO LUZ LED MED 2025 RMV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	27/08/25	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Domingo		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:	WOL 847		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Carlos Alberto Diaz	10[illegible]70			Jose Cortes	1098727731
William Chavania	98681775				
Angelo Comet	1052187124				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 59 x cll 44	E	EW	Retiro de Semáforo o Ménsula (1 Aparato).			170
			Giro de Semaforo o Ménsula			171
			Construccion de Empalme			94
65A x calle 53	W	WE	Giro de Semáforo a Ménsula			171
			Retiro de lampara de Conteo			196
			Reinstalación de lampara de conteo y construcción de Empalme.			219-94
Carrera 57 x cll 58	S	SN	Giro de Semáforo a Ménsula			171
			Retiro de lampara de Conteo.			196
			Reinstalación de lampara de conteo y Construccion de Empalme			219-94
Carrera 57 x cll 59	N	EW	Giro de Semáforo a Ménsula			171
Carrera 52 x cll 62	W	WE	Giro de Semáforo a Ménsula			171
Carrera 45 x cll 61	W	EW	Giro de Semáforo a Ménsula			171
Carrera 45 x cll 67	E	SN	Giro de Semáforo a Ménsula			171

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Gueny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO SIT CARDL 1450 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	02 de Agosto 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Domingo.		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	WLY 897		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Carlos D. at	10H144470			Jose cortes	1098727131
William Chavarro	98681775				
Anyelo Gomez	1152187124.				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 39 x cll 88	W	WE	Giro de Semaforo a Ménsula y Retiro de Contraste.			171-
	E	EW	Giro de Semaforo a Ménsula y Retiro de Contraste.			171-
CR 32 x cll 50	W	WE	Giro de Semaforo a Ménsula y Retiro de Contraste			171-
Cr 30 x cll 47	W	WE	Giro de Semaforo a Ménsula y Retiro de Contraste.			171-
			Retiro de Lampara de Conteo.			196-
			Reinstalacion de Lampara y Construcción de Empalme.			219-94
	N	NS.	Giro de Semaforo a Ménsula y Retiro de Contraste.			171-
			Retiro de Lampara de Conteo			196-
			Reinstalacion de Lampara de conteo y Construccion de Empalme			219-94
			Cuneta de Asfalto Roto a Parcheto.			260-
Carrera 32 x cll 45	N	NS	Giro de Semaforo a Ménsula y Retiro de Contraste			171-
			Retiro de Lampara de Conteo			196-
			Reinstalacion de lampara de Conteo y Construcción de Empalme			219-94
	W	WE	Giro de Semáforo a Ménsula y Retiro de Contraste.			171-
			Retiro de lampara de Conteo.			196-
			Reinstalación de Lampara de Conteo y Construccion de Empalme			219-94

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTEGRAL 1400 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	02 de Agosto 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Domingo		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	WLY 897		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Carlos bat	1077144470			Jefe cortes	1098727431
William Chavarria	98681775				
Anyelo Comet	1152187124				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cra 61 D 30 x Cll 95	N	NS	Giro de Semaforo a Ménsola y Retiro de Contraste			171 -
			Retiro de lampara de Conteo			196 -
			Reinstalacion de lampara y construccion de Empalme.			219-94
Cra 61 D 36 x Cll 97	E	EW	Giro de Semaforo a Ménsola			171 -
			Retiro de lampara de Conteo			196 -
			Reinstalación de Lampara y Construccion de Empalme			219-94
Cra 61 D 36 x Cll 97	N	NS	Giro de Semaforo a Ménsola			171 -
			Retiro de lampara de Conteo			196 -
			Reinstalación de lampara y Construcción de Empalme.			219-94
Cra 61 D 36 x Cll 97	S	SN	Giro de Semaforo a Ménsola			171 -
			Retiro de lampara de Conteo.			196 -
			Reinstalación de lampara y Construccion de Empalme			219-94
Cra 61 D 36A x Cll 97	S	SN	Giro de Semaforo a Ménsola y Retiro de lampara de Conteo.			171-196
			Reinstalación de lampara y Construccion de Empalme			219-94

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	02 de Agosto del 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Domingo		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	WOL 897		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Carlos Diaz	1017444770			Jose Carter	1098727791
Angela Gomez	1152189129				
William Chaguaiio	98681735				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cra 10 36 x Cll 54	N	NS	Giro de Semáforo a Ménsola			171
	S	SN	Giro de Semáforo a Ménsola			171
	E	EW	Giro de Semáforo a Ménsula			171
Cra 10 36 x Cll 51	N	NS	Giro de Semáforo a Ménsola			171
	S	SN	Giro de Semáforo a Ménsola			171
	W	WE	Giro de Semáforo a Ménsola			171
Cra 10 36 x Cll 50	N	NS	Giro de Semáforo a Ménsola			171
	S	SN	Giro de Semáforo a Ménsola			171
	E	EW	Giro de Semáforo a Ménsola			171
			Retiro de lampara de Control			196
			Reinstalación de lampara de Control y Construcción de Empalme			219-94
Cra 10 36 x Cll 45	W	WE	Giro de Semáforo a Ménsola			171
			Retiro de lampara de Control			196
			Reinstalación de lampara de Control			219
			Construcción de Empalme			94

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO ILUSTRADO 2025 | UNIÓN TEMPORAL ILUMEDELLÍN | RHY

PLAN DE CALIDAD

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO

Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025

SIT-SGC-F-001 | VERSIÓN 1 | ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	3 de Agosto del 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Domingo		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	WLY897		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Carlos Alberto Diaz	1017444470			Jose cortes	1098727197
William Chavarria	98681775				
Angelo Gomez	1052187124				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 36 x cll 45	W	SN	Giro de Semaforo a Ménsula			171
			Retiro de Lampara de Cortes			196
			Reinstalación de Lampara de Cortes y Construccion de Empalme			219-94
Carrera 36A cll 40	W	WE	Giro de Semáforo a Ménsula			171
	N	NS	Giro de Semaforo a Ménsula			171
	S	SN	Giro de Semáforo a Ménsula			171
Carrera 36A cll 36	W	WE	Giro de Semáforo a Ménsula			171
	S	SN	Giro de Semáforo a Ménsula.			171
Carrera 34 x calle 41	W	WE	Giro de Semáforo a Ménsula			171
	N	NS	Giro de Semáforo a Ménsula			171
			Retiro de Lampara de Cortes			196
			Reinstalación de Lampara y Construcción de Empalme.			219-94
Carrera 37 x cll 40	S	SN	Giro de Semáforo a Ménsula.			171
	S	EW	Giro de Semaforo a Ménsula.			171

EQUIPO EN OBRA:

Vehiculo

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO SIT PARQUE MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	02 08 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Domingo		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI ✓
VEHÍCULOS:	MTN 502		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Barbosa	16791406			Jose cortes	1098727191
Jose andrade	11227857				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* Cr 46 cll 49			Se encontra apoyado cruce semaforico.	04am		—
* Cr 66D cll 30			Se presta apoyo con el Tecnico para su revision corte de cableado en el Grupo 7 (Peatonal - biciclotero.)		06:40am	
			Se construyen 3 empalmes en caja de paso en mal estado.			94
			Se construyen 4 empalmes en semaforos (peatonales y biciclotero.			94
			Pendiente el cambio de cableado por apertura de Cajas metalicas de Tigo y el cambio de fusibles en el Equipo.			
* Cr 70 cll 53	W	S N	~~Cambio de Disco~~ Retiro de Disco Direccional en mal estado (↑)			179
			Instalacion de Disco Direccional nuevo (Derecho ↑)			83
	E	S N	Retiro de Disco Direccional en mal estado (↑)			179
* Cr 73 cll 53	S	W E	Instalacion de Disco Direccional nuevo (Derecho (↑)			83
			Retiro de Disco Direccional en mal estado (↑)			179
			Instalacion de Disco Direccional nuevo Derecho (↑)		01 pm	83

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTERVIAL MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105589 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	02 08 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Domingo		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	ESQ 669		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime Cifuentes	71480675			Sobecortes	1098727151
Alberto Oquendo	154 85477				
Anyelo Gomez					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
cra 73 x 50	N-OI	OS-OC	lavado de 1 POSTE de menzula, lavado de 1 brazo de menzula, lavado de	7. AM	7.40 AM	230-229
			1 Semaforo vaicolar, lavado de 1 semaforo Peatonal lavado de 1 disco			234-233-236
			lavado de 1 Semaforo de menzula			235
cra 81A x 50	N-OC	N-S	lavado de 1 POSTE de menzula, lavado de 1 brazo de menzula, lavado de 1	7.40 AM	8.20 AM	230-229
			Semaforo vaicolar, lavado de 1 Semaforo Peatonal, lavado de 1 disco			234-233-236
			lavado de 1 Semaforo de menzula			235
cra 81A x 50	N-OI	OS-OC	lavado de 1 POSTE de menzula, lavado de 1 brazo de menzula, lavado de 1	8.20 AM	8.40 AM	230-229
			Semaforo vaicolar, lavado de 1 disco, lavado de 1 semaforo de menzula			234-236-235
cra 81B x 50	N-OI	OS-OC	lavado de 1 POSTE de menzula, lavado de 1 brazo de menzula, lavado de 2	8.40 AM	9.20 AM	230-229
			Semaforos de menzula, lavado de 1 semaforo vaicolar, lavado de 1			235-234
			de 1 Semaforo Peatonal lavado de 1 disco			231-236
cra 81B x 50	N-OC	N-S	lavado de 1 POSTE de menzula, lavado de 1 brazo de menzula, lavado	9.20 AM	10 AM	230-229
			de semaforo de menzula, lavado de 1 semaforo vaicolar			235-234
			lavado de 1 Semaforo Peatonal lavado de 1 disco			231-236

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTERVENTOR MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600108555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105589 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	02 08 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	domingo		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:	ESQ 669		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime Cifuentes	71480675			Jose Cortes	70987271
Alberto Oquendo	15483477				
Angelo Gomez					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
cra 81 B # 50	S-oc	oc-or	lavado de 1 poste de manzola, lavado de 1 brazo de manzola, lavado de 2 semaforo de manzola, lavado de 2 semaforos peatonales, lavado de 1 disco	10 AM	10.40 AM	230-229-235-234-236
cra 81 B # 50	S-oc	N-S	lavado de 1 poste de manzola, lavado de 1 brazo de manzola, lavado de 1 semaforo de manzola, lavado, lavado de 1 semaforo vehicular, lavado de 2 semaforo peatonales, lavado de 1 disco	10.40 AM	11.20 AM	230-229-235-234-231-236
cra 81 A # 50	S-oc	oc-or	lavado de 1 poste de manzola, lavado de 1 brazo de manzola, lavado de 1 semaforo de manzola, lavado de 1 semaforo vehicular, lavado de 1 semaforo peatonal, lavado de 1 disco	11.20 AM	12 PM	230-229-235-234-231-236
cra 81 A # 50	S-or	S-N	lavado de 1 poste de manzola, lavado de 1 brazo de manzola, lavado de 1 semaforo de manzola, lavado de 1 semaforo vehicular, lavado de 1 semaforo peatonal, lavado de 1 disco	12.30 PM	1 PM	230-229-235-234-231-236
cra 77 X # 50	S-oc	oc-or	lavado de 1 poste de manzola, lavado de 1 brazo de manzola, lavado de 2 semaforos de manzola, lavado de 1 semaforo vehicular, lavado de 1 semaforo peatonal, lavado de 1 disco, lavado de 1 semaforizador	1 PM	1.30 PM	230-229-235-234-231-236-232

EQUIPO EN OBRA:

lavado de 1 disco pec, cepico de 1 placa 236-199

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

plataforma

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTERVIAL MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105569 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	02 08 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	domingo		LLUVIOSO			SI ✓		SI		SI
VEHÍCULOS:	ESQ 669		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime C. Fuentes	71480675			Jose Cortes	1098727131
Alberto Oquendo	15485477				
Anyelo Gomez					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
cra 7 x 50	S-oc	oc-or	lavado de 1 poste de manzula, lavado de 1 brazo de manzula, lavado de 1 semaforo de manzula, lavado de 1 semaforo vehicular, lavado de 1 semaforo peatonal, lavado de 1 disco, retiro de 1 aviso de motos	1:30 Pm	2 Pm	230-229 235-234 231-236-180
cra 74 x 50	S-oc	S-N	lavado de 1 poste de manzula, lavado de 1 brazo de manzula, lavado de 1 semaforo de manzula, lavado de 1 semaforo vehicular, lavado de 2 semaforos peatonales, lavado de 1 disco	2 Pm	2:30 Pm	230-229 235-234 231-236
cra 73 x 50	S-oc	oc-or	lavado de 1 poste de manzula, lavado de 1 brazo de manzula, lavado de 1 semaforo de manzula, lavado de 1 semaforo vehicular, lavado de 1 semaforo peatonal, lavado de 1 disco	2:30 Pm	3 Pm	230-229 235-234 231-236
cra 70 x 50	S-oc	oc-or	lavado de 1 poste de manzula, lavado de 1 brazo de manzula, lavado de 1 semaforo de manzula, lavado de 1 semaforo vehicular, lavado de 1 semaforo peatonal, lavado de 1 disco	3 Pm	3:50 Pm	230-229 235-234 231-236
cra 67 x 50	S-oc	oc-oc	lavado de 1 poste, lavado de 1 brazo de manzula, lavado de 1 semaforo de manzula, lavado de 1 semaforo vehicular, lavado de 1 semaforo peatonal, lavado de 1 disco	3:50 Pm	4:30 Pm	230-229 235-234 231-236

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA 2025 · RAV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	03-08-2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	LUNES		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	WHL 737		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin santos	1038810427			Jose soto	1098127131
Juan Rua					
simeon vivas	1065913019				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
cr v64B x cll.50			se atiende vandalismo de pulsadores digitales a poste	8:50 am		
	N-E	E-W	retiro de 4 cordones de 10cm en tapa de 50x50			183-
			perforación en poste con taladro x machurlos			
			suministro estalación de 4 mts de cable 4x18 nuevos			215-
			construcción de 1 empalme electrico en la caja de 50x50			94-
			estalacion de 1 pulsador digital de segunda a poste			214-
			estalación de 1 tapa bornera de segunda a poste			
			soldada de 4 cordones de 10cm en tapa de 50x50			262-
			soldada de 2 puntos en el pulsador digital			262-
	peatonal/ central	E-W	retiro de 1 base de pulsador a poste			171-
			retiro de 4 cordones de 10cm en tapa de 50x50			183-
			perforación en poste con taladro x machurlos			
			suministro estalación de 5 mts de cable 4x18 nuevos			215-
			construcción de 1 empalme electrico en la caja de 50x50			94-
			estalacion de 1 pulsador digital de segunda a poste			214-
			estalacion de 1 tapa bornera de segunda a poste			
			soldada de 4 cordones de 10cm en tapa de 50x50			262

EQUIPO EN OBRA:

taladro, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	03-08-2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	LUNES		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:	WHL737		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1038810427			Jose carles	1098727137
Juan Roa					
Simeon vivas	1065913019				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
cra 64B x cll 50	separador central	E-W	soldada de 2 puntos en el pulsador digital			262
	s-w	W-E	retiro de 4 cordones de 15cm en tapa de 50x50			183
			retiro de 12mts de cable 4x18 del poste a la caja			173
			perforación en poste con taladro y machuelos			
			instalación de 12 mts de cable 4x18 de la caja al poste			215
			instalación de 1 pulsador digital de segunda a poste			214
			soldada de 4 cordones de 10cm en tapa de 50x50			262
			soldada de 2 puntos en el pulsador digital		4:00pm	262
			se realizan pruebas funcionales desde el controlador con el personal tecnico quedando todo en buen funcionamiento			
			NOTA: queda pendiente instalar canastos de seguridad para los pulsadores por vandalismo			

EQUIPO EN OBRA:

Taladro, Planta electrica, equipo soldador, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN 2025 · RSV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	03 08 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	lunes		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	MTN 502		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Barbosa	16791906			Jose Cortes	70707271
Cristian mena	1076817116				
Cristian Duboy.	1151960785				
Jose Andrade	11222857				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 49 cll 45	Separador	WE	Enderezada de Semaforo Vehicular.	07am		258
	//	NS	Enderezada de Semaforo Peatonal			258
	//	SN	Enderezada de semaforo bicicleta.			258
	//	NS	Enderezada de Semaforo Peatonal.			258
	//	WE	Retiro de Disco Direccional (↑)			179
			Instalacion de Disco Direccional nuevo (Derecho ↑)			83
Cr50 cll 49	E	SN	Retiro de Disco Direccional en mal estado ↑			179
	W	SN	Instalacion de Disco Direccional nuevo (Derecho ↑)			83
			Retiro de Disco Direccional en mal estado (↑)			179
			Instalacion de Disco Direccional nuevo Derecho (↑)			83
Diagonal 50			Retiro de Disco en mal estado. Pendiente su instalacion.			179
cll 49	S	WE	Enderezada de Semaforo Vehicular			258
	S	WE	Enderezada de Semaforo Peatonal			258
	S	WE	Retiro de Controla en mal estado.			179
Carrera 36			Grupo 4 en cotta peatonales			
calle 54			Construccion de Empalme en caso de poso			94
			Construccion de Empalme en peatonales 2 und.			94
			Enderezada de Semaforo Peatonal y sinchado - 4 und.		05pm	258-10

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, mesa, esllonga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	03 09 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	lunes		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI /
VEHÍCULOS:	MTN 502		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Balboa	16791906			Jose Cortes	1098727131
Cristian mena	1076817116				
Cristian Balboa	1151966795				
Jose andrade	11 222857				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* Cr 36 Cll 54	E	SN	Retiro de herraje de Polipropileno	07 am		187
	W	SN	Retiro de tapa de concreto.			187
			Instalacion de herraje de 2 Tapas de 50x50			13
			Demolicion de base de controlador			2

EQUIPO EN OBRA:

Talabro demoledor, Planta electrica, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

114

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTEGRAL MED 2025 · DEVI	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	03-08-2026	TIEMPO	SECO	✓	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Lunes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO ✓

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Nelson Galeano	1139597837			Jose cortes	1098771131
Carlos Mario	1049894858				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cl 52 x Cl 25 Sur	Separa	N-S	Lavado de semaforo peatonal #2			231
			Lavado de semaforo bici usuario #2	7:00 Am	5 Pm	231
			Lavado de disco direccional			236
			Lavado de disco botón para peatones			236
			Lavado de sonorizador			232
			Lavado de poste recto			230
	N-E	S-N	Lavado de semaforo peatonal			231
			Lavado de semaforo ciclista #2			231
			Lavado de disco direccional			236
			Lavado de sonorizador			232
			Lavado de poste recto			230
	Separador	N-S	Lavado de disco botón para peatones			236
			Lavado de sonorizador			232
			Lavado de poste sonorizador			230

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, arnes, eslinga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

2/4

CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN MED. 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA: 02-08-2026 DIA: lunes VEHÍCULOS:	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	✓	UNIFORMES	CUMPLE SI ✓ NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI ✓ NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI NO ✓

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Yeison Galeano	1039547832			Jose ortes	1098727191
Carlos mario	1049804958				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
G52 x C125UV	N E	S-N	lavado de semáforo peatonal	7Am	5Pm	231
			lavado de disco de pulse espere			236
			lavado de pulsador			232
			lavado de poste recto			230
	E-S	S-N	Lavado de semaforo vehicular			234
			Lavado de semáforo peatonal			231
			lavado de disco direccional			236
			lavado de poste recto			230
	N-W	S-N	lavado de semáforo peatonal			231
			lavado de poste recto			230
			lavado de disco pulse espere			236
			lavado de pulzador			232

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, arnes, eslinga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

3/4

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	03-02-2026	TIEMPO	SECO	✓	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	lunes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO ←

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Yeison Salcedo	1035977832			Jose Cortes	1098727191
Carlos mario	1049884058				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
252 x Cl 25UV	N-W	E-W	lavado de Semaforo peatonal			231
			lavado de disco pulse y espere			236
			lavado de poste recto	7am	5pm	230
			lavado de semáforo Vehicular			234
			lavado de semáforo peatonal #2			231
			lavado de disco direccional			236
			lavado de disco pulse espere			236
			lavado de pulsador			232
			lavado de poste recto			230
Cl 50 x Cl 25UV W-E	N-S		lavado de poste recto			230
			lavado de semáforo peatonal de poste			231
			lavado de disco pulse espere			236
			lavado de pulsador			232

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, arnes, eslinga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

714

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO SEMAFOROS MED 2025 · UNIÓN TEMPORAL SEMAFOROS MEDELLÍN	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA: 03-02-2026 DIA: Lunes VEHÍCULOS:	TIEMPO	SECO ✓ LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE SI ✓ NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI ✓ NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI NO ✓

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Yeison Galeano	1039597832			Jose Ortiz	1098727137

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 50 x Cl 25W	We	We	lavado de Semáforo peatonal deposte	7Am	5pm	231
	Separador		lavado de disco pulse y espere			236
			lavado de pulsador - Lavado poste			232-230
Cr 50 x Cl 25W	SE	We	lavado de Semáforo peatonal de poste			231
			lavado de poste recto			230
			lavado de Sonorizador			232

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, arnes, eslinga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INT. FAROL MED. 2026 / UNION TEMPORAL SIT MEDELLÍN / Metro de Medellín / EPM	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA: 02-02-2026 DIA: MAR VEHÍCULOS:	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	✓	UNIFORMES	CUMPLE SI ✓ NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI ✓ NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
William Chavarro Laura Padilla	78.681.777			Jose Cortes	1098727137

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
cll 3C calle 2 Sur	S.C	E-W	lavado de 1 semaforo vehicular lavado de 2 semaforos peatonales lavado de 1 disco direccional lavado de 1 poste recto	8 a.m.		234 231 236 230
	S.C	S-N	lavado de 2 semaforos peatonales lavado de 2 semaforos vehiculares lavado de 1 disco peatonal lavado de 1 pulsador		9 a.m.	231 231 236 232
cll 3 I calle 2 Sur		W-E	lavado de 1 semaforo peatonal lavado de 1 disco peatonal lavado de 1 pulsador	9.10		231 236 232
		E-W	lavado de 1 semaforo vehicular lavado de 2 semaforos peatonales lavado de 1 disco direccional lavado de 1 disco peatonal lavado de 1 poste lavado de 1 pulsador		10:30	234 231 236 236 230 232

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, arnes, eslinga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA

ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	RESPONSABLE INTERVENTORÍA APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO SIT FAROL MED 2025 · R&Y	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	03-03-2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	lunes		LLUVIOSO			SI X		SI X		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Wilmer chuquiz	98 181 771			Jose Cortes	1092727137
Laura pantilla					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CL 50	S.C	W-E	lavado de semaforo vehicular	8 am		234-
cra 72			lavado de 7 semaforos peatonales	10 am		231-
			lavado de 1 disco direccional			236-
			lavado de 1 disco pcp			236-
			lavado de 1 poste recto			230-
	N-E	S-N	lavado de poste recto			230-
			lavado de 1 semaforo peatonal			231-
			lavado de 1 disco pcp			236-
			lavado de 1 pulsador			232-
	N-W	E-W	lavado de 1 poste recto			230-
			lavado de 1 semaforo peatonal			231-
			lavado de 1 disco pcp			236-
			lavado de 1 pulsador			232-

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, arnes, eslinga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
UNIÓN TEMPORAL EPM MEDELLÍN / CONSORCIO INTERVIAL 2025 / RNV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA: 07-05-2026 DIA: lunes VEHÍCULOS:	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	X	UNIFORMES	CUMPLE SI X NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI X NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
William Eduardo Tavera Padilla	95 081777			Jose Cortes	1098424137

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
cra 50	S.C	E-W	lavado de semaforo vehicular			234
calle 2			lavado de semaforo peatonal			231
			lavado de disco pep			236
			lavado de poleas			232
	S-E	W-E	lavado de semaforo peatonal			231
			lavado de poste recto			230
			lavado de disco pep			236
			lavado de poleas			232
cra 50	W	S-N	lavado de semaforo vehicular			234
calle 4 sur			lavado de disco direccional			236
			lavado de poste recto			230
	E	S-N	lavado de semaforo vehicular			234
			lavado de poste recto			230
			lavado de disco direccional			236
					5:00	

EQUIPO EN OBRA:

p 8 Cabrera, Arbey, Erlinda

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTERVIAL MED 2025 - RFV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	03-08-2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Lunes		LLUVIOSO			SI X		SI		SI
VEHÍCULOS:	WLT 892		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Cesar Santos	1038806300			Jose Cortes	1095977157
Miguel Villegas	1018922962				
Enmis Torres	1028030487				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR44CL78	S-E	S-N	Suministro e instalación de 1 brazo de mensula	10-00		203
			5.5mts			
			Suministro de 4 juegos de tornillos para flanche de mensula			
			Suministro e instalación de 9mts de cable 4x18			215
			Instalación de 1 semaforo vehicular 1 regulador			234
			Instalación de 1 semaforo vehicular a mensula			207
			Construcción de 2 encalmes electricos		13-00	94
CR44CL79	S-W		Construcción de 1 acometida electrica aerea	14-20		42
			Suministro 18mts de cable 2x12			
			Construcción de 2 encalmes electricos con			94
			2 conectores en "C" de cobre cada 1			100
			60x80.		15-10	
CR44CL74			Retiro de 1 brazo de mensula 4.5mts	15-35		—
			Retiro de 1 semaforo vehicular a mensula			170
			Retiro de 7mts de cable 4x18		16-40	193

Programar instalación de reguladores

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO RED SEMAFÓRICO 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA - DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	04 - 08 - 2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MARTES		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	WHL 737		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin santos	1038810427			Jose Cortes	1098727191
Laura pedilla	1017221580				
wilman chavarria	98691775				
juan Rua					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cra 46 x Cll 54	separador central	N-S	atencion de vandalismo de cables de potencia cortados en la recamara de EPM.	8:43 am		
			suministro instalacion de 20 mts de cable 4x18 nuevos			215
			construccion de 16 empalmes electricos en la recamara de Epm			94
			soldada de 4 cardenes de 10cm en tapa de 60x80			262
			concretada de 1 tapa de 60x80 de 7x7			263
	N-E	N-S	cambio de accesoria perdida en semaforo vehicular a poste			
			retiro de 1 semaforo vehicular en poste			172
			instalacion de 1 accesorio de segunda en la parte de arriba			-
			reinstalacion de 1 semaforo vehicular a poste			208
			construccion de 2 empalmes electricos a poste en el vehicular y peatonal		4:10pm	94

EQUIPO EN OBRA:
Equipo soldador, Planta electrica, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

1/2

CONSORCIO ESPAÑOL MED.2029 · RSV	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	04-02-2026	TIEMPO	SECO	10 horas	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MARTES		LLUVIOSO			SI X		SI X		SI ✓
VEHÍCULOS:	MTN-502		DURACIÓN	10 horas		NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Simon Fernando Vivas	1065913019			Jose Soto	1098727137
Luis Iglano	91452201				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CRA 69 CL173			RECOGIDA DE ESCOMBRO 5 COSTALES	02:00 Pm	02:50 Pm	—
CRA 51 CL 36			Soldadura de Herraje con TAPA 50x50cm	03:56 Pm		262
			Soldadura de Herraje con TAPA 50x50 cm			262
			Soldadura de Herraje con TAPA 50x50 cm			262
			Soldadura de Herraje con TAPA 60x80 cm			262
			Soldadura de Herraje con TAPA 50x50 cm			262
			Soldadura de Herraje con TAPA 50x50 cm			262
CRA 51 CL 38			Soldadura de Herraje con TAPA 50x50 cm			262
			Soldadura de Herraje con TAPA 60x80 cm			262
			Soldadura de Herraje con TAPA 50x50 cm			262
			Soldadura de Herraje con TAPA 50x50 cm			262
			Soldadura de Herraje con TAPA 60x80 cm			262
			Soldadura de Herraje con TAPA 50x50 cm			262
			Soldadura de Herraje con TAPA 50x50 cm			262
			Soldadura de 2 Herraje con TAPA 60x80 cm			262
			Soldadura de Herraje con TAPA 50x50 cm			262
			Soldadura de 2 Herraje con TAPA 60x80 cm			262

EQUIPO EN OBRA:
Equipo soldador, Planta electrica, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

2/2

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN · CONSORCIO SIT FARO MED 2024 · RMY	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	04-08-2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MARTES		LLUVIOSO			SI ✓		SI X		SI
VEHÍCULOS:	MTN-502		DURACIÓN	10 HORAS		NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Simeon Fernando Ulloa	1065913019			Jose Cortes	1098727791
Luis Lozano	91452201			Shaw Lanton	71275731

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CRA 51 CLL 38			SOLDADURA DE HIERRO CON TAPA 50X50 CM			2625
			SOLDADURA DE HIERRO CON TAPA 50X50 CM		07:00pm	2625
CRA 51 CLL 37			SONDEO Y VERIFICACIÓN DE RUTA SEMAFÓRICA	07:00pm		2371
			SEMÁFOROS PEATONALES Y VEHICULARES		12:00 AM	

EQUIPO EN OBRA:

Equipo soldador, Planta electrica, Pesca

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTERVIAL MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA: 4 Agosto 2026 DIA: Martes VEHÍCULOS: WLY 997	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN		UNIFORMES	CUMPLE SI NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Cesar Santos	1.039.806.300			Jose cortes	1098727151
Miguel Villegas	1.013.229.962				
Leon oyendo	15.495.477				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 44x Calle 84	S-E	S-N	Demolicion de concreto en platina de mensula de 0.40x0.40, se encontro un tornillo reventado en la platina de la mensula.	11:00		1
			Retiro de semaforo vehicular a mensula			170
			Retiro de 8 metros de cable 4x16			173
			Retiro de brazo de mensula de 4,5 mts.			—
			Nota: Programar la instalacion de realce en platina de mensula.		11:30	
Carrera 46x Calle 84	N-O	O-S	Corte de 4 cabezas de pernos en platina de mensula, se presento la ruptura de un perno en la platina de la mensula.	11:40		182
			Retiro de semaforo vehicular a mensula			170
			Retiro de 8 metros de cable 4x16			173
			Retiro de brazo de mensula de 4.5 mts			—
			Nota: Programar la instalacion de realce en platina de mensula.		12:05	

EQUIPO EN OBRA: Pulidora, Planta electrica, Plataforma

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INT. PARDL MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600106556 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600106596 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	4 Agosto 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Martes		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	WLY 897		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Cesar Santos	1.039.806.300			Jose Cortes	1098727715
Miguel villegas	1.018.229.962				
Leon oquendo	15.425.477				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 46x	N-W	N-S	Retiro de semaforo vehicular a mensula.	13:30		170
Calle 80			Retiro de semaforo vehicular a poste			172
			Retiro de semaforo peatonal.			192
			Retiro de disco direccional.			179
			Retiro de 16 metros de cable control 4X16			173
			Retiro de 1 mensula completa de 4.5 mts.			166
			Corte de 4 cabezas de pernos en platina.			182
			Lavado de 2 semaforos vehicularer.			234
			Lavado de 1 semaforo peatonal.			231
			Lavado de disco direccional			236
			Suministro e instalacion de una mensula nueva de 5.5 mts.			203
			Suministro e instalacion de 9 mts de cable de control 4X18 nuevo.			215
			Reinstalacion de 8 mts de cable 4X16			215
			Reinstalacion de semaforo vehicular a mensula			207
			Reinstalacion de semaforo vehicular a poste			208
			Reinstalacion de semaforo peatonal			208

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma, Pulidora, Planta electrica

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Qeeny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de interventoria

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTEGRAL MED 2025 R&Y	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600103555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	4 Agosto 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Martes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	WLY 997		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Cesar Santos	1.038.606.300			Jose Cortes	1098727731
Miguel villegas	1.018.229.962				
Leon oquendo	15.495.477				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 46x	N-W	N-S	Reinstalacion de disco direccional			220
Calle 90			Suministro de 4 tuercas y 4 Arandelas para platina de mensula.			—
			Suministro de 4 juegos de tornillos para flanche de la mensula			—
			Construccion de 3 empalmes electricos.		4:00	94

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO MTL CAROL MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	05-08-2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MIERCOLES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin santos	1038810427			Jose cortes	1098727831
Juan ROA	1000537975			Alvaro Londa	2527171
Yelson Quiceno	1034547832				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
X cra 49 x cll 10	S-W	S-N	cambio de cable de potencia en corto del grupo #7	8:43 Am		
			retiro de 1 semaforo vehicular a poste			172-
			retiro de 59 mts de cable 4x18 del poste al controlador para reinstalar			173-
			suministro instalación de 64 mts de cable 4x18 nuevos			215-
			reinstalación de 1 semaforo vehicular a poste			208-
			construcción de 1 empalme electrico a poste		1:00 pm	94-
cra 36A x cll 47	S-E	S-N	cambio de semaforo vehicular y peatonal en mal estado a poste	1:20pm		
			retiro de 1 semaforo vehicular a poste			172-
			retiro de 1 semaforo peatonal a poste			172-
			suministro instalacion de 1 semaforo vehicular nuevo a poste			65-
			stiker: rojo 7077 - amarillo 7012 - verde 7073			
			suministro instalacion de 1 semaforo peatonal nuevo estatico a poste			70-
			stiker: ROJO 0970 - verde 0971			
			construccion de 2 empalmes electricos a poste		3:30pm	94-

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor, Pesca

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoria

C986-2016

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	05 08 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	miercoles		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	MTN 502		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Barbosa	16791906			Jose cortes	1098427891
Jose Andrade	11272857				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cra 63B Cll 33	S	WE	Vandalismo en el cableado de Semaforo del Grupo 3 y 5 y cableado del Pulsador.	04am		
			Construccion de 6 Empalmes en caja de paso de Cableado.			94
			Contruccion de 3 Empalme en Semaforo Vehicular Semaforo peatonal — pulsador.			94
			Concretida caja de 50x50			263
Cr72A Cll78B	W	NS	Instalacion de cable nuevo (40 metros) 4x18		08am	215
			Construccion de Empalme en acometida			94
			Construccion de Empalme en cableado UTP			94
			Soldadura en caja de 60x90			262
			Soldadura en caja de 120x100			262
Cr41 Cll47	S	WE	Soldadura en caja de 50x50			262
			Enderezada de Semaforo Peatonal		1pm	258

EQUIPO EN OBRA: Pasca, equipo soldador, Planta electrica herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO IST PARQUE MED 2025 · RAY	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	05-03-2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MIERCOLES		LLUVIOSO			SI X		SI X		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN	+0		NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Simeon Fernando Ulloa	1065913019			Jose Cortes	1098727131
Luis Tozano	91452201				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
D Tv Interior			Soldadura de Herraje con tapa 60x50 cm	02:00 Pm		262
Cll 12			Soldadura de Herraje con tapa 50x50 cm		05:30 Pm	262
X Cll 49			Soldadura de 3 tapas con Herraje	05:30 Pm		262
Cra 46			Soldadura de 3 tapas con Herraje			262
			Soldadura de 3 tapas con Herraje			262
			Soldadura de 3 tapas con Herraje			262
			Soldadura de 3 tapas con Herraje			262
			Soldadura de 3 tapas con Herraje		12:00 mm	262

EQUIPO EN OBRA:

Equipo soldador, Planta electrica

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTEGRAL MED 2025 · UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN · RNV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	5/8/26	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miercoles		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	7x1998		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Christian Balbosa				Jose Ortes	1098727131
Cristian Mena				Ricardo Lalso	71775731

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Tv 80 x Cl 129			Se atiende caso de semaforo apagado por vandalismo Se instalan 64 metros de cable para el grupo	8:00		215
			Grupo 1 = 16 = 16 Grupo 2 = 16 = 16 Grupo 5 = 16+16 = 32 Total 64			
			Se realizan 8 empalmes Se retira un hueco metalico con tapa de concreto Se instala hueco metalico con tapa de seguridad El cruce queda funcionando correctamente		3.00	94 187 13

EQUIPO EN OBRA:

Pesca, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INTEGRAL MED 2025 RMV	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	05-08-2025	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miercoles		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:	WLT 892		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Cesar Santos	1038806300			Jose Cortes	1098727731
Jaime Cifuentes	71480675				
Miguel Villegas	1018229462				
Leon Oquendo	1152834437				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR46CL38	N-W	N-S	Entrega de 1 semaforo Vehicular a mensula	8-15	9--10	257
CR51CL67	N-W	N-S	Suministro e instalación de 1 semaforo Vehicular en mensula (1017 - 1018 - 1019	10-20		
			Suministro e instalación de 7mts de cable 4x18			215
			construcción de 2 empalmes vehicular		13-00	94
CR46CL86	N-W	N-S	Retiro de 1 semaforo Vehicular en mensula	10-10		170
			Retiro de 1 semaforo Vehicular a Poste			172
			Retiro de 1 semaforo Peatonal			179
			Retiro de 1 disco direccional Fa			166
			Retiro de 1 mensula A.Smtr			234
			Lavada de 2 semaforos Vehiculares			231
			lavada de 1 semaforo Peatonal			236
			lavada de 1 disco direccional			173
			Retiro de (2 x 4m + 8m) = 16m cable 4x16		17-05	

EQUIPO EN OBRA:

Pesca, Plataforma, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Yueny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO SIT. MAYOL-MED. 2025 / RAY	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	05-08-2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miercoles		ILUVIOSO			SI X		SI X		SI
VEHÍCULOS:	WLY 891		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Cesar Sentor	1039806300			Jose cortes	1098427131
Miguel Vallejos	1082299062				
Leon Oquendo	1548547				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 46 CL 86	N-W	N-S	Suministro e instalación de 1 mensula 5.5mts			203
			Suministro de 4 juegos de tornillos Para flecha de mensula (Electrosegicol)			-
			Suministro de 4 arandelas y 4 tuercas Para Placa de mensula			-
			Suministro e instalación de 9m de cable 4x16			215
			Reinstalación de 8m de cable 4x16			215
			Reinstalación de 1 semaforo Vehicular a mensula			207
			Reinstalación de 1 semaforo Vehicular a Poste			208
			Reinstalación de 1 semaforo Peatonal			208
			Reinstalación de 1 disco direccional			220
			Construcción de 3 empalmes electricos			94
			Cortando de 4 cables de cobre en plataforma de mensula		17-05	182

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

1/2

CONSORCIO INTEGRAL MED 2025 · BMV · UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	06 - 08 - 2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	JUEVES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	WHL737		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1638810427			Jose Cortes	1098727891
Wilson Chavarria	9868175				
Juan Roa	1000537976				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* TV. INFERIOR X Cll 7B	S-E	N-S	se realizo sondeo por vecámaras telefonicas de UNE	8:30Am	12:00pm	237

EQUIPO EN OBRA:

Perfca

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

42

2Ø3"

14mts

11

1

7Ø2"

17mts

11

3Ø3"

10mts

trasversal inferior

N

MALL VERONA

CLL. 7B

S

1/2

	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105595 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	06-08-2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	JUEVES		LLUVIOSO			SI X		SI X		SI
VEHÍCULOS:	MTN-502		DURACIÓN	10 H		NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Simeon Fernando Viuda	1065913019			Jose cortes	1098727137
Luis Iozano	91452201				

	DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
*	CRA 38 CII 51	E-W	N-S	VERIFICACIÓN A SEMAFOROS PEATONALES APAGADOS	02:00 PM	03:50 PM	261
*	CR46 CII 49	SEPARADOR	N-S	VERIFICACION SEMAFORO VEHICULAR LO CUAL SE ENCONTRO EMPALME SUELTO, SE PROCEDE NUEVAMENTE A EMPALMAR, QUEDANDO TODO EN BUEN ESTADO	03:50 PM		94
*	CR46 CII 49	W-E	N-S	VERIFICACION SEMAFORO TRANVIA LO CUAL SE ENCONTRO LAMPARA DE 5 IGB QUEMADA, SE PROCEDE A REALIZAR EL CAMBIO DE LAMPARA QUEDANDO TODO EN BUEN ESTADO		08:00 PM	195 218 94
*	CRA 40 CII 52	SEPARADOR	E-W	VERIFICACION SEMAFORO CICLISTA LUZ VERDE APAGADO SE ENCONTRO CABLE SEMAFORICO EN MAL ESTADO PARCIAL (QUEMADO) SE PROCEDE A RETIRAR CABLE SEMAFORICO, SE INSTALA CABLE SEMAFORICO NUEVO (7MTS) SE EMPALMA NUEVAMENTE QUEDANDO TODO EN BUEN ESTADO	08:00 PM	09:24 PM	173 215 94

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta Menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA

ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	RESPONSABLE INTERVENTORÍA APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoria

2/2

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO DE FAROLEO 2026 · UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN · BOY	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	06-02-2026	TIEMPO	SECO	+	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	JUEVES		LLUVIOSO			SI +		SI +		SI
VEHÍCULOS:	MTU - 502		DURACIÓN	10 HRS		NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Simeon Fernando Vivas	1065913019			Jose cortes	1098727131
Luis Lozano	91452201				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CRA 40 CL 52	W-E	S-N	VERIFICACION SEMAFORO PEATONAL CON LUZ ROJA APAGADO, LO CUAL SE ENCONTRO LAMPARA ROJA QUEMADA, SE PROCEDE A REALIZAR EL RESPECTIVO CAMBIO DE LAMPARA RETIRO LAMPARA ROJA QUEMADA	09:20 PM		195
			REINSTALACION LAMPARA ROJA DE SEGUNDA EN BUEN ESTADO			218
			REALIZACION EMPALME CABLE SEMAFORICO		12:00 AM	94

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	6/8/26	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	DX7978		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Christian Barbosa	1151.966.785	Jeffer Alfaro Miranda	1053982270	Jose Cortes	1098427131
Cristian Mena					
Nelson Caleano					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* C 39 x C 58			Se realiza canalizacion en zona verde 5 metros	9:00		26
			Se instala pegante 4.5 metros			
			Se lleva fibra de poste al equipo controlador		2:00	

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

113

	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA: 06/08/26 DIA: Jueves VEHÍCULOS:	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	X	UNIFORMES	CUMPLE SI X NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI X NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Carlos Gonzalez	1049894058			Jole Cortes	1098772731
Laura Padilla.	1017221580				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
K Cl 52	C-N	S-N	lavado de semaforo vehicular de poste	09:00		234
Cll 20			lavado de semaforo Peatonal			231
			lavado de disco direccional			236
			lavado de Pulsador			232
			lavado de Poste recto			230
	E-N	S-N	lavado de semaforo vehicular de poste			234
			lavado de semaforo Peatonal			231
			lavado de disco direccional			236
			lavado de Poste recto			230
	Costado Central	S-N	lavado de Pulsador			232
			lavado de disco Pulse espere			236
			lavado de Poste de Pulsador			230
	Costado Central	S-N	lavado de Pulsador			232
			lavado de disco Pulse espere			236
			Lavado de Poste de Pulsador			230

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, Arnes, eslinga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

2/3

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTEGRAL VIAL 2025 + DRV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	06/08/26	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Carlos Gonzalez	1049894058			Jose cortes	1098727113
Laura Padilla.	1017221580				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
X Cr 52	Corvi	N-S	lavado de pulsador			232
Cll 20	Central		lavado de disco pulse espere			236
			lavado de Poste de pulsador			230
	W-N	N-S	lavado de semaforo vehicular de poste			234
			lavado de semaforo peatonal			231
			lavado de disco direccional			236
			lavado de pulsador			232
			lavado de disco pulse espere			236
			lavado de poste recto			230
	N-E	N-S	lavado de semaforo vehicular de poste			234
			lavado de semaforo peatonal			231
			lavado de disco direccional			236
			lavado de disco pulse espere			236
			lavado de pulsador			232
			lavado de poste recto			230

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, arnes, eslinga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Dueny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

3/3

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTEGRAL MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	06/08/25	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves		LLUVIOSO			SI /		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Carlos Gonzalez	1049894058			Jose Cortes	1098427791
Laura Pedillo	1017221580				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
K Cr 52	E-N	S-N	lavado de semaforo vehicular de Poste			234
Cll 70			lavado de Semaforo Peatonal			231
			lavado de disco direccional			236
			lavado de disco Pulse espere			236
			lavado de pulsador			232
			lavado de Poste recto			230
	W-N	N-S	lavado de semaforo vehicular de Poste			234
			lavado de semaforo Peatonal			231
			lavado de disco direccional			236
			lavado de sonorizador			232
			lavado de Poste recto			230
	W-S	N-S	lavado de semaforo vehicular de poste			234
			lavado de semaforo Peatonal			231
			lavado de disco direccional			236
			lavado de disco Pulse espere			236
			lavado de sonorizador			232
			lavado de Poste recto		16:00	230

EQUIPO EN OBRA

Escalera, arnes, eslinga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTEGRAL MED 2025 / RAY	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	06-08-2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:	WLT 847		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Cesar Santos	1038806300	Diana Arad	1017162399	Jonathan Jiménez	1036602210
Miguel Villegas	1018229962				
Alberto Oquendo	1548052477				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CRA 6 Cl 86	N-E	E-W	Retiro de 1 semaforo Vehicular a mensula			170
			Retiro de 1 semaforo Vehicular a Poste			172
			Retiro de 1 semaforo Peatonal			172
			Retiro de 1 disco direccional #4 Para semaforo			179
			Retiro de (2 x Aprox 9m) = 17m de cable 4x16			173
			Cortadas de 4 cabezas de pernos en Placa de mensula			182
			Retiro de 1 mensula de #4 5.5m			166
			Lavada de 2 semaforos Vehiculares			234
			Lavada de 1 semaforo Peatonal			231
			Suministro instalación de 1 mensula 5.5m			203
			Suministro de 4 juegos de tornillos para fijación mensula			
			Suministro de Arandelas y de tuercas para Placa de mensula			
			Reinstalación de 17m de cable 4x16			215
			Reinstalación de 1 semaforo Vehicular a mensula			207
			Reinstalación de 1 semaforo Vehicular a Poste			208
			Reinstalación de 1 semaforo peatonal			208
			Construcción de (3) empalmes electricos			94
			Suministro e instalación de 1 disco direccional #4			83

EQUIPO EN OBRA:

Planta, puntas de tensión (plataforma) elementos de mano

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

Se verifica señalización y EPP.

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO MT PARQUE 2026	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	06-08-2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:	WLT 892		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Cesar Santos	1038806300	Oliver Pinto	9071623899	Jose cortes	1098127151
Miguel Villegas	1018229962				
Alberto Ospina	15485477				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR22CL48-49	S-E	S-N	Retiro de 1 semaforo vehicular a Quito motivo			172
			traslado para mantto			
			Reinstalación de 1 Semaforo vehicular a mantto			207
			Suministro e instalación de 7m de cable 4x18			215
			construcción de 2 empalmes electricos			94

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INT. FAROL 1932-2020 · R/V	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	07 OR 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Viernes		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:	MTN 502		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Barbosa	16741906			Jose Cortes	1098727191
Jose Andrade	11222857				

	DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
*	Cr 46 Cll 57	E	NS	Enderezado de Semaforo Peatonal	04 am		258
*	Cr 47 cll 54	E	SN	Enderezado de semaforo Peatonal			258
	Cr 50 cll 54	N	EW	Enderezado de semaforo Vehicular			258
				Retiro de controlc			199
				Enderezado de Semaforo Peatonal.			258
*	Cr 51 cll 64	E	SN	Enderezado de semaforo Peatonal			258
				Enderezado de Semaforo Vehicular.			258
*	Cr 51 cll 64	N	WE	Enderezado de Semaforo Peatonal			258
				Enderezado de Semaforo bicicleta			258
				Enderezado de Semaforo Peatonal.			258
*	Cr 51 cll 99	E	SN	Enderezado de Semaforo Vehicular.		01 pm	258

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, arnes, eslinga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO SIT FASOL MED 2025 · ROY	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	07-08-2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	viernes		LLUVIOSO			SI X		SI X		SI
VEHÍCULOS:	MTN - 502		DURACIÓN	10 H		NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Simeon Fernando Vivas	1065913019			Jose Cortes	1098427131
Luis Uzuano	91452201				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CRA 52 cll 14	Occidental	N-S	RETIRO SEMAFORO VEHICULAR	02:00 pm		172.-
			RETIRO SEMAFORO PEATONAL			172.-
			RETIRO SEMAFORO CICLISTA			172.-
			RETIRO SEMAFORO PEATONAL			172.-
			RETIRO SEMAFORO CICLISTA			172.-
			RETIRO CABLE SEMAFORICO 15 MTS			173.-
			RETIRO DISCO DIRECCIONAL DE FRENTE			179.-
			RETIRO DISCO DIRECCIONAL DE PULSADOR			179.-
			RETIRO DE PULSADOR			177.-
			RETIRO POSTE ENTERRAMIENTO			168.-
			INSTALACION POSTE DE ENTERRAMIENTO NUEVO			206.-
			REINSTALACION CABLE SEMAFORICO 15 MTS			215.-
			REINSTALACION SEMAFORO VEHICULAR			208.-
			REINSTALACION SEMAFORO PEATONAL			208.-
			REINSTALACION SEMAFORO CICLISTA			208.-
			REINSTALACION SEMAFORO PEATONAL			208.-
			REINSTALACION DISCO DIRECCIONAL DE FRENTE			220.-
			RECTIFICACION DE ENRAIME CABLE SEMAFORICO X4		08:10 pm	94.-

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor, escalera, arnes eslinga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	07-08-2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	viernes		LLUVIOSO			SI X		SI X		SI
VEHÍCULOS:	MTV - 502		DURACIÓN	10 H		NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Simeon Fernando Viviana	1065913019			Jose Cortes	1098427134
Luis Lozano	91452201				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cra 46 Cll 49			SE VISITA INTERSECCIÓN SE VERIFICA LO CUAL SE ENCUENTRA TODO EN BUEN FUNCIONAMIENTO	08:10 am	12:00 pm	261

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTERVENTOR MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	08-09-2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Sabado		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1038804427			Jose Cortes	1098722137
Cristian Mena	1076812116				

DIRECCION	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CRA 52 X CLL 82	N-W	N-S	cambio de herrajes metalicos de 50x50	6:00am		1 -
			demolicion de tapa concretada de 50x50 en zona dura			13 -
			suministro instalacion de 7 herraje nuevo de 50x50			
	N-E	N-S	retiro de 7 herraje metalico de 50x50 para reintegro			18 -
			suministro instalacion de 7 herrajes nuevo de 50x50		12:00pm	13 -

EQUIPO EN OBRA:
Planta electrica, taladro demoledor, Pulidora, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA:

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN · CONSORCIO SIT. RAFOL MED. 2025 · R&V	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	08-07-2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Sabado		LLUVIOSO			SI X		SI X		SI
VEHÍCULOS:	M+N-502		DURACIÓN	10 ft		NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Simeon fernando vivas	1065913019			Jose cortes	1098427151
Luis lozano	91452201				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* CRA 52 C 11 14	Semaforo	N-S	INSTALACION SEMAFORO CICLISTA FALTANTE	02:00 Pm	0	208
			APERTURA ONIFICIO EN EL POSTE			247
			APERTURA DE 4 HUECOS CON TAPA			
			SE VERIFICA SEMAFORO PEATONAL Y CICLISTA APAGADO, LO CUAL SE ENCONTRO CABLE SEMAFORICO EN MAL ESTADO (PARTIDO)			173
			SE PROCEDE A CAMBIAR UN TRAMO DE CABLE SEMAFOR			215
			SE CAMBIA 13 MTS DE CABLE SEMAFORICO			94
			SE CORRIGEN 5 EMPALMES DE CABLE SEMAFORICO QUE SE ENCONTRARON EN MAL ESTADO			
			SE QUITA SOLDADURA A TAPA. 60X80 cm			183
			SE REALIZA SOLDADURA A TAPA 60 x 80			262
			SE DEJA SEMAFORO PEATONAL Y CICLISTA EN BUEN FUNCIONAMIENTO		06:40 Pm	
			SE REALIZA EMPALME CABLE SEMAFORICO x 2			94
* CRA 38 cll 91			SE REALIZA VISITA A INTERSECCION SE ENCONTRO SEMAFORO PEATONAL CON LUZ VERDE APAGADA LO CUAL NO			261
			SE PUDO REALIZAR EL TRABAJO YA QUE TAPAS CONCRETADAS, CABLE MAL ESTADO	06:40 Pm	12:00 Am	

EQUIPO EN OBRA:

Pulidora, Planta electrica, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	09-08-2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Domingo		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:	WLY 897		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
William Chavarro	98681775			Jose Cortes	1098727137
Anyelo Gomez	1152187124				
Carlos Diaz	1041444470				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 43B x Cll 71	E	EW	Retiro de semáforo a Ménsula y Reinstalación de Semáforo			171 -
			Retiro de lampara a Ménsula			196 -
			Reinstalación de semáforo a Ménsula y Construcción de Empalme			219-94 -
Carrera 43 x Cll 71	E	EW	Retiro de semáforo a Ménsula y Reinstalación de Semáforo			171 -
			Retiro de lampara a Ménsula			196 -
			Reinstalación de lampara a Ménsula y Construcción de Empalme			219-94 -
Carrera 43F x Cll 71	E	EW	Retiro de Semáforo a Ménsula y Reinstalación de Semáforo			171 -
			Retiro de lampara a Ménsula			196 -
			Reinstalación de lampara a Ménsula y Construcción de Empalme			219-94 -
Carrera 53 x Cll 52	W	WE	Retiro Instalación de Semáforo a Ménsula			171 -

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO SEÑ. SEMAFORIZACIÓN MED. 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	09-08-2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Domingo		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	WLY897		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Carlos Alberto Diaz	1017444410			Jose Cortez	1098727134
Angelo Gomez	1152189124				
William Chavarro.	98681775				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr65 x Calle 59	S	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola.			171
Cr62cx Cl 57	N	NS	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola.			171
Cll1065x Cl 43	S	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola			171
			Retiro de Campana de Control			196
			Reinstalación de campana de Control y Construcción de Empalme			219-94
	W	WE	Retiro e instalación de semáforo a Ménsola.			171
Cll1065x Cl 41D	S	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola.			171
			Retiro de Campana de Control			196
			Reinstalación de campana de Control y Construcción de Empalme			219-94
Cll1065B x Cl 50	W	WE	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola			171
	S	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola			171
	E	EW	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola.			171
Cll1065A x Cl 50	E	EW	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola.			171
			Retiro de campana de Control.			196
			Reinstalación de campana de Control y Construcción de Empalme			219-94

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Lueny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · Unión Temporal SIT Medellín · Consorcio Int. Patol. Med. 2025 · DAV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	09-09-2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Domingo		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:	WLY897		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Williar Chavarro	98681795			Jose Cortes	1098472131
Angelo Gomez	1152187124				
Carlos Diaz	1017444770				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 70 x Cl 30	A	NS	Retiro e instalación de Semáforo o Ménsula			171
			Retiro de lampara de Cenitco			196
			Reinstalacion de lampara de Cenitco y Construcción de Empalme			219-94
Carrera 65 x Cl 25	E	EW	Retiro e instalación de Semáforo o Ménsula			171
			Retiro de lampara de Cenitco			196
			Reinstalacion de lampara de Cenitco y Construcción de Empalme			219-94
	N	NS.	Retiro e instalación de Semáforo o Ménsula			171
			Retiro de Lampara de Cenitco			196
			Reinstalacion de Lampara de Cenitco y Construcción de Empalme			219-94
Carrera 43 x Cl 10	W	WE	Retiro e instalación de Semáforo o Ménsula			171
			Retiro de Lampara de Cenitco			196
			Reinstalacion de Lampara de Cenitco y Construcción de Empalme			219-94
Carrera 41 x Cl 10	W	WE	Retiro e instalación de Semáforo o Ménsula			171
			Retiro de Lampara de Cenitco			196
			Reinstalación de Lampara de Cenitco y Construcion de Empalme			219-94

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INT. PATRUL MED. 2025 · BMV · UNIÓN TEMPORAL IMT MEDELLÍN	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	04-08-2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Domingo		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:	WLY 894		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
William Chavarro	98681775			Jose Cortes	1098427191
Angelo Gomez	1152187224				
Carlos Diaz	1041444470				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 40 x Cll 40	W	WE	Retiro e instalacion de semaforo a Mensula			171
			Retiro de lampara de Conteo			196
			Reinstalación de lampara de conteo y Construccion de Empalme			219-94
Carrera 41 x Cll 40	N	NS	Retiro e instalación de semáforo a Mensula			171
Carrera 36 x Cll 40A	S	SN	Retiro e instalación de semáforo a Mensula			171
Carrera 35 x Cll 40A	E	EW	Retiro e instalación de semaforo a Mensula			171
			Retiro de lampara de conteo			196
			Reinstalación de lampara de conteo y Construcción de Empalme			219-94
Carrera 35 x Cll 40	N	NS	Retiro e instalación de semaforo a Mensula			171
			Retiro de lampara de conteo			196
			Reinstalación de lampara de conteo y Construcción de Empalme			219-94
Carrera 32 x Cll 40	W	WE	Retiro e instalación de semaforo a Mensula			171
			Retiro de lampara de conteo			196
			Reinstalación de lampara de conteo y Construcción de empalme			219-94

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTERVIAL MED 2025 · RMV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	09-09-2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Domingo		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	WLY 897		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
William Granada	98681795			Jose Cortes	1098727131
Angelo Gomez	1152187124				
Carlos Diaz	1017146470				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 32 x Cll 10	S	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula			171
Carrera 32 x Cll 16	W	WE	Retiro de instalación de Semáforo a Ménsula			171
Carrera 37B x Cll 12	W	WE	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula			171
	E	EW	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula			171
Carrera 32 x Cll 8	W	EW	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula			171
Carrera 32 x Cll 9	W	WE	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula			171
	E	EW	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula			171
	E	EW	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula			171
San Locos Mall	WE	WE	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula			171
Carrera 25 x 12	S	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula Retiro de lampara de Cortesia Reinstalacion de lampara de Cortesia y Construcción de Empalme			171 196 219-94

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO SIT FAROL MED 2025 · R&V	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	09-08-2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Domingo		LLUVIOSO			SI ✓		SI		SI
VEHÍCULOS:	WLY 897		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
William Arboleda	98680475			Jose cortes	1098727131
Angelo Gomez	1521897124				
Carlos Diaz	10H144970				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 25 x Cll 12 Sur	E	E-O	Retiro de Semáforo a Ménsola y Reinstalación de Semáforo			171
Carrera 25 x Cll 6 Sur	E	S-N	Retiro de Semáforo a Ménsola y Reinstalación de Semáforo			171
			Retiro de Lampara de Centro			196
			Reinstalación de lampara de Centro y Construcción de Empalme			219-94
	O	O-E	Retiro de semáforo a Ménsola y Reinstalación de Semáforo			171
Carrera 25 x Cll 2 Sur	S	S-N	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola			171
			Retiro de lampara de Centro			196
			Reinstalación de lampara de Centro y Construcción de Empalme			219-94
Carrera 25 x Cll 2 Sur	S	S-N	Retiro e instalación de Semáforo de Centro Regulado			171
			Retiro de lampara de Centro			196
			Instalación de lampara de Centro y Construcción de Empalme			219-94
	E	E-O	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola			171
Carrera 25 x Cll 10	O	O-E	Retiro e Instalación de Semáforo a Ménsola			171

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · Unidad Ejecutora Especial de Infraestructura Vial · Consorcio Mantenimiento Semaforización 2025 · BMV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	09-08-2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Domingo		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	WLY897		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Willian Chavarria	98681775			Jose Cortes	1098772491
Angela Gomez	1152187124				
Carlos Diaz	1017444470				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 32 x cll 10	E	EW	Retiro e instalación de Semaforo a Ménsula			171
Carrera 33 x cll 10	E	EW	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula			171 -
			Retiro de Lampara de Cortes.			196 -
			Reinstalacion de lampara de Cortes y Construccion de Empalme.			219-94 -
Carrera 34 x cll 10	E	EW	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula.			171 -
			Retiro de lampara de Cortes			196 -
			Reinstalación de lampara de Cortes y Construcción de Empalme.			219-94 -
	S	SN	Retiro e instalación de semáforo a Ménsula			171 -
			Retiro de lampara de Cortes.			196 -
			Reinstalación de lampara de Cortes y Construcción de Empalme.			219-94 -
Carrera 35 x cll 10	~~S~~ E	EW	Retiro de Semáforo a Ménsula y Reinstalacion.			171 -
			Retiro de lampara de Cortes			196 -
			Reinstalación de lampara de Cortes y Construcción de Empalme			219-94 -
Carrera 36 x cll 10	N	NS	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula			171 -
			Retiro de lampara de Cortes			196 -
			Reinstalación de lampara de Cortes y Construcion de Empalme			219-94 -

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO EL BARQUI MED 2025 · UNIÓN TEMPORAL EPM MEDELLÍN · RAV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	10-09-2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	LUNES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	WHL 737		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Suntas	1038810427			Jose cortes	1098727737
Simeon Vivas	1065413019			Jhonathan Reador	1036962270

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* CRR 72A x CLL 78B	N-W	N-S	atención de vandalismo de herraje y cables de potencia cortados de los grupos # 10, 11, 12, 9.	8:40Am		
			retiro de 7 herraje metalico de 50x50 en zona verde			187
			retiro de 8mts de cable 4x18 de la caja del controlador			172
			suministro instalación de 12mts de cable 4x18 nuevos			215
			construcción de 4 empalmes electricos en la caja de 50x50			94
			suministro instalación de 1 herraje nuevo de 50x50		12:20pm	13
* CRR 46 x CLL 52	N-W	N-S	cambio de semaforo vehicular por vandalismo	1:47Pm		
			retiro de 1 semaforo vehicular a poste			172
			suministro instalación de 1 semaforo vehicular nuevo a poste			65
			stikers: ROJO 1023 - AMARILLO 1024 - Verde 1025			
			construccion de 1 empalme electrico a poste		3:00Pm	94

EQUIPO EN OBRA:
Pulidora, Planta electrica, Martillo demoledor, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	10/8/26	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Lunes		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	DXT978		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Christian Palacio				Jose carter	1098727451
Juan Roa					
Yerson Galeano					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 65 x Cl 4)	W	S N	Se retiran 2 barreja (1 de polipropileno - 1 de tapa de concreto)			187
			Se instalan 2 barreja metalicas con tapa de seguridad			13
			Se realiza un empalme a raja			94
			Se realiza concreto de 5 x 50 x 10 (ancho, larga, alto)			263
Cr 65 x Cl 59	W	N S	Se realiza ajuste de sumidero peatonal			260

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor, taladro demoledor, Planta electrica

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	PLAN DE CALIDAD	VERSIÓN 1
	REINTEGRO DE ELEMENTOS	1/09/2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBJETO: MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD
NÚMERO DEL CONTRATO	4600105655 de 2025 (UNION TEMPORAL SIT)

Entregado por: ANYELO GOMEZ M. **Recibido por: FRANK GARCIA**

FECHA	ELEMENTO	CANTIDAD	UND	OBSERVACIÓN
6/8/2026	PLACAS DE CONTRASTES	36	UND	SINIESTROS
6/8/2026	BRAZOS DE MENSULA	10	UND	SINIESTROS
6/8/2026	DISCOS DIRECCIONALES	14	UND	SINIESTROS
6/8/2026	DISCOS PEP	2	UND	SINIESTROS
6/8/2026	ARAÑAS	10	UND	SINIESTROS
6/8/2026	FLAUTAS	10	UND	SINIESTROS
6/8/2026	CARCAZAS VEHICULARES	13	UND	SINIESTROS
6/8/2026	CARCAZAS PEATONALES	4	UND	SINIESTROS

VERIFICACIÓN

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA:		FIRMA PERSONA QUE RECIBE	
nombre	ANYELO DANIEL GOMEZ MEJIA	nombre	FRANK GARCIA
cargo	ALMACENISTA	cargo	CIOS

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO ILUMINACIÓN EL PAROL MED 2024 - R&V	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	10 09 2025	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	lunes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	MTN 502		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Barbosa	16794906			Jose Cortes	1098727191
Jose Andrade	11222587				
Carlos Gonzalez					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 50 - 51	N	WE	Reporte de Cableado malo en cerro del Grupo	07 am		
Calle 35			4 peatonal.			
			Desabilado de 4 Tapas de 50x50 y una 60x80			183
			instalacion de Cableado nuevo 4x18 (74 metros)			215
			Enderezada de Semaforo Peatonal			258
			Enderezada de Semaforo Peatonal y lampara			258
			Verde peatonal.			
			Soldadura en 4 Tapas de 50x50 y una 60x80			262
			Construccion de 2 empalmes en semaforos			94
			Peatonales.		03pm	
Cr 36 - Cll 45	E	SN	Reporte de Equipo controlador de Semaforos			
			apagado acometida en (95 Volt)			
			Se construye empalme de acometida en			94
			poste de alumbrado. queda (115 Volt)		05pm	

EQUIPO EN OBRA:

equipo Soldador, Planta electrica, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

1/2

CONSORCIO INT. PAROL MED. 2025	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	11-03-2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MARTES		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	WHL737		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1038810427			Jose Cortes	1095427131
Simeon Vivas	1065413119				
Yerson Galeano	1039597832				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
¥ cvv 51 x cll 49	S-E	S-N	cumplen de semaforo vehicular en mal estado a poste y revicion de ciclistas apagados.	8:30 Am		
			retiro de 4 puntos de soldadura en tapa de 60x80			183.-
			retiro de 4 puntos de soldadura en tapa de 60x60			183.-
			Retiro de 1 semaforo vehicular a poste			172.-
			suministro estalacion de 1 semaforo vehicular nuevo a poste			65.-
			stiker: Rojo 1035 - AMARILLO 1036 - verde 1037			
			construccion de 1 empalme electrico a poste			94.-
			NOTA: queda pendiente apertura de reconmoras de EPM para cambiar el cable de los semaforos ciclista		10:50 Am	
¥ cvv 36A x cll 36	N-W	N-S	se encuentra semaforo peatonal con el aspecto averiado a poste	11:29 Am		260.-
			ajuste de aspecto en semaforo peatonal a poste		11:34 Am	
# cvv 36 x cll 36	S-E	E-W	retiro de 1 lampara Roja peatonal a poste	11:36 Am		195.-
			estalacion de 1 lampara ROTA peatonal de segunda a poste			218.-
			construccion de 1 empalme electrico a poste		11:43 Am	94.-

EQUIPO EN OBRA:

Pulidora, Planta electrica, herramienta menor, equipo soldador

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

2/2

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	11-08-2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MARTES		LLUVIOSO			SI ✓		SI		SI
VEHÍCULOS:	WHL737		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin santos	1038816427			Jose Cortes	1098727191
Simeon vivas	1065413019				
Yerson galeano	1039597832				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
✱ cvr36 x cll.40	N-E	S-N	orientacion de 1 semaforo peatonal a poste	11:50am		258
	N-W	S-N	orientación de 1 semaforo peatonal a poste			258
			NOTA. queda pendiente cambiar poste recto que esta por secar al piso y aplomar otro poste recto		12:00pm	
✱ cvr65 x cll.5	separador	S-N	orientación de 1 semaforo peatonal a poste	2:00pm		258
	N-W	N-S	cambio de lamparas peatonales en mal estado a poste			195
			retiro de 2 lamparas rojas peatonales a poste			195
			retiro de 2 lamparas verdes peatonales a poste			218
			instalacion de 2 lamparas rojas peatonales de segunda a poste			218
			instalacion de 2 lamparas verdes peatonales dinamicas a poste			94
			construccion de 2 empalmes electricos a poste		2:40pm	
✱ cvr65 x cll.25	S-W	W-S	orientacion de 1 semaforo peatonal a poste	2:46pm	3:00pm	258
✱ cvr65 x cll.470	S-E	S-N	orientación de 2 semaforos peatonales a poste	3:30pm	4:00pm	258

EQUIPO EN OBRA:

Edcalera ames .=5 1099

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	ÁPROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Dueny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

113

CONSORCIO SEMÁFOROS MED 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	11 09 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Martes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	MTN 502		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Bahoso P.	16791906			Jose Cortes	1098427131
Jose Andrade	11 222 587				
Carlos Gonzalez					
luis lozano					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* Cr 46 - Cl 49	W	N S	Retiro de Semaforo Peatonal.	07 am		172
			Suministro Instalacion de Semaforo Peatonal. nuevo			70
			Serial = roja = 0979 Verde = 0978 Carcasa = 0022			
			Construccion de Empalme en Semaforo Peatonal			94
	E	N S	Retiro de Semaforo Peatonal			172
			Suministro Instalacion de Semaforo Peatonal. nuevo			70
			Serial = roja = 0976 Verde 0977 carcasa = 7250046			
			Construcion de Empalme en Semaforo Peatonal.			94
	E	N S	Retiro de Semaforo Peatonal			172
			Suministro Instalacion de Semaforo Peatonal nuevo			70
			serial = rojo = 0960 Verde = 0961 carcasa = 0110			
			Construccion de Empalme en semaforo Peatonal.			94
	W	N S	Retiro de Semaforo Peatonal.			172
			Suministro Instalacion de Semaforo Peatonal. nuevo.			70
			Señal - rojo = 0962 Verde 0963 carcasa 1029			
			Construccion de Empalme en semaforo Peatonal.		11 am	94

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, arnes, eslinga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO SUR EABOL MED 2025 | BNY	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	11 03 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	martes		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:	MTN 522		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Barbosa				Jose Cortes	1090472191
Jose Andrade					
Luis Lozano					
Carlos Gonzalez					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 46 Cll 49	E	SN°	Retiro de Semaforo Peatonal.	11 am		172
			Suministro Instalacion de Semaforo Peatonal nuevo			70
			Serial = roja 0988 Verde 0989 carcasa = 0090			
			Construccion de Empalme en semaforo peatonal.			94
	W	SN°	Retiro de Semaforo Peatonal.			172
			Suministro Instalacion de Semaforo Peatonal nuevo			70
			Serial = roja 0980 Verde 0981 Carcasa = 0100			94
	W	SN°	Retiro de Semaforo Peatonal.			172
			Suministro Instalacion de Semaforo Peatonal nuevo			70
			Serial = roja: 0982 Verde: 0983 carcasa: 0053			
			Construccion de Empalme en Semaforo Peatonal.			94
	E	SN°	Retiro de Semaforo Peatonal.			172
			Suministro Instalacion de Semaforo Peatonal nuevo			70
			Serial: roja: 0975 Verde: 0974 carcasa. 0015			
			Construccion de Empalme en Semaforo Peatonal		1 pm	94

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, arnes, eslinga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

317

3

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	11 08 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	martes		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	MTN 502		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Barbosa R	1679906			Jose cortes	1098727131
Jose Andrade	11 222 859				
Carlos Gonzales					
luis lozano					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
X Cr 46 Cll 49	Separador	SN	Retiro de Semaforo Peatonal.	01 pm		172
			Suministro Instalacion de semaforo Peatonal nuevo			70
			Serial: roja - 0987 Verde 0986 carcasa: 0084			
			Construccion de Empalme			94
	Separador	NS	Retiro de Semaforo Peatonal			172
			Suministro Instalacion de Semaforo Peatonal nuevo			70
			Serial: roja: 0973 verde: 0972 carcasa: 0056			
			Construccion de Empalme en semaforo Peatonal.			94
	Separador	NS	Retiro de Semaforo Peatonal.			172
			Suministro Instalacion de Semaforo Peatonal nuevo			70
			Serial: roja: 0991 verde: 0990 carcasa: 0010			
			Construccion de Empalme en semaforo Peatonal			94
	Separador	SN	Retiro de Semaforo peatonal			172
			Suministro Instalacion de Semaforo Peatonal nuevo			70
			Serial: roja: 0984 Verde: 0985 carcasa: 0078			
X Cr 36 Cll 45			Construccion de Empalme en Poste de alumbrado			94
			en punto nuevo queda Trabajando 119 al		05 pm	
			Equipo control de Trafico.			

EQUIPO EN OBRA:

Estacion, arnes, cs1089

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO SIT FAROL MED 2025 · BMV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	11/8/26	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Martes		LLUVIOSO			SI X		SI		SI
VEHÍCULOS:	7		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Cristian Pulgarin				Jose cortes	1098127131
Jesus Rua					
Carlos Mena					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* C. 43C x C110	S	WE	Se ajusta semaforo peatonal			260
	E	NS	Se Ajusta semaforo peatonal			260
	W	NS	Se Ajusta semaforo peatonal			260
			Se retira modulo verde peatonal			195
			Se instala lampara verde dinamica peatonal			218
			Se realiza empalme			94
* C. 41 x C110	W	NS	Se retira lampara verde peatonal			195
			Se instala lampara verde dinamica peatonal			218
			Se realiza empalme			94
* Trans x C195U	Separador	EW	Se retira lampara roja			195
			Se retira lampara amarilla			195
			Se retira lampara verde			195
			Se instala lampara roja			218
			Se instala lampara amarilla			218
			Se instala lampara verde			218
			Se realiza empalme			94

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, arnes, eslinga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

1/2

	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	11-08-26	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE		SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Martes		LLUVIOSO			SI	X		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO			NO		NO X

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Laura Marcela Padilla	1017221580			Jose Ortiz	1098127131
Willian Chavaria	9858775				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* Cr 46 cl 54	N-E	E-W	Pintado De poste Recto sin Rasqueteo	8-00		225
	S-W	E-W	Pintado De Poste Recto sin Rasqueteo			225
	S	N-S	Pintada De poste Recto sin Rasqueteo			225
* Cr 46 cl 53	S-E	S-N	Pintada De Poste De mensula sin Rasqueteo			225
	S	S-N	pintada De poste Recto sin Rasqueteo			225
	N-E	S-N	Pintada De Poste Recto sin Rasqueteo			225
	S	S-N	pinta De poste Recto sin Rasqueteo			225
	N-O	N-S	pinta De poste mensula sin Rasqueteo		4:00	225

EQUIPO EN OBRA:
Kit antiderrame - Arex. Escalera Ute Tecor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO MT PARQUE MED 2025 BMV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	11-08-26	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Martes		LLUVIOSO			SI X		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO X

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Laura Marcela P	1017221586			Jose Cortes	1098727131
William Chavarria	98581775				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr46 CL 53	S	N-S	Pintada De Poste Recto Sin Rasqueteo	8:00		225
	N-W	W-E	pintada De poste Recto sin Rasqueteo			225
	S-E	W-E	Pintada De Poste Recto Sin Rasqueteo			225
	N-E	W-E	pintada De Poste Recto sin Rasqueteo			225
						4:00

EQUIPO EN OBRA:

kit cotidiano - Escalera - Cuy - Pc menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO SIT CARGA 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	11-08-2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Martes		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	WLT 891.		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Cesar Santos	1038806300			Jose Cortes	1095127131
Miguel Villegas	1018229962				
Ermis Torres	1028030487				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 50 CL 67	N-E	E-W	Retiro de 2 Semaforos Vehicular a mensula	11-30		170
			Retiro de 1 Semaforo Peatonal			172
			Retiro de 1 disco direccional "T"			179
			Retiro de (2 x 5m + 8m + 7m) = 25m de cable 4x16. (Reintegro de 15m de cable 4x16)			173
			Retiro de 1 mensula especial de 5.5m.			166
			lavadero de 2 Semaforos Vehiculares.			234
			lavadero de 1 Semaforo Peatonal.			231
			lavadero de 1 disco direccional.			236
			Suministro e instalacion de 1 mensula 5.5m especial.			203
			Suministro de 4 juegos de tornillos para flanche de mensula (Electroservicios)			-
			Suministro de 4 arandelas y 4 tuercas para flanche de mensula (Electroservicios).			-
			Reinstalacion de 10m de cable 4x16.			215
			Suministro e instalacion de (9m + 7m) = 16m de cable 4x16 nuevo.		16-45	215

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTERVIAL MEDELLÍN 2025 - RFIV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	11-08-2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Mart		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:	WLY 892		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Cesar Santos	1039[illegible]6300			Jose cortes	1098727151
Miguel Villegas	1014729862				
Emis Teran	1028030487				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR50CLG7	N-E	E-W	Reinstalación de 2 Semaforos Vehiculares en mensulas	11-20		207
			Reinstalación de 1 semaforo peatonal.			208
			Reinstalación de 1 disco direccional.			220
			Construcción de 3 empalmes electricos.		16-45	94

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de interventoría

CONSORCIO SIT CARGA MED 2025 RAV	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA: 11-08-2026 DIA: Jueves VEHÍCULOS:	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN		UNIFORMES	CUMPLE SI NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
				Jose Castes	1098727131
				Auxiliar	71725751

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CTOS			Suministro de 500 fusibles ceramicos de L=3/4" y diametro 3/16" de 3,15 A			160

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	PLAN DE CALIDAD	VERSIÓN 1
	REINTEGRO DE ELEMENTOS	1/09/2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBJETO: MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD
NÚMERO DEL CONTRATO	4600105555 de 2025 (UNION TEMPORAL SIT)

Entregado por: ANYELO GOMEZ M. **Recibido por: FRANK GARCIA**

FECHA	ELEMENTO	CANTIDAD	UND	OBSERVACIÓN
12/8/2026	CABLE ENCAUCHETADO 4X16/4X18	186	MTS	SINIESTROS
12/8/2026	SONORIZADOR CON CANASTILLA	1	UND	SINIESTROS
12/8/2026	PULSADORES DIGITAL	2	UND	REVISAR PARA UTILIZAR
12/8/2026	PULSADOR DE BOTON	2	UND	REVISAR PARA UTILIZAR
12/8/2026	BASE DE PULSADOR	1	UND	SINIESTROS
12/8/2026	SEÑAL DE MOTOS	1	UND	SINIESTROS
12/8/2026	SEÑAL PEATONAL (INFORMATIVA DESECHABLE)	1	UND	SINIESTROS
12/8/2026	POSTE DE ENTERRAMIENTO	1	UND	SINIESTROS
12/8/2026	POSTE DE MENSULA	4	UND	SINIESTROS
12/8/2026	CARCAZA DE UN ASPECTO	1	UND	SINIESTROS
12/8/2026	BRAZO DE MENSULA	1	UND	SINIESTROS
12/8/2026	BAJANTE IMC 2"	3	UND	SINIESTROS
12/8/2026	ANTENAS DE COMUNICACIÓN 192,168,100,1	1	UND	S/N (23BPTUAHU0019)
12/8/2026	ANTENAS DE COMUNICACIÓN 192,168,100,1	1	UND	S/N (23BPTUAHU0018)
12/8/2026	ANTENAS DE COMUNICACIÓN 192,168,100,1	1	UND	S/N (23BPTUAHU0016)
12/8/2026	PLACAS DE CONTRASTE	37	UND	SINIESTROS
12/8/2026	ARAÑAS	1	UND	SINIESTROS
12/8/2026	FLAUTAS	2	UND	SINIESTROS
12/8/2026	DISCOS DIRECCIONALES	1	UND	SINIESTROS

VERIFICACION

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA:		FIRMA PERSONA QUE RECIBE	
nombre	ANYELO DANIEL GOMEZ MEJIA	nombre	FRANK GARCIA
cargo	ALMACENISTA	cargo	CIOS

CONSORCIO LUCERO 1650 2025 | EMV

PLAN DE CALIDAD

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO

Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105589 de 2025

SIT-SGC-F-001
VERSIÓN 1
ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	12/Ago/2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miércoles		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	DXT928		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Christian Barbosa				Jose Cortes	1098772703
Luis Lozano					
Juan Leo					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* Cr 55 x Cl 50			Se realiza sunchado de equipo controlado 2 sunchos 2 1/2			104
* Tv sup Cl 212	S	WE	Se realiza Ajuste de semaforo vehicular			260
			Se realiza Ajuste de semaforo peatonal			260
			Se retiran visores de semaforo peatonal malos			198
		SN	Se retiran visores peatonales malos			198
* Cr 49a x Cl 9cm	S	WE	Se retira lampara peatonal verde			195
			Se instala lampara peatonal verde micrelec			218-94
			Empalme			
* Cr 46 x Cl 80	W	NS	Se Ajusta semaforo peatonal			260
* Cr 49 x Cl 73	P	EW	Queda pendiente cambio de semaforo vehicular.			—

EQUIPO EN OBRA:

herramienta Menor, escalera

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INTEGRAL 2025	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	12-08-2026	TIEMPO	SECO	✓	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MIERCOLES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI ✓
VEHÍCULOS:	WHL737		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin santos	1038810427			Jose cortes	1098777137
simeon vivas	1065913019			Jonathan Pedon	1036962270
wilian chavarria	98681775				
Lenon pedilla	1092215816				


DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
AV 80 X cll 25 Y 21	N-W	N-S	demolición en zona dura de anden 7x7 por 30cm de espesor para buscar caja perdida.	9:30Am		1
			se realizo sondeo en toda la intercepción pasando por cajas de una se encuentra cajas perdida x canalización ostruida en la vía		4:00pm	237

EQUIPO EN OBRA: Planta electrica, Martillo demoledor, herramienta menor, Escoba, Pesca

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA: Mirar opciones para realizar Caja

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

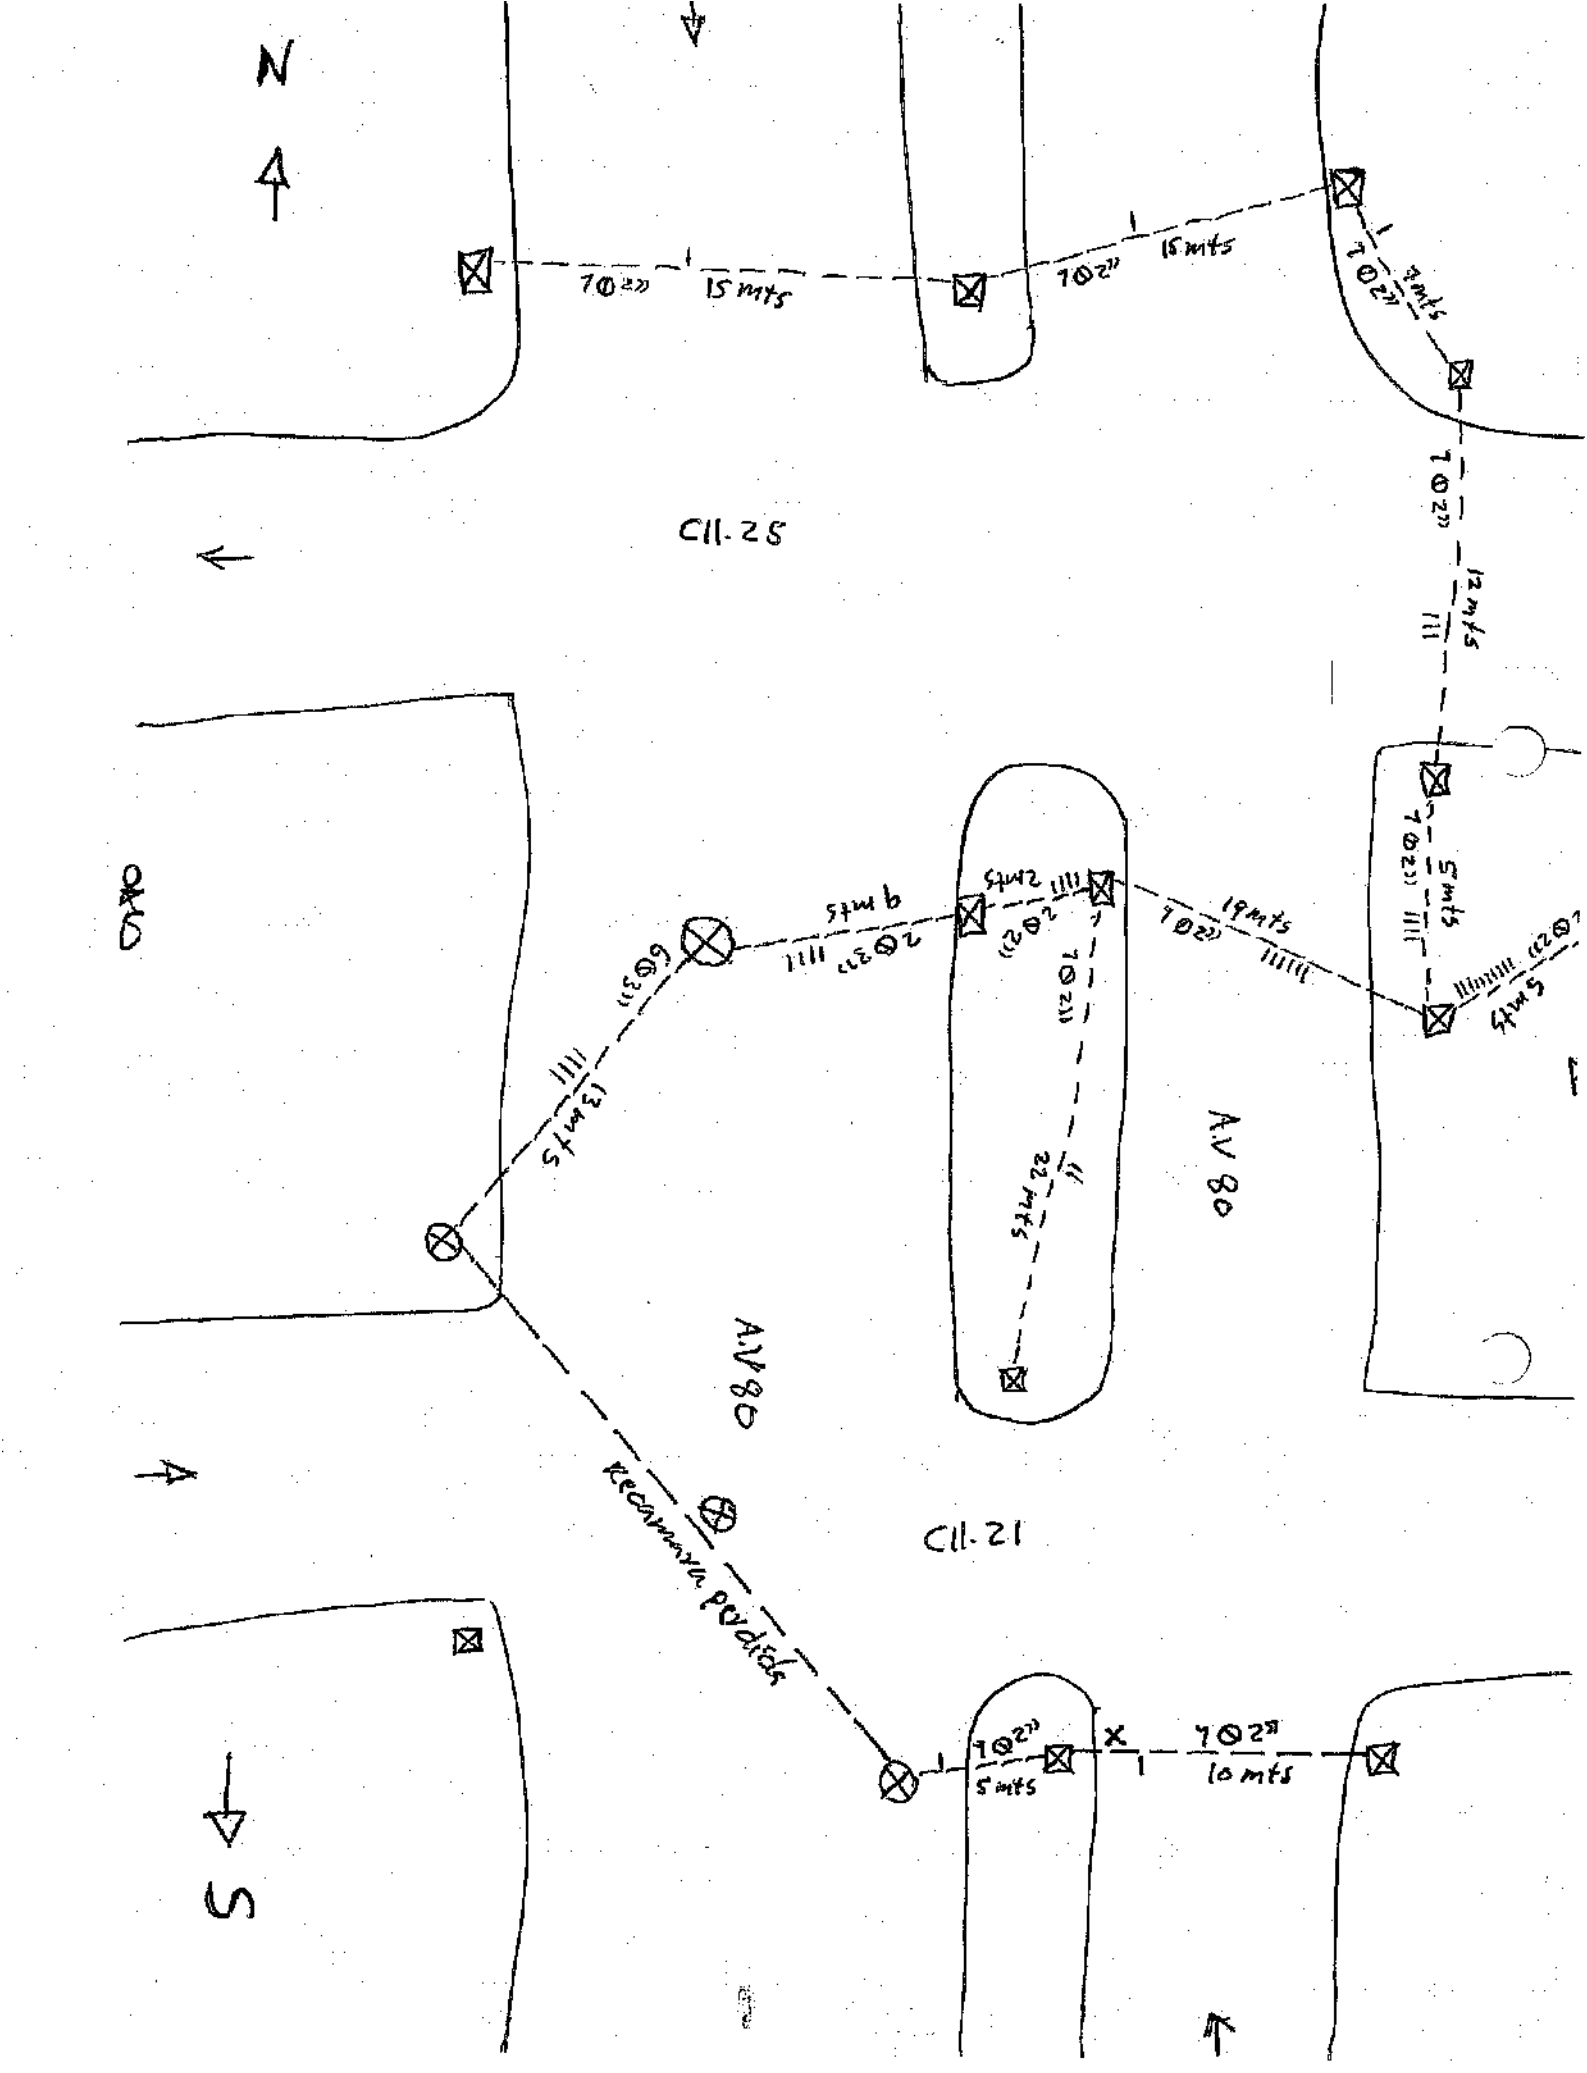
N
70 2"
15 mts
70 2"
15 mts
70 2"
9 mts
70 2"
12 mts
C11-25
5 mts
19 mts
13 mts
9 mts
22 mts
A.V 80
A.V 80
Recamara pedida
C11-21
70 2"
5 mts
X
70 2"
10 mts
S

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTEGRAL NCG 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	12 08 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	miercoles		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	ESQ 669		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime Cifuentes	71480675			Jose Cortes	1098727151
Jose Perez	524 0599				
Freddi valencia	1017 202 572				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
cra 48 # 10	S-or	or-oc	lavado de 1 poste. lavado de 1 semaforo vehicular. lavado de 1 semaforo peatonal. lavado de 1 disco	9.1 AM	9.30 AM	230-234-231-236
cra 48 x 10	N-or	S-N	lavado de 1 poste. lavado de 1 semaforo vehicular. lavado de 1 disco	9.30 AM	10.1 AM	230-234-236
cra 48 # 7	separador	S-N	lavado de 1 poste. lavado de 1 semaforo vehicular, lavado de 1 semaforo peatonal. lavado de 1 disco. lavado de 1 disco. lavado de 1 disco pec. lavado de 1 pulsador. lavado de 1 semaforo ciclista	10 AM	10.30 AM	230-234-231-236-232-231
cra 48 # 7	separador	N-S	lavado de 1 poste. lavado de 1 semaforo vehicular. lavado de 1 semaforo peatonal. lavado de 1 disco lavado de 1 pulsador lavado de 1 disco pec. lavado de 1 semaforo ciclista	10.30 AM	11.1 AM	230-234-231-236-232-231
cra 48 x 5	separador	N-S	lavado de 1 poste. lavado de 1 semaforo peatonal. lavado de 1 disco pec lavado de 1 pulsador.	11.1 AM	11.30 AM	230-231-236-235
cra 48 # 5	separador	S-N	lavado de 1 poste. lavado de 1 semaforo peatonal. lavado de 1 pulsador, lavado de 1 disco pec	11.30 AM	12 PM	230-231-232-236

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma - Arnes - Llave Allen

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTERVIAL MED 2025 · INTV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	12.08.2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	miercoles		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:	ESQ 669		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime cifuentes	71480675			Jose cortes	1020871494
Jose paez	82405 99				
Fredi valencia	1017202572				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
cra48X inem	separador	N-S	lavado de 1 poste, lavado de 1 semaforo vehicular, lavado de 1 semaforo peatonal, lavado de 1 semaforo ciclista, lavado de 1 disco, lavado de 1 pulsador, lavado de 1 disco PEC	1:1 pm	1.30 pm	230-234 / 231-231 / 236-232-236
cra48X inem	separador	S-N	lavado de 1 poste, lavado de 1 semaforo vehicular, lavado de 1 semaforo peatonal, lavado de 1 semaforo ciclista, lavado de 1 disco, lavado de 1 pulsador, lavado de 1 disco PEC	1.30 pm	2 pm	230-234 / 231-231 / 236-232-236
cra48X7	separador	N-S	lavado de 1 poste, lavado de 1 semaforo vehicular, lavado de 2 semaforos peatonales, lavado de 1 semaforo ciclista, lavado de 1 disco	2 pm	2.30 pm	230-234-231 / 231-236
cra48X7	N.or	S-N	lavado de 1 poste, lavado de 1 semaforo peatonal	2.30 pm	3 pm	230-231
cra48X7	N.or	or.oc	lavado de 1 poste, lavado de 1 semaforo vehicular, lavado de 1 disco	3 pm	3.30 pm	230-234 / 236
cra48X7	S.or	or.oc	lavado de 1 poste, lavado de 1 semaforo vehicular, lavado de 1 disco	3.30 pm	4 pm	230-234 / 236

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma - Arrex. 12 mts c

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTEGRAL MED 2025 RMV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105598 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	12.08.2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	miercoles		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	25 a		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime cifuentes	71.680.675			Jose carta	1098727131
JOSE PEREZ	82405994				
Fredi valencia	1017202572				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
cra 48 # 7	S-or	S-N	lavado de 1 poste. lavado de 1 semaforo vehicular. lavado de 1 semaforo ciclista. lavado de 1 disco	11 PM	11:15 PM	230-234
						231-236
cra 48 # 7	S-or	or. oc	lavado de 1 poste. lavado de 1 semaforo ciclista	11:15 PM	11:30 PM	230-231
	Separador					

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma - Amey - Hilux Nacar

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoria

1/2

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO LINEA PARQUEADERO 2025 · RHY	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600108569 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	12 Agosto 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miercoles		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	WLY 397		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Cesar Santos	1.038.906.300			Jose Cortes	1098727131
Miguel Villegas	1.013.229.962				
Elmis Torres	1.028.030.487				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 36 x	N-W	N-S	Suministro e instalacion de 1 Semaforo Vehicular			67
Calle 10A			a mensula de Conteo regresivo Stickers (1029-1293-1031)			
			Construccion de 1 empalme electrico			94
Carrera 46 x	N-W	N-S	Retiro de 1 Semaforo Vehicular a mensula			170
Calle 78			Retiro de 1 Semaforo Vehicular a poste			172
			Retiro de 1 Semaforo peatonal.			172
			Retiro de 1 disco direccional			179
			Retiro de (4L*4m+7m)=23m de cable 4x16			173
			reintegro de 7m de Cable 4x16			—
			Retiro de 1 mensula 4.5m			166
			Lavada de 2 Semaforos Vehicularres			234
			Lavado de 1 Semaforo peatonal			231
			Lavada de 1 disco direccional			226
			Suministro e instalacion de 1 mensula de 5.5m			203
			Suministro de 4 juegs de tornillos para flanche de mensula			—

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma - Anax - Hf Acer

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTEGRAL MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	12 Agosto 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miercoles		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	WLY 907		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Cesar Tuntos	1.038.906.300			Jose Cortes	70928127[illegible]
Miguel Villegas	1.019.229.962				
Emil Flores	1.028.030.487				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 46x calle 79	N-W	N-S	Suministro de 4 arandelas y 4 tuercas para patina de mensula			—
			Reinstalacion de 1 Semaforo vehicular a mensula			201
			Reinstalacion de 1 Semaforo vehicular a poste			208
			Reinstalacion de 1 Semaforo peatonal.			208
			Reinstalacion de 1 disco direccional			220
			Reinstalacion de 16 m cable 4x16			215
			Suministro e instalacion de 9m de cable 4x18			215
			Construccion de 3 empalmes electricos.			94

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma - Brazo Hidraulico

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Dueny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	13 -08 -2026	TIEMPO	SECO	61	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	JUEVES		LLUVIOSO			SI ✓		SI		SI ✓
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
edwin sandos	1038810427			Jose cortes	1098727191
simon vivas	1065913019				
Luis Lozano	9141229				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIÓ	HORA FINAL	ITEM
cra50 xcll52	S-W	E-W	cumbre de poste recto en mal estado	9:00am		1
			demolición de 1 pedestal en el poste			172
			retiro de 1 semaforo vehicular a poste			172
			retiro de 1 semaforo peatonal a poste			179
			retiro de 1 disco direccional 4 a poste para reintegro			173
			retiro de 10mts de cable 4x16 del poste			168
			retiro de 1 poste recto para reintegro			206
			suministro instalación de 1 poste recto nuevo			208
			reestalacion de 1 semaforo vehicular a poste			208
			reestalacion de 1 semaforo peatonal a poste			215
			reestalacion de 10mts de cable 4x16 al poste			94
			construccion de 2 empalmes electricos a poste			18
			concretado de 1 pedestal en el poste		2:00pm	
cra67 xcll49B exito colombia	N-W	W-E	se hace la visita ala intersección para revisar los pulsadores y abrir el armario se encuentra el cable desconectado se procede a hacer el chequeo con el personal tecnico desde el controlador quedando en buen funcionamiento	2:30 Pm	4:30pm	261

EQUIPO EN OBRA:

taladro demoledor, Planta electrica, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO SIT. EABOL BIEQ.2025 · BMY	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	13 08 2025	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:	MTN 502		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Barbosa	16791906			Jose Cortes	1048124131
Iguva					
Juan Roa					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 70 Cll 50	E	N S	Retiro de Semaforo Vehicular Vandalizado.	07am		172 -
			Instalacion Suministro de Semaforo nuevo			65 -
			Vehicular Serial. rojo = 1041 verde = 1043 amarilla = 1042			
			carcasa. = 0064			
			Sunchada y construcion de Empalme.			94 -
Cr 36 Cll 45			Se encuentra Equipo ~~de~~ apagado.			
			Retiro de cableado de acometida en mal			173 -
			estado 11 m			
			Suministro instalacion de cable para acometida			79 -
			encauchetado 2x12 15 metros.			
			Desoldada de caja 50 x 50			183 -
			Soldadura de caja 50 x 50			262 -
			construcion de Empalme Aereo.		06 pm	94 -

EQUIPO EN OBRA:

Equipo soldador, Planta electrica, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	14-08-2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	VIERNES		LLUVIOSO			SI ✓		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1038810427			Jose cortes	1098727131
Laura padilla	1017221580				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
cra 36 x cl 140	N-E	S-N	aplomada de 7 poste de enterramiento directo en zona dura	8:30 Am		197
	N-W	S-N	aplomada de 7 poste de enterramiento directo en zona dura		11:00Am	197
cra 36 x cl 145			cambio de lamparas peatonales rojas en mal estado	11:08pm		
	S-W	W-E	retiro de 7 lampara roja peatonal a poste			195
			instalación de 7 lampara roja peatonal de segunda a poste			218
			construcción de 7 empalme electrica a poste			94
	N-E	W-E	retiro de 7 lampara roja peatonal a poste			195
			instalación de 7 lampara roja peatonal de segunda a poste			218
			construcción de 7 empalme electrica a poste		12:00pm	94

EQUIPO EN OBRA:

taladro demoledor, Planta electrica herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

1/2

PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

CONSORCIO INTERMEDIO 2025 RMV

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	14 08 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	VIERNES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	ESQ 664		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JAIME CEPEDA	71480675			JOSE CORTES	1098772139
JOSE PEREZ	52403994				
FREDI VALENCIA	1017207572				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CRA 48 X CL 50	N-OC	N-OC	lavado de 1 poste, lavado de 1 semaforo vehicular, lavado de 1 semaforo peatonal, y ciclista, lavado de 1 disco lavado de 1 sonorizador	7:30 AM	8 AM	230-234 231-236-232
CRA 48 X CL 50	S-OC	N-OC	lavado de 1 poste, lavado de 1 semaforo vehicular, lavado de 1 semaforo peatonal y ciclista, lavado de 1 disco lavado de 1 sonorizador	8 AM	8:30 AM	230-234 231-236-232
CRA 48 X CL 50	S-OC	N-S	lavado de 1 POSTE, lavado de 1 semaforo peatonal y ciclista, lavado de 1 semaforo vehicular, lavado de 1 disco, lavado de 1 sonorizador	8:30 AM	9 AM	230-231 234-236-232
CRA 48 X CL 50	S-OC	OR-OC	lavado de 1 poste, lavado de 1 semaforo peatonal lavado de 1 sonorizador.	9 AM	9:30 AM	230-231 232
CRA 48 X CL 50	S-OR	OR-N	lavado de 1 POSTE, lavado de 1 semaforo vehicular, lavado de 2 semaforo peatonales y ciclistas, lavado de 1 disco, lavado de 1 sonorizador	9:30 AM	10 AM	230-234 231-236 232
CRA 48 X CL 50	N-OR	OR-N	lavado de 1 poste, lavado de 1 semaforo vehicular, lavado de 1 semaforo peatonal y ciclista, lavado 1 disco, lavado de 1 sonorizador	10 AM	10:30 AM	230-234 231-236-232

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma - Anex. Hab Mecr

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

2/2

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTERVIAL MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	14 08 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE		SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	VIERNES		LLUVIOSO			SI ✓			SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	ESQ 669		DURACIÓN			NO			NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime Cifuentes	71480 679			Jose Cortes	1098 [illegible]
Jose Perez	524 05 94				
Fredy valencia	1017 05 99				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
cra 48 x 45 sur	S-or	S-N	lavado de 1 poste. lavado de 1 poste para sonorizador.	10.30 AM	11 AM	230 ✓
			lavado de 1 sonorizador.			232 ✓
cra 48 x 45 sur	N-or	S-oc	lavado de 1 poste. lavado de 1 semaforo vehicular. lavado del disco	11 AM	11.30 AM	230-234 ✓
						236 ✓
cra 48 x 45 sur	S-or	S-oc	lavado de 1 poste. lavado de 1 semaforo vehicular. lavado de 1 disco			230-234 ✓
						236 ✓
cra 48 x 45 sur	S-or	S-N	lavado de 1 poste. lavado de 1 semaforo vehicular. lavado de 1 semaforo ciclista. lavado de 1 disco	11.30 AM	12 PM	230-234 ✓
						231-236 ✓

EQUIPO EN OBRA: Plataforma

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Dueny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTEPAROL MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	14 Agosto 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE		SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Viernes		LLUVIOSO			SI	✓		SI		SI
VEHÍCULOS:	WLY 897		DURACIÓN			NO			NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Cesar Santos	1.038.906 300			Jose Cortez	1098127131
Miguel Villegas	1.019.229.962				
Elmis Torres	1.028.030.497				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Transversal Superior x Calle 5 Sur	S-W	W-E	Retiro y reinstalacion de 1 Sensor de Vehiculo	9:10		172-208
			Encerezada de 1 semaforo vehicular a poste			258
					9:41	
Carrera 63x Calle 52	S-e	S-n	Retiro de 1 semaforo vehicular a mensula	10:00		170
			Retiro de 3 metros de caide 4x16			173
			Retiro de 1 brazo de mensula			167
			Demolicion de concreto en plataforma de mensula (0,6M x 0,6m x 0,12m)			1
					1:00	
			Se debe de programar la instalación de reciclaje debido a que la plataforma existente no coincide con la plataforma de la mensula nueva			

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma - Arnes - Casco

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO RELEASOL MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	15 08 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Sabado		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	MTN 502		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Bolbaa	16791906			Jose Cortes	1098712191
Cristian Mena	1076817116				
Jose Andrade	11222857				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 25	S	EW	Suministro Instalacion de herraje de 50050	07 am		13
Cll 2 Sur			Suministro Instalacion de herraje de 50050		11 am	13
Cra 49 cl 10			Revision de acometida de la carrera 49.			
			cl 10 construccion de Empalme de acometida			94
			en caja de paso			
076 Cl 78	N	EW	Enderezada del semaforo Vehicular			258
			Retiro de contrayte en mal estado			199
	S	EW	Retiro de contrayte en mal estado			199
KR80 cl 25			Recogida de Escombros.		4 30pm	

EQUIPO EN OBRA:

Planta electrica, taladro demoledor, Pulidora, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO VIAL FAROL BID 2025 · RDV · UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	16 09 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE		SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Domingo		LLUVIOSO			SI	✓		SI		SI
VEHÍCULOS:	MTN 502		DURACIÓN			NO			NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Barbosa	1679190 G			Jose Cortes	1098727191
Jose Andrade	11222857				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 52 - 53	Separador	W-E	Hurto de Cabledo en caja de paso y	08am		
Cll 4-6 sur			Tubería.			
			concretada de 3 cajas de paso de			263 -
			50 x 50 y Tubería 1 metro concreto.		4pm	18 -

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTEGRAL SEMAFORIZACIÓN 2025 · RNV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBR ARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	16-08-2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Domingo		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	WLY 893		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1038811427			Jose Cortes	1098727131
Angela Gomez	1152187129				
Carlos Diaz	1017444476				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Conc 109 x Cll 62	S	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola	7:00		171
	W	WE	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola		7:15	171
Conc 91 x Cll 64	W	WE	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola	7:20		171
	E	EW	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola		7:35	171
Conc 85 x Cll 960	W	WE	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola	7:40		171
	N	NS	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola		7:50	171
Av 80 x Cll 95	E	EW	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola	7:55		171
	W	WE	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola			171
	W	WE	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola		8:10	171
Av 80 x Conc 78A	N	NS	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola	8:15	825	171
Conc 77A x Cll 65	W	WE	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola	8:30		171
			Retiro de 3 lamparas de Flecha a Ménsola			196
			Reinstalación de 3 lamparas de Flecha y Conformación de 1 Empalme		840	219
						94

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma - Aux. - Ate Nocr

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	6-05-2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Domingo		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	UOL 897		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1038810727			Jose Cortes	1098727791
Angelo Gomez	1152189124				
Cailo Bioil	1017144470				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 77A x Cll 65	E	EW	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola	8:40		171
			Retiro de 3 Lamparas de Techo a Ménsola			196
			Reinstalación de 3 lamparas y Construccion de Empalme.		8:60	219-94
Carrera 72A x Cll 73	S	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola.	8:55		171
	S	NS	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola			171
	N	NS	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola			171
	N	NS.	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola			171
	N	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola		9:30	171
Carrera 67 x calle 69 (c Florida)	W	WE	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola	9:35	9:45	171
Carrera 64 x Cll 97	E	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola	9:50		171
	S	EW	Retiro e instalación de 2 Semaforos a Ménsola			171
	S	WE	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola			171
	W	WE	Retiro e instalacion de 2 Semáforos a Ménsola.			171
	E	EW	Retiro e instalación de 2 Semáforos a Ménsola		10:30	171

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma - Annex - Hilos Nacor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Gueny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	16-08-2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Domingo		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	WLY 894		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1035810727			Jose Cortes	1090727131
Angelo Gomez	1152189124				
Carlos Diaz	1011444 10.				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 64C x Cll 67	Nw	NS	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	10:30	10:40	171
Carrera 65 x Cll 69	N	EW	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	10:45	10:55	171
Carrera 72A x Cll 79	E	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	11:00	11:15	171
Carrera 75 x Cll 80	E	EW	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	11:25		171
Carrera 75 x Cll 80	N	NS	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula			171
	W	WE	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula		11:40	171
Carrera 92A x Cll 79	W	NS	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula.	12:00	12:00	171
Av 80 x Cll 78	S	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	12:10		171
	N	NS	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula		12:30	171
Av 80 x Cll 97E	N	NS	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	12:35	12:45	171
Av 80 x Cll 97BB	N	NS.	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	12:50	13:00	171
Av 80 x Cll 456	N	NS	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	13:10	13:20	171
Carrera 84 x Cll 44	E	EW	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	13:30		171
			Retiro de lampara de Control			196
			Reinstalación de lampara de Control y Construcción de Empalme		13:50	219-94

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma - Amez - Hb Mevo.

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO SIT FERROL MED 2025 · DAV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	16-08-2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Domingo		LLUVIOSO			SI ✓		SI		SI
VEHÍCULOS:	WLY897		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1038810727			Jose Cortes	1698427713
Angelo Gomez	1152187124				
Carlos Diaz	10AA4470				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 84 x Cll 44	N	NS	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola.	14:00	14:10	171
Carrera 84 x Cll 44	W	WE	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola	14:10	14:20	171
			Retiro de lampara de Contro			196
			Reinstalación de lampara de Contro. y Construcción de Empalme			219-94
	S	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola	14:20	14:30	171
Carrera 84 x Cll 44	N	NS	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola	14:30	14:40	171
Av 80 x Cll 38	E	EW	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola	14:45		171
			Retiro de lampara de Contro			196
			Reinstalación de lampara de Contro y Construcción de Empalme		14:55	219-94
Av 80 x Calle 16	N	NS	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	15:00		171
	W	WE	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola			171
			Retiro de 3 lamparas de Flecha			196
			Reinstalación de 3 lamparas de Flecha y Construcción de Empalme		15:10	219
Av 80 x Calle 2	N	NS	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola	15:20	15:30	171

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma - Anuex - Hts Mewr

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTERVIAL MED 2025 / RMV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	16-08-2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Domingo		LLUVIOSO			SI /		SI		SI
VEHÍCULOS:	WOLY 893		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1039810927			Jose Cortes	1098727131
Angelo Gomez	1132187124				
Carlos Diaz	1017449410				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Av 80 x Calle 70	N	NS	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	15:35		171
			Retiro de Lampara de Cenital			196
			Reinstalación de Lampara de Cenital y Construccion de Empalme			219-94
	Co	WE	Retiro e instalación de Semaforo a Ménsula			171
			Retiro de Lampara de Cenital			196
			Reinstalación de Lampara de Cenital y Construcción de Empalme		15:50	219-94
Calle 50 FF x Cl 78 SW	E	EW	Retiro de Semaforo Vehicular a Ménsula	16:	16:10	171

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma - Vta Menor. Amex

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · Unión Temporal SIT Medellín · Consorcio SIT Fase III 2025 · BRT	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	17 - AGOSTO - 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Lunes (Festivo)		LLUVIOSO	X		SI X		SI X		SI
VEHÍCULOS:	WLY 897.		DURACIÓN			NO		NO		NO X

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Deivyd Yepez Mejia	1152189124			Jose Cortes	1098727151
Carlos Alberto Diaz	1017144470				
William Echeverri	9868175				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cra 63B X Av 33.	Separador	VE	Retiro de Poste de Entramado (siniestro)	7:30.		168
			Retiro de Semaforo vehicular (siniestro)			172
			Retiro de Semaforo peatonal (siniestro)			172
			Retiro de Mastil direccional (siniestro)			179
			Retiro de Brazo PEP (siniestro)			179
			Retiro de Botoin Pulsador. (Bueno - Reutilizar)			177
			Retiro de cable 4X16. (3 mts) - (siniestro).			173
			Atencion por Incidente de transito (siniestros)		8:00.	

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor - Dotex - Eppe.

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INTERVENTOR MED 2025	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA - DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	19/08/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Lunes		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:	WLY897		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Anyelo Gomez	1152187129			Jose Cortes	1098727731
William Chavarria	98681975				
Carlos Diaz	1017199470				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 43A x cll 19A Sur	W	WE	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola	14:10	14:20	171
			Retiro de Lampara de Conteo a Mensola			196
Carrera 43A x cll 16A Sur	S	SN	Reinstalación de Lampara de conteo y construcción de Empalme			219-94
			Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola	14:50		171
			Retiro de 3 Lamparas a Ménsola (2 de Flecha y 1 de Conteo).			196
			Reinstalación de 3 Lamparas y Construcción de Empalme.		14:40	219-94
Carrera 43A x cll 8 Sur	S	SN	Retiro de Semáforo a Ménsola y Reinstalación de Semáforo.	14:45	14:50	171
Carrera 43A x cll 5 Sur	S	SN	Retiro de Semáforo a Ménsola y Reinstalación de Semáforo	14:55	15:05	171
			Retiro de lampara de Conteo			196
	W.	WE	Reinstalación de Lampara y Construcción de Empalme			219-94
			Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola	1505	15:15	171
Carrera 43A x cll 9	S	SN	Retiro de Semáforo y Reinstalación de Semáforo	15:20		171
			Retiro de lampara de Conteo			196
			Reinstalación de Lampara de Conteo y Construcción de Empalme		15:30	219-94

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma - Hts Nenuco Amyo

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Dueny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	19/08/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Lunes		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:	WOL 897		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Anyelo Gomez	1152189129			Jose Cortes	1098727191
Cailian Chavarria	98681975				
Carlos Diaz	1019444470				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 66x cll 94	N	NS	Retiro instalación de Semáforo a Ménsula	10:00	10:10	17
	W	WE	Retiro instalación de Semáforo a Ménsula	10:10	10:20	17
Carrera 65x cll 94	W	WE	Retiro instalación de Semáforo a Ménsula	10:20	10:30	17
Carrera 52x cll 93	W	WE	Retiro instalación de Semáforo a Ménsula	10:40	10:50	17
Carrera 52 x cll 93	S	NS	Retiro instalación de Semáforo a Ménsula	10:50	11:00	17
Carrera 52x cll 92	N	NS	Retiro instalación de Semáforo a Ménsula	11:00	11:10	17
	S	SN	Retiro instalación de Semáforo a Ménsula	11:10	11:20	17
Carrera 52 x cll 93	S	SN	Retiro instalación de Semáforo a Ménsula	11:20	11:30	17
Carrera 52x cll 80	N	NS	Retiro instalación de Semáforo a Ménsula	11:40	11:50	17
Carrera 43 cx cll 45bis	N	NS	Retiro instalación de Semáforo a Ménsula.	12:20	12:30	17
Carrera 43c x cll 45bis	W	WE	Retiro instalación de Semáforo a Ménsula	12:30	12:40	17
	E	EW	Retiro instalación de Semáforo a Ménsula	12:40	12:50	17
	W	EW	Retiro instalación de Semáforo a Ménsula	12:50	13:00	17
Carrera 43C x Calle 60bis	S	SN	Retiro instalación de Semáforo a Ménsula	13:30	13:40	17
Carrera 43A x cll 8 Sur	N	NSur	Retiro instalación de Semáforo a Ménsula	13:40	13:50	17
Carrera 43A x cll 8A Sur	N	NSur	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula.	14:00	1410	17
			Retiro de lampara de Control			196
			Retiro instalación de lampara de Control y Construcción de Empalme.			219-94

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma - Arnes - UPC Nexo

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO DEL FAROL MED 2025 · BMY	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	17/08/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Lunes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	WLY899		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Anyelo Gomez	1152189124			Jose cortes	1098727131
William Chavarria	98681775				
Carlos Diaz	1041444470				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Regional x Monterrey	S	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	6:30.	6:40	
Cl 82 x cll 92	SE	WE	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	6:40	6:50	
Cl 85 x cll 93	S	WE	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	6:50	7:00	
	N	NS.	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula.	7:00	7:10	
	S	NS	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	7:10	7:20	
Carrera 91A x calle 92	N	NS	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	7:20	7:30	
	SW	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	7:30	7:40	
	SE	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	7:40	7:50	
	E	EW	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	7:50	8:00	
Carrera 93 x Cll 94	E	EW	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	8:00	8:10	
	N	NS	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	8:10	8:20	
Carrera 92 x cll 93	N	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	8:20	8:30	
Carrera 92 x cll 93	N	EW	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	8:30	8:40	
Carrera 95 x cll 94	S	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	8:40	8:50	
	E	EW	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	8:50	9:10	
	N	NS	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	9:10	9:20	
Carrera 92 x cll 93	N	NS	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	9:30	9:40	
	W	EW	Retiro e instalación de 2 Semáforos a Ménsula	9:40	9:50	

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma - Anex - Hp Neuer

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO MEL FABOL MED 2025 / BMV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA - DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	17/08/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Lunes		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	WLY 897		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Angelo Gomez	1152187124			Jose Cortes	1098727131
William Chavarria	98681775				
Carlos Diaz	1017444470				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 49 x Cll 66F	W	WE	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula.	545		171
Carrera 49 x Cll 73	E	EW	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula			171
			Retiro de Lampara de Control		5:55	196
			Reinstalación de Lampara y Construcción de Empalme			219-94
	W	WE	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	6:00	605	171
	W	WE	Retiro e instalación de semáforo a Ménsula (Doble Semaforo)			171
			Retiro de lampara de Control			196
			Reinstalación de Lampara de Control y Construcción de Empalme			219-94
	S	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	6:05	6:15	171
			Retiro de Lampara de Control.			196
			Reinstalación de lampara de Control y Construcción de Empalme			219-94
	N	NS	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula			171
			Retiro de lampara de Control			196
			Reinstalación de Lampara de Control y Construcción de Empalme	615	620	219-94
Carrera 49 x Cll 70	W	WE	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	620	625	171
Carrera 49 x Cll 69	W	WE	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	625	630	171

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma - Hpc Nuevo. Anux.

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN / CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	17-08-2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE		SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Lunes		LLUVIOSO			SI /			SI /		SI
VEHÍCULOS:	WLJ 897		DURACIÓN			NO			NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Angelo Gomez	1152189129			Jose Cortes	1098727731
Willian Chavarria	98681975				
Carlos Diaz	1017199470				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Av80xCll33	N	NS	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	15:50		171
			Retiro de Lampara.			196
			Reinstalación de Lampara y Construcción de Empalme		16:00	219-94
	S	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	16:00	16:10	171
			Retiro de Lampara			196
			Reinstalación de Lampara y Construcción de Empalme			219-94
	W	WE	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	16:10	16:20	171
			Retiro de Lampara			196
			Reinstalación de Lampara y Construcción de Empalme			219-94
Av80xCll32F	N	NS	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	16:20		171
			Retiro de Lampara de Concreto			196
			Reinstalación de Lampara y Construcción de Empalme		16:30	219-94
Av80xcalle30	N	NS	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	1630	16:40	171
	S	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula			171
Av80xcalle28	N	NS	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	16:40		171
	W	WE	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula		16:50	171
Av80xcll21425	N	NS	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	16:50		171
	W	WE	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula		19:00	171

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma - Vta Mecor. Auxx.

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INTEGRAL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	17-08-2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Lunes		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:	WLY 897		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Angelo Gomez	1152184124			Jose Cortes	7098727137
William Chavarria	98681775				
Carlos Diaz	10A144470.				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Av80x calle21425	S	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola	17:50	19:05	171
Av80x calle20A	N	NS	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola	1905		171
	W	WE	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola			171
	S	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola		19:20	171
Av80xcalle85ov	N	NS	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola	17:20		171
			Retiro de lampara de Control			196
			Reinstalación de lampara de Control y Construcción de Empalme			219-94
	W	WE	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola			171
			Retiro de Lampara de Control			196
			Reinstalación de Lampara de Control y Construcción de Empalme		17:35	219-94

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma - Amex - Ute Ncor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO SIT PATROL MED 2025 · RMV · UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	17/08/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Lunes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	WLY897		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Anyelo Gomez	1152187129			Jose Cortes	1098727111
William Chavarria	98681775				
Carlos Diaz	1017144470				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 43A x Cll 10	S	SN	Retiro e instalación de Semaforo a Mayoria	15:15		171
			Retiro de Lampara de Conteo			196
			Reinstalación de Lampara de Conteo y Construcción de Empalme		15:20	219-94

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma - Camioneta

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN · CONSORCIO SIT FARO MED 2025 · PAV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	18 - 08 - 2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MARTES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI ✓
VEHÍCULOS:	DXT928		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1038810427			Jose Cortes	1098727131
wilian chavarria	9868175				
cristian barbosa					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CRA 64A X CLL 33	separador central	E - W	se aborda la intersección por suministro de incidente de tránsito en poste recto.	7:30 AM		
			demolición de tapa con concreto de 50X50			16
			retiro de 7 herraje de 50X50			187
			Limpieza de caja de 50X50			54
			suministro instalación de 7 poste recto nuevo			206
			suministro instalación de 30mts de cable 4X18 nuevos de la caja al poste			215
			suministro instalación de 7 semaforo vehicular nuevo a poste			65
			stiker: Rojo 1050 - amarillo 1051 - verde 1052			
			suministro instalación de 7 semaforo peatonal nuevo dinamico a poste			90
			stiker: Rojo 1294 - verde 1295			
			construccion de 3 empalmes electricos en la caja de 50X50			94
			construcción de 7 empalmes electricos a poste			94
			suministro instalacion de 7 herraje nuevo de 50X50			13
			perforacion en poste con taladro, broca cera, y machuelos			247
			Instalacion de 7 pulsador de boton de segunda a poste		12:00 PM	214

EQUIPO EN OBRA:

Taladro destapador, Planta electrica, herramienta menor, Pulidora

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

1/2

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
UNIÓN TEMPORAL MTTMEDELLÍN / CONSORCIO INTEL PATROL MED 2025 / RMY	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	18-06-26	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MARTES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	MTN 502		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1638810427	Franklin Barbosa	16791906	Jose Cortes	1098727491
wilson chavarria	9868175				
Yerson quintero	1039597432				
Carlos mario	1049894058				


DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Crr 46 x cll. 49			se realiza sondeo en la intersección y desoldado de tuercas	10:00pm		237
	N-W		retiro de 3 puntos de soldadura			183
	separador		retiro de 3 puntos de soldadura			183
	S-E		retiro de 3 puntos de soldadura			183
	N-E		retiro de 3 puntos de soldadura			183
	separador		retiro de 3 puntos de soldadura		5:00 am	183

EQUIPO EN OBRA:
Equipo soldador, Planta electrica, Pulidora, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

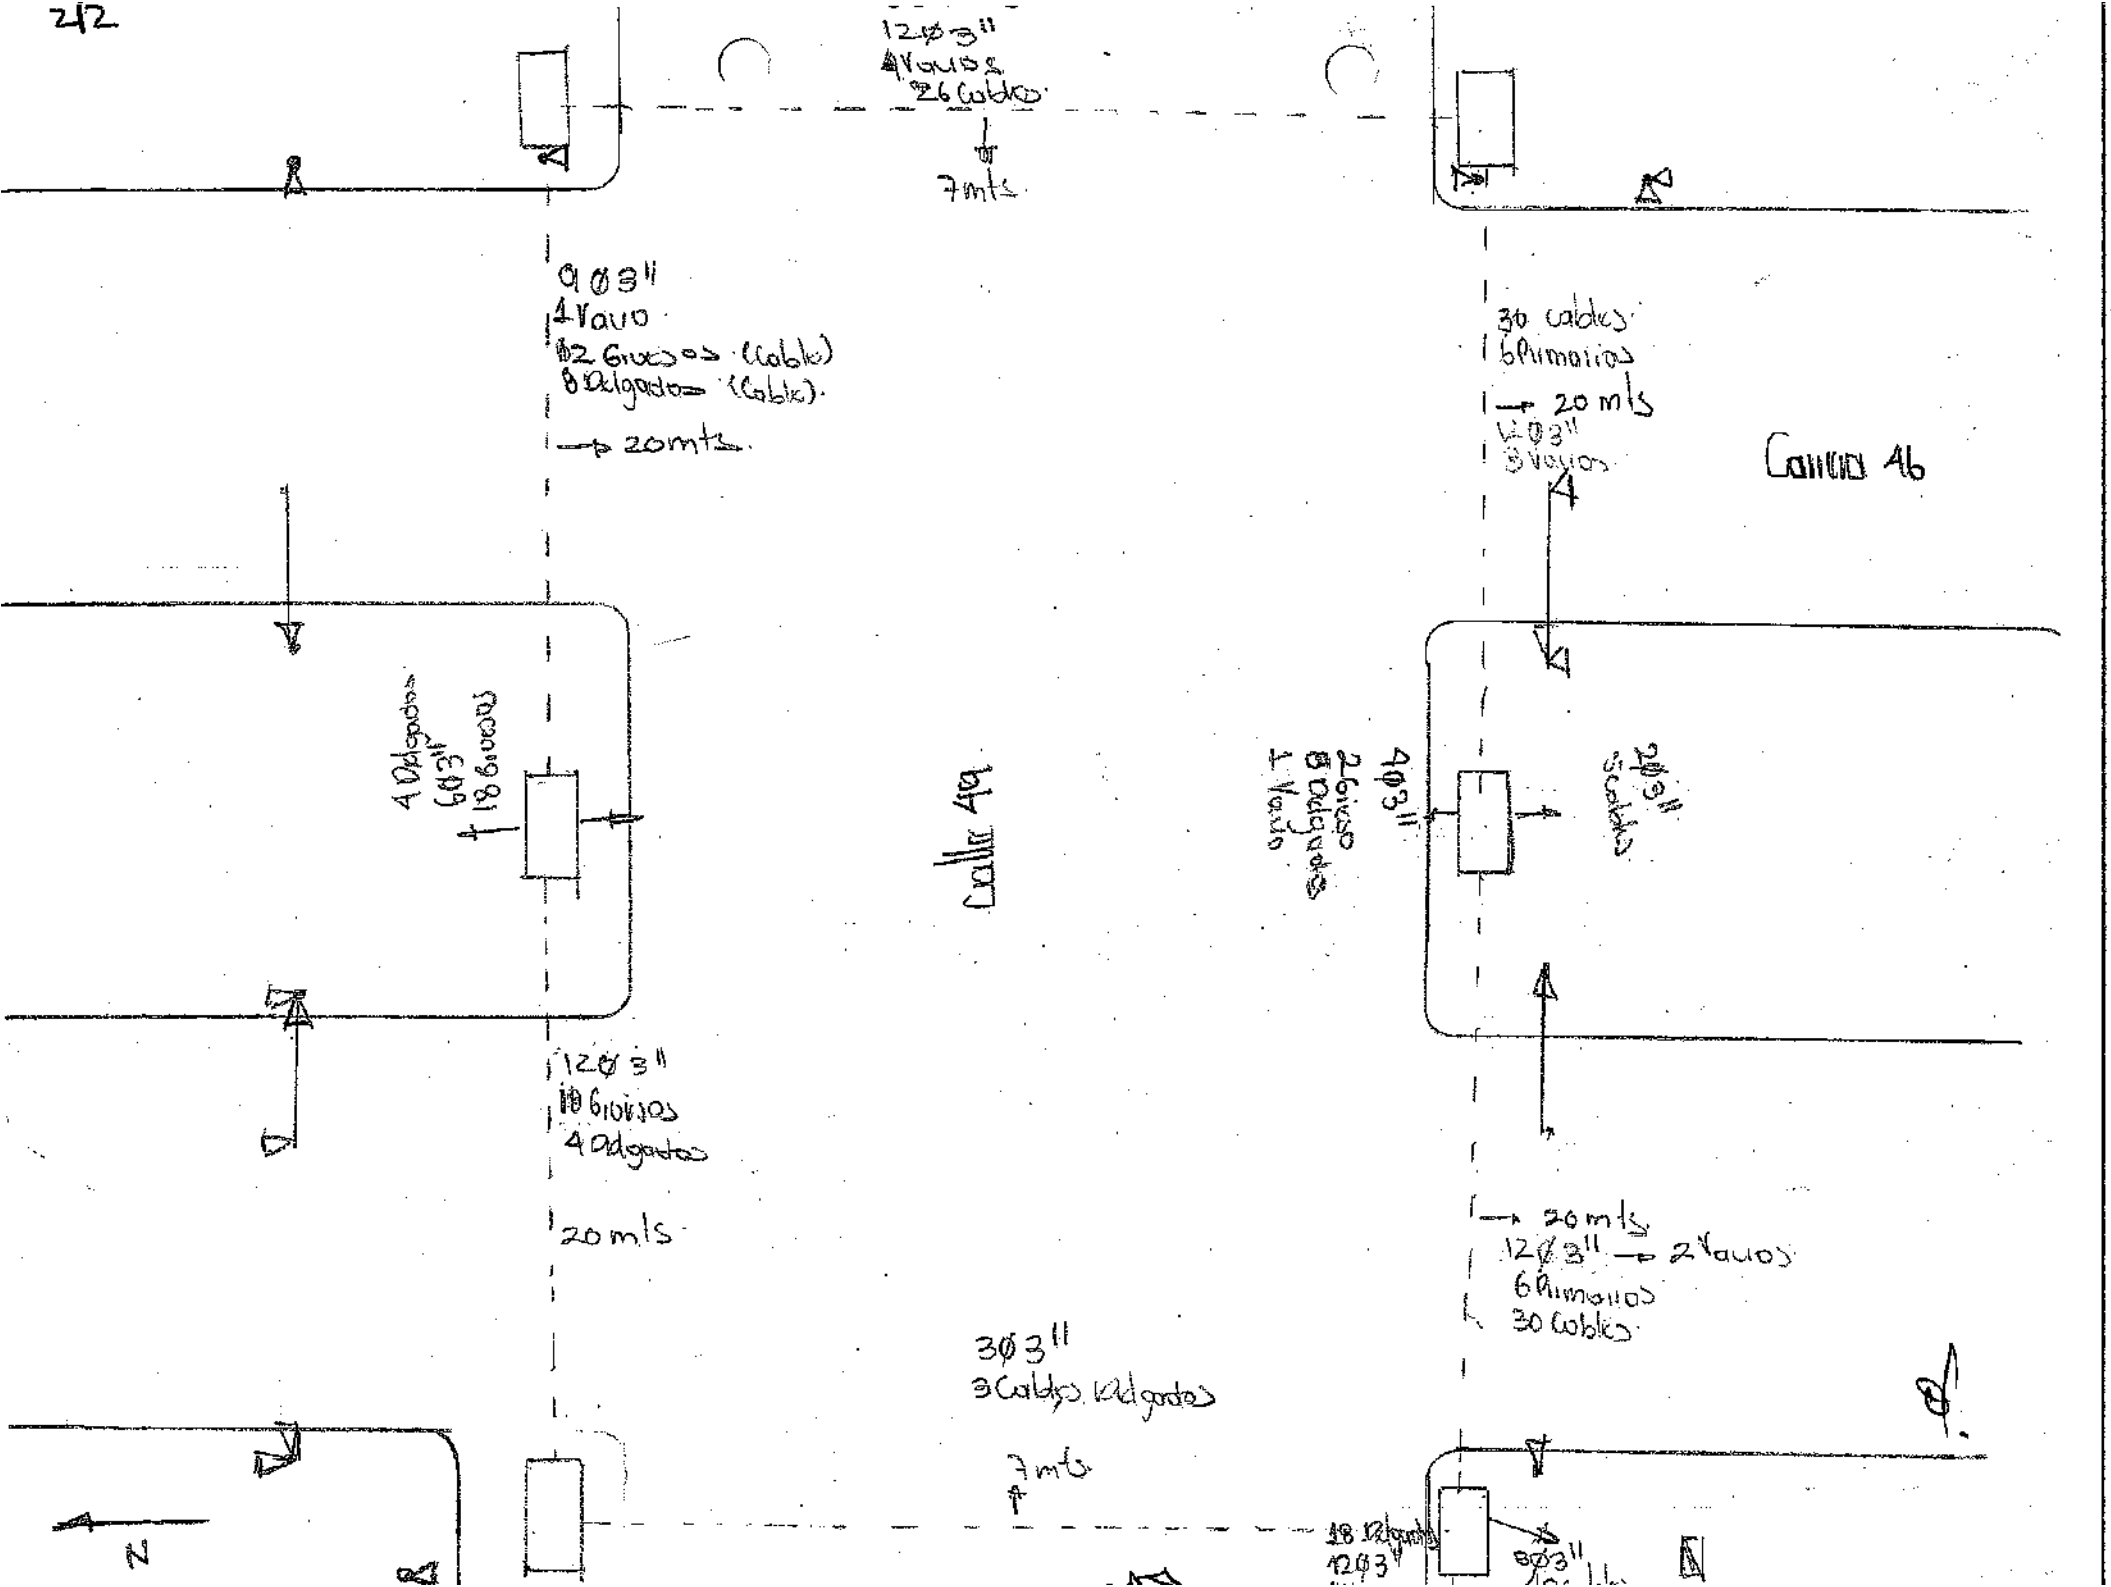
12 ø 3"
4 Vanos
26 Cables
7 mts
9 ø 3"
1 Vano
#2 Gruesos (Cable)
8 Delgados (Cable)
20 mts
30 cables
6 Primarios
20 m/s
4 ø 3"
3 Vanos
Calle 46
4 Delgados
6 ø 3"
18 Gruesos
Calle 49
2 Grupos
8 Delgados
1 Vano
4 ø 3"
2 ø 3"
12 ø 3"
10 Gruesos
4 Delgados
20 m/s
20 m/s
12 ø 3" → 2 Vanos
6 Primarios
30 Cables
3 ø 3"
3 Cables Delgados
7 mts
N

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO ALUMBRADO MED 2025 · RMV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	18 Agosto 2026	TIEMPO	SECO	x	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Martes		LLUVIOSO			SI ✓		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Hugo José Rico Silva	1000532976			Jose Cortes	1098714731
Jimeson Fernando Uval				Alexis Lobo	75771771

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
A- carrera 52 - calle 54	E	N-S	• Se encuentra cruce con grupos 4 y 5 (peatonal) apagado	9:00 AM		
			• Verificación de cableado			
			• Construcción de 3 empalmes			94 -
			• Se deja el grupo # 5 operativo			
			• El grupo # 4 queda pendiente por cambio de cableado ya que este se debe realizar con continuidad		10:00	
X- Carrera 65 - calle 78	W	N-S	• Se encuentra grupo # 16 apagado (con corto)	10:47		
			• Retiro de soldadura de 3 capas de 80 x 50			1835
			• Retiro de 61 metros de cable 4 x 18 en mal estado			1763
			• Suministro e instalación de 163 metros de cable 4x18 nuevo			215
			• Construcción de empalme			94
			• Soldado de 3 capas de 50x50		5:00pm	262

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN MED 2025 RMY	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	18 08 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	martes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	MTN 502		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Barbaja	16791906			1036962270	
Carlos Gonzales	1089957832			Jonathan Pundor	1036962270
Yeison Galeano	1094990408			Jose Carlos	1090727131

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 51	W	NS	Poste recto golpeado por Vehiculo.	07am		172
Cll 49			Retiro de Semaforo peatonal			172
			Retiro de Semaforo Vehicular			179
			Retiro de Disco Direccional			173
			Retiro de Cableado 4X18 8 metros.			168
			Retiro de poste recto en mal estado.			206
			Instalacion de Poste recto nuevo.			215
			Reinstalacion de Cableado 4X18 8 metros			220
			Reinstalacion de Disco Direccional.			208
			Reinstalacion de Semaforo peatonal			208
			Reinstalacion de Semaforo Vehicular.			94
			Construccion de Empalmes en Semaforo peatonal y Vehicular.			199
	E	NS	Retiro de Contraste en mal estado.		05pm	

EQUIPO EN OBRA

Planta electrica, Bateria, Taladro demoledor, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

Se verifica señalización y EPP, retiro contraste en semaforo costado N sentido occi-orien

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTERVIAL 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	18/08/26 19/08/26	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Martes		LLUVIOSO			SI ✓		SI		SI ✓
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Yeison Jose Rivo Silva	1035931996			Jose Cortes	1098727139
Yeimer Fernando Vivas	1069915019			Jonathan Rendon	1036962270
Jose Andrade	11 222 857				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* Avenida 80 con Asturias	Separador central	E - W	• Construcción de canalización de 24 metros (Zona Verde)	7:00 AM		25
			• Suministro e instalación de 4 tubos IMC (12 Metros) (3")			—
			• Suministro e instalación de 3 tubos 3" PVC (12 Metros)			18
			• Recubrimiento de canalización con concreto (24 Metros)			35
			• Construcción de caja de 60 x 60			13
			• Suministro e instalación de hierro de 60 x 60			13
			• Suministro e instalación de hierro de 50 x 50			1
			• Demolición de caja eléctrica 50 x 50 (EPM)			
			• Re-construcción de caja eléctrica 50 x 50 (EPM)		5:00 PM	

EQUIPO EN OBRA:

Planta electrica, taladro demoledor, Pulidora, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
K4 CONSORCIO SIT FARO LED 2025 · RPV · UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	19/8/26	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miercoles		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	MJN509		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Christian Londoño				Jose Cortes	1040[illegible]1
Luis Tordoya					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
X Cr 49 x Cl 72	N	E W	Se retira semaforo vehicular Malo	8:00		172 -
			Suministro, instalacion de semaforo vehicular			65 -
			(1016-1015-1014-Semaforo 20250149)			
			Se realiza empalme			94 -
X Cr 76 x Cl 36	S	W E	Se retira semaforo vehicular Malo			172 -
			Suministro e instalacion de semaforo vehicular			65 -
			(			
			Se realiza empalme			94 -
- Cr 64A x Cl 73	N y Sep	W E	Rojo peatonal apagado se revisa los modulos y estan en funcionamiento queda pendiente revisar el cableado y cambiar una tapa concreyada			-
X Cr 65 x Cl 80		S N	Recoger escombros		5:00	-

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor - Escalera. Anex.

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO SEMÁFOROS MED 2025 · UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN · DEVI	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	20 - 08 - 2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	JUEVES		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:	WHL 737		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1039810427			Jose Cotta	1098727131
Yeison Gulcano	1039597832				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CRA 53 X CLL 46	S - E	W - E	retiro de 1 gavinete nuevo para reestalar en la cra 55 por cll 50	8:50am		165 -
CRA 55 X CLL 50	N - E	N - S	reestalacion de 1 gavinete nuevo que se retiro en la cra 53 por cll 46		10:36 Am	216 -
CRA 77 X CLL 30			cambio de semaforos vehicolares en mal estado	12:50pm		
	separador central	W - E	retiro de 1 semaforo vehicular a poste suministro estalacion de 1 semaforo vehicular nuevo a poste sticker poste 1026 - amarillo 1027 - verde 1028 construccion de 1 empalme electrico a poste			172 - 65 - 94 -
	S - E	S - N	retiro de 1 semaforo vehicular a poste suministro estalacion de 1 semaforo vehicular nuevo a poste sticker: poste 1032 - amarillo 1033 - verde 1034 construccion de 1 empalme electrico a poste		2:00Pm	172 - 65 - 94 -

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta Menor - Escaleras - Arnex

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	20/08/2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves		LLUVIOSO			SI ✓		SI		SI ✓
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Carlos Gonzalez Simeon Fernando	1049894058			Jose cortes	1098727131

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 46 - C1149	S-W	S-N	Se realizan 4 cordones de soldadura de 15 cm en tapas	0830		262
	N-W	S-N	Se realizan 4 cordones de soldadura de 15 cm en tapas			262
	Abril central	S-N	Se realizan 4 cordones de soldadura de 15 cm en ~~cordones~~ tapas			262
	Carril central	N-S	Se realizan 4 cordones de soldadura de 15 cm en tapas			262
	N-E	N-S	Se realizan 4 cordones de soldadura de 15 cm en tapas			262
	S-E	S-N	Se realizan 4 cordones de soldadura de 15 cm en tapas		12:30	262

EQUIPO EN OBRA:

Equipo soldador, Planta electrica, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO SIT PAROL MED 2026 / DMV — UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	21-08-2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	VIERNES		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:	LKO061		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1038810427			Jose Cortes	1098127131
Juan Roa	1000537976				
Simeon Vivas	1065913019				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* cra 47 x cll 52	N-W	N-S	se realiza apertura de zacamaza de tipo para empalmar semaforo de piso.	8:40Am		
			retiro de 1 semaforo de piso			
			construccion de 1 empalme en el semaforo de piso			94
			construccion de 1 empalme electrico en la zacamaza telefonica			94
			suministro estalacion de 1 fuente nueva en la zacamaza			
			stiker 0275 - S/N 2025 07 02			
			restalacion de 1 semáforo de piso			212
			soldada de 4 puntos en tapa de tapa redonda			262
			soldada de 2 tapas redondas de EPM 8 puntos		11:00Am	262
* cra 63A x cll 44			intento de vandalismo de cables de potencia en los postes	12:20pm		
	N-E	E-W	istalacion de 1 tapa bornera de segunda a poste			
	separador	E-W	retiro de 1 disco direccional de peatones a poste			179
			restalacion de 1 disco direccional de peatones a poste			220
			istalacion de 1 tapa bornera de segunda a poste		12:30 Pm	

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta Menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	22 OB 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE		SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Sabado		LLUVIOSO			SI			SI		SI
VEHÍCULOS:	MTN 507		DURACIÓN			NO			NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Duboom	16791906			Jole Cortes	1098727131
Jose Andrade	11222857				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* Cr 64C Cll 67			Suministro Instalacion de Tubo IMC de 6 metros	07	(6)	46
			Suministro instalacion de 10 metros de acometida 2x10			80
			Construccion de Empalme Aereo			94
* CrBO cll 79	Separador		construccion de 3 cajas de Derrame 50x50 (Nota = Es instalacion de 3 Hornajes de seguridad 50x50 → Retiro de 3 Hornajes de Concreto de 50x50			13 187

EQUIPO EN OBRA:

Planta electrica, taladro demoledor, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTEGRAL MED 2025 · BAY	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	23/08/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Domingo		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	WAY 804		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1035810427			Jose Cortez	1098727151
Angelo Gomez	1152183124			Alcantarilla	71725429
Carlos A. Diaz	1011444470				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cra32 x calle 52	W	WE	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	7:00	7:20	171
Cl36x calle 40	N	NS.	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	7:15		171
	SE	EW	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula		8:25	171
Carrera 48 x cll 49	E	EW	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	7:35		171
	W	WE	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula		7:50	171
Carrera 52 x Calle 56	S	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	8:10		171
	E	EW	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula		8:36	171
Carrera 53 x cll 54	S	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	8:40	855	171
Carrera 53 x Cll 59	S	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	9:10	9:20	171
Carrera 65 x cll 94	E	EW	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	9:40	9:50	171
Carrera 58 x Cll 43 bis	W	WE	Reinstalacion de Lampara y construccion de Empalme	10:10		219-94
Carrera 58 x cll 43 bis	W	WE	Retiro e instalacion de Semaforo a Mensula, Retiro de Lampara		10:30	171

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma - Amer - Hi Floor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

- Reto en mal estado Cr 26 x cll 40

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Dueny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INTEGRAL VIAL 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	23/08/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE		SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Domingo		LLUVIOSO			SI	✓		SI	✓		SI	
VEHÍCULOS:	WOLY 897		DURACIÓN			NO			NO			NO	

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1035860427			José Cortes	1098727731
Angelo Gomez	1152187129			Alexander	71275734
Carlos A Diaz	1017[illegible]70				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS,	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 66Bx cll 30A	O	SN	Retiro instalación de Semáforo a Mensula	10:30	11:00	171
Carrera 48x cll 45 01	W	WE	Retiro instalación de Semáforo a Ménsula	11:20	11:30	171
Carrera 48x cll 16 So	S	SN	Instalacion de Semáforo a Ménsula de Regando con Cantco	1140	11:50	171
Carrera 43A x cll 11	S	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	12:00	12:10	171
			Retiro de lampara de Cantco			196
			Reinstalación de lampara de Cantco y Construcción de Empalme			219-94
Carrera 43A x cll 14	S	SN	Retiro e instalacion de Semaforo a Ménsula	12:15		171
			Retiro de lampara de Cantco			196
			Reinstalación de lampara de Cantco y Construcción de Empalme		12:25	219-94
Carrera 43A x cll 25	S	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	12:25	1235	171
Cra 50 PP x Call 85 So	S	SN	Retiro e instalación de Semaforo a Ménsula	1250		171
			Retiro de lampara de Cantco			196
			Reinstalación de lampara y construccion empalme		13:00	219-94

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma - Arnex - Hilo Kevr

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CELEBRACIÓN INT. PARQUE MED. 2020	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	23/08/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Domingo		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:	WQY897		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1088810427			Jose Cortes	1098727131
Anyelo Gomez	1132187124				
Carlos Arbey	1017444470				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cra 52 x Cll 45 y 6301	W	WE	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula.	13:10.	13:20	171
Cra 70 x Cll 61	S	SN	Retiro de 2 Semaforos a Ménsula e instalación de 2.	13:30		171
	N	NS.	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula			171
	S	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula		13:55	171
Cra 70 x Cll 61	S	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	13:55		171
	N	NS	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula		14:05	171
Contra 70 x Cll 14	S	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	14:05	14:15	171
Contra 70 x Cll 16	S	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	14:15		171
	N	NS	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula		14:30	171
Contra 70 x Cll 19	S	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	14:30		171
			Retiro de Lampara de Cruce			196
			Reinstalación de Lampara y Construcción de Empalme		14:30	219.94
Contra 70 x Cll 24	N	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	14:40	14:50	171

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma - Camioneta

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INT. FABOL MED. 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	23/08/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Domingo		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	WLY897		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1038810427			Jose Cortes	1098427131
Angelo Gomez	1152187124				
Carlos Diaz	1017KA470.				

	DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
*	Cl 79AA x Cll 44	E	EW	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	15:00	15:10	171
*	Transv 39B x Cr 79	S	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	15:15	15:25	171
	TV 41 x DG 79A						
*	Av 80 x Cll 456	S	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	15:30	15:40	171
				Retiro de Lampara de Centro			196
				Reinstalación de Lampara y Construcción de Empalme			219-94
*	Cr 81 x Cll 59	S	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	15:50		171
		N	NS	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula			171
		W	WE	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula		16:10	171
*	Cl 74B x Cll 65	W	WE	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	16:18	16:25	171
*	Av 80 x Cll 77	S	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula	16:35	1645	171
3	Av 80 x Cll 55	S	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsula, Retiro de 1 lampara			171-196
				Reinstalación de 1 Lampara y Construcción de Empalme			219-94

EQUIPO EN OBRA:

10 Plataforma - Hilux Nuevo - Bruce

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSERVACIÓN MEJORAMIENTO MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	22/08/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Domingo		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	UOLY897		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1058851042			Jose Ortiz	1095422131
Anyelo Gomez	1152189124				
Carlos Diaz	10144930				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* Av80 x Cl2	E	SN	Cerrado de Aspecto Abierto (Peatonal)			260
Cra84 x Cl34	W	WE	Retiro de 3 lamparas a Ménsola de Flecha			196
*			Instalación de 3 lamparas a Ménsola de Flecha			219
			Construcion de 1 Empalme			94
Conicio 80 x Cl135	E	EW	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola			171
*			Retiro de lamparas de Conteo			196
			Reinstalación de lamparas de Conteo y Construcción de			219
			Empalme.			94
Av80 x Cl97BB	S	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola.			171

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma - Brazo. Hidrolavadora

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105535 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	23/08/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Domingo		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:	OLY897		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1098810427			Jose Cortes	1098727131
Angelo Gomez	1152187124				
Carlos Abiat	1017144470				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Av80x cll2	S	SN	Retiro e instalación de Semáforo a Ménsola	17:00	17:10	171
Av80x cll 19	S	SN	Retiro e instalación de semáforo a Ménsola	17:20	17:30	171
Av80x cll28	S	SN	Retiro e instalación de semáforo a Ménsola	17:35	17:45	171
Cll 82A x Cll30A	E	EW	Retiro e instalación de semáforo a Ménsola	17:55		171
			Retiro de Lampara de control			196
			Reinstalación de Lampara y construcción de Empalme			219-94
	S	SN	Retiro e instalación de semáforo a Ménsola			171
			Retiro de Lampara de control			196
			Reinstalación de Lampara y construcción de Empalme		18:10	219-94
Av80x cll327	S	SN	Retiro de Lampara de Control.	18:20		196
			Retiro e instalación de Semaforo a Ménsola			171
			Reinstalación de Lampara y Construcción de Empalme.		1830	219-94
Cl84x Cll34	W	WE	Retiro e instalación de Semaforo a Ménsola	1840		171
	E	EW	Retiro e instalación de Semaforo a Ménsola		18:50	171

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma - Mex. Ute Rver

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO MT PATOL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	24 - 08 - 2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	LUNES		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI /
VEHÍCULOS:	DXT928		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin santos	1038860427			Jose cortes	1098427191
Simon vivas	1065913019				
Luis Lozano	9115220				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
X cra55x cll50	N-E	N-S	traslado de cables de potencia, acometida, fibra optica y puesta tierra y cambio de herraje.	8:30am		
			retiro de 4 herraje de 50x50 para reintegro			187
			retiro de 4mts de cable encauchetado 2x12 del controlador			173
			retiro de 4 mts de cable de fibra optica del controlador			173
			retiro de 4 mts de cable verde tierra #8 del controlador			173
			retiro de 32 mts de cable 4x18 del controdor			173
			retiro de 7 empalme antiguo para reintegro			165
			suministro estalacion de 4mts de cable 4x18 nuevos			215
			suministro estalación de 7 herraje metalico nuevo de 50x50			12
			construcción de 2 empalmes electricos en la caja de 50x50			94
			reestalación de 4mts de cable encauchetado 2x12 de acometida			215
			reestalacion de 4mts de cable de fibra optica			215
			reestalación de 4 mts de cable verde tierra #8			215
			reestalación de 32 mts de cable 4x18		12:20pm	215
			nota: queda pendiente demoler base de controlador y cambiar cable de acometida			

EQUIPO EN OBRA:

taladro demoledor, Planta electrica, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO SIT PARCIAL MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	[redacted] 24 - 09 - 2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	LUNES		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:	DXT 928		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1039810427			Jose carta	1098127731
Simon Vivas	1065913019			Bladimir	1193732
Luis Lozano	915220				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
X AV 80 x cll 30A y 28	separador central	S-N	se hace la visita ala intersección entre la AV 80 por cll 30A y 28 por caida de señal en el cable de comunicación se procede a hacer el seguimiento del cable de comunicación y se encuentra poste de alumbrado publico caido por siniestro dejando el cable cortado en el poste	1:53 pm	4:00 pm	261

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTERVIAL MED 2025 · UNIÓN TEMPORAL INT MEDELLÍN · BNV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	24 Agosto 2026	TIEMPO	SECO	*	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Lunes		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Evanelia Barbosa	16791906			José Cortes	1098727131
Juan José Ruiz Silva	1000537926			Rivera Cortes	71775750

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* CR 66B CL 30	N	E - W	• Retiro de ganchos en caja	07am		1 -
			• Limpieza de caja			57 -
			• Suministro e instalación de herraje 50 x 50			13 -
	SE PONEN POR	W - E	• Ajuste de modulo por semaforo peatonal			260 -
			• Re- orientación de semaforo peatonal			258 -
			• Re- orientación de semaforo vehicular		5pm	258 -

EQUIPO EN OBRA:
Planta electrica, taladra demoledor, Pulidora, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

1/2

CONSORCIO MT FARDL MCO 2025	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	25-08-2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MARTES		LLUVIOSO			SI /		SI /		SI
VEHÍCULOS:	DTS 928		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin santos	1038910477			Jose Cortes	1098727131
simeon vivas	1065913614				
Luis Lozano	9115 2201				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cra 49 x Cll 57	N-E	N-S	traslado de cables de potencia, fibra optica, puesta tierra, acometida y cables de comunicacion y retiro de equipos.	9:00Am		
			retiro de 50 mts de cable 4x16 del controlador ala caja			173
			retiro de 4 mts de cable verde tierra #8 ala caja			173
			retiro de 5 mts de cable de fibra optica hasta la caja			173
			retiro de 4 mts de cable 4x16 de acometida hasta la caja			173
			retiro de 6 mts de cable de comunicacion de 10 pares hasta la caja			173
			retiro de 21 mts de cable 4x18 del controlador al poste grupos #2 y 4 para reintegro.			173
			retiro de 4 equipos antiguo para reintegro			165
			suministro instalacion de 21 mts de cable 4x18 nuevos del poste al controlador grupo # 2 y 4			215
			reinstalacion de 50 mts de cable 4x16 de la caja al controlador			215
			reinstalacion de 4 mts de cable verde tierra #8 de la caja al controlador			215
			reinstalacion de 5 mts de cable de fibra optica al controlador			215
			reinstalacion de 4 mts de cable 4x16 de acometida al controlador			215
			NOTA: queda pendiente demoler vase de controlador y cambiar cable de acometida		7:15 pm	

EQUIPO EN OBRA:

Pesca - Pala Macor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Dueny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO SEMÁFOROS MED 2025 · DAVY	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	25 08 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Martes		LLUVIOSO			SI ✓		SI /		SI
VEHÍCULOS:	MTN 502		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Barbosa	16791906			Jose cortes	1098727131
Cristian Barbosa				Alexander	21775?3/

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Diagonal 66B	Superior.		Dano en el calleado del Grupo 5-7-8-9 hutto.	07am		
Circular 1			corto en 10-11			
			Instalación de calleado en Grupo 5-7-8-9			215
			cantidad por Grupo 95-95-95-95 = 380 de			
			Calleado 4x18 nuevo.			
			Construcion de 4 empalmes		5pm	94
Cra 46 C1149	E	S N.	Enderezado de semaforo Peatonal			256
			Reinstalacion de espejo y modulo rojo			260
			Enderezado de Semaforo Vehicular.		638m	258

EQUIPO EN OBRA:

Pesca, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO SIT FAROL MED 2025 · BMV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105589 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	25-06-2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MARTES		LLUVIOSO			SI X		SI X		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Willy Chavarria	98681997			Jose Soltys	909842731
Jhon Marcela Peláez	1017221385				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
AV. Autopista Cll. 44	S.C	N-S	Lavado de 1 semaforo vehicular			234
			Lavado de 2 semaforos peatonales			231
			Lavado de 1 disco direccional			236
			Lavado de 1 cofre recto			230
	S.C	S-N	Lavado de 1 semaforo peatonal			231
			Lavado de 1 poste recto			230
	N-C	S-N	Lavado de 1 semaforo peatonal			231
			Lavado de 1 poste recto			230
	N-E	S-N	Lavado de 1 semaforo peatonal			231
			Lavado de 1 poste recto			230
	N-E	W-E	Lavado de 1 poste recto			230
			Lavado de 1 semaforo peatonal			231

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, arnes, eslinga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

114

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO SIT PATROL MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	25-08-2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:			LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Laura marcela portilla	1017221580			José Cortes	1098427191
Wilson Chavarro	98557775				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
AV - Autobus Calle 41	S-E	S-N	Lavado de 1 semaforo vehicular			234
			Lavado de 2 semaforos peatonales			231
			Lavado de 1 disco direccional			236
			Lavado de 1 poste recto			230
	S-W	N-S	Lavado de 1 semaforo peatonal			231
			Lavado de 1 poste recto			230
	N-W	N-E	Lavado de 1 semaforo peatonal			231
			Lavado de 1 poste recto			230
AV Autobus Calle 40	S-E	N-S	Lavado de 1 semaforo vehicular			234
			Lavado de 2 semaforos peatonales			231
			Lavado de 1 disco direccional			236
			Lavado de 1 poste recto			230
	N-E	S-W	Lavado de 1 semaforo peatonal			231
			Lavado de 1 poste recto			230

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, Arnes, eslinga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN / CONSERVACIÓN SEMAFÓRICA 2025 / DEVI	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	25-08-2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MARTES		LLUVIOSO			SI X		SI X		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Wilmer Chavarria	98 (07 977			Jose Ortiz	1098727131
Laura Maria Pabon	1017221580				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
AV-Nutibara	N-E	E-W	Tuvo di 1 simafuro vehicular			234
Cll. 40b			Tuvo di 1 simatura peatonal			231
			Tuvo di 1 disco direccional			236
			Tuvo di 1 poste recto			230
	S-O	S-W	Tuvo di 1 simafuro vehicular			234
			Tuvo di 2 simafuros peatonales			231
			Tuvo di 1 disco direccional			236
			Tuvo di 1 poste recto			230
	S-W	N-E	Tuvo di 1 simafuro peatonal			231
			Tuvo di 1 poste recto			230
	S-W	E-W	Tuvo di 1 simafuro peatonal			231
			Tuvo di 1 poste recto			230
	N-W	E-W	Tuvo di 1 simafuro peatonal			231
			Tuvo di 1 poste recto			230

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, arnes, eslinga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

414

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO SIT PARQUEADEROS 2025 · BMV · UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	25-09-2025	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MARTES		LLUVIOSO			SI X		SI X		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Wilmer Chavarro	98(6)787			Jose Cortes	1098724171
Laura Marcela P	1017225880				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
AV Bolivariana	S.C	N-S	Izquierdo del semáforo vehicular			234
Cra 40A			Izquierdo del semáforo peatonal			231
			Izquierdo del disco direccionador			236
			Izquierdo del poste recto			230
	S.C	S-N	Izquierdo del semáforo peatonal			231
			Izquierdo del poste recto			230
	N-E	S-N	Izquierdo del semáforo peatonal			231
			Izquierdo del poste recto			230
	N-E	AV-E	Izquierdo del semáforo peatonal			231
			Izquierdo del poste recto			230
	S-E	W-E	Izquierdo del semáforo peatonal			231
			Izquierdo del poste recto			230
	S.C	S-N	Izquierdo del semáforo vehicular			234
			Izquierdo del semáforo peatonal			231
			Izquierdo del disco direccionador			236
			Izquierdo del poste recto			230

EQUIPOS EN OBRA: Escalera arco, esliga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO LINE PARQ. RED 2025 RMV	**REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	25 Agosto 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Martes.		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Cesar Santos	1.039.306.200			Ingle Ortiz Flores Leiva	1098727137 7197532
Higuel Villegas.	1.019.229.962				
Amis Torres	1.028.030.497				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Avenida 80 entre Calles 30 y 23	E	S-N	Se realiza sondeos de canalizaciones y cajas de inspección, buscando la mejor ruta para realizar el cambio del cable de comunicaciones que se encuentra malo, en el plano del sondeo se muestra la mejor ruta.			237 ✓


EQUIPO EN OBRA:

Pesca

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

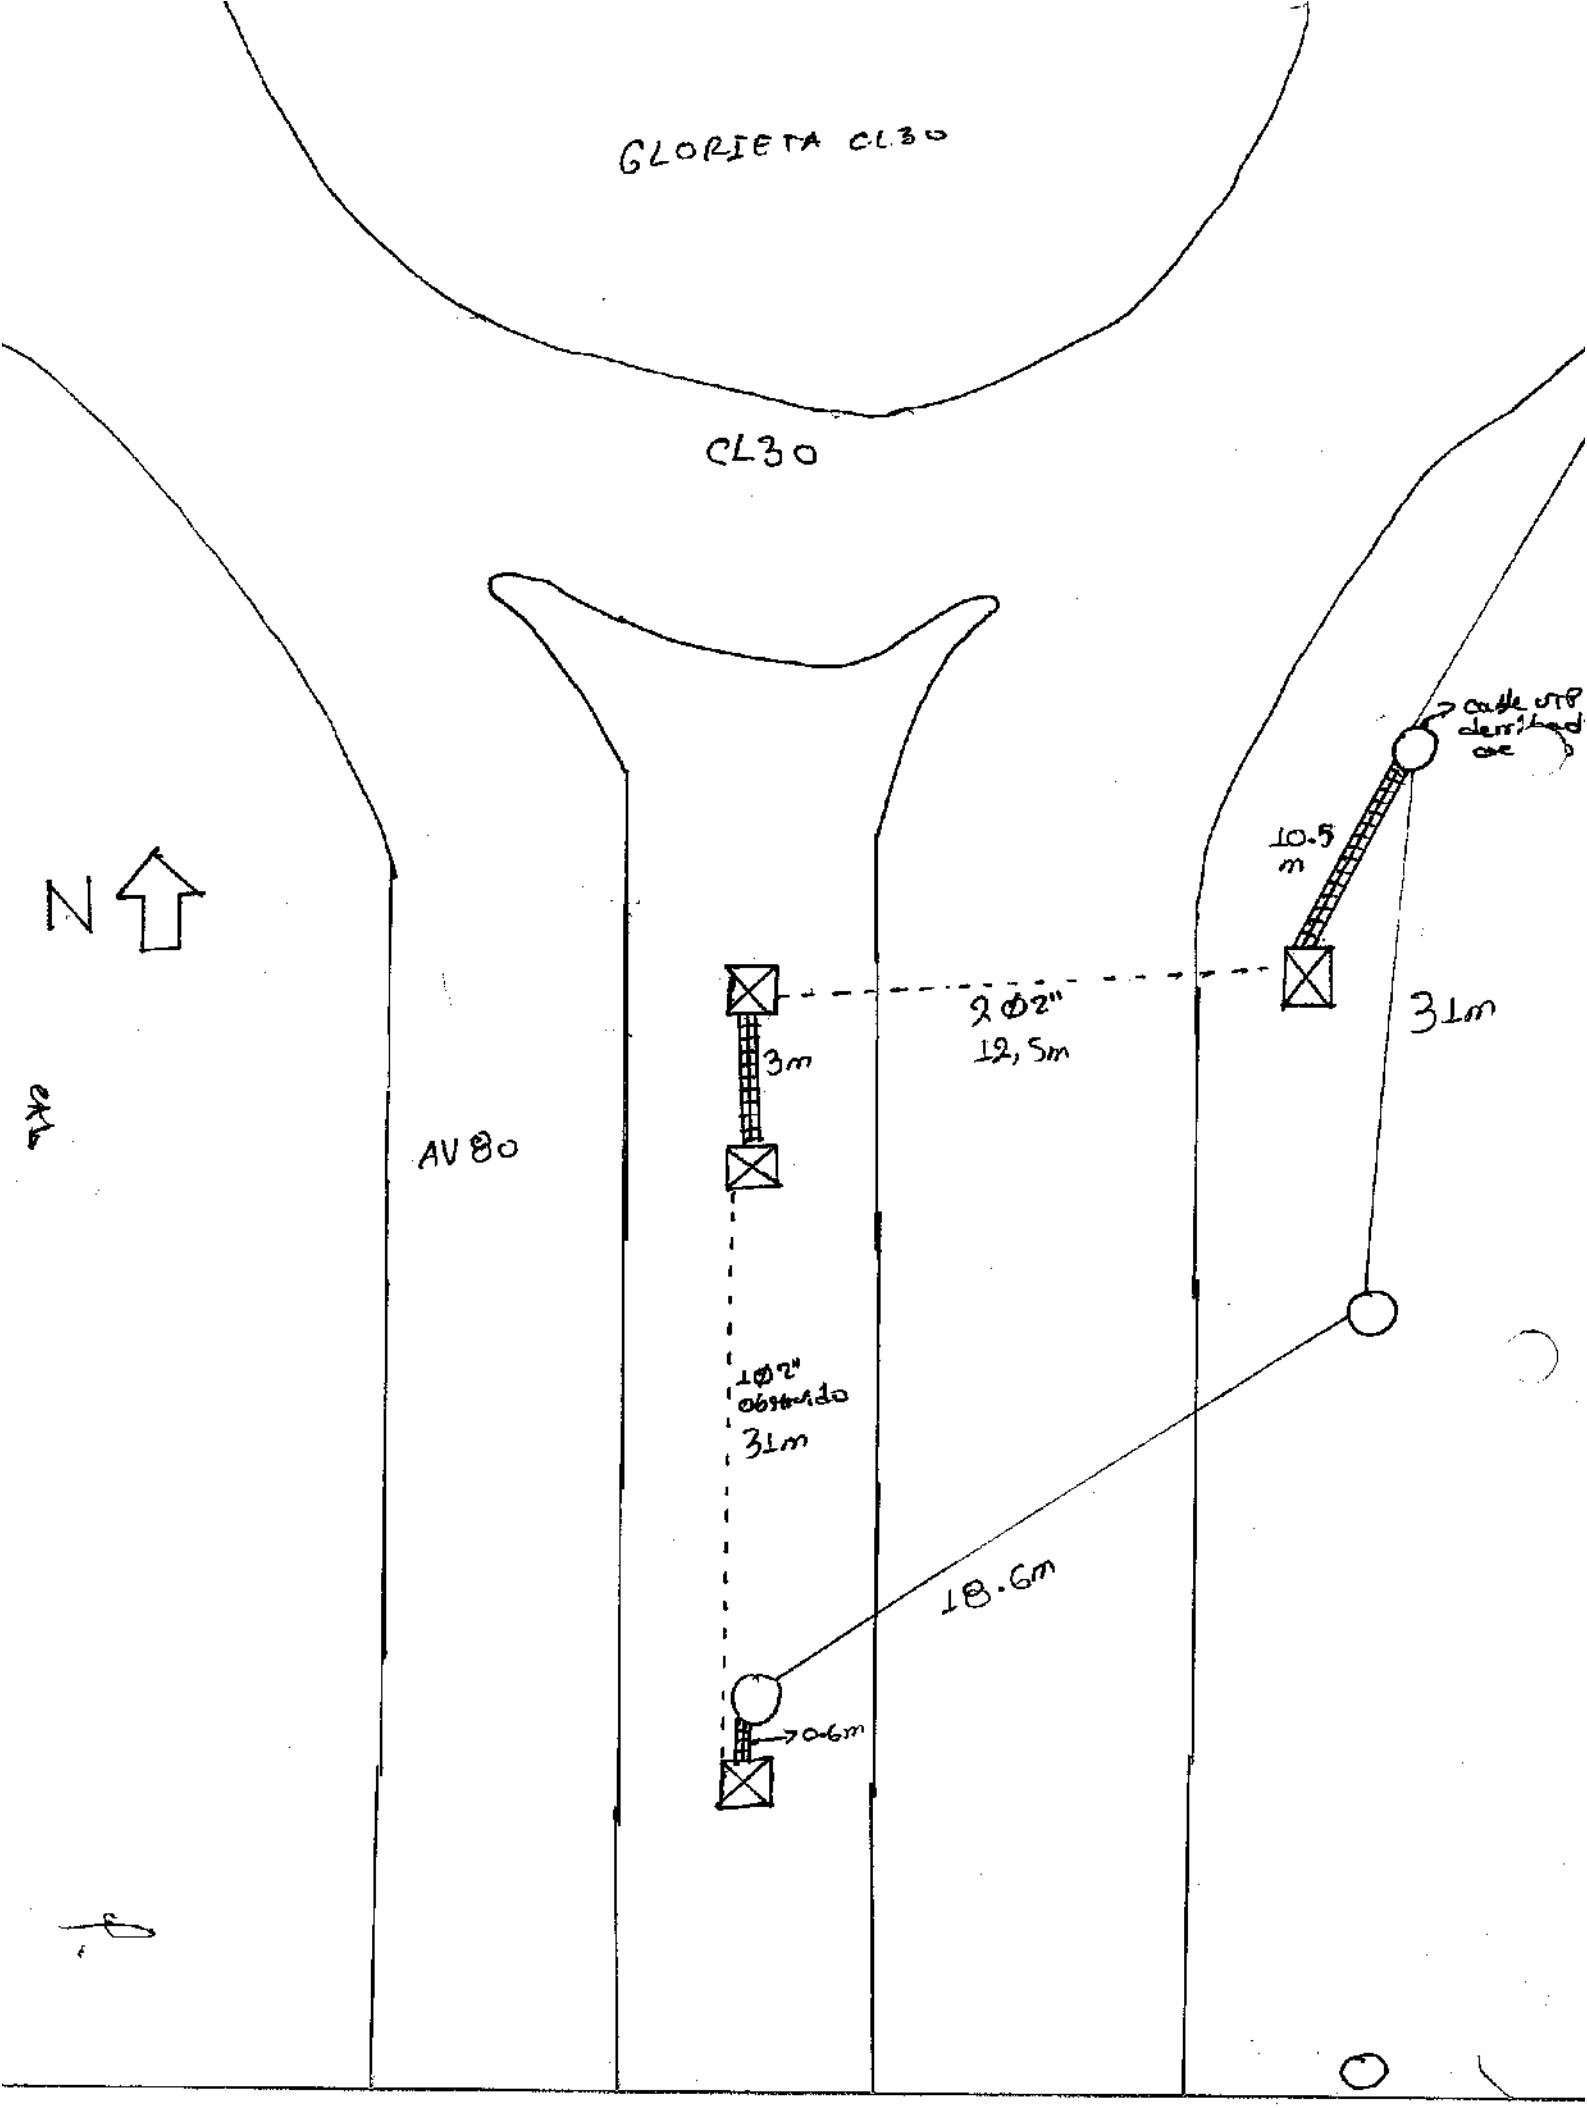
GLORIETA CL30
CL30
N
AV 80
3m
2Ø2"
12,5m
10.5
m
31m
1Ø2"
obstruido
31m
18.6m
0.6m

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	PLAN DE CALIDAD	VERSIÓN 1
	REINTEGRO DE ELEMENTOS	1/09/2025

NOMBRE DEL PROYECTO: OBJETO: MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD

NÚMERO DEL CONTRATO: 4600105565 de 2025 (UNION TEMPORAL SIT)

Entregado por: ANYELO GOMEZ M. **Recibido por: FRANK GARCIA**

FECHA	ELEMENTO	CANTIDAD	UND	OBSERVACIÓN
20/8/2026	PLACAS DE CONTRASTE	82	UND	SINIESTROS
20/8/2026	MARCO CON TAPA METALICO 50X50	2	UND	SINIESTROS
20/8/2026	MARCO METALICO SIN TAPA 50X50	4	UND	SINIESTROS
20/8/2026	MARCO CON TAPA POLIPROPILENO	3	UND	SINIESTROS
20/8/2026	MARCO CON CONCRETO Y/O TAPA CONCRETO	12	UND	SINIESTROS
20/8/2026	POSTE DE ENTERRAMIENTO	5	UND	SINIESTROS
20/8/2026	POSTE DE MENSULA	1	UND	SINIESTROS
20/8/2026	BRAZO DE MENSULA	4	UND	SINIESTROS
20/8/2026	DISCO PEP	1	UND	SINIESTROS
20/8/2026	CABLE ENCAUCHETADO 4X164X18	135	MTS	SINIESTROS
20/8/2026	TAPA DE CONCRETO 50X50	2	UND	SINIESTROS

VERIFICACIÓN

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA:		FIRMA PERSONA QUE RECIBE	
nombre	ANYELO DANIEL GOMEZ MEJIA	nombre	FRANK GARCIA
cargo	ALMACENISTA	cargo	CIOS

	PLAN DE CALIDAD **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	26-09-2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MIERCOLES		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI ✓
VEHÍCULOS:	DXT928		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1038810427			Jose Cortes	1098774731
Luis Lezama	9145220l				
simeon vivas	1065913019				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
X Cra 30 X Cll 47	S-E	E-W	apertura de tapa de 50x50	9:00am		
			Limpieza de tapa y herraje de 50x50		9:06am	54
X Cra 32 X Cll 51	S-E	W-E	cambio de herraje de 50x50 en mal estado	9:34am		
			retiro de 1 herraje con tapa de 50x50 para reinstalar			187
			suministro instalacion de 1 herraje metalico nuevo de 50x50		12:00pm	13
X Cra 43A X Cll 10	N-W	W-E	estalacion de 1 semaforo peatonal de pisa nuevo	1:20pm		212
			stiker: 0888			
			serial: 20250152			
			construccion de 1 empalme electrico		3:30pm	94

EQUIPO EN OBRA:
Pulidora, Planta electrica, taladro demolador, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO SIT FAROL MED 2025 · RAV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	26 08 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	miercoles		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	MTN 502		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Yeison Galeano	1039547032			Jose cortes	1098762731
Cristian Barbosa	1151966785				
Franklin Barbosa	16791200				
Juan roa	1000053797 6				

	DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
*	Cr 65 - 67	W	N S	Reporte de cambio de Cableado del Grupo 15 y 16	07am		
	Cll 78 - 80			Desoldada de caja de paso de cableado, 50 RTO			183
				Instalacion de cable 4x18 para el Grupo 15			215
				Cantidad (52) metros.			
				Retiro de dos lamparas rojas peatonales			195
				Retiro de dos lamparas Verdes peatonales			195
				Instalacion de dos lamparas rojas peatonales			218
				Instalacion de dos lamparas Verdes peatonales			218
				construccion de dos Empalmes en Semaforos			94
				Soldadura en caja de paso de 50 RTO		01 pm	262
*	Cr 46 Cll 49	E	SN	Retiro de Accesorio de Policarbonato de Semaforo Peatonal			
				Instalacion Suministro de Accesorio de Policarbonato para Semaforo Peatonal.			94-104
				construccion de Empalme y Sunchada.			
*	trans 78	S	EW	Endererada de Semaforo Vehicular			258
	Calle 65	N	EW	Endererada de Semaforo Vehicular.		05pm	258

EQUIPO EN OBRA:

Pesa, equipo soldador, planta electrica

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTERVIAL MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105569 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	26-08-26	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miercoles		LLUVIOSO			SI X		SI X		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO X

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Kevin Ochoa	98681775			Jose Cortes	1090472131
Laura Marcela P	1017221580				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
AV. Nutibara	S-C	N-S	lavado de poste recto	8:30		230
Cra. 40a			lavado de semaforo peatonal			231
	S-W	N-S	lavado de 1 poste recto			230
			lavado de 1 semaforo peatonal			231
	S-W	W-E	lavado de 1 semaforo peatonal			231
			lavado de 1 poste recto			230
			lavado de 1 disco direccional			236
AV Nut. Sur	S-C	N-S	lavado de 1 semaforo vehicular			284
Calle 39 sur			lavado de 2 semaforo peatonal			231
			lavado de 1 disco direccional			236
			lavado de 1 poste recto			230
					1:00	

EQUIPO EN OBRA: Escalera, arnes, eslinga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO SIT FARO MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	26-08-26	TIEMPO	SECO	P	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miercoes		LLUVIOSO			SI P		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Wilian Chavarro	98968177			Jose Ortiz	1098127131
Laura Marcela P	1017221586				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
AV Nutibara Calle 39d	S.C	S-N	Levado de 1 semaforo Vehicular	8:30		234
			Levado de 2 semaforos peatonales			231
			Levado de 1 disco direccional			236
			Levado de 1 poste recto			230
	S.C	E-W	Levado de 1 semaforo Vehicular			234
			Levado de 2 semaforos peatonales			231
			Levado de 1 disco direccional			236
			Levado de 1 poste recto			230
	S.C	W-E	Levado de 1 semaforo Vehicular			234
			Levado de 2 semaforos peatonales			231
			Levado de 1 disco direccional			236
			Levado de 1 poste recto			230
AV Nutibara Calle 39C	S.C	S-W	Levado de 1 semaforo peatonal			231
			Levado de 1 poste recto			230
					A=00	

EQUIPO EN OBRA:

Estacionario grúa, escalera

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Dueny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSOLIDACIÓN SIT. PAROL MED. 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	26-08-26	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miercles		LLUVIOSO			SI X		SI X		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO X

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jhonyan Chavarro	98881775			Jose Cortes	1098727131
Laura Marcela P	1017221586				

DIRECCION	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Av Nutibara	N-E	S-W	Levant. de 1 semaforo peatonal	8:30		231
Cra 39 C			Levant. de 1 poste recto			230
	S-E	N-S	Levant. de 1 semaforo vehicular			234
			Levant. de 1 semaforo peatonal			231
			Levant. de 1 disco direccional			236
			Levant. de 1 poste recto			230
	S-E	E-W	Levant. de 1 semaforo peatonal			231
			Levant. de 1 poste recto			230
			Levant. de 1 disco direccional			236
	S-E	S-N	Levant. de 1 semaforo vehicular			234
			Levant. de 1 semaforo peatonal			231
			Levant. de 1 disco direccional			236
			Levant. de 1 poste recto			230
					4:00	

EQUIPO EN OBRA: Escalera, arnes, eslinga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	26-08-25	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE		SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MIERCOLES		LLUVIOSO			SI	X		SI	X	SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO			NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Wilmar Chavarria	98681775			Jose ortiz	1098427137
Laura marcela p	1017221580				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Av Bolivariana Calle 39 c	S.C	N-S	Levant. de 1 semaforo peatonal	8:30		231
			Levant. de 1 poste recto			230
	S-W	N-S	Levant. de 1 semaforo peatonal			231
			Levant. de 1 poste recto			230
	S-W	E-W	Levant. de 1 semaforo peatonal			231
			Levant. de 1 poste recto			230
	N-W	E-W	Levant. de 1 semaforo peatonal			231
			Levant. de 1 poste recto			230
Av Bolivariana Calle 396	S.C	N-S	Levant. de semaforo vehicular			234
			Levant. de 1 semaforo peatonal			231
			Levant. de 1 mano direccional			236
			Levant. de 1 poste recto			230
	S.C	S-N	Levant. de semaforo peatonal			231
			Levant. de 1 poste recto		A=00	230

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, arnes, eslinga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO SIT FAROL MED 2025 R&V	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	27 08 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	MTN 502		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Yeison Galeano	1127908			Jose cortes	1098727137
Franklin Barbosa	16791906				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 64c Cll 67	S	WE	Demolicion de caja de 50x50	07 am		1
			Retiro de marco de 50x50			197
			Instalacion de Tapa de seguridad 50x50			13
			Construccion de Empalme de acometida			94
			en caja		2:39	
			Limpieza de Caja			54
Cr 76 Cll 25			Retiro de Semaforo Vehicular en mal estado.			172
			Instalacion de Suministro de Semaforo			65
			Vehicular nuevo serial = 1338 - 1030 - 1336			
			Construccion de Empalme en Semaforo.			94
Cr 76 Cll 30			Retiro de Semaforo Vehicular en mal estado			172
			Instalacion y Suministro de Semaforo Vehicular			65
			nuevo Serial =			
			Construccion de Empalme en Semaforo Vehicular.		5:30pm	94

EQUIPO EN OBRA:

taladro demoledor, planta electrica, Pulidora, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO MALLA VIAL MED 2025 · RyNY · UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	27 Agosto 2026	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE		SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves		LLUVIOSO			SI	/		SI	/		SI	
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO			NO			NO	

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Juan José Rico Pitta	1006532976			Jose Cortes	1098727131
Cristhan Barbosa				Alcalorito	71975771

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* AVENIDA 80 - CALLE 65	SEMAFORO	W-S	• Retiro de semaforo peatonal en mal estado			172
			• Suministro e instalacion de semaforo peatonal estatico nuevo con serial 20250114			70
			Lampara peatonal roja 1515			
			Lampara peatonal verde 1814 - Construccion de empalme			94
* CARRERA 73 - CALLE 55	W	N-S	• Re - orientacion de semaforo peatonal			258
CR 53 X CL 73						
* CARRERA 51 - CALLE 61	S	W-E	• Cableado y re - orientacion de semaforo peatonal			258
			• Construccion de empalme			94
* CARRERA 39 - CALLE 55	S	E-W	• Cableado de semaforo peatonal			258
			• Re - orientacion de semaforo peatonal			
* CARRERA 34 - CALLE 55	N	E-W	• Retiro de Lampara peatonal roja mala			195
			• Instalacion de Lampara peatonal roja de segunda			218
			• Construccion de empalme			94

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, arnes, eslinga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO ILUMINACIÓN MED 2025 · UNIÓN TEMPORAL SEMÁFOROS MEDELLÍN · DNV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	27 Agosto 2025	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	✓		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Yar Yoie Rua Silva	1000593970			Jose Ortiz	4098427131
Cristian Bolivar				Mauricio	21275731

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CARRERA 41 - CALLE 58	W	S - N	• Retiro de visera en mal estado de semaforo vehicular			198
CARRERA 41 - CALLE 58	E	S - N	• Ajuste de visera de semaforo vehicular			260
CARRERA 45 - CALLE 67	S	E - W	• Retiro de lampara peatonal verde mala			195
			• Instalación de lampara peatonal verde de segunda			218
			• Construcción de empalme			94
CARRERA 66B - CALLE 34	SEPARADOR	S - N	• Cableado y re-orientación de semaforo peatonal			258
CARRERA 66B - CALLE 34	SEPARADOR	S - N	• Re-orientación de Semaforo peatonal			258
CARRERA 66B - CALLE 34	SEPARADOR	S - N	• Cableado y re-orientación de semaforo peatonal			258
			• Ajuste de modulo verde de semaforo vehicular			260
			(Pendiente cambio de lampara vehicular amarilla cambio de semaforo vehicular cambio de semaforo peatonal en Carrera 66B - calle 34)			

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, arnes - 8510989

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	Jueves	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	27-08-26		LLUVIOSO			SI X		SI X		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO X

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
William Chavarro	98681775			Jose cortes	1098777137
Laura marcela p	1017221585				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR66 B-Q 30	S-O	N-S	Lavado de 2 semaforos peatonales (cuadrtas).	8:00		231
			Lavado de poste de Platina			230
	SO	O-E	Lavado de Semaforo Vehicular de 4 aspectos			234
			Lavado de Semaforo Peatonal			231
			Lavado de disco bivisual			236
			Lavado de Poste Recto			230
	N-W	E-W	Lavado de poste Recto			230
			Lavado de semaforo Peatonal			231
	SC	E-W	Lavado de Poste Recto			230
			Lavado de Semaforo peatonal			231
	SE	E-W	Lavado de un Semaforo Sicrista			231
			Lavado de poste recto		4:00	230

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, arnes, cuerda

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTEGRAL SEMAFORIZACIÓN 2025 RSV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	27-08-25	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves		LLUVIOSO			SI X		SI X		SI X
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
William Moreno	98681795			Jose cortes	1098727191
Laura Marcela P	1017221580				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CRA 66B-CL35	N-E	S-N	Lavado de un Semaforo Peatonal	8:00		231
			Lavado de un Semaforo			232
			Lavado de poste Recto			230
	SC	E-W	Lavado de un Semaforo Vehicular			234
			Lavado de un Semaforo Peatonal			231
			Lavado de Disco Direccional			236
			Lavado de un poste Recto			230
			Lavado de Semaforo			232
	SC	S-N	Lavado de un Semaforo Peatonal			231
			Lavado de poste Recto			230
	SC	S-N	Lavado de Semaforo Vehicular			234
			Lavado de disco Direccional			236
			Lavado de poste Recto			230
	S-E	W-S	Lavado de Semaforo Peatonal			231
			Lavado de poste Recto		4:00	230

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, arnes, eslinga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN MED 2025 | RMV

PLAN DE CALIDAD	VERSIÓN 1
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA: 27-08-26 DIA: Jueves VEHÍCULOS:	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	A	UNIFORMES	CUMPLE SI X NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI A NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI NO X

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Wilson Chavarro	98061795			Jose Cortes	1098727791
Laura Marce P	1017221580				

TRABAJOS REALIZADOS

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO		HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 66B - 9-30	S-C	W-E	Lavado De un semaforo peatonal	8:00		231
			Lavado de un poste Recto			230
AV. Nutibara Trabajar 39B	N-W	W-S	Lavado de poste Recto			230
			Lavado Semaforo Vehicular			234
			Lavado Semaforo peatonal			231
			Lavado de semaforo sicronizado			281
			Lavado de Disco			236
	N-E	S-W	Lavado de poste Recto			230
			Lavado de Semaforo Peatonal			231
			Lavado de semaforo peatonal			258
	S-E	W-E	Lavado de poste Recto			230
			Lavado de semaforo peatonal			231
			Lavado de Disco PEP			236
			Lavado de pulsador		4:00	232

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, arnes, eslinga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	27-08-25	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves		LLUVIOSO			SI X		SI X		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO X

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Cristian Cifuentes	98[illegible]1775			Jose cortes	1098727131
Laura marcela p	1017[illegible]500				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Avenida Nutibara	S-E	W-E	Lavado De poste Recto	8:00		230
Transversal 39B			Lavado de semaforo Peatonal			231
			Lavado de Disco PEP			236
			Lavado de pulsador			232
	S-C	S-N	Lavado de Semaforo Vehicular			234
			Lavado de semaforo peatonal			231
			Lavado De Disco Direccional			236
			Lavado de poste Recto			230
	S C	N-S	Lavado de poste Recto			230
			Lavado De Semaforo Peatonal			231
			Lavado de Disco PEP			236
			Lavado de pulsador			232
	S-W	N-S	Lavado de poste Recto			230
			Lavado De semaforo Peatonal			231
			Lavado de Disco PEP		9:00	236
			Lavado de pulsador			232

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, arnes, eslinga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	PLAN DE CALIDAD	
		VERSIÓN 1
	REINTEGRO DE ELEMENTOS	1/09/2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBJETO: MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600106555 de 2025 (UNION TEMPORAL SIT)

Entregado por: ANYELO GOMEZ M. **Recibido por: FRANK GARCIA**

FECHA	ELEMENTO	CANTIDAD	UND	OBSERVACIÓN
28/8/2026	PLACAS DE CONTRASTE	17	UND	SINIESTROS
28/8/2026	MARCO CON TAPA METALICO 50X50	2	UND	SINIESTROS
28/8/2026	MARCO METALICO SIN TAPA 50X50	1	UND	SINIESTROS
28/8/2026	GABINETE DE CONTROL SIN TARJETAS	2	UND	
28/8/2026	MARCO CON CONCRETO Y/O TAPA CONCRETO	2	UND	SINIESTROS
28/8/2026	HERRAJE CON TAPA 60X60 CONCRETO	1	UND	SINIESTROS
28/8/2026	DISCO PEP	1	UND	SINIESTROS
28/8/2026	CABLE ENCAUCHETADO 4X164X18	171	MTS	SINIESTROS
28/8/2026	LAMPARA PEATONAL VERDE MALAS	31	UND	SINIESTROS
28/8/2026	LAMPARA PEATONAL ROJA MALAS	26	UND	SINIESTROS
28/8/2026	LAMPARA CICLISTA VERDE MALA	6	UND	SINIESTROS
28/8/2026	LAMPARA CICLISTA ROJA MALA	6	UND	SINIESTROS
28/8/2026	CARCAZA DE SEMAFORO VEHICULAR	4	UND	SINIESTROS
28/8/2026	CARCAZA DE SEMAFORO PEATONAL	5	UND	SINIESTROS

VERIFICACIÓN

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA:		FIRMA PERSONA QUE RECIBE	
nombre	ANYELO DANIEL GOMEZ MEJIA	nombre	FRANK GARCIA
cargo	ALMACENISTA	cargo	CIOS

CONSORCIO INTERVIAL MED 2025	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	28-08-2026	TIEMPO	SECO	51	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	VIERNES		LLUVIOSO			SI ✓		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
edwin santos	1038810427			Jose cortes	1098727731
simeon vivas	1065913019				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
A.V80 x C11.25	S-E	E-W	se ase el retiro restalacion del poste recto por ostruccion en la tuberia en la curva de la caja el poste.	8:20am		
			retiro de 1 semaforo vehicular a poste			172
			retiro de 1 semaforo peatonal a poste			172
			retiro de 1 disco direccional 4 a poste			179
			retiro de 5 mts de cable 4x16 del poste ala caja			173
			retiro de 1 poste recto en zona verde			168
			reistalacion de 1 poste recto en zona verde			206
			reistalacion de 5 mts de cable 4x16 de la caja al poste			215
			reistalacion de 10 mts de cable 4x18 nuevos que se dejo en la caja			215
			reistalacion de 1 semaforo vehicular a poste			208
			Reistalación de 1 semaforo peatonal a poste			208
			reistalación de 1 disco direccional 4 a poste			220
			construccion de 2 empalmes electricos a poste			94
			suministro restalacion de 17 tapares a poste que avian quedado pendiente por istalar		12:20pm	

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta menor, taladro dumolder Planta electrica, Rulidora

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO SIS. FÁBRICA MED. 2025 · RHY	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	29 02 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE		SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Viernes		LLUVIOSO			SI	✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	MTN502		DURACIÓN			NO			NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Durbosa	16791906			Jose Cortes	1094972491
Yeison Galeano				Alexis Londoño	717418231

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
G50FF	S	W/E	Datos de acometida aereo	07 am		47
Cll 12 Sur			Instalacion Suministro de 6metros Tubo imc 1½			80
			Instalacion Suministro de 20 metros acometida 2x10			263
			Concretada de caja 50x50		02 pm	
			Instalacion de conexiones			

EQUIPO EN OBRA:

Herramienta Menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	20 Agosto 2026	TIEMPO	SECO	x	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Viernes		LLUVIOSO			SI /		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Juan Jose Rio				Jose Cort-S	1098777777
Cristian Bedoya					

	DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
*	CARRERA 45 - CALLE 67	S	E - W	• Endiresado de Semaforo vehicular			258 -
				• Re- orientacion de semaforo vehicular			
*	CARRERA 45 - CALLE 63	SEPARADOR CENTRAL	O - N	• Retiro de semaforo peatonal en mal estado			172 -
				• Suministro e instalacion de semaforo peatonal nuevo			70 -
				con senal 20250120			
				Lampara peatonal roja senal 1315			
				Lampara peatonal verde senal 1320			94 -
				• Construccion de empalme			
*	CARRERA 45 - CALLE 63	E	S - N	• Retiro de semaforo peatonal en mal estado			172 -
				• Suministro e instalacion de semaforo peatonal estatico nuevo			70 -
				con senal 20250003			
				Lampara peatonal roja 1311			
				Lampara peatonal Verde 1310			94 -
				• Construccion de empalme			

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, arnes, eslinga

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSTRUCCIÓN UT FAROL MED 2025	**REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO**	VERSIÓN 1
	Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	28 Agosto 2025	TIEMPO	SECO	x	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves		LLUVIOSO			SI x		SI x		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Juan José Ruo Silva	1002532446			Jose Cortes	1098727191
Cristian Barbosa					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CARRERA 66 B CALLE 34	SEPARADOR	S - N	• Retiro de semaforo vehicular en mal estado			172
			• Suministro e instalacion de semaforo vehicular nuevo con serial 20250322			65
			Lampara vehicular roja 1044			
			Lampara vehicular amarilla 1045			
			Lampara vehicular verde 1046			94
			• Construccion de empalme			
CARRERA 66 B- CALLE 34	SEPARADOR	S - N	• Retiro de semaforo peatonal en mal estado			172
			• Suministro e instalacion de semaforo peatonal			70
			estandar nuevo con serial 20250063			
			Lampara peatonal roja 1317			
			Lampara peatonal verde 1316			94
			• Construccion de empalme			

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, arnes, esl, 099

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

113

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO MANTENIMIENTO 2025 BHV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	28-08-2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	viernes		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Brayan Palacio	1'096.247.535				
Stiven Palacio	1'096.218.904				
Carlos Zuñiga	1'096.247.524				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
	W	N-S	Construcción de canalización en zona verde = 6,30m			25
			Construcción de Caja 60x60 = 2un			35
CR48x CR18			Instalación de Herraje en hierro dúctil de 60x60 cm = 2Un			13
			Canalización en zona dura = 2,20m			22
			Demolición de andén = (1,60m * 2,12m)+ (1,10m * 0,4m)			1
			Construcción de andén = (1,60m * 2,12m)+ (1,10m * 0,4m)			36

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

23

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTERVIAL MED 2025 · RMV · UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	28-08-2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	viernes		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Brayan Palacio	1'096.247.535				
Styven Palacio	1'096218.904				
Carlos Zúñiga	1'096.247.524				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
	Separador Central		Construcción de caja 60x60 = 1 un			35
			Instalación de herraje 60x60 en hierro dúctil = 1 un			13
			Construcción canalización en zona verde = 1,10m			25
CR 48 x CL 18			Demolición $\frac{(\pi * 1{,}90m)^2}{2}$			1
			Demolición $\frac{(\pi * 1{,}25m)^2}{2} - (0{,}6 \times 0{,}6m)$			1
			Demolición $(1{,}75m \times 0{,}8m) + (0{,}55m \times 0{,}75m) + (0{,}4m \times 0{,}5m)$			1
			* Mismos valores de demolición en construcción de andén			36
			Construcción caja 60x60 = 1un			35

EQUIPO EN OBRA

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO SIT. SEMAFORIZACIÓN MED. 2025 · UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN · PdIV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	28-08-2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	viernes		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Brayan Palacio	1'096.247.535				
Steven Palacio	1'096.218.904				
Carlos Zuñiga					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CL 48 x CL 18			Construcción de bordillo = 3,70m			3
			Suministro e Instalación de adoquín de 0,1m = 3,70 m			
			Instalación de herraje = 1un			13
CL 65 x CL 50	NW		Construcción de canalización en zona verde = 5,30 m			25
			Ataque de tubería = 5,30 m			18
			Construcción de caja 60x60 = 2un			35
			Instalación de herraje = 2 un			13

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	30 08 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	domingo		LLUVIOSO			SI ✓		SI		SI
VEHÍCULOS:	ESQ 669		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime CIFUENTES	71080675			Jose Cortes	1098127137
Alberto Oquendo	15485477				
MIGUEL ANGEL	1018229962				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
cra 66 f 50	S-N	oc-or	lavado de 1 poste de mazula, lavado de 1 brazo de mazula	8. AM	8:30 AM	230-229
			lavado de 1 semaforo de mazula, lavado de 1 semaforo vehicular			235-234
			lavado de 2 semaforos peatonales, lavado de 1 disco			231-236
cra 66 f 50	oc	S-N	lavado de 1 poste de mazula, lavado de 1 brazo de mazula,	8:30 AM	9. AM	230-229
			lavado de 1 semaforo de mazula, lavado de 1 semaforo vehicular			235-234
			lavado de 1 semaforo peatonal lavado de 1 disco			231-236
cra 65 f 50	S	oc-or	lavado de 1 poste de mazula, lavado de 1 semaforo de mazula	9. AM	9:30 AM	230-229
			lavado de 1 semaforo peatonal lavado de 1 brazo de mazula			231-235
			lavado de 1 semaforo vehicular, lavado de 1 disco			234-236
cra 65 f 50	S-or	S-N	lavado de 1 poste, lavado de 1 brazo de mazula, lavado de 1	9:30 AM	10. AM	230-229
			semaforo de mazula, lavado de 1 semaforo vehicular, lavado			235-234
			de 1 semaforo peatonal lavado de 1 disco retiro 1 avisa motos			231-236-233
cra 64 B f 50	S-oc	oc-or	lavado de 1 poste de mazula, lavado de 1 brazo de mazula	10. AM	10:30 AM	230-229
			lavado de 1 semaforo de mazula, lavado de 1 semaforo vehicular			235-234

EQUIPO EN OBRA:

lavado de 1 semaforo peatonal lavado de 1 disco — 231-236

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

plataforma - Amex - Hfc Menor

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoria

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	30 08 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE		SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	domingo		LLUVIOSO			SI			SI		SI
VEHÍCULOS:	ESQ 669		DURACIÓN			NO			NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime Cifuentes	71480675			Jose Soto	1098727171
Alberto Oquendo	15483477				
Miguel Arango	1018229962				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
cra 64B x 50	Sur	S-N	lavado de 1 poste de manzola, lavado de 1 brazo de manzola	10:30 Am	11 Am	230-229
			lavado de 1 semaforo de manzola, lavado de 1 semaforo			235-234
			vehicular, lavado de 1 semaforo peatonal lavado de 1 disco			231-236
cra 57 x 44	Nor	N-S	lavado de 1 poste de manzola lavado de 1 brazo de manzola,	11 Am	11:30 Am	230-229
			lavado de 1 semaforo de manzola, lavado de 1 semaforo vehicular			235-234
			lavado de 1 semaforo peatonal, lavado de 1 semaforo ciclista			231-231
			lavado de 1 disco			236
cra 57 x 44	Nor	oriec	lavado de 1 poste, lavado de 1 brazo de manzola, lavado de 1	11:30 Am	12 Pm	230-229
			semaforo de manzola, lavado de 1 semaforo vehicular			235-234
			lavado de 1 disco			236
cra 58 x 44	Nor	occ	lavado de 1 poste de manzola, lavado de 1 brazo de manzola	1 Pm	1:30 Pm	230-229
			lavado de 1 semaforo de manzola, lavado de 1 semaforo vehicular			235-234
			lavado de 1 semaforo peatonal lavado de 1 disco			231-236

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma - Dmax - Hyundai

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Gueny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTEGRAL MED 2025 · DAV · UNIÓN TEMPORAL SEMAFORIZACIÓN	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105598 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	30 08 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	domingo		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	ESQ 669		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime Cifuentes	71480675			Jose Cortes	1098927139
Alberto Oquendo	15485477				
Miguel Angel	1018229962				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
cra 58 x 44	S-O	or-oc	lavado de 1 poste de manzola, lavado de 1 brazo de manzola	1:30 Pm	2 Pm	230-229
			lavado de 1 semaforo de manzola, lavado de 1 semaforo vascular			235-234
			lavado de 1 semaforo peatonal lavado de 1 disco			231-236
cra 63 A x 44	N-	or-oc	lavado de 1 poste de manzola, lavado de 2 semaforos de manzola	2 Pm	2:30 Pm	230-235
			lavado de 1 poste de manzola, lavado de 1 semaforo			229-234
			vascular, lavado de 1 semaforo peatonal lavado de 1 disco			231-236
cra 65 x 44	S-or	or-oc	lavado de 1 poste de manzola, lavado de 1 brazo de manzola	2:30 Pm	3 Pm	230-229
			lavado de 1 semaforo de manzola, lavado de 1 semaforo			235-234
			vascular, lavado de 1 semaforo peatonal lavado de 1 semaforo			231-231
			celeste, lavado de 1 disco			236
cra 65 x 44	N-or	or-oc	lavado de 1 poste de manzola, lavado de 1 brazo de manzola	3 Pm	3:30 Pm	230-229
			lavado de 1 semaforo de manzola, lavado de 1 semaforo vascular			235-234
			lavado de semaforo peatonal lavado de 1 disco			231-236

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma - Amarillo Dacar

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Quany Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoria

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTEGRAL MED 2025 DNV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105595 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105598 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	30 08 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	domingo		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:	ESQ 669		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime cifuentes	71180675			Jose cortes	1098727131
Albeiro oquendo	15485477				
miguel MGG	1018229962				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
cra 68A X 44	S-OR	OCIOC	lavado de 1 poste de manzola, lavado de 1 brazo de manzola	3:30 Pm	4:15 Pm	230-229
			lavado de 1 semaforo de manzola, lavado de 1 semaforo			235-234
			vehicular, lavado de 2 semaforos peatonales lavado de			231-236
			1 disco			
cra 68A X 44	N-OR	OCIOC	lavado de 1 poste de manzola, lavado de 1 brazo de manzola	4:15 Pm	4:20 Pm	230-229
			lavado de 1 semaforo de manzola, lavado de 1 semaforo			235-234
			vehicular, lavado de 1 semaforo peatonal lavado de 1 disco			231-236
cra 70 X 44	N-OR	OCIOC	lavado de 1 poste de manzola, lavado de 1 brazo de manzola	4:20 Pm	4:40 Pm	230-229
			lavado de 1 semaforo de manzola, lavado de 1 semaforo			235-234
			vehicular, lavado de 1 semaforo peatonal lavado de 1 disco			231-236
cra 70 X 44	N-OC	N-S	lavado de 1 poste de manzola, lavado de 1 brazo de manzola	4:40 Pm	5:1 Pm	230-229
			lavado de 1 semaforo de manzola, lavado de 1 semaforo			235-234
			vehicular lavado de 1 semaforo peatonal lavado de 1			231-236
			disco lavado de 1 sonorizador			232

EQUIPO EN OBRA:

Plataforma - Amue - Retroexc

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
COMISIÓN MUNDIAL FANOL MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	31-08-2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	lunes		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
				José Cortés	1098727737
				Queny Barre.	43065512.

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
			• Suministro de marco de 50x50 cm, incluye tapa de seguridad. 36 Und			9
			• Suministro de marco de 60X60 cm, incluye tapa de seguridad. 10 und.			11
Ojos			• Suministro de gabinete para controlador local en lamina calibre 16. 7 und.			147
			• Suministro de mensula galvanizada con brazo de longitud 4.5m. 10 und.			140
			• Suministro de poste recto de enterramiento. 10 und			141
			• Suministro de switch capa 3 64 und			130
			• Suministro de protector de sobrecarga para controlador. 8 und			90
			• Suministro tornillo 5/8 para cajas 92 und.			15

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTEGRAL MED 2025 · UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN · DAV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105595 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	31/08/26	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Lunes		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
José Andrade	1122857				
Cristian mena					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 46-1149	Carril Central	S-N	Retiro de marco y tapa de 50 x 50 Suministro e instalacion de herraje de 50 x 50 "nuevo"	10:30		187 13
	Carril Central	S-N	Retiro de marco y tapa de 50 x 50 Suministro e instalacion de herraje de 50 x 50 "nuevo"			187 13
	Carril Central	N-S	Retiro de marco y tapa de 50 x 50 Suministro e instalacion de herraje de 50 x 50 "nuevo"		16:00	187 13

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

ANEXO 13.

PERSONAL LIQUIDADO

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396

Nombre: **Aguedo Alcides Riasco Reyes**
Identificación: **4852397**
No Contrato: **4852397**
Cargo: **Auxiliar de Mantenimiento**
Motivo retiro: **Voluntario**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	**2026/01/26**
FECHA FINAL	**2026/07/30**
DIAS LABORADOS	**185.00**
LICENCIAS NO REMUNERADAS	**3.00**

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	**$ 1,750,905.00**
AUXILIO DE TRANSPORTE	**$ 249,095.00**

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES

	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2026/01/26	2026/07/30	2,024,948.41	182.00	$ 1,023,724.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2026/01/26	2026/07/30	1,023,723.92	185.00	$ 63,130.00
Prima Liquidación Contrato	2026/01/26	2026/07/30	2,072,605.56	27.00	$ 155,445.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2026/01/26	2026/07/30	1,752,791.42	7.71	$ 450,467.00
				TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	$ 1,692,766.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Total Ingresos		$ 0.00	**Total Deducciones**		$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	$ 1,692,766.00

LA SUMA DE: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

SE HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

Aguedo Alcides Riasco Reyes
C.C. 4852397

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Nit 901979396

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos

PAZ Y SALVO LABORAL

Codigo A019

Yo, AGUEDO ALCIDES RIASCO REYES identificado (a) con cedula de ciudadania No 4852397 declaro que la firma UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN , con NIT No 901.979.396-1 cumplió con todos los pagos de salarios legales, extralegales, prestaciones sociales, compensaciones e indemnizaciones causadas en el desarrollo del Contrato No UT SIT MEDELLIN cuyo objeto es Realizar Mantenimiento y Obras de Ampliacion y Reposicion de la Red de Semaforos en el Distrito Especial de Medellin

Por consiguiente declaro a la Empresa a **Paz y Salvo** por todo concepto.

Lo anterior se expide en Barrancabermeja el 11 de Agosto de 2026.

Atentamente



AGUEDO ALCIDES RIASCO REYES
CARGO : Auxiliar de Mantenimiento
C.C. 4852397



HUELLA INDICE DERECHO

ANEXO 14. CERTIFICADO DE EMPRESA DE MUJERES

ASESORÍA TRIBUTARIA
& REVISORÍA FISCAL

Sergio Andrés Díaz Montañez
Contador Público Especialista en Tributaria & Revisoría Fiscal.
310 205 1725
sergio.andresdiaz@hotmail.com
Trans. 49 # 10A - 01 Edificio Terzetto - oficina 406

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA QUE:

REVISADO EL LIBRO DE ACCIONISTAS Y ACCIONES DE LA SOCIEDAD SERVICIVIL SAS IDENTIFICADO CON NIT 800147909-3 DESDE EL DÍA 15 JUNIO DEL AÑO 2021 HASTA LA FECHA DEL PRESENTE CERTIFICADO, SE ENCONTRÓ LA SIGUIENTE COMPOSICION ACCIONARIA, ADEMAS SE CERTIFICA QUE LOS ACCIONISTAS SON COLOMBIANOS.

CAPITAL AUTORIZADO	**$ 580.000.000.**
No DE ACCIONES	**1000**
VALOR NOMINAL	**$ 580.000**
CAPITAL SUSCRITO	**$ 580.000.000**
Y PAGADO	
No DE ACCIONES	**1000**
VALOR NOMINAL	**$580.000**

ACCIONISTA	**JORGE TRUJILLO NIÑO**
C.C.	**13893413**
No DE ACCIONES	**490**
PARTICIPACIÓN	**49%**
VALOR TOTAL ACCIONES	**$ 284.200.000**

ACCIONISTA	**NELSY VANEGAS CALDERON**
C.C.	**63459480**
PARTICIPACIÓN	**51%**
No DE ACCIONES	**510**
VALOR TOTAL ACCIONES	**$ 295.800.000**

DADO EN BARRANCABERMEJA, A LOS 09 DIAS DE FEBRERO DE 2026

SERGIO ANDRES DIAZ MONTAÑEZ
T.P 187097-T
CONTADOR PÚBLICO

ANEXO 15.

CAMARA DE COMERCIO

CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 25/09/2025 - 15:21:03
Recibo No. S000690987, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1hJ33VHjmQ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=02 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : SERVICIVIL S.A.S
Nit : 800147909-3
Domicilio: Barrancabermeja, Santander

MATRÍCULA

Matrícula No: 21568
Fecha de matrícula: 22 de noviembre de 1991
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 30 de abril de 2025
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : DIAGONAL 62 NO. 43-151
Barrio : LAS GRANJAS
Municipio : Barrancabermeja, Santander
Correo electrónico : servicivil_ltda@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 6102194
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : 3125486349

Dirección para notificación judicial : DIAGONAL 62 NO. 43-151
Barrio : LAS GRANJAS
Municipio : Barrancabermeja, Santander
Correo electrónico de notificación : servicivil_ltda@hotmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 2370 del 28 de octubre de 1991 de la Notaria 1a. De Barrancabermeja de Barrancabermeja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de noviembre de 1991, con el No. 912486 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada SERVICIVIL LIMITADA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 12 del 06 de octubre de 2018 de la Junta de Socios de Barrancabermeja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de octubre de 2018, con el No. 25347 del Libro IX, se inscribió Transformación de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada

Por Acta No. 12 del 06 de octubre de 2018 de la Junta de Socios de Barrancabermeja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de octubre de 2018, con el No. 25347 del Libro IX, se decretó Cambio de nombre de SERVICIVIL LIMITADA por SERVICIVIL S.A.S

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

HABILITACIÓN(ES) ESPECIAL(ES)

La persona jurídica no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: Por Acta No. 019 del 05 de noviembre de 2024 de la Asamblea General de Accionistas, inscrita el 06 de noviembre de 2024 se reformo así: Articulo 2. La sociedad tendrá por objeto principal el desarrollo de actividades tendientes a la realización de obras arquitectónicas, de urbanismo e ingeniería, bien sea civiles, eléctricas, electrónicas, mecánicas, ambientales, petroleras, energéticas, hidráulicas, de servicios públicos, saneamiento básico, mineras, de telecomunicaciones, agrícolas, rurales, de sistemas de información, vías y transportes, en todo lo relacionado con asesorías, ejecución, planeación, preparación, diseño, montaje y construcción de todo tipo de obras, estructuras, instalación de plantas de toda clase, mantenimiento y operación de las mismas, excavación de pozos profundos, suministros de materiales de construcción y de cantera, industria minera, economía minera, comercialización, exploración, explotación, trituración, beneficio y distribución de minerales comunes, exploración minera, geología minera, exploración y evaluación de reservas mineras,, minería a cielo abierto, minería subterránea, procesamiento de minerales, manejo y transporte de minerales, metalurgia metales ferrosos y no ferrosos, exploración y explotación de minerales usuales (comodietis), cobre, zinc, plomo, níquel, mineral de hierro, bauxita, alúmina, aluminio, oro, plata, platino, fosfatos, magnesio, cromo, lignito, antracita, metales raros. La prestación de toda clase de servicios de consultoría, interventorías técnicas y administrativas en las diferentes áreas anteriormente mencionadas, el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social según la legislación vigente, la promoción, compra, venta, arriendo y administración de inmuebles tanto urbanos como rurales, urbanización de terrenos y la construcción de edificaciones, el desarrollo de actividades tendientes a la adquisición, venta, comercializa con, distribución, suministro, alquiler, arrendamientos, reparación, transformación de todo tipo de maquinaria pesada y equipos destinados a la construcción, a la explotación agrícola, a la explotación minera, a la explotación acuífera, en el área de servicios públicos, petrolífera y sus derivados, industria petroquímica, de biocombustibles, el desarrollo de actividades tendientes a la adquisición, venta, comercialización, distribución, suministro, alquiler, arrendamientos, reparación transformación de vehiculos de carga, vehiculos de transporte de pasajeros, bien sea terrestres o fluviales, fabricación y comercialización de equipos y o dispositivos de control de transito con y sin registro gráficos de infracciones, (semáforos, equipos de control, botoneras peatonales, dispositivos sonoros, cámaras de seguridad, cámara de foto – detección, materiales eléctricos y electrónicos), suministros, instalación y programación de software para controladores de semáforos ,equipos de foto detección y en general para entidades de tránsito y transporte , en el desarrollo de todo lo anterior que comprende el objeto social de la empresa, se podrán constituir en territorio nacional o extranjero, sucursales o agencias, podrá promover y fundar establecimientos, almacenes de depósitos, fabricas; podrá además adquirir a cualquier título toda clase de bienes muebles e inmuebles, arrendarlos, enajenarlos o gravarlos y darlos en garantía de sus propias obligaciones, adquirir toda clase de derecho mineros, permisos o licencias, ejecutar o conformar asociaciones, aportes y/o concesiones, uniones temporales, para explorar y explotar minas o yacimientos, , explotar o registrar marcas, nombres comerciales, patentes, invenciones o cualquier otro bien incorporal u objeto contractual que pueda desarrollarse, dentro de los parámetros del objeto social, girar, aceptar, endosar, cobrar, pagar, negociar, toda clase de títulos valores, bursátiles, de inversión, celebrar contratos de mutuo, seguro y transporte, agencia comercial, cuentas en participación y demas contratos comerciales, concurrir a licitaciones públicas, privadas y contrataciones directas, celebrar cualquier tipo de contratos con entidades bancarias o financieras y concurrir a la formación de aportes a entidades de crédito como bancos, corporaciones financieras, dedicadas a la financiación de actividades comprendida dentro de los objetivos sociales, efectuar cualquier tipo de tramites tendiente a importar o exportar mercancías de productos en cumplimiento del objeto social. Parágrafos: en desarrollo o cumplimiento de tal objeto, la sociedad podrá: hacer en su propio nombre o por cuenta de terceros, todas las actividades o en participación con ellos toda clase de operaciones comerciales, civiles e industriales o financieras sobre bienes muebles e inmuebles y constituir cualquier clase de gravamen sobre estos, celebrar contratos civiles o administrativos, con personas naturales o jurídicas, sean estas en derechos privado o público y abrir cuentas corrientes y de ahorros en bancos y corporaciones que sean convenientes para el logro de los

fines sociales. participación con ellos toda clase de operaciones comerciales, civiles e industriales o financieras sobre bienes muebles e inmuebles y constituir cualquier clase de gravamen sobre' estos, celebrar contratos civiles o administrativos, con personas naturales o jurídicas, sean estas en derechos privado o público y abrir cuentas corrientes y de ahorros en bancos y corporaciones que sean convenientes para el logro de los fines sociales.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	$ 580.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 580.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	$ 580.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 580.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	$ 580.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 580.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

representante legal: Articulo 27. Se hace transformacion según acta no. 12 Del 6 de octubre de 2018, inscrita el 17 de octubre de 2018, antes mencionada: La representacion legal de la sociedad por acciones simplificada estara a cargo de una persona natural o juridica, accionista o no, quien tendra un suplente para sus faltas temporales o absolutas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal: Articulo 28. Se hace transformacion segun acta no. 12 Del 6 de octubre de 2018, inscrita el 17 de octubre de 2018, antes mencionada: La sociedad sera gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal (o su suplente en las faltas temporales o absolutas), quien no tendra restricciones de contratacion por razon de la naturaleza ni de la cuantia de los actos que celebre. Por lo tanto, se entendera que el representante legal podra celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entendera investido de los mas amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepcion de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le esta prohibido al represnetante legal y a los demas administradores de la sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad juridica prestamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantia de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 12 del 06 de octubre de 2018 de la Junta de Socios, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 17 de octubre de 2018 con el No. 25347 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL	JORGE TRUJILLO NIÑO	C.C. No. 13.893.413
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELSY VANEGAS CALDERON	C.C. No. 63.459.480

REVISORIA FISCAL TEXTUAL

** Revisor fiscal: ** Que por acta no. 0000003 De asamblea de accionistas del 2 de diciembre de 2016 , inscrita el 5 de diciembre de 2016 bajo el numero 00022750 del libro ix , fue(ron) nombrado(s): Nombre identificacion revisor fiscal murillo villarreal pablo emilio c.C.13891253 Tarjeta profesional: 14953 T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) E.P. No. 1122 del 10 de mayo de 1993 de la Notaria 1a. De Barrancabermeja	3365 del 06 de abril de 1994 del libro IX
*) E.P. No. 2009 del 25 de julio de 1995 de la Notaria 1a. De Barrancabermeja	3968 del 01 de agosto de 1995 del libro IX
*) E.P. No. 2076 del 12 de julio de 1996 de la Notaria 1a. De Barrancabermeja	4587 del 02 de septiembre de 1996 del libro IX
*) E.P. No. 2499 del 21 de noviembre de 2007 de la Notaria Primera Barrancabermeja	11284 del 30 de noviembre de 2007 del libro IX
*) E.P. No. 1827 del 26 de julio de 2011 de la Notaria Primera Barrancabermeja	14715 del 28 de julio de 2011 del libro IX
*) E.P. No. 1073 del 25 de junio de 2012 de la Notaria Primera Barrancabermeja	16185 del 04 de julio de 2012 del libro IX
*) E.P. No. 1073 del 25 de junio de 2012 de la Notaria Primera Barrancabermeja	16188 del 04 de julio de 2012 del libro IX
*) E.P. No. 1073 del 25 de junio de 2012 de la Notaria Primera Barrancabermeja	16189 del 04 de julio de 2012 del libro IX
*) E.P. No. 746 del 21 de abril de 2014 de la Notaria Primera Barrancabermeja	18588 del 05 de mayo de 2014 del libro IX
*) E.P. No. 1828 del 09 de octubre de 2015 de la Notaria Primera Barrancabermeja	21205 del 20 de octubre de 2015 del libro IX
*) E.P. No. 1828 del 09 de octubre de 2015 de la Notaria Primera Barrancabermeja	21206 del 20 de octubre de 2015 del libro IX
*) Acta No. 12 del 06 de octubre de 2018 de la Junta De Socios	25347 del 17 de octubre de 2018 del libro IX
*) Acta No. 18 del 15 de julio de 2024 de la Asamblea General De Accionistas	35939 del 23 de julio de 2024 del libro IX
*) Acta No. 19 del 05 de noviembre de 2024 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas	36444 del 06 de noviembre de 2024 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4390
Actividad secundaria Código CIIU: E3900
Otras actividades Código CIIU: H4923 F4220

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: SERVICIVIL BCA
Matrícula No.: 62658
Fecha de Matrícula: 27 de noviembre de 2006
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : 62 NO 43 151
Barrio : LAS GRANJAS
Municipio: Barrancabermeja, Santander

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $3.214.000.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4390.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio


Fecha expedición: 25/09/2025 - 15:21:03
Recibo No. S000690987, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1hJ33VHjmQ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=02 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



PILAR ADRIANA CONTRERAS GÓMEZ
PRESIDENTA EJECUTIVA

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

ANEXO 16.

CEDULAS

PERSONAL 100% COLOMBIANO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.151.966.785**

BARBOSA YEPES

APELLIDOS

CHRISTIAN

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-JUN-1998**

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

17-JUN-2016 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-3100150-00838444-M-1151966785-20160702 **0050**330467A 1 45220169


CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.037.368.900

Apellidos
BEDOYA VALENCIA

Nombres
ANDRES FERLEY

Nacionalidad
COL

Estatura
1.65

Sexo
M

Fecha de nacimiento
10 JUN 1990

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
MACEO (ANTIOQUIA)

Fecha y lugar de expedición
11 DIC 2008, MACEO

Firma
andres Bedoya

Fecha de expiración
22 SEPT 2033


.CO

032536593

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL032536593601175<<<<<<<<<<<
9006108M3309221COL1037368900<3
BEDOYA<VALENCIA<<ANDRES<FERLEY

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.049.894.058**

GONZALEZ MORA

APELLIDOS

CARLOS MARIO

NOMBRES

Carlos Mario -

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-ABR-2001**

HATILLO DE LOBA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

11-ABR-2019 HATILLO DE LOBA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-0300150-01300080-M-1049894058-20220602 **00795**38656A 1 8504797463

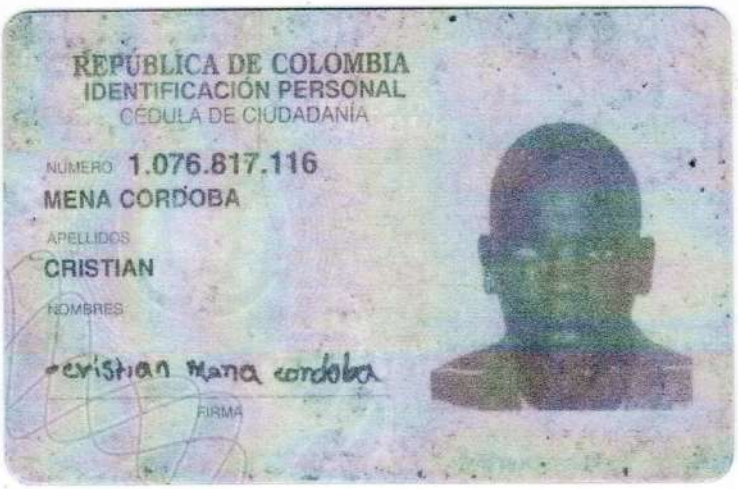

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.076.817.116
MENA CORDOBA
APELLIDOS
CRISTIAN
NOMBRES

cristian Mena cordoba
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 06-JUN-1991
CONDOTO
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
26-AGO-2009 CONDOTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO

A-1701300-00844744-M-1076817116-20160824 0050726215A 1 45839510

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.038.810.427**

SANTOS HERNANDEZ

APELLIDOS

EDWIN DAVID

NOMBRES

edwin david santos hernandez

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-AGO-1992**

MONTERIA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

09-AGO-2010 CHIGORODO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0110600-00266236-M-1038810427-20101118 **0024**863480A 1 34994022



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.038.810.427**

SANTOS HERNANDEZ

APELLIDOS

EDWIN DAVID

NOMBRES

edwin david santos hernandez

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **04-AGO-1992**

MONTERIA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

09-AGO-2010 CHIGORODO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-0110600-00266236-M-1038810427-20101118 0024863480A 1 34894022


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.096.218.904

PALACIO ACEVEDO

APELLIDOS

JAIME ESTIVEN

NOMBRES

Stiven

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 18-MAY-1992

MACEO
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA

AB+ G.S. RH

M SEXO

15-DIC-2010 BARRANCABERMEJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-3100150-00570561-M-1096218904-20140508 0038389502A 1 2862858412

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.052.982.270**

ALTAMIRANDA DIAZ

APELLIDOS

JENIFER DEL CARMEN

NOMBRES

Jenifer Altamiranda Diaz

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-OCT-1992**

MAGANGUE
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**B+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

06-OCT-2010 MAGANGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0502800-00279702-F-1052982270-20110201 **0025**74797A 1 35708396

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.123.409.521**

GONZALEZ BURGOS


APELLIDOS

MARTIN JOSE

NOMBRES

Martin Gonzalez

FIRMA

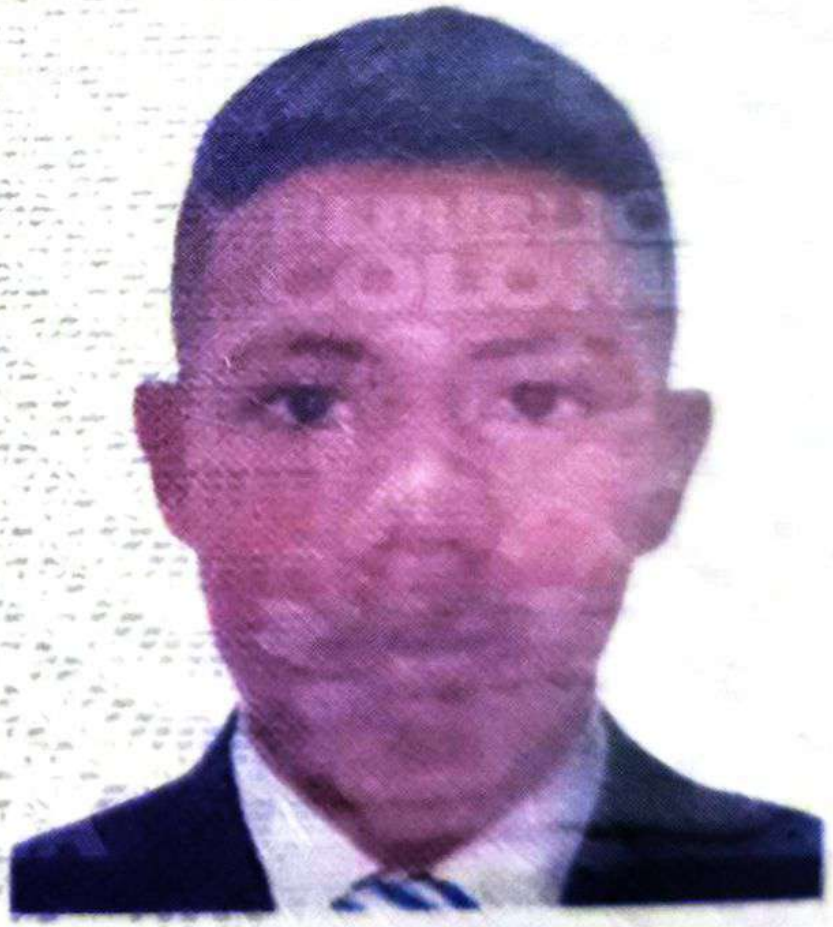



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-DIC-2001**

DIBULLA
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

24-DIC-2019 TOLUVIEJO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-2832000-01124651-M-1123409521-20200109 **0069**589379A 1 53711091



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.123.409.521**

GONZALEZ BURGOS

APELLIDOS

MARTIN JOSE

NOMBRES

Martin Gonzalez

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-DIC-2001**

DIBULLA
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

24-DIC-2019 TOLUVIEJO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-2832000-01124651-M-1123409521-20200109 0069589379A 1 53711091

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 98.681.775



Apellidos
CHAVARRIA BUILES

Nombres
WILLIAN ALBEIRO

Nacionalidad
COL

Estatura
1.83

Sexo
M

Fecha de nacimiento
03 SEPT 1977

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
SABANALARGA (ANTIOQUIA)

Fecha y lugar de expedición
15 JUN 1996, SABANALARGA

Fecha de expiración
22 JUL 2034

Firma

.CO

0509139 23

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL0509139236012 17<<<<<<<<<<<
7709036M3407220COL98681775<<<8
CHAVARRIA<BUILES<<WILLIAN<ALBE


CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 98.681.775

Apellidos
CHAVARRIA BUILES

Nombres
WILLIAN ALBEIRO

Nacionalidad
COL

Estatura
1.83

Sexo
M

Fecha de nacimiento
03 SEPT 1977

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
SABANALARGA (ANTIOQUIA)

Fecha y lugar de expedición
15 JUN 1996, SABANALARGA

Firma

Fecha de expiración
22 JUL 2034


0509139231

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL0509139236012l7<<<<<<<<<<
7709036M3407220COL98681775<<<8
CHAVARRIA<BUILES<<WILLIAN<ALBE

CÉDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 4.852.397



Apellidos
RIASCO REYES

Nombres
AGUEDO ALCIDES

Nacionalidad
COL

Estatura
1.75

Sexo
M

Fecha de nacimiento
05 FEB 1964

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
BAJO BAUDO (PIZARRO) (CHOCO)

Fecha y lugar de expedición
19 NOV 1983, BAHIA SOLANO

Fecha de expiración
18 MAR 2033

Firma

Alcides Riascos

.CO

020198477

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL020198477417008<<<<<<<<<<<
6402053M3303182COL4852397<<<<0
RIASCO<REYES<<AGUEDO<ALCIDES<<

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.002.500.113**

REYES AMAYA

APELLIDOS

MOISES DAVID

NOMBRES

Moises Reyes A

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-AGO-1999**

MAGANGUE
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA

B+ G.S. RH

M SEXO

05-ENE-2018 MAGANGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-0502800-00972751-M-1002500113-20180125 0059290273A 1 49259471

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.152.187.124

GOMEZ MEJIA

APELLIDOS

ANYELO DANIEL

NOMBRES



Anyelo Daniel Gómez M.

FIRMA

Scanned with CamScanner



22-MAY-1990

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

1.81 A- M

23-MAY-2008 MEDELLIN

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.096.247.535**

PALACIO ACEVEDO


APELLIDOS

BRAYAN ESMID

NOMBRES

Brayan Palacio

FIRMA

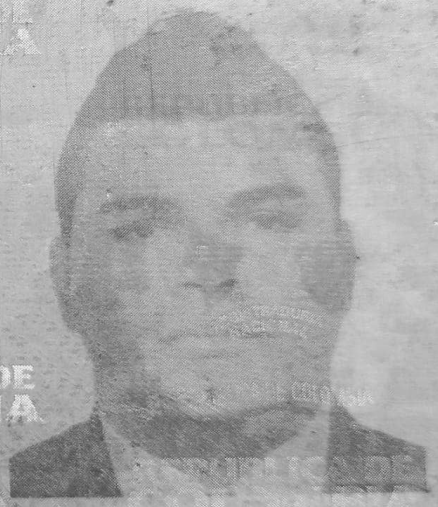



FECHA DE NACIMIENTO **29-ABR-1998**

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

05-MAY-2016 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

ÍNDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-2701900-01294488-M-1096247535-20220505 **00790**78024A 1 9918929745


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 1.096.247.524
ZUÑIGA BENAVIDES
APELLIDOS
CARLOS ANDRES
NOMBRES
Carlos Zuñiga
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 30-ABR-1998
BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.77
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
04-MAY-2016 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO
P-2701900-00841290-M-1096247524-20160728
0050528695A 1
45109384



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.017.144.470
DIAZ PEÑA
APELLIDOS
CARLOS ALBERTO
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 10-ENE-1987

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

10-FEB-2005 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

P-0100100-14136685-M-1017144470-20060103 00199 06003H 01 197206634

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.000.537.976**

ROA SILVA

APELLIDOS

JUAN JOSE

NOMBRES

FIRMA



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-ABR-2000**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

17-MAY-2018 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-0100150-01015231-M-1000537976-20180618 **00615**69756A 1 50040024

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **91.446.091**

NIEVES VALENCIA


APELLIDOS

FRANCISCO JAVIER

NOMBRES

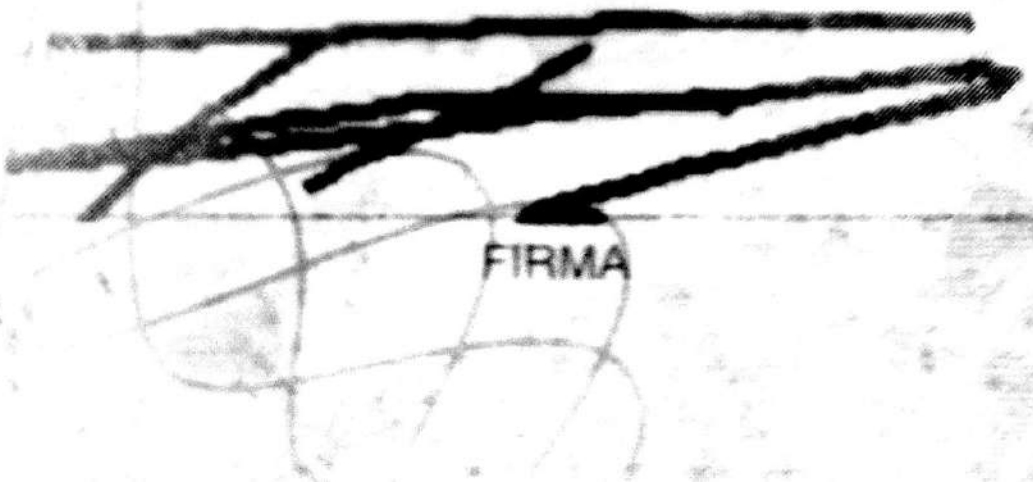

FIRMA

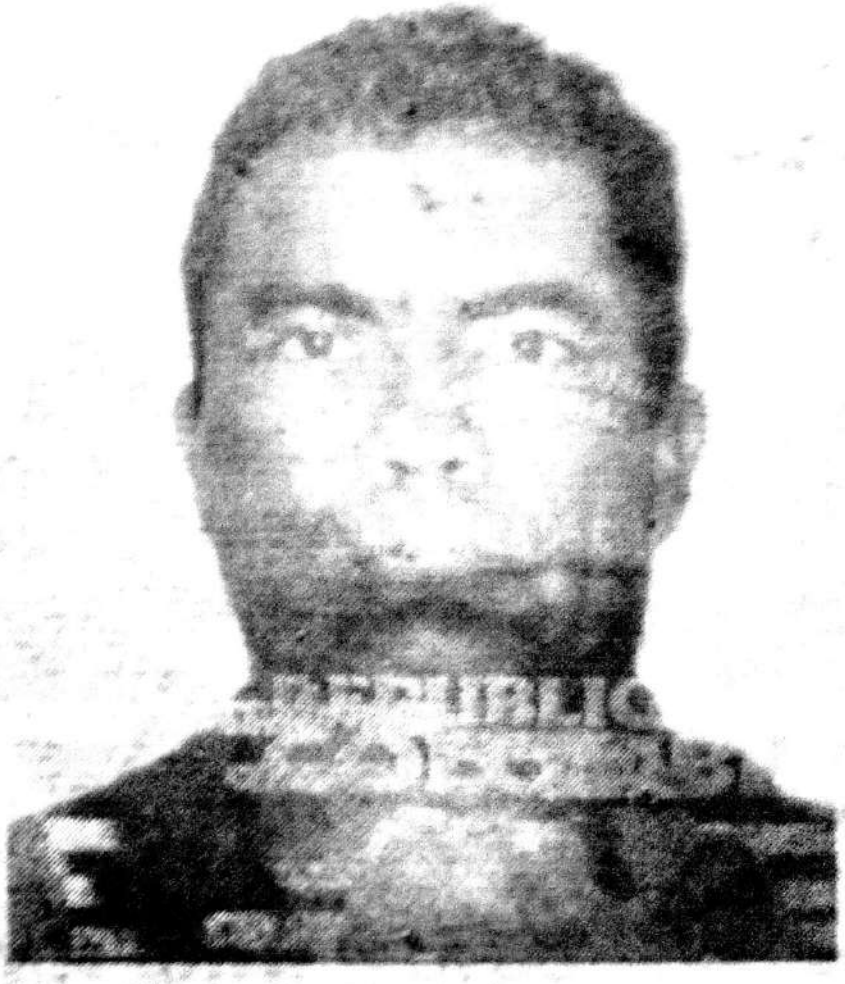

Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-AGO-1975**

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

31-OCT-1994 BARRANCABERMEJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0100150-00713668-M-0091446091-20150610 **00444**57306A 1 7013424191

Powered by CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO **20-AGO-1975**

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

31-OCT-1994 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0100150-00713668-M-0091446091-20150610 0044457306A 1 7013424191

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.037.605.230**

MORENO VALENCIA

APELLIDOS

JAIR ALONSO

NOMBRES

Jair Moreno

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **11-JUN-1990**

MACEO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

07-JUL-2008 ENVIGADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0104900-00488737-M-1037605230-20131007 0035334768A 1 2172573142

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.007.571.457**

BELEÑO GALVIS
APELLIDOS

JHON DEIVIS
NOMBRES

Jhon Deivis B.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-ENE-2002**
AGUACHICA
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

29-ENE-2020 AGUACHICA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-1207500-01131954-M-1007571457-20200213 **0070**082283A 1 52959355


CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 11.222.857

Apellidos
ANDRADE GARCIA

Nombres
JOSE ALCIBIADES

Nacionalidad
COL

Estatura
1.65

Sexo
M

Fecha de nacimiento
24 JUN 1977

G.S.
B+

Lugar de nacimiento
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

Fecha y lugar de expedición
19 MAR 1997, GIRARDOT

Fecha de expiración
17 MAR 2033

Firma


.CO

020217615

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL020217615015109<<<<<<<<<<<
7706242M3303171COL11222857<<<8
ANDRADE<GARCIA<<JOSE<ALCIBIADE

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **32220126**

GIRALDO BOTERO
APELLIDOS

LINA MARIA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-OCT-1982**
SANTUARIO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

23-ENE-2001 SANTUARIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-0125600-14092643-F-0032220126-20010814 **00905** 01194P 01 100861994



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 42.683.289

DURANGO ARENAS
APELLIDOS

MARIA VICTORIA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-FEB-1967
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO

14-DIC-1987 COPACABANA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-0110300-00903448-F-0042683289-20170509 0055312616A 2 9999877919

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.065.913.019**

VIVAS MANDON

APELLIDOS

SIMEON FERNANDO

NOMBRES

Simeon F. VIVAS

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-FEB-1998**

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.77	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

16-FEB-2016 AGUACHICA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-1207500-00801034-M-1065913019-20160314 0048941810A 1 45800978



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-DIC-1996**

CONCORDIA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA | **O-** G.S. RH | **M** SEXO

29-ENE-2016 HISPANIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-0115000-00812631-M-1039597832-20160411 **0049**254415G 1 45539531

Scanned with CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.039.597.832**

GALEANO PARRA

APELLIDOS

YEISON ALEJANDRO

NOMBRES

Yeison Alejandro Galeano P

FIRMA



Scanned with CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-MAR-2000**

APARTADO
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.85	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

11-ABR-2018 APARTADO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-0103500-01001737-M-1001025750-20180430 **0060**97701A 1 50027940

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.001.025.750**

ACOSTA SIMANCA

APELLIDOS

HERNAN DARIO

NOMBRES

H. Acosta

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **16.791.906**

BARBOSA PALOMINO

APELLIDOS

FRANKLIN

NOMBRES



FIRMA

Powered by CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO **30-JUL-1971**

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

31-OCT-1989 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0100150-00032442-M-0016791906-20080728 **00015**36733A 1 2020021788

Powered by CamScanner


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 1.015.186.405
RAMIREZ LOPERA
APELLIDOS
JOHAN
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 07-ABR-2002
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
03-AGO-2020 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA
INDICE DERECHO
00847 35526A 3
8505122346

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.017.221.580



Apellidos
PADILLA GIRALDO

Nombres
LAURA MARCELA

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.66	F

Fecha de nacimiento
29 JUL 1994

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
PALMIRA (VALLE)

Fecha y lugar de expedición
10 AGO 2012, MEDELLIN

Firma
Laura MPG

Fecha de expiración
18 ENE 2034

.CO

037809496

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL037809496201001<<<<<<<<<<<
9407299F3401181COL1017221580<1
PADILLA<GIRALDO<<LAURA<MARCELA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91452201**

LOZANO ROJAS
APELLIDOS

LUIS DANOVER
NOMBRES



Luis Danover Lozano
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-NOV-1977**

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

19-JUN-1996 ARATOCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-0500100-30104581-M-0091452201-20030127 **02482** 03024A 01 129453752

ANEXO 17.

CERTIFICADO PERSONAL 100% COLOMBIANO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Señores
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Calle 44 # 52 165
Medellín, Antioquia

127 - 2026

El suscrito JORGE TRUJILLO NIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.893.413 de Barrancabermeja, actuando en calidad de Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN, identificada con NIT 901.979.396-1, bajo la gravedad de juramento, certifico que durante el **período comprendido entre el 01 de agosto de 2026 y el 31 de agosto de 2026**, para la ejecución del Contrato de Obra No. 4600105555 de 2025, cuyo objeto es realizar el mantenimiento y las obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín, **se destinó el cien por ciento (100 %) de empleados y/o contratistas por prestación de servicios de nacionalidad colombiana para la ejecución del objeto contractual.**

Lo anterior se certifica en cumplimiento de lo dispuesto en el Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional y Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, correspondientes al Proceso de Contratación No. 0070007743.

En constancia, se firma en Medellín, Antioquia, a los **Tres (01)** días del mes de **septiembre** de **2026**.

Cordialmente,

JORGE TRUJILLO NIÑO
C.C 13.893.413 de Barrancabermeja
R/L. UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

ANEXO 18.

ACTA MES DE AGOSTO

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

CONTRATO 4600105555 DE 2025	**FECHA DE INICIO**	**5/09/2025**	**ACTA NO. 12**		
OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.	**AMPLIACIONES**	**N/A**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**31/08/2026**	
	DURACIÓN	**865 DÍAS**			
	VALOR INICIAL	**$ 14.162.162.240**	**PERIODO**	**25/5/2025- 31/8/2026**	
	ADICIONES	**$ -**	**VALOR DE LA PRESENTE ACTA**	**$ 634.386.099,00**	
CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN	**VALOR CON ADICIONES**	**$ 14.162.162.240**			
INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED	**% EJECUTADO EN EL PERIODO**	**4,48%**	**% EJECUTADO ACUMULADO**	**59,87%**	

CONDICIONES CONTRACTUALES						**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO**	
Item	**Actividad**	**Unidad**	**Cant. Total**	**Valor Unitario**	**Vr. Parcial Total**	**Cant**	**Vr. Parcial**	**Cant**	**Vr. Total**
	OBRA CIVIL								
1	Demolición de andén hasta 20cm, incluye corte con disco de concreto, cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales	m2	1,0	$ 48.280,00	$ 48.280	34,25	$ 1.653.590	274,13	$ 13.234.996,40
2	Demolición base controlador local. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante	Un	1,0	$ 159.885,00	$ 159.885	1,00	$ 159.885	34,00	$ 5.436.090,00
3	Suministro e instalación de bordillo en concreto de 0.45m (espesor 0.15)	m	1,0	$ 148.053,00	$ 148.053	3,70	$ 547.796	71,41	$ 10.572.464,73
4	Retiro o demolición bordillo (cordón), incluye cargue, transporte y botada de material sobrante	m	1,0	$ 14.768,00	$ 14.768	0,00	$ -	21,70	$ 320.465,60
5	Demolición de cajas de empalme hasta de 0.80 x 0.80 m libres. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante	Un	1,0	$ 147.881,00	$ 147.881	0,00	$ -	0,00	$ -
6	Demolición de resaltos viales en mezcla asfáltica hasta nivel de via. Incluye cargue y botada de material sobrante.	m3	1,0	$ 260.770,00	$ 260.770	0,00	$ -	0,00	$ -
7	Demolición de carpeta asfáltica hasta nivel de base granular, Incluye llenos temporales en base granular, cargue y botada de material sobrante.	m3	1,0	$ 656.913,00	$ 656.913,00	0,00	$ -	1,12	$ 735.742,56
8	Retiro de tapas en concreto reforzado de cajas hasta 0,80 x 0,80 m. Incluye transporte a su disposición final.	Un	1,0	$ 14.384,00	$ 14.384	0,00	$ -	1,00	$ 14.384,00
9	Suministro de marco de 50x50 cm, en ángulo de 2"x2"x1/4" y acabado en pintura anticorrosiva. Incluye tapa de seguridad en lámina de alfajor calibre 1/8" de 50x50 cm medida exterior y anclajes en varillas de 1/4" para fijación del marco	Un	1,0	$ 534.013,00	$ 534.013	36,00	$ 19.224.468	695,00	$ 371.139.035,00
10	Suministro e instalación de marco y tapa para cajas en concreto de 0,60 x0,80 m interna. Incluye concreto de 21 MPA, para el empotramiento del elemento.	Un	1,0	$ 626.290,00	$ 626.290,00	0,00	$ -	0,00	$ -
11	Suministro de marco de 60x60 cm, en ángulo de 2"x2"x1/4" y acabado en pintura anticorrosiva. Incluye tapa de seguridad en lámina de alfajor calibre 1/8" de 60x60 cm medida exterior anclajes en varillas de 1/4" para fijación del marco	Un	1,0	$ 723.504,00	$ 723.504	10,00	$ 7.235.040	106,00	$ 76.691.424,00
12	Instalación de tapa metálica de hasta de 60x60 cm. Incluye demolición de concreto, limpieza de caja, recolección de escombros	Un	1,0	$ 56.495,00	$ 56.495	0,00	$ -	1,00	$ 56.495,00
13	Instalación de marco y tapa metálicos para cajas de hasta 60x60 cm interna. Incluye concreto de 21 MPa para empotramiento de elemento	Un	1,0	$ 153.601,00	$ 153.601,00	32,00	$ 4.915.232	927,00	$ 142.388.127,00
14	Reparación de marco de tapa de caja de registro con ángulo o platina de 2" calibre 1/8", hasta 60 cm	Un	1,0	$ 103.386,00	$ 103.386	0,00	$ -	0,00	$ -
15	Suministro de Tornillos de 5/8 " para cajas de hasta 60 x 60 cm, según especificaciones de la Secretaría de Movilidad de Medellín	Un	1,0	$ 29.167,00	$ 29.167	92,00	$ 2.683.364	1602,00	$ 46.725.534,00
16	Suministro de tapa y marco de seguridad en hierro dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12, de 50x50 cm medida exterior, incluye tornillones de seguridad en acero galvanizado según especificaciones SMM.	Un	1,0	$ 625.739,00	$ 625.739,00	0,00	$ -	70,00	$ 43.801.730,00
17	Suministro de tapa y marco de seguridad en hierro dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12, de 60x60 cm medida exterior, incluye tornillones de seguridad en acero galvanizado según especificaciones SMM.	Un	1,0	$ 776.380,00	$ 776.380	0,00	$ -	20,00	$ 15.527.600,00
18	Suministro e instalación de Concreto de 21 Mpa hecho en obra.	m3	1,0	$ 743.427,00	$ 743.427	3,10	$ 2.304.624	5,99	$ 4.453.127,73

CONDICIONES CONTRACTUALES						PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Item	Actividad	Unidad	Cant. Total	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Parcial	Cant	Vr. Total
19	Construcción de canalización en Pavimento de 0.50m, con profundidad de 70 cm. Incluye corte con cortadora de concreto, demolición de pavimento de espesor variable hasta 0,15m, excavación, botada de escombros al botadero oficial, instalación de 2 tubos electricos DB de 3", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento mecánicamente.	m	1,0	$ 256.892,00	$ 256.892,00	0,00	$ -	40,90	$ 10.506.882,80
20	Construcción de canalización en Pavimento de 0.50m, con profundidad de 30 cm, incluye corte con cortadora de concreto, demolición de pavimento de espesor variable hasta 0,15m, excavación, botada de escombros al botadero oficial, instalación de 2 tubos eléctricos IMC de 3", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento mecánicamente	m	1,0	$ 308.637,00	$ 308.637	0,00	$ -	6,40	$ 1.975.276,80
21	Suministro e instalación provisional de pavimento flexible en frío de 50 cm de ancho y e=2.5 cm, según requerimientos de la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín.	m	1	$ 125.098,00	$ 125.098	0,00	$ -	37,40	$ 4.678.665,20
22	Construcción Canalización en Zona Dura de 0.40m, incluye corte con cortadora de concreto, demolición de concreto de espesor variable hasta 0.15m, excavación, botada de escombros, instalación de dos tubos eléctricos DB de 2", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento rigido y la cimentación de la tuberia, concreto de 21 Mpa de espesor 0.1 m.	m	1	$ 292.727,00	$ 292.727,00	2,20	$ 643.999	65,25	$ 19.100.436,75
23	Construcción Canalización en adoquín de 0.20m, incluye retiro de adoquines, excavación, botada de escombros, instalación de dos tubos eléctricos DB de 2", lleno compactado de los materiales que componen la estructura y de la cimentación, reintalación adoquines y reposición de adoquines deteriorados (10%), arena de pega y sellado de adoquines con arena de revoque.	m	1,0	$ 156.993,00	$ 156.993	0,00	$ -	169,04	$ 26.538.096,72
24	Construcción de canalización en adoquín de 0,1 m incluye retiro de adoquines, excavación, botada de escombros, instalación de un tubo eléctrico PVC DB de 2", lleno compactado de los materiales que componen la estructura y de la cimentación, reinstalación de adoquines y reposición de adoquines deteriorados , arena de pega y sellado de adoquines con arena de revoque.	m	1,0	$ 47.379,00	$ 47.379	0,00	$ -	2,50	$ 118.447,50
25	Construcción Canalización en zona verde, incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalación de 2 tubos eléctricos DB de 2", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente.	m	1,0	$ 113.988,00	$ 113.988,00	36,70	$ 4.183.360	284,75	$ 32.458.083,00
26	Construcción Canalización en zona dura o zona verde de hasta 30 cm de profundidad. Incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalación de un (1) tubo eléctrico DB de 3/4", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente (Si aplica). NO incluye demoliciones.	m	1,0	$ 20.398,00	$ 20.398	5,00	$ 101.990	24,20	$ 493.631,60
27	Construcción Canalización en zona verde de hasta 30 cm de profundidad. Incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalación de un (1) tubo eléctrico DB de 1 1/2", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente (Si aplica). NO incluye demoliciones.	m	1,0	$ 27.759,00	$ 27.759	0,00	$ -	48,20	$ 1.337.983,80
28	Construcción Canalización en zona dura o zona verde de hasta 30 cm de profundidad. Incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalación de un (1) tubo eléctrico DB de 2", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente (Si aplica). NO incluye demoliciones.	m	1,0	$ 31.737,00	$ 31.737,00	0,00	$ -	101,25	$ 3.213.371,25
29	Suministro e instalación de cubierta metálica para viga de puente en lámina galvanizada calibre 16 de hasta 0,25 m2 y pintura electrostática negra. Incluye todos los elementos para su correcta fijación.	Un	1,0	$ 321.237,00	$ 321.237	0,00	$ -	0,00	$ -
30	Construcción de canalización aérea tubería IMC de 2", incluye accesorios de fijación.	m	1,0	$ 107.747,00	$ 107.747	0,00	$ -	0,00	$ -
31	Suministro e instalación de conduleta metálica de 2"	Un	1,0	$ 189.634,00	$ 189.634,00	0,00	$ -	4,00	$ 758.536,00
32	Construcción de canalización aérea tubería IMC de 3", incluye accesorios de fijación.	m	1,0	$ 161.859,00	$ 161.859	0,00	$ -	18,00	$ 2.913.462,00
33	Construcción Base para Controlador Local en concreto de 21 Mpa, acabado a la vista, medidas de hasta 0.6 X 0.41 X 1.50 m, acero de refuerzo principal, 4 de 3/8", 3 estribos de 3/8", 3 tubos eléctricos de 3" de 1.50 m, c/u, 3 curvas eléctricas de 3", excavación de 0.40 X 0.6 x 0.3 m. Incluye formaleta metálica y curado. Botada de material sobrante.	Un	1,0	$ 827.666,00	$ 827.666	0,00	$ -	85,00	$ 70.351.610,00

CONDICIONES CONTRACTUALES						PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Item	Actividad	Unidad	Cant. Total	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Parcial	Cant	Vr. Total
34	Construcción de Cajas de 50 X 50 cm internas en concreto de 21 Mpa, paredes de 0.10 m y profundidad de 0.8 m, no incluye herraje (marco y tapa) metálico y/o sintético, antifraude, fondo en triturado lavado de tamaño 3/4", espesor 0,10 m. Incluye excavación y botada de material sobrante.	Un	1,0	$ 322.250,00	$ 322.250,00	0,00	$ -	10,00	$ 3.222.500,00
35	Construcción de Cajas de 60 X 60 cm internas en concreto de 21 Mpa, paredes de 0.15 m y profundidad hasta 1 m, no incluye herraje metálico (marco y tapa) , fondo en triturado lavado de tamaño 3/4", espesor 0,10 m. Incluye excavación y botada de material sobrante.	Un	1,0	$ 405.108,00	$ 405.108	7,00	$ 2.835.756	64,00	$ 25.926.912,00
36	Construcción andenes en concreto de 21 Mpa, de espesor 8 cm, incluye acero de refuerzo #2 (2 Kg*m2), y base granular de espesor 15 cm, juntas de dilatación y acabado	m2	1,0	$ 119.037,00	$ 119.037	4,65	$ 553.522	114,57	$ 13.638.069,09
37	Construcción rampa para personas con movilidad reducida, incluye concreto de 21 Mpa, loseta táctil alerta, llaves de confinamiento en concreto, sellado de adoquines con arena de revoque y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Ver Figuras en en manual de espacio público	m2	1,0	$ 155.931,00	$ 155.931,00	0,00	$ -	18,96	$ 2.956.451,76
38	Excavación manual en material heterogéneo con cualquier tipo de humedad, H: entre 0,0 y 1,2m, incluye cargue, transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales.	m3	1,0	$ 52.461,00	$ 52.461	0,00	$ -	14,56	$ 763.832,16
39	Construccion de llaves de confinamiento en concreto de 21 Mpa, de varias medidas. Incluye formaleta de cualquier material para concreto a la vista, y biseles triangulares de 1/2"	m	1,0	$ 85.447,00	$ 85.447	0,00	$ -	0,00	$ -
40	Construccion de vigas en concreto de 21 Mpa, medida de 0,20 x 0,20 m, incluye acero de refuerzo: 4 varillas longitudinales de 1/2" y 7 estribos de 3/8" espaciados cada 0,15 m de 0,12 X 0,12 m. La excavación se pagará en su respectivo item.	m	1,0	$ 91.307,00	$ 91.307,00	0,00	$ -	0,00	$ -
41	Construcción de malla detectora en pavimento asfáltico, incluye corte de pavimento con disco, cable de 2x18 con su respectivo empalme eléctrico, y resane con epóxico para carpeta asfáltica	m	1,0	$ 73.690,00	$ 73.690	0,00	$ -	0,00	$ -
42	Suministro e instalación de acometida eléctrica, para controlador local, incluye demolición, excavación, hasta 6 m de tubería IMC de 3/4", zuncho metálico de 5/8", y hasta 25 mts de cable encauchetado 2x12, empalmes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	1,0	$ 387.566,00	$ 387.566	1,00	$ 387.566	9,00	$ 3.488.094,00
43	Construccion de puesta a tierra RA4-020 tipo EPM - incluye varilla coperweld 5/8", alambre No. 10 de cobre, soldadura exotérmica, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento y cumpliendo con la norma y especificación de E. P. M. Incluye medición e informe.	Un	1,0	$ 371.481,00	$ 371.481,00	0,00	$ -	15,00	$ 5.572.215,00
44	Construcción de descarga a tierra de pantalla de cable telefónico.	Un	1,0	$ 32.607,00	$ 32.607	0,00	$ -	0,00	$ -
45	Construcción contrapeso de puesta a tierra para cumplimiento con la norma y especificación de E. P. M. Incluye medición e informe.	Un	1,0	$ 443.993,00	$ 443.993	0,00	$ -	3,00	$ 1.331.979,00
46	Suministro, transporte e instalación de bajantes metálicos de 2", incluye accesorios de fijación.(Cinta bandit de 5/8" y hebillas tambien en acero).	m	1,0	$ 76.588,00	$ 76.588,00	6,00	$ 459.528	19,50	$ 1.493.466,00
47	Suministro, transporte e instalación de bajantes metálicos de 1 1/2", incluye elementos de fijación.(Cinta bandit de 5/8" y hebillas en acero).	m	1,0	$ 72.987,00	$ 72.987	6,00	$ 437.922	26,00	$ 1.897.662,00
48	Suministro, transporte e instalación de bajantes metálicos de 1 ", incluye accesorios de fijación.(Cinta bandit de 5/8" y hebilla en acero).	m	1,0	$ 54.610,00	$ 54.610	0,00	$ -	0,00	$ -
49	Suministro, transporte e instalación de bajantes metálicos de 3/4"", incluye accesorios de fijación.(Cinta bandit de 5/8" y hebillas en acero).	m	1,0	$ 47.767,00	$ 47.767,00	0,00	$ -	4,50	$ 214.951,50
50	Suministro e instalación de tubo eléctrico DB de 1 1/2"	m	1,0	$ 10.610,00	$ 10.610	0,00	$ -	0,00	$ -
51	Suministro e instalación de tubo eléctrico DB de 2"	m	1,0	$ 12.132,00	$ 12.132	0,00	$ -	1,05	$ 12.738,60
52	Suministro e instalación de tubo eléctrico DB de 3"	m	1,0	$ 23.642,00	$ 23.642,00	0,00	$ -	22,95	$ 542.583,90
53	Retiro e instalación de Adoquines (liso, alerta o güía). Incluye subbase y arena	m2	1,0	$ 56.161,00	$ 56.161	0,00	$ -	23,60	$ 1.325.399,60
54	Limpieza de caja de inspección de hasta 60x80 cm hasta 1 m de profundidad. Debe incluir minimo el 50% del volumen de la caja.	Un	1,0	$ 20.032,00	$ 20.032	7,00	$ 140.224	661,00	$ 13.241.152,00
55	Encamisado de tubería pvc en canalizacion existente hasta 50 cm.	Un	1,0	$ 19.377,00	$ 19.377,00	0,00	$ -	23,00	$ 445.671,00

CONDICIONES CONTRACTUALES						PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Item	Actividad	Unidad	Cant. Total	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Parcial	Cant	Vr. Total
56	Suministro, transporte e instalación de mezcla asfáltica densa en caliente MDC 19, espesor 4", ancho hasta 50 cm. Compactada por medio mecánico, Incluye riego de emulsión asfáltica de rompimiento rapido	m	1,0	$ 106.272,00	$ 106.272	0,00	$ -	0,00	$ -
57	Suministro, transporte e instalación de mezcla asfáltica densa en caliente MDC 19, espesor 6", ancho hasta 50 cm. Compactada por medio mecánico, Incluye riego de emulsión asfáltica de rompimiento rapido.	m	1,0	$ 136.627,00	$ 136.627	0,00	$ -	36,40	$ 4.973.222,80
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS SEMAFÓRICOS								
58	Suministro, transporte e instalación de ménsula galvanizada (poste recto con platina y brazo de L= 5.5 m), con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla normas para espesores de tubería, pintura y adherencia. Incluye elementos de fijación.	Un	1,0	$ 3.931.291,00	$ 3.931.291	0,00	$ -	5,00	$ 19.656.455,00
59	Suministro, transporte e instalación de ménsula galvanizada (poste recto con platina y brazo de L= 4.5 m), con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla normas para espesores de tubería, pintura y adherencia. Incluye elementos de fijación.	Un	1,0	$ 3.862.147,00	$ 3.862.147	0,00	$ -	0,00	$ -
60	Suministro, transporte e instalación de poste recto de enterramiento directo, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores de tubería y pintura y lo mismo que adherencia. Incluye demolición de concreto, excavación y concreto de 21 Mpa para empotramiento del poste	Un	1,0	$ 1.557.489,00	$ 1.557.489,00	0,00	$ -	8,00	$ 12.459.912,00
61	Suministro, transporte e instalación de poste recto con platina , con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores para tubería, pintura y adherencia. Incluye elementos de fijación.	Un	1,0	$ 2.144.221,00	$ 2.144.221	0,00	$ -	0,00	$ -
62	Suministro, transporte e instalación de poste recto con platina para instalación de brazo de ménsula, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores para tubería, pintura y adherencia. Incluye brida o flanche y elementos de fijación.	Un	1,0	$ 2.221.574,00	$ 2.221.574	0,00	$ -	0,00	$ -
63	Suministro, transporte e instalación de poste para ubicación de sonorizador, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores para tubería, pintura y adherencia. Incluye demolición, excavación, concreto de 21 Mpa para empotramiento del poste.	Un	1,0	$ 787.506,00	$ 787.506,00	0,00	$ -	0,00	$ -
64	Suministro, transporte e instalación de semáforo vehicular en ménsula, incluye elementos de fijación, colocación horizontal sin placa de contraste. Incluye dos soportes en policarbonato.	Un	1,0	$ 1.481.576,00	$ 1.481.576	0,00	$ -	11,00	$ 16.297.336,00
65	Suministro, transporte e instalación de semáforo vehicular a poste recto, incluye elementos de fijación. (flejes de acero Bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato.	Un	1,0	$ 1.382.865,00	$ 1.382.865	12,00	$ 16.594.380	61,00	$ 84.354.765,00
66	Suministro, transporte e instalación de semáforo vehicular de 4 aspectos a poste recto, incluye elementos de fijación. (flejes de acero Bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos accesorios de pasta.	Un	1,0	$ 1.788.944,00	$ 1.788.944,00	0,00	$ -	0,00	$ -
67	Suministro, transporte e instalación de semáforo vehicular de conteo regresivo a ménsula, tres aspectos. Conteo regresivo de rojo y conteo regresivo de verde y amarillo completo durante el tiempo de amarillo. Incluye elementos de fijación (flejes de acero Bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato.	Un	1,0	$ 2.165.692,00	$ 2.165.692	1,00	$ 2.165.692	14,00	$ 30.319.688,00
68	Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal de conteo regresivo. Incluye elementos de fijación (flejes de acero bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato.	Un	1,0	$ 1.658.257,00	$ 1.658.257	0,00	$ -	8,00	$ 13.266.056,00
69	Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal de conteo regresivo para paso peatonal actuado (pulsado). Incluye elementos de fijación (flejes de acero bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye módulo de conteo, cableado interno y dos soportes en policarbonato.	Un	1,0	$ 1.781.158,00	$ 1.781.158,00	0,00	$ -	0,00	$ -
70	Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal estático. Incluye elementos de fijación (flejes de acero bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato.	Un	1,0	$ 1.220.337,00	$ 1.220.337	18,00	$ 21.966.066	63,00	$ 76.881.231,00

CONDICIONES CONTRACTUALES						PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Item	Actividad	Unidad	Cant. Total	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Parcial	Cant	Vr. Total
71	Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal proyector en piso. Incluye ajuste y elementos de fijación.	Un	1,0	$ 4.004.506,00	$ 4.004.506	0,00	$ -	0,00	$ -
72	Suministro, transporte e instalación de módulo sonoro para semáforo peatonal.	Un	1,0	$ 2.243.667,00	$ 2.243.667,00	0,00	$ -	63,00	$ 141.351.021,00
73	Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal tipo totem de 160x37x24 cm. Incluye sonorizador, dos lámparas peatonal estaticas de 200 mm, pulsador inductivo touchless y panel de mensajería de 19.5x97.5 cm.	Un	1,0	$ 9.476.115,00	$ 9.476.115	0,00	$ -	0,00	$ -
74	Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	Un	1,0	$ 3.511.437,00	$ 3.511.437	0,00	$ -	0,00	$ -
75	Suministro, transporte e instalación de semáforo estático para ciclistas, de tres aspectos de 100 mm. IP65. Incluye elementos de fijación (flejes de acero bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato.	un	1,0	$ 1.229.318,00	$ 1.229.318,00	0,00	$ -	0,00	$ -
76	Suministro, transporte de instalación de contraste para semáforo de cuatro aspectos, inluye pintura anticorrosivo y acabado en poliuretano.	Un	1,0	$ 463.039,00	$ 463.039	0,00	$ -	0,00	$ -
77	Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG (Termoflex) 4x18, 600 v, 105°C, para semaforización.	m	1,0	$ 7.556,00	$ 7.556	0,00	$ -	3660,00	$ 27.654.960,00
78	Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG (Termoflex) 2x18, 600 v, 105°, para semaforización.	m	1,0	$ 4.101,00	$ 4.101,00	0,00	$ -	0,00	$ -
79	Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG 2x12 de Potencia-Tipo Fuerza, para semaforización. Debe cumplir con las normas y especificaciones de E. P M.	m	1,0	$ 8.546,00	$ 8.546	15,00	$ 128.190	396,00	$ 3.384.216,00
80	Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG 2x10 de Potencia-Tipo Fuerza, para semaforización. Debe cumplir con las normas y especificaciones de E. P M.	m	1,0	$ 12.789,00	$ 12.789	80,00	$ 1.023.120	360,00	$ 4.604.040,00
81	Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG 2x8 de Potencia-Tipo Fuerza, para semaforización. Debe cumplir con las normas y especificaciones de E. P M.	m	1,0	$ 20.225,00	$ 20.225,00	0,00	$ -	0,00	$ -
82	Suministro, transporte e instalación de cable mensajero, desnudo y de espesor E=1/8"	m	1,0	$ 2.583,00	$ 2.583	0,00	$ -	0,00	$ -
83	Suministro, transporte e instalación de discos direccionales, para postes de semáforos, en lámina galvanizada y/o fibra de vidrio, con material reflectivo tipo IX, incluye elementos de fijación (cinta band it de 3/4" y hebillas) y recubrimiento del borde con esmalte epóxico. Se debe cumplir con las normas y especificaciones del manual de Señalizacion vial vigente en cuanto a color y papel.	Un	1,0	$ 201.244,00	$ 201.244	29,00	$ 5.836.076	328,00	$ 66.008.032,00
84	Suministro, transporte e instalación de señal de seguridad vial SI-27A, para poste peatonal con pulsador.	Un	1,0	$ 266.799,00	$ 266.799,00	0,00	$ -	0,00	$ -
85	Reparación de disco direccional. Incluye retiro de material reflectivo existente, suministro e instalación de material reflectivo tipo IX (mínimo) y recubrimiento del borde con esmalte epóxico. Se debe cumplir con las normas y especificaciones del manual de Señalizacion vial vigente en cuanto a color y papel.	Un	1,0	$ 104.200,00	$ 104.200	0,00	$ -	0,00	$ -
86	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de semáforo a 50, 100 o 200 m, incluye excavación y concreto de 21 MPA para empotramiento. Se debe cumplir con las normas y especificaciones del manual de señalizacion vial vigente.	Un	1,0	$ 287.345,00	$ 287.345	0,00	$ -	4,00	$ 1.149.380,00
87	Suministro, transporte e instalación de pulsadores para peatones. Incluye elementos de fijación.	Un	1,0	$ 940.860,00	$ 940.860,00	0,00	$ -	7,00	$ 6.586.020,00
88	Suministro, transporte e instalación de pulsadores touchless (Sin contacto) para peatones.Lámina autoadhesiva de identificación de 9x5 cm.	Un	1,0	$ 1.026.702,00	$ 1.026.702	0,00	$ -	55,00	$ 56.468.610,00
89	Suministro, transporte e instalación de percha con aislador	Un	1,0	$ 75.588,00	$ 75.588	0,00	$ -	12,00	$ 907.056,00
90	Suministro de Protector de sobrecargas eléctricas para controlador local.	Un	1,0	$ 3.668.548,00	$ 3.668.548,00	8,00	$ 29.348.384	19,00	$ 69.702.412,00
91	Suministro, transporte e instalación de radar para detección de vehículos en intersección semafórica	Un	1,0	$ 5.276.791,00	$ 5.276.791	0,00	$ -	9,00	$ 47.491.119,00
92	Suministro, transporte e instalación de lengüetas para chapas de controlador local	Un	1,0	$ 63.406,00	$ 63.406	0,00	$ -	0,00	$ -
93	Suministro, transporte e instalación de chapa principal para gabinetes de controlador local. Incluye tornillos de fijación	Un	1,0	$ 361.923,00	$ 361.923,00	0,00	$ -	0,00	$ -

CONDICIONES CONTRACTUALES						PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Item	Actividad	Unidad	Cant. Total	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Parcial	Cant	Vr. Total
94	Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos AWG 4x18, 2x16, 3x18 y 4x12	Un	1,0	$ 53.619,00	$ 53.619	265,00	$ 14.209.035	3160,00	$ 169.436.040,00
95	Suministro, transporte e instalación de empalme Cable telefónico de 10 pares. Incluye elementos necesarios para el buen desempeño	Un	1,0	$ 356.628,00	$ 356.628	0,00	$ -	29,00	$ 10.342.212,00
96	Suministro, transporte e instalación de cortacircuitos breaker monopolar de 6 amperios.	Un	1,0	$ 17.522,00	$ 17.522,00	0,00	$ -	21,00	$ 367.962,00
97	Suministro, transporte e instalación de anclajes para ménsula, incluye demolición, excavación, acero de refuerzo, concreto de 21 Mpa, cargue, transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales.	Un	1,0	$ 614.727,00	$ 614.727	0,00	$ -	15,00	$ 9.220.905,00
98	Suministro, transporte e instalación de plaqueta identificadora de cable de semáforos	Un	1,0	$ 8.781,00	$ 8.781	0,00	$ -	147,00	$ 1.290.807,00
99	Suministro, transporte e instalación de empalme UY	Un	1,0	$ 2.077,00	$ 2.077,00	0,00	$ -	0,00	$ -
100	Suministro, transporte e instalación de empalme con Conector en "C" de cable AWG 8 ó 10	Un	1,0	$ 15.558,00	$ 15.558	2,00	$ 31.116	5,00	$ 77.790,00
101	Suministro, transporte e instalación de fusibles cerámica de L = 3/4" y diámetro 3/16" de 3.15 A	Un	1,0	$ 9.408,00	$ 9.408	0,00	$ -	1,00	$ 9.408,00
102	Suministro e instalación de cable # 8 entre varillas de 5/8" para puesta a tierra	m	1,0	$ 9.107,00	$ 9.107,00	0,00	$ -	22,00	$ 200.354,00
103	Suministro e Instalación de alambre # 10 para tierra desde la varilla de 5/8" a la bornera	m	1,0	$ 7.498,00	$ 7.498	0,00	$ -	0,00	$ -
104	Suministro e instalación de 50 cm de cinta bandit para semáforo vehicular o peatonal a poste recto	Un	1,0	$ 10.062,00	$ 10.062	15,00	$ 150.930	253,00	$ 2.545.686,00
105	Suministro de flauta para soporte de semáforo en ménsula. Incluye Pintura lijada, aplicación de anticorrosivo y pintura poliuretano.	Un	1,0	$ 92.570,00	$ 92.570,00	0,00	$ -	0,00	$ -
106	Suministro e Instalación de accesorio para soporte de semáforo de hasta 50 cm	Un	1,0	$ 122.434,00	$ 122.434	0,00	$ -	0,00	$ -
107	Suministro e Instalación de tornillos para flanche.	Un	1,0	$ 7.763,00	$ 7.763	0,00	$ -	4,00	$ 31.052,00
108	Suministro e instalación de cable encauchetado 2 x 10	m	1,0	$ 12.967,00	$ 12.967,00	0,00	$ -	812,00	$ 10.529.204,00
109	Suministro e Instalación de Cable encauchetado 2 x 14	m	1,0	$ 9.214,00	$ 9.214	0,00	$ -	162,00	$ 1.492.668,00
110	Suministro e Instalación de Cable UTP cat6+ para intemperie	m	1,0	$ 5.901,00	$ 5.901	0,00	$ -	7800,00	$ 46.027.800,00
111	Suministro e Instalación de Cable STP cat6+ para intemperie	m	1,0	$ 6.374,00	$ 6.374,00	0,00	$ -	0,00	$ -
112	Suministro e instalación de tapa bornera	Un	1,0	$ 113.050,00	$ 113.050	0,00	$ -	0,00	$ -
	RED DE COMUNICACIONES								
113	Suministro e instalación de fibra óptica armada de 24 hilos.	m	1,0	$ 10.793,00	$ 10.793,00	210,00	$ 2.266.530	34729,00	$ 374.830.097,00
114	Empalme por fusión de fibra óptica de 24 hilos , incluye instalación de mufla con derivación.	Un	1,0	$ 431.593,00	$ 431.593	0,00	$ -	15,00	$ 6.473.895,00
115	Empalme por fusión de fibra óptica de hasta 48 hilos, tipo sangría, organización de hilos en bandeja y adosamiento en cámara o poste	Un	1,0	$ 379.842,00	$ 379.842	0,00	$ -	0,00	$ -
116	Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos.	Un	1,0	$ 289.775,00	$ 289.775,00	0,00	$ -	152,00	$ 44.045.800,00
117	Certificación de enlace Óptico de 1 hilo, incluye reflectometría con bobina de lanzamiento, prueba VFL, potencia óptica y verificación microscópica de conectores. Incluye entregables (Gráficas de OTDR + Potencias) punto a punto	Un	1,0	$ 14.471,00	$ 14.471	0,00	$ -	964,00	$ 13.950.044,00
118	Suministro e instalación de conector rápido de fibra óptica	Un	1,0	$ 13.093,00	$ 13.093	0,00	$ -	0,00	$ -
119	Suministro e instalación de conversor de medio de fibra óptica	Un	1,0	$ 256.359,00	$ 256.359,00	0,00	$ -	0,00	$ -
120	Suministro e instalación de pathcore de fibra óptica de 5 m monomodo SC	Un	1,0	$ 44.404,00	$ 44.404	0,00	$ -	0,00	$ -
121	Localización y replanteo del trazado definitivo de la red. Incluye Plano KMZ	m	1,0	$ 1.114,00	$ 1.114	0,00	$ -	71957,00	$ 80.160.098,00
122	Suministro, transporte e instalación de fibra óptica ADSS, monomodo, span 100, de 24 hilos. No incluye plano record.	m	1,0	$ 11.099,00	$ 11.099,00	0,00	$ -	4292,00	$ 47.636.908,00
123	Suministro, transporte e instalación de tuerca de ojo para instalación de fibra óptica	Un	1,0	$ 24.288,00	$ 24.288	0,00	$ -	170,00	$ 4.128.960,00
124	Suministro, transporte e instalación de herraje de suspensión para instalación de fibra óptica	Un	1,0	$ 25.261,00	$ 25.261	0,00	$ -	1,00	$ 25.261,00
125	Suministro, transporte e instalación de helicoidal para instalación de fibra óptica	Un	1,0	$ 18.086,00	$ 18.086,00	0,00	$ -	186,00	$ 3.363.996,00
126	Suministro, transporte e instalación de placa identificadora de fibra óptica	Un	1,0	$ 9.200,00	$ 9.200	7,00	$ 64.400	1437,00	$ 13.220.400,00

CONDICIONES CONTRACTUALES						PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Item	Actividad	Unidad	Cant. Total	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Parcial	Cant	Vr. Total
127	Suministro, configuración y puesta en marcha de equipo de comunicación inalámbrica. Consta de transmisor y antena tipo látigo con soporte para instalación en ménsula.	Un	1,0	$ 1.229.450,00	$ 1.229.450	0,00	$ -	0,00	$ -
128	Instalación de equipo de comunicación inalámbrica en ménsula. Incluye cinta bandit	Un	1,0	$ 182.536,00	$ 182.536,00	0,00	$ -	2,00	$ 365.072,00
129	Retiro de equipo de comunicación inalámbrica en ménsula	Un	1,0	$ 158.942,00	$ 158.942	0,00	$ -	2,00	$ 317.884,00
130	Suministro de switch capa 3 de fibra óptica	Un	1,0	$ 1.039.940,00	$ 1.039.940	64,00	$ 66.556.160	268,00	$ 278.703.920,00
131	Suministro e instalación de switch capa 2 de cinco puertos ethernet de 1 gbps	Un	1,0	$ 106.517,00	$ 106.517,00	0,00	$ -	0,00	$ -
132	Suministro e instalación de módulo SFP de 1,25 Gbps Dúplex LC/APC 1310 nm	Un	1,0	$ 183.379,00	$ 183.379	17,00	$ 3.117.443	191,00	$ 35.025.389,00
133	Instalación, configuración y puesta en funcionamiento de switch capa 3 de fibra óptica	Un	1,0	$ 243.495,00	$ 243.495	9,00	$ 2.191.455	115,00	$ 28.001.925,00
134	Suministro, configuración e instalación de Router 6200 G.SHDSL.bis VPN 11.362 Mbps.	Un	1,0	$ 2.497.278,00	$ 2.497.278,00	0,00	$ -	0,00	$ -
135	Suministro e instalación dentro de gabinete de controlador de multitoma AC de 6 puestos con polo a tierra.	Un	1,0	$ 30.679,00	$ 30.679	0,00	$ -	0,00	$ -
136	Sumnistro e instalación de tubería embebida al interior de cárama de inspección en tubería metálica flexible de 1". Incluye elementos de fijación.	m	1,0	$ 35.197,00	$ 35.197	0,00	$ -	0,00	$ -
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS SEMAFÓRICOS								
137	Suministro de Carcaza de un aspecto para semáforo de 200 mm en policarbonato. Incluye visera	Un	1,0	$ 294.625,00	$ 294.625	0,00	$ -	8,00	$ 2.357.000,00
138	Suministro de Carcaza de dos aspectos para semáforo de 200 mm en policarbonato. Incluye visera	Un	1,0	$ 533.590,00	$ 533.590	0,00	$ -	6,00	$ 3.201.540,00
139	Suministro de ménsula galvanizada (poste recto con platina y brazo de L= 5.5 m), con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla normas para espesores de tubería, pintura y adherencia. Incluye elementos de fijación y tapones.	Un	1,0	$ 3.486.539,00	$ 3.486.539,00	0,00	$ -	46,00	$ 160.380.794,00
140	Suministro de ménsula galvanizada (poste recto con platina y brazo de L= 4.5 m), con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla normas para espesores de tubería, pintura y adherencia. Incluye elementos de fijación y tapones.	Un	1,0	$ 3.417.396,00	$ 3.417.396	10,00	$ 34.173.960	10,00	$ 34.173.960,00
141	Suministro de poste recto de enterramiento directo, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores de tubería y pintura y lo mismo que adherencia.	Un	1,0	$ 1.442.326,00	$ 1.442.326	10,00	$ 14.423.260	191,00	$ 275.484.266,00
142	Suministro de poste recto de platina, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores de tubería y pintura y lo mismo que adherencia.	Un	1,0	$ 2.077.371,00	$ 2.077.371,00	0,00	$ -	3,00	$ 6.232.113,00
143	Suministro de semáforo vehicular, incluye dos soportes en poliuretano	Un	1,0	$ 1.354.428,00	$ 1.354.428	0,00	$ -	10,00	$ 13.544.280,00
144	Suministro de semáforo peatonal de conteo regresivo, incluye dos soportes en poliuretano	Un	1,0	$ 1.622.178,00	$ 1.622.178	0,00	$ -	92,00	$ 149.240.376,00
145	Suministro de semáforo peatonal estático, incluye dos soportes en poliuretano	Un	1,0	$ 1.184.259,00	$ 1.184.259,00	0,00	$ -	0,00	$ -
146	Suministro de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	Un	1,0	$ 3.317.524,00	$ 3.317.524	0,00	$ -	200,00	$ 663.504.800,00
147	Suministro de gabinete para controlador local, en lámina calibre 16. Incluye pintura anticorrosiva y esmalte gris mate. El gabinete debe incluir dos chapas adicionales para seguridad en la puerta con llave maestra.	Un	1,0	$ 4.610.908,00	$ 4.610.908	7,00	$ 32.276.356	67,00	$ 308.930.836,00
148	Suministro de cable encauchetado AWG (Termoflex) 4x18, 600 v, 105°C, para semaforización.	m	1,0	$ 6.353,00	$ 6.353,00	0,00	$ -	36275,00	$ 230.455.075,00
149	Suministro de pulsadores touchless para peatones. Incluye acople de 4" y elementos de fijación.	Un	1,0	$ 967.895,00	$ 967.895	0,00	$ -	0,00	$ -
150	Suministro de soporte tipo L para cámara a poste Recto	Un	1,0	$ 106.507,00	$ 106.507	0,00	$ -	0,00	$ -
151	Suministro de Soporte para Semáforo vehicular de 200mm a Ménsula (son un par)	Un	1,0	$ 107.728,00	$ 107.728,00	0,00	$ -	0,00	$ -
152	Suministro de Par de argollas para accesorio soporte a ménsula	Un	1,0	$ 62.692,00	$ 62.692	0,00	$ -	0,00	$ -
153	Suministro de soporte para ménsula, flauta galvanizada y platina galvanizada. Incluye perno de sujeción	Un	1,0	$ 181.246,00	$ 181.246	0,00	$ -	0,00	$ -
154	Suministro de lámparas a Led D= 200 mm, vehicular, verde, roja o amarilla.	Un	1,0	$ 335.933,00	$ 335.933,00	0,00	$ -	0,00	$ -
155	Suministro de Lámparas a Led D=200 mm, peatonal. Verde o roja.	Un	1,0	$ 336.446,00	$ 336.446	0,00	$ -	40,00	$ 13.457.840,00

CONDICIONES CONTRACTUALES						PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Item	Actividad	Unidad	Cant. Total	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Parcial	Cant	Vr. Total
156	Suministro de Lámparas a Led D= 200 mm, ciclistas. Verde o roja.	Un	1,0	$ 363.199,00	$ 363.199	0,00	$ -	65,00	$ 23.607.935,00
157	Suministro de lámpara vehicular a LED D=200 mm de conteo regresivo amarilla, con conteo regresivo en rojo y en verde	Un	1,0	$ 373.428,00	$ 373.428,00	0,00	$ -	200,00	$ 74.685.600,00
158	Suministro de Fuente de alimentación para lámpara a led	Un	1,0	$ 44.362,00	$ 44.362	0,00	$ -	0,00	$ -
159	Suministro de Bombillo C7 E12 7W 110V	Un	1,0	$ 1.223,00	$ 1.223	0,00	$ -	0,00	$ -
160	Suministro de Fusible de cerámica L = 3/4" y diámetro 3/16" de 3.15 A	Un	1,0	$ 7.653,00	$ 7.653,00	500,00	$ 3.826.500	500,00	$ 3.826.500,00
161	Suministro de borneras para gabinete de controlador local.	Un	1,0	$ 8.430,00	$ 8.430	68,00	$ 573.240	561,00	$ 4.729.230,00
162	Suministro de Transformador (220-110)	Un	1,0	$ 176.626,00	$ 176.626	0,00	$ -	0,00	$ -
163	Suministro de Canastilla para sonorizador	Un	1,0	$ 411.114,00	$ 411.114,00	0,00	$ -	0,00	$ -
164	Suministro de insecticida matacucarachas en aerosol x 400 ml	Un	1,0	$ 23.376,00	$ 23.376	0,00	$ -	0,00	$ -
	RETIROS DE ELEMENTOS DE AMOBLAMIENTO SEMAFÓRICO								
165	Retiro de Controlador local. Incluye transporte a su disposición final	Un	1,0	$ 115.227,00	$ 115.227,00	3,00	$ 345.681	34,00	$ 3.917.718,00
166	Retiro de ménsula metálica, incluye brazo y poste. Incluye equipo de plataforma de altura, cargue y transporte a su disposición final	Un	1,0	$ 224.375,00	$ 224.375	7,00	$ 1.570.625	40,00	$ 8.975.000,00
167	Retiro de brazo de ménsula metálica. Incluye equipo de plataforma de altura, cargue y transporte a su disposición final.	Un	1,0	$ 96.137,00	$ 96.137	1,00	$ 96.137	4,00	$ 384.548,00
168	Retiro de Poste Recto de enterramiento directo. Incluye equipo de corte de concreto, demolición, excavacion, cargue y transporte a su disposición final y el material sobrante al botadero oficial.	Un	1,0	$ 189.513,00	$ 189.513,00	5,00	$ 947.565	219,00	$ 41.503.347,00
169	Retiro de Poste Recto con platina. Incluye cargue transporte a su disposición final y botada de material sobrante	Un	1,0	$ 83.338,00	$ 83.338	0,00	$ -	5,00	$ 416.690,00
170	Retiro de Semáforo vehicular a ménsula. Incluye utilización de equipo de altura y transporte a su disposición final.	Un	1,0	$ 76.942,00	$ 76.942	13,00	$ 1.000.246	67,00	$ 5.155.114,00
171	Retiro e instalación de Semáforo vehicular a ménsula. Incluye utilización de equipo de altura, retiro de placa de constraste, girada de viseras y ubicación del semáforo de manera horizontal.	Un	1,0	$ 258.474,00	$ 258.474,00	246,00	$ 63.584.604	447,00	$ 115.537.878,00
172	Retiro de Semáforo vehicular, peatonal o de ciclista, a poste recto. Incluye transporte a disposición final.	Un	1,0	$ 28.668,00	$ 28.668	61,00	$ 1.748.748	609,00	$ 17.458.812,00
173	Retiro de Cable AWG 4 x 16, 4x18 y Cable de Comunicación . Incluye transporte a disposición final	m	1,0	$ 527,00	$ 527	518,50	$ 273.250	22171,40	$ 11.684.327,80
174	Retiro de Cable mensajero de E=1/8". Incluye transporte a su disposición final.	Un	1,0	$ 871,00	$ 871,00	0,00	$ -	0,00	$ -
175	Retiro de acometida eléctrica de controlador local. Incluye retiro de la tubería y transporte a su disposición final.	Un	1,0	$ 106.330,00	$ 106.330	0,00	$ -	0,00	$ -
176	Retiro de Sonorizador. Incluye transporte a su disposición final.	Un	1,0	$ 39.167,00	$ 39.167	0,00	$ -	42,00	$ 1.645.014,00
177	Retiro de Pulsador peatonal. Incluye transporte a su disposición final.	Un	1,0	$ 39.167,00	$ 39.167,00	4,00	$ 156.668	125,00	$ 4.895.875,00
178	Retiro de placa de contraste a semáforo vehicular a ménsula. Incluye utilización de plataforma para altura y transporte a su disposición final.	Un	1,0	$ 36.389,00	$ 36.389	0,00	$ -	5,00	$ 181.945,00
179	Retiro de Disco direccional o disco pulse espere y pase. Incluye transporte a su disposición final.	Un	1,0	$ 8.169,00	$ 8.169	38,00	$ 310.422	426,00	$ 3.479.994,00
180	Retiro de señal informativa de motos. Incluye transporte a la obra de la Obra.	Un	1,0	$ 36.389,00	$ 36.389,00	1,00	$ 36.389	12,00	$ 436.668,00
181	Retiro de señalización vertical de tránsito de cualquier tipo. Incluye cargue y transporte al sitio donde lo indique la interventoria.	Un	1,0	$ 19.311,00	$ 19.311	0,00	$ -	0,00	$ -
182	Retiro de perno en platina de poste. Incluye corte con pulidora. Incluye transporte a su disposición final	Un	1,0	$ 6.955,00	$ 6.955	20,00	$ 139.100	48,00	$ 333.840,00
183	Retiro de Soldadura en tapa- marco en caja de inspección	Un	1,0	$ 8.304,00	$ 8.304,00	22,00	$ 182.688	625,00	$ 5.190.000,00
184	Retiro de Extensión de tubería IMC a poste vehicular para cableado aéreo. Incluye transporte a su disposición final.	Un	1,0	$ 42.558,00	$ 42.558	0,00	$ -	6,00	$ 255.348,00
185	Retiro de Cámara y gabinete para aforo vehicular. Incluye equipo de plataforma para altura y transporte a su disposición final.	Un	1,0	$ 207.248,00	$ 207.248	0,00	$ -	0,00	$ -
186	Retiro de Cámaras de video analítica para aforos , elementos de anclaje y soporte, cables de potencia y Datos, retiro de Gabinete de Control de Cámaras. Incluye transporte a su disposición final	Un	1,0	$ 305.670,00	$ 305.670,00	0,00	$ -	0,00	$ -

CONDICIONES CONTRACTUALES						PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Item	Actividad	Unidad	Cant. Total	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Parcial	Cant	Vr. Total
187	Retiro de herraje metálico (marco y tapa), de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final y botada de material sobrante en botadero	Un	1,0	$ 80.804,00	$ 80.804	20,00	$ 1.616.080	766,00	$ 61.895.864,00
188	Retiro de marco métalico o sintético, de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final y botada de material sobrante en botadero	Un	1,0	$ 80.804,00	$ 80.804	0,00	$ -	17,00	$ 1.373.668,00
189	Retiro de tapa en concreto reforzado, de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final	Un	1,0	$ 21.502,00	$ 21.502,00	0,00	$ -	2,00	$ 43.004,00
190	Retiro de dispositivo de análisis en campo.	Un	1,0	$ 69.655,00	$ 69.655	0,00	$ -	0,00	$ -
191	Retiro de percha de electroporcelana	Un	1,0	$ 41.445,00	$ 41.445	0,00	$ -	1,00	$ 41.445,00
192	Retiro de bajante IMC de hasta 3". Incluye transporte a su disposición final	Un	1,0	$ 22.320,00	$ 22.320,00	0,00	$ -	6,00	$ 133.920,00
193	Retiro e instalación de tapa Bornera, incluye pintura y cinta bandit con dos hebillas	Un	1,0	$ 35.852,00	$ 35.852	0,00	$ -	0,00	$ -
194	Retiro de soporte tipo L para cámara a poste Recto. Incluye transporte a su disposición final	Un	1,0	$ 27.623,00	$ 27.623	0,00	$ -	0,00	$ -
195	Retiro de lámpara vehicular o peatonal a poste recto. Incluye transporte a su disposición final	Un	1,0	$ 15.116,00	$ 15.116,00	24,00	$ 362.784	629,00	$ 9.507.964,00
196	Retiro de lámpara vehicular a ménsula. Incluye transporte a su disposición final	Un	1,0	$ 27.184,00	$ 27.184	86,00	$ 2.337.824	248,00	$ 6.741.632,00
197	Retiro e instalación (aplome o nivelación) de poste recto de enterramiento directo. Incluye concreto de 21 Mpa	Un	1,0	$ 102.470,00	$ 102.470	2,00	$ 204.940	23,00	$ 2.356.810,00
198	Retiro de visera a poste recto. Incluye transporte a su disposición final	Un	1,0	$ 10.426,00	$ 10.426,00	5,00	$ 52.130	13,00	$ 135.538,00
199	Retiro de Contraste a poste. Incluye transporte a su disposición final	Un	1,0	$ 17.938,00	$ 17.938	10,00	$ 179.380	848,00	$ 15.211.424,00
200	Retiro de cable telefónico de 10, 20 ó 50 pares. Incluye transporte a su disposición final	m	1,0	$ 723,00	$ 723	0,00	$ -	515,00	$ 372.345,00
201	Retiro de pasacalles por obstrucción de visual de semáforo.	Un	1,0	$ 68.017,00	$ 68.017,00	0,00	$ -	0,00	$ -
202	Retiro de elemento obstructivo en ménsula. Incluye uso de vehículo carro canasta o grúa	Un	1,0	$ 107.195,00	$ 107.195	0,00	$ -	0,00	$ -
	INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE AMOBLAMIENTO SEMAFÓRICO								
203	Instalación de ménsula metálica con brazo de 4,5 o 5,50 m	Un	1,0	$ 435.317,00	$ 435.317,00	7,00	$ 3.047.219	45,00	$ 19.589.265,00
204	Instalación de brazo de ménsula metálica. Incluye equipo de plataforma de altura, cargue y transporte a su punto de instalación.	Un	1,0	$ 159.063,00	$ 159.063	0,00	$ -	1,00	$ 159.063,00
205	Instalación de poste recto con platina	Un	1,0	$ 76.855,00	$ 76.855	0,00	$ -	6,00	$ 461.130,00
206	Instalación de poste recto de enterramiento directo. incluye demolición, excavación y concreto de 21 MPA para empotramiento del poste y cargue y botada de material sobrante	Un	1,0	$ 129.735,00	$ 129.735,00	5,00	$ 648.675	214,00	$ 27.763.290,00
207	Instalación de semáforo vehicular a ménsula. Incluye utilización de plataforma, elementos de fijación (Cinta bandit de 5/8"y hebilla)	Un	1,0	$ 112.610,00	$ 112.610	9,00	$ 1.013.490	48,00	$ 5.405.280,00
208	Instalación de Semáforo vehicular o peatonal a poste recto. Incluye elementos de fijación (Cinta bandit en acero de 5/8" y hebilla)	Un	1,0	$ 33.170,00	$ 33.170	29,00	$ 961.930	508,00	$ 16.850.360,00
209	Instalación de placa de contraste para semáforo vehicular a poste recto. Incluye elementos de fijación (Cinta bandit de 5/8" y hebilla)	Un	1,0	$ 63.098,00	$ 63.098,00	0,00	$ -	0,00	$ -
210	Instalación de viseras de semáforo en brazo de ménsula. Incluye utilización de plataforma.	Un	1,0	$ 15.826,00	$ 15.826	0,00	$ -	0,00	$ -
211	Instalación de viseras de semáforo en poste recto	Un	1,0	$ 4.084,00	$ 4.084	0,00	$ -	12,00	$ 49.008,00
212	Instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	Un	1,0	$ 208.865,00	$ 208.865,00	2,00	$ 417.730	211,00	$ 44.070.515,00
213	Instalación de Sonorizador. Incluye elementos de fijación	Un	1,0	$ 74.317,00	$ 74.317	0,00	$ -	13,00	$ 966.121,00
214	Instalación de Pulsador. Incluye elementos de fijación.	Un	1,0	$ 84.079,00	$ 84.079	5,00	$ 420.395	77,00	$ 6.474.083,00
215	Instalación de Cable AWG 4x16, cable 2x16, cable 4x18 o neopreno, o telefónico de 10 pares.	Un	1,0	$ 1.410,00	$ 1.410,00	1276,00	$ 1.799.160	32045,80	$ 45.184.578,00
216	Instalación de Controlador local. Incluye prueba de acometida, cableado de grupos, detectores y pulsadores.	Un	1	$ 357.787,00	$ 357.787	1,00	$ 357.787	89,00	$ 31.843.043,00
217	Instalación de placa identificadora de cables de semáforo	Un	1,0	$ 4.291,00	$ 4.291	0,00	$ -	0,00	$ -
218	Instalación de lámpara vehicular o peatonal a poste recto	Un	1,0	$ 17.984,00	$ 17.984,00	26,00	$ 467.584	644,00	$ 11.581.696,00
219	Instalación de lámpara vehicular a ménsula	Un	1,0	$ 32.074,00	$ 32.074	87,00	$ 2.790.438	249,00	$ 7.986.426,00

CONDICIONES CONTRACTUALES						PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Item	Actividad	Unidad	Cant. Total	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Parcial	Cant	Vr. Total
220	Instalación de disco direccional. Incluye transporte y elementos de fijación (Cinta bandit en acero de 5/8" y hebilla).	Un	1,0	$ 18.598,00	$ 18.598	9,00	$ 167.382	135,00	$ 2.510.730,00
221	Instalación de señal vertical. Incluye concreto de 21 Mpa, botada de material sobrante.	Un	1,0	$ 41.159,00	$ 41.159,00	0,00	$ -	0,00	$ -
222	Calibración y mantenimiento de los planeamientos de tráfico en los controladores locales de la red semafórica de la Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Medellín	Hr	1,0	$ 50.539,00	$ 50.539	236,00	$ 11.927.204	3380,00	$ 170.821.820,00
	PINTURA DE ELEMENTOS SEMAFÓRICOS								
223	Pintura de brazo de ménsula (en bodega). Incluye retiro total de pintura hasta superficie original de la tubería (rasqueteada), dos manos de pintura anticorrosiva o base, dos manos de pintura poliuretano blanca y franjas negras. Debe cumplir con los espesores y adherencia de la pintura.	Un	1,0	$ 178.847,00	$ 178.847,00	0,00	$ -	0,00	$ -
224	Pintura de poste recto en sitio, colores blanco y negro en poliuretano, CON retiro total de pintura (rasqueteada) . Incluye limpieza y lijada del poste, y dos manos en poliuretano blanca y franjas negras.	Un	1,0	$ 143.944,00	$ 143.944	0,00	$ -	70,00	$ 10.076.080,00
225	Pintura de poste recto en sitio, colores blanco y negro en poliuretano, SIN retiro total de pintura (rasqueteada) . Incluye limpieza y lijada del poste, y dos manos en poliuretano blanca y franjas negras.	Un	1,0	$ 85.515,00	$ 85.515	12,00	$ 1.026.180	129,00	$ 11.031.435,00
226	Pintura de gabinete de controlador local según diseño y color de la SMM.	Un	1,0	$ 144.020,00	$ 144.020,00	0,00	$ -	0,00	$ -
227	Pintura de placas de contraste. Lijada y limpieza de la superficie con disolvente, wash primer, pintura en poliuretano blanco para el marco y negro para el fondo completo.	Un	1,0	$ 60.705,00	$ 60.705	0,00	$ -	0,00	$ -
	LAVADA DE ELEMENTOS SEMAFÓRICOS								
228	Lavada de gabinete de controlador local	Un	1,0	$ 32.665,00	$ 32.665,00	0,00	$ -	3,00	$ 97.995,00
229	Lavada de brazo de ménsula	Un	1,0	$ 60.829,00	$ 60.829	32,00	$ 1.946.528	261,00	$ 15.876.369,00
230	Lavada de Poste recto	Un	1,0	$ 23.214,00	$ 23.214	237,00	$ 5.501.718	1488,00	$ 34.542.432,00
231	Lavada de semáforo peatonal o ciclista	Un	1,0	$ 23.214,00	$ 23.214,00	298,00	$ 6.917.772	1718,00	$ 39.881.652,00
232	Lavada de Sonorizadores o pulsador	Un	1,0	$ 13.891,00	$ 13.891	64,00	$ 889.024	327,00	$ 4.542.357,00
233	Lavada de avisos de motos	Un	1,0	$ 23.090,00	$ 23.090	1,00	$ 23.090	10,00	$ 230.900,00
234	Lavado de semáforo vehicular a poste	Un	1,0	$ 25.936,00	$ 25.936,00	163,00	$ 4.227.568	1035,00	$ 26.843.760,00
235	Lavado de semáforo vehicular a ménsula de 3 o 4 aspectos	Un	1,0	$ 60.829,00	$ 60.829	34,00	$ 2.068.186	279,00	$ 16.971.291,00
236	Lavada de disco direccional	Un	1,0	$ 12.886,00	$ 12.886	207,00	$ 2.667.402	1225,00	$ 15.785.350,00
	VARIOS								
237	Sondeo de canalizaciones, buscada de cajas, halado de cables y levantamiento actual georreferenciado de la intersección completa en software SIG, incluye el diámetro de las tuberías, número de cables, longitudes, distancia entre cajas, tipo de cajas, registro fotográfico, y toda la información necesaria para su correcto entendimiento.	Un	1,0	$ 243.212,00	$ 243.212	5,00	$ 1.216.060	171,00	$ 41.589.252,00
238	Adecuación en taller de perforaciones de base ménsula para ensamble en cimentación existente, incluye transporte, tratamiento de la superficie afectada con spray de zinc y pintura de acabado negra.	Un	1,0	$ 85.481,00	$ 85.481	0,00	$ -	0,00	$ -
239	Suministro, transporte e instalación de platina especial para realce de anclaje de ménsula. Incluye soldadura en anclaje de ménsula existente.	Un	1,0	$ 507.820,00	$ 507.820,00	1,00	$ 507.820	7,00	$ 3.554.740,00
240	Suministro, transporte e instalación de conector tipo piercing para acometida de controlador. Incluye dos conductores (F-F o F-N)	Un	1,0	$ 134.829,00	$ 134.829	0,00	$ -	18,00	$ 2.426.922,00
241	Reparación de semáforo vehicular, peatonal o ciclista.	Un	1,0	$ 39.537,00	$ 39.537	0,00	$ -	22,00	$ 869.814,00
242	Reparación estructural, en taller, de hasta 1m de longitud de poste recto de 4" con platina.	Un	1,0	$ 491.690,00	$ 491.690,00	0,00	$ -	0,00	$ -
243	Reparación estructural, en taller, de hasta 1m de longitud de poste recto de 4" de enterramiento.	Un	1,0	$ 347.436,00	$ 347.436	0,00	$ -	0,00	$ -
244	Mantenimiento de brazo de ménsula galvanizado. Incluye retiro de pintuta existente y pintura electrostática	Un	1,0	$ 188.195,00	$ 188.195	0,00	$ -	0,00	$ -

CONDICIONES CONTRACTUALES						PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Item	**Actividad**	**Unidad**	**Cant. Total**	**Valor Unitario**	**Vr. Parcial Total**	**Cant**	**Vr. Parcial**	**Cant**	**Vr. Total**
245	Suministro y aplicación de líquido rico en zinc para flanches de ménsula x 150 ml.	Un	1,0	$ 53.095,00	$ 53.095,00	0,00	$ -	0,00	$ -
246	Pintura de símbolo en lámparas de semáforo peatonal o vehicular	Un	1,0	$ 28.207,00	$ 28.207	0,00	$ -	14,00	$ 394.898,00
247	Perforación de 1-1/8" de poste o ménsula. Incluye tapón de caucho de 1-1/8" con agujero de 3/4" y spray de zinc.	Un	1,0	$ 69.849,00	$ 69.849	2,00	$ 139.698	6,00	$ 419.094,00
248	Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.	Un	1,0	$ 94.727,00	$ 94.727,00	0,00	$ -	288,00	$ 27.281.376,00
249	Alineación de brazo de ménsula, incluye tornillos.	Un	1,0	$ 100.202,00	$ 100.202	0,00	$ -	2,00	$ 200.404,00
250	Adecuación de controlador local existente. Incluye instalación de ventilador, termostato, breakers, borneras, tomas de alimentación, cableado de los grupos, acometida, puesta a tierra, prueba en laboratorio y limpieza de racks (son hasta tres) y de cables. No incluye programación de tarjetas	Un	1,0	$ 917.023,00	$ 917.023	3,00	$ 2.751.069	31,00	$ 28.427.713,00
251	Suministro e instalación de chapa de seguridad para gabinete de controlador local existente. Incluye lengüeta en acero galvanizado de 2" y llave.	Un	1,0	$ 140.003,00	$ 140.003,00	0,00	$ -	0,00	$ -
252	Suministro de llave para apertura de cámara de inspección según diseño.	Un	1,0	$ 29.403,00	$ 29.403	0,00	$ -	78,00	$ 2.293.434,00
253	Suministro e instalación de final de carrera para detección de apertura de gabinete. Incluye cableado hasta tarjeta de entrada del controlador.	Un	1,0	$ 88.518,00	$ 88.518	0,00	$ -	0,00	$ -
254	Adecuación de flanches (Brida), en taller, para ménsulas de 4.5 o 5.5 m, incluye dos bridas, extensión de 20cm del brazo y tratamiento con zinc.	Un	1,0	$ 352.728,00	$ 352.728,00	0,00	$ -	0,00	$ -
255	Lleno de caja de registro de hasta 60x80 cm con triturado. Incluye costales.	Un	1,0	$ 50.285,00	$ 50.285	0,00	$ -	4,00	$ 201.140,00
256	Lleno de caja de registro de hasta 60x80 cm con triturado existente. Incluye costales	Un	1,0	$ 17.436,00	$ 17.436	0,00	$ -	11,00	$ 191.796,00
257	Enderezada cara semáforo vehicular a ménsula	Un	1,0	$ 66.533,00	$ 66.533,00	1,00	$ 66.533	12,00	$ 798.396,00
258	Enderezada cara semáforo vehicular o peatonal o ciclistas a poste	Un	1,0	$ 22.423,00	$ 22.423	51,00	$ 1.143.573	369,00	$ 8.274.087,00
259	Enderezada o ajustada de visera a ménsula	Un	1,0	$ 42.581,00	$ 42.581	0,00	$ -	11,00	$ 468.391,00
260	Enderezada o ajustada de visera a poste	Un	1,0	$ 12.253,00	$ 12.253,00	14,00	$ 171.542	89,00	$ 1.090.517,00
261	Diagnóstico, verificación y reparación de cruce con problemas de corto o fracturas en cableado que impiden el servicio. Incluye transporte de peronal y equipos.	Un	1,0	$ 93.381,00	$ 93.381	7,00	$ 653.667	174,00	$ 16.248.294,00
262	Soldada de cajas de inspección. Mínimo 15 cm de cordón en cada lado de la caja	Un	1,0	$ 66.601,00	$ 66.601	74,00	$ 4.928.474	967,50	$ 64.436.467,50
263	Suministro e instalación de concreto (e=15 cm) de 21 Mpa, para sellado de caja de inspección	Un	1,0	$ 51.086,00	$ 51.086,00	9,25	$ 472.546,00	159,70	$ 8.158.434,20
264	Mantenimiento a caja de inspección de 50x50 cm, 60x60 cm o 50x80 cm existente. Incluye limpieza, tratamiento anticorrosivo y lubricación de tornillos de seguridad.	Un	1,0	$ 47.238,00	$ 47.238	0,00	$ -	14,00	$ 661.332,00
			COSTOS DIRECTOS		**$ 116.649.142**	**COSTO DIRECTO ACTA**	**$ 435.872.864,00**	**COSTO DIRECTO ACUM.**	**$ 5.909.612.854,00**
			Administración	32,90%	$ 38.377.568	32,90%	$ 143.402.172,00	32,90%	$ 1.944.262.629,00
			Imprevistos	0,50%	$ 583.246	0,00%	$ -	0,00%	$ -
			Utilidad	5,00%	$ 5.832.457	5,00%	$ 21.793.643,00	5,00%	$ 295.480.643,00
			Valor Total AIU	38,40%	$ 44.793.271	37,90%	**$ 165.195.815,00**	37,90%	**$ 2.239.743.272,00**
			Pago Reajuste		$ 100.000.000		$ 27.268.519,00		$ 221.374.479,00
			Guía Socioambiental		$ 125.529.472		$ 6.048.901,00		$ 57.984.466,00
			Pólizas		$ 71.143.135				$ 50.147.456,00
			PRESUPUESTO TOTAL		**$ 458.115.020**	**VALOR TOTAL ACTA**	**$ 634.386.099,00**	**VALOR TOTAL ACUM.**	**$ 8.478.862.527,00**

Miguel Ángel Osorio Gómez
Director de Obra - UT SIT MEDELLIN

Marta Lucía Suárez Gómez
Director de Interventoría - CONSORCIO INT FAROL MED

ANEXO 19.

INDICES DE CAMACOL

ÍNDICES DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN

SAO
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE OBRA

UN SOLO ECOSISTEMA. MÁS CONTROL. MÁS RENTABILIDAD. MEJORES OBRAS.

PLANIFICA > EJECUTA > CONTROLA > DECIDE

OPTIMIZA PRESUPUESTOS Y CONTROLA COSTOS DE OBRA

DESDE UNA SOLA PLATAFORMA.

Optimiza presupuestos y controla costos de obra **desde una sola plataforma.**



MÓDULO 1
PRESUPUESTO
Elabora presupuestos precisos, análisis de precios y cotizaciones de manera rápida y confiable.

MÓDULO 2
CONTROL DE COSTOS DE OBRA
Controla, compara y analiza los costos reales de tu obra para tomar mejores decisiones.

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
Datos actualizados al instante.

CONTROL TOTAL DE COSTOS
Presupuesto, compromisos y costos en un solo lugar.

REPORTES INTELIGENTES
Análisis claros para mejores decisiones.

ACCESO SEGURO DESDE CUALQUIER LUGAR
En oficina, obra o en movimiento.

COLABORACIÓN EN EQUIPO
Todos trabajan con la misma información.

¡SOLICITA YA TU DEMO!

322 653 4335
WHATSAPP

Este documento que contiene los Índices de Costos de la Construcción, son para uso exclusivo de la empresa: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - ALCALDÍA DE MEDELLÍN, identificada con Nit: 8909052111. Para cualquier usuario diferente deberá ser verificada su validez.

CAMACOL ANTIOQUIA

ÍNDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN

PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE VIVIENDA EN MEDELLÍN

BASE 100 = DICIEMBRE DE 1989

JULIO DE 2026

ÍNDICE COSTO TOTAL	JUNIO	JULIO	VARIACION % MENS.	VARIACION % ACUM/26	VARIACION % ANUAL
EDIFICACIÓN	3.936,86	3.930,49	-0,16	9,24	9,41

CONCEPTO	COD	UNIFAMILIAR			MULTIFAMILIAR		PROMEDIO		INDICE TOTAL POR ITEM	VARIACION POR ITEM %		
		MÍNIMO	MEDIO	COMPLETO	HASTA 5 PISOS	MAS DE 5 PISOS	UNI-FAMILIAR	MULTI-FAMILIAR		jun-26 jul-26	dic-25 jul-26	jul-25 jul-26
TOTAL MANO DE OBRA	TMO	4.696,44	4.645,62	4.641,31	4.566,62	4.577,12	4.652,58	4.569,01	4.594,77	0,00	14,64	14,64
CEMENTO	CE	3.918,29	3.911,54	3.907,03	3.905,55	3.903,13	3.907,72	3.903,00	3.903,42	0,00	6,26	6,46
CONCRETO PREMEZCLADO	CO	3.670,11	3.695,47	3.697,08	3.707,79	3.713,49	3.694,36	3.707,92	3.700,69	0,00	3,53	3,53
PREFABRICADOS	PR	2.974,50	3.899,06	3.270,70	3.325,09	3.106,65	3.568,49	3.192,70	3.289,47	0,00	8,49	8,49
AGREGADOS MINERALES	AM	3.234,67	2.950,65	3.016,57	2.805,19	2.870,64	3.029,20	2.776,68	2.833,64	0,00	4,51	3,00
HIERRO	HI	3.969,47	4.045,06	3.681,37	2.999,75	3.431,58	3.891,60	3.202,77	3.405,95	-1,43	6,75	14,24
MADERAS PARA CONSTRUCCIÓN	MA	7.269,12	7.526,62	7.945,31	6.865,75	7.046,40	7.647,39	6.956,97	7.171,74	-1,44	10,74	17,43
MATERIALES PARA MAMPOSTERÍA	MM	4.838,95	5.126,79	4.925,75	4.383,32	5.041,21	5.027,25	4.664,68	4.770,34	0,00	13,08	13,09
MAT.INST. HIDRÁULICA SANITARIA	IHS	5.445,55	5.825,62	6.467,17	6.009,87	4.957,94	6.003,31	5.568,29	5.686,05	0,00	4,45	3,60
INST. ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA	IET	9.935,70	11.751,72	11.203,09	12.345,55	10.159,01	11.247,11	11.337,51	11.287,55	0,18	12,09	4,98
MATERIALES PARA CUBIERTA	MC	3.597,73	3.519,34	2.776,81	3.567,94	3.458,07	3.188,46	3.485,47	3.389,64	1,54	9,98	12,53
TOTAL MATERIALES OBRA NEGRA	TMON	4.720,76	4.888,96	4.606,28	4.850,49	4.574,65	4.747,05	4.718,31	4.698,70	-0,27	8,17	8,26
PISOS	PIS	3.046,66	2.445,15	2.344,78	2.425,58	2.468,19	2.491,29	2.457,79	2.472,46	-0,28	8,17	9,13
CARPINTERÍA DE MADERA	CMA	3.108,14	3.188,65	3.198,36	3.100,20	3.089,32	3.109,27	3.091,05	3.109,38	-1,75	0,88	3,48
CARPINTERÍA METÁLICA	CM	2.843,80	3.088,65	3.189,15	3.448,38	3.477,63	3.118,46	3.459,05	3.359,10	-0,07	4,95	4,96
APARATOS SANITARIOS	AS	1.895,22	1.923,41	2.125,43	1.994,49	2.160,90	2.000,87	2.057,20	2.045,17	0,00	4,53	4,16
PINTURAS	PI	2.282,48	2.169,21	2.137,50	3.122,05	2.792,18	2.149,41	2.992,64	2.742,88	1,98	17,28	19,51
INSTALACIONES ESPECIALES	IE	3.736,64	3.118,68	3.082,36	2.782,19	2.526,24	3.103,54	2.616,04	2.722,44	0,00	1,17	0,66
ENCHAPES	EN	1.565,37	1.495,96	1.612,57	1.731,41	1.662,10	1.562,95	1.694,66	1.660,22	0,00	4,85	4,85
TOTAL MATERIALES ACABADOS	TMA	2.599,83	2.670,84	2.638,00	2.754,63	2.680,60	2.651,98	2.710,16	2.692,55	-0,16	5,11	5,74
HERRAMIENTAS	HE	3.184,08	2.976,88	3.229,02	2.258,91	2.077,04	3.109,20	2.277,51	2.566,70	-0,45	5,17	6,30
EQUIPOS	EQ	1.430,88	1.392,53	1.550,01	1.448,07	1.542,96	1.461,31	1.478,44	1.472,85	-0,02	2,46	2,46
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO	THE	1.906,18	1.771,43	1.922,77	1.493,98	1.580,39	1.860,09	1.523,64	1.638,15	-0,13	2,93	3,19
TOTAL MATERIALES	TM	4.107,84	3.948,81	3.644,26	3.832,96	3.546,08	3.842,02	3.689,96	3.721,95	-0,23	7,17	7,41
COSTO TOTAL DE EDIFICACIÓN	CTE	4.266,42	4.136,79	3.920,39	4.019,99	3.773,64	4.064,75	3.891,06	3.930,49	-0,16	9,24	9,41

DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE INNOVACCIÓN

NOTA: PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL

Este documento que contiene los Índices de Costos de la Construcción, son para uso exclusivo de la empresa: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - ALCALDÍA DE MEDELLÍN, identificada con Nit: 8909052111. Para cualquier usuario diferente deberá ser verificada su validez.


CONCEPTO	BASE 100	CODIGO	JUNIO	JULIO	VARIACIÓN %		
					jun-26	dic-25	jul-25
					jul-26	jul-26	jul-26
ACCESORIOS DE BRONCE	dic-89	ACC.BR.	5.708,52	5.708,52	0,00	5,86	10,47
ACCESORIOS DE HIERRO FUNDIDO	dic-89	ACC.HF.	2.181,75	2.181,75	0,00	8,74	8,20
AFIRMADOS - BASE GRANULAR (*)	dic-89	AF	4.705,37	4.705,37	0,00	5,63	6,57
AISLADORES	dic-89	AIS.	1.703,50	1.703,50	0,00	11,03	19,61
ALAMBRE (COBRE Y ALUMINIO)	dic-89	ALM	11.027,72	11.015,06	-0,11	2,23	0,99
ALAMBRE DE COBRE	dic-89	ACU	30.230,97	30.281,01	0,17	0,84	0,65
ALAMBRES DE ALUMINIO	dic-89	AL.AL.	11.929,77	11.929,77	0,00	2,64	-5,90
ALCANTARILLADOS (*)	dic-89	AL	2.880,53	2.880,53	0,00	10,27	10,11
ALUMBRADO PUBLICO	dic-97	ALP	330,37	330,37	-1,17	3,37	3,12
ANDENES, CUNETAS Y CORDONES (*)	dic-89	ACC	1.874,83	1.874,83	0,00	7,80	8,19
BLOQUE DE CONCRETO PARA MAMPOSTERIA	dic-89	BLC	2.718,06	2.718,06	0,00	9,85	9,85
CABLE DE ALUMINIO FORRADO	dic-97	CAF	2.323,55	2.323,55	0,00	0,43	1,10
CONCRETO DE 2.000 P.S.I PREMEZCLADO	dic-89	C20	3.507,64	3.507,64	0,00	4,90	4,90
CONCRETO DE 2.500 P.S.I PREMEZCLADO	dic-89	C25	3.822,60	3.822,60	0,00	5,05	5,05
CONCRETO DE 3.000 P.S.I PREMEZCLADO	dic-89	C30	3.694,01	3.694,01	0,00	5,05	5,05
CONCRETO DE 3.500 P.S.I PREMEZCLADO	dic-89	C35	3.734,31	3.734,31	0,00	5,10	5,10
CONCRETO DE 4.000 P.S.I PREMEZCLADO	dic-89	C40	4.139,04	4.139,04	0,00	5,10	5,10
CONCRETO DE 4.500 P.S.I PREMEZCLADO	dic-89	C45	4.353,58	4.353,58	0,00	4,59	4,59
CONCRETO DE 5.000 P.S.I PREMEZCLADO	dic-89	C50	4.442,11	4.442,11	0,00	4,59	4,59
CONDUCTORES DE COBRE	dic-97	CC	5.865,84	5.859,25	-0,11	5,62	6,20
DRYWALL	dic-23	DWL	105,53	105,53	0,00	1,27	-0,11
ELEMENTOS METALICOS	dic-89	E.M.	2.412,40	2.412,40	0,00	2,87	2,87
EQUIPO BASICO	dic-98	EB	526,11	526,11	0,00	-2,63	-2,09
EQUIPO DE ELEVACION	dic-23	ELE	111,41	108,93	-2,22	-0,51	-3,83
EQUIPO DE OBRAS PUBLICAS	dic-89	EQO	2.504,50	2.504,50	0,00	-3,34	-2,35
EQUIPO PARA EDIFICACION	dic-89	EQE	1.596,70	1.596,87	0,01	2,66	2,66
EQUIPO PARA EXCAVACION EN ROCA	dic-98	EER	441,32	441,32	0,00	0,00	-4,32
EQUIPO PARA IMPRIMACION Y PAVIMENTO ASFAL	dic-98	EIPA	303,34	303,34	0,00	1,25	-0,59
EQUIPO PARA MOVIMIENTO DE TIERRA	dic-98	EMT	531,36	531,36	0,00	-3,65	-4,72
EQUIPO PARA PAVIMENTOS NO CONVENCIONALE	dic-98	EPNC	354,60	354,60	0,00	-0,37	0,66
EQUIPO PARA SUBBASE Y BASE	dic-98	ESB	596,41	596,41	0,00	-4,41	0,35
GABINETE ELECTRICO - SUBESTACION	dic-97	GES	431,09	431,17	0,02	5,48	6,37
GAS - CENTROS DE MEDICION	dic-95	GCM	303,39	306,79	1,12	0,07	4,51
GAS - RED EXTERNA POLIETILENO	dic-97	REX	669,81	669,81	0,00	3,90	6,70
LLANTAS PARA EL TRANSPORTE DE CARGA	dic-89	LL	6.196,50	6.196,50	0,00	4,14	1,54
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	dic-89	LC	6.210,97	6.233,67	0,37	0,49	2,65
MANO DE OBRA ELECTRICA	dic-97	MOBE	617,08	617,08	0,00	21,20	21,26
MANO DE OBRA PARA OBRAS PUBLICAS	dic-89	MOOP	4.222,43	4.222,43	0,00	17,21	17,21
MANO DE OBRA SUBCONTRATADA EDIF.	dic-89	MOSE	7.133,32	7.133,32	0,00	21,18	21,91
MATERIALES GALVANIZADOS	dic-89	M.G.	1.496,01	1.513,11	1,14	-2,28	-2,50
MEZCLA ASFALTICA	dic-89	MAS	11.192,96	11.192,96	0,00	9,79	9,79
MOVIMIENTO DE ROCA (*)	dic-89	MR	2.321,56	2.321,56	0,00	0,00	-1,31
MOVIMIENTO DE TIERRA (*)	dic-89	MT	3.356,93	3.358,77	0,05	0,58	0,15
PAVIMENTO ASFALTICO (CORRIDO) (*)	dic-89	PA	8.341,08	8.341,08	0,00	9,55	9,41
PAVIMENTO ASFALTICO (PARCHEO)(*)	dic-98	PAP	1.166,41	1.166,41	0,00	11,44	11,24
PAVIMENTOS DE CONCRETO (*)	dic-89	PC	2.789,29	2.786,72	-0,09	5,68	5,99
POSTERIA DE CONCRETO	dic-89	PT.C.	2.725,17	2.725,17	0,36	6,00	6,00
SALIDA ELECTRICA	dic-97	SA	1.761,81	1.784,76	1,30	3,18	4,13
SUB-BASE (*)	dic-89	SB	4.233,58	4.233,58	0,00	5,34	6,43
TRANSFORMADOR	dic-89	TR	3.456,35	3.456,35	0,00	0,00	-4,48
TRANSPORTE (*)	dic-89	TRA	2.038,20	2.039,31	0,05	1,70	1,86
TUBERIA DE ACERO	dic-89	T.ACE.	1.657,16	1.657,16	0,00	0,46	0,46
TUBERIA DE COBRE	dic-89	T.CU.	1.178,25	1.178,25	0,00	-0,37	-0,37
TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA	dic-89	TCR	2.199,69	2.199,69	0,00	4,68	4,68

(*) INCLUYE MANO DE OBRA

Este documento que contiene los Índices de Costos de la Construcción, son para uso exclusivo de la empresa: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - ALCALDÍA DE MEDELLÍN, identificada con Nit: 8909052111. Para cualquier usuario diferente deberá ser verificada su validez.

CONCEPTO	BASE 100	CODIGO	JUNIO	JULIO	VARIACIÓN %		
					jun-26	dic-25	jul-25
					jul-26	jul-26	jul-26
TUBERIA DE PRESION Y ACCESORIOS PVC	dic-89	PVCP	7.521,07	7.521,07	0,00	4,55	4,55
TUBERIA PVC (DUCTO TELEFONICO)	dic-89	PVCT	8.060,63	8.060,63	0,00	4,76	4,76
TUBERIA PVC CORRUGADA	dic-89	PVCC	13.427,23	13.427,23	0,00	10,00	10,00
TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS PVC	dic-89	PVCS	5.410,29	5.410,27	0,00	6,27	5,78
TUBERIA Y ACCESORIOS GALVANIZADOS	dic-89	T.G.	2.913,36	2.963,04	1,71	1,44	1,91
VIDRIO	dic-89	VI	1.272,09	1.272,09	0,00	-0,25	-0,25
INDICES DE ADITIVOS							
CEMENTICIOS	dic-99	CEM	385,18	385,18	0,00	8,51	8,51
CEMENTOS MODIFICADOS	dic-99	CEMO	1.018,35	1.018,35	0,00	8,59	22,52
EPÓXICOS (ADHERENTES)	dic-99	EPX	613,44	613,44	0,00	6,18	10,87

VARIACIÓN ANUAL JULIO
DEL ICCV EN EL VALLE DE ABURRA
(Índices de Costos de Construcción de Viviendas)
2017 A 2026

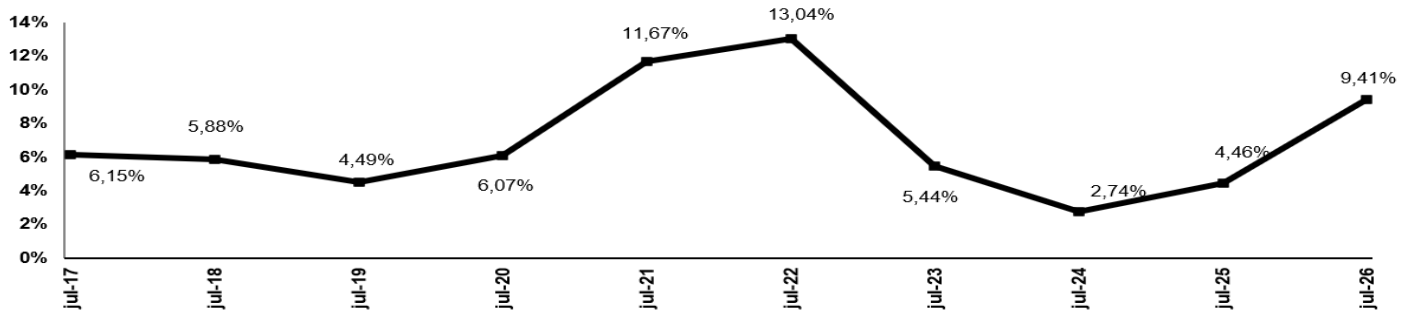

ÍNDICES DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN

DEFINICIÓN

EL ÍNDICE DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN es un elemento estadístico que permite estimar el cambio promedio de los precios de los principales recursos requeridos para la edificación de viviendas, insumos básicos o actividades de construcción

El número índice es una cifra abstracta, expresada como porcentaje y se calcula con base en una participación en el costo y por la mano de obra según categorías, es decir, por aquellos elementos que conforman los costos directos. No incluye el valor del terreno. Los costos indirectos, constituidos por los gastos generales, impuestos y las utilidades, no se tomaron en cuenta por la dificultad para captar la información necesaria para elaborar el índice.

El índice en un periodo de tiempo determinado permite conocer el cambio porcentual en el costo medio de los materiales, equipo y la mano de obra en dicho periodo con relación al costo promedio de los materiales, equipo y la mano de obra en el período base.
La base tiene valor de 100.

USOS:
- Los índices se utilizan principalmente como instrumento para el reajuste de los contratos de obra, ya sea que estos se pacten entre particulares o entre firmas contratistas y el estado.

En los factores determinantes de los costos. Para tal efecto, la revisión debe hacerse mediante fórmulas polinómicas incorporadas en el respectivo contrato.

- Con los índices de costos se pueden hacer estimativos sobre la posible evolución de los precios de los insumos.

- Los índices permiten detectar variaciones estacionales en los precios y en consecuencia preveer periodos de escasez o alzas relativas al grupo de insumos estudiados.

- En la elaboración de cuentas nacionales, los índices de costos se emplean para deflactar o ajustar el valor bruto de la producción del sector a precios constantes.

INFORMACIÓN ADICIONAL
- Los precios incluyen el impuesto a las ventas, excepto los que expresamente estipule la ley con excepción. Los precios son de lista y no se considera ningún descuento.

La Vivienda Unifamiliar se divide en tres tipos según su costo: mínimo, medio y completo. La Vivienda Multifamiliar según su estructura hasta cinco pisos y más de cinco pisos.

- Los precios de los materiales como el cemento, los agregados minerales, bloques de concreto, los ladrillos, etc. No incluyen valor del transporte.

ANEXO 20. CERTIFICADO DE NO SUB-CONTRATACION

Medellín, Antioquia, 04 de Septiembre de 2026

Señores

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Calle 44 # 52 165
Medellín, Antioquia

CÉSAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
R/L CONSORCIO INT FAROL MED 2025
Interventor - Contrato de Interventoría N° 4600105599 de 2025
Correo: consorciofarolmed@kalpaingenieria.com.co

MARIO ALFONSO PÉREZ LINARES
Profesional Especializado - Unidad de Circulación
Supervisor Contrato de Obra N° 4600105555 de 2025
Secretaría de Movilidad del Distrito de Medellín
Correo: marioa.perez@medellin.gov.co

160 - 2026

Asunto. Certificación de inexistencia de subcontratos en la ejecución del Contrato de Obra N° 4600105555 de 2025, para el periodo comprendido entre el **período comprendido entre el 05 de Septiembre de 2025 y el 31 de Agosto de 2026.**

En mi calidad de representante legal de la UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN, identificado como JORGE TRUJILLO NIÑO, mayor de edad, portador de la cédula de ciudadanía No. 13.893.413 de Barrancabermeja, me permito certificar bajo la gravedad de juramento que la UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN **NO** ha suscrito, celebrado ni ejecutado ningún tipo de subcontrato con terceros para el desarrollo del **Contrato de Obra N° 4600105555 de 2025**, cuyo objeto es: "Realizar el mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín para el periodo comprendido entre el **05 de Septiembre de 2025 y el 31 de Agosto de 2026"**

Esta certificación se expide en cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula 19 – Independencia del Contratista y la Cláusula 20 – Inexistencia de relación laboral entre la Entidad y el Contratista del mencionado contrato, dejando constancia de que todas las actividades, obligaciones y compromisos contractuales han sido ejecutados directamente por la UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN, sin que haya existido delegación, cesión o subcontratación alguna.

La presente se expide a solicitud de los interesados, para los fines pertinentes.

Dada en Medellín, Antioquia, se expide el presente documento a los **Cuatro (04)** días del mes de **Septiembre** de **2026**.

Cordialmente,

JORGE TRUJILLO NIÑO
C.C 13.893.413 de Barrancabermeja
R/L. UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

ANEXO 21.

CERTIFICADO DE REUTILIZACION DE AGUAS LLUVIAS

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

Medellín, Antioquia, 01 de septiembre de 2026

Ingenieros

MARTA LUCÍA SUÁREZ GÓMEZ
Directora de interventoría

CÉSAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
R/L CONSORCIO INT FAROL MED 2025
Interventor - Contrato de Interventoría N° 4600105599 de 2025
Correo: consorciofarolmed@kalpaingenieria.com.co

MARIO ALFONSO PÉREZ LINARES
Profesional Especializado - Unidad de Circulación
Supervisor Contrato de Obra N° 4600105555 de 2025
Secretaría de Movilidad del Distrito de Medellín
Correo: marioa.perez@medellin.gov.co

129 - 2026

Asunto. Certificación de implementación de sistema de recolección de aguas lluvias – Plan de Sostenibilidad Ambiental para la ejecución del Contrato de Obra N° 4600105555 de 2025.

Por medio de la presente, la UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN, en el marco de la ejecución del Contrato de Obra N° 4600105555 de 2025, se permite certificar que, para la vigencia comprendida entre el **01 de agosto de 2026 y el 31 de agosto de 2026**, se evidenció avance en la implementación y optimización del sistema de recolección y aprovechamiento de aguas lluvias, en cumplimiento de las medidas establecidas dentro del Plan de Sostenibilidad Ambiental del proyecto.

Durante el periodo correspondiente al mes de **agosto de 2026**, y en continuidad con las acciones implementadas durante el mes de Junio del mismo año, se evidencian avances significativos en el mejoramiento de la calidad del agua recolectada en el proyecto.

En efecto, partiendo del diagnóstico previo en el cual se identificaron condiciones lodosas asociadas principalmente a la presencia de sedimentos provenientes del contacto con canaletas, bajantes y superficies de captación, durante el mes de marzo se consolidaron y fortalecieron las medidas correctivas y de optimización previamente adoptadas, destacándose:

- La continuidad y fortalecimiento de las rutinas periódicas de limpieza en los puntos de captación y conducción.
- La mejora en la eficiencia de los procesos de filtrado primario y en el manejo de sedimentos dentro de los sistemas de almacenamiento.
- La implementación de ajustes operativos adicionales orientados a disminuir la carga de sólidos suspendidos previo al almacenamiento final.

Como resultado de lo anterior, durante el mes de **Junio de 2026** se ha evidenciado una mejora progresiva y sostenida en la calidad del agua recuperada, reduciendo de manera significativa la presencia de material particulado y optimizando sus condiciones para el aprovechamiento en actividades propias de obra y usos domésticos asociados al proyecto.

Este avance contribuye de manera efectiva a la reducción del consumo de agua potable, al uso eficiente del recurso hídrico y al cumplimiento de los lineamientos ambientales aplicables al contrato.

En consecuencia, se deja constancia del avance positivo en la gestión y tratamiento del agua recolectada, ratificando el compromiso del contratista con la sostenibilidad ambiental y la mejora continua dentro del desarrollo contractual.

Dada en Medellín, Antioquia, se expide el presente documento al **uno (01)** día del mes de **septiembre** de **2026.**

Cordialmente,

JORGE TRUJILLO NIÑO
C.C 13.893.413 de Barrancabermeja
R/L. UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

Proyectaron. Ing. Miguel Angel Osorio Gomez – Director de Obra UT SIT MEDELLIN
Ing. Carlos Alberto Diaz Peña – Residente de Obra UT SIT MEDELLIN

ANEXO 22. CERTIFICADO DE MADRE CABEZA DE FAMILIA

PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN CONTRATO DE OBRA POR PARTE DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O MUJERES VÍCTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Señores

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Calle 44 # 52 165
Medellín, Antioquia

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA N° 4600105555 DE 2025

Objeto: **REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN**

Estimados señores:
Nosotros, JORGE TRUJILLO NIÑO identificado con cédula de ciudadanía No. 13.893.413 de Barrancabermeja, y SERGIO ANDRES DIAZ MONTAÑEZ, identificado con C.C. No. 1.098.609.537 de Bucaramanga en nuestra condición de REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO de la UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN, identificada con NIT 901.979.396-1, certificamos bajo la gravedad de juramento que se **VINCULÓ PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° 4600105555 DE 2025** en el periodo comprendido entre **01 de agosto de 2026 al 31 de agosto de 2026** empleadas y/o contratistas por prestación de servicios por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar.

En el siguiente cuadro señalo las mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan en la ejecución del contrato referenciado:

Nombre de las mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan en la ejecución del Contrato de Obra	Identificación de las mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan en la ejecución del Contrato de Obra	Cargo en la UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
JENIFER DEL CARMEN ALTAMIRANDA DÍAZ	C.C. 1.052.982.270 **FECHA INGRESO:** 1/09/2025	Auxiliar SST y Ambiental
LAURA PADILLA GIRALDO	C.C. 1.017.221.580 **FECHA INGRESO:** 21/01/2026	Auxiliar de mantenimiento

En constancia, se firma en **Medellín, Antioquia**, al **uno (01)** día del mes de **septiembre** de **2026**.

Cordialmente,

SERGIO ANDRES DIAZ MONTAÑEZ
C.C. 1.098.609.537 de Bucaramanga
Contador Público - T.P 187097-T
UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

JORGE TRUJILLO NIÑO
C.C 13.893.413 de Barrancabermeja
R/L. UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

ANEXO 23.

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE.

PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES - CONTRATO No. 4600105555 DE 2025									
Con base al modelo de Compra de pública innovadora, sostenible y socialmente responsable del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, se deben relacionar a continuación todos los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual y los resultados relevantes de la incorporación.									
Eje del acuerdo 016 incorporado	**Implementó**		**Describa el criterio incorporado**	**Medio de verificación**	**Medición del criterio**	**Costos adicionales**		**Describa el costo adicional**	**Observaciones**
	Si	**No**				**Si**	**No**		
Relacione el eje del acuerdo 016 al que se incorpora criterios.	*Marque sí o no en caso de que se haya implementado el criterio.*		*Relacione los criterios que quedaron incorporados en los documentos precontractuales o minuta del contrato.*	*Relacione la evidencia tenida en cuenta para el seguimiento del criterio.*	*Relacione el resultado del criterio en términos de cantidades, valores ($), % u otros datos relevantes con el que se midió la implementación del criterio. Del mayor detalle posible sobre el resultado.*	*Marque sí o no en caso de que se haya evidenciado un aumento en el costo debido a la implementación del criterio.*		*En caso de que la respuesta anterior sea si, relacione el costo adicional generado.*	*En este espacio puede describir otros impactos directos o indirectos en términos de cantidades, valores ($), % u otros, que haya generado la incorporación del criterio.*
Compra pública sostenible: Satisface la necesidad y contribuye a la protección del medio ambiente, la reducción en el consumo de recursos, o la inclusión y la justicia social durante el desarrollo de un proceso de compra pública. 8.7. Mantenimiento de obras	**X**		Todos los envases y/o empaques de las pinturas, solventes, esmaltes y similares, deberán estar correctamente etiquetados, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Dentro de la ejecución del contrato se implementó el programa para el manejo de sustancias químicas. Dentro de este programa el Consorcio realizó las siguientes actividades: - Identificación y clasificación de las sustancias químicas. - Actualización periódica del inventario. - Adquisición y verificación de fichas de seguridad. - Rotulación adecuada de rec ipientes conforme al SGA. - Definición de condiciones seguras de almacenamiento	El 100% de los envases fueron debidamente etiquetados correctamente y se entregó la ficha técnica de los productos		**X**	NA	NA
	X		El contratista deberá entregar la Ficha Técnica y Ficha de Datos de Seguridad (FDS) de pinturas, solventes, esmaltes y demás productos similares.				**X**	NA	NA
	X		El cemento debe cumplir con las normas técnicas NTC-ISO121:202 y NTC-ISO	La UT realizó el diseño de mezclas y con base a él se realizan los concretos para obras civiles	El Cemento cumple con la normatividad legal vigente NTC- ISO121:202 y NTC-ISO		**X**	NA	NA
	X		Verificación de proveedores y procedencia de materiales pétreos, concretos y mezclas asfálticas suministradas para la ejecución de obras civiles.	Remisiones, facturas, certificados de proveedor	NA		**X**	NA	NA
	x		elaborado bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento o gestión de la calidad conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018	El contratista en su oferta presenta el formato 7C- Plan de calidad, se compromite de presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto,	S han elaborado 12 informes de cada mes de ejecución de los 29 meses contractuales 12/29=41,37%		**X**	NA	El contratista en el informe mensual de Agosto de 2026, presenta dentro de su informe de calidad el cumplimeinto de este compromiso.

Con base al modelo de Compra de pública innovadora, sostenible y socialmente responsable del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, se deben relacionar a continuación todos los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual y los resultados relevantes de la incorporación.									
Eje del acuerdo 016 incorporado	**Implementó**		**Describa el criterio incorporado**	**Medio de verificación**	**Medición del criterio**	**Costos adicionales**		**Describa el costo adicional**	**Observaciones**
	Si	**No**				**Si**	**No**		
	X		Implementación de un programa de ahorro y uso eficiente del agua durante la ejecución del contrato, mediante acciones orientadas a reducir el consumo de agua potable, promover su aprovechamiento eficiente y, cuando sea técnicamente viable, utilizar aguas lluvias para actividades propias de la obra que no requieran agua potable.	Registros mensuales de consumo de agua; registros fotográficos de las medidas implementadas; evidencias de sistemas de recolección y aprovechamiento de aguas lluvias; facturas o soportes de consumo; formatos de inspección y seguimiento; y certificación mensual de implementación del programa de ahorro y uso eficiente del agua. Seguimiento mensual al consumo y ahorro de agua, verificando la implementación de las medidas establecidas y cuantificando, cuando aplique, el volumen de agua lluvia recolectada y aprovechada. Indicador: Volumen de agua aprovechada (m³) / Volumen total de agua utilizada (m³) × 100. Adicionalmente, se verificará el 100 % de cumplimiento de las actividades programadas para el periodo.	(13 m³ consumo promedio 2026 − 11 m³ consumo agosto de 2026) / 13 m³ × 100 = **15,38 % de ahorro de agua**		**X**	NA	El Contratista allegó como soporte documental el recibo de servicios públicos expedido por Empresas Públicas de Medellín – EPM, correspondiente al Contrato No. 675829, cuya dirección de prestación del servicio corresponde a CL 54 CR 77 D -74, Medellín – Antioquia. Para el periodo evaluado se evidencia un consumo de acueducto de 11 m³, documento que se incorpora como medio de verificación para el seguimiento y cumplimiento del criterio ambiental de ahorro y uso eficiente del agua correspondiente al Acta No. 12 – Agosto de 2026.
COMPRA PÚBLICA INNOVADORA: Fomenta la innovación y el desarrollo de los proveedores del estado desde la demanda de bienes y servicios de las entidades estatales que no pueden ser satisfecha por el mercado. · Permite que las entidades estatales adquieran nuevas y mejores soluciones innovadoras para satisfacer sus necesidades mejorando la forma como éstas cumplen su misión y entregan bienes, obras y servicios a los ciudadanos.	**X**		Para el criterio de innovación, la Guía Para la Compra Pública la define como “La compra Pública de Tecnología Innovadora consiste en la compra pública de un bien o servicio que no existe en el momento de la compra pero que puede desarrollarse en un período de tiempo razonable. Dicha compra requiere el desarrollo de tecnología nueva o mejorada para poder cumplir con los requisitos demandados por el comprador”. Dado que en el presente proceso de selección no se pretende adquirir bienes que no existen, **este criterio no es aplicable.**						
▪ Permite crear o desarrollar algo nuevo o encontrar nuevas y mejores formas de hacer las cosas o prestar un servicio a los ciudadanos.	**X**								

Con base al modelo de Compra de pública innovadora, sostenible y socialmente responsable del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, se deben relacionar a continuación todos los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual y los resultados relevantes de la incorporación.

Eje del acuerdo 016 incorporado	Implementó		Describa el criterio incorporado	Medio de verificación	Medición del criterio	Costos adicionales		Describa el costo adicional	Observaciones
	Si	No				Si	No		
COMPRA PÚBLICA SOCIALMENTE RESPONSABLE: Permite al Estado obtener valor por dinero porque aborda factores de riesgo, como los impactos negativos sobre la sostenibilidad y las violaciones y abusos de los derechos humanos.	**X**		Vinculación de personas con discapacidad: La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).	En el proceso de selección el oferente entregó: A). Formato8– Vinculación de personas en condición de discapacidad suscrito por el representante legal en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente. B. Certificado expedido por el Ministerio de Trabajo acreditando dos (2) personas en condición de discapacidad, equivalente al 40% del personal total vinculado. Personal que esta vigente en la ejecución del contrato.	1 persona vinculada / 1 persona comprometida × 100 = **100 %.** Se aclara que este criterio es aportado por el integrante SERVICIVIL S.A.S de la UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN		**X**	NA	El contrato acredita 1 persona con discapacidad . El informe mensual incluye los respectivos certifiados que soportan el cumplimiento del formato.
	X		MiPymes Domiciliada en Colombia: La Entidad otorgará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de MiPymes domiciliada en Colombia, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.	En el proceso de selección el Proponente acreditó la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Condición que estuvo vigente en la ejecución del contrato.	Esta condición es acreditada por los tres (3) integrantes SERVICIVIL S.A.S, SOLUTRAFFIC INGENIERIA S.A.S Y MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ de la UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN		**X**	NA	El contratista entrega en el inicio de oferta la documentación que acretida esto.
	x		Entre 5 y 10% del personal destinado al cumplimiento contractual, la provisión de bienes, obras y servicios; que tenga formación y/o experiencia relacionada con el desarrollo del objeto del contrato y estén en condición de: Pobreza extrema, desplazados por la violencia, proceso de reintegración o incorporación y sujetos de especial protección constitucional como: •Población LGTBIQ+. •Población afrodescendiente, palenqueras y raizales. •Población indígena. •Población víctimas del conflicto armado. •Personas pospenadas. •Población migrante. •Poblaciones jóvenes ley de primer empleo. •Población campesina. •Mujeres víctimas de violencia basada en género, madres cabeza de familia y personas mayores (tercera edad). • Ex habitante de calle.	Durante la ejecución del contrato se aseguró la vinculación de mínimo el 5% de sujetos especiales (Mujeres ca, personal de pobreza extrema y víctimas del conflicto). Así mismo, se aseguro la vinculación de sujetos de protección especial (personal mayor de 60 años, personal de pobreza extrema y moderada, personal vulnerable, mujeres cabeza de familia, comunidad afrocolombiana, comunidad negra y víctimas del conflicto).	Este criterio es acreditado mediante personal de nomina de la UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN que cuenta con condición de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan en la ejecución del Contrato de Obraldentificación de las mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan en la ejecución del Contrato de Obra Cargo en la UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN JENIFER DEL CARMEN ALTAMIRANDA DÍAZC.C. 1.052.982.270 FECHA INGRESO: 1/09/2025 Auxiliar SST y Ambiental LAURA PADILLA GIRALDOC.C. 1.017.221.580 FECHA INGRESO: 21/01/2026Auxiliar de mantenimiento		**X**	NA	Se adjunta la presente documento documento Certificación PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN CONTRATO DE OBRA POR PARTE DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O MUJERES VÍCTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR debidamente firmado por el representante legal y contador publico de la UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

Con base al modelo de Compra de pública innovadora, sostenible y socialmente responsable del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, se deben relacionar a continuación todos los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual y los resultados relevantes de la incorporación.

Eje del acuerdo 016 incorporado	Implementó		Describa el criterio incorporado	Medio de verificación	Medición del criterio	Costos adicionales		Describa el costo adicional	Observaciones
	Si	No				Si	No		
	X		ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA JURÍDICA) : acreditar la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015	En seguimiento a los compromisos de la Compra Pública Socialmente Responsable y equidad de género, la Interventoría revisó la acreditación del criterio de [Emprendimientos de Mujeres / Vinculación de Mujeres]. Se verificó la documentación aportada por el contratista, correspondiente a [la certificación del Revisor Fiscal sobre la participación societaria femenina / las planillas de pago a seguridad social PILA y contratos del personal femenino asignado a la obra]. De acuerdo con el análisis realizado, se constató un porcentaje de participación/vinculación del más del 50%, cumpliendo de manera satisfactoria con el indicador ofertado en el proceso de selección y los lineamientos del Decreto 1860 de 2021.	Este criterio es aportado por parte del integrante SERVICIVIL S.A.S. de la UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN		X	NA	Se evidencia en el informe mensual con la copia del Registro a Industria y Comercio .
	X		PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL: destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el 100% del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato, de conformidad con el tercer inciso del artículo 2.2.1.2.4.2.9 del decreto 1082 de 2015.	"En lo relativo a la verificación de los compromisos de Promoción de la Industria Nacional y Servicios Nacionales (conforme a la Ley 816 de 2003 y el Decreto 1082 de 2015), el contratista oferto con el formato 9A-comprometiendose a al menos el Noventa y Cinco por ciento (95%) del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato.	Este criterio es aportado por todos los integrantes de la UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN		X	NA	Se evidencia en el informe mensual con las cédulas de los empleados y comparado con los pagos de ISS, adjuntos en el informe mensual de julio.

ANEXO 24.

PRESUPUESTO SOCIO-AMBIENTAL

PRESUPUESTO GUÍA SOCIO AMBIENTAL					may-26					jul-26					ago-26					
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																
GESTION AMBIENTAL																				
Manejo de residuos sólidos					N° Factura	Cant	Valor Unitario	Valor total	Faltante por facturar	N° Factura	Cant	Valor Unitario	Valor total	Faltante por facturar	N° Factura	Cant	Valor Unitario	Valor total	Faltante por facturar	
Plástico Negro x1m ancho calibre 3.5	Un	50	$ 8.000	$ 400.000											CCFD7242	56,8	$ 8.000	$ 454.400	$ 185	
Dispositivos para canalizar el																				
Abanderados																				
GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO																				
Guantes de poliuretano	un	200	$ 5.000	$ 1.000.000	CCFD66627	26	$ 5.000	$ 130.000	$ 2.947	CCFD71567	39	5000	195000	4420,2						
					CCFD66627	53	$ 5.000	$ 265.000	$ 894											
Examen médico periódico (para contratos superiores a 1 año)	Un	5	$ 72.000	$ 360.000	560838	3	$ 72.000	$ 216.000	30100	563467	2	68400	136800							
Protección respiratoria con filtros (pintura)	Un	10	$ 126.900	$ 1.269.000						CCFD71567	5	53900	338584,75							
Filtros vapores orgánicos (pintura)	Un	10	$ 60.000	$ 600.000						CCFD71567	10	32700	369673,5							
Botas con puntera dieléctrica	Un	20	$ 90.000	$ 1.800.000											CCFD72538	22	$ 90.000	$ 1.980.000	$ 47.643	
Calibración detector de gases	Un	12	$1.000.000	$ 12.000.000	FE 15405	1	$ 413.166	$ 438.808												
					FE 15404	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000	188810											
Guantes largos para lavado	Un	20	$ 35.000	$ 700.000	CCFD66627	6	$ 23.500	$ 159.401		CCFD71567	7	22500	178053,75							
										CCFD71567	5	22500	127181,25							
TOTAL APLICACIÓN GUÍA SOCIO AMBIENTAL								$ 2.269.208					$ 1.345.293					$ 2.434.400		$ 6.048.901
Elaboró:_____		Aprobó:																		
Mario Alfonso Pérez Linares - Rol Técnico CEEC 70007631		Mateo González Benítez - Secretario de Mov																		
