	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
PARCIAL: _____TOTAL: X	**FECHA 24/JUN/2026**
CONTRATO No.	197-00-B-COFAC-BACOF-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	09-DIC-2025
OBJETO	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, A TODO COSTO, DE SHELTER HABITACIONAL Y SHELTER DE BAÑOS ADECUADOS CON MOBILIARIO, EQUIPOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO Y ELECTRODOMÉSTICOS, INCLUYENDO EL DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL SHELTER HABITACIONAL Y DE BAÑOS ACTUALMENTE INSTALADO
FORMA DE PAGO	**FECHA DE CORTE** / **PAC** / **VALOR** 31 DE DICIEMBRE DE 2025 / CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2026 / ÚNICO PAGO: DE CONFORMIDAD CON LOS BIENES FACTURADOS CON CORTE EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA	ECONTAINERS SAS
INTERVENTOR (si aplica)	N/A
SUPERVISOR	CT. TIRIA CONTRERAS CHRISTIAN MAURICIO
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($272.800.000,00)
FECHA DE INICIO	12-DIC-2025
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	31-DIC-2025

MODIFICACIONES AL CONTRATO		
Modificatorio No. 1	Fecha: 30/12/2025	MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL DÍA 31-01-2026, SE MODIFICA LA FORMA DE PAGO (CORTE 31-01-2026 – PAC SEGUNDO BIMESTRE 2026 - CONSTITUYENDO LA RESERVA PRESUPUESTAL) Y SE MODIFICAN LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO.
Modificatorio No. 2	Fecha: 30/01/2026	MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL DÍA 28-02-2026, SE MODIFICA LA FORMA DE PAGO (CORTE 28-02-2026, PAC SEGUNDO BIMESTRE 2026 – RESERVA PRESUPUESTAL) SE MODIFICA EL ANEXO TÉCNICO RESPECTO A LA CUBIERTA DE LOS SHELTERS, SE MODIFICAN LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO.
Modificatorio No. 3	Fecha: 25/2/2026	MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL DÍA 10-04-2026, SE MODIFICA LA FORMA DE PAGO (CORTE 10-04-2026, PAC TERCER BIMESTRE 2026 – RESERVA PRESUPUESTAL) Y SE MODIFICAN LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO.
Modificatorio No. 4	Fecha: 10/04/2026	MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL LUGAR DE EJECUCIÓN, PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL DÍA 10-05-2026, SE MODIFICA LA FORMA DE PAGO (CORTE 10-05-2026, PAC JUNIO 2026 – RESERVA PRESUPUESTAL) Y SE MODIFICAN LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO.
Modificatorio No. 5	Fecha: 08/05/2026	MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL ANEXO T[ECNICO DEL CONTRATO, ACORDE A LAS NECESIDADES DEL NUEVO SITIO DE INSTALACIÓN, PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL DÍA 10-06-2026, SE MODIFICA LA FORMA DE PAGO (CORTE 10-06-2026,

		PAC AGOSTO 2026 – RESERVA PRESUPUESTAL) Y SE MODIFICAN LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO.
Modificatorio No.6	Fecha: 10/06/2026	MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO, ACORDE A LAS NECESIDADES DEL NUEVO SITIO DE INSTALACIÓN, PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL DÍA 19-06-2026, SE MODIFICA LA FORMA DE PAGO CORTE 19-06-2026, PAC AGOSTO 2026 – RESERVA PRESUPUESTAL) Y SE MODIFICAN LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO.
Modificatorio No. 7	Fecha: 19/06/2026	MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO, ACORDE A LAS NECESIDADES DEL NUEVO SITIO DE INSTALACIÓN, PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL DÍA 24-06-2026, SE MODIFICA LA FORMA DE PAGO CORTE 24-06-2026, PAC AGOSTO 2026 – RESERVA PRESUPUESTAL) Y SE MODIFICAN LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO.
SUSPENSIÓN Y REINICIOS		
Suspensión No. 1		N/A
Ampliación Suspensión		N/A
Reinicio		N/A
FORMA DE PAGO FINAL		Se realizará única entrega con corte de facturación 24 de junio de 2026 y único pago del 100% CONSTITUIDO EN RESERVA PRESUPUESTAL CON CARGO AL PAC AGOSTO 2026, DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL		24 de junio de 2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO		Se mantiene el mismo valor del Contrato inicial el cual asciende a la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($272.800.000)

En Yopal, a los veinticuatro (24) días del mes de junio de 2026, la señora **TC. JOHANA ANDREA SALAMANCA CORDERO,** en su calidad de Ordenadora del Gasto (E), el señor **CT. TIRIA CONTRERAS CHRISTIAN MAURICIO,** en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – BASE AÉREA COMANDO FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor **JOHN JAIRO VALENCIA HINCAPIE,** en su calidad de representante legal de ECONTAINERS SAS, empresa **CONTRATISTA**; efectúan el correspondiente recibo **TOTAL,** de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SHELTER ADECUADO PARA BAÑO	1	Se recibe acorde a la ficha técnica establecida.
SHELTER HABITACIONAL	1	Se recibe acorde a la ficha técnica establecida.
SOFACAMA SENCILLO	1	Se recibe acorde a la ficha técnica establecida.
NEVERA BOTTOM FREZEER	1	Se recibe acorde a la ficha técnica establecida.
TELEVISOR SMARTV DE 65”	1	Se recibe acorde a la ficha técnica establecida.
HORNO MICROONDAS 120V	1	Se recibe acorde a la ficha técnica establecida.

COLCHON SENCILLO ORTOPÉDICO DE MEDIDAS 120 X 190CM	4	Se recibieron acorde a la ficha técnica establecida.
BOMBA HIDRONEUMÁTICA HYDROFLOW DE 1/2 HP Y 50 LITROS	1	Se recibieron acorde a la ficha técnica establecida.
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
ANDRES ALBERTO BONILLA ROA	INGENIERO CIVIL - RESIDENTE / SUPERVISOR	15202-378306 BYC
RAFAEL OLANO	MAESTRO DE OBRA	071037-06477132
LEONARDO JAIME	OFICIAL DE OBRA	EXPERIENCIA CERTIFICADA
LUIS EDUARDO MIELES ROMERO	TÉCNICO ELECTRICISTA CERTIFICADO RETIE	1052997796-129054
EDWIN PARRA DUARTE	PLOMERO/FONTANERO	EXPERIENCIA CERTIFICADA
JHON IVAN BOCAREJO	OPERADOR DE GRÚA O MONTACARGAS	SDS 8779
EDWIN ARNULFO GIL DÍAZ	SOLDADOR	FORMACIÓN Y EXPERIENCIA CERTIFICADA
FAUSTO DE JESUS CARBONO LASSO	AYUDANTE 1	N/A
FERNELIS BORJA	AYUDANTE 2	N/A
DIEGO MAURICIO DÍAZ ROJAS	AYUDANTE 3	N/A
DIEGO FELIPE MORALES CURREA	AYUDANTE 4	N/A

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

  SI: ____NO: X

  Valor del incremento: NO APLICA

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

  SI: ____NO: X Años a incrementar: NO APLICA

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

  SI: ____NO: X

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$272.800.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	
VALOR FINAL	$272.800.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO TOTAL PAC JUNIO	$272.800.000,00	PENDIENTE POR FACTURAR
SALDO	$0,00	

OBSERVACIONES

[Diligenciar los aspectos que se consideren importantes para dejar constancia en el acta de recibo a satisfacción; en caso de no haber ninguno, indicar No Aplica.]

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JOHN JAIRO VALENCIA HINCAPIE
R/L ECONTAINERS SAS
CONTRATISTA

CT. TIRIA CONTRERAS CHRISTIAN
SUPERVISOR

TC. JOHANA ANDREA SALAMANCA CORDERO
ORDENADORA DEL GASTO (E)

ANEXO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO No. 197-00-B-COFAC-BACOF-2025

OBJETO: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, A TODO COSTO, DE SHELTER HABITACIONAL Y SHELTER DE BAÑOS ADECUADOS CON MOBILIARIO, EQUIPOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO Y ELECTRODOMÉSTICOS, INCLUYENDO EL DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL SHELTER HABITACIONAL Y DE BAÑOS ACTUALMENTE INSTALADO

CONTRATISTA: ECONTAINERS S.A.S.

VALOR CONTRATO: $272.800.000,00

ELEMENTOS ENTREGADOS:

Ref. Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor
1	SHELTER ADECUADO PARA BAÑOS (según especificaciones técnicas)	1.00	VG	$ 144.531.900,00
2	SHELTER HABITACIONAL (según especificaciones técnicas)	1.00	VG	$ 110.000.000,00
3	SOFACAMA SENCILLO (según especificaciones técnicas)	1.00	UN	$ 833.000,00
4	NEVERA BOTTOM FREZEER (según especificaciones técnicas)	1.00	UN	$ 3.630.000,00
5	TELEVISOR SMARTV DE 65 (según especificaciones técnicas)	1.00	UN	$ 4.142.000,00
6	HORNO MICROONDAS 120 V (según especificaciones técnicas)	1.00	UN	$ 484.400,00
7	COLCHÓN SENCILLO ORTOPÉDICO DE MEDIDAS 120X190 (según especificaciones técnicas)	4.00	UN	$ 7.393.700,00
8	BOMBA HIDROFLOW HIDRONEUMÁTICA 1/2 HP 50 LITROS (según especificaciones técnicas)	1.00	UN	$ 1.785.000,00
TOTAL				**$ 272.800.000,00**

SOPORTE FOTOGRÁFICO:
















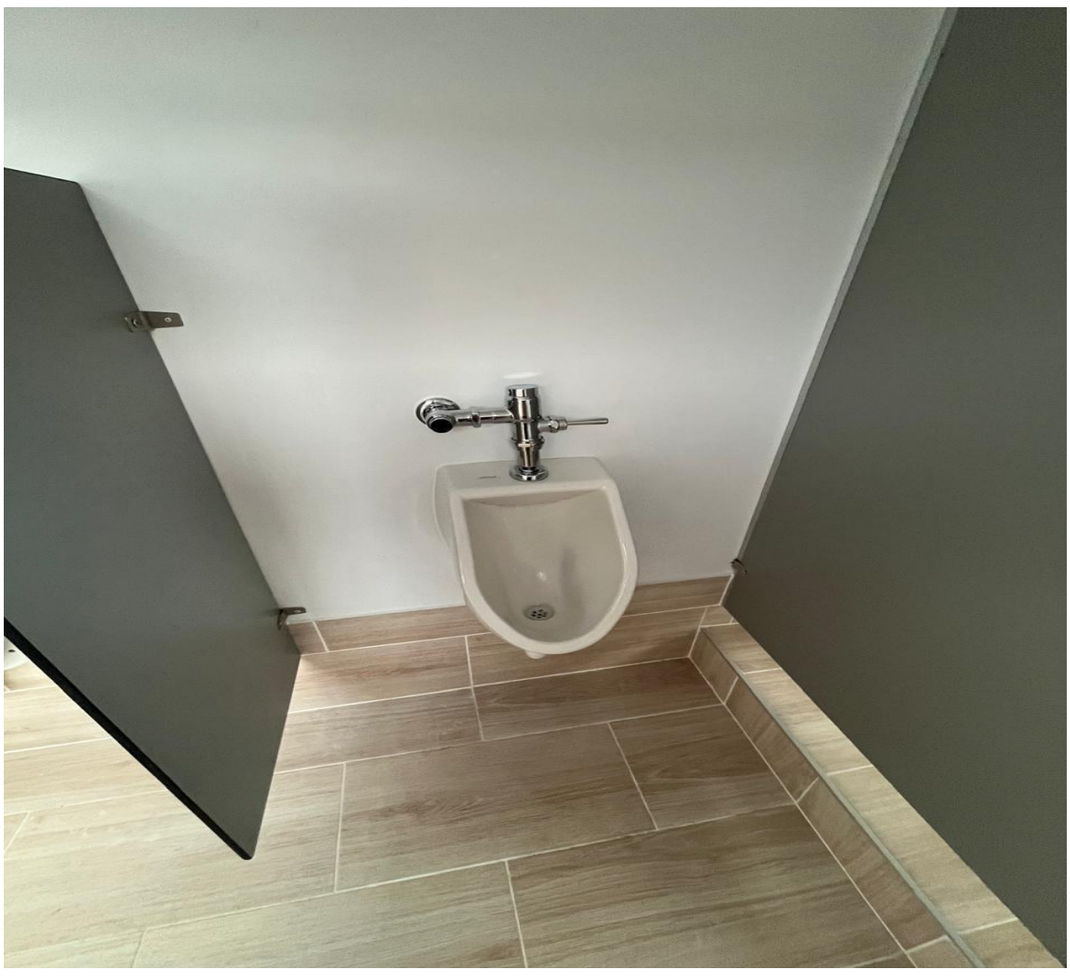




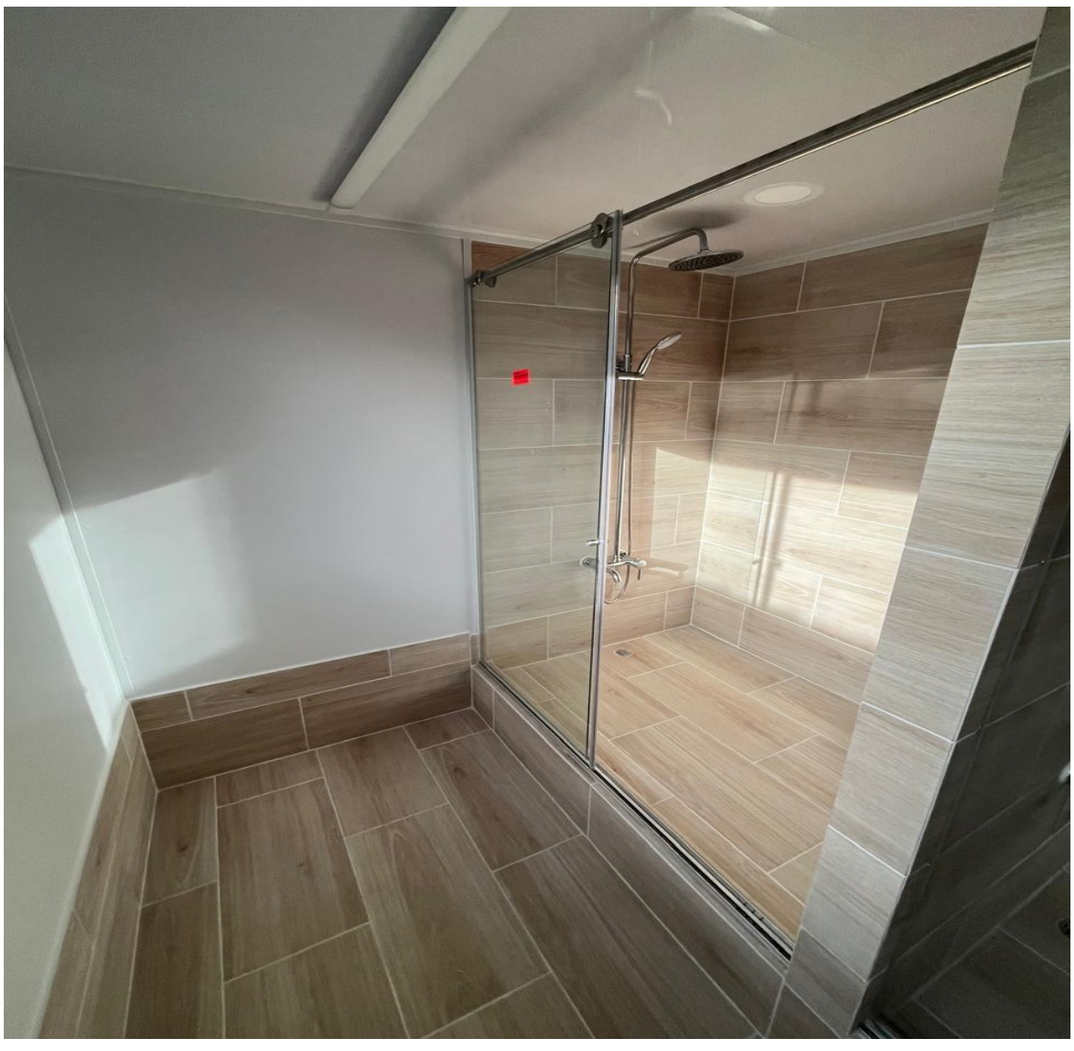


BAÑO

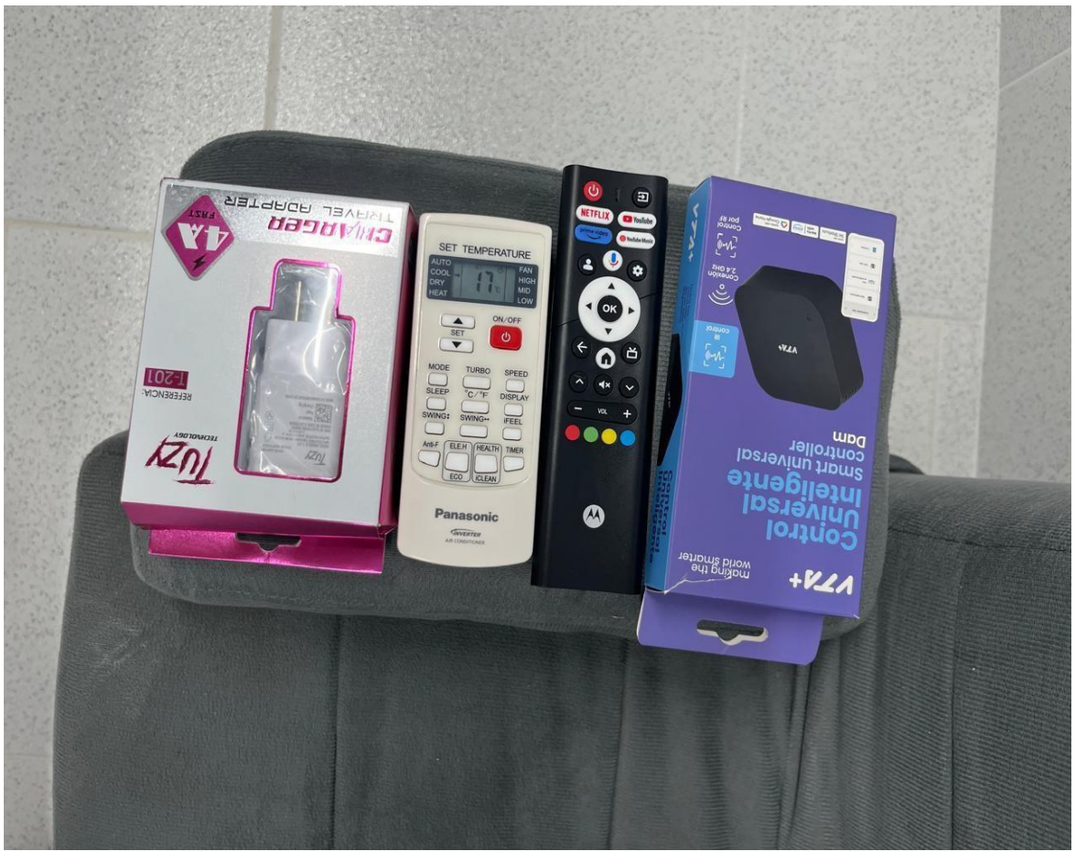

CHARGER
TRAVEL ADAPTER
4A
FAST
TUZY
TECHNOLOGY
REFERENCIA:
T-201
SET TEMPERATURE
AUTO
COOL
DRY
HEAT
FAN
HIGH
MID
LOW
ON/OFF
SET
MODE
TURBO
SPEED
SLEEP
°C/°F
DISPLAY
SWING↕
SWING↔
iFEEL
Anti-F
ELEH
ECO
HEALTH
iCLEAN
TIMER
Panasonic
INVERTER
AIR CONDITIONER
NETFLIX
OK
VOL
V7A+
moving the world smarter
Control Universal Inteligente
Smart universal controller
DAM
Conexión 2.4 GHz
Control por IR
Control


Arte/cultura (sin música)
MPEG1-L2 Estéreo español
1080i HD 30Hz
1
CARACOL HD
Antena
16:35 vie
26 jun 2026
*Sugerencia de consumo

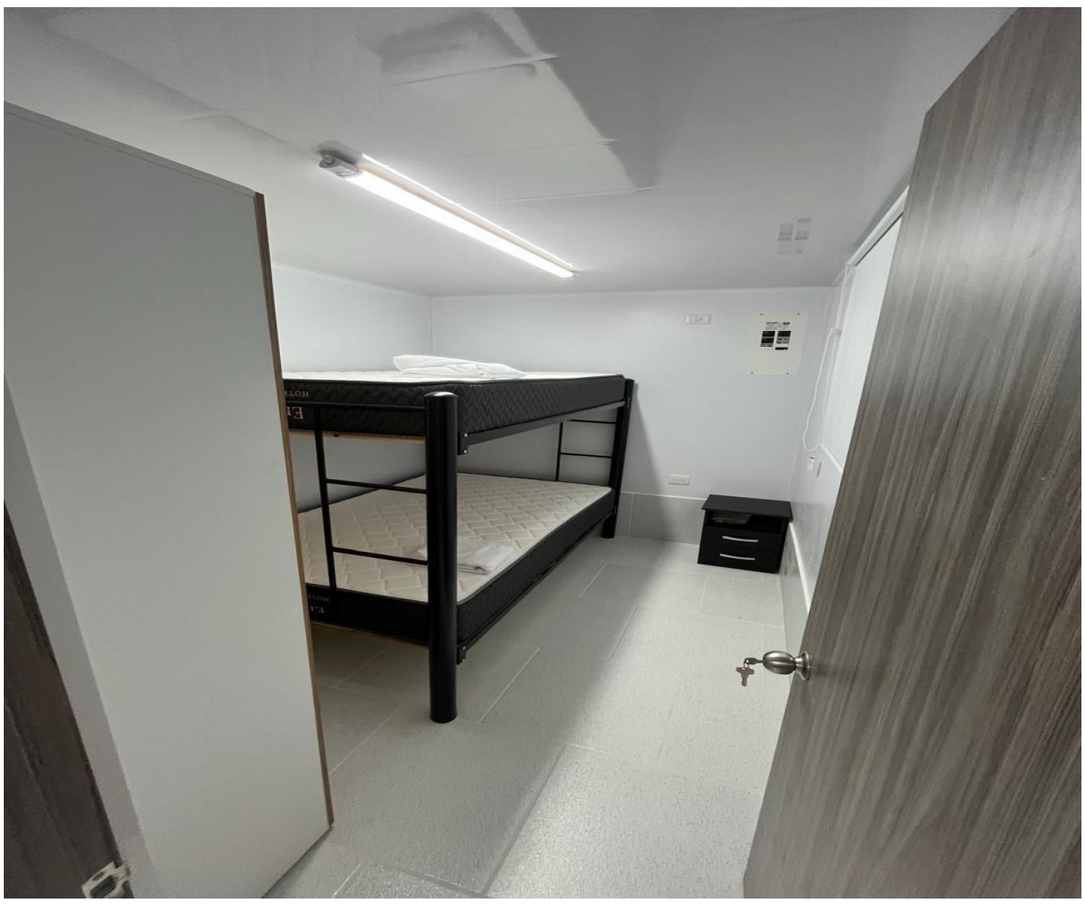




Agua

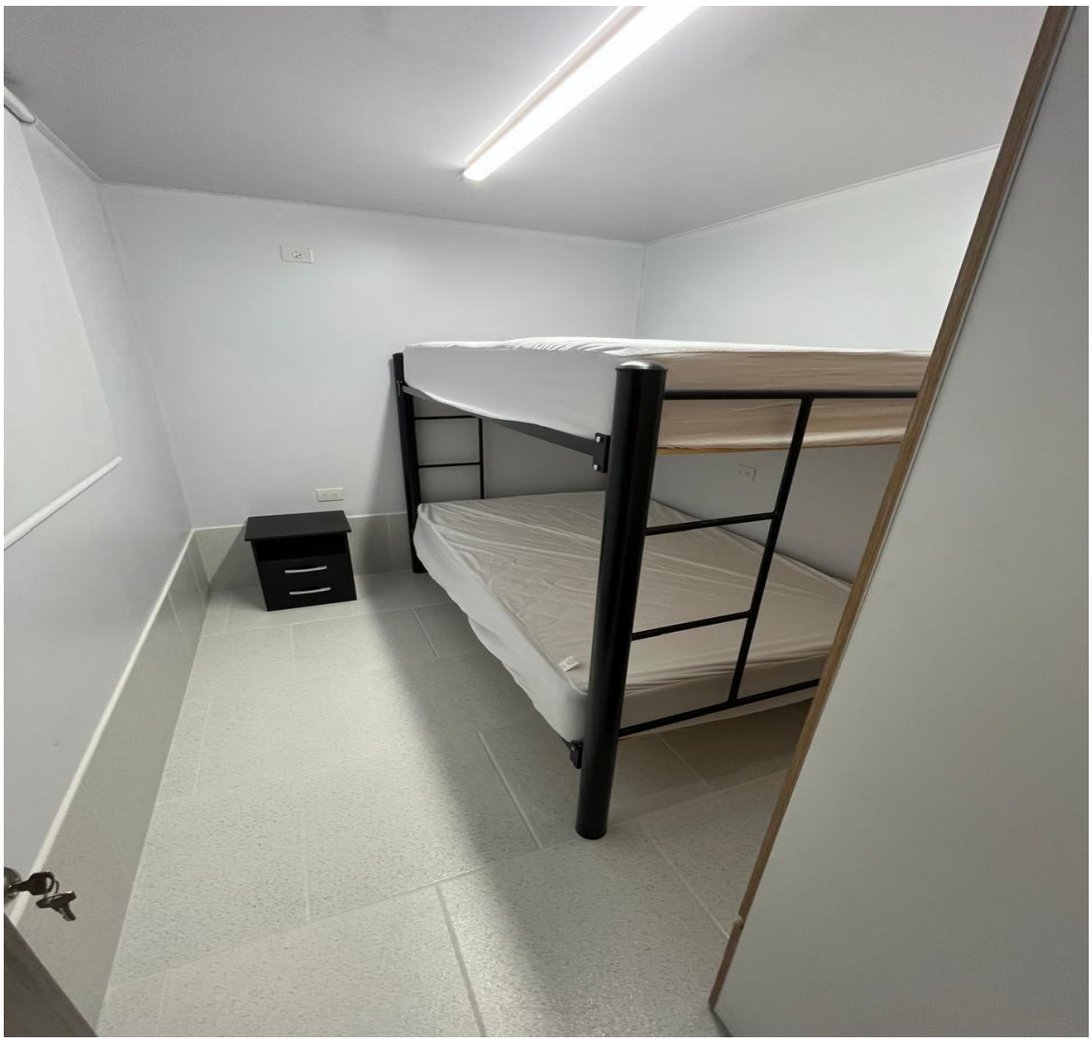




DORMITORIO
