INFORME SUPERVISION N°3

DIRECCION TECNICA EDTB
CONTRATO: 050-2025

FECHA DEL CONTRATO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATO	N° 050-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO PUERTO CLAVER
NIT O DOCUMENTO DEL CONTRATISTA	NIT 901982342-5
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"
VALOR DEL CONTRATO	TRES MIL SEISCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/MTCE ($ 3.605.339.826,79) INCLUIDO EL A.U Y DEMÁS COSTOS A QUE HAYA LUGAR
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	QUINCE (15) DE SEPTIEMBRE DE 2025
ACTA DE SUSPENSION No1:	12 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE AMPLIACION No1 SUSPENSION No1:	11 DE ENERO DE 2026
ACTA DE SUSPENSION No2:	16 DE MARZO DE 2026
ACAT DE AMPLIACION No1 A LA SUSPENSION No2:	30 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 DE MAYO DE 2026
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL N°1	MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($ 1.384.914.578,48)

VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL N°2	MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS Y VEINTE CENTAVOS M/TCE ($ 1.320.500.422,20)
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL N°3	QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ CENTAVOS M/CTE ($ 5388.950.310,10)
SALDO DEL CONTRATO	$ 360,974,516.01
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	DIEZ (10) DE ABRIL DE 2026

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

a) EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

RUBRO	VALOR A CANCELAR ($)
2.3.2.02.02.005	**$ 3.605.339.826,79**

CRP No 1725 del 25 de julio de 2025

b) VALOR ANTICIPO: N/A

c) VALOR A PAGAR ACTA DE COBRO PARCIAL N°.1: $ 1.384.914.578,48
d) VALOR A PAGAR ACTA DE COBRO PARCIAL N°.2: $ 1.320.500.422,20
e) VALOR A PAGAR ACTA DE COBRO PARCIAL N°.3: $ 538.950.310,10
f) CONCEPTO DEL SUPERVISOR:

ATRIBUTO EVALUADO	CONCEPTO DEL DESEMPEÑO
ATENCIÓN	El Municipio como entidad de la división político-administrativo del Estado, le corresponde propiciar buenas condiciones para la movilidad y circulación al interior de los centros urbanos, en tal sentido se han realizado inversiones de recursos para proyectos viales. En tanto la población de los sectores beneficiados con el proyecto, vienen ejerciendo control y vigilancia de procesos de formulación, gestión y posterior inversión de recursos durante la ejecución de las obras.

	Este proyecto es de vital importancia para lograr mejorar las condiciones de infraestructura vial del casco urbano del corregimiento de puerto Claver, teniendo en cuenta que si se requiere promover la competitividad se requiere de oferta de transporte y de malla vial adecuada que genere mecanismos adecuados de transporte, comunicación e interacción entre los pobladores. Los beneficios de la intervención en estos espacios viales por parte de la alcaldía de El Bagre se representan en la facilidad en la movilidad, comodidad, seguridad, estética y costos que influyen en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Los problemas de movilidad reducida, seguridad vial, afecciones de salud, riesgo físico para transeúntes y deterioro del entorno vial físico, impactan con la misma intensidad a un amplio espectro de la población Bagreña y se pueden evidenciar en todos los barrios del municipio
OPORTUNIDAD	El mal estado en que se encuentran los 819.92 ml a intervenir se refleja en las regulares condiciones de seguridad y confort para la circulación del transporte y con el aumento acelerado que ha experimentado el corregimiento de Puerto Claver, lo cual no ha permitido desarrollar una malla continua y coherente con las expectativas actuales en dicho corregimiento, conformada por terreno natural y materiales mixtos de relleno sin una base estabilizada, lo que ha generado un avanzado deterioro superficial, hundimientos y una incapacidad por soportar el trafico vehicular, el resultado de esto es una red vial de transito peligroso para aquellos que requieren transitar en la carrera 31d entre calle 38 y calle 36, carrera 32 entre calle 36 y calle 35, calle 35 entre carrera 32 y carrera 29ª, en general este tipo de carencia en la infraestructura de la malla vial en el eje se convierte en un obstáculo para la correcta prestación de algunos servicios básicos como es el caso de la recolección de residuos sólidos, transporte de enfermos y atención de emergencias e incide negativamente sobre la percepción que la comunidad tienen de su entorno.

	Por lo anterior expuesto, la vía del barrio La Punta que se encuentra dentro del modelo de priorización de intervención del municipio, y que actualmente no cuenta con condiciones adecuadas de transpirabilidad y las grandes deformaciones de la superficie de la vía dificultan el acceso. En este proyecto se plante mejorar la vía existente, con el fin de garantizar una estructura que otorgue comodidad, durabilidad, seguridad en la vía y accesibilidad de zona. Por lo antes expuesto las vías que se encuentra dentro del modelo de priorización de intervención del municipio, son las vías de principal acceso al barrio El Progreso, y que actualmente no cuenta con condiciones adecuadas de transpirabilidad y las grandes deformaciones de la superficie de la vía dificultan el acceso. En este proyecto se plantea mejorar la vía existente, con el fin de garantizar una estructura que otorgue comodidad, durabilidad, seguridad en la vía y accesibilidad de zona.
CALIDAD	Se verifica que las obras realizadas cumplen con el objetivo planteado en el estudio previo y las condiciones técnicas mínimas exigidas. Durante la ejecución de las actividades en obra, se han realizado diferentes controles técnicos para verificar el cumplimiento de lo propuesto en ellos estudios y diseños proyectados para esta obra.
INFRAESTRUCTURA EMPLEADA	Mano de obra calificada, mano de obra no calificada, herramienta menor, mezcladora, retrocargador, minicargador, volquetas, vibrocompactador.

Ver capítulo 6.1 del Manual de Contratación

Se firma el 10 de abril 2026

DOIVER NISPERUZA.

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
C.C. 8.364.481
Supervisor

NOTA: Ver evidencia anexada en el informe del contratista.

ACTA LITERAL

ACTA DE AVANCE OBRA
PUBLICA N°3

CONTRATO	050-2025
CONTRATANTE:	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE (EDTB) (901.526.561-7)
CONTRATISTA	CONSORCIO PUERTO CLAVER
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"
VALOR	TRES MIL SEISCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/MTCE ($ 3.605.339.826,79) INCLUIDO EL A.U Y DEMÁS COSTOS A QUE HAYA LUGAR
SUPERVISOR	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ (Director Técnico)
PLAZO	SEIS (6) MESES
ACTA DE INICIO:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ACTA DE SUSPENSION No1:	12 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE AMPLIACION No1 SUSPENSION No1:	11 DE ENERO DE 2026
ACTA DE SUSPENSION No2:	16 DE MARZO DE 2026
ACAT DE AMPLIACION No1 A LA SUSPENSION No2:	30 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 DE MAYO DE 2026
FECHA DE PRESENTE ACTA:	10 DE ABRIL DE 2026

En el Municipio de El Bagre - Antioquia, a los diez (10) días del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron en el municipio de El bagre **DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ**, Director Técnico en calidad de Supervisor de la Obra y **WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ**, representando a **CONSORCIO PUERTO CLAVER**, en calidad de contratista, con el propósito de suscribir **ACTA PARCIAL N°.3** del contrato en

referencia y recibir a satisfacción las obras y actividades reportadas (verificar acta de cobro N°.3, la cual representa avance financiero parcial ejecutado del 14.95%, tal como lo dicta cuadro anexo a la presente el cual refleja las siguientes condiciones de pago:

VALOR DEL CONTRATO:	$	3.605.339.826,79
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	$	0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$	3.605.339.826,79
VALOR ANTICIPO:	$	0,00
VALOR A AMORTIZAR POR ANTICIPO:	$	0,00
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL N°.1:	$	1.384.914,578,48
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL N°.2:	$	1.320.500,422,20
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL N°.3:	$	538.950,310,10

SON: QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ CENTAVOS M/CTE ($ 5388.950.310,10)

Valor que corresponde a un avance ejecutado del 14.95%.
Avance acumulado ejecutado del 89.99%.

Para mayor constancia firman los que en ella intervinieron a los diez (10) días del mes de abril del 2026.

Doiver Nisperuza.

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
DIRECTOR TECNICO
Supervisor

WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ
R.L CONSORCIO PUERTO CALVER
Contratista

Intervinieron en el Documento:

Firma: Doiver Nisperuza	**Firma:** Doiver Nisperuza.
Elaboró Doiver Nisperuza **Cargo:** Director Técnico	**Revisó** Doiver Nisperuza **Cargo:** Director Técnico

MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 3

PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

En el Municipio de El Bagre, a los (10) dias del mes de abril de 2026 se reunieron en las oficinas de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB, por parte del contratista de Obra CONSORIO PUERTO CALVER. Representando WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ, por parte del contratista de interventoria JORGE ANDRES SOTO CALLE y como SUPERVISOR, el ING. DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ, Director Tecnico de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB; con el fin de elaborar el ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 3, realizado a la fecha por el contratista de Obra y recibido a satisfacion por parte de la interventoria y la supervision, teniendo en cuenta las especificaciones y cantidades, segun lo estipulado en el contrato de la referencia.

	CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO PUERTO CLAVER	**CONTRATO DE OBRA:**	N° 050-2025	**PERIODO:** 23 DE ENERO 2026 AL 22 DE FEBRERO / 23 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO / 06 DE ABRIL AL 10 DE ABRIL									
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: INGECOR S.A.S	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	N° 052-2025										
	SUPERVISOR CONTRATO: DOIVER ANTONIO NISPERUZA **(EDTB)**	**FECHA DE PRESENTE ACTA:**	10/04/26					**% EJECUTADO**	**14,95%**	**% ACUMULADO**		**89,99%**	
	PRESUPUESTO OFICIAL							**CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No1**		**CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA PARCIAL N° 3)**		**CANTIDADES ACUMULADAS**	
No.	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**					**CANT**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**
1,0	**Preliminares**												
1,1	Cerramiento lona h=2.00 mts	m2	1614,00	$ 8.142,90	$ 13.142.647,00	3157,17	$ 25.708.563,00	0,00	$ -	2465,55	$ 20.076.725,09		
				Sub - Total	**$ 13.142.647,00**		**$ 25.708.563,00**		**$ -**		**$ 20.076.725,09**		
2,0	**Movimientos de Tierra.**												
2,1	Excavacion mecanica varias sin clasificar, incluye retiro	m3	3128,11	$ 63.760,02	$ 199.448.278,00	4030,53	$ 256.986.498,00	281,90	$ 17.974.034,00	3836,16	$ 244.593.589,00		
2,2	Mejoramiento de subrasante con material seleccionado y compactado, (Incluye trasporte)	m3	1340,62	$ 169.385,78	$ 227.081.639,00	1338,93	$ 226.795.797,00	225,00	$ 38.111.800,00	1255,63	$ 212.685.864,00		
2,3	Suministro, extendido, conformacion y compactacion de Subbase granular (Incluye trasporte)	m3	893,75	$ 225.813,09	$ 201.819.413,00	892,61	$ 201.563.864,00	190,00	$ 42.904.488,00	837,08	$ 189.023.624,00		
				Sub - Total	**$ 628.349.330,00**		**$ 685.346.159,00**		**$ 98.990.322,00**		**$ 646.303.077,00**		
3,0	**Pavimento y Concretos**												
3,1	Suministro e instalación de concreto hidráulico, MR=40 Kg/cm2, para losas de pavimento de espesor 20 cm	m2	4468,73	$ 203.018,21	$ 907.232.938,00	4375,12	$ 888.229.190,00	1193,28	$ 242.257.313,00	4098,58	$ 832.087.018,00		
3,2	Suministro e instalacion de Bordillos de concreto de 3000 Psi, para confinamiento de calzada, dimensiones h=0.15, e=0.15 (Incluye refuerzo longitudinal y transversal, bordillo sobrepuesto en Placas de Pavimento Dilatados cada placa)	ml	1449,73	$ 68.036,17	$ 98.634.076,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
3,3	Acero de refuerzo grado 60	kg	17283,66	$ 10.799,49	$ 186.654.794,00	16168,00	$ 174.606.254,00	4146,21	$ 44.776.998,00	14254,62	$ 153.942.698,00		
3,4	Corte de placa de concreto con disco de 18"	ml	2314,30	$ 7.137,73	$ 16.518.856,00	2234,02	$ 15.945.832,00	639,41	$ 4.563.941,00	2170,31	$ 15.491.114,00		
3,5	Sello de juntas en silicona para Pavimento rigido	ml	2314,30	$ 7.212,17	$ 16.691.131,00	2234,02	$ 16.112.130,00	165,88	$ 1.196.325,08	1016,81	$ 7.333.382,22		
				Sub - Total	**$ 1.225.731.795,00**		**$ 1.094.893.406,00**		**$ 292.794.577,08**		**$ 1.008.854.212,22**		
4,0	**Sistema de Red Alcantarillado Sanitario y Elementos de Conexión**												
4,1	Suministro, transporte é instalacion de Tuberia PVC Alcantarillado Ø 6", incluye maquinaria, equipos e insumos	ml	550,00	$ 154.193,14	$ 84.806.226,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
4,2	Suministro, transporte é instalacion de Tuberia PVC Alcantarillado Ø 8", incluye maquinaria, equipos e insumos	ml	589,09	$ 179.175,14	$ 105.550.283,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
4,3	Suministro, transporte é instalacion de Tuberia PVC Alcantarillado Ø 12", incluye maquinaria, equipos e insumos	ml	319,42	$ 267.775,14	$ 85.532.735,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
4,4	Suministro, transporte é intslacion de Kit Silla Yee Ø 6" a Ø 8" (Incluye hidro sellos y lubricantes)	und	81,00	$ 185.885,00	$ 15.056.685,00	95,00	$ 17.659.075,00	0,00	$ -	95,00	$ 17.659.075,00		
4,5	Suministro, transporte é intslacion de Kit Silla Yee Ø 6" a Ø 12" (Incluye hidro sellos y lubricantes)	und	29,00	$ 308.365,00	$ 8.942.585,00	26,00	$ 8.017.490,00	0,00	$ -	26,00	$ 8.017.490,00		
4,6	Suministro, transporte é instalacion de arena para protección de tubería, incluye maquinarias y equipos	m3	272,55	$ 76.109,50	$ 20.743.877,00	233,94	$ 17.805.391,00	0,00	$ -	233,94	$ 17.805.113,00		
4,7	Suministro, extendido, conformación y compactación de material de recebo para tubería.	m3	91,36	$ 77.585,15	$ 7.088.400,00	83,02	$ 6.441.483,00	0,00	$ -	83,02	$ 6.441.483,00		
4,8	Suministro y transporte de material para caja de inspección	und	110,00	$ 290.485,97	$ 31.953.456,00	24,00	$ 6.971.663,00	0,00	$ -	24,00	$ 6.971.663,00		
4,9	Suministro y transporte de material para Pozos de Inspección D=1.20	ml	33,42	$ 780.265,17	$ 26.076.462,00	22,93	$ 17.891.480,00	0,00	$ -	22,93	$ 17.891.480,00		
4,10	Suministro y transporte de material para Placas de fondo en pozos de inspección D=1.20, e=0.20	und	19,00	$ 555.756,29	$ 10.559.370,00	17,00	$ 9.447.857,00	0,00	$ -	17,00	$ 9.447.857,00		
4,11	Suministro y transporte de material para Tapas en pozos de inspección D=1.20, e=0.20, con tapa de aro con núcleo de concreto	und	19,00	$ 1.037.411,00	$ 19.710.809,00	17,00	$ 17.635.987,00	0,00	$ -	17,00	$ 17.635.987,00		
4,12	Excavaciones varias en material común en seco a mano (para estructura de entrega final)	m3	24,00	$ 63.760,02	$ 1.530.240,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
4,13	Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI) para solados, (para estructura de entrega final)	m3	0,19	$ 1.009.794,37	$ 195.395,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
4,14	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) (para estructura de entrega final)	m3	1,78	$ 1.266.779,89	$ 2.257.402,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
4,15	Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa- (para estructura de entrega final)	kg	84,69	$ 10.799,49	$ 914.596,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
4,16	Relleno para Estructuras con recebo - (para estructura de entrega final)	m3	14,40	$ 121.093,02	$ 1.743.739,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
				Sub - Total	**$ 422.662.260,00**		**$ 101.870.426,00**		**$ -**		**$ 101.870.148,00**		

MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 3

PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

En el Municipio de El Bagre, a los (10) dias del mes de abril de 2026 se reunieron en las oficinas de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB, por parte del contratista de Obra CONSORIO PUERTO CALVER. Representando WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ, por parte del contratista de interventoria JORGE ANDRES SOTO CALLE y como SUPERVISOR, el ING. DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ, Director Tecnico de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB; con el fin de elaborar el ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 3, realizado a la fecha por el contratista de Obra y recibido a satisfacion por parte de la interventoria y la supervision, teniendo en cuenta las especificaciones y cantidades, segun lo estipulado en el contrato de la referencia.

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO PUERTO CLAVER	**CONTRATO DE OBRA:**	N° 050-2025	**PERIODO:** 23 DE ENERO 2026 AL 22 DE FEBRERO / 23 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO / 06 DE ABRIL AL 10 DE ABRIL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: INGECOR S.A.S	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	N° 052-2025	
SUPERVISOR CONTRATO: DOIVER ANTONIO NISPERUZA **(EDTB)**	**FECHA DE PRESENTE ACTA:**	10/04/26	

								% EJECUTADO	14,95%	% ACUMULADO	89,99%	
	PRESUPUESTO OFICIAL					**CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No1**		**CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA PARCIAL N° 3)**			**CANTIDADES ACUMULADAS**	
No.	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT**	**VR. TOTAL**		**CANT**	**VR. TOTAL**
5,0	**Sistema de Red Alcantarillado Pluvial y Elementos de Conexión**											
5,1	Suministro, transporte é instalacion de Tuberia PVC Pluvial Ø 8", incluye maquinaria, equipos e insumos	ml	35,77	$ 179.175,14	$ 6.409.095,00	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -
5,2	Suministro, transporte é instalacion de Tuberia PVC Pluvial Ø 24", incluye maquinaria, equipos e insumos	ml	52,89	$ 748.063,84	$ 39.565.097,00	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -
5,3	Suministro, transporte é instalacion de arena para protección de tubería, incluye maquinarias y equipos	m3	42,83	$ 76.109,50	$ 3.259.862,00	31,24	$ 2.377.610,00	0,00	$ -		31,24	$ 2.377.610,00
5,4	Suministro y transporte de material para Pozos de Inspección D=1.20	ml	1,50	$ 780.265,17	$ 1.170.398,00	1,32	$ 1.029.950,00	0,00	$ -		1,32	$ 1.029.950,00
5,5	Suministro y transporte de material para Placas de fondo en pozos de inspección D=1.20, e=0.20	und	1,00	$ 555.756,29	$ 555.756,00	1,00	$ 555.756,00	0,00	$ -		1,00	$ 555.756,00
5,6	Suministro y transporte de material para Tapas en pozos de inspección D=1.20, e=0.20, con tapa de aro con núcleo de concreto	und	1,00	$ 1.037.411,00	$ 1.037.411,00	1,00	$ 1.037.411,00	0,00	$ -		1,00	$ 1.037.411,00
5,7	Sumidero Transversal ST-40	ml	22,50	$ 1.607.739,30	$ 36.174.134,00	30,01	$ 48.253.401,00	0,00	$ -		19,96	$ 32.089.833,00
5,8	Excavaciones varias en material común en seco a mano (para estructura de entrega final)	m3	32,00	$ 63.760,02	$ 2.040.321,00	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -
5,9	Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI) para solados, (para estructura de entrega final)	m3	0,26	$ 1.009.794,37	$ 260.527,00	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -
5,10	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) (para estructura de entrega final)	m3	2,38	$ 1.266.779,89	$ 3.009.869,00	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -
5,11	Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa- (para estructura de entrega final)	kg	112,92	$ 10.799,49	$ 1.219.462,00	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -
5,12	Relleno para Estructuras con recebo - (para estructura de entrega final)	m3	19,20	$ 121.093,02	$ 2.324.986,00	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -
				Sub - Total	**$ 97.026.918,00**		**$ 53.254.128,00**		**$ -**			**$ 37.090.560,00**
6,0	**Sistema de Red Acueducto y Elementos de Conexión**											
6,1	Suministro, transporte e instalacion de Tuberia PVC U.M. RDE 21 Ø 3", incluye maquinaria, equipos e insumos	ml	934,39	$ 129.741,28	$ 121.228.954,00	889,83	$ 115.448.175,00	0,00	$ -		889,83	$ 115.448.175,00
6,2	Suministro, transporte e instalacion de acometida domiciliaria en manguera PF de 16 mm	ml	550,00	$ 17.544,74	$ 9.649.608,00	753,06	$ 13.212.243,00	0,00	$ -		753,06	$ 13.212.243,00
6,3	Suministro, transporte e instalacion de kit de derivación domiciliaria en PVC de diámetro 3" x 1/2". Incluye accesorios	und	110,00	$ 62.360,49	$ 6.859.654,00	153,00	$ 9.541.155,00	0,00	$ -		153,00	$ 9.541.156,00
6,4	Suministro, transporte e instalacion de Valvula de Compuerta Elástica de 3" HD JR	und	6,00	$ 483.866,91	$ 2.903.201,00	4,00	$ 1.935.468,00	0,00	$ -		4,00	$ 1.935.468,00
6,5	Suministro, transporte e instalacion Union universal HD 3", incluye accesorios y demas elementos de fijacion	und	18,00	$ 359.801,23	$ 6.476.422,00	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -
6,6	Suministro, transporte e instalacion de accesorio en codo de 45° - 3" RDE 21 PVC ó Similar	und	4,00	$ 121.385,92	$ 485.544,00	1,00	$ 121.386,00	0,00	$ -		1,00	$ 121.386,00
6,7	Suministro, transporte é instalacion de arena para protección de tubería, incluye maquinarias y equipos	m3	288,89	$ 76.109,50	$ 21.987.093,00	135,82	$ 10.337.111,00	0,00	$ -		135,82	$ 10.337.111,00
6,8	Suministro, transporte e instalacion de accesorio en Valvula ventosa 3" en HD JR	und	2,00	$ 682.486,57	$ 1.364.973,00	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -
6,9	Suministro, transporte e instalacion de Tuberia PVC U.M. RDE 21 Ø 8", incluye maquinaria, equipos e insumos	ml	299,20	$ 343.861,16	$ 102.883.258,00	316,30	$ 108.763.353,00	0,00	$ -		316,30	$ 108.763.353,00
6,10	Suministro, transporte e instalacion de accesorio en tapon de 8"	und	2,00	$ 286.394,92	$ 572.790,00	1,00	$ 286.395,00	0,00	$ -		1,00	$ 286.395,00
6,11	Suministro, transporte e instalacion de Accesorio en Tee HD JR para PVC de 8"X3"	und	1,00	$ 1.808.828,31	$ 1.808.828,00	1,00	$ 1.808.828,00	0,00	$ -		1,00	$ 1.808.828,00
				Sub - Total	**$ 276.220.325,00**		**$ 261.454.114,00**		**$ -**			**$ 261.454.115,00**
7,0	**Señalizacion y Demarcaciones**											
7,1	Suminstro e instalación de elementos de Señales verticales en fondo reflectivo Tipo Alta Intensidad con tablero en lámina cal 16, terminados en pintura electrostática blanca. (Manual Señalizacion MinT Colombia 2015)	und	37,00	$ 617.235,46	$ 22.837.712,00	34,00	$ 20.986.006,00	0,00	$ -		0,00	$ -
7,2	Concreto de 4000 psi para resalto vehicular, con protuberancia de 10 cm y longitud a lo largo de la calzada (incluye refuerzo)	ml	17,20	$ 806.510,66	$ 13.871.983,00	16,64	$ 13.416.547,00	0,00	$ -		0,00	$ -
				Sub - Total	**$ 36.709.695,00**		**$ 34.402.553,00**		**$ -**			**$ -**

MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 3

PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

En el Municipio de El Bagre, a los (10) dias del mes de abril de 2026 se reunieron en las oficinas de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB, por parte del contratista de Obra CONSORIO PUERTO CALVER. Representando WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ, por parte del contratista de interventoria JORGE ANDRES SOTO CALLE y como SUPERVISOR, el ING. DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ, Director Tecnico de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB; con el fin de elaborar el ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 3, realizado a la fecha por el contratista de Obra y recibido a satisfacion por parte de la interventoria y la supervision, teniendo en cuenta las especificaciones y cantidades, segun lo estipulado en el contrato de la referencia.

	CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO PUERTO CLAVER	**CONTRATO DE OBRA:**	N° 050-2025	**PERIODO:** 23 DE ENERO 2026 AL 22 DE FEBRERO / 23 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO / 06 DE ABRIL AL 10 DE ABRIL
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: INGECOR S.A.S	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	N° 052-2025	
	SUPERVISOR CONTRATO: DOIVER ANTONIO NISPERUZA **(EDTB)**	**FECHA DE PRESENTE ACTA:**	10/04/26	

PRESUPUESTO OFICIAL

No.	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No1		% EJECUTADO 14,95% CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA PARCIAL N° 3) CANT	VR. TOTAL	% ACUMULADO 89,99% CANTIDADES ACUMULADAS CANT	VR. TOTAL
	ITEMS NO PREVISTOS						**$ 442.913.621,00**		**$ -**		**$ 378.170.971,35**
N.P 1	Suministro e instalacion de Bordillos de concreto de 3000 Psi, para confinamiento de calzada, dimensiones h=0.15, e=0.15 (bordillo sobrepuesto en Placas de Pavimento Dilatados cada placa)	ml		$ 67.913,62		1578,59	$ 107.207.557,00	0,00	$ -	631,29	$ 42.873.164,27
N.P 2	Suministro, transporte é instalacion de Tuberia PVC Alcantarillado Ø6", incluye maquinaria, equipos e insumos, y lubricante para unión mecánica	ml		$ 154.193,14		654,22	$ 100.876.097,00	0,00	$ -	654,22	$ 100.876.096,66
N.P 3	Suministro, transporte é instalacion de Tuberia PVC Alcantarillado Ø 8", incluye maquinaria, equipos e insumos, y lubricante para unión mecánica	ml		$ 179.175,14		583,44	$ 104.537.585,00	0,00	$ -	583,44	$ 104.537.584,78
N.P 4	Suministro, transporte é instalacion de Tuberia PVC Alcantarillado Ø 12", incluye maquinaria, equipos e insumos, y lubricante para unión mecánica	ml		$ 265.309,91		313,32	$ 83.126.900,00	0,00	$ -	313,32	$ 83.126.900,18
N.P 5	Suministro, transporte é instalacion de Tuberia PVC Pluvial Ø 24", incluye maquinaria, equipos e insumos, y lubricante para unión mecánica	ml		$ 725.446,43		18,00	$ 13.058.036,00	0,00	$ -	18,00	$ 13.058.035,69
N.P 6	Suministro, transporte é instalacion de Tuberia PVC Pluvial Ø 20", incluye maquinaria, equipos e insumos, y lubricante para unión mecánica	ml		$ 545.923,09		58,28	$ 31.814.924,00	0,00	$ -	58,28	$ 31.814.923,91
N.P 7	Demolición de estructura, incluye retiro.	m2		$ 87.640,27		26,16	$ 2.292.522,00	0,00	$ -	21,50	$ 1.884.265,86

COSTOS DIRECTOS	**$ 2.699.842.970,00**		**$ 2.699.842.970,00**		**$ 391.784.899,08**		**$ 2.453.819.808,66**
AIU **29,67%**	**$ 800.921.930,79**	29,67%	**$ 800.921.930,79**	28,67%	**$ 112.307.102,35**	28,67%	**$ 703.399.730,45**
TOTAL OBRA	**$ 3.500.764.900,79**		**$ 3.500.764.900,79**		**$ 504.092.001,43**		**$ 3.157.219.539,11**
Guia Ambiental (PAGA)	$ 40.492.216,00		$ 40.492.216,00		$ 13.497.405,33		$ 33.743.513,33
Plan Manejo Transito (PMT)	$ 64.082.710,00		$ 64.082.710,00		$ 21.360.903,33		$ 53.402.258,33
TOTAL OBRA + PAGA + PMT	**$ 3.605.339.826,79**		**$ 3.605.339.826,79**		**$ 538.950.310,10**		**$ 3.244.365.310,78**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 3.605.339.826,79**	
ANTICIPO:	**$ 0,00**	**0,00%**
VALOR A AMORTIZAR EN PRESENTE ACTA:	**$ 0,00**	**0,00%**
VALOR ADICION DEL CONTRATO:	**$ 0,00**	**0,00%**
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA PARCIAL N°: 3	**$ 538.950.310,10**	**14,95%**
VALOR TOTAL FALTANTE POR EJECUTAR:	**$ 360.974.516,01**	**10,01%**
TOTAL A PAGAR EN ACTA PARCIAL N° 3:	**$ 538.950.310,10**	**14,95%**

VALOR EN LETRAS SON:

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS Y DIEZ CENTAVOS M/CTE

Elaboro:
EL CONTRATISTA

Firma:
Nombre: **WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ**
Representante Legal o su Apoderado
Contratista de Obra: **CONSORCIO PUERTO CALVER**
Matrícula No /C.C: 98.650.618

Aprobo:
INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: **JORGE ANDRES SOTO CALLE**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoria: **INGENIERÍA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S**
Matrícula No /C.C: 1.143.373.420

VoBo:

Firma:
Nombre: **DOIVER ANTONIO NISPERUZA**
Supervisor, Director Tecnico
Supervisor (EDTB)
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO PUERTO CLAVER
NIT 901.982.342-5
CRA 12A 2345
Tel: 3104057905
Planeta Rica - Colombia
consorcio050puertoclaver@gmail.com

No. FV 3

				Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
Señores	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIA EL BAGRE- EDTB				
NIT	901.526.561-7	**Teléfono**	(604) 3113590471		
Dirección	cra 49 n 48a-56	**Ciudad**	El Bagre - Colombia	2026-04-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL N° 3. Objeto:CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO YOBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO,SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDEEL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª,EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURALDEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	1.00	538,950,310.10

Total items: 1

Total Bruto	538,950,310.10
Total a Pagar	538,950,310.10

Valor en Letras:
Quinientos treinta y ocho millones novecientos cincuenta mil trescientos diez pesos m/cte con diez cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia	$	538,950,310.10

Observaciones:

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

ANEXO 15. ACTAS DE COMITÉ.

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA	16	3	2026
	(Día)	(Mes)	(Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 18
(La numeración será consecutiva)

CONTRATO DE OBRA No. 050 **DE** 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO CLAVER

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 052 **DE** 2025

INTERVENTOR: INGECOR S.A.S

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Do...r Nisperuza	Director Técnico	EDTB
Eder del toro	Director de obra	CONSORCIO PUERTO CLAVER
Jorge Soto	Director de Interventoria	INGECOR S.A.S
Carlos Andres Arrieta	Secretario Obras Publicas	SUPERVISOR ALCALDIA MUNICIPAL

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Suspension N° 2

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA

Orden publico y suspension del contrato 050/2025 y 052/2025

Toma de decisiones y observaciones propias dada por cada una de las partes que intervienen en el comité

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo las 3:00 pm; se da inicio al comité técnico por parte de la EDTB, presentando un cordial saludo a fin de cumplir con la programación prevista para el desarrollo de la reunión.

Se so... a todos los participantes del comité, que sea muy específicos en los comentarios, observaciones y con ello avanzar en el objetivo primordial de este comite generar compromisos y ton... decisiones que sirva al avance de la obra y lograr una reunión más productiva.

El Director de Obra del contratista (Ing. Toro), expresa que el día hoy 16 de marzo de 2026 se tenía previsto la llegada de cemento, acero y agregados pétreos pero los mismos se encuentran bloqueados por el paro minero que comenzó hoy, y de acuerdo comunicaciones efectuadas por los proveedores no existe acceso hacia el municipio debido a los represamientos desde tempranas horas de la mañana llevado a cabo por la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba del país.

Ing. Soto (Director de Interventoría) expone que a través de las redes sociales Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba del país emitió un comunicado y el cual se adjunta a este comité y en donde se cita textualmente:

"Asimismo, se informa a la comunidad que se garantizará el paso de un corredor humanitario, con el fin de no afectar situaciones de emergencia ni necesidades prioritarias de la población.

Dentro del corredor humanitario podrán movilizarse:

- ***Ambulancias y misión médica***
- ***Vehículos que transporten pacientes o personas con citas médicas***
- ***Adultos mayores, niños y mujeres embarazadas***
- ***Vehículos de organismos de socorro (Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos)***
- ***Transporte de medicamentos e insumos médicos***
- ***Vehículos funerarios***
- ***Transporte de combustibles***
- ***Casos humanitarios o de urgencia debidamente justificados***
- **Carros recolectores de residuos sólidos (basura)**
- ***Vehículos que transporten semovientes..."***

Ing. Doiver (Supervisor EDTB), toma la palabra y acota que no existe entre el corredor humanitario lo relacionado a los materiales y en la cual la llegada de estos al municipio no es prioritario, además agrega que con los acontecimientos llevados a cabo en anteriores Paros Mineros en la región del Bajo Cauca por la mesa minera el mismo tiende a tomar con alteración de orden público.

El Secretario de Obras Públicas (Arq. Arrieta), manifiesta que desde la administración municipal trabajara de manera articulada para generar espacios que permitan avanzar a través de

Ing Doiver (EDTB) e Ing (Soto), estan en concordancia con los argumentos plasmados por el contratista y con el fin de salvaguardar al personal tanto de obra como de interventoria y a la espera que las condiciones de seguridad sean las idoneas en el municipio para dar comienzo a los contrato 050/2025 y 052/2025

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA	16	3	2026
	(Día)	(Mes)	(Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

OBSERVACIONES
(En este especio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)


FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventora suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Doiver Nisperuza	Doiver Nisperuza.
Eder Del Toro	
Jorge Andrés Soto Calle	
Carlos Andres Arrieta	

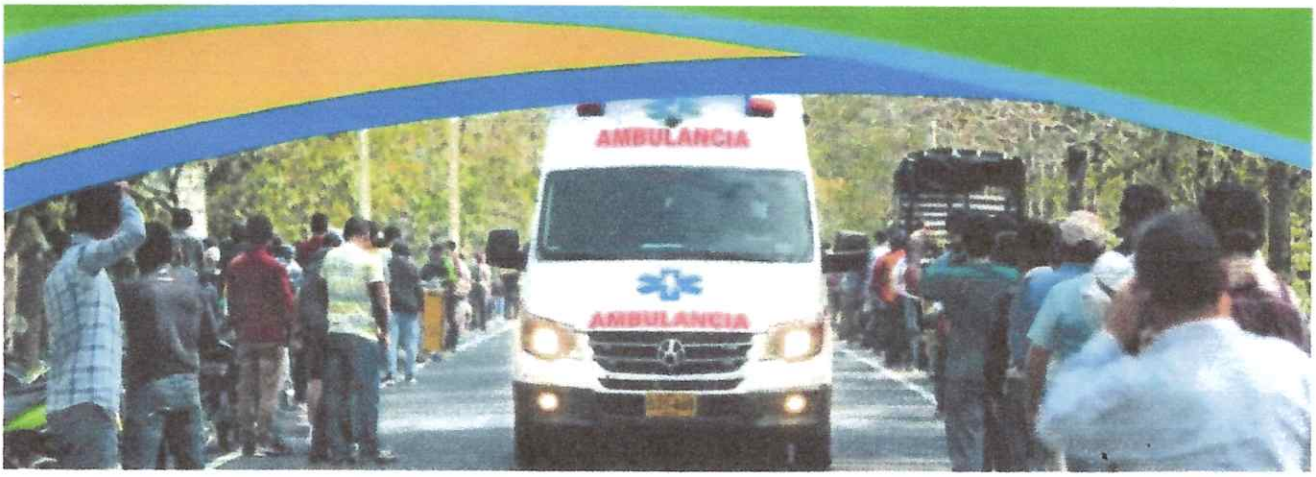

COMUNICADO

A LA OPINIÓN PÚBLICA

(Comunicado #5: 16/03/2026 Hora 11:00 am)

La Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba informa a la comunidad en general que a partir del día de hoy se da inicio al paro minero en el territorio, como una acción de las comunidades mineras para exigir soluciones reales frente a la grave problemática que enfrenta el sector.

Esta decisión surge ante la falta de respuestas efectivas del Gobierno Nacional frente a las necesidades de miles de familias que dependen de la actividad minera para su sustento.

La Mesa Minera reitera que esta jornada se desarrollará en el marco de la organización comunitaria y la defensa del trabajo minero, buscando llamar la atención de las autoridades para que se generen espacios de diálogo y soluciones estructurales para la región.


Asimismo, ***se informa a la comunidad que se garantizará el paso de un corredor humanitario, con el fin de no afectar situaciones de emergencia ni necesidades prioritarias de la población.***

Dentro del corredor humanitario podrán movilizarse:

- **Ambulancias y misión médica**
- **Vehículos que transporten pacientes o personas con citas médicas**
- **Adultos mayores, niños y mujeres embarazadas**
- **Vehículos de organismos de socorro (Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos)**
- **Transporte de medicamentos e insumos médicos**
- **Vehículos funerarios**
- **Transporte de combustibles**
- **Casos humanitarios o de urgencia debidamente justificados**
- **Carros recolectores de residuos sólidos (basura)**
- **Vehículos que transporten semovientes**

La Mesa Minera hace un llamado a la comunidad para mantener el respeto, la calma y la solidaridad durante el desarrollo de esta jornada.
Reiteramos que nuestra lucha es por la defensa del trabajo digno de las comunidades mineras del territorio.

Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba

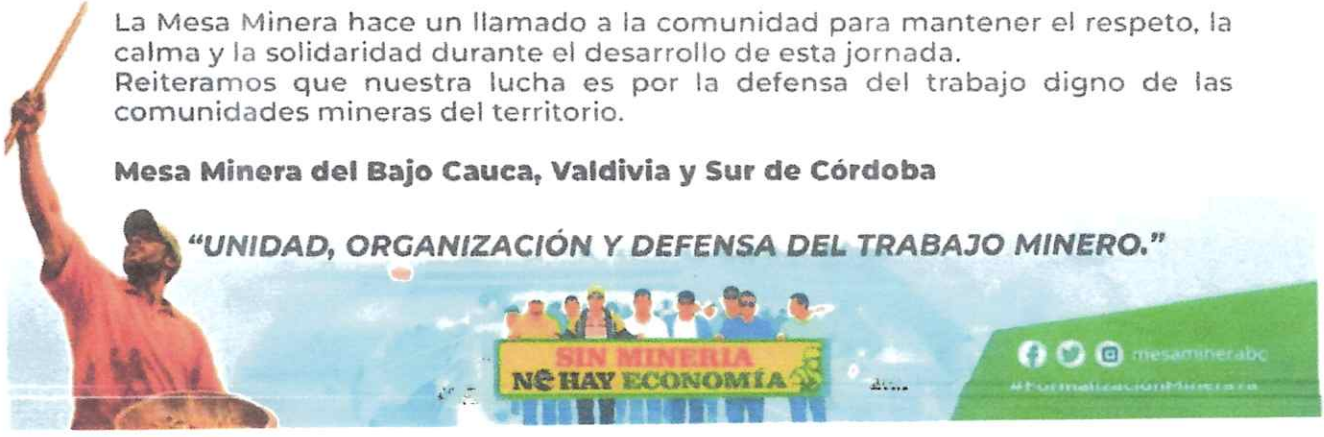

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

	FECHA	30 (Día)	3 (Mes)	2026 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 19
(La numeración será consecutiva)

CONTRATO DE OBRA No. 050 **DE** 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO CLAVER

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 052 **DE** 2025

INTERVENTOR: INGECOR S.A.S

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Doiver Nisperuza	Director Técnico	EDTB
Eder del toro	Director de obra	CONSORCIO PUERTO CLAVER
Jorge Soto	Director de Interventoria	INGECOR S.A.S
Carlos Andres Arrieta	Secretario Obras Publicas	SUPERVISOR ALCALDIA MUNICIPAL

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Ampliacion No1 Suspension N° 2

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Ampliacion No1 050/2025 y 052/2025

Toma de decisiones y observaciones propias dada por cada una de las partes que intervienen en el comité

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo las 8:00 am; se da inicio al comité técnico por parte de la EDTB, presentando un cordial saludo a fin de cumplir con la programación prevista para el desarrollo de la reunión.

Se solicita a todos los participantes del comité, que sea muy específicos en los comentarios, observaciones y con ello avanzar en el objetivo primordial de este comite generar compromisos y toma de decisiones que sirva al avance de la obra y lograr una reunión más productiva.

El Director de Obra del contratista (Ing. Toro), comunica que aún no es posible la reanudación del contrato 050/2025, ya que los proveedores de cemento, acero, agregados pétreos han notificado de que los despachos serán el día 06 de abril, esto debido al paro minero llevado a cabo por la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba del país, aun cuando se llevo a cabo el levantamiento de este hay represamiento de despachos de materiales.

Ing. Soto (Director de Interventoria) expone que la problemática expuesta por el contratista es debido a doce (12) días de paro, y si a esto se le suma que los días de asueto propios de la semana mayor, esta interventoria esta de acuerdo con llevar a cabo una ampliación de la SUSPENSIÓN No2 por seis (06) días y la reanudación del contrato 050/2025 y 052/2025 el día seis (06) del mes de abril en el que se espera se normalicen los suministros de parte de los diferentes proveedores, y que le permitirá al contratista reprogramar todas las actividades, actualizar los pedidos, realizar las negociaciones comerciales para las compras y despacho de los materiales y que este adelante las gestiones pertinentes.

Ing. Doiver (Supervisor EDTB), toma la palabra y acota que dado lo anterior, y teniendo en cuenta todos los acontecimientos que han ocurrido en el Bajo Cauca Antioqueño y Córdoba, aprueba la AMPLIACION No1 a la SUSPENSION No1 por seis (06) días y con inicio del contrato de obra el día 06 de abril de la presente anualidad.

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA	6	4	2026
	(Día)	(Mes)	(Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. **20**
(La numeración será consecutiva)

CONTRATO DE OBRA No. 050 **DE** 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO CLAVER

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 052 **DE** 2025

INTERVENTOR: INGECOR S A S

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Dorver Nisperuza	Director Técnico	EDTB
Eder del toro	Director de obra	CONSORCIO PUERTO CLAVER
Jorge Soto	Director de Interventoria	INGECOR S A S
Carlos Andres Arrieta	Secretario Obras Publicas	SUPERVISOR ALCALDIA MUNICIPAL

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Acta de Reinicio a la SUSPENSION No2

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Reinicio No2 050/2025 y 052/2025

Toma de decisiones y observaciones propias dada por cada una de las partes que intervienen en el comité

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo las 7:00 am, se da inicio al comité técnico por parte de la EDTB, presentando un cordial saludo a fin de cumplir con la programación prevista para el desarrollo de la reunión

Se solicita a todos los participantes del comité, que sea muy específicos en los comentarios, observaciones y con ello avanzar en el objetivo primordial de este comite generar compromisos y toma de decisiones que sirva al avance de la obra y lograr una reunión más productiva.

Ing. Dolver (Supervisor EDTB), expone que una vez transcurrido el plazo de la suspensión No2 con su ampliación, tanto el contratista de interventoria como de obra se deben reiniciar, pues se considera que ya los hechos que motivaron la suspensión de los contratos 050/2025 y 052/2025 han sido superados, especialmente el despacho de materiales (cemento, acero, agregados pétreos)

Arq. Arneta (Secretario de Obras Publicas), enfatiza que CONSORCIO PUERTO CLAVER e INGECOR S.A.S debe ampliar las vigencias y coberturas de las pólizas constituidas inicialmente y allegarlas al ente contratante para su revisión y respectiva aprobación

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA: 6 (Día) 4 (Mes) 2026 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventora suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Dolver Nisperuza	Dolver Nisperuza
Eder Del Toro	
Jorge Andrés Soto Calle	
Carlos Andres Arreta	

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO PUERTO CLAVER

Versión: 01

OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. SISTEMA DE ALCANTARILLADO. SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"
CONTRATO No.	052/2025
CONTRATISTA	CONSORCIO PUERTO CLAVER
INTERVENTOR	INGECOR S.A.S
ITEM	Excavacion mecanica varias sin clasificar, incluye retiro
UNIDAD	M3

LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	MH		ABCISAS		DIMENSIONES				Diametro promedio De cadaca	Espesor Pavimento (m)	CANTIDAD	VOLUMEN (M3)	UNIDAD	TOTAL
		INCIAL	FINAL	INCIAL	FINAL	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área (m2)						
SECTOR 2	CALZADA			k0+740	K0+810			0.70				1.00	244.5	M3	244.49
				K0+290	K0+310			0.70				1.00	35.9	M3	35.89
														CALZADA	280,38
	ST-40 (2)			K0+296,70		4.97	0.81	1.08			0.70	1.00	1,53	M3	1,53
														ST-40	1,53
														TOTAL EXCAVACION SECTOR 2	281,90

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO PUERTO CLAVER

Versión: 01

OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"
CONTRATO No.	050/2025
CONTRATISTA	CONSORCIO PUERTO CLAVER
INTERVENTOR	INGECOR S.A.S
ITEM	Mejoramiento de subrasante con material seleccionado y compactado, (Incluye trasporte)

UNIDAD: M3

LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABCISAS		DIMENSIONES			Área (m2)	CANTIDAD	VOLUMEN (M3)	UNIDAD	TOTAL
		INCIAL	FINAL	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)					
SECTOR 1	CALZADA	k0+220	K0+290			0,30			105,00	M3	105,00
										TOTAL MEJORAMIENTO SECTOR 1	**105,00**
SECTOR 2	CALZADA	K0+740	K0+810						105,00	M3	105,00
	CALZADA	K0+290	K0+310						15,00	M3	15,00
										TOTAL MEJORAMIENTO SECTOR 2	**120,00**

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO PUERTO CLAVER

Versión 01

OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"
CONTRATO No.	050/2025
CONTRATISTA	CONSORCIO PUERTO CLAVER
INTERVENTOR	INGECOR S.A.S
ITEM	Suministro e instalación de concreto hidráulico, MR=40 Kg/cm2, para losas de pavimento de espesor 20 cm
UNIDAD	M2

LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABCISAS		DIMENSIONES			Área (m2)	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
		INCIAL	FINAL	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)				
SECTOR 1	CALZADA	K0+177,93	K0+285,14	107,29		0,20	533,28	1,00	M2	533,28
	CALZADA	K0+285,97	k0+296	9,35		0,20	44,36	1,00	M2	44,36
									TOTAL CONCRETO MR=40 KG/M2 SECTOR 1	577,64
SECTOR 2	CALZADA	K0+297,08	K0+318,07	90,85		0,2	90,85	1,00	M2	90,85
	CALZADA	K0+632,79	K0+637,82	5,02		0,2	24,19	1,00	M2	24,19
	CALZADA	K0+639,24	K0+647,82	8,60		0,2	41,96	1,00	M2	41,96
	CALZADA (COSTADO IZQUIERDO)	K0+699,77	K0+737,81	38,04		0,2	95,98	1,00	M2	95,98
	CALZADA	K0+737,81	K0+812	70,07		0,2	362,67	1,00	M2	362,67
									TOTAL CONCRETO MR=40 KG/M2 SECTOR 2	615,64
									Suministro e instalación de concreto hidráulico, MR=40 Kg/cm2, para losas de pavimento de espesor 20 cm	1.193,28

ESQUEMA

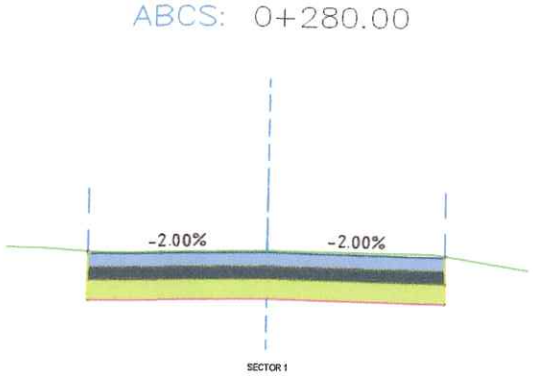

Elaboro:
EL CONTRATISTA

WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ
R/L. CONSORCIO PUERTO CLAVER
CONTRATISTA DE OBRA

Aprobo:
INTERVENTORIA

JORGE ANDRES SOTO CALLE
R/L INGECOR S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

VoBo:

DOIVER ANTONIO NISPERUZA
SUPERVISOR - EDTB
CONTRATANTE

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO PUERTO CLAVER

Versión 01


OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"
CONTRATO No.	050/2025
CONTRATISTA	CONSORCIO PUERTO CLAVER
INTERVENTOR	INGECOR S.A.S
ITEM	Acero de refuerzo grado 60
UNIDAD	KG

LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABCISAS INICIAL	ABCISAS FINAL	ITEM	DESCRIPCION	Área a Intervenir (m2)	#	Varilla (Kg/m)	Longitud (m)	Kg Total
SECTOR 1	CALZADA	K0+177,93	K0+285,14	Refuerzo Longitudinal Barra de Anclaje	L= 1.00 m #4@1,20m		1/2"	0,994	89,41	88,87
	CALZADA	K0+285,97	k0+296	Refuerzo Longitudinal Barra de Anclaje	L= 1.00 m #4@1,20m		1/2"	0,994	7,79	7,75
	CONEXIÓN CALZADA - B.C CALLE 36 (COSTADO DERECHO)	K0+173,95	K0+190	Refuerzo Longitudinal Barra de Anclaje	L= 1.00 m #4@1,20m		1/2"	0,994	14,63	14,54
	CONEXIÓN CALZADA - B.C CARRERA 32 (COSTADO IZQUIERDO)	K0+193,94	K0+203,10	Refuerzo Longitudinal Barra de Anclaje	L= 1.00 m #4@1,20m		1/2"	0,994	8,67	8,62
	CONEXIÓN CALZADA B.C CALLE 35 (COSTADO DERECHO)	K0+285,97	K0+291,41	Refuerzo Longitudinal Barra de Anclaje	L= 1.00 m #4@1,20m		1/2"	0,994	5,56	5,52
	CONEXIÓN CALZADA CALLE CARRERA 32	K0+285,97	k0+296,40	Refuerzo Longitudinal Barra de Anclaje	L= 1.00 m #4@1,20m		1/2"	0,994	11,12	11,05
									SECTOR 1	136,35
SECTOR 2	CALZADA	k0+296,40	K0+312,12	Refuerzo Longitudinal Barra de Anclaje	L= 1.00 m #4@1,20m		1/2"	0,994	12,54	12,46
	CALZADA	K0+632,79	K0+637,82	Refuerzo Longitudinal Barra de Anclaje	L= 1.00 m #4@1,20m		1/2"	0,994	4,18	4,16
	CALZADA	K0+639,24	K0+647,82	Refuerzo Longitudinal Barra de Anclaje	L= 1.00 m #4@1,20m		1/2"	0,994	7,17	7,12
	CALZADA	K0+737,81	k0+812	Refuerzo Longitudinal Barra de Anclaje	L= 1.00 m #4@1,20m		1/2"	0,994	61,73	61,36
	CONEXIÓN CALZADA B.C CARRERA 29A (COSTADO IZQUIERDO)	K0+796,04		Refuerzo Longitudinal Barra de Anclaje	L= 1.00 m #4@1,20m		1/2"	0,994	16,44	16,35
									SECTOR 2	101,45
									REFUERZO TRANSVERSAL	237,80
SECTOR 1	CALZADA	K0+177,93	K0+285,14	Refuerzo Transversal Pasadores de carga	L= 40 cm #8@30cm		1"	3,978	238,00	946,75
	CALZADA	K0+285,97	k0+296	Refuerzo Transversal Pasadores de carga	L= 40 cm #8@30cm		1"	3,978	19,68	78,28
									SECTOR 1	1.025,03
SECTOR 2	CALZADA	k0+296,40	K0+312,12	Dovelas	L= 40 cm #8@30cm		1"	3,978	30,31	120,59
	CALZADA	K0+312,12	K0+318,07	Dovelas	L= 40 cm #8@30cm		1"	3,978	6,82	27,13
	CALZADA	K0+632,79	K0+637,82	Dovelas	L= 40 cm #8@30cm		1"	3,978	6,48	25,79
	CALZADA	K0+639,24	K0+647,82	Dovelas	L= 40 cm #8@30cm		1"	3,978	13,35	53,09
	CALZADA (COSTADO IZQUIERDO)	K0+699,77	K0+737,81	Dovelas	L= 40 cm #8@30cm		1"	3,978	40,35	160,52
	CALZADA	K0+737,81	K0+812	Dovelas	L= 40 cm #8@30cm		1"	3,978	155,82	619,83
									SECTOR 2	1.006,96
									REFUERZO LONGITUDINAL	2.032,00
									TOTA ACERO DE REFUERZO	2.269,80
SECTOR 1	CALZADA (COSTADO IZQUIERDO)	K0+182,94	K0+188,5	PLACA IRREGULAR	#4@0,20m		1/2"	0,994	130,22	129,44
	CALZADA (COSTADO DERECHO)	K0+197,5	K0+200,51	PLACA IRREGULAR	#4@0,20m		1/2"	0,994	71,73	71,30
	CALZADA (COSTADO IZQUIERDO)	K0+285,97	k0+296	PLACA IRREGULAR	#4@0,20m		1/2"	0,994	132,31	131,52
	CALZADA (COSTADO DERECHO)	K0+285,97	K0+288,4	PLACA IRREGULAR	#4@0,20m		1/2"	0,994	68,57	68,15
	CALZADA (COSTADO DERECHO)	K0+293,80	k0+296	PLACA IRREGULAR	#4@0,20m		1/2"	0,994	71,73	71,30
									SECTOR 1	471,71
									REFUERZO PLACAS IRREGULARES	471,71

ESQUEMA





DETALLE DE PASAJUNTAS LONGITUDINALES DIMENSIONES

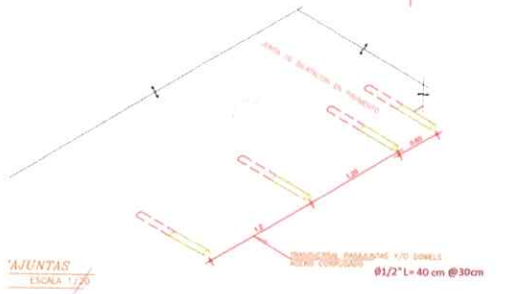

'AJUNTAS

SECTOR 1	MH6	K0+185,51		#4@0,20m		1/2"	0,994	137,701	136,87
	MH7	K0+200,74		#4@0,20m		1/2"	0,994	63,445	63,06
	MH8	K0+290		#4@0,20m		1/2"	0,994	60,738	60,37
								MH	260,31
	P(1)	K0+290		#4@0,20m		1/2"	0,994	64,028	63,64
								POZO PLUVIAL	63,64
								SECTOR 1	323,96
SECTOR 2	MH14	K0+637,2		#4@0,20m		1/2"	0,994		126,00
	MH16	K0+739,0		#4@0,20m		1/2"	0,994		108,26
	MH17	K0+794,70		#4@0,20m		1/2"	0,994		134,53
								SECTOR 2	368,80
								TOTAL REFUERZO EN PLACAS IRREGULARES EN MH	368,80
SECTOR 1	MH6	K0+185,51		#4@0,20m		1/2"	0,994	48,200	47,91
	MH7	K0+200,74		#4@0,20m		1/2"	0,994	48,200	47,91
	MH8	K0+290		#4@0,20m		1/2"	0,994	48,200	47,91
								MH	143,73
	P(1)	K0+290		#4@0,20m		1/2"	0,994	48,200	47,91
								POZO PLUVIAL	47,91
								SECTOR 1	191,64
SECTOR 2	MH14	K0+637,2		#4@0,20m		1/2"	0,994	48,200	47,91
	MH16	K0+739,0		#4@0,20m		1/2"	0,994	48,200	47,91
	MH17	K0+794,70		#4@0,20m		1/2"	0,994	48,200	47,91
								SECTOR 2	143,73
								TOTAL REFUERZO EN LOSA SUPERIOR DEL MH	335,37
SECTOR 1	COSTADO DERECHO	K0+190	K0+285,12	ACERO REFUERZO TRANSVERSAL	#3@0,50m		3/8"	0,559	66,218	37,02
	COSTADO IZQUIERDO	K0+174,87	K0+191,52	ACERO REFUERZO TRANSVERSAL	#3@0,50m		3/8"	0,559	17,802	9,95
	COSTADO IZQUIERDO	K0+205,8	k0+294	ACERO REFUERZO TRANSVERSAL	#3@0,50m		3/8"	0,559	100,148	55,98
									ACERO TRANSVERSAL	102,95
	COSTADO DERECHO	K0+190	K0+285,12	ACERO REFUERZO LONGITUDINAL	#3		3/8"	0,559	123,238	68,89
	COSTADO IZQUIERDO	K0+174,87	K0+191,52	ACERO REFUERZO LONGITUDINAL	#3		3/8"	0,559	33,132	18,52
	COSTADO IZQUIERDO	K0+205,8	k0+294	ACERO REFUERZO LONGITUDINAL	#3		3/8"	0,559	186,387	104,19
									ACERO LONGITUDINAL	191,60
									ACERO BORDILLO SECTOR 1	294,55
SECTOR 2	COSTADO DERECHO	K0+296,40	K0+318,07	ACERO REFUERZO TRANSVERSAL	#3@0,50m		3/8"	0,559	26,10	14,59
	COSTADO IZQUIERDO	k0+294	K0+318,07	ACERO REFUERZO TRANSVERSAL	#3@0,50m		3/8"	0,559	25,18	14,08
									ACERO TRANSVERSAL	28,67
	COSTADO DERECHO	K0+296,40	K0+318,07	ACERO REFUERZO LONGITUDINAL	#3		3/8"	0,559	48,581	27,16
	COSTADO IZQUIERDO	k0+294	K0+318,07	ACERO REFUERZO LONGITUDINAL	#3		3/8"	0,559	46,872	26,20
									ACERO LONGITUDINAL	53,36
									ACERO BORDILLO SECTOR 2	82,03
									TOTAL REFUERZO EN BORDILLOS	376,58
									Acero de refuerzo grado 60	4.146,21

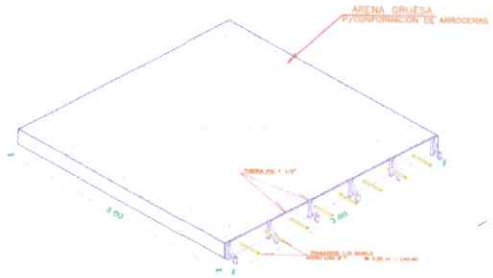

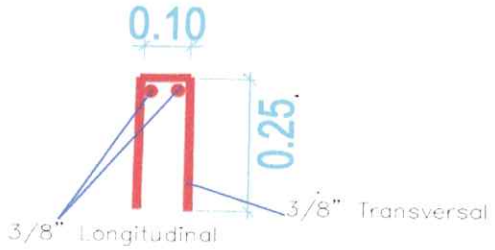

Elaboro:
EL CONTRATISTA

WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ
R/L. CONSORCIO PUERTO CLAVER
CONTRATISTA DE OBRA

Aprobo:
INTERVENTORIA

JORGE ANDRES SOTO CALLE
R/L. INGECOR S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

VoBo:

DOIVER ANTONIO NISPERUZA
SUPERVISOR - EDTB
CONTRATANTE

DESPIECE

Versión 01

OBJETO: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

ASUNTO: PASADORES DE CARGA SECTOR 1 Y 2 — INTERVENTORIA: INGECOR S.A.S

POS.	DETALLE	# (No.)	Nº de Pza	Long. De la Pieza	ø 1/4" (#2)	ø 3/8" (#3)	ø 1/2" (#4)	ø 5/8" (#5)	ø 3/4" (#6)	ø 7/8" (#7)	ø 1" (#8)	ø 1 1/8" (#9)	OBSERVACIONES
1	0,40	6	595	0,40							238,00		SECTOR 1 K0+ 177,93al K 0+288,14
2	0,40	6	49	0,40							19,68		SECTOR 1 K0+ 265,97 AL K0+288
3	0,40	6	76	0,40							30,31		SECTOR 2 BARRA DE ANCLAJE K0+296,40 AL 312,12 (AMBOS COSTADOS)
4	0,40	6	17	0,40							6,82		SECTOR 2 K 0+312,12 AL K 0+318,07 (COSTADO DERECHO)
5	0,40	6	18	0,40							8,48		SECTOR 2 DEL K0+632,79 AL K0+637,82
6	0,40	6	33	0,40							13,35		SECTOR 2 DEL K0+639,24 AL K0+647,82
7	0,40	6	101	0,40							40,36		SECTOR 2 DEL K0+699,77 AL K0+737,81 (COSTADO IZQUIERDO)
8	0,40	6	390	0,40							155,82		SECTOR 2 DEL K0+737,81 AL K0+812
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
	TOTAL M.L				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,81	0,00	PESO TOTAL (Kg)
	PESO POR M.L				0,249	0,559	0,994	1,554	2,237	3,045	3,978	5,060	Nº CABEZALES: ESTA HOJA 2032,00 / ACUMULADO 4216,36
	TOTAL ESTA HOJA (KG)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2032,00	0,00	
	AC. HASTA ESTA HOJA (KG)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2032,00	0,00	

Elaboró — Firma: Carlos A Mercado J — Nombre: CARLOS MERCADO — CONTRATISTA

Aprobó — Firma: — Nombre: JORGE ANDRES SOTO — INTERVENTORIA

DESPIECE

Version: 01

OBJETO: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

ASUNTO: BARRAS DE ANCLAJE SECTOR 1 Y 2

INTERVENTORIA: INGECOR S.A.S

POS.	DETALLE	# (No.)	Nº de Pza.	Long. De la Pieza	ø 1/4" (#2)	ø 3/8" (#3)	ø 1/2" (#4)	ø 5/8" (#5)	ø 3/4" (#6)	ø 7/8" (#7)	ø 1" (#8)	ø 1 1/8" (#9)	OBSERVACIONES
1	1,00	4	15	1,00			14,85						TRAMO 1 BARRA DE ANCLAJE (CONEXIÓN CALZADA B.C CALLE 36 COSTADO DERECHO)
2	1,00	4	9	1,00			8,87						TRAMO 1 BARRA DE ANCLAJE (CONEXIÓN CALZADA B.C CARRERA 32 COSTADO IZQUIERDO)
3	1,00	4	6	1,00			5,56						TRAMO 1 BARRA DE ANCLAJE (CONEXIÓN CALZADA B.C CALLE 35 COSTADO DERECHO)
4	1,00	4	11	1,00			11,12						TRAMO 1 BARRA DE ANCLAJE (CONEXIÓN CALZADA CALLE CARRERA 32
5	1,00	4	89	1,00			89,41						SECTOR 1 BARRA DE ANCLAJE K0+177,93 AL K 0+285,14
6	1,00	4	8	1,00			7,79						SECTOR 1 BARRA DE ANCLAJE K0+285,97 AL K0+296
7	1,00	4	13	1,00			12,64						SECTOR 2 BARRA DE ANCLAJE K0+296,40 AL 312,12 (AMBOS COSTADOS)
8	1,00	4	4	1,00			4,18						SECTOR 2 BARRA DE ANCLAJE K0+632,79 AL K0+637,82
9	1,00	4	7	1,00			7,17						SECTOR 2 BARRA DE ANCLAJE K0+639,24 AL K0+647,82
10	1,00	4	74	1,00			73,78						SECTOR 2 BARRA DE ANCLAJE K0+699,77 AL K0+737,81 (COSTADO IZQUIERDO)
11	1,00	4	62	1,00			61,73						SECTOR 2 BARRA DE ANCLAJE K0+737,81 AL K0+812
12	1,00	4	16	1,00			16,44						CONEXIÓN CALZADA - B.C CARRERA 29A (COSTADO IZQUIERDO)
13	1,00												
14	1,00												
15	1,00												
16	1,00												
17	1,00												
18	1,00												
19	1,00												
20	1,00												
21	1,00												
22	1,00												
23	1,00												
24	1,00												
25	1,00												
26	1,00												
27	1,00												
28	1,00												
29	1,00												
30	1,00												
31	1,00												
	TOTAL M.L				0,00	0,00	313,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PESO POR M.L				0,249	0,559	0,994	1,554	2,237	3,045	3,979	5,060	PESO TOTAL (Kg)
	TOTAL ESTA HOJA (KG)				0,00	0,00	311,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nº CABEZALES: ESTA HOJA: 311,14 ACUMULADO: 2184,36
	AC. HASTA ESTA HOJA (KG)				0,00	0,00	311,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Elaboró:
Firma: Carlos A. Mercado J.
Nombre: CARLOS MERCADO
CONTRATISTA

Aprobó:
Firma:
Nombre: JORGE ANDRES SOTO
INTERVENTORIA

DESPIECE

CONSORCIO PUERTO CLAVER

Versión: 01

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

ASUNTO: ACERO DE REFUERZO EN BORDILLOS SECTOR 2

INTERVENTORIA: INGENIERIA, SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ISC S.A.S

POS.	DETALLE	# (No.)	Nº de Pza	Long. De a Pieza	ø 1/4" (#2)	ø 3/8" (#3)	ø 1/2" (#4)	ø 5/8" (#5)	ø 3/4" (#6)	ø 7/8" (#7)	ø 1" (#8)	ø 1 1/8" (#9)	OBSERVACIONES
1		3	44	0,60		26,10							COSTADO DERECHO TRANSVERSAL KG+296,40 AL KG+318,07
2		3	2	24,29		48,58							COSTADO DERECHO LONGITUDINAL KG+296,40 AL KG+3818,07
4		3	42	0,60		25,18							COSTADO IZQUIERDO TRANSVERSAL KG+294 AL KG+318,07
5		3	2	23,44		46,87							COSTADO IZQUIERDO LONGITUDINAL KG+294 AL KG+318,07
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
	TOTAL M.L				0,00	146,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PESO TOTAL (Kg)
	PESO POR M.L				0,249	0,559	0,994	1,554	2,237	3,043	3,973	5,060	
	TOTAL ESTA HOJA (KG)				0,00	82,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nº CASEZALES: ESTA HOJA: 82,03 ACUMULADO: 1873,22
	AC. HASTA ESTA HOJA (KG)				0,00	82,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Elaboró
Firma: Carlos A. Mercado J.
Nombre: CARLOS MERCADO
CONTRATISTA

Aprobó
Firma:
Nombre: JORGE ANDRES SOTO
INTERVENTORIA

DESPIECE

CONSORCIO PUERTO CLAVER

Versión 01

OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29", EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"
ÁREA/TD:	ACERO DE REFUERZO EN BORDILLOS SECTOR I

INTERVENTORIA: INGECOR S.A.S.

POS.	DETALLE	f' (No.)	N° de Pza	Long. De la Pieza	ø 1/4" (# 2)	ø 3/8" (# 3)	ø 1/2" (# 4)	ø 5/8" (# 5)	ø 3/4" (# 6)	ø 7/8" (# 7)	ø 1" (# 8)	ø 1 1/8" (# 9)	OBSERVACIONES
1		3	110	0,60		66,22							COSTADO DERECHO TRANSVERSAL K0+190 AL K0+265,12
2		3	2	61,62		123,24							COSTADO DERECHO LONGITUDINAL K0+190 AL K0+265,12
3		3	30	0,60		17,80							COSTADO IZQUIERDO TRANSVERSAL K0+174,87 AL K0+191,52
4		3	2	16,67		33,13							COSTADO IZQUIERDO LONGITUDINAL K0+174,87 AL K0+191,52
5		3	167	0,60		100,15							COSTADO IZQUIERDO TRANSVERSAL K0+205,8 AL K0+294
6		3	2	93,19		186,39							COSTADO IZQUIERDO LONGITUDINAL K0+205,8 AL K0+294
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
	TOTAL M.L				0,00	529,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PESO POR M.L				0,249	0,559	0,994	1,554	2,237	3,045	3,979	5,060	PESO TOTAL (Kg)
	TOTAL ESTA HOJA (KG)				0,00	294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N° CABEZALES: ESTA HOJA 294,551 / ACUMULADO 1791,196
	AC. HASTA ESTA HOJA (KG)				0,00	294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Elaboró
Firma: Carlos A. Mercado T
Nombre: CARLOS MERCADO
CONTRATISTA

Aprobó
Firma:
Nombre: JORGE ANDRES SOTO
INTERVENTORIA

DESPIECE


CONSORCIO PUERTO CLAVER

Versión 01

OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

ARUNTO: PLACAS IRREGULARES SECTOR 2

INTERVENTORIA: INGECOR S.A.S

POS.	DETALLE	F (No.)	N° de Pza	Long. De ø Pieza	ø 1/4" (#2)	ø 3/8" (#3)	ø 1/2" (#4)	ø 5/8" (#5)	ø 3/4" (#6)	ø 7/8" (#7)	ø 1" (#8)	ø 1 1/8" (#9)	OBSERVACIONES
1		4	1	126,76			126,76						PLACA IRREGULAR EN MH14LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL
2		4	1	108,92			108,92						PLACA IRREGULAR EN MH16 LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL
3		4	1	135,34			135,34						PLACA IRREGULAR EN MH17 LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
13													
13													

TOTAL M.L	0,00	0,00	371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PESO TOTAL (Kg)		
PESO POR M.L	0,249	0,559	0,994	1,554	2,237	3,043	3,978	5,060	N° CABEZALES	ESTA HOJA	ACUMULADO
TOTAL ESTA HOJA (KG)	0,00	0,00	368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		368,80	1496,80
AC. HASTA ESTA HOJA (KG)	0,00	0,00	368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Elaboró
Firma: Carlos A Mercado J
Nombre: CARLOS MERCADO
CONTRATISTA

Aprobó
Firma:
Nombre: JORGE ANDRES SOTO
INTERVENTORIA

DESPIECE




CONSORCIO PUERTO CLAVER

Versión 01

OBJETO: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

APUNTE: REFUERZO LOSA SUPERIOR EN MH EN EL SECTOR 2

INTERVENTORIA: INGECOR S.A.S

POS.	DETALLE		f' (No.)	N° de Pza	Long. De la Pieza	ø 1/4" (# 2)	ø 3/8" (# 3)	ø 1/2" (# 4)	ø 5/8" (# 5)	ø 3/4" (# 6)	ø 7/8" (# 7)	ø 1" (# 8)	ø 1 1/8" (# 9)	OBSERVACIONES
1		var	4	1	16,89			16,89						SECCION CIRCULAR MH14 K0+637,2
		var	4	1	25,03			25,03						PLACA LONGITUDINAL MH14 K0+637,2
		1.62	4	4	1,62			6,48						REFUERZO DIAGONAL
2		var	4	1	16,89			16,89						SECCION CIRCULAR MH16 K0+739
		var	4	1	25,03			25,03						PLACA LONGITUDINAL MH16 K0+739
		1.62	4	4	1,62			6,48						REFUERZO DIAGONAL
3		var	4	1	16,89			16,89						SECCION CIRCULAR MH17 K0+794,70
		var	4	1	25,03			25,03						PLACA LONGITUDINAL MH17 K0+794,70
		1.62	4	4	1,62			6,48						REFUERZO DIAGONAL
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
		TOTAL M.L				0,00	0,00	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PESO TOTAL (Kg)
		PESO POR M.L				0,249	0,559	0,994	1,554	2,237	3,045	3,979	5,060	
		TOTAL ESTA HOJA (KG)				0,00	0,00	143,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N° CABEZALES: ESTA HOJA 143,73 ACUMULADO 1127,85
		AC. HASTA ESTA HOJA (KG)				0,00	0,00	143,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Elaboró
Firma: Carlos A. Mercado J.
Nombre: CARLOS MERCADO
CONTRATISTA

Aprobó
Firma:
Nombre: JORGE ANDRES SOTO
INTERVENTORIA

DESPIECE





CONSORCIO PUERTO CLAVER

Versión 01

OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

ASUNTO: REFUERZO LOSA SUPERIOR EN MH EN EL SECTOR 1 Y POZO PLUVIAL

INTERVENTORIA: INGECOR S.A.S

POS.	DETALLE		(No)	N° de Pza	Long. De la Pieza	ø 1/4" (# 2)	ø 3/8" (# 3)	ø 1/2" (# 4)	ø 5/8" (# 5)	ø 3/4" (# 6)	ø 7/8" (# 7)	ø 1" (# 8)	ø 1 1/8" (# 9)	OBSERVACIONES
1		var	4	1	16,69			16,69						SECCION CIRCULAR MH8 EXISTENTE K 0+185,51
		var	4	1	25,03			25,03						PLACA LONGITUDINAL MH8 EXISTENTE K 0+185,51
		1.50	4	4	1,62			6,48						REFUERZO DIAGONAL
2		var	4	1	16,69			16,69						SECCION CIRCULAR MH7 EXISTENTE K 0+200,74
		var	4	1	25,03			25,03						PLACA LONGITUDINAL MH7 EXISTENTE K 0+200,74
		1.50	4	4	1,62			6,48						REFUERZO DIAGONAL
3		var	4	1	16,69			16,69						SECCION CIRCULAR MH8EXISTENTE K 0+290
		var	4	1	25,03			25,03						PLACA LONGITUDINAL MH8 EXISTENTE K 0+290
		1.50	4	4	1,62			6,48						REFUERZO DIAGONAL
4		var	4	1	16,69			16,69						SECCION CIRCULAR P(1) K0+290
		var	4	1	25,03			25,03						SECCION CIRCULAR P(1) K0+290
		1.50	4	4	1,62			6,48						REFUERZO DIAGONAL
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
		TOTAL M.L.				0,00	0,00	192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PESO POR M.L.				0,249	0,560	0,994	1,554	2,237	3,043	3,973	5,060	
		TOTAL ESTA HOJA (KG)				0,00	0,00	191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		AC. HASTA ESTA HOJA (KG)				0,00	0,00	191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Elaboró:	Aprobó:	PESO TOTAL (Kg)	
Firma: Carlos A Mercado J	Firma:	N° CABEZALES	ESTA HOJA: 191,64 / ACUMULADO: 994,12
Nombre: CARLOS MERCADO	Nombre: JORGE ANDRES SOTO		
CONTRATISTA	INTERVENTORIA		









DESPIECE

CONSORCIO PUERTO CLAVER

Versión 01

OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

ASUNTO: CONTINUACION DE PLACAS IRREGULARES EN EL SECTOR 1 — **INTERVENTORIA:** INGECOR S.A.S

POS.	DETALLE	/ (No.)	N° de Pza	Long. De la Pieza	ø 1/4" (# 2)	ø 3/8" (# 3)	ø 1/2" (# 4)	ø 5/8" (# 5)	ø 3/4" (# 6)	ø 7/8" (# 7)	ø 1" (# 8)	ø 1 1/8" (# 9)	OBSERVACIONES
1		4	1	137,70			137,70						PLACA IRREGULAR EN MH6 LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL
3		4	13	5,06			65,11						PLACA IRREGULAR COSTADO DERECHO DEL K0+182,94 AL K0+188,5 LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL
		4	25	2,57			65,11						
2		4	1	63,45			63,45						PLACA IRREGULAR EN MH7 LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL
3		4	12	2,79			34,26						PLACA IRREGULAR COSTADO DERECHO DEL K0+197,5 AL K0+200,51 LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL
		4	14	2,48			34,26						
4		4	1	84,03			84,03						PLACA IRREGULAR EN P(1) LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL
5		4	1	132,31			132,31						PLACA IRREGULAR K0+285,97 AL K0+296 (COSTADO IZQUIERDO) LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL
6		4	14	2,45			34,28						PLACA IRREGULAR COSTADO DERECHO DEL K0+285,97 AL K0+288,4, LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL
		4	12	2,80			34,28						
7		4	13	2,63			35,87						PLACA IRREGULAR COSTADO DERECHO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL
		4	14	2,64			35,87						
8		4	1	60,74			60,74						PLACA IRREGULAR EN MH8 LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL
	TOTAL M.L				0,00	0,00	797,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PESO TOTAL (Kg)
	PESO POR M.L				0,249	0,559	0,994	1,554	2,237	3,045	3,978	5,060	N° CABEZALES / ESTA HOJA / ACUMULADO
	TOTAL ESTA HOJA (KG)				0,00	0,00	792,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,46 / 792,46
	AC. HASTA ESTA HOJA (KG)				0,00	0,00	792,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Elaboró
Firma: Carlos A Mercado J.
Nombre: CARLOS MERCADO
CONTRATISTA

Aprobó
Firma:
Nombre: JORGE ANDRES SOTO
INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO PUERTO CLAVER


Versión 01

OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29", EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"
CONTRATO No.	050/2025
CONTRATISTA	CONSORCIO PUERTO CLAVER
INTERVENTOR	INGECOR S.A.S
ITEM	Corte de placa de concreto con disco de 18"

UNIDAD: ML

LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABCISAS INICIAL	ABCISAS FINAL	DIMENSIONES Largo (m)	DIMENSIONES Ancho (m)	DIMENSIONES Alto (m)	Área (m2)	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
SECTOR 1	CALZADA	K0+177,93	K0+285,14	183,34					ML	183,34
	CALZADA	K0+285,97	k0+296	14,76					ML	14,76
									TRANSVERSAL	198,10
	CALZADA	K0+177,93	K0+285,14	107,29					ML	107,29
	CALZADA	K0+285,14	k0+296	9,35					ML	9,35
	CONEXIÓN CALZADA - CALLE CARRERA 32	K0+285,97	k0+296,40	13,34					ML	13,34
									LONGITUDINAL	129,98
									SECTOR 1	328,09
SECTOR 2	CALZADA	K0+296,40	K0+312,12	22,74					ML	22,74
	CALZADA (COSTADO DERECHO)	K0+312,12	K0+318,07	7,65					ML	7,65
	CALZADA	K0+632,79	K0+637,82	9,64					ML	9,64
	CALZADA	K0+639,24	K0+647,82	14,98					ML	14,98
	CALZADA (COSTADO IZQUIERDO)	K0+699,77	K0+737,81	30,29					ML	30,29
	CALZADA	K0+737,81	K0+812	121,82					ML	121,82
									LONGITUDINAL	207,12
	CALZADA	K0+296,40	K0+318,07	21,00					ML	21,00
	CALZADA	K0+632,79	K0+637,82	5,02					ML	5,02
	CALZADA	K0+639,24	K0+647,82	7,00					ML	7,00
	CALZADA	K0+737,81	K0+812	71,19					ML	71,19
									LONGITUDINAL	104,20
									SECTOR 2	311,32
									Corte de placa de concreto con disco de 18"	639,41

ESQUEMA



Elaboro:
EL CONTRATISTA

WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ
R/L. CONSORCIO PUERTO CLAVER
CONTRATISTA DE OBRA

Aprobo:
INTERVENTORIA

JORGE ANDRES SOTO CALLE
R/L. INGECOR S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

VoBo:

DOIVER ANTONIO NISPERUZA
SUPERVISOR - EDTB
CONTRATANTE

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO PUERTO CLAVER


Versión: 01

OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"
CONTRATO No.	050/2025
CONTRATISTA	CONSORCIO PUERTO CLAVER
INTERVENTOR	INGECOR S.A.S
ITEM	Sello de juntas en silicona para Pavimento rigido

UNIDAD: ML

LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABCISAS		DIMENSIONES			Área (m2)	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
		INCIAL	FINAL	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)				
SECTOR 2	CALZADA	K0+296,40	K0+312,12	22,74					ML	22,74
	CALZADA	K0+429,76	K0+632,79	143,14					ML	143,14
									TRANSVERSAL	165,88
									SECTOR 2	165,88
									Sello de juntas en silicona para Pavimento rigido	165,88

ESQUEMA



Elaboro:
EL CONTRATISTA

WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ
R/L. CONSORCIO PUERTO CLAVER
CONTRATISTA DE OBRA

Aprobo:
INTERVENTORIA

JORGE ANDRES SOTO CALLE
R/L. INGECOR S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

VoBo:

DOIVER ANTONIO NISPERUZA
SUPERVISOR - EDTB
CONTRATANTE

CONSORCIO
PUERTO CLAVER



CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.

MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

23 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DE 2026
23 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2026
06 DE ABRIL AL 10 DE ABRIL DE 2026

Correo Electrónico: consorcio050puertoclaver@gmail.com
Dirección: CR 12 A # 23 - 45 BRR JERUSALEN
Planeta Rica - Córdoba

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
   1.1. Localización 4
   1.2. Ubicación del proyecto 5
2. INFORMACION CONTRATO DE OBRA 7
   4.4.. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA 7
   4.4.. RELACION DE POLIZAS 8
3. REPORTE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA 9
   3.1. PROGRAMA MANEJO SOCIAL 9
   3.2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 11
   3.3. ACTIVIDADES AMBIENTALES 16
   3.4. ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 21
   3.5. MAQUINARIA Y EQUIPOS 22
   3.6. RELACION DE PERSONAL DE OBRA. 24
   3.7. MEDIDA DE SEGURIDAD Y CONTROL DE TRAFICO. 26
   3.8. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 28
   - Capacitación al personal de obra. 30
   - Incidentes. 35
   - Accidentes de trabajo. 35
   - Análisis del ausentismo 36
   3.9. INFORME GENERAL DEL TIEMPO 37
   3.10. INFORME AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LA OBRA 37
   3.11. OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO. 38
   - ✓ BITACORA DE OBRA 39
   - ✓ ACTAS DE COMITÉ 39
   - ✓ CORRESPONDENCIA 39
   - ✓ REGISTRO FOTOGRAFICO 39
   - ✓ COSTOS DE OFICINA, PAPELRIA Y OTROS 39
4. CONCLUSIONES 41

1. INTRODUCCIÓN

El Bagre es un municipio de Colombia, localizado en la subregión del Bajo Cauca del departamento de Antioquia. Limita por el norte con el departamento de Bolívar, por el sur con los municipios de Segovia y Zaragoza, y por el oeste con los municipios de Zaragoza, Caucasia y Nechí. Su cabecera municipal está a 284 kilómetros de la ciudad capital Medellín,

El contrato cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"**, se desarrolla bajo las Especificaciones Técnicas de Construcción y con ello las normas mínimas de este, que, junto con los Esquemas, Planos y las Especificaciones Técnicas particulares, la Normatividad Técnica aplicable y el listado general de actividades, se desarrollan los ítems que forman parte integral y complementaria de la ejecución de las obras objeto del Contrato, el desarrollo de cada una de las actividades a ejecutar están basados en el manejo de los diferentes aspectos sociales, ambientales y de seguridad en el área de influencia; y así mismo, minimizar los efectos negativos producto de la ejecución de la obra en cada una de las etapas pertenecientes al proyecto.

Este tercer informe contiene toda la información detallada y relacionada con las acciones desarrolladas en el periodo del 23 de enero al 22 de febrero de 2026, 23 de febrero al 15 de marzo de 2026 y del 06 de abril al 10 de abril de 2026 y con ello las actividades ejecutadas en el tramo denominado el sector 1 con el mejoramiento de la calzada desde el k0+220 al k0+290,

instalación de subbase granular (k0+180 – k0+290) e instalación de pavimento rígido (K0+177,93 - K0+285,14; K0+285,97 - k0+296); además en el sector 2 se llevó a cabo el corte de calzada, mejoramiento, subbase granular del k0+740 al k0+810 y del k0+290 al k0+310, e instalación del pavimento rígido en ambos costados del K0+297,08 al K0+318,07; K0+632,79 al K0+637,82; K0+639,24 al K0+647,82; K0+737,81 - K0+812; y del costado izquierdo del K0+699,77 al K0+737,81 y demás actividades detalladas en las memorias de cantidades del acta parcial 3.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Bagre es uno de los seis municipios de la subregión del Bajo Cauca del departamento de Antioquia, situado a 326 kilómetros de la ciudad de Medellín. Su extensión es de 1.563 km², de los cuales solo 10,8 km² se encuentran urbanizados, constituyéndose el área restante en zona rural, Con relación a las fronteras, limita por el norte con el municipio de Nechí; por el sur con los municipios de Zaragoza y Segovia, por el este con las serranías de San Lucas y Santa Bárbara en el departamento de Bolívar; por el occidente con los municipios de Caucasia y Zaragoza. La cabecera municipal se encuentra ubicada a orillas del río Nechí, en la confluencia con el río Tigüí, el cual es afluente del río Nechí y éste del río Cauca.

1.1. Localización

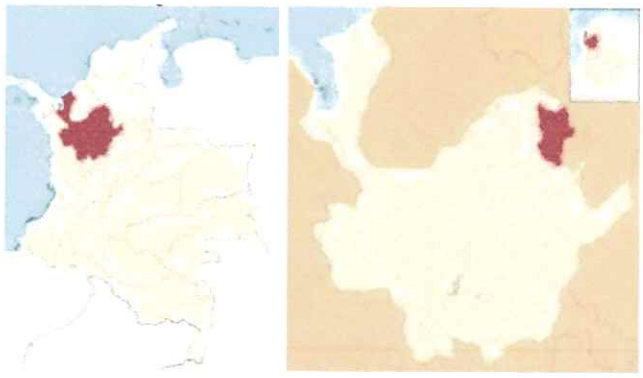


Figura 1. Localización general del municipio de El Bagre

Geográficamente la vía en estudio se localiza en las Coordenadas que se detallan a continuación:

TRAMO	LUGAR	INICIO		FINAL	
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD
01	Corregimiento de Puerto Claver - tramo 1	7°42'41.99"N	74°45'7.73"W	7°42'43.16"N	74°45'23.46"W
02	Corregimiento de Puerto Claver – tramo 2	7°42'43.16"N	74°45'23.46"W	7°42'51.91"N	74°45'25.51"W

Tabla 1. Coordenadas de los dos tramos de ejecución. **Fuente:** Consorcio Puerto Claver.

1.2. Ubicación del proyecto

El área en estudio está ubicada en el Corregimiento de Puerto Claver al norte de la cabecera municipal de El Bagre en la subregión Bajo Cauca, en la carrera 31d entre calle 38 y calle 36, carrera 32 entre calle 36 y calle 35, calle 35 entre carrera 32 y carrera 29ª, cuyas condiciones actuales no ha permitido desarrollar una malla vial continua y coherente con las expectativas actuales en dicho corregimiento, conformada por terreno natural y materiales mixtos de relleno sin una base estabilizada, lo que ha generado un avanzado deterioro superficial, hundimientos y una incapacidad para soportar el tráfico vehicular, el resultado de esto es una red vial de tránsito peligroso para aquellos que requieren transitar de seguridad y confort para la circulación del transporte y con el aumento acelerado que ha experimentado el corregimiento de Puerto Claver en los últimos años.

La vía en estudio está dividida en dos tramos el primero comprende el **TRAMO 1** en la carrera 31D entre calle 38 y calle 36, carrera 32 entre calle 36 y calle 35, **TRAMO 2** desde la calle 35 entre carrera 32 y carrera 29ª, y el tal y como se observa en la figura 2, acorde con los sectores de diseño proyectados.

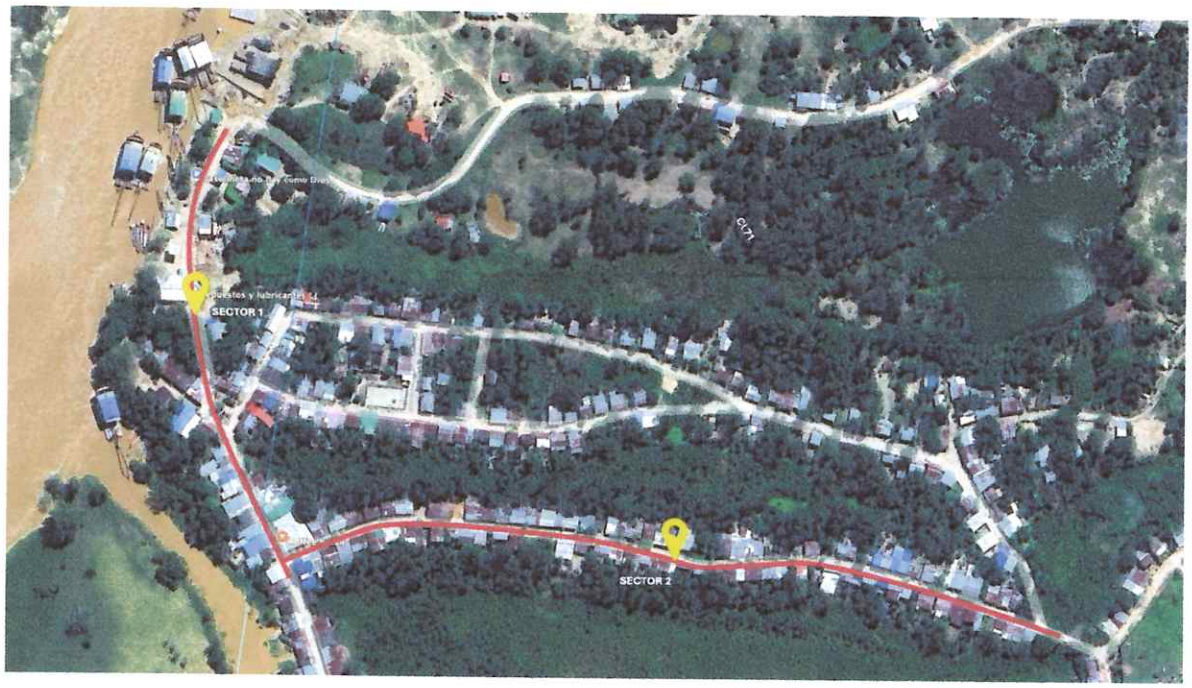


Imagen 1. Localización sector 1 y 2. **Fuente:** GOOGLE EARTH.

2. INFORMACION CONTRATO DE OBRA

4.4..INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA

Número del Contrato	No. 050 de 2025
Objeto del Contrato	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA
Valor del Contrato	TRES MIL SEISCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 3.605.339.826,79) INCLUIDO EL A.U. Y DEMAS COSTOS A QUE HAYA LUGAR
Contratante	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB
NIT. No.	901.526.561-7
Contratista	CONSORCIO PUERTO CLAVER
NIT. No.	901.982.342-5
Plazo Inicial	SEIS (06) MESES
Anticipo (50%)	N/A
Interventoría:	INGENIERIA DE CORDOBA INGECOR S.A.S
NIT. No.	901.281.531-2
Fecha de Suscripción Contrato	1 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Acta de Inicio	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Acta de Suspensión No1:	12 DE DICIEMBRE DE 2025
Acta de Ampliación No1 Suspensión No1:	11 DE ENERO DE 2026
Acta de Suspensión No2:	16 DE MARZO DE 2026
Acta de Ampliación No1 Suspensión No2:	31 DE MARZO DE 2026
Fecha de terminación	12 DE MAYO DE 2026

4.4.. RELACION DE POLIZAS

En función del reinicio del contrato de obra 050/2025 a partir del día 06 de abril de 2026 y con la nueva fecha de terminación del contrato del día 12 de mayo de 2026, se lleva a cabo las respectivas acta de Reinicio No2 y con esto la actualización de las garantías de las pólizas, la cual se radico mediante el oficio el oficio EDTB – 41 – 2025, tal y como se observa a continuación:

RIESGO ASEGURADO	PÓLIZA NO.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			INICIO	FINAL
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL				
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	COQ-100006616	$721.067.965	15/09/25	12/11/26
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES		$ 360.533.982,70	15/09/25	12/05/29
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		$1.081.601.948,10	15/09/25	12/05/31
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
AMPARO BASICO – PREDIO, LABORES Y OPERACIONES	COQ-100001670	$569.400.000,00	15/09/25	12/05/26
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS				
RCE PATRONAL				
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS				

Tabla 2. Pólizas contrato de obra 050/2025. **Fuente:** Consorcio Puerto Claver

ANEXO 1. POLIZAS.

3. REPORTE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

3.1. PROGRAMA MANEJO SOCIAL

Durante esta tercera acta parcial se llevó a cabo las divulgaciones en cuanto a los cierres previo al inicio de los trabajos y con ello las vías de acceso durante la ejecución de los sectores a intervenir para garantizar un eficaz funcionamiento de éste.

En la siguiente tabla se observa el programa de manejo social imperante en el contrato 050/2025:

	Proyecto	Código	APLICA
1	Atención a la comunidad	PGS-6.1-18	
2	Información y divulgación	PGS-6.2-19	✓
3	Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos	PGS-6.3-20	
4	Cultura vial y participación comunitaria	PGS-6.5-22	
5	Contratación de mano de obra	PGS-6.6-23	

Tabla 3. Programa de manejo social contrato 050/2025. **Fuente:** Consorcio Puerto Claver.

La estrategia de divulgación a través de los volantes para dar a conocer los inicios de los trabajos en el sector 2 (K0+297,08 al K0+318,07; K0+737,81 - K0+812), en el siguiente grafico se observa los porcentajes de los volantes entregados a lo largo de estos 5 meses de ejecución y los que faltan por distribuir.


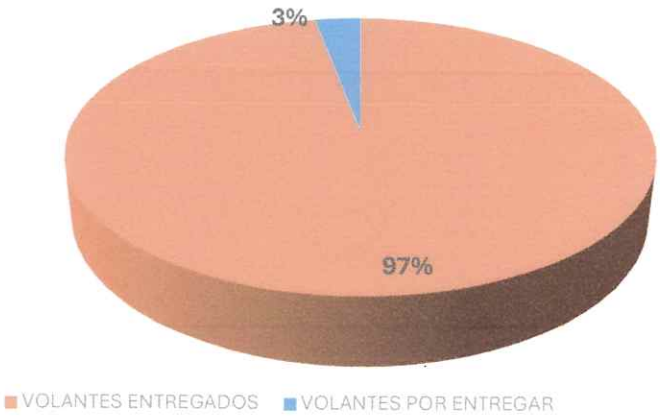


Gráfico 1. Distribución porcentual de los volantes en el tercer mes de ejecución.
Fuente: Consorcio Puerto Claver.

La distribución porcentual plasmada en el grafico anterior, se observa que se han distribuido un total de ciento noventa y cuatro (194) volantes y con esto faltando por distribuir un 3%, es decir, seis (6) volantes. En las siguientes fotografías se observan la divulgación e información de estos en los sectores intervenidos en esta tercera acta parcial.



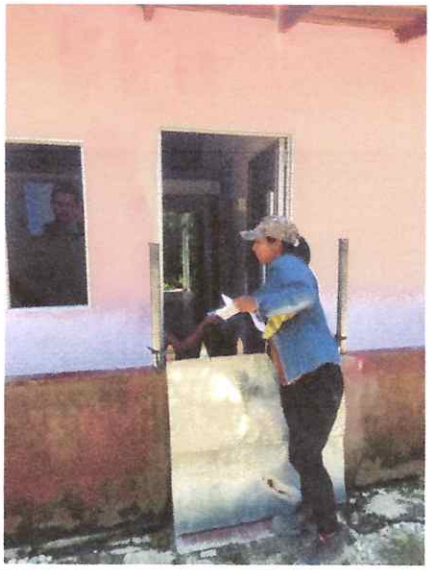

Fotografía 1 y 2. volantes para el inicio de los trabajos en el sector 2.

A continuación, se observa la distribución de los volantes para el inicio de los trabajos entregados en las tres actas parciales y la relación en cada uno de los sectores ejecutados con su respectiva abscisa

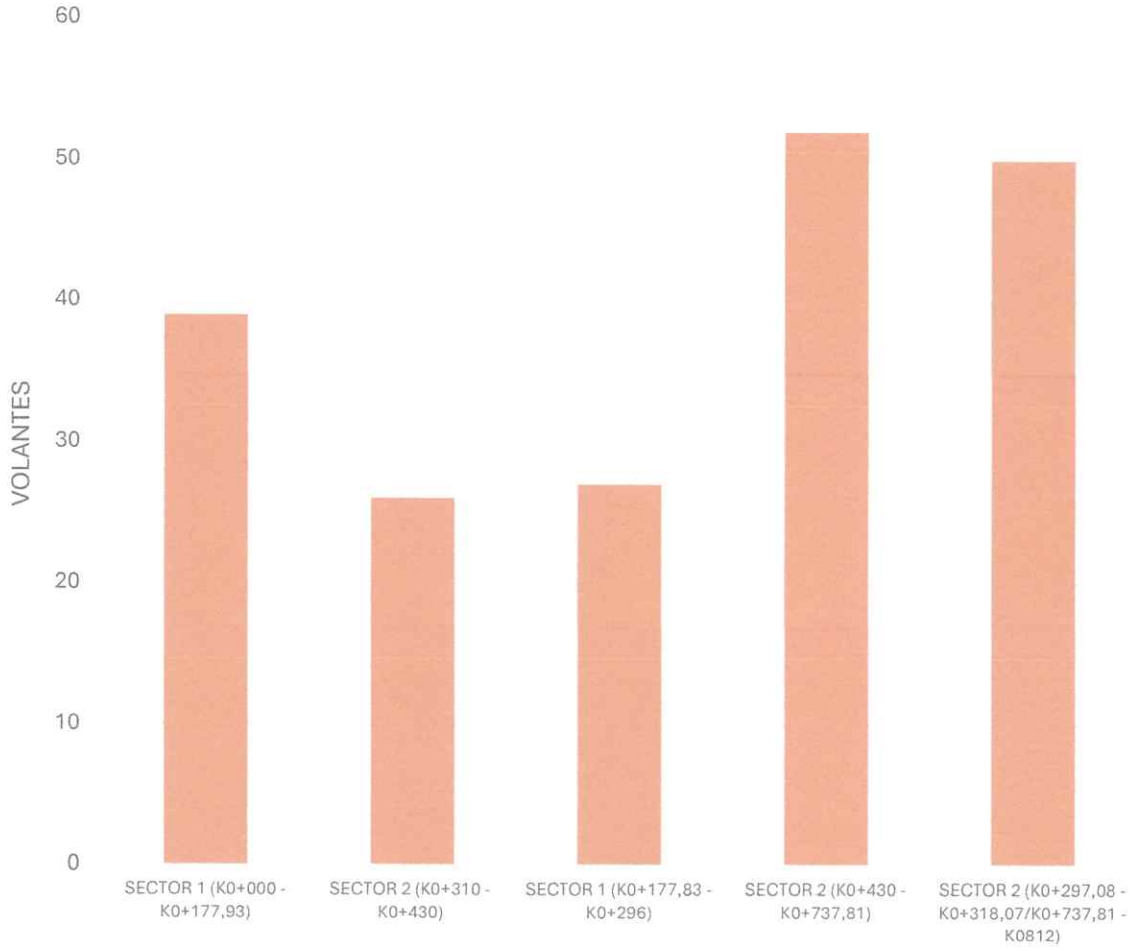


Gráfico 2. Distribución de entrega de volantes para el inicio de los trabajos.
Fuente: Consorcio Puerto Claver.

En el **ANEXO 2. PROGRAMA MANEJO SOCIAL** se encuentran los volantes distribuidos para el inicio de los trabajos, con el respectivo soporte el cual asciende a $100.000.

3.2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS.

Durante el Acta Parcial N°3 se realizaron las siguientes actividades:

Topografía, localización en el sector 2 en ambos costados K0+297,08 al K0+318,07; K0+632,79 al K0+637,82; K0+639,24 al K0+647,82; K0+737,81 - K0+812; y del costado izquierdo del K0+699,77 al K0+737,81 y en cuanto control de caja para excavaciones, control de relleno con material de mejoramiento, control de sub-base granular, reubicación y replanteo. Cálculo de volúmenes y elaboración de planos.



Fotografía 3. Durante el corte en calzada en el sector 2.



Fotografía 4. Toma de niveles en pavimento rígido instalado

- ✓ **Sector 1 en la carrera 31d entre calle 38 y calle 36 (k0+177,93) hasta la carrera 32 entre calle 36 y calle 35 (k0+296).**

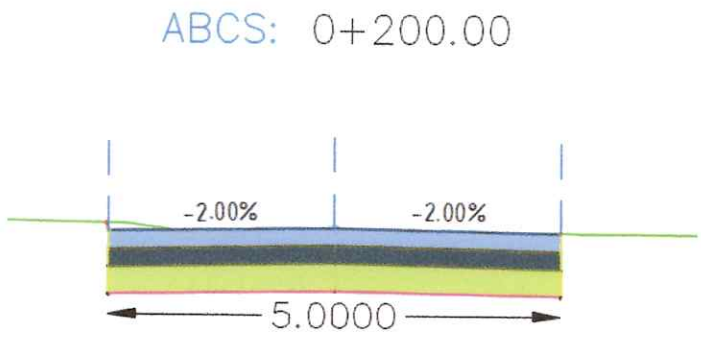


Imagen 2. Sección típica tramo 1 (k0+177,93 al k0+285,14)

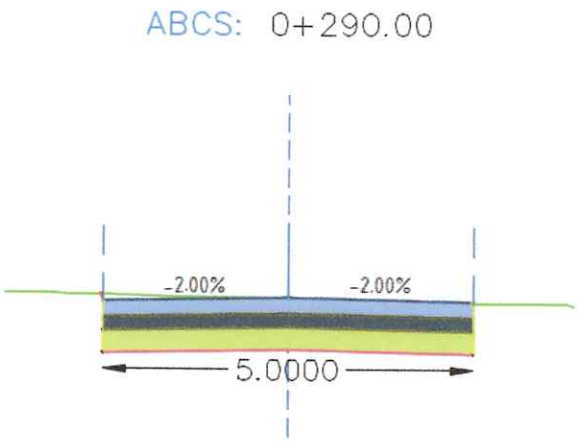


Imagen 3. Sección típica tramo 1 (k0+285,14 al k0+296).

Se realiza mejoramiento con material seleccionado del k0+220 – k 0+290.

Se realiza instalación de subbase granular del k0+180 – k 0+290.

Se realiza concreto pavimento rígido MR=40 Kg/cm2 de espesor 20 cm ambos costados del K0+177,93 - K0+285,14 y del K0+285,97 - k0+296.

Se realiza instalación de acero para transferencia para placas de concreto (L= 40 cm #8@30cm), refuerzo transversal (L= 1.0 m #4@1,20m), placas irregulares en MH, acero transversal y longitudinal para bordillos.

Se realiza corte para calzada transversal del K0+177,93 - K0+285,14 y del K0+285,97 - k0+296; longitudinalmente K0+177,93 - k0+296.

- ✓ **Sector 2 en la calle 35 entre carrera 32 y carrera 29A (k0+740– k0+812)**

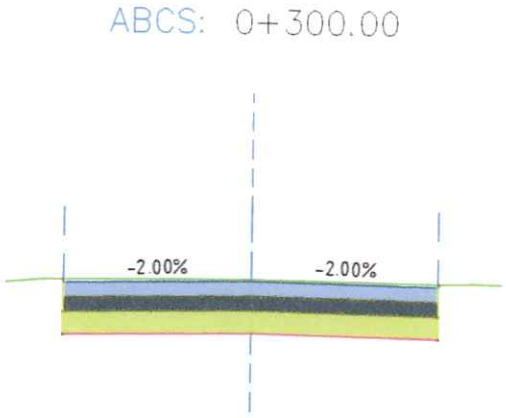


Imagen 4. Sección típica tramo 2 (k0+297,08 al k0+318,07).

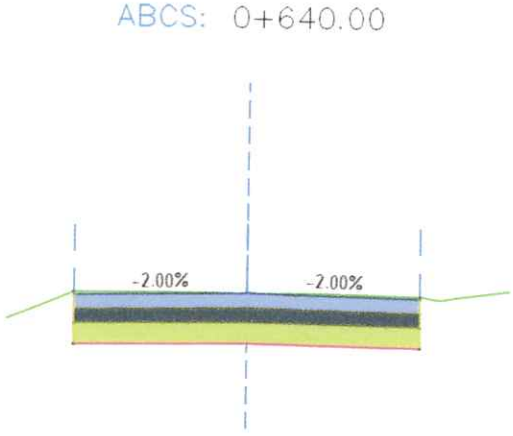


Imagen 5. Sección típica tramo 2 (k0+639,24 al k0+647,82).

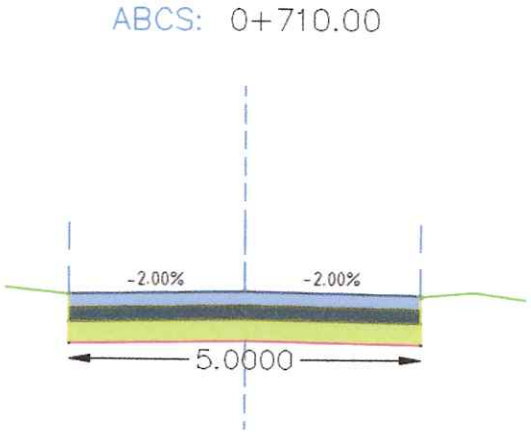


Imagen 6. Sección típica tramo 2 del costado izquierdo (k0+699,77 al k0+737,81)

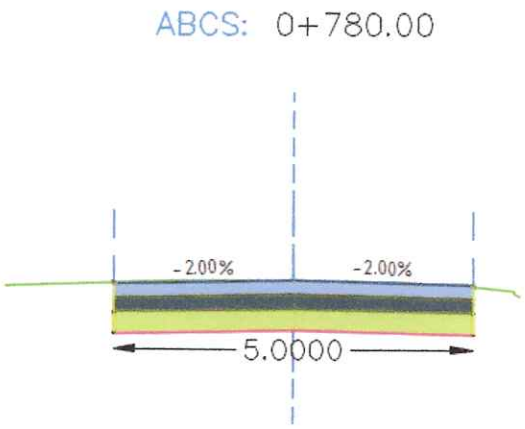


Imagen 7. Sección típica tramo 2 (k0+737,81 al k0+812)

Se realiza excavación mecánica en calzada k 0+740– k 0+810 y del k0+290 al k0+310, ST-40 (K0+296,70).

Se realiza mejoramiento con material seleccionado, sub-base granular del k0+740 – k 0+810, K0+290 – K0+310.

Se realiza concreto pavimento rígido MR=40 Kg/cm2 de espesor 20 cm en ambos costados del K0+297,08 al K0+318,07; K0+632,79 al K0+637,82;

K0+639,24 al K0+647,82; K0+737,81 - K0+812; y del costado izquierdo del K0+699,77 al K0+737,81.

Se realiza instalación de acero para transferencia para placas de concreto (L= 40 cm #8@30cm), refuerzo transversal (L= 1.0 m #4@1,20m), placas irregulares en MH, acero transversal y longitudinal para bordillos.

Se realiza corte para calzada transversal del ambos costados del K0+296,40 – K0+312,12; K0+632,79 - K0+632,79; K0+639,24 - K0+647,82; K0+737,81 - K0+812; en el costado derecho K0+312,12 - K0+318,07 y en el costado izquierdo K0+699,77 - K0+737,81. Mientras que longitudinalmente va del K0+296,40 - K0+318,07; K0+632,79 - K0+637,82; K0+639,24 - K0+647,82; K0+737,81 - K0+812.

Se realiza sellado de junta para calzada transversalmente K0+296,40 – K0+312,12; K0+429,76 - K0+632,79

Se instala 68 Kit Silla Yee Ø 6" a Ø 8" del MH10-MH11, MH11 – MH12, MH12-MH13, MH13 – MH14; MH14 – MH15; MH15 – MH16; MH16 – MH17.
Suministro, transporte é instalación de arena para protección de tubería y relleno con material de recebo en tubería sanitaria de ϕ8", ϕ6".

3.3. ACTIVIDADES AMBIENTALES

Las actividades ambientales de este informe están basados en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA. en las cuales se desglosan lo siguiente:

- Cumplimiento de las vigencias y normatividades vigentes, de las licencias y permisos de explotación de la cantera para su

utilización y compra de materiales para la ejecución de las actividades objeto del contrato.

- Instalación de señalización preventiva de acuerdo al plan de manejo de tránsito en las zonas intervenidas, así como para la ejecución de las actividades de demoliciones o excavaciones como medida de prevención de accidentes.
- Almacenamiento de escombros y/o material de retiro.
- Tres (3) puntos ecológicos los cuales constan de recipientes identificados y señalizados conforme al código de colores establecido en la Resolución 2184 del 26 de Diciembre de 2019 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Dichos recipientes están instalados en el área de almacén o bodega del proyecto y dos (2) en los frentes de trabajo a entera disposición del personal que se encuentra en campo adelantando las actividades.
- Orden y aseo en los sectores intervenidos.
- Residuos de construcción generados durante la ejecución de las actividades fueron evacuados hacia el sitio de disposición final definido y solicitado por parte de la Administración Municipal CONSORCIO PUERTO CLAVER. Dicho transporte fue realizado en volquetas en las cuales se garantizó que el material estuviese cubierto para evitar dispersión del material o emisiones al medio.
- El agua no potable para uso industrial utilizada en la ejecución de las actividades constructivas fue suministrada por la Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Municipio de el Bagre – Antioquia S.A E.S.P – Aguas de El Bagre S.A E.S.P, con Concesión de Aguas otorgada por Corantioquia mediante la Resolución No. 160PZ-1911-6817 del 25 de Noviembre de 2019.

- Kit emergencia (camillas, botiquines) y kit antiderrame los cuales están ubicados en las oficinas y en los frentes de trabajo.



Imagen 8. Código de colores de los puntos ecológicos utilizados en el proyecto.

En las siguientes fotografías se observan los puntos ecológicos y el Kit de emergencia instalados en los sectores en ejecución en el periodo comprendido entre el 23 de enero al 22 de febrero de 2026, 23 de febrero al 15 de marzo de 2026 y del 06 de abril al 10 de abril de 2026




Fotografía 5. Punto ecológico y Kit de emergencia en la oficina.



Fotografía 6. Punto ecológico y Kit de emergencia en el sector 2.

Una vez concluido las actividades programadas se lleva a cabo el orden y aseo, en las siguientes fotografías se observa estas

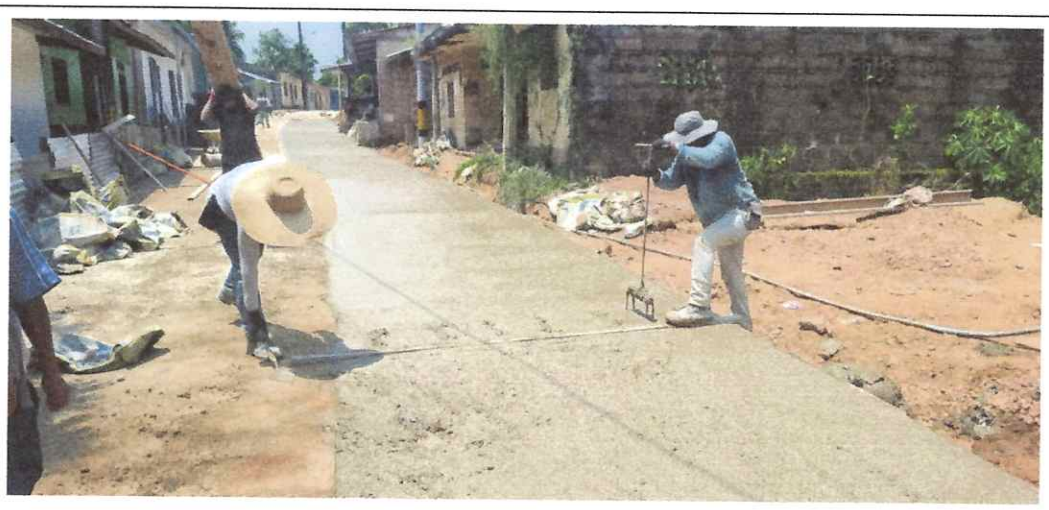

Fotografía 7. Durante la construcción del pavimento rígido y los desechos generados durante la jornada laboral en el sector 2.



Fotografía 8. Después de concluida a jornada laboral y efectuado el orden y aseo en el sector 2.

Al igual que lo expresado en los informes correspondientes al acta parcial 1 y 2, en esta tercera acta parcial se sigue contando con el Corregimiento de Puerto Claver de un área de apoyo en las proximidades del frente de trabajo, en la carrera 31D perteneciente al sector 1, cuyas coordenadas se observan en la imagen 5, donde se ubica el almacenamiento temporal de materiales, equipo menor entre otros, el cual está ubicado dentro de las oficinas de este en dicho corregimiento.



Imagen 9. Ubicación de bodega en el sector 1.

En el **PAGA No4 y No5** se detalla de manera amplia cada uno de los componentes establecido del 23 de enero al 22 de febrero de 2026, 23 de febrero al 15 de marzo de 2026 y del 06 de abril al 10 de abril de 2026.

3.4. ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Para la verificación de la calidad de las obras ejecutas se realizan los ensayos conforme a la norma INVIAS, adicionalmente se cuenta con los certificados de calidad de los materiales usados, así como los certificados de calibración de los equipos de inspección, seguimiento y medición. **VER ANEXO 3. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES** y **ANEXO 4. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS.**

PRUEBAS Y ENSAYOS

Para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas se realiza ensayos a los diferentes materiales utilizados para la ejecución siguiendo los protocolos de las Normas del Instituto Nacional de Vías INVIAS.

Los informes entregados por el laboratorio ASESORIAS Y ESTUDIOS EN CONSTRUCCIONES CIVILES, SUELOS Y PAVIMENTOS JG, se encuentra relacionados en la tabla siguiente:

Item	ENSAYO
1	Densidad y peso unitario del suelo por el método de cono y arena INV E-161-13
2	Resistencia a la flexión del concreto usando una viga simplemente apoyada en los tercios de la luz libre - NORMA INVIAS E 414-13
3	Compresión de cilindros INV E-401, 402, 404, 405, 410

Tabla 4. Relación de ensayos. **Fuente:** Consorcio Puerto Claver.

ANEXO 5. LABORATORIOS.

3.5. MAQUINARIA Y EQUIPOS

En esta tercera acta parcial, se continuo llevando a cabo los equipos y maquinarias la inspección a través de los pre-operacionales y con esto la verificación en obra del estado óptimo de estos. A continuación se observa la tabla 5 del equipo con su respectiva capacidad y referencia.

EQUIPO	CANTIDAD	TIPO O CAPACIDAD	CODIGO
Volqueta sencilla	2	6m3	N/A
Retroexcavadora de llanta	1	XCMG	XC870K
Retroexcavadora Cargadora de llanta	1	CATERPILLAR	416E
Vibro compactador mono cilíndrico	1	CATERPILLAR	N/A
Minicargador	1	XMCG	XC740K
Mini Compactador	1	KAMA	192F
Apisonador compactador tipo canguro	1	HODA GX 100	MR68H
Compactadora tipo Rana	1	WARNING	N/A
Taladro	1	MAKITA	
Pulidora	1	MAKITA	N/A
Cortadora de pavimento	1	KAMA	MF18
Mezcladora	2	MAQUIEQUIPOS	N/A
Tronzadora	1	MAKITA	N/A
Flota canal	1	120 cm	N/A
Texturizador	1	120 cm x ¾"	N/A

Tabla 5. Relación de maquinaria y equipos. **Fuente:** Consorcio Puerto Claver.

Nota: Se cuenta con herramienta menor en cada uno de los diferentes frentes de trabajo para la ejecución de las actividades.

Este acta parcial 3, se continuo realizando el seguimiento a cada uno de los equipos y/o maquinaria que se encontraba operando y con ello la verificación respectiva de la documentación. **ANEXO 6. DOCUMENTACIÓN MAQUINARIA.** Igualmente, se continuo con la verificación de la documentación de los vehículos al servicio de las obras correspondiente a revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes, así como el SOAT y la tarjeta de propiedad, en la cual se observó que esta se encontraba al día. **ANEXO 7. DOCUMENTACIÓN VEHÍCULOS**

Durante el desarrollo de las actividades constructivas desarrolladas del 23 de enero al 22 de febrero de 2026, 23 de febrero al 15 de marzo de 2026 y del 06 de abril al 10 de abril de 2026, conto con las inspecciones a través de los preoperacionales a los equipos, vehículos, maquinaria, ejecutado por el personal SISO adscrito a este consorcio, verificando el estado óptimo de funcionamiento. **ANEXO 8. INSPECCIONES PREOPERACIONALES.**

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

$$nivel\ de\ indicador\ de\ cumplimiento = \frac{\#\ inspecciones\ de\ ingreso\ de\ maquinaria\ \ y\ equipos\ realizadas}{\#\ maquinaria\ y\ equipos\ ingresados}\ x100$$

Inspecciones de ingreso de maquinaria y equipos= 54
Maquinaria y equipos ingresados = 54

$$\boldsymbol{nivel\ de\ indicador\ de\ cumplimiento = 100\%}$$

3.6. RELACION DE PERSONAL DE OBRA.

El personal que interviene en el desarrollo de la obra corresponde a mano de obra calificada (Director de Obra, Ingeniero, etc) y la no calificada (cadenero, vigilantes, entre otros), el cual una vez reiniciado los trabajos luego de una suspensión de veintiún (21) días no sufrió modificación alguna. CONSORCIO PUERTO CLAVER ha realizado las respectivas afiliaciones y pagos de ley correspondientes a cada uno de sus trabajadores, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente.

CARGO	NOMBRE	CANTIDAD	AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Director de obra	Eder del Toro	1	SI
Residente de Obra	Carlos Mercado	1	SI
SISO	Mayulis Guerrero	1	SI
Topógrafo	Jairo Herazo	1	SI
Secretario	Rafael Ruiz	1	SI
Cadenero	Jaime Almario	1	SI
Cadenero	Jhon Almario	1	SI
Vigilante	Carlos Sequeda	1	SI
Vigilante	Alex Navarro	1	SI
	TOTAL	**9**	

Tabla 5. Relación de personal de obra. **Fuente:** Consorcio Puerto Claver.

Se adjunta planilla de pago de seguridad social y parafiscal correspondiente al mes de marzo del año 2025. **ANEXO 9. PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL.**

- **Inducción y perfil sociodemográfico del personal.**


En esta tercera acta parcial comprendido entre el 23 de enero al 22 de febrero de 2026, 23 de febrero al 15 de marzo de 2026 y del 06 de abril al 10 de abril de 2026, al igual que lo efectuado en las dos actas parciales al personal de nuevo ingreso se realizó induccion de seguridad y salud en el trabajo al personal de nuevo ingreso tanto de la mano de calificada como la no calificada, en conformidad con lo establecido en el ítem estándar 3.1.1 de la Resolución 0312 de 2019 solicita en su artículo 16 ***"Recolectar la siguientes información actualizada de todos los trabajadores del último año: la descripción socio demográfica de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil)"***. **ANEXO 10. FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.**


3.7. MEDIDA DE SEGURIDAD Y CONTROL DE TRAFICO.

Las actividades ejecutadas en esta tercera acta parcial perteneciente a la comunidad del Barrio La Punta en el Sector 1 en la carrera 31d entre calle 38 y calle 36 (k0+177,93) hasta la carrera 32 entre calle 36 y calle 35 (k0+296), mientras que el sector 2 en la calle 35 entre carrera 32 y carrera 29A (k0+740–k0+812), son los más perjudicadas por la restricción de vehículos en los sectores antes citados, el riesgo de la maquinaria con la entrada y salida de esta, equipo menor, herramienta menor en las zonas aledañas a sus viviendas el cual se continuo con la toma de medidas acordes con el PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) con su respectiva señalización en cumplimiento de la ley 769 de agosto de 2002 (Código Nacional de tránsito) y ajustado al manual de señalización del Ministerio del Transporte capítulo IV, Señalización. Las medidas adoptadas para las obras en la vía se desglosan lo siguiente:

1. Adecuación del área de almacenamiento de agregados, cemento y acero.
2. Señalización y demarcación de material utilizado.
3. Así mismo durante la ejecución de los trabajos se realizó la debida señalización del frente de obra ubicando señales (preventivas, reglamentarias e informativas).



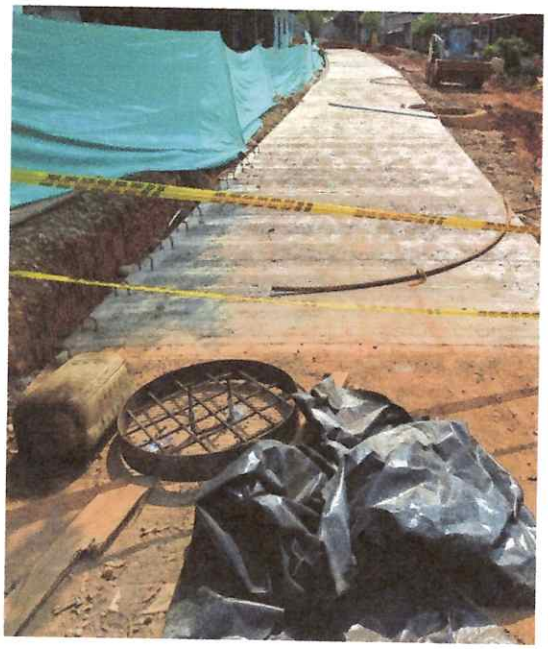

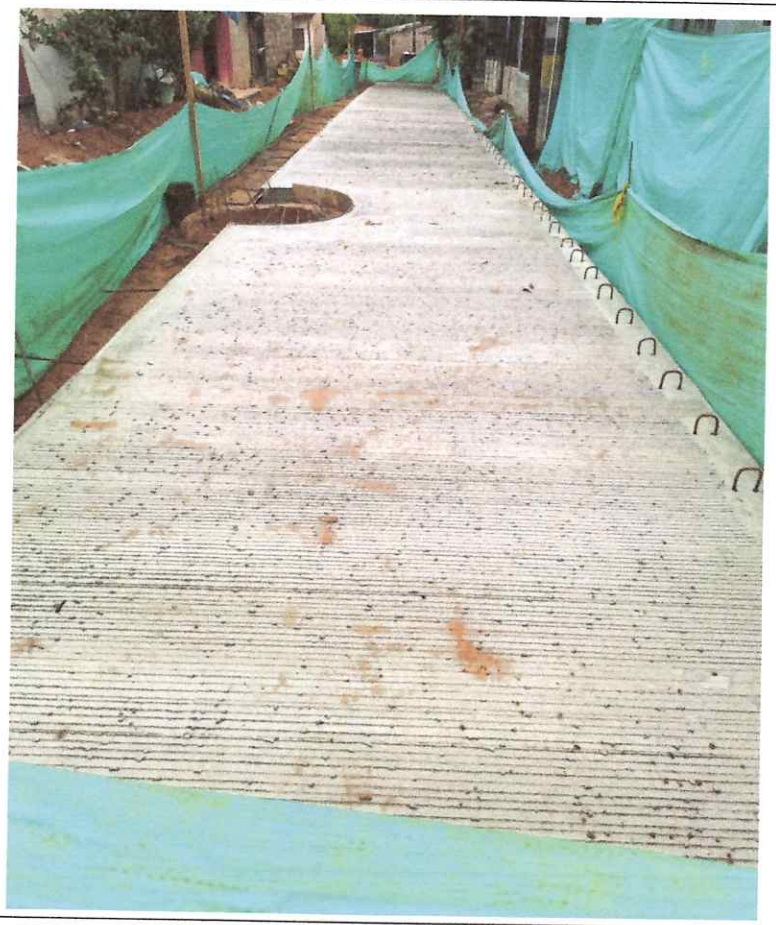

Fotografía 9, 10 Y 11. Durante el desarrollo de las actividades constructivas.

El **PMT No4 y No5** se detalla las medidas de seguridad adquiridas con sus respectivos soportes.

3.8. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El personal SISO continuo con la adopción de medidas en seguridad durante el periodo del 23 de enero al 22 de febrero de 2026, 23 de febrero al 15 de marzo de 2026 y del 06 de abril al 10 de abril de 2026, ejecutadas en esta tercera acta parcial la cual abarca lo siguiente:

- **Entrega de dotación y elementos de protección personal (EPP)**

En esta acta parcial Consorcio Puerto Claver continuo proporcionando al trabajador elementos de protección personal necesarios para la ejecución de las actividades establecidas en la tercera acta parcial de obra, acordes con los riesgos reales o potenciales existentes en los dos sectores intervenidos, todo ello conforme a la Resolución 2400 de 1979. **ANEXO 11. ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.**

En la siguiente fotografía se observa las evidencias de la entrega de la dotación respectiva.








Fotografías 12, 13 y 14. Entrega de dotación al personal de nuevo ingreso.

Por otro lado, CONSORCIO PUERTO CLAVER continuo con la reposición de EPP al igual que lo efectuado en el acta parcial 1 y 2, una vez este cumplió

su vida útil la cual se observa en el **ANEXO 11. ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.**

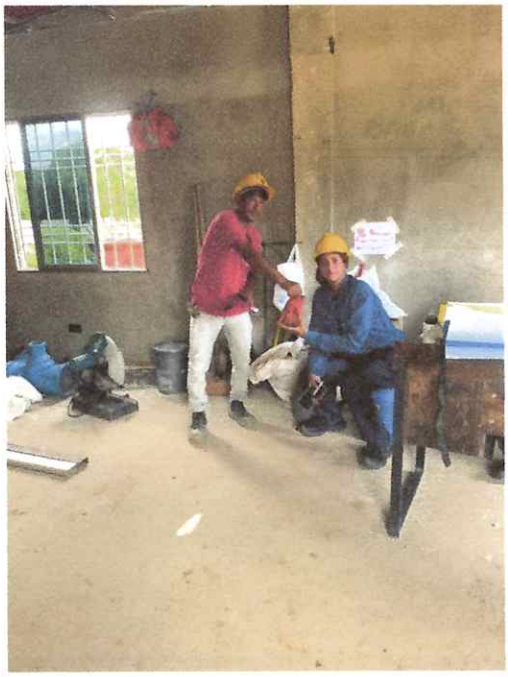



Fotografías 15 y 16. Reposición de elementos de Protección Personal.

- **Capacitación al personal de obra.**

CONSORCIO PUERTO CLAVER en conformidad a lo establecido en el decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, los dos sectores intervenidos durante esta tercera acta parcial, conto con capacitación a través de 3 charlas por lapso de 15 minutos, los temas tratados fueron: orden y aseo, EPP y el Ruido, tal y como se visualiza en la siguiente tabla:

TIPO	LUGAR	TEMA	NO. PERSONAS	TIEMPO (MIN)	HHC
Capacitación	Sector 2	EPP	8	15	2h 0min
Capacitación	Sector 2	Orden y Aseo	10	15	2h 30min
Capacitación	Sector 2	Ruido	6	15	1h 30min
		TOTAL	**35**		6h 00min

Tabla 6. Relación de capacitaciones y/o charlas ejecutadas. **Fuente:** Consorcio Puerto Claver.

Los soportes se ubican en el **ANEXO 12. CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.** Los indicadores de acuerdo a la tabla anterior se llevaron a cabo indicadores de cumplimiento

- ✓ **Capacitaciones**

$$nivel\ de\ indicador\ de\ cumplimiento = \frac{\#\ capacitaciones\ programada}{\#\ capacitaciones\ realizadas}\ x100$$

Capacitaciones programadas= 3
Capacitaciones realizada= 3

$$nivel\ de\ indicador\ de\ cumplimiento = 100\%$$


- ✓ **Personal sensibilizado**

$$nivel\ de\ indicador\ de\ cumplimiento = \frac{\#\ trabajadores\ sensibilizados}{\#\ trabajadores\ vinculados\ en\ obra}\ x100$$

Trabajadores sensibilizados = 24
Trabajadores vinculados en obra = 24

$$nivel\ de\ indicador\ de\ cumplimiento = 100\%$$

En las fotografías adjuntas se evidencia la realización de estas

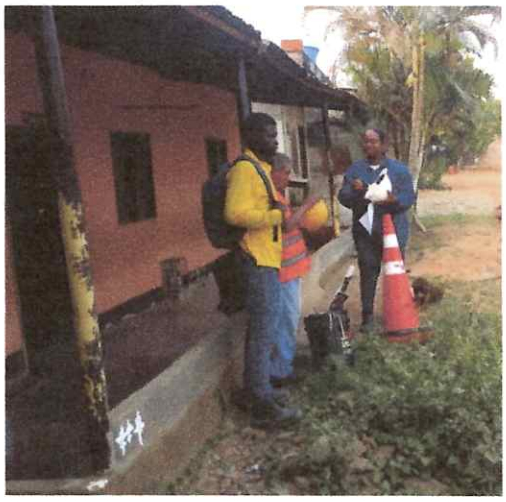

Fotografía 17. Charla KIT ANTIDERRAME en el sector 2.



Fotografía 18. Charla del reciclaje y la importancia del orden y aseo.

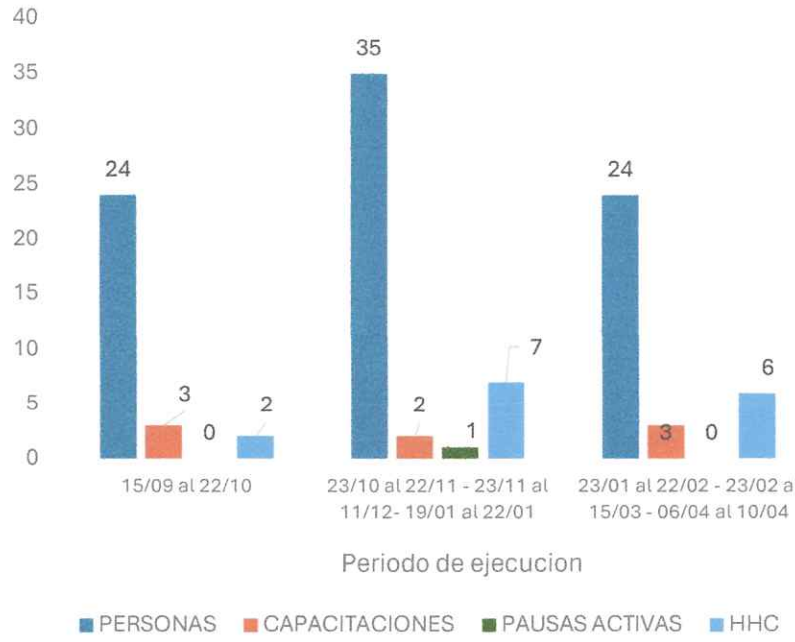


Gráfico 3. Capacitaciones del personal y su variación mensual. **Fuente:** Consorcio Puerto Claver.


De grafico anterior se observa las capacitaciones llevadas a cabo al personal entre el periodo del 23 de enero al 22 de febrero de 2026, 23 de febrero al 15 de marzo de 2026 y del 06 de abril al 10 de abril de 2026 además

de las actas parciales anteriores en sus respectivos y con ello se ha sensibilizado a lo largo del desarrollo del contrato 050/2025 un total de 8 capacitaciones y con ello 83 trabajadores en un tiempo de 15 horas hombres capacitadas.

- **Acompañamiento al personal de obra.**

De acuerdo a las actividades enmarcadas en el acta parcial 3, el personal SISO del consorcio continuo con el acompañamiento de acuerdo a la memoria de cantidades y con ello se verifica las condiciones del desarrollo de estas, acorde con las recomendaciones del profesional SISO en campo, utilizando todos los elementos de protección personal.




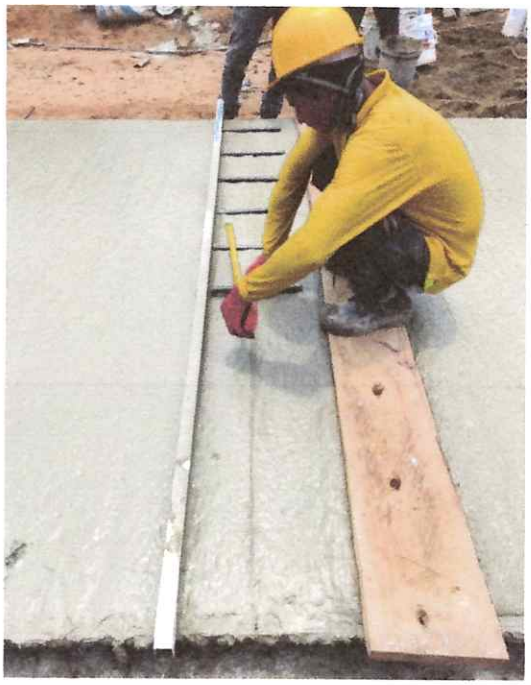


Fotografía 19 y 20. Acompañamiento en las actividades constructivas durante la instalación de tubería sanitaria en el sector 2.






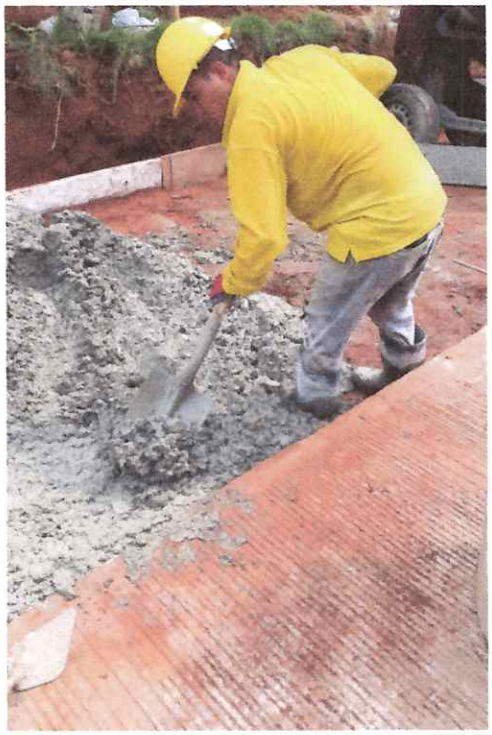

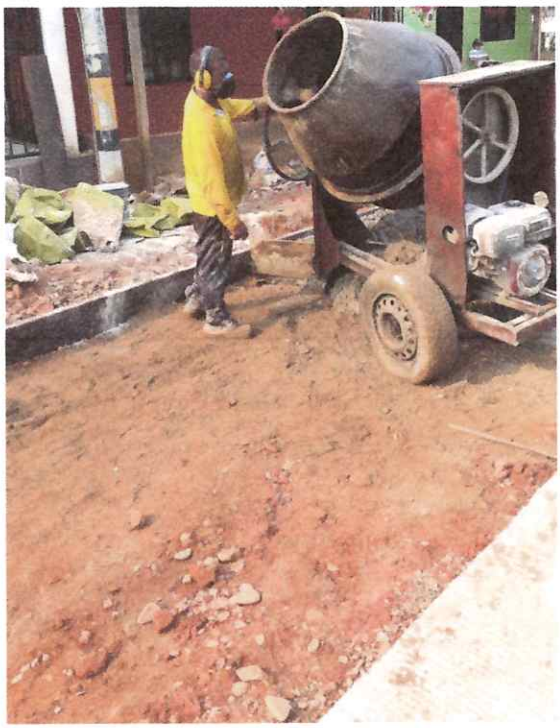

Fotografía 21, 22, 23 y 24. Acompañamiento en las actividades constructivas.

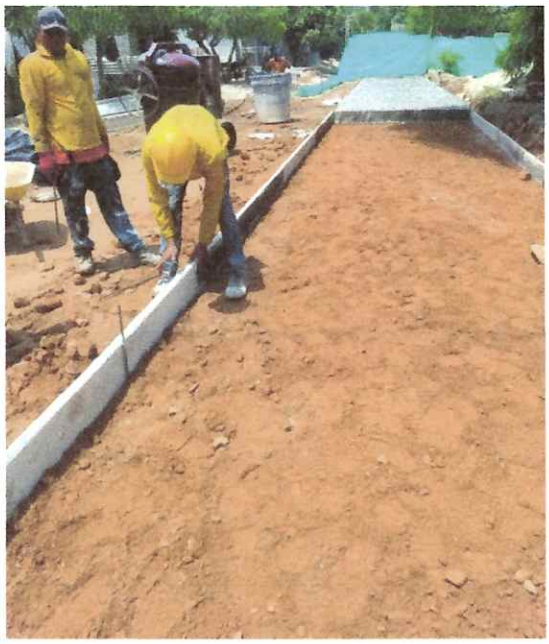

Fotografía 25. Acompañamiento en las actividades constructivas.

- **Incidentes.**

Durante el desarrollo de las actividades del del 23 de enero al 22 de febrero de 2026, 23 de febrero al 15 de marzo de 2026 y del 06 de abril al 10 de abril de 2026, no se presentaron incidentes de trabajo tanto para el personal calificado como no calificado.

Consorcio Puerto Claver continua con el desarrollo de capacitaciones en los temas de SST con el 100% de cumplimiento en cuanto al seguimiento y las observaciones al personal de obra por parte del personal SISO.

- **Accidentes de trabajo.**

Con respecto a este no se generó accidente alguno, en los cinco (05) meses de ejecución del contrato 050/2025.

- **Análisis del ausentismo**

En el periodo del 23 de enero al 22 de febrero de 2026, 23 de febrero al 15 de marzo de 2026 y del 06 de abril al 10 de abril de 2026, se presentó ausencia no médico en la mano de obra no calificada, tal y como se visualiza en la siguiente tabla

TIPO DE AUSENTISMO	CANTIDAD (DIAS)	MANO DE OBRA	HHA
AUSENTISMO MEDICO	0	CALIFICADA	0
AUSENTISMO NO MEDICO	2	NO CALIFICADA	16

Tabla 7. Relación de ausentismos y su mano de obra. **Fuente:** Consorcio Puerto Claver.

La relación de las Horas Hombre Trabajadas (HHT) y la Horas Hombre Ausentismo (HHA) durante las tres actas parciales se observa en la siguiente tabla:

MES	15 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE	23 OCTUBRE AL 22 NOVIEMBRE	22 NOVIEMBRE AL 11 DICIEMBRE	19 ENERO AL 22 ENERO	23 ENERO AL 22 FEBRERO	23 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO	06 DE ABRIL AL 10 DE ABRIL
HHT	3264	2688	1224	256	4608	3168	960
HHA	32	32	288	0	0	16	0
TOTAL DE PERSONAL	**12**	**14**	**17**	**8**	**24**	**24**	**24**

Tabla 8. Relación HHT y HHA. **Fuente:** Consorcio Puerto Claver.

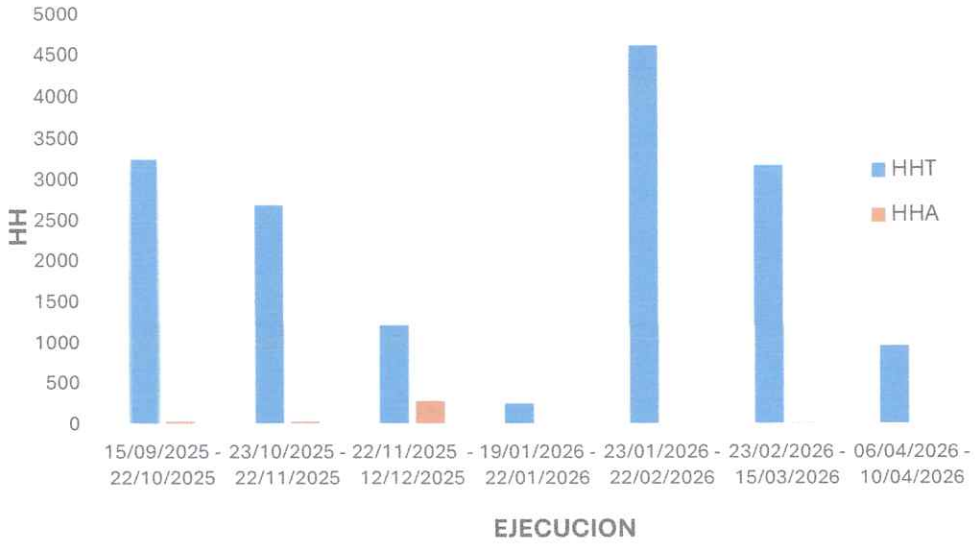


Gráfico 4. Porcentaje de HHT vs HHA. **Fuente:** Consorcio Puerto Claver.

El grafico anterior se observa la distribución en las tres actas parciales de las HH, y de la cual ha existido un total de 368 Horas Hombre Ausentismo (HHA) no medico relacionados en 31 días a lo largo de 16168 Horas Hombre Trabajadas (HHT).


3.9. INFORME GENERAL DEL TIEMPO

En el periodo comprendido entre el 23 de enero al 22 de febrero de 2026, 23 de febrero al 15 de marzo de 2026 y del 06 de abril al 10 de abril de 2026, del presente año se presentó días soleados, nublado, llovizna y lluvia tal y como se observa en el respectivo formato del estado del tiempo. **ANEXO 13. INFORME MENSUAL ESTADO DEL TIEMPO.**

3.10. INFORME AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LA OBRA

En esta tercera acta parcial, presento un % ejecutado acumulado del 89,99% correspondiente a $3.244.365.310,78 en relación a una programación programada del 90,00%.

A continuación, se observa la curva S con el avance programado y ejecutado en los cinco meses de ejecución en los periodos de ejecución de esta además de la Suspensión No2 y la Ampliación No1 de la cual fue objeto el contrato 050/2025 desde el 16 de marzo de 2026 al 05 de abril de 2026.

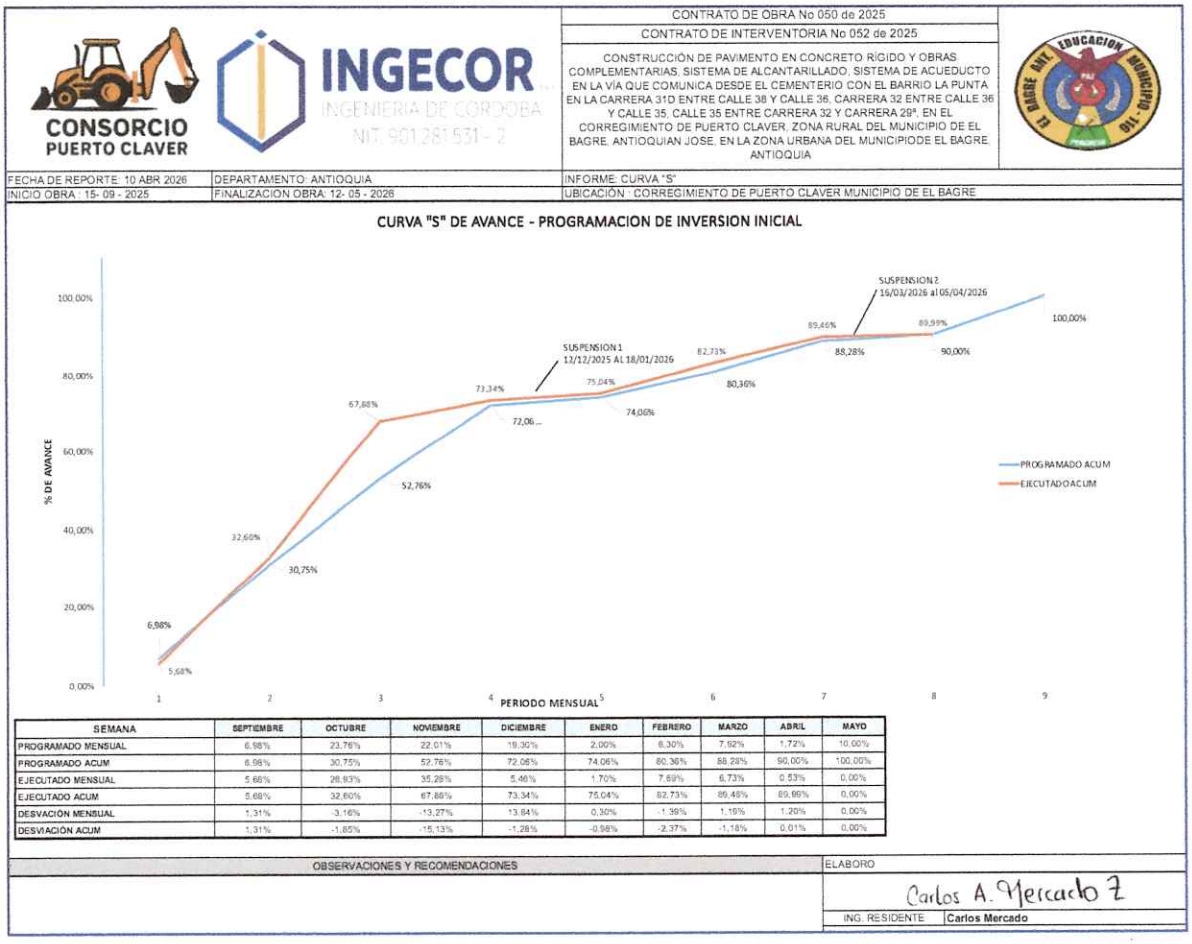

SEMANA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
PROGRAMADO MENSUAL	6,98%	23,76%	22,01%	19,30%	2,00%	6,30%	7,92%	1,72%	10,00%
PROGRAMADO ACUM	6,98%	30,75%	52,76%	72,06%	74,06%	80,36%	88,28%	90,00%	100,00%
EJECUTADO MENSUAL	5,68%	26,93%	35,28%	5,46%	1,70%	7,69%	6,73%	0,53%	0,00%
EJECUTADO ACUM	5,68%	32,60%	67,88%	73,34%	75,04%	82,73%	89,46%	89,99%	0,00%
DESVIACIÓN MENSUAL	1,31%	-3,16%	-13,27%	13,84%	0,30%	-1,39%	1,15%	1,20%	0,00%
DESVIACIÓN ACUM	1,31%	-1,85%	-15,13%	-1,28%	-0,98%	-2,37%	-1,18%	0,01%	0,00%

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

ELABORO

Carlos A. Mercado Z

ING. RESIDENTE | Carlos Mercado

Figura 3. Curva S contrato 050/2025. **Fuente:** Consorcio Puerto Claver.

3.11. OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO.

✓ BITACORA DE OBRA

El Residente de Obra diligencia la bitácora en cuanto a mano de obra, clima, maquinaria y equipos, además de las correspondientes actividades ejecutadas en la segunda acta parcial. **ANEXO 14. BITACORA DE OBRA.**

✓ ACTAS DE COMITÉ

Durante el presente periodo se realizan diferentes reuniones o comités técnicos en los sectores de ejecución desarrollados en las instalaciones de la EDTB y cuyos soportes de los comités se observan. **ANEXO 15. ACTAS DE COMITÉ.**

✓ CORRESPONDENCIA

Elaboración y trámite de correspondencia enviada y recibida ante el ente contratante y la Interventoría se observa claramente en el **ANEXO 16. CORRESPONDENCIA.**

✓ REGISTRO FOTOGRAFICO

Se adjunta el registro fotográfico del avance de obra, con la documentación de imágenes en el sector 2 y 1. **ANEXO 17. REGISTRO FOTOGRÁFICO.**

✓ COSTOS DE OFICINA, PAPELRIA Y OTROS

En la siguiente tabla se observa los costos indirectos establecidos en el contrato 050/2025:

	COSTO INDIRECTOS	CONTRATO	SOPORTE				
			15/09 AL 14/10	15/10 AL 14/11	15/11 AL 11/11 – 19/01 AL 22/01	23/01 AL 22/02	23/02 AL 15/03 – 06/04 AL 10/04
1	Arrendamiento de oficina y bodega	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Papelería, fotocopias, etc	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
3	Servicios públicos y Operacionales	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
4	Equipos de cómputos y comunicaciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Estación topográfica nivel y accesorios	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tabla 8. Costos indirectos contrato 050/2025. **Fuente:** consorcio Puerto Claver.

Lo desglosado en la tabla anterior se observa en el ***ANEXO 18. COSTOS DE OFICINA, PAPELERIA Y OTROS.***

4. CONCLUSIONES

El contrato de obra presento una Suspensión No2 la cual inicio el 16 de marzo de 2026 debido al paro minero en el Bajo Cauca Antioqueño y se extendió hasta el 05 de abril de 2026 y cuyo Reinicio No2 se efectuó el 06 de abril de 2026, arrojando una nueva fecha de terminación el 12 de mayo de 2026.

El acta parcial 3 posee un ejecutado acumulado de 89,99% correspondiente a $3.244.365.310,78 (TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS Y SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE) en relación a una programación programada del 90,00%.

Se continúa implementando el seguimiento y control de tráfico a través del PMT establecido en los estudios previos del contrato de obra 050/2025 para la ejecución del proyecto de obra, garantizando así las medidas de seguridad y el libre tránsito de la comunidad.

Así mismo, se deja constancia que se verifico por parte de la interventoría INGECOR S.A.S el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social.

ANEXO 11. ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Con el animo de protegar su salud,le estamos entregando las herramientas y/o equipos requeridos para realizar su actividad que acontinuación relacionamos, los cuales debe utilizar simpre que este cumpliendo con su labor. En caso de deterioro o perdida, informar a su jefe inmediato para que le sea entregado uno nuevo.

N°	NOMBRES	N° DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA	CANTIDAD DE EPP ENTREGADOS Diligencie en cada casilla el número de elementos entregados al trabajador, si la actividad no lo requiere coloque N/A										FIRMA DEL TRABAJADOR
				CASCO DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD	TAPABOCAS	BOTAS DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVAS	BUZOS	BOTAS DE CAUCHO	GUANTES	Otro EPP. Cantidad recibida	¿CUAL?	
1	Dounsa Mestra	1.066720685			X	X		X			4			Dounsa
2	Simón Mestra	1066727353			X	X		X			X			Simón
3	Rafael Salcedo	1101462777			X	X		X			X			Rafael
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

ACTA DE COMPROMISO

EL trabajadoe recibe los elementos personal previo a la induccion de uso adecuado y cuidado de los mismos, es responsabilidad del trabajador:
correctamente los equipos y elementos de proteccion persoanl
equipos y elementos de proteccion personal despues de su utilizacion en el lugar indicadopara ello
seguridad indistrial cualquier defecto, anomalia o daño apreciado en los equipos y elementos de proteccion personal utilizados con el fin de hacer el cambio, para lo cual debe devolver los deteriorados. Para constancia de ello se firma el documento.

1. Utilizar y cuidar
2. Colocar los
3. Informar al responsable de

Firma y datos del Coordinador de SST del Centro de Trabajo	Hayelis Guerra B.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Con el animo de proteger su salud,le estamos entregando las herramientas y/o equipos requeridos para realizar su actividad que acontinuación relacionamos, los cuales debe utilizar simpre que este cumpliendo con su labor. En caso de deterioro o perdida, informar a su jefe inmediato para que le sea entregado uno nuevo.

N°	NOMBRES	N° DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA	CANTIDAD DE EPP ENTREGADOS Diligencie en cada casilla el número de elementos entregados al trabajador, si la actividad no lo requiere coloque N/A									FIRMA DEL TRABAJADOR
				CASCO DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD	TAPABOCAS	BOTAS DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVAS	BUZOS	BOTAS DE CAUCHO	GUANTES	Otro EPP - Cantidad recibida	¿CUAL?	
1	Daricl Cuello	1066749265			X	X		X			X			Daricl C
2	Josie Urda	1066736933			X	X		X			X			Josie Urda
3	Esteban Pereira	1066739790			X	X		X			X			Esteban Pereira.
4	Matias calderon	1069191712	4/04/22		X	X		X			X			Matias calderon
5	Victor Reyes	1067293338			X	X		X			X			Victor Reyes
6	Danw. Soto.	1066789185			X	X		X			X			Danw S.
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

ACTA DE COMPROMISO

EL trabajador recibe los elementos personal previo a la induccion de uso adecuado y cuidado de los mismos, es responsabilidad del trabajador:
correctamente los equipos y elementos de proteccion persoanl.
equipos y elementos de proteccion personal despues de su utilizacion en el lugar indicadcpara ello.
seguridad indistrial cualquier defecto, anomalia o daño apreciado en los equipos y elementos de proteccion personal utilizados con el fin de hacer el cambio, para lo cual debe devolver los deteriorados. Para constancia de ello se firma el documento.

1. Utilizar y cuidar
2. Colocar los
3 Informar al responsable de

Firma y datos del Coordinador de SST del Centro de Trabajo	Mayelis Guerra B

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Con el animo de proteger su salud,le estamos entregando las herramientas y/o equipos requeridos para realizar su actividad que acontinuación relacionamos, los cuales debe utilizar simpre que este cumpliendo con su labor. En caso de deterioro o perdida, informar a su jefe inmediato para que le sea entregado uno nuevo.

N°	NOMBRES	N° DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA	CANTIDAD DE EPP ENTREGADOS Diligencie en cada casilla el número de elementos entregados al trabajador, si la actividad no lo requiere coloque N/A										FIRMA DEL TRABAJADOR
				CASCO DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD	TAPABOCAS	BOTAS DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVAS	BUZOS	BOTAS DE CAUCHO	GUANTES	Otro EPP. Cantidad recibida	¿CUAL?	
1	Simón Mestre	1066727753			X	X		X			X			[illegible]
2	Dounsa Mestre	1.066726858			X	X		X			X			Dounsa
3	ELIECER CALL	1091087508			X	X		X			X			
4	Rafael Salcedo	1101062777			X	X		X			X			Rafael
5	Daniel Cuello	1065749265			X	X		X			X			Daniel Cuello
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

ACTA DE COMPROMISO

EL trabajador recibe los elementos personal previo a la induccion de uso adecuado y cuidado de los mismos, es responsabilidad del trabajador:
1. Utilizar y cuidar correctamente los equipos y elementos de proteccion persoanl.
2. Colocar los equipos y elementos de proteccion personal despues de su utilizacion en el lugar indicadopara ello.
3. Informar al responsable de seguridad indistrial cualquier defecto, anomalia o daño apreciado en los equipos y elementos de proteccion personal utilizados con el fin de hacer el cambio, para lo cual debe devolver los deteriorados. Para constancia de ello se firma el documento.

Firma y datos del Coordinador de SST del Centro de Trabajo	Maylis Guerra B.

ANEXO 14. BITACORA DE OBRA.

[illegible] y Equipo Vibrocompactador (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Minicargador (1), Volqueta (2), Equipo menor, Equipo topografía, Herramienta menor.

Actividades:

- Se llevan a cabo labores en OBRA para las actividades de OBRA. del Pto proyect 2 por parcial del recubrimiento de Subbase
- La Cantidad de topografía tomas dentro para el Cato en calzada en el Pto 2 del KG+740. al KG+812.

Carlos A. Mercado Z

- Viernes 23 de Enero 2026
Estado del CLIMA. Soleado todo el jornada Laboral.
Personal de OBRA: Residente (1), Director (1), Topografo (1), Cadenero (2), Volquete (2), Sectores (1), DADORES (2), CUADRILLA de OBRA., SST (1)
Herramientas y Equipos: Vibrocompactador (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Volqueta (2), Minicargador (1), Equipo topografía, Herramienta menor, Equipo menor Utilizados.
- Se realizo la Imprimación en el Pto 2 del KG+740 al KG+812 para calzada.
-

Carlos A. Mercado Z

- SABADO 24 Enero de 2026
ESTADO del CLIMA: Soleado todo la jornada Laboral.
Personal de OBRA: Residente (1), Director (1), Topografo (1), Cadenero (2), Volquete (2), Laboral (1), PEONES (2), CUADRILLA de OBRA., SST (1)
Herramientas y Equipos: Vibrocompactador (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Volqueta (2), Minicargador (1), Equipo topografía, Herramienta menor, Equipo menor Utilizados
- Se realizo la imprimación en calzada
- Cambio topografía toma N.d del Eje todo

Domingo 25 de enero de 2026

No se labora

Carlos A. Mercado Z

Lunes 26 de enero de 2026
Estado del clima: Soleado toda la jornada laboral
Personal de obra: Director (1), Residente (1), topógrafo (1), SST (1), cadeneros (2), peones (1), Pintor (2), ayudante (2)
Maquinaria y equipos: Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), volqueta (2), Mezcladora (1), Equipo topográfico, Equipo menor, Herramienta menor, Planchas
- Se culmina con la cota de subrasante en el sector 2. del K0+740 al K0+810
- La cuadrilla de topografía Toma Nivel de Apoyo en el sector 2

Carlos A. Mercado Z

Martes 27 de enero de 2026
Estado del clima: Soleado toda la jornada laboral
Personal de obra: Director (1), Residente (1), topógrafo (1), SST (1), cadeneros (2), peones (1), Operario de Retroexcavadora (1), Pintor (2), Ayudante de obra
Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Volqueta (2), Mezcladora (1), Equipo topográfico, Herramienta menor, Equipo menor.
Actividades:
- Se inicia con el corte de subrasante en el tramo del K0+ 810
- Se inicia con el corte en subrasante del K0+790 al K0+310 ambos costados
- La cuadrilla topográfica toma Nivel en el tramo subrasante

Carlos A. Mercado Z

Miércoles 28 de ENERO de 2020
Estado del CLIMA: lluvia 7:00am - 12:00pm,
lluvia NO; poca 2:00pm, Estado estable de la jornada
Personal de OBRA: Residente (1), Director (1), SSTU (1),
Topógrafo (1), CAPATAZ (2), Velador (2), Peón (1),
Cuadrilla de OBRA.
TRABAJADORES y Equipo Vibrocompactador (1), Retroexcavadora
(1), Retroexcavadora (1), Minicargador (1), Volqueta (2), Equipo
topografía, Herramienta menor, Equipo menor
protección
- Se culmina en la excavación de este de Vigueta
en el sector 2 Fo+290 al Fo+310.
- Se inicia el fraguado del muro de refuerzo para
placas Aligeradas, Losas y BARRAS de ANCLAJE.

Carlos A. Mercado Z

- Jueves 29 de ENERO de 2020
Estado del CLIMA: soleado hasta las 1pm lluvia Leve
Personal de OBRA: Residente (1), Director (1), SST (1)
Topógrafo (1), CAPATAZ (2), ~~AYUDANTE~~, Velador (2), Peón
(2), Soldador (1) CUADRILLA DE OBRA
TRABAJADORES y Equipo: Vibrocompactador (1), Retroexcavadora
(1), Retroexcavadora (1), Volqueta (2), Minicargador (1), Equipo
topografía, Herramienta menor, Equipo menor
protección
- Se culmina en el fraguado de Muro de Refuerzo para
PLACAS Aligeradas, Losas, BARRAS de ANCLAJE, Muro
Transversal para bodegas.
- Se culmina excavación del Fo+290 al Fo+310
en el sector 2.
- Se realiza ensayos para el PT-40 de Fo+290,00

Carlos A. Mercado Z

Viernes 30 De Enero 2020
Lluvia 7:00 am - 12:00pm, Ingreso resto de la
jornada
NO SE TRABAJO
Carlos A. Mercado Z

SABADO 31 De Enero 2026
Estado de clima: bueno toda la jornada laboral
Personal de OBRA: Residente (1), SSTC(1), Operador (1), Cabos (2), Ayudante (2), Peones (1), CUADRILLA DE OBRA
Maquinaria y equipos: Retroexcavadora (1), Rodillo Vibratorio (1), Minicargador (1), Volqueta (2), Equipo topografico, Herramienta menor (1), Equipo menor
Retardos
- Se coloco en el Espesor del Box para Muro Angulo Izquierdo y transversal, tuvieron Dificultades, Dados y Espaldas de Anclaje.
- Se fundio este del Km 0+200 - Km 0+30 de este 2.
- El Concreto Empleado fue Mixto en Sitio realizado

Carlos A. Mercado Z

Domingo 01 de Febrero de 2026

NO SE LABORO

Carlos A. Mercado Z

LUNES 02 Febrero de 2026

NO SE LABORO

Carlos A. Mercado Z

MARTES 03 Febrero de 2026
Clima: bueno toda la jornada laboral
Personal de Obra: Director (1), Residente (1), SSTC(1), Topografo (1), Cabos (2), Ayudante (2), Peones (1), CUADRILLA DE OBRA
Maquinaria y Equipos: Vibrocompactador (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Volqueta (2), Cargador (1), Equipo topografico, Herramienta Menor, Equipo Menor,

Actividad:
- Inicio de la Instalación de equipamiento en el tesis 2 K0+740 al K0+812.
- Charla inicial [illegible] a la sub-base instalada.

Carlos A. Mercado Z

Miércoles 04 de Febrero 2026
Estado del tiempo: Soleado [illegible] la jornada laboral.
Personal de Obra: Ducto (1), Conduit (1), SST (1), Topografo (1), CADENERO (2), Ayudante (2), Soldador (1), CUADRILLA de OBRA, PALETAS (2)
HERRAMIENTA y Equipo: Vibrocompactador (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Minicargador (1), Volqueta (2), Equipo topografico, Equipo Menor, Herramienta Menor.
Actividades:
- Se continua con la Instalación de equipamiento en el tesis 2 K0+740 al K0+812.
- Charlas topograficas [illegible] en el equipamiento instalado

Carlos A. Mercado Z

Jueves 05 de Febrero de 2026
Estado del tiempo: Soleado toda la jornada laboral.
Personal de Obra: Ducto (1), Conduit (1), SST (1), Topografo (1), CADENERO (2), Ayudante (2), Soldador (1), CUADRILLA de OBRA, PALETAS (2)
HERRAMIENTA y Equipo: Vibrocompactador (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Minicargador (1), Volqueta (2), Equipo topografico, Equipo Menor, Herramienta Menor.
Actividades:
- Se continua con la instalación de [illegible] equipamiento en el tesis 2 K0+740 al K0+812
- Charlas topograficas [illegible] en la instalación del equipamiento

Carlos A. Mercado Z

Viernes 06 Febrero 2020
Estado del CLIMA: Soleado todo la jornada laboral.
Personal de OBRA: Residente (1), Residente (1), SST (1), topografo (1), CADENERO (2), Ayudante (2), Soldador (1), Oficial (2), CUADRILLA DE OBRA MAQUINARIAS Y EQUIPOS: Vibrocompactador (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Minicargador (1), Volqueta (2), Equipo topografico, Herramienta menor, Equipo menor
Actividades
- Se ubica Instalacion de [redacted] en el sector 2 del Abscisado K0+240 al K0+812.
- se hace Hincado del Abscisado soldado del K0+240 al K0+812
- se inicia Instalacion de Abscisado en el sector 2 K0+290 al K0+310

Carlos A. Mercado Z

SABADO 07 Febrero de [redacted] 2020
Estado del CLIMA: Soleado toda jornada laboral
Personal de OBRA: Residente (1), Residente (1), SST (1), topografo (1), CADENERO (2), Sectorista (1), Ayudante (2), Oficial (2), CUADRILLA DE OBRA MAQUINARIAS Y EQUIPOS: Vibrocompactador (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Minicargador (1), Volqueta (2), Equipo topografico, Equipo menor, Herramienta menor
Actividades
- Se hacha Instalacion del Abscisado en el sector 2 K0+290 al K0+310
- La cuadrilla topografia fue Nivelado en el Abscisado Instalado.

Carlos A. Mercado Z

Domingo 08 Febrero 2020

NO SE LABORO

Carlos A. Mercado Z

Lunes 09 de Febrero de 2026
Estado del CLIMA: Soleado toda la jornada laboral
Personal de OBRA: Directo (1), Residente (1), SST (1), topógrafo (1), OPERARIO (2), Vigilante (2), Portero (2), Sereno (1), CUADRILLA de OBRA
MAQUINARIAS y Equipos: Vibrocompactador (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Mezcladora (1), Volqueta (1), Equipo topográfico, Equipo menor, Herramienta menor.
Actividades:
- Se inicia Instalación del cabezote en el sector 2 K0+740 al K0+12.

Carlos A. Mercado Z

- MARTES 10 de Febrero de 2026
Estado del CLIMA: Soleado toda la jornada laboral
Personal de OBRA: Directo (1), Residente (1), SST (1), topógrafo (1), OPERARIO (2), Vigilante (2), PORTERO (2), Sereno (1), CUADRILLA de OBRA
MAQUINARIAS y Equipos: Vibrocompactador (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Mezcladora (1), Volqueta (2), Equipo topográfico, Equipo menor, HERRAMIENTA menor.
Actividades:
- Se continua con la instalación de tubos Grantes en el sector 2 K0+740 al K0+12.
- La cuadrilla topográfica toma Niveles de la tubería grantes instalada en el sector 2.

Carlos A. Mercado Z

- Miercoles 11 de Febrero de 2026
Estado del Clima: Soleado toda la jornada Laboral
Personal de OBRA: Directo (1), Residente (1), SST (1), topógrafo (1), OPERARIO (2), Vigilante (2), Sereno (1), PORTERO (2), Equipo topográfico, Herramienta Menor, Equipo menor.
Actividades:

Scanned with CamScanner

- Se continua con la instalación de subbase granular del km 0+740 al km 0+810
- No cuenta topografía fue nivelado en el subbase granular existente

Carlos A. Mercado Z

- Jueves 12 De Febrero de 2026
Estado del tiempo: Nublado 7:00 a 8:00 am, Lluvia 9 am a 11:00 am, y Nublado el resto de la jornada
Personal de OBRA: Director (1), Residente (1), SST (1), Topógrafo (1), CADENERO (2), Vigilante (2), Laterista (2), Operario (2), CUADRILLA DE OBRA
MAQUINARIAS y Equipos: Vibrocompactador (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Volqueta (2), Mezclador (1), Equipo topografía, Equipo menor, Herramienta menor
Actividades:
- Se realizó Instalación de subbase granular en el sector 2 del km 0+740 al km 0+810 (Lado izquierdo)
- No cuenta topografía fue nivelado en la subbase instalada

Carlos A. Mercado Z

- Viernes 13 De Febrero de 2026
Estado del tiempo: Nublado 7:00 a 8:00 am y el resto de la jornada Soleado
Personal de OBRA: Residente (1), Director (1), Topógrafo (1), CADENERO (2), Vigilante (2), Laterista (1), SST (1), CUADRILLA DE OBRA
MAQUINARIAS y Equipos: Vibrocompactador (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Mezclador (1), Volqueta (2), Equipo topografía, Equipo menor, Herramienta menor
Actividades:
- Se inicia Instalación de subbase granular en el sector 2 km 0+290 al km 0+310

Carlos A. Mercado Z

Scanned with CamScanner

SABADO 14 de Febrero DE 2026
Estado del CLIMA: Soleado toda la jornada
Personal DE OBRA: Director (1), Residente (1), SST (1), topógrafo (1), CADENEROS (2), Lenteros (1), Ayudante (2), PORTEROS (2), CUADRILLA DE OBRA.
MAQUINARIA y Equipos: Vibrocompactador (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Minicargador (1), Volqueta (2), Equipo topografía, Herramienta menor, Equipo menor.
Actividades
- Se continuo con las instalaciones de subbase granular en el sector 2 del KO+290 al KO+310.
- CP CAMINOS topografía toma Nivel en la subbase granular instalada
- Se instalan Rollos retalizos en el sector 2. KO+740.

Carlos A. Mercado Z

- Domingo 15 De Febrero 2026

NO SE LABORÓ

Carlos A. Mercado Z

LUNES 16 DE FEBRERO 2026
CLIMA: Soleado toda la jornada lluvia
Personal de OBRA: Director (1), Residente (1), SST (1), topógrafo (1), CADENERO (2), lenteros (1), Ayudante (2), PORTEROS (2), CUADRILLA DE OBRA
MAQUINARIA y EQUIPOS: Vibrocompactador (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Minicargador (1), Volqueta (2) Equipo topografía, Herramienta menor, Equipo menor
Actividades
- Se continua con las instalación de subbase granular en el sector 2 del KO+290 al KO+310
- Se instala vías de refugio en el KO+632,74 al KO+637,82 y rollos retalizos en subbase granular

Carlos A. Mercado Z

Scanned with CamScanner

Martes 17 de Febrero de 2026
Estado del clima: Soleado todo la jornada laboral
Personal de OBRA: Director (1), SST (1), Residente (1), topógrafo (1), CADENERO (2), Peones (1), Vigilante (2), Pintor (2), CUADRILLA DE OBRA
MAQUINARIA y EQUIPOS: Vibrocompactador (1), Retroexcavadora (1), Cargador (1), Formaleta (1), volqueta (2), Equipo topografía, Herramienta Menor, Equipo Varios
Actividades
- Se funde concreto en Placa piso del tanque 1 de 637,82
- Se instala acero de refuerzo transversal en Bordillo del TK 0+632,79 al tanque 1+637,82, Dowels y BARRAS de Anclaje
- Se instala malla en la subbase granular tanque 1+639,24 al tanque 647,82.

Carlos A. Mercado Z

- Miercoles 18 Febrero de 2026
Estado del clima: Soleado todo la jornada laboral
Personal de OBRA: Director (1), SST (1), Residente (1), topógrafo (1), CADENERO (2), Peones (1), Vigilante (2), PINTOR (2), CUADRILLA DE OBRA
MAQUINARIA y EQUIPOS: Vibrocompactador (1), Retroexcavadora (1), Cargador (1), Formaleta (1), volqueta (2), Equipo topografía, Equipo Varios, Herramienta Menor
Actividades
- Se funde concreto vigueta en FR=40 M/M2 del tanque 1+639,24 al tanque 647,82.
- Se instala malla metálica en subbase granular del acero de refuerzo por BARRAS de Anclaje, placa vigueta del tanque 1+637,82 al tanque 1+812.
- Se instala acero transversal para bordillo en Ø 3/8"

Carlos A. Mercado Z

Scanned with CamScanner

Jueves 19 Febrero de 2026.
Estado del clima: Soleado toda la jornada (temp)
Personal de OBRA: Director (1), Residente (1), SST (1), topografo (1), CADENEROS (2), Vigilante (2), Ferreros (1), CUADRILLA DE OBRA; DADORES (2)
EQUIPAMIENTO y Equipos: Vibrocompactador (1), Retroexcavadora Retroexcavadora (1), Formaleta (1), Volqueta (2), Equipo topografico, Formaleta recta, Equipo varios
Actividades
- Se funde pavimento rigido FR= 40kg/cm² del K0+737,81 se instalan dowel ferrules en BADILLOS Ø 3/8".
- DOWELS y BARRAS De Anclaje.
- Se instalan Rieles Metalicos en el costado izquierdo K0+632,79 al K0+637,82.

Carlos A. Mercado Z

- Viernes 20 de Febrero de 2026
Estado del CLIMA: Soleado toda la jornada (temp)
Personal de OBRA: Director (1), Residente (1), SST (1), topografo (1), CADENEROS (2), vigilante (2), Ferreros (1), CUADRILLA de OBRA, PALETERO (2)
EQUIPAMIENTOS y Equipos: Director (1), Residente (1), SST (1) topografo (1), CADENEROS (2), Vigilante (2), Ferreros (1), CUADRILLA De OBRA, PALETERO (2).
Actividad
- Se funde concreto en Pavimento rigido FR=40kg/cm² del K0+632,79 al K0+637,82,
- Se instalan BADILLOS Ø3/8" transversal, Dowels y BARRAS de ANCLAJE
- Se instalan Rieles metalicos en costado izquierdo del K0+639,29 al K0+647,82.

Carlos A. Mercado Z

- SABADO 21 Febrero de 2026.
Estado del CLIMA: Soleado toda la jornada (temp)
Personal de OBRA: Director (1), Residente (1), SST (1), topografo (1), CADENEROS (2), Vigilante (2), Ferreros (1), PALETA (2)

CUADRILLA DE OBRAS
RECEPCIONA Y EQUIPOS: Vibrocompactador (1), Retroexcavadora de oruga (1), Rompedor (1), Volqueta (2), Equipo topográfico, herramienta menor, Equipo menor.
Actividades
Ejecutadas.
- Se funde concreto MR = 42 kg/cm² del K0+639,24 al K0+647,82
- Se instalan Rejillas metálicas del K0+737,81 al K0+812.
- Se instala bordillos en cuneta de relleno 4 3/8"; Dados y BARRAS de anclaje.

Carlos A. Mercado Z

- Domingo 22 de Febrero 2020
Estado del CLIMA: Soleado toda la jornada laboral
Personal de OBRA: Residente (1), Director (1), SST (1), Retroexcavadora (1), Rompedor (1), Equipo (1), OPERARIO (2), Soldador (1), Pilotes (2), Vigilante (2), CUADRILLA DE OBRAS MAQUINARIA y Equipos: Vibrocompactador (1), Retroexcavadora (1), Rompedor (1), Retroexcavadora (1), Volqueta (2), Equipo topográfico, Equipo menor, Herramienta menor
Actividades.
- Se funde concreto de MR = 42 kg/cm² del K0+737,81 al K0+812.
- Se instala Reja estado (3ruedo del K0+619,24 al K0+737,81.; K0+297,08 al K0+318,07
- Se instalo cuneta de Relleno para placas Angulos y BARRAS de Anclaje.

Carlos A. Mercado Z

- LUNES 23 de Febrero 2020
Estado del CLIMA: Soleado toda la jornada laboral
Personal de OBRA: Residente (1), Director (1), SST (1), Equipo (1), OPERARIO (2), Vigilante (2), Soldador (1),

Peones (2), CUADRILLA DE OBRA
MAQUINARIA y equipos: Vibrocompactador (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Mezclador (1), Volqueta (2), Equipo topografía, Herramienta menor, Equipo menor.
Actividades
- Se inicia excavación del K0+040,71 al K0+077,81 y del K0+277,03 al K0+313,01
- Se entrega Novedad, no hay formaleta para bordillos y 3/8"

Carlos A. Mercado Z

- MARTES 24 de Febrero DE 2020
Estado del CLIMA: Soleado toda la jornada laboral
Personal de OBRA: Residente (1), Director (1), SST (1), topografo (1), CONDUCTOR (2), Vigilante (2), Inspector (1), PEONES (2), CUADRILLA DE OBRA
MAQUINARIA y EQUIPS: Vibrocompactador (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Volqueta (2), Equipo topografía, Herramienta menor, Equipo menor.
Actividades:
- Se Inicia Mejoramiento del Afirmado en el sector 1 del K0+220 al K0+290.
- La Cuneta triangular fue nivelada en el mejoramiento existente

Carlos A. Mercado Z

MIERCOLES 25 de Febrero 2020.
Estado del CLIMA: Soleado toda la jornada laboral
Personal de OBRA: Residente (1), Director (1) SST (1) topografo (1), CONDUCTOR (2), Vigilante (2), Inspector (1), PEONES (2), CUADRILLA DE OBRA
MAQUINARIA y EQUIPS: Vibrocompactador (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Volqueta (2), Equipo topografía, Mezclador (1), Herramienta menor, Equipo menor
Actividades
- Se continua en el mejoramiento en el Afirmado sector 1 K0+220 al K0+290
- Se Inicia en el Cajeado para Bordillos, SARDINELES de ANCHO, Base de Apoyo PARA Bordillos, PLACAS Inclinadas

- Lo cual queda bajo mi cuidado y responsabilidad.

Carlos A. Mercado Z

- Jueves 26 de Febrero de 2026
Estado del clima: nublado 7:00 a 8:00am, resto de la jornada soleado
Personal de OBRA: Dueña (1), Residente (1), SST (1), topógrafo (1), cadeneros (2), Ayudante (2), Soldador (2), Soldador (1), cuadrilla de OBRA.
MAQUINARIA y equipo: Retroexcavadora (1), Rodillo liso (1), Retroexcavadora (1), vehículo (2), Mezclador (1), Equipo topográfico, Equipo menor, Herramienta menor
Actividades:
- Se continua con la colocación de empradización en el sitio 9, K0+220 al K0+290
- Se continua con el riego del pasto de Rollos en Zarzo, BARRAS de Anclaje, PLACAS Empalme, con tensogel para SOKdrillo.

Carlos A. Mercado Z

- Viernes 27 de Febrero de 2026
Estado del clima: Lluvia 7:00 am - 11:00 am, nublado el resto de la jornada
Personal de OBRA: Dueña (1), Residente (1), SST (1), topógrafo (1), cadeneros (2), Soldador (1), Ayudante (2), cuadrilla de OBRA
MAQUINARIA y equipo: Retroexcavadora (1), Rodillo liso (1), Retroexcavadora (1), Mezclador (1), vehículo (2), Equipo topográfico, Herramienta menor, Equipo menor
Actividades
- La jornada laboral no inicio a las 7:00pm debido a la lluvia en el sector de Puerto Colón
- Se continua con la instalación de empradización en el sitio 9 del K0+220 al K0+290
- Ningún topógrafo tomo nivel en el empradizado instalado.

- Se realiza en el kilometro del cruce de riego. Retiro, señales de reflexivas, pasos trapiados, acero de refuerzo terminal para botadero.

Carlos A. Mercado Z

- SOMOS 28 de Febrero de 2026
Estado del CLIMA: Soleado todo la jornada Laboral
- Personal de OBRA: Jefe (1), Residente (1), SST (1), Topógrafo (1), Cadeneros (2), Ayudante (2), Pintores (2), Señales (1), CUADRILLA DE OBRA
- EQUIPOS y Herramientas: Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), volqueta (2), Equipo topografico, Equipo Flow, Herramienta Menor
Actividades:
- Se realiza la Instalación de Hitos en el sector 1 KO+220 al K0+240
- La cuneta triangular fue vaciada en el segundo instalado en el sector 1 del K0+220 al K0+240

Carlos A. Mercado Z

- Bogotá 09 de Marzo de 2026

NO se LABORO

Carlos A. Mercado Z

- LUNES 02 MARZO de 2026
Estado del CLIMA: Soleado todo la jornada Laboral
Personal de OBRA: Jefe (1), Residente (1), SST (1), topografo (2), CADENEROS (2), Ayudante (2), Señales (1), Pintor (2), CUADRILLA DE OBRA
EQUIPOS y Herramientas: Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), volqueta (2), Equipo topografico, Equipo Flow, Herramienta Menor
Actividades
- Se Realiza instalación de Subbase granular del

KO+180 al KO+290

- LA CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIENE UNA LONGITUD DE LA SUBBASE GRANULAR ESTABLECIDA

Carlos A. Mercado Z

- MARTES 03 DE MARZO DE 2020
- ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO TODO EL DIA (ASFALTO)
- PERSONAL DE OBRA: INGENIERO (1), INGENIERO (1), SST (1), TOPOGRAFO (1), CADENERO (2), AYUDANTE (2), AYUDANTE (2), OPERARIO (1), CUADRILLA DE OBRA.
- MAQUINARIA Y EQUIPOS: VIBROCOMPACTADOR (1), RETROEXCAVADORA (1), RETROCARGADOR (1), MOTONIVELADORA (1), VOLQUETA (2), EQUIPO TOPOGRAFICO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO MENOR
- ACTIVIDAD:
- SE CULMINA CON LA CONSTRUCCIÓN DE SUBBASE GRANULAR DE EL SECTOR 1 DE KO+180 AL KO+290.
- LA CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIENE UNA LONGITUD DE LA SUBBASE GRANULAR ESTABLECIDA

Carlos A. Mercado Z

- MARTES 04 DE MARZO DE 2020
- ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO TODO EL DIA (ASFALTO)
- PERSONAL DE OBRA: INGENIERO (1), INGENIERO (1), SST (1), TOPOGRAFO (1), CADENERO (2), AYUDANTE (2), AYUDANTE (2), OPERARIO (1) CUADRILLA DE OBRA.
- MAQUINARIA Y EQUIPOS: VIBROCOMPACTADOR (1), RETROEXCAVADORA (1), RETROCARGADOR (1), MOTONIVELADORA (1), VOLQUETA (2), EQUIPO TOPOGRAFICO, EQUIPO MENOR, HERRAMIENTA MENOR.
- ACTIVIDAD
- SE CULMINA CON LA CONSTRUCCIÓN DE SUBBASE GRANULAR DEL KO+180 AL KO+290
- LA CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIENE UNA LONGITUD DE LA SUBBASE GRANULAR ESTABLECIDA
- SE CULMINA CON EL TENDIDO DEL PASO DE PEATONES EN PLACA HUELLA, CUNETA, BANQUETA DE CONCRETO, CON TERRAZO PARA BORDILLO.

Carlos A. Mercado Z

Scanned with CamScanner

Jueves 05 de marzo de 2026
Estado del clima: Soleado toda la jornada laboral
Personal de obra: Director (1), Residente (1), SST (1), Topógrafo (1), Cadenero (2), Peón (2), Soldador (1), cuadrilla de obra
Maquinaria y equipo: Retroexcavadora (1), Retrocargador (1), Motoniveladora (1), Mixer grande (1), volqueta (2), Equipo topográfico, Equipo menor, Herramienta menor
Actividades:
- Se retoma en la instalación de tubería de hierro galvanizado en el sector 1 del km 150 al km 290
- La cuadrilla topográfica toma nivel de la tubería recién instalada
- Se realiza un recorrido del área de trabajo con el ingeniero residente, Director de obra, SST y el Capataz.

Carlos A. Mercado Z

- Viernes 06 de marzo de 2026
Estado del clima: Nublado 7:00 a 10:00 am y soleado el resto de la jornada laboral
Personal de obra: Director (1), Residente (1), SST (1), Topógrafo (1), Cadenero (2), Soldador (1), Ayudante (2), Pintor (2), cuadrilla de obra
Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora (1), Retrocargador (1), Motoniveladora (1), volqueta (2), Equipo topográfico, Equipo menor, Herramienta menor
Actividades:
- Se retoma en la instalación de tubería galvanizada en el km 150 al km 290
- La cuadrilla topográfica toma nivel en la tubería recién instalada.
- Se realiza un recorrido por área de trabajo, Director de obra, SST y el Capataz.

Carlos A. Mercado Z

SABADO 07 MARZO de 2026
Estado del CLIMA: Soleado toda la jornada
Personal de OBRA: Dexter (1), Rosalito (1), SST (1), topografo (1), CADenero (2), Ayudante (2), Saloon (1), PALito (1), CUADRILLA DE OBRA
HERRAMIENTAS y Equipo: Vibrocompactador (1), Retroexcavadora (1), Rebarjador (1), Mezcladora (1), Martillo (1), Vibrador (2), Equipo topografico, Equipo ROW, Equipo ROW
Actividades
- Se realizo instalacion de tubo ranurado en el sitio 1 KM 18+040
- Otros topografos toma cota en el sublote ya instalado.
- Se instalo RAP relleno en los tubos ranurados KM 18+040.

Carlos A. Mercado Z

- Dia 08 de MARZO de 2026

NO se LABORO

Carlos A. Mercado Z

- LUNES 09 de MARZO de 2026
CLIMA: Soleado toda la jornada Laboral
Personal de OBRA: Dexter (1), Rosalito (1), SST (1), topografo (1), CADenero (2), Ayudante (2), Saloon (1), PALito (2), CUADRILLA DE OBRA
HERRAMIENTAS y Equipo: Vibrocompactador (1), Rebarjador (1), Retroexcavadora (1), Mezcladora (1), Martillo (1), Vibrador (2), Equipo topografico, Equipo ROW, Herramienta ROW
Actividades
- Se inicia en la instalacion de pavimento rigido MR= 40 kg/cm² en el setor 1 del KM 18+93
- Se coloca Dovelas, BARRAS de ANCLAJE, demas transf para bordillo en Ø3/8".

Carlos A. Mercado Z

- Martes, 10 De marzo de 2026
Estado del clima: Lluvia toda la jornada laboral
Personal de OBRA: Director (1), Residente (1), topógrafo (1), SST (1), Operarios (2), Vigilante (2), Peones (1), Soldadores (2), CUADRILLA DE OBRA
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volqueta (1), Retroexcavadora (1), Retrocargador (1), Mezcladora (2), Vibrador (1), Equipo topografía, Equipo menor, Herramienta menor
Actividad
- Se instala Riel en la Sección anclas instaladas.
- Se instala BARRAS de Acero, anclaje de refuerzo en placas inferior en el sector 1.
- Se realiza viga en placa de concreto en punto anclas instaladas

Carlos A. Mercado Z

- Miercoles 11 De marzo 2026
Estado del CLIMA: Lluvia toda la jornada laboral
Personal de OBRA: Residente (1), Director (1), SST (1), topografo (1), Sectorista (1), Operarios (2), Vigilante (2), Peones (2), CUADRILLA DE OBRA.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Volqueta (1), Retroexcavadora (1), Retrocargador (1), Mezcladora (1), Vibrador (2), Equipo topografia, Herramienta menor, Equipo menor
Actividades
- Se instala pernos rigido de DIR= 40 M/m²
- Se instala Anclas y cajas de Refuerzo transversal en Rieles
- Se instala nivel retenido en la Sección anclas de ±0+177,93.

Carlos A. Mercado Z

- Jueves 12 de marzo de 2026
Estado del CLIMA: Soleado toda la jornada laboral
Personal de OBRA: Director (1), Residente (1), SST (1)

Topógrafo (1), CADENERO (2), Residente (1), Ayudante (2), PEÓN (2), CUADRILLA de OBRA

- MAQUINARIA y Equipo: Retroexcavadora (1), Rodillo liso (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Equipo topográfico, Camioneta Ram Platinada
- Se realiza inicio de prueba de carga Pilote Barrera desde el KD+177,93
- Se inician Pilotes, con traslado por cuadrillas de 3/3', Pilote Ensayo

Carlos A. Mercado Z

- VIERNES 13 DE MARZO de 2024
Estado del CLIMA: Soleado toda la jornada laboral
Personal de OBRA: Director (1), Residente (1), SST (1), Topógrafo (1), CADENERO (2), Ayudante (2), Inspector (2), PEÓN (2), CUADRILLA de OBRA
MAQUINARIA y Equipo: Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Volqueta (2), Equipo topografía (1), Camioneta Ram, Equipo Ram Platinado
- Se inician pilotes Metálicos en su base gente en el sector 1
- Se colga este transcurso en clase
= Se colgó este transcurso porque ayudo colegio

Carlos A. Mercado Z

- SABADO 14 de MARZO de 2024
Estado del CLIMA: Soleado toda la jornada laboral
Personal de OBRA: Director (1), Residente (1), SST (1), Topógrafo (1), CADENERO (2), Ayudante (2), Inspector (2), PEÓN (2), Cuadrilla de OBRA
MAQUINARIA y Equipo: Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Volqueta (2), Equipo topográfico, Camioneta Ram, Equipo Ram Platinado

Scanned with CamScanner

- x instala transito coyed TLK=16 kg/cm² en el tanque hasta el t=+255,14.
- S instala Acero terminal para bastidor 3/8" pernos y cant para Stand Inyect.

Carlos A. Mercado Z

Domingo 15 de MARZO de 2026

NO x LABORO

Carlos A. Mercado Z

LUNES 16 DE MARZO 2026
Estado del CLIMA: Soleado toda la jornada laboral
Personal de OBRAS: Pinta (1), Rondero (1), SSTC (1) topógrafo (1), CADENERO (2), cadenero (2), Semanero (1), PÓRTES (2), CUADRILLA DE OBRA.
MAQUINARIA y Equipo: Vibrocompactador (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Montacargas (1), Camioneta (2), Equipo topográfico, Planta de luz, Equipo Menor
Actividades
Se lleva a cabo corte de Obra #18 desde el PK0+000 en el EJE CENTRAL y el Ensanche hacia el Margen de Izq BORDE, y en pro de salvaguardar el personal de OBRA e Instalaciones se coloca Señalamiento Preventivo No 2.

Carlos A. Mercado Z

MARTES 17 DE MARZO DE 2026

Suspendido por Orden Publica, PARO MINERO

Carlos A. Mercado Z

Scanned with CamScanner

Martes 18 De MARZO de 2020

Supervisor por PAPA MINERO

Carlos A. Mercado Z

Jueves 19 De MARZO de 2020

Supervisor por PAPA MINERO

Carlos A. Mercado Z

Viernes 20 de MARZO de 2020

Supervisor por papa MINERO

Carlos A. Mercado Z

~~Sabado~~ 21 De MARZO de 2020 (SABADO)

Supervisor por PAPA MINERO

Carlos A. Mercado Z

Domingo 22 De MARZO 2020

Supervisor por PAPA MINERO

Carlos A. Mercado Z

Lunes 23 De MARZO de 2020

Supervisor por PAPA MINERO

Carlos A. Mercado Z

~~MARTES~~ 24. De MARZO DE 2020

Supervisor Por PAPA MINERO

Carlos A. Mercado Z

Scanned with CamScanner

Miercoles 25 DE MARZO DE 2020

Suspension por PARO MINERO

Carlos A. Mercado Z

Jueves 26 de MARZO DE 2020

Suspension por PARO MINERO

Carlos A. Mercado Z

VIERNES 27 de MARZO de 2020.

Suspension por PARO MINERO

Carlos A. Mercado Z

SABADO 28 DE MARZO de 2020

Suspension por PARO MINERO

Carlos A. Mercado Z

DOMINGO 29 de MARZO 2020

Suspension por PARO MINERO

Carlos A. Mercado Z

LUNES 30 DE MARZO 2020

Conte de OBRA #19, ADICION N°1 Suspension 2

Carlos A. Mercado Z

MARTES 31. de MARZO de 2020

Suspension Por PARO MINERO

Carlos A. Mercado Z

Scanned with CamScanner

Martes 09 De Abril de 2016

Suspensión por PARO MINERO

Carlos A. Mercado Z

Jueves 07 De ABRIL de 2016

Suspensión por PARO MINERO

Carlos A. Mercado Z

VIERNES 08 De ABRIL De 2016

SUSPENSIÓN POR PARO MINERO

Carlos A. Mercado Z

SABADO 04 De ABRIL DE 2016

Suspensión por PARO MINERO

Carlos A. Mercado Z

Domingo 05 de ABRIL de 2016

Suspensión por PARO MINERO

Carlos A. Mercado Z

LUNES 06 De ABRIL de 2016
Estado del CLIMA SOLEADO todo la jornada laboral.
Personal de OBRA: Dueño (1), Residente (1), topógrafo (1), SSTC (1), CADENEROS (2), Señores (1), oficiales (2), PEÓNES (2), CUADRILLA de OBRA (PERSONAL) y Equipos: Volqueta (1), Retroexcavadora Mixta (1), Volqueta (2), Equipo topográfico Estación Total, Equipo Menor, Pulidora (1) Pulidora

- Se instala rieles retenidos, AEN (se suelden) quedan instalados del K0+285,95 al K0+295 en el sect 1
- Se instalan cruz de refuerzo (cruz para) soportes y BARRAS de ANCLAJE.

Carlos A. Mercado Z

MARTES 07 de Abril de 2026
Estado del CLIMA: Soleado todo la jornada Laboral
Personal de OBRA: Director (1), Residente (1), SST (1), CAPATAZ (2), Topografo (1), Soldador (1), Ayudante (2), Peones (2), CUADRILLA de OBRA
HERRAMIENTAS y EQUIPOS: Videocompactador (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Minicargador (1), volqueta (2), Equipo topografico, Herramienta menor, Equipo menor (1).
Actividad
- Se colocan instalación de pernos rígidos PR=4 stylus del K3+285,95 al K3+295.
- Se instala Bandeja en Ø3/8 tramos.
- Se instala Pasacables, BARRAS de ANCLAJE.

Carlos A. Mercado Z

- Martes 08 de Abril de 2026
Estado del CLIMA: Soleado Toda la jornada laboral.
Personal de OBRA: Director (1), Residente (1), SST (1), topografo (1), CAPATAZ (2), Soldador (1), Ayudante (2), Peones (2), CUADRILLA de OBRA
HERRAMIENTAS y EQUIPOS: Videocompactador (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Minicargador (1), volqueta (2), Equipo topografico, Herramienta menor, Equipo menor.
Actividad
- Se colocan instalación de Pernos en Soldados y muros
- Se instala BARRAS de Anclaje., Abrazaderas en PLACAS Empalmes
- Se colocan Cable en pernos rígidos instalados TENSIONADO.

Carlos A. Mercado Z

Jueves 07 de Abril de 2022
Estado del clima: Soleado toda la jornada laboral
Personal de OBRA: Dicta (1), Rachete (1), SPTC (1), Cobreros (2), topógrafo (1), Vigilante (2), Señalero (1), Plástico, Cuadrilla de Obra
MAQUINARIA y Equipo: Retroexcavadora (1), Retrocargador (1), Vibrocompactador (1), Volqueta (2), Equipo topográfico, Equipo Rana, Herramienta menor
Actividades
- Se instala geotextil NT2400 de RR = 40 kN/m²
- Se instala bordillo en concreto rígido.
- Se instala pavimento ~~rígido~~ en el sector 1 longitudinal del K0+190 al K0+285,12. en el costado derecho y en el costado izquierdo del K0+184,87 al K0+191,52.
- Se instala pavimento longitudinal en el sector 2 del K0+296,10 al K0+318,07 del costado derecho

Carlos A. Mercado Z

- Viernes 08 de Abril de 2022
Estado del clima: Soleado toda la jornada laboral
Personal de OBRA: Dicta (1), Rachete (1), SPTC (1), topógrafo (1), Vigilante (2) Cobrero (2), Señalero (1), PLASTERO (2), CUADRILLA DE OBRA
MAQUINARIA y Equipos: Vibrocompactador (1), Retroexcavadora (1), Retrocargador (1), Volqueta (2) Equipo topográfico, Equipo Rana, Herramienta menor
Actividades
- Se retira geotextil y longitudinal en punto inicial K0+285,85 al K0+290
- Se retira colocación de cuneta longitudinal en bordillo en el sector 1 del costado derecho del K0+285,8 al K0+294
- Se retira colocación de cuneta longitudinal en bordillo del K0+294 al K0+318,07 en el costado izquierdo

Carlos A. Mercado Z

ANEXO 4. CALIBRACION DE EQUIPOS

SERVICIO DE LABORATORIO OPTICOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO

CERTIFICADO
NO. C2550

INSTRUMENTO:	Estación total	**FECHA DE REVISIÓN:**	30 DE AGOSTO DE 2025
MARCA:	TOPCON	**SUGERIMOS NUEVA REVISIÓN:**	28 DE FEBRERO DE 2026
REFERENCIA:	GTS-252	**CLIENTE:**	JHON ERIC DELGADO
PRECISIÓN ANGULAR R:	2"	**CC:**	1.080.017.212
PRECISIÓN A DISTANCIA:	2mm + 2ppm	**CIUDAD:**	SITIONUEVO
SERIAL:	KA0276	**CELULAR:**	3127460454

INSPECCIÓN OPTICOMECÁNICA

BASE NIVELANTE
NIVELES TABULARES Y ESFERICOS
VERTICALIDAD
OPTICA GENERAL
EJE VERTICAL Y HORIZONTAL
FRENOS Y MOVIMIENTOS TANGENCIALES
PLOMADA OPTICA Y/O LASER

AJUSTE Y VERIFICACIÓN
GENERAL DE FUNCIONES
ACEPTABLE

INSPECCIÓN Y AJUSTE SISTEMA ANGULAR

INSPECCIÓN DE ENTRADA	POSICIÓN 1 (VERTICAL D)	89°	59'	55"
	POSICIÓN 1 (HORIZONTAL D)	00°	00'	00"
	POSICIÓN 1 (VERTICAL I)	270°	00'	15"
	POSICIÓN 1 (HORIZONTAL I)	180°	00'	08"
	ERROR OBSERVADO V	00°	00'	-10"
	ERROR OBSERVADO H	00°	00'	8"

AJUSTE EN LABORATORIO	POSICIÓN 1 (VERTICAL D)	89°	59'	55"
	POSICIÓN 1 (HORIZONTAL D)	00°	00'	00"
	POSICIÓN 1 (VERTICAL I)	270°	00'	05"
	POSICIÓN 1 (HORIZONTAL I)	180°	00'	00"
	ERROR OBSERVADO V	00°	00'	0"
	ERROR OBSERVADO H	00°	00'	0"

Powered by CamScanner

SERVICIO DE LABORATORIO
OPTICOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO

CERTIFICADO
NO. C2550

INSTRUMENTO:	Estación total	**FECHA DE REVISIÓN:**	30 DE AGOSTO DE 2025
MARCA:	TOPCON	**SUGERIMOS NUEVA REVISIÓN:**	28 DE FEBRERO DE 2026
REFERENCIA:	GTS-252	**CLIENTE:**	**JHON ERIC DELGADO**
SERIAL:	KA0276	**CC:**	3127460454

INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE MEDIDA ANGULAR, COLIMADOR DE CUATRO TUBOS
MODELO F420-4TA

COMPENSADOR OPTICOMECÁNICO COMPENSADOR ELECTRÓNICO **AJUSTE Y VERIFICACIÓN**	AJUSTE Y VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES ACEPTABLE

INSPECCIÓN EDM SOBRE LÍNEA BASE 320.162 m
(DISTANCIOMETRO) CONDICIONES: TEMPERATURA 25°C, PRESIÓN ATMOSFERICA 640mmhg,
CONSTANTE DEL PRISMA -30

PRISMAS MEDIDA DISTANCIA CONSTANTE DEL PRISMA CONSTANTE PPM	AJUSTE Y VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES ACEPTABLE

CONTROLES Y VISUALIZACIÓN ELECTRÓNICA

TECLADO DISPLAY ACCESO MEMORIA BATERÍA COMUNICACIÓN DISPOSITIVO EXTERNO	AJUSTE Y VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES ACEPTABLE

JMENDOZA EQUIPO SAS. CERTIFICA QUE EL INSTRUMENTO SE ENTREGA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y QUE LOS ERRORES ENCONTRADOS AL INGRESO DEL EQUIPO, HAN SIDO CORREGIDOS DE ACUERDO CON LOS PARAMENTROS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE

TÉCNICO JMEQUIPOS SAS
Este certificado no es válido sin firma.

Verifique la validez de este certificado en
www.jmequipos.com/consultar-certificados.php

Recuerde nuestro sitio web www.jmequipos.com, en la tienda virtual tenemos los productos con los mejores precios para usted.

Powered by CamScanner

JM EQUIPOS	**F- CERTIFICADO DE AJUSTE**	Código: 0-F-04 Versión: 04 Edición: 12/02/2018 Copia controlada Hoja 1 de 1

SERVICIO DE LABORATORIO
OPTICOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO

CERTIFICADO
NO. C3851

INSTRUMENTO:	Nivel	**FECHA DE REVISIÓN:**	8 DE AGOSTO DE 2025
		SUGERIMOS NUEVA REVISIÓN:	8 DE FEBRERO DE 2026
MARCA:	KOLIDA	**CLIENTE:**	JHON ERIC DELGADO C.
REFERENCIA:	KL32	**CC:**	1.080.017.212
		CIUDAD:	SITIONUEVO
SERIAL:	1185756	**CELULAR:**	3127460454

INSPECCIÓN OPTICOMECÁNICA

BASE NIVELANTE NIVELES TABULARES Y ESFERICOS HORIZONTALIDAD OPTICA GENERAL MOVIMIENTOS TANGENCIALES	AJUSTE Y VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES ACEPTABLE

INSPECCIÓN DE CONTROL DE COLIMADOR DE CUATRO TUBOS MODELO F420-4TA

COMPENSADOR OPTICOMECÁNICO COMPENSADOR ELECTRÓNICO HORIZONTALIDAD DE RETICULA	AJUSTE Y VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES ACEPTABLE

LECTURAS

L1:		L2:	
1.550	m	1.550	m
1.547	m	1.550	m
3	mm	0	mm

ERROR DETECTADO 0 mm

JMENDOZA EQUIPO SAS. CERTIFICA QUE EL INSTRUMENTO SE ENTREGA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y QUE LOS ERRORES ENCONTRADOS AL INGRESO DEL EQUIPO, HAN SIDO CORREGIDOS DE ACUERDO CON LOS PARAMENTROS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE

JMENDOZA Equipos S.A.S.

TÉCNICO JMEQUIPOS SAS

Este certificado no es válido sin el símbolo de aceptación.

Verifique la validez de este certificado en
www.jmequipos.com/consultar-certificados.php

Recuerde nuestro sitio web www.jmequipos.com, en la tienda virtual tenemos los productos con los mejores precios para usted.

Distribuidores en Colombia autorizados por:
GEOMAX TOPCON Leica Geosystems PENTAX SOKKIA Nikon

Medellín: Calle 30B #71-42 PBX:(574) 3220619 Ext. 102 Cel: 310-7983526
Bogotá: Calle 51 # 71A-18 OF 101 Tel: (571) 7559969
www.jmequipos.com - laboratorio@jmequipos.com - laboratorio.bogota@jmequipos.com - ventas@jmequipos.com

Powered by CamScanner

ANEXO 12. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

CONSORCIO PUERTO CLAVER	CONSORCIO PUERTO CLAVER N.I.T: 901.982.342-5	CONTRATO DE OBRA No. 050 DE 2025

CAPACITACIONES

			Aprobación: Gerente General
FECHA	30/09/2026	LUGAR	
CAPACITACIÓN N°		CARGO	
RESPONSABLE	SST		SST
TEMA CAPACITACIÓN	EPP.		
ASPECTOS TRATADOS	- Uso correcto de los EPP - Importancia del uso adecuado - Ubicación de los Rayos		
OBSERVACIONES	15 minutos		

LISTADO PERSONAL


NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Jhon Alfaro		Jhon Alfaro
2	Wilson Alfaro		
3	Daniel Cuello		Daniel Cuello
4	Pablo Horato		
5	Rafael Cleruto		Clemente Ospino
6	Yeison Pajaro		
7	Victor Reyes		Victor Reyes
8	Carlos Izquierdo		CARLOS
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			


CONSORCIO PUERTO CLAVER	REGISTRO FOTOGRAFICO CHARLA	VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1
		FECHA	30	1	2026

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PUERTTO CLAVER	CONTRATO N°	050 DE 2025	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DOIVER NISPERUZA
INTERVENTORÍA	INGENIERIA DE CORDOBA INGECOR S.A.S	CONTRATO N°	052 DE 2025		
OBJETO DEL PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"				



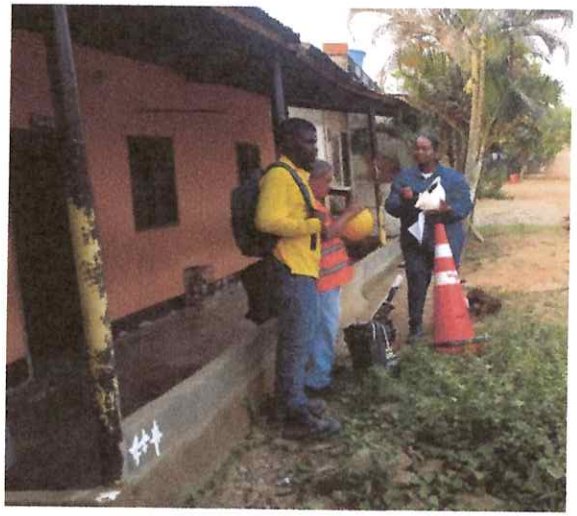

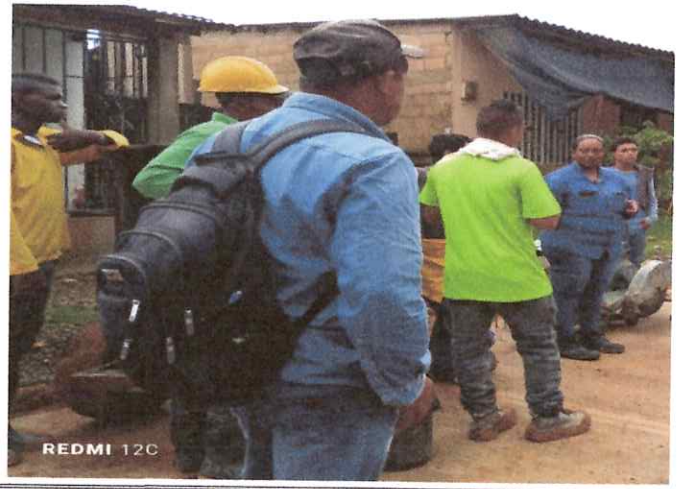

Descripción: EPP uso correcto de estos, importancia del uso adecuado para la mitigacion de los riesgos.

CONSORCIO PUERTO CLAVER	CONSORCIO PUERTO CLAVER N.I.T: 901.982.342-5	CONTRATO DE OBRA No. 050 DE 2025

CAPACITACIONES

FECHA	20/12/2025	Aprobación: Gerente General	
CAPACITACIÓN N°		LUGAR	Sede K 2
RESPONSABLE	SST	CARGO	SST
TEMA CAPACITACIÓN	Orden y Aseo		
ASPECTOS TRATADOS	- Importancia del Orden Aseo y Aseo - El Recibo en el orden y Aseo en Obra		
OBSERVACIONES	15 minutos.		

LISTADO PERSONAL


NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Rafael JANTOS		Rafael Jantos
2	Wilson Alcazar		Wilson Alcazar
3	WILLIAN PITRA		
4	Jhon Beltran		
5	Victor Reyes		Victor Reyes
6	DDaniel Cuello		Daniel Cuello
7	Luis NARVAEZ.		Victor Reyes
8	CARLO Segunda		CARLOS
9	Josue Urda.		Josue Urda
10	Esteban Pereira.		Pereira
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

CONSORCIO PUERTO CLAVER	REGISTRO FOTOGRAFICO CHARLAS Y/O CAPACITACIONES	VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1
		FECHA	20	2	2026

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PUERTTO CLAVER	**CONTRATO N°**	050 DE 2025	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	DOIVER NISPERUZA
INTERVENTORÍA	INGENIERIA DE CORDOBA INGECOR S.A.S	**CONTRATO N°**	052 DE 2025		
OBJETO DEL PROYECTO	**"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"**				



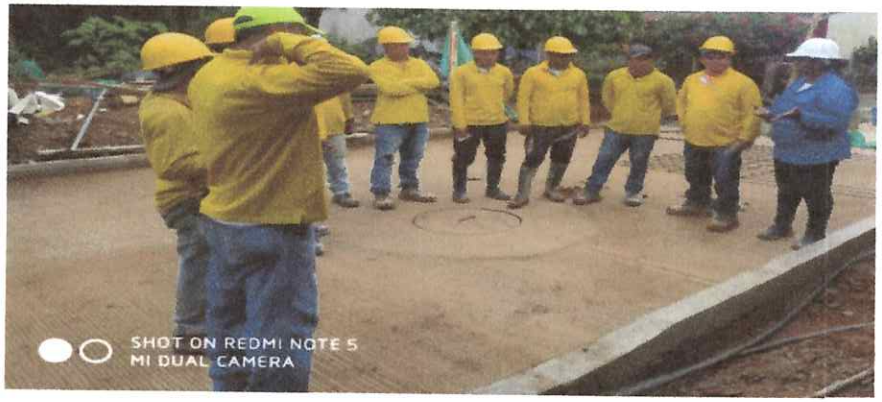

Descripción: Orden y aseo, importancia del reciclaje

CONSORCIO PUERTO CLAVER	CONSORCIO PUERTO CLAVER N.I.T: 901.982.342-5	CONTRATO DE OBRA No. 050 DE 2025

CAPACITACIONES

FECHA	05/09/2025	Aprobación: Gerente General	
CAPACITACIÓN N°		LUGAR	Puerto Clave
RESPONSABLE	SST	CARGO	OBS
TEMA CAPACITACIÓN	Ruido		
ASPECTOS TRATADOS	- Maquinaria y Equipo Menor. - Uso Adecuado del Tapa Oido.		
OBSERVACIONES	15 minuto		

LISTADO PERSONAL

NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Heiro Hoyos		
2	Daniel Cuello		Daniel Cuello
3	Heiro Almario		Heiro Almario
4	Rafael Cleves		Cleves Cleves
5	Wilson Almario		Wilson Almario
6	Javier Vargas		Javier Vargas
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

CARTERAS TOPOGRAFICAS
SECTOR 1 (K0+230 AL 290)

Correo Electrónico: consorcio050puertoclaver@gmail.com
Dirección: CR 12 A # 23 - 45 BRR JERUSALEN
Planeta Rica - Córdoba

CONSORCIO PUERTO CLAVER

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO CLAVER

INTERVENTORIA: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

FECHA: Febrero -2026

VOLUMEN: MEJORAMIENTO SECTOR 1 (K0+230 - K0+290)

ABSCISA	AREAS SECCION M2	AREAS SUMADAS	AREAS PROMEDIADAS M2	DISTANCIA ABSCISADO	VOLUMEN SECCION M3	VOLUMEN PARCIAL M3
K0+230	1,500	3,00	1,50	10,0	15,00	15,00
K0+240	1,500	3,00	1,50	10,0	15,00	30,00
K0+250	1,500	3,00	1,50	10,0	15,00	45,00
K0+260	1,500	3,00	1,50	10,0	15,00	60,00
K0+270	1,500	3,00	1,50	10,0	15,00	75,00
K0+280	1,500	3,00	1,50	10,0	15,00	90,00
K0+290	1,500	3,00	1,50	10,0	15,00	105,00
TOTAL VOLUMEN ACUMULADO M3						105,00

Levantaron

Jairo Herazo
TOPOGRAFO LIC: 01-4637
CONSORCIO PUERTO CLAVER

Laura Marcela Bueno Niño
TOPOGRAFO LIC: 01-23707
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

Reviso

Carlos Mercado
Residente de Obra
CONSORCION PUERTO CLAVER

Jorge [illegible] Soto Calle
Director de Interventoria
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

CONSORCIO PUERTO CLAVER

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO CLAVER

INTERVENTORIA: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

FECHA: Marzo -2026

VOLUMEN: SUBBASE SECTOR 1 (K0+190 - K0+290)

ABSCISA	AREAS SECCION M2	AREAS SUMADAS	AREAS PROMEDIADAS M2	DISTANCIA ABSCISADO	VOLUMEN SECCION M3	VOLUMEN PARCIAL M3
K0+190	1,000	2,00	1,00	10,0	10,00	10,00
K0+200	1,000	2,00	1,00	10,0	10,00	20,00
K0+210	1,000	2,00	1,00	10,0	10,00	30,00
K0+220	1,000	2,00	1,00	10,0	10,00	40,00
K0+230	1,000	2,00	1,00	10,0	10,00	50,00
K0+240	1,000	2,00	1,00	10,0	10,00	60,00
K0+250	1,000	2,00	1,00	10,0	10,00	70,00
K0+260	1,000	2,00	1,00	10,0	10,00	80,00
K0+270	1,000	2,00	1,00	10,0	10,00	90,00
K0+280	1,000	2,00	1,00	10,0	10,00	100,00
K0+290	1,000	2,00	1,00	10,0	10,00	110,00
TOTAL VOLUMEN ACUMULADO M3						110,00

Levantaron

Jairo Herazo
TOPOGRAFO LIC: 01-4637
CONSORCIO PUERTO CLAVER

Laura Marcela Bueno Niño
TOPOGRAFO LIC:
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

Reviso

Carlos A. Mercado 7
Carlos Mercado
Residente de Obra
CONSORCION PUERTO CLAVER

Jorge [illegible] Soto Calle
Director de Interventoria
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

CONSORCIO PUERTO CLAVER

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO CLAVER

INTERVENTORIA: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

FECHA: Febrero -2026

VOLUMEN: SUBBASE SECTOR 2

ABSCISA	AREAS SECCION M2	AREAS SUMADAS	AREAS PROMEDIADAS M2	DISTANCIA ABSCISADO	VOLUMEN SECCION M3	VOLUMEN PARCIAL M3
K0+300	1,000	2,00	1,00	10,0	10,00	10,00

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

CARTERAS TOPOGRAFICAS
SECTOR 2 (K0+300)

Correo Electrónico: consorcio050puertoclaver@gmail.com
Dirección: CR 12 A # 23 - 45 BRR JERUSALEN
Planeta Rica - Córdoba

CONSORCIO PUERTO CLAVER

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO CLAVER

INTERVENTORIA: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

FECHA: Enero -2026

VOLUMEN: CORTE DE TERRENO SECTOR 2

ABSCISA	AREAS SECCION M2	AREAS SUMADAS	AREAS PROMEDIADAS M2	DISTANCIA ABSCISADO	VOLUMEN SECCION M3	VOLUMEN PARCIAL M3
K0+300	3,629	7,18	3,59	10,0	35,89	35,89
TOTAL VOLUMEN ACUMULADO M3						35,89

Levantaron

Jairo Herazo
TOPOGRAFO LIC: 01-4637
CONSORCIO PUERTO CLAVER

Laura Marcela Bueno Niño
TOPOGRAFO LIC: 01-23707
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

Reviso

Carlos Mercado
Residente de Obra
CONSORCION PUERTO CLAVER

Jorge [illegible] Soto Calle
Director de Interventoria
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

CONSORCIO PUERTO CLAVER

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO CLAVER

INTERVENTORIA: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

FECHA: Febrero -2026

VOLUMEN: MEJORAMIENTO SECTOR 2

ABSCISA	AREAS SECCION M2	AREAS SUMADAS	AREAS PROMEDIADAS M2	DISTANCIA ABSCISADO	VOLUMEN SECCION M3	VOLUMEN PARCIAL M3
K0+300	1,500	3,00	1,50	10,0	15,00	15,00

CONSORCIO PUERTO CLAVER

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO CLAVER

INTERVENTORIA: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

FECHA: Febrero -2026

VOLUMEN: SUBBASE SECTOR 2

ABSCISA	AREAS SECCION M2	AREAS SUMADAS	AREAS PROMEDIADAS M2	DISTANCIA ABSCISADO	VOLUMEN SECCION M3	VOLUMEN PARCIAL M3
K0+300	1,000	2,00	1,00	10,0	10,00	10,00

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

CARTERAS TOPOGRAFICAS
SECTOR 2 (K0+750 AL K0+810)

Correo Electrónico: consorcio050puertoclaver@gmail.com
Dirección: CR 12 A # 23 - 45 BRR JERUSALEN
Planeta Rica - Córdoba

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO CLAVER

INTERVENTORIA: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

FECHA: Enero -2026

VOLUMEN: CORTE DE TERRENO SECTOR 2

ABSCISA	AREAS SECCION M2	AREAS SUMADAS	AREAS PROMEDIADAS M2	DISTANCIA ABSCISADO	VOLUMEN SECCION M3	VOLUMEN PARCIAL M3
K0+750	3,647	7,30	3,65	10,0	36,52	36,52
K0+760	3,392	7,04	3,52	10,0	35,20	71,72
K0+770	3,348	6,74	3,37	10,0	33,70	105,42
K0+780	3,520	6,87	3,43	10,0	34,34	139,76
K0+790	3,630	7,15	3,58	10,0	35,75	175,51
K0+800	3,318	6,95	3,47	10,0	34,74	210,25
K0+810	3,531	6,85	3,42	10,0	34,25	244,49
TOTAL VOLUMEN ACUMULADO M3						244,49

Levantaron

Jairo Herazo
TOPOGRAFO LIC: 01-4637
CONSORCIO PUERTO CLAVER

Laura Marcela Bueno Niño
TOPOGRAFO LIC: 01-23707
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

Reviso

Carlos Mercado
Residente de Obra
CONSORCION PUERTO CLAVER

Jorge [illegible] Soto Calle
Director de Interventoria
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

CONSORCIO PUERTO CLAVER

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO CLAVER

INTERVENTORIA: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

FECHA: Febrero -2026

VOLUMEN: MEJORAMIENTO SECTOR 2

ABSCISA	AREAS SECCION M2	AREAS SUMADAS	AREAS PROMEDIADAS M2	DISTANCIA ABSCISADO	VOLUMEN SECCION M3	VOLUMEN PARCIAL M3
K0+750	1,500	3,00	1,50	10,0	15,00	15,00
K0+760	1,500	3,00	1,50	10,0	15,00	30,00
K0+770	1,500	3,00	1,50	10,0	15,00	45,00
K0+780	1,500	3,00	1,50	10,0	15,00	60,00
K0+790	1,500	3,00	1,50	10,0	15,00	75,00
K0+800	1,500	3,00	1,50	10,0	15,00	90,00
K0+810	1,500	3,00	1,50	10,0	15,00	105,00
TOTAL VOLUMEN ACUMULADO M3						105,00

Levantaron

Jairo Herazo
TOPOGRAFO LIC: 01-4637
CONSORCIO PUERTO CLAVER

Laura Marcela Bueno Niño
TOPOGRAFO LIC: 01-23707
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

Reviso

Carlos A. Mercado 7
Carlos Mercado
Residente de Obra
CONSORCION PUERTO CLAVER

Jorge [illegible] Soto Calle
Director de Interventoria
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

CONSORCIO PUERTO CLAVER

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO CLAVER

INTERVENTORIA: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

FECHA: Febrero -2026

VOLUMEN: SUBBASE SECTOR 2

ABSCISA	AREAS SECCION M2	AREAS SUMADAS	AREAS PROMEDIADAS M2	DISTANCIA ABSCISADO	VOLUMEN SECCION M3	VOLUMEN PARCIAL M3
K0+750	1,000	2,00	1,00	10,0	10,00	10,00
K0+760	1,000	2,00	1,00	10,0	10,00	20,00
K0+770	1,000	2,00	1,00	10,0	10,00	30,00
K0+780	1,000	2,00	1,00	10,0	10,00	40,00
K0+790	1,000	2,00	1,00	10,0	10,00	50,00
K0+800	1,000	2,00	1,00	10,0	10,00	60,00
K0+810	1,000	2,00	1,00	10,0	10,00	70,00
TOTAL VOLUMEN ACUMULADO M3						70,00

Levantaron

Jairo Herazo
TOPOGRAFO LIC: 01-4637
CONSORCIO PUERTO CLAVER

Laura Marcela Bueno Niño
TOPOGRAFO LIC:
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

Reviso

Carlos A. Mercado 7
Carlos Mercado
Residente de Obra
CONSORCION PUERTO CLAVER

Jorge [illegible] Soto Calle
Director de Interventoria
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

ANEXO 3. CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

Corsan®

INDUSTRIAS METALICAS CORSAN S.A.
NIT 890,900,160
AUTOPISTA SUR Nro 85B-71 - ITAGUI
TEL: 4440755
www.corsan.com.co
ITAGUI - COLOMBIA

CERTIFICADO DE CALIDAD — CONSECUTIVO 637 — 21/03/2025

REFERENCIA: 33R100142 — ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRUCCIÓN

Señores: DISTRIAS S.A.S — **PEDIDO 10406627**

Nit: 900377621 Tel: 7823430

CR 2 44 110 MONTERIA

CARACTERISTICAS A VERIFICAR

1. PRQPIEDADES MECÁNICAS			
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN			
ESPECIFICACION=		35 - 45	Kgf/mm2
RESULTADOS:	MUESTRA 1=	37.26	Kgf/mm2
	MUESTRA 2=	33.45	Kgf/mm2
	MUESTRA 3=	40.39	Kgf/mm2
2. DIMENSIONES			
DIAMETRO			
ESPECIFICACION=		1.47	± 0.05 mm
RESULTADOS:	MUESTRA 1=	1.44	mm
	MUESTRA 2=	1.47	mm
	MUESTRA 3=	1.50	mm
3. RECUBRIMIENTO DE ZINC			
ESPESOR DE CAPA			
ESPECIFICACION=		N/A	g/m2
RESULTADOS:	MUESTRA 1=	N/A	g/m2
	MUESTRA 2=	N/A	g/m2
	MUESTRA 3=	N/A	g/m2

CALIDAD SAE 1006 **PESO: 10.000** Kg

OBERVACIONES

ELABORADO POR
Valentina Villa

REVISADO POR
Alejandra Agudelo

Fecha de impresión 21/03/2025

EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT

Certificado de Calidad 10000262774

Centro: CO2A

Material: 445712A 805
VULKEM 45 SSL GRIS x 5 GAL (18.9 L)
Grupo Art: SEALANT
Fecha de fabricación: 08/02/2025
Lote: 7800440

Toxement S.A. por medio de este documento da constancia de conformidad al lote de fabricación referenciado, de acuerdo con los resultados obtenidos bajo procedimientos estandarizados del laboratorio. Así mismo, los datos registrados dan cumplimiento a los parámetros citados en la hoja tecnica del producto

Caracteristica	Método	Especificación	Resultado
CURADO	IM003		Aprobado
SAG	IM003	35.00 - 100.00	100.00
VISCOSIDAD	IM003	25000.00 - 50000.00 CPS	29370.00

ESTE CERTIFICADO ES EMITIDO ELECTRÓNICAMENTE Y TIENE VALIDEZ SIN FIRMA

CamScanner

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Autopista Sur Km 25 Via Bogota, Sibate, Colombia. C.P
- 250058 Tel/Fax: 3118760266

Nº: 10018131658461

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
DISTRIAS S A S	9007740826/120	PED 04112025	11116310/000120	NTC 2289	3.120

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	COMPOSICION QUIMICA (%) Ensayo según método ASTM E415											
				C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E
108000077	ALB COR NTC 2289 1/4"	1727238201	GR 60	0,26	0,67	0,010	0,025	0,15	0,26	0,10	0,09	0,02	0,002	0,026	0,42
Rangos de referencia según norma				max 0,3000 %	máx 1,5000 %	max 0,0350 %	max 0,0450 %	max 0,5000 %							máx 0,550

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	PROPIEDADES MECÁNICAS Ensayo según método NTC3353						CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				
				R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Separa	Ángulo	
108000077	ALB COR NTC 2289 1/4"	1727238201	2	453	643	1,42	17,3	0,249	OK	4,40	0,34	1,98	51	
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	min 1,250	min 14,00	max 0,234 kg/m		max 4,45 mm	min 0,25 mm	max 2,40 mm	45,0 - 70,0 deg	

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

SIBATÉ. 22.11.2025

IVAN ANDRES PORTILLO CUADROS

ADHESIVOS • SELLADORES • PRODUCTOS QUÍMICOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN

MAPEI Colombia S.A.S,
Sede: Carrera 43 # 100 d Sur - 250. La Estrella
Tel +57 4 4446515
E-mail info@mapeicom.co

jueves, 24 de abril de 2025

Certificado de análisis

(Analysis Test Report)

Nombre del Producto: (Product Name)	**Mapecure E30 CO**
Fecha de producción: (Production Date)	**jueves, 24 de abril de 2025**
Lote: (Batch)	**230425070806**

Descripción del Método (Method Description)	U/M (U/M)	Resultado (Value)	Min (Min)	Max (Max)
Contenido Seco	%	16.46	13.50	16.50
pH	-	7.73	7.50	9.50
Densidad	g/ml	0.988	0.960	1.000
Inspección Visual		OK	Líquido Blanco Homogeneo	

Certificamos que el material indicado arriba ha sido inspeccionado y probado de acuerdo con los procedimientos de nuestro sistema de calidad y cumple con las especificaciones del material.
Este documento ha sido generado electronicamente, por lo tanto es válido sin ninguna firma. Para información o clarificación en referencia a los datos suministrados, por favor contacte a la Dirección Comercial de MAPEI.

Laboratorio de Control de Calidad
(Quality Control Lab.)

yumbolon

CERTIFICADO TÉCNICO

POLYLON S.A. garantiza que toda nuestra línea de productos cumple con las especificaciones mencionadas a continuación y que las respectivas mediciones son realizadas con los equipos apropiados para tal efecto y cumpliendo con los parámetros establecidos en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma NTC ISO 9001:2015 actualmente certificado por Bureau Veritas Quality International, además por ser un producto no nocivo para la salud las recomendaciones a tener en cuenta para su manipulación se citan a continuación:

Descripción Técnica						
Referencia	Calibre (mm)			Long (m)		
	Mín	Std	Máx	Mín	Std	Máx
453 - YMB JUNTA 1/4"x1700mGr-1700m-CAJx1UD	6.3	6.35	6.43	1700	1700	1703

COMPOSICIÓN:

- ✓ **Resina de baja densidad.**
  -Índice de fluidez: 2.

PROPIEDADES:

- ✓ Resistente a todo tipo de químicos:
  -Ácidos, solventes, pegantes a base de caucho, gasolina, entre otros.
- ✓ 100% Impermeable
- ✓ Se adapta a irregularidades en las juntas
- ✓ Evita filtraciones
- ✓ Liviano y flexible
- ✓ Inocuo
- ✓ No genera contraindicaciones para la salud
- ✓ No Propagante de llama

COLOMBIA

Oficinas Cali

Planta Funza

ECUADOR

Planta Guayaquil

PERÚ

Oficina

PANAMÁ

yumbolon.com

RECOMENDACIONES:

- ✓ No someter el producto (contacto directo) a temperaturas mayores a 70°C.
- ✓ Evitar exposición del producto a lugar generadores de llama.
- ✓ En caso de presentar llama apagar con extintor tipo ABC
- ✓ Evitar exposición a la luz directa del sol.
- ✓ Evitar exposición permanente al agua.

Caterin Torres Palacio
Directora de Calidad
c.c. Certificados de Calidad

COLOMBIA

Oficinas Cali

Planta Funza

ECUADOR

Planta Guayaquil

PERÚ

Oficina

PANAMÁ

yumbolon.com

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Carretera Central del Norte Km 27, Tuta, Colombia.
C.P - 150408 Tel/Fax: 7426350

Nº: 10008131627063

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
DISTRIAS S A S	9007711623/10	OC 02092025	11092641/000010	NTC161 AH-24 SAE1015	32.000

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	
109000483	BAR LIS NTC 161 1" 6m	1727029101		0,14	0,51	0,020	0,029	0,12	0,24	0,13	0,12	0,03	0,002	0,000	
109000483	BAR LIS NTC 161 1" 6m	1727029201		0,16	0,49	0,020	0,024	0,15	0,26	0,15	0,12	0,05	0,002	0,007	
109000483	BAR LIS NTC 161 1" 6m	1727029301		0,15	0,50	0,023	0,033	0,13	0,24	0,11	0,13	0,02	0,002	0,000	
109000483	BAR LIS NTC 161 1" 6m	1727029401		0,16	0,49	0,021	0,029	0,16	0,25	0,11	0,14	0,03	0,002	0,000	
Rangos de referencia según norma				0,1300 - 0,1800%	0,3000 - 0,6000%	max 0,0400%	max 0,0500 %								

PROPIEDADES MECÁNICAS — **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**

Ensayo según método NTC 1353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	Alargamiento %	Masa Lineal	Doblado	R.T/R.F	Diámetro	Ovalid			
109000483	BAR LIS NTC 161 1" 6m	1727029101	NA	302	451	31,1	3,894	BUENO	1,49	25,18	0,25			
109000483	BAR LIS NTC 161 1" 6m	1727029201	NA	307	461	27,7	3,894	BUENO	1,50	25,01	0,16			
109000483	BAR LIS NTC 161 1" 6m	1727029301	NA	309	463	29,6	3,875	BUENO	1,50	25,12	0,22			
109000483	BAR LIS NTC 161 1" 6m	1727029401	NA	316	470	30,6	3,860	BUENO	1,49	25,08	0,19			
Rangos de referencia según norma				mín 235,0 MPa	mín 363,0 MPa	mín 18,00%	mín 3,742 kg/m		mín 1,100	21,80 - 26,00 mm	máx 0,60 mm			

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

Gerdau Diaco certifica que para la producción de nuestro acero, el porcentaje de contenido reciclado mínimo post-consumo corresponde al 90%.

RESPONSABLE DE CALIDAD

TUTA, 04.09.2025

PAOLA KATHERIN MATEUS

INFORME DE ENSAYOS

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Ternium
El acero que hace fuerte a Colombia

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S.
NIT: 901131909-1 **Página Web:** www.ternium.com.co
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Vía Barranquilla Ponedera km 48 + 600 m, Palmar de Varela, Atlántico,Colombia

INFORMACIÓN GENERAL

Cliente: GYJ FERRETERIAS SA TUNJA
Dirección: CARRERA 2 ESTE No. 56 - 04 TUNJA
Teléfono: 7457093

Fecha Impresión: 2026/02/28
Nro.Remisión: 187318370

Nro.Informe: 158219
Nro.Informe Ant:
Centro: Centro Planta Atlantico

DATOS GENERALES

MATERIAL	DESCRIPCIÓN	COLADA/LOTE	PESO.PAQ(KG)	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BFO0028510	1263	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BFO0028513	1505	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BFO0028514	1502	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BFO0028515	1492	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BFO0028516	1505	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BFO0028517	1488	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BFO0028518	1475	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BFO0028530	1525	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BFO0028531	1519	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BFO0028540	1499	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BFO0028542	1495	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROPIEDADES QUÍMICAS

MATERIAL	COLADA/LOTE	% C	% Mn	% Mo	% Si	% S	% P	% Cr	% Ni	% Cu	% V	% CE
C8007443	BFO0028530	0.30	1.22	0.000	0.21	0.011	0.022	0.01	0.01	0.01	0.001	0.50
C8007443	BFO0028531	0.30	1.22	0.000	0.21	0.011	0.022	0.01	0.01	0.01	0.001	0.50
C8007443	BFO0028540	0.30	1.22	0.000	0.21	0.011	0.022	0.01	0.01	0.01	0.001	0.50
C8007443	BFO0028542	0.30	1.22	0.000	0.21	0.011	0.022	0.01	0.01	0.01	0.001	0.50
C8007443	BFO0028515	0.30	1.22	0.000	0.21	0.011	0.022	0.01	0.01	0.01	0.001	0.50
C8007443	BFO0028516	0.30	1.22	0.000	0.21	0.011	0.022	0.01	0.01	0.01	0.001	0.50
C8007443	BFO0028517	0.30	1.22	0.000	0.21	0.011	0.022	0.01	0.01	0.01	0.001	0.50
C8007443	BFO0028518	0.30	1.22	0.000	0.21	0.011	0.022	0.01	0.01	0.01	0.001	0.50
C8007443	BFO0028510	0.30	1.22	0.000	0.21	0.011	0.022	0.01	0.01	0.01	0.001	0.50
C8007443	BFO0028513	0.30	1.22	0.000	0.21	0.011	0.022	0.01	0.01	0.01	0.001	0.50
C8007443	BFO0028514	0.30	1.22	0.000	0.21	0.011	0.022	0.01	0.01	0.01	0.001	0.50

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROPIEDADES FÍSICAS

MATERIAL	COLADA/LOTE	Resistencia Fluencia MPa	Resistencia Tracción MPa	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Fecha Ensayo
C8007443	BFO0028530	473	626	17.32	SinGrieta	1.32	20260227
C8007443	BFO0028531	473	626	17.32	SinGrieta	1.32	20260227
C8007443	BFO0028540	473	626	17.32	SinGrieta	1.32	20260227
C8007443	BFO0028542	473	626	17.32	SinGrieta	1.32	20260227
C8007443	BFO0028515	473	626	17.32	SinGrieta	1.32	20260227
C8007443	BFO0028516	473	626	17.32	SinGrieta	1.32	20260227
C8007443	BFO0028517	473	626	17.32	SinGrieta	1.32	20260227
C8007443	BFO0028518	473	626	17.32	SinGrieta	1.32	20260227
C8007443	BFO0028510	473	626	17.32	SinGrieta	1.32	20260227
C8007443	BFO0028513	473	626	17.32	SinGrieta	1.32	20260227
C8007443	BFO0028514	473	626	17.32	SinGrieta	1.32	20260227

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Quimicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROPIEDADES DIMENSIONALES

MATERIAL	COLADA/LOTE	Espaciamiento mm	Peso Metro (Masa) Kg/m	Altura Resalte mm	Separación Extremos mm	Angulo Resalte °
C8007443	BFO0028530	6.11	0.550	0.52	2.39	50
C8007443	BFO0028531	6.11	0.550	0.52	2.39	50
C8007443	BFO0028540	6.11	0.550	0.52	2.39	50
C8007443	BFO0028542	6.11	0.550	0.52	2.39	50
C8007443	BFO0028515	6.11	0.550	0.52	2.39	50
C8007443	BFO0028516	6.11	0.550	0.52	2.39	50
C8007443	BFO0028517	6.11	0.550	0.52	2.39	50
C8007443	BFO0028518	6.11	0.550	0.52	2.39	50
C8007443	BFO0028510	6.11	0.550	0.52	2.39	50
C8007443	BFO0028513	6.11	0.550	0.52	2.39	50
C8007443	BFO0028514	6.11	0.550	0.52	2.39	50

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

* Tracción: NTC 2289:2020, Num. 9 y 15.2 NTC 3353:2024 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2:2024 Num. 5.1, 5.2.1,5.2.2, 6.6, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5.7.6, 7.7, 7.10, 7.11,7.13, 7.14, 8

* Doblado: NTC 2289:2020. Num. 10 NTC 3353: 2024 Num. 15 NTC 1:2024 Num. 4.6, 6.2, 8.1.1, 9.3, 9.7, 9.9, 10 y 11

* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8

* Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

VARIABLE	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA(1)
Resistencia a la Fluencia	± 2.69 MPA
Resistencia a la Tracción	± 2.45 MPA
Alargamiento	± 0.60 %
Altura Resalte	± 2 %
Separación entre extremos	± 4 %
Espaciamiento	± 0.30 %
Angulo de Resalte	± 0.53 °
Peso metro (masa)	± 0.20 %

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianzade 95%.

ANEXO 16. CORRESPONDENCIA.

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

EDTB -34-2026

El Bagre Antioquia, 06 de marzo 2026

Señor
Franklin Cabarcas
Gerente (E)
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE
El Bagre, Antioquia

Referencia: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29°, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA."

Asunto: Actualización de póliza contrato 050/ 2025

Atento saludo,

CONSORCIO PUERT CLAVER remite a su despacho la actualización de la póliza de Cumplimiento y la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, de acuerdo al Acta de Reinicio No1, para los trámites pertinentes.

Sin otro particular,

WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ
Representante Legal
CONSORCIO PUERTO CLAVER

Anexo: Póliza de responsabilidad civil extracontractual No C0Q-100001670 (2 folios).
Póliza de cumplimiento No C0Q-100006616 (3 folios).

C.C. Ing. Jorge Soto. Representante Legal. INGECOR S.A.S

Correo Electrónico: consorcio050puertoclaver@gmail.com
Dirección: CR 12 A # 23 - 45 BRR JERUSALEN
Planeta Rica - Córdoba

seguros mundial

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.03.03 16:49:27 -05:00

Codigo de Seguridad: f8nytvTvg7c57ivOvIRVFw==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100006616	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	680015806	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/03/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	15/09/2025	24:00 Horas Del	21/04/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PUERTO CLAVER	No. DOC. IDENTIDAD	901.982.342-5
DIRECCIÓN	CR 12 A # 23 - 45 BRR JERUSALEN	TELÉFONO	3104057905
ASEGURADO	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE EDTB	No. DOC. IDENTIDAD	901.526.561-7
DIRECCIÓN	CALLE 50 47 A 19 SEGUNDO PISO	TELÉFONO	3113590471
BENEFICIARIO	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE EDTB	No. DOC. IDENTIDAD	901.526.561-7
DIRECCIÓN	CALLE 50 47 A 19 SEGUNDO PISO	TELÉFONO	3113590471

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS, SEGUN:

-ACTA DE SUSPENSION 01 DE FECHA 12/12/2025
-ACTA DE AMPLIACION 1 DE FECHA 09/01/2026
-ACTA DE REINICIO 01 DE FECHA 19/01/2026

FECHA TERMINACION 21/04/2026

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS, CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.050-2025 , CUYO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 12/12/2025	24:00 Horas Del 21/10/2026	721.067.965,40	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 12/12/2025	24:00 Horas Del 21/04/2029	360.533.982,70	91.368,20
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 21/04/2026	24:00 Horas Del 21/04/2031	1.081.601.948,10	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 2.163.203.896,20	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MARLEN BALLESTEROS ORJUELA	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LIDER	CERTIF. LIDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	91.368,20
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	91.368,20
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	17.359,96
TOTAL A PAGAR	$	108.728,16

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 03/03/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACION DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICION LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACION, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUI INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA POLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañia Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atencion al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplimos con nuestro compromiso de calidad, responsablemente protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860 037 013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855660 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100006616	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	680015806	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/03/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	15/09/2025	24:00 Horas Del	21/04/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

OBJETO ES
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
NOTA: ASEGURADO Y BENEFICIARIO A LA EDTB, IDENTIFICADO CON EL NIT. 901526561 7 Y AL MUNICIPIO DE EL BAGRE, IDENTIFICADO CON EL NIT. 890984221-2.
NOTA: NOTA: SE ACLARA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA, INICIA VIGENCIA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE
RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DELAENTIDAD CONTRATANTE LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR
ESCRITO A LA COMPAÑÍA.
EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CC: 98650618 WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ (PART. 50,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 901930946 CONSTRULARM SAS (PART. 50,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO PUERTO CLAVER)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

APP-0233 - LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA - PAGA - APP

seguros mundial®

Aliados

COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **COQ-100006616** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **CONSORCIO PUERTO CLAVER** Asegurado o Beneficiario: **EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE EDTB / EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE EDTB** , expedida por la Compañía en **03/03/2026,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN ORINOQUIA a los **03** días del mes **MARZO** del año **2026.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

VIGILADO

seguros mundial

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.03.03 16:47:32 -05:00

Código de Seguridad: 3z2ztBK7Sj/SH/QpKMK90g==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100001670	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	680015808	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/03/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	15/09/2025	24:00 Horas Del	21/04/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PUERTO CLAVER	No. DOC. IDENTIDAD	901.982.342-5
DIRECCIÓN	CR 12 A # 23 - 45 BRR JERUSALEN	TELÉFONO	3104057905
ASEGURADO	CONSORCIO PUERTO CLAVER	No. DOC. IDENTIDAD	901.982.342-5
DIRECCIÓN	CR 12 A # 23 - 45 BRR JERUSALEN	TELÉFONO	3104057905
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	1

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS, SEGUN:

-ACTA DE SUSPENSION 01 DE FECHA 12/12/2025
-ACTA DE AMPLIACION 1 DE FECHA 09/01/2026
-ACTA DE REINICIO 01 DE FECHA 19/01/2026

FECHA TERMINACION 21/04/2026

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS, CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	144.300,00
PATRONAL	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 569.400.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MARLEN BALLESTEROS ORJUELA	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	$	144.300,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	144.300,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	27.417,00
TOTAL A PAGAR	$	171.717,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 03/03/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACION, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUI INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA POLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atencion al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogota: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestros clientes, especialmente... Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento

VIGILADO

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2351220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100001670	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	680015808	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/03/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	15/09/2025	24:00 Horas Del	21/04/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NO.050-2025 , CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA .
NOTA: ASEGURADO: LA EDTB, IDENTIFICADO CON EL NIT. 901526561 7 Y AL MUNICIPIO DE EL BAGRE, IDENTIFICADO CON EL NIT. 890984221-2 Y CONSORCIO PUERTO CLAVER
NIT 9 0 1 9 8 2 3 4 2-5
BENEFICIARIOS: LA EDTB, IDENTIFICADO CON EL NIT. 901526561 7 Y AL MUNICIPIO DE EL BAGRE, IDENTIFICADO CON EL NIT. 890984221-2 Y TERCEROS AFECTADOS.
NOTA SE ACLARA QUE LA POLIZA CUBRE LOS SIGUIENTES AMPAROS:
1. PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES
2. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS SALVO EN EL EVENTO EN QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
3. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS
4. AMPARO PATRONAL
5. GASTOS MEDICOS
6. GASTOS DE DEFENSA
7. PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES
8. DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE
EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CC: 98650618 WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ (PART. 50,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 901930946 CONSTRULARM (PART. 50,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO PUERTO CLAVER) , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE EDTB COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PUERTO CLAVER, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE EDTB BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE EDTB COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICACIÓN A LA CARÁTULA COLOMBIANA DE LA LEY 1328 DE 2009 Y DEMÁS NORMAS APLICABLES

ANEXO 18. COSTOS DE OFICINA, PAPELERIA Y OTROS

El Bagre, 22 de febrero de 2026

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO PUERTO CLAVER

NIT: 901.982.342-5

DEBE A:

JHON ERIC DELGADO CANTILLO
N.I.T: 1.080.017.212-1

LA SUMA DE:

TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (3.600.000)

POR CONCEPTO DE:

- ALQUILER DE ESTACION TOTAL MARCA TOPCON SERIAL KA0276 Y NIVEL MARCA: KOLIDA REFERENCIA NO.: KL-32 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DE 2026.

Cordialmente,

JHON ERIC DELGADO CANTILLO
CC: 1.080.017.212
Cel: 312-7460454

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 1 Inscripcion

4. Numero de formulario: 14728048247

(415)7707212489984(8020) 000001499006105 4

5. Numero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 8 0 0 1 7 2 1 2	1	Impuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Numero de Identificacion	27. Fecha expedicion
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cedula de Ciudadania 1 3	1080017212	

Lugar de expedicion / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 1	Sitionuevo 7 4 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
DELGADO	CANTILLO	JHON	ERIC

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Sitionuevo 7 4 5

41. Dirección principal: CRA 2 # 5 – 13

42. Correo electrónico: jhonericdelgadocantillo@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 7 4 6 0 4 5 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 2 5 1 0 1 4							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código: 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 3 | 61. Fecha: 2025 - 10 - 14 / 11 38 10

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice
Firma autorizada

984. Nombre: DELGADO CANTILLO JHON ERIC

985. Cargo: Contribuyente

Fecha generacion documento PDF: 14-10-2025 11:38:21AM

Powered by CamScanner

El Bagre, 22 de febrero de 2026

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO PUERTO CLAVER

NIT: 901.982.342-5

DEBE A:

MAYULIS DEL CARMEN GUERRA BLANCO
N.I.T: 1.049.346.692-1

LA SUMA DE:

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($450.000)

POR CONCEPTO DE:

- ALQUILER DE EQUIPO PORTATIL HP 15" TÁCTIL - RAM 8GB - DISCO SSD 512GB PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DE 2026

Mayulis Guerra P.

MAYULIS GUERRA
CC: 1.049.346.692
Cel: 302-4464878

El Bagre, 10 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO PUERTO CLAVER

NIT: 901.982.342-5

DEBE A:

MAYULIS DEL CARMEN GUERRA BLANCO
N.I.T: 1.049.346.692-1

LA SUMA DE:

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($450.000)

POR CONCEPTO DE:

- ALQUILER DE EQUIPO PORTATIL HP 15" TÁCTIL - RAM 8GB - DISCO SSD 512GB PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO, 06 DE ABRIL AL 10 DE ABRIL DE 2026.

Mayulis Guerra B

MAYULIS GUERRA
CC: 1.049.346.692
Cel: 302-4464878

El Bagre, 10 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO PUERTO CLAVER

NIT: 901.982.342-5

DEBE A:

JHON ERIC DELGADO CANTILLO
N.I.T: 1.080.017.212-1

LA SUMA DE:

TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (3.600.000)

POR CONCEPTO DE:

- ALQUILER DE ESTACION TOTAL MARCA TOPCON SERIAL KA0276 Y NIVEL MARCA: KOLIDA REFERENCIA NO.: KL-32 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO, 06 DE ABRIL AL 10 DE ABRIL DE 2026.

Cordialmente,

JHON ERIC DELGADO CANTILLO
CC: 1.080.017.212
Cel: 312-7460454

2:22

PAGAR

¡El pago fue exitoso!

Total pagado: $76.000

No. comprobante
TR260331142202QtSgb4

Fecha y hora
31 Mar 2026 14:22

Referencia del producto
1199836 1774984861 82117

Producto origen
Cuenta de ahorros **** 5132

Comercio
Wompi SAS

Costo transacción
$ 0 COP

Descargar Comprobante

Regresar al Comercio

ANEXO 6. DOCUMENTACION MAQUINARIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 112515

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC522770	HYUNDAI	R140W-9S	2023

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	HHKHZ412TE0001746

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	26501619	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
14700 Kg	3140 mm	2500 mm	7770 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
ARRIETA GOMEZ FERNEY JOSE

IDENTIFICACIÓN
C.C. 98.650.065

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
INST TTOYTTE DE CERETE

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
17-03-2023	17-03-2023	*****

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	352023000086693	21/02/2023





ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000053930

Servicios Integrales 61733.7.A-1 05/22

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 131107

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC083584	CATERPILLAR	236B	2011

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	MINICARGADOR	CAT0236BKA9H01044

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLA	CYM24532	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
3178 Kg	3965 mm	1676 mm	3515 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
ARRIETA GOMEZ FERNEY JOSE	C.C. 98.650.065

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN


LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
31-08-2018	06-05-2024	******

ORIGEN	DOC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	242016M00000113	03/06/2016





ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000061707

Servicios Integrales 81733.7-8-1 06/21

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 128481

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC006566	CATERPILLAR	416E	2007

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	RETROEXCAVADORA	CAT0416ETSHA03003

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	G4D15753	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
6790 Kg	2820 mm	2300 mm	7290 mm

PROPIETARIO. APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
ARRIETA GOMEZ FERNEY JOSE	C.C 98.650.065

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR *
STRIA TTEYTTO ENVIGADO

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
22-04-2016	29-01-2024	******
ORIGEN	DOC IMPORTACION	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	462012000346900	09/08/2012

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000062025

ANEXO 7. DOCUMENTACION VEHICULOS

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

PREVISORA

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE: HORA 00:00	VIGENCIA HASTA: HORA 24:00
2025-06-13	2025-06-14	2026-06-13

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE EN CC	MODELO
4308306896608000	STL180	CARGA O MIXTO	PUBLICO	7636	2015

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
2	INTERNATIONAL	PLATON

LINEA VEHICULO	
DURASTAR 4300 SBA 4X2	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	KILOMETRAJE
472H9M2U1610087	3HAMMAAR5FL099085	3HAMMAAR5FL099088	9 84

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
GARCES DAJUD JUAN CARLOS	3116838647	CC	92527771	SINCELEJO

CÓDIGO DE AGRUPAMIENTO	TIPO EUROREAL EXPEDIDORA	CLASE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA AUA	CONTRIBUCIÓN FONDO	TASA RUNT	
320	$ 839200	$ 436300	$ 2400	

TOTAL A PAGAR

$ 1277900

A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE VICTIMAS	701,68 [2]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	8.77	
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

1

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10018378886

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
STL180	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300 SBA	2015

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
7.636	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	9636

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
470HM2U1610087	N	3HAMMAAR5FL099089

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
3HAMMAAR5FL099089	N	3HAMMAAR5FL099089	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

GARCES DAJUD JUAN CARLOS

IDENTIFICACIÓN

C.C. 92527773

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP

195

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

192014000028536

FECHA IMPORT.

13/03/2014

PUERTAS

2


LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
31/03/2014	15/05/2019	

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTEYTTO SINCELEJO

LT03002465702

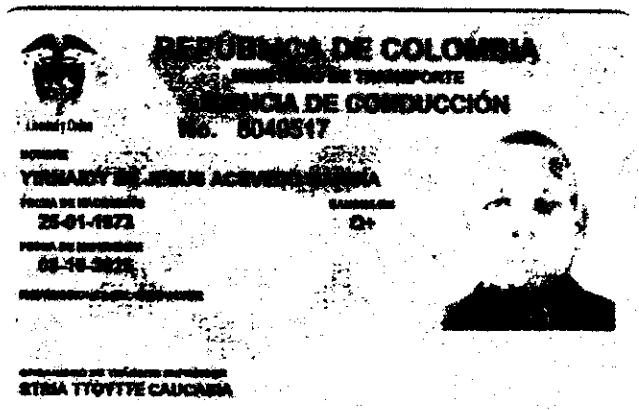

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 8046517


YINNADY DE JESUS ACEVEDO [illegible]

FECHA DE NACIMIENTO
25-01-1973

GRUPO SANGUÍNEO
O+

FECHA DE EXPEDICIÓN
08-10-2025

AUTORIDAD DE TRÁNSITO EXPEDIDORA
SEDA TTOYTTE CAUCASIA

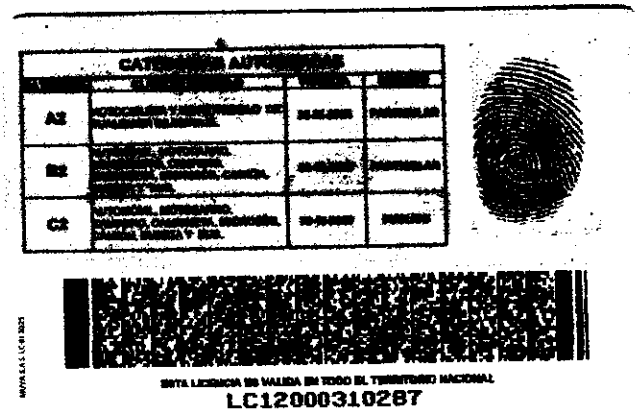

CATEGORÍAS AUTORIZADAS			
CLASE	DESCRIPCIÓN	VIGENCIA	RESTRICCIONES
A2	MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS DE [illegible]	08-10-2035	PARCIALES
B2	AUTOMÓVIL, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, BUSETA, CAMIÓN, [illegible]	08-10-2035	PARCIALES
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, BUSETA Y CAMIÓN.	08-10-2035	NINGUNA

ESTA LICENCIA SE VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC1200310287

MOVILES LC 01 2025

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDIC	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2025-03-23	2025-03-24	2026-03-23

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
14289413013070	SBJ502	CARGA O MIXTO	PUBLICO	7560	1952

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FORD	VOLCO
	LÍNEA VEHICUL: F 6	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
93066696	F6R2EG34035		3.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
VALLEJO GOMEZ, DIANA PATRICIA	3205666127	CC	39274010	YARUMAL

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	10	4013	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$ 580700	$ 301900	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 884700

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	701,68 [2] UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	8,77 UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	180 750 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

FIRMA AUTORIZADA

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

Protección de datos personales:

SEGUROS DEL ESTADO S.A y SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. informa que sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que se encontrará disponible a través de las páginas www.segurosdelestado.com/pages/ProteccionDatos y www.segurosdevidadelestado.com/pages/ProteccionDatos para su consulta.

Recuerda que, en calidad de titular de sus datos personales, podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir su información personal, así como, el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales para algunas de las finalidades dada, a través de la dirección de correo electrónico protecciondatospersonales@segurosdelestado.com

Tenga presente las principales finalidades para las que serán tratados sus datos personales por cuenta de **SEGUROS DEL ESTADO S.A** y **SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A** como es para la emisión de la póliza y vinculación como cliente; ejecutar los contratos que celebre **SEGUROS DEL ESTADO** con sus terceros encargados; controlar y prevenir fraudes, lavado de activos, la financiación del terrorismo o la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva; determinar y liquidar pagos de siniestros así como mantener el contacto para dar seguimiento a peticiones, quejas y reclamos; enviar información relativa a educación financiera, encuestas de satisfacción, ofertas de productos o servicios y comunicaciones comerciales de cualquier clase, relacionadas con servicios inherentes a la actividad aseguradora, a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo ofertas de productos y servicios de Compañías con las que **SEGUROS DEL ESTADO** tenga convenio o alianzas comerciales; en los casos que corresponda, ser usados en aplicativos móviles o plataformas tecnológicas propias de **SEGUROS DEL ESTADO** como aquellas administradas a través de Encargados y/o Compañías Tratantes y todas las demás finalidades que se definan en la política de protección de datos personales de **SEGUROS DEL ESTADO** y sus actualizaciones.

Topes de cobertura gastos médicos
1 Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150,711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910,920. Decreto 2644 de 2022.
2 Para las demás tarifas no citadas en (1).

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023042486

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SBJ502	FORD	F 6	1952

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
7.560	AZUL ROJO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KG/PAS
CAMION	VOLCO	DIESEL	3000

NÚMERO DE MOTOR
93066696

REG N VIN ******

NUMERO DE SERIE
F6R2EG34035

REG S NÚMERO DE CHASIS F6R2EG34035 REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
VALLEJO GOMEZ DIANA PATRICIA

IDENTIFICACIÓN
C.C. 39274010

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE (Nivel balístico) POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

LIC FECHA IMPORT PUERTAS
I 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
****

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO	FECHA VENCIMIENTO
14/08/1953	31/05/2021	*******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEYITO YARUMAL



LT07000767332

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 181764440

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DEL CARIBE LIMITADA

NIT: 900132238

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-015-001

Fecha de expedición: 2025/06/14

Fecha de vencimiento: 2026/06/14

DATOS VEHÍCULO

PLACA: STL180

CLASE: VOLQUETA

MARCA: INTERNATIONAL

MODELO: 2015

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 7636

NRO. MOTOR: 470HM2U1610087

NRO. CHASIS: 3HAMMAAR5FL099088

VIN: 3HAMMAAR5FL099088

LÍNEA: DURASTAR 4300 SBA 4X2

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: JUAN C. GARCES D.

FIRMA DEL RESPONSABLE

RAMIRO JAVIER VERGARA GONZALEZ



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1063275197

Libertad y Orden

NOMBRE

JAVIER GANDIA SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO

14-09-1996

GRUPO SANGUÍNEO

O+

FECHA DE EXPEDICIÓN

14-01-2026

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTOYITE CAUCASIA



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	14-01-2036	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	14-01-2026	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC12000378341

ANEXO 10. FORMATO DE INDUCCION Y REINDUCCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

CONSORCIO PUERTO CLAVER	CONSORCIO PUERTO CLAVER N.I.T: 901-982.342-5
	PERFIL SOCIODEMOGRAFICO DEL PERSONAL

1	NOMBRES Y APELLIDOS	William Manuel Martinez Solano
2	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1040 495 511
3	GÉNERO	Masculino
4	CELULAR	321 627 9413
5	CORREO ELECTRÓNICO	
6	FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)	13/11/1987
7	EDAD	37
8	LUGAR DE NACIMIENTO (Municipio)	El Bagre
9	NACIONALIDAD	Colombiano
10	ESTADO CIVIL	Union libre
11	NÚMERO DE PERSONAS A CARGO	3
12	NIVEL DE ESCOLARIDAD	Primaria
13	FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA (dd/mm/aaaa)	
14	CARGO	AYUDANTE
15	TIPO DE CONTRATACIÓN	OBRA LABOR CONTRATADA
16	PRACTICA ALGUN DEPORTE (CUAL?)	Futbol
17	ARL	SURA.
18	EPS	COMFAMA MEDICINA
19	AFP	PROTECCIÓN
20	CCF	COMFAMA
21	SUFRE DE ALGUNA ENFERMEDAD (CUAL)	NO
22	CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS	Si.
23	ES FUMADOR	Si.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Nombre completo	William Martinez				
Número de cédula	1011095511	Cargo	Aprendiz		
Fecha		Inducción	X	Reinducción	

Considero que estoy capacitado (a) para cumplir con mi labor y las tareas que me han sido asignadas, de manera segura, responsable y eficaz; de igual forma me comprometo a cumplir con todas los reglamentos, procedimientos, políticas y demás normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, administrativas y operativas que la empresa establezca y a utilizar de manera correcta y permanente los elementos de protección personal y equipos de protección contra caídas de altura que me han asignado y realizarles su debido mantenimiento para conservar su vida útil e informarles a mis Jefes inmediatos o Auxiliar SST la requisición o cambio de ellos.

Igualmente, acepto y autorizo la realización de pruebas de alcoholemia y sustancias psicoactivas para evidenciar o descartar el ingreso a laboral bajo el efecto de sustancias psicoactivas o el consumo de estas en las instalaciones de la empresa y durante mi horario laboral.

Además, certifico que conozco y acepto las responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondientes con mi cargo.

Hago constar que he recibido la Inducción y/o Reinducción de Seguridad y Salud en el Trabajo en la cual se han tratado los siguientes temas:

* Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos
* Reporte de incidentes, accidentes de trabajo, actos y condiciones inseguros.
* Actos y condiciones inseguras.
* Uso permanente y adecuado de EPP.
* COPASST.
* Comité de convivencia laboral.
* Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
* Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
* Normas, procedimientos y protocolos de seguridad.
* Seguridad social.
* Clasificación de residuos sólidos.
* Roles y responsabilidades SGSST.
* Política de seguridad y Salud en el Trabajo
* Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
* Riesgos y peligros de acuerdo a la GTC 45: Biológicos, físicos, químicos, psicosocial, biomecánicos, condiciones de seguridad y fenómenos naturales.

Firma del trabajador	William Martinez Solano


CONSORCIO PUERTO CLAVER	CONSORCIO PUERTO CLAVER
	INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Evaluación de conocimiento de inducción y/o reinducción

1. Seleccione con una X los elementos de protección personal que son necesarios para su labor

 Casco de seguridad	 Overol en tela drill	 Mascarilla para humos metalicos y gases	Delantal de carnaza	 Pantaloneta
 Botas plasticas con puntera	 Guantes de carnaza	 Tapabocas	 Camiseta tipo polo	 Monogafas antiempañantes
 Careta	 Arnés y eslingas certificados	 Dotacion en Denim	 Botas para trabajos en caliente	 Gorra
 Guantes plasticos	 Protector auditivo	Monja para soldadura	Zapatos cubiertos	 Tenis

2. Identifique cuál de las imágenes corresponde a un incidente, accidente de trabajo, acto inseguro y condición insegura

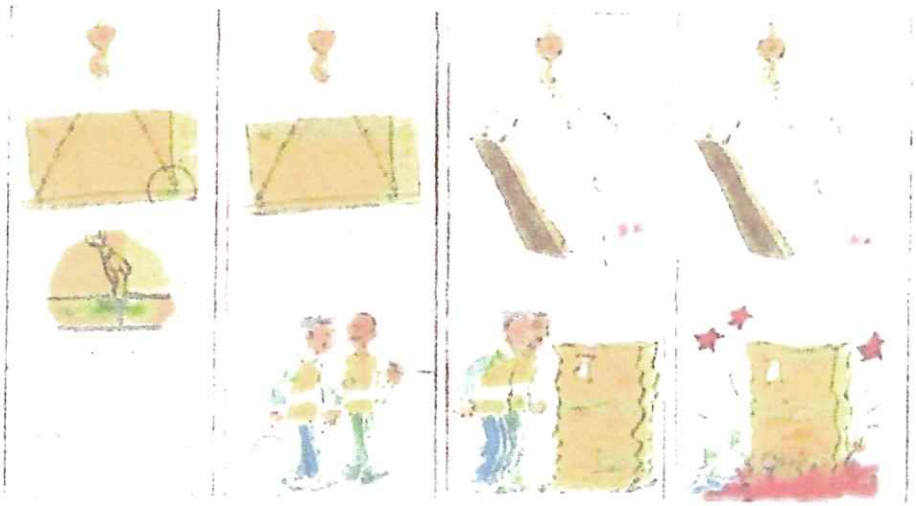

S. Y no se	A. Y no se	incidente	Sin te

3. ¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo?

a. Asistir a las capacitaciones y charlas SST.

b. Uso permanente y correcto de los EPP.


c. Reportar los incidentes y accidentes de trabajo.

d. Brindar información verás de su estado de salud.

e. Todas las anteriores.

CONSORCIO PUERTO CLAVER	CONSORCIO PUERTO CLAVER
	INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4. Escriba al frente de cada residuo, el número que corresponde a la caneca donde se debería depositar el mismo

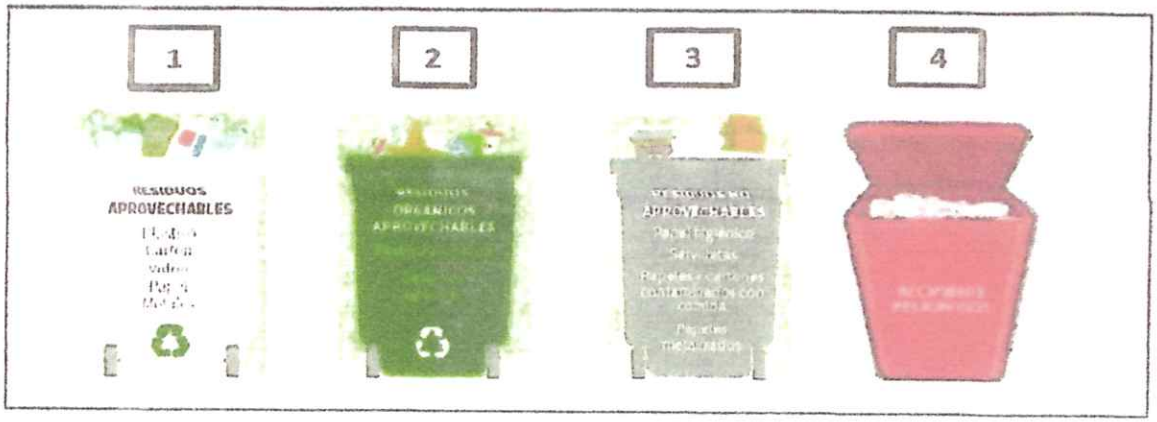

Residuo	Recipiente
Estopas impregnadas con grasas y aceites, envases de sustancias químicas peligrosas	4
Cartón limpio, papel periódico, papel archivo, plástico, vidrio metales	1
Papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados	3
Restos de comida, desechos agrícolas	2

5. ¿Cuáles son los propósitos del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST?

a. Apoyar las investigaciones de los accidentes de trabajo

b. Reunirse mensualmente

c. Realizar inspecciones de seguridad

d. Todas las anteriores.

Firma del evaluador	Naylis Guerra B

CONSORCIO PUERTO CLAVER	CONSORCIO PUERTO CLAVER N.I.T: 901-982.342-5
	PERFIL SOCIODEMOGRAFICO DEL PERSONAL

1	NOMBRES Y APELLIDOS	Yeiner Andres palacio Acuedo
2	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1001682724
3	GÉNERO	Mascolino
4	CELULAR	3106207571
5	CORREO ELECTRÓNICO	YeinerAcuedo135@gmail.com
6	FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)	16 de septiembre 2002
7	EDAD	23
8	LUGAR DE NACIMIENTO (Municipio)	el Bagre Antioquia
9	NACIONALIDAD	colombiano
10	ESTADO CIVIL	Soltero
11	NÚMERO DE PERSONAS A CARGO	1
12	NIVEL DE ESCOLARIDAD	7
13	FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA (dd/mm/aaaa)	
14	CARGO	
15	TIPO DE CONTRATACIÓN	
16	PRACTICA ALGUN DEPORTE (CUAL?)	No
17	ARL	
18	EPS	
19	AFP	
20	CCF	
21	SUFRE DE ALGUNA ENFERMEDAD (CUAL)	Nada
22	CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS	No
23	ES FUMADOR	No

CONSORCIO PUERTO CLAVER	CONSORCIO PUERTO CLAVER
	INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Nombre completo	Yeimer Andres palacio Acevedo				
Número de cédula	1001682724	Cargo	1		
Fecha		Inducción		Reinducción	

Considero que estoy capacitado (a) para cumplir con mi labor y las tareas que me han sido asignadas, de manera segura, responsable y eficaz; de igual forma me comprometo a cumplir con todas los reglamentos, procedimientos, políticas y demás normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, administrativas y operativas que la empresa establezca y a utilizar de manera correcta y permanente los elementos de protección personal y equipos de protección contra caídas de altura que me han asignado y realizarles su debido mantenimiento para conservar su vida útil e informarles a mis Jefes inmediatos o Auxiliar SST la requisición o cambio de ellos.

Igualmente, acepto y autorizo la realización de pruebas de alcoholemia y sustancias psicoactivas para evidenciar o descartar el ingreso a laboral bajo el efecto de sustancias psicoactivas o el consumo de estas en las instalaciones de la empresa y durante mi horario laboral.

Además, certifico que conozco y acepto las responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondientes con mi cargo.

Hago constar que he recibido la Inducción y/o Reinducción de Seguridad y Salud en el Trabajo en la cual se han tratado los siguientes temas:



* Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos
* Reporte de incidentes, accidentes de trabajo, actos y condiciones inseguros.
* Actos y condiciones inseguras.
* Uso permanente y adecuado de EPP.
* COPASST.
* Comité de convivencia laboral.
* Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
* Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
* Normas, procedimientos y protocolos de seguridad.
* Seguridad social.
* Clasificación de residuos sólidos.
* Roles y responsabilidades SGSST.
* Política de seguridad y Salud en el Trabajo
* Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
* Riesgos y peligros de acuerdo a la GTC 45: Biológicos, físicos, químicos, psicosocial, biomecánicos, condiciones de seguridad y fenómenos naturales.

Firma del trabajador	


CONSORCIO PUERTO CLAVER	CONSORCIO PUERTO CLAVER
	INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Evaluación de conocimiento de Inducción y/o reinducción

1. Seleccione con una X los elementos de protección personal que son necesarios para su labor

 Casco de seguridad	 Overol en tela drill	 Mascarilla para humos metalicos y gases	Delantal de carnaza	 Pantaloneta
 Botas plasticas con puntera	 Guantes de carnaza	 Tapabocas	 Camiseta tipo polo	 Monogafas antiempañantes
 Careta	 Arnés y eslingas certificados	 Dotación en Denim	 Botas para trabajos en caliente	 Gorra
 Guantes plasticos	 Protector auditivo	Monja para soldadura	Zapatos cubiertos	 Tenis

2. Identifique cuál de las imágenes corresponde a un incidente, accidente de trabajo, acto inseguro y condición insegura

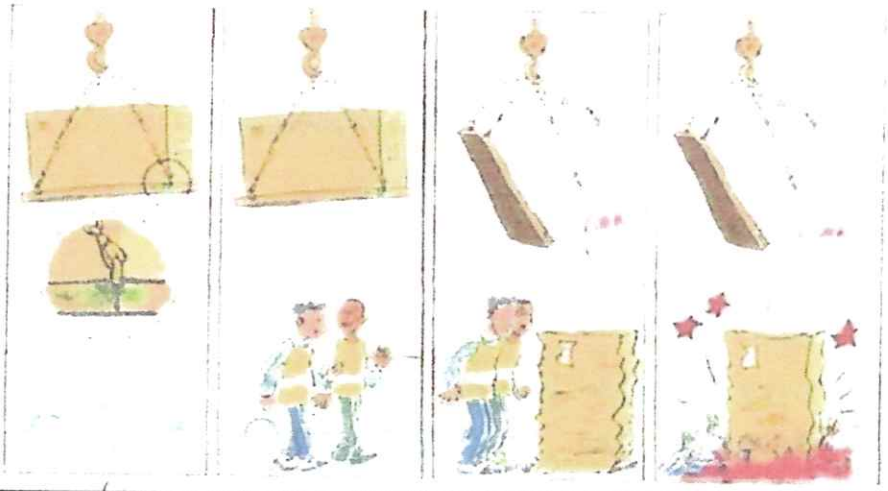

condicion insegura	Acto inseguro	incidente	Accidente

3. ¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo?

a. Asistir a las capacitaciones y charlas SST.

b. Uso permanente y correcto de los EPP.


c. Reportar los incidentes y accidentes de trabajo.

d. Brindar información verás de su estado de salud.

X Todas las anteriores.

CONSORCIO PUERTO CLAVER	CONSORCIO PUERTO CLAVER
	INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4. Escriba al frente de cada residuo, el número que corresponde a la caneca donde se debería depositar el mismo

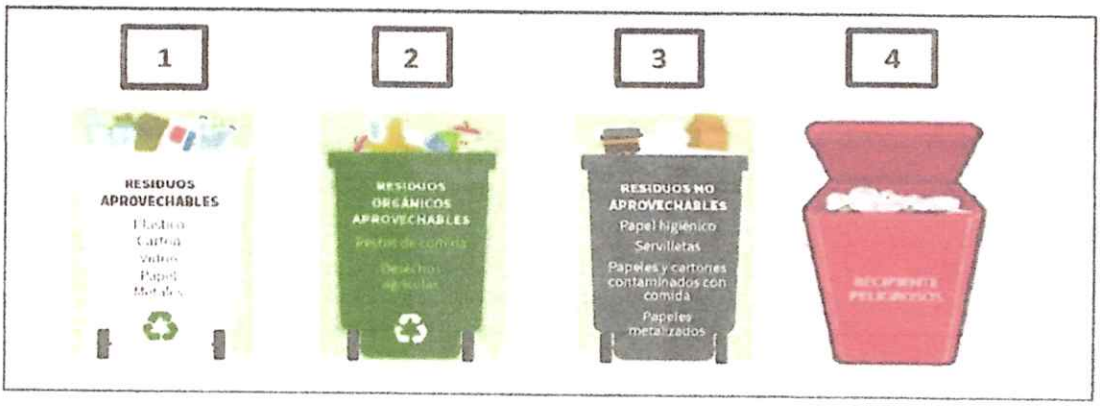

Residuo	Recipiente
Estopas impregnadas con grasas y aceites, envases de sustancias químicas peligrosas	4
Cartón limpio, papel periódico, papel archivo, plástico, vidrio metales	1
Papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados	3
Restos de comida, desechos agrícolas	2

5. ¿Cuáles son los propósitos del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST?

a. Apoyar las investigaciones de los accidentes de trabajo

b. Reunirse mensualmente

c. Realizar inspecciones de seguridad

X d. Todas las anteriores.

Firma del evaluador	Naylis Guerra B

CONSORCIO PUERTO CLAVER	CONSORCIO PUERTO CLAVER N.I.T: 901-982.342-5
	PERFIL SOCIODEMOGRAFICO DEL PERSONAL

1	NOMBRES Y APELLIDOS	Clemente Ortega montes
2	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	92098381
3	GÉNERO	Masculino
4	CELULAR	314 8478043
5	CORREO ELECTRÓNICO	
6	FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)	06-07-78
7	EDAD	
8	LUGAR DE NACIMIENTO (Municipio)	Galeras Sucre
9	NACIONALIDAD	colombiano
10	ESTADO CIVIL	union libre
11	NÚMERO DE PERSONAS A CARGO	4
12	NIVEL DE ESCOLARIDAD	bachiller
13	FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA (dd/mm/aaaa)	
14	CARGO	Maestro
15	TIPO DE CONTRATACIÓN	
16	PRACTICA ALGUN DEPORTE (CUAL?)	NO
17	ARL	
18	EPS	
19	AFP	
20	CCF	
21	SUFRE DE ALGUNA ENFERMEDAD (CUAL)	NO
22	CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS	NO
23	ES FUMADOR	NO

CONSORCIO PUERTO CLAVER	CONSORCIO PUERTO CLAVER
	INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Nombre completo	Clemente Rafael Ortega Montes				
Número de cédula	92098381	Cargo			
Fecha		Inducción		Reinducción	

Considero que estoy capacitado (a) para cumplir con mi labor y las tareas que me han sido asignadas, de manera segura, responsable y eficaz; de igual forma me comprometo a cumplir con todas los reglamentos, procedimientos, políticas y demás normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, administrativas y operativas que la empresa establezca y a utilizar de manera correcta y permanente los elementos de protección personal y equipos de protección contra caídas de altura que me han asignado y realizarles su debido mantenimiento para conservar su vida útil e informarles a mis Jefes inmediatos o Auxiliar SST la requisición o cambio de ellos.

Igualmente, acepto y autorizo la realización de pruebas de alcoholemia y sustancias psicoactivas para evidenciar o descartar el ingreso a laboral bajo el efecto de sustancias psicoactivas o el consumo de estas en las instalaciones de la empresa y durante mi horario laboral.

Además, certifico que conozco y acepto las responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondientes con mi cargo.

Hago constar que he recibido la Inducción y/o Reinducción de Seguridad y Salud en el Trabajo en la cual se han tratado los siguientes temas:

* Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos
* Reporte de incidentes, accidentes de trabajo, actos y condiciones inseguros.
* Actos y condiciones inseguras.
* Uso permanente y adecuado de EPP.
* COPASST.
* Comité de convivencia laboral.
* Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
* Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
* Normas, procedimientos y protocolos de seguridad.
* Seguridad social.
* Clasificación de residuos sólidos.
* Roles y responsabilidades SGSST.
* Política de seguridad y Salud en el Trabajo
* Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
* Riesgos y peligros de acuerdo a la GTC 45: Biológicos, físicos, químicos, psicosocial, biomecánicos, condiciones de seguridad y fenómenos naturales.

Firma del trabajador	Clemente Ortega


CONSORCIO PUERTO CLAVER	
CONSORCIO PUERTO CLAVER	INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Evaluación de conocimiento de inducción y/o reinducción

1. Seleccione con una X los elementos de protección personal que son necesarios para su labor

 Casco de seguridad	 Overol en tela dril	 Mascarilla para humos metalicos y gases	Delantal de carnaza	 Pantaloneta
 Botas plasticas con puntera	 Guantes de carnaza	 Tapabocas	 Camiseta tipo polo	 Monogafas antiempañantes
 Careta	 Arnés y eslingas certificados	 Dotación en Denim	 Botas para trabajos en caliente	 Gorra
 Guantes plasticos	 Protector auditivo	Monja para soldadura	Zapatos cubiertos	 Tenis

2. Identifique cuál de las imágenes corresponde a un incidente, accidente de trabajo, acto inseguro y condición insegura

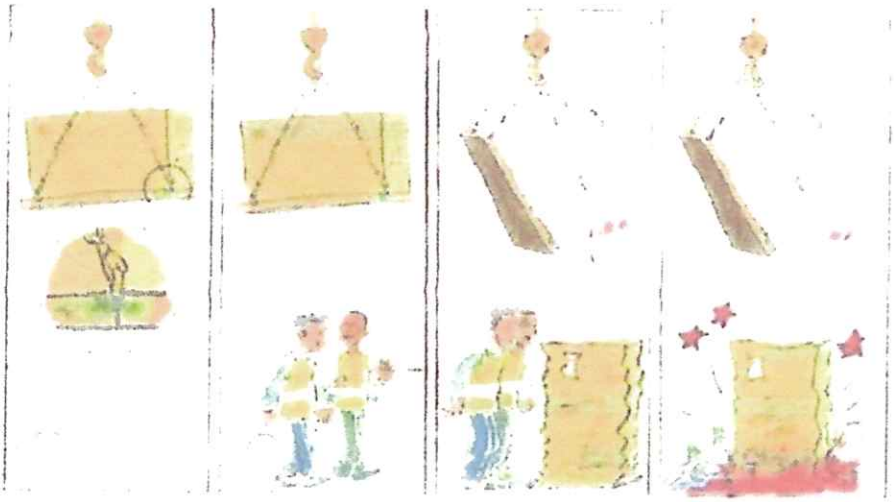

condicion insegura	ACTO inseg	Incidente	Accidente

3. ¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo?

a. Asistir a las capacitaciones y charlas SST.

b. Uso permanente y correcto de los EPP.


c. Reportar los incidentes y accidentes de trabajo.

d. Brindar información verás de su estado de salud.

e. Todas las anteriores.

CONSORCIO PUERTO CLAVER	CONSORCIO PUERTO CLAVER
	INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4. Escriba al frente de cada residuo, el número que corresponde a la caneca donde se debería depositar el mismo

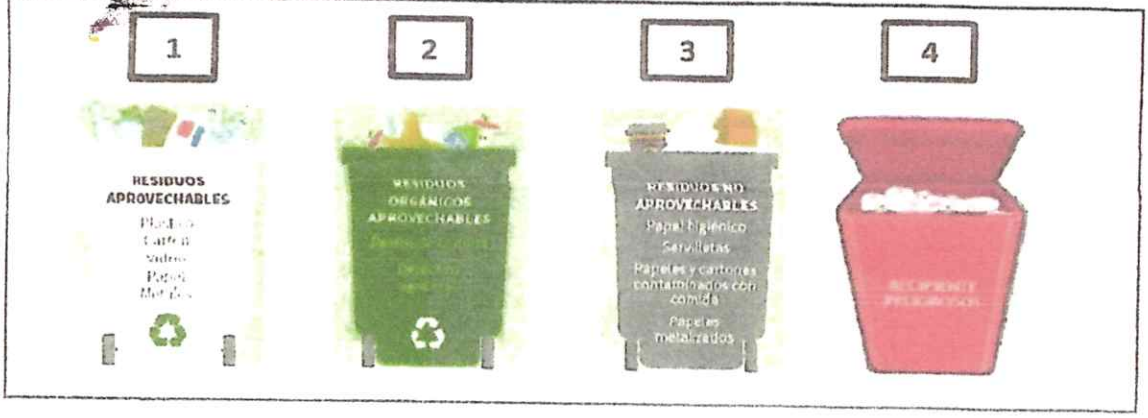

Residuo	Recipiente
Estopas impregnadas con grasas y aceites, envases de sustancias químicas peligrosas	4
Cartón limpio, papel periódico, papel archivo, plástico, vidrio metales	1
Papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados	3
Restos de comida, desechos agrícolas	2

5. ¿Cuáles son los propósitos del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST?

a. Apoyar las investigaciones de los accidentes de trabajo

b. Reunirse mensualmente

c. Realizar inspecciones de seguridad

d. Todas las anteriores.

Firma del evaluador	Yaquelis Guerra B

ANEXO 13. INFORME MENSUAL ESTADO DEL TIEMPO.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

INFORME MENSUAL ESTADO DEL TIEMPO

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	UBICACIÓN:	CORREGIMIENTO DE PUERTO CALVER MUNICIPIO EL BAGRE (ANTIOQUIA).	MES: ENERO AÑO: 2026
INTERVENTORIA:	INGECOR S.A.S	CONTRATO:	052-2025	

	HORA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A.M.	12:00-1:00																															
	1:00-2:00																															
	2:00-3:00																															
	3:00-4:00																															
	4:00-5:00																															
	5:00-6:00																															
	6:00-7:00																															
	7:00-8:00																			S	S	S	S	S	S	S	S	S	C	S	S	S
	8:00-9:00																			S	S	S	S	S	S	S	S	S	C	S	S	S
	9:00-10:00																			S	S	S	S	S	S	S	S	S	C	S	S	S
	10:00-11:00																			S	S	S	S	S	S	S	S	S	C	S	S	S
	11:00-12:00																			S	S	S	S	S	S	S	S	S	C	S	S	S
P.M.	12:00-1:00																			S	S	S	S	S	S	S	S	S	C	S	S	S
	1:00-2:00																			S	S	S	S	S	S	S	S	S	C	S	S	S
	2:00-3:00																			S	S	S	S	S	S	S	S	S	C	S	S	S
	3:00-4:00																			S	S	S	S	S	S	S	S	S	C	S	S	S
	4:00-5:00																			S	S	S	S	S	S	S	S	S	C	S	S	S
	5:00-6:00																			S	S	S	S	S	S	S	S	S	C	S	S	S
	6:00-7:00																			S	S	S	S	S	S	S	S	S	C	S	S	S
	7:00-8:00																															
	8:00-9:00																															
	9:00-10:00																															
	10:00-11:00																															
	11:00-12:00																															

DUSPENSION Nº 1

ORDEN PÚBLICO

ELABORÓ:

VoBo ING. RESIDENTE: Carlos A. Mercado Z

VoBo INTERVENTOR:

ESTADO DEL TIEMPO			
LLVZ	LLOVIZNA	N	NUBLADO
D.N	DESPEJADO NOCHE		
LL	LLUVIA	S	SOL

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

INFORME MENSUAL ESTADO DEL TIEMPO

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	UBICACIÓN:	CORREGIMIENTO DE PUERTO CÁLVER MUNICIPIO EL BAGRE (ANTIOQUIA).
			MES: FEBRERO
			AÑO: 2026
INTERVENTORIA:	INGECOR S.A.S	CONTRATO:	052-2025

	HORA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A.M.	12:00-1:00																															
	1:00-2:00																															
	2:00-3:00																															
	3:00-4:00																															
	4:00-5:00																															
	5:00-6:00																															
	6:00-7:00																															
	7:00-8:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	LL	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S			
	8:00-9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	LL	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			
	9:00-10:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	LL	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			
	10:00-11:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	LL	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			
	11:00-12:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			
P.M.	12:00-1:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S			
	1:00-2:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S			
	2:00-3:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S			
	3:00-4:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S			
	4:00-5:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S			
	5:00-6:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S			
	6:00-7:00																															
	7:00-8:00																															
	8:00-9:00																															
	9:00-10:00																															
	10:00-11:00																															
	11:00-12:00																															

ELABORÓ:

VoBo ING. RESIDENTE Carlos A. Mercado Z

VoBo INTERVENTOR

ESTADO DEL TIEMPO			
LLVZ	LLOVIZNA	N	NUBLADO
D.N	DESPEJADO NOCHE		
LL	LLUVIA	S	SOL

CONSORCIO PUERTO CLAVER

INFORME MENSUAL ESTADO DEL TIEMPO

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	UBICACIÓN:	CORREGIMIENTO DE PUERTO CALVER MUNICIPIO EL BAGRE (ANTIOQUIA).
INTERVENTORIA:	INGECOR S.A.S	CONTRATO:	052-2025

MES: MARZO

AÑO: 2026

	HORA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A.M.	12:00-1:00																															
	1:00-2:00						I																									
	2:00-3:00																															
	3:00-4:00																															
	4:00-5:00																															
	5:00-6:00																															
	6:00-7:00																															
	7:00-8:00	S	S	S	S	S	N	S	S	L	S	S	S	S	S	S																
	8:00-9:00	S	S	S	S	S	N	S	S	L	S	S	S	S	S	S																
	9:00-10:00	S	S	S	S	S	N	S	S	L	S	S	S	S	S	S																
	10:00-11:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S																
	11:00-12:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S																
P.M.	12:00-1:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S																
	1:00-2:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S																
	2:00-3:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S																
	3:00-4:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S																
	4:00-5:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S																
	5:00-6:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S																
	6:00-7:00																															
	7:00-8:00																															
	8:00-9:00																															
	9:00-10:00																															
	10:00-11:00																															
	11:00-12:00																															

SUSPENSIÓN Nº2. DAÑO MINERO

ELABORÓ:	VoBo ING. RESIDENTE Carlos A. Mercado Z	VoBo INTERVENTOR

ESTADO DEL TIEMPO

LLVZ	LLOVIZNA	N	NUBLADO
D.N	DESPEJADO NOCHE		
LL	LLUVIA	S	SOL

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

INFORME MENSUAL ESTADO DEL TIEMPO

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	UBICACIÓN:	CORREGIMIENTO DE PUERTO CALVER MUNICIPIO EL BAGRE (ANTIOQUIA).	MES: ABRIL AÑO: 2026
INTERVENTORIA:	INGECOR S.A.S	CONTRATO:	052-2025	

	HORA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A.M.	12:00-1:00																															
	1:00-2:00																															
	2:00-3:00																															
	3:00-4:00																															
	4:00-5:00																															
	5:00-6:00																															
	6:00-7:00																															
	7:00-8:00						S	S	S	S	S																					
	8:00-9:00						S	S	S	S	S																					
	9:00-10:00						S	S	S	S	S																					
	10:00-11:00						S	S	S	S	S																					
	11:00-12:00						S	S	S	S	S																					
P.M.	12:00-1:00						S	S	S	S	S																					
	1:00-2:00						S	S	S	S	S																					
	2:00-3:00						S	S	S	S	S																					
	3:00-4:00						S	S	S	S	S																					
	4:00-5:00						S	S	S	S	S																					
	5:00-6:00						S	S	S	S	S																					
	6:00-7:00																															
	7:00-8:00																															
	8:00-9:00																															
	9:00-10:00																															
	10:00-11:00																															
	11:00-12:00																															

PARO SUSPENSION Nº2 TUNDIDO

ELABORÓ:

VoBo ING. RESIDENTE: Carlos A. Mercado Z

VoBo INTERVENTOR:

ESTADO DEL TIEMPO			
LLVZ	LLOVIZNA	N	NUBLADO
D.N	DESPEJADO NOCHE		
LL	LLUVIA	S	SOL

ANEXO 8. INSPECCIONES PREOPERACIONALES

¡¡DESCONOCIDO!	CONSORCIO PAVIMENTO SAN JOSE INSPECCION PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO	PAGINA: 1 DE 1

CONTRATO N°: 042 DE 2025

OBJETO DE CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO NUEVA GRANADA Y SAN JOSE, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

VIB CONCRETO No. : _____ MARCA: _____ OPERADOR: Daniel.

PERIODO EVALUADO: 16/02/2026 AL 22/02/2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable de ignición (traflector)	X		X		X		X		X		X		V	
	* Estado del interruptor de encendido	X		X		X		X		X		X		V	
	* Estado de la manguera	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado del cuerpo (CARCAZA)	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de la aguja vibrante (sin fisuras, grietas, costras)	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de sistema de bloqueo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado del motor eléctrico	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado del botón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de la plaqueta de identificación	X		X		X		X		X		X		X	
OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE	Daniel.		Daniel.		Daniel.		Daniel.		Daniel.		Daniel.		Daniel.	
	FIRMA														
TECNOLOGO SST	NOMBRE														
	FIRMA	Yaylis Guerra B.		Yaylis Guerra B.		Yaylis Guerra B.									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO PUERTO CLAVER	CONSORCIO PUERTO CLAVER INSPECCION PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO	PAGINA: 1 DE 1

CONTRATO N°: 050 DE 2025

OBJETO DE CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29°, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

VIB CONCRETO No. : _____ MARCA: _____ OPERADOR: Daniel.

PERIODO EVALUADO: 23/02/2026 AL: 01/03/2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable de ignición (tiraflector)	X		X											
	* Estado del interruptor de encendido	X		X											
	* Estado de la manguera	X		X											
	* Estado del cuerpo (CARCAZA)	X		X											
	* Estado de la aguja vibrante (sin fisuras, grietas, costras)	X		X											
	* Estado de sistema de bloqueo	X		X											
	* Estado del motor eléctrico	X		X											
	* Estado del botón de seguridad	X		X											
	Estado de la plaqueta de identificación	X		X											
OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE	Daniel.		Daniel.											
	FIRMA														
TECNOLOGO SST	NOMBRE														
	FIRMA	Yaylis Guerra P.													

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO PUERTO CLAVER	CONSORCIO PUERTO CLAVER INSPECCION PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO	PAGINA: 1 DE 1

CONTRATO N°: 050 DE 2025

OBJETO DE CONTRATO: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª. EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA."

VIB CONCRETO No. : _____ MARCA: _____ OPERADOR: Daniel.

PERIODO EVALUADO: 06/04/2026 AL 12/04/2026

ITEM	CONCEPTO		LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable de ignición (tiraflector)				X				X							
	* Estado del interruptor de encendido				X				X							
	* Estado de la manguera				X				X							
	* Estado del cuerpo (CARCAZA)				X				X							
	* Estado de la aguja vibrante (sin fisuras, grietas, costras)				X				X							
	* Estado de sistema de bloqueo				X				X							
	* Estado del motor eléctrico				X				X							
	* Estado del botón de seguridad				X				X							
	Estado de la plaqueta de identificación				X				X							
OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)		NOMBRE			Daniel.				Daniel.							
		FIRMA														
TECNOLOGO SST		NOMBRE														
		FIRMA			Yaylis Guerra B.				Yaylis Guerra B.							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER
INSPECCION PREOPERACIONAL
TRONZADORA

PAGINA: 1 DE 1

CONTRATO N°: 050 **DE** 2025

OBJETO DE CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA."

TRONZADORA No. : 3800 RPM **MARCA:** PORTER FTZ **OPERADOR:** .....

PERIODO EVALUADO: 09/02/2026 **AL** 15/02/2026

ITE.	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas	X		X		X				X					
	* Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo	X		X		X				X					
	* Estado del accesorio portadiscos	X		X		X				X					
	* Estado del mango	X		X		X				X					
	* Estado del cuerpo (pernos de orejetas, base, graduación profundidad de corte)	X		X		X				X					
	Estado de la cubierta del disco	X		X		X				X					
	* Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)	X		X		X				X					
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la tronzadora	X		X		X				X					
	Estado general de la guia de corte	X		X		X				X					
	Estado de la plaqueta de identificación	X		X		X				X					
OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE	Rafael Ruiz		Rafael Ruiz		Rafael Ruiz				Rafael Ruiz					
	FIRMA	[signature]		[signature]		[signature]				[signature]					
TECNOLOGO SST	NOMBRE														
	FIRMA	Yaquelis Guerra F.		Yaquelis Guerra F.						Yaquelis Guerra F.					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER
INSPECCION PREOPERACIONAL
TRONZADORA

PAGINA: 1 DE 1

CONTRATO N°: 050 **DE** 2025

OBJETO DE CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA."

TRONZADORA No. : 3800 RPM **MARCA:** MAKITA **OPERADOR:**

PERIODO EVALUADO: 26/09/2026 **AL** 02/12/2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas	X				X				X					
	* Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo	X				X				X					
	* Estado del accesorio portadiscos	X				X				X					
	* Estado del mango	X				X				X					
	* Estado del cuerpo (pernos de orejetas, base, graduación profundidad de corte)	X				X				X					
	Estado de la cubierta del disco	X				X				X					
	* Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)	X				X				X					
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la tronzadora	X				X				X					
	Estado general de la guía de corte	X				X				X					
	Estado de la plaqueta de identificación	X				X				X					
OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE	Rafael Flor				Rafael Flor				Rafael Flor					
	FIRMA	Rafa Flor				Rafa Flor				Rafa Flor					
TECNOLOGO SST	NOMBRE														
	FIRMA	Yaquelis Guerra R.				Yaquelis Guerra R.				Yaquelis Guerra R.					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER
INSPECCION PREOPERACIONAL
TRONZADORA

CONTRATO N°: 050 DE 2025

OBJETO DE CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29", EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA."

TRONZADORA No. : 3800 RPM MARCA: RIDGETOOL OPERADOR: _____

PERIODO EVALUADO: 09/02/2026 AL 15/02/2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas	X		X		X				X					
	* Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo	X		X		X				X					
	* Estado del accesorio portadiscos	X		X		X				X					
	* Estado del mango	X		X		X				X					
	* Estado del cuerpo (pernos de orejetas, base, graduación profundidad de corte)	X		X		X				X					
	Estado de la cubierta del disco	X		X		X				X					
	* Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)	X		X		X				X					
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la tronzadora	X		X		X				X					
	Estado general de la guia de corte	X		X		X				X					
	Estado de la plaqueta de identificación	X		X		X				X					
OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE	Rafael Ruiz		Rafael Ruiz		Rafael Ruiz				Rafael Ruiz					
	FIRMA	[signature]		[signature]		[signature]				[signature]					
TECNOLOGO SST	NOMBRE														
	FIRMA	Yaulis Guerra P.		Yaulis Guerra P.						Yaulis Guerra P.					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER
INSPECCION PREOPERACIONAL
TRONZADORA

CONTRATO N°: 050 **DE** 2025

OBJETO DE CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA."

TRONZADORA No. : 3800 RPM **MARCA:** RAGUD **OPERADOR:** _____

PERIODO EVALUADO: 16/12/2025 **AL** 22/12/2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas			√				X				√		X	
	* Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo			X				X				X		X	
	* Estado del accesorio portadiscos			√				X				√		X	
	* Estado del mango			√				X				X		X	
	* Estado del cuerpo (pernos de orejetas, base, graduación profundidad de corte)			X				X				X		X	
	Estado de la cubierta del disco			X				X				X		X	
	* Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)			X				X				X		X	
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la tronzadora			X				X				X		X	
	Estado general de la guía de corte			X				X				X		X	
	Estado de la plaqueta de identificación			X				X				X		X	
OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE			Rafael Ruiz				Rafael Ruiz				Rafael Ruiz		Rafael Ruiz	
	FIRMA			Fafa Rod				Fafa Rod				Fafa Rod		Fafa Rod	
TECNOLOGO SST	NOMBRE														
	FIRMA			Jaylis Guerra P.				Jaylis Guerra P.				Jaylis Guerra P.			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER
INSPECCION PREOPERACIONAL
TRONZADORA

PAGINA: 1 DE 1

CONTRATO N°: 050 **DE** 2025

OBJETO DE CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA."

TRONZADORA No. : 3800 KPA **MARCA:** MAKITA **OPERADOR:**

PERIODO EVALUADO: 02/02/2026 **AL** 08/02/2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas	X				X		X				X			
	* Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo	X				X		X				X			
	* Estado del accesorio portadiscos	X				X		X				X			
	* Estado del mango	X				X		X				X			
	* Estado del cuerpo (pernos de orejetas, base, graduación profundidad de corte)	X				X		X				X			
	Estado de la cubierta del disco	X				X		X				X			
	* Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)	X				X		X				X			
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la tronzadora	X				X		X				X			
	Estado general de la guia de corte	X				X		X				X			
	Estado de la plaqueta de identificación	X				X		X				X			
OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE	Rafael Flor				Rafael Flor		Rafael Flor				Rafael Flor			
	FIRMA	Fafó Flor				Fafó Flor		Fafó Flor				Fafó Flor			
TECNOLOGO SST	NOMBRE														
	FIRMA	Yaquelis Guerra R.				Yaquelis Guerra R.						Yaquelis Guerra R.			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO PUERTO CLAVER	CONSORCIO PUERTO CLAVER INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	PAGINA: 1 DE 1

CONTRATO Nº: 050 DE 2025

OBJETO DE CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA."

PU[illegible]RA No. : Amarok RPM: 4000 (2167) OPERADOR:

PERIODO EVALUADO: 09/02/2026 AL 15/02/2026 TAMAÑO: G [ ] P [ ]

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas	X		X		X						X			
	* Estado del interruptor de encendido y su seguro	X		X		X						X			
	* Estado del accesorio portadiscos	X		X		X						X			
	* Estado del mango	X		X		X						X			
	* Estado del cuerpo (CARCAZA)	X		X		X						X			
	* Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)	X		X		X						X			
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	X		X		X						✓			
	Estado general de la guía y la guarda	X		X											
	Estado de la plaqueta de identificación	X		X		X						X			

OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE LEGIBLE	Rafael Santos		Rafael Santos		Rafael Santos				Rafael Ruiz	
	FIRMA										
TECNOLOGO SST	NOMBRE LEGIBLE										
	FIRMA	Yaylis Guerra P.		Yaylis Guerra P.		Yaylis Guerra P.				Yaylis Guerra P.	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

F	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER
INSPECCION PREOPERACIONAL
MEZCLADORA

CONTRATO N°: 050 **DE** 2025

OBJETO DE CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA."

MEZCLADORA No. : 186F-A **MARCA:** [illegible] **OPERADOR:**

PERIODO EVALUADO: 16/02/2026 **AL** 22/02/2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	F AS			X		X		X		X		X		X	
	MEDIDOR DE ACEITE			X		X		X		X		X		X	
	TAPA DE COMBUSTIBLE			X		X		X		X		X		X	
	BUJIA			X		X		X		X		X		X	
	TUBO DE ESCAPE			X		X		X		X		X		X	
	* GUARDA DE LOS PIÑONES			X		X		X		X		X		X	
	CHOQUE			X		X		X		X		X		X	
	YOYO			X		X		X		X		X		X	
	ACELERADOR			X		X		X		X		X		X	
	VOLANTE DE OPERACIÓN			X		X		X		X		X		X	
	* MOTOR			X		X		X		X		X		X	
	FILTRO DE COMBUSTIBLE			X		X		X		X		X		X	
	TAPON DE ACEITE			X		X		X		X		X		X	
	TORNILLOS EN GENERAL			X		X		X		X		X		X	
	GUARDA DE LOS PIÑONES			X		X		X		X		X		X	
	* TAPA PROTECTORA MOTOR			X		X		X		X		X		X	
	* TAMBOR			X		X		X		X		X		X	
	ESTRIAS DE COMPACTACIÓN(INTERNO)			X		X		X		X		X		X	
	LLANTAS			X		X		X		X		X		X	
	ENGRASE EN GENERAL			X		X		X		X		X		X	
	BALINERAS			X		X		X		X		X		X	
	* FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR)			X		X		X		X		X		X	
	PINTURA			X		X		X		X		X		X	
	[illegible]			X		X		X		X		X		X	
OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE			Chuck		Chuck		Chuck		Chuck		Chuck		Chuck	
	FIRMA			Chuck		Chuck		Chuck		Chuck		Chuck		Chuck	
TECNOLOGO SST	NOMBRE														
	FIRMA			Yaylis Guerra F.				Yaylis Guerra F.				Yaylis Guerra F.			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER
INSPECCION PREOPERACIONAL
MEZCLADORA

CONTRATO N°: 050 DE 2025

OBJETO DE CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA."

MEZCLADORA No. : 136 F-D MARCA: [illegible] OPERADOR: .....

PERIODO EVALUADO: 23/12/2025 AL 04/03/2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	LLAS	X		X											
	MEDIDOR DE ACEITE	X		X											
	TAPA DE COMBUSTIBLE	X		X											
	BUJIA	X		X											
	TUBO DE ESCAPE	X		X											
	* GUARDA DE LOS PIÑONES	X		X											
	CHOQUE	X		X											
	YOYO	X		X											
	ACELERADOR	X		X											
	VOLANTE DE OPERACIÓN	X		X											
	* MOTOR	X		X											
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		X											
	TAPON DE ACEITE	X		X											
	TORNILLOS EN GENERAL	X		X											
	GUARDA DE LOS PIÑONES	X		X											
	* TAPA PROTECTORA MOTOR	X		X											
	* TAMBOR	X		X											
	ESTRIAS DE COMPACTACIÓN(INTERNO)	X		X											
	LLANTAS	X		X											
	ENGRASE EN GENERAL	X		X											
	BALINERAS	X		X											
	* FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR)	X		X											
	PINTURA	X		X											
	O	X		X											
OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE	[illegible]		[illegible]											
	FIRMA	[illegible]		[illegible]											
TECNOLOGO SST	NOMBRE														
	FIRMA	Yaquelis Guerra P.													

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO PUERTO CLAVER	CONSORCIO PUERTO CLAVER INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	PAGINA: 1 DE 1

CONTRATO N°: 050 **DE** 2025

OBJETO DE CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA."

PULIDORA No. : [illegible] **RPM:** 8400 (2.1HP) **OPERADOR:**

PE D EVALUADO: 02/03/2026 **AL** 08/03/2026 **TAMAÑO:** G [ ] P [ ]

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas	X				X				X		X			
	* Estado del interruptor de encendido y su seguro	X				X				X		X			
	* Estado del accesorio portadiscos	X				X				X		X			
	* Estado del mango	X				X				X		X			
	* Estado del cuerpo (CARCAZA)	X				X				X		X			
	* Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)	X				X				X		X			
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	X				X				X		X			
	Estado general de la guía y la guarda	X				X				X		X			
	Estado de la plaqueta de identificación	X				X				X		X			

OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE LEGIBLE	Rafael Ruiz				Rafael Ruiz				Rafael Ruiz		Rafael Ruiz			
	FIRMA	Rafael Ruiz				Rafael Ruiz				Rafael Ruiz		Rafael Ruiz			
TECNOLOGO SST	NOMBRE LEGIBLE														
	FIRMA	Yaylis Guerra P.				Yaylis Guerra P.				Yaylis Guerra P.					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER
INSPECCION PREOPERACIONAL
MEZCLADORA

CONTRATO N°: 050 DE 2025

OBJETO DE CONTRATO: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA."

MEZCLADORA No. : 1307 D MARCA: [illegible] OPERADOR: _____

PERIODO EVALUADO: 06/01/2026 AL 12/01/2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	POLEAS			X				X							
	* DOR DE ACEITE			X				X							
	* A DE COMBUSTIBLE			X				X							
	BUJIA			X				X							
	TUBO DE ESCAPE			X				X							
	* GUARDA DE LOS PIÑONES			X				X							
	CHOQUE			X				X							
	YOYO			X				X							
	ACELERADOR			X				X							
	VOLANTE DE OPERACIÓN			X				X							
	* MOTOR			X				X							
	FILTRO DE COMBUSTIBLE			X				X							
	TAPON DE ACEITE			X				X							
	TORNILLOS EN GENERAL			X				X							
	GUARDA DE LOS PIÑONES			X				X							
	* TAPA PROTECTORA MOTOR			X				X							
	* TAMBOR			X				X							
	ESTRIAS DE COMPACTACIÓN(INTERNO)			X				X							
	LLANTAS			X				X							
	ENGRASE EN GENERAL			X				X							
	BALINERAS			X				X							
	* FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR)			X				X							
	PINTURA			X				X							
	ASEO			X				X							
OPE[illegible]JR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE			Cleid				Cleid							
	FIRMA			Cleid				Cleid							
TECNOLOGO SST	NOMBRE			Yaylis Guerra P.				Yaylis Guerra P.							
	FIRMA														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO PUERTO CLAVER	CONSORCIO PUERTO CLAVER INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MENOR	PAGINA: 1 DE 1

CONTRATO N° 050 DE 2025

OBJETO DE CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA."

PERIODO EVALUADO: 26/09/2026 AL 01/02/2026 UBICACIÓN: Isla 2.

HERRAMIENTA	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción														
Barras / Barretones	Estado general	X				X		X		X		X			
Cinceles	Cabeza libre de rebabas, que no se encuentre achatada, cóncava o poco afilada	X													
	Filos de corte redondeados	X													
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar/ desenrollar.	X		X		X		X		X		X			
	Visibilidad de la escala de medición	X		X		X		X		X		X			
Destornilladores	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto	X													
	Punta que no sea roma, rota o malformada	X													
Llaves fijas, mixtas, expansivas	Estado del cuadrante y tornillo sinfín														
	Estado de muescas de la estrella														
Grapas de alinear	Estado general														
Limas	Estado de superficie estriada y del mango	X						X		X		X			
Llaves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfín estriado.														
Machetes	Estado del mango y la funda														
Martillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas	X		X				X				X			
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.	X													
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	X		X		X		X		X		X			
Paladragas	Mangos, resortes, ejes	X													
Picas	Mango														
	Mango														
	Estado general														
Carretillas	Llanta y pasador en buen estado	X		X				X		X		X			
	Mangos y platón	X		X				X		X		X			

OPERADOR HERRAMIENTA	NOMBRE LEGIBLE	Daniel.	Alex	Daniel.	Alex	Daniel.	Alex	
	FIRMA							
TECNOLOGO SST	NOMBRE LEGIBLE							
	FIRMA	Faydis Guerra P.		Faydis Guerra P.		Faydis Guerra P.		

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO PUERTO CLAVER

INSPECCION PREOPERACIONAL . HERRAMIENTA MENOR

CONTRATO N° 050 **DE** 2025

OBJETO DE CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA."

PERIODO EVALUADO: 02/02/2026 **AL** 03/02/2026 **UBICACIÓN:** Extra 2

HERRAMIENTA	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción			X								X			
[illegible]s / Barretones	Estado general														
Cinceles	Cabeza libre de rebabas, que no se encuentro achatada, cóncava o poco afilada							X							
	Filos de corte redondeados							X							
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar/ desenrollar.														
	Visibilidad de la escala de medición			X		X		X		X		X			
Destornilladores	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto			X		X		X		X		X			
	Punta que no sea roma, rota o malformada														
Llaves fijas, mixtas, expansivas	Estado del cuadrante y tornillo sinfín														
	Estado de muescas de la estrella														
Grapas de alinear	Estado general														
Limas	Estado de superficie estriada y del mango														
Llaves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfín estriado.														
Machetes	Estado del mango y la funda							X							
Martillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas			X		X				X		X			
Sorruchos	Mango, revisar dientes trabados.														
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas			X		X		X		X		X			
Paladragas	Mangos, resortes, ejes			X		X		X				X			
Picas	Mango														
[illegible]	Mango			X		X				X		X			
[illegible]s	Estado general														
Carretillas	Llanta y pasador en buen estado			X		X		X		X		X			
	Mangos y platón			X		X		X		X		X			
OPERADOR HERRAMIENTA	**NOMBRE LEGIBLE**			Daniel.		Daniel.		Alex		Rafael Ramos		Rafael Ramos			
	FIRMA														
TECNOLOGO SST	**NOMBRE LEGIBLE**			Yaulis Guerra P.		Yaulis Guerra P.		Yaulis Guerra P.		Yaulis Guerra P.		Yaulis Guerra P.			
	FIRMA														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO PUERTO CLAVER

INSPECCION PREOPERACIONAL

HERRAMIENTA MENOR

PAGINA: 1 DE 1

CONTRATO N° 050 DE 2025

OBJETO DE CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA."

PERIODO EVALUADO: 16/02/2026 AL 22/02/2026 UBICACIÓN: Dique

HERRAMIENTA	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción													X	
Barras / Barretones	Estado general	X		X				X		X		X		X	
Cinceles	Cabeza libre de rebabas, que no se encuentre achatada, cóncava o poco afilada														
	Filos de corte redondeados														
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar/ desenrollar.	X		X		X		X		X		X		X	
	Visibilidad de la escala de medición	X		X		X		X		X		X		X	
Destornilladores	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto														
	Punta que no sea roma, rota o malformada														
Llaves fijas, mixtas, expansivas	Estado del cuadrante y tornillo sinfín														
	Estado de muescas de la estrella														
Grapas de alinear	Estado general														
Limas	Estado de superficie estriada y del mango														
Llaves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfín estriado.														
Machetes	Estado del mango y la funda													X	
Martillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas	X				X		X		X				X	
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.														
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas													X	
Paladragas	Mangos, resortes, ejes	X		X		X		X		X		X		X	
Picas	Mango													X	
Porr	Mango			X		X		X		X		X		X	
Pre	Estado general														
Carretillas	Llanta y pasador en buen estado	X		X		X		X		X		X		X	
	Mangos y platón	X		X		X		X		X		X		X	

OPERADOR HERRAMIENTA	NOMBRE LEGIBLE	Rafael Ros	Daniel.	Daniel.	Alex	Rafael Ros	Alex	Alex
	FIRMA	Rafael Ros				Rafael Ros		
TECNOLOGO SST	NOMBRE LEGIBLE							
	FIRMA	Yaylis Guerra P.	Yaylis Guerra P.	Yaylis Guerra P.	Yaylis Guerra P.	Yaylis Guerra P.		

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER
INSPECCION PREOPERACIONAL
HERRAMIENTA MENOR

CONTRATO N° 050 DE 2025

OBJETO DE CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA."

PERIODO EVALUADO: 04/03/2026 AL 10/08/2026 UBICACIÓN: Sector 1

HERRAMIENTA	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción														
Barras / Barretones	Estado general														
Cinceles	Cabeza libre de rebabas, que no se encuentre achatada, cóncava o poco afilada														
	Filos de corte redondeados														
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar/ desenrollar.	X		X		X		X		X		X			
	Visibilidad de la escala de medición	X		X		X		X		X		X			
Destornilladores	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto														
	Punta que no sea roma, rota o malformada														
Llaves fijas, mixtas, expansivas	Estado del cuadrante y tornillo sinfín														
	Estado de muescas de la estrella														
Grapas de alinear	Estado general														
Limas	Estado de superficie estriada y del mango	X		X				X				X			
Llaves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfín estriado.														
Machetes	Estado del mango y la funda					X				X					
Martillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas														
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.	X		X				X				X			
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	X		X		X		X		X		X			
Paladragas	Mangos, resortes, ejes	X		X		X		X		X		X			
Picas	Mango														
Porr	Mango	X				X				X		X			
Prei	Estado general	X		X		X		X		X		X			
Carretillas	Llanta y pasador en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Mangos y platón	X		X		X		X		X		X			
OPERADOR HERRAMIENTA	NOMBRE LEGIBLE	Rafael Ruiz		Daniel.		Daniel.		Alex		Alex		Alex			
	FIRMA	Rafael Ruiz													
TECNOLOGO SST	NOMBRE LEGIBLE	Yaulis Guerra F.				Yaulis Guerra F.				Yaulis Guerra F.					
	FIRMA														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO PUERTO CLAVER	CONSORCIO PUERTO CLAVER INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MENOR	PAGINA: 1 DE 1

CONTRATO N° 050 **DE** 2025

OBJETO DE CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA."

PERIODO EVALUADO: 06/01/2026 **AL** 12/24/2026 **UBICACIÓN:** _____

HERRAMIENTA	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción														
Barras / Barretones	Estado general	X		X				X							
Cinceles	Cabeza libre de rebabas, que no se encuentre achatada, cóncava o poco afilada														
	Filos de corte redondeados														
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar/ desenrollar.	X		X		X		X							
	Visibilidad de la escala de medición	X		X		X		X							
Destornilladores	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto														
	Punta que no sea roma, rota o malformada														
Llaves fijas, mixtas, expansivas	Estado del cuadrante y tornillo sinfín														
	Estado de muescas de la estrella														
Grapas de alinear	Estado general														
Limas	Estado de superficie estriada y del mango	X		X		X		X							
Llaves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfín estriado.														
Machetes	Estado del mango y la funda	X		X		X		X							
Martillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas	X		X		X		X							
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.	X		X		X		X							
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	X		X		X		X							
Paladragas	Mangos, resortes, ejes														
Picas	Mango	X		X		X		X							
Porr	Mango	X		X		X		X							
Pren	Estado general	X		X		X		X							
Carretillas	Llanta y pasador en buen estado	X		X		X		X							
	Mangos y platón	X		X		X		X							
OPERADOR HERRAMIENTA	**NOMBRE LEGIBLE**	Alex		Alex		Alex		Alex							
	FIRMA														
TECNOLOGO SST	**NOMBRE LEGIBLE**	Jaquelis Guerra F.				Jaquelis Guerra F.									
	FIRMA														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER
INSPECCION PREOPERACIONAL
CORTADORA DE PAVIMENTO

CONTRATO N°: 050 **DE** 2025

OBJETO DE CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA."

CORTADORA DE PAVIEMNTO No. : _____ **MARCA:** Husqvarna **OPERADOR:** _____

PERIODO EVALUADO: 16/12/2026 **AL** 22/12/2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas	X		X				X		X		X			
	* Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo	X		X				X		X		X			
	* Estado del accesorio portadiscos	X		X				X		X		X			
	* Estado del mango	X		X				X		X		X			
	* Estado del cuerpo (pernos de orejetas, base, graduación profundidad de corte)	X		X				X		X		X			
	Estado de la cubierta del disco	X		X				X		X		X			
	* Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)	X		X				X		X		X			
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la cortadora de pavimento	X		X				X		X		X			
	Estado general de la guía de corte	X		X				X		X		X			
	Estado de la plaqueta de identificación	X		X				X		X		X			
OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE	Daniel.		Daniel.				Daniel.		Daniel.		Daniel.			
	FIRMA	Daniel S.		Daniel.				Daniel S.		Daniel.		Daniel.			
TECNOLOGO SST	NOMBRE														
	FIRMA	Yaylis Guerra P.						Yaylis Guerra P.		Yaylis Guerra P.					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER
INSPECCION PREOPERACIONAL
CORTADORA DE PAVIMENTO

CONTRATO N°: 050 DE 2025

OBJETO DE CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29", EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA."

CORTADORA DE PAVIEMNTO No. : _____ MARCA: TRAUMESPAPS OPERADOR: _____

PERIODO EVALUADO: 23/02/2026 AL 07/03/2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas			X		X									
	* Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo			X		X									
	* Estado del accesorio portadiscos			X		X									
	* Estado del mango			X		X									
	* Estado del cuerpo (pomos de orejetas, base, graduación profundidad de corte)			X		X									
	Estado de la cubierta del disco			X		X									
	* Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)			X		X									
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la cortadora de pavimento			X		X									
	Estado general de la guia de corte			X		X									
	Estado de la plaqueta de identificación			X		X									
OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE			Daniel.		Daniel.									
	FIRMA			Daniel.		Daniel.									
TECNOLOGO SST	NOMBRE														
	FIRMA			Yaudis Guerra P.											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER
INSPECCION PREOPERACIONAL
CORTADORA DE PAVIMENTO

CONTRATO N°: 050 **DE** 2025

OBJETO DE CONTRATO: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA."

CORTADORA DE PAVIEMNTO No. : _____ **MARCA:** Npreciblyss **OPERADOR:** _____

PERIODO EVALUADO: 06/24/2026 **AL** 12/24/2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas					X		X							
	* Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo					X		X							
	* Estado del accesorio portadiscos					X		X							
	* Estado del mango					X		X							
	* Estado del cuerpo (pernos de orejetas, base, graduación profundidad de corte)					X		X							
	Estado de la cubierta del disco					X		X							
	* Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)					X		X							
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la cortadora de pavimento					X		X							
	Estado general de la guía de corte					X		X							
	Estado de la plaqueta de identificación					X		X							
OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	NOMBRE					Daniel.		Daniel.							
	FIRMA					Daniel.		Daniel.							
TECNOLOGO SST	NOMBRE														
	FIRMA					Yaylis Guerra R.									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

REFERENCIA: XC760 | MODELO: 2023 | MARCA: XCMG | TIPO DE MAQUINA/EQUIPO: MINICARGADOR

No. INTERNO: MC-1067 | CAPACIDAD: | PERIODO EVALUADO: 19/01/2026 AL 25/01/2026 | *CERTIFICADO OPERADOR: NUMERO / VENCE

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN: 352022 000 45 1523 | SERIAL: | *PPCE | *CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA

CONTRATO N°: 050 DE 2025

OBJETO DE CONTRATO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PLANTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL PAGRE, ANTIOQUIA

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		X		X		✓		X				X			
	Indicador de temperatura		X		X		X		X				X			
	Indicador de aceite		X		X		X		X				X			
	Indicador de bateria		X		X		X		X				X			
	Indicador de refrigerante		X		X		X		X				X			
	Indicador de combustible		X		X		X		X				X			
	Indicador de filtro de aire		X		X		X		X				X			
	*Horometro		X		X		X		X				X			
LUCES	*Frontales de trabajo		X		X		X		X				X			
	*Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X				X			
	Señales de giro (derecha, izquierda)		X		X		X		X				X			
	*Baliza		X		X		X		X				X			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X				X			
	*Nivel de aceite en la transmision (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X				X			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X				X			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X				X			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X				X			
GENERAL	*Espejo central convexo		X		X		X		X				X			
	*Espejos laterales		X		X		X		X				X			
	*Alarma de retroceso		X		X		X		X				X			
	Pito		X		X		X		X				X			
	* Freno de servicio		X		X		X		X				X			
	* Freno de estacionamiento		X		X		X		X				X			
	*Cinturones de seguridad		X		X		X		X				X			
	Vidrio Panoramico		X		X		X		X				X			
	*Kit para Derrames		X		X		X		X				X			
	*Extintor de incendios Capacidad: POS		X		X		X		X				X			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		X		X		X		X				X			
	Asiento		X		X		X		X				X			
	Escaleras y apoyos de acceso		X		X		X		X				X			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abalamientos)		X		X		X		X				X			
	Presion de aire de las llantas		X		X		X		X				X			
MECÁNICO	* Servotransmision		X		X		X		X				X			
	* Direccion		X		X		X		X				X			
	Estado de pasadores		X		X		X		X				X			
	Estado y tension de las correas		X		X		X		X				X			
	Estado de pedales		X		X		X		X				X			
	Estado de Orugas (tensionadas)		X		X		X		X				X			
	Mecanismo de giro y escualizacion cuchillas		X		X		X		X				X			
	Estado de las Hojas de empuje o nivelación		X		X		X		X				X			
	Mecanismo de giro (Tomarneza)		X		X		X		X				X			
	*Bomba Hidráulica		X		X		X		X				X			
	Corona de tomarneza en buen estado		X		X		X		X				X			
	*Mangos de avance		X		X		X		X				X			
	* Mando de estacionamiento		X		X		X		X				X			
	Estado general cesgarrador (balde)		X		X		X		X				X			
	*Mangos de levante del brazo		X		X		X		X				X			
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X				X			
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X				X			
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X		X				X			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X		X				X			
	* Resguardos		X		X		X		X				X			
	Anclajes de contrapeso		X		X		X		X				X			
	Guardas		X		X		X		X				X			
	Estado del bastidor		X		X		X		X				X			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X				X			
	*Motor sin grietas		X		X		X		X				X			
	Exosto (Punto de escape)		X		X		X		X				X			

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

Operador	Nombre	Luis			Luis			Luis			Luis					Luis			
	Firma	Luis			Luis			Luis			Luis					Luis			
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre																		
	Firma																		

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	5272,7	5276,7	4	
MARTES	5276,7	5279,7	3	
MIERCOLES				
JUEVES	5279,7	5283,5	3,8	
VIERNES				
SABADO	5283,5	5.288,7	5.2	
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los Ítems (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los Ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector en la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACION Y ACEPTACION

Con el presente se verifica la buena condición operativa y mecánica, así como la idoneidad para la operación de la maquinaria y/o equipo descrita para ser usada en el Proyecto cumpliendo a cabalidad con todas las normas de seguridad establecidas.

NOTAS

TIPO: Corresponde a la clase a la que pertenece la Maquina
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad especificada establecida por el Fabricante o Propietario de la Maquina
No. INTERNO: Identificación con número impreso por los Propietarios o Contratista del Proyecto
MODELO: Año de fabricación de la Maquina
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada
No. Serial: Serial de la Maquina

El Usuario
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo Bo
El Jefe
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

(*) Mal: Deficiencia responsabilidad del contratista
Bien: Aceptable
N/A: No aplica

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

REFERENCIA XCMG MODELO 2023 MARCA XCMG TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Motoniveladora

No. INTERNO MC10767 CAPACIDAD PERIODO EVALUADO 26/09/2026 AL 09/02/2026

	NUMERO	VENCE
*CERTIFICADO OPERADOR		
*PECE		
*CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA		

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN 352022006152 SERIAL

CONTRATO N° 050 DE 2025

OBJETO DE CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 39 Y CALLE 35, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de bateria		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de refrigerante		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de combustible		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de filtro de aire		X		X		X		X		X		X			
	*Horometro		X		X		X		X		X		X			
LUCES	*Frontales de trabajo		X		X		X		X		X		X			
	*Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X			
	Señales de giro (derecha, izquierda)		X		X		X		X		X		X			
	*Baliza		X		X		X		X		X		X			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel de aceite en la transmision (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del sistema hidraulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del liquico de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	**Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
GENERAL	*Espejo central convexo		X		X		X		X		X		X			
	*Espejos laterales		X		X		X		X		X		X			
	*Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X			
	Pito		X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X		X			
	* Freno de estacionamiento		X		X		X		X		X		X			
	*Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X			
	Vidrio Panoramico		X		X		X		X		X		X			
	*Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X			
	*Extintor de incendios Capacidad: POS		X		X		X		X		X		X			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		X		X		X		X		X		X			
	Asiento		X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso		X		X		X		X		X		X			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X			
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X			
MECÁNICO	* Servotransmisión		X		X		X		X		X		X			
	* Direccion		X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores		X		X		X		X		X		X			
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X			
	Estado de pedales		X		X		X		X		X		X			
	Estado de Orugas (tensionadas)		X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro y escalización cuchillas		X		X		X		X		X		X			
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Tornameza)		X		X		X		X		X		X			
	*Bomba Hidráulica		X		X		X		X		X		X			
	Corona de tornameza en buen estado		X		X		X		X		X		X			
	*Mandos de avance		X		X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento		X		X		X		X		X		X			
	Estado general cesgamador (balde)		X		X		X		X		X		X			
	*Mandos de levante del brazo		X		X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de combustión		X		X		X		X		X		X			
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X		X		X		X			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X		X		X		X			
	* Resguardos		X		X		X		X		X		X			
	Anclajes de contrapeso		X		X		X		X		X		X			
	Guardas		X		X		X		X		X		X			
	Estado del bastidor		X		X		X		X		X		X			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X			
	*Motor sin grieta (		X		X		X		X		X		X			
	Exosto (Humo del escape)		X		X		X		X		X		X			

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

Operador	Nombre																		
	Firma																		
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre																		
	Firma																		

DIA	HORÓMETRO INICIO	HORÓMETRO FINAL	HORÓMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	5288,7	5292,7	4	
MARTES	5292,7	5297,7	5	
MIERCOLES	5.297,7	5303,2	5.5	
JUEVES	5303,2	5309,2	6	
VIERNES	5309,2	5315,7	6,5	
SABADO	5315,7	5320,7	5	
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la maquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACION Y ACEPTACION

Con el presente recibo de conformidad de maquinaria, se da constancia que la misma se encuentra en optimas condiciones para iniciar el Proyecto, cumpliendo con todos los ítems evaluados.

NOTAS

TIPO: Corresponde a características que definen la función de la Máquina
REFERENCIA: Identificación con la especificación respectiva dada por la Marca o Serie de la Máquina
No. INTERNO: Identificación interna empleada por la Maquinaria disponible en el Proyecto
MODELO: Año de fabricación de la Máquina
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada
N.A: No aplica

Firma: Carlos A. Mercado Z
Nombre:
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo Bo Firma:
Nombre:
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoria

Original: Dependencia responsable del control
Copia para interventoria
Copia para contratista

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

REFERENCIA: XCMG MODELO: 2023 MARCA: XCMG TIPO DE MAQUINA/EQUIPO: MINICARGADOR

No. INTERNO: MCG-69 CAPACIDAD: PERIODO EVALUADO: 02/02/2026 AL: 08/02/2026

	NUMERO	VENCE
*CERTIFICADO OPERADOR		
*PRCE		
*CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA		

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN: 35732000451528 SERIAL:

CONTRATO N°: 050 DE: 2025

OBJETO DE CONTRATO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VIA QUE COMUNICA EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 39 Y CALLE 35, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				X				X		X		X		X	
	Indicador de temperatura				X				X		X		X		X	
	Indicador de aceite				X				X		X		X		X	
	Indicador de batería				X				X		X		X		X	
	Indicador de refrigerante				X				X		X		X		X	
	Indicador de combustible				X				X		X		X		X	
	Indicador de filtro de aire				X				X		X		X		X	
	*Horometro				X				X		X		X		X	
LUCES	*Frontales de trabajo				X				X		X		X		X	
	*Traseras de trabajo (Reflector)				X				X		X		X		X	
	Señales de giro (derecho, izquierda)				X				X		X		X		X	
	*Baliza				X				X		X		X		X	
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				X				X		X		X		X	
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)				X				X		X		X		X	
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				X				X		X		X		X	
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)				X				X		X		X		X	
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				X				X		X		X		X	
GENERAL	*Espejo central convexo				X				X		X		X		X	
	*Espejos laterales				X				X		X		X		X	
	*Alarma de retroceso				X				X		X		X		X	
	Pito				X				X		X		X		X	
	* Freno de servicio				X				X		X		X		X	
	* Freno de estacionamiento				X				X		X		X		X	
	*Cinturones de seguridad				X				X		X		X		X	
	Vidrio Panoramico				X				X		X		X		X	
	*Kit para Derrames				X				X		X		X		X	
	*Extintor de incendios Capacidad: POS				X				X		X		X		X	
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)				X				X		X		X		X	
	Asiento				X				X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso				X				X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				X				X		X		X		X	
	Presión de aire de las llantas				X				X		X		X		X	
MECÁNICO	* Servotransmisión				X				X		X		X		X	
	* Dirección				X				X		X		X		X	
	Estado de pasadores				X				X		X		X		X	
	Estado y tensión de las correas				X				X		X		X		X	
	Estado de pedales				X				X		X		X		X	
	Estado de Orugas (tensionadas)				X				X		X		X		X	
	Mecanismo de giro y escarificación cuchillas				X				X		X		X		X	
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación				X				X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (Tornameza)				X				X		X		X		X	
	*Bomba Hidráulica				X				X		X		X		X	
	Corona de tornameza en buen estado				X				X		X		X		X	
	*Mandos de avance				X				X		X		X		X	
	* Mando de estacionamiento				X				X		X		X		X	
	Estado general cesgarrador (balde)				X				X		X		X		X	
	*Mandos de levante del brazo				X				X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire				X				X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible				X				X		X		X		X	
	Pasadores y tornillos en buen estado				X				X		X		X		X	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)				X				X		X		X		X	
	* Resguardos				X				X		X		X		X	
	Anclajes de contrapeso				X				X		X		X		X	
	Guardas				X				X		X		X		X	
	Estado del bastidor				X				X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				X				X		X		X		X	
	*Motor sin grietas				X				X		X		X		X	
	Exosto (Humo de escape)				X				X		X		X		X	

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

Operador	Nombre																		
	Firma			JUS					JUS		JUS			JUS		JUS			
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre																		
	Firma																		

DIA	HORÓMETRO INICIO	HORÓMETRO FINAL	HORÓMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				
MARTES	5320.7	5328.2	7.5	
MIERCOLES				
JUEVES	5328.2	5336.2	8	
VIERNES	5336.2	5344.7	8.5	
SABADO	5344.7	5351.7	7.	
DOMINGO	5351.7	5359.1	7.4	

El incumplimiento de cualquiera de los Ítems (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos lo comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente formato de revisión preoperacional de maquinaria, se da conformidad que la maquina es apta para ser usada al Proyecto, cumple con todos los ítems evaluados.

NOTAS

DIDO: Corresponde a la persona que diligencia la inspección de la Máquina.
REFERENCIA: Corresponde a la marca, propiedad o placa asignada por la Matriz o Subsidiaria de la Maquinaria.
No. INTERNO: Identificación interna asignada por la Maquina, controlada al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N.A: No aplica.

(Firma) Carlos A. Mercado Z
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

V° B° (Firma)
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

(1) Nivel Dependencia responsable del control
(2) Empresa interventora
(3) Empresa contratista

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

REFERENCIA XCMG MODELO 2023 MARCA XCMG TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Minicargador

No. INTERNO MC M2769 CAPACIDAD PERIODO EVALUADO 09/02/2026 AL 15/02/2026 *CERTIFICADO OPERADOR NUMERO VENCE

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN 352222004515278. SERIAL *PRCE

*CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA

CONTRATO N° 050 DE 2025

OBJETO DE CONTRATO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO A PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CARRERA 32 ENTRE CALLE 35 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		X		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de bateria		X		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de refrigerante		X		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de combustible		X		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de filtro de aire		X		X		X		X		X		X		X	
	*Horometro		X		X		X		X		X		X		X	
LUCES	*Frontales de trabajo		X		X		X		X		X		X		X	
	* Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X		X	
	Señales de giro (derecha, izquierda)		X		X		X		X		X		X		X	
	*Baliza		X		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X		X	
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X		X	
	*Nivel del sistema hidraulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X		X	
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X		X	
	*Mangueras, tubos , conexiones y radores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	*Espejo central convexo		X		X		X		X		X		X		X	
	*Espejos laterales		X		X		X		X		X		X		X	
	*Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de estacionamiento		X		X		X		X		X		X		X	
	*Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X		X	
	*Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X		X	
	*Extintor de incendios Capacidad: POS		X		X		X		X		X		X		X	
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento		X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso		X		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X		X	
	Presión de aire en las llantas		X		X		X		X		X		X		X	
MECÁNICO	* Servotransmisión		X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccion		X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasacores		X		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tensor de las correas		X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales		X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de Orugas (tensionadas)		X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro y escualizacion cuchillas		X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelacion		X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (Tornamezaj		X		X		X		X		X		X		X	
	*Bomba Hidráulica		X		X		X		X		X		X		X	
	Corona de tornameza en buen estado		X		X		X		X		X		X		X	
	*Mandos de avance		X		X		X		X		X		X		X	
	* Mando de estacionamiento		X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general cesgarrador (balde)		X		X		X		X		X		X		X	
	*Mandos de levante del brazo		X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X		X	
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X		X		X		X		X	
	* Resguardos		X		X		X		X		X		X		X	
	Anclajes de contrapeso		X		X		X		X		X		X		X	
	Guarcas		X		X		X		X		X		X		X	
	Estado del bastidor		X		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X		X	
	*Motor sin grieta)		X		X		X		X		X		X		X	
	Exosto (humo de escape)		X		X		X		X		X		X		X	

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

Operador	Nombre	Luis		Luis		Luis		Luis		Luis		Luis		Luis					
	Firma																		
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector interventoría	Nombre																		
	Firma																		

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	5359.1	5365.6	6.5	
MARTES	5365.6	5372.6	7	
MIERCOLES	5372.6	5379.8	7.2	
JUEVES	5379.8	5387.2	7.4	
VIERNES	5387.2	5395.2	8	
SABADO	5395.2	5403.3	8.1	
DOMINGO	5403.3	5411.8	8.5	

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento

CONSTANCIA DE VERIFICACION Y ACEPTACION

Con el presente formato de Inspección preoperacional de maquinaria, vehículos y equipos se verifica las siguientes aceptado para realizar el Proyecto, cumple a satisfacción en cuanto a seguridad y buen estado.

NOTAS

TIPO: Categoría de características que definen la función de la Máquina
REFERENCIA: Clasificación de la capacidad específica de la Máquina establecida por la Marca o Fabricante de la Máquina
No. INTERNO: Identificación interna empleada por las Maquinas vinculadas al Proyecto
MODELO: Año de fabricación de la Máquina
CAPACIDAD: Capacidad nominada en No. de pasajeros a cargar, o la que transportado
N/A: No aplica

Firma: Carlos A. Mercado Z
Nombre:
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo Bo
Firma:
Nombre:
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoria

Original: Dependencia responsable del contrato
Segunda: Interventor
Tercera: contratista

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

REFERENCIA	XCMG	MODELO	2023	MARCA	XCMG	TIPO DE MAQUINA/EQUIPO	MINICARGADOR
No. INTERNO	MC10459	CAPACIDAD		PERIODO EVALUADO	10/02/2026	AL	24/02/2026
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN	35072 00045828.	SERIAL					

	NUMERO	VENCE
*CERTIFICADO OPERADOR		
*PRCE		
*CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA		

CONTRATO N° 050 DE 2025

OBJETO DE CONTRATO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 33 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29A, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				X				X		X		X			
	Indicador de temperatura				X				X		X		X			
	Indicador de aceite				X				X		X		X			
	Indicador de batería				X				X		X		X			
	Indicador de refrigerante				X				X		X		X			
	Indicador de combustible				X				X		X		X			
	Indicador de filtro de aire				X				X		X		X			
	*Horometro				X				X		X		X			
LUCES	*Frontales de trabajo				X				X		X		X			
	*Traseras de trabajo (Reflector)				X				X		X		X			
	Señales de giro (derecha, izquierda)				X				X		X		X			
	*Baliza				X				X		X		X			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				X				X		X		X			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)				X				X		X		X			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				X				X		X		X			
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)				X				X		X		X			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				X				X		X		X			
GENERAL	*Espejo central convexo				X				X		X		X			
	*Espejos laterales				X				X		X		X			
	*Alarma de retroceso				X				X		X		X			
	Pito				X				X		X		X			
	* Freno de servicio				X				X		X		X			
	* Freno de estacionamiento				X				X		X		X			
	*Cinturones de seguridad				X				X		X		X			
	Vidrio Panorámico				X				X		X		X			
	*Kit para Derrames				X				X		X		X			
	*Extintor de Incendios Capacidad PQS				X				X		X		X			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)				X				X		X		X			
	Asiento				X				X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso				X				X		X		X			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				X				X		X		X			
	Presión de aire de las llantas				X				X		X		X			
MECÁNICO	* Servotransmisión				X				X		X		X			
	* Dirección				X				X		X		X			
	Estado de pasadores				X				X		X		X			
	Estado y tensión de las correas				X				X		X		X			
	Estado de pedales				X				X		X		X			
	Estado de Orugas (tiene orugas)				X				X		X		X			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas				X				X		X		X			
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación				X				X		X		X			
	Mecanismo de giro (Tornameza)				X				X		X		X			
	*Bomba Hidráulica				X				X		X		X			
	Corona de tornameza en buen estado				X				X		X		X			
	*Mandos de avance				X				X		X		X			
	* Mando de estacionamiento				X				X		X		X			
	Estado general cucharón (balde)				X				X		X		X			
	*Mandos de levante del brazo				X				X		X		X			
	Estado de filtro de aire				X				X		X		X			
	Estado de filtro de combustible				X				X		X		X			
	Pasadores y tornillos en buen estado				X				X		X		X			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)				X				X		X		X			
	* Resguardos				X				X		X		X			
	Anclajes de contrapeso				X				X		X		X			
	Guardas				X				X		X		X			
	Estado del bastidor				X				X		X		X			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				X				X		X		X			
	*Motor sin grietas				X				X		X		X			
	Exosto (Humo de escape)				X				X		X		X			

CONSORCIO PUERTO CLAVER	CONSORCIO PUERTO CLAVER	PAGINA: 2 DE 2
	PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA	

Operador	Nombre																		
	Firma			JUS					JUS		JUS		JUS						
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre																		
	Firma																		

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				
MARTES	5411.3	5416.3	4.5	
MIERCOLES				
JUEVES	5416.3	5421.3	5.5	
VIERNES	5421.8	5427.3	6.0	
SABADO	5427.8	5434.3	6.5	
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comunique al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACION Y ACEPTACION

Con el presente certificado de [illegible] la máquina se encuentra para ser operada al [illegible]

NOTAS

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina
REFERENCIA: Combinación de la especificación [illegible] de la Máquina
No. INTERNO: Identificación interna empleada por la Empresa [illegible]
MODELO: Año de fabricación de la Máquina
CAPACIDAD: Capacidad [illegible]
N.A: No aplica

Firma: Carlos A. Mercado Z
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo Bo Firma
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Original: Dependencia responsable del documento
Una copia: Interventoría
Una copia: Contratista

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

REFERENCIA XC745 MODELO 2023 MARCA XCMG TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Minicargador

No. INTERNO HC16769 CAPACIDAD PERIODO EVALUADO 23/02/2026 AL 01/03/2026

	NUMERO	VENCE
*CERTIFICADO OPERADOR		
*RNCE		
*CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA		

MANIFIESTO DE IMPORTACION 352220045128 SERIAL

CONTRATO Nº 050 DE 2025

OBJETO DE CONTRATO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS S SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA V A QUE CONDUCE DESDE EL CEMENTERIO CORREGIMIENTO DE EL BARRIO LA PLANTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 35 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X				X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X				X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X				X	
	Indicador de batería		X		X		X		X		X				X	
	Indicador de refrigerante		X		X		X		X		X				X	
	Indicador de combustible		X		X		X		X		X				X	
	Indicador de filtro de aire		X		X		X		X		X				X	
	*Horometro		X		X		X		X		X				X	
LUCES	*Frontales de trabajo		X		X		X		X		X				X	
	*Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X				X	
	Señales de giro (derecha, izquierda)		X		X		X		X		X				X	
	*Baliza		X		X		X		X		X				X	
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X				X	
	*Nivel de aceite en la transmision (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X				X	
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X				X	
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X				X	
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X				X	
GENERAL	*Espejo central convexo		X		X		X		X		X				X	
	*Espejos laterales		X		X		X		X		X				X	
	*Alarma de retroceso		X		X		X		X		X				X	
	Pito		X		X		X		X		X				X	
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X				X	
	* Freno de estacionamiento		X		X		X		X		X				X	
	*Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X				X	
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X				X	
	*Kit para Derrames		X		X		X		X		X				X	
	*Extintor de incendios Capacidad: POS		X		X		X		X		X				X	
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		X		X		X		X		X				X	
	Asiento		X		X		X		X		X				X	
	Escaleras y apoyos de acceso		X		X		X		X		X				X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X				X	
	Presion de aire de las llantas		X		X		X		X		X				X	
MECÁNICO	* Servotransmisión		X		X		X		X		X				X	
	* Direccion		X		X		X		X		X				X	
	Estado de pasadores		X		X		X		X		X				X	
	Estado y tensór de las correas		X		X		X		X		X				X	
	Estado de pedales		X		X		X		X		X				X	
	Estado de Orugas (tensionadas)															
	Mecanismo de giro y escualizacion cuchillas		X		X		X		X		X				X	
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelacion		X		X		X		X		X				X	
	Mecanismo de giro (Tornameza)		X		X		X		X		X				X	
	*Bomba Hidráulica		X		X		X		X		X				X	
	Corona de tornameza en buen estado		X		X		X		X		X				X	
	*Mandos de avance		X		X		X		X		X				X	
	* Mando de estacionamiento		X		X		X		X		X				X	
	Estado general cesgarrador (bulldo)		X		X		X		X		X				X	
	*Mandos de levante del brazo		X		X		X		X		X				X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X				X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X				X	
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X		X		X				X	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X		X		X				X	
	* Resguardos		X		X		X		X		X				X	
	Anclajes de contrapeso		X		X		X		X		X				X	
	Guardas		X		X		X		X		X				X	
	Estado del bastidor		X		X		X		X		X				X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X				X	
	*Motor sin grietas		X		X		X		X		X				X	
	Exesto (Humo de escape)		X		X		X		X		X				X	

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

Operador	Nombre	JOS			JOS			JOS			JOS			JOS				JOS			
	Firma	JOS			JOS			JOS			JOS			JOS				JOS			
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoria	Nombre																				
	Firma																				

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	5431.3	5444,3	13	
MARTES	5444,3	54548	10.5	
MIERCOLES	54548	54657	10.9	
JUEVES	5465,7	54687	3	
VIERNES	5469,7	5473,4	4.7	
SABADO				
DOMINGO	5473,4	5477,4	4	

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems con se encuentren seleccionados en la opción (mal), se cebera reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos lo comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos, y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACION Y ACEPTACION

Con el presente formato de inspección preoperacional de maquinaria se verifica que la maquinaria se encuentra para iniciar el Proyecto cumpliendo con todos los requerimientos de la normatividad

NOTAS

TIPO: Corresponde a la característica que define la función de la Máquina
REFERENCIA: Es el dato que define la capacidad respectiva con que fue dotada por la Marca el diseño de la Máquina
No. INTERNO: Identificación interna empleada por las Máquinas vinculadas al Proyecto
MODELO: Año de fabricación de la Máquina
CAPACIDAD: Capacidad máxima de operación que la máquina es capaz de transportar
N.A: No aplica

Firma: Carlos A. Mercado 7
Nombre:
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo Bo Firma:
Nombre:
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoria

Original: Dependencia responsable del contrato
Una copia: Interventoria
Una copia: Contratista

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

PAG NA: * DE 2

REFERENCIA XC-XCT MODELO 7323 MARCA XCMG TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Motoniveladora

No. INTERNO XC 16 X69 CAPACIDAD PERIODO EVALUADO 02/03/2026 AL 08/03/2026

	NUMERO	VENCE
*CERTIFICADO OPERADOR		
*PRCE		
*CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA		

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN 352072000 45128 SERIAL

CONTRATO N° 050 DE 2025

OBJETO DE CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31 ENTRE CALLE 35 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de bateria		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de refrigerante		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de combustible		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de filtro de aire		X		X		X		X		X		X			
	*Horometro		X		X		X		X		X		X			
LUCES	*Frontales de trabajo		X		X		X		X		X		X			
	*Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X			
	Señales de giro (derecha izquierda)		X		X		X		X		X		X			
	*Baliza		X		X		X		X		X		X			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
GENERAL	*Espejo central convexo		X		X		X		X		X		X			
	*Espejos laterales		X		X		X		X		X		X			
	*Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X			
	Pito		X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X		X			
	* Freno de estacionamiento		X		X		X		X		X		X			
	*Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X			
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X			
	*Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X			
	*Extintor de incendios Capacidad: POS		X		X		X		X		X		X			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		X		X		X		X		X		X			
	Asiento		X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso		X		X		X		X		X		X			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X			
	Presion de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X			
MECANICO	* Servotransmisión		X		X		X		X		X		X			
	* Dirección		X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores		X		X		X		X		X		X			
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X			
	Estado de pedales		X		X		X		X		X		X			
	Estado de Orugas (tensionadas)		X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro y escualizacion cuchillas		X		X		X		X		X		X			
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Tornameza)		X		X		X		X		X		X			
	*Bomba Hidráulica		X		X		X		X		X		X			
	Corona de tornameza en buen estado		X		X		X		X		X		X			
	*Mandos de avance		X		X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento		X		X		X		X		X		X			
	Estado general desparramador (Bolde)		X		X		X		X		X		X			
	*Mandos de levante del brazo		X		X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X			
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X		X		X		X			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X		X		X		X			
	* Resguardos		X		X		X		X		X		X			
	Anclajes de contrapeso		X		X		X		X		X		X			
	Guardas		X		X		X		X		X		X			
	Estado del bastidor		X		X		X		X		X		X			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X			
	*Motor sin goteras		X		X		X		X		X		X			
	Exosto (Humo de escape)		X		X		X		X		X		X			

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

Operador	Nombre																	
	Firma																	
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre																	
	Firma																	

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	5477.4	5483,7	6.3	
MARTES				
MIERCOLES	5483,7	5497,3	8.9	
JUEVES	5497,3	5501,7	9.9	
VIERNES	5.501,7	5507.6	5.9	
SABADO	5504.6	5512.4	4.8	
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACION Y ACEPTACION

Con el presente formato de lista de chequeo preoperacional de maquinaria y equipos, queda la maquinaria aceptada para iniciar el desarrollo normal de las labores establecidas en la obra contratada.

NOTAS

TIPO: Corresponde a la clasificación según el tipo de la Máquina.
REFERENCIA: Clasificación según la especialidad específica asignada por el Fabricante de la Máquina.
No. INTERNO: Identificación interna asignada por las Máquinas y/o equipos al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Máquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada.
N.A: No aplica.

Firma: Carlos A. Mercado Z
Nombre:
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo.Bo. Firma:
Nombre:
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Original: Dependencia responsable del contrato
Copia: Interventoría
Copia: Contratista

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

REFERENCIA XC760K MODELO 323 MARCA XCMG TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Minicargador

No. INTERNO MQ 16769 CAPACIDAD PERIODO EVALUADO 09/03/2026 AL 15/03/2026

	NUMERO	VENCE
*CERTIFICADO OPERADOR		
*PRCE		
*CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA		

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN 352022000455123 SERIAL

CONTRATO N° 050 DE 2025

OBJETO DE CONTRATO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 36 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		X		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de bateria		X		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de refrigerante		X		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de combustible		X		X		X		X		X		X		X	
	Indicador de filtro de aire		X		X		X		X		X		X		X	
	*Horometro		X		X		X		X		X		X		X	
LUCES	*Frontales de trabajo		X		X		X		X		X		X		X	
	*Traseras de trabajo (Reflectivo)		X		X		X		X		X		X		X	
	Señales de giro (derecha, izquierda)		X		X		X		X		X		X		X	
	*Baliza		X		X		X		X		X		X		X	
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X		X	
	*Nivel de aceite en la transmision (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X		X	
	*Nivel del sistema hidraulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X		X	
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X		X	
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X		X	
GENERAL	*Espejo central convexo		X		X		X		X		X		X		X	
	*Espejos laterales		X		X		X		X		X		X		X	
	*Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de estacionamiento		X		X		X		X		X		X		X	
	*Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio Panoramico		X		X		X		X		X		X		X	
	*Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X		X	
	*Extintor de incendios Capacidad: POS		X		X		X		X		X		X		X	
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento		X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso		X		X		X		X		X		X		X	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X		X	
	Presion de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X		X	
MECANICO	* Servotransmision		X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccion		X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores		X		X		X		X		X		X		X	
	Estado y tension de las correas		X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales		X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de Orugas (tensionadas)		X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro y excavacion cuchillas		X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (*Cinamreza)		X		X		X		X		X		X		X	
	*Bomba Hidraulica		X		X		X		X		X		X		X	
	Corona de tornameza en buen estado		X		X		X		X		X		X		X	
	*Mandos de avance		X		X		X		X		X		X		X	
	* Mando de estacionamiento		X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general desgarrador (balde)		X		X		X		X		X		X		X	
	*Mandos de levante del brazo		X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X		X	
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X		X		X		X		X	
	* Resguardos		X		X		X		X		X		X		X	
	Anclajes de contrapeso		X		X		X		X		X		X		X	
	Guardas		X		X		X		X		X		X		X	
	Estado del bastidor		X		X		X		X		X		X		X	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X		X	
	*Motor sin grietas		X		X		X		X		X		X		X	
	Exosto (Humo de escape)		X		X		X		X		X		X		X	

CONSORCIO PUERTO CLAVER	CONSORCIO PUERTO CLAVER	PAGINA: 2 DE 2
	PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA	

Operador	Nombre	Luis		Luis		Luis		Luis		Luis		Luis		Luis							
	Firma	Luis		Luis		Luis		Luis		Luis		Luis		Luis							
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre																				
	Firma																				

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	5512.4	5515.9	3.5	
MARTES	5515.9	5522.3	6.4	
MIERCOLES	5522.3	5529.9	7.6	
JUEVES	5529.9	5534.8	4.9.	
VIERNES	5534.8	5540.7	5.9	
SABADO	5540.7	5547.0	6.3.	
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la maquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACION Y ACEPTACION

Con el presente reporte de inspección preoperacional de maquinaria se da cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 en lo relacionado con la verificación y aceptación de los equipos utilizados.

NOTAS

TIPO: Conjunto de características que identifican la función de la Máquina
REFERENCIA: Certificación emitida por el fabricante del equipo que indica las características técnicas de la Máquina
No. INTERNO: Identificación interna empleada por la Máquina o vinculado al Proyecto
MODELO: Año de fabricación de la Máquina
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada
N.A: No aplica

Firma: Carlos A. Mercado Z
Nombre:
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo.Bo Firma:
Nombre:
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Para el Dependiente responsable del reporte:
Operativo - Mantenimiento
Maquina contratista

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

REFERENCIA XCMG MODELO 2023 MARCA XCMG TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Minicargador

No. INTERNO MC[illegible]89 CAPACIDAD PERIODO EVALUADO 06/04/2026 AL 12/04/2026 *CERTIFICADO OPERADOR NUMERO VENCE

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN 352022020451728. SERIAL *PRCE

*CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA

CONTRATO N° 050 DE 2025

OBJETO DE CONTRATO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36 CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 25A EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de bateria		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de refrigerante		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de combustible		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de filtro de aire		X		X		X		X		X		X			
	*Horometro		X		X		X		X		X		X			
LUCES	*Frontales de trabajo		X		X		X		X		X		X			
	*Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X			
	Señales de giro (derecha, izquierda)		X		X		X		X		X		X			
	*Baliza		X		X		X		X		X		X			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel de aceite en la transmision (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del sistema hidraulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
GENERAL	*Espejo central convexo		X		X		X		X		X		X			
	*Espejos laterales		X		X		X		X		X		X			
	*Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X			
	Pito		X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X		X			
	* Freno de estacionamiento		X		X		X		X		X		X			
	*Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X			
	Vidrio Panoramico		X		X		X		X		X		X			
	*Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X			
	*Extintor de incendios Capacidad POS		X		X		X		X		X		X			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		X		X		X		X		X		X			
	Asiento		X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso		X		X		X		X		X		X			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X			
	Presión de aire de las Llantas		X		X		X		X		X		X			
MECÁNICO	* Servotransmision		X		X		X		X		X		X			
	* Direccion		X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores		X		X		X		X		X		X			
	Estado y tension de las correas		X		X		X		X		X		X			
	Estado de pedales		X		X		X		X		X		X			
	Estado de Orugas (tensionarlas)		X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		X		X		X		X		X		X			
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelacion		X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Tornameza)		X		X		X		X		X		X			
	*Bomba Hidraulica		X		X		X		X		X		X			
	Corona de tornameza en buen estado		X		X		X		X		X		X			
	*Mandos de avance		X		X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento		X		X		X		X		X		X			
	Estado general desgarrador (baldo)		X		X		X		X		X		X			
	*Mandos de levante del brazo		X		X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X			
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X		X		X		X			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X		X		X		X			
	* Resguardos		X		X		X		X		X		X			
	Anclajes de contrapeso		X		X		X		X		X		X			
	Guardas		X		X		X		X		X		X			
	Estado del bastidor		X		X		X		X		X		X			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X			
	**Motor sin grietas		X		X		X		X		X		X			
	Exosto (Ruido de escape)		X		X		X		X		X		X			

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

Operador	Nombre	Jos			Jos			Jos			Jos			Jos			Jos			Jos			
	Firma	Jos			Jos			Jos			Jos			Jos			Jos			Jos			
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre																						
	Firma																						

DIA	HORÓMETRO INICIO	HORÓMETRO FINAL	HORÓMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	5547.0	5556.1	9.1	
MARTES	5556.1	5565.8	9.7	
MIERCOLES	5565.8	5578.0	12.2	
JUEVES	5578.0	5584.9	6.9	
VIERNES	5584.9	5588.5	3.6	
SABADO	5588.5	5592.5	4	
DOMINGO	5592.5	5599.3	6.8	

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico Inspector de la Obra, para que estos lo comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACION Y ACEPTACION

Con el presente recibo de la(s) maquina(s) descrita(s) en la(s) presente(s) hoja(s) para la misma el Residente cumple a satisfacción con el mantenimiento.

NOTAS

TIPO: Corresponde a la clase de Maquinaria o Equipo.
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad especifica, establecida por el Manual de Operación de la Maquinaria.
No. INTERNO: Identificación asignada por la Maquinaria suministrada al Proyecto.
MODELO: Año de fabricación de la Maquina.
CAPACIDAD: Capacidad estimada en Kilovatios, caballos de fuerza o toneladas.
N.A: No aplica.

(Firma)
(Nombre) Carlos A. Mercado Z
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo Bo (Firma)
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoria

(*) = El Dependiente responsable del contrato
Ing. Residente Interventoria
Ing. Residente Contratista

CONSORCIO PUERTO CLAVER

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

PAGINA: 1 DE 2

CONTRATO: 050 DE 2025 LOCALIZACION: Sector 2 MODELO: 2015

PLACAS: STL 180 INSPECCIONADO POR: [illegible] SEMANA: DEL 19 DE 09 / 2026 MARCA: AL

DE 23/09 DE 2026

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2									X		X			
	Luz de media (ld/li)	4									X		X			
	Luz dia (ld/li)	2									X		X			
	Luz alta (id/li)	4									X		X			
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2									X		X			
	Luz direccional delantera (ld/li)	2									X		X			
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2									X		X			
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2									X		X			
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2									X		X			
	Luz direccional trasera (ld/li)	2									X		X			
	Luz de pisada del freno	2									X		X			
	Luz direccional volco	12									X		X			
CABINA	Licuadoras	2									X		X			
	Espejos laterales	2									X		X			
	Sistema limpia parabrizas	2									X		X			
	Alarma de retroceso	1									X		X			
	Pito	1									X		X			
	Cometas	2									X		X			
	Freno de servicio	Completa									X		X			
	Freno de emergencia	Completa									X		X			
	Cinturón de seguridad	2									X		X			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1									X		X			
	Limpia brisas	2									X		X			
	Asiento en buena condición	1									X		X			
	Cables de la bateria (revise si los cables del	Completo									X		X			
	Seguros de capot	2									X		X			
	Hora inicial diaria	Completo									X		X			
TABLERO DE INSTRUMENTOS	Temperatura caja	1									X		X			
	Temperatura diferencial delantera	1									X		X			
	Temperatura diferencial trasera	1									X		X			
	Temperatura motor revisar	1									X		X			
	Temperatura agua motor revisar	1									X		X			
	Pisada freno revisar	1									X		X			
	Pirómetro	1									X		X			
	Códigos de falla	1									X		X			
	Carga baterias	2									X		X			
SISTEMA DE DIRECCIÓN	Deposito hidráulico	Completo									X		X			
	Golpe al dar dirección	Completo									X		X			
	Vibradera	Completo									X		X			
	Dirección jala para la derecha o izquierda	1									X		X			
	Timón	1									X		X			
	Caja de dirección principal fugas	1									X		X			
	Caja de dirección auxiliar fugas	1									X		X			
	Mangueras sistema de dirección	Completo									X		X			
LLANTAS Y RINES	Llanta delantera (li)	1									X		X			
	Llanta delantera (ld)	1									X		X			
	Llanta pacha delantera interna (ld)	1									X		X			
	Llanta pacha delantera externa (ld)	1									X		X			
	Llanta pacha delantera interna (li)	1									X		X			
	Llanta pacha delantera externa (li)	1									X		X			
	Llanta pacha trasera interna (ld)	1									X		X			
	Llanta pacha trasera externa (ld)	1									X		X			
	Llanta pacha trasera interna (li)	1									X		X			
	Llanta pacha trasera externa (li)	1									X		X			
	Llanta de repuesto	1									X		X			
	Rines	10									X		X			
	Presión llantas	10									X		X			

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO MOTOR	Separador de agua-combustible - drenar	1									X		X			
	Nivel del aceite lubricante - revisar	FULL									X		X			
	Nivel del refrigerante - revisar	FULL									X		X			
	Ventilador de enfriamiento - revisar	1									X		X			
	Bandas impulsoras - revisar	2									X		X			
	Tubería de admisión de aire - revisar	Completo									X		X			
	Tubo del respiradero del cárter - revisar	1									X		X			
	Tanques y depósitos de aire - drenar	2									X		X			
	Tubería de escape de pos tratamiento - r	Completo									X		X			
	Tubería de carga de aire - revisar	Completo									X		X			
ESTADO MECANICO SUSPENSIÓN	Suspensión delantera - bujes, pasadores, balancín	Completo									X		X			
	Suspensión delantera - muelles y grapas	Completo									X		X			
	Suspensión delantera - amortiguadores	2									X		X			
	Suspensión delantera - fugas tapa, grasera (ld, li)	2									X		X			
	Suspensión delantera - frenos delanteros (ld, li)	2									X		X			
	Suspensión delantera - retenedor delantero (ld,li)	2									X		X			
	Ruido extraño (traqueteo,caja de cubiertos,	1									X		X			
	(traqueteo) en movimiento al girar hacia la derecha	1									X		X			
	Ruido extraño (traqueteo) en movimiento al girar hacia	1									X		X			
	Cadena del cardan.	1									X		X			
	Embrague (duro - ruido)	1									X		X			
	Acoples rápidos.	Completo									X		X			
	Caja velocidades - funcionamiento	Completo									X		X			
	Freno de seguridad (en la cabina)	Completo									X		X			
VOLCO	Manguera (rasgadas,gruñidas, cristalizadas)	2									X		X			
	Manguera deposito aceite (rasgadas, gruñidas,	Completo									X		X			
	Mecanismo apertura puerta	Completo									X		X			
	Cachucha de protección cabina	2									X		X			
	Controles desde cabina	2									X		X			
	Bisagra trasera	1									X		X			
	Seguros compuerta	2									X		X			
	Fisuras	Completo									X		X			
	Cilindro telescópico	1									X		X			
	Otros															
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	1									X		X			
	Extintor (20 Lb)	1									X		X			
	Botiquin	1									X		X			
	Pala antichispa	1									X		X			
	Otros:										X		X			
VoBo HSE											Mauricio Gueva P.					

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si_ no

OBSERVACIONES:

NOMBRE CONDUCTOR

YIRENIS BERMUDEZ

NOMBRE ING RESIDENTE

Carlos A. Mercado Z

CONSORCIO PUERTO CLAVER

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

CONTRATO: 050 DE 2025 LOCALIZACION: Jetty 2 MODELO: MARCA:

PLACAS: SBT-502 INSPECCIONADO POR: SEMANA: DEL 19 DE 01/2026 AL

DE 25/01 DE 2026

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2									X		X			
	Luz de media (ld/li)	4									X		X			
	Luz dia (ld/li)	2									X		X			
	Luz alta (ld/li)	4									X		X			
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2									X		X			
	Luz direccional delantera (ld/li)	2									X		X			
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2									X		X			
	Luz de parquoo trasera (ld/li)	2									X		X			
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2									X		X			
	Luz direccional trasera (ld/li)	2									X		X			
	Luz de pisada del freno	2									X		X			
	Luz direccional volco	12									X		X			
	Licuadoras	2									X		X			
CABINA	Espejos laterales	2									X		X			
	Sistema limpia parabrizas	2									X		X			
	Alarma de retroceso	1									X		X			
	Pito	1									X		X			
	Cometas	2									X		X			
	Freno de servicio	Completa									X		X			
	Freno de emergencia	Completa									X		X			
	Cinturón de seguridad	2									X		X			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1									X		X			
	Limpia brisas	2									X		X			
	Asiento en buena condición	1									X		X			
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo									X		X			
	Seguros de capot	2									X		X			
	Hora inicial diaria	Completo									X		X			
TABLERO DE INSTRUMENTOS	Temperatura caja	1									X		X			
	Temperatura diferencial delantera	1									X		X			
	Temperatura diferencial trasera	1									X		X			
	Temperatura motor revisar	1									X		X			
	Temperatura aqua motor revisar	1									X		X			
	Pisada freno revisar	1									X		X			
	Pirómetro	1									X		X			
	Códigos de falla	1									X		X			
	Carga baterías	2									X		X			
SISTEMA DE DIRECCIÓN	Deposito hidráulico	Completo									X		X			
	Golpe al dar dirección	Completo									X		X			
	Vibradera	Completo									X		X			
	Dirección jala para la derecha o izquierda	1									X		X			
	Timón	1									X		X			
	Caja de dirección principal fugas	1									X		X			
	Caja de dirección auxiliar fugas	1									X		X			
	Mangueras sistema de dirección	Completo									X		X			
LLANTAS Y RINES	Llanta delantera (li)	1									X		X			
	Llanta delantera (ld)	1									X		X			
	Llanta pacha delantera interna (ld)	1									X		X			
	Llanta pacha delantera externa (ld)	1									X		X			
	Llanta pacha delantera interna (li)	1									X		X			
	Llanta pacha delantera externa (li)	1									X		X			
	Llanta pacha trasera interna (ld)	1									X		X			
	Llanta pacha trasera externa (ld)	1									X		X			
	Llanta pacha trasera interna (li)	1									X		X			
	Llanta pacha trasera externa (li)	1									X		X			
	Llanta de repuesto	1									X		X			
	Rines	10									X		X			
	Presión llantas	10									X		X			

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO MOTOR	Separador de agua-combustible - drenar	1									X		X			
	Nivel del aceite lubricante - revisar	FULL									X		X			
	Nivel del refrigerante - revisar	FULL									X		X			
	Ventilador de enfriamiento - revisar	1									X		X			
	Bandas impulsoras - revisar	2									X		X			
	Tubería de admisión de aire - revisar	Completo									X		X			
	Tubo del respiradero del cárter - revisar	1									X		X			
	Tanques y depósitos de aire - drenar	2									X		X			
	Tubería de escape de pos tratamiento - r	Completo									X		X			
	Tubería de carga de aire - revisar	Completo									X		X			
ESTADO MECANICO SUSPENSIÓN	Suspensión delantera - bujes, pasadores, balancín	Completo									X		X			
	Suspensión delantera - muelles y grapas	Completo									X		X			
	Suspensión delantera - amortiguadores	2									X		X			
	Suspensión delantera - fugas tapa, grasera (ld, li)	2									X		X			
	Suspensión delantera - frenos delanteros (ld, li)	2									X		X			
	Suspensión delantera - retenedor delantero (ld,li)	2									X		X			
	Ruido extraño (traqueteo,caja de cubiertos,	1									X		X			
	(traqueteo) en movimiento al girar hacia la derecha	1									X		X			
	Ruido extraño (traqueteo) en movimiento al girar hacia	1									X		X			
	Cadena del cardan.	1									X		X			
	Embrague (duro - ruido)	1									X		X			
	Acoples rápidos.	Completo									X		X			
	Caja velocidades - funcionamiento	Completo									X		X			
	Freno de seguridad (en la cabina)	Completo									X		X			
VOLCO	Manguera (rasgadas,gruñidas, cristalizadas)	2									X		X			
	Manguera deposito aceite (rasgadas, gruñidas,	Completo									X		X			
	Mecanismo apertura puerta	Completo									X		X			
	Cachucha de protección cabina	2									X		X			
	Controles desde cabina	2									X		X			
	Bisagra trasera	1									X		X			
	Seguros compuerta	2									X		X			
	Fisuras	Completo									X		X			
	Cilindro telescópico	1									X		X			
	Otros										X		X			
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	1									X		X			
	Extintor (20 Lb)	1									X		X			
	Botiquin	1									X		X			
	Pala antichispa	1									X		X			
	Otros:															

VoBo HSE Mayuli Guerra P.

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si_ no

OBSERVACIONES:

NOMBRE CONDUCTOR Javier Candia

NOMBRE ING RESIDENTE Carlos A. Mercado Z

CONSORCIO PUERTO CLAVER

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

CONTRATO: 050 DE 2025 LOCALIZACION: Lote 2 MODELO: MARCA:

PLACAS: SRJ 502 INSPECCIONADO POR: SLAS SEMANA: DEL 20 DE 01 /2026 AL

DE 01/02 DE 2026

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN.		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz de media (ld/li)	4	X		X		X		X		X		X			
	Luz dia (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz alta (ld/li)	4	X		X		X		X		X		X			
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz direccional delantera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz direccional trasera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz de pisada del freno	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz direccional volco	12	X		X		X		X		X		X			
	Licuadoras	2	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Espejos laterales	2	X		X		X		X		X		X			
	Sistema limpia parabrizas	2	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X			
	Pito	1	X		X		X		X		X		X			
	Cometas	2	X		X		X		X		X		X			
	Freno de servicio	Completa	X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia	Completa	X		X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad	2	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	X		X		X		X		X		X			
	Limpia brisas	2	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buena condición	1	X		X		X		X		X		X			
	Cables de la bateria (revise si los cables del	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Seguros de capot	2	X		X		X		X		X		X			
	Hora inicial diaria	Completo	X		X		X		X		X		X			
TABLERO DE INSTRUMENTOS	Temperatura caja	1	X		X		X		X		X		X			
	Temperatura diferencial delantera	1	X		X		X		X		X		X			
	Temperatura diferencial trasera	1	X		X		X		X		X		X			
	Temperatura motor revisar	1	X		X		X		X		X		X			
	Temperatura agua motor revisar	1	X		X		X		X		X		X			
	Pisada freno revisar	1	X		X		X		X		X		X			
	Pirómetro	1	X		X		X		X		X		X			
	Códigos de falla	1	X		X		X		X		X		X			
	Carga baterias	2	X		X		X		X		X		X			
SISTEMA DE DIRECCIÓN	Deposito hidráulico	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Golpe al dar dirección	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Vibradera	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Dirección jala para la derecha o izquierda	1	X		X		X		X		X		X			
	Timón	1	X		X		X		X		X		X			
	Caja de dirección principal fugas	1	X		X		X		X		X		X			
	Caja de dirección auxiliar fugas	1	X		X		X		X		X		X			
	Mangueras sistema de dirección	Completo	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS Y RINES	Llanta delantera (li)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta delantera (ld)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha delantera interna (ld)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha delantera externa (ld)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha delantera interna (li)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha delantera externa (li)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha trasera interna (ld)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha trasera externa (ld)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha trasera interna (li)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha trasera externa (li)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta de repuesto	1	X		X		X		X		X		X			
	Rines	10	X		X		X		X		X		X			
	Presión llantas	10	X		X		X		X		X		X			

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO MOTOR	Separador de agua-combustible - drenar	1	X		X		X		X		X		X			
	Nivel del aceite lubricante - revisar	FULL	X		X		X		X		X		X			
	Nivel del refrigerante - revisar	FULL	X		X		X		X		X		X			
	Ventilador de enfriamiento - revisar	1	X		X		X		X		X		X			
	Bandas impulsoras - revisar	2	X		X		X		X		X		X			
	Tubería de admisión de aire - revisar	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Tubo del respiradero del cárter - revisar	1	X		X		X		X		X		X			
	Tanques y depósitos de aire - drenar	2	X		X		X		X		X		X			
	Tubería de escape de pos tratamiento - r	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Tubería de carga de aire - revisar	Completo	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO SUSPENSIÓN	Suspensión delantera - bujes, pasadores, balancín	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Suspensión delantera - muelles y grapas	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Suspensión delantera - amortiguadores	2	X		X		X		X		X		X			
	Suspensión delantera - fugas tapa, grasera (ld, li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Suspensión delantera - frenos delanteros (ld, li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Suspensión delantera - retenedor delantero (ld,li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Ruido extraño (traqueteo,caja de cubiertos,	1	X		X		X		X		X		X			
	(traqueteo) en movimiento al girar hacia la derecha	1	X		X		X		X		X		X			
	Ruido extraño (traqueteo) en movimiento al girar hacia	1	X		X		X		X		X		X			
	Cadena del cardan.	1	X		X		X		X		X		X			
	Embrague (dum - ruido)	1	X		X		X		X		X		X			
	Acoples rápidos.	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Caja velocidades - funcionamiento	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Freno de seguridad (en la cabina)	Completo	X		X		X		X		X		X			
VOLCO	Manguera (rasgadas,gruñidas, cristalizadas)	2	X		X		X		X		X		X			
	Manguera deposito aceite (rasgadas, gruñidas,	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo apertura puerta	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Cachucha de protección cabina	2	X		X		X		X		X		X			
	Controles desde cabina	2	X		X		X		X		X		X			
	Bisagra trasera	1	X		X		X		X		X		X			
	Seguros compuerta	2	X		X		X		X		X		X			
	Fisuras	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Cilindro telescópico	1	X		X		X		X		X		X			
	Otros															
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	1	X		X		X		X		X		X			
	Extintor (20 Lb)	1	X		X		X		X		X		X			
	Botiquin	1	X		X		X		X		X		X			
	Pala antichispa	1	X		X		X		X		X		X			
	Otros:															
VoBo HSE			Jaquelis Guerra B		Jaquelis Guerra B.											

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si_ no

OBSERVACIONES:

NOMBRE CONDUCTOR Javier Candia

NOMBRE ING RESIDENTE Carlos A. Mercado Z

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

CONTRATO: 050 DE 2025 LOCALIZACION: Vía 2 MODELO: MARCA:

PLACAS: SRJ-302 INSPECCIONADO POR: [illegible] SEMANA: DEL 02 DE 02 / 2026 AL

DE 02/02 DE 2026

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2			X		X		X		X		X			
	Luz de media (ld/li)	4			X		X		X		X		X			
	Luz dia (ld/li)	2			X		X		X		X		X			
	Luz alta (ld/li)	4			X		X		X		X		X			
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2			X		X		X		X		X			
	Luz direccional delantera (ld/li)	2			X		X		X		X		X			
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2			X		X		X		X		X			
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2			X		X		X		X		X			
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2			X		X		X		X		X			
	Luz direccional trasera (ld/li)	2			X		X		X		X		X			
	Luz de pisada del freno	2			X		X		X		X		X			
	Luz direccional volco	12			X		X		X		X		X			
	Licuadoras	2			X		X		X		X		X			
CABINA	Espejos laterales	2			X		X		X		X		X			
	Sistema limpia parabrizas	2			X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X		X			
	Pito	1			X		X		X		X		X			
	Cometas	2			X		X		X		X		X			
	Freno de servicio	Completa			X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia	Completa			X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad	2			X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1			X		X		X		X		X			
	Limpia brisas	2			X		X		X		X		X			
	Asiento en buena condición	1			X		X		X		X		X			
	Cables de la bateria (revise si los cables del	Completo			X		X		X		X		X			
	Seguros de capot	2			X		X		X		X		X			
	Hora inicial diaria	Completo			X		X		X		X		X			
TABLERO DE INSTRUMENTOS	Temperatura caja	1			X		X		X		X		X			
	Temperatura diferencial delantera	1			X		X		X		X		X			
	Temperatura diferencial trasera	1			X		X		X		X		X			
	Temperatura motor revisar	1			X		X		X		X		X			
	Temperatura agua motor revisar	1			X		X		X		X		X			
	Pisada freno revisar	1			X		X		X		X		X			
	Pirómetro	1			X		X		X		X		X			
	Códigos de falla	1			X		X		X		X		X			
	Cama baterías	2			X		X		X		X		X			
SISTEMA DE DIRECCIÓN	Deposito hidráulico	Completo			X		X		X		X		X			
	Golpe al dar dirección	Completo			X		X		X		X		X			
	Vibradera	Completo			X		X		X		X		X			
	Dirección jala para la derecha o izquierda	1			X		X		X		X		X			
	Timón	1			X		X		X		X		X			
	Caja de dirección principal fugas	1			X		X		X		X		X			
	Caja de dirección auxiliar fugas	1			X		X		X		X		X			
	Manqueras sistema de dirección	Completo			X		X		X		X		X			
LLANTAS Y RINES	Llanta delantera (li)	1			X		X		X		X		X			
	Llanta delantera (ld)	1			X		X		X		X		X			
	Llanta pacha delantera interna (ld)	1			X		X		X		X		X			
	Llanta pacha delantera externa (ld)	1			X		X		X		X		X			
	Llanta pacha delantera interna (li)	1			X		X		X		X		X			
	Llanta pacha delantera externa (li)	1			X		X		X		X		X			
	Llanta pacha trasera interna (ld)	1			X		X		X		X		X			
	Llanta pacha trasera externa (ld)	1			X		X		X		X		X			
	Llanta pacha trasera interna (li)	1			X		X		X		X		X			
	Llanta pacha trasera externa (li)	1			X		X		X		X		X			
	Llanta de repuesto	1			X		X		X		X		X			
	Rines	10			X		X		X		X		X			
	Presión llantas	10			X		X		X		X		X			

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO MOTOR	Separador de agua-combustible - drenar	1			X		X		X		X					
	Nivel del aceite lubricante - revisar	FULL			X		X		X		X					
	Nivel del refrigerante - revisar	FULL			X		X		X		X					
	Ventilador de enfriamiento - revisar	1			X		X		X		X					
	Bandas impulsoras - revisar	2			X		X		X		X					
	Tubería de admisión de aire - revisar	Completo			X		X		X		X					
	Tubo del respiradero del cárter - revisar	1			X		X		X		X					
	Tanques y depósitos de aire - drenar	2			X		X		X		X					
	Tubería de escape de pos tratamiento - r	Completo			X		X		X		X					
	Tubería de carga de aire - revisar	Completo			X		X		X		X					
ESTADO MECANICO SUSPENSIÓN	Suspensión delantera - bujes, pasadores, balancín	Completo			X		X		X		X					
	Suspensión delantera - muelles y grapas	Completo			X		X		X		X					
	Suspensión delantera - amortiguadores	2			X		X		X		X					
	Suspensión delantera - fugas tapa, grasera (ld, li)	2			X		X		X		X					
	Suspensión delantera - frenos delanteros (ld, li)	2			X		X		X		X					
	Suspensión delantera - retenedor delantero (ld,li)	2			X		X		X		X					
	Ruido extraño (traqueteo,caja de cubiertos,	1			X		X		X		X					
	(traqueteo) en movimiento al girar hacia la derecha	1			X		X		X		X					
	Ruido extraño (traqueteo) en movimiento al girar hacia	1			X		X		X		X					
	Cadena de' cardan	1			X		X		X		X					
	Embrague (duro - ruido)	1			X		X		X		X					
	Acoples rápidos	Completo			X		X		X		X					
	Caja velocidades - funcionamiento	Completo			X		X		X		X					
	Freno de seguridad (en la cabina)	Completo			X		X		X		X					
VOLCO	Manguera (rasgadas,gruñidas, cristalizadas)	2			X		X		X		X					
	Manguera deposito aceite (rasgadas, gruñidas,	Completo			X		X		X		X					
	Mecanismo apertura puerta	Completo			X		X		X		X					
	Cachucha de protección cabina	2			X		X		X		X					
	Controles desde cabina	2			X		X		X		X					
	Bisagra trasera	1			X		X		X		X					
	Seguros compuerta	2			X		X		X		X					
	Fisuras	Completo			X		X		X		X					
	Cilindro telescópico	1			X		X		X		X					
	Otros				X											
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	1			X		X		X		X					
	Extintor (20 Lb)	1			X		X		X		X					
	Botiquin	1			X		X		X		X					
	Pala antichispa	1			X		X		X		X					
	Otros:															
VoBo HSE			Yaylis Guerra P.		Yaylis Guerra P.											

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarla a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si_ no

OBSERVACIONES:

NOMBRE CONDUCTOR

JAVIER OJEDA

NOMBRE ING RESIDENTE

Carlos A. Mercado Z

CONSORCIO PUERTO CLAVER

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

CONTRATO: 050 DE 2025 LOCALIZACION: SITE 2 MODELO: MARCA:

PLACAS: SBS 502 INSPECCIONADO POR: SITE SEMANA: DEL 09 DE 02 / 2026 AL

DE 09/02 DE 2026

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz de media (ld/li)	4	X		X		X		X		X		X			
	Luz dia (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz alta (ld/li)	4	X		X		X		X		X		X			
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz direccional delantera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz direccional trasera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz de pisada del freno	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz direccional volco	12	X		X		X		X		X		X			
	Licuadoras	2	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Espejos laterales	2	X		X		X		X		X		X			
	Sistema limpia parabrizas	2	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X			
	Pito	1	X		X		X		X		X		X			
	Cometas	2	X		X		X		X		X		X			
	Freno de servicio	Completa	X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia	Completa	X		X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad	2	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	X		X		X		X		X		X			
	Limpia brisas	2	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buena condición	1	X		X		X		X		X		X			
	Cables de la batería (revise si los cables del ...	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Seguros de capot	2	X		X		X		X		X		X			
	Hora inicial diaria	Completo	X		X		X		X		X		X			
TABLERO DE INSTRUMENTOS	Temperatura caja	1	X		X		X		X		X		X			
	Temperatura diferencial delantera	1	X		X		X		X		X		X			
	Temperatura diferencial trasera	1	X		X		X		X		X		X			
	Temperatura motor revisar	1	X		X		X		X		X		X			
	Temperatura agua motor revisar	1	X		X		X		X		X		X			
	Pisada freno revisar	1	X		X		X		X		X		X			
	Pirómetro	1	X		X		X		X		X		X			
	Códigos de falla	1	X		X		X		X		X		X			
	Carga baterías	2	X		X		X		X		X		X			
SISTEMA DE DIRECCIÓN	Deposito hidráulico	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Golpe al dar dirección	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Vibradera	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Dirección jala para la derecha o izquierda	1	X		X		X		X		X		X			
	Timón	1	X		X		X		X		X		X			
	Caja de dirección principal fugas	1	X		X		X		X		X		X			
	Caja de dirección auxiliar fugas	1	X		X		X		X		X		X			
	Mangueras sistema de dirección	Completo	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS Y RINES	Llanta delantera (li)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta delantera (ld)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha delantera interna (ld)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha delantera externa (ld)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha delantera interna (li)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha delantera externa (li)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha trasera interna (ld)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha trasera externa (ld)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha trasera interna (li)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha trasera externa (li)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta de repuesto	1	X		X		X		X		X		X			
	Rines	10	X		X		X		X		X		X			
	Presión llantas	10	X		X		X		X		X		X			

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO MOTOR	Separador de agua-combustible - drenar	1	X		X		X		X		X		X			
	Nivel del aceite lubricante - revisar	FULL	X		X		X		X		X		X			
	Nivel del refrigerante - revisar	FULL	X		X		X		X		X		X			
	Ventilador de enfriamiento - revisar	1	X		X		X		X		X		X			
	Bandas impulsoras - revisar	2	X		X		X		X		X		X			
	Tubería de admisión de aire - revisar	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Tubo del respiradero del cárter - revisar	1	X		X		X		X		X		X			
	Tanques y depósitos de aire - drenar	2	X		X		X		X		X		X			
	Tubería de escape de pos tratamiento - r	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Tubería de carga de aire - revisar	Completo	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO SUSPENSIÓN	Suspensión delantera - bujes, pasadores, balancín	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Suspensión delantera - muelles y grapas	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Suspensión delantera - amortiguadores	2	X		X		X		X		X		X			
	Suspensión delantera - fugas tapa, grasera (ld, li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Suspensión delantera - frenos delanteros (ld, li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Suspensión delantera - retenedor delantero (ld,li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Ruido extraño (traqueteo,caja de cubiertos,	1	X		X		X		X		X		X			
	(traqueteo) en movimiento al girar hacia la derecha	1	X		X		X		X		X		X			
	Ruido extraño (traqueteo) en movimiento al girar hacia	1	X		X		X		X		X		X			
	Cadena del cardan.	1	X		X		X		X		X		X			
	Embraque (duro - ruido)	1	X		X		X		X		X		X			
	Acoples rápidos.	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Caja velocidades - funcionamiento	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Freno de seguridad (en la cabina)	Completo	X		X		X		X		X		X			
VOLCO	Manguera (rasgadas,gruñidas, cristalizadas)	2	X		X		X		X		X		X			
	Manguera deposito aceite (rasgadas, gruñidas,	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo apertura puerta	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Cachucha de protección cabina	2	X		X		X		X		X		X			
	Controles desde cabina	2	X		X		X		X		X		X			
	Bisagra trasera	1	X		X		X		X		X		X			
	Seguros compuerta	2	X		X		X		X		X		X			
	Fisuras	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Cilindro telescópico	1	X								/		X			
	Otros															
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	1	X		X		X		X		X		X			
	Extintor (20 Lb)	1	X		X		X		X		X		X			
	Botiquin	1	X		X		X		X		X		X			
	Pala antichispa	1	X		X		X		X		X		X			
	Otros:															
	VoBo HSE		Yaquelis Guerra P.		Yaquelis Guerra P.											

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si_ no

OBSERVACIONES:

NOMBRE CONDUCTOR

JAVIER OJEDA

NOMBRE ING RESIDENTE

Carlos A. Mercado Z

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

CONTRATO: 050 DE 2025 LOCALIZACION: [illegible] MODELO: 2015 MARCA:

PLACAS: SIC-180 INSPECCIONADO POR: [illegible] SEMANA: DEL 05 DE 02 / 2026 AL

DE 15/02 DE 2026

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz de media (ld/li)	4	X		X		X		X		X		X			
	Luz dia (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz alta (ld/li)	4	X		X		X		X		X		X			
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz direccional delantera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz direccional trasera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz de pisada del freno	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz direccional volco	12	X		X		X		X		X		X			
	Licuadoras	2	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Espejos laterales	2	X		X		X		X		X		X			
	Sistema limpia parabrizas	2	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X			
	Pito	1	X		X		X		X		X		X			
	Cometas	2	X		X		X		X		X		X			
	Freno de servicio	Completa	X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia	Completa	X		X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad	2	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	X		X		X		X		X		X			
	Limpia brisas	2	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buena condición	1	X		X		X		X		X		X			
	Cables de la bateria (revise si los cables del	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Seguros de capot	2	X		X		X		X		X		X			
	Hora inicial diaria	Completo	X		X		X		X		X		X			
TABLERO DE INSTRUMENTOS	Temperatura caja	1	X		X		X		X		X		X			
	Temperatura diferencial delantera	1	X		X		X		X		X		X			
	Temperatura diferencial trasera	1	X		X		X		X		X		X			
	Temperatura motor revisar	1	X		X		X		X		X		X			
	Temperatura agua motor revisar	1	X		X		X		X		X		X			
	Pisada freno revisar	1	X		X		X		X		X		X			
	Pirómetro	1	X		X		X		X		X		X			
	Códigos de falla	1	X		X		X		X		X		X			
	Carga baterías	2	X		X		X		X		X		X			
SISTEMA DE DIRECCIÓN	Deposito hidráulico	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Golpe al dar dirección	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Vibradera	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Dirección jala para la derecha o izquierda	1	X		X		X		X		X		X			
	Timón	1	X		X		X		X		X		X			
	Caja de dirección principal fugas	1	X		X		X		X		X		X			
	Caja de dirección auxiliar fugas	1	X		X		X		X		X		X			
	Mangueras sistema de dirección	Completo	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS Y RINES	Llanta delantera (li)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta delantera (ld)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha delantera interna (ld)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha delantera externa (ld)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha delantera interna (li)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha delantera externa (li)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha trasera interna (ld)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha trasera externa (ld)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha trasera interna (li)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha trasera externa (li)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta de repuesto	1	X		X		X		X		X		X			
	Rines	10	X		X		X		X		X		X			
	Presión llantas	10	X		X		X		X		X		X			

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO MOTOR	Separador de agua-combustible - drenar	1	X		X		X		X		X		X			
	Nivel del aceite lubricante - revisar	FULL	X		X		X		X		X		X			
	Nivel del refrigerante - revisar	FULL	X		X		X		X		X		X			
	Ventilador de enfriamiento - revisar	1	X		X		X		X		X		X			
	Bandas impulsoras - revisar	2	X		X		X		X		X		X			
	Tuberia de admisión de aire - revisar	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Tubo del respiradero del cárter - revisar	1	X		X		X		X		X		X			
	Tanques y depósitos de aire - drenar	2	X		X		X		X		X		X			
	Tubería de escape de pos tratamiento - r	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Tubería de carga de aire - revisar	Completo	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO SUSPENSIÓN	Suspensión delantera - bujes, pasadores, balancín	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Suspensión delantera - muelles y grapas	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Suspensión delantera - amortiguadores	2	X		X		X		X		X		X			
	Suspensión delantera - fugas tapa, grasera (ld, li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Suspensión delantera - frenos delanteros (ld, li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Suspensión delantera - retenedor delantero (ld,li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Ruido extraño (traqueteo,caja de cubiertos,	1	X		X		X		X		X		X			
	(traqueteo) en movimiento al girar hacia la derecha	1	X		X		X		X		X		X			
	Ruido extraño (traqueteo) en movimiento al girar hacia	1	X		X		X		X		X		X			
	Cadena del cardan.	1	X		X		X		X		X		X			
	Embrague (duro - ruido)	1	X		X		X		X		X		X			
	Acoples rápidos.	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Caja velocidades - funcionamiento	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Freno de seguridad (en la cabina)	Completo	X		X		X		X		X		X			
VOLCO	Manguera (rasgadas,gruñidas, cristalizadas)	2	X		X		X		X		X		X			
	Manguera deposito aceite (rasgadas, gruñidas,	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo apertura puerta	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Cachucha de protección cabina	2	X		X		X		X		X		X			
	Controles desde cabina	2	X		X		X		X		X		X			
	Bisagra trasera	1	X		X		X		X		X		X			
	Seguros compuerta	2	X		X		X		X		X		X			
	Fisuras	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Cilindro telescópico	1	X		X		X		X		X		X			
	Otros															
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	1	X		X		X		X		X		X			
	Extintor (20 Lb)	1	X		X		X		X		X		X			
	Botiquin	1	X		X		X		X		X		X			
	Pala antichispa	1	X		X		X		X		X		X			
	Otros:															
VoBo HSE			Yaulis Guerra P.		Yaulis Guerra P.											

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si_ no

OBSERVACIONES:

NOMBRE CONDUCTOR

Wilkin Ayala Pacheco

NOMBRE ING RESIDENTE

Carlos A. Mercado Z

CONSORCIO PUERTO CLAVER

PAGINA: 1 DE 2

CONSORCIO PUERTO CLAVER

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

LOCALIZACION: Lote 2 MODELO: 2011 MARCA: AL

CONTRATO: 050 DE 2025 SEMANA: DEL 19 DE 02

PLACAS: SXT-180 INSPECCIONADO POR: [illegible]

DE 25/02 DE 2026

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIÉ B	MIÉ M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SÁB B	SÁB M	DOM B	DOM M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2					X				X					
	Luz de media (ld/li)	4					X				X					
	Luz dia (ld/li)	2					X				X					
	Luz alta (ld/li)	4					X				X					
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2					X				X					
	Luz direccional delantera (ld/li)	2					X				X					
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2					X				X					
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2					X				X					
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2					X				X					
	Luz direccional trasera (ld/li)	2					X				X					
	Luz de pisada del freno	12					X				X					
	Luz direccional volco	2					X				X					
	Licuadoras	2					X				X					
CABINA	Espejos laterales	2					X				X					
	Sistema limpia parabrizas	1					X				X					
	Alarma de retroceso	1					X				X					
	Pito	2					X				X					
	Cometas	Completa					X				X					
	Freno de servicio	Completa					X				X					
	Freno de emergencia	2					X				X					
	Cinturón de seguridad	1					X				X					
	Vidrio frontal (en buen estado)	2					X				X					
	Limpia brisas	1					X				X					
	Asiento en buena condición	Completo					X				X					
	Cables de la batería (revise si los cables del	2					X				X					
	Seguros de capot	Completo					X				X					
	Hora inicial diaria	1					X				X					
TABLERO DE INSTRUMENTOS	Temperatura caja	1					X				X					
	Temperatura diferencial delantera	1					X				X					
	Temperatura diferencial trasera	1					X				X					
	Temperatura motor revisar	1					X				X					
	Temperatura agua motor revisar	1					X				X					
	Pisada freno revisar	1					X				X					
	Pirómetro	1					X				X					
	Códigos de falla	2					X				X					
	Carga baterías	Completo					X				X					
SISTEMA DE DIRECCIÓN	Deposito hidráulico	Completo					X				X					
	Golpe al dar dirección	Completo					X				X					
	Vibradera	1					X				X					
	Dirección jala para la derecha o izquierda	1					X				X					
	Timón	1					X				X					
	Caja de dirección principal fugas	1					X				X					
	Caja de dirección auxiliar fugas	Completo					X				X					
	Mangueras sistema de dirección	1					X				X					
LLANTAS Y RINES	Llanta delantera (li)	1					X				X					
	Llanta delantera (ld)	1					X				X					
	Llanta pacha delantera interna (ld)	1					X				X					
	Llanta pacha delantera externa (ld)	1					X				X					
	Llanta pacha delantera interna (li)	1					X				X					
	Llanta pacha delantera externa (li)	1					X				X					
	Llanta pacha trasera interna (ld)	1					X				X					
	Llanta pacha trasera externa (ld)	1					X				X					
	Llanta pacha trasera interna (li)	1					X				X					
	Llanta pacha trasera externa (li)	1					X				X					
	Llanta de repuesto	10					X				X					
	Rines	10					X				X					
	Presión llantas															

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO MOTOR	Separador de agua-combustible - drenar	1					X				X					
	Nivel del aceite lubricante - revisar	FULL					X				X					
	Nivel del refrigerante - revisar	FULL					X				X					
	Ventilador de enfriamiento - revisar	1					X				X					
	Bandas impulsoras - revisar	2					X				X					
	Tubería de admisión de aire - revisar	Completo					X				X					
	Tubo del respiradero del cárter - revisar	1					X				X					
	Tanques y depósitos de aire - drenar	2					X				X					
	Tubería de escape de pos tratamiento - r	Completo					X				X					
	Tubería de carga de aire - revisar	Completo					X				X					
ESTADO MECANICO SUSPENSIÓN	Suspensión delantera - bujes, pasadores, balancín	Completo					X				X					
	Suspensión delantera - muelles y grapas	Completo					X				X					
	Suspensión delantera - amortiguadores	2					X				X					
	Suspensión delantera - fugas tapa, grasera (ld, li)	2					X				X					
	Suspensión delantera - frenos delanteros (ld, li)	2					X				X					
	Suspensión delantera - retenedor delantero (ld,li)	2					X				X					
	Ruido extraño (traqueteo,caja de cubiertos,	1					X				X					
	(traqueteo) en movimiento al girar hacia la derecha	1					X				X					
	Ruido extraño (traqueteo) en movimiento al girar hacia	1					X				X					
	Cadena del cardan.	1					X				X					
	Embrague (duro - ruido)	1					X				X					
	Acoples rápidos.	Completo					X				X					
	Caja velocidades - funcionamiento	Completo					X				X					
	Freno de seguridad (en la cabina)	Completo					X				X					
VOLCO	Manguera (rasgadas,gruñidas, cristalizadas)	2					X				X					
	Manguera deposito aceite (rasgadas, gruñidas,	Completo					X				X					
	Mecanismo apertura puerta	Completo					X				X					
	Cachucha de protección cabina	2					X				X					
	Controles desde cabina	2					X				X					
	Bisagra trasera	1					X				X					
	Seguros compuerta	2					X				X					
	Fisuras	Completo					X				X					
	Cilindro telescópico	1					X				X					
	Otros															
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	1					X				X					
	Extintor (20 Lb)	1					X				X					
	Botiquin	1					X				X					
	Pala antichispa	1					X				X					
	Otros:															
VoBo HSE							Paulis Guerra P.									

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehiculo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si no

OBSERVACIONES:

NOMBRE CONDUCTOR

YIRNEY PEREZ J

NOMBRE ING RESIDENTE

Carlos A. Mercado Z

CONSORCIO PUERTO CLAVER

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

CONTRATO: 050 DE 2025 LOCALIZACION: Este 2 MODELO: MARCA:

PLACAS: SGJ 502 INSPECCIONADO POR: SOS SEMANA: DEL 16 DE 02/2026 AL

DE 22/02 DE 28/2026

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Luz de media (ld/li)	4	X		X		X		X		X		X		X	
	Luz dia (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Luz alta (ld/li)	4	X		X		X		X		X		X		X	
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Luz direccional delantera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Luz direccional trasera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Luz de pisada del freno	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Luz direccional volco	12	X		X		X		X		X		X		X	
	Licuadoras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	Espejos laterales	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema limpia parabrizas	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Pito	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Cometas	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Freno de servicio	Completa	X		X		X		X		X		X		X	
	Freno de emergencia	Completa	X		X		X		X		X		X		X	
	Cinturón de seguridad	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Limpia brisas	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento en buena condición	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Seguros de capot	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Hora inicial diana	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
TABLERO DE INSTRUMENTOS	Temperatura caja	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Temperatura diferencial delantera	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Temperatura diferencial trasera	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Temperatura motor revisar	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Temperatura agua motor revisar	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Pisada freno revisar	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Pirómetro	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Códigos de falla	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Carga baterías	2	X		X		X		X		X		X		X	
SISTEMA DE DIRECCIÓN	Deposito hidráulico	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Golpe al dar dirección	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Vibradera	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Dirección jala para la derecha o izquierda	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Timón	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Caja de dirección principal fugas	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Caja de dirección auxiliar fugas	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras sistema de dirección	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS Y RINES	Llanta delantera (li)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Llanta delantera (ld)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Llanta pacha delantera interna (ld)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Llanta pacha delantera externa (ld)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Llanta pacha delantera interna (li)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Llanta pacha delantera externa (li)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Llanta pacha trasera interna (ld)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Llanta pacha trasera externa (ld)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Llanta pacha trasera interna (li)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Llanta pacha trasera externa (li)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Llanta de repuesto	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Rines	10	X		X		X		X		X		X		X	
	Presión llantas	10	X		X		X		X		X		X		X	

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO MOTOR	Separador de agua-combustible - drenar	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del aceite lubricante - revisar	FULL	X		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del refrigerante - revisar	FULL	X		X		X		X		X		X		X	
	Ventilador de enfriamiento - revisar	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Bandas impulsoras - revisar	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Tubería de admisión de aire - revisar	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Tubo del respiradero del cárter - revisar	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Tanques y depósitos de aire - drenar	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Tubería de escape de pos tratamiento - r	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Tubería de carga de aire - revisar	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO SUSPENSIÓN	Suspensión delantera - bujes, pasadores, balancín	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión delantera - muelles y grapas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión delantera - amortiguadores	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión delantera - fugas tapa, grasera (ld, li)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión delantera - frenos delanteros (ld, li)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Suspensión delantera - retenedor delantero (ld,li)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Ruido extraño (traqueteo,caja de cubiertos,	1	X		X		X		X		X		X		X	
	(traqueteo) en movimiento al girar hacia la derecha	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Ruido extraño (traqueteo) en movimiento al girar hacia	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Cadena del cardan.	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Embrague (duro - ruido)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Acoples rápidos.	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Caja velocidades - funcionamiento	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Freno de seguridad (en la cabina)	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
VOLCO	Manguera (rasgadas,gruñidas, cristalizadas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Manguera deposito aceite (rasgadas, gruñidas,	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo apertura puerta	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Cachucha de protección cabina	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Controles desde cabina	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Bisagra trasera	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Seguros compuerta	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Fisuras	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Cilindro telescópico	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Otros															
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor (20 Lb)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Botiquin	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Pala antichispa	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Otros:															
VoBo HSE			Yaydis Guerra P.						Yaydis Guerra P.							

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si_ no

OBSERVACIONES:

NOMBRE CONDUCTOR

JAVIER OJEDA

NOMBRE ING RESIDENTE

Carlos A. Mercado Z

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

CONTRATO: 050 DE 2025 LOCALIZACION: Bloque 1 MODELO: MARCA:

PLACAS: SBJ-302 INSPECCIONADO POR: SAS. SEMANA: DEL 20 DE 02 /2026 AL

DE. 01/03 DE 2026

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz de media (ld/li)	4	X		X		X		X		X		X			
	Luz dia (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz alta (ld/li)	4	X		X		X		X		X		X			
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz direccional delantera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz direccional trasera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz de pisada del freno	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz direccional volco	12	X		X		X		X		X		X			
	Licuadoras	2	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Espejos laterales	2	X		X		X		X		X		X			
	Sistema limpia parabrizas	2	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X			
	Pito	1	X		X		X		X		X		X			
	Cometas	2	X		X		X		X		X		X			
	Freno de servicio	Completa	X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia	Completa	X		X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad	2	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	X		X		X		X		X		X			
	Limpia brisas	2	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buena condición	1	X		X		X		X		X		X			
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Seguros de capot	2	X		X		X		X		X		X			
	Hora inicial diaria	Completo	X		X		X		X		X		X			
TABLERO DE INSTRUMENTOS	Temperatura caja	1	X		X		X		X		X		X			
	Temperatura diferencial delantera	1	X		X		X		X		X		X			
	Temperatura diferencial trasera	1	X		X		X		X		X		X			
	Temperatura motor revisar	1	X		X		X		X		X		X			
	Temperatura agua motor revisar	1	X		X		X		X		X		X			
	Pisada freno revisar	1	X		X		X		X		X		X			
	Pirómetro	1	X		X		X		X		X		X			
	Códigos de falla	1	X		X		X		X		X		X			
	Carga baterias	2	X		X		X		X		X		X			
SISTEMA DE DIRECCIÓN	Deposito hidráulico	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Golpe al dar dirección	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Vibradera	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Dirección jala para la derecha o izquierda	1	X		X		X		X		X		X			
	Timón	1	X		X		X		X		X		X			
	Caja de dirección principal fugas	1	X		X		X		X		X		X			
	Caja de dirección auxiliar fugas	1	X		X		X		X		X		X			
	Mangueras sistema de dirección	Completo	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS Y RINES	Llanta delantera (li)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta delantera (ld)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha delantera interna (ld)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha delantera externa (ld)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha delantera interna (li)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha delantera externa (li)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha trasera interna (ld)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha trasera externa (ld)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha trasera interna (li)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha trasera externa (li)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta de repuesto	1	X		X		X		X		X		X			
	Rines	10	X		X		X		X		X		X			
	Presión llantas	10	X		X		X		X		X		X			

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO MOTOR	Separador de agua-combustible - drenar	1	X		X		X		X		X		X			
	Nivel del aceite lubricante - revisar	FULL	X		X		X		X		X		X			
	Nivel del refrigerante - revisar	FULL	X		X		X		X		X		X			
	Ventilador de enfriamiento - revisar	1	X		X		X		X		X		X			
	Bandas impulsoras - revisar	2	X		X		X		X		X		X			
	Tubería de admisión de aire - revisar	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Tubo del respiradero del cárter - revisar	1	X		X		X		X		X		X			
	Tanques y depósitos de aire - drenar	2	X		X		X		X		X		X			
	Tubería de escape de pos tratamiento - r	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Tubería de carga de aire - revisar	Completo	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO SUSPENSIÓN	Suspensión delantera - bujes, pasadores, balancín	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Suspensión delantera - muelles y grapas	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Suspensión delantera - amortiguadores	2	X		X		X		X		X		X			
	Suspensión delantera - fugas tapa, grasera (ld, li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Suspensión delantera - frenos delanteros (ld, li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Suspensión delantera - retenedor delantero (ld,li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Ruido extraño (traqueteo,caja de cubiertos,	1	X		X		X		X		X		X			
	(traqueteo) en movimiento al girar hacia la derecha	1	X		X		X		X		X		X			
	Ruido extraño (traqueteo) en movimiento al girar hacia	1	X		X		X		X		X		X			
	Cadena del cardan.	1	X		X		X		X		X		X			
	Embrague (duro - ruido)	1	X		X		X		X		X		X			
	Acoples rápidos.	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Caja velocidades - funcionamiento	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Freno de seguridad (en la cabina)	Completo	X		X		X		X		X		X			
VOLCO	Manguera (rasgadas,gruñidas, cristalizadas)	2	X		X		X		X		X		X			
	Manguera deposito aceite (rasgadas, gruñidas,	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo apertura puerta	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Cachucha de protección cabina	2	X		X		X		X		X		X			
	Controles desde cabina	2	X		X		X		X		X		X			
	Bisagra trasera	1	X		X		X		X		X		X			
	Seguros compuerta	2	X		X		X		X		X		X			
	Fisuras	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Cilindro telescópico	1	X		X		X		X		X		X			
	Otros															
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	1	X		X		X		X				X			
	Extintor (20 Lb)	1	X		X		X		X				X			
	Botiquin	1	X		X		X		X				X			
	Pala antichispa	1	X		X		X		X				X			
	Otros:															
VoBo HSE			Yaylis Guerra P.						Yaylis Guerra P.							

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección prooperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si_ no

OBSERVACIONES:

NOMBRE CONDUCTOR

JAVIER OJEDA

NOMBRE ING RESIDENTE

Carlos A. Mercado Z

CONSORCIO PUERTO CLAVER

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

CONTRATO: 050 DE 2025 LOCALIZACION: [illegible] MODELO: 2015 MARCA:

PLACAS: SRL - 180 INSPECCIONADO POR: [illegible] SEMANA: DEL 02 DE 03 /2026 AL

DE 03/03 DE 2026

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz de media (ld/li)	4	X		X		X		X		X		X			
	Luz dia (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz alta (ld/li)	4	X		X		X		X		X		X			
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2	X		X		X		X		X					
	Luz direccional delantera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz direccional trasera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz de pisada del freno	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz direccional volco	12	X		X		X		X		X		X			
	Licuadoras	2	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Espejos laterales	2	X		X		X		X		X		X			
	Sistema limpia parabrizas	2	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X			
	Pito	1	X		X		X		X		X		X			
	Cometas	2	X		X		X		X		X		X			
	Freno de servicio	Completa	X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia	Completa	X		X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad	2	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	X		X		X		X		X		X			
	Limpia brisas	2	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buena condición	1	X		X		X		X		X		X			
	Cables de la bateria (revise si los cables del	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Seguros de capot	2	X		X		X		X		X		X			
	Hora inicial diaria	Completo	X		X		X		X		X		X			
TABLERO DE INSTRUMENTOS	Temperatura caja	1	X		X		X		X		X		X			
	Temperatura diferencial delantera	1	X		X		X		X		X		X			
	Temperatura diferencial trasera	1	X		X		X		X		X		X			
	Temperatura motor revisar	1	X		X		X		X		X		X			
	Temperatura agua motor revisar	1	X		X		X		X		X		X			
	Pisada freno revisar	1	X		X		X		X		X		X			
	Pirómetro	1	X		X		X		X		X		X			
	Códigos de falla	1	X		X		X		X		X		X			
	Carga baterías	2	X		X		X		X		X		X			
SISTEMA DE DIRECCIÓN	Deposito hidráulico	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Golpe al dar dirección	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Vibradera	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Dirección jala para la derecha o izquierda	1	X		X		X		X		X		X			
	Timón	1	X		X		X		X		X		X			
	Caja de dirección principal fugas	1	X		X		X		X		X		X			
	Caja de dirección auxiliar fugas	1	X		X		X		X		X		X			
	Mangueras sistema de dirección	Completo	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS Y RINES	Llanta delantera (li)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta delantera (ld)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha delantera interna (ld)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha delantera externa (ld)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha delantera interna (li)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha delantera externa (li)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha trasera interna (ld)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha trasera externa (ld)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha trasera interna (li)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha trasera externa (li)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta de repuesto	1	X		X		X		X		X		X			
	Rines	10	X		X		X		X		X		X			
	Presión llantas	10	X		X		X		X		X		X			

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO MOTOR	Separador de agua-combustible - drenar	1														
	Nivel del aceite lubricante - revisar	FULL														
	Nivel del refrigerante - revisar	FULL														
	Ventilador de enfriamiento - revisar	1														
	Bandas impulsoras - revisar	2														
	Tubería de admisión de aire - revisar	Completo														
	Tubo del respiradero del cárter - revisar	1														
	Tangues y depósitos de aire - drenar	2														
	Tubería de escape de pos tratamiento - r	Completo														
	Tubería de carga de aire - revisar	Completo														
ESTADO MECANICO SUSPENSIÓN	Suspensión delantera - bujes, pasadores, balancín	Completo														
	Suspensión delantera - muelles y grapas	Completo														
	Suspensión delantera - amortiguadores	2														
	Suspensión delantera - fugas tapa, grasera (ld, li)	2														
	Suspensión delantera - frenos delanteros (ld, li)	2														
	Suspensión delantera - retenedor delantero (ld,li)	2														
	Ruido extraño (traqueteo,caja de cubiertos,	1														
	(traqueteo) en movimiento al girar hacia la derecha	1														
	Ruido extraño (traqueteo) en movimiento al girar hacia	1														
	Cadena del cardan.	1														
	Embrague (duro - ruido)	1														
	Acoples rápidos.	Completo														
	Caja velocidades - funcionamiento	Completo														
	Freno de seguridad (en la cabina)	Completo														
VOLCO	Manguera (rasgadas,gruñidas, cristalizadas)	2														
	Manguera deposito aceite (rasgadas, gruñidas,	Completo														
	Mecanismo apertura puerta	Completo														
	Cachucha de protección cabina	2														
	Controles desde cabina	2														
	Bisagra trasera	1														
	Seguros compuerta	2														
	Fisuras	Completo														
	Cilindro telescópico	1														
	Otros															
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	1														
	Extintor (20 Lb)	1														
	Botiquin	1														
	Pala antichispa	1														
	Otros:															

VoBo HSE Yaneth Guerra P. Yaneth Guerra P.

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si no

OBSERVACIONES:

NOMBRE CONDUCTOR Yeferson Pereira

NOMBRE ING RESIDENTE Carlos A. Mercado Z

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

CONTRATO: 059 DE 2025 LOCALIZACION: [illegible] MODELO: [illegible] MARCA:

PLACAS: 801-802 INSPECCIONADO POR: [illegible] SEMANA: DEL 02 DE 03 AL

DE 08/03 DE 2026

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2														
	Luz de media (ld/li)	4														
	Luz dia (ld/li)	2														
	Luz alta (ld/li)	4														
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2														
	Luz direccional delantera (ld/li)	2														
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2														
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2														
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2														
	Luz direccional trasera (ld/li)	2														
	Luz de pisada del freno	2														
	Luz direccional volco	12														
	Licuadoras	2														
CABINA	Espejos laterales	2														
	Sistema limpia parabrizas	2														
	Alarma de retroceso	1														
	Pito	1														
	Cometas	2														
	Freno de servicio	Completa														
	Freno de emergencia	Completa														
	Cinturón de seguridad	2														
	Vidrio frontal (en buen estado)	1														
	Limpia brisas	2														
	Asiento en buena condición	1														
	Cables de la bateria (revise si los cables del	Completo														
	Seguros de capot	2														
	Hora inicial diana	Completo														
TABLERO DE INSTRUMENTOS	Temperatura caja	1														
	Temperatura diferencial delantera	1														
	Temperatura diferencial trasera	1														
	Temperatura motor revisar	1														
	Temperatura agua motor revisar	1														
	Pisada freno revisar	1														
	Pirómetro	1														
	Códigos de falla	1														
	Carga baterias	2														
SISTEMA DE DIRECCIÓN	Deposito hidráulico	Completo														
	Golpe al dar dirección	Completo														
	Vibradera	Completo														
	Dirección jala para la derecha o izquierda	1														
	Timón	1														
	Caja de dirección principal fugas	1														
	Caja de dirección auxiliar fugas	1														
	Mangueras sistema de dirección	Completo														
LLANTAS Y RINES	Llanta delantera (li)	1														
	Llanta delantera (ld)	1														
	Llanta pacha delantera interna (ld)	1														
	Llanta pacha delantera externa (ld)	1														
	Llanta pacha delantera interna (li)	1														
	Llanta pacha delantera externa (li)	1														
	Llanta pacha trasera interna (ld)	1														
	Llanta pacha trasera externa (ld)	1														
	Llanta pacha trasera interna (li)	1														
	Llanta pacha trasera externa (li)	1														
	Llanta de repuesto	1														
	Rines	10														
	Presión llantas	10														

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO MOTOR	Separador de agua-combustible - drenar	1	X		X		X		X		X		X			
	Nivel del aceite lubricante - revisar	FULL	X		X		X		X		X		X			
	Nivel del refrigerante - revisar	FULL	X		X		X		X		X		X			
	Ventilador de enfriamiento - revisar	1	X		X		X		X		X		X			
	Bandas impulsoras - revisar	2	X		X		X		X		X		X			
	Tubería de admisión de aire - revisar	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Tubo del respiradero del cárter - revisar	1	X		X		X		X		X		X			
	Tanques y depósitos de aire - drenar	2	X		X		X		X		X		X			
	Tubería de escape de pos tratamiento - r	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Tubería de carga de aire - revisar	Completo	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO SUSPENSIÓN	Suspensión delantera - bujes, pasadores, balancín	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Suspensión delantera - muelles y grapas	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Suspensión delantera - amortiguadores	2	X		X		X		X		X		X			
	Suspensión delantera - fugas tapa, grasera (ld, li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Suspensión delantera - frenos delanteros (ld, li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Suspensión delantera - retenedor delantero (ld,li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Ruido extraño (traqueteo,caja de cubiertos,	1	X		X		X		X		X		X			
	(traqueteo) en movimiento al girar hacia la derecha	1	X		X		X		X		X		X			
	Ruido extraño (traqueteo) en movimiento al girar hacia	1	X		X		X		X		X		X			
	Cadena del cardan.	1	X		X		X		X		X		X			
	Embrague (duro - ruido)	1	X		X		X		X		X		X			
	Acoples rápidos.	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Caja velocidades - funcionamiento	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Freno de seguridad (en la cabina)	Completo	X		X		X		X		X		X			
VOLCO	Manguera (rasgadas,gruñidas, cristalizadas)	2	X		X		X		X		X		X			
	Manguera deposito aceite (rasgadas, gruñidas,	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo apertura puerta	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Cachucha de protección cabina	2	X		X		X		X		X		X			
	Controles desde cabina	2	X		X		X		X		X		X			
	Bisagra trasera	1	X		X		X		X		X		X			
	Seguros compuerta	2	X		X		X		X		X		X			
	Fisuras	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Cilindro telescópico	1	X		X		X		X		X		X			
	Otros															
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	1	X		X		X		X		X		X			
	Extintor (20 Lb)	1	X		X		X		X		X		X			
	Botiquin	1	X		X		X		X		X		X			
	Pala antichispa	1	X		X		X		X		X		X			
	Otros:															
VoBo HSE			Yaylis Guerra B.		Yaylis Guerra B.											

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si_ no

OBSERVACIONES:

NOMBRE CONDUCTOR

Javier Candia

NOMBRE ING RESIDENTE

Carlos A. Mercado Z

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

CONTRATO: 050 DE 2025 LOCALIZACION: [illegible] MODELO: MARCA:

PLACAS: 551 - 552 INSPECCIONADO POR: [illegible] SEMANA: DEL 09 DE 03/2026 AL

DE 05/03 DE 2026

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz de media (ld/li)	4	X		X		X		X		X		X			
	Luz dia (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz alta (ld/li)	4	X		X		X		X		X		X			
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz direccional delantera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz direccional trasera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz de pisada del freno	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz direccional volco	12	X		X		X		X		X		X			
	Licuadoras	2	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Espejos laterales	2	X		X		X		X		X		X			
	Sistema limpia parabrizas	2	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X			
	Pito	1	X		X		X		X		X		X			
	Cometas	2	X		X		X		X		X		X			
	Freno de servicio	Completa	X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia	Completa	X		X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad	2	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	X		X		X		X		X		X			
	Limpia brisas	2	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buena condición	1	X		X		X		X		X		X			
	Cables de la bateria (revise si los cables del	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Seguros de capot	2	X		X		X		X		X		X			
	Hora inicial diaria	Completo	X		X		X		X		X		X			
TABLERO DE INSTRUMENTOS	Temperatura caja	1	X		X		X		X		X		X			
	Temperatura diferencial delantera	1	X		X		X		X		X		X			
	Temperatura diferencial trasera	1	X		X		X		X		X		X			
	Temperatura motor revisar	1	X		X		X		X		X		X			
	Temperatura agua motor revisar	1	X		X		X		X		X		X			
	Pisada freno revisar	1	X		X		X		X		X		X			
	Pirómetro	1	X		X		X		X		X		X			
	Códigos de falla	1	X		X		X		X		X		X			
	Carga baterias	2	X		X		X		X		X		X			
SISTEMA DE DIRECCIÓN	Deposito hidráulico	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Golpe al dar dirección	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Vibradera	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Dirección jala para la derecha o izquierda	1	X		X		X		X		X		X			
	Timón	1	X		X		X		X		X		X			
	Caja de dirección principal fugas	1	X		X		X		X		X		X			
	Caja de dirección auxiliar fugas	1	X		X		X		X		X		X			
	Mangueras sistema de dirección	Completo	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS Y RINES	Llanta delantera (li)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta delantera (ld)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha delantera interna (ld)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha delantera externa (ld)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha delantera interna (li)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha delantera externa (li)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha trasera interna (ld)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha trasera externa (ld)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha trasera interna (li)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha trasera externa (li)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta de repuesto	1	X		X		X		X		X		X			
	Rines	10	X		X		X		X		X		X			
	Presión llantas	10	X		X		X		X		X		X			

CONSORCIO PUERTO CLAVER

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO MOTOR	Separador de agua-combustible - drenar	1	X		X		X		X		X					
	Nivel del aceite lubricante - revisar	FULL	X		X		X		X		X					
	Nivel del refrigerante - revisar	FULL	X		X		X		X		X					
	Ventilador de enfriamiento - revisar	1	X		X		X		X		X					
	Bandas impulsoras - revisar	2	X		X		X		X		X					
	Tubería de admisión de aire - revisar	Completo	X		X		X		X		X					
	Tubo del respiradero del cárter - revisar	1	X		X		X		X		X					
	Tanques y depósitos de aire - drenar	2	X		X		X		X		X					
	Tubería de escape de pos tratamiento - r	Completo	X		X		X		X		X					
	Tubería de carga de aire - revisar	Completo	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO SUSPENSIÓN	Suspensión delantera - bujes, pasadores, balancín	Completo	X		X		X		X		X					
	Suspensión delantera - muelles y grapas	Completo	X		X		X		X		X					
	Suspensión delantera - amortiguadores	2	X		X		X		X		X					
	Suspensión delantera - fugas tapa, grasera (ld, li)	2	X		X		X		X		X					
	Suspensión delantera - frenos delanteros (ld, li)	2	X		X		X		X		X					
	Suspensión delantera - retenedor delantero (ld,li)	2	X		X		X		X		X					
	Ruido extraño (traqueteo,caja de cubiertos,	1	X		X		X		X		X					
	(traqueteo) en movimiento al girar hacia la derecha	1	X		X		X		X		X					
	Ruido extraño (traqueteo) en movimiento al girar hacia	1	X		X		X		X		X					
	Cadena del cardan.	1	X		X		X		X		X					
	Embrague (duro - ruido)	1	X		X		X		X		X					
	Acoples rápidos.	Completo	X		X		X		X		X					
	Caja velocidades - funcionamiento	Completo	X		X		X		X		X					
	Freno de seguridad (en la cabina)	Completo	X		X		X		X		X					
VOLCO	Manguera (rasgadas,gruñidas, cristalizadas)	2	X		X		X		X		X					
	Manguera deposito aceite (rasgadas, gruñidas,	Completo	X		X		X		X		X					
	Mecanismo apertura puerta	Completo	X		X		X		X		X					
	Cachucha de protección cabina	2	X		X		X		X		X					
	Controles desde cabina	2	X		X		X		X		X					
	Bisagra trasera	1	X		X		X		X		X					
	Seguros compuerta	2	X		X		X		X		X					
	Fisuras	Completo	X		X		X		X		X					
	Cilindro telescópico	1	X		X		X		X		X					
	Otros															
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	1	X		X		X		X		X					
	Extintor (20 Lb)	1	X		X		X		X		X					
	Botiquin	1	X		X		X		X		X					
	Pala antichispa	1	X		X		X		X		X					
	Otros:															
	VoBo HSE		Yaquelis Guerra P.				Yaquelis Guerra P.									

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si_ no

OBSERVACIONES:

NOMBRE CONDUCTOR

JAVIER GANDIA

NOMBRE ING RESIDENTE

Carlos A. Mercado Z

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

CONTRATO: 050 DE 2025 LOCALIZACION: Sector 7 MODELO: MARCA: AL

PLACAS: SLC-180 INSPECCIONADO POR: SLO SEMANA: DEL 06 DE 04 / 2026

DE 06/04 DE 2026

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz de media (ld/li)	4	X		X		X		X		X		X			
	Luz dia (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz alta (ld/li)	4	X		X		X		X		X		X			
	Luz estacionana delantera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz direccional delantera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz direccional trasera (ld/li)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz de pisada del freno	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz direccional volco	12	X		X		X		X		X		X			
	Licuadoras	2	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Espejos laterales	2	X		X		X		X		X		X			
	Sistema limpia parabrizas	2	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X			
	Pito	1	X		X		X		X		X		X			
	Cometas	2	X		X		X		X		X		X			
	Freno de servicio	Completa	X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia	Completa	X		X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad	2	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	X		X		X		X		X		X			
	Limpia brisas	2	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buena condición	1	X		X		X		X		X		X			
	Cables de la bateria (revise si los cables del	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Seguros de capot	2	X		X		X		X		X		X			
	Hora inicial diaria	Completo	X		X		X		X		X		X			
TABLERO DE INSTRUMENTOS	Temperatura caja	1	X		X		X		X		X		X			
	Temperatura diferencial delantera	1	X		X		X		X		X		X			
	Temperatura diferencial trasera	1	X		X		X		X		X		X			
	Temperatura motor revisar	1	X		X		X		X		X		X			
	Temperatura agua motor revisar	1	X		X		X		X		X		X			
	Pisada freno revisar	1	X		X		X		X		X		X			
	Pirómetro	1	X		X		X		X		X		X			
	Códigos de falla	1	X		X		X		X		X		X			
	Carga baterías	2	X		X		X		X		X		X			
SISTEMA DE DIRECCIÓN	Deposito hidráulico	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Golpe al dar dirección	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Vibradera	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Dirección jala para la derecha o izquierda	1	X		X		X		X		X		X			
	Timón	1	X		X		X		X		X		X			
	Caja de dirección principal fugas	1	X		X		X		X		X		X			
	Caja de dirección auxiliar fugas	1	X		X		X		X		X		X			
	Mangueras sistema de dirección	Completo	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS Y RINES	Llanta delantera (li)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta delantera (ld)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha delantera interna (ld)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha delantera externa (ld)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha delantera interna (li)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha delantera externa (li)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha trasera interna (ld)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha trasera externa (ld)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha trasera interna (li)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta pacha trasera externa (li)	1	X		X		X		X		X		X			
	Llanta de repuesto	1	X		X		X		X		X		X			
	Rines	10	X		X		X		X		X		X			
	Presión llantas	10	X		X		X		X		X		X			

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO MOTOR	Separador de agua-combustible - drenar	1	X		X		X		X		X					
	Nivel del aceite lubricante - revisar	FULL	X		X		X		X		X					
	Nivel del refrigerante - revisar	FULL	X		X		X		X		X					
	Ventilador de enfriamiento - revisar	1	X		X		X		X		X					
	Bandas impulsoras - revisar	2	X		X		X		X		X					
	Tubería de admisión de aire - revisar	Completo	X		X		X		X		X					
	Tubo del respiradero del cárter - revisar	1	X		X		X		X		X					
	Tanques y depósitos de aire - drenar	2	X		X		X		X		X					
	Tubería de escape de pos tratamiento - r	Completo	X		X		X		X		X					
	Tubería de carga de aire - revisar	Completo	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO SUSPENSIÓN	Suspensión delantera - bujes, pasadores, balancín	Completo	X		X		X		X		X					
	Suspensión delantera - muelles y grapas	Completo	X		X		X		X		X					
	Suspensión delantera - amortiguadores	2	X		X		X		X		X					
	Suspensión delantera - fugas tapa, grasera (ld, li)	2	X		X		X		X		X					
	Suspensión delantera - frenos delanteros (ld, li)	2	X		X		X		X		X					
	Suspensión delantera - retenedor delantero (ld,li)	2	X		X		X		X		X					
	Ruido extraño (traqueteo,caja de cubiertos,	1	X		X		X		X		X					
	(traqueteo) en movimiento al girar hacia la derecha	1	X		X		X		X		X					
	Ruido extraño (traqueteo) en movimiento al girar hacia	1	X		X		X		X		X					
	Cadena del cardan.	1	X		X		X		X		X					
	Embrague (duro - ruido)	1	X		X		X		X		X					
	Acoples rápidos.	Completo	X		X		X		X		X					
	Caja velocidades - funcionamiento	Completo	X		X		X		X		X					
	Freno de seguridad (en la cabina)	Completo	X		X		X		X		X					
VOLCO	Manguera (rasgadas,gruñidas, cristalizadas)	2	X		X		X		X		X					
	Manguera deposito aceite (rasgadas, gruñidas,	Completo	X		X		X		X		X					
	Mecanismo apertura puerta	Completo	X		X		X		X		X					
	Cachucha de protección cabina	2	X		X		X		X		X					
	Controles desde cabina	2	X		X		X		X		X					
	Bisagra trasera	1	X		X		X		X		X					
	Seguros compuerta	2	X		X		X		X		X					
	Fisuras	Completo	X		X		X		X		X					
	Cilindro telescópico	1	X		X		X		X		X					
	Otros										X					
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	1	X		X		X		X		X					
	Extintor (20 Lb)	1	X		X		X		X		X					
	Botiquin	1	X		X		X		X		X					
	Pala antichispa	1	X		X		X		X		X					
	Otros:															
VoBo HSE			Paulis Guerra P.						Paulis Guerra P.							

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si_ no

OBSERVACIONES:

NOMBRE CONDUCTOR Yeiner Acevedo

NOMBRE ING RESIDENTE Carlos A. Mercado Z

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

CONTRATO: 050 DE 2025 LOCALIZACION: [illegible] MODELO: [illegible] MARCA: AL

PLACAS: [illegible] INSPECCIONADO POR: [illegible] SEMANA: DEL 06 DE 04 / 2026

DE 12/04/ DE 2026

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN.		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2			X				X							
	Luz de media (ld/li)	4			X				X							
	Luz dia (ld/li)	2			X				X							
	Luz alta (ld/li)	4			X				X							
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2			X				X							
	Luz direccional delantera (ld/li)	2			X				X							
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2			X				X							
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2			X				X							
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2			X				X							
	Luz direccional trasera (ld/li)	2			X				X							
	Luz de pisada del freno	2			X				X							
	Luz direccional volco	12			X				X							
	Licuadoras	2			X				X							
CABINA	Espejos laterales	2			X				X							
	Sistema limpia parabrizas	2			X				X							
	Alarma de retroceso	1			X				X							
	Pito	1			X				X							
	Cometas	2			X				X							
	Freno de servicio	Completa			X				X							
	Freno de emergencia	Completa			X				X							
	Cinturón de seguridad	2			X				X							
	Vidrio frontal (en buen estado)	1			X				X							
	Limpia brisas	2			X				X							
	Asiento en buena condición	1			X				X							
	Cables de la bateria (revise si los cables del	Completo			X				X							
	Seguros de capot	2			X				X							
	Hora inicial diaria	Completo			X				X							
TABLERO DE INSTRUMENTOS	Temperatura caja	1			X				X							
	Temperatura diferencial delantera	1			X				X							
	Temperatura diferencial trasera	1			X				X							
	Temperatura motor revisar	1			X				X							
	Temperatura agua motor revisar	1			X				X							
	Pisada freno revisar	1			X				X							
	Pirómetro	1			X				X							
	Códigos de falla	1			X				X							
	Carga baterias	2			X				X							
SISTEMA DE DIRECCIÓN	Deposito hidráulico	Completo			X				X							
	Golpe al dar dirección	Completo			X				X							
	Vibradera	Completo			X				X							
	Dirección jala para la derecha o izquierda	1			X				X							
	Timón	1			X				X							
	Caja de dirección principal fugas	1			X				X							
	Caja de dirección auxiliar fugas	1			X				X							
	Mangueras sistema de dirección	Completo			X				X							
LLANTAS Y RINES	Llanta delantera (li)	1			X				X							
	Llanta delantera (ld)	1			X				X							
	Llanta pacha delantera interna (ld)	1			X				X							
	Llanta pacha delantera externa (ld)	1			X				X							
	Llanta pacha delantera interna (li)	1			X				X							
	Llanta pacha delantera externa (li)	1			X				X							
	Llanta pacha trasera interna (ld)	1			X				X							
	Llanta pacha trasera externa (ld)	1			X				X							
	Llanta pacha trasera interna (li)	1			X				X							
	Llanta pacha trasera externa (li)	1			X				X							
	Llanta de repuesto	1			X				X							
	Rines	10			X				X							
	Presión llantas	10			X				X							

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO MOTOR	Separador de agua-combustible - drenar	1			X				X							
	Nivel del aceite lubricante - revisar	FULL			X				X							
	Nivel del refrigerante - revisar	FULL			X				X							
	Ventilador de enfriamiento - revisar	1			X				X							
	Bandas impulsoras - revisar	2			X				X							
	Tubería de admisión de aire - revisar	Completo			X				X							
	Tubo del respiradero del cárter - revisar	1			X				X							
	Tanques y depósitos de aire - drenar	2			X				X							
	Tubería de escape de pos tratamiento - r	Completo			X				X							
	Tubería de carga de aire - revisar	Completo			X				X							
ESTADO MECANICO SUSPENSIÓN	Suspensión delantera - bujes, pasadores, balancín	Completo			X				X							
	Suspensión delantera - muelles y grapas	Completo			X				X							
	Suspensión delantera - amortiguadores	2			X				X							
	Suspensión delantera - fugas tapa, grasera (ld, li)	2			X				X							
	Suspensión delantera - frenos delanteros (ld, li)	2			X				X							
	Suspensión delantera - retenedor delantero (ld,li)	2			X				X							
	Ruido extraño (traqueteo,caja de cubiertos,	1			X				X							
	(traqueteo) en movimiento al girar hacia la derecha	1			X				X							
	Ruido extraño (traqueteo) en movimiento al girar hacia	1			X				X							
	Cadena del cardan.	1			X				X							
	Embrague (duro - ruido)	1			X				X							
	Acoples rápidos.	Completo			X				X							
	Caja velocidades - funcionamiento	Completo			X				X							
	Freno de segundad (en la cabina)	Completo			X				X							
VOLCO	Manguera (rasgadas,gruñidas, cristalizadas)	2			X				X							
	Manguera deposito aceite (rasgadas, gruñidas,	Completo			X				X							
	Mecanismo apertura puerta	Completo			X				X							
	Cachucha de protección cabina	2			X				X							
	Controles desde cabina	2			X				X							
	Bisagra trasera	1			X				X							
	Seguros compuerta	2			X				X							
	Fisuras	Completo			X				X							
	Cilindro telescópico	1			X				X							
	Otros															
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	1			X				X							
	Extintor (20 Lb)	1			X				X							
	Botiquin	1			X				X							
	Pala antichispa	1			X				X							
	Otros:															

VoBo HSE — Paulis Guerra P.

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si_ no

OBSERVACIONES:

NOMBRE CONDUCTOR

JAVIER OROZCO

NOMBRE ING RESIDENTE

Carlos A. Mercado Z

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

PRECPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

REFERENCIA _____ MODELO 2023 MARCA XCMG TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Retroexcavadora

No. INTERNO RC616769 CAPACIDAD _____ PERIODO EVALUADO 02/02/2026 AL 03/02/2026 CERTIFICADO OPERADOR NUMERO _____ VENCE _____

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN 350220004545128. SERIAL _____ *PRCE _____

*CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA _____

CONTRATO N° 050 DE 2025

OBJETO DE CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 25, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				X		X		X		X		X			
	Indicador de temperatura				X		X		X		X		X			
	Indicador de aceite				X		X		X		X		X			
	Indicador de batería				X		X		X		X		X			
	Indicador de refrigerante				X		X		X		X		X			
	Indicador de combustible				X		X		X		X		X			
	Indicador de filtro de aire				X		X		X		X		X			
	*Horometro				X		X		X		X		X			
LUCES	*Frontales de trabajo				X		X		X		X		X			
	*Traseras de trabajo (Reflector)				X		X		X		X		X			
	Señales de giro (derecha, izquierda)				X		X		X		X		X			
	*Baliza				X		X		X		X		X			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X			
	*Nivel de aceite en la transmision (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X			
GENERAL	*Espejo central convexo				X		X		X		X		X			
	*Espejos laterales				X		X		X		X		X			
	*Alarma de retroceso				X		X		X		X		X			
	Pito				X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio				X		X		X		X		X			
	* Freno de estacionamiento				X		X		X		X		X			
	*Cinturones de seguridad				X		X		X		X		X			
	Vidrio Panoramico				X		X		X		X		X			
	*Kit para Derrames				X		X		X		X		X			
	*Extintor de incendios Capacidad POS				X		X		X		X		X			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)				X		X		X		X		X			
	Asiento				X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso				X		X		X		X		X			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				X		X		X		X		X			
	Presión de aire de las llantas				X		X		X		X		X			
MECÁNICO	* Servotransmisión				X		X		X		X		X			
	* Dirección				X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores				X		X		X		X		X			
	Estado y tension de las correas				X		X		X		X		X			
	Estado de pedales				X		X		X		X		X			
	Estado de Orugas (tensionadas)				X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas				X		X		X		X		X			
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación				X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Tomamesa)				X		X		X		X		X			
	*Bomba Hidráulica				X		X		X		X		X			
	Corona de tomamesa en buen estado				X		X		X		X		X			
	*Mandos de avance				X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento				X		X		X		X		X			
	Estado general desgarrador (balde)				X		X		X		X		X			
	*Mandos de levante del brazo				X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de aire				X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de combustible				X		X		X		X		X			
	Pasadores y tornillos en buen estado				X		X		X		X		X			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)				X		X		X		X		X			
	* Resguardos				X		X		X		X		X			
	Anclajes de contrapeso				X		X		X		X		X			
	Guardas				X		X		X		X		X			
	Estado del bastidor				X		X		X		X		X			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				X		X		X		X		X			
	*Motor sin grietas				X		X		X		X		X			
	Exosto (Humo de escape)				X		X		X		X		X			

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

Operador	Nombre																		
	Firma																		
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre																		
	Firma																		

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	5288,7	5288,7	0,0	
MARTES	5288,7	5295.2	6.5	
MIERCOLES	5295.2	5302,7	7.5	
JUEVES	5302.7	5308.2	5.5	
VIERNES	5312.7	5312.7	4.5	
SABADO	5312.7	5316.2	- 3.5	
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los items (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los items que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACION Y ACEPTACION

Con el presente acuerdo de las partes se deja constancia que la maquinaria descrita para ejecutar el Proyecto cumple a satisfacción con todos los ítems evaluados.

NOTAS

TIPO: Categoría de maquinaria especificada en Ficha Técnica de la Máquina
REFERENCIA: Clasificación de maquinaria según fabricante (Ejemplo: Marca, Línea, modelo, Clase, etc.)
No. INTERNO: Identificación interna empleada por la obra para maquinaria del Proyecto
MODELO: Año de fabricación de la Máquina
CAPACIDAD: Capacidad nominal en No. de pasajeros o carga según especificación técnica
N.A: No aplica

Firma: _____
Nombre: Carlos A. Mercado T
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo Bo

Firma: _____
Nombre: _____
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoria

Original: Dependencia responsable del contrato
Duplicado: Interventor
Triplicado: Contratista

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

REFERENCIA _____ MODELO 2023 MARCA XCMG TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Retroexcavadora

No. INTERNO MC 610769 CAPACIDAD _____ PERIODO EVALUADO 09/12/2025 AL 15/02/2026

	NUMERO	VENCE
*CERTIFICADO OPERADOR		
*PRCE		
*CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA		

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN 35022000545128 SERIAL _____

CONTRATO N° 050 DE 2025

OBJETO DE CONTRATO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 36 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de bateria		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de refrigerante		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de combustible		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de filtro de aire		X		X		X		X		X		X			
	*Horometro		X		X		X		X		X		X			
LUCES	*Frontales de trabajo		X		X		X		X		X		X			
	*Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X			
	Señales de giro (derecha, izquierda)		X		X		X		X		X		X			
	*Baliza		X		X		X		X		X		X			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
GENERAL	*Espejo central convexo		X		X		X		X		X		X			
	*Espejos laterales		X		X		X		X		X		X			
	*Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X			
	Pito		X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X		X			
	* Freno de estacionamiento		X		X		X		X		X		X			
	*Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X			
	Vidrio Panoramico		X		X		X		X		X		X			
	*Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X			
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		X		X		X		X		X		X			
	Asiento		X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso		X		X		X		X		X		X			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X			
	Presion de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X			
MECÁNICO	* Servotransmisión		X		X		X		X		X		X			
	* Dirección		X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores		X		X		X		X		X		X			
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X			
	Estado de pecalos		X		X		X		X		X		X			
	Estado de Orugas (tensionadas)		X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro y escalizacion cuchillas		X		X		X		X		X		X			
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Tomarneza)		X		X		X		X		X		X			
	*Bomba Hidráulica		X		X		X		X		X		X			
	Corona de tomarneza en buen estado		X		X		X		X		X		X			
	*Mandos de avance		X		X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento		X		X		X		X		X		X			
	Estado general desgarrador (balde)		X		X		X		X		X		X			
	*Mandos de levante del brazo		X		X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X			
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X		X		X		X			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X		X		X		X			
	* Resguardos		X		X		X		X		X		X			
	Anclajes de contrapeso		X		X		X		X		X		X			
	Guarcas		X		X		X		X		X		X			
	Estado del bastidor		X		X		X		X		X		X			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X			
	*Motor sin grietas		X		X		X		X		X		X			
	Exosto (Humo de escape)		X		X		X		X		X		X			

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

Operador	Nombre																		
	Firma																		
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre																		
	Firma																		

DIA	HORÓMETRO INICIO	HORÓMETRO FINAL	HORÓMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	5316.2	5325.2	9.	
MARTES	5325.2	5333.7	8.5	
MIERCOLES	5333.7	5341.4	7.7	
JUEVES	5341.4	5347.9	6.5	
VIERNES	5347.9	5353.3	5.4	
SABADO	5353.3	5359.5	6.2	
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la maquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecanico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y este determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACION Y ACEPTACION

Con el presente formato de listas de chequeo preoperacional de maquinaria, se da constancia que la maquina se encuentra para ser operada satisfactoriamente de acuerdo a las especificaciones.

NOTAS

TIPO: Corresponde a las características que definen la función de la Máquina
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de la Maquinaria
No. INTERNO: Identificación interna asignada por las Maquinas y Vehículos del Proyecto
MODELO: Año de fabricación de la Máquina
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No de pasajeros o carga transportada
N/A: No aplica

Firma: Carlos A. Mercado Z
Nombre:
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo Bo
Firma:
Nombre:
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoria

Original: Dependencia responsable del control
Una copia: interventor
Una copia: contratista

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

REFERENCIA _____ MODELO 2023 MARCA XCMG TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Retroexcavadora

No. INTERNO NCCORO89 CAPACIDAD _____ PERIODO EVALUADO 23/02/2026 al 01/03/2026 CERTIFICADO OPERADOR NUMERO _____ VENCE _____

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN 31022000477 SERIAL _____ *PRCE _____ *CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA _____

CONTRATO N° 050 DE 2025

OBJETO DE CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de bateria		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de refrigerante		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de combustible		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de filtro de aire		X		X		X		X		X		X			
	*Horometro		X		X		X		X		X		X			
LUCES	*Frontales de trabajo		X		X		X		X		X		X			
	*Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X			
	Señales de giro (derecha, izquierda)		X		X		X		X		X		X			
	*Baliza		X		X		X		X		X		X			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
GENERAL	*Espejo central convexo		X		X		X		X		X		X			
	*Espejos laterales		X		X		X		X		X		X			
	*Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X			
	Pito		X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X		X			
	* Freno de estacionamiento		X		X		X		X		X		X			
	*Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X			
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X			
	*Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X			
	*Extintor de incendios Capacidad: POS		X		X		X		X		X		X			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		X		X		X		X		X		X			
	Asiento		X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso		X		X		X		X		X		X			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		X		X		X		X		X		X			
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X			
MECÁNICO	* Servotransmisión		X		X		X		X		X		X			
	* Dirección		X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores		X		X		X		X		X		X			
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X			
	Estado de pedales		X		X		X		X		X		X			
	Estado de Orugas (tensionadas)		X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro y escalizacion cuchillas		X		X		X		X		X		X			
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Tornamesa)		X		X		X		X		X		X			
	*Bomba Hidráulica		X		X		X		X		X		X			
	Corona de tornamesa en buen estado		X		X		X		X		X		X			
	*Mandos de avance		X		X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento		X		X		X		X		X		X			
	Estado general desgarrador (balde)		X		X		X		X		X		X			
	*Mandos de levante del brazo		X		X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X			
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X		X		X		X			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X		X		X		X			
	* Resguardos		X		X		X		X		X		X			
	Anclajes de contrapeso		X		X		X		X		X		X			
	Guardas		X		X		X		X		X		X			
	Estado del bastidor		X		X		X		X		X		X			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X			
	*Motor sin grietas		X		X		X		X		X		X			
	Exosto (Humo de escape)		X		X		X		X		X		X			

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

| | | |

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

REFERENCIA _____ MODELO 213 MARCA XCMG TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Retroexcavadora

No. INTERNO NC6M769 CAPACIDAD _____ PERIODO EVALUADO 02/03/2026 AL 05/03/2026 *CERTIFICADO OPERADOR NUMERO _____ VENCE _____

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN 350220030418108 SERIAL _____ *PRCE _____

*CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA _____

CONTRATO N° 050 DE 2025

OBJETO DE CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de refrigerante		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de combustible		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de filtro de aire		X		X		X		X		X		X			
	*Horometro		X		X		X		X		X		X			
LUCES	*Frontales de trabajo		X		X		X		X		X		X			
	*Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X			
	Señales de giro (derecha, izquierda)		X		X		X		X		X		X			
	*Baliza		X		X		X		X		X		X			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
GENERAL	*Espejo central convexo		X		X		X		X		X		X			
	*Espejos laterales		X		X		X		X		X		X			
	*Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X			
	Pito		X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X		X			
	* Freno de estacionamiento		X		X		X		X		X		X			
	*Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X			
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X			
	*Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X			
	*Extintor de incendios Capacidad: POS		X		X		X		X		X		X			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		X		X		X		X		X		X			
	Asiento		X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso		X		X		X		X		X		X			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y s.n abultamientos)		X		X		X		X		X		X			
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X			
MECÁNICO	* Servotransmisión		X		X		X		X		X		X			
	* Dirección		X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores		X		X		X		X		X		X			
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X			
	Estado de pedales		X		X		X		X		X		X			
	Estado de Orugas (tensionadas)		X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro y escualizacion cuchillas		X		X		X		X		X		X			
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Tornameza)		X		X		X		X		X		X			
	*Bomba Hidráulica		X		X		X		X		X		X			
	Corona de tornameza en buen estado		X		X		X		X		X		X			
	*Mandos de avance		X		X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento		X		X		X		X		X		X			
	Estado general cesgarrador (balde)		X		X		X		X		X		X			
	*Mandos de levante del brazo		X		X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X			
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X		X		X		X			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X		X		X		X			
	* Resquardos		X		X		X		X		X		X			
	Anclajes de contrapeso		X		X		X		X		X		X			
	Guardas		X		X		X		X		X		X			
	Estado del bastidor		X		X		X		X		X		X			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X			
	*Motor sin grietas		X		X		X		X		X		X			
	Exosto (Humo de escape)		X		X		X		X		X		X			

CONSORCIO PUERTO CLAVER	CONSORCIO PUERTO CLAVER	PAGINA: 2 DE 2
	PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA	

Operador	Nombre																						
	Firma																						
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre																						
	Firma																						

DIA	HORIMETRO INICIO	HORIMETRO FINAL	HORIMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	5406.9	5414,6	8.5	
MARTES	5414,6	5421,1	6.5	
MIERCOLES	5421,1	5427,1	6	
JUEVES	5427,1	5432.1	5	
VIERNES	5432,1	5436.6	4.5	
SABADO	5436.6	5440.1	3.5	
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la maquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comunquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos, y este determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACION Y ACEPTACION

Con el presente registro de inspección preoperacional de maquinaria, se da a entender que la maquina se encuentra apta para ser usada en el Proyecto cumpliendo satisfactoriamente con todos los ítems evaluados.

NOTAS

TIPO: Conjunto de características que definen la función de la Máquina
REFERENCIA: Clasificación con la capacidad especificada establecida por el Fabricante de la Maquinaria
No. INTERNO: Identificación interna empleada por la Maquina o Contratista
MODELO: Año de fabricación de la Maquina
CAPACIDAD: Capacidad estimada en Kg de peso, para cargar o ser transportada
N.A: No aplica

(Firma) Carlos A. Mercado Z
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo.Bo (Firma)
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoria

Original: Dependencia responsable del contrato
Una copia: Interventor
Una copia: Contratista

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

REFERENCIA RC 622 XD MODELO 2023 MARCA Hyundai TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Excavadora

No. INTERNO CAPACIDAD M700 Ft PERIODO EVALUADO 26/09/2025 AL 09/02/2026 CERTIFICADO OPERADOR NUMERO VENCE

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN 352023000286693 SERIAL 2 *PRCE

*CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA

CONTRATO N° 050 DE 2025

OBJETO DE CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 35, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓				✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓				✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓				✓		✓			
	Indicador de batería		✓		✓		✓				✓		✓			
	Indicador de refrigerante		✓		✓		✓				✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓				✓		✓			
	Indicador de filtro de aire		✓		✓		✓				✓		✓			
	*Horometro		✓		✓		✓				✓		✓			
LUCES	*Frontales de trabajo		✓		✓		✓				✓		✓			
	*Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓				✓		✓			
	Señales de giro (derecha, izquierda)		✓		✓		✓				✓		✓			
	*Baliza		✓		✓		✓				✓		✓			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓				✓		✓			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓				✓		✓			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓				✓		✓			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓				✓		✓			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓				✓		✓			
GENERAL	*Espejo central convexo		✓		✓		✓				✓		✓			
	*Espejos laterales		✓		✓		✓				✓		✓			
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓				✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓				✓		✓			
	* Freno de servicio		✓		✓		✓				✓		✓			
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓				✓		✓			
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓				✓		✓			
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓				✓		✓			
	*Kit para Derrames		✓		✓		✓				✓		✓			
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓				✓		✓			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓				✓		✓			
	Asiento		✓		✓		✓				✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓				✓		✓			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓				✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓				✓		✓			
MECÁNICO	* Servotransmisión		✓		✓		✓				✓		✓			
	* Dirección		✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado de pasadores		✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado de pedales		✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado de Orugas (tensionadas)		✓		✓		✓				✓		✓			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		✓		✓		✓				✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornamesa)		✓		✓		✓				✓		✓			
	*Bomba hidráulica		✓		✓		✓				✓		✓			
	Corona de tornamesa en buen estado		✓		✓		✓				✓		✓			
	*Mandos de avance		✓		✓		✓				✓		✓			
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)		✓		✓		✓				✓		✓			
	*Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓				✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓				✓		✓			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓				✓		✓			
	* Resguardos		✓		✓		✓				✓		✓			
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓				✓		✓			
	Guardas		✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado del bastigo		✓		✓		✓				✓		✓			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓				✓		✓			
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓				✓		✓			
	Exosto (humo de escape)		✓		✓		✓				✓		✓			

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

Operador	Nombre	[illegible]		[illegible]		[illegible]					[illegible]		[illegible]				
	Firma																
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre																
	Firma																

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	3930.2	3935.7	5.5	
MARTES	3935.7	3942.7	7.	
MIERCOLES	3948.5	3948.5	58	
JUEVES				
VIERNES	3948.5	3951.0	2.5	
SABADO	3951.0	3959.1	8.1	
DOMINGO				

El incumplimento de cualquiera de los items (*) inhabilita la maquina para operar.
Para el resto de los items que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACION Y ACEPTACION

Con el presente reporte de [illegible] maquinaria [illegible] para [illegible] el Proyecto cumple [illegible] evaluado.

NOTAS

TIPO: Elemento de comunicación que define la función de la Máquina
REFERENCIA: Clase General a la cual pertenece la Máquina [illegible] Mecánico del Departamento de Maquinaria
No. INTERNO: Identificación asignada a la Máquina [illegible] Propiedad del Proyecto
MODELO: Año de fabricación de la Máquina
CAPACIDAD: Capacidad o medida en la cual [illegible] es transportada
N.A: No aplica

Firma: Carlos A. Mercado Z
Nombre:
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo. Bo.

Firma:
Nombre:
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Original: Dependencia responsable del control
Copia: para interventoría
Copia: para contratista

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

REFERENCIA _____ MODELO TSR (2021) MARCA CAT TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Vibrocompactador

No. INTERNO _____ CAPACIDAD 12 Ton PERIODO EVALUADO 02/02/2026 AL 03/02/2026 CERTIFICADO OPERADOR NUMERO _____ VENCE _____

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN _____ SERIAL 02/02/2026 *PRCE _____

CONTRATO N° 050 DE 2025 *CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA _____

OBJETO DE CONTRATO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 35 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables				X		X		X		X		X			
	Indicador de temperatura				X		X		X		X		X			
	Indicador de aceite				X		X		X		X		X			
	Indicador de bateria				X		X		X		X		X			
	Indicador de refrigerante				X		X		X		X		X			
	Indicador de combustible				X		X		X		X		X			
	Indicador de filtro de aire				X		X		X		X		X			
	*Horometro				X		X		X		X		X			
LUCES	*Frontales de trabajo					X		X		X		X		X		
	*Traseras de trabajo (Reflector)				X		X		X		X		X			
	Señales de giro (derecha, izquierda)				X		X		X		X		X			
	*Baliza				X		X		X		X		X			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X			
	*Nivel de aceite en la transmision (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X			
	*Mangueras, tobos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X			
GENERAL	*Espejo central convexo				X		X		X		X		X			
	*Espejos laterales				X		X		X		X		X			
	*Alarma de retroceso				X		X		X		X		X			
	Pito				X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio				X		X		X		X		X			
	* Freno de estacionamiento				X		X		X		X		X			
	*Cinturones de seguridad				X		X		X		X		X			
	Vidrio Panoramico				X		X		X		X		X			
	*Kit para Derrames				X		X		X		X		X			
	*Extintor de incendios Capacidad: POS				X		X		X		X		X			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)				X		X		X		X		X			
	Asiento				X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso				X		X		X		X		X			
	Llantas bien estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				X		X		X		X		X			
	Presion de aire de las llantas															
MECANICO	* Servotransmision				X		X		X		X		X			
	* Direccion				X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores				X		X		X		X		X			
	Estado y tension de las correas				X		X		X		X		X			
	Estado de pedales				X		X		X		X		X			
	Estado de Orugas (tensionadas)															
	Mecanismo de giro y estabilización cuchillas															
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación															
	Mecanismo de giro (Tomamoza)															
	*Bomba Hidraulica															
	Corona de tomarreza en buen estado				X		X		X		X		X			
	**Mandos de avance				X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento				X		X		X		X		X			
	Estado general desgarrador (balde)										X		X			
	**Mandos de levante del brazo															
	Estado de filtro de aire				X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de combustible				X		X		X		X		X			
	Pasadores y tornillos en buen estado															
	* Estado de cilindro (amortiguadores)															
	* Resguardos															
	Anclajes de contrapeso															
	Guardas															
	Estado del bastidor															
	Ausencia de ruidos extraños en el motor															
	*Motor sin grietas				X		X		X		X		X			
	Exosto (humo de escape)				X		X		X		X		X			

CONSORCIO PUERTO CLAVER	CONSORCIO PUERTO CLAVER	PAGINA: 2 DE 2
	PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA	

Operador	Nombre														
	Firma														
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre														
	Firma														

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				
MARTES				
MIERCOLES				
JUEVES				
VIERNES				
SABADO				
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente formato de inspección preoperacional de maquinaria, se da constancia de la inspección realizada para el ingreso al Proyecto cumpliendo satisfactoriamente todos los ítems evaluados.

NOTAS

TIPO: Corresponde a la clase o tipo de la Máquina
REFERENCIA: Corresponde a la referencia o especificación dada por la Casa Fabricante de la Máquina
No INTERNO: Identificación interna asignada por la Maquinaria a cada Equipo
MODELO: Año de fabricación de la Máquina
CAPACIDAD: Capacidad nominal en No. de pasadas o carga a ser transportada
No. Serial/Placa:

Firma: Carlos A. Mercado Z
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo.Bo. Firma:
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Diligenciar: Dependiendo la responsabilidad del cargo
Interventoría: Interventor
Contratista: Residente contratista

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

REFERENCIA _____ MODELO TSR 1200 D. MARCA CAT TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Vibrocompactador

No INTERNO _____ CAPACIDAD 12 Ton PERIODO EVALUADO 09/02/2016 AL 15/02/2025 CERTIFICADO OPERADOR NUMERO _____ VENCE _____

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN _____ SERIAL _____ *PRCE _____ *CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA _____

CONTRATO N° 050 DE 2025

OBJETO DE CONTRATO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 38 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de bateria		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de refrigerante		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de combustible		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de filtro de aire		X		X		X		X		X		X			
	*Horometro		X		X		X		X		X		X			
LUCES	*Frontales de trabajo			X		X		X		X		X		X		
	*Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X			
	Señales de giro (derecha, izquierda)		X		X		X		X		X		X			
	*Baliza		X		X		X		X		X		X			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del sistema hidraulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
GENERAL	*Espejo central convexo		X		X		X		X		X		X			
	*Espejos laterales		X		X		X		X		X		X			
	*Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X			
	Pito		X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X		X			
	* Freno de estacionamiento		X		X		X		X		X		X			
	*Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X			
	Vidrio Panorámico		X		X		X		X		X		X			
	*Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X			
	*Extintor de incendios Capacidad: POS		X		X		X		X		X		X			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		X		X		X		X		X		X			
	Asiento		X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso		X		X		X		X		X		X			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)															
	Presión de aire de las llantas															
MECANICO	* Servotransmisión		X		X		X		X		X		X			
	* Dirección		X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores		X		X		X		X		X		X			
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X			
	Estado de pedales		X		X		X		X		X		X			
	Estado de Orugas (tensionadas)															
	Mecanismo de giro y escualizacón cuchillas															
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación															
	Mecanismo de giro (Tomameza)															
	*Bomba Hidraulica															
	Corona de tomameza en buen estado		X		X		X		X		X		X			
	*Mandos de avance		X		X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento		X		X		X		X		X		X			
	Estado general desgarrador (balde)															
	*Mandos de levante del brazo															
	Estado de filtro de aire															
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X			
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X		X		X		X			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)															
	* Resguardos															
	Anclajes de contrapeso															
	Guardas															
	Estado del bastidor															
	Ausencia de ruidos extraños en el motor															
	*Motor sin grietas		X		X		X		X		X		X			
	Exosto (Humo de escape)		X		X		X		X		X		X			

CONSORCIO PUERTO CLAVER	CONSORCIO PUERTO CLAVER	PAGINA: 2 DE 2
	PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA	

Operador	Nombre																		
	Firma																		
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre																		
	Firma																		

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				
MARTES				
MIERCOLES				
JUEVES				
VIERNES				
SABADO				
DOMINGO				

El incumplimento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico Inspector de la Obra para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACION Y ACEPTACION

Con el presente formato de inspección preoperacional de maquinaria, se da constancia que la maquinaria descrita en el mismo, cumple a satisfacción con lo solicitado.

NOTAS

UTM: Coordenadas en las que se ubica la maquina
REFERENCIA: Características de la maquina especificadas en la placa de identificación
No. INTERNO: Identificación interna asignada por la Maquinaria a la cual pertenece
MODELO: Año de fabricación de la Maquina
CAPACIDAD: Cantidad estimada en No. de pasajeros o carga que se transporta
N.A: No aplica

Firma: Carlos A Mercado Z
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo Bo Firma:
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoria

Original: Dependencia responsable del control
Segunda: Interventor
Tercera: contratista

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

REFERENCIA _____ MODELO TSK 120D MARCA CAT TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Vibrocompactador

No. INTERNO _____ CAPACIDAD 120 Kg PERIODO EVALUADO 17/02/2026 AL 22/02/2026 CERTIFICADO OPERADOR NUMERO _____ VENCE _____

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN _____ SERIAL _____ *PRCE _____

CONTRATO N° 050 DE 2025 *CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA _____

OBJETO DE CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PLATA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 23ª EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables				X				X				X			
	Indicador de temperatura				X				X				X			
	Indicador de aceite				X				X				X			
	Indicador de bateria				X				X				X			
	Indicador de refrigerante				X				X				X			
	Indicador de combustible				X				X				X			
	Indicador de filtro de aire				X				X				X			
	*Horometro				X				X				X			
LUCES	*Frontales de trabajo					X				X				X		
	*Traseras de trabajo (Reflector)				X				X				X			
	Señales de giro (derecha, izquierda)				X				X				X			
	*Baliza				X				X				X			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				X				X				X			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)				X				X				X			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)								X				X			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)				X				X				X			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				X				X				X			
GENERAL	*Espejo central convexo				X				X				X			
	*Espejos laterales				X				X				X			
	*Alarma de retroceso				X				X				X			
	Pito				X				X				X			
	* Freno de servicio				X				X				X			
	* Freno de estacionamiento				X				X				X			
	*Cinturones de seguridad				X				X				X			
	Vidrio Panoramico				X				X				X			
	*Kit para Derrames				X				X				X			
	*Extintor de incendios Capacidad: POS				X				X				X			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)				X				X				X			
	Asiento				X				X				X			
	Escaleras y apoyos de acceso				X				X				X			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)								X				X			
	Presion de aire de las llantas															
MECÁNICO	* Servotransmision															
	* Dirección				X				X				X			
	Estado de pasadores				X				X				X			
	Estado y tensión de las correas				X				X				X			
	Estado de pedales				X				X				X			
	Estado de Orugas (tensionadas)															
	Mecanismo de giro y escalizacion cuchillas															
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación															
	Mecanismo de giro (Tornamesa)															
	*Bomba Hidráulica															
	Corona de tornamesa en buen estado				X				X				X			
	*Mandos de avance				X				X				X			
	* Mando de estacionamiento				X				X				X			
	Estado general desgarrador (brida)				X				X				X			
	*Mandos de levante del brazo															
	Estado de filtro de aire															
	Estado de filtro de combustible				X				X				X			
	Pasadores y tornillos en buen estado				X				X				X			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)															
	* Resguardos															
	Anclajes de contrapeso															
	Guardas															
	Estado del bastidor															
	Ausencia de ruidos extraños en el motor															
	*Motor sin grietas				X				X				X			
	Exosto (Punto de escape)				X				X				X			

CONSORCIO PUERTO CLAVER	CONSORCIO PUERTO CLAVER	PAGINA 2 DE 2
	PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA	

Operador	Nombre																
	Firma																
Autorización para uso de Maquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre																
	Firma																

DIA	HORÓMETRO INICIO	HORÓMETRO FINAL	HORÓMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				
MARTES				
MIERCOLES				
JUEVES				
VIERNES				
SABADO				
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACION Y ACEPTACION

Con el presente se constata que el operador se encuentra apto para operar la maquina y/o equipo descrito en el presente documento y cumple con los requisitos exigidos para el mismo.

NOTAS

TIPO: Categoría de características que definen la función de la Maquina
REFERENCIA: Clasificación según la capacidad de especificaciones dadas por la Marca o Fabricante de la Maquinaria
No. INTERNO: Identificación interna empleada por la Maquina o entregadas al Proyecto
MODELO: Año de fabricación de la Maquina
CAPACIDAD: Capacidad estimada en No. de pasajeros o carga a ser transportada
N.A: No aplica

Firma: Carlos A. Mercado Z
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo. Bo. (Firma)
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoria

(Cargo del Dependiente responsable del control)
(Fecha: [illegible])
(Observaciones)

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

REFERENCIA _____ MODELO TSR 120D MARCA CAT TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Vibrocompactador

No. INTERNO _____ CAPACIDAD 120 Hp PERIODO EVALUADO 25/02/2026 AL 01/03/2026 CERTIFICADO OPERADOR NUMERO _____ VENCE _____

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN _____ SERIAL _____ *PRCE _____

CONTRATO N° 050 DE 2025 *CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA _____

OBJETO DE CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables				X		X		X		X		X			
	Indicador de temperatura				X		X		X		X		X			
	Indicador de aceite				X		X		X		X		X			
	Indicador de bateria				X		X		X		X		X			
	Indicador de refrigerante				X		X		X		X		X			
	Indicador de combustible				X		X		X		X		X			
	Indicador de filtro de aire				X		X		X		X		X			
	*Horometro				X		X		X		X		X			
LUCES	*Frontales de trabajo					X		X		X		X		X		
	*Traseras de trabajo (Reflector)				X		X		X		X		X			
	Señales de giro (derecha, izquierda)				X		X		X		X		X			
	*Baliza				X		X		X		X		X			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X			
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				X		X		X		X		X			
GENERAL	*Espejo central convexo				X		X		X		X		X			
	*Espejos laterales				X		X		X		X		X			
	*Alarma de retroceso				X		X		X		X		X			
	Pito				X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio				X		X		X		X		X			
	* Freno de estacionamiento				X		X		X		X		X			
	*Cinturones de seguridad				X		X		X		X		X			
	Vidrio Panorámico				X		X		X		X		X			
	*Kit para Derrames				X		X		X		X		X			
	*Extintor de incendios Capacidad: POS				X		X		X		X		X			
	*Cabina anti vuelco (R.O.P.S)				X		X		X		X		X			
	Asiento				X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso				X		X		X		X		X			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				X		X		X		X		X			
	Presion de aire de las llantas															
MECÁNICO	* Servotransmisión															
	* Dirección				X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores				X		X		X		X		X			
	Estado y tensión de las correas				X		X		X		X		X			
	Estado de pedales				X		X		X		X		X			
	Estado de Orugas (tensionadas)				X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro y esculizacion cuchillas															
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación															
	Mecanismo de giro (Tomamieza)															
	*Bomba Hidraulica															
	Corona de tomamieza en buen estado				X		X		X		X		X			
	*Mandos de avance				X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento				X		X		X		X		X			
	Estado general desgarrador (balde)				X		X		X		X		X			
	*Mandos de levante del brazo															
	Estado de filtro de aire															
	Estado de filtro de combustible				X		X		X		X		X			
	Pasadores y tornillos en buen estado				X		X		X		X		X			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)															
	* Resguardos															
	Anclajes de contrapeso															
	Guardas															
	Estado del bastidor															
	Ausencia de ruidos extraños en el motor															
	*Motor sin grietas				X		X		X		X		X			
	Exosto (Humo de escape)				X		X		X		X		X			

CONSORCIO PUERTO CLAVER	CONSORCIO PUERTO CLAVER	PAGINA 2 DE 2
	PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA	

Operador	Nombre															
	Firma															
Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoría	Nombre															
	Firma															

DIA	HORÓMETRO INICIO	HORÓMETRO FINAL	HORÓMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				
MARTES				
MIERCOLES				
JUEVES				
VIERNES				
SABADO				
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos lo comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente se verifica el(los) preoperacional(es) de maquinaria y se da(n) por aceptada(s) la(s) maquinaria(s) para su normal funcionamiento, cumpliendo a satisfacción con lo requerido en la(s) hoja(s) de vida.

NOTAS

TIPO: Corresponde a la clasificación que define la función de la Maquina
REFERENCIA: Clasificación propia de la especialidad o especificación dada por la Marca o Fabricante de la Maquina
No. INTERNO: Identificación interna asignada por La Maquina a las obras del Proyecto
MODELO: Año de fabricación de la Maquina
CAPACIDAD: Capacidad referida al No. de pasajeros para vehículos o de tipo portátil
N.A: No Aplica

Firma: Carlos A. Mercado Z
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Vo. Bo. Firma:
(Nombre)
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoría

Control Documental responsable del contrato
Fecha de actualización
Versión actualizada

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA

REFERENCIA _____ MODELO TSL (2001) MARCA CAT TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Vibrocompactador

No. INTERNO _____ CAPACIDAD 14000 kg PERIODO EVALUADO 02/09/2026 AL 08/09/2026 *CERTIFICADO OPERADOR NUMERO _____ VENCE _____

MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN _____ SERIAL _____ *PRCE _____

*CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA _____

CONTRATO N° 050 DE 2025

OBJETO DE CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 39 Y CALLE 38, CARRERA 32 ENTRE CALLE 39 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 23 EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de bateria		X		X		X		X		X		X			
	ndicador de refrigerante		X		X		X		X		X		X			
	ndicador de combustible		X		X		X		X		X		X			
	ndicador de filtro de aire		X		X		X		X		X		X			
	*Horometro			X		X		X		X		X		X		
LUCES	*Frontales de trabajo		X		X		X		X		X		X			
	*Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X			
	Señales de giro (derecha, izquierda)		X		X		X		X		X		X			
	*Baliza		X		X		X		X		X		X			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fuga)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel de aceite en la transmision (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
GENERAL	*Espejo central convexo		X		X		X		X		X		X			
	*Espejos laterales		X		X		X		X		X		X			
	*Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X			
	Pito		X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X		X			
	* Freno de estacionamiento		X		X		X		X		X		X			
	*Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X			
	Visor Panoramico		X		X		X		X		X		X			
	*Kit para Derrames		X		X		X		X		X		X			
	*Extintor de incendios Capacidad: POS		X		X		X		X		X		X			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		X		X		X		X		X		X			
	Asiento		X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso		X		X		X		X		X		X			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)															
	Presion de aire de las Llantas															
MECÁNICO	* Servotransmisión		X		X		X		X		X		X			
	* Dirección		X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores		X		X		X		X		X		X			
	Estado y tension de las correas		X		X		X		X		X		X			
	Estado de pedales		X		X		X		X		X		X			
	Estado de Orugas (tensionadas)															
	Mecanismo de giro y escarificación cuchillas															
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación															
	Mecanismo de giro (Tornamesa)															
	*Bomba Hidráulica															
	Corona de tornamesa en buen estado		X		X		X		X		X		X			
	*Mandos de avance		X		X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento		X		X		X		X		X		X			
	Estado general desgarrador (baldo)															
	*Mandos de levante del brazo															
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X			
	Pasadores y tornillos en buen estado															
	* Estado de cilindro (amortiguadores)															
	* Resguardos															
	Anclajes de contrapeso															
	Guardas															
	Estado del bastidor															
	Ausencia de ruidos extraños en el motor															
	*Motor sin grietas		X		X		X		X		X		X			
	Exosto (Humo de escape)		X		X		X		X		X		X			

CONSORCIO PUERTO CLAVER	CONSORCIO PUERTO CLAVER	PAGINA 2 DE 2
	PREOPERACIONALES MAQUINARIA PESADA	

Operador	Nombre																				
	Firma																				
Autorizacion para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector Interventoria	Nombre																				
	Firma																				

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				
MARTES				
MIERCOLES				
JUEVES				
VIERNES				
SABADO				
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal) se cebera reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Residente de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y este determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

CONSTANCIA DE VERIFICACION Y ACEPTACION

Con el presente formato de inspección preoperacional de maquinaria, se da constancia que la maquinaria o equipo descrita para ingresar al Proyecto cumple con las condiciones mecánicas de seguridad y operación.

NOTAS

TIPO: Corresponde a características que definen la función de la Maquina
REFERENCIA: Clase o nombre con las características específicas asignadas por la Dirección Ejecutiva de la Maquinaria
No. INTERNO: Identificación interna asignada a la Maquina para su identificación al interior
MODELO: Año de fabricación de la Maquina
CAPACIDAD: Capacidad instalada en los dispositivos de carga o sistema portado
N.A: No aplica

Nombre: Carlos A Mercado T
Responsable de la Maquinaria y Equipos del Contratista

Visto Bueno
Nombre:
Responsable de la Maquinaria y Equipos de la Interventoria

Original: Dependencia responsable del control
Copia: Interventor
Copia: Contratista

ANEXO 1. POLIZAS

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.04.09 17:52:34 -05:00

Código de Seguridad: vFDrh1L0tBIQysB3xjfzNg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX: 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100001670	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	680016502	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/04/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	15/09/2025	24:00 Horas Del	12/05/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PUERTO CLAVER	No. DOC. IDENTIDAD	901.982.342-5
DIRECCIÓN	CR 12 A # 23 - 45 BRR JERUSALEN	TELÉFONO	3104057905
ASEGURADO	CONSORCIO PUERTO CLAVER	No. DOC. IDENTIDAD	901.982.342-5
DIRECCIÓN	CR 12 A # 23 - 45 BRR JERUSALEN	TELÉFONO	3104057905
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	1

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS, SEGUN:

-ACTA DE SUSPENSION 02 DE FECHA 116/03/2026
-ACTA DE AMPLIACION 1 DE FECHA 30/03/2026
·ACTA DE REINICIO 01 DE FECHA 06/04/2026

FECHA TERMINACION 12/05/2026

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS, CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	81.900,00
PATRONAL	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 569.400.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MARLEN BALLESTEROS ORJUELA	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	81.900,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	81.900,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	15.561,00
TOTAL A PAGAR	$	97.461,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 09/04/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA - PAGA APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100001670	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	680016502	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/04/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	15/09/2025	24:00 Horas Del	12/05/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NO.050-2025 , CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA .
NOTA: ASEGURADO: LA EDTB, IDENTIFICADO CON EL NIT. 901526561 7 Y AL MUNICIPIO DE EL BAGRE, IDENTIFICADO CON EL NIT. 890984221-2 Y CONSORCIO PUERTO CLAVER
NIT 9 0 1 9 8 2 3 4 2-5
BENEFICIARIOS: LA EDTB, IDENTIFICADO CON EL NIT. 901526561 7 Y AL MUNICIPIO DE EL BAGRE, IDENTIFICADO CON EL NIT. 890984221-2 Y TERCEROS AFECTADOS.
NOTA SE ACLARA QUE LA POLIZA CUBRE LOS SIGUIENTES AMPAROS:
1. PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES
2. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS SALVO EN EL EVENTO EN QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
3. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS
4. AMPARO PATRONAL
5. GASTOS MEDICOS
6. GASTOS DE DEFENSA
7. PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES
8. DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE
EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CC: 98650618 WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ (PART. 50,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 901930946 CONSTRULARM (PART. 50,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO PUERTO CLAVER) , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE EDTB COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PUERTO CLAVER, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE EDTB BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE EDTB COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.04.09 17:54:15 -05:00

Código de Seguridad: bUl0JQlvR8Mhmonm9dIksQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100006616	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	680016501	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/04/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	15/09/2025	24:00 Horas Del	12/05/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PUERTO CLAVER	No. DOC. IDENTIDAD	901.982.342-5
DIRECCIÓN	CR 12 A # 23 - 45 BRR JERUSALEN	TELÉFONO	3104057905
ASEGURADO	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE EDTB	No. DOC. IDENTIDAD	901.526.561-7
DIRECCIÓN	CALLE 50 47 A 19 SEGUNDO PISO	TELÉFONO	3113590471
BENEFICIARIO	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE EDTB	No. DOC. IDENTIDAD	901.526.561-7
DIRECCIÓN	CALLE 50 47 A 19 SEGUNDO PISO	TELÉFONO	3113590471

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS, SEGUN:

-ACTA DE SUSPENSION 02 DE FECHA 116/03/2026
-ACTA DE AMPLIACION 1 DE FECHA 30/03/2026
-ACTA DE REINICIO 01 DE FECHA 06/04/2026

FECHA TERMINACION 12/05/2026

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS, CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.050-2025 , CUYO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 16/03/2026	24:00 Horas Del 12/11/2026	721.067.965,40	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 16/03/2026	24:00 Horas Del 12/05/2029	360.533.982,70	51.857,63
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 12/05/2026	24:00 Horas Del 12/05/2031	1.081.601.948,10	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 2.163.203.896,20	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MARLEN BALLESTEROS ORJUELA	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	$	51.857,63
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	51.857,63
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	9.852,95
TOTAL A PAGAR	$	61.710,58

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 09/04/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA)

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente
Protege el medio ambiente evitando la impresion de este documento

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA - PISA - ANI

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100006616	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	680016501	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/04/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	15/09/2025	24:00 Horas Del	12/05/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

OBJETO ES
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
NOTA: ASEGURADO Y BENEFICIARIO A LA EDTB, IDENTIFICADO CON EL NIT. 901526561 7 Y AL MUNICIPIO DE EL BAGRE, IDENTIFICADO CON EL NIT. 890984221-2.
NOTA: NOTA: SE ACLARA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA, INICIA VIGENCIA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE
RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DELAENTIDAD CONTRATANTE LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR
ESCRITO A LA COMPAÑÍA.
EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CC: 98650618 WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ (PART. 50,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 901930946 CONSTRULARM SAS (PART. 50,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO PUERTO CLAVER)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **COQ-100006616** y endoso, **4** cuyo afianzado es: **CONSORCIO PUERTO CLAVER** Asegurado o Beneficiario: **EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE EDTB / EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE EDTB** , expedida por la Compañía en **09/04/2026,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN ORINOQUIA a los **09** días del mes **ABRIL** del año **2026**.

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO

ANEXO 2. PROGRAMA DE MANEJO SOCIAL.

El Bagre, 08 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO PUERTO CLAVER

N.I.T: 901.982.342-5

DEBE A:

CRISTIAN ANDRES RODELO MORENO
N.I.T: 1.040.507.788-9

LA SUMA DE:

CIENTO MIL PESOS M/CTE ($100.000)

POR CONCEPTO DE:

- 50 VOLANTES DE INICIO DE LOS TRABAJOS EN EL SECTOR 2 (K0+297,08 - K0+318,07/ K0+737,81 - K0+812)

Cordialmente,

Cristian Rodelo

CRISTIAN ANDRES RODELO MORENO
CC: 1040507788

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE **EL BAGRE**





INGECOR

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

INICIO DE ACTIVIDADES EL VIERNES 23 DE ENERO DE 2026

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

CONSORCIO PUERTO CLAVER, INFORMA A LA COMUNIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES EN LA CALLE 35 DEL K0+737,81 A LA CALLE 35 CON CARRERA 29A EN EL K0+812 PERTENECIENTE AL SECTOR 2.

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE **EL BAGRE**





INGECOR

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

INICIO DE ACTIVIDADES EL VIERNES 23 DE ENERO DE 2026

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

CONSORCIO PUERTO CLAVER, INFORMA A LA COMUNIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES EN LA CALLE 35 DEL K0+737,81 A LA CALLE 35 CON CARRERA 29A EN EL K0+812 PERTENECIENTE AL SECTOR 2.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14400958863

(415)7707212489984(8020) 000001440095886 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 4 0 5 0 7 7 8 8	9	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de ciudadanía 1 3	1 0 4 0 5 0 7 7 8 8	2 0 1 0 1 1 1 6

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA	1 6 9	Antioquia 0 5	El Bagre 2 5 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RODELO	MORENO	CRISTIAN	ANDRES

35. Razón social:

36. Nombre comercial:	37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	El Bagre 2 5 0

41. Dirección principal
CR 40 62 02 BRR LAS DELICIAS

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
carodelo1992@icloud.com		3 1 9 3 8 0 9 4 3 1	

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 3 1 0	2 0 1 7 0 1 0 1						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	1	2																								

12- Ventas régimen simplificado

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código:										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI ☐ NO ☐ 60. No. de Folios: 61. Fecha:

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

BORRADOR DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE-EDTB
Nit: 901526561-7

COMPROBANTE DE EGRESO N. 000024

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00032	16/04/2026

Fecha de Expedición: 16/04/2026

Nit ó Cedula:	901.982.342
Beneficiario:	CONSORCIO PUERTO CLAVER
Observa:	

Concepto de este Egreso

PAGO 3 AL CONTRATO 050-2025, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, EN ZONA RURAL DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005		**SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**	**538.950.310,10**
CCPET01 - TIPO DE RECURSO	1.0	RECURSOS CORRIENTES	538.950.310,10
CCPET01 - CPC V2 1 AC	53211	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles	538.950.310,10
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACION	2.2.8.1.00	ASIGNACIONES DIRECTAS	434.309.628,45
	2.2.8.2.00	ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL	104.640.681,65
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	SSF	Sin Situación de Fondos	538.950.310,10
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2025052500004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, EN ZONA RURAL DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA	538.950.310,10

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
538.950.310,10	91.621.552,71	447.328.757,39

Valor en letras:

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON DIEZ CENTAVOS. PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
11101	SSF ASIGNACION DIRECTA	0000egre24	356.133.894,90
11102	SSF ASIGNACION INVERSION LOCAL	0000egre24	91.194.862,49

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	4,00	21.556.012,40
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1,50	8.084.254,65
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	5.389.503,10
TASA PRO-DEPORTE	1,50	8.084.254,65
CONTRIBUCIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 5%	5,00	26.947.515,51
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN	2,00	10.779.006,20
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,00	10.779.006,20

Director Administrativo y Financiero

Firma del Interesado(a)
Nit / C.C.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A S. Reservados todos los derechos - 19_ce_eduh.rdlc - Versión AriesNet

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHrcorrea	RAFAEL DE JESUS CORREA ARC
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-052501	EMPRESA PARA EL DESARROLL TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-17-9:33 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	223737826	**Fecha Registro:**	2026-04-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-052501 EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB		
Estado:		Autorizada		**Nro Obligación:**	926	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:		2026-04-20		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	
Valor Bruto:	38.950.310,10	**Valor Deducciones:**	6.621.552,86	**Valor Neto:**	32.328.757,24	**Saldo x Pagar:**	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901982342	**Razón Social:**	CONSORCIO PUERTO CLAVER	**Medio de Pago:**	A

CUENTA BANCARIA

Número:	897186987	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	A

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
	Número:	050-2025	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR R
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS
03-052501 EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB / 00IL-2402-0600-2025-05250-0004 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS S ALCANTARILLADO SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO								
	Nación	IL05250	CSF	38.950.310,10	0,00			

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901526561	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB	2,000 %	779.006,20	
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	779.006,20	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	901526561	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB	5,000 %	1.947.515,58	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	901526561	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB	1,500 %	584.254,69	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	901526561	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB	4,000 %	1.558.012,40	
2-03-06	ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	901526561	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB	1,000 %	389.503,10	
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	901526561	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB	1,500 %	584.254,69	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
03-052501 - EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB	SGR-AIL - ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL	2026-04-16	38.950.310,10	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHrcorrea RAFAEL DE JESUS CORREA ARC

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-052501 EMPRESA PARA EL DESARROLL TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTE

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-17-9:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	223785026	**Fecha Registro:**	2026-04-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-052501 EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB				
Estado:		Autorizada		**Nro Obligación:**	926	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:		2026-04-21		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			
Valor Bruto:	500.000.000,00	**Valor Deducciones:**	85.000.000,14	**Valor Neto:**	414.999.999,86	**Saldo x Pagar:**			

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901982342	**Razón Social:**	CONSORCIO PUERTO CLAVER	**Medio de Pago:**	A

CUENTA BANCARIA

Número:	897186987	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	A

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**	050-2025	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

				VALOR		VALOR PAGADO		VALOR R
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	**FUENTE**	**REC**	**SIT**	**PESOS**	**MONEDA**	**PESOS**	**MONEDA**	**PESOS**
03-052501 EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB / 00DA-2402-0600-2025-05250-0004 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS S ALCANTARILLADO SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO								
	Nación	DA05250	CSF	500.000.000,00	0,00			

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901526561	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB	2,000 %	9.999.999,80	
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	9.999.999,80	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	901526561	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB	5,000 %	25.000.000,42	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	901526561	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB	1,500 %	7.500.000,31	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	901526561	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB	4,000 %	19.999.999,60	
2-03-06	ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	901526561	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB	1,000 %	4.999.999,90	
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	901526561	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB	1,500 %	7.500.000,31	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
03-052501 - EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB	SGR-ADAN - ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS	2026-04-16	500.000.000,00	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE-EDTB

Nit: 901526561-7

ORDEN DE PAGO OP Nº 00032

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00005	12/09/2025

Fecha de Expedición: 16/04/2026

Nit ò Cedula:	901.982.342
Beneficiario:	CONSORCIO PUERTO CLAVER
Observa:	

Por Concepto de:

PAGO 3 AL CONTRATO 050-2025, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, EN ZONA RURAL DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	**SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**538.950.310,10**
CCPET61 - TIPO DE RECURSO	1.0	RECURSOS CORRIENTES	538.950.310,10
CCPET01 - CPC V2.1 AC	53211	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles	538.950.310,10
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.2.8.1.00	ASIGNACIONES DIRECTAS	434.309.628,45
	2.2.8.2.00	ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL	104.640.681,65
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	SSF	Sin Situación de Fondos	538.950.310,10
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2025052500004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, EN ZONA RURAL DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA	538.950.310,10

Valor en letras:

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON DIEZ CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	4,00	21.558.0
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1,50	8.084.25
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	5.389.50
TASA PRO-DEPORTE	1,50	8.084.25
CONTRIBUCIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 5%	5,00	26.947.515,51
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN	2,00	10.779.006,20
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,00	10.779.006,20

IMPUTACIÓN CONTABLE			
CUENTA		DÉBITO	CRÉDITO
2902	0121	434.309.628,45	0,00
2460	0201	0,00	538.950.310,10
2902	0122	104.640.681,65	0,00
	TOTAL:	538.950.310,10	538.950.310,10

Total IVA

0,00

Total de la Presente Orden **Total Retenciones** **Total a Pagar**
