INFORME SUPERVISION N°4 Y FINAL

DIRECCION TECNICA EDTB
CONTRATO: 050-2025

FECHA DEL CONTRATO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATO	N° 050-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO PUERTO CLAVER
NIT O DOCUMENTO DEL CONTRATISTA	NIT 901982342-5
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"
VALOR DEL CONTRATO	TRES MIL SEISCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/MTCE ($ 3.605.339.826,79) INCLUIDO EL A.U Y DEMÁS COSTOS A QUE HAYA LUGAR
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	QUINCE (15) DE SEPTIEMBRE DE 2025
ACTA DE SUSPENSION No1:	12 DE DICIEMBRE DE 2026
ACTA DE AMPLIACION No1, SUSPENSION No1:	11 DE ENERO DE 2026
ACTA DE SUSPENSION No2:	16 DE MARZO DE 2026
ACTA DE AMPLIACION No1, SUSPENSION No2:	30 DE MARZO DE 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	12 DE MAYO DE 2026
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL N°1	MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($

	1.384.914.578,48)
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL N°2	MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS Y VEINTE CENTAVOS M/TCE ($ 1.320.500.422,20)
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL N°3	QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ CENTAVOS M/CTE ($ 5388.950.310,10)
VALOR A PAGAR ACTA FINAL N°4	TRECIENTOS SESENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON UN CENTAVO M/CTE ($ 360.974.516,01)
SALDO DEL CONTRATO	$ 0.00
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	DOCE (12) DE MAYO DE 2026

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

a) **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:**

RUBRO	VALOR A CANCELAR ($)
2.3.2.02.02.005	**$ 3.605.339.826,79**

CRP No 1725 del 25 de julio de 2025

b) **VALOR ANTICIPO: N/A**

c) VALOR A PAGAR ACTA DE COBRO PARCIAL N°.1: $ 1.384.914.578,48
d) VALOR A PAGAR ACTA DE COBRO PARCIAL N°.2: $ 1.320.500.422,20
e) VALOR A PAGAR ACTA DE COBRO PARCIAL N°.3: $ 538.950.310,10
f) VALOR A PAGAR ACTA DE COBRO PARCIAL N°.4 Y FINAL: $ 360.974.516,01
g) CONCEPTO DEL SUPERVISOR:

ATRIBUTO EVALUADO	CONCEPTO DEL DESEMPEÑO
ATENCIÓN	El Municipio como entidad de la división político-administrativo del Estado, le corresponde propiciar buenas condiciones para la movilidad y circulación al interior de los centros urbanos, en tal sentido se han realizado inversiones de recursos para proyectos viales. En tanto la población de

	los sectores beneficiados con el proyecto, vienen ejerciendo control y vigilancia de procesos de formulación, gestión y posterior inversión de recursos durante la ejecución de las obras. Este proyecto es de vital importancia para lograr mejorar las condiciones de infraestructura vial del casco urbano del corregimiento de puerto Claver, teniendo en cuenta que si se requiere promover la competitividad se requiere de oferta de transporte y de malla vial adecuada que genere mecanismos adecuados de transporte, comunicación e interacción entre los pobladores. Los beneficios de la intervención en estos espacios viales por parte de la alcaldía de El Bagre se representan en la facilidad en la movilidad, comodidad, seguridad, estética y costos que influyen en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Los problemas de movilidad reducida, seguridad vial, afecciones de salud, riesgo físico para transeúntes y deterioro del entorno vial físico, impactan con la misma intensidad a un amplio espectro de la población Bagreña y se pueden evidenciar en todos los barrios del municipio
OPORTUNIDAD	El mal estado en que se encuentran los 819.92 ml a intervenir se refleja en las regulares condiciones de seguridad y confort para la circulación del transporte y con el aumento acelerado que ha experimentado el corregimiento de Puerto Claver, lo cual no ha permitido desarrollar una malla continua y coherente con las expectativas actuales en dicho corregimiento, conformada por terreno natural y materiales mixtos de relleno sin una base estabilizada, lo que ha generado un avanzado deterioro superficial, hundimientos y una incapacidad por soportar el trafico vehicular, el resultado de esto es una red vial de transito peligroso para aquellos que requieren transitar en la carrera 31d entre calle 38 y calle 36, carrera 32 entre calle 36 y calle 35, calle 35 entre carrera 32 y carrera 29ª, en general este tipo de carencia en la infraestructura de la malla vial en el eje se convierte en un obstáculo para la correcta prestación de algunos servicios básicos como es el caso de la recolección de residuos sólidos, transporte de enfermos y atención de emergencias e incide negativamente sobre la percepción que

	la comunidad tienen de su entorno. Por lo anterior expuesto, la vía del barrio La Punta que se encuentra dentro del modelo de priorización de intervención del municipio, y que actualmente no cuenta con condiciones adecuadas de transpirabilidad y las grandes deformaciones de la superficie de la vía dificultan el acceso. En este proyecto se plante mejorar la vía existente, con el fin de garantizar una estructura que otorgue comodidad, durabilidad, seguridad en la vía y accesibilidad de zona. Por lo antes expuesto las vías que se encuentra dentro del modelo de priorización de intervención del municipio, son las vías de principal acceso al barrio El Progreso, y que actualmente no cuenta con condiciones adecuadas de transpirabilidad y las grandes deformaciones de la superficie de la vía dificultan el acceso. En este proyecto se plantea mejorar la vía existente, con el fin de garantizar una estructura que otorgue comodidad, durabilidad, seguridad en la vía y accesibilidad de zona.
CALIDAD	Se verifica que las obras realizadas cumplen con el objetivo planteado en el estudio previo y las condiciones técnicas mínimas exigidas. Durante la ejecución de las actividades en obra, se han realizado diferentes controles técnicos para verificar el cumplimiento de lo propuesto en ellos estudios y diseños proyectados para esta obra.
INFRAESTRUCTURA EMPLEADA	Mano de obra calificada, mano de obra no calificada, herramienta menor, mezcladora, retrocargador, minicargador, volquetas, vibrocompactador.

Ver capítulo 6.1 del Manual de Contratación

Se firma el 12 de mayo 2026

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
C.C. 8.364.481
Supervisor

NOTA: Ver evidencia anexada en el informe del contratista.

ACTA LITERAL

ACTA DE AVANCE OBRA PUBLICA N°4 Y FINAL

CONTRATO	050-2025
CONTRATANTE:	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE (EDTB) (901.526.561-7)
CONTRATISTA	CONSORCIO PUERTO CLAVER
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"
VALOR	TRES MIL SEISCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/MTCE ($ 3.605.339.826,79) INCLUIDO EL A.U Y DEMÁS COSTOS A QUE HAYA LUGAR
SUPERVISOR	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ (Director Técnico)
PLAZO	SEIS (6) MESES
ACTA DE INICIO:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ACTA DE SUSPENSION No1:	12 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE AMPLIACION No1, SUSPENSION No1:	11 DE ENERO DE 2026
ACTA DE SUSPENSION No2:	16 DE MARZO DE 2026
ACTA DE AMPLIACION No1, SUSPENSION No2:	30 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 DE MAYO DE 2026
FECHA DE PRESENTE ACTA:	12 DE MAYO DE 2026

En el Municipio de El Bagre - Antioquia, a los doce (12) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron en el municipio de El bagre **DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ**, Director Técnico en calidad de Supervisor de la Obra y **WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ**, representando a **CONSORCIO PUERTO CLAVER**, en calidad de contratista, con el propósito de suscribir **ACTA PARCIAL N°.4 Y FINAL** del contrato en referencia y recibir a satisfacción las obras y actividades reportadas (verificar

acta de cobro N°.4 y Final, la cual representa avance financiero parcial ejecutado del 10.01%, tal como lo dicta cuadro anexo a la presente el cual refleja las siguientes condiciones de pago:

VALOR DEL CONTRATO:	$	3.605.339.826,79
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	$	0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$	3.605.339.826,79
VALOR ANTICIPO:	$	0,00
VALOR A AMORTIZAR POR ANTICIPO:	$	0,00
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL N°.1:	$	1.384.914,578,48
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL N°.2:	$	1.320.500,422,20
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL N°.3:	$	538.950,310,10
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL N°.4 Y FINAL:	$	360.974,516,01

SON: TRECIENTOS SESENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON UN CENTAVO M/CTE ($ 360.974.516,01)

Valor que corresponde a un avance ejecutado del 10.01%.
Avance acumulado ejecutado del 100.00%.

Para mayor constancia firman los que en ella intervinieron a los doce (12) días del mes de mayo del 2026.

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
DIRECTOR TECNICO
Supervisor

WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ
R.L CONSORCIO PUERTO CALVER
Contratista

Intervinieron en el Documento:

Firma:	**Firma:**
Elaboró Doiver Nisperuza **Cargo:** Director Técnico	**Revisó** Doiver Nisperuza **Cargo:** Director Técnico

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE CONTRATO
No 050 DE 2025.

CONTRATO	050-2025
CONTRATANTE:	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE (EDTB) (901.526.561-7)
CONTRATISTA	CONSORCIO PUERTO CLAVER
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"
VALOR	TRES MIL SEISCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/MTCE ($ 3.605.339.826,79) INCLUIDO EL A.U Y DEMÁS COSTOS A QUE HAYA LUGAR
SUPERVISOR	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ (Director Técnico)
PLAZO	SEIS (6) MESES
ACTA DE INICIO:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ACTA DE SUSPENSION No1:	12 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE AMPLIACION No1 SUSPENSION No1:	11 DE ENERO DE 2026
ACTA DE SUSPENSION No2:	16 DE MARZO DE 2026
ACAT DE AMPLIACION No1 A LA SUSPENSION No2:	30 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 DE MAYO DE 2026
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL N°1	$ 1.384.914.578,48
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL N°2	$ 1.320.500.422,20
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL N°3	$ 538.950.310,10
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL N°4 Y/O LIQUIDACION	$ 360,974,516.01
FECHA DE PRESENTE ACTA:	12 DE MAYO DE 2026

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE **EL BAGRE**

En el Municipio de El Bagre el 12 de mayo de 2026. En las oficinas de la EDTB, **WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ**, identificado con cedula de ciudadania **98.650.618** actuando en representación de **CONSORCIO PUERTO CLAVER** con **NIT 901.982.342-5,** como contratista del contrato en relación y **DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ,** en calidad de **SUPERVISOR** del contrato de la referencia, y en representación del municipio con el propósito de proceder al recibo y entrega final del contrato en mención.

Las partes intervinientes de común acuerdo hemos realizado una conciliación así: Se entrega y recibe a entera satisfacción el objeto de la presente acta de conformidad con las especificaciones y cantidades expresas en el presupuesto el equivalente al valor de $ 3.605.339.826,79 (100%) avance físico total ejecutado, y 89,99% financiero total ejecutado, quedando un saldo a pagar en el ACTA PARCIAL N°4 Y FINAL de $ 360.974.516,01 (10,01%).

En consecuencia, el supervisor hace constar que lo estipulado en el contrato **N° 050 - 2025,** ha sido entregado por el **CONTRATISTA** y recibido a entera satisfacción.

Para constancia se firma por quienes han intervenido en el municipio de el Bagre Antioquia, una vez aprobada.

WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ
RTE. CONSORCIO PUERTO CLAVER
Contratista

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
Supervisor

Intervinieron en el documento:

Firma:	**Firma:**
Elaboró: Doiver Nisperuza López **Cargo:** Director Técnico	**Revisó y Aprobó:** Doiver Nisperuza López **Cargo:** Director Técnico **Dependencia:** Dirección Técnica

MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 4 Y/O LIQUIDACION

PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29", EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

En el Municipio de El Bagre, a los (12) días del mes de mayo de 2026 se reunieron en las oficinas de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB, por parte del contratista de Obra CONSORCIO PUERTO CALVER, Representando WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ, por parte del contratista de interventoria JORGE ANDRES SOTO CALLE y como SUPERVISOR, el ING. DONVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ, Director Tecnico de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB, con el fin de elaborar el ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 4 Y/O LIQUIDACION, realizado a la fecha por el contratista de Obra y recibido a satisfaccion por parte de la interventoria y la supervision, teniendo en cuenta las especificaciones y cantidades, segun lo estipulado en el contrato de la referencia.

	CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO PUERTO CLAVER	**CONTRATO DE OBRA:**	N° 050-2025		% EJECUTADO 99,25%
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: INGECOR S.A.S	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	N° 052-2025	**PERIODO:** 11 DE ABRIL DE 2026 AL 12 DE MAYO	% IMPREVISTOS 0,75%
	SUPERVISOR CONTRATO: DONVER ANTONIO NISPERUZA (EDTB)	**FECHA DE PRESENTE ACTA:**	12/05/26		% ACUMULADO 100,00%

	PRESUPUESTO OFICIAL					CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No1		CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA PARCIAL N° 4 Y/O LIQUIDACION)		CANTIDADES ACUMULADAS	
No.	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**
1,0	**Preliminares**										
1,1	Cerramiento lona h=2.00 mts	m2	1614,00	$ 8.142,90	$ 13.142.647,00	3157,17	$ 25.708.563,00	691,63	$ 5.631.837,08	3157,17	$ 25.708.563,07
				Sub - Total	**$ 13.142.647,00**		**$ 25.708.563,00**		**$ 5.631.837,08**		**$ 25.708.563,07**
2,0	**Movimientos de Tierra.**										
2,1	Excavacion mecanica varias sin clasificar. incluye retiro	m3	3128,11	$ 63.760,02	$ 199.448.270,00	4030,53	$ 256.986.498,00	194,37	$ 12.392.988,00	4030,53	$ 256.986.492,00
2,2	Mejoramiento de subrasante con material seleccionado y compactado. (Incluye trasporte)	m3	1340,82	$ 169.386,78	$ 227.081.639,00	1338,93	$ 226.795.797,00	83,30	$ 14.109.934,00	1338,93	$ 226.795.798,00
2,3	Suministro, extendido, conformacion y compactacion de Subbase granular (Incluye trasporte)	m3	883,75	$ 225.813,09	$ 201.819.413,00	892,61	$ 201.563.864,00	55,53	$ 12.549.241,00	892,61	$ 201.563.865,00
				Sub - Total	**$ 628.349.330,00**		**$ 685.346.159,00**		**$ 39.043.883,00**		**$ 685.346.160,00**
3,0	**Pavimento y Concretos**										
3,1	Suministro e instalación de concreto hidraulico, MR=40 Kg/cm2, para losas de pavimento de espesor 25 cm	m2	4468,73	$ 223.018,21	$ 997.232.998,00	4375,12	$ 888.229.180,00	276,54	$ 56.142.173,00	4375,12	$ 888.229.191,00
3,2	Suministro e instalacion de Bordillos de concreto de 3000 Psi, para confinamiento de calzada dimensiones h=0.15, e=0.15 (Incluye refuerzo longitudinal y transversal, bordillo sobrepuesto en Placas de Pavimento Distantes cada placa)	m	1449,73	$ 68.036,12	$ 98.634.076,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
3,3	Acero de refuerzo grado 60	kg	17283,66	$ 10.799,49	$ 186.654.794,00	16168,00	$ 174.606.254,00	1913,38	$ 20.663.555,00	16168,00	$ 174.606.353,00
3,4	Corte de placa de concreto con disco de 18"	ml	2314,30	$ 7.137,73	$ 16.518.856,00	2234,02	$ 15.945.832,00	63,71	$ 454.718,00	2234,02	$ 15.945.832,00
3,5	Sello de juntas en silicona para Pavimento rigido	ml	2314,30	$ 7.212,12	$ 16.691.131,00	2234,02	$ 16.112.139,00	1217,21	$ 8.778.745,18	2234,02	$ 16.112.130,42
				Sub - Total	**$ 1.225.731.795,00**		**$ 1.094.893.405,00**		**$ 88.039.194,18**		**$ 1.094.893.405,40**
4,0	**Sistema de Red Alcantarillado Sanitario y Elementos de Conexión**										
4,1	Suministro, transporte e instalacion de Tuberia PVC Alcantarillado Ø 6", incluye maquinaria, equipos e insumos	ml	550,00	$ 154.193,14	$ 84.806.226,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,2	Suministro, transporte e instalacion de Tuberia PVC Alcantarillado Ø 8", incluye maquinaria, equipos e insumos	m	586,09	$ 179.175,14	$ 105.550.283,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,3	Suministro, transporte e instalacion de Tuberia PVC Alcantarillado Ø 10", incluye maquinaria, equipos e insumos	m	319,42	$ 267.775,14	$ 85.532.735,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,4	Suministro, transporte e instalacion de Kit Silla Yee Ø 6" a Ø 8" (Incluye hidro sellos y lubricantes)	und	81,00	$ 185.885,00	$ 15.056.685,00	95,00	$ 17.659.075,00	0,00	$ -	95,00	$ 17.659.075,00
4,5	Suministro, transporte e instalacion de Kit Silla Yee Ø 6" a Ø 12" (Incluye hidro sellos y lubricantes)	und	29,00	$ 308.365,00	$ 8.942.585,00	26,00	$ 8.017.490,00	0,00	$ -	26,00	$ 8.017.490,00
4,6	Suministro, transporte e instalacion de arena para protección de tuberia, incluye maquinarias y equipos	m3	272,55	$ 76.100,50	$ 20.743.877,00	233,94	$ 17.805.391,00	0,00	$ -	233,94	$ 17.805.113,00
4,7	Suministro, extendido, conformación y compactación de material de relleno para tubería	m3	91,36	$ 77.585,15	$ 7.088.400,00	83,02	$ 6.441.483,00	0,00	$ -	83,02	$ 6.441.483,00
4,8	Suministro y transporte de material para caja de inspección	und	110,00	$ 288.485,97	$ 31.953.456,00	24,00	$ 6.971.663,00	0,00	$ -	24,00	$ 6.971.663,00
4,9	Suministro y transporte de material para Pozos de Inspección D=1.20	ml	33,42	$ 780.265,17	$ 26.076.462,00	22,93	$ 17.891.480,00	0,00	$ -	22,93	$ 17.891.480,00
4,10	Suministro y transporte de material para Plantas de fondo en pozos de inspección D=1.20, e=0.20	und	19,00	$ 555.706,29	$ 10.559.370,00	17,00	$ 9.447.857,00	0,00	$ -	17,00	$ 9.447.857,00
4,11	Suministro y transporte de material para Tapas en pozos de inspección D=1.20, e=0.20, con tapa de aro con sucko de concreto	und	19,00	$ 1.037.411,00	$ 19.710.809,00	17,00	$ 17.635.987,00	0,00	$ -	17,00	$ 17.635.987,00
4,12	Excavaciones varias en material comun en seco a mano (para estructura de entrega final)	m3	24,00	$ 63.760,02	$ 1.530.240,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,13	Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI) para soladas, (para estructura de entrega final)	m3	0,19	$ 1.009.794,37	$ 195.395,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,14	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) (para estructura de entrega final)	m3	1,75	$ 1.266.779,89	$ 2.257.492,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,15	Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa (para estructura de entrega final)	kg	84,59	$ 10.799,49	$ 914.596,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,16	Relleno para Estructuras con recebo - para estructura de entrega final)	m3	14,40	$ 121.093,02	$ 1.743.739,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
				Sub - Total	**$ 422.662.268,00**		**$ 101.870.426,00**		**$ -**		**$ 101.870.148,00**

MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 4 Y/O LIQUIDACION

PROYECTO "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

En el Municipio de El Bagre, a los (12) días del mes de mayo de 2026 se reunieron en las oficinas de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB, por parte del contratista de Obra CONSORCIO PUERTO CLAVER, Representando WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ, por parte del contratista de intervención JORGE ANDRES SOTO CALLE y como SUPERVISOR, el ING. DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ, Director Técnico de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB con el fin de elaborar el ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 4 Y/O LIQUIDACION, realizado a la fecha por el contratista de Obra y revisado a satisfacción por parte de la interventoria y la supervisor, teniendo en cuenta las especificaciones y cantidades, según lo estipulado en el contrato de la referencia.

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO PUERTO CLAVER	**CONTRATO DE OBRA:**	N° 050-2025		% EJECUTADO	99,25%
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: INGECOR S.A.S	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	N° 062-2025	**PERIODO:** 11 DE ABRIL DE 2026 AL 12 DE MAYO	% IMPREVISTOS	0,75%
SUPERVISOR CONTRATO: DOIVER ANTONIO NISPERUZA (EDTB)	**FECHA DE PRESENTE ACTA:**	12/05/26		% ACUMULADO	100,00%

	PRESUPUESTO OFICIAL					CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No1		CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA PARCIAL N° 4 Y/O LIQUIDACION)		CANTIDADES ACUMULADAS	
No.	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL			CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
5,0	**Sistema de Red Alcantarillado Pluvial y Elementos de Conexión**										
5,1	Suministro, transporte é instalación de Tubería PVC Pluvial Ø 8". incluye maquinaria, equipos e insumos	ml	35,72	$ 179.175,14	$ 6.401.095,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,2	Suministro, transporte é instalacion de Tubería PVC Pluvial Ø 24". incluye maquinaria, equipos e insumos	ml	52,89	$ 748.063,84	$ 39.565.092,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,3	Suministro, transporte é instalacion de arena para protección de tubería, incluye maquinarias y equipos	m3	42,83	$ 76.109,50	$ 3.259.662,00	31,24	$ 2.377.610,00	0,00	$ -	31,24	$ 2.377.610,00
5,4	Suministro y transporte de material para Placa de Inspección D=1.20	ml	1,50	$ 780.268,17	$ 1.170.398,00	1,32	$ 1.029.950,00	0,00	$ -	1,32	$ 1.029.950,00
5,5	Suministro y transporte de material para Placas de fondo en pozos de inspección D=1.20, e=0.20	und	1,00	$ 555.756,28	$ 555.756,00	1,00	$ 555.756,00	0,00	$ -	1,00	$ 555.756,00
5,6	Suministro y transporte de material para Tapas en pozos de inspección D=1.20, e=0.20, con tapa de aro con nicho de concreto	und	1,00	$ 1.037.411,00	$ 1.037.411,00	1,00	$ 1.037.411,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.037.411,00
5,7	Sumidero Transversal SI-40	ml	22,50	$ 1.807.739,30	$ 36.174.134,00	30,01	$ 46.253.401,00	10,05	$ 16.163.568,00	30,01	$ 46.253.401,00
5,8	Excavaciones varias en material comun en seco a mano (para estructura de entrega final)	m3	32,00	$ 63.760,02	$ 2.040.321,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,9	Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI) para solados, (para estructura de entrega final)	m3	0,26	$ 1.009.794,37	$ 260.327,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,10	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) (para estructura de entrega final)	m3	2,38	$ 1.269.779,89	$ 3.009.869,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,11	Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa- (para estructura de entrega final)	kg	112,92	$ 10.799,49	$ 1.219.462,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,12	Relleno para Estructuras con recebo - (para estructura de entrega final)	m3	19,20	$ 121.093,02	$ 2.324.986,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
				Sub - Total	**$ 97.026.918,00**		**$ 53.254.128,00**		**$ 16.163.568,00**		**$ 53.254.128,00**
6,0	**Sistema de Red Acueducto y Elementos de Conexión**										
6,1	Suministro, transporte e instalacion de Tubería PVC U.M. RDE 21 Ø 3". incluye maquinaria, equipos e insumos	ml	934,39	$ 129.741,28	$ 121.228.954,00	889,83	$ 115.448.176,00	0,00	$ -	889,83	$ 115.448.175,00
6,2	Suministro, transporte e instalacion de acometida domiciliaria en manguera PF de 1/2 mm	m	550,00	$ 17.544,74	$ 9.649.608,00	753,06	$ 13.212.243,00	0,00	$ -	753,06	$ 13.212.243,00
6,3	Suministro, transporte e instalacion de kit de derivación domiciliaria en PVC de diámetro 3" x 1/2", incluye accesorios	und	110,00	$ 62.360,49	$ 6.859.654,00	153,00	$ 9.541.155,00	0,00	$ -	153,00	$ 9.541.156,00
6,4	Suministro, transporte e instalacion de Valvula de Compuerta Elástica de 3" HD JR	und	6,00	$ 483.868,91	$ 2.903.201,00	4,00	$ 1.935.468,00	0,00	$ -	4,00	$ 1.935.468,00
6,5	Suministro, transporte e instalacion Unión universal HD 3", incluye accesorios y demas elementos de tipicon	und	18,00	$ 359.801,23	$ 6.476.422,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,6	Suministro, transporte e instalacion de accesorio en codo de 45° - 3" RDE 21 PVC a Enlair	und	4,00	$ 121.385,92	$ 485.544,00	1,00	$ 121.386,00	0,00	$ -	1,00	$ 121.386,00
6,7	Suministro, transporte e instalacion de arena para protección de tubería, incluye maquinarias y equipos	m3	288,89	$ 76.109,50	$ 21.987.093,00	135,82	$ 10.337.111,00	0,00	$ -	135,82	$ 10.337.111,00
6,8	Suministro, transporte e instalacion de accesorio en Valvula ventosa 3" en HD JR	und	2,00	$ 692.486,57	$ 1.384.973,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,9	Suministro, transporte e instalacion de Tubería PVC U.M. RDE 21 Ø 8", incluye maquinaria, equipos e insumos	ml	299,20	$ 343.861,16	$ 102.853.258,00	316,50	$ 108.793.353,00	0,00	$ -	316,50	$ 108.793.353,00
6,10	Suministro, transporte e instalacion de accesorio en tapon de 8"	und	2,00	$ 286.395,92	$ 572.790,00	1,00	$ 286.395,00	0,00	$ -	1,00	$ 286.395,00
6,11	Suministro, transporte e instalacion de Accesorio en Tee HD JR para PVC de 6"X3"	und	1,00	$ 1.808.826,31	$ 1.808.828,00	1,00	$ 1.808.828,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.808.828,00
				Sub - Total	**$ 276.220.325,00**		**$ 261.454.114,00**		**$ -**		**$ 261.454.115,00**
7,0	**Señalizacion y Demarcaciones**										
7,1	Suministro e instalación de elementos de Señales verticales en fondo reflectivo Tipo Alta Intensidad con tablero en lámina cal 16, terminados en pintura electrostática blanca. (Manual Señalizacion MinT Colombia 2015)	und	37,00	$ 617.235,46	$ 22.837.712,00	34,00	$ 20.986.006,00	34,00	$ 20.986.006,00	34,00	$ 20.986.006,00
7,2	Concreto de 4000 psi para tránsito vehicular, con protuberancia de 10 cm y longitud a lo largo de la calzada (incluye refuerzo)	ml	17,20	$ 806.510,85	$ 13.871.983,00	16,64	$ 13.416.547,00	16,64	$ 13.416.547,00	16,64	$ 13.416.547,00
				Sub - Total	**$ 36.709.695,00**		**$ 34.402.553,00**		**$ 34.402.553,00**		**$ 34.402.553,00**

MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 4 Y/O LIQUIDACION

PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

En el Municipio de El Bagre, a los (12) días del mes de mayo de 2026 se reunieron en las oficinas de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB, por parte del contratista de Obra CONSORIO PUERTO CALVER, Representando WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ, por parte del contratista de interventoria JORGE ANDRES SOTO CALLE, y como SUPERVISOR, el ING. DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ, Director Tecnico de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB, con el fin de elaborar el ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 4 Y/O LIQUIDACION, realizado a la fecha por el contratista de Obra y recibido a satisfacion por parte de la interventoria y la supervision, teniendo en cuenta las especificaciones y cantidades, segun lo estipulado en el contrato de la referencia.

	CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO PUERTO CLAVER	CONTRATO DE OBRA:	N° 050-2025		% EJECUTADO: 99,25%
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: INGECOR S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	N° 057-2025	PERIODO: 11 DE ABRIL DE 2026 AL 12 DE MAYO	% IMPREVISTOS: 0,75%
	SUPERVISOR CONTRATO: DOIVER ANTONIO NISPERUZA (EDTB)	FECHA DE PRESENTE ACTA:	12/05/26		% ACUMULADO: 100,00%

No.	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No1		CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA PARCIAL N° 4 Y/O LIQUIDACION)		CANTIDADES ACUMULADAS	
								CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
	ITEMS NO PREVISTOS						$ 442.913.621,00		$ 64.742.925,18		$ 442.913.696,53
N.P.1	Suministro e instalacion de Bordillos de concreto de 3000 Psi, para confinamiento de calzada, dimensiones h=0.15, a=0.15 (bordillo antiguo en Pucas de Pavimento Divididas cada placa)	m		$ 67.913,82		1578,59	$ 107.207.557,00	947,30	$ 64.334.392,26	1578,59	$ 107.207.556,53
N.P.2	Suministro, transporte e instalacion de Tuberia PVC Alcantarillado Ø6", incluye maquinaria, equipos e insumos, y lubricante para unión mecánica	m		$ 154.193,14		654,22	$ 100.876.087,00		$ -	654,22	$ 100.876.096,66
N.P.3	Suministro, transporte e instalacion de Tuberia PVC Alcantarillado Ø 8", incluye maquinaria, equipos e insumos, y lubricante para unión mecánica	m		$ 179.175,14		583,44	$ 104.537.685,00		$ -	583,44	$ 104.537.684,78
N.P.4	Suministro, transporte e instalacion de Tuberia PVC Alcantarillado Ø 12", incluye maquinaria, equipos e insumos, y lubricante para unión mecánica	m		$ 265.309,91		313,32	$ 83.126.900,00		$ -	313,32	$ 83.126.900,10
N.P.5	Suministro, transporte e instalacion de Tuberia PVC Pluvial Ø 24", incluye maquinaria, equipos e insumos, y lubricante para unión mecánica	m		$ 725.448,43		18,00	$ 13.058.036,00		$ -	18,00	$ 13.058.035,69
N.P.6	Suministro, transporte e instalacion de Tuberia PVC Pluvial Ø 20", incluye maquinaria, equipos e insumos, y lubricante para unión mecánica	m		$ 548.923,09		58,28	$ 31.814.924,00		$ -	58,28	$ 31.814.923,91
N.P.7	Demolición de estructura, incluye retiro	m2		$ 97.640,27		26,16	$ 2.292.572,00	4,66	$ 408.592,93	26,16	$ 2.292.798,78

	COSTOS DIRECTOS	$ 2.699.842.970,00		$ 2.699.842.970,00		$ 246.023.161,34		$ 2.699.842.970,00		$ 2.699.842.970,00	
A/U	29,67%	$ 800.921.930,79	29,67%	$ 800.921.930,79	28,67%	$ 70.523.770,64	28,67%	$ 773.923.501,09		$ 3.473.766.471,09	
	TOTAL OBRA	$ 3.500.764.900,79		$ 3.500.764.900,79		$ 316.546.931,98		$ 3.473.766.471,09		$ 3.473.766.471,09	
	Guia Ambiental (PAGA)	$ 40.492.216,00		$ 40.492.216,00		$ 6.748.702,67		$ 40.492.216,00		$ 40.492.216,00	
	Plan Manejo Transito (PMT)	$ 64.082.710,00		$ 64.082.710,00		$ 10.680.461,67		$ 64.082.710,00		$ 64.082.710,00	
	TOTAL OBRA + PAGA + PMT	$ 3.605.339.826,79		$ 3.605.339.826,79		$ 333.976.096,31		$ 3.578.341.397,09		$ 3.578.341.397,09	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 3.605.339.826,79

ANTICIPO: $ 0,00 0,00%

VALOR A AMORTIZAR EN PRESENTE ACTA: $ 0,00 0,00%

VALOR ADICION DEL CONTRATO: $ 0,00 0,00%

VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA PARCIAL N°: 4 Y/O LIQUIDACION: $ 333.976.096,31 9,26%

IMPREVISTOS: $ 26.998.429,70 1,00%

TOTAL A PAGAR EN ACTA PARCIAL N° 4 Y/O LIQUIDACION: $ 360.974.516,01 10,01%

VALOR EN LETRAS SON:

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS Y TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE

Elabora:
EL CONTRATISTA

Firma:
Nombre: WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ
Representante Legal o su Apoderado
Contratista de Obra: CONSORCIO PUERTO CALVER
Matricula No /C.C. 98.650.618

Aprobo:
INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: JORGE ANDRES SOTO CALLE
Representante Legal o su Apoderado
Interventoria: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S
Matricula No /C.C. 1.143.373.420

Vo.Bo:

Firma:
Nombre: DOIVER ANTONIO NISPERUZA
Supervisor: Director Tecnico
Supervisor (EDTB)
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO PUERTO CLAVER
NIT 901.982.342-5
CRA 12A 2345
Tel: 3104057905
Planeta Rica - Colombia
consorcio050puertoclaver@gmail.com

No. FV 4

Señores	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIA EL BAGRE- EDTB			**Fecha y hora comprobante**	**Fecha de Vencimiento**
NIT	901.526.561-7	**Teléfono**	(604) 3113590471		
Dirección	cra 49 n 48a-56	**Ciudad**	El Bagre - Colombia	2026-08-10	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL N° 4. Y FINAL Objeto:CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO YOBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO,SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDEEL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURALDEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	1.00	360,974,516.01

Total items: 1

Total Bruto	360,974,516.01
Total a Pagar	360,974,516.01

Valor en Letras:
Trescientos sesenta millones novecientos setenta y cuatro mil quinientos dieciseis pesos mícte con un cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 360,974,516.01

Observaciones:

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CODIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2
		FECHA	23 (día)	2 (mes)	2026 (año)

(Este formato no aplica para reuniones diferentes a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 17
(Si numeración es una reanudación)

CONTRATO DE OBRA No. 050 DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO CLAVER

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CARRERA 32 ENTRE CALLE 35 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 33°, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 052 DE 2025

INTERVENTOR: INGECOR S.A.S

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Dover Nisperuza	Director Técnico	EDTS
Eder del toro	Director de obra	CONSORCIO PUERTO CLAVER
	Residente de Obra	CONSORCIO PUERTO CLAVER
Jorge Soto	Director de Interventoría	INGECOR S.A.S
Diego Camacho	Residente de Interventoría	INGECOR S.A.S
Carlos Andres Arrieta	Secretario Obras Publicas	SUPERVISOR ALCALDIA MUNICIPAL

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Avance de obra

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
sector 1 y 2
Imprevistos

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo las 9:00 am; se da inicio al comité técnico por parte de la EDTS, presentando un cordial saludo a fin de cumplir con la programación prevista para el desarrollo de la reunión.

Se solicita a todos los participantes del comité, que sea muy específicos en los comentarios, observaciones y con ello avanzar en el objetivo primordial de este comité generar compromisos y toma de decisiones que sirva al avance de la obra y lograr una reunión más productiva.

El Director Técnico por parte del contratista (Ing. Del Toro) expresa que se han ejecutado un 7,69% correspondiente entre el 23 de enero al 22 de febrero en la cual se han ejecutado:

Sector 2, se realizó excavación, mejoramiento, subbase granular del k0+290 al k0+310, y del k0+740 al k0+812, se fundió pavimento rígido del ambos costados del K0+297,08 - K0+318,07; K0+632,79 - K0+637,82; K0+639,24 - K0+647,62; K0+737,31 - K0+812; y el día de hoy se fundió el costado izquierdo del K0+699,77 - K0+737,81.

Ing. Mercado (Residente Obra) expresa que el día de mañana se dará inicio con la instalación del mejoramiento en el sector 1 del k0+220 al k0+200.

Ing. Camacho (Residente Interventoría) agrega que de acuerdo a reprogramación presentada por el Contratista un ejecutado programado acumulado es de 80,36% frente a un ejecutado acumulado del 82,75% dando una desviación de 2,73%, además expresa que falta por ejecutar un 17,27% en un periodo de 20 días de ejecución.

Del Toro (Director del Contratista) expone los imprevistos surgidos en desde el inicio de las actividades constructivas a la fecha:

1.Excavación manual de el manguera pf instalado en los sectores 1 y 2 la cual asciende a 225,92 m3, la cual fue necesaria ejecutar para la instalación en el sector 1 de 215,70 ml y en el sector 2 de 536,27 ml
2.Curvas en concreto curvas in situ en el sector tanto en el costado izquierdo como el derecho del sector 2 para encausar las aguas producto de la escorrentía
3.Instalación de una válvula de compuerta diámetro de 3" la cual resulta necesario instalar en el sector 2 en la bocanilla de la carrera 29A (costado izquierdo)

El director del contratista indica que las actas parciales presentadas y avaladas por la interventoría y con visto bueno del ente contratante no fueron pagados el 1% correspondiente al imprevistos en dichas actas parciales. El Ing Dover solicita que el contratista complete enviando para su respectiva verificación.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2
		FECHA	23 (Día)	2 (Mes)	2026 (Año)

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITE DE OBRA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervinieron, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Dolver Nisperuza	Dolver Nisperuza.
Carlos Mercado	Carlos A. Mercado Z
Eder Del Toro	
Jorge Andrés Solo Calle	
Diego Camacho	
Carlos Andres Arrieta	

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2
		FECHA	21 (Día)	4 (Mes)	2026 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 21
(La numeración será consecutiva)

CONTRATO DE OBRA No. 050 DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO CLAVER

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 38 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29°, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 052 DE 2025

INTERVENTOR: INGECOR S.A.S

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Dover Nisperuza	Director Técnico	EDTB
Eder del Toro	Director de obra	CONSORCIO PUERTO CLAVER
Carlos Maigado	Residente de Obra	CONSORCIO PUERTO CLAVER
Jorge Soto	Director de interventoría	INGECOR S.A.S
Diego Camacho	Residente de Interventoría	INGECOR S.A.S
Carlos Andres Arrola	Secretario Obras Publicas	SUPERVISOR ALCALDIA MUNICIPAL

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Avance de obra
Imprevistos.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA

sector 1 y 2

DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA

Siendo las 11:00 am se da inicio al comité técnico por parte de la EDTB, presentando un cordial saludo a fin de cumplir con la programación previsto para el desarrollo de la reunión.

Se solicita a todos los participantes del comité, que sean muy específicos en los comentarios, observaciones y con ello avanzar en el objetivo primordial de este comité generar compromisos y toma de decisiones que sirva el avance de la obra y lograr una reunión más productiva.

El Ing Camacho Residente por parte de la interventoría hace un resumen del contrato de obra 050/2025

1.Se presento una suspensión entre el dieciséis (16) de marzo de 2026 hasta el cinco (05) de abril de 2026, con una ampliación n°1 abarcado del treinta y uno (31) de marzo de 2026 al cinco (05) de abril de 2026, para un total de veintiún (21) días.
2.El Contratista de obra anexo a través del oficio EDTB-41-2026 la actualización de los pólizas con respecto al reinicio efectuado el día 06 de abril de 2026, cuya nueva fecha de terminación es el 12 de mayo de 2026.
3.El contratista ha presentado tres actas parciales de obra cuyo acumulado es de tres mil doscientos cuarenta y cuatro millones trescientos setenta y cinco mil trescientos diez pesos y setenta y ocho centavos, representado un acumulado ejecutado del 80,99%.
4.El contratista de obra posee un valor de imprevistos de veintiséis millones novecientos noventa y ocho mil cuatrocientos veintinueve pesos y setenta centavos equivalente al 1% lo cuales no fueron pagados en las actas parciales 1, 2 y 3 presentadas y avaladas por esta interventoría.

El Ing Dover Nisperuza toma la palabra y acota que dentro del A/U se le reconoce al contratista las pólizas cuyo porcentaje es del 1,19% el cual posee un valor de $32.126.131 y de acuerdo al pago realizado por el contratista en cuanto a la expedición de las pólizas para el contrato, con respecto al acta de inicio y las dos suspensiones este valor es de $ 23.290.283,53 y con ello una diferencia de $8.837.847,47 del cual se adjunta a este comité el cuadro correspondiente a las pólizas y sus revisiones.

Ing Del Toro toma la palabra y expresa que es de conocimiento por parte de la interventoría, ante contratista y la Supervisión por parte del Municipio de actividades que fueron necesarias ejecutar y analizadas en comité de obra #17 y #2, entre estas la construcción de cunetas de concreto, la instalación de una válvula en la b.c carrera 29° (costado izquierdo) en el sector 2, la excavación manual para la instalación de la máquina pf en el sector 1 y 2, la instalación de relleno con material de recebo para la tubería pluvial y de acueducto, así como también la grava para protección de la tubería sanitaria.

Ing Dover (EDTB), solicita que el contratista allegue con la interventoría los imprevistos acompañado de las memorias de cantidades, y los APU´S que darán legar a estos, para su aprobación.

Arq. Arrola (Secretario de Obras Publicas) las cunetas a construir en el costado derecho (k0+802,55 – k0+812) y en el costado izquierdo (k0+805,30 – k0+812), es necesario llevar a cabo de tal forma que permita transportar las aguas de escorrentía con esto proteger el pavimento rígido y su estructura, y añadir que dichos APU´S deben estar acorde a la región del bajo cauca.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
IMPREVISTOS	23/04/26	CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2
		FECHA	21 (Día)	4 (Mes)	2026 (Año)

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes podrá consignar las observaciones que considere pertinentes)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA

_____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Dorvel Nepomuceno	
Carlos Mercado	
Edier Del Toro	
Jorge Andrés Solo Calle	
Diego Camacho	
Carlos Andres Arrieta	

POLIZA	No de POLIZA	MONTO	No RESOLUCION	OBSERVACION
POLIZA DE SEGURIDAD DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES ESTATALES	C0Q-100006616	$ 22.004.695,79	090	CON RESPECTO AL CONTRATO DE FECHA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
POLIZA DE SEGURIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	C0Q-100001670	$ 845.971,00	090	CON RESPECTO AL CONTRATO DE FECHA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
POLIZA DE SEGURIDAD DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES ESTATALES	C0Q-100006616	$ -	097	CON RESPECTO AL ACTA INICIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
POLIZA DE SEGURIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	C0Q-100001670	$ -	097	CON RESPECTO AL ACTA INICIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026
POLIZA DE SEGURIDAD DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES ESTATALES	C0Q-100006616	$ 108.728,16	019_1	CON RESPECTO A LA SUSPENSION No1
POLIZA DE SEGURIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	C0Q-100001670	$ 171.717,00	019_1	CON RESPECTO A LA SUSPENSION No1
POLIZA DE SEGURIDAD DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES ESTATALES	C0Q-100006616	$ 61.710,58	029	CON RESPECTO A LA SUSPENSION No2
POLIZA DE SEGURIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	C0Q-100001670	$ 97.461,00	029	CON RESPECTO A LA SUSPENSION No2
	TOTAL	**$ 23.290.283,53**		
	VALOR POLIZA AIU	*$ 32.128.131,00*		
	DIFERENCIA	**$ 8.837.847,47**		

MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 35 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

CONSORCIO PUERTO CLAVER

INGECOR

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO PUERTO CLAVER	CONTRATO DE OBRA:	N° 058-2025	FECHA DEL IMPREVISTO:	MONTO	$ 35.836.277
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: INGECOR S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	N° 052-2025	may-25	EJECUCION	100%
SUPERVISOR CONTRATO: DOIVER ANTONIO NISPERUZA (EDTB)					

PRESUPUESTO							CANTIDADES EJECUTADAS		
No.	ESP INVIAS	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
		ITEMS NO PREVISTOS							$ 27.852.281,32
4,6		Suministro, transporte e instalacion de arena para proteccion de tubería, incluye maquinarias y equipos	M3		$ 76.109,50		32,34	76.109,50	$ 2.461.712,80
4,7		Suministro, extendido, conformación y compactación de material de receho para tubería.	M3		$ 77.585,15		54,39	77.585,15	$ 4.219.644,96
6,4		Suministro, transporte e instalacion de Valvula de Compuerta Ebtrea de 3" HD JR	UNO		$ 483.866,91		1,00	483.866,91	$ 483.866,91
NP08		Excavación manual, incluye retiro	M3		$ 83.432,27		226,92	83.432,27	$ 18.848.853,19
NP09		Construcción de cuneta en concreto de 3000 psi	M2		$ 119.885,51		15,33	119.885,51	$ 1.838.204,45
					SUB TOTAL				$ 27.852.281,32

COSTOS DIRECTOS	$ 27.852.281,32
AU	28,67% $ 7.983.995,85
TOTAL OBRA	$ 35.836.277,17
Guia Ambiental (PAGA)	$ -
Plan Manejo Transito (PMT)	$ -
TOTAL OBRA + PAGA + PMT	$ 35.836.277,17

Elaboro:
EL CONTRATISTA

Firma:
Nombre: WILSON FERNEY ACUDELO MUÑOZ
Representante Legal o su Apoderado
CONSORCIO PUERTO CALVER
Matricula No /C.C. 98.650.616

Aprobo:
INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: JORGE ANDRES SOTO CALLE
Representante Legal o su Apoderado
INGEMERÍA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S
Matricula No /C.C. 1.143.373.420

VoBo:

Firma:
Nombre: DOIVER ANTONIO NISPERUZA
Supervisor, Director Tecnico
Supervisor (EDTB)
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ITEM NO PREVISTOS	Código: Fecha: Abril 2026 Versión: Página:

OBJETO :

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 28 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

ITEM: Excavación manual, mdo y retiro — UNIDAD: M3

NP-08 — PRECIO UNITARIO: $ 83.432,27

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	CANT.	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
Herramienta menor	1,00	$ 48.887,88	5,00%	$ 2.444,39
retrocargador tipo (pajarita)	1,00	$ 850.000,00	0,02	$ 15.300,00
Volqueta sencilla	1,00	$ 1.200.000,00	0,01	$ 16.800,00
			Sub-Total	$ 34.544,39

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.
			Sub-Total	$ 0,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
				Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

PERSONAL		JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
2 AYUDANTES		161.330,00	3,30	$ 48.887,88
			Sub-Total	$ 48.887,88

TOTAL COSTO DIRECTO $ 83.432,27

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	%	V-TOTAL
Administracion	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
	Sub-Total 0,00%	-

TOTAL COSTO $ 83.432,27

Elaboro:
EL CONTRATISTA
Firma:
Nombre: WILSON F AGUDELO MUÑOZ
Representante Legal o su Apoderado
CONSORCIO PUERTO CLAVER

Aprobo:
INTERVENTORIA
Firma:
Nombre: JORGE ANDRES SOTO CALLE
Representante Legal o su Apoderado
INGECOR S.A.S

VoBo:
Firma: Dover Nisperuza
Nombre: DOVER ANTONIO NISPERUZA
Supervisor, Director Tecnico
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ITEM NO PREVISTOS	Código: Fecha: Abril 2026 Versión: Página:

OBJETO:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

ITEM:

Construcción de cuneta en concreto de 3000 psi

UNIDAD: M2

NP-09

PRECIO UNITARIO: $ 119.885,51

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
Herramienta menor	1,00	$ 48.088,69	5,00%	$ 2.404,43
Mezcladora de concreto 1 BULTO	1,00	$ 150.000,00	0,05	$ 7.500,00
Vibrador de concreto	1,00	$ 35.000,00	0,05	$ 1.750,00
Formaletas Metalicas lateral Rieles	1,00	$ 3.500,00	0,49	$ 1.730,58
			Sub-Total	$ 13.385,02

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.
Concreto mezclado en obra	m3	$ 584.118,00	0,10	$ 58.411,80
			Sub-Total	$ 58.411,80

III. TRANSPORTES

MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
				Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

PERSONAL		JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
1 OFICIAL 3 AYUDANTES		384.709,50	8,00	$ 48.088,69
			Sub-Total	$ 48.088,69

TOTAL COSTO DIRECTO $ 119.885,51

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	%	V-TOTAL
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	

TOTAL COSTO $ 119.885,51

Elaboro:
EL CONTRATISTA

Firma:
Nombre: **WILSON F AGUDELO MUÑOZ**
Representante Legal o su Apoderado
CONSORCIO PUERTO CLAVER

Aprobo:
INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: **JORGE ANDRES SOTO CALLE**
Representante Legal o su Apoderado
INGECOR S.A.S

Vo.Bo:

Firma: DORVER NISPERUZA.
Nombre: **DORVER ANTONIO NISPERUZA**
Supervisor, Director Tecnico
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

EDTB-50-2026

El Bagre Antioquia, 11 de mayo 2026

Ingeniero
Doiver Nisperuza
Director Técnico
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE
El Bagre, Antioquia

Referencia: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA."

Asunto: Actas de cierre no ejecutadas en los sector 1 y 2.

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos remitir información en el oficio del asunto de la referencia, correspondientes treinta (30) predios donde no fue posible llevar a cabo esta en las innumerables visitas efectuadas en vista que se encontraban cerradas y otras los propietarios no quisieron atender al personal de Consorcio Puerto Clover, aun cuando las misma presentan actas de inicio. A continuación se relacionan estás de acuerdo al respectivo sector de intervención:

1. Sector 1, seis (06) infraestructuras.
2. Sector 2, veinticuatro (24) infraestructuras.

Sin otro particular,

WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ
Representante Legal
CONSORCIO PUERTO CLAVER
Anexo: Registro fotográfico (8 folios).
C.C. Ing. Jorge Soto. Director Interventoria. INGECOR S.A

Recibido Diaz
11/05/2026
3:04pm

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

REGISTRO FOTOGRAFICO


SECTOR 1 (CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35)

	
Propietario y/o persona que atendió el acta de vecindad de inicio: Katerine Romero	**Propietario y/o persona que atendió el acta de vecindad de inicio:** Gildardo Villamizar
	
Propietario y/o persona que atendió el acta de vecindad de inicio: Luz Meza	**Propietario y/o persona que atendió el acta de vecindad de inicio:** Mauricio Mieles

	
Propietario y/o persona que atendió el acta de vecindad de inicio: Yudith Lopez	**Propietario y/o persona que atendió el acta de vecindad de inicio:** Rosa Moreno

SECTOR 2 (CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29A)

	
Propietario y/o persona que atendió el acta de vecindad de inicio: Esttefanny Gonzalez	**Propietario y/o persona que atendió el acta de vecindad de inicio:** DAVID Buelvas
	
Propietario y/o persona que atendió el acta de vecindad de inicio: Estefania Navarro	**Propietario y/o persona que atendió el acta de vecindad de inicio:** Yadira Chavez

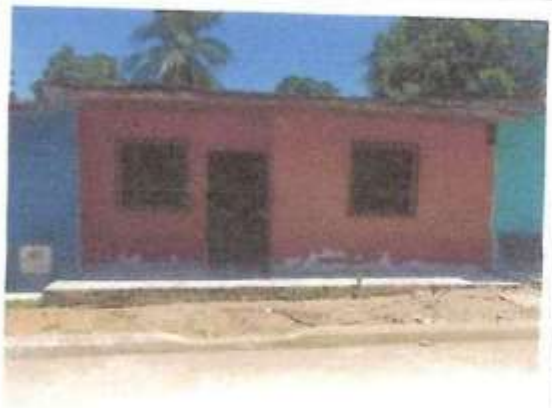	
Propietario y/o persona que atendió el acta de vecindad de inicio: Cruz Moreno	**Propietario y/o persona que atendió el acta de vecindad de inicio:** Eliana Polo
	
Propietario y/o persona que atendió el acta de vecindad de inicio: Angie Mesa	**Propietario y/o persona que atendió el acta de vecindad de inicio:** Rafael Montes
	
Propietario y/o persona que atendió el acta de vecindad de inicio: Eloina Novoa	**Propietario y/o persona que atendió el acta de vecindad de inicio:** Doris Benavides

	
Propietario y/o persona que atendió el acta de vecindad de inicio: Patricia Carmona	**Propietario y/o persona que atendió el acta de vecindad de inicio:** Maria Lopez
	
Propietario y/o persona que atendió el acta de vecindad de inicio: Edilsa Meza	**Propietario y/o persona que atendió el acta de vecindad de inicio:** Mirian Araujo

	
Propietario y/o persona que atendió el acta de vecindad de inicio: Darniris Payares	**Propietario y/o persona que atendió el acta de vecindad de inicio:** Doris Benavides
	
Propietario y/o persona que atendió el acta de vecindad de inicio: Doris Benavides	**Propietario y/o persona que atendió el acta de vecindad de inicio:** Marycelis Caceres

	
Propietario y/o persona que atendió el acta de vecindad de inicio: Elsi Seguanes	**Propietario y/o persona que atendió el acta de vecindad de inicio:** lidis Morales
	
Propietario y/o persona que atendió el acta de vecindad de inicio: Melida Salgado	**Propietario y/o persona que atendió el acta de vecindad de inicio:** Melida Salgado

	
Propietario y/o persona que atendió el acta de vecindad de inicio: Ana Chavez	**Propietario y/o persona que atendió el acta de vecindad de inicio:** Yazmin Vaquero

ANEXO 15. ACTAS DE COMITÉ.

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	7
		FECHA	4 (Día)	5 (Mes)	2026 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 22
(La numeración será consecutiva)

CONTRATO DE OBRA No. 050 **DE** 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO CLAVER

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 36 Y CALLE 36 CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 012 **DE** 2025

INTERVENTOR: INGECOR S.A.S

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Dolver Nisperuza	Director Técnico	EDTB
Edor del Toro	Director de obra	CONSORCIO PUERTO CLAVER
Carlos Mercado	Residente de Obra	CONSORCIO PUERTO CLAVER
Jorge Soto	Director de Interventoria	INGECOR S.A.S
Diego Camacho	Residente de Interventoria	INGECOR S.A.S
Carlos Andres Arrieta	Secretario Obras Publicas	SUPERVISOR ALCALDIA MUNICIPAL

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Avance de obra

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

sector 1 y 2

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo las 7:00 am se da inicio al comité técnico por parte de la EDTB, presentando un cordial saludo a fin de cumplir con la programación prevista para el desarrollo de la reunión.

Se solicita a todos los participantes del comité, que sea muy específicos en los comentarios, observaciones y con ello avanzar en el objetivo primordial de este comité generar compromisos y toma de decisiones que sirva al avance de la obra y lograr una reunión más productiva.

El Residente de obra por parte del contratista expresa que en el Sector 1 se fundió el concreto de MR = 40 kg/cm2 en la B.C calle 36 (costado derecho), B.C carrera 32 (costado izquierdo), B.C calle 35 (costado derecho) y la Calle carrera 32, se fundió bordillos en el costado derecho K0+173,94 a la B.C CARRERA 32 y en el costado izquierdo K0+173,94 al K0+435,75 a la K0+256,40. A su vez acota que el hoy se inicia con los bordillos en el sector 2 en el costado izquierdo del K0+296,40 AL K0+316,07.

El Ing. Camacho expresa que el porcentaje de avance acumulado al día de hoy es de 94,16%.

Ing. Dolver Nisperuza solicita que el contratista concluido el sector 1 de inicio a la actas de vecindad de cierre en este sector y radique las mismo a la entidad contratante.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

	FECHA	4	5	2026
		(Día)	(Mes)	(Año)

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITE DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES!

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Oliver Nisperuza	Oliver Nisperuza.
Carlos Mercado	Carlos A. Mercado Z
Eder Del Toro	
Jorge Andrés Solo Calle	
Diego Camacho	
Carlos Andres Arrieta	

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CODIGO			
		VERSION	1		
		PAGINA	1	DE	2

FECHA: 21 (DIA) | 4 (MES) | 2026 (AÑO)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 21

(Numeración consecutiva)

CONTRATO DE OBRA No. 050 **DE** 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO CLAVER

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 3e. CARRERA 32 ENTRE CALLE 35 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 062 **DE** 2025

INTERVENTOR: INGECOR S.A.S

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Dever Nisperuza	Director Tecnico	EDTS
Eder del toro	Director de obra	CONSORCIO PUERTO CLAVER
Carlos Mercado	Residente de Obra	CONSORCIO PUERTO CLAVER
Jorge Soto	Director de interventoria	INGECOR S.A.S
Diego Camacho	Residente de interventoria	INGECOR S.A.S
Carlos Andres Arrieta	Secretario Obras Publicas	SUPERVISOR ALCALDIA MUNICIPAL

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Avance de obra

Imprevistos.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA

sector 1 y 2

DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA

Siendo las 11:09 am; se da inicio al comité técnico por parte de la EDTS, presentando un cordial saludo a fin de cumplir con la programación prevista para el desarrollo de la reunión.

Se solicita a todos los participantes del comité, que sea muy específicos en los comentarios, observaciones y con ello avanzar en el objetivo primordial de este comité generar compromisos y toma de decisiones que sirva al avance de la obra y lograr una reunión más productiva.

El Ing Camacho Residente por parte de la interventoria hace un resumen del contrato de obra 050/2025

1.Se presento una suspensión entre el dieciséis (16) de marzo de 2026 hasta el cinco (05) de abril de 2026, con una ampliación n°1 abarcado del treinta y uno (31) de marzo de 2026 al cinco (05) de abril de 2026, para un total de veintiún (21) días.
2.El Contratista de obra radico a través del oficio EDTS-41-2026 la actualización de las pólizas con respecto al reinicio efectuado el día 06 de abril de 2026, cuya nueva fecha de terminación es el 12 de mayo de 2026.
3.El contratista ha presentado tres actas parciales de obra cuyo acumulado es de tres mil doscientos cuarenta y cuatro millones trescientos sesenta y cinco mil trescientos diez pesos y setenta y ocho centavos, representado un acumulado ejecutado del 89,99%.
4.El contratista de obra posee un valor de imprevistos de veintiséis millones novecientos noventa y ocho mil cuatrocientos ventinueve pesos y setenta centavos equivalente al 1% lo cuales no fueron pagados en las actas parciales 1, 2 y 3 presentadas y avaladas por este interventoria.

El Ing Dever Nisperuza toma la palabra y acota que dentro del AIU se le reconoce al contratista las pólizas cuyo porcentaje es del 1,19% el cual posee un valor de $32.128.131 y de acuerdo al pago realizado por el contratista en cuanto a la expedición de las polizas para el control, con respecto al acta de inicio y las dos suspensiones este valor es de $ 23.390.283,53 y con ello una diferencia de $8.837.847,47 del cual se adjunto a este comité el soporte correspondiente a las polizas y sus resoluciones.

Ing Del Toro toma la palabra y expresa que es de conocimiento por parte de la interventoria, ante contratante y la Supervisión por parte del Municipio de actividades que fueron necesarias ejecutar y analizados en comité de obra #17 y #2, entre estos la construcción de cunetas de concreto, la instalación de una válvula en el k 0 cámara 29ª (costado izquierdo) en el sector 2, la excavación manual para la instalación de la reguera pf en el sector 1 y 2, la instalación de relleno con material de recebo para la tubería pluvial y de acueducto, así como también la arena para protección de la tubería sanitaria.

Ing Dever (EDTS), solicita que el contratista oficialice con la interventoria los imprevistos acompañado de las memorias de cantidades, y los APU'S que dieron lugar a estos, para su aprobación.

Arq. Arrieta (Secretario de Obras Publicas) las cunetas a construir en el costado derecho (k0+802,53 – k0+812) y en el costado izquierdo (k0+805,30 – k0+812), es necesario llevarla cabo de tal forma que permita transportar las aguas de escorrentía con esto protegar el pavimento rígido y su estructura, y añade que dichos APU'S deben estar acorde a la región del bajo cauca.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
IMPREVISTOS	23/04/26	CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	de	2
		FECHA	21 (Día)	4 (Mes)	2020 (Año)

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que crea sean necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Dover Nisperuza	
Carlos Mercado	
Eder Del Toro	
Jorge Andrés Soto Calle	
Diego Camacho	
Carlos Andres Arrieta	

POLIZA	No de POLIZA	MONTO	No RESOLUCION	OBSERVACION
POLIZA DE SEGURIDAD DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES ESTATALES	C0Q-100006616	$ 22.004.695,79	090	CON RESPECTO AL CONTRATO DE FECHA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
POLIZA DE SEGURIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	C0Q-100001670	$ 845.971,00	090	CON RESPECTO AL CONTRATO DE FECHA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
POLIZA DE SEGURIDAD DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES ESTATALES	C0Q-100006616	$ -	097	CON RESPECTO AL ACTA INICIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
POLIZA DE SEGURIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	C0Q-100001670	$ -	097	CON RESPECTO AL ACTA INICIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026
POLIZA DE SEGURIDAD DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES ESTATALES	C0Q-100006616	$ 108.728,16	019_1	CON RESPECTO A LA SUSPENSION No1
POLIZA DE SEGURIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	C0Q-100001670	$ 171.717,00	019_1	CON RESPECTO A LA SUSPENSION No1
POLIZA DE SEGURIDAD DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES ESTATALES	C0Q-100006616	$ 61.710,58	029	CON RESPECTO A LA SUSPENSION No2
POLIZA DE SEGURIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	C0Q-100001670	$ 97.461,00	029	CON RESPECTO A LA SUSPENSION No2
	TOTAL	**$ 23.290.283,53**		
	VALOR POLIZA AIU	*$ 32.128.131,00*		
	DIFERENCIA	**$ 8.837.847,47**		

CONSORCIO
PUERTO CLAVER



CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29°, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.

MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

11 DE ABRIL DE 2026 AL 12 DE MAYO DE 2026.

Correo Electrónico: consorcio050puertoclaver@gmail.com
Dirección: CR 12 A # 23 - 45 BRR JERUSALEN
Planeta Rica - Córdoba

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
1.1. Localización 4
1.2. Ubicación del proyecto 5
2. INFORMACION CONTRATO DE OBRA 7
4.4.. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA 7
4.4.. RELACION DE POLIZAS 8
3. REPORTE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA 8
3.1. PROGRAMA MANEJO SOCIAL 8
3.2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 11
3.3. ACTIVIDADES AMBIENTALES 16
3.4. ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 20
3.5. MAQUINARIA Y EQUIPOS 21
3.6. RELACION DE PERSONAL DE OBRA. 23
3.7. MEDIDA DE SEGURIDAD Y CONTROL DE TRAFICO. 25
3.8. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 27
- Capacitación al personal de obra. 29
- Incidentes. 34
- Accidentes de trabajo. 34
- Análisis del ausentismo 35

3.9. INFORME GENERAL DEL TIEMPO 36
3.10. INFORME AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LA OBRA 36
3.11. OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO. 37
- ✓ BITACORA DE OBRA 38
- ✓ ACTAS DE COMITÉ 38
- ✓ CORRESPONDENCIA 38
- ✓ REGISTRO FOTOGRAFICO 38
- ✓ COSTOS DE OFICINA, PAPELRIA Y OTROS 38

4. CONCLUSIONES 40

1. INTRODUCCIÓN

El Bagre es un municipio de Colombia, localizado en la subregión del Bajo Cauca del departamento de Antioquia. Limita por el norte con el departamento de Bolívar, por el sur con los municipios de Segovia y Zaragoza, y por el oeste con los municipios de Zaragoza, Caucasia y Nechí. Su cabecera municipal está a 284 kilómetros de la ciudad capital Medellín.

El contrato cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"**, se desarrolla bajo las Especificaciones Técnicas de Construcción y con ello las normas mínimas de este, que, junto con los Esquemas, Planos y las Especificaciones Técnicas particulares, la Normatividad Técnica aplicable y el listado general de actividades, se desarrollan los ítems que forman parte integral y complementaria de la ejecución de las obras objeto del Contrato, el desarrollo de cada una de las actividades a ejecutar están basados en el manejo de los diferentes aspectos sociales, ambientales y de seguridad en el área de influencia; y así mismo, minimizar los efectos negativos producto de la ejecución de la obra en cada una de las etapas pertenecientes al proyecto.

Este cuarto y/o informe de liquidación contiene toda la información detallada y relacionada con las acciones desarrolladas en el periodo del 11 de abril de 2026 al 10 de mayo de 2026 y con ello las actividades ejecutadas en el tramo denominado el sector 1 con la excavación, mejoramiento, subbase de la calzada desde el k0+220 al k0+290, instalación de subbase

granular (k0+180 – k0+290) e instalación de pavimento rígido (K0+177,93 - K0+285,14; K0+285,97 - k0+296); además en el sector 2 se llevó a cabo el corte de calzada, mejoramiento, subbase granular del k0+740 al k0+810 y del k0+290 al k0+310, e instalación del pavimento rígido en ambos costados del K0+297,08 al K0+318,07; K0+632,79 al K0+637,82; K0+639,24 al K0+647,82; K0+737,81 - K0+812; y del costado izquierdo del K0+699,77 al K0+737,81 y demás actividades detalladas en las memorias de cantidades del acta parcial 3.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Bagre es uno de los seis municipios de la subregión del Bajo Cauca del departamento de Antioquia, situado a 326 kilómetros de la ciudad de Medellín. Su extensión es de 1.563 km², de los cuales solo 10,8 km² se encuentran urbanizados, constituyéndose el área restante en zona rural. Con relación a las fronteras, limita por el norte con el municipio de Nechí; por el sur con los municipios de Zaragoza y Segovia, por el este con las serranías de San Lucas y Santa Bárbara en el departamento de Bolívar; por el occidente con los municipios de Caucasia y Zaragoza. La cabecera municipal se encuentra ubicada a orillas del río Nechí, en la confluencia con el río Tigüí, el cual es afluente del río Nechí y éste del río Cauca.

1.1. Localización



Figura 1. Localización general del municipio de El Bagre

Geográficamente la vía en estudio se localiza en las Coordenadas que se detallan a continuación:

TRAMO	LUGAR	INICIO		FINAL	
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD
01	Corregimiento de Puerto Claver - tramo 1	7°42'41.99"N	74°45'7.73"W	7°42'43.16"N	74°45'23.46"W
02	Corregimiento de Puerto Claver – tramo 2	7°42'43.16"N	74°45'23.46"W	7°42'51.91"N	74°45'25.51"W

Tabla 1. Coordenadas de los dos tramos de ejecución. **Fuente:** Consorcio Puerto Claver.

1.2. Ubicación del proyecto

El área en estudio está ubicada en el Corregimiento de Puerto Claver al norte de la cabecera municipal de El Bagre en la subregión Bajo Cauca, en la carrera 31d entre calle 38 y calle 36, carrera 32 entre calle 36 y calle 35, calle 35 entre carrera 32 y carrera 29°, cuyas condiciones actuales no ha permitido desarrollar una malla vial continua y coherente con las expectativas actuales en dicho corregimiento, conformada por terreno natural y materiales mixtos de relleno sin una base estabilizada, lo que ha generado un avanzado deterioro superficial, hundimientos y una incapacidad para soportar el tráfico vehicular, el resultado de esto es una red vial de tránsito peligroso para aquellos que requieren transitar de seguridad y confort para la circulación del transporte y con el aumento acelerado que ha experimentado el corregimiento de Puerto Claver en los últimos años.

La vía en estudio está dividida en dos tramos el primero comprende el **TRAMO 1** en la carrera 31D entre calle 38 y calle 36, carrera 32 entre calle 36 y calle 35, **TRAMO 2** desde la calle 35 entre carrera 32 y carrera 29ª, y el tal y como se observa en la figura 2, acorde con los sectores de diseño proyectados.



Imagen 1. Localización sector 1 y 2. **Fuente:** GOOGLE EARTH.

2. INFORMACION CONTRATO DE OBRA

4.4.. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA

Número del Contrato	No. 050 de 2025
Objeto del Contrato	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29°, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA
Valor del Contrato	TRES MIL SEISCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 3.605.339.826,79) INCLUIDO EL A.U. Y DEMAS COSTOS A QUE HAYA LUGAR
Contratante	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB
NIT. No.	901.526.561-7
Contratista	CONSORCIO PUERTO CLAVER
NIT. No.	901.982.342-5
Plazo Inicial	SEIS (06) MESES
Anticipo (50%)	N/A
Interventoria:	INGENIERIA DE CORDOBA INGECOR S.A.S
NIT. No.	901.281.531-2
Fecha de Suscripción Contrato	1 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Acta de Inicio	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Acta de Suspensión No1:	12 DE DICIEMBRE DE 2025
Acta de Ampliación No1 Suspensión No1:	11 DE ENERO DE 2026
Acta de Suspensión No2:	16 DE MARZO DE 2026
Acta de Ampliación No1 Suspensión No2:	31 DE MARZO DE 2026
Fecha de terminación	12 DE MAYO DE 2026

ANEXO 2. ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025 | Contrato de Interventoría No. 052/2025 | Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección: | Teléfonos: 3205120055

Nombre de la persona que atiende la visita: Diana Basilios | CC No. 33297393

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva | 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Diana Basilios | CC No. 33297393

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

...AS

Firma: X Diana Basilio
Nombre:
Responsable y/o Propietario
C.C. O NIT: X 33297393

Firma: Carlos A Mercado Z
Nombre: Carlos Mercado
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.:01037-0654602 ANT

Firma:
Nombre: Diego Camacho
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 69202-276114 STD

Firma:
Nombre
Testigo
C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Se realizó la inspección de la vivienda. en el cual se encontró desprendimiento de pintura, en paredes. parte inferior de fachada no se visualizan fachadas laterales, multiples fisuras, tiene cerramiento en muro de concreto, enrejado en metal, con rampa para acceso.	
La propietaria manifiesta que no fue afectada durante el proceso de ejecución de la obra de pavimento rigido y obras complemetarias.	
firma a satisfacción la presente acta.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Dianna Basilio	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 33297393	Matrícula profesional No.: 011037-0554602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

PISO EXTERIOR





PARED FRONTAL



PARED LATERAL



Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 38 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección		Teléfonos	3205537818
Nombre de la persona que atiende la visita:	Jorge Martinez	CC No.	1040494170
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Jorge Martinez	CC No.	1040494170.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo.	

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable y/o Propietario C.C. O NIT:	x Jorge Martinez. x 1.040.494.770	Firma Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 01 1037-0654602 ANT	Carlos A. Mercado Z	Firma Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD		Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:	

CONSORCIO PUERTO CLAVER	**ACTA DE VECINDAD**	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 059/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Se procedió a la revisión de la vivienda para verificar el estado general de la misma.	
No se persiben alteraciones o afectaciones a la estructura. que pudieran ser ocasionadas durante las intervensiones de la construccion del pavimento y obras complementarias.	
El propietario manifiesta entera satisfacción y afirma no haber tenido ningun tipo de daño o inconveniente durante la ejecucion de la obra.	
Firma a satisfaccion.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: [signature]	Firma: [signature]	Firma: [signature]	Firma: [signature]
Nombre: Jorge Martinez	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre:
Responsable y/o Propietario	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 1.040.494.170	Matrícula profesional No. 011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

FACHADA FRONTAL Y LATERAL DERECHA



PISO INTERIR



TECHO



PISO EXTERIOR LATERAL



Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 053/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección		Teléfonos	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Yojaira Julio	CC No.	43692223
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Yojaira Julio	CC No.	43692223

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable y/o Propietario C.C. O NIT:	x Yojaira Julio x 43 692 223	Firma Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No. 011037-0654602 ANT	Carlos A. Mercado 7	Firma Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 68202-278114 STD		Firma Nombre: Testigo C.C. O NIT:	

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
El propietario no permitió el acceso a la vivienda.	
Manifiesta que no presentó daños o afectaciones, firma a conformidad la presente acta.	

Firma el acta de cierre a satisfacción: SI [X] NO [ ]

Firma: X Josaira Julio	Firma: Carlos A. Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: X 43692 223	Matrícula profesional No.:011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

FACHADA



PISO EXTERIOR



Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de obeervaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección		Teléfonos	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Cristian Martinez	CC No.	1040503064
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Cristian Martinez	CC No.	1040503064

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI	NO
		X

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable y/o Propietario C.C. O NIT:	Firma Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:011037-0654602 ANT	Firma Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:
1040503064			

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 062/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Se realizó la inspección a la vivienda hasta donde el propietario permitió el acceso. el estado de predio despues de las actividades obra no muestran alteraciones o afectaciones	
El propietario firma a satisfaccion la presente acta de cierre.	

Firma al acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: [signature]	Firma: Carlos A Mercado Z	Firma: [signature]	Firma: [signature]
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre:
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoria	Testigo
C.C. O NIT: 1040503064	Matricula profesional No.:811037-0654602 ANT	Matricula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales idóneos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO	
PISO	PARED
	
TECHO	PARED LATERAL DERECHA
	

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección		Teléfonos	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Evelio Julio Macias	CC No.	1040502595
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Evelio J. Macias	CC No.	1040502595

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI	
	NO	

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES)
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Evelio Julio Macias	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 1040502595	Matrícula profesional No.:011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-275114 STD	C.C. O NIT:

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Se realiza la visita al predio, el usuario no permitió el ingreso a la vivienda, manifiesta que no hubo afectaciones y que está satisfecho con la ejecución de la obra. y con las condiciones generales en las que se encuentra su vivienda.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: x Evelio Tulio	Firma: Carlos A. Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: x 1040502595	Matrícula profesional No. 011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No. 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

PISO EXTERIOR





PISO EXTERIOR





Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 059/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección		Teléfonos	3216418677
Nombre de la persona que atiende la visita:	Marley Montes	CC No.	43896622
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Marley Montes	CC No.	43896622

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable y/o Propietario C.C. O NIT:	Marley Montes 43896622	Firma: Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 011037-0654602 ANT	Carlos A. Mercado Z	Firma: Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD		Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:	

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 39 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoria No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Dia / Mes / Año)
Durante la visita a la vivienda se logró verificar el estado general de la misma, Se encuentra en optimas condiciones, y el propietario no manifiesta ninguna inconformidad.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: X Mayley Montes
Nombre:
Responsable y/o Propietario
C.C. O NIT: X 43896622

Firma: Carlos A Mercado Z
Nombre: Carlos Mercado
Ing. Residente Contratista
Matricula profesional No.:0110370654602 ANT

Firma:
Nombre: Diego Camacho
Ing. Residente Interventoria
Matricula profesional No.: 68202-276114 STD

Firma:
Nombre
Testigo
C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoria, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO	
PISO INTERIOR	PARED LATERAL IZQUIERDA
	
TECHO	PARED
	

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29F, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección		Teléfonos	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Jojaira Julio	CC No.	43692223
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Beatriz Restrepo	CC No.	

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable y/o Propietario C.C. O NIT:	Jojaira Julio 43 692 223	Firma Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No. 011037-0654602 ANT	Carlos A. Mercado Z	Firma Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD		Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:	

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE AQUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29F, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Durante la visita me recibió un encargado del predio. el cual manifestó que no existe ningun daño o afectación. y mediante una llamada telefónica. el propietario autorizó a la señora Yajaira Julio firmar el acta a conformidad.	


Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: Yajaira Julio	Firma: Carlos A. Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 43 692 223	Matrícula profesional No. 011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:


Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

PARED FACHADA

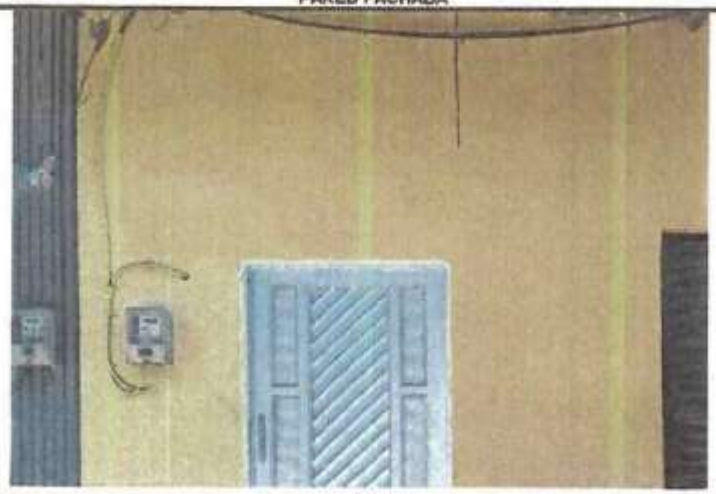

ACCESO

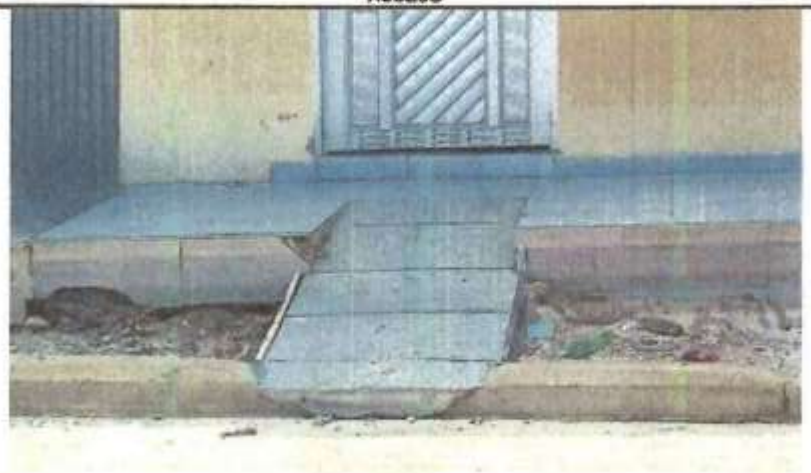

FACHADA



PARED FACHADA



Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 38 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección		Teléfonos	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Jojaira Julio.	CC No.	43692223
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Beatriz Chavez	CC No.	

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hay afectación.

FIRMAS

Firma: Jojaira Julio Nombre: Responsable y/o Propietario C.C. O NIT: 43 692 223	Firma: Carlos A. Mercado Z Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No. 011037-0654802 ANT	Firma: Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	Firma: Nombre Testigo C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 060/2025	Contrato de Interventoría No. 062/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Durante la visita al predio, Se visualiza un local. con piso exterior en cerámica en buen estado general, no se permitio el ingreso.	
La persona encargada manifiesta que en el interior no se presentó ningún tipo de alteracion o afectación.	
El Responsable de la vivienda autoriza a la señora Jayara Julio firmar el acta a satisfacción sin ningun requerimiento adicional.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: X Josaira Julio
Nombre:
Responsable y/o Propietario
C.C. O NIT: X 43 692 223

Firma: Carlos A. Mercado Z
Nombre: Carlos Mercado
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.:011037-0654602 ANT

Firma:
Nombre: Diego Camacho
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD

Firma:
Nombre
Testigo
C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025 | Contrato de Interventoría No. 052/2025 | Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección: | Teléfonos:

Nombre de la persona que atiende la visita: Yojaira Julio | CC No. 43 692 223

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Yojaira Julio | CC No.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación

FIRMAS

Firma: x Yojaira Julio Nombre: Responsable y/o Propietario C.C. O NIT: x 43 692 223	Firma: Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No. 011037-0654602 ANT	Firma: Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	Firma: Nombre Testigo C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER	**ACTA DE VECINDAD**	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Durante la visita no se procedió al ingreso de la vivienda a conformidad de la propietaria, la cual manifiesta que no existen afectaciones, daños o inconformidad por las condiciones actuales del predio	

Firma el acta de cierre a satisfacción: SI [X] NO [ ]

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Jaiver Julio	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 43 692 223	Matrícula profesional No. 011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 38 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección		Teléfonos	
Nombre de la persona que atiende la visita:		CC No.	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		
Nombre del responsable / propietario de la construcción:		CC No.	

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
Piso exterior	1

FIRMAS

Firma Nombre: **Responsable y/o Propietario** C.C. O NIT: 42887680	Firma Nombre: Carlos Mercado **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No. 011037-0554602 ANT	Firma Nombre: Diego Camacho **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	Firma Nombre **Testigo** C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Se procedió a la inspección de la vivienda. donde se visualiza alteraciones en el piso exterior de la vivienda, La paredes en el interior y exterior no presentaron daños. piso interior sin alteraciones, La propietaria manifiesta. que a excepción del piso exterior no se presentaron daños en el predio	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma:	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 1038960886	Matrícula profesional No.: 0110370654802 ANT	Matrícula profesional No.: 68203-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

PISO EXTERIOR





PISO INTERIOR



PARED



Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BAIRRO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025 | Contrato de Interventoría No. 052/2025 | Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección: | Teléfonos: 3232906638

Nombre de la persona que atiende la visita: Olbar Perez | CC No. 8200694

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva: 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Olbar Perez | CC No. 8 200 694

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto: SI ☐ NO ☐

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES)
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma: Olbar Perez	Firma: Carlos A. Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre: Responsable y/o Propietario	Nombre: Carlos Mercado. Ing. Residente Contratista.	Nombre: Diego Camacho. Ing. Residente Interventoría	Nombre: Testigo
C.C. O NIT: 8200.694	Matrícula profesional No.:0110370654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Se realizó la visita a la tienda, el predio se encuentra en buenas condiciones generales no se visualizan alteraciones o cualquier tipo de afectación o alteración a fachada o en el interior de la vivienta.	
Propietarios manifiestan que no tubo afectaciones y firman a conformidad la presente acta.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Olbar Perez	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre:
Responsable y/o Propietario	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 8202.694	Matrícula profesional No. 011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

PISO INTERIOR	PARED
	
PARED	**TECHO**
	

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 28ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección		Teléfonos	3232906638
Nombre de la persona que atiende la visita:	Olbar Perez	CC No.	8200694
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Olbar Perez	CC No.	8200694

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI	
	NO	X
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo		
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo		

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable y/o Propietario C.C. O NIT:	Olbar Perez 8200694	Firma Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No. 011037-0654902 ANT	Carlos A. Mercado Z	Firma Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD		Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:	

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Se realiza la inspeccion al predio. piso exterior e interior con ceramica, el estado general de la vivienda no presenta afectacion, El Propietario expresa que no tiene anomalias en la vivienda y firma a satisfaccion la presente acta	

Firma el acta de cierre a satisfacción: SI [X] NO [ ]

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Olbar Perez	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre:
Responsable y/o Propietario	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 8200.694	Matrícula profesional No.:011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregara al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

PARED DE FACHADA	PARED INTERIOR
	
PIS INTERIOR	**PARED INTERIOR**
	

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	**Acta de Vecindad de Cierre**

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección		**Teléfonos**	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Yojaira Julio	CC No.	43692223
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Yojaira Julio	CC No.	43692223

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma: x Yojaira Julio Nombre: **Responsable y/o Propietario** C.C. O NIT: x 43 692 223	Firma: Carlos A. Mercado Z Nombre: Carlos Mercado **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.: 311037-0654602 ANT	Firma: Nombre: Diego Camacho **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	Firma Nombre **Testigo** C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER	**ACTA DE VECINDAD**	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Durante la visita el propietario expresa que no tuvo ningún tipo de afectación en la vivienda, manifiesta conformidad y satisfacción con las actividades realizadas.	
Se visualiza el exterior de la vivienda en buen estado general, conservando las condiciones preexistentes	
No se ingresó a la vivienda a conformidad del propietario	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: Nombre: Jagaira Ruzio **Responsable y/o Propietario** C.C. O NIT: 43 692 723	Firma: Nombre: Carlos Mercado **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.: 011037-0654602 ANT	Firma: Nombre: Diego Camacho **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.: 68202 275114 STD	Firma: Nombre: **Testigo** C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

PARED FACHADA



FACHADA



PISO EXTERIOR



Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025 | Contrato de Interventoría No. 052/2025 | Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección: | Teléfonos:

Nombre de la persona que atiende la visita: Yojaira Julio | CC No. 43692223

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva | 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Yojaira Julio | CC No. 43692223

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto: SI ☐ NO ☐

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES)
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación

FIRMAS

Firma
Nombre: x Yojaira Julio
Responsable y/o Propietario
C.C. O NIT: x 43 692 223

Firma
Nombre: Carlos Mercado
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.:011037-0854602 ANT

Firma
Nombre: Diego Camacho
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29°, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Durante la visita el propietario expresó que no tuvo ningún tipo de afectación en la vivienda, manifiesta conformidad y satisfacción con las actividades realizadas.	
Se visualiza el exterior de la vivienda en buen estado general conservando las condiciones preexistentes.	
No se ingresó a la vivienda a conformidad del propietario	

Firma el acta de cierre a satisfacción: SI [X] NO [ ]

Firma: X Nombre: Josaito Julio Responsable y/o Propietario C.C. O NIT: 43 692 723	Firma: Carlos A. Mercado Z Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:011037-0654602 ANT	Firma: Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	Firma: Nombre: Testigo C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales idóneos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

PARED FACHADA



PISO EXTERIOR



FACHADA



Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección		Teléfonos	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Jopina Julio	CC No.	43692223
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Jopina Julio	CC No.	43692223

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI	NO
		X

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable y/o Propietario C.C. O NIT:	Jopina Julio 43.692 223	Firma Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No. 011037-0854602 ANT	Carlos A. Mercado Z	Firma Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD		Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:	

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025 | Contrato de Interventoría No. 062/2025 | Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Durante la visita el propietario manifiesta que no tuvo ningún tipo de afectacion en la vivienda, manifiesta conformidad y satisfacción con las actividades ejecutadas	
Se visualiza el exterior de la vivienda en buen estado general conservando las condiciones preexistentes en el acta de inicio.	
No se ingresó a la vivienda a conformidad de propietario	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: *Josaira Julio	Firma: Carlos A. Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: * 43 692 223	Matrícula profesional No. 011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del analista de gestión social del proyecto.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO
CERRAMIENTO / FACHADA









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 650/2025	Contrato de Interventoría No. 652/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección		Teléfonos	3218538081
Nombre de la persona que atiende la visita:	Lina Marcela Basilio	CC No.	1001741569
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Lina Basilio	CC No.	820503

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI	
	NO	X
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo		
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo		

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectacion en la vivienda.

FIRMAS

Firma Nombre: Lina marcela Basilio G. **Responsable y/o Propietario** C.C. O NIT: 1001741564	Firma Nombre: Carlos Mercado **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No. 01103/-0654802 ANT	Firma Nombre: Diego Camacho **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No. 68202-278114 STD	Firma Nombre **Testigo** C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER	**ACTA DE VECINDAD**	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoria No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Dia / Mes / Año)
No afecto en la vivienda.	
la propietaria de la vivienda. no permitio el acceso.	
Expresa que no sufrió ningún tipo de afectación o alteración a la vivienda.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma:	Firma	Firma	Firma
Nombre: Erica Marcela Bustillo G.	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoria**	**Testigo**
C.C. O NIT: 1001741569.	Matricula profesional No.:011037-0554602 ANT	Matricula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se lleno en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoria, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

FACHADAS





PISO EXTERIOR



Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor. Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 07/ 05 / 2026


Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección		Teléfonos	3207257951
Nombre de la persona que atiende la visita:	Yuliana Petro	CC No.	1068811324
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Modesto Pineda	CC No.	797923

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA

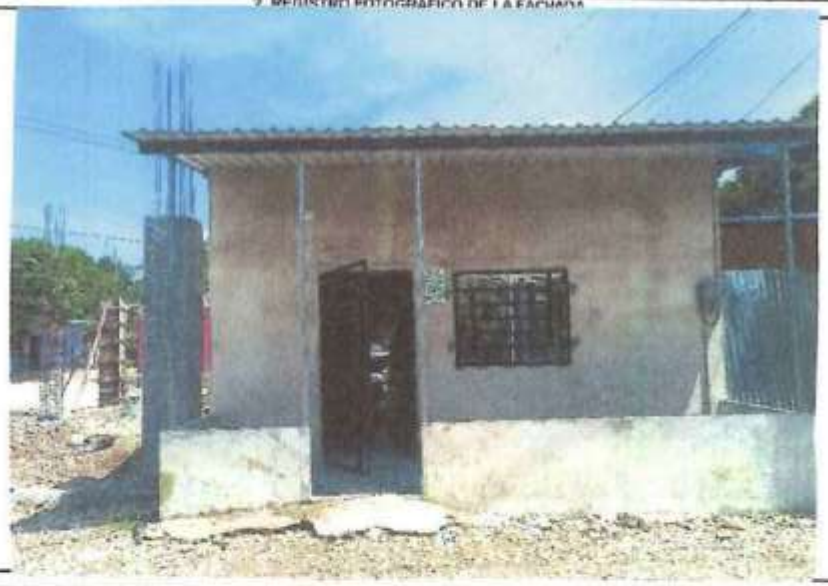

3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construccion sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCION DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma: X Yuliana Petro Nombre: Responsable y/o Propietario C.C. O NIT: X1068811324	Firma: Carlos A. Mercado Z Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:011037-0654602 ANT	Firma: Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 68202-278114 STD	Firma: Nombre Testigo C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 38 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA: 07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Durante la visita el propietario manifiesta que no tuvo ningun tipo de afectación en la vivienda, expresa conformidad y satisfaccion con las actividades ejecutadas.	
No se ingresó a la vivienda a conformidad del propietario	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: X Nombre: Yuliana Pelro Responsable y/o Propietario X 1046811324 C.C. O NIT:	Firma: Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No :011037-0654602 ANT	Firma: Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No : 68207-276114 STD	Firma: Nombre Testigo C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

PARED DE FACHADA



CONTRAFACHADA



ACCESO



Notas: 4, En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSION	1
PAGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 35, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 059/2025	Contrato de Interventoria No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección: Teléfonos:

Nombre de la persona que atiende la visita: Elvira Fleres CC No. 22247445

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva: 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Isabel Mercado CC No. 4553004

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI	
	NO	X
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo		
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo		

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable y/o Propietario C.C. O NIT:	Firma Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matricula profesional No. 011027-0654602 ANT	Firma Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoría Matricula profesional No.: 68202-276114 STD	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:
Elvira Fleres. 22247445	Carlos A. Mercado Z		

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRÉ, ANTIOQUIA.
FECHA	07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	**Acta de Vecindad de Cierre**

ACTIVIDAD REALIZADA	**FECHA** (Día / Mes / Año)
La persona que atiende la visita manifiesta que la vivienda no presentó ningun tipo de daño.	
Se visualiza el exterior, piso exterior sin daños, paredes	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma * Elvira Flores	Firma ? Carlos A Mercado ?	Firma	Firma
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario *	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 22247445	Matrícula profesional No: 011037-0854602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

PISO EXTERIOR	PARED LATERAL
	
PISO EXTERIOR	PARED LATERAL
	

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025
Acta de Vecindad de Cierre	FECHA 07/ 05 / 2026

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección: Teléfonos:

Nombre de la persona que atiende la visita: Naydid Reyes CC No. 1072265482

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Isabel Mercado Castro CC No. 45530013

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación

FIRMAS

Firma: x Naydid	Firma: Carlos A. Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre:
Responsable y/o Propietario	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No. 011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 36, CALLE 36 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29°, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Durante la visita, La persona que atiende expresa que no hubo daños o afectaciónes al predio.	
No autoriza el ingreso a la vivienda.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: Naidid	Firma: Carlos A. Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No. 011037-0854602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

PARED FACHADA



PISO EXTERIOR



Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025
Acta de Vecindad de Cierre	FECHA: 07/ 05 / 2026

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección		**Teléfonos**	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Wendy Soto Bohorquez	CC No.	55 302 121
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Thon Tulio	CC No.	8362928.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI: ☐ NO: ☒
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hay afectación

FIRMAS

Firma Nombre: **Responsable y/o Propietario** C.C. O NIT: 55302121	Firma Nombre: Carlos Mercado **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.: 011037-0654602 ANT	Firma Nombre: Diego Camacho **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.: 68702-279114 STD	Firma Nombre **Testigo** C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 38 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29°, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 060/2025	Contrato de Interventoría No. 062/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Se visualiza lote con vivienda en construcción.	
No existen daños, o inconformidades.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	TesSgo
C.C. O NIT: 55 [illegible]	Matrícula profesional No: 0110370654602 ANT	Matrícula profesional No.: 6A202-278114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO







Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025 | Contrato de Interventoría No. 052/2025 | Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección: | Teléfonos:

Nombre de la persona que atiende la visita: Wendy Soto Bolaños CC No. 55302121

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva: 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Jhon Julio CC No. 8362928

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto: SI ☐ NO ☐

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES)
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma: Nombre: Responsable y/o Propietario C.C. O NIT: 55302121

Firma: Nombre: Carlos Mercado. Ing. Residente Contratista. Matrícula profesional No. 011037-0654602 ANT

Firma: Nombre: Diego Camacho. Ing. Residente Interventoría. Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD

Firma: Nombre: Testigo C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 38 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Local comercial, con repello, pintada de amarillo, fisuras en la parte superior de la fachada. y en el interior del local, No posee cerramiento.	
La persona que atende la visita expresa que no se presentaron daños o afectaciones al predio.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: [signature]	Firma: [signature]	Firma: [signature]	Firma: [signature]
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario X 33382124	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.: 011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-278114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

PISO INTERIOR




PARED



TECHO



PARED

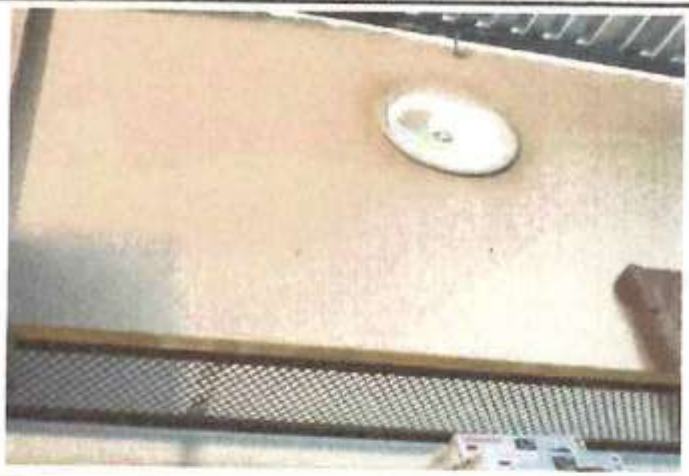

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 28ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025 | Contrato de Interventoría No. 052/2025 | Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección: | **Teléfonos:** 3113731692.

Nombre de la persona que atiende la visita: Juan Atencia. | CC No. 8203 454.

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva: 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Jhon Julio | CC No. 8362928

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto: SI ☐ NO ☐

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES)
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hay afectaciones.

FIRMAS

Firma: x
Nombre:
Responsable y/o Propietario
C.C. O NIT: x 8'203.454

Firma
Nombre: Carlos Mercado
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No. 011037-0654602 ANT

Firma
Nombre: Diego Camacho
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 38 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Se procede a la realización de recolección de evidencia fotográfica, se evidencia acceso con rampa de concreto con desgaste, piso exterior con grietas, concreto liso pigmentado grietas en paredes del interior con multiples fisuras. El que atiende la visita expresa que son condiciones existentes antes de dar inicio a las actividades ejecutada por objeto del contrato. Y manifiesta que no existen alteraciones al predio.	

Firma el acta de cierre a satisfacción / SI [X] NO [ ]

Firma Nombre: **Responsable y/o Propietario** C.C. O NIT: x 8'203.454	Firma Nombre: Carlos Mercado **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.:011037-0654602 ANT	Firma Nombre: Diego Camacho **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	Firma Nombre **Testigo** C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

PAREDES





PAREDES





Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 38 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 060/2025	Contrato de Interventoría No. 057/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección		Teléfonos	3146478384
Nombre de la persona que atiende la visita:	Rut Jimenez	CC No.	43893750
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Jhon Julio	CC No.	8362928

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable y/o Propietario C.C. O NIT:	Firma Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 011037-0654662 ANT	Firma Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:
x 43893750	Carlos A Mercado Z		

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
El encargado del restaurante. recibe la visita. expresa no haber tenido inconvenientes, alteración o daños a la propiedad a causa de las actividades ejecutadas.	
Se visualiza piso exterior en concreto liso con con grietas y fisuras multiples, paredes en buen estado.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: [signature]	Firma: [signature]	Firma: [signature]	Firma: [signature]
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre:
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 43893750	Matrícula profesional No.: 611037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

PARED DE FACHADA	PISO INTERIOR
	
PISO EXTERIOR	PISO EXTERIOR
	

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección		Teléfonos	
Nombre de la persona que atiende la visita:		CC No.	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		
Nombre del responsable / propietario de la construcción:		CC No.	

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI	
	NO	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo		
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo		

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No existen afectaciones

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable y/o Propietario C.C. O NIT: 8'203.454	Firma Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:011037-0654002 ANT	Firma Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 38 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA	FECHA 07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Se permite el ingreso a la Vivienda en construcción, ubicada en segundo piso sin acabados, ~~se~~ posee ventanas y puertas exteriores, paredes en Obra gris con repello fachada lateral con repello.	
Buen estado general de la estructura, sin alteraciones daños o afectaciones con respecto a la ejecución de las actividades.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 8'203.454	Matrícula profesional No.: 011037-0654692 ANT	Matrícula profesional No.: 68202 276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales idóneos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

PARED LATERAL IZQUIERDA



PARED INTERIOR



LOSA



PISO



Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 08/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección		Teléfonos	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Yorladis Julio	CC No:	43896086
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Jhon Julio	CC No.	

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI	☐
	NO	☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo		
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo		

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable y/o Propietario C.C. O NIT:	Firma Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No. 01103705654602 ANT	Firma Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:
Yorladis Julio 43896080	Carlos A Mercado T		

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36; CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	08/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 059/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Se inspeccionó el predio, no se evidencia cambios o alteraciones.	
Se visualiza fachada con repello y pintada. piso exterior en concreto liso en leve fisura, fisuras leves en paredes interiores laterales, techo en cielo raso PVC, Piso en interios de ceramica buen estado general.	
El Responsable del predio expresa que no existen alteraciones y firma a conformidad la presente acta	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 43996080	Matrícula profesional No. 011037-3654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

PISO



PARED



PARED



PISO



Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección	B/ La Punta	Teléfonos	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Juveral Fuentes	CC No.	8202076
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:		CC No.	

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI	NO
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo		
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo		

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No existe daños o alteraciones

FIRMAS

Firma Nombre: **Responsable y/o Propietario** C.C. O NIT:	Firma Nombre: Carlos Mercado **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No. 011037-0654692 ANT	Firma Nombre: Diego Camacho **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No. 68202-276114 STD	Firma Nombre **Testigo** C.C. O NIT:
x 8202076			

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSION	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoria No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Dia / Mes / Año)
V Se procedió a la inspección de la vivienda para verificar las condiciones en la que se encuentra.	
Donde se evidenció que la vivienda en obra, conserva las condiciones iniciales, previas a la ejecucion de la obra, posee humedad en la parte inferior de las paredes, no posee lunden, o piso exterior. no posee revbomerto. Zin en buen estado.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma
Nombre:
Responsable y/o Propietario
C.C. O NIT: x 8202076

Firma
Nombre: Carlos Mercado
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No :011037-0654602 ANT

Firma
Nombre: Diego Camacho
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO
FACHADA





Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 35 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE. ANTIOQUIA.	FECHA 07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección		Teléfonos	3218418677
Nombre de la persona que atiende la visita:	Marley Montes P	CC No.	43896622
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Marley Montes P	CC No.	43896622

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI	
	NO	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo		
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo		

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable y/o Propietario C.C. O NIT:	Marley Montes 43896622	Firma Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No. 0110370654602 ANT	Carlos A Mercado 7	Firma Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD		Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:	

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29°, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Se visualiza piso exterior con fisuras y grietas.	
Cerámica en pared sin alteraciones, piso interior en cerámica en buen estado paredes con leves fisuras, techo Zin buen estado, cielo raso en madera, con deterioro.	
El Propietario expresa conformidad con las condiciones actuales. y firma a satisfaccion la presente acta.	

Firma el acta de cierre a satisfaccion SI [X] NO [ ]

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: * Marley Montes	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: x 43896622	Matrícula profesional No.:0110J7-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales tecnicos del Contratista y la interventoria, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO	
PISO EXTERIOR	PARED LATERAL
	
PISO EXTERIOR	PISO INTERIOR
	

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección		Teléfonos	

Nombre de la persona que atiende la visita: Eduardo Hoyos CC No. 98615005

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva: 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Deyanira Hermon CC No. 25828323.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI	NO
		X

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES)
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

AREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo Afectacion

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: X 98'615'005	Matrícula profesional No.: 011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025 | Contrato de Interventoría No. 052/2025 | **Acta de Vecindad de Cierre**

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
El día 09-junio de 2026 se realizó la inspección en la vivienda. para verificar si hubo daños a la propiedad durante la ejecución del proyecto de pavimentación.	
El propietario manifestó a conformidad y completa satisfacción que su propiedad NO presentó daño alguno o alteración al anden. conservando sus características pre existentes.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [ ] NO [ ]

Firma: x Eduardo Hoyos	Firma: Carlos A. Mercado T	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho G	Nombre
Responsable y/o Propietario x 98.615.005	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No. 0110370864602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-270114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO	
PISO INTERIOR	PARED LATERAL
	
PARED LATERAL	PARED POSTERIOR
	

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copies: Interventor. Subdirección de Sostenibilidad. Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025 | Contrato de Interventoría No. 052/2025 | Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección: | Teléfonos:

Nombre de la persona que atiende la visita: Eutorgio Bermudez | CC No. 3673562

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva — 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Eutorgio Bermudez | CC No. 3673562

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto — SI ☐ NO ☐

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES)
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación

FIRMAS

Firma: x Eutorgio	Firma: Carlos A Mercado	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: x 3673562	Matrícula profesional No. 011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No. 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Se realiza la Revisión de la vivienda, para verificar las condiciones actuales y determinar si existieron daños o afectaciones. a la propiedad.	
Piso exterior con multiples fisuras y grietas, paredes interior con fisuras. y desgaste en pintura, piso interior con desgaste por paso, techo interior en madera con deterioros, pared de fachada repellada y pintada, buen estado general.	
El propietario expresa satisfaccion con el proyecto y con las condiciones finales de su vivienda y firma conformidad la presente acta	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma	* Eustorgio	Firma	Carlos A Mercado Z
Nombre:		Nombre:	Carlos Mercado
Responsable y/o Propietario		Ing. Residente Contratista	
C.C. O NIT:	* 3673562	Matrícula profesional No. 01 1037-0654802 ANT	

Firma		Firma	
Nombre:	Diego Camacho	Nombre	
Ing. Residente Interventoría		Testigo	
Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD		C.C. O NIT:	

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO	
PISO EXTERIOR	PARED LATERAL
	
PISO INTERIOR	TECHO
	

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36; CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección		Teléfonos	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Dorwis Chaves	CC No.	43896639
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		2
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Ariel	CC No.	

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI	NO
		X

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES)
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma	Darlis chavez	Firma	Carlos A Mercado Z	Firma		Firma	
Nombre:		Nombre:	Carlos Mercado	Nombre:	Diego Camacho	Nombre	
Responsable y/o Propietario		Ing. Residente Contratista		Ing. Residente Interventoría		Testigo	
C.C. O NIT:	43896639	Matrícula profesional No. 011037-0654602 ANT		Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD		C.C. O NIT:	

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	07/ 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025 | Contrato de Interventoría No. 052/2025 | Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Durante la inspección del local comercial, no se visualizaron daños o alteraciones, tiene un piso exterior en concreto liso en buenas condiciones generales, pared de fachada con fisuras leves, grieta vertical en el lado derecho del muro con desprendimiento, fisuras en paredes internas del predio.	
El encargado de la propiedad expresa que no hay alteraciones ocasionadas por la ejecución del proyecto. y firma a conformidad la presente acta.	

Firma el acta de cierre a satisfacción: SI [X] NO [ ]

Firma: ×Darlis Chavez	Firma: Carlos A. Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: ×43896639	Matrícula profesional No.: 011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO	
PISO EXTERIOR	PARED LATERAL
	
PISO INTERIOR	PISO INTERIOR
	

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025 | Contrato de Interventoría No. 052/2026 | Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección: | Teléfonos: 3218032495.

Nombre de la persona que atiende la visita: Ariel Meza | CC No. 1040514178.

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva: 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Ariel Meza. | CC No. 1040514178

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construccion sufrio alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma: ×
Nombre:
Responsable y/o Propietario
C.C. O NIT: ×1040514178

Firma:
Nombre: Carlos Mercado
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 011037-0854602 ANT

Firma:
Nombre: Diego Camacho
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD

Firma:
Nombre:
Testigo
C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA: 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Vivienda con cerramiento en muro de concreto, con humedad. y grietas verticales en la parte lateral. esquina, piso exterior en concreto, piso en concreto liso con desgaste por paso y fisuras, paredes con desgaste en pintura, no se visualizan grietas. en el interior.	
El Propietario niega daños o afectaciones ocasionadas por la ejecución del contrato firma a conformidad la presente acta	

Firma el acta de cierre a satisfacción: SI [X] NO [ ]

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Comacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoria	Testigo
C.C. O NIT: 1040514178	Matrícula profesional No.:01 1037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

PISO EXTERIOR



PARED LATERAL



PISO EXTERIOR



TECHO EXTERIOR



Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.

FECHA: 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025 | Contrato de Interventoría No. 052/2025 | Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección: | Teléfonos:

Nombre de la persona que atiende la visita: Erika Pereira | CC No. 1040498870

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva: 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Erika Pereira | CC No. 1040498870

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto: SI ☐ NO ☐

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES)
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación

FIRMAS

Firma: X ERIKA PEREIRA	Firma: Carlos A. Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: X 1040 498 870	Matrícula profesional No.:011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Se procede a la revisión de la vivienda para verificar el estado de la misma	
No se persiben daños o afectaciones a la estructura. que pudieran ser ocasionadas durante las intervensiones de la construccion del pavimento y obras complementarias.	
El Propietario expresa entera satisfacción y afirma no haber tenido ningun tipo de daño o inconveniente durante la ejecución de la obra.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: X
Nombre: ERIKA PEREIRA
Responsable y/o Propietario
C.C. O NIT: 1040498870

Firma: Carlos A. Mercado Z
Nombre: Carlos Mercado
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No. 011037-0654602 ANT

Firma:
Nombre: Diego Camacho
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD

Firma:
Nombre:
Testigo
C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

PISO EXTERIOR	PISO INTERIOR
	
ACCESO	PISO EXTERIOR
	

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 35, CARRERA 32 ENTRE CALLE 38 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoria No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección		Teléfonos	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Erika Pereira	CC No.	1040498870
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Erika Pereira	CC No.	1040 498 870

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI	
	NO	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo		
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo		

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable y/o Propietario C.C. O NIT:	ERIKA PEREIRA 1040498870	Firma Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No. 01037-0854602 ANT	Carlos A Mercado Z	Firma Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD		Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:	

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRÉ, ANTIOQUIA.
FECHA	08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Durante la inspeccion de la vivienda no se persiben daños o afectaciones a la estructura. que puderan ser ocasionadas durante las intervensiones.	
El Propietario manifiesta entera satisfacción y afirma no haber tenido ningun tipo de daño o inconveniente durante. la ejecución de la obra.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: XERIMA PEREIRA	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: X1040498870	Matrícula profesional No.:011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.

FECHA: 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025 | Contrato de Interventoría No. 052/2025 | Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección: | Teléfonos: 321 641 8677

Nombre de la persona que atiende la visita: Marley Montes | CC No. 43896622.

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Yeison D. Montes | CC No. 1040508720.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma: Marley Montes
Nombre:
Responsable y/o Propietario
C.C. O NIT: 43896622

Firma: Carlos A. Mercado Z
Nombre: Carlos Mercado
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No. 011037-0654602 ANT

Firma:
Nombre: Diego Camacho
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD

Firma:
Nombre:
Testigo
C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Durante la visita el propietario no se encontraba en casa, no autorizaron la entrada, un familiar firma el acta de cierre, manifestando que la vivienda no sufrió daño alguno.	

Firma el acta de cierre o satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: x Marley Montes	Firma: Carlos A. Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: x 43896622	Matrícula profesional No. 011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección: Teléfonos:

Nombre de la persona que atiende la visita: Miran Ortiz CC No. 43804076

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva — 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Miran Ortiz CC No. 43804076

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto — SI ☐ NO ☐

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES)
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma: x miviam ortiz	Firma: Carlos A. Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: x 43804076	Matrícula profesional No.:011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoria No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Dia / Mes / Año)
Durante la inspeccion de la vivienda el piso exterior mantiene sus condiciones iniciales, el interior de la casa no se perciben daño o afectaciones,	
El Propietario manifiesta entera satisfacción con el desarrollo del Proyecto, afirma no haber tenido ningun inconveniente, firma la presente acta a conformidad.	

Firma el acta de cierre a satisfaccion SI [X] NO [ ]

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Yminian Ortiz	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre:
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoria	Testigo
C.C. O NIT: X43804076	Matricula profesional No. 011037-0884602 ANT	Matricula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoria, con el apoyo del equipo de gestion social del proyecto.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO	
PISO ECTERIOR	INTERIOR
	
PARED LATERAL	PISO INTERIOR
	

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.

FECHA: 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025 | Contrato de Interventoría No. 052/2025 | Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección: | Teléfonos: 32220234 32

Nombre de la persona que atiende la visita: Eliana Arias | CC No. 1040500934

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Eliana Arias | CC No. 1040500934

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construccion sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto: SI ☐ NO ☐

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES)
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma Nombre: Eliana Arias Responsable y/o Propietario C.C. O NIT: 1040500934	Firma Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:011037-0854602 ANT	Firma Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29°, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 060/2025	Contrato de Interventoría No. 057/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Durante la inspección de la vivienda. no se perbieron daños o afectaciones, el piso exterior con ceramica no tiene alteraciones y el interior de la vivienda no se visualizan grietas o nuevas fisuras que fueran ocasionadas por las intervenciones.	
Expresan entera satisfacción por el desarrollo del proyecto	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Deliana Ayia	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre:
Responsable y/o Propietario	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 1040500934	Matrícula profesional No. 011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales tecnicos del Contratista y la Interventoria, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO	
PISO EXTERIOR	TECHO EXTERIOR
	
PISO INTERIOR	PARED FRONTAL
	

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.

FECHA: 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025 | Contrato de Interventoría No. 052/2025 | Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección: | Teléfonos:

Nombre de la persona que atiende la visita: Olga lucia Monterrosa | CC No. 1003292526

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva: 2

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Olga L. Monterrosa | CC No. 1003292526

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto: SI ☐ NO ☐

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES)
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
Piso exterior.	En la Ubicación del Registro Sanitario presenta área afectada. ei

FIRMAS

Firma: Olga Monterrosa Nombre: Responsable y/o Propietario C.C. O NIT: 1003.292.526	Firma: Carlos A. Mercado Z Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:011037-0654602 ANT	Firma: Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	Firma: Nombre Testigo C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Durante la visita. no se permitió el acceso a la vivienda.	
El Responsable del Predio expresa que no tuvo inconveniente. daños o afectaciones al predio, firma acta a conformidad	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: X Olga Monterroso	Firma: Carlos A. Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: X 1003.292.526	Matrícula profesional No.: 211037-0514602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. SISTEMA DE ALCANTARILLADO. SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección		Teléfonos	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Leydi Ortiz	CC No.	1040503642
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Leydi Ortiz	CC No.	1040503642

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI	☐
	NO	☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo		
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo		

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación

FIRMAS

Firma Nombre: **Responsable y/o Propietario** C.C. O NIT:	Leydis Ortiz 1040503642	Firma Nombre: Carlos Mercado **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No. 011037-0554502 ANT	Carlos A Mercado 7	Firma Nombre: Diego Camacho **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.: 68702-276114 STD		Firma Nombre **Testigo** C.C. O NIT:	

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Vivienda en obra negra, no tiene techo, se encuentra en remodelación, El Propietario manifiesta durante la visita que no tuvo ningun tipo de afectación expresa en tred satisfacción respecta a las actividades realizadas. firma a conformidad la presente acta.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: Keydis Ortiz	Firma: Carlos A. Mercado Z	Firma: Diego Camacho	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre:	Nombre
Responsable y/o Propietario	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: X 1040503642	Matrícula profesional No :011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

PISO EXTERIOR



PAREDES



PISO EXTERIOR



PISO INTERIOR



Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

111

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 053/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección		Teléfonos	3217759221
Nombre de la persona que atiende la visita:	Clara Ines Arias C.	CC No.	1237438284
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		2
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Barrans. Chavez	CC No.	

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI	
	NO	X
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo		
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo		

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable y/o Propietario C.C. O NIT:	Clara Ines Arias 1237438284	Firma Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:011037-0654602 ANT	Carlos A Mercado T	Firma Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 68202-776114 STD		Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:	

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Durante la visualiza visita se visualiza piso exterior con grietas y multiples fisuras, desgaste por paso paredes resanadas, techo en zinc en buen estado	
El Propietario expresa conformidad con las condiciones actuales del predio y con las actividades ejecutadas.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: x Clara arias	Firma: Carlos A. Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: x 1237438284.	Matrícula profesional No.:011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

PISO EXTERIOR



PARED LATERAL



PARED FACHADA



PISO INTERIOR



Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA	FECHA 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección: Teléfonos: 3108447475

Nombre de la persona que atiende la visita: Veronica Ortiz CC No. 1007467291

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva: 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Veronica Ortiz CC No. 1007467291

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI: ☐ NO: ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma Nombre: X Veronica Ortiz Responsable y/o Propietario X 1007467291 C.C. O NIT:	Firma Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 011037-2654602 ANT	Firma Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 68702-27R114 STD	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Durante la visita se visualiza piso exterior deteriorado con multiples grietas y fisuras, pared de fachada, con repello y pintada. Paredes del interior en obra gris, No se persiben afectaciones a causa de las intervenciones del proyecto, El propietario firma el acta a conformidad.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: X Veronica Ortiz	Firma: Carlos A. Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre:
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 1007467291	Matrícula profesional No.:01103-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO	
PISO EXTERIOR	PARED LATERAL
	
PISO EXTERIOR	PARED LATERAL
	

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025 | Contrato de Interventoria No. 052/2025 | **Acta de Vecindad de Cierre**

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección: | **Teléfonos:**

Nombre de la persona que atiende la visita: Irlena Sampayo — CC No. 1040503916

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva — 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Candelaria Jimenez — CC No. 1040503916

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
Muro Exterior.	Se visualiza daños moderados en el muro exterior.

FIRMAS

Firma: * Irlena Sampayo	Firma: Carlos A. Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoria**	**Testigo**
C.C. O NIT: * 1040503916	Matrícula profesional No.: 011037-055402 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 056/2025 | Contrato de Interventoria No. 052/2025 | **Acta de Vecindad de Cierre**

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Dia / Mes / Año)
El dia 10 / junio 2026 se realizó la inspeccion de la vivienda. para verificar el estado general.	
El propietario manifiesta que se le generaron daños en el muro exterior como se visualiza en las evidencias fotográficas.	
El estado general de la estructura de la vivienda se encuentra en buen estado.	
El propietario solicita el arreglo de del muro.	

Firma el acta de cierre a satisfaccion SI [X] NO [ ]

Firma: X Nombre: Lilena Sarraño **Responsable y/o Propietario** C.C. O NIT: X 1040503976	Firma: Nombre: Carlos Mercado **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.:011037-0654602 ANT	Firma: Nombre: Diego Camacho **Ing. Residente Interventoria** Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	Firma: Nombre **Testigo** C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO	
FACHADA LATERAL	PARED POSTERIOR
	
PISO INTERIOR	PARED FRONTAL
	

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.

FECHA: 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025 | Contrato de Interventoría No. 052/2025 | Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección: | Teléfonos:

Nombre de la persona que atiende la visita: Stefania Gomez | CC No. 1112775429

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva | 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Stefania Gomez | CC No. 1112775429.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto: SI ☐ NO ☐

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES)
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma: Stefania Gómez
Nombre:
Responsable y/o Propietario
C.C. O NIT: 1112 775429

Firma: Carlos A Mercado 7
Nombre: Carlos Mercado
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.:0110037-0654802 ANT

Firma:
Nombre: Diego Camacho
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD

Firma:
Nombre
Testigo
C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Durante la visita, El propietario expresa satisfacción con las actividades que se ejecutaron del proyecto, así mismo manifiesta que su vivienda se encuentra en óptimas condiciones, que no se presentaron daños o afectaciones al predio.	
La vivienda con cerramiento en muro de concreto, deterioro en piso exterior en interior por el paso, desgaste en pintura de pared de fachada y muros del cerramiento, paredes con fisuras y grietas - todas preexistentes.	
El Propietario firma la presente acta a satisfacción.	

Firma el acta de cierre a satisfacción: SI [X] NO [ ]

Firma: Stefania Gómez	Firma: Carlos A. Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 1117775429	Matrícula profesional No.:0110370654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

PARED EXTERIOR



PARED LATERAL INTERIOR



PISO EXTERIOR



PISO INTERIOR



Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSION: 1

PAGINA: 1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.

FECHA: 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025 | Contrato de Interventoría No. 052/2025 | Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección: | Teléfonos: 3108291088

Nombre de la persona que atiende la visita: Ester Pedroza | CC No. 43895683

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Alfredo Bermudez | CC No. 98 475996

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI: NO: X
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma: X
Nombre:
Responsable y/o Propietario X 43895683
C.C. O NIT:

Firma:
Nombre: Carlos Mercado
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 011037-0654602 ANT

Firma:
Nombre: Diego Camacho
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD

Firma:
Nombre
Testigo
C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Vivienda con signos de deterioro, paredes y pisos con multiples grietas y fisuras, preexistentes a las actividades ejecutadas. Piso con desgaste por el paso, presenta deterioro en techo por humedad y en pared o fachada trasera.	
El propietario no expresa inconformidades con las condiciones actuales de la vivienda, aque no tuvo afectación o daños debido a las activides ejecutadas del proyecto, firma a satisfaccion la presente acta.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: YESTHEZ	Firma: Carlos A. Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario X	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 43895683	Matrícula profesional No.:011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

PARED FACHADA



PARED LATERAL



PISO FACHADA



PISO INTERIOR



Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 36 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 060/2025	Contrato de Interventoría No. 062/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección		Teléfonos	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Andy T. Galcera.	CC No.	1001682449
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Ermedis Galcera	CC No.	

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectacion.

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable y/o Propietario C.C. O NIT:	Andy Galcera 1001682449	Firma Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:01037-0654602 ANT	Carlos A Mercado 7	Firma Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD		Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:	

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoria No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Vivienda con cerramiento de muros en concreto, piso exterior e interior con desgaste por el paso, fisuras en paredes y desgaste en pintura, fachadas laterales sin repello.	
No se visualizan daños que puedan ser ocasionados por las actividades ejecutadas.	
El Propietario firma a conformidad la presente acta	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: X Andy Calcerra	Firma: Carlos A. Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoria**	**Testigo**
C.C. O NIT: X 1001682449	Matrícula profesional No. 011037-0854602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregara al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales tecnicos del Contratista y la Interventoria, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

PISO EXTERIOR



TECHO INTERIOR



FACHADA LATERAL DERECHA



FACHADA LATERAL IZQUIERDA



Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoria No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección		Teléfonos	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Nana Ortiz	CC No.	40804451
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Orlando Pedroza	CC No.	9847591

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable y/o Propietario C.C. O NIT:	x maria Ortiz x 43 804451	Firma Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No. 01103705654602 ANT	Carlos A. Mercado Z	Firma Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoria Matrícula profesional No.: 68202-279114 STD		Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:	

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 053/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Durante la visita no se percibieron afectaciones ocacionadas por el desarrollo del proyecto de pavimentación, El propietario expresa plena conformidad con las condiciones actuales de su vivienda.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: *maria ortiz
Nombre:
Responsable y/o Propietario X 43 804 451
C.C. O NIT:

Firma: Carlos A. Mercado Z
Nombre: Carlos Mercado
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.:011037-0654602 ANT

Firma:
Nombre: Diego Camacho
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales idóneos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

PISO EXTERIOR



PARED POSTERIOR



PISO INTERIOR



PARED LATERAL



Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 057/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección		Teléfonos	

Nombre de la persona que atiende la visita: Ana Gabriela Arias CC No. 43898353

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva — 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Adolia Gonzalez CC No. 43804657

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI	NO
		X

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES)
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo ningun tipo de afectación a la vivienda.

FIRMAS

Firma: X Ana Gabriela Arias	Firma: Carlos A. Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre:
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: X 43 898 353	Matrícula profesional No.:011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Durante la visita se visualiza el estado de la vivienda. el cual presenta multiples grietas y fisuras en piso exterior e interior y paredes, además desprendimiento en el marco de la puerta, resanes en diversar partes de las paredes, El propietario expresa conformidad con el estado actual de las vivienda ya que conserva el estado en el que se encontraba antes de las intervenciones. firma a conformidad la presente acta.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: Anna Gabriela Arias	Firma: Carlos A. Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 43 898 353.	Matrícula profesional No. 011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO	
PISO EXTERIOR	PARED FACHADA POSTERIOR
	
TECHO	PISO INTERIOR
	

Notes: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29A, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	**Acta de Vecindad de Cierre**

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento**	**Municipio**	**Vereda**	**PR**

Dirección: **Teléfonos:**

Nombre de la persona que atiende la visita: Ana Gabriela Arias. CC No. 43898353

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva — 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Ana Gabriela A CC No. 43898353

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma: Anna Gabriela Arias	Firma: Carlos A Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 43 898 353	Matrícula profesional No.:01103/-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA	FECHA 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Vivienda en obra negra, no se visualiza fachadas laterales. presenta fisura en la parte lateral izquierda y resane en el marco de la puerta, piso en concreto liso con desgaste por paso peatonal, paredes de sala, repilladas y pintadas de blanco, El propietario expresa plena conformidad con las condiciones actuales de la vivienda, firma a satisfaccion la presente acta.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: ANA Gabriela Arias	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre:
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 1113898353.	Matrícula profesional No.: 011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del enlace de gestión social del proyecto.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO	
PISO INTERIOR	PARED FACHADA
	
PARED FACHADA POSTERIOR	PARED FACHADA
	

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la pagina destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoria No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección		Teléfonos	

Nombre de la persona que atiende la visita: Ana Gabriela Arias — CC No. 43898353

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Kellys Arias — CC No.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI	NO
		X

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES)
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Ana Gabriela Arias	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoria	Testigo
C.C. O NIT: 43898353	Matrícula profesional No.:011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA: 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoria No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Se realiza la visita a la vivienda, se visualiza piso exterior con grietas y fisuras., piso interior con desgaste propio de paso peatonal, paredes en buen estado general con fisuras leves, El propietario expresa plena conformidad con el estado actual de la vivienda, firma a satisfaccion la presente acta	

Firma el acta de cierre a satisfacción: SI [X] NO [ ]

Firma: Xana Gabriela Arias
Nombre: Responsable y/o Propietario
C.C. O NIT: 1143898353


Firma: Carlos A. Mercado Z
Nombre: Carlos Mercado
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 01103720654602 ANT

Firma:
Nombre: Diego Camacho
Ing. Residente Interventoria
Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD

Firma:
Nombre
Testigo
C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoria, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

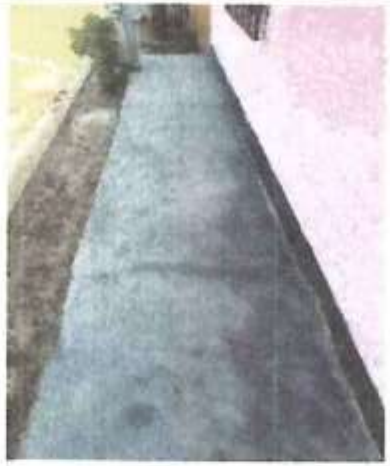PARED FACHADA	PISO INTERIOR
	
PISO EXTERIOR	**PARED LATERAL**
	

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 059/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección: | Teléfonos:

Nombre de la persona que atiende la visita: Rosa Amelia Cortes — CC No. 43699490

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Rosa A. Cortes — CC No. 43699490

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma Nombre: Rosa cortes Responsable y/o Propietario C.C. O NIT: 43-699490	Firma Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 011037-0654602 ANT	Firma Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Durante la inspección de la vivienda no se perciben daños o afectaciones a la estructura que pudieran ser ocasionadas durante las intervenciones de proyecto.	
El propietario manifiesta entera satisfacción y afirma no haber tenido daño alguno o inconvenientes durante la ejecución de la obra.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma Nombre: Responsable y/o Propietario C.C. O NIT:	Firma Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:011037-0654602 ANT	Firma Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:
x Rosa Cortes x 43699490	Carlos A. Mercado Z		

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales idóneos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

PISO EXTERIOR



FACHADA LATERAL DERECHA



PARED INTERIOR



PISO INTERIOR



Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29°, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoria No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección: Teléfonos:

Nombre de la persona que atiende la visita: Ana Gabriela Arias CC No. 43898353

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva — 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Ana Gabriela Arias CC No. 43898353

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación

FIRMAS

Firma: Ana Gabriela Arias	Firma: Carlos A. Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoria	Testigo
C.C. O NIT: 43898353	Matrícula profesional No.:011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 059/2025	Contrato de Interventoria No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Dia / Mes / Año)
Se realiza la inspección a vivienda construidas con materiales no convencionales, buen estado general, desgaste en pintura en el interior de la vivienda, piso en concreto pigmentado liso, con desgaste y desprendimientos, resane en el piso de la sala	
El propietario expresa plena satisfaccion con las actividades ejecutadas no manifiesta insatifacción con las con las condicione actuales de la vivienda, firma la presente acta a conformidad	

Firma el acta de cierre a satisfaccion SI [X] NO [ ]

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Yana Gabriela Arias	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre:
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoria	Testigo
C.C. O NIT: 1143898353	Matricula profesional No. 011037-0654602 ANT	Matricula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoria, con el apoyo del equipo de gestion social del proyecto.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO	
PISO INTERIOR	TECHO INTERIOR
	
PISO INTERIOR	
	

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR


Dirección: Teléfonos:

Nombre de la persona que atiende la visita: Estefani Gonzalez CC No. 1054679557

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva: 2

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Jaqueline Marte CC No. 1128200506

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA

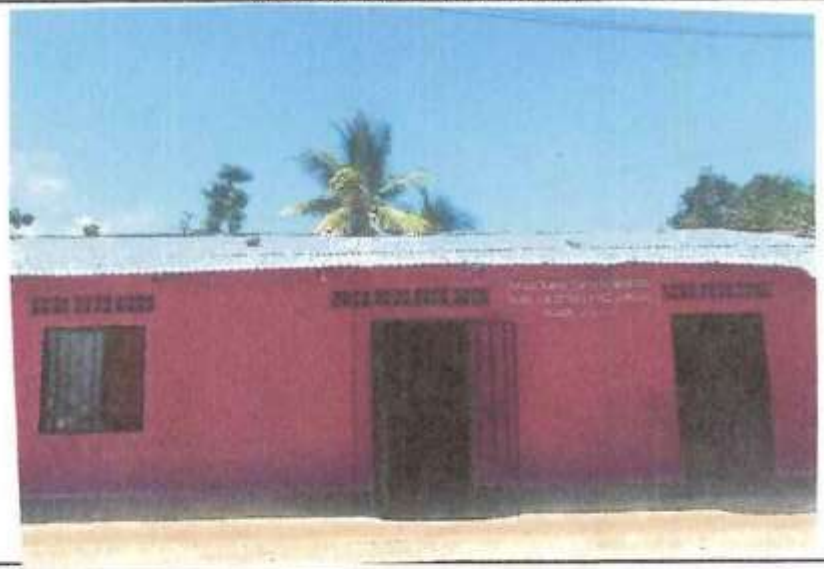

3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto — SI ☐ NO ☐

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES)
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma: Estefanny Gonzalez	Firma: Carlos A Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: x 1054679557	Matrícula profesional No. 011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Vivienda intervenida durante la ejecución de la obra. con recorte del piso exterior. El estado general de la vivienda conserva las condiciones preexistentes. a la construccion de pavimento.	
El Responsable de la vivienda expresa conformidad. respecto al estado actual del predio, las grietas, fisuras y desgastes en piso, paredes y fachada. No presentan cambios. La presente acta se firma a satisfacción.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: Stelfanny Gonzalez	Firma: Carlos A. Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario X	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 1054679557	Matrícula profesional No.:011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO	
PISO EXTRERIOR	PARED INTERIOR
	
PISO INTERIOR	PARED INTERIOR
	

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025 | Contrato de Interventoria No. 052/2025 | Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección: | Teléfonos:

Nombre de la persona que atiende la visita: Yadira Chavez Mendoza CC No. 43894082

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva: 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Yadira Chavez CC No. 43894082

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☒
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma: x Yadira Chavez M.
Nombre: Responsable y/o Propietario
C.C. O NIT: x 43894082

Firma
Nombre: Carlos Mercado
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 011037-0654602 ANT

Firma
Nombre: Diego Camacho
Ing. Residente Interventoria
Matrícula profesional No.: 68202-279111 STD

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoria No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Dia / Mes / Año)
Vivienda en buen estado general con humedad en fachadas laterales, y leves fisuras en paredes, piso con baldosa en optimo estado, jardinera en buen estado.	
El propietario expresa conformidad con las actividades ejecutadas y las condiciones finales de la vivienda firma a satisfaccion la presente acta.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Yudira Cuadz M.	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre:
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoria	Testigo
C.C. O NIT: 43894082	Matricula profesional No :011037-0654602 ANT	Matricula profesional No : 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales tecnicos del Contratista y la Interventoria, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

FACHADA LATERAL DERECHA



PISO INTERIOR



PISO INTERIOR





Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR


Dirección: Teléfonos:

Nombre de la persona que atiende la visita: Roberto Benavidez Cirka CC No. 8373907

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva: 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Alba Romero CC No. 32211372

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA

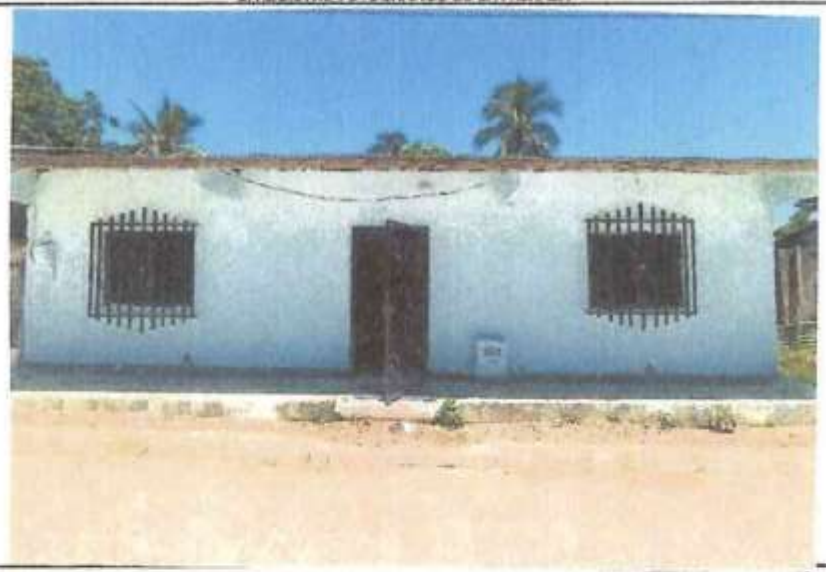

3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: x 8373907	Matrícula profesional No. 011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Durante la inspección de la vivienda, se aprecia que el piso, exterior junto con la fachada mantienen sus condiciones iniciales y en el interior de la casa no se perciben daños o afectaciones. El propietario manifestó gran satisfacción con el desarrollo del proyecto, afirmo no haber tenido ningún inconveniente por lo cual firma la presente acta a conformidad.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [ ] NO [ ]

Firma: [signature]	Firma: [signature]	Firma: [signature]	Firma: [signature]
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 8373907	Matrícula profesional No. 011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STO	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregara al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO	
PISO EXTERIOR	PISO INTERIOR
	
PARED INTERIOR	PARED INTERIOR
	

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 35 Y CALLE 35, CARRERA 32 ENTRE CALLE 35 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección		Teléfonos	
Nombre de la persona que atiende la visita:			CC No.
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		
Nombre del responsable / propietario de la construcción:			CC No.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable y/o Propietario C.C. O NIT:	Firma Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No. 01037-0554602 ANT	Firma Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:
x Leidy Y Ortega x 43695881	Carlos A. Mercado Z		

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoria No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Dia / Mes / Año)
Durante la visita se observa humedad en la parte inferior de la fachada, presenta desgaste en pisos. Se evidencia que la vivienda se encuentra en remodelacion en estado de obra gris.	
El propietario manifestó no haber tenido inconvenientes durante el desarrollo del proyecto. por lo cual firma la presente acta a conformidad.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: x Leidy y Olga	Firma: Carlos A. Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoria	Testigo
C.C. O NIT: x 43895 386	Matricula profesional No.: 011037-0654602 ANT	Matricula profesional No.: 68202 278114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoria, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO	
PARED FACHADA	PARED LATERAL
	
PARED FACHADA	PARED LATERAL
	

Notas:
4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoria No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección		Telefonos	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Yibirson Mejia	CC No.	8051963
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Yibirson Mejia	CC No.	8051963

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI	
	NO	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo		
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo		

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable y/o Propietario C.C. O NIT:	*Yibirson Mejia *8051963	Firma Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:011037-0654002 ANT	Carlos A. Mercado Z	Firma Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD		Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:	

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 38 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29°, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.

FECHA: 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025 | Contrato de Interventoría No. 052/2025 | Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Durante la visita de la vivienda se aprecia la fachada y terraza exterior en sus condiciones iniciales a la del proyecto, en el interior de la casa no se perciben daños o afectaciones.	
El propietario manifiesta satisfacción con el desarrollo del proyecto, y afirma no haber tenido inconveniente alguno. Firma la presente acta a conformidad	

Firma el acta de cierre a satisfacción: SI [X] NO [ ]

Firma: x Yibilsou Mejia	Firma: Carlos A. Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: x 8051 963.	Matrícula profesional No.:011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

PISO EXTERIOR	PARED LATERAL
	
PISO INTERIOR	**PISO EXTERIOR**
	

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección		Teléfonos	

Nombre de la persona que atiende la visita: Johana Martinez — CC No 1050555921

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva — 2

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Dario Ortiz — CC No.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable y/o Propietario C.C. O NIT: X1050555921	Firma Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:011037-0654602 ANT	Firma Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 68202-278114 STD	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Se procede a la visita en la vivienda, se verifica las condiciones actuales, paredes con fisuras multiples, grietas en pisos y pared exterior e interior, piso exterior en concreto liso con grietas. todas las condiciones actuales. coinciden con las iniciales. El Propietario. expresa conformidad. por las condiciones actuales de la vivienda. firma la el acta a satisfacción.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma Nombre: Responsable y/o Propietario C.C. O NIT:	Firma Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 011037-0654602 ANT	Firma Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:
1105055921			

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO	
PARED FACHADA	PARED LATERAL
	
PARED FACHADA	PISO INTERIOR
	

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección: Teléfonos:

Nombre de la persona que atiende la visita: Darlis Chavez CC No. 43896639

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva: 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Maria Georgilda CC No. 1040491341

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto: SI [ ] NO [X]

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
(0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES)
(0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma: X Darlis Chavez	Firma: Carlos A. Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: X43896639	Matrícula profesional No. 011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER	**ACTA DE VECINDAD**	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Durante la visita se visualizan grietas en el cerramiento de muro en concreto, grietas, fisuras y resanes en paredes interiores. Piso en concreto con desgaste y desprendimientos propios del paso peatonal. La persona que atiende la visita expresa conformidad por las condiciones actuales de la vivienda ya que no fueron alteradas durante la ejecución de las actividades constructivas del proyecto.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma Nombre: Darlis Chavez **Responsable y/o Propietario** C.C. O NIT: 43896639	Firma Nombre: Carlos Mercado **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.: 011037-6654602 ANT	Firma Nombre: Diego Camacho **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	Firma Nombre **Testigo** C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO	
CERRAMIENTO	PARED INTERIOR
	
PISO EXTERIOR	PARED FACHADA
	

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoria No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección		Teléfonos	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Darlys Chavez	CC No.	43896639
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Darlys Chavez	CC No.	43896639

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI	
	NO	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo		
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo		

AREA AFECTADA	DESCRIPCION DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable y/o Propietario C.C. O NIT:	Darlis Chavez 43 896 639	Firma Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matricula profesional No.: 01037-0654602 ANT	Carlos A. Mercado Z	Firma Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoria Matricula profesional No.: 68202-276114 STD		Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:	

CONSORCIO PUERTO CLAVER	**ACTA DE VECINDAD**	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Durante la inspección de la vivienda el piso exterior mantiene sus condiciones iniciales. en el interior de la casa no se persiben daños o afectaciones.	
El propietario manifiesta entera satisfacción con el desarrollo del proyecto, afirma no haber tenido ningun inconveniente daño o afectación al predio y firma la la presente acta a conformidad.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: Darlis Chavez	Firma: Carlos A. Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 43 896 639	Matrícula profesional No. 011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No. 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 38 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección		Teléfonos	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Darlys Chavez	CC No.	43896639
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		4
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Darlys Chavez	CC No.	43896639

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable y/o Propietario C.C. O NIT:	Darlis Chavez 43 896 639	Firma Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No. 01107-0654602 ANT	Carlos A. Mercado Z	Firma Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 88202-276114 STD		Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:	

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 08 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Durante la inspeccion de la vivienda el piso exterior mantiene sus condiciones iniciales. En el interior de la vivienda no se persiben daños o afectaciones.	
El Propietario manifiesta entera satisfacción con el desarrollo del proyecto, afirma no haber tenido ningun inconveniente daño o afectación al predio y firma la presente acta a conformidad	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: Darlis chavez	Firma: Carlos A. Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 43 896 639	Matrícula profesional No.:011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

PISO EXTERIOR



PARED LATERAL



PARED FACHADA



PISO INTERIOR



Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

PISO EXTERIOR	PARED LATERAL
	
PISO INTERIOR	**PARED LATERAL**
	

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre	09 / 05 / 2026

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección		Teléfonos	
Nombre de la persona que atiende la visita:		CC No.	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		
Nombre del responsable / propietario de la construcción:		CC No.	

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI	
	NO	X
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo		
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo		

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable y/o Propietario C.C. O NIT:	x Lesdy Y Ortega x 43595881	Firma Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No. 01037-3654602 ANT	Carlos A Mercado Z	Firma Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD		Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:	

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 09 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 060/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Durante la inspección de la vivienda la pachada. y piso exterior mantienen sus condiciones iniciales	
El techo en zinc se encuentra en buen estado la paredes de la sala estan con repello y pintura. con signos de desgaste la fachada trasera. está en obra gris, se visualizan algunas fisuras y grietas tanto en piso como en paredes.	
El propietario expresa entera satisfacción con el desarrollo del proyecto, afirma no haber tenido ningun inconveniente dano o afectación al predio se firma la presente acta a conformidad	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: x Lesdy Y. Ortega	Firma: Carlos A. Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: x 43 895 581	Matrícula profesional No. 011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68207-27R114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

PISO EXTERIOR	PARED LATERAL
	
PISO INTERIOR	**PARED LATERAL**
	

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 09 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección: | Teléfonos:

Nombre de la persona que atiende la visita: Yesica Cardeño CC No. 1040495143

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Yesica Cardeño CC No. 1040495143

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto: SI ☐ NO ☐

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES)
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación

FIRMAS

Firma: Yesica Cardeño	Firma: Carlos A. Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre:
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 1040495143	Matrícula profesional No.:011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 09 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Durante la inspección de la vivienda se observaron remodelaciones, considerables, piso con baldosa y paredes con repello y pintura	
El Propietario manifiesta entera satisfacción con el desarrollo del proyecto y conformidad con las condiciones actuales de la propiedad	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: Yesica Cardeño	Firma: Carlos A. Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 1040495145	Matrícula profesional No.:011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita ante las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 39 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 09 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 056/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección		Teléfonos	3205023122.
Nombre de la persona que atiende la visita:	Yesica Cardeño	CC No.	1040495143
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Yesica Cardeño	CC No.	1040495143

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI	NO
		X

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable y/o Propietario C.C. O NIT:	X Yesica Cardeño X 1040495143	Firma Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 011037-0654602 ANT	Carlos A. Mercado Z	Firma Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD		Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:	

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE VECINDAD	VERSION	1
		PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 38, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 09 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Durante la visita no permitieron el ingreso a la vivienda, La estructura de la casa (fachada) se encuentra en optimas condiciones el propietario expresa total conformidad por las condiciones actuales del predio. y manifiesta no haber sufrido daño o afectación firma a satisfaccion la presente acta.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: Yesica Cardeño	Firma: Carlos A. Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 1040495143	Matrícula profesional No :011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-278114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 38, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	09 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025 | Contrato de Interventoría No. 052/2025 | **Acta de Vecindad de Cierre**

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección: | Teléfonos:

Nombre de la persona que atiende la visita: Doris Bernardez Cortes — CC No. 22 247 402

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva — 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Doris B Cortes — CC No. 22247402.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto: SI ☐ NO ☐

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES)
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectacion alguna.

FIRMAS

Firma: Doris Bernardez Nombre: Responsable y/o Propietario C.C. O NIT: 22247402	Firma: Carlos A. Mercado Z Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:011037-0654602 ANT	Firma: Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	Firma: Nombre: Testigo C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 09 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Durante la inspeccion de la vivienda se visualiza. grietas en esquinas de paredes interiores, resanes en pared de fachada y multiples fisuras, ademas de desgastes y desprendimientos en piso de concreto liso El piso exterior conserva sus caracteristicas preexistentes. El Propietario expresa conformidad con las condiciones actuales de la vivienda, además afirma no haber tenido ningun tipo de afectación por parte de las actividades ejecutadas del proyecto. firma a satisfaccion la presente acta.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: X	Firma: Carlos A. Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre: DORIS BERRABIERES	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre:
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: X 22 42 47 402	Matrícula profesional No.: 011037-0654902 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

PISO EXTERIOR



PARED INTERIOR



PARED FACHADA



PISO INTERIOR



Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad. Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN: 1

PAGINA: 1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 36 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.

FECHA: 09 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025 | Contrato de Interventoría No. 052/2025 | **Acta de Vecindad de Cierre**

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección: | **Teléfonos**:

Nombre de la persona que atiende la visita: Rodrigo Durango | CC No. 3673685

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Rodrigo Durango | CC No. 3673685

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto: SI ☐ NO ☒

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES)
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectaciones.

FIRMAS

Firma: *Rodrigo Durango	Firma: Carlos A. Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: *3673685	Matrícula profesional No.:011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	09 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Durante la inspección de la vivienda se visualiza que el piso exterior conserva las condiciones preexistentes. ala ejecución del proyecto. no se evidencian nuevas grietas o fisuras.	
El Propietario expresa entera conformidad con las actividades ejecutadas. y con la condicion actual de la vivienda, firma a satisfacción la presente acta.	

Firma al acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: x	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: x 36 736 225	Matrícula profesional No. 011037-0854602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

ACCESO



PARED INTERIOR



PARED FACHADA



PISO EXTERIOR



Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN: 1

PAGINA: 1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	09 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025 | Contrato de Interventoría No. 052/2025 | **Acta de Vecindad de Cierre**

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección: | Teléfonos:

Nombre de la persona que atiende la visita: Yuberlis Ortiz Lopez | CC No. 1040500097

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva | 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Yuberlis Ortiz | CC No. 1040500097

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto: SI ☐ NO ☒

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES)
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma: Yuberlis Ortiz	Firma: Carlos A. Mercado	Firma:
Nombre: Responsable y/o Propietario	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho
C.C. O NIT: 1040500097	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría
	Matrícula profesional No.: 01037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD

Firma:
Nombre:
Testigo
C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 09 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
El Propietario no permitió el acceso a la vivienda. Se observan remodelaciones en fachada.	
El Propietario expresa completa satisfacción con las condiciones actuales del predio y Firma la presente acta a conformidad.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: [signature]	Firma: [signature]	Firma: [signature]	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 1040800097	Matrícula profesional No.:011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-278111 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 09 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección: Teléfonos:

Nombre de la persona que atiende la visita: Yermuis Vaquero Lopez CC No. 1040501635

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva — 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Marin Lopez CC No. 50940090

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto — SI ☐ NO ☒

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES)
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma: YERMUIS V Nombre: Responsable y/o Propietario C.C. O NIT: 1040501635	Firma: Carlos A. Mercado Z Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 011037-0654602 ANT	Firma: Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	Firma: Nombre Testigo C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 09 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoria No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Dia / Mes / Año)
Durante la visita se visualiza una Vivienda construida en madera con signos de deterioro desgaste en pintura, Piso en concreto liso con desgaste propio del paso peatonal.	
El Propietario expresa que no tuvo daños en el predio ocasionados por la ejecución del objeto del proyecto, Firma la presente acta a conformidad.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: WEBNUIS V	Firma: Carlos A Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoria**	**Testigo**
C.C. O NIT: 1040607635	Matricula profesional No.: 011037-0654602 ANT	Matricula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales tecnicos del Contratista y la Interventoria, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO	
PISO INTERIOR	CONTRAFACHADA
	
PARED LATERAL	PARED LATERAL
	

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.

FECHA: 09 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025 | Contrato de Interventoría No. 052/2025 | Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección: | Teléfonos:

Nombre de la persona que atiende la visita: Harly Lopez Guevara | CC No. 59121581

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva: 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Harly Lopez | CC No. 59121581

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto: SI ☐ NO ☐

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo:

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES)
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo:

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma: *Harly Lopez Guevara
Nombre:
Responsable y/o Propietario
C.C. O NIT: 59121581

Firma: Carlos A. Mercado 7
Nombre: Carlos Mercado
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.:011037-0654602 ANT

Firma:
Nombre: Diego Camacho
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD

Firma:
Nombre
Testigo
C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 09 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Vivienda con fachada laterales en obra gris, fachada frontal con baldosa repellada, estucada y pintada, cerramiento al pegue del bordillo en concreto con grietas, fisuras y desprendimientos, piso en concreto liso pigmentado con desgaste propio del paso peatonal se visualizan grietas y fisuras multiples en paredes interiores	
El Propietario firma el acta presente a entera satisfacción y afirma que no tuvo inconvenientes daños o afectaciones con relación a la ejecución del proyecto.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Marly López Ocampo	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre:
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 59121881	Matrícula profesional No.:011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 08202-278114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

CERRAMIENTO	PARED INTERIOR
	
PISO EXTERIOR	**PARED POSTERIOR FACHADA**
	

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 09 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección: Teléfonos: 3215598688

Nombre de la persona que atiende la visita: Jaider Galindo CC No. 1073986843

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Alcedo Perez B CC No. 11057225

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) (0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo)	

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma: X Jaider Galindo Nombre: Responsable y/o Propietario C.C. O NIT: X 1073986843	Firma: Carlos A. Mercado Z Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:011037-0954602 ANT	Firma: Nombre: Diego Comacho Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	Firma: Nombre Testigo C.C. O NIT:

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	09 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 05/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Vivienda con humedade en paredes exteriores e interiores grietas y fisuras multiples en paredes de fachada Piso en concreto liso con con rosanes, desprendimientos grietas y deterioro, paredes sin repello. y desprendimientos fachada frontal, repellada y pintada.	
Los propietarios Firman a conformidad afirmando que no tuvo afectaciones ni daños en el predio. atribuibles al desarrollo de las actividades ejecutadas.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: X Nombre: Responsable y/o Propietario C.C. O NIT: X 1073996393	Firma: Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No. :011037-0654602 ANT	Firma: Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	Firma: Nombre Testigo C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO	
PISO EXTERIOR	PISO INTERIOR
	
FACHADA LATERAL /CONTRAFACHADA	PISO INTERIOR
	

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL, DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	09 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025 | Contrato de Interventoría No. 052/2025 | Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección: | Teléfonos:

Nombre de la persona que atiende la visita: Yoerlis Arrieta | CC No. 1040492716

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Angela atencal | CC No. 1038896980

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto: SI ☐ NO ☐

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES)
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma: X Yoherlis Arrieta
Nombre:
Responsable y/o Propietario
C.C. O NIT: X 1040492716

Firma: Carlos A. Mercado Z
Nombre: Carlos Mercado
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.:011037-0554602 ANT

Firma:
Nombre: Diego Camacho
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD

Firma:
Nombre
Testigo
C.C. O NIT:

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 36, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	09 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Durante la visita no se permitió el libre acceso a la vivienda, el piso exterior mantiene sus condiciones iniciales, en el interior de la casa no se perciben daños o afectaciones	
El Propietario manifiesta entera satisfacción con el desarrollo del proyecto, y autoriza mediante llamada telefonica a la señora Yoheris firmar el acta a conformidad.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: X Yoheris Arrieta	Firma: Carlos A. Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: X 1040497716	Matrícula profesional No.:011037-6654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

PISO EXTERIOR



PARED INTERIOR



PARED FACHADA



PISO INTERIOR



Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	09 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
Dirección		Teléfonos	3135168015.	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Cristi Hernandez	CC No.	1065377812	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Cristi Hernandez	CC No.	1065377812.	

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable y/o Propietario X C.C. O NIT:	Cristi H 1065377812	Firma Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:011037-0654602 ANT	Carlos A. Mercado Z	Firma Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE. ANTIOQUIA.
FECHA	09 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Durante la inspección de la vivienda. se observa que mantiene las condiciones preexistentes. al inicio del proyecto, en el interior no se perciben daños o afectaciones atribuibles ala ejecucion de la obra.	
El propietario expresa satisfaccion con las condiciones actuales del predio y firma a conformidad la presente acta.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [ ] NO [ ]

Firma: X Cristi. H	Firma: Carlos A. Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre:
Responsable y/o Propietario X	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 1065377812	Matrícula profesional No. 0110370654603 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-275114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

FACHADA LATERAL DERECHA	PARED LATERAL INTERIOR
	
PISO INTERIOR	**PARED LATERAL INTERIOR**
	

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 09 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección		Teléfonos	3136190416.
Nombre de la persona que atiende la visita:	Andris Medina	CC No.	1040516863
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Juana Perez	CC No.	22246579.

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectacion a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable y/o Propietario C.C. O NIT:	Andry Yiseth Medina 1040516863	Firma Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:01037-0634602 ANT	Carlos A. Mercado Z
Firma Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 68202-278114 STD		Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:	

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	09 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Durante la inspección de la vivienda se observa que mantiene las condiciones mismas iniciales al proyecto, no se persiben daños o alteraciones al predio, atribuible a la ejecución de la obra.	
El Propietario expresa conformidad con las condiciones actuales de la vivienda y firma a conformidad la presente acta	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: X
Nombre: Andry Yiseth Medina
Responsable y/o Propietario
C.C. O NIT: X 1040 516 863

Firma
Nombre: Carlos Mercado
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.:0110370654602 ANT

Firma
Nombre: Diego Camacho
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 66202-276114 STD

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento tecnico, que debe ser diligenciada por profesionales idoneos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO	
PARED FACHADA	TECHO INTERIOR
	
PISO INTERIOR	PARED INTERIOR
	

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	09 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	**Acta de Vecindad de Cierre**

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento**	**Municipio**	**Vereda**	**PR**

Dirección		**Teléfonos**	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Hedarda Ortiz	CC No.	43894495
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propio; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:		CC No.	

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma Nombre: **Responsable y/o Propietario** C.C. O NIT:	* Hedarda Ortiz * 43894495	Firma Nombre: Carlos Mercado **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No. 01037-065460Z ANT	Carlos A. Mercado Z
Firma Nombre: Diego Camacho **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD		Firma Nombre **Testigo** C.C. O NIT:	

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 09 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Durante la inspección de la vivienda se visualizan grietas, fisuras y resanes en paredes y piso no atribuibles a la ejecución de la obra.	
El Propietario firma a satisfaccion la presente acta. y expresa no haber tenido ningun tipo de afectacion.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: Medarda Ortiz	Firma: Carlos A. Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre: Responsable y/o Propietario	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre: Testigo
C.C. O NIT: 43894495	Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No. 0110370654602 ANT	Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO	
PISO INTERIOR	PISO EXTERIOR
	
PARED INTERIOR	PISO EXTERIOR
	

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 09 / 05 / 2026


Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección		Teléfonos	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Jennifer Barrios	CC No.	1001684326
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Everlides Perez	CC No.	43895878.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA

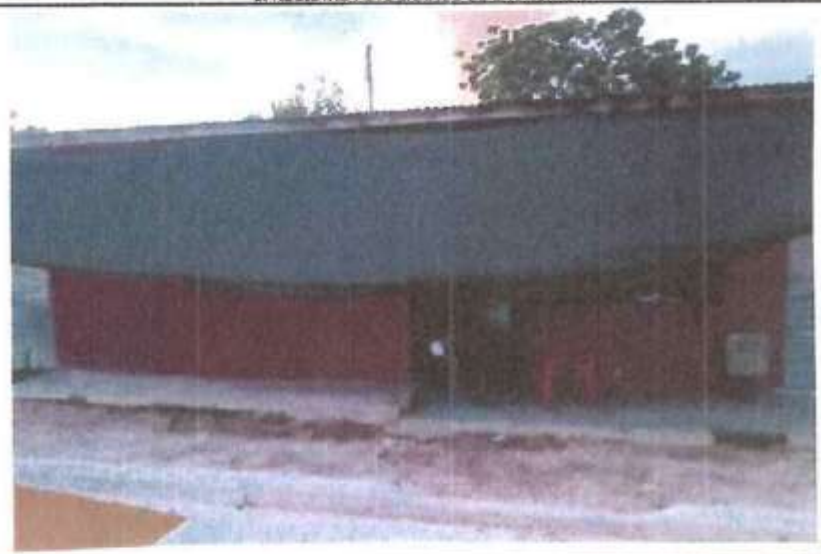

3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI	
	NO	X
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo		
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo		

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable y/o Propietario C.C. O NIT:	* Jennifer Barrios M 1001684326	Firma Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No. 011037-0854602 ANT	Carlos A. Mercado Z
Firma Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD		Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:	

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL SAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 09 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 056/2025	Contrato de Interventoria No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Dia / Mes / Año)
Se realiza la inspección a la vivienda, se visualiza en piso exterior desprendimientos, grietas y fisuras.	
En las pared de fachada e interiores de la vivienda contemplan diversas fisuras. no atribuible a la ejecucion del proyecto de pavimentación y obras complementarias.	
El Propietario expresa conformidad con las actividades ejecutadas y firma la presente acta a satisfacción	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: Jennifer Bawicosh	Firma: Carlos A. Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoria	Testigo
C.C. O NIT: 1001682326	Matricula profesional No.:011037-0054602 ANT	Matricula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregara al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoria, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO	
PISO INTERIOR	PARED INTERIOR LATERAL
	
PISO INTERIOR	PARED INTERIOR LATERAL
	

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL, DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 09 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección: Teléfonos:

Nombre de la persona que atiende la visita: Sayda Martinez CC No.: 1040505055

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva: 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Sayda Martinez CC No.: 1040505055

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☐
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma: X Saida M.
Nombre:
Responsable y/o Propietario
C.C. O NIT: X 1040505055

Firma:
Nombre: Carlos Mercado
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.:011037-0554602 ANT

Firma:
Nombre: Diego Camacho
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD

Firma:
Nombre
Testigo
C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 09 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Durante la visita se contempla mejoras en la vivienda.	
El Propietario expresa plena satisfacción con las actividades ejecutadas de la obra y firma la presente acta a conformidad.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: X Saida M.	Firma: Carlos A. Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: X 1040 505 055	Matrícula profesional No.: 011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-275114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 38 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	09 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025 | Contrato de Interventoría No. 052/2025 | Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección: | Teléfonos:

Nombre de la persona que atiende la visita: Dina Romero | CC No. 1148206066

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva: 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Jose A. Perez | CC No. 1105720024

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto: SI ☐ NO ☐

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo:

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES)
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo:

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hay afectaciones.

FIRMAS

Firma: Dina Romero
Nombre:
Responsable y/o Propietario
C.C. O NIT: 1148206066

Firma
Nombre: Carlos Mercado
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No. 011037-0654602 ANT

Firma
Nombre: Diego Camacho
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 09 / 05 / 2026

Contrato de Obra No: 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Durante la visita el propietario de la vivienda autoriza a la señora Dina Romero firmar acta a satisfacción.	
El Propietario expresa no haber sufrido ningun tipo de inconveniente, daño o afectación a la propiedad.	

Firma el acta de cierre a satisfaccion SI [X] NO [ ]

Firma: Dina Romero Nombre: **Responsable y/o Propietario** C.C. O NIT: 1148 206 066	Firma: Nombre: Carlos Mercado **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No. 911037-0654602 ANT	Firma: Nombre: Diego Camacho **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD
Firma: Nombre **Testigo** C.C. O NIT:		

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.


5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

PISO EXTERIOR





PARED FACHADA

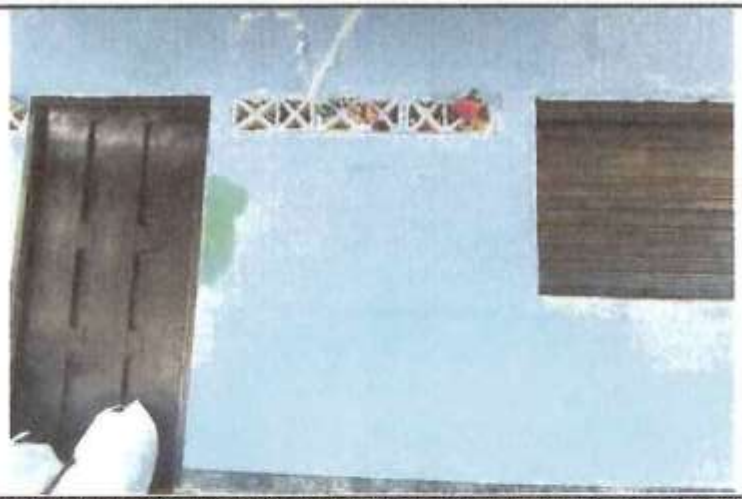



Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	09 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025 | Contrato de Interventoría No. 052/2025 | **Acta de Vecindad de Cierre**

1. DATOS DEL PREDIO

	Departamento	Municipio	Vereda	PR
Ubicación:				

Dirección: | **Teléfonos:**

Nombre de la persona que atiende la visita: Rosmery Benavides CC No. 1040491268

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propio; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva: 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Rosmery Benavides CC No. 1040491268

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto: SI ☐ NO ☐

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES)
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma: Rosmery Benavides	Firma: Carlos A Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 1040491268	Matrícula profesional No.: 011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 09 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Durante la inspección a la vivienda se visualizan grietas, fisuras, en piso y paredes, además, desprendimiento de pintura en la parte inferior de paredes de fachada trasera, se hicieron mejoras en el anden.	
La propietaria expresa entera satisfacción respecto a las actividades ejecutadas y con las condiciones actuales de la vivienda.	
Firma a conformidad la presente acta.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: X Nombre: Rosmeri Benavides Responsable y/o Propietario C.C. O NIT: X 1.040 401268	Firma: Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.:0110370654602 ANT	Firma: Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	Firma: Nombre: Testigo C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrito entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO	
PISO EXTERIOR	PISO INTERIOR
	
PISO EXTERIOR	PISO INTERIOR
	

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 09 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección		Teléfonos	

Nombre de la persona que atiende la visita: Mildred Benavidez CC No. 43974974

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Mildred Benavidez CC No. 43974974

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI	NO
		X

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES)
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable y/o Propietario X 43974974 C.C. O NIT:	Firma Nombre: Carlos Mercado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No. 011037-0554602 ANT	Firma Nombre: Diego Camacho Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29°, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 09 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Durante la inspección se visualizan grietas severas en paredes del interior de la vivienda. no atribuibles a las actividades ejecutadas de la obra. de pavimentación.	
El Propietario pinta fachada color verde, y expresa entera conformidad con las actividades ejecutadas de proyecto en cuestión y firma a satisfacción la presente acta.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 1039710976	Matrícula profesional No. 011037-0554602 ANT	Matrícula profesional No.: 58202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

PISO EXTERIOR	PARED INTERIOR
	
PISO INTERIOR	**PARED INTERIOR**
	

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

ACTA DE VECINDAD

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
FECHA	09 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 050/2025 | Contrato de Interventoría No. 052/2025 | Acta de Vecindad de Cierre

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR

Dirección: | Teléfonos: 3217413906

Nombre de la persona que atiende la visita: Damaris Chavez | CC No. 43896618

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva | 1

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Manuel Arias. | CC No. 8 374 485

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto: SI ☐ NO ☐

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES)
0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
	No hubo afectación.

FIRMAS

Firma: Damaris Chavez
Nombre: Responsable y/o Propietario
C.C. O NIT: 43.896 618

Firma
Nombre: Carlos Mercado
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 01 1037-0554662 ANT

Firma
Nombre: Diego Camacho
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT:

CONSORCIO PUERTO CLAVER	ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 3

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29°, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	FECHA 09 / 05 / 2026

Contrato de Obra No. 056/2025	Contrato de Interventoría No. 052/2025	Acta de Vecindad de Cierre

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
Durante la inspeccrón se visualiza fachada resanadas en puerta y ventanas, paredes de sala con acabados piso con baldosa, cielo raso PVC, parede de habitaciones con grietas y fisuras. severas nb atribuibles a las actividades ejecutadas del proyedo en cuestion.	
El Propietario firma a satisfaccion la presente acta expresando su conformidad con la obra ejecutada.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: Damaris Chavez.	Firma: Carlos A. Mercado Z	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Carlos Mercado	Nombre: Diego Camacho	Nombre
Responsable y/o Propietario	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoria	Testigo
C.C. O NIT: x43.906.605	Matrícula profesional No. 011037-0654602 ANT	Matrícula profesional No.: 68202-276114 STD	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO	
PISO EXTERIOR	PARED INTERIOR
	
PARED INTERIOR	PARED INTERIOR
	

Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

ANEXO 14. BITACORA DE OBRA.

Sábado 11 de Abril de 2020
Estado del tiempo: Lluvia todo el jornada.
Personal de OBRA: Dueño (1), Residente (1), SST (1), Topógrafo (1), CADENERO (2), RAQUETERO (2), Ayudante (2), CUADRILLA DE OBRA
HERRAMIENTAS y Equipo: Vibrocompactador (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Mezcladora de (1), Volqueta (2), Equipo topográfico, Equipo flex, Herramienta menor.
Actividades:
- Se realizo excavación en Box Culvert del estribo derecho K0+192. y en Cabezote izquierdo K0+207,44.
- Cuadrilla topografica toma niveles Diario excavación en Box culvert

Carlos A. Mercado Z

Domingo 12 de Abril de 2020

NO SE TRABAJO

Carlos A. Mercado Z

- Lunes 13 de Abril de 2020
Estado del CLIMA: Lluvia todo la jornada.
Personal de OBRA: Dueño (1) Residente (1) Residente (1), SST (1), Topografo (1), CADENERO (2), RAQUETERO (2), Ayudante (2), CUADRILLA DE OBRA
HERRAMIENTAS y Equipo: Vibrocompactador (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Mezcladora (1), Volqueta (2), Equipo topografico, Herramienta Flex, Equipo Flex
Actividades:
- Se realizo excavación en Box culvert de la calle 35 estribo derecho. (K0+190).
- Se instala Hidrosiembra en el Box culvert del estribo derecho (K0+182)
- Cuadrilla topografica toma niveles

Carlos A. Mercado Z

Martes 16 de Abril de 2024
Estado del clima: Soleado todo la jornada laboral
Personal de OBRA: Director (1), Residente (1), SSTT (1), Topografo (1), Cadeneros (2), Soldador (1), Ayudante (2), PEONES (2), CUADRILLA De OBRA
MAQUINARIAS y EQUIPOS: Vibrocompactador (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Volqueta (2), Cisterna agua, Equipo topografico, Equipo Rover, Herramienta Menor
Actividades:
- Se instala tubería ranurada en la B.C. del Km 1+02 costado derecho
- Se instala Reparto en el Km 2+20,14 del costado izquierdo. y en el Km 2+20, berma del costado derecho.
- Se toman respectivas tomas Niveles de la tubería ranurada y el Reparto.

Carlos A. Mercado Z

Martes 16 de Abril de 2024
Estado del clima: Soleado todo la jornada laboral
Personal de OBRA: Director (1), Residente (1), SSTT (1), Topografo (1), Cadeneros (2), Soldador (1), Ayudante (2), PEONES (2), CUADRILLA De OBRA
MAQUINARIAS y EQUIPOS: Vibrocompactador (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Volqueta (2), Cisterna agua, Equipo topografico, Equipo Rover, Herramienta Menor
Actividades:
- Se instala Reparto longitudinal y Relleno transversal Km 0+180 costado derecho en el Bordillo en el Km 1+82 del costado derecho, PLANTA Típica
- Se instala tubería ranurada en el Km 2+20,14 (costado izquierdo) y en Bordillo del Km 2+20 costado derecho).

Carlos A. Mercado Z

Scanned with CamScanner

Jueves 14 de Abril de 2016
estado del clima: Soleado toda la jornada
Personal de OBRA: Director (1), Residente (1), SST (1), Topógrafo (1), CADENERO (2), Peones (1), Veladores (2), Operador (1), CUADRILLA DE OBRA
MAQUINARIA y Equipo: Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Mezcladora (1), Volqueta (3), Equipo topografía, Equipo menor, Herramienta menor
Actividades:
- Se realiza cate en BC Calle 36 (costado Derecho)
- Se instala acero de refuerzo transversal #3/8" en BC. Calle 36 (costado Derecho).

Carlos A. Mercado Z

Viernes 15 de Abril de 2016
estado del clima: Soleado toda la jornada
LABOR:
Personal de OBRA: Director (1), Residente (1), SST (1), Topógrafo (1), CADENERO (2), Peones (1), Veladores (2), CUADRILLA DE OBRA
MAQUINARIA y Equipo: Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Mezcladora (1), Volqueta (3), Equipo topografía, Equipo menor, Herramienta menor
Actividades:
- Se realiza cate en BC Calle 36 (costado Derecho)
- Se instala Acero en BC Carrera 32 (costado izquierdo).
- Se entrega Acero en PLANOS Ingreso en BC Carrera 32, Juntas y Anclajes de transversales
- Se finaliza transversales en BC de la Carrera 32 en el Fot 291,400
- Los cruces topográficos toma Niveles en la Intersección de los BC. De la Carrera 32.

Carlos A. Mercado Z

[illegible] 1° de [illegible]
[illegible] Sol. [illegible] [illegible] [illegible]
(Obra)
Personal de OBRA: Residente (1), Dest. (1), SST (1), Capataz (2), Topografo (1), Ayudante (2), Operarios (1), Peones (3), Cuadrilla de OBRA
Maquinaria y Equipo: Vibrocompactador (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Volqueta (2), Mezcladora (1), Equipo topografico, Camioneta Hilux, Equipo Varios.
Actividades:
- Se instala concreto de f'c = 350 kg/cm² en BC. CARRera 32 (estado 13 grados).
- Se vertio los excesos en el BC CARRera 32.
- Cuadrilla topografica toma niveles de excavacion en los BC CARRera 32.

Carlos A. Mercado Z

- Dia 19 de Abril de 2026

No se labora

Carlos A. Mercado Z

- Lunes 20 de Abril de 2026
Estado del CLIMA: Soleado toda la jornada
Personal de OBRA: Residente (1), Dest. (1), SST (1), Capataz (2), Topografo (1), Ayudante (2), Operarios (1), Peones (2), Cuadrilla de OBRA
Maquinaria y Equipo: Vibrocompactador (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Volqueta (2), Mezcladora (1), Equipo topografico, Equipo Varios, Camioneta Hilux
Actividades:
- Se vertio concreto en pavimentos de los BC CARRera 32 (estado 13 grados)
- Se inicia instalacion de Rieles en BC. CARRera 35 (estado derecho) y Area tangencial y (Adicional para PARQ Irregular)

Carlos A. Mercado Z

Carlos A. Mercado Z

Carlos A. Mercado Z

- Jueves 13 de [illegible] de 2016 (DÍA 1)
Estado del tiempo: Nublado - lluvia
Hora inicio: 8:00 am - 17:00 pm, Suspendido actividades de la jornada
Personal de OBRA: Director (1), Residente (1), SST (1), Topógrafo (1), CADENEROS (2), Carpinteros (1), Oficiales (2), CUADRILLA DE OBRA
HERRAMIENTAS y equipos: Vibrocompactador (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Mezcladora (1), Volqueta (2), Equipo topografía, Herramienta Menor, Equipo Menor
Actividades
- Se termina la instalación del reforzamiento en la CDMo carrera 32
- La cuneta topográfica fue nivelada en el reforzamiento instalado en la calle carrera 32
- Se vacía concreto para filetes de refuerzo en Ø 3/8", OBRERO y GARAGE respectivamente.

Carlos A. Mercado Z

- Viernes 14 de ABRIL de 2016
Estado del tiempo: Soleado toda la jornada laboral
Personal de OBRA: Director (1), Residente (1), SST (1), Topógrafo (1), CADENEROS (2), Carpinteros (1), Oficiales (1), PEONES (2), CUADRILLA DE OBRA
HERRAMIENTAS y equipos: Vibrocompactador (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Mezcladora (1), Volqueta (2), Equipo topografía, Equipo Menor, Herramienta Menor
Actividades
- Se finaliza la instalación de todas las cunetas en la calle carrera 32
- La cuneta topográfica fue nivelada en la totalidad de las cunetas instaladas.

Scanned with CamScanner

- Se realizan en el [illegible] del [illegible] de referencia
Para [illegible], [illegible] y [illegible] de [illegible].

Carlos A. Mercado Z

- SÁBADO [illegible] de [illegible] de [illegible]
Estado del tiempo: [illegible] Todas las jornadas laboral.
Personal de OBRA: Director (1), Residente (1), SST (1), Topógrafo (1), Cadenero (2), Ayudantes (1), Dobletero (2), Vigilante (2), CUADRILLA DE OBRA
MAQUINARIA Y EQUIPO: Vibrocompactador (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Volqueta (2), Equipo topográfico, Herramienta menor, Equipo menor.
Actividades:
- Se inicia la instalación de sub-base granular en la calle carrera 32
- La cuadrilla topográfica toma Nivel en la sub-base granular en la calle CARRERA 32
- Se instala red hidráulica, Pasa por debajo de Andenes y Anden terminado y Calzada en pavimento rígido.

Carlos A. Mercado Z

- Domingo 26 de Abril de 2020

NO SE LABORÓ

Carlos A. Mercado Z

- LUNES 27 de ABRIL DE 2020
Estado del clima: Soleado Toda la Jornada.
Personal de OBRA: Residente (1), Director (1), SST (1), Topógrafo (1), Cadenero (2), Secretaria (1), Dobletero (2), Vigilante (2), CUADRILLA DE OBRA.
MAQUINARIA Y EQUIPO: Vibrocompactador (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Volqueta (2), Equipo topográfico, Herramienta (1), Herramienta Menor, Equipo menor.

Actividades:
- Se instalan [illegible] de HA: 6179/6 en la calle [illegible] 32 de
- Se instalan caños [illegible] para [illegible] en 3/8"
- Se instala [illegible] para bordillos en el sector 7 del +0+173,94 al BC calle 36 (estado derecho): BC calle 36 (estado derecho) al +0+170;

Carlos A. Mercado Z

- MARTES 28 de Abril de 2026
Estado del tiempo: Soleado toda la jornada
Personal de OBRA: Director (1), Residente (1), SST (1), Topógrafo (1), Baqueano (1), CAPATAZ (2), Ayudante (2), OFICIALES (2), CUADRILLA DE OBRA
MAQUINARIAS y Equipos: Vibrocompactador (1), Retroexcavadora (1), MEZCLADORA (1), Volqueta (2), Equipo topográfico, Equipo menor, Herramienta menor
Actividades
Se instala cuneta de 3000 PIT para bordillo en el sector 1 del +0+173,94 al BC calle 36 (estado derecho). BC calle 36 (estado derecho) al +0+170
- Se instalan reductores en BC [illegible] calle 32
- Se instala caño de refuerzo para placa huellero en calzada en calle carrera 32
- Se instala bordillo en el sector 1 estado izquierdo +0+173,94 al +0+191,82 ; +0+191,82 - BC carrera 32 (estado izquierdo); BC carrera 32 (estado izquierdo) - +0+205,8.

Carlos A. Mercado Z

- MIERCOLES 29 de ABRIL DE 2026
Estado del CLIMA: Soleado toda la jornada laboral
Personal de OBRA: Director (1), Residente (1), SST (1),

Scanned with CamScanner

topógrafo (1), cadeneros (2), ayudante (1), Vigilante (2), Peletero (2), CUADRILLA DE OBRA.
Equipos y herramientas: Volqueta (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Vibrocompactador (1), Vehículo (2), equipo topográfico, Herramienta Menor, Equipo de Soldadura.

- Se instala poste PIII - 1571 (1m) en la calle Carrera 32, K
- Se instala cruceta horizontal para bombillas 4 x 18 en la calle Carrera 32.
- Se instala ~~proyecto~~ cuatro (3x3) PIJ para bombillo en el lado 1 del costado izquierdo KO+173,94 al KO+ 191,12 y del 91,12 al BC Carrera 32 (costado izquierdo); BC Carrera 32 (costado izquierdo) - KO+205,3.
- Se instala Relés en el costado derecho del lado 1 KO+190 - KO+285,12; KO+285,12 - BC Carrera 32 (costado derecho).

Carlos A. Mercado Z

Jueves 30 de Abril de 2026
Estado del Clima: Soleado toda la jornada hasta
Trabajadores y equipos: Volqueta, Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Vibrocompactador (1), Volqueta (2), equipo topográfico, Herramienta Menor
Residente de Obra: Director (1), Residente (1), SST (1), topógrafo (1), CADENEROS (2), Auxiliar (1), ayudante (2), Peleteros (2), CUADRILLA DE OBRA
Actividades:
- Se instala circuito 3x3 PII en el lado 1 costado derecho KO+190 - KO+285,12; KO+285,12 - BC Carrera 32 (Costado derecho)
- Se realiza corte transversal en cotejado de la calle Carrera 32.
- Se instala Relés para bombillas en el costado izquierdo KO+205,3 al KO+294 del lado 1
- Se inicia excavación en la BC Carrera 32 (costado

(izquierdo) en el texto 2.
- CP Cemex izquierdos tomo [illegible] en el [illegible]
de la BC CAMARA 29A (antes izquierdo) en el [illegible]

Carlos A. Mercado Z

- 01 De MAYO de 2026 (VIERNES)

NO se LABORO

Carlos A. Mercado Z

- SABADO 02 de MAYO de 2026
Estado del CLIMA: Soleado todas las jornadas laborales.
Personal de OBRA: Dreta de OBRA (1), Residente (1) SST (1), Topografo (1) CP Cemex (2), Electricista (1), Vigilante (2), Operario (1), AYUDANTES (2), CUADRILLA DE OBRA
MAQUINARIA y Equipos: Vibrocompactador (1), Retroexcavadora (1), Retrocargador (1), Minicargador (1) Volqueta (2), Equipo topografico, Herramienta Menor, Equipo Menor
Actividades.
- Se realiza instalacion de Hidrosanitario en la BC CAMARA 29A (Costado izquierdo).
- CP cemex topografo toma Niveles en el Hidrosanitario instalado en la BC CAMARA 29A (costado izquierdo).
- Se instala concreto 3000 PSI en Bordillos del sector 1 (costado izquierdo) K0.+205,3 al K0+294
- Se instala Piel de [illegible] en Bordillos del en el sector 2 del costado derecho K0+290,00 al K0+318,07.

Carlos A. Mercado Z

Domingo 03 De MAYO de 2026

NO se LABORO

Carlos A. Mercado Z

Lunes 14 de [illegible]
Estado del clima [illegible]
Personal de obra: [illegible]
topógrafo (1), cadeneros (2), [illegible]
[illegible], cuadrilla de [illegible]
[illegible] y Equipos: [illegible]
(1), Retroexcavadora (1), [illegible]
[illegible], volqueta (2), [illegible]
[illegible]

Actividades:

- Se instala [illegible] en el tramo 2.
- [illegible] en el tramo 2 del K0+296,40 - K0+318,07.
- Se instala Riego en el costado izquierdo del tramo 2 K0+294 al K0+ 312,12. para Bodillas
- Se baja [illegible] para Bodillas

Carlos A. Mercado Z

- [illegible] OT de MAYO de 2024
Estado del clima [illegible]
Personal de obra: Director (1), Residente (1), SST (1), topógrafo (1), cadeneros (2), vigilante (2), Serenos (1), Obreros (2), cuadrilla de [illegible]
Herramientas y Equipos: Vibrocompactador (1), Retroexcavadora (1), Retroexcavadora (1), Minicargador (1), Equipos topográficos Volqueta (2), Herramienta [illegible], Equipo [illegible]

Actividades:

- Se instala Riego en B.C. Carrera 29A (costado izquierdo) del tramo 2.
- Se instala cuneta de triangular en Bodillas Izquierdo en B.C. Carrera 29A (costado izquierdo)
- Se instalado cuneta 3000 PSI en Bodillas en el

Carlos A. Mercado Z

Carlos A. Mercado Z

(Lado izquierdo) del tubo 2.
- Se instala cuchilla 3000 PSI en Bordillos en el tubo 2 del Lado izquierdo del K0+531,85 al K0+531,85 del K0+531,85
- Se instala Rieles en Bordillos del tubo 1 en el Costado derecho del K0+ 632,79 (Parada de Lado derecho) a la calle Carrera 32 y en Costado izquierdo de la calle Carrera 32. K0+ 632,79.

Carlos A. Mercado Z

- Viernes 08 de MAYO de 2020.
Estado del CLIMA Soleado todo el periodo laboral.
Personal de OBRA. Director (1), Residente (1), SST (1), CAPATAZ (2), Topografo (1), Ayudante (1), Oficial (2), Peletero (2), CUADRILLA de OBRA
MAQUINARIA y Equipos: Vibrocompactador (1), Retroexcavadora (1), Rotary de (1), Planeros de (1), Retroexcavadora (2), Equipo topografico, Herramienta Menor, Equipo Menor
Actividades:
- Se instala cuchilla de 3000 PSI en Bordillos del tubo 1 del BC (Parada 32 (Costado derecho) a la calle Carrera 32 y en el costado izquierdo de la calle Carrera 32 del tubo 2 K0+ 632,79
- Se instala rieles en el tubo 2 del K0+ 632,79 al K0+ 512 para Bordillos del costado derecho
- Se instala Riel del K0+531.85 al K0+ 632,79 del costado izquierdo para Bordillos.

Carlos A. Mercado Z

- SABADO 09 De MAYO de 2020.
Estado del CLIMA Soleado todo la jornada Nocturna
Personal de OBRA. Director (1), Residente (1), SST (1), CAPATAZ (2), Topografo (1), Ayudante (1), Oficial (2), Peletero (2), CUADRILLA de OBRA
MAQUINARIA y Equipos: Planeros del (1) Retroexcavadora (1), volqueta (2), Equipo Topografico (1), Equipo Menor, Herramienta menor

Actividades:

- Instala concreto de 3000 PSI para Bachillerato en el tramo 2 entre los [illegible] y [illegible]
- Instala concreto [illegible]

Carlos A. Mercado Z

Domingo 10 MAYO de 2015

Estado del tiempo: Soleado todo el día

Personal de OBRA: Director (1), Residente (1), SST (1), Topógrafo (1), OBRERO (2), Fierreros (1), Veladores (2), PEONES (2), CUADRILLA DE OBRA

MAQUINARIA y Equipos: Volqueta (2), Mezcladora (1), Equipo topografía, Herramienta Menor, Equipo Menor

Actividades

- Instala concreto para Bachillerato 2 en concreto de 3000 P.S.I. del [illegible] al [illegible]
- La cantidad topografía entrega de el levantamiento topográfico de los pozos real de entrada [illegible]
- Se realiza orden y aseo en el sector 1.

Carlos A. Mercado Z

Lunes 11 de MAYO de 2015

Estado del tiempo: Soleado todo el tiempo

Personal de OBRA: Director (1), Residente (1), SST (1), Topógrafo (1), OBRERO (2), Fierreros (1), Veladores (2), OBRERO (2), CUADRILLA de OBRA

Actividades

- Realiza orden y aseo en el sector 2.
- Cantidad topografía tomada el levantamiento en el sector 2.

Carlos A. Mercado Z

ANEXO 5. CALIBRACION DE EQUIPOS.

SERVICIO DE LABORATORIO OPTICOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO

CERTIFICADO
NO. C2550

INSTRUMENTO:	Estación total	**FECHA DE REVISIÓN:**	30 DE AGOSTO DE 2025
MARCA:	TOPCON	**SUGERIMOS NUEVA REVISIÓN:**	28 DE FEBRERO DE 2026
REFERENCIA:	GTS-252	**CLIENTE:**	JHON ERIC DELGADO
PRECISIÓN ANGULAR R:	2"	**CC:**	1.080.017.212
PRECISIÓN A DISTANCIA:	2mm + 2ppm	**CIUDAD:**	SITIONUEVO
SERIAL:	KA0276	**CELULAR:**	3127460454

INSPECCIÓN OPTICOMECÁNICA

BASE NIVELANTE
NIVELES TABULARES Y ESFERICOS
VERTICALIDAD
OPTICA GENERAL
EJE VERTICAL Y HORIZONTAL
FRENOS Y MOVIMIENTOS TANGENCIALES
PLOMADA OPTICA Y/O LASER

AJUSTE Y VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES
ACEPTABLE

INSPECCIÓN Y AJUSTE SISTEMA ANGULAR

INSPECCIÓN DE ENTRADA	POSICIÓN 1 (VERTICAL D)	89°	59'	55"
	POSICIÓN 1 (HORIZONTAL D)	00°	00'	00"
	POSICIÓN 1 (VERTICAL I)	270°	00'	15"
	POSICIÓN 1 (HORIZONTAL I)	180°	00'	08"
	ERROR OBSERVADO V	00°	00'	-10"
	ERROR OBSERVADO H	00°	00'	8"

AJUSTE EN LABORATORIO	POSICIÓN 1 (VERTICAL D)	89°	59'	55"
	POSICIÓN 1 (HORIZONTAL D)	00°	00'	00"
	POSICIÓN 1 (VERTICAL I)	270°	00'	05"
	POSICIÓN 1 (HORIZONTAL I)	180°	00'	00"
	ERROR OBSERVADO V	00°	00'	0"
	ERROR OBSERVADO H	00°	00'	0"

Powered by CamScanner

SERVICIO DE LABORATORIO OPTICOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO

CERTIFICADO
NO. C2550

INSTRUMENTO	Estación total	**FECHA DE REVISIÓN**	30 DE AGOSTO DE 2025
MARCA	TOPCON	**SUGERIMOS NUEVA REVISIÓN**	28 DE FEBRERO DE 2026
REFERENCIA	GTS-952	**CLIENTE**	**JHON ERIC DELGADO**
SERIAL	6A0976	**CC**	3127460454

INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE MEDIDA ANGULAR, COLIMADOR DE CUATRO TUBOS
MODELO F420-4TA

COMPENSADOR OPTICOMECÁNICO	AJUSTE Y VERIFICACIÓN
COMPENSADOR ELECTRÓNICO	GENERAL DE FUNCIONES
AJUSTE Y VERIFICACIÓN	ACEPTABLE

INSPECCIÓN EDM SOBRE LÍNEA BASE 320.162 m
(DISTANCIOMETRO) CONDICIONES: TEMPERATURA 25°C, PRESIÓN ATMOSFERICA 640mmHg,
CONSTANTE DEL PRISMA -30

PRISMAS	AJUSTE Y VERIFICACIÓN
MEDIDA DISTANCIA	GENERAL DE FUNCIONES
CONSTANTE DEL PRISMA	ACEPTABLE
CONSTANTE PPM	

CONTROLES Y VISUALIZACIÓN ELECTRÓNICA

TECLADO	AJUSTE Y VERIFICACIÓN
DISPLAY	GENERAL DE FUNCIONES
ACCESO MEMORIA	ACEPTABLE
BATERÍA	
COMUNICACIÓN DISPOSITIVO EXTERNO	

JMENDOZA EQUIPO SAS. CERTIFICA QUE EL INSTRUMENTO SE ENTREGA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y QUE LOS ERRORES ENCONTRADOS AL INGRESO DEL EQUIPO, HAN SIDO CORREGIDOS DE ACUERDO CON LOS PARAMENTROS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE

TÉCNICO JMEQUIPOS SAS
Este certificado no es válido sin firma.

Verifique la validez de este certificado en
www.jmequipos.com/consultar-certificados.php

Recuerde nuestro sitio web www.jmequipos.com, en la tienda virtual tenemos los productos con los mejores precios para usted.

Powered by CamScanner

https://sotgts.com/v2/...

JM EQUIPOS	F- CERTIFICADO DE AJUSTE	Código: G-F-04 Versión: 04 Edición: 12/03/2018 Copia controlada Hoja 1 de 1

SERVICIO DE LABORATORIO
OPTICOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO

CERTIFICADO
NO. C3851

INSTRUMENTO:	Nivel	**FECHA DE REVISIÓN:**	5 DE AGOSTO DE 2025
		SUGERIMOS NUEVA REVISIÓN:	8 DE FEBRERO DE 2026
MARCA:	KOLIDA	**CLIENTE:**	JHON ERIC DELGADO C.
REFERENCIA:	KL32	**CC:**	1.080.017.212
		CIUDAD:	SITIONUEVO
SERIAL:	1185756	**CELULAR:**	3127460454

INSPECCIÓN OPTICOMECÁNICA

BASE NIVELANTE NIVELES TABULARES Y ESFERICOS HORIZONTALIDAD OPTICA GENERAL MOVIMIENTOS TANGENCIALES	AJUSTE Y VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES ACEPTABLE

INSPECCIÓN DE CONTROL DE COLIMADOR DE CUATRO TUBOS MODELO F420-4TA

COMPENSADOR OPTICOMECÁNICO COMPENSADOR ELECTRÓNICO HORIZONTALIDAD DE RETICULA	AJUSTE Y VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES ACEPTABLE

LECTURAS

L1:		L2:	
1.850	m	1.850	m
1.847	m	1.850	m
3	mm	0	mm

ERROR DETECTADO: 0 m

JMENDOZA Equipos S.A.S.

JMENDOZA EQUIPO SAS. CERTIFICA QUE EL INSTRUMENTO SE ENTREGA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y QUE LOS ERRORES ENCONTRADOS AL INGRESO DEL EQUIPO, HAN SIDO CORREGIDOS DE ACUERDO CON LOS PARAMENTROS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE

TÉCNICO JMEQUIPOS SAS

Este certificado no es válido sin el símbolo de aceptación.

Verifique la validez de este certificado en
www.jmequipos.com/consultar-certificados.php

Recuerde nuestro sitio web www.jmequipos.com, en la tienda virtual tenemos los productos con los mejores precios para usted.

Distribuidores en Colombia autorizados por:
GEOMAX TOPCON Leica Geosystems PENTAX SOKKIA Nikon

Medellín: Calle 30B #71-42 PBX:(574) 3220619 Ext. 102 Cel: 310-7983526
Bogotá: Calle 51 # 71A-18 OF 101 Tel: (571) 7559969
www.jmequipos.com - laboratorio@jmequipos.com - laboratorio.bogota@jmequipos.com - ventas@jmequipos.com

Powered by CamScanner

CARTERA TOPOGRAFICA EN B.C CALLE 35 (COSTADO DERECHO) DEL SECTOR 1

Correo Electrónico: consorcio050puertoclaver@gmail.com
Dirección: CR 12 A # 23 - 45 BRR JERUSALEN
Planeta Rica - Córdoba

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

CONTRATISTA: CONSORDIO PUERTO CLAVER

INTERVENTORIA: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

FECHA: Abril -2026

VOLUMEN: CORTE EN B.C CALLE 35 (COSTADO DERECHO) DEL SECTOR 1

ABSCISA	AREAS SECCION M2	AREAS SUMADAS	AREAS PROMEDIADAS M2	ALTURA (M)	VOLUMEN SECCION M3	VOLUMEN PARCIAL M3
k0+290	35,20	35,20	35,20	0,7	24,64	24,64
TOTAL VOLUMEN ACUMULADO M3						24,64

Levantaron

Jairo Herazo
TOPOGRAFO LIC. 01-4637
CONSORCIO PUERTO CLAVER

Laura Marcela Bolaño Niño
TOPOGRAFO LIC. 01-23707
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

Revisó

Carlos Mercado
Residente de Obra
CONSORCION PUERTO CLAVER

Jorge Daniel Soto Calle
Director de Interventoría
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

CONSORCIO PUERTO CLAVER

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29I, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO CLAVER

INTERVENTORIA: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

FECHA: Abril -2026

VOLUMEN: MEJORAMIENTO EN B.C CALLE 35 (COSTADO DERECHO) DEL SECTOR 1

ABSCISA	AREAS SECCION M2	AREAS SUMADAS	AREAS PROMEDIADAS M2	ALTURA (M)	VOLUMEN SECCION M3	VOLUMEN PARCIAL M3
k0+290	35,20	35,20	35,20	0,3	10,56	10,56
TOTAL VOLUMEN ACUMULADO M3						10,56

Levantaron

Jairo Herazo
TOPOGRAFO LIC: 01-4637
CONSORCIO PUERTO CLAVER

Laura Marcela Bueno Niño
TOPOGRAFO LIC: 01-23707
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

Revisó

Carlos A. Mercado 7
Carlos Mercado
Residente de Obra
CONSORCION PUERTO CLAVER

Jorge [illegible] Soto Calle
Director de Interventoria
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29I, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO CLAVER

INTERVENTORIA: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

FECHA: April -2026

VOLUMEN: SUBBASE EN B.C CALLE 35 (COSTADO DERECHO) DEL SECTOR 1

ABSCISA	AREAS SECCION M2	AREAS SUMADAS	AREAS PROMEDIADAS M2	ALTURA (M)	VOLUMEN SECCION M3	VOLUMEN PARCIAL M3
K0+280	35,20	35,20	35,20	0,2	7,04	7,04
TOTAL VOLUMEN ACUMULADO M3						7,04

Levantaron

Jairo Herazo
TOPOGRAFO LIC: 01-4637
CONSORCIO PUERTO CLAVER

Laura Marcela Bueno Niño
TOPOGRAFO LIC: 01-25707
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

Revisó

Carlos A Mercado 7
Carlos Mercado
Residente de Obra
CONSORCIO PUERTO CLAVER

Jorge [illegible] Soto Calle
Director de Interventoria
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

CARTERA TOPOGRAFICA EN B.C CALLE 36 (COSTADO DERECHO) EN EL SECTOR 1

Correo Electrónico: consorcio050puertoclaver@gmail.com
Dirección: CR 12 A # 23 - 45 BRR JERUSALEN
Planeta Rica - Córdoba

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29A, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO CLAVER

INTERVENTORIA: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

FECHA: Abril -2026

VOLUMEN: CORTE EN B.C CALLE 36 (COSTADO DERECHO) EN EL SECTOR 1

ABSCISA	AREAS SECCION M2	AREAS SUMADAS	AREAS PROMEDIADAS M2	ALTURA (M)	VOLUMEN SECCION M3	VOLUMEN PARCIAL M3
K0+182	54,762	54,76	54,76	0,7	38,33	38,33
TOTAL VOLUMEN ACUMULADO M3						38,33

Levantaron

Jairo Herazo
TOPOGRAFO LIC: 01-4637
CONSORCIO PUERTO CLAVER

Laura Marcela Bueno Niño
TOPOGRAFO LIC: 01-23707
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

Revisó

Carlos Mercado
Residente de Obra
CONSORCIO PUERTO CLAVER

Jorge [illegible] Soto Calle
Director de Interventoria
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 33D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO CLAVER

INTERVENTORIA: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

FECHA: Abril -2026

VOLUMEN: MEJORAMIENTO EN B.C CALLE 36 (COSTADO DERECHO) EN EL SECTOR 1

ABSCISA	AREAS SECCION M2	AREAS SUMADAS	AREAS PROMEDIADAS M2	ALTURA (M)	VOLUMEN SECCION M3	VOLUMEN PARCIAL M3
K0+182	54,762	54,76	54,76	0,3	16,43	16,43
TOTAL VOLUMEN ACUMULADO M3						16,43

Levantaron

Jairo Herazo
TOPOGRAFO LIC: 01-4637
CONSORCIO PUERTO CLAVER

Laura Marcela Bueno Niño
TOPOGRAFO LIC: 01-23707
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

Revisó

Carlos Mercado
Residente de Obra
CONSORCIO PUERTO CLAVER

Jorge de Jesus Soto Calle
Director de Interventoria
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

CONSORCIO PUERTO CLAVER

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO CLAVER

INTERVENTORIA: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

FECHA: Abril -2026

VOLUMEN: SUBBASE EN B.C CALLE 36 (COSTADO DERECHO) EN EL SECTOR 1

ABSCISA	AREAS SECCION M2	AREAS SUMADAS	AREAS PROMEDIADAS M2	ALTURA (M)	VOLUMEN SECCION M3	VOLUMEN PARCIAL M3
K0+182	54,762	54,76	54,76	0,2	10,95	10,95
TOTAL VOLUMEN ACUMULADO M3						10,95

Levantaron

Jairo Herazo
TOPOGRAFO LIC: 01-4637
CONSORCIO PUERTO CLAVER

Laura Marcela Bueno Niño
TOPOGRAFO LIC: 01-23707
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

Reviso

Carlos Mercado
Residente de Obra
CONSORCIO PUERTO CLAVER

Jorge Alcides Soto Calle
Director de Interventoria
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

CARTERA TOPOGRAFICA B.C CARRERA 29A (COSTADO IZQUIERDO) DEL SECTOR 2

Correo Electrónico: consorcio050puertoclaver@gmail.com
Dirección: CR 12 A # 23 - 45 BRR JERUSALEN
Planeta Rica - Córdoba

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO CLAVER

INTERVENTORIA: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

FECHA: Abril -2026

VOLUMEN: CORTE EN B.C CARRERA 29A (COSTADO IZQUIERDO) DEL SECTOR 2

ABSCISA	AREAS SECCION M2	AREAS SUMADAS	AREAS PROMEDIADAS M2	ALTURA (M)	VOLUMEN SECCION M3	VOLUMEN PARCIAL M3
K0+796,04	43,183	43,18	43,18	0,7	30,23	30,23
TOTAL VOLUMEN ACUMULADO M3						30,23

Levantaron

Jairo Herazo
TOPOGRAFO LIC: 01-4637
CONSORCIO PUERTO CLAVER

Laura Marcela Bueno Niño
TOPOGRAFO LIC: 01-23707
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

Revisó

Carlos Mercado
Residente de Obra
CONSORCIO PUERTO CLAVER

Jorge [illegible] Soto Calle
Director de Interventoría
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29#, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO CLAVER

INTERVENTORIA: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

FECHA: Abril -2026

VOLUMEN: MEJORAMIENTO EN E.C CARRERA 29A (COSTADO IZQUIERDO) DEL SECTOR 2

ABSCISA	AREAS SECCION M2	AREAS SUMADAS	AREAS PROMEDIADAS M2	ALTURA (M)	VOLUMEN SECCION M3	VOLUMEN PARCIAL M3
K0+796,04	43,182	43,18	43,18	0,3	12,95	12,95
TOTAL VOLUMEN ACUMULADO M3						12,95

Levantaron

Jairo Herazo
TOPOGRAFO LIC: 01-4637
CONSORCIO PUERTO CLAVER

Laura Marcela Bueno Niño
TOPOGRAFO LIC: 01-23707
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

Reviso

Carlos Mercado
Residente de Obra
CONSORCION PUERTO CLAVER

Jorge [illegible] Soto Calle
Director de Interventoria
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29F, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO CLAVER

INTERVENTORIA: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

FECHA: Abril -2026

VOLUMEN: SUBBASE EN B.C CARRERA 29A (COSTADO IZQUIERDO) DEL SECTOR 2

ABSCISA	AREAS SECCION M2	AREAS SUMADAS	AREAS PROMEDIADAS M2	ALTURA (M)	VOLUMEN SECCION M3	VOLUMEN PARCIAL M3
K0+796,04	43,182	43,18	43,18	0,2	8,64	8,64
TOTAL VOLUMEN ACUMULADO M3						8,64

Levantaron

Jairo Herazo
TOPOGRAFO LIC: 01-4637
CONSORCIO PUERTO CLAVER

Laura Marcela Bueno Niño
TOPOGRAFO LIC: 01-23707
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

Revisó

Carlos Mercado
Residente de Obra
CONSORCIO PUERTO CLAVER

Jorge [illegible] Soto Calle
Director de Interventoria
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

CARTERA TOPOGRAFICA EN B.C CARRERA 32 DEL SECTOR 1

Correo Electrónico: consorcio050puertoclaver@gmail.com
Dirección: CR 12 A # 23 - 45 BRR JERUSALEN
Planeta Rica - Córdoba

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29F, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO CLAVER

INTERVENTORIA: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

FECHA: Abril -2026

VOLUMEN: CORTE EN B.C CARRERA 32 DEL SECTOR 1

ABSCISA	AREAS SECCION M2	AREAS SUMADAS	AREAS PROMEDIADAS M2	ALTURA (M)	VOLUMEN SECCION M3	VOLUMEN PARCIAL M3
K0+291,4	113,733	113,73	113,73	0,7	79,61	79,61
TOTAL VOLUMEN ACUMULADO M3						79,61

Levantaron

Jairo Herazo
TOPOGRAFO LIC: 01-4637
CONSORCIO PUERTO CLAVER

Laura Marcela Bueno Niño
TOPOGRAFO LIC: 01-23707
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

Revisa

Carlos Mercado
Residente de Obra
CONSORCIO PUERTO CLAVER

Jorge Andrés Soto Calle
Director de Interventoria
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29I, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO CLAVER

INTERVENTORIA: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

FECHA: abril -2025

VOLUMEN: MEJORAMIENTO EN B.C EN B.C CARRERA 32 DEL SECTOR 1

ABSCISA	AREAS SECCION M2	AREAS SUMADAS	AREAS PROMEDIADAS M2	ALTURA (M)	VOLUMEN SECCION M3	VOLUMEN PARCIAL M3
K0+291,4	113,733	113,73	113,73	0,3	34,12	34,12
TOTAL VOLUMEN ACUMULADO M3						34,12

Levantaron

Jairo Herazo
TOPOGRAFO LIC: 01-4637
CONSORCIO PUERTO CLAVER

Laura Marcela Bueno Niño
TOPOGRAFO LIC: 01-23707
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

Revisó

Carlos Mercado
Residente de Obra
CONSORCIO PUERTO CLAVER

Jorge [illegible] Solo Calle
Director de Interventoria
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29F, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO CLAVER

INTERVENTORIA: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

FECHA: Abril -2026

VOLUMEN: SUBBASE EN B.C CARRERA 32 DEL SECTOR 1

ABSCISA	AREAS SECCION M2	AREAS SUMADAS	AREAS PROMEDIADAS M2	ALTURA (M)	VOLUMEN SECCION M3	VOLUMEN PARCIAL M3
K0+291,4	113,733	113,73	113,73	0,2	22,75	22,75
TOTAL VOLUMEN ACUMULADO M3						22,75

Levantaron

Jairo Herazo
TOPOGRAFO LIC: 01-4697
CONSORCIO PUERTO CLAVER

Laura Marcela Bueno Niño
TOPOGRAFO LIC: 01-29707
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

Revisó

Carlos Mercado
Residente de Obra
CONSORCIO PUERTO CLAVER

Jorge Soto Calle
Director de Interventoria
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

CARTERA TOPOGRAFICA EN B.C CARRERA 32(COSTADO IZQUIERDO) DEL SECTOR 1

Correo Electrónico: consorcio050puertoclaver@gmail.com
Dirección: CR 12 A # 23 - 45 BRR JERUSALEN
Planeta Rica - Córdoba

CONSORCIO PUERTO CLAVER

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 35, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29I, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO CLAVER

INTERVENTORIA: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

FECHA: Abril -2026

VOLUMEN: CORTE EN B.C CARRERA 32 (COSTADO IZQUIERDO) DEL SECTOR 1

ABSCISA	AREAS SECCION M2	AREAS SUMADAS	AREAS PROMEDIADAS M2	ALTURA (M)	VOLUMEN SECCION M3	VOLUMEN PARCIAL M3
KO+200,74	30,79	30,79	30,79	0,7	21,55	21,55
TOTAL VOLUMEN ACUMULADO M3						21,55

Levantaron

Jairo Herazo
TOPOGRAFO LIC: 01-4637
CONSORCIO PUERTO CLAVER

Laura Manela Bueno Niño
TOPOGRAFO LIC: 01-23707
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

Revisó

Carlos Mercado
Residente de Obra
CONSORCIO PUERTO CLAVER

Jorge [illegible] Soto Calle
Director de Interventoria
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

CONSORCIO PUERTO CLAVER

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 51D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL SAGRE, ANTIOQUIA"

CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO CLAVER

INTERVENTORIA: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

FECHA: Abril -2026

VOLUMEN: MEJORAMIENTO EN B/C CARRERA 32 (COSTADO IZQUIERDO) DEL SECTOR 1

ABSCISA	AREAS SECCION M2	AREAS SUMADAS	AREAS PROMEDIADAS M2	ALTURA (M)	VOLUMEN SECCION M3	VOLUMEN PARCIAL M3
KO+200,74	30,79	30,79	30,79	0,3	9,24	9,24
TOTAL VOLUMEN ACUMULADO M3						9,24

Levantaron

Jairo Herazo
TOPOGRAFO LIC: 01-4637
CONSORCIO PUERTO CLAVER

Dairo Marcella Bueno Niño
TOPOGRAFO LIC: 01-23707
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

Revino

Carlos Mercado
Residente de Obra
CONSORCIO PUERTO CLAVER

Jorge Nolasco Soto Calle
Director de Interventoria
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"

CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO CLAVER

INTERVENTORIA: INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

FECHA: Abril -2026

VOLUMEN: SUBBASE EN B. C CARRERA 32 (COSTADO IZQUIERDO) DEL SECTOR 1

ABSCISA	AREAS SECCION M2	AREAS SUMADAS	AREAS PROMEDIADAS M2	ALTURA (M)	VOLUMEN SECCION M3	VOLUMEN PARCIAL M3
KD+200,74	30,79	30,79	30,79	0,2	6,15	6,16
TOTAL VOLUMEN ACUMULADO M3						6,16

Levantaron

Jairo Herazo
TOPOGRAFO LIC: 01-4637
CONSORCIO PUERTO CLAVER

Laura Marcela Bueno Niño
TOPOGRAFO LIC: 01-23707
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

Revisó

Carlos Mercado
Residente de Obra
CONSORCION PUERTO CLAVER

Jorge Andrés Soto Calle
Director de Interventoria
INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR S.A.S

ANEXO 4. CERTIFICADO CALIDAD DE LOS MATERIALES.

PINTUTRAFICO ACRILICO BASE SOLVENTE MOD. BLANCO 13754 - 1 G
10115022

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

1.1 Identificador SGA del producto: PINTUTRAFICO ACRILICO BASE SOLVENTE MOD. BLANCO 13754 - 1 G 10115022

1.2 Uso recomendado del producto químico y restricciones:

Usos pertinentes: Pintura para señalización de tráfico. Uso exclusivo usuario industrial.

Usos desaconsejados: Todo aquel uso no especificado en este epígrafe ni en el epígrafe 7.3

1.3 Datos sobre el proveedor:

Pintuco
Autopista Medellín Bogotá Km 37 Vía Belén Rionegro Km 1
054040 Rionegro - Antioquia - Colombia
Tfno.: 57 4 569 81 00
contacto@pintuco.com
http://www.pintuco.com

1.4 Número de teléfono para emergencias: CISTEMA SURA Colombia al 018000 51 14 14, fuera de Colombia (0574) 4444578

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla:

SGA:

La clasificación del producto se ha realizado conforme con al decreto 1496 de 2018, por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

Irrit. Cut. 2: Irritación cutánea, categoría 2, H315
Liq. Infl. 2: Líquidos inflamables, Categoría 2, H225
Repr. 2: Tóxico para la reproducción, Categoría 2, H361
STOT repe. 2: Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas), Categoría 2, H373
STOT única 3: Toxicidad específica con efectos de somnolencia y vértigo (exposición única), Categoría 3, H336
Tox. Asp. 1: Peligro por aspiración, Categoría 1, H304

2.2 Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos los consejos de prudencia:

SGA:

Peligro



Indicaciones de peligro:

Irrit. Cut. 2: H315 - Provoca irritación cutánea
Liq. Infl. 2: H225 - Líquido y vapores muy inflamables
Repr. 2: H361 - Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto
STOT repe. 2: H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas
STOT única 3: H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo
Tox. Asp. 1: H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias

Consejos de prudencia:

P201: Procurarse las instrucciones antes del uso
P210: Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar
P280: Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración
P308+P313: EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico
P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción
P501: Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente

2.3 Otros peligros que no conducen a una clasificación:

No relevante

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PAGINA -

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES (continúa)

3.1 Sustancias:

No aplicable

3.2 Mezclas:

Descripción química: Mezcla a base de productos químicos

Componentes:

De acuerdo al Decreto 1496 de 2018, el producto presenta:

Identificación	Nombre químico/clasificación	Concentración
CAS: 108-88-3	Tolueno	25 - <50 %
CAS: 13463-67-7	Dióxido de titanio	2.5 - <10 %
CAS: 14808-60-7	Cuarzo (1 % < RCS < 10 %)	<1 %

Para ampliar información sobre la peligrosidad de las sustancias consultar las secciones 11, 12 y 16. La clasificación respecto Carcinogenicidad de las sustancias se ha establecido en función de las monografías de la IARC adecuándola al sistema de clasificación SGA, para información sobre la clasificación IARC consulte la sección 11.

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilios necesarios:

Los síntomas como consecuencia de una intoxicación pueden presentarse con posterioridad a la exposición, por lo que, en caso de duda, exposición directa al producto químico o persistencia del malestar solicitar atención médica, mostrándole la FDS de este producto.

Por inhalación:

Sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. En casos graves como perada cardiorespiratoria, se aplicarán técnicas de respiración artificial (respiración boca a boca, masaje cardíaco, suministro de oxigeno, etc.) requiriendo asistencia médica inmediata.

Por contacto con la piel:

Quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con abundante agua fría y jabón neutro. En caso de afección importante acudir al médico. Si el producto produce quemaduras o congelación, no se debe quitar la ropa debido a que podría empeorar la lesión producida si esta se encuentra pegada a la piel. En el caso de formarse ampollas en la piel, éstas nunca deben reventarse ya que aumentaría el riesgo de infección.

Por contacto con los ojos:

Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o cierre los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo más rápidamente posible con la FDS del producto.

Por ingestión/aspiración:

Requerir asistencia médica inmediata, mostrándole la FDS de este producto. No inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración. En el caso de pérdida de consciencia no administrar nada por vía oral hasta la supervisión del médico. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestión. Mantener al afectado en reposo.

4.2 Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados:

Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11.

4.3 Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial:

No relevante

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción apropiados:

Emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), alternativamente utilizar espuma física o extintores de dióxido de carbono (CO_2). NO SE RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente de extinción.

5.2 Peligros específicos del producto químico:

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS (continúa)

Como consecuencia de la combustión o descomposición térmica se generan subproductos de reacción que pueden resultar altamente tóxicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud.

5.3 Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios:

En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiración autónomo. Disponer de un mínimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín portátil,...).

Disposiciones adicionales:

Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuación ante accidentes y otras emergencias. Suprimir cualquier fuente de ignición. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos susceptibles a inflamación, explosión como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos empleados en la extinción del incendio al medio acuático.

SECCIÓN 6: MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia:

Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempeñen esta función. Evacuar la zona y mantener a las personas sin protección alejadas. Ante el contacto potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de protección personal (ver sección 8). Evitar de manera prioritaria la formación de mezclas vapor-aire inflamables, ya sea mediante ventilación o el uso de un agente inertizante. Suprimir cualquier fuente de ignición. Eliminar las cargas electroestáticas mediante la interconexión de todas las superficies conductoras sobre las que se puede formar electricidad estática, y estando a su vez el conjunto conectado a tierra.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Producto no clasificado como peligroso para el medioambiente. Mantener el producto alejado de los desagües y de las aguas superficiales y subterráneas.

6.3 Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos:

Se recomienda:

Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrín u otros absorbentes combustibles. Para cualquier consideración relativa a la eliminación consultar la sección 13.

6.4 Referencias a otras secciones:

Ver secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura:

A.- Precauciones generales

Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Mantener los recipientes herméticamente cerrados. Controlar los derrames y residuos, eliminándolos con métodos seguros (sección 6). Evitar el vertido libre desde el recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos.

B.- Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones.

Trasvasar en lugares bien ventilados, preferentemente mediante extracción localizada. Controlar totalmente los focos de ignición (teléfonos móviles, chispas,...) y ventilar en las operaciones de limpieza. Evitar la existencia de atmósferas peligrosas en el interior de recipientes, aplicando en lo posible sistemas de inertización. Trasvasar a velocidades lentas para evitar la generación de cargas electroestáticas. Ante la posibilidad de existencia de cargas electroestáticas: asegurar una perfecta conexión equipotencial, utilizar siempre tomas de tierras, no emplear ropa de trabajo de fibras acrílicas, empleando preferiblemente ropa de algodón y calzado conductor. Cumplir con los requisitos esenciales de seguridad para equipos y con las disposiciones mínimas para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores. Consultar la sección 10 sobre condiciones y materias que deben evitarse.

C.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos.

LAS MUJERES EMBARAZADAS NO DEBEN EXPONERSE A ESTE PRODUCTO. Manipular en lugares fijos que reúnan las debidas condiciones de seguridad (duchas de emergencia y lavaojos en las proximidades), empleando equipos de protección personal, en especial de cara y manos (ver sección 8). Limitar los trasvases manuales a recipientes de pequeñas cantidad. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos después de cada utilización, y despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer.

D.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales

Se recomienda disponer de material absorbente en las proximidades del producto (ver epígrafe 6.3)

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades:

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO (continúa)

A.- Medidas técnicas de almacenamiento

Temperatura mínima: 5 °C

Temperatura máxima: 30 °C

Tiempo máximo: 18 meses

B.- Condiciones generales de almacenamiento:

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. Para información adicional ver epígrafe 10.5

7.3 Usos específicos finales:

Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendación especial en cuanto a los usos de este producto.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Parámetros de control:

Sustancias cuyos valores límite de exposición profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo (ACGIH):

Identificación	Valores límite ambientales		
Tolueno CAS: 108-88-3	TLV-TWA	20 ppm	
	TLV-STEL		
Dióxido de titanio CAS: 13463-67-7	TLV-TWA		10 mg/m³
	TLV-STEL		
Cuarzo (1 % < RCS < 10 %) CAS: 14808-60-7	TLV-TWA		0.025 mg/m³
	TLV-STEL		

8.2 Controles técnicos apropiados:

A.- Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)

De acuerdo al orden de prioridad para el control de la exposición profesional se recomienda la extracción localizada en la zona de trabajo como medida de protección colectiva para evitar sobrepasar los límites de exposición profesional. Para más información sobre los equipos de protección individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de protección,...) consultar el folleto informativo facilitado por el fabricante del EPP. Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de protección para el producto diluido podrán variar en función de su grado de dilución, uso, método de aplicación, etc. Para determinar la obligación de instalación de duchas de emergencia y/o lavaojos en los almacenes se tendrá en cuenta la normativa referente al almacenamiento de productos químicos aplicable en cada caso. Para más información Ver epígrafes 7.1 y 7.2.

Toda la información aquí incluida es una recomendación siendo necesario su concreción por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales al desconocer las medidas de prevención adicionales que la empresa pudiese disponer.

B.- Protección respiratoria:

Pictograma	EPP	Observaciones
 Protección obligatoria de las vías respiratorias	Máscara con filtro para gases y vapores	Reemplazar cuando se detecte olor o sabor del contaminante en el interior de la máscara o adaptador facial. Cuando el contaminante no tiene buenas propiedades de aviso se recomienda el uso de equipos aislantes.

C.- Protección específica de las manos:

Pictograma	EPP	Observaciones
 Protección obligatoria de las manos	Guantes de protección química	El tiempo de paso (Breakthrough Time) indicado por el fabricante ha de ser superior al del tiempo de uso del producto. No emplear cremas protectoras después del contacto del producto con la piel.

Dado que el producto es una mezcla de diferentes materiales, la resistencia del material de los guantes no se puede calcular de antemano con total fiabilidad y por lo tanto tiene que ser controlados antes de su aplicación.

D.- Protección ocular y facial:

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL (continua)

Pictograma	EPP	Observaciones
 Protección obligatoria de la cara	Gafas de seguridad	Limpiar a diario y desinfectar periódicamente de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se recomienda su uso en caso de riesgo de salpicaduras.

E.- Protección corporal

Pictograma	EPP	Observaciones
 Protección obligatoria del cuerpo	Prenda de protección frente a riesgos químicos antiestática e ignífuga	Uso exclusivo en el trabajo. Limpiar periódicamente de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
 Protección obligatoria de los pies	Calzado de seguridad contra riesgo químico, con propiedades antiestáticas y resistencia al calor	Reemplazar las botas ante cualquier indicio de deterioro.

F.- Medidas complementarias de emergencia

Medida de emergencia	Normas	Medida de emergencia	Normas
 Ducha de emergencia	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	 Lavaojos	DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Controles de la exposición del medio ambiente:

Se recomienda evitar el vertido tanto del producto como de su envase al medio ambiente. Para información adicional ver epigrafe 7.1.D

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS Y CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

9.1 Información de propiedades físicas y químicas básicas:

Para completar la información ver la ficha técnica/hoja de especificaciones del producto.

Aspecto físico:

Estado físico a 20 °C:	Líquido
Aspecto:	Fluido
Color:	☐ Blanco
Olor:	Característico
Umbral olfativo:	No relevante *
Volatilidad:	
Temperatura de ebullición a presión atmosférica:	>100 - 2230 °C
Presión de vapor a 20 °C:	2838 Pa
Presión de vapor a 50 °C:	12263,81 Pa (12,26 kPa)
Tasa de evaporación a 20 °C:	No relevante *
Caracterización del producto:	
Densidad a 20 °C:	1,3 - 1,5 kg/m³
Densidad relativa a 20 °C:	1,417
Viscosidad dinámica a 20 °C:	No relevante *
Viscosidad cinemática a 20 °C:	No relevante *
Viscosidad cinemática a 40 °C:	<20,5 cSt

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS Y CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD (continúa)

Concentración:	No relevante *
pH:	No relevante *
Densidad de vapor a 20 °C:	No relevante *
Coeficiente de reparto n-octanol/agua a 20 °C:	No relevante *
Solubilidad en agua a 20 °C:	No relevante *
Propiedad de solubilidad:	No relevante *
Temperatura de descomposición:	No relevante *
Punto de fusión/punto de congelación:	No relevante *
Propiedades explosivas:	No relevante *
Propiedades comburentes:	No relevante *
Inflamabilidad:	
Punto de inflamación:	12 °C
Inflamabilidad (sólido, gas):	No relevante *
Temperatura de auto-inflamación:	432 °C
Límite de inflamabilidad inferior:	No determinado
Límite de inflamabilidad superior:	No determinado
Explosividad:	
Límite inferior de explosividad:	No relevante *
Límite superior de explosividad:	No relevante *

9.2 Información adicional:

Tensión superficial a 20 °C:	No relevante *
Índice de refracción:	No relevante *

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad:

No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos químicos. Ver sección 7.

10.2 Estabilidad química:

Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y uso.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:

Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presión o temperaturas excesivas.

10.4 Condiciones que deben evitarse:

Aplicables para manipulación y almacenamiento a temperatura ambiente:

Choque y fricción	Contacto con el aire	Calentamiento	Luz Solar	Humedad
No aplicable	No aplicable	Riesgo de inflamación	Evitar incidencia directa	No aplicable

10.5 Materiales incompatibles:

Ácidos	Agua	Materias comburentes	Materias combustibles	Otros
Evitar ácidos fuertes	No aplicable	Evitar incidencia directa	No aplicable	Evitar álcalis o bases fuertes

10.6 Productos de descomposición peligrosos:

Ver epígrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposición específicamente. En dependencia de las condiciones de descomposición, como consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias químicas: dióxido de carbono (CO_2), monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (continúa)

11.1 Información sobre las posibles vías de exposición:

No se dispone de datos experimentales del producto en sí mismo relativos a las propiedades toxicológicas

Efectos peligrosos para la salud:

En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los límites de exposición profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en función de la vía de exposición:

A- Ingestión (efecto agudo):

- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por ingestión. Para más información ver sección 3.
- Corrosividad/Irritabilidad: La ingesta de una dosis considerable puede originar irritación de garganta, dolor abdominal, náuseas y vómitos.

B- Inhalación (efecto agudo):

- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación. Para más información ver sección 3.
- Corrosividad/Irritabilidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

C- Contacto con la piel y los ojos (efecto agudo):

- Contacto con la piel: Produce inflamación cutánea.
- Contacto con los ojos: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

D- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción):

- Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Para más información ver sección 3.
  IARC: Tolueno (3); Cuarzo (1 % < RCS < 10 %) (1); Dióxido de titanio (2B)
- Mutagenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.
- Toxicidad para la reproducción: Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto

E- Efectos de sensibilización:

- Respiratoria: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes. Para más información ver secciones 2, 3 y 15.
- Cutánea: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

F- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición única:

Una exposición a altas concentraciones pueden motivar depresión del sistema nervioso central ocasionando dolor de cabeza, mareos, vértigos, nauseas, vómitos, confusión y en caso de afección grave, pérdida de conciencia.

G- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida:

- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida: Efectos nocivos para la salud en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación de forma repetitiva, produciendo depresión del sistema nervioso central ocasionando dolor de cabeza, mareos, vértigos, nauseas, vómitos, confusión y en caso de afección grave, pérdida de conciencia.
- Piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

H- Peligro por aspiración:
La ingesta de una dosis considerable puede producir daño pulmonar.

Información adicional: CAS 13463-67-7 Dióxido de Titanio: IARC lista esta sustancia como un posible carcinógeno humano (grupo 2B), indicando que hay suficientes evidencias para considerarlo carcinógeno en animales pero insuficientes para considerarlo como carcinógeno para seres humanos. La monografía de IARC para esta sustancia indica que no hay exposición significativa al dióxido de titanio durante el uso normal de productos en los que dióxido de titanio está unido permanentemente a otros materiales, tales como pinturas (Ref: Monografía IARC, Vol. 93, 2010).

Información toxicológica específica de las sustancias:

Identificación	Toxicidad aguda		Género
Tolueno	DL50 oral	5580 mg/kg	Rata
CAS: 108-88-3	DL50 cutánea	12124 mg/kg	Rata
	CL50 inhalación	28,1 mg/L (4 h)	Rata
Dióxido de titanio	DL50 oral	10000 mg/kg	Rata
CAS: 13463-67-7	DL50 cutánea	10000 mg/kg	Conejo
	CL50 inhalación	No relevante	

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las propiedades ecotoxicológicas.

12.1 Toxicidad:

Identificación	Toxicidad aguda		Especie	Género
Tolueno	CL50	13 mg/L (96 h)	Carassius auratus	Pez
CAS: 108-88-3	CE50	11,5 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Crustáceo
	CE50	125 mg/L (48 h)	Scenedesmus subspicatus	Alga

12.2 Persistencia y degradabilidad:

Identificación	Degradabilidad		Biodegradabilidad	
Tolueno	DBO5	2,5 g O2/g	Concentración	100 mg/L
CAS: 108-88-3	DQO	No relevante	Periodo	14 días
	DBO5/DQO	No relevante	% Biodegradado	100 %

12.3 Potencial de bioacumulación:

Identificación	Potencial de bioacumulación	
Tolueno	BCF	13
CAS: 108-88-3	Log POW	2,73
	Potencial	Bajo

12.4 Movilidad en el suelo:

Identificación	Absorción/Desorción		Volatilidad	
Tolueno	Koc	178	Henry	672,8 Pa m³/mol
CAS: 108-88-3	Conclusión	Moderado	Suelo seco	Si
	Tensión superficial	2,793E-2 N/m (25 ºC)	Suelo húmedo	Si

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB:

No aplicable

12.6 Otros efectos adversos:

No descritos

SECCIÓN 13: INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

13.1 Métodos de eliminación:

Gestión del residuo (eliminación y valorización):

Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorización y eliminación. En el caso de que el envase haya estado en contacto directo con el producto se gestionará del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se gestionará como residuo no peligroso. Se desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver epígrafe 6.2.

Disposiciones legislativas relacionadas con la gestión de residuos:

Legislación relacionada con la gestión de residuos:

Decreto 1076 de 2015 (Decreto único reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible)

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Transporte terrestre de mercancías peligrosas:

En aplicación a la norma técnica colombiana 1692:

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE (continúa)



14.1	**Número ONU:**	UN1263
14.2	**Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:**	PINTURA
14.3	**Clase(s) relativas al transporte:**	3
	Etiquetas:	3
14.4	**Grupo de embalaje/envasado si se aplica:**	II
14.5	**Riesgos ambientales:**	No
14.6	**Precauciones especiales para el usuario**	
	Propiedades físico-químicas:	Ver epígrafe 9
14.7	**Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/78 y al Código IBC:**	No relevante

Transporte marítimo de mercancías peligrosas:

En aplicación al IMDG 39-18:



14.1	**Número ONU:**	UN1263
14.2	**Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:**	PINTURA
14.3	**Clase(s) relativas al transporte:**	3
	Etiquetas:	3
14.4	**Grupo de embalaje/envasado si se aplica:**	II
14.5	**Riesgos ambientales:**	No
14.6	**Precauciones especiales para el usuario**	
	Propiedades físico-químicas:	Ver epígrafe 9
14.7	**Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/78 y al Código IBC:**	No relevante

Transporte aéreo de mercancías peligrosas:

En aplicación al IATA/OACI 2020:



14.1	**Número ONU:**	UN1263
14.2	**Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:**	PINTURA
14.3	**Clase(s) relativas al transporte:**	3
	Etiquetas:	3
14.4	**Grupo de embalaje/envasado si se aplica:**	II
14.5	**Riesgos ambientales:**	No
14.6	**Precauciones especiales para el usuario**	
	Propiedades físico-químicas:	Ver epígrafe 9
14.7	**Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/78 y al Código IBC:**	No relevante

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

15.1 Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto de que se trate:

NTP (National Toxicology Program): No relevante

Disposiciones particulares en materia de protección de las personas o el medio ambiente:

Se recomienda emplear la información recopilada en esta hoja de datos de seguridad de materiales como datos de entrada en una evaluación de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevención de riesgos para el manejo, utilización, almacenamiento y eliminación de este producto.

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN (continúa)

Otras legislaciones:

Resolución 0312 de 2019 – Nuevos estándares mínimos del SG-SST
CONPES 3868 - Política de gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas.
Decreto 1079 de 2015 - Decreto único reglamentario del sector transporte
NTC 1692 -Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación, marcado, etiquetado y rotulado
NTC 4532- Transporte de mercancías peligrosas. Tarjetas de emergencia para transporte de materiales. Elaboración
Decreto número 4741 de 2005
Decreto 1299 de 2008 -Reglamenta departamento de gestión ambiental de empresas a nivel industrial estado
Decreto 321 de 1999 - Adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas.
NTC 4702 - 1 -Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 1. Explosivos
NTC 4702 - 2 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 2. Gases
NTC 4702 - 3 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 3. Líquidos Inflamables
NTC 4702 - 4 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 4. Sólidos Inflamables, Sustancias que presentan riesgo de combustión espontánea, sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables.
NTC 4702 - 5 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 5. Sustancias Comburentes y Peróxidos Orgánicos
NTC 4702 - 6 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 6. Sustancias Tóxicas e Infecciosas
NTC 4702 - 8 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 8. Sustancias Corrosivas
NTC 4702 - 9 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 9. Sustancias Peligrosas varias

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES

Legislación aplicable a fichas de datos de seguridad:
Esta hoja de datos de seguridad de materiales se ha desarrollado de acuerdo a la norma técnica colombiana NTC 4435:2010

Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 2:
H225: Líquido y vapores muy inflamables
H315: Provoca irritación cutánea
H361: Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto
H336: Puede provocar somnolencia o vértigo
H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas
H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias

Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 3:
Las frases indicadas no se refieren al producto en sí, son sólo a título informativo y hacen referencia a los componentes individuales que aparecen en la sección 3

SGA:
Irrit. Cut. 2: H315 - Provoca irritación cutánea
Liq. Infl. 2: H225 - Líquido y vapores muy inflamables
Repr. 2: H361 - Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto
STOT repe. 2: H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas
STOT repe. 2: H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas (Inhalación)
STOT única 3: H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo
Tox. Asp. 1: H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias

Consejos relativos a la formación:
Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto, con la finalidad de facilitar la comprensión e interpretación de esta hoja de datos de seguridad de materiales, así como del etiquetado del producto.

Principales fuentes bibliográficas:
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC).
IARC: Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer.
OSHA: Occupational Safety and Health Administration, U.S Department of Labor.
NTP: National Toxicology Program.
TOXNET: Toxicology data network.

Abreviaturas y acrónimos:

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES (continua)

IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo
OACI: Organización de Aviación Civil Internacional
DQO:Demanda Química de Oxígeno
DBO5:Demanda Biológica de Oxígeno a los 5 días
BCF: Factor de bioconcentración
DL50: Dosis letal 50
CL50: Concentración Letal 50
EC50: Concentración Efectiva 50
Log POW: Logaritmo Coeficiente Partición Octanol-Agua
Koc: Coeficiente de Partición del Carbono Orgánico

Información adicional

CAS 14808-60-7 Cuarzo: IARC lista esta sustancia como cancerígeno humano (grupo 1) por inhalación. La monografía de IARC para esta sustancia indica que la exposición se presenta durante la producción y uso en estado sólido, no en los productos en los que está unida permanentemente a otros materiales, tales como pinturas (Ref.: Monografía IARC, vol. 68, 1997).

El lijado repetido de las superficies de película seca puede producir riesgo de sobreexposición al polvo dependiendo de la duración y nivel de lijado, para evitarla deben tomarse las medidas de protección adecuadas.

La información contenida en esta ficha de datos de seguridad está fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislación vigente a nivel europeo y estatal, no pudiendo garantizar la exactitud de la misma. Esta información no es posible considerarla como una garantía de las propiedades del producto, se trata simplemente de una descripción en cuanto a los requerimientos en materia de seguridad. La metodología y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad última del usuario tomar las medidas necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a manipulación, almacenamiento, uso y eliminación de productos químicos. La información de esta ficha de datos de seguridad de materiales únicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican.

FIN DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Producto: 5891321

Descripción del Producto: P7 PINTUTRAFICO ACRYL 13754-653 18.93l

Fabricante: Compania Global de Pinturas S.A.S.
Autopista Medellin-Bogota KM1 - Via a Belen
Ciudad: Rionegro País: Colombia

Detalles de Lote

Número de Lote: 598548183
Fecha de Manufactura: 28.11.2025
Fecha de Expiración: 22.05.2027
Lote de Inspección: 40007720982
Cond. de Almacenam: En los envases originales sin abrir, protegidos de la luz solar.

Detalles Comerciales:

RESULTADOS DE ANÁLISIS DEL LOTE

Características	Método	Tolerancia			Resultados	Unidad
		Límite Inferior		Límite Superior		
ACABADO			P/F		Pasó	-
COLOR VISUAL PRODUCTOS			P/F		Pasó	-
VISCOSIDAD KU		85,00	-	95,00	86,00	KrebsUnits
DENSIDAD		1,526	-	1,555	1,553	g/cm3
MOLIENDA HEGMAN		3,00	-	5,00	4,00	Hegman
SECAMIENTO AL TACTO (min)		5,00	-	12,00	12,00	minute
PODER CUBRIENTE EN HUMEDO			P/F		Pasó	-

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Producto: 5891321

Descripción del Producto: P7 PINTUTRAFICO ACRYL 13754-653 18.93l

Fabricante: Compania Global de Pinturas S.A.S.
Autopista Medellin-Bogota KM1 - Via a Belen
Ciudad: Rionegro País: Colombia

Certificado Por: Departamento de Control de Calidad

Aprobador: John Arboleda

Fecha Expedición: 3-jun-2026

Certificado generado electronicamente, no requiere firma. Gestión de calidad de la compañía garantiza el cumplimiento de todas las propiedades de calidad referenciadas en la hoja técnica de este producto.

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Producto: 5891748

Descripción del Material del Cli AJUSTADOR XILOL 21204 GTA007/3.7L/AA7

Fabricante: Compania Global de Pinturas S.A.S.
Autopista Medellin-Bogota KM1 - Via a Belen
Ciudad: Rionegro País: Colombia

Detalles del Lote:

Número de Lote: 5985273005
Fecha de Manufactura: 30.10.2025
Fecha de Expiración: 23.04.2027
Cond. de Almacenam: En los envases originales sin abrir, protegidos de la luz solar.

Detalles Comerciales:

Código de Color: N/A

RESULTADOS DE ANÁLISIS DEL LOTE

Características	Método	Tolerancia			Resultados	Unidad
		Límite Inferior		Límite Superior		
DENSIDAD		0.848	-	0.875	0,870	g/cm3
COLOR VISUAL PRODUCTOS			P/F		Pasó	-
PODER DE DILUCION			P/F		Pasó	-

Certificado Por: Departamento de Control de Calidad Aprobador: Alejandra Osorio Arias Fecha Expedición: 3-jun-2026

Certificado generado electronicamente, no requiere firma. Gestión de calidad de la compañía garantiza el cumplimiento de todas las propiedades de calidad referenciadas en la hoja técnica de este producto.

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Producto: 5891321

Descripción del Producto: P7 PINTUTRAFICO ACRYL 13754-653 18.93l

Fabricante: Compania Global de Pinturas S.A.S.
Autopista Medellin-Bogota KM1 - Via a Belen
Ciudad: Rionegro Pais: Colombia

Detalles de Lote

Número de Lote: 598548183
Fecha de Manufactura: 28.11.2025
Fecha de Expiración: 22.05.2027
Lote de Inspección: 40007720982
Cond. de Almacenam: En los envases originales sin abrir, protegidos de la luz solar.

Detalles Comerciales:

RESULTADOS DE ANÁLISIS DEL LOTE

Características	Método	Tolerancia Límite Inferior		Límite Superior	Resultados	Unidad
ACABADO			P/F		Pasó	-
COLOR VISUAL PRODUCTOS			P/F		Pasó	-
VISCOSIDAD KU		85,00	-	95,00	86,00	KrebsUnits
DENSIDAD		1,526	-	1,555	1,553	g/cm3
MOLIENDA HEGMAN		3,00	-	5,00	4,00	Hegman
SECAMIENTO AL TACTO (min)		5,00	-	12,00	12,00	minute
PODER CUBRIENTE EN HUMEDO			P/F		Pasó	-

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Producto: 5891321

Descripción del Producto: P7 PINTUTRAFICO ACRYL 13754-653 18.93l

Fabricante: Compania Global de Pinturas S.A.S.
Autopista Medellin-Bogota KM1 - Via a Belen
Ciudad: Rionegro Pais: Colombia

Certificado Por: Departamento de Control de Calidad Aprobador: John Arboleda Fecha Expedición: 3-jun-2026

Certificado generado electronicamente, no requiere firma. Gestión de calidad de la compañia garantiza el cumplimiento de todas las propiedades de calidad referenciadas en la hoja técnica de este producto.

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Producto: 5891727

Descripción del Producto: P7 PINTUTRAF IMPRIMAN NEGRO 13759 3.79L

Fabricante: Compania Global de Pinturas S.A.S.
Autopista Medellin-Bogota KM1 - Via a Belen
Ciudad: Rionegro País: Colombia

Detalles de Lote

Número de Lote: 598536094
Fecha de Manufactura: 28.08.2025
Fecha de Expiración: 19.02.2027
Lote de Inspección: 40007531198
Cond. de Almacenam: En los envases originales sin abrir, protegidos de la luz solar.

Detalles Comerciales:

RESULTADOS DE ANÁLISIS DEL LOTE

Características	Método	Tolerancia			Resultados	Unidad
		Límite Inferior		Límite Superior		
VISCOSIDAD KU		75,00	-	85,00	79,00	KrebsUnits
DENSIDAD		1,402	-	1,431	1,431	g/cm3
BRILLO A 60°		0,00	-	10,00	2,00	Gloss Unit
MOLIENDA HEGMAN		4,00	-	5,00	5,00	Hegman
SECAMIENTO AL TACTO (min)		5,00	-	15,00	15,00	minute

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Producto: 5891727

Descripción del Producto: P7 PINTUTRAF IMPRIMAN NEGRO 13759 3.79L

Fabricante: Compania Global de Pinturas S.A.S.
Autopista Medellin-Bogota KM1 - Via a Belen
Ciudad: Rionegro País: Colombia

Certificado Por: Departamento de Control de Calidad

Aprobador: Alejandra Osorio Arias

Fecha Expedición: 3-jun-2026

Certificado generado electronicamente, no requiere firma. Gestión de calidad de la compañia garantiza el cumplimiento de todas las propiedades de calidad referenciadas en la hoja técnica de este producto.

GOYA
¡La aplicación perfecta!

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO : RODILLO PROFESIONAL 9" CODIGO INTERNO: 1112
TIPO DE MATERIAL: RODILLO EN FELPA ACRILICA
FECHA : ENERO 26 DE 2011.

PRODUCTO

DESCRIPCION : Rodillo Profesional en varilla zincada, felpa acrilica 100% y mango en polietileno.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES: LARGO 330 mm
PESO 202 g
DIAMETRO 44 mm
COLOR Yema de Huevo

Felpa : Acrilica tipo pesado
Mango : Polietileno de Alto impacto antideslizante
Varilla : Alambre zincado calibre 48 cm.
Resistencia: Thiner 100%
Resistencia: Gasolina vehicular 100%
Resistente : Disolventes de pinturas en general 100%
Toxicidad: No presenta - No decolora

PROPIEDADES :
Este producto es elaborado con materiales de alta calidad cumpliendo estandares internacionales , bajo las normas de produccion NTC Iso 9001 V 2000

PRESENTACIÓN:
Unidades individuales en bolsa . Bolsa por docenas
Cajas por docenas zunchadas

USOS :
especialmente diseñado para aplicaciones de vinilos y distintos tipos de pintura.

RECOMENDACIONES :
* Almacenar en un lugar fresco y seco protegiendose de luz UV y la humedad
* No mezclar con quimicos de alta volatilidad
* Cuando utilice este producto se recomienda el uso de elementos se seguridad y ropa de trabajo adecuados
* Material inflamable no almacenar en sitios con mas 50° C de temperatura
* No utilizar en usos diferentes a los recomendados
* La fecha de elaboración de esta ficha anula la anterior

La información suministrada en esta ficha es de buena fe y refleja los estudios realizados al producto, sin embargo INDUSTRIAS GOYA no se responsabiliza por el uso inadecuado de esta información o producto

Observaciones :

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Autopista Sur Km 25 Via Bogota, Sibate, Colombia. C.P
- 250058 Tel/Fax: 3118760266

N°: 10018131658461

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACION	PESO (Kg)
DISTRIAS S A S	9007740826/120	PED 04112025	11116310/000120	NTC 2289	3.120

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	COMPOSICION QUIMICA (%) Ensayo según método ASTM E415											
				C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E
108000077	ALB COR NTC 2289 1/4"	1727238201	GR 60	0,26	0,87	0,010	0,025	0,15	0,26	0,10	0,09	0,02	0,002	0,026	0,42
Rangos de referencia según norma				max 0,3000%	max 1,5030%	max 0,0150%	max 0,0450%	max 0,5000%							máx 0,550

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	PROPIEDADES MECÁNICAS Ensayo según método NTC3353						CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				
				R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Separa	Ángulo	
108000077	ALB COR NTC 2289 1/4"	1727238201	2	453	643	1,42	17,3	0,249	OK	4,40	0,34	1,98	51	
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 14,00%	min 0,234 kg/m		max 4,46 mm	min 0,25 mm	max 2,49 mm	45,0 - 70,0 deg	

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

SIBATÉ. 22.11.2025

IVAN ANDRES PORTILLO CUADROS

INFORME DE ENSAYOS

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-003

Ternium
El acero que hace fuerte a Colombia

Razón Social: Ternium Colombia S.A.S.
NIT: 890932389-8 **Página Web:** www.ternium.com.co
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales

INFORMACIÓN GENERAL

Cliente: FERRETERIA FERROSVEL
Dirección: CL 31 B 89 E 140 MEDELLIN
Teléfono: 4440616

Fecha Impresión: 2026/04/28
Nro.Remisión: 187349851

Nro.Informe: 170006
Nro.Informe Ant:
Centro: Centro Planta Manizales

DATOS GENERALES

MATERIAL	DESCRIPCIÓN	COLADA/LOTE	PESO.PAQ(KG)	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE
C8000061	ANGULO 2"x1/4" 6m A572/G50	A012420017	1995	NTC 4537	Ternium
C8000070	ANGULO 2"x3/16" 6m A572/G50	A012135603	2004	NTC 4537	Ternium
C8000070	ANGULO 2"x3/16" 5m A572/G50	A012160005	2004	NTC 4537	Ternium

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
Los resultados fuera de: V 0.004 % a 0.026 %, Ni 0.06% a 0.58% y Nb 0.0004% a 0.0998% no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.
Los resultados de alargamiento fuera de 8,5 % a 25,78 % no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
No reproducir información parcial del informe, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROPIEDADES QUÍMICAS

MATERIAL	COLADA/LOTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Cr	% Ni	% Cu	% V	% Mo	% Nb
C8000061	A012420017	0.21	0.74	0.14	0.022	0.012	0.148	0.070	0.178	0.018	0.036	0.002
C8000070	A012135603	0.21	0.63	0.16	0.026	0.011	0.126	0.068	0.169	0.019	0.024	0.002
C8000070	A012160005	0.21	0.66	0.17	0.023	0.010	0.151	0.066	0.113	0.017	0.035	0.001

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
Los resultados fuera de: V 0.004 % a 0.026 %, Ni 0.06% a 0.58% y Nb 0.0004% a 0.0998% no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.
Los resultados de alargamiento fuera de 8.5 % a 25.78 % no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
No reproducir información parcial del informe, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROPIEDADES FÍSICAS

MATERIAL	COLADA/LOTE	Resistencia Fluencia MPa	Resistencia Tracción MPa	Alargamiento %	Resiste. Tracción2 MPa	Alargamiento 2 %	Fecha Ensayo	Resist. Fluencia2 MPa
C8000061	A012420017	395	535	20	533	20	20250330	401
C8000070	A012135603	377	508	22	502	23	20251122	374
C8000070	A012160005	366	486	22	494	23	20251125	369

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
Los resultados fuera de: V 0.004 % a 0.026 %, Ni 0.06% a 0.58% y Nb 0.0004% a 0.0998% no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.
Los resultados de alargamiento fuera de 8.5 % a 25,78 % no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
No reproducir información parcial del informe, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

Los resultados de los ensayos en ángulos y canales cumplen con los métodos descritos en las normas:

* Composición Química: NTC 5192: 2024 Num. 9.1.2 (ASTM E415) NTC 5231: 2024

* Tracción: NTC 3353:2024, Num. 8, 9.2, 13, 14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

VARIABLE	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA(1)
% C	± 0.006719 %
% Mn	± 0.00373 %
% Si	± 0.0098 %
% S	± 0.0021 %
% P	± 0.0015 %
% Cr	± 0.0113 %
% Ni	± 0.0193 %
% Cu	± 0.0098 %
% V	± 0.0007 %
% Nb	± 0.0005 %
% Mo	± 0.0088%
Resistencia a la Fluencia	± 7.71 MPA
Resistencia a la Tracción	± 9.26 MPA
Alargamiento	± 0.42 %

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianzade 95%.

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan unicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
Los resultados fuera de V 0.004 % a 0.026 %, Ni 0.06% a 0.58% y Nb 0.0004% a 0.0998% no estan dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.
Los resultados de alargamiento fuera de 8.5 % a 25.76 % no estan dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA PROD", la regla de decisión aplicada es aceptacion simple.
No reproducir información parcial del informe, excepto si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio.

Sebastian Carmona Restrepo

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-003

El acero que hace fuerte a Colombia

Razón Social: Ternium Colombia S.A.S.
NIT: 890932389-8 **Página Web:** www.ternium.com.co
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Km 2 Vía Termales la Enea, Manizales

INFORMACIÓN GENERAL

Cliente: FERROSVEL BARRANQUILLA
Dirección: PARQUE INDUSTRIAL DE MALAMBO C BARRANQUILLA
Teléfono: 324 259 1859

Fecha Impresión: 2026/04/08
Nro.Remisión: 187336501

Nro.Informe: 165575
Nro.Informe Ant:
Centro: Centro Planta Manizales

DATOS GENERALES

MATERIAL	DESCRIPCIÓN	COLADA/LOTE	PESO.PAQ(KG)	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE
C8000065	ANGULO 2"x1/8" 6m A572/G50	A012422302	2007	NTC 4537	Ternium
C8000065	ANGULO 2"x1/8" 6m A572/G50	A012422305	2007	NTC 4537	Ternium
C8000090	ANGULO 3"x1/4" 6m A572/G50	A012422917	2012	NTC 4537	Ternium

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
Los resultados fuera de: V 0.004 % a 0.026 %, Ni 0.06% a 0.58% y Nb 0.0004% a 0.0998% no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.
Los resultados de alargamiento fuera de 8,5 % a 25,78 % no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
No reproducir información parcial del informe, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROPIEDADES QUÍMICAS

MATERIAL	COLADA/LOTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Cr	% Ni	% Cu	% V	% Mo	% Nb
C8000065	A012422305	0.21	0.87	0.16	0.020	0.014	0.124	0.058	0.162	0.021	0.012	0.002
C8000065	A012422302	0.21	0.87	0.16	0.020	0.014	0.124	0.058	0.162	0.021	0.012	0.002
C8000090	A012422917	0.19	0.82	0.15	0.029	0.012	0.156	0.071	0.186	0.019	0.019	0.001

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
Los resultados fuera de: V 0.004 % a 0.026 %, Ni 0.06% a 0.58% y Nb 0.0004% a 0.0998% no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.
Los resultados de alargamiento fuera de 8,5 % a 25,78 % no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
No reproducir información parcial del informe, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROPIEDADES FÍSICAS

MATERIAL	COLADA/LOTE	Resistencia Fluencia MPa	Resistencia Tracción MPa	Alargamiento %	Resiste. Tracción2 MPa	Alargamiento 2 %	Fecha Ensayo	Resist. Fluencia2 MPa
C8000065	A012422305	443	587	20	587	22	20260402	446
C8000065	A012422302	443	587	20	587	22	20260402	446
C8000090	A012422917	387	527	26	526	24	20260403	385

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
Los resultados fuera de: V 0.004 % a 0.026 %, Ni 0.06% a 0.58% y Nb 0.0004% a 0.0998% no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.
Los resultados de alargamiento fuera de 8,5 % a 25,78 % no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
No reproducir información parcial del informe, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

Los resultados de los ensayos en ángulos y canales cumplen con los métodos descritos en las normas:

* Composición Quimica: NTC 5192: 2024 Num. 9.1.2 (ASTM E415) NTC 5231: 2024
* Tracción: NTC 3353:2024, Num. 8, 9.2, 13, 14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

VARIABLE	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA(1)
% C	± 0.006719 %
% Mn	± 0.00373 %
% Si	± 0.0098 %
% S	± 0.0021 %
% P	± 0.0015 %
% Cr	± 0.0113 %
% Ni	± 0.0193 %
% Cu	± 0.0098 %
% V	± 0.0007 %
% Nb	± 0.0005 %
% Mo	± 0.0088%
Resistencia a la Fluencia	± 7.71 MPA
Resistencia a la Tracción	± 9.26 MPA
Alargamiento	± 0.42 %

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianzade 95%

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
Los resultados fuera de: V 0.004 % a 0.026 %, Nb 0.06% a 0.58% y Nb 0.0004% a 0.0958% no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.
Los resultados de alargamiento fuera de 8.6 % a 25.73 % no estan dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
No reproducir información parcial del informe, excepto si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio

Sebastian Carmona Restrepo

INFORME DE ENSAYOS

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Ternium
El acero que hace fuerte a Colombia

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S.
NIT: 901131909-1 **Página Web:** www.ternium.com.co
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Via Barranquilla Ponedera km 48 + 600 m, Palmar de Varela, Atlántico,Colombia

INFORMACIÓN GENERAL

Cliente: GYJ FERRETERIAS SA TUNJA
Dirección: CARRERA 2 ESTE No. 56 - 04 TUNJA
Teléfono: 7457093

Fecha Impresión: 2026/02/28
Nro.Remisión: 187318370

Nro.Informe: 158219
Nro.Informe Ant:
Centro: Centro Planta Atlantico

DATOS GENERALES

MATERIAL	DESCRIPCIÓN	COLADA/LOTE	PESO.PAQ(KG)	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BFO0028510	1263	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BFO0028513	1505	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BFO0028514	1502	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BFO0028515	1492	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BFO0028516	1505	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BFO0028517	1488	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BFO0028518	1475	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BFO0028530	1525	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BFO0028531	1519	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BFO0028540	1499	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BFO0028542	1495	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROPIEDADES QUÍMICAS

MATERIAL	COLADA/LOTE	% C	% Mn	% Mo	% Si	% S	% P	% Cr	% Ni	% Cu	% V	% CE
C8007443	BFO0028530	0.30	1.22	0.000	0.21	0.011	0.022	0.01	0.01	0.01	0.001	0.50
C8007443	BFO0028531	0.30	1.22	0.000	0.21	0.011	0.022	0.01	0.01	0.01	0.001	0.50
C8007443	BFO0028540	0.30	1.22	0.000	0.21	0.011	0.022	0.01	0.01	0.01	0.001	0.50
C8007443	BFO0028542	0.30	1.22	0.000	0.21	0.011	0.022	0.01	0.01	0.01	0.001	0.50
C8007443	BFO0028515	0.30	1.22	0.000	0.21	0.011	0.022	0.01	0.01	0.01	0.001	0.50
C8007443	BFO0028516	0.30	1.22	0.000	0.21	0.011	0.022	0.01	0.01	0.01	0.001	0.50
C8007443	BFO0028517	0.30	1.22	0.000	0.21	0.011	0.022	0.01	0.01	0.01	0.001	0.50
C8007443	BFO0028518	0.30	1.22	0.000	0.21	0.011	0.022	0.01	0.01	0.01	0.001	0.50
C8007443	BFO0028510	0.30	1.22	0.000	0.21	0.011	0.022	0.01	0.01	0.01	0.001	0.50
C8007443	BFO0028513	0.30	1.22	0.000	0.21	0.011	0.022	0.01	0.01	0.01	0.001	0.50
C8007443	BFO0028514	0.30	1.22	0.000	0.21	0.011	0.022	0.01	0.01	0.01	0.001	0.50

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROPIEDADES FÍSICAS

MATERIAL	COLADA/LOTE	Resistencia Fluencia MPa	Resistencia Tracción MPa	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Fecha Ensayo
C8007443	BFO0028530	473	626	17.32	SinGrieta	1.32	20260227
C8007443	BFO0028531	473	626	17.32	SinGrieta	1.32	20260227
C8007443	BFO0028540	473	626	17.32	SinGrieta	1.32	20260227
C8007443	BFO0028542	473	626	17.32	SinGrieta	1.32	20260227
C8007443	BFO0028515	473	626	17.32	SinGrieta	1.32	20260227
C8007443	BFO0028516	473	626	17.32	SinGrieta	1.32	20260227
C8007443	BFO0028517	473	626	17.32	SinGrieta	1.32	20260227
C8007443	BFO0028518	473	626	17.32	SinGrieta	1.32	20260227
C8007443	BFO0028510	473	626	17.32	SinGrieta	1.32	20260227
C8007443	BFO0028513	473	626	17.32	SinGrieta	1.32	20260227
C8007443	BFO0028514	473	626	17.32	SinGrieta	1.32	20260227

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROPIEDADES DIMENSIONALES

MATERIAL	COLADA/LOTE	Espaciamiento mm	Peso Metro (Masa) Kg/m	Altura Resalte mm	Separación Extremos mm	Angulo Resalte °
C8007443	BFO0028530	6.11	0.550	0.52	2.39	50
C8007443	BFO0028531	6.11	0.550	0.52	2.39	50
C8007443	BFO0028540	6.11	0.550	0.52	2.39	50
C8007443	BFO0028542	6.11	0.550	0.52	2.39	50
C8007443	BFO0028515	6.11	0.550	0.52	2.39	50
C8007443	BFO0028516	6.11	0.550	0.52	2.39	50
C8007443	BFO0028517	6.11	0.550	0.52	2.39	50
C8007443	BFO0028518	6.11	0.550	0.52	2.39	50
C8007443	BFO0028510	6.11	0.550	0.52	2.39	50
C8007443	BFO0028513	6.11	0.550	0.52	2.39	50
C8007443	BFO0028514	6.11	0.550	0.52	2.39	50

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Quimicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

* Tracción: NTC 2289:2020, Num. 9 y 15.2 NTC 3353:2024 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2:2024 Num. 5.1, 5.2.1,5.2.2, 6.6, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5,7.6, 7.7, 7.10, 7.11,7.13, 7.14, 8

* Doblado: NTC 2289:2020, Num. 10 NTC 3353: 2024 Num. 15 NTC 1:2024 Num. 4.6, 6.2, 8.1.1, 9.3, 9.7, 9.9, 10 y 11

* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8

* Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

VARIABLE	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA(1)
Resistencia a la Fluencia	± 2.69 MPA
Resistencia a la Tracción	± 2.45 MPA
Alargamiento	± 0.60 %
Altura Resalte	± 2 %
Separación entre extremos	± 4 %
Espaciamiento	± 0.30 %
Angulo de Resalte	± 0.53 °
Peso metro (masa)	± 0.20 %

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianzade 95%.

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA PROD" la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Sebastián Carmona Restrepo

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Carretera Central del Norte Km 27, Tuta, Colombia.
C.P - 150408 Tel/Fax: 7426350

N°: 10008131627063

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
DISTRIAS S A S	9007711623/10	OC 02092025	11092641/000010	NTC161 AH-24 SAE1015	32.000

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	
109000483	BAR LIS NTC 161 1'' 6m	1727029101		0,14	0,51	0,020	0,029	0,12	0,24	0,13	0,12	0,03	0,002	0,000	
109000483	BAR LIS NTC 161 1'' 6m	1727029201		0,16	0,49	0,020	0,024	0,15	0,26	0,15	0,12	0,05	0,002	0,007	
109000483	BAR LIS NTC 161 1'' 6m	1727029301		0,15	0,50	0,023	0,033	0,13	0,24	0,11	0,13	0,02	0,002	0,000	
109000483	BAR LIS NTC 161 1'' 6m	1727029401		0,16	0,49	0,021	0,029	0,16	0,25	0,11	0,14	0,03	0,002	0,000	
Rangos de referencia según norma				0,1300 - 0,1800%	0,3000 - 0,6000%	max 0,0400%	max 0,0500 %								

PROPIEDADES MECÁNICAS — **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**

Ensayo según método NTC 1353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	Alargamiento %	Masa Lineal	Doblado	R. T/R f	Diámetr	Ovalid			
109000483	BAR LIS NTC 161 1'' 6m	1727029101	NA	302	451	31,1	3,894	BUENO	1,49	25,18	0,25			
109000483	BAR LIS NTC 161 1'' 6m	1727029201	NA	307	461	27,7	3.894	BUENO	1,50	25,01	0,16			
109000483	BAR LIS NTC 161 1'' 6m	1727029301	NA	309	463	29,6	3,875	BUENO	1,50	25,12	0,22			
109000483	BAR LIS NTC 161 1'' 6m	1727029401	NA	315	470	30,6	3,860	BUENO	1,49	25,08	0,18			
Rangos de referencia según norma				mín 235,0 MPa	mín 363,0 MPa	mín 18,00%	mín 3,742 kg/m		mín 1,100	24,80 - 25,00 mm	máx 0,60 mm			

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

Gerdau Diaco certifica que para la producción de nuestro acero, el porcentaje de contenido reciclado mínimo post-consumo corresponde al 90%.

RESPONSABLE DE CALIDAD

TUTA, 04.09.2025

PAOLA KATHERIN MATEUS

ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S.

Resolución 0501 del 4 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR-CER624632
Certificate

Fecha de Aprobación: 2024-10-02
Approval Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2030-10-01
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
APOLO	Tubos y Accesorios de Acueducto	Materiales Ferrosos Hierro dúctil Acero al Carbon Acero Inoxidable Materiales Elastómeros NBR, SBR, EPDM Recubrimiento Pintura epoxica	Tees, Codos, Reducciones, Cruces, Tapones, Bridas Ciegas, Bridas Roscadas, Bridas Locas, Filtros en Yee, Collares de Derivación, Niples y Pasamurros Diametros de 2" a 24"	Extremos: Lisos, Junta Rápida, Bridas, Mecanico y sus combinaciones Usos: Tuberias de PVC, Acero al carbon e Inoxidable, Hierro Ductil, Asbesto Cemento, Polietileno, GRP	ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S. Carrera 42 No 29 A - 49, Itagüí, Antioquia, Colombia

ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S.

Anexo Certificado CSR -CER624632
Certificate

Fecha de Aprobación: 2024-10-02
Approval Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Resolución 0501 del 4 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento: 2030-10-01
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
APOLO	Tubos y Accesorios de Acueducto	Materiales Ferrosos Hierro dúctil Acero al Carbon Materiales Elastómeros NBR, SBR, EPDM Recubrimiento Pintura epoxica	Uniones y Acoples tipo Universal, Dresser, Rapida, Mecanico con y sin restrictor, de Reparacion, de Desmontaje, Adaptadores Diametros de 2" a 24"	Extremos: Lisos, Junta Ràpida, Bridas, Mecanico y sus combinaciones Usos: Tuberias de PVC, Acero al carbon e Inoxidable, Hierro Ductil, Asbesto Cemento, Polietileno, GRP	ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S. Carrera 42 No 29 A - 49, Itagüi, Antioquia, Colombia

ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S.

Resolución 0501 del 4 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER624632
Certificate

Fecha de Aprobación: 2024-10-02
Approval Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2030-10-01
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
APOLO	Tubos y Accesorios de Acueducto	Materiales Ferrosos Hierro dúctil Acero Inoxidable Materiales No Ferrosos Laton Materiales Elastómeros NBR, SBR, EPDM Recubrimiento Pintura epoxica	Hidrantes tipo. Barril Seco, Humedo, Poste Diametros de 3", 4" y 6"	Extremos: Lisos, Junta Rápida, Bridas, Mecanico, Roscado Usos: Tuberias de PVC, Acero al carbon e Inoxidable, Hierro Ductil, Asbesto Cemento, Polietileno, GRP	ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S. Carrera 42 No 29 A - 49, Itagüi, Antioquia, Colombia

ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S.

Anexo Certificado CSR-CER624632
Certificate

Fecha de Aprobación: 2024-10-02
Approval Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Resolución 0501 del 4 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento: 2030-10-01
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
APOLO	Tubos y Accesorios de Acueducto	Materiales Ferrosos Hierro dúctil Acero Inoxidable Materiales No Ferrosos Laton Materiales Elastómeros NBR, SBR, EPDM Recubrimiento Pintura epoxica	Válvulas tipo: Compuerta Elástica, Ventosa, Cheque o antiretorno Diametros de 2"a 12"	Extremos: Lisos, Junta Rápida, Bridas, Mecanico y sus combinaciones Usos: Tuberias de PVC, Acero al carbon e Inoxidable, Hierro Ductil, Asbesto Cemento, Polietileno, GRP	ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S. Carrera 42 No 29 A – 49, Itagüi, Antioquia, Colombia

ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S.

Resolución 0501 del 4 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER624632
Certificate

Fecha de Aprobación: 2024-10-02
Approval Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2030-10-01
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
APOLO	Tubos y Accesorios de Acueducto	Materiales Plasticos PVC Materiales No Ferrosos Laton	Valvula de bola o registro Diametro de ½"	Extremos rosca NPT hembra y macho, acople polietileno y soldar PVC.	INCODI S.A.S Autopista Medellin Bogotá, Via aeropuerto José María Córdoba, Km 1,2 Guarne - Guarne, Antioquia, Colombia. Maquilador

ICONTEC ES MIEMBRO DE

IQNET

Building trust together

Certificate

ICONTEC has issued an IQNet recognized certificate that the **organization**

ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S.

Carrera 42 No. 29 A – 49, Itagüí, Antioquia, Colombia

has implemented and maintains a

Quality Management System

for the following scope:

Diseño, producción y comercialización de válvulas, hidrantes y accesorios para acueducto y alcantarillado

Design, production and commercialization of valves, hydrants and fittings

ISO 9001:2015

Issued on: 2017-03-03
Expires on: 2026-03-02

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: CO-SC-CER521072

Alex Stoichitoiu
President of IQNet

Roberto Enrique Montoya Villa
CEO of ICONTEC

LL

This attestation is directly linked to the IQNET Member's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

IQNET Members*:
AENOR Spain **AFNOR** Certification France **APCER** Portugal **CCC** Cyprus **CISQ** Italy **CQC** China **CQM** China **CQS** Czech Republic **Cro Cert** Croatia **DQS Holding GmbH** Germany **EAGLE Certification Group** USA **FCAV** Brazil **FONDONORMA** Venezuela **ICONTEC** Colombia **ICS** Bosnia and Herzegovina **Inspecta Sertifiointi Oy** Finland **INTECO** Costa Rica **IRAM** Argentina **IQA** Japan **KFQ** Korea **LSQA** Uruguay **MIRTEC** Greece **MSZT** Hungary **Nemko AS** Norway **NSAI** Ireland **NYCE-SIGE** México **PCBC** Poland **Quality Austria** Austria **SII** Israel **SIQ** Slovenia **SIRIM QAS International** Malaysia **SQS** Switzerland **SRAC** Romania **TSE** Turkey **YUQS** Serbia

* The list of IQNet Members is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

icontec

Sello con Reglamento Técnico

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according to ISO/IEC 17067) for:

VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE
VÁLVULAS EN PVC PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE

Fabricado por **ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S** en la **Carrera 42 No. 29A - 49, Itagüi, Antioquia, Colombia, identificada** con **número de NIT 900.941.680-0**

Manufactured by **ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S** in the **Carrera 42 No. 29A - 49, Itagüi, Antioquia, Colombia**, identified with **NIT number 900.941.680-0**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución 0501 del 4 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Por el cual se expide los requisitos técnicos relacionados con composición quimica (articulo 5 de conformidad con el articulo 6) e información técnica (articulos 10 y 11), que deben cumplir los tubos, ductos y accesorios utilizados en acueducto o en las instalaciones hidráulicas de la vivienda y se derogan las resoluciones 1166 de 2006 y 1127 de 2007
which issues the technical requirements related to chemical composition (article 5 in accordance with article 6) and technical information (articles 10 and 11), that the pipes, ducts and accessories used in the aqueduct or in the hydraulic installations of the home must comply and resolutions 1166 of 2006 and 1127 of 2007 are repealed.

SECTOR ICS 23.040.10

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSR -CER624632
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	2024-10-02	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	
Fecha de Renovación: Renewal Date:		**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2030-10-01

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por
ICONTEC is a certification body accreditated by

ONAC ACREDITADO

ICONTEC 17065:2012
19-CPR-002

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

icontec

F-PS-628
Versión 00

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado.
ICONTEC Calle 25 # 59-76 Torre a "Agua" "Centro Empresarial Elemento" Bogotá D.C., Colombia

ICONTEC ES MIEMBRO DE

IQNET

icontec

ISO 9001

ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de la organización:
ICONTEC certifies that the Organization's Management System of:

ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S.

Carrera 42 No. 29 A – 49, Itagüí, Antioquia, Colombia

ha sido auditado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:
has been audited and approved based on the specified requirements of:

ISO 9001:2015

Este Certificado es aplicable al siguiente alcance:
This certificate is applicable to the following scope:

Diseño, producción y comercialización de válvulas, hidrantes y accesorios para acueducto y alcantarillado

Design, production and commercialization of valves, hydrants and fittings

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC

This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by ICONTEC

Certificado: **SC-CER521072**
Certificate:

Fecha de Otorgamiento:	**2017-03-03**
Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo:	**2023-03-02**
Fecha de Inicio del ciclo actual de certificación:	**2023-03-15**
Fecha de Vencimiento ciclo actual:	**2026-03-02**
Fecha de Auditoria de Recertificación:	**2023-02-07**
Fecha de Revisión:	**2023-03-15**

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

icontec

ONAC ACREDITADO

IAF

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado ICONTEC carrera 37 nro. 52-95, Bogotá D.C. Colombia

yumbolón

CERTIFICADO TÉCNICO

POLYLON S.A. garantiza que toda nuestra línea de productos cumple con las especificaciones mencionadas a continuación y que las respectivas mediciones son realizadas con los equipos apropiados para tal efecto y cumpliendo con los parámetros establecidos en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma NTC ISO 9001:2015 actualmente certificado por Bureau Veritas Quality International, además por ser un producto no nocivo para la salud las recomendaciones a tener en cuenta para su manipulación se citan a continuación:

Descripción Técnica						
Referencia	Calibre (mm)			Long (m)		
	Mín	Std	Máx	Mín	Std	Máx
453 - YMB JUNTA 1/4"x1700mGr-1700m-CAJx1UD	6.3	6.35	6.43	1700	1700	1703

COMPOSICIÓN:

- ✓ Resina de baja densidad.
  -Índice de fluidez: 2.

PROPIEDADES:

- ✓ Resistente a todo tipo de químicos:
  -Ácidos, solventes, pegantes a base de caucho, gasolina, entre otros.
- ✓ 100% Impermeable
- ✓ Se adapta a irregularidades en las juntas
- ✓ Evita filtraciones
- ✓ Liviano y flexible
- ✓ Inocuo
- ✓ No genera contraindicaciones para la salud
- ✓ No Propagante de llama

yumbolón

RECOMENDACIONES:

- ✓ No someter el producto (contacto directo) a temperaturas mayores a 70°C.
- ✓ Evitar exposición del producto a lugar generadores de llama.
- ✓ En caso de presentar llama apagar con extintor tipo ABC
- ✓ Evitar exposición a la luz directa del sol.
- ✓ Evitar exposición permanente al agua.

Caterin Torres Palacio
Directora de Calidad
c.c. Certificados de Calidad

ADHESIVOS • SELLADORES • PRODUCTOS QUÍMICOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN

MAPEI Colombia S.A.S.
Sede: Carrera42 #100dSur-250. La Estrella
Tel:+57 4 4446515
E-mail: info@mapei.com.co

jueves, 24 de abril de 2025

Certificado de análisis

(Analysis Test Report)

Nombre del Producto: (Product Name)	**Mapecure E30 CO**
Fecha de producción: (Production Date)	**jueves, 24 de abril de 2025**
Lote: (Batch)	**230425070806**

Descripción del Método (Method Description)	U/M (U/M)	Resultado (Value)	Min (Min)	Max (Max)
Contenido Seco	%	16.46	13.50	16.50
pH	-	7.73	7.50	9.50
Densidad	g/ml	0.988	0.960	1.000
Inspección Visual		OK	Liquido Blanco Homogeneo	

Certificamos que el material indicado arriba ha sido inspeccionado y probado de acuerdo con los procedimientos de nuestro sistema de calidad y cumple con las especificaciones del material.
Este documento ha sido generado electronicamente, por lo tanto es válido sin ninguna firma. Para información o clarificación en referencia a los datos suministrados, por favor contacte a la Dirección Comercial de MAPEI.

Laboratorio de Control de Calidad
(Quality Control Lab.)

REPORTE DE ENS .YOS

DIACO S.A.
Autopista Sur Km 25 Via Bogota, Sibate, Colombia, C.P
- 250058 Tel/Fax: 3118760266

Nº: 10018131658461

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACION	PESO (Kg)
DISTRIAS S A S	9007740826/120	PED 04112025	11116310/000120	NTC 2289	3.120

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E
106000077	ALB COR NTC 2289 1/4"	1727236201	GR 60	0,26	0,87	0,010	0,025	0,15	0,26	0,10	0,09	0,02	0,002	0,026	0,42
Rangos de referencia según norma				max 0,3000	min 1,5000	max 0,0150	max 0,0450	max 0,5000							max 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Separa	Ángulo	
106000077	ALB COR NTC 2289 1/4"	1727236201	2	453	643	1,42	17,3	0,249	OK	4,40	0,34	1,98	51	
Rangos de referencia según norma				4200 - 5400 MPa	min 5530 MPa	min 1,250	min 14,00	max 0,234 kg/m		min 4,45 mm	max 0,39 mm	max 2,40 mm	45,0 - 70,0 deg	

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

SIBATÉ, 22.11.2025

IVAN ANDRES PORTILLO CUADROS

EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT

Certificado de Calidad 10000262774

Centro: CO2A

Material: 445712A 805
VULKEM 45 SSL GRIS x 5 GAL (18.9 L)
Grupo Art: SEALANT
Fecha de fabricación: 08/02/2025
Lote: 7880440

Toxement S.A. por medio de este documento da constancia de conformidad al lote de fabricación referenciado, de acuerdo con los resultados obtenidos bajo procedimientos estandarizados del laboratorio. Así mismo, los datos registrados dan cumplimiento a los parámetros citados en la hoja técnica del producto

Característica	Método	Especificación	Resultado
ASPECTO	IM003		Aprobado
SAG	IM003	30.00 - 100.00	100.00
VISCOSIDAD	IM003	25000.00 - 50000.00 CPS	29370.00

ESTE CERTIFICADO ES EMITIDO ELECTRÓNICAMENTE Y TIENE VALIDEZ SIN FIRMA

CamScanner

Corsan®

INDUSTRIAS METALICAS CORSAN S.A.
NIT 890,900,160
TEL: 4440755
ITAGUI - COLOMBIA

AUTOPISTA SUR Nro 85B-71 - ITAGUI
www.corsan.com.co

CERTIFICADO DE CALIDAD

CONSECUTIVO 637 21/03/2025

REFERENCIA: 33R100142 ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRUCCIÓN

Señores: DISTRIAS S.A.S

PEDIDO 10406627

Nit: 900377621 Tel: 7823430

CR 2 44 110 MONTERIA

CARACTERISTICAS A VERIFICAR

1. PRQPIEDADES MECÁNICAS			
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN			
ESPECIFICACION=		35 - 45	Kgf/mm2
RESULTADOS:	MUESTRA 1=	37.26	Kgf/mm2
	MUESTRA 2=	33.45	Kgf/mm2
	MUESTRA 3=	40.39	Kgf/mm2
2. DIMENSIONES			
DIAMETRO			
ESPECIFICACION=		1.47	± 0.05 mm
RESULTADOS:	MUESTRA 1=	1.44	mm
	MUESTRA 2=	1.47	mm
	MUESTRA 3=	1.50	mm
3. RECUBRIMIENTO DE ZINC			
ESPESOR DE CAPA			
ESPECIFICACION=		N/A	g/m2
RESULTADOS:	MUESTRA 1=	N/A	g/m2
	MUESTRA 2=	N/A	g/m2
	MUESTRA 3=	N/A	g/m2

CALIDAD SAE 1006 **PESO: 10.000** Kg

OBERVACIONES

ELABORADO POR
Valentina Villa

REVISADO POR
Alejandra Agudelo

Fecha de impresión 21/03/2025

ANEXO 16. CORRESPONDENCIA

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

EDTB -41-2026

El Bagre Antioquia, 14 de abril 2026

Señor
Franklin Cabarcas
Gerente (E)
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE
El Bagre, Antioquia

Referencia: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29°, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA."

Asunto: Actualización de póliza contrato 050/ 2025

Atento saludo,

CONSORCIO PUERTO CLAVER remite a su despacho la actualización de la póliza de Cumplimiento y la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, de acuerdo al Acta de Reinicio No2, para los trámites pertinentes.

Sin otro particular,

WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ
Representante Legal
CONSORCIO PUERTO CLAVER

Anexo: Póliza de responsabilidad civil extracontractual No C0Q-100001670 (2 folios).
Póliza de cumplimiento No C0Q-100006616 (3 folios).

C.C. Ing. Jorge Soto. Representante Legal. INGECOR S.A.S

Recibido 14/04/2026 7:00 am

Correo Electrónico: [redacted]
Dirección: CR 12 A # 23 - 45 BRR JERUSALEN
Planeta Rica - Córdoba

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.04.09 17:54:15 -05:00

Codigo de Seguridad: bUl0JQlvR8Rhmorm9dlksQ==

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 30-05-2023 -1317-P-05-PPSUS00000000059-0001

No POLIZA COQ-100086616 | No. ANEXO 4 | No CERTIFICADO 688016591 | No RIESGO

TIPO DE DOCUMENTO | FECHA DE EXPEDICION 09/04/2026 | SUC. EXPEDIDORA CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	15/09/2025	24:00 Horas Del	12/05/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PUERTO CLAVER	No. DOC. IDENTIDAD	901.982.342-5
DIRECCION	CR 12 A # 23 - 45 BRR JERUSALEN	TELEFONO	3104857985
ASEGURADO	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE EDTB	No. DOC. IDENTIDAD	901.526.561-7
DIRECCION	CALLE 50 47 A 19 SEGUNDO PISO	TELEFONO	3113598471
BENEFICIARIO	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE EDTB	No. DOC. IDENTIDAD	901.526.561-7
DIRECCION	CALLE 50 47 A 19 SEGUNDO PISO	TELEFONO	3113598471

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS, SEGUN:

-ACTA DE SUSPENSION 02 DE FECHA 16/03/2026
-ACTA DE AMPLIACION 1 DE FECHA 30/03/2026
-ACTA DE REINICIO 01 DE FECHA 06/04/2026

FECHA TERMINACION 12/05/2026

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS, CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.050-2025 , CUYO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 16/03/2026	24:00 Horas Del 12/11/2026	721.087.965,40	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 16/03/2026	24:00 Horas Del 12/05/2029	360.533.982,70	51.857,63
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 12/05/2026	24:00 Horas Del 12/05/2031	1.081.681.948,10	0,00

TOTAL ASEGURADO $ 2.163.283.896,20

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACION
MARLEN BALLESTEROS ORJUELA	AGENTES	100,00

DISTRIBUCION COASEGURO				
COMPANIA	TIPO COASEGURO	POLIZA LIDER	CERTIF. LIDER	% PARTICIPACION

PRIMA BRUTA	$	51.857,63
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	51.857,63
GASTOS EXP	$	0,00
IVA	$	9.852,95
TOTAL A PAGAR	$	61.710,58

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 09/04/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CODIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICION DE LA POLIZA.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
Nacional: **01 8000 111 935**
Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

seguros mundial

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN CENTRAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2851500 FAX 2851270 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSU52R000000059-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100006616	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	600016501	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/04/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	15/09/2025	24:00 Horas Del	12/05/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

OBJETO ES
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
NOTA: ASEGURADO Y BENEFICIARIO A LA EDTB, IDENTIFICADO CON EL NIT. 901526561 7 Y AL MUNICIPIO DE EL BAGRE, IDENTIFICADO CON EL NIT. 890984221-2.
NOTA: NOTA: SE ACLARA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA, INICIA VIGENCIA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE
RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DELAENTIDAD CONTRATANTE LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR
ESCRITO A LA COMPAÑIA.
EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CC: 98650618 WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ (PART. 50,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 901938946 CONSTRULARM SAS (PART. 50,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO PUERTO CLAVER)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

Aliados

INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **COQ-100006616** y endoso, **4** cuyo afianzado es: **CONSORCIO PUERTO CLAVER** Asegurado o Beneficiario: **EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE EDTB / EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE EDTB** , expedida por la Compañía en **09/04/2026,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN ORINOQUIA a los **09** dias del mes **ABRIL** del año **2026.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

seguros mundial

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.04.09 17:52:34 -05:00

Codigo de Seguridad: vFDrh1L0t8IQys83xjfzNg==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1517-P-00-PPSUS0000000027-0001

No. PÓLIZA	COQ-100001670	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	600016502	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/04/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	15/09/2025	24:00 Horas Del	12/05/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PUERTO CLAVER	No. DOC. IDENTIDAD	901.982.342-5
DIRECCION	CR 12 A # 23 - 45 BRR JERUSALEN	TELÉFONO	3104857905
ASEGURADO	CONSORCIO PUERTO CLAVER	No. DOC. IDENTIDAD	901.982.342-5
DIRECCIÓN	CR 12 A # 23 - 45 BRR JERUSALEN	TELÉFONO	3104857905
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	1

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS, SEGUN:

-ACTA DE SUSPENSION 02 DE FECHA 116/03/2026
-ACTA DE AMPLIACION 1 DE FECHA 30/03/2026
-ACTA DE REINICIO 01 DE FECHA 05/04/2026

FECHA TERMINACION 12/05/2026

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS, CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	81.900,00
PATRONAL	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 569.400.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MARLEN BALLESTEROS ORJUELA	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LIDER	CERTIF. LIDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	81.900,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	81.900,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	15.561,00
TOTAL A PAGAR	$	97.461,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 09/04/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

EL DILIGENCIAMIENTO CORRECTO DE LA PRESENTE SOLICITUD, FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRO DE INFORMACIÓN VERAZ Y OPORTUNA, Y LA REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN DEL RIESGO, CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, SON REQUISITOS PARA LA EMISIÓN DE LA PÓLIZA.

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS ACEPTADO, TODAS LAS INQUIETUDES Y ACLARADO LOS ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y RECIBO TOMADA LA PÓLIZA DE SEGUROS CONFORME A LA PRESENTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atencion al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogota: **327 4712 - 327 4713**

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN CENTRAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2355080 FAX 2351720 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-86-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100001670	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	680016582	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/04/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINDOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	15/09/2025	24:00 Horas Del	12/05/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NO.850-2025 , CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29A, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA .
NOTA: ASEGURADO: LA EDTB, IDENTIFICADO CON EL NIT. 901526561 7 Y AL MUNICIPIO DE EL BAGRE, IDENTIFICADO CON EL NIT. 890984221-2 Y CONSORCIO PUERTO CLAVER
NIT 9 0 1 9 8 2 3 4 2-5
BENEFICIARIOS: LA EDTB, IDENTIFICADO CON EL NIT. 901526561 7 Y AL MUNICIPIO DE EL BAGRE, IDENTIFICADO CON EL NIT. 890984221-2 Y TERCEROS AFECTADOS.
NOTA SE ACLARA QUE LA POLIZA CUBRE LOS SIGUIENTES AMPAROS:
1. PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES
2. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS SALVO EN EL EVENTO EN QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
3. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS
4. AMPARO PATRONAL
5. GASTOS MEDICOS
6. GASTOS DE DEFENSA
7. PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES
8. DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE
EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CC: 98650618 WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ (PART. 50,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 901930946 CONSTRULARM (PART. 50,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO PUERTO CLAVER) , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRA A EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE EDTB COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PUERTO CLAVER, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE EDTB BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE EDTB COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

IGC-46-2026

El Bagre Antioquia, 23 de abril 2026

Ingeniero
JORGE SOTO
Representante Legal
INGECOR S.A.S
El Bagre, Antioquia

Referencia: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29°, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA."

Asunto: Solicitud de aprobación de imprevistos e ítems no previstos

Respetado ingeniero,

Como es de su conocimiento, el contrato 050/2025 tiene pactado un porcentaje de imprevistos del 1% el cual asciende a $ 26.998.429,70 el cual no fue pagado en las tres actas parciales presentadas y avaladas por INGECOR, y de acuerdo a lo expresado en comité de obra # 21 de fecha 21 de abril de la presente anualidad existe cantidades de obras a mayores e ítems no previstos que asciende a $35.836.277,17. En tal sentido hemos puesto en conocimiento la necesidad de ejecutar ítems no previstos (NP08, NP09) para la culminación satisfactoria del contrato de la referencia y mayores cantidades de obra (4.6, 4.7 Y 6.4), siendo estas de pleno conocimiento de la interventoría y del ente contratante expuesto de manera verbal en diversos escenarios y oficializado en el comité de obra #17 y #21.

Correo Electrónico: consorcio050puertoclaver@gmail.com
Dirección: CR 12 A # 23 - 45 BRR JERUSALEN
Planeta Rica - Córdoba

CONSORCIO
PUERTO CLAVER

Dado que se debe llevar a cabo una redistribución de los costos en cuanto al valor del ítem **GARANTIAS, IMPUESTOS Y DEDUCCIONES** de acuerdo a la siguiente tabla:

GARANTIAS Y POLIZAS	1,19%	$32.128.131
VALOR DE POLIZAS CANCELADAS		$23.290.283,53
VALOR A DISTRIBUIR A LOS IMPREVISTOS		$8.837.847,47

Lo anterior genera un valor de imprevistos correspondientes a $35.836.277,17 del cual se adjunta a la presente comunicación el presupuesto de estos y sus respectivos ítems no previstos.

Sin otro particular, y a la espera de una respuesta favorables en pro de la buena culminación del proyecto

WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ
Representante Legal
CONSORCIO PUERTO CLAVER

Anexo: 01. Imprevistos (10 folios)
02. Ítems No Previstos (2 folios)
03. Comité de obra No17 (2 folios)
04. Comité de obra No21 (3 folios)

ANEXO 7. DOCUMENTACION MAQUINARIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 112515

No. REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC622779	HYUNDAI	R140W-9S	2023

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	HHKR2A1TEB001705

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	26501619	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
14700 Kg	3140 mm	2500 mm	7770 mm

PROPIETARIO(S) APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACION
ARRIETA GOMEZ FERNEY JOSE	C.C. 98.659.065

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

N.R.

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR

INST TTOYTTE DE CERETE

FECHA MATRICULA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
17-03-2023	17-03-2023	******

ORIGEN	DOC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	352023000066693	21/02/2023

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000053930

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 111858

No. DE REGISTRO MC623164	MARCA XCMG	LINEA XC870K	AÑO MODELO 2023
TIPO DE MAQUINARIA CONSTRUCCION	CLASE RETROEXCAVADORA	No. SERIE XUG0870HNCA00700	
COLOR(ES) AMARILLO GRIS	No. MOTOR 4P21S003963	RODAJE NEUMATICOS	
PESO Y MEDIDAS DE ACCESORIOS PESO 7600 Kg	ALTO 3450 mm	ANCHO 2350 mm	LARGO 7400 mm
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) ARRIETA GOMEZ FENNEY JOSE		IDENTIFICACION C.C. 98 650 065	

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTEYTTO ENVIGADO

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
02-03-2023	02-03-2023	
ORIGEN	DOC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	3520220004 68053	28/10/2022

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000053738

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 128481

No. DE REGISTRO MC0B3566	MARCA CATERPILLAR	LINEA 416E	AÑO MODELO 2007
TIPO DE MAQUINARIA CONSTRUCCION	CLASE RETROEXCAVADORA		No. SERIE CAT0416ETSHA03569
COLOR(ES) AMARILLO	No. Motor G4D15753		RODAJE NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
6790 Kg	2020 mm	2360 mm	7290 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
ARRIETA GOMEZ FERNEY JOSE

IDENTIFICACIÓN
C.C 98.650.065

LOCATARIO APELLIDOS(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD



ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
STRIA TTEYTTO ENVIGADO

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICION	FECHA VENCIMIENTO
22-04-2016	29-01-2024	
ORIGEN	DOC. IMPORTACION	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	46201200034890O	09/09/2012

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000062025

ANEXO 8. DOCUMENTACION VEHICULOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10018378886

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
STL180	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300 SBA	2015

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
7.636	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	9635

NÚMERO DE MOTOR	REPOT	VIN
470H862U1610087	N	3HAMMAAR5FL096089

NÚMERO DE SERIE	REPOT	NÚMERO DE CHASIS	REPOT
3HAMMAAR5FL096089	N	3HAMMAAR5FL096089	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

GARCES DAJUD JUAN CARLOS

IDENTIFICACIÓN

C.C. 92527773

RESTRICCIÓN MOVILIDAD | BLINDAJE | POTENCIA HP

195

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN | DEPARTAMENTO DE EXPEDICIÓN | FECHA EXPEDICIÓN | PUERTOS

19301400029536 | 13/03/2014 | 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

NINGUNA

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
31/03/2014	16/06/2019	

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTEYTTO SINCELEJO

LT03002465702

SOAT

PREVISORA

4398366866638000	STL189	CARGA O MIXTO	PUBLICO	7636	2015

2	INTERNATIONAL DURASTAR 4300 SBA 4X2		PLATON	
47384Z0191J087	3HMMXAAR5FL209366			934
GARCES DAZA JUAN CARLOS	3116639647	CC		SOLEDAD
AT1324	43	09913588	0	BOGOTA D.C.

320	$ 809000	$ 436800	$ 2400	263,13[1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
$ 1277800				701,68[2]	
				8,77	
				180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
				750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 160, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920 Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 5049517

Libre y Dale

NOMBRE

YENNADY DE JESUS ACEVEDO GARCIA

FECHA DE NACIMIENTO

26-01-1973

GRUPO RH

O+

FECHA DE EXPEDICIÓN

09-10-2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DEPARTAMENTAL

SYRIA TIOYTIE CAUCASIA

CATEGORÍAS AUTORIZADAS			
A2			
B2			
C2			

LC12000310287



REPÚBLICA DE COLOMBIA


MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023042486

PLACA: SBJ502	MARCA: FORD	LINEA: F 6	MODELO: 1952
CILINDRADA CC: 7.660	COLOR: AZUL ROJO		SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHICULO: CAMION	TIPO CARROCERIA: VOLCO	COMBUSTIBLE: DIESEL	CAPACIDAD KG/PAS: 3000
NUMERO DE MOTOR: 93066096	REG: N	VIN: *****	
NUMERO DE SERIE: F6R2EG34035	REG: S	NUMERO DE CHASIS: F6R2EG34035	REG: N

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRE(S): VALLEJO GOMEZ DIANA PATRICIA

IDENTIFICACION: C.C. 39274010

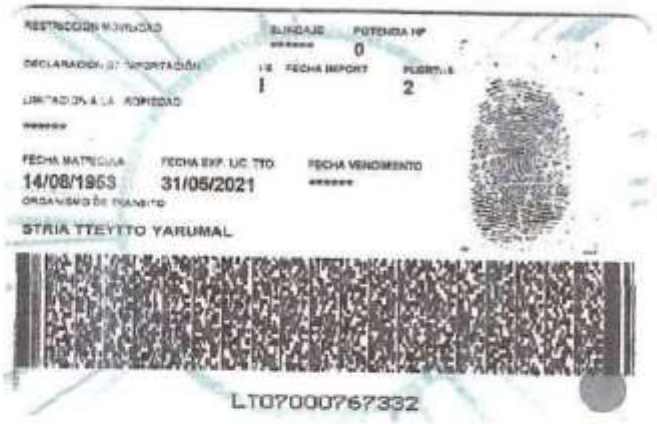

RESTRICCIONES MOVILIDAD: *****

BLINDAJE: *****

POTENCIA HP: 0

DECLARACION DE IMPORTACION:

LE: I

FECHA IMPORT:

PUERTAS: 2

LIMITACION A LA PROPIEDAD: *****

FECHA MATRICULA: 14/08/1963

FECHA EXP. LIC. TTO: 31/05/2021

FECHA VENCIMIENTO: *****

ORGANISMO DE TRANSITO: STRIA TTEYTTO YARUMAL

LT07000767332

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 181764440

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DEL CARIBE LIMITADA

NIT: 900132238

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-015-001

Fecha de expedición: 2025/06/14

Fecha de vencimiento: 2026/06/14

DATOS VEHÍCULO

PLACA: STL180

CLASE: VOLQUETA

MARCA: INTERNATIONAL

MODELO: 2015

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 7636

NRO. MOTOR: 470HM2U1610087

NRO. CHASIS: 3HAMMAAR5FL099088

VIN: 3HAMMAAR5FL099088

LÍNEA: DURASTAR 4300 SBA 4X2

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: JUAN C. GARCES D.

FIRMA DEL RESPONSABLE

RAMIRO JAVIER VERGARA GONZALEZ



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC12000378341

ANEXO 13. INFORME MENSUAL ESTADO DEL TIEMPO.

CONSORCIO PUERTO CLAVER

CONSORCIO PUERTO CLAVER

INFORME MENSUAL ESTADO DEL TIEMPO

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	UBICACIÓN:	CORREGIMIENTO DE PUERTO CALVER MUNICIPIO EL BAGRE (ANTIOQUIA).
			MES: ABRIL
			AÑO: 2026
INTERVENTORÍA:	INGECOR S.A.S	CONTRATO:	052-2025

	HORA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A.M.	12:00-1:00																															
	1:00-2:00																															
	2:00-3:00																															
	3:00-4:00																															
	4:00-5:00																															
	5:00-6:00																															
	6:00-7:00																															
	7:00-8:00						S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	N	S	S	S	S	S	S	
	8:00-9:00						S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	N	S	S	S	S	S	S	
	9:00-10:00						S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	N	S	S	S	S	S	S	
	10:00-11:00						S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	N	S	S	S	S	S	S	
	11:00-12:00						S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	N	S	S	S	S	S	S	
P.M.	12:00-1:00						S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	
	1:00-2:00						S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	
	2:00-3:00						S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	
	3:00-4:00						S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	
	4:00-5:00						S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	
	5:00-6:00						S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	
	6:00-7:00																															
	7:00-8:00																															
	8:00-9:00																															
	9:00-10:00																															
	10:00-11:00																															
	11:00-12:00																															

SUSPENSIÓN Nº 2 PARO NACIONAL

ELABORÓ:	VoBo ING. RESIDENTE: Carlos A. Mercado Z	VoBo INTERVENTOR:

ESTADO DEL TIEMPO			
LLVZ	LLOVIZNA	N	NUBLADO
D.N	DESPEJADO NOCHE		
LL	LLUVIA	S	SOL

CONSORCIO PUERTO CLAVER

INFORME MENSUAL ESTADO DEL TIEMPO

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE COMUNICA DESDE EL CEMENTERIO CON EL BARRIO LA PUNTA EN LA CARRERA 31D ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CARRERA 32 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 35, CALLE 35 ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 29ª, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	UBICACIÓN:	CORREGIMIENTO DE PUERTO CALVER MUNICIPIO EL BAGRE (ANTIOQUIA).
			MES: MAYO
			AÑO: 2026
INTERVENTORIA:	INGECOR S.A.S	CONTRATO:	052-2025

	HORA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A.M.	12:00-1:00																															
	1:00-2:00																															
	2:00-3:00																															
	3:00-4:00																															
	4:00-5:00																															
	5:00-6:00																															
	6:00-7:00																															
	7:00-8:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S																				
	8:00-9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S																				
	9:00-10:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S																				
	10:00-11:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S																				
	11:00-12:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S																				
P.M.	12:00-1:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S																				
	1:00-2:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S																				
	2:00-3:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S																				
	3:00-4:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S																				
	4:00-5:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S																				
	5:00-6:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S																				
	6:00-7:00																															
	7:00-8:00																															
	8:00-9:00																															
	9:00-10:00																															
	10:00-11:00																															
	11:00-12:00																															

ELABORÓ:

VoBo ING. RESIDENTE: Carlos A. Mercado Z


VoBo INTERVENTOR:

ESTADO DEL TIEMPO			
LLV2	LLOVIZNA	N	NUBLADO
D.N	DESPEJADO NOCHE		
LL	LLUVIA	S	SOL


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO

		INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL									

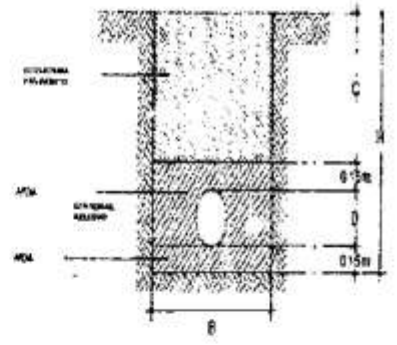

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO PUERTO CLAVER

OBRA	CONSTRUCCIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CONDICIONES DE HACINAMIENTO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE CICLORUTA, CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, CONSTRUCCIÓN DE ZONAS VERDES, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL, CONSTRUCCIÓN DE PARQUE BIOSALUDABLE, CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA, CONSTRUCCIÓN DE CASETA COMUNAL, CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA, CONSTRUCCIÓN DE PARADEROS, CONSTRUCCIÓN DE MOBILIARIO URBANO, CONSTRUCCIÓN DE ARBORIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL, CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR, CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS, CONSTRUCCIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN GAVIONES, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN MAMPOSTERÍA, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN TIERRA ARMADA, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN SUELO REFORZADO, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN SUELO NAILING, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN SUELO ANCLADO, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN SUELO ESTABILIZADO, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN SUELO MEJORADO, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN SUELO TRATADO, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN SUELO ESTABILIZADO CON CAL, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN SUELO ESTABILIZADO CON YESO, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN SUELO ESTABILIZADO CON ASFALTO, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN SUELO ESTABILIZADO CON POLÍMEROS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN SUELO ESTABILIZADO CON FIBRAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN SUELO ESTABILIZADO CON GEOSINTÉTICOS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN SUELO ESTABILIZADO CON GEOMALLAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN SUELO ESTABILIZADO CON GEOCELDAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN SUELO ESTABILIZADO CON GEOTEXTILES, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN SUELO ESTABILIZADO CON GEOCOMPUESTOS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN SUELO ESTABILIZADO CON GEOMEMBRANAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN SUELO ESTABILIZADO CON GEOREDES, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN SUELO ESTABILIZADO CON GEOESPUMAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN SUELO ESTABILIZADO CON GEOPOLÍMEROS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN SUELO ESTABILIZADO CON GEOCOMPUESTOS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN SUELO ESTABILIZADO CON GEOMEMBRANAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN SUELO ESTABILIZADO CON GEOREDES, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN SUELO ESTABILIZADO CON GEOESPUMAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN SUELO ESTABILIZADO CON GEOPOLÍMEROS
MUNICIPIO	PUERTO BERRIO
CONTRATISTA	CONSORCIO PUERTO CLAVER
INTERVENTOR	
ITEM	

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	EJE		ABSCISA		DIMENSIONES				CANTIDAD	LONGITUD	UNIDAD	TOTAL
		INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área (m2)				
SECTOR 2	5 G CAMELLÓN 2SM (DOBLADO CONCRETO)									1,00		UNID	1,00
												SECTOR 2	1,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO PUERTO CLAVER

OBJETO	[illegible]
CONTRATISTA	CONSORCIO PUERTO CLAVER
INTERVENTOR	[illegible]
ITEM	[illegible]

LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	EJE		ABSCISAS		DIMENSIONES				CANTIDAD	VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL
		INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Area (m2)				
SECTOR 1	COSTADO IZQUIERDO			K0+000		0,60	0,30	1,00		1,00	2,64	M3	2,64
	COSTADO IZQUIERDO			K0+020		7,80	0,30	1,00		1,00	2,34	M3	2,34
	COSTADO DERECHO			K0+040		3,41	0,30	1,00		1,00	1,02	M3	1,02
	COSTADO IZQUIERDO			K0+060		10,40	0,30	1,00		1,00	3,12	M3	3,12
	COSTADO DERECHO			K0+080,5		6,60	0,30	1,00		1,00	1,98	M3	1,98
	COSTADO DERECHO			K0+115		2,60	0,30	1,00		1,00	0,69	M3	0,69
	COSTADO DERECHO			K0+120		3,00	0,30	1,00		1,00	0,90	M3	0,90
	COSTADO IZQUIERDO			K0+122		8,00	0,30	1,00		1,00	2,64	M3	2,64
	COSTADO IZQUIERDO			K0+138,5		7,10	0,30	1,00		1,00	2,13	M3	2,13
	COSTADO IZQUIERDO			K0+145,5		6,70	0,30	1,00		1,00	2,01	M3	2,01
	COSTADO DERECHO			K0+154,5		2,60	0,30	1,00		1,00	0,78	M3	0,78
	COSTADO IZQUIERDO			K0+157		6,30	0,30	1,00		1,00	1,89	M3	1,89
	COSTADO DERECHO			K0+158		3,60	0,30	1,00		1,00	1,08	M3	1,08
	COSTADO IZQUIERDO			K0+160		5,60	0,30	1,00		1,00	1,68	M3	1,68
	COSTADO DERECHO			K0+169		1,89	0,30	1,00		1,00	0,48	M3	0,48
	COSTADO IZQUIERDO			K0+171		6,70	0,30	1,00		1,00	2,01	M3	2,01
	COSTADO DERECHO			K0+187,5		2,00	0,30	1,00		1,00	0,54	M3	0,54
	COSTADO DERECHO			K0+198,88		10,50	0,30	1,00		1,00	2,98	M3	3,15
	COSTADO DERECHO			K0+196,15		3,36	0,30	1,00		1,00	0,71	M3	0,71
	COSTADO DERECHO			E0 CARRERA 32 (COSTADO DERECHO)		8,42	0,30	1,00		1,00	2,54	M3	2,54
	COSTADO IZQUIERDO			K0+204		13,20	0,30	1,00		1,00	3,96	M3	3,96
	COSTADO DERECHO			K0+208		3,01	0,30	1,00		1,00	1,08	M3	1,08
	COSTADO DERECHO			K0+232		2,20	0,30	1,00		1,00	0,66	M3	0,66
	COSTADO IZQUIERDO			K0+235,6		5,60	0,30	1,00		1,00	1,74	M3	1,74
	COSTADO DERECHO			K0+238		2,56	0,30	1,00		1,00	0,77	M3	0,77
	COSTADO DERECHO			K0+300		1,20	0,30	1,00		1,00	0,36	M3	0,36
	COSTADO IZQUIERDO			K0+325		5,60	0,30	1,00		1,00	1,68	M3	1,68
	COSTADO DERECHO			K0+328		2,50	0,30	1,00		1,00	0,75	M3	0,75
	COSTADO IZQUIERDO			K0+329		5,70	0,30	1,00		1,00	1,71	M3	1,71

SECTOR 1	COSTADO IZQUIERDO			KD+020.5	5.00	0.30	1.00				1.50	M3	1.50
	COSTADO DERECHO			KD+039	2.30	0.30	1.00			0.69	0.83	M3	0.83
	COSTADO DERECHO			KD+060	2.00	0.30	1.00			3.00	0.60	M3	0.60
	COSTADO IZQUIERDO			KD+081	5.00	0.30	1.00			4.00	1.50	M3	1.50
	COSTADO IZQUIERDO			KD+105	9.60	0.30	1.00			5.00	1.68	M3	1.68
	COSTADO IZQUIERDO			KD+253	5.50	0.30	1.00			6.00	1.65	M3	1.65
	COSTADO IZQUIERDO			KD+259	4.83	0.30	1.00			3.00	1.45	M3	1.45
	COSTADO DERECHO			KD+260	1.93	0.30	1.00			0.69	0.58	M3	0.58
	COSTADO DERECHO			KD+260.2	2.40	0.30	1.00			9.00	0.72	M3	0.72
	COSTADO IZQUIERDO			KD+265.5	5.65	0.30	1.00			1.00	1.70	M3	1.70
	COSTADO DERECHO			KD+240	1.94	0.30	1.00			1.00	0.58	M3	0.58
	COSTADO IZQUIERDO			KD+277.2	5.10	0.30	1.00			1.00	1.53	M3	1.53
	COSTADO IZQUIERDO			KD+277	5.90	0.30	1.00			1.00	1.77	M3	1.77
	COSTADO DERECHO			KD+281.4	1.50	0.30	1.00			1.00	0.45	M3	0.45
	COSTADO DERECHO			KD+287.4	4.00	0.30	1.00			1.00	1.20	M3	1.20
												MAMPARA PEATONAL SECTOR 1		MLM
SECTOR 2	COSTADO DERECHO			KD+010	2.25	0.30	1.00			3.00	0.68	M3	0.68
	COSTADO DERECHO			KD+754	2.60	0.30	1.00			1.00	0.60	M3	0.60
	COSTADO IZQUIERDO			II CCARRERA 28A (COSTADO IZQUIERDO)	8.53	0.30	1.00			1.00	2.56	M3	2.56
	COSTADO DERECHO			KD+787.5	1.80	0.30	1.00			2.00	0.48	M3	1.48
	COSTADO DERECHO			KD+788.5	2.22	0.30	1.00			1.00	0.67	M3	0.67
	COSTADO DERECHO			KD+772	1.60	0.30	1.00			1.00	0.48	M3	0.48
	COSTADO DERECHO			KD+7778	1.80	0.30	1.00			5.00	0.54	M3	0.54
	COSTADO IZQUIERDO			KD+777	8.60	0.30	1.00			1.00	2.58	M3	2.58
	COSTADO DERECHO			KD+775	1.50	0.30	1.00			1.00	0.48	M3	0.48
	COSTADO DERECHO			KD+788.5	2.20	0.30	1.00			1.00	0.66	M3	0.66
	COSTADO IZQUIERDO			KD+794.3	7.47	0.30	1.00			1.00	2.24	M3	2.24
	COSTADO IZQUIERDO			KD+793.5	7.47	0.30	1.00			1.00	2.24	M3	2.24
	COSTADO DERECHO			KD+758	2.60	0.30	1.00			1.00	0.78	M3	0.78
	COSTADO IZQUIERDO			KD+716	2.00	0.30	1.00			1.00	0.60	M3	0.60
	COSTADO IZQUIERDO			KD+758	6.60	0.30	1.00			1.00	1.98	M3	1.98
	COSTADO IZQUIERDO			KD+751	6.60	0.30	1.00			1.00	1.98	M3	1.98
	COSTADO DERECHO			KD+2455	3.18	0.30	1.00			1.00	0.95	M3	0.95

		COSTADO IZQUIERDO			KM-742	6,70	0,30	1,00			2,01	M3	2,01		
		COSTADO IZQUIERDO			KM-735	7,00	0,30	1,00		1,00	2,10	M3	2,10		
		COSTADO IZQUIERDO			KM-730	7,80	0,30	1,00		1,00	2,34	M3	2,34		
		COSTADO DERECHO			KM-724,5	3,30	0,30	1,00		1,00	0,99	M3	0,99		
		COSTADO IZQUIERDO			KM-724,5	6,60	0,30	1,00		1,00	1,98	M3	1,98		
		COSTADO DERECHO			KM-724	2,90	0,30	1,00		1,00	0,87	M3	0,87		
		COSTADO DERECHO			KM-718	2,40	0,30	1,00		1,00	0,72	M3	0,72		
		COSTADO IZQUIERDO			KM-718	7,50	0,30	1,00		1,00	2,25	M3	2,25		
		COSTADO IZQUIERDO			KM-708	7,60	0,30	1,00		1,00	2,28	M3	2,28		
		COSTADO DERECHO			KM-702,2	2,40	0,30	1,00		1,00	0,72	M3	0,72		
		COSTADO DERECHO			KM-702	2,40	0,30	1,00		1,00	0,72	M3	0,72		
		COSTADO IZQUIERDO			KM-698	8,00	0,30	1,00		1,00	2,40	M3	2,40		
		COSTADO IZQUIERDO			KM-695	7,60	0,30	1,00		1,00	2,85	M3	2,28		
		COSTADO DERECHO			KM-691,8	1,80	0,30	1,00		1,00	0,54	M3	0,54		
		COSTADO IZQUIERDO			KM-689	8,00	0,30	1,00		1,00	2,40	M3	2,40		
		COSTADO IZQUIERDO			KM-682,5	5,40	0,30	1,00		1,00	1,62	M3	1,62		
		COSTADO DERECHO			KM-678	1,60	0,30	1,00		1,00	0,48	M3	0,48		
		COSTADO IZQUIERDO			KM-675,5	7,70	0,30	1,00		1,00	2,31	M3	2,31		
		COSTADO DERECHO			KM-674,5	2,20	0,30	1,00		1,00	0,66	M3	0,66		
		COSTADO IZQUIERDO			KM-667,1	7,50	0,30	1,00		1,00	2,25	M3	2,25		
		COSTADO IZQUIERDO			KM-662	7,50	0,30	1,00		1,00	2,25	M3	2,25		
		COSTADO DERECHO			KM-661,5	2,80	0,30	1,00		1,00	0,84	M3	0,84		
		COSTADO DERECHO			KM-660	2,80	0,30	1,00		1,00	0,84	M3	0,84		
		COSTADO IZQUIERDO			KM-654	6,70	0,30	1,00		1,00	2,01	M3	2,01		
		COSTADO DERECHO			KM-650	2,10	0,30	1,00		1,00	0,63	M3	0,63		
		COSTADO IZQUIERDO			KM-648	6,50	0,30	1,00		1,00	1,95	M3	1,95		
		COSTADO IZQUIERDO			KM-639,5	5,60	0,30	1,00		1,00	1,68	M3	1,68		
		COSTADO DERECHO			KM-635,5	2,80	0,30	1,00		1,00	0,84	M3	0,84		
		COSTADO DERECHO			KM-635,2	2,80	0,30	1,00		1,00	0,84	M3	0,84		
		COSTADO IZQUIERDO			KM-628	6,70	0,30	1,00		1,00	2,01	M3	2,01		
		COSTADO IZQUIERDO			KM-621,6	6,75	0,30	1,00		2,00	2,03	M3	2,03		
		COSTADO IZQUIERDO			KM-608	8,00	0,30	1,00		1,00	2,40	M3	2,40		
		COSTADO DERECHO			KM-600	2,40	0,30	1,00		1,00	1,02	M3	1,02		
		COSTADO DERECHO			KM-598,8	2,20	0,30	1,00		1,00	0,66	M3	0,66		

SECTOR2

		COSTADO DERECHO			KM-626,5	2,20	0,30	1,00				0,66	M3	0,66	
		COSTADO IZQUIERDO			KM-626,1	7,60	0,30	1,00		1,00	2,28	M3	2,28		
		COSTADO IZQUIERDO			KM-626	7,60	0,30	1,00		1,00	2,28	M3	2,28		
		COSTADO IZQUIERDO			KM-586,4	6,50	0,30	1,00		1,00	1,95	M3	1,95		
		COSTADO IZQUIERDO			KM-586	6,50	0,30	1,00		1,00	1,95	M3	1,95		
		COSTADO DERECHO			KM-582,4	3,90	0,30	1,00		1,00	1,17	M3	1,17		
		COSTADO IZQUIERDO			KM-578	7,70	0,30	1,00		1,00	2,31	M3	2,31		
		COSTADO DERECHO			KM-574,1	2,70	0,30	1,00		1,00	0,81	M3	0,81		
		COSTADO DERECHO			KM-571,1	3,60	0,30	1,00		1,00	1,08	M3	1,08		
		COSTADO IZQUIERDO			KM-571	7,30	0,30	1,00		1,00	2,19	M3	2,19		
		COSTADO DERECHO			KM-568,7	2,80	0,30	1,00		1,00	0,84	M3	0,84		
		COSTADO IZQUIERDO			KM-568	7,60	0,30	1,00		1,00	2,28	M3	2,28		
		COSTADO DERECHO			KM-561	3,00	0,30	1,00		1,00	0,90	M3	0,90		
		COSTADO IZQUIERDO			KM-559	7,20	0,30	1,00		1,00	2,16	M3	2,16		
		COSTADO DERECHO			KM-551	2,60	0,30	1,00		1,00	0,87	M3	0,87		
		COSTADO DERECHO			KM-548,2	7,90	0,30	1,00		1,00	2,37	M3	2,37		
		COSTADO DERECHO			KM-541,1	2,50	0,30	1,00		1,00	0,75	M3	0,75		
	SECTOR 2	COSTADO DERECHO			KM-541	2,50	0,30	1,00		1,00	0,75	M3	0,75		
		COSTADO IZQUIERDO			KM-534,1	7,80	0,30	1,00		1,00	2,34	M3	2,34		
		COSTADO IZQUIERDO			KM-534	7,40	0,30	1,00		1,00	2,22	M3	2,22		
		COSTADO DERECHO			KM-527,4	3,00	0,30	1,00		1,00	0,90	M3	0,90		
		COSTADO DERECHO			KM-527,2	2,60	0,30	1,00		1,00	0,78	M3	0,78		
		COSTADO IZQUIERDO			KM-526,5	6,60	0,30	1,00		1,00	1,98	M3	1,98		
		COSTADO IZQUIERDO			KM-522	6,70	0,30	1,00		1,00	2,01	M3	2,01		
		COSTADO DERECHO			KM-518	2,80	0,30	1,00		1,00	0,84	M3	0,84		
		COSTADO DERECHO			KM-505,5	2,70	0,30	1,00		1,00	0,81	M3	0,81		
		COSTADO IZQUIERDO			KM-502,1	6,50	0,30	1,00		1,00	1,95	M3	1,95		
		COSTADO IZQUIERDO			KM-502	6,50	0,30	1,00		1,00	1,95	M3	1,95		
		COSTADO IZQUIERDO			KM-495,1	6,20	0,30	1,00		1,00	1,86	M3	1,86		
		COSTADO DERECHO			KM-492,3	2,85	0,30	1,00		1,00	0,86	M3	0,86		
		COSTADO DERECHO			KM-492,2	2,80	0,30	1,00		1,00	0,84	M3	0,84		
		COSTADO IZQUIERDO			KM-485	6,60	0,30	1,00		1,00	1,98	M3	1,98		
		COSTADO DERECHO			KM-473,6	3,00	0,30	1,00		1,00	0,90	M3	0,90		
		COSTADO IZQUIERDO			KM-469,1	7,00	0,30	1,00		1,00	2,10	M3	2,10		

		COSTADO IZQUIERDO			KM+460	1.00	0,30	1.00		1,00	2,10	M3	2,10
		COSTADO DERECHO			KM+464	2.60	0.30	1,00		1.00	0.78	M3	0,78
		COSTADO IZQUIERDO			KM+450	3.50	0.30	1,00		1,00	1,05	M3	1,05
		COSTADO DERECHO			KM+452,8	3,00	0.30	1,00		1.00	0.90	M3	0,90
		COSTADO IZQUIERDO			KM+450	5.10	0,30	1,00		1.00	1.53	M3	1,53
		COSTADO DERECHO			KM+440	3.10	0.30	1.00		1.00	0.93	M3	0,93
		COSTADO IZQUIERDO			KM+440,2	5,75	0.30	1.00		1,00	1,73	M3	1,73
		COSTADO IZQUIERDO			KM+440,1	5,73	0.30	1,00		1.00	1,72	M3	1,72
		COSTADO DERECHO			KM+440	2,70	0.30	1,00		1.00	0,81	M3	0,81
		COSTADO IZQUIERDO			KM+431,8	5,80	0.30	1,00		1,00	1,74	M3	1,74
		COSTADO IZQUIERDO			KM+431,2	5.80	0.30	1,00		1,00	1,74	M3	1,74
		COSTADO DERECHO			KM+425,5	3,70	0,30	1,00		1,00	1,11	M3	1,11
	SECTOR 2	COSTADO DERECHO			KM+420,4	3,70	0.30	1.00		1,00	1,11	M3	1,11
		COSTADO IZQUIERDO			KM+340,9	7,60	0,30	1,00		1,00	2,28	M3	2,28
		COSTADO IZQUIERDO			KM+340,8	7,00	0,30	1,00		1,00	2,10	M3	2,10
		COSTADO IZQUIERDO			KM+338,6	7,00	0,30	1,00		1,00	2,10	M3	2,10
		COSTADO DERECHO			KM+332,9	3,30	0,30	1,00		1,00	0,99	M3	0,99
		COSTADO DERECHO			KM+332,8	3,30	0,30	1,00		1,00	0,99	M3	0,99
		COSTADO IZQUIERDO			KM+324,1	6,70	0,30	1,00		1,00	2,01	M3	2,01
		COSTADO DERECHO			KM+324,0	3,30	0,30	1,00		1,00	0,99	M3	0,99
		COSTADO IZQUIERDO			KM+315,6	6,10	0,30	1,00		1,00	1,83	M3	1,83
		COSTADO DERECHO			KM+312,6	2,30	0,30	1,00		1,00	0,69	M3	0,69
		COSTADO DERECHO			KM+302,3	3,15	0,30	1,00		1,00	0,95	M3	0,95
		COSTADO IZQUIERDO			KM+301,8	5,70	0,30	1,00		1,00	1,71	M3	1,71
		COSTADO IZQUIERDO			KM+301,0	5,10	0,30	1,00		1,00	1,77	M3	1,77

Elaboró:

Revisó:

Fecha:

WILBER FERNEY MUÑOZ MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSULTORIA DE OBRA

JORGE ANDRES RODRIGUEZ
INGENIERO CIVIL
CONSULTORIA DE MEDIO AMBIENTE

SUPERVISOR SOBRE
CONTRATANTE

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO PUERTO CLAVER

OBJETO	[illegible]
CONTRATO No.	[illegible]
CONTRATISTA	[illegible]
INTERVENTOR	[illegible]
ITEM	[illegible]

UNIDAD: M2

LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	EJE		ABSCISA		DIMENSIONES				CANTIDAD	VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL
		INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área (m2)				
SECTOR 3	CUNETA (COSTADO IZQUIERDO)	K0+805,30	K0+812						6,65	1,00		M2	6,65
	CUNETA (COSTADO DERECHO)	K0+805,60	K0+812						6,35	1,00		M2	6,35
												SECTOR 3	13,00
												Cuenta de control	13,00

Elaboró:

Revisó:

Vobo.

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
