**CONTRATO DE (OBRA/CONSULTORÍA) No. CLOPIH221 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y LA FIRM V&M INGENIERIA SAS**

**INFORME (MENSUAL) N° 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | | **ENTIDAD** | INDERHUILA |
| **1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO** | | | |
| **CONTRATO No.** | CLOPIH221 DE 2024 | | |
| **OBJETO** | "CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA" | **PERIODO DEL INFORME** | Entre 12 de noviembre al 30 De noviembre de 2024 |
| **CONTRATISTA** | **V&M INGENIERIA SAS** | **NIT** | .900.062.688-7 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO | **C.C** | 7.713.933 |

| | |
|---|---|
| **FECHA SUSCRIPCIÓN:** | |
| **FECHA DE INICIO:** | 12 DE NOVIMEBRE DE 2024 |
| **PLAZO INICIAL** | TRES (03) MESES, contados a partir del acta de inicio |
| **PLAZO ADICIONAL (No.1):** | N/A |
| **PLAZO TOTAL** | TRES (03) MESES |
| **VALOR INICIAL** | MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($1.453.038.929,00) MCTE |
| **VALOR ADICIONAL** | N/A |
| **VALOR TOTAL** | MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($1.453.038.929,00) MCTE |
| **INTERVENTOR** | CONSTRUMAC INGENIERIA SAS<br>NIT: 900.116.571-7<br>R/L: DANIELA CARRILLO TAVERA |

## 2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA, ESPECIFICAMENTE EN EL KM 3 VIA MUNICIPIO DE GUADALUPE AL MUNICIPIO DE ALTAMIRA.




## 3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Consiste en la construcción de cancha sintética en el municipio de Guadalupe, Huila. El proyecto contempla la construcción de placa e instalación de césped sintético e instalación de porterías, con su cerramiento perimetral, sistema de drenaje e iluminación del espacio deportivo.

## 4. HISTORIA CRONOLÓGICA DEL PROYECTO – ACTAS SUBSCRITAS E INFORME DE ACTAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

**ACTA DE INICIO:** 12 de noviembre de 2024

## 5. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

| | |
|---|---|
| **ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS** | **REVISIÓN DE DISEÑOS** |
| **ACTIVIDADES OPERATIVAS** | **LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, INCLUYE TPOPOGRAFIA E IMPLANTACIÓN DEL DISEÑO IN SITU (DEMARCIÓN DE COMPONENTES Y EJES EN SITIO)**<br><br>**DESCAPOTE Y LIMPIEZA (RETIRO DE MATERIAL BIOLOGICO- CAPA VEGETAL)**<br><br>**INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA** |

## 6. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

Las condiciones climáticas durante el periodo de 12 de noviembre al 30 de noviembre de 2024, fueron condiciones soleadas en su mayoría con incidencias de días nublados y lluvias parciales.

## 7. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo de 12 de noviembre al 30 de noviembre de 2024, no se realizaron ensayos de laboratorio.

## 8. CONTROL DE ANTICIPO

Durante el periodo de 12 de noviembre al 30 de noviembre de 2024, no se ha radicado el anticipo de obra

## 9. RELACION DE PERSONAL

| PROFESIONAL | CARGO |
|---|---|
| YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO | REPRESENTANTE LEGAL |
| YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO | DIRECTOR DE OBRA |
| ADRIANA LISETH MAYORCA PERDOMO | RESIDENTE |
| OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO | PROFESIONAL SST |

## 10. RELACIÓN DE PAGOS

| **TIPO DE PAGO** (Acta No./Anticipo) | **No. COMPROBANTE** | **FECHA** |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

## 11. RELACIÓN DE PAGOS DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

| PERSONAL | PENSIÓN | SALUD | ARL | CCF | PARAFISCALES |
|---|---|---|---|---|---|
| YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO | $ 208.000 | $ 52.000 | $ 90.500 | $ 0 | $ 0 |
| ADRIANA LISETH MAYORCA PERDOMO | $ 256.000 | $ 200.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO | $ 208.000 | $ 162.000 | $ 6800 | $ 0 | $ 0 |

## 12. PÓLIZAS DE GARANTÍA

**POLIZA DE CUMPLIMIENTO**

| ASEGURADORA | No. | ENDOSO | FECHA DE EMISIÓN (D/M/A): | AMPARO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DESDE (D/M/A): | HASTA (D/M/A): |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A | 61-44-10155753 | ANEXO No. 0 | 27/09/2024 | Cumplimiento del contrato | 27/09/2024 | 27/06/2025 |
| | | | | Buen Manejo y correcta inversión del anticipo | 27/09/2024 | 27/06/2025 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 27/09/2024 | 27/12/2027 |
| | | | | Estabilidad y Calidad de Obras | 5 AÑOS | |
| **PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL** | | | | | | |
| **ASEGURADORA** | **No.** | **ENDOSO** | **FECHA DE EMISIÓN (D/M/A):** | **VIGENCIA** | | |
| | | | | **DESDE (D/M/A):** | **HASTA (D/M/A):** | |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A | 61-40-101020276 | ANEXO No. 0 | 27/09/2024 | 27/09/2024 | 27/12/2024 | |

**13. PLANOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO** (Describir el contenido del plano)

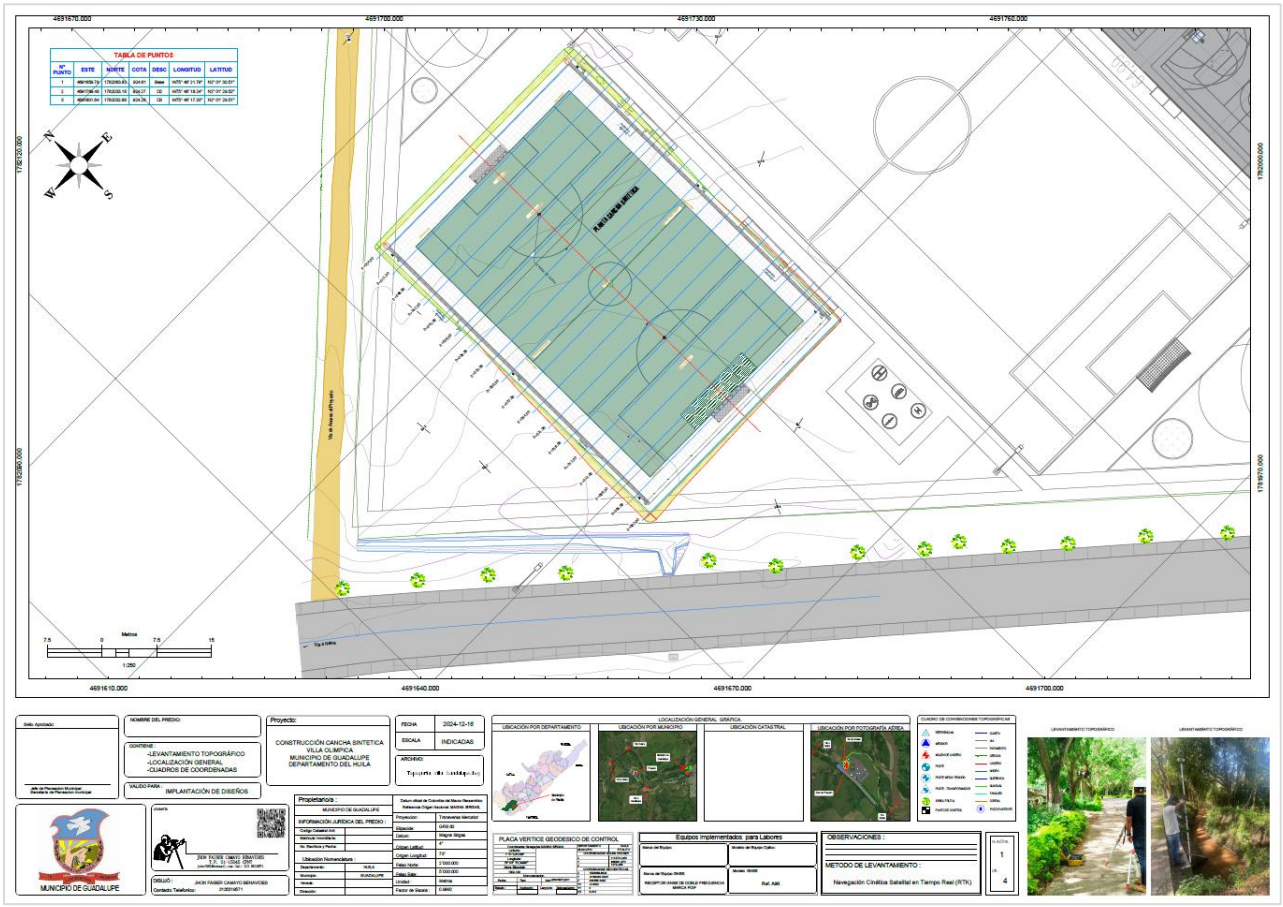



***Ilustración No. 1.*** Plano topográfico de levantamiento realizado

| 14. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UND** | **CANT** | **PRECIO UNITARIO** | **VALOR TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | **% EJECUCIÓN** |
| **1** | **ACTIVIDADES PRELIMINARES** | | | | | | | |
| 1.1 | Localización y replanteo manual | M2 | 1924 | $ 2,226 | $ 4,282,824 | 1924 | $ 4,282,824 | 0.368 % |
| 1.2 | Descapote e=0,20m a máquina incluye retiro material | M2 | 1924 | $ 4,770 | $ 9,177,480 | 0.00 | $ ,000 | 0 % |
| | **SUB-TOTAL CAPITULO** | | | | **$ 13,460,304.00** | | **$ 4.282.824,00** | **0.368%** |
| **2** | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | | | | | | | |
| 2.1 | Excavación manual incluye retiro | M3 | 119.94 | $ 31,545 | $ 3,783,507 | 0.00 | $ 0,00 | 0 % |
| 2.2 | Excavación mecánica incluye retiro 1 km | M3 | 384.8 | $ 19,793 | $ 7,616,346 | 0.00 | $ 0,00 | 0 % |
| 2.3 | Rellenos con recebo compactado mecánicamente | M3 | 384.8 | $ 190,829 | $ 73,430,999 | 0.00 | $ 0,00 | 0 % |
| | **SUB-TOTAL CAPITULO** | | | | **$ 84,830,852.00** | | **$ 0,00** | **0 %** |
| **3** | **RED AGUAS LLUVIAS** | | | | | 0.00 | $ 0,00 | 0 % |
| 3.1 | Construcción de cuneta perimetral en concreto 3000 PSI; Dimensiones: 40 cm de ancho y altura variable. Incluye rejilla prefabricada en poliuretano. | ML | 104 | $ 137,428 | $ 14,292,512 | 0.00 | $ 0,00 | 0 % |
| 3.2 | Caja inspección 1,0x 1,0 m medida interna en concreto 3000 psi para empalme sistema de drenaje, incluye tapa con marco y cañuela, altura variable | UND | 4.0 | $ 657,029 | $ 2,628,116 | 0.00 | $ 0,00 | 0 % |
| 3.3 | Red de aguas lluvias suministro e instalación de tubería PVC Ø 8 Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama con arena 15 cm y relleno material de la excavación a zanjón | ML | 30 | $ 79,488 | $ 2,384,640 | 0.00 | $ 0,00 | 0 % |
| 3.4 | Construcción de filtros laterales externos en un ancho de 0.40 m, con altura variable menor a 0.50 m, recubrimiento en geotextil no tejido NT-1600, con gravilla común o triturado de 1 1/2 a 4 + Tubería PVC drenajes de 6 | ML | 178 | $ 99,727 | $ 17,751,406 | 0.00 | $ 0,00 | 0 % |
| 3.5 | Caja inspección 1,2x 1,2 m medida interna en concreto 3000 psi para empalme sistema | UND | 2.0 | $ 713,327 | $ 1,426,654 | 0.00 | $ 0,00 | 0 % |

| 14. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UND** | **CANT** | **PRECIO UNITARIO** | **VALOR TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | **% EJECUCIÓN** |
| | de drenaje, incluye tapa con marco y cañuela, altura variable | | | | | | | |
| | **SUB-TOTAL CAPITULO** | | | | **$ 38,483,328.00** | | **$ 0,00** | **0 %** |
| **4** | **PLACA CANCHA** | | | | | 0.00 | $ 0,00 | 0 % |
| 4.1 | Placa de piso en concreto 3000 psi, e =0,07m dilatada, junta machimbrada incluye malla electrosoldada de 5mm. | M2 | 1750 | $ 87,325 | $ 152,818,750 | 0.00 | $ 0,00 | 0 % |
| 4.2 | Marco para microfutbol futbol 8 6mX2m, en tubo galvanizado tipo pesado de 4, según especificaciones técnicas, incluye anclaje, malla e instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | UND | 2.0 | $ 2,344,832 | $ 4,689,664 | 0.00 | $ 0,00 | 0 % |
| 4.3 | Suministro e instalación de césped monofilamentado rafia de 50mm de altura, con protección de rayos UV, con 1300 gramos por metro cuadrado de rafia, de 13200 dtx, base: backing doble capa, demarcación de color blanco con césped de blanco (...) | M2 | 1750 | $ 181,076 | $ 316,883,000 | 0.00 | $ 0,00 | 0 % |
| 4.4 | Suministro e instalación de almohadilla de choque shock pad 20 mm | M2 | 1750 | $ 146,659 | $ 256,653,250 | 0.00 | $ 0,00 | 0 % |
| 4.5 | Suministro e instalación de bordillo prefabricado 20X50X50 | ML | 186 | $ 55,658 | $ 10,352,388 | 0.00 | $ 0,00 | 0 % |
| | **SUB-TOTAL CAPITULO** | | | | **$ 741,397,052.00** | | **$ 0,00** | **0 %** |
| **5** | **CERRAMIENTO** | | | | | 0.00 | $ 0,00 | 0 % |
| 5.1 | Concreto ciclópeo 2500 psi (60% concreto-40% piedra media zonga) para cimentación cerramiento | M3 | 16.74 | $ 376,028 | $ 6,294,709 | 0.00 | $ 0,00 | 0 % |
| 5.2 | Concreto 3000 psi viga de cimentación cerramiento 0,2x0,2m | M3 | 37.4 | $ 659,191 | $ 24,653,743 | 0.00 | $ 0,00 | 0 % |
| 5.3 | Muro cerramiento en ladrillo semiprensado a la vista | M2 | 112.5 | $ 105,765 | $ 11,898,563 | 0.00 | $ 0,00 | 0 % |
| 5.4 | Acero de refuerzo 37000 psi incluye figurado e instalación | KG | 1057.11 | $ 6,647 | $ 7,026,597 | 0.00 | $ 0,00 | 0 % |
| 5.5 | Tubería galvanizada 2 cal 2mm incluye anclajes, tapa | ML | 220.4 | $ 44,432 | $ 9,792,813 | 0.00 | $ 0,00 | 0 % |

| 14. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UND** | **CANT** | **PRECIO UNITARIO** | **VALOR TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | **% EJECUCIÓN** |
| 5.6 | Módulos cerramiento 2,5x2,5 m en ángulo 1 1/2x1/8 con varilla de 5/8 lisa cada 14 cm, diagonales en ángulo 1 1/2 x 1/8 y lamina cal 16 10X10 cm de refuerzo en la esquinas (lado norte y sur) h=2,5m | M2 | 200 | $ 109,070 | $ 21,814,000 | 0.00 | $ 0,00 | 0 % |
| 5.7 | Módulos cerramiento 2,5x2,5 m en ángulo 1 1/2x1/8 con malla eslabonada cal 10 hueco 2 1/4x2 1/4, diagonales en ángulo 1 1/2 x1/8 y lamina cal 16 10X10cm de refuerzo en la esquinas (lado oriente y occidente) h=2,5m | M2 | 268.75 | $ 54,091 | $ 14,536,956 | 0.00 | $ 0,00 | 0 % |
| 5.8 | Suministro e instalación de puerta en tubería 2 galvanizada cal 2mm con malla eslabonada cal 10 y con portacandado, incluye pasador porta candado. | UND | 1.0 | $ 802,805 | $ 802,805 | 0.00 | $ 0,00 | 0 % |
| 5.9 | Concreto 3000 psi andenes perimetrales e=8cm, incluye malla electrosoldada y formaleta | M2 | 148.8 | $ 80,868 | $ 12,033,158 | 0.00 | $ 0,00 | 0 % |
| 5.10 | Suministro e instalación de malla de cerramiento en nylon 100% alta densidad con protección UV, ojo 13x13, calibre #4 incluye; guaya, tensores y tubo de 2 | M2 | 3031 | $ 37,545 | $ 113,798,895 | 0.00 | $ 0,00 | 0 % |
| 5.11 | Pie de amigo en tubería galvanizada 2 cal 2mm incluye anclajes, concreto 3000 psi 50x50x60 costados norte y sur | UND | 32.0 | $ 263,483 | $ 8,431,456 | 0.00 | $ 0,00 | 0 % |
| | **SUB-TOTAL CAPITULO** | | | | **$ 231,083,695.00** | | **$ 0,00** | **0 %** |
| **6** | **ILUMINACIÓN** | | | | | 0.00 | $ 0,00 | 0 % |
| 6.1 | Suministro, montaje y conexión de proyector led 300 W SYLFLOOD, temperatura de color 5000K, vida útil 100000h, flujo luminoso 39000 lm incluye soporte | UND | 6.0 | $ 1,718,814 | $ 10,312,884 | 0.00 | $ 0,00 | 0 % |
| 6.2 | Suministro e instalación de tablero de 6 circuitos con puerta incluye 3 breaker de 30 AMP con normativa RETIE | UND | 1.0 | $ 511,864 | $ 511,864 | 0.00 | $ 0,00 | 0 % |
| 6.3 | Suministro e instalación de acometida en CABLE CU AISL THHN/THWN - 2x8F+1x10T en tubería PVC 1 | ML | 50 | $ 45,333 | $ 2,266,650 | 0.00 | $ 0,00 | 0 % |

| 14. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UND** | **CANT** | **PRECIO UNITARIO** | **VALOR TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | **% EJECUCIÓN** |
| 6.4 | Salida Parcial Eléctrica (2 THHN No.10 + 1 THHN No.12) | ML | 50 | $ 42,110 | $ 2,105,500 | 0.00 | $ 0,00 | 0 % |
| 6.5 | Suministro e instalación de postes de concreto pretensado L= 12 m 750 kg incluye transporte e izada | UND | 6.0 | $ 2,884,636 | $ 17,307,816 | 0.00 | $ 0,00 | 0 % |
| 6.6 | Puesta a tierra en varilla coper weld cobre de 1/2 incluye conectores, cableado, soldadura y mejoramiento de tierra | UND | 1.0 | $ 513,186 | $ 513,186 | 0.00 | $ 0,00 | 0 % |
| 6.7 | Murete para tablero de control en muro con bloque # 5 | UND | 1.0 | $ 377,230 | $ 377,230 | 0.00 | $ 0,00 | 0 % |
| 6.8 | Construcción de cajas de inspección tipo alumbrado en concreto de 30x30 | UND | 6.0 | $ 266,806 | $ 1,600,836 | 0.00 | $ 0,00 | 0 % |
| 6.9 | Cajas de inspección de 60X60 CM (medida interior) | UND | 8.0 | $ 336,951 | $ 2,695,608 | 0.00 | $ 0,00 | 0 % |
| 6.10 | Suministro e instalación de sistema de apantallamiento | UND | 1.0 | $ 15,484,338 | $ 15,484,338 | 0.00 | $ 0,00 | 0 % |
| | **SUB-TOTAL CAPITULO** | | | | **$ 53,175,912.00** | | **$ 0,00** | **0 %** |
| | **SUB-TOTAL, OBRAS** | | | | **$ 1,162,431,143.00** | | **$ 4,282,824.00** | |
| | **ADMINISTRACIÓN** | | | | $ 232,486,229 | | $ 856,564.80 | |
| | **IMPREVISTO** | | | | $ 11,624,311 | | $ 42,828.24 | |
| | **UTILIDAD** | | | | $ 46,497,246 | | $ 171,312.96 | |
| | **VALOR TOTAL** | | | | **$ 1,453,038,929** | | **$ 5,353,530.00** | |
| **% AVANCE DE OBRA** | | | | | | | | **0.368 %** |

***R.L. YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO***

***CONTRATISTA OBRA***


***R.L.* DANIELA CARRILLO TAVERA**

***CONTRATISTA INTERVENTOR***

## 15. REGISTRO FOTOGRÁFICO

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Socialización de proyecto de obra<br>19/11/2024</td><td>Conformación de veeduría ciudadana<br>19/11/2024</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Visita inicial<br>20/11/2024</td><td>Suministro e información de valla informativa<br>20/11/2024</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Inicio de actividades de localización y replanteo<br>22/11/2024</td><td>Actividades de localización y replanteo<br>(levantamiento topográfico)<br>22/11/2024</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
|  |  |
| *Actividades de localización y replanteo (levantamiento topográfico) 22/11/2024* | *Actividades de localización y replanteo (levantamiento topográfico) 22/11/2024* |
|  |  |
| *Actividades de localización y replanteo (levantamiento topográfico) 22/11/2024* | *Actividades de localización y replanteo (levantamiento topográfico) 22/11/2024* |
|  |  |
| *Actividades de localización y replanteo (levantamiento topográfico) 22/11/2024* | *Actividades de localización y replanteo (levantamiento topográfico) 22/11/2024* |
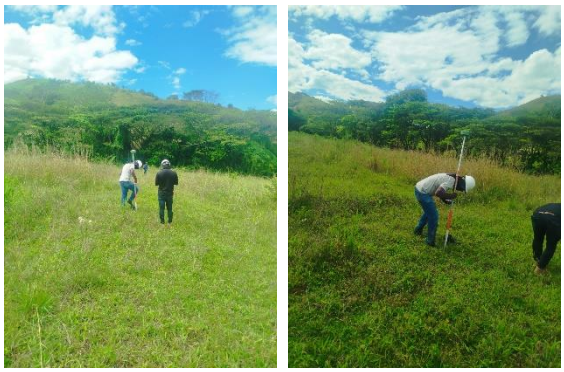
| | |
|---|---|
|  |  |
| *Actividades de localización y replanteo (levantamiento topográfico) 23/11/2024* | *Actividades de localización y replanteo (levantamiento topográfico) 23/11/2024* |
|  |  |
| *Actividades de localización y replanteo (levantamiento topográfico) 23/11/2024* | *Actividades de localización y replanteo (levantamiento topográfico) 23/11/2024* |
|  |  |
| *Actividades de localización y replanteo (levantamiento topográfico) 23/11/2024* | *Actividades de localización y replanteo (levantamiento topográfico) 23/11/2024* |

## 16. ANEXOS

- Se anexa Bitácora de obra a corte de 30 noviembre de 2024.
- Se anexa certificado de calidad (equipo de topografía).
- Se anexan planillas de seguridad social correspondientes al mes de noviembre de 2024.

| | | |
|---|---|---|
| ING. YERSON FERNANDO CAMACHO LADIÑO | (30/11/2024) | ING. DANIELA CARRILLO TAVERA |
| **FIRMA CONTRATISTA** | **FECHA DE ENTREGA** | **VoBo INTERVENTOR** |

# ANEXOS:

# BITACORA DE OBRA:

# CERTIFICADOS DE CALIDAD

# CERTIFICADO EQUIPO TOPOGRAFICO:

**N°. Certificado:** 1884
**Fecha:** 6/11/2024

## CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

**Servicio Tecnico NOVA S.A.S**
**NIT. 901163978-5**

| DATOS DEL CLIENTE | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre | **JHON FAIBER CAMAYO BENAVIDES** | Nit/ C.C | **1.083.910.153** |
| Dirección | **CRA 2 N° 7 - 69 PITALITO** | Ciudad | **HUILA** |
| Telefono | **3135519571** | Fecha de Expiración | **5/05/2025** |

| DATOS DEL EQUIPO | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo | **ESTACION TOTAL** | Marca | **GOWIN** |
| Modelo | **TKS-402N** | N° Serial | **SY5898** |
| Aumentos | **30X** | Precisión | **2''** |

Basado en los procedimientos según norma ISO 17123-1-2-3-4, estipulada por el fabricante a continuación se describen los ajustes realizados al equipo

**Inspección Mecánica**

| Partes | A | R | M | CP | N/A |
|---|---|---|---|---|---|
| Base Nivelante | | | X | | |
| Frenos - paso lento Hz y Vt | | | | | X |
| Teclados y contactos | | | | | X |
| Eje Hz y Vt | | | | | X |
| Sistema de enfoque | | | | | X |
| Verticalidad | | | | | X |
| Niveles tubulares y esférico | X | | | | |

**Inspección Electrónica**

| Partes | A | R | M | CP | N/A |
|---|---|---|---|---|---|
| Distanciómetro | | | | | X |
| Nonios Hz y Vt | | | | | X |
| Puntero laser | | | | | X |
| Compensador Electrónico | | | | | X |
| Plomada Láser / óptica | X | | | | |
| Sensores Hz y Vt | | | | | X |

(**A**) Ajuste (**R** ) Reparación (**M**) Mantenimiento (**CP**) Cambio de piezas (**N/A**) No aplica

**AJUSTE ANGULAR Y DISTANCIA**

| **Patrón** | Fase 1 | Fase 2 | Residuo | Tolerancia | Cierre | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | 90,0000 | 270,0010 | 0,0010 | (+ / -) 0.0002 | 270,0000 | 0,0000 |
| **Horizontal** | 0,0000 | 180,0004 | 0,0004 | (+ / -) 0.0002 | 180,0000 | 0,0000 |
| **Distancia** | 5,5290 | 5,5290 | 0.018 | (+ / -) 0.001 | 5,5290 | 0,0000 |

Equipo verificado, ajustado y patronado bajo las normas ISO 17123 de acuerdo a los procedimientos dados por el fabricante

**Observaciones:**

El instrumento se encuentra en buen funcionamiento, se recomienda realizar chequeos de campo.
El cliente es responsable del buen transporte del equipo, ya que las vibraciones y manipulación no adecuada pueden desajustarlo

Nova NIT. 901163978

HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
*Técnico Laboratorio.*

| CERTIFICADO DEL COLIMADOR | Servicio Tecnico NOVA S.A.S<br>NIT. 901163978-5 |
|---|---|

| SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INSPECCION:** | **25/07/2024** | | |
| **PROXIMA INSPECCION:** | **24/01/2025** | | |
| **EMPRESA:** | SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S | **NIT :** | 901163978-5 |
| **DIRECCION :** | CL 45E # 76-24 - VELODROMO | **CIUDAD:** | MEDELLIN-ANTIOQUIA |
| **TELEFONO :** | 5017426 | **PROXIMO CONTROL** | 24/01/2025 |
| **INSTRUMENTO :** | COLIMADOR | **MARCA** | SOUTH |
| **MODELO :** | W420-3 | **SERIE** | S/N |
| **ANGULO DE GRADUACION** | 10"2mm | **GRADUACION MINIMA** | 20" |

| inspección sistemas mecanicos y óptimos | ajuste | lubricación | reparación | repuesto | limpieza | función aceptable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **niveles tubulares y esféricos** | x | | | | | |
| **tubo superior** | x | | | | | |
| **tubo intermedio** | x | | | | | |
| **tubo inferior** | x | | | | | |

| SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S | | | |
|---|---|---|---|
| **inspeccion de cierres angulares de cada eje** | **lectura inicial** | **errores encontrados** | **lecturas después de ajuste** |
| **Angulo vertical tubo superior** | 60°00´12" | 00°00´12" | 00°00´00" |
| **Angulo vertical tubo intermedio** | 90°00´15" | 00°00´15" | 00°00´00" |
| **Angulo vertical tubo inferior** | 119°59´50" | 00°00´10" | 00°00´00" |
| **Angulo horizontal tubo superior** | 00°00´07" | 00°00´07" | 00°00´00" |
| **Angulo horizontal tubo intermedio** | 00°00´00" | 00°00´00" | 00°00´00" |
| **Angulo horizontal tubo inferior** | 00°00´12" | 00°00´12" | 00°00´00" |

| CERTIFICADO EQUIPOS PATRONES | Servicio Tecnico NOVA S.A.S<br>NIT. 901163978-5 |
|---|---|

**SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO. CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INSPECCION:** | | **25/07/2024** | |
| **PROXIMA INSPECCION:** | | **24/01/2025** | |
| **EMPRESA:** | SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S | **NIT :** | 901163978-5 |
| **DIRECCION :** | CL 45E # 76-24 - VELODROMO | **CIUDAD:** | MEDELLIN- |
| **TELEFONO :** | 5017426 | **PROXIMO CONTROL** | 24/01/2025 |
| **INSTRUMENTO :** | ESSTACION TOTAL | **MARCA** | TOPCON |
| **MODELO :** | GPT7501L | **SERIE** | S/N |
| **ANGULO DE GRADUACION** | 1" | **GRADUACION MINIMA** | (2mm+2ppm*D)m.s.e |

| inspección opto mecanica | corrección | ajuste | lubricacion | reparacion | repuestos | limpieza | función aceptable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base nivelante | | | x | | | | |
| Niveles tubulares y esféricos | | x | | | | | x |
| Verticalidad | | | | | | | x |
| óptica general (lentes y prisma) | | | | | | | x |
| Eje vertical y horizontal | | | | | | | x |
| Frenos y movimientos tangenciales | | | | | | | x |

| Inspección sistema de medida angular y verificacion según prueba de campo procedimiento N. | corrección | ajuste | lubricación | reparación | repuestos | limpieza | función aceptable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compensador automático | | | | | | | |
| compensador electrónico | | x | | | | | |
| colimación vertical | | x | | | | | |
| colimación horizontal | | x | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Posición 1 ( vertical) | 90° | Grados | 00´ | Minutos | 00" |
| Posición 2 (vertical) | 170° | Grados | 00´ | Minutos | 05" |
| Error detectado | 00° | Grados | 00´ | Minutos | 08" |
| Posición 1 ( horizontal) | 00° | Grados | 00´ | Minutos | 00" |
| Posición 2 (horizontal) | 180° | Grados | 00´ | Minutos | 10" |
| Error detectado | 00° | Grados | 00´ | Minutos | 10" |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INSTRUMENTO** | NIVEL AUTOMATICO | **MARCA** | SOKKISHA |
| **MODELO** | B1C | **SERIE** | 6906 |
| **AUMENTOS** | 32X | **PRECISIÓN EN DISTANCIA** | .+/-0.8mm*2kmde nivelación |

| **Inspección de centro de diferencia nivel según prueba de campo procedimiento** | **corrección** | **ajuste** | **lubricación** | **reparación** | **repuestos** | **limpieza** | **función aceptable** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **sistema pendular automatico** | | | | | | | x |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1.254 | MM | B2 | 1.425 | |
| A2 | 1.246 | MM | B1 | 1.375 | |
| A1-A2 | | MM | B1-B2 | | |

| | |
|---|---|
| **Error detectado** | **0.000** |




HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
*Técnico Laboratorio.*

# PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

# (NOVIEMBRE):

# YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO

# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
# PLANILLA NRO. 31527963
# REFERENCIA DE PAGO (PIN):
# Fecha Pago Planilla: 2024-11-08

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | VYM INGENERIA | TIPO DE PERSONA | Jurídica | TIPO DE DOCUMENTO | NIT |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 900062688 | D.V. | 7 | TIPO DE APORTANTE | B menor a 200 empleados |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CALLE 9 17 18 | DEPARTAMENTO | HUILA | MUNICIPIO | NEIVA |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 4220 | CORREO ELECTRÓNICO | 2018AFILIACIONES@GMAIL.COM | TELÉFONO | 6335646 |
| FAX | 8643535 | SUCURSAL | 01oficina | NOMBRE SUCURSAL | 01oficina |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | ARL SURA | Tipo de aportante | Empleador |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 7713933 | PRIMER APELLIDO | CAMACHO | SEGUNDO APELLIDO | LADINO |
| PRIMER NOMBRE | YERSON | SEGUNDO NOMBRE | FERNANDO | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Año: 2024 | Mes: 11 | Año: 2024 | Mes: 12 | Sucursal |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 6 | | $8.883.334 | | 31527963 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | | Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Tipo Vinculación | Subtipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Actividad Eco | Tipo de Salario | Nombres | Salario Básico |
| CC-7713933 | 01 | No | No | No | 41 | 1 | 5711001 | Fijo | CAMACHO LADINO YERSON FERNANDO | $1.300.000 |
| CC-36312881 | 01 | No | No | No | 41 | 1 | 5711001 | Fijo | MONJE FLOR LINA CONSTANZA | $1.300.000 |
| CC-7714529 | 01 | No | No | No | 41 | 1 | 5711001 | Fijo | MURCIA HERNANDEZ ALBEIRO | $1.300.000 |
| CC-52033387 | 01 | No | No | No | 41 | 1 | 1661901 | Fijo | ROBAYO GUZMAN ALEJANDRINA | $2.600.000 |
| CC-1084923149 | 01 | No | No | No | 41 | 1 | 5711001 | Fijo | SANCHEZ RIVERA HERMIDES | $1.300.000 |
| CC-1084869075 | 01 | No | No | No | 41 | 1 | 5711001 | Fijo | TRUJILLO PERDOMO LUIS FERNANDO | $1.300.000 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Nov Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | AVP | VCT | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin |
| CC - 7713933 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 36312881 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 36312881 | | | | | | | | | | | | | | | | X | 2024-11-04 | 2024-11-08 | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 7714529 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 52033387 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1084923149 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1084869075 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 7713933 | PORVENIR | 30 | $1.300.000 | 0.1600000 | $208.000 | $0 | $0 | $208.000 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 36312881 | PORVENIR | 25 | $1.083.334 | 0.1600000 | $173.400 | $0 | $0 | $173.400 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 36312881 | PORVENIR | 5 | $216.667 | 0.1600000 | $34.700 | $0 | $0 | $34.700 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 7714529 | PORVENIR | 30 | $1.300.000 | 0.1600000 | $208.000 | $0 | $0 | $208.000 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 52033387 | COLPENSIONES | 30 | $2.600.000 | 0.1600000 | $416.000 | $0 | $0 | $416.000 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 1084923149 | PORVENIR | 30 | $1.300.000 | 0.1600000 | $208.000 | $0 | $0 | $208.000 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 1084869075 | PORVENIR | 30 | $1.300.000 | 0.1600000 | $208.000 | $0 | $0 | $208.000 | $0 | $0 | $0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | EPS | Dias Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Dias Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 7713933 | SANITAS | 30 | $1.300.000 | 0.0400000 | $52.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.300.000 | 5 | 0.0696000 | $90.500 |
| CC - 36312881 | SANITAS | 25 | $1.083.334 | 0.0400000 | $43.400 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 25 | $1.083.334 | 5 | 0.0696000 | $75.500 |
| CC - 36312881 | SANITAS | 5 | $216.667 | 0.0400000 | $8.700 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 5 | $216.667 | 5 | 0.0000000 | $0 |
| CC - 7714529 | SANITAS | 30 | $1.300.000 | 0.0400000 | $52.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.300.000 | 5 | 0.0696000 | $90.500 |
| CC - 52033387 | NUEVA E.P.S. S.A. | 30 | $2.600.000 | 0.0400000 | $104.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $2.600.000 | 1 | 0.0052200 | $13.600 |
| CC - 1084923149 | ESSC ASMET SALUD | 30 | $1.300.000 | 0.0400000 | $52.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.300.000 | 5 | 0.0696000 | $90.500 |
| CC - 1084869075 | NUEVA E.P.S. S.A. | 30 | $1.300.000 | 0.0400000 | $52.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.300.000 | 5 | 0.0696000 | $90.500 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | CCF | Días Cota CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-7713933 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 30 | $1.300.000 | 0.0400000 | $52.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-36312881 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 25 | $1.083.334 | 0.0400000 | $43.400 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-36312881 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 5 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-7714529 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 30 | $1.300.000 | 0.0400000 | $52.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-52033387 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 30 | $2.600.000 | 0.0400000 | $104.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-1084923149 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 30 | $1.300.000 | 0.0400000 | $52.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-1084869075 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 30 | $1.300.000 | 0.0400000 | $52.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |

## TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 11

### TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORVENIR | 5 | $1.040.100 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $1.040.100 |
| COLPENSIONES | 1 | $416.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $416.000 |

### TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOTAL APORTES COT | SUBTOTAL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANITAS | 3 | $156.100 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $156.100 | 0 | $0 | $0 | $156.100 | $0 | 0 | $0 | $0 | $156.100 | $0 | $0 | $156.100 |
| ESSC ASMET SALUD | 1 | $52.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $52.000 | 0 | $0 | $0 | $52.000 | $0 | 0 | $0 | $0 | $52.000 | $0 | $0 | $52.000 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | 2 | $156.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $156.000 | 0 | $0 | $0 | $156.000 | $0 | 0 | $0 | $0 | $156.000 | $0 | $0 | $156.000 |

### TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL SURA | 6 | $451.100 | 0 | $0 | $0 | $451.100 | 0 | $0 | $451.100 | 0 | $0 | $0 | $451.100 |

### TOTAL APORTES PARAFISCALES

| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| COMFAMILIAR DEL HUILA | 6 | $355.400 | 0 | $0 | $355.400 |
| SENA | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ICBF | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ESAP | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| MinEdu | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| SALUD | 3 | $364.100 |
| PENSIONES | 2 | $1.456.100 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | $451.100 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 1 | $355.400 |
| SENA | 1 | $0 |
| ICBF | 1 | $0 |
| ESAP | 1 | $0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | $0 |
| GRAN TOTAL | 1 | $2.626.700 |

# ADRIANA LISETH MAYORCA PERDOMO

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1079409298 | | MAYORCA PERDOMO ADRIANA LISSETH | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CARRERA 5 W 33 26 SANTA INES | NEIVA-HUILA | 8377022 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-11 | 2024-11 | 1081618282 | 9477138795 | I | 2024/12/23 | 2024/11/28 | BANCOLOMBIA | 0 | $456,000 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1079409298 | MAYORCA ADRIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $1,600,000 | $256,000 | EPS005 | 30 | $1,600,000 | $200,000 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | No | $456,000 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,600,000 | $256,000 | | | $1,600,000 | $200,000 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 | | $456,000 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1079409298 | | MAYORCA PERDOMO ADRIANA LISSETH | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CARRERA 5 W 33 26 SANTA INES | NEIVA-HUILA | 8377022 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-11 | 2024-11 | 1081618282 | 9477138795 | I | 2024/12/23 | 2024/11/28 | BANCOLOMBIA | 0 | $456,000 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $256,000 | $0 | $0 | $256,000 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $256,000 | $0 | $0 | $256,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $200,000 | $0 | $0 | $200,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $200,000 | $0 | $0 | $200,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $456,000 | $0 | $0 | $456,000 |

# OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-1075213839 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | INDEPENDIE |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | INDEPENDIENTE |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2024-11-06 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2024-12-10 |
| FECHA DE PAGO: | 2024-11-06 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2024-11 |
| PERÍODO SALUD: | 2024-11 |
| NÚMERO PLANILLA: | 31247197 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 31247197 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS005 | 800251440 | SANITAS | 1 | $ 1.300.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 162.500 | $ 162.500 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 1 | $ 1.300.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 208.000 | $ 208.000 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | $ 1.300.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 6.800 | $ 6.800 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 377.300 | $ 377.300 |

PAGADO

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 07/01/2025 |
