CONTRATO DE OBRA No. CLOPIH221 de 2024

INFORME DE OBRA No. 003

MENSUAL [X] **FINAL** [ ]

Objeto Contrato: "CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"





MUNICIPIO: **GUADALUPE**

DEPARTAMENTO: **HUILA**

CONTRATO DE (OBRA) No. CLOPIH221 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y LA FIRMA V&M INGENIERÍA SAS

APOYO A LA SUPERVISIÓN	XIMENA ADELINA JIMÉNEZ	**ENTIDAD**	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	CLOPIH221DE 2024		
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"	**PERIODO DEL INFORME**	Entre 01 de enero al 30 de enero de 2025.
CONTRATISTA	V&M INGENIERÍA SAS	**NIT:**	900.062.688-7
REPRESENTANTE LEGAL:	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO	**C.C:**	7.713.933 NEIVA HUILA

FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	27/09/2024		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	12/11/2024		
PLAZO INICIAL	El plazo estimado para la ejecución del contrato será TRES (03) meses, contados a partir del acta e inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones.		
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	Dos (02) meses		
PLAZO TOTAL:	El plazo estimado para la ejecución del contrato será Cinco (05) meses, contados a partir del acta e inicio, conforme a la adicional en tiempo mediante prorroga No.1		
VALOR INICIAL:	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($1.453.038.929,00) MCTE		
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	N/A		
VALOR TOTAL:	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($1.453.038.929,00) MCTE		
INTERVENTOR:	CONSTRUMAC INGENIERÍA SAS	**NIT:**	900.116.571-8
REPRESENTANTE LEGAL:	DANIELA CARRILLO TAVERA	**C.C:**	1.007.750.886 DE ARMENIA (Q)


2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto Construcción Cancha Sintética Villa Olímpica del Municipio de Guadalupe, Departamento del Huila se ubica en el municipio de Guadalupe - Huila, en la región andina de Colombia.

Esta localidad se encuentra rodeada de paisajes montañosos y ríos, es conocida por su belleza natural y su enorme herencia cultural. La cancha sintética se construirá dentro de las instalaciones del proyecto macro Villa Olímpica, área designada para actividades deportivas y recreativas que beneficiarán a la comunidad local.

MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA, ESPECÍFICAMENTE EN EL KM 3 VÍA MUNICIPIO DE GUADALUPE AL MUNICIPIO DE ALTAMIRA.



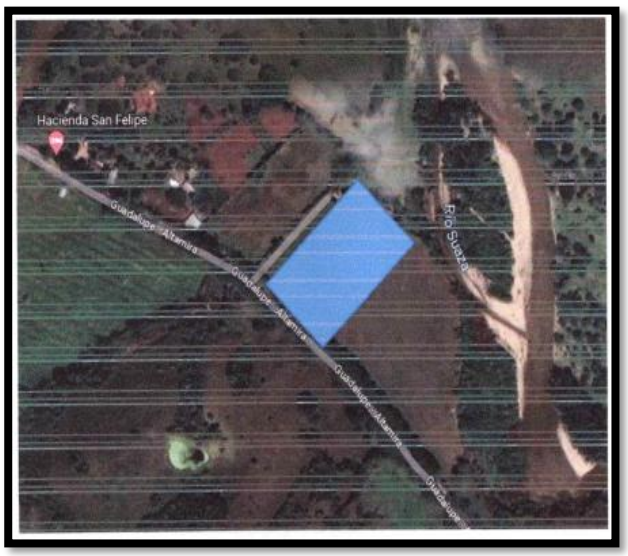

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La cancha sintética tendrá una superficie total de 1750 m² y contará con una serie de características y componentes, incluyendo:

- Red de aguas lluvias con cuneta perimetral de concreto de 3000 psi, cajas de inspección y filtros laterales.
- Placa de piso de 3000 PSI.
- Instalación de césped.
- Demarcación de la cancha.
- Cerramiento perimetral.
- Iluminación.

El proyecto busca proporcionar un espacio seguro y de alta calidad para la práctica deportiva y recreativa, así como para la realización de eventos culturales y comunitarios.

4. INFORME CONCRETO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DURANTE EL PERIODO

Se realiza reunión con el Comité de Veeduría, secretaria de Planeación y directores de la obra para supervisar avances y calidad del proceso de construcción del proyecto CLOPIH 221/2024. El director de la obra presenta los resultados alcanzados y la gestión del control de la obra, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos y la transparencia en el proceso.

5. HISTORIA CRONOLÓGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa)
FECHA DE INICIO	**12/11/2024**			
OTROSÍ No.1	**31/01/2025**	**81**		**13/04/2025**
TERMINACIÓN CTO.				
TOTAL DIAS				

6. ACTAS		
Tipo de Acta	**No.**	**Fecha**
ACTA DE INICIO	**1**	12 de noviembre de 2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No. 1	**2**	31 de enero de 2025


7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	
a). **Actividades administrativas**	- Registro en la bitácora de obra de las actividades realizadas durante el periodo del informe. - Presentación de informes mensuales para revisión y aprobación de la interventoría, según los lineamientos contractuales. - Respuesta oportuna mediante oficios a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato por parte del interventor o la supervisión. - Revisión y trámite oportuno de las actas levantadas en el periodo del informe. - Control financiero de las obras ejecutadas y control presupuestal. - Pago de servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra. - Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que se encuentra laborando para la ejecución de la obra. - Cumplimiento con obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculadora a la obra. - Afiliación de personal directo, verificando que se ubique en el nivel de riesgo correspondiente.
b.) **Actividades operativas**	**REVISIÓN TÉCNICA** La nueva ubicación presenta un terreno con irregularidades significativas, requiriendo ajustes de diseño para asegurar la planicidad de la cancha y la correcta cimentación del cerramiento y andenes. Por ende se realizó la evaluación de cantidades de obra y los ajustes de diseño necesarios por parte del contratista de obra e interventoría. Tras la evaluación del evento ocurrido, se determinó que el proyecto requiere modificaciones significativas en cortes y rellenos para garantizar la nivelación adecuada del terreno destinado a la construcción de la cancha. Esta situación también incide en las profundidades de cimentación del cerramiento y en el diseño de los andenes. Dando respuesta y viabilizando esta eventualidad, el contratista de obra y la interventoría realizaron los ajustes de diseño necesarios, optimizando las cantidades de obra. Por medio de un balance de mayores y menores cantidades expuesto ante ustedes para su consideración y aprobación Por lo anterior en el mes de enero, se llevó a cabo la revisión y análisis del levantamiento topográfico inicial, en comparación con los planos de diseño y las condiciones de campo existentes. Este proceso confirmó las diferencias de ubicación del proyecto previamente identificadas, las cuales ya habían sido reportadas. En respuesta a esta verificación topográfica, el contratista de obra se dispone a dar inicio a las actividades preliminares necesarias para la preparación del terreno, incluyendo: 1. **Descapote mecánico:** Remoción de la capa superior de suelo orgánico y vegetación. 2. **Excavación mecánica:** Proceso de remoción del suelo a las profundidades especificadas en los planos, con el fin de crear las bases para la cancha y las estructuras complementarias.

3. **Suministro, extendido y nivelación de material de relleno:** Acondicionamiento de la base para la cancha, Suministro y distribución de material de relleno en recebo seleccionado, el cual será compactado para alcanzar las elevaciones y pendientes de diseño de la cancha.

Estas actividades se ejecutaron en estricto cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad establecidas, garantizando la calidad de la obra y la correcta preparación del terreno para la construcción de la cancha.

8. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

El mes de enero de 2025 presentó condiciones climáticas parcialmente soleadas en la zona de influencia, lo que permitió el óptimo desarrollo de las actividades anteriormente descritas. A continuación, se presentan algunos detalles adicionales sobre las condiciones climáticas:

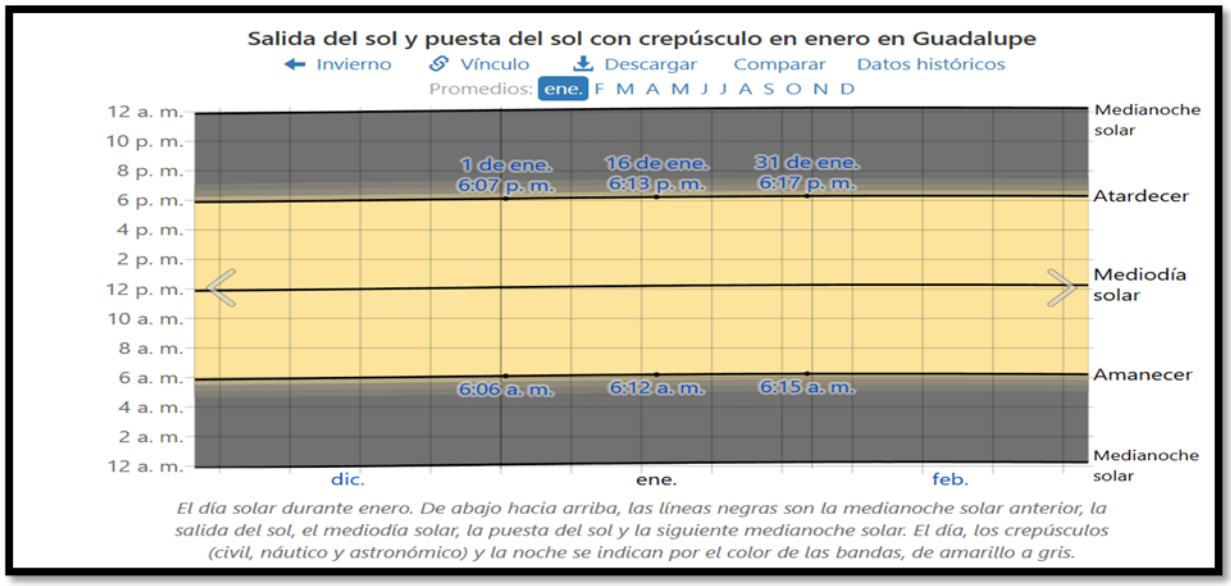

El día solar durante enero. De abajo hacia arriba, las líneas negras son la medianoche solar anterior, la salida del sol, el mediodía solar, la puesta del sol y la siguiente medianoche solar. El día, los crepúsculos (civil, náutico y astronómico) y la noche se indican por el color de las bandas, de amarillo a gris.

9. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Tipo Prueba de Laboratorio	Resistencia concreto	Relación volumétrica concreto
Diseños de mezcla para los concretos.	**N/A**	**N/A**
Diseños de mezcla para base.	**N/A**	**N/A**
Compresión simple al concreto.	**N/A**	**N/A**
Ensayo de compactación de campo	**N/A**	**N/A**

NOTA: *Las obras de concreto ejecutadas se le realiza prueba a la compresión simple, Norma Articulo 630-07 ensayo E-410, cumpliendo con las resistencias exigidas.*

Nota: Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de enero de 2025, no se realizaron ensayos de laboratorio.

10. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Valor Anticipo (20%)	N/A	$		$
Acta Parcial No. 1	N/A	$	$	$
Acta Recibo Final No.	N/A	$	$	$
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 1,453,038,929.00	N/A	$ 1,453,038,929.00		

11. COMITÉS DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité
26 DE NOVIEMBRE DE 2024	Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila. (INDERHUILA)	Se lleva a cabo reunión en las instalaciones del INDER HUILA con el fin de discutir el avance del contrato de obra CLOPIH 221 de 2024. Asistentes: - Ingeniera Jimena Jiménez (apoyo a la supervisión) - Ingeniero Yerson Fernando Camacho Ladino (representante legal de V&M INGENIERÍA SAS, contratista de obra) - Ingeniera Daniela Carrillo Tavera (representante legal de CONSTRUMAC INGENIERO SAS, interventoría) Objetivo: Solicitar avances de ejecución del contrato y discutir dificultades presentadas.
23 DE DICIEMBRE DE 2024	Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila. (INDERHUILA)	Se lleva a cabo reunión en las instalaciones del INDER HUILA con el fin de discutir el contrato CLOPIH 221 de 2024. Asistentes: - Ingeniera Jimena Jiménez (apoyo a la supervisión) - Ingeniero Yerson Fernando Camacho Ladino Representante legal de V&M INGENIERÍA SAS, contratista de obra - Ingeniera Daniela Carrillo Tavera Representante legal de CONSTRUMAC INGENIERO SAS, interventoría Objetivo: Analizar las respuestas de la Alcaldía de Guadalupe sobre topografía y diseños, revelando una nueva localización del proyecto que difiere de la etapa precontractual.

12. RELACIÓN DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS

TIPO DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA A LA ENTIDAD (dd/mm/aaaa)	No. RADICADO (Emitido por INDERHUILA)	FORMATO (Físico/Digital)

Correspondencia (periodo del (01 al 30 de enero de 2025)	27/01/2025		Físico – Digital
Copia de Bitácora de Obra (periodo del (01 al 30 de enero de 2025)	31/01/2025		Físico – Digital
Planillas de aportes a seguridad social integral (EPS-ARP-AFP) periodo del (01 al 30 de enero de 2025)	31/01/2025		Físico – Digital

13. RELACIÓN DE PERSONAL DURANTE EL PERIODO

NOMBRE Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO	7.713.933	DIRECTOR DE OBRA	Prestación de servicios
ADRIANA LISETH MAYORCA PERDOMO	1.079.409.298	RESIDENTE DE OBRA	Prestación de servicios
OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO	1.075.213.839	PROFESIONAL SST	PROFESIONAL SST

14. RELACIÓN DE PAGOS

TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)	No. COMPROBANTE	FECHA
N/A	N/A	N/A

15. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO
YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO	$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 0.00	32219152	2025/01/14
ADRIANA LISETH MAYORCA PERDOMO	$ 275.200	$ 215.000	$ 99.100	$ 0	$ 0.00	9480892171	2025/01/31
OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0.00	32082478	2025/01/07

16. RELACIÓN DE PÓLIZAS DE GARANTÍA

Póliza legalización del CONTRATO: CLOPIH221 DE 2024

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO DE OBRA

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (D/M/A):	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (D/M/A):	HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S. A	61-44-10155753	Anexo 0	27/09/2024	Cumplimiento del contrato	27/09/2024	27/06/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	27/09/2024	27/06/2025

				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	27/09/2024	27/12/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (D/M/A):	VIGENCIA HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S. A	61-40-101020276	Anexo 0	27/09/2024	27/09/2024	27/12/2024

Póliza actualizada ACTA DE INICIO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (D/M/A):	VIGENCIA HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S. A	61-44-101055753	Anexo 1-2	19/11/2024	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	12/08/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	12/11/2024	12/08/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/11/2024	12/02/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (D/M/A):	VIGENCIA HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S. A	61-40-101020276	Anexo 1-2	19/11/2025	12/11/2024	11/02/2025

Póliza actualizada x PRORROGA No. 1


PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO – OTRO SI No.1 31/01/2025

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (D/M/A):	VIGENCIA HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S. A	61-44-101055753	Anexo 3	12/02/2025	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	12/10/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	12/11/2024	12/10/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/11/2024	12/04/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS	


PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD OTRO SI No.1 31/01/2025

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (D/M/A):	VIGENCIA HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S. A	61-44-101020276	Anexo 3-4	12/02/2025	12/11/2024	12/04/2025

17. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO.

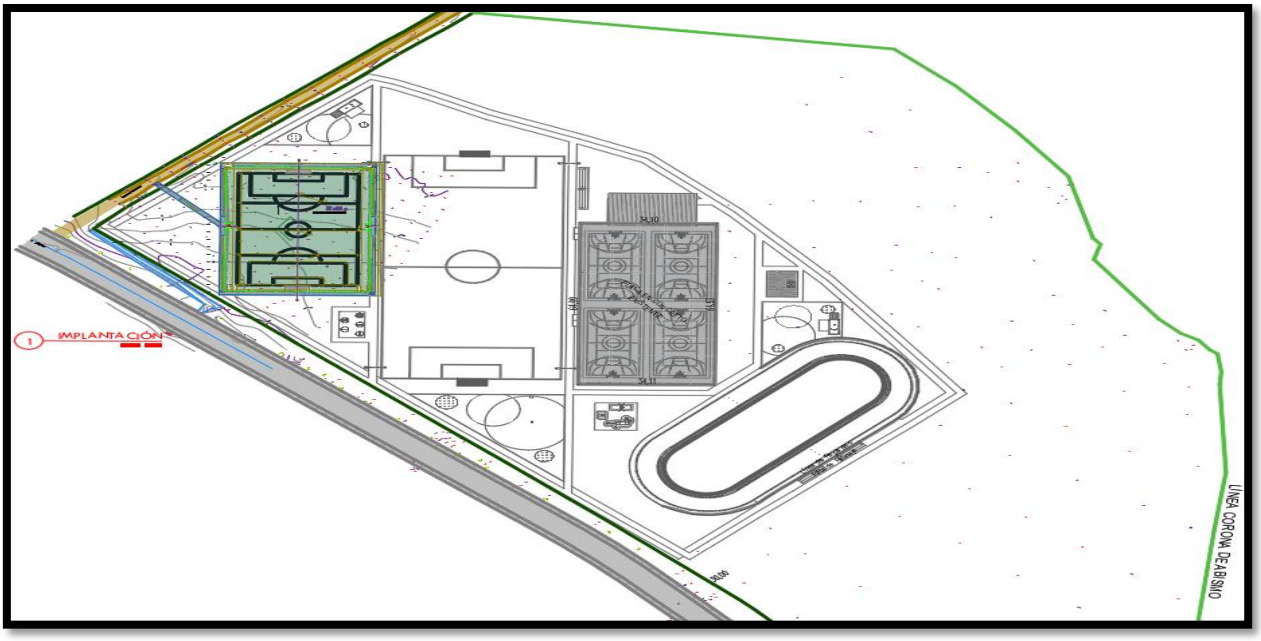

NUEVA IMPLANTACION DE DISEÑO – LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"

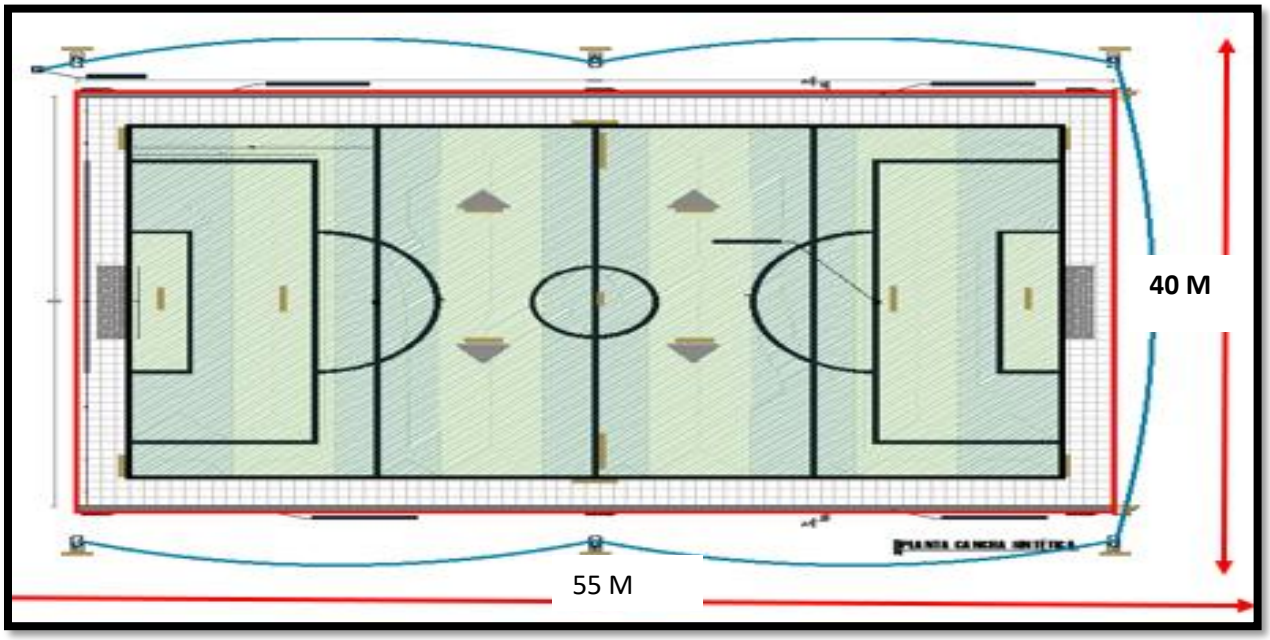

18. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

CONDICIONES ORIGINALES						EJECUCIÓN DE OBRA MENSUAL			EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	%	CANT	%
ACTIVIDADES PRELIMINARES										
1.1	Localización y replanteo manual	m²	1,924.00	$ 2,226	$ 4,282,824				1924.00	100.00%
1.2	Descapote e=0,20m a máquina incluye retiro material	m²	1,924.00	$ 4,770	$ 9,177,480	1924.00	$ 9,177,480	100%	1924.00	100.00%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 13,460,304**		**$ 9,177,480**			
MOVIMIENTO DE TIERRA										
2.1	Excavación manual incluye retiro	m³	119.94	$ 31,545	$ 3,783,507					
2.2	Excavación mecánica incluye retiro 1 km	m³	384.80	$ 19,793	$ 7,616,346	384.80	$ 7,616,346	100%	384.80	100.00%
2.3	Rellenos con recebo compactado mecánicamente	m³	384.80	$ 190,829	$ 73,430,999	384.80	$ 73,430,999	100%	384.80	100.00%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 84,830,852**		**$ 81,047,346**			
RED AGUAS LLUVIAS										
3.1	Construcción de cuneta perimetral en concreto 3000 PSI; Dimensiones: 40 cm de ancho y altura variable. incluye rejilla prefabricada en poliuretano	ml	104.00	$ 137,428	$ 14,292,512					
3.2	Caja inspección 1,0x 1,0 m medida interna en concreto 3000 psi para empalme sistema de drenaje, incluye tapa con marco y cañuela, altura variable	und	4.00	$ 657,029	$ 2,628,116					

18. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

CONDICIONES ORIGINALES						EJECUCIÓN DE OBRA MENSUAL			EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	%	CANT	%
3.3	Red de aguas lluvias suministro e instalación de tubería PVC Ø 8" incluye: Transporte al sitio de la obra, cama con arena 15 cms y relleno material de la excavación a zanjón	ml	30.00	$ 79,488	$ 2,384,640					
3.4	Construcción de filtros laterales externos en un ancho de 0.40 m, con altura variable menor a 0.50 m, recubrimiento en geotextil no tejido NT-1600, con gravilla común o triturado de 1 1/2" a 4" + Tubería PVC drenajes de 6"	ml	178.00	$ 99,727	$ 17,751,406					
3.5	Caja inspección 1,2x 1,2 m medida interna en concreto 3000 psi para empalme sistema de drenaje, incluye tapa con marco y cañuela, altura variable	und	2.00	$ 713,327	$ 1,426,654					
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 38,483,328**		**$ 0**			
PLACA CANCHA										
4.1	Placa de piso en concreto 3000 psi, e =0,07m dilatada, junta machimbrada incluye malla electrosoldada de 5mm.	m^2	1,750.00	$ 87,325	$ 152,818,750					
4.2	Marco para microfutbol futbol 8 6mX2m, en tubo galvanizado tipo pesado de 4", según especificaciones técnicas, incluye anclaje, malla e instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	und	2.00	$ 2,344,832	$ 4,689,664					

18. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

CONDICIONES ORIGINALES						EJECUCIÓN DE OBRA MENSUAL			EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	%	CANT	%
4.3	Suministro e instalación de césped monofila mentada rafia de 50mm de altura, con protección de rayos UV, con 1300 gramos por metro cuadrado de rafia, de 13200 dux, base: backing doble capa, demarcación de color blanco con césped de blanco de fábrica, incluye granulo de caucho, pegamento importado.	m^2	1,750.00	$ 181,076	$ 316,883,000					
4.4	Suministro e instalación de almohadilla de choque shock pad 20 mm	m^2	1,750.00	$ 146,659	$ 256,653,250					
4.5	Suministro e instalación de bordillos prefabricado 20X50X50	ml	186.00	$ 55,658	$ 10,352,388					
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 741,397,052**		**$ 0**			
CERRAMIENTO										
5.1	Concreto ciclópeo 2500 psi (60% concreto- 40% piedra media zonga) para cimentación cerramiento	m^3	16.74	$ 376,028	$ 6,294,709					
5.2	Concreto 3000 psi viga de cimentación cerramiento 0,2x0,2m	m^3	37.40	$ 659,191	$ 24,653,743					
5.3	Muro cerramiento en ladrillo semiprensado a la vista	m^2	112.50	$ 105,765	$ 11,898,563					
5.4	Acero de refuerzo 37000 psi incluye figurado e instalación	kg	1,057.11	$ 6,647	$ 7,026,597					
5.5	Tubería galvanizada 2" cal 2mm incluye anclajes, tapa	ml	220.40	$ 44,432	$ 9,792,813					

18. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

CONDICIONES ORIGINALES						EJECUCIÓN DE OBRA MENSUAL			EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	%	CANT	%
5.6	Módulos cerramiento 2,5x2,5 m en Angulo 1 1/2"x1/8 con varilla de 5/8" lisa cada 14 cms, diagonales en Angulo 1 1/2" x 1/8 y lamina cal 16 10X10 cms de refuerzo en la esquinas (lado norte y sur)h=2,5m	m^2	200.00	$ 109,070	$ 21,814,000					
5.7	Módulos cerramiento 2,5x2,5 m en Angulo 1 1/2"x1/8 con malla eslabonada cal 10 hueco 2 1/4"x2 1/4", diagonales en Angulo 1 1/2" x1/8 y lamina cal 16 10X10cm de refuerzo en la esquinas (lado oriente y occidente) h=2,5m	m^2	268.75	$ 54,091	$ 14,536,956					
5.8	Suministro e instalación de puerta en tubería 2" galvanizada cal 2mm con malla eslabonada cal 10 y con portacandado, incluye pasador porta candado.	und	1.00	$ 802,805	$ 802,805					
5.9	Concreto 3000 psi andenes perimetrales e=8cm, incluye malla electrosoldada y formaleta	m^2	148.80	$ 80,868	$ 12,033,158					
5.10	Suministro e instalación de malla de cerramiento en nylon 100% alta densidad con protección UV, ojo 13x13, calibre #4 incluye; guaya, tensores y tubo de 2"	m^2	3,031.00	$ 37,545	$ 113,798,895					
5.11	Pie de amigo en tubería galvanizada 2" cal 2mm incluye anclajes, concreto 3000 psi 50x50x60 costados norte y sur	und	32.00	$ 263,483	$ 8,431,456					

18. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

CONDICIONES ORIGINALES						EJECUCIÓN DE OBRA MENSUAL			EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	%	CANT	%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 231,083,695**		**$ 0**			
ILUMINACIÓN										
6.1	Suministro, montaje y conexión de Proyector led 300 W SYLFLOOD, temperatura de color 5000K, vida útil 100000h, flujo luminoso 39000 lm incluye soporte	und	6.00	$ 1,718,814	$ 10,312,884					
6.2	Suministro e Instalación de Tablero de 6 Circuitos con puerta incluye 3 breaker de 30 amp con normativa RETIE	und	1.00	$ 511,864	$ 511,864					
6.3	Suministro e Instalación de Acometida en CABLE CU AISL THHN/THWN - 2x8F+1x10T en tubería PVC 1"	ml	50.00	$ 45,333	$ 2,266,650					
6.4	Salida Parcial Eléctrica (2 THHN No.10 + 1 THHN No.12)	ml	50.00	$ 42,110	$ 2,105,500					
6.5	Suministro e instalación de postes de concreto pretensado L= 12 m 750 kg incluye transporte e izada	und	6.00	$ 2,884,636	$ 17,307,816					
6.6	Puesta a tierra en varilla coper weld cobre de 1/2" incluye conectores, cableado, soldadura y mejoramiento de tierra	und	1.00	$ 513,186	$ 513,186					
6.7	Murete para tablero de control en muro con bloque # 5	und	1.00	$ 377,230	$ 377,230					
6.8	Construcción de cajas de inspección tipo alumbrado en concreto de 30x30	und	6.00	$ 266,806	$ 1,600,836					

18. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

CONDICIONES ORIGINALES						EJECUCIÓN DE OBRA MENSUAL			EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA	
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	%	CANT	%
6.9	Cajas de inspección de 60X60 CM (medida interior)	und	8.00	$ 336,951	$ 2,695,608					
6.10	Suministro e Instalación de sistema de apantallamiento	und	1.00	$ 15,484,338	$ 15,484,338					
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 53,175,912**		**$ 0**			
% AVANCE DE OBRA								**7.76%**		**8.13**

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ING. **YERSON FERNANDO CAMACHO**
DIRECTOR DE OBRA

ING. **FELIPE STAND VILLAREAL**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

19. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1. Descapote e=0,20m a máquina incluye retiro material



Foto 2. Retiro me material sobrante -



Foto 3. Excavación mecánica incluye retiro 1 km



Foto 4. Excavación mecánica incluye retiro 1 km



Foto 5. Suministro de material de relleno Recebo



Foto 5. Extendida de material de relleno Recebo





Foto 6. Rellenos con recebo compactado mecánicamente

20. ANEXOS

- SE ANEXA BITACORA DE OBRA.
- SE ANEXA SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP).
- SE ANEXA CERTIFICADO VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA REALIZADO POR EL INTERVENTOR (Vo.Bo. Interventor).
- SE ANEXA CORRESPONDENCIA GENERADA DURANTE EL PERIODO.
- SE ENTREGA UN CD CON LA COPIA DIGITALIZADA DE TODO EL INFORME Y SUS ANEXOS.

		
ING. YERSON FERNANDO CAMACHO	(31/01/2025)	**ING. FELIPE STAND VILLAREAL**
FIRMA ORIGINAL **DIRECTOR DE OBRA**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **Vo.Bo DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

ANEXOS

BITACORA DE OBRA

BITACORA DE OBRA.

CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA
VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE
GUADALUPE – HUILA.

CONTRATO No: CLOPTH 221 DE 2024.

V&M INGENIERIA S.A.S.
R.L / JERSON FERNANDO C.

CONSTRUMAC INGENIEROS SAS
R.L / DANIELA CARRILLO T.

Powered by CamScanner

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

CONTRATO No.: CLOPIH 221 DE 2024.

ENTIDAD CONTRATANTE: INDERHUILA.

OBJETO: "CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA".

CONTRATISTA: VSM INGENIERIA S.A.S.
NIT : 900.662.688.7.
R/L : YERSON FERNANDO CAMACHO.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 27 DE OCTUBRE DE 2024.
FECHA DE INICIO: 12 DE INICIO DE 2024.
PLAZO INICIAL: TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA.
PLAZO ADICIONAL: NO. 1 / N.A.
PLAZO TOTAL: TRES MESES.

VALOR TOTAL:

INTERVENTOR: CONSTRUMAC INGENIERIA S.A.S.
NIT: 900. 116. 571.-7.
R/L: DANIELA CARRILLO TAUTERA.

Powered by CamScanner

Acta de Inicio.

12-11-24

Lugar: Neiva - Huila.

Hora:

Asistentes: DR. FELIPE VICTORIA BARRAGAN.

INTERVENTOR: DANIELA CARRILLO TAVERA.

CONTRATISTA: YERSON FERNANDO CAMACHO.

→Acta de Inicio del contrato de obra pública numero CLOPIH221 de 2024. - Celebrado, entre el Instituto Departamental de Deporte, la Educación Física, la Recreación y el Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila. INDERHUILA. Y LA FIRMA V&M INGENIERIA SAS.

A los doce dias del mes de Noviembre de 2024, se reunieron en la oficina + del INDERHUILA. DR. Felipe Victoria Barragan en calidad de Supervisor; Daniela Carrillo Tavera en calidad de Interventor y Yerson Fernando Camacho Ladino en calidad de Contratista, a fin de dar Inicio a la ejecución del Contrato de obra No. CLOPIH221 DE 2024.

De acuerdo a lo anterior se firma previo a las consideraciones de ejecución expresadas y estipuladas por la entidad Contratante.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

Powered by CamScanner

19-11-24 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 10:00 a.m - Fin de jornada: 4:00 p.m.
Condiciones climaticas:
Personal en obra: Ing. Yerson Fernando Camacho.
Personal de Interventoria: Ing. Daniela Carrillo. Tavera.
Supervicion:

→ Actividades Realizadas.
Se llevo a cabo una socializacion del proyecto de construccion de la cancha sintetica villa olimpica del Municipio de Guadalupe - Huila, con el objetivo de informar y sensibilizar a la comunidad sobre los beneficios y alcances del proyecto,

En el mismo acto, se conformó el acto de veeduria ciudadana, mediante la cual se establecio la instancia de vigilancia y seguimiento de la ejecucion del proyecto garantizando la transparencia y la participacion ciudadana en la toma de decisiones.

ING. RESIDENTE DE OBRA.

ING. RESIDENTE DE INT.

20-11-24 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de Jornada:
Condiciones Climaticas
Personal en obra: Ing Yerson Fernando Camacho Ladino
1 Oficial.
Personal de Interventoria: Ing. Daniela Carrillo.

Powered by CamScanner

Actividades Realizadas.

El dia 20 de Noviembre de 2024, se realizo la visita inicial al sitio de obra "Construcción de cancha sintetica villa olimpica del Municipio de Guadalupe - Huila, con el objetivo de evaluar las condiciones iniciales del terreno y verificar la disponibilidad de los servicios necesarios para la ejecución de las actividades

En el marco de la visita, se procedio con el suministro e instalación de la valla informativa, la cual contiene la información relevante sobre el proyecto: esta incluye, El nombre del proyecto, la entidad contratante, Firma contratista, Valor del contrato y plazo de ejecución, Etc.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

22-11-24 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.

Inicio de jornada: 7 am. - Fin de jornada: 4:30 pm

Condiciones climaticas: Parcialmente soleado.

Personal en obra: Residente de obra:

Comision de Topografia.

Personal de Interventoria: Residente de Interventoria.

Actividades Realizadas.

Un equipo de comision topografico especializado dio inicio a las actividades de localización y replanteo, asi como el levantamiento topografico detallado, en el sitio de ejecucion de obra "Construccion de cancha sintética - villa olimpica. Esta etapa resulta crucial para definir con precisión los limites y caracteristicas del terreno

Powered by CamScanner

El equipo de comision topografico ejecuto el trabajo en campo conjuntamente con los profecionales del proyecto para asegurar la optima recopilación de datos y que estos fueran seguros y confiables. los cuales son necesarios para la planificación y ejecución de las actividades.

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

23-11-24 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:am Fin de jornada: 4:30 p.m
Condiciones climaticas: Parcialmente soleado
Personal en obra: (1) Residente de obra
(1) Maestro de obra
(1) oficial de obra.
(1) Comision Topografica.
Personal de Interventoria: (1) Residente de Interventoria:

Actividades Realizadas:
Se continuaron las actividades de localización y replantco, levantamiento topografico y redefinicion de diseño y/o reubicacion de escenarios deportivos en el sitio de obra "Construcción de cancha sintética Villa olimpica del Municipio de Guadalupe - Huila.

En esta etapa se realiza verificación de los datos recopilados; posteriormente, se procedio a la implantación del diseño definitivo, teniendo en cuenta las condiciones topograficas y geotecnicas del terreno, así como los necesidades y requerimientos de los escenarios deportivos. con el fin de ser emitidos al ente contratante para su revisión y aprobación de diseño.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

Powered by CamScanner

25-11-24
30-11-24

Nota: Durante el periodo comprendido entre el 25 de noviembre y 30 de Noviembre de 2024, se realizaron las siguientes actividades:

- Se Culmino la actividad de localización y replanteo, como inspección inical al terreno establecido para el escenario deportivo, la cual tuvo como objetivo determinar con precisión la ubicación de la cancha sintética del Municipio de , Huila.

16-

Posteriormente el equipo de comision Topografica procedio a realizar diseño, ubicacion y replanteo de las areas localizadas con el fin de establecer un punto de exactitud para la ejecucion de obra.

De acuerdo a lo anterior el contratista de obra y la interventoria a cargo del contrato CLOPIH 221 de 2024. se han mantenido en constante comunicación con el fin de determinar y dar inico a las actividades de obra. segun la programación establecido.

Por lo anterior firmo:

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO.

26-12-24 Revision de diseños.

→ Una vez realizada la localizacion y replanteo inicial del terreno establecido para la ejecucion de la cancha sintetica del Municipio de Gudalupe, se determino que la ubicacion inicial

no era optima debido a condiciones adversas, especificamente la amenaza de socavación del río Suaza.

Por lo tanto se requiere una nueva implantación de diseño y redistribución del espacio para la ejecuación de los escenarios deportivos. Para lo cual nuevamente se desarrollan actividades de localizacion y replanteo del area de influencia segun nueva implantación de diseño establecido. - UBICACION DEFINITIVA PROPORCIONADA POR LA ADMINISTRACIÓN EL 19 DE DICIEMBRE.

16-12-24 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7 am Fin jornada: 3:00 p.m
Condiciones climaticas:
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Comisión de Topografia. (1).

Actividades realizadas
Nuevamente se retoman las actividades de localizacion y replanteo con el fin de realizar levantamiento topografico detallado de la nueva ubicación para implantación del diseño establecido segun revision de estudios. en el sitio de ejecucion de obra "construcción de cancha sintetica villa olimpica". Actividad crucial para determinar con precisión los limites y caracteristicas del terreno.

Firma:

RESIDENTE DE OBRA


RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

Powered by CamScanner

17-12-24 Lugar: Municipio de Guadalupe – Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 3:00 p.m.
Condiciones Climaticas:
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Comision de Topografia (1).

Actividades realizadas.
→ Se continua con la actividad de localización y replanteo, levantamiento topografico con el fin de determinar irregularidades significativas en el terreno.

Firma:



RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE DE

18-12-24 Lugar: Municipio de Guadalupe – Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am – Fin jornada: 2:00 pm.
Condiciones Climaticas:
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Comision de Topografia (1)

Se culmina la actividad de localización y replanteo y se determina que la nueva ubicación presenta un terreno con irregularidades, lo cual requiere ajustes de diseño para asegurar la planicidad de la cancha y la correcta cimentación de cerramiento.

Powered by CamScanner

Con ello se realizo evaluación de cantidades de obra y ajustes de diseño necesarios por parte del contratista y la interventoria, sin embargo a fecha debido a las condiciones se a dado inicio a las actividades preliminares.

22-12-24. Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada:
Condiciones climaticas:
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Comision de topografia. (1).

Actividades Realizadas

luego de haber realizado la localización y replanteo del área y/o terreno delimitado para la construcción de la cancha sintética, una comisión de topografia calificada se dispuso a realizar la demarcación y toma de niveles topográficos, con el fin de dar inicio a las a las actividades de obra civil.

FIRMA:

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTO

Powered by CamScanner

ACTA DE COMITE

23-12-24

Lugar: INDER - HUILA. - NEIVA.

Hora de inicio: 7:00 am Hora final: 8:00 am

ASISTENTES: • Person Fernando Camacho ladino
R.L V&M INGENIERIA S.A.S.

• Daniela Carrillo Tavera
R.L CONSTRUMEC INGENIERIA S.A.S.

• Ximena Adelinda Jiménez
APOYO a la SUPERVISIÓN.

AGENDA:

→ Socialización avance del proyecto
→ Atender inquietudes respecto a los diseños y presupuesto de obra
→ Respuesta requerimiento de INDERHUILA, respuesta Alcaldia Municipal Guadalupe, Huila.

DESARROLLO.

En las instalaciones de INDER HUILA, se reunen Ing, Ximena Jiménez, como apoyo a la supervisión del contrato de interventoría, Ing. Person Camacho ladino representante legal de V&M INGENIERIA SAS, Contratista de obra e Ing Daniela camilo Tavera R.L de CONSTRUMAC INGENIEROS SAS. Con el fin de socializar las respuestas enviadas de parte de la Alcaldia de Guadalupe al oficio IH2-2024-1403 del 06 de diciembre de 2024 por INDER HUILA. Solicito topografia y aclaración de diseños por otra parte las inquietudes presentadas en el capitulo electrico; manifiesta que el diseño actualizado de redes incluye la conexión desde un transformación de SOLUA, Considerando las condiciones de la nueva ubicación del escenario deportivo del proyecto, por lo cual se debe revisar el plano suministrado, las cantidades y costos contemplados en el presupuesto del contrato de obra para determinar su idoneidad.

ING. RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

Powered by CamScanner

20-01-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 p.m
Condiciones climaticas: Parcialmente Soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Operador de Maquinaria: (1)
Maestro de obra (1)

Actividades Realizadas
→ Se realizo descapote mecanico del terreno con una Profundida de 20 cm con el objetivo de eliminar la capa superfical y preparar el terreno para las siguientes etapas de construcción.

FIRMA:

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

21-01-25 Lugar: Municipio de guadalupe, Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 p.m
Condiciones Climaticas: Parcialmente Soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Operador de Maquinaria (1)
Maestro de obra (1).

Actividades realizadas
→ Se continua y culmina la actividad de descapote mecanico de e: 20 cm.

→ Se inicia actividades de Excavación mecanica (cajeo para cancha sintetica.


Powered by CamScanner

→ Toma manual de Niveles
→ Retiro de material sobrante, desarpole, excavacion.

Firma:



RESIDENTE DE OBRA




RESIDENTE DE INTERVENTORI

22-01-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin de jornada: 5:00 pm
Condiciones Climaticas: Parcialmente Soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Operador de Maquinaria (1)
Maestro de obra (1)


Actividades realizadas

→ Se continua con la actividad de excavacion mecanica - Cargeo de cancha mecanica.
→ Retiro de material sobrante de excavación.
→ Toma de niveles

FIRMA:



RESIDENTE DE OBRA.

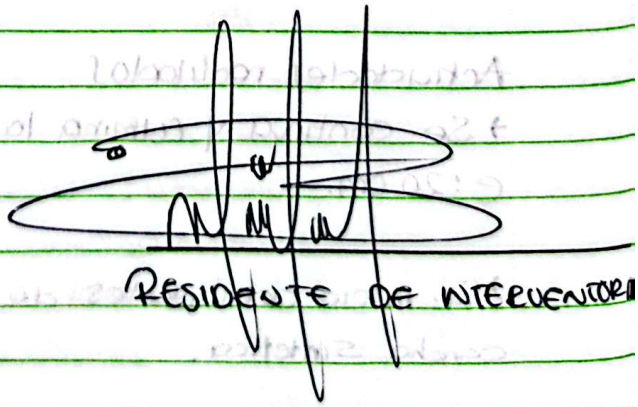

RESIDENTE DE INTERVENTORI

Powered by CamScanner

23-01-25

Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin de jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: Parcialmente soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoría (1)
Maestro de obra (1)
Operador Maquinaria (2).

Actividades Realizadas.

→ El dia 23 de enero de 2025, se llevaron a cabo varias actividades en la obra de la cancha sintetica:

- Se realizo cajeo para estructura de la cancha sintetica
- Se realizo cargue y retiro de material sobrante de excavación para su disposición final en un sitio autorizado.
- Se verificaron los niveles de la topografia realizada anteriormente.

Firma:

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA


24-01-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 p.m.
Condiciones climaticas: Parcialmente soleado
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra
Operador Maquinaria (1)
Comision Topografica (1).
Actividades Realizadas

→ Se continua con la actividad de excavación mecanica para cajeo de estructura de la cancha Sintetica.


→ Se realiza replanteo y verificación de niveles por medio de la comisión de topografia.

→ Se realiza retiro de material sobrante de excavación para disposición final en sitio autorizado.

Firma:



RESIDENTE DE OBRA.



RESIDENTE DE INTERVENTORIA

25-01-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin de jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: Parcialmente soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Operador Maquinaria (1).

Powered by CamScanner

27-01-25 Lugar: Municipio de Guadalupe, Huila.
Inicio de jornada: 7:00 a.m Fin de jornada 5:00 p.m
Condiciones climaticas: Parcialmente Soleado
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de Obra (1)
Operador de Maquinaria (2).

Actividades Realizadas

→ Se Continua con la actividad de excavación mecanica para cajeo de estructura de cancha sintetica, por otra parte se realiza cargue y retiro de material sobrante de excavacion para disposición final en sitio autorizado.

Firma:

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

28-01-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin de jornada: 5:00 pm.
Condiciones climaticas: Parcialmente Soleado
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Operador Maquinaria (1).

Actividades Realizadas
→ Se Culmina la actividad de excavación mecanica para cajeo de la estructura de cancha sintetica, por otra parte se realiza cargue y retiro de material sobrante.

Powered by CamScanner

29-01-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 p.m.
Condiciones climaticas: Parcialmente Soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra
Maquinaria (3). Volqueta de 6m³

Actividades realizadas

→ Se realiza suministro de material de receba granular (capa de 20cm) para relleno del terreno de la cancha sintetica, por otra parte se realiza replanteo y verificación de niveles.

Firma:

RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

30-01-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin de jornada: 5:00 p.m
Condiciones climaticas: Parcialmente Soleado
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Maquinaria y equipos
- Volqueta 6m³ (2).
- Retroexcavadora.


Actividades Realizadas:

→ Suministro de material de receba granular (capa de 20cm) para relleno - del terreno de la cancha sintetica


→ Extendida, Nivelación y compactación de material de relleno

→ Replanteo y verificación de niveles

FIRMA:



RESIDENTE DE OBRA:



RESIDENTE DE INTERVENTORIA

31-01-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 p.m.
Condiciones climaticas: Parcialmente Soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra
Maquina y Equipo: Retroexcavadora. (1)
Volqueta 6m³ (2)


Actividades realizadas.

→ Suministro de material de recebo para relleno del área de construcción de la cancha sintetica.

→ Se realiza extencion — Nivelacion y compactacion del material de relleno (Recebo).

→ Se realiza Replanteo y verificacion de niveles.

FIRMA:



RESIDENTE DE OBRA.



RESIDENTE DE INT.

Powered by CamScanner

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

ENERO

FERNANDO CAMACHO LADINO

CamScanner

CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que VYM INGENERIA NI 900062688 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO, identificado con CC 7713933 en la planilla número 31527963 Sucursal No. 01oficina

Período pensión	2024-11	Número planilla	31527963	Entidad bancaria	BANCOLOMBIA
Período Salud	2024-12	Referencia de pago			
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2024-11-08		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
01	0			5711001	HUILA	NEIVA	AFP	230301	PORVENIR	30	$ 1.300.000	0,1600000	$ 208.000
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 1.300.000	0,000	$ 0
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 1.300.000	0,000	$ 0
							EPS	EPS005	SANITAS	30	$ 1.300.000	0,0400000	$ 52.000
							ARL	14-11	ARL SURA	30	$ 1.300.000	0,0696000	$ 90.500
							CCF	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$ 1.300.000	0,0400000	$ 52.000
							SENA	SENA	SENA	30	$ 1.300.000	0,0000000	$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 1.300.000	0,0000000	$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 1.300.000	0,0000000	$ 0
							Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 1.300.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que VYM INGENERIA NI 900062688 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO, identificado con CC 7713933 en la planilla número 31905315 Sucursal No. 01oficina

Período pensión	2024-12	Número planilla	31905315	Entidad bancaria	BANCOLOMBIA
Período Salud	2025-01	Referencia de pago			
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2024-12-11		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
01	0			5711001	HUILA	NEIVA	AFP	230301	PORVENIR	30	$ 1.300.000	0,1600000	$ 208.000
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 1.300.000	0,000	$ 0
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 1.300.000	0,000	$ 0
							EPS	EPS005	SANITAS	30	$ 1.300.000	0,0400000	$ 52.000
							ARL	14-11	ARL SURA	30	$ 1.300.000	0,0696000	$ 90.500
							CCF	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$ 1.300.000	0,0400000	$ 52.000
							SENA	SENA	SENA	30	$ 1.300.000	0,0000000	$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 1.300.000	0,0000000	$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 1.300.000	0,0000000	$ 0
							Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 1.300.000	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que VYM INGENERIA NI 900062688 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO, identificado con CC 7713933 en la planilla número 32219152 Sucursal No. 01oficina

Período pensión	2025-01	Número planilla	32219152	Entidad bancaria	BANCOLOMBIA
Período Salud	2025-02	Referencia de pago			
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2025-01-14		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
01	0			5711001	HUILA	NEIVA	AFP	230301	PORVENIR	30	$ 1.423.500	0,1600000	$ 227.800
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 1.423.500	0,000	$ 0
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 1.423.500	0,000	$ 0
							EPS	EPS005	SANITAS	30	$ 1.423.500	0,0400000	$ 57.000
							ARL	14-11	ARL SURA	30	$ 1.423.500	0,0696000	$ 99.100
							CCF	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$ 1.423.500	0,0400000	$ 57.000
							SENA	SENA	SENA	30	$ 1.423.500	0,0000000	$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 1.423.500	0,0000000	$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 1.423.500	0,0000000	$ 0
							Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 1.423.500	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que VYM INGENERIA NI 900062688 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO, identificado con CC 7713933 en la planilla número 32364582 Sucursal No. 01oficina

Período pensión	2025-02	Número planilla	32364582	Entidad bancaria	BANCOLOMBIA
Período Salud	2025-03	Referencia de pago			
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2025-02-10		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
01	0			5711001	HUILA	NEIVA	AFP	230301	PORVENIR	30	$ 1.423.500	0,1600000	$ 227.800
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 1.423.500	0,000	$ 0
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 1.423.500	0,000	$ 0
							EPS	EPS005	SANITAS	30	$ 1.423.500	0,0400000	$ 57.000
							ARL	14-11	ARL SURA	30	$ 1.423.500	0,0696000	$ 99.100
							CCF	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$ 1.423.500	0,0400000	$ 57.000
							SENA	SENA	SENA	30	$ 1.423.500	0,0000000	$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 1.423.500	0,0000000	$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 1.423.500	0,0000000	$ 0
							Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 1.423.500	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

ADRIANA LISETH MAYORCA PERDOMO

CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1079409298		MAYORCA PERDOMO ADRIANA LISSETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 5 W 33 26 SANTA INES	NEIVA-HUILA	8377022	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1231610022	9480892171	I	2025/02/24	2025/01/31	NEQUI	0	$490,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1079409298	MAYORCA ADRIANA																		231001	30	$1,720,000	$275,200	EPS005	30	$1,720,000	$215,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$490,200
Total	**Afiliados(1)**																						$1,720,000	$275,200			$1,720,000	$215,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$490,200

CamScanner

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1079409298		MAYORCA PERDOMO ADRIANA LISSETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 5 W 33 26 SANTA INES	NEIVA-HUILA	8377022	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1231610022	9480892171	I	2025/02/24	2025/01/31	NEQUI	0	$490,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,200	$0	$0	$275,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$275,200	$0	$0	$275,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$215,000	$0	$0	$215,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$215,000	$0	$0	$215,000
TOTAL				1	$490,200	$0	$0	$490,200

CamScanner

OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO

CamScanner

CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que VYM INGENERIA NI 900062688 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO, identificado con CC 1075213839 en la planilla número 32239644 Sucursal No. 195

Período pensión	2024-12	Número planilla	32239644	Entidad bancaria	BANCOLOMBIA
Período Salud	2024-12	Referencia de pago			
Tipo de planilla	Y	Fecha de pago	2025-01-14		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
59	0			5711001	HUILA	IQUIRA	AFP	SINAFP	SINAFP	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	0	$ 0	0,000	$ 0
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	0	$ 0	0,000	$ 0
							EPS	SINEPS	SIN EPS	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							ARL	14-11	ARL SURA	27	$ 1.170.000	0,0696000	$ 81.500
							CCF	SINCCF	SIN CCF	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							SENA	SENA	SENA	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	$ 0	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
R	**04/12/2024**																											0		

CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que VYM INGENERIA NI 900062688 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO, identificado con CC 1075213839 en la planilla número 32408056 Sucursal No. 195

Período pensión	2025-01	Número planilla	32408056	Entidad bancaria	BANCOLOMBIA
Período Salud	2025-01	Referencia de pago			
Tipo de planilla	Y	Fecha de pago	2025-02-10		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
59	0			5711001	HUILA	IQUIRA	AFP	SINAFP	SINAFP	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	0	$ 0	0,000	$ 0
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	0	$ 0	0,000	$ 0
							EPS	SINEPS	SIN EPS	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							ARL	14-11	ARL SURA	30	$ 1.423.500	0,0696000	$ 99.100
							CCF	SINCCF	SIN CCF	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							SENA	SENA	SENA	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	$ 0	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CORRESPONDENCIA

CamScanner

Neiva, 27 de enero de 2025

V&M-CBTA-10

Señores:
CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S.
ATN. ING. DANIELA CARRILLO
R.L. Interventoría
Ciudad

REFERENCIA**: CONTRATO CLOPIH221 DE 2024 "CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA"**

Asunto: Solicitud de prórroga.

Respetuoso saludo,

Por medio del presente nos dirigimos a usted con el fin de solicitar una prórroga del contrato de obra CLOPIH221 de 2024, cuyo objeto es la "**CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA"** celebrado entre **V&M INGENIERÍA S.A.S** y el **MUNCIPIO DE GUADALUPE**; debido a circunstancias imprevistas que han afectado el cronograma de la obra.

En la reunión del comité técnico realizado en las instalaciones de INDER HUILA, se analizaron las actividades realizadas hasta la fecha, incluyendo la localización, replanteo y descapote de la zona. Sin embargo, se detectaron discrepancias en las cantidades de obra, lo que ha requerido ajustes de diseño y una reevaluación de dichas cantidades, más aun cuando el lote que se tenia destinado inicialmente para la construccion de la cancha tuvo que ser cambiado debido a la problemática generada en el contexto de la construccion de la villa olimpica y las afectaciones originadas por el rio Suaza a dicho predio.

La nueva ubicación de la cancha sintética, anunciada por la alcaldía de Guadalupe, presenta un terreno irregular que requiere cortes y rellenos significativos para asegurar la planicie correspondiente a la construcción de la cancha. Esto ha implicado un ajuste a los diseños modificando el cronograma de obra y la necesidad de una prórroga para garantizar la estabilidad y calidad del proyecto.

La prórroga solicitada es de dos (02) meses, contados a partir de la fecha de finalización inicialmente establecida, es decir, el 11 de febrero de 2025. Este tiempo adicional es necesario para realizar las actividades pendientes debido a los ajustes realizados en los diseños, con el fin de cumplir con el objeto del proyecto y garantizar su estabilidad, así como para asegurar la ejecución adecuada de las actvidades contratadas.

Por todo lo anteriormente expuesto, V&M INGENIERIA S.A.S, contratista de obra CLOPIH221 de 2024, solicita formalmente ante ustedes una prórroga en tiempo de dos (02) meses, para

DIRECCION: CR 4 No. 11 – 188
TERUEL - HUILA
Tel: 8741735
E-MA ingenieria52@gmail.com

CamScanner

garantizar la ejecución de obra dentro de los lineamientos técnicos establecidos, y avanzar en las actividades propuestas de manera adecuada.

Agradezco su atención a esta solicitud.

Atentamente,



YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
Representante Legal

DIRECCION: CR 4 No. 11 – 188
TERUEL - HUILA
Tel: 8741735
E-MA[illegible]ngenieriasas@gmail.com

CamScanner
