CONTRATO DE OBRA No. CLOPIH221 de 2024

INFORME DE OBRA No. 006

MENSUAL [X] **FINAL** [ ]

Objeto Contrato: "CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"





MUNICIPIO: **GUADALUPE**

DEPARTAMENTO: **HUILA**

CONTRATO DE (OBRA) No. CLOPIH221 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y LA FIRMA V&M INGENIERÍA SAS

APOYO A LA SUPERVISIÓN	LUIS MIGUEL CAQUIMBO	**ENTIDAD**	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	CLOPIH221DE 2024		
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"	**PERIODO DEL INFORME**	Entre 01 de abril al 30 de abril de 2025.
CONTRATISTA	V&M INGENIERÍA SAS	**NIT:**	900.062.688-7
REPRESENTANTE LEGAL:	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO	**C.C:**	7.713.933 NEIVA HUILA

FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	27/09/2024		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	12/11/2024		
PLAZO INICIAL	El plazo estimado para la ejecución del contrato será TRES (03) meses, contados a partir del acta e inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones.		
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	31/01/2025 Dos (02) meses		
AZO ADICIONAL (No.2) (D/M/A):	10/04/2025 Dos (02) meses		
PLAZO TOTAL SEGÚN OTRO SI No. 2	El plazo estimado para la ejecución del contrato será Siete (07) meses, contados a partir del acta e inicio, conforme a la adicional en tiempo mediante prorroga No.2.		
VALOR INICIAL:	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($1.453.038.929,00) MCTE		
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	N/A		
VALOR TOTAL:	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($1.453.038.929,00) MCTE		
INTERVENTOR:	CONSTRUMAC INGENIERÍA SAS	**NIT:**	900.116.571-8
REPRESENTANTE LEGAL:	DANIELA CARRILLO TAVERA	**C.C:**	1.007.750.886 DE ARMENIA (Q)


2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto Construcción Cancha Sintética Villa Olímpica del Municipio de Guadalupe, Departamento del Huila se ubica en el municipio de Guadalupe - Huila, en la región andina de Colombia.

Esta localidad se encuentra rodeada de paisajes montañosos y ríos, es conocida por su belleza natural y su enorme herencia cultural. La cancha sintética se construirá dentro de las instalaciones del proyecto macro Villa Olímpica, área designada para actividades deportivas y recreativas que beneficiarán a la comunidad local.

MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA, ESPECÍFICAMENTE EN EL KM 3 VÍA MUNICIPIO DE GUADALUPE AL MUNICIPIO DE ALTAMIRA.



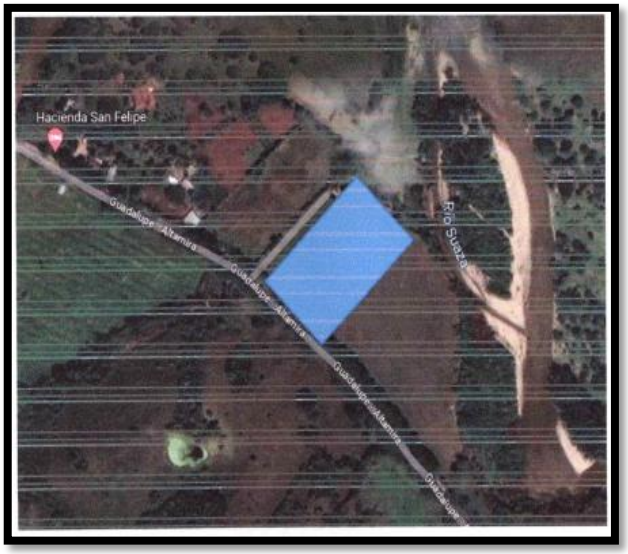

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La cancha sintética tendrá una superficie total de 1750 m² y contará con una serie de características y componentes, incluyendo:

- Red de aguas lluvias con cuneta perimetral de concreto de 3000 psi, cajas de inspección y filtros laterales.
- Placa de piso de 3000 PSI.
- Instalación de césped.
- Demarcación de la cancha.
- Cerramiento perimetral.
- Iluminación.

El proyecto busca proporcionar un espacio seguro y de alta calidad para la práctica deportiva y recreativa, así como para la realización de eventos culturales y comunitarios.

4. INFORME CONCRETO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DURANTE EL PERIODO

Se realiza reunión con el Comité de Veeduría, secretaria de Planeación y directores de la obra para supervisar avances y calidad del proceso de construcción del proyecto CLOPIH 221/2024. El director de la obra presenta los resultados alcanzados y la gestión del control de la obra, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos y la transparencia en el proceso.

5. HISTORIA CRONOLÓGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa)
FECHA DE INICIO	**12/11/2024**			
OTROSÍ No.1	**31/01/2025**	**81**		**13/04/2025**
OTROSÍ No.2	**10/04/2025**	**69**		**12/06/2025**

TERMINACIÓN CTO.	**11/06/2025**			
TOTAL DIAS		**150**		

6. ACTAS

Tipo de Acta	No.	Fecha
ACTA DE INICIO		12 de noviembre de 2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No. 1	**1**	31 de enero de 2025
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No. 2	**2**	10 de abril de 2025

7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

a). **Actividades administrativas**	- Registro en la bitácora de obra de las actividades realizadas durante el periodo del informe. - Presentación de informes mensuales para revisión y aprobación de la interventoría, según los lineamientos contractuales. - Respuesta oportuna mediante oficios a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato por parte del interventor o la supervisión. - Revisión y trámite oportuno de las actas levantadas en el periodo del informe. - Control financiero de las obras ejecutadas y control presupuestal. - Pago de servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra. - Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que se encuentra laborando para la ejecución de la obra. - Cumplimiento con obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculadora a la obra. - Afiliación de personal directo, verificando que se ubique en el nivel de riesgo correspondiente. - Cuantificación de mayores y menores cantidades para entrega de balance No.1
b.) **Actividades operativas**	Durante el mes de abril de 2025, Se adelanta acto administrativo en las instalaciones del INDER HUILA las partes interesadas V&M INENIERIA SAS R/L Yerson Fernando Camacho Ladino en calidad de contratista, CONSTRUCMAC INGENIEROS SAS R/L Daniela Carrillo Tavera en calidad de interventor y Luis Miguel Caquimbo Gómez como apoyo a la Supervisión del contrato de interventoría Con el propósito de adelantar comité técnico de obra para revisar el avance del contrato y el estado del balance de obra No. 1 de mayores y menores cantidades respecto al capítulo eléctrico. Además, se expone el retraso acumulado del 27.36% de la ejecución de obra Por lo anterior se emite solicitud de prorroga mediante oficio V&M-GUA-17 como medida correctiva con el fin de mitigar el atraso presentado considerando que, la ejecución de las actividades se ha visto afectada por factores externos no imputables al contratista, específicamente por factores como: En primer lugar, el cambio en la ubicación del lote destinado para la construcción de la cancha sintética, implico nuevo levantamiento topográfico e implantación de diseño de la cancha sintética en otra ubicación, garantizando la funcionalidad de la misma. Sin embargo, esta eventualidad generó cantidades mayores y menores en cortes, rellenos y demás actividades. Por otra parte, la funcionalidad del sistema eléctrico se encuentra supeditada a un proyecto macro externo al contratista, en la misma línea se expresa que el sistema eléctrico requiere revisión y ajuste de mayores y menores cantidades con el fin de dar cumplimiento a la meta física contrato con ello la finalidad de emitir balance de obra No.1

Por otra parte, el ingreso de materiales de obra se vio afectado por las constantes protestas y bloqueos de vías por parte del sector arrocero en el departamento del Huila y Tolima lo que impidió en transporte y entrega oportuna de materiales, herramienta y equipos.

Finalmente, pero no menos importante las condiciones climáticas adversas en la presente ola invernal que afectan la región, con días de constantes lluvias torrenciales han dificultado la ejecución de las actividades.

Estos factores han generado un atraso en el desarrollo de las actividades contractuales debido a que se ha ocasionado deterioro de las vías de acceso a las plantas que proveen de materiales pétreos, ingreso de maquinaria, equipos y materiales de ferretería programados para entrega en obra.

De acuerdo a lo anterior y bajo a las consideraciones anteriormente expuestas se firma otro si No.2 -prorroga el día 10 de abril de 2025

Del mismo modo, en el marco de la ejecución del contrato, durante el mes de abril se llevaron a cabo las actividades programadas correspondientes al cerramiento perimetral

Durante este período, se ejecutaron las siguientes actividades:

- Excavación manual con retiro de material
- Red de aguas lluvias suministro e instalación de tubería PVC Ø 8"
- Construcción de filtros laterales externos en un ancho de 0.40 m, con altura variable menor a 0.50 m, recubrimiento en geotextil no tejido NT-1600, con gravilla común o triturado de 1 1/2" a 4" + Tubería PVC drenajes de 6"
- Placa de piso en concreto 3000 psi, e =0,07m dilatada, junta machimbrada incluye malla electrosoldada de 5mm.
- Suministro e instalación de bordillos prefabricado 20X50X50
- Concreto 3000 psi pedestales cerramiento perimetral
- Módulos cerramiento 2,5x2,5 m en Angulo 1 1/2"x1/8 con varilla de 5/8" lisa cada 14 cms, diagonales en angulo 1 1/2" x 1/8 y lamina cal 16 10X10 cms de refuerzo en las esquinas (lado norte y sur) h=2,5m

Es importante destacar que estas actividades se ejecutaron en estricto cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad establecidas, garantizando la calidad de la obra.

8. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO


MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA

ABRIL 2025

Durante el mes de abril de 2025, el municipio de Guadalupe, Huila, experimentó condiciones climáticas adversas con fuertes precipitaciones que dificultaron el desarrollo óptimo de las actividades programadas. La ola invernal que afecta la región ha generado pérdidas económicas considerables al contratista, lo que ha ocasionado reprocesos y retrasos en el cronograma de actividades predecesoras.

El promedio de lluvia durante un periodo de 31 días en abril en Guadalupe es esencialmente constante, permaneciendo en aproximadamente 116 milímetros y rara vez excede 186 milímetros o es menos de 50 milímetros. El promedio de la acumulación máxima de 31 días es 119

milímetros, registrado el 17 de abril. Estas condiciones climáticas han tenido un impacto significativo en la ejecución de las actividades y han generado retrasos y pérdidas económicas

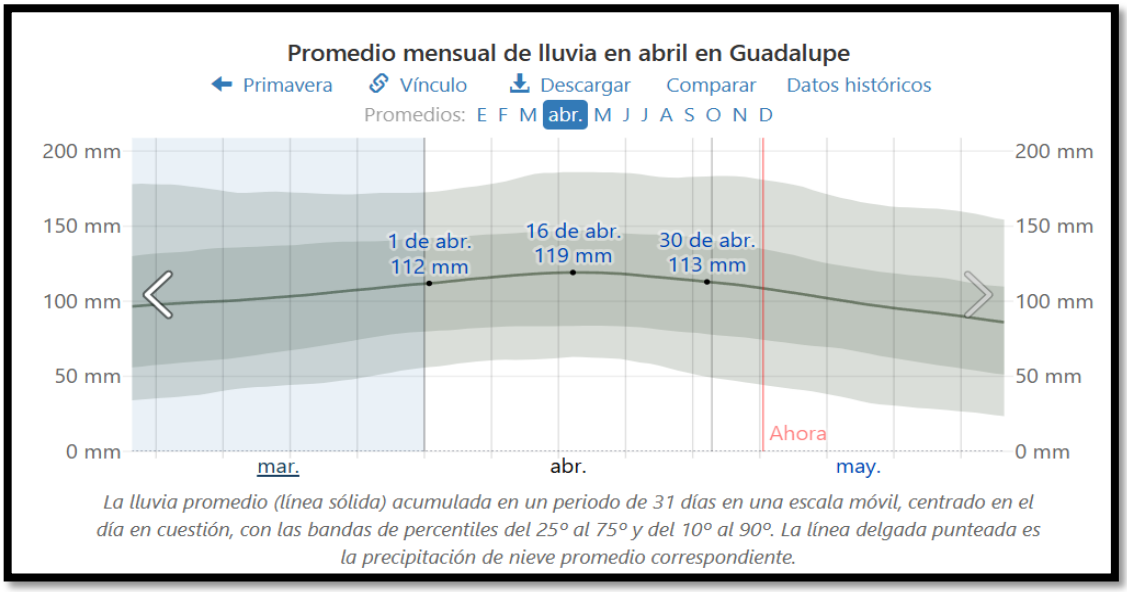

.

9. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Tipo Prueba de Laboratorio	Resistencia concreto	Relación volumétrica concreto
Diseños de mezcla para los concretos.	2500 PSI	CANTIDADES EN VOLUMEN SUELTO PARA PREPARAR UN METRO CÚBICO DE CONCRETO (M3) 18Mpa CEMENTO: 6,78 Bulto Mixto Fuente Acopio Héctor Vargas 1,22 m3 AGUA:175 Litros
Diseños de mezcla para base.	*3000 PSI*	*CANTIDADES EN VOLUMEN SUELTO PARA PREPARAR UN METRO CÚBICO DE CONCRETO (M3) 21Mpa* *CEMENTO: 7,49 Bulto* *Mixto Fuente Acopio Héctor Vargas 1,2 m3* *AGUA:175 Litros*
Compresión simple al concreto.	*2500 PSI CONCRETO CICLOPEO*	
	3000 PSI VIGA DE CIMENTACION	
	3000 PSI PLACA DE PISO	
Ensayo de compactación de campo	*DENSIDAD SECA MÁXIMA (g./cm3)* *HUMEDAD ÓPTIMA (%)*	

	Gravedad Especifica Bulk Partículas Gruesas, K (g/cm3) R² = 0.9954 2.145 6.00 2.56
Proctor compactación modificada material de relleno	*DENSIDAD SECA MÁXIMA (g./cm3)* *HUMEDAD ÓPTIMA (%)* *Gravedad Especifica Bulk Partículas Gruesas, K (g/cm3) R² = 0.9954 2.145 6.00 2.56*

NOTA: *Las obras de concreto ejecutadas se le realiza prueba a la compresión simple, Norma Articulo 630-07 ensayo E-410, cumpliendo con las resistencias exigidas.*

Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Anden, Muro concreto ciclópeo, Cuneta)	**FECHA TOMA DE MUESTRA** (dd/mm/aaaa)	**FECHA ROTURA** (dd/mm/aaaa)	**EDAD DEL ENSAYO**			**RESISTENCIA REQUERIDA**	**RESISTENCIA FINAL OBTENIDA**	**CUMPLE/ NO CUMPLE**
			7	**14**	**28**			
Placa de piso polideportivo	04/03/2025	11/03/2025	x			2100 PSI	2399 PSI	CUMPLE
		11/03/2025	x			2100 PSI	2290 PSI	CUMPLE
		01/04/2025			x	3000 PSI	3087 PSI	CUMPLE
		01/04/2025			x	3000 PSI	3159 PSI	CUMPLE
Placa de piso polideportivo	05/03/2025	12/03/2025	x			2100 PSI	2460 PSI	CUMPLE
		12/03/2025	x			2100 PSI	2499 PSI	CUMPLE
		02/04/2025			x	3000 PSI	3531 PSI	CUMPLE
		02/04/2025			x	3000 PSI	3619 PSI	CUMPLE
Viga de cimentación cerramiento	11/03/2025	18/03/2025	x			2100 PSI	2568.95 PSI	CUMPLE
		18/03/2025	x			2100 PSI	2603.43 PSI	CUMPLE
		08/04/2025			x	3000 PSI	3820.44 PSI	CUMPLE
		08/04/2025			x	3000 PSI	3774.89 PSI	CUMPLE
Placa de piso polideportivo	15/03/2025	22/03/2025	x			2100 PSI	2029.94 PSI	NO CUMPLE
		22/03/2025	x			2100 PSI	1950.58 PSI	NO CUMPLE
		12/04/2025			x	3000 PSI	3080.31 PSI	CUMPLE
		12/04/2025			x	3000 PSI	3138.43 PSI	CUMPLE
Placa de piso polideportivo	18/03/2025	25/03/2025	x			2100 PSI	2123.86 PSI	CUMPLE
		25/03/2025	x			2100 PSI	2031.63 PSI	CUMPLE
		15/04/2025			x	3000 PSI	3221.44 PSI	CUMPLE

		15/04/2025			x	3000 PSI	3145.13 PSI	CUMPLE
Placa de piso polideportivo	20/03/2025	27/03/2025	x			2100 PSI	1857.42 PSI	NO CUMPLE
		27/03/2025	x			2100 PSI	1842.53 PSI	NO CUMPLE
		17/04/2025			x	3000 PSI	3022.05 PSI	CUMPLE
		17/04/2025			x	3000 PSI	3005.63 PSI	CUMPLE
Placa de piso polideportivo	22/03/2025	29/03/2025	x			2100 PSI	2215.39 PSI	CUMPLE
		29/03/2025	x			2100 PSI	2221.70 PSI	CUMPLE
		19/04/2025			x	3000 PSI	3197.64 PSI	CUMPLE
		19/04/2025			x	3000 PSI	3056.12 PSI	CUMPLE
Placa de piso polideportivo	25/03/2025	01/04/2025	x			2100 PSI	2229.13 PSI	CUMPLE
		01/04/2025	x			2100 PSI	2170.02 PSI	CUMPLE
		22/04/2025			x	3000 PSI	3045.84 PSI	CUMPLE
		22/04/2025			x	3000 PSI	3072.10 PSI	CUMPLE
Placa de piso polideportivo	27/03/2025	03/04/2025	x			2100 PSI	1947.24 PSI	NO CUMPLE
		03/04/2025	x			2100 PSI	2093.61 PSI	NO CUMPLE
		24/04/2025			x	3000 PSI	3051.59 PSI	CUMPLE
		24/04/2025			x	3000 PSI	3130.33 PSI	CUMPLE
Placa de piso polideportivo	31/03/2025	07/04/2025	x			2100 PSI	2451.60 PSI	CUMPLE
		07/04/2025	x			2100 PSI	2402.31 PSI	CUMPLE
		28/04/2025			x	3000 PSI	3565.25 PSI	CUMPLE
		28/04/2025			x	3000 PSI	3072.98 PSI	CUMPLE

DENSIDADES MÉTODO CONO DE ARENA					
No. ENSAYO	**ABSCISA/EJE**	**PROFUNDIDAD/ALTURA – DEL ENSAYO EN CM.**	**MATERIAL**	**PORCENTAJE COMPACTACIÓN (%)**	**CUMPLE/ NO CUMPLE**
D-0001	Cancha sintética costado izquierdo	12.00	Relleno	99.26%	CUMPLE
D-0002	Cancha sintética costado izquierdo	12.00	Relleno	98.37%	CUMPLE
D-0003	Cancha sintética costado izquierdo	12.00	Relleno	98.80%	CUMPLE

D-0004	Cancha sintética costado izquierdo	12.00	Relleno	99.17%	CUMPLE
D-0005	Cancha sintética costado derecho	12.00	Relleno	98.95%	CUMPLE
D-0006	Cancha sintética costado derecho	12.00	Relleno	98.14%	CUMPLE

10. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	**Fecha** (dd/mm/aaaa)	**Valor Acta**	**Amortización**	**Valor pagado**
Valor Anticipo (20%)	**04/03/2025**	$$ 290.607.785, 80		$
Acta Parcial No. 1	**N/A**	$	$	$
Acta Recibo Final No.	**N/A**	$	$	$
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 1,453,038,929.00	**N/A**	$ 1,453,038,929.00		

11. COMITÉS DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	**Lugar**	**Resultado del Comité**
19 DE NOVIEMBRE DE 2024	Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila. (INDERHUILA)	En el municipio de Guadalupe se desarrolló socialización del contrato de obra e interventoría y se realizó constitución de veeduría ciudadana. Asistentes: Ingeniera Jimena Jiménez (apoyo a la supervisión) - Ingeniero Yerson Fernando Camacho Ladino (representante legal de V&M INGENIERÍA SAS, contratista de obra) - Ingeniera Daniela Carrillo Tavera (representante legal de CONSTRUMAC INGENIERO SAS, interventoría)
26 DE NOVIEMBRE DE 2024	Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila. (INDERHUILA)	Se lleva a cabo reunión en las instalaciones del INDER HUILA con el fin de discutir el avance del contrato de obra CLOPIH 221 de 2024. Asistentes: - Ingeniera Jimena Jiménez (apoyo a la supervisión) - Ingeniero Yerson Fernando Camacho Ladino (representante legal de V&M INGENIERÍA SAS, contratista de obra) - Ingeniera Daniela Carrillo Tavera (representante legal de CONSTRUMAC INGENIERO SAS, interventoría)

		Objetivo: Solicitar avances de ejecución del contrato y discutir dificultades presentadas.
23 DE DICIEMBRE DE 2024	Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila. (INDERHUILA)	Se lleva a cabo reunión en las instalaciones del INDER HUILA con el fin de discutir el contrato CLOPIH 221 de 2024. Asistentes: - Ingeniera Jimena Jiménez (apoyo a la supervisión) - Ingeniero Yerson Fernando Camacho Ladino Representante legal de V&M INGENIERÍA SAS, contratista de obra - Ingeniera Daniela Carrillo Tavera Representante legal de CONSTRUMAC INGENIERO SAS, interventoría Objetivo: Analizar las respuestas de la Alcaldía de Guadalupe sobre topografía y diseños, revelando una nueva localización del proyecto que difiere de la etapa precontractual.
23 DE ENERO DE 2025	Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila. (INDERHUILA)	En instalaciones de INDER Neiva se realizó comité técnico para socializar el avance de la obra hasta la fecha, que abarca actividades de localización, replanteo y descapote de la zona. Asistentes: - Ingeniera Jimena Jiménez (apoyo a la supervisión) - Ingeniero Yerson Fernando Camacho Ladino Representante legal de V&M INGENIERÍA SAS, contratista de obra - Ingeniera Daniela Carrillo Tavera Representante legal de CONSTRUMAC INGENIERO SAS, interventoría
25 DE FEBRERO DE 2025	Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila. (INDERHUILA)	Se realizó comité técnico el pasado 25 de febrero de 2025 para evaluar el desarrollo y avance de las actividades, del mismo desprendieron ciertos compromisos a evaluar por parte del ente supervisor del contrato, el contratista de obra y la evaluación y aprobación de la interventoría: En el marco del comité, se acordó revisar y actualizar los estudios y diseños del sistema eléctrico para su implementación en la cancha sintética del municipio de Guadalupe. El objetivo es realizar una cuantificación y distribución adecuada del sistema eléctrico mediante la revisión de estudios y diseños para dar cumplimiento al marco contractual de las actividades y que este sea acorde a las necesidades del escenario deportivo.
02 DE ABRIL DE 2025	Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila. (INDERHUILA)	Se lleva a cabo reunión en las instalaciones del INDER HUILA con el fin de discutir el contrato CLOPIH 221 de 2024. Asistentes: - Ingeniero Yerson Fernando Camacho Ladino Representante legal de V&M INGENIERÍA SAS, contratista de obra - Daniela Carrillo Tavera Representante legal de CONSTRUMAC INGENIERO SAS, interventoría - Luis Miguel Caquimbo (supervisor por parte de INDERHUILA)

		Objetivo: Revisar el avance del contrato y discutir dificultades presentadas. Se estipula que la obra se desarrolla a un ritmo inferior al estipulado debido a condiciones externas y cambios en el diseño eléctrico, por ende, se solicita y aprueba prorrogar el contrato por 2 meses, con el fin de presentar el balance de obra aprobado por interventoría y gestionar la modificación del proyecto y adición presupuestal.

12. RELACIÓN DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS

TIPO DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA A LA ENTIDAD (dd/mm/aaaa)	No. RADICADO (Emitido por INDERHUILA)	FORMATO (Físico/Digital)
Correspondencia (periodo del (01 al 30 de abril de 2025)	04/04/20255		Físico – Digital
Solicitud de prorroga	04/04/20255		Digital
Solicitud plazo adicional entrega de Blance No. 1	11/04/2025		Digital
Entrega acta de mayores y menores cantidades - Ítems no previstos para adición de recursos	22/04/2025		Digital
Copia de Bitácora de Obra (periodo del (01 al 30 de abril de 2025)	30/04/2025		Físico – Digital
Planillas de aportes a seguridad social integral (EPS-ARP-AFP) periodo del (01 al 30 de abril de 2025)	30/04/2025		Físico – Digital
Registros de ensayos de laboratorio periodo del (01 al 30 de enero de 2025)	30/04/2025		Físico – Digital

13. RELACIÓN DE PERSONAL DURANTE EL PERIODO

NOMBRE Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO	7.713.933	**REPRESENTANTE LEGAL**	**Indefinido**
YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO	7.713.933	DIRECTOR DE OBRA	**Indefinido**
ADRIANA LISETH MAYORCA PERDOMO	1.079.409.298	RESIDENTE DE OBRA	Prestación de servicios
OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO	1.075.213.839	PROFESIONAL SST	Prestación de servicios
PABLO ARBEY LIZARAZO CORREA	17.709.845	MAESTRO DE OBRA	Prestación de servicios
MANUEL BUSTOS SALDAÑA	1.006.531.292	AYUDANTE	Obra o Labor
DIEGO ALBERTO CASTILLA SCARPETTA	1.000.514.656	AYUDANTE	Obra o Labor

DANIEL JOSE SANTOS MENDOZA	1.002.230.693	AYUDANTE	Obra o Labor
MARIO JOSE SANTOS URAN	92.533.487	AYUDANTE	Obra o Labor
LEONARDO TOVAR BETES	1.083.882.691	AYUDANTE	Obra o Labor

14. RELACIÓN DE PAGOS

TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)	No. COMPROBANTE	FECHA
ANTICIPO	191796625 - P.A. ANT V&M INGENIERIA SAS	04/03/2025

15. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO
YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO	$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 0.00	33033425	04/04/2025
ADRIANA LISETH MAYORCA PERDOMO	$ 275.200	$ 215.000	$ 104.300	$ 0.00	$ 0.00	PY 33700064 PI 9484509223	09/06/2025 28/04/2025
OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO	$ 227.800	$ 178.000	$ 99.100	$ 0.00	$ 0.00	PY 33067091 PI 32748466	12/05/2025 07/04/2025
PABLO ARBEY LIZARAZO CORREA	$ 227.800	$ 178.000	$ 99.100	$ 0.00	$ 0.00	PY 33331858 PI 33027021	12/05/2025 13/05/2025
MANUEL BUSTOS SALDAÑA	$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 0.00	33268655	12/05/2025
DIEGO ALBERTO CASTILLA SCARPETTA	$ 91.200	$ 22.800	$ 39.700	$ 22.800	$ 0.00	33268655	12/05/2025
DANIEL JOSE SANTOS MENDOZA	$ 91.200	$ 22.800	$ 39.700	$ 22.800	$ 0.00	33268655	12/05/2025
MARIO JOSE SANTOS URAN	$ 91.200	$ 22.800	$ 39.700	$ 22.800	$ 0.00	33268655	12/05/2025
LEONARDO TOVAR BETES	$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 0.00	33268655	12/05/2025

16. RELACIÓN DE PÓLIZAS DE GARANTÍA

Póliza legalización del CONTRATO: CLOPIH221 DE 2024

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO DE OBRA

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (D/M/A):	AMPARO	VIGENCIA DESDE (D/M/A):	VIGENCIA HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S. A	61-44-10155753	Anexo 0	27/09/2024	Cumplimiento del contrato	27/09/2024	27/06/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	27/09/2024	27/06/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	27/09/2024	27/12/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (D/M/A):	VIGENCIA HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S. A	61-40-101020276	Anexo 0	27/09/2024	27/09/2024	27/12/2024

Póliza actualizada ACTA DE INICIO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (D/M/A):	VIGENCIA HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S. A	61-44-101055753	Anexo 1-2	19/11/2024	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	12/08/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	12/11/2024	12/08/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/11/2024	12/02/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (D/M/A):	VIGENCIA HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S. A	61-40-101020276	Anexo 1-2	19/11/2025	12/11/2024	11/02/2025

Póliza actualizada x PRORROGA No. 1

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO – OTRO SI No.1 31/01/2025

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (D/M/A):	VIGENCIA HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S. A	61-44-101055753	Anexo 3	12/02/2025	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	12/10/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	12/11/2024	12/10/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/11/2024	12/04/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD OTRO SI No.1 31/01/2025

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (D/M/A):	VIGENCIA HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S. A	61-44-101020276	Anexo 3-4	12/02/2025	12/11/2024	12/04/2025

Póliza actualizada x PRORROGA No. 2

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO – OTRO SI No.2 10/04/2025


ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (D/M/A):	VIGENCIA HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S. A	61-44-101055753	ANEXO 3	16/04/2025	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	12/12/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	12/11/2024	12/12/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/11/2024	12/06/2028

				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD OTRO SI No. 2 10/04/2025


ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (D/M/A):	HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S. A	61-44-101020276	ANEXO 4	16/04/2025	12/11/2024	12/06/2025

17. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO.

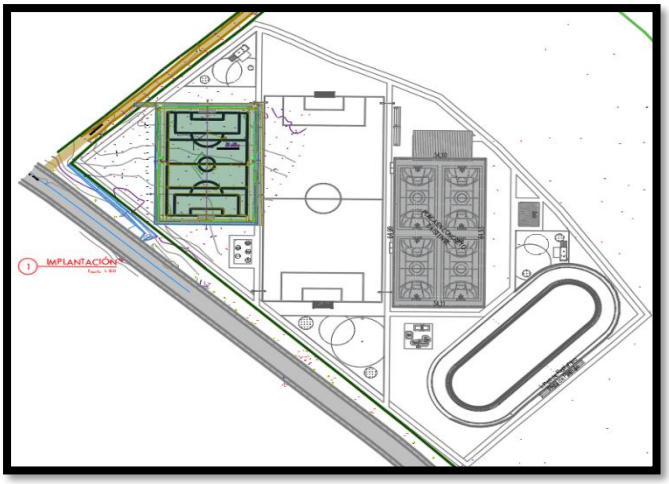





Levantamiento topográfico con el fin de determinar ajustes de diseño que garanticen la correcta ejecución del contrato.

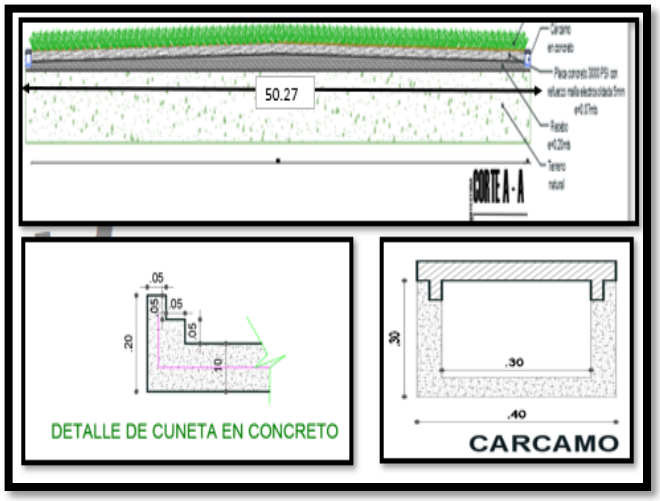


Detalle de cuenta perimetral - Cárcamo

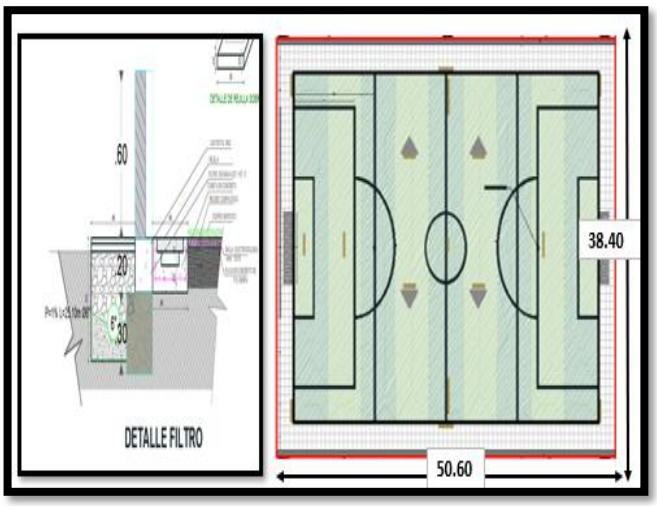


Detalle filtros laterales externos

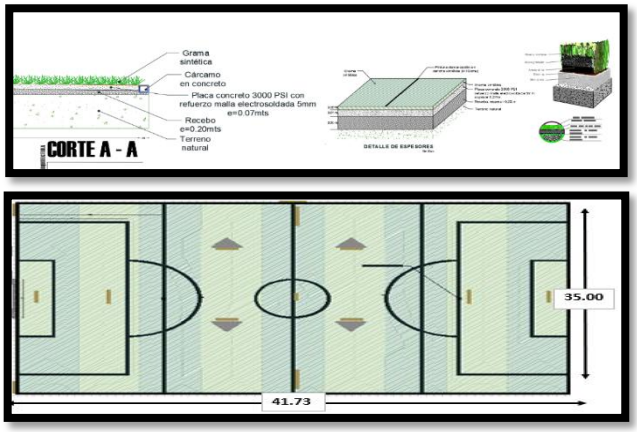


Detalle placa de piso en concreto de 3000 PSI

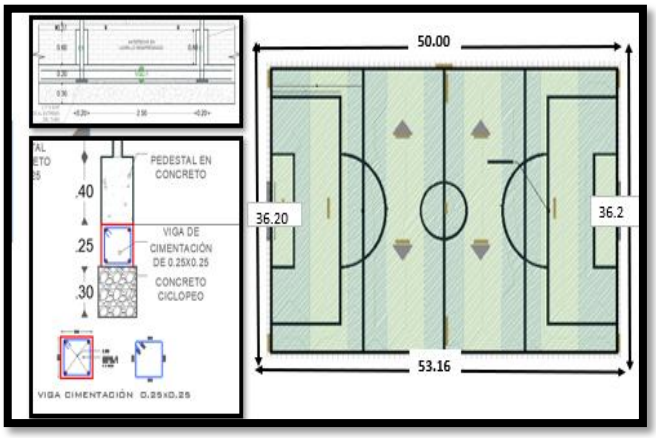


Detalle concreto ciclópeo, viga de cimentación y pedestales

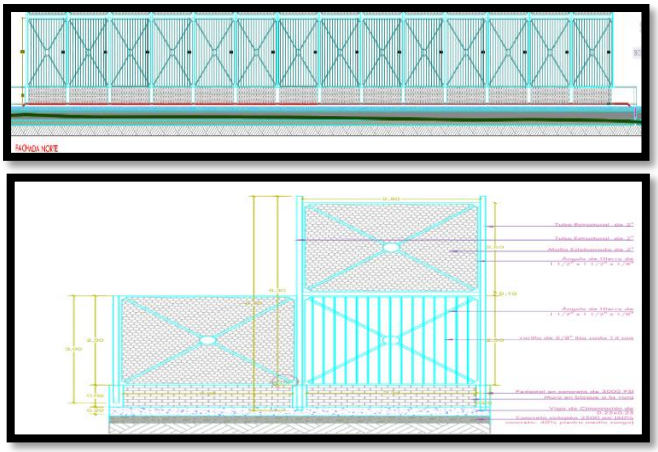


Detalle de cerramiento metálico Módulos cerramiento 2,5x2,5 m en ángulo 1 1/2"x1/8 con varilla de 5/8"

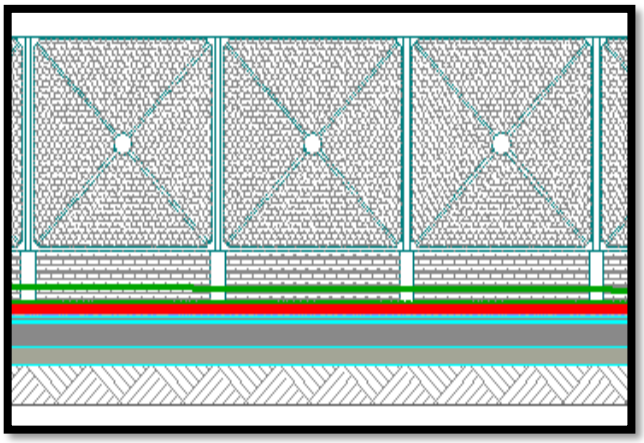

Detalle cerramiento metálico Módulos cerramiento 2,5x2,5 m en malla eslabonada

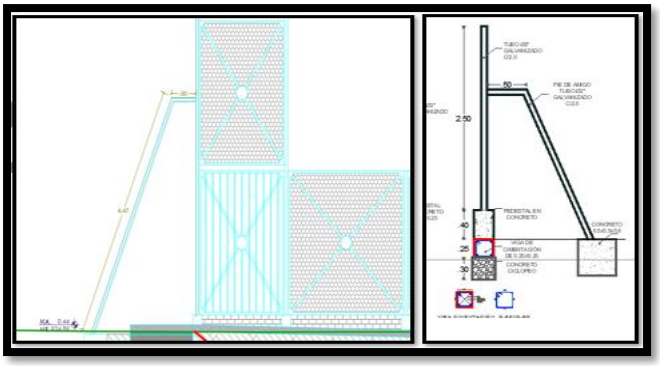

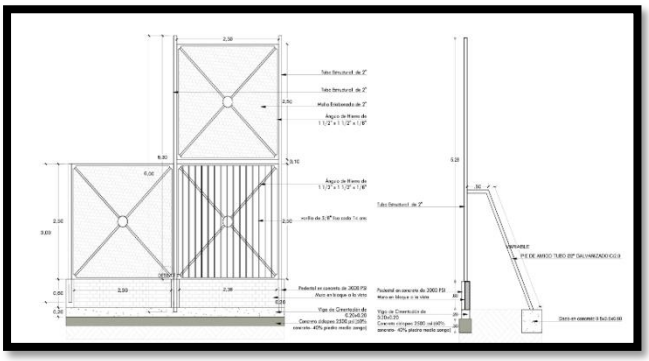

18. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

N.º	ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES					EJECUTADO ABR 2025			EJECUTADO ACUMULADO	
		DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	%	CANT	%
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES										
1	1.1	Localización y replanteo manual	m²	1,924.00	$ 2,226	$ 4,282,824				1924.00	100%
2	1.2	Descapote e=0,20m a máquina incluye retiro material	m²	1,924.00	$ 4,770	$ 9,177,480				1924.00	100%
SUB-TOTAL CAPITULO						**$ 13,460,304**		**$ 0**		0.00	
2	MOVIMIENTO DE TIERRA										
3	2.1	Excavación manual incluye retiro	m³	119.94	$ 31,545	$ 3,783,507	65.10	$ 2,053,580	54%	119.94	100%
4	2.2	Excavación mecánica incluye retiro 1 km	m³	384.80	$ 19,793	$ 7,616,346				384.80	100%
5	2.3	Rellenos con recebo compactado mecánicamente	m³	384.80	$ 190,829	$ 73,430,999				384.80	100%
SUB-TOTAL CAPITULO						**$ 84,830,852**		**$ 2,053,580**			
3	RED AGUAS LLUVIAS										
6	3.1	Construcción de cuneta perimetral en concreto 3000 PSI; Dimensiones: 40 cm de ancho y altura variable. incluye rejilla prefabricada en poliuretano	ml	104.00	$ 137,428	$ 14,292,512				0.00	0%
7	3.2	Caja inspección 1,0x 1,0 m medida interna en concreto 3000 psi para empalme sistema de drenaje, incluye tapa con marco y cañuela, altura variable	und	4.00	$ 657,029	$ 2,628,116				0.00	0%
8	3.3	Red de aguas lluvias suministro e instalación de tubería PVC Ø 8" incluye: Transporte al sitio de la obra, cama con arena 15 cms y relleno material de la excavación a zanjón	ml	30.00	$ 79,488	$ 2,384,640	30.00	$ 2,384,640	100%	30.00	100%

18. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS												
N.º	ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES					EJECUTADO ABR 2025			EJECUTADO ACUMULADO	
		DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	%	CANT	%
9	3.4	Construcción de filtros laterales externos en un ancho de 0.40 m, con altura variable menor a 0.50 m, recubrimiento en geotextil no tejido NT-1600, con gravilla común o triturado de 1 1/2" a 4" + Tubería PVC drenajes de 6"	ml	178.00	$ 99,727	$ 17,751,406	178.00	$ 17,751,406	100%	178.00	100%
10	3.5	Caja inspección 1,2x 1,2 m medida interna en concreto 3000 psi para empalme sistema de drenaje, incluye tapa con marco y cañuela, altura variable	und	2.00	$ 713,327	$ 1,426,654				0.00	0%
SUB-TOTAL CAPITULO						**$ 38,483,328**		**$ 20,136,046**			
4	**PLACA CANCHA**										
11	4.1	Placa de piso en concreto 3000 psi, e =0,07m dilatada, junta machimbrada incluye malla electrosoldada de 5mm.	m^2	1,750.00	$ 87,325	$ 152,818,750	70.00	$ 6,112,750	4%	1750.00	100%
12	4.2	Marco para microfutbol futbol 8 6mX2m, en tubo galvanizado tipo pesado de 4", según especificaciones técnicas, incluye anclaje, malla e instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	und	2.00	$ 2,344,832	$ 4,689,664				0.00	0%

18. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS												
N.º	ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES					EJECUTADO ABR 2025			EJECUTADO ACUMULADO	
		DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	%	CANT	%
13	4.3	Suministro e instalación de césped monofilamentado rafia de 50mm de altura, con protección de rayos UV, con 1300 gramos por metro cuadrado de rafia, de 13200 dux, base: backing doble capa, demarcación de color blanco con césped de blanco de fabrica, incluye granulo de caucho, pegamento importado.	m^2	1,750.00	$ 181,076	$ 316,883,000				0.00	0%
14	4.4	Suministro e instalación de almohadilla de choque shock pad 20 mm	m^2	1,750.00	$ 146,659	$ 256,653,250				0.00	0%
15	4.5	Suministro e instalación de bordillos prefabricado 20X50X50	ml	186.00	$ 55,658	$ 10,352,388	186.00	$ 10,352,388	100%	186.00	100%
SUB-TOTAL CAPITULO						**$ 741,397,052**		**$ 16,465,138**			
5	**CERRAMIENTO**										
16	5.1	Concreto ciclópeo 2500 psi (60% concreto-40% piedra media zonga)para cimentación cerramiento	m^3	16.74	$ 376,028	$ 6,294,709				15.52	93%
17	5.2	Concreto 3000 psi viga de cimentación cerramiento 0,2x0,2m	m^3	37.40	$ 659,191	$ 24,653,743	1.63	$ 1,074,481	4%	12.41	33%
18	5.3	Muro cerramiento en ladrillo semiprensado a la vista	m^2	112.50	$ 105,765	$ 11,898,563				93.28	83%
19	5.4	Acero de refuerzo 37000 psi incluye figurado e instalación	kg	1,057.11	$ 6,647	$ 7,026,597				832.48	79%
20	5.5	Tubería galvanizada 2" cal 2mm incluye anclajes, tapa	ml	220.40	$ 44,432	$ 9,792,813				220.40	100%

18. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS											
N.º	ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES					EJECUTADO ABR 2025			EJECUTADO ACUMULADO	
		DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	%	CANT	%
21	5.6	Módulos cerramiento 2,5x2,5 m en Angulo 1 1/2"x1/8 con varilla de 5/8" lisa cada 14 cms, diagonales en Angulo 1 1/2" x 1/8 y lamina cal 16 10X10 cms de refuerzo en la esquinas (lado norte y sur)h=2,5m	m^2	200.00	$ 109,070	$ 21,814,000	108.20	$ 11,801,374	54%	108.20	54%
22	5.7	Módulos cerramiento 2,5x2,5 m en Angulo 1 1/2"x1/8 con malla eslabonada cal 10 hueco 2 1/4"x2 1/4", diagonales en Angulo 1 1/2" x1/8 y lamina cal 16 10X10cm de refuerzo en la esquinas (lado oriente y occidente) h=2,5m	m^2	268.75	$ 54,091	$ 14,536,956				0.00	0%
23	5.8	Suministro e instalación de puerta en tubería 2" galvanizada cal 2mm con malla eslabonada cal 10 y con portacandado, incluye pasador porta candado.	und	1.00	$ 802,805	$ 802,805				0.00	0%
24	5.9	Concreto 3000 psi andenes perimetrales e=8cm, incluye malla electrosoldada y formaleta	m^2	148.80	$ 80,868	$ 12,033,158				0.00	0%
25	5.10	Suministro e instalación de malla de cerramiento en nylon 100% alta densidad con protección UV, ojo 13x13, calibre #4 incluye; guaya, tensores y tubo de 2"	m^2	3,031.00	$ 37,545	$ 113,798,895				0.00	0%
26	5.11	Pie de amigo en tubería galvanizada 2" cal 2mm incluye anclajes, concreto 3000 psi 50x50x60 costados norte y sur	und	32.00	$ 263,483	$ 8,431,456				0.00	0%
SUB-TOTAL CAPITULO						**$ 231,083,695**		**$ 12,875,855**			

18. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS											
N.º	ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES					EJECUTADO ABR 2025			EJECUTADO ACUMULADO	
		DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	%	CANT	%
6	ILUMINACIÓN										
27	6.1	Suministro, montaje y conexión de Proyector led 300 W SYLFLOOD, temperatura de color 5000K, vida útil 100000h, flujo luminoso 39000 lm incluye soporte	und	6.00	$ 1,718,814	$ 10,312,884				0.00	0%
28	6.2	Suministro e Instalación de Tablero de 6 Circuitos con puerta incluye 3 breaker de 30 amp con normativa RETIE	und	1.00	$ 511,864	$ 511,864				0.00	0%
29	6.3	Suministro e Instalación de Acometida en CABLE CU AISL THHN/THWN - 2x8F+1x10T en tubería PVC 1"	ml	50.00	$ 45,333	$ 2,266,650				0.00	0%
30	6.4	Salida Parcial Eléctrica (2 THHN No.10 + 1 THHN No.12)	ml	50.00	$ 42,110	$ 2,105,500				0.00	0%
31	6.5	Suministro e instalación de postes de concreto pretensado L= 12 m 750 kg incluye transporte e izada	und	6.00	$ 2,884,636	$ 17,307,816				0.00	0%
32	6.6	Puesta a tierra en varilla coper weld cobre de 1/2" incluye conectores, cableado, soldadura y mejoramiento de tierra	und	1.00	$ 513,186	$ 513,186				0.00	0%
33	6.7	Murete para tablero de control en muro con bloque # 5	und	1.00	$ 377,230	$ 377,230				0.00	0%
34	6.8	Construcción de cajas de inspección tipo alumbrado en concreto de 30x30	und	6.00	$ 266,806	$ 1,600,836				0.00	0%
35	6.9	Cajas de inspección de 60X60 CM (medida interior)	und	8.00	$ 336,951	$ 2,695,608				0.00	0%

18. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

N.º	ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES					EJECUTADO ABR 2025			EJECUTADO ACUMULADO	
		DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	%	CANT	%
36	6.10	Suministro e Instalación de sistema de apantallamiento	und	1.00	$ 15,484,338	$ 15,484,338				0.00	0%
SUB-TOTAL CAPITULO						$ 53,175,912		$ 0			
					SUBTOTAL OBRAS	$ 1,162,431,143		$ 51,530,619			
% AVANCE DE OBRA									4.43%		28.61%

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ING. **YERSON FERNANDO CAMACHO**
DIRECTOR DE OBRA

ING. **FELIPE STAND VILLAREAL**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

18. REGISTRO FOTOGRÁFICO






Excavación manual con retiro de material




Red de aguas lluvias suministro e instalación de tubería PVC Ø 8"





Construcción de filtros laterales externos en un ancho de 0.40 m, con altura variable menor a 0.50 m, recubrimiento en geotextil no tejido NT-1600, con gravilla común o triturado de 1 1/2" a 4" + Tubería PVC drenajes de 6"





Placa de piso en concreto 3000 psi, e =0,07m dilatada, junta machimbrada incluye malla electrosoldada de 5mm.





Suministro e instalación de bordillos prefabricado 20X50X50





Concreto 3000 psi pedestales cerramiento perimetral





Módulos cerramiento 2,5x2,5 m en Angulo 1 1/2"x1/8 con varilla de 5/8" lisa cada 14 cms, diagonales en angulo 1 1/2" x 1/8 y lamina cal 16 10X10 cms de refuerzo en las esquinas (lado norte y sur) h=2,5m

19. ANEXOS

- SE ANEXA BITACORA DE OBRA.
- SE ANEXA SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP).
- SE ANEXA CERTIFICADO VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA REALIZADO POR EL INTERVENTOR (Vo.Bo. Interventor).
- SE ANEXA CORRESPONDENCIA GENERADA DURANTE EL PERIODO.
- SE ENTREGA UN CD CON LA COPIA DIGITALIZADA DE TODO EL INFORME Y SUS ANEXOS.

		
ING. YERSON FERNANDO CAMACHO	(30/04/2025)	**ING. FELIPE STAND VILLAREAL**
FIRMA ORIGINAL **DIRECTOR DE OBRA**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **Vo.Bo DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

ANEXOS

CamScanner

INFORME MENSUAL HSEQ

CamScanner

CONTRATO CLOPIH221-2024

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



“CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA”.

ABRIL 2025

1. INTRODUCCIÓN

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) se ha convertido en una de las gestiones más esenciales de una empresa para la mejora continua y la protección de los colaboradores, este incluye la política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y las acciones de mejora; Es por ello, que el objetivo de la implementación del SG-SST es anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud de los colaboradores de la organización, sin importar su tamaño. Todo este proceso está sustentado en el ciclo conocido como PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar).

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, está en constante cambio, debe ser gestionado por la organización para incrementar el nivel de eficacia frente a la disminución de accidentes y enfermedades laborales, para mantener y aumentar el bienestar integral del trabajador, respecto a nuevos procesos, nuevas formas de trabajo, exigencias de clientes y sugerencias de las partes interesadas.

La mejora continua se puede entender mediante la metodología del ciclo PHVA, en la cual, una vez establecido el criterio a mejorar, se planean las actividades y se ejecutan; se analiza o verifica si se cumplió el objetivo, se toman nuevamente medidas de acuerdo con los resultados, es decir que es un proceso cíclico, donde no solo se verifica la disminución de accidentalidad y enfermedades laborales o la eficiencia de los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica (SVE) sino también contribuye positivamente en el bienestar integral del trabajado

Conforme lo anterior, y comprometido con la seguridad y salud de sus trabajadores, basado en la normativa vigente y con la disposición de cumplir con las regulaciones en materia de seguridad y salud laboral **V&M INGENIERIA S.A.S.** implementa su SG-SST para identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales, lo que contribuye a prevenir accidentes y enfermedades laborales. promoviendo unas condiciones de salud y trabajo sanas y seguras para todos sus colaboradores y demás actores involucrados en el proyecto en marcha cuyo objeto es el **"CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA",** correspondiente a la ejecución del contrato de obra pública **CLOPIH221-2024.**

2. OBJETO Y ALCANCE

2.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar y estructurar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST con el fin de promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y trabajo en el **V&M INGENIERIA S.A.S**., y de preservar un estado de salud físico, mental y social de los trabajadores, previniendo accidentes y enfermedades laborales factibles de intervención, dando cumplimiento a la normatividad aplicable vigente.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Minimizar la ocurrencia de incidentes que puedan causar lesiones o enfermedades incapacitantes a los trabajadores.
- Fomentar la participación activa de todos los colaboradores en la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, promoviendo la conciencia y el compromiso con la seguridad y la salud.
- Identificar los peligros existentes en el lugar de trabajo, evaluando los riesgos asociados y establecer medidas de control necesarias para reducirlos o eliminarlos.

3. ALCANCE

V&M INGENIERIA S.A.S, planifica, desarrolla, controla y documenta las actividades realizadas en el proyecto "**CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA"**. Implementando las medidas de manejo (prevención, mitigación y compensación) para garantizar la ejecución de la obra y la preservación del medio ambiente.

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

4.1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

El contrato **CLOPIH221-2024** deberá ejecutarse en el término de tres (03) meses calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Datos generales del Contrato de Obra son:

Contrato N°:	CLOPIH221-2024
Objeto:	"CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA".
Plazo:	TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
Contratante:	MUNICIPIO DE GUADALUPE – HUILA
Contratista:	V & M INGENIERIA S.A.S Nit. 900.062.688-7 YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO C.C N° 7.713.933 de Neiva - Huila
Fecha del acta de Inicio:	12 DE NOVIEMBRE 2024
Prorroga:	DOS (2) MESES
Fecha de finalización:	12 ABRIL 2024

4.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Guadalupe es un municipio colombiano ubicado al sur del departamento de Huila, a margen izquierda del valle del río Suaza, sobre los flancos de la cordillera Oriental. Su extensión territorial es de 242 km², se encuentra a una altura de 940 m s. n. m. y su temperatura promedio es de 22 °C.2 Cuenta con una población de 19.508 habitantes de acuerdo con proyección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística para el 2024. Hace parte de la Región Subcentro del departamento. Las principales actividades económicas del municipio son la agricultura, ganadería, piscicultura, pequeña industria artesanal y el comercio.

La vereda Los Cauchos Guadalupe es una vereda rica en agricultura, ocupa un área importante con cultivos de maracuyá, ahuyama, tomate, cítricos, maíz, fríjol y hortalizas. Al interior de este sistema de producción se destaca también el manejo de praderas en forma intensiva, y algunas especies menores como aves, cerdos y estanques para peces. Se encuentra a 5 minutos del casco urbano con una población de más de 400 habitantes entre los que se destaca la producción de sombreros de paja, artículos en fique y artículos de alfarería.

4.3. CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO

Se realizará la Construcción de la Cancha Sintética Villa Olímpica del Municipio de Guadalupe, donde será un lugar recreativo tanto para niños como adultos, donde van a pasar momentos agradables en familia, gracias al desarrollo de dicho contrato.

El proyecto se desarrollará en el municipio de Guadalupe



Imagen 1 Departamento del Huila



Imagen 2 Municipio de Guadalupe

El objeto del contrato **"CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA".** tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.

Las actividades a ejecutar para el cumplimiento de este proyecto pueden presentar conflictos con el medio ambiente tales como contaminación atmosférica, alteración del espacio público, entre otras; la programación está hecha para controlar y mitigar dichos efectos.

5. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

V&M INGENIERIA S.A.S., estructuró el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para el contrato de obra **CLOPIH221-2024**, con el fin de promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y trabajo, y preservar el estado de salud físico, metal y social de los trabajadores, en la prevención de accidentes y enfermedades laborales factibles de intervención, dando cumplimiento a la normatividad aplicable vigente.

V&M INGENIERIA S.A.S., en su función a la aplicación del SG-SST en el frente de obra del proyecto **"CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA"**, contrato de obra pública **CLOPIH221-2024**, ejecuto las actividades programadas durante el periodo, a través de medidas de seguridad establecidas para el control de

los factores de riesgo presentes en la ejecución de los contratos de obra en el periodo del presente informe.

6. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL COMPONENTE SST

6.1. AFILIACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) es un marco normativo y organizativo en Colombia que tiene como fin regular el servicio público esencial de salud. Su finalidad es crear condiciones para que la población del país acceda a la atención médica en todos los niveles. Su principal objetivo es proteger la salud de los colombianos garantizando la universalidad del aseguramiento y el acceso efectivo a los servicios de salud. Es por ello que **V&M INGENIERIA S.A.S.** durante el mes de **ABRIL** de **2025,** se realizaron los debidos pagos al Sistema de Seguridad Social a cada uno de los trabajadores involucrados al contrato de obra pública **CLOPIH221-2024**, y se verificó que los subcontratistas estén afiliados al Sistema General de Riesgos y Seguridad Social.

ANEXO SST 1. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

6.2. EXÁMENES MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO Y /O PERIÓDICOS

Los exámenes médicos ocupacionales al ingreso permiten detectar cualquier condición médica o de salud que el trabajador pueda tener antes de comenzar su labor; esto son de vital importancia para evaluar si están en condiciones de desempeñar su trabajo de manera segura, determinan si el trabajador es apto para realizar las tareas específicas de su puesto y si se identifican limitaciones o riesgos, se pueden tomar medidas preventivas o asignar tareas adecuadas, por ello que **V&M INGENIERIA S.A.S.** dando cumplimiento a la Resolución 2346 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, que regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales, del personal y de los subcontratistas basados en cargo que desempeña o ejecuta el colaborador.

V&M INGENIERIA S.A.S. para el mes **ABRIL** de **2025**, no se registraron ingresos, por lo cual no se reportan exámenes médicos ocupacionales de ingreso; aunque se reportan retiro de personal para el periodo en mención, no se ejecutaron los exámenes, debido a que el personal que se ha retirado ha sido notificado para su valoración de retiro, sin embargo, desisten voluntariamente y no se los realizaron. Por lo anterior no hay soportes de exámenes de retiro.

ANEXO SST 2. EXAMENES DE INGRESO

6.3. RELACIÓN DE PERSONAL

PERSONAL ADMINISTRATIVO			
N.	**ID**	**EMPLEADO**	**CARGO**
1	CC 7713933	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO	DIRECTOR
2	CC 1079409298	ADRIANA LISSETH MAYORCA PEERDOMO	RESIDENTE
3	CC 1075213839	OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO	SST
4	CC 17709845	PABLO ARBEY LIZARAZO CORREA	MAESTRO

Tabla N. 1. *Personal Administrativo*

PERSONAL OPERATIVO						
N.	**ID**	**EMPLEADO**	**Fecha ING**	**RET**	**Fecha RET**	**Razón Social**
1	CC 1006531292	BUSTOS SALDAÑA MANUEL	2025/03/07			VAMECOL INGENERIA SAS
2	CC 1000514656	CASTILLA SCARPETTA DIEGO ALBERTO	2025/03/20	X	2025/04/12	VAMECOL INGENERIA SAS
3	CC 1002230693	SANTOS MENDOZA DANIEL JOSE	2025/03/07	X	2025/04/12	VAMECOL INGENERIA SAS
4	CC 92533487	SANTOS URAN MARIO JOSE	2025/03/04	X	2025/04/12	VAMECOL INGENERIA SAS
5	CC 1083882691	TOVAR BETES LEONARDO	2025/03/11			VAMECOL INGENERIA SAS

Tabla N. 2. *Personal Operativo*

6.4. INDUCCIONES SST

V&M INGNEIERIA S.A.S. durante el periodo del mes de **ABRIL** de **2024,** no se registraron ingresos para el proyecto, por lo cual se dejan incluidos los últimos soportes registrado del mes de MARZO, donde se evidencio el cumplimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, ejecutando la inducción a todos colaboradores que ingresaron en su momento.

El objetivo de realizar este proceso es ayudar a los nuevos colaboradores a sentirse integrados, conocer más sobre el proyecto que se ejecutara y la empresa, tener una mejor comprensión y adaptación para la ejecución de sus actividades de obra.



Imagen 3 Inducción en SST

ANEXO SST 3. CONSTANCIA DE INDUCCIÓN

ANEXO SST 4. CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DE RIESGOS EN OBRA

6.5. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Decreto 1072 de 2015 establece claramente las pautas que deben seguirse, incluyendo la frecuencia y los plazos para la entrega. Este cumplimiento no solo asegura un ambiente laboral seguro y cómodo, sino que también demuestra el compromiso de la empresa con su equipo humano. Recordar las fechas clave para la entrega de dotaciones es crucial para evitar sanciones y mantener una relación positiva con los empleados. En última instancia, el respeto por estas regulaciones fortalece la cultura organizacional y contribuye al éxito empresarial a largo plazo.

V&M INGENIERIA S.A.S. durante el periodo del mes de **ABRIL** del **2025** realizó reposiciones en entrega de elementos de protección personal – EPP a personal operativo, suministrando los elementos de protección personal necesarios que se requieren para el desarrollo de sus actividades.



Imagen 4 Entrega de EPP

ANEXO SST 5. ENTREGA EPP

6.6. SEÑALIZACION EN OBRA – CUMPLIMIENTO PMT Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN

V&M INGENIERIA S.A.S. con el fin de dar cumplimiento al PMT y a su objetivo principal que es “Presentar las medidas para el manejo del tránsito, a fin de mitigar el impacto negativo en los índices de movilidad y disminuir en el mayor grado posible el riesgo de accidentabilidad que se pueda generar a causa de la ejecución del contrato “CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA”, De igual forma se busca establecer condiciones seguras para los usuarios, personal de la obra y vecinos del lugar, bajo el cumplimiento de las normas establecidas para la regulación del tránsito, se verifica la señalización en el frente de trabajo, garantizando la seguridad tanto de los trabajadores como de las personas aledañas a la obra.

6.7. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Dentro del periodo del mes de **ABRIL** de **2025**, se realizaron inspecciones de seguridad con el fin de identificar oportunidades de mejora y condiciones inseguras que puedan generar accidentes de trabajo o generar algún riesgo en la ejecución de las actividades, y con ello implementar medidas de control o acciones preventivas. Por lo anterior se realizaron las siguientes inspecciones de seguridad:

- Personal en campo: Se verificó que todo el personal que labora en obra cuente con las afiliaciones de seguridad social, cuente con EPP apropiados para la tarea y dotación mínima.
- Señalización de obra: Se verifica la señalización instalada diariamente y se reporta para llevar un control y garantizar que se cumpla lo trazado en el PMT.
- Uso de EPP y dotación: Se verifica que el personal cuenta con los elementos de protección requeridos para las actividades que se está desarrollando.
- Botiquín – Camilla – Extintor: Se verificó que los elementos del botiquín se encontraran vigentes y completos, así como también que la camilla y el extintor estén en condiciones optimas para ser usados en caso de cualquier eventualidad.
- Orden y aseo: Las inspecciones de orden y aseo ayudan a verificar que los procesos, actividades y tareas se desempeñen según lo planificado, procedimientos, estándares y políticas, buscando la mejora dentro de los procesos o espacios laborales, por el bien y protección de los trabajadores.

ANEXO SST 6. INSPECCIONES

6.8. CAPACITACIONES EN SST

V&M INGENIERIA S.A.S. en las labores propias del proyecto y dando cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y cronograma de actividades, se realizaron capacitaciones para la retroalimentación en la prevención de los riesgos asociados a las actividades que se ejecutan en obra, a todo el personal que laboro para el proyecto con el fin de generar conciencia frente a la responsabilidad, autocuidado y el compromiso de contribuir al logro de los objetivos del SST, garantizando áreas seguras de trabajo y productivo.

Durante el periodo en mención se realizaron capacitaciones según programadas. A continuación, se relacionan las charlas y capacitaciones realizadas en el mes de **ABRIL** del **2025**.

N°8	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN	FECHA	DURACIÓN
1	Política de Uso Adecuado de EPP	09/04/2025	40 min
2	Principales Causas de Accidentes de Obra de Construcción	14/04/2025	40 min
3	Prevención de Accidentes por Caídas a Nivel	25/04/2025	2 horas

4	Prevención y Control de Riesgo Mecanico	25/04/2025	2 horas

Tabla N. 3. *Capacitaciones*



Imagen 5 Registro de capacitaciones

CUMPLIMIENTO

Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas * 100 = 100% = 10/10*100 = 100%

Asistentes 5 / Personas programas 5 *100 = 100%

ANEXO SST 7. CAPACITACIONES

6.9. PAUSAS ACTIVAS

De acuerdo con el objetivo de la política de responsabilidad social de **V&M INGENIERIA S.A.S,** que se enfoca en los buenos hábitos de descanso, nutrición y ejercicio se llevaron a cabo varias actividades de pausas activas con el personal que estuvo dispuesto a realizarlas, cuyo objetivo fue dar un tiempo de reposo o cambio de actividad rutinaria para desestresar y relajar al personal, implementando una metodología de ejercicios de relajación corporal minimizando las consecuencias de riesgo psicolaboral por factores de estrés y condiciones de la tarea (monotonía y rutinaria).



Imagen 6 Pausas Activas

7. PLAN DE EMERGENCIAS

El plan de Prevención y Preparación para afrontar emergencias que presenta el **V&M INGENIERIA S.A.S,** consiste en un conjunto de estrategias anticipadas, elaboradas gracias a un trabajo colectivo que comprende las políticas, la organización, normas y procedimientos que debe tener la empresa, para prevenir y disminuir los niveles de riesgo ante una situación de emergencia que afecten las personas, los recursos, los procesos productivos y el medio ambiente, incluyendo actividades que deben ser administradas de una manera adecuada y eficiente, tales como la formulación y ejecución de programas, planes y proyectos relacionados con: la adopción de medidas tendientes a prevenir y mitigar los efectos que las diferentes amenazas (internas o externas) puedan generar. Incluye acciones relacionadas con la legislación, la organización para afrontar situaciones de emergencia, las acciones relacionadas con los planes operativos de emergencia, la capacitación, el entrenamiento, el suministro de los recursos necesarios para hacer frente a una emergencia y la recuperación del proceso productivo en el menor tiempo posible, con acciones que disminuyan el lucro cesante y la susceptibilidad a sufrir nuevos efectos dañinos en el futuro.

8. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

8.1. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Se cuenta con la instalación de punto ecológico con su respectiva señalización y deposito (blanca. verde, negra). Dichos residuos son recogidos por las empresas autorizadas en el municipio los días establecidos.

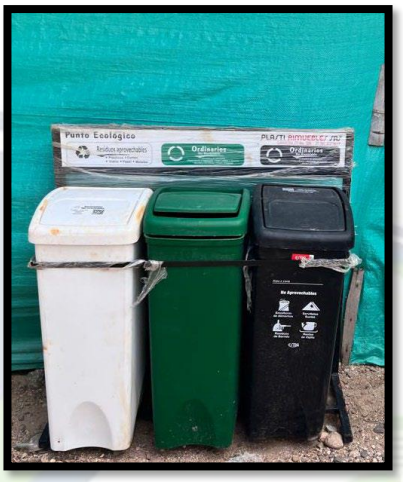


Imagen 7 Punto ecológico

9. CONCLUSIONES

Durante el periodo de tiempo evaluado en el presente informe, se han evidenciado prácticas implementadas en el **"CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA",** que propenden al cumplimiento, mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Calidad y Ambiental.

Se establece una relación directa entre la SALUD y el TRABAJO entendida como el vínculo del individuo con la labor que desempeña y la influencia que sobre la salud acarrea dicha labor. El conjunto de variables que definen la realización de la tarea y el entorno en que ésta se realiza se denominan CONDICIONES DE TRABAJO, constituidas por factores del ambiente, de la tarea y de la organización.

V&M INGENIERIA S.A.S, justifica la implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que garantice el mejoramiento continuo de las condiciones de salud, trabajo y bienestar de sus trabajadores, para que se desempeñen de una manera adecuada y eficiente permitiendo su crecimiento personal y familiar y a la vez el mejoramiento de la productividad de la empresa.

Durante este periodo se realizaron actividades propias de los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo (medicina preventiva y del trabajo y de higiene y seguridad industrial), establecidos en el Sistema de Gestión de la Seguridad de Salud en el Trabajo de **V&M INGENIERIA S.A.S.**, dando cumplimiento así en lo dispuesto en la normatividad legal aplicable vigente.

Se evidencia que para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de Abril del 2025, el porcentaje de cumplimiento según nuestro cronograma de actividades planeadas fue del 100%.

Elaboró:

OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Ingeniera Industrial
Especialista en SST

ANEXO SST 1. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33033425
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-04-04

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	VYM INGENERIA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900062688	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 9 17 18	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4220	CORREO ELECTRÓNICO	2018AFILIACIONES@GMAIL.COM	TELÉFONO	6335646
FAX	8643535	SUCURSAL	01oficina	NOMBRE SUCURSAL	01oficina
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7713933	PRIMER APELLIDO	CAMACHO	SEGUNDO APELLIDO	LADINO
PRIMER NOMBRE	YERSON	SEGUNDO NOMBRE	FERNANDO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 04	Año: 2025	Mes: 05	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		$9.964.500		33033425

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-7713933	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	CAMACHO LADINO YERSON FERNANDO	$1.423.500
CC-36312881	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	MONJE FLOR LINA CONSTANZA	$1.423.500
CC-7714529	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	MURCIA HERNANDEZ ALBEIRO	$1.423.500
CC-52033387	01	No	No	No	41	1	1661901	Fijo	ROBAYO GUZMAN ALEJANDRINA	$2.847.000
CC-1084923149	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	SANCHEZ RIVERA HERMIDES	$1.423.500
CC-1084869075	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	TRUJILLO PERDOMO LUIS FERNANDO	$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 7713933																													0		
CC - 36312881																													0		
CC - 7714529																													0		
CC - 52033387																													0		
CC - 1084923149																													0		
CC - 1084869075																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 7713933	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 36312881	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 7714529	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 52033387	COLPENSIONES	30	$2.847.000	0.1600000	$455.600	$0	$0	$455.600	$0	$0	$0
CC - 1084923149	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1084869075	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 7713933	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 36312881	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 7714529	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 52033387	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.847.000	0.0400000	$113.900	$0	0	$0	0	$0	30	$2.847.000	1	0.0052200	$14.900
CC - 1084923149	ESSC ASMET SALUD	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1084869075	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-7713933	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36312881	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7714529	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52033387	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.847.000	0.0400000	$113.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1084923149	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1084869075	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 04											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$455.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$455.600
PORVENIR	5	$1.139.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.139.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																		
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$170.900	$0	0	$0	0	$0	$170.900	0	$0	$0	$170.900	$0	0	$0	$0	$170.900	$0	$0	$170.900
ESSC ASMET SALUD	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	0	$0	$0	$57.000	$0	0	$0	$0	$57.000	$0	$0	$57.000
SANITAS	3	$171.000	$0	0	$0	0	$0	$171.000	0	$0	$0	$171.000	$0	0	$0	$0	$171.000	$0	$0	$171.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	6	$510.400	0	$0	$0	$510.400	0	$0	$510.400	0	$0	$0	$510.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	6	$398.900	0	$0	$398.900
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$398.900
PENSIONES	2	$1.594.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$510.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$398.900
SENA	1	$0
ICBF	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.902.800

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33700064
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-06-09

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	VYM INGENERIA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900062688	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 9 3 50 LOCAL 412	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	GUADALUPE
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4220	CORREO ELECTRÓNICO	YERSONFCAMACHO@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	8643535
FAX	8643535	SUCURSAL	221	NOMBRE SUCURSAL	CONTRATO CANCHA SINTETICA GUADALUPE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7713933	PRIMER APELLIDO	CAMACHO	SEGUNDO APELLIDO	LADINO
PRIMER NOMBRE	YERSON	SEGUNDO NOMBRE	FERNANDO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 04	Año: 2025	Mes: 04	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		33700064

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1079409298	59	No	No	No	41	206	5711001	Salario	MAYORCA PERDOMO ADRIANA LISSETH	$1.423.500

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1079409298																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1079409298	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1079409298	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5711001	0.0696000	$99.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1079409298	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 04											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	18	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SIN EPS	1	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	18	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$99.100	0	$0	$0	$99.100	18	$1.200	$100.300	0	$0	$0	$100.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	18	$0	$0
SENA	0	$0	18	$0	$0
ICBF	0	$0	18	$0	$0
ESAP	0	$0	18	$0	$0
MinEdu	0	$0	18	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	0	$0
PENSIONES	0	$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	$100.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$100.300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1079409298		MAYORCA PERDOMO ADRIANA LISSETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 5 W 33 26 SANTA INES	NEIVA-HUILA	8377022	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1439218251	9484509223	I	2025/05/23	2025/04/28	NEQUI	0	$490,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1079409298	MAYORCA ADRIANA																		231001	30	$1,720,000	$275,200	EPS005	30	$1,720,000	$215,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$490,200
Total	**Afiliados(1)**																						$1,720,000	$275,200			$1,720,000	$215,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$490,200

2025/04/28 01:42 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1079409298		MAYORCA PERDOMO ADRIANA LISSETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 5 W 33 26 SANTA INES	NEIVA-HUILA	8377022	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1439218251	9484509223	I	2025/05/23	2025/04/28	NEQUI	0	$490,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,200	$0	$0	$275,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$275,200	$0	$0	$275,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$215,000	$0	$0	$215,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$215,000	$0	$0	$215,000
TOTAL				1	$490,200	$0	$0	$490,200

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33067091
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-05-12

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	VYM INGENERIA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900062688	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 9 3 50 LOCAL 412	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	IQUIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4220	CORREO ELECTRÓNICO	YERSONFCAMACHO@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	8643535
FAX	8643535	SUCURSAL	195	NOMBRE SUCURSAL	195 del 2023
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7713933	PRIMER APELLIDO	CAMACHO	SEGUNDO APELLIDO	LADINO
PRIMER NOMBRE	YERSON	SEGUNDO NOMBRE	FERNANDO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 04	Año: 2025	Mes: 04	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
8		$0		33067091

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1102805593	59	No	No	No	41	357	5711001	Salario	ALDANA BARCINILLA EDER SAMIR	$1.423.500
CC-1019065586	59	No	No	No	41	357	5711001	Salario	CAMARGO ARCILA CARLOS ESTEBAN	$1.423.500
CC-1075257431	59	No	No	No	41	357	5711001	Salario	QUIMBAYA CUELLAR LUZ DIVIA	$1.423.500
CC-12121175	59	No	No	No	41	1	5711001	Salario	RAMON MUÑOZ WILLIAM IGNACIO	$1.423.500
CC-10273855	59	No	No	No	41	357	5711001	Salario	RESTREPO MOSCOSO JULIO CESAR	$1.423.500
CC-1080292451	59	No	No	No	41	357	5711001	Salario	SALAZAR GALINDO BLADIMIR	$1.423.500
CC-1075213839	59	No	No	No	41	357	5711001	Salario	TRUJILLO POLANCO OMAIRA ANDREA	$1.423.500
CC-26593081	59	No	No	No	41	357	5711001	Salario	VARGAS GONZALEZ MARILUZ	$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1102805593																													0		
CC - 1019065586																													0		
CC - 1075257431																													0		
CC - 12121175																													0		
CC - 10273855																													0		
CC - 1080292451																													0		
CC - 1075213839																													0		
CC - 26593081																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1102805593	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1019065586	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1075257431	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 12121175	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 10273855	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1080292451	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1075213839	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 26593081	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1102805593	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1019065586	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1075257431	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 12121175	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 10273855	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1080292451	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1075213839	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 26593081	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1102805593	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1019065586	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075257431	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12121175	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10273855	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1080292451	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075213839	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26593081	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 04											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	8	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SIN EPS	8	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	8	$792.800	0	$0	$0	$792.800	0	$0	$792.800	0	$0	$0	$792.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	8	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	0	$0
PENSIONES	0	$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	$792.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$792.800

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075213839
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	INDEPENDIE
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	INDEPENDIENTE
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-12
FECHA DE PAGO:	2025-04-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	32748466
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32748466
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/06/2025

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33331858
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-05-12

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	VAMECOL INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901614817	D.V.	4	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR42-85 KM32 PLAERMO	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	2018AFILIACIONES@GMAIL.COM	TELÉFONO	3123255722
FAX	0	SUCURSAL	07	NOMBRE SUCURSAL	SINTETICA GUADALUPE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1075303013	PRIMER APELLIDO	CUELLAR	SEGUNDO APELLIDO	PASTRANA
PRIMER NOMBRE	CAROLINA	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 04	Año: 2025	Mes: 04	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		33331858

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-17709845	59	No	No	No	41	319	5711001	Salario	LIZARAZO CORREA PABLO ARBEY	$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 17709845																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 17709845	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 17709845	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-17709845	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 04											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	5	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SIN EPS	1	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	5	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$99.100	0	$0	$0	$99.100	5	$400	$99.500	0	$0	$995	$99.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	5	$0	$0
SENA	0	$0	5	$0	$0
ICBF	0	$0	5	$0	$0
ESAP	0	$0	5	$0	$0
MinEdu	0	$0	5	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	0	$0
PENSIONES	0	$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	$99.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$99.500

RAZÓN SOCIAL :	PABLO ARBEY LIZARAZO CORREA
IDENTIFICACIÓN:	CC-17709845
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-05-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-13
FECHA DE PAGO:	2025-05-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	33027021
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33027021
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800	$ 405.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/06/2025

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33268655
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-05-12

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	VAMECOL INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901614817	D.V.	4	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR42-85 KM32 PLAERMO	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	2018AFILIACIONES@GMAIL.COM	TELÉFONO	3123255722
FAX	0	SUCURSAL	07	NOMBRE SUCURSAL	SINTETICA GUADALUPE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1075303013	PRIMER APELLIDO	CUELLAR	SEGUNDO APELLIDO	PASTRANA
PRIMER NOMBRE	CAROLINA	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 04	Año: 2025	Mes: 05	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
5		$4.555.200		33268655

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1006531292	01	No	No	No	41	319	5711001	Fijo	BUSTOS SALDAÑA MANUEL	$1.423.500
CC-1000514656	01	No	No	No	41	319	5711001	Fijo	CASTILLA SCARPETTA DIEGO ALBERTO	$1.423.500
CC-1002230693	01	No	No	No	41	319	5711001	Fijo	SANTOS MENDOZA DANIEL JOSE	$1.423.500
CC-92533487	01	No	No	No	41	319	5711001	Fijo	SANTOS URAN MARIO JOSE	$1.423.500
CC-1083882691	01	No	No	No	41	319	5711001	Fijo	TOVAR BETES LEONARDO	$1.423.500

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1006531292																													0		
CC - 1000514656			X	2025-04-12																									0		
CC - 1002230693			X	2025-04-12																									0		
CC - 92533487			X	2025-04-12																									0		
CC - 1083882691																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1006531292	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1000514656	PORVENIR	12	$569.400	0.1600000	$91.200	$0	$0	$91.200	$0	$0	$0
CC - 1002230693	PORVENIR	12	$569.400	0.1600000	$91.200	$0	$0	$91.200	$0	$0	$0
CC - 92533487	PORVENIR	12	$569.400	0.1600000	$91.200	$0	$0	$91.200	$0	$0	$0
CC - 1083882691	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1006531292	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1000514656	COMPENSAR-EPS	12	$569.400	0.0400000	$22.800	$0	0	$0	0	$0	12	$569.400	5	0.0696000	$39.700

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1002230693	NUEVA E.P.S. S.A.	12	$569.400	0.0400000	$22.800	$0	0	$0	0	$0	12	$569.400	5	0.0696000	$39.700
CC - 92533487	EPS-S COOSALUD	12	$569.400	0.0400000	$22.800	$0	0	$0	0	$0	12	$569.400	5	0.0696000	$39.700
CC - 1083882691	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1006531292	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1000514656	COMFAMILIAR DEL HUILA	12	$569.400	0.0400000	$22.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1002230693	COMFAMILIAR DEL HUILA	12	$569.400	0.0400000	$22.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-92533487	COMFAMILIAR DEL HUILA	12	$569.400	0.0400000	$22.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1083882691	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 04											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	5	$729.200	$0	$0	$0	$0	5	$2.400	$0	$0	$731.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	3	$136.800	$0	0	$0	0	$0	$136.800	5	$500	$0	$137.300	$0	0	$0	$0	$137.300	$0	$0	$137.300
COMPENSAR-EPS	1	$22.800	$0	0	$0	0	$0	$22.800	5	$100	$0	$22.900	$0	0	$0	$0	$22.900	$0	$0	$22.900
EPS-S COOSALUD	1	$22.800	$0	0	$0	0	$0	$22.800	5	$100	$0	$22.900	$0	0	$0	$0	$22.900	$0	$0	$22.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	5	$317.300	0	$0	$0	$317.300	5	$1.100	$318.400	0	$0	$3.184	$318.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	5	$182.400	5	$600	$183.000
SENA	0	$0	5	$0	$0
ICBF	0	$0	5	$0	$0
ESAP	0	$0	5	$0	$0
MinEdu	0	$0	5	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$183.100
PENSIONES	1	$731.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$318.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$183.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.416.100

ANEXO SST 2. EXAMENES DE INGRESO

NO SE REGISTRAN EXAMENES OCUPACIONALES DURANTE EL PERIODO DE ABRIL

ANEXO SST 3. CONSTANCIA DE INDUCCIÓN

SE REGISTRAN LOS DEL PERSONAL ACTIVO DE OBRA

v&m ingeniería SAS	**SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**Versión:** 001
		Código: SG-SST-F-16
	CONSTANCIA DE INDUCCIÓN / REINDUCCIÓN EN SST – MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD	**Fecha:** 19/03/2019

Nombre: Manuel Bustos
Área: Cancha Sintetica.
Cargo: Oficial

Cedula: 1006531292
Fecha: 07/03/2025
Inducción X Reinducción ___

POLITICA Y OBJETIVOS DEL SGI, POLITICA DE SEGURIDAD VIAL, POLITICA DE NO ALCOHOL, NO DROGAS Y NO TABAQUISMO	☑	RIESGO PSICOSOCIAL, FORMAS DE PREVENCION, COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	☑
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES	☑	CLASIFICACION DE LOS RIESGOS	☑
		PLAN DE EMERGENCIAS	☑
REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	☑	MANEJO DE EXTINTORES	☑
INFORMACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO	☑	SANEAMIENTO BASICO	☑
FACTORES DE RIESGOS POTENCIALES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION	☑	SUSTANCIAS PELIGROSAS Y ROMBO DE SEGURIDAD NFPA	☑
ENFERMEDADES LABORALES	☑	COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST	☑
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y ROPA DE TRABAJO:		SUSPENSION DE LOS TRABAJOS	☑
PROTECCION DE LA CABEZA	☑	OTRAS FUNCIONES Y DEBERES	☑
PROTECCION DEL ROSTRO	☑	ATENCION A SUGERENCIAS	☑
PROTECCION AUDITIVA	☑	**MANEJO AMBIENTAL**	
PROTECCION RESPIRATORIA	☑	POLITICA AMBIENTAL Y ASPECTOS LEGALES	☑
PROTECCION DE LAS MANOS	☑	ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	☑
PROTECCION DE LOS PIES	☑	MANEJO DE LA CALIDAD DEL AIRE	☑
PROMOCION Y PREVENCION		MANEJO DE LAS AGUAS SUPERFICIALES	☑
AUTOCUIDADO	☑	MANEJO DEL SUELO	☑
HABITOS SALUDABLES	☑	MANEJO DE LA FLORA Y FAUNA	☑

Manifiesto que he recibido y comprendo cabalmente la **INDUCCION / REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD** y me comprometo a seguir las instrucciones respectivas dadas por la empresa para el adecuado desarrollo de mis actividades, cumpliendo con todas las normas establecidas para la protección de mi integridad, la de quienes me rodean y para preservar el medio ambiente.

manuel BUSTOS 1006531292
NOMBRE Y CEDULA

manuel BUSTOS S.
FIRMA

ANDRES TORRIJO
ENCARGADO INDUCCIÓN

FIRMA

Powered by CamScanner

v&m Ingeniería SAS	**SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**Versión:** 001
		Código: SG-SST-F-16
	CONSTANCIA DE INDUCCIÓN / REINDUCCIÓN EN SST – MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD	**Fecha:** 19/03/2019

Nombre: Jaquida Toar
Área: Oficial
Cargo: Cancha Sintetica

Cedula: 1073588769
Fecha: 11/03/2025
Inducción X Reinducción ___

POLITICA Y OBJETIVOS DEL SGI, POLITICA DE SEGURIDAD VIAL, POLITICA DE NO ALCOHOL, NO DROGAS Y NO TABAQUISMO	☑	RIESGO PSICOSOCIAL, FORMAS DE PREVENCION, COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	☑
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES	☑	CLASIFICACION DE LOS RIESGOS	☑
REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	☑	PLAN DE EMERGENCIAS	☑
INFORMACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO	☑	MANEJO DE EXTINTORES	☑
FACTORES DE RIESGOS POTENCIALES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION	☑	SANEAMIENTO BASICO	☑
ENFERMEDADES LABORALES	☑	SUSTANCIAS PELIGROSAS Y ROMBO DE SEGURIDAD NFPA	☑
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y ROPA DE TRABAJO:		COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST	☑
PROTECCION DE LA CABEZA	☑	SUSPENSION DE LOS TRABAJOS	☑
PROTECCION DEL ROSTRO	☑	OTRAS FUNCIONES Y DEBERES	☑
PROTECCION AUDITIVA	☑	ATENCION A SUGERENCIAS	☑
PROTECCION RESPIRATORIA	☑	**MANEJO AMBIENTAL**	
PROTECCION DE LAS MANOS	☑	POLITICA AMBIENTAL Y ASPECTOS LEGALES	☑
PROTECCION DE LOS PIES	☑	ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	☑
PROMOCION Y PREVENCION		MANEJO DE LA CALIDAD DEL AIRE	☑
AUTOCUIDADO	☑	MANEJO DE LAS AGUAS SUPERFICIALES	☑
HABITOS SALUDABLES	☑	MANEJO DEL SUELO	☑
		MANEJO DE LA FLORA Y FAUNA	☑

Manifiesto que he recibido y comprendo cabalmente la **INDUCCION / REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD** y me comprometo a seguir las instrucciones respectivas dadas por la empresa para el adecuado desarrollo de mis actividades, cumpliendo con todas las normas establecidas para la protección de mi integridad, la de quienes me rodean y para preservar el medio ambiente.

Jaquida Toar 1073588769
NOMBRE Y CEDULA

FIRMA

ANDRES TRUJILLO
ENCARGADO INDUCCIÓN

FIRMA

Scanned with CamScanner

ANEXO SST 4. CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DE RIESGOS EN OBRA

SE REGISTRAN LOS DEL PERSONAL ACTIVO DE OBRA

V&M ingeniería SAS	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 1
	REGISTRO NOTIFICACION DE RIESGOS EN OBRA	Codigo: SG-SST-F-13
		Fecha: 19/3/2019

Generalidades del Proyecto:

Nombre del Proyecto: V&M INGENIERIA S.A.S

Objeto del contrato: Contrato No. CLOPIH221 de objeto "CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Ubicación: GUADALUPE - HUILA

Líder en SST: ANDREA TRUJILLO POLANCO

Atención Primeros Auxilios: Camilla - Botiquín de primeros auxilios -

Extintor - Plan de contingencia - Plan de Emergencia

Reglamento Interno




Horarios:

Horario de Entrada: 7.00 am

Horario de Almuerzo: 12.00 m

Horario de Salida: 5:00 pm

Prohibiciones:

Prohibido consumo de licor y trabajar en estado de embriaguez, al igual que el consumo de sustancias psicoactivas en obra y trabajar bajo sus efectos.
También están Prohibidas las peleas, riñas o maltratos en obra.

Deberes:

Notificar los accidentes de trabajo.
Entrar al proyecto por la portería autorizada
Reportar las condiciones inseguras y usar adecuadamente los baños.



Normas de Seguridad Industrial

- El uso del casco es obligatorio.
- Esta prohibido el uso de cachuchas debajo del casco, el uso de tenis en obra, el uso de sudaderas y pantalonetas en obra.
- No se debe utilizar joyas en obra (anillos, pulseras, aretes, etc.).
- El uso de elementos de protección personal es obligatorio de acuerdo a la actividad.
- Las áreas deben estar en orden y aseo.
- No se permite estar en áreas de trabajo sin chaleco
- Obligatorio uso de arnés y línea de vida cuando se desarrollen trabajos a una altura mayor a 1,5 metros (Res. 1409 de 2012).
- No se permite trabajar si no se ha realizado el permiso ATS
- Las personas que presenten restricciones medicas no podrán trabajar en altura.



Importancia de Trabajar Con Seguridad



- El trabajo es bienestar y la salud es vida
- Tu familia te espera en casa
- Recuerda que al trabajar con seguridad todos nos beneficiamos
- Si nos cuidamos evitamos muchos accidentes. Si nos cuidamos prevenimos los accidentes. Por eso la mejor de protegernos es el auto cuidado.



Recuerde debemos cuidarnos, para llegar a casa sanos y felices y así poder disfrutar con nuestra familia



Normas Ambientales

- Realizar la Separación de residuos dependiendo de su material.
- No arrojar sustancias químicas en la red de alcantarillado.
- Humedecer las áreas para evitar emisión de material particulado.
- Informar cuando se presenten fugas o derrames de aceites.
- No afectar ni perjudicar los arboles y la vegetación.
- Cerrar las llaves de paso de agua si no se van a utilizar.
- Consumir los recursos necesarios evitando desperdicios

Importancia de Cuidar el Medio Ambiente



- Cuidar el medio ambiente evita la aparición de enfermedades.
- Cuando se realizan actividades sin impactar el medio ambiente no se extingue la fauna y se conserva la riqueza de la flora.
- Si realizamos nuestro trabajo reduciendo la generación de ruido y material particulado evitaremos molestias a la comunidad que vive en las áreas cercanas al proyecto.
- Debemos cuidar el planeta para que lo disfruten nuestros hijos

Notificación de Riesgos

Factor de Riesgo	Agente	A	NA	Factor de Riesgo	Agente	A	NA
A: Aplica, NA: No Aplica				A: Aplica, NA: No Aplica			
Riesgos Físicos	Ruido Temperatura Falta de Iluminación Vibraciones	✓		Riesgo Locativos	Almacenamiento inadecuado. Orden y aseo Pisos resbalosos Escaleras y barandas	✓	
Riesgo Químico	Material particulado Manipulación de sustancias	✓		Riesgos Eléctricos	Baja tensión (conexiones) Media tensión (instalaciones)	✓	
Riesgo Biológico	Bacterias Virus, hongos	✓		Riesgo Psicológico	Falta de coordinación de tareas Turnos y sobreesfuerzos Abuso de autoridad (maltrato)	✓	
Riesgo Ergonómico:	Posturas. Levantamiento de cargas	✓					
Riesgo Mecánico:	Caída de Objetos Contacto con sustancias Partes en movimiento Proyección de partículas Elementos corto punzantes	✓		Tareas de Alto Riesgo	1. Trabajo en Alturas 2. Trabajo en Espacios Confinados. 3. Trabajo en Caliente. 4. Trabajo con Energías Peligrosas. 5. Trabajo Sustancias Químicas Peligrosas.	✓	
Riesgo Público	Robos Atracos Asaltos Atentados	✓					

YO, el aquí firmante manifiesto que he recibido y entendido completamente todo lo relacionado con los factores de riesgo a los cuales estoy expuesto, las normas de seguridad y salud en el trabajo y las normas ambientales en la realización de mi trabajo y me comprometo a cumplirlas al igual que las responsabilidades a mi asignadas

NOMBRE: manuel RUSTOS CEDULA: 1006531292. RH: O+

DIRECCIÓN: Vereda la hacienda Brucelas. Nº TEL ó CELULAR: 3232406224

AREA DE TRABAJO: cancha sintetica. CONTRATISTA: V&M CARGO: oficial

EPS: NPS AFP: ARL: SURA EXAMENES MEDICOS: SI NO

PERSONA DE CONTACTO: 314 4896588 NELLY AIVAREZ Nº TEL CELULAR:

FIRMA: manuel RUSTOS C. FECHA DE INGRESO: 07/03/2025

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ANTERIORES NORMAS GENERARÁ MULTA

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión 1
v&m ingeniería SAS		Codigo SG-SST-F-13
	REGISTRO NOTIFICACION DE RIESGOS EN OBRA	Fecha 19/3/2019

Generalidades del Proyecto:

Nombre del Proyecto: V&M INGENIERIA S.A.S

Objeto del contrato: Contrato No. CLOPH221 de objeto "CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Ubicación: GUADALUPE - HUILA

Líder en SST: ANDREA TRUJILLO POLANCO

Atención Primeros Auxilios: Camilla - Botiquín de primeros auxilios -

Extintor - Plan de contingencia - Plan de Emergencia

Reglamento Interno

Horarios:

Horario de Entrada: 7:00 am





Horario de Almuerzo: 12:00 m

Horario de Salida: 5:00 pm

Prohibiciones:

Prohibido consumo de licor y trabajar en estado de embriaguez, al igual que el consumo de sustancias psicoactivas en obra y trabajar bajo sus efectos.
También están Prohibidas las peleas, riñas o maltratos en obra.

Deberes:

Notificar los accidentes de trabajo.
Entrar al proyecto por la portería autorizada
Reportar las condiciones inseguras y usar adecuadamente los baños.



Normas de Seguridad Industrial

- El uso del casco es obligatorio.
- Esta prohibido el uso de cachuchas debajo del casco, el uso de tenis en obra, el uso de sudaderas y pantalonetas en obra.
- No se debe utilizar joyas en obra (anillos, pulseras, aretes, etc.)
- El uso de elementos de protección personal es obligatorio de acuerdo a la actividad.
- Las áreas deben estar en orden y aseo.
- No se permite estar en áreas de trabajo sin chaleco
- Obligatorio uso de arnés y línea de vida cuando se desarrollen trabajos a una altura mayor a 1,5 metros (Res. 1409 de 2012).
- No se permite trabajar si no se ha realizado el permiso ATS
- Las personas que presenten restricciones medicas no podrán trabajar en altura.



Importancia de Trabajar Con Seguridad

- El trabajo es bienestar y la salud es vida
- Tu familia te espera en casa
- Recuerda que al trabajar con seguridad todos nos beneficiamos
- Si nos cuidamos evitamos muchos accidentes. Si nos cuidamos previenimos los accidentes. Por eso la mejor de protegarnos es el auto cuidado.







Recuerda debemos cuidarnos, para llegar a casa sanos y felices y así poder disfrutar con nuestra familia

Normas Ambientales

- Realizar la Separación de residuos dependiendo de su material.
- No arrojar sustancias químicas en la red de alcantarillado.
- Humedecer las áreas para evitar emisión de material particulado.
- Informar cuando se presenten fugas o derrames de aceites.
- No afectar ni perjudicar los arboles y la vegetación.
- Cerrar las llaves de paso de agua si no se van a utilizar.
- Consumir los recursos necesarios evitando desperdicios.

Importancia de Cuidar el Medio Ambiente

- Cuidar el medio ambiente evita la aparición de enfermedades.
- Cuando se realizan actividades sin impactar el medio ambiente no se extingue la fauna y se conserva la riqueza de la flora.
- Si realizamos nuestro trabajo reduciendo la generación de ruido y material particulado evitaremos molestias a la comunidad que vive en las áreas cercanas al proyecto.
- Debemos cuidar el planeta para que lo disfruten nuestros hijos.



Notificación de Riesgos

Factor de Riesgo	Agente	A	NA	Factor de Riesgo	Agente	A	NA
	A: Aplica, NA: No Aplica				A: Aplica, NA: No Aplica		
Riesgos Físicos	Ruido Temperatura Falta de Iluminación Vibraciones	✓		Riesgo Locativos	Almacenamiento inadecuado. Orden y aseo Pisos resbalosos Escaleras y barandas	✓	
Riesgo Químico	Material particulado Manipulación de sustancias	✓		Riesgos Eléctricos	Baja tensión (conexiones) Media tensión (instalaciones)	✓	
Riesgo Biológico	Bacterias Virus, hongos	✓					
Riesgo Ergonómico:	Posturas. Levantamiento de cargas	✓		Riesgo Psicológico	Falta de coordinación de tareas Turnos y sobreesfuerzos Abuso de autoridad (maltrato)	✓	
Riesgo Mecánico:	Caída de Objetos Contacto con sustancias Partes en movimiento Proyección de partículas Elementos corto punzantes	✓		Tareas de Alto Riesgo	1. Trabajo en Alturas 2. Trabajo en Espacios Confinados. 3. Trabajo en Caliente. 4. Trabajo con Energías Peligrosas. 5. Trabajo Sustancias Químicas Peligrosas.	✓	
Riesgo Público	Robos Atracos Asaltos Atentados	✓					

YO, el abajo firmante, manifiesto que he recibido y entendido completamente todo lo relacionado con los factores de riesgo a los cuales estoy expuesto, las normas de seguridad y salud en el trabajo y las normas ambientales en la realización de mi trabajo y me comprometo a cumplirlas al igual que las responsabilidades a mi asignadas.

NOMBRE: Leonardo Tovar	CEDULA: 1082882691	RH: O+	
DIRECCIÓN: Guadalupe Huila	Nº TEL ó CELULAR:		
AREA DE TRABAJO: Cancha Sintetica	CONTRATISTA: V&M	CARGO: oficial	
EPS: NUEVA AFP:	ARL: SURA	EXAMENES MEDICOS: SI NO	
PERSONA DE CONTACTO: Paola	Nº TEL ó CELULAR: 3148397564		
FIRMA: Leonardo Tovar	FECHA DE INGRESO: 11/03/2025		

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ANTERIORES NORMAS GENERARÁ MULTA

Scanned with CamScanner

ANEXO SST 5. ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

V&M Ingeniería SAS	Entrega de Dotacion - EPP	Código: I-GA-FT-02 Versión: 1 Fecha: 09/02/2024

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Manuel Bustos Saldaña

TIPO DE DOCUMENTO 1006531292

AREA O PUESTO DE TRABAJO: cuadrilla soldadura.

No. DE DOCUMENTO Cedula.

FECHA DE ENTREGA (DD/MM/AAAA)	CAMISA / CAMISETA		PANTALON		ZAPATOS DE SEG.		CHALECO REFLECTIVO		GAFAS		PROTECTORES AUDITIVOS		GUANTES		TAPA BOCAS	CASCO DE SEGURIDAD	OBEROL	IMPERMEABLE		FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TIPO	NEGRA	TRANSP	COPA	INSERC.	VAQUETA	NITRILO							
7/03/2025							1	X	X		X		X	X		X				Manuel Bustos.	
22/04/25									1			1	1	1	1					manuel Bustos	

Powered by CamScanner

V&M ingeniería SAS	Entrega de Dotacion - EPP	Código: I-GA-FT-02 Versión: 1 Fecha: 09/02/2024

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Leonard Toro

TIPO DE DOCUMENTO C. C.

AREA O PUESTO DE TRABAJO: Cancha Sintetica Guadalupe.

No. DE DOCUMENTO 1083882691

FECHA DE ENTREGA (DD/MM/AAAA)	CAMISA / CAMISETA		PANTALON		ZAPATOS DE SEG.		CHALECO REFLECTIVO		GAFAS		PROTECTORES AUDITIVOS		GUANTES		TAPA BOCAS	CASCO DE SEGURIDAD	OBEROL	IMPERMEABLE	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TIPO	NEGRA	TRANSP	COPA	INSERC.	VAQUETA	NITRILO						
11/03/2025							x		x		x		x	x		x				
22/04/25									1			1	1	1	1				Leonardo Toro	
																			Leonardo Toro	

Scanned with CamScanner

ANEXO SST 6. INSPECCIONES

v&m ingenieria SAS	**SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**Versión:** 1
		Código: SG-SST-F-03
	INSPECCIONES BOTIQUIN Y CAMILLA	Fecha: 11/11/2024

FECHA INSPECCIÓN : **22/04/2025** TIPO DE BOTIQUIN: FIJO____PORTATIL **X**

UBICACIÓN / AREA **CAMPAMENTO OBRA - CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DE GUADALUPE**

BOTIQUIN

ITEM	ELEMENTO	SI	NO	CANT	UNIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
	Material para Limpieza y Protección Tejidos						
1	Apósitos oculares	✓					
2	Microporex (Grueso / Delgado)	✓					
3	Gasas en paquetes individuales	✓					
4	Curitas o banditas	✓					
5	Apósitos o toallas higiénicas	✓					
6	Esparadrapo tela de 4"	✓					
7	Algodón	✓					
8	Aplicadores (Copitos)	✓					
	Soluciones Para Limpieza y Desinfección						
9	Isodine solución (ml - cc)	✓				Jul-25	
10	Isodine espuma (ml - cc)	✓					
11	Suero fisiologico o solución salina (ml-cc)	✓					
12	Yodo - povidona	✓				Jul-25	
13	Agua oxigenda	✓				Dic-25	
14	Jabon quirurgico	✓				Nov-25	
15	Alcohol (ml - cc)	✓				Jul-25	
	Material para Inmovilizar						
16	Baja lenguas	✓					
17	Vendas elásticas de 2 x 5 yardas	✓					
18	Inmovilizador para cuello o collarín	✓					
	Material de Apoyo						
19	Tapabocas	✓					
20	Guantes de latex desechables (M-L)	✓					
21	Sales de hidratación (suero bebible)	✓					
22	Preservativos	✓					
23	Tijeras	✓					
24	Pito	✓					
25	Linterna						
26	Termometro						
	Otros						

CAMILLA

ítem	DESCRIPCION	ESTADO				OBSERVACIONES
		BUENO	REGULAR		MALO	
1	Orden y Aseo	✓				
2	Condiciones Físicas	✓				
3	Cinturones	✓				
4	Agarraderas	✓				
5	Señalización	✓				

FIRMA RESPONSABLE
Nombre: **ADRIANA LISSETH MAYORCA**
Cargo: **RESIDENTE DE OBRA**

INSPECCIONADO POR:
Nombre: **OMAIRA ANDREA TRUJILLO**
Cargo: **PROFESIONAL SST**

FECHA.	ELABORO.	REVISO.	APROBO.
11/11/2024	PROFESIONAL SST	DIRECTOR PROYECTO	GERENTE

v&m ingeniería SAS	**SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**Versión:** 1
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	**Código:** SG-SST-F-04
		Fecha: 11/11/2024

ÁREA:	OPERATIVA — LUGAR: GUADALUPE
RESPOSABLE:	OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO
FRECUENCIA:	MENSUAL
OBJETO:	"CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA"

DILIGENCIE LOS ESPACIOS DESCRITOS A CONTINUACION
MARQUE CON UNA X LAS CONDICIONES DEL EXTINTOR = B: BUENO M: MALO SI: SI NO: NO

ITEM	FECHA DE INSPECCIÓN	CODIGO EXTINTOR	UBICACIÓN	TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA RECARGA		MANÓMETRO		PASADOR O SEGURO		RECIPIEN-TE O TANQUE		MANIJA		BOQUILLA		PINTURA		SEÑALIZA-CION		ALTURA O BASE	
						ACT	PROX	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	17/02/2025	GUA-01	CAMPAMENTO	ABC	10 KG	jul-24	jul-25	X		X		X		X		X		X		X		X	
1	28/03/2025	GUA-01	CAMPAMENTO	ABC	10 KG	jul-24	jul-25	X		X		X		X		X		X		X		X	
1	22/04/25	GUA-01	Campamento	ABC	10 KG	Jul-24	Jul-25	X		X		X		X		X		X		X		X	

V°B° SUPERVISOR:

OBSERVACIONES GENERALES:

EXTINTOR EN CONDICIONES ADECUADAS

FIRMA RESPONSABLE DEL AREA

FIRMA SST

FECHA.	ELABORO.	REVISO.	APROBO.
1/02/2018	PROFESIONAL SST	DIRECTOR PROYECTO	GERENTE

DOCUMENTO CONTROLADO

v&m ingeniería SAS	**SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**Versión:** 002
		Código: SG-SST-F-5
	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	11/11/2024

CENTRO DE TRABAJO/ÁREA:	OPERATIVO	FECHA:	23/04/2024
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	TOVAR BETES LEONARDO	CARGO:	AYUDANTE
INSPECCIONADO POR:	O. ANDREA TRUJILLO	CARGO:	PROFESINAL SST

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	ESTADO			OBSERVACIONES
	BUENO	MALO	N/A	
JEAN	✓			
CAMISA	✓			
GUANTES DE VAQUETA	✓			SE REALIZA REPOSICIÓN X DETERIORO
GUANTES DE CARNAZA	✓			SE REALIZA REPOSICIÓN X DETERIORO
PROTECCIÓN AUDITIVA	✓			SE REALIZA REPOSICIÓN X DETERIORO
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	✓			SE REALIZA REPOSICIÓN X DETERIORO
BOTAS CON PUNTERA	✓			
BOTAS DE CAUCHO				
IMPERMEABLE				
CASCO DE SEGURIDAD	✓			
MONJITAS				
GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS	✓			SE REALIZA REPOSICIÓN X DETERIORO
GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS				
OTRO: CUAL?				

Inspeccionado por:	**Trabajor:**
Firma:	**Firma:** Leonardo Tovar
Cargo:	**Cargo:** OFICIAL

FECHA:	ELABORÓ:	REVISÓ	APROBÓ:
11/11/2024	PROFESIONAL SST	DIRECTOR PROYECTOS	REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTO CONTROLADO

v&m ingeniería SAS	**SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**Versión:** 002
		Código: SG-SST-F-5
	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	31/03/2025

CENTRO DE TRABAJO/ÁREA:	OPERATIVO	FECHA:	23/04/2024
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	BUSTOS SALDAÑA MANUEL	CARGO:	AYUDANTE
INSPECCIONADO POR:	O. ANDREA TRUJILLO	CARGO:	PROFESINAL SST

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	ESTADO			OBSERVACIONES
	BUENO	MALO	N/A	
JEAN	✓			
CAMISA	✓			
GUANTES DE VAQUETA	✓			SE REALIZA REPOSICIÓN X DETERIORO
GUANTES DE CARNAZA	✓			SE REALIZA REPOSICIÓN X DETERIORO
PROTECCIÓN AUDITIVA	✓			SE REALIZA REPOSICIÓN X DETERIORO
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	✓			SE REALIZA REPOSICIÓN X DETERIORO
BOTAS CON PUNTERA	✓			
BOTAS DE CAUCHO				
IMPERMEABLE				
CASCO DE SEGURIDAD	✓			
MONJITAS				
GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS	✓			SE REALIZA REPOSICIÓN X DETERIORO
GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS				
OTRO: CUAL?				

Inspeccionado por:	**Trabajor:**
Firma:	**Firma:** Marcel BUSTOS S.
Cargo:	**Cargo:** Oficial

FECHA:	ELABORÓ:	REVISÓ	APROBÓ:
31/03/2025	PROFESIONAL SST	DIRECTOR PROYECTOS	REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTO CONTROLADO

v&m ingeniería SAS	**SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**VERSION** 001
		CODIGO SG-SST-F-7
	INSPECCION ORDEN Y ASEO	**FECHA** 11/11/2024

Fecha:	**22 de Abril del 2025**
Responsable:	**OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO**
Objeto:	**"CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA"**

Áreas internas	Aspectos	ESTADO			Observaciones
		Bueno	Regular	Malo	
INSTALACIONES LOCATIVAS	Superficies de Trabajo: pisos, paredes y techos limpios y en buen estado	✓			
	Vías de acceso (señalizadas, libres de obstáculos, iluminadas)	✓			
	Sistemas de ventilación	✓			
	Iluminación	✓			Natural
	Instalaciones eléctricas	✓			
ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	Botiquín (Elementos Vencidos)	✓			Elementos inspeccionados y en optimas condiciones
	Extintor (Boquilla, carga, manómetro, broche de seguridad y/o condiciones generales)	✓			En optimas condiciones
	Señalización (Rutas de evacuación, uso EPP, etc.	✓			
	Camilla	✓			En optimas condiciones
BODEGA	Materiales almacenados en condiciones seguras	✓			
	Pisos limpios y en buen estado	✓			
	Los elementos están almacenados de forma ordenada	✓			
EQUIPOS	Herramientas operando de manera adecuada	✓			
	Vehículos (condiciones generales)	✓			
	Herramientas manuales y eléctricas (Condiciones generales)	✓			
PRODUCTOS QUIMICOS	Almacenamiento de productos químicos	✓			
	Hojas de seguridad (Ubicación)	✓			
EPP	Condiciones de EPP de Trabajadores	✓			
	Uso de EPP por parte de los trabajadores	✓			
ESCOMBROS Y BASURAS	Están plenamente identificadas las áreas de residuos	✓			
	Los residuos se encuentran plenamente almacenados	✓			
	Están en condiciones seguras para su disposición final	✓			
	Las canecas de basura presentan los residuos correctos de acuerdo a su identificación	✓			
Otros?					

ADRIANA LISSETH MAYORCA	OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO
FIRMA RESPONSABLE AREA	**FIRMA SST**

FECHA.	ELABORÓ.	REVISÓ.	APROBÓ.
11/11/2024	PROFESIONAL SST	DIRECTOR PROYECTOS	REPRESENTANTE LEGAL
DOCUMENTO CONTROLADO			

ANEXO SST 7. CAPACITACIONES

v&m ingeniería SAS	**SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**Versión:** 001
		Código: SG-SST-F-9
	REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACION	**Fecha:** 31/03/2025

TIPO DE EVENTO				**FECHA DEL EVENTO**				**INTENSIDAD**	
Sensibilización		Inducción		**Día**	**Mes**	**Año**		40 MIN	
Capacitación	X	Reinducción						**LUGAR DEL EVENTO**	
Reunión Informativa		Otro:		9	04	2025		CAMPAMENTO OBRA	
NOMBRE DEL EXPOSITOR:		OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO						**CARGO:**	PROF SST
TEMA DEL EVENTO:		POLÍTICA DE USO ADECUADO DE EPP							

PARTICIPANTES

	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
	Leonardo Tocai	1073882691	oficial	Leonardo
	manuel BUSTOS	1006531292	oficial	manuel B.

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS O EVALUACION DE LA EFICACIA

FIRMA DEL EVALUADOR DE LA EFICACIA:

Powered by CamScanner

v&m ingenieria SAS	**SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**Versión:** 001
		Código: SG-SST-F-9
	REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACION	**Fecha:** 31/03/2025

TIPO DE EVENTO				FECHA DEL EVENTO			INTENSIDAD
Sensibilización		Inducción		Día	Mes	Año	40 MIN
Capacitación	X	Reinducción					LUGAR DEL EVENTO
Reunión Informativa		Otro:		14	04	2025	CAMPAMENTO OBRA
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO					CARGO:	PROF SST
TEMA DEL EVENTO:	PRINCIPALES CAUSAS DE ACCIDENTES EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN						

PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
manuel B:S:	1006531292	oficial	manuel.
Leonardo Tovar	1063388691	oficial	Leonardo T.

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS O EVALUACION DE LA EFICACIA

FIRMA DEL EVALUADOR DE LA EFICACIA:

Fecha:	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
31/03/2025	PROFESIONAL SST	DIRECTOR PROYECTO	REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTO CONTROLADO

Powered by CamScanner

v&m ingeniería SAS	**SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**Versión:** 001
		Código: SG-SST-F-9
	REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACION	**Fecha:** 31/03/2025

TIPO DE EVENTO				**FECHA DEL EVENTO**				**INTENSIDAD**	
Sensibilización		Inducción			**Día**	**Mes**	**Año**	2 HORAS	
Capacitación	X	Reinducción						**LUGAR DEL EVENTO**	
Reunión Informativa		Otro:			25	04	2025	CAMPAMENTO OBRA	
NOMBRE DEL EXPOSITOR:		PREVENTION WORLD						**CARGO:**	ALIDOS SURA
TEMA DEL EVENTO:		PREVENCION DE ACCIDENTES POR CAIDAS A NIVEL							

PARTICIPANTES

	NOMBRE Y APELLIDOS	**DOCUMENTO DE IDENTIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
	Leonaido Tocor	1083881691	oficial	Leonado T.
	manuel B S.	1006531292	oficial	manuel :

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS O EVALUACION DE LA EFICACIA

FIRMA DEL EVALUADOR DE LA EFICACIA:

Powered by CamScanner

v&m ingeniería SAS	**SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**Versión:** 001
		Código: SG-SST-F-9
	REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACION	**Fecha:** 31/03/2025

TIPO DE EVENTO				FECHA DEL EVENTO				INTENSIDAD	
Sensibilización		Inducción		Día	Mes	Año		2 HORAS	
Capacitación	X	Reinducción						LUGAR DEL EVENTO	
Reunión Informativa		Otro:		25	04	2025		CAMPAMENTO OBRA	
NOMBRE DEL EXPOSITOR:		PREVENTION WORLD						CARGO:	ALIDOS SURA
TEMA DEL EVENTO:		PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIEGO MECANICO							

PARTICIPANTES

	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
	manuel BUSTOS S.	1006531292.	oficial	manuel
	Idonado Tooa	1083887691	oFicial	Leonard T.

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS O EVALUACION DE LA EFICACIA

FIRMA DEL EVALUADOR DE LA EFICACIA:	

Powered by CamScanner

ENSAYOS DE LABORATORIO

CamScanner

SEND Suelos y Concretos S.A.S	**COMUNICACION DE ENTREGA DE INFORME DE ENSAYOS**	**VEL-000** **V.01**

Informe No 202504-50

Garzon, 29 de abril de 2025

Señor (a)

V & M INGENIERIA S.A.S

Proyecto: CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

ENTREGA DEL INFORME DE LABORATORIO No202504-50

V & M INGENIERIA S.A.S

Informe No202504-50 contiene 7 paginas

Nombre del Ensayo	Cant.
FALLO DE CILINDROS DE CONCRETO A COMPRESION	12
----------	-------
----------	-------
----------	-------
----------	-------
----------	-------
----------	-------
----------	-------
----------	-------

Esta información no intenta suplir los conocimientos, técnicas y criterios profesionales responsables de la construcción de las obras.

Los resultados emitidos en este informe no deben ser utilizados en ningún tipo de campaña de información técnica o comercial.

SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S no se responsabiliza por el muestreo transporte y/o daños que se presenten en el transcurso del mismo.

Agradecemos la confianza depositada en nuestro laboratorio y estamos dispuestos a resolver cualquier tipo de inquietud.

Cordial saludo,

Ing. DIANA LORENA MURCIA G.
Representante Legal

(a) El presente informe no puede reproducirse sin la aprobación por parte del laboratorio.

(b) Los resultados de los ensayos emitidos en este informe solo son aplicables a las muestras ensayadas.

(c) El Informe No202504-50 contiene 7 páginas incluida la carta de entrega de informes de ensayos.

Informe SEND SUELOS Y CONCRETOS SAS N° 202504-50

CamScanner

SEND Suelos y Concretos S.A.S	COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	VEL-005
		V.01

PROYECTO:	CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA		
SOLICITADO POR:	V & M INGENIERIA S.A.S		
LOCALIZACIÒN:	PLACA DE PISO POLIDEPORTIVO. CONCRETO 3000 PSI		
NORMA ASOCIADA:	ASTM C-31, C-39a, C-143M, INV E 410-22, NTC 673	FECHA RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	21/03/2025
EQUIPO UTILIZADO:	EQUIPO PARA ENSAYO DE COMPRESION MARCA R&R, BALANZA, PIE DE REY		

Cilindro N°	N° Interno	Localizacion	Peso	Altura	Diametro	Area cm^2	Densidad kg/m3	Fecha Fundido	Fecha Fallado	Edad Fallado	Carga KN	Resistencia PSI	Resistencia MPa	Falla Tipo	Resistencia Promedio PSI	Resistencia Promedio Mpa
20029		PLACA DE PISO POLIDEPORTIVO. CONCRETO 3000 PSI	12.03	30.40	15.10	179.08	2209.78	18/03/25	25/03/25	7	262.30 kN	2123.86 PSI	14.65 MPa	3	2077.75 PSI	14.33 MPa
20030			12.76	30.40	15.30	183.85	2283.71	18/03/25	25/03/25	7	257.60 kN	2031.63 PSI	14.01 MPa	3		
20031			12.61	30.30	15.00	176.71	2355.05	18/03/25	15/04/25	28	392.60 kN	3221.44 PSI	22.22 MPa	2	3183.28 PSI	21.95 MPa
20032			12.44	30.40	15.00	176.71	2315.66	18/03/25	15/04/25	28	383.30 kN	3145.13 PSI	21.69 MPa	3		

PROBETAS SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE / NSR10 - C.5.6.2.4 — Un ensayo de resistencia debe ser el promedio de las resistencias de al menos dos probetas de 150 por 300 mm o de al menos tres probetas de 100 por 200 mm, preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a 28 días o a la edad de ensayo establecida para la determinación de fc' .

Esquema de los Modelos de Fractura Típicos NTC 673

TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6
Cono Razonablemente Bien Formados En Ambos Extremos	Cono Bien Formado En Un Extremo Pero No En El Otro , Grietas Verticales Que Llegan A Los Extremos	Agrietamiento Verticar Columnar Que Abarca Ambos Extremos. No Hay Conos Bien Formados	Fractura Diagonal Sin Grietas A Traves De Los Extremos, Se Deb Golpear Con Martillo Para Distinguirlo De Tipo 1	Fracturas En Las Esquinas (Usuales En Cilindros Sin Refrendar)	Similar Al Tipo 5 Pero Las Grietas Tienden A A Unirse En La Superficie Del Cilindro.

ELABORADO POR
Ing. Juan Carlos Caballero A.

REVISADO POR
Ing. Diana L. Murcia G.

Informe SEND SUELOS Y CONCRETOS SAS N° 2025-0450
SEND Suelos y Concretos S.A.S Nit 901.680.866-6 Servicio de Ensayos
Cra 15 #15-42 Barrio Los Samanes. e mail sendsuelosyconcretos@gmail.com Tel: 311 446 86 54 - 310 287 84 24 Gigante - Huila
CamScanner

Suelos y Concretos S.A.S

COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO

VEL-005


V.01

PROYECTO:	CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA		
SOLICITADO POR:	V & M INGENIERIA S.A.S		
LOCALIZACIÓN:	PLACA DE PISO POLIDEPORTIVO. CONCRETO 3000 PSI		
NORMA ASOCIADA:	ASTM C-31, C-39a, C-143M, INV E 410-22, NTC 673	FECHA RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	23/03/2025
EQUIPO UTILIZADO:	EQUIPO PARA ENSAYO DE COMPRESION MARCA R&R, BALANZA, PIE DE REY		

Cilindro N°	N° Interno	Localizacion	Peso	Altura	Diametro	Area cm^2	Densidad kg/m3	Fecha Fundido	Fecha Fallado	Edad Fallado	Carga KN	Resistencia PSI	Resistencia MPa	Falla Tipo	Resistencia Promedio PSI	Resistencia Promedio Mpa
20033		PLACA DE PISO POLIDEPORTIVO. CONCRETO 3000 PSI	12.50	30.50	15.40	186.27	2215.16	20/03/25	27/03/25	7	238.60 kN	1857.42 PSI	12.81 MPa	3	1850.03 PSI	12.76 MPa
20034			12.69	30.40	15.40	186.27	2241.78	20/03/25	27/03/25	7	236.70 kN	1842.63 PSI	12.71 MPa	3		
20035			12.43	30.50	15.00	176.71	2306.95	20/03/25	17/04/25	28	368.30 kN	3022.05 PSI	20.84 MPa	2	3013.84 PSI	20.78 MPa
20036			12.37	30.50	15.10	179.08	2264.41	20/03/25	17/04/25	28	371.20 kN	3005.63 PSI	20.73 MPa	3		

PROBETAS SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE / NSR10 - C.5.6.2.4 — Un ensayo de resistencia debe ser el promedio de las resistencias de al menos dos probetas de 150 por 300 mm o de al menos tres probetas de 100 por 200 mm, preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a 28 días o a la edad de ensayo establecida para la determinación de fc' .

Esquema de los Modelos de Fractura Típicos NTC 673



TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6
Cono Razonablemente Bien Formados En Ambos Extremos	Cono Bien Formado En Un Extremo Pero No En El Otro , Grietas Verticales Que Llegan A Los Extremos	Agrietamiento Verticar Columnar Que Abarca Ambos Extremos. No Hay Conos Bien Formados	Fractura Diagonal Sin Grietas A Traves De Los Extremos, Se Deb Golpear Con Martillo Para Distinguirlo De Tipo 1	Fracturas En Las Esquinas (Usuales En Cilindros Sin Refrendar)	Similar Al Tipo 5 Pero Las Grietas Tienden A A Unirse En La Superficie Del Cilindro.

ELABORADO POR
Ing. Juan Carlos Caballero A.

REVISADO POR
Ing. Diana L. Murcia G.

Informe SEND SUELOS Y CONCRETOS SAS N° 20250150
SEND Suelos y Concretos S.A.S Nit 901.680.866-6 Servicio de Ensayos
Cra 15-42 Barrio Los Samanes. email sendsuelosyconcretos@gmail.com Tel: 311 446 86 54 - 310 827 84 24 Gigante - Huila
CamScanner


SEND Suelos y Concretos S.A.S	COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	VEL-005
		V.01

PROYECTO:	CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA		
SOLICITADO POR:	V & M INGENIERIA S.A.S		
LOCALIZACIÓN:	PLACA DE PISO POLIDEPORTIVO. CONCRETO 3000 PSI		
NORMA ASOCIADA:	ASTM C-31, C-39a, C-143M, INV E 410-22, NTC 673	FECHA RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	25/03/2025
EQUIPO UTILIZADO:	EQUIPO PARA ENSAYO DE COMPRESION MARCA R&R, BALANZA, PIE DE REY		

Cilindro N°	N° Interno	Localizacion	Peso	Altura	Diametro	Area cm^2	Densidad kg/m3	Fecha Fundido	Fecha Fallado	Edad Fallado	Carga KN	Resistencia PSI	Resistencia MPa	Falla Tipo	Resistencia Promedio PSI	Resistencia Promedio Mpa
20037		PLACA DE PISO POLIDEPORTIVO. CONCRETO 3000 PSI	12.62	30.40	15.30	183.85	2258.30	22/03/25	29/03/25	7	280.90 kN	2215.39 PSI	15.28 MPa	3	2218.55 PSI	15.30 MPa
20038			12.71	30.20	15.30	183.85	2289.47	22/03/25	29/03/25	7	281.70 kN	2221.70 PSI	15.32 MPa	2		
20039			12.63	30.60	15.00	176.71	2336.03	22/03/25	19/04/25	28	389.70 kN	3197.64 PSI	22.05 MPa	2	3126.88 PSI	21.56 MPa
20040			12.75	30.40	15.30	183.85	2281.56	22/03/25	19/04/25	28	387.50 kN	3056.12 PSI	21.08 MPa	2		

PROBETAS SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE / NSR10 - C.5.6.2.4 — Un ensayo de resistencia debe ser el promedio de las resistencias de al menos dos probetas de 150 por 300 mm o de al menos tres probetas de 100 por 200 mm, preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a 28 días o a la edad de ensayo establecida para la determinación de fc' .

Esquema de los Modelos de Fractura Típicos NTC 673



TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6
Cono Razonablemente Bien Formados En Ambos Extremos	Cono Bien Formado En Un Extremo Pero No En El Otro , Grietas Verticales Que Llegan A Los Extremos	Agrietamiento Verticar Columnar Que Abarca Ambos Extremos. No Hay Conos Bien Formados	Fractura Diagonal Sin Grietas A Traves De Los Extremos, Se Deb Golpear Con Martillo Para Distinguirlo De Tipo 1	Fracturas En Las Esquinas (Usuales En Cilindros Sin Refrendar)	Similar Al Tipo 5 Pero Las Grietas Tienden A A Unirse En La Superficie Del Cilindro.

ELABORADO POR
Ing. Juan Carlos Caballero A.

REVISADO POR
Ing. Diana L. Murcia G.

Informe SEND SUELOS Y CONCRETOS SAS N° 2025-0150
SEND Suelos y Concretos S.A.S Nit 901.680.866-0 Servicio de Ensayos
Cra 15-42 Barrio Los Samanes. email sendsuelosyconcretos@gmail.com Tel: 311 446 86 54 - 310 827 84 24 Garzón - Huila
CamScanner

Suelos y Concretos S.A.S

COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO

VEL-005


V.01

PROYECTO:	CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA		
SOLICITADO POR:	V & M INGENIERIA S.A.S		
LOCALIZACIÓN:	PLACA DE PISO POLIDEPORTIVO. CONCRETO 3000 PSI		
NORMA ASOCIADA:	ASTM C-31, C-39a, C-143M, INV E 410-22, NTC 673	FECHA RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	28/03/2025
EQUIPO UTILIZADO:	EQUIPO PARA ENSAYO DE COMPRESION MARCA R&R, BALANZA, PIE DE REY		

Cilindro N°	N° Interno	Localizacion	Peso	Altura	Diametro	Area cm^2	Densidad kg/m3	Fecha Fundido	Fecha Fallado	Edad Fallado	Carga KN	Resistencia PSI	Resistencia MPa	Falla Tipo	Resistencia Promedio PSI	Resistencia Promedio Mpa
20041		PLACA DE PISO POLIDEPORTIVO. CONCRETO 3000 PSI	12.28	30.30	15.10	179.08	2263.88	25/03/25	01/04/25	7	275.30 kN	2229.13 PSI	15.37 MPa	2	2199.57 PSI	15.17 MPa
20042			12.72	30.20	15.10	179.08	2351.99	25/03/25	01/04/25	7	268.00 kN	2170.02 PSI	14.97 MPa	3		
20043			12.94	30.40	15.00	176.71	2408.36	25/03/25	22/04/25	28	371.20 kN	3045.84 PSI	21.01 MPa	3	3058.97 PSI	21.10 MPa
20044			12.86	30.50	15.00	176.71	2385.25	25/03/25	22/04/25	28	374.40 kN	3072.10 PSI	21.19 MPa	2		


PROBETAS SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE / NSR10 - C.5.6.2.4 — Un ensayo de resistencia debe ser el promedio de las resistencias de al menos dos probetas de 150 por 300 mm o de al menos tres probetas de 100 por 200 mm, preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a 28 días o a la edad de ensayo establecida para la determinación de fc' .

Esquema de los Modelos de Fractura Típicos NTC 673




TIPO 1

Cono Razonablemente Bien Formados En Ambos Extremos




TIPO 2

Cono Bien Formado En Un Extremo Pero No En El Otro , Grietas Verticales Que Llegan A Los Extremos




TIPO 3

Agrietamiento Verticar Columnar Que Abarca Ambos Extremos. No Hay Conos Bien Formados




TIPO 4

Fractura Diagonal Sin Grietas A Traves De Los Extremos, Se Deb Golpear Con Martillo Para Distinguirlo De Tipo 1



TIPO 5

Fracturas En Las Esquinas (Usuales En Cilindros Sin Refrendar)



TIPO 6

Similar Al Tipo 5 Pero Las Grietas Tienden A A Unirse En La Superficie Del Cilindro.

ELABORADO POR
Ing. Juan Carlos Caballero A.

REVISADO POR
Ing. Diana L. Murcia G.

Informe SEND SUELOS Y CONCRETOS SAS N° 20250401-50
CamScanner

Suelos y Concretos S.A.S

COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO

VEL-005


V.01

PROYECTO:	CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA		
SOLICITADO POR:	V & M INGENIERIA S.A.S		
LOCALIZACIÓN:	PLACA DE PISO POLIDEPORTIVO. CONCRETO 3000 PSI		
NORMA ASOCIADA:	ASTM C-31, C-39a, C-143M, INV E 410-22, NTC 673	FECHA RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	30/03/2025
EQUIPO UTILIZADO:	EQUIPO PARA ENSAYO DE COMPRESION MARCA R&R, BALANZA, PIE DE REY		

Cilindro N°	N° Interno	Localizacion	Peso	Altura	Diametro	Area cm^2	Densidad kg/m3	Fecha Fundido	Fecha Fallado	Edad Fallado	Carga KN	Resistencia PSI	Resistencia MPa	Falla Tipo	Resistencia Promedio PSI	Resistencia Promedio Mpa
20045		PLACA DE PISO POLIDEPORTIVO. CONCRETO 3000 PSI	12.53	30.50	15.30	183.85	2233.78	27/03/25	03/04/25	7	246.90 kN	1947.24 PSI	13.43 MPa	1	2020.43 PSI	13.93 MPa
20046			12.72	30.50	15.20	181.46	2298.32	27/03/25	03/04/25	7	262.00 kN	2093.61 PSI	14.44 MPa	3		
20047			12.52	30.40	15.00	176.71	2329.80	27/03/25	24/04/25	28	371.90 kN	3051.59 PSI	21.04 MPa	2	3090.96 PSI	21.32 MPa
20048			12.17	30.60	15.10	179.08	2220.52	27/03/25	24/04/25	28	386.60 kN	3130.33 PSI	21.59 MPa	2		


PROBETAS SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE / NSR10 - C.5.6.2.4 — Un ensayo de resistencia debe ser el promedio de las resistencias de al menos dos probetas de 150 por 300 mm o de al menos tres probetas de 100 por 200 mm, preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a 28 días o a la edad de ensayo establecida para la determinación de fc' .

Esquema de los Modelos de Fractura Típicos NTC 673




TIPO 1

Cono Razonablemente Bien Formados En Ambos Extremos




TIPO 2

Cono Bien Formado En Un Extremo Pero No En El Otro , Grietas Verticales Que Llegan A Los Extremos




TIPO 3

Agrietamiento Verticar Columnar Que Abarca Ambos Extremos. No Hay Conos Bien Formados




TIPO 4

Fractura Diagonal Sin Grietas A Traves De Los Extremos, Se Deb Golpear Con Martillo Para Distinguirlo De Tipo 1



TIPO 5

Fracturas En Las Esquinas (Usuales En Cilindros Sin Refrendar)



TIPO 6

Similar Al Tipo 5 Pero Las Grietas Tienden A A Unirse En La Superficie Del Cilindro.

ELABORADO POR

Ing. Juan Carlos Caballero A.

REVISADO POR

Ing. Diana L. Murcia G.

Informe SEND SUELOS Y CONCRETOS SAS N° 20250425.50

CamScanner

Suelos y Concretos S.A.S

COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO

VEL-005


V.01

PROYECTO:	CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA		
SOLICITADO POR:	V & M INGENIERIA S.A.S		
LOCALIZACIÒN:	PLACA DE PISO POLIDEPORTIVO. CONCRETO 3000 PSI		
NORMA ASOCIADA:	ASTM C-31, C-39a, C-143M, INV E 410-22, NTC 673	FECHA RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	3/04/2025
EQUIPO UTILIZADO:	EQUIPO PARA ENSAYO DE COMPRESION MARCA R&R, BALANZA, PIE DE REY		

Cilindro N°	N° Interno	Localizacion	Peso	Altura	Diametro	Area cm^2	Densidad kg/m3	Fecha Fundido	Fecha Fallado	Edad Fallado	Carga KN	Resistencia PSI	Resistencia MPa	Falla Tipo	Resistencia Promedio PSI	Resistencia Promedio Mpa
20049		PLACA DE PISO POLIDEPORTIVO. CONCRETO 3000 PSI	12.64	30.40	15.20	181.46	2291.74	31/03/25	07/04/25	7	306.80 kN	2451.60 PSI	16.91 MPa	3	2426.96 PSI	16.74 MPa
20050			12.87	30.60	15.30	183.85	2288.33	31/03/25	07/04/25	7	304.60 kN	2402.31 PSI	16.57 MPa	3		
20051			12.82	30.60	15.00	176.71	2370.80	31/03/25	28/04/25	28	434.50 kN	3565.25 PSI	24.59 MPa	5	3634.11 PSI	25.06 MPa
20052			13.03	30.70	15.20	181.46	2339.71	31/03/25	28/04/25	28	463.40 kN	3702.98 PSI	25.54 MPa	5		

PROBETAS SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE / NSR10 - C.5.6.2.4 — Un ensayo de resistencia debe ser el promedio de las resistencias de al menos dos probetas de 150 por 300 mm o de al menos tres probetas de 100 por 200 mm, preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a 28 días o a la edad de ensayo establecida para la determinación de fc' .

Esquema de los Modelos de Fractura Típicos NTC 673



TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6
Cono Razonablemente Bien Formados En Ambos Extremos	Cono Bien Formado En Un Extremo Pero No En El Otro, Grietas Verticales Que Llegan A Los Extremos	Agrietamiento Verticar Columnar Que Abarca Ambos Extremos. No Hay Conos Bien Formados	Fractura Diagonal Sin Grietas A Traves De Los Extremos, Se Deb Golpear Con Martillo Para Distinguirlo De Tipo 1	Fracturas En Las Esquinas (Usuales En Cilindros Sin Refrendar)	Similar Al Tipo 5 Pero Las Grietas Tienden A A Unirse En La Superficie Del Cilindro.

ELABORADO POR
Ing. Juan Carlos Caballero A.

REVISADO POR
Ing. Diana L. Murcia G.

Informe SEND SUELOS Y CONCRETOS SAS N° 20250470
SEND Suelos y Concretos S.A.S Nit 901.680.866-0 Servicio de Ensayos
Cra 15-42 Barrio Los Samanes. email sendsuelosyconcretos@gmail.com Tel: 311 446 86 54 - 310 827 84 24 Gigante - Huila
CamScanner

CERTIFICADOS DE CALIDAD

CamScanner



REPORTE DE CALIDAD

CEMEX Uso General

Fecha de Emisión: 24-oct-24
Número de Reporte: IBG-UG-41-2024
Km 5 Vía Buenos Aires-Payandé, Tolima, Colombia
Planta Caracolito

Cemento Hidráulico Tipo UG


Fecha inicial* 6-oct-24 ..... **Fecha final*** 12-oct-24

Resistencia a la compresión	Método de ensayo	Resultados	Requisitos norma
1 día	NTC 220	**11.7 MPa**	No especificado
3 días	NTC 220	**20.0 MPa**	Mínimo 8.0
7 días	NTC 220	**22.8 MPa**	Mínimo 15.0
28 días (+)	NTC 220	**27.3 MPa**	Mínimo 24.0

Otros parámetros físicos	Método de ensayo	Resultados
Retenido en Tamiz 45 µm	NTC 294	7.12 %
Superficie Específica Blaine	NTC 33	406 m²/kg
Tiempo de Fraguado Final	NTC 118	207 min


Otros parámetros físicos

Tiempo de Fraguado Inicial (min)




Resultado: 152 min
Método de ensayo: NTC 118

Contenido de Aire en Mortero (%)



Resultado: 7.6%
Método de ensayo: NTC 224

Expansión de Barra de Mortero a 14 días (%) (+)



Resultado: 0.001%
Método de ensayo: NTC 4927

Nuestros productos cumplen con la **Norma Técnica Colombiana NTC 121:2023 "ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO PARA CEMENTO HIDRÁULICO".** Adicionalmente contamos con la certificación **ISO 9001 versión 2015** para "Producción de Cemento Hidráulico" emitida por el **ICONTEC,** el cual ejecuta auditorias periódicas de seguimiento a nuestro Sistema de Gestión de Calidad para verificar el cumplimiento de nuestros procesos y garantizar la calidad de nuestros productos.

* Este Reporte de Calidad corresponde a valores promedio de los análisis del producto entre las fechas del periodo indicado.
** El muestreo y análisis fueron realizados de acuerdo al procedimiento CGC-VIP-PT-05.
*** Este Reporte de Calidad no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de Cemex Colombia S.A.
(+) Valores reportados del periodo mensual anterior.

Carlos Andrés Parra Bermúdez
Coordinador de Aseguramiento de Calidad

CamScanner

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Carretera Central del Norte Km 27, Tuta, Colombia.
C.P - 150408 Tel/Fax: 7426350

Nº: 10008131271319

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
G Y J FERRETERIAS S A CARTAGO	**9007400934/110**	**OC 14802367**	**10778196/000110**	**NTC 1920-SAE 1015**	**1.000**

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	
109000519	PLT NTC 1920 2 1/2''x3/16'' 6m	1725790201	GR 36	0,15	0,51	0,010	0,029	0,15	0,26	0,08	0,18	0,02	0,003	0,000	
Rangos de referencia según norma				máx 0,2300%	máx 1,3500%	máx 0,0400%	máx 0,0500%	máx 0,4000%							

PROPIEDADES MECÁNICAS — Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	Alargamiento	Masa Lineal			Espeso	Ancho			
109000519	PLT NTC 1920 2 1/2''x3/16'' 6m	1725790201	NA	327	462	25,1	2,256			4,63	63,80			
Rangos de referencia según norma				mín 250,0 MPa	400,0 - 550,0 MPa	mín 20,00%				4,56 - 4,96 mm	62,71 - 65,09 mm			

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

Gerdau Diaco certifica que para la producción de nuestro acero, el porcentaje de contenido reciclado mínimo post-consumo corresponde al 90%.

RESPONSABLE DE CALIDAD

TUTA, 26.07.2023

PAOLA KATHERIN MATEUS

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Carretera Central del Norte Km 27, Tuta, Colombia.
C.P - 150408 Tel/Fax: 7426350

Nº: 10008131304736

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
G Y J FERRETERIAS SA NEIVA	9007431535/10	2.10.2023	10813725/000010	NTC161 AH-24 SAE1015	9.000

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	
109000483	BAR LIS NTC 161 1'' 6m	1725897001	GR 36	0,15	0,48	0,015	0,032	0,14	0,26	0,09	0,18	0,02	0,002	0,001	
109000483	BAR LIS NTC 161 1'' 6m	1725897001	GR 36	0,15	0,48	0,015	0,032	0,14	0,26	0,09	0,18	0,02	0,002	0,001	
Rangos de referencia según norma				0,1300 - 0,1800%	0,3000 - 0,6000%	máx 0,0400%	máx 0,0500%								

PROPIEDADES MECÁNICAS

Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	R.T/R.F	Diámet	Ovalid			
109000483	BAR LIS NTC 161 1'' 6m	1725897001	NA	296	458	29,7	3,926	BUENO	1,54	25,25	0,08			
109000483	BAR LIS NTC 161 1'' 6m	1725897001	NA	296	458	29,7	3,926	BUENO	1,54	25,25	0,08			
Rangos de referencia según norma				mín 235,0 MPa	mín 363,0 MPa	mín 18,00%	mín 3,742 kg/m		mín 1,100	24,80 - 26,00 mm	máx 0,60 mm			

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

Gerdau Diaco certifica que para la producción de nuestro acero, el porcentaje de contenido reciclado mínimo post-consumo corresponde al 90%.

RESPONSABLE DE CALIDAD

TUTA, 04.10.2023

PAOLA KATHERIN MATEUS

PROALCO BEKAERT	INFORME GENERICO ALAMBRE GALVANIZADO MTS	CÓDIGO	FO-01-11
		VERSION	7

INFORME DE ENSAYO Nº	FECHA DE ELABORACION
DCG-1697-2023	2/10/2023

PEDIDO	CLIENTE	CIUDAD
NA	G Y J FERRETERIAS SA	CARTAGO
PRODUCTO:	ALAMBRE GALVANIZADO Ø 2,11mm	

CODIGO DEL PRODUCTO	210366	LOTES DE PRODUCCION	FA214802
		DESARROLLO:	NO APLICA
		FICHA TÉCNICA :	FT-PL-25

ENSAYOS MECÁNICOS						
ENSAYO	CALIBRE (BWG)	DIÁMETRO (mm)	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (kgf/mm²)		OVALIDAD (mm)	
ESPECIFICACION	14	2,11 ± 0,04	MIN 40	MAX 60	0,02	

ENSAYOS ALAMBRE TERMINADO			
ENSAYO	TORSION	CAPA DE ZINC (g/m²)	
ESPECIFICACION	N/A	MIN 30	MAX 55

CARACTERÍSTICAS DEL DESPACHO		
NUMERO DE UNIDADES (UND)	PESO PROMEDIO (Kg)	PESO TOTAL (kg)
20	50	1000

OBSERVACIONES

PROALCO BEKAERT
better together

CamScanner

Esquema de certificación tipo 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according to ISO/IEC 17067) for:

TUBOS Y ACCESORIOS PARA ALCANTARILLADO DURAFORT

Fabricado por **CELTA S.A.S.** en la **Carrera 24 No. 30-500, Soledad, Atlántico, COLOMBIA,** identificada con **número de NIT 800.164.590-1**

Manufactured by **CELTA S.A.S.** in the **Carrera 24 No. 30-500, Soledad, Atlántico, COLOMBIA,** identificada con **número de NIT 800.164.590-1**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC3722-3 (2012)

Sistemas de tuberías plásticas para uso sin presión en drenajes y alcantarillados enterrados (o bajo tierra), sistemas de tuberías de pared estructural de poli (cloruro de vinilo) rígido (PVC U), polipropileno (PP) y polietileno (PE). parte 3: tuberías y accesorios con superficie externa no lisa, tipo B

Plastics piping systems for non pressure underground drainage and sewerage – structured – wall piping systems of unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE). Part 3: pipes and fittings with non – smooth external surface, type B

SECTOR ICS 23.040.20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC-CER1073426
Certificate

Fecha de Aprobación: 2024-10-11
Approval Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2030-10-10
Expiration Date:

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ID # 0677

Este certificado es propiedad de ICONTEC [illegible]
ICONTEC, Calle 26 # 69-79, Torre 4 "Agua" [illegible] esarial Elemento". Bogotá D.C., Colombia

CamScanner

PANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL - ABRIL

CamScanner

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33033425
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-04-04

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	VYM INGENERIA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900062688	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 9 17 18	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4220	CORREO ELECTRÓNICO	2018AFILIACIONES@GMAIL.COM	TELÉFONO	6335646
FAX	8643535	SUCURSAL	01oficina	NOMBRE SUCURSAL	01oficina
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7713933	PRIMER APELLIDO	CAMACHO	SEGUNDO APELLIDO	LADINO
PRIMER NOMBRE	YERSON	SEGUNDO NOMBRE	FERNANDO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 04	Año: 2025	Mes: 05	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		$9.964.500		33033425

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-7713933	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	CAMACHO LADINO YERSON FERNANDO	$1.423.500
CC-36312881	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	MONJE FLOR LINA CONSTANZA	$1.423.500
CC-7714529	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	MURCIA HERNANDEZ ALBEIRO	$1.423.500
CC-52033387	01	No	No	No	41	1	1661901	Fijo	ROBAYO GUZMAN ALEJANDRINA	$2.847.000
CC-1084923149	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	SANCHEZ RIVERA HERMIDES	$1.423.500
CC-1084869075	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	TRUJILLO PERDOMO LUIS FERNANDO	$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 7713933																													0		
CC - 36312881																													0		
CC - 7714529																													0		
CC - 52033387																													0		
CC - 1084923149																													0		
CC - 1084869075																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 7713933	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 36312881	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 7714529	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 52033387	COLPENSIONES	30	$2.847.000	0.1600000	$455.600	$0	$0	$455.600	$0	$0	$0
CC - 1084923149	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1084869075	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 7713933	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 36312881	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 7714529	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 52033387	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.847.000	0.0400000	$113.900	$0	0	$0	0	$0	30	$2.847.000	1	0.0052200	$14.900
CC - 1084923149	ESSC ASMET SALUD	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1084869075	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-7713933	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36312881	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7714529	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52033387	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.847.000	0.0400000	$113.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1084923149	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1084869075	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 04											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$455.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$455.600
PORVENIR	5	$1.139.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.139.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																		
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$170.900	$0	0	$0	0	$0	$170.900	0	$0	$0	$170.900	$0	0	$0	$0	$170.900	$0	$0	$170.900
ESSC ASMET SALUD	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	0	$0	$0	$57.000	$0	0	$0	$0	$57.000	$0	$0	$57.000
SANITAS	3	$171.000	$0	0	$0	0	$0	$171.000	0	$0	$0	$171.000	$0	0	$0	$0	$171.000	$0	$0	$171.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	6	$510.400	0	$0	$0	$510.400	0	$0	$510.400	0	$0	$0	$510.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	6	$398.900	0	$0	$398.900
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$398.900
PENSIONES	2	$1.594.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$510.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$398.900
SENA	1	$0
ICBF	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.902.800

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33700064
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-06-09

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	VYM INGENERIA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900062688	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 9 3 50 LOCAL 412	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	GUADALUPE
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4220	CORREO ELECTRÓNICO	YERSONFCAMACHO@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	8643535
FAX	8643535	SUCURSAL	221	NOMBRE SUCURSAL	CONTRATO CANCHA SINTETICA GUADALUPE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7713933	PRIMER APELLIDO	CAMACHO	SEGUNDO APELLIDO	LADINO
PRIMER NOMBRE	YERSON	SEGUNDO NOMBRE	FERNANDO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 04	Año: 2025	Mes: 04	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		33700064

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1079409298	59	No	No	No	41	206	5711001	Salario	MAYORCA PERDOMO ADRIANA LISSETH	$1.423.500

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1079409298																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1079409298	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1079409298	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5711001	0.0696000	$99.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1079409298	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 04											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	18	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SIN EPS	1	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	18	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$99.100	0	$0	$0	$99.100	18	$1.200	$100.300	0	$0	$0	$100.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	18	$0	$0
SENA	0	$0	18	$0	$0
ICBF	0	$0	18	$0	$0
ESAP	0	$0	18	$0	$0
MinEdu	0	$0	18	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	0	$0
PENSIONES	0	$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	$100.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$100.300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1079409298		MAYORCA PERDOMO ADRIANA LISSETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 5 W 33 26 SANTA INES	NEIVA-HUILA	8377022	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1439218251	9484509223	I	2025/05/23	2025/04/28	NEQUI	0	$490,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1079409298	MAYORCA ADRIANA																		231001	30	$1,720,000	$275,200	EPS005	30	$1,720,000	$215,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$490,200
Total	**Afiliados(1)**																						$1,720,000	$275,200			$1,720,000	$215,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$490,200

2025/04/28 01:42 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1079409298		MAYORCA PERDOMO ADRIANA LISSETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 5 W 33 26 SANTA INES	NEIVA-HUILA	8377022	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1439218251	9484509223	I	2025/05/23	2025/04/28	NEQUI	0	$490,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,200	$0	$0	$275,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$275,200	$0	$0	$275,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$215,000	$0	$0	$215,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$215,000	$0	$0	$215,000
TOTAL				1	$490,200	$0	$0	$490,200

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33067091
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-05-12

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	VYM INGENERIA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900062688	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 9 3 50 LOCAL 412	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	IQUIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4220	CORREO ELECTRÓNICO	YERSONFCAMACHO@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	8643535
FAX	8643535	SUCURSAL	195	NOMBRE SUCURSAL	195 del 2023
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7713933	PRIMER APELLIDO	CAMACHO	SEGUNDO APELLIDO	LADINO
PRIMER NOMBRE	YERSON	SEGUNDO NOMBRE	FERNANDO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 04	Año: 2025	Mes: 04	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
8		$0		33067091

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1102805593	59	No	No	No	41	357	5711001	Salario	ALDANA BARCINILLA EDER SAMIR	$1.423.500
CC-1019065586	59	No	No	No	41	357	5711001	Salario	CAMARGO ARCILA CARLOS ESTEBAN	$1.423.500
CC-1075257431	59	No	No	No	41	357	5711001	Salario	QUIMBAYA CUELLAR LUZ DIVIA	$1.423.500
CC-12121175	59	No	No	No	41	1	5711001	Salario	RAMON MUÑOZ WILLIAM IGNACIO	$1.423.500
CC-10273855	59	No	No	No	41	357	5711001	Salario	RESTREPO MOSCOSO JULIO CESAR	$1.423.500
CC-1080292451	59	No	No	No	41	357	5711001	Salario	SALAZAR GALINDO BLADIMIR	$1.423.500
CC-1075213839	59	No	No	No	41	357	5711001	Salario	TRUJILLO POLANCO OMAIRA ANDREA	$1.423.500
CC-26593081	59	No	No	No	41	357	5711001	Salario	VARGAS GONZALEZ MARILUZ	$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1102805593																													0		
CC - 1019065586																													0		
CC - 1075257431																													0		
CC - 12121175																													0		
CC - 10273855																													0		
CC - 1080292451																													0		
CC - 1075213839																													0		
CC - 26593081																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1102805593	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1019065586	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1075257431	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 12121175	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 10273855	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1080292451	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1075213839	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 26593081	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1102805593	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1019065586	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1075257431	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 12121175	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 10273855	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1080292451	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1075213839	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 26593081	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1102805593	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1019065586	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075257431	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12121175	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10273855	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1080292451	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075213839	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26593081	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 04											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	8	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SIN EPS	8	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	8	$792.800	0	$0	$0	$792.800	0	$0	$792.800	0	$0	$0	$792.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	8	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	0	$0
PENSIONES	0	$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	$792.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$792.800

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075213839
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	INDEPENDIE
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	INDEPENDIENTE
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-12
FECHA DE PAGO:	2025-04-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	32748466
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32748466
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/06/2025

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33331858
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-05-12

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	VAMECOL INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901614817	D.V.	4	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR42-85 KM32 PLAERMO	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	2018AFILIACIONES@GMAIL.COM	TELÉFONO	3123255722
FAX	0	SUCURSAL	07	NOMBRE SUCURSAL	SINTETICA GUADALUPE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1075303013	PRIMER APELLIDO	CUELLAR	SEGUNDO APELLIDO	PASTRANA
PRIMER NOMBRE	CAROLINA	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 04	Año: 2025	Mes: 04	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		33331858

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-17709845	59	No	No	No	41	319	5711001	Salario	LIZARAZO CORREA PABLO ARBEY	$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 17709845																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 17709845	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 17709845	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-17709845	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 04											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	5	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SIN EPS	1	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	5	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$99.100	0	$0	$0	$99.100	5	$400	$99.500	0	$0	$995	$99.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	5	$0	$0
SENA	0	$0	5	$0	$0
ICBF	0	$0	5	$0	$0
ESAP	0	$0	5	$0	$0
MinEdu	0	$0	5	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	0	$0
PENSIONES	0	$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	$99.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$99.500

RAZÓN SOCIAL :	PABLO ARBEY LIZARAZO CORREA
IDENTIFICACIÓN:	CC-17709845
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-05-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-13
FECHA DE PAGO:	2025-05-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	33027021
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33027021
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800	$ 405.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/06/2025

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33268655
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-05-12

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	VAMECOL INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901614817	D.V.	4	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR42-85 KM32 PLAERMO	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	2018AFILIACIONES@GMAIL.COM	TELÉFONO	3123255722
FAX	0	SUCURSAL	07	NOMBRE SUCURSAL	SINTETICA GUADALUPE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1075303013	PRIMER APELLIDO	CUELLAR	SEGUNDO APELLIDO	PASTRANA
PRIMER NOMBRE	CAROLINA	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 04	Año: 2025	Mes: 05	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
5		$4.555.200		33268655

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1006531292	01	No	No	No	41	319	5711001	Fijo	BUSTOS SALDAÑA MANUEL	$1.423.500
CC-1000514656	01	No	No	No	41	319	5711001	Fijo	CASTILLA SCARPETTA DIEGO ALBERTO	$1.423.500
CC-1002230693	01	No	No	No	41	319	5711001	Fijo	SANTOS MENDOZA DANIEL JOSE	$1.423.500
CC-92533487	01	No	No	No	41	319	5711001	Fijo	SANTOS URAN MARIO JOSE	$1.423.500
CC-1083882691	01	No	No	No	41	319	5711001	Fijo	TOVAR BETES LEONARDO	$1.423.500

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1006531292																													0		
CC - 1000514656			X	2025-04-12																									0		
CC - 1002230693			X	2025-04-12																									0		
CC - 92533487			X	2025-04-12																									0		
CC - 1083882691																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1006531292	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1000514656	PORVENIR	12	$569.400	0.1600000	$91.200	$0	$0	$91.200	$0	$0	$0
CC - 1002230693	PORVENIR	12	$569.400	0.1600000	$91.200	$0	$0	$91.200	$0	$0	$0
CC - 92533487	PORVENIR	12	$569.400	0.1600000	$91.200	$0	$0	$91.200	$0	$0	$0
CC - 1083882691	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1006531292	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1000514656	COMPENSAR-EPS	12	$569.400	0.0400000	$22.800	$0	0	$0	0	$0	12	$569.400	5	0.0696000	$39.700

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1002230693	NUEVA E.P.S. S.A.	12	$569.400	0.0400000	$22.800	$0	0	$0	0	$0	12	$569.400	5	0.0696000	$39.700
CC - 92533487	EPS-S COOSALUD	12	$569.400	0.0400000	$22.800	$0	0	$0	0	$0	12	$569.400	5	0.0696000	$39.700
CC - 1083882691	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1006531292	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1000514656	COMFAMILIAR DEL HUILA	12	$569.400	0.0400000	$22.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1002230693	COMFAMILIAR DEL HUILA	12	$569.400	0.0400000	$22.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-92533487	COMFAMILIAR DEL HUILA	12	$569.400	0.0400000	$22.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1083882691	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 04											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	5	$729.200	$0	$0	$0	$0	5	$2.400	$0	$0	$731.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	3	$136.800	$0	0	$0	0	$0	$136.800	5	$500	$0	$137.300	$0	0	$0	$0	$137.300	$0	$0	$137.300
COMPENSAR-EPS	1	$22.800	$0	0	$0	0	$0	$22.800	5	$100	$0	$22.900	$0	0	$0	$0	$22.900	$0	$0	$22.900
EPS-S COOSALUD	1	$22.800	$0	0	$0	0	$0	$22.800	5	$100	$0	$22.900	$0	0	$0	$0	$22.900	$0	$0	$22.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	5	$317.300	0	$0	$0	$317.300	5	$1.100	$318.400	0	$0	$3.184	$318.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	5	$182.400	5	$600	$183.000
SENA	0	$0	5	$0	$0
ICBF	0	$0	5	$0	$0
ESAP	0	$0	5	$0	$0
MinEdu	0	$0	5	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$183.100
PENSIONES	1	$731.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$318.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$183.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.416.100

CORRESPONDENCIA

CamScanner

Neiva, 04 de abril de 2025 **V&M-GUA-016**

Señores
CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S
ANT. ING. DANIELA CARRILLO
R.L Interventoría

Referencia: Contrato No. CLOPIH221 de 2024 de objeto "CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"

Asunto: Corrección de informes mensuales contrato de obra No. CLOPIH 221 de 2024.

Cordial Saludo,

Me dirijo a usted para presentar los informes mensuales correspondientes a los meses de enero No.3 y febrero No.3. Estos informes incluyen las correcciones solicitadas por la entidad contratante, Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila. (INDERHUILA).

Los informes se presentan en formato digital en un CD, de acuerdo con las especificaciones solicitadas por la entidad. Además, se entrega una copia física de los mismos para su revisión y verificación.

A continuación, se detallan los informes que se entregan:

- DIH-GID-F13 INFORME DE OBRA-CONSULTORÍA No.3
- DIH-GID-F13 INFORME DE OBRA-CONSULTORÍA No.4
- PLAN DE CALIDAD VILLA OLIMPICA GUADALUPE.
- PMT- PLAN DE MANEJO DE TRANSITO VILLA

Agradezco de antemano su colaboración y apoyo en este proyecto. Quedo a su disposición para cualquier consulta o requerimiento adicional.

Atentamente,

YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO

Representante Legal

DIRECCION: CR 4 No. 11 – 188
TERUEL - HUILA
Tel: 8741735
E-MA ingenieria@vmingenieria.com

CamScanner

Neiva, 04 de abril de 2025 **V&M-GUA-017**

Señores
CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S
ANT. ING. DANIELA CARRILLO
R.L Interventoría

Referencia: Contrato No. CLOPIH221 de 2024 de objeto "CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"

Asunto: Solicitud de prorroga contrato de obra No. CLOPIH 221 de 2024.

Cordial Saludo,

Me dirijo a ustedes con el fin de solicitar prórroga del contrato de obra No. CLOPIH 221 de 2024, celebrado con el Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila. (INDERHUILA) y V&M INGENIERIA S.A.S.

Considerando que la ejecución de las actividades se ha visto afectada por factores externos no imputables al contratista, específicamente por factores como:

En primer lugar, el cambio en la ubicación del lote destinado para la construcción de la cancha sintética, ya que todo radica a partir de un error en el cruce de información entre el Municipio de Guadalupe Huila y el Inder Huila para la implantación del diseño y distribución de los escenarios deportivos que conforman la villa olímpica del municipio de Guadalupe. La alcaldía municipal entregó un diseño para la implantación que no contempló adecuadamente la eventualidad de socavación y peligro que generaba la afectación al lote por parte del rio Suaza.

Una vez que el contratista se dispuso a realizar las actividades preliminares y levantamientos topográficos, se percató de dichas discrepancias e irregularidades del terreno. Posteriormente, se informó a la entidad correspondiente y se procedió a realizar una nueva implantación de diseño en otra ubicación, garantizando la funcionalidad de la misma. Sin embargo, esta eventualidad generó cantidades mayores y menores en cortes, rellenos y demás actividades.

Además, la funcionalidad del sistema eléctrico y ciertas actividades se encuentran supeditadas a un proyecto macro externo al contratista, ejecutado por la firma DANES INGENIEROS S.A.S (CONTRATO DE OBRA No. 382 DE 2023). Proyecto de interés público el cual se puede consultar y corroborar la información anteriormente descrita). siendo así el contrato de obra CLOPIH221 DE 2024 requiere revisión del diseño eléctrico y

DIRECCIÓN CR 11 – 188
TERUEL - HUILA
Tel: 8741735
E-MA ingenieria@vmingenieria.com

CamScanner

distribución de mismo por ende el contratista emite Balance No.1 – Mayores y menores cantidades considerando lo anterior, por ende, se solicita amablemente extender el plazo de ejecución con el fin de garantizar el alcance y calidad del proyecto.


Por otra parte, el ingreso de materiales de obra se vio afectado por las constantes protestas y bloqueos de vías por parte del sector arrocero en el departamento del Huila y Tolima lo que impidió en transporte y entrega oportuna de materiales, herramienta y equipos.

Finalmente, pero no menos importante las condiciones climáticas adversas en la presente ola invernal que afectan la región, con días de constantes lluvias torrenciales han dificultado la ejecución de las actividades.

Estos factores han generado un atraso en el desarrollo de las actividades contractuales debido a que se ha ocasionado deterioro de las vías de acceso a las plantas que proveen de materiales pétreos, ingreso de maquinaria, equipos y materiales de ferretería programados para entrega en obra. Esto ha afectado las actividades de los ítems (2,1) “EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL”, (2,3) “RELLENOS CON RECEBO COMPACTADO”, CAPITULO DE AGUAS LLUVIAS (3.1 - 3.5), “FUNDICIÓN DE PLACAS” (4.1 -4.5) “CERRAMIENTO” (5.1 – 5.10) “ILUMINACION” (6.1 – 6.10).

El aumento en las precipitaciones que ha ocasionado la ola invernal que afecta la región por la época ha generado pérdidas económicas considerables al contratista de obra debido a la perdida de la estructura de la placa y materiales pétreos lo cual genera reprocesos y retrasos en el cronograma de actividades predecesoras. A continuación, relacionamos historial del promedio mensual de lluvias en el municipio de Guadalupe Huila durante la ola invernal:

Promedio mensual de lluvia en febrero en Guadalupe

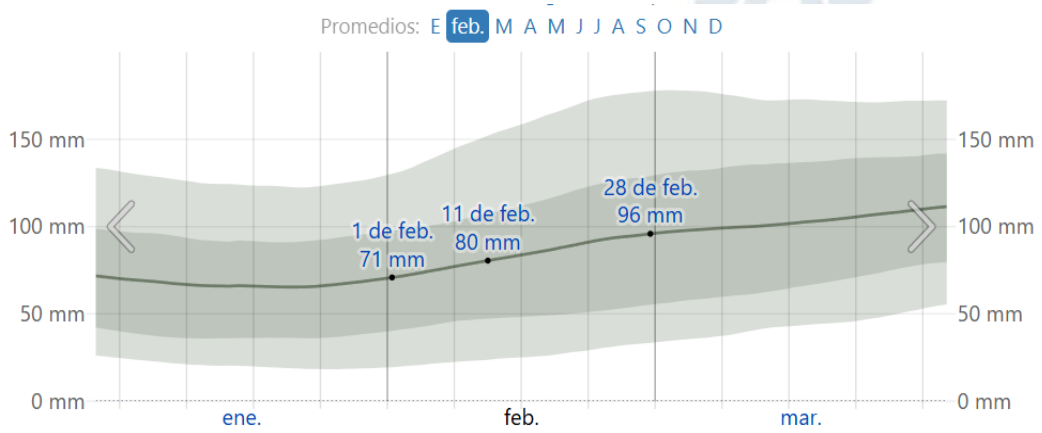


La lluvia promedio (línea sólida) acumulada en un periodo de 31 días en una escala móvil, centrado en el día en cuestión, con las bandas de percentiles del 25º al 75º y del 10º al 90º. La línea delgada punteada es la precipitación de nieve promedio correspondiente.

No. 11 – 188
TERUEL - HUILA
Tel: 8741735
E-MA ngenieria@vmingenieria.com


CamScanner

Categorías de nubosidad en febrero en Guadalupe

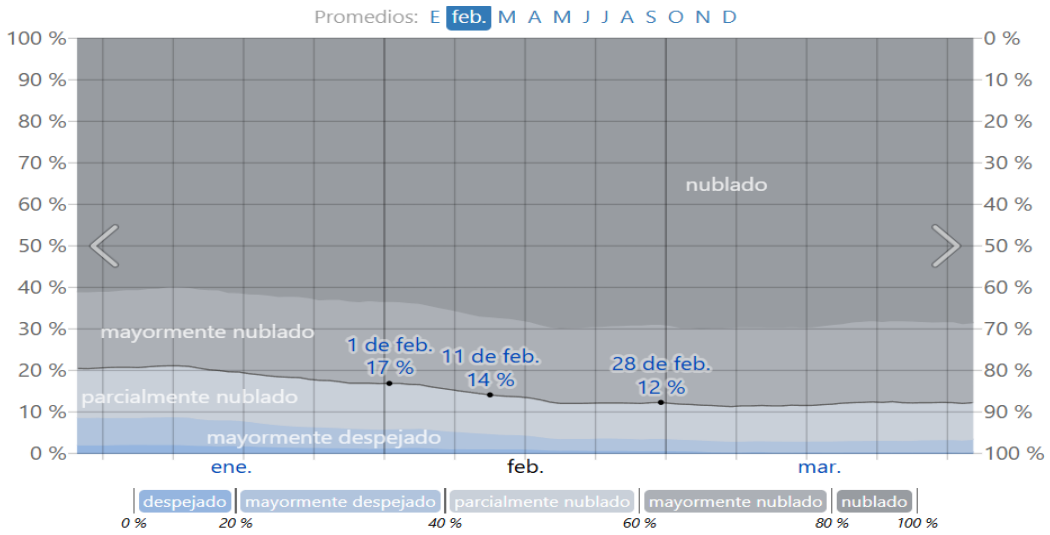

El porcentaje de tiempo pasado en cada banda de cobertura de nubes, categorizado según el porcentaje del cielo cubierto de nubes.

Promedio mensual de lluvia en marzo en Guadalupe

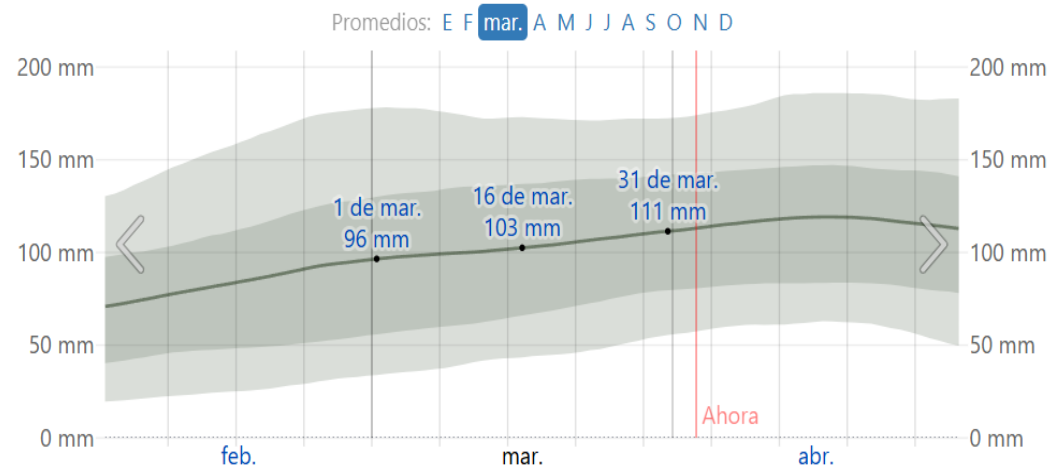


La lluvia promedio (línea sólida) acumulada en un periodo de 31 días en una escala móvil, centrado en el día en cuestión, con las bandas de percentiles del 25º al 75º y del 10º al 90º. La línea delgada punteada es la precipitación de nieve promedio correspondiente.

DIRECCION: CR 4 No. 11 – 188
TERUEL - HUILA
Tel: 8741735
E-MA ngenieria@vmingenieria.com


CamScanner

Categorías de nubosidad en marzo en Guadalupe

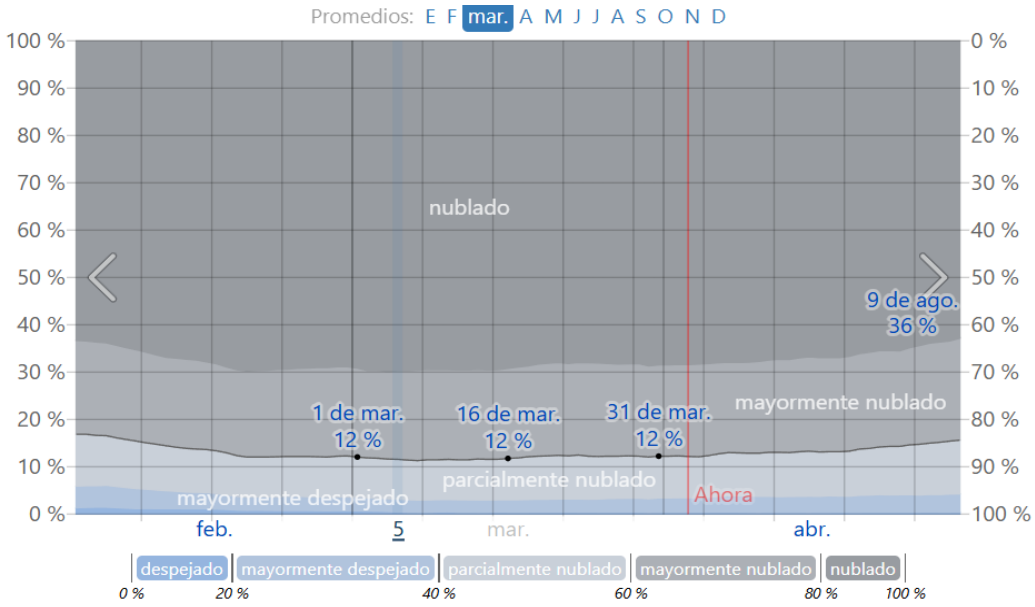

El porcentaje de tiempo pasado en cada banda de cobertura de nubes, categorizado según el porcentaje del cielo cubierto de nubes.

Promedio mensual de lluvia en abril en Guadalupe

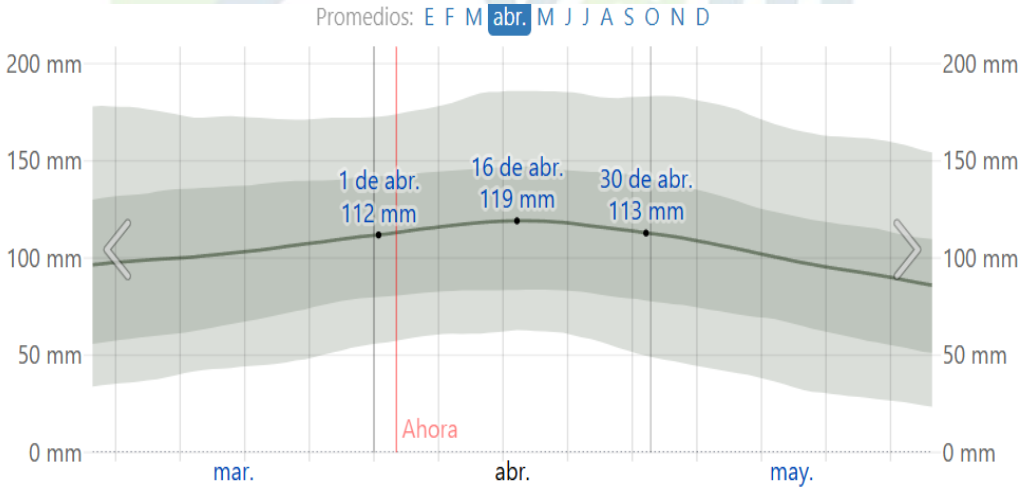

La lluvia promedio (línea sólida) acumulada en un periodo de 31 días en una escala móvil, centrado en el día en cuestión, con las bandas de percentiles del 25º al 75º y del 10º al 90º. La línea delgada punteada es la precipitación de nieve promedio correspondiente.

DIRECCION: CR 4 No. 11 – 188
TERUEL - HUILA
Tel: 8741735
E-MA ngenieria@vmingenieria.com

CamScanner

De acuerdo con las gráficas anteriores, se puede observar que el régimen de lluvias en los meses de febrero, marzo y abril son abundantes.

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>


DIRECCION: CR 4 No. 11 – 188
TERUEL - HUILA
Tel: 8741735
E-MA ingenieriavm@gmail.com

CamScanner

Por lo anterior, V&M INGENIERIA S.A.S., contratista del contrato de obra CLOPIH221 de 2024, solicita formalmente una prórroga por un plazo de dos (02) meses para realizar ajuste en la programación y ejecución de las actividades afectadas por las razones anteriormente expuestas lo cual ha generado un atraso en el cronograma de actividades dejando en evidencia una problemática que podría afectar el cumplimiento del objeto contractual, además se debe realizar una revisión del capítulo eléctrico y el Balance No. 1 de mayores y menores cantidades para su correcta aprobación.

Agradezco de antemano su colaboración y apoyo en este proyecto. Quedo a su disposición para cualquier consulta o requerimiento adicional.

Atentamente,



YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO

Representante Legal

DIRECCION: CR 4 No. 11 – 188
TERUEL - HUILA
Tel: 8741735
E-MA ingenieria@vmingenieria.com

CamScanner

Neiva, 11 de abril de 2025 **V&M-GUA-018**

Señores
CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S
ANT. ING. DANIELA CARRILLO
R.L Interventoría

Referencia: Contrato No. CLOPIH221 de 2024 de objeto "CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"

Asunto: Solicitud plazo entrega balance contrato de obra No. CLOPIH 221 de 2024.

Cordial Saludo,

Me dirijo a ustedes con el fin de solicitar plazo para la entrega del balance del contrato de obra No. CLOPIH 221 de 2024, celebrado con el Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila. (INDERHUILA) y V&M INGENIERIA S.A.S.

Por lo anterior, V&M INGENIERIA S.A.S., contratista del contrato de obra CLOPIH221 de 2024, solicita formalmente plazo para realizar la entrega de la información del balance de obra ya que no ha sido posible terminar las observaciones sobre las cantidades y actividades no previstas en especial el componente eléctrico debido a la complejidad en el empalme con el contrato general de la villa olímpica del municipio de Guadalupe para la generación de la certificación RETIE, RETILAP y legalización ante Electro Huila, todo esto fundamentado en una información pendiente de suministrar la cual es esencial para finalizar la revisión del componente eléctrico.

Así las cosas, se tenía pendiente ante INDERHUILA, como fecha máxima de presentación del Balance de obra el 11 de abril de 2025, son pena de reclamaciones y sanciones de parte de la entidad por incumplimiento en entrega de información.

Por tal motivo este contratista solicita plazo hasta el martes 15 de marzo de 2025 una vez haya sido entregada dicha información y validación por esta interventoría.

Agradezco de antemano su colaboración y apoyo en este proyecto. Quedo a su disposición para cualquier consulta o requerimiento adicional.

Atentamente,

YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO

Representante Legal

DIRECCION: CR 4 No. 11 – 188
TERUEL - HUILA
Tel: 8741735
E-MA ingenieria@vmingenieria.com

CamScanner

Neiva, 22 de abril de 2025 **V&M-GUA-019**

Señores
CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S
ANT. ING. DANIELA CARRILLO
R.L Interventoría

Referencia: Contrato No. CLOPIH221 de 2024 de objeto "CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"

Asunto: Acta de mayores y menores cantidades de obra y creación de nuevos ítems para adición de recursos del contrato de obra No. CLOPIH 221 de 2024.

Cordial Saludo,

Me dirijo a ustedes con el fin de realizar entrega del balance del contrato de obra No. CLOPIH 221 de 2024, celebrado con el Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila. (INDERHUILA) y V&M INGENIERIA S.A.S.

Después de haber realizado una minuciosa revisión a los diseños del contrato de obra en referencia, tanto estructurales, arquitectónicos y eléctricos se hacen los respectivo ajustes al presupuesto de obra mediante la revisión de las actividades que se afectan por el desplazamiento del lote donde se proyecta construir el escenario deportivo y la verificación del diseño eléctrico en cuanto a su funcionalidad y actividades presupuestadas para su construcción y se observan variaciones en cantidades por lo cual se hace necesario la elaboración del acta de mayores y menores cantidades de obra y la creación de nuevas actividades para la correcta ejecución del capítulo eléctrico de acuerdo con el comité de obra virtual realizado el día 16 de abril de 2025 donde participaron el Ingeniero LUIS MIGUEL CAQUIMBO quien actúa en calidad de apoyo a la supervisión de interventoría, YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO representante legal de V&M INGENIERÍA S.A.S. en calidad de contratista de obra, la Ing. DANIELA CARRILLO TAVERA representante legal de CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S. en calidad de Interventor y el ingeniero GERMAN FELIPE HERRERA PUENTES, apoyo técnico en el área eléctrica por parte del INDER; se revisaron las actividades del capítulo eléctrico para sustentar el diseño planteado por la entidad logrando definir diferentes inconsistencias y se aclaró el alcance de dicha actividad para lo cual se evidencio la necesidad de crear ítems no previstos y la implementación de la actividad de certificación RETIE Y RETILAP.

Por estas razones y con el fin de suscribir el acta de mayores y menores cantidades de obra del Contrato de Obra Pública No. CLOPIH221 de 2024, se define realizar las respectivas modificaciones al presupuesto de obra en los siguientes términos:

1. ACTIVIDADES PRELIMINARES

DIRECCION: CR 4 No. 11 – 188
TERUEL - HUILA
Tel: 8741735
E-MA ingenieria@vmingenieria.com

CamScanner

1	1.1	Localización y replanteo manual	m²	1.924,00	$ 2.226	$ 4.282.824	+	276,00	$ 614.376	2.200,00	$ 4.897.200
2	1.2	Descapote e=0,20m a máquina incluye retiro material	m²	1.924,00	$ 4.770	$ 9.177.480	+	276,00	$ 1.316.520	2.200,00	$ 10.494.000

- Realizando la revisión de las medidas en campo, se observa que debido a la nueva ubicación del lote para la construcción de la cancha sintética y al área a intervenir las actividades preliminares aumentaron de 1.924 m2 en las condiciones iniciales; y se incrementan en 276 m2 para un total de 2.200 m2.

2. MOVIMIENTO DE TIERRA

3	2.1	Excavación manual incluye retiro	m³	119,94	$ 31.545	$ 3.783.507	+	262,15	$ 8.269.522	382,09	$ 12.053.029
4	2.2	Excavación mecánica incluye retiro 1 km	m³	384,80	$ 19.793	$ 7.616.346	+	295,88	$ 5.856.353	680,68	$ 13.472.699
5	2.3	Rellenos con recebo compactado mecánicamente	m³	384,80	$ 190.829	$ 73.430.999	+	356,39	$ 68.009.547	741,19	$ 141.440.547

- Después de revisar los niveles del lote en su nueva ubicación se evidencia que debido a la topografía se presenta una variación en cuanto a las cantidades de las condiciones originales, específicamente en los ítems 2.1, 2.2 y 2.3. El ítem 2.1 pasa de 119.94 m3 aumentando en 208.54 m3 acumulando un total de 328.48 m3. El ítem 2.2 pasa de 384.80 m3 aumentando en 128.55 m3 acumulando un total de 513.35 m3. El ítem 2.3 pasa de 384.80 m3 aumentando en 176.41 m3 acumulando un total de 561.21 m3.

3. RED AGUAS LLUVIAS

DIRECCION: CR 4 No. 11 – 188
TERUEL - HUILA
Tel: 8741735
E-MA ingenieria@vmingenieria.com

CamScanner

6	3.1	Construcción de cuneta perimetral en concreto 3000 PSI; Dimensiones: 40 cm de ancho y altura variable. incluye rejilla prefabricada en poliuretano	ml	104,00	$ 137.428	$ 14.292.512	-	-4,00	-$ 549.712	100,00	$ 13.742.800
7	3.2	Caja inspección 1,0x 1,0 m medida interna en concreto 3000 psi para empalme sistema de drenaje, incluye tapa con marco y cañuela, altura variable	und	4,00	$ 657.029	$ 2.628.116	-	-2,00	-$ 1.314.058	2,00	$ 1.314.058
8	3.3	Red de aguas lluvias suministro e instalación de tubería pvc Ø 8" Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama con arena 15 cms y relleno material de la excavacion a zanjon	ml	30,00	$ 79.488	$ 2.384.640	+	125,27	$ 9.957.462	155,27	$ 12.342.102
9	3.4	Construccion de filtros laterales externos en un ancho de 0.40 m, con altura variable menor a 0.50 m, recubrimiento en geotextil no tejido NT-1600, con gravilla comun o triturado de 1 1/2" a 4" + Tuberia pvc drenajes de 6"	ml	178,00	$ 99.727	$ 17.751.406	+	7,48	$ 745.958	185,48	$ 18.497.364
10	3.5	Caja inspeccion 1,2x 1,2 m medida interna en concreto 3000 psi para empalme sistema de drenaje, incluye tapa con marco y cañuela, altura variable	und	2,00	$ 713.327	$ 1.426.654	-		$ 0	2,00	$ 1.426.654

- Después de revisar la nueva ubicación del lote se evidencia que, debido a la topografía y a la distancia con respecto al resto de escenarios de la villa olímpica del municipio de Guadalupe Huila, se presenta variación en cuanto a las cantidades de las condiciones iniciales, específicamente en los ítems 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4. El ítem 3.1 pasa de 104 ml disminuyendo en 4 ml acumulando un total de 100 ml. El ítem 3.2 pasa de 4 und disminuyendo en 2 und acumulando un total de 2 und. El ítem 3.3 pasa de 30 ml aumentando en 125.27 ml acumulando un total de 155.27 ml. El ítem 3.4 pasa de 178 ml aumentando en 7.48 ml acumulando un total de 185.48 ml.

- **4. PLACA CANCHA**

DIRECCION: CR 4 No. 11 – 188
TERUEL - HUILA
Tel: 8741735
E-MA ngenieria@vmingenieria.com

CamScanner

11	4.1	Placa de piso en concreto 3000 psi, e =0,07m dilatada, junta machimbrada incluye malla electrosoldada de 5mm.	m^2	1.750,00	$ 87.325	$ 152.818.750		-	$ 0	1.750,00	$ 152.818.750
12	4.2	Marco para microfutbol futbol 8 6mX2m, en tubo galvanizado tipo pesado de 4", según especificaciones técnicas, incluye anclaje, malla e instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	und	2,00	$ 2.344.832	$ 4.689.664		-	$ 0	2,00	$ 4.689.664
13	4.3	Suministro e instalación de césped monofilamentado rafia de 50mm de altura, con proteccion de rayos UV, con 1300 gramos por metro cuadrado de rafia, de 13200 dtx, base: backing doble capa, demarcacion de color blanco con cesped de blanco de fabrica, incluye granulo de caucho, pegamento importado.	m^2	1.750,00	$ 181.076	$ 316.883.000		-	$ 0	1.750,00	$ 316.883.000
14	4.4	Suministro e instalacion de almohadilla de choque shock pad 20 mm	m^2	1.750,00	$ 146.659	$ 256.653.250		-	$ 0	1.750,00	$ 256.653.250
15	4.5	Suministro e instalacion de bordillos prefabricado 20X50X50	ml	186,00	$ 55.658	$ 10.352.388	+	52,00	$ 2.894.216	238,00	$ 13.246.604

- Después de revisar la nueva ubicación del lote se evidencia que, debido a la topografía y a la distancia con respecto al resto de escenarios de la villa olímpica del municipio de Guadalupe Huila, se presenta variación en cuanto a las cantidades de las condiciones iniciales contractualmente, específicamente en el ítem 4.5 que pasa de 186 ml aumentando en 52 ml acumulando un total de 238 ml.

DIRECCION: CR 4 No. 11 – 188
TERUEL - HUILA
Tel: 8741735
E-MA ngenieria@vmingenieria.com

CamScanner

5. CERRAMIENTO

16	5.1	Concreto ciclopeo 2500 psi (60% concreto- 40% piedra media zonga)para cimentacion cerramiento	m^3	16,74	$ 376.028	$ 6.294.709	-	-1,22	-$ 458.754	15,52	$ 5.835.955
17	5.2	Concreto 3000 psi viga de cimentacion cerramiento 0,2x0,2m	m^3	37,40	$ 659.191	$ 24.653.743	-	-24,99	-$ 16.473.183	12,41	$ 8.180.560
18	5.3	Muro cerramiento en ladrillo semiprensado a la vista	m^2	112,50	$ 105.765	$ 11.898.563	-	-19,15	-$ 2.025.400	93,35	$ 9.873.163
19	5.4	Acero de refuerzo 37000 psi incluye figurado e instalacion	kg	1.057,11	$ 6.647	$ 7.026.597	+	227,40	$ 1.511.541	1.284,51	$ 8.538.138
20	5.5	Tuberia galvanizada 2" cal 2mm incluye anclajes, tapa	ml	220,40	$ 44.432	$ 9.792.813	+	95,80	$ 4.256.586	316,20	$ 14.049.398
21	5.6	Modulos cerramiento 2,5x2,5 m en angulo 1 1/2"x1/8 con varilla de 5/8" lisa cada 14 cms, diagonales en angulo 1 1/2" x 1/8 y lamina cal 16 10X10 cms de refuerzo en la esquinas (lado norte y sur)h=2,5m	m^2	200,00	$ 109.070	$ 21.814.000		-	$ 0	200,00	$ 21.814.000
22	5.7	Modulos cerramiento 2,5x2,5 m en angulo 1 1/2"x1/8 con malla eslabonada cal 10 hueco 2 1/4"x2 1/4", diagonales en angulo 1 1/2" x1/8 y lamina cal 16 10X10cm de refuerzo en la esquinas (lado oriente y occidente) h=2,5m	m^2	268,75	$ 54.091	$ 14.536.956	+	143,75	$ 7.775.581	412,50	$ 22.312.538
23	5.8	Suministro e instalacion de puerta en tuberia 2" galvanizada cal 2mm con malla eslabonada cal 10 y con portacandado, incluye pasador porta candado.	und	1,00	$ 802.805	$ 802.805	+	1,00	$ 802.805	2,00	$ 1.605.610
24	5.9	Concreto 3000 psi andenes perimentrales e=8cm, incluye malla electrosoldada y formaleta	m^2	148,80	$ 80.868	$ 12.033.158	+	106,18	$ 8.586.564	254,98	$ 20.619.723

DIRECCION: CR 4 No. 11 – 188
TERUEL - HUILA
Tel: 8741735
E-MA ngenieria@vmingenieria.com

CamScanner

25	5.10	Suministro e instalacion de malla de cerramiento en nylon 100% alta densidad con proteccion UV, ojo 13x13, calibre #4 incluye; guaya, tensores y tubo de 2"	m^2	3.031,00	$ 37.545	$ 113.798.895	-	-623,00	-$ 23.390.535	2.408,00	$ 90.408.360
26	5.11	Pie de amigo en tubería galvanizada 2" cal 2mm incluye anclajes, concreto 3000 psi 50x50x60 costados norte y sur	und	32,00	$ 263.483	$ 8.431.456	-	-2,00	-$ 526.966	30,00	$ 7.904.490

- Después de revisar las cantidades inicialmente contratadas y de acuerdo con la nueva ubicación del lote se evidencia que se presenta variación en las cantidades específicamente en los ítems 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 y 5.11. El ítem 5.1 pasa de 17,74 m3 disminuyendo en 1.22 m3 acumulando un total de 15.52 m3. El ítem 5.2 pasa de 37.40 m3 disminuyendo en 24.99 m3 acumulando un total de 12.41 m3. El ítem 5.3 pasa de 112.5 m2 disminuyendo en 19.15 m2 acumulando un total de 93.35 m2. El ítem 5.4 pasa de 1057.11 kg aumentando en 227.40 kg acumulando un total de 1284.51 kg. El ítem 5.5 pasa de 220.40 ml aumentando en 95.80 ml acumulando un total de 316.20 ml. El ítem 5.7 pasa de 268.75 m2 aumentando en 143.75 m2 acumulando un total de 412.50 m2. El ítem 5.8 pasa de 1 und aumentando en 1 und acumulando un total de 2 und. El ítem 5.9 pasa de 148.80 m2 aumentando en 106.18 m2 acumulando un total de 254.98 m2. El ítem 5.10 pasa de 3031 m2 disminuyendo en 623 m2 acumulando un total de 2408 m2. El ítem 5.11 pasa de 32 und disminuyendo en 2 und acumulando un total de 30 und.

6. ILUMINACION

27	6.1	Suministro, montaje y conexión de Proyector led 300 W SYLFLOOD, temperatura de color 5000K, vida útil 100000h, flujo luminoso 39000 lm incluye soporte	und	6,00	$ 1.718.814	$ 10.312.884	-	-6,00	-$ 10.312.884	0,00	$ 0
28	6.2	Suministro e Instalacion de Tablero de 6 Circuitos con puerta incluye 3 breaker de 30 amp con normativa RETIE	und	1,00	$ 511.864	$ 511.864	-	-1,00	-$ 511.864	0,00	$ 0
29	6.3	Suministro e Instalación de Acometida en CABLE CU AISL THHN/THWN - 2x8F+1x10T en tuberia PVC 1"	ml	50,00	$ 45.333	$ 2.266.650	+	100,20	$ 4.542.367	150,20	$ 6.809.017

DIRECCION: CR 4 No. 11 – 188
TERUEL - HUILA
Tel: 8741735
E-MA ngenieria@vmingenieria.com

CamScanner

30	6.4	Salida Parcial Electrica (2 THHN No.10 + 1 THHN No.12)	ml	50,00	$ 42.110	$ 2.105.500	+	34,00	$ 1.431.740	84,00	$ 3.537.240
31	6.5	Suministro e instalacion de postes de concreto pretensado L= 12 m 750 kg incluye transporte e hizada	und	6,00	$ 2.884.636	$ 17.307.816		-	$ 0	6,00	$ 17.307.816
32	6.6	Puesta a tierra en varilla coper weld cobre de 1/2" incluye conectores, cableado, soldadura y mejoramiento de tierra	und	1,00	$ 513.186	$ 513.186		-1,00	-$ 513.186	0,00	$ 0
33	6.7	Murete para tablero de control en muro con bloque # 5	und	1,00	$ 377.230	$ 377.230		-	$ 0	1,00	$ 377.230
34	6.8	Construcción de cajas de inspección tipo alumbrado en concreto de 30x30	und	6,00	$ 266.806	$ 1.600.836		-	$ 0	6,00	$ 1.600.836
35	6.9	Cajas de inspeccion de 60X60 CM (medida interior)	und	8,00	$ 336.951	$ 2.695.608		-3,00	-$ 1.010.853	5,00	$ 1.684.755
36	6.10	Suministro e Instalación de sistema de apantallamiento	und	1,00	$ 15.484.338	$ 15.484.338		-	$ 0	1,00	$ 15.484.338

- Después de revisar las cantidades inicialmente contratadas y de acuerdo con la revisión del diseño eléctrico y sus anexos con respecto a la ubicación del nuevo lote se evidencia que se presenta variación en las cantidades específicamente en los ítems 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 y 6.9. El ítem 6.1 pasa de 6 und disminuyendo en 6 und acumulando un total de 0 und debido a que las especificaciones de esta actividad no corresponden a la necesidad con que fue proyectada según el estudio fotométrico. El ítem 6.2 pasa de 1 und disminuyendo en 1 und acumulando un total de 0 und debido a que la nuevas especificaciones y lineamientos en los procesos de certificación RETIE y RETILAP son más exigentes en cuanto a los dispositivos de control de alumbrado para escenarios deportivos. El ítem 6.3 pasa de 50 ml aumentando en 100.20 ml acumulando un total de 150.20 ml debido al aumento en la distancia de conexión con el proyecto macro de la villa olímpica del municipio de Guadalupe Huila. El ítem 6.4 pasa de 50 ml aumentando en 34 ml acumulando un total de 84 ml. El ítem 6.6 pasa de 1 und disminuyendo en 1 und acumulando un total de 0 und debido a que esta actividad está incluida en el apantallamiento del proyecto eléctrico. El ítem 6.9 pasa de 8 und disminuyendo en 3 und acumulando un total de 5 und.

6. ITEMS NO PREVISTOS

DIRECCION: CR 4 No. 11 – 188
TERUEL - HUILA
Tel: 8741735
E-MA ngenieria@vmingenieria.com

CamScanner

37	NP 01	Suministro, montaje y conexión de Proyector led 300 W, flujo luminoso 50100 lm incluye soporte	und	0,0	$ 2.142.626			8,00	$ 17.141.008	8,00	$ 17.141.008
38	NP 02	Suministro e Instalacion de Tablero de control de alumbrado con caja con protecciones según circuitos con contactores y botonera ON-OF	und	0,0	$ 4.156.960	$ 0		1,00	$ 4.156.960	1,00	$ 4.156.960
39	NP 03	Suministro e Instalación de Acometida 1 No 2Xfase + 1 No2xNeutro + 1No8xtierra	ml	0,0	$ 133.514			158,00	$ 21.095.141	158,00	$ 21.095.141
40	NP 04	Ducto de 3/4" IMC para bajante de conexión electrica	ml	0,0	$ 49.701			72,00	$ 3.578.450	72,00	$ 3.578.450
41	NP 05	Reunir, diligenciar y realizar levantamiento de plano AS-BUILT de obra construida, georreferenciada, en baja tensión incluyendo formatos, informes y documentos requeridos para dictamen RETIE y RETILAP, incluye dictamen RETIE y RETILAP, para operador de red registro fotográfico, entrega física y magnética de la información firmada por el ingeniero electricista constructor.	und	0,0	$ 11.882.545			1,00	$ 11.882.545	1,00	$ 11.882.545

- Después de revisar las cantidades inicialmente contratadas y de acuerdo con la revisión del diseño eléctrico y sus anexos con respecto a la ubicación del nuevo lote se evidencia que se presenta variación en las cantidades además de la creación de nuevas actividades dando origen a los ítems NP01, NP02, NP03, NP04 y NP05. El ítem NP01 se crea con 8 und debido a que las especificaciones de esta actividad son de mayor demanda y luminosidad según el estudio fotométrico entregado por la entidad. El ítem NP02 se crea con un total de 1 und debido a que la nuevas especificaciones y lineamientos en los procesos de certificación RETIE y RETILAP son más exigentes en cuanto a los dispositivos de control de alumbrado para escenarios deportivos. El ítem NP03 se crea con un total de 158 metros lineales debido al aumento en la distancia de conexión con el proyecto macro de la Villa olímpica al municipio de Guadalupe huila. El NP04 se crea con una cantidad de 72 ml debido a la ausencia de

DIRECCIÓN: CR 4 NO. 11 – 188
TERUEL - HUILA
Tel: 8741735
E-MA ngenieria@vmingenieria.com


CamScanner

ductos para el cableado subterráneo de la acometida entre postes. El NP05 se crea con 1 und debido a que el diseño eléctrico y su instalación debe ser entregado a la electrificadora del huila cumpliendo todas las especificaciones técnicas de registro fotográfico, entrega física y magnética en información.

Por lo enunciado anteriormente y con el fin de permitir la culminación de la obra garantizando su ejecución, estabilidad y funcionalidad, es necesario aprobar las modificaciones propuestas en el acta de mayores y menores cantidades de obra No.1 para el contrato cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA CLOPIH221 DE 2024. Donde se solicita revisión y aprobación por parte de la interventoría CONSTRUMAC INGENIEROS SAS, para el cual se requiere recursos adicionales por un valor de CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO Y SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($174,172,308.00)

Agradezco de antemano su colaboración y apoyo en este proyecto. Quedo a su disposición para cualquier consulta o requerimiento adicional.

Atentamente,



YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO

Representante Legal

ANEXOS

- ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y CREACION DE ÍTEMS NUEVOS No. 01, (con sus respectivas memorias de cantidades, APUS - ítems nuevos y cotizaciones)

- Plano Arquitectónico con sus respectivas modificaciones

DIRECCION: CR 4 No. 11 – 188
TERUEL - HUILA
Tel: 8741735
E-MA ngenieros@vmingenieros.com

CamScanner

COTIZACIONES

CamScanner

Serial No.: CT-60055

DATE/FECHA: 【22/04/2025】

Buyer/Comprador:	V & M INGENIERA SAS	ID/NIT:	900.062.688
City/Ciudad	Teruel - Huila	Address/Dirección:	Carrera 4 # 11-188 B. San Roque
Client name/Nombre cliente:		Phone/Tel:	3103273184 3115159413
Position/Cargo:		E-mail/Correo:	vymingenieriasas@gmail.com

Supplier/Proveedor:	ELECTRO REDES E INGENIERÍA SAS	ID/NIT:	900.456.257-8

Contact/Contacto	Cristian Trujillo	E-mail/Correo:	proyectos@eri.com.co
Position/Cargo:	Director Comercial	Phone/Tel:	(+57) 3115302410

S/No.	Reference Referencia	Product description and specification Descripcion del producto y especificación	Brand Marca	Product availability Disponibilidad de Producto	(Quantity in PCS) (Cantidad in PCS)	Price per unit Precio por unidad	Total value Valor Total	Image Imagen
1	P27762-36	LED SYLFLOOD 300W CW 45°	SYLVANIA	INMEDIATO	1	$ 1.685.250	$ 1.685.250	
2	10CC02-CO	CABLE CU AISLADO # 2 AWG THHN/THWN	CERTIFICADO	INMEDIATO	1	$ 26.616	$ 26.616	
3	07G075	TUBO GALVANIZADO 3/4 X 3 MTS	CERTIFICADO	INMEDIATO	1	$ 55.850	$ 55.850	
4	07UG075	UNION GALVANIZADA 3/4	CERTIFICADO	INMEDIATO	1	$ 1.980	$ 1.980	
				TOTAL PCS	4	Subtotal	$ 1.769.696	
						IVA	$ 336.242	
						TOTAL	$ 2.105.938	

1. Forma de Pago: CONTADO
2. Tiempo de entrega: INMEDIATO
3. Lugar de entrega: NEIVA - HUILA
4. Observaciones:

CamScanner

ELECTRICOS MASLUZ S.A.S

CARRERA 6 # 2 - 56 **TELEF. 3112318719** **COTIZ.** **402**

Fecha: 22 DE ABRIL 2025

Nombre: V & M INGENIERIA SAS **NIT:** 900062688

Direccion:

COTIZACION DE MATERIALES ELECTRICOS				
ITEM	DESCRIPCION	CANT	V. UNIT	V.TOTAL
1	REFLCTOR LED SYFLOOD 300 W. FLUJO LUMINOSO 59162 LM	1	$ 2.135.039	$ 2.135.039,00
2	CABLE CU # 2	1	$ 32.309	$ 32.309,00
3	TUBO IMC 3/4	1	$ 66.640	$ 66.640,00
4	UNION EMT 3/4	1	$ 2.440	$ 2.440,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			TOTAL=	$ 2.236.428,00

NOTA:

VALIDEZ 7 DIAS

JOSE ANDRES SANTOS B.

CamScanner

	FORMATO	PR10-F1 CODIGO	2 VERSIÓN
	COTIZACION PRODUCTO / SERVICIO	FECHA DE VIGENCIA	09/24/2022

CONSECUTIVO N°	3908
FECHA	22/04/2025

DATOS CLIENTE	
Nombre/ Razon Social	V & M INGENIERIA S.A.S
contacto	
Direccion	CR 4 11 188 BRR SAN ROQUE
Telefono	3103273184
Email	vymingenieriasas@gmail.com

DATOS VENDEDOR	
Nombre	JOSE LUIS ESCOBAR
Telefono	8710614 - 3108174174
Email	ingenieria@cysmaterialeselectricos.com

ITEM	DESCRIPCION DE SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CON IVA
1	Suministro de tablero para alumbrado de 70x50x25 cm, en lamina cold roller ip 55, pintado electrostaticamente, con certificado de ensamble, el cual contiene un breaker de montaje sobre riel de 2x32 Amp, un bloque distribución, breakes de montaje sobre riel de 1x20 Amp y 2x20 Amp, dos contactores de 25 Amp - 220V, dos pulsadores dobles, dos pilotos verdes, canaleta ranurada de 40x60 mm, un barraje de neutro y tierra con sus aisladores. **El material cotizdo es en marca Chint.**	U	1	3 - 5 días habiles	$ 3.025.210	$ 3.600.000
2	**TOTAL**					**$ 3.600.000**
3	**NOTA: El tablero se entrega en las instalaciones de CYS Materiales Electricos.**					

VALORES IVA INCLUIDO

CONDICIONES COMERCIALES	
FORMA DE PAGO	**TRANSFERECIA**
VALIDEZ DE LA OFERTA	**8 DIAS HABILES SALVO VENTA PREVIA DE MATERIALES**

Calle 5 # 5-34 Cel. 3173156570
E-mail: ventas@cysmaterialeselectricos.com
www.cysmaterialeselectricos.com
NEIVA-HUILA

CamScanner

ELECTRICOS MASLUZ S.A.S

CARRERA 6 # 2 - 56 **TELEF. 3112318719** **COTIZ. 410**

Fecha: 22 DE ABRIL 2025
Nombre: V & M INGENIERIA SAS **NIT:** 900062688
Direccion:

COTIZACION DE MATERIALES ELECTRICOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	V. UNIT	V.TOTAL
1	COFRE METALICO PARA ALUMBRADO DE 70X50X25 CM EN LAMINA COLDROLLER IP 55, PINTADO ELECTROSTATICAMENTE, CON CERTIFICADO DE ENSAMBLE, BREAKER DE MONTAJE SOBRE RIEL DE 2X32AMP BLOQUE DE DISTRIBUCIÓN, BREAKER DE MONTAJE SOBRE RIEL DE 1X20AMP, BREAKER DE MONTAJE SOBRE RIEL DE 2X20AMP, 2 CONTACTOR DE 25AMP-220V, 2 PULSADORES DOBLES, 2 PILOTOS VERDES, CANALETA RANURADA DE 40X60MM, BARRAJE NEUTRO, BARRAJE TIERRA CON SUS	1	$ 3.730.000	$ 3.730.000,00
			TOTAL=	$ 3.730.000,00

NOTA:
VALIDEZ 7 DIAS

JOSE ANDRES SANTOS B.

CamScanner

SELLO DE CONTROL	**OFERTA COMERCIAL RETIE**			
	CÓDIGO	**RE-083**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**	**25/10/2024**
	VERSIÓN	**3**	**NUMERO DE PÁGINA**	**NA**

Bogotá DC, 22 de abril de 2025 COL-0211

Señores
V&M INGENIERIA SAS
Ciudad

Reciban un cordial saludo de parte de RETIE COLOMBIA SAS

En atención a su solicitud, le presentamos la propuesta comercial para el proceso de inspección de la instalación eléctrica de su proyecto; en donde se evaluará la conformidad con el Reglamento de Instalaciones Eléctricas RETIE de acuerdo con sus resoluciones 90708 del 30 de agosto de 2013, 90907 del 25 de octubre de 2013, 90795 del 25 de julio de 2014 y 40492 del 24 de abril de 2015.

A. DATOS DE LA INSTALACIÓN

Nombre del proyecto: Cubierta polideportivo barrio Siloé San Agustín - Huila
Propietario: V&M INGENIERIA SAS
Dirección del proyecto: Barrio Siloé San Agustín, Huila.
Número del contacto: 3103273184
Correo electrónico del contacto: NR

B. ALCANCE DE LA INSPECCIÓN

Certificación RETIE desde punto de conexión del operador de red hasta salidas de iluminación y fuerza de cubierta deportiva 1280m, incluye acometida, caja de medidores, tablero de control de iluminación, sistema de puesta a tierra y sistema de apantallamiento.

C. VALOR DE LA OFERTA COMERCIAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Certificación RETIE del alcance mencionado	1	GL	$ 4.250.000	$ 4.250.000
SUBTOTAL					**$ 4.250.000**
IVA (19%)					**$ 807.500**
TOTAL					**$ 5.057.500**

Número de visitas: 2
Costo de la visita adicional: 700.000
Tiempo de validez de la oferta comercial: 60 días

CamScanner

D. FORMA DE PAGO

Para iniciar el proceso se deberá pagar el 100% del costo de la oferta comercial a la ***cuenta de ahorros de Banco Caja Social No 24141598194 a nombre RETIE COLOMBIA SAS***.
El resultado de la certificación solo dependerá de la conformidad de la instalación eléctrica inspeccionada con el RETIE, y no del pago del servicio.
Por favor tener en cuenta que RETIE COLOMBIA SAS se abstendrá de entregar certificados o dictámenes, si el cliente no se encuentra a paz y salvo.

E. ACEPTACIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL

Si acepta nuestra oferta comercial, se requiere la entrega por parte del cliente de los siguientes documentos por medio digital:

1. Comprobante de pago por el valor de la propuesta comercial
2. Formato RE-084 ACEPTACIÓN DE LA OFERTA firmado por el propietario del proyecto, constructor civil o representante legal.
   NOTA: Si no hay evidencia de la aceptación por medio digital, en el momento que el cotizante realice la consignación del valor de la presente cotización, a la cuenta de RETIE COLOMBIA SAS – RETICOL se darán por aceptadas las condiciones de la presente oferta.
3. Documentación discriminada en el literal F del presente documento (antes de iniciar el proceso de inspección).
4. Registro único tributario (RUT).

F. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA INICIAR EL PROCESO

1. *Planos eléctricos* del proyecto en físico o digital firmados por diseñador.
2. Planos eléctricos finales del proyecto en físico o digital firmados por el constructor.
3. *Memoria de cálculo* del proyecto, según el artículo 10.1 del Anexo General del RETIE.
4. Formato exigido por el RETIE de la *declaración de cumplimiento en* físico *y* firmada en origina por el constructor de la obra eléctrica.
5. Fotocopia de la *tarjeta profesional* del diseñador y del constructor de la obra eléctrica del proyecto.
6. Fotocopia de la *matricula profesional* del interventor de la obra eléctrica si aplica.
7. Fotocopia de la *Cedula de ciudadanía* del constructor de la obra eléctrica del proyecto.
8. *Certificados de conformidad con el RETIE de los productos* instalados en la obra eléctrica del proyecto.

CamScanner

NOTA: RETIE COLOMBIA SAS declara que en el momento de realizar esta oferta se revisaron las amenazas a la independencia e imparcialidad y se tomaron las medidas necesarias para impedir que dicho riesgo se materialice.

G. CONFIDENCIALIDAD

Se informa que RETIE COLOMBIA SAS en cumplimiento con la Ley No. 1581 del 17 de octubre de 2012, y el decreto 1377 DE 2013, solicita su autorización para dar tratamiento solo para fines del proceso de certificación a los datos y documentos personales requeridos. Por ello, el organismo RETIE COLOMBIA SAS, garantiza el manejo confidencial de la información obtenida en el transcurso de sus actividades de inspección.

Adicionalmente se comunica que si el organismo RETIE COLOMBIA SAS obtiene información sobre el cliente y/o la instalación a inspeccionar por medio de fuentes distintas al cliente (por ejemplo, una persona que realiza una queja, de autoridades reglamentarias) esta será tratada como información confidencial, y se verificará la veracidad de dicha información de manera imparcial.

Igualmente se informa a los clientes que cuando el organismo de inspección RETIE COLOMBIA SAS deba por ley divulgar información confidencial, esta será proporcionada a las autoridades, y entidades regulatorias; realizando la debida notificación sobre la información a suministrar, salvo que esté prohibido por ley dicha notificación.

RETIE COLOMBIA SAS hace la aclaración que la información utilizada en los dictámenes será de dominio público y se podrá consultar en la página web del organismo https://retiecolombiasas.com/ y en el aplicativo SICERCO, según los requerimientos del Ministerio de Minas y Energía.

H. QUEJAS Y APELACIONES

a. Quejas

Para el recurso de la queja, el cliente podrá descargar el formato RE-030 en la página web del organismo https://retiecolombiasas.com/ , o lo podrá solicitar vía telefónica, de forma presencial en la oficina del organismo, o por correo electrónico. La radicación de la queja se podrá realizar enviándola al correo electrónico servicioalcliente@retiecolombia.com presentándola de forma física en las instalaciones del organismo. El cliente será informado del resultado de la apelación en un máximo de 15 días hábiles vía correo electrónico o por documento físico.

b. Apelaciones.

Para el recurso de apelación, el cliente podrá descargar el formato RE-030 en la página web del organismo https://retiecolombiasas.com/ , o lo podrá solicitar vía telefónica, de

CamScanner

forma presencial en la oficina del organismo, o por correo electrónico. La radicación de la apelación se podrá realizar enviándola al correo electrónico servicioalcliente@retiecolombia.com o presentándola de forma física en las instalaciones del organismo. El cliente será informado del resultado de la apelación en un máximo de 15 días hábiles vía correo electrónico o por documento físico

NATALIA ROMERO GUEVARA
RETIE COLOMBIA S.A.S
CARRERA 46 141 22 AP 505
Cel. 3024166503

CamScanner

	OFERTA COMERCIAL RETILAP			
SELLO DE CONTROL	**CÓDIGO**	**RE-090**	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**	**25/10/2024**
	VERSIÓN	**2**	**NUMERO DE PÁGINA**	**NA**

Bogotá DC, 22 de abril de 2025 COL-0212

Señores
V&M INGENIERIA SAS
Ciudad

Reciban un cordial saludo de parte de RETIE COLOMBIA SAS

En atención a su solicitud, le presentamos la propuesta comercial para el proceso de inspección de la instalación eléctrica de su proyecto; en donde se evaluará la conformidad con el Reglamento Técnico de iluminación y Alumbrado Público RETILAP de acuerdo con su resolución 18 0540 de 2010 del Ministerio de Minas.

A. DATOS DE LA INSTALACIÓN

Nombre del proyecto: Cubierta polideportivo barrio Siloé San Agustín - Huila
Propietario: V&M INGENIERIA SAS
Dirección del proyecto: Barrio Siloé San Agustín, Huila.
Número del contacto: 3103273184
Correo electrónico del contacto: NR

B. ALCANCE DE LA INSPECCIÓN

Certificación RETILAP para cubierta deportiva 1280m contiene 12 luminarias.

C. VALOR DE LA OFERTA COMERCIAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Certificación RETILAP del alcance mencionado	1	GL	$ 4.250.000	$ 4.250.000
SUBTOTAL					**$ 4.250.000**
IVA (19%)					**$ 807.500**
TOTAL					**$ 5.057.500**

Número de visitas: 2
Costo de la visita adicional: 700.000
Tiempo de validez de la oferta comercial: 60 días.

CamScanner

D. FORMA DE PAGO

Para iniciar el proceso se deberá pagar el 100% del costo de la oferta comercial a la ***cuenta de ahorros de Banco Caja Social No 24141598194 a nombre RETIE COLOMBIA SAS***.
El resultado de la certificación solo dependerá de la conformidad de la instalación eléctrica inspeccionada con el RETIE, y no del pago del servicio.
Por favor tener en cuenta que RETIE COLOMBIA SAS se abstendrá de entregar certificados o dictámenes, si el cliente no se encuentra a paz y salvo.

E. ACEPTACIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL

Si acepta nuestra oferta comercial, se requiere la entrega por parte del cliente de los siguientes documentos por medio digital:

1. Comprobante de pago por el valor de la propuesta comercial
2. Formato RE-084 ACEPTACIÓN DE LA OFERTA firmado por el propietario del proyecto, constructor civil o representante legal.
   NOTA: Si no hay evidencia de la aceptación por medio digital, en el momento que el cotizante realice la consignación del valor de la presente cotización, a la cuenta de RETIE COLOMBIA SAS – RETICOL se darán por aceptadas las condiciones de la presente oferta
3. Documentación discriminada en el literal F del presente documento (antes de iniciar el proceso de inspección).
4. Registro único tributario (RUT).

F. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA INICIAR EL PROCESO

1. Planos de montaje y distribución de luminarias.
2. Memorias descriptivas y de cálculos fotométricos.
3. Cálculos eléctricos.
4. Propuesta de esquema funcional de la instalación para propiciar el uso racional de energía.
5. Esquema y programa de mantenimiento.
6. Especificaciones de los equipos recomendados.
7. Validación del software especializado.
8. Evaluación de los factores de riesgo propios del sistema de iluminación.
9. Certificados bajo RETILAP de productos utilizados en el sistema de iluminación.

CamScanner

10. Matrículas profesionales de diseñador y constructor del sistema de iluminación.
11. Formación experiencia o certificado de competencia profesional del diseñador del sistema de iluminación.
12. Declaración de cumplimiento de RETILAP.
13. Formación, experiencia o certificado de competencia profesional del constructor del sistema de iluminación.
14. Constancia de cumplimiento del RETILAP suscrita por el diseñador del sistema de iluminación.
15. Certificación de las instalaciones eléctricas con RETIE.
16. Mas los análisis que se requieran según el tipo de instalación de acuerdo al reglamento técnico de iluminación RETILAP.

NOTA: RETIE COLOMBIA SAS declara que en el momento de realizar esta oferta se revisaron las amenazas a la independencia e imparcialidad y se tomaron las medidas necesarias para impedir que dicho riesgo se materialice.

G. CONFIDENCIALIDAD

Se informa que RETIE COLOMBIA SAS en cumplimiento con la Ley No. 1581 del 17 de octubre de 2012, y el decreto 1377 DE 2013, solicita su autorización para dar tratamiento solo para fines del proceso de certificación a los datos y documentos personales requeridos. Por ello, el organismo RETIE COLOMBIA SAS, garantiza el manejo confidencial de la información obtenida en el transcurso de sus actividades de inspección.

Adicionalmente se comunica que si el organismo RETIE COLOMBIA SAS obtiene información sobre el cliente y/o la instalación a inspeccionar por medio de fuentes distintas al cliente (por ejemplo, una persona que realiza una queja, de autoridades reglamentarias) esta será tratada como información confidencial, y se verificará la veracidad de dicha información de manera imparcial.

Igualmente se informa a los clientes que cuando el organismo de inspección RETIE COLOMBIA SAS deba por ley divulgar información confidencial, esta será proporcionada a las autoridades, y entidades regulatorias; realizando la debida notificación sobre la información a suministrar, salvo que esté prohibido por ley dicha notificación.

RETIE COLOMBIA SAS hace la aclaración que la información utilizada en los dictámenes será de dominio público y se podrá consultar en la página web del organismo https://retiecolombiasas.com/ y en el aplicativo SICERCO, según los requerimientos del Ministerio de Minas y Energía.

CamScanner

H. QUEJAS Y APELACIONES

a. Quejas

Para el recurso de la queja, el cliente podrá descargar el formato RE-030 en la página web del organismo https://retiecolombiasas.com/ , o lo podrá solicitar vía telefónica, de forma presencial en la oficina del organismo, o por correo electrónico. La radicación de la queja se podrá realizar enviándola al correo electrónico servicioalcliente@retiecolombia.com presentándola de forma física en las instalaciones del organismo. El cliente será informado del resultado de la apelación en un máximo de 15 días hábiles vía correo electrónico o por documento físico.

b. Apelaciones.

Para el recurso de apelación, el cliente podrá descargar el formato RE-030 en la página web del organismo https://retiecolombiasas.com/ , o lo podrá solicitar vía telefónica, de forma presencial en la oficina del organismo, o por correo electrónico. La radicación de la apelación se podrá realizar enviándola al correo electrónico servicioalcliente@retiecolombia.com o presentándola de forma física en las instalaciones del organismo. El cliente será informado del resultado de la apelación en un máximo de 15 días hábiles vía correo electrónico o por documento físico.

NATALIA ROMERO GUEVARA
RETIE COLOMBIA SAS
CARRERA 46 141 22 AP 505
Cel. 3024166503

CamScanner

BITACORA DE OBRA

CamScanner

BITACORA DE OBRA.

CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA
VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE
GUADALUPE - HUILA.

CONTRATO No: CLOPIH 221 DE 2024.

V&M INGENIERIA S.A.S.
R.L / YERSON FERNANDO C.

CONSTRUMAC INGENIEROS SAS
R.L / DANIELA CARRILLO T.

Powered by CamScanner

01-04-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: Dia lluvioso
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra
Oficiales (2)
Ayudantes (3).

Actividades Realizadas

→ El personal de mano de obra se dispone a continuar con la actividad de conformación y compactación de estructura de placa de piso, instalacion de malla electrosoldada, posteriormente vaciado de concreto de 3000 psi e: 0.07.

Por otra parte se inicia excavacion manual para construcción de filtros laterales externos, recubrimiento en geotextil no tejido NT 1600, con gravilla comun o triturado de 1 1/2 a 4 + Tubería PVC 6".

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior. firma.

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

02-04-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7 am - Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: Dia lluvioso
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro (1).
oficiales (2).
Ayudantes (3).

Powered by CamScanner

Actividades realizadas.

- Se continua con las actividades programadas segun el cronograma de ejecución:

Actividad de conformación y compactación de estructura de placa de piso, Instalación de malla electrosoldada, posterior vaciado de concreto de 3000 psi ϵ: 0.07.

Excavación manual para construccion de filtros laterales externos; recubrimiento en geotextil no tejido UT 1600, con gravilla comun o triturado de 1 1/2 a + 4 + tubería PVC drenajes de 6".

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior firma:

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTO

03-04-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7 am — Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: Fuertes lluvias.
Personal en obra: Residente de obra (1).
Residente de Interventoria (1).
Maestro de obra (1)
Oficiales (2)
Ayudantes (2).

Actividades Realizadas.

→ Debido a las condiciones climaticas adversas por las que atraviesa el municipio de Guadalupe. se Suspenden

actividades operativas - ejecucion de actividades programadas.

por lo anterior es necesario resaltar. que se resalta acta administrativa en las instalaciones del INDER HUILA las Partes interesadas UBM INGENIERIA SAS. R/L Yerson Fernando Camacho Ladino en calidad de contratista, CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S. R/L Daniela Camilo Tavera en calidad de Interventor y Luis Miguel Coquimbo Gómez como Apoyo a la supervisión del contrato de interventoría. con el propósito de adelantar comite tecnico de obra para revisar el avance del contrato donde se evidencia atraso significativo en la ejecución de las actividades. como medida correctiva con el fin de mitigar el atraso presentado se ajusta el cronograma de actividades y la programación de ejecución de las mismas.

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior firma.

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

04-04-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:am Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: Dia nublado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1
Oficiales (2).
Ayudante (3).

Actividades Realizadas.

El dia 04 de Abril de 2015 se emite Solicitud de prorroga mediante oficio USM-GCM-17 como medida Correctiva con el fin de mitigar el atraso presentado considerando que, la ejecucion de las actividades se ha visto afectada por factores externos no imputables al contratista. por factores como:

Cambio de la ubicación del lote destinado para la construccion de la cancha sintetica implico nuevo levantamiento topografico e implantación de diseño.

por otra parte, la funcionalidad del sistema electrico se encuentra supeditada a un proyecto macro externo al contratista del mismo modo el sistema electrico requiere revision y ajuste de mayores y menores cantidades con el fin de dar Cumplimiento a la meta fisica del Contrato con ello la finalidad de emitir Balance de obra No. 1..

Finalmente. las condiciones climaticas adversas en la presente epoca invernal que afecta la region con dias de continuas lluvias torrenciales han dificultado han dificultado la ejecución de las actividades.

De acuerdo a lo anterior se esta a la espera de aval a la Solicitud de prorroga. por un plazo no mayor a 2 meses para la correcta ejecucion y Culminacion de las actividades de obra.

Para constancia de lo anterior firma.

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

05-04-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inico de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: Parcialmente soleado.
Personal en obio: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Oficiales (2)
Ayudantes (3).

Actividades Realizadas:

→ Se continua con las actividades programadas segun el cronograma de ejecución:

Actividad de conformacion y compactacion de estructura de placa de piso, instalación de malla electrosoldada, posteriormente vaciado de concreto de 3000 PSI E:0.07.

Excavación manual para construccion de filtros laterales externos; recubrimiento en geotextil no tejido NT 1600, con grava común o triturado de 1 1/2 a 4+ tubería PVC. manguera perforada 6".

Con ello se finaliza la jornada laboral y en conformidad a lo anterior firma:

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

09-04-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 Pm.
Condiciones climaticas: parcialmente nublado.

Powered by CamScanner

Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1).
Maestro de obra (1)
Oficiales (2).
Ayudantes (3).

Actividades Realizadas.

→ Se continua con las actividades programadas segun el cronograma de ejecución:

Actividad de conformación y compactación de estructura de placa de piso, instalación de malla electrosoldada por tenerrante vaciado de concreto de 3000 PSI f'c:207. Con ello se culmina la actividad.

por otra parte se continua con la excavación manual y construcción de filtros laterales externos, recubrimiento en geotextil no tejido NT 1600, con grava comun o triturado 1 1/2 a 4" tubería PVC manguera perforada de 6".

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior firma:

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

08-04-25. Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7 am Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climaticas: Dia lluvioso.
personal en obra: Residente de obra. (1)
Residente de Interventoria. (1).
Maestro (1). Oficiales (1).
Ayudantes (3).

Actividades Realizadas:

→ Se continua con las actividades programadas segun el cronograma de ejecucion:

Actividad de excavación manual y construccion de filtros laterales externos, recubrimiento en geotextil no tejido NT 1600, con gravilla común o triturada 1 1/2 a 4" + tubería PVC. manguera perforada de 6".

Construccion de pedestales - cerramiento perimetral, instalacion de formaleta y vaciado de concreto de 3000 PSI.

con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior firma:

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

29-04-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Condiciones climaticas: Parcialmente soleado.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm.
Personal en obra: Residente de obra: (1)
Residente de Interventoria (1).
Maestro de obra (1)
Oficiales (1).
Ayudantes (1).

Actividades Realizadas.


→ Se continua con las actividades programadas segun el Cronograma de ejecucion:

Powered by CamScanner


Actividad de excavacion manual y construccion de filtros laterales, recubrimiento en geotextil no tejido NT1600, con grauila comun o triturada 1 1/2 a 4T Tubera pvc manguera perforada de 6".

Construccion de pedestales - cerramiento perimetral, instalacion de formaleta y vaciado de concreto de 3000 PSI.

con ello se finaliza la jornada laboral, en constancia a lo anterior firma:



RESIDENTE DE OBRA.



RESIDENTE DE INTERVENTORIA

10-04-25 lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am fin jornada 5:00 pm
Condiciones climatologicas: parcialmente nublado.
Personal en obra: Residente de obra (1).
Residente de Interventoria (1).
Maestro de obra (1).
Oficiales (2).
Ayudantes (3).

Actividades Realizadas

→ Se continuan con las actividades programadas segun el cronograma de ejecucion:

Actividad de excavacion manual y construccion de filtros laterales, recubrimiento en geotextil no tejido NT 1600 con grauila comun o triturada 1 1/2 Tubera pvc drenajes 6".

Construccion de pedestales - cerramiento perimetral

Powered by CamScanner

Instalacion de formaleta y vaciado de concreto de 3000 PSI.

Por otra parte se emite aval de solicitud de prorroga por un plazo no mayor a dos meses por parte de la interventoria del contrato CIOP III 221 de 2024. bajo las consideraciones expuestas en el oficio VBM GOA-17 se firma otro Si No2 - Prorroga.

11-04-25 lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
-Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climaticas: parcialmente soleado.
personal en obra: Residente de obra (1).
Residente de Interventoria (1).
Maestro de obra (1).
Oficiales (2).
Ayudantes (3).

Actividades Realizadas:

→ Se continuan con las actividades programadas segun el Cronograma de ejecución.

Actividad de excavación manual y construccion de filtros laterales, recubrimiento en geotextil no tejido NT 1600, con gravilla común o triturada 1 1/2 a 4T Tubería pvc manguera perforada.

Construccion de pedestales - cerramiento perimetral, Instalacion de formaleta y vaciado de concreto de 3000 PSI.

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo a lo anterior firma:

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

12-04-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7 am Fin jornada 5:00 pm.
Condiciones climaticas: parcialmente soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1).
Maestro de obra (1)
Oficiales (2).
Ayudantes (3).

Actividades realizadas:

→ Se continua con las actividades programadas segun el Cronograma de ejecución.

Actividad de excavacion manual y construccion de filtros laterales, recubrimiento en geotextil no tejido NT 1600, con grauilla común o triturado 1 1/2 a 2+ tubería PVC manguera perforada. 6".

construccion de pedestales - Cerramiento perimetral, Instalacion de formaleta y vaciado de concreto de 3000 PSI.

Con ello se finaliza la ejecucion de dichas actividades y la jornada laboral. En constancia a lo anteno firma.

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

14-04-25. Lugar: Municipio de Guadalupe - Itula.
Inicio de jornada: 7 am Fin jornada 5:00 pm
Condiciones climaticas: Parcialmente soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1).
Maestro de obra (1)
Oficales (1).
Ayudantes (2)

Actividades Realizadas.

→ Se da inicio a las actividades programadas segun el cronograma de ejecucion:

Actividad de excavacion manual para construccion de red de aguas lluvias - Suministro e instalacion de tuberia PVC ⌀ 8". y Suministro de intalacion de bordillo prefabricado de 20x50x50.

Con ello se finaliza la jornada laboral y en conformidad a lo anterior firma:

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

15-04-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Itula.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climaticas: parcialmente nublado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1).
Maestro de obra (1).
Oficiales (2).
Ayudantes (2)

Powered by CamScanner

Actividades realizadas.

→ Se continua con las actividades programadas segun el cronograma de ejecución:

Actividad de excavación manual para construcción de red de aguas lluvias – Suministro e instalacion de tubería PVC Ø8" y Suministro e intalacion de bordillo prefabricado 20x50*50

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior firma:

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

16-04-25 Lugar: Municipio de Guadalupe – Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climaticas: parcialmente Soleado.
Personal en obra: Residente de obra. (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1).
Oficiales (2).
Ayudantes (2)


Actividades Realizadas.

→ Se continua con las actividades programadas segun el cronograma de ejecución:

Actividad de excavación manual para construcion de red de aguas lluvia – Suministro e instalacion de tubería PVC Ø 8" y Suministro e intalacion de bordillo prefabricado.

Powered by CamScanner

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior firma:



RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

17-04-25 al 19-04-25 Nota: A partir del 17 de abril de 2025 al 19 de abril de 2025 se suspenden actividades de obra durante periodo de Semana Santa.

21-04-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.

Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm

Condiciones climaticas: parcialmente soleado.

Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1).
Maestro de obra (1).
Oficiales (2)
Ayudante (1).
Soldadores (2).


Actividades Realizadas:

→ Se continua con las actividades programadas segun el cronograma de ejecucion.


Actividad de excavacion manual para construccion de red de agua lluvia - tuberia PVC Ø 8" y bordillo Prefabricado.

Por otra parte se inicia construccion de cerramiento - modulos 2,5 x 2,5 m en Angulo 1 1/2" x 1/8 con varilla de 5/8 lisa.

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior se firma:



RESIDENTE DE OBRA.



RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

22-05-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am - Fin jornada: 3:00 pm.
Condiciones climaticas: Parcialmente nublado.
Personal en obra: Residente de obra: (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Oficiales (2)
Ayudantes (1)
Soldadores (2).


Actividades Realizadas:

→ Se continua con las actividades programadas segun el cronograma de ejecucion


Actividad de excavacion manual para construccion de red de aguas lluvias - suministro e instalacion de tuberia PVC 8" y suministro e instalacion de bordillo prefabricado.

Construccion de modulos de cerramiento 2,5 x 2,5 en Angulo 1 1/2 * 1/8 con canda de 5/8" Lisa.

Con ello se finaliza la jornada laboral en constancia a lo anterior firma.



RESIDENTE DE OBRA.



RESIDENTE INTERVENTOR.

Powered by CamScanner

23-04-25 Lugar: Municipio de Guadalupe – Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climáticas: Parcialmente soleado
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoría (1)
Maestro de obra (1)
Oficiales (2)
Ayudantes (1)
Soldadores (2).

Actividades Realizadas:

→ Se culmina la construcción de red de Aguas lluvia – Suministro e instalación de tubería PVC de ø 8".

→ Se continua la actividad de excavación manual para suministro e instalación de bordillo prefabricado.

→ Se realiza construcción de modulos de cerramiento 2,5 x 2,50 en Aguas 1" h=1 1/8 con vanila de 5/8 lisa. en sentido norte y sur.

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior firma:

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

24-04-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climáticas: Dia nublado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de interventoria. (1)
Maestro de obra (1). Oficiales (2).
Ayudantes (1) soldadores (2).

Powered by CamScanner


Actividades Realizadas:

→ Se continua con la actividad de Suministro e instalacion de bordillo prefabricado.


→ Se realiza construccion de modulos de cerramiento 2.5 x 2.5 Angulo 1 1/2 x 1/8 con varilla de 5/8' liso en sentido norte y sur.

2

Con ello se finaliza la jornada laboral y en conformidad a lo anteriormente firmal:



RESIDENTE DE OBRA.



RESIDENTE DE INTERVENTORIA

25-04-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm.
Condiciones climaticas: parcialmente soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1).
Maestro de obra (1)
Oficiales (2).
Ayudantes (1)
Soldadores (0)


Actividades Realizadas:

→ Se continua con la actividad de Suministro e instalacion de bordillo prefabricado


→ Se realiza construcción de modulos de cerramiento 2.5 x 2.5 Angulo 1 1/2 x 1/8 con varilla lisa en sentido norte y sur.

Powered by CamScanner

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia de lo anterior firma:



RESIDENTE DE OBRA.



RESIDENTE INTERVENTOR.

26-09-25 Lugar: Municipio de Guadalupe - Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: parcialmente soleado.
Personal en obra: Residente de obra. (1)
Residente de interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Oficiales (2)
Ayudantes (1)
Soldadores (2).

Actividades Realizadas.


→ Se continua con la actividad de suministro e instalacion de bordillo prefabricado.

→ Se realiza construcción de modelos de cerramiento 2.5 x 2.50 Angulo 1 1/2 x 1/8 con varilla 5/8 1.59 en sentido norte y sur.

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia de lo anterior firma:



RESIDENTE DE OBRA.



RESIDENTE INTERVENTOR.

Powered by CamScanner

28-04-25 Lugar: Municipio de Guadalupe – Huila
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: parcialmente soleado.
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Oficiales (2)
Ayudantes (1).
Soldadores (2).

Actividades Realizadas.

→ Se continua con la actividad de suministro e instalación de bordillo prefabricado.

→ Se realiza construcción de modulos de cerramiento 2.5 x 2.50 Angulo 1 1/2 x 1/8 con canilla Lisa 5/8 en sentido norte y sur.

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior se firma.

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE INTERVENTOR.

29-04-25 Lugar: Municipio de Guadalupe – Huila.
Inicio de jornada 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: parcialmente nublado
personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de Interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Oficiales (2)
Ayudantes (1)
soldadores (2).

Powered by CamScanner

Actividades realizadas.


→ Se culmina la actividad de suministro e instalacion de Bordillo prefabricado.

→ Se realiza construcción de modulos de cerramiento 2.5 x 2.5 Angulo 1½ x 1/8 con varilla liso 5/8 en sentido norte y Sur.

Con ello se finaliza la jornada laboral y en constancia a lo anterior firman,



RESIDENTE DE OBRA.



RESIDENTE INTERVENTOR

30-04-25 Lugar: Municipio de Guadalupe Huila.
Inicio de jornada: 7:00 am Fin jornada: 5:00 pm
Condiciones climaticas: Fuertes lluvias
Personal en obra: Residente de obra (1)
Residente de interventoria (1)
Maestro de obra (1)
Oficiales (2)
Ayudantes (2)
Soldadores (...)

Actividades Realizadas:

→ Se realiza construcción de modulos de cerramiento 2.5 x 2.5 Angulo 1½ x 1/8 con varilla liso 5/8 en sentido norte y Sur.

→ Se inicia la actividad de construcción de Cuneta perimetral en concreto de 3000 PSI.

Powered by CamScanner
