

JUNIO 12 - 2026.

SE CONTINUA LA INSTALACION DE BORDILLOS EN LAS ABSISAS KI+394, EXCAVACION CANAL 9, CONSTRUCCION DE FILTRO CONTRA EL MURO, LLENO DE CON UN SECTOR CERO.







JUNIO 13 - 2026.

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE BORDILLOS, SE CONTINUA FILTRO EN EL CANAL 9, SE CONTINUA CON EL FILTRO MURO.





JUNIO 16 DE 2026.

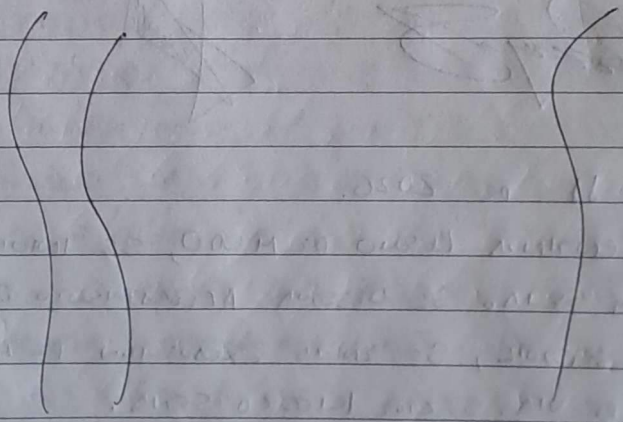


SE CONTINUA CONSTRUCCION FILTRO FRENTE ACCESO SAN, EXCAVACION PARA PEDRAPLEN EN LAS ABSISAS KI+894 - KI+844, EXCAVACION PEDRAPLEN EN EL KI+936 - KI+847.

Powered by CamScanner

SE INICIA LLENOS EN LA CASA DE VIA SECTOR KIOSKO,


JUNIO 17 DE 2026.

SE INICIA EL USUARIO DE LA CAMARA 11 Y CAMARA 9, SE CONTINUA CON EL FILTRO KM+784 - KM+802.



JUNIO 19 DE 2026.

SE TOMAN DENSIDADES AL AFIRMADO DE ANDEN KM+496, KM+485, SE RESUME USUARIO DE ANDEN EN EL SECTOR SUMIDERO MR42, SE CONTINUA CON INSTALACION DE ACERO PARA ANDENES EN MR45.

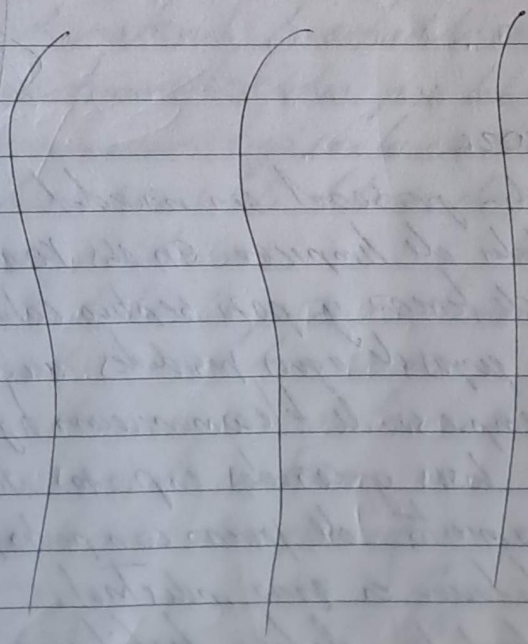

JUNIO 19 DE 2026.

Tiempo soleado - personal en obra: Ing residente, director de obra.
Operario de maquinaria 9, Ayudantes 35, 170 oficiales, 100 administrativos.
Equipo, vibro, volquetas, retro excavadora y herramienta menor.
- se realiza fundición de Andenes - losa en zona industrial MZ-45
Compactación para andenes en Abscisado Km 415, formaleta y nivelación. se pueden placas base en pozos zona sena.
instalación de bordillos.
se realiza comité en la alcaldía, se tratan temas relevantes para el desarrollo de la obra y queda el compromiso por parte de la secretaría para dar viabilidad al retiro de postes abscisado Km

JUNIO 20 DE 2026.

Tiempo nublado - personal sin novedad,
se realiza la actividad aplicación de antisol en losas de andenes sector industrial. Apisonado, nivelación y mejoramiento con pedraplen sector sena. fundición de pozos frente sena.
- se realizan cortes en losas para puntas de derivación.
- formaletas para separadores de losa táctil en andenes.


JUNIO 22 DE 2026.

tiempo soleado - personal sin novedad.
se inician actividades de limpieza en abscisado Km 404 sector Valhalla para perfilado de terreno y pozo septico colindante, la actividad se pausa por pozos de aguas residuales acumulados además de actividades de empresa de telecomunicaciones hgo; se continua construcción de losas y cantoneras en postes. sector sena.
se realiza mejoramiento de terreno con pedraplen. en sector sena.
- cortes de derivación en zona industrial.
- se inician actividades de losa táctil en andenes abscisado Km 454.

- colocación de bordillos en Ko+530.
- En visita por parte de la auxiliar se actualiza el diseño y la construcción de muro de contención de gaviones para la estabilización del terreno que colinda con caño natural. Abs: Ko+574.

JUNIO 23 DE 2026.

tiempo nublado. - personal en obra sin novedad.
- se realizan actividades de capeo y demolición de sardinel y bordillo en separador vía Ko+515.
- fundición de paredes de pozo sector sena.



- se inicia excavación para muro de contención en andenes, compactación y formaleta en andenes.

se inician actividades de instalación de tapas de alcantarillas con losa de confinamiento.
- Excavaciones en zona peatonal lado sur para andenes.

JUNIO 24 DE 2026.

Tiempo nublado - personal sin novedad.
- se inician actividades en zona inicial Ko+304, Excavación y retiro de material, las actividades en andenes sector colbuje continúan detenidas por labores de empresa de telecomunicaciones hasta con la construcción de caja reparadora. se instala tubería de pvc para cableado en separador vía.
- las actividades de pozo continúan con la fundición de paredes en sector sena.
- fundición de losa para andenes Ko+530, se presenta Zorpo en muro de contención.
- compactación de apisonado en sector sena.

75 de junio de 2026.
Tiempo soleado - personal sin novedad. Maquinaria lo mismo. Se continuan con las labores de compactacion de apisonado sector sesa, terminacion de pilotes y cabezal. instalacion de tapa de pozo con losa de amarramiento. las actividades de compactacion de andenes sector sesa continuan con uso de vibro compactador, varia. se instala zona de bordillo sector sesa y se procede a tomar densidades.

76 de junio de 2026
Tiempo soleado - personal sin novedad. - Maquinaria y equipo compactacion de apisonado y subbase en zona - sesa, retiro de postes y nivelacion final, se inicia formaleta de pozo de descole sector sesa, se continuan las instalaciones de las tapas y losas de amarramiento de los pozos, se termina nivelacion entorno de andenes con mezcla de contencion y se completa pozo nivelacion final y formaleta, pendiente de andenes en zona isual sesa., * se presenta daño en hidrante de 6" de agua potable - posible falla en termo fusion, se presenta personal de Inbama para reparacion.

27 de junio 2026


Tiempo soleado - personal sin novedad.

se continua con actividad de compactacion de subbase sector sesa, pendiente y cotas de cuneta eje sector sesa, se instala bordillo sector sesa.
se adelanta actividad de pavimento sector andenes sesa.
E: K0+304 se continua con instalacion de aparcado y nivelacion.

28 de junio de 2026

Domingo

29 de junio de 2026.



30 de junio de 2026

Tiempo soleado - personal sin novedad - no presento.

- Actividad de fundicion de andenes sector sena, se presentan pequeñas fisuras en 2 losas de andenes, segun analisis la falta de malla electrosoldada y espesor de 8cm de losa sumado al terreno con presencia de arcillas, son causantes de estas fallas por retraccion del concreto. La interventoria aprueba la demolicion y instalacion de la nueva losa con malla 4mm se aclara que el diseño es el presentado por la entidad y que se advierte posibles nuevas fallas por la no presencia de refuerzo en estas losas tan delgadas.

01 de julio de 2026

Tiempo soleado - personal 11 administrativos - 42 mano de obra operativa.

se continua con la compactacion final de subbase sector sena, se inicia la demolicion de losas con fallas, instalacion de bordillo

- Se notifica a la entidad que a la fecha aun no se han retirado los postes en Km 304 zona de la obra, los actividades en este tramo se han visto pausadas y se evita ejecucion de notificacion.

nuevamente se verifica el estado de las losas de andenes y no se autoriza el uso de malla electrosoldada, se continua con el mismo diseño.

02 de julio de 2026

Tiempo soleado - personal sin novedad.
compactacion de subbase capa final en sector sena,
se toma de adelanto la actividad de nivelacion con apoyado
en Km 304 Zona inicial pero se tiene con el problema de
la ubicacion de los polos, a la fecha han pasado mas
de 15 dias calendario desde el compromiso por parte
de la alcaldia de hacer seguimiento a esta actividad.
no se pueden continuar actividades en esta zona.

03 de julio 2026.
Tiempo soleado - personal 79 ayudantes, 13 oficiales, 12 almacenistas
equipo y maquinaria sin novedad.
compactacion de subbase sector sena, se continua con la nivelacion
sector Abs Km 304. se realizan actividades por parte de las
empresas privadas por cambio de contratista.
continuan las ordenes sector industrial.
se continua con la instalacion de bordillo sector sena.

JULIO 04 DE 2026.

TIEMPO SOLEADO, PERSONAL 24 AYUDANTES, 13 OFICIALES,
EQUIPO Y MAQUINARIA NO PRESENTA NOVEDAD.
SE INICIA ESTUDIOS EN PEDRAPLEN EN EL SECTOR DE
LA VIA FRENTE A BOMBEROS, SE CONTINUA LA INSTALACION
DE ANDEN SECTOR SENA CONSTRUCCION DE ANDEN SECTOR TCC.

Powered by CamScanner

JUNIO 06 DE 2026.

TIEMPO SECO, SE INSTALA SUB-BASE EN ANDEN SECTOR MODELO UNIDAD PARA POSTERIOR FUNDIDA EN CONCRETO, EN EL SECTOR CELEMA SE COLOCA FORMALETA PARA LOZAS TECHOS EN ANDENES, DE IGUAL MANERA SE INSTALAN PEQUEÑOS TECHOS EN ANDENES SECTOR SUMSTEC

JUNIO 07 DE 2026.

PERSONAL EN OBRA: 24 AYUDANTES, 13 OFICIALES, 12 ADMINISTRATIVOS, MAQUINARIA NO REPORTA NOVEDAD. SE EXTIENDE SUB BASE GRANULAR EN EL SECTOR ENTRADA A CELEMA, SE COLOCA FORMALETA PARA LA CONSTRUCCION CANAL DE DESCOLE AGUAS LLUVIAS EN EL SECTOR BOMBEROS.

JUNIO 09 DE 2026.

SE FUNDE PLACA EN MR 42 ANDENES EN EL SECTOR , SE FUNDEN PLACAS DE CANALES SE FUNDE SEGUNDO CUERPO CANAL DESCOLE AGUAS LLUVIAS, SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE BORDILLOS EN EL KM.

Powered by CamScanner

JUNIO, 10 DE 2026.

TIEMPO SECO, SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE BORDILLO EN LAS OBS. ICM AL ICM ,
SE FUNDE PLACAS EN LA CAMARA ,
SE FUNDE MR.42 FRENTE AL CRUCE DE ENTRADA DE CITEC
SE CULMINA LA CONSTRUCCION DE CAMARA CIEGA FRENTE AL HOTEL CANASTA.

JUNIO 11 DE 2026.

SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE ANDEN, COLOCACION DE SUB-BASE EN ESTE SECTOR, ICM. , SE FUNDE ANDEN EN EL SECTOR TCC, SE REMUEVEN ROCAS ENCONTRADAS EN EL ACCESO A ,
SE INSTALA TUBERIA SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN SUMIDERO.

JUNIO 14 DE 2026.

TIEMPO SECO, SE INSTALAN REJILLAS EN SUMIDEROS,
SE CONTINUAN CON LA REMOCION DE ROCAS ENCONTRADAS EN EL SECTOR DE ICM ,
SE FUNDEN PLACAS DE CAMARAS, SE IMPRIMA PARA LA INSTALACION DE ASFALTO.

Powered by CamScanner
