INFORME FINAL

CONTRATO No. 110-03.02-148-2026-SAMC-CS

OBJETO:

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA Y/O RADIO ENLACE PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ, CUNDINAMARCA

CONTRATANTE
MUNICIPIO DE CUCUNUBA - CUNDINAMARCA

CONTRATISTA
SISTEM-SOLUCIONES INTEGRALES SAS

NIT. 901837772

VALOR DEL CONTRATO
CINCUENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($52.065.600)

Villavicencio, 15 de Septiembre de 2026

CONDICIONES TECNICAS DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	GLB/UND	CANTIDAD
	CENTROS DE MONITOREO		
1	SUMINISTRO INSTALACION Y CONFIGURACION:NVR 32CH H.265+ DECODIFICACION 4CH@4K O 16CH@2MP AB ENTRADA 320MBPS 8 SATA 2 HDMI : IP Serie: IP Pro, T ipo: NVR IP Núrnero de Canales: 16CH Resolución Máxima: Hasta 12MP Capacidad de Decodificación: 16CH@1080P Ancho de Banda de Entrada (Mbps): Entrada 320Mbps, Analíticas: ANPR (Deteccion de Placas), Busqueda Inteligente, Conteo de Personas, Cruce de linea e intrusión, Detección de movimiento, Detección Facial, Fisheye Dewarping, Mapa de calor, Objetos sustraidos o abandonados, POS, Cornpresión: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG, Núrnero de HDD: 2 SATA Capacidad HDD: HASTA 10TB Salidas HDMI: 1P HDMI Salidas VGA: 1 P VGA Resolución máxima salida HDMI 1: HDM11 (3840 x 2160)/30Hz Interfa z de red: RJ45 10/100/1000 M bps Cantidad Puertos RJ45: 1 P RJ45 E/S Alarma: E/S Alarma 4/2 Reproducción simultánea: Reproducción sirnultánea 16-ch Consumo sin HDD: 9.SW	UND	1
2	Disco duro interno NAS HDD de 8 TB, SATA de 3.5 pulgadas, 6 Gb/s, 7200 RPM, caché de 256 MB para almacenamiento conectado	UND	2
3	Switch 24 Puertos Gigabit Escritorio/rack	UND	2
	CAMARAS MUNICIPALES		
4	SUMINISTRO CAMARA IP BULLET FIJA CAMARACAMARA IP BALA SEMIMETALICA 4MP LENTE. 2,8 - 12MM FOV 98° - 31° DWDR IR 50M H.265+ POE IP67 CON ADAPTADOR DE CORRIENTE INSTALADA EN POSTE CON CINTA BANDIT Y HEBILLA	GLB	4
5	Ups 500va Regulador De VoltajeAutosoporta y poteje punto de de Camara en Cada Poste	UND	30
6	FIBRA OPTICA TIPO DROP 4 HILOS PARA ENLACE DE PUNTOS DE CAMARAS INCLUYE COMUNICACIÓN DIRECTA DESDE POSTE DE UBICACIÓN DE CAMARA HASTA LA ALCALDIA MUNICIPAL O ESTACION DE POLICIA PUNTO MAS CERCANO DE ENLACE	GL	4000
7	Convertidor De Medios Transceiver Un 1 Hilo Gigabit (par)a+b CONVERSION DE FIBRA A UTP PAR POR PUNTO DE CAMARA. Con AUTOATENUADOR ALTA CALIDAD	PAR	40
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TODO COSTOS DESMONTAJE Y MONTAJES DE CAMARAS PTZ Y CAMARAS FIJAS EXISTENTES, REPARACION PUNTO ELECTRICO REEMPLAZO DE ENLACE DE FIBRA	GL	40

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y/O ACTIVIDADES A EJECUTAR POR EL CONTRATISTA.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
1.) Tramitar con diligencia el presente contrato.	Se dio cumplimiento satisfactorio a esta obligación, realizando la gestión y trámite del contrato con la debida diligencia, responsabilidad y dentro de los términos establecidos, conforme a las condiciones contractuales.
2.) Colaborar con la Entidad contratante para que el objeto del contrato se cumpla y ofrezca las mejores condiciones de calidad.	Se dio cumplimiento satisfactorio a esta obligación, manteniendo una adecuada colaboración y disposición con la Entidad contratante para garantizar el cumplimiento del objeto contractual y procurando en todo momento las mejores condiciones de calidad.
3) En el marco de este contrato, acatar las órdenes que durante su ejecución le imparta el Representante legal del Municipio	Se dio cumplimiento satisfactorio a esta obligación, atendiendo y acatando las instrucciones y órdenes impartidas por el Representante Legal del Municipio durante la ejecución del contrato, de conformidad con las condiciones establecidas contractualmente.
4) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o entrabamientos que pudieren presentarse.	Se dio cumplimiento satisfactorio a esta obligación, actuando durante las diferentes etapas contractuales bajo los principios de lealtad, buena fe, responsabilidad y transparencia, sin generar dilaciones o entrabamientos en la ejecución del contrato.
5) Garantizar el cumplimiento del presente contrato y responder por ello.	Se dio cumplimiento satisfactorio a esta obligación, atendiendo las obligaciones y compromisos adquiridos en el contrato y respondiendo de manera oportuna por su ejecución, conforme a las condiciones pactadas.
6) No acceder a las peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales situaciones, el contratista deberá informar de tal evento a las autoridades competentes para que ellas adopten las medidas necesarias.	Se dio cumplimiento satisfactorio a esta obligación, toda vez que durante la ejecución contractual no se accedió a peticiones, presiones o amenazas provenientes de actuaciones por fuera de la ley, ni se presentó situación que requiriera ser informada a las autoridades competentes.
7) Cumplir todas las obligaciones que se deriven del presente contrato.	Se dio cumplimiento satisfactorio a esta obligación, atendiendo las obligaciones derivadas del contrato de manera oportuna y conforme a las condiciones, términos y requerimientos establecidos en el mismo.
8) Avisar oportunamente al Municipio de las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio financiero del contrato.	Se dio cumplimiento satisfactorio a esta obligación, manteniendo comunicación oportuna con el Municipio respecto de cualquier situación que pudiera afectar la ejecución contractual. Durante el desarrollo del contrato no se presentaron circunstancias que afectaran el equilibrio financiero del mismo.
9) Ejecutar idónea y oportunamente el objeto contratado.	Se dio cumplimiento satisfactorio a esta obligación, ejecutando el objeto contractual de manera idónea, oportuna y conforme a las especificaciones, condiciones y obligaciones establecidas en el contrato.

OBLIGACIONES GENERALES DEL MUNICIPIO:

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO	CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
1) Exigir del contratista y/o garante la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.	Se dio cumplimiento a esta obligación, realizando el seguimiento y control correspondiente a la ejecución del objeto contractual y verificando que las actividades fueran desarrolladas de manera idónea y oportuna, conforme a las condiciones pactadas.
2) Recibir los bienes y verificar que se cumpla con las especificaciones y las condiciones técnicas pactadas.	Se dio cumplimiento a esta obligación, efectuando la recepción de los bienes objeto del contrato y verificando que estos cumplieran con las especificaciones, características y condiciones técnicas establecidas contractualmente.
3) Expedir oportunamente el certificado de recibido a satisfacción de los bienes y pagar el valor del presente contrato conforme a lo acordado en la cláusula siguiente	Se dio cumplimiento a esta obligación, realizando el recibo a satisfacción de los bienes entregados, previa verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales, y adelantando el trámite correspondiente para el pago del valor del contrato, conforme a lo establecido contractualmente.

INFORME FINAL

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato No. **110-03.02-148-2026-SAMC-CS**, el día 27 de agosto de 2026 se dio inicio con la ejecucion del contrato y se llevó a cabo visita técnica de replanteo en las instalaciones del Municipio de Cucunuba.

Durante dicha jornada se hicieron presentes los señores **Jorge Gutiérrez y Andrés García**, quienes participaron en calidad de **técnicos especializados en instalación y mantenimiento de sistemas de videovigilancia**, actuando en representación del contratista.

El alcance de la visita consistió en la verificación en campo de las condiciones físicas y técnicas, así como en la definición y georreferenciación preliminar de los puntos de instalación y mantenimiento de las cámaras, conforme a los requerimientos técnicos y al objeto contractual.
Durante la jornada se realizó:

- Identificación de ubicaciones estratégicas para los equipos.
- Evaluación de condiciones de infraestructura, accesos y soportes.
- Validación preliminar de necesidades técnicas para la instalación y mantenimiento del sistema.

- Verificación de un total de veintitrés (23) puntos, los cuales fueron evaluados técnicamente y georreferenciados, dejando registro de sus coordenadas correspondientes, las cuales se anexan al presente informe como soporte técnico.
- Revisión de las rutas propuestas para el tendido de la fibra óptica.
- Verificación de las condiciones de tráfico vehicular y peatonal, así como de la altura de instalación de la fibra óptica en los tramos aéreos.
- Evaluación del impacto urbano asociado al tendido de la fibra óptica, considerando infraestructura existente y entorno urbano.
- Inspección técnica de la caja de paso ubicada en la Alcaldía Nueva, correspondiente al ingreso al nuevo edificio, con el fin de validar la instalación de la fibra óptica subterránea que conecta con el Centro de Monitoreo.
- Presentación formal del personal técnico en la Estación de Policía, como parte del procedimiento previo para el inicio de labores asociadas al contrato.


INFORME FINAL					
ITEM N°	**1**	**NOMBRE**	**Suministro Instalación Y Configuración: Nvr 32ch H.265+ Decodificación**	**CANT**	**1**
DESCRIPCCION			SUMINISTRO INSTALACION Y CONFIGURACION:NVR 32CH H.265+ DECODIFICACION 4CH@4K O 16CH@2MP AB ENTRADA 320MBPS 8 SATA 2 HDMI : IP Serie: IP Pro, T ipo: NVR IP Núrnero de Canales: 16CH Resolución Máxima: Hasta 12MP Capacidad de Decodificación: 16CH@1080P Ancho de Banda de Entrada (Mbps): Entrada 320Mbps, Analíticas: ANPR (Deteccion de Placas), Busqueda Inteligente, Conteo de Personas, Cruce de linea e intrusión, Detección de movimiento, Detección Facial, Fisheye Dewarping, Mapa de calor, Objetos sustraidos o abandonados, POS, Cornpresión: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG, Núrnero de HDD: 2 SATA Capacidad HDD: HASTA 10TB Salidas HDMI: 1P HDMI Salidas VGA: 1 P VGA Resolución máxima salida HDMI 1: HDM11 (3840 x 2160)/30Hz Interfa z de red: RJ45 10/100/1000 M bps Cantidad Puertos RJ45: 1 P RJ45 E/S Alarma: E/S Alarma 4/2 Reproducción simultánea: Reproducción sirnultánea 16-ch Consumo sin HDD: 9.SW		
ALCALDIA DE CUCUNUBA			**CONTRATO No MC N° 110-03.02-148-2026-SAMC-CS**		
1	**MARCA**		**DAHUA**		
2	**DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN**		En cumplimiento del Contrato N°. 110-03.02-148-2026-SAMC-CS, el día 05 de septiembre de 2026, **en las instalaciones de la Alcaldía de Cucunuba**, se realizó la entrega del equipo, el cual fue **revisado y aprobado por la supervisión del contrato**, quien verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas. Así mismo, se constató que el equipo se encuentra en perfecto estado, apto para su instalación y configuración. EL equipo entregado cuenta con **serial: CD11D22PAJ009C5** Modelo_ Dahua Technology DHI-NVR5232-EI2		

REGISTRO FOTOGRAFICO






5/09/2026 9:42:34 a. m.
5,2503N 73,7665W
Cucunubá
CUCUNUBÁ
INSTALACIÓN NVR
DISCOS DUROS 8TB

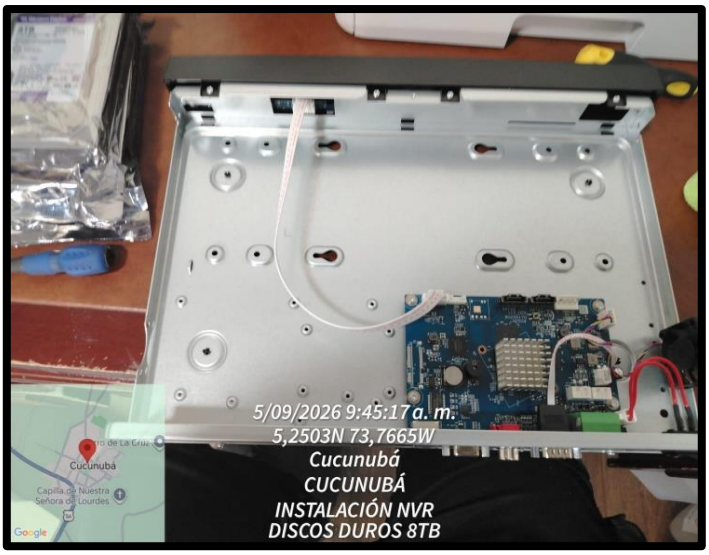
5/09/2026 9:45:17 a. m.
5,2503N 73,7665W
Cucunubá
CUCUNUBÁ
INSTALACIÓN NVR
DISCOS DUROS 8TB


5/09/2026 9:54:53 a. m.
5,2503N 73,7665W
Cucunubá
CUCUNUBÁ
INSTALACIÓN NVR
DISCOS DUROS 8TB
Cucunubá
Capilla de Nuestra Señora de Lourdes
Google






NVR NUEVO DE 32 CANALES – INSTALADO ALCALDIA MUNICIPAL









Se efectuó el traslado del NVR existente desde la Alcaldía hacia la Estación de Policía, quedando instalado y disponible para su operación en la nueva ubicación.

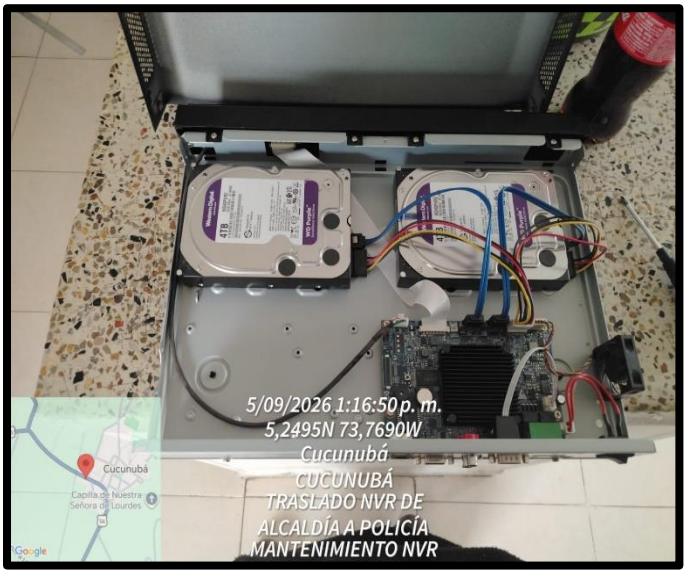

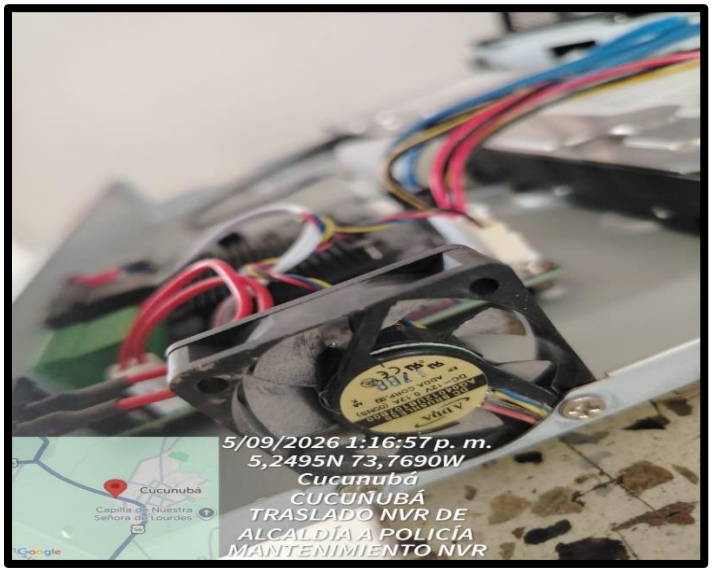

Se efectuó el traslado del NVR desde la Alcaldía hacia la Estación de Policía. Posteriormente, se desmontó el NVR existente en la Estación de Policía, identificado con el serial S/N: 7F08CBDPAZ6F4E6, el cual fue reubicado en la Alcaldía, quedando disponible en dicha dependencia.



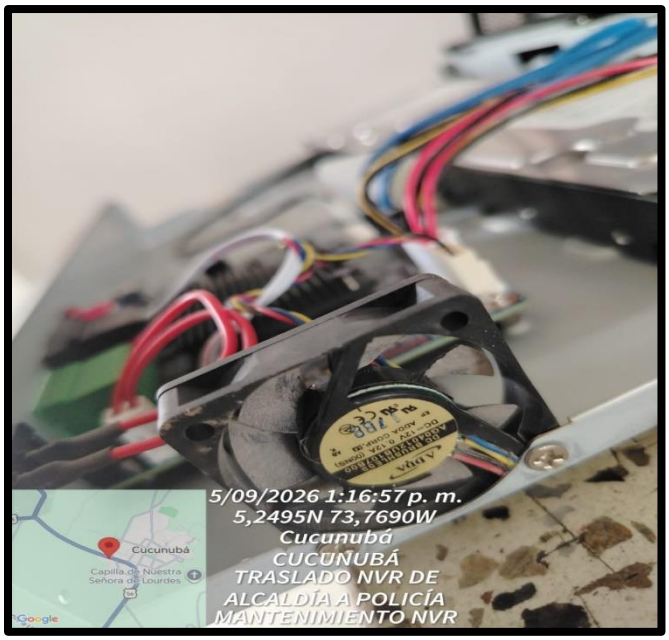



El NVR desmontado en la Estación de Policía corresponde al dispositivo identificado con el serial **S/N: 7F08CBDPAZ6F4E6.**


ITEM N°	**2**	**NOMBRE**	Disco Duro Interno	**CANT**	**2**
DESCRIPCCION			Disco duro interno NAS HDD de 8 TB, SATA de 3.5 pulgadas, 6 Gb/s, 7200 RPM, caché de 256 MB para almacenamiento conectado		
ALCALDIA DE CUCUNUBA			**CONTRATO No 110-03.02-148-2026-SAMC-CS**		
1	**MARCA**		**Western Digital**		
2	**DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN**		En cumplimiento del Contrato N° 110-03.02-148-2026-SAMC-CS, el día 05 de septiembre de 2026, **en las instalaciones de la Alcaldía de Cucunuba**, se realizó la entrega del equipo **Disco Duro Interno Western Digital WD Purple Surveillance WD85PURZ – 8 TB**, diseñado para sistemas de videovigilancia. El equipo fue **revisado y aprobado por la supervisión del contrato**, quien verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas. Así mismo, se constató que el equipo se encuentra en perfecto estado, apto para su instalación y configuración. Los discos se registraron bajo los seriales: **S/N: 1F0K5AAU -- MDL: WD85PURZ - 74C4WYO** **S/N: 1F0J69TU -- MDL: WD85PURZ – 74C4WYO** **Nota: Los dos discos nuevos de 8TB fueron instalados en el NVR HIKVISON existente en la entidad el cual se ubico en la sede de la alcaldía Municipal**		

REGISTRO FOTOGRAFICO







8TB
8TB
5/09/2026 9:41:40 a. m.
5,2503N 73,7665W
Cucunubá
CUCUNUBÁ
INSTALACIÓN NVR
DISCOS DUROS 8TB

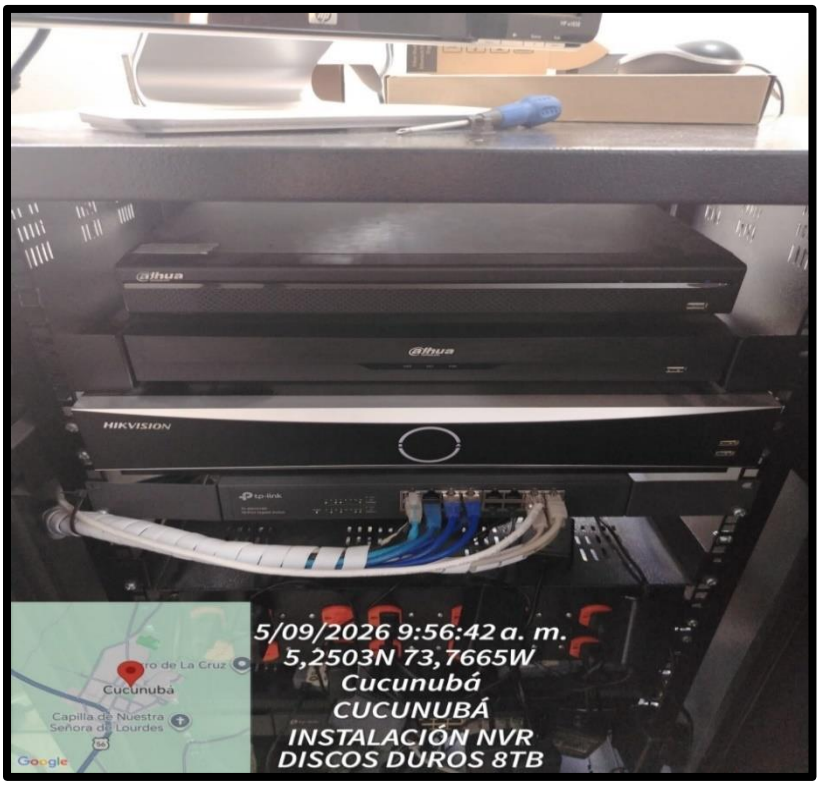
5/09/2026 9:56:42 a. m.
5,2503N 73,7665W
Cucunubá
CUCUNUBÁ
INSTALACIÓN NVR
DISCOS DUROS 8TB



5/09/2026 9:55:57 a. m.
5,2503N 73,7665W
Cucunubá
CUCUNUBÁ
INSTALACIÓN NVR
DISCOS DUROS 8TB

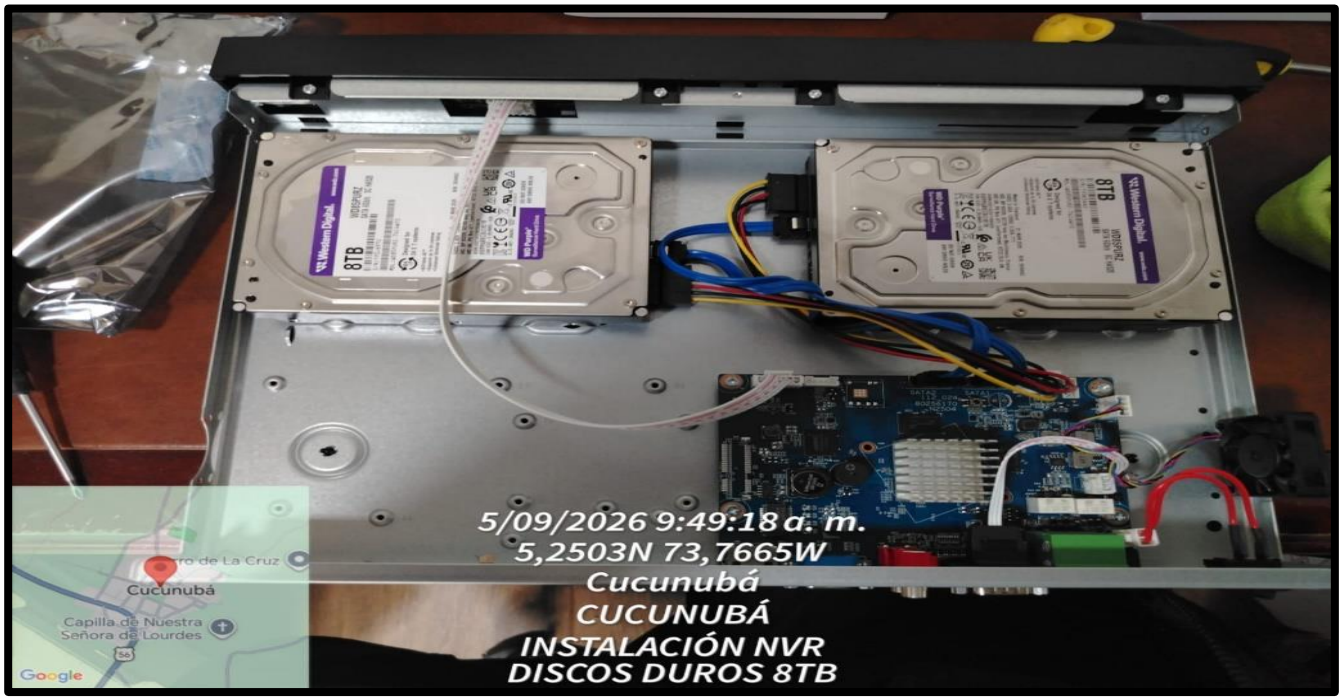

Se llevó a cabo la instalación de un nuevo NVR, el cual fue equipado con dos discos duros de 8 TB cada uno. Tras la implementación, el sistema quedó operativo con un total de 49 cámaras en funcionamiento.

NVR NUEVO DAHUA – DE 49 CANALES con disco duro de 8 TB



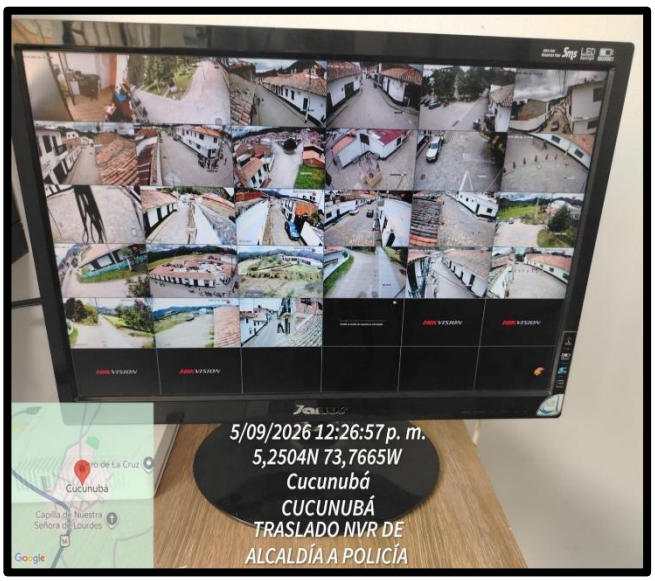

ITEM N°	**3**	**NOMBRE**	Switch 24 Puertos Gigabit Escritorio/rack	**CANT**	**2**
DESCRIPCCION			Switch 24 Puertos Gigabit Escritorio/rack		
ALCALDIA DE CUCUNUBA			**CONTRATO No 110-03.02-148-2026-SAMC-CS**		
1	**MARCA**		**HIKVISION**		
2	**DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN**		En cumplimiento del Contrato N° 110-03.02-148-2026-SAMC-CS, el día 06 de enero de 2026, **en las instalaciones de la Alcaldía de Cucunuba**, se realizó la entrega del equipo **Switch 24 Puertos Gigabit Escritorio/rack**, el cual fue **revisado y aprobado por la supervisión del contrato**, quien verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas. Así mismo, se constató que el equipo se encuentra en perfecto estado, apto para su instalación y configuración. Los switch están registrados bajo los seriales **S/N: FZ8249947 Modelo: DS-3E0524-E(C) S/N: FZ8250015 Modelo: DS-3E0524-E(C)**		

REGISTRO FOTOGRAFICO



SWITCH No. 1 S/N: FZ8249947



SWITCH No. 2 S/N: FZ8250015



Se registró el ingreso de switches al almacén municipal de Cucunubá, efectuándose la entrega de dos (2) equipos para su correspondiente almacenamiento y control institucional.

ITEM N°	**4**	**NOMBRE**	CAMARA IP BULLET FIJA CAMARA IP BALA SEMIMETALICA	**CANT**	**4**
DESCRIPCCION			SUMINISTRO CAMARA IP BULLET FIJA CAMARACAMARA IP BALA SEMIMETALICA 4MP LENTE . 2,8 - 12MM FOV 98° - 31° DWDR IR 50M H.265+ POE IP67 CON ADAPTADOR DE CORRIENTE INSTALADA EN POSTE CON CINTA BANDIT Y HEBILLA		
ALCALDIA DE CUCUNUBA			**CONTRATO No 110-03.02-148-2026-SAMC-CS**		
1	**MARCA**		**DAHUA**		
2	**DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN**		En cumplimiento del Contrato No. 110-03.02-148-2026-SAMC-CS, el día 06 de enero de 2026, **en las instalaciones de la Alcaldía de Cucunuba**, se realizó la entrega de las Cámaras Ip Bullet Fija, las cuales fueron **revisadas y aprobadas por la supervisión del contrato**, quien verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas. Así mismo, se constató que se encuentra en perfecto estado, aptas para su instalación y configuración. Las cámaras entregadas cuentan con seriales: **BB09185PAG0216A - BH0B83EPAGA5BAE- BH0B83EPAGA020F - BB09185PAG75BBD**		

REGISTRO FOTOGRAFICO




Las Camaras fueron entregadas en la Oficina de Almacén, donde se realizó la recepción y verificación correspondiente, siendo recibidos a satisfacción, de conformidad con las condiciones establecidas.



ITEM N°	**5**	**NOMBRE**	Ups 500va Regulador De Voltaje	**CANT**	**30**
DESCRIPCCION			Ups 500va Regulador De VoltajeAutosoporta y poteje punto de de Camara en Cada Poste		
ALCALDIA DE CUCUNUBA			**CONTRATO No 110-03.02-148-2026-SAMC-CS**		
1	**MARCA**		**NEOTEK**		
2	**DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN**		En cumplimiento del Contrato No. 110-03.02-148-2026-SAMC-CS, el día 11 de septiembre de 2026, **en las instalaciones de la Alcaldía de Cucunuba**, se realizó la entrega de las Ups 500va Regulador De Voltaje, las cuales fueron **revisadas y aprobadas por la supervisión del contrato**, quien verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas. Así mismo, se constató que se encuentran en perfecto estado, aptas para su instalación y configuración.		


REGISTRO FOTOGRAFICO

Las UPS fueron entregadas en la Oficina de Almacén, donde se realizó la recepción y verificación correspondiente, siendo recibidos a satisfacción, de conformidad con las condiciones establecidas.

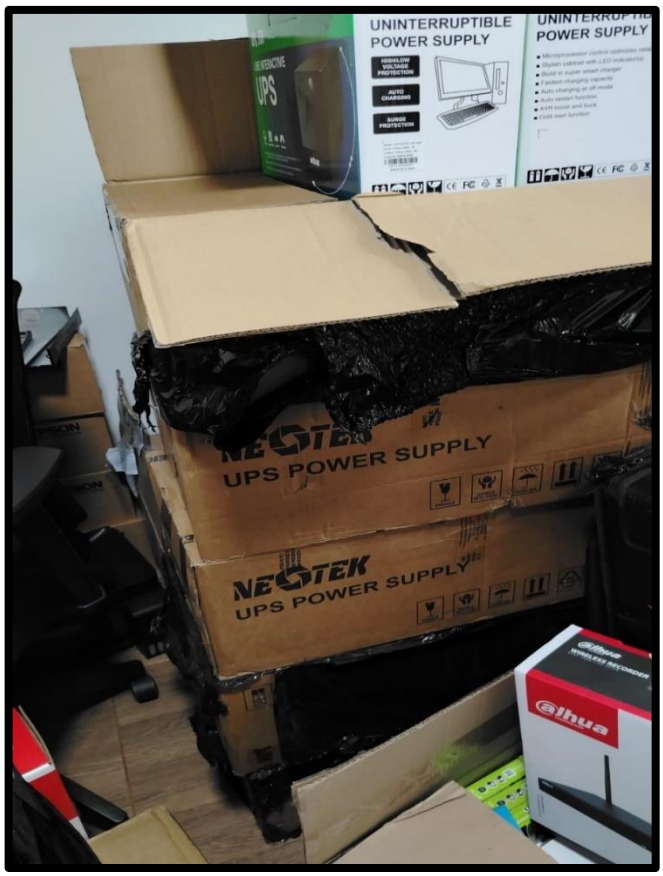




UPS NEOTEK JNP-U650
NEOTEK

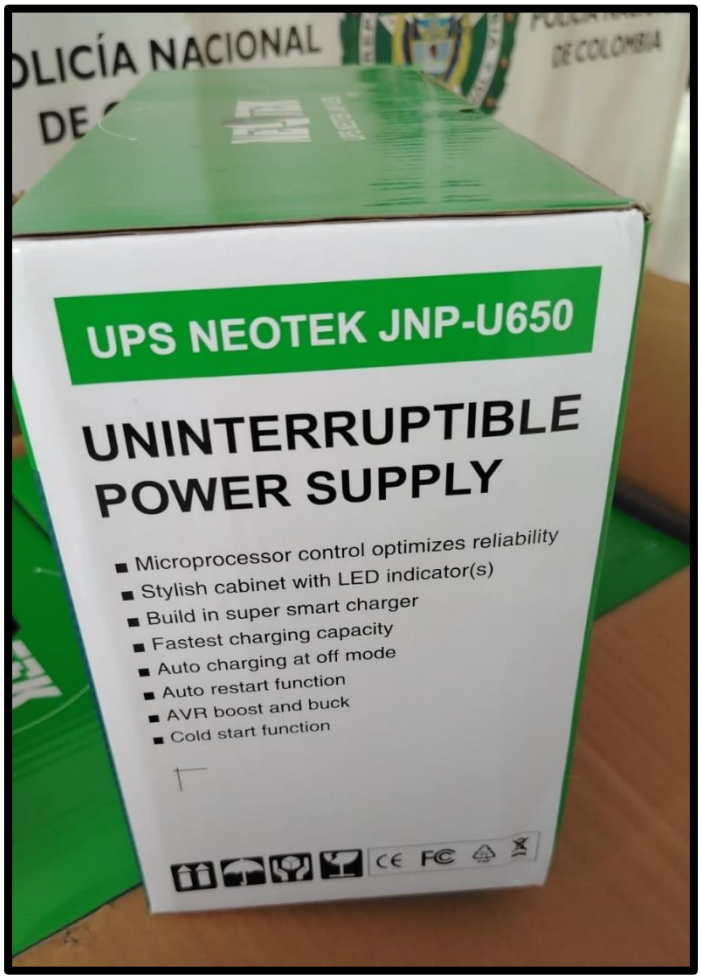
UPS NEOTEK JNP-U650
UNINTERRUPTIBLE
POWER SUPPLY
Microprocessor control optimizes reliability
Stylish cabinet with LED indicator(s)
Build in super smart charger
Fastest charging capacity
Auto charging at off mode
Auto restart function
AVR boost and buck
Cold start function

ITEM N°	**6**	**NOMBRE**	Fibra Óptica Tipo Drop 4 Hilos	**CANT**	**4000**
DESCRIPCCION			FIBRA OPTICA TIPO DROP 4 HILOS PARA ENLACE DE PUNTOS DE CAMARAS INCLUYE COMUNICACIÓN DIRECTA DESDE POSTE DE UBICACIÓN DE CAMARA HASTA LA ALCALDIA MUNICIPAL O ESTACION DE POLICIA PUNTO MAS CERCANO DE ENLACE		
ALCALDIA DE CUCUNUBA			**CONTRATO No 110-03.02-148-2026-SAMC-CS**		
1	**MARCA**		**FIBER OPTIC DEVICE**		
2	**DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN**		En cumplimiento del Contrato N°.110-03.02-148-2026-SAMC-CS, el día 11 de septiembre de 2026, **en las instalaciones de la Alcaldía de Cucunuba**, se realizó la entrega de los 4000 metros de Fibra Óptica Tipo Drop de 4 hilos, los cuales fueron **revisadas y aprobadas por la supervisión del contrato**, quien verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas. Así mismo, se constató que la fibra se encuentra en perfecto estado, aptas para su instalación. **Notas:** En todos los inicios de postes la fibra instalada esta marcada con las marquillas color rojo que van numeradas desde 401 hasta 500.		

REGISTRO FOTOGRAFICO

El extendido de fibra óptica no se ha ejecutado en su totalidad; únicamente se ha realizado por tramos específicos. El material restante se encuentra en reserva dentro del almacén municipal, disponible para su utilización






Se realizaron cambios en el tendido de fibra óptica en los siguientes sectores del municipio de Cucunubá:

- **Poste de salida del colegio.**
- **Enlace entre la Estación de Policía y la Alcaldía.**
- **Poste de entrada a Casa Lata y empalme en Casa Lata.**







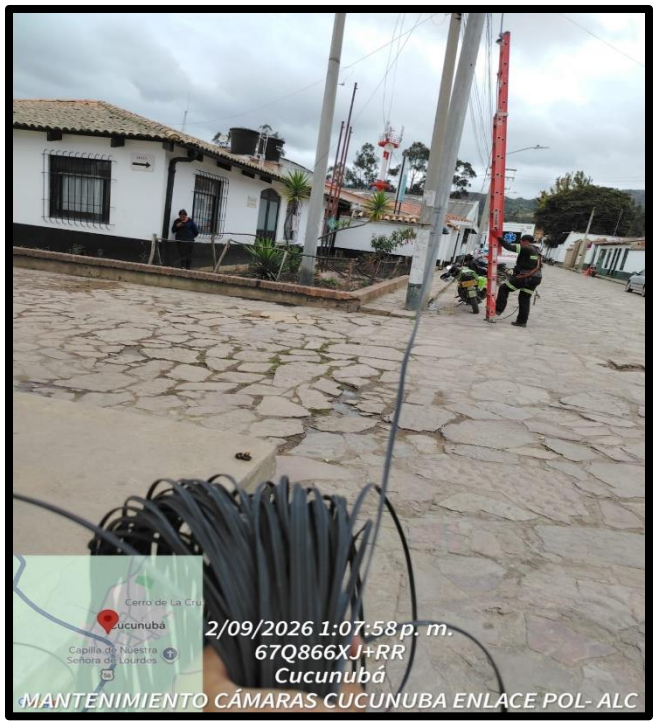




2/09/2026 10:17:40 a. m.
5°14'57,156"N 73°45'55,908"W
Cucunubá
MANTENIMIENTO CÁMARAS CUCUNUBA POSTE 2 SAN JUAN


2/09/2026 1:29:00 p. m.
67Q866XJ+JQ
Cucunubá
MANTENIMIENTO CÁMARAS CUCUNUBA ENLACE POL- ALC




4/09/2026 4:24:59 p. m.
5,2527N 73,7735W
Cucunubá
CUCUNUBÁ
POSTE ENTRADA
CASA LATA




4/09/2026 4:24:57 p. m.
5,2527N 73,7736W
Cucunubá
CUCUNUBÁ
POSTE ENTRADA
CASA LATA


4/09/2026 4:42:11 p. m.
5,2527N 73,7732W
Cucunubá
CUCUNUBÁ
EMPALME CASA LATA
CASA LATA


4/09/2026 4:42:12 p. m.
5,2527N 73,7732W
Cucunubá
CUCUNUBÁ
EMPALME CASA LATA
CASA LATA

ITEM N°	**7**	**NOMBRE**	Convertidor De Medios Transceiver	**CANT**	**40**
DESCRIPCCION			Convertidor De Medios Transceiver Un 1 Hilo Gigabit (par)a+b CONVERSION DE FIBRA A UTP PAR POR PUNTO DE CAMARA. Con AUTOATENUADOR ALTA CALIDAD		
ALCALDIA DE CUCUNUBA			**CONTRATO No 110-03.02-148-2026-SAMC-CS**		
1	**MARCA**		**HTB**		
2	**DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN**		En cumplimiento del Contrato N°110-03.02-148-2026-SAMC-CS, el día 11 de septimebre de 2026, **en las instalaciones de la Alcaldía de Cucunuba**, se realizó la entrega de los Convertidor De Medios Transceiver, los cuales fueron **revisados y aprobados por la supervisión del contrato**, quien verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas. Así mismo, se constató que se encuentra en perfecto estado y aptos para su instalación.		


REGISTRO FOTOGRAFICO

Los transceptores (transceivers) fueron entregados en la Oficina de Almacén, donde se realizó la recepción y verificación correspondiente, siendo recibidos a satisfacción, de conformidad con las condiciones establecidas.






Media Converter
FIBER MEDIA CONVERTER

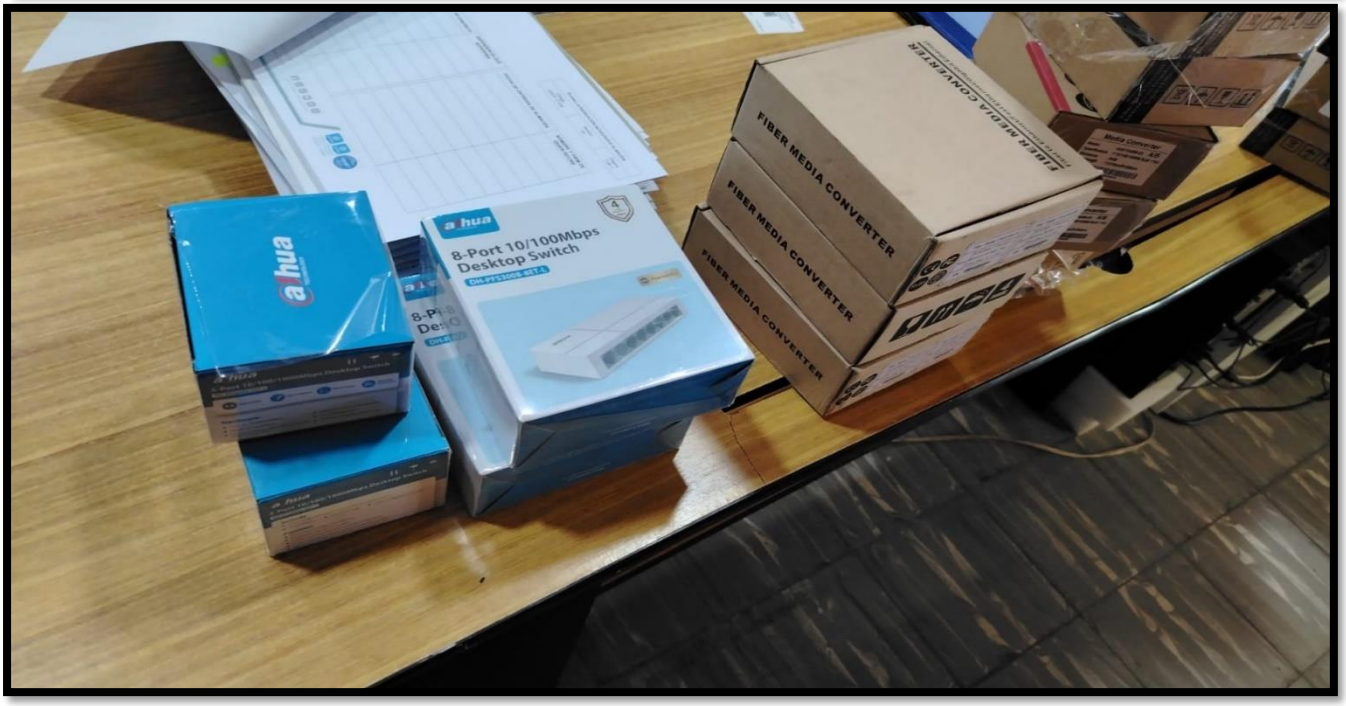
FIBER MEDIA CONVERTER
FIBER MEDIA CONVERTER
FIBER MEDIA CONVERTER
8-Port 10/100Mbps
Desktop Switch

ITEM N°	**8**	**NOMBRE**	Mantenimiento	**CANT**	**40**
DESCRIPCCION			MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TODO COSTOS DESMONTAJE Y MONTAJES DE CAMARAS PTZ Y CAMARAS FIJAS EXISTENTES, REPARACION PUNTO ELECTRICO REEMPLAZO DE ENLACE DE FIBRA		
ALCALDIA DE CUCUNUBA			**CONTRATO No 110-03.02-148-2026-SAMC-CS**		
1	**MARCA**		**SERVICIO**		
2	**DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN**		En cumplimiento del Contrato N°110-03.02-148-2026-SAMC-CS, y desde el día de inicio de la ejecución de las actividades de campo, se llevaron a cabo las **instalaciones, mantenimientos correctivos y preventivos** a toda la red y al sistema que conectan todos los puntos, garantizando el **adecuado funcionamiento de las cámaras de videovigilancia del municipio**, de la siguiente manera:		

- Se realizo conexión y empalme con fibra óptica en sectores de casa lata, duraznos, sector la Bares.
- Se realizo cambio de swich y transeiver en el sector Bolera

Traslados de NVR:

- Se trasladó un NVR desde la Alcaldía hacia la Estación de Policía, quedando instalado y operativo.
- Se desmontó el NVR existente en la Estación de Policía (S/N: 7F08CBDPAZ6F4E6) y se reubicó en la Alcaldía, quedando disponible en dicha dependencia.
- **Instalación de almacenamiento**: incorporación de dos (2) discos duros de 8 TB en el NVR nuevo.
- **Revisión de equipos afectados por filtración de agua**: se solicitó reparación y se programó revisión de puntas COES y reponchado.

Sector Alto de Aire:

- Cambio de cableado en una cámara (pendiente traslado a Cancha Cubierta).
- Sustitución de UPS.
- Limpieza y mantenimiento preventivo al NVR y cámaras.
- Identificación de una cámara dañada; se dejó cableado listo para instalación de reemplazo.

Panel de alarma: apagado por falla de fuente; se requiere reemplazo.

Salón Comunal Atorhur:

- Cambio de cableado en dos (2) cámaras.
- Mantenimiento y limpieza en otras dos (2) cámaras.
- Reemplazo de cable blanco cristalizado.

Equipos de cómputo:

- Uno presenta reinicios automáticos; se programó mantenimiento preventivo y correctivo.
- Otro permanece en estado de procesamiento y no arranca; se programó mantenimiento.

NVR dañado: no inicia, pruebas realizadas sin respuesta. Identificación: S/N: 7E008F3PAZ47CCD, P/N: 1.0.01.23.12228.

Salón Comunal Carrizal:

- Visita técnica de verificación de equipos.
- UPS programada para mantenimiento.
- Instalación de línea de cable para cámara.
- Cámaras habilitadas; se recogió UPS en Cucunubá y se programó regreso para finalizar instalación.
- Mantenimiento correctiva y preventiva a NVR limpieza de equipos


Sector Peñas:

- Cambio de cableado en dos (2) cámaras (poste y polideportivo).
- Mantenimiento y limpieza al DVR y rack.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Se registró un evento de empalme en un tramo de 695 metros correspondiente al sector de Casalata. Sin embargo, no existe reserva disponible para descender la caja y rehacer el empalme, lo que limita la intervención en este punto.



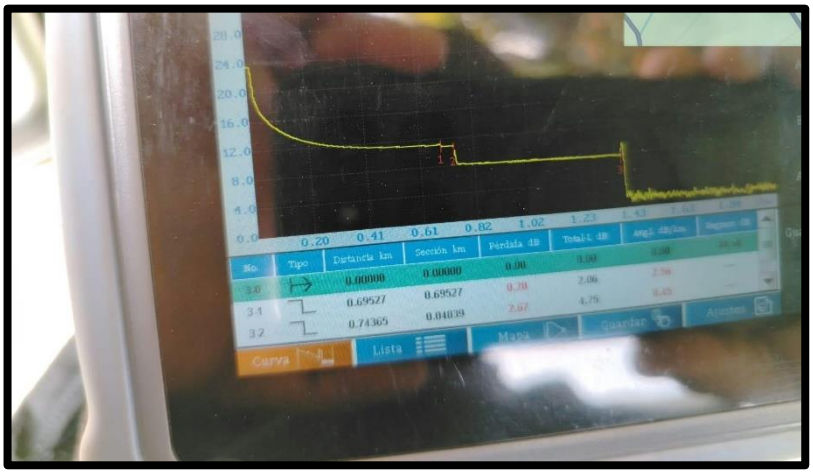


Se reinician funciones

En el sector de Bares se registró un evento de empalme, el cual fue superado a los 743 metros, quedando el






Se realizó el primer empalme de fibra óptica en el sector Duraznos, quedando el tramo habilitado para su operación.

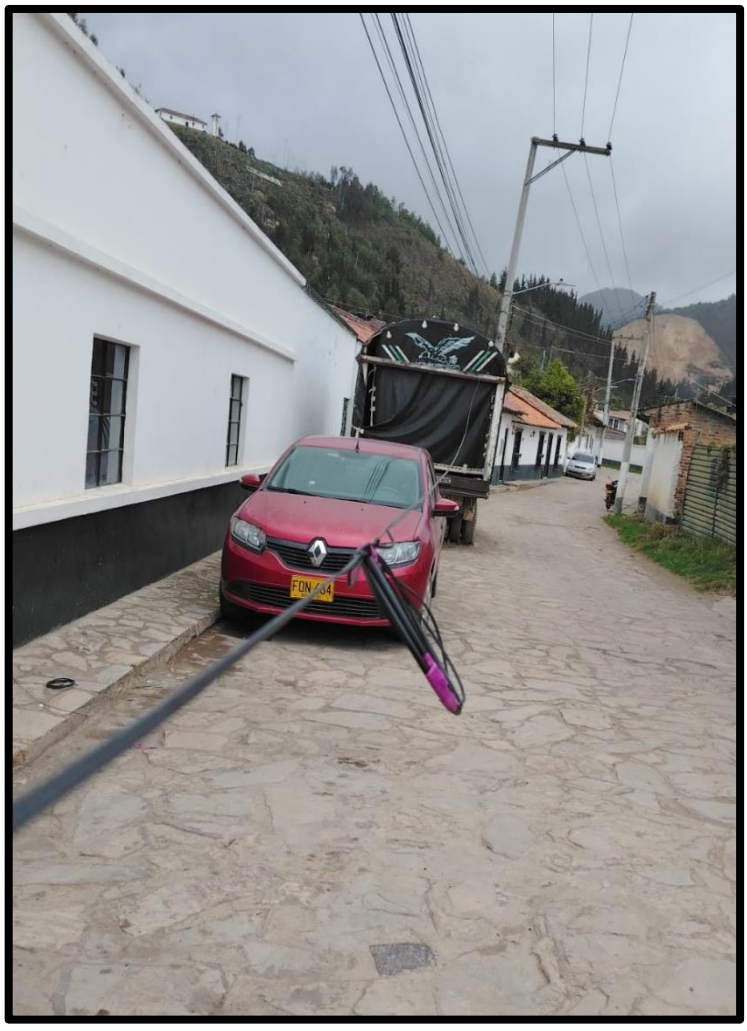

Se completó el primer empalme de fibra óptica, quedando el tramo habilitado y operativo tras la intervención realizada.


Se realizaron dos (2) empalmes de fibra óptica, con la instalación de 30 metros de cable de fibra y la colocación de tres (3) tensores de drop, quedando el tramo operativo tras la intervención.



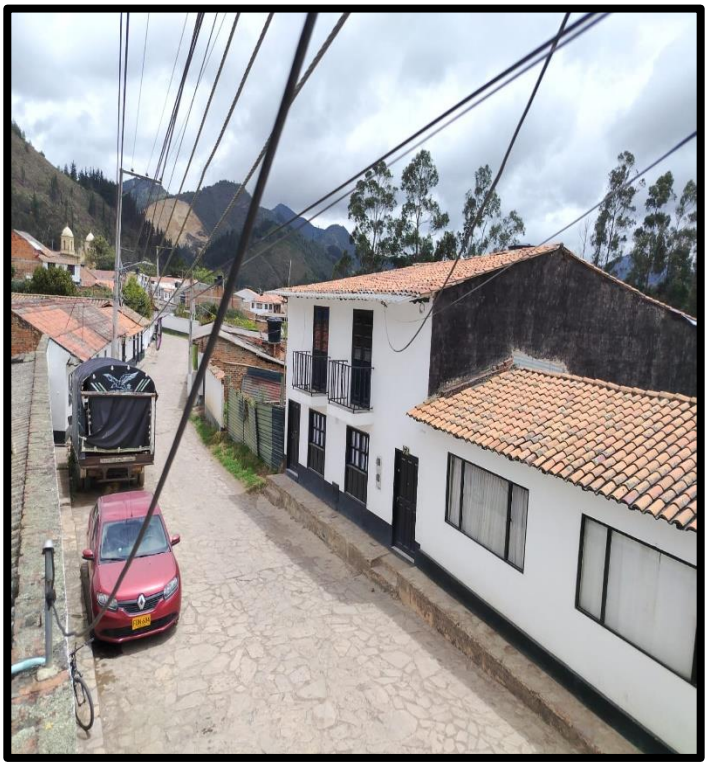





La cámara ubicada en el sector Duraznos restableció el enlace de comunicación. Durante la intervención se efectuó el cambio de conector, quedando el dispositivo operativo.

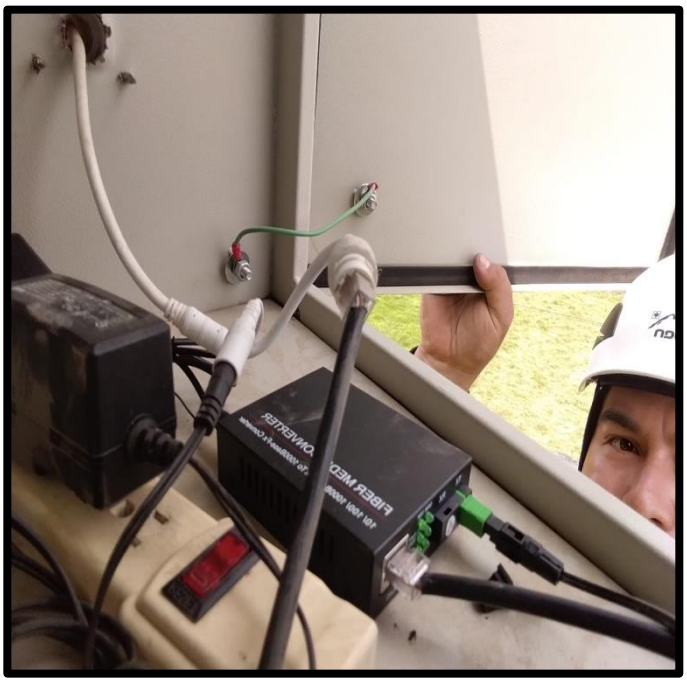



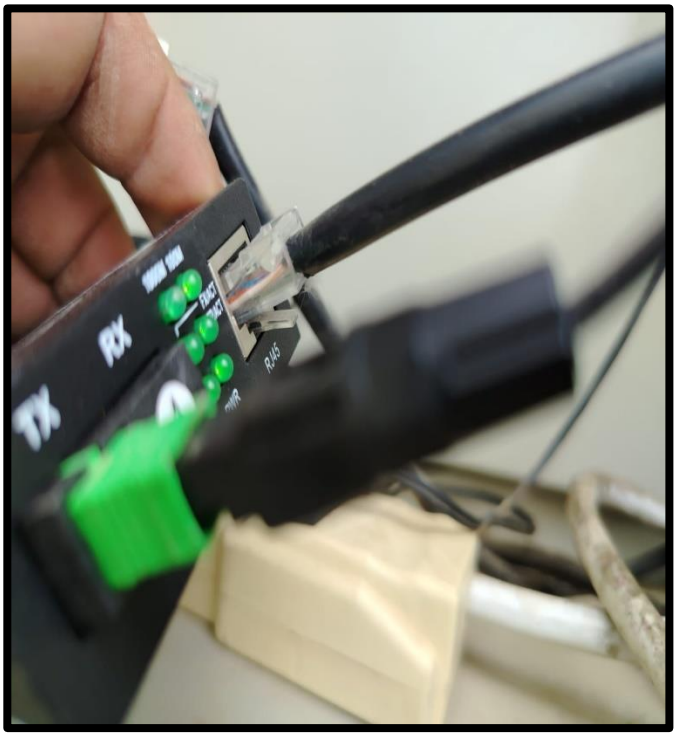

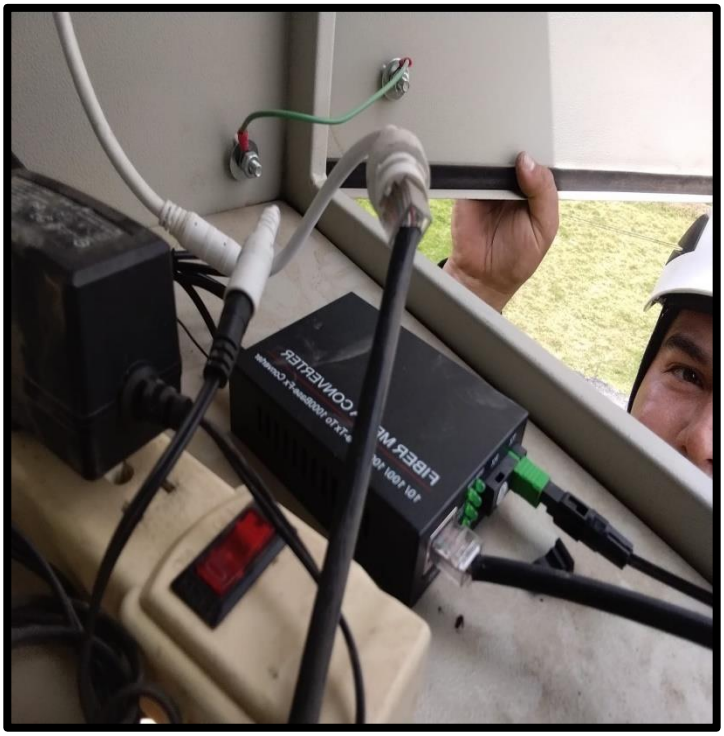



Cámara sector de duraznos





Se realizó el cambio de switch en la Bolera, instalando un equipo 8-Port 10/100 Mbps Desktop Switch, identificado con el serial S/N: AG01124PAJ00820, número de parte P/N: 1.0.01.20.10931-0036 y modelo DH-PFS3008-8ET-L. El dispositivo quedó operativo en la nueva ubicación.





Se efectuó el cambio de transceiver en el sector Bolera, quedando el equipo instalado y operativo tras la intervención realizada.





SECTOR LAS PEÑAS

Se efectuó la revisión de las cámaras instaladas en el sector Peñas, municipio de Cucunubá, verificando su estado operativo y condiciones de funcionamiento.








Se realizó la revisión de los equipos, identificando una gotera que afectaba directamente su funcionamiento al caer agua sobre ellos. Se solicitó la reparación de la filtración y, una vez corregida, se procederá a revisar cada punta COES y efectuar nuevamente el reponchado correspondiente.





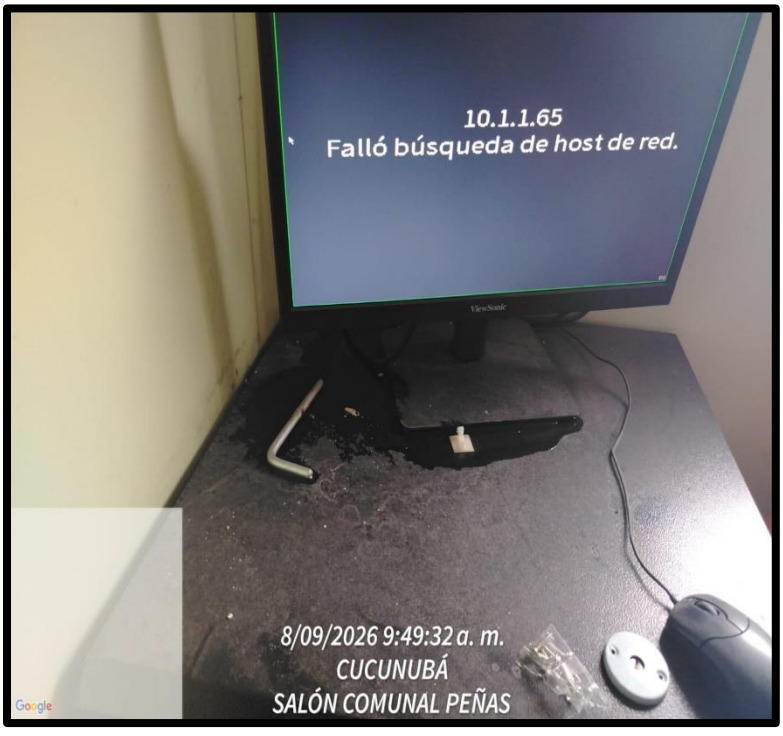









En el sector Peñas se realizó el cambio de cableado de dos (2) cámaras de videovigilancia, una ubicada en poste y otra en el polideportivo. Adicionalmente, se efectuaron las labores de revisión y verificación de las conexiones correspondientes



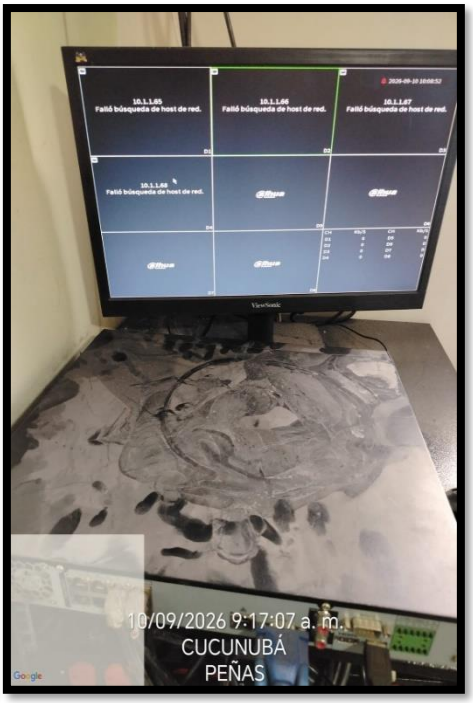

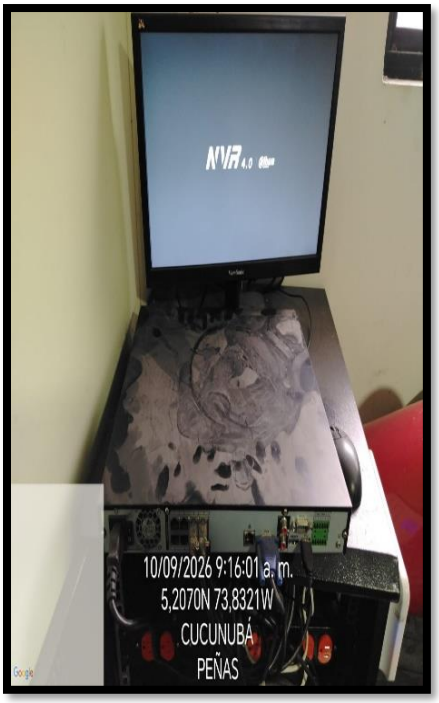




10/09/2026 10:46:45 a. m.
5,2072N 73,8322W
CUCUNUBÁ
PEÑAS


10/09/2026 10:46:48 a. m.
5,2071N 73,8322W
CUCUNUBÁ
PEÑAS


10/09/2026 10:30:15 a. m.
5,2071N 73,8320W
CUCUNUBÁ
PEÑAS


10/09/2026 10:44:30 a. m.
5,2072N 73,8321W
CUCUNUBÁ
PEÑAS

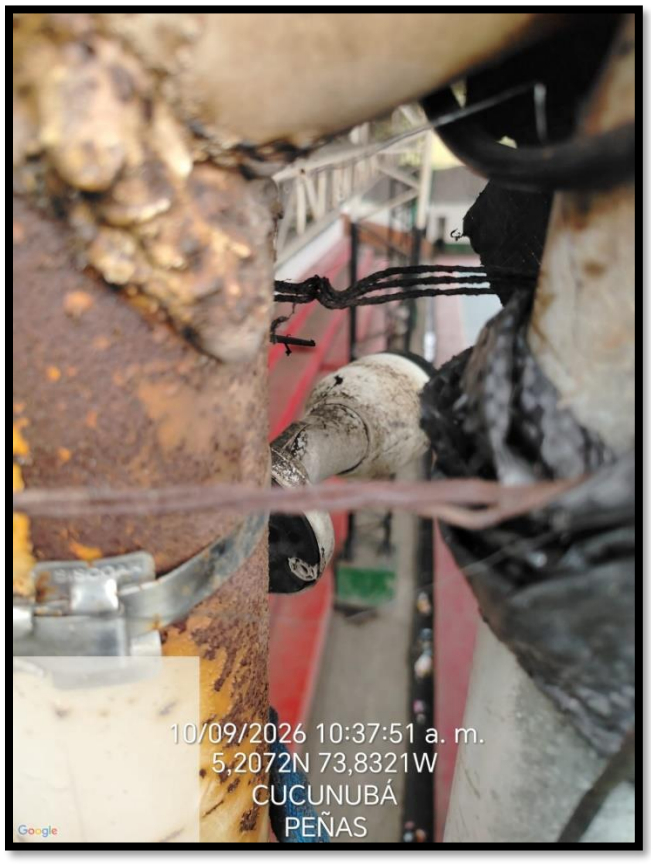
10/09/2026 10:37:51 a. m.
5,2072N 73,8321W
CUCUNUBÁ
PEÑAS

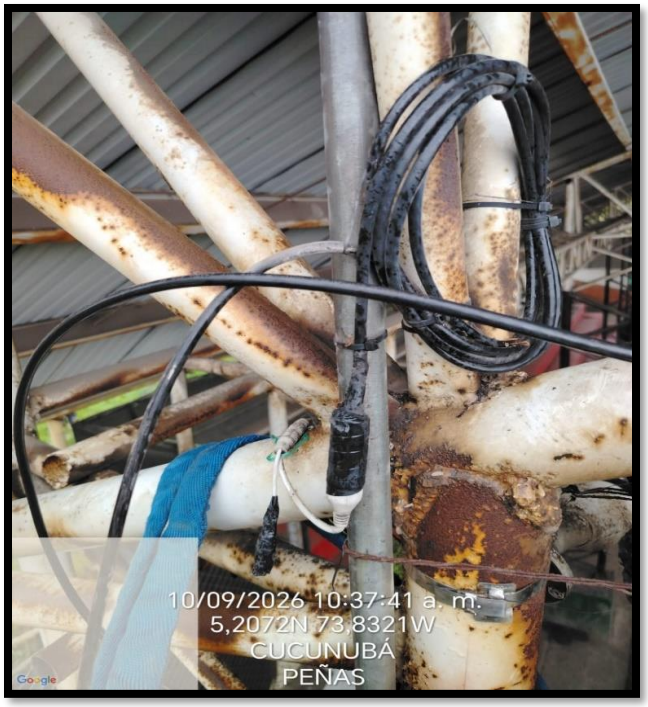

Se evidencia que la **estructura donde se encuentran instaladas las cámaras presenta condiciones de deterioro y se encuentra en mal estado**, por lo que se recomienda realizar las adecuaciones y/o reparaciones necesarias para garantizar la seguridad y estabilidad de los equipos.


Adicionalmente, se realizaron labores de **mantenimiento preventivo y limpieza del rack y del equipo de grabación**, efectuando la revisión general de sus componentes y conexiones









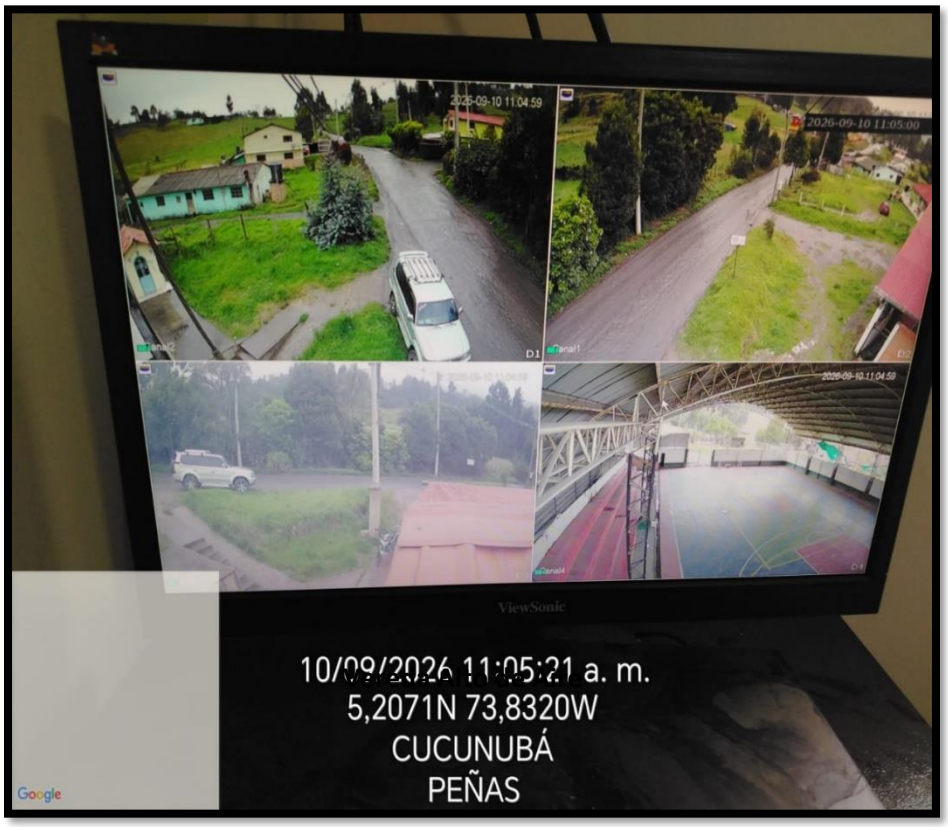

Finalmente, se verificó el estado general de los equipos y cámaras, constatando que quedaron en **perfecto estado de funcionamiento**, realizando correctamente las funciones de **grabación, visualización y transmisión de imagen**, así como la comunicación con el sistema de monitoreo.

Se realizaron las respectivas pruebas de funcionamiento, evidenciando que el sistema quedó **operativo y funcionando con normalidad**.


10/09/2026 11:12:32 a. m.
5,2071N 73,8320W
CUCUNUBÁ
PEÑAS


10/09/2026 11:12:28 a. m.
5,2060N 73,8330W
CUCUNUBÁ
PEÑAS


10/09/2026 11:12:21 a. m.
5,2060N 73,8330W
CUCUNUBÁ
PEÑAS

SECTOR ALTA DE AIRE







En el sector Alto de Aire se identificó la necesidad de realizar el cambio de cableado de una cámara. Dado que se efectuará el reemplazo del cable, se evaluará la posibilidad de trasladar dicha cámara hacia la Cancha Cubierta, según viabilidad técnica. Las cámaras que actualmente se encuentran en funcionamiento serán sometidas a labores de limpieza y mantenimiento preventivo.









El panel de alarma se encuentra apagado debido a falla en la fuente de alimentación. Se requiere el reemplazo de la fuente para restablecer el funcionamiento del sistema.








En el sector Alto de Aire se efectuó el cambio de la UPS, con el fin de garantizar un adecuado suministro de energía a los equipos del sistema de videovigilancia. Asimismo, se realizaron labores de limpieza, mantenimiento preventivo y revisión del NVR y de las cámaras instaladas en el punto.

Se identificó que una de las cámaras presenta daño y requiere ser reemplazada. En consecuencia, se dejó el cableado y las conexiones debidamente adecuadas y listas para la instalación de la nueva cámara.








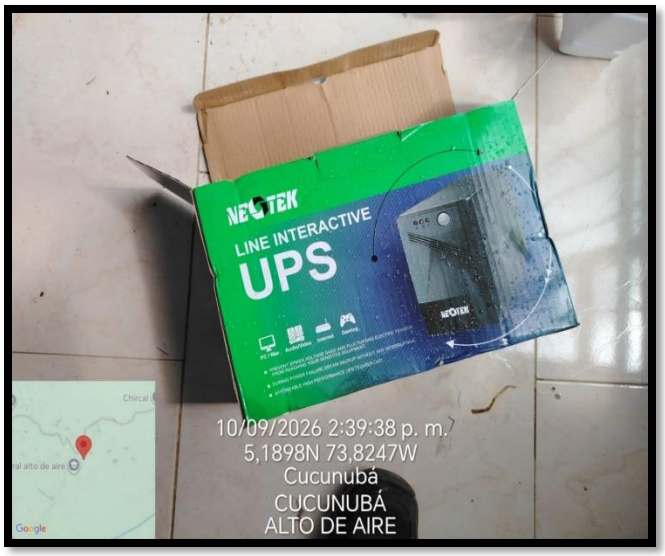

CAMBIO DE
UPS NEOTEK JNP-U650 S/N: C2211425470598

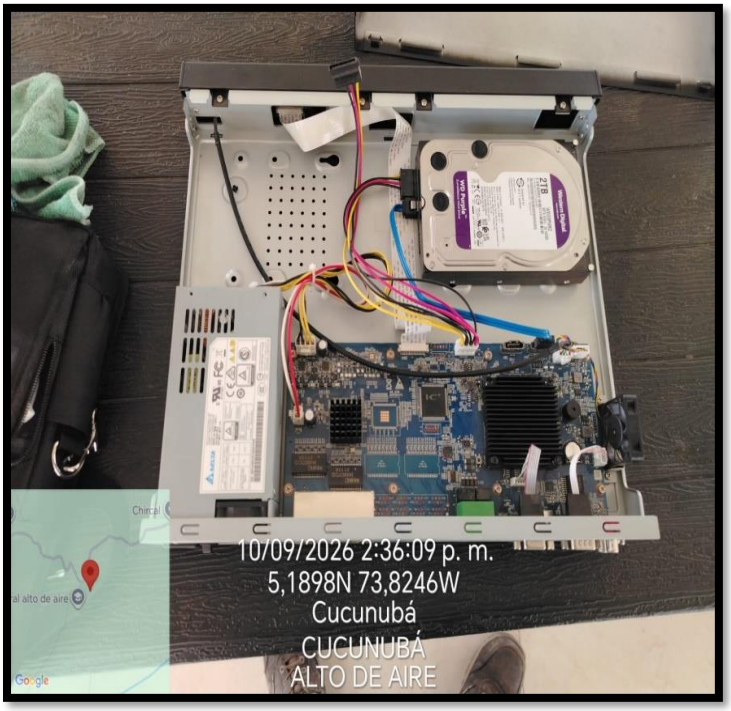



se realizaron labores de limpieza, mantenimiento preventivo y revisión del NVR y de las cámaras instaladas en el punto.









Evidencia camara dañada

Una vez finalizadas las labores de mantenimiento y verificación, se constató que en el sector quedan **tres (3) cámaras operativas**, funcionando correctamente, con **transmisión de imagen y grabación**, encontrándose en **perfecto estado de funcionamiento**

SECTOR CARRIZAL









Se realizó la visita al Salón Comunal de Carrizal para verificar el estado de los equipos y cámaras instaladas, programando las acciones de mantenimiento y correctivos necesarios.







El sistema UPS del sector Carrizal se encuentra programado para labores de mantenimiento, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y continuidad operativa.









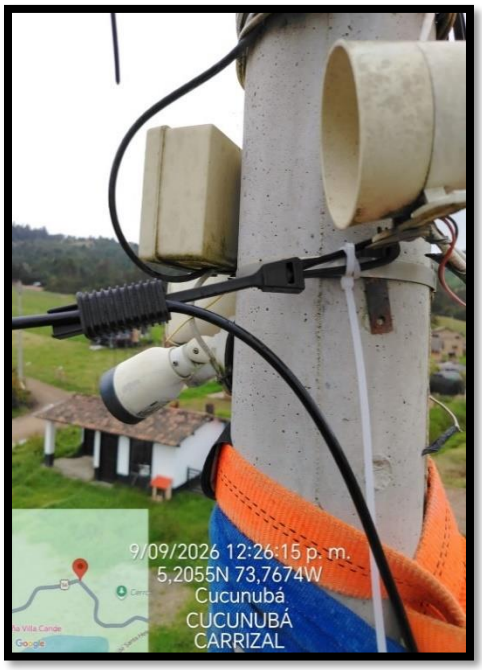

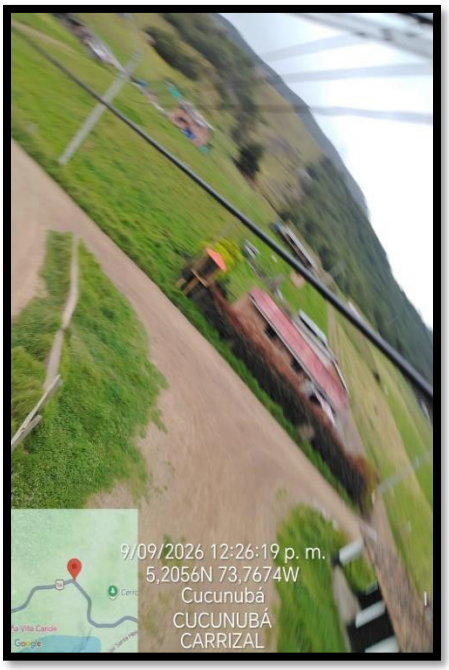


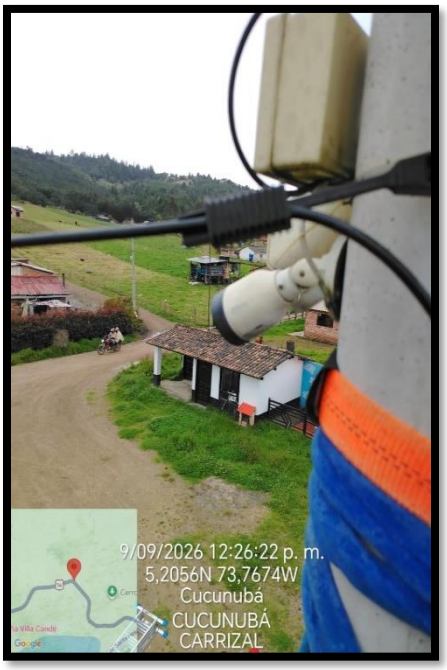


En el sector Carrizal se realizó la instalación de una línea de cable destinada a la conexión de cámara, quedando el tramo habilitado para su funcionamiento.

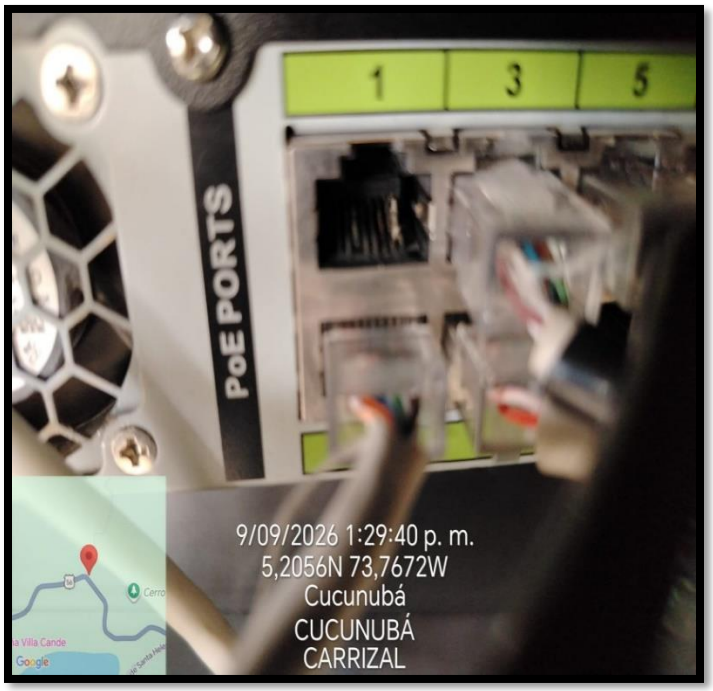




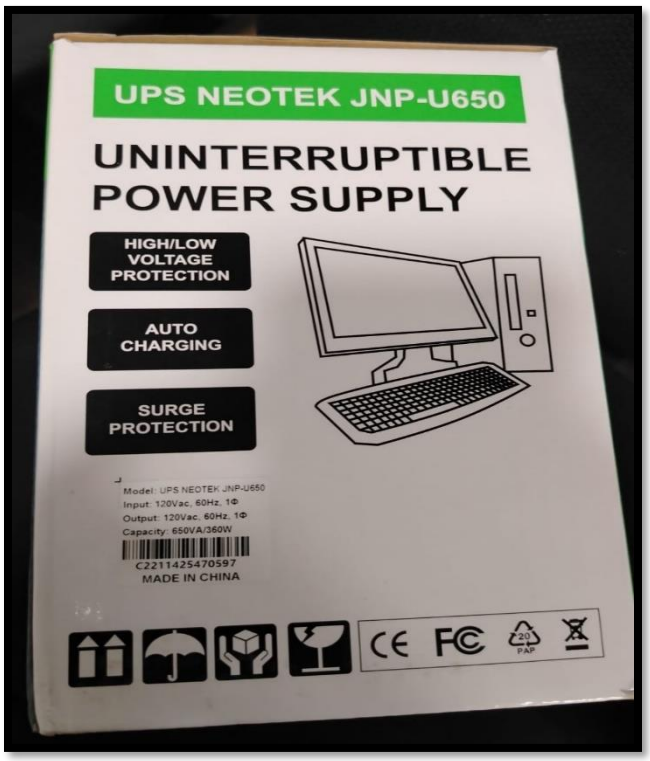


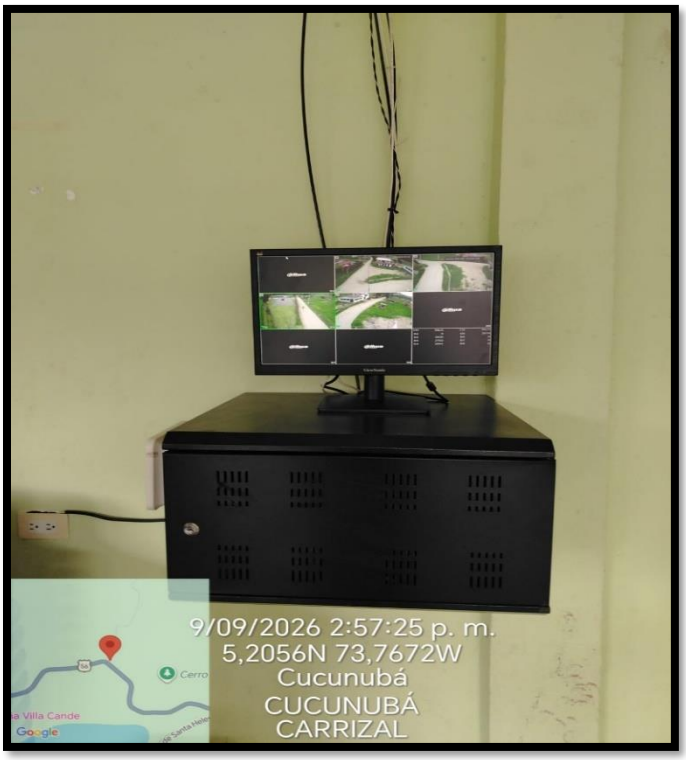



Se realizaron labores de mantenimiento preventivo y limpieza a las cámaras de videovigilancia, efectuando la revisión general de cada uno de los equipos y sus respectivas conexiones




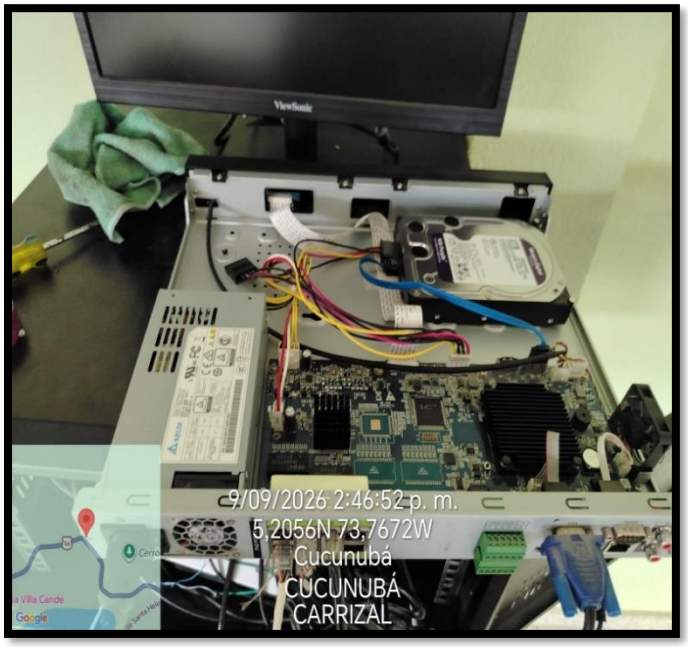

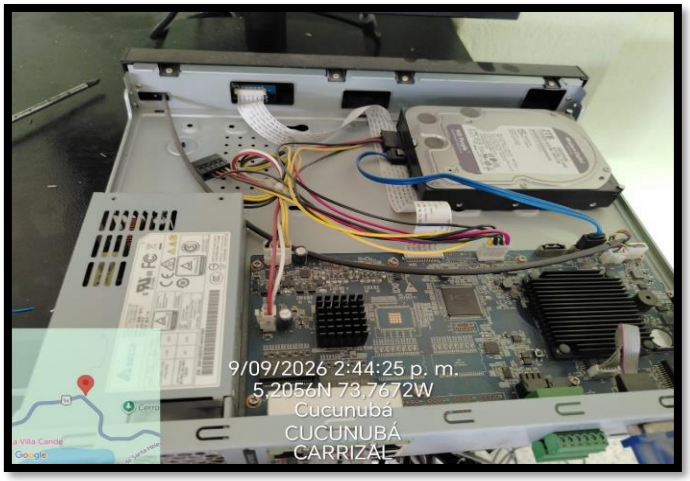

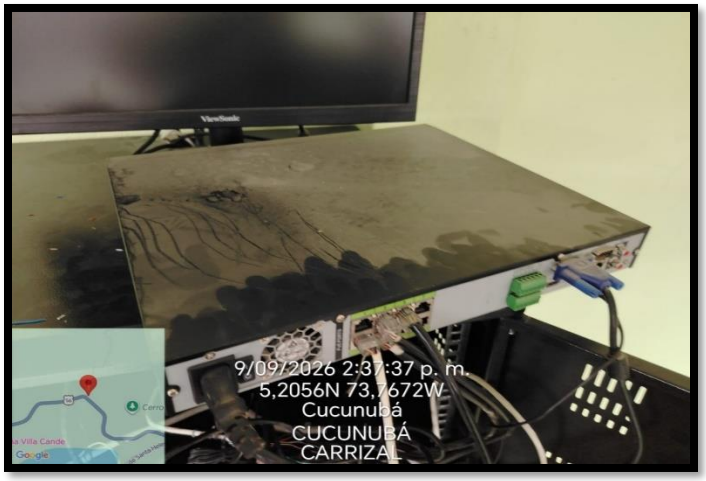

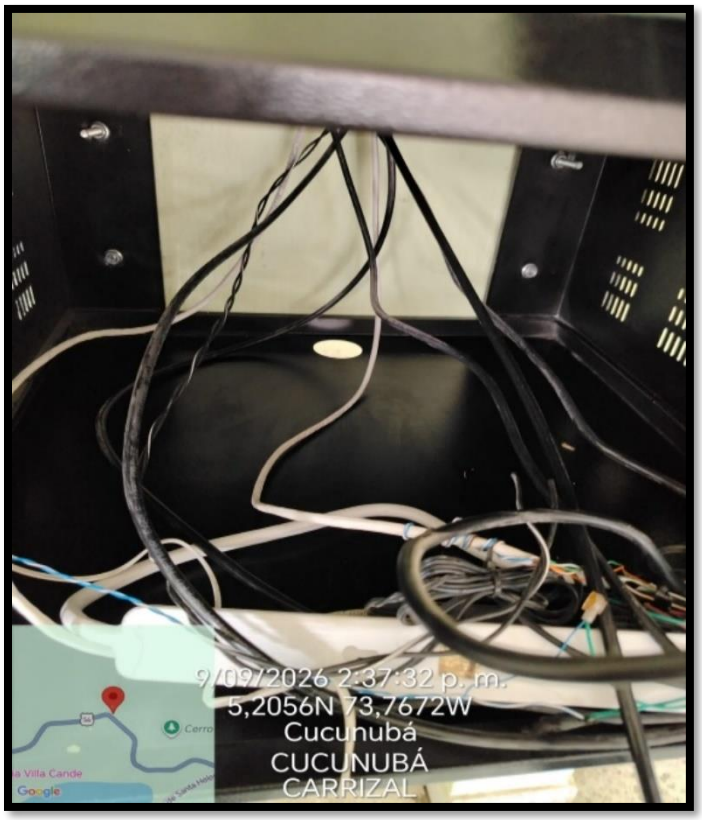

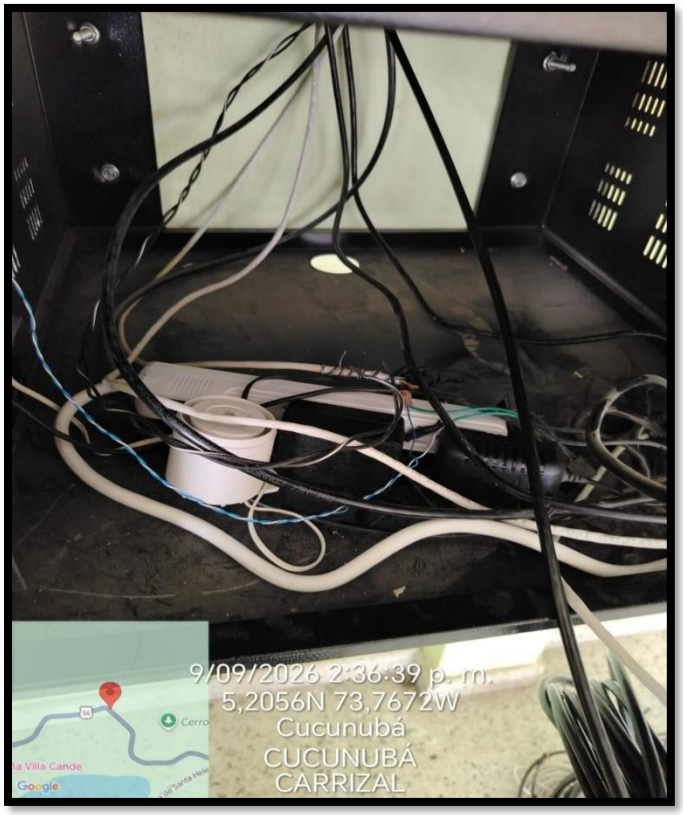

Se realizó mantenimiento preventivo y limpieza a todos los equipos de visualización, grabación y transmisión de video, efectuando la revisión general de su estado y funcionamiento





Se evidenció daño en la UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) del sector, afectando el suministro de energía de los equipos del sistema de videovigilancia.
Por lo anterior, se realizó el cambio de la UPS, efectuando posteriormente las respectivas pruebas de funcionamiento





Una vez finalizada la intervención, se verificó que todos los equipos del sistema quedaran operativos y funcionando correctamente, garantizando la continuidad de la visualización, grabación y transmisión de video.


9/09/2026 1:29:10 p. m.
5,2056N 73,7672W
Cucunubá
CUCUNUBÁ
CARRIZAL
PoE PORTS
Cerro
Villa Cande
Google

SECTOR ATORHUR









Se evidenció que el equipo presenta reinicios automáticos. Se programó la realización de mantenimiento preventivo y correctivo con el fin de estabilizar su funcionamiento y garantizar la continuidad operativa.







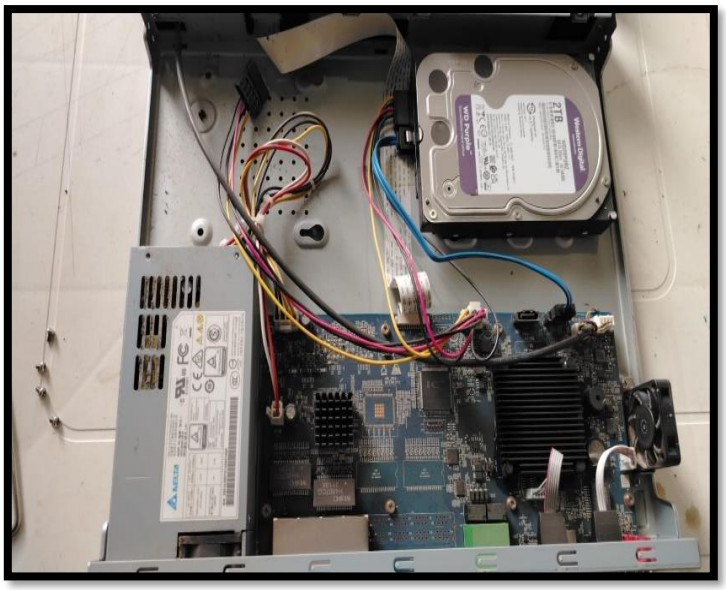

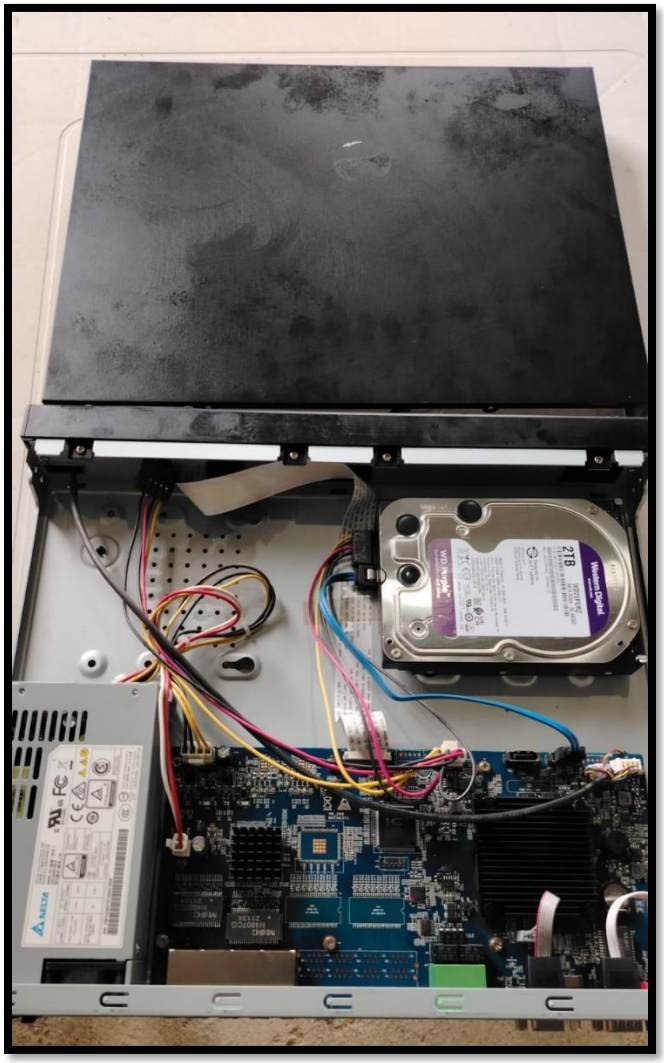



El NVR presenta daño crítico y no inicia. Se realizaron las pruebas correspondientes sin obtener respuesta del equipo. El dispositivo se identifica con el serial S/N: 7E008F3PAZ47CCD y número de parte P/N: 1.0.01.23.12228.



Serial S/N: 7E008F3PAZ47CCD

Número de parte P/N: 1.0.01.23.12228

El equipo permanece en estado de procesamiento y no logra iniciar correctamente. Se programó la ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo para identificar la causa y restablecer su funcionamiento.



CONTRATISTA	VoBo Supervisora del contrato
 **SISTEM- SOLUCIONES INTEGRALES SAS** **R/L. DIANA VALBUENA**	
NOMBRE Y FIRMA	FIRMA

Factura Electrónica De Venta No. FE7

Representación Gráfica

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 8

Fecha de Validación: 14/09/2026 12:04 PM
Fecha de Emisión: 14/09/2026 12:04 PM
Responsabilidad Tributaria: R-99-PN
Responsabilidad Tributaria: No aplica
Régimen Fiscal: 48

Emisor: SISTEM-SOLUCIONES INTEGRALES SAS

Nombre Comercial: SISTEM-SOLUCIONES INTEGRALES SAS
Nit del Emisor: 901837772
Correo Electrónico: SISTEMSOLUCIONESINTEGRALES@GMAIL.COM
Teléfono: 3105653107
Dirección: CRA 45 CL 17 N 5
Departamento: META
Municipio: VILLAVICENCIO
Pais: Colombia

Receptor: MUNICIPIO DE CUCUNUBA

Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL CUCUNUBA
Identificación: 899999406
Correo Electrónico: hacienda@cucunuba-cundinamarca.gov.co
Teléfono: 3212110209
Dirección: N/D
Responsabilidad Tributaria: ZZ
Departamento: Cundinamarca
Municipio: Cucunubá

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA	Total
1	GT01	INSTALACION Y CONFIGURACION:NVR 32 CH	SUMINISTRO INSTALACION Y CONFIGURACION:NVR 32CH H.265+ DECODIFICACION 4CH@4K O 16CH@2MP AB ENTRADA 320MBPS 8 SATA 2 HDMI : IP Serie: IP Pro, T ipo: NVR IP Núrnero de Canales: 16CH Resolución Máxima: Hasta 12MP Capacidad de Decodificación: 16CH@1080P Ancho de Banda de Entrada (Mbps): Entrada 320Mbps, Analíticas: ANPR (Deteccion de Placas), Busqueda Inteligente, Conteo de Personas, Cruce de linea e intrusión, Detección de movimiento, Detección Facial, Fisheye Dewarping, Mapa de calor, Objetos sustraidos o abandonados, POS, Cornpresión: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG, Núrnero de HDD: 2 SATA Capacidad HDD: HASTA 10TB Salidas HDMI: 1P HDMI Salidas VGA: 1 P VGA Resolución máxima salida HDMI 1: HDM11 (3840 x 2160)/30Hz Interfa z de red: RJ45 10/100/1000 M bps Cantidad Puertos RJ45: 1 P RJ45 E/S Alarma: E/S Alarma 4/2 Reproducción simultánea: Reproducción sirnultánea 16-ch Consumo sin HDD: 9.SW	1.00	unidad	2,789,351.00	2,789,351.00	529,976.69	**3,319,327.69**
2	GT02	DISCO DURO	Disco duro interno NAS HDD de 8 TB, SATA de 3.5 pulgadas, 6 Gb/s, 7200 RPM, caché de 256 MB para almacenamiento conectado	2.00	unidad	1,353,361.00	2,706,722.00	514,277.18	**3,220,999.18**
3	GT03	SWITCH RACKEABLE	Switch 24 Puertos Gigabit Escritorio/rack	2.00	unidad	1,490,000.00	2,980,000.00	566,200.00	**3,546,200.00**
4	GT04	CAMARA Ip Bullet	SUMINISTRO CAMARA IP BULLET FIJA CAMARACAMARA IP BALA SEMIMETALICA 4MP LENTE . 2,8 - 12MM FOV 98° - 31° DWDR IR 50M H.265+ POE IP67 CON ADAPTADOR DE CORRIENTE INSTALADA EN POSTE CON CINTA BANDIT Y HEBILLA	4.00	unidad	589,162.00	2,356,648.00	447,763.12	**2,804,411.12**

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA	Total
5	GT05	UPS 500 VA	Ups 500va Regulador De VoltajeAutosoporta y poteje punto de de Camara en Cada Poste	30.00	unidad	206,573.00	6,197,190.00	1,177,466.10	**7,374,656.10**
6	GT06	FIBRA OPTICA	FIBRA OPTICA TIPO DROP 4 HILOS PARA ENLACE DE PUNTOS DE CAMARAS INCLUYE COMUNICACIÓN DIRECTA DESDE POSTE DE UBICACIÓN DE CAMARA HASTA LA ALCALDIA MUNICIPAL O ESTACION DE POLICIA PUNTO MAS CERCANO DE ENLACE	4,000.00	unidad	1,513.00	6,052,000.00	1,149,880.00	**7,201,880.00**
7	GT07	CONVERTIDOR DE MEDIOS	Convertidor De Medios Transceiver Un 1 Hilo Gigabit (par)a+b CONVERSION DE FIBRA A UTP PAR POR PUNTO DE CAMARA. Con AUTOATENUADOR ALTA CALIDAD	40.00	unidad	189,076.00	7,563,040.00	1,436,977.60	**9,000,017.60**
8	GT08	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TODO COSTOS DESMONTAJE Y MONTAJES DE CAMARAS PTZ Y CAMARAS FIJAS EXISTENTES, REPARACION PUNTO ELECTRICO REEMPLAZO DE ENLACE DE FIBRA	27.00	unidad	327,731.00	8,848,737.00	1,681,260.03	**10,529,997.03**

Detalles:
Son: CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS
CUFE :
5ae7ad2415e7bac8a5dac8543f87c2270e0e9e1058026abe11d3407534a12b3df0e40a4790b82f9ef7ea88df9d3b7d09

Detalle de Venta	
Subtotal:	COP 39,493,688.00
Monto Bruto:	COP 39,493,688.00
Monto IVA:	COP 7,503,800.72
Total Venta:	COP 46,997,488.72
Total a pagar:	COP 46,997,488.72

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901837772-9	SISTEM SOLUCIONES INTEGRALES SAS	CRR 42 16- 50	3105653107	SISTEMSOLUCIONESINTEGRALES@GAMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95096595	10/09/2026	2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$2,976,539	$730.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	49.100	0		0		0	0	0	0	49.100	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
231001	Colfondos	800227940-6	196.200	0	0	0	0	0	0		196.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	15.600				15.600	0	0	15.600			156	15.600	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	49.100	0	0	49.100	1
CCF34	Cofrem	892000146-3	70.100	0	0	70.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	119.200	119.200
Pensión	2	476.400	476.400
Riesgos Laborales	1	15.600	15.600
CCF	2	119.200	119.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	730.400	730.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901837772-9	SISTEM SOLUCIONES INTEGRALES SAS	CRR 42 16- 50	3105653107	SISTEMSOLUCIONESINTEGRALES@GAMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95096595	10/09/2026	2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$2,976,539	$730.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1116797260	VALBUENA ANTOLINEZ DIANA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1118547179	SUAREZ SANABRIA JEINNY DOLORES	1	0			S	X																231001	1.225.634	21	196.200	0	0	0	0	EPS005	1.225.634	21	49.100	14-23	1.225.634	21	1	6.400	CCF10	1.225.634	21	49.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901837772-9	SISTEM SOLUCIONES INTEGRALES SAS	CRR 42 16- 50	3105653107	SISTEMSOLUCIONESINTEGRALES@GAMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94050814	05/08/2026	2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$3,501,810	$859.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	18.400				18.400	0	0	18.400			184	18.400	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	70.100	0	0	70.100	1
CCF34	Cofrem	892000146-3	70.100	0	0	70.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	140.200	140.200
Pensión	2	560.400	560.400
Riesgos Laborales	1	18.400	18.400
CCF	2	140.200	140.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	859.200	859.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901837772-9	SISTEM SOLUCIONES INTEGRALES SAS	CRR 42 16- 50	3105653107	SISTEMSOLUCIONESINTEGRALES@GAMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94050814	05/08/2026	2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$3,501,810	$859.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1116797260	VALBUENA ANTOLINEZ DIANA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1118547179	SUAREZ SANABRIA JEINNY DOLORES	1	0			S	X																231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
