SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES Y EL SUBDIRECTOR ES EL ING. OSCAR ACEVEDO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.4681 - 2023.
Periodo:	DICIEMBRE/2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución de designación No. 3309 de fecha 23 de octubre de 2021.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMOS O SECTORES A INTERVENIR:

CORREGIMIENTO BUENAVISTA
LONGITUD DE TRAMO A INTERVENIR: 100 m

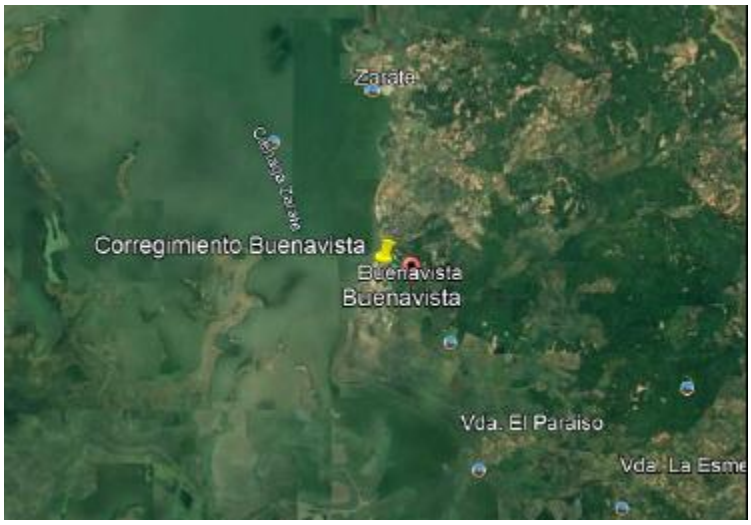


Ilustración 1.

CORREGIMIENTO CERRO GRANDE

LONGITUD DE TRAMO A INTERVENIR: 80 m

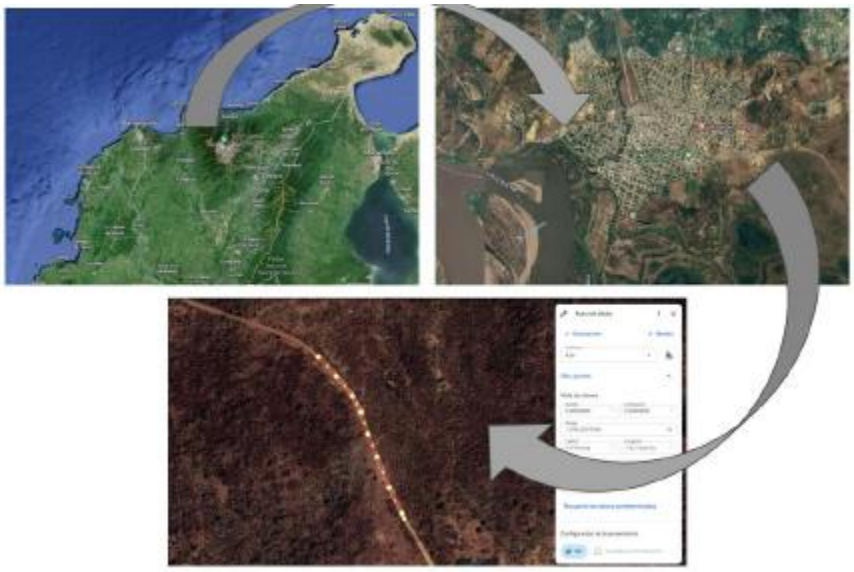


Ilustración 2.

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CORREGIMIENTO BUENAVISTA

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4500 - 2023		
OAC:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA	NIT:	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	SIN ORDEN DE INICIO.		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	N/A		
VALOR INICIAL:	$ 202.335.442,00		
VALOR ACTUAL:	$ 202.335.442,00		
PLAZO INICIAL:	N/A		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	N/A		

CORREGIMIENTO CERRO GRANDE

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4418 - 2023		
OAC:	JUNTA DE ACCION COMUNAL CERRO GRANDE	NIT:	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CERRO GRANDE MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	SIN ORDEN DE INICIO.		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	N/A		
VALOR INICIAL:	$ 202.342.267,00		

VALOR ACTUAL:	$ 202.342.267,00
PLAZO INICIAL:	N/A
SUSPENSIÓN 1:	N/A
REINICIO:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	N/A

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

CORREGIMIENTO BUENAVISTA

REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1348223	10	$ 202.335.442,00	$ 0	$ 202.335.442,00 -

CORREGIMIENTO CERRO GRANDE

REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1302523	10	$ 202.342.267,00	$ 0	$ 202.342.267,00 -

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

No se presentan actas de obras y ajustes tramitados durante el mes de diciembre, ya que no se han registrado avances en las obras.

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
….	….	….	……	……

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.1, para el periodo diciembre de 2023, se reporta un avance para los convenios solidarios, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

CORREGIMIENTO BUENAVISTA

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 202.335.442,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0

CORREGIMIENTO CERRO GRANDE

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 202.342.267,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	-

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

CORREGIMIENTO BUENAVISTA
Meta física programada 0%
Meta física ejecutada 0%

CORREGIMIENTO CERRO GRANDE

Meta física programada 0%
Meta física ejecutada 0%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el mes No se gestionaron ítem no previstos por parte de ninguna de las OAC.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	…

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

CORREGIMIENTO BUENAVISTA

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	…

CORREGIMIENTO CERRO GRANDE

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	…

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

CORREGIMIENTO BUENAVISTA

Convenio Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/mes/Año)	Hasta (Día/mes/Año)
...	...	...	...

CORREGIMIENTO CERRO GRANDE

Convenio Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/mes/Año)	Hasta (Día/mes/Año)
...	...	...	...

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

CORREGIMIENTO BUENAVISTA

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.467.088,40	NB-100295824	22/11/2023	01/03/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 10.116.772,10	NB-100295824	28/12/2023	01/05/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 60.700.632,60	NB-100295824	01/05/2024	01/05/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

Responsabilidad Civil Extracontractual	$232.000.000,00	NB-100073293	22/11/2023	01/05/2024
Otros	$ -	-		

CORREGIMIENTO CERRO GRANDE

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 40.468.453,40	NB-100295389	20/12/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 10.117.113,35	NB-100295389	20/11/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 60.702.680,10	NB-100295389	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual	$232.000.000,00	N.B-100074154	20/11/2023	31/12/2023
Otros	$ -	-		

1.1. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1	…	…	…	…	…

1.2. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

No Oficio	Consecutivo	Asunto	Fecha	Destinatario
1	N/A	Oficio solicitud de adición cto inter. 4681-2023	14/12/2023	Invias – territorial Magdalena
2	C-4681-2023-001	Remisión hojas de vida personal de interventoría	14/12/2023	Invias – territorial Magdalena

No Oficio	Consecutivo	Asunto	Fecha	Destinatario
1	2023-VMAG-025797	Aprobación de pólizas previo a la orden de inicio del contrato no 4681 de 2023	12/12/2023	Ger & Pro SAS
2	2023S-VMAG-028641	Orden de inicio contrato 4681 de 2023	14/12/2023	Ger & Pro SAS

1.3. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4681 - 2023		
CONTRATISTA:	GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S	NIT:	900.155.280-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):			
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PLATO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	14/12/2023		

PLAZO INICIAL:	31/12/2023
VALOR INICIAL:	$ 60.747.877,00
VALOR ADICIONES:	$ 19.464.668,00
ADICIÓN 1:	$ 19.464.668,00
VALOR ACTUAL:	$ 80.212.545,00
SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023
REINICIO SUSP 1:	29/01/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/01/2024

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1311423	10	NACIÓN	$ 60.747.877,00	$ 0	$ 60.747.877,00
1311423	10	NACIÓN	$ 19.464.668,00	$ 0	$ 19.464.668,00
TOTAL	…	…	**$ 80.212.545,00**	**$ 0**	**$ 80.212.545,00**

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	Mes/Año de Ejecución	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA COSTOS 1	**DICIEMBRE 2023**	$ 0	$ 0	…	$ 0
TOTALES	…	**$ 0**	**$ 0**	**…**	**$**

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No.1 para el período de diciembre de 2023 el contrato reporta un avance de 0%

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: $ N/A
Total, inversión ejecutada: $ 0%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
29/12/2023	1	…	29/12/23 - 29/01/24	30/01/2024

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor
1	14/12/2023	$ 19.464.668,00

PRORROGAS

Convenio Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/mes/Año)	Hasta (Día/mes/Año)
…	…	…	…

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 6.074.787,70	47-44-101025640	27/11/2023	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 12.149.575,40	47-44-101025640	27/11/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	$ 18.224.363,10	47-44-101025640	27/11/2023	31/12/2024

PÓLIZA SEGÚN ADICIÓN:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.4**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 8.021.254,50	47-44-101025640	14/12/2023	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 16.042.509,00	47-44-101025640	14/12/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	$ 24.063.763,50	47-44-101025640	14/12/2023	31/12/2024

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Suspensión No.1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/12/23
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: En trámite
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: A la espera de aprobación
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	…	…	…	…	…

2.11 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.13. **OFICIOS GESTIONADOS POR LA SUPERVISIÓN**

En el periodo no se gestionaron oficios.


3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.3 OTROS ASPECTOS.

Cordialmente,



FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA
Director Territorial Magdalena.
Supervisor del contrato 1714-2016
MP N° 13202-097750 BLV
