SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES Y EL SUBDIRECTOR ES EL ING. OSCAR ACEVEDO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.4681 - 2023.
Periodo:	JUNIO/2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución de designación No. 3309 de fecha 23 de octubre de 2021.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMOS O SECTORES A INTERVENIR:

CORREGIMIENTO BUENAVISTA
LONGITUD DE TRAMO A INTERVENIR: 100 m

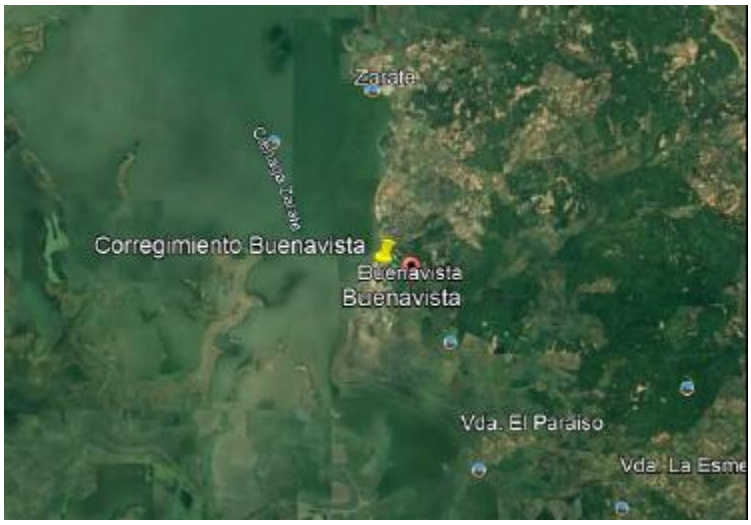


Ilustración 1.

CORREGIMIENTO CERRO GRANDE

LONGITUD DE TRAMO A INTERVENIR: 80 m

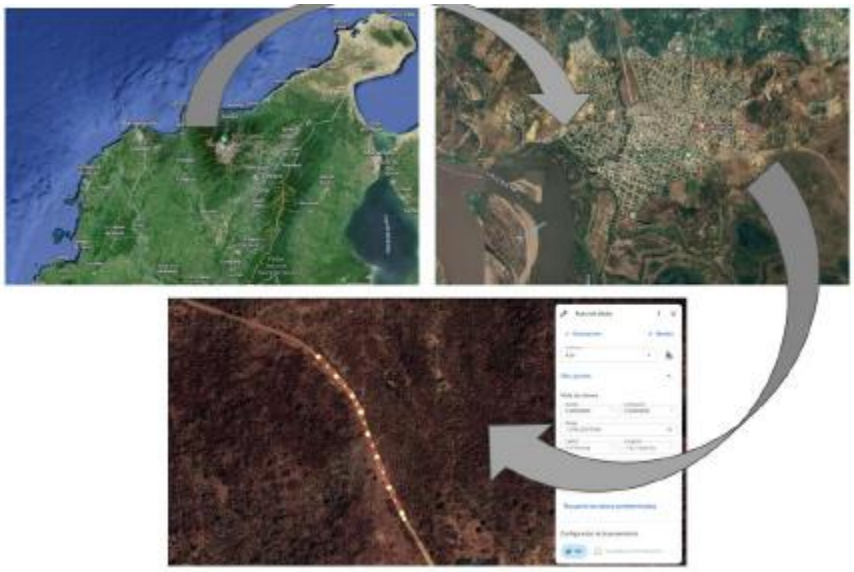


Ilustración 2.

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CORREGIMIENTO BUENAVISTA

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4500 - 2023		
OAC:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA	NIT:	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	21/02/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	20/06/2024		
VALOR INICIAL:	$ 202.335.442,00		
VALOR ACTUAL:	$ 202.335.442,00		
PLAZO INICIAL:	20/06/2024		
PRÓRROGA 1:	30/07/2024		

FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/07/2024

CORREGIMIENTO CERRO GRANDE

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4418 - 2023		
OAC:	JUNTA DE ACCION COMUNAL CERRO GRANDE	NIT:	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CERRO GRANDE MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	26/02/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	25/06/2024		
VALOR INICIAL:	$ 202.342.267,00		
VALOR ACTUAL:	$ 202.342.267,00		
PLAZO INICIAL:	25/06/2024		
PRORROGA No.1	30/07/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/07/2024		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

CORREGIMIENTO BUENAVISTA

REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1348223	10	$ 202.335.442,00	$ 0	$ 202.335.442,00 -

CORREGIMIENTO CERRO GRANDE

REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1302523	10	$ 202.342.267,00	$ 0	$ 202.342.267,00 -

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

No se presentan actas de obras y ajustes tramitados durante el mes de junio, ya que no se han registrado avances en las obras.

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
….	….	….	……	……

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.5, para el periodo junio de 2024, se reporta un avance para convenios solidarios, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

CORREGIMIENTO BUENAVISTA

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 150.062.802,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0

CORREGIMIENTO CERRO GRANDE

REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1302523	10	$ 202.342.267,00	$ 0	$ 202.342.267,00
1302523	10	$ 202.342.267,00	$ 0	$ 202.342.267,00
1302523	10	$ 202.342.267,00	$ 0	$ 202.342.267,00
1302523	10	$ 202.342.267,00	$ 0	$ 202.342.267,00
1302523	10	$ 202.342.267,00	$ 79.360.347	$ 122.981.920,00
1302523	10	$ 202.342.267,00	$ 63.775.790,43	$ 59.206.129,57
TOTAL			$ 143.136.137	$ 59.206.129,57

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0

Amortizado	$ 0
Saldo	-

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

CORREGIMIENTO BUENAVISTA
Meta física programada 0%
Meta física ejecutada 0%

CORREGIMIENTO CERRO GRANDE

Meta física programada 0%
Meta física ejecutada 0%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el mes No se gestionaron ítem no previstos por parte de ninguna de las OAC.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	…

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

CORREGIMIENTO BUENAVISTA

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	…

CORREGIMIENTO CERRO GRANDE

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	…

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

CORREGIMIENTO BUENAVISTA

Convenio Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/mes/Año)	Hasta (Día/mes/Año)
1	20/06/2024	20/06/2024	30/07/2024

CORREGIMIENTO CERRO GRANDE

Convenio Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/mes/Año)	Hasta (Día/mes/Año)
1	24/06/2024	25/06/2024	30/07/2024

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

CORREGIMIENTO BUENAVISTA

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.1**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 40.467.088,40	NB-100295824	22/11/2023	01/03/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 10.116.772,10	NB-100295824	28/12/2023	01/05/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 60.700.632,60	NB-100295824	01/05/2024	01/05/2029

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.1**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual	$232.000.000,00	NB-100073293	22/11/2023	01/05/2024
Otros	$ -	-		

Póliza de Prórroga No.1

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 40.467.088,40	NB-100295824	22/11/2023	Hasta la liquidación del convenio solidario
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 10.116.772,10	NB-100295824	28/12/2023	30/07/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 60.700.632,60	NB-100295824	A partir de la fecha de suscripción del acta de entrega y	Cinco (5) años a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega y

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
			recibo definitivo de obra	recibo definitivo de obra

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.1**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual	$232.000.000,00	NB-100073293	22/11/2023	01/05/2024
Otros	$ -	-		

CORREGIMIENTO CERRO GRANDE

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 40.468.453,40	NB-100295389	20/12/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 10.117.113,35	NB-100295389	20/11/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 60.702.680,10	NB-100295389	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**

Responsabilidad Civil Extracontractual	$232.000.000,00	N.B-100074154	20/11/2023	31/12/2023
Otros	$ -	-		

Póliza de Prórroga No.1

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 40.468.453,40	NB-100295389	20/12/2023	Hasta la liquidación del convenio solidario
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 10.117.113,35	NB-100295389	20/11/2023	30/07/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 60.702.680,10	NB-100295389	A partir de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de obra	Cinco (5) años a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de obra

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual	$232.000.000,00	N.B-100074154	20/11/2023	31/12/2023
Otros	$ -	-		

1.1. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

		ENVIADO A JURÍDICA	ACTUAL		
1	…	…	…	…	…

1.2. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

No Oficio	Consecutivo	Asunto	Fecha	Destinatario
1	C-4681-2023-023	Solicitud de prórroga	04/06/2024	Invias – territorial Magdalena
2	C-4681-2023-024	Remisión informes semanales No 16	05/06/2024	Invias – territorial Magdalena
3	C-4681-2023-025	Concepto de aprobación de profesional residente de convenio 4500 de 2023	07/06/2024	OAC Buenavista
4	C-4681-2023-026	Requisitos para pago de honorarios ing. Residente y contador de Juntas de Acción Comunal	08/06/2024	OAC Cerro Grande y OAC Buenavista
5	C-4681-2023-027	Solicitud de prórroga del contrato de interventoría hasta 25 de junio de 2024	14/06/2024	Invias – territorial Magdalena
6	C-4681-2023-028	Remisión de informes semanales No 17 y 18 del contrato de interventoría 4681 de 2023	14/06/2024	Invias – territorial Magdalena
7	C-4681-2023-029	Justificación de solicitud de adicional No 2 y prórroga No 6 del contrato de la referencia	19/06/2024	Invias – territorial Magdalena
8	C-4681-2023-030	Concepto de aprobación de profesional residente convenio	21/06/2024	OAC Buenavista
9	C-4681-2023-031	Remisión de informes semanales No 19 del contrato de interventoría	22/06/2024	Invias – territorial Magdalena

No Oficio	Consecutivo	Asunto	Fecha	Remitente
1	2024S-VMAG-041041	Reiteración de cumplimiento de las obligaciones del contrato No 4681-2023	26/06/2024	Invias – territorial Magdalena
2	2024S-VMAG-041598	Aprobación de Especialista del contrato de interventoría No. 4681–2023	26/06/2024	Invias – territorial Magdalena

1.3. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4681 - 2023		
CONTRATISTA:	GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S	NIT:	900.155.280-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):			
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PLATO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	14/12/2023		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
VALOR INICIAL:	$ 60.747.877,00		
VALOR ADICIONES:	$ 19.464.668,00		
ADICIÓN 1:	$ 19.464.668,00		

VALOR ACTUAL:	$ 80.212.545,00
SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023
REINICIO SUSP 1:	29/01/2024
FECHA FINALIZACIÓN SEGÚN SUSP 1:	30/01/2024
AMPLIACIÓN SUSP 1:	28/01/2024
REINICIO AMPL 1:	16/02/2024
AMPLIACIÓN SUSP 2:	14/02/2024
REINICIO AMPL 2:	29/02/2024
PRORROGA 1:	30/04/2024
PRORROGA 2:	22/05/2024
PRORROGA 3:	04/06/2024
PRORROGA 4:	05/05/2024
PRORROGA 5:	25/06/2024
PRORROGA 6:	15/07/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15/07/2024

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1311423	10	NACIÓN	$ 60.747.877,00	$ 60.747.877,00	$ 0
1311423	10	NACIÓN	$ 19.464.668,00	$ 14.979.558,00	$ 4.485.110,00
TOTAL	**…**	**…**	**$ 80.212.545,00**	**$ 46.988.340,00**	**$ 4.485.110,00**

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	Mes/Año de Ejecución	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA COSTOS 1	**DICIEMBRE 2023**	$ 0	$ 0	…	$ 0
ACTA COSTOS 2	**FEBRERO -2024**	$ 0	$ 0	…	$ 0
ACTA COSTOS 3	**MARZO -2024**	$ 5.154.000,00	$ 979.260,00	…	$ 6.133.260,00
ACTA COSTOS 4	**ABRIL - 2024**	$ 15.554.000,00	$ 2.955.260,00	…	$ 18.509.260,00
ACTA COSTOS 5	**MAYO - 2024**	$ 18.778.000,00	$ 3.567.820,00	…	$ 22.345.820,00
ACTA COSTOS 5	**JUNIO - 2024**	$ 24.150.500,00	$ 4.588.595,00	…	$ 28.739.095,00

TOTALES	…	**$ 63.636.500,00**	**$ 12.090.935,00**	**…**	**$ 75.727.435,00**

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No.5 para el período de junio de 2024 el contrato reporta un avance de 94,41%

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: $ N/A
Total, inversión ejecutada: $ 94,41%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	…

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor
…	…	…

PRORROGAS

Convenio Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/mes/Año)	Hasta (Día/mes/Año)
4	04/06/2024	04/06/2024	14/06/2024
5	14/06/2024	14/06/2024	25/06/2024
6	25/06/202	26/06/2024	15/07/2024

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 6.074.787,70	47-44-101025640	27/11/2023	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 12.149.575,40	47-44-101025640	27/11/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	$ 18.224.363,10	47-44-101025640	27/11/2023	31/12/2024

PÓLIZA SEGÚN ADICIÓN:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.4**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 8.021.254,50	47-44-101025640	14/12/2023	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 16.042.509,00	47-44-101025640	14/12/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	$ 24.063.763,50	47-44-101025640	14/12/2023	31/12/2024

PÓLIZA SEGÚN PRORROGA No.4

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.7**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**

Cumplimiento	$ 8.021.254,50	47-44-101025640	14/12/2023	14/12/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 16.042.509,00	47-44-101025640	14/12/2023	14/06/2027
Calidad del Servicio	$ 24.063.763,50	47-44-101025640	14/12/2023	14/06/2025

PÓLIZA SEGÚN PRORROGA No. 5 y No.6

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.9**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 8.021.254,50	47-44-101025640	14/12/2023	15/01/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 16.042.509,00	47-44-101025640	14/12/2023	15/07/2027
Calidad del Servicio	$ 24.063.763,50	47-44-101025640	14/12/2023	15/07/2025

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	…	…	…	…	…

2.11 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.13. **OFICIOS GESTIONADOS POR LA SUPERVISIÓN**

En el periodo no se gestionaron oficios.

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO.

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

En el marco de la ejecución de los convenios solidarios, se resalta que no se presentaron inconvenientes en el desarrollo de las actividades técnicas previstas. Tanto las obras como las acciones contempladas en los planes de trabajo se adelantaron conforme a lo estipulado, con el cumplimiento de los estándares de calidad y dentro de los tiempos establecidos, lo que permitió garantizar el adecuado desarrollo de los objetivos propuestos.

3.1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

En lo referente a los aspectos administrativos y financieros, la gestión se desarrolló de manera organizada y transparente, asegurando el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la administración de los recursos. La documentación de soporte fue presentada en los tiempos requeridos, las cuentas fueron debidamente justificadas y se dio cumplimiento a los lineamientos normativos y contractuales, sin que se registraran novedades que afectaran el flujo financiero ni el proceso administrativo.

3.2. OTROS ASPECTOS.

En otros aspectos asociados a la ejecución de los convenios y su interventoría, se destaca la adecuada articulación y comunicación entre las partes involucradas, lo que permitió mantener un ambiente de trabajo colaborativo y armónico. De igual forma, no se reportaron situaciones que generaran retrasos o dificultades adicionales, consolidándose así un balance positivo que refleja el cumplimiento integral de los compromisos adquiridos

REGISTRO FOTOGRÁFICO DIARIO



Ilustración 3. **CERRO GRANDE**



Ilustración 4. **CERRO GRANDE**

Cordialmente,

FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA
Director Territorial Magdalena.
Supervisor del contrato 4681-2023
MP N° 13202-097750 BLV
