SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES Y EL SUBDIRECTOR ES EL ING. OSCAR ACEVEDO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.4681 - 2023.
Periodo:	SEPTIEMBRE/2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución de designación No. 3309 de fecha 23 de octubre de 2021.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMOS O SECTORES A INTERVENIR:

CORREGIMIENTO BUENAVISTA
LONGITUD DE TRAMO A INTERVENIR: 100 m

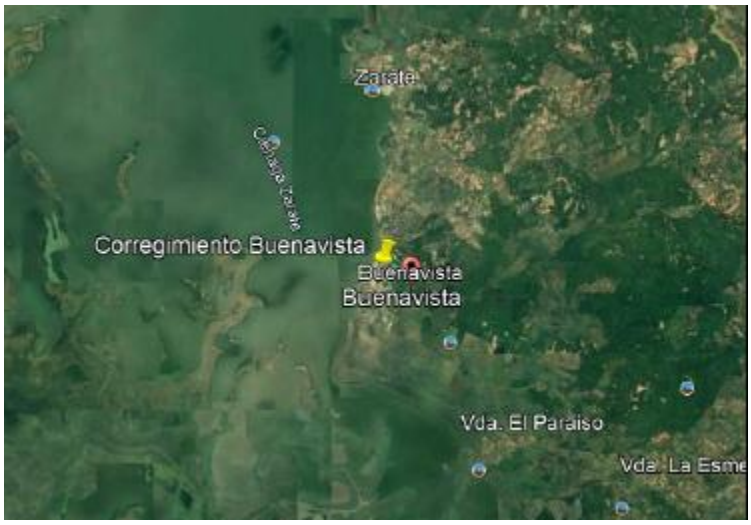


Ilustración 1.

CORREGIMIENTO CERRO GRANDE
LONGITUD DE TRAMO A INTERVENIR: 80 m

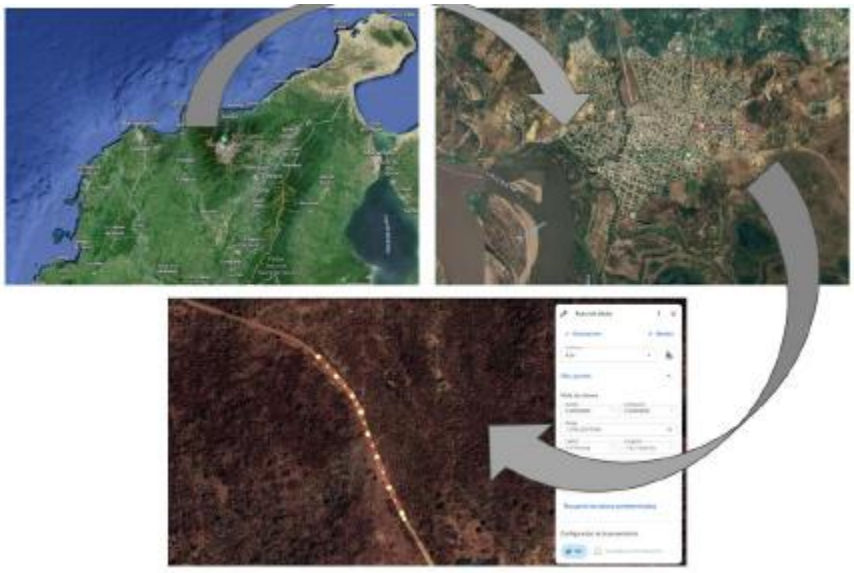


Ilustración 2.

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CORREGIMIENTO BUENAVISTA

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4500 - 2023		
OAC:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA	NIT:	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	21/02/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	20/06/2024		
VALOR INICIAL:	$ 202.335.442,00		
VALOR ACTUAL:	$ 202.335.442,00		
PLAZO INICIAL:	20/06/2024		
PRÓRROGA 1:	30/07/2024		
PRÓRROGA 2:	30/09/2024		
PRÓRROGA 3:	30/10/2024		
SUSPENSIÓN 1:	22/07/2024		
REINICIO SUSP 1:	23/08/2024		
FECHA FINALIZACIÓN SEGÚN SUSP 1:	30/08/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/10/2024		

CORREGIMIENTO CERRO GRANDE

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4418 - 2023		
OAC:	JUNTA DE ACCION COMUNAL CERRO GRANDE	NIT:	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CERRO GRANDE MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL		

	MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
FECHA DE INICIO:	26/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	25/06/2024
VALOR INICIAL:	$ 202.342.267,00
VALOR ACTUAL:	$ 202.342.267,00
PLAZO INICIAL:	25/06/2024
PRORROGA No.1	30/07/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/07/2024

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

CORREGIMIENTO BUENAVISTA 4500

REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1348223	10	$ 202.335.442,00	$ 0	$ 202.335.442,00 -

CORREGIMIENTO CERRO GRANDE 4418

REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1302523	10	$ 202.342.267,00	$ 202.259.267	$ 83.000 -

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

No se presentan actas de obras y ajustes tramitados durante el mes de octubre, ya que no se han registrado avances en las obras.

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
….	….	….	……	……

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.9, para el periodo octubre de 2024, se reporta un avance para convenios solidarios, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

CORREGIMIENTO BUENAVISTA

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 150.062.802,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0

CORREGIMIENTO CERRO GRANDE

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 202.335.442,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 179.873.090,35	88,90%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 179.873.090,35	88,90%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 21.386.176,65	11%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 201.259.267,00	99,5%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	-

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 4500

CORREGIMIENTO BUENAVISTA
Meta física programada 0%
Meta física ejecutada 0%

CORREGIMIENTO CERRO GRANDE 4418

Meta física programada 100%
Meta física ejecutada 100%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el mes No se gestionaron ítem no previstos por parte de ninguna de las OAC.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	…

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

CORREGIMIENTO BUENAVISTA 4500

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	…

CORREGIMIENTO CERRO GRANDE 4418

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	…

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

CORREGIMIENTO BUENAVISTA 4500

Convenio Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/mes/Año)	Hasta (Día/mes/Año)
2	10/09/2024	10/09/2024	30/09/2024
3	25/09/2024	25/09/2024	30/10/2024

CORREGIMIENTO CERRO GRANDE 4418

Convenio Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/mes/Año)	Hasta (Día/mes/Año)
…	…	…	…

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

CORREGIMIENTO BUENAVISTA

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.467.088,40	NB-100295824	22/11/2023	01/03/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 10.116.772,10	NB-100295824	28/12/2023	01/05/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 60.700.632,60	NB-100295824	01/05/2024	01/05/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.1	Vigencia	
			Desde	Hasta

Responsabilidad Civil Extracontractual	$232.000.000,00	NB-100073293	22/11/2023	01/05/2024
Otros	$ -	-		

POLIZA SEGÚN PRORROGAS No.2 Y No.3

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.1**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 40.467.088,40	NB-100295824	22/11/2023	Hasta la liquidación del convenio solidario
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 10.116.772,10	NB-100295824	28/12/2023	30/10/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 60.700.632,60	NB-100295824	A partir de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de obra	Cinco (5) años a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de obra

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.1**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual	$232.000.000,00	NB-100073293	22/11/2023	01/05/2024
Otros	$ -	-		

CORREGIMIENTO CERRO GRANDE

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 40.468.453,40	NB-100295389	20/12/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 10.117.113,35	NB-100295389	20/11/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 60.702.680,10	NB-100295389	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual	$232.000.000,00	N.B-100074154	20/11/2023	31/12/2023
Otros	$ -	-		

1.1. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1	…	…	…	…	…

1.2. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

No Oficio	Consecutivo	Asunto	Fecha	Destinatario
1	C-4681-2023-032	Solicitud de consignación de rendimientos financieros de mayo y junio de 2024	04/07/2024	OAC Cerro Grande y OAC Buenavista
2	C-4681-2023-033	Solicitud de información y/o documento	04/07/2024	OAC Cerro Grande
3	C-4681-2023-034	Remisión de informes semanales No 20 y 21 del contrato de interventoría 4681 de 2023	08/07/2024	Invias – territorial Magdalena
4	C-4681-2023-035	Solicitud de suspensión No 1 de contrato de interventoría de la referencia	22/07/2024	Invias – territorial Magdalena

No Oficio	Consecutivo	Asunto	Fecha	Remitente
1	2024S-VMAG-044451	Respuesta a solicitud adición Contrato de interventoría No 4681-2023	05/07/2024	Invias – territorial Magdalena
2	2024S-VMAG-048674	Aprobación de anexos 6, 7, 8 y 9 pólizas de seguro de cumplimiento No 47-44-101025640	22/07/2024	Invias – territorial Magdalena

1.3. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4681 - 2023		
CONTRATISTA:	GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S	NIT:	900.155.280-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):			

OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PLATO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
FECHA DE INICIO:	14/12/2023
PLAZO INICIAL:	31/12/2023
VALOR INICIAL:	$ 60.747.877,00
VALOR ADICIONES:	$ 19.464.668,00
ADICIÓN 1:	$ 19.464.668,00
ADICIÓN 2:	$ 13.051.920,00
VALOR ACTUAL:	$ 93.264.465,00
SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023
REINICIO SUSP 1:	29/01/2024
FECHA FINALIZACIÓN SEGÚN SUSP 1:	30/01/2024
AMPLIACIÓN SUSP 1:	28/01/2024
REINICIO AMPL 1:	16/02/2024
AMPLIACIÓN SUSP 2:	14/02/2024
REINICIO AMPL 2:	29/02/2024
PRORROGA 1:	30/04/2024
PRORROGA 2:	22/05/2024
PRORROGA 3:	04/06/2024
PRORROGA 4:	05/05/2024
PRORROGA 5:	25/06/2024
PRORROGA 6:	15/07/2024
PRORROGA 7:	23/07/2024
PRORROGA 8:	30/09/2024
SUSPENSIÓN 1:	22/07/2024
REINICIO SUSP 1:	22/08/2024
FECHA FINALIZACIÓN SEGÚN SUSP 1:	23/08/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/09/2024

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1311423	10	NACIÓN	$ 60.747.877,00	$ 60.747.877,00	$ 0
1311423	10	NACIÓN	$ 19.464.668,00	$ 19.049.358,00	$ 415.310,00
TOTAL	**…**	**…**	**$ 80.212.545,00**	**$ 79.797.235,00**	**$ 415.310,00**

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	Mes/Año de Ejecución	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA COSTOS 1	**DICIEMBRE 2023**	$ 0	$ 0	…	$ 0
ACTA COSTOS 2	**FEBRERO -2024**	$ 0	$ 0	…	$ 0
ACTA COSTOS 3	**MARZO -2024**	$ 5.154.000,00	$ 979.260,00	…	$ 6.133.260,00
ACTA COSTOS 4	**ABRIL - 2024**	$ 15.554.000,00	$ 2.955.260,00	…	$ 18.509.260,00
ACTA COSTOS 5	**MAYO - 2024**	$ 18.778.000,00	$ 3.567.820,00	…	$ 22.345.820,00
ACTA COSTOS 6	**JUNIO - 2024**	$ 24.150.500,00	$ 4.588.595,00	…	$ 28.739.095,00
ACTA COSTOS 7	**JULIO - 2024**	$ 3.420.000,00	$ 649.800,00	…	$ 4.069.800,00
ACTA COSTOS 8	**AGOSTO – 2024**	…	…	…	…
ACTA COSTOS 9	**SEPTIEMBRE - 2024**	…	…	…	…
TOTALES	…	**$ 67.056.500,00**	**$ 12.740.735,00**	**…**	**$ 79.797.235,00**

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No.9 para el período de octubre de 2024 el contrato reporta un avance de 99,48%

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: $ N/A
Total, inversión ejecutada: $ 99,48%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	…

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor
2	17/09/2024	$ 13.051.920,00

PRORROGAS

Convenio Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/mes/Año)	Hasta (Día/mes/Año)
9	30/09/2024	30/09/2024	30/10/2024

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 6.074.787,70	47-44-101025640	27/11/2023	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 12.149.575,40	47-44-101025640	27/11/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	$ 18.224.363,10	47-44-101025640	27/11/2023	31/12/2024

PÓLIZA SEGÚN ADICIÓN No. 2 y PRORROGA No.9:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.11**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 9.326.446,50	47-44-101025640	14/12/2023	30/04/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 18.652.893,00	47-44-101025640	14/12/2023	30/10/2027
Calidad del Servicio	$ 27.979.339,50	47-44-101025640	14/12/2023	30/10/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga No.9

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/09/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: En trámite

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: A la espera de aprobación

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	…	…	…	…	…

2.11 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.13. **OFICIOS GESTIONADOS POR LA SUPERVISIÓN**

En el periodo no se gestionaron oficios.

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO.

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

En el marco de la ejecución de los convenios solidarios, se resalta que no se presentaron inconvenientes en el desarrollo de las actividades técnicas previstas. Tanto las obras como las acciones contempladas en los planes de trabajo se adelantaron conforme a lo estipulado, con el cumplimiento de los estándares de calidad y dentro de los tiempos establecidos, lo que permitió garantizar el adecuado desarrollo de los objetivos propuestos.

3.1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

En lo referente a los aspectos administrativos y financieros, la gestión se desarrolló de manera organizada y transparente, asegurando el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la administración de los recursos. La documentación de soporte fue presentada en los tiempos requeridos, las cuentas fueron debidamente justificadas y se dio cumplimiento a los lineamientos normativos y contractuales, sin que se registraran novedades que afectaran el flujo financiero ni el proceso administrativo.

3.2. OTROS ASPECTOS.

En otros aspectos asociados a la ejecución de los convenios y su interventoría, se destaca la adecuada articulación y comunicación entre las partes involucradas, lo que permitió mantener un ambiente de trabajo colaborativo y armónico. De igual forma, no se reportaron situaciones que generaran retrasos o dificultades adicionales, consolidándose así un balance positivo que refleja el cumplimiento integral de los compromisos adquiridos.

- Para el Convenio 4418 de 2023 – OAC Cerro Grande, el proyecto de placa huella se encuentra actualmente culminado, con un 100% de su ejecución.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DIARIO



Ilustración 3. **CERRO GRANDE**

Cordialmente,



FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA
Director Territorial Magdalena.
Supervisor del contrato 4681-2023
MP N° 13202-097750 BLV
