**SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES Y EL SUBDIRECTOR ES EL ING. OSCAR ACEVEDO**
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.4681 - 2023. |
| **Periodo:** | ABRIL/2025 |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | Resolución de designación No. 3309 de fecha 23 de octubre de 2021. |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

**TRAMOS O SECTORES A INTERVENIR:**

**CORREGIMIENTO BUENAVISTA**
**LONGITUD DE TRAMO A INTERVENIR: 100 m**

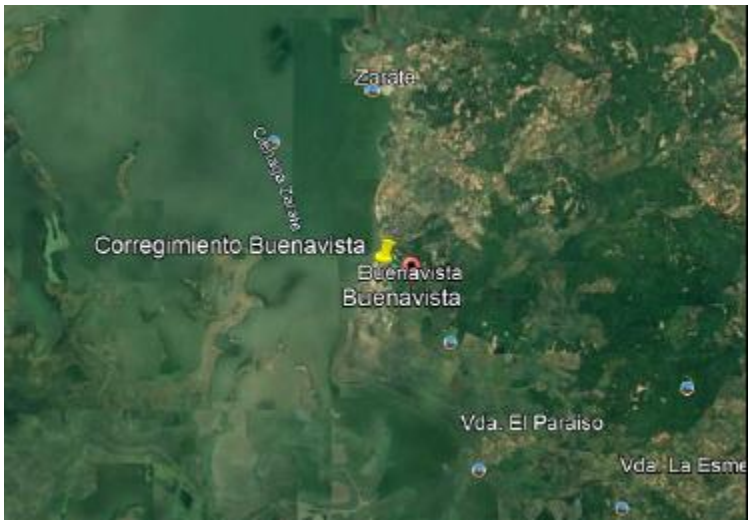



Ilustración 1.

**CORREGIMIENTO CERRO GRANDE**
**LONGITUD DE TRAMO A INTERVENIR: 80 m**

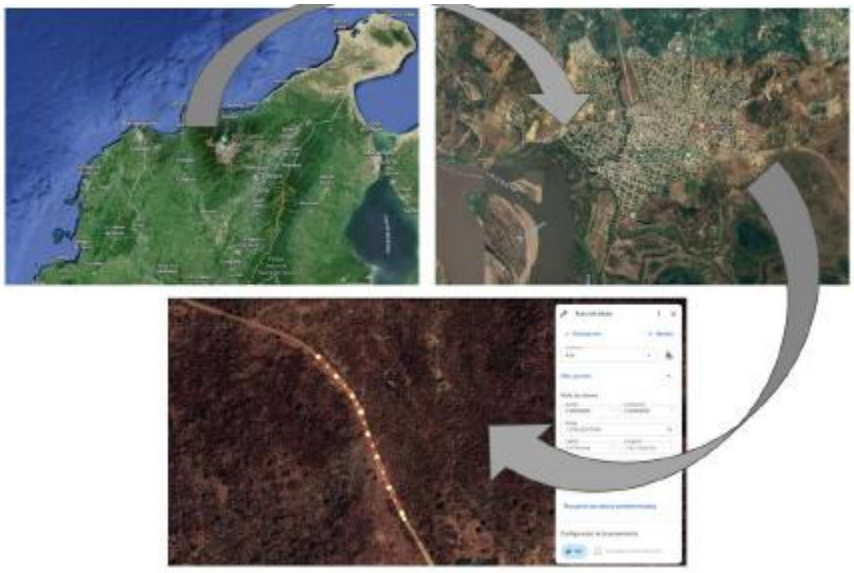


Ilustración 2.

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

**CORREGIMIENTO BUENAVISTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 4500 - 2023 | | |
| **OAC:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA | NIT: | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 21/02/2024 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 20/06/2024 | | |
| **VALOR INICIAL:** | $ 202.335.442,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 202.335.442,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | 20/06/2024 | | |
| **PRÓRROGA 1:** | 30/07/2024 | | |
| **PRÓRROGA 2:** | 30/09/2024 | | |

| | |
|---|---|
| **PRÓRROGA 3:** | 30/10/2024 |
| **PRÓRROGA 4:** | 10/12/2024 |
| **PRÓRROGA 5:** | 28/02/2025 |
| **PRÓRROGA 6:** | 30/04/2025 |
| **SUSPENSIÓN 1:** | 22/07/2024 |
| **REINICIO SUSP 1:** | 23/08/2024 |
| **SUSPENSIÓN 2:** | 11/12/2024 |
| **REINICIO SUSP 2:** | 26/12/2024 |
| **FECHA FINALIZACIÓN SEGÚN SUSP 1:** | 30/08/2024 |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 28/02/2025 |

**CORREGIMIENTO CERRO GRANDE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 4418 - 2023 | | |
| **OAC:** | JUNTA DE ACCION COMUNAL CERRO GRANDE | NIT: | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CERRO GRANDE MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 26/02/2024 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 25/06/2024 | | |
| **VALOR INICIAL:** | $ 202.342.267,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 202.342.267,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | 25/06/2024 | | |
| **PRORROGA No.1** | 30/07/2024 | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 30/07/2024 | | |

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

**CORREGIMIENTO BUENAVISTA 4500**

| REGISTRO | RECURSO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|
| 1348223 | 10 | $ 202.335.442,00 | $ 202.303.595,63 | $ 31.846,00 |

**CORREGIMIENTO CERRO GRANDE 4418**

| REGISTRO | RECURSO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|
| 1302523 | 10 | $ 202.342.267,00 | $ 202.259.267 | $ 83.000,00 |

### 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

No se presentan actas de obras y ajustes tramitados durante el mes de abril, ya que no se han registrado avances en las obras.

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| …. | …. | …. | …… | …… |

### 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.15, para el periodo abril de 2025, se reporta un avance para convenios solidarios, relacionado a continuación:

#### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**CORREGIMIENTO BUENAVISTA**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 202.335.442,00 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 148.697.661,92 | 73,49% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 148.697.661,92 | 73,49% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 53.605.934 | 26,49% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 202.303.595,63 | 99,98% |

**CORREGIMIENTO CERRO GRANDE**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 202.342.267,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 179.873.090,35 | 88,90% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 179.873.090,35 | 88,90% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 22.386.176,65 | 11% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 202.259.267,00 | 99,96% |

#### 1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ 0 |
| **Amortizado** | $ 0 |
| **Saldo** | - |

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 4500**

**CORREGIMIENTO BUENAVISTA**
Meta física programada 100%
Meta física ejecutada 100%%

**CORREGIMIENTO CERRO GRANDE 4418**

Meta física programada 100%
Meta física ejecutada 100%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el mes No se gestionaron ítem no previstos por parte de ninguna de las OAC.

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| … | … | … |

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

1.7. **PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| … | … | … |

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

**CORREGIMIENTO BUENAVISTA 4500**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACIÓN No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA | FECHA DE REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | 3 | 1 | 14/03/25-31/03/25 | 31/03/2025 |

**CORREGIMIENTO CERRO GRANDE 4418**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACIÓN No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA | FECHA DE REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | … |

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

**CORREGIMIENTO BUENAVISTA 4500**

| Convenio Adicional No. | Fecha | Periodo | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (Día/mes/Año) | Hasta (Día/mes/Año) |
| 6 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 30/04/2025 |

**CORREGIMIENTO CERRO GRANDE 4418**

| Convenio Adicional No. | Fecha | Periodo | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (Día/mes/Año) | Hasta (Día/mes/Año) |
| … | … | … | … |

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: Prorroga No.6

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 31/03/2025

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:** En trámite

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:** A la espera de aprobación

**PÓLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO

**CORREGIMIENTO BUENAVISTA**

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.7** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $ 40.467.088,40 | NB-100295824 | 22/11/2023 | 03/03/2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | $ 10.116.772,10 | NB-100295824 | 28/12/2023 | 30/04/2028 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | $ 60.700.632,60 | NB-100295824 | 20/05/2024 | 20/05/2030 |

**Garantía de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.1** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | $232.000.000,00 | NB-100073293 | 22/11/2023 | 01/05/2024 |
| Otros | $ - | - | | |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: Prorroga No.1

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 25/06/2024

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:** En trámite

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:** A la espera de aprobación

**PÓLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO

**CORREGIMIENTO CERRO GRANDE**

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.4** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $ 40.468.453,40 | NB-100295389 | 20/11/2023 | 30/07/2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | $ 10.117.113,35 | NB-100295389 | 20/11/2023 | 30/07/2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | $ 60.702.680,10 | NB-100295389 | 30/07/2024 | 30/07/2029 |

**Garantía de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | $232.000.000,00 | N.B-100074154 | 20/11/2023 | 31/12/2023 |
| Otros | $ - | - | | |

1.1. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| **No.** | **CAUSAL INTERPUESTA** | **No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA** | **ESTADO ACTUAL** | **FECHA AUDIENCIA** | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | … | … | … | … | … |

1.2. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| No Oficio | Consecutivo | Asunto | Fecha | Destinatario |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C-4681-2023-032 | Solicitud de consignación de rendimientos financieros de mayo y junio de 2024 | 04/07/2024 | OAC Cerro Grande y OAC Buenavista |
| 2 | C-4681-2023-033 | Solicitud de información y/o documento | 04/07/2024 | OAC Cerro Grande |
| 3 | C-4681-2023-034 | Remisión de informes semanales No 20 y 21 del contrato de interventoría 4681 de 2023 | 08/07/2024 | Invias – territorial Magdalena |
| 4 | C-4681-2023-035 | Solicitud de suspensión No 1 de contrato de interventoría de la referencia | 22/07/2024 | Invias – territorial Magdalena |

| No Oficio | Consecutivo | Asunto | Fecha | Remitente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024S-VMAG-044451 | Respuesta a solicitud adición Contrato de interventoría No 4681-2023 | 05/07/2024 | Invias – territorial Magdalena |
| 2 | 2024S-VMAG-048674 | Aprobación de anexos 6, 7, 8 y 9 pólizas de seguro de cumplimiento No 47-44-101025640 | 22/07/2024 | Invias – territorial Magdalena |

1.3. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

## 2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.** | 4681 - 2023 | | |
| **CONTRATISTA:** | GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S | NIT: | 900.155.280-6 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):** | | | |

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PLATO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| **FECHA DE INICIO:** | 14/12/2023 |
| **PLAZO INICIAL:** | 31/12/2023 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 60.747.877,00 |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 19.464.668,00 |
| **ADICIÓN 1:** | $ 19.464.668,00 |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 80.212.545,00 |
| **FECHA FINALIZACIÓN SEGÚN SUSP 1:** | 30/01/2024 |
| **AMPLIACIÓN SUSP 1:** | 28/01/2024 |
| **REINICIO AMPL 1:** | 16/02/2024 |
| **AMPLIACIÓN SUSP 2:** | 14/02/2024 |
| **REINICIO AMPL 2:** | 29/02/2024 |
| **PRORROGA 1:** | 30/04/2024 |
| **PRORROGA 2:** | 22/05/2024 |
| **PRORROGA 3:** | 04/06/2024 |
| **PRORROGA 4:** | 5/05/2024 |
| **PRORROGA 5:** | 25/06/2024 |
| **PRORROGA 6:** | 15/07/2024 |
| **PRORROGA 7:** | 23/07/2024 |
| **PRORROGA 8:** | 30/09/2024 |
| **PRORROGA 9:** | 30/10/2024 |
| **PRORROGA 10:** | 15/12/2024 |
| **PRORROGA 11:** | 28/02/2025 |
| **PRORROGA 12:** | 30/04/2025 |
| **SUSPENSIÓN 1:** | 1/01/2024 - 25/02/2024 |
| **REINICIO SUSP 1:** | 26/02/2024 |
| **SUSPENSIÓN 2:** | 22/07/2024 - 27/08/2024 |
| **REINICIO SUSP 2:** | 27/08/2024 |
| **SUSPENSIÓN 3:** | 30/08/2024 - 10/09/2024 |
| **REINICIO SUSP 3:** | 11/09/2024 |
| **SUSPENSIÓN 4:** | 11/12/2024 - 26/12/2024 |
| **REINICIO SUSP 4:** | 27/12/2024 |
| **SUSPENSIÓN 5:** | 28/02/2025 – 30/03/2025 |
| **REINICIO SUSP 5:** | 1/04/2024 |
| **FECHA FINALIZACIÓN SEGÚN SUSP 1:** | 23/08/2024 |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 30/04/2025 |

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1311423 | 10 | NACIÓN | $ 60.747.877,00 | $ 60.747.877,00 | $ 0 |
| 1311423 | 10 | NACIÓN | $ 19.464.668,00 | $ 19.049.358,00 | $ 0 |
| 1311423 | 10 | NACIÓN | $ 13.051.920,00 | $ 6.210.610,00 | $ 91.630,00 |
| **TOTAL** | **…** | **…** | **$ 93.264.465,00** | **$ 93.172.835,00** | **$ 91.630,00** |

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | Mes/Año de Ejecución | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA COSTOS 1** | **DICIEMBRE 2023** | $ 0 | $ 0 | … | $ 0 |
| **ACTA COSTOS 2** | **FEBRERO -2024** | $ 0 | $ 0 | … | $ 0 |
| **ACTA COSTOS 3** | **MARZO -2024** | $ 5.154.000,00 | $ 979.260,00 | … | $ 6.133.260,00 |
| **ACTA COSTOS 4** | **ABRIL - 2024** | $ 15.554.000,00 | $ 2.955.260,00 | … | $ 18.509.260,00 |
| **ACTA COSTOS 5** | **MAYO - 2024** | $ 18.778.000,00 | $ 3.567.820,00 | … | $ 22.345.820,00 |
| **ACTA COSTOS 6** | **JUNIO - 2024** | $ 24.150.500,00 | $ 4.588.595,00 | … | $ 28.739.095,00 |
| **ACTA COSTOS 7** | **JULIO - 2024** | $ 3.420.000,00 | $ 649.800,00 | … | $ 4.069.800,00 |
| **ACTA COSTOS 8** | **AGOSTO – 2024** | … | … | … | … |
| **ACTA COSTOS 9** | **SEPTIEMBRE - 2024** | … | … | … | … |
| **ACTA COSTOS 10** | **OCTUBRE – 2024** | $ 349.000 | $ 66.310,00 | … | $ 415.310,00 |
| | | $ 155.000 | $ 29.459,00 | … | $ 184.450,00 |
| **ACTA COSTOS 11** | **NOVIEMBRE – 2024** | **…** | **…** | **…** | **…** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA COSTOS 12** | **DICIEMBRE – 2024** | **…** | **…** | **…** | **…** |
| **ACTA COSTOS 13** | **ENERO – 2024** | **…** | **…** | **…** | **…** |
| **ACTA COSTOS 14** | **FEBRERO – 2024** | $ 5.064.000,00 | $ 962.160,00 | | $ 6.026.160,00 |
| **ACTA COSTOS 15** | **MARZO – 2024** | **…** | **…** | **…** | **…** |
| **ACTA COSTOS 16** | **ABRIL – 2024** | $ 5.672.000,00 | $ 1.077.680,00 | **…** | $ 6.749.680,00 |
| **TOTALES** | … | **$ 78.296.500,00** | **$ 14.876.335,00** | **…** | **$ 93.172.835,00** |

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No.15 para el período de abril de 2024 el contrato reporta un avance de 99,90%

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: $ N/A
Total, inversión ejecutada: $ 99,90%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | 5 | 1 | 14/03/25 – 31/03/25 | 31/03/2025 |

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

**PRORROGAS**

| Convenio Adicional No. | Fecha | Periodo | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (Día/mes/Año) | Hasta (Día/mes/Año) |
| 12 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 30/04/2025 |

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 6.074.787,70 | 47-44-101025640 | 27/11/2023 | 30/06/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A | | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $ 12.149.575,40 | 47-44-101025640 | 27/11/2023 | 31/12/2026 |
| Calidad del Servicio | $ 18.224.363,10 | 47-44-101025640 | 27/11/2023 | 31/12/2024 |

**PÓLIZA SEGÚN PRORROGA No.12**

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No.19 | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 9.326.446,50 | 47-44-101025640 | 14/12/2023 | 31/10/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A | | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $ 18.652.893,00 | 47-44-101025640 | 14/12/2023 | 30/04/2028 |
| Calidad del Servicio | $ 27.979.339,50 | 47-44-101025640 | 14/12/2023 | 30/04/2026 |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: Prorroga No.12
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 31/03/2025
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:** En tramite

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:** A la espera de aprobación

**PÓLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | … | … | … | … | … |

2.11 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

2.13. **OFICIOS GESTIONADOS POR LA SUPERVISIÓN**

En el periodo no se gestionaron oficios.

## 3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO.

### 3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

En el marco de la ejecución de los convenios solidarios, se resalta que no se presentaron inconvenientes en el desarrollo de las actividades técnicas previstas. Tanto las obras como las acciones contempladas en los planes de trabajo se adelantaron conforme a lo estipulado, con el cumplimiento de los estándares de calidad y dentro de los tiempos establecidos, lo que permitió garantizar el adecuado desarrollo de los objetivos propuestos.

### 3.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

En lo referente a los aspectos administrativos y financieros, la gestión se desarrolló de manera organizada y transparente, asegurando el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la administración de los recursos. La documentación de soporte fue presentada en los tiempos requeridos, las cuentas fueron debidamente justificadas y se dio cumplimiento a los lineamientos normativos y contractuales, sin que se registraran novedades que afectaran el flujo financiero ni el proceso administrativo.

## 4. OTROS ASPECTOS.

En otros aspectos asociados a la ejecución de los convenios y su interventoría, se destaca la adecuada articulación y comunicación entre las partes involucradas, lo que permitió mantener un ambiente de trabajo colaborativo y armónico. De igual forma, no se reportaron situaciones que generaran retrasos o dificultades adicionales, consolidándose así un balance positivo que refleja el cumplimiento integral de los compromisos adquiridos.

- Para el Convenio 4418 de 2023 – OAC Cerro Grande, el proyecto de placa huella se encuentra actualmente culminado, con un 100% de su ejecución.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DIARIO**




Ilustración 3. **CERRO GRANDE**

Cordialmente,

**FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Director Territorial Magdalena.
Supervisor del contrato 4681-2023
MP N° 13202-097750 BLV
