C.I.R-1724-2024-SDHT-1000

Bogota, Julio 6 de 2026

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
ATT CAMILO EDUARDO TORRES
Director Operaciones
ATT LAURA JULIANA SANCHEZ
Apoyo a la supervisión

Referencia: CONTRATO SDHT-1724-2024

Asunto: INFORME SEMANAL INTERVENTORIA

Cordial saludo

Anexo a la presente hago entrega a usted del informe semanal 30 de interventoría, correspondientes al contrato 1755-2024.

Agradecemos su atención

RL CONSORCIO INGESCOR R 2024

SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT PROYECTO - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	CODIGO No.	
	VERSIÓN:	V-0
	FECHA:	enero-25
	PÁGINA:	1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN	6	7	2026	2. INFORME No.	30	3. SEMANA No.	30	4. PERIODO	30	junio	AL	5	julio

5. NOMBRE DE LA INTERVENTORIA	CONSORCIO INGESCOR R 2024	6. NIT	901.901.440-2

7. CONTRATO No:	1724-2024	8. FECHA CONTRATO:	20/12/2024	9. VALOR CONTRATO:	$ 764.387.531,00
10. FECHA ACTA INICIO:	5/05/2025	11. FECHA DE TERMINACIÓN:	4/02/2026	12. PLAZO:	9 MESES

13. OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ESPACIO PUBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

15. NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL HABITAT	16. NIT	901.901.933-1

17. CONTRATO No:	1755-2024	18. FECHA CONTRATO:	30/12/2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 1.526.039.033,90
20. FECHA ACTA INICIO:	5/05/2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	4/02/2026	22. PLAZO:	9 MESES

23. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ESPACIO PUBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT LOTE 2

24. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA - OBRA

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor Inicial	$ 1.526.039.033,90	Valor Inicial	$ 764.387.531,00
Valor Adicional 1	$ -	Valor Adicional 1	$ -
valor Adicional 2	$ -	valor Adicional 2	$ -
Valor Actualizado	$ 1.526.039.033,90	Valor Actualizado	$ 764.387.531,00
Valor ETAPA 1	$ 220.442.868,00	Valor ETAPA 1	$ 194.522.541,00
Valor ETAPA 2	$ 1.305.596.165,90	Valor ETAPA 2	$ 569.864.990,00
Plazo Inicial	9 MESES	Plazo Inicial	9 MESES
Plazo Prórroga 1		Plazo Prórroga 1	
Plazo Actualizado		Plazo Actualizado	
Fecha de Iniciación	5/05/2025	Fecha de Iniciación	5/05/2025
Fecha de suspensión No.1	14/10/2025	Fecha de suspensión No.1	14/10/2025
Fecha de ampliación No.1 suspensión No.1	13/11/2025	Fecha de ampliación No.1 suspensión No.1	13/11/2025
Fecha de ampliación No.2 suspensión No.1	13/12/2025	Fecha de ampliación No.2 suspensión No.1	13/12/2025
Fecha de ampliación No.3 suspensión No.1	13/01/2026	Fecha de ampliación No.3 suspensión No.1	13/01/2026
Fecha de ampliación No.4 suspensión No.1	13/02/2026	Fecha de ampliación No.4 suspensión No.1	13/02/2026
Fecha de ampliación No.5 suspensión No.1	30/03/2026	Fecha de ampliación No.5 suspensión No.1	30/03/2026
Fecha de reinicio No.1	13/05/2025	Fecha de reinicio No.1	13/05/2025
Fecha de Terminación Inicial	4/02/2026	Fecha de Terminación Inicial	4/02/2026
Fecha de Terminación Actual	5/09/2026	Fecha de Terminación Actual	5/09/2026

25. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE CONTRATISTA DE OBRA

VR. CONTRATO	100%	$ 1.526.039.034,00

No. Acta	Valor del Acta	VR. Deducciones	Fecha Acta
Acta No. 1	$ 88.177.147,20	$ 22.044.286,80	27/04/2026
Acta No. 2	$ -	$ -	
Acta No. 3	$ -	$ -	
Acta No. 4	$ -	$ -	
Acta No. 5	$ -	$ -	
Acta No. 6	$ -	$ -	
Acta No. 7	$ -	$ -	
Acta No. 8	$ -	$ -	

VALOR EJECUTADO	$ 88.177.147,20	% Avc.	5,78%
VALOR POR EJECUTAR	$ 1.437.861.886,70	% Falt.	94,22%
VALOR RETEGARANTIA	$ 71.893.094,34	% Avc.	4,71%
VALOR POR DEDUCCIÓN	$ 22.044.286,80	% Falt.	1,44%

CONTRATO DE INTERVENTORIA

VR. CONTRATO	100%	$ 764.387.531,00

No. Acta	Valor Acumulado	VR. Deducciones	Fecha Acta
Acta No. 1	$ 34.241.247,22	$ -	27/04/2026
Acta No. 2	$ -	$ -	
Acta No. 3	$ -	$ -	
Acta No. 4	$ -	$ -	
Acta No. 5	$ -	$ -	
Acta No. 6	$ -	$ -	
Acta No. 7	$ -	$ -	
Acta No. 8	$ -	$ -	


VALOR EJECUTADO	$ 34.241.247,22	% Avc.	4,48%
VALOR POR EJECUTAR	$ 730.146.283,78	% Falt.	95,52%
VALOR POR DEDUCCIÓN	$ -	% Falt.	0,00%

26. AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO DURANTE LA SEMANA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado Anterior	20,95%	20,75%	0,21%
Durante la Semana	6,71%	6,96%	-0,26%
Actual Acumulado	27,66%	27,71%	-0,05%

PROGRAMADO	SEMAMA	ACUMULADO
PROGRAMADO	6,96%	27,71%
VALOR PROGRAMADO	$ 106.264.246,96	$ 422.880.140,26

EJECUTADO	SEMAMA	ACUMULADO
EJECUTADO	6,71%	27,66%
VALOR EJECUTADO	$ 102.363.527,97	$ 422.124.764,72

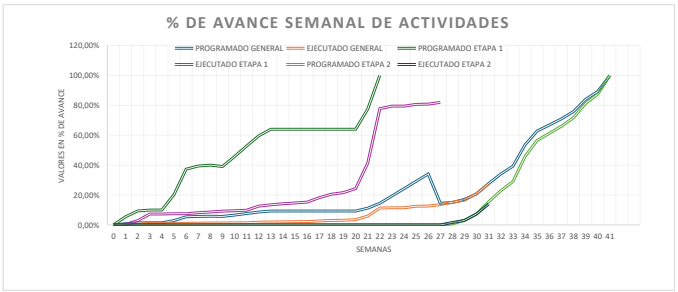

CONTRATO GENERAL		ETAPA 1		ETAPA 2	
PROGRAMADO	27,71%	PROGRAMADO	100,00%	PROGRAMADO	15,50%
EJECUTADO	27,66%	EJECUTADO	100,00%	EJECUTADO	14,08%
DIAS	- 0,13	DIAS	0,00	DIAS	-2,14

27. CONTROL DE PROGRAMACION - COMPONENTE TECNICO

DESCRIPCION	FECHA INICIO	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL	DIAS ATRASO	% AVANCE		OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	
Etapa 1 - Diagnóstico, estudios, diseños definitivos y aprobaciones	05-05-25	04-07-25			100		
FASE 1	05-05-25	04-06-25	10-09-25	98	100	100%	
FASE 2	05-06-25	04-07-25	03-10-25	91	100	100%	
FASE 3	05-07-25	04-10-25			100	45%	
copilacion aprobaciones y documentacioin final		13-05-26			100		ok
documento tecnico final componente arquitectonico y urbano		13-05-26	28-05-26	15	100	100%	ok
planimetria y detalles etapa 2		13-05-26	28-05-26	15	100	100%	ok
diseño definitivo pavimentos		13-05-26	28-05-26	15	100	100%	ok
informe aprobaciones SDM		13-05-26			100		ok
diseño definitivo SUDS		13-05-26	28-05-26	15	100	100%	ok
Aprobacion y documentos gestion redes secas		13-05-26			100		ok
Presupuesto V3		13-05-26	02-06-26	20	100	100%	ok
cronograma definitivo		13-05-26	27-05-26	14	100	100%	ok
plan de compras etapa 2		13-05-26	01-06-26	19	100	100%	ok
Acta WR		13-05-26			100		ok
Cronograma alistamiento etapa 2		13-05-26			100		ok
Informe general cierre etapa 1 (fases 1, 2 y 3)		13-05-26			100		ok
equipo minimo		13-05-26	02-06-26	20	100	100%	ok
Manejo de escombros		13-05-26			100		ok
Tramite se permisos provisionales		13-05-26			100		ok
Instalacion de vallas		13-05-26			100		ok
Actas de vecindad de inicio etapa 2		13-05-26			100		ok
Reuniones previas de Inicio		13-05-26	05-06-26	23	100	100%	ok
SUBSANACION INFORMES MENSUALES		13-05-26			100		ok
ETAPA 2 - CONSTRUCCION	14-05-26	05-09-26	05-09-26		0,65%	7,37%	
Actividades preelimianares	04-06-26	10-06-26			100,00%	100,00%	
Excavaciones y rellenos	17-06-26	22-06-26			100,00%	22,65%	
Demoliciones	04-06-26	05-09-26			100,00%	71,48%	
Redes humedas y secas	04-06-26	05-09-26			23,00%	17,59%	
Plan de manejo de trafico	04-06-26	05-09-26			30,00%	51,16%	
Construccion corredor Alcala	14-05-26	05-09-26	08-06-26		100,00%	100,00%	

CONTROL DE TRAMITES Y PERMISOS

ENTIDAD	INCIDENCIA INICIO	ESTADO ACTUAL	TIPO DE TRAMITE	OBSERVACIONES
SDM	INDISPENSABLE	TRAMITE	ET	sale aprobacion 26-6-2026
SDM	INDISPENSABLE	APROBADO	PMT	sale aprobacion 4-6-2026
ACTA WR	ALTA	APROBADO		
EAAB	ALTA	APROBADO		
UAESP	MEDIA	APROBADO		
ENEL	MEDIA	APROBADO		

	SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT PROYECTO - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	CODIGO No.	
		VERSIÓN:	V-0
		FECHA:	enero-25
		PÁGINA:	1 de 1

28. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE TÉCNICO

COMPONENTE	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACION
ACTIVIDADES PREELIMINARES	Se relizan cambios de tipo de cerramiento con polisombra azul a mitad y mitad verde.	
EXCAVACIONES Y RELLENO	Se realiza el perfilado de la primera capa para compactación con la retroexcavadora y en las esquinas de manera manual, por contener redes. Se realiza la cmpactacion de la capa natural y se realiza el extendido de la primera capa de sub base granular que es compactada con vibrocompactador de media tonelada.	
DEMOLICIONES	Se realiza la demolición de las cajas existentes para la reposicion de las nuevas, la demolicion del concreto y su retiro a otadero certifiado	
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT	Se realizan actividades de cargue de material de excavación, por ende el uso de paletero de obra para entrada y salida de vehiculos durante la semana. El manejo del trafico para la limpieza de la actividad CIPP, el alquiler de la señal de transito tipo barricada y su respectivo cerramiento en colombinas para el paso peatonal	
REDES HUMEDAS Y SECAS	Se realizan actividades de CIPP en la red de aguas residuales del area. Se realiza la limpieza de las tuberias, verificacion de espesores, extracción y limpieza de las tuberias y comienza la implementacion de la resina de GRP en la tuberia de 16" dando por terminado este primer tramo.	
SUDS 01 ZONA DE BIO RETENCION 01	Empieza la figuracion del acero de refuerzo para el SUDS 01.	

29. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE SST - AMBIENTAL

Cronograma y/o Programa de trabajo, unificado con demás componentes: técnico, social, ambiental, SST.	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de trabajo SST y ambiental.	
Diagnóstico - Línea Base Ambiental.	Control y seguimiento a la prevención y mitigación de los impactos ambientales generado.	
Identificación de determinantes ambientales, tramites y permisos requeridos por la AAC, para viabilizar el proyecto.	Revisión y seguimiento a los determinantes ambientales, tramites y permisos requeridos por la AAC.	
Diagnóstico - Línea Base Ambiental FINAL.	Control y seguimiento a la prevención y mitigación de los impactos ambientales generados.	
Diligenciamiento Matriz de aspectos e impactos ambientales –V2 (PG03-FO796).	Seguimiento a la implementación de los controles para prevenir la materialización de los impactos ambientales potenciales a generar en obra.	
Matriz de Identificación de riesgos y evaluación de peligros del contrato.	Inspección, seguimiento a la implementación de los controles para evitar la materialización de los riesgos SST.	
Manejo ambiental de obra - MAO.	Seguimiento a las fichas del MAO.	
PG-RCD	Se realiza el seguimiento al adecuado manejo de los RCD generados en obra y al cumplimiento de los descrito en el PRCD.	
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SG SST	Seguimiento al plan de acción del SG-SST.	
Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP)	Seguimiento a la implementación de las acciones y actividades del Plan de Gestión del Riesgo.	
Protocolo de Bioseguridad y PAPSO	Seguimiento al control del plan de bioseguridad y PAPSO en obra.	
Cronograma de trabajo (Incluido en cronograma general técnico).	Cumplimiento del cronograma de trabajo SST y ambiental.	
Cronograma de capacitación por componente.	Verificación charlas ambientales y SST. Listado de asistencia y registro fotográfico.	
Informe de etapa de recopilación, análisis y revisión de información existente.	Seguimiento al cumplimiento de permisos ambientales, tramites con entidades y visitas de auditoria y seguimiento de entidades distritales.	
Participación en comité semanal de seguimiento técnico virtual dia 01/07/2026. Los componentes social y ambiental podrán se conectaron mediante enlace virtual a las 11:00 a.m. La visita del día viernes 10:00 am se cancela por la supervisión.	Verificación señalización PMT y cerramiento de la obra. Supervisión actividades de excavación, uso de EPP y dotación.	
Verificación de uso de EPP y dotación y supervisión de actividades de obra durante los días 1 y 3 de	Verificación cerramiento, uso de valla y PMT.	

30. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE SOCIAL

TOTALES	15	**% DE AVANCE**
REALIZADAS	15	100,00%
POR REALIZAR	0	0,00%

Informes semanales	Pendiente informe semanal del 26 junio al 03 de julio al 25 de por parte del contratista
Informes mensuales	Pendiente inicio de Informe mes de Junio 2026
Comités de seguimiento al componente social	Se realizó seguimiento al componente el dia 26 de junio 2026 con el fin de verificar pendientes.
Comités de seguimiento de obra	Se asistió al comité de seguimiento 01 de julio 2026, de manera Virtual.
Avance de la caracterización social	Cumple, Firmada y aprobada
Reuniones con comunidad	El contratista envio el 03/07/2026 Productos de Comité Mi Habitat se encuentran en revisión por parte de la Interventoria
Actividades del plan de gestión social	Se ha dado cumplimiento a las actividades del plan de gestión social, se iniciaran actividades en la etapa 2 tales como: El contratista realizo la entrega de los productos de Comité Mi Habitat 01.
Pendientes	El contratista se encuentra pendiente con el informe semanal N 31 (26 junio al 03 de julio) e Inicio de elaboracion informe mes de Junio para su respectiva revisión y aprobación.

31. PERSONAL OPERATIVO INTERVENTORÍA		32. PERSONAL DE CONSULTORIA		33. ESTADO DE EQUIPOS EN OBRA			34. ESTADO DEL TIEMPO		
CARGO	**CANT.**	**CARGO**	**CANT.**	**EQUIPO / MAQUINARIA**	**CANT.**	**UBICACIÓN**	**DIA**	**HORAS DE LLUVIA**	**ESTADO**
DIRECTOR INTERVENTORIA	1	DIRECTOR CONSULTORIA	1	RETROEXCAVADORA	1		LUNES		F
DISEÑO ARQUITECTONICO	1	DISEÑO ARQUITECTONICO	1				MARTES		F
ESP ESTRUCTURAL	1	ESP ESTRUCTURAL	1				MIÉRCOLES		F
INGENIERO FORESTAL	1	INGENIERO FORESTAL	1				JUEVES		F
ARQUEOLOGO	1	ARQUEOLOGO	1				VIERNES		F
COSTOS Y PRESUPUESTOS	1	COSTOS Y PRESUPUESTOS	1				SÁBADO		F
PROFESIONAL SST	1	RESIDENTE SST	1				DOMINGO		
PROFESIONAL GESTION SOCIAL	1	PROFESIONAL GESTION SOCIAL	1				**TOTAL DE Hr.**	0,00 Hr/semana	
ESP HIDRAULICO	1	ESP HIDRAULICO	1						
TOPOGRAFO	1	TOPOGRAFO	1						
CADENERO	1	CADENERO	1						
GESTION AMBIENTAL	1	RESIDENTE AMBIENTAL	1						
REDES ELECTRICAS	1	REDES ELECTRICAS	1						
GEOTECNIA	1	GEOTECNIA	1						
VIAS Y MOVILIDAD	1	VIAS Y MOVILIDAD	1						
RESIDENTE	1	RESIDENTE DE OBRA	1						
		ALMACENISTA							
		VIGILANTE							
TOTAL DE PERSONAL	**16**	**TOTAL DE PERSONAL**	**16**	**TOTAL DE MAQUINARIA / EQUIPO**	**1**				

ESTADO

LLUVIOSO (L)
FAVORABLE (F)
SOLEADO (S)

35 ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

FECHA DELCOMPROMISO	COMPROMISO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
26-jun	**LLEGADA DE SUB BASE GRANULAR**	**MANUEL ALVAREZ**	**CUMPLE**
26-jun	**IMPLEMENTACION Y EJECUCION CIPP**	**MANUEL ALVAREZ**	**CUMPLE**
27-jun	**PRESENTAR SUBSANACIONES PRESUPUESTO**	**MANUEL ALVAREZ**	**CUMPLE**

36. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

37. OBSERVACIONES

Se requiere de la inclusion de los items no previstos y de la actualizacion del balance general para minimizar atrasos presentes.

39. RECOMENDACIONES

Se recomienda la terminacion de labores de CIPP, dado que uno de ellos ya esta finiquitado, el de 16", con esta labor que la realiza un externo, se puede avanzar en la ejecucion del presupuesto. Dado que esta tarea tiene un gran valor presupuestal.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INGESCOR R 2024

	SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT PROYECTO - SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	CODIGO No.	0
		VERSIÓN:	V-0
		FECHA:	1 de 1
		PÁGINA:	1 de 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA - COMPONENTE TÉCNICO

Tramo: Calle 137
CIV:11008810
Dirección: Calle 137 #45a
Descripción: Extendida y compactada de sub base granular reciclada
Fecha: 30-06-2026



Tramo: Calle 137
CIV: 11008810
Dirección: Calle 137 #45a
Descripción:Extendida y compactada de sub base granular reciclada
Fecha: 02-07-2026



Tramo: Calle 137
CIV: 11008810
Dirección: Calle 137 #45a
Descripción: Perfilado de terreno
Fecha: 01-07-2026



Tramo: Calle 137
CIV: 11008810
Dirección: Calle 137 #45a
Descripción: Limpieza de tuberia para implementacion de CIPP
Fecha: 30-06-2026



Tramo: Carrera 137
CIV: 11008810
Dirección: Carrera 137 #45a
Descripción: Corte de resina GRP a borde de tubo existente, recubrimiento bajo metodo CIPP
Fecha: 30-06-2026



Tramo: Calle 137
CIV: 11008810
Dirección: Calle 137 #45a
Descripción: Reparación de puntos de agua potable de 1/2 pulgada.
Fecha: 02-07-2026



Tramo: Carrera 137
CIV: 11008810
Dirección: Calle 137 #45a
Descripción: Montaje de cajas de inspección aguas residuales.
Fecha: 01-07-2026



Tramo: Calle 137
CIV: 11008810
Dirección: Calle 137 #45a
Descripción: Limpieza de redes de alcantarilaldo CIPP
Fecha: 30-06-2026



Tramo: Calle 137
CIV: 11008810
Dirección: Calle 137 #45a
Descripción: Excavacion mecanica y manual junto a tuberias existentes.
Fecha: 03-07-2026



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA - COMPONENTE SST - AMBIENTAL

Tramo:
CIV: 11008810
Dirección: Calle 137 entre carreras 45 y 45 a
Descripción: Supervisión actividades de excavación, uso de EPP y dotación.
Fecha: 01/07/2026



Tramo:
CIV: 11008810
Dirección: Calle 137 entre carreras 45 y 45 a
Descripción: Supervisión uso de EPP y dotación.
Fecha: 01/07/2026



Tramo:
CIV: 11008810
Dirección: Calle 137 entre carreras 45 y 45 a
Descripción: Supervisión uso de EPP y dotación y buenas posturas de trabajo.
Fecha: 01/07/2026



Tramo:
CIV: 11008810
Dirección: Calle 137 entre carreras 45 y 45 a
Descripción: Verificación señalización PMT y cerramiento de la obra.
Fecha: 03/07/2026



Tramo:
CIV: 11008810
Dirección: Calle 137 entre carreras 45 y 45 a
Descripción: Verificación señalización sendero peatonal.
Fecha: 03/07/2026



Tramo:
CIV: 11008810
Dirección: Calle 137 entre carreras 45 y 45 a
Descripción: Supervisión actividades de obra, uso de EPP.
Fecha: 03/07/2026



Tramo:
CIV: 11008810
Dirección: Calle 137 entre carreras 45 y 45 a
Descripción: Supervisión actividades de instalación de redes.
Fecha: 01/07/2026




Tramo:
CIV: 11008810
Dirección: Calle 137 entre carreras 45 y 45 a
Descripción: Acompañamiento en actividades de obra.
Fecha: 01/07/2026



Tramo:
CIV: CIV: 11008810
Dirección: Calle 137 entre carreras 45 y 45 a
Descripción: Verificación cerramiento, uso de valla y PMT.
Fecha: 01/07/2026



	SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT PROYECTO - SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	CODIGO No.	0
		VERSIÓN:	V-0
		FECHA:	1 de 1
		PÁGINA:	1 de 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA - COMPONENTE SOCIAL		
Tramo: Carrera 137 CIV: 11008810 Dirección:Cl 135 # 45 A – 25 Descripción:Aprobacion de Productos Fecha:30-06-2026 	Tramo: Carrera 137 CIV:11008810 Dirección:Cl 135 # 45 A – 25 Descripción: Comité de Seguimiento Fecha:01-07-2026 	Tramo: Carrera 137 CIV:11008810 Dirección:Cl 135 # 45 A – 25 Descripción: Fecha:
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA - COMPONENTE BIOSEGURIDAD		
Tramo: CIV: Dirección: Descripción: Fecha:	Tramo: CIV: Dirección: Descripción: Fecha:	Tramo: CIV: Dirección: Descripción: Fecha:
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA- COMPONENTE PMT		
Tramo: Carrera 45a CIV: 11008810 Dirección: Carrera 45a #136 Descripción: Asistencia a la salida de voqlueta con material de excavación. Fecha: 30-06-2026 	Tramo: Carrera 45a CIV: 11008810 Dirección: Carrera 45a #136 Descripción: Asistencia a la salida de volqueta con material de excavación. Fecha: 30-06-2026 	Tramo: Carrera 45a CIV: 11008810 Dirección: Carrera 45a #136 Descripción:Asistencia a la trafico actividad de limpieza CIPP. Fecha: 30-06-2026 
Tramo: Carrera 45a CIV: 11008810 Dirección: Carrera 45a #136 Descripción: Paso peatonal habilitado Fecha: 02-07-2026 	Tramo: Carrera 45a CIV: 11008810 Dirección: Carrera 45a #136 Descripción: Asistencia a la trafico actividad de limpieza CIPP. Fecha: 02-07-2026 	Tramo: Carrera 45a CIV: 11008810 Dirección: Carrera 45a #136 Descripción: Asistencia a la trafico actividad de limpieza CIPP. Fecha: 30-06-2026 
