SEGUIMIENTO AL VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El empleo es de todos Mintrabajo	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	Código: IVC-PD-05-AN-01-F-02 Versión: 4.0 Fecha: Marzo 09 de 2022 Página 1 de 1

EL SUSCRITO COORDINADOR DE ATENCION AL CIUDADANO Y TRAMITES DE LA DIRECCION TERRITORIAL DEL META

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	11EE2026715000100003154
FECHA RADICADO:	05/05/2026
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	VIALGA SAS
IDENTIFICACIÓN:	900389943-5

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	16
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)*	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: *Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997* *Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)*	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.*	**6%**

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

OBSERVACIONES: Ninguna

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Villavicencio al once (11) días del mes de mayo de 2026.

LUIS CARLOS MACIAS CASTAÑEDA

Elaboró: L/Macias.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900389943	5	VIALGA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COFREM	CALLE 47A No 32 - 52 CAUDAL	VILLAVICENCIO-META	3114740288	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	9505447500	9505447500	E	2026/06/11	2026/05/29	BANCO DE BOGOTA	0	$6,280,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COFREM (10 Afiliados)																						$17,333,960	$2,774,000			$17,333,960	$694,000			$17,333,960	$694,000			$17,333,960		$398,100		$0	$0		$4,560,100
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (6 Afiliados)																						$10,505,430	$1,681,200			$10,505,430	$420,600			$10,505,430	$420,600			$10,505,430		$55,200		$0	$0		$2,577,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (6 Afiliados)																						$10,505,430	$1,681,200			$10,505,430	$420,600			$10,505,430	$420,600			$10,505,430		$55,200		$0	$0		$2,577,600
1	CC	1122918352	ABRIL CANO ELBER JULIAN	X																23020 1	30	$1,750,905	$280,200	CCFCS 5	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
2	CC	1121869346	CASTELLANOS BORBON NICOLE PATRICIA																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS00 5	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
3	CC	1121818086	CLAVO SANCHEZ JHON ALEJANDRO																	23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS00 2	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
4	CC	1121856401	GARAVITO ANGELA MARIA																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS00 5	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
5	CC	1117323825	MINOJOSA ACHURY LEIDI AMADILIA																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	CCFCS 5	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
6	CC	1006655998	LEON CASTILLO KATHERINE ANDREA																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS00 5	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
Centro de Trabajo: OBRA (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
7	CC	1007140010	ARANGO LONDOÑO EDISON STIVEN																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS03 7	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
Centro de Trabajo: OPERATIVO (3 Afiliados)																						$5,077,625	$812,600			$5,077,625	$203,300			$5,077,625	$203,300			$5,077,625		$221,000		$0	$0		$1,440,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)																						$5,077,625	$812,600			$5,077,625	$203,300			$5,077,625	$203,300			$5,077,625		$221,000		$0	$0		$1,440,200
8	CC	1122514190	CASTRO LAMPREA FABIAN LEONARDO																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS00 5	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
9	CC	1121817814	OREJUELA LOPEZ VICTOR ALFONSO																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS00 5	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
10	CC	1121940840	RODRIGUEZ HERRERA DANIEL ALFONSO	X																23030 1	27	$1,575,815	$252,200	EPS00 5	27	$1,575,815	$63,100	CCF34	27	$1,575,815	$63,100	14-11	27	$1,575,815	4.350%	$68,600	27	$0	$0	SI	$447,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVOS (4 Afiliados)																						$7,012,715	$1,122,200			$7,012,715	$280,700			$7,012,715	$280,700			$7,012,715		$36,800		$0	$0		$1,720,400
Centro de Trabajo: RIESGO I (4 Afiliados)																						$7,012,715	$1,122,200			$7,012,715	$280,700			$7,012,715	$280,700			$7,012,715		$36,800		$0	$0		$1,720,400
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)																						$7,012,715	$1,122,200			$7,012,715	$280,700			$7,012,715	$280,700			$7,012,715		$36,800		$0	$0		$1,720,400
11	CC	1121932438	CASTILLO BLANDON ANGY XIMENA																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS00 5	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
12	CC	1088284786	GIL RUIZ MARIA CAMILA																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS00 5	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
13	CC	1121842387	TORRES RAMOS JHON HAYER																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS00 5	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
14	CC	1098634144	VARGAS TORRES KAREN ANDREA																	23030 1	30	$1,760,000	$281,600	EPS00 5	30	$1,760,000	$70,400	CCF34	30	$1,760,000	$70,400	14-11	30	$1,760,000	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$431,600
Total Afiliados(14)																						$24,346,675	$3,896,200			$24,346,675	$974,700			$24,346,675	$974,700			$24,346,675		$434,900		$0	$0		$6,280,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$3,896,200	$0	$0	$3,896,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$3,055,600	$0	$0	$3,055,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$560,400	$0	$0	$560,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$434,900	$0	$0	$434,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$434,900	$0	$0	$434,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$974,700	$0	$0	$974,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	14	$974,700	$0	$0	$974,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$974,700	$0	$0	$974,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	2	$140,200	$0	$0	$140,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$694,300	$0	$0	$694,300
TOTAL				14	$6,280,500	$0	$0	$6,280,500

SEGUIMIENTO EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES

CERTIFICACIÓN DE ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESA DE MUJERES

GERMAN JAVIER DIAZ GUTIÉRREZ Y KAREN ANDREA VARGAS TORRES identificados con C.C No. 80.056.325 de Bogotá y 1.098.634.144 de Bucaramanga, en nuestra condición de representante legal y Revisor Fiscal de VIALGA S.A.S identificada con el NIT 900.389.943-5, en adelante el Proponente, acreditamos la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015.

Conforme a lo anterior, manifestamos bajo la gravedad del juramento que por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica han sido ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratación en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Para los efectos de esta certificación son empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, son cargos del rango directivo los que dentro de la organización de la empresa implican mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

En constancia, se firma en Villavicencio, a los 30 días del mes de Mayo del 2026.

GERMAN JAVIER DIAZ GUTIÉRREZ
C.C 80.056.325 de Bogotá

KAREN ANDREA VARGAS TORRES
T.P 182000-T
Revisora Fiscal

INFORME SEGUIMIENTO DE OBRA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

INFORME N° 1
PERIODO DEL *11/05/2026* ***AL*** *31/05/2026*
FECHA DE PRESETANCION: *25/06/2026*
MENSUAL

INFORMACIÓN BASICA				
TIPO DE CONTRATO:	*OBRA PUBLICA*			
CONTRATO N°:	*103.13.09.003-2026*			
OBJETO CONTRATO:	*"FASE 1 ETAPA 1 SECTOR UBICADO SOBRE LA VIA NACIONAL - AVENIDA 14 DESDE LA CARRERA SEPTIMA (7) HASTA LA CARRERA QUINCE (15)".*			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	*CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS DOCE PESOS MONEDA CORRIENTE. ($ 41.710.590.512)*			
CONTRATISTA:	*UNION TEMPORAL URBANO 2026*			
CORREO ELECTRONICO:	*uniontemporalpuertolopez@gmail.com*			
FECHA DE INICIACIÓN:	*11/05/2026*			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	*18*	***Meses***		***Días***
FECHA DE TERMINACIÓN:	*10/11/27*			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:	*103.13.07.002-2026*			
OBJETO DE LA INTERVENTORÍA:	*"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LA FASE 1 ETAPA 1 SECTOR UBICADO SOBRE LA VIA NACIONAL - AVENIDA 14 DESDE LA CARRERA SEPTIMA (7) HASTA LA CARRERA QUINCE (15)"*			
CORREO ELECTRONICO:	*consorciointerurbano12@gmail.com*			
SUPERVISOR ASIGNADO:	*MARYLIN FONSECA CRUZ*			
FECHA DE ASIGNACIÓN:	*N/A*			
CORREO ELECTRONICO:	*secinfraestructura@puertolopez-meta.gov.co*			

MODIFICACIONES AL CONTRATO				
PRORROGA N°:	*N/A*			
TIEMPO:	*N/A*	***Meses***	*N/A*	***Días***

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	*N/A*			
SUSPENSIÓN N°:	*N/A*			
TIEMPO:		***Meses***		***Días***
AMPLIACION N° XX A SUSPENSION N° XX:		***Meses***		***Días***
TIEMPO:				
REINICIO N° XX:	*N/A*			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	*N/A*			
MODIFICACIÓN N° XX:	*N/A*			
VALOR MODIFICADO:	*N/A*			
FECHA ADICIONAL N° XX:	*N/A*			
VALOR ADICIONAL:	*N/A*			
VALOR ACTUALIZADO:	*N/A*			
FECHA ACTUAL DE TERMINACION:	*N/A*			

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

La zona del proyecto está ubicada en el área urbana del municipio de Puerto López, el cual es conocido nacionalmente como el Ombligo de Colombia debido a que coincide con el centro geográfico del territorio continental del país.


Puerto López es además uno de los más importantes puertos fluviales sobre río Meta y está localizado a 86 km al este de Villavicencio. El municipio de Puerto López limita al Norte con los municipios de Cumaral, Cabuyaro y el departamento de Casanare; Al oriente con el municipio de Puerto Gaitán; al sur con el municipio de San Martin, y al occidente con los municipios de San Carlos De Guaroa y Villavicencio. El municipio tiene una extensión total de 6.898 km². La principal vía de acceso es a través de la carretera que la une a Villavicencio. También se comunica con toda la extensión de los Llanos Orientales a través del río Meta y con Venezuela a través del río Orinoco. A continuación, se muestra la localización general del sitio de estudio.

MUNICIPIO:	*PUERTO LOPEZ*	***VEREDA:***	*AV 14 CARRERA 7 A LA CARRERA 15*
CORREGIMIENTO:	*N/A*	***BARRIO:***	*N/A*
COORDENADAS:	*LATITUD 4°05'23"*	*LONGITUD 72°57'43"*	


NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

Figura 1. Localización del proyecto

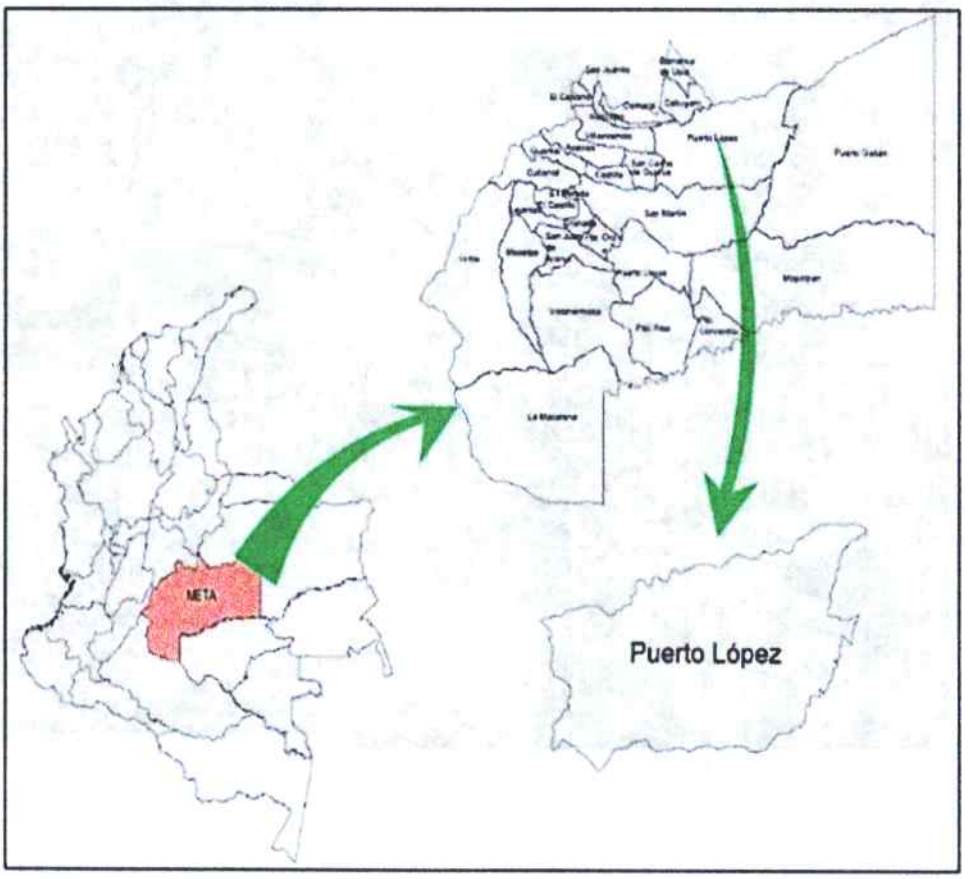

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

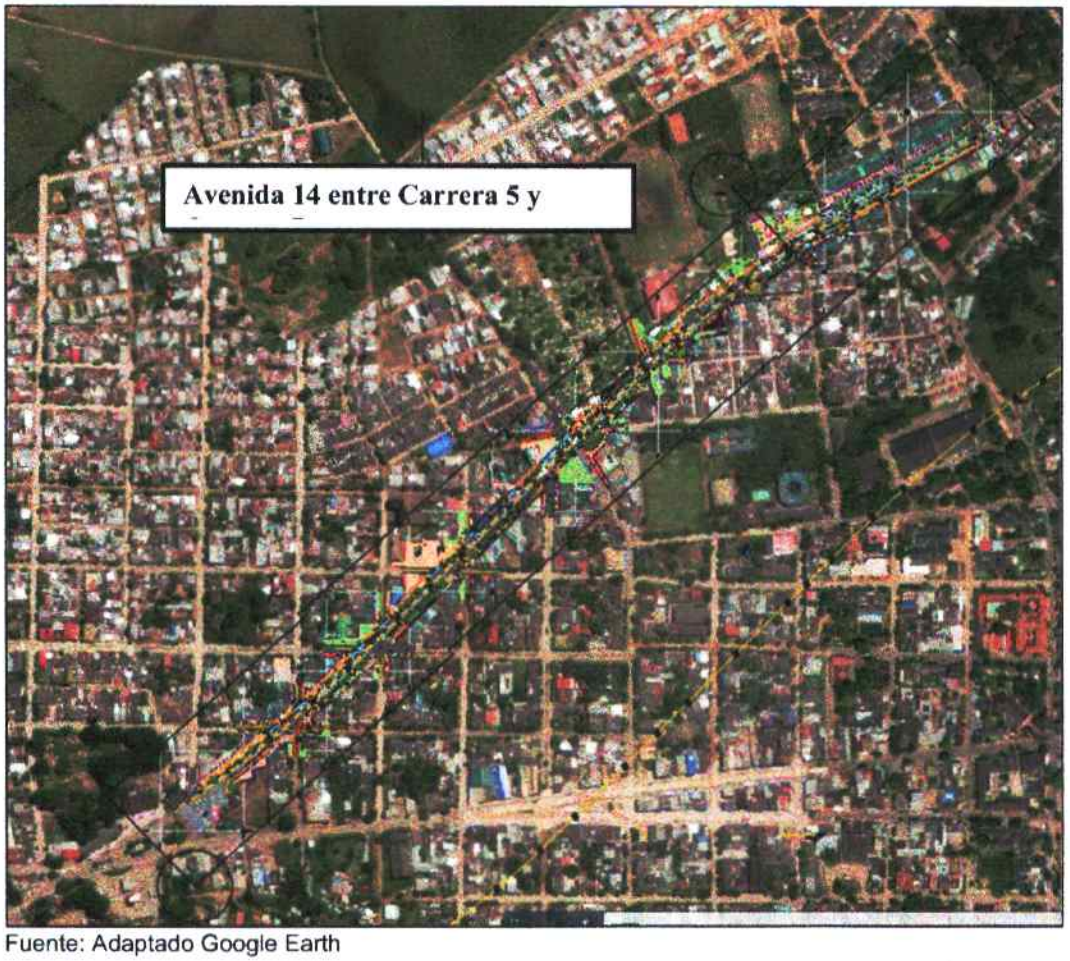

Fuente: Adaptado Google Earth

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

A. INFORME TECNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE


Avance físico

MES	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
MAYO 2026	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,02%	$ 10.347.849,00	0,02%	$ 10.347.849,00
JUNIO 2026	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00				
JULIO 2026	2,46%	$ 1.027.776.303,86	2,46%	$ 1.027.776.303,86				
AGOSTO 2026	8,68%	$ 3.622.385.544,16	11,15%	$ 4.650.161.848,02				
SEPTIEMBRE 2026	12,26%	$ 5.115.573.200,62	23,41%	$ 9.765.735.048,64				
OCTUBRE 2026	12,64%	$ 5.274.155.895,25	36,06%	$ 15.039.890.943,89				
NOVIEMBRE 2026	12,44%	$ 5.186.982.024,29	48,49%	$ 20.226.872.968,18				
DICIEMBRE 2026	14,15%	$ 5.903.837.311,24	62,65%	$ 26.130.710.279,42				
ENERO 2027	15,23%	$ 6.352.403.860,58	77,88%	$ 32.483.114.140,00				
FEBRERO 2027	8,38%	$ 3.493.332.861,66	86,25%	$ 35.976.447.001,66				
MARZO 2027	3,25%	$ 1.356.278.905,33	89,50%	$ 37.332.725.906,99				
ABRIL 2027	1,00%	$ 415.799.386,56	90,50%	$ 37.748.525.293,55				
MAYO 2027	0,92%	$ 385.498.807,88	91,43%	$ 38.134.024.101,43				
JUNIO 2027	0,92%	$ 382.163.265,71	92,34%	$ 38.516.187.367,14				
JULIO 2027	1,22%	$ 509.666.498,18	93,56%	$ 39.025.853.865,32				
AGOSTO 2027	1,90%	$ 794.076.850,61	95,47%	$ 39.819.930.715,93				
SEPTIEMBRE 2027	1,93%	$ 804.408.673,34	97,40%	$ 40.624.566.587,42				
OCTUBRE 2027	2,01%	$ 837.227.198,15	99,40%	$ 41.461.566.587,42				

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

MES	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
NOVIEBRE 2027	0,60%	$ 249.023.924,69	100,00%	$ 41.710.590.512,00				

Grafica Avance Físico

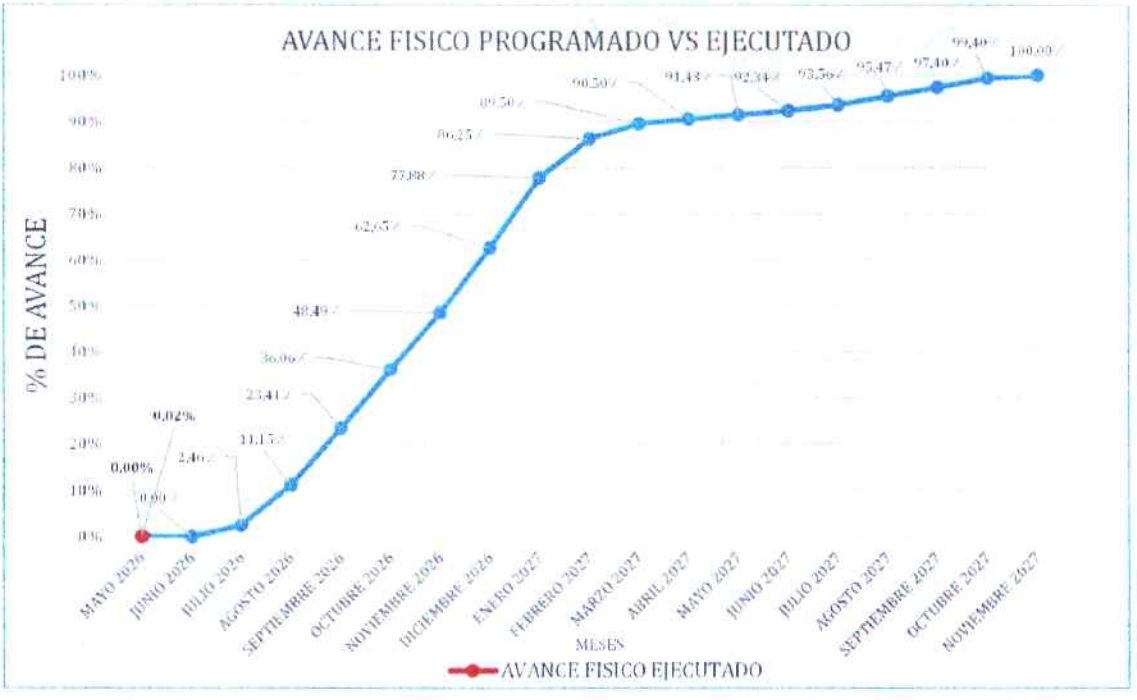

Durante el periodo del presente informe se realizaron actividades administrativas, el porcentaje programa para este periodo es del 0,00% y el ejecutado es de 0,02%.

2. *GESTIÓN TECNICA Y DOCUMENTAL*

Relación de Oficios y documentos proyectados, durante el desarrollo del contrato en el periodo reportado en el presente informe, solicitudes comunidad, entidades, temas varios e Informes presentados, requerimientos y demás.

Correspondencia enviada.

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
14/05/2026	CI-004-2026	SOLICITUD DE ENTREGA DOCUMENTAL Y PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA DE ENTREGABLES – CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 103.13.09.003-2026.	CONSORCIO INTERURBANO	UNION TEMPORAL URBANO 2026
14/05/2026	CI-005-2026	SOLICITUD DE REMISIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL Y TÉCNICA- CONTRATO DE OBRA No. 103.13.09.003-2026.	CONSORCIO INTERURBANO	ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO LOPEZ, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
20/05/2026	CI-006-2026	APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO – CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 103.13.09.003-2026.	CONSORCIO INTERURBANO	UNION TEMPORAL URBANO 2026
20/05/2026	CI-007-2026	APROBACIÓN Y SOLICITUD DE CONTINUIDAD DEL TRÁMITE DE ANTICIPO – CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 103.13.09.003-2026.	CONSORCIO INTERURBANO	ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO LOPEZ, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
21/05/2026	CI-003-2026	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE DE ANTICIPO – CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 103.13.07.002-2026.	CONSORCIO INTERURBANO	ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO LOPEZ, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
21/05/2026	CI-008-2026	SOLICITUD DE DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE VALLA INFORMATIVA – CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 103.13.09.003-2026.	CONSORCIO INTERURBANO	ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO LOPEZ, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
29/05/2026	CI-009-2026	ENTREGA DOCUMENTOS DE INICIO – CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 103.13.07.002-2026.	CONSORCIO INTERURBANO	ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO LOPEZ, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Correspondencia recibida.

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
15/05/2026	UTU-004-2026	SOLICITUD INFORMACION EMPRESAS PROVEEDORAS DE SERVICIOS QUE UTILIZAN INFRAESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE EMSA.	UNION TEMPORAL URBANO 2026	EMSA ESP Y CONSORCIO INTERURBANO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO
15/05/2026	UTU-005-2026	NOTIFICACION DE INICIO ACTIVIDADES DEL CONTRATO A ENTIDADES CORRESPONDIENTES	UNION TEMPORAL URBANO 2026	UFINET COLOMBIA SA Y CONSORCIO INTERURBANO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO
15/05/2026	UTU-006-2026	NOTIFICACION DE INICIO ACTIVIDADES DEL CONTRATO A ENTIDADES CORRESPONDIENTES	UNION TEMPORAL URBANO 2026	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA TIGO Y CONSORCIO INTERURBANO POR

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
				MEDIO DE CORREO ELECTRONICO
15/05/2026	UTU-007-2026	NOTIFICACION DE INICIO ACTIVIDADES DEL CONTRATO A ENTIDADES CORRESPONDIENTES	UNION TEMPORAL URBANO 2026	CLARO COLOMBIA Y CONSORCIO INTERURBANO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO
15/05/2026	UTU-008-2026	NOTIFICACION DE INICIO ACTIVIDADES DEL CONTRATO A ENTIDADES CORRESPONDIENTES	UNION TEMPORAL URBANO 2026	ETB SA ESP Y CONSORCIO INTERURBANO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO
15/05/2026	UTU-009-2026	NOTIFICACION DE INICIO ACTIVIDADES DEL CONTRATO A ENTIDADES CORRESPONDIENTES	UNION TEMPORAL URBANO 2026	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP Y CONSORCIO INTERURBANO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO
15/05/2026	UTU-010-2026	NOTIFICACION DE INICIO ACTIVIDADES DEL CONTRATO A ENTIDADES CORRESPONDIENTES	UNION TEMPORAL URBANO 2026	INTERNEXA Y CONSORCIO INTERURBANO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO
15/05/2026	UTU-011-2026	NOTIFICACION DE INICIO ACTIVIDADES DEL CONTRATO A ENTIDADES CORRESPONDIENTES	UNION TEMPORAL URBANO 2026	HOLA TELECOMUNICACIONES COLOMBIA SAS Y CONSORCIO INTERURBANO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO
15/05/2026		REMISION DE DOCUMENTACION TECNICA Y CONTRACTUAL – CONTRATO DE OBRA No. 103.13.09.003.-2026.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – SUPERVICION	CONSORCIO INTERURBANO
20/05/2026	UTU-003-2026	ENTREGA DE DOCUMENTOS PLAN INVERSION DE ANTICIPO.	UNION TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO
20/05/2026	UTU-012-2026	SOLICITUD DISEÑO Y MEDIDAS DE VALLA PARA CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 103.09.003-2026.	UNION TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO

Nota: *Lo anterior relacionado se encuentra adjunto en los anexos del presente informe mensual de interventoria.*

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

2.1. COMITÉS, REUNIONES Y ASPECTOS SOCIALES

COMITÉ/ REUNION	*FECHA*	*ASPECTOS TRATADOS*
ACTA No. 01	21/05/2026	➢ Presentación y aspectos generales del contrato de obra. ➢ Revisión documental para inicio, según lista de chequeo contractual. ➢ Revisión técnica, presupuesta, componente social y ambiental inicial.
ACTA No. 02	26/05/2026	➢ Discutir los lineamientos básicos para tener en cuenta para la ejecución del proyecto. ➢ Verificar y validar las condiciones aprobadas mediante oficio GD-I-20224200295901 del 19 de agosto de 2022. ➢ Establecer las condiciones constructivas para el proyecto y que se deben reflejar en los planos que se deben presentar para la actualización de los diseños.

Nota: *Las actas mencionadas anteriormente se adjuntan en los anexos del presente informe mensual de interventoría.*

B. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

1. PROCESO CONSTRUCTIVO

El contratista de obra en el periodo del presente informe no ha realizado actividades de obra. Por lo anterior no se reportan actividades en ejecución, únicamente se han realizado actividades administrativas:

- Socialización del proyecto a la comunidad del municipio de Puerto López, Meta.
- Inspección previa para la elaboración del acta de visita.
- Visita en la zona del proyecto para la elaboración y suscripción de actas de vecindad.
- En el periodo se incorporaron el personal mínimo requerido, el contratista presenta sus respectivas afiliaciones.

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

2. *MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD*

Durante el presente periodo la interventoría realizo los respectivos diseños de mezcla, el análisis técnico y seguimiento a los diseños de mezcla elaborados por el laboratorio de control de calidad para los concretos especificados en el proyecto, correspondientes a resistencias de **2.000 psi, 2.500 psi, 3.000 psi y 4.000 psi**. Esta actividad tuvo como propósito verificar que las dosificaciones propuestas cumplieran con las especificaciones técnicas del proyecto, la normatividad vigente aplicable y los requisitos de resistencia, trabajabilidad, durabilidad y calidad exigidos para cada uno de los elementos estructurales y no estructurales contemplados en la obra.

Como parte del proceso de aseguramiento de la calidad, la interventoría verificó que los diseños de mezcla estuvieran sustentados en ensayos de laboratorio realizados sobre los materiales que serán utilizados durante la ejecución del proyecto, garantizando que las proporciones definidas permitan obtener concretos con el comportamiento mecánico esperado y un adecuado desempeño en servicio.

De igual forma, se realizaron los ensayos de caracterización de los materiales granulares que serán empleados en las diferentes actividades del proyecto, incluyendo la determinación de sus propiedades físicas, mecánicas y de clasificación, mediante pruebas de laboratorio tales como granulometría, contenido de humedad, equivalente de arena, Proctor y CBR, entre otras que resulten aplicables de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto y la normativa vigente.

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	*FECHA*	*NORMA*
-	-	-

Nota: *Dar aplicabilidad al F -251 Acta Resumen Ensayos y Pruebas de Laboratorio, remitir como anexo al presente informe.*

3. *SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO*

Relacionar la aplicación de la normatividad vigente sobre seguridad industrial, salud ocupacional y señalización.

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
11 al 31 de mayo 2026	Designación de la responsable del SG-SST y personal de apoyo SST	Se designó a Sandra Milena Castro Herrera como responsable del SG-SST y a María Alejandra Riveros Torres como apoyo para la implementación y seguimiento de las actividades SST del proyecto.
11 al 31 de mayo 2026	Verificación de afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral	Se verificó que el personal vinculado contara con afiliación vigente a EPS, AFP y ARL previo al inicio de actividades.
11 al 31 de mayo 2026	Realización de exámenes médicos ocupacionales de ingreso	Se realizaron los exámenes ocupacionales de ingreso al personal vinculado al proyecto.
11 al 31 de mayo 2026	Convocatoria para conformación del COPASST	Se realizó la convocatoria para la elección de representantes de los trabajadores, programando la conformación para junio de 2026.
11 al 31 de mayo 2026	Convocatoria para conformación del Comité de Convivencia Laboral	Se realizó la convocatoria para la elección de representantes y conformación del comité durante el siguiente período.
11 al 31 de mayo 2026	Elaboración del Programa de Capacitación SST-A	Se definieron los temas, cronograma y responsables de las actividades de capacitación en SST para la ejecución del proyecto.
11 al 31 de mayo 2026	Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo	Se socializaron los riesgos, controles, políticas SST, reglamento de higiene y seguridad y procedimientos de reporte al personal vinculado.
11 al 31 de mayo 2026	Elaboración y divulgación de políticas SST	Se formalizaron y socializaron las políticas de SST, seguridad vial, gestión de emergencias, uso de EPP y prevención del consumo de alcohol, drogas y tabaco.

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
11 al 31 de mayo 2026	Elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos	Se identificaron los peligros y se valoraron los riesgos aplicando la metodología GTC 45:2012.
11 al 31 de mayo 2026	Elaboración del Programa de Inspecciones SST	Se establecieron los tipos de inspección, periodicidad, responsables y mecanismos de seguimiento para su implementación.
11 al 31 de mayo 2026	Entrega de dotación y elementos de protección personal	Se suministraron los elementos requeridos para el desarrollo seguro de las actividades y se capacitó al personal sobre su uso adecuado.
11 al 31 de mayo 2026	Elaboración del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias	Se identificaron amenazas, vulnerabilidades y procedimientos de actuación ante emergencias aplicables al proyecto.
11 al 31 de mayo 2026	Seguimiento a la gestión de accidentes de trabajo	No se registraron incidentes, accidentes de trabajo ni enfermedades laborales durante el período evaluado.
11 al 31 de mayo 2026	Gestión de productos químicos	No se utilizaron ni almacenaron productos químicos durante la etapa de pre-construcción.

Nota: *Diligenciar F- 261 Control de Seguridad Industrial, remitir como anexo al presente informe*

4. MANEJO AMBIENTAL

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
PAGA-GSA-01 Gestión ambiental y social	100%	Se conformó el Grupo de Gestión Ambiental y Social y se realizó seguimiento a los compromisos ambientales y sociales aplicables al proyecto durante la etapa de pre-construcción.
PAGA-GSA-02 Capacitación y sensibilización ambiental	N/A	Durante el período se formuló el Programa SST-A y

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
		se realizaron inducciones al personal. La implementación de las capacitaciones iniciará en junio de 2026.
PAGA-MAO-01 Manejo de materiales	N/A	No se registró ingreso, almacenamiento o utilización de materiales de construcción durante el período evaluado.
PAGA-MAO-02 Manejo de materiales provenientes de terceros	N/A	No se recibieron materiales provenientes de terceros debido a que no se ejecutaron actividades constructivas.
PAGA-MAO-03 Señalización ambiental y PMT	N/A	No se requirió la implementación de señalización temporal ni de medidas asociadas al PMT, dado que no sea iniciado las obras.
PAGA-MAO-04 Campamentos y áreas temporales	N/A	Se evaluaron alternativas para la ubicación de oficina, cerramientos y áreas temporales requeridas para la futura ejecución del proyecto.
PAGA-MAO-05 Manejo integral de residuos y RCD	N/A	No se generaron residuos de construcción y demolición (RCD). Se adelantó la planificación de las medidas de manejo aplicables a la etapa constructiva.
PAGA-MAO-06 Control de emisiones y material particulado	N/A	No se presentaron fuentes generadoras de emisiones atmosféricas o material

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
		particulado asociadas a actividades constructivas.
PAGA-MAO-07 Control de ruido y vibraciones	N/A	No se desarrollaron actividades que generaran ruido o vibraciones asociadas a maquinaria o procesos constructivos.
PAGA-MAO-08 Manejo de aguas lluvias y escorrentías	N/A	Se realizó reconocimiento preliminar de las condiciones de drenaje existentes en el área de intervención.
PAGA-MAO-09 Excavaciones y movimientos de tierra	N/A	No se ejecutaron excavaciones, cortes, rellenos o movimientos de tierra durante el periodo evaluado.
PAGA-MAQ-01 Manejo de maquinaria y vehículos	N/A	No ingresó maquinaria ni vehículos de obra al área de intervención durante la etapa de pre-construcción.
PAGA-GS-01 Mano de obra y enfoque diferencial	100%	Se promovió la contratación local, logrando que el 100% de la mano de obra no calificada vinculada correspondiera a residentes de Puerto López.
PAGA-GS-02 Participación comunitaria	100%	Se realizaron socializaciones, recorridos comunitarios y levantamiento de actas de vecindad en el área de influencia.
PAGA-GS-03 Accesibilidad y movilidad peatonal	100%	Se identificaron condiciones de accesibilidad y movilidad existentes para la futura

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
		implementación de medidas de manejo durante la obra.
PAGA-GS-04 Atención a comunidad y PQRS	N/A	No se recibieron PQRS durante el período evaluado; se mantuvieron habilitados los canales de comunicación con la comunidad.
PAGA-GS-05 Información y divulgación	100%	Se divulgó información relacionada con el alcance del proyecto, actividades preliminares y mecanismos de atención comunitaria.
PAGA-MB-01 Protección de cobertura vegetal urbana	N/A	No se realizaron intervenciones sobre árboles, zonas verdes o coberturas vegetales presentes en el área de influencia.
PAGA-MB-02 Paisajismo y recuperación de áreas intervenidas	N/A	No se requirieron actividades de recuperación ambiental o paisajística debido a la ausencia de intervenciones físicas.

Nota: *Diligenciar F- 253 Implementación Plan de Manejo Ambiental, remitir como anexo al presente informe.*

C. INFORME ADMINISTRATIVO

1. PERSONAL ACTUAL PROFESIONAL VIGENTE MINIMO.

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA-MES
DANIEL FERNANDO PINEDA NOVOA	DIRECTOR DE OBRA 1	25%
JUAN DAVID MARTINEZ BACCA	RESIDENTE DE OBRA	100%

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

SANDRA MILENA CASTRO HERRERA	PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL	100%
JUAN FERNANDO GALVEZ FLOREZ	INGENIERO ELECTRICISTA	50%
OSCAR JULIAN ARIAS MELO	PROFESIONAL EN ARTES	100%

2. *APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES*

NUMERO DE PLANILLA:		9505821743				
NOMBRE PERSONAL	CARGO Y/O OFICIO	CEDULA	DÍAS COT	RELACIONAR EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO		
				SALUD	PENSIÓN	ARL
ARIAS MELO OSCAR JULIAN	PROFESIONAL ARTES	86079033	20	SALUD TOTAL	PORVENIR	SEGUROS BOLIVAR
AVENDAÑO LEYTON JEHISON RUBEN	AYUDANTE	1120871576	2	NUEVA EPS MOVILIDAD	PORVENIR	SEGUROS BOLIVAR
CASTRO HERRERA SANDRA MILENA	PROFESIONAL SST	1122646157	20	FAMISANAR	PORVENIR	SEGUROS BOLIVAR
DIAZ MICAN HERNAN ELVECIO	OPERARIO	79123498	30	FAMISANAR	PORVENIR	SEGUROS BOLIVAR
GALVEZ FLOREZ JUAN FERNANDO	INGENIERO ELECTRICO	80112917	20	SANITAS	COLPENSIONES	SEGUROS BOLIVAR
GIRALDO GONZALEZ CRISTINA	DIRECTOR DE OBRA 2	1121833213	30	SALUD TOTAL	PORVENIR	SEGUROS BOLIVAR
MARTINEZ BACCA JUAN DAVID	RESIDENTE DE OBRA	1119892740	30	FAMISANAR	PORVENIR	SEGUROS BOLIVAR
NOVOA MANCHAY DANIEL ENRIQUE	AYUDANTE	1121958136	2	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SEGUROS BOLIVAR
PINEDA NOVOA DANIEL FERNANDO	DIRECTOR DE OBRA 1	17389742	27	FAMISANAR	COLPENSIONES	SEGUROS BOLIVAR
RIVEROS TORRES MARIA ALEJANDRA	SUPERVISOR SST	1193042465	24	FAMISANAR	COLPENSIONES	SEGUROS BOLIVAR
RUIZ TURRIAGO DAVID FERNANDO	TRABAJADOR SOCIAL	1122648237	24	SALUD TOTAL	PROTECCION	SEGUROS BOLIVAR
TERAN TELLEZ PEDRO ANTONIO	AYUDANTE	1120871321	2	FAMISANAR	PROTECCION	SEGUROS BOLIVAR
ORTIZ RODRIGUEZ EDISON LEONARDO	INGENIERO AMBIENTAL	1118550393	20	NUEVA EPSMOVILIDAD	PORVENIR	SEGUROS BOLIVAR

Nota: *Diligenciar F- 252 Acta Control y Seguimiento Seguridad Social y Parafiscales, remitir como anexo al presente informe.*

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co
