ALCALDIA PUERTO LÓPEZ	OFICIO	Código: F - 287
		Versión: 002
		Fecha: Enero de 2024

Puerto López, Meta, 12 de agosto de 2026 **SI 150.35-503-08-2026**

Señora:
JOHANNA PAOLA VEGA MORENO
Jefe de la oficina de contratación
Alcaldía municipal de Puerto López
Municipio.

REF: Contrato de Obra No. 103.13.09.003-2026 "FASE 1 ETAPA 1 SECTOR UBICADO SOBRE LA VÍA NACIONAL – AVENIDA 14 DESDE LA CARRERA SÉPTIMA (7) HASTA LA CARRERA QUINCE (15)"

Asunto: Radicación Informe Mensual No. 2 de obra – periodo del 01 al 30 de junio de 2026.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito remitir a su despacho el informe mensual de obra correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2026, junto con sus respectivos soportes.

El citado informe fue previamente revisado por la interventoría del contrato, quien verificó la información técnica, administrativa y demás documentación correspondiente al periodo reportado, otorgando viabilidad para su radicación y archivo en el expediente contractual.

En consecuencia, se remite la documentación para su conocimiento, trámite correspondiente e incorporación al expediente del contrato.
Cordialmente,

MARYLIN FONSECA CRUZ
Supervisora
Secretaría de Infraestructura

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
Nombre: RUDDY RAMIREZ CHACON	Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ	Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
Cargo: PROFESIONAL ESPECIALISTA	Cargo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cargo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Fecha: 12/08/2026	Fecha: 12/08/2026	Fecha: 12/08/2026

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

CONSORCIO
INTERURBANO

Puerto López, 06 de agosto de 2026.

6256-26
Alcaldía Municipal
Puerto López-Meta
Radicado
06/08/2026 Hora 3:19pm.
Ruta Alejandra (265)

Señores
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
Calle 6 No. 4 - 40, Barrio Centro
Municipio de Puerto López-Meta.
secinfraestructura@puertolopez-meta.gov.co
SUPERVISOR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ING. MARYLIN FONSECA CRUZ

CI-070-2026

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LA FASE 1 ETAPA 1 SECTOR UBICADO SOBRE LA VÍA NACIONAL - AVENIDA 14 DESDE LA CARRERA SEPTIMA (7) HASTA LA CARRERA QUINCE (15).

ASUNTO: REMISION DE INFORME No 2 – CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 103.13.09.003-2026.

Respetados señores:

Por medio de la presente, y en cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas, nos permitimos remitir la documentación del informe No 2 del periodo del 01 al 30 de junio de 2026 del contrato de obra pública No. 103.13.09.003-2026 cuyo objeto *"FASE 1 ETAPA 1 SECTOR UBICADO SOBRE LA VIA NACIONAL - AVENIDA 14 DESDE LA CARRERA SEPTIMA (7) HASTA LA CARRERA QUINCE (15)"*, conforme a la lista de chequeo y requisitos establecidos por la entidad.

La documentación ha sido revisada, verificada y avalada por esta interventoría, conforme a los requisitos técnicos y normativos aplicables.

La documentación adjunta se entrega debidamente organizada y foliada entre los folios 7 al 284

Quedamos atentos a su pronta respuesta.

Cordialmente,

Angela Barcalcel

CONSORCIO INTERURBANO
LUZ ANGELA BARCALCEL QUEZADA
C.C. No. 1.070.612.767 de Girardot
Representante Legal.

Dirección: CR 31 45 61 AP 202 | **Villavicencio, Meta** | Email: consorciointerurbano12@gmail.com
Teléfono: 3112631208

INFORME DE OBRA

2

UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026

INFORME OBRA No.2

Periodo: 01/06/2026 a 30/06/2026

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 103.13.09.003-2026
"FASE 1 ETAPA 1 SECTOR UBICADO SOBRE LA VÍA NACIONAL – AVENIDA 14 DESDE LA CARRERA SÉPTIMA (7) HASTA LA CARRERA QUINCE (15), EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META"

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
JUAN DAVID MARTINEZ BACCA MP. 091037-0573734CND RESIDENTE DE OBRA UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	DANIEL FERNANDO PINEDA NOVOA MP. 25202-127004 CND DIRECTOR DE OBRA UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	WILMER FABIAN QUEVEDO CC. 1.121.824.964 REPRESENTANTE LEGAL UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

INFORMACIÓN BASICA				
TIPO DE CONTRATO:	OBRA PÚBLICA			
CONTRATO N°:	103.13.09.003-2026			
OBJETO CONTRATO:	FASE 1 ETAPA 1 SECTOR UBICADO SOBRE LA VIA NACIONAL - AVENIDA 14 DESDE LA CARRERA SEPTIMA (7) HASTA LA CARRERA QUINCE (15)			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/cte. ($41.710.590.512,00)			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL URBANO 2026			
CORREO ELECTRONICO:	uniontemporalpuertolopez@gmail.com			
FECHA DE INICIACIÓN:	11/05/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	18	**Meses**		**Días**
FECHA DE TERMINACIÓN:	10/11/2027			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:	103.13.07.002-2026			
OBJETO DE LA INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LA FASE 1 ETAPA 1 SECTOR UBICADO SOBRE LA VIA NACIONAL - AVENIDA 14 DESDE LA CARRERA SEPTIMA (7) HASTA LA CARRERA QUINCE (15)			
CORREO ELECTRONICO:	consorciointerurbano12@gmail.com			
SUPERVISOR ASIGNADO:	MARYLIN FONSECA CRUZ			
FECHA DE ASIGNACIÓN:	N/A			
CORREO ELECTRONICO:	secinfraestructura@puertolopez-meta.gov.co			

MODIFICACIONES AL CONTRATO				
PRORROGA N°:				N/A
TIEMPO:	N/A	**Meses**	N/A	**Días**
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:				N/A
SUSPENSIÓN N°:				N/A
TIEMPO:	N/A	**Meses**	N/A	**Días**
AMPLIACION N° A SUSPENSION N°:	N/A	**Meses**	N/A	**Días**
TIEMPO:	N/A	**Meses**	N/A	**Días**
REINICIO N°:				N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:				N/A
MODIFICACIÓN N°:				N/A
VALOR MODIFICADO:				N/A
FECHA ADICIONAL N°:				N/A


NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

VALOR ADICIONAL:	*N/A*
VALOR ACTUALIZADO:	*N/A*
FECHA ACTUAL DE TERMINACION:	*N/A*

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

MUNICIPIO:	*PUERTO LOPEZ*	***VEREDA:***	*AV 14 CARRERA 7 A LA CARRERA 15*
CORREGIMIENTO:	*N/A*	***BARRIO:***	*N/A*
COORDENADAS:	*3°52´29" N – 67°55´19" W*		

MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

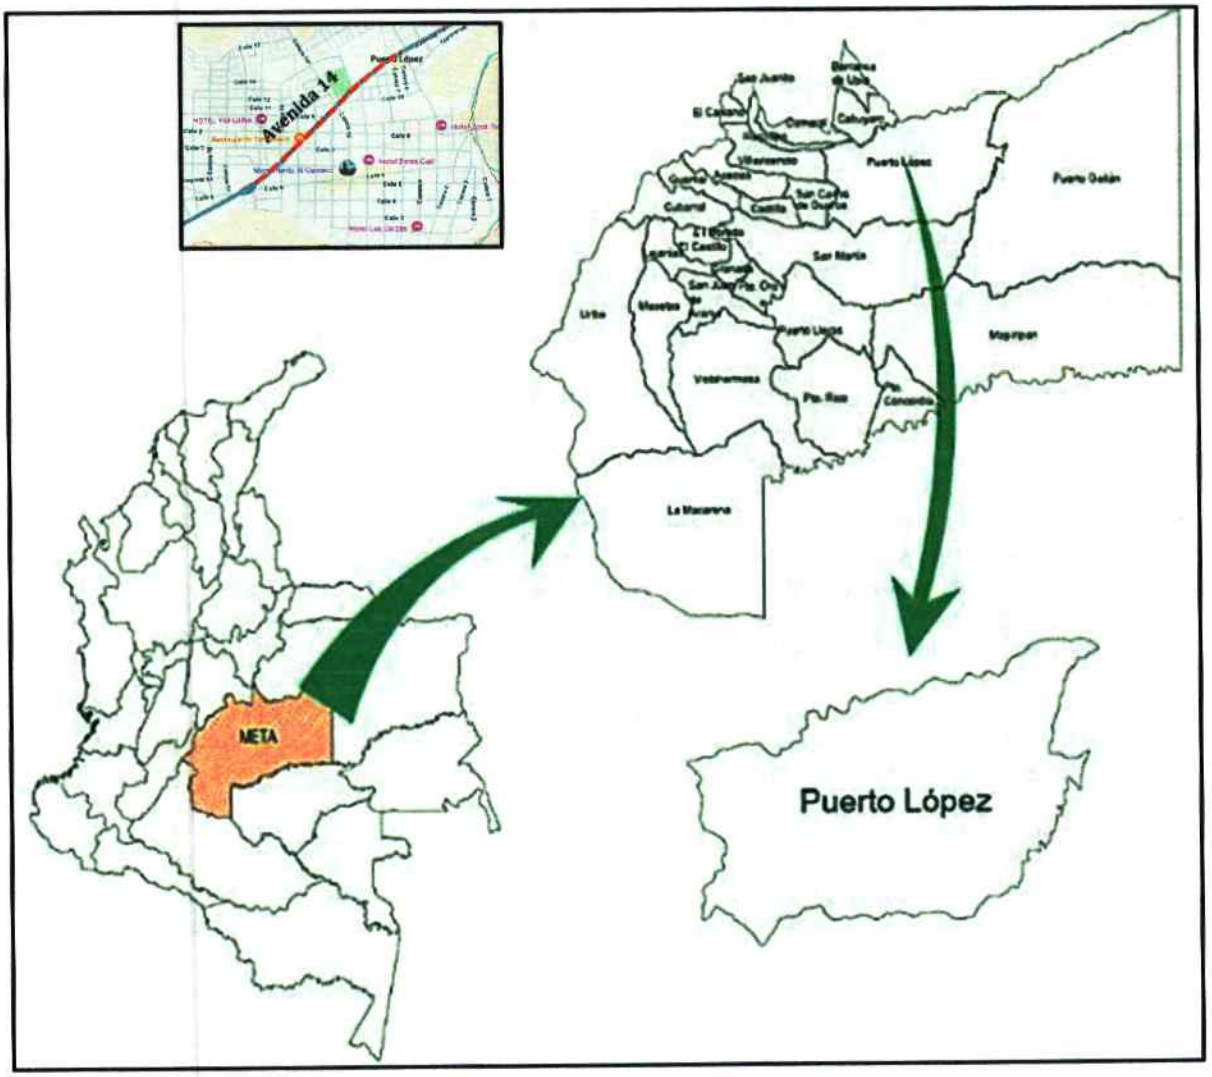

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

A. INFORME TECNICO


1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE

Avance físico

MES	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
MAYO 2026	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,02%	$ 10.347.849,00	0,02%	$ 10.347.849,00
JUNIO 2026	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,04%	$ 15.221.772,00	0,06%	$ 25.869.621,00
JULIO 2026	2,46%	$ 1.027.776.303,86	2,46%	$ 1.027.776.303,86				
AGOSTO 2026	8,68%	$ 3.622.385.544,16	11,15%	$ 4.650.161.848,02				
SEPTIEMBRE 2026	12,26%	$ 5.115.573.200,62	23,41%	$ 9.765.735.048,64				
OCTUBRE 2026	12,64%	$ 5.274.155.895,25	36,06%	$ 15.039.890.943,89				
NOVIEMBRE 2026	12,44%	$ 5.186.982.024,29	48,49%	$ 20.226.872.968,18				
DICIEMBRE 2026	14,15%	$ 5.903.837.311,24	62,65%	$ 26.130.710.279,42				
ENERO 2027	15,23%	$ 6.352.403.860,58	77,88%	$ 32.483.114.140,00				
FEBRERO 2027	8,38%	$ 3.493.332.861,66	86,25%	$ 35.976.447.001,66				
MARZO 2027	3,25%	$ 1.356.278.905,33	89,50%	$ 37.332.725.906,99				
ABRIL 2027	1,00%	$ 415.799.386,56	90,50%	$ 37.748.525.293,55				
MAYO 2027	0,92%	$ 385.498.807,88	91,43%	$ 38.134.024.101,43				
JUNIO 2027	0,92%	$ 382.163.265,71	92,34%	$ 38.516.187.367,14				
JULIO 2027	1,22%	$ 509.666.498,18	93,56%	$ 39.025.853.865,32				
AGOSTO 2027	1,90%	$ 794.076.850,61	95,47%	$ 39.819.930.715,93				
SEPTIEMBRE 2027	1,93%	$ 804.408.673,34	97,40%	$ 40.624.566.587,42				
OCTUBRE 2027	2,01%	$ 837.227.198,15	99,40%	$ 41.461.566.587,42				
NOVIEBRE 2027	0,60%	$ 249.023.924,69	100,00%	$ 41.710.590.512,00				

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

Grafica Avance Físico

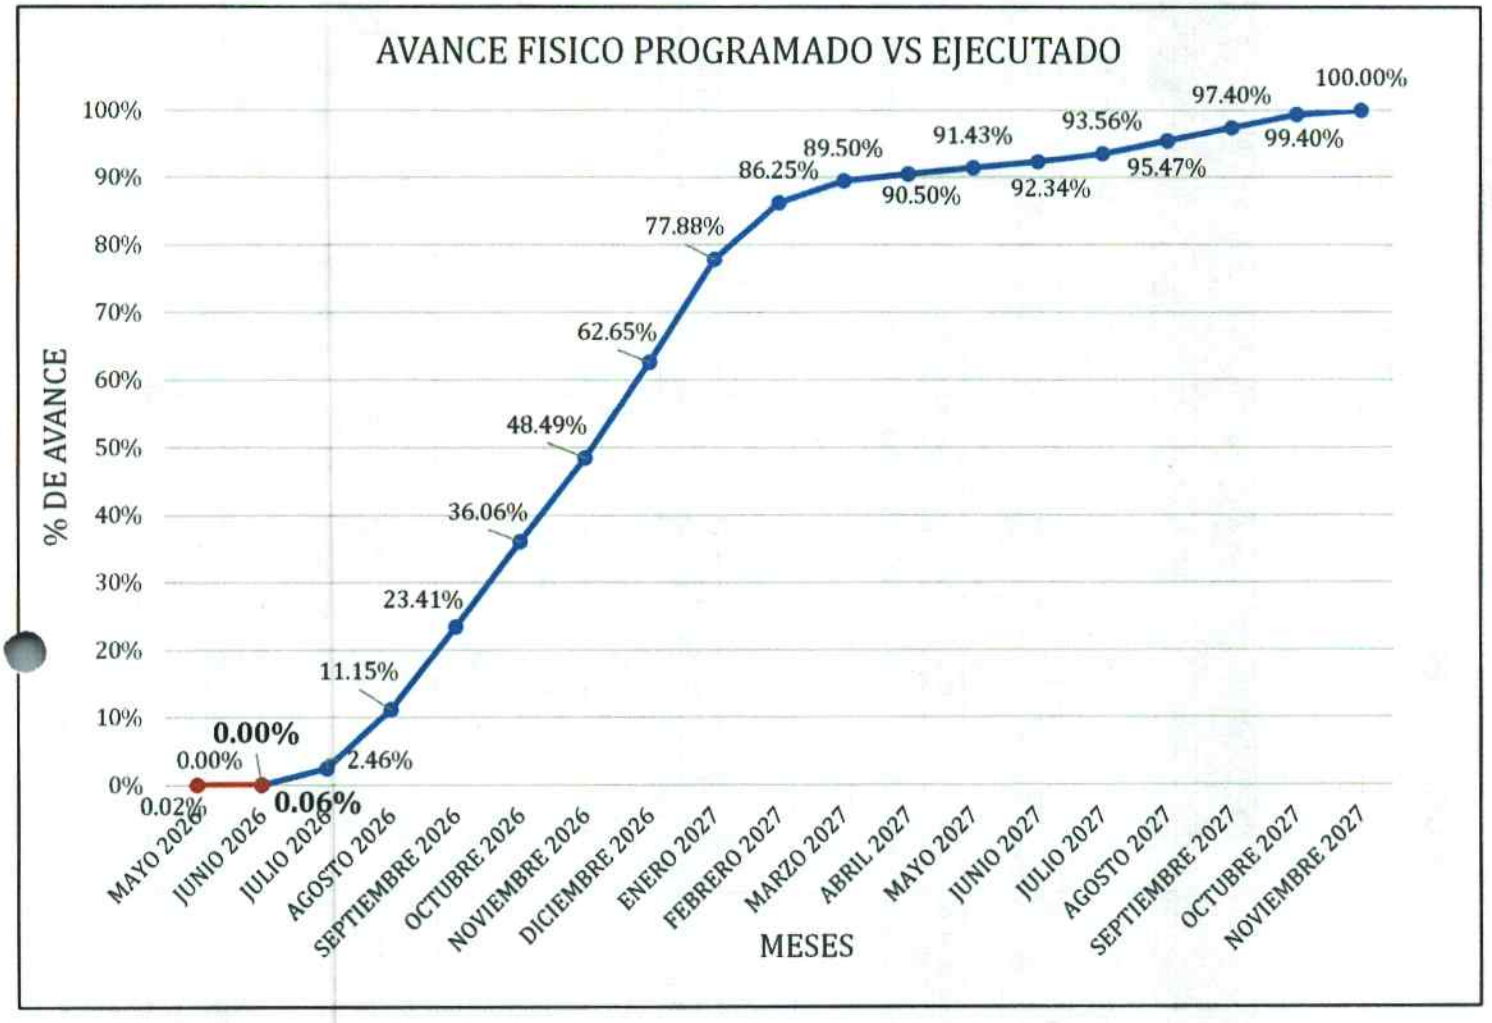

Durante el período correspondiente a este informe, se desarrollaron actividades de carácter administrativo orientadas a la preparación y puesta en marcha de la ejecución contractual.

El avance presentado en el cuadro y la gráfica anteriores corresponde al personal del contratista contemplado en el presupuesto aprobado del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), conformado por el Ingeniero Ambiental, el Auxiliar SST-A y el Trabajador Social. Igualmente, se incluyen los auxiliares de tránsito presentados en el Plan de Manejo de Transito (PMT).

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

Cantidades ejecutadas

ITEM No.	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				AVANCE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR		AVANCE EJECUTADO PRESENTE MES		AVANCE EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR		POCENTAJE ACUMULADO
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
1	PRELIMINARES													
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	23636.52	$ 4,689.00	$ 110,831,642.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	23636.52	$ 110,831,642.00	0.00%
SUBTOTAL					$ 110,831,642.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 110,831,642.00	0.00%
2	DEMOLICIONES Y DESMONTES													
2.1	DEMOLICIONES													
2.1.1	CORTES PAVIMENTO RIGIDO (CONCRETO E= 0.10 M)	M	723.33	$ 20,560.00	$ 14,871,665.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	723.33	$ 14,871,665.00	0.00%
2.1.2	DEMOLICION PAVIMENTO RIGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	362.17	$ 549,724.00	$ 199,093,541.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	362.17	$ 199,093,541.00	0.00%
2.1.3	DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	1277.52	$ 547,085.00	$ 698,912,029.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1277.52	$ 698,912,029.00	0.00%
2.1.4	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	63.13	$ 562,716.00	$ 35,524,261.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	63.13	$ 35,524,261.00	0.00%
2.1.5	DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE DE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	938.32	$ 17,420.00	$ 16,345,534.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	938.32	$ 16,345,534.00	0.00%
2.1.6	TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES.	VJ	342.00	$ 305,717.00	$ 104,555,214.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	342.00	$ 104,555,214.00	0.00%
2.2	DESMONTES													
2.2.1	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	3223.54	$ 9,054.00	$ 29,185,931.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	3223.54	$ 29,185,931.00	0.00%
2.2.2	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	3223.54	$ 25,809.00	$ 83,196,344.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	3223.54	$ 83,196,344.00	0.00%
2.2.3	DESMONTE DE SEÑAL VERTICAL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	U	68.00	$ 94,838.00	$ 6,448,984.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	68.00	$ 6,448,984.00	0.00%
2.2.4	DESTRONQUE Y RETIRO DE ARBOLES. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	U	154.00	$ 617,905.00	$ 95,157,370.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	154.00	$ 95,157,370.00	0.00%
SUBTOTAL					$ 1,283,290,873.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 1,283,290,873.00	0.00%
3	URBANISMO													
3.1	EXCAVACIONES													
3.1.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	5907.48	$ 98,100.00	$ 579,523,788.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	5907.48	$ 579,523,788.00	0.00%
3.1.2	TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES.	VJ	1097.00	$ 305,717.00	$ 335,371,549.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1097.00	$ 335,371,549.00	0.00%
3.2	RELLENOS													
3.2.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO,	M3	7369.40	$ 88,867.00	$ 654,896,470.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	7369.40	$ 654,896,470.00	0.00%

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

ITEM No.	CONDICIONES ACTUALIZADAS					AVANCE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR		AVANCE EJECUTADO PRESENTE MES		AVANCE EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR		POCENTAJE ACUMULADO
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
	NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.													
3.2.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR	M3	1725.22	$ 187,378.00	$ 323,268,273.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1725.22	$ 323,268,273.00	0.00%
3.2.3	BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR. COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	462.01	$ 200,593.00	$ 92,675,972.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	462.01	$ 92,675,972.00	0.00%
3.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVILLA TRITURADA DE 1 1/2", INCLUYE EXTENDIDA Y NIVELACION.	M3	83.63	$ 198,955.00	$ 16,638,607.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	83.63	$ 16,638,607.00	0.00%
3.2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR.	M3/KM	113876.80	$ 2,309.00	$ 262,941,531.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	113876.80	$ 262,941,531.00	0.00%
3.3	**SARDINELES, BORDILLOS Y ANDENES**													
3.3.1	SARDINEL EN CONCRETO TIPO A-10, MEDIDAS H=0.50 m, E=0.20. CONCRETO 3.000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, MEZCLA EN OBRA). INCLUYE ACERO DE REFUERZO, LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO Y DILATACION.	M	1853.72	$ 264,942.00	$ 491,128,284.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1853.72	$ 491,128,284.00	0.00%
3.3.2	BORDILLO EN CONCRETO TIPO A-80, MEDIDAS H=0.35 m, E=0.20 m. CONCRETO 3.000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, MEZCLA EN OBRA). INCLUYE ACERO DE REFUERZO, LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO Y DILATACION.	M	9355.99	$ 208,504.00	$ 1,950,761,339.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	9355.99	$ 1,950,761,339.00	0.00%
3.3.3	REMATE RAMPA TIPO A-105, MEDIDAS H=0.275 m, B=0.40 m. CONCRETO 3.000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, MEZCLA EN OBRA). INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	M	139.40	$ 123,756.00	$ 17,251,586.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	139.40	$ 17,251,586.00	0.00%
3.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO DE CONCRETO RAMPA VEHICULAR TIPO A-100. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	U	126.00	$ 104,977.00	$ 13,227,102.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	126.00	$ 13,227,102.00	0.00%
3.3.5	SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO DE CONCRETO BAJO RAMPA TIPO A-85. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	M	369.91	$ 120,705.00	$ 44,649,987.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	369.91	$ 44,649,987.00	0.00%
3.3.6	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA PREFABRICADA EN	M2	903.75	$ 235,016.00	$ 212,395,710.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	903.75	$ 212,395,710.00	0.00%

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

ITEM No.	CONDICIONES ACTUALIZADAS					AVANCE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR		AVANCE EJECUTADO PRESENTE MES		AVANCE EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR		POCENTAJE ACUMULADO
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
	CONCRETO TIPO A-50 COLOR. MEDIDAS 40cm X 40cm X 6cm.													
3.3.7	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA EN CONCRETO TACTIL ALERTA TIPO A-55 COLOR. MEDIDAS 40cm X 40cm X 6cm.	M2	641.13	$ 273,834.00	$ 175,563,192.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	641.13	$ 175,563,192.00	0.00%
3.3.8	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA EN CONCRETO TACTIL GUIA TIPO A-56 COLOR. MEDIDAS 40cm X 40cm X 6cm.	M2	683.16	$ 273,834.00	$ 187,072,435.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	683.16	$ 187,072,435.00	0.00%
3.3.9	PLACA DE CONTRAPISO ESTAMPADO Y ACABADO EN COLOR, CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) E=0,10 M, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 5000 KG/CM2, MEZCLADA EN OBRA, COLOCACION, AMARRE Y CONSTRUCCION.	M2	8249.69	$ 625,058.00	$ 5,156,534,732.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	8249.69	$ 5,156,534,732.00	0.00%
3.3.10	PLACA DE CONTRAPISO ESTAMPADO Y ACABADO EN COLOR, CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) E=0.20 M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO fy=420 MPa / G60, MEZCLADA EN OBRA, COLOCACION, AMARRE Y CONSTRUCCION.	M2	767.81	$ 1,455,389.00	$ 1,117,462,228.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	767.81	$ 1,117,462,228.00	0.00%
3.3.11	CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 MEDIDAS 1,20M X 1,20M X 1,20M. EN LADRILLLO DE PERFORACION VERTICAL PORTANTE e=0,12 M CON ACERO DE REFUERZO VERTICAL, INCLUYE VIGA DE CIMENTACION Y ACERO DE REFUERZO.	U	211.00	$ 3,188,896.00	$ 672,857,056.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	211.00	$ 672,857,056.00	0.00%
3.4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**													
3.4.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	18.81	$ 951,600.00	$ 17,899,596.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	18.81	$ 17,899,596.00	0.00%
3.4.2	VIGA DE CIMENTACION SECCION 0.25Mx0.65M EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO fy=420 MPa / G60.	M	27.65	$ 746,673.00	$ 20,645,508.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	27.65	$ 20,645,508.00	0.00%
3.4.3	MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, E= 0.20M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO fy=420 MPa / G60.	M2	27.65	$ 679,354.00	$ 18,784,138.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	27.65	$ 18,784,138.00	0.00%
3.4.4	ESCALERA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO fy=420 MPa / G60.	M3	1.88	$ 4,274,492.00	$ 8,036,045.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.88	$ 8,036,045.00	0.00%
3.4.5	BANCA EN CONCRETO 20.7 MPa - 3000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, MEZCLA EN OBRA). INCLUYE ACERO DE REFUERZO fy=420 MPa / G60.	M	372.50	$ 1,572,359.00	$ 585,703,728.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	372.50	$ 585,703,728.00	0.00%
3.4.6	BANCA TIPO MATERAS CON ESPALDAR EN CONCRETO 20.7 MPa - 3000 PSI (FUNDIDO EN SITIO,	M	118.91	$ 2,324,296.00	$ 276,382,037.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	118.91	$ 276,382,037.00	0.00%

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

ITEM No.	CONDICIONES ACTUALIZADAS					AVANCE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR		AVANCE EJECUTADO PRESENTE MES		AVANCE EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR		POCENTAJE ACUMULADO
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
	MEZCLA EN OBRA). INCLUYE ACERO DE REFUERZO fy=420 MPa / G60.													
3.5	CONSTRUCCION CICLORUTA													
3.5.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	M2	2158.68	$ 5,518.00	$ 11,911,596.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2158.68	$ 11,911,596.00	0.00%
3.5.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION.	M3	107.93	$ 1,550,975.00	$ 167,396,732.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	107.93	$ 167,396,732.00	0.00%
	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3-KM	13673.65	$ 2,689.00	$ 36,768,445.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	13673.65	$ 36,768,445.00	0.00%
3.6	MOBILIARIO URBANO													
3.6.1	PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS TIPO M91 SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA.	U	123.00	$ 490,647.00	$ 60,349,581.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	123.00	$ 60,349,581.00	0.00%
3.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA CON EL LOGO DE LA ENTIDAD. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA.	U	60.00	$ 2,783,155.00	$ 166,989,300.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	60.00	$ 166,989,300.00	0.00%
3.6.3	CICLO-PARQUEADERO TIPO M101 (TIPO 2) (H=0.6 M, L=2.0 M, A=0.6 M). SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA.	U	4.00	$ 1,235,576.00	$ 4,942,304.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	4.00	$ 4,942,304.00	0.00%
3.6.4	BARANDA METALICA EN TUBO DE AGUAS NEGRAS DE 1-1/2" X 2.0 mm, PERNOS DE ANCLAJE DE 5/8", PLATINA DE FIJACION DE 15 cm x 15 cm DE 1/4", INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	M	27.65	$ 798,855.00	$ 22,088,341.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	27.65	$ 22,088,341.00	0.00%
3.6.5	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60. SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE BASE EN CONCRETO 2500 PSI MEZCLA EN OBRA	U	68.00	$ 366,909.00	$ 24,949,812.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	68.00	$ 24,949,812.00	0.00%
3.7	PAISAJISMO													
3.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA, INCLUYE TIERRA NEGRA.	M2	2621.65	$ 101,357.00	$ 265,722,579.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2621.65	$ 265,722,579.00	0.00%
3.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOL OITI H=1.50 m	U	222.00	$ 215,360.00	$ 47,809,920.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	222.00	$ 47,809,920.00	0.00%
3.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA	M3	202.11	$ 306,796.00	$ 62,006,540.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	202.11	$ 62,006,540.00	0.00%
3.8	SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL													
3.8.1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA EN BASE SOLVENTE PARA CICLORUTA, INCLUYE IMPRIMANTE ACRILICO Y DEMARCACION VIAL.	M2	2375.81	$ 193,860.00	$ 460,574,527.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2375.81	$ 460,574,527.00	0.00%
3.8.2	SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA CUADRADA DE 0.45M X 0.45M PARA CICLORUTA, INCLUYE PARAL 3M, ANGULO DE 2"X2"X1/4", LAMINA	U	27.00	$ 547,386.00	$ 14,779,422.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	27.00	$ 14,779,422.00	0.00%

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

ITEM No.	CONDICIONES ACTUALIZADAS					AVANCE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR		AVANCE EJECUTADO PRESENTE MES		AVANCE EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR		POCENTAJE ACUMULADO
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
	CAL. 16 SEÑALIZADA POR UNA CARA. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE 2500 PSI MEZCLA EN OBRA.													
3.8.3	SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA CIRCULAR D=0.45M PARA CICLORUTA, INCLUYE PARAL 3M, ANGULO DE 2"X2"X1/4", LAMINA CAL. 16 SEÑALIZADA POR UNA CARA. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE 2500 PSI MEZCLA EN OBRA.	U	30.00	$ 547,386.00	$ 16,421,580.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	30.00	$ 16,421,580.00	0.00%
3.8.4	SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA CUADRADA DE 0.45M X 0.45M PARA CICLORUTA, INCLUYE PARAL 3M, ANGULO DE 2"X2"X1/4", LAMINA CAL. 16 SEÑALIZADA POR UNA CARA. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE 2500 PSI MEZCLA EN OBRA.	U	2.00	$ 547,386.00	$ 1,094,772.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 1,094,772.00	0.00%
3.9	**SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL**													
3.9.1	DISEÑO Y ELABORACION DE MONUMENTO URBANO ESCENOGRAFICO INSTAGRAMEABLE.	U	1.00	$ 712,315,786.00	$ 712,315,786.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 712,315,786.00	0.00%
3.9.2	DISEÑO Y ELBORACION DE MURALISMO URBANO SOBRE MURO.	M2	93.94	$ 1,808,598.00	$ 169,899,696.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	93.94	$ 169,899,696.00	0.00%
3.9.3	DISEÑO, ELABORACION E INSTALACION DE ESCULTURA URBANA ESCENOGRAFICAS PARA EXTERIORES INSTAGRAMEABLES.	U	1.00	$ 116,720,263.00	$ 116,720,263.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 116,720,263.00	0.00%
SUBTOTAL					**$ 15,594,412,089.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 15,594,412,089.00**	**0.00%**
4	**CASETAS Y PARADEROS**													
4.1	**PRELIMINARES**													
4.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	296.14	$ 4,689.00	$ 1,388,600.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	296.14	$ 1,388,600.00	0.00%
4.2	**EXCAVACIONES**													
4.2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	87.39	$ 98,100.00	$ 8,572,959.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	87.39	$ 8,572,959.00	0.00%
4.2.2	TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES.	VJ	39.21	$ 305,717.00	$ 11,987,164.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	39.21	$ 11,987,164.00	0.00%
4.3	**RELLENOS**													
4.3.1	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. COMPACTACION MANUAL.	M3	54.10	$ 42,700.00	$ 2,310,070.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	54.10	$ 2,310,070.00	0.00%
4.4	**CIMENTACION**													
4.4.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	3.47	$ 951,600.00	$ 3,302,052.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	3.47	$ 3,302,052.00	0.00%

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

ITEM No.	CONDICIONES ACTUALIZADAS					AVANCE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR		AVANCE EJECUTADO PRESENTE MES		AVANCE EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR		POCENTAJE ACUMULADO
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
4.4.2	ZAPATA SECCION 1.00Mx1.00Mx0.25M EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO fy=420 MPa / G60.	U	32.00	$ 1,006,686.00	$ 32,213,952.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	32.00	$ 32,213,952.00	0.00%
4.4.3	VIGA DE CIMENTACION SECCION 0.30Mx0.30M EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO fy=420 MPa / G60.	M	170.76	$ 525,421.00	$ 89,720,890.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	170.76	$ 89,720,890.00	0.00%
4.4.4	PEDESTAL SECCION 0.35Mx0.35Mx0.75M, EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO fy=420 MPa / G60.	U	32.00	$ 863,753.00	$ 27,640,096.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	32.00	$ 27,640,096.00	0.00%
4.5	**ACERO ESTRUCTURAL**													
4.5.1	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACION, MONTAJE Y PINTURA).	KG	5721.08	$ 44,204.00	$ 252,894,620.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	5721.08	$ 252,894,620.00	0.00%
4.5.2	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A572 (FABRICACION, MONTAJE Y PINTURA).	KG	2242.30	$ 44,702.00	$ 100,235,295.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2242.30	$ 100,235,295.00	0.00%
4.5.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 (FABRICACION, MONTAJE Y PINTURA).	KG	965.76	$ 44,850.00	$ 43,314,336.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	965.76	$ 43,314,336.00	0.00%
4.6	**PLACA DE CONTRAPISO**													
4.6.1	PLACA DE CONTRAPISO ESTAMPADO Y ACABADO EN COLOR, CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) E=0,10 M, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 5000 KG/CM2, MEZCLADA EN OBRA, COLOCACION, AMARRE Y CONSTRUCCION.	M2	24.50	$ 625,058.00	$ 15,313,921.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	24.50	$ 15,313,921.00	0.00%
4.7	**CUBIERTA**													
4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO PREPINTADO CALIBRE 26.	M2	279.98	$ 219,849.00	$ 61,553,323.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	279.98	$ 61,553,323.00	0.00%
4.8	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**													
4.8.1	PUNTO HIDRAULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	U	4.00	$ 74,589.00	$ 298,356.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	4.00	$ 298,356.00	0.00%
4.8.2	ACCESORIO CPVC 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	U	36.00	$ 5,880.00	$ 211,680.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	36.00	$ 211,680.00	0.00%
4.8.3	VALVULA DE CORTE 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	U	2.00	$ 56,422.00	$ 112,844.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 112,844.00	0.00%
4.8.4	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACION	M	20.00	$ 40,710.00	$ 814,200.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	20.00	$ 814,200.00	0.00%
4.8.5	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACION	U	8.00	$ 15,286.00	$ 122,288.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	8.00	$ 122,288.00	0.00%

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

ITEM No.	CONDICIONES ACTUALIZADAS					AVANCE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR		AVANCE EJECUTADO PRESENTE MES		AVANCE EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR		POCENTAJE ACUMULADO
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
4.8.6	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	U	2.00	$ 94,206.00	$ 188,412.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 188,412.00	0.00%
4.8.7	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	U	2.00	$ 107,694.00	$ 215,388.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 215,388.00	0.00%
4.8.8	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	U	2.00	$ 761,030.00	$ 1,522,060.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 1,522,060.00	0.00%
4.8.9	MONTAJE LAVAPLATOS	U	2.00	$ 62,918.00	$ 125,836.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 125,836.00	0.00%
4.9	**SISTEMA DE EVACUACION AGUAS LLUVIAS**													
4.9.1	SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON TAPAS, SOSCOS, ACCESORIOS, ANTICORROSIVO Y PINTURA.	M	118.50	$ 233,223.00	$ 27,636,926.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	118.50	$ 27,636,926.00	0.00%
4.9.2	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 3" PVC SUMINISTRO E INSTALACION	M	35.00	$ 24,079.00	$ 842,765.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	35.00	$ 842,765.00	0.00%
4.10	**INSTALACIONES ELECTRICAS**													
4.10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA MEDIDOR MONOFASICO EN POLICARBONATO, INCLUYE MEDIDOR MONOFASICO Y ACCESORIOS DE INSTALACION.	U	2.00	$ 982,372.00	$ 1,964,744.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 1,964,744.00	0.00%
4.10.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE INSPECCION DE 30CMX30CM CON CIERRE HERMETICO, INCLUYE VARILLA EN COBRE Y CONECTOR.	U	2.00	$ 658,360.00	$ 1,316,720.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 1,316,720.00	0.00%
4.10.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 4 CIRCUITOS MONOFASICO; INCLUYE PROTECCIONES.	U	2.00	$ 429,782.00	$ 859,564.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 859,564.00	0.00%
4.10.4	SALIDA DE LAMPARA TIPO T8 DE 2*32 SUMINISTRO E INSTALACION.	U	4.00	$ 294,322.00	$ 1,177,288.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	4.00	$ 1,177,288.00	0.00%
4.10.5	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACION.	U	2.00	$ 248,460.00	$ 496,920.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 496,920.00	0.00%
4.10.6	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACION.	U	6.00	$ 169,119.00	$ 1,014,714.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6.00	$ 1,014,714.00	0.00%
SUBTOTAL					**$ 689,367,983.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 689,367,983.00**	**0.00%**
5	**CONSTRUCCION MURO CERRAMIENTO CEMENTERIO**													
5.1	**PRELIMINARES**													
5.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	114.88	$ 4,689.00	$ 538,672.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	114.88	$ 538,672.00	0.00%
5.2	**EXCAVACIONES**													
5.2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	39.45	$ 98,100.00	$ 3,870,045.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	39.45	$ 3,870,045.00	0.00%
5.2.2	TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES.	VJ	4.00	$ 305,717.00	$ 1,222,868.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	4.00	$ 1,222,868.00	0.00%
5.3	**RELLENOS**													
5.3.1	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE	M3	20.34	$ 42,700.00	$ 868,518.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	20.34	$ 868,518.00	0.00%

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

ITEM No.	CONDICIONES ACTUALIZADAS					AVANCE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR		AVANCE EJECUTADO PRESENTE MES		AVANCE EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR		POCENTAJE ACUMULADO
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
	LA EXCAVACION. COMPACTACION MANUAL.													
5.4	**CIMENTACION**													
5.4.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	2.54	$ 951,600.00	$ 2,417,064.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.54	$ 2,417,064.00	0.00%
5.4.2	ZAPATA SECCION 1.00Mx1.00Mx0.25M EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO fy=420 MPa / G60.	U	23.00	$ 1,006,348.00	$ 23,146,004.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	23.00	$ 23,146,004.00	0.00%
5.4.3	VIGA DE CIMENTACION SECCION 0.30Mx0.30M EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO fy=420 MPa / G60.	M	114.88	$ 525,421.00	$ 60,360,364.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	114.88	$ 60,360,364.00	0.00%
5.5	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**													
5.5.1	COLUMNA SECCION 0.30Mx0.30M EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO fy=420 MPa / G60.	M	74.75	$ 559,364.00	$ 41,812,459.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	74.75	$ 41,812,459.00	0.00%
5.5.2	COLUMNA SECCION 0.15Mx0.40M EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO fy=420 MPa / G60.	M	20.00	$ 461,291.00	$ 9,225,820.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	20.00	$ 9,225,820.00	0.00%
5.5.3	ALFAJIAS 0.40 X 0.07 M, EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION, INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.	M	114.88	$ 243,648.00	$ 27,990,282.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	114.88	$ 27,990,282.00	0.00%
5.5.4	VIGA AEREA SECCION 0.20Mx0.30M EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO fy=4200 Mpa/G60.	M	114.88	$ 421,695.00	$ 48,444,322.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	114.88	$ 48,444,322.00	0.00%
5.5.5	PLACA MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) E= 0,10 M, MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO PDR 60.	M2	13.56	$ 380,369.00	$ 5,157,804.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	13.56	$ 5,157,804.00	0.00%
5.6	**MAMPOSTERIA, PAÑETE Y PINTURA**													
5.6.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3).	M2	389.84	$ 80,137.00	$ 31,240,608.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	389.84	$ 31,240,608.00	0.00%
5.6.2	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACION.	M2	689.28	$ 53,330.00	$ 36,759,302.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	689.28	$ 36,759,302.00	0.00%
5.6.3	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS.	M2	689.28	$ 20,433.00	$ 14,084,058.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	689.28	$ 14,084,058.00	0.00%
SUBTOTAL					**$ 307,138,190.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 307,138,190.00**	**0.00%**
6	**VIAS URBANAS**													
6.1	**EXCAVACIONES**													
6.1.1	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS INCLUYE CARGUE.	M3	544.09	$ 69,200.00	$ 37,651,028.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	544.09	$ 37,651,028.00	0.00%

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

ITEM No.	CONDICIONES ACTUALIZADAS					AVANCE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR		AVANCE EJECUTADO PRESENTE MES		AVANCE EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR		POCENTAJE ACUMULADO
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
6.1.2	TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES.	VJ	102.00	$ 305,717.00	$ 31,183,134.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	102.00	$ 31,183,134.00	0.00%
6.2	RELLENOS													
6.2.1	SUBBASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR	M3	562.68	$ 187,378.00	$ 105,433,853.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	562.68	$ 105,433,853.00	0.00%
6.2.2	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR.	M3/KM	17825.00	$ 2,309.00	$ 41,157,925.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	17825.00	$ 41,157,925.00	0.00%
6.3	PAVIMENTOS DE CONCRETO													
6.3.1	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 40 KG/CM2 O 4.0 MPA, INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS (TRANSFERENCIA/AMARRE), VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA.	M3	375.96	$ 1,664,890.00	$ 625,932,044.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	375.96	$ 625,932,044.00	0.00%
6.3.2	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO PARA AREAS IRREGULARES MR 40 KG/CM2 O 4.0 MPA, INCLUYE FUNDIDO, FORMALETEADO, BARRAS (TRANSFERENCIA/AMARRE), ACERO DE REFUERZO fy=420 MPa / G60, VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS.	M3	310.03	$ 3,261,939.00	$ 1,011,298,948.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	310.03	$ 1,011,298,948.00	0.00%
6.4	REDUCTORES DE VELOCIDAD													
6.4.1	REDUCTOR DE VELOCIDAD TIPO POMPEYANO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO fy=420 MPa / G60.	M	11.40	$ 8,465,471.00	$ 96,506,369.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	11.40	$ 96,506,369.00	0.00%
6.5	SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL													
6.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA ACRILICA EN BASE SOLVENTE PARA LA DEMARCACION VIAL, INCLUYE IMPRIMANTE ACRILICO Y MICROESFERAS.	M2	1166.47	$ 206,021.00	$ 240,317,316.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1166.47	$ 240,317,316.00	0.00%
6.5.2	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 60 X 60 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACION.	U	43.00	$ 439,137.00	$ 18,882,891.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	43.00	$ 18,882,891.00	0.00%
6.5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) DIMENSIONES DE 0.75M X 0.34M X 0.55M, INCLUYE PARAL 3M, ANGULO DE 2"X2"X1/4", LAMINA CAL. 16 SEÑALIZADA POR UNA CARA. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE 2500 PSI, MEZCLA EN OBRA.	U	6.00	$ 717,780.00	$ 4,306,680.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6.00	$ 4,306,680.00	0.00%
6.5.4	SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA SR-1 (PARE) OCTAGONO ALTURA 60 CM CON PARAL EN ANGULO	U	23.00	$ 516,055.00	$ 11,869,265.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	23.00	$ 11,869,265.00	0.00%

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com
