
	FORMATO	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**SEMANA 9**


CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CCC CIENAGA NIT: 902 046 185 - 4 RL/ DANILO JOSE DURANGO BOTIA	**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO DE OBRA NO.	328 de 18 de Marzo de 2026	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO CIÉNAGA DE ORO DEL DEPARTAMENTO CÓRDOBA	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER CIENGA AVC NIT: NIT 902 047 304 - 9 RL/ ANDRES FELIPE FERIA AGUIRRE		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	325 de 17 de Marzo de 2026	**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**	
VALOR INICIAL	$ 1.846.610.986,00		
PLAZO CONTRACTUAL	5 meses		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.846.610.986,00	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO CIÉNAGA DE ORO DEL DEPARTAMENTO CÓRDOBA.	
FECHA DE INICIACIÓN	miércoles, 15 de julio de 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	martes, 15 de diciembre de 2026		

SEMANA NUMERO.	**9**	**DEL**	7/09/2026	**AL**	12/09/2026	**DIAS TRANSCURRIDOS DESDE EL INICIO**	60


AVANCE DEL CONTRATO

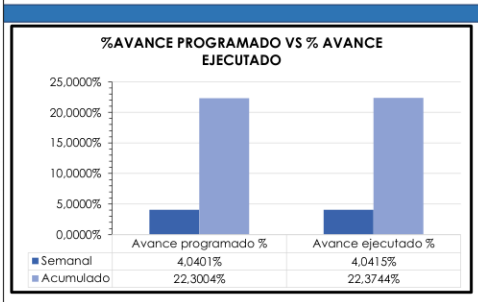

Semanal	Acumulado	
4,0401%	22,3004%	Avance programado %
$ 74.605.503,66	$ 411.801.490,52	Valor programado
4,0415%	22,3744%	Avance ejecutado %
$ 413.168.106,65	$ 413.168.106,65	Valor ejecutado

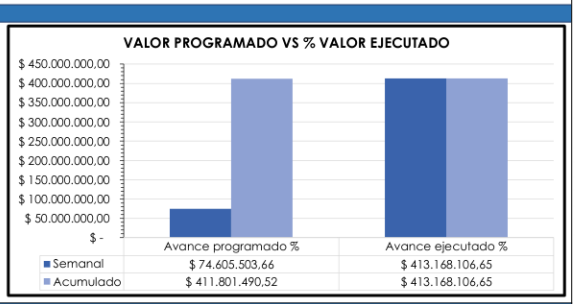

GRAFICA DE AVANCE

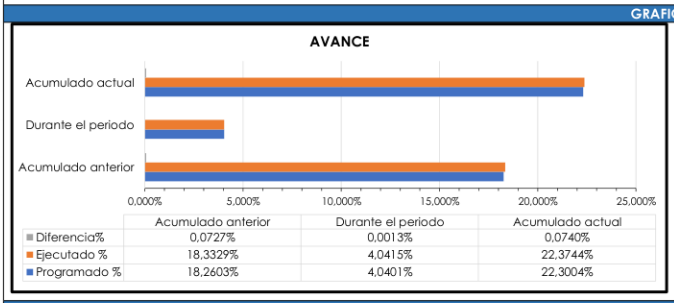

Programado %	Ejecutado %	Diferencia%		
18,2603%	18,3329%	0,0727%	Acumulado anterior	Ok,Adelantados
4,0401%	4,0415%	0,0013%	Durante el periodo	Ok,Adelantados
22,3004%	22,3744%	0,0740%	Acumulado actual	Ok,Adelantados

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE AVANCE ACUMULADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO
1,0	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**							
Subtotal					**$ 39.221.436,09**		**2,12%**	**$ 39.221.436,09**
2,0	**CIMENTACIONES**							
Subtotal					**$ 94.094.346,44**		**5,10%**	**$ 94.094.346,44**
3,0	**ESTRUCTURAS**							
Subtotal					**$ 82.929.614,98**		**4,49%**	**$ 82.929.614,98**
4,0	**MAMPOSTERÍA**							
4,1	**EDIFICIO DE SERVICIO**							
4,2	**AREA POLIVALENTE MULTIPROPOSITO**							
4,2,3	Suministro, figurado e intalación de acero horizontal de refuerzo según despiece estructural, Fy=420 MPa (4200 kg/cm2/) NTC-2289.	Kg	72,92	$ 13.791,77	$ 1.005.695,88	72,92	0,0545%	$ 1.005.695,88
4,2,4	Suministro y colocación de epoxico a traccion	m	7,20	$ 137.022,30	$ 986.560,53	7,20	0,0534%	$ 986.560,53
4,2,5	Suministro de mortero para dovela	m3	9,60	$ 975.299,17	$ 9.362.872,04	9,60	0,5070%	$ 9.362.872,04
Subtotal					**$ 105.187.268,15**		**5,70%**	**$ 105.187.268,15**
5,0	**PLACA "PAZ A LO BIEN"**							
Subtotal					**$ 7.771.829,37**		**0,00%**	**$ -**
6,0	**PINTURA Y ACABADOS**							
Subtotal					**$ 18.282.886,57**		**0,00%**	**$ -**
7,0	**CUBIERTA**							
7,1	**EDIFICIO DE SERVICIO**							
7,1,1	Levante en mamposteria en bloque de concreto 12Mpa, incluye mortero de pega tipo S: f'cp= 12.5MPa (125Kg/cm²), con acabado split	m2	7,86	$ 237.879,75	$ 1.869.734,85	7,86	0,1013%	$ 1.869.734,85
7,1,2	Suministro e instalación de lamina termoacústica tipo Sandwich e=18mm	m2	90,03	$ 549.067,15	$ 49.430.319,65	90,03	2,6768%	$ 49.430.319,65
7,1,3	Suministro y colocación de concreto de F'c= 21MPa para viga cinta de 0,10x0,15m.	m3	0,80	$ 1.547.906,40	$ 1.236.622,42	0,40	0,0335%	$ 618.311,21
Subtotal					**$ 268.229.847,05**		**2,81%**	**$ 51.918.365,71**
8,0	**IMPERMEABILIZACIONES**							
Subtotal					**$ 4.879.736,45**		**0,00%**	**$ -**
9,0	**CARPINTERIA METALICA**							
Subtotal					**$ 39.260.462,35**		**0,00%**	**$ -**
10,0	**ESPACIO PUBLICO**							
Subtotal					**$ 89.073.503,90**		**0,00%**	**$ -**
11,0	**PLAZAS Y ANDENES**							
Subtotal					**$ 696.317.769,43**		**0,00%**	**$ -**
12,0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS**							
12,1	**RED SANITARIA**							
12,1,5	Suministro y colocación de capa de arena para cimentacion de tuberia emax= 15cm.	m3	4,83	$ 144.767,30	$ 699.611,74	4,83	0,0379%	$ 699.611,74
12,1,6	sifon de piso y rejilla de 2"	Und	5,00	$ 70.553,76	$ 352.768,80	5,00	0,0191%	$ 352.768,80
12,1,7	Ramal de desagüe, tubería 2" pvc. Incluye suministro e intalacion de accesorios según diseños.	m	48,08	$ 54.095,97	$ 2.600.934,44	48,08	0,1408%	$ 2.600.934,44
12,1,8	Ramal de desagüe tubería 4" pvc. Incluye suministro e intalacion de accesorios según diseños.	m	57,75	$ 80.276,02	$ 4.635.940,40	57,75	0,2511%	$ 4.635.940,40
12,1,9	Construcción de cajas de registro de 50x50cm en mamposteria.	m2	8,15	$ 157.234,20	$ 1.281.458,76	8,15	0,0694%	$ 1.281.458,76
12,1,10	Construcción de cajas de registro de 70x70cm en mamposteria.	m2	2,28	$ 157.234,20	$ 358.808,45	2,28	0,0194%	$ 358.808,45
Subtotal					**$ 126.450.174,22**		**1,36%**	**$ 25.092.317,47**
13,0	**INSTALACIONES ELECTRICAS**							
Subtotal					**$ 227.395.176,97**		**0,00%**	**$ -**
CERTIFICACIONES RETIE - RETILAP		1,00	$ 13.440.042,00		**$ 13.440.042,00**		**-**	$ -
IMPACTO AMBIENTAL Y URBANO		1,00	$ 16.794.462,00		**$ 16.794.462,00**	0,43	**0,39%**	$ 7.256.952,46
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (PGIO)		1,00	$ 17.282.430,00		**$ 17.282.430,00**	0,43	**0,40%**	$ 7.467.805,34
TOTAL ACUMULADO					**$ 1.846.610.986,00**		**22,3744%**	**$ 413.168.106,65**

	FORMATO	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**SEMANA 9**


CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CCC CIENAGA NIT: 902 046 185 - 4 RL/ DANILO JOSE DURANGO BOTIA	**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO DE OBRA NO.	328 de 18 de Marzo de 2026	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO CIÉNAGA DE ORO DEL DEPARTAMENTO CÓRDOBA	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER CIENGA AVC NIT: NIT 902 047 304 - 9 RL/ ANDRES FELIPE FERIA AGUIRRE		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	325 de 17 de Marzo de 2026	**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**	
VALOR INICIAL	$ 1.846.610.986,00		
PLAZO CONTRACTUAL	5 meses	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO CIÉNAGA DE ORO DEL DEPARTAMENTO CÓRDOBA.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.846.610.986,00		
FECHA DE INICIACIÓN	miércoles, 15 de julio de 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	martes, 15 de diciembre de 2026		

SEMANA NUMERO.	**9**	**DEL**	7/09/2026	**AL**	12/09/2026	**DIAS TRANSCURRIDOS DESDE EL INICIO**	60

Realizó. ANDRES FERIA AGUIRRE INTERVENTORIA	Revisó. ADALBERTO SOLOMAYOR RUIZ SECRETRARIO DE OBRAS PUBLICAS - MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO	Supervisó. DAVID GONZALES PUENTE SUPERVISOR DEL CONTRATO
Realizó. DANILO DURANGO BOTIA REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO		
Realizó.		

REGISTRO FOTOGRAFICO




OBSERVACIONES

En el transcurso de esta semana se realizaron las actividades conrrespondientes a la culminacion del suministro, figuracion y colocacion del acero horizontal de dovelas, la colocacion del anclaje epoxico a traccion y el mortero de las dovelas en el Area Polivalente.
Igualmente en la Cubierta del Edificio de Servicio se culmino con la mamposteria de la cuchilla, la colocacion de la lamina termoacustica y se inicio la viga cinta de remate de cubierta.
Con respecto a las Instalaciones hidrosanitarias en el subcapitulo de la Red Sanitaria, se culmino con la colocacion de la capa de arena para la cama de la tuberia sanitaria, se colocaron los sifones de piso, se extendieron los ramales de desague tanto de Ø4" y Ø2" se construyeron las cajas de registro de 50x50 y de 70x70.
Se continuan tambien con las actividades correspondientes a los Programas de impacto ambiental y el Plan de Gestion Integral de la Obra (PGIO).
