

Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Unidad
1			**PROGRAMACIÓN DE OBRA - AUDITORIO RAFAEL URIBE URIBE**	**217,5 días**	**lun 16/02/26**	**lun 30/11/26**			
2			INICIO	0 días	lun 16/02/26	lun 16/02/26		3	
3			DIAGNOSTICO DE OBRA	45 días	lun 16/02/26	jue 16/04/26	2	10FC+15 d	
4			TRAMITES DERIVADOS DE LA ELABORACION DEL DISEÑO	45 días	mié 27/05/26	lun 7/09/26	20	53;52FC+2 días;54FC+	
5			**DESMONTES, RETIROS Y PRELIMINARES (LAS ACTIVIDADES INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION)**	**113,5 días**	**vie 17/04/26**	**mié 16/09/26**			
6		1,01	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA	2 días	sáb 18/04/26	mar 21/04/26	3FC+1 día	9CC+2 días;17;18	M2
7		1,02	DESMONTE MANUAL DE DIVISIONES MODULARES EN PERFILERÍA METÁLICA Y TABLEROS DE AGLOMERADO/TRIPLEX Y VIDRIO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	2 días	sáb 18/04/26	mar 21/04/26	3FC+1 día	9CC+2 días;17;18	M2
8		1,03	DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISIONES Y VIDRIOS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	1 día	sáb 18/04/26	lun 20/04/26	3FC+1 día	9CC+2 días;17;18	M2
9		1,04	DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	1 día	mar 21/04/26	mié 22/04/26	8CC+2 días;7CC+2 días;6CC+2 días	13FC+1 día;12FC+1 día	UN
10		1,07	DESMONTE DIVISION, PANEL DRY WALL Y RETIRO H=3M	1 día	jue 7/05/26	vie 8/05/26	3FC+15 días	100	M2
11		1,08	DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA).	2 días	mar 16/06/26	jue 18/06/26	3FC+43 días	47	M2
12		1,09	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO MODULAR PESADO	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	9FC+1 día	36;26;33	M2
13		1,11	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON E.<=10 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26	9FC+1 día	36;26;33	M2
14		1,12	DESMONTE DE APARATOS ELÉCTRICOS EN TECHO, PISO O PARED (TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, SENSORES, DETECTORES). INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD	8 días	vie 17/04/26	sáb 8/08/26	3		UN
15		1,13	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFE	8 días	lun 7/09/26	mié 16/09/26	3FC+54 días		M
16			**MAPOSTERIA Y RELACIONADOS**	**8 días**	**lun 14/09/26**	**mié 23/09/26**			
17		2,01	MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA	8 días	lun 14/09/26	mié 23/09/26	8;7;6	100;40CC;3	M3
18		2,03	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	8 días	lun 14/09/26	mié 23/09/26	8;6;7	40CC;39CC	M3
19			**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**139 días**	**vie 17/04/26**	**lun 19/10/26**			
20		NP 1	Diseño electrico de iluminacion fotometrica basados en requerimeintos retilap vigente, inlcuye; memorias planos electricos	23 días	vie 17/04/26	mar 19/05/26	3	4	

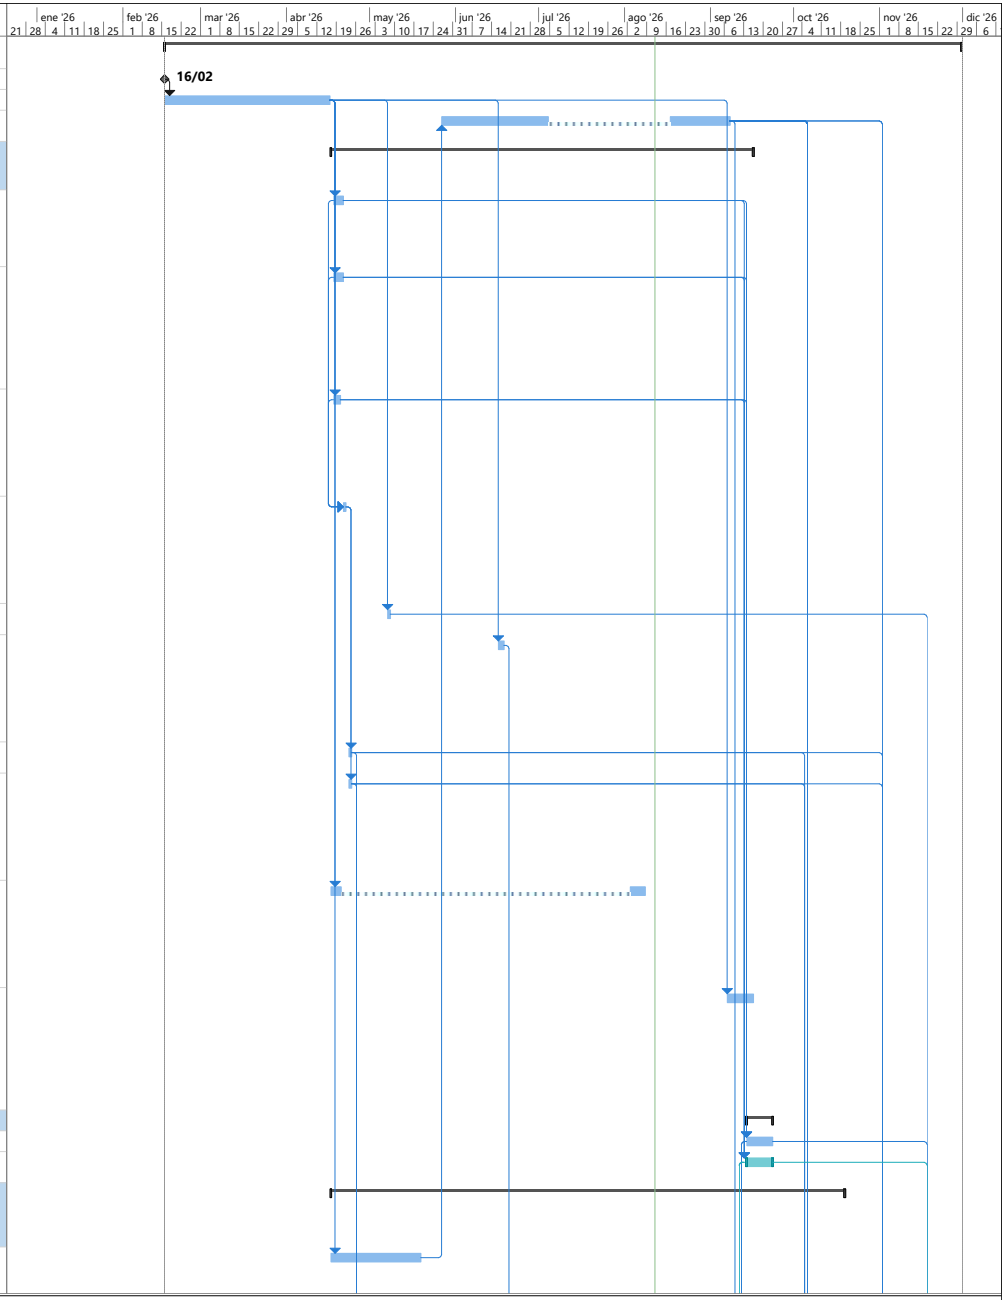

Proyecto: REPROGRAMACIÓN
Fecha: mié 12/08/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Unidad
21		3,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E	2 días	lun 12/10/26	mar 13/10/26		23CC	UN
22		3,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXI	2 días	lun 12/10/26	mar 13/10/26	85	23CC	UN
23		3,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A , INLUYE APARATO	2 días	lun 12/10/26	mar 13/10/26	21CC;22CC	24	UN
24		3,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E	4 días	mié 14/10/26	lun 19/10/26	23		UN
25			**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**	**30 días**	**lun 5/10/26**	**mié 11/11/26**			
26		4.03	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO +	5 días	lun 5/10/26	vie 9/10/26	13;12	27	M2
27		4.04	ACABADO DE PISO CON BALDOSA DE CERÁMICA DE 33,8X33,8 CM, TIPO DUROPISO DE CORONA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE DILATACIÓN DE ALUMINIO SEGÚN DISEÑO Y EMBOQUILLE, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA.	4 días	sáb 10/10/26	jue 15/10/26	26		M2
28		4.07	GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	3,5 días	lun 19/10/26	jue 22/10/26			M2
29		4.08	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	3 días	lun 19/10/26	mié 21/10/26			M2
30		4.09	CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM	3,5 días	lun 2/11/26	jue 5/11/26			M2
31		4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO DE 20 X 30	8 días	lun 2/11/26	mié 11/11/26			M2
32			**CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**15 días**	**lun 2/11/26**	**jue 19/11/26**			
33		5.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA EN MADERA CON RIELES, HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA, INCLUYE HERRAJES, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	15 días	lun 2/11/26	jue 19/11/26	13;12		M2
34		5.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA, HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA, INCLUYE HERRAJES, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	3,5 días	lun 2/11/26	jue 19/11/26			M2
35			**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).**	**166,5 días**	**vie 24/04/26**	**lun 30/11/26**			
36		6,01	CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS EN FIBROCEMENTO E.=6 MM, DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL.26, SOPORTADO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS	16 días	vie 24/04/26	vie 26/06/26	13;12		M2
37		6,03	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE DIVISIONES EN PANELERÍA LIVIANA ACABADO DOS (2) CARAS FABRICADAS EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE FIBROCEMENTO E.=6 MM, SIN FRESCASA, PERFILERÍA GALVANIZADA CR. BASE 9 CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE E	4 días	lun 5/10/26	lun 30/11/26			M2
38			**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**	**8 días**	**lun 5/10/26**	**mié 14/10/26**			

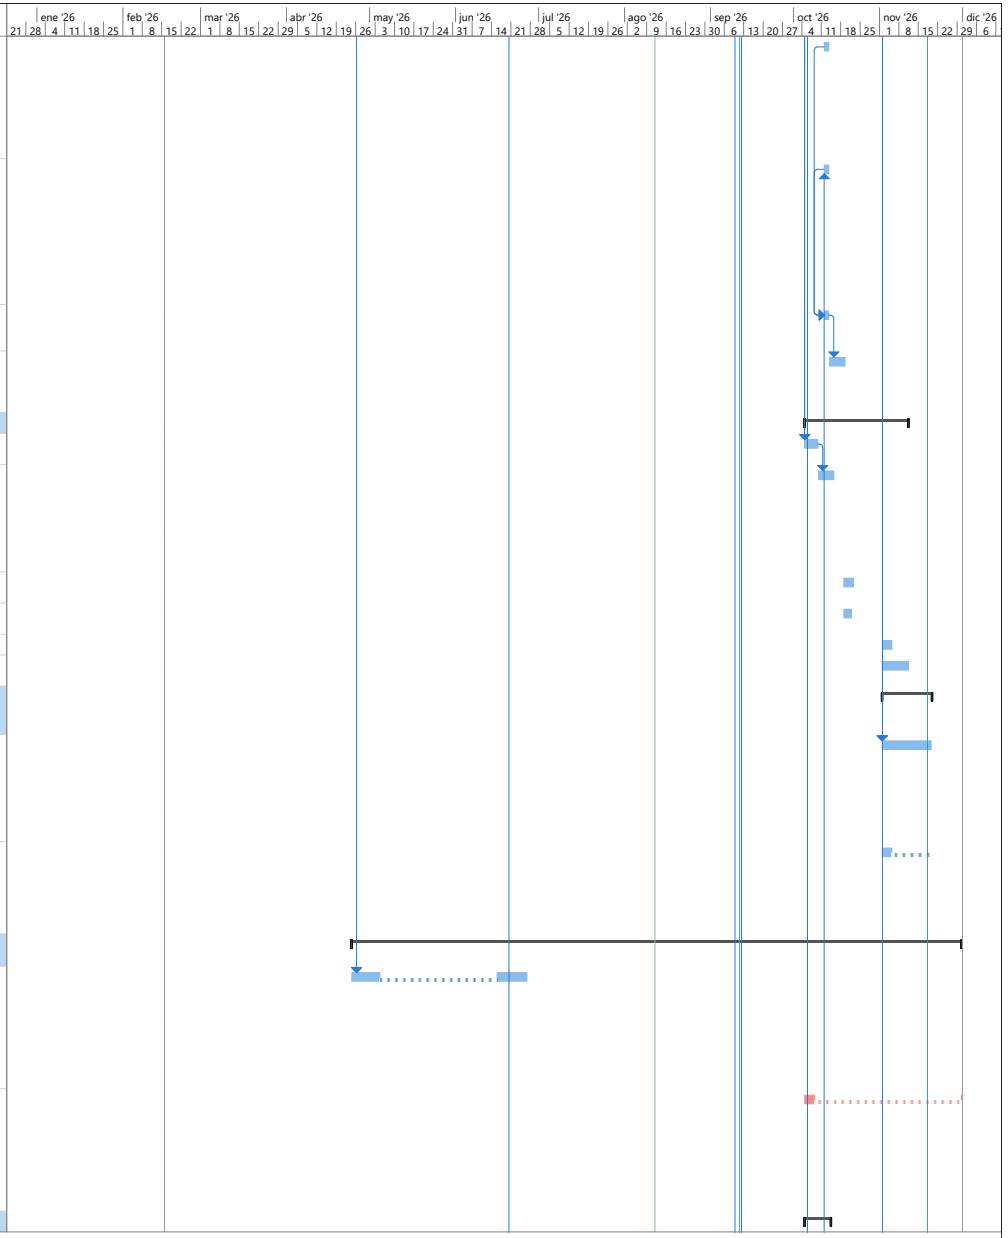

Proyecto: REPROGRAMACIÓN
Fecha: mié 12/08/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Unidad
39		7,01	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA	8 días	lun 5/10/26	mié 14/10/26	17CC;18CC		M2
40		7,03	PAÑETE LISO COMÚN 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	8 días	lun 5/10/26	mié 14/10/26	17CC;18CC		M2
41			**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**	**17 días**	**lun 5/10/26**	**lun 26/10/26**			
42		8,02	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	8 días	mar 6/10/26	jue 15/10/26		45	M2
43		8,03	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	8 días	lun 5/10/26	mié 14/10/26		45	M2
44		8,04	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	8 días	lun 5/10/26	mié 14/10/26		45	M2
45		8,08	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	8 días	jue 15/10/26	lun 26/10/26	42;44;43	100	ML
46			**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**5 días**	**jue 18/06/26**	**mié 24/06/26**			
47		9,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	5 días	jue 18/06/26	mié 24/06/26	11	100	M2
48			**OTRAS ACTIVIDADES**	**15 días**	**lun 2/11/26**	**jue 19/11/26**			
49		10,01	CERTIFICACION RETIE	15 días	lun 2/11/26	jue 19/11/26		100FF;50C	UN
50		10,02	CERTIFICACION RETILAP	15 días	lun 2/11/26	jue 19/11/26	49CC	100FF	UN
51			**NO PREVISTOS**	**66 días**	**mar 8/09/26**	**lun 30/11/26**			
52		NP 2	Desmonte de alfombra existente adherida o instalada sobre piso, incluye retiro manual de material, desprendimiento de pegantes o fijaciones, recolección, apilamiento y acopio temporal del material resultante, uso de	2 días	mar 6/10/26	mié 7/10/26	4FC+22 días	56	
53		NP 3	Desmonte de todo tipo de lamparas, incluye retiro y dispocision final al sitio indicado por la entidad, andamio certificado y equipo de	2 días	mar 8/09/26	mié 9/09/26	4		
54		NP 4	Demolición de placa de concreto existente de hasta 20 cm de espesor mediante uso de rotomartillo, incluye fragmentación, retiro de material resultante, herramientas, equipos requerido, no incluye cargue de lonas ni	2 días	mar 6/10/26	mié 7/10/26	4FC+22 días		
55		NP 5	Reparación integral de claraboya circular altura de 50cm, diametro 64cm, incluye adecuación de estructura con omegas galvanizadas, conformación y reparación de laterales en drywall, tratamiento de juntas, sellado	3 días	mar 6/10/26	jue 8/10/26	4FC+22 días	63	
56		NP 6	Suministro e instalación de vidrio transparente de 6 mm, incluye corte a medida, transporte, cargue, descargue, manipulación, instalación, sellado perimetral, limpieza y entrega final.	4 días	jue 8/10/26	mar 13/10/26	52		
57		NP 11	Mantenimiento integral de piso en madera mediante proceso de lijado, eliminación de acabados existentes, preparación de superficie, aplicación de tintilla para uniformidad de color, sellador catalizado para cierre de poros y	8 días	lun 5/10/26	mié 14/10/26		59CC+3 días	
58		NP 12	Suministro e instalacion de blackout enrollable con soporte metalico anclado a muro con chazo metalico, para las ventanas laterales del auditorio incluye (herramienta menor, equipos, andamio certificado, equipo de trabajo en	2 días	lun 28/09/26	mar 29/09/26			
59		NP 13	Mantenimiento de muros en madera mediante lijado, limpieza, reparaciones con masilla, aplicación de tintilla, sellador y acabado con laca, incluye protección de áreas adyacentes,	15 días	jue 8/10/26	mar 27/10/26	57CC+3 días	60CC	
60		NP 14	Suministro e instalación de lamina triplex 18mm, incluye cortes, aplicación de adhesivo de contacto tipo Boxer, pegado, ajuste y posterior tratamiento superficial mediante	13 días	jue 8/10/26	vie 23/10/26	59CC	100	

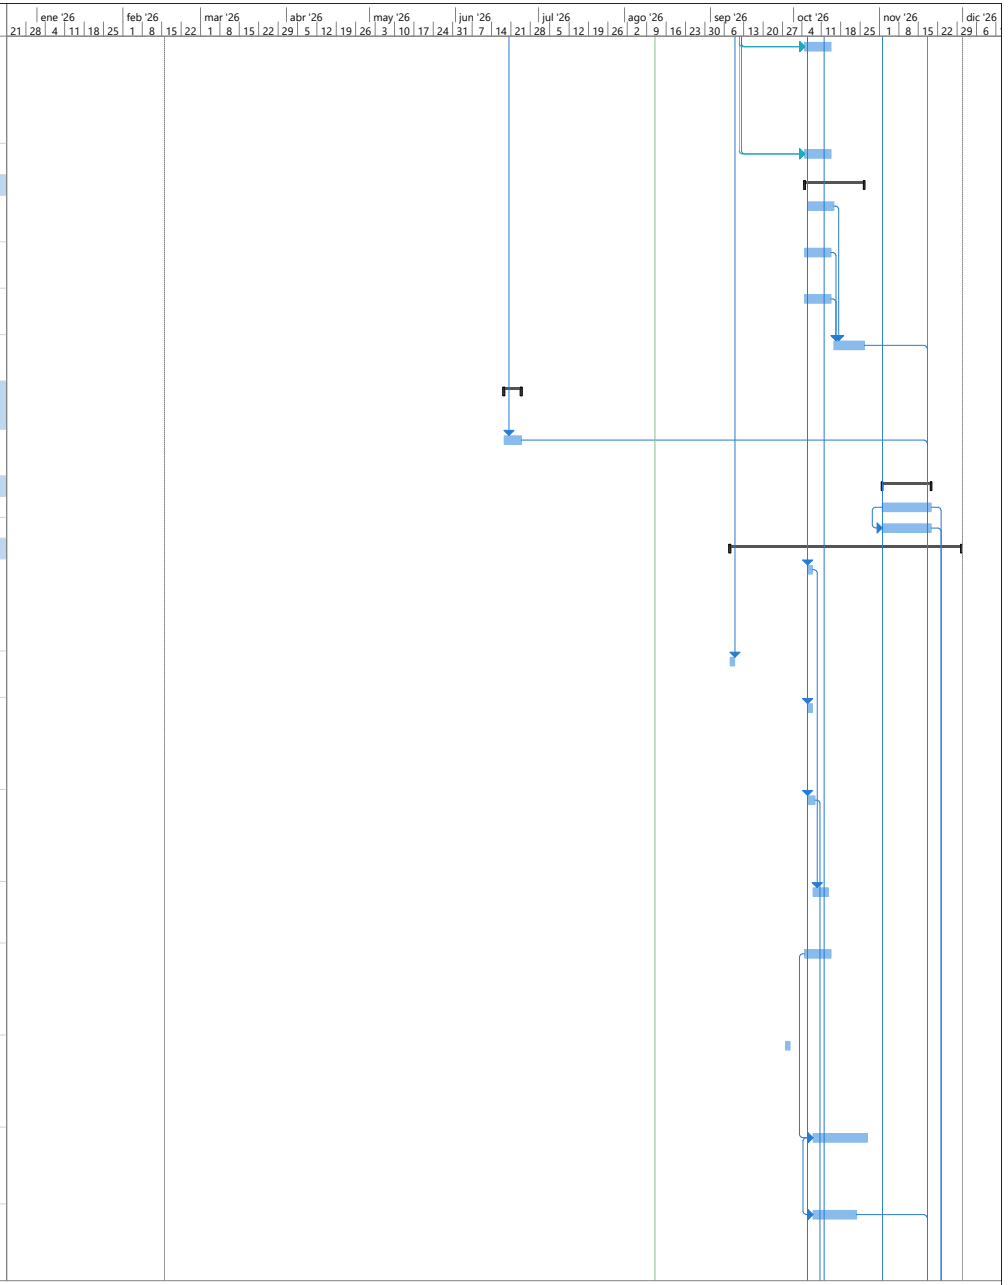

Proyecto: REPROGRAMACIÓN
Fecha: mié 12/08/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Unidad
61		NP 17	Mantenimiento correctivo de red contra incendio, incluye suministro e instalación de presostato, válvula cheque de 2", y cambio de sello mecánico de motobomba centrífuga, incluye desmontaje de elementos deteriorados, instalación de nuevos componentes, acc	8 días	mar 6/10/26	jue 15/10/26	4FC+22 días		
62		NP 19	Suministro e instalación de refuerzo metálico para baranda en balcón de sala de control, incluye fabricación e instalación con tubería metálica, platinas de anclaje, cortes, soldadura, pulido, fijación, aplicación de masilla, anticorrosivo y pintura esmal	3 días	lun 5/10/26	mié 7/10/26			
63		NP 24	Trasiego interno de material en lona de 60x90, incluye llenado de lona, transporte hasta una distancia máxima de 40 metros, descargue en sitio indicado, herramientas menores y limpieza	5 días	vie 9/10/26	jue 15/10/26	55		
64		NP 25	Suministro e instalación de luminaria LED tipo tortuga, incluye luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, instalación, pruebas de funcionamiento, herramienta menor,	3 días	lun 19/10/26	mié 21/10/26		65CC	
65		NP 26	Suministro e instalación de lámpara de emergencia de aplique 4w, incluye suministro del equipo, accesorios de fijación, conexión eléctrica, instalación, pruebas de funcionamiento y autonomía,	3 días	lun 19/10/26	mié 21/10/26	64CC	76	
66		NP 27	Desmonte de todo tipo de cableado eléctrico, incluye equipo de trabajo en alturas, andamio certificado y disposición final a sitio autorizado por la entidad	2 días	lun 14/09/26	mar 15/09/26		73CC	
67		NP 28	Suministro e instalación de cable 3x12 awg libre de halógenos, incluye equipo de trabajo en alturas y andamio certificado.	5 días	vie 2/10/26	jue 8/10/26	86CC+2 días	87	
68		NP 29	Suministro e instalacion de division metalica y tapa inferior y superior para bandeja tipo escalerilla de 30 cm en lamina galvanizada en caliente calibre 20 con division en lamina galvanizada en caliente incluye andamio	3 días	jue 15/10/26	lun 19/10/26	87		
69		NP 30	Suministro e instalacion de tablero de empotrar trifasico de 18 circuitos con espacio para totalizador, incluye puerta y tapa.	3 días	lun 14/09/26	mié 16/09/26		71CC+2 días	
70		NP 31	Suministro e instalacion de totalizador trifasico tipo industrial de 100 A, 60A, 70A marca Legrand,- ABB, LG o Similar.	3 días	lun 14/09/26	mié 16/09/26		71CC+2 días	
71		NP 32	Suministro e instalacion de breaker enchufable monopolar de 1X20A, 1X30A marca Legrand ABB LG o similar.	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	70CC+2 días;69CC+2 días	72CC+2 días	
72		NP 33	Suministro e instalacion de caja radweld salidad de 3/4, inlcuye tapa metalica, andamio certificado y equipo para trabajo en altura.	2 días	vie 18/09/26	lun 21/09/26	71CC+2 días	85	
73		NP 34	Desmonte de cajas eléctricas plásticas existentes, incluye equipo de trabajo en alturas, andamio certificado y disposición final a sitio autorizado por la entidad.	2 días	lun 14/09/26	mar 15/09/26	66CC	74CC	
74		NP 35	Desmonte de tableros eléctricos existentes, incluye aislamiento, desenergización temporal, desconexión de circuitos eléctricos existentes, y disposición final a sitio autorizado	3 días	lun 14/09/26	mié 16/09/26	73CC	75CC+2 días	
75		NP 36	Desmonte de tuberia electrica existente, incluye herramienta, andamio certificado y equipo de trabajo en alturas. Incluye disposición final a sitio autorizado por la Entidad	3 días	mié 16/09/26	vie 18/09/26	74CC+2 días		
76		NP 37	Suministro e instalacion lampara lineal minicontinuum 80 w marca Sylvania, incluye Kit de fijación, herramienta, transporte, andamio certificado y equipo de trabajo en alturas.	5 días	jue 22/10/26	mié 28/10/26	65	77CC+1 día	
77		NP 38	Suministro e instalacion bala de 20W jupiter marca Sylvania, incluye Kit de fijación, herramienta, transporte, andamio certificado y equipo de trabajo en alturas.	3 días	vie 23/10/26	mar 27/10/26	76CC+1 día	78CC+1 día	
78		NP 39	Suministro e instalacion bala de 15W jupiter marca Sylvania, incluye Kit de fijación, herramienta, transporte, andamio certificado y equipo de trabajo en alturas.	3 días	sáb 24/10/26	mié 28/10/26	77CC+1 día		
79		NP 40	Tablero de control de ilumincacion 8 RELÉS, 5 modulos DE RELÉS DE 2 POLOS DE 20A 240/480V, 1 BOTONERA ANALOGA DE 4 BOTONES	5 días	lun 19/10/26	vie 23/10/26			

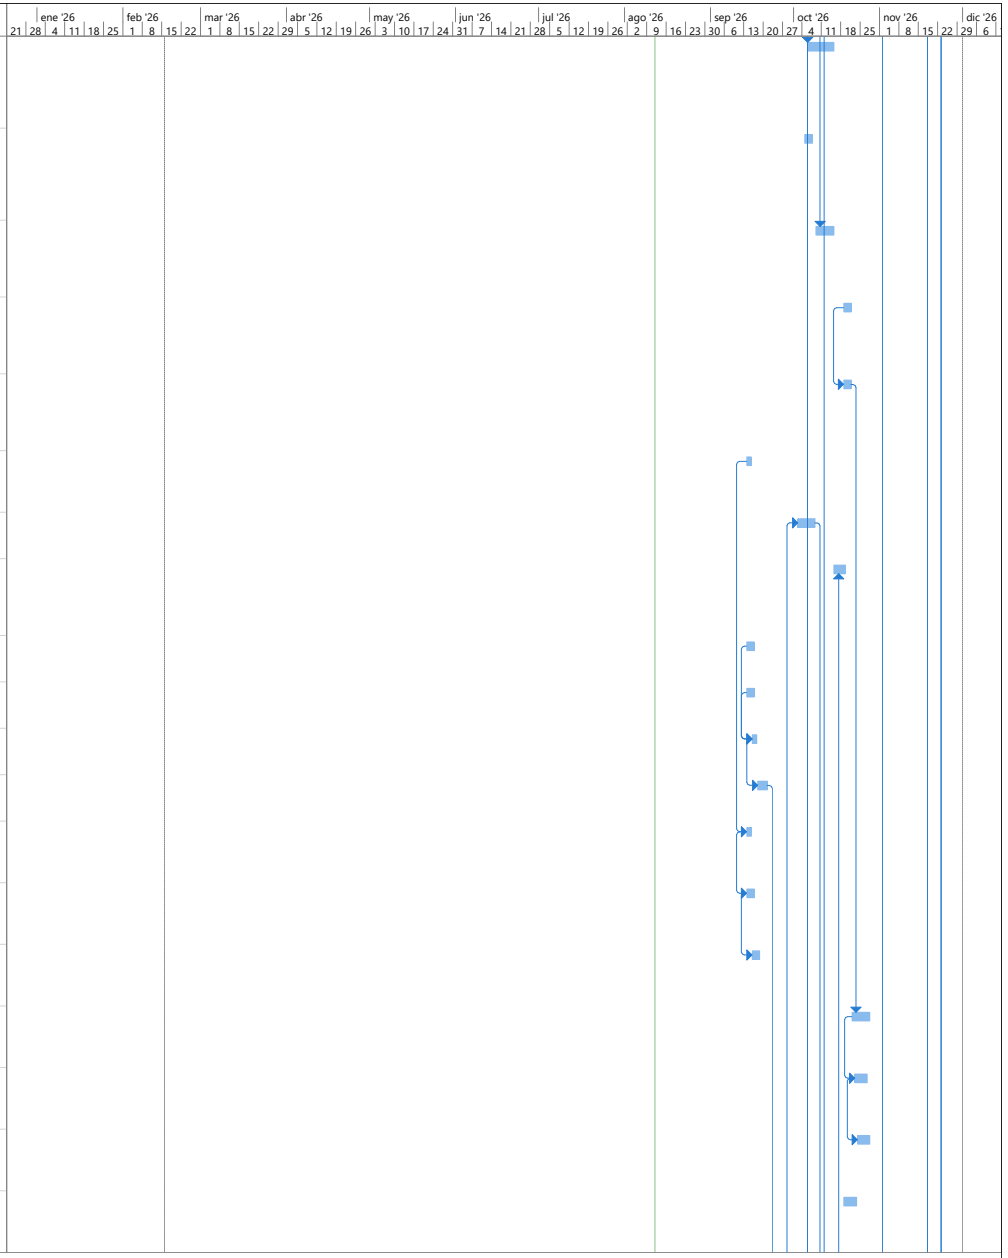

Proyecto: REPROGRAMACIÓN
Fecha: mié 12/08/26

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Unidad
80		NP 41	Suministro e instalación de etiquetas de identificación para tuberías, elaboradas en material autoadhesivo de alta durabilidad, incluye diseño, impresión, corte, transporte, instalación y fijación. Incluye andamio certificado y equipo para trabajo en altu	20 días	lun 21/09/26	jue 15/10/26	81CC		
81		NP 42	Suministro e instalacion de tubo EMT de 3/4, i7ncluye accesorios EMT de 3/4", equipo de trabajo en alturas y andamio certificado.	4 días	lun 21/09/26	jue 24/09/26		82CC+1 día;80CC	
82		NP 43	Suministro e instalacion de tuberia EMT de 1", incluye accesorios EMT de 1"", equipo de trabajo en alturas y andamio certificado	4 días	mar 22/09/26	vie 25/09/26	81CC+1 día	83CC+1 día	
83		NP 44	Suministro e instalacion de tuberia EMT de 1 y 1/2", incluye accesorios EMT de 1 y 1/2", equipo de trabajo en alturas y andamio	4 días	mié 23/09/26	lun 28/09/26	82CC+1 día	84CC+2 días	
84		NP 45	Suministro e instalación de tubería emt de 2, incluye accesorios emt de 2, equipo de trabajo en alturas y andamio certificado.	4 días	vie 25/09/26	mié 30/09/26	83CC+2 días	86	
85		NP 46	Suministro e instalacion de caja de paso metalica 30X30X15 marca Luminex Tercol, Similar incluye adaptador terminal de EMT 2", andamio certificado y equipo de trabajo de	3 días	lun 21/09/26	jue 24/09/26	72	22	
86		NP 47	Suministro e instalacion de acometida en cable 3X8+1X8+1X8T AWG libre de halogenas, incluye andamio certificado y equipo de trabajo en	5 días	mié 30/09/26	mar 6/10/26	84	67CC+2 días	
87		NP 48	Suministro e instalación de cable no 10 para aterrizar escalerilla, incluye equipo para trabajo en alturas y andamio certificado escalerilla	5 días	vie 9/10/26	jue 15/10/26	67	68	
88		NP 50	Suministro e instalación de consola análoga YAMAHA MG16XU con 10 entradas incluye transporte y herramienta menor especializada.	23 días	lun 2/11/26	lun 30/11/26	4FC+22 días		
89		NP 51	Suministro e instalacion de cabina activa de 15" JBL PRX915, incluye transporte y herramienta menor especializada.	23 días	lun 2/11/26	lun 30/11/26	4FC+22 días		
90		NP 52	Suministro e instalacion de microfono AKG MIG45 y/o similar con entrada hibrida, incluye transporte y herramienta especializada	23 días	mar 6/10/26	mar 3/11/26	4FC+22 días		
91		NP 53	Suministro e instalacion de JBL SRX81S SUBWOFFER ACTIVO 1X18" incluye transporte y herramienta especializada, andamio certificado y equipo de trabajo en alturas.	23 días	mar 6/10/26	mar 3/11/26	4FC+22 días		
92		NP 54	Suministro e instalacion de procesar de audio DBX venus 360, Incluye transporte y herramienta especializada.	23 días	mar 6/10/26	mar 3/11/26	4FC+22 días		
93		NP 55	Suministro e instalacion de Soporte de pared para cabina, incluye elementos de fijación, incluye herramienta menor, equipos, andamio certificado y equipo de trabajo en alturas y transporte de los elementos	23 días	mar 6/10/26	mar 3/11/26	4FC+22 días		
94		NP 56	Suministro e instalacion de soporte de microfono tripode	23 días	mar 6/10/26	mar 3/11/26	4FC+22 días		
95		NP 57	Suministro e instalacion de cable enchufable 3x12 AWG negro st pvc 600v incluye andamio certificado y equipo de trabajo en alturas	23 días	mar 6/10/26	mar 3/11/26	4FC+22 días		
96		NP 58	Suministro e instalacion de cable balanceado de sonido XLR, incluye andamio certificado y equipo de trabajo en alturas	23 días	mar 6/10/26	mar 3/11/26	4FC+22 días		
97		NP 59	PUERTA CORTAFUEGO CERTIFICADA UL 60 MINUTOS Ancho: 1.20m x Alto: 2.15m Marco en acero cold rolled calibre 16 certificado UL muro de 100mm Hoja batiente en acero cold rolled calibre 18 certificada UL 3 Bisagras Ball Bearing en acero inox 201 Barra antipan	23 días	mar 6/10/26	mar 3/11/26	4FC+22 días		
98		NP 60	Suministro e instalacion de microfono inalambrico de patron polar carcoide con piaña	23 días	mar 6/10/26	mar 3/11/26	4FC+22 días		
99		NP 61	Desmonte y reinstalacion de nubes altura 6:30 metros incluye equipo para trabajo en alturas y andamio certificado	30 días	mar 6/10/26	jue 12/11/26	4FC+22 días		
100			FIN	0 días	jue 19/11/26	jue 19/11/26	49FF;50FF;		

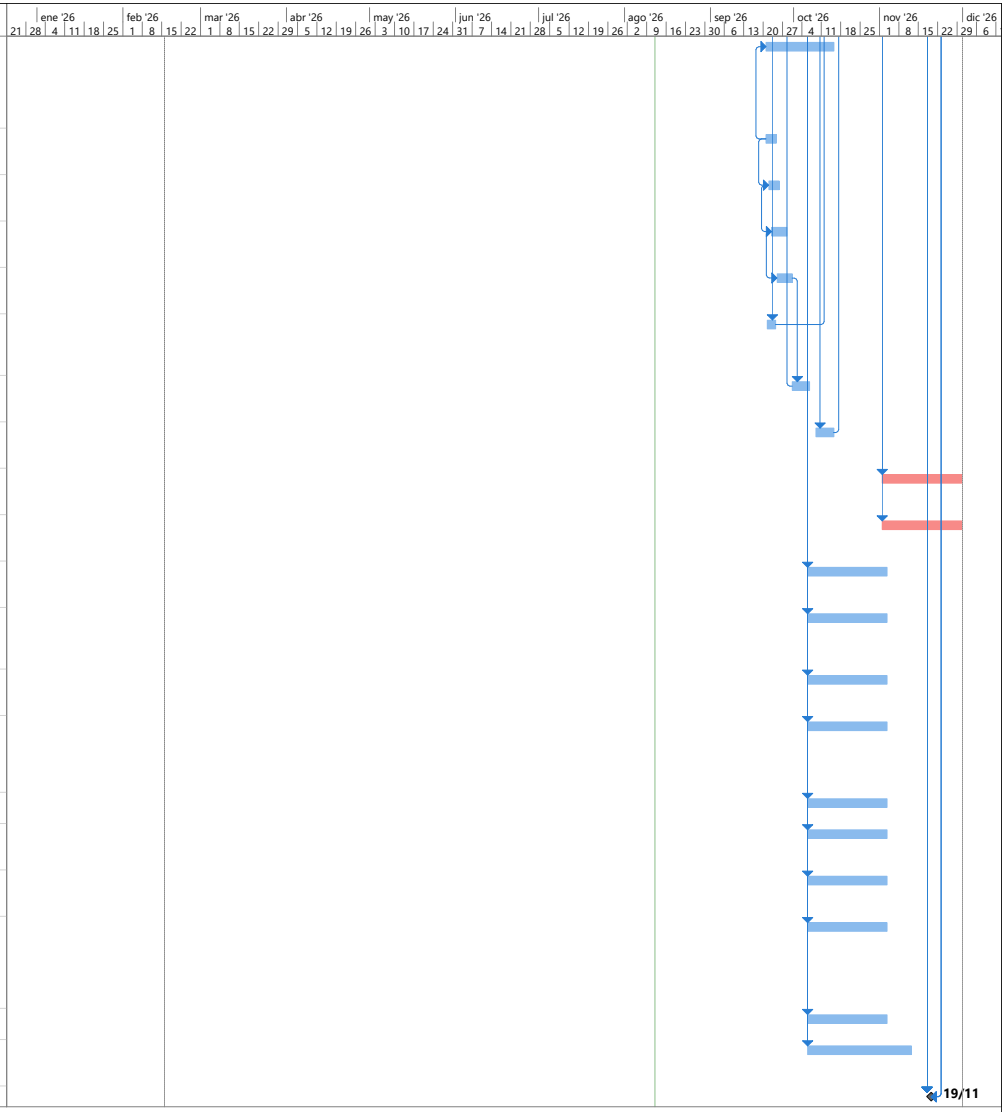

Proyecto: REPROGRAMACIÓN
Fecha: mié 12/08/26

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual
