EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON
INGENIERIA CIVIL

TECNICA

Dirección: Calle 73 No. 22 - 88 **Barrio:** Villa Sol **Celular:** 316 5208147

INDERHUILA	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-GID-F16
	PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Vigencia: 1/11/2024
	LISTA DE CHEQUEO PARA LIQUIDACIÓN Y COBRO FINAL CONTRATOS DE INTERVENTORÍA/CONSULTORÍA	Versión: 3

ITEM	DOCUMENTOS DE SOPORTES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA PARA COBRO Y ARCHIVO	FINANCIERA	TECNICA	CUMPLE		
				SI	NO	N/A
1	**Oficio Radicado Contratista de Obra o Interventoria.**		Original			
2	**Documento FURC.**		1 Copia			
3	**Formato Certificado de Cumplimiento Infraestructura** - Apoyo a la Supervision.		Original			
4	**Cuenta de cobro** (Regimen Simplificado) o **Factura Electronica.**					
5	**Poliza debidamente aprobada** - solo si no se ha cobrado anticipo.					
6	**Otro si** (Cuando Aplique).					
7	**Poliza Otro si debidamente aprobada.** (Cuando Aplique).					
8	**Registro Unico Tributario** - RUT (Consorcio y de los integrantes del Consorcio).					
9	**Certificación Cuenta Bancaria para consignar.**					
10	**Copia de Registros Presupuestales** (SGRP y HASS)					
11	**Acta de Inicio.**					
12	**Actas de Suspensión.**					
13	**Actas de Reiniciación** - Anexar Poliza de Ampliacion.					
14	**Acta de Terminación Contrato de Interventoria.**		Original			
15	**Acta Final de Obra** - (firma R.LContratista e R.L Interventor)		1 Copia			
16	**Memorias de Cantidades de Obra.** - (firma Director, Residente de obra y Director, Residente de Interventoria)		1 Copia			
17	**Acta Recibo Final de Interventoria** - (firma R.L Interventor, VoBo Supervisor, VoBo Apoyo Supervisión y Asesor Jurídico Externo INDERHUILA)		Original			
18	**Póliza Finales Extendidas Cumplimiento R.C**		1 Copia			
19	**Constancia General de Actividades Contrato de Obra/Consultoría** - (firma Interventor)		Original			
20	**Acta Liquidación Proyectos Infraestructura** - (firma R.L Interventor, VoBo Supervisor, VoBo Apoyo Supervisión y Asesor Jurídico Externo INDERHUILA).		Original			
21	**Documento Consorcial.** (Cuando Aplique).		1 Copia			X
22	**Planilla de Pago de Salud, Pensión y ARL** - Por cada mes :		1 Copia			
	a. El pago debe ser por el contratista que debe ser el cotizante.					
	b. Cuando es Consorciado, los socios deben ser Cotizantes y anexar el recibo de Pago de cada uno.					
	c. Si es persona juridica , el Cotizante debe ser el Representante Legal.					
	d. Solo planillas del ultimo pago parcial, sin incluir suspensiones del contrato.					
	e. Certificado verificación de pago de seguridad social realizado por el interventor. (Vo.Bo. Interventor)		1 Copia			
23	**Certificación de Encontrarse al día en Pagos de Aportes Seguridad Social y Aportes Parafiscales** - (firma revisor fiscal si está obligado o sino por el R.L)		1 Copia			
24	**Informe final de Interventoria.** - (firma Interventor y VoBo. Apoyo Supervisión)		Original			
25	**Certificado Paz y Salvo de Servicios Públicos Provisionales.** (Cuando Aplique).		Original			X
26	**Paz y Salvo Ministerio de Protección Social.**		Original			
27	**Comprobante de Pago Aportes Caja Compensación Familiar.**		Original			
28	**Comprobante de Pago Aportes I.C.B.F.**		Original			
29	**Comprobante de Pagos Aportes SENA.**		Original			
30	**Pantallazo de Publicación de Información en el SECOP II**		1 Copia			
31	**Informe Apoyo a la Supervisión** (firma Vo.Bo Supervisor y Apoyo Supervisión)		Original			

Para tener encuenta...	
1.	Los documentos se deben entregar en 2 paquetes así: 1. Financiera, 2. Técnica, todas las cuentas deberan ser entregadas con firmas originales.
2.	Cada paquete debe estar debidamente marcado por dependencia, foliado, en carpeta y legajado.
3.	Si las carpetas no contienen los documentos exigidos y/o presentán correciones por parte del Funcionario quien verifica los documentos, serán inmediatamente devueltos.

Funcionario quien verifica los documentos	Nombre Completo:	
	Cargo:	Firma.

EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON
INGENIERIA CIVIL

Neiva, 17 de junio de 2026

ARQ.
YOVANY PEÑA FIERRO
Apoyo supervisión INDERHUILA
Neiva – Huila

Asunto: Entrega documentación requerida para liquidación - Contrato de Interventoría No. CIHCM400 de 2023

Ref.: Contrato de Interventoría No. CIHCM400 de 2023 que tiene por objeto INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Reciba un cordial saludo,

Por medio del presente realizo la entrega de la documentación exigida por la entidad establecida:

Ítem	DOCUMENTOS DE SOPORTES LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA	FINANCIERA	TECNICA
1	Documento FURC	X	X
2	Formato Certificado de Cumplimiento Infraestructura	X	X
3	Factura Electronica	X	
4	Póliza Inicial debidamente aprobada	X	
5	Otro si	X	
6	Póliza Otro si debidamente aprobada	X	
7	Registro Unico Tributario – RUT	X	
8	Certificación Bancaria	X	
9	Copia Registros Presupuestales	X	
10	Acta de Inicio	X	
11	Actas de suspensión	X	
12	Actas de reinicio	X	
13	Acta de terminación contrato interventoría	X	X
14	Acta final de obra	X	X
15	Memorias de cantidades de obra		X

Dirección: Calle 73 No. 22 - 88 **Barrio:** Villa Sol **Celular:** 316 5208147

EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON
INGENIERIA CIVIL

16	Acta de recibo final interventoría	X	X
17	Pólizas finales extendidas Cumplimiento R.C.	X	X
18	Constancia General de Actividades Contrato de Obra/Consultoría		X
19	Acta liquidación proyectos infraestructura	X	X
20	Planilla de pago de salud, pensión y ARL- Por cada mes	X	X
	e. Certificado verificación de pago de seguridad social realizado por el Interventor. (Vo.Bo. Interventor)	X	X
21	Certificación de Encontrarse al día en Pagos de Aportes Seguridad Social y Aportes Parafiscales	X	X
22	Informe Final de Interventoría		X
23	Paz y Salvo Ministerio de Protección Social.		X
24	Comprobante de Pago Aportes Caja Compensación Familiar.		X
25	Comprobante de Pago Aportes I.C.B.F.		X
26	Comprobante de Pagos Aportes SENA.		X
27	Pantallazo de Publicación de Información en el SECOP II	X	X
28	Informe Apoyo a la Supervisión		X

Agradezco la atención prestada y su valiosa colaboración, quedo pendiente de su pronta respuesta,

EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON
C.C. 7.706.737
Interventor

Dirección: Calle 73 No. 22 - 88 **Barrio:** Villa Sol **Celular:** 316 5208147

INDERHUILA	FORMATO	CODIGO	PA-GF-F02
		Versión:	002
	FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS FURC	VIGENCIA	feb-22

RADICADO INTERNO: RECIBIDO POR:

Diligenciar Unicamente a Computador

INFORMACIÓN DE PAGOS (PUC CONTABLE)

1- Clase y Datos del Contrato

Tipo de contrato	CONTRATO DE INTERVENTORÍA			Nro.	CIHCM400 DE 2023		Fecha:	17	11	2023
Proveedor	EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON			NIT	C.C. X	No.	7.706.737			
Dirección	CALLE 73 No. 22 - 88	Correo Electrónico	emro31@gmail.com	Teléfonos	316 5208147					
Establecer si es Secop I o II	secop I		secop II X	Código del contrato por Secop II	CO1.PCCNTR.5458111					
Cesión de contrato	SI NO X	Nombre del cedente		NIT	C.C.	No.				
Aporte a pensiones voluntarias	SI NO X	Aporte cuenta AFC		Entidad donde realiza el Aporte						
Cuenta de Aporte AFC y/o Pensión Vol.				Banco						

2- Información para Pago Electrónico

Cuenta Bancaria	45455577521	Banco	BANCOLOMBIA	Ahorros	X	Corriente	

3- Información Tributaria

Responsable de IVA	SI	No	Autorretenedor de Renta		Contribuyente de Renta	X	Código actividad ICA del Municipio de Neiva	
Gran Contribuyente	SI	No	Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta: Art. 19 E.T. y Art. 1.4 Dec. 4400 de 2004	

INFORMACIÓN DEL COMPROMISO Y VALOR A PAGAR (LA INFORMACIÓN DEBE SER IDÉNTICA AL CONTRATO)

4- Información del Compromiso

Objeto : Copiar tal cual aparece en el contrato : "el objeto"

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Plazo: (copiar tal cual parece en el objeto)	OCHO (8) MESES Y MEDIO, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones sin superar la vigencia fiscal.
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	LA ENTIDAD PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO EN PAGOS MEDIANTE ACTA(S) DE RECIBO PARCIAL PREVIA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL VALOR DE LAS ACTAS PARCIALES NO PODRÁ SUPERAR EL 90% DEL VALOR DEL CONTRATO DE OBRA. EL VALOR FINAL CORRESPONDIENTE AL 10% SERÁ CANCELADO EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN.

Fecha de Inicio	17	11	2023	Adición	1	Adición No.		Fecha :	19	05	2025	Valor edición	$ 1.052.678
Valor compromiso inicial	$	45.738.299,00		Valor adición(es)		$ 1.052.678		Valor total compromiso	$	46.790.977,00			

5- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final	X	Pago Parcial No.		Periodo:	De	Fecha	01	08	2024		
							A:	Fecha	23	12	2025		
						Anticipo		% Anticipo				Valor Anticipo	
Entrada a Almacén No.				Fecha Entrada				Valor Entrada					
Otros		Cual:											

6- Pago de Seguridad Social

Periodos Pagados	Pago ARL	Pago Pensión	Pago Salud	Número de Planillas de Seguridad Social
nov-23	$ 55.100	$ 400.300	$ 257.400	30663569 - 4529498539
dic-23	$ 101.300	$ 506.400	$ 283.900	30663574 - 4529505624
may-24	$ 50.700	$ 212.500	$ 108.500	30663580 - 4537491705
jun-24	$ 99.300	$ 420.600	$ 215.700	30663583 - 4544812878
jul-24	$ 97.300	$ 416.000	$ 214.500	30663586 - 4560876282
ago-24	$ 6.800	$ 208.000	$ 162.500	31117225 - 4579543297
may-25	$ 7.500	$ 227.800	$ 178.000	4612346105
jun-25	$ 7.500	$ 227.800	$ 178.000	4612346409
jul-25	$ 7.500	$ 227.800	$ 178.000	4612477831
oct-25	$ 7.500	$ 227.800	$ 178.000	4625532971
nov-25	$ 7.500	$ 227.800	$ 178.000	4630729676
dic-25	$ 7.500	$ 227.800	$ 178.000	4633720602

8- Registros Presupuestales y Valores a afectar

Número del CDP	Número del RP	Código de la Fuente de Financiación y denominación del recurso	Valor pendiente por Ejecutar	Valor Ejecutado
2023000591	2023000650	00AD-SSF-ASIGNACIONES DIRECTAS 20%	$ 33.128.250,00	$ 12.610.049,00
2025000052	2025000038	00AD-ASIGNACIONES DIRECTAS DEPARTAMENTO DEL HUILA	$ -	$ 33.128.250,00
2025000389	2025000514	00AD-ASIGNACIONES DIRECTAS DEPARTAMENTO DEL HUILA	$ 1.052.678,00	$ 1.052.109,00
Valor a cobrar en pesos $	$ 34.180.359,00	Valor a cobrar en letras	TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS	

8- Autorización del pago:

Declaración: Con su firma el Supervisor y/o interventor y el Contratista certifican que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social y publicidad en el SECOP 2 si aplica). Igualmente dan fe de estar a paz y salvo en todos los tributos y obligaciones adquiridas con el Departamento del Huila.

Firma del Contratista	Firma del interventor (si aplica)	Firma del Supervisor (Unicamente Secretarios, Directores o Lideres de Grupo)
EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON C.C. EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON		FELIPE VICTORIA BARRAGAN SUPERVISOR INDERHUILA

INFORMACIÓN A TRAMITAR POR LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA TESORERIA

10- Firmas de aprobación de pagos por parte de Contabilidad y Tesorería

Visto Bueno Contabilidad (Firma y fecha)	Firma de aprobación de Tesorería con fecha de aprobación

11- Devolución

Causa	Fecha	Radicación	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y/o Contabilidad

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F15
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO INFRAESTRUCTURA	Versión: 2
Fecha Aprobación: 13/02/2023		Página 1 de 2

APOYO A LA SUPERVISIÓN

HACE CONSTAR:

El Supervisor, certifica que la documentación presentada por el ejecutor del contrato No. **CIHCM400** de fecha **2023**, cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".",** en donde se puede verificar que ha cumplido con todos los requisitos establecidos en las obligaciones contractuales para la ejecución del contrato, de acuerdo a la información suministrada por el **CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA**; en lo que corresponde a la solicitud y trámite para el pago de Cobro del Acta Final de Interventoría del periodo del 17 de noviembre de 2023 al 27 de diciembre de 2023 del 16 de mayo de 2024 al 26 de agosto de 2024, del 19 de mayo de 2025 al 17 de julio de 2025 y del 6 de octubre de 2025 al 23 de noviembre de 2024 y del 18 de diciembre de 2025 al 23 de diciembre de 2025, me permito indicar que la descripción de los ítem, las cantidades de obra, valores unitarios y valor total, corresponden a lo ejecutado encontrándose plenamente soportado en las memorias de cantidades de obra, las cuales están tomadas de acuerdo a los diseños y conservan el objeto, el alcance y la localización del mismo. Es por ello que las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista de Obra e Interventoría, quienes las cuantificaron y constataron en el terreno; para lo cual anexo los siguientes documentos:

No.	DOCUMENTO	FOLIO
1	Pantallazo de Publicación de Información en el SECOP II	
2	Oficio Radicado Contratista de Obra e Interventoría.	
3	Documento FURC.	
4	Formato Certificado de Cumplimiento Infraestructura - PM-GID-F15	
5	Cuenta de cobro	
6	Copia de Registros Presupuestales	
7	Acta de Inicio	
8	Factura electrónica	
9	Certificación Cuenta Bancaria para consignar	
10	Registro Único Tributario - RUT	
11	Pólizas debidamente aprobadas	

5

12	Otro si	
13	Otrosí N°2	
14	Otrosí N°3	
15	Otrosí N°4	
16	Actas de Suspensión.	
17	Actas de Reiniciación	
18	Acta Parcial de Obra - PM-GID-F22	
19	Acta Parcial de Obra – PM-GID-F27	
20	Certificación de Encontrarse al día en Pagos de Aportes Seguridad Social y Aportes Parafiscales	
21	Planilla de Pago de Salud, Pensión y ARL	
22	Certificado verificación de pago de seguridad social realizado por el interventor.	

El porcentaje ejecutado de obra para el Acta Final es del 73,05% y el porcentaje acumulado es del 100.00% del 100% contratado.

Por lo anterior se le puede dar el trámite respectivo al Acta Final de fecha 27 de enero de 2026, del periodo comprendido del 1 de agosto de 2024 al 26 de agosto de 2024, del 19 de mayo de 2025 al 17 de julio de 2025 y del 6 de octubre de 2025 al 23 de noviembre de 2024 y del 18 de diciembre de 2025 al 23 de diciembre de 2025 presentada por **ING. EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCÓN.**

Para constancia se firma a los veintitrés (27) días de enero de 2026.

ARQ. YOVANY PEÑA FIERRO
Apoyo a la Supervisión
INDER-HUILA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO:	DE INTERVENTORIA No. CIHCM400 DE 2023
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
CONTRATISTA:	EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCÓN. NIT. 7.706.737-6 C.C. 7.706.737 De Neiva.
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
VALOR INICIAL CONTRATO:	CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA ($ 45.738.299,oo) M/CTE
FECHA DE INICIO:	17 de noviembre 2023
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 01	28 de diciembre de 2023
FECHA ACTA DE REINICIO 01	16 de mayo de 2024
OTROSÍ No. 01 3/07/2024	DOS (2) MESES
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 02	27 de agosto de 2024
FECHA ACTA DE REINICIO 02	19 de mayo de 2025
OTROSÍ No. 2: 19/05/2025	PRORROGA: DOS (02) MESES. ADICIÓN: UN MILLON CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA ($1.052.678,oo) M/CTE
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 03	18 de julio de 2025
FECHA ACTA DE REINICIO 03	6 de octubre de 2025
OTROSÍ No. 3: 14/10/2025	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 04	24 de noviembre de 2024
FECHA ACTA DE REINICIO 04	18 de diciembre de 2025
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES Y MEDIO, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones sin superar la vigencia fiscal.
VALOR TOTAL CONTRATO:	CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOSMONEDA CORRIENTE COLOMBIANA ($ 46.790.977,oo) M/CTE
VALOR TOTAL EJECUTADO:	CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL

	CUATROCIENTOS OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA ($ 46.790.408,oo) M/CTE
VALOR NO EJECUTADO:	QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($569,oo) M/CTE
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE DICIEMBRE 2025
FECHA DEL ACTA:	23 DE DICIEMBRE 2025

2. HISTORIAL DE ACTAS DEL CONTRATO

ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO	17 DE NOVIEMBRE 2023
ACTA DE JUSTIFICACION No. 1 PARA SUSPENSION No. 1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSION No. 1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE JUSTIFICACION No. 2 PARA REINICIO No. 1	16 DE MAYO DE 2024
ACTA DE REINICIO No. 1	16 DE MAYO DE 2024
ACTA DE JUSTIFICACION No. 3 DE OTROSI No.1	03 DE JULIO DE 2024
OTROSÍ No.1	03 DE JULIO DE 2024
ACTA DE JUSTIFICACION No. 4 PARA SUSPENSION No. 2	27 DE AGOSTO DE 2024
ACTA DE SUSPENSION No. 2	27 DE AGOSTO DE 2024
ACTA DE JUSTIFICACION No. 5 PARA REINICIO No. 2	19 DE MAYO DE 2025
ACTA DE REINICIO No. 2	19 DE MAYO DE 2025
ACTA DE JUSTIFICACION No. 6 DE OTROSI No. 2	19 DE MAYO DE 2025
OTROSI No. 2	19 DE MAYO DE 2025
ACTA DE JUSTIFICACION No. 7 PARA SUSPENSION No. 3	18 DE JULIO DE 2025
ACTA DE SUSPENSION No. 3	18 DE JULIO DE 2025
ACTA DE JUSTIFICACION No. 8 PARA REINICIO No. 3	6 DE OCTUBRE DE 2025
ACTA DE REINICIO No. 3	6 DE OCTUBRE DE 2025
ACTA DE JUSTIFICACION No. 9 OTROSI No. 3	14 DE OCTUBRE DE 2025
OTROSI No. 3	14 DE OCTUBRE DE 2025
ACTA DE JUSTIFICACION No. 10 PARA SUSPENSION No. 4	24 DE NOVIEMBRE DE 2025
ACTA DE SUSPENSION No. 4	24 DE NOVIEMBRE DE 2025
ACTA DE JUSTIFICACION No. 11 PARA REINICIO No. 4	18 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE REINICIO No. 4	18 DE DICIEIMBRE DE 2025
ACTA DE TERMINACION	23 DE DICIEMBRE DE 2025

3. CONSIDERANDO

1. El Director del **INDERHUILA** el Dr. **FELIPE VICTORIA BARRAGÁN** en calidad de Supervisor, el Ingeniero **EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCÓN**, actuando a nombre propio y en calidad de contratista interventor y el Arquitecto **YOVANY PEÑA FIERRO** en calidad de Apoyo a la Supervisión manifiestan que la Interventoría cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA,**

ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA, DEPARTAMENTO DEL HUILA", de la obra localizada en el MUNICIPIO DE OPORAPA del Contrato de Obra No. **CLPIH373-2023** - DEPARTAMENTO DEL HUILA, su plazo de ejecución ha terminado y por ende se suscribe la presente Acta de Terminación de Interventoría, y que lo ejecutado es responsabilidad del contratista de Obra e Interventoría.

2. Que de acuerdo con el vencimiento del plazo contractual se da por terminada la ejecución del Contrato de Interventoría No. CIHCM400 de 2023

3. Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

4. ACUERDAN

1. Dar por terminado el contrato de Interventoría **CIHCM400 de 2023** como se detalla a continuación:
   Fecha de terminación: 23/12/2025
   Causa de terminación: Terminación del plazo contractual.

2. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías, de conformidad con lo estipulado en el contrato.

3. El Interventor del contrato remitirá copia de la presenta acta de terminación al garante.

La presente acta se firma en Neiva-Huila a los 23 días del mes de diciembre del 2025.

FELIPE VICTORIA BARRAGAN
Director Inderhuila
Supervisor

EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCÓN
Interventor

Vo.Bo. ARQ. YOVANY PEÑA FIERRO
Apoyo a la supervisión interventoría
Contratista Inderhuila

Vo.Bo:
JAIME ENRIQUE JIMENEZ LOPEZ
Asesor Jurídico Externo

INDERHUILA

SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	No:	CLPIH 373 DE 2023			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 557.117.259,00	ACTA DE INICIO:	17 DE NOVIEMBRE 2023		
VALOR ADICIONAL 1:	$ 27.763.956,01	ACTA DE SUSPENSION 01:	28 DE DICIEMBRE 2023		
VALOR TOTAL:	$ 583.537.213,00	ACTA DE REINICIO 01:	16 DE MAYO DE 2024	ACTA DE RECIBO FINAL	
VALOR ANTICIPO 25%:	$ 139.279.315,00	ACTA DE ADICIONAL No 1 EN TIEMPO	03 DE JULIO DE 2024		
PLAZO:	3 MESES	ACTA DE SUSPENSION 02:	27 DE AGOSTO DE 2024		
PLAZO ADICIONAL 1:	2 MESES	ACTA DE REINICIO 02:	19 DE MAYO DE 2025		
PLAZO ADICIONAL 2:	2 MESES	ACTA DE ADICIONAL No 2 EN TIEMPO	19 DE MAYO DE 2025		
PLAZO ADICIONAL 3:	1,5 MESES	ACTA DE SUSPENSION 03:	18 DE JULIO DE 2025		
PLAZO TOTAL:	9,5 MESES	ACTA DE REINICIO 03:	6 DE OCTUBRE DE 2025		
		ACTA DE ADICIONAL No 3 EN TIEMPO	14 DE OCTUBRE DE 2025	1	
		ACTA DE SUSPENSION 04:	24 DE NOVIEMBRE DE 2025		
		ACTA DE REINICIO 04:	18 DE DICIEMBRE DE 2025		
		FECHA DE PRESENTE ACTA:	23 DE DICIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GLOBAL CC	R.L	ING. YOHAN FERNANDO SALAZAR BAENA	VALOR PRESENTE ACTA:	$ 241.724.731
INTERVENTOR:	EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON	R.L	ING. EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON	VALOR POR PAGAR:	$ 193.234.249

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
ACTIVIDADES PRELIMINARES																
1.01	Localización y replanteo	M2	655,36	$ 3.552,00	$ 2.256.759,00	655,36	$ 2.256.759,00	711,37	$ 3.552,00	$ 2.528.786,00	75,53	$ 269.841,00	0,00	$ -	711,34	$ 2.526.610,00
1.02	Descapote manual en 20m (incluye retiro	M2	51,30	$ 16.972,00	$ 870.664,00	51,30	$ 870.664,00	711,37	$ 16.972,00	$ 12.073.372,00	660,07	$ 11.202.708,00	0,00	$ -	711,37	$ 12.073.372,00
1.03	Construcción marcos canchas existentes	UND	2,00	$ 116.516,00	$ 233.032,00	0,00	$ -	0,00	$ 116.516,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.04	Excavación manual sin clasificar, incluye todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada	M3	282,64	$ 45.921,00	$ 12.979.111,00	282,64	$ 12.979.111,00	438,75	$ 45.921,00	$ 20.155.597,00	156,03	$ 7.176.528,00	0,00	$ -	438,72	$ 20.154.219,00
1.05	Relleno en recebo seleccionado y compactado manualmente	M3	158,24	$ 83.700,00	$ 13.245.262,00	158,24	$ 13.244.638,00	452,29	$ 83.700,00	$ 37.854.873,00	294,03	$ 24.610.311,00	0,00	$ -	452,27	$ 37.854.339,00
CIMENTACION																
2.01	Solado en concreto de 3000psi e=0,05 mts	M2	13,92	$ 33.552,00	$ 472.612,00	0,00	$ -	0,00	$ 33.552,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.02	Construcción zapatas en concreto 3500 PSI, CM1-3000 PSI, Ver diseño.	M3	41,29	$ 617.561,00	$ 25.497.071,00	28,158	$ 17.400.546,00	28,158	$ 617.561,00	$ 17.400.546,00	0,00	$ -	0,00	$ -	28,158	$ 17.400.546,00
2.03	Acero de refuerzo Fy=60.000 PSI, incluido	KG	2953,00	$ 7.104,00	$ 20.978.112,00	1904,00	$ 13.526.016,00	1904,00	$ 7.104,00	$ 13.526.016,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1904,00	$ 13.526.016,00
2.04	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI, Ver diseño	M3	8,06	$ 740.720,00	$ 5.155.411,00	6,56	$ 4.859.123,00	8,20	$ 740.720,00	$ 6.073.904,00	1,64	$ 1.214.781,00	0,00	$ -	8,20	$ 6.073.904,00
2.05	Acero de refuerzo Fy=60.000 PSI, viga de cimentación	KG	1220,00	$ 7.104,00	$ 8.665.680,00	1075,00	$ 7.635.600,00	1292,00	$ 7.104,00	$ 9.178.368,00	187,00	$ 1.328.448,00	0,00	$ -	1292,00	$ 9.178.368,00
2.06	Concreto ciclopeo - 2500 PSI (175 KG/CM2) 60% concreto 1500 PSI + 40% piedra manuabarga	M3	28,56	$ 359.363,00	$ 13.557.637,00	25,35	$ 9.109.552,00	25,35	$ 359.363,00	$ 9.109.552,00	0,00	$ -	0,00	$ -	25,35	$ 9.109.552,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
ESTRUCTURA EN CONCRETO																
3.01	Construcción de columnas en concreto de 210 KG/CM2 3000 PSI	M3	14.00	$ 959.189,00	$ 12.958.546,00	12.00	$ 11.038.268,00	12,43	$ 919.555,00	$ 11.357.644,00	0,43	$ 357.678,00	0,00	$ -	12,43	$ 11.397.944,00
3.02	Acero de refuerzo Fy=60 000 P.S.I columnas	KG	4454,00	$ 7.104,00	$ 31.641.216,00	2967,59	$ 21.661.759,00	2954,55	$ 7.104,00	$ 20.991.565,00	-12,64	$ 89.765,00	0,00	$ -	2954,55	$ 20.991.954,00
3.03	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI incluye instrumentalización	M3	17,00	$ 1.003.096,00	$ 17.052.632,00	0,00	$ -	16,91	$ 1.003.096,00	$ 16.962.184,00	16,91	$ 16.962.184,00	0,00	$ -	16,91	$ 16.962.184,00
3.04	Acero de refuerzo Fy=60 000 P.S.I Viga Canal	KG	1795,00	$ 7.104,00	$ 12.474.624,00	0,00	$ -	2044,67	$ 7.104,00	$ 14.525.335,00	2044,67	$ 14.525.335,00	0,00	$ -	2044,67	$ 14.525.335,00
3.05	Suministro e instalación de manta zintal viga canal	M2	57,16	$ 40.276,00	$ 2.326.349,00	0,00	$ -	60,63	$ 40.276,00	$ 2.441.781,00	60,63	$ 2.441.781,00	0,00	$ -	60,63	$ 2.441.781,00
CUBIERTA																
4.01	Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22 en paneles engargolados e interlocking de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a mt 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	654,00	$ 211.132,00	$ 144.511.843,00	0,00	$ -	684,30	$ 211.132,00	$ 144.511.843,00	0,00	$ -	684,30	$ 144.511.843,00	684,30	$ 144.511.843,00
ACABADOS - PLACA EN CONCRETO																
5.01	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades cíclicas. (voleibol, voleibol y baloncesto)	ML	307,11	$ 14.772,00	$ 4.536.629,00	0,00	$ -	307,11	$ 14.772,00	$ 4.536.629,00	0,00	$ -	307,11	$ 4.536.629,00	307,11	$ 4.536.629,00
5.02	Suministro e instalación de cancha de multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo ANI 2" Cal 18 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 2000M de 1.5 * 1,05 M , incluye: aro, malla, demarcado, logos, postes curvos y pintura	UNID	2,00	$ 3.704.163,00	$ 7.408.326,00	0,00	$ -	2,00	$ 3.704.163,00	$ 7.408.326,00	0,00	$ -	2,00	$ 7.408.326,00	2,00	$ 7.408.326,00
5.03	Placa de caja en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	M2	600,00	$ 84.584,00	$ 50.750.400,00	0,00	$ -	543,00	$ 84.584,00	$ 45.675.360,00	543,00	$ 45.675.360,00	0,00	$ -	543,00	$ 45.675.360,00
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS																
6.01	Bajantes en tubería PVC S de 4" tipo sanitario de conexión para desagues y bajantes de aguas lluvia	ML	59,20	$ 80.003,00	$ 4.736.178,00	0,00	$ -	46,40	$ 80.003,00	$ 3.712.139,00	46,40	$ 3.712.139,00	0,00	$ -	46,40	$ 3.712.139,00
6.02	Suministro e instalación de tubería PVC-S de 6", con accesorios de conexión, para desagues	ML	22,40	$ 106.901,00	$ 2.394.582,00	0,00	$ -	20,80	$ 106.901,00	$ 2.292.161,00	0,00	$ -	20,80	$ 2.292.161,00	22,60	$ 2.292.161,00
6.03	Suministro e instalacion de tubería PVC-S de 8", con accesorios de conexión, para salida	ML	30,00	$ 218.660,00	$ 6.559.800,00	0,00	$ -	12,00	$ 215.663,00	$ 2.623.956,00	0,00	$ -	12,00	$ 2.623.956,00	12,00	$ 2.623.956,00
6.04	Caja de inspección en concreto de F'c= 2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, Ht. 1.55 incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 3 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts según diseño	UNID	2,00	$ 349.366,00	$ 698.732,00	0,00	$ -	2,00	$ 349.366,00	$ 698.732,00	2,00	$ 698.732,00	0,00	$ -	2,00	$ 698.732,00
INSTALACIONES ELECTRICAS																
7.01	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina antideslizante	UNID	3,00	$ 637.765,00	$ 1.913.295,00	0,00	$ -	3,00	$ 637.765,00	$ 1.913.295,00	0,00	$ -	3,00	$ 1.913.295,00	3,00	$ 1.913.295,00
7.02	Excavación manual sin clasificar. Incluye todo lacheo y disposición final del material en escombrera autorizada	M3	5,28	$ 45.921,00	$ 242.463,00	0,00	$ -	5,28	$ 45.921,00	$ 242.463,00	0,00	$ -	5,28	$ 242.463,00	5,28	$ 242.463,00
7.03	Canalización en ducto corrugado pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye excavación y tapada de trocha a=0,40 mts	ML	33,00	$ 48.254,00	$ 1.592.382,00	0,00	$ -	33,00	$ 48.254,00	$ 1.592.382,00	0,00	$ -	33,00	$ 1.592.382,00	33,00	$ 1.592.382,00
7.04	Transición aérea-subterránea tubería AAC 1 1/2"	UNID	2,00	$ 303.981,00	$ 607.922,00	0,00	$ -	3,00	$ 303.981,00	$ 911.883,00	0,00	$ -	3,00	$ 911.883,00	3,00	$ 911.883,00
7.05	Transición aérea subterránea tubería AAC 1"	UNID	2,00	$ 251.774,00	$ 503.548,00	0,00	$ -	2,00	$ 281.774,00	$ 563.548,00	0,00	$ -	2,00	$ 563.548,00	2,00	$ 563.548,00

7.06	Suministro - instalación y cableado de reflector de piso	UNO	1.00	$ 1.015.016,35	$ 1.015.016,00	0.00	$ -	1.00	$ 1.015.016,00	$ 1.015.016,00	0.00	$ -	1.00	$ 1.015.016,00	1.00	$ 1.015.016,00			
7.07	Suministro - instalación y cableado de cable de distribución aislado en columna	UNO	1.00	$ 4.532.840,00	$ 4.692.840,00	0.00	$ -	1.00	$ 4.692.840,00	$ 4.692.840,00	0.00	$ -	1.00	$ 4.692.840,00	1.00	$ 4.692.840,00			
7.08	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2#6 al 3#4/0 + 1#4 al 3#2/0 + 1#2 cu	ML	21.00	$ 88.378,00	$ 1.855.938,00	0.00	$ -	21.00	$ 88.378,00	$ 1.855.938,00	0.00	$ -	21.00	$ 1.855.938,00	21.00	$ 1.855.938,00			
7.09	Instalación brazo soporte según diseño de 1.5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	UNO	12.00	$ 368.312,00	$ 4.419.744,00	0.00	$ -	10.00	$ 368.312,00	$ 3.683.120,00	0.00	$ -	10.00	$ 3.683.120,00	10.00	$ 3.683.120,00			
7.10	Suministro e instalación de cableado para reflectores internos para montaje de reflectores	ML	60.00	$ 58.650,00	$ 3.483.099,00	0.00	$ -	54 estimativo ML	$ 58.650,00	$ 3.416.823,00	0.00	$ -	58,86	$ 3.416.823,00	58,86	$ 3.416.823,00			
7.11	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UNO	12.00	$ 1.019.975,00	$ 12.239.700,00	0.00	$ -	10.00	$ 1.016.975,00	$ 10.169.750,00	0.00	$ -	10.00	$ 10.169.750,00	10.00	$ 10.169.750,00			
7.12	Suministro e instalación de luminaria led a 120 v	UNO	1.00	$ 973.278,00	$ 973.278,00	0.00	$ -	1.00	$ 973.278,00	$ 973.278,00	0.00	$ -	1.00	$ 973.278,00	1.00	$ 973.278,00			
7.13	Suministro e instalación de luminaria led a 240v y luminaria led a 120 v	UNO	1.00	$ 1.933.524,00	$ 1.933.524,00	0.00	$ -	1.00	$ 1.933.524,00	$ 1.933.524,00	0.00	$ -	1.00	$ 1.933.524,00	1.00	$ 1.933.524,00			
TRANSPORTE																			
8.01	Transporte de materiales pétreos	M3-Km	8099.29	$ 1.099,00	$ 8.901.196,00	8090.19	$ 8.891.118,00	27777.37	$ 1.099,00	$ 30.527.878,00	19 686.54	$ 21.636.507,00	3,00	$ -	27778.73	$ 30.526.626,00			
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 445.633.807,00		$ 122.556.745,00			$ 467.909.773,00		$ 151.637.557,00		$ 193.379.775,00		$ 467.904.077,00			
	Administración			20,00%	$ 89.130.761,00	20,00%	$ 24.577.349,00		20,00%	$ 93.581.954,00	20,00%	$ 30.327.511,00	20,00%	$ 38.675.955,00	20,00%	$ 93.580.815,00			
	Imprevistos			1,00%	$ 4.455.938,00	1,00%	$ 1.223.567,00		1,00%	$ 4.679.098,00	1,00%	$ 1.516.378,00	1,00%	$ 1.933.798,00	1,00%	$ 4.679.041,00			
	Utilidad			4,00%	$ 17.827.752,00	4,00%	$ 4.915.470,00		4,00%	$ 18.716.391,00	4,00%	$ 6.065.512,00	4,00%	$ 7.735.191,00	4,00%	$ 18.716.163,00			
	TOTAL COSTO				$ 557.117.258,00		$ 153.603.431,00			$ 584.887.213,00		$ 189.546.946,00		$ 241.724.719,69		$ 584.880.096,00			
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO			25%	$ 139.279.315		-$ 38.400.858					-$ 47.386.737		-$ 60.431.179		-$ 146.220.024			
	VALOR TOTAL MENOS (-) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO						$ 115.202.573					$ 142.160.209		$ 181.293.540		$ 438.660.072			
	% AVANCE DE OBRA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS						26,26%					32,41%		41,33%		100,00%			

NOTA 1: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

NOTA 2: Se calcula el AIU como se pactó en el presupuesto oficial, evidenciando que en el anexo contractual en la parte digitada se presenta un AIU del 19%, 1% y 5% respectivamente, no obstante, el cálculo matemáticamente se presenta como se muestra en el acta A/U del 20%, 1% y 4%

NOTA 3: Con el cobro de la presente acta se termina de amortizar el anticipo con un valor de $ 139 279 315

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

Ing. Yohan Fernando Salazar Bagna
R.L. CONSORCIO FLORAL CC
CONTRATISTA DE OBRA

Ing. Edwin Mauricio Rojas Alarcon
R.L. EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	No. CONTRATO:	OBRA PUBLICA No CLPIH373 DE 2023
LOCALIZACION:	MUNICIPIO DE OPORAPA	PERIODO COMPRENDIDO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO GLOBAL CC	Desde: 14 de Noviembre de 2025 Y del 16 de Diciembre de 2025	Memorias de CALCULO Acta Final
INTERVENTOR:	EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON	Hasta: 23 de Noviembre de 2025 El 23 de Diciembre de 2025	

CAPÍTULO:	4	CUBIERTA		
ITEM:	4,01	Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	UNIDAD:	M2

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto / prof		Distancias	Total
Cubierta Autoportante	30,40	22,51	0,00	0,00	0,00	684,30
TOTAL						684,30

ESQUEMAS:

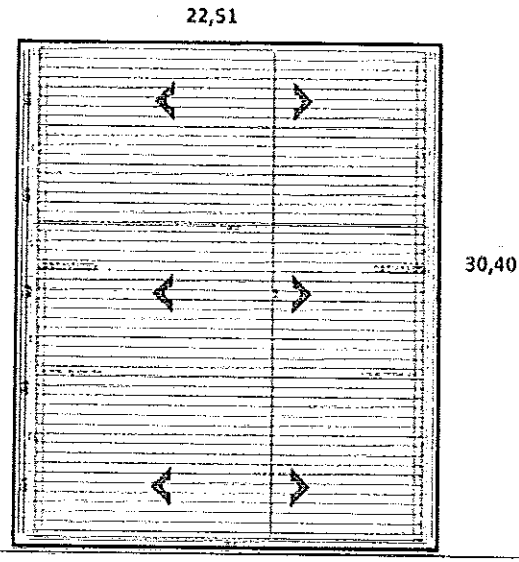

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son totalmente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno

Vo.Bo. Ing. Juan Carlos Angarita Puerto
RESIDENTE DE OBRA

Ing. Yohan Fernando Salazar Baron
DIRECTOR DE OBRA


Vo.Bo. Ing. Edwin Mauricio Rojas Alarcon
RESIDENTE DE INTERVENTORIA


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código: [illegible]
			Versión: 1
			Fecha de Aprobación:
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		12/05/2021

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	No. CONTRATO:		OBRA PUBLICA No CLPIH373 DE 2023
LOCALIZACION:	MUNICIPIO DE OPORAPA	PERIODO COMPRENDIDO:		Memorias de CALCULO Acta FINAL.:
CONTRATISTA:	CONSORCIO GLOBAL CC	Desde:	14 DE NOVIEMBRE 2025	
INTERVENTOR:	EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON	Hasta:	23 DE DICIEMBRE DE 2025	

CAPÍTULO:	4	CUBIERTA		
ITEM:	4,01	Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22, en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO

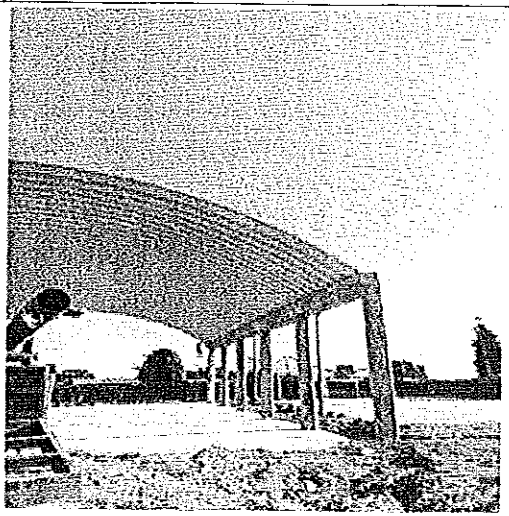

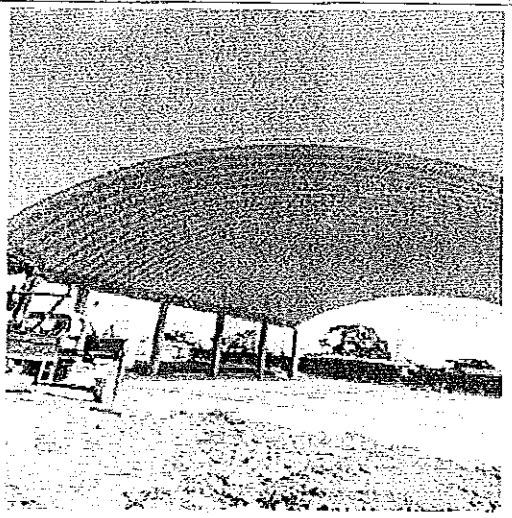



Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Juan Carlos Angarita

Vo.Bo. Ing. Juan Carlos Angarita Pulido
RESIDENTE DE OBRA

Yohan Fdo Salazar Baena

Ing. Yohan Fernando Salazar Baena
DIRECTOR DE OBRA

Vo.Bo. Ing. Edwin Mauricio Rojas Alarcon
RESIDENTE DE INTERVENTORIA


CAPÍTULO:	5	ACABADOS - PLACA EN CONCRETO		
ITEM:	5,01	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	UNIDAD:	ML


PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto / prof		Distancias	Total
Microfutbol	88,00				1,00	88,00
	14,31				2,00	28,62
	15,91				1,00	15,91
Voleibol	10,29				1,00	10,29
	54,09				1,00	54,09
	8,91				2,00	17,82
Baloncesto	0,15				4,00	0,60
	16,80				1,00	16,80
	0,10				2,00	0,20
	5,65				2,00	11,30
	23,15				2,00	46,32
	17,16				1,00	17,16

CAPÍTULO:	5	ACABADOS - PLACA EN CONCRETO		
ITEM:	5,01	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	UNIDAD:	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO

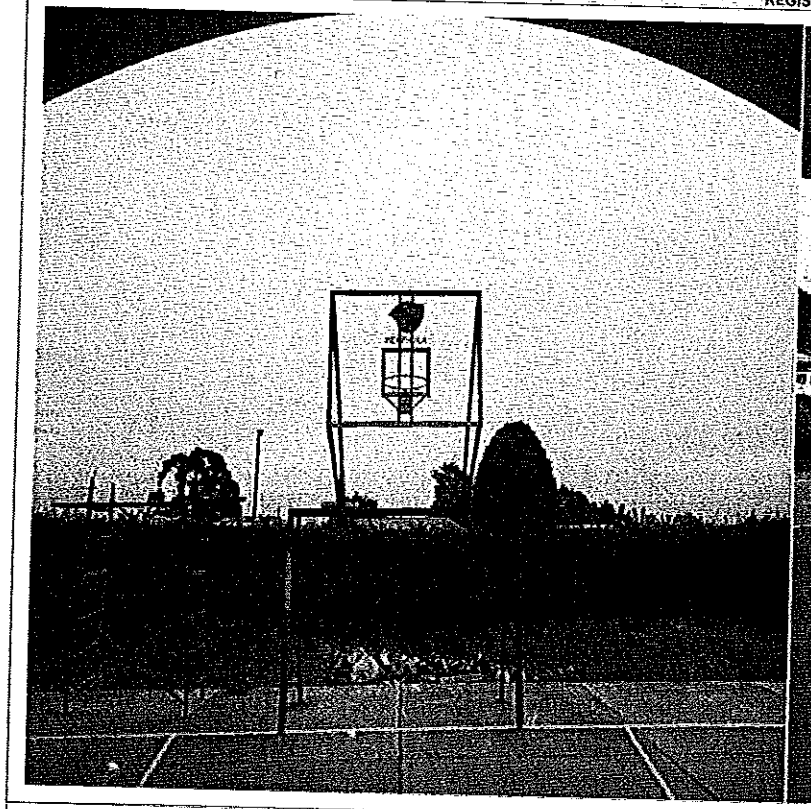

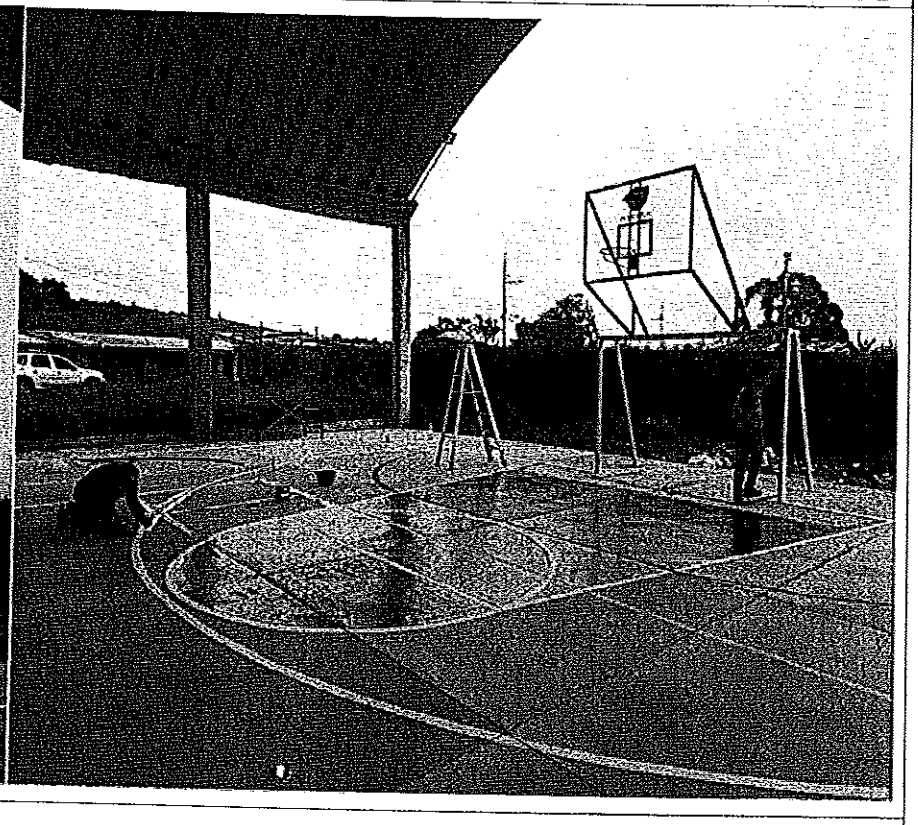

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Juan Carlos Angarita.
Vo.Bo. Ing. Juan Carlos Angarita Pueño
RESIDENTE DE OBRA

Yohan Fdo. Salazar B.
Ing. Yohan Fernando Salazar Baena
DIRECTOR DE OBRA

Vo.Bo. Ing. Edwin Mauricio Rojas Alarcon
RESIDENTE DE INTERVENTORIA


5

CAPÍTULO:	5	ACABADOS - PLACA EN CONCRETO		
ITEM:	5,02	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 18 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura.	UNIDAD:	UNO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto / prof		Cantidad	Total
Marcos canchas	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
TOTAL						2,00

ESQUEMAS:

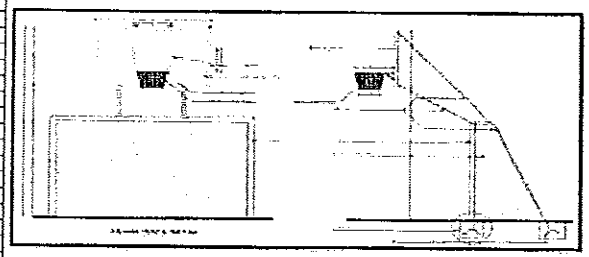

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno

Juan Carlos Ingapirta

Vo.Bo. Ing. Juan Carlos Angarita Puerto
RESIDENTE DE OBRA

Yohan Fdo Salazar Ba.

Ing. Yohan Fernando Salazar Baena
DIRECTOR DE OBRA


Edwin

Vo.Bo. Ing. Edwin Mauricio Rojas Alarcon
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

47

CAPÍTULO:	5	ACABADOS - PLACA EN CONCRETO		
ITEM:	5,01	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	UNIDAD:	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO

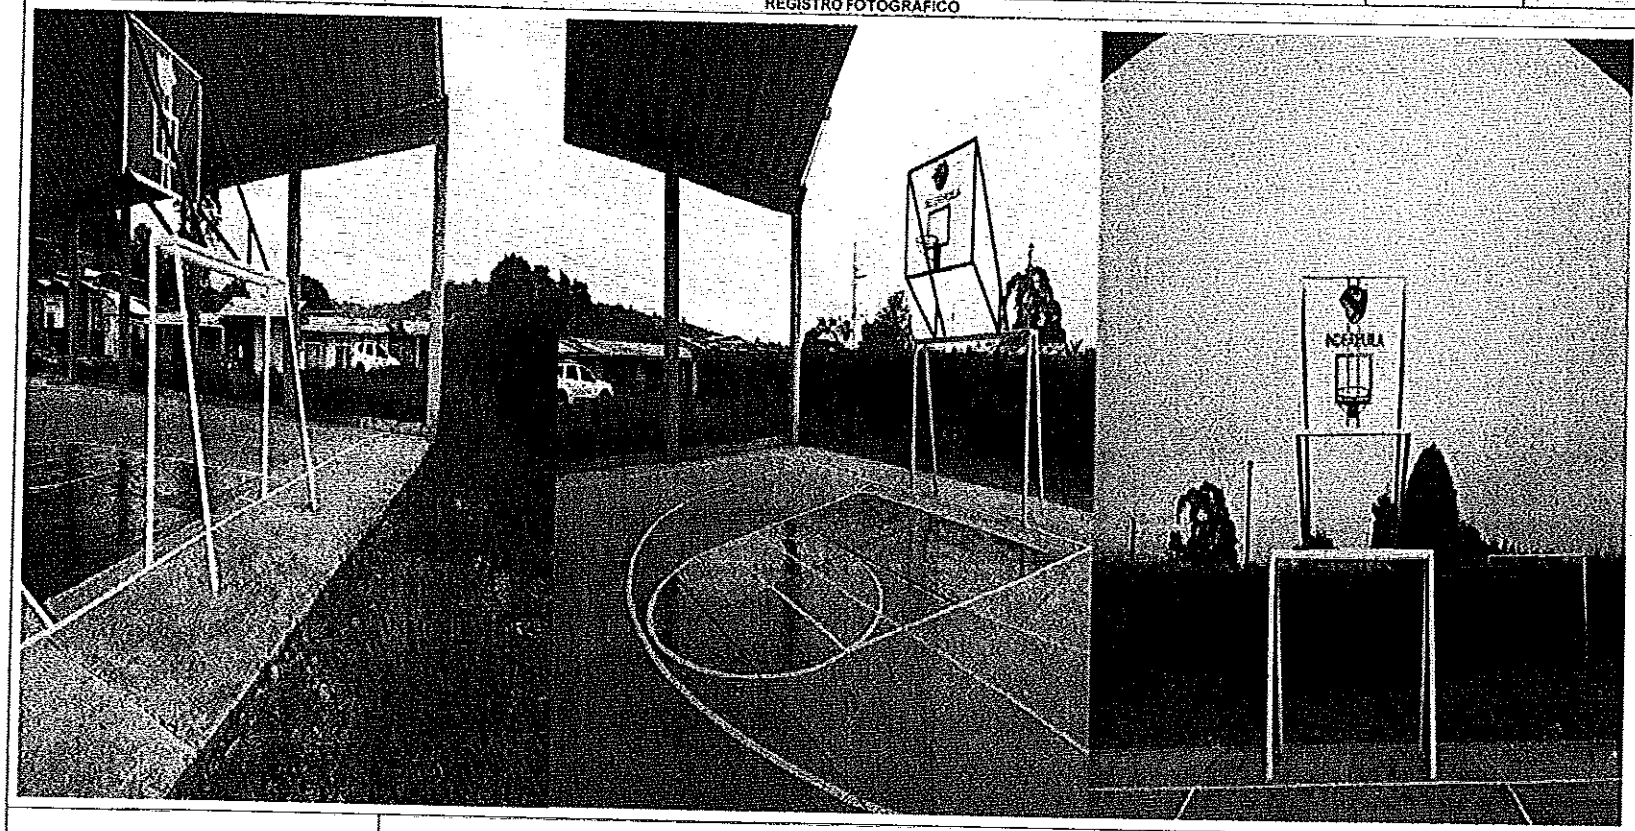

Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno


Juan Carlos Ingarita
Vo.Bo. Ing. Juan Carlos Angarita Puerto
RESIDENTE DE OBRA

Yohan Fdo Salazar F.
Ing. Yohan Fernando Salazar Baena
DIRECTOR DE OBRA

Vo.Bo. Ing. Edwin Mauricio Rojas Alarcon
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

68

CAPITULO:	5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
ITEM:	5,02	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.				UNIDAD:	ML
PROCEDIMIENTO PARA CALCULO							
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto / prof		Cantidad	Total	ESQUEMAS:
Caja a Caja	20.60	0.00	0.00	0.00	1.00	20.60	
TOTAL						20,6	
Observaciones:							



NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno

Juan Carlos Angarita

Vo.Bo. Ing. Juan Carlos Angarita Puerto
RESIDENTE DE OBRA

Yohan Fdo Salazar B.

Ing. Yohan Fernando Salazar Baena
DIRECTOR DE OBRA

Vo.Bo. Ing. Edwin Mauricio Rojas Alarcon
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAPÍTULO:	6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
ITEM:	6,02	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.	UNIDAD:	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Juan Carlos Inganita
Vo.Bo. Ing. Juan Carlos Anganita Puerto
RESIDENTE DE OBRA

Yohan Fdo Salazar Ba.
Ing. Yohan Fernando Salazar Bacha
DIRECTOR DE OBRA

Vo.Bo. Ing. Edwin Mauricio Rojas Alarcon
RESIDENTE DE INTERVENTORIA


28

CAPÍTULO:	6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
ITEM:	6,03	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.				UNIDAD:	ML

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto / prof		Cantidad	Total
Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	12,00	0,00	0,00	0,00	1,00	12,00
TOTAL						12,00
Observaciones:						

ESQUEMAS:

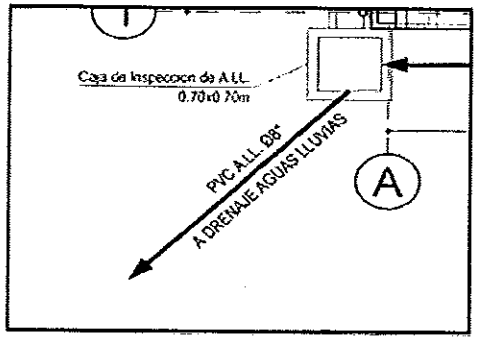

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son entera responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Juan Carlos Angarita.

Vo.Bo. Ing. Juan Carlos Angarita Puerto
RESIDENTE DE OBRA


Yohan Fdo Salazar B

Ing. Yohan Fernando Salazar Baena
DIRECTOR DE OBRA

Vo.Bo. Ing. Edwin Mauricio Rojas Alarcon
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAPÍTULO:	6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
ITEM:	6,03	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	UNIDAD:	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO

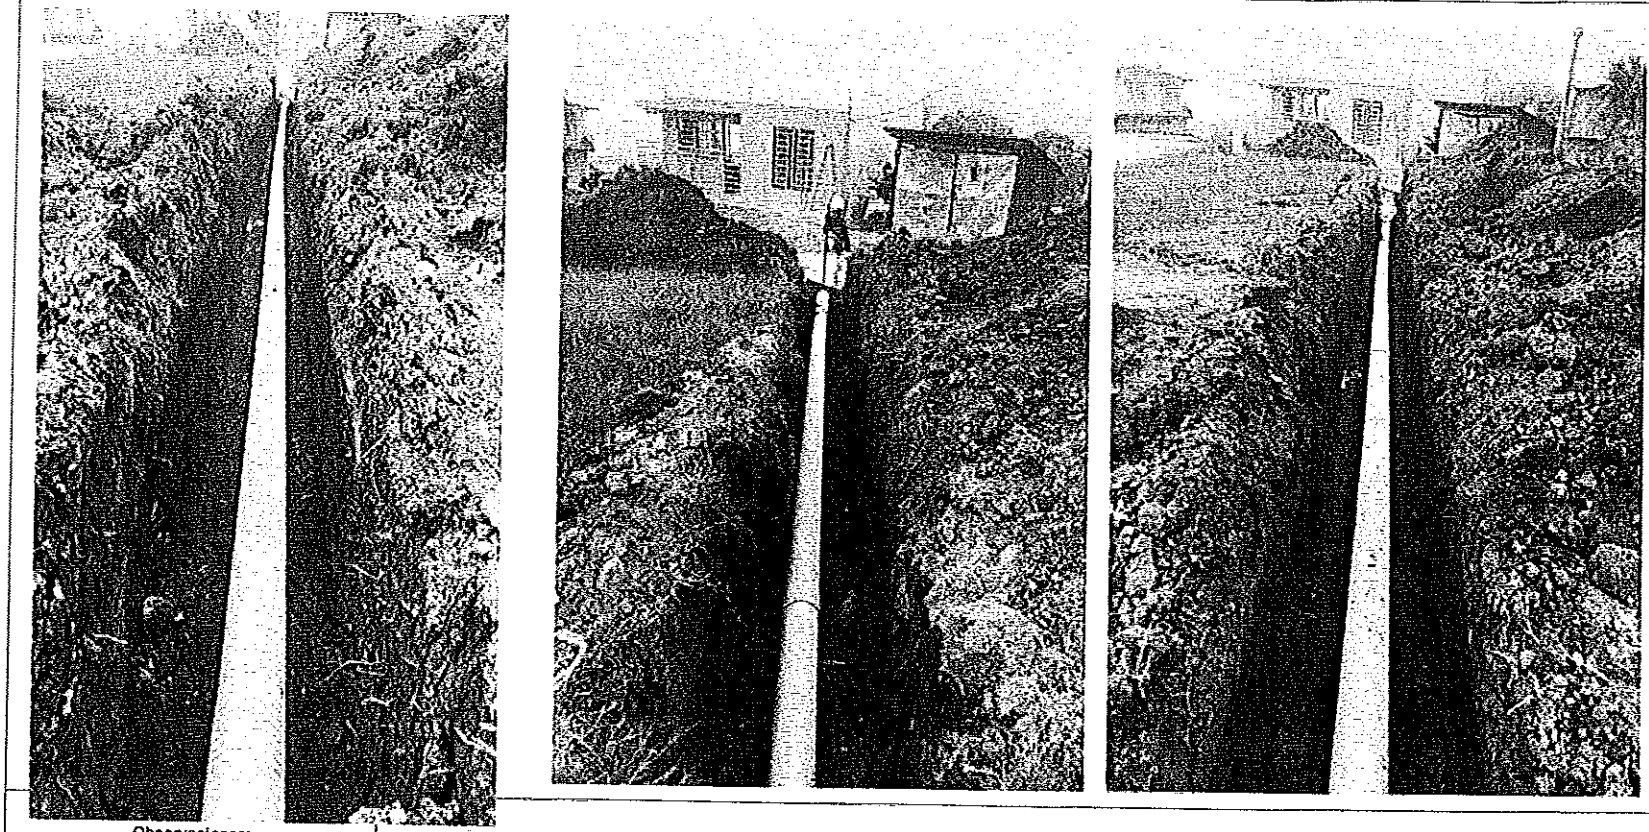

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Juan Carlos Angarita.
Vo.Bo. Ing. Juan Carlos Angarita Puerto
RESIDENTE DE OBRA

Yohan Fdo Salazar B.
Ing. Yohan Fernando Salazar Baena
DIRECTOR DE OBRA

Vo.Bo. Ing. Edwin Mauricio Rojas Alarcon
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

22


CAPÍTULO:	7	INSTALACIONES ELECTRICAS		
ITEM:	7,01	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lámina alfajor.	UNIDAD:	UND


PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto / prof		Cantidad	Total
Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lámina alfajor.	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00

CAPÍTULO:	7	INSTALACIONES ELECTRICAS		
ITEM:	7,01	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.	UNIDAD:	UND

REGISTRO FOTOGRAFICO

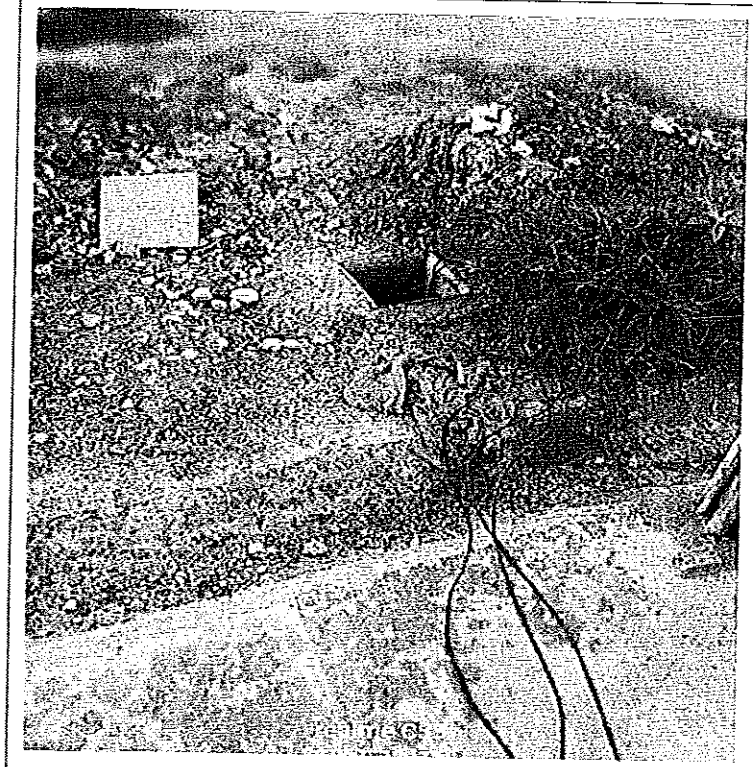

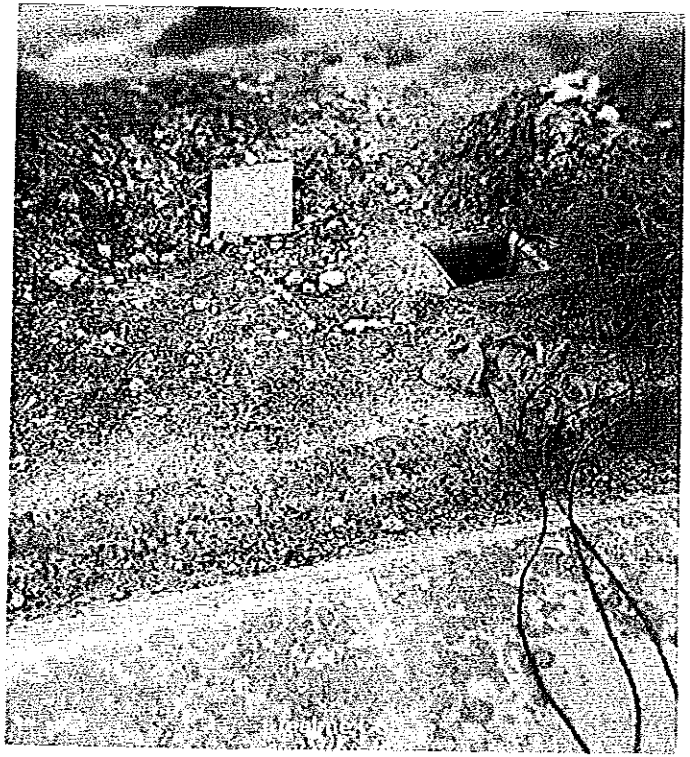

Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno

Juan Carlos Inganita.
Vo Bo. Ing. Juan Carlos Anganita Pearto
RESIDENTE DE OBRA

Yohan Fdo Salazar B.
Ing. Yohan Fernando Salazar Baena
DIRECTOR DE OBRA

Vo.Bo. Ing. Edwin Mauricio Rojas Alarcon
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAPÍTULO:	7	INSTALACIONES ELECTRICAS	UNIDAD:	M3
ITEM:	7,02	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.		

PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto / prof		Cantidad	Total
Canalización en ductos, dos ductos de 1 1/2"	33,00	0,40	0,40	0,00	1,00	5,28

CAPÍTULO:	7	INSTALACIONES ELECTRICAS		
ITEM:	7,02	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	UNIDAD:	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Juan Carlos Ingarita
Vo.Bo. Ing. Juan Carlos Angarita Puerto
RESIDENTE DE OBRA

Yohan Fdo Salazar B.
Ing. Yohan Fernando Salazar Bacna
DIRECTOR DE OBRA

Vo.Bo. Ing. Edwin Mauricio Rojas Alarcon
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAPÍTULO:	7	INSTALACIONES ELECTRICAS						
ITEM:	7,01	Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.					UNIDAD:	ML


PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto / prof		Cantidad	Total
Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.	33,00	0,00	0,00	0,00	1,00	33,00

CAPÍTULO:	7	INSTALACIONES ELECTRICAS		
ITEM:	7,03	Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión, incluye compactación y tapada de brecha, a=0,40 mts.	UNIDAD:	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO



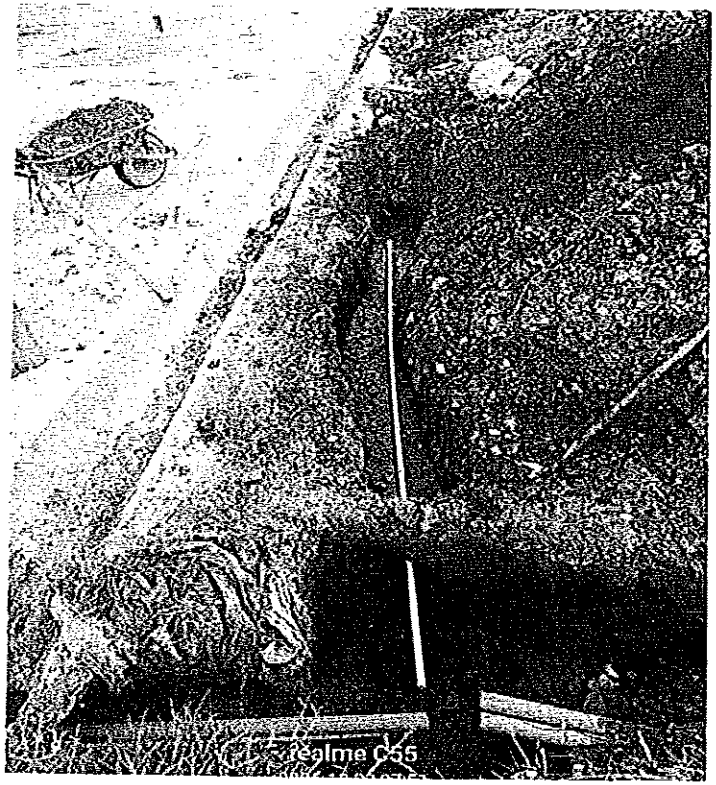

Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Juan Carlos Angarita.
Vo.Bo. Ing. Juan Carlos Angarita Puerto
RESIDENTE DE OBRA

Yohan Fdo Salazar B.
Ing. Yohan Fernando Salazar Baena
DIRECTOR DE OBRA

Vo.Bo. Ing. Edwin Mauricio Rojas Alarcon
RESIDENTE DE INTERVENTORIA


28

CAPÍTULO:	7	INSTALACIONES ELECTRICAS					
ITEM:	7,04	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2".				UNIDAD:	UND

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto / prof		Cantidad	Total
Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2".	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
TOTAL						3,00

ESQUEMAS:

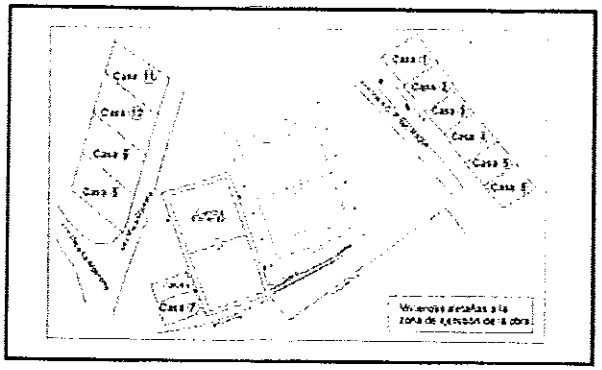



Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Juan Carlos Angarita

Vo.Bo. Ing. Juan Carlos Angarita Puerto
RESIDENTE DE OBRA


Yohan Fernando Salazar B

Ing. Yohan Fernando Salazar Baena
DIRECTOR DE OBRA

Vo.Bo. Ing. Edwin Mauricio Rojas Alarcon
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAPÍTULO:	7	INSTALACIONES ELECTRICAS		
ITEM:	7,04	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	UNIDAD:	UND

REGISTRO FOTOGRAFICO

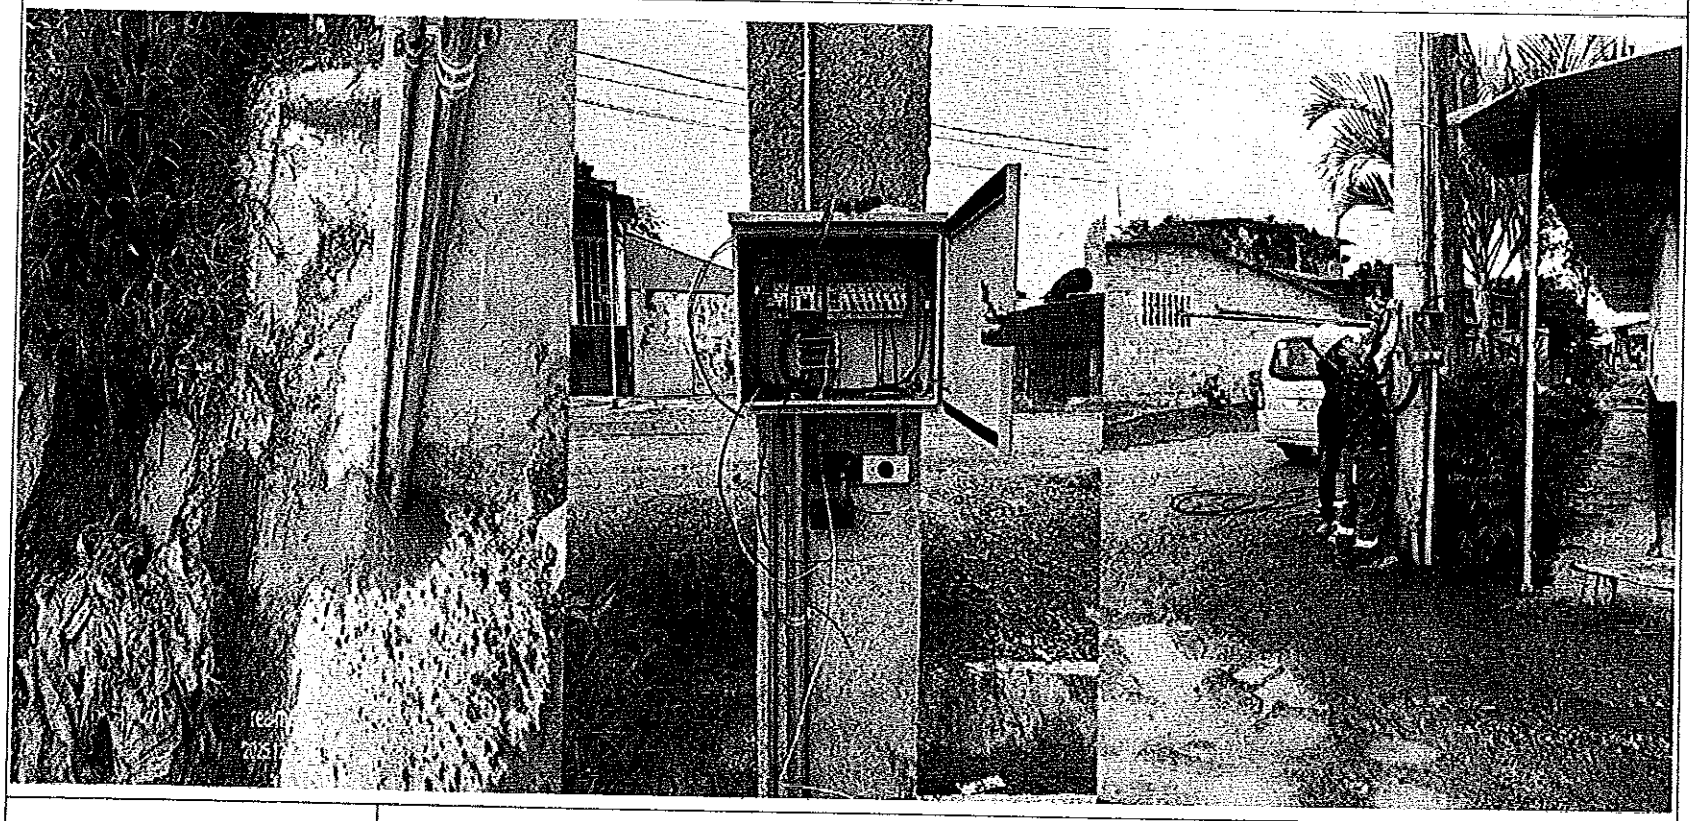

Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Vo.Bo. Ing. Juan Carlos Angarita Puerto
RESIDENTE DE OBRA

Ing. Yohan Fernando Salazar Baena
DIRECTOR DE OBRA

Vo.Bo. Ing. Edwin Mauricio Rojas Alarcon
RESIDENTE DE INTERVENTORIA


CAPITULO:	7	INSTALACIONES ELECTRICAS					
ITEM:	7,05	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1".				UNIDAD:	UND

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto / prof		Cantidad	Total
Transición aérea-subterránea tubería IMC 1".	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00

CAPÍTULO:	7	INSTALACIONES ELECTRICAS		
ITEM:	7,05	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	UNIDAD:	UND

REGISTRO FOTOGRÁFICO

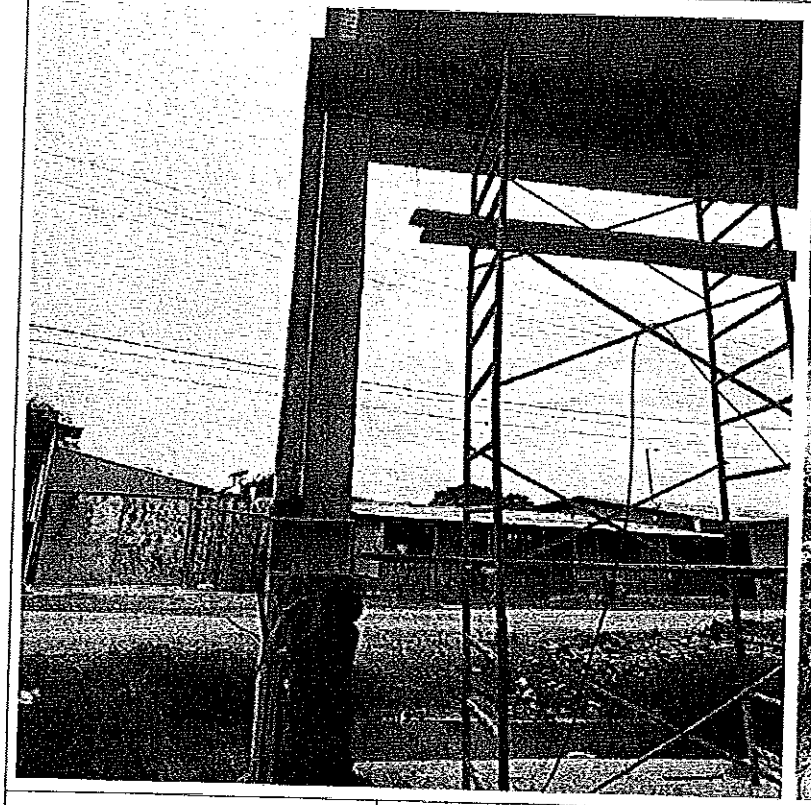



Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Juan Carlos Ingarita

Vo.Bo. Ing. Juan Carlos Angarita Puerto
RESIDENTE DE OBRA

Yohan Fdo Salazar R.

Ing. Yohan Fernando Salazar Baena
DIRECTOR DE OBRA

Edwin


Vo.Bo. Ing. Edwin Mauricio Rojas Alarcon
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAPÍTULO:	7	INSTALACIONES ELECTRICAS					
ITEM:	7,08	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.				UNIDAD:	UND

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto / prof		Cantidad	Total
Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL						1,00

ESQUEMAS:

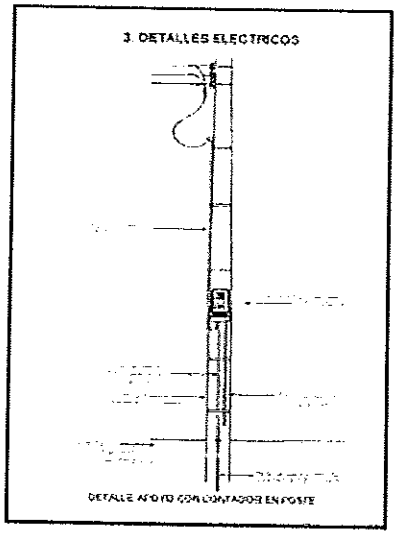

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y consignaron en el terreno.

Juan Carlos Ingavita

Vo.Bo. Ing. Juan Carlos Angarita Puerto
RESIDENTE DE OBRA


Yohan Fdo Salazar B.

Ing. Yohan Fernando Salazar Baena
DIRECTOR DE OBRA

Vo.Bo. Ing. Edwin Mauricio Rojas Alarcon
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAPÍTULO:	7	INSTALACIONES ELECTRICAS		
ITEM:	7,06	Suministro - Instalación y cableado de medida directa en poste.	UNIDAD:	UND

REGISTRO FOTOGRAFICO

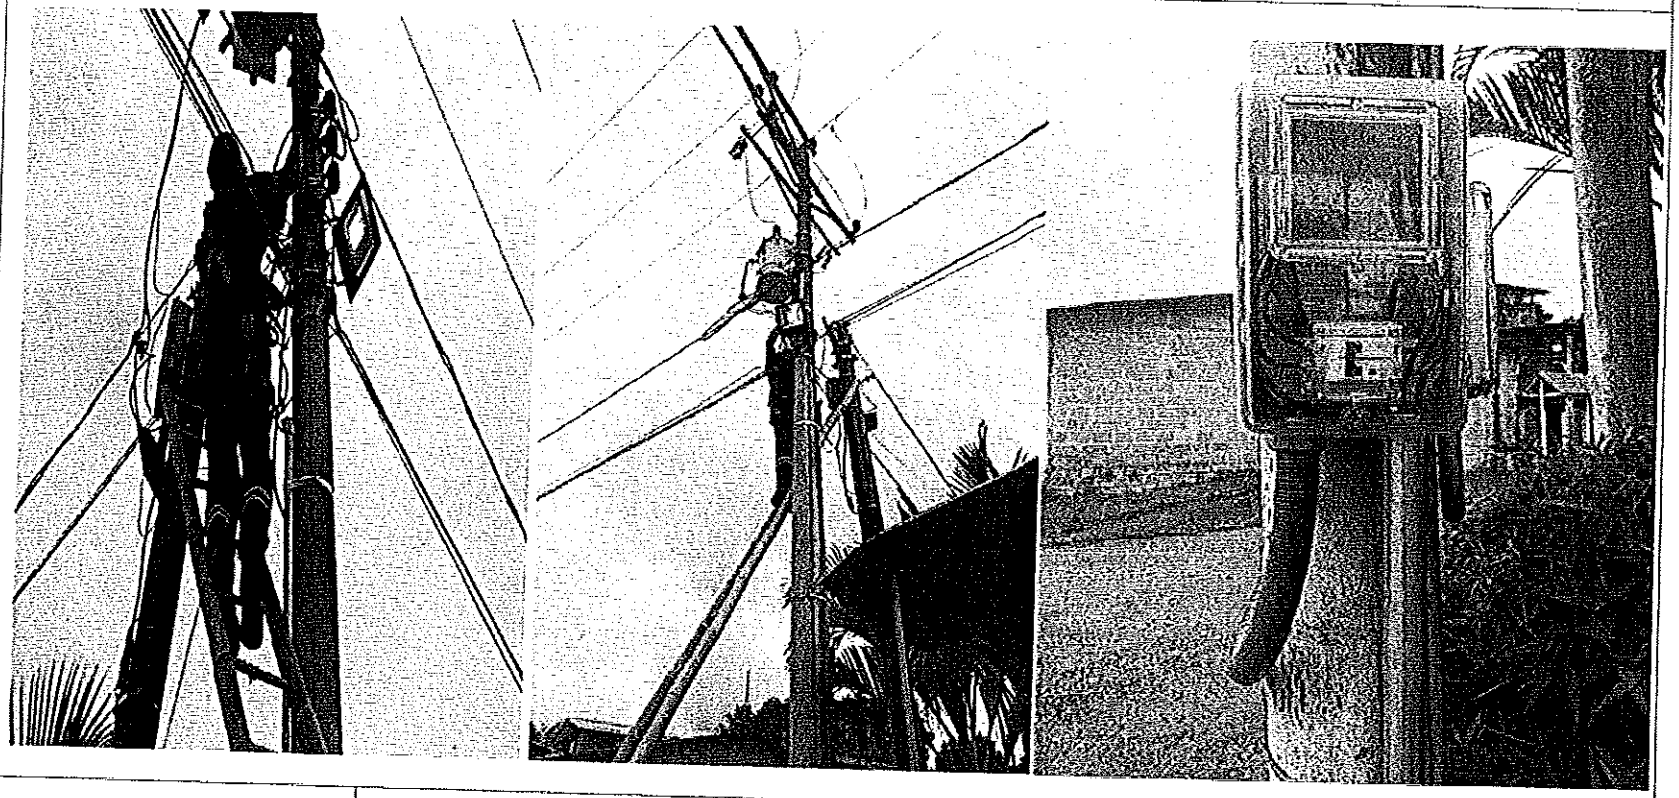

Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Vo.Bo. Ing. Juan Carlos Angarita Puerto
RESIDENTE DE OBRA

Ing. Yohan Fernando Salazar Baena
DIRECTOR DE OBRA


Vo. Bo. Ing. Edwin Mauricio Rojas Alarcon
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAPÍTULO:	7	INSTALACIONES ELECTRICAS					
ITEM:	7,07	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.				UNIDAD:	UND

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto / pesf		Cantidad	Total
Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL						1,00

ESQUEMAS:

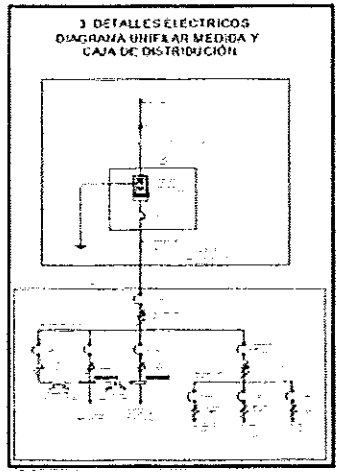

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno

Juan Carlos Angarita

Vo.Bo. Ing. Juan Carlos Angarita Puerto
RESIDENTE DE OBRA


Yohan Fdo Salazar B.

Ing. Yohan Fernando Salazar Bravo
DIRECTOR DE OBRA

Vo.Bo. Ing. Edwin Mauricio Rojas Alarcon
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAPÍTULO:	7	INSTALACIONES ELECTRICAS		
ITEM:	7,07	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UNIDAD:	UND

REGISTRO FOTOGRAFICO

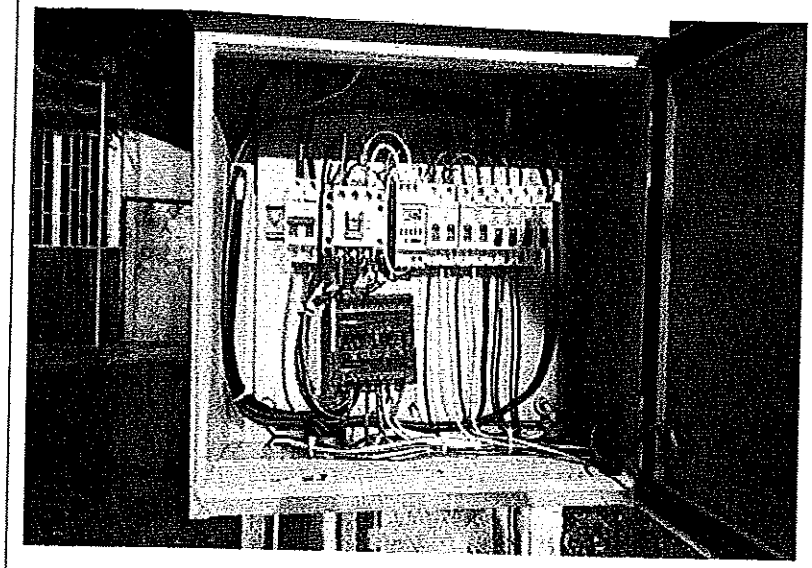



Observaciones:	


NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno

Juan Carlos Angarita.
Vo.Bo. Ing. Juan Carlos Angarita Puerto
RESIDENTE DE OBRA

yohan fdo Salazar B.
Ing. Yohan Fernando Salazar Baena
DIRECTOR DE OBRA

Edwin
Vo.Bo. Ing. Edwin Mauricio Rojas Alarcon
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAPÍTULO:	7	INSTALACIONES ELECTRICAS				UNIDAD:	ML
ITEM:	7,08	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.					
PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO							
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	Longitud (m)	Ancho (e)	Alto / prof		Cantidad	Total	ESQUEMAS:
Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	
TOTAL						21,00	

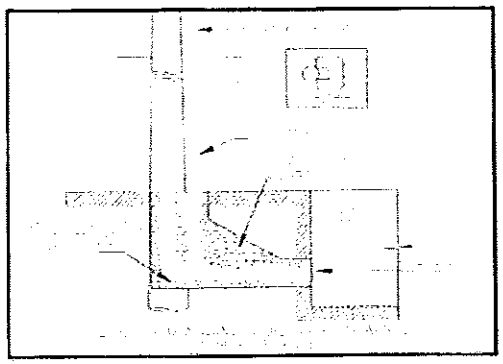

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno

Juan Carlos Ingarita


Vo.Bo. Ing. Juan Carlos Angarita Puerto
RESIDENTE DE OBRA

Yohan Fernando Salazar Baena
Ing. Yohan Fernando Salazar Baena
DIRECTOR DE OBRA

Vo.Bo. Ing. Edwin Mauricio Rojas Alarcon
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAPITULO:	7	INSTALACIONES ELECTRICAS		
ITEM:	7,08	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.	UNIDAD:	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO

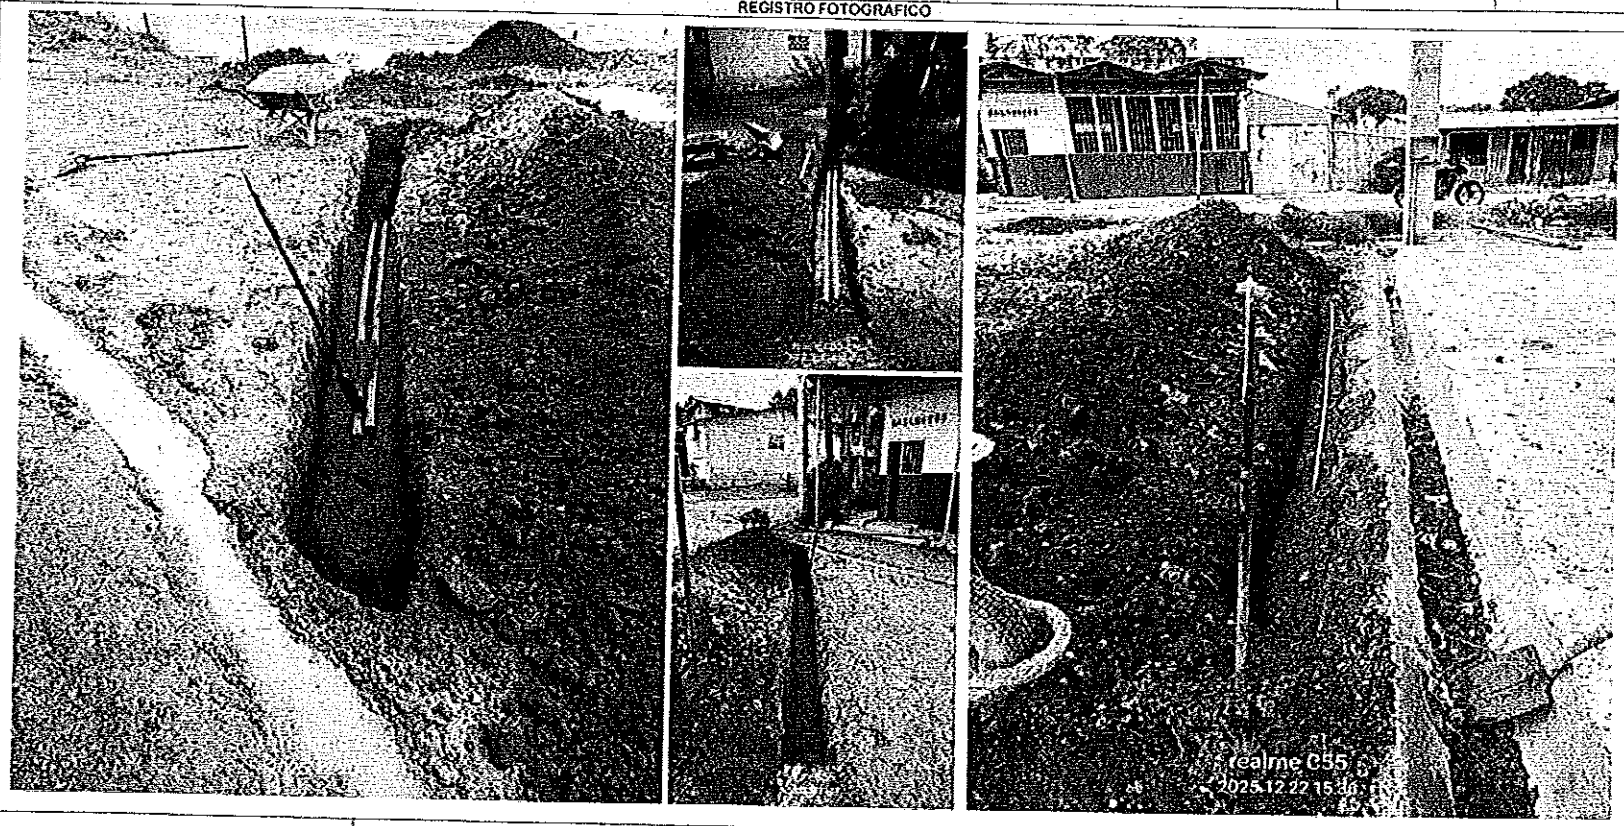

Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Juan Carlos Angarita.
Vo.Bo. Ing. Juan Carlos Angarita Puerto
RESIDENTE DE OBRA

Yohan Fdo Salazar B.
Ing. Yohan Fernando Salazar Barona
DIRECTOR DE OBRA

Vo.Bo. Ing. Edwin Mauricio Rojas Alarcon
RESIDENTE DE INTERVENTORIA


38


CAPÍTULO:	7	INSTALACIONES ELECTRICAS					
ITEM:	7,09	Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.				UNIDAD:	UND

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto / prof		Cantidad	Total
Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
TOTAL						10,00

ESQUEMAS:

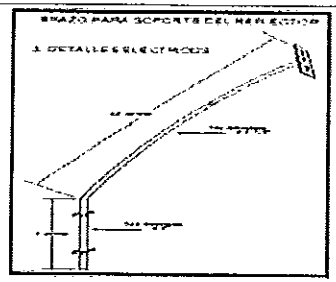



Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.


Juan Carlos Angarita.
Vo.Bo. Ing. Juan Carlos Angarita Puerto
RESIDENTE DE OBRA


Yohan Fdo Salazar B.
Ing. Yohan Fernando Salazar Baena
DIRECTOR DE OBRA

Vo.Bo. Ing. Edwin Mauricio Rojas Alarcon
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAPÍTULO:	7	INSTALACIONES ELECTRICAS		
ITEM:	7,09	Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	UNIDAD:	UNO

REGISTRO FOTOGRAFICO

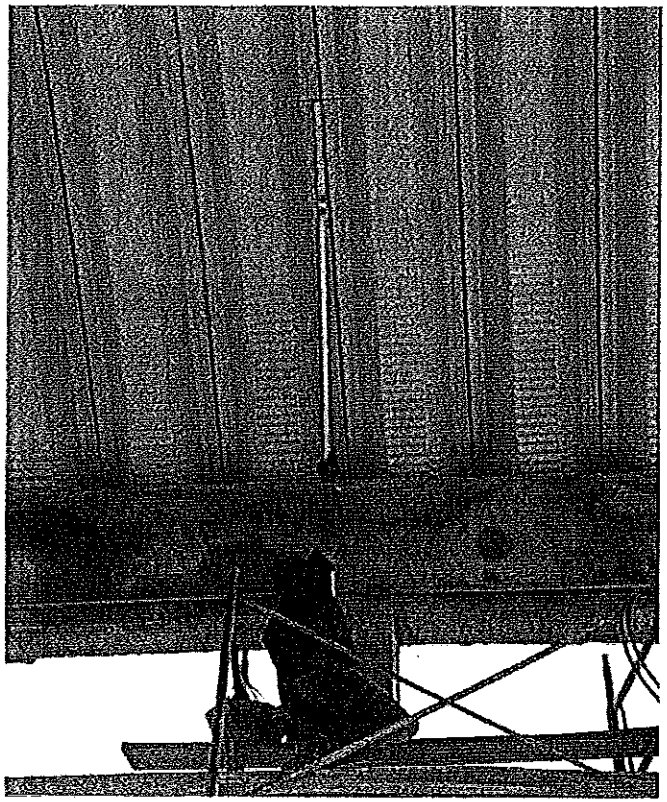

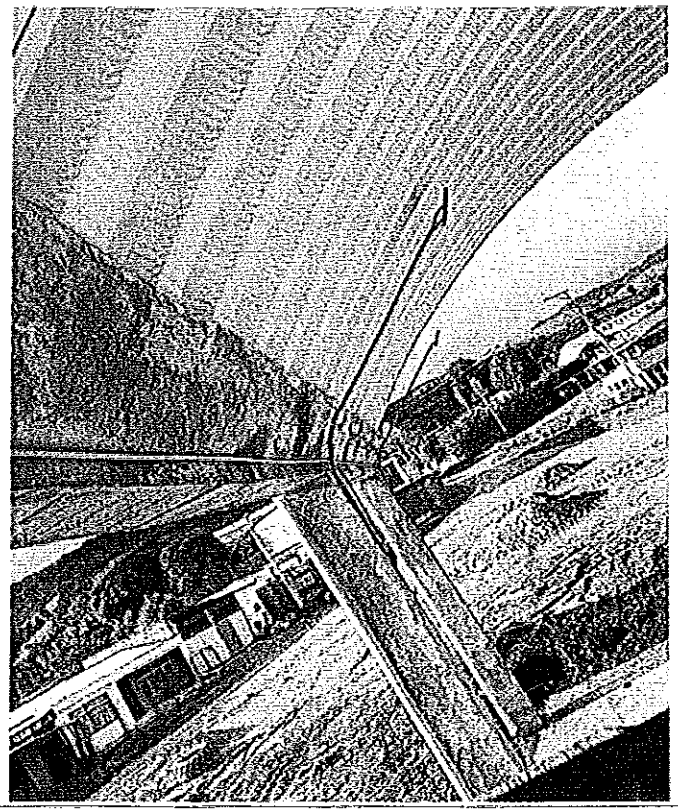

Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno

Vo.Bo. Ing. Juan Carlos Argaez Puerto
RESIDENTE DE OBRA

Ing. Yohan Fernando Salazar Barma
DIRECTOR DE OBRA

Vo.Bo. Ing. Edwin Mauricio Rojas Alarcon
RESIDENTE DE INTERVENTORIA


CAPÍTULO:	7	INSTALACIONES ELECTRICAS		
ITEM:	7,10	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	UNIDAD:	ML


PROCEDIMIENTO PARA CALCULO


DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto / prof		Cantidad	Total
Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	58,88	0,00	0,00	0,00	1,00	58,88

CAPÍTULO:	7	INSTALACIONES ELECTRICAS		
ITEM:	7,10	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	UNIDAD:	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO

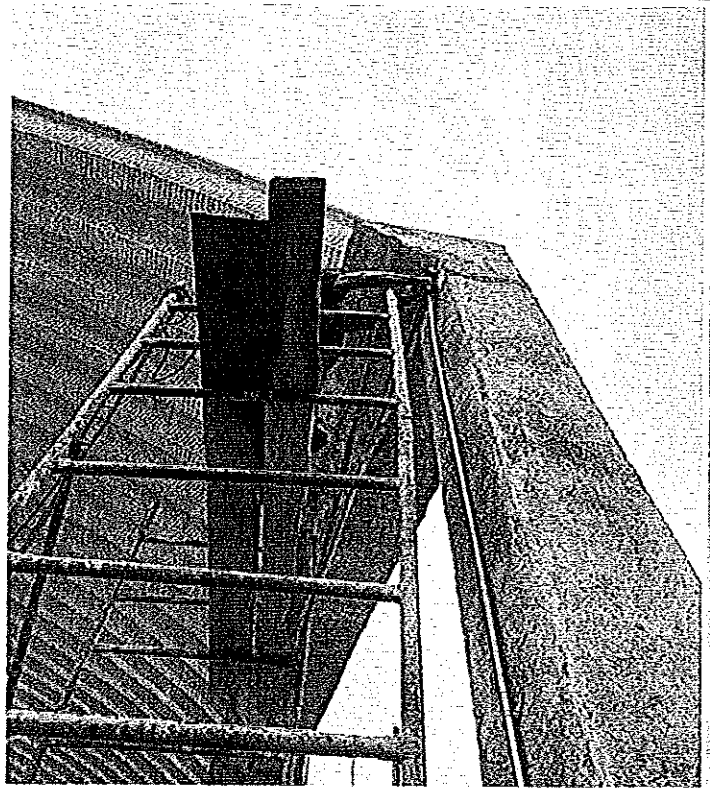

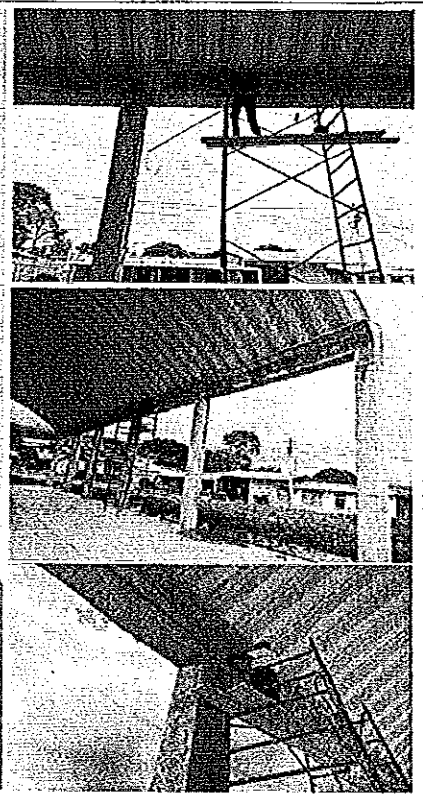

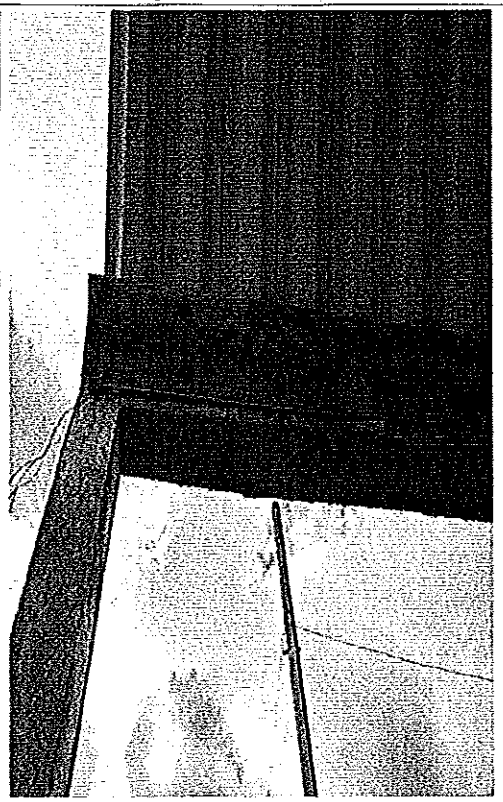

Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Juan Carlos Angarita.
Vo.Bo. Ing. Juan Carlos Angarita Puerto
RESIDENTE DE OBRA

Yohan Fdo Salazar B.
Ing. Yohan Fernando Salazar Bacca
DIRECTOR DE OBRA

Vo.Bo. Ing. Edwin Mauricio Rojas Alarcon
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

24


CAPÍTULO:	7	INSTALACIONES ELECTRICAS						
ITEM:	7,11	Suministro e instalación de reflector led de 150 w.					UNIDAD:	UNO


PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto / prof		Cantidad	Total
Suministro e instalación de reflector led de 150 w.	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00

CAPÍTULO:	7	INSTALACIONES ELECTRICAS	UNIDAD:	UND
ITEM:	7,11	Suministro e instalación de reflector led de 150 w		

REGISTRO FOTOGRAFICO

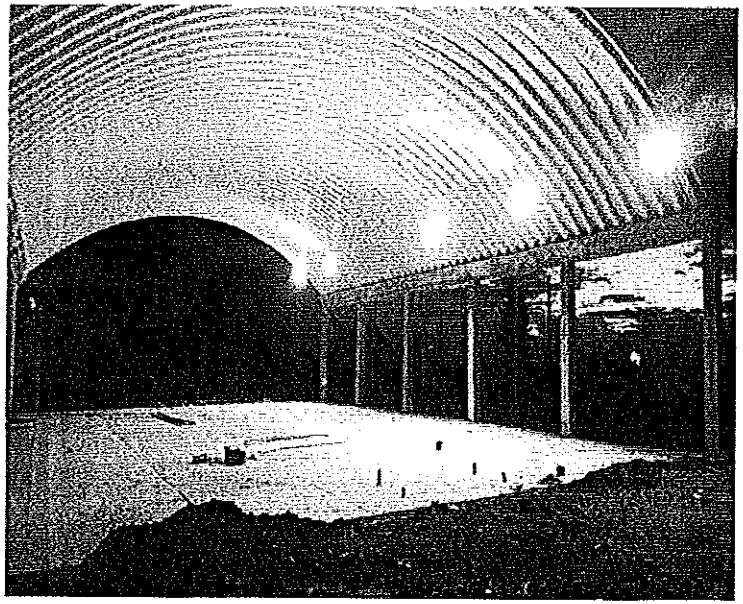

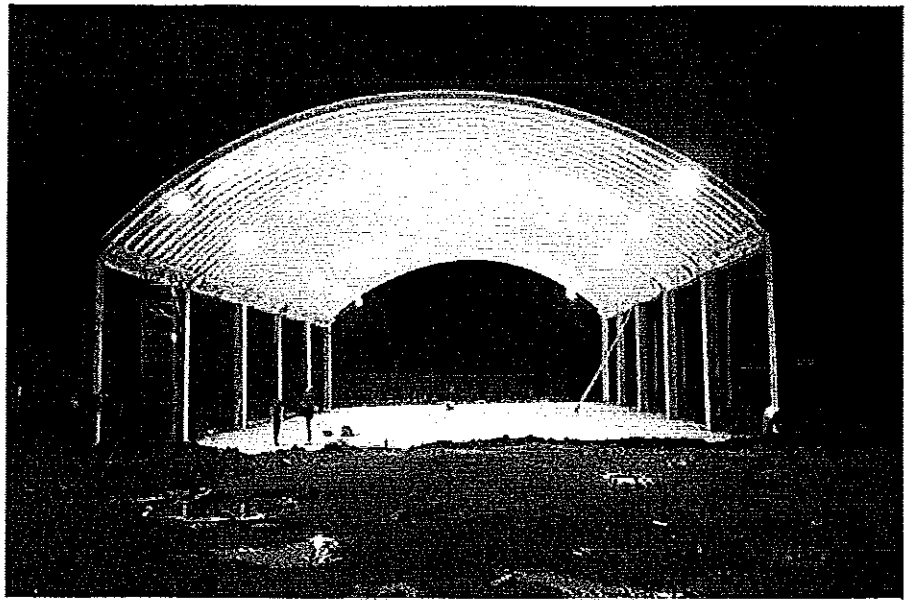

Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Juan Carlos Ingante
Vo.Bo. Ing. Juan Carlos Angarita Puerto
RESIDENTE DE OBRA

Yohan Fdo Salazar B.
Ing. Yohan Fernando Salazar Baena
DIRECTOR DE OBRA

Vo.Bo. Ing. Edwin Mauricio Rojas Alarcon
RESIDENTE DE INTERVENTORIA


CAPÍTULO:	7	INSTALACIONES ELECTRICAS					
ITEM:	7,12	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.				UNIDAD:	UND

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto / prof		Cantidad	Total
Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

CAPITULO:	7	INSTALACIONES ELECTRICAS		
ITEM:	7,12	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UNIDAD:	UNO

REGISTRO FOTOGRAFICO

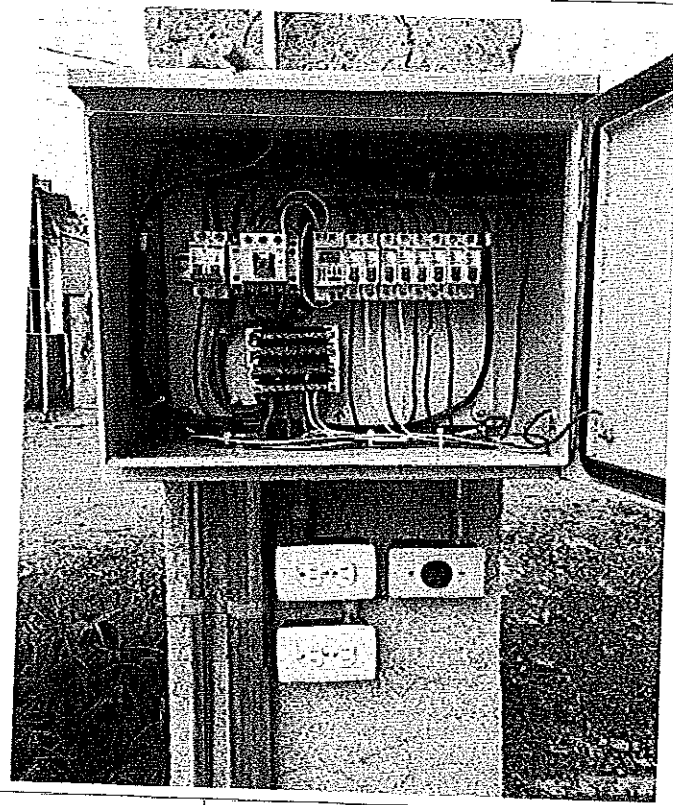



Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Juan Carlos Angarita Puerto
Vo.Bo. Ing. Juan Carlos Angarita Puerto
RESIDENTE DE OBRA


Yohan Fdo Salazar B.
Ing. Yohan Fernando Salazar Baena
DIRECTOR DE OBRA


Vo.Bo. Ing. Edwin Mauricio Rojas Alarcon
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAPÍTULO:	7	INSTALACIONES ELECTRICAS						
ITEM:	7,13	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.					UNIDAD:	UNO
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	PROCEDIMIENTO PARA CALCULO							
	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto / prof		Cantidad	Total		
Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
TOTAL						1,00		

Observaciones:

ESQUEMAS:



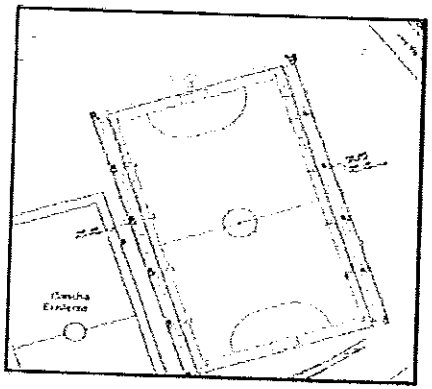

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista a excepción quienes las cuantificaron y constataron en el terreno

Juan Carlos Angarita.

Vo.Bo. Ing. Juan Carlos Angarita Puerto
RESIDENTE DE OBRA


Yohan F. Salazar B.


Ing. Yohan Fernando Salazar Baena
DIRECTOR DE OBRA

Vo.Bo. Ing. Edwin Mauricio Rojas Alarcon
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAPITULO:	7	INSTALACIONES ELECTRICAS		
ITEM:	7,13	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	UNIDAD:	UND

REGISTRO FOTOGRAFICO

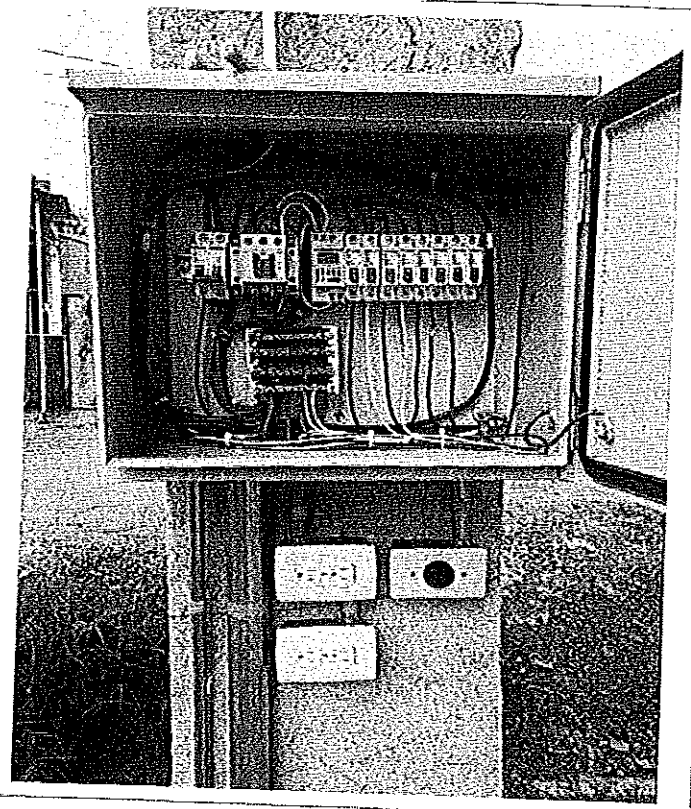

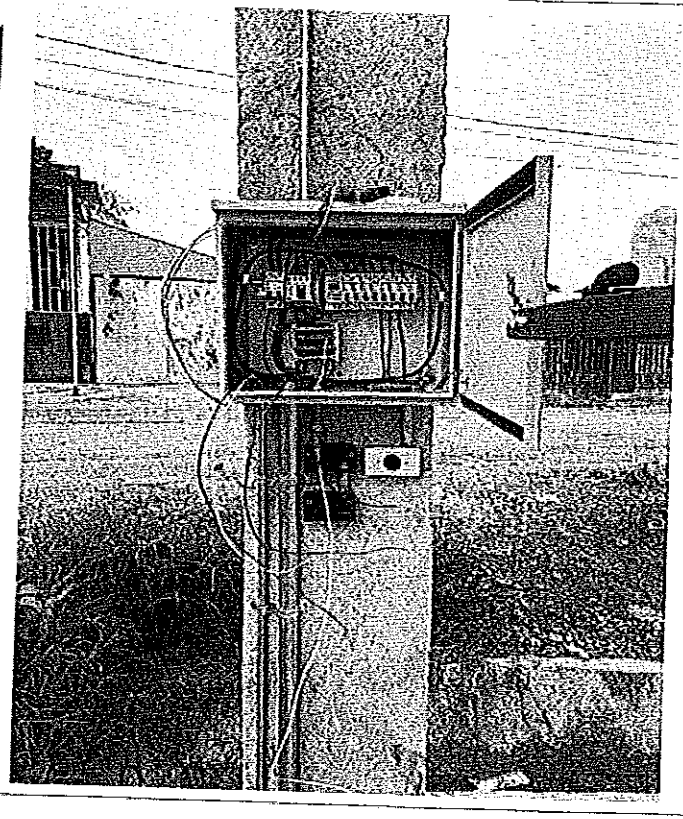

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Juan Carlos Ingavita.
Vo.Bo. Ing. Juan Carlos Angarita Puerto
RESIDENTE DE OBRA


Yohan Fdo Salazar B
Ing. Yohan Fernando Salazar Baena
DIRECTOR DE OBRA


Vo.Bo. Ing. Edwin Mauricio Rojas Alarcon
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

68

CAPITULO:	5	ACABADOS		
ITEM:	5,03	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO

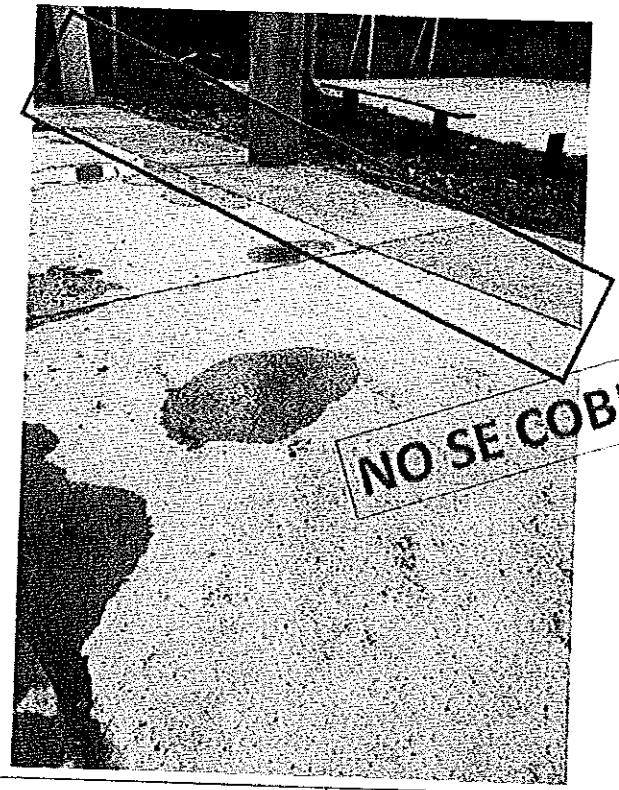

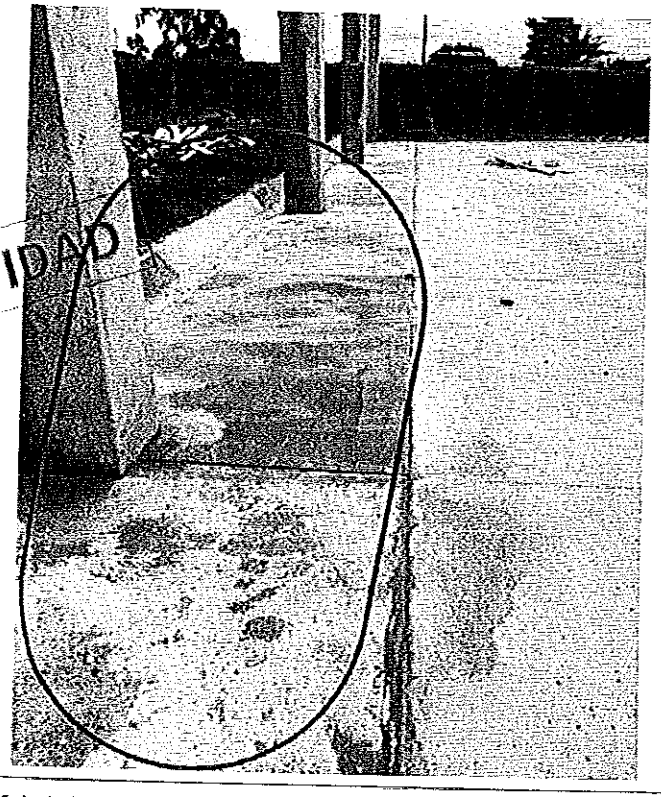

NO SE COBRA ESTA ACTIVIDAD

Observaciones:	El contratista ejecutó voluntariamente dos (2) franjas de concreto rígido (90 m²=1,5m*30m) entre la placa y la cañuela del polideportivo, actividad no contemplada en el contrato ni en sus cantidades de obra. Dicho trabajo constituye un aporte a la comunidad y no será objeto de cobro ni generará reclamación económica presente o futura, conforme a la Ley 80 de 1993 y normas concordantes. Toda vez que se garantice la correcta ejecución de la placa, garantizando el escurrimiento de agua superficial.

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno


Vo.Bo. Ing. Jdan Carlos Angarita Puerto
RESIDENTE DE OBRA

Ing. Yohan Fernando Salazar Baena
DIRECTOR DE OBRA

Vo.Bo. Ing. Edwin Mauricio Rojas Alarcon
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAPÍTULO:									
ITEM:		ITEMS NO COBRADOS						UNIDAD:	M2
		Pintura de Trafico pesado para placa en concreto del polideportivo							
		PROCEDIMIENTO PARA CALCULO							
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto/ pref (m)		Cant.	Medida	Total	ESQUEMAS:	
Pintura para placa de concreto	16,00	28,00				448,00			
TOTAL							448,00		

NO SE COBRA ESTA ACTIVIDAD

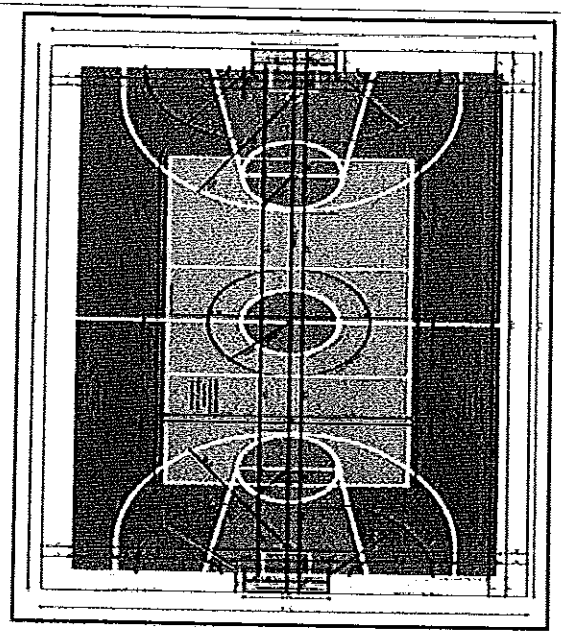

Observaciones: El contratista ejecutó voluntariamente una pintura para la placa del polideportivo. Las cantidades no cobradas corresponden a un área total de 448 m², obtenida a partir de la aplicación de pintura de tráfico sobre la placa de concreto del polideportivo con dimensiones aproximadas de 16,00 m por 28,00 m, esta actividad no está contemplada en el contrato ni en sus cantidades de obra. Dicho trabajo constituye un aporte a la comunidad y no será objeto de cobro ni generará reclamación económica presente o futura, conforme a la Ley 80 de 1993 y normas concordantes.

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno

Juan Carlos Angarita

Vo.Bo. Ing. Juan Carlos Angarita Puerto
RESIDENTE DE OBRA


Yohan Fdo Salazar B

Ing. Yohan Fernando Salazar Barra
DIRECTOR DE OBRA

Vo.Bo. Ing. Edwin Mauricio Rojas Alarcon
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAPÍTULO:				
ITEM:		ITEMS NO COBRADOS	UNIDAD:	M2
		Pintura de Trafico pesado para placa en concreto del polideportivo		

REGISTRO FOTOGRAFICO

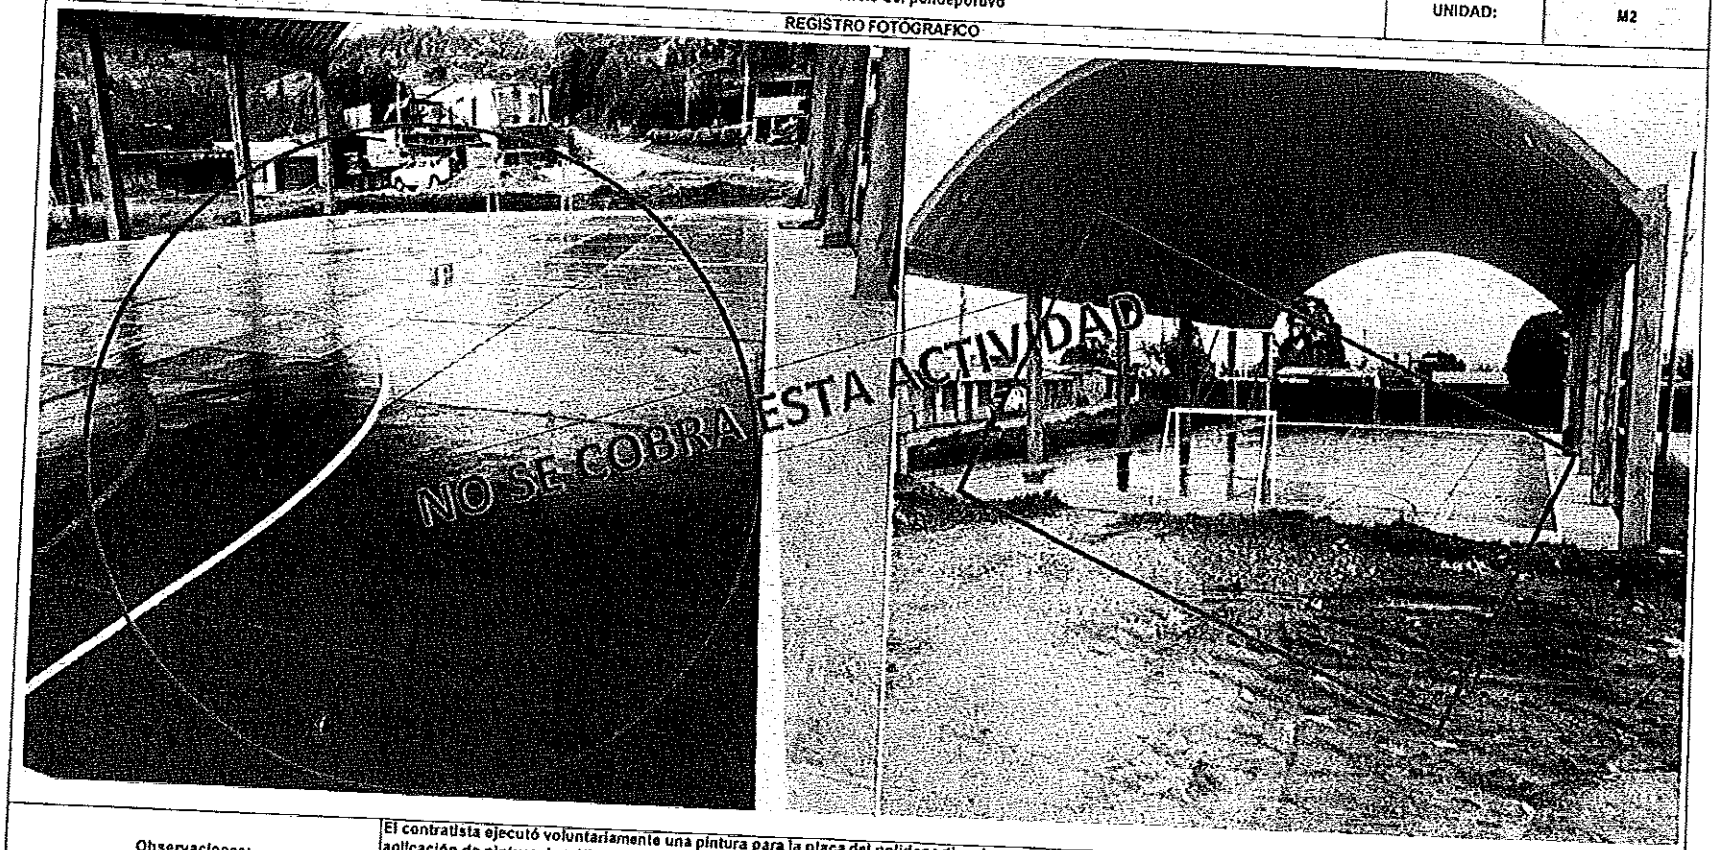

Observaciones:	El contratista ejecutó voluntariamente una pintura para la placa del polideportivo. Las cantidades no cobradas corresponden a un área total de 448 m², obtenida a partir de la aplicación de pintura de tráfico sobre la placa de concreto del polideportivo con dimensiones aproximadas de 16,00 m por 28,00 m, esta actividad no está contemplada en el contrato ni en sus cantidades de obra. Dicho trabajo constituye un aporte a la comunidad y no será objeto de cobro ni generará reclamación económica presente o futura, conforme a la Ley 80 de 1993 y normas concordantes.

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista o interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Juan Carlos Ingarita.
Vo.Bo. Ing. Juan Carlos Argarita Pulido
RESIDENTE DE OBRA

Yohan Fdo Salazar B.
Ing. Yohan Fernando Salazar Baena
DIRECTOR DE OBRA

Vo.Bo. Ing. Edwin Mauricio Rojas Alarcon
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DEL HUILA
INDERHUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CIHCM400 de 2023	**ACTA DE RECIBO FINAL**	
CONTRATISTA:	EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCÓN		
REPR. LEGAL:	EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCÓN	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO.**	$ 45.738.299
SUPERVISOR:	FELIPE VICTORIA BARRAGAN Director INDERHUILA	**VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:**	$ 1.052.678
HOJA 1 DE 1		**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$ 46.790.977

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: Tres (03) Meses previa suscripción acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y legalización del contrato.

PLAZO ADICIONADO N°1: Dos (02) Meses.

PLAZO ADICIONADO N°2: Dos (02) Meses.

PLAZO ADICIONADO N°3: Cuarenta y cinco (45) días.

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN: OCHO (8) MESES Y MEDIO, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones sin superar la vigencia fiscal.

FECHA DEL ACTA:	27/01/2026		
FECHA DE INICIACIÓN:	NOVIEMBRE 17 DEL 2023	**VALOR PRESENTE ACTA:**	$ 34.180.359,00

No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	FORMA DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA RECIBIDO PARA PAGO ACTAS PARCIALES O FINAL	PORCENTAJE ACUMULADO DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA PARA PAGO ACTAS PARCIALES O FINAL	VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	VALOR PAGADO A LA FECHA POR ACTAS PARCIALES O FINAL	VALOR SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	% DEL CONTRATO A COBRAR	VALOR DE COBRO PARCIAL O FINAL
CIHCM400 DE 2023	La entidad pagará al contratista el valor del contrato en pagos mediante acta(s) de recibo parcial previa presentación y aprobación por parte del supervisor del contrato. El valor de las actas parciales no podrá superar el 90% del valor del contrato de obra. El valor final correspondiente al 10% será cancelado en el acta de liquidación.	100%	0,00%	$ 46.790.977,00	$ 46.790.408,00	$ 569,00	99,999%	$ 34.180.359,00

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($34.180.359) M/CTE.

ING. EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ARQ. YOVANY PEÑA FIERRO
INDERHUILA
Vo. Bo. APOYO A LA SUPERVISIÓN

FELIPE VICTORIA BARRAGAN
INDERHUILA
SUPERVISOR

25

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F20
		Versión: 2
Fecha Aprobación: 13/02/2023	ACTA DE RECIBO FINAL PROYECTOS INFRAESTRUCTURA	Página 1 de 4

1. DESCRIPCION GENERAL

___ CONTRATO:	*OBRA:__/CONSULTORIA:____/INTERVENTORIA:_X__*	No:	*CIHC M400*	AÑO:	*2023*
___CONVENIO:					

CONTRATANTE:	***INDERHUILA***			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCÓN		
	NIT O CC:	7.706.737-6		
	DIRECCIÒN:	CL 71 A 1 A W 05 BRR LA VORAGINE	**CEL:**	316 5208147
	CIUDAD:	Neiva, Huila		
	REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCÓN		
	CC:	7.706.737 de Neiva		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No. 2023000144 FECHA (dd/mm/aaaa): 31/10/2023** **No. 2023000650 FECHA (dd/mm/aaaa): 31/10/2023** **No. 2025000052 FECHA (dd/mm/aaaa): 17/01/2025** **No. 2025000038 FECHA (dd/mm/aaaa): 17/01/2025** **No. 2025000389 FECHA (dd/mm/aaaa): 12/05/2025** **No. 2025000514 FECHA (dd/mm/aaaa): 13/08/2025**			
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO INICIAL:	$ 45.738.299 MCTE			
	Valor en Letras: *Quinientos cincuenta y siete millones ciento diecisiete mil doscientos cincuenta y ocho pesos MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA ($557.117.258) M/CTE*			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	**Nombre: INDERHUILA**			
	Valor ($): $ 45.738.299 MCTE			
	Valor en Letras: *CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA ($ 45.738.299,oo) M/CTE*			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	**$ 1.052.678** MCTE		
	Valor en letras: *UN MILLON CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA ($1.052.678,oo) M/CTE*			
VALOR TOTAL	$ *46.790.977* MCTE			
	Valor en Letras: *CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOSMONEDA CORRIENTE COLOMBIANA ($ 46.790.977,oo) M/CTE*			
PLAZO INICIAL:	*TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.*			
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	**OTROSI No. 1** de fecha (3/07/2024) por el cual se modifica la **CLAUSULA 4 PLAZO DEL CONTRATO** prorrogándose Dos (02) Meses más.		
	Nº2	**OTROSI No. 2** de fecha (19/05/2025) por el cual se modifica la **CLAUSULA 4 PLAZO DEL CONTRATO** prorrogándose Dos (02) Meses más.		
	Nº3	**OTROSI No. 3** de fecha (14/10/2025) por el cual se modifica la **CLAUSULA 4 PLAZO DEL CONTRATO** prorrogándose Cuarenta y cinco (45) días más.		
PLAZO TOTAL:	OCHO (8) MESES Y MEDIO, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones sin superar la vigencia fiscal.			

FECHA DE INICIO: (dd/mm/aaaa)	*17/11/2023*		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aaaa)	**N°1**	**SUSPENSIÒN**	*28/12/2023*
		REINICIACIÒN	*16/05/2024*
	N°2	**SUSPENSIÒN**	27/08/2024
		REINICIACIÒN	19/05/2025
	N°3	**SUSPENSIÒN**	18/07/2025
		REINICIACIÒN	6/10/2025
	N°4	**SUSPENSIÒN**	24/11/2025
		REINICIACIÒN	18/12/2025
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aaaa)	*23/12/2025*		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aaaa)	*23/12/2025*		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aaaa)	*DEL 17/11/2023 AL 27/12/2023, Y DEL 16/05/2024 AL 26/08/2024 DEL 19/05/2025 AL 17/07/2025 DEL 6/10/2025 AL 23/11/2025 Y DEL 18/12/2025 AL 23/12/2025*		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	*Dr. Felipe Victoria Barragán*	
	EN CALIDAD DE:	*DIRECTOR INDERHUILA*	
	NOMBRE:	*Arq. Yovany Peña Fierro*	
	EN CALIDAD DE:	*APOYO A LA SUPERVISION INDERHUILA*	
	NOMBRE:	*Ing. Yohan Fernando Salazar Baena*	
	EN CALIDAD DE:	*CONTRATISTA R.L CONSORCIO GLOBAL CC*	
	NOMBRE:	*Ing. Edwin Mauricio Rojas Alarcón*	
	EN CALIDAD DE:	*INTERVENTOR R.L EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON*	

2. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	17/11/2023	$ 45.738.299
VALOR ADICIONAL N°1	19/05/2025	$ 1.052.678
VALOR FINAL CONTRATADO	19/05/2025	$ 46.790.977
VALOR ACTA PARCIAL N°1	*23/12/2024*	*$12.610.049*
VALOR ACTA FINAL	23/12/2025	*$34.180.359*
VALOR FINAL EJECUTADO	23/12/2025	*$46.790.408*
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	*N/A*	$0
SALDO A FAVOR DEL INDERHUILA		*$569*

3. BALANCE TÉCNICO

Que el apoyo a la supervisión el arquitecto **YOVANY PEÑA FIERRO,** certifica que El ingeniero **EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON** identificado con NIT 7.706.737-6 en calidad de contratista, ejecuto y cumplió a cabalidad las actividades y obligaciones establecidas en el objeto del contrato de interventoría No. **CIHCM400 DE 2023** conforme a los términos, condiciones y alcances pactados. Así mismo, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, de acuerdo con las planillas adjuntas en el Acta de Recibo Final de Proyectos, correspondientes a los números de Planilla No. 30663569 - 4529498539 del mes de noviembre de 2023 pagada el 8 de agosto de 2024, Planilla No. 30663574 - 4529505624 del mes de diciembre de 2023 pagada

el 01 de diciembre de 2023, Planilla No. 30663580 - 4537491705 del mes de mayo de 2024 pagada el 8 de agosto de 2024, Planilla No. 30663583 - 4544812878 del mes de junio de 2024 pagada el 8 de agosto de 2024, Planilla No. 30663586 - 4560876282 del mes de julio de 2024 pagada el 26 de julio de 2024, Planilla No. 31117225 - 4579543297 del mes de agosto de 2024 pagada el 08 de agosto de 2024, Planilla No. 4612346105 del mes de mayo de 2025 pagada el 05 de mayo de 2025, Planilla No. 4612346409 del mes de junio de 2025 pagada el 10 de julio de 2025, Planilla No. 4612477831 del mes de julio de 2025 pagada el 05 de agosto de 2025, Planilla No. 4625532971 del mes de octubre de 2025 pagada el 14 de noviembre de 2025, Planilla No. 4630729676 del mes de noviembre de 2025, pagada el mes de 04 de diciembre de 2025, Planilla No. 4633720602 del mes de diciembre del 2025 pagada el 13 de enero de 2026.

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

4. RECIBO A SATISFACIÒN

1. Que el ingeniero **EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON**, en su calidad de interventor del Contrato de Obra No. CLPIH373 de 2023, CONSORCIO GLOBAL CC, certifica que la ejecución contractual se realizó conforme a las especificaciones técnicas, financieras y demás obligaciones pactadas, habiéndose recibido la obra a entera satisfacción el día 23 de diciembre de 2025, según consta en el Acta De Recibo Final. En virtud de ello, se procedió a la suscripción del acta de liquidación el 12 de junio de 2026, para un porcentaje de ejecución del 100%. En virtud de lo anterior, se procede a la suscripción de la presente acta.

2. Igualmente, se deja constancia expresa de que las cantidades y la calidad de las obras ejecutadas en el marco del Contrato de Obra No. CLPIH373 de 2023 son de exclusiva responsabilidad del contratista de obra e interventor, quienes realizaron su cuantificación y verificación en el terreno.

3. Que, las obras han sido ejecutadas de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos arquitectónicos, estructurales, conforme a las actividades del contrato de Obra y de interventoría.

4. Que, el arquitecto YOVANY PEÑA FIERRO, en calidad de apoyo a la supervisión, deja constancia expresa del cumplimiento diligente del Contrato de Interventoría por parte del contratista hasta el día veintitrés (23) de diciembre de 2025, correspondiente al Contrato de Interventoría No. CMCIH400 de 2023, así como de la afiliación al Sistema de Seguridad Social en los periodos comprendidos del 21 de noviembre de 2023 al 18 de marzo de 2024 y del 15 de enero de 2025 al 17 de julio de 2025.

5. Que, el apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. CMCIH400 de 2023, avala y aprueba el pago correspondiente al Acta de Recibo Final, por la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL GTRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($34.180.359,00) M/CTE, valor que corresponde a los periodos del 17/11/2023 AL 27/12/2023, Y DEL 16/05/2024 AL 26/08/2024 DEL 19/05/2025 AL 17/07/2025 DEL 6/10/2025 AL 23/11/2025 Y DEL 18/12/2025 AL 23/12/2025, conforme a la terminación y liquidación de los Contratos de Obra No. CLPIH373 objeto de la interventoría.

6. Que las partes contratantes cumplieron con lo pactado, por lo que de común acuerdo y con base en la Cláusula 8 – Forma de pago del Contrato de Interventoría No. CMCIH400 de 2023, se aprueba el presente pago y se recibe a entera satisfacción las actividades ejecutadas.

5. SOPORTES TÉCNICOS DE LA PRESENTA ACTA

Para constatar del recibo a satisfacción se menciona y hace parte del presente acta los siguientes documentos:

- Acta Final de Obra - (firma R.L Contratista e R.L Interventor) EXCEL
- Acta Recibo Final de Obra - (firma R.L Contratista, R.L Interventor, Vo. Bo. Supervisor, Vo. Bo. Apoyo Supervisión y Asesor Jurídico Externo INDERHUILA) WORD

6. CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002:

El contratista presenta Certificación de cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, parafiscales lo cual fue debidamente verificado por el Interventor y el Supervisor designado del INDERHUILA en cuanto a los términos de ejecución y los porcentajes a pagar.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron, en Neiva a los Veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2025.

Dr. FELIPE VICTORIA BARRAGÁN
Director INDERHUILA

Arq. YOVANY PEÑA FIERRO
Apoyo a la Supervisión INDERHUILA

Ing. EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCÓN
INTERVENTOR CONTRATO

Vo. Bo. JAIME JIMÉNEZ LOPEZ
Abogado Contratista Externo

seguros mundial

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	eUd77Q7ZHsb7tRM+XFXvdA==	**Número de póliza**	100009432
Número de anexo	10	**Ramo**	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
Fecha de expedición	24/03/2026	**Inicio de vigencia Global**	17/11/2023
Fin de vigencia Global	28/12/2030	**Tomador**	ROJAS ALARCON, EDWIN
		Asegurado	INDERHUILA
Valor asegurado	23.395.488,50		
Movimiento	PRORROGA		
to de póliza	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. CIHCM400 , CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"NOTA: EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ESTARA VIGENTE POR EL TERMINO DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION DEL CONTRATANTE.MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS POR ACTA DE TERMINACION CON FECHA DE FIRMA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2025.		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 24/11/2025	24:00 Horas del 28/06/2026	$ 9.358.195,40	$ 0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 24/11/2025	24:00 Horas del 27/12/2028	$ 4.679.097,70	$ 0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 23/12/2025	24:00 Horas del 23/12/2030	$ 9.358.195,40	$ 0,00

Esta información debe coincidir con la póliza impresa.
Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmundial.com.co o también puedes llamar a la línea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.03.24 16:53:33 -05:00

NIT 860 037 013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: eUd77Q7ZHsb7tRM+XFXvdA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTA
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS28000000059-00007

No. PÓLIZA	CHU-180009482	No. ANEXO	10	No. CERTIFICADO	533144350	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/03/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	28/12/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	ROJAS ALARCON, EDWIN	No. DOC. IDENTIDAD	7.706.737
DIRECCIÓN	CRA. 48 #20-114	TELÉFONO	3165208147
ASEGURADO	INDERHUILA	No. DOC. IDENTIDAD	813.005.578-7
DIRECCIÓN	CARRERA 18 CALLE 17 UNIDAD DEPORTIVA	TELÉFONO	6088750431
BENEFICIARIO	INDERHUILA	No. DOC. IDENTIDAD	813.005.578-7
DIRECCIÓN	CARRERA 18 CALLE 17 UNIDAD DEPORTIVA	TELÉFONO	6088750431

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS POR ACTA DE TERMINACION CON FECHA DE FIRMA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2025.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. CIHCM400 , CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
NOTA: EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ESTARA VIGENTE POR EL TERMINO DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION DEL CONTRATANTE.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 24/11/2025	24:00 Horas Del 28/06/2026	9.358.195,40	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 24/11/2025	24:00 Horas Del 27/12/2028	4.679.097,70	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 23/12/2025	24:00 Horas Del 23/12/2030	9.358.195,40	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 23.395.488,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LOBY ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 24/03/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

ATENDIDOS A LA CARRERA CON CAMBIO DE LA REPRESENTACIÓN Y PASEA ART

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

59

No. PÓLIZA	CHU-100009482	No. ANEXO	10	No. CERTIFICADO	533144350	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/03/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/11/2023	24:00 Horas Del	28/12/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF
Asociación Panamericana de Afianzadoras
Panamerican Surety Association

60

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CHU-100009482** y endoso, **10** cuyo afianzado es: **ROJAS ALARCON, EDWIN** Asegurado o Beneficiario: **INDERHUILA / INDERHUILA** , expedida por la Compañía en **24/03/2026,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN HUILA a los **24** días del mes **MARZO** del año **2026.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO

Neiva, 23 de diciembre de 2025

En mi calidad de representante legal del contrato de Interventoría No. CHICM400 de 2023, por medio del presente documento hago constar que:

El contrato de (obra/consultoría) No. CLPIH373 de 2023 celebrado entre el Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y el Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila - "INDERHUILA" y el CONSORCIO GLOBAL CC.

CONTRATO No.	CLPIH373 DE 2023		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA		
REPRESENTANTE LEGAL:	Yohan Fernando Salazar Baena	**C.C**	7.709.122
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	2 de Noviembre de 2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	17 de Noviembre de 2023		
PLAZO INICIAL (D/M/A:	*TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.*		
PLAZO ADICIONAL (No.1)):(SI APLICA)	**OTROSI No. 1** de fecha (3/07/2024) por el cual se modifica la **CLAUSULA 4 PLAZO DEL CONTRATO** prorrogándose Dos (02) Meses más.		
PLAZO ADICIONAL (No.2)):(SI APLICA)	**OTROSI No. 2** de fecha (19/05/2025) por el cual se modifica la **CLAUSULA 4 PLAZO DEL CONTRATO** prorrogándose Dos (02) Meses más.		
PLAZO ADICIONAL (No.3)):(SI APLICA)	**OTROSI No. 3** de fecha (14/10/2025) por el cual se modifica la **CLAUSULA 4 PLAZO DEL CONTRATO** prorrogándose Cuarenta y cinco (45) días más.		
PLAZO TOTAL	OCHO (8) MESES Y MEDIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación		

62

	de los documentos previstos en el pliego de condiciones.
VALOR INICIAL	*Quinientos cincuenta y siete millones ciento diecisiete mil doscientos cincuenta y ocho pesos MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA ($557.117.258) M/CTE*
VALOR ADICIONAL (SI APLICA)	*Veintisiete millones setecientos sesenta y nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA ($27.769.955) M/CTE*
VALOR TOTAL	*Quinientos ochenta y cuatro millones ochocientos ochenta y siete mil doscientos trece pesos. MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA ($584.887.213) M/CTE*
FECHA SUSPENSIÓN No.1 (SI APLICA)	*28/12/2023*
FECHA REINICIO No.1	*16/05/2024*
FECHA SUSPENSIÓN No.2 (SI APLICA)	27/08/2024
FECHA REINICIO No.2	19/05/2025
FECHA SUSPENSIÓN No.3 (SI APLICA)	18/07/2025
FECHA REINICIO No.3	6/10/2025
FECHA SUSPENSIÓN No.4 (SI APLICA)	24/11/2025
FECHA REINICIO No.4	18/12/2025
FECHA TERMINACIÓN	23/12/2025
VALOR EJECUTADO CONTRACTUAL	QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL NOVENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA ($584.880.096,oo) M/CTE
VALOR PAGADO POR EL INDERHUILA	QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL NOVENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA ($584.880.096,oo) M/CTE

1. OBRAS EJECUTADAS

Las obras relacionadas en el contrato No.CLPIH373 de 2023 cuyo objeto es *"CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEL*

DEPARTAMENTO DEL HUILA", y las que se pactaron en el adicional No.1 fueron ejecutadas en su totalidad y dentro de los tiempos del contrato, la Interventoría certifica y avala que las obras que ejecutaron, se realizaron con calidad y cumplimiento, siguiendo las especificaciones técnicas y los planos suministrados por INDERHUILA, los cuales se identifican a continuación:

No.	Tipo	Descripción	Numero plancha
1	Estructural	Planta de viga de cimentación – Despiece de vigas de cimentación.	E1
2	Estructural	Planta despiece de columnas – Despiece de vigas aéreas – Detalle de zapatas.	E2
3	Estructural	Planta de cubierta – Corte cubierta autoportante – Detalles estructurales.	E3
4	Especificaciones técnicas.	Especificaciones técnicas.	E4
5	Hidrosanitario.	Planta aguas lluvias- Corte Transversal – Detalles constructivos.	HS-1

A continuación, se relacionan en detalle las actividades ejecutadas en el escenario deportivo cuyo objeto es:

✓ En el polideportivo centro poblado de San Roque, en el municipio de Oporapa del departamento del Huila se ejecutaron las siguientes actividades:

a- Construcción de estructura en concreto consta de 12 columnas viga de cimentación y viga canal.
b- Construcción de cubierta en lámina galvanizada tipo auto soportante.
c- Instalación de redes eléctricas internas y 10 luminarias tipo LED.

Las obras fueron entregadas a la entidad asignada/competente y estas fueron recibidas a entera satisfacción.

✓ En el polideportivo del centro poblado de San Roque, en el municipio de Oporapa del departamento del Huila se ejecutaron las siguientes actividades:

1. Localización y replanteo
2. Descapote manual e=0.2 incluye retiro.
3. Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.
4. Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.
5. Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.
6. Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas
7. Construcción de vigas de cimentación en concreto de 210 kg/cm2-3000 PSI. Ver diseño.
8. Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación

64

9. Concreto ciclopeo - 2500 PSI (175 KG/CM2) 60% concreto 2500 PSI + 40% piedra media zonga.
10. Construcción de columnas en concreto de 210 kg/cm2-3000 PSI.
11. Acero de refuerzo Fy=60.000 PSI columnas.
12. Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización.
13. Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal
14. Suministro e instalación de manto zetal viga canal.
15. Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.
16. Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.
17. Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura.
18. Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.
19. Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.
20. Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.
21. Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.
22. Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño.
23. Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.
24. Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.
25. Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.
26. Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"
27. Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"
28. Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.
29. Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.
30. Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.
31. Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.
32. Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.
33. Suministro e instalación de reflector led de 150 w
34. Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.
35. Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.

C 5

36. Transporte de materiales pétreos.

2. BALANCE CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTAS	VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO	SALDO
1. Contrato Inicial	2/11/2023		$557.117.258	
2. Valor Adicional No. 1 (Si aplica)	19/05/2025		$27.769.955	
3. Acta Parcial No.1	23/12/2024	$ 153.608.431		$115.206.323
4. Acta Parcial No.2	23/12/2025	$189.546.946		$142.160.209
5. Acta Final	En tramite	$241.724.719		$7.117
TOTAL VALOR ACTAS		$584.880.096	$584.887.213	$7.117

3. RESUMEN FINAL

La interventoría verifico y valida que la(s) obra(s) relacionada(s) en el contrato de Obra No. CLPIH373 de 2023 contaron y cumplieron con los permisos ambientales requeridos y necesarios para el desarrollo de las actividades contratadas.

Que durante el tiempo de ejecución del Contrato de Obra No.CLPIH373 de 2023, se verificó mensualmente el pago de seguridad social y de aportes realizado por el contratista.

Una vez realizada las visitas a las obras por parte de la interventoría y el contratista de obra, se corroboro en obra de que las cantidades contratadas fueron ejecutadas según el contrato inicial y el Otrosí No.1 en un 100%, tal como lo evidencia el acta de mayores y menores cantidades No.1, con la que finalmente se realizó el acta de recibo final de proyectos de infraestructura.

Se verifico que las obras fueron ejecutadas con la calidad de los materiales idóneos, siguiendo las especificaciones y planos suministrados por el INDERHUILA, los cuales fueron auditados por la interventoría.

La comunidad se encuentra satisfecha por la calidad de la obra y por el cumplimiento del contratista, prueba de ello es la firma sin ningún reparo del acta de cierre de Veeduría ciudadana en cada polideportivo, las cuales son adjuntadas como soporte para la liquidación del contrato.

CC

Que a la fecha la construcción de la obra está sujeta a las Licencias y permisos dados por cada municipio.

Como prueba de la terminación según especificaciones se firma acta de recibo final por parte del Contratista, Interventor y se procede a realizar los trámites de la liquidación del contrato de obra No.CLPIH373 de 2023.

Una vez entregada físicamente las obras en el polideportivo, como recomendaciones se sugiere lo siguiente:

a- Realizar el mantenimiento preventivo de el anclaje de la cubierta a la estructura en concreto por lo menos una vez al año.
b- Realizar periódicamente mantenimiento a las redes eléctricas.
c- Realizar periódicamente mantenimiento a las vigas canales con el fin de evitar taponamientos por hojas de los bajantes de aguas lluvias.

Finalmente se certifica que todos los materiales en la obra cumplieron con los estándares de calidad exigidos tanto por la normatividad colombiana como con las especificaciones técnicas propias del contrato, tanto de concretos, aceros, materiales eléctricos y cubierta autoportante. Así mismo se contó con fuente de materiales pétreos ubicados en los municipios ELÍAS, las cuales están certificadas como canteras y permitió garantizar el suministro de material para la ejecución de la(s) obra(s), tal como se evidencia en los soportes del proceso.

Atte.

EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCÓN
R.L : EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCÓN

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F18
		Versión: 2
Fecha Aprobación: 13/02/2023	ACTA LIQUIDACION PROYECTOS INFRAESTRUCTURA	Página 1 de 6

1. DESCRIPCION GENERAL

___ CONTRATO	*OBRA:___/CONSULTORIA:___/INTERVENTORIA:_X_*	No:	*CIHC M400*	AÑO:	2023
___ CONVENIO					

CONTRATANTE:	*INDERHUILA*			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCÓN		
	NIT o CC:	7.706.737-6		
	DIRECCIÒN:	CL 71 A 1 A W 05 BRR LA VORAGINE	**CEL:**	316 5208147
	CIUDAD:	Neiva, Huila		
	REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCÓN		
	CC:	7.706.737 de Neiva		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No. 2023000144 FECHA (dd/mm/aaaa): 31/10/2023** **No. 2023000650 FECHA (dd/mm/aaaa): 31/10/2023** **No. 2025000052 FECHA (dd/mm/aaaa): 17/01/2025** **No. 2025000038 FECHA (dd/mm/aaaa): 17/01/2025** **No. 2025000389 FECHA (dd/mm/aaaa): 12/05/2025** **No. 2025000514 FECHA (dd/mm/aaaa): 13/08/2025**			
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO INICIAL:	$ 45.738.299 MCTE **Valor en Letras:** *CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA ($ 45.738.299,oo) M/CTE*			
APORTANTE O CONVINIENTE: **(Efectivo – Especie):**	**Nombre: INDERHUILA** **Valor ($):**$ 45.738.299 MCTE **Valor en Letras:** *CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA ($ 45.738.299,oo) M/CTE*			
VALOR ADICIONAL	**Nº1** **$ 1.052.678** MCTE **Valor en letras:** *UN MILLON CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA ($1.052.678,oo) M/CTE*			
VALOR TOTAL	$ *46.790.977* MCTE **Valor en Letras:** *CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOSMONEDA CORRIENTE COLOMBIANA ($ 46.790.977,oo) M/CTE*			
PLAZO INICIAL:	*TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.*			

PLAZO ADICIONAL:	**N°1**	**OTROSI No. 1** de fecha (3/07/2024) por el cual se modifica la **CLAUSULA 4 PLAZO DEL CONTRATO** prorrogándose Dos (02) Meses más.
	N°2	**OTROSI No. 2** de fecha (19/05/2025) por el cual se modifica la **CLAUSULA 4 PLAZO DEL CONTRATO** prorrogándose Dos (02) Meses más.
	N°3	**OTROSI No. 3** de fecha (14/10/2025) por el cual se modifica la **CLAUSULA 4 PLAZO DEL CONTRATO** prorrogándose Cuarenta y cinco (45) días más.
PLAZO TOTAL:	OCHO (8) MESES Y MEDIO, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones sin superar la vigencia fiscal.	
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aaaa)	*17/11/2023*	

FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aaaa)	**N°1**	**SUSPENSIÒN**	*28/12/2023*
		REINICIACIÒN	*16/05/2024*
	N°2	**SUSPENSIÒN**	27/08/2024
		REINICIACIÒN	19/05/2025
	N°3	**SUSPENSIÒN**	18/07/2025
		REINICIACIÒN	6/10/2025
	N°4	**SUSPENSIÒN**	24/11/2025
		REINICIACIÒN	18/12/2025

FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aaaa)	*23/12/2025*
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aaaa)	28 AGO 2026
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aaaa)	*DEL 17/11/2023 AL 27/12/2023, Y DEL 16/05/2024 AL 26/08/2024 DEL 19/05/2025 AL 17/07/2025 DEL 6/10/2025 AL 23/11/2025 Y DEL 18/12/2025 AL 23/12/2025*

PRESENTES HOY:	NOMBRE:	*Dr. Felipe Victoria Barragán*
	EN CALIDAD DE:	*DIRECTOR INDERHUILA*
	NOMBRE:	*Arq. Yovany Peña Fierro*
	EN CALIDAD DE:	*APOYO A LA SUPERVISION INDERHUILA*
	NOMBRE:	*Ing. Edwin Mauricio Rojas Alarcón*
	EN CALIDAD DE:	*INTERVENTOR R.L EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON*

2. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTAS
Valor inicial del contrato	*17/11/2023*	*$45.738.299*
Valor Adicional 1	*19/05/2025*	*$1.052.678*
Valor total	*19/05/2025*	*$46.790.977*
Acta Parcial No.1	*23/12/2024*	*$ 12.610.049*
Acta final	*23/12/2025*	*$34.180.359*

Valor final ejecutado	*23/12/2025*	*$46.790.408*
Saldo a favor del contratista	*N/A*	*$0*
Saldo a favor del INDERHUILA		*$569*

3. RELACION DE PAGOS

TIPO DE PAGO (Acta No./Anticipo)	No. COMPROBANTE	FECHA
Acta N°1	189548524	*23/12/2024*
Acta Final	*En trámite.*	*En trámite.*

4. BALANCE TECNICO

Que el apoyo a la supervisión el arquitecto **YOVANY PEÑA FIERRO,** certifica que El ingeniero **EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON** identificado con NIT 7.706.737-6 en calidad de contratista, ejecuto y cumplió a cabalidad las actividades y obligaciones establecidas en el objeto del contrato de interventoría No. **CIHCM400 DE 2023** conforme a los términos, condiciones y alcances pactados. Así mismo, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, de acuerdo con las planillas adjuntas en el Acta de Recibo Final de Proyectos, correspondientes a los números de Planilla No. 30663569 - 4529498539 del mes de noviembre de 2023 pagada el 8 de agosto de 2024, Planilla No. 30663574 - 4529505624 del mes de diciembre de 2023 pagada el 01 de diciembre de 2023, Planilla No. 30663580 - 4537491705 del mes de mayo de 2024 pagada el 8 de agosto de 2024, Planilla No. 30663583 - 4544812878 del mes de junio de 2024 pagada el 8 de agosto de 2024, Planilla No. 30663586 - 4560876282 del mes de julio de 2024 pagada el 26 de julio de 2024, Planilla No. 31117225 - 4579543297 del mes de agosto de 2024 pagada el 08 de agosto de 2024, Planilla No. 4612346105 del mes de mayo de 2025 pagada el 05 de mayo de 2025, Planilla No. 4612346409 del mes de junio de 2025 pagada el 10 de julio de 2025, Planilla No. 4612477831 del mes de julio de 2025 pagada el 05 de agosto de 2025, Planilla No. 4625532971 del mes de octubre de 2025 pagada el 14 de noviembre de 2025, Planilla No. 4630729676 del mes de noviembre de 2025, pagada el mes de 04 de diciembre de 2025, Planilla No. 4633720602 del mes de diciembre del 2025 pagada el 13 de enero de 2026.

5. RECIBO A SATISFACIÓN

RECIBO A SATISFACCION:

1. Que el ingeniero **EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON**, en su calidad de interventor del Contrato de Obra No. CLPIH373 de 2023, CONSORCIO GLOBAL CC, certifica que la ejecución contractual se realizó conforme a las especificaciones técnicas, financieras y demás obligaciones pactadas, habiéndose recibido la obra a entera satisfacción el día 23 de diciembre de 2025, según consta en el Acta De Recibo Final. En virtud de ello, se procedió a la suscripción del acta de liquidación el 12 de junio de 2026, para un porcentaje de ejecución del 100%. En virtud de lo anterior, se procede a la suscripción de la presente acta.

2. Igualmente, se deja constancia expresa de que las cantidades y la calidad de las obras ejecutadas en el marco del Contrato de Obra No. CLPIH373 de 2023 son de exclusiva responsabilidad del contratista de obra e interventor, quienes realizaron su cuantificación y verificación en el terreno.

3. Que, las obras han sido ejecutadas de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos arquitectónicos, estructurales, conforme a las actividades del contrato de Obra y de interventoría.

4. Que, el arquitecto YOVANY PEÑA FIERRO, en calidad de apoyo a la supervisión, deja constancia expresa del cumplimiento diligente del Contrato de Interventoría por parte del contratista hasta el día veintitrés (23) de diciembre de 2025, correspondiente al Contrato de Interventoría No. CMCIH400 de 2023, así como de la afiliación al Sistema de Seguridad Social en los periodos comprendidos del 21 de noviembre de 2023 al 18 de marzo de 2024 y del 15 de enero de 2025 al 17 de julio de 2025.

5. Que, el apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. CMCIH400 de 2023, avala y aprueba el pago correspondiente al Acta de Recibo Final, por la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL GTRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($34.180.359,00) M/CTE, valor que corresponde a los periodos del 17/11/2023 AL 27/12/2023, Y DEL 16/05/2024 AL 26/08/2024 DEL 19/05/2025 AL 17/07/2025 DEL 6/10/2025 AL 23/11/2025 Y DEL 18/12/2025 AL 23/12/2025, conforme a la terminación y liquidación de los Contratos de Obra No. CLPIH373 objeto de la interventoría.

6. Que las partes contratantes cumplieron con lo pactado, por lo que de común acuerdo y con base en la Cláusula 8 – Forma de pago del Contrato de Interventoría No. CMCIH400 de 2023, se aprueba el presente pago y se recibe a entera satisfacción las actividades ejecutadas.

GRUPO 1 - DOCUMENTOS PARA SOPORTES PARA ARCHIVO

Certificado de cumplimiento infraestructura, Informe obra/consultoría o informe interventoría, Actas conformación de veedurías ciudadana, Actas de cierre de veeduría ciudadana, Acta de recibo final proyectos de infraestructura, Acta recibo de obra, Constancia general de actividades contrato de obra/consultoría, Acta liquidación proyectos infraestructura, Acta final de obra, Acta de recepción de obra, Consignación rendimientos financieros, Justificación inversión imprevistos, Póliza finales extendidas cumplimiento R.C, Planos record de obra , Registro fotográfico inicial vs final, Fotografía de valla publicitaria, Soportes de ensayos y/o pruebas de laboratorios, Memorias de cálculo – cantidades ejecutadas, Declaración de cumplimiento del reglamento técnico de instalación eléctrica, Acta de recibo de obra de alumbrado público y/o cuenta, Bitácora original, Certificado de calidad de los materiales, Certificado paz y salvo de servicios públicos provisionales, Paz y salvo ministerio de protección social, Comprobante de pago aportes caja compensación Familiar, Comprobante de pago aportes I.C.B.F, Comprobante de pago aportes SENA, Comprobante de pago aportes seguridad social (EPS -ARL-AFP) paz y salvo de proveedores y contratistas, Cd con las memorias.

GRUPO 2 - DOCUMENTOS SOPORTE PARA CUENTA

Certificado de cumplimiento infraestructura, Factura y/o acta de cobro original y copia, Copia certificación bancaria, copia consignación rendimientos financieros de anticipo, , Copia otro Sl, publicación y pólizas del mismo, Copia acta de suspensiones y reiniciaciones, Copia ampliación pólizas suspensión y reiniciación (si se han generado, Acta de recibo final proyectos de infraestructura, Acta recibo de obra, Acta liquidación proyectos infraestructura, Acta final de obra, Certificación aportes caja compensación Familiar, Certificación aportes I.C.B.F, Certificación aportes SENA, Certificación aportes seguridad social (EPS -ARL-AFP) firmadas por el revisor fiscal si está obligado o sino por el R.L y Cd con las memorias.

6. LIQUIDACIÒN

En virtud de la presente acta, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo, las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contencioso administrativa relacionada con esta acta de liquidación. Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron.

7. CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002:

El Interventor presenta Certificación de cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, parafiscales lo cual fue debidamente verificado por el supervisor ARQ. YOVANY PEÑA FIERRO designado y/o director del INDERHUILA en cuanto a los términos de ejecución y los porcentajes a pagar.

Mes cotizado (dd/mm/aaaa)	Numero de planilla director de obra	Numero de planilla residente de obra	Numero de planilla demás personal
1/11/2023	30663569	4529498539	9459528470-4529052800-27976727
1/12/2023	30663574	4529505624	94600215556-4529143236
1/05/2024	30663580	4537491705	9467729926
1/06/2024	30663583	4544812878	9469159103
1/07/2024	30663586	4560876282	9470513640
1/08/2024	31117225	4579543297	
1/05/2025		4612346105	
1/06/2025		4612346409	
1/07/2025		4612477831	
1/10/2025		4625532971	
1/11/2025		4630729676	
1/12/2025		4633720602	

12

INDERHUILA

En consideración a lo anterior; El INDERHUILA cancelará al Contratista la suma de **TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHETA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($34.180.359,oo)**. las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron, en Neiva a los 31 AGO 2020.

Dr. FELIPE VICTORIA BARRAGÁN
Director INDERHUILA

Arq. YOVANY PEÑA FIERRO
Apoyo a la Supervisión INDERHUILA

Ing. EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCÓN
INTERVENTOR CONTRATO

Vo. Bo. JAIME JIMENEZ LOPEZ
Abogado Contratista Externo

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7706737
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CL 21 A NO 1 A W 05	TELEFONO:	8674368
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	45294985539			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	noviembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2023.12.01			NUMERO AUTORIZACIÓN:			9999799805

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
23101	23101-COLFONDOS	1	$ 296.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 296.000	$ 0		$ 296.000
SUBTOTALES:										$ 296.000	$ 0		$ 296.000

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 231.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 231.300	$ 0	$ 0	$ 231.300
SUBTOTALES:													$ 231.300	$ 0	$ 0	$ 231.300

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PASO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0			$ 9.700	$ 9.700	$ 0	$ 0	$ 9.700
SUBTOTALES:									$ 9.700	$ 0	$ 0	$ 9.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| N° | DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | EXONERADO APORTES SALUD | EXONERADO APORTES PARAFISCALES Y ART. 114-1 ESTATUTO TRIBUTARIA | NOVEDADES: IGE | RET | TDP | TAE | TDA | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES DIAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30663569
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-08-08

PAGADO

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	EDWIN MAURICIO ALARCON	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7706737	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 71 A NO 1 A W 05	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	SUSEGUROSNEIVA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	8720380
FAX	8723018	SUCURSAL	A	NOMBRE SUCURSAL	edwin mauricio rojas alarcon
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 11	Año: 2023	Mes: 12	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$541.334		30663569

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1075257458	01	No	No	No	41	1	5421001	Fijo	ARENAS ROJAS LUIS MANUEL	$1.160.000

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1075257458	X	2023-11-17																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1075257458	PROTECCION	14	$541.334	0.1600000	$86.700	$0	$0	$86.700	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1075257458	SANITAS	14	$541.334	0.0400000	$21.700	$0	0	$0	0	$0	14	$541.334	5	0.0696000	$37.700

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1075257458	COMFAMILIAR DEL HUILA	14	$541.334	0.0400000	$21.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$86.700	$0	$0	$0	$0	240	$17.600	$0	$0	$104.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$21.700	$0	0	$0	0	$0	$21.700	240	$4.400	$0	$26.100	$0	0	$0	$0	$26.100	$0	$0	$26.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$37.700	0	$0	$0	$37.700	240	$7.700	$45.400	0	$0	$0	$45.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$21.700	240	$4.400	$26.100
SENA	0	$0	240	$0	$0
ICBF	0	$0	240	$0	$0
ESAP	0	$0	240	$0	$0
MinEdu	0	$0	240	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$26.100
PENSIONES	1	$104.300
RIESGOS PROFESIONALES	1	$45.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$26.100
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$201.900

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30663574
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-08-08

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	EDWIN MAURICIO ALARCON	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7706737	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 71 A NO 1 A W 05	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	SUSEGUROSNEIVA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	8720380
FAX	8723018	SUCURSAL	A	NOMBRE SUCURSAL	edwin mauricio rojas alarcon
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 12	Año: 2024	Mes: 01	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.120.000		30663574

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1075257458	01	No	No	No	41	1	5421001	Fijo	ARENAS ROJAS LUIS MANUEL	$1.200.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1075257458			X	2023-12-28																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1075257458	PROTECCION	28	$1.120.000	0.1600000	$179.200	$0	$0	$179.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1075257458	SANITAS	28	$1.120.000	0.0400000	$44.800	$0	0	$0	0	$0	28	$1.120.000	5	0.0696000	$78.000

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1075257458	COMFAMILIAR DEL HUILA	28	$1.120.000	0.0400000	$44.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$179.200	$0	$0	$0	$0	210	$31.200	$0	$0	$210.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$44.800	$0	0	$0	0	$0	$44.800	210	$7.800	$0	$52.600	$0	0	$0	$0	$52.600	$0	$0	$52.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$78.000	0	$0	$0	$78.000	210	$13.600	$91.600	0	$0	$0	$91.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$44.800	210	$7.800	$52.600
SENA	0	$0	210	$0	$0
ICBF	0	$0	210	$0	$0
ESAP	0	$0	210	$0	$0
MinEdu	0	$0	210	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$52.600
PENSIONES	1	$210.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$91.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$52.600
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$407.200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7706737
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CL 71 A NO 1 A W 05	TELÉFONO:	8674568
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4529505624	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2023-12-12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9995447421

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
23101	23101-COLFONDOS	1	$ 296.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 296.000	$ 0	$ 296.000
SUBTOTALES:										$ 296.000	$ 0	$ 296.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 231.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 231.300	$ 0	$ 0	$ 231.300
SUBTOTALES:													$ 231.300	$ 0	$ 0	$ 231.300

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0			$ 9.700	$ 9.700	$ 0	$ 0	$ 9.700
SUBTOTALES:									$ 9.700	$ 0	$ 0	$ 9.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 7706737	EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.850.000			NO																	

SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
23101-COLFONDOS	30	$ 1.850.000	$ 296.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 296.000

SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.850.000	$ 231.300	$ 0	$ 231.300

ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.850.000	$ 7706737	$ 9.700

PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 537.000

Planilla Pagada

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30663580
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-08-08

PAGADO

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	EDWIN MAURICIO ALARCON	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7706737	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 71 A NO 1 A W 05	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	SUSEGUROSNEIVA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	8720380
FAX	8723018	SUCURSAL	A	NOMBRE SUCURSAL	edwin mauricio rojas alarcon
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 05	Año: 2024	Mes: 06	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$650.000		30663580

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1075257458	01	No	No	No	41	1	5421001	Fijo	ARENAS ROJAS LUIS MANUEL	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1075257458	X	2024-05-16																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1075257458	PROTECCION	15	$650.000	0.1600000	$104.000	$0	$0	$104.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1075257458	SANITAS	15	$650.000	0.0400000	$26.000	$0	0	$0	0	$0	15	$650.000	5	0.0696000	$45.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1075257458	COMFAMILIAR DEL HUILA	15	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$104.000	$0	$0	$0	$0	56	$4.500	$0	$0	$108.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$26.000	$0	0	$0	0	$0	$26.000	56	$1.200	$0	$27.200	$0	0	$0	$0	$27.200	$0	$0	$27.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$45.300	0	$0	$0	$45.300	56	$2.000	$47.300	0	$0	$0	$47.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$26.000	56	$1.200	$27.200
SENA	0	$0	56	$0	$0
ICBF	0	$0	56	$0	$0
ESAP	0	$0	56	$0	$0
MinEdu	0	$0	56	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$27.200
PENSIONES	1	$108.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	$47.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$27.200
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$210.200

28

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7706737
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON
CIUDAD MUNICIPIO	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CL 71 A NO 1 A W 65	TELÉFONO:	8674568
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE ELIGIERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			453491705	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/05/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	99698102296

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 104.000
SUBTOTALES:										$ 104.000	$ 0	$ 104.000

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR AJUSTES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR AJUSTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 61.300	$ 0	$ 600	$ 0	$ 61.300	$ 0	$ 0	$ 61.300
SUBTOTALES:													$ 61.300	$ 0	$ 0	$ 61.300

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 3.400	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 3.400
SUBTOTALES:									$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 3.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES: COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXTRANJERO	RESIDENTE FISCAL EN COLOMBIA	PENSIONADO	INGRESO TRIBUTARIA	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 7706737	EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON	DEPENDIENTE. CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000						NO								6-30									

Nº	LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES: SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN: ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD: ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTES	TOTAL APORTE	ARP: ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES: DÍAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	231001-COLFONDOS	15	$ 650.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 104.000	EPS005-SANITAS S.A.	15	$ 650.000	$ 61.300	$ 0	$ 61.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 650.000	7706737	$ 3.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 188.700

Planilla pagada

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30663583
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-08-08

PAGADO

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	EDWIN MAURICIO ALARCON	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7706737	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 71 A NO 1 A W 05	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	SUSEGUROSNEIVA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	8720380
FAX	8723018	SUCURSAL	A	NOMBRE SUCURSAL	edwin mauricio rojas alarcon
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 06	Año: 2024	Mes: 07	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.200.000		30663583

98

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1075257458	01	No	No	No	41	1	5421001	Fijo	ARENAS ROJAS LUIS MANUEL	$1.200.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1075257458																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1075257458	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1075257458	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	5	0.0696000	$90.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1075257458	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.200.000	0.0400000	$48.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	29	$4.600	$0	$0	$212.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	29	$1.200	$0	$53.200	$0	0	$0	$0	$53.200	$0	$0	$53.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$90.500	0	$0	$0	$90.500	29	$2.000	$92.500	0	$0	$0	$92.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$48.000	29	$1.100	$49.100
SENA	0	$0	29	$0	$0
ICBF	0	$0	29	$0	$0
ESAP	0	$0	29	$0	$0
MinEdu	0	$0	29	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$53.200
PENSIONES	1	$212.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$92.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$49.100
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$407.400

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7706737
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CL 71 A NO 1 A W 66	TELÉFONO:	8574866
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4544812878		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES Junio AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES Junio AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2024/06/25		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9997500090

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS			FSP	MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										$ 208.000	$ 0	$ 208.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 152.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.500	$ 0	$ 0	$ 152.500
SUBTOTALES:													$ 152.500	$ 0	$ 0	$ 152.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
SUBTOTALES:									$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																											PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	EXTRANJERO	DEPENDENCIA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 7706737	EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.850.000				NO								E1-30									231001-COLFONDOS	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 152.500	$ 0	$ 152.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 7706737	$ 6.800	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 377.300

Planilla pagada

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30663586
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-08-08

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	EDWIN MAURICIO ALARCON	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7706737	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 71 A NO 1 A W 05	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	SUSEGUROSNEIVA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	8720380
FAX	8723018	SUCURSAL	A	NOMBRE SUCURSAL	edwin mauricio rojas alarcon
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 07	Año: 2024	Mes: 08	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.200.000		30663586

89

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1075257458	01	No	No	No	41	1	5421001	Fijo	ARENAS ROJAS LUIS MANUEL	$1.200.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1075257458																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1075257458	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1075257458	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	5	0.0696000	$90.500

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1075257458	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.200.000	0.0400000	$48.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 07											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$208.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	0	$0	$0	$52.000	$0	0	$0	$0	$52.000	$0	$0	$52.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$90.500	0	$0	$0	$90.500	0	$0	$90.500	0	$0	$0	$90.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$48.000	0	$0	$48.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$52.000
PENSIONES	1	$208.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$90.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$48.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$398.500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1706737
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON
CIUDAD Y MUNICIPIO	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CL 71 A NO 1 A W 05	TELEFONO:	5674568
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4560876282	TIPO DE PLANILLA:			INDEPENDIENTES
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS	MES	JULIO	AÑO 2024	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	JULIO	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/07/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			6997520090

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTAROS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTAROS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										$ 208.000	$ 0	$ 208.000

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IEP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IEP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
SUBTOTALES:									$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	RESIDENTE	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INP	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	ISC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTAROS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTAROS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	ISC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	ISC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DIAS COT	ISC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1706737	EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON	DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.850.000				INO																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 770.737	$ 6.800	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 377.300

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7706737
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON
CIUDAD Y MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CL 71 A NO 1 A W 05	TELÉFONO:	8674868
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades registradoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4579543297	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024-08-08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9990675778

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
23101	23101-COLFONDOS	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:		1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
										$ 208.000	$ 0	$ 208.000

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 152.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.500	$ 0	$ 0	$ 152.500
SUBTOTALES:		1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 152.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.500	$ 0	$ 0	$ 152.500
													$ 152.500	$ 0	$ 0	$ 152.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ARP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD ARP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
SUBTOTALES:		1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
									$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 31117225
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-09-30

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	EDWIN MAURICIO ALARCON	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7706737	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 71 A NO 1 A W 05	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	SUSEGUROSNEIVA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	8720380
FAX	8723018	SUCURSAL	A	NOMBRE SUCURSAL	edwin mauricio rojas alarcon
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 08	Año: 2024	Mes: 09	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.300.000		31117225

23

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1075257458	01	No	No	No	41	1	5421001	Fijo	ARENAS ROJAS LUIS MANUEL	$1.300.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1075257458			X	2024-08-30																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1075257458	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1075257458	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	5	0.0696000	$90.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1075257458	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	20	$3.100	$0	$0	$211.100

44

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	20	$800	$0	$52.800	$0	0	$0	$0	$52.800	$0	$0	$52.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$90.500	0	$0	$0	$90.500	20	$1.400	$91.900	0	$0	$0	$91.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$52.000	20	$800	$52.800
SENA	0	$0	20	$0	$0
ICBF	0	$0	20	$0	$0
ESAP	0	$0	20	$0	$0
MinEdu	0	$0	20	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$52.800
PENSIONES	1	$211.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	$91.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$52.800
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$408.600

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7706737
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON
CIUDAD Y MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CL 71 A NO 1 A Y 05	TELÉFONO:	8674566
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			46123484409	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Junio AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	Junio AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/07/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9999999901

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 227.800	$ 200	$ 228.000
SUBTOTALES:										$ 227.800	$ 200	$ 228.000

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 178.000	$ 200	$ 0	$ 178.200
SUBTOTALES:													$ 178.000	$ 200	$ 0	$ 178.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 100	$ 0	$ 7.600
SUBTOTALES:									$ 7.500	$ 100	$ 0	$ 7.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EN EL EXTERIOR | ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN | RESIDENTE REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES: IGE | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COM | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN | DÍAS COT. | IBC | FSP COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | DÍAS COT. | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP ADMIN | DÍAS COT. | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES DÍAS COT. | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Scotiabank COLPATRIA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7706737
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON
CIUDAD MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CL 7 1 A NO 1 A W 05	TELÉFONO:	8674568
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4612477831		TIPO DE PLANILLA:		INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES julio AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		8124478900

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										$ 227.800	$ 0	$ 227.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Scotiabank COLPATRIA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	7706737
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			EDWYN MAURICIO ROJAS ALARCON
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CL 21 A NO 1 A W 05	TELÉFONO:	8674568
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE ENMERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4615933631	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN		0555412868

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										$ 227.800	$ 0	$ 227.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD RP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PASO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | SALUD | | | | | | | | ARP | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Scotiabank COLPATRIA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7706737
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON
CIUDAD Y MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CL 71 A NO 1 A W 05	TELÉFONO:	8674068
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4620712856	TIPO DE PLANILLA:	INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2025/10/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2256657778

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.600	$ 0	$ 227.600
SUBTOTALES:										$ 227.600	$ 0	$ 227.600

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS006	EPS006-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																														PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	REFORMA TRIBUTARIA	IRP	INT	TDA	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	IGE	IRL	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN DIAS COT.	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	PENSIÓN TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DIAS COT.	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DIAS COT.	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	CCF DIAS COT.	CCF IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 7706737	EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON	P-DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.423.500			NO																		231001-COLFONDOS	30	1.423.500	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.600	EPS006-SANITAS S.A.	30	1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.423.500	$ 7706737	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 413.300

Planilla pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Scotiabank COLPATRIA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7706737
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CL 71 A NO 1 A W 05	TELÉFONO:	8674868
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4625532971**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025		
DÍAS DE MORA:	2				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	5694217710		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 228.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 228.100**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 178.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 413.300**
VALOR MORA:	**$ 700**
TOTAL PAGADO:	**$ 414.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Scotiabank. COLPATRIA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7706737
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CL 71 A NO 1 A W 05	TELÉFONO:	8674868
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4630729676**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		7218441714

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 413.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 413.300**

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIbank

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7706737
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CL 71 A NO 1 A W 05	TELÉFONO:	8674868
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4633720602**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/01/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		0259239264	

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 413.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 413.300**

1635

CERTIFICACIÓN DE ENCONTRARSE AL DÍA EN PAGOS DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo **Edwin Mauricio Rojas Alarcón** identificado con cedula de ciudadanía No. 7.706.737 de Neiva - Huila, bajo la gravedad del juramento certifico durante el periodo del 17 de noviembre de 2023 al 27 de diciembre de 2023, del 16 de mayo de 2024 al 26 de agosto de 2024, del 19 de mayo de 2025 al 17 de julio de 2025, del 6 de octubre de 2025 al 23 de noviembre de 2025 y del 18 de diciembre de 2025 al 23 de diciembre de 2025 a la fecha de la presente cuenta de acta final, el contratista de obra ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, para lo cual se adjuntan las planillas correspondientes.

Lo anterior, por ejecución del contrato de obra No. CLPIH373 de 2023 cuyo objeto es: *"CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".*

Dada en Neiva, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre del 2025.

Edwin Mauricio Rojas Alarcón
C.C. 7.706.737

Dirección: Calle 73 No. 22 – 88
Barrio: Villa Sol
Celular: 316 5208147

CERTIFICACIÓN DE ENCONTRARSE AL DÍA EN PAGOS DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo **Yovany Peña Fierro** identificado con cedula de ciudadanía No. 83.089.490 de Campoalegre - Huila, bajo la gravedad del juramento certifico que **Edwin Mauricio Rojas Alarcón** identificado con NIT 7.706.737-6 durante 17 de noviembre de 2023 al 27 de diciembre de 2023, del 16 de mayo de 2024 al 26 de agosto de 2024, del 19 de mayo de 2025 al 17 de julio de 2025, del 6 de octubre de 2025 al 23 de noviembre de 2025 y del 18 de diciembre de 2025 al 23 de diciembre de 2025 a la fecha de la presente cuenta de acta final, ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, para lo cual se adjuntan las planillas correspondientes.

Certificado Encontrado

Ejecución del contrato de interventoría No. CIHCM400 de 2023 cuyo objeto es *"Interventoría técnica, administrativa, legal y financiera al contrato cuyo objeto es la construcción de cubierta del polideportivo del centro poblado San Roque en el municipio del departamento del Huila"*.

Dada en Neiva, a los veintisiete (27) días del mes de enero del 2026.

Yovany Peña Fierro
Apoyo a la supervisión.
C.C. 83.089.490

CERTIFICACIÓN DE ENCONTRARSE AL DÍA EN PAGOS DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo **Edwin Mauricio Rojas Alarcón** identificado con cedula de ciudadanía No. 7.706.737 de Neiva - Huila, bajo la gravedad del juramento certifico que durante los meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, he cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que me encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, para lo cual se adjuntan las planillas correspondientes.

Lo anterior, por ejecución del contrato de interventoría No. CIHCM400 de 2023 cuyo objeto es: *"Interventoría técnica, administrativa, legal y financiera al contrato cuyo objeto es la "construcción e iluminación de cubierta del polideportivo del centro poblado San Roque en el municipio de Oporapa del departamento del Huila".*

Dada en Neiva, a los veintisiete (27) días del mes de enero del 2026.


Edwin Mauricio Rojas Alarcón
Contratista interventoría
C.C. 7.706.737

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCM400 de 2023

INFORME DE ACTA FINAL DE INTERVENTORIA.

PARCIAL [ ] FINAL [X]

Objeto Contrato: Interventoría técnica, administrativa, legal y financiera al contrato cuyo objeto es la "Construcción e iluminación de cubierta del polideportivo del centro poblado San Roque en el municipio de Oporapa del departamento del Huila".

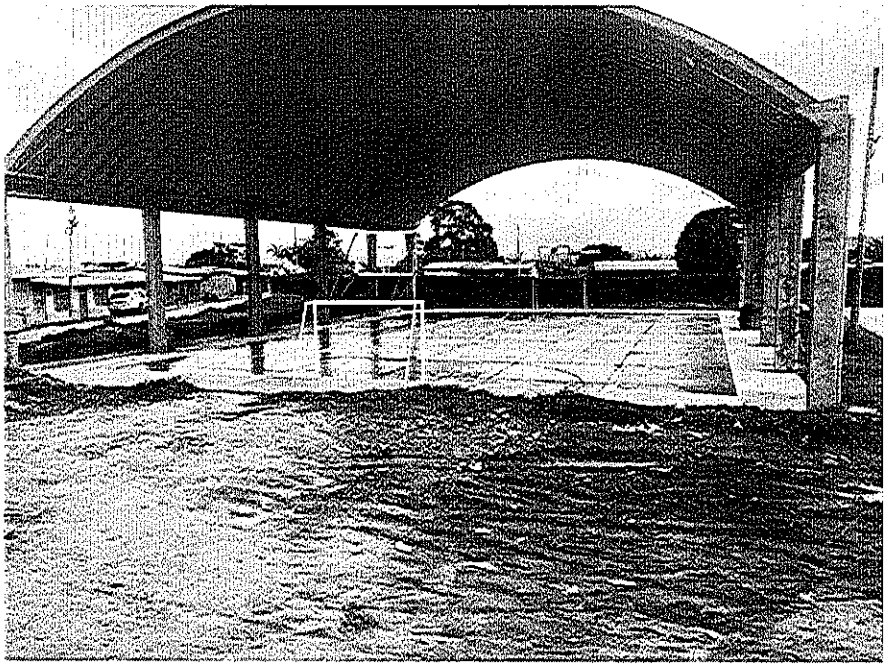

MUNICIPIO: OPORAPA


DEPARTAMENTO: HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCM400 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON

APOYO A LA SUPERVISIÓN	YOVANY PEÑA FIERRO	**ENTIDAD**	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO INTERVENTORIA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CIHCM400 DE 2023		
OBJETO	Interventoría técnica, administrativa, legal y financiera al contrato cuyo objeto es la "construcción e iluminación de cubierta del polideportivo del centro poblado San Roque en el municipio de Oporapa del departamento del Huila".	**PERIODO DEL INFORME**	Entre el 17 de NOVIEMBRE de 2023 al 27 de DICIEMBRE DE 2023, del 16 de MAYO de 2024 al 26 de AGOSTO de 2024 al 19 de MAYO de 2025 al 17 de JULIO de 2025 y del 6 de OCTUBRE al 23 de NOVIEMBRE de 2025 y del 18 de DICIEMBRE de 2025 al 23 de DICIEMBRE de 2025.
CONTRATISTA	Edwin Mauricio Rojas Alarcón	**NIT:**	7.706.737 - 6.
REPRESENTANTE LEGAL:		**C.C:**	7.706.737
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	31/10/2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	17/11/2023		
PLAZO INICIAL	El plazo estimado para la ejecución del contrato será de **Tres (03) meses**, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones, sin superar la presente vigencia fiscal.		
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	Dos (2) Meses 03/07/2024		
PLAZO ADICIONAL (No.2) (D/M/A):	Dos (2) Meses 19/05/2025		
PLAZO ADICIONAL (No.3) (D/M/A):	Cuarenta y cinco (45) Días 14/10/2025		
PLAZO TOTAL:	OCHO (8) MESES Y MEDIO, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones sin superar la vigencia fiscal.		
VALOR INICIAL:	$ 45.738.299		
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	$ 1.052.678		
VALOR TOTAL:	$ 46.790.977		
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA No.	CLPIH373 DE 2023		

OBJETO:	Construcción e iluminación de cubierta del polideportivo del centro poblado San Roque en el municipio de Oporapa del departamento del Huila.		
CONTRATISTA	Consorcio Global CC	NIT:	901.765.554-1
REPRESENTANTE LEGAL:	Yohan Fernando Salazar Baena	C.C:	7.709.122
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	02/11/2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	17/11/2023		
PLAZO INICIAL	Tres (03) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.		
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	Dos (2) Meses 03/07/2024		
PLAZO ADICIONAL (No.2) (D/M/A):	Dos (2) Meses 19/05/2025		
PLAZO ADICIONAL (No.3) (D/M/A):	Cuarenta y cinco (45) Días 14/10/2025		
PLAZO TOTAL:	OCHO (8) MESES Y MEDIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones.		
VALOR INICIAL:	$ 557.117.258		
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	$ 27.769.955		
VALOR TOTAL:	$ 584.887.213		

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

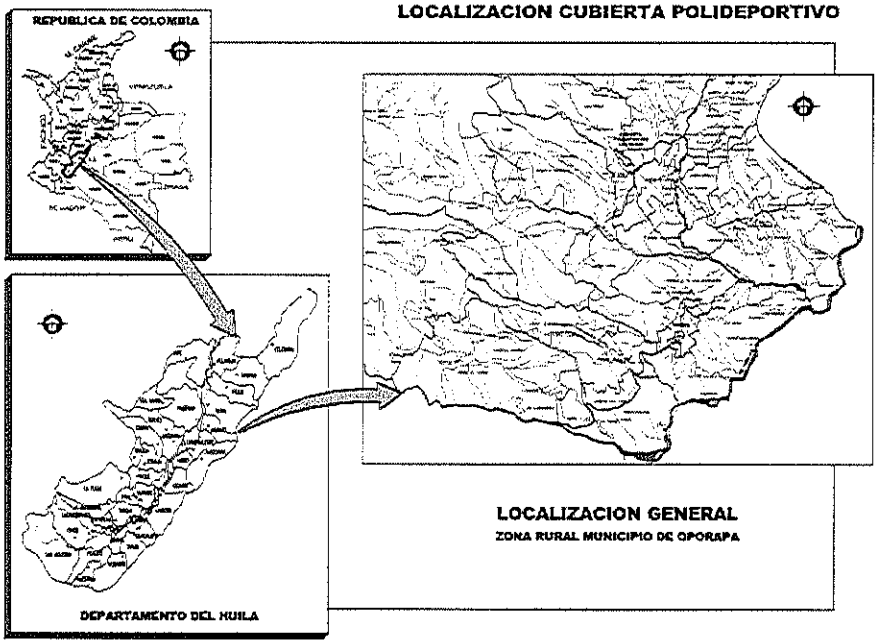

Fuente: Estudio previo proceso LPIH012-2023 – INDERHUILA

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

109

En el centro poblado San Roque del Municipio de Oporapa, los espacios públicos para las prácticas deportivas de los habitantes, son insuficientes e inadecuados para la población que está en capacidad física para practicar algún deporte. Los espacios existentes están deteriorados y con frecuencia son ocupados para desarrollar otras actividades. Adicionalmente, las personas con talento para el deporte o aquellas que buscan aprovechar el buen uso del tiempo libre al no contar con espacios apropiados ni apoyo buscan alternativas fuera de la localidad. Lo cual, hacer que las familias tengan que recurrir a inversiones para manutención y transporte.

Según la información otorgada por el municipio de Oporapa Huila; existen 5 polideportivos de acuerdo al diagnóstico de los escenarios deportivos, de los cuales 3 no se encuentran cubiertos, por otra parte 2 cuentan con cubierta que en algunos de los casos requieren de mantenimiento respectivos. La infraestructura deportiva instalada sólo puede atender el 10% de la población entre 10 y 17 años en capacidad de hacer actividad deportiva de manera habitual; la infraestructura podrá beneficiar a 12.537 personas en el municipio de Oporapa y la población objetivo abarca 450 del centro Poblado San Roque de los cuales 194 correspondes a mujeres y 256 a hombres. En el Municipio de Oporapa, no cuentan con un espacio adecuado para realizar actividades deportivas, recreativas, culturales y de índole comunitario; la mayoría de actividades de esta índole, las realizan en un área que no cuenta con las instalaciones adecuadas para normal desarrollo de actividades de la comunidad. de acuerdo con lo mencionado, se viabiliza mediante Resolución No. 220 de 2023 el proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA". Mediante el cual, se pretende realizar la construcción de una (1) cubierta e iluminación para el polideportivo del centro poblado de San Roque, que contará con redes eléctricas e hidráulicas que garanten el continuo y normal funcionamiento de la totalidad del escenario sin que se vea afectado por el horario o condiciones climáticas del sector para la práctica deportiva, esto con el fin de fortalecer el deporte y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

El sistema que se construyó incluye actividades como replanteo de 711,37 m², estructuras en concreto, cubierta, restitución de placa polideportiva en concreto, instalaciones hidrosanitarias e instalaciones eléctricas.

La cubierta se construyó con sistema auto portante, sostenida por columnas en concreto reforzado. El sistema estructural consiste en columnas de grava para la estabilización del terreno, zapatas aisladas, pedestales, vigas de cimentación y viga canal. Resaltando que, todas las obras serán ejecutadas de conformidad con lo establecido en el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10.

Se resalta que en el Municipio de Oporapa - Huila, la mayoría de su población no dispone de este tipo de escenarios en donde puedan desarrollar actividades físicas, recreativas, lúdicas y aprovechamiento del tiempo libre, de una manera segura, que contribuya a mejorar las condiciones motrices en especial de los niños y niñas, haciéndolas óptimas para realizar actividades recreo deportivas etc. De esta manera se hace más atractiva para la niñez en general realizar este tipo de actividades, cumpliendo con el objeto de mejorar la oferta de infraestructura deportiva, para garantizar el aprovechamiento de los espacios y el tiempo libre, garantizando el continuo desarrollo de los jóvenes y niños en general, quienes son el futuro de nuestro Departamento.

5. DESCRIPCION DEL AVANCE MENSUAL DE OBRA

En el periodo comprendido entre el 17 de noviembre de 2023 al 27 de diciembre de 2023, del 16 de mayo de 2024 al 26 de agosto de 2024, del 19 de Mayo de 2025 al 17 de julio de 2025, del 6 de octubre de 2025 al 23 de noviembre de 2025 y del 18 de diciembre al 23 diciembre de 2025 y teniendo en cuenta los actos administrativos de suspensión y reinicio suscritos hasta la fecha debido al balance de mayores y menores cantidades presentado durante el final del mes de agosto del 2024 y cuya aprobación se dio en Mayo de 2025. Durante el mes de Agosto de 2024 y desde el 19 de mayo de 2025 hasta el 17 de julio de 2025 y del 6 de octubre de 2025 al 13 de noviembre de 2025 se logró alcanzar un avance de ejecución del 100,00%.
El avance en mención incluye:

110

1. La ejecución total de los ítems de localización y replanteo, descapote manual de capa de 20 cm de espesor en toda el área de la placa polideportiva, excavación manual para la posterior construcción de los elementos estructurales y la instalación de recebo seleccionado compactado mecánicamente.

Durante el mes de noviembre de 2023 se realizó la búsqueda del personal de obra, para ejecutar las actividades preliminares del contrato de obra, donde hubo dificultad para conseguir mano de obra, por lo que se avanzó en la actividad de localización y replanteo, de igual manera se presentan fuerte lluvias.

Durante el mes de diciembre de 2023 se realizaron actividades concernientes al capítulo de actividades preliminares, se identificó que no hay marcos existentes que se deban retirar, por lo tanto se prosiguió con el descapote manual, y posterior compactación, de igual manera se avanzó en las excavaciones.

El día 28 de diciembre del 2023 se suscribió el acta de suspensión No.1, fundamentado por el contratista de obra por los siguientes motivos: i) En el centro de poblado San Roque, se encuentra en temporada de alta lluvias de invierno, que no permite la ejecución de temas de excavación, compactación y drenado; ii) Existen inconvenientes de orden público en la zona (Grupos al margen de la ley – Guerrilla); iii) Por las temporadas de diciembre de 2023 y del enero de 2024. Las ferreterías y almacenes, quienes suministran los materiales como el acero de refuerzo y el cemento se encuentran cerrados e inventarios hasta el otro año.

En el mes de mayo, a los dieciséis (16) día del mes de mayo se suscribió el acta de reinicio No. 1. Durante los primeros días, luego del reinicio de la obra, se hizo una limpieza al terreno y se continuó con la construcción de las zapatas y vigas. Esta actividad se inició con la instalación del ciclópeo para las zapatas. En los días de lluvias se adelantó en el amarre y figurado del acero.
El día 31 del mes de mayo, se llevó a cabo la socialización del proyecto a la comunidad, aclarando todos los requisitos y obligaciones del contratista de obra, de la interventoría y de la entidad frente a la ejecución del contrato. Además, se realizó el acta de vecindad y se formó el Comité de Veeduría Ciudadana.

En el mes de junio, el contratista de obra inició con la instalación del acero y posteriormente la fundición de las zapatas y de las vigas. Sin embargo, esta actividad se vio afectada por las constantes precipitaciones en el centro poblado San Roque.

Para el mes de julio, ya con las zapatas y vigas fundidas el contratista de obra inició con la instalación del acero de las columnas y posterior fundición de las mismas en su totalidad.

Durante el mes de agosto de 2024 se llevaron a cabo actividades relacionadas con el corte y figurado del acero de refuerzo para las vigas canal, disponiéndose el material en la caseta del centro poblado y realizando los trabajos en el mismo lugar. Estas tareas se realizaron pese a las fuertes lluvias presentadas en el mes. Como resultado de estas condiciones, se gestionó un acta de mayores y menores cantidades de obra, lo que conllevó a la suspensión el día 27 de agosto de 2024.

Posteriormente, el 19 de mayo de 2025 se realizó el reinicio del contrato de obra e interventoría. Sin embargo, durante las dos primeras semanas posteriores al reinicio se presentaron dificultades para encontrar el personal de obra necesario, razón por la cual se continuó con actividades de corte y figurado de acero de refuerzo para las vigas canal, así como con la demolición de una de las columnas de los pórticos.

Durante la primera semana de junio de 2025 persistió la dificultad para conseguir mano de obra, esto en gran medida por la época de cosecha del café, pero se continuaron las labores de corte y figurado del acero. A partir de la segunda semana y con mayor mano de

obra, se dio inicio a la disposición e instalación del acero de refuerzo de las vigas canal entre las columnas, realizándose el trabajo por secciones, con un total de cinco (5) secciones por pórtico. Posteriormente se realizó la fundición de concreto de viga canal de uno de los pórticos para dos semanas después fundir el pórtico faltante y así dar cumplimiento a la actividad.

Durante el mes de julio se presentaron dificultades de logística debidos al cierre de la vía que conduce al centro poblado, provocado por un alud que mantuvo la vía cerrada por más de una semana, además la maquinaria que se iba a utilizar en obra se ocupó realizando la limpieza de la vía, lo que ocasionó más retrasos, de igual manera, se realizó el transporte de materiales y se trabajó con lo necesario para seguir con los detalles y aletas de las vigas canal, de igual manera se transportó el acero requerido para la placa de polideportivo (Malla electrosoldada).

Durante el mes de octubre de 2025 se realizó el transporte del material y del personal necesario para realizar la construcción de la placa de concreto del polideportivo en 3000 PSI, se realiza la limpieza y compactación del terreno y del recebo de la zona donde se construirá la placa del polideportivo, así como la instalación de formaletas y de malla electrosoldada para la construcción de la placa en concreto del polideportivo, además se funden varios módulos de la placa.

Durante el mes de noviembre de 2025 se presentaron fuertes lluvias, no obstante se prosiguió con la construcción de la placa en concreto del polideportivo, llegando al 100% de su ejecución para posteriormente continuar con el suministro e instalación de la cubierta autoportante en lamina calibre 22. No obstante debido a la alta demanda del material de cubierta por los distintos proveedores, se determinó que fue necesario la suspensión del contrato de obra, debido a las fuertes lluvias y a que no se cuenta con la oferta de la cubierta autoportante.

Durante el mes diciembre de 2025 se realizó el suministro e instalación de la cubierta autoportante, una de las actividades con mayor peso financiero del proyecto, se realizó además las instalaciones eléctricas, incluyendo la instalación de la tubería y el cableado necesario para el correcto funcionamiento de la iluminación de la cubierta, así como la demarcación de la cancha del polideportivo.

Se realizaron las siguientes actividades operativas.
Localización y replanteo
Descapote manual e=0.2 incluye retiro.
Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.
Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.
Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.
Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas
Construcción de vigas de cimentación en concreto de 210 kg/cm2-3000 PSI. Ver diseño.
Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación
Concreto ciclopeo - 2500 PSI (175 KG/CM2) 60% concreto 2500 PSI + 40% piedra media zonga.
Construcción de columnas en concreto de 210 kg/cm2-3000 PSI.
Acero de refuerzo Fy=60.000 PSI columnas.
Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización.
Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal
Suministro e instalación de manto zetal viga canal.
Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.
Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.

Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura.
Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.
Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.
Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.
Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.
Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño.
Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.
Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.
Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.
Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"
Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"
Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.
Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.
Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.
Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.
Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.
Suministro e instalación de reflector led de 150 w
Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.
Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.
Transporte de materiales pétreos.

6. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
Suscripción	02/11/2023	0	0	
Iniciación	17/11/2023	0	0	16/02/2024
Suspensión No. 1	28/12/2023	41	0	16/02/2024
Reinicio No. 1	16/05/2024	0	138	05/07/2024
Otrosi No. 1	03/07/2024	48	0	04/09/2024
Suspensión No. 2	27/08/2024	53	0	04/09/2024
Reinicio No. 2	19/05/2025	0	262	26/05/2024
Otrosí No. 2	19/05/2025	0	0	25/07/2025
Suspensión No. 3	18/07/2025	59	0	25/07/2025
Reinicio No. 3	6/10/2025	0	78	14/10/2025
Otrosí No. 3	14/10/2025	9	0	29/11/2025
Suspensión No. 4	24/11/2025	39	0	29/11/2025
Reinicio No. 4	18/12/2025	0	24	23/12/2025
Terminación Cto.	**23/12/2025**	6	0	**23/12/2025**
TOTAL DIAS		**255**	**502**	

7. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
Acta de Inicio	1	17 de noviembre de 2023
Acta de Justificación No. 1	2	28 de diciembre de 2023
Acta de Suspensión No. 1	3	28 de diciembre de 2023
Acta de Justificación No. 2	4	14 de mayo de 2024
Acta de Reinicio No. 1	5	16 de mayo de 2024
Acta de Justificación No. 3	6	03 de julio de 2024
Otrosi Modificatorio No. 1	7	03 de julio de 2024
Acta de Justificación No.4	8	27 de agosto de 2024
Acta de Suspensión No. 2	9	27 de agosto de 2024
Acta de Justificación No.5	10	19 de mayo de 2025
Acta de Reinicio No. 2	11	19 de mayo de 2025
Acta de Justificación No.6	12	19 de mayo de 2025
Otrosi Modificatorio No. 2	13	19 de mayo de 2025
Acta de Justificación No.7	14	18 de julio de 2025
Acta de Suspensión 3	15	18 de julio de 2025
Acta de Justificación No.8	16	6 de octubre de 2025
Acta de Reinicio 3	17	6 de octubre de 2025
Acta de Justificación No.9	18	14 de octubre de 2025
Acta Modificatorio No.3	19	14 de octubre de 2025
Acta de Justificación No.10	20	24 de noviembre de 2025
Acta de Suspensión No.4	21	24 de noviembre de 2025
Acta de Justificación No.11	22	18 de diciembre 2025
Acta de Reinicio No.4	23	18 de diciembre 2025
Acta de Terminación	24	23 de diciembre 2025

8. ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DURANTE EL PERIODO

(Cumplimiento Obligaciones del contrato).

a). **Obligaciones de Carácter General.**	Durante el periodo comprendido entre el 17 de noviembre de 2023 al 27 de diciembre de 2023 del 16 de mayo de 2024 al 26 de agosto de 2024 del 19 de mayo de 2025 al 17 de julio de 2025 del 6 de octubre de 2025 al 23 de noviembre de 2025 y del 18 de diciembre de 2025 al 23 de diciembre de 2025 - Se desarrolló el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y demás obligaciones definidas en los documentos que hacen parte del proceso de contratación, y con el personal técnico ofertado en el mismo el cual cumple con los ítems de formación académica y experiencia definida en el documento base. Lo anterior, ha implicado tener constante comunicación con la entidad contratante para informar sobre los avances y/o peticiones presentadas por el contratista de obra especialmente, aquellas concernientes en aspectos técnicos para la suscripción de suspensión, reinicio o modificación del contrato en las fechas indicadas en los numerales anteriores del presente informe.

119

- Se realizó constante supervisión al personal de obra y el propio de la interventoría en cuanto al uso adecuado de los elementos de protección personal y la debida instalación de señalización para la prevención de accidentes de trabajo.

- Se realizó mensualmente el pago de honorarios y/o salarios al personal vinculado para la ejecución del contrato. Igualmente, se han realizado las debidas afiliaciones y pagos mensuales al sistema de seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecidos en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993.

- Cuando fue requerido, se reportó a la entidad contratante toda información que pudiera influir sobre el normal desarrollo de las obras. Así mismo, se mantuvo debida confidencialidad de la información entregada por la entidad contratante para el debido cumplimiento del objeto contractual.

- Se ejecutó el contrato de acuerdo con los precios establecidos en la propuesta y con los propios medios, materiales, equipo y personal ofertado de forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa que hacen parte del proceso de licitación del cual derivo el contrato de obra objeto de esta interventoría.

- Se adoptaron las medidas necesarias para evitar poner en peligro a las personas, los trabajadores y al medio ambiente durante el desarrollo de las obras.

- Después del 1 de agosto de 2024, se realizó verificación en campo y aprobación de la localización de los trabajos y las condiciones técnicas del sitio. Conforme a las modificaciones realizadas en el otrosí No. 2.

- Se realizó verificación y análisis de los diseños y especificaciones técnicas suministrados por la entidad contratante para el desarrollo de las obras objeto de interventoría. Así como, la inspección y control de cada una de las obras ejecutadas. Indicando que, cuando fue requerido se realizaron los debidos análisis de laboratorio.

- Se ejerció vigilancia y control sobre el cumplimiento, por parte del contratista de obra, de todas las obligaciones contractuales. Así mismo, es importante indicar que, hasta la fecha no se han presentado reclamaciones por parte de terceros con ocasión de la ejecución del respectivo contrato. Así mismo, con previo conocimiento de peticiones entregadas por el contratista de obra, se realizaron las debidas comunicaciones a la entidad contratante para poner en conocimiento casos fortuitos o hechos de fuerza mayor que incidieron sobre el normal desarrollo del contrato. Tal como, lo hecho sobre las precipitaciones presentadas a finales del año 2023 por ocasión a la temporada de invierno.

- Se informó al supervisor del contrato sobre la necesidad y la justificación de suscribir una prórroga en el plazo del contrato. Por otra parte, es importante indicar que en los días, 27 de agosto de 2024, 19 de mayo de 2025, se suscribieron las actas suspensión No. 2, reinicio No. 2, y otrosí modificatorio N°2 respectivamente. Así mismo, se realizaron las gestiones pertinentes para la modificación de las garantías y/o pólizas constituidas de conformidad con lo establecido en la Clausula 17 del presente contrato de interventoría. Igualmente, se realizó verificación sobre las garantías constituidas por el contratista de obra. Por otra parte, es importante indicar que, mediante el recibo de pago No.


	4102500028810 con fecha de expedición 26 de septiembre de 2025, se realizó el pago de las estampillas o tributos establecidos por la secretaria de hacienda de la gobernación del Huila para la debida legalización del presente contrato de interventoría. - Cuando fue requerido se proyectaron respuestas a los requerimientos efectuados por el supervisor del contrato en los términos establecidos en el contrato.
b). **Actividades Administrativas.**	Durante el periodo comprendido entre el 17 de noviembre de 2023 al 27 de diciembre de 2023 del 16 de mayo de 2024 al 26 de agosto de 2024 del 19 de mayo de 2025 al 17 de julio de 2025 del 6 de octubre de 2025 al 23 de noviembre de 2025 y del 18 de diciembre de 2025 al 23 de diciembre de 2025. Se realizaron actividades tales como la revisión y ajuste del cronograma de ejecución, la verificación de pólizas de cumplimiento y de RCE, también se ha realizado la afiliación del personal de obra a la planilla de seguridad social, además en esfuerzo conjunto con la entidad se han suscrito las actas de suspensión y reinicio de los contratos. También se realizó el seguimiento a la disponibilidad de materiales y la comunicación con la comunidad para informar sobre el estado del proyecto y el avance de obra.
c). **Actividades Operativas.**	Durante el periodo comprendido entre el 17 de noviembre de 2023 al 27 de diciembre de 2023 del 16 de mayo de 2024 al 26 de agosto de 2024 del 19 de mayo de 2025 al 17 de julio de 2025 del 6 de octubre de 2025 al 23 de noviembre de 2025 y del 18 de diciembre de 2025 al 23 de diciembre de 2025. se realizaron las siguientes actividades operativas: Localización y replanteo Descapote manual e=0.2 incluye retiro. Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada. Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente. Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño. Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas Construcción de vigas de cimentación en concreto de 210 kg/cm2-3000 PSI. Ver diseño. Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación Concreto ciclopeo - 2500 PSI (175 KG/CM2) 60% concreto 2500 PSI + 40% piedra media zonga. Construcción de columnas en concreto de 210 kg/cm2-3000 PSI. Acero de refuerzo Fy=60.000 PSI columnas. Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización. Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal Suministro e instalación de manto zetal viga canal. Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz. Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto. Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura. Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm. Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias. Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.

	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida. Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño. Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor. Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada. Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts. Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2" Transición aérea-subterránea tubería IMC 1" Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste. Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna. Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu. Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector. Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores. Suministro e instalación de reflector led de 150 w Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v. Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v. Transporte de materiales pétreos
d). **Actividades Logísticos.**	Durante el periodo comprendido entre el 17 de noviembre de 2023 al 27 de diciembre de 2023 del 16 de mayo de 2024 al 26 de agosto de 2024 del 19 de mayo de 2025 al 17 de julio de 2025 del 6 de octubre de 2025 al 23 de noviembre de 2025 y del 18 de diciembre de 2025 al 23 de diciembre de 2025, se realizaron actividades tales como, control diario de la bitácora de hora, mediciones de los ítems ejecutados por el contratista de conformidad con las especificaciones técnicas y planos suministrados por la entidad contratante, programación de comités semanales de obra, inspección de los trabajos ejecutados por el contratista de conformidad con la programación presentada por el mismo, control y vigilancia para la correcta ejecución de las actividades que componen el contrato de obra, control permanente de los suministros de los diferentes materiales de construcción que se requieran para ejecutar las obras y solicitud de los ensayos y/o pruebas de calidad establecidas en las especificaciones técnicas y las necesarias y convenientes de acuerdo al desarrollo de la obra. Esto último para efectuar el debido control de calidad de los materiales a utilizar antes de iniciar las obras o en el transcurso de la ejecución de las mismas.
e). **Obligaciones de Carácter Ambiental.**	Durante la ejecución del proyecto se veló por el cumplimiento de la normatividad ambiental establecida para la construcción de cubiertas para placas polideportivas, al igual que el acatamiento de las condiciones y estipulaciones generales y particulares estipuladas en los contratos de obra e interventoría CLPIH 373 de 2023 y CIHCM400 DE 2023. El material pétreo que el contratista obtuvo, lo extrajo de canteras autorizadas, dicha autorización se puede ver anexa en el RUCOM. Asimismo el contratista tomó en arrendo una bodega con el fin de salvaguardar los materiales y sus residuos. Por otra parte, se realizaron procesos y actividades enfocadas a la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar qué las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y de disposición de residuos se implementarán para minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normatividad aplicable.


f). **Actividades Financieras.**	Durante la ejecución del proyecto se efectuó el debido control administrativo y financiero del contrato de obra CPLIH 373 de 2023. Así mismo, se ha efectuado control en la inversión del contrato de obra mencionado con anterioridad. Indicando además que, se ha realizado el debido análisis del avance financiero de las obras ejecutadas. De tal manera que, se puedan prever eventuales necesidades de modificación asegurando así el flujo de fondos del contrato. Por otra parte, se realizaron los debidos chequeos de información y/o requisitos establecidos por la entidad contratante para tramite de la segunda acta parcial de cobro con un avance del 58.67% de ejecución de obra.
g). **Actividades Jurídicos.**	Durante el periodo comprendido entre el 17 de noviembre de 2023 al 27 de diciembre de 2023 del 16 de mayo de 2024 al 26 de agosto de 2024 del 19 de mayo de 2025 al 17 de julio de 2025 del 6 de octubre de 2025 al 23 de noviembre de 2025 y del 18 de diciembre de 2025 al 23 de diciembre de 2025 no se presentaron incumplimientos por parte del contratista de obra ni tampoco se han recibido reclamaciones por parte de los colaboradores del mismo por causa o con ocasión del contrato. Así mismo, se mantuvo asesorando, apoyando e informando constantemente a la entidad contratante en los aspectos jurídicos que se han presentado tal como, las peticiones entregadas por el contratista de obra para evaluar la posibilidad de suscribir actos administrativos de suspensión, reinicio y modificación del contrato debido a las precipitaciones presentadas por la temporada de invierno y otros factores que influyen en el normal desarrollo de las obras. Por ocasión a la suscripción de los actos administrativos mencionados anteriormente, se realizaron verificación de las modificaciones generadas a las garantías o pólizas constituidas por el contratista en v irtud de las estipulaciones contractuales enmarcadas en el contrato de obra CPLIH 373 de 2023.

9. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante el mes de noviembre de 2023, se realizaron actividades a partir de la fecha de 17 de noviembre de 2023, fecha del acta de inicio. El estado del tiempo durante este mes se ve a continuación:



Se observó que en el transcurso del mes de diciembre, tambien se presentaron varios dias de lluvia, siendo los días 17, 19 y 26 los días de mayores precipitaciones, como se observa en las siguientes ilustraciones; debido a esto se suspende la obra por los siguientes 4 meses, por lo cual no se presenta un informe para estos meses.

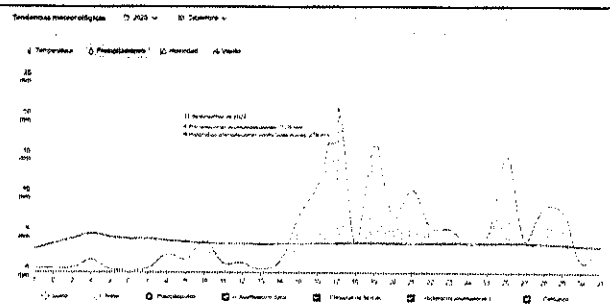

Diciembre

Temp. media: **16°C** | Días de lluvia: **14 Días**

Temp. máx media: **22°C** | Acum. de lluvia: **80 mm**

Temp. min media: **10°C** | Viento medio: **5 km/h**

La obra se reanudó el 16 de mayo, mes en el cual también se presentaron bastantes lluvias, aunque con una menor intensidad que los meses anteriores. No obstante, con una temperatura media inferior a los meses pasados.

Mayo

Temp. media: **15°C** | Días de lluvia: **18 Días**

Temp. máx media: **20°C** | Acum. de lluvia: **121 mm**

Temp. min media: **10°C** | Viento medio: **5 km/h**

A lo largo del mes de junio se presentaron menos lluvias, sin embargo, la tendencia de una menor temperatura respecto a meses anteriores continúa.

Junio

Temp. media: **14°C** | Días de lluvia: **13 Días**

Temp. máx media: **19°C** | Acum. de lluvia: **56 mm**

Temp. min media: **9°C** | Viento medio: **5 km/h**

En el transcurso del mes de Julio se tuvieron menos días de lluvia, y al igual que los meses anteriores se cuentan con temperaturas menores.


Julio

Temp. media: **13°C** | Días de lluvia: **11 Días**


Temp. máx media: **19°C** | Acum. de lluvia: **41 mm**

Temp. min media: **9°C** | Viento medio: **5 km/h**


Durante el mes de agosto de 2024, se llevaron a cabo actividades correspondientes al corte del acero de refuerzo para la viga canal. Sin embargo, dichas labores se vieron afectadas por las constantes lluvias registradas durante este período, como se puede evidenciar en el estado del tiempo que se presenta a continuación:

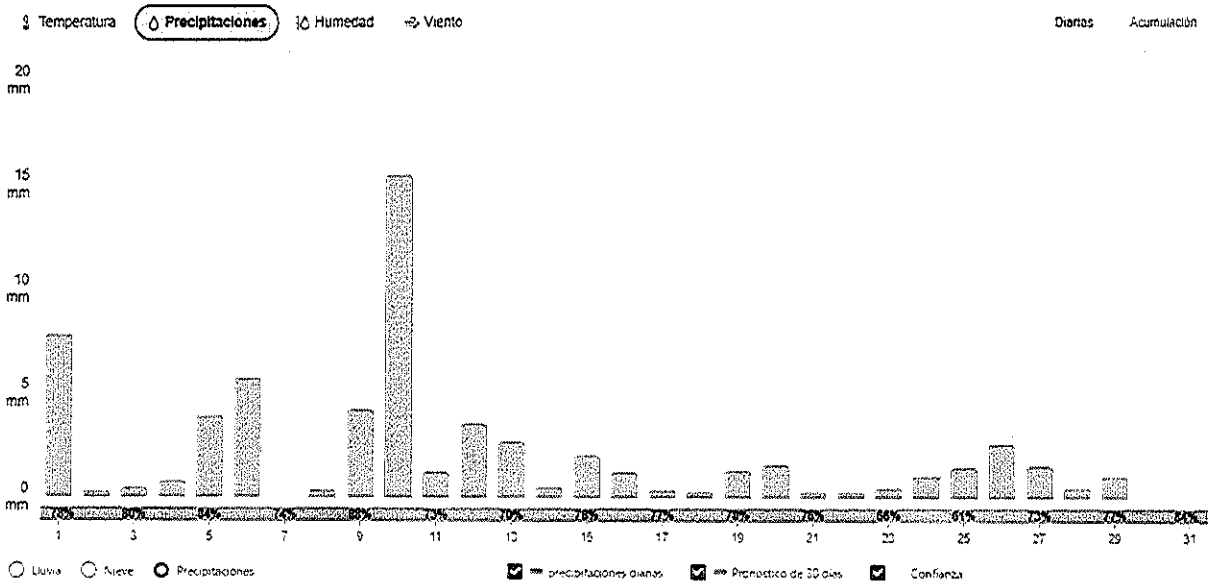


La obra se reanudó el 19 de mayo de 2025, mes en el que también se presentaron precipitaciones frecuentes, aunque de menor intensidad en comparación con los meses anteriores. No obstante, se registró una temperatura media inferior a la de los meses previos.

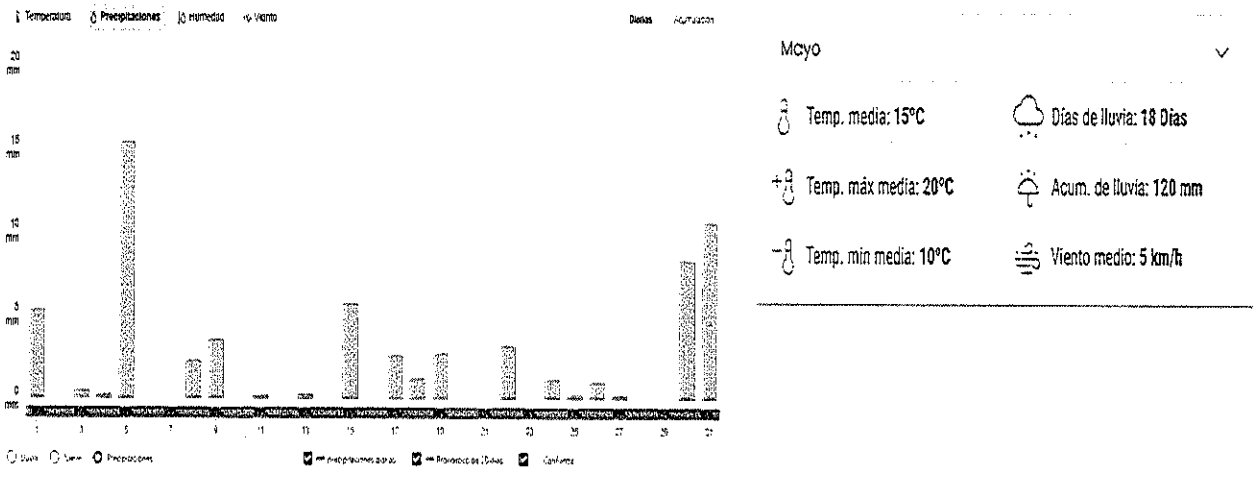


A lo largo del mes de junio de 2025 se registró una disminución en las precipitaciones; sin embargo, se presentan temperaturas más bajas en comparación con los meses anteriores se mantuvo.

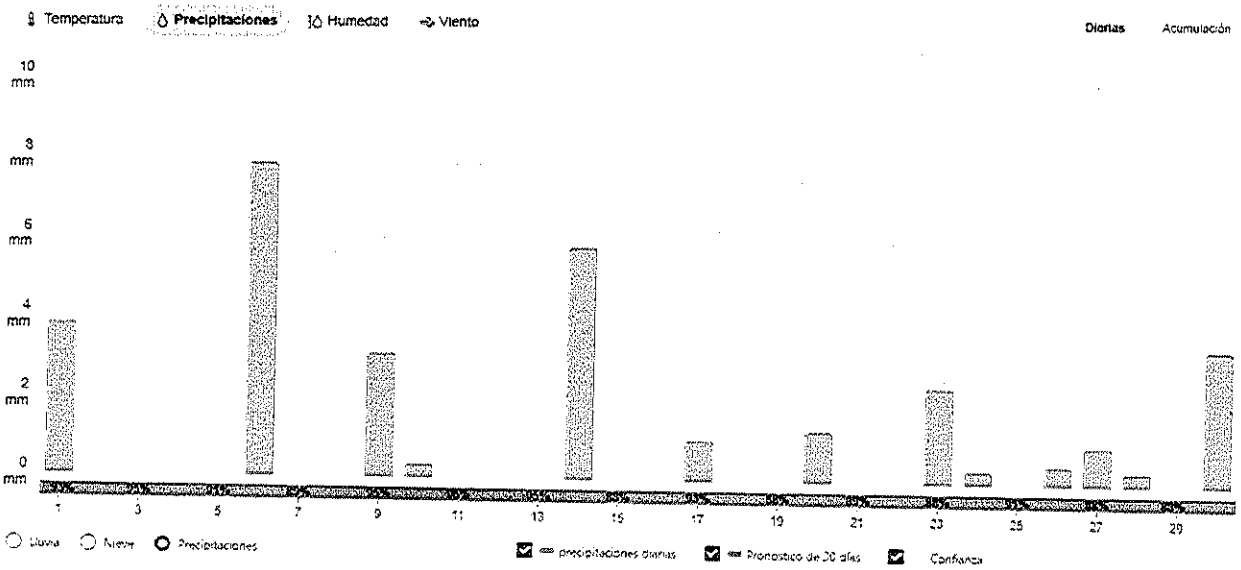


Durante el mes de julio de 2025 se observaron menos días de lluvia, en relación con el mes de junio.

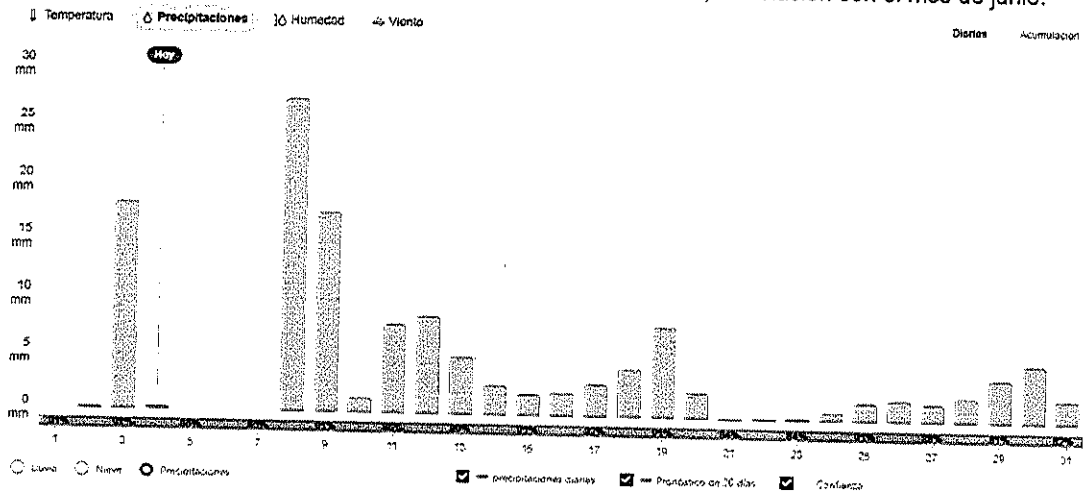

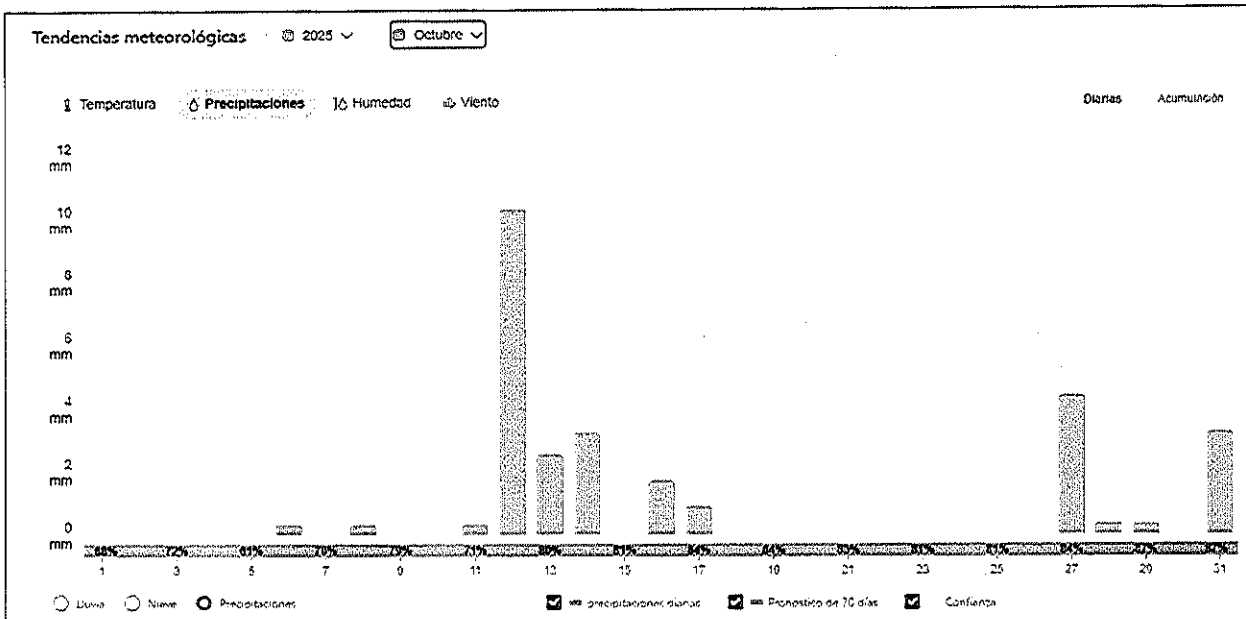


Durante el mes de octubre de 2025 fue un mes en el que también se presentaron precipitaciones frecuentes, aunque de menor intensidad en comparación con los meses anteriores.

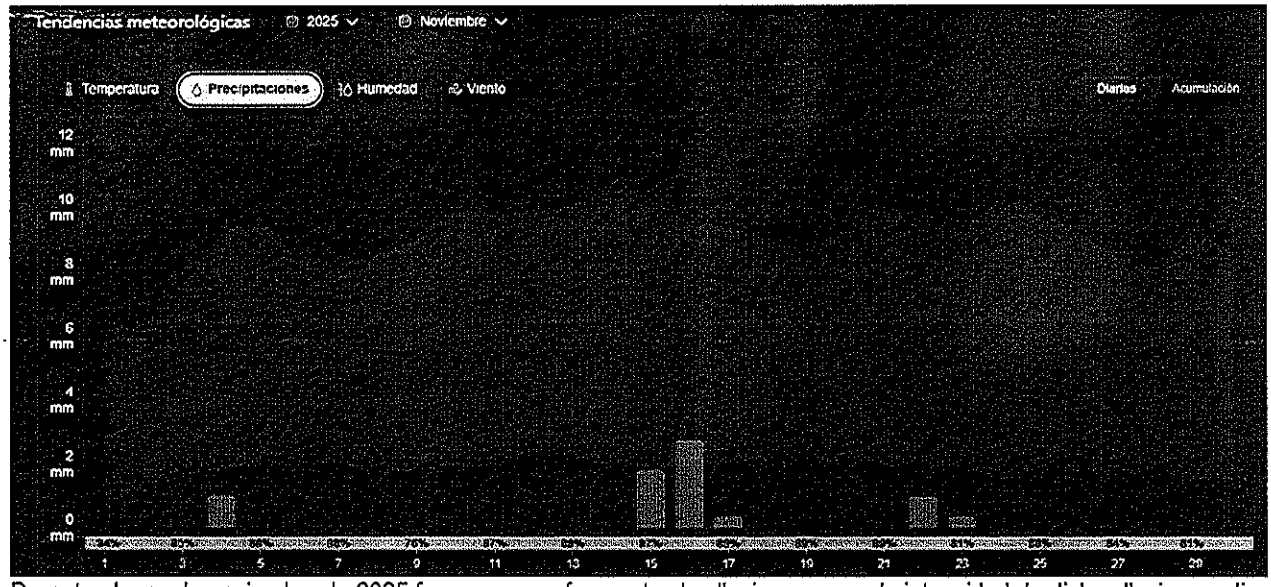

Durante el mes de noviembre de 2025 fueron menos frecuentes las lluvias, aunque la intensidad de dichas lluvias no disminuyó.

Acumulado anual.

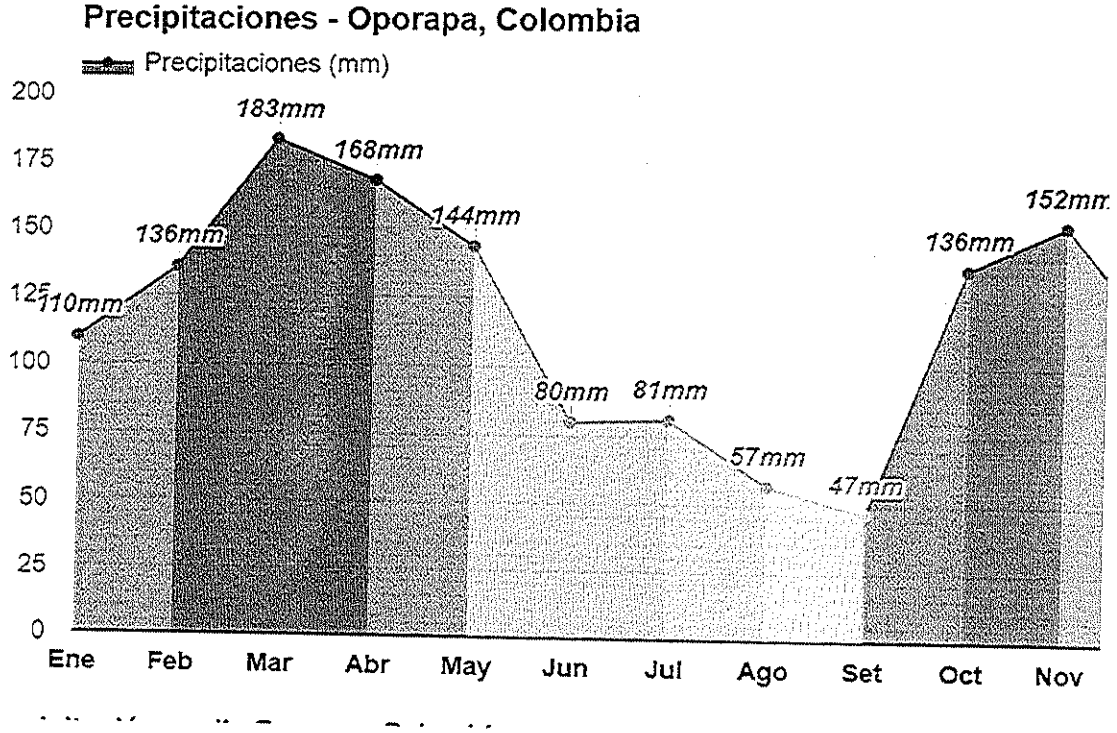

Fuentes: https://www.clima.com/colombia/huila/oporapa
https://www.msn.com/es-es/eltiempo/prevision/in-Oporapa,Huila

10. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Tipo Prueba de Laboratorio	Resistencia concreto	Relación volumétrica concreto
Diseños de mezcla para los concretos.	2000 2500 3000 4000	CEMENTO AGUA ARENA GRAVILLA 1.0 BTO 4.9 BALDES 11.0 BALDES 13.0 BALDES 1.0 BTO 3.8 BALDES 10.0 BALDES 11.0 BALDES 1.0 BTO 2.9 BALDES 8.5 BALDES 9.5 BALDES 1.0 BTO 2.0 BALDES 7.0 BALDES 8.0 BALDES
Diseños de mezcla para base.	*No aplica*	*No aplica*
Compresión simple al concreto.	*Cumple*	
Ensayo de compactación de campo		

NOTA: *Las obras de concreto ejecutadas se le realiza prueba a la compresión simple, Norma Articulo 630-07 ensayo E-410, cumpliendo con las resistencias exigidas.*

Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio realizados por la INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Anden, Muro concreto ciclópeo, Cuneta)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA (PSI)	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA (PSI)	CUMPLE/ NO CUMPLE
			7	14	28			
Ciclópeo	20/05/24	03/06/24		X		3000	3218	CUMPLE
	20/05/24	17/06/24			X	3000	3563	CUMPLE
Ciclópeo	27/05/24	10/06/24		X		3000	3051	CUMPLE
	27/05/24	24/06/24			X	3000	3317	CUMPLE
Zapatas	30/05/24	13/06/24		X		3000	2850	CUMPLE
	30/05/24	27/06/24			X	3000	3158	CUMPLE
Zapatas	02/06/24	16/06/24		X		3000	2877	CUMPLE
	02/06/24	30/06/24			X	3000	3229	CUMPLE
Vigas	06/06/24	20/06/24		X		3000	3016	CUMPLE
	06/06/24	04/07/24			X	3000	3351	CUMPLE
Vigas	13/06/24	27/06/24		X		3000	2787	CUMPLE
	13/06/24	11/07/24			X	3000	3112	CUMPLE
Columnas	17/06/24	01/07/24		X		3000	2946	CUMPLE
	17/06/24	15/07/24			X	3000	3261	CUMPLE
Columnas	24/06/24	08/07/24		X		3000	2858	CUMPLE
	24/06/24	22/07/24			X	3000	3222	CUMPLE
Columna	04/06/25	11/06/25	X			3000	2156 (> 65% de resistencia)	CUMPLE
	04/06/25	02/07/25			X	3000	3210	CUMPLE
Viga canal izquierda	21/06/25	28/06/25	X			3000	2102 (> 65% de resistencia)	CUMPLE
	21/06/25	19/07/25			X	3000	3198	CUMPLE
Viga canal derecha	03/07/25	10/07/25	X			3000	2135 (> 65% de resistencia)	CUMPLE
	03/07/25	31/07/25			X	3000	3320	CUMPLE
	14/10/25	28/10/25		x		3000	3543	CUMPLE

Placa en concreto polideportivo	14/10/25	11/11/25			x	3000	3810	CUMPLE
Placa en concreto polideportivo	25/10/25	8/11/25		x		3000	3454	CUMPLE
	25/10/25	22/11/25			x	3000	3698	CUMPLE
Placa en concreto polideportivo	4/11/25	18/11/25		x		3000	3387	CUMPLE
	4/11/25	2/12/25			x	3000	3655	CUMPLE

Control Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio realizados por el CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Anden, Muro concreto iclópeo, Cuneta)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA (PSI)	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA (PSI)	CUMPLE/ NO CUMPLE
			7	14	28			
Ciclópeo	20/05/24	03/06/24		x		3000	3214	CUMPLE
	20/05/24	17/06/24			X	3000	3572	CUMPLE
Ciclópeo	27/05/24	10/06/24		x		3000	3055	CUMPLE
	27/05/24	24/06/24			x	3000	3321	CUMPLE
Zapatas	30/05/24	13/06/24		x		3000	2849 (> 90% de resistencia)	CUMPLE
	30/05/24	27/06/24			x	3000	3166	CUMPLE
Zapatas	02/06/24	16/06/24		x		3000	2879 (> 90% de resistencia)	CUMPLE
	02/06/24	30/06/24			x	3000	3240	CUMPLE
Vigas	06/06/24	20/06/24		x		3000	3020	CUMPLE
	06/06/24	04/07/24			x	3000	3361	CUMPLE
Vigas	13/06/24	27/06/24		x		3000	2796(> 90% de resistencia)	CUMPLE
	13/06/24	11/07/24			x	3000	3120	CUMPLE
Columnas	17/06/24	01/07/24		x		3000	2949 (> 90% de resistencia)	CUMPLE
	17/06/24	15/07/24			x	3000	3270	CUMPLE
Columnas	24/06/24	08/07/24		x		3000	2866(> 90% de resistencia)	CUMPLE

125

	24/06/24	22/07/24			x	3000	3227	CUMPLE
Columna	04/06/25	11/06/25	X			3000	2412 (> 65% de resistencia)	CUMPLE
	04/06/25	02/07/25			X	3000	3152	CUMPLE
Viga canal izquierda	21/06/25	28/06/25	X			3000	2230 (> 65% de resistencia)	CUMPLE
	21/06/25	19/07/25			x	3000	3234	CUMPLE
Viga canal derecha	03/07/25	10/07/25	x			3000	2346 (> 65% de resistencia)	CUMPLE
	03/07/25	31/07/25			x	3000	3124	CUMPLE
Placa en concreto polideportivo	14/10/25	28/10/25		x		3000	3542	CUMPLE
	14/10/25	11/11/25			x	3000	3806	CUMPLE
Placa en concreto polideportivo	25/10/25	8/11/25		x		3000	3453	CUMPLE
	25/10/25	22/11/25			x	3000	3696	CUMPLE
Placa en concreto polideportivo	4/11/25	18/11/25		x		3000	3384	CUMPLE
	4/11/25	2/12/25			x	3000	3651	CUMPLE

11. CONTROL DE ANTICIPO

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Valor Anticipo (25%)		$ 139.279.315,00		$ 139.279.315,00
Acta Parcial No. 1	31/07/2024	$ 153.608.431,00	$ 38.402.108	$ 115.206.323,00
Acta Parcial No. 2	13/11/2024	$189.546.946,00	$ 47.386.737,00	$ 142.160.209,00
Acta Final.	En tramite	$241.724.719,00	$53.490.470,00	$ 188.234.249,00
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 557.117.258,00	**$ 27.769.955,00**	$ 584.887.213,00	$ 584.880.096,00	$ 7.117,00

12. COMITES DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
08/08/2024	Caseta comunal centro poblado San Roque	Se verificó que el corte y figurado del acero de refuerzo para la viga canal cumple con las dimensiones de los planos estructurales y se aplicaron correctamente las técnicas establecidas. Se constató que la reconstrucción de la columna se ejecutó conforme a los lineamientos técnicos del proyecto, con adecuada disposición del acero, uso del
16/08/2024		
23/08/2024		
26/08/2024		
23/05/2025		
30/05/2025		

06/06/2025 13/06/2025 20/06/2025 07/06/2025 13/10/2025 20/10/2025 27/10/2025 4/11/2025 11/11/2025 18/11/2025 22/12/2025		concreto especificado y cumplimiento de la resistencia exigida según ensayos de laboratorio. Se verificó la correcta instalación del acero de refuerzo en las vigas canal, conforme a los planos aprobados y especificaciones técnicas, garantizando la calidad estructural e hidráulica de la obra. Se verificó la correcta fundición de la viga canal junto con los procesos de curado de las estructuras. Se verificó la correcta fundición de la placa del polideportivo, junto con la instalación de las bajantes de agua y el desarrollo de la construcción de las cajas de inspección, se constata la fuerte ola invernal por la que pasa el municipio, y como afecta al centro poblado. Se habla sobre la necesidad de realizar una suspensión debido a la escasez del material de cubierta por la alta demanda. Se habla de las instalaciones eléctricas, el suministro e instalación de la cubierta, y acabados, se proyecta el acta de terminación de obra.

13. RELACIÓN DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS

TIPO DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA A LA ENTIDAD (dd/mm/aaaa)	No. RADICADO (Emitido por INDERHUILA)	FORMATO (Físico/Digital)
Solicitud de ampliación de tiempo por parte de la interventoría a InderHuila, de la solicitud del contratista de obra respecto a la ampliación de tiempo para el contrato de Obra Pública	02/07/2024	1117	Físico
Entrega de documentación para el desembolso del anticipo y balance de obra ajustado a la necesidad del proyecto.	13/06/2024	1016	Físico
Actas de socialización e inicio de obra	14/06/2024	1036	Físico
Actas de conformación de veeduría ciudadana	28/05/2024	N/A	Físico
Actas de vecindad	14/06/2024	1036	Físico
Entrega de documentación para desembolso del anticipo.	30/05/2024	923	Físico

14. RELACION DE PERSONAL (Profesional Interventoría)

NOMBRE Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION

Edwin Mauricio Rojas Alarcón	7.706.737	Residente de interventoría	Prestación de Servicios

15. RELACIÓN DE PAGOS

TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)	No. COMPROBANTE	FECHA
Acta Parcial 1.	189548524	26/12/2024

16. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
(Por Mes)

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO
Director de obra (noviembre - 2023)	$ 104.300	$ 26.100	$ 45.400	$ 0	$ 0	30663569	08/08/2024
Residente de obra (noviembre - 2023)	$ 296.000	$ 231.300	$ 9.700	$ 0	$ 0	4529498539	01/12/2023
Secretario (noviembre - 2023)	$ 265.000	$ 207.000	$ 8.700	$ 0	$ 0	9459528470	08/08/2024
Topógrafo (noviembre - 2023)	$ 185.600	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	4529052800	08/08/2024
Cadenero (noviembre - 2023)	$ 192.000	$ 150.000	$ 6.300	$ 0	$ 0	27976727	08/08/2024
Director de obra (diciembre - 2023)	$ 210.400	$ 52.600	$ 91.600	$ 0	$ 0	30663574	08/08/2024
Residente de obra (diciembre - 2023)	$ 296.000	$ 231.300	$ 9.700	$ 0	$ 0	4529505624	12/12/2023
Secretario (diciembre - 2023)	$ 265.000	$ 207.000	$ 8.700	$ 0	$ 0	94600215556	08/08/2024
Topógrafo (diciembre - 2023)	$ 185.600	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	4529143236	08/08/2024
Director de obra (Mayo – 2024)	$ 108.500	$ 27.200	$ 47.300	$ 0	$ 0	30663580	08/08/2024
Residente de obra (Mayo – 2024)	$ 104.000	$ 81.300	$ 3.400	$ 0	$ 0	4537491705	31/05/2024
Secretario (mayo - 2024)	$ 224.000	$ 175.000	$7.400	$ 0	$ 0	9467729926	08/08/2024
Director de obra (Junio – 2024)	$ 212.600	$ 53.200	$ 92.500	$ 0	$ 0	30663583	08/08/2024
Residente de obra (Junio – 2024)	$ 208.000	$ 162.500	$ 6.800	$ 0	$ 0	4544812878	25/06/2024
Secretario (junio - 2024)	$ 224.000	$ 175.000	$7.400	$ 0	$ 0	9469159103	08/08/2024
Director de obra	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 0	$ 0	30663586	08/08/2024

(Julio – 2024)							
Residente de obra (Julio – 2024)	$ 208.000	$ 162.500	$ 6.800	$ 0	$ 0	4560876282	26/07/2024
Secretario (julio - 2024)	$ 224.000	$ 175.000	$7.400	$ 0	$ 0	9470513640	08/08/2024
Director de obra (agosto – 2024)	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 0	$ 0	31117225	09/30/2024
Residente de interventoría (Agosto - 2024)	$ 208.000	$ 162.500	$ 6.800	$ 0	$ 0	4579543297	08/08/2024
Residente de interventoría (Mayo- 2025)	$ 228.000	$ 178.200	$ 7.600	$ 0	$ 0	4612346105	05/05/2025
Residente de interventoría (Junio- 2025)	$ 228.000	$ 178.200	$ 7.600	$ 0	$ 0	4612346409	10/07/2025
Residente de interventoría (Julio- 2025)	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	4612477831	05/08/2025
Residente de interventoría (Octubre- 2025)	$ 228.100	$ 178.300	$ 7.600	$ 0	$ 0	4625532971	11/14/2025
Residente de interventoría (Noviembre- 2025)	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	4630729676	04/12/2025
Residente de interventoría (Diciembre- 2025)	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	4633720602	01/13/2026

17. RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA

Póliza legalización del CONTRATO: CIHCM400 DE 2023

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
Compañía mundial de seguros S.A.	CHU-100009482	1	23/05/2024	Cumplimiento del contrato	31/10/2023	31/07/2024
				Prestaciones sociales	31/10/2023	31/01/2027
				Calidad del Servicio	31/01/2024	31/01/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA

					(dd/mm/aaaa)
Compañía mundial de seguros S.A.	CHU-100001887	1	23/05/2024	31/10/2023	31/01/2024

Póliza actualizada ACTA DE INICIO del CONTRATO: CIHCM400 DE 2023

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
Compañía mundial de seguros S.A.	CHU-100009482	2	23/05/2024	Cumplimiento del contrato	17/11/2023	17/08/2024
				Prestaciones sociales	17/11/2023	17/02/2027
				Calidad del Servicio	17/02/2024	17/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
Compañía mundial de seguros S.A.	CHU-100001887	2	23/05/2024	17/11/2023	17/02/2024

Póliza actualizada ACTA DE SUSPENSION No. 1 - ACTA DE REINICIO No. 1 del CONTRATO: CIHCM400 DE 2023

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
Compañía mundial de seguros S.A.	CHU-100009482	3	23/05/2024	Cumplimiento del contrato	16/05/2024	07/01/2025
				Prestaciones sociales	16/06/2024	07/07/2027
				Calidad del Servicio	07/07/2024	07/07/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
Compañía mundial de seguros S.A.	CHU-100001887	3	24/05/2024	17/11/2023	07/07/2024

Póliza actualizada x PRORROGA No. 1 del CONTRATO: CIHCM400 DE 2023

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA

136

			(dd/mm/aaaa)		(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Compañía mundial de seguros S.A.	CHU-100009482	4	05/07/2024	Cumplimiento del contrato	03/07/2024	07/03/2025
				Prestaciones sociales	03/07/2024	02/09/2027
				Calidad del Servicio	07/09/2024	07/09/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
Compañía mundial de seguros S.A.	CHU-100001887	4	05/07/2024	17/11/2023	07/09/2024

Póliza actualizada x Suspensión No. 2 del CONTRATO: CIHCM400 DE 2023

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
Compañía mundial de seguros S.A.	CHU-100009482	5	29/05/2025	Cumplimiento del contrato	27/08/2024	30/11/2025
				Prestaciones sociales	27/08/2024	30/05/2028
				Calidad del Servicio	30/05/2025	30/05/2030

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
Compañía mundial de seguros S.A.	CHU-100001887	5	29/05/2025	17/11/2023	30/05/2025

Póliza actualizada x Prorroga No. 2 del CONTRATO: CIHCM400 DE 2023

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
Compañía mundial de seguros S.A.	CHU-100009482	6	30/05/2025	Cumplimiento del contrato	19/07/2025	30/01/2026
				Prestaciones sociales	19/07/2025	30/07/2028
				Calidad del Servicio	30/07/2025	30/07/2030

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
Compañía mundial de seguros S.A.	CHU-100001887	6	30/05/2025	17/11/2023	30/07/2030

Póliza actualizada x Prorroga No. 3 del CONTRATO: CIHCM400 DE 2023

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
Compañía mundial de seguros S.A.	CHU-100009482	7	27/10/2025	Cumplimiento del contrato	14/10/2025	17/03/2026
				Prestaciones sociales	14/10/2025	15/09/2028
				Calidad del Servicio	15/09/2025	15/09/2030

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
Compañía mundial de seguros S.A.	CHU-100001887	7	30/05/2025	17/11/2023	2/12/2025

Póliza legalización del CONTRATO: CLPIH373 de 2023

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO	37-44-101041844	Anexos 0	31/10/2023	Cumplimiento del contrato	31/10/2023	31/07/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	31/10/2023	31/07/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	31/10/2023	31/01/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 años, 0 meses y 0 día a partir de la suscripción del acta de recibo de la obra.	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGURO DEL ESTADO S.A.	37-40-101025972	Anexo 0	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2024

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO del CONTRATO: CLPIH373 de 2023

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGURO DEL ESTADO S.A.	37-44-101041844	Anexo 0	31/10/2023	Cumplimiento del contrato	31/10/2023	31/07/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	31/10/2023	31/07/2024

				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	31/10/2023	31/01/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años, 0 meses y 1 días	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGURO DEL ESTADO S.A.	37-40-101025972	Anexo 0	31/10/2023	31/10/2023	31/01/2024

Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION No. 1 - ACTA DE REINICIO No. 1 del CONTRATO: CLPIH373 de 2023

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGURO DEL ESTADO S.A.	37-44-101041844	Anexo 1 Suspensión	10/01/2024	Cumplimiento del contrato	31/10/2023	31/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	31/10/2023	31/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	31/10/2023	28/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años, 0 meses y 1 días.	
SEGURO DEL ESTADO S.A.	37-44-101041844	Anexo 6 Reinicio	29/05/2024	Cumplimiento del contrato	31/10/2023	14/12/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	31/10/2023	14/12/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	31/10/2023	14/06/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años, 0 meses y 1 días.	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGURO DEL ESTADO S.A.	37-40-101025972	Anexo 1 Suspensión	10/01/2024	31/10/2023	29/02/2024
SEGURO DEL ESTADO S.A.	37-40-101025972	Anexo 6 Reinicio	29/05/2024	31/10/2023	14/06/2024

Póliza actualizada x PRORROGA No. 1 del CONTRATO: CLPIH373 de 2023

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGURO DEL ESTADO S.A.	37-44-101041844	Anexo 11 Otro si n1	17/07/2024	Cumplimiento del contrato	31/10/2023	14/02/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	31/10/2023	14/02/2025

133

				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	31/10/2023	14/08/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años, 0 meses y 1 días.	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGURO DEL ESTADO S.A.	37-40-101025972	Anexo 7	17/07/2024	31/10/2023	14/08/2024

Póliza actualizada TRASLADO DE VIGENCIA del CONTRATO: CLPIH373 de 2023

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGURO DEL ESTADO S.A.	37-44-101041844	Anexo 13	17/07/2024	Cumplimiento del contrato	17/11/2023	17/11/2023
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/11/2023	17/11/2023
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2023	17/11/2023
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años, 0 meses y 1 días.	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGURO DEL ESTADO S.A.	37-40-101025972	Anexo 9	28/10/2024	17/11/2023	31/08/2024

Póliza actualizada x PRORROGA No. 2 del CONTRATO: CLPIH373 de 2023

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGURO DEL ESTADO S.A.	37-44-101041844	Anexo 18 Otrosí. No.2	12/06/2025	Cumplimiento del contrato	17/11/2023	27/01/2026
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/11/2023	27/01/2026
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2023	27/07/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años, 0 meses y 1 días.	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)

SEGURO DEL ESTADO S.A.	37-40-101025972	Anexo 13	28/10/2024	17/11/2023	27/07/2025

Póliza Actualizada PRORROGA No. 3						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGURO DEL ESTADO S.A.	37-44-101041844	Anexo 19 Otrosí. No.3	30/10/2025	Cumplimiento del contrato	17/11/2023	12/03/2026
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/11/2023	12/03/2026
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2023	12/09/2029
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años, 0 meses y 1 días.	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGURO DEL ESTADO S.A.	37-40-101025972	Anexo 14	30/10/2025	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES.	17/11/2023	12/09/2025

Póliza Actualizada Terminación						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGURO DEL ESTADO S.A.	37-44-101041844	Anexo 24 Terminación	30/10/2025	Cumplimiento del contrato	17/11/2023	23/06/2026
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/11/2023	23/06/2026
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2023	12/09/2029
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años, 0 meses y 1 días.	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGURO DEL ESTADO S.A.	37-40-101025972	Anexo 15	14/01/2026	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES.	17/11/2023	23/12/2025

18. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

(Describir el contenido del plano)

El proyecto San Roque se ejecutó de manera discontinua en cinco (5) periodos contractuales, comprendidos entre el 17 de noviembre de 2023 y el 23 de diciembre de 2025, de acuerdo con la programación, las condiciones técnicas del proyecto y los eventos externos que incidieron en su desarrollo.

Durante el primer periodo (17 de noviembre – 27 de diciembre de 2023) se ejecutaron actividades correspondientes al capítulo de obras preliminares, tales como localización y replanteo, descapote manual, compactación y excavaciones. El 28 de diciembre de 2023 se suscribió el Acta de Suspensión No. 1, debido a la temporada invernal, dificultades de orden público y la indisponibilidad temporal de materiales por cierre de proveedores.

En el segundo periodo (16 de mayo – 26 de agosto de 2024), posterior al Acta de Reinicio No. 1, se retomaron las actividades de obra, ejecutándose la limpieza del terreno, la construcción de zapatas, vigas y columnas, así como el corte, figurado e instalación del acero de refuerzo. Durante este periodo se realizó la socialización del proyecto con la comunidad, la elaboración del acta de vecindad y la conformación del Comité de Veeduría Ciudadana. Las actividades se desarrollaron con afectaciones parciales por condiciones climáticas. El 3 de julio de 2024 se suscribe el otrosí N° 1. Y el 27 de agosto se suscribe el acta de suspensión N°2.

En el tercer periodo (19 de mayo – 17 de julio de 2025), con la suscripción del reinicio N°2 y Otrosí No. 2, se ejecutaron actividades adicionales derivadas de las mayores y menores cantidades de obra. Se adelantaron nuevamente actividades preliminares, ajustes estructurales, reconstrucción puntual de una columna y la construcción de vigas canal, incluyendo el corte, figurado, instalación del acero y fundición de concreto, presentándose afectaciones logísticas y de acceso al proyecto. El 18 de julio de 2025 se suscribe el acta de suspensión N°3.

Durante el cuarto periodo contractual (6 de octubre – 23 de noviembre de 2025) se ejecutó la construcción de la placa de concreto del polideportivo, alcanzando el 100% de su ejecución, e iniciándose el suministro e instalación de la cubierta autoportante. No obstante, debido a condiciones climáticas adversas y a la alta demanda del material, fue necesaria una nueva suspensión del contrato. El 24 de noviembre de 2025 se suscribe el acta de suspensión N°4.

Finalmente, en el quinto periodo contractual (18 de diciembre – 23 de diciembre de 2025) se realizó el suministro e instalación de la cubierta autoportante, así como las instalaciones eléctricas asociadas, y el capítulo de acabados culminando las actividades previstas en el alcance contractual.

Las cantidades ejecutadas y las actividades desarrolladas durante cada periodo se encuentran debidamente soportadas en las memorias de cantidades, actas, informes y planos aprobados, los cuales hacen parte integral del proceso de interventoría y liquidación del contrato.
A la fecha, el avance de obra incluye las siguientes actividades:


Localización y replanteo
Descapote manual e=0.2 incluye retiro.
Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.
Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.
Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.
Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas
Construcción de vigas de cimentación en concreto de 210 kg/cm2-3000 PSI. Ver diseño.
Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación
Concreto ciclopeo - 2500 PSI (175 KG/CM2) 60% concreto 2500 PSI + 40% piedra media zonga.
Construcción de columnas en concreto de 210 kg/cm2-3000 PSI.
Acero de refuerzo Fy=60.000 PSI columnas.
Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización.

136

Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal
Suministro e instalación de manto zetal viga canal.
Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.
Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.
Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura.
Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.
Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.
Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.
Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.
Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño.
Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.
Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.
Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.
Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"
Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"
Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.
Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.
Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.
Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.
Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.
Suministro e instalación de reflector led de 150 w
Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.
Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.
Transporte de materiales pétreos
A continuación, se anexan los esquemas correspondientes a las actividades anteriormente descritas.


Esquema 1: Localización y replanteo

127

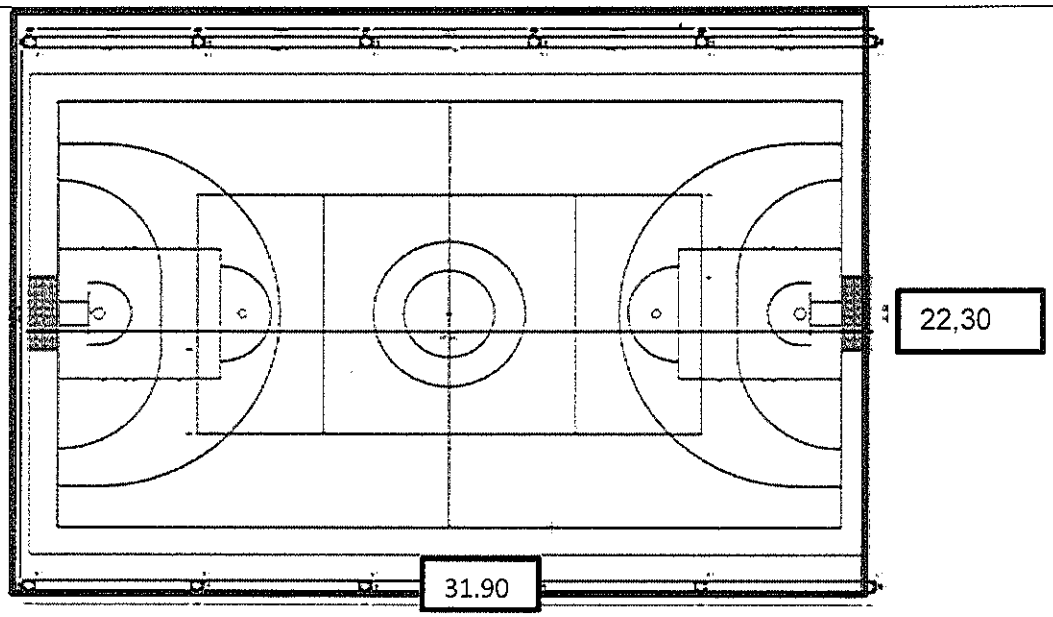


Esquema 1: Se evidencia las medidas tomadas para la localización y replanteo, siendo necesario agregar una mayor longitud debido a que inicialmente no se consideraron las dimensiones de las zapatas; esta cantidad fue ajustada y formalizada mediante el Otrosí Modificatorio N.° 2

squema 2: Descapote Manual

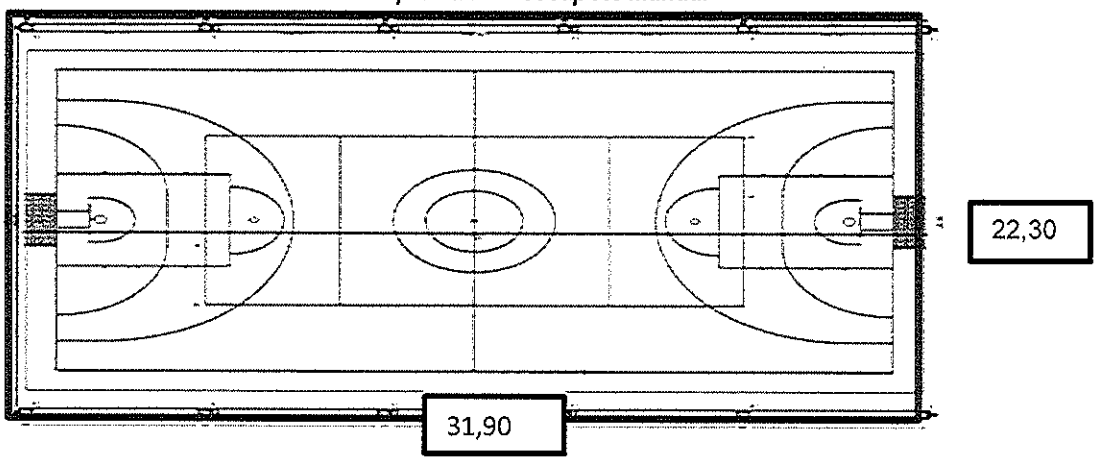


Esquema 2: Se muestra la cantidad a la que se le realizó el descapote manual, cantidad que fue acordada en el Otrosí modificatorio N°2 .

Esquema 3: Excavaciones para la placa

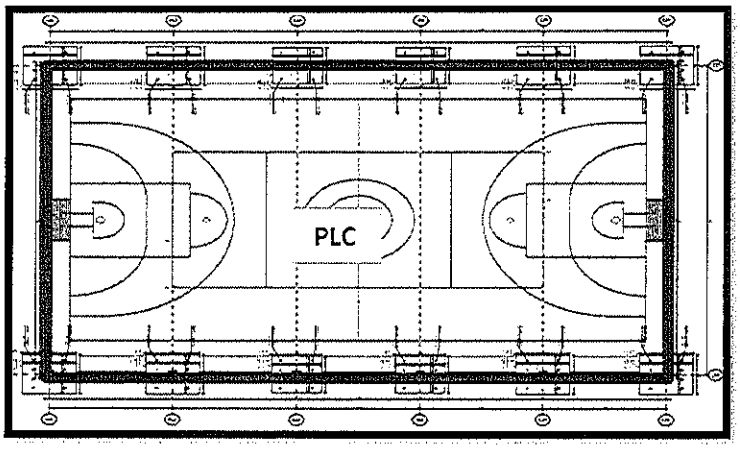


Esquema 3: Área a la que se le realizaron excavaciones: las siglas PLC indican la placa, en esta última se necesitó realizar una excavación adicional, que fue acordada en el Otrosí modificatorio N°2 .

Esquema 4: Rellenos para la placa

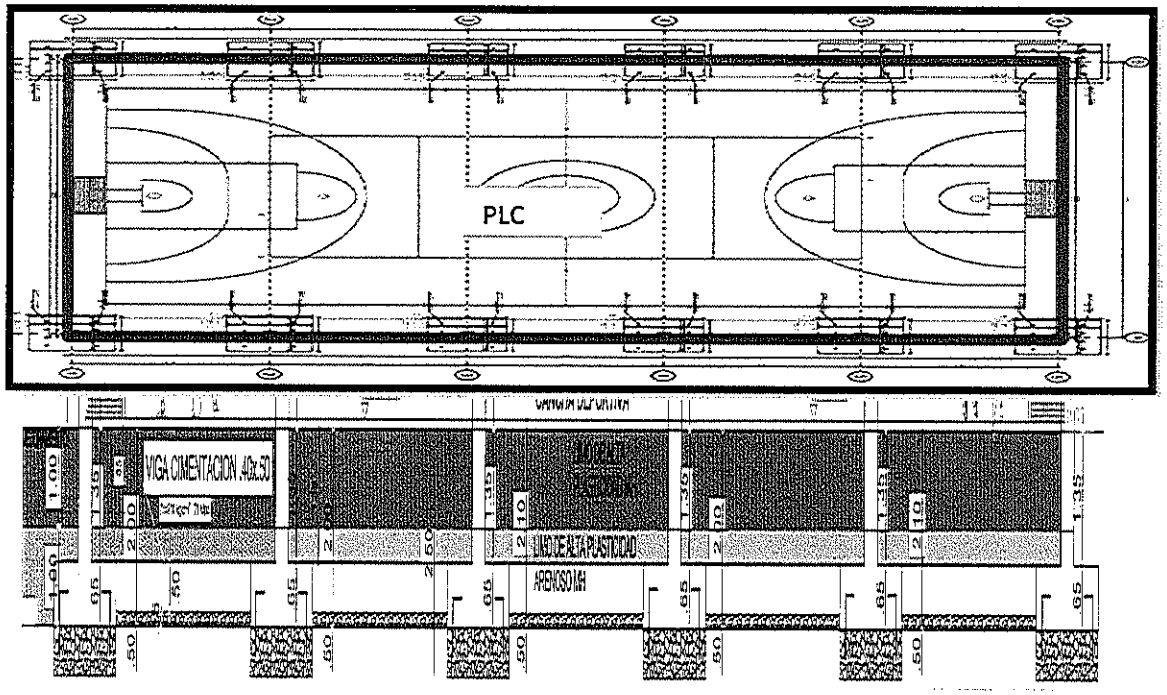


Esquema 4: Área a la que se le realizó el relleno: las siglas PLC indican la placa, en esta última se necesitó realizar un relleno adicional, que fue acordada en el Otrosí modificatorio N°2 .

Esquema 5: Construcción de zapatas de cimentación

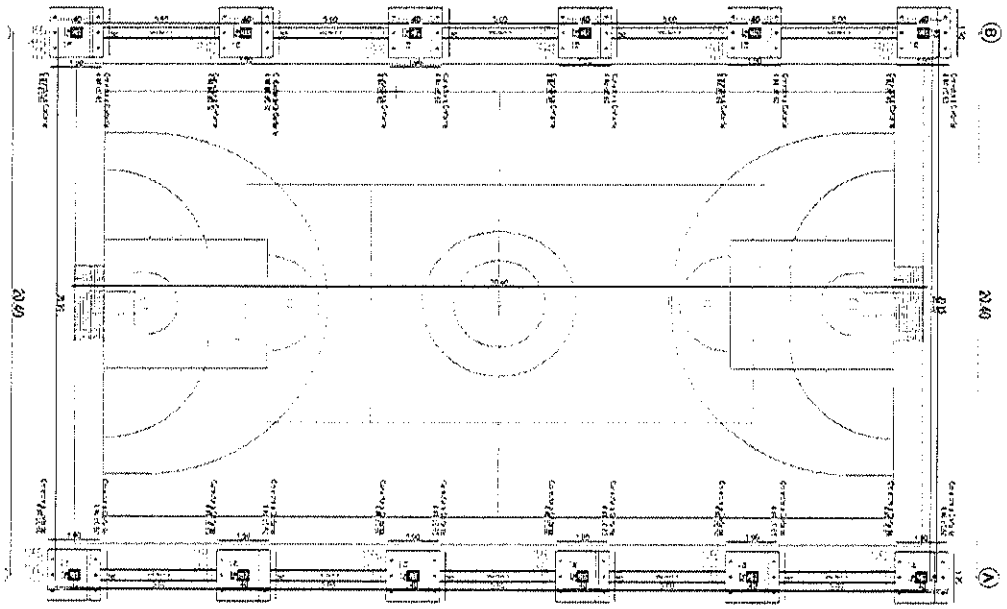

Esquema 5: Se evidencia la construcción de las zapatas de cimentación.


Esquema 6: Construcción de vigas de cimentación

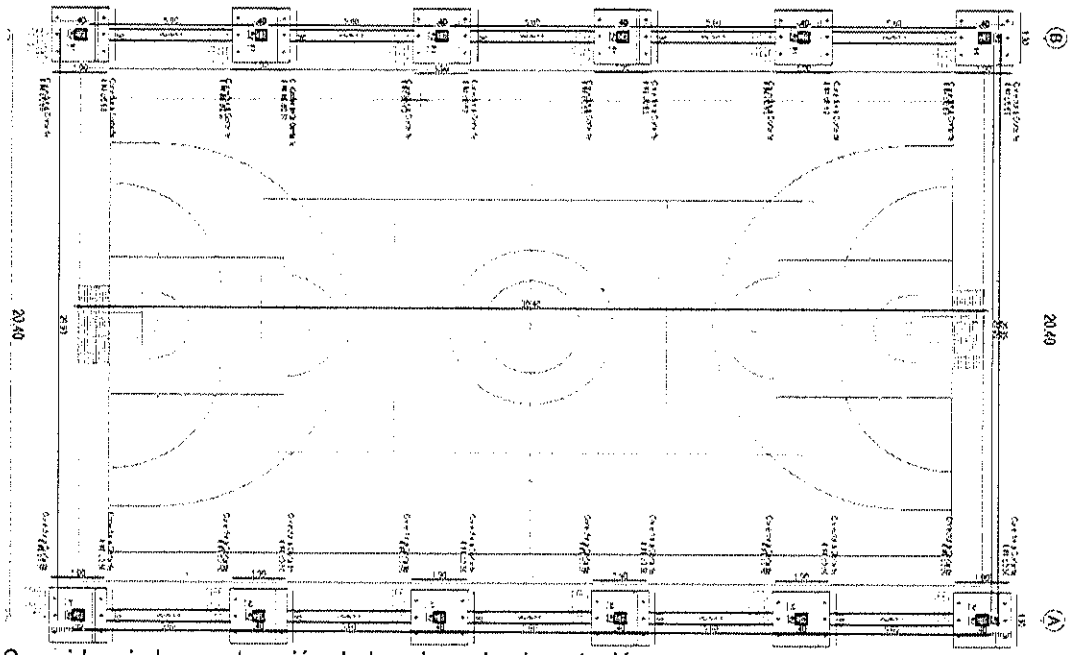

Esquema 6: Se evidencia la construcción de las vigas de cimentación


140

Esquema 7: Construcción de las columnas.

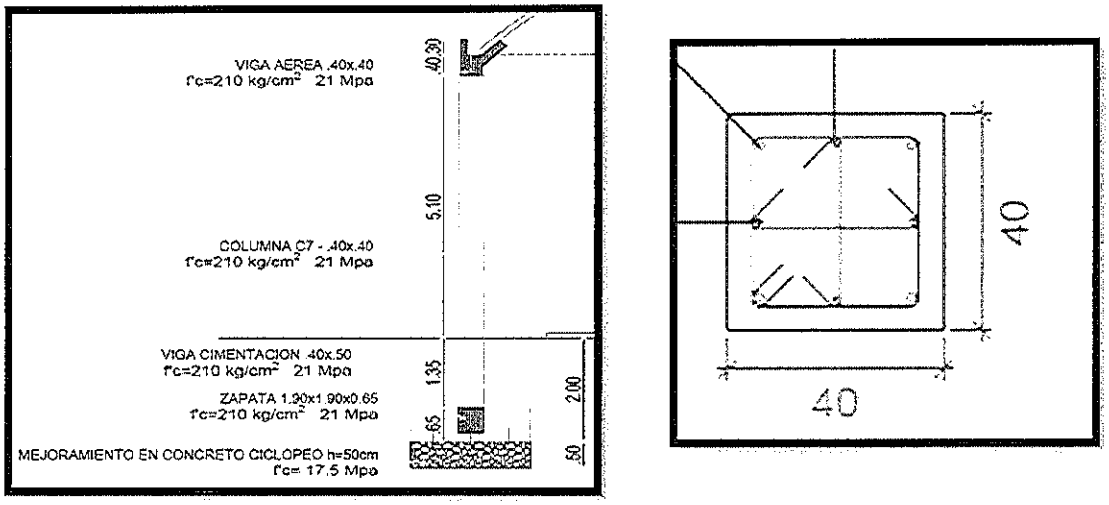


Esquema 7: Se evidencia la construcción de las zapas de cimentación.

Esquema 8: Construcción de viga canal y suministro e instalación de manto zetal viga canal.

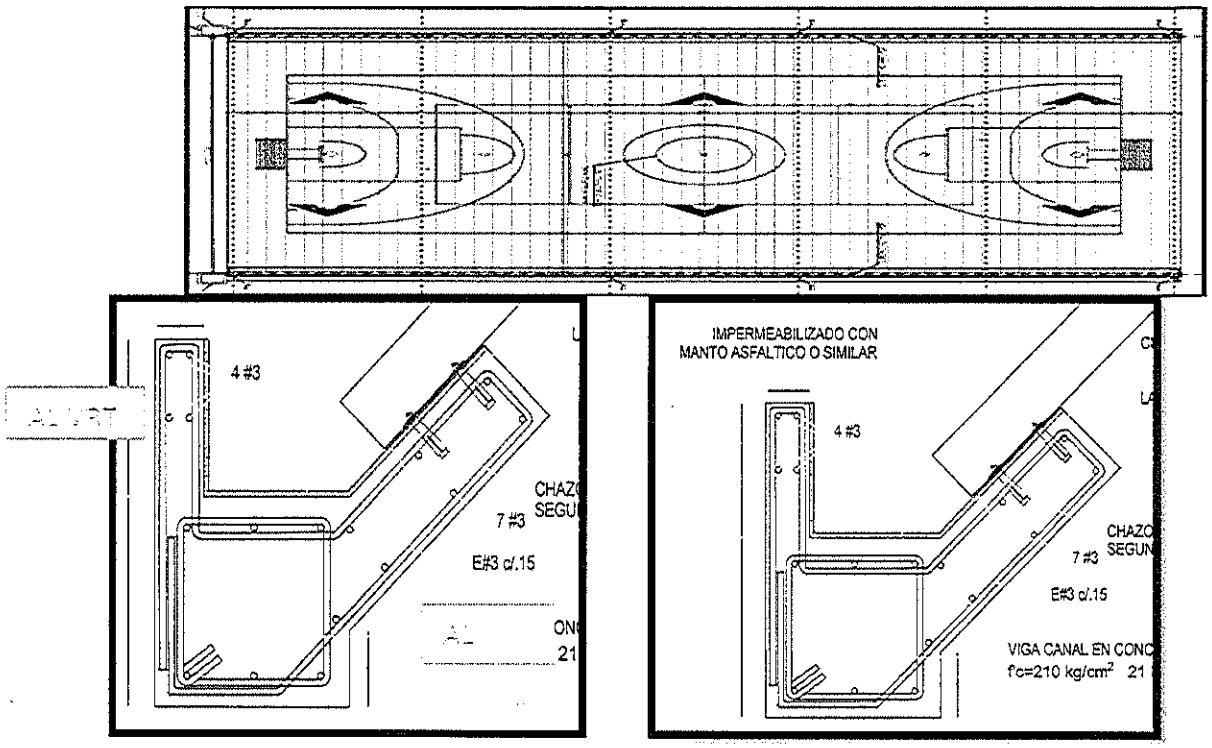

Esquema 8: Se evidencia la ubicación y la sección de la viga canal, conformada con una aleta vertical y una inclinada, así como la instalación del manto zetal para su impermeabilización.


Esquema 9: Demarcación cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.

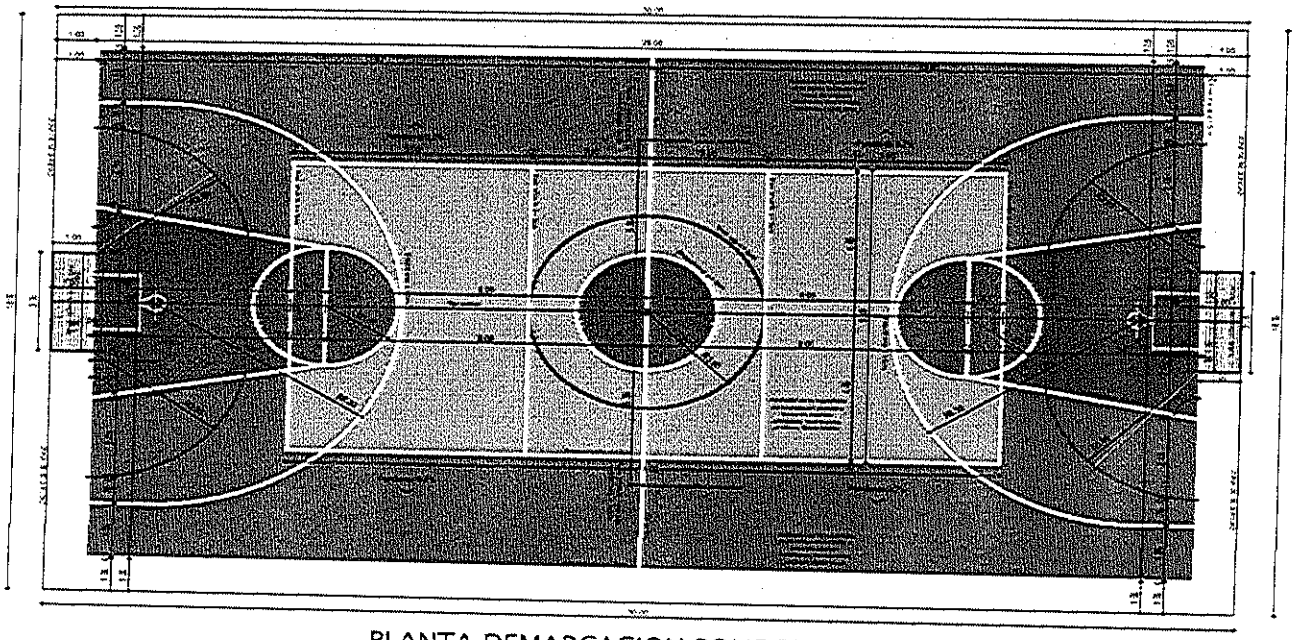

PLANTA DEMARCACION POLIDEPORTIVO

Esquema 9: Se evidencia la ubicación y la sección de la viga canal, conformada con una aleta vertical y una inclinada, así como la instalación del manto zetal para su impermeabilización.


Esquema 10: Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura.

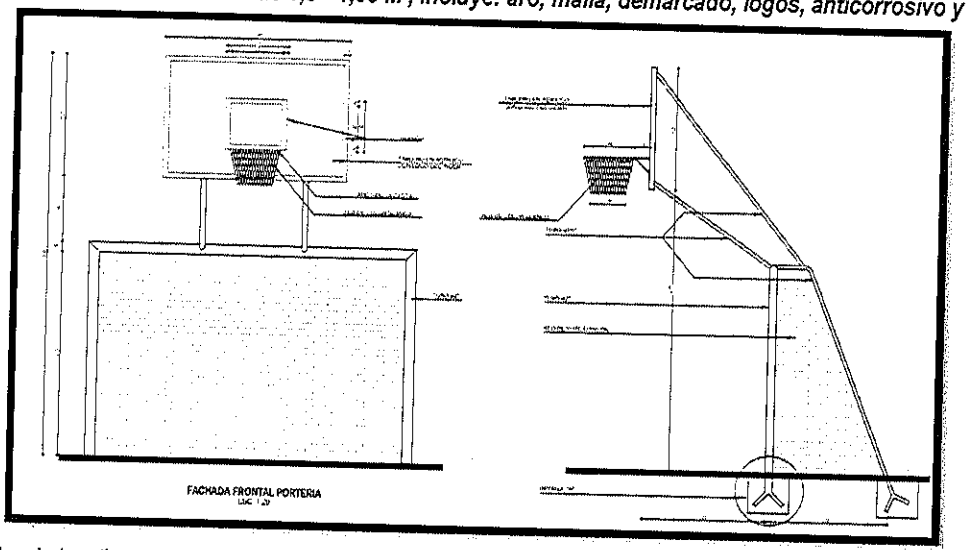

Esquema 10: Se evidencia las dimensiones y el tipo de marcos, tableros y mallas.


142


Esquema 11: Construcción de placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 m.

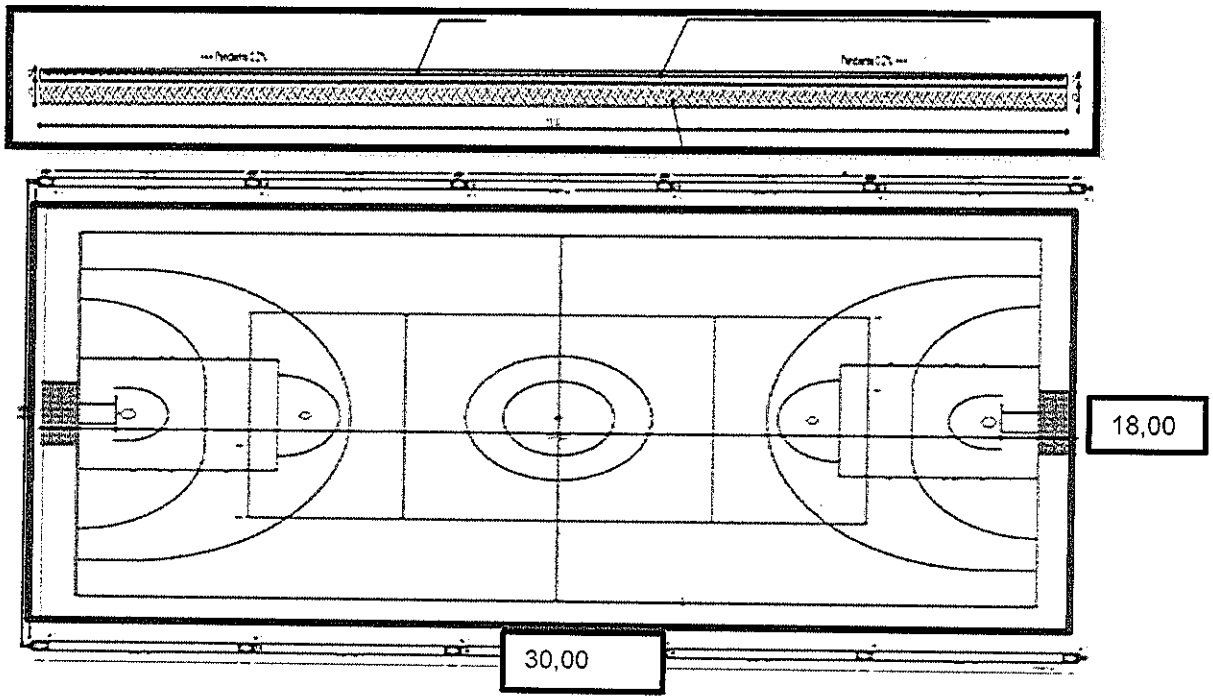

Esquema 11: Se evidencia la ubicación y la sección de la placa de piso en concreto, conformada por un espesor de 10 cm así como de una malla electrosoldada.


Esquema 12: Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.

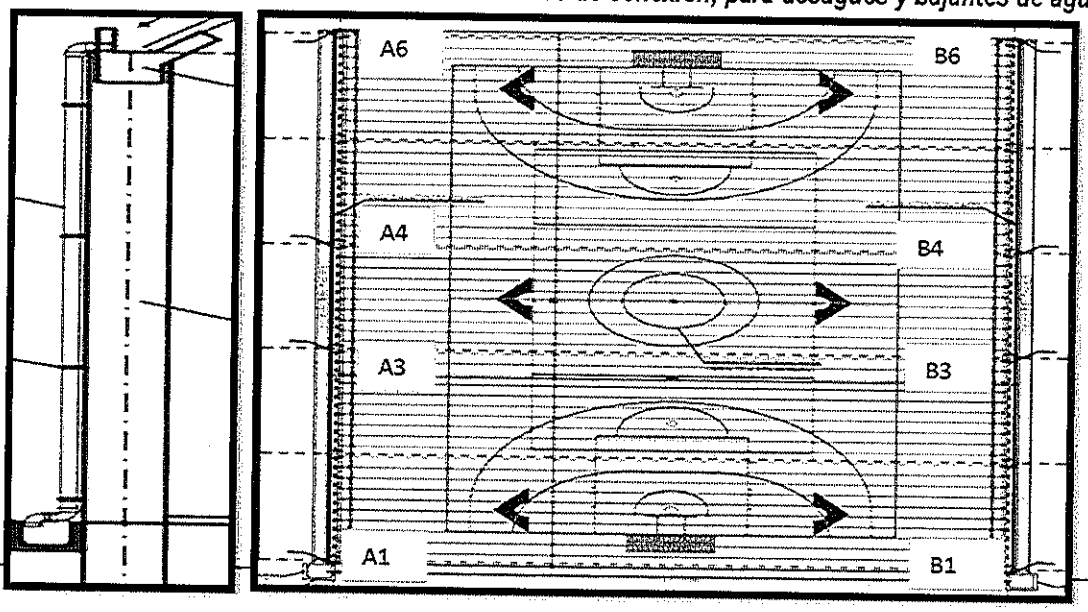

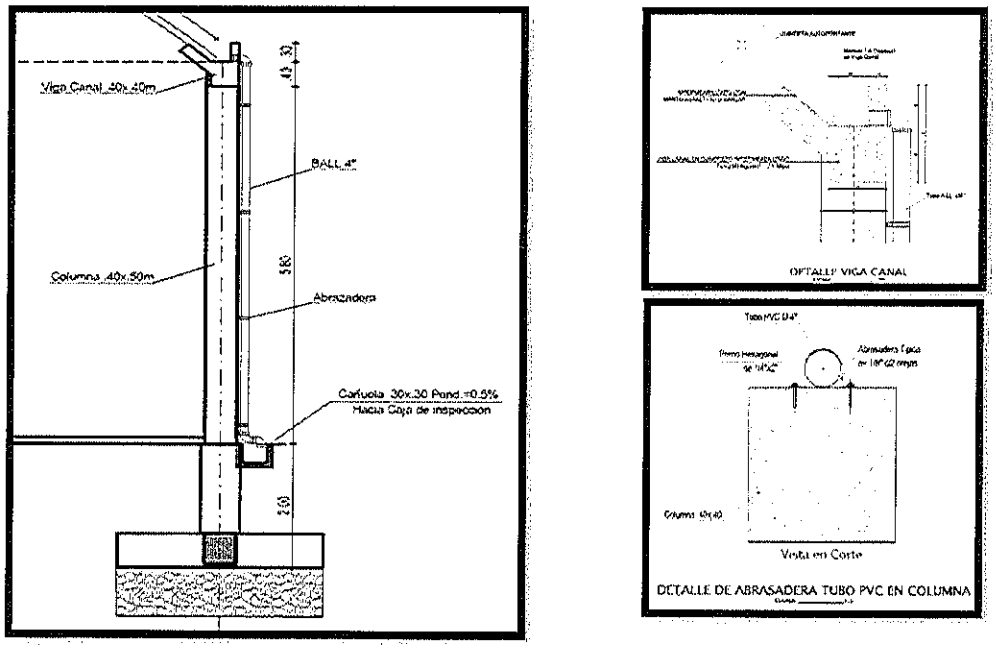


Esquema 12: Se evidencia la ubicación de las bajantes de agua de diámetro 4 pulgadas, con su respectiva vista de detalle lateral y de sección.

Esquema 13: Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagües.

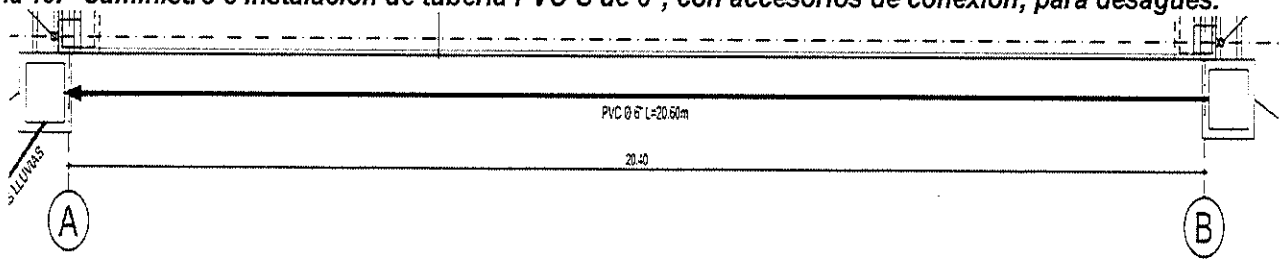



149

Esquema 14: Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.



*Esquema 15: Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño.*

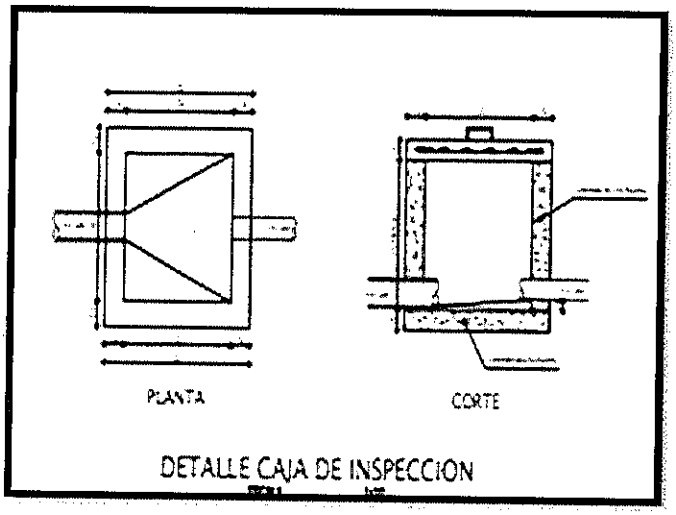


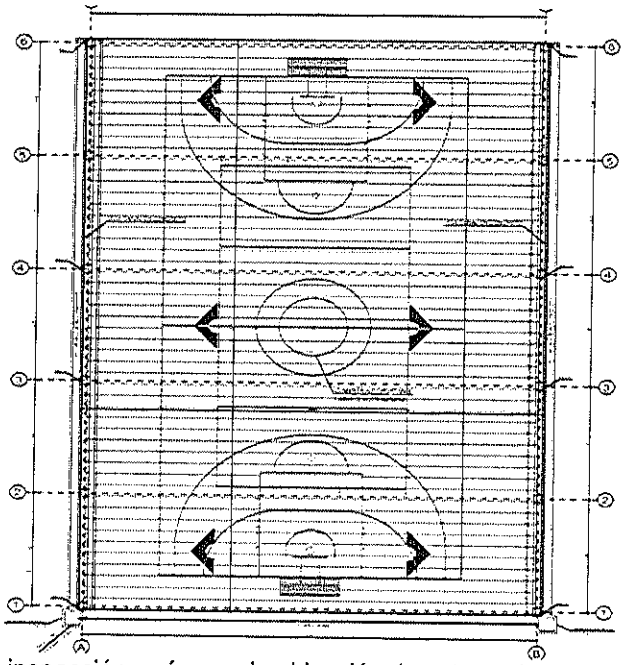


Esquema 15: Se evidencian las dimensiones de las cajas de inspección, así como la ubicación de estas y de las cañuelas.

145


Esquema 16: Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.

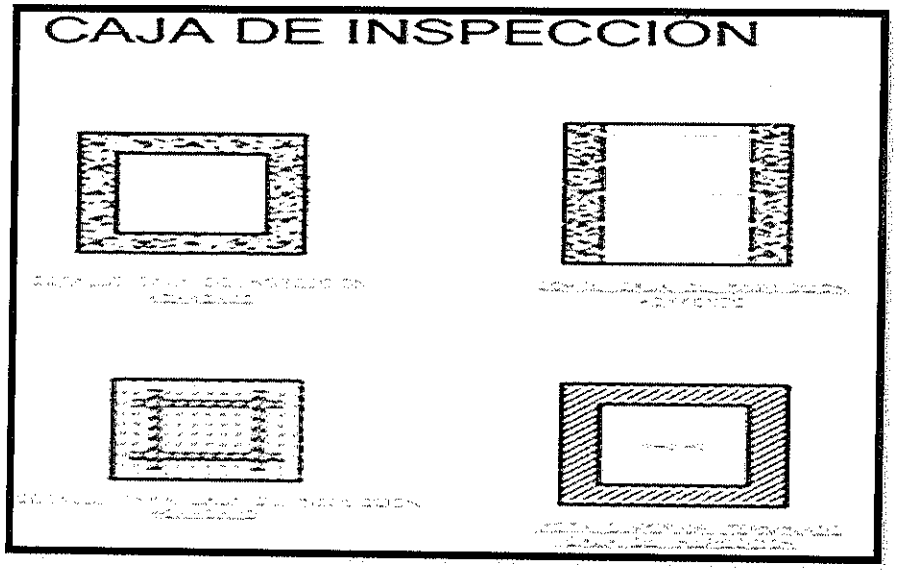


Esquema 17: Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.

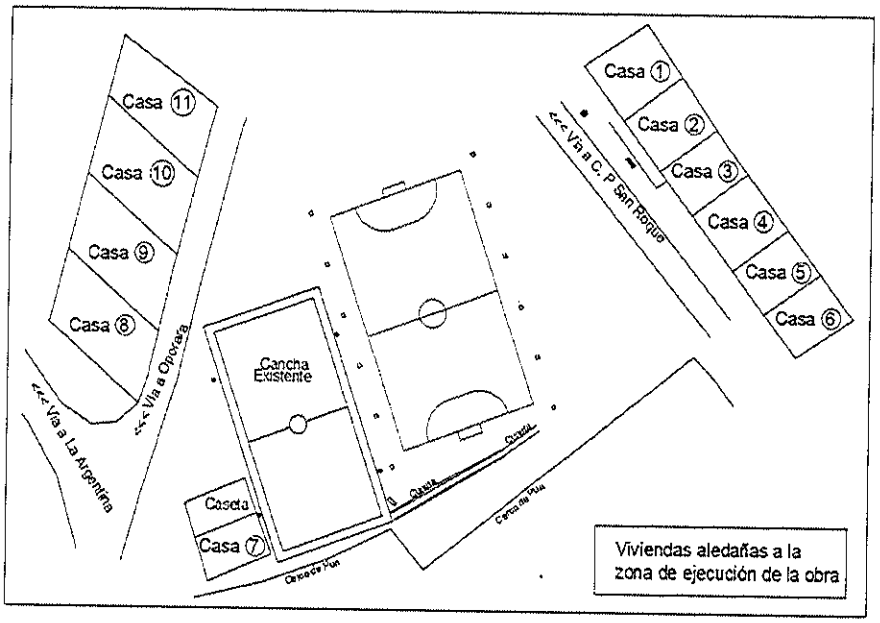


Esquema 18: Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.

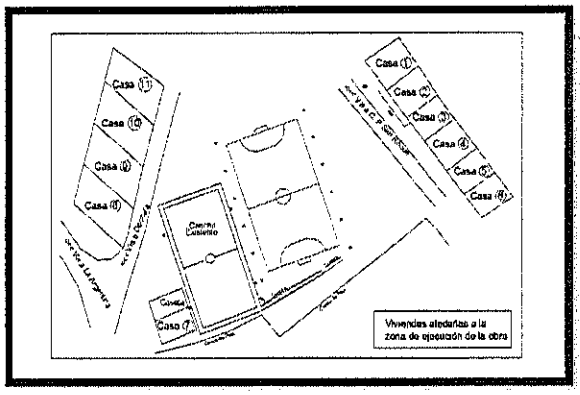


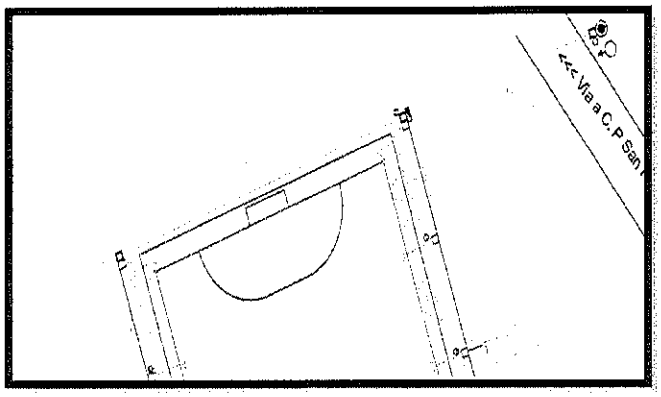


Esquema 19: Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2".

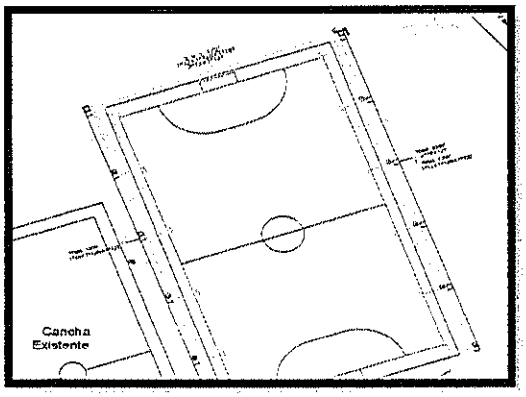


Esquema 20: Transición aérea-subterránea tubería IMC 1".

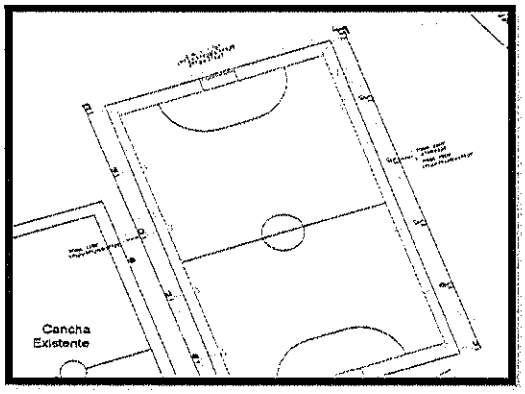


Esquema 21: Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.

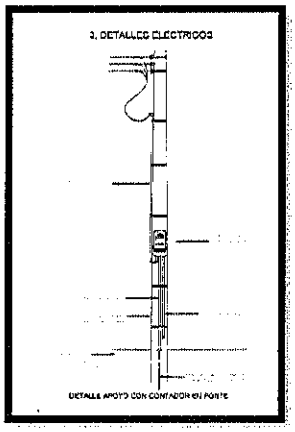


Esquema 22: Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.

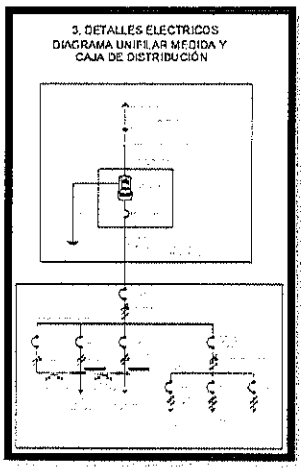


Esquema 23:Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.

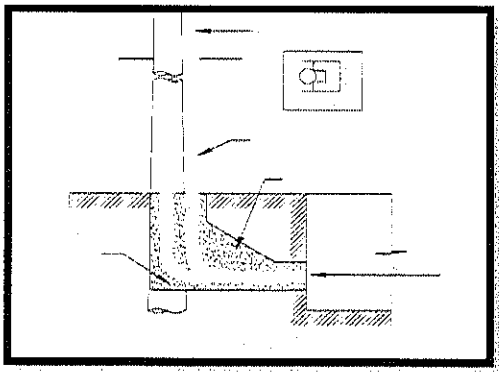


Esquema 24: Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.

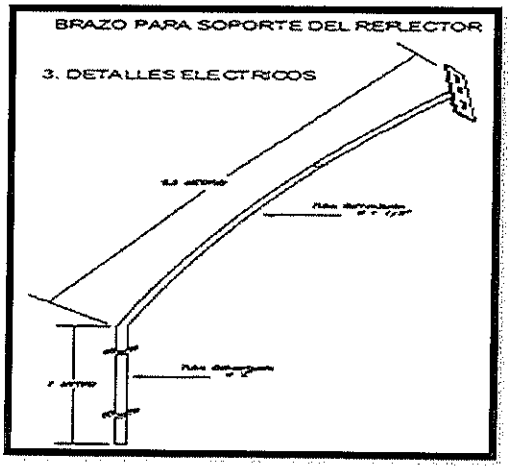

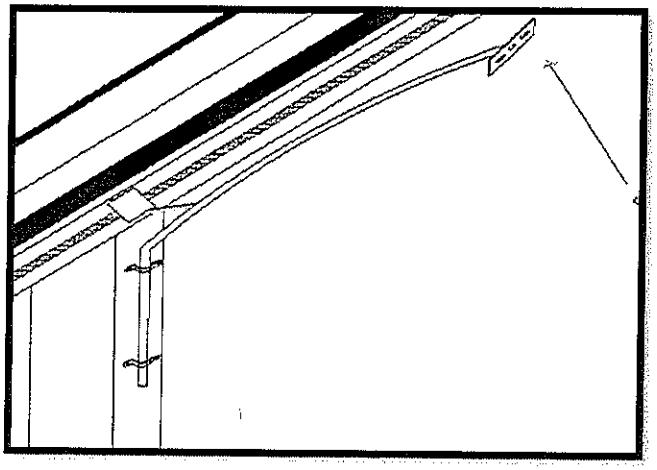


Esquema 25: Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.

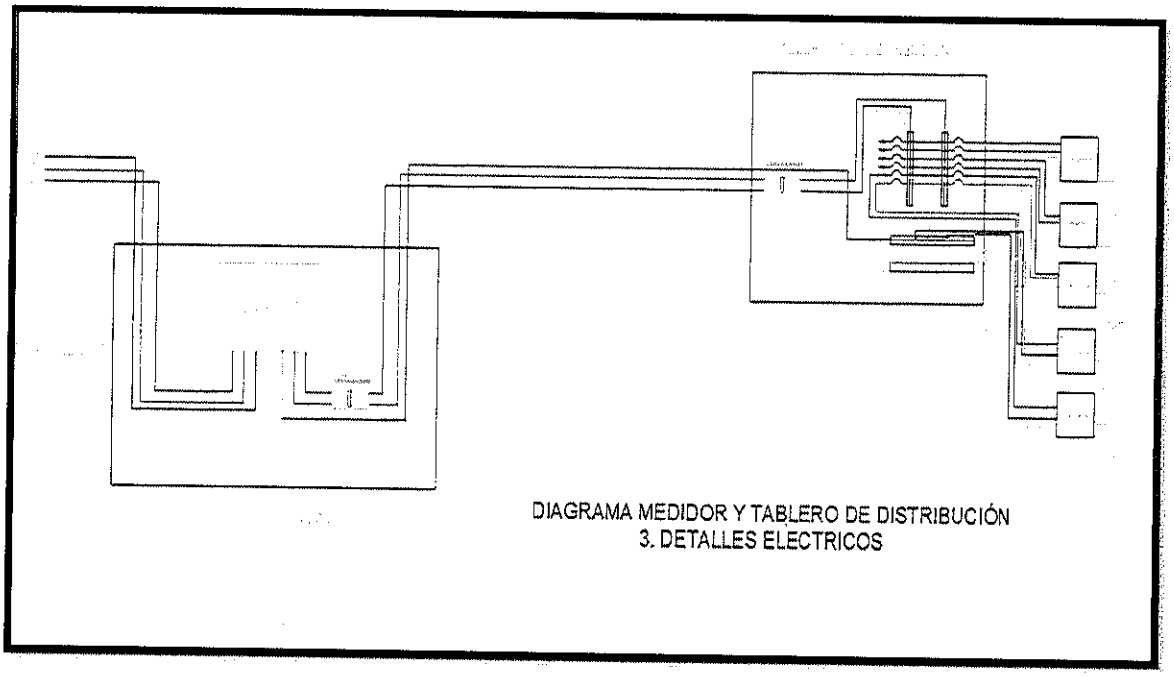


149

Esquema 26: Suministro e instalación de reflector led de 150 w.

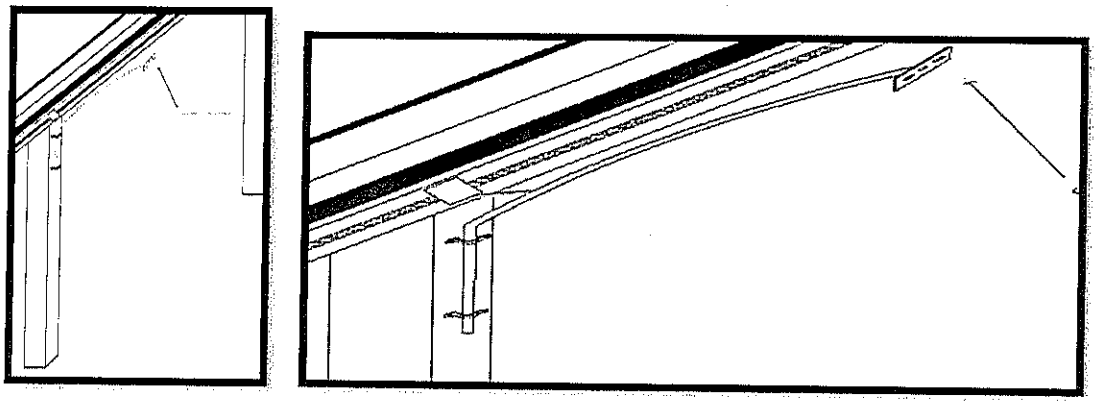

Esquema 27: Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.

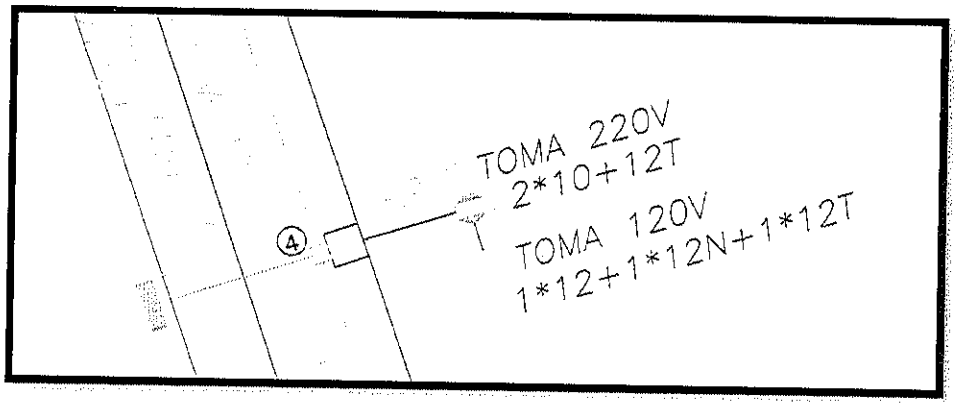

19. SEGUIMIENTO AL AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE LA OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS						EJECUCIÓN DE OBRA		
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR/UNITARIO	VR/TOTAL	CANT ACUM	VR/TOTAL ACUM	%EJECUCIÓN ACUM
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
1.01	Localización y replanteo.	M2	711,37	$ 3.552,00	$ 2.526.786,00	711,34	$ 2.526.680,00	100,00%
1.02	Descapote manual e=.20m incluye retiro	M2	711,37	$ 16.972,00	$ 12.073.372,00	711,37	$ 12.073.372,00	100,00%
1.03	Desmonte marcos canchas existentes.	UND	0,00	$ 116.516,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
1.04	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	436,75	$ 45.921,00	$ 20.055.997,00	436,72	$ 20.054.619,00	100,00%
1.05	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	452,29	$ 83.700,00	$ 37.856.673,00	452,27	$ 37.854.999,00	100,00%
	SUB-TOTAL CAPITULO						**$ 72.509.670,00**	
2	CIMENTACIÓN							
2.01	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	0,00	$ 33.952,00	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00%
2.02	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	28,158	$ 617.961,00	$ 17.400.546,00	28,158	$ 17.400.546,00	100,00%
2.03	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	1904,00	$ 7.104,00	$ 13.526.016,00	1904,00	$ 13.526.016,00	100,00%
2.04	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	8,20	$ 740.720,00	$ 6.073.904,00	8,20	$ 6.073.904,00	100,00%
2.05	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación	KG	1262,00	$ 7.104,00	$ 8.965.248,00	1262,00	$ 8.965.248,00	100,00%

2.06	Concreto ciclopeo - 2500 PSI (175 KG/CM2) 60% concreto 2500 PSI + 40% piedra media zonga.	M3	25,35	$ 359.363,00	$ 9.109.852,00	25,35	$ 9.109.852,00	100,00%
	SUB-TOTAL CAPITULO						**$ 55.075.566,00**	
3	ESTRUCTURAS DE CONCRETO							
3.01	Construcción de columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	KG	12,40	$ 919.189,00	$ 11.397.944,00	12,40	$ 11.397.944,00	100,00%
3.02	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	2954,95	$ 7.104,00	$ 20.991.965,00	2954,95	$ 20.991.964,00	100,00%
3.03	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización.	M3	16,91	$ 1.003.086,00	$ 16.962.184,00	16,91	$ 16.962.184,00	100,00%
3.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	2044,67	$ 7.104,00	$ 14.525.336,00	2044,67	$ 14.525.336,00	100,00%
3.05	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	60,80	$ 40.276,00	$ 2.448.781,00	60,80	$ 2.448.781,00	0,00%
	SUB-TOTAL CAPITULO						**$ 66.326.209,00**	
4	CUBIERTA							
4.01	Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	684,30	$ 211.182,00	$ 144.511.843,00	684,30	$ 144.511.843,00	100,00%
	SUB-TOTAL CAPITULO						**$ 144.511.843,00**	
5	ACABADOS - PLACA EN CONCRETO							

5.01	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	ML	307,11	$ 14.772,00	$ 4.536.629,00	307,11	$ 4.536.629,00	100,00%
5.02	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero de 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura	UND	2,00	$ 3.704.163,00	$ 7.408.326,00	2,00	$ 7.408.326,00	100,00%
5.03	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	M2	540,00	$ 84.584,00	$ 45.675.360,00	540,00	$ 45.675.360,00	100,00%
	SUB-TOTAL CAPITULO						**$ 57.620.315,00**	
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS							
6.01	Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.	ML	46,40	$ 80.003,00	$ 3.712.139,00	46,40	$ 3.712.139,00	100,00%
6.02	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.	ML	20,60	$ 106.901,00	$ 2.202.161,00	20,60	$ 2.202.161,00	100,00%
6.03	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	ML	12,00	$ 218.663,00	$ 2.623.956,00	12,00	$ 2.623.956,00	100,00%
6.04	Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño	UND	2,00	$ 349.366,00	$ 698.732,00	2,00	$ 698.732,00	100,00%
	SUB-TOTAL CAPITULO						**$ 9.236.988,00**	
7	INSTALACIONES ELECTRICAS							

7.01	Caja de inspeccion en concreto de F'c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño	UND	3,00	$ 637.765,00	$ 1.913.295,00	3,00	$ 1.913.295,00	100,00%
7.02	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.	M3	5,28	$ 45.921,00	$ 242.463,00	5,28	$ 242.463,00	100,00%
7.03	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	ML	33,00	$ 49.254,00	$ 1.625.382,00	33,00	$ 1.625.382,00	100,00%
7.04	Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.	UND	3,00	$ 303.961,00	$ 911.883,00	3,00	$ 911.883,00	100,00%
7.05	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	UND	2,00	$ 281.774,00	$ 563.548,00	2,00	$ 563.548,00	100,00%
7.06	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	UND	1,00	$ 1.015.016,00	$ 1.015.016,00	1,00	$ 1.015.016,00	100,00%
7.07	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.	UND	1,00	$ 4.692.840,00	$ 4.692.840,00	1,00	$ 4.692.840,00	100,00%
7.08	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	ML	21,00	$ 88.378,00	$ 1.855.938,00	21,00	$ 1.855.938,00	100,00%
7.09	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.	UND	10,00	$ 368.312,00	$ 3.683.120,00	10,00	$ 3.683.120,00	100,00%
7.10	Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	ML	58,8820673098675	$ 58.050,00	$ 3.418.104,00	58,86	$ 3.416.823,00	99,96%

7.11	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	UND	10,00	$ 1.016.975,00	$ 10.169.750,00	10,00	$ 10.169.750,00	100,00%
7.12	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	1,00	$ 973.278,00	$ 973.278,00	1,00	$ 973.278,00	100,00%
7.13	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	$ 1.033.524,00	$ 1.033.524,00	1,00	$ 1.033.524,00	100,00%
	SUB-TOTAL CAPITULO						**$ 32.096.860,00**	
8	TRANSPORTE							
8.01	Transporte de materiales	M3-Km	27777,87	$ 1.099,00	$ 30.527.879,00	27776,73	$ 30.526.626,00	100,00%
	SUB-TOTAL CAPITULO						**$ 30.526.626,00**	
AVANCE DE OBRA ACUMULADO							$ 193.379.775,00	41,33%
AVANCE DE OBRA ACUMULADO - ACTA FINAL							$ 467.904.077,00	100,00%

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Ing. **YOHAN FERNANDO SALAZAR BAENA**
DIRECTOR DE OBRA


Ing. **EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCÓN**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

155

20. REGISTRO FOTOGRAFICO



20/11/2023- 29/11/2023: Instalación de la valla del proyecto.

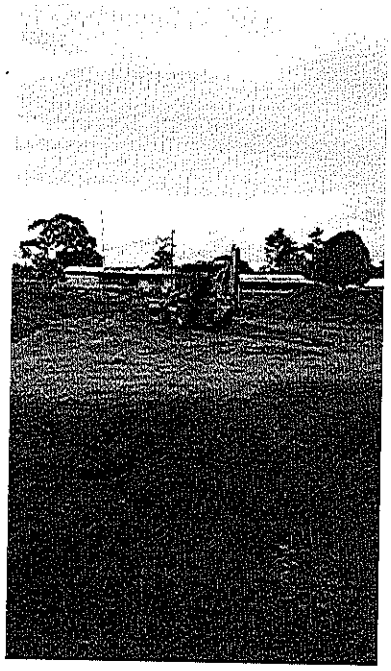




28/11/2023-8/12/2023: Localización, replanteo, descapote y aplicación de recebo.




9/12/2023-29/12/2023: Excavaciones para cimentaciones.

19/05/2024- 24/05/2024: Aplicación de concreto ciclópeo.

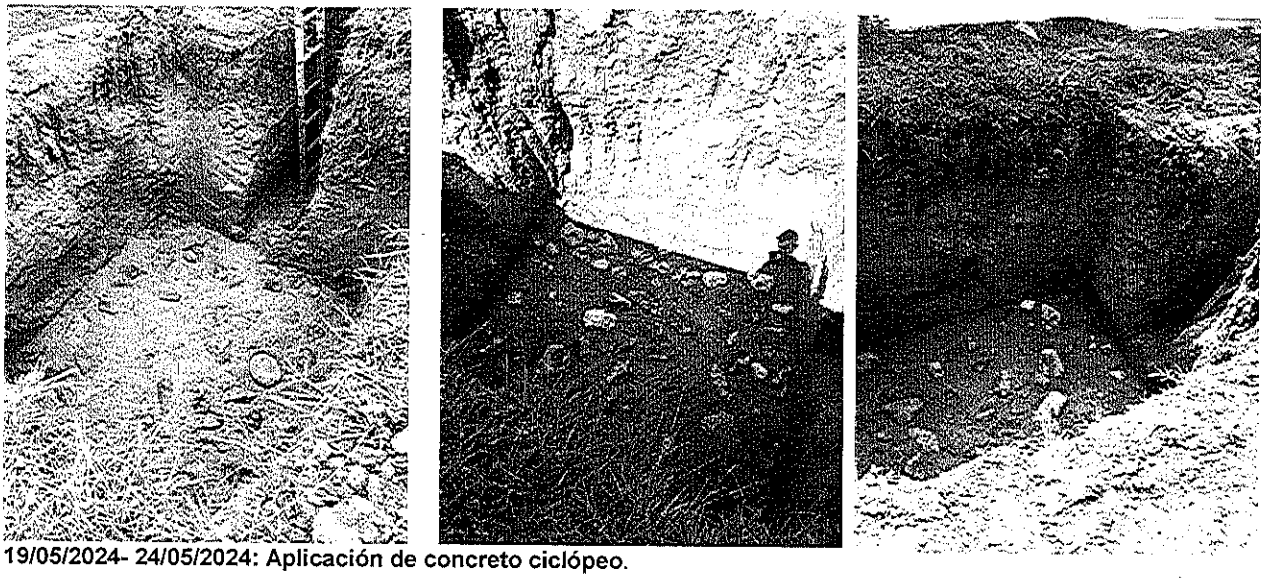

19/05/2024- 24/05/2024: Aplicación de concreto ciclópeo.

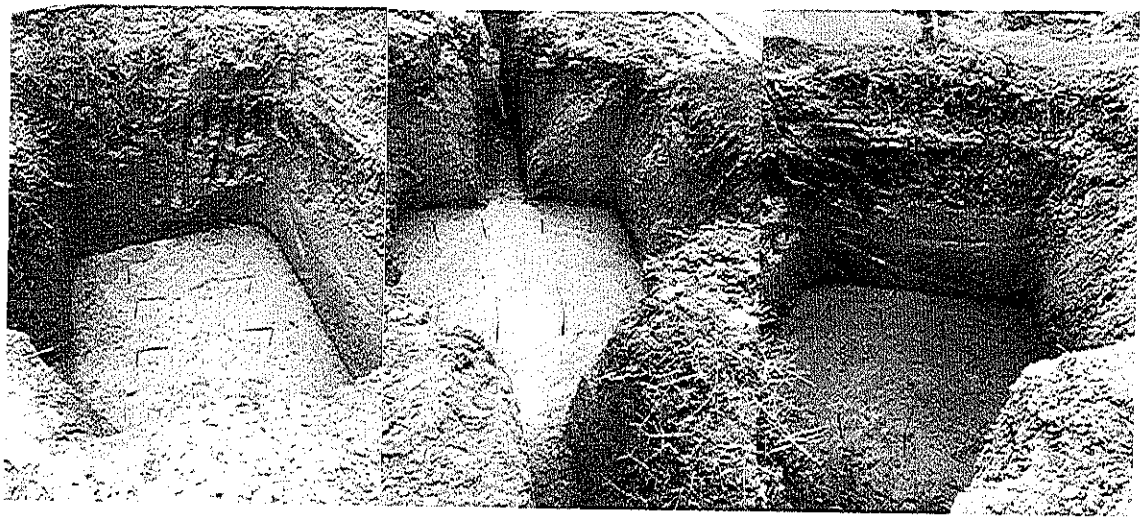


30/05/2024 – 9/06/2024: Construcción de zapatas y vigas.



14/06/2024 -20/07/2024: acero de refuerzo de las columnas.

158

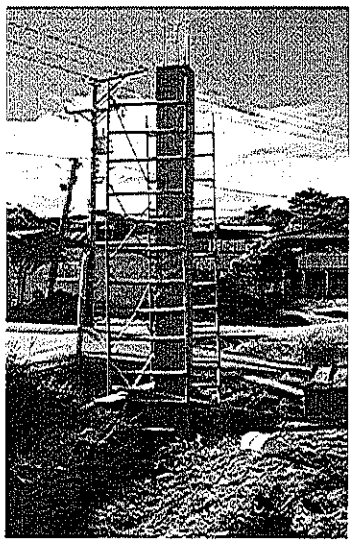


17/06/2024 -28/07/2024: Construcción de columnas.

Con la aprobación del otrosí N°2 se aprobaron nuevas cantidades.


Localización, replanteo, descapote y aplicación de recebo: 21/05/2025-31/05/2025






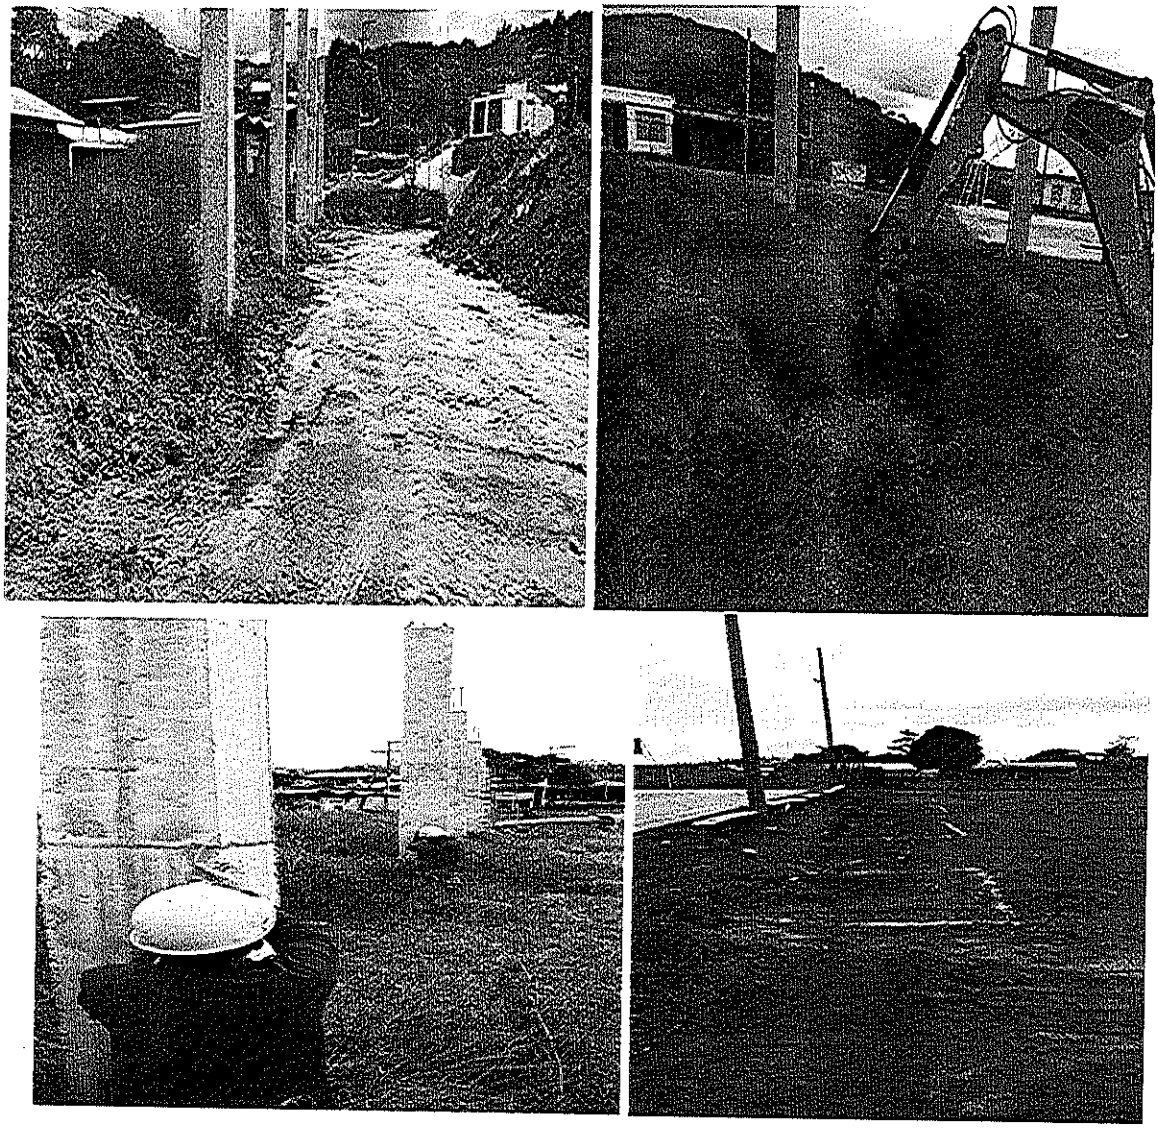


Demolición de columna: 27/05/2025-31/05/2025

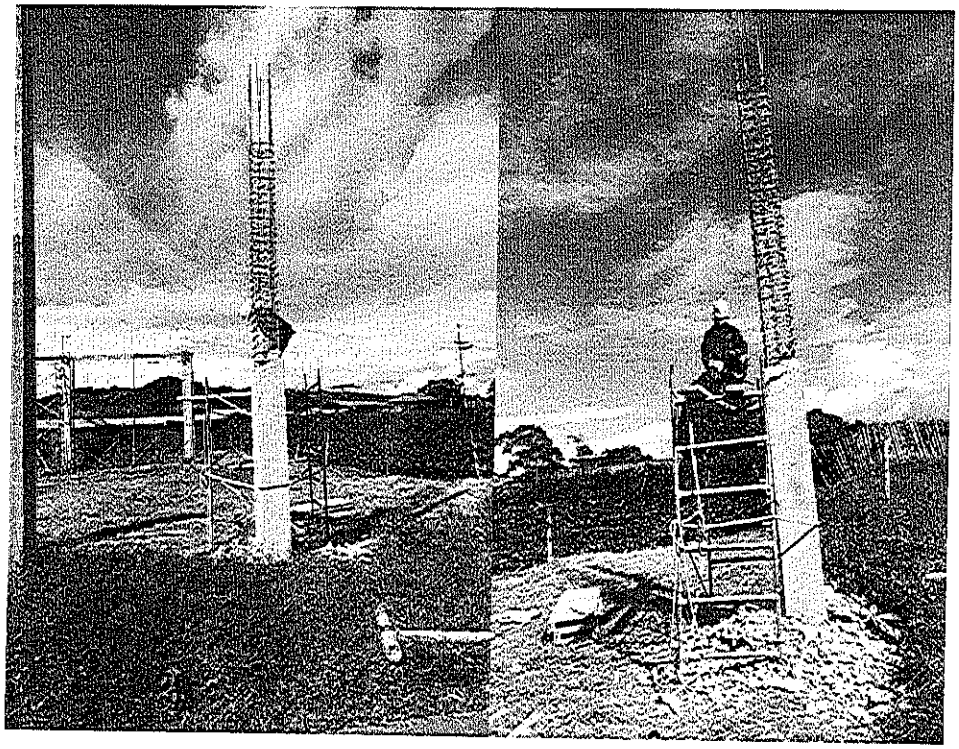



Instalación del acero de refuerzo para viga canal, junto con su respectivo corte y figurado: 24/05/2025- 30/06/2025

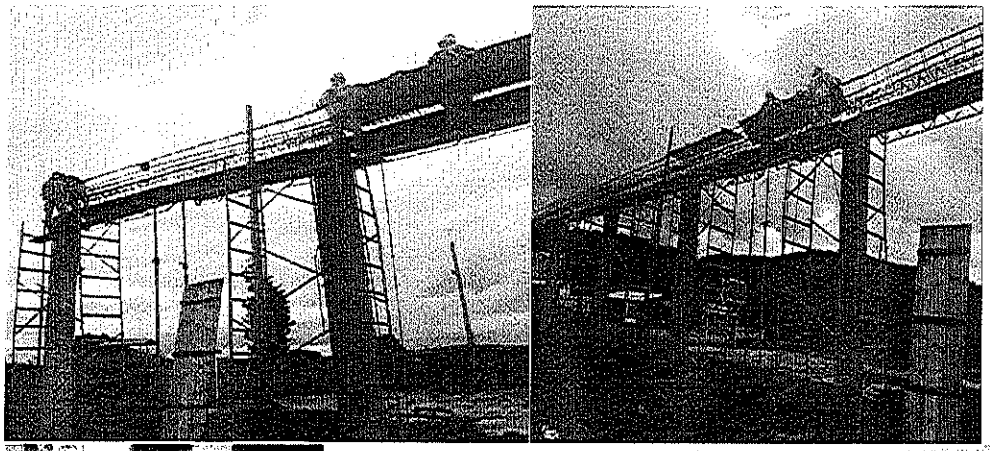


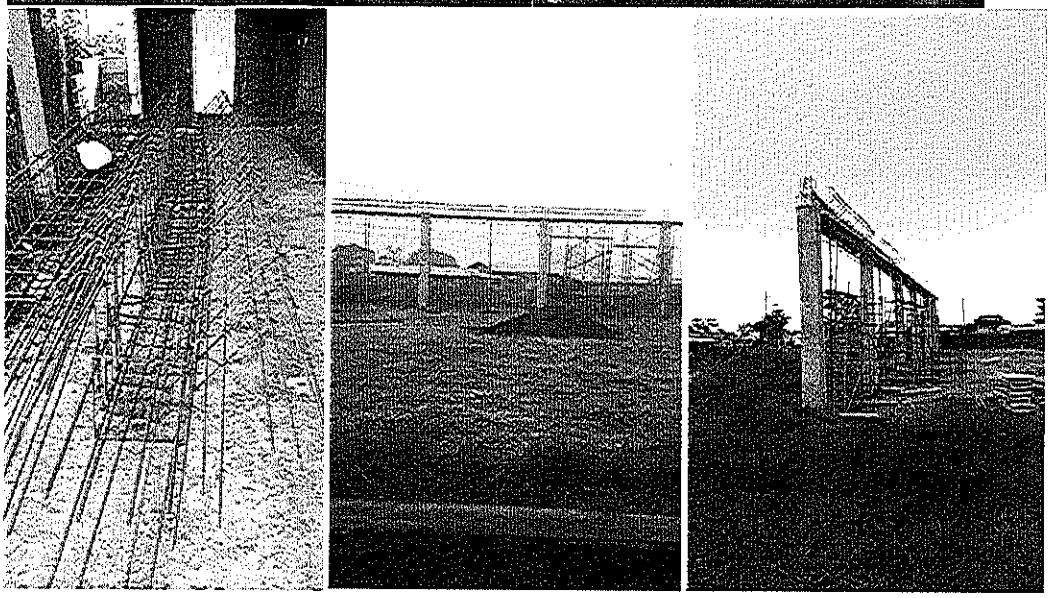


Colocación de formaletas y camillas para vigas canal: 07/06/2025 19/6/2025

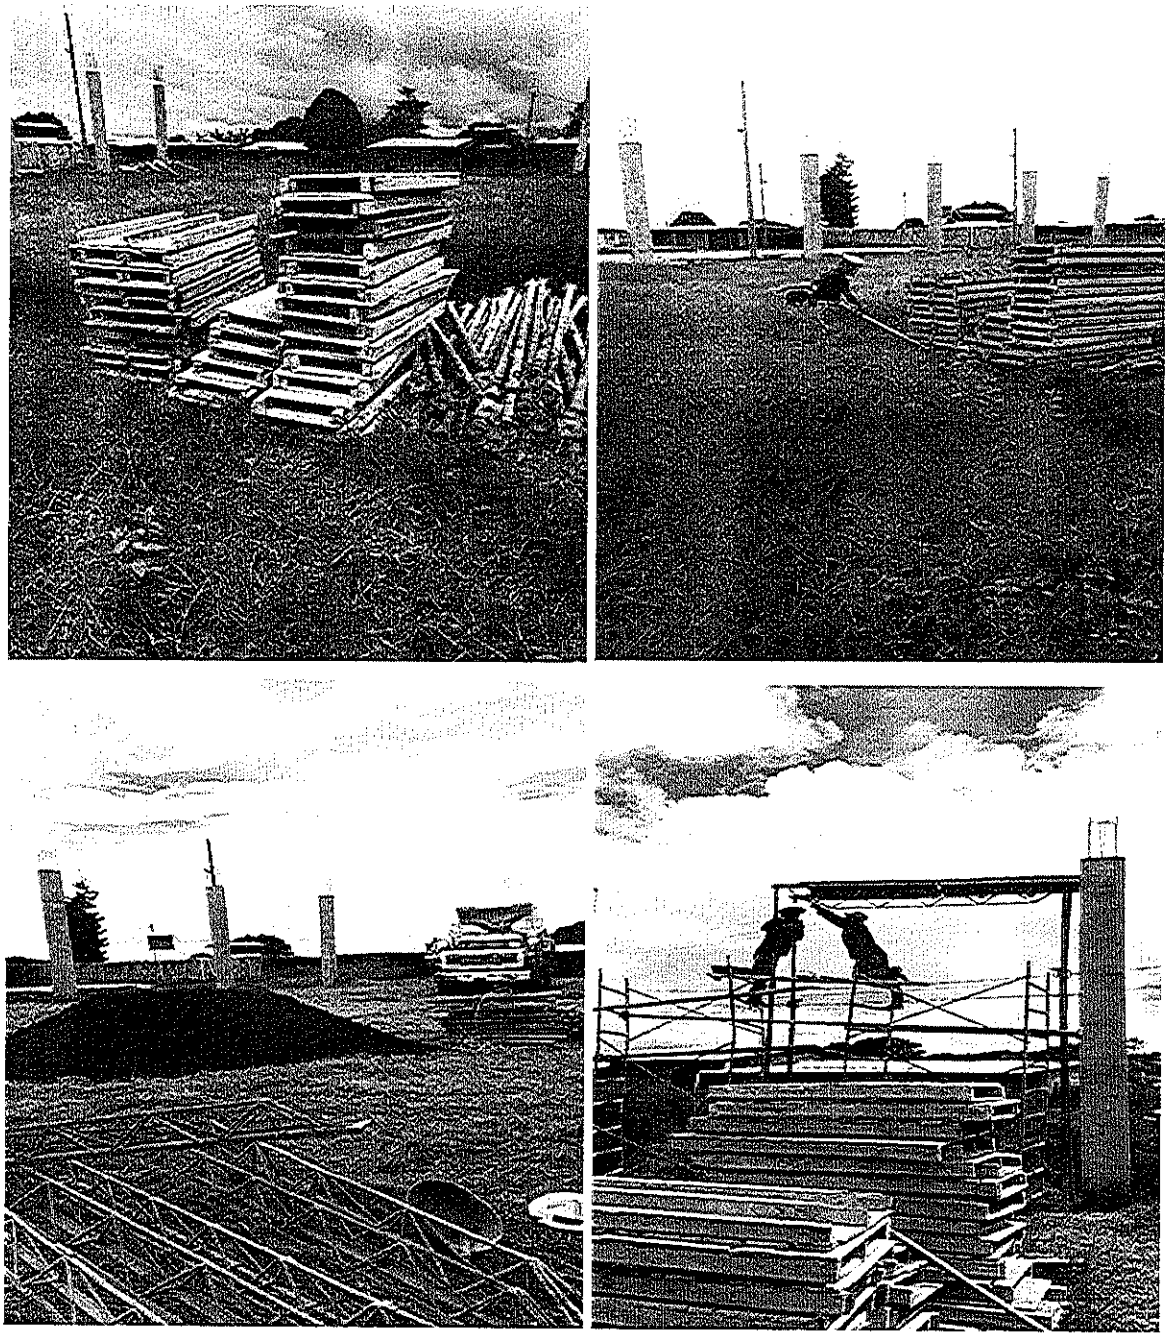

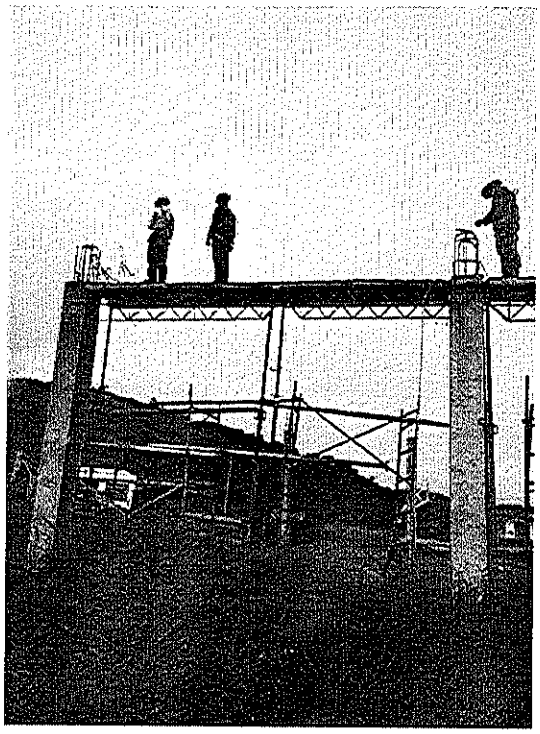


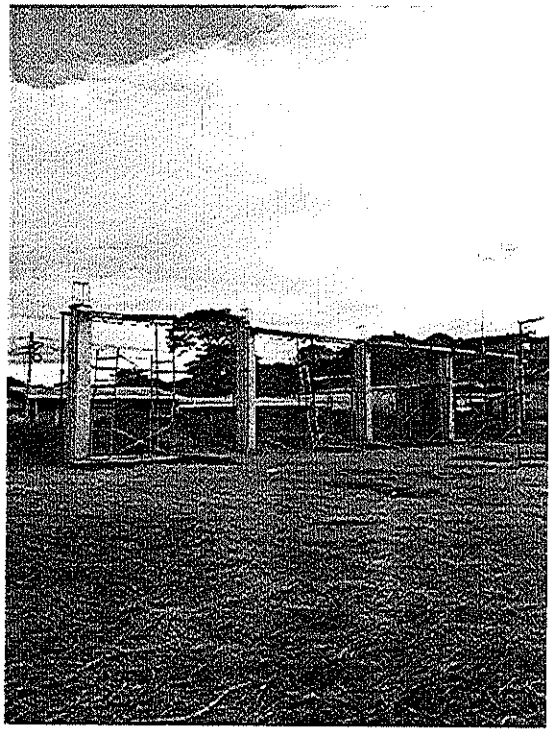

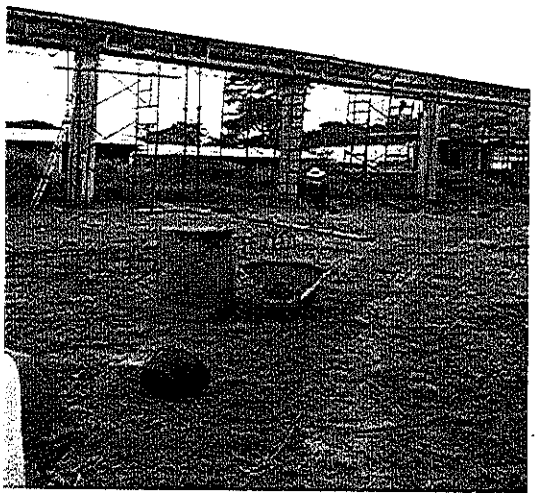





Fundición de la viga canal: 21/06/2025 – 03/07/2025

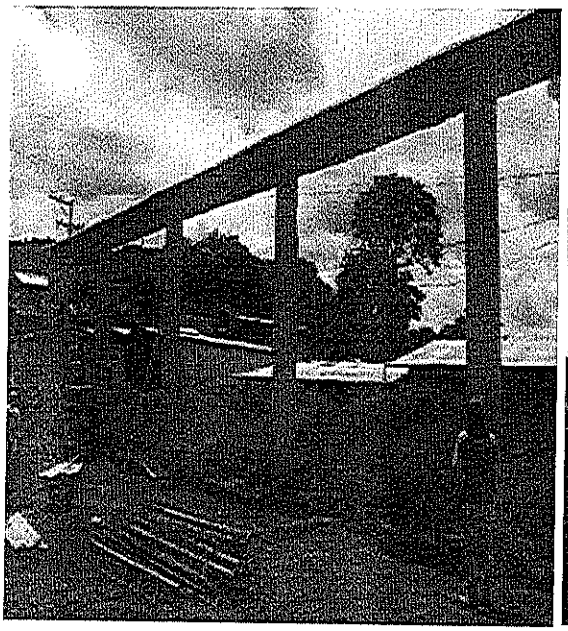




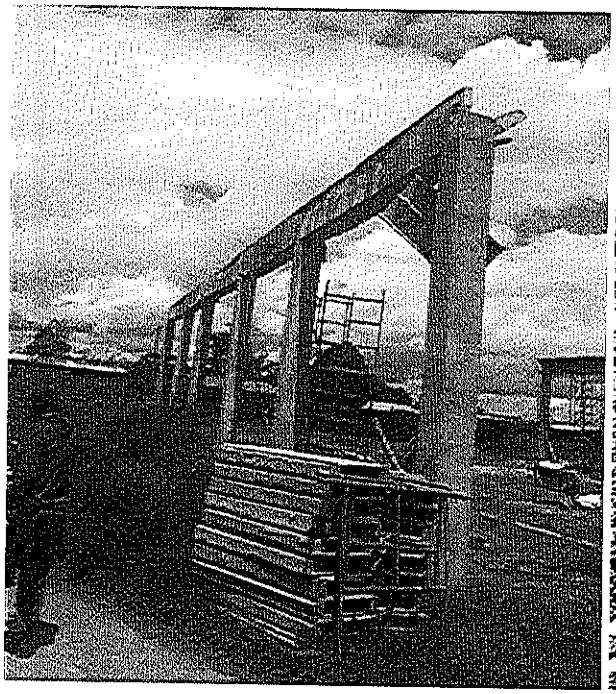


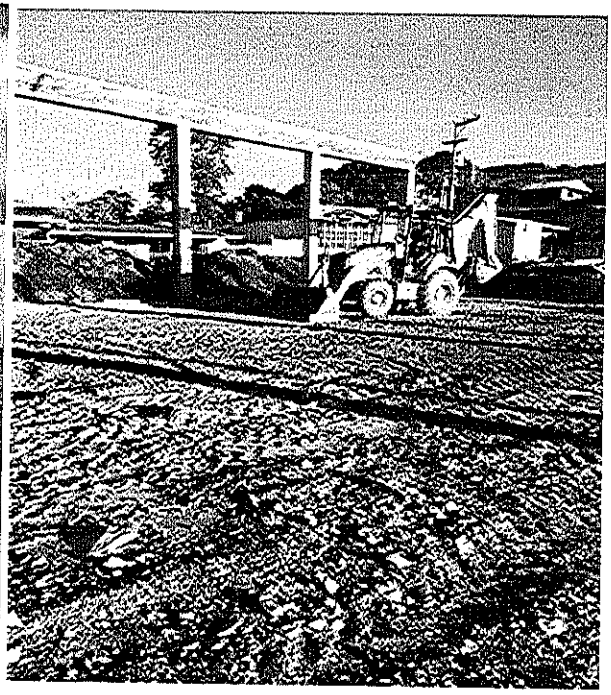


165

Suministro e instalación de manto zetal viga canal. 17/10/2025 – 31/10/2025

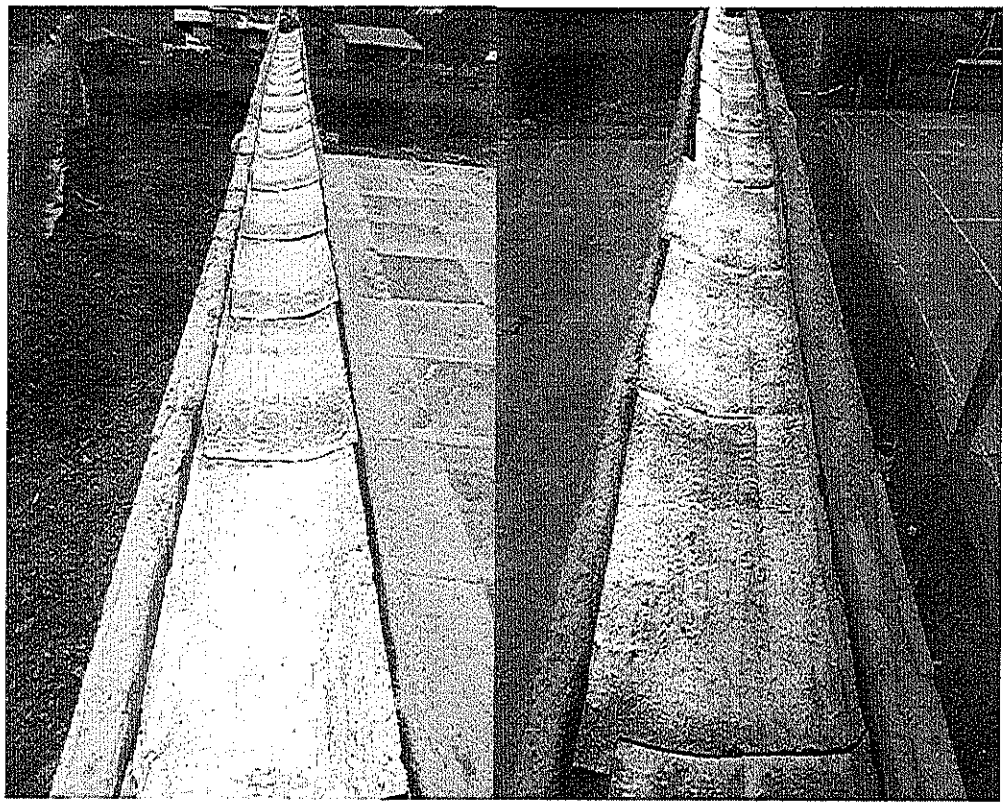

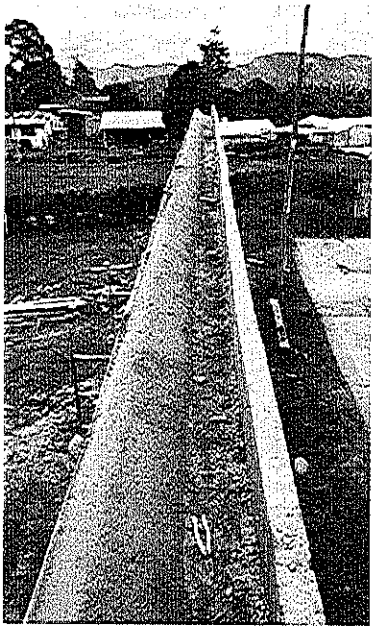

Construcción de placa en concreto del polideportivo con espesor de 10 cm. 6/10/2025-13/11/2025

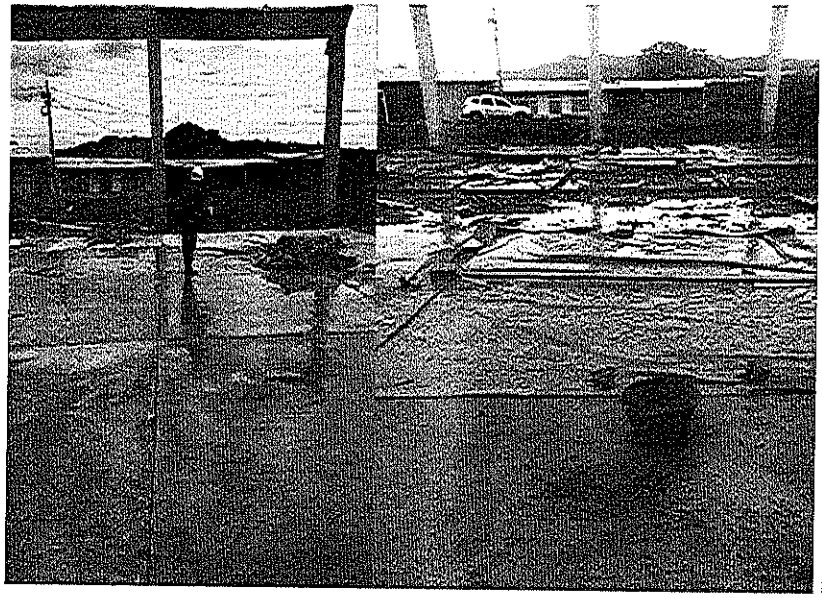










Construcción de cañuelas. 30/10/2025 – 13/11/2025

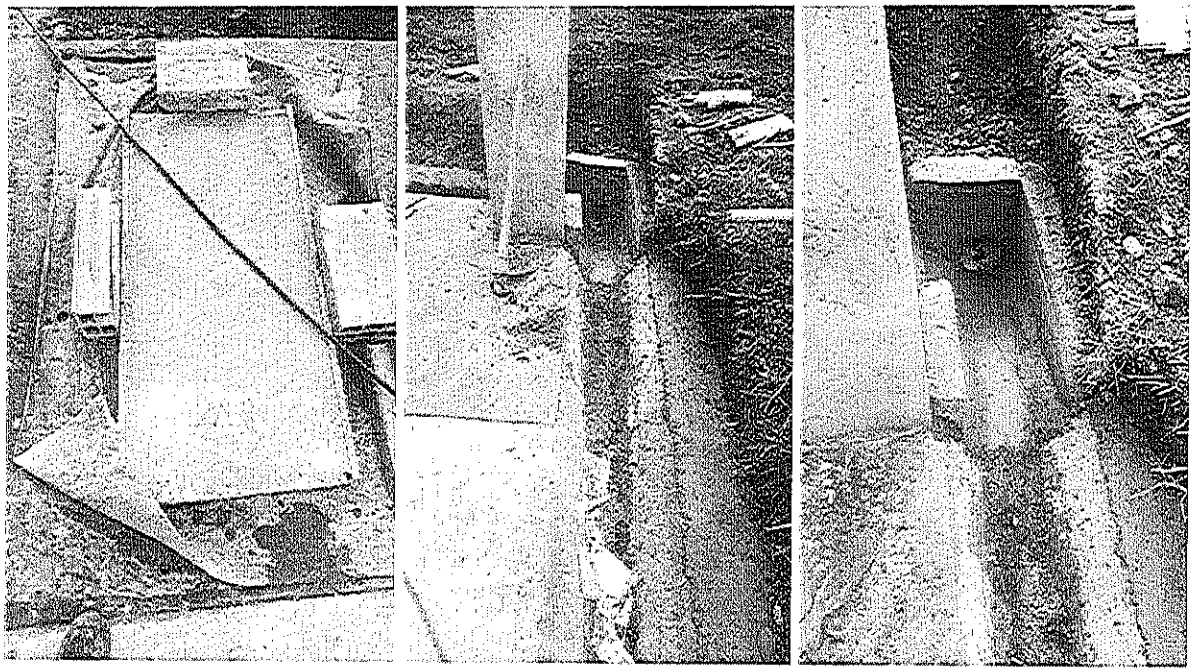


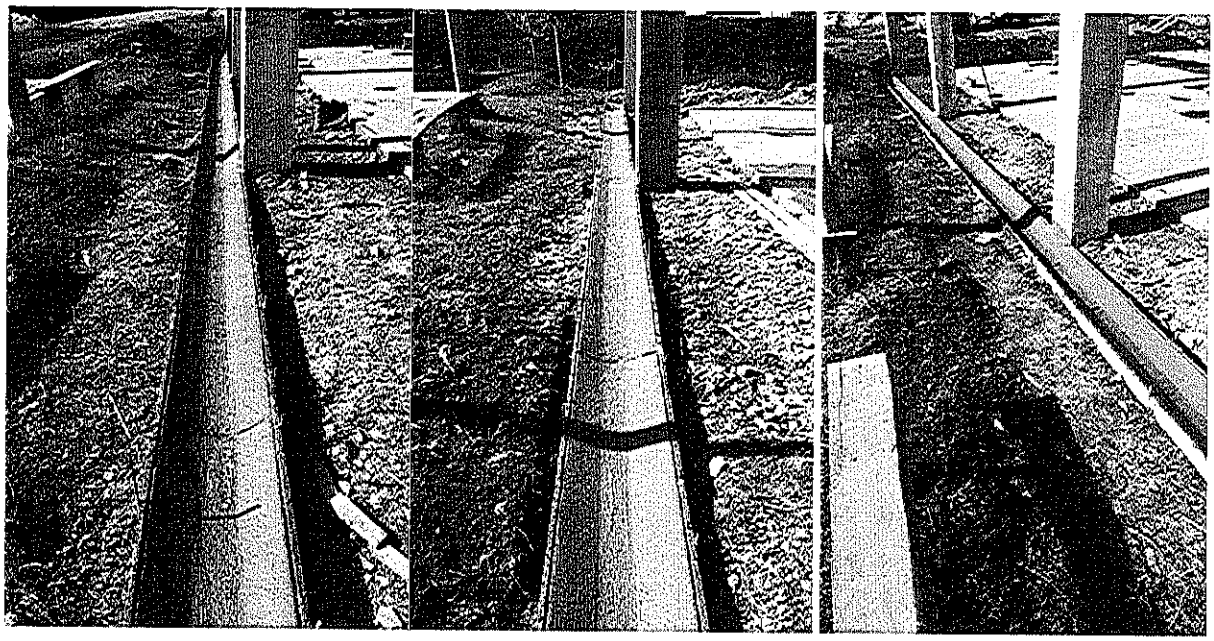


Instalación de bajantes de agua en pvc de diámetro 4 pulgadas: 4/11/2025 – 13/11/2025

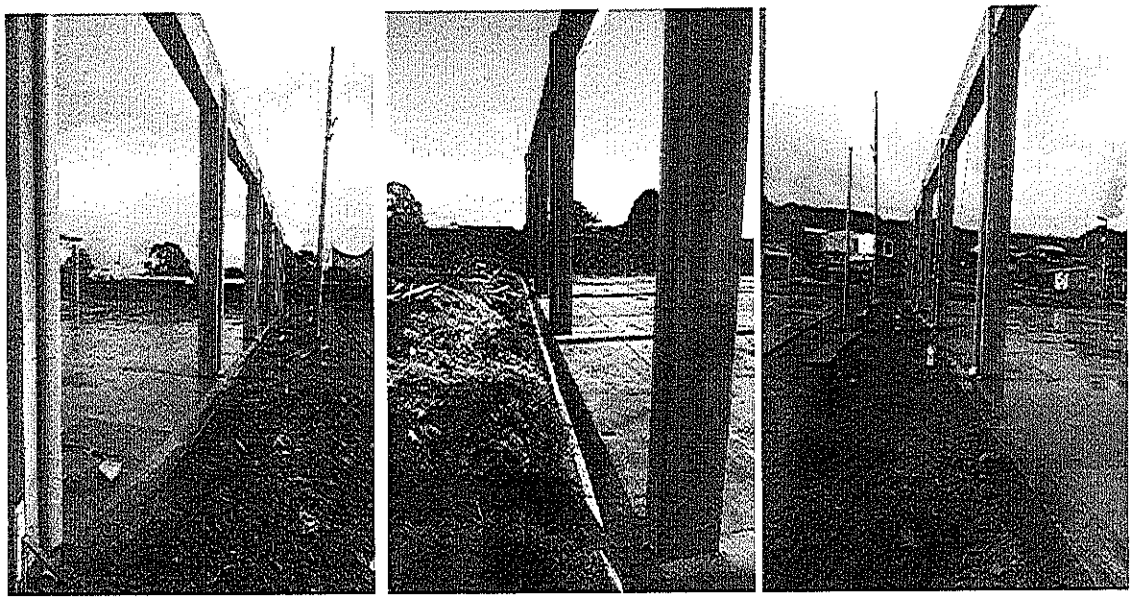


Instalación de tubería en PVC para salida: 18/11/2025 – 23/12/2025

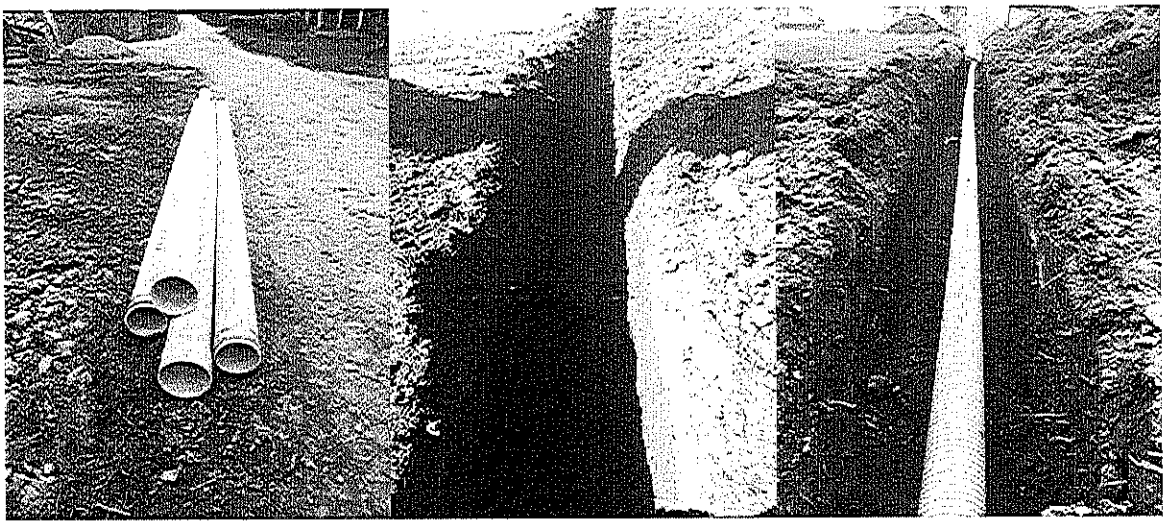


Instalación de cubierta autoportante calibre 22: 18/12/2025 – 19/12/2025

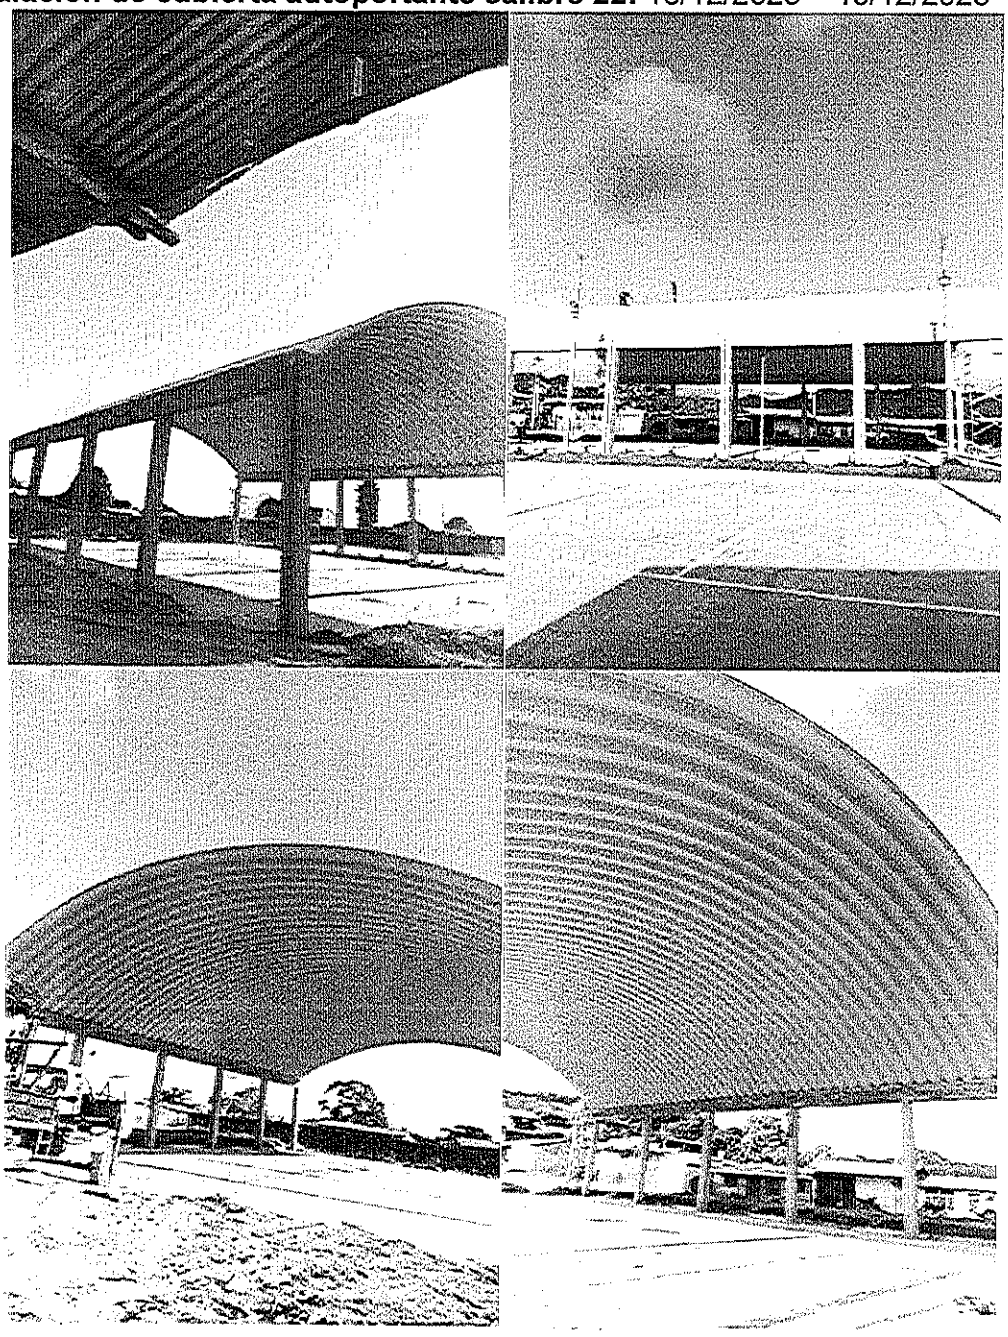


Excavación y construcción de caja de inspección de 40x40 cm: 18/12/2025 – 19/12/2025

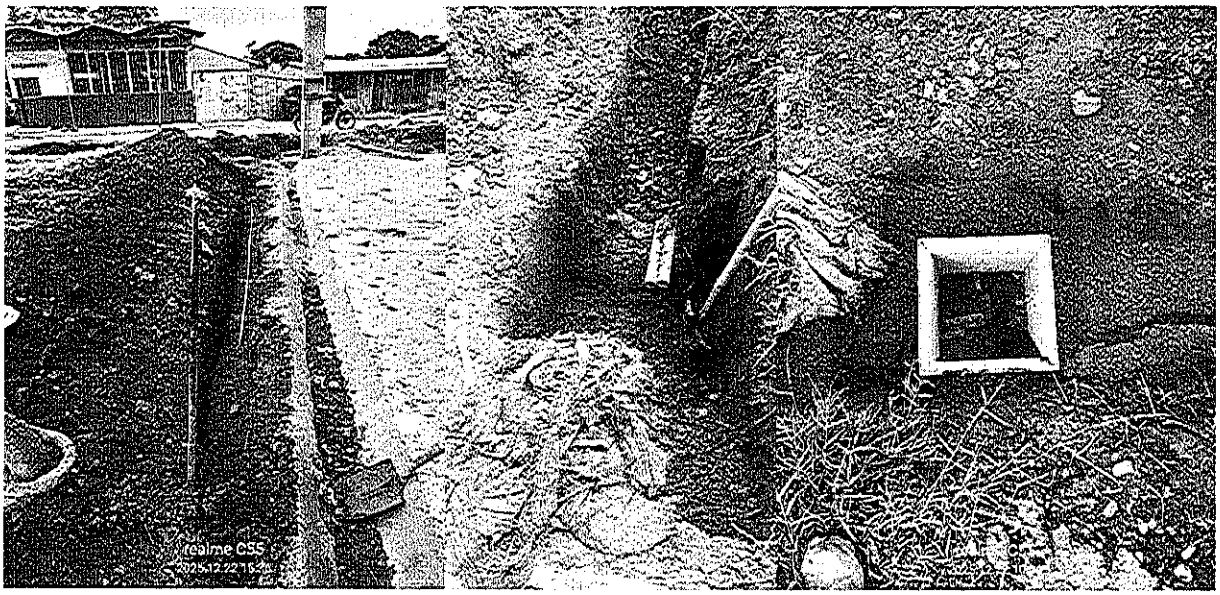

Transporte de material pétreo: 31/05/2025 – 17/07/2025 y 6/10/2025 - 13/11/2025

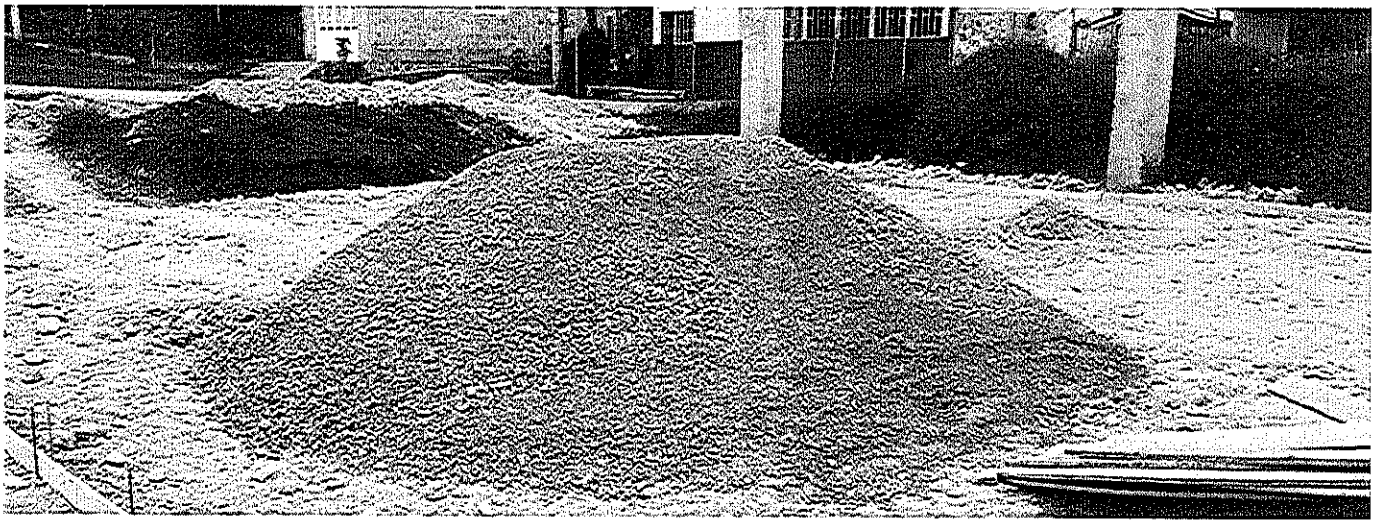

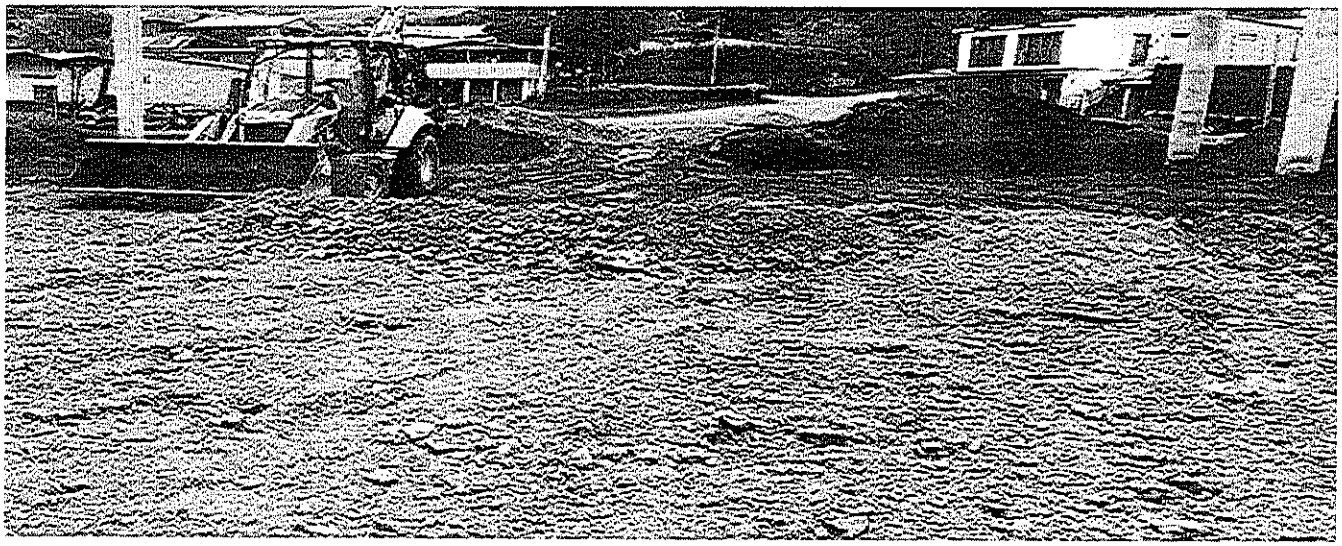



172

21. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

- A la fecha de corte del presente informe, la obra presentó un avance total del 100.00%. Que, una vez realizada la correspondiente verificación técnica, administrativa y financiera, se efectuó la revisión y aprobación del Acta Final y de Liquidación, por la suma de $241.724.719,00 correspondiente al periodo comprendido entre 17 de noviembre de 2023 al 27 de diciembre de 2023 del 16 de mayo de 2024 al 26 de agosto de 2024 del 19 de mayo de 2025 al 17 de julio de 2025 del 6 de octubre de 2025 al 23 de noviembre de 2025 y del 18 de diciembre de 2025 al 23 de diciembre de 2025, en la cual se constata el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista.

- Las cantidades de obra ejecutadas durante dicho periodo fueron revisadas y verificadas conforme a los diseños, especificaciones técnicas y el cronograma de ejecución establecido en el contrato, encontrándose debidamente soportadas y ajustadas a lo pactado contractualmente.

22. ANEXOS

- ACTAS DE COMITÉS.
- RESULTADO DE ENSAYOS Y PRUEBA DE LABORATORIO.
- CERTIFICADO CALIDAD MATERIALES.
- MEMORIAS DE CÁLCULO.
- BITACORA DE OBRA.
- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP) INTERVENTORIA.
- CERTIFICADO VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA INTERVENTORIA REALIZADO POR EL APOYO A AL SUPERVISION (Vo.Bo. Apoyo Supervisión).
- CORRESPONDENCIA GENERADA DURANTE EL PERIODO.
- ENTREGAR UN CD CON LA COPIA DIGITALIZADA DE TODO EL INFORME Y SUS ANEXOS.

Ing. EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCÓN	23/12/2025	Arq. YOVANY PEÑA FIERRO
FIRMA ORIGINAL **RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **Vo. Bo APOYO SUPERVISION**

Trabajo

No. Radicado: 08SE2026904139600001972
Fecha: 2026-04-10 03:14:43 pm
Remitente: Sede: D. T. HUILA
Depen:INSPECCIÓN LA PLATA
Destinatario EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCÓN
Anexos: 0 Folios: 1
08SE2026904139600001972

A3

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL DE HUILA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

HACE CONSTAR QUE:

Una vez verificado el sistema de información de reclamaciones, investigaciones administrativo-laborales y sanciones de la Dirección Territorial de Huila, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencio lo siguiente:

Radicado de la solicitud	05EE2026904139600002237
Nombre y/o Razón Social	EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCÓN
Identificación	7706737

En el periodo comprendido entre el 10/04/2025 al 9/04/2026 correspondiente al último año contado a partir de la fecha de expedición:

- **SANCIONES:** No. Registra
- **RECLAMACIONES:** No. Registra
- **INVESTIGACIONES**: No. Registra

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, para los fines legales pertinentes y tiene validez en los municipios de la Jurisdicción que le corresponden a la Dirección Territorial del Huila del Ministerio del Trabajo, de conformidad con lo estipulado en el artículo primero, numeral 20 de la Resolución 3455 del 16/11/2021 del Ministerio del Trabajo.

Neiva Huila, viernes 10 de abril de 2026

GUILLERMO MATEO MONROY GUTIERREZ
Director Territorial del Huila

Elaboro: mandradel
Reviso/ Aprobó: Gmonroy

Para verificar la validez de este documento escaneé el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

Comfamiliar Huila

421107-7706737-2

LA SUSCRITA JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDO DE APORTES DE COMFAMILIAR HUILA

CERTIFICA QUE:

La Empresa **EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON** identificada con Cedula de ciudadania No. **7.706.737,** se encuentra en estado **Activo** en nuestro sistema y cancela Aportes Parafiscales por los periodos de 202311 a 202512 **CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA**, así:

Anexo: Kardex de aportes

"La expedición de este documento no impide que Comfamiliar Huila pueda realizar visitas de verificación de la correcta y oportuna liquidación de los aportes, bases de liquidación y el pago oportuno de los mismos. (Decreto 562/9)

'ESTE CERTIFICADO NO ES VALIDO PARA AFILICIACIÓN A OTRAS CAJAS DE COMPENSACION NI COMO SOPORTE DE PAGO DE PARAFISCALES POR CONTRATOS'.

Dicha certificación se expide a los 24 días del mes de Abril del año 2026.

BRILLI YURANI CRUZ BARRETO

JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDO DE APORTES

175

Comfamiliar Huila
Por los progresos todos

LA SUSCRITA JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDO DE APORTES DE COMFAMILIAR HUILA

KARDEX DE APORTES

#	Comprobante	Recibo	Periodo	Nómina	Aporte	Mora	Indice	Empleados	Fecha Pago
1	L4	2243552	202311	$ 541.334	$ 21.700	$ 4.400	4	1	2024-08-08
2	L4	2243553	202312	$ 1.120.000	$ 44.800	$ 7.800	4	1	2024-08-08
3	L4	2243554	202405	$ 650.000	$ 26.000	$ 1.200	4	1	2024-08-08
4	L4	2262769	202406	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 1.100	4	1	2024-08-08
5	L4	2262770	202407	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	4	1	2024-08-08
6	L4	2262771	202408	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	4	1	2024-08-08
7	L4	2262777	202505	$ 1.425.000	$ 57.000	$ 0	4	1	2025-05-05
8	L4	2262778	202506	$ 1.425.000	$ 57.000	$ 0	4	1	2025-07-10
9	L4	2265060	202507	$ 1.425.000	$ 57.000	$ 0	4	1	2025-08-05
10	L4	2280502	202510	$ 1.425.000	$ 57.000	$ 0	4	1	2025-11-14
11	L4	2280841	202511	$ 1.425.000	$ 57.000	$ 0	4	1	2025-04-12
12	L4	2280930	202512	$ 1.425.000	$ 57.000	$ 0	4	1	2026-01-13

BRILLI YURANI CRUZ BARRETO

JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDO DE APORTES

176

41-1080
Neiva

Señor
EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON
NIT: 7706737-
davidcabrera.c05@gmail.com
Neiva - Huila

Asunto: Solicitud paz y salvo FIC

Cordial saludo señor Rojas Alarcón,

En atención a su comunicación con radicado No. 7-2026-160526 NIS: 2026-01-180134 de fecha 31 de marzo de2026 donde requiere "paz y salvo o la no necesidad de pago del FIC, dado a que en los contratos de interventoría no se realizan dichos aportes, esta solicitud surge en cumplimiento de los requisitos de la entidad contratante para la liquidación del contrato de interventoría CIHCM400 de 2023, entre mi persona y el INDERHUILA", me permito informar lo siguiente:

Todas las actividades qué estén codificadas con el Código CIIU 7112 (Actividades de ingeniería y consultoría técnica conexa (estudios geotécnicos, topografía, interventoría, etc.) se consideran trabajo intelectual relacionado con actividades de construcción, mas no son directamente trabajo en la obra por lo tanto no pagan FIC. Pero si dentro de alguno de estos contratos, en uno de los párrafos está establecido Qué adicional a las asesorías o estudios realizará una de las actividades "Incluidas" en las divisiones 41, 42, 43; debe cancelar el FIC por ese contrato.

El SENA no expide certificaciones avalando qué una determinada empresa o interventoría no está obligada a pagar la contribución FIC, porqué, aunque una empresa no sea del sector de la construcción, en un momento dado y de manera ocasional a través de un tercero puede ejecutar una obra y en ese caso estaría obligada a responder por el pago del FIC de esa obra.

Cordialmente

ELIANA CONSTANZA TELLO ZAMBRANO
Coordinadora Grupo de Relaciones Corporativas e Internacionales

Proyectó: Jorge Alberto Cuenca Perdomo
Fiscalizador - Grupo de Relaciones Corporativas e Internacionales.

177

1 **Información general**
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.SLCNTR.11557540
Número del contrato	CIHCM400-2023
Versión del contrato	7
Objeto del contrato	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
Tipo de contrato	Proceso de Contratación
Fecha de inicio del contrato	17/11/2023 9:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29/11/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Duración del contrato	8 Meses
Tiempo adiciones en días	0 días
Fecha de venta del contrato	-
Proveedor(es) seleccionado(s)	(•) Sí ( ) No
Estado del contrato	En ejecución
Liquidación	(•) Sí ( ) No
Fecha de inicio de liquidación	1/12/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/11/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	( ) Sí (•) No
Obligaciones Pos Consumo	( ) Sí (•) No
Reversión	( ) Sí (•) No

Entidad Estatal

INDERHUILA

COLOMBIA, Neiva

☆☆☆☆☆

0 Recomendación (es)

Proveedor Seleccionado

Edwin Mauricion Rojas Alarcon

☆☆☆☆☆

0 Recomendación (es)

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Edwin Mauricio Rojas Alarcon	Banco colombia	Ahorros	07661320669

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

128

Aprobado por:	edwin mauricio rojas alarcon	**Fecha de aprobación:**	31/10/2023 4:34:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:	MIGDONIA PATIÑO ARIAS	**Fecha de aprobación:**	31/10/2023 4:46:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_5456111_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_5456111_En ejecución

Información del objeto

Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto
Régimen jurídico o marco legal	
Unidad de contratación	AREA DE CONTRATACION INDERHUILA
Proceso de Contratación	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAP
Título de la oferta	N/A
Cuantía del contrato	46.790.977,00 COP

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

1 Información general
2 **Condiciones**
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Documentos Tipo

Documentos Tipo No — Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ○ Sí ◉ No — Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega A definir

Fecha inicio de ejecución (estimada) -

Fecha fin de ejecución (estimada) -

El contrato puede ser prorrogado ○ Sí ◉ No

Contrato quebradizo? ○ Sí ○ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ◉ Sí ○ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ○ Sí ◉ No

Seriedad de la oferta ◉ Sí ○ No

◉ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ◉ Sí ○ No

Cumplimiento del contrato

◉ % del valor del contrato — 20,000000 — Fecha de vigencia (desde) — 27/10/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

○ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 27/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Pago de salarios

◉ % del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 27/10/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

○ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 27/07/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Calidad del servicio

◉ % del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 27/10/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

○ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 26/07/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ◉ Sí ○ No

◉ No. de SMMLV — 200

Fecha límite para entrega de garantías: 1/11/2023 3:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 22 días de tiempo transcurrido *(17/04/2026 6:50:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

180

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detalle
CO1.WRT.19771494	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	23.395.488,50 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	23/12/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aceptado	Detalle
CO1.WRT.12852107	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	31/01/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle
CO1.WRT.12851928	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	22.869.150,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	31/01/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aceptado	Detalle
CO1.WRT.12683729	Seriedad de la oferta	-	4.679.100,00 COP	-	26/02/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle

Agregar

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? Sí ◉ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Comentarios

Anexos del contrato

Descripción

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 18 CALLE 17

Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva

País COLOMBIA

Departamento Huila

Municipio Neiva

Dirección CRA 18 CALLE 17

Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CENTRO POBLADO SAN ROQUE	COLOMBIA > Huila > Oporapa
2	CENTRO POBLADO SAN ROQUE	COLOMBIA > Huila > Oporapa
3	CENTRO POBLADO SAN ROQUE	COLOMBIA > Huila > Oporapa

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	ANEXO CONTRATO INTERVENTORIA CIHCM400-2023.pdf	ANEXO CONTRATO INTERVENTORIA CIHCM400-2023.pdf	(detalle)
☐	ACTA DE JUSTIFICACION No.3 - CLPIH373-2023 CIHCM400-2023.pdf	ACTA DE JUSTIFICACION No.3 - CLPIH373-2023 CIHCM400-2023.pdf	(detalle)
☐	OTRO SI MODIFICATORIO No. 1 CMCIH400-2023.pdf	OTRO SI MODIFICATORIO No. 1 CMCIH400-2023.pdf	(detalle)
☐	JUSTIFICACION (5)DE REINICIO No.2 INTERVENTORÍA N°CIHCM400 DE 2023 (2).pdf	JUSTIFICACION (5)DE REINICIO No.2 INTERVENTORÍA N°CIHCM400 DE 2023 (2).pdf	(detalle)
☐	ACTA REINICIO INTERVENTORIA N° CMCIH400 de 2023 (2).pdf	ACTA REINICIO INTERVENTORIA N° CMCIH400 de 2023 (2).pdf	(detalle)
☐	-ACTA DE JUSTIFICACION 6 DE PRORROGA Y ADICION 400 (1).pdf	-ACTA DE JUSTIFICACION 6 DE PRORROGA Y ADICION 400 (1).pdf	(detalle)
☐	-ACTA DE JUSTIFICACION 9 DE PRORROGA 400 (2).pdf	-ACTA DE JUSTIFICACION 9 DE PRORROGA 400 (2).pdf	(detalle)
☐	-OTROSI 3 PRORROGA CIHCM400.pdf	-OTROSI 3 PRORROGA CIHCM400.pdf	(detalle)

¿Documentos del Contrato están firmados por ambas partes? ○ Sí ○ No

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

182

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

( ) Porcentaje ( ) Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ( ) Sí (•) No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	FVE-101	27/12/2024 8:42:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	12.610.049 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
( )	Soporte Pago Estampillas IHCM013-23.PDF	Soporte Pago Estampillas IHCM013-23.PDF	Comprador	Descargar	Detalle
( )	100009482_20231102 CUMPLIMIENTO.pdf	100009482_20231102 CUMPLIMIENTO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
( )	100001887_20231102 RCE.pdf	100001887_20231102 RCE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
( )	Designacio´n acta de inicio IHCM013-CIHCM400.pdf	Designacio´n acta de inicio IHCM013-CIHCM400.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
( )	RP INTERVENTORÍA IHCM013.pdf	RP INTERVENTORÍA IHCM013.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	202407061411.pdf	202407061411.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	202407061412.pdf	202407061412.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
( )	ACTA DE JUSTIFICACION 4 SUSPENSION INTERVENTORIA No.2- CIHCM400 ok (3) (1).pdf	ACTA DE JUSTIFICACION 4 SUSPENSION INTERVENTORIA No.2- CIHCM400 ok (3) (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
( )	ACTA DE SUSPENCION CONTRATO INTERV 400 OK (1).pdf	ACTA DE SUSPENCION CONTRATO INTERV 400 OK (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Poliza Cumplimiento - Acta Inicio.pdf	Poliza Cumplimiento - Acta Inicio.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Poliza Responsabilidad Civil - Acta Inicio Anexo 2.pdf	Poliza Responsabilidad Civil - Acta Inicio Anexo 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Poliza Cumplimiento - Firma Contrato Anexo 1.pdf	Poliza Cumplimiento - Firma Contrato Anexo 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Poliza Responsabilidad Civil - Firma Contrato Anexo 1.pdf	Poliza Responsabilidad Civil - Firma Contrato Anexo 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Poliza Cumplimiento - Reinicio No. 1 Anexo 3.pdf	Poliza Cumplimiento - Reinicio No. 1 Anexo 3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Poliza Responsabilidad Civil - Reinicio No. 1 Anexo 3.pdf	Poliza Responsabilidad Civil - Reinicio No. 1 Anexo 3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Poliza Cumplimiento - Otrosi 1 Anexo 4.pdf	Poliza Cumplimiento - Otrosi 1 Anexo 4.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Poliza Responsabilidad Civil - Otrosi 1 Anexo 4.pdf	Poliza Responsabilidad Civil - Otrosi 1 Anexo 4.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
( )	Verificación y Aprobación Pólizas - San Roque - Oporapa.pdf	Verificación y Aprobación Pólizas - San Roque - Oporapa.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
( )	RP Y CDP CIHCM400-2023.pdf	RP Y CDP CIHCM400-2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
( )	DESIGNACION APOYO SUPERVISION CTO CIHCM400-2023.pdf	DESIGNACION APOYO SUPERVISION CTO CIHCM400-2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	SUS Y REINICIO ANEXO 6 (1).pdf	SUS Y REINICIO ANEXO 6 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	SU Y REINICIO CUMPLIMIENTO (1).pdf	SU Y REINICIO CUMPLIMIENTO (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

☐	SUS Y REINICIO RESP CIVIL (1).pdf	SUS Y REINICIO RESP CIVIL (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	SUS Y REINICIO RES CIVL 6 (1).pdf	SUS Y REINICIO RES CIVL 6 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ACTA APROBACION POLIZA CUMPLIMIENTO ANEXO 5 - REINICIO 2.pdf	ACTA APROBACION POLIZA CUMPLIMIENTO ANEXO 5 - REINICIO 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA APROBACION POLIZA RCE ANEXO 5 - REINICIO 2.pdf	ACTA APROBACION POLIZA RCE ANEXO 5 - REINICIO 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA APROBACION POLIZA CUMPLIMIENTO ANEXO 6 - OTROSI 2.pdf	ACTA APROBACION POLIZA CUMPLIMIENTO ANEXO 6 - OTROSI 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA APROBACION POLIZA RCE ANEXO 6 - OTROSI 2.pdf	ACTA APROBACION POLIZA RCE ANEXO 6 - OTROSI 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Designacion apoyo supervision 2026 - CIHCM400-2023.pdf	Designacion apoyo supervision 2026 - CIHCM400-2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	02 DESIGNACION DE APOYO A LA SUPERVISIÓN CDIH143-2024 julio 2024.pdf	02 DESIGNACION DE APOYO A LA SUPERVISIÓN CDIH143-2024 julio 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CONSULTA POLIZA ANEXO 10 ACTA TERMINACION.pdf	CONSULTA POLIZA ANEXO 10 ACTA TERMINACION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 **Modificaciones del Con...**
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Est

VER CONTRATO

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.22405538	Reactivar el contrato	25/03/2026 5:44 PM *(UTC -5 horas)*	25/03/2026 5:47 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	7	
CO1.CTRMOD.21450431	Suspender el contrato	29/12/2025 1:49 PM *(UTC -5 horas)*	29/12/2025 1:51 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	7	
CO1.CTRMOD.20622567	Modificar el contrato	24/10/2025 10:13 AM *(UTC -5 horas)*	24/10/2025 10:35 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	7	Ver
CO1.CTRMOD.20536821	Reactivar el contrato	16/10/2025 10:21 AM *(UTC -5 horas)*	16/10/2025 10:23 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	6	
CO1.CTRMOD.19718418	Suspender el contrato	25/07/2025 3:49 PM *(UTC -5 horas)*	25/07/2025 3:50 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	6	
CO1.CTRMOD.19269461	Modificar unilateralmente el contrato	6/06/2025 10:19 AM *(UTC -5 horas)*	6/06/2025 10:33 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	6	Ver
CO1.CTRMOD.19269448	Modificar el contrato	4/06/2025 11:04 AM *(UTC -5 horas)*	6/06/2025 10:19 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	Ver
CO1.CTRMOD.19237160	Reactivar el contrato	3/06/2025 9:42 AM *(UTC -5 horas)*	3/06/2025 9:45 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	4	
CO1.CTRMOD.16553076	Suspender el contrato	30/08/2024 10:21 PM *(UTC -5 horas)*	30/08/2024 10:30 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	4	
CO1.CTRMOD.16029629	Modificar el contrato	4/07/2024 4:06 PM *(UTC -5 horas)*	4/07/2024 4:14 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	4	Ver
CO1.CTRMOD.15565668	Modificar el contrato	17/05/2024 10:35 AM *(UTC -5 horas)*	17/05/2024 10:43 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	3	Ver
CO1.CTRMOD.15564655	Reactivar el contrato	17/05/2024 10:29 AM *(UTC -5 horas)*	17/05/2024 10:34 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	
CO1.CTRMOD.14270547	Suspender el contrato	28/12/2023 7:00 PM *(UTC -5 horas)*	28/12/2023 7:02 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	
CO1.CTRMOD.14257670	Modificar el contrato	28/12/2023 3:11 PM *(UTC -5 horas)*	28/12/2023 3:15 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	Ver

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Est


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCM400 DE 2023

INFORME DE ACTA FINAL DE SUPERVISION

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas por el Contratista desde el 17 de noviembre de 2023 al 27 de diciembre de 2023, del 16 de mayo de 2024 al 26 de agosto de 2024 al 19 de mayo de 2025 al 17 de julio de 2025 y del 6 de octubre al 23 de noviembre de 2025 y del 18 de diciembre de 2025 al 23 de diciembre de 2025.

FINAL [X] **PARCIAL** [ ]

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINITRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

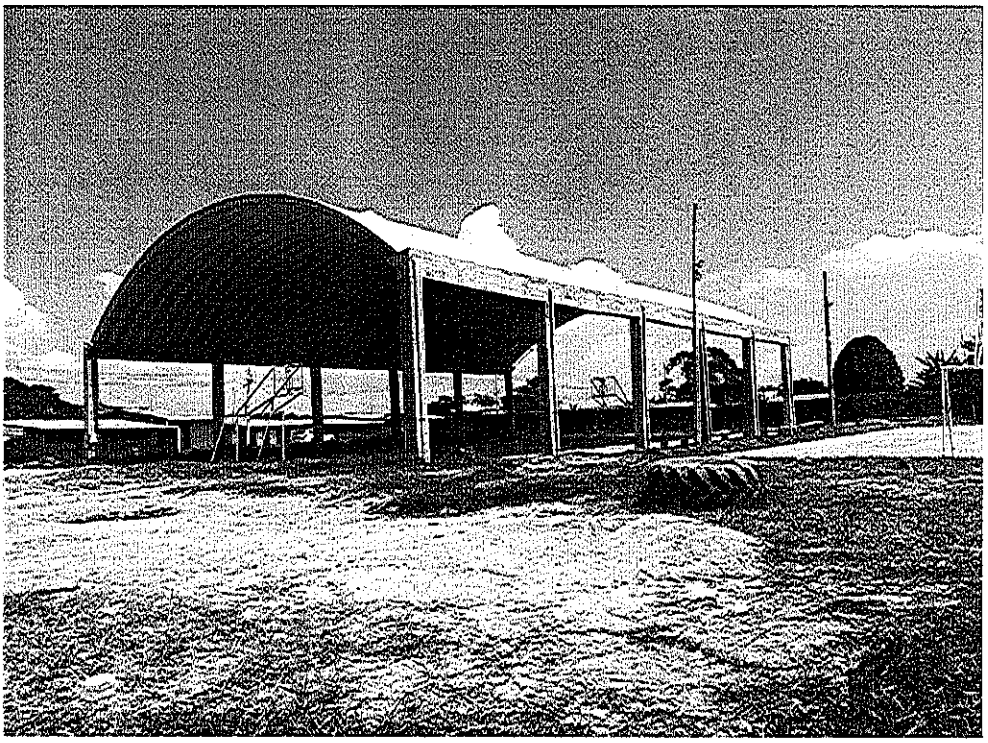

MUNICIPIO: OPORAPA

DEPARTAMENTO: HUILA

1. PRESENTACIÓN

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas por la supervisión desde **el 17 de noviembre de 2023 al 27 de diciembre de 2023, del 16 de mayo de 2024 al 26 de agosto de 2024 al 19 de mayo de 2025 al 17 de julio de 2025 y del 6 de octubre al 23 de noviembre de 2025 y del 18 de diciembre de 2025 al 23 de diciembre de 2025**, en cumplimiento del contrato de interventoría No. CIHCM400 de 2023 cuyo objeto es *"Interventoría técnica, administrativa, legal y financiera al contrato cuyo objeto es la construcción e iluminación de cubierta del polideportivo del centro poblado san roque en el municipio de Oporapa del departamento del Huila"*

Para lo cual se efectuará en Oporapa: La supervisión a la interventoría técnica, administrativa, legal y financiera al contrato cuyo objeto es la construcción e iluminación de cubierta del polideportivo del centro poblado san roque en el municipio de Oporapa del departamento del Huila.

Mediante cuadros anexos y registro fotográfico se pretende dejar constancia de los trabajos adelantados por la interventoría hasta lograr la culminación de los trabajos. En este informe se da a conocer las obras ejecutadas a la fecha de cada una de las actividades con un registro fotográfico mostrando la obra en ejecución.

2. JUSTIFICACIÓN

En el Departamento del Huila, los espacios públicos para las prácticas deportivas de los habitantes, son insuficientes e inadecuados para la población que está en capacidad física para practicar algún deporte. Los espacios existentes están deteriorados y con frecuencia son ocupados para desarrollar otras actividades. Son escasos los programas de fomento al deporte y por eso hay bajo interés por las prácticas deportivas.

La carencia de programas de fomento al deporte y el inadecuado uso del tiempo libre conlleva al aumento del sedentarismo que trae consigo dificultades de salud. Adicionalmente, las personas con talento para el deporte al no contar con espacios apropiados ni apoyo buscan alternativas fuera de la localidad y esto hace que sus familias tengan que invertir en manutención y transporte. El desarrollo de programas que permitan el buen uso del tiempo libre es fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas, activar espacios deportivos brinda más oportunidades de recreación y educación a los niños y niñas que por diferentes motivos como lo son la ubicación de los escenarios, no pueden realizar de manera correcta un deporte al que se podrían dedicar a futuro, además con estos espacios no solo se están formando deportistas, sino adultos con una capacidad para desarrollar una buena calidad de vida y hábitos saludables que les permitirán llegar a la vejez manteniendo un buen estado de salud, pudiendo compartir más tiempo con los diferentes miembros de una familia sin la necesidad de transportarse a lejanos lugares, de esta manera se mejora la calidad de vida de los beneficiarios.

El sedentarismo es una problemática que atañe el siglo XXI, de manera que los niños deben estar preparados para afrontarla, la solución no radica en la eliminación de la raíz del problema, que en su mayoría es el uso de dispositivos móviles, sino en tener un control sobre estos dispositivos, y darles un propósito que no esté más allá de la educación y el conocimiento, de manera que para poder acabar con el sedentarismo es necesario saber administrar el tiempo para poder invertirlo en actividades que permitan cambiar la manera en la que se vive, esto se puede lograr realizando actividades físicas que permitan disminuir el tiempo que los jóvenes, niños

y adultos pasan frente a las pantallas, de manera que lo fundamental para lograr este objetivo es proporcionar espacios dedicados a la recreación y el buen uso del tiempo libre.


Es importante entender que en condiciones de alta intensidad en las precipitaciones o frente a una gran exposición a la luz solar puede hacer que las personas no se sientan atraídas a la realización de actividad física, ofrecer espacios cubiertos mejora la experiencia de los usuarios, pues permite que este juegue o entrene de manera que sea más cómoda y confortable pues le es indiferente el clima que pueda haber a su alrededor; por otro lado la cubierta permite la realización de actividades diferentes a las deportivas y puede servir como refugio frente a diferentes amenazas. La construcción de la cubierta también tiene un impacto en la visibilidad y desarrollo que se puede observar en la comunidad, reflejándose en el aumento de la calidad de vida y el bienestar general.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En el municipio de Oporapa, perteneciente al departamento del Huila, se llevará a cabo la construcción e iluminación de la cubierta del polideportivo del centro poblado San Roque. Este proyecto incluirá la instalación de redes eléctricas e hidráulicas que garantizarán el funcionamiento continuo y normal de todas las instalaciones, sin que se vean afectadas por el horario o las condiciones climáticas de la región. El objetivo de esta obra es fortalecer la práctica deportiva y mejorar la calidad de vida de los habitantes. La estructura se ejecutará en un sistema a porticado de concreto y se utilizarán tejas autosoportantes metálicas de calibre 22.

4. LOCALIZACIÓN

La construcción e iluminación de la cubierta del polideportivo se encuentra localizado en el centro poblado San Roque del municipio de Oporapa, Huila.

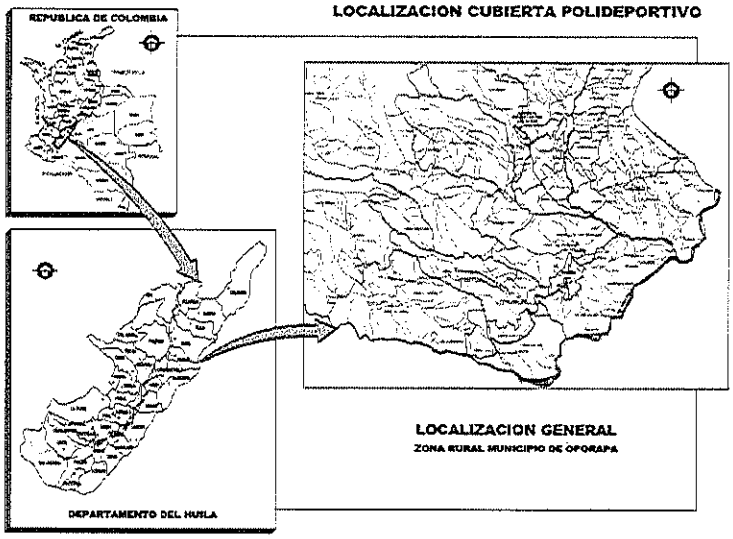

Fuente: Estudio previo proceso LPIH012-2023 – Gobernación del Huila

4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las obras contemplan la construcción del polideportivo, en donde tiene por objeto contractual las siguientes actividades de ejecución:

- Actividades preliminares
- Cimentación
- Estructuras en concreto
- Cubierta
- Acabados – placa de concreto
- Instalaciones sanitarias
- Instalaciones eléctricas
- Transporte

5. INFORMACION GENERAL DE CONTRATOS

5.1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

Que mediante Resolución No.282 del 15 de septiembre de 2023, la entidad dio apertura al procedimiento de contratación IHCM013-2023 y que mediante Resolución No. 361 del 09 de octubre de 2023, la entidad adjudico el contrato al señor **Edwin Mauricio Rojas Alarcón.**

CONTRATO No.	CIHCM400 de 2023
TIPO DE CONTRATO:	Contrato de Interventoría
OBJETO:	Interventoría técnica, administrativa, legal y financiera al contrato cuyo objeto es la "Construcción e iluminación de cubierta del polideportivo del centro poblado san roque en el municipio de Oporapa del departamento del Huila".
CONTRATISTA:	Edwin Mauricio Rojas Alarcón C.C. No. 7.706.737 de Neiva NIT: 7.706.737-6
CONTRATANTE:	INDERHUILA NIT: 813.005.578-7
VALOR INICIAL:	Cuarenta y cinco millones setecientos treinta y ocho mil doscientos noventa y nueve pesos (**$ 45.738.299,00**) M/CTE.
VALOR ADICIONAL:	Un millón cincuenta y dos mil seiscientos setenta y ocho pesos (**$ 1.052.678,00**) M/CTE.
VALOR TOTAL CONTRATO:	Cuarenta y seis millones setecientos noventa mil novecientos setenta y siete pesos (**$ 46.790.977**) M/CTE

FECHA SUSCRIPCIÓN:	31 de octubre de 2023
PLAZO INICIAL:	El plazo estimado para la ejecución del contrato será de Tres (03) meses, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones, sin superar la presente vigencia fiscal.
PLAZO ADICIONAL No. 01:	Dos (02) meses
PLAZO ADICIONAL No. 02:	Dos (02) meses
PLAZO ADICIONAL No. 02:	Un (1) Mes y medio
PLAZO TOTAL:	OCHO (8) MESES Y MEDIO, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones sin superar la vigencia fiscal.
FECHA DE INICIO:	17 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE REINICIO No. 01:	16 de mayo de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02:	27 de agosto de 2024.
FECHA DE REINICIO No. 02:	19 de mayo de 2025.
FECHA DE OTROSÍ No. 02	19 de mayo de 2025.
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 03:	18 de julio de 2025.
FECHA DE REINICIO No. 03:	6 de octubre de 2025.
FECHA DE OTROSÍ No. 03	14 de octubre de 2025.
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 04	24 de noviembre de 2025
FECHA DE REINICIO No. 04	18 de diciembre de 2025
FECHA TERMINACION:	23 de diciembre de 2025.

Estado Financiero del Contrato de Interventoría			CIHCM 400 DE 2023	
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINITRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"				
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	**Fecha** (dd/mm/aaaa)	**Valor Acta**	**Amortización %**	**Valor pagado**
Valor Anticipo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Acta Parcial N°1		$ 12.610.049,00	$ 0,00	$ 12.610.049,00
Acta Parcial No. 2				
Acta Recibo Final No.4				
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 45.738.299,00	$1.052.678,00	$ 46.790.977,00	$ 12.610.049,00	$ 34.180.928,00

HISTORIAL CRONOLÓGICO DEL PROYECTO				
ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DIAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DIAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION
Firma Contrato	30/10/2023	0	0	16/02/2024
Iniciación	17/NOV/2023	0	0	16/FEB/2024
Suspensión No. 1	28/DIC/2023	41	0	16/FEB/2024
Reinicio No. 1	16/MAY/2024	0	138	03/JUL/2024
Otrosí No. 1	3/JUL/2024	48	0	5/SEP/2024
Suspensión No. 2	27/AGO/2024	53	0	5/SEP/2024
Reinicio No. 2	19/MAY/2025	0	262	27/MAY/2024
Otrosí No. 2	19/MAY/2025	0	0	27/JUL/2025
Suspensión No. 3	18/JUL/2025	59	0	27/JUL/2025
Reinicio No. 3	6/OCT/2025	0	78	14/OCT/2025
Otrosí No. 3	14/OCT/2025	9	0	29/NOV/2025
Suspensión No. 4	24/NOV/2025	39	0	29/NOV/2025
Reinicio No. 4	18/DIC/2025	0	24	23/DIC/2025
Terminación Cto.	**23/DIC/2025**	6	0	**23/DIC/2025**
TOTAL DIAS		**255**	**502**	

NOTA: Desde la fecha de inicio del contrato hasta el 28 de diciembre de 2023, se contabilizaron 41 días de ejecución por parte de la interventoría, fecha en la cual se suscribió el Acta de Suspensión No. 01. Posteriormente, transcurrieron 140 días de suspensión hasta la firma del Acta de Reinicio No. 01.Después de 49 días de reanudación, se suscribió el Otrosí No. 1, mediante el cual se adicionó tiempo al contrato. Luego de ello, transcurrieron 54 días hasta la firma del Acta de Suspensión No. 02. A continuación, se mantuvo la suspensión por 265 días, al cabo de los cuales se suscribieron el Acta de Reinicio No. 02 y el Otrosí No. 2, pasan 60 días de ejecución, se suscribe el acta de suspensión No. 3, pasan 80 días hasta el reinicio No.3 y desde el reinicio pasan 9 días de ejecución hasta el otrosí No. 3. Se realiza la suspensión N°4 después de haber ejecutado 39 días, después de 24 días de suspensión se realiza el reinicio N°4 el 18 de diciembre de 2025 y tras 6 días de ejecución se realiza el acta de terminación.

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)		
Tipo de Acta	**No.**	**Fecha**
Firma contrato	1	31 de octubre de 2023
Acta de inicio	2	17 de noviembre de 2023
Acta de Justificación No. 1	3	28 de diciembre de 2023
Acta de suspensión No. 1	4	28 de diciembre de 2023
Acta de justificación No. 2	5	14 de mayo de 2024
Acta de reinicio No. 1	6	16 de mayo de 2024
Acta de justificación No. 3	7	3 de julio de 2024
Otro si modificatorio No. 01	8	3 de julio de 2024
Acta de Justificación No.4	9	27 de agosto de 2024
Acta de Suspensión No. 2	10	27 de agosto de 2024

Acta de Justificación No.5	11	19 de mayo de 2025
Acta de Reinicio No. 2	12	19 de mayo de 2025
Acta de Justificación No.6	13	19 de mayo de 2025
Otrosí Modificatorio No. 2	14	19 de mayo de 2025
Acta de Justificación No.7	15	18 de julio de 2025
Acta de Suspensión 3	16	18 de julio de 2025
Acta de Justificación No.8	17	6 de octubre de 2025
Acta de Reinicio 3	18	6 de octubre de 2025
Acta de Justificación No.9	19	14 de octubre de 2025
Acta Modificatorio No.3	20	14 de octubre de 2025
Acta de Justificación No.10	21	24 de noviembre de 2025
Acta de Suspensión 4	22	24 de noviembre de 2025
Acta de Justificación No.11	23	18 de diciembre de 2025
Acta de Reinicio 4	24	18 de diciembre de 2025
Acta de Terminación	25	23 de diciembre de 2025

5.1.1. INFORMACION PRESUPUESTAL

PROYECTO PRESUPUESTAL:	Número: 2025000514	VALOR	VIGENCIA
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al certificado de disponibilidad presupuestal No. 2025000389 del 12 de Mayo de 2025, Rubro 00AD denominado construcción e iluminación de cubierta del polideportivo del centro poblado san roque en el municipio de Oporapa del departamento del Huila – PROYECTO 2023004410086 - Construcción de mejoramientos y mejoramientos de escenarios deportivos nuevos y existente en el departamento del Huila: FUENTE: 00AD-Asignaciones directas 20% estampillas departamentales para legalización del contrato de interventoría por valor de $ 1.052.678,00 No. 2025000514 del 26 de septiembre de 2023.		$ 46.790.977,00	2025

5.1.2. RELACION DE POLIZAS DE GARANTIAS

Póliza legalización del CONTRATO: CIHCM400 DE 2023						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
Compañía mundial de seguros S.A.	CHU-100009482	1	23/05/2024	Cumplimiento del contrato	31/10/2023	31/07/2024
				Prestaciones sociales	31/10/2023	31/01/2027
				Calidad del Servicio	31/01/2024	31/01/2029
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
Compañía mundial de S.A.	CHU-100001887	1	23/05/2024		31/10/2023	31/01/2024

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

INDERHUILA	FORMATO	CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	MAYO 2021

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
Compañía mundial de seguros S.A.	CHU-100009482	2	23/05/2024	Cumplimiento del contrato	17/11/2023	17/08/2024
				Prestaciones sociales	17/11/2023	17/02/2027
				Calidad del Servicio	17/02/2024	17/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
Compañía mundial de seguros S.A.	CHU-100001887	2	23/05/2024	17/11/2023	17/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION No. 1 - ACTA DE REINICIO No. 1:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
Compañía mundial de seguros S.A.	CHU-100009482	3	23/05/2024	Cumplimiento del contrato	16/05/2024	07/01/2025
				Prestaciones sociales	16/06/2024	07/07/2027
				Calidad del Servicio	07/07/2024	07/07/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
Compañía mundial de seguros S.A.	CHU-100001887	3	24/05/2024	17/11/2023	07/07/2024

Póliza actualizada x PRORROGA No. 1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
Compañía mundial de seguros S.A.	CHU-100009482	4	05/07/2024	Cumplimiento del contrato	03/07/2024	07/03/2025
				Prestaciones sociales	03/07/2024	02/09/2027
				Calidad del Servicio	07/09/2024	07/09/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
Compañía mundial de seguros S.A.	CHU-100001887	4	05/07/2024	17/11/2023	07/09/2024

Póliza actualizada x Suspensión No. 2

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA	AMPARO	VIGENCIA

			DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
Compañía mundial de seguros S.A.	CHU-100009482	5	29/05/2025	Cumplimiento del contrato	27/08/2024	30/11/2025
				Prestaciones sociales	27/08/2024	30/05/2028
				Calidad del Servicio	30/05/2025	30/05/2030
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	**No.**	**ENDOZO**	**FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)**		**VIGENCIA**	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	**HASTA (dd/mm/aaaa)**
Compañía mundial de seguros S.A.	CHU-100001887	5	29/05/2025		17/11/2023	30/05/2025

Póliza actualizada x Prorroga No. 2						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	**No.**	**ENDOZO**	**FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)**	**AMPARO**	**VIGENCIA**	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	**HASTA (dd/mm/aaaa)**
Compañía mundial de seguros S.A.	CHU-100009482	6	30/05/2025	Cumplimiento del contrato	19/07/2025	30/01/2026
				Prestaciones sociales	19/07/2025	30/07/2028
				Calidad del Servicio	30/07/2025	30/07/2030
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	**No.**	**ENDOZO**	**FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)**		**VIGENCIA**	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	**HASTA (dd/mm/aaaa)**
Compañía mundial de seguros S.A.	CHU-100001887	6	30/05/2025		17/11/2023	30/07/2030

Póliza actualizada x Prorroga No. 3 del CONTRATO: CIHCM400 DE 2023						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	**No.**	**ENDOZO**	**FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)**	**AMPARO**	**VIGENCIA**	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	**HASTA (dd/mm/aaaa)**
Compañía mundial de seguros S.A.	CHU-100009482	7	27/10/2025	Cumplimiento del contrato	14/10/2025	17/03/2026
				Prestaciones sociales	14/10/2025	15/09/2028
				Calidad del Servicio	15/09/2025	15/09/2030
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	**HASTA (dd/mm/aaaa)**
Compañía mundial de seguros S.A.	CHU-100001887	7	30/05/2025		17/11/2023	2/12/2025

CONTRATO DE OBRA

Que mediante la Resolución N.191 del 28 de agosto de 2023 la Entidad abrió el Proceso de Contratación No. LPIH012 – 2023 y que mediante la Resolución N. 323 del 27 de septiembre de 2023 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista **Consorcio Global CC.**

CONTRATO No.	CLPIH373 de 2023
TIPO DE CONTRATO:	Contrato de obra
OBJETO:	Construcción e iluminación de cubierta del polideportivo del centro poblado san roque en el municipio de Oporapa del departamento del Huila.
CONTRATISTA:	Consorcio Global CC NIT: 901.765.554-1 R/L: Yohan Fernando Salazar Baena C.C. 7.709.122
CONTRATANTE:	INDERHUILA NIT: 813.005.578-7
VALOR INICIAL:	Quinientos cincuenta y siete millones ciento diecisiete mil doscientos cincuenta y ocho MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA (**$557.117.258**) M/CTE
VALOR ADICIONAL:	Veintisiete millones setecientos sesenta y nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA (**$27.769.955**) M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	Quinientos ochenta y cuatro millones ochocientos ochenta y siete mil doscientos trece pesos. MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA (**$584.887.213**) M/CTE
FECHA SUSCRIPCIÓN:	2 de noviembre de 2023
PLAZO INICIAL:	Tres (03) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
PLAZO ADICIONAL No. 01:	Dos (02) meses
PLAZO ADICIONAL No. 02:	Dos (02) meses
PLAZO ADICIONAL No. 03:	Un (1) Mes y medio
PLAZO TOTAL:	OCHO (8) MESES Y MEDIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones.
FECHA DE INICIO:	17 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE REINICIO No. 01:	16 de mayo de 2024
OTROSI No. 01:	03 de julio de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02:	27 de Agosto de 2024.
FECHA DE REINICIO No. 02:	19 de Mayo de 2025.
FECHA DE OTROSÍ No. 02	19 de Mayo de 2025.
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 03:	18 de julio de 2025.
FECHA DE REINICIO No. 03:	6 de octubre de 2025.
FECHA DE OTROSÍ No. 03	14 de octubre de 2025.
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 04	24 de noviembre de 2025

FECHA DE REINICIO No. 04	18 de diciembre de 2025
FECHA TERMINACION:	23 de diciembre de 2025

Estado Financiero del Contrato de Obra			CLPIH373 de 2023	
Objeto: "CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"				
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	**Fecha (dd/mm/aaaa)**	**Valor Acta**	**Amortización 25%**	**Valor pagado**
Valor Anticipo (25%)	**08/07/2024**	$ 139.279.315,00		$ 139.279.315,00
Acta Parcial No. 1	**23/12/2024**	$ 153.608.431,00	$ 38.402.108,00	$ 115.206.323,00
Acta Parcial No. 2	**23/12/2025**	$189.546.946,00	$ 47.386.737,00	$ 142.160.209,00
Acta Final	**En tramite**	$241.724.719,00	$53.490.470,00	$ 188.234.249,00
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$557.117.258	$ 27.769.955,00	$ 584.887.213,00	$ 584.880.096,00	$ 7.117,00

HISTORIAL CRONOLÓGICO DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
Firma Contrato	30/10/2023	0	0	16/02/2024
Iniciación	17/NOV/2023	0	0	16/FEB/2024
Suspensión No. 1	28/DIC/2023	41	0	16/FEB/2024
Reinicio No. 1	16/MAY/2024	0	138	03/JUL/2024
Otrosí No. 1	3/JUL/2024	48	0	5/SEP/2024
Suspensión No. 2	27/AGO/2024	53	0	5/SEP/2024
Reinicio No. 2	19/MAY/2025	0	262	27/MAY/2024
Otrosí No. 2	19/MAY/2025	0	0	27/JUL/2025
Suspensión No. 3	18/JUL/2025	59	0	27/JUL/2025
Reinicio No. 3	6/OCT/2025	0	78	14/OCT/2025
Otrosí No. 3	14/OCT/2025	9	0	29/NOV/2025
Suspensión No. 4	24/NOV/2025	39	0	29/NOV/2025
Reinicio No. 4	18/DIC/2025	0	24	23/DIC/2025
Terminación Cto.	**23/DIC/2025**	6	0	**23/DIC/2025**
TOTAL DIAS		**255**	**502**	

NOTA: Desde la fecha de inicio del contrato hasta el 28 de diciembre de 2023, se contabilizaron 41 días de ejecución por parte de la interventoría, fecha en la cual se suscribió el Acta de Suspensión No. 01. Posteriormente, transcurrieron 140 días de suspensión hasta la firma del Acta de Reinicio No. 01.Después de 49 días de reanudación, se suscribió el Otrosí No. 1, mediante el cual se adicionó tiempo al contrato. Luego de ello, transcurrieron 54 días hasta la firma del Acta de Suspensión No. 02. A continuación, se mantuvo la suspensión por 265 días, al cabo de los cuales se suscribieron el Acta de Reinicio No. 02 y el Otrosí No. 2, pasan 60 días de ejecución, se suscribe el acta de suspensión No. 3, pasan 80 días hasta el reinicio No.3 y desde el reinicio pasan 9 días de ejecución hasta el otrosí No. 3. Se realiza la suspensión N°4 después de haber ejecutado 39 días, después de 24 días de suspensión se realiza el reinicio N°4 el 18 de diciembre de 2025 y tras 6 días de ejecución se realiza el acta de terminación.

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final)

Tipo de Acta	No.	Fecha
Firma contrato	1	2 de noviembre de 2023
Acta de inicio	2	17 de noviembre de 2023
Acta de Justificación No. 1	3	28 de diciembre de 2023
Acta de suspensión No. 1	4	28 de diciembre de 2023
Acta de justificación No. 2	5	14 de mayo de 2024
Acta de reinicio No. 1	6	16 de mayo de 2024
Acta de justificación No. 3	7	3 de julio de 2024
Otro si modificatorio No. 01	8	3 de julio de 2024
Acta de Justificación No.4	9	27 de agosto de 2024
Acta de Suspensión No. 2	10	27 de agosto de 2024
Acta de Justificación No.5	11	19 de mayo de 2025
Acta de Reinicio No. 1	12	19 de mayo de 2025
Acta de Justificación No.6	13	19 de mayo de 2025
Otrosi Modificatorio No. 2	14	19 de mayo de 2025
Acta de Justificación No.7	15	18 de julio de 2025
Acta de Suspensión 3	16	18 de julio de 2025
Acta de Justificación No.8	17	6 de octubre de 2025
Acta de Reinicio 3	18	6 de octubre de 2025
Acta de Justificación No.9	19	14 de octubre de 2025
Acta Modificatorio No.3	20	14 de octubre de 2025
Acta de Justificación No.10	21	24 de noviembre de 2025
Acta de Suspensión 4	22	24 de noviembre de 2025
Acta de Justificación No.11	23	18 de diciembre de 2025
Acta de Reinicio 4	24	18 de diciembre de 2025
Acta de Terminación	25	23 de diciembre de 2025

5.2. INFORMACION PRESUPUESTAL

PROYECTO PRESUPUESTAL:	Número: 2025000515	VALOR	VIGENCIA

197

Servicios para la comunidad, sociales y CONSORCIO personales AUXILIAR· 102-Construcción. Mejoramiento Y Adecuacion De Escenarios Deportivos Nuevos Y Existentes En El Departamento Del Huila UNIDAD EJECUTORA.O-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACION PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz SUBPROGRAMA: 1604-Recreación y deporte ELEM. CONST: 0001-Infraestructura en parques recreativos ylo espacios lúdicos incluyeinfraestructura municipal. que implica la construcción de escenanosadecuados para la practica de la actividad física. la recreación y el deporte. procurando que en lo posible sea una infraestructura mulumooalque permita la practica de diversos deportes y actividades PRODUCTO: 4301026-Cancha construida y dotada META· 10-Construccion y Dotación de Polideportivo ACTIV. 103- CONSTRUIR E ILUMINAR CUBIERTAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PROYECT0: 2023004410086-Construcción. Mejoramiento Y Adecuación De Escenarios Deportivos Nuevos Y Existentes En El Departamento Del Huila. FUENTE• 155915 FUENTE: 00AD-SSF-ASIGNACIONES DIRECTAS 20%	CONSORCIO	$ 584.887.213	2025

5.3. RELACION DE POLIZAS DE GARANTIAS

Póliza legalización del CONTRATO: CLPIH373 de 2023						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	**No.**	**ENDOZO**	**FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)**	**AMPARO**	**VIGENCIA**	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	**HASTA (dd/mm/aaaa)**
SEGUROS DEL ESTADO	37-44-101041844	Anexos 0	31/10/2023	Cumplimiento del contrato	31/10/2023	31/07/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	31/10/2023	31/07/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	31/10/2023	31/01/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 años, 0 meses y 0 día a partir de la suscripción del acta de recibo de la obra.	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	**No.**	**ENDOZO**	**FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)**		**VIGENCIA**	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	**HASTA (dd/mm/aaaa)**
SEGURO DEL ESTADO S.A.	37-40-101025972	Anexo 0	31/10/2023		31/10/2023	31/10/2024

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	**No.**	**ENDOZO**	**FECHA DE EMISIÓN**	**AMPARO**	**VIGENCIA**	
					DESDE	**HASTA**

			(dd/mm/aaaa)		(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
SEGURO DEL ESTADO S.A.	37-44-101041844	Anexo 0	31/10/2023	Cumplimiento del contrato	31/10/2023	31/07/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	31/10/2023	31/07/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	31/10/2023	31/01/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años, 0 meses y 1 días	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)					
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGURO DEL ESTADO S.A.	37-40-101025972	Anexo 0	31/10/2023	31/10/2023	31/01/2024

Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION No. 1 - ACTA DE REINICIO No. 1:						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGURO DEL ESTADO S.A.	37-44-101041844	Anexo 1 Suspensión	10/01/2024	Cumplimiento del contrato	31/10/2023	31/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	31/10/2023	31/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	31/10/2023	28/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años, 0 meses y 1 días.	
SEGURO DEL ESTADO S.A.	37-44-101041844	Anexo 6 Reinicio	29/05/2024	Cumplimiento del contrato	31/10/2023	14/12/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	31/10/2023	14/12/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	31/10/2023	14/06/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años, 0 meses y 1 días.	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)					
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGURO DEL ESTADO S.A.	37-40-101025972	Anexo 1 Suspensión	10/01/2024	31/10/2023	29/02/2024

SEGURO DEL ESTADO S.A.	37-40-101025972	Anexo 6 Reinicio	29/05/2024	31/10/2023	14/06/2024

Póliza actualizada x PRORROGA No. 1						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	**No.**	**ENDOZO**	**FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)**	**AMPARO**	**VIGENCIA**	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	**HASTA (dd/mm/aaaa)**
SEGURO DEL ESTADO S.A.	37-44-101041844	Anexo 11 Otro si n1	17/07/2024	Cumplimiento del contrato	31/10/2023	14/02/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	31/10/2023	14/02/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	31/10/2023	14/08/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años, 0 meses y 1 días.	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	**No.**	**ENDOZO**	**FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)**		**VIGENCIA**	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	**HASTA (dd/mm/aaaa)**
SEGURO DEL ESTADO S.A.	37-40-101025972	Anexo 7	17/07/2024		31/10/2023	14/08/2024

Póliza actualizada TRASLADO DE VIGENCIA.						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	**No.**	**ENDOZO**	**FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)**	**AMPARO**	**VIGENCIA**	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	**DESDE (dd/mm/aaaa)**
SEGURO DEL ESTADO S.A.	37-44-101041844	Anexo 13	17/07/2024	Cumplimiento del contrato	17/11/2023	17/11/2023
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/11/2023	17/11/2023
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2023	17/11/2023
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años, 0 meses y 1 días.	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	**No.**	**ENDOZO**	**FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)**		**VIGENCIA**	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	**HASTA (dd/mm/aaaa)**
SEGURO DEL ESTADO S.A.	37-40-101025972	Anexo 9	28/10/2024		17/11/2023	31/08/2024

Póliza actualizada x PRORROGA No. 2						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	**No.**	**ENDOZO**	**FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)**	**AMPARO**	**VIGENCIA**	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	**DESDE (dd/mm/aaaa)**

SEGURO DEL ESTADO S.A.	37-44-101041844	Anexo 18 Otrosí. No.2	12/06/2025	Cumplimiento del contrato	17/11/2023	27/01/2026
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/11/2023	27/01/2026
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2023	27/07/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años, 0 meses y 1 días.	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGURO DEL ESTADO S.A.	37-40-101025972	Anexo 13	28/10/2024	17/11/2023	27/07/2025

Póliza Actualizada PRORROGA No. 3

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGURO DEL ESTADO S.A.	37-44-101041844	Anexo 19 Otrosí. No.3	30/10/2025	Cumplimiento del contrato	17/11/2023	12/03/2026
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/11/2023	12/03/2026
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2023	12/09/2029
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años, 0 meses y 1 días.	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGURO DEL ESTADO S.A.	37-40-101025972	Anexo 14	30/10/2025	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES.	17/11/2023	12/09/2025

Póliza Actualizada Terminación

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)

SEGURO DEL ESTADO S.A.	37-44-101041844	Anexo 21 Terminación	14/01/2026	Cumplimiento del contrato	17/11/2023	23/06/2026
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/11/2023	23/06/2026
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2023	12/09/2029
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años, 0 meses y 1 días.	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGURO DEL ESTADO S.A.	37-40-101025972	Anexo 15	14/01/2026	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES.	17/11/2023	23/12/2025

6. DESIGNACIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN

- El día 16 de noviembre del 2023, mediante oficio remitido por la directora del INDERHUILA la señora **MIGDONIA PATIÑO ARIAS**, designó a la Ing. **CARMEN LIGIA ROJAS DUARTE** como apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. **CIHCM400 de 2023** cuyo objeto es la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINITRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA adjudicado del proceso precontractual de selección de concurso de méritos No. IHCM013-2023.

- El día 16 de febrero del 2024, el arquitecto **YOVANY PEÑA FIERRO** es designado mediante oficio remitido por el director del INDERHUILA el señor **FELIPE VICTORIA BARRAGAN**, como apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. **CIHCM400 de 2023** cuyo objeto es la "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINITRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL

MUNICIPIO DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA adjudicado del proceso precontractual de selección de concurso de méritos No. IHCM013-2023.

7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Dentro de las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 17 de noviembre de 2023 al 27 de diciembre de 2023, del 16 de mayo de 2024 al 26 de agosto de 2024 al 19 de mayo de 2025 al 17 de julio de 2025 y del 6 de octubre al 23 de noviembre de 2025 y del 18 de diciembre de 2025 al 23 de diciembre de 2025.

- ✓ A partir del día 1 de Agosto de 2024 se sigue trabajando en las labores concernientes al corte y figurado de acero de refuerzo de la viga canal, de igual manera durante el desarrollo del mes se presentó un balance de mayores y menores cantidades de obra.
- ✓ El día 27 de Agosto de 2024 se realiza la suspensión de los contratos, por razón de la revisión del balance de mayores y menores cantidades de obra. Una vez se superen estas condiciones que ha originado la suspensión se realiza el respectivo reinicio.
- ✓ El día 19 de mayo de 2025 se suscribe el acta de justificación No.05 y acta de reinicio N°02 del contrato obra e interventoría N°CLPIH373 de 2023 y N°CIHCM400 de 2023 respectivamente, por superarse los motivos que originaron la suspensión del contrato.
- ✓ El día 19 de mayo de 2025 se suscribe el acta de justificación No.06 y acta Modificatorio Otrosí N°02 del contrato de interventoría No.CIHCM400 de 2023, modificando la CLÁUSULA 4. PLAZO, prorrogando en DOS (02) MESES más el contrato de interventoría N°CIHCM400 de 2023 y adicionando UN MILLÓN CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($1.052.678) M/CTE al contrato, para un valor total de CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($ 46.790.977) M/CTE
- ✓ Que, el día 19 de mayo de 2025 se suscribe el acta de justificación No.06 y acta Modificatorio Otrosí N°02 del contrato obra N°CLPIH373 de 2023, modificando la CLÁUSULA 4. PLAZO, prorrogando en DOS (02) MESES más el contrato de obra N°CLPIH373 de 2023 y adicionando VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 27.769.955,00) M/CTE al contrato para un valor total de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS ($ 584.887.213,00) M/CTE.
- ✓ Se realizó la instalación del acero de refuerzo de las viga canales y posteriormente la fundición de las viga canales.
- ✓ Se realizó el transporte de los agregados y demás materiales para relleno y compactación, así como los requeridos para la fundición de concreto.
- ✓ Durante el mes de julio del año 2025 se ha venido teniendo contacto vía telefónica y mediante correo electrónico por parte de la Interventoría con el representante del consorcio y se está trabajando en el trámite y revisión de la documentación para cobro del acta parcial N°2.
- ✓ El día 18 de julio de 2025 se suscribe el acta de justificación No.07 y acta de suspensión N°03 del contrato obra e interventoría N°CLPIH373 de 2023 y N°CIHCM400 de 2023 por los motivos expuestos en el acta referida.
- ✓ El día 6 de octubre de 2025 se suscribe el acta de justificación No.08 y acta de reinicio N°03 del contrato obra e interventoría N°CLPIH373 de 2023 y N°CIHCM400 de 2023 respectivamente, por superarse los motivos que originaron la suspensión del contrato.
- ✓ Se realizó la instalación del acero de refuerzo de la placa de concreto del polideportivo junto con la construcción del mismo, se realiza la instalación de la malla electrosoldada para las cañuelas y la construcción de las cajas de inspección, además se realiza la instalación de las bajantes de agua en diámetro de 4 pulgadas y en pvc.

- ✓ Que, el día 14 de octubre de 2025 se suscribe el acta de justificación No.09 y acta Modificatorio Otrosí N°03 del contrato obra N°CLPIH373 de 2023, modificando la CLÁUSULA 4. PLAZO, prorrogando en CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS más el contrato de obra N°CLPIH373 de 2023
- ✓ Que, el día 14 de octubre de 2025 se suscribe el acta de justificación No.09 y acta Modificatorio Otrosí N°03 del contrato obra N°CLPIH373 de 2023, modificando la CLÁUSULA 4. PLAZO, prorrogando en CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS más el contrato de interventoría N° CIHCM400 de 2023

8. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE MENSUAL DE CONSULTORÍA / OBRA / INTERVENTORIA


Durante el periodo comprendido entre el 17 de noviembre de 2023 al 27 de diciembre de 2023, del 16 de mayo de 2024 al 26 de agosto de 2024 al 19 de mayo de 2025 al 17 de julio de 2025 y del 6 de octubre al 23 de noviembre de 2025 y del 18 de diciembre de 2025 al 23 de diciembre de 2025. y debido a las precipitaciones presentadas durante el final de la vigencia 2025 y parte del primer semestre del 2024 se ha podido obtener un avance de ejecución de la obra del 100.00%.

8.1 AVANCE DE OBRAS Y TRABAJOS


- Localización y replanteo
- Descapote manual e=0.2 incluye retiro.
- Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.
- Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.
- Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.
- Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas
- Construcción de vigas de cimentación en concreto de 210 kg/cm2-3000 PSI. Ver diseño.
- Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación
- Concreto ciclopeo - 2500 PSI (175 KG/CM2) 60% concreto 2500 PSI + 40% piedra media zonga.
- Construcción de columnas en concreto de 210 kg/cm2-3000 PSI.
- Acero de refuerzo Fy=60.000 PSI columnas.
- Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización.
- Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal
- Suministro e instalación de manto zetal viga canal.
- Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.
- Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.
- Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura.
- Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.
- Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.
- Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.
- Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.
- Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño.
- Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.

- Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.
- Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.
- Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"
- Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"
- Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.
- Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.
- Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.
- Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.
- Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.
- Suministro e instalación de reflector led de 150 w
- Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.
- Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.
- Transporte de materiales pétreos

9. ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO

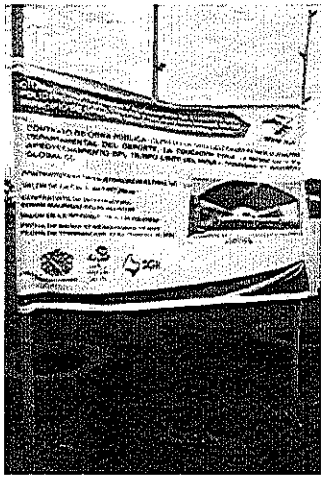

20/11/2023- 29/11/2023: Instalación de la valla del proyecto.

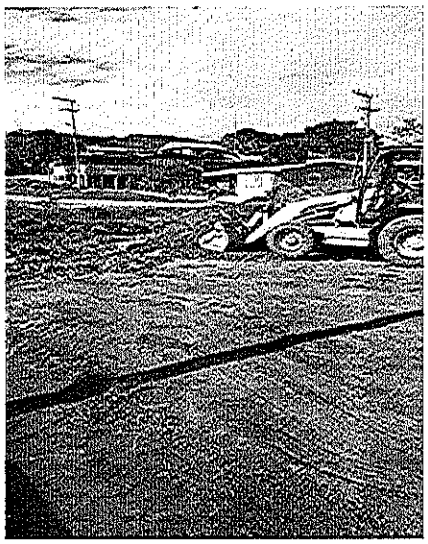




28/11/2023-8/12/2023: Localización, replanteo, descapote y aplicación de recebo



9/12/2023-29/12/2023: Excavaciones para cimentaciones.

19/05/2024- 24/05/2024: Aplicación de concreto ciclópeo.

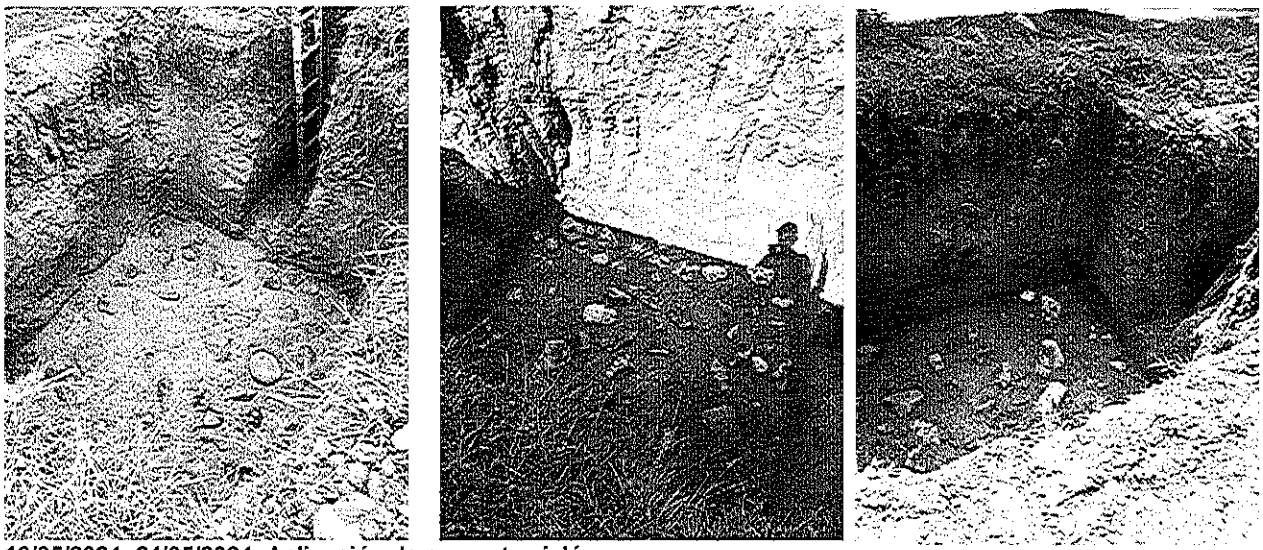


19/05/2024- 24/05/2024: Aplicación de concreto ciclópeo.



14/06/2024 -20/07/2024: acero de refuerzo de las columnas.

207

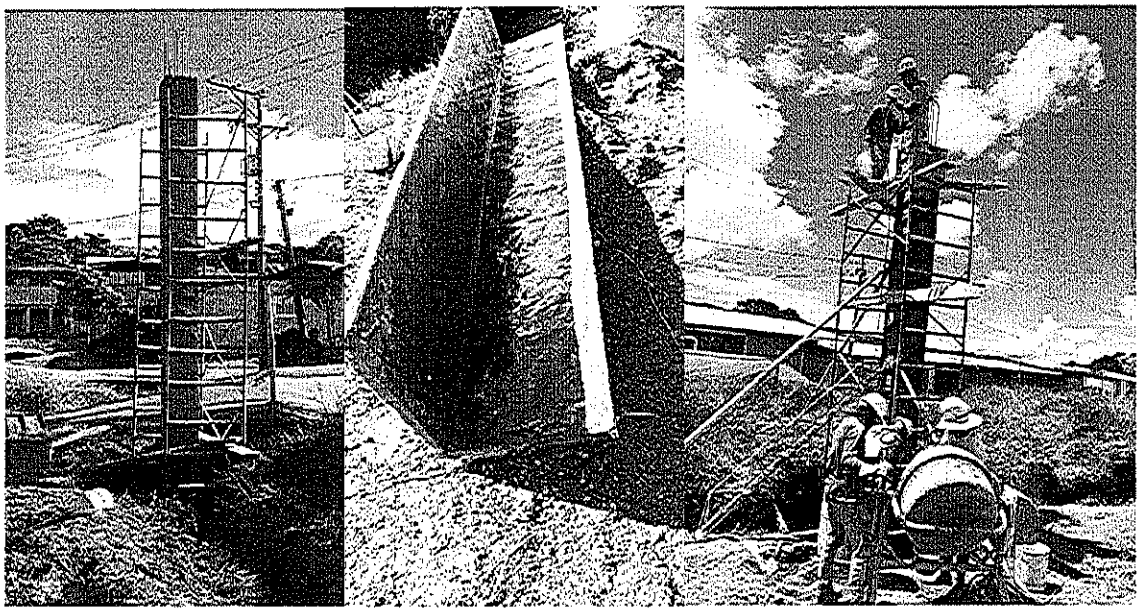


17/06/2024 -28/07/2024: Construcción de columnas.

258


Localización, replanteo, descapote y aplicación de recebo: 19/05/2025-31/05/2025



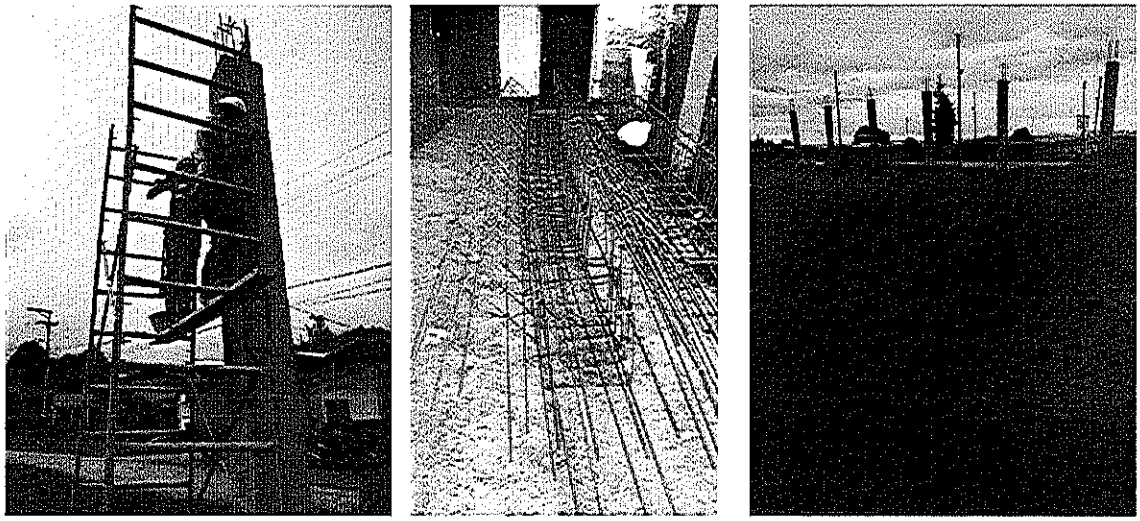

Corte y figurado de acero refuerzo de la viga canal. 1/08/2024- 31/05/2025

209

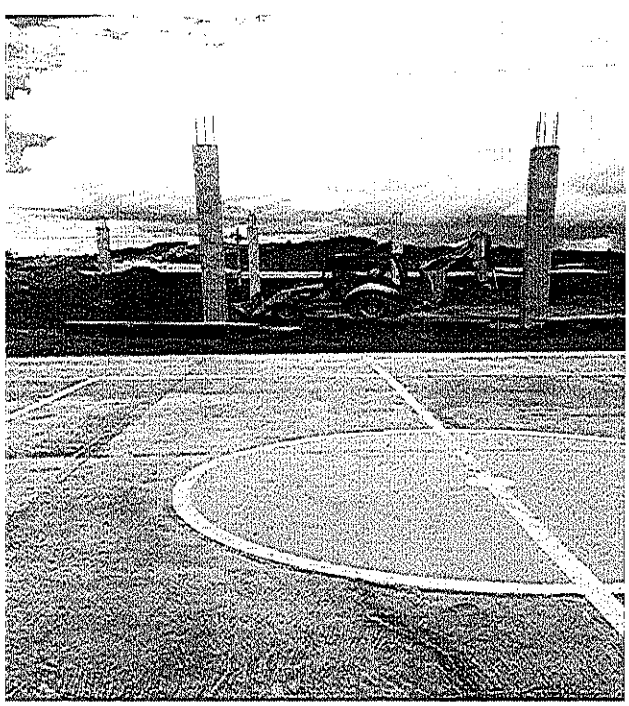





21/05/2025-31/05/2025: Localización, replanteo, descapote y aplicación de recebo.










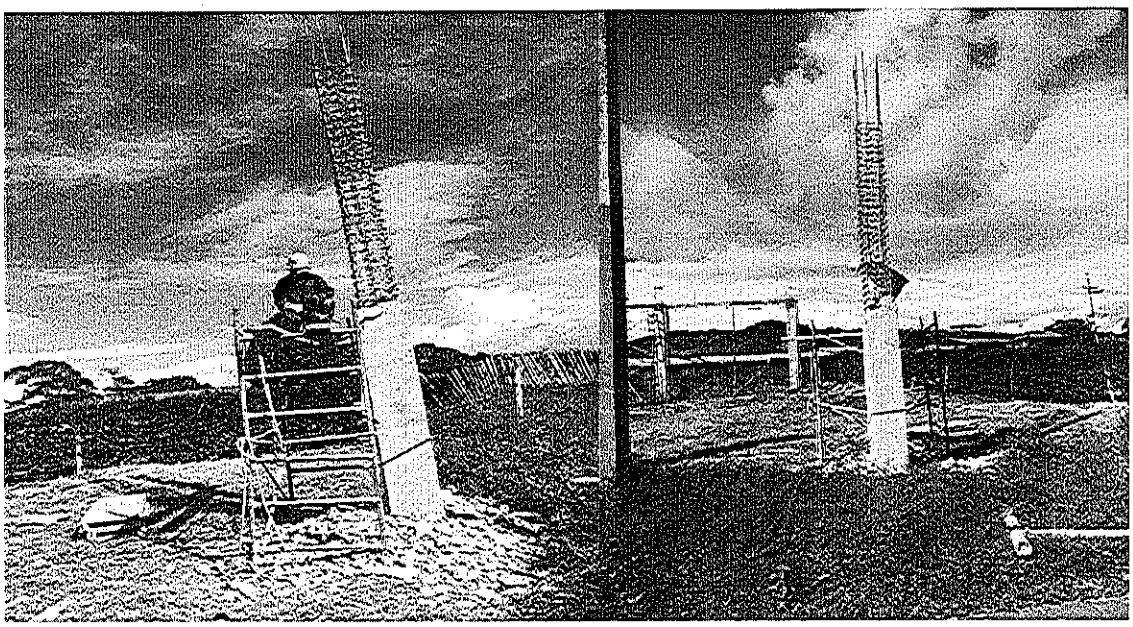

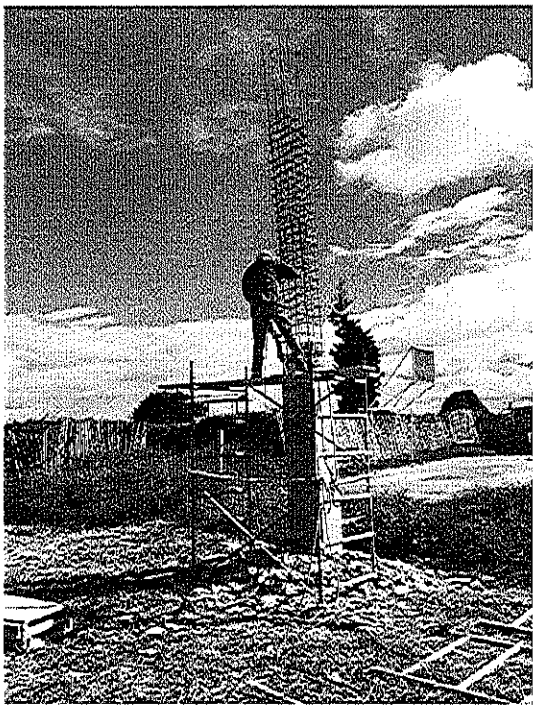


Demolición de columna: 27/05/2025-31/05/2025


Instalación del acero de refuerzo para viga canal, junto con su respectivo corte y figurado: 24/05/2025- 30/06/2025

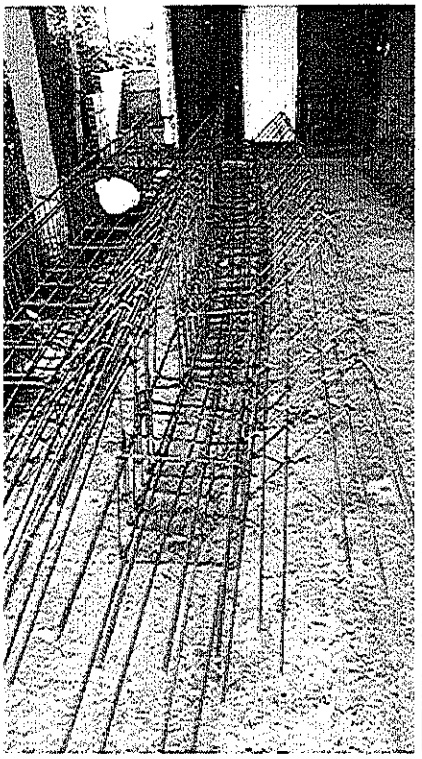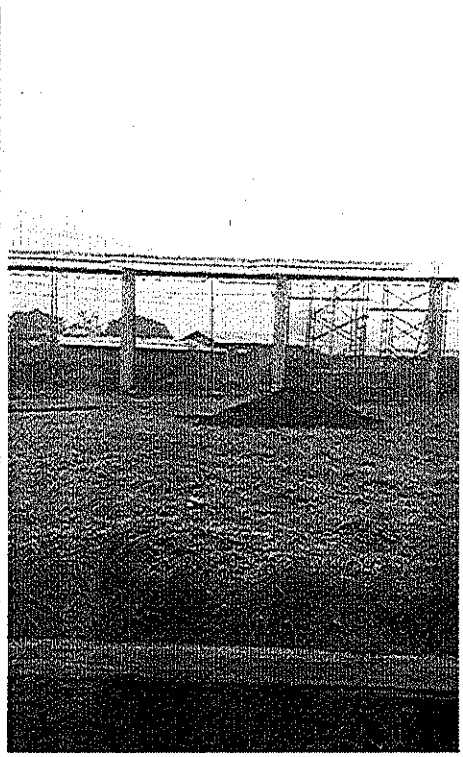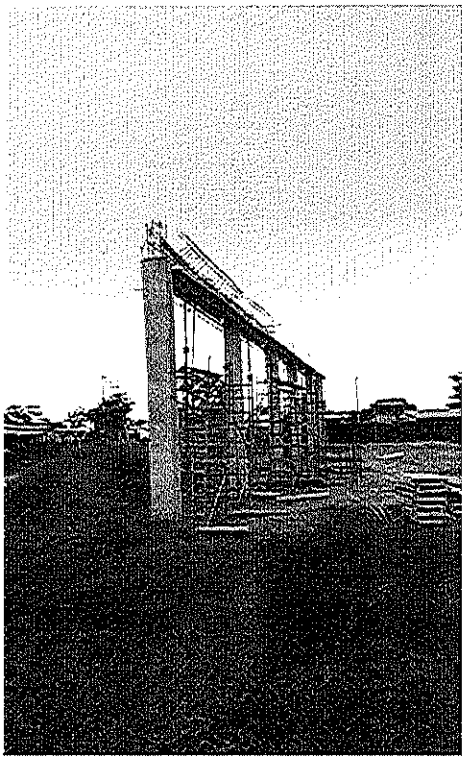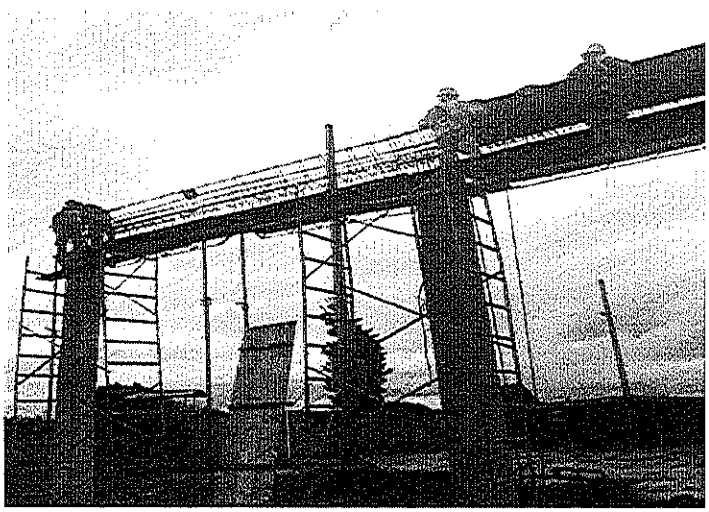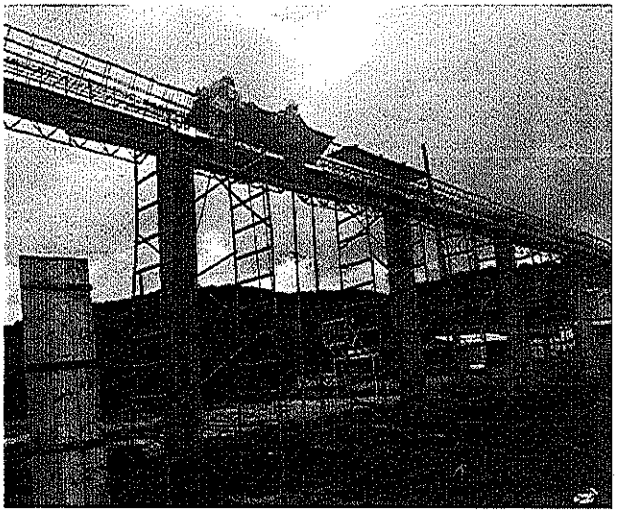




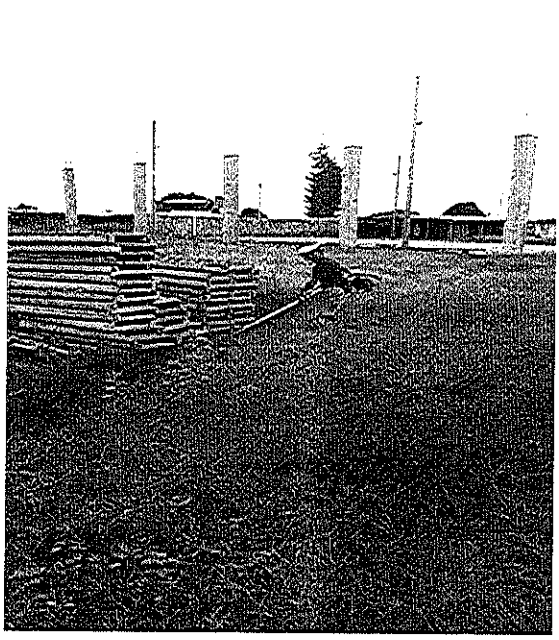

Colocación de formaletas y camillas para vigas canal: 07/06/2025 19/6/2025

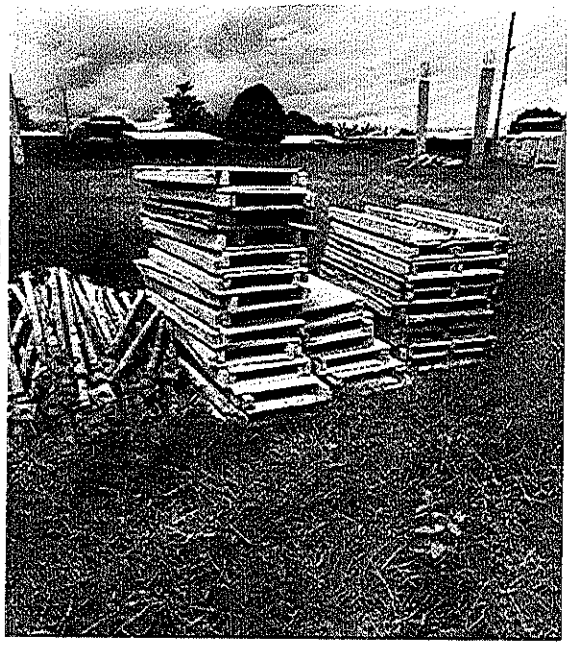22

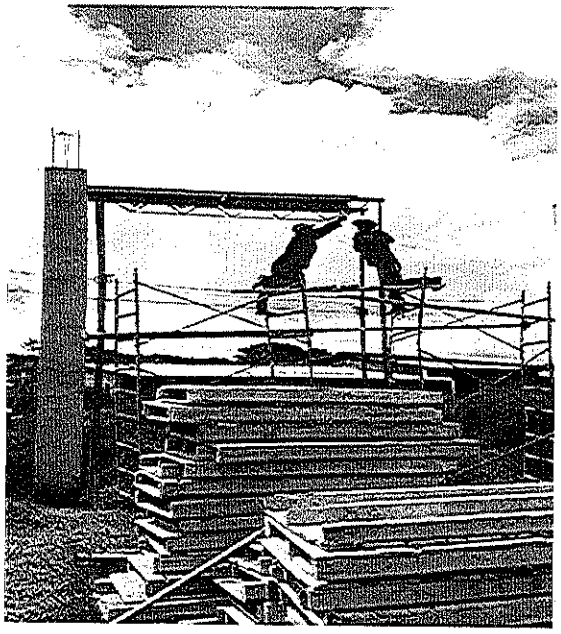









43

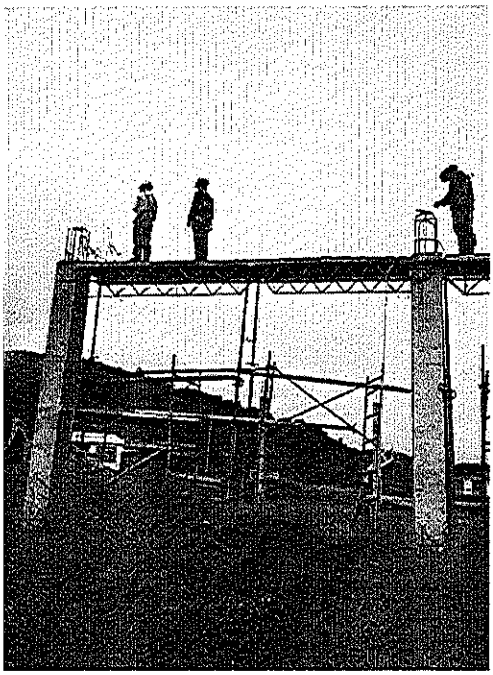


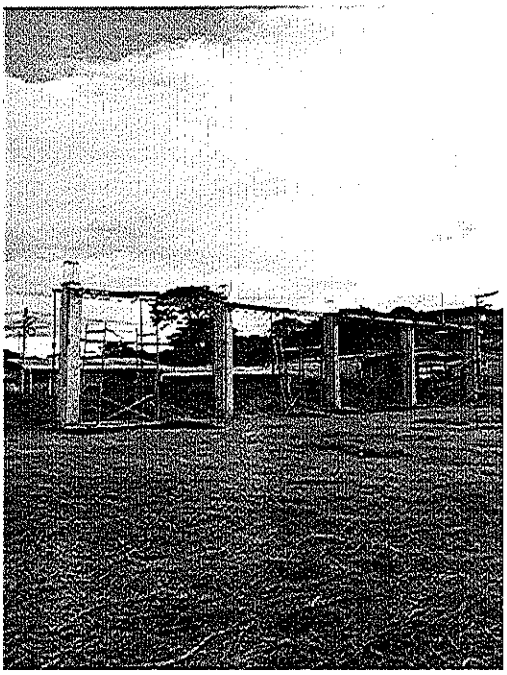







Fundición de la viga canal: 21/06/2025 – 03/07/2025

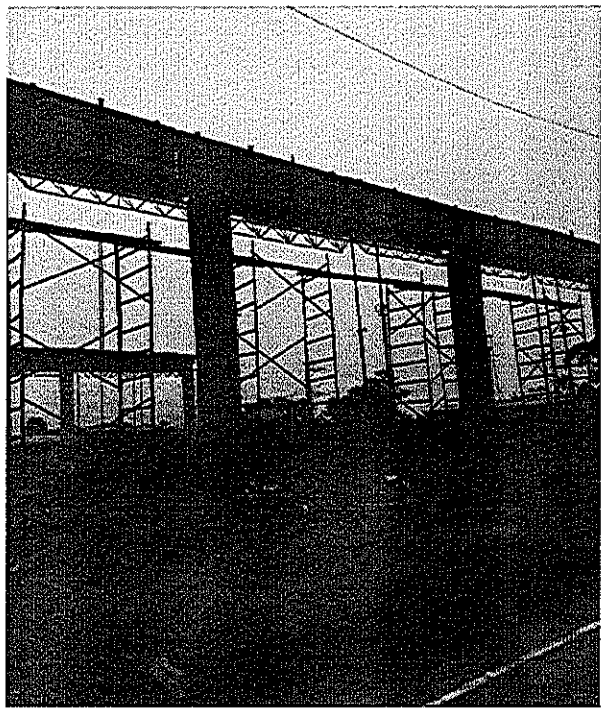




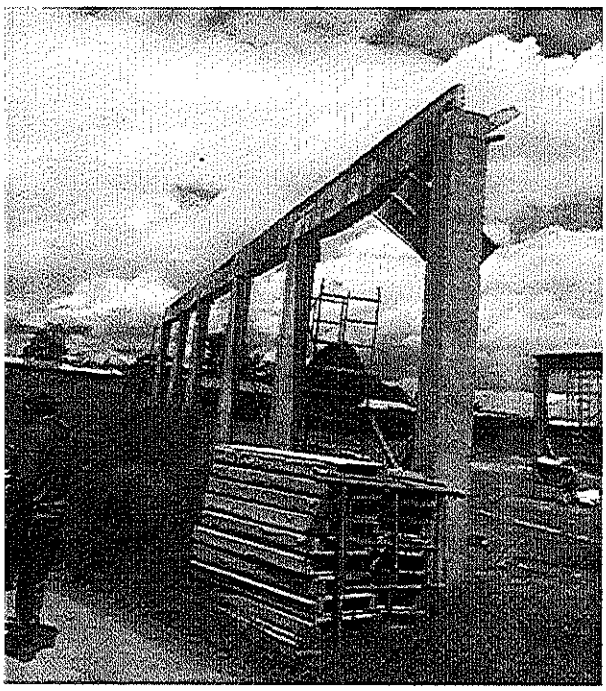


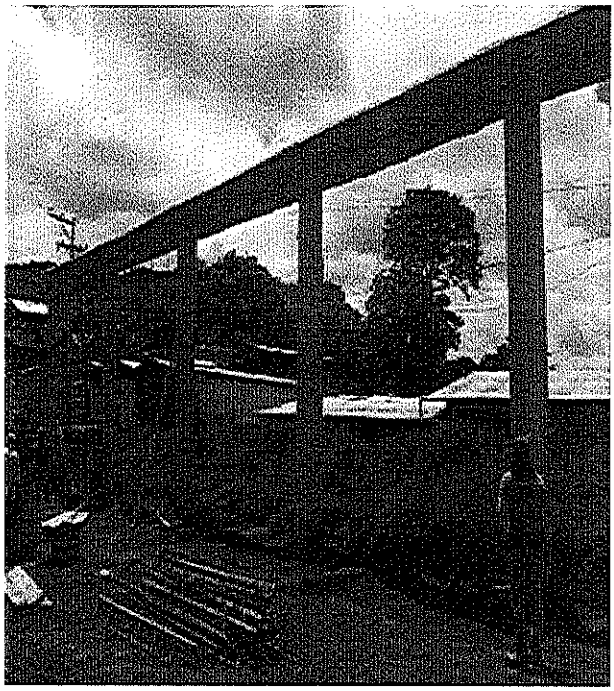

25

Suministro e instalación de manto zetal viga canal. 17/10/2025 – 31/10/2025

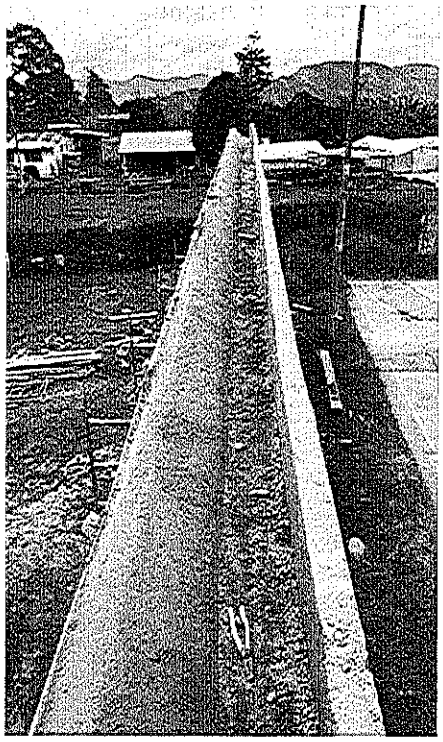

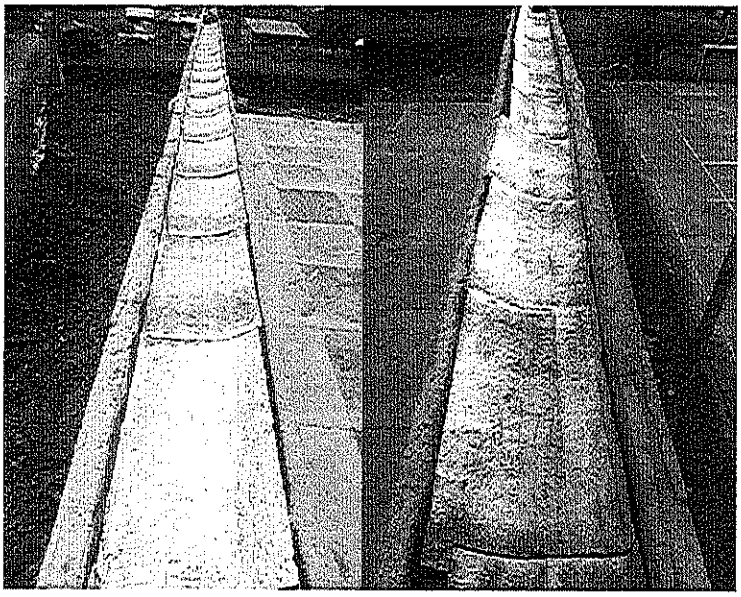

216


Construcción de placa en concreto del polideportivo con espesor de 10 cm. 6/10/2025-13/11/2025







27

Construcción de cañuelas. 30/10/2025 – 13/11/2025

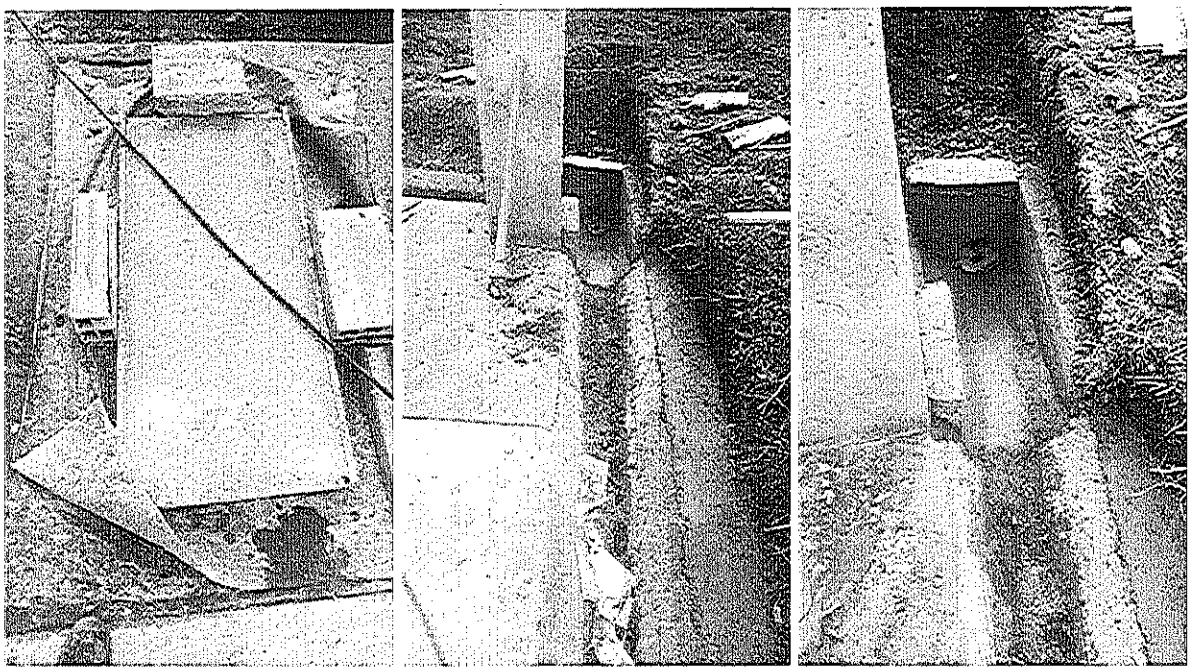


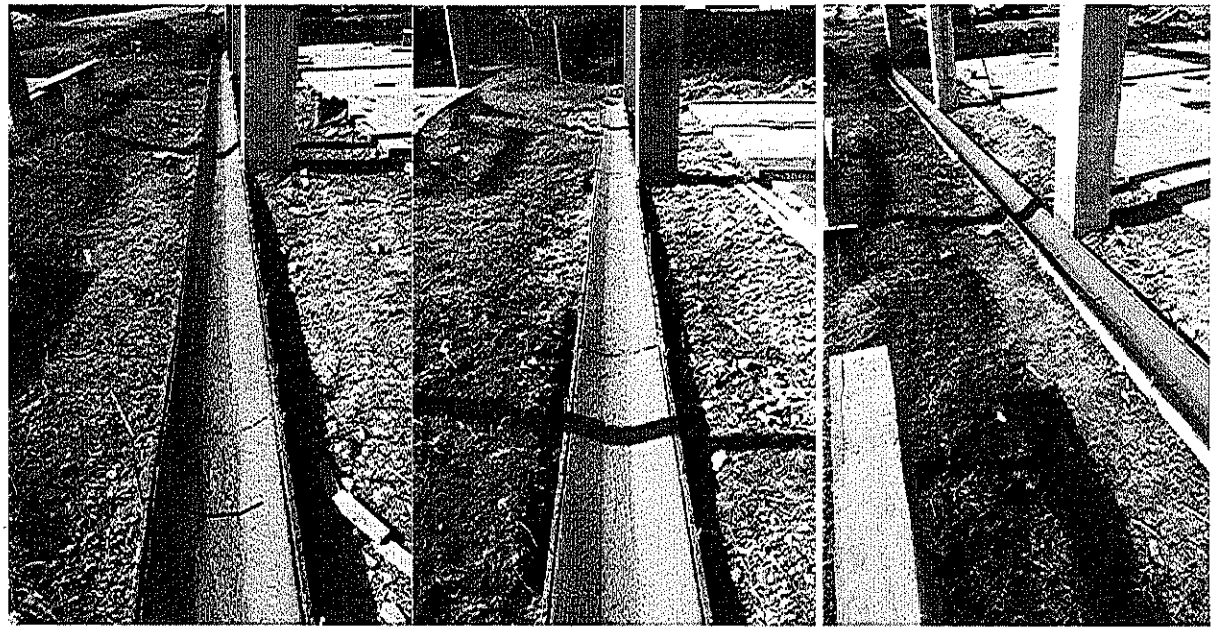


Instalación de bajantes de agua en pvc de diámetro 4 pulgadas: 4/11/2025 – 13/11/2025

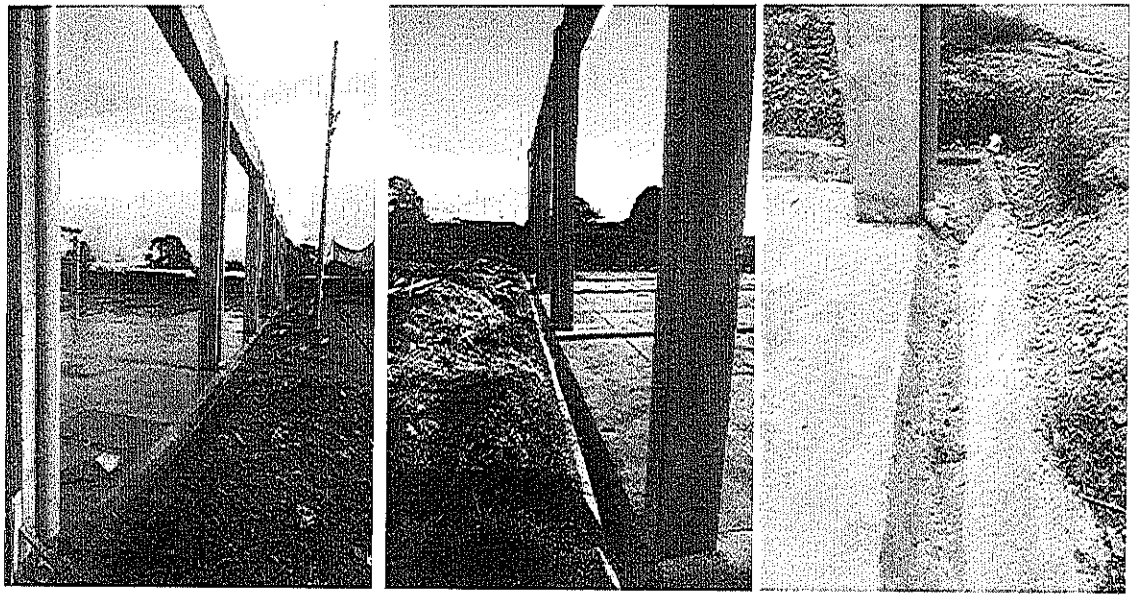




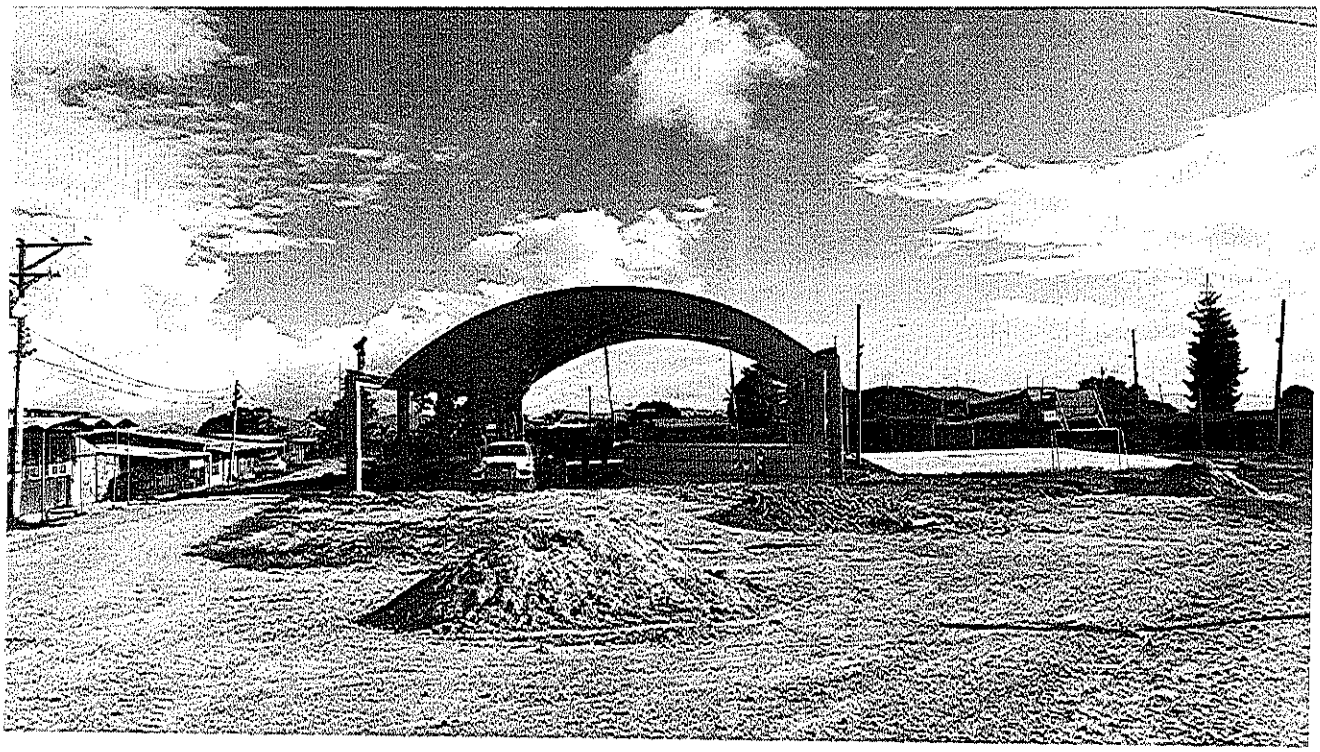

18/12/2025 Suministro e instalación de cubierta.

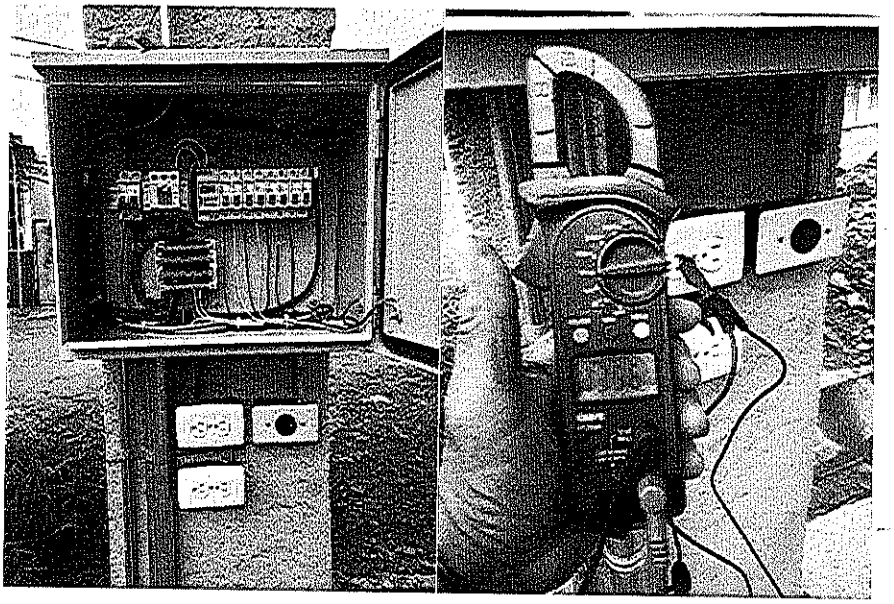

19/12/2025- Iluminación de la cubierta.

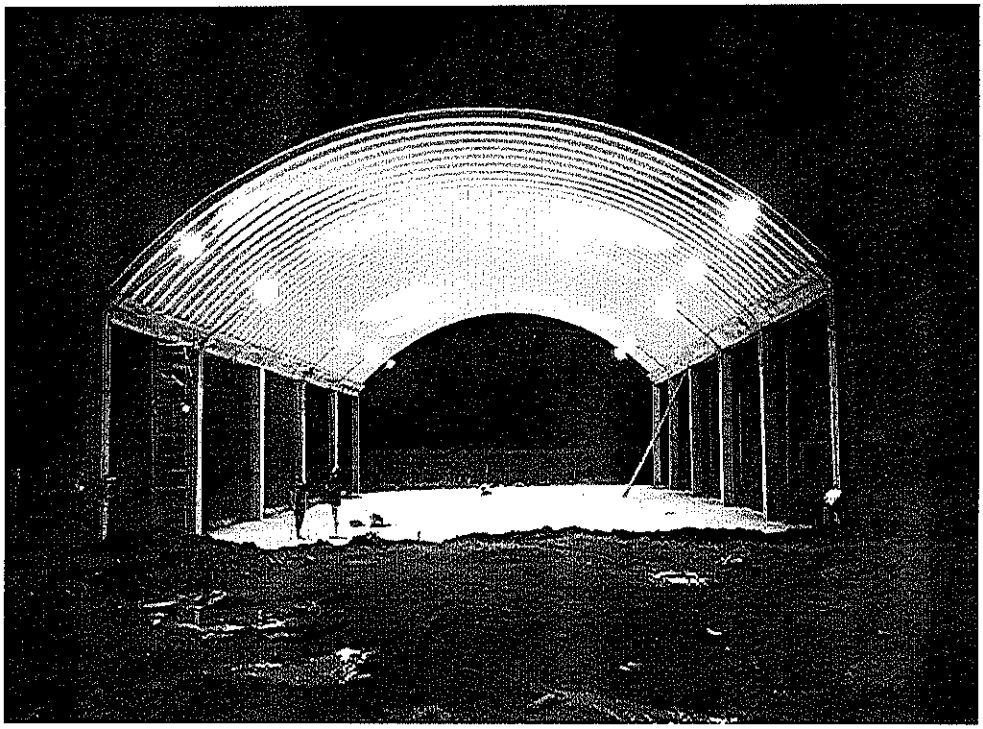


19/12/2025- Instalación de tubería



224




23/12/2025- Instalación de lámparas.

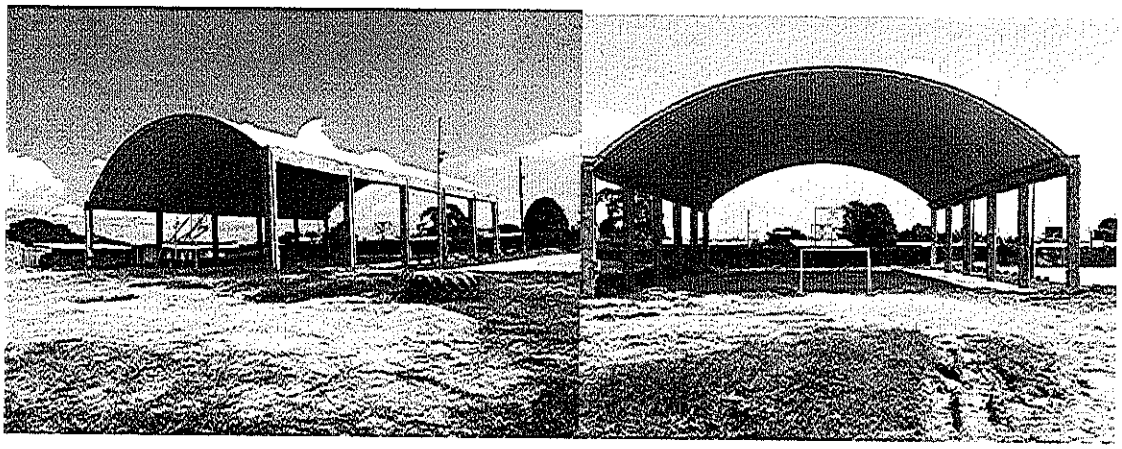


23/12/2025- Acabado final.


222


Transporte de material pétreo: 31/05/2025 – 04/07/2025

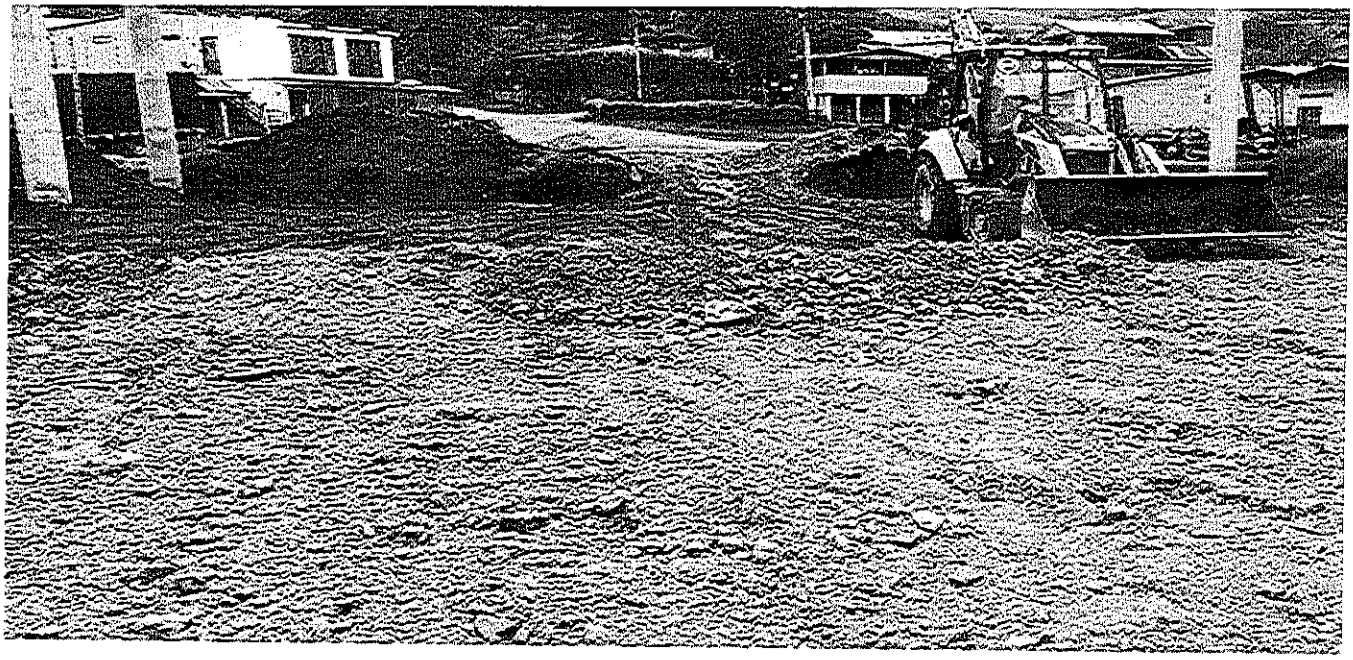

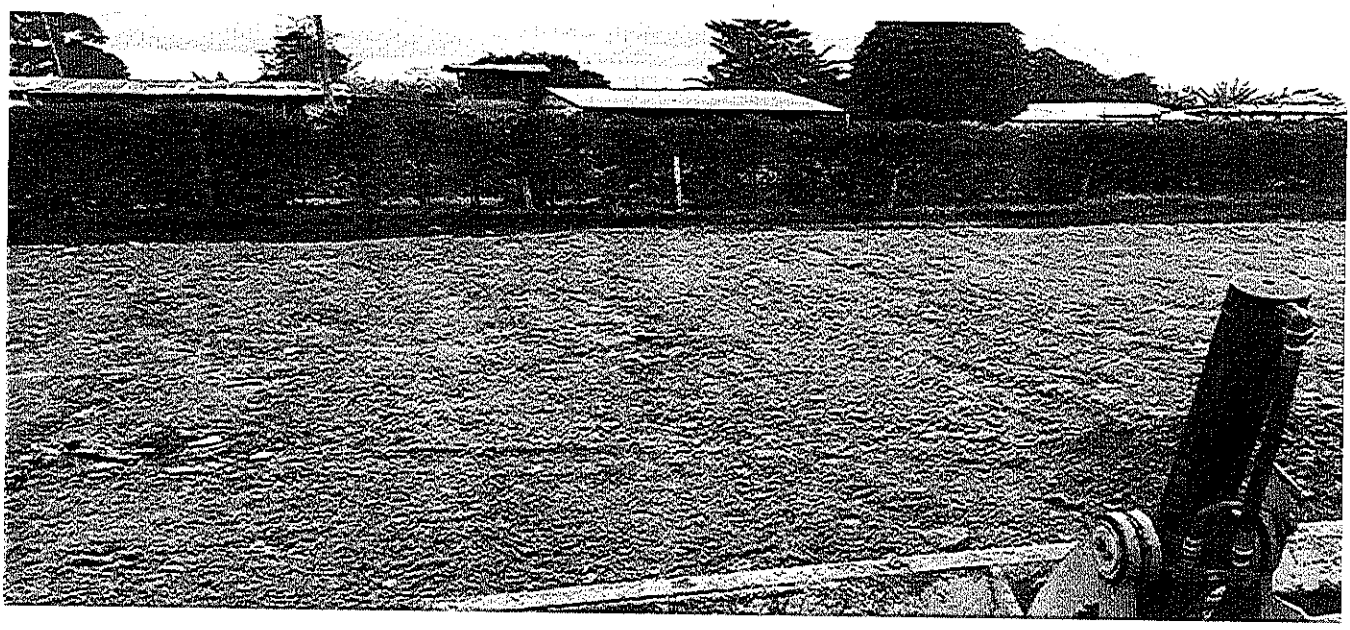

223

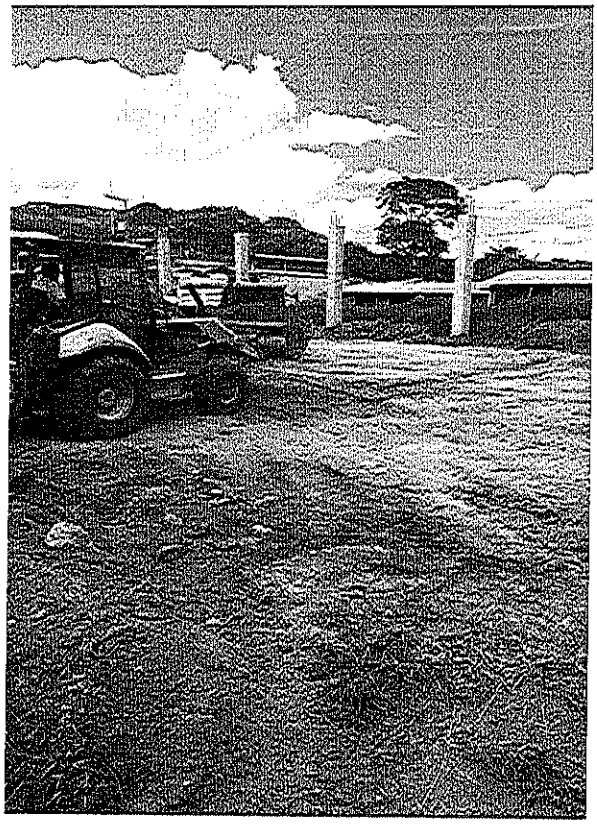

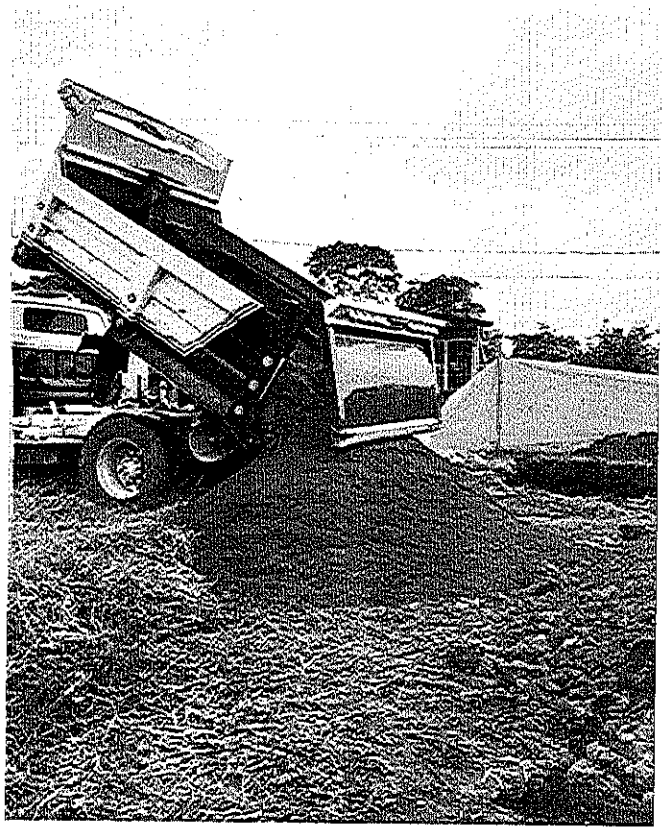

Arq. YOVANY PEÑA FIERRO	23/12/2025	Ing. XIMENA ADELINDA JIMENEZ ZUÑIGA
FIRMA ORIGINAL **APOYO A LA SUPERVISIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **Vo. Bo. CONTRATISTA GESTIÓN INFRAESTRUCTURA**
