FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO



EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTEMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO.

CONSORCIO COCO

INFORME AMBIENTAL No. 7

1 AL 31 DE JULIO DE 2026



BOGOTA, JULIO DE 2026
VERSION 2

VALIDACIONES DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaboró	Residente Ambiental	Hernán David Bermúdez	
Aprobó:	Director de Obra	Marlo Santamaria	

APROBACIÓN INTERVENTORÍA

La interventoría ha revisado el presente informe, por lo tanto, aprueba y avala la información descrita, autoriza la radicación del mismo ante la Entidad.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Revisó:	Residente Ambiental	Edna Ruth Casadiego	
Aprobó:	Director de Interventoría	Santiago Carrillo	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO
1	27/07/2026	Emisión Inicial
2	4/08/2026	Atención a observaciones realizadas por interventoria

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 6
2. OBJETIVOS 7
2.1. OBJETIVO GENERAL 7
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 7
3. ALCANCE 8
4. MARCO NORMATIVO 8
4.1. NORMATIVIDAD GENERAL 8
4.2. NORMATIVIDAD PARA RESIDUOS SÓLIDOS 9
4.3. NORMATIVIDAD PARA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 9
4.4. NORMATIVIDAD PARA MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES Y VERTIMIENTOS 10
4.5. NORMATIVIDAD PARA MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 10
4.6. NORMATIVIDAD PARA SEÑALIZACIÓN 11
5. GENERALIDADES DEL PROYECTO 11
5.1. LOCALIZACION DEL PROYECTO 11
5.2. INFORMACION DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA 14
6. METODOLOGIA 16
7. ACTIVIDADES TECNICAS 16
8. MANUAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 18
8.1. COMPONENTE A SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 18
8.1.1 Programa A1. Manejo para el cumplimiento de requisitos y A&SST 18
8.2. COMPONENTE B MANEJO AMBIENTAL EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 22
8.2.1 Programa B1. Manejo de Campamentos fijo y/o temporales y centros de acopio.. 22
8.2.2 Programa B2. Manejo de Materiales de Construcción 24
8.2.3 Programa B3. Manejo Integral de Residuos sólidos 27
8.2.4 Programa B4. Control de Emisiones Atmosféricas 31
8.2.5 Proyecto B5. Manejo integral de Cuerpos de Agua, Sumideros y Estructuras hidráulicas 31

8.3. COMPONENTE C MANEJO DE LA VEGETACIÓN, PAISAJISMO Y FAUNA SILVESTRE 32
8.3.1 Programa C1 Manejo de la vegetación 32
8.3.2 Programa C2 Manejo de Fauna Silvestre 33
8.4. COMPONENTE E MANEJO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD. 33
8.4.1 Programa E1 Manejo de Plan de Señalización 33
9. SEGUIMIENTO 35
10. CUMPLIMIENTO DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD 38
10.1. POLÍTICA AMBIENTAL 38
10.2. ACTIVIDADES DE SOSTENIBILIDAD 39
11. CONCLUSIONES 40

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Normatividad General....8
Tabla 2 Normatividad para residuos sólidos....9
Tabla 3 Normatividad para materiales de construcción....9
Tabla 4 Normatividad para aguas superficiales y vertimientos....10
Tabla 5 Normatividad para emisiones atmosféricas....10
Tabla 6 Normatividad para señalización....11
Tabla 7 Listado de CIVS Y PK-ID - CONTRATO DE OBRA 613 – 2025 – LP (143265) – CONSORCIO COCO....12
Tabla 8 Listado de PK-ID - CONTRATO DE OBRA 613 – 2025 – LP (143265) – CONSORCIO COCO....13
Tabla 9. Listado de CIVS Y PK-ID - CONTRATO DE OBRA 613 – 2025 – LP (143265) – CONSORCIO COCO....14
Tabla 10 Información general....14
Tabla 11 Profesionales componente Ambiental y SST....19
Tabla 12 Permisos ambientales....19
Tabla 13 Relación de correspondencia enviada y recibida durante el periodo del informe....20
Tabla 14 Comités de seguimiento....21
Tabla 15 Proveedores de materiales....24
Tabla 16. Relación de gestores de RCD presentados....28
Tabla 17. COI Aprobados....35

INDICE DE FOTOGRAFIAS

Fotografía 1. Comité de seguimiento de obra realizado en la Alcaldía deTunjuelito....21
Fotografía 2. Comité de seguimiento de obra....21
Fotografía 3. Capacitacion frente de obra....22
Fotografía 4. Capacitacion punto Crea....22
Fotografía 5. Oficina Consorcio COCO....22
Fotografía 6. Oficina Consorcio COCO....23
Fotografía 7. Campamento de obra CIV 6001206....23
Fotografía 8. Campamento de obra CIV 6000830....23
Fotografía 9. Campamento de obra CIV 6000617....23
Fotografía 10. Punto Ecologico CIV 6001206....23
Fotografía 11. Punto Ecologico CIV 6000830....233
Fotografía 12. Punto Ecológico CIV 6000617....233
Fotografía 13. Punto Ecológico CIV 6001206....23
Fotografía 14. Punto Ecológico puntyo CREA....28

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1. Componente A. Sistema GA.
Anexo 2. Componente B. Manejo Ambiental.
Anexo 3. Componente C. Manejo de vegetación y Paisajismo.
Anexo 4. Componente E. Manejo de señalización.

1. INTRODUCCION

En el presente informe se presenta el avance del contrato de obra No. 613 de 2025 a cargo de CONSORCIO COCO, en el periodo comprendidos entre 1 al 31 de julio de 2026, en el cual se realiza una descripción detallada de las actividades ambientales del contrato de obra durante la ejecución en el periodo actual, enmarcadas en la etapa constructiva, describiendo las solicitudes requeridas ante Entidades Distritales, la aplicación del Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición (PMA-RCD), los programas propuestos en el Manual de Control y Seguimiento Ambiental y SST, documentos contractuales y procedimientos establecidos por parte del Fondo de desarrollo local de Tunjuelito, en el desarrollo de las actividades propias del contrato de obra cuyo objeto es “**EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTEMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO”**

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Describir en el presente informe el cumplimiento de los programas ambientales del contrato **FDLT-613 DE 2025** que tiene por objeto **"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTEMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO".**

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Describir las actividades del componente ambiental desarrolladas en el periodo del 1 al 31 de julio de 2026.
- Dar cumplimiento a las normas ambientales y mineras, originando una interacción educada con el medio ambiente y tomando medidas de control para generar ambientes de trabajo, saludables y seguros para los trabajadores y habitantes del área de influencia directa e indirecta del proyecto.
- Demostrar el cumplimiento de las obligaciones legales ambientales.
- Demostrar el cumplimiento a las actividades establecidas en el cronograma de actividades contempladas en el Manuel de control y seguimiento ambiental.
- Documentar la gestión realizada del área ambiental para el inicio de actividades contractuales.
- Implementar el Plan de Señalización para garantizar la seguridad e integridad de los usuarios, peatones y trabajadores, evitando también la obstrucción del flujo vehicular.

3. ALCANCE

En el presente informe se describen las actividades del componente ambiental adelantadas en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del contrato de obra cuyo objeto es "**EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR LE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS CTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTEMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO".**

Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido el MAO y el Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición presentados con anterioridad con el objetivo de prevenir, mitigar, controlar corregir o compensar los impactos al medio ambiente generados por la ejecución del contrato.

4. MARCO NORMATIVO

4.1. Normatividad General

Tabla 1 Normatividad General

Decreto Ley 2811 de 1974	Código nacional de los recursos naturales. Presidencia de la República.
Ley 99 de 1993	Crea el Ministerio de Medio Ambiente. Congreso de la República de Colombia.
Acuerdo 19-1996	Crea el Estatuto General de Protección Ambiental del D.C. SIAC Asignando competencias a las Entidades Distritales. Alcaldía de Bogotá.
Ley 388 de 1997	Ordenamiento Territorial Colombiano. Presidencia de la República.
Acuerdo 79 de 2003	Expedición del Código de Policía de Bogotá. Alcaldía de Bogotá.
Acuerdo 645 de 2016	Por el cual se adopta El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 "Bogotá Mejor Para Todos".
Decreto 319 de 2006	Por lo cual se adopta el Plan Maestro de Movilidad –PMM- para Bogotá Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones.
Decreto Distrital 190 de 2004.	Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003. Plan de Ordenamiento de Bogotá D.C.

Fuente: CONSORCIO COCO

4.2. Normatividad para residuos sólidos

Tabla 2 Normatividad para residuos sólidos

Ley 142 de 1994	Servicios Públicos. Congreso de la República de Colombia.
Resolución 00932 del 2015	Por la cual la Secretaria Distrital de Ambiente modifica y adiciona la Resolución 1115 de 2012. Guía de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición de 2015 - Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. – Secretaria Distrital de Ambiente.
Resolución 1330 de 2019	Por la cual se establecen los lineamientos del Directorio Ambiental de Proveedores de Materiales de Construcción. Sitios de Disposición _Final y Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD del IDU.
Decreto 838 de 2005	Modifica el Decreto 1713 sobre la disposición final de residuos sólidos. Presidencia de la república de Colombia.
Decreto 034 de 2009	Por el cual se establecen condiciones para el tránsito de vehículos descarga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones: Alcaldía de Bogotá.
Resolución 472 de 2017	Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones
Resolución 1257 de 2021	Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones

Fuente: CONSORCIO COCO

4.3. Normatividad para materiales de construcción

Tabla 3 Normatividad para materiales de construcción

Ley 26 de 1989	Ministerio de Minas.
Decreto 2222 de 1993.	Ministerio de Minas y Energía. Presidencia de la república de Colombia.
Resolución 222 de 1994	Por la cual se determinan zonas compatibles para las explotaciones mineras de materiales de construcción en la Sabana de Bogotá y se dictan otras disposiciones. Ministerio del medio ambiente.
Decreto 1521 de 1998	Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo. Ministerio de minas y energía.
Ley 685 de 2001	Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones. Congreso de Colombia.
Decreto 4299 de 2005	Por el cual se reglamenta el artículo 61 de la Ley 812 de 2003 y se establecen otras disposiciones. Ministerio de minas y energía.
Decreto 265 de 2016.	Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 442 de 2015 y se adoptan otras disposiciones
Decreto 442 de 2015.	Por medio del cual se crea el Programa de aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas en el Distrito Capital y se adoptan otras disposiciones. Alcaldía de Bogotá.

Fuente: CONSORCIO COCO

4.4. Normatividad para manejo de aguas superficiales y vertimientos

Tabla 4 Normatividad para aguas superficiales y vertimientos

Decreto 2811 de 1974	Vertimientos. Presidencia de la República de Colombia.
Decreto 2858 de 1981	Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 56 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y se modifica el Decreto 1541 de 1978. Presidencia de la República de Colombia.
Decreto 1594 de 1984	Usos del Agua y Residuos Líquidos. Presidencia de la República de Colombia.
Decreto 321 de 1999	Plan de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas. Ministerio de medio ambiente.
Resolución 3956 de 2009.	Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital. Secretaría distrital de ambiente.
Resolución 3957 de 2009	Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en el Distrito Capital". Secretaría distrital de ambiente
Resolución 631 de 2015.	Por el cual se establecen los parámetros y los valores límite Máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. Ministerio de medio ambiente

Fuente: CONSORCIO COCO

4.5. Normatividad para manejo de emisiones atmosféricas

Tabla 5 Normatividad para emisiones atmosféricas

Decreto 02 de 1982	Calidad del Aire. Presidencia de la República de Colombia.
Decreto 2107 de 1995	Modifica el decreto 948 de 1995. Decreto 2107 de 1995
Resolución 005 de 1996	Regula los niveles permisibles de emisiones de fuentes móviles. Ministerio de transporte.
Resolución 160 de 1996.	Emisiones fuentes móviles. DAMA.
Resolución 2254 de 2017	Por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan otras disposiciones.
Decreto 417 de 2006	Medidas para reducir y mejorar la calidad del aire en Bogotá D.C. Alcaldía de Bogotá.
Resolución 627 de 2006	Norma nacional de emisión de ruido ambiental. Ministerio de medio ambiente.
Resolución 910 de 2008	Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones. Ministerio de medio ambiente.
Resolución 6982 de 2011	Por la cual se dictan normas sobre prevención y control de la contaminación atmosférica por fuentes fijas y protección de la calidad del aire. Secretaría Distrital de Ambiente.
Decreto 1801 de 2016	Código Nacional de Policía y Convivencia. Presidencia de la República de Colombia.

Fuente: CONSORCIO COCO

4.6. Normatividad para señalización

Tabla 6 Normatividad para señalización

Resolución 463 de 1999	Por el cual se adopta el Manual para el Manejo de Tránsito por obras civiles en zonas urbanas. Alcaldía de Bogotá.
Resolución 171 de 2003	Por el cual se modifica el Manual para el Manejo de Tránsito por obras civiles en zonas urbanas. Alcaldía de Bogotá
Resolución 1050 de 2004	Por medio de la cual se adopta el Manual de señalización vial. Ministerio de Transporte.
Decreto 1801 de 2016	Código Nacional de Policía y Convivencia. Presidencia de la República de Colombia.


Fuente: CONSORCIO COCO

5. GENERALIDADES DEL PROYECTO

5.1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El presente proyecto se llevará a cabo en la localidad 6, Tunjuelito. La cual se encuentra ubicada al sur de la ciudad, en la margen derecha del río Tunjuelito. Limita, al norte con las localidades de Puente Aranda y Kennedy; al occidente con la localidad de Ciudad Bolívar; al sur con la localidad de Usme y al oriente, con la localidad de Rafael Uribe Uribe.

Imagen 1 Localidad de Tunjuelito

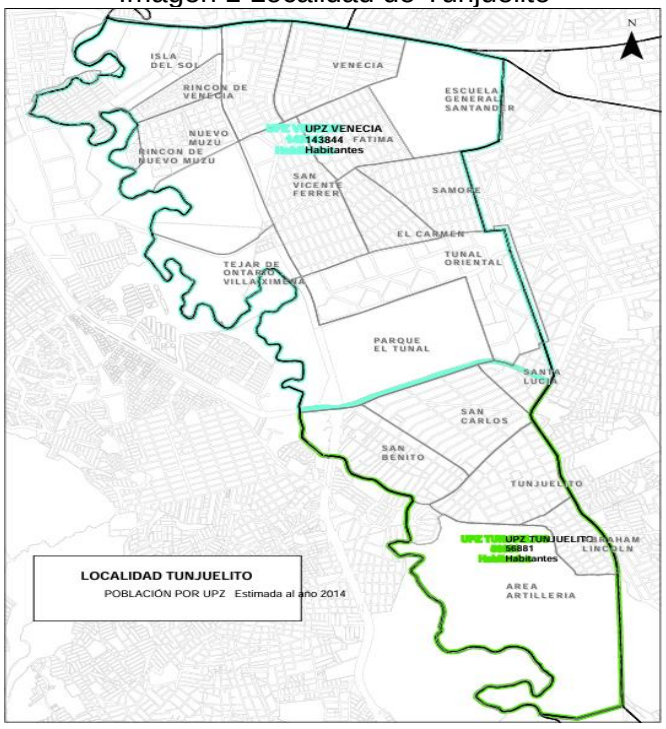

Fuente: Alcaldía Local de Tunjuelito

Posee una extensión total de 991,1 hectáreas (ha), de las cuales 281 ha se clasifican en suelo protegido. Por otra parte, la localidad de Tunjuelito no presenta suelo rural; cuenta con dos (2) UPZ de las cuales Venecia es de tipo residencial consolidado y Tunjuelito es de tipo residencial de urbanización incompleta.

La UPZ 42 Venecia se ubica en la zona norte de Tunjuelito y tiene una extensión de 662,05 ha que, equivalen al 66,8% del total del suelo de esta localidad. Limita por el norte con la avenida del Sur o autopista Sur; por el oriente con la Escuela General Santander, la calle 47 sur y la urbanización El Tunal; por el sur con la avenida Ciudad de Villavicencio y por el occidente, con el río Tunjuelito.

La UPZ 62 Tunjuelito se localiza al sur de la localidad y tiene una extensión de 329,05 ha. Limita por el norte con la avenida Ciudad de Villavicencio, por el oriente con la avenida Caracas carretera a Usme, por el sur con el límite de la localidad Usme y por el occidente con el río Tunjuelito.

Teniendo en cuenta lo anterior y la disponibilidad presupuestal en el proyecto de inversión No. 2914 “Tunjuelito se moviliza con seguridad” para la vigencia 2025, se priorizaron los siguientes segmentos viales con intervención sobre calzada que obtuvieron los factores de priorización más altos y que serán la meta del presente proyecto son:

Tabla 7 Listado de CIVS Y PK-ID - CONTRATO DE OBRA 613 – 2025 – LP (143265) – CONSORCIO COCO

CIV	PK-ID	EJE VIAL	DESDE	HASTA	BARRIO	TIPO DE PAVIMENTO	TIPO DE MALLA VIAL	TIPO DE INTERVENCIÓN	ÁREA
6001390	324120	Cll. 53 sur	Cra. 15	Cra. 17	San Carlos	Flexible	Intermedia	Rehabilitación - reconstrucción	356,81
6000789	322292	Cll. 49ª sur	Cra. 31	Cra. 33	Samoré	Flexible	Intermedia	Rehabilitación – reconstrucción	612,03
6000859	322502	Cll. 50 sur	Cra. 29	Cra. 31	Samoré	Flexible	Local	Rehabilitación – reconstrucción	170,6
6000931	322715	Cll. 53b sur	Cra. 32	Cra. 33	San Vicente f.	Flexible	Local	Rehabilitación – reconstrucción	287,46
6000833	322424	Cll. 50 b sur	Cra. 32	Cra. 31	Samoré	Flexible	Local	Rehabilitación – reconstrucción	180,3
6000557	321649	Cll. 50 a sur	Cra. 36	Cra. 37	Fátima	Flexible	Local	Mantenimiento Periódico	220,1
6000389	321168	Cra. 38	Cll. 50 a sur	Cll. 50 b sur	Fátima	Flexible	Local	Mantenimiento Periódico	100,3
6000372	321121	Cll. 50 a sur	Tv. 44	Cra. 38	Fátima	Flexible	Local	Mantenimiento Periódico	180,3
6000617	321826	Cra. 37 a	Cll, 53 b sur	Cll. 54 sur	Fátima	Flexible	Circuito movilidad	Rehabilitación – reconstrucción	160,7

CIV	PK-ID	EJE VIAL	DESDE	HASTA	BARRIO	TIPO DE PAVIMENTO	TIPO DE MALLA VIAL	TIPO DE INTERVENCIÓN	ÁREA
6000830	322415	Cra. 34	Cll. 54 sur	Cll. 54 a sur	San Vicente f.	Flexible	Local	Rehabilitación – reconstrucción	120,54
6000870	322532	Cl. 53b sur	Cra. 33ª	Cra. 34	San Vicente f.	Flexible	Local	Rehabilitación – reconstrucción	650,34
6002092	322280	Dg. 52 sur	Cra. 33	Cra. 35	Fátima	Flexible	Local	Rehabilitación – reconstrucción	200.64
6000857	322496	Cl. 53ª sur	Cra. 33ª	Cra.34	San Vicente f.	Flexible	Local	Rehabilitación – reconstrucción	606,41
6000721	322103	Cl. 52 g sur	Tv.35 b	Cra. 35 a	Fátima	Flexible	Intermedia	Rehabilitación – reconstrucción	80,05
6001013	322958	Cl. 48 c sur	Cra. 26	Cra. 27	Samoré	Flexible	Intermedia	Rehabilitación – reconstrucción	696,4
6001167	323436	Cra. 24c	Cl.48 sur	Cl. 48c sur	Tunal oriental	Flexible	Intermedia	Rehabilitación – reconstrucción	1538,2
6000786	322283	Cra. 34	Dg. 52b sur	Cl. 52 g sur	San Vicente f.	Flexible	Local	Rehabilitación – reconstrucción	231,43
6001008	322943	Kr 26	Cl 48ª s	Cl 48b s	Samoré	Flexible	Intermedia	Rehabilitación – reconstrucción	323,99

Teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal en el proyecto de inversión No. 2824 “Una nueva visión de infraestructura en pro de la comunidad de Tunjuelito 2025” para la vigencia 2025, se priorizaron los siguientes segmentos viales para intervención en andenes que obtuvieron los factores de priorización más altos

Tabla 8 Listado de PK-ID - CONTRATO DE OBRA 613 – 2025 – LP (143265) – CONSORCIO COCO

CIV	PK-ID	EJE VIAL	DESDE	HASTA	BARRIO	TIPO DE PAVIMENTO	TIPO DE MALLA VIAL	TIPO DE INTERVENCIÓN	ÁREA
6001206	323557	Cra. 25	Cll. 54 sur	Cll. 54a sur	Tunal oriental	Venecia	Articulado	Rehabilitación - reconstrucción	163,14
6001200	323539	Cra. 25	Cll. 52b sur	Cll. 54 sur	Tunal oriental	Venecia	Articulado	Rehabilitación - reconstrucción	186,62
6000812	322362	Dg. 52b sur	Cra. 33	Cra. 34	Fátima	Venecia	Rígido	Rehabilitación - reconstrucción	179,72
6001888	325589	Cra. 61 g	Cra. 61 a	Dg. 48 sur	Isla del sol	Venecia	Rígido	Rehabilitación - reconstrucción	173
6001384	324103	Cll. 57 sur	Cra. 18d	Cra. 19	San Carlos	Venecia	Rígido	Mantenimiento Periódico	172,52
6001940	325772	Cll. 57 sur	Cra. 17a	Cra. 18	San Carlos	Venecia	Rígido	Rehabilitación - reconstrucción	198,94
6001407	324176	Cra. 18b	Cll. 55 sur	Cll. 57 sur	San Carlos	Venecia	Rígido	Rehabilitación - reconstrucción	847,03

CIV	PK-ID	EJE VIAL	DESDE	HASTA	BARRIO	TIPO DE PAVIMENTO	TIPO DE MALLA VIAL	TIPO DE INTERVENCIÓN	ÁREA
6001479	324416	Cll. 57 sur	Cra. 16	Cra. 17	San Benito	Tunjuelito	Rígido	Rehabilitación - reconstrucción	104,94
6001683 (6001303)	323827	Cll. 51 sur	Dg. 48 sur	Cra. 19 b	Santa lucía	Tunjuelito	Rígido	Rehabilitación - reconstrucción	129,35
6001388	324115	Cra. 18 c	Cll. 55 sur	Cll. 57 sur	San Carlos	Tunjuelito	Rígido	Rehabilitación - reconstrucción	513,91
6001389	324116	Cll. 57 sur	Cra. 18 c	Cra. 18 d	San Benito	Tunjuelito	Rígido	Mantenimiento Periódico	95,42
6001850	325476	Cll. 57 sur	Cra. 17	Cra. 17 a	San Carlos	Tunjuelito	Mixto	Rehabilitación - reconstrucción	213,36
6001779	325283	Cll. 53a sur	Cra. 9	Cra. 8 a	Abraham Lincoln	Tunjuelito	Rígido	Mantenimiento Periódico	72,46
6001800	325347	Cll. 53 a sur	Cra. 7 a	Cra. 8	Abraham Lincoln	Tunjuelito	Rígido	Mantenimiento Periódico	54,79
6001788	325310	Cra. 8	Cll. 53 a sur	Cll. 53 sur	Abraham Lincoln	Tunjuelito	Rígido	Rehabilitación - reconstrucción	148,21
6001303	323827	CL 51S	KR 19B	KR 19C	San Carlos	Tunjuelito	Rígido	Rehabilitación - reconstrucción	129,14
6001302	323824	KR19B	DG 50 A S	CL 51 S	San Carlos	Tunjuelito	Rígido	Rehabilitación - reconstrucción	160,42

Fuente: *Área Ambiental SST – AHLA SHUGL INTERNATIONAL SAS*

Es importante señalar que en cumplimiento de los resultados del proceso de priorización de la ruta Transforma lo Local del programa Proyecta Local – Presupuestos Participativos 2025, según las elecciones ciudadanas y de acuerdo con las directrices dadas para la Coordinación General de Presupuestos Participativos – GPP, se priorizaron segmentos viales de calzada y anden para el presente proyecto, los cuales se presentan a continuación:

Tabla 9. Listado de CIVS Y PK-ID - CONTRATO DE OBRA 613 – 2025 – LP (143265) – CONSORCIO COCO

CIV	PK-ID	EJE VIAL	DESDE	HASTA	BARRIO	TIPO DE PAVIMENTO	TIPO DE MALLA VIAL	TIPO DE INTERVENCIÓN	ÁREA
6000580	20007649	Cra. 54b	Dg. 52 b sur	Tv. 44	Venecia	Flexible	Intermedia	Mantenimiento Periódico	221,66
6000528	321577	Cra. 55a	Dg. 52 b sur	Tv. 44	Venecia	Flexible	Intermedia	Mantenimiento rutinario	140,26

Fuente: Anexo Técnico

5.2. INFORMACION DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA

Tabla 10 Información general

CONTRATISTA - Contrato 613 de 2025	
Empresa	CONSORCIO COCO
NIT	902.010.258-8
Representante Legal	JOTAM MAESTRE

CONTRATISTA - Contrato 613 de 2025	
Objeto	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTEMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO.
Dirección	CALLE 49 A SUR # 28-36
Valor Inicial del Contrato	$ 6.795.537.201
Valor adición del contrato	$ 4.179.255.379
Valor Total del contrato	$ 10.974.792.580
Acta de Iniciación	17 de diciembre de 2025
Fecha de inicio de obra	17 de diciembre de 2025
Fecha de terminación de la obra sin adición	16 de agosto de 2026
Fecha de terminación de la obra con adición	16 de diciembre de 2026
Tiempo estimado de duración de la obra sin adición	8 meses
Tiempo de adición	4 meses
Tiempo estimado de duración de la obra con adición	12 meses
INTERVENTORIA- Contrato 652 de 2025	
Empresa	AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.
NIT	901.719.068-6
Representante Legal	NAYDU LISBETH LOPEZ OROZCO
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
Dirección	Calle 57 # 3-42 Oficina 402
Valor inicial del contrato	$ 636.794.760
Valor de Adición del contrato	$ 357.911.935
Valor Total del contrato	$ 994.706.605
Fecha de inicio	17 de diciembre de 2025
Fecha de terminación	16 de agosto de 2026
Tiempo estimado de duración de la Interventoría	8 meses
Prorroga No. 1	4 meses
Fecha de terminación del contrato con adición	16 diciembre 2026

Fuente: CONSORCIO COCO

6. METODOLOGIA

El CONSORCIO COCO se compromete a minimizar los impactos ambientales del contrato de obra 613 de 2025, mediante la caracterización ambiental, identificación de impactos, y aplicación de medidas de manejo ambiental según normativas vigentes y contractuales.

Para la elaboración del manual de Control y seguimiento ambiental y SST, se tomó como línea base lo establecido en la resolución número 6004 de 2022 “Por el cual se actualiza el Manual de Control y Seguimiento Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -SST del IDU” V3”.

El cumplimiento se dará con la ejecución de las siguientes medidas:

- Implementación de las medidas ambientales de acuerdo con lo establecido en el Manual de control y seguimiento ambiental y SST.
- Revisión y seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades ambientales
- Asistencia y participación en comités de obra
- Inspecciones diarias en los frentes de trabajo
- Registros físicos y fotográficos
- Capacitación al personal de obra
- Control y aseguramiento de los registros ambientales
- Cumplimiento al Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición

7. ACTIVIDADES TECNICAS

A continuación, se describen las actividades adelantadas por parte del equipo técnico de obra:

- **CIV 6000617 – Carrera 37ª – 53B SUR – CALLE 554 SUR:** Durante el mes se ejecutaron las actividades de demolición de la capa de rodadura existente en mezcla asfáltica mediante el empleo de equipos y medios mecánicos especializados, garantizando una intervención controlada y eficiente de la estructura del pavimento. Los trabajos se desarrollaron de acuerdo con las dimensiones y límites establecidos en los diseños y especificaciones técnicas del proyecto, procurando preservar las áreas

aledañas y evitando afectaciones a la infraestructura existente. Asimismo, se realizaron verificaciones permanentes para asegurar que la demolición alcanzara las profundidades y anchos requeridos, dejando la superficie en condiciones adecuadas para la ejecución de las actividades constructivas posteriores.

- De manera complementaria, se efectuó el cargue, retiro, transporte y disposición final del material producto de la demolición, manteniendo el frente de obra en condiciones óptimas de orden, limpieza y seguridad. El manejo de los residuos se realizó conforme a la normatividad ambiental vigente y a los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto, disponiendo el material en sitios autorizados. Estas actividades permitieron liberar el área de intervención de manera oportuna, garantizando la continuidad de la programación de obra y el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad industrial y protección ambiental definidos para el contrato.

- **CIV 6001206 – CARRERA 25 – CALLE 54 SUR – CALLE 54ª SUR:** Se continúa con la instalación de bordillo tipo A-80 en el tramo intervenido, la instalación se desarrolla garantizando la estabilidad estructural y la adecuada delimitación de la estructura vial y del espacio público, asegurando que cada pieza quede correctamente ajustada.
- De manera complementaria, se realiza la humectación controlada de la superficie compactada, con el fin de alcanzar el contenido de humedad óptimo que permita mejorar las condiciones de adherencia. Finalmente, el frente de obra queda en etapa de alistamiento para la instalación y vaciado de concreto, verificando la limpieza de la superficie, la correcta conformación de la base.

- **CRUCE DIAGONAL 52 A SUR (BACHEO):** Durante la jornada se ejecutaron las actividades como el corte controlado y la demolición de la capa de rodadura en mezcla asfáltica existente, utilizando equipos especializados para garantizar una intervención precisa. Posteriormente, se realizó la limpieza y adecuación de la superficie intervenida, permitiendo la instalación de la capa de base granular, seguidamente, se llevó a cabo el proceso de compactación.
- Como actividad final, se realizó la instalación de la nueva carpeta asfáltica, garantizando la nivelación y compactación para obtener una superficie uniforme y en óptimas

condiciones de servicio. Con la culminación de estas actividades se logró la rehabilitación y liberación del cruce, restableciendo la transitabilidad vehicular de manera segura y continua, mejorando las condiciones de movilidad del sector y asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos para la ejecución del proyecto.

- **CIV 6000830 – CRA. 34 – CALLE 54 SUR – CALLE 54 A:** Durante el periodo se dio continuidad a las actividades de retiro, cargue, transporte y disposición final del material producto de la excavación manual realizada para la construcción e instalación de sumideros, garantizando la limpieza permanente del frente de obra y el adecuado manejo de los residuos generados. Estas labores se ejecutaron con el fin de minimizar la generación de material particulado, mantener condiciones óptimas de orden y aseo en la zona de intervención y asegurar la correcta disposición del material excavado en sitios autorizados. De igual manera, se verificó que las áreas intervenidas permanecieran libres de material sobrante, permitiendo el desarrollo seguro y continuo de las actividades posteriores.

- Adicionalmente, se culminó la perforación de la totalidad de los barrenos, actividad ejecutada de acuerdo con la localización, alineamiento y profundidad definidos en los diseños y especificaciones técnicas del proyecto. La finalización de esta labor constituye un avance significativo para la preparación de las siguientes etapas constructivas, garantizando la correcta ejecución de los procesos posteriores y el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y rendimiento establecidos para la obra.

8. MANUAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

8.1. COMPONENTE A SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

8.1.1 Programa A1. Manejo para el cumplimiento de requisitos y A&SST

Se realizaron actividades preliminares para cumplir con la estructura del sistema de gestión ambiental establecido teniendo en cuenta el Manuel de Control y Seguimiento Ambiental.

A continuación, se presenta el personal A&SST activo según el MAO, para la etapa constructiva:

Tabla 11 Profesionales componente Ambiental y SST

CARGO	NOMBRE	PORCENTAJE DE DEDICACION
Residente Ambiental	Hernán David Bermúdez	50%
Residente SST	Saraima Patricia Sierra	80%

Fuente: Consorcio COCO

De acuerdo con los lineamientos legales ambientales, y teniendo en cuenta las características del proyecto a continuación se relacionan los permisos requeridos para la ejecución de las actividades:

Tabla 12 Permisos ambientales

TIPO DE PERMISO	APLICA		ACTIVIDAD DE OBRA	OBSERVACION
	SI	NO		
Ruido		X	Trabajos nocturnos	No se realiza trabajos en horarios nocturnos, de ser así se realizará el debido permiso ante el FDLT
Permiso silvicultural, Inventario y balance de zonas verdes Aprobación diseño paisajístico, Actualización y/o creación de códigos SIGAU, Levantamiento de veda, Sustracción de áreas de reserva forestal o áreas protegidas.		X	Manejo de individuos arbóreos presentes en la AID del proyecto. Actividades propias de la obra y por diseño	No Aplica
Registro de elementos de publicidad exterior visual		X	Instalación de vallas	Debido al tipo de contrato no aplica la instalación de valla informativa de obra se proyecta instalar vallas móviles informativas
Plan de manejo de fauna silvestre		X	Actividades en entorno urbano y rural, que ofrecen sitios para el refugio, descanso, reproducción, alimentación y paso transitorio de la fauna silvestre.	Luego de realizar el diagnostico de los segmentos viales definidos se concluye que no se requiere adelantar el trámite de permiso de fauna silvestre
Permiso de ocupación de cauce, depósito de agua ozona de ronda, lineamiento para el manejo de ZMPA y corredores ecológicos		X	Intervención fuentes de agua	Se elaboró informe técnico de las actividades, localización, medidas de manejo ambiental a realizar y proceso constructivo para consultar a la SDA si son necesarios lineamientos o permisos en el CIV 6001888.
Apertura y cierre del PIN	x		Manejo RCD en obra	PIN Ambiental 17465.

Fuente: Consorcio COCO

El contratista informa que radicó el Manual Ambiental de Obra (MAO) y el Plan de Manejo Ambiental y Residuos de Construcción y Demolición (PMA-RCD) con numero de radicado **FDLT-CTO-613-2025/012,** cual fue aprobado mediante el comunicado de interventoria **INT-652-2025-006** y **INT-652-2025-007**.

Correspondencia

Se relaciona a continuación la correspondencia enviada y recibida durante el periodo del informe, la cual constituye el soporte de la gestión administrativa y ambiental adelantada en el marco del contrato. Esta información permite evidenciar la trazabilidad de las comunicaciones entre el Contratista y la Interventoría, así como el seguimiento a los requerimientos, solicitudes, observaciones y respuestas generadas durante el desarrollo del proyecto.

Tabla 13 Relación de correspondencia enviada y recibida durante el periodo del informe.

Correspondencia Enviada		
Fecha	**Consecutivo**	**Asunto**
14/07/2026	FDLT-CTO-613-2025/**098**	Reporte Granulo caucho (MCCH-25) CTO-613-2025
23/07/2026	FDLT-CTO-613-2025/**099**	Respuesta SPMT 202631207178601 Incumplimiento en la implementación del plan de manejo de tránsito.
Correspondencia Recibida		
Fecha	**Consecutivo**	**Asunto**
N/A	N/A	N/A

Fuente: CONSORCIO COCO

Los soportes de la correspondencia del periodo se presentan en el **Anexo 1. Componente A. Sistema GA\1. Correspondencia.**

Comités de obra semanales de seguimiento


A continuación, se presenta el consolidado de los comités realizados durante el periodo del informe, indicando el número de comité y la fecha en que fueron efectuados.

Tabla 14 Comités de seguimiento

Número de comité	Fecha de realización
27	08 de julio de 2026
28	14 de julio de 2026
29	22 de julio de 2026
30	29 de julio de 2026

Fuente: CONSORCIO COCO

Los soportes de los comités realizados se presentan en el **Anexo 1. Componente A. Sistema GA\2. Actas de comité**

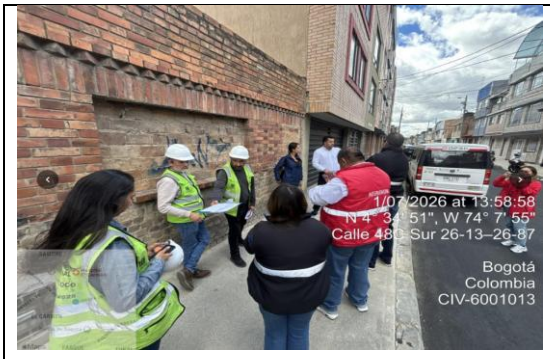

Fotografía 1. Comité de seguimiento de obra, con recorrido por los diferentes frentes de obra con interventoría.



Fotografía 2 Comité de seguimiento de obra 14/07/2026

Fuente: CONSORCIO COCO

Inducción y Capacitación

Dando cumplimiento al cronograma de capacitaciones programadas para el contrato, el día 21 de julio de 2026 se llevó a cabo la capacitación sobre Manejo Integral De Cuerpos De Agua y Sumideros, dirigida al personal de obra y administrativo. Esta actividad tuvo como finalidad fortalecer los conocimientos y competencias del personal administrativo y operativo para prevenir la contaminación de cuerpos de agua y garantizar la adecuada protección, manejo y mantenimiento de los sumideros y sistemas de drenaje durante la ejecución de las obras, asegurando el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y minimizando los impactos sobre los recursos hídricos.

	
Fotografía 3. Capacitación frente de obra	**Fotografía 4**. Capacitación Punto Crea

Los soportes de los comités realizados se presentan en el **Anexo 1. Componente A. Sistema GA\3. Registros de Inducción y Capacitación**

8.2. COMPONENTE B MANEJO AMBIENTAL EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

8.2.1 Programa B1. Manejo de Campamentos fijo y/o temporales y centros de acopio.

Campamento:

Las oficinas del Consorcio se encuentran ubicadas en la Diagonal 46 a sur #52c-56, barrio Venecia, este campamento cuenta con dos puntos ecológicos, señalización SST-MA, un kit de emergencias, cuatro baños fijos y servicios públicos de energía, agua, gas y servicio de internet.

Fotografía 5. Oficina Consorcio COCO	**Fotografía 6.** Oficina Consorcio COCO

Fuente: CONSORCIO COCO



Fotografía 7. Campamento de obra CIV 6001206




Fotografía 8. Campamento de obra CIV 6000830



Fotografía 9. Campamento de obra CIV 6000617



Fotografía 10. Punto ecológico CIV-6001206

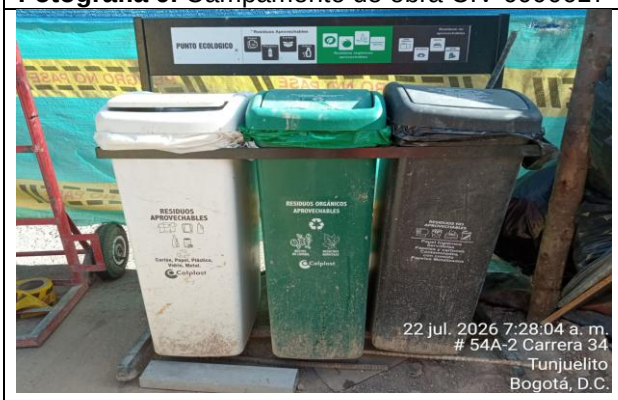

Fotografía 11. Punto ecológico CIV-6000830



Fotografía 12. Punto ecológico CIV-6000617

8.2.2 Programa B2. Manejo de Materiales de Construcción

En el periodo del informe se realizó el análisis de las canteras y las distancias de suministro para los segmentos viales en ejecución. En el Manual Ambiental de Obra (MAO) se incluyen los proveedores de materiales autorizados; no obstante, las empresas seleccionadas podrán ser reemplazadas en caso de presentarse circunstancias imprevistas, situación que será previamente informada a la interventoría para su respectiva revisión y aprobación, en cumplimiento de los permisos ambientales aplicables. Para la definición de este listado se consideraron los proveedores registrados en el Directorio de Proveedores Ambientales del IDU que se encuentran activos y actualizados a la fecha.

Tabla 15 Proveedores de materiales

NOMBRE GESTOR	ENTIDAD QUE AUTORIZA	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	TIPO DE PROVEEDOR
CONSTRITURAR LTDA	CAR	Res 407 de 02/04/2002	Agregados pétreos
INCOMINERIA SAS (MOSQUERA)	CAR	Res 0237 del 15/02/2008 – Res 2687 de 16/12/2016 – Res 3729 de 20/11/2018	Agregados pétreos
INCOMINERIA SAS (SOACHA)	CAR	Res 0425 del 11/03/2008	Agregados pétreos
GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS (PTE GUADUA)	CAR	Comunicado No. 20242064523 de 24/07/2024	Agregados a partir de residuos de construcción y demolición
GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS (CIUDAD BOLIVAR)	SDA	Informe técnico No. 01939 del 10/12/2020	Agregados a partir de residuos de construcción y demolición
INCOMINERIA SAS (MOSQUERA)	CAR	Cominicado No. 20252018701 del 04/04/2025	Agregados a partir de residuos de construcción y demolición
SECAM JR EU (USME)	CAR	Comunicado No. 20242106607 de 16/12/2024	Agregados a partir de residuos de construcción y demolición
SECAM JR EU (SOACHA)	CAR	Comunicado No. 11242005484 de 20/12/2024	Agregados a partir de residuos de construcción y demolición
RECICLADOS INDUSTRIALES	CAR	Comunicado CAR N° 09252012832 del	Agregados a partir de residuos de construcción y demolición

NOMBRE GESTOR	ENTIDAD QUE AUTORIZA	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	TIPO DE PROVEEDOR
CONSTRITURAR LTDA	CAR	Res 407 de 02/04/2002	Agregados pétreos
		31/07/2025	
EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	CAR	Comunicado No. 11252003088 del 12/08/2025	Prefabricados
PREFABRICADOS CONCRETARTE	CAR	Comunicado No. 09242017230 del 28/11/2024	Prefabricados
PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIONES PREFACON	CAR	Comunicado No. 09242017230 de 28/11/2024	Prefabricados
CYT ARCILLAS Y PREFABRICADOS EN CONCRETO SAS	SDA	Comunicado No. 2025EE128551 de 16/06/2025	Prefabricados
CONCREMOVIL SAS (BOGOTÁ)	SDA	Comunicado No. 2025EE115107 de 29/05/2025	Concreto
CONCREMOVIL SAS (SOACHA)	CAR	Comunicado No. 11252001843 de 15/05/2025	Concreto
POLIMIX CONCRETO COLOMBIA SAS	SDA	Comunicado SDA No. 2025EE38133 del 12/02/2025	Concreto
MINER GROPUPS SAS	CAR	Resolución 1043 de 06/07/2001-Resolucion 1334 de 12/11/02	Agregados pétreos.
CEMEX	SDA	Comunicado No. 2021EE28110 del 15/02/2021	Concreto
CONCRETOS ARGOS	SDA	Comunicado N° 11222001710 del 27/04/2022	Concreto
DOBLE A	CAR	Resolución 50227000026 del 03/02/2022	Asfalto
INCOMINERIA	CAR	Resolución 0372 del 12/02/2019	Asfalto
SOFAN	CAR	Resolución 50207100797 del 17/04/20	Asfalto
PAVIOBRAS	CAR	Resolución 0689 del 08/03/18	Asfalto
DROMOS	CAR	Resolución 50207100864 16/06/2020	Asfalto
ARKA PREFABRICADOS	CAR	Comunicado	Prefabricados

NOMBRE GESTOR	ENTIDAD QUE AUTORIZA	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	TIPO DE PROVEEDOR
CONSTRITURAR LTDA	CAR	Res 407 de 02/04/2002	Agregados pétreos
		11252004524	

Fuente: CONSORCIO COCO

Así mismo, para los segmentos viales que se encuentran en ejecución, 6001206, 6000617 y 6000830, se utilizaron materiales provenientes de los proveedores autorizados y descritos en el MAO; se precisa informar que las cantidades y volúmenes registrados en el presente informe corresponden al mes de junio 2026, teniendo en cuenta que se reporta mes vencido debido a la consecución de las certificaciones tanto de RCD como de material. Las cantidades y volúmenes empleados en el periodo evaluado se encuentran expresados en la siguiente tabla:

Tabla 16. Demanda ambiental materiales usados en obra

MATERIAL	M3	TON	PROVEEDOR	CIRCULARIDAD/APROVECHAMIENTO
SUB BASE TIPO PEA	103	139,05	MOLINOS JN	CIRCULARIDAD
B-200	64	86,40	MOLINOS JN	CIRCULARIDAD
SARDINEL A-10	6,4	10,55	C&T PREFABRICADOS	MATERIAL
BORDILLO A-80	19,32	31,86	C&T PREFABRICADOS	MATERIAL
BAJO RAMPA A-85	9,3	15,33	C&T PREFABRICADOS	MATERIAL
GRANULO CAUCHO (MCCH-25)	119,84	290,0128	PAVIOBRAS	MATERIAL
MD-19	81,10	115,162	SOFAN	MATERIAL
CONCRETO 3000 PSI	36	86,4	POLIMIX	MATERIAL
TOTAL	438,96	688.36		

Fuente: CONSORCIO COCO

$$\textbf{Circularidad} = \frac{\textbf{Peso total de materiales provenientes de la valorización de RCD}}{\textbf{Peso total de materiales de construcción}} \; x100\%$$

$$\textbf{Circularidad} = \frac{225{,}45}{\textbf{688, 36}} \ \boldsymbol{x100\%}$$

PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CIRCULARIDAD PARA EL PERIDODO = 32,75%

Los soportes correspondientes al periodo se presentan en el **Anexo 2. Componente B. Manejo Ambiental \ Reporte RCD JUNIO-2026.**

NOTA: De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 646 del 2025. Artículo 260. “Metas para la circularidad en la construcción”. Se presenta el porcentaje de circularidad acumulado hasta la fecha.

$$\textbf{Circularidad} = \frac{\textbf{Peso total de materiales aprovechados de la valorización de RCD}}{\textbf{Peso total de materiales de construcción}} \ \boldsymbol{x100\%}$$

$$\textbf{Circularidad} = \frac{3.137{,}40}{\textbf{4. 214, 39}} \ \boldsymbol{x100\%}$$

PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CIRCULARIDAD ACUMULADO= 74,44%

8.2.3 Programa B3. Manejo Integral de Residuos sólidos

En el presente periodo los residuos sólidos fueron dispuestos de acuerdo con el código de colores establecidos en la Resolución 2184 de 2019 para su correspondiente separación en la fuente, en canecas ubicadas en el campamento administrativo del Consorcio, estos fueron dispuestos a través del operador encargado de la recolección de residuos en la Localidad de Tunjuelito, la empresa de aseo LIME.



Fotografía 13 Punto Ecológico CIV 6001206



Fotografía 14 Punto Ecológico punto CREA.

Fuente: CONSORCIO COCO

Residuos Peligrosos:

En el presente periodo no se generaron residuos peligrosos, en el desarrollo de las actividades del proyecto. No obstante, se mantuvo el seguimiento permanente a las actividades con el fin de prevenir su generación y garantizar, en caso de presentarse, su adecuada gestión conforme a los lineamientos establecidos en el Manual Ambiental de Obra y la normativa aplicable

Residuos de Construcción y Demolición (RCD):

La documentación ambiental de los gestores de RCDs fue revisada para garantizar que estuviera actualizada ante la secretaria Distrital de Ambiente y fue presentada al Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición (PMA-RCD).

No obstante, en caso de requerirse sustituir o adicionar algún gestor de RCD, se presentará su documentación o registro en el Directorio de Proveedores de Materiales de Construcción, Sitios de Disposición final, Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD.

Tabla 17. Relación de gestores de RCD presentados.

NOMBRE GESTOR	ENTIDAD QUE AUTORIZA	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	TIPO DE MATERIAL AUTORIZADO PARA DISPONER
MANEJO Y GESTION	CAR	Resolución 0680 del 01/04/2016	Disposición final de RCD

NOMBRE GESTOR	ENTIDAD QUE AUTORIZA	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	TIPO DE MATERIAL AUTORIZADO PARA DISPONER
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS SAS - MAGIR			
INGENIERIA Y TRANSPORTES LAMD	CAR	Resolución 0280 del 01/02/2019	Disposición final de material de excavación
CEMEX COLOMBIA SA (LA FISCALA)	ANLA	Res 1506 del 22/05/2006	Disposición final de RCD
CEMEX COLOMBIA SA (CIUDAD BOLIVAR)	SDA	Res 01280 de 15/06/2017	Disposición final de RCD
	SDA	Informe Técnico No. 00649 del 14/02/2023	Transformación y aprovechamiento de RCD
MAQUINAS AMARILLAS SAS	ANLA	Res 1480 del 04/12/2014 - Res 0228 del 07/03/2016	Disposición final de RCD
SAN JOSE GREEN GROUP SAS	CAR	Comunicado No. 20252035623 de 22/05/2025	Disposición final de RCD
GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS (PTE GUADUA)	CAR	Comunicado No. 20252082393 del 02/09/2025	Transformación y aprovechamiento de RCD
GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS (CIUDAD BOLIVAR)	SDA	Informe tecnico 01939 de 10/12/2022	Transformación y aprovechamiento de RCD
SECAM JR EU (USME)	CAR	Comunicado No. 20242106607 de 16/12/2025	Transformación y aprovechamiento de RCD
SECAM JR EU (SOACHA)	CAR	Comunicado No. 11242005484 de 20/12/2024	Transformación y aprovechamiento de RCD
ECODESARROLLO	CAR	Resolución 20237000730 del 26/10/2023	Disposición final de RCD
VECOAGREINT	CAR	Comunicado 20231024191	Transformación y aprovechamiento de RCD

Fuente: Consorcio COCO

Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 646 del 2025, se elaboró y entregó a la Interventoría el Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición PMA-RCD, una vez avalado, se generó el PIN Ambiental de obra **17465** el 26 de febrero de 2026.

Para los residuos de construcción y demolición (RCD) generados durante el periodo del informe, se adelantó su manejo conforme a los lineamientos establecidos en el Manual Ambiental de Obra (MAO) y la normativa ambiental vigente, garantizando su adecuada disposición a través de gestores autorizados; las cantidades y volúmenes generados se encuentran en la carpeta de

Anexos 2. Componente B. Manejo ambiental/Reporte de RCD en donde se presentan el Anexo l, Anexo ll, Anexo V y Anexo VI, de acuerdo a lo establecido en el decreto 646 del 2025.

A continuación, se relaciona los RCD generados durante el periodo evaluado del **1 de junio al 30 de junio de 2026**.

Tabla 18. RCD generados durante el periodo.

TIPO DE MATERIAL	M3	TON	GESTOR
DISPISICION FINAL			
N/A	N/A	N/A	N/A
APROVECHAMIENTO			
EXCAVACION	29	40,6	CODEOBRAS
EXCAVACION	15	23,52	SECAM JR
RECEBO	15	23,52	
EXCAVACION	218	310,60	MOLINOS JN
DEMOLICION	105	133,50	
TOTAL	382	531,74	

Fuente: Consorcio COCO

$$\text{Aprovechamiento} = \frac{\text{Total de RCD aprovechado sin } tener\ en\ cuenta\ excavación\ y\ sobrantes\ de\ adecuación\ de\ terreno)}{\text{Total RCD generado sin } tener\ en\ cuenta\ excavación\ y\ sobrantes\ de\ adecuación\ de\ terreno)} x100\%$$

$$\text{Aprovechamiento} = \frac{133{,}50}{133{,}50} x100\%$$

PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO APROVECHAMIENTO= 100%

Los soportes correspondientes al periodo se presentan en el **Anexo 2. Componente B. Manejo Ambiental \ Reporte RCD JUNIO-2026.**

8.2.4 Programa B4. Control de Emisiones Atmosféricas

El material particulado y la emisión de gases constituyen impactos asociados al desarrollo de actividades tales como el movimiento de maquinaria y equipos, demoliciones, excavaciones y movimiento de tierras, acopio de escombros y materiales, así como la ejecución de rellenos, entre otras. En este sentido, se vienen implementando medidas de manejo orientadas a la prevención y control de estos impactos, dentro de las cuales se incluye el seguimiento permanente a la maquinaria y vehículos empleados en obra, verificando sus condiciones operativas y su adecuado funcionamiento.

De igual manera, se están adoptando acciones para la adecuada protección de los acopios de materiales, con el fin de evitar la dispersión de partículas por acción del viento y minimizar la generación de material particulado hacia las áreas aledañas.

Por otro lado, se realiza la revisión de la documentación de los vehículos y maquinaria que operan en los frentes de obra, validando que cuenten con la certificación técnico-mecánica y de emisiones de gases vigente, en cumplimiento de la normativa ambiental aplicable y con el propósito de mitigar la generación de contaminantes atmosféricos.

8.2.5 Proyecto B5. Manejo integral de Cuerpos de Agua, Sumideros y Estructuras hidráulicas

En el presente periodo se realizó la inspección de los frentes de obra en ejecución, con el fin de identificar las estructuras hidráulicas existentes en cada tramo vial, tales como sumideros y pozos de inspección, así como verificar el estado de sus rejillas y tapas, con el propósito de establecer las medidas de manejo necesarias para su protección durante el desarrollo de las actividades constructivas.

En este sentido, se llevó a cabo la protección de los sumideros correspondientes a los CIV 6000617, 6000830 mediante la implementación de elementos que permiten evitar el ingreso de material particulado, residuos de construcción y otros elementos que puedan generar obstrucciones o afectaciones al sistema de drenaje. Estas acciones se realizan de manera progresiva, conforme al avance de obra, y son registradas en los formatos de control FOAC 50, que se presenta en el **Anexo 2. Componente B. Manejo Ambiental\B5. FOAC 50 Sumideros**

Así mismo, se continuará con la implementación de estas medidas en los demás frentes de trabajo que se vayan habilitando, garantizando la adecuada conservación de las estructuras hidráulicas. De igual manera, se remitirá a la interventoría el soporte correspondiente a la disposición final de los vertimientos generados por las unidades portátiles sanitarias, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente, los cuales se encuentran en la carpeta **Anexo 2. Componente B. Manejo Ambiental\CERTIFICADOS UNIDADES SANITARIAS.**

A continuación, tenemos la relación de las unidades portátiles sanitarias por frente de obra

Tabla 19. UPS en frentes de obra

CIV	FRENTE DE OBRA	CANTIDAD
6001206	COLEGIO DE BOGOTA	3
6000830	# 7	2
6000617	# 8	1

Fuente: Consorcio COCO

8.3. COMPONENTE C MANEJO DE LA VEGETACIÓN, PAISAJISMO Y FAUNA SILVESTRE

8.3.1 Programa C1 Manejo de la vegetación

En el presente periodo se verificó la información entregada por el FDLT y el Contrato de obra, donde se llevó a cabo una inspección de los segmentos viales contratados, con el fin de verificar la presencia de zonas verdes y arbolado. Durante el periodo evaluado no se identificó ningún tipo de afectación a las zonas mencionadas. **Anexo 3. Componente C. Manejo de vegetación y Paisajismo**

8.3.2 Programa C2 Manejo de Fauna Silvestre

Para el presente informe se realizó un recorrido de verificación en conjunto con la interventoría en los segmentos a intervenir, con el propósito de identificar posibles interacciones con fauna silvestre en las áreas de influencia del proyecto. Durante la inspección no se evidenció presencia de fauna silvestre que pudiera verse afectada por el desarrollo de las actividades constructivas.

No obstante, se mantendrá el monitoreo y seguimiento permanente en los diferentes frentes de obra, con el fin de prevenir posibles afectaciones a la fauna, especialmente en caso de avistamientos o presencia eventual de especies, para garantizar la protección y conservación de la fauna presente en el área de influencia del proyecto.

8.4. COMPONENTE E MANEJO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.

8.4.1 Programa E1 Manejo de Plan de Señalización

Durante el periodo de reporte se realizó la verificación de los sitios de campamentos temporales instalados, así como de la señalización implementada en los diferentes frentes de obra, con el fin de prevenir posibles accidentes y garantizar condiciones seguras tanto para el personal como para terceros. En este sentido, se hace seguimiento permanente al estado de la señalización preventiva, informativa y reglamentaria, asegurando su adecuada ubicación, visibilidad y funcionalidad. Así mismo, la Brigada de Orden, Aseo y Limpieza realiza la verificación continua del mantenimiento y la demarcación, incluyendo la reposición de la cinta de cerramiento, colombinas y demás elementos de señalización que presenten deterioro.

Para la demarcación de campamentos, señalización interna y cerramiento perimetral de cada frente de obra, se implementaron los diferentes tipos de cerramientos definidos en el proyecto, de acuerdo con las condiciones de cada sector. Estas medidas permiten delimitar las áreas de intervención, controlar el acceso y reducir los riesgos asociados a la ejecución de las actividades constructivas, garantizando la seguridad de los trabajadores y de la comunidad aledaña.

De igual manera, se realizó la radicación ante la Secretaría Distrital de Movilidad de los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) correspondientes a los diferentes frentes de obra, los cuales

cuentan con la respectiva revisión y aprobación por parte de la interventoría. Así mismo, se implementó en campo la señalización vial conforme a lo establecido en los PMT aprobados. A continuación, se relacionan los PMT aprobados durante el periodo.

Tabla 20. COI Aprobados

CIV	Fecha de inicio	Fecha de finalización	COI Aprobación
6000372	12-jun-26	13-ago-26	No. 23
6000857	12-jun-26	13-ago-26	No. 24
60001200 60001206	10-jul-26	29-octl-26	No. 28
6000830	12-jun-26	13-ago-26	No. 24
6000786	12-jun-26	13-ago-26	No. 24
6001013	12-jun-26	13-ago-26	No. 23
6000389	10-jul-26	29-oct-26	No. 28
6000557	10-jul-26	29-oct-26	No. 28
6000617	12-jun-26	13-ago-26	No. 23

Fuente: CONSORCIO COCO

Los COI aprobados en el periodo se puede revisar en el **Anexo 4. Componente E. Manejo de señalización.**

9. SEGUIMIENTO

COMPONENTE	PROGRAMA	INDICADOR	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO			
			DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	RESULTADO	MES 4	REGISTRO DEL COMPLIMIENTO
COMPONENTE A SISTEMA DE GESTI´ÓN AMBIENTAL	Programa A1. Cumplimiento a obligaciones ambientales y SST contractuales	Grupo ambiental	N° de Profesionales participantes en el periodo / N° de Profesionales laborando	100%	=2/2 X 100 = 100% Se cuenta con las dos profesionales para las áreas A&SST	Informes
		Personal capacitado	N° de trabajadores capacitados / N° de trabajadores convocados	100%	= ((13/13) X 100) =100%	Registro de inducción, capacitación y entrenamiento
COMPONENTE B. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	Programa B1. Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio	Cumplimiento Normativo de las medidas ambientales propuestas.	N° de puntos ecológicos / N° de frente de trabajo	100%	= ((6/6) *100) = 100%	Informes para interventoría
	Programa B2. Manejo de materiales de construcción	Quejas y reclamos por manejo de materiales de construcción.	N° de quejas y reclamos resueltos por manejo de materiales en el periodo / N° total de quejas recibidas por manejo de material en el periodo	0	No aplica para el periodo	Informe para Interventoría
		Calidad de material certificado	Cantidad de material certificado / Cantidad de material utilizado	100%	688,36 TON	La certificación se encuentra en el **ANEXO 2.**
	Programa B3. Manejo Integral de Residuos Sólidos	Peso de residuos peligrosos, entregados a las empresas calificadas y certificadas	Volumen de residuos sólidos peligrosos entregados/ Volumen de residuos sólidos peligrosos generados	0%	No aplica para el periodo	Certificado de residuos entregados
		Aprovechamiento en obra de RCD	Cantidad mensual de residuos aprovechados en la obra/ Cantidad mensual de material utilizado para la ejecución de la obra	100%	531,74 TON	Formato de seguimiento y aprovechamiento en la obra **ANEXO 2.**

COMPONENTE	PROGRAMA	INDICADOR	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO			
			DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	**RESULTADO**	**MES 4**	**REGISTRO DEL COMPLIMIENTO**
		Disposición de RCD	Cantidad mensual de RCD dispuestos en sitios autorizados / Cantidad estimada de RCD a generar en el mes	0 %	0 TON	Certificados de RCD se encuentran en el **ANEXO 2.** Formato de control de residuos de construcción y demolición RCD
	Programa B4. Control de emisiones atmosféricas	Vehículos operando	N° de vehículos con revisión técnico mecánica / N° de vehículos aprobados para el desarrollo del proyecto	100%	= ((5/5) * 100) = 100%	Certificado de revisión técnico- mecánica de los vehículos presentados.
	Programa B5. Manejo integral de cuerpos de agua, sumideros y obras hidráulicas	Cumplimiento de los requerimientos de manejo de obras hidráulicas	Número de sumideros protegidos/ Número de sumideros presentes en el CIV	100%	= ((2/2) * 100) = 100%	Informe Mensual Interventoría Formato de Manejo de cuerpos de agua
			Número de pozos protegidos/ Número de pozos presentes en el CIV	0%	No aplica para el periodo	Informe Mensual Interventoría Formato de Manejo de cuerpos de agua
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO	Programa C1. Manejo de la vegetación	Cumplimiento de los requerimientos de manejo de la vegetación	N° de especies arbóreas protegidas / N° de especies arbóreas presentes en el periodo	0%	= ((2/2) *100) = 100%	Informes para interventoría Registro fotográfico
COMPONENTE E. PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD	Programa de señalización	Accidentes por no señalización.	N° de frentes de obra señalizados / N° de frentes de obra operando	100%	=6/6 *100 = 100/	Registro fotográfico. Informe para Interventoría

10. CUMPLIMIENTO DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

10.1. POLÍTICA AMBIENTAL

El Consorcio COCO, fomenta todas aquellas acciones que favorecen a la conservación del medioambiente, con el compromiso de utilizar de manera racional y eficiente los recursos naturales necesarios para las actividades que se desarrollan.

La dirección del Consorcio declara su propósito de desarrollar e implantar un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 14001:2015, con la intención de proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de objetivos ambientales y así mejorar de forma continua su eficacia. El sistema aplicable a sus oficinas centrales, oficinas de obra, actividades y proyectos.

El Consorcio, asume igualmente el compromiso de cumplir con la legislación y reglamentación ambiental aplicables, así como con otros requisitos que pueda suscribir relacionados con sus aspectos ambientales y de impulsar la implantación de la gestión ambiental y la mejora continua de los resultados ambientales.

Para poner en práctica estos objetivos generales, el Consorcio establece la Política Ambiental que se refleja en los siguientes puntos:

- ✓ Garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable, así como el de todos los compromisos que se suscriban voluntariamente en la empresa.
- ✓ Prevenir la contaminación que pudiera generarse como consecuencia de las actividades de la organización durante la ejecución de sus proyectos de construcción.
- ✓ Establecimiento de un programa de Gestión Ambiental que incluya objetivos y metas, con su correspondiente calendario. En este programa se incluirán la asignación de las responsabilidades y los medios necesarios para la consecución de dichos objetivos y metas.
- ✓ Prevenir, reducir y mitigar los impactos ambientales de cada área de trabajo.
- ✓ Implementar buenas prácticas ambientales para el ahorro de agua, energía y consumibles, así como el efectivo tratamiento y disposición final de residuos.
- ✓ Contribuir a la sensibilización ambiental en los empleados, proveedores y clientes con el fin de fomentar la protección y el cuidado de nuestro entorno.
- ✓ Administrar por medio de un Programa de Gestión Ambiental todos los indicadores derivados de las actividades de la empresa.
- ✓ Formular, desarrollar, aplicar y retroalimentar periódicamente nuestros objetivos y programas ambientales.

- ✓ Racionalizar el consumo de recursos y gestionar convenientemente los residuos generados mediante la reutilización, segregación y reciclado.

10.2. ACTIVIDADES DE SOSTENIBILIDAD

- Se garantiza que las bombillas que se utilizan en las oficinas sean de la más alta eficacia como T5 o tecnología LED.
- Se garantiza la implementación de equipos y sistemas de bajo consumo de agua.
- Se promueve el cuidado y reutilización de materiales de construcción y aprovechables generados en la obra, dando cumplimiento al Decreto 646 del 2025.
- Se pone en práctica los procedimientos adecuados de señalización, construcción y de protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o subterráneos existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.
- Dentro de la estructura organizacional, se cuenta con personal idóneo, responsable de la gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo, que garantice el cumplimiento normativo. Las personas asignadas son idoneidad, experiencia y fueron aprobados por la interventoría.

11. CONCLUSIONES

- Para el periodo evaluado el contratista informa que participó activamente en los comités de obra semanales, tanto virtuales como presenciales realizados en la Alcaldía Local de Tunjuelito, con la Interventoría y los funcionarios del área de infraestructura que apoyan la supervisión del contrato.
- Durante el periodo se realizó el suministro de materiales granulares a los diferentes frentes de obra del proyecto: 438,96 (M3) lo que equivale a 688,36 (Ton) de material certificado.
- Durante este periodo se realizó un aprovechamiento de 105 (M3) lo que es equivalente a 133,50 (Ton) de material aprovechado entregado a plantas de tratamiento, que de acuerdo a la formula se reporta el material de demolición sin tener en cuenta la excavación.
- Durante el periodo evaluado no se reportan cantidades de material entregado a plantas de disposición final.
- A la fecha contamos con un porcentaje de aprovechamiento del 100% de acuerdo a lo certificados presentados en el **Anexo 2.**
- Durante el periodo de reporte se evidencia el cumplimiento de las actividades ambientales y de gestión asociadas al contrato, conforme a lo establecido en el Manual Ambiental de Obra (MAO) y la normativa vigente aplicable.
- Se adelantó la implementación de medidas de manejo ambiental orientadas a la prevención, mitigación y control de impactos, destacándose el seguimiento a la calidad del aire mediante el control de material particulado, la verificación de la maquinaria y vehículos en operación, así como la protección de acopios de materiales para evitar su dispersión.
- Se evidenció la implementación de medidas de protección de sumideros en los CIV 6000617, 6000830 con el fin de prevenir obstrucciones y afectaciones al sistema de drenaje.
- En materia de seguridad vial y ordenamiento de obra, se instalaron campamentos temporales y la señalización correspondiente a los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) aprobados, garantizando condiciones seguras para el personal y la comunidad, así como el control adecuado de los frentes de trabajo.

ANEXO 1

FDLT-CTO-613-2025/098

Bogotá D.C, 14 de julio de 2026

Señores:
AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.
Atn Ing Santiago Carrillo Vargas
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
Bogotá D.C

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA FDLT-CTO-613-2025

OBJETO: "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

ASUNTO: Reporte Granulo Caucho (MCCH25) CTO-613-2025

Respetados señores,

Por medio de la presente, me permito compartir el reporte semestral de Granulo Caucho correspondiente a la gestión del contrato mencionado en el asunto, en el cual se consolidan las certificaciones de los proveedores del material suministrado, así como también el formato de reporte de material con Granulo Caucho (GRC) utilizado.

Cordialmente,

JOTAM MAESTRE DIAB
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO COCO

CONSORCIO COCO
E-mail: consorciococo2025@gmail.com; Tel 601-4770190

Bogotá D.C, 23 de julio de 2026

Señores:
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
Atn Martha Cecilia Bayona Gómez
SUBDIRECTORA DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO
Bogotá D.C

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA FDLT-CTO-613-2025

OBJETO: "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

ASUNTO: Respuesta SPMT 202631207178601. Incumplimientos en la implementación del plan de manejo de tránsito (PMT).

Respetados señores,

En atención a la comunicación SPMT No. 202631207178601, mediante la cual se informan incumplimientos en la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) en el área de intervención< del proyecto, nos permitimos presentar la correspondiente respuesta a las observaciones realizadas durante la visita de seguimiento.

Incumplimientos:

Carrera 25 entre Calle 53B Sur y Calle 54A Sur: (CIV 6001206).

- Se observó cierre total del andén del costado oriental sin la implementación de manejo peatonal, exponiendo a los peatones a diversas condiciones de riesgo, generando conflicto ciclista-peatón. (ver fotografía 1).
- Se evidenció discontinuidad de la bici carril colocando en riesgo a los ciclistas, generando conflicto vehículo-peatón (ver fotografía 2).

Respuesta:
Con relación a las afectaciones observadas en materia de movilidad y seguridad con respecto al cierre del andén, el contratista habilitó un sendero peatonal seguro y bici carriles para ambos sentidos, coordinando de manera integrada la relación ciclista-peatón, esto mediante la implementación de maletines y colombinas plásticas, cinta peligro y apoyo del auxiliar de tráfico, con señalizaciones preventivas

para indicar a los transeúntes los carriles correctos según su medio de transporte. (Ver fotografías 1 y 2).

	
Fotografía 1. Sendero peatonal y bici carriles en CIV 6001206.	**Fotografía 2.** Sendero peatonal y bici carriles en CIV 6001206.

Calle 48C Sur entre Carrera 26 y Carrera 27: (CIV 6001013).

- Se evidenció cerramiento deficiente, con broche abierto que permite el ingreso de usuarios a la zona de obra, generando una condición de riesgo para los transeúntes (ver fotografía 4).
- Se evidenció la ausencia de barricada y señalización de desvío en el extremo del cierre de la Calle 48C Sur con Carrera 26, generando desinformación para los usuarios (ver fotografía 6).
- Se evidenció cierre de carril occidental de la Carrera 26 por Calle 48C Sur costado occidental, no contemplado en la propuesta de PMT presentada por el Contratista y autorizada por la SPMT. Adicionalmente, se observó canalización implementada con elementos no reglamentados que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial, considerando que para este tipo de intervenciones los dispositivos a utilizar deberían ser delineadores plásticos tipo colombina (ver Fotografía 5).

Respuesta:

Es importante precisar que las observaciones efectuadas por la Secretaría Distrital de Movilidad corresponden a una verificación realizada durante la etapa de ejecución de las actividades constructivas. No obstante, las situaciones identificadas fueron atendidas de manera inmediata mediante la implementación de las acciones correctivas correspondientes.

Así mismo, se informa que, a la fecha de la presente respuesta, las actividades constructivas en el frente de obra han sido culminadas en su totalidad, razón por la cual ya no se presentan las condiciones observadas durante la visita de inspección. En consecuencia, el área intervenida cuenta con las condiciones operativas, de seguridad vial y de movilidad acordes con la finalización de la intervención, garantizando el tránsito seguro de peatones y demás actores viales. (Ver fotografías 3, 4, 5 y 6).

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Fotografía 3.</td><td>Fotografía 4. Calle 48C Sur con Carrera 27</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Fotografía 5. Nomenclatura vial</td><td>Fotografía 6. Carrera 26 con Calle 48C Sur</td></tr>
</table>

<u>Calle 53ª Sur entre Carrera 33ª y Carrera 34: (CIV 6000857).</u>

- Se evidenció la ausencia de barricada y señalización de desvío que oriente a los usuarios sobre la ruta a tomar. Asimismo, se observó la ausencia de sendero peatonal transversal que garantice las condiciones de seguridad para los peatones (ver fotografías 8 y 10).
- Se evidenció cierre de carril oriental de la Carrera 34 por Calle 53A Sur, que no se encuentra contemplado en la propuesta presentada por el Contratista

y autorizada por la SDM. Adicionalmente, se evidenció el uso de elementos no reglamentados que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial, considerando que para este tipo de intervenciones los elementos de canalización deben corresponder a delineadores plásticos tipo colombina (ver fotografía 9).

- Se observó ausencia total de sendero peatonal en calzada sobre la Carrera 34 por Calle 53A, enviando al peatón a transitar a riesgo por la calzada, generando conflicto peatón -vehículo (ver fotografía 9).
- Se evidenció superficie de pavimento deteriorada, con material de pavimento demolido sobre la intersección de la Calle 53A Sur con Carrera 34, situación que genera condiciones de incomodidad e inseguridad para los diferentes actores viales, principalmente motociclistas y ciclistas que transitan por el corredor. (ver fotografía 9).

Respuesta:
Respecto a las observaciones sobre este frente obra, el contratista aclara que el sendero peatonal fue retirado de manera temporal por actividades de construcción, siendo restablecido bajo los parámetros del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) al terminar las actividades. Asimismo, se informa que las barricadas con señales de desvío ya fueron instaladas en el corredor vial para garantizar la correcta orientación de los conductores. Mientras que el uso temporal de canalizadores no reglamentarios (colombinas artesanales) obedece a los constantes hurtos de la señalización estándar en el sector.

Con respecto al cierre del carril oriental de la Carrera 34 con Calle 53A Sur, el contratista anteriormente había informado sobre la necesidad de esta intervención para conectar las redes de sumideros del tramo intervenido con el pozo de inspección de la intersección. Adicionalmente, se explicó que esta intervención permite ejecutar el proceso de nivelación de cargas requerido para asegurar la durabilidad de la estructura.

El contratista informa que, a la fecha de la presente respuesta, las actividades constructivas en el frente de obra han sido culminadas razón por la cual ya no se presentan las condiciones observadas durante la visita de inspección. (Ver fotografías 7,8,9 y 10)

	
Fotografía 7. Nomenclatura vial	**Fotografía 8.** Calle 53ª Sur con Carrera 33
	
Fotografía 9. Calle 53ª Sur con Carrera 34	**Fotografía 10.** Calle 53ª Sur con Carrera 34

Carrera 34 entre Calle 54 Sur y Calle 54A Sur: (CIV 6000830).

- Se evidenció parqueo de maquinaria pesada en el carril sur de la Carrera 34 por Calle 54 Sur, por fuera del cerramiento, sin contar con PMT autorizado para dicha afectación. Adicionalmente, se observa que falta la transición de carril con barricada y señal de desvío y la presencia de personal auxiliar de tránsito que ayude a controlar el paso vehicular hacia el carril libre (ver fotografías 12 y 13).
- Se evidenció la ausencia de barricada y señalización de desvío en el extremo de la Carrera 34 con Calle 54A Sur, que oriente a los usuarios sobre la ruta a tomar. Asimismo, se observó la ausencia de sendero peatonal transversal que garantice las condiciones de seguridad para los peatones (ver fotografía 14).

Respuesta:

El contratista informa que las situaciones evidenciadas correspondieron a condiciones puntuales presentadas durante la ejecución de las actividades constructivas, las cuales fueron atendidas de manera inmediata mediante la

implementación de las acciones correctivas necesarias, garantizando el restablecimiento de las condiciones de seguridad vial y movilidad conforme a la normatividad vigente.

Una vez identificada la situación, se procedió al retiro inmediato de la maquinaria ubicada por fuera del área autorizada de intervención, eliminando la afectación sobre el carril de circulación. De igual manera, se restablecieron las condiciones de manejo de tránsito mediante la implementación de la señalización temporal correspondiente y el reforzamiento de los controles operativos para garantizar que la ubicación de maquinaria y equipos se desarrollara exclusivamente dentro de las áreas autorizadas por el Plan de Manejo de Tránsito vigente.

En atención a la observación, se realizó la instalación de la barricada y de la señalización temporal requerida para orientar adecuadamente a los usuarios sobre los desvíos implementados durante la ejecución de la obra. De igual forma, se adecuó el paso peatonal requerido para garantizar condiciones seguras de circulación y accesibilidad para los peatones mientras se desarrollaban las actividades constructivas.

Adicionalmente, se reforzaron las inspecciones periódicas a la señalización y a los dispositivos de manejo de tránsito, con el propósito de verificar permanentemente su correcta ubicación, funcionalidad y conservación, asegurando el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Manual de Señalización Vial y en el Plan de Manejo de Tránsito autorizado. (Ver fotografías 11 y 12)

CONSORCIO


	
Fotografía 11. Barricada de desvío y sendero peatonal	**Fotografía 12.** Sendero peatonal y señalización.

Carrera 34 entre Calle 52B Sur y Calle 52G Sur: (CIV 6000786).

- Se evidenció cerramiento deficiente, con broche abierto que permite el ingreso de usuarios a la zona de obra, generando una condición de riesgo para los transeúntes (ver fotografías 16 y 17).
- Se evidenció ausencia de señalización de aproximación sobre el andén del costado norte de la Calle 52G Sur, ocasionando desinformación en los conductores que utilizan este corredor (ver fotografía 18).

Respuesta:
Referente a los broches abiertos y cerramiento deficiente, se tomaron medidas correctivas realizando mantenimiento de los mismos mediante reafirmación de rollizos y tensionamiento de polisombra mixta, asimismo se le explicó al personal de obra sobre la importancia de la permanencia de broches cerrados para la seguridad de los peatones. Asimismo, se instaló la señalización correspondiente.

El contratista informa que, a la fecha de la presente respuesta, las actividades constructivas en el frente de obra han sido culminadas en su totalidad, razón por la cual ya no se presentan las condiciones observadas durante la visita de inspección. En consecuencia, el área intervenida cuenta con las condiciones operativas, de seguridad vial y de movilidad acordes con la finalización de la intervención, garantizando el tránsito seguro de peatones y demás actores viales (Ver fotografías 11 y 12).

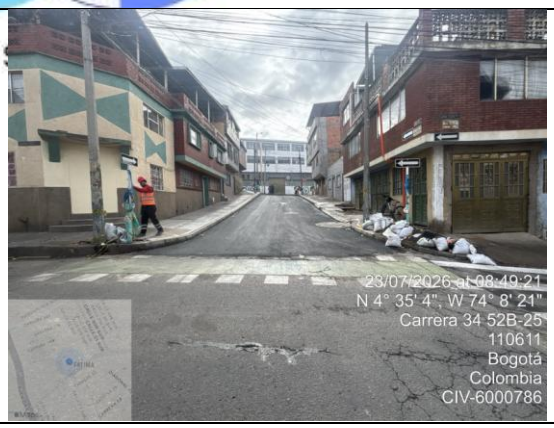	
Fotografía 13. Carrera 34 con calle 52B Sur	**Fotografía 14.** Carrera 34 con Calle 52G Sur

Calle 50A Sur entre Carrera 36 y Carrera 37: (CIV 6000557).

- Se evidenció la ausencia de senderos peatonales transversales, obligando a los peatones a transitar por la calzada y generando riesgo para los peatones por el conflicto peatón–vehículo (ver fotografías 19 y 20).

- Se evidenció la ausencia de barricadas y señales de desvío en los extremos del cierre, generando desinformación en los conductores (ver fotografías 19 y 20).

Respuesta:
Considerando la observación realizada y teniendo claro la importancia de los senderos peatonales y las señales de desvíos (barricadas) en la prevención de accidentes, se procedió a instalar estos elementos de seguridad vial en ambas bocacalles del tramo, para garantizar el correcto tránsito tanto vehicular como peatonal en el área.

El contratista informa que, a la fecha de la presente respuesta, las actividades constructivas en el frente de obra han sido culminadas en su totalidad, razón por la cual ya no se presentan las condiciones observadas durante la visita de inspección.

En consecuencia, el área intervenida cuenta con las condiciones operativas, de seguridad vial y de movilidad acordes con la finalización de la intervención, garantizando el tránsito seguro de peatones y demás actores viales (Ver Fotografías 15 y 16).

	
Fotografía 15. Calle 50ª Sur con Carrera 37	**Fotografía 16.** Calle 50ª Sur con Carrera 36

<u>Calle 50A Sur entre Carrera 38 y Transversal 44: (CIV 6000372)</u>

- En la fotografía 22, se evidencia el cierre de la intersección de la Calle 50A Sur con Carrera 38 para adecuación de campamento y baño; es de aclarar que esta afectación no se encuentra contemplada en la propuesta de PMT presentada por el Contratista y autorizada por la SDM. Asimismo, se observa que este cierre no se encuentra señalizado, generando afectación a la movilidad y condición de riesgo, toda vez que los usuarios no son alertados con la debida antelación sobre la existencia del cierre.

- Se evidenciaron cerramientos deficientes, con broches abiertos que permiten el ingreso de usuarios a la zona de obra, exponiéndolos a diversos riesgos. (ver fotografía 22).
- Se evidenció ausencia de broche controlado con acceso solo a residentes en el acceso sur de la Calle 50 Sur por Carrera 38, lo que permite el ingreso de vehículos que deben realizar maniobras peligrosas para retomar su recorrido; esto genera condiciones inseguras para los habitantes del sector (ver fotografía 23).
- Se evidenció el uso de elementos no reglamentados que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial, considerando que para este tipo de intervenciones los elementos de canalización deben corresponder a barreras plásticas (maletines). (ver fotografía 24).
- En la fotografía 24, se observa sendero peatonal transversal inseguro y deficiente, implementado sin PMT autorizado sobre el carril oriental de la Transversal 44 con Calle 50A Sur. Se recuerda que los senderos peatonales en calzada, deben asilarse y protegerse de los vehículos mediante barreras plásticas flexibles tipo maletín y deben contar como mínimo con transición de carril y kit de señales de aproximación.

Respuesta:

En este sentido, el contratista ha venido realizando las acciones necesarias para asegurar el adecuado manejo del tránsito peatonal y vehicular en las áreas de intervención correspondientes al contrato 613-2025, dando cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente y en el PMT aprobado por la SDM.

El contratista informa que, a la fecha de la presente respuesta, las actividades constructivas en el frente de obra han sido culminadas en su totalidad, razón por la cual ya no se presentan las condiciones observadas durante la visita de inspección. En consecuencia, el área intervenida cuenta con las condiciones operativas, de seguridad vial y de movilidad acordes con la finalización de la intervención, garantizando el tránsito seguro de peatones y demás actores viales. (Ver Fotografías 17, 18, 19 y 20)

El contratista reitera su compromiso con el cumplimiento de los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) previamente aprobados por la SDM y con la implementación de las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los actores viales en los segmentos en intervención. Por tanto, se continuará trabajando en el fortalecimiento, seguimiento y mejora de la señalización implementada, en cerramiento instalado y el manejo del tránsito, con el fin de evitar la ocurrencia nuevamente en el desarrollo de las actividades del proyecto.

	
Fotografía 17. Intersección Calle 50ª Sur con Carrera 38	**Fotografía 18.** Calle 50ª Sur con Carrera 38
	
Fotografía 19. Calle 50ª Sur con Carrera 38	**Fotografía 20.** Transversal 44 con Calle 50ª Sur

Cordialmente,

JOTAM MAESTRE DIAB
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO COCO

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Comité N° 27 seguimiento al COP 613-2025
Fecha:	8 Julio 2026
Hora de inicio:	9:00am
Hora de finalización:	10:30am
Modalidad:	X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta
Lugar:	FDLT - Alcaldía local
Dependencia:	Infraestructura.
Nombre del Responsable:	Diego caballero

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (natural o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO- TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	91'472.482	Marlo Santamaría	—	Consorcio Coco										consorciococo@gmail.com	
CC	1014264950	Valentina Martinez M.	—	FDLT / Infraest.										Valentina.martinez@gob	
CC	79.792.630	Misael Pulido G.	—	Interventoría										3227872292	
CC	80128761	Luis Eduardo Cadena	—	Consocio Coco										3015384752	
CC	1081145002	David Bermudez	—	Consorcio CoCo										ambiental fuy velito vias@gmail.com	David B.
CC	1067816960	[illegible]	—	Consorcio Coco										ssst.tunjuelitovias@gmail.com	[illegible]
CC	53134703	Maritza Vanegas	—	Consorcio Coco										sociedantonio@gmail.c	Myo.
C.	1024547145	Diego Caballero	—	FDLT										diego.caballero	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://guias.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

Scanned with CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de seguimiento al COE 613-2025, en las instalaciones de la alcaldía local de Tunjuelito, en conjunto contratista apoyo a la supervisión del FDLT e interventoría.

Se verifican compromisos del comité anterior se cumplio con la entrega de planilla seguridad social para el informe N°5., el contratista realiza entrega de presupuesto, se encuentra en revisión por parte de la interventoría y la entidad.

Se realiza presentación por cada componente por parte del contratista y cada una de las áreas.

Por parte del área social se informa que a la fecha se tienen 8 vías cerradas, se continua con la atención a la comunidad en el punto PAC, se tienen instaladas las vallas informativas y PSI en los frentes de obra en ejecución, se programan reuniones de inicio para los CIV 6001603 (6001303) Santa Lucia y CIV 6000617 Fatima, Informe N°6 aprobado.

El área ambiental y SST informa que se realizo reunión con el PIGA realizando el cargue de RCD del mes de abril y mayo, se acordo reunión para la semana del 13 julio para cargue del granulo de caucho se realizo revisión informe SST N°6 pendiente planilla seguridad social para posterior aprobación, informe ambiental N°6 se encuentra aprobado.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Planilla seguridad social informe N° 6	contratista.	8 julio
2	Informe mensual N° 6 área técnica	contratista	9 julio
3	Subsanar informes semanales	contratista.	10 julio

NOTA 1: En caso de no una reunión virtual se puede anexar cualquier de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formalidad.
NOTA 2: Agregar cuantas hojas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Scanned with CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

Por parte del área técnica de interventoría se solicita al contratista realizar ajuste a los informes semanales y entrega del informe mensual N° 6, el contratista manifiesta que realizara entrega. al 10 de julio

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

NOTA 1: En esta de esta una reunión virtual se puede anexar elemento de evidencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formulario.
NOTA 2: Asegure eliminar los files que sean innecesarios para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Scanned with CamScanner



CONTRATO DE OBRA No. 613-2025


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO COMITÉ No 27

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATISTA – COP 613 DEL 2025	
Empresa	CONSORCIO COCO
NIT	902.010.258-8
Objeto	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTEMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO.
Valor Total del contrato	$6.795.537.201
Acta de Iniciación	17 de diciembre de 2025
Fecha de inicio de obra	17 de diciembre de 2025
Fecha de terminación de la obra	16 de agosto de 2026
Tiempo estimado de duración de la obra	8 meses

AVANCE DE OBRA

AVANCE EN TIEMPO					
SEMANA No.	PERIODO DESDE	PERIODO HASTA	DIAS TRANSC	DIAS CONTRAC	%
29	29-jun-26	05-jul-26	200,00	242,00	82,64%

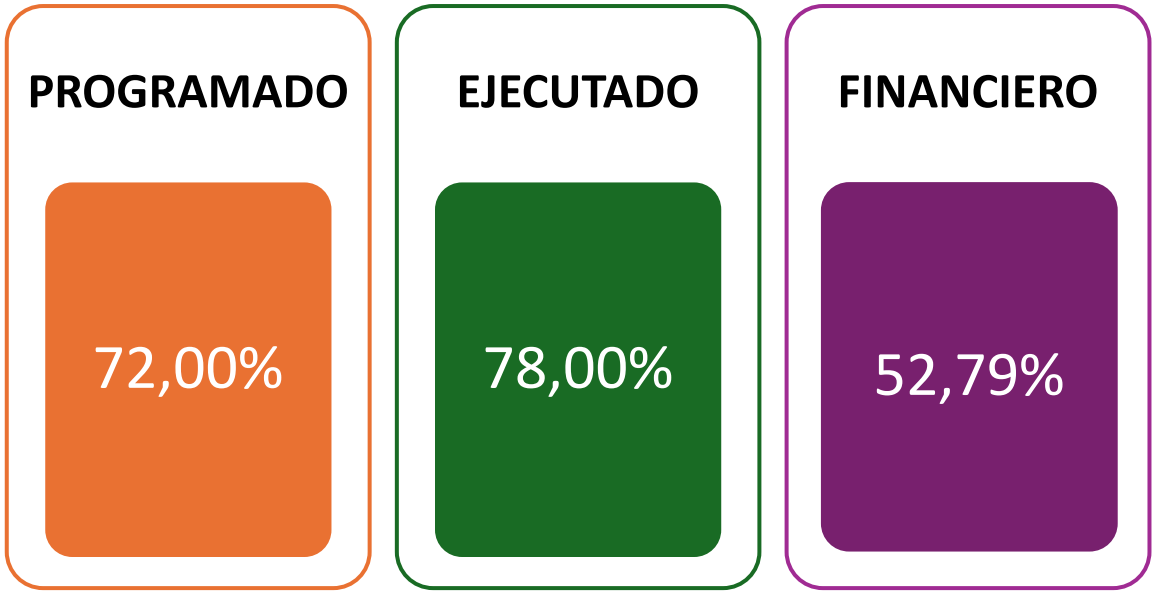

AVANCE FINANCIERO

VALOR CONTRATO	PORCENTAJE FACTURADO
$ 6.795.537.201	52,79%

ACTAS DE COBRO PARCIAL	VALOR
ACTA No 1	$ 147.690.799
ACTA No 2	$ 459.546.247
ACTA No 3	$ 1.086.683.907
ACTA No 4	$ 1.740.874.303
ACTA No 5	$ 144.438.690
TOTAL FACTURADO	$ 3.579.233.946
SALDO POR FACTURAR	$ 3.216.303.255


CIV´S FINALIZADOS

CIV 6000580	INICIO: 09/02/2026 FIN: 17/03/2026
CIV 6000528	INICIO: 19/02/2026 FIN: 05/03/2026
CIV 6001200	INICIO: 24/02/2026 FIN: 26/05/2026
CIV 6001013	INICIO: 16/03/2026 FIN: 26/06/2026
CIV 6000857	INICIO: 24/03/2026 FIN: 30/06/2026

ACTIVIDADES

CIV 6000372	ACTIVIDADES
 	Se ejecutan labores de remate y ajuste final de pozos de inspección y sumideros, consistentes en la adecuación de cotas, conformación de acabados y aseguramiento de la correcta instalación de marcos y tapas, de acuerdo con los niveles de diseño establecidos. Estas actividades garantizan la adecuada funcionalidad de la red de drenaje y su correcta integración con la estructura vial y las superficies terminadas.

ACTIVIDADES

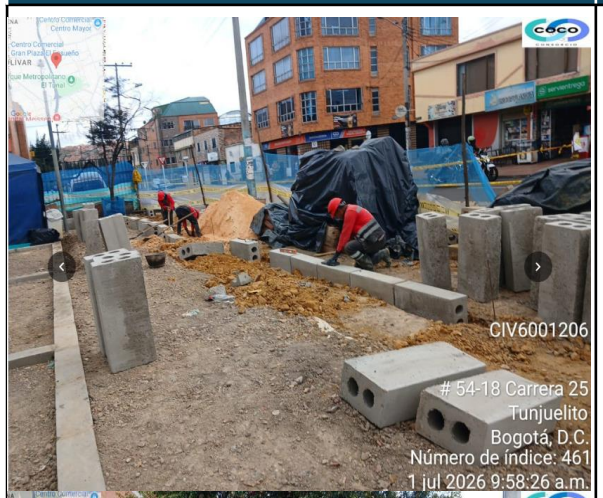CIV 6001206	ACTIVIDADES
 	Se realiza Excavación manual para bordillo, instalación de bordillo A-80 posteriormente se realizo la nivelación de cajas de redes secas y humedad, se continúa instalación y emboquillado de bordillo A-80.

ACTIVIDADES

CIV 6000830	ACTIVIDADES
 	Durante la semana se realizo Armado de acero para losa superior cárcamo de la red pluvial. Posteriormente se realizo la colocación concreto para losa superior de cárcamo. Además se inicia con la demolición de sumideros existentes y excavación manual para sumideros prefabricados

ACTIVIDADES

CIV 6000557	ACTIVIDADES
 	Se realizan la colocación concreto de 3.000PSI para franja de ajuste en andenes.

ACTIVIDADES

CIV 6000389	ACTIVIDADES
	Se realizan la colocación concreto de 3.000PSI para franja de ajuste en andenes.

ACTIVIDADES

CIV 6000786	ACTIVIDADES
	Se realizó la nivelación y extensión de la mezcla asfáltica en el tramo 6000786, garantizando el cumplimiento de las cotas y la uniformidad de la superficie para la conformación de la carpeta de rodadura. De igual manera, se ejecutó la colocación de la primera capa de asfalto en el tramo 786, efectuando su extendido y compactación conforme a las especificaciones técnicas del proyecto para asegurar la adecuada calidad y desempeño del pavimento.

Componente SST

TOTAL DE EMPLEOS:

- TOTAL EMPLEOS DIRECTOS CONTRATO: **38**
- TOTAL EMPLEOS INDIRECTOS CONTRATO: **12**
- TOTAL EMPLOS DIRECTOS E INDIRECTOS MUJER CONTRATO: **7**
- TOTAL EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS JÓVENES CONTRATO: **3**
- TOTAL EMPLEOS DISCAPACIDAD: **1**

- TOTAL EMPLEOS DIRECTOS INTERVENTORIA: **15**
- TOTAL EMPLEOS INDIRECTOS INTERVENTORIA: **1**
- TOTAL EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS MUJER INTERVENTORIA: **8**
- TOTAL EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS JOVENES INTERVENTORIA: **0**



Componente SST

Se realizó reposición de dotación y EPP en los frentes de obra CIV´S 6000857-6000830-6000372-6000557.

Se realizó charla de 5 minutos en el frente de obra CIV 6000372.

Se realizó inspección de kit de emergencias botiquín y extintor en el frente de obra CIV 6000557.

Se realizó mesa de trabajo en el frente de obra CIV 6001013, en conjunto con la contraloría, el Fondo de Desarrollo Local de la alcaldía de Tunjuelito FDLT y la interventoría.

Se realizó desmantelamiento del frente de obra CIV 6001013.









Componente Ambiental

Cumplimiento de la normatividad ambiental vigente referente a la disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), la circularidad de residuos y la correcta disposición de vertimientos provenientes de los baños.



Jornada de orden y aseo en los frentes de obra CIV´S 6000372-6000557-6001206-6001013-6000857-6000786.



Inspección de kit de derrames en el frente de obra CIV 6000557.



Desmantelamiento del frente de obra CIV 6001013.



Mantenimiento a protección de sumideros en el frente de obra CIV 6000557.



Mesa de trabajo en el frente de obra CIV 6001013, en conjunto con la contraloría, el Fondo de Desarrollo Local de la alcaldía de Tunjuelito FDLT y la interventoría.



Instalación de protección de materiales en el frente de obra CIV 6000830.

Componente Social

- Se atiende solicitud de reunión para el tramo 6001013, con la Contraloría. Donde se les indica el avance de obra y la actividad que se realizo en dicho tramo


- A la fecha se cuenta con ocho (8) PQR`S de las cuales se encuentras cerradas,
- A la fecha se cuenta cinco (5) Derechos de petición cerrados.


- Se atiende en el punto PAC al representante de las comunidades el señor Marino Giraldo .

- Se remite informes mensual No 6 con el fin de revisión y aprobación





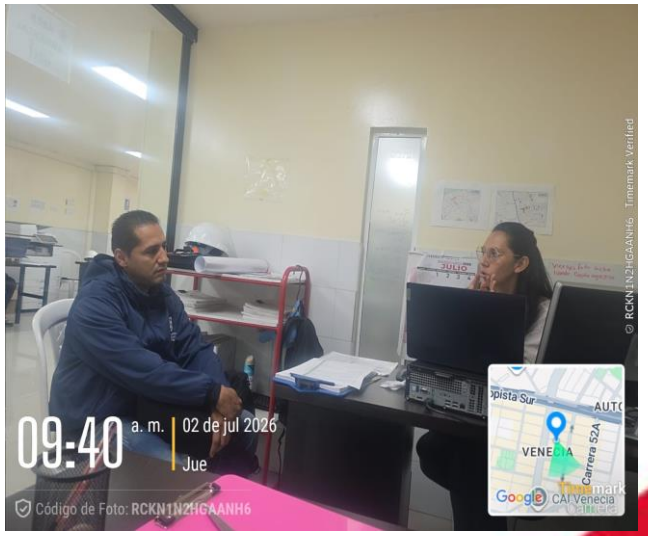

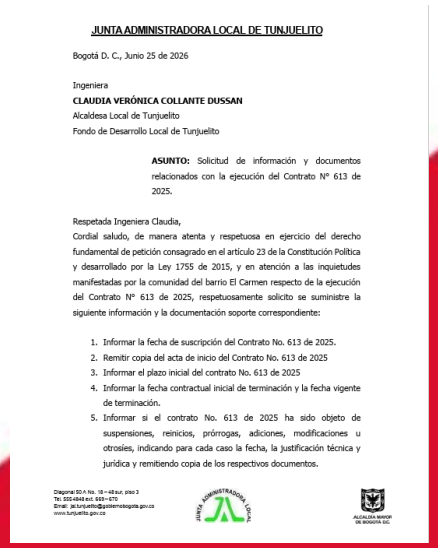

JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE TUNJUELITO

Bogotá D. C., Junio 25 de 2026

Ingeniera
CLAUDIA VERÓNICA COLLANTE DUSSAN
Alcaldesa Local de Tunjuelito
Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito

ASUNTO: Solicitud de información y documentos relacionados con la ejecución del Contrato N° 613 de 2025.

Respetada Ingeniera Claudia,
Cordial saludo, de manera atenta y respetuosa en ejercicio del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y desarrollado por la Ley 1755 de 2015, y en atención a las inquietudes manifestadas por la comunidad del barrio El Carmen respecto de la ejecución del Contrato N° 613 de 2025, respetuosamente solicito se suministre la siguiente información y la documentación soporte correspondiente:







1. Informar la fecha de suscripción del Contrato No. 613 de 2025.
2. Remitir copia del acta de inicio del Contrato No. 613 de 2025
3. Informar el plazo inicial del contrato No. 613 de 2025
4. Informar la fecha contractual inicial de terminación y la fecha vigente de terminación.
5. Informar si el contrato No. 613 de 2025 ha sido objeto de suspensiones, reinicios, prórrogas, adiciones, modificaciones u otrosíes, indicando para cada caso la fecha, la justificación técnica y jurídica y remitiendo copia de los respectivos documentos.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Seguimiento al COP 613-2025 Comité No 28			
Fecha:	14 de julio de 2026	**Hora de inicio: 9:00 am**	**Modalidad:**	**Presencial**
Lugar:	Virtual	**Hora de finalización: 10:00 am**		**Virtual X**
Dependencia:	Infraestructura	**Nombre del responsable: Diego Caballero**		**Telefónica**
				Mixta

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
CC	1014264950	Valentina Martínez Muñoz	N/A	FDLT/Infraestructura			X						X	valentinamartinez@gobiernobogota.gov.co	
CC	79518952	Santiago Carrillo Vargas	N/A	Interventoría			X						X	cintunjuelito@gmail.com	
CC	79797630	Misael Pulido Guzmán	N/A	Interventoría			X						X	cintunjuelito@gmail.com	
CC	1081145002	Hernán David Bermúdez	N/A	Contratista			X						X	ambientaltunjuelitovias@gmail.com	
CC	53134703	Maritza Vanegas	N/A	Contratista			X						X	contratotunjuelito@gmail.com	
CC	37327329	Edna Ruth Casadiego	N/A	Interventoría			X						X	cintunjuelito@gmail.com	
CC	52843440	Marcela Mendoza	N/A	Interventoría			X						X	cintunjuelito@gmail.com	
CC	81067816960	Saraima Sierra Oñate	N/A	Contratista			X						X	Sss.tunjuelitovias@gmail.com	
CC	91472482	Marlo Santamaria	N/A	Contratista			X						X	contratotunjuelito@gmail.com	
CC	80128761	Luis Eduardo Cadena	N/A	Contratista			X						X	contratotunjuelito@gmail.com	
CC	52281375	Adriana Gutiérrez	N/A	interventoría			X						X	cintunjuelito@gmail.com	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de seguimiento al COP 613-2025 de manera virtual, en conjunto contratista, apoyo a la supervisión del FDLT e interventoría, se realiza lectura del acta anterior.

Referente a los compromisos, del comité anterior, la entrega de planilla seguridad social informe No 6 se dio cumplimiento a este compromiso, respecto al informe mensual del área técnica No 6, subsanación de los informes semanales fueron enviados por el contratista y se encuentran en revisión por parte de la interventoría.

Se realiza la presentación del comité por parte del contratista referente a las diferentes áreas, la cual se anexa a la presente acta.

Por parte del área ambiental y SST de la interventoría se informa que a la fecha se tienen aprobación de los informes mensuales No 6 para cada área, referente a los recorridos se encuentra en campo la adecuada instalación de cerramientos perimetrales, elementos de emergencia en adecuadas condiciones, pendiente el envió de reporte de granulo de caucho para concertar reunión con la referente PIGA de la alcaldía local de Tunjuelito, se solicita la respuesta del oficio de requerimiento de la secretaria distrital de movilidad; el contratista esta realizando la respectiva revisión y entrega de documentación, la Ing. Valentina solicita realizar la gestión para dar cumplimiento con este tema.

Por parte de área social de la interventoría se informa que se continua con la atención a la comunidad, se tienen instalados los PSI y vallas informativas en cada frente de obra en ejecución, se mantiene la atención a la comunidad, a la fecha se tienen 8 PQRS, 3 actas de compromiso y se cumple con el porcentaje de 54% de personal de MONC local, 14.5% de personal femenino y 6.2% de personal vulnerable dando cumplimiento de esta manera con lo requerido por el FDLT, se programa reunión de inicio el día de hoy en el CIV 6001222 tunal II.

La Ing. Valentina solicita realizar la revisión y verificación de los registros fotográficos de todos los segmentos viales, adicional a ello envío de los informes mensuales No 6 por parte del contratista e interventoría al FDLT, realizar revisión de los andenes para intervención y realizar la entrega del derecho de petición solicitado.


Personal contratado por parte del contratista:
Directo: 33
Indirecta: 12
Mujeres: 7
Menores de 28 años: 3

Personal contratado por parte de la interventoría:
Directa: 15
Indirecta: 1
Mujeres: 8
Menores de 28 años: 0

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

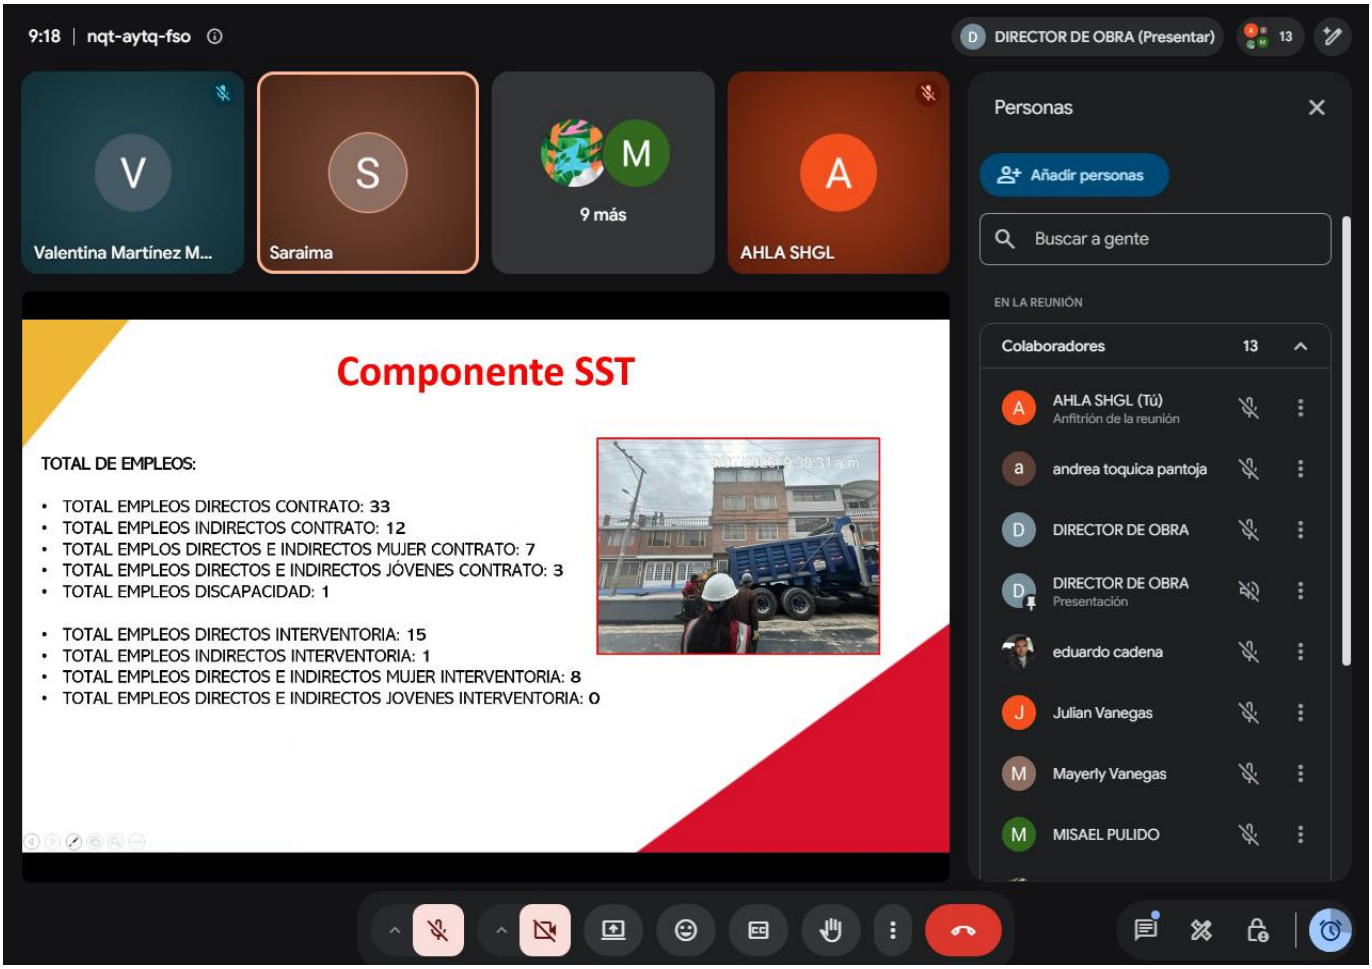

9:20 | nqt-aytq-fso

DIRECTOR DE OBRA (Presentar) 13

Julian Vanegas | Santiago Barrera | 9 más | AHLA SHGL

Componente Ambiental

Cumplimiento de la normatividad ambiental vigente referente a la disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), la circularidad de residuos y la correcta disposición de vertimientos provenientes de los baños.


Cargue de RCD en el frente de obra CIV 6001206.


Limpieza de unidades sanitarias portátiles en los frentes de obra.


Protección de sumideros en el frente de obra CIV 6001206.


Orden y aseo en los frentes de obra CIV´S 6001206-6000372-6000389.


Acompañamiento a reuniones de inicio de los frentes de obra CIV´S 6000617-6001303.


Reunión de reporte de RCD con profesional PIGA y profesional de interventoria.

Personas

Añadir personas

Buscar a gente

EN LA REUNIÓN

Colaboradores 13

- AHLA SHGL (Tú) — Anfitrión de la reunión
- andrea toquica pantoja
- DIRECTOR DE OBRA
- DIRECTOR DE OBRA — Presentación
- eduardo cadena
- Julian Vanegas
- Mayerly Vanegas
- MISAEL PULIDO

9:27 | nqt-aytq-fso

DIRECTOR DE OBRA (Presentar) 13

Julian Vanegas | Santiago Barrera | Mayerly Vanegas | Valentina Martínez ... | 7 más | AHLA SHGL

Componente Social

- Se entrego once (11) volante de reunión de inicio para el CIV 6000617.
- Se entrego un (1) volantes de reunión de inicio para el CIV 6001303.
- Se entrego once (11) volante de inicio de obra para el CIV 6000617.
- Se realizó reunión de inicio de obra del CIV 6000617, con la participación de siete (7) asistentes.
- Se llevó a cabo reunión de inicio de obra del CIV 60001303, con la asistencia de seis (6) participantes.
- Se radico informe N°6 con numero de radicado FDLT-CTO-613-2025/095








CONTRATO DE OBRA No. 613-2025


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO COMITÉ No 28

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATISTA – COP 613 DEL 2025	
Empresa	CONSORCIO COCO
NIT	902.010.258-8
Objeto	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTEMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO.
Valor Total del contrato	$6.795.537.201
Acta de Iniciación	17 de diciembre de 2025
Fecha de inicio de obra	17 de diciembre de 2025
Fecha de terminación de la obra	16 de agosto de 2026
Tiempo estimado de duración de la obra	8 meses

AVANCE DE OBRA

AVANCE EN TIEMPO					
SEMANA No.	PERIODO DESDE	PERIODO HASTA	DIAS TRANSC	DIAS CONTRAC	%
30	06-jul-26	12-jul-26	207,00	242,00	85,54%

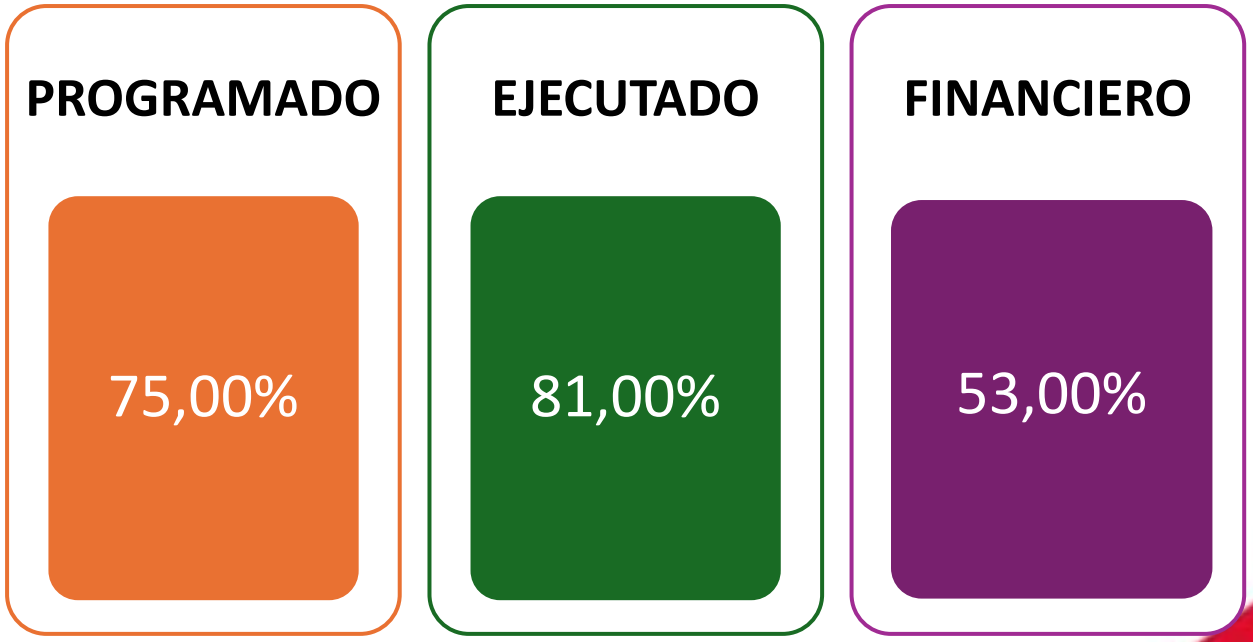

AVANCE FINANCIERO

VALOR CONTRATO	PORCENTAJE FACTURADO
$ 6.795.537.201	52,79%

ACTAS DE COBRO PARCIAL	VALOR
ACTA No 1	$ 147.690.799
ACTA No 2	$ 459.546.247
ACTA No 3	$ 1.086.683.907
ACTA No 4	$ 1.740.874.303
ACTA No 5	$ 144.438.690
TOTAL FACTURADO	$ 3.579.229.946
SALDO POR FACTURAR	$ 3.216.307.255

CIV´S FINALIZADOS

CIV 6000580	INICIO: 09/02/2026 FIN: 17/03/2026
CIV 6000528	INICIO: 19/02/2026 FIN: 05/03/2026
CIV 6001200	INICIO: 24/02/2026 FIN: 26/05/2026
CIV 6001013	INICIO: 16/03/2026 FIN: 26/06/2026
CIV 6000372	INICIO: 18/02/2026 FIN: 10/07/2026
CIV 6000389	INICIO: 30/03/2026 FIN: 10/07/2026
CIV 6000857	INICIO: 24/03/2026 FIN: 30/06/2026

ACTIVIDADES

CIV 6000372	ACTIVIDADES
 	Se dio inicio a la instalación de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 en el frente de obra correspondiente al CIV 6000372, realizando el extendido de la mezcla asfáltica con el espesor de diseño y su posterior compactación mediante equipos adecuados. La actividad se ejecutó conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, garantizando la uniformidad, densidad y regularidad superficial requeridas para el adecuado desempeño de la estructura del pavimento.

ACTIVIDADES

CIV 6001206	ACTIVIDADES
 	Se continúa con la instalación de bordillo tipo A-80 en el tramo intervenido, realizando el replanteo, alineación, nivelación y fijación de las piezas sobre la base preparada, verificando el cumplimiento de las cotas y pendientes establecidas en los planos del proyecto. La actividad se ejecuta conforme a las especificaciones técnicas, garantizando la estabilidad, continuidad y correcta delimitación de la estructura vial.

ACTIVIDADES

CIV 6000830	ACTIVIDADES
 	Se realizó la excavación manual para la instalación de ductos y sumideros prefabricados, de acuerdo con las dimensiones y profundidades establecidas en los planos del proyecto. La actividad incluyó la remoción del material, el perfilado de las paredes y el fondo de la excavación, garantizando las condiciones adecuadas para la posterior instalación de los elementos del sistema de drenaje, conforme a las especificaciones técnicas y de seguridad establecidas.

ACTIVIDADES

CIV 6000557	ACTIVIDADES
 	Se realizó la nivelación asfáltica en el tramo intervenido mediante la colocación, extensión y compactación de mezcla asfáltica, con el fin de corregir las irregularidades de la superficie existente y garantizar el cumplimiento de las cotas, pendientes y espesores establecidos en el diseño. La actividad se ejecutó de conformidad con las especificaciones técnicas del proyecto, obteniendo una superficie uniforme y estable para la posterior instalación de la carpeta de rodadura.

ACTIVIDADES

CIV 6000786	ACTIVIDADES
 	Se realizó la nivelación y extensión de la mezcla asfáltica en el tramo 857, garantizando el cumplimiento de las cotas y la uniformidad de la superficie para la conformación de la carpeta de rodadura. De igual manera, se ejecutó la colocación de la primera capa de asfalto en el tramo 786, efectuando su extendido y compactación conforme a las especificaciones técnicas del proyecto para asegurar la adecuada calidad y desempeño del pavimento.

ACTIVIDADES

CIV 6000389	ACTIVIDADES
 	Se realizó la instalación de mezcla asfáltica tipo MCCH-25 en el tramo intervenido, mediante el extendido y conformación de la mezcla con el espesor especificado en el diseño, seguido de su compactación con los equipos adecuados hasta alcanzar la densidad requerida. La actividad se ejecutó conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, garantizando la estabilidad, capacidad estructural y uniformidad de la capa asfáltica.

Componente SST

TOTAL DE EMPLEOS:

- TOTAL EMPLEOS DIRECTOS CONTRATO: **33**
- TOTAL EMPLEOS INDIRECTOS CONTRATO: **12**
- TOTAL EMPLOS DIRECTOS E INDIRECTOS MUJER CONTRATO: **7**
- TOTAL EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS JÓVENES CONTRATO: **3**
- TOTAL EMPLEOS DISCAPACIDAD: **1**

- TOTAL EMPLEOS DIRECTOS INTERVENTORIA: **15**
- TOTAL EMPLEOS INDIRECTOS INTERVENTORIA: **1**
- TOTAL EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS MUJER INTERVENTORIA: **8**
- TOTAL EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS JOVENES INTERVENTORIA: **0**



Componente SST

Se realizó fabricación e instalación de plafones en el frente de obra CIV 6000830.

Se realizó inspección de dotación y EPP en el frente de obra CIV 6000557.

Se realizó acompañamiento en actividades de obra en los frentes CIV´S 6000372-6000389.

Se realizó acompañamiento a reuniones de inicio de los frentes de obra CIV´S 6000617-6001303.

Se realizó desmantelamiento de los frentes de obra CIV´S 6000857-6000786.









Componente Ambiental

Cumplimiento de la normatividad ambiental vigente referente a la disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), la circularidad de residuos y la correcta disposición de vertimientos provenientes de los baños.



Cargue de RCD en el frente de obra CIV 6001206.



Limpieza de unidades sanitarias portátiles en los frentes de obra.



Protección de sumideros en el frente de obra CIV 6001206.



Orden y aseo en los frentes de obra CIV´S 6001206-6000372-6000389.



Acompañamiento a reuniones de inicio de los frentes de obra CIV´S 6000617-6001303.



Reunión de reporte de RCD con profesional PIGA y profesional de interventoría.

Componente Social

- Se entrego once (11) volante de reunión de inicio para el CIV 6000617.
- Se entrego un (1) volantes de reunión de inicio para el CIV 6001303.
- Se entrego once (11) volante de inicio de obra para el CIV 6000617.
- Se realizó reunión de inicio de obra del CIV 6000617, con la participación de siete (7) asistentes.
- Se llevó a cabo reunión de inicio de obra del CIV 60001303, con la asistencia de seis (6) participantes.
- Se radico informe N°6 con numero de radicado FDLT-CTO-613-2025/095









BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Seguimiento al COP 613-2025 Comité No 29			
Fecha:	21 de julio de 2026	**Hora de inicio: 9:00 am**	**Modalidad:**	**Presencial**
Lugar:	Virtual	**Hora de finalización: 10:00 am**		**Virtual X**
Dependencia:	Infraestructura	**Nombre del responsable: Diego Caballero**		**Telefónica**
				Mixta

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
CC	1014264950	Valentina Martínez Muñoz	N/A	FDLT/Infraestructura			X						X	valentinamartinez@gobiernobogota.gov.co	
CC	79518952	Santiago Carrillo Vargas	N/A	Interventoría			X						X	cintunjuelito@gmail.com	
CC	79797630	Misael Pulido Guzmán	N/A	Interventoría			X						X	cintunjuelito@gmail.com	
CC	1081145002	Hernán David Bermúdez	N/A	Contratista			X						X	ambientaltunjuelitovias@gmail.com	
CC	53134703	Maritza Vanegas	N/A	Contratista			X						X	contratotunjuelito@gmail.com	
CC	37327329	Edna Ruth Casadiego	N/A	Interventoría			X						X	cintunjuelito@gmail.com	
CC	52843440	Marcela Mendoza	N/A	Interventoría			X						X	cintunjuelito@gmail.com	
CC	81067816960	Saraima Sierra Oñate	N/A	Contratista			X						X	Sss.tunjuelitovias@gmail.com	
CC	91472482	Marlo Santamaria	N/A	Contratista			X						X	contratotunjuelito@gmail.com	
CC	80128761	Luis Eduardo Cadena	N/A	Contratista			X						X	contratotunjuelito@gmail.com	
CC	52281375	Adriana Gutiérrez	N/A	interventoría			X						X	cintunjuelito@gmail.com	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de seguimiento al COP 613-2025 de manera virtual, en conjunto contratista, apoyo a la supervisión del FDLT e interventoría, se realiza lectura del acta anterior.

Se realiza la presentación del comité por parte del contratista referente a las diferentes áreas, la cual se anexa a la presente acta.

El ing. Misael solicita el informe mensual No 6 ya que se enviaron observaciones y no se han recibido, el Ing. Marlo manifiesta que se entregara el día de hoy las observaciones, La Ing. Valentina solicita hacer entrega de los informes mensuales antes del 15 de cada mes, para evitar demoras en las entregas.

Por parte del área ambiental y SST de la interventoría se informa que referente a los recorridos se encuentra en campo la adecuada instalación de cerramientos perimetrales, elementos de emergencia en adecuadas condiciones, se recomienda dar respuesta al oficio de la secretaria de movilidad el contratista dará respuesta al mismo en el trascurso de la semana.

Por parte de área social de la interventoría se informa que se continua con la atención a la comunidad, se tienen instalados los PSI y vallas informativas en cada frente de obra en ejecución, se mantiene la atención a la comunidad, a la fecha se tienen 8 PQRS, 3 actas de compromiso y se cumple con el porcentaje de personal MONC local, femenino y vulnerable.

La Ing. Valentina solicita dar celeridad a los inicios de segmentos viales pendientes, para dar cumplimiento a las fechas establecidas en el contrato, adicional a ello revisar fechas de entrega de actas de pagos.

Personal contratado por parte del contratista:
Directo: 33
Indirecta: 12
Mujeres: 7
Menores de 28 años: 3

Personal contratado por parte de la interventoría:
Directa: 15
Indirecta: 1
Mujeres: 8
Menores de 28 años: 0

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Entrega observaciones informe técnico No 6	Contratista	21 julio 2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO



9:19 | tnn-uvek-tza

DIRECTOR DE OBRA (Presentar) 12

DIRECTOR DE OBRA | MISAEL PULIDO | Valentina Martínez ... | Saraima | 6 más | AHLA SHGL

Componente SST

Se dio apertura a los frentes de obra CIV´S 6000617-6000721 donde se realizó instalación de carteleras informativas SST-AMBIENTAL, kit de emergencias (botiquín, extintor y camilla), señalización preventiva de seguridad industrial.

Se realizó desmantelamiento al frente de obra CIV 6000557.

Se realizó señalización de áreas peligrosas en el frente de obra CIV 6000721.

Se realizó reposición de EPP en punto crea al personal de trabajo.






9:21 | tnn-uvek-tza

DIRECTOR DE OBRA (Presentar) 12

DIRECTOR DE OBRA | Julian Vanegas | Santiago Barrera | Saraima | 6 más | AHLA SHGL

Componente Ambiental

Cumplimiento de la normatividad ambiental vigente referente a la disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), la circularidad de residuos y la correcta disposición de vertimientos provenientes de los baños.


Apertura del frente de obra CIV 6000617.


Cargue de RCD en el frente de obra CIV 6000617.


Orden y aseo en el frente de obra CIV 6000617.


Apertura del frente de obra CIV 6000721.


Instalación de kit de derrames CIV 6000617.


Protección de sumideros CIV 6001206.


9:30 | tnn-uvek-tza
DIRECTOR DE OBRA (Presentar)
12
MISAEL PULIDO
Valentina Martínez ...
Santiago Barrera
Julian Vanegas
6 más
AHLA SHGL
Componente Social
• Se lleva acabo la reunión de inicio de obra en el segmento 6001222, donde se tubo una participación de cinco (5) participantes de la comunidad, tres (3) de Interventoría y cinco (5)
• Se realiza la entrega del volante de inicio de obra del bacheo
• Instalación de valla informativa y el volante de no parqueo vehicular en el tramo 6000617
• A la fecha se cuenta con ocho (8) PQR`S de las cuales se encuentras cerradas
11:15
14 de jul 2026



CONTRATO DE OBRA No. 613-2025


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO COMITÉ No 29

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATISTA – COP 613 DEL 2025	
Empresa	CONSORCIO COCO
NIT	902.010.258-8
Objeto	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTEMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO.
Valor Total del contrato	$6.795.537.201
Acta de Iniciación	17 de diciembre de 2025
Fecha de inicio de obra	17 de diciembre de 2025
Fecha de terminación de la obra	16 de agosto de 2026
Tiempo estimado de duración de la obra	8 meses

AVANCE DE OBRA

AVANCE EN TIEMPO					
SEMANA No.	PERIODO DESDE	PERIODO HASTA	DIAS TRANSC	DIAS CONTRAC	%
31	13-jul-26	19-jul-26	214,00	242,00	88,43%

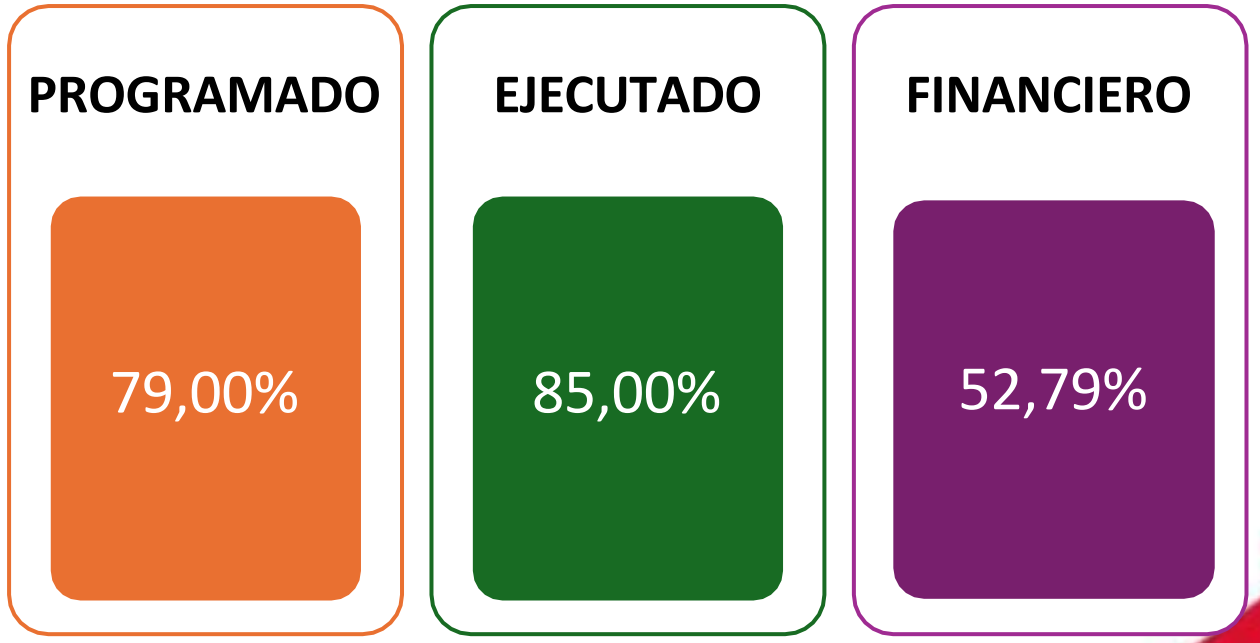

AVANCE FINANCIERO

VALOR CONTRATO	PORCENTAJE FACTURADO
$ 6.795.537.201	52,79%


ACTAS DE COBRO PARCIAL	VALOR
ACTA No 1	$ 147.690.799
ACTA No 2	$ 459.546.247
ACTA No 3	$ 1.086.683.907
ACTA No 4	$ 1.740.874.303
ACTA No 5	$ 144.438.690
TOTAL FACTURADO	$ 3.579.229.946
SALDO POR FACTURAR	$ 3.216.307.255

CIV´S FINALIZADOS

CIV 6000580	INICIO: 09/02/2026 FIN: 17/03/2026
CIV 6000528	INICIO: 19/02/2026 FIN: 05/03/2026
CIV 6001200	INICIO: 24/02/2026 FIN: 26/05/2026
CIV 6001013	INICIO: 16/03/2026 FIN: 26/06/2026
CIV 6000372	INICIO: 18/02/2026 FIN: 10/07/2026
CIV 6000389	INICIO: 30/03/2026 FIN: 10/07/2026
CIV 6000857	INICIO: 24/03/2026 FIN: 30/06/2026
CIV 6000557	INICIO: 15/04/2026 FIN: 14/07/2026
CIV 6000786	INICIO: 20/04/2026 FIN: 14/07/2026


ACTIVIDADES

CIV 6000830	ACTIVIDADES
 	Retiro, cargue, transporte y disposición del material producto de la excavación manual ejecutada para la construcción e instalación de sumideros, garantizando la limpieza del frente de obra y el cumplimiento de las especificaciones ambientales y de seguridad.

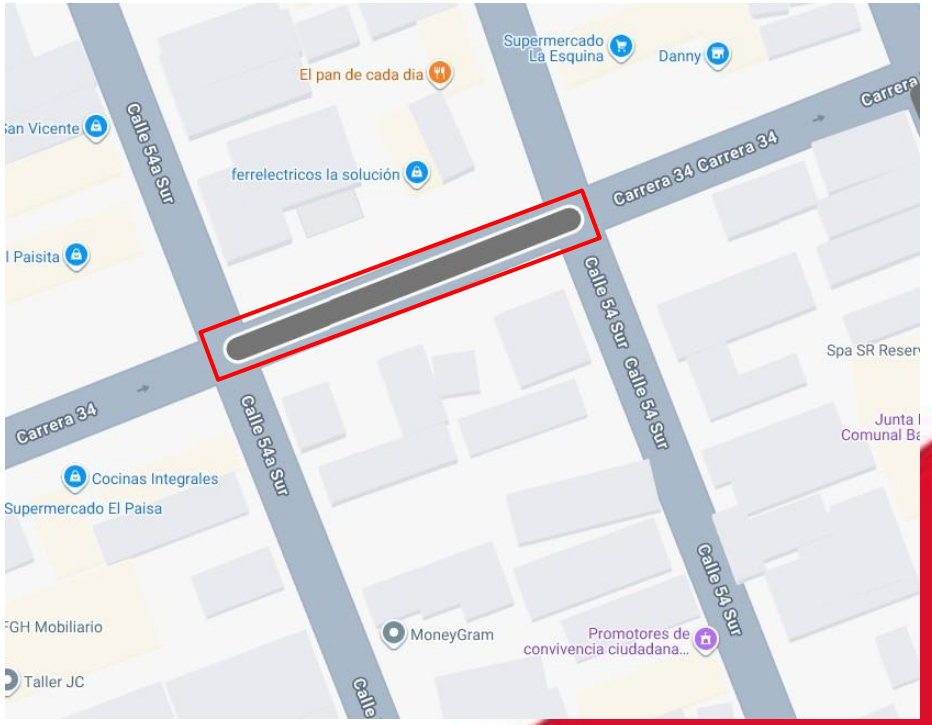


ACTIVIDADES

CIV 6000617	ACTIVIDADES
 	Demolición de la capa de rodadura en mezcla asfáltica existente mediante medios mecánicos, incluyendo el cargue, retiro y disposición final del material resultante, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

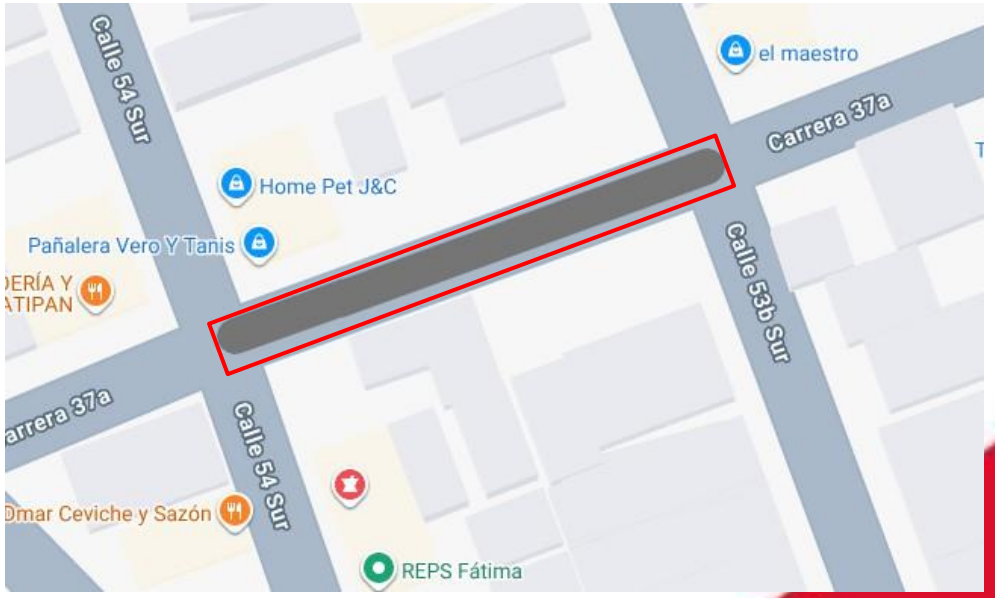

ACTIVIDADES

CRUCE	ACTIVIDADES
	Inicio de las actividades de bacheo en la intersección de la Diagonal 52A Sur con Carrera 32, mediante la demolición mecánica del pavimento asfáltico existente en las áreas previamente delimitadas, con el fin de retirar el material deteriorado y preparar la superficie para la posterior reconstrucción de la estructura de pavimento, de acuerdo con las especificaciones técnicas y los diseños del proyecto.

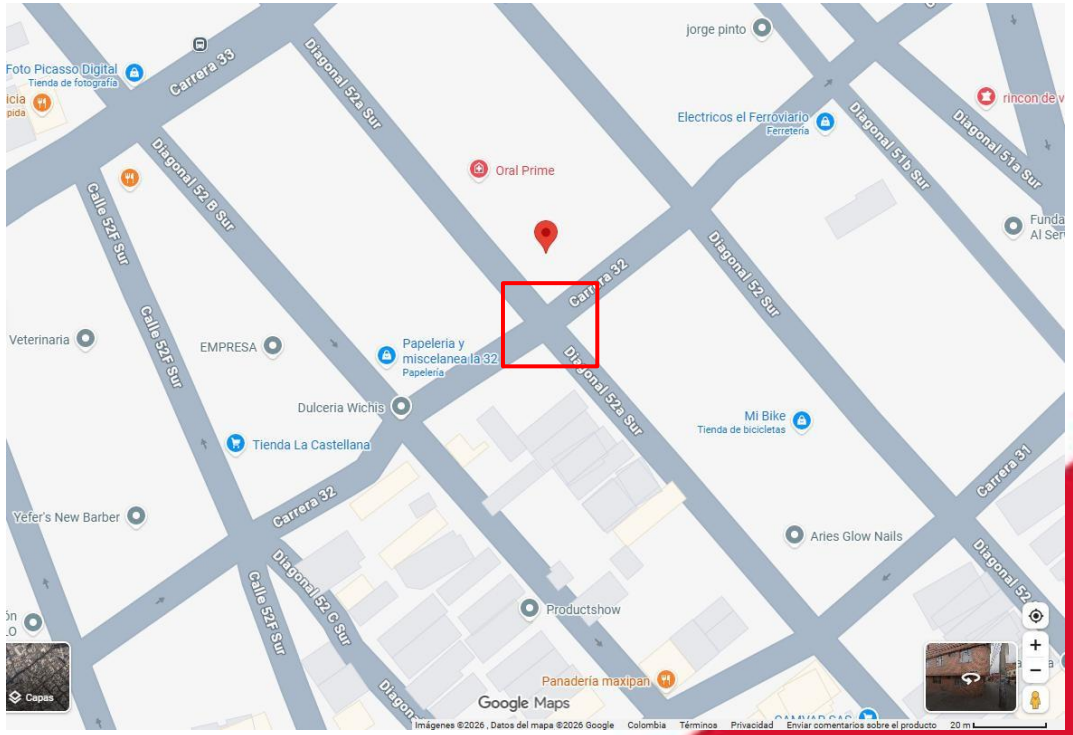

Componente SST

TOTAL DE EMPLEOS:

- TOTAL EMPLEOS DIRECTOS CONTRATO: **33**
- TOTAL EMPLEOS INDIRECTOS CONTRATO: **12**
- TOTAL EMPLOS DIRECTOS E INDIRECTOS MUJER CONTRATO: **7**
- TOTAL EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS JÓVENES CONTRATO: **3**
- TOTAL EMPLEOS DISCAPACIDAD: **1**

- TOTAL EMPLEOS DIRECTOS INTERVENTORIA: **15**
- TOTAL EMPLEOS INDIRECTOS INTERVENTORIA: **1**
- TOTAL EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS MUJER INTERVENTORIA: **8**
- TOTAL EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS JOVENES INTERVENTORIA: **0**



Componente SST

Se dio apertura a los frentes de obra CIV´S 6000617-6000721 donde se realizó instalación de carteleras informativas SST-AMBIENTAL, kit de emergencias (botiquín, extintor y camilla), señalización preventiva de seguridad industrial.

Se realizó desmantelamiento al frente de obra CIV 6000557.

Se realizó señalización de áreas peligrosas en el frente de obra CIV 6000721.

Se realizó reposición de EPP en punto crea al personal de trabajo.









Componente Ambiental

Cumplimiento de la normatividad ambiental vigente referente a la disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), la circularidad de residuos y la correcta disposición de vertimientos provenientes de los baños.



Apertura del frente de obra CIV 6000617.



Cargue de RCD en el frente de obra CIV 6000617.



Orden y aseo en el frente de obra CIV 6000617.



Apertura del frente de obra CIV 6000721.



Instalación de kit de derrames CIV 6000617.



Protección de sumideros CIV 6001206.

Componente Social

- Se lleva acabo la reunión de inicio de obra en el segmento 6001222, donde se tubo una participación de cinco (5) participantes de la comunidad, tres (3) de Interventoría y cinco (5)



- Se realiza la entrega del volante de inicio de obra del bacheo

- Instalación de valla informativa y el volante de no parqueo vehicular en el tramo 6000617

- A la fecha se cuenta con ocho (8) PQR`S de las cuales se encuentras cerradas



GRACIAS

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión: Seguimiento al COP 613-2023 Comité N° 30

Fecha: 29-07-2026.

Hora de inicio: 9:00 am

Hora de finalización: 12:00pm

Modalidad: X Presencial; Virtual; Telefónica; Mixta

Lugar: Recorrido y Alcaldía Tunjuelito.

Dependencia: Infraestructura

Nombre del Responsable: Diego Caballero

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
	79518952	Santiago Camilo Vargas		INTERVENTORIA			X						X	Ing. Santiago Camilo Volquetil@	
	80128761	Luis Eduardo Cadena		Consorcio Coco			X						X	consorciococo2025 @gmail.com	
	1060781950	Daniela Sierra		Consorcio Coco			X						X	est.tunjuelitovias @gmail.com	Daniela Sierra
	1081145002	David Bermudez.		Consorcio CoCo			X							ambientalcoco @gmail com	David B
	79797,630	Misael Pulido G		Interventoria										3227672292	
	53134703	Maritza Quiroga		Consorcio			X							3003926406	
	1014264950	Valentina Martinez M		FDLT/Apoyo Sup			X						X	3204509964	Valentina M.
	1022597185	Diego Caballero		FDLT/Ejec			X						X	3144619792	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://guias.gobiernobogota.gov.co/content/listado-integrado-de-gestion-tdg

Scanned with CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

Se realiza recorrido el dia 29 de julio del 2026. la Interventoria el Contratista y el FDLT. Durante este Se definen los 2 bacheos. Bacheo 1, con el CIV Bacheo 2, con el CIV. Se lleva a cabo la presentación donde el área tecnico. da a conocer. los actividades, en los siguientes tramos CIV 600617, se ejecutan actividades de excavación, se solicita desde el área tecnico. modificar. la presentación. y modificar actividades en el tramo 600617. colocar Cunetas, Se continua con las actividades el Cruce de la Dg 52 A Sur. se culmina las actividades de extendido de asfalto. esta actividad ya se culmino, a la fecha. Se esta realizando la limpieza y retiro de material y lo escombros, En el 6001206, se ejecuta la colocación y vaciado de concreto hidráulico., en el 6001222 informa el contratista, que este CIV se pretende terminar. la primera semana de agosto, para el 601303, se dio inicio de actividades Constructivas el 28 de julio del 2026, para el 6000870. desde el area social y ambiental se inicirá actividades el dia jueves 31 de julio, desde el Supervision de FDLT. informa que debe realizar el CIV 600617 el cual es contractual, Continua el área SST. indica las actividades tales, como empleo. y contratación, se realiza. Inspeccion de K,t faltan planillas y envian observaciones del Informe. mensual N°7. Desde la interventoria Solicita el informe N°7. y Subsanar observaciones del informe Semanales. N° 29, 30, 31 Asimismo continua el área Ambiental. quien Se realiza observaciones al informe N°7 y temas de los RCD, para finalizar el Area Social. se indica las actividades Constructivas, la entrega de volantes de inicio de obra y Cierres de los calpaque. Por Parte del FDLT. Solicita que para el 14 de agosto. se debe realizar la entrega. de vias las reuniones de finalizacion en los CIV 6006372, 6006389, 6006337 Barrio fatima.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

NOTA 1: Es una de las mas importantes ya que de ahi se desprenden los acuerdos pactados por las partes y las decisiones de mejoras o ajustes que durante la reunión
NOTA 2: Asegurar archivar todas las actas realizadas para registrar los avances y los compromisos de la reunión

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito

FECHA 21 (DD) 07 (MM) 2026 (AAAA)

CONTRATO No. 613-2025

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, BOGOTÁ D.C".

NOMBRE DEL PROFESIONAL David Bermudez

EMPRESA: CONSORCIO COCO

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [X] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros

LUGAR DEL EVENTO Frentes de obra

HORA DE INICIO: _____ HORA DE TERMINACIÓN: _____

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
1	Jose Moreno	6388159	Boal	Consorcio	
2	Eduar Ortega	1085226564	Boal	Consorcio	
3	Carlos Villamizar	79658299	Ayudante	Siglo XXI	
4	Vicente Ouiza	80127447	Operador	Siglo XXI	
5	Leonar Moreno	1004495	Boal	Consorcio	
6	Oscar Sánchez	80132078	Oficial	Siglo XXI	
7	Sergio Garcia	1085227822	Boal	Consorcio	
8	Laura Monjura	1022950246	Boal	Consorcio	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					


(Firma) _____

(Nombre) David Bermudez

Residente Ambiental Contratista


Dato No. 1

En obra se deberá mantener disponible en todo momento un equipo de bombeo que garantice el manejo de contingencias por inundaciones que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos, especialmente durante las excavaciones.



Dato No. 2

Se deben mantener limpias las cunetas, canales y drenajes naturales y artificiales de aguas lluvias, para lo cual se deberá retirar periódicamente los sedimentos y residuos que allí se acumulen y que obstruyan el flujo normal del agua.



Dato No. 3

Las aguas lluvias no se podrán mezclar con aguas residuales domésticas crudas para su vertimiento.


Captación (Sumideros): Son estructuras diseñadas para recolectar el agua de escorrentía superficial y evitar el ingreso de sólidos grandes a la red pluvial. Dependiendo de la topografía y el caudal:

- **Sumideros de ventana o bordillo: Aberturas laterales en la acera.**
- **Sumideros de rejilla: Instalados en zonas planas o deprimidas.**
- **Sumideros combinados: Unen ambas tecnologías para mayor eficiencia en puntos críticos de inundación.**

Tras la captación, el agua se dirige hacia los cuerpos receptores (ríos, quebradas, humedales)



MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS

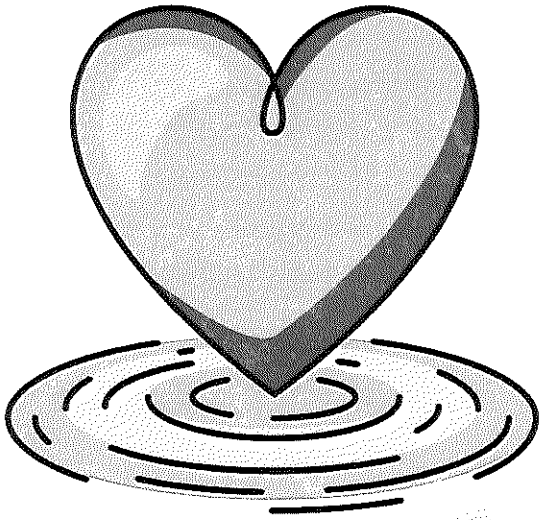

El manejo integral de cuerpos de agua y sumideros en obra civil implica el diseño, construcción y mantenimiento de infraestructuras para captar aguas lluvias, controlar la escorrentía, mitigar la erosión y proteger el medio ambiente.

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito

FECHA 21 (DD) 07 (MM) 2026 (AAAA)

CONTRATO No. 613-2025

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, BOGOTÁ D.C".

NOMBRE DEL PROFESIONAL David Bermudez.

EMPRESA: **CONSORCIO COCO**

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [X] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros.

LUGAR DEL EVENTO Punto Crea

HORA DE INICIO: 2:00pm HORA DE TERMINACIÓN: 2:30pm

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
1	DAYANA SIERRA O	1026786960	R. SST	COCO	DAYANA
2	Maria Araujo	1002915875	Aux. Sisoma	Coco	Maria Araujo
3	Valentina Avila Sigret	1.000.858.033	Aux. Tecnica	Coco	Valentina Avila
4	Manuel Puerto	80493233	Almacenista	coco	Manuel Puerto
5	CINDY ALVAREZ	1012381508	AUX. SOCIAL	COCO	CINDY ALVAREZ
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					


(Firma) _____

(Nombre) David Bermudez

Residente Ambiental Contratista


Dato No. 1

En obra se deberá mantener disponible en todo momento un equipo de bombeo que garantice el manejo de contingencias por inundaciones que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos, especialmente durante las excavaciones.



Dato No. 2

Se deben mantener limpias las cunetas, canales y drenajes naturales y artificiales de aguas lluvias, para lo cual se deberá retirar periódicamente los sedimentos y residuos que allí se acumulen y que obstruyan el flujo normal del agua.



Dato No. 3

Las aguas lluvias no se podrán mezclar con aguas residuales domésticas crudas para su vertimiento.


Captación (Sumideros): Son estructuras diseñadas para recolectar el agua de escorrentía superficial y evitar el ingreso de sólidos grandes a la red pluvial. Dependiendo de la topografía y el caudal:

- **Sumideros de ventana o bordillo: Aberturas laterales en la acera.**
- **Sumideros de rejilla: Instalados en zonas planas o deprimidas.**
- **Sumideros combinados: Unen ambas tecnologías para mayor eficiencia en puntos críticos de inundación.**

Tras la captación, el agua se dirige hacia los cuerpos receptores (ríos, quebradas, humedales)



MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS

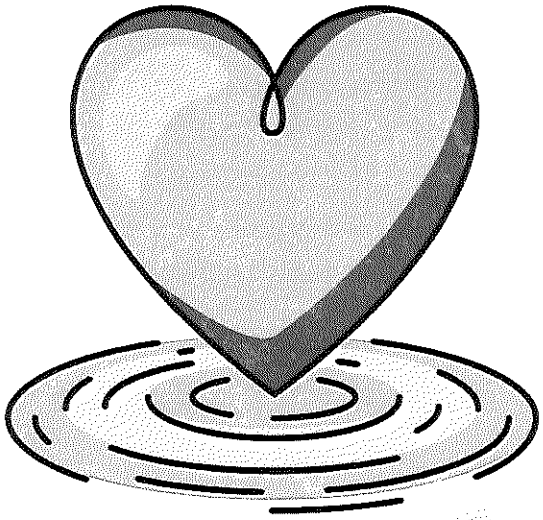

El manejo integral de cuerpos de agua y sumideros en obra civil implica el diseño, construcción y mantenimiento de infraestructuras para captar aguas lluvias, controlar la escorrentía, mitigar la erosión y proteger el medio ambiente.

EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLES	ESTADO	2026																														OBSERVACIONES
			ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				
			SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
GESTIÓN AMBIENTAL																																			
Elaboración del MAO - Medidas ambientales en obra	Residente Ambiental	P																																	
		E	X	X	X	X	X	X																											
Seguimiento y control del MAO - Medidas ambientales en obra	Residente Ambiental	P																																	
		E							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Inducción al personal nuevo	Residente Ambiental	P																																	
		E	X	X	X	X	X	X	X	X																									
Presentación de informes mensuales ambientales	Residente Ambiental	P																																	
		E				X				X				X				X				X				X				X					
Diligenciamiento de formatos ambientales aplicables al contratista	Residente Ambiental	P																																	
		E							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Verificación y seguimiento a los permisos y licencias de carácter ambiental que apliquen para el proyecto	Residente Ambiental	P																																	
		E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Capacitación Consumo Responsable	Residente Ambiental	P																																	
		E								X																									
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS																																			
B1. MANEJO DE CAMPAMENTOS, ALMACENES Y CENTROS DE ACOPIO																																			
Instalación y seguimiento a la demarcación y señalización del campamento de obra	Residentes Ambiental y SST	P																																	
		E							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Instalación de recipientes y seguimiento a la clasificación de residuos	Ayudantes, Residente Ambiental	P																																	
		E							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Desmantelamiento y restauración de la zonas destinadas a campamentos o centros de acopio.	Dirección de Obra, Residentes del proyecto	P																																	
		E											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Realización de labores de Orden, Aseo y Limpieza en el campamento	Ayudantes y personal de obra	P																																	
		E							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Capacitacion Señalizacion de residuos de construccion y demolicion RCD	Residente Ambiental	P																																	
		E											X																							
B2. MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN																																			
Verificación de la implementación de las medidas de manejo ambiental establecidas para la realización de mezclas de concreto en frentes de obra	Personal operativo	P																																	
		E							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Verificación de la implementación de las medidas de manejo ambiental establecidas para el acopio de materiales de construcción en frentes de obra.	Personal opeativo	P																																	
		E							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Capacitación medidas de manejo de materiales	Residente Ambiental	P																																	
		E														X																			
B3. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS																																			
Verificación de las actividades de cargue y retiro de RCD de los frentes de obra.	Personal operativo	P																																	
		E							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Verificación de la implementación de las medidas de manejo ambiental establecidas para el acopio de RCD y materiales reciclables en frentes de obra.	BOAL y personal de obra	P																																	
		E							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Verificación de las condiciones de Orden Aseo y Limpieza en Frentes de Obra.	BOAL y personal de obra	P																																	
		E							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Verificación del cumplimiento del PGRCD	Personal operativo	P																																	
		E							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Capacitación manejo y disposición final de RCD, residuos sólidos convencionales y especiales	Residente Ambiental	P																																	
		E																X																	

| | | |

	“EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, BOGOTÁ D.C”.						
CONTRATO N° 613 DE 2025	FECHA:	01/07/26 AL 31/07/26	HOJA	1	DE	7	INFORME AMBIENTAL

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO

LOCALIDAD DE TUNJUELITO

		
PUNTO ECOLOGICO CIV 60001206	PUNTO ECOLOGICO CIV 6000830	PUNTO ECOLOGICO CIV 6000617

		
CAMPAMENTO CIV 60001206	CAMPAMENTO CIV 6000830	CAMPAMENTO CIV 6000617

	“EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, BOGOTÁ D.C”.						
CONTRATO N° 613 DE 2025	FECHA:	01/07/26 AL 31/07/26	HOJA	2	DE	7	INFORME AMBIENTAL

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO

LOCALIDAD DE TUNJUELITO

		
SENDERO PEATONAL CIV 6001206	SENDERO PEATONAL CIV 6000830	SENDERO PEATONAL CIV 6000617

		
ASEO CIV 6001206	ASEO CIV 6000830	ASEO CIV 6000617

	“EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, BOGOTÁ D.C”.						
CONTRATO N° 613 DE 2025	FECHA:	01/07/26 AL 31/07/26	HOJA	3	DE	7	INFORME AMBIENTAL

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO

LOCALIDAD DE TUNJUELITO

		
BARRICADA CIV 6000721 (BACHEO)	PROTECCION DE ARBOLES CIV 6001206	LIMPIEZA DE SUMIDEROS CIV 6001206
		
LIMPIEZA DE SUMIDEROS CIV 6000830	LIMPIEZA DE SUMIDEROS CIV 6000617	CERRAMIENTO CIV 6001206

	“EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, BOGOTÁ D.C”.						
CONTRATO N° 613 DE 2025	FECHA:	01/07/26 AL 31/07/26	HOJA	4	DE	7	INFORME AMBIENTAL

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO

LOCALIDAD DE TUNJUELITO

		
CERRAMIENTO CIV 6000830	CERRAMIENTO CIV 6000617	PROTECCIÓN DE MATERIALES CIV´S 6000372-6000389

		
CARGUE RCD CIV 6000617	CARGUE RCD CIV 6000617	LAVADO DE BAÑO CIV 6001206

	“EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, BOGOTÁ D.C”.						
CONTRATO N° 613 DE 2025	FECHA:	01/07/26 AL 31/07/26	HOJA	5	DE	7	INFORME AMBIENTAL

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO

LOCALIDAD DE TUNJUELITO

		
LAVADO DE BAÑO CIV 6000830	INSTALACION DE BAÑO CIV 6000617	KIT DE DERRAMES CIV 6001206

		
KIT DE DERRAMES CIV 6000617	INSPECCIÓN KIT DE DERRAMES CIV 6001206	INSPECCIÓN KIT DE DERRAMES CIV 6000617

	“EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, BOGOTÁ D.C”.						
CONTRATO N° 613 DE 2025	FECHA:	01/07/26 AL 31/07/26	HOJA	6	DE	7	INFORME AMBIENTAL

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO

LOCALIDAD DE TUNJUELITO

		
CAPACITACION SOBRE MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS	CAPACITACION SOBRE MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS	DESMANTELAMIENTO CIV 6000372
		
DESMANTELAMIENTO CIV 6000389	DESMANTELAMIENTO CIV 6000557	DESMANTELAMIENTO CIV 6000786

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO

LOCALIDAD DE TUNJUELITO

	
DESMANTELAMIENTO CIV 6000857	APERTURA CIV 6000721 (BACHEO)

ANEXO 2

FORMATO		
MANEJOS DE CUERPO DE AGUA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-50	Prácticas Integrales de Gestión	3

CONTRATO No.	FDLT-613-2025					FECHA	jul-26
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C						
FRENTE DE OBRA	6000617						
SUMIDEROS	X	**NÚMERO DE SUMIDEROS**	**1**	**CUERPO DE AGUA**	N.A.	**TIPO DE CUERPO DE AGUA**	N.A.
REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL				**Nª ACTO ADMINISTRATIVO**			

PERIODO	**ESTADO ACTUAL**	**ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS**	**MEDIDAS DE MANEJO**
SUMIDEROS			
01/07/2026 - 31/07/2026	Regular	Aislamiento y protección	Instalación de geotextil
CUERPOS DE AGUA			
N.A.	N.A	N.A	N.A

OBSERVACIONES :

REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA)



ANTES DE LA INTERVENCIÓN



DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN

(Firma) _____
(Nombre) (Nombre) HERNÁN DAVID BERMÚDEZ
Residente Ambiental Contratista

(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente Ambiental de Interventoría

FORMATO		
MANEJOS DE CUERPO DE AGUA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-50	Prácticas Integrales de Gestión	3

CONTRATO No.	FDLT-613-2025					FECHA	jul-26
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C						
FRENTE DE OBRA	6000830						
SUMIDEROS	X	**NÚMERO DE SUMIDEROS**	**1**	**CUERPO DE AGUA**	N.A.	**TIPO DE CUERPO DE AGUA**	N.A.
REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL				**Nª ACTO ADMINISTRATIVO**			
PERIODO	**ESTADO ACTUAL**		**ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS**			**MEDIDAS DE MANEJO**	
SUMIDEROS							
01/07/2026 - 31/07/2026	Regular		Aislamiento y protección			Instalación de geotextil	
CUERPOS DE AGUA							
N.A.	N.A		N.A			N.A	

OBSERVACIONES :

REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA)



ANTES DE LA INTERVENCIÓN



DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN

(Firma)		(Firma)	
(Nombre)	(Nombre) HERNÁN DAVID BERMÚDEZ	(Nombre)	
	Residente Ambiental Contratista		Residente Ambiental de Interventoría

VEOLIA	CERTIFICADO DE TRANSPORTE	FORMATO **VAR-IPA-F-11** Versión: 06

FECHA:	**DIA**	05	**MES**	08	**AÑO**	2026	**CIUDAD:**	BOGOTA	**CERTIFICADO N°:**	BOG-11245
CLIENTE:	CONSORCIO COCO									
DIRECCIÓN CLIENTE:	Calle 50a sur entre transversal 44 y carrera 38.								**NIT CLIENTE:**	902010258
GENERADOR:	CONSORCIO COCO									
DIRECCIÓN/PROYECTO:	FRENTE 2 CAI VENECIA								**NIT GENERADOR:**	902010258

CERTIFICADO DE SERVICIOS

Por medio de la presente me permito certificar que **SEPTICLEAN by Veolia** presta en la actualidad los servicios públicos de aseo en las actividades de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos generados en USP el fin de resolver las necesidades sanitarias y ambientales en las instalaciones del cliente.

No de baños:			1
Modelo de Baño:			Aspen / Flushing
No. de aseos:	Semanal:		
	Mensual:		2
Periodo de servicio:			JULIO 2026
Consumo de agua:			50 litros
Volumen de residuos retirados:			39.63 gl

El residuo fue transportado por Septiclean by Veolia y recepcionado, tratado y dispuesto por Aquaplus NIT 901.005.144-3

El residuo fue transportado por Septiclean by Veolia y recepcionado, tratado y dispuesto por Biolodos NIT 830.123.158-4

El residuo fue transportado, recepcionado, tratado y dispuesto por la Empresa Metropolitana de Aseo sucursal "Septiclean by Veolia" NIT 800.249.174.

Cualquier duda con mucho gusto se la aclararemos

Cordialmente,



Christian Alberto Lopez Moya
Gerente Operaciones Nacionales
Oficinas: Calle 96 # 10 - 72
Línea nacional 317 673 2950 - 315 692 2299
co.cx.veoliasaar@veolia.com

VEOLIA	CERTIFICADO DE TRANSPORTE	FORMATO **VAR-IPA-F-11** Versión: 06

FECHA:	**DIA**	05	**MES**	08	**AÑO**	2026	**CIUDAD:**	BOGOTA	**CERTIFICADO N°:**	BOG-11247
CLIENTE:	CONSORCIO COCO									
DIRECCIÓN CLIENTE:	Calle. 48c Sur #26-18								**NIT CLIENTE:**	902010258
GENERADOR:	CONSORCIO COCO									
DIRECCIÓN/PROYECTO:	FRENTE DE OBRA 4 CIUDAD TUNAL								**NIT GENERADOR:**	902010258

CERTIFICADO DE SERVICIOS

Por medio de la presente me permito certificar que **SEPTICLEAN by Veolia** presta en la actualidad los servicios públicos de aseo en las actividades de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos generados en USP el fin de resolver las necesidades sanitarias y ambientales en las instalaciones del cliente.

No de baños:			1
Modelo de Baño:			Aspen / Flushing
No. de aseos:	Semanal:		
	Mensual:		7
Periodo de servicio:			JULIO 2026
Consumo de agua:			175 litros
Volumen de residuos retirados:			138.71 gl

El residuo fue transportado por Septiclean by Veolia y recepcionado, tratado y dispuesto por Aquaplus NIT 901.005.144-3

El residuo fue transportado por Septiclean by Veolia y recepcionado, tratado y dispuesto por Biolodos NIT 830.123.158-4

El residuo fue transportado, recepcionado, tratado y dispuesto por la Empresa Metropolitana de Aseo sucursal "Septiclean by Veolia" NIT 800.249.174.

Cualquier duda con mucho gusto se la aclararemos

Cordialmente,



Christian Alberto Lopez Moya
Gerente Operaciones Nacionales
Oficinas: Calle 96 # 10 - 72
Línea nacional 317 673 2950 - 315 692 2299
co.cx.veoliasaar@veolia.com

VEOLIA	CERTIFICADO DE TRANSPORTE	FORMATO VAR-IPA-F-11 Versión: 06

FECHA:	**DIA**	05	**MES**	08	**AÑO**	2026	**CIUDAD:**	BOGOTA	**CERTIFICADO N°:** BOG-11244
CLIENTE:	CONSORCIO COCO								
DIRECCIÓN CLIENTE:	Carrera 25 #53b sur - 32								**NIT CLIENTE:** 902010258
GENERADOR:	CONSORCIO COCO								
DIRECCIÓN/PROYECTO:	COLEGIO CIUDAD DE BOGOTA								**NIT GENERADOR:** 902010258

CERTIFICADO DE SERVICIOS

Por medio de la presente me permito certificar que **SEPTICLEAN by Veolia** presta en la actualidad los servicios públicos de aseo en las actividades de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos generados en USP el fin de resolver las necesidades sanitarias y ambientales en las instalaciones del cliente.

No de baños:			1
Modelo de Baño:			Aspen / Flushing
No. de aseos:	Semanal:		
	Mensual:		7
Periodo de servicio:			JULIO 2026
Consumo de agua:			175 litros
Volumen de residuos retirados:			138.71 gl

El residuo fue transportado por Septiclean by Veolia y recepcionado, tratado y dispuesto por Aquaplus NIT 901.005.144-3

El residuo fue transportado por Septiclean by Veolia y recepcionado, tratado y dispuesto por Biolodos NIT 830.123.158-4

El residuo fue transportado, recepcionado, tratado y dispuesto por la Empresa Metropolitana de Aseo sucursal "Septiclean by Veolia" NIT 800.249.174.

Cualquier duda con mucho gusto se la aclararemos

Cordialmente,



Christian Alberto Lopez Moya
Gerente Operaciones Nacionales
Oficinas: Calle 96 # 10 - 72
Línea nacional 317 673 2950 - 315 692 2299
co.cx.veoliasaar@veolia.com

VEOLIA	CERTIFICADO DE TRANSPORTE	FORMATO **VAR-IPA-F-11** Versión: 06

FECHA:	**DIA**	05	**MES**	08	**AÑO**	2026	**CIUDAD:**	BOGOTA	**CERTIFICADO N°:** BOG-11249
CLIENTE:	CONSORCIO COCO								
DIRECCIÓN CLIENTE:	Carrera 34 # 52b - 08 sur								**NIT CLIENTE:** 902010258
GENERADOR:	CONSORCIO COCO								
DIRECCIÓN/PROYECTO:	INSTITUTO TÉCNICO								**NIT GENERADOR:** 902010258

CERTIFICADO DE SERVICIOS

Por medio de la presente me permito certificar que **SEPTICLEAN by Veolia** presta en la actualidad los servicios públicos de aseo en las actividades de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos generados en USP el fin de resolver las necesidades sanitarias y ambientales en las instalaciones del cliente.

No de baños:			1
Modelo de Baño:			Aspen / Flushing
No. de aseos:	Semanal:		
	Mensual:		5
Periodo de servicio:			JULIO 2026
Consumo de agua:			125 litros
Volumen de residuos retirados:			99.08 gl

El residuo fue transportado por Septiclean by Veolia y recepcionado, tratado y dispuesto por Aquaplus NIT 901.005.144-3

El residuo fue transportado por Septiclean by Veolia y recepcionado, tratado y dispuesto por Biolodos NIT 830.123.158-4

El residuo fue transportado, recepcionado, tratado y dispuesto por la Empresa Metropolitana de Aseo sucursal "Septiclean by Veolia" NIT 800.249.174.

Cualquier duda con mucho gusto se la aclararemos

Cordialmente,



Christian Alberto Lopez Moya
Gerente Operaciones Nacionales
Oficinas: Calle 96 # 10 - 72
Línea nacional 317 673 2950 - 315 692 2299
co.cx.veoliasaar@veolia.com

VEOLIA	CERTIFICADO DE TRANSPORTE	FORMATO VAR-IPA-F-11 Versión: 06

FECHA:	**DIA**	05	**MES**	08	**AÑO**	2026	**CIUDAD:**	BOGOTA	**CERTIFICADO N°:** BOG-11246
CLIENTE:	CONSORCIO COCO								
DIRECCIÓN CLIENTE:	Calle 50A Sur # 50-45 Sur								**NIT CLIENTE:** 902010258
GENERADOR:	CONSORCIO COCO								
DIRECCIÓN/PROYECTO:	FRENTE 6 - PANADEREIA SANDY								**NIT GENERADOR:** 902010258

CERTIFICADO DE SERVICIOS

Por medio de la presente me permito certificar que **SEPTICLEAN by Veolia** presta en la actualidad los servicios públicos de aseo en las actividades de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos generados en USP el fin de resolver las necesidades sanitarias y ambientales en las instalaciones del cliente.

No de baños:			1
Modelo de Baño:			Aspen / Flushing
No. de aseos:	Semanal:		
	Mensual:		7
Periodo de servicio:			JULIO 2026
Consumo de agua:			175 litros
Volumen de residuos retirados:			138,71 gl

El residuo fue transportado por Septiclean by Veolia y recepcionado, tratado y dispuesto por Aquaplus NIT 901.005.144-3

El residuo fue transportado por Septiclean by Veolia y recepcionado, tratado y dispuesto por Biolodos NIT 830.123.158-4

El residuo fue transportado, recepcionado, tratado y dispuesto por la Empresa Metropolitana de Aseo sucursal "Septiclean by Veolia" NIT 800.249.174.

Cualquier duda con mucho gusto se la aclararemos

Cordialmente,



Christian Alberto Lopez Moya
Gerente Operaciones Nacionales
Oficinas: Calle 96 # 10 - 72
Línea nacional 317 673 2950 - 315 692 2299
co.cx.veoliasaar@veolia.com

VEOLIA	CERTIFICADO DE TRANSPORTE	FORMATO VAR-IPA-F-11 Versión: 06

FECHA:	**DIA**	05	**MES**	08	**AÑO**	2026	**CIUDAD:**	BOGOTA	**CERTIFICADO N°:** BOG-11248
CLIENTE:	CONSORCIO COCO								
DIRECCIÓN CLIENTE:	Calle 53a Sur entre carreras 33a y 34								**NIT CLIENTE:** 902010258
GENERADOR:	CONSORCIO COCO								
DIRECCIÓN/PROYECTO:	FRENTE OBRA 5 - PARROQUIA								**NIT GENERADOR:** 902010258

CERTIFICADO DE SERVICIOS

Por medio de la presente me permito certificar que **SEPTICLEAN by Veolia** presta en la actualidad los servicios públicos de aseo en las actividades de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos generados en USP el fin de resolver las necesidades sanitarias y ambientales en las instalaciones del cliente.

No de baños:			1
Modelo de Baño:			Aspen / Flushing
No. de aseos:	Semanal:		
	Mensual:		6
Periodo de servicio:			JULIO 2026
Consumo de agua:			150 litros
Volumen de residuos retirados:			118,89 gl

El residuo fue transportado por Septiclean by Veolia y recepcionado, tratado y dispuesto por Aquaplus NIT 901.005.144-3

El residuo fue transportado por Septiclean by Veolia y recepcionado, tratado y dispuesto por Biolodos NIT 830.123.158-4

El residuo fue transportado, recepcionado, tratado y dispuesto por la Empresa Metropolitana de Aseo sucursal "Septiclean by Veolia" NIT 800.249.174.

Cualquier duda con mucho gusto se la aclararemos

Cordialmente,



Christian Alberto Lopez Moya
Gerente Operaciones Nacionales
Oficinas: Calle 96 # 10 - 72
Línea nacional 317 673 2950 - 315 692 2299
co.cx.veoliasaar@veolia.com

ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

Mes del Aprovechamiento: JUNIO	
Nombre del Proyecto:	CONSORCIO COCO
PIN-GEN:	17465

1. Registro fotográfico del "antes" del sitio que va a ser utilizado para la reutilización, con referencia de la zona:

Descripción:

2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCDs (Especifique las dímensiones del área para reutilizar)

Alto: **Ancho:** **Largo:**

3. Tipo de material a emplear en la reutilización:

Descripción detallada:

4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.

ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

5. Registro fotográfico durante la reutilización:

Descripción:

6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:

Información de la Reutilización:

7. Cantidad de material proveniente de Plantas de Tratamiento y/o Aprovechamiento móviles _____ **(Ton)**

7.1. PIN TRAT/APROV (planta de tratamiento y/o aprovechamiento móvil): _____

8. Volumen total reutilizado: _____ **(Ton)**

9. Duración del proceso: _____ **(meses)**

10. Área final recuperada: _____ **(m2)**

11. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: _____ **(%)**

12. Comentarios, Conclusiones y/o Justificacíon de la no reutilización:

Para el periodo comprendido entre el 01 de junio al 30 de junio no se realizó aprovechamiento In situ

_____

Representante Legal

MJN - EM | 0360

La informacion suministrada en el presente certificado, corresponde a la informacion cruzada en nuestra base de datos de acuerdo a los viajes recibidos en nuestra planta y los vales entregados oportunamente al tercero. Por lo cual se prohibe su cambio y/o modificacion.

ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES		FECHA: 10 JULIO 2026
DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	**GESTOR N° 57 / PIN-TRATA 24197**	
Nombre o razón social	MOLINOS JN	
Documento de identificación o NIT	79.208.472 - 5	
Representante Legal	JORGE CANON MORA	
Dirección	KM 1 VDA PANAMA LOTE EL JORDAN INT 2	
Teléfono	3058777561 – 3174223215	
Correo electrónico	molinosjn@gmail.com – jorgec2203@hotmail.com	
Municipio o Distrito	Soacha, Cundinamarca	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	x
	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	CONTRATO N° 613-2025 PIN 17465	
Nombre o razón social	CONSORCIO COCO	
Documento de identificación o NIT	902.010.258 - 8	
Representante Legal	MAESTRE DIAB JOTAM	
Dirección domicilio	CARRERA 9 # 40 - 20	
Teléfono	314 688 7857	
Correo electrónico	consorciococo2025@gmail.com	
Dirección de generación de RCD	TUNJUELITO	
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO		
Tipo de Residuo	**M3**	***(t)***
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	**323**	**444,10**
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	218	310,60
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás	-	-
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	105	133,50
Total RCD recibidos	**323**	**444,10**
Fecha de recepción de los RCD	03 AL 24 JUNIO 2026	

Cordialmente,

MOLINOS JN
PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD

JORGE CANON MORA
REPRESENTANTE LEGAL
MOLINOS JN - GESTOR N° 57 CAR

Anexo N° 3. Relacion recepcion material en planta.

FECHA	N° VALE MOLINOS	TERCERO	PLACA	MATERIAL	METROS CUBICOS	TONELADAS
3/06/2026	1629	SIGLO XXI - COCO	AFE182	EXCAVACION	7,00	9,100
3/06/2026	1631	SIGLO XXI - COCO	SNF516	EXCAVACION	7,00	9,100
4/06/2026	1632	SIGLO XXI - COCO	AFE182	EXCAVACION	7,00	9,100
4/06/2026	1633	SIGLO XXI - COCO	SNF516	EXCAVACION	7,00	11,320
4/06/2026	1634	SIGLO XXI - COCO	SBC537	EXCAVACION	7,00	9,100
4/06/2026	1635	SIGLO XXI - COCO	SNF516	EXCAVACION	7,00	10,550
4/06/2026	1636	SIGLO XXI - COCO	AFE182	EXCAVACION	7,00	10,845
4/06/2026	1637	SIGLO XXI - COCO	SBC537	EXCAVACION	7,00	10,555
5/06/2026	1640	SIGLO XXI - COCO	AFE182	EXCAVACION	7,00	9,100
9/06/2026	1642	SIGLO XXI - COCO	AFE182	EXCAVACION	7,00	11,495
9/06/2026	1643	SIGLO XXI - COCO	SBC537	EXCAVACION	7,00	11,080
9/06/2026	1645	SIGLO XXI - COCO	SNF516	EXCAVACION	7,00	11,940
17/06/2026	1997	SIGLO XXI - COCO	SMA801	ASFALTO	15,00	18,750
17/06/2026	1998	SIGLO XXI - COCO	SMA801	ASFALTO	15,00	18,750
17/06/2026	1818	SIGLO XXI - COCO	SMA801	EXCAVACION	15,00	24,155
18/06/2026	1999	SIGLO XXI - COCO	SMA801	ASFALTO	15,00	18,750
18/06/2026	2000	SIGLO XXI - COCO	SMA801	ASFALTO	15,00	18,750
19/06/2026	2236	SIGLO XXI - COCO	SMA801	EXCAVACION	15,00	18,750
19/06/2026	2237	SIGLO XXI - COCO	SMA801	EXCAVACION	15,00	18,750
20/06/2026	2238	SIGLO XXI - COCO	SMA801	EXCAVACION	15,00	18,750
20/06/2026	2239	SIGLO XXI - COCO	SMA801	EXCAVACION	15,00	18,750
22/06/2026	2240	SIGLO XXI - COCO	SMA801	EXCAVACION	15,00	18,750
22/06/2026	2241	SIGLO XXI - COCO	SMA801	EXCAVACION	15,00	18,750
16/06/2026	1994	SIGLO XXI - COCO	SMA801	ASFALTO	15,00	19,500
16/06/2026	1995	SIGLO XXI - COCO	SMA801	ASFALTO	15,00	19,500
16/06/2026	1996	SIGLO XXI - COCO	SMA801	ASFALTO	15,00	19,500
24/06/2026	1877	SIGLO XXI - COCO	AFE182	EXCAVACION	7,00	12,815
24/06/2026	1881	SIGLO XXI - COCO	SMA801	EXCAVACION	15,00	25,835
24/06/2026	1885	SIGLO XXI - COCO	AFE182	EXCAVACION	7,00	12,010

CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

CA-0693-26

CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO - PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION RCD

"**CODEOBRAS S.A.S"** certifica que ha recibido con fines de aprovechamiento en la generación de nuevos materiales para la construcción, de la empresa:

INFORMACION DEL GENERADOR	
EMPRESA	CONSORCIO COCO
NIT	902010258-8
REPRESENTANTE LEGAL	JOTAM MAESTRE DIAB
TELEFONO	3146887857
CORREO ELECTRONICO	Consorciococo2025@gmail.com
DIRECCION DE DOMICILIO	CR 9 # 40-20 Monteria
OBRA	CONTRATO DE OBRA N°. 613-2025 OBJETO DE CONTRATO: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
UBICACIÓN OBRA	
PIN	17465

Las siguientes cantidades de RCD por tipo:

TIPO DE RESIDUO	**CANTIDAD APROVECHADA**
ESCOMBRO	29,00 M3 (40,6 TN)
ASFALTO	0,00
CONCRETO	0,00

1. Residuos de construcción y demolición – RCD susceptibles de aprovechamiento	**CANTIDAD APROVECHADA**
1.3. Petreos: Hormigon, arenas, gravas, gravillas, cantos, p étreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros	29,00 M3 (40,6 TN)
TOTALES	29,00 M3 (40,6 TN)

En el periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2026.

Codeobras S.A.S., según la Resolucion 1257 del 23 de noviembre de 2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, certifica, además que las cantidades y tipo de materiales relacionados anteriormente son utilizados en el proceso de generación de nuevos materiales para la construcción.

INFORMACION DEL GESTOR		
REGISTRO CAR	No. 068	Gestor modalidad de planta de aprovechamiento
CODEOBRAS SAS	NIT	800.169.155-1
REPRESENTANTE LEGAL		GERMAN RAMIRO CASTAÑEDA RUIZ
DIRECCION	COTA	Autopista Medellin Km 1,5 Via Siberia – Bogota
CORREO ELECTRONICO		contacto@codeobras.com
TELEFONO		3162630001

Codeobras S.A.S., solamente certifica la información verificada contra nuestras Boletas de disposición.

Se expide a solicitud del Interesado el día 29 de julio de 2026.

ING. VILMA CINTURA RUBIO
Gerente Administrativa

Transforma Ambientes

Bogotá D.C., jueves, 30 de julio de 2026 **Certificación No. SEC-01045SO-2026**

SECAM J.R S.A.S.
NIT. 830.507.163-0
GESTOR DE RCDS

CERTIFICA QUE

DATOS BASICOS DEL GESTOR	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	REGISTRO DE INSCRIPCIÓN CAR 030 OCTUBRE 23 DE 2020
Nombre o razón social	SECAM J.R S.A.S
NIT	830.507.163-0
Representante Legal	RUBIELA RADA ORTIZ
Dirección	CRA 71 D 57 - 10 SUR
Número telefónico de contacto	7763445 - 3002414969
Correo electrónico	solicitudes.soacha@secamjr.com
Municipio o Distrito	BOGOTÁ D.C.
Gestor	☐ Punto Limpio ☑ Planta de aprovechamiento ☐ Disposición final
DATOS BASICOS DEL GENERADOR	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	17465
Nombre o razón social	CONSORCIO COCO
Número de identificación o NIT	902010258-8
Representante legal	JOTAM MAESTRE DIAB
Dirección de domicilio	CR 9 40 20 Monteria
Teléfono	3146887857
Correo electrónico	Consorciococo2025@gmail.com
	CONTRATO DE OBRA N°. 613-2025 OBJETO DE CONTRATO: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS

Dirección de generación de RCD	UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOS POR TIPO		
Tipo de Residuo	Cantidad de RCD recibidos del generador	
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras,limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	15.00 M3	23.52 TON
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.		
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas,gravillas,cantos,pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	15.00 M3	23.52 TON
Total RCD recibidos	30.00 M3	47.04 TON
Fecha de recepción de los RCD	Del 10/06/2026 al 12/06/2026	

Atentamente,



ANGIE PANQUEVA RADA

C.C. No. 1.010.234.998

Representante Legal

Verificar autenticidad

Verifique siempre la autenticidad del presente certificado, comuníquese a los teléfonos relacionados en el pie de la página o por medio del correo electrónico solicitudes.soacha@secamjr.com

PAVIOBRAS S.A.S.

PAVIOBRAS SAS
NIT. 830.073.703-3

Bogotá, D.C., 14 JULIO 2026.

CCM-074-26
Hoja 1 de 1

SEÑORES:
CONSORCIO COCO
BOGOTA

REF: CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente, **PAVIOBRAS S.A.S.** (NIT 830.073.703-3) certifica que durante el período comprendido entre el **1 y el 30 de Junio del 2026**, suministró mezcla asfáltica a **CONSORCIO COCO** (NIT 902.010.258-8), para la ejecución del **CONTRATO CTO-613-2025** con **OBJETO**: "*Ejecutar a monto agotable por el sistema de precios unitarios, las actividades para la construcción y/o conservación y/o mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial local e intermedia, espacio público y obras complementarias en la localidad de Tunjuelito.*". **PIN DE OBRA:** 17465

La mezcla asfáltica suministrada **cumple con las especificaciones técnicas** exigidas por el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU), así como con los **estándares de calidad establecidos.**

MATERIAL	CANTIDAD (M3)
MCCH25	119,84
TOTAL	119,84

Atentamente,

PAVIOBRAS SAS
LUIS ALBERTO CAMARGO TOBIAS
GERENTE GENERAL

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2848

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764101546979 que habilita desde FE 2470 hasta FE 10000. Desde el 13-11-2025 hasta el 2026-11-13

PAVIOBRAS SAS

Nit 830073703 3

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Grandes Contribuyentes ICA Resolución No 212000-120 de 31-10-2025

Actividad Económica ICA 4290 7.12 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO COCO
NIT	902010258 8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 9 40 20	Bogota D.C.	3146887857

POR CONCEPTO DE

60496-60497-60499-60500-60551-60552-60553-60554

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
08/07/2026	08/07/2026	ANDRES ALBERTO CAMARGO VOGEL	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	4116	HORMIGÓN ASFÁLTICO TIPO MCCH25-A	120,00	m³	806.737	19%	153.280	96.808.440

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

CIENTO DOCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	0	0,00
Imprevistos	0	0,00
Utilidad	0	0,00

0,00

SUBTOTAL	**96.808.440**
DESCUENTO	**0**
IVA	**18.393.604**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**115.202.044**
RETEFUENTE	**2.420.211**
RETEGARANTIA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**112.781.833**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/07/2026 11:38:54

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

AV 15 119 A 03 OF 305 Teléfono 3108745544 3052936105

Correo Electrónico administrativo@paviobras.com.co

CUFE: 6a4d944e91cd6f1c6ccbda17d6ffc5293bd9e634326d5fe5290778d02d1abbab5c1c5571a85a8b0782c196c6d8ed7d6b --Expedición: 08/07/2026 11:42 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PAVIOBRAS S.A.S.

PAVIOBRAS SAS
830.073.703-3
Dirección: CARRERA 17 # 81A-66 SUR
Teléfono: 3052936105

Comprobante:	30068	Placa:	SOP947	Tipo Vehiculo:	DOBLE
Empresa:	902010258	CONSORCIO COCO			
Conductor:	79925801	JOSE VANEGAS			
Unidad:	KG	Producto:	MCCH 25		
Fecha Entrada:	25/06/2026	Hora Entrada:	6:50:00 a. m.	Peso Entrada:	9,780
Fecha Salida:	25/06/2026	Hora Salida:	9:11:00 a. m.	Peso Salida:	35,420
				Peso Neto:	25,640
Remisión Ent.:	006	Remisión Sal.:	60500	Cubicos:	14,735.63 M3
Origen:	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.-CIUDAD			
Destino:	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.-TUNJUELITO			

Observaciones:

PAVIOBRAS S.A.S.
NIT.830.073.703-3

ANDRES CAMARGO
Firma Operario

Firma Conductor

PAVIOBRAS S.A.S.

PAVIOBRAS SAS
830.073.703-3
Dirección: CARRERA 17 # 81A-66 SUR
Teléfono: 3052936105

Comprobante:	30060	Placa:	SOP192	Tipo Vehiculo:	DOBLE
Empresa:	902010258	CONSORCIO COCO			
Conductor:	79609955	HENRY CASAS			
Unidad:	KG	Producto:	MCCH 25		
Fecha Entrada:	25/06/2026	Hora Entrada:	3:21:00 a. m.	Peso Entrada:	12,520
Fecha Salida:	25/06/2026	Hora Salida:	6:10:00 a. m.	Peso Salida:	40,450
				Peso Neto:	27,930
Remisión Ent.:	002	Remisión Sal.:	60497	Cubicos:	16,051.72 M3
Origen:	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.-CIUDAD			
Destino:	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.-TUNJUELITO			

Observaciones:

K04055 - K04095 - Tarr
K040 - K04050 - Per
09:10 - 10:10

PAVIOBRAS S.A.S.
NIT.830.073.703-3

ANDRES CAMARGO
Firma Operario

Firma Conductor

PAVIOBRAS S.A.S.

PAVIOBRAS SAS
830.073.703-3

Dirección: CARRERA 17 # 81A-66 SUR
Teléfono: 3052936105

Comprobante: 30067
Placa: SLE866
Tipo Vehiculo: DOBLE

Empresa: Consorcio COCO E
Conductor: 1 ANGEL MAYORGA
Unidad: KG
Producto: MCCH 25

Fecha Entrada: 25/06/2026
Fecha Salida: 25/06/2026
Hora Entrada: 6:25:00 a. m.
Hora Salida: 8:20:00 a. m.
Peso Entrada: 12,330
Peso Salida: 38,420
Peso Neto: 26,090
Cubicos: 14,994.25 M3

Remisión Ent.: 004
Origen: BOGOTA D.C.
Destino: BOGOTA D.C.
Remisión Sal.: 60499
BOGOTA D.C.-CIUDAD
BOGOTA D.C.-TUNJUELITO
Observaciones:

PAVIOBRAS S.A.S.
NIT.830.073.703-3
ANDRES CAMARGO
Firma Operario

Firma Conductor

PAVIOBRAS S.A.S.

PAVIOBRAS SAS
830.073.703-3

Dirección: CARRERA 17 # 81A-66 SUR
Teléfono: 3052936105

Comprobante: 30059
Placa: TFP488
Tipo Vehiculo: DOBLE

Empresa: 902010258 CONSORCIO COCO
Conductor: 79925801 JOSE VANEGAS
Unidad: KG
Producto: MCCH 25

Fecha Entrada: 25/06/2026
Fecha Salida: 25/06/2026
Hora Entrada: 3:10:00 a. m.
Hora Salida: 5:13:00 a. m.
Peso Entrada: 12,460
Peso Salida: 37,610
Peso Neto: 25,150
Cubicos: 14,454.02 M3

Remisión Ent.: 001
Origen: BOGOTA D.C.
Destino: BOGOTA D.C.
Remisión Sal.: 60496
BOGOTA D.C.-CIUDAD
BOGOTA D.C.-TUNJUELITO
Observaciones:
04000 - 04052
08:00 - 08:52
carril izquierda

PAVIOBRAS S.A.S.
NIT.830.073.703-3
ANDRES CAMARGO
Firma Operario

Firma Conductor

PAVIOBRAS S.A.S.

PAVIOBRAS SAS
830.073.703-3

Dirección: CARRERA 17 # 81A-66 SUR
Teléfono: 3052936105

Comprobante:	30194	Placa:	TFP488	Tipo Vehiculo:	DOBLE
Empresa:	902010258	CONSORCIO COCO			
Conductor:	79925801	JOSE VANEGAS			
Unidad:	KG	Producto:	MCCH 25		
Fecha Entrada:	27/06/2026	Hora Entrada:	8:28:00 a. m.	Peso Entrada:	12,420
Fecha Salida:	27/06/2026	Hora Salida:	9:41:00 a. m.	Peso Salida:	37,880
				Peso Neto:	25,460
Remisión Ent.:	001	Remisión Sal.:	60551	Cubicos:	14,632.18 M3
Origen:	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.-CIUDAD			
Destino:	BOGOTA D.C.	BOGOTA			

Observaciones:

PAVIOBRAS S.A.S.
NIT.830.073.703-3

ANDRES CAMARGO
Firma Operario

Firma Conductor

PAVIOBRAS S.A.S.

PAVIOBRAS SAS
830.073.703-3

Dirección: CARRERA 17 # 81A-66 SUR
Teléfono: 3052936105

Comprobante:	30195	Placa:	SPV659	Tipo Vehiculo:	DOBLE
Empresa:	902010258	CONSORCIO COCO			
Conductor:	1033718626	DIEGO VARGAS			
Unidad:	KG	Producto:	MCCH 25		
Fecha Entrada:	27/06/2026	Hora Entrada:	8:31:00 a. m.	Peso Entrada:	12,140
Fecha Salida:	27/06/2026	Hora Salida:	10:26:00 a. m.	Peso Salida:	37,520
				Peso Neto:	25,380
Remisión Ent.:	002	Remisión Sal.:	60552	Cubicos:	14,586.21 M3
Origen:	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.-CIUDAD			
Destino:	BOGOTA D.C.	BOGOTA			

Observaciones:

PAVIOBRAS S.A.S.
NIT.830.073.703-3

ANDRES CAMARGO
Firma Operario

Firma Conductor

PAVIOBRAS S.A.S.

PAVIOBRAS SAS
830.073.703-3

Dirección: CARRERA 17 # 81A-66 SUR
Teléfono: 3052936105

Comprobante:	30197	Placa:	SOP192	Tipo Vehiculo:	DOBLE
Empresa:	902010258	CONSORCIO COCO			
Conductor:	79609955	HENRY CASAS			
Unidad:	KG	Producto:	MCCH 25		
Fecha Entrada:	27/06/2026	Hora Entrada:	9:48:00 a. m.	Peso Entrada:	12,640
Fecha Salida:	27/06/2026	Hora Salida:	11:26:00 a. m.	Peso Salida:	40,450
				Peso Neto:	27,810
Remisión Ent.:	003	Remisión Sal.:	60553	Cubicos:	15,982.76 M3
Origen:	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.-CIUDAD			
Destino:	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.-TUNJUELITO			

Observaciones:

PAVIOBRAS S.A.S.
NIT.830.073.703-3

ANDRES CAMARGO
Firma Operario

Firma Conductor

PAVIOBRAS S.A.S.

PAVIOBRAS SAS
830.073.703-3

Dirección: CARRERA 17 # 81A-66 SUR
Teléfono: 3052936105

Comprobante:	30198	Placa:	SOP947	Tipo Vehiculo:	DOBLE
Empresa:	902010258	CONSORCIO COCO			
Conductor:	79925801	JOSE VANEGAS			
Unidad:	KG	Producto:	MCCH 25		
Fecha Entrada:	27/06/2026	Hora Entrada:	10:30:00 a. m.	Peso Entrada:	9,900
Fecha Salida:	27/06/2026	Hora Salida:	12:15:00 p. m.	Peso Salida:	34,970
				Peso Neto:	25,070
Remisión Ent.:	004	Remisión Sal.:	60554	Cubicos:	14,408.05 M3
Origen:	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.-CIUDAD			
Destino:	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.-TUNJUELITO			

Observaciones:

PAVIOBRAS S.A.S.
NIT.830.073.703-3

ANDRES CAMARGO
Firma Operario

Firma Conductor

POLIMIX COLOMBIA

NIT 830.106.474-5

icontec ISO 9001 SC764-1

Bogotá, 27 de julio del 2026

Señores

CONSORCIO COCO
Nit 902.010.258-8
Direccion: CR 9 # 40-20
Telefono: 3205767369
Obras CONSORCIO COCO
PIN AMBIENTAL: 17465

Por medio de la presento **POLIMIX CONCRETO COLOMBIA SAS** notifica volúmenes despachados mes de Junio 2026 para **CTO-613-2025 CONSORCIO COCO**

OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO

1 al 30 de junio 2026

Producto	Cantidad m3
CONSORCIO COCO	**36,00**
30BN286C Bombeable Normal de 3000 psi 28 dias GC de 6 plg	**36,00**

Cordialmente,

PAULO LANZETTA SAIZ
Gerente Comercial
POLIMIX CONCRETO COLOMBIA SAS
Correo: paulo@tremix.com.co
Cel. 3168779472

Bogotá, Julio 07 de 2026

Señores
Consorcio Coco
Nit 902.010.258-8
Ciudad

REF: Certificación de entrega de materiales, Pin Ambiental: 17465

OBJETO: "Ejecutar a monto agotable por el sistema de precios unitarios, las actividades para la construcción y/o conservación y/o mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial local e intermedia, espacio público y obras complementarias en la localidad de Tunjuelito"

Por medio del presente comunicado, yo Jaime Delgado Jerez con nombre comercial CYT ARCILLAS Y PREFABRICADOS EN CONCRETO NIT 900.434.625-0, certifica que ha suministrado material en Arcilla y prefabricados en concreto, para el proyecto que se cita en la referencia, el cual es llevado a cabo por la empresa Consorcio Coco.

PERIODO: Del 01 al 30 de Junio de 2026

FECHA	REM	MATERIAL	CANT	KG UND	KG TOTAL
01/06/2026	3470	Bordillo A-80 prefabricado; 20*35*80	110	90	9.900
03/06/2026	3533	Bordillo A-80 prefabricado; 20*35*80	85	90	7.650
03/06/2026	3533	Bajo rampa A-85 prefabricado; 20*35*80	25	100	2.500
09/06/2026	3551	Sardinel A-10 prefabricado; 20*50*80	80	134	10.720
05/06/2026	3450	Bajo rampa A-85 prefabricado; 20*35*80	60	100	6.000
05/06/2026	3450	Bordillo A-80 prefabricado; 20*35*80	50	90	4.500
16/06/2026	3476	Bordillo A-80 prefabricado; 20*35*80	50	90	4.500
10/06/2026	3474	Bajo rampa A-85 prefabricado; 20*35*80	81	100	8.100
19/06/2026	3480	Bordillo A-80 prefabricado; 20*35*80	50	90	4.500

Cordialmente,

JAIME DELGADO JEREZ
ING. CIVIL

C&T Arcillas y Prefabricados en Concreto S.A.S.

(57)(1) 7037007 - 7036993
Carrera 13ª No. 89-38 of. 414
Edificio Nippon Center
Bogotá D.C. – Colombia
(313) 534 5162
gerencia1@sofaningenieria.com
www.sofaningenieria.com

SOFÁN Ingeniería S.A.S

Mosquera, 06 de julio del 2026

CERTIFICACIÓN

Señores
CONSORCIO COCO
NIT: 902.010.258-8
CON: CTO-613-2025
OBJETO: "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO"
PIN AMBIENTAL: 17465
PERIODO: DEL MES DE JUNIO DEL 2026.

Por medio de la presente certificamos que la empresa **SOFAN INGENIERIA S.A.S** identificada con NIT. **800012888-7**, suministro a la empresa **CONSORCIO COCO** Identificada con el NIT. **902010258-8** los siguientes tipos de mezcla y cantidades relacionados en el siguiente cuadro:

FECHA	TIPO DE MEZCLA
	MD-19 (m3)
26/06/2026	42,29
30/06/2026	38,81
TOTAL	**81,10**

Cordialmente,

Ing. David Andrés Castellanos Villalobos
Gerente de Planta Asfalto

AFILIADO CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

SOFAN INGENIERIA S.A.S

Nit: 800012888
Dir: CRA 6 No. 95-170 BARRIO MOCARI SECTOR EL BOSQUE
e-mail: contabilidad@sofaningenieria.com
Página:

Teléfono:
Ciudad: MONTERÍA
Régimen: C
Actividad: 90

FACTURA ELECTRONICA

Nro.	SOF	755

FECHA			VENCE		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
7	7	2026	06	08	2026

Cliente: **CONSORCIO COCO** **Nit:** 902010258
Dirección: CARRERA 9 No.40-20 **Ciudad:** MONTERÍA **Tel:**
e-mail: consorciococo2025@gmail.com **Local:** **Vend:** MARIA DEL PILAR SERPA URANGO

Cant.	Descripcion	Vr. Unitario	Vr Total
81.10	VENTA DE MATERIALES SUMINISTRO DE 81,1 M3 DE MEZCLA ASFALTICA MD 19, PARA OBRAS EN BOGOTA D.C. ACTA DE OBRA No.1 SEGUN OFERTA MERCANTIL No.CS-SOF-216-2026.	525,864.00	42,647,570.40

Resolución DIAN No. 18764080049017 23/09/2024, Numeración Autorizada del No. 564 al 1000.

Valor en Letras:	CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS	**Vr Bruto**	**42,647,570**
		Descuentos	0
		I.V.A.	8,103,038
		Total	**50,750,609**

Despues de 10 Dias calendario a apartir de la fecha de recibido no se aceptan devoluciones ni reclamos. Quien recibe esta autorizado por el comprador. A la presente factura se le aplicara las normas relativas a la letra de cambio (Art. 772 s.s. y 779 del co. de Co.) Art. 617 del estauto tributario. Modifi. Ley 1231/2008.

Aceptada:

CUFE: dde24f76110fe52e5db8d8c1c37d866e87665ef79dcad21a6fd17925a597914f4d4d5f4c3ae4eacf436eb5bf78b7c038

SOFAN INGENIERIA S.A.S.
Planta de Asfalto
Nit : 800 012.888-7

Tiquete de Bascula Salida No : **20014950**

Placa :	SOP197	Peso Entrada :	12,640	kg
Fecha Entrada :	26/06/2026 03:17:35 AM	Peso Salida :	35,820	kg
Fecha Salida :	26/06/2026 04:42:48 AM	Peso Neto :	23,180	kg
Ciudad :	MOSQUERA	Volumen :	13.96	m3
Cliente :	CONSORCIO COCO			
Producto :	MEZCLA MD 19			
Conductor :	HENRRY CASAS			
Destino :	CL48CSUR/KR26/27			
Observaciones :	TUNJUELITO			
	TEMP 150°C			

SOFAN Ingeniería S.A.S. NIT: 800012888-7 ENTREGADO POR BASCULA

DESPACHADO	RECIBIDO	CONDUCTOR

CARRERA 13 A No. 89-38 OFC. 414 - TEL: +57(1) 703 7007 - BOGOTA - COLOMBIA

Elaborado Por: Martin Ortiz — Bascula Camionera Electronica de 80 Tons. — Impreso el: 26-JUN-2026

SOFAN INGENIERIA S.A.S.
Planta de Asfalto
Nit : 800 012.888-7

Tiquete de Bascula Salida No : **20014951**

Placa :	SOP947	Peso Entrada :	9,760	kg
Fecha Entrada :	26/06/2026 03:18:44 AM	Peso Salida :	32,280	kg
Fecha Salida :	26/06/2026 05:03:19 AM	Peso Neto :	22,520	kg
Ciudad :	MOSQUERA	Volumen :	13.57	m3
Cliente :	CONSORCIO COCO			
Producto :	MEZCLA MD 19			
Conductor :	EDGAR BELTRAN			
Destino :	CL48CSUR/KR26/27			
Observaciones :	TUNJUELITO			
	TEMP 150°C			

SOFAN Ingeniería S.A.S. NIT: 800012888-7 ENTREGADO POR BASCULA

DESPACHADO	RECIBIDO	CONDUCTOR

CARRERA 13 A No. 89-38 OFC. 414 - TEL: +57(1) 703 7007 - BOGOTA - COLOMBIA

Elaborado Por: Martin Ortiz — Bascula Camionera Electronica de 80 Tons. — Impreso el: 26-JUN-2026

SOFAN INGENIERIA S.A.S.
Planta de Asfalto
Nit : 800.012.888-7

Tiquete de Bascula Salida No : **20014949**

Placa :	TFP488		Peso Entrada :	12,360 kg
Fecha Entrada :	26/06/2026 03:16:36 AM		Peso Salida :	36,860 kg
Fecha Salida :	26/06/2026 04:27:51 AM		Peso Neto :	24,500 kg
Ciudad :	MOSQUERA		Volumen :	14.76 m3
Cliente :	CONSORCIO COCO			
Producto :	MEZCLA MD 19			
Conductor :	JORGE BARBOSA			
Destino :	CL48C SUR/KR 26/27			
Observaciones :	TUNJUELITO			
	TEMPP 160°C			

SOFÁN Ingeniería S.A.S. NIT: 800012888-7 ENTREGADO POR BASCULA

DESPACHADO	RECIBIDO	CONDUCTOR
	Joaquin Boquerón	

CARRERA 13 A No. 89-38 OFC. 414 - TEL: +57(1) 703 7007 - BOGOTA - COLOMBIA

Elaborado Por: Martin Ortiz — Bascula Camionera Electronica de 80 Tons. — Impreso el: 26-JUN-2026

SOFAN INGENIERIA S.A.S.
Planta de Asfalto
Nit : 800.012.888-7

Tiquete de Bascula Salida No : **20014965**

Placa :	SOP192		Peso Entrada :	12,560 kg
Fecha Entrada :	30/06/2026 04:13:09 AM		Peso Salida :	38,600 kg
Fecha Salida :	30/06/2026 05:41:14 AM		Peso Neto :	26,040 kg
Ciudad :	MOSQUERA		Volumen :	15.69 m3
Cliente :	CONSORCIO COCO			
Producto :	MEZCLA MD 19			
Conductor :	HENRY CASAS			
Destino :	CL48SUR/KR26/27			
Observaciones :	TUNJUELITO			
	TEMP 160°C			

SOFÁN Ingeniería S.A.S. NIT: 800012888-7 ENTREGADO POR BASCULA

DESPACHADO	RECIBIDO	CONDUCTOR

CARRERA 13 A No. 89-38 OFC. 414 - TEL: +57(1) 703 7007 - BOGOTA - COLOMBIA

Elaborado Por: Martin Ortiz — Bascula Camionera Electronica de 80 Tons. — Impreso el: 30-JUN-2026

SOFAN INGENIERIA S.A.S.
Planta de Asfalto
Nit : 800.012.888-7

Tiquete de Bascula Salida No : **20014964**

Placa :	TFP488
Fecha Entrada :	30/06/2026 04:12:07 AM
Fecha Salida :	30/06/2026 05:14:49 AM
Ciudad :	MOSQUERA
Cliente :	CONSORCIO COCO
Producto :	MEZCLA MD 19
Conductor :	JORGE BARBOSA
Destino :	CL48SUR/KR26/27/TUNJUELITO
Observaciones :	TEMP 160°C

Peso Entrada :	12,300	kg
Peso Salida :	38,460	kg
Peso Neto :	26,160	kg
Volumen :	15.76	m3

SOFÁN Ingeniería S.A.S NIT: 800012888-7 ENTREGADO POR BASCULA

DESPACHADO	RECIBIDO	CONDUCTOR

CARRERA 13 A No. 89-38 OFC. 414 - TEL: +57(1) 703 7007 - BOGOTA - COLOMBIA

Elaborado Por: Martin Ortiz — Bascula Camionera Electronica de 80 Tons. — Impreso el 30-JUN-2026

SOFAN INGENIERIA S.A.S.
Planta de Asfalto
Nit : 800.012.888-7

Tiquete de Bascula Salida No : **20014963**

Placa :	XAC218
Fecha Entrada :	30/06/2026 04:10:29 AM
Fecha Salida :	30/06/2026 04:56:31 AM
Ciudad :	MOSQUERA
Cliente :	CONSORCIO COCO
Producto :	MEZCLA MD 19
Conductor :	RONALD MUÑOZ
Destino :	CL 48/SUR KR 26/27 TUNJUELITO
Observaciones :	TEMP 160°C

Peso Entrada :	6,700	kg
Peso Salida :	18,920	kg
Peso Neto :	12,220	kg
Volumen :	7.36	m3

SOFÁN Ingeniería S.A.S NIT: 800012888-7 ENTREGADO POR BASCULA

DESPACHADO	RECIBIDO	CONDUCTOR
		Ronald Muñoz

CARRERA 13 A No. 89-38 OFC. 414 - TEL: +57(1) 703 7007 - BOGOTA - COLOMBIA

Elaborado Por: Martin Ortiz — Bascula Camionera Electronica de 80 Tons. — Impreso el 30-JUN-2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente	**ANEXO VI. CONSTANCIA DE MATERIALES PÉTREOS Y NO PÉTREOS VALORIZADOS DE RCD**

1. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO	
Nombre o razón social	CONSROCIO COCO
Documento de identificación o NIT	902.010.258-8
Representante Legal	JOTAM MAESTRE DIAB
Dirección	CR 9 No. 40-20
Teléfono	3146887857
Correo electrónico	consorciococo2025@gmail.com
Municipio o distrito	BOGOTA D.C.
Nombre de la Obra	FDLT-LP-255-2025 denominado "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"
PIN-GEN	17645

2. DATOS BÁSICOS DEL PROVEEDOR	
PIN-PROV	24197
Nombre o razón social	MOLINOS JN
Documento de identificación o NIT	79.208.472-5
Representante Legal	JORGE CANON MORA
Dirección domicilio	KM 1 VDA PANAMA LOTE EL JORDAN INT 2
Teléfono	3058777561
Correo electrónico	molinosjn@gmail.com

3. CANTIDADES DE MATERIALES VALORIZADOS DE RCD SUMINISTRADOS AL GENERADOR

Nota 1. *La información reportada en este anexo, se entenderá que esta presentada baja la gravedad de juramento.*
Nota 2. *Se debe anexar certificados, soportes de estudios técnicos de laboratorios, y/o ficha técnica de la composición del material valorizado*

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD (Ton)	CARACTERISTICAS/COMPOSICIÓN
SUB BASE TIPO PEA	139,05	Es un material pétreo de cantera (generalmente caliza) con forma irregular y tamaños grandes. Se caracteriza por su alta resistencia, capacidad de carga, durabilidad y alta permeabilidad, ideal para mejorar subrasantes blandas, cimentaciones, pedraplenes y estabilización de suelos con presencia de agua.
B-200	86,4	Es un recebo de tipo granular y baja especificación utilizado en la construcción para terraplenes, subbases y rellenos de mejoramiento. Su función principal es soportar la estructura de pavimentos y cimentaciones, mejorando la capacidad de soporte del terreno original.
Total RCD suministrados (Ton)	225,45	
Fecha de suministro de material	Del 01/06/2026 al 30/06/2026	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.C o NIT: 1.065.825.668
NOMBRE: JOTAM MAESTRE DIAB

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD MOLINOS JN

Resolución No. 0472 de 2017 y Resolución 1257 de 2021 MADS
Gestor Registro No. 57

MOLINOS JN
PARA LA CONSTRUCCIÓN

MJN - SM | 0390

La informacion suministrada en el presente certificado, corresponde a la informacion cruzada en nuestra base de datos de acuerdo a los viajes despachados por nuestra planta y los respectivos vales entregados oportunamente al tercero. Por lo cual se prohibe su cambio y/o modificacion. El material entregado por nuestra planta de aprovechamiento proviene de un proceso de clasificacion y tratamiento especial que se da a distintos materiales de redisuos de construccion y/o demolicion recibidos en nuestras instalaciones.

ANEXO IV. FORMATO CONSTANCIA GESTORES		FECHA: 08 JULIO 2026
DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	**GESTOR N° 57 / PIN-TRATA 24197**	
Nombre o razón social	MOLINOS JN	
Documento de identificación o NIT	79.208.472 - 5	
Representante Legal	JORGE CANON MORA	
Dirección	KM 1 VDA PANAMA LOTE EL JORDAN INT 2	
Teléfono	3058777561 – 3174223215	
Correo electrónico	molinosjn@gmail.com – jorgec2203@hotmail.com	
Municipio o Distrito	Soacha, Cundinamarca	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	x
	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR Y/O COMPRADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	CONTRATO N° 613-2025 PIN 17465	
Nombre o razón social	CONSORCIO COCO	
Documento de identificación o NIT	902.010.258 - 8	
Representante Legal	MAESTRE DIAB JOTAM	
Dirección domicilio	CARRERA 9 # 40 - 20	
Teléfono	314 688 7857	
Correo electrónico	consorciococo2025@gmail.com	
Dirección de uso material de RCD	TUNJUELITO	

MATERIALES TRANSFORMADOS DE RCD SUMINISTRADOS AL GENERADOR		
Tipo de Material	**M3**	***(t)***
BASE RECICLADA	-	
SUB BASE TIPO PEA	103	139,05
BG_ 38	-	-
AR _ SBG 50	-	
B200	64	86,40
ARENA DE PEÑA MOLIDA	-	
TRITURADO 3/4 "	-	-
Total Materiales Entregados	**167**	**225,45**
Fecha de Entrega Material	01 AL 30 JUNIO 2026	

Cordialmente,

MOLINOS JN
PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION - RCD

JORGE CANON MORA
REPRESENTANTE LEGAL
MOLINOS JN - GESTOR N° 57 CAR

ETAPA CONSTRUCTIVA	TIPO DE RCD	CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA (Toneladas)	ORIGEN *	CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas)	TIPO DE GESTIÓN				
					Disposición Final	Reutilización	Reciclaje	Otros	Lugar de Disposición Final
Demolición, Excavación y cimentación Construcción	**01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento**								
	01 01 Excavación								
	01 01 01 Coberturas vegetales								
	01 01 02 Tierras limpias de excavación								
	01 01 03 Limos								
	01 01 04 Materiales pétreos productos de la excavación		EXCAVACIÓN	334,12	0	334,12			CODEOBRAS - MOLINOS JN - SECAM JR
	01 01 05 Otros residuos de excavación								
	01 02 Productos de Cimentación y Pilotaje								
	01 02 01 Arcillas								
	01 02 02 Bentonitas								
	01 02 03 Otros residuos de cimentación y pilotaje								
	01 03 Pétreos								
	01 03 01 Concretos								
	01 03 02 Gravas								
	01 03 03 Cantos								
	01 03 04 Ladrillos								
	01 03 05 Arenas								
	01 03 06 Morteros								
	01 03 07 Materiales Cerámicos								
	01 03 08 Residuos de material asfáltico		DEMOLICION	197,62	0	197,62			CODEOBRAS - MOLINOS JN - SECAM JR
	01 03 09 Bases y sub bases granulares	225,45	MOLINOS JN						
	01 03 10 Otros residuos pétreos								
	01 04 No pétreos								
	01 04 01 Madera								
	01 04 02 Plásticos								
	01 04 03 Vidrio								
	01 04 04 Papel y Cartón								
	01 04 05 Gomas y cauchos								
	01 04 06 Cartón yeso (drywall)								
	01 04 07 Acrílico								
	01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán								
	01 04 09 Materiales a base fibrocemento								
	01 04 10 Otros residuos no pétreos								
	01 05 Metales								
	01 05 01 Acero y hierro								
	01 05 02 Zinc								
	01 05 03 Cobre								
	01 05 04 Aluminio								
	01 05 05 Otros metales								
	02 RCD No susceptibles de aprovechamiento								
	02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados								
	02 02 Los que tengan características de peligrosidad								
	02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan								
	02 02 02 Otros residuos con características de peligrosidad								

*El origen debe indicar si es un material o elemento de construcción virgen o reciclado.
**Nota Aclaratoria. La información reportada en este anexo se entenderá que esta presentada baja la gravedad de juramento.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T-AAAA-XXXX

Transportador: Razón Social | | No. de Identificación

Vehículos asociados Tipo | DOBLE TROQUE | Placa | NOW390 | No. PIN TRANS : 25155

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN-GEN	17456
Nombre de la obra	CTO-613-2025
NTR	**T-AAAA-XXXX**
Fecha de entrega RCD	2/06/2026

Datos del Generador

Representante Legal: JOTAM MAESTRE DIAB
Dirección: CALLE 49 A SUR 28-36
Municipio: CUNDINAMARCA
Teléfono de contacto: 3146887857
Fecha entrega RCD conductor:2/06/2026

01 RCD susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavación	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales pétreos de excavación	
01 01 05	Otros residuos de excavación	

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	

01 04 No pétreos		**Ton**
01 04 01	Madera	
01 04 02	Plásticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall) con o sin pintura	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Pétreos		**Ton**
01 03 01	Concretos	19,6
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales cerámicos	
01 03 08	Residuos de material asfáltico	
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos pétreos	

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No susceptibles de aprovechamiento		**Ton**
201	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
202	Los que tengan características de peligrosidad	
36.924	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
37.289	Otros residuos con características de peligrosidad.	

Nombre del encargado obra (Director de obra, representante legal, residente técnico ambiental, o quien haga sus veces)	JOTAM MAESTRE DIAB		
CC: 1.065.825.668		**Firma**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T-AAAA-XXXX

Transportador: Razón Social | | No. de Identificación

Vehículos asociados Tipo | DOBLE TROQUE | Placa | NOW390 | No. PIN TRANS : 25155

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN-GEN	17456
Nombre de la obra	CTO-613-2025
NTR	**T-AAAA-XXXX**
Fecha de entrega RCD	20/05/2026

Datos del Generador

Representante Legal: JOTAM MAESTRE DIAB
Dirección: CALLE 49 A SUR 28-36
Municipio: CUNDINAMARCA
Teléfono de contacto: 3146887857
Fecha entrega RCD conductor: 20/05/2026

01 RCD susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavación	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales pétreos de excavación	
01 01 05	Otros residuos de excavación	

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	

01 04 No pétreos		**Ton**
01 04 01	Madera	
01 04 02	Plásticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall) con o sin pintura	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Pétreos		**Ton**
01 03 01	Concretos	21
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales cerámicos	
01 03 08	Residuos de material asfáltico	
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos pétreos	

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No susceptibles de aprovechamiento		**Ton**
201	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
202	Los que tengan características de peligrosidad	
36.924	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
37.289	Otros residuos con características de peligrosidad.	

Nombre del encargado obra (Director de obra, representante legal, residente técnico ambiental, o quien haga sus veces)	JOTAM MAESTRE DIAB		
CC: 1.065.825.668		**Firma**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T-AAAA-XXXX

Transportador: Razón Social | | No. de Identificación

Vehículos asociados Tipo | DOBLE TROQUE | Placa | UVM655 | No. PIN TRANS: 19448

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN-GEN	17456
Nombre de la obra	CTO-613-2025
NTR	**T-AAAA-XXXX**
Fecha de entrega RCD	12/06/2026

Datos del Generador

Representante Legal: JOTAM MAESTRE DIAB
Dirección: CALLE 49 A SUR 28-36
Municipio: CUNDINAMARCA
Teléfono de contacto: 3146887857
Fecha entrega RCD conductor: 12/06/2026

01 RCD susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavación	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales pétreos de excavación	23,52
01 01 05	Otros residuos de excavación	

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	

01 04 No pétreos		**Ton**
01 04 01	Madera	
01 04 02	Plásticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall) con o sin pintura	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Pétreos		**Ton**
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales cerámicos	
01 03 08	Residuos de material asfáltico	
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos pétreos	

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No susceptibles de aprovechamiento		**Ton**
201	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
202	Los que tengan características de peligrosidad	
36.924	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
37.289	Otros residuos con características de peligrosidad.	

Nombre del encargado obra (Director de obra, representante legal, residente técnico ambiental, o quien haga sus veces)	JOTAM MAESTRE DIAB		
CC: 1.065.825.668		**Firma**	

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T-AAAA-XXXX

Transportador: Razón Social | | No. de Identificación

Vehículos asociados Tipo | DOBLE TROQUE | Placa | UVM655 | No. PIN TRANS: 19448

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN-GEN	17456
Nombre de la obra	CTO-613-2025
NTR	**T-AAAA-XXXX**
Fecha de entrega RCD	10/06/2026

Datos del Generador

Representante Legal: JOTAM MAESTRE DIAB
Dirección: CALLE 49 A SUR 28-36
Municipio: CUNDINAMARCA
Teléfono de contacto: 3146887857
Fecha entrega RCD conductor: 10/06/2026

01 RCD susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavación	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales pétreos de excavación	
01 01 05	Otros residuos de excavación	

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	

01 04 No pétreos		**Ton**
01 04 01	Madera	
01 04 02	Plásticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall) con o sin pintura	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Pétreos		**Ton**
01 03 01	Concretos	23,52
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales cerámicos	
01 03 08	Residuos de material asfáltico	
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos pétreos	

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No susceptibles de aprovechamiento		**Ton**
201	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
202	Los que tengan características de peligrosidad	
36.924	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
37.289	Otros residuos con características de peligrosidad.	

Nombre del encargado obra (Director de obra, representante legal, residente técnico ambiental, o quien haga sus veces)	JOTAM MAESTRE DIAB		
CC: 1.065.825.668		**Firma**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T-AAAA-XXXX

Transportador: Razón Social | | No. de Identificación

Vehículos asociados Tipo | SENCILLA | Placa | AFE182 | No. PIN TRANS: 16756

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN-GEN	17456
Nombre de la obra	CTO-613-2025
NTR	**T-AAAA-XXXX**
Fecha de entrega RCD	3/06/2026

Datos del Generador

Representante Legal: JOTAM MAESTRE DIAB
Dirección: CALLE 49 A SUR 28-36
Municipio: CUNDINAMARCA
Teléfono de contacto: 3146887857
Fecha entrega RCD conductor: 3/06/2026

01 RCD susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavación	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales pétreos de excavación	8,26
01 01 05	Otros residuos de excavación	

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	

01 04 No pétreos		**Ton**
01 04 01	Madera	
01 04 02	Plásticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall) con o sin pintura	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Pétreos		**Ton**
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales cerámicos	
01 03 08	Residuos de material asfáltico	
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos pétreos	

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No susceptibles de aprovechamiento		**Ton**
201	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
202	Los que tengan características de peligrosidad	
36.924	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
37.289	Otros residuos con características de peligrosidad.	

Nombre del encargado obra (Director de obra, representante legal, residente técnico ambiental, o quien haga sus veces)	JOTAM MAESTRE DIAB		
CC: 1.065.825.668		**Firma**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T-AAAA-XXXX

Transportador: Razón Social | | No. de Identificación

Vehículos asociados Tipo | SENCILLA | Placa | SNF516 | No. PIN TRANS: 247

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN-GEN	17456
Nombre de la obra	CTO-613-2025
NTR	**T-AAAA-XXXX**
Fecha de entrega RCD	3/06/2026

Datos del Generador

Representante Legal: JOTAM MAESTRE DIAB
Dirección: CALLE 49 A SUR 28-36
Municipio: CUNDINAMARCA
Teléfono de contacto: 3146887857
Fecha entrega RCD conductor: 3/06/2026

01 RCD susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavación	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales pétreos de excavación	9,10
01 01 05	Otros residuos de excavación	

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	

01 04 No pétreos		**Ton**
01 04 01	Madera	
01 04 02	Plásticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall) con o sin pintura	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Pétreos		**Ton**
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales cerámicos	
01 03 08	Residuos de material asfáltico	
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos pétreos	

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No susceptibles de aprovechamiento		**Ton**
201	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
202	Los que tengan características de peligrosidad	
36.924	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
37.289	Otros residuos con características de peligrosidad.	

Nombre del encargado obra (Director de obra, representante legal, residente técnico ambiental, o quien haga sus veces)	JOTAM MAESTRE DIAB		
CC: 1.065.825.668		**Firma**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T-AAAA-XXXX

Transportador: Razón Social | | No. de Identificación

Vehículos asociados Tipo | SENCILLA | Placa | AFE182 | No. PIN TRANS: 16756

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN-GEN	17456
Nombre de la obra	CTO-613-2025
NTR	**T-AAAA-XXXX**
Fecha de entrega RCD	4/06/2026

Datos del Generador

Representante Legal: JOTAM MAESTRE DIAB
Dirección: CALLE 49 A SUR 28-36
Municipio: CUNDINAMARCA
Teléfono de contacto: 3146887857
Fecha entrega RCD conductor: 4/06/2026

01 RCD susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavación	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales pétreos de excavación	9,10
01 01 05	Otros residuos de excavación	

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	

01 04 No pétreos		**Ton**
01 04 01	Madera	
01 04 02	Plásticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall) con o sin pintura	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Pétreos		**Ton**
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales cerámicos	
01 03 08	Residuos de material asfáltico	
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos pétreos	

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No susceptibles de aprovechamiento		**Ton**
201	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
202	Los que tengan características de peligrosidad	
36.924	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
37.289	Otros residuos con características de peligrosidad.	

Nombre del encargado obra (Director de obra, representante legal, residente técnico ambiental, o quien haga sus veces)	JOTAM MAESTRE DIAB		
CC: 1.065.825.668		**Firma**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T-AAAA-XXXX

Transportador: Razón Social | | No. de Identificación

Vehículos asociados Tipo | SENCILLA | Placa | SNF516 | No. PIN TRANS: 247

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN-GEN	17456
Nombre de la obra	CTO-613-2025
NTR	**T-AAAA-XXXX**
Fecha de entrega RCD	4/06/2026

Datos del Generador

Representante Legal: JOTAM MAESTRE DIAB
Dirección: CALLE 49 A SUR 28-36
Municipio: CUNDINAMARCA
Teléfono de contacto: 3146887857
Fecha entrega RCD conductor: 4/06/2026

01 RCD susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavación	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales pétreos de excavación	11,32
01 01 05	Otros residuos de excavación	

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	

01 04 No pétreos		**Ton**
01 04 01	Madera	
01 04 02	Plásticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall) con o sin pintura	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Pétreos		**Ton**
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales cerámicos	
01 03 08	Residuos de material asfáltico	
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos pétreos	

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No susceptibles de aprovechamiento		**Ton**
201	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
202	Los que tengan características de peligrosidad	
36.924	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
37.289	Otros residuos con características de peligrosidad.	

Nombre del encargado obra (Director de obra, representante legal, residente técnico ambiental, o quien haga sus veces)	JOTAM MAESTRE DIAB		
CC: 1.065.825.668		**Firma**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T-AAAA-XXXX

Transportador: Razón Social | | No. de Identificación

Vehículos asociados Tipo | SENCILLA | Placa | SBC537 | No. PIN TRANS: 11528

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN-GEN	17456
Nombre de la obra	CTO-613-2025
NTR	**T-AAAA-XXXX**
Fecha de entrega RCD	4/06/2026

Datos del Generador

Representante Legal: JOTAM MAESTRE DIAB
Dirección: CALLE 49 A SUR 28-36
Municipio: CUNDINAMARCA
Teléfono de contacto: 3146887857
Fecha entrega RCD conductor: 4/06/2026

01 RCD susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavación	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales pétreos de excavación	9,10
01 01 05	Otros residuos de excavación	

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	

01 04 No pétreos		**Ton**
01 04 01	Madera	
01 04 02	Plásticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall) con o sin pintura	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Pétreos		**Ton**
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales cerámicos	
01 03 08	Residuos de material asfáltico	
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos pétreos	

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No susceptibles de aprovechamiento		**Ton**
201	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
202	Los que tengan características de peligrosidad	
36.924	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
37.289	Otros residuos con características de peligrosidad.	

Nombre del encargado obra (Director de obra, representante legal, residente técnico ambiental, o quien haga sus veces)	JOTAM MAESTRE DIAB		
CC: 1.065.825.668		**Firma**	

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T-AAAA-XXXX

Transportador: Razón Social | | No. de Identificación

Vehículos asociados Tipo | SENCILLA | Placa | SNF516 | No. PIN TRANS: 247

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN-GEN	17456
Nombre de la obra	CTO-613-2025
NTR	**T-AAAA-XXXX**
Fecha de entrega RCD	4/06/2026

Datos del Generador

Representante Legal: JOTAM MAESTRE DIAB
Dirección: CALLE 49 A SUR 28-36
Municipio: CUNDINAMARCA
Teléfono de contacto: 3146887857
Fecha entrega RCD conductor: 4/06/2026

01 RCD susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavación	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales pétreos de excavación	10,55
01 01 05	Otros residuos de excavación	

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	

01 04 No pétreos		**Ton**
01 04 01	Madera	
01 04 02	Plásticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall) con o sin pintura	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Pétreos		**Ton**
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales cerámicos	
01 03 08	Residuos de material asfáltico	
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos pétreos	

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No susceptibles de aprovechamiento		**Ton**
201	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
202	Los que tengan características de peligrosidad	
36.924	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
37.289	Otros residuos con características de peligrosidad.	

Nombre del encargado obra (Director de obra, representante legal, residente técnico ambiental, o quien haga sus veces)	JOTAM MAESTRE DIAB		
CC: 1.065.825.668		**Firma**	

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T-AAAA-XXXX

Transportador: Razón Social | | No. de Identificación

Vehículos asociados Tipo | SENCILLA | Placa | AFE182 | No. PIN TRANS: 16756

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN-GEN	17456
Nombre de la obra	CTO-613-2025
NTR	**T-AAAA-XXXX**
Fecha de entrega RCD	4/06/2026

Datos del Generador

Representante Legal: JOTAM MAESTRE DIAB
Dirección: CALLE 49 A SUR 28-36
Municipio: CUNDINAMARCA
Teléfono de contacto: 3146887857
Fecha entrega RCD conductor: 4/06/2026

01 RCD susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavación	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales pétreos de excavación	10,48
01 01 05	Otros residuos de excavación	

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	

01 04 No pétreos		**Ton**
01 04 01	Madera	
01 04 02	Plásticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall) con o sin pintura	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Pétreos		**Ton**
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales cerámicos	
01 03 08	Residuos de material asfáltico	
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos pétreos	

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No susceptibles de aprovechamiento		**Ton**
201	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
202	Los que tengan características de peligrosidad	
36.924	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
37.289	Otros residuos con características de peligrosidad.	

Nombre del encargado obra (Director de obra, representante legal, residente técnico ambiental, o quien haga sus veces)	JOTAM MAESTRE DIAB		
CC: 1.065.825.668		**Firma**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T-AAAA-XXXX

Transportador: Razón Social | | No. de Identificación

Vehículos asociados Tipo | SENCILLA | Placa | SBC537 | No. PIN TRANS: 11528

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN-GEN	17456
Nombre de la obra	CTO-613-2025
NTR	**T-AAAA-XXXX**
Fecha de entrega RCD	4/06/2026

Datos del Generador

Representante Legal: JOTAM MAESTRE DIAB
Dirección: CALLE 49 A SUR 28-36
Municipio: CUNDINAMARCA
Teléfono de contacto: 3146887857
Fecha entrega RCD conductor: 4/06/2026

01 RCD susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavación	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales pétreos de excavación	10,555
01 01 05	Otros residuos de excavación	

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	

01 04 No pétreos		**Ton**
01 04 01	Madera	
01 04 02	Plásticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall) con o sin pintura	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Pétreos		**Ton**
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales cerámicos	
01 03 08	Residuos de material asfáltico	
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos pétreos	

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No susceptibles de aprovechamiento		**Ton**
201	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
202	Los que tengan características de peligrosidad	
36.924	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
37.289	Otros residuos con características de peligrosidad.	

Nombre del encargado obra (Director de obra, representante legal, residente técnico ambiental, o quien haga sus veces)	JOTAM MAESTRE DIAB		
CC: 1.065.825.668		**Firma**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T-AAAA-XXXX

Transportador: Razón Social | No. de Identificación

Vehículos asociados Tipo: SENCILLA | Placa: AFE182 | No. PIN TRANS: 16756

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN-GEN	17456
Nombre de la obra	CTO-613-2025
NTR	**T-AAAA-XXXX**
Fecha de entrega RCD	5/06/2026

Datos del Generador

Representante Legal: JOTAM MAESTRE DIAB
Dirección: CALLE 49 A SUR 28-36
Municipio: CUNDINAMARCA
Teléfono de contacto: 3146887857
Fecha entrega RCD conductor: 5/06/2026

01 RCD susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavación	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales pétreos de excavación	9,10
01 01 05	Otros residuos de excavación	

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	

01 04 No pétreos		**Ton**
01 04 01	Madera	
01 04 02	Plásticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall) con o sin pintura	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Pétreos		**Ton**
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales cerámicos	
01 03 08	Residuos de material asfáltico	
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos pétreos	

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No susceptibles de aprovechamiento		**Ton**
201	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
202	Los que tengan características de peligrosidad	
36.924	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
37.289	Otros residuos con características de peligrosidad.	

Nombre del encargado obra (Director de obra, representante legal, residente técnico ambiental, o quien haga sus veces)	JOTAM MAESTRE DIAB	
CC: 1.065.825.668		**Firma**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T-AAAA-XXXX

Transportador: Razón Social | | No. de Identificación

Vehículos asociados Tipo | SENCILLA | Placa | AFE182 | No. PIN TRANS: 16756

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN-GEN	17456
Nombre de la obra	CTO-613-2025
NTR	**T-AAAA-XXXX**
Fecha de entrega RCD	9/06/2026

Datos del Generador

Representante Legal: JOTAM MAESTRE DIAB
Dirección: CALLE 49 A SUR 28-36
Municipio: CUNDINAMARCA
Teléfono de contacto: 3146887857
Fecha entrega RCD conductor: 9/06/2026

01 RCD susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavación	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales pétreos de excavación	11,495
01 01 05	Otros residuos de excavación	

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	

01 04 No pétreos		**Ton**
01 04 01	Madera	
01 04 02	Plásticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall) con o sin pintura	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Pétreos		**Ton**
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales cerámicos	
01 03 08	Residuos de material asfáltico	
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos pétreos	

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No susceptibles de aprovechamiento		**Ton**
201	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
202	Los que tengan características de peligrosidad	
36.924	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
37.289	Otros residuos con características de peligrosidad.	

Nombre del encargado obra (Director de obra, representante legal, residente técnico ambiental, o quien haga sus veces)	JOTAM MAESTRE DIAB		
CC: 1.065.825.668		**Firma**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T-AAAA-XXXX

Transportador: Razón Social | | No. de Identificación

Vehículos asociados Tipo | SEMCILLA | Placa | SBC537 | No. PIN TRANS: 16755

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN-GEN	17456
Nombre de la obra	CTO-613-2025
NTR	**T-AAAA-XXXX**
Fecha de entrega RCD	9/06/2026

Datos del Generador

Representante Legal: JOTAM MAESTRE DIAB
Dirección: CALLE 49 A SUR 28-36
Municipio: CUNDINAMARCA
Teléfono de contacto: 3146887857
Fecha entrega RCD conductor: 9/06/2026

01 RCD susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavación	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales pétreos de excavación	11,08
01 01 05	Otros residuos de excavación	

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	

01 04 No pétreos		**Ton**
01 04 01	Madera	
01 04 02	Plásticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall) con o sin pintura	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Pétreos		**Ton**
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales cerámicos	
01 03 08	Residuos de material asfáltico	
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos pétreos	

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No susceptibles de aprovechamiento		**Ton**
201	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
202	Los que tengan características de peligrosidad	
36.924	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
37.289	Otros residuos con características de peligrosidad.	

Nombre del encargado obra (Director de obra, representante legal, residente técnico ambiental, o quien haga sus veces)	JOTAM MAESTRE DIAB		
CC: 1.065.825.668		**Firma**	

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T-AAAA-XXXX

Transportador: Razón Social | | No. de Identificación

Vehículos asociados Tipo | SENCILLA | Placa | SNF516 | No. PIN TRANS: 247

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN-GEN	17456
Nombre de la obra	CTO-613-2025
NTR	**T-AAAA-XXXX**
Fecha de entrega RCD	9/06/2026

Datos del Generador

Representante Legal: JOTAM MAESTRE DIAB
Dirección: CALLE 49 A SUR 28-36
Municipio: CUNDINAMARCA
Teléfono de contacto: 3146887857
Fecha entrega RCD conductor: 9/06/2026

01 RCD susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavación	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales pétreos de excavación	11,94
01 01 05	Otros residuos de excavación	

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	

01 04 No pétreos		**Ton**
01 04 01	Madera	
01 04 02	Plásticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall) con o sin pintura	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Pétreos		**Ton**
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales cerámicos	
01 03 08	Residuos de material asfáltico	
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos pétreos	

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No susceptibles de aprovechamiento		**Ton**
201	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
202	Los que tengan características de peligrosidad	
36.924	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
37.289	Otros residuos con características de peligrosidad.	

Nombre del encargado obra (Director de obra, representante legal, residente técnico ambiental, o quien haga sus veces)	JOTAM MAESTRE DIAB		
CC: 1.065.825.668		**Firma**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T-AAAA-XXXX

Transportador: Razón Social | | No. de Identificación

Vehículos asociados Tipo | DOBLE TROQUE | Placa | SMA801 | No. PIN TRANS: 11450

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN-GEN	17456
Nombre de la obra	CTO-613-2025
NTR	**T-AAAA-XXXX**
Fecha de entrega RCD	17/06/2026

Datos del Generador

Representante Legal: JOTAM MAESTRE DIAB
Dirección: CALLE 49 A SUR 28-36
Municipio: CUNDINAMARCA
Teléfono de contacto: 3146887857
Fecha entrega RCD conductor: 17/06/2026

01 RCD susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavación	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales pétreos de excavación	
01 01 05	Otros residuos de excavación	

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	

01 04 No pétreos		**Ton**
01 04 01	Madera	
01 04 02	Plásticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall) con o sin pintura	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Pétreos		**Ton**
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales cerámicos	
01 03 08	Residuos de material asfáltico	18
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos pétreos	

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No susceptibles de aprovechamiento		**Ton**
201	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
202	Los que tengan características de peligrosidad	
36.924	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
37.289	Otros residuos con características de peligrosidad.	

Nombre del encargado obra (Director de obra, representante legal, residente técnico ambiental, o quien haga sus veces)	JOTAM MAESTRE DIAB		
CC: 1.065.825.668		**Firma**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T-AAAA-XXXX

Transportador: Razón Social | | No. de Identificación

Vehículos asociados Tipo | DOBLE TROQUE | Placa | SMA801 | No. PIN TRANS: 11450

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN-GEN	17456
Nombre de la obra	CTO-613-2025
NTR	**T-AAAA-XXXX**
Fecha de entrega RCD	17/06/2026

Datos del Generador

Representante Legal: JOTAM MAESTRE DIAB
Dirección: CALLE 49 A SUR 28-36
Municipio: CUNDINAMARCA
Teléfono de contacto: 3146887857
Fecha entrega RCD conductor: 17/06/2026

01 RCD susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavación	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales pétreos de excavación	
01 01 05	Otros residuos de excavación	

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	

01 04 No pétreos		**Ton**
01 04 01	Madera	
01 04 02	Plásticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall) con o sin pintura	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Pétreos		**Ton**
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales cerámicos	
01 03 08	Residuos de material asfáltico	18
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos pétreos	

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No susceptibles de aprovechamiento		**Ton**
201	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
202	Los que tengan características de peligrosidad	
36.924	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
37.289	Otros residuos con características de peligrosidad.	

Nombre del encargado obra (Director de obra, representante legal, residente técnico ambiental, o quien haga sus veces)	JOTAM MAESTRE DIAB		
CC: 1.065.825.668		**Firma**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T-AAAA-XXXX

Transportador: Razón Social | | No. de Identificación

Vehículos asociados Tipo | DOBLE TROQUE | Placa | SMA801 | No. PIN TRANS: 11450

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN-GEN	17456
Nombre de la obra	CTO-613-2025
NTR	**T-AAAA-XXXX**
Fecha de entrega RCD	17/06/2026

Datos del Generador

Representante Legal: JOTAM MAESTRE DIAB
Dirección: CALLE 49 A SUR 28-36
Municipio: CUNDINAMARCA
Teléfono de contacto: 3146887857
Fecha entrega RCD conductor: 17/06/2026

01 RCD susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavación	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales pétreos de excavación	22
01 01 05	Otros residuos de excavación	

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	

01 04 No pétreos		**Ton**
01 04 01	Madera	
01 04 02	Plásticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall) con o sin pintura	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Pétreos		**Ton**
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales cerámicos	
01 03 08	Residuos de material asfáltico	
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos pétreos	

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No susceptibles de aprovechamiento		**Ton**
201	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
202	Los que tengan características de peligrosidad	
36.924	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
37.289	Otros residuos con características de peligrosidad.	

Nombre del encargado obra (Director de obra, representante legal, residente técnico ambiental, o quien haga sus veces)	JOTAM MAESTRE DIAB	
CC: 1.065.825.668		**Firma**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T-AAAA-XXXX

Transportador: Razón Social | | No. de Identificación

Vehículos asociados Tipo | DOBLE TROQUE | Placa | SMA801 | No. PIN TRANS: 11450

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN-GEN	17456
Nombre de la obra	CTO-613-2025
NTR	**T-AAAA-XXXX**
Fecha de entrega RCD	18/06/2026

Datos del Generador

Representante Legal: JOTAM MAESTRE DIAB
Dirección: CALLE 49 A SUR 28-36
Municipio: CUNDINAMARCA
Teléfono de contacto: 3146887857
Fecha entrega RCD conductor: 18/06/2026

01 RCD susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavación	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales pétreos de excavación	
01 01 05	Otros residuos de excavación	

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	

01 04 No pétreos		**Ton**
01 04 01	Madera	
01 04 02	Plásticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall) con o sin pintura	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Pétreos		**Ton**
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales cerámicos	
01 03 08	Residuos de material asfáltico	18
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos pétreos	

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No susceptibles de aprovechamiento		**Ton**
201	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
202	Los que tengan características de peligrosidad	
36.924	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
37.289	Otros residuos con características de peligrosidad.	

Nombre del encargado obra (Director de obra, representante legal, residente técnico ambiental, o quien haga sus veces)	JOTAM MAESTRE DIAB		
CC: 1.065.825.668		**Firma**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T-AAAA-XXXX

Transportador: Razón Social | | No. de Identificación

Vehículos asociados Tipo | DOBLE TROQUE | Placa | SMA801 | No. PIN TRANS: 11450

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN-GEN	17456
Nombre de la obra	CTO-613-2025
NTR	**T-AAAA-XXXX**
Fecha de entrega RCD	18/06/2026

Datos del Generador

Representante Legal: JOTAM MAESTRE DIAB
Dirección: CALLE 49 A SUR 28-36
Municipio: CUNDINAMARCA
Teléfono de contacto: 3146887857
Fecha entrega RCD conductor: 18/06/2026

01 RCD susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavación	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales pétreos de excavación	
01 01 05	Otros residuos de excavación	

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	

01 04 No pétreos		**Ton**
01 04 01	Madera	
01 04 02	Plásticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall) con o sin pintura	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Pétreos		**Ton**
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales cerámicos	
01 03 08	Residuos de material asfáltico	18
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos pétreos	

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No susceptibles de aprovechamiento		**Ton**
201	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
202	Los que tengan características de peligrosidad	
36.924	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
37.289	Otros residuos con características de peligrosidad.	

Nombre del encargado obra (Director de obra, representante legal, residente técnico ambiental, o quien haga sus veces)	JOTAM MAESTRE DIAB		
CC: 1.065.825.668		**Firma**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T-AAAA-XXXX

Transportador: Razón Social | | No. de Identificación

Vehículos asociados Tipo | DOBLE TROQUE | Placa | SMA801 | No. PIN TRANS: 11450

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN-GEN	17456
Nombre de la obra	CTO-613-2025
NTR	**T-AAAA-XXXX**
Fecha de entrega RCD	19/06/2026

Datos del Generador

Representante Legal: JOTAM MAESTRE DIAB
Dirección: CALLE 49 A SUR 28-36
Municipio: CUNDINAMARCA
Teléfono de contacto: 3146887857
Fecha entrega RCD conductor: 19/06/2026

01 RCD susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavación	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales pétreos de excavación	22
01 01 05	Otros residuos de excavación	

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	

01 04 No pétreos		**Ton**
01 04 01	Madera	
01 04 02	Plásticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall) con o sin pintura	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Pétreos		**Ton**
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales cerámicos	
01 03 08	Residuos de material asfáltico	
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos pétreos	

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No susceptibles de aprovechamiento		**Ton**
201	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
202	Los que tengan características de peligrosidad	
36.924	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
37.289	Otros residuos con características de peligrosidad.	

Nombre del encargado obra (Director de obra, representante legal, residente técnico ambiental, o quien haga sus veces)	JOTAM MAESTRE DIAB		
CC: 1.065.825.668		**Firma**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T-AAAA-XXXX

Transportador: Razón Social | | No. de Identificación

Vehículos asociados Tipo | DOBLE TROQUE | Placa | SMA801 | No. PIN TRANS: 11450

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN-GEN	17456
Nombre de la obra	CTO-613-2025
NTR	**T-AAAA-XXXX**
Fecha de entrega RCD	19/06/2026

Datos del Generador

Representante Legal: JOTAM MAESTRE DIAB
Dirección: CALLE 49 A SUR 28-36
Municipio: CUNDINAMARCA
Teléfono de contacto: 3146887857
Fecha entrega RCD conductor: 19/06/2026

01 RCD susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavación	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales pétreos de excavación	22
01 01 05	Otros residuos de excavación	

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	

01 04 No pétreos		**Ton**
01 04 01	Madera	
01 04 02	Plásticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall) con o sin pintura	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Pétreos		**Ton**
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales cerámicos	
01 03 08	Residuos de material asfáltico	
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos pétreos	

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No susceptibles de aprovechamiento		**Ton**
201	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
202	Los que tengan características de peligrosidad	
36.924	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
37.289	Otros residuos con características de peligrosidad.	

Nombre del encargado obra (Director de obra, representante legal, residente técnico ambiental, o quien haga sus veces)	JOTAM MAESTRE DIAB		
CC: 1.065.825.668		**Firma**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T-AAAA-XXXX

Transportador: Razón Social | | No. de Identificación

Vehículos asociados Tipo | DOBLE TROQUE | Placa | SMA801 | No. PIN TRANS: 11450

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN-GEN	17456
Nombre de la obra	CTO-613-2025
NTR	**T-AAAA-XXXX**
Fecha de entrega RCD	20/06/2026

Datos del Generador

Representante Legal: JOTAM MAESTRE DIAB
Dirección: CALLE 49 A SUR 28-36
Municipio: CUNDINAMARCA
Teléfono de contacto: 3146887857
Fecha entrega RCD conductor: 20/06/2026

01 RCD susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavación	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales pétreos de excavación	22
01 01 05	Otros residuos de excavación	

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	

01 04 No pétreos		**Ton**
01 04 01	Madera	
01 04 02	Plásticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall) con o sin pintura	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Pétreos		**Ton**
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales cerámicos	
01 03 08	Residuos de material asfáltico	
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos pétreos	

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No susceptibles de aprovechamiento		**Ton**
201	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
202	Los que tengan características de peligrosidad	
36.924	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
37.289	Otros residuos con características de peligrosidad.	

Nombre del encargado obra (Director de obra, representante legal, residente técnico ambiental, o quien haga sus veces)	JOTAM MAESTRE DIAB		
CC: 1.065.825.668		**Firma**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T-AAAA-XXXX

Transportador: Razón Social | | No. de Identificación

Vehículos asociados Tipo | DOBLE TROQUE | Placa | SMA801 | No. PIN TRANS: 11450

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN-GEN	17456
Nombre de la obra	CTO-613-2025
NTR	**T-AAAA-XXXX**
Fecha de entrega RCD	20/06/2026

Datos del Generador

Representante Legal: JOTAM MAESTRE DIAB
Dirección: CALLE 49 A SUR 28-36
Municipio: CUNDINAMARCA
Teléfono de contacto: 3146887857
Fecha entrega RCD conductor: 20/06/2026

01 RCD susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavación	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales pétreos de excavación	22
01 01 05	Otros residuos de excavación	

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	

01 04 No pétreos		**Ton**
01 04 01	Madera	
01 04 02	Plásticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall) con o sin pintura	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Pétreos		**Ton**
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales cerámicos	
01 03 08	Residuos de material asfáltico	
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos pétreos	

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No susceptibles de aprovechamiento		**Ton**
201	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
202	Los que tengan características de peligrosidad	
36.924	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
37.289	Otros residuos con características de peligrosidad.	

Nombre del encargado obra (Director de obra, representante legal, residente técnico ambiental, o quien haga sus veces)	JOTAM MAESTRE DIAB		
CC: 1.065.825.668		**Firma**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T-AAAA-XXXX

Transportador: Razón Social | | No. de Identificación

Vehículos asociados Tipo | DOBLE TROQUE | Placa | SMA801 | No. PIN TRANS: 11450

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN-GEN	17456
Nombre de la obra	CTO-613-2025
NTR	**T-AAAA-XXXX**
Fecha de entrega RCD	22/06/2026

Datos del Generador

Representante Legal: JOTAM MAESTRE DIAB
Dirección: CALLE 49 A SUR 28-36
Municipio: CUNDINAMARCA
Teléfono de contacto: 3146887857
Fecha entrega RCD conductor: 22/06/2026

01 RCD susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavación	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales pétreos de excavación	22
01 01 05	Otros residuos de excavación	

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	

01 04 No pétreos		**Ton**
01 04 01	Madera	
01 04 02	Plásticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall) con o sin pintura	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Pétreos		**Ton**
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales cerámicos	
01 03 08	Residuos de material asfáltico	
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos pétreos	

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No susceptibles de aprovechamiento		**Ton**
201	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
202	Los que tengan características de peligrosidad	
36.924	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
37.289	Otros residuos con características de peligrosidad.	

Nombre del encargado obra (Director de obra, representante legal, residente técnico ambiental, o quien haga sus veces)	JOTAM MAESTRE DIAB		
CC: 1.065.825.668		**Firma**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T-AAAA-XXXX

Transportador: Razón Social | | No. de Identificación

Vehículos asociados Tipo | DOBLE TROQUE | Placa | SMA801 | No. PIN TRANS: 11450

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN-GEN	17456
Nombre de la obra	CTO-613-2025
NTR	**T-AAAA-XXXX**
Fecha de entrega RCD	22/06/2026

Datos del Generador

Representante Legal: JOTAM MAESTRE DIAB
Dirección: CALLE 49 A SUR 28-36
Municipio: CUNDINAMARCA
Teléfono de contacto: 3146887857
Fecha entrega RCD conductor: 22/06/2026

01 RCD susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavación	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales pétreos de excavación	22
01 01 05	Otros residuos de excavación	

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	

01 04 No pétreos		**Ton**
01 04 01	Madera	
01 04 02	Plásticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall) con o sin pintura	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Pétreos		**Ton**
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales cerámicos	
01 03 08	Residuos de material asfáltico	
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos pétreos	

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No susceptibles de aprovechamiento		**Ton**
201	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
202	Los que tengan características de peligrosidad	
36.924	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
37.289	Otros residuos con características de peligrosidad.	

Nombre del encargado obra (Director de obra, representante legal, residente técnico ambiental, o quien haga sus veces)	JOTAM MAESTRE DIAB		
CC: 1.065.825.668		**Firma**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T-AAAA-XXXX

Transportador: Razón Social | | No. de Identificación

Vehículos asociados Tipo | DOBLE TROQUE | Placa | SMA801 | No. PIN TRANS: 11450

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN-GEN	17456
Nombre de la obra	CTO-613-2025
NTR	**T-AAAA-XXXX**
Fecha de entrega RCD	16/06/2026

Datos del Generador

Representante Legal: JOTAM MAESTRE DIAB
Dirección: CALLE 49 A SUR 28-36
Municipio: CUNDINAMARCA
Teléfono de contacto: 3146887857
Fecha entrega RCD conductor: 16/06/2026

01 RCD susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavación	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales pétreos de excavación	
01 01 05	Otros residuos de excavación	

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	

01 04 No pétreos		**Ton**
01 04 01	Madera	
01 04 02	Plásticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall) con o sin pintura	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Pétreos		**Ton**
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales cerámicos	
01 03 08	Residuos de material asfáltico	18
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos pétreos	

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No susceptibles de aprovechamiento		**Ton**
201	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
202	Los que tengan características de peligrosidad	
36.924	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
37.289	Otros residuos con características de peligrosidad.	

Nombre del encargado obra (Director de obra, representante legal, residente técnico ambiental, o quien haga sus veces)	JOTAM MAESTRE DIAB		
CC: 1.065.825.668		**Firma**	

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T-AAAA-XXXX

Transportador: Razón Social | | No. de Identificación

Vehículos asociados Tipo | DOBLE TROQUE | Placa | SMA801 | No. PIN TRANS: 11450

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN-GEN	17456
Nombre de la obra	CTO-613-2025
NTR	**T-AAAA-XXXX**
Fecha de entrega RCD	16/06/2026

Datos del Generador

Representante Legal: JOTAM MAESTRE DIAB
Dirección: CALLE 49 A SUR 28-36
Municipio: CUNDINAMARCA
Teléfono de contacto: 3146887857
Fecha entrega RCD conductor: 16/06/2026

01 RCD susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavación	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales pétreos de excavación	
01 01 05	Otros residuos de excavación	

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	

01 04 No pétreos		**Ton**
01 04 01	Madera	
01 04 02	Plásticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall) con o sin pintura	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Pétreos		**Ton**
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales cerámicos	
01 03 08	Residuos de material asfáltico	18
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos pétreos	

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No susceptibles de aprovechamiento		**Ton**
201	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
202	Los que tengan características de peligrosidad	
36.924	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
37.289	Otros residuos con características de peligrosidad.	

Nombre del encargado obra (Director de obra, representante legal, residente técnico ambiental, o quien haga sus veces)	JOTAM MAESTRE DIAB		
CC: 1.065.825.668		**Firma**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T-AAAA-XXXX

Transportador: Razón Social | | No. de Identificación

Vehículos asociados Tipo | DOBLE TROQUE | Placa | SMA801 | No. PIN TRANS: 11450

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN-GEN	17456
Nombre de la obra	CTO-613-2025
NTR	**T-AAAA-XXXX**
Fecha de entrega RCD	16/06/2026

Datos del Generador

Representante Legal: JOTAM MAESTRE DIAB
Dirección: CALLE 49 A SUR 28-36
Municipio: CUNDINAMARCA
Teléfono de contacto: 3146887857
Fecha entrega RCD conductor: 16/06/2026

01 RCD susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavación	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales pétreos de excavación	
01 01 05	Otros residuos de excavación	

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	

01 04 No pétreos		**Ton**
01 04 01	Madera	
01 04 02	Plásticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall) con o sin pintura	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Pétreos		**Ton**
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales cerámicos	
01 03 08	Residuos de material asfáltico	18
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos pétreos	

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No susceptibles de aprovechamiento		**Ton**
201	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
202	Los que tengan características de peligrosidad	
36.924	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
37.289	Otros residuos con características de peligrosidad.	

Nombre del encargado obra (Director de obra, representante legal, residente técnico ambiental, o quien haga sus veces)	JOTAM MAESTRE DIAB		
CC: 1.065.825.668		**Firma**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T-AAAA-XXXX

Transportador: Razón Social | | No. de Identificación

Vehículos asociados Tipo | SENCILLA | Placa | AFE182 | No. PIN TRANS: 16756

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN-GEN	17456
Nombre de la obra	CTO-613-2025
NTR	**T-AAAA-XXXX**
Fecha de entrega RCD	24/06/2026

Datos del Generador

Representante Legal: JOTAM MAESTRE DIAB
Dirección: CALLE 49 A SUR 28-36
Municipio: CUNDINAMARCA
Teléfono de contacto: 3146887857
Fecha entrega RCD conductor: 24/06/2026

01 RCD susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavación	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales pétreos de excavación	8
01 01 05	Otros residuos de excavación	

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	

01 04 No pétreos		**Ton**
01 04 01	Madera	
01 04 02	Plásticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall) con o sin pintura	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Pétreos		**Ton**
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales cerámicos	
01 03 08	Residuos de material asfáltico	
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos pétreos	

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No susceptibles de aprovechamiento		**Ton**
201	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
202	Los que tengan características de peligrosidad	
36.924	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
37.289	Otros residuos con características de peligrosidad.	

Nombre del encargado obra (Director de obra, representante legal, residente técnico ambiental, o quien haga sus veces)	JOTAM MAESTRE DIAB		
CC: 1.065.825.668		**Firma**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T-AAAA-XXXX

Transportador: Razón Social | | No. de Identificación

Vehículos asociados Tipo | DOBLE TROQUE | Placa | SMA801 | No. PIN TRANS: 11450

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN-GEN	17456
Nombre de la obra	CTO-613-2025
NTR	**T-AAAA-XXXX**
Fecha de entrega RCD	24/06/2026

Datos del Generador

Representante Legal: JOTAM MAESTRE DIAB
Dirección: CALLE 49 A SUR 28-36
Municipio: CUNDINAMARCA
Teléfono de contacto: 3146887857
Fecha entrega RCD conductor: 24/06/2026

01 RCD susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavación	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales pétreos de excavación	22
01 01 05	Otros residuos de excavación	

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	

01 04 No pétreos		**Ton**
01 04 01	Madera	
01 04 02	Plásticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall) con o sin pintura	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Pétreos		**Ton**
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales cerámicos	
01 03 08	Residuos de material asfáltico	
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos pétreos	

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No susceptibles de aprovechamiento		**Ton**
201	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
202	Los que tengan características de peligrosidad	
36.924	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
37.289	Otros residuos con características de peligrosidad.	

Nombre del encargado obra (Director de obra, representante legal, residente técnico ambiental, o quien haga sus veces)	JOTAM MAESTRE DIAB		
CC: 1.065.825.668		**Firma**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T-AAAA-XXXX

Transportador: Razón Social | | No. de Identificación

Vehículos asociados Tipo | SENCILLA | Placa | AFE182 | No. PIN TRANS: 16756

1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

PIN-GEN	17456
Nombre de la obra	CTO-613-2025
NTR	**T-AAAA-XXXX**
Fecha de entrega RCD	24/06/2026

Datos del Generador

Representante Legal: JOTAM MAESTRE DIAB
Dirección: CALLE 49 A SUR 28-36
Municipio: CUNDINAMARCA
Teléfono de contacto: 3146887857
Fecha entrega RCD conductor: 24/06/2026

01 RCD susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavación	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales pétreos de excavación	12,02
01 01 05	Otros residuos de excavación	

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	

01 04 No pétreos		**Ton**
01 04 01	Madera	
01 04 02	Plásticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall) con o sin pintura	
01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

01 03 Pétreos		**Ton**
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales cerámicos	
01 03 08	Residuos de material asfáltico	
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos pétreos	

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

02 RCD No susceptibles de aprovechamiento		**Ton**
201	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
202	Los que tengan características de peligrosidad	
36.924	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
37.289	Otros residuos con características de peligrosidad.	

Nombre del encargado obra (Director de obra, representante legal, residente técnico ambiental, o quien haga sus veces)	JOTAM MAESTRE DIAB		
CC: 1.065.825.668		**Firma**	

CODEOBRAS
CONSTRUIMOS FUTURO!.

CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

30 AÑOS

BOLETA DE DISPOSICION RCD

18298

NIT.: 800.169.155-1

Empresa: ARK

Obra / Pin: Venecia Fecha: 02.06.2026

Conductor: Antonio cristian Hora: _____

Placa del Vehículo: NOW 390 Pin: _____

Concreto	☐	_____	M3	_____ TON
Aleatorio	☒	14	M3	_____ TON
Recebo	☐	_____	M3	_____ TON
Asfalto	☐	_____	M3	_____ TON

Recibido por: _____ $ _____

Firma: _____

C.C.: 79136334 Telefono: _____

OBSERVACIONES: _____

OBRA:
No es una factura

PLANTA COTA
PARA CERTIFICACIONES, SOLICITARLAS
AL CORREO: contacto@codeobras.com
Cels.: 316 388 1743

CODEOBRAS
CONSTRUIMOS FUTURO!

CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

30 AÑOS

BOLETA DE DISPOSICION RCD

18441

NIT.: 800.169.155-1

Empresa: Constructora Burgos

Obra / Pin: Berlin Fecha: 19.06.2026

Conductor: Antonio Cristiano Hora:

Placa del Vehículo: NOW 390 Pin:

Concreto	☐		M3		TON
Aleatorio	☒	15	M3		TON
Recebo	☐		M3		TON
Asfalto	☐		M3		TON

Recibido por: nelson $

Firma:

C.C.: 79136334 Telefono:

OBSERVACIONES:

OBRA:
No es una factura

PLANTA COTA
PARA CERTIFICACIONES, SOLICITARLAS
AL CORREO: contacto@codeobras.com
Cels.: 316 388 1743

Pin obra: 17465

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD

Res. No. 0472 de 2017 y Res. 1257 de 2021 MADS - Gestor Registro No. 57

MOLINOS J N

VEREDA PANAMÁ LOTE EL JORDÁN - CEL. 305 877 7561 - 317 422 3215

E-mail: molinosjn@gmail.com

Lugar de origen: Tunjuelito

Fecha de ingreso: 03 Junio 2026

ORDEN No. 1629

Nombre del generador: Construcciones siglo xxi

Placa: AFE182

TIPO DE VIAJE		MATERIAL			
DOBLE	SENCILLO	Concreto:		Escombro:	
	x2mts	Asfalto:		Cantos:	
		Hormigón:		Cimentación:	
		Ladrillo: - Bloque:		Otro:	x
		Cuál? Excavación			
		CANTIDAD (Ton.)			

MOLINOS J N 03 JUN 2026

Responsable MOLINOS JN

FORMATO TIQUETE DE INGRESO

1

Pin: 17465

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD

Res. No. 0472 de 2017 y Res. 1257 de 2021 MADS - Gestor Registro No. 57

MOLINOS J N

VEREDA PANAMÁ LOTE EL JORDÁN - CEL. 305 877 7561 - 317 422 3215

E-mail: molinosjn@gmail.com

Lugar de origen: 03 - Junio - 2026

Fecha de ingreso: Tunjuelito

ORDEN No. 1631

Nombre del generador: Construcciones y Tanques Siglo XXI

Placa: SNF 516

TIPO DE VIAJE		MATERIAL			
DOBLE	SENCILLO	Concreto:		Escombro:	
	x2mts	Asfalto:		Cantos:	
		Hormigón:		Cimentación:	
		Ladrillo: - Bloque:		Otro:	X
		Cuál?			
		CANTIDAD (Ton.)			

MOLINOS J N 03 JUN 2026

Responsable MOLINOS JN

FORMATO TIQUETE DE INGRESO

2

Pin: 17465

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD

Res. No. 0472 de 2017 y Res. 1257 de 2021 MADS - Gestor Registro No. 57

MOLINOS J N

VEREDA PANAMÁ LOTE EL JORDÁN - CEL. 305 877 7561 - 317 422 3215

E-mail: molinosjn@gmail.com

Lugar de origen: Tunjuelito

Fecha de ingreso: 04 Junio 2026

ORDEN No. 1632

Nombre del generador: Construcciones siglo xxi

Placa: AFE182

TIPO DE VIAJE		MATERIAL			
DOBLE	SENCILLO	Concreto:		Escombro:	
	x2mts	Asfalto:		Cantos:	
		Hormigón:		Cimentación:	
		Ladrillo: - Bloque:		Otro:	x
		Cuál?			
		CANTIDAD (Ton.)			

MOLINOS J N 04 JUN 2026

Responsable MOLINOS JN

FORMATO TIQUETE DE INGRESO

3

Pin: 17465

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD

Res. No. 0472 de 2017 y Res. 1257 de 2021 MADS - Gestor Registro No. 57

MOLINOS J N

VEREDA PANAMÁ LOTE EL JORDÁN - CEL. 305 877 7561 - 317 422 3215

E-mail: molinosjn@gmail.com

Lugar de origen: Tunjuelito

Fecha de ingreso: 04 Junio 2026

ORDEN No. 1633

Nombre del generador: Construcciones siglo xxi

Placa: SNF516

TIPO DE VIAJE		MATERIAL			
DOBLE	SENCILLO	Concreto:		Escombro:	
	x2mts	Asfalto:		Cantos:	
		Hormigón:		Cimentación:	
		Ladrillo: - Bloque:		Otro:	x
		Cuál? Excavación			
		CANTIDAD (Ton.)			11,320

MOLINOS J N 04 JUN 2026

Responsable MOLINOS JN

FORMATO TIQUETE DE INGRESO

4

Pin AMB: 174465

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD

Res. No. 0472 de 2017 y Res. 1257 de 2021 MADS - Gestor Registro No. 57

VEREDA PANAMÁ LOTE EL JORDÁN - CEL. 305 877 7561 - 317 422 3215

E-mail: molinosjn@gmail.com

MOLINOS J N

Lugar de origen: TUNJUELITO

ORDEN No. 1634

Fecha de ingreso: 04 Junio 2026

Nombre del generador: Construcciones Siglo xxi

Placa: SBC537

TIPO DE VIAJE		MATERIAL			
DOBLE	SENCILLO	Concreto:		Escombro:	
	X 7 MTS	Asfalto:		Cantos:	
		Hormigón:		Cimentación:	
		Ladrillo: - Bloque:		Otro:	X

Cuál? Excavacion

CANTIDAD (Ton.)

MOLINOS J N

04 JUN 2026

Responsable MOLINOS JN

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD

FORMATO TIQUETE DE INGRESO

5

Pin AMB: 174465

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD

Res. No. 0472 de 2017 y Res. 1257 de 2021 MADS - Gestor Registro No. 57

VEREDA PANAMÁ LOTE EL JORDÁN - CEL. 305 877 7561 - 317 422 3215

E-mail: molinosjn@gmail.com

MOLINOS J N

Lugar de origen: TUNJUELITO

ORDEN No. 1635

Fecha de ingreso: 04 Junio 2026

Nombre del generador: Construcciones Siglo xxi

Placa: SNF516

TIPO DE VIAJE		MATERIAL			
DOBLE	SENCILLO	Concreto:		Escombro:	
	X 7 MTS	Asfalto:		Cantos:	
		Hormigón:		Cimentación:	
		Ladrillo: - Bloque:		Otro:	X

Cuál? Excavacion

CANTIDAD (Ton.) 10,550

MOLINOS J N

04 JUN 2026

Responsable MOLINOS JN

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD

FORMATO TIQUETE DE INGRESO

6

Pin Obra: 174465

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD

Res. No. 0472 de 2017 y Res. 1257 de 2021 MADS - Gestor Registro No. 57

VEREDA PANAMÁ LOTE EL JORDÁN - CEL. 305 877 7561 - 317 422 3215

E-mail: molinosjn@gmail.com

MOLINOS J N

Lugar de origen: Tunjuelito

ORDEN No. 1636

Fecha de ingreso: 04 - Junio - 2026

Nombre del generador: Construcciones y transportes Siglo XXI

Placa: AFE 182

TIPO DE VIAJE		MATERIAL			
DOBLE	SENCILLO	Concreto:		Escombro:	
	X 7 Mts	Asfalto:		Cantos:	
		Hormigón:		Cimentación:	
		Ladrillo: - Bloque:		Otro:	X

Cuál? Excavacion

CANTIDAD (Ton.) 10.480

MOLINOS J N

04 JUN 2026

Responsable MOLINOS JN

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD

FORMATO TIQUETE DE INGRESO

7

Pin AMB: 174465

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD

Res. No. 0472 de 2017 y Res. 1257 de 2021 MADS - Gestor Registro No. 57

VEREDA PANAMÁ LOTE EL JORDÁN - CEL. 305 877 7561 - 317 422 3215

E-mail: molinosjn@gmail.com

MOLINOS J N

Lugar de origen: Tunjuelito

ORDEN No. 1637

Fecha de ingreso: 04 Junio 2026

Nombre del generador: Construcciones Siglo xxi

Placa: SBC537

TIPO DE VIAJE		MATERIAL			
DOBLE	SENCILLO	Concreto:		Escombro:	
	7 MTS	Asfalto:		Cantos:	
		Hormigón:		Cimentación:	
		Ladrillo: - Bloque:		Otro:	X

Cuál? Excavación

CANTIDAD (Ton.) 10,555

MOLINOS J N

04 JUN 2026

Responsable MOLINOS JN

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD

FORMATO TIQUETE DE INGRESO

8

Pin AUB: 17465

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD

Res. No. 0472 de 2017 y Res. 1257 de 2021 MADS - Gestor Registro No. 57

MOLINOS J N

VEREDA PANAMÁ LOTE EL JORDÁN - CEL. 305 877 7561 - 317 422 3215

E-mail: molinosjn@gmail.com

Lugar de origen: Tunjuelito

ORDEN No. 1640

Fecha de ingreso: 05 - Junio - 2026

Nombre del generador: Construcciones y Terminados Siglo XXI

Placa: AFE 182

TIPO DE VIAJE		MATERIAL			
DOBLE	SENCILLO	Concreto:		Escombro:	
	X 7 mts	Asfalto:		Cantos:	
		Hormigón:		Cimentación:	
		Ladrillo: - Bloque:		Otro:	X

Cuál? Excavacion

CANTIDAD (Ton.)

05 JUN 2026

Responsable MOLINOS JN

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD

FORMATO TIQUETE DE INGRESO

9

Pin obra: 17465

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD

Res. No. 0472 de 2017 y Res. 1257 de 2021 MADS - Gestor Registro No. 57

MOLINOS J N

VEREDA PANAMÁ LOTE EL JORDÁN - CEL. 305 877 7561 - 317 422 3215

E-mail: molinosjn@gmail.com

Lugar de origen: Tunjuelito

ORDEN No. 1642

Fecha de ingreso: 09 Junio 2026

Nombre del generador: Construcciones Siglo XXI

Placa: AFE182

TIPO DE VIAJE		MATERIAL			
DOBLE	SENCILLO	Concreto:		Escombro:	
	X 3 Mts	Asfalto:		Cantos:	
		Hormigón:		Cimentación:	
		Ladrillo: - Bloque:		Otro:	X

Cuál? Excavación

CANTIDAD (Ton.) 11,495

09 JUN 2026

Responsable MOLINOS JN

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD

FORMATO TIQUETE DE INGRESO

10

Pin obra: 17465

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD

Res. No. 0472 de 2017 y Res. 1257 de 2021 MADS - Gestor Registro No. 57

MOLINOS J N

VEREDA PANAMÁ LOTE EL JORDÁN - CEL. 305 877 7561 - 317 422 3215

E-mail: molinosjn@gmail.com

Lugar de origen: Tunjuelito

ORDEN No. 1643

Fecha de ingreso: 09 Junio 2026

Nombre del generador: Construcciones Siglo XXI

Placa: SBC537

TIPO DE VIAJE		MATERIAL			
DOBLE	SENCILLO	Concreto:		Escombro:	
	X 3 Mts	Asfalto:		Cantos:	
		Hormigón:		Cimentación:	
		Ladrillo: - Bloque:		Otro:	X

Cuál? Excavación

CANTIDAD (Ton.) 11,080

09 JUN 2026

Responsable MOLINOS JN

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD

FORMATO TIQUETE DE INGRESO

11

Pin obra = 17465

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD

Res. No. 0472 de 2017 y Res. 1257 de 2021 MADS - Gestor Registro No. 57

MOLINOS J N

VEREDA PANAMÁ LOTE EL JORDÁN - CEL. 305 877 7561 - 317 422 3215

E-mail: molinosjn@gmail.com

Lugar de origen: Tunjuelito

ORDEN No. 1645

Fecha de ingreso: 09 Junio 2026

Nombre del generador: Construcciones Siglo XXI

Placa: SNF516

TIPO DE VIAJE		MATERIAL			
DOBLE	SENCILLO	Concreto:		Escombro:	
	X 7 MTROS	Asfalto:		Cantos:	
		Hormigón:		Cimentación:	
		Ladrillo: - Bloque:		Otro:	X

Cuál? Excavación

CANTIDAD (Ton.) 11,940

09 JUN 2026

Responsable MOLINOS JN

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD

FORMATO TIQUETE DE INGRESO

12

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD

Res. No. 0472 de 2017 y Res. 1257 de 2021 MADS - Gestor Registro No. 57

VEREDA PANAMÁ LOTE EL JORDÁN - CEL. 305 877 7561 - 317 422 3215

E-mail: molinosjn@gmail.com

MOLINOS J N

Lugar de orígen: TUNJUELITO

Fecha de ingreso: 17 JUNIO 2026

Nombre del generador: SIGLO XXI

Placa: SZA801

ORDEN No. 1997

TIPO DE VIAJE		MATERIAL			
DOBLE	SENCILLO	Concreto:		Escombro:	
		Asfalto:	X	Cantos:	
		Hormigón:		Cimentación:	
		Ladrillo: - Bloque:		Otro:	
		Cuál?			
		CANTIDAD (Ton.)			

17 JUN 2026

Responsable MOLINOS JN

FORMATO TIQUETE DE INGRESO

13

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD

Res. No. 0472 de 2017 y Res. 1257 de 2021 MADS - Gestor Registro No. 57

VEREDA PANAMÁ LOTE EL JORDÁN - CEL. 305 877 7561 - 317 422 3215

E-mail: molinosjn@gmail.com

MOLINOS J N

Lugar de orígen: TUNJUELITO

Fecha de ingreso: 17 JUNIO 2026

Nombre del generador: SIGLO XXI

Placa: SZA801

ORDEN No. 1998

TIPO DE VIAJE		MATERIAL			
DOBLE	SENCILLO	Concreto:		Escombro:	
		Asfalto:	X	Cantos:	
		Hormigón:		Cimentación:	
		Ladrillo: - Bloque:		Otro:	
		Cuál?			
		CANTIDAD (Ton.)			

17 JUN 2026

Responsable MOLINOS JN

FORMATO TIQUETE DE INGRESO

14

Fin obra: 17465

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD

Res. No. 0472 de 2017 y Res. 1257 de 2021 MADS - Gestor Registro No. 57

VEREDA PANAMÁ LOTE EL JORDÁN - CEL. 305 877 7561 - 317 422 3215

E-mail: molinosjn@gmail.com

MOLINOS J N

Lugar de orígen: TUNJUELITO

Fecha de ingreso: 17 JUNIO 2026

Nombre del generador: CONSTRUCCIONES SIGLO XXI

Placa: SHA801

ORDEN No. 1818

TIPO DE VIAJE		MATERIAL			
DOBLE	SENCILLO	Concreto:		Escombro:	
		Asfalto:		Cantos:	
		Hormigón:		Cimentación:	
		Ladrillo: - Bloque:		Otro:	X
		Cuál?	Excavación		
		CANTIDAD (Ton.)			

JUN 2026

Responsable MOLINOS JN

FORMATO TIQUETE DE INGRESO

15

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD

Res. No. 0472 de 2017 y Res. 1257 de 2021 MADS - Gestor Registro No. 57

VEREDA PANAMÁ LOTE EL JORDÁN - CEL. 305 877 7561 - 317 422 3215

E-mail: molinosjn@gmail.com

MOLINOS J N

Lugar de orígen: TUNJUELITO

Fecha de ingreso: 18 JUNIO 2026

Nombre del generador: SIGLO XXI

Placa: SZA801

ORDEN No. 1999

TIPO DE VIAJE		MATERIAL			
DOBLE	SENCILLO	Concreto:		Escombro:	
		Asfalto:	X	Cantos:	
		Hormigón:		Cimentación:	
		Ladrillo: - Bloque:		Otro:	
		Cuál?			
		CANTIDAD (Ton.)			

1 JUN 2026

Responsable MOLINOS JN

FORMATO TIQUETE DE INGRESO

17

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD

Res. No. 0472 de 2017 y Res. 1257 de 2021 MADS - Gestor Registro No. 57

VEREDA PANAMÁ LOTE EL JORDÁN - CEL. 305 877 7561 - 317 422 3215

E-mail: molinosjn@gmail.com

MOLINOS J N

Lugar de orígen: TUNJUELITO

Fecha de ingreso: 18 JUNIO 2026

ORDEN No. 2000

Nombre del generador: SIGLO XXI

Placa: SQA801

TIPO DE VIAJE		MATERIAL			
DOBLE	SENCILLO	Concreto:		Escombro:	
	X	Asfalto:		Cantos:	
		Hormigón:		Cimentación:	
		Ladrillo: - Bloque:		Otro:	X
		Cuál?			
		CANTIDAD (Ton.)			

Responsable MOLINOS JN

FORMATO TIQUETE DE INGRESO

17

Pin obra: 17465

3881

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD

Res. No. 0472 de 2017 y Res. 1257 de 2021 MADS - Gestor Registro No. 57

VEREDA PANAMÁ LOTE EL JORDÁN - CEL. 305 877 7561 - 317 422 3215

E-mail: molinosjn@gmail.com

MOLINOS J N

Lugar de orígen: TUNJUELITO

Fecha de ingreso: 19 JUNIO 2026

ORDEN No. 2236

Nombre del generador: CONSTRUCCIONES SIGLO XXI

Placa: SQA801

TIPO DE VIAJE		MATERIAL			
DOBLE	SENCILLO	Concreto:		Escombro:	
X		Asfalto:		Cantos:	
		Hormigón:		Cimentación:	
		Ladrillo: - Bloque:		Otro:	X
		Cuál? EXCAVACION			
		CANTIDAD (Ton.)			

Responsable MOLINOS JN

FORMATO TIQUETE DE INGRESO

18

Pin obra: 17465

3882

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD

Res. No. 0472 de 2017 y Res. 1257 de 2021 MADS - Gestor Registro No. 57

VEREDA PANAMÁ LOTE EL JORDÁN - CEL. 305 877 7561 - 317 422 3215

E-mail: molinosjn@gmail.com

MOLINOS J N

Lugar de orígen: TUNJUELITO

Fecha de ingreso: 19 JUNIO 2026

ORDEN No. 2237

Nombre del generador: CONSTRUCCIONES SIGLO XXI

Placa: SQA801

TIPO DE VIAJE		MATERIAL			
DOBLE	SENCILLO	Concreto:		Escombro:	
X		Asfalto:		Cantos:	
		Hormigón:		Cimentación:	
		Ladrillo: - Bloque:		Otro:	X
		Cuál? EXCAVACIÓN			
		CANTIDAD (Ton.)			

Responsable MOLINOS JN

FORMATO TIQUETE DE INGRESO

19

Pin obra: 17465

3883

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD

Res. No. 0472 de 2017 y Res. 1257 de 2021 MADS - Gestor Registro No. 57

VEREDA PANAMÁ LOTE EL JORDÁN - CEL. 305 877 7561 - 317 422 3215

E-mail: molinosjn@gmail.com

MOLINOS J N

Lugar de orígen: TUNJUELITO

Fecha de ingreso: 20 JUNIO 2026

ORDEN No. 2238

Nombre del generador: CONSTRUCCIONES SIGLO XXI

Placa: SQA801

TIPO DE VIAJE		MATERIAL			
DOBLE	SENCILLO	Concreto:		Escombro:	
X		Asfalto:		Cantos:	
		Hormigón:		Cimentación:	
		Ladrillo: - Bloque:		Otro:	X
		Cuál? EXCAVACIÓN			
		CANTIDAD (Ton.)			

Responsable MOLINOS JN

FORMATO TIQUETE DE INGRESO

20

3884

Pin Amb = 17465

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD

Res. No. 0472 de 2017 y Res. 1257 de 2021 MADS - Gestor Registro No. 57

VEREDA PANAMÁ LOTE EL JORDÁN - CEL. 305 877 7561 - 317 422 3215

E-mail: molinosjn@gmail.com

MOLINOS J N

Lugar de origen: TUNJUELITO — ORDEN No. 2239

Fecha de ingreso: 20 JUNIO 2026

Nombre del generador: CONSTRUCCIONES SIGLO XXI

Placa: SQA801

TIPO DE VIAJE		MATERIAL			
DOBLE	SENCILLO	Concreto:		Escombro:	
X15MTS		Asfalto:		Cantos:	
		Hormigón:		Cimentación:	
		Ladrillo: - Bloque:		Otro:	X

Cuál? EXCAVACION

CANTIDAD (Ton.)

21 JUN 2026

Responsable MOLINOS JN

FORMATO TIQUETE DE INGRESO

21

Pin Amb = 17465

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD

Res. No. 0472 de 2017 y Res. 1257 de 2021 MADS - Gestor Registro No. 57

VEREDA PANAMÁ LOTE EL JORDÁN - CEL. 305 877 7561 - 317 422 3215

E-mail: molinosjn@gmail.com

MOLINOS J N

Lugar de origen: TUNJUELITO — ORDEN No. 2240

Fecha de ingreso: 22 JUNIO 2026

Nombre del generador: CONSTRUCCIONES SIGLO XXI

Placa: SQA801

TIPO DE VIAJE		MATERIAL			
DOBLE	SENCILLO	Concreto:		Escombro:	
X15MTS		Asfalto:		Cantos:	
		Hormigón:		Cimentación:	
		Ladrillo: - Bloque:		Otro:	X

Cuál? EXCAVACION

CANTIDAD (Ton.)

22 JUN 2026

Responsable MOLINOS JN

FORMATO TIQUETE DE INGRESO

22

3886

Pin Amb = 17465

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD

Res. No. 0472 de 2017 y Res. 1257 de 2021 MADS - Gestor Registro No. 57

VEREDA PANAMÁ LOTE EL JORDÁN - CEL. 305 877 7561 - 317 422 3215

E-mail: molinosjn@gmail.com

MOLINOS J N

Lugar de origen: TUNJUELITO — ORDEN No. 2241

Fecha de ingreso: 22 JUNIO 2026

Nombre del generador: CONSTRUCCIONES SIGLO XXI

Placa: SQA801

TIPO DE VIAJE		MATERIAL			
DOBLE	SENCILLO	Concreto:		Escombro:	
X15MTS		Asfalto:		Cantos:	
		Hormigón:		Cimentación:	
		Ladrillo: - Bloque:		Otro:	X

Cuál? EXCAVACIÓN

CANTIDAD (Ton.)

22 JUN 2026

Responsable MOLINOS JN

FORMATO TIQUETE DE INGRESO

23

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD

Res. No. 0472 de 2017 y Res. 1257 de 2021 MADS - Gestor Registro No. 57

VEREDA PANAMÁ LOTE EL JORDÁN - CEL. 305 877 7561 - 317 422 3215

E-mail: molinosjn@gmail.com

MOLINOS J N

Lugar de origen: TUNJUELITO — ORDEN No. 1994

Fecha de ingreso: 16 JUNIO 2026

Nombre del generador: SIGLO XXI

Placa: SQA801

TIPO DE VIAJE		MATERIAL			
DOBLE	SENCILLO	Concreto:		Escombro:	
X15MTS		Asfalto:		Cantos:	X
		Hormigón:		Cimentación:	
		Ladrillo: - Bloque:		Otro:	

Cuál?

CANTIDAD (Ton.)

17 JUN 2026

Responsable MOLINOS JN

FORMATO TIQUETE DE INGRESO

24

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD

Res. No. 0472 de 2017 y Res. 1257 de 2021 MADS - Gestor Registro No. 57

VEREDA PANAMÁ LOTE EL JORDÁN - CEL. 305 877 7561 - 317 422 3215

E-mail: molinosjn@gmail.com

MOLINOS J N

Lugar de orígen: TUNJUELITO — ORDEN No. 1995

Fecha de ingreso: 16 JUNIO 2026

Nombre del generador: SIGLO XXI

Placa: SQA801

TIPO DE VIAJE		MATERIAL			
DOBLE	SENCILLO	Concreto:		Escombro:	
X15415		Asfalto:	X	Cantos:	
		Hormigón:		Cimentación:	
		Ladrillo: - Bloque:		Otro:	
		Cuál?			
		CANTIDAD (Ton.)			

16 JUN 2026

Responsable MOLINOS JN

FORMATO TIQUETE DE INGRESO

25

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD

Res. No. 0472 de 2017 y Res. 1257 de 2021 MADS - Gestor Registro No. 57

VEREDA PANAMÁ LOTE EL JORDÁN - CEL. 305 877 7561 - 317 422 3215

E-mail: molinosjn@gmail.com

MOLINOS J N

Lugar de orígen: TUNJUELITO — ORDEN No. 1996

Fecha de ingreso: 16 JUNIO 2026

Nombre del generador: SIGLO XXI

Placa: SQA801

TIPO DE VIAJE		MATERIAL			
DOBLE	SENCILLO	Concreto:		Escombro:	
X15415		Asfalto:	X	Cantos:	
		Hormigón:		Cimentación:	
		Ladrillo: - Bloque:		Otro:	
		Cuál?			
		CANTIDAD (Ton.)			

16 JUN 2026

Responsable MOLINOS JN

FORMATO TIQUETE DE INGRESO

26

Pin AMB = 17465

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD

Res. No. 0472 de 2017 y Res. 1257 de 2021 MADS - Gestor Registro No. 57

VEREDA PANAMÁ LOTE EL JORDÁN - CEL. 305 877 7561 - 317 422 3215

E-mail: molinosjn@gmail.com

MOLINOS J N

Lugar de orígen: TUNJUELITO — ORDEN No. 1877

Fecha de ingreso: 24 JUNIO 2026

Nombre del generador: CONSTRUCCIONES SIGLO XXI

Placa: AFE182

TIPO DE VIAJE		MATERIAL			
DOBLE	SENCILLO	Concreto:		Escombro:	
X15415		Asfalto:		Cantos:	
		Hormigón:		Cimentación:	
		Ladrillo: - Bloque:		Otro:	X
		Cuál?	Excavación		
		CANTIDAD (Ton.)			

24 JUN 2026

Responsable MOLINOS JN

FORMATO TIQUETE DE INGRESO

27

Pin AMB = 17465

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD

Res. No. 0472 de 2017 y Res. 1257 de 2021 MADS - Gestor Registro No. 57

VEREDA PANAMÁ LOTE EL JORDÁN - CEL. 305 877 7561 - 317 422 3215

E-mail: molinosjn@gmail.com

MOLINOS J N

Lugar de orígen: TUNJUELITO — ORDEN No. 1881

Fecha de ingreso: 24 JUNIO 2026

Nombre del generador: CONSTRUCCIONES SIGLO XXI

Placa: SQA801

TIPO DE VIAJE		MATERIAL			
DOBLE	SENCILLO	Concreto:		Escombro:	
X15415		Asfalto:		Cantos:	
		Hormigón:		Cimentación:	
		Ladrillo: - Bloque:		Otro:	X
		Cuál?	Excavación		
		CANTIDAD (Ton.)			

24 JUN 2026

Responsable MOLINOS JN

FORMATO TIQUETE DE INGRESO

28

Pin sub: 17405

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD

Res. No. 0472 de 2017 y Res. 1257 de 2021 MADS - Gestor Registro No. 57

VEREDA PANAMÁ LOTE EL JORDÁN - CEL. 305 877 7561 - 317 422 3215

E-mail: molinosjn@gmail.com

MOLINOS J N

Lugar de orígen: Tunjuelito	ORDEN No. 1885
Fecha de ingreso: 24 - Junio - 2026	
Nombre del generador: Construcciones y Transportes Siglo XXI	
Placa: AFE 182	

TIPO DE VIAJE		MATERIAL			
DOBLE	*SENCILLO*	*Concreto:*		*Escombro:*	
	X 7mts	*Asfalto:*		*Cantos:*	
		Hormigón:		*Cimentación:*	
		Ladrillo: - Bloque:		*Otro:*	X

Cuál? Excavacion

CANTIDAD (Ton.) 12.06

MOLINOS J N

24 JUN 2026

Responsable MOLINOS JN

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RCD

FORMATO TIQUETE DE INGRESO

29

SECAM J.R. S.A.S.
NIT. 830.507.163-0

RECIBIDO

Transformamos Sostenible

VALE No. 11378
NIT: 830.507.163-0
atribuidor de Materiales para Construcción
GESTOR RCD'S REGISTRO CAR 001
ANTA APROVECHAMIENTO SECAM UVA
Resolución 0472 de 2017
Celular: 3015981851

Fecha: 12/06/2026 13:09 Vale No.: 11378

Datos del Cliente

Cliente: ARK INGENIERIA SAS
Placa: UVM655
Origen: VENECIA
Conductor: MARCOS MERCHAN

Información de Despacho

Material: MIXTOS
Cantidad m³: 15.00
Peso Entrada: 0
Peso Salida: 0
Neto: 0
Destino: DISPOSICIÓN
Observaciones:

Firma y Autorización

Firma Autorizado

SECAM J.R.
NIT. 830.507.163-0
RECIBIDO

VALE No. 24110
NIT: 830.507.163-0
Distribuidor de Materiales para Construcción
GESTOR RCD'S REGISTRO CAR 038
PLANTA APROVECHAMIENTO SECAM
SOACHA
Resolución 0472 de 2017
Celular: 3015981851

Fecha: 10/06/2026 15:37 Vale No.: 24110

Datos del Cliente

Cliente: CONSTRUCCIONES CIVILES BURGOS SAS
Placa: UVM-655
Origen: TUNJUELITO
Conductor: MARCOS MERCHAN

Información de Despacho

Material: RECEBO
Cantidad m³: 15.00
Peso Entrada: 0
Peso Salida: 0
Neto: 0
Clase: DISPOSICIÓN
Observaciones:

Firma y Autorización

ANEXO 3

NO SE REPORTO NINGUNA NOVEDAD PARA EL PERIODO EVALUADO

ANEXO 4

COI No. 23
JUNIO 04 DE 2026
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No.	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		CONTRATISTA	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	ING. RESPONSABLE	No RADICADO SDM
	INICIO	FIN	INICIO	FIN		INICIO	FIN								
17605	N/A	N/A	CUADRANTE: CL 77 15.1m AL NORTE ENTRE 20.7m AL OCCIDENTE Y 13.5m AL ORIENTE DE LA KR 112	N/A	CONSORCIO CCA CALLES COMERCIALES	5-jun-26	30-jul-26	24 HORAS	24 HORAS	IDU-2404-2024	NOTAS: 1. EXTREMAR MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LAS MANIOBRAS, SALVAGUARDANDO SIEMPRE LA INTEGRIDAD DE LOS USUARIOS DE LA VIA. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO (BAHIA Y ZONA DURA) PARA ACOPIO DE MATERIAL. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO LA INTERVENCION EN CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON POLISOMBRA. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ENTRADA Y SALIDA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR DE LA ZONA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA DEL LUGAR DE INTERVENCION, NI FILAS A LA ESPERA DE INGRESAR. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDEN O CALZADA COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.	SI	ENGATIVA	JHON J. FLOREZ B.	20266120169980 2
17606	10000827	N/A	CL 77BIS KR 112A	CL 77BIS KR 112B	CONSORCIO CCA CALLES COMERCIALES	5-jun-26	30-jul-26	24 HORAS	24 HORAS	IDU-2404-2024	NOTA: SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO COMODO Y SEGURO A LAS VIVIENDAS, MEDIANTE PLAFONES DE MADERA DE ANCHO MINIMO DE 1,2m COMODOS Y SEGUROS. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE CALZADA PEATONAL Y ZONA VERDE EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS (ETAPA 1: ZONA VERDE 2: SENDEROS ADYACENTES AL PARAMENTO) PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,2m EN LA ETAPA 1 Y DE 1,5m EN LA ETEPA 2. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA PEATONAL O INTERVENCION EN LA INTERSECCION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR ACCESO PEATONAL EN CONDICIONES SEGURAS A RESIDENTES Y ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.	SI	ENGATIVA	JHON J. FLOREZ B.	20266120166275 2
17607	6001013	N/A	CL 48C SUR KR 26	CL 48C SUR KR 27	CONSORCIO COCO	12-jun-26	13-ago-26	07:00-17:00	24 HORAS	FDLTU-613-2025	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y POSICIONAMIENTO DE VEHICULO DE OBRA EN EL INTERIOR DEL CERRAMIENTO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN LOS ANDENES ADYACENTES AL CIERRE DE OBRA.DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA CON POLISOMBRA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA DE MINIMO 1.2m.). EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. EN LAS VIAS QUE HACEN PARTE DE LA RUTA DE DESVIO EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD VIAL A LOS DIFERENTES ACTORES VIALES.	SI	TUNJUELITO	FERNEL E. BONZA R.	20266120180228 2

COI No. 23
JUNIO 04 DE 2026
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No.	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		CONTRATISTA	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	ING. RESPONSABLE	No RADICADO SDM
	INICIO	FIN	INICIO	FIN		INICIO	FIN								
17608	6000372	N/A	CL 50A SUR KR 38	CL 50A SUR TV 44	CONSORCIO COCO	12-jun-26	13-ago-26	07:00-17:00	24 HORAS	FDLTU-613-2025	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y POSICIONAMIENTO DE VEHICULO DE OBRA EN EL INTERIOR DEL CERRAMIENTO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN LOS ANDENES ADYACENTES AL CIERRE DE OBRA.DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA CON POLISOMBRA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA DE MINIMO 1.2m. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. EN LAS VIAS QUE HACEN PARTE DE LA RUTA DE DESVIO EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD VIAL A LOS DIFERENTES ACTORES VIALES.	SI	TUNJUELITO	FERNEL E. BONZA R.	20266120180247 2

COI No. 24
JUNIO 11 DE 2026
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No.	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		CONTRATISTA	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	ING. RESPONSABLE	No RADICADO SDM
	INICIO	FIN	INICIO	FIN		INICIO	FIN								
18015	N/A	N/A	CUADRANTE: 94m Y 74m AL SUR DE LA CL 93 ENTRE AV BOYACA (AK 72) Y 66m AL OCCIDENTE	N/A	CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA	12-jun-26	29-oct-26	24 HORAS	24 HORAS	IDU-1776-2023	NOTAS: 1. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DEL ESPACIO PUBLICO DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE, ANTES DE REALIZAR LA IMPLEMENTACION. 3. DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR TRANSMILENIO S.A. 4. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRANTE RETROALIMENTAR A LA COMUNIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO SOBRE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR. 5. DEBE CUMPLIR A CABALIDAD CON LAS RECOMENDACIONES Y REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION DE LA SDM PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE LA INTERSECCION SEMAFORIZADA. 6. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO DE CIRCULACION LIBRE PEATONAL DE MINIMO 1.50m Y 2.50m RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS DE SEÑALIZACION. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL ACCESO OCCIDENTAL DEL CICLOPUENTE DE LA CL 86A POR AV BOYACA Y CIERRE TOTAL DE ESPACIO PUBLICO (ALAMEDA) PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE NUEVA ESTRUCTURA DEL CICLOPUENTE AV BOYACA POR CANAL SALITRE, CON DESVIO DE MODOS NO MOTORIZADOS POR LA INTERSECCION SEMAFORIZADA PROVISIONAL (PEATON Y CICLISTA). ASEGURAR EL DESVIO DEL PEATON POR LA CL 81B Y LA RUTA ALTERNA DE DESVIO PARA EL CICLISTA POR LA KR 69T, AC 80, CICLOPUENTE AC 80 POR AV BOYACA Y KR 72B. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZAN CIERRES SOBRE LA AV BOYACA (AK 72). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DEL PROYECTO. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS SOBRE VIA NI FORMACION DE COLAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. LA OBRA DEBE PERMANER EN TODO MOMENTO AISLADA Y SEÑALIZADA. SE DEBEN IMPLEMENTAR TODOS LOS PENDONES Y SEÑALIZACION VERTICAL INFORMATIVA, PROPUESTOS. LA CICLOINFRAESTRUCTURA TEMPORAL DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL VIGENTE Y EL PROTOCOLO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO POR OBRA Y OTROS.	SI	CORREDOR	MAIKOL Y. GAMBA A.	20266120211298220266120211281 2
18016	6000857	N/A	CL 53A SUR KR 33A	CL 53A SUR KR 34	CONSORCIO COCO	12-jun-26	13-ago-26	07:00-17:00	24 HORAS	FDLTU-613-2025	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y POSICIONAMIENTO DE VEHICULO DE OBRA EN EL INTERIOR DEL CERRAMIENTO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN LOS ANDENES ADYACENTES AL CIERRE DE OBRA.DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA CON POLISOMBRA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA DE MINIMO 1.2m.. PARA EL BICICARRIL PROVISIONAL DEBE AISLAR AL CICLISTA DE VEHICULOS CON BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) ENTRALAZADOS E IMPLEMENTAR PERSONAL AUXILIAR DE TRANSITO EN CADA ENTRECRUZAMIENTO DE CICLISTAS (INTERSECCIONES). EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. EN LAS VIAS QUE HACEN PARTE DE LA RUTA DE DESVIO EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD VIAL A LOS DIFERENTES ACTORES VIALES.	SI	TUNJUELITO	FERNEL E. BONZA R.	20266120180270 2

COI No. 24
JUNIO 11 DE 2026
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No.	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		CONTRATISTA	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	ING. RESPONSABLE	No RADICADO SDM
	INICIO	FIN	INICIO	FIN		INICIO	FIN								
18217	6000830	N/A	KR 34 CL 54 SUR	KR 34 CL 54A SUR	CONSORCIO COCO	12-jun-26	13-ago-26	07:00-17:00	24 HORAS	FDLTU-613-2025	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y POSICIONAMIENTO DE VEHICULO DE OBRA EN EL INTERIOR DEL CERRAMIENTO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN LOS ANDENES ADYACENTES AL CIERRE DE OBRA.DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA CON POLISOMBRA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA DE MINIMO 1.2m.. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. EN LAS VIAS QUE HACEN PARTE DE LA RUTA DE DESVIO EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD VIAL A LOS DIFERENTES ACTORES VIALES.	SI	TUNJUELITO	FERNEL E. BONZA R.	20266120180270 2
18218	6000870	N/A	CL 53B SUR KR 33A	CL 53B SUR KR 34	CONSORCIO COCO	12-jun-26	13-ago-26	07:00-17:00	24 HORAS	FDLTU-613-2025	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y POSICIONAMIENTO DE VEHICULO DE OBRA EN EL INTERIOR DEL CERRAMIENTO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN LOS ANDENES ADYACENTES AL CIERRE DE OBRA.DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA CON POLISOMBRA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA DE MINIMO 1.2m.. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. EN LAS VIAS QUE HACEN PARTE DE LA RUTA DE DESVIO EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD VIAL A LOS DIFERENTES ACTORES VIALES.	SI	TUNJUELITO	FERNEL E. BONZA R.	20266120180270 2

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI) y otros	
CÓDIGO: PM02-PR01-F04	VERSIÓN: 3.0

COI No. 24
JUNIO 11 DE 2026
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No.	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		CONTRATISTA	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	ING. RESPONSABLE	No RADICADO SDM
	INICIO	FIN	INICIO	FIN		INICIO	FIN								
18219	6000786	N/A	KR 34 CL 52B SUR	KR 34 CL 52G SUR	CONSORCIO COCO	12-jun-26	13-ago-26	07:00-17:00	24 HORAS	FDLTU-613-2025	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2. NO SE AUTORIZA INTERVENCION ALGUNA SOBRE EL BICARRIL. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y POSICIONAMIENTO DE VEHICULO DE OBRA EN EL INTERIOR DEL CERRAMIENTO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN LOS ANDENES ADYACENTES AL CIERRE DE OBRA.DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA CON POLISOMBRA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA DE MINIMO 1.2m.. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. EN LAS VIAS QUE HACEN PARTE DE LA RUTA DE DESVIO EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD VIAL A LOS DIFERENTES ACTORES VIALES.	SI	TUNJUELITO	FERNEL E. BONZA R.	20266120180270 2

COI No. 28
JULIO 09 DE 2026
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No.	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		CONTRATISTA	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	ING. RESPONSABLE	No RADICADO SDM
	INICIO	FIN	INICIO	FIN		INICIO	FIN								
20737	6000557	N/A	CL 50A SUR KR 36	CL 50A SUR KR 37	CONSORCIO COCO	10-jul-26	29-oct-26	07:00-17:00	24 HORAS	FDLTU-613-2025	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2,ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 03-JUL-26 Y 09-JUL-26. INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE). LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y POSICIONAMIENTO DE VEHICULO DE OBRA EN EL INTERIOR DEL CERRAMIENTO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN LOS ANDENES ADYACENTES AL CIERRE DE OBRA.DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA CON POLISOMBRA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA DE MINIMO 1.2m. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. EN LAS VIAS QUE HACEN PARTE DE LA RUTA DE DESVIO EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD VIAL A LOS DIFERENTES ACTORES VIALES.	SI	TUNJUELITO	FERNEL E. BONZA R.	202661202377502
20738	6001200	6001206	KR 25 CL 53B SUR	KR 25 CL 54A SUR	CONSORCIO COCO	10-jul-26	29-oct-26	07:00-17:00	24 HORAS	FDLTU-613-2025	NOTAS. 1. ANTES DE INICIAR OBRA DEBE CONTAR CON LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES. 2. ACATAR LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. 2,ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 03-JUL-26 Y 09-JUL-26. INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE). LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y/O RECONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA IMPLEMENTACION DE BICICARRIL (2.4m) E IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL (2.6m) Y CIERRE PARCIAL DE BAHIA COSTADO ORIENTAL PARA CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. LOS SENDEROS PEATONALES Y DE CICLISTAS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE SEÑALIZADOS Y CANALIZADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA PARA EVITAR Y BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) CON EL FIN DE SEGREGAR AL CICLISTA DE LOS VEHICULOS QUE TRANSITAN POR LA KR 25. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR CON VEHICULOS LIVIANOS DE ACUERDO CON PROPUESTA PRESENTADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. EL CERRAMIENTO Y LA SEÑALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ TERMINADA LA ACTIVIDAD DEBE HABILITAR LA TOTALIDAD EL ANDEN Y LA CICLORRUTA BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.	SI	TUNJUELITO	FERNEL E. BONZA R.	202661202377872
20739	N/A	N/A	VARIOS USAQUEN	N/A	CONSORCIO CON	-	-	-	-	FDLUSA-423-2025	LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL DE LA KR 7A ENTRE CL 182A Y CL 182 PARA ACTIVIDADES DE CONSEVACION DE ESPACIO PUBLICO Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 7A POR Cl 182A PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIO LA TOTALIDAD DE OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 24 DE MARZO DE 2026, EN LO REFERENTE A: 1. TENIENDO EN CUENTA QUE LA CARRERA 7A FUNCIONA COMO DESVIO DEL CIERRE PREVIAMENTE APROBADO PARA ESTE MISMO CONTRATISTA EN LA CARRERA 7C, NO SE APROBARA ESTE FRENTE HASTA TANTO NO SE CULMINEN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES EN DICHO FRENTE. 2. AJUSTAR LOS DATOS DEL SUPERVISOR, EN ESPECIAL EL CORREO ELECTRONICO. 3. AJUSTAR Y COMPLETAR LA DIRECCION DEL DIRECTOR DE OBRA. 4. PROPORCIONAR UNA DIRECCION FISICA EN BOGOTA PARA LA INTERVENTORIA.5. EN EL NUMERAL 4.3.6.4 SE INDICA QUE SE GARANTIZARAN 48 M DE CALZADA LIBRE. AJUSTAR ESTA INFORMACION. 6. REVISAR LO DESCRITO EN EL NUMERAL 4.3.6.6.1 Y PRESENTAR EL INVENTARIO DE SEÑALIZACION EN PLANO Y EL REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL ACTA DE COMPROMISO DE RESTITUCION DE SEÑALIZACION.7. NO SE EVIDENCIA EL ACTA DE SOCIALIZACION ESPECIFICA CON EL COLEGIO.	NO	USAQUEN	YURY Y. VALBUENA A.	202661202010352

NORMATIVIDAD
El Plan de Manejo de Tránsito debe cumplir con lo establecido en el Manual de señalización vial vigente.
La Secretaría Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Disitrito Capital, principalmente la reglamentación que rige la utilización del espaco público, la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano, el manejo de tránsito y seguridad para peatones por la ejecución de obras civiles.

A. ESPACIO PÚBLICO
Según ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre: Artículos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
Decreto 840 del 27 de diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones y restricciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones"
Decreto 077 del 04 de marzo de 2020 "Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 840 de 2019 y se dictan otras disposiciones"

NOTA
1. En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM para la verificación por parte de las autoridades competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.
2. No se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El contratista y la interventoría son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.
4. En horario nocturno y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalación de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberán aislarse y/o canalizarse mediante maletines plásticos entrelazados.
6. En caso de congestión vehicular y/o por solicitud expresa de la Policía de Tránsito, deberá levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones óptimas de tránsito y seguridad vial.
7. La señalización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
8. La longitud de transición a implementar para cierres de carril deberá cumplir las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
9. Para trabajos nocturnos, dominicales y/o festivos se debe contar con la autorización por parte de la alcaldía local de acuerdo con lo estipulado en el decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.5.1.5.15. o aquellas normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan
10. Si en el área de influencia del proyecto existen redes de semaforización, el contratista debe propender por su integridad, de igual manera durante la ejecución de obras el contratista es responsable de la custodia de redes y elementos de mobiliario semafórico, y de incidentes que se deriven por daños a los controles semafóricos.
11. Previo a la intervención se debe socializar las actividades, el PMT y demás restricciones con la comunidad directamente afectada, y es responsabilidad de la interventoría y la entidad contratante verificar el cumplimiento de esta condición.

Arq. Juan Camilo Rodríguez Cárdenas
Director de Ingeniería de Tránsito

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
Los PMT señalados con * no fueron revisados y autorizados por la Subdirectora
