INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE JULIO 2026
-AGOSTO DE 2026

UNION TEMPORAL SAN DIEGO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

CONTRATO DE OBRA No. 1381 DE 2025


Realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el Sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones físicas, las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRANSMILENIO S.A.

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE JULIO 2026
-AGOSTO DE 2026

Imagen 1.UBICACION FRENTES DE OBRA Lote 2

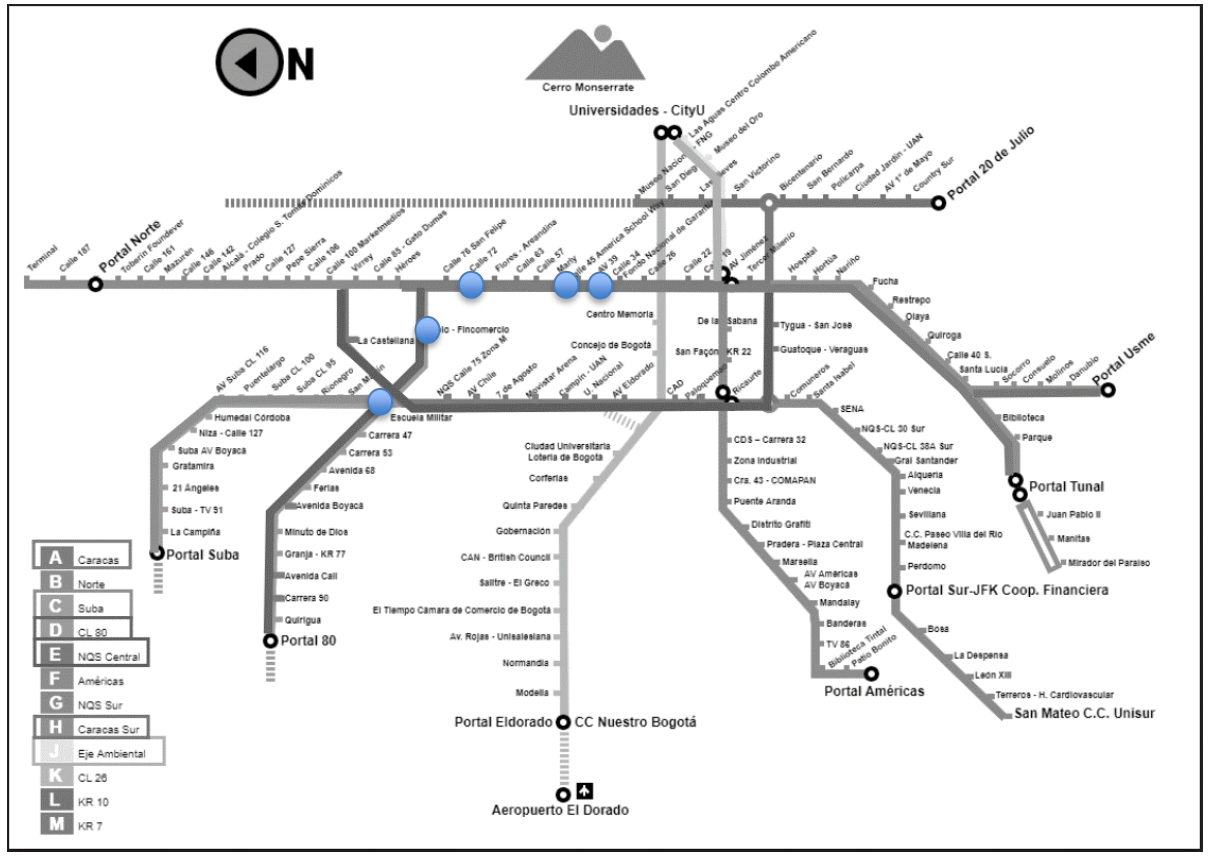

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE JULIO 2026 -AGOSTO DE 2026

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Julio de 2026 al 20 de Agosto del 2026.

MET-02	**1381-L2-064**	**CARACAS - A**	**ESTACION AV.39**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES	**100%**

CANTIDAD		
Cantidad teórica	**Cantidad ejecutada**	**% avance**
207,80	207,80	100%

ANTES



DURANTE



DESPUES



Se realiza la instalación de los realces de la pasarela en las zonas de transición norte y sur de la estación, previa ejecución del aislamiento y preparación del área de trabajo. Los elementos son instalados de acuerdo con las modulaciones establecidas en los diseños aprobados.

De igual manera, se realiza la instalación de las celosías conformadas en tubería, garantizando la separación y la inclinación definidas en los diseños, así como su correcta ubicación y disposición de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto.

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE JULIO 2026 -AGOSTO DE 2026

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Julio de 2026 al 20 de Agosto del 2026.

MET-11	1381-L2-065	CARACAS - A	ESTACION AV. 39	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA PARA FACHADADE VAGONES ETAPA 2	100%

CANTIDAD		
Cantidad teórica	Cantidad ejecutada	% avance
712,28	712,28	100%

ANTES



DURANTE



DESPUES



En la estación se ejecuta el suministro e instalación de las celosías de fachada, de conformidad con las modulaciones, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en los diseños aprobados.

Como sistema de protección y acabado, los elementos contemplan la aplicación de imprimante de zinc y posterior acabado en pintura de uretano, garantizando la protección de la estructura y la calidad del acabado final.

La separación, alineación y disposición de las celosías se realizan de acuerdo con los planos y diseños suministrados para la ejecución de la actividad, asegurando su correcta instalación y correspondencia con los requerimientos del proyecto.

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1


MES DE JULIO 2026 -AGOSTO DE 2026

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Julio de 2026 al 20 de Agosto del 2026.

SEÑ 01	1381-L2-66	CARACAS - A	ESTACION CALLE 72	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLAS PARA SEÑALETICA E INFORMACION AL USUARIO	100 %

CANTIDAD		
Cantidad teórica	Cantidad ejecutada	% avance
84,08	84,08	100 %

ANTES

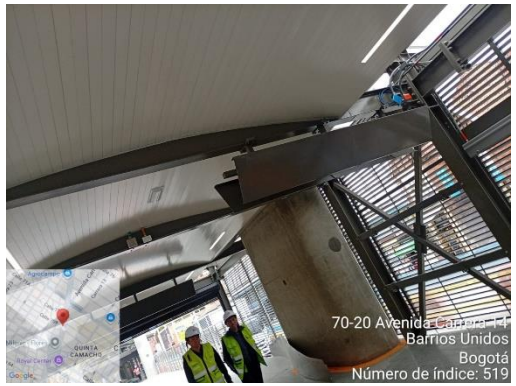

DURANTE



DESPUES



Se realiza la instalación de las señales correspondientes a la referencia SEÑ-01, mediante el uso de cinta adhesiva acrílica de doble faz y tornillería, garantizando su adecuada fijación y estabilidad.

La actividad se ejecuta de acuerdo con los esquemas y lineamientos establecidos en la cartilla de señalización suministrada por la interventoría, verificando la correcta ubicación, nivelación y disposición de cada elemento conforme a los diseños y especificaciones del proyecto.

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE JULIO 2026 -AGOSTO DE 2026

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Julio de 2026 al 20 de Agosto del 2026.

SEÑ 03	1381-L2-67	CARACAS - A	ESTACION CALLE 72	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLAS PARA SEÑALETICA E INFORMACION AL USUARIO EN VINILO FOTOLUMINISCENTE	100 %

CANTIDAD		
Cantidad teórica	Cantidad ejecutada	% avance
7,62	7,62	100%

ANTES



DURANTE



DESPUES



Se ejecuta la instalación de los avisos fotoluminiscentes en la estación, de acuerdo con las ubicaciones, dimensiones y especificaciones definidas en los diagramas y diseños suministrados por la interventoría.

Los avisos, elaborados en lámina de ACM (aluminio compuesto), son instalados garantizando su correcta fijación, estabilidad y disposición dentro de las áreas establecidas. La actividad se desarrolla en cumplimiento de los lineamientos y criterios de señalización establecidos por TransMilenio.

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE JULIO 2026 -AGOSTO DE 2026

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Julio de 2026 al 20 de Agosto del 2026.

MET-04	1381-L2-072	CARACAS - A	MARLY	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE VAGONES EN ESTACIONES	100%

CANTIDAD		
Cantidad teórica	Cantidad ejecutada	% avance
14,43	14,43	100%

ANTES



DURANTE



DESPUES



En la estación se realiza la instalación de puertas abatibles conformadas por cuatro hojas en celosía, distribuidas en dos hojas con apertura hacia el costado izquierdo y dos hacia el costado derecho.

Cada hoja cuenta con sus respectivas bisagras y pasadores, garantizando la correcta operación, fijación y estabilidad del sistema, de acuerdo con las dimensiones, modulación y especificaciones establecidas en los diseños del proyecto.

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE JULIO 2026 -AGOSTO DE 2026

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Julio de 2026 al 20 de Agosto del 2026.

MET-11	1381-L2-073	CARACAS - A	MARLY	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA PARA FACHADADE VAGONES ETAPA 2	100%

CANTIDAD		
Cantidad teórica	Cantidad ejecutada	% avance
4,27	4,27	100%

ANTES	DURANTE	DESPUES







En la estación se realiza la instalación de las celosías superiores de fachada, completando el sistema de cerramiento y proporcionando el soporte requerido para la correcta instalación y funcionamiento de la puerta.

Los elementos se instalan de acuerdo con las dimensiones, modulación y especificaciones definidas en los diseños del proyecto, garantizando su adecuada integración y estabilidad dentro del sistema de cerramiento.

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE JULIO 2026 -AGOSTO DE 2026

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Julio de 2026 al 20 de Agosto del 2026.

MET-04	1381-L2-074	CARACAS - A	ESTACION CALLE 72	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE VAGONES EN ESTACIONES	100%

CANTIDAD		
Cantidad teórica	Cantidad ejecutada	% avance
14,45	14,45	100%

ANTES



DURANTE



DESPUES



En la estación se realiza la instalación de puertas abatibles conformadas por cuatro hojas en celosía, distribuidas en dos hojas con apertura hacia el costado izquierdo y dos hacia el costado derecho.

Cada hoja cuenta con sus respectivas bisagras y pasadores, garantizando la correcta operación, fijación y estabilidad del sistema, de acuerdo con las dimensiones, modulación y especificaciones establecidas en los diseños del proyecto.

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1


MES DE JULIO 2026 -AGOSTO DE 2026

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Julio de 2026 al 20 de Agosto del 2026.

MET-11	1381-L2-075	NQS CENTRAL -E	ESTACION CALLE 72	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA PARA FACHADADE VAGONES ETAPA 2	100%

CANTIDAD		
Cantidad teórica	Cantidad ejecutada	% avance
4,08	4,08	100%


ANTES

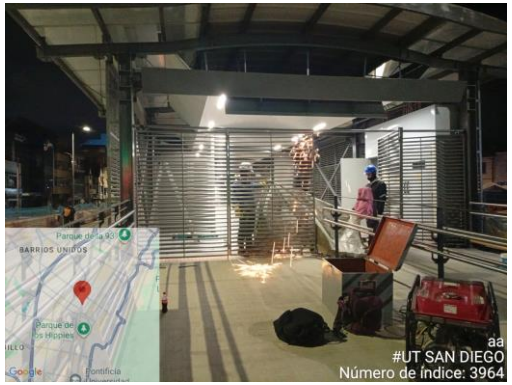

DURANTE



DESPUES

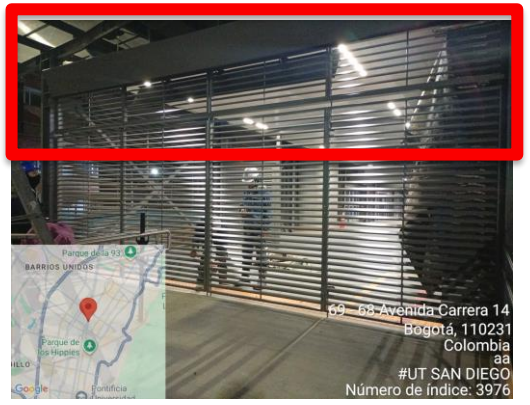

En la estación se realiza la instalación de las celosías superiores de fachada, completando el sistema de cerramiento y proporcionando el soporte requerido para la correcta instalación y funcionamiento de la puerta.

Los elementos se instalan de acuerdo con las dimensiones, modulación y especificaciones definidas en los diseños del proyecto, garantizando su adecuada integración y estabilidad dentro del sistema de cerramiento

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1


MES DE JULIO 2026 -AGOSTO DE 2026

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Julio de 2026 al 20 de Agosto del 2026.


OBC - 02	1381-L2-76	CALLE 80 - D	ESCUELA MILITAR	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES	EN EJECUCION

CANTIDAD		
Cantidad teórica	Cantidad ejecutada	% avance
		5 %

ANTES

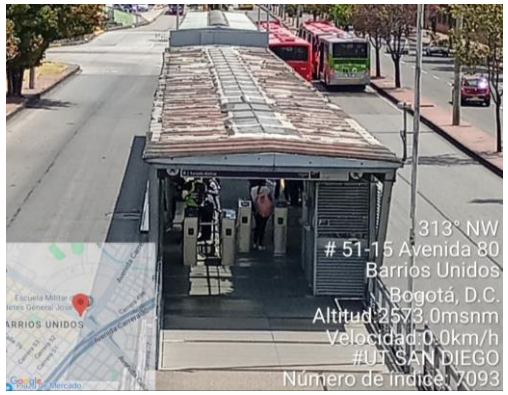

EN EJECUCION

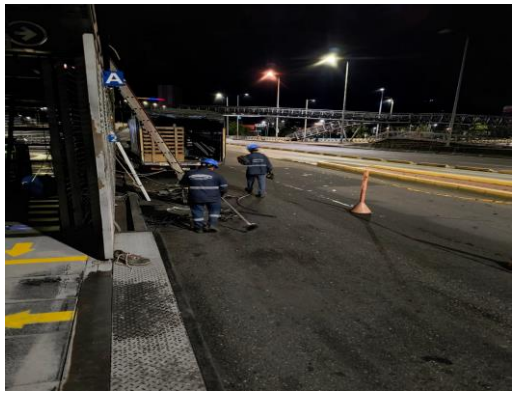

Se realiza el desmonte de la cubierta en un sector de la cubierta. Se detienen los trabajos en espera de autorización por parte de la Escuela Militar.

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE JULIO 2026 -AGOSTO DE 2026

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Julio de 2026 al 20 de Agosto del 2026.


OBC - 02	1381-L2-77	CALLE 80 - D	ESTACION POLO	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES	100 %

CANTIDAD		
Cantidad teórica	Cantidad ejecutada	% avance
802,79	802,79	100 %

ANTES



DURANTE

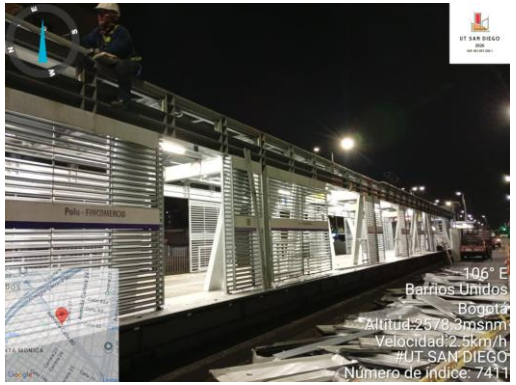

DESPUES



Se realiza el desmonte de la cubierta existente en la estación, incluyendo el retiro del lucernario ubicado en el área de intervención. Posteriormente, se ejecuta el cambio e instalación de una nueva cubierta en lámina de Aluzinc, configurada a dos aguas, de acuerdo con las especificaciones técnicas y diseños establecidos para el proyecto.

Adicionalmente, se realiza la instalación de caballete, tapas de panel y remates laterales, garantizando el adecuado cierre, protección y acabado de la nueva cubierta.

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE JULIO 2026 -AGOSTO DE 2026

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Julio de 2026 al 20 de Agosto del 2026.

MET-11	1381-L2-078	CARACAS - A	ESTACION AV. 39	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA PARA FACHADADE VAGONES ETAPA 2	100%

CANTIDAD		
Cantidad teórica	Cantidad ejecutada	% avance
4,30	4,30	100%

ANTES	DURANTE	DESPUES







En la estación se realiza la instalación de las celosías superiores de fachada, completando el sistema de cerramiento y proporcionando el soporte requerido para la correcta instalación y funcionamiento de la puerta.

Los elementos se instalan de acuerdo con las dimensiones, modulación y especificaciones definidas en los diseños del proyecto, garantizando su adecuada integración y estabilidad dentro del sistema de cerramiento

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE JULIO 2026 -AGOSTO DE 2026

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Julio de 2026 al 20 de Agosto del 2026.

MET-04	1381-L2-079	CARACAS – A	ESTACION AV. 39	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE VAGONES EN ESTACIONES	100%

CANTIDAD		
Cantidad teórica	Cantidad ejecutada	% avance
14,75	14,75	100%

ANTES	DURANTE	DESPUES







En la estación se realiza la instalación de puertas abatibles conformadas por cuatro hojas en celosía, distribuidas en dos hojas con apertura hacia el costado izquierdo y dos hacia el costado derecho.

Cada hoja cuenta con sus respectivas bisagras y pasadores, garantizando la correcta operación, fijación y estabilidad del sistema, de acuerdo con las dimensiones, modulación y especificaciones establecidas en los diseños del proyecto.

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE JULIO 2026 -AGOSTO DE 2026

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Julio de 2026 al 20 de Agosto del 2026.

MET-02	**1381-L2-080**	**CARACAS - A**	**ESTACION CALLE 19**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES	**EN EJECUCION**

CANTIDAD		
Cantidad teórica	**Cantidad ejecutada**	**% avance**
		5%

ANTES



EN EJECUCION



Se realiza la medición y se inicia proceso de compra de elementos a emplear en el realce.

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE JULIO 2026 -AGOSTO DE 2026

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Julio de 2026 al 20 de Agosto del 2026.

MET-11	1381-L2-081	NQS CENTRAL -E	ESTACION CALLE 19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA PARA FACHADADE VAGONES ETAPA 2	EN EJECUCION

CANTIDAD		
Cantidad teórica	Cantidad ejecutada	% avance
		5%

ANTES



EN EJECUCION



Se realizan las mediciones para la construcción de las celosías de fachada y se inicia proceso de compra de materiales de la Estación

INFORME EJECUTIVO

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Julio de 2026 al 20 de Agosto del 2026.

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE JULIO 2026
-AGOSTO DE 2026

COMPONENTE DE CALIDAD









FICHA TECNICA CUBIERTA OBC-02

Se realiza revisión de los materiales suministrados aprobadas para la instalación de la cubierta cumpliendo con las especificaciones técnicas

TRABAJOS CONSTRUCCION EN TALLER MET- 11 MET-02 MET-04

Se realiza revisión de la fabricación de las celosías para los MET-02,MET-11 Y MET-04 las cuales se encuentran de acuerdo con la ficha de trabajo.

INFORME EJECUTIVO

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Julio de 2026 al 20 de Agosto del 2026.

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE JULIO 2026
-AGOSTO DE 2026


COMPONENTE DE CALIDAD



ENVASES CON SUS RESPECTIVAS ETIQUETAS



CONTROL DE ESCUADRAS

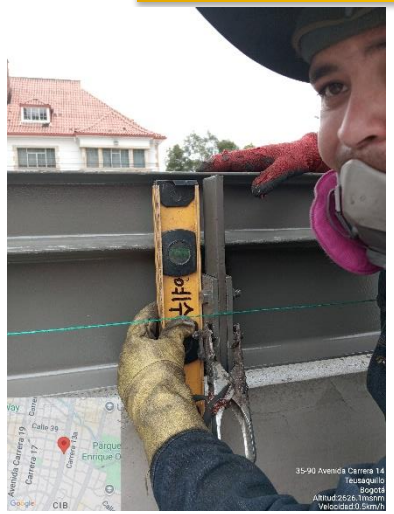

CONTROL DE NIVELES

Se realizan verificaciones en obra de la estructura metálica instalada, mediante controles de nivelación y plomada, con el fin de garantizar la correcta alineación, verticalidad y posición de los elementos.

Adicionalmente, se verifica la separación entre las “T” que conforman las celosías, asegurando que las dimensiones y distancias ejecutadas correspondan con los diseños y especificaciones técnicas establecidos para el proyecto.

INFORME EJECUTIVO

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Julio de 2026 al 20 de Agosto del 2026.


UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE JULIO 2026
-AGOSTO DE 2026

COMPONENTE SST






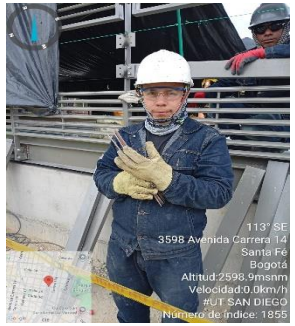







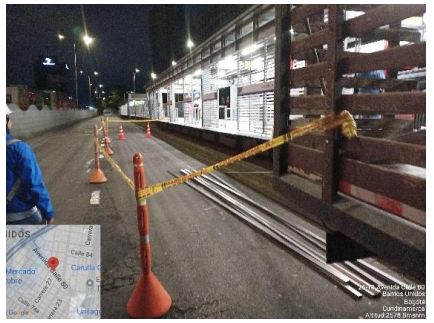

DEMARCACION Y PROTECCION ESPACIOS DE TRABAJO EN OBRA

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

SEÑALIZACION ESPACIOS DE TRABAJO EN OBRA

Se realizaron los respectivos cerramientos y la señalización de obra. Cada punto de trabajo contó con su respectivo extintor y protección en las zonas donde se ubicaron las plantas por medio de diques. el personal dispuso de la dotación completa, en cumplimiento de las normas de seguridad establecidas.

INFORME EJECUTIVO

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Julio de 2026 al 20 de Agosto del 2026.


UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1


MES DE JULIO 2026
-AGOSTO DE 2026

COMPONENTE AMBIENTAL



KIT DE DERAMES Y CAMILLA

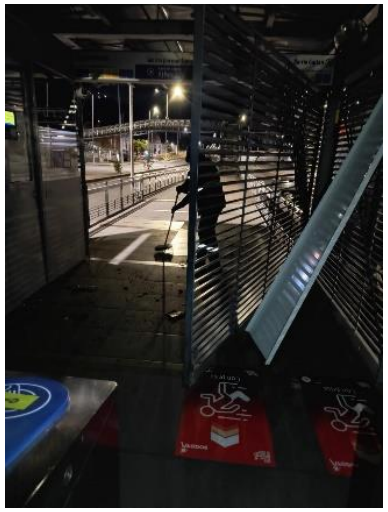

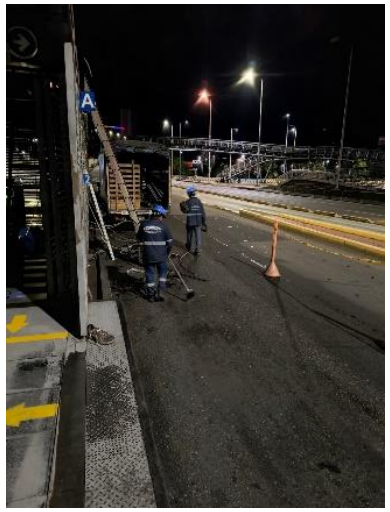

ASEO DE OBRA



PUNTOS DE REUTILIZACION DE MATERIAL DESMONTADO,

Las actividades se ejecutaron cumpliendo normativas ambientales y de gestión. Se garantizó la correcta identificación y manejo de residuos peligrosos y de construcción, con disposición en sitios autorizados. El manejo de sustancias químicas cumplió con el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) .El frente poseía camillas y elementos de protección ambiental.

INFORME EJECUTIVO

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Julio de 2026 al 20 de Agosto del 2026.

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE JULIO 2026
-AGOSTO DE 2026

CONCLUSION

Durante el periodo comprendido entre el 21 de junio de 2026 y el 20 de julio de 2026, la Unión Temporal San Diego 2026 ejecutó las actividades programadas en el marco del Contrato de Obra No. 1381 de 2026, atendiendo las órdenes de trabajo asignadas y dando cumplimiento a los lineamientos, planos, diseños y especificaciones técnicas establecidos por la interventoría.
En desarrollo de las actividades ejecutadas, se realizaron las siguientes labores de instalación, control y verificación:

- Se realizó la instalación de la estructura metálica de acuerdo con los planos, diseños y especificaciones técnicas aprobados para el proyecto.
- Se verificó la correcta alineación, nivelación y verticalidad de los elementos instalados en fachada, garantizando su adecuada posición y estabilidad.
- Se aplicaron los sistemas de protección y pintura de acabado conforme a las especificaciones técnicas establecidas.
- Se verificaron las uniones soldadas, garantizando el cumplimiento de los criterios de resistencia, estabilidad y seguridad estructural requeridos.
- Se realizó la instalación de la cubierta, garantizando su adecuada disposición y la correcta transmisión de cargas hacia la estructura de soporte.
- Se verificó que los materiales y elementos instalados en la cubierta cumplieran con los requerimientos de resistencia y durabilidad establecidos para el proyecto.
- Se verificaron las pendientes de la cubierta de acuerdo con los diseños, con el propósito de garantizar una adecuada evacuación de aguas lluvias y minimizar el riesgo de filtraciones.
- Se realizó la instalación de la señalización de acuerdo con los diseños, esquemas y lineamientos suministrados por la interventoría.
- Se verificó la correcta ubicación, fijación, estabilidad y visibilidad de los elementos de señalización.
- Finalmente, se verificó que la señalización cumpliera con los criterios de calidad, identificación e imagen establecidos para el sistema, garantizando su funcionalidad, legibilidad y adecuada visibilidad para los usuarios.
