LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF
FASE No. 2 OBRA
No. 1_SEDE PULGARCITO

FECHA	24/01/2021	PERÍODO DE OBRA No.	0,02	DEL	18/01/2021	AL	24/01/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE PRESTA SERVICIO EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**2. CALDAS - MANIZALES, HOGAR INFANTIL PULGARCITO, CR 26 # 16 - 23 BARRIO SAN ANTONIO;**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE CONSULTORIA - ESTUDIOS Y DISEÑOS			
CONTRATO No.:	No.0101646 - 2020			CONTRATO No.:	No 0101649 - 2020		
PLAZO INICIAL:	UN MES Y VEINTICINCO DÍAS			PLAZO INICIAL:	UN MES Y QUINCE DÍAS		
PLAZO ACTUALIZADO:	CUATRO MESES			PLAZO ACTUALIZADO:	TRES MESES Y DIECINUEVE DÍAS		
FECHA DE INICIACIÓN	viernes, 6 de noviembre de 2020			FECHA DE INICIACIÓN:	viernes, 6 de noviembre de 2020		
*FECHA DE SUSPENSIÓN No 1 :	-			*FECHA DE SUSPENSIÓN No 1 :	-		
*FECHA DE REINICIACIÓN:	-			*FECHA DE REINICIACIÓN:	-		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	jueves, 31 de diciembre de 2020			FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	lunes, 21 de diciembre de 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	sábado, 6 de marzo de 2021			FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	jueves, 25 de febrero de 2021		
PLAZO ACTUALIZADO:	121			PLAZO ACTUALIZADO:	112		
PLAZO TRANSCURRIDO:	80	EQUIVALE AL	66%	PLAZO TRANSCURRIDO:	80	EQUIVALE AL	71%
VALOR INICIAL:	$		249.043.319,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$		733.959.553,00
VALOR INICIAL :	$		249.043.319,00	VALOR FRENTE DE TRABAJO :	$		71.139.663,00
VALOR ADICION(ES):	$		-	VALOR ADICION(ES):	$		-
VALOR ACTUALIZADO:	$		249.043.319,00	VALOR ACTUALIZADO:	$		71.139.663,00
VALOR PAGADO:	$		-	VALOR PAGADO:	$		-
VALOR POR PAGAR:	$		249.043.319,00	VALOR POR PAGAR:	$		71.139.663,00
SUPERVISOR:	LINA MARIA MARGARITA HUARI MATEUS			INTERVENTOR:	LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.		
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	PEDRO JOSÉ LEÓN DIAZ			REPRESENTANTE LEGAL:	EHIDA JULIET RAMIREZ GUINA		

2. CONTROL ADMINISTRATIVO Y ESTADO DEL TIEMPO

2.1 PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA

PERSONAL DE OBRA	DEDICACIÓN	CANT.	PERSONAL DE INTERVENTORIA	DEDI.	CANT.
REPRESENTANTE LEGAL	100%	1	REPRESENTANTE LEGAL	100%	1
DIRECTOR DE OBRA	50%	1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	50%	1
RESIDENTE DE OBRA	100%	1	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA No.1	100%	1
RESIDENTE SISOMA	100%	1	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA No.2	100%	1
ESPECIALISTA HIDROSANITARIO	5%	1	RESIDENTE SISOMA	100%	1
ESPECIALISTA ELÉCTRICO	5%	1	ASESOR HIDROSANITARIO	5%	1
RESIDENTE DE COSTOS Y PRE.	5%	1	ASESOR ELÉCTRICO	5%	1
MAESTRO DE OBRA	100%	1	PROFESIONAL DE COSTOS Y PRES	5%	1
AYUDANTE DE OBRA	100%	5	APOYO TÉCNICO DE INTERVENTORÍA	100%	1

2.2 PERÍODO DE LLUVIAS

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
ESTADO DEL CLIMA	☑ Tiempo Seco ☐ Lluvia Moderada ☐ Lluvia Intensa	☐ Tiempo Seco ☑ Lluvia Moderada ☐ Lluvia Intensa	☑ Tiempo Seco ☐ Lluvia Moderada ☐ Lluvia Intensa	☑ Tiempo Seco ☐ Lluvia Moderada ☐ Lluvia Intensa	☑ Tiempo Seco ☐ Lluvia Moderada ☐ Lluvia Intensa	☐ Tiempo Seco ☑ Lluvia Moderada ☐ Lluvia Intensa	☑ Tiempo Seco ☐ Lluvia Moderada ☐ Lluvia Intensa
DURACIÓN (h)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SECO MAÑANA MODERADA TARDE Y NOCHE	NO APLICA	NO APLICA

AFECTACIÓN A LA OBRA POR LLUVIAS

OBSERVACIONES

NO SE PRESENTARON AFECTACIONES DE LLUVIA A LAS OBRAS INICIADAS EN LA SEDE PULGARCITO

2.3 ASPECTOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN	SI	NO
¿Se ejecutó bajo los preceptos técnicos indicados?	☑	☐
¿El rendimiento corresponde a lo indicado en programación?	☑	☐
¿El personal destinado fue suficiente?	☑	☐
¿El personal era idóneo para la actividad?	☑	☐
¿ Los materiales utilizados cumplen con la especificación del proyecto?	☑	☐

3. CONTROL DE ACTIVIDADES DE SUBPROYECTOS

Actividades en Ejecución y/o adelantadas — Actividades en Atraso — Actividades no Iniciadas — Actividades Terminadas

No	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	CAN	UN	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
				Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
	SUBPROYECTO No.1 Adecuación del área destinada para gimnasio: nivelación de piso en concreto, enchape de piso en cerámica, instalación de cielo Raso en PVC, isntalación de luminarias LE, Pintura General										
	PRELIMINARES			**12/01/2021**	**19/01/2021**	**8**	**12/01/2021**		**ejecución**	**0**	**ejecución**
1,29	Desmonte Cielo Falso En Cualquier Material	**M2**	23,09	12/01/2021	15/01/2021	4	12/01/2021	12/01/2021	1	0	3
1,45	Desmonte De Luminarias, Tableros Electricos Y Aparatos Electricos Instalados Superficialmente.	**UND**	3,00	12/01/2021	15/01/2021	4	12/01/2021	12/02/2021	32	0	-28
1,49	Retiro De Sobrantes, Cargue, Transporte Y Disposición Final De Escombros A Sitio Autorizado	**M3**	4,00	16/01/2021	19/01/2021	4	16/01/2021	17/01/2021	2	0	2
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**			**20/01/2021**	**23/01/2021**	**4**	**13/01/2021**	**13/01/2021**	**1**	**7**	**10**
4,18	Refuerzo Malla Electrosoldada 15*15, 5Mm	**KG**	44,78	20/01/2021	23/01/2021	4	13/01/2021	13/01/2021	1	7	10
5	**MAMPOSTERÍA**			**24/01/2021**	**29/01/2021**	**6**	**13/01/2021**	**13/01/2021**	**1**	**11**	**16**
5,08	Muro En Bloque Nº 4 E= 0.10 M	**M2**	23,09	24/01/2021	29/01/2021	6	13/01/2021	13/01/2021	1	11	16
10	**PISOS BASES**			**30/01/2021**	**2/02/2021**	**4**	**14/01/2021**	**14/01/2021**	**1**	**16**	**19**
10,1	Alistado Endurecido Mortero 1:3 H=4	**M2**	23,09	30/01/2021	2/02/2021	4	14/01/2021	14/01/2021	1	16	19
11	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS- RED CONTRA INCENDIO**			**3/02/2021**	**6/02/2021**	**4**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
11,4	Bajante Aguas Lluvias Pvc 4"	**ML**	6,00	3/02/2021	6/02/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12,1	**EQUIPO DE ILUMINACION**			**7/02/2021**	**10/02/2021**	**4**	**23/01/2021**	**23/01/2021**	**1**	**15**	**18**
12,12	Suministro E Instalación De Luminaria Led Panel 60 X60 Metalica Para Incrustar, 50W,Luz Blanca, 120 V.	**UND**	4,00	7/02/2021	10/02/2021	4	23/01/2021	23/01/2021	1	15	18
12,2	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			**7/02/2021**	**10/02/2021**	**4**	**18/01/2021**	**18/01/2021**	**1**	**20**	**23**
12,1,2	Salida Para Iluminación En Tubo Conduit Emt De 1/2"-3/4" Y Conductores De Cobre N12Awg Thhn. Incluye Proporcionar Interruptor, Curvas, Terminales, Uniones, Soportes Y Marcas De Identificación	**UND**	4,00	7/02/2021	10/02/2021	4	18/01/2021	22/01/2021	5	20	19
13	**PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS**			**3/02/2021**	**17/02/2021**	**15**	**18/01/2021**	**19/01/2021**	**2**	**16**	**29**
13,16	Tableta Antideslizante (Incluye Mortero De Pega Y Boquilla) (Incluye Mortero De Pega Y Boquilla)	**M2**	23,09	3/02/2021	17/02/2021	15	18/01/2021	19/01/2021	2	16	29
14	**CIELOS RASOS- DIVISIONES**			**11/02/2021**	**16/02/2021**	**6**	**20/01/2021**	**22/01/2021**	**3**	**22**	**25**
14,5	Cielo Raso En Pvc (Incluye Estructura Y Accesorios De Fijación)	**M2**	23,09	11/02/2021	16/02/2021	6	20/01/2021	22/01/2021	3	22	25

LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF
FASE No. 2 OBRA
No. 1_SEDE PULGARCITO

	FECHA	24/01/2021				PERÍODO DE OBRA No.	0,02	DEL	18/01/2021	AL	24/01/2021	
15	**PINTURAS**			**18/02/2021**	**23/02/2021**	**6**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
15,13	Vinilo Tipo I Sobre Muros Lavable (Incluye Aplicación 3 Manos)	**M2**	50,70	18/02/2021	23/02/2021	**6**			no iniciado	no iniciado	no iniciado
21	**MOBILIARIO URBANO**			**24/02/2021**	**25/02/2021**	**2**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
21,22	Aseo General	**M2**	48,00	24/02/2021	25/02/2021	**2**			no iniciado	no iniciado	no iniciado
	SUBPROYECTO No.2 Cambio de puertas y ventanas en la mina por puertas y ventanas en aluminio en jardín A y jardín B; instalación de cielo raso e ilumniación led en aulas prejardín C, Jardín A y jardín B. Pintura General de estos espacios.											
1	**PRELIMINARES**			**12/01/2021**	**25/01/2021**	**14**	**12/01/2021**	**13/01/2021**	**2**	**0**	**12**
1,29	Desmonte Cielo Falso En Cualquier Material	**M2**	104,99	12/01/2021	15/01/2021	**4**	12/01/2021	13/01/2021	2	0	2
1,45	Desmonte De Luminarias, Tableros Electricos Y Aparatos Electricos Instalados Superficialmente.	**UND**	8,00	12/01/2021	15/01/2021	**4**	12/01/2021	13/01/2021	2	0	2
1,49	Retiro De Sobrantes, Cargue,Transporte y Disposición final de Escombros A Sitio Autorizado	**M3**	4,00	24/01/2021	25/01/2021	**2**	17/01/2021	17/01/2021	1	7	8
1,67	Desmonte De Reja En Hierro Tubo Cuadrado	**M2**	1,05	20/01/2021	23/01/2021	**4**	13/01/2021	13/01/2021	1	7	10
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**			**26/01/2021**	**29/01/2021**	**4**	**15/01/2021**	**17/01/2021**	**3**	**11**	**12**
4,17	Acero Figurado 60000 Psi	**KG**	7,17	26/01/2021	27/01/2021	**2**	15/01/2021	17/01/2021	3	11	10
4,31	Columneta De Confinamiento en concreto de 3000 PSI para Mamposteria Nueva	**ML**	1,70	26/01/2021	29/01/2021	**4**	15/01/2021	17/01/2021	3	11	12
4,41	Proceso De Anclaje Para Varilla De 1/2" Perforando Una Profundidad De 6.00 Cm (Indiferente De La Longitud De La Varilla A Inscrustar Posteriormente). Incluye Perforación Con Broca De Diametro Superior, Limpieza, Inyección Del Epoxico E Inscrustación De La Varilla Y Varilla De Acero)	**UND**	4,00	26/01/2021	27/01/2021	**2**	15/01/2021	17/01/2021	3	11	10
5	**MAMPOSTERÍA**			**28/01/2021**	**30/01/2021**	**3**	**16/01/2021**	**17/01/2021**	**2**	**12**	**13**
5.08	Muro En Bloque Nº 4 E= 0.10 M	**M2**	2,04	28/01/2021	30/01/2021	**3**	16/01/2021	17/01/2021	2	12	13
6	**PAÑETES**			**31/01/2021**	**5/02/2021**	**6**	**18/01/2021**	**20/01/2021**	**3**	**13**	**16**
6,2	Pañete Liso Muros 1:4,E=1.5 Cm (Lineal)	**ML**	1,70	31/01/2021	5/02/2021	**6**	18/01/2021	20/01/2021	3	13	16
6,5	Pañete Liso Sobre Muros 1:4	**M2**	5,10	31/01/2021	5/02/2021	**6**	18/01/2021	20/01/2021	3	13	16
9,2	**CARPINTERIA METALICA**			**16/01/2021**	**23/02/2021**	**39**	**13/01/2021**		**ejecución**	**3**	**ejecución**
9.2.2	Pasamanos En Tubo Para Escaleras	**ML**	5,00	6/02/2021	13/02/2021	**8**			no iniciado	no iniciado	no iniciado
9.2.3	Marcos Puertas Lamina C.R. C18 - B=80 Cm (Antic - Esmalte)	**UND**	2,00	10/02/2021	17/02/2021	**8**			no iniciado	no iniciado	no iniciado
9.2.5	Puerta Entamborada Lamina C.R. C18 (Incluye Anticorrosivo Y Pintura Esmalte)	**M2**	4,00	10/02/2021	17/02/2021	**8**			no iniciado	no iniciado	no iniciado
9,2,16	Ventanería En Aluminio Arquitectonico Tipo Pesado Anodizado Color Natural Con Persiana Fija 3" Y Vidrio 5 Mm	**M2**	16,66	14/02/2021	23/02/2021	**10**			no iniciado	no iniciado	no iniciado
9,2,21	Desmonte Puertas Y Ventas Diferentes Medidas Y Materiales - (Incluye Dispocision Final)	**M2**	20,66	16/01/2021	19/01/2021	**4**	13/01/2021	14/01/2021	2	3	5
9,3	**CARPINTERIA DE MADERA**			**10/02/2021**	**13/02/2021**	**4**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
9,3,3	Cerradura De Pomo Tipo Alcoba	**UND**	3,00	10/02/2021	13/02/2021	**4**			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12,1	**EQUIPO DE ILUMINACIÓN**			**6/02/2021**	**9/02/2021**	**4**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
12,1,2	Suministro E Instalación De Luminaria Led Panel 60 X60 Metalica Para Incrustar, 50W,Luz Blanca, 120 V.	**UND**	14,00	6/02/2021	9/02/2021	**4**			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12,2	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			**14/02/2021**	**21/02/2021**	**8**	**20/01/2021**	**23/01/2021**	**4**	**25**	**29**
12.2.2	Salida Para Iluminación En Tubo Conduit Emt De 1/2"-3/4" Y Conductores De Cobre N12Awg Thhn. Incluye Proporcionar Interruptor, Curvas, Terminales, Uniones, Soportes Y Marcas De Identificación	**UND**	14,00	14/02/2021	21/02/2021	**8**	20/01/2021	23/01/2021	4	25	29
14	**CIELOS RASOS - DIVISIONES**			**14/02/2021**	**21/02/2021**	**8**	**21/01/2021**	**22/01/2021**	**2**	**24**	**30**
14.15	Cielo Raso En Pvc (Incluye Estructura Y Accesorios De Fijación)	**M2**	104,99	14/02/2021	21/02/2021	**8**	21/01/2021	22/01/2021	2	24	30
15	**PINTURAS**			**6/02/2021**	**13/02/2021**	**8**	**20/01/2021**		**ejecución**	**17**	**ejecución**
15.2	Estuco Sobre Muros (Incluye Aplicación Y Lijada)	**M2**	5,36	6/02/2021	9/02/2021	**4**	20/01/2021		ejecución	17	ejecución
15.13	Vinilo Tipo I Sobre Muros Lavable (Incluye Aplicación 3 Manos)	**M2**	114,73	10/02/2021	13/02/2021	**4**			no iniciado	no iniciado	no iniciado
21	**MOBILIARIO URBANO**			**24/02/2021**	**25/02/2021**	**2**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
21,22	Aseo General	**M2**	79,92	24/02/2021	25/02/2021	**2**			no iniciado	no iniciado	no iniciado
	SUBPROYECTO No.3 Cambio de cubierta traslucida e instalación de luminarias led en zona de lavandería y en área de enfermería, cambio de canales, adecuación de bajantes y colocación de flanches en lámina para Corrección de filtraciones y/o goteras por cubierta de asbesto-cemento (canaleta 90)											
1	**PRELIMINARES**			**12/01/2021**	**31/01/2021**	**20**	**15/01/2021**		**ejecución**	**-3**	**ejecución**
1,29	Desmonte Cielo Falso En Cualquier Material	**M2**	2,24	12/01/2021	15/01/2021	**4**			no iniciado	no iniciado	no iniciado
1,33	Desmonte De Canales En Lámina	**ML**	15,50	16/01/2021	19/01/2021	**4**			no iniciado	no iniciado	no iniciado
1,35	Desmonte De Cubierta En Teja Termoacustica	**M2**	46,30	20/01/2021	23/01/2021	**4**	15/01/2021	15/01/2021	1	5	8
1,45	Desmonte De Luminarias, Tableros Electricos Y Aparatos Electricos Instalados Superficialmente.	**UND**	2,00	24/01/2021	27/01/2021	**4**	23/01/2021	23/01/2021	1	1	4
1,46	Desmonte De Punto Electrico	**UND**	2,00	24/01/2021	27/01/2021	**4**	23/01/2021	23/01/2021	1	1	4
1,49	Retiro De Sobrantes, Cargue, Transporte Y Disposición Final De Escombros A Sitio Autorizado	**M3**	4,00	28/01/2021	31/01/2021	**4**			no iniciado	no iniciado	no iniciado
7	**CUBIERTAS**			**1/02/2021**	**16/02/2021**	**16**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
7,21	Suministro E Instalación Cubierta En Policarbonato Alveolar (Incluye Remates Y Accesorios)	**M2**	46,30	1/02/2021	10/02/2021	**10**	15/01/2021	18/01/2021	4	17	23
7,31	Suministro E Instalación Flanche En Lamina Galvanizada Calibre 20; Ds=25	**ML**	43,60	11/02/2021	16/02/2021	**6**			no iniciado	no iniciado	no iniciado
7,43	Suministro E Instalación Canal En Lamina Galvanizada Calibre 20; Ds=50	**ML**	47,00	11/02/2021	16/02/2021	**6**			no iniciado	no iniciado	no iniciado
11	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS- RED CONTRA INCENDIO**			**17/02/2021**	**21/02/2021**	**5**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
11,4	Bajante Aguas Lluvias Pvc 4"	**ML**	14,00	17/02/2021	21/02/2021	**5**			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12,1	**EQUIPO DE ILUMINACIÓN**			**5/02/2021**	**10/02/2021**	**6**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
12,1,2	Suministro E Instalación De Luminaria Led Panel 60 X60 Metalica Para Incrustar, 50W,Luz Blanca, 120 V.	**UND**	1,00	5/02/2021	10/02/2021	**6**			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12,34	Suministro E Instalación De Lampara Hermética 2X120 Serie B	**UND**	3,00	5/02/2021	10/02/2021	**6**			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12,2	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			**1/02/2021**	**4/02/2021**	**4**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
12.2.2	Salida Para Iluminación En Tubo Conduit Emt De 1/2"-3/4" Y Conductores De Cobre N12Awg Thhn. Incluye Proporcionar Interruptor, Curvas, Terminales, Uniones, Soportes Y Marcas De Identificación	**UND**	4,00	1/02/2021	4/02/2021	**4**			no iniciado	no iniciado	no iniciado
14	**CIELOS RASOS - DIVISIONES**			**11/02/2021**	**23/02/2021**	**13**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
14.15	Cielo Raso En Pvc (Incluye Estructura Y Accesorios De Fijación)	**M2**	2,24	11/02/2021	23/02/2021	**13**			no iniciado	no iniciado	no iniciado

LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF
FASE No. 2 OBRA
No. 1_SEDE PULGARCITO

FECHA	24/01/2021			PERÍODO DE OBRA No.		0,02	DEL	18/01/2021	AL	24/01/2021	
21	**MOBILIARIO URBANO**			**24/02/2021**	**25/02/2021**	**2**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
21,22	Aseo General	**M2**	28,00	24/02/2021	25/02/2021	**2**			no iniciado	no iniciado	no iniciado
	SUBPROYECTO No.4 Cambio de ventanas en lamina por ventanas en aluminio con reja bancaria en oficina de administración y secretaria. Cambio de ventanas en lamina por ventanas tipo Persiana con angeo en cocina, Cambio de puerta ventana de acceso a patio de juegos externo y Adecuación de interruptores y tomacorrientes incluyendo GFCI en cocina.										
1	**PRELIMINARES**			**12/01/2021**	**31/01/2021**	**20**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
1,67	Desmonte De Reja En Hierro Tubo Cuadrado	**M2**	7,80	12/01/2021	15/01/2021	**4**			no iniciado	no iniciado	no iniciado
9,2	**CARPINTERIA METALICA**			**24/01/2021**	**23/02/2021**	**31**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
9.2.3	Marcos Puertas Lamina C.R. C18 - B=80 Cm (Antic - Esmalte)	**UND**	1,00	24/01/2021	29/01/2021	**6**			no iniciado	no iniciado	no iniciado
9.2.5	Puerta Entamborada Lamina C.R. C18 (Incluye Anticorrosivo Y Pintura Esmalte)	**M2**	3,00	30/01/2021	4/02/2021	**6**			no iniciado	no iniciado	no iniciado
9.2.7	Reja Bancaria (Antic - Esmalte)	**M2**	8,82	5/02/2021	10/02/2021	**6**			no iniciado	no iniciado	no iniciado
9,2,16	Ventanería En Aluminio Arquitectonico Tipo Pesado Anodizado Color Natural Con Persiana Fija 3" Y Vidrio 5 Mm	**M2**	3,00	11/02/2021	17/02/2021	**7**			no iniciado	no iniciado	no iniciado
9,2,21	Desmonte Puertas Y Ventas Diferentes Medidas Y Materiales - (Incluye Dispocision Final)	**M2**	13,80	18/02/2021	23/02/2021	**6**			no iniciado	no iniciado	no iniciado
9,2,26	Suministro E Instalacion De Angeo (Incluye Angulo)	**M2**	3,00	18/02/2021	23/02/2021	**6**			no iniciado	no iniciado	no iniciado
9,2,28	Suministro E Instalación Ventana Tipo Persiana Fija En Lámina C.R. Calibre 18	**M2**	3,00	18/02/2021	23/02/2021	**6**			no iniciado	no iniciado	no iniciado
9,3	**CARPINTERIA DE MADERA**			**24/02/2021**	**25/02/2021**	**2**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
9,3,3	Cerradura De Pomo Tipo Alcoba	**UND**	3,00	24/02/2021	25/02/2021	**2**			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12,2	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			**16/01/2021**	**23/01/2021**	**8**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
12,2,5	Suministro De Toma Corriente Gfci.	**UND**	4,00	20/01/2021	23/01/2021	**4**			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12,2,25	Acondicionamiento Punto Eléctrico, Incluye Mano De Obra Y Materiales	**UND**	10,00	16/01/2021	19/01/2021	**4**			no iniciado	no iniciado	no iniciado
	ENTREGA FINAL DE SUBPROYECTOS EJECUTADOS			**25/01/2021**	**25/01/2021**	**1**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
Plazo del proyecto en días									**112**		

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	DIAS DE (+) ADELANTO (-) ATRASO EN LA RUTA CRÍTICA A LA FECHA DE CORTE		% sobre el plazo total
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.	$ 5.399.595,37	7,59%	3,17%	Al inicio de la actividad	-	0,00%
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	$ 26.802.348,41	10,76%		Al final de la actividad	3	2,68%

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

3.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

1. EL DESMONTE DEL CIELO FALSO NO SE HACE HASTA QUE NO INSTALEN LA CUBIERTA TRASLUCIDA POR CUESTION DE SEGURIDAD
2. EL DESMONTE DE CANAL SE HACE CUANDO ESTE EN OBRA LA NUEVA CANAL PARA RECOGER POSIBLES AGUAS LLUVIAS
3. EL DESMONTE DE LA REJA EN HIERRO NO SE HACE POR SEGURIDAD
4. LAS INSTALACIONES ELECTRICAS SE HARAN CUANDO SE ADECUEN LAS VENTANAS EN COCINA

3.2. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

La calidad de los productos de la Etapa No. 1 Diagnósticos fue buena, y se atendieron a satisfacción las observaciones y solicitudes realizadas por la internventoría.

La calidad de las actividades de la Etapa No. 2 Obra, es buena,se han atendido observaciones de la interventoria con el fin de entregar dentro de los plazos contractuales, se ha solicitado al contratista formalmente Notificar a la interventoria se requieren cambio de especificaciones técnicas para evaluar la viabilidad de acuerdo a las necesidades de cada sede durante el desarrollo de obra.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
NO APLICA PARA LA SEMANA No.1 TENIENDO EN CUENTA QUE PRESENTAN AVANCE SOBRE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	N/A	N/A

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS

01. N/A


7. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DEL 18 DE ENERO DE 2021 AL 24 DE ENERO DE 2021

LA CUBIERTA DE LA ENFERMERIA SE INSTALO EN TEJA TRASLUCIDA PVC Y NO EN POLICARBONATO ALVEOLAR, SE SOLICITO AL CONTRATISTA DE OBRA NOTIFICAR FORMALMENTE A LA INTERVENTORÍA LA JUSTIFICACIÓN CON EL FIN DE REALIZAR LA RESPECTIVA REVISIÓN Y/O AVAL PERTINENTE.

FECHA	24/01/2021	PERÍODO DE OBRA No.	0,02	DEL	18/01/2021	AL	24/01/2021

8. REGISTRO FOTOGRAFICO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DEL 18 DE ENERO DE 2021 AL 24 DE ENERO DE 2021

1. HOGAR INFANTIL PULGARCITO - MANIZALES




1. CIELO RASO GIMNASIO



2. CIELORASO PVC AULA PREJARDIN A



3. CIELO RASO PVC AULA PREJARDIN A




4. REPARACION GOTERA LACTANCIA



5. AULA PREJARDIN B



6. CUBIERTA TEJA TRASLUCIDA EN PVC ENFERMERIA

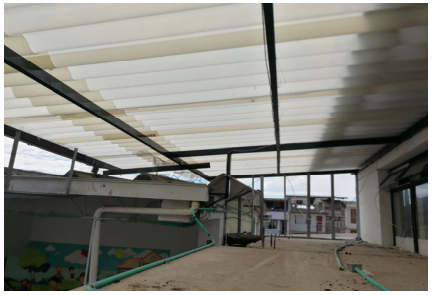

7.CUBIERTA TEJA TRASLUCIDA EN PVC ENFERMERIA



8. PISO TABLETA ANTIDESLIZANTE GIMNASIO



9. CUBIERTA TEJA TRASLUCIDA EN PVC LAVANDERIA



10. CUBUERTA TEJA TRASLUCIDA EN PVC LAVANDERIA



11. MURO AULA PREJARDIN A



12. MURO AULA PREJARDIN A

9. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

01. Desmonte Puertas Y Ventanas Diferentes Medidas Y Materiales - (Incluye Disposicion Final)
02. Alistado Endurecido Mortero 1:3 H=4
03. Tableta Antideslizante (Incluye Mortero De Pega Y Boquilla)
04. Pañete Liso Muros 1:4,E=1.5 Cm (Lineal)
05. Resane De Muros

LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF

FASE No. 2 OBRA

No. 1_SEDE PULGARCITO


FECHA	24/01/2021	PERÍODO DE OBRA No.	0,02	DEL	18/01/2021	AL	24/01/2021

10. CUADRO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA RUTA CRÍTICA

No.	Descripción de Item	PROGRAMADO				REAL EJECUTADO		
		PESO	% PROGRAMADO	%	VALOR PROGRAMADO	AVANCE	%	DINERO EJECUTADO
	SUBPROYECTO No.1 Adecuación del área destinada para gimnasio: nivelación de piso en concreto, enchape de piso en céramica, instalación de cielo Raso en PVC, isntalación de luminarias LE, Pintura General							
1,00	PRELIMINARES	0,76%	100,00%	0,76%	$ 435.343,00	100%	0,76%	$ 435.343,00
4,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	0,45%	100,00%	0,45%	$ 258.812,00	100%	0,45%	$ 258.812,00
5,00	MAMPOSTERIA	1,55%	0,00%	0,00%	$ -	70%	1,09%	$ 619.571,40
10,00	PISOS BASES	1,63%	0,00%	0,00%	$ -	70%	1,14%	$ 651.777,00
11,00	INST.HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INC.	0,37%	0,00%	0,00%	$ -		0,00%	$ -
12,10	EQUIPO DE ILUMINACION	1,28%	0,00%	0,00%	$ -	70%	0,89%	$ 509.538,40
12,20	INSTALACIONES ELECTRICAS	0,95%	0,00%	0,00%	$ -	70%	0,66%	$ 376.969,60
12,20	PISOS , ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS	2,96%	0,00%	0,00%	$ -	70%	2,07%	$ 1.181.404,70
14,00	CIELOS RASOS - DIVISIONES	3,65%	0,00%	0,00%	$ -	70%	2,56%	$ 1.457.199,10
15,00	PINTURAS	0,89%	0,00%	0,00%	$ -		0,00%	$ -
21,22	ASEO GENERAL	0,36%	0,00%	0,00%	$ -		0,00%	$ -
	SUBPROYECTO No.2 Cambio de puertas y ventanas en la mina por puertas y ventanas en aluminio en jardín A y jardín B; instalación de cielo raso e ilumniación led en aulas prejardín C, Jardín A y jardín B. Pintura General de estos espacios.							
1,00	PRELIMINARES	2,42%	86,00%	2,08%	$ 1.183.782,26	70%	1,69%	$ 963.543,70
4,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	0,28%	0,00%	0,00%	$ -	70%	0,19%	$ 110.279,40
5,00	MAMPOSTERIA	0,14%	0,00%	0,00%	$ -	70%	0,10%	$ 54.751,20
6,00	PAÑETES	0,29%	0,00%	0,00%	$ -	70%	0,20%	$ 115.588,20
9,20	CARPINTERIA METALICA	12,79%	21,00%	2,69%	$ 1.529.659,11		0,00%	$ -
9,30	CARPINTERÍA EN MADERA	0,25%	0,00%	0,00%	$ -		0,00%	$ -
12,10	EQUIPO DE ILUMINACION	4,47%	0,00%	0,00%	$ -		0,00%	$ -
12,20	INSTALACIONES ELECTRICAS	3,31%	0,00%	0,00%	$ -	70%	2,32%	$ 1.319.393,60
14,00	CIELOS RASOS - DIVISIONES	16,62%	0,00%	0,00%	$ -	70%	11,64%	$ 6.627.273,10
15,00	PINTURAS	2,09%	0,00%	0,00%	$ -	40%	0,84%	$ 477.131,60
21,22	ASEO GENERAL	0,60%	0,00%	0,00%	$ -		0,00%	$ -
	SUBPROYECTO No.3Cambio de cubierta traslucida e instalación de luminarias led en zona de lavandería y en área de enfermería, cambio de canales, adecuación de bajantes y colocación de flanches en lámina para Corrección de filtraciones y/o goteras por cubierta de asbesto.							
1,00	PRELIMINARES	1,69%	60,00%	1,02%	$ 578.934,60	40%	0,68%	$ 385.956,40
7,00	CUBIERTAS	28,24%	0,00%	0,00%	$ -	70%	19,77%	$ 11.257.816,01
11,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS- RED CONTRA INCENDIO	0,85%	0,00%	0,00%	$ -		0,00%	$ -
12,10	EQUIPO DE ILUMINACION	1,00%	0,00%	0,00%	$ -		0,00%	$ -
12,20	INSTALACIONES ELECTRICAS	0,95%	100,00%	0,95%	$ 538.528,00		0,00%	$ -
14,00	CIELOS RASOS - DIVISIONES	0,35%	0,00%	0,00%	$ -		0,00%	$ -
21,22	ASEO GENERAL	0,21%	0,00%	0,00%	$ -		0,00%	$ -
	SUBPROYECTO No.4 Instalación de concertina para el cerramiento perimetral costados norte y Oriente, instalación de luminarias en comedor, sala de profesores y lavandería.							
1,00	PRELIMINARES	0,13%	60,00%	0,08%	$ 42.920,40		0,00%	$ -
9,20	CARPINTERIA METALICA	6,91%	0,00%	0,00%	$ -		0,00%	$ -
9,30	CARPINTERIA DE MADERA	0,08%	0,00%	0,00%	$ -		0,00%	$ -
12,20	INSTALACIONES ELECTRICAS	1,46%	100,00%	1,46%	$ 831.616,00		0,00%	$ -
		TOTAL PESO	% PROGRAMADO		VALOR PROGRAMADO	% EJECUTADO		VALOR EJECUTADO
-	TOTALES	100,00%	9,48%		$ 5.399.595,37	47,06%		$ 26.802.348,41
			ADMINISTRACIÓN	16,00%	$ 863.935,26	ADMINISTRACIÓN	16,00%	$ 4.288.375,75
			IMPREVISTOS	3,90%	$ 210.584,22	IMPREVISTOS	3,90%	$ 1.045.291,59
			UTILIDAD	4,20%	$ 226.783,01	UTILIDAD	4,20%	$ 1.125.698,63
			IVA / UTILIDAD	19,00%	$ 43.088,77	IVA / UTILIDAD	19,00%	$ 213.882,74
			TOTAL PROGRAMADO		$ 6.743.986,63	TOTAL EJECUTADO		$ 33.475.597,12
	PORCENTAJE DE AVANCE/ATRASO A LA FECHA 17 DE ENERO DE 2021		-37,58%		DINERO DE DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO			-$ 26.731.610,49

Logia 3	**LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF** **FASE No. 2 OBRA** **No. 1_SEDE PULGARCITO**

FECHA	24/01/2021				PERÍODO DE OBRA No.	0,02	DEL	18/01/2021	AL	24/01/2021
SUBPROYECTO 1	**14,87%**	**SUBPROYECTO 2**	**43,26%**	**SUBPROYECTO 3**		**33,29%**		**SUBPROYECTO 4**	**8,58%**	

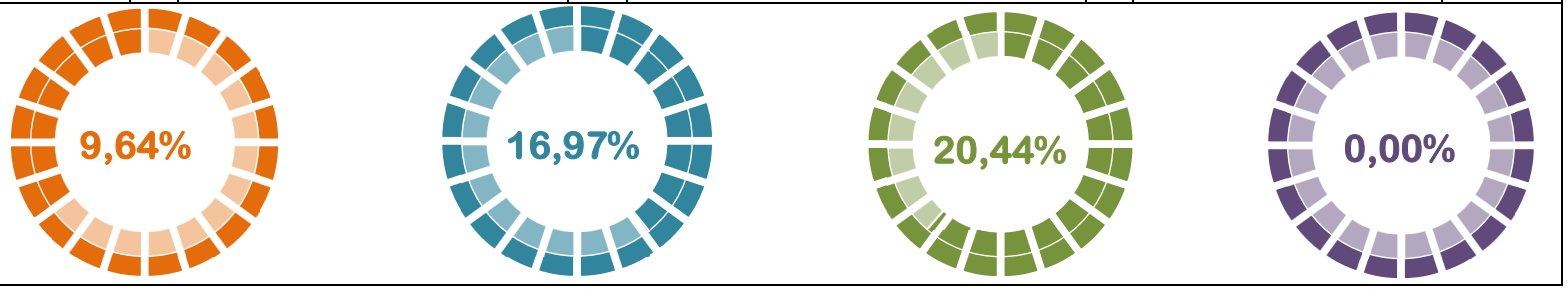

10. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

***NOTA ACLARATORIA: El control de las actividades de la Ruta crítica se ajustaron de acuerdo a los subproyectos aprobados por la interventoría y la entidad, asi mismo el cuadro de seguimiento general se ajustò con los flujos de inversiòn aprobados con el fin de realizar el control financiero para la sede Pulgarcito -Manizales**

01. Estado del contrato: La interventoría en cumplimiento de sus obligaciones ha supervisado el desarrollo del contrato No 0101646 - 2020, el cual se ha venido ejecutando dentro de los tiempos establecidos.

02. Se dio inicio formal de actividades de obra desde el dia 12 de enero de 2021, a la fecha las condiciones climaticas han generado retrasos en las actividades de obra.

03. De acuerdo al cuadro de control y seguimiento de la ruta crítica del proyecto , **las actividades programadas corresponden al 9,48% hasta el dia 24 de enero de 2021, y el avance real ejecutado es del 47,06 %**

04. Se evidenciaron avances en las actividades de SP1: Equipos de iluminacion, instalaciones electricas, pisos y guardaescoba y cielo raso; SP2: Pañetes, instalaciones electricas y cielo raso.

07. Respecto al control financiero las **actividades programadas representan un valor de $6.743.986,63**en contraste con **las actividades ejecutadas que representan un valor de $33.475.597,12** es decir, una diferencia de **$26.731.610,49** por encima de las actividades programadas, equivalente a un 37,58% de avance en actividades iniciadas.


08. El avance presentado es un indicador de la culminaciòn del proyecto dentro de los plazos establecidos con fecha final de entrega el dia 25 de febrero de 2021

09. Se han desarrollado las actividades dentro del marco del protocolo de Bioseguridad por COVID 19 y de acuerdo a la normatividad de trabajo seguro, bajo condiciones aceptables para la ejecuciòn de actividades de obra.


Logia 3	LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF FASE No. 2 OBRA No. 1_SEDE PULGARCITO

FECHA	24/01/2021	PERÍODO DE OBRA No.	0,02	DEL	18/01/2021	AL	24/01/2021

10. RESUMEN DE EJECUCIÓN

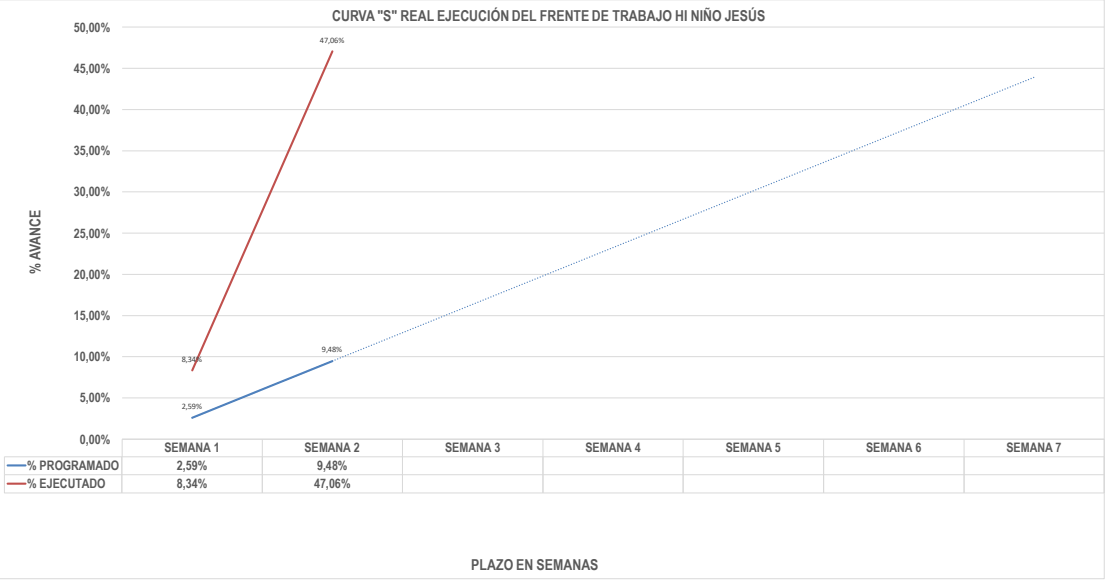

	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7
% PROGRAMADO	2,59%	9,48%					
% EJECUTADO	8,34%	47,06%					

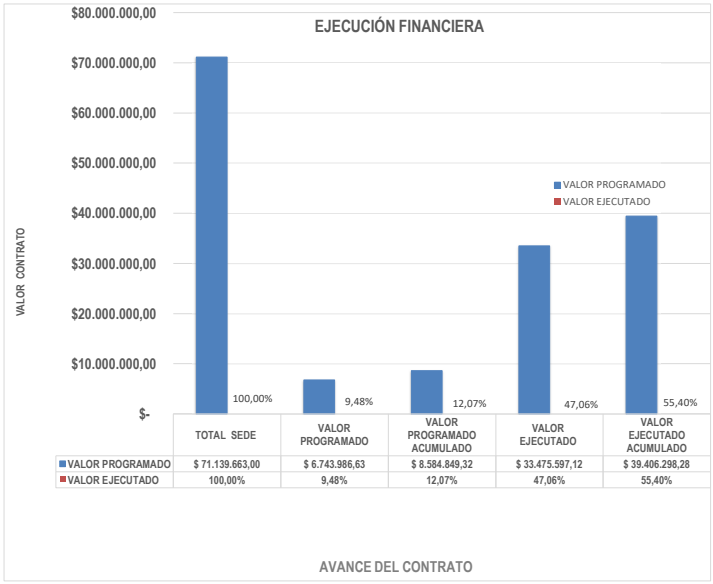

	TOTAL SEDE	VALOR PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO
VALOR PROGRAMADO	$ 71.139.663,00	$ 6.743.986,63	$ 8.584.849,32	$ 33.475.597,12	$ 39.406.298,28
VALOR EJECUTADO	100,00%	9,48%	12,07%	47,06%	55,40%

FIRMA INTERVENTOR
NOMBRE: EHIDA JULIET RAMIREZ GUINA
R/L. LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.

VoBo SUPERVISION
NOMBRE : LINA MARIA MARGARITA HUARI MATEUS
SUPERVISION ICBF SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL

VoBo SUPERVISION
NOMBRE :PEDRO JOSÉ LEÓN DÍAZ
APOYO A LA SUPERVISION ICBF SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL
