ICCU	**FORMATO** **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-037
		VERSIÓN	0
	INFORME DE VISITA PARA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	**FECHA**	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN	**17**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

REFERENCIA N°. **498**

CONSECUTIVO N° **163**

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU-139-2025 (OBRA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	24/01/2025	**FECHA INCIO**	1/04/2025
	ICCU-220-2025 (INTERVENTORÍA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	3/03/2025	**FECHA INCIO**	1/04/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO YVY	**NIT**	901.902.786-1
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	**NIT**	901.915.452-9
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	**Prorroga No. 1**				
	Ampliar el plazo de ejecucion del presente contrato de obra No. ICCU 139 de 2025 y de interventoria No. ICCU 220 de 2025, hasta el 31 de mayo de 2026.				
	Prorroga No. 2				
	Ampliar el plazo de ejecucion del presente contrato de obra ICCU 139 de 2025 y de interventoria ICCU 220 de 2025, hasta el 19 de Octubre de 2026.				
FECHA DE TERMINACIÓN	Contrato de Interventoria: 19 de Octubre de 2026 según prórroga No.2. Contrato de Obra: 19 de Octubre de 2026 según prórroga No.2.				
		PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	1 al 30 de junio de 2026		


3. DESCRICIÓN DE LA VISITA

El día viernes **26 de junio** se realizó visita en el municipio de **Manta,** perteneciente a la provincia de **Almeidas**. Con el objetivo de realizar un recorrido técnico por el tramo de intervención, se llevó a cabo una visita destinada a observar el estado actual de las obras ya ejecutadas, verificar el avance en la conformación de cunetas y revisar el desarrollo pendiente en el resto del tramo. Aunque se esperaba contar con el acompañamiento del diputado, la actividad se efectuó finalmente con la presencia del contratista y la interventoría, quienes guiaron el recorrido y aportaron información sobre el progreso de la obra. Asimismo, se contó con la participación del secretario de planeación y de la personería municipal, lo que permitió atender inquietudes y aclarar dudas relacionadas con la ejecución del proyecto


Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	**N/A**	**Chalecos**	**Sí**
	Cascos	**Sí**	**Otros**	**N/A**
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	**X**	**NO**	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO




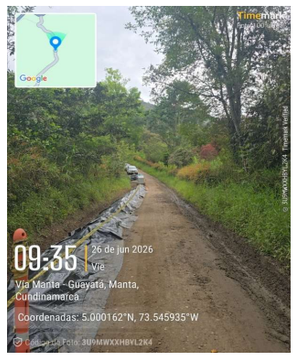




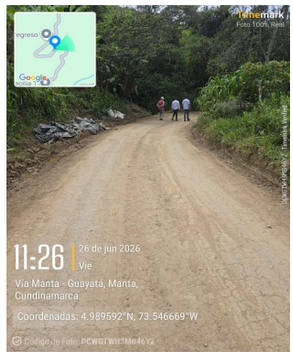




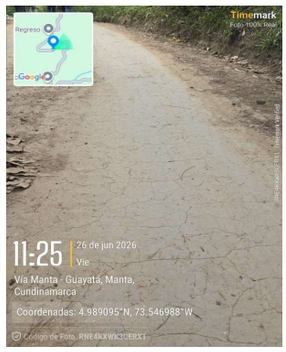





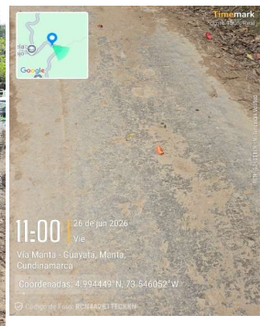





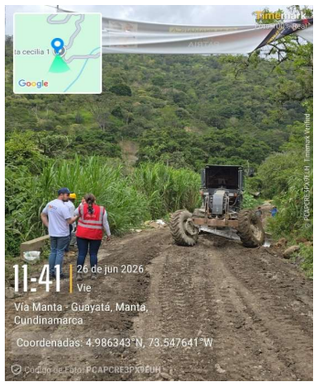

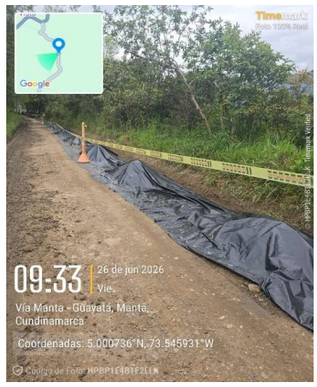

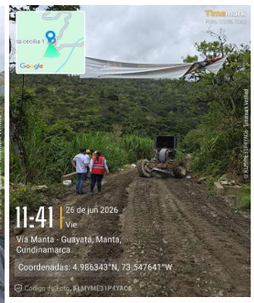



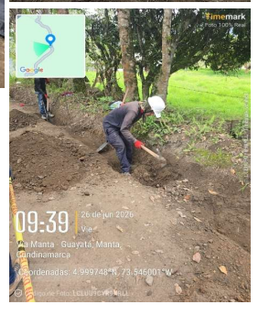



6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El recorrido técnico permitió verificar de manera directa el estado de las obras ya ejecutadas, evaluar el avance en la construcción de cunetas y revisar el desarrollo pendiente del tramo, garantizando así un seguimiento detallado de la intervención. Aunque no se contó con la presencia del diputado, la participación activa del contratista y la interventoría aseguró la continuidad del proceso, mientras que la asistencia del secretario de planeación y de la personería aportó claridad institucional y respaldo en la atención de inquietudes de la comunidad.

7. ANEXOS

No se presentan

FUNCIONARIO COMISIONADO O CONTRATISTA QUE REALIZÓ LA VISITA

NOMBRE	CARGO	FIRMA - ELABORÓ
GABRIEL LOZANO	SUPERVISOR Y GESTOR	
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA - SUPERVISOR(A)**
GABRIEL LOZANO	SUPERVISOR Y GESTOR	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	miércoles, 8 de julio de 2026	
