EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA

INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES N°003

CONTRATO DE FABRICACIÓN E INSTALACION DE MODULOS DE VENTAS EN LA CALLE 30 (CALLE REAL) DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS

---

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No.: CD-029-2026-COP

Objeto Contractual: Fabricación e instalación de módulos de ventas.

Contratante: Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia – EDUNA

Contratista: ALBA NELLY MONSALVE LENIS

Supervisor: CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO

Lugar de Ejecución: Calle 30 (REAL), municipio de Santa Rosa de Osos

Fecha del Informe: 09/08/2026

Periodo Informado:

Desde 21/08/2026

Hasta 02/09/2026

Informe No.: 3

---

2. OBJETO DEL PRESENTE INFORME

Presentar el estado de ejecución técnica del contrato correspondiente al período reportado, indicando las actividades desarrolladas, el porcentaje de avance alcanzado, las evidencias de ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, con el fin de soportar la revisión del supervisor y el trámite del pago correspondiente.

---

3. RESUMEN EJECUTIVO

Concepto	Estado
Avance Programado	100 %
Avance Ejecutado en el período	>50 %
Cumplimiento del Cronograma	Sí () No (X)
Novedades Contractuales	Sí (X) No ()

Se requiere adición al contrato y segunda prorroga

---

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Evidencia
Redes Hidrosanitarias					
Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 9, 500 PSI, diámetro 1/2", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento.	ml	10	$ 6.688	$ 66.800	Imagen

Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC, con un DIÁMETRO DE 2" para redes sanitarias, incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 2", transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	ml	10	$ 1.140.000	$5.700.000	Imagen
Suministro, transporte e instalacion de lavatrastes en acero inoxidable, incluye: Griferia, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	unidad	5	$ 480.000	$ 2.400.000	Imagen
Suministro, transporte e instalacion de lavatraperas en acero inoxidable, incluye: Griferia, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	unidad	4	$ 800.000	$ 3.200.000	Imagen
Suministro e instalación de trampa de grasas compacta para lavatrastes, incluyendo conexiones hidráulicas y sanitarias.	unidad	5	$930.000	$ 4.650.000	Imagen
Redes Eléctricas					
Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 3/4". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	ml	130,00	16.713	$ 2.172.690	ml

Suministro e instalación de linea de tomas 110 Y 220 TRIFILAR conductor de cobre sólido No. 14 AWG THHN/THWN en tubería conduit, incluyendo tendido, conexiones, pruebas y puesta en funcionamiento.	ml	205,00	6.466	$ 1.325.560	ml
Suministro e instalación de caja metálica tipo Rawelt 4" × 2", tres (3) salidas de 1", para instalaciones eléctricas, incluye tapa.	unidad	55,00	42.500	$ 2.337.500	unidad
Suministro e instalación de tomacorriente doble tipo Leviton 15 A – 125 V, NEMA 5-15R, con tapa (placa) y accesorios.	unidad	15,00	48.000	$ 720.000	unidad
Suministro e instalación de caja metálica para tablero de distribución de 6 puestos, apta para instalación eléctrica residencial o comercial ligera.	unidad	5,00	125.000	$ 625.000	unidad
Suministro e instalación de breaker termomagnético de 40 A, curva C, capacidad de interrupción mínima de 10 kA, para tablero de distribución.	unidad	30,00	78.000	$ 2.340.000	unidad
Suministro e instalación de luminaria LED tipo ojo de buey de sobreponer, panel circular de 24 W, luz cálida (3000 K), incluye accesorios de fijación y conexión.	unidad	20	88.000	$ 1.760.000	unidad
Suministro e instalación de cinta LED 110 V, luz cálida (3000 K), rollo de 10 metros, incluye accesorios de conexión y fijación.	Rollo	5	117.000	$ 585.000	Rollo

Recubrimientos y Acabados					
suministro, fabricación e instalación de barra de atención exterior en acero inoxidable de 2,40 × 0,30 m, incluye estructura metálica de soporte, cubierta en acero inoxidable, cuatro (4) pie amigos en tubo inoxidable, platinas, anclajes, soldadura, acabado satinado, transporte, montaje, nivelación y pruebas de estabilidad.	unidad	5	860.000	$ 4.300.000	unidad
suministro e instalación de placa de fibrocemento tipo eterboard de 14 mm, instalada sobre estructura metálica, incluye cortes, tornillería auto perforante, tratamiento de juntas, sellado, herramienta menor, desperdicios y limpieza final.	m2	23,8	122.500	$ 2.915.500	m2
suministro e instalación de piso en baldosa cerámica blanca de alto tráfico, incluye adhesivo tipo C2, boquilla, cortes, nivelación, limpieza final, herramienta menor y desperdicios.	m2	23,8	122.439	$ 2.914.050	m2
suministro e instalación de placa de fibrocemento tipo eterboard de 6 mm, para revestimiento interior de muros sobre estructura metálica, incluye cortes, tornillería autoperforante, tratamiento de juntas con cinta y masilla, lijado, herramienta menor, desperdicios y limpieza final.	m2	46,5	76.500	$ 3.557.250	m2
Suministro y aplicación de pintura tipo Pintuco Baños y Cocinas, color blanco, sobre placa de fibrocemento previamente preparada, incluye sellador, dos manos de pintura, materiales y limpieza.	m2	46,5	20.800	$ 967.200	m2

suministro e instalación de guardaescobas media caña cerámico color blanco, incluye adhesivo tipo c2, boquilla impermeable, cortes, ajustes, sellado sanitario, herramienta menor, desperdicios y limpieza final.	ml	20	67.500	$ 1.350.000,	ml
Mobiliario					
Suministro, fabricación e instalación de silla tipo banca en estructura metálica fabricada en tubo cuadrado de 1" × 1" calibre 16, con asiento en madera de pino inmunizada, rebordeada y barnizada, incluye soldadura, discos de corte, desbaste y flap, base catalizada, pintura y todo lo necesario para su fabricación.	unidad	20	384.660	$ 7.693.200	unidad
Obras Extras					
suministro e instalación de revestimiento decorativo en vinilo adhesivo blanco para exteriores, impreso digitalmente a full color y protegido con laminado mate, incluye diseño y ajuste de archivos, impresión, laminado, corte, desperdicios, preparación y limpieza de superficies, aplicación sobre fachadas, recorte en vanos y elementos existentes, mano de obra especializada, herramientas, equipos, transporte y demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	m2	45,35	235.955	$ 10.700.559	m2

Costo Directo	$ 59.245.009
Administración	$ 13.614.503
Utilidad	$ 2.962.250
Total	$ 75.821.763

5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ACTIVIDADES

Durante el periodo objeto del presente informe se ejecutaron las siguientes actividades:

I. Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 9, 500 PSI, diámetro 1/2", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento.

   Se realiza el replanteo de los puntos y recorridos de la red, verificando niveles y ubicación de los elementos. Posteriormente se suministra, corta y ensambla la tubería y sus accesorios mediante limpiador y cemento solvente, utilizando teflón en las conexiones roscadas. Finalmente se realizan pruebas de presión y estanqueidad para verificar que no existan fugas y garantizar el correcto funcionamiento de la red.

II. Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC, con un DIÁMETRO DE 2" para redes sanitarias, incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 2", transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

Se replantea el recorrido de la red sanitaria y se preparan los puntos de conexión. Se realiza el suministro, corte, presentación y unión de la tubería y accesorios mediante cemento solvente, verificando pendientes y alineación. Finalmente se efectúan pruebas de funcionamiento y estanqueidad, realizando los ajustes necesarios.

III. Suministro, transporte e instalacion de lavatrastes en acero inoxidable, incluye: Griferia, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento

Se verifica previamente la ubicación y dimensiones del punto de instalación. Se instala el lavatrastes sobre su estructura o superficie de apoyo, conectando la grifería, suministro de agua y desagüe sanitario. Se realizan pruebas de funcionamiento, verificando nivelación, estabilidad y ausencia de fugas.

IV. Suministro, transporte e instalacion de lavatraperas en acero inoxidable, incluye: Griferia, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento

Se prepara y verifica el área destinada para la instalación. Se coloca y nivela la lavatrápera, realizando las conexiones hidráulicas y sanitarias correspondientes, incluyendo grifería y accesorios. Finalmente se efectúan pruebas de funcionamiento y estanqueidad.

V. Suministro e instalación de trampa de grasas compacta para lavatrastes, incluyendo conexiones hidráulicas y sanitarias.

Se determina y prepara el punto de instalación de acuerdo con el recorrido de las redes. Se instala la trampa de grasas, conectando la entrada proveniente del lavatrastes y la salida hacia la red sanitaria. Se verifica la estanqueidad, nivelación y correcto flujo del sistema mediante pruebas de funcionamiento.

VI. Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 3/4". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.

Se realiza el replanteo de los recorridos de la instalación eléctrica. Se corta, dobla y ensambla la tubería EMT, utilizando uniones, adaptadores, curvas y elementos de fijación. Finalmente se verifica la continuidad y correcta fijación de la canalización, dejando preparada para el tendido de conductores.

VII. Suministro e instalación de linea de tomas 110 Y 220 TRIFILAR conductor de cobre sólido No. 14 AWG THHN/THWN en tubería conduit, incluyendo tendido, conexiones, pruebas y puesta en funcionamiento.

Se realiza el replanteo de los circuitos y puntos eléctricos. Se instalan los conductores dentro de la tubería previamente instalada, efectuando el tendido, identificación y conexión en cajas, tomacorrientes y tablero. Finalmente se realizan pruebas de continuidad, polaridad, tensión y funcionamiento.

VIII. Suministro e instalación de caja metálica tipo Rawelt 4" × 2", tres (3) salidas de 1", para instalaciones eléctricas, incluye tapa.

Se determina la ubicación de la caja de acuerdo con el diseño eléctrico. Se fija y nivela la caja metálica, realizando las conexiones con la canalización EMT mediante los accesorios correspondientes. Se instala la tapa y se verifica que quede correctamente asegurada y alineada.

IX. Suministro e instalación de tomacorriente doble tipo Leviton 15 A – 125 V, NEMA 5-15R, con tapa (placa) y accesorios.

Se instala el tomacorriente en la caja previamente dispuesta, realizando la conexión de los conductores de fase, neutro y puesta a tierra según corresponda. Se fija el dispositivo y su placa, verificando polaridad, tensión y correcto funcionamiento.

X. Suministro e instalación de caja metálica para tablero de distribución de 6 puestos, apta para instalación eléctrica residencial o comercial ligera.

Se replantea la ubicación del tablero y se prepara el área de instalación. Se fija y nivela la caja metálica, realizando las conexiones con las canalizaciones eléctricas correspondientes. Finalmente se verifica su correcta disposición para recibir los dispositivos de protección y distribución.

XI. Suministro e instalación de breaker termomagnético de 40 A, curva C, capacidad de interrupción mínima de 10 kA, para tablero de distribución.

Se instala el breaker en el tablero de distribución, conectando los conductores de alimentación y salida de acuerdo con el circuito correspondiente. Se verifica el ajuste de las conexiones y posteriormente se realizan pruebas de energización y funcionamiento del dispositivo.

XII. Suministro e instalación de luminaria LED tipo ojo de buey de sobreponer, panel circular de 24 W, luz cálida (3000 K), incluye accesorios de fijación y conexión.

Se replantea la ubicación de la luminaria y se prepara el punto eléctrico. Se fija la luminaria sobre la superficie mediante los accesorios correspondientes y se realiza la conexión eléctrica. Finalmente se energiza el circuito y se verifica su correcto funcionamiento.

XIII. Suministro e instalación de cinta LED 110 V, luz cálida (3000 K), rollo de 10 metros, incluye accesorios de conexión y fijación.

Se determina y prepara el recorrido de la cinta LED, realizando los cortes y ajustes necesarios. Se instala mediante los elementos de fijación correspondientes y se efectúan las conexiones eléctricas. Finalmente se realiza la energización y prueba de funcionamiento de la iluminación

XIV. suministro, fabricación e instalación de barra de atención exterior en acero inoxidable de 2,40 × 0,30 m, incluye estructura metálica de soporte, cubierta en acero inoxidable, cuatro (4) pie amigos en tubo inoxidable, platinas, anclajes, soldadura, acabado satinado, transporte, montaje, nivelación y pruebas de estabilidad.

Se toman medidas y se realiza el replanteo del área de instalación. Se fabrica la estructura metálica de soporte y los elementos de apoyo mediante corte, armado y soldadura. Posteriormente se instala la cubierta en acero inoxidable, se

realizan los anclajes y se efectúa el montaje, nivelación y ajuste final, verificando su estabilidad y acabado.

XV. suministro e instalación de placa de fibrocemento tipo eterboard de 14 mm, instalada sobre estructura metálica, incluye cortes, tornillería auto perforante, tratamiento de juntas, sellado, herramienta menor, desperdicios y limpieza final.

Se verifica y prepara la estructura metálica de soporte. Las placas se cortan y presentan de acuerdo con las dimensiones requeridas y se fijan mediante tornillería autoperforante. Posteriormente se tratan y sellan las juntas, se realizan los ajustes necesarios y se efectúa la limpieza final de la superficie.

XVI. suministro e instalación de placa de fibrocemento tipo eterboard de 6 mm, para revestimiento interior de muros sobre estructura metálica, incluye cortes, tornillería autoperforante, tratamiento de juntas con cinta y masilla, lijado, herramienta menor, desperdicios y limpieza final.

Se prepara la estructura metálica de soporte y se realizan los cortes de las placas según las dimensiones requeridas. Las placas se fijan mediante tornillería autoperforante. Se tratan las juntas con cinta y masilla, posteriormente se lijan y afinan las superficies, dejándolas preparadas para el acabado final.

XVII. Suministro y aplicación de pintura tipo Pintuco Baños y Cocinas, color blanco, sobre placa de fibrocemento previamente preparada, incluye sellador, dos manos de pintura, materiales y limpieza.

Se prepara la superficie de fibrocemento mediante limpieza, corrección de imperfecciones y aplicación de sellador. Una vez acondicionada la superficie, se aplican las capas de pintura requeridas, garantizando uniformidad y cubrimiento. Finalmente se realizan retoques y limpieza del área.

XVIII. suministro e instalación de guardaescobas media caña cerámico color blanco, incluye adhesivo tipo c2, boquilla impermeable, cortes, ajustes, sellado sanitario, herramienta menor, desperdicios y limpieza final.

Se prepara y limpia la superficie de instalación. Se realizan los cortes y ajustes de las piezas y se instalan mediante adhesivo, verificando alineación y nivelación. Posteriormente se aplica la boquilla impermeable y el sellado sanitario en las zonas requeridas, finalizando con la limpieza.

XIX. Suministro, fabricación e instalación de silla tipo banca en estructura metálica fabricada en tubo cuadrado de 1" × 1" calibre 16, con asiento en madera de pino inmunizada, rebordeada y barnizada, incluye soldadura, discos de corte, desbaste y flap, base catalizada, pintura y todo lo necesario para su fabricación.

Se realizan las medidas y el corte de los perfiles metálicos según el diseño. Se arma y suelda la estructura, efectuando posteriormente el desbaste y preparación de las soldaduras. La estructura se limpia y recibe base y pintura de acabado. Paralelamente se prepara la madera de pino mediante corte, rebordeado, lijado y barnizado. Finalmente se ensamblan el asiento y la estructura, verificando estabilidad y acabado.

XX. suministro e instalación de revestimiento decorativo en vinilo adhesivo blanco para exteriores, impreso digitalmente a full color y protegido con laminado mate, incluye diseño y ajuste de archivos, impresión, laminado, corte, desperdicios, preparación y limpieza de superficies, aplicación sobre fachadas, recorte en vanos y elementos existentes, mano de obra especializada, herramientas, equipos, transporte y demás elementos necesarios para su correcta ejecución.

Se realiza el diseño y ajuste del archivo gráfico de acuerdo con las dimensiones de la fachada. Posteriormente se imprime el material, se aplica el laminado protector y se realizan los cortes requeridos. La superficie de instalación se limpia y prepara previamente. Finalmente se instala el vinilo mediante aplicación controlada, realizando recortes y ajustes alrededor de vanos y elementos existentes, verificando adherencia, alineación y acabado final.

6. CONTROL DE CALIDAD

Durante el periodo reportado se verificó:

- Calidad de las soldaduras.
- Verticalidad y nivelación.

- Calidad de pintura.
- Funcionamiento de puertas.
- Funcionamiento de cerraduras.
- Revisión de acabados.
- Verificación de materiales.

7. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante el desarrollo de las actividades:

- Se utilizaron los Elementos de Protección Personal correspondientes.
- No se presentaron accidentes laborales durante el periodo informado.
- Se cumplió con los protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

---

8. NOVEDADES CONTRACTUALES

Ninguna

9. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista certifica que:

- Se encuentra al día en el pago de Seguridad Social.
- Los materiales utilizados cumplen con las especificaciones técnicas del contrato
- Se dio cumplimiento al cronograma aprobado.
- Se atendieron las observaciones formuladas por la supervisión.

---

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se anexan fotografías debidamente identificadas indicando:

- Fecha.
- Lugar.

---

11. ANEXOS

1. Registro fotográfico.
2. Planillas de Seguridad Social.

---

12. CERTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que la información contenida en el presente informe corresponde fielmente a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado y que las mismas fueron desarrolladas conforme a las obligaciones contractuales, especificaciones técnicas y disposiciones impartidas por la supervisión del contrato.

---


13. SOLICITUD

Con fundamento en el presente informe y los soportes anexos, respetuosamente solicito al Supervisor del Contrato emitir concepto favorable respecto del cumplimiento de las obligaciones ejecutadas durante el periodo reportado, para efectos de continuar con el trámite administrativo correspondiente al pago previsto en el contrato.

FIRMAS

CONTRATISTA

Nombre: Alba Nelly Monsalve Lenis
Cargo: Representante Legal
Fecha: 31/07/2026

Firma: 

ENCARGADO DE OBRA

Nombre: Daniel Alejandro Medina Palacio
Cargo: Encargado de Obra
Fecha: 31/07/2026

Firma:



Anexos

Imagen 1. Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 9, 500 PSI, diámetro 1/2", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. 10/08/2026; Calle Real



Imagen 2. Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC, con un DIÁMETRO DE 2" para redes sanitarias, incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 2", transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento 10/08/2026; Calle Real



Imagen 3. Suministro, transporte e instalación de lavatrastes en acero inoxidable, incluye: Grifería, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento 13/08/2026; Calle Real



Imagen 4. Suministro, transporte e instalacion de lavatraperas en acero inoxidable, incluye: Griferia, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, 14/08/2026; Calle Real



Imagen 5. Suministro e instalación de trampa de grasas compacta para lavatrastes, incluyendo conexiones hidráulicas y sanitarias, 14/08/2026; Calle Real



Imagen 6. Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 3/4". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y demás accesorios necesarios para su correcta instalación, 17/08/2026; Calle Real



Imagen 7. Suministro e instalación de línea de tomas 110 Y 220 TRIFILAR conductor de cobre sólido No. 14 AWG THHN/THWN en tubería conduit, incluyendo tendido, conexiones, pruebas y puesta en funcionamiento, 18/08/2026; Calle Real

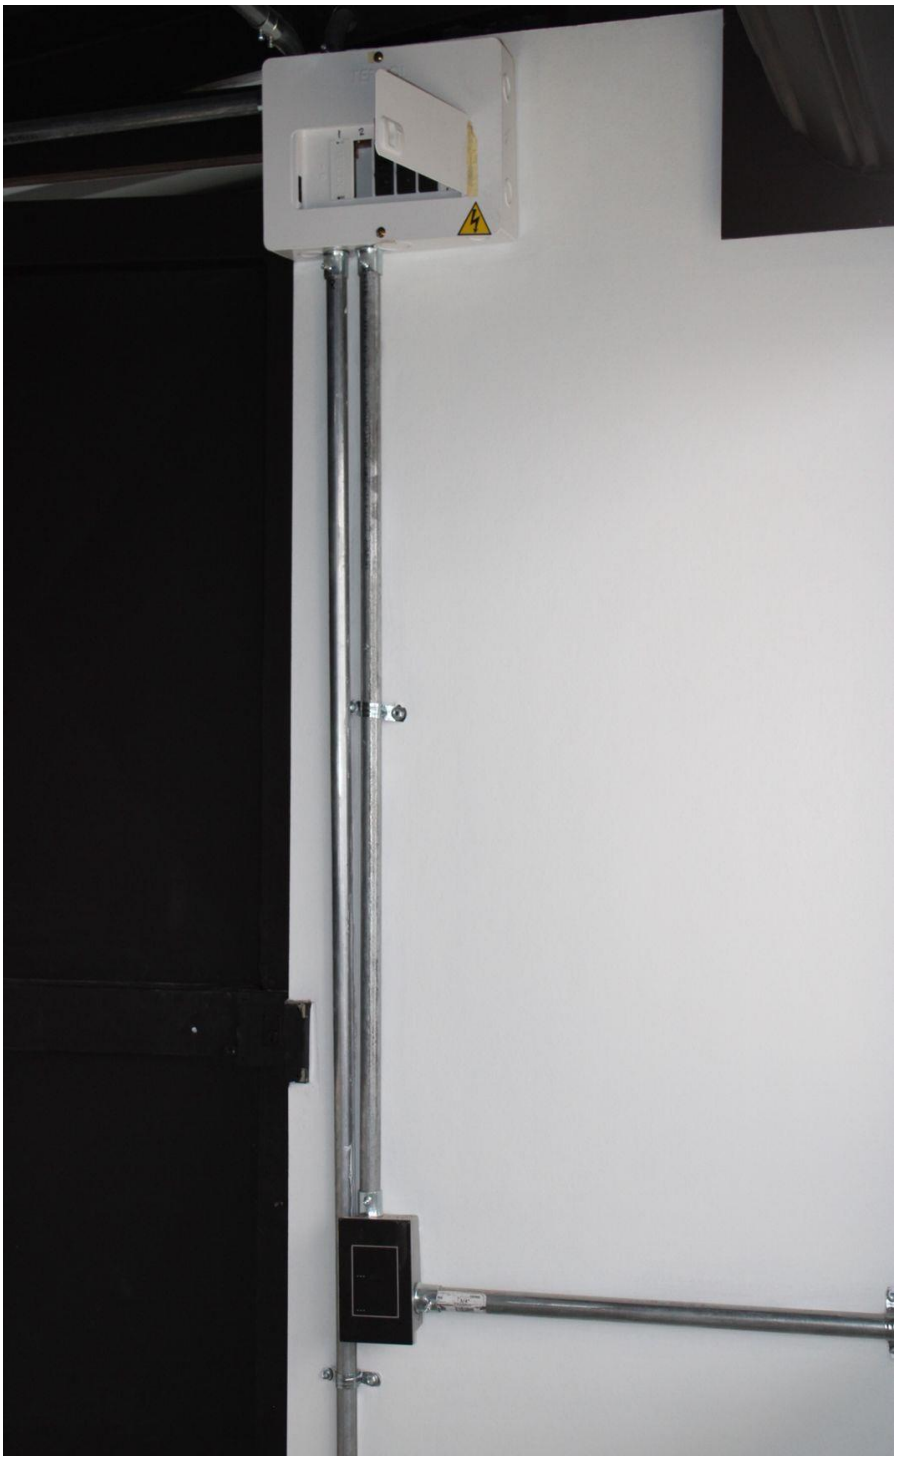


Imagen 8. Suministro e instalación de caja metálica tipo Rawelt 4" × 2", tres (3) salidas de 1", para instalaciones eléctricas, incluye tapa, 19/08/2026; Calle Real



Imagen 9. Suministro e instalación de tomacorriente doble tipo Leviton 15 A – 125 V, NEMA 5-15R, con tapa (placa) y accesorios. 19/08/2026; Calle Real



Imagen 10. Suministro e instalación de caja metálica para tablero de distribución de 6 puestos, apta para instalación eléctrica residencial o comercial ligera, 20/08/2026; Calle Real



Imagen 11. Suministro e instalación de breaker termomagnético de 40 A, curva C, capacidad de interrupción mínima de 10 kA, para tablero de distribución, 20/08/2026; Calle Real



Imagen 12. Suministro e instalación de cinta LED 110 V, luz cálida (3000 K), rollo de 10 metros, incluye accesorios de conexión y fijación, 21/08/2026; Calle Real

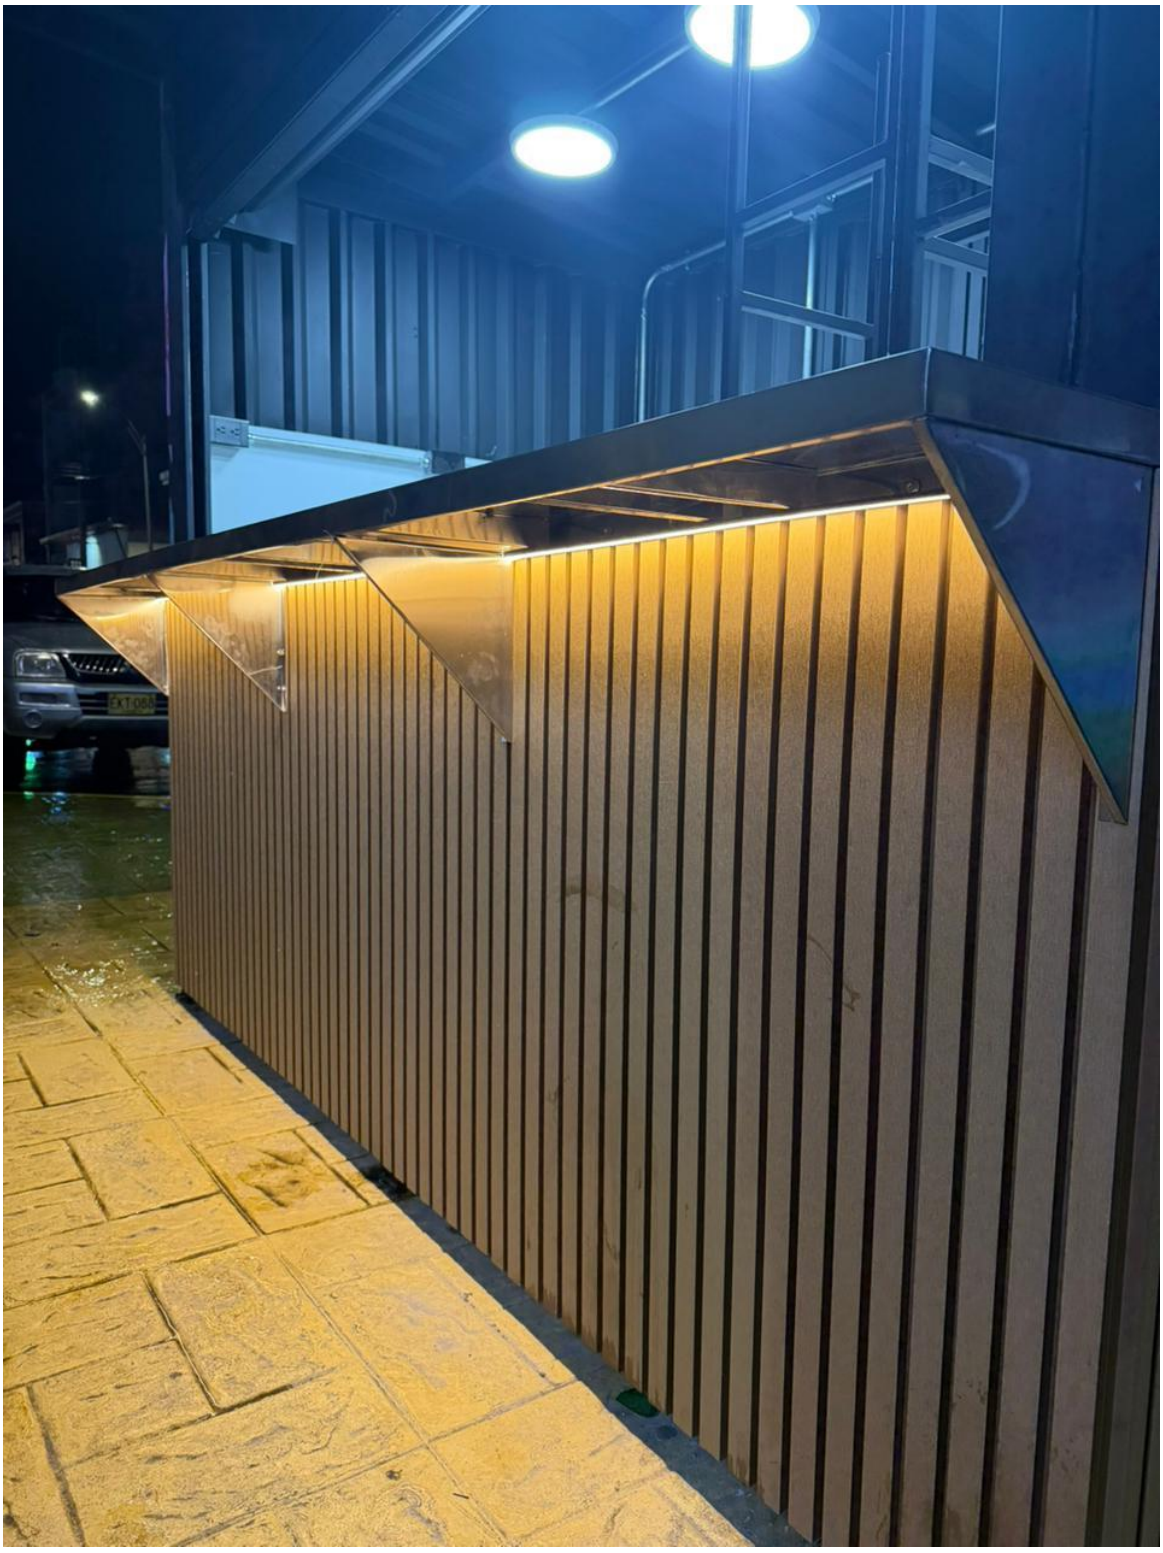


Imagen 13. suministro, fabricación e instalación de barra de atención exterior en acero inoxidable de 2,40 × 0,30 m, incluye estructura metálica de soporte, cubierta en acero inoxidable, cuatro (4) pie amigos en tubo inoxidable, platinas, anclajes, soldadura, acabado satinado, transporte, montaje, nivelación y pruebas de estabilidad, 24/08/2026; Calle Real



Imagen 14. suministro e instalación de placa de fibrocemento tipo eterboard de 14 mm, instalada sobre estructura metálica, incluye cortes, tornillería auto perforante, tratamiento de juntas, sellado, herramienta menor, desperdicios y limpieza final, 24/08/2026; Calle Real



Imagen 15. suministro e instalación de piso en baldosa cerámica blanca de alto tráfico, incluye adhesivo tipo C2, boquilla, cortes, nivelación, limpieza final, herramienta menor y desperdicios, 25/08/2026; Calle Real



Imagen 16. suministro e instalación de placa de fibrocemento tipo eterboard de 6 mm, para revestimiento interior de muros sobre estructura metálica, incluye cortes, tornillería autoperforante, tratamiento de juntas con cinta y masilla, lijado, herramienta menor, desperdicios y limpieza final, 26/08/2026; Calle Real



Imagen 17. Suministro y aplicación de pintura tipo Pintuco Baños y Cocinas, color blanco, sobre placa de fibrocemento previamente preparada, incluye sellador, dos manos de pintura, materiales y limpieza, 27/08/2026; Calle Real



Imagen 18. suministro e instalación de guardaescobas media caña cerámico color blanco, incluye adhesivo tipo c2, boquilla impermeable, cortes, ajustes, sellado sanitario, herramienta menor, desperdicios y limpieza final, 26/08/2026; Calle Real



Imagen 19. Suministro, fabricación e instalación de silla tipo banca en estructura metálica fabricada en tubo cuadrado de 1" × 1" calibre 16, con asiento en madera de pino inmunizada, rebordeada y barnizada, incluye soldadura, discos de corte, desbaste y flap, base catalizada, pintura y todo lo necesario para su fabricación., 28/08/2026; Calle Real



Imagen 20. suministro e instalación de revestimiento decorativo en vinilo adhesivo blanco para exteriores, impreso digitalmente a full color y protegido con laminado mate, incluye diseño y ajuste de archivos, impresión, laminado, corte, desperdicios, preparación y limpieza de superficies, aplicación sobre fachadas, recorte en vanos y elementos existentes, mano de obra especializada, herramientas, equipos, transporte y demás elementos necesarios para su correcta ejecución, 29/08/2026; Calle Real

