HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA
ING. CIVIL
M.P.
05202140753

INFORME PMT

HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA

ING. CIVIL

M.P.

05202140753

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT
CONTRATO N.° 019-2025

Código:	001
Version:	1
Fecha:	03/04/2025

Objeto del contrato:	Construcción de pavimento en concreto rígido, obras complementarias y sistema de alcantarillado pluvial en el barrio Los Comodatos de Arriba, en la vía Cra 41 entre Cll 33 y final de pavimento existente (sector base militar), Cll 33 entre Cra 41 y 40, Cra 41 entre Calle 33 y entrada al SENA, zona urbana del municipio de El Bagre, Antioquia.
Periodo evaluado:	3 de mayo de 2025 - 2 de junio de 2025
Presenta:	Interventoría del contrato: HUMBERTO ESTEBAN VIDES SANJONA Fecha: junio de 2025

1. Introducción.

En cumplimiento de las funciones de interventoría del Contrato N.° 019-2025, se presenta el Informe de Seguimiento y Verificación al Plan de Manejo de Tránsito (PMT), correspondiente al período comprendido entre el **03 de mayo y el 03 de junio de 2025**, durante el cual se efectuó el control y seguimiento a las medidas implementadas por el contratista **SOLINAC S.A.S.** para garantizar la movilidad y la seguridad vial en las zonas intervenidas por la ejecución de las obras.

Durante el período evaluado, la Interventoría realizó visitas técnicas a los diferentes frentes de trabajo con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el PMT aprobado, comprobando la adecuada implementación de la señalización temporal, los dispositivos para el control del tránsito, los cierres parciales de vía y las rutas de desvío establecidas para minimizar las afectaciones a peatones, residentes y usuarios de las vías intervenidas.

HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA

ING. CIVIL

M.P.

05202140753

2. Alcance de la revisión.

Durante el período comprendido entre el **03 de mayo y el 03 de junio de 2025**, la Interventoría efectuó el seguimiento y verificación de la implementación del Plan de Manejo de Tránsito, evaluando principalmente los siguientes aspectos:

- Cumplimiento de las medidas establecidas en el PMT aprobado por la autoridad competente.
- Correcta instalación y conservación de la señalización preventiva, reglamentaria e informativa en los diferentes frentes de obra.
- Implementación de cierres parciales de vía y rutas alternas para garantizar la movilidad de vehículos y peatones.
- Disponibilidad y desempeño del personal encargado del control del tránsito durante la ejecución de las actividades.
- Estado de los dispositivos de canalización y seguridad vial utilizados en las zonas intervenidas.
- Atención de las condiciones generadas por las lluvias registradas durante el período evaluado, garantizando el mantenimiento de la señalización y la seguridad de los usuarios.
- Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Interventoría en las inspecciones realizadas.

HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA
ING. CIVIL
M.P.
05202140753

3. Cuadro comparativo - Reporte del contratista vs verificación de interventoría

Actividad / Aspecto PMT	Reportado por el contratista	Verificación de interventoría	Observación
Socialización del PMT	Se continuó informando a la comunidad sobre el avance de los trabajos y los cierres temporales.	Se verificó mediante visitas de campo que la comunidad tenía conocimiento de las actividades programadas.	Cumplida.
Señalización temporal	Se mantuvo instalada la señalización preventiva, reglamentaria e informativa en los frentes activos.	La señalización permaneció visible y en condiciones adecuadas; se realizaron ajustes puntuales debido a las lluvias.	Cumplida.
Cierres parciales y desvíos	Se mantuvieron los cierres parciales de acuerdo con el avance de las obras	Se verificó el adecuado funcionamiento de los desvíos sin generar inconvenientes significativos para la movilidad.	Cumplida.
Personal de control de tráfico	Permaneció personal encargado de orientar la circulación vehicular y peatonal durante la jornada laboral.	Verificado en las visitas de interventoría, evidenciando el uso adecuado de los elementos de protección personal.	Cumplida.
Mantenimiento de la señalización	Se efectuó revisión permanente de la señalización instalada.	La Interventoria verificó reposición y reubicación de algunos dispositivos afectados por las condiciones climáticas.	Cumplida parcialmente. Se recomienda aumento de elementos reflectivos.
Seguridad vial	Se implementaron medidas preventivas para garantizar la circulación segura durante la ejecución de las obras.	No se evidenciaron situaciones que comprometieran la seguridad de peatones y usuarios de la vía.	Cumplida.
Incidentes o accidentes	No se reportaron accidentes asociados al manejo del tránsito.	La Interventoría confirmó la inexistencia de incidentes relacionados con la implementación del PMT.	Cumplida.

HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA

ING. CIVIL

M.P.

05202140753

4. Observaciones técnicas.

- Durante el período evaluado se verificó que el Plan de Manejo de Tránsito continuó implementándose conforme a las condiciones aprobadas para el desarrollo del proyecto.
- Como consecuencia de las precipitaciones registradas durante el mes de mayo, fue necesario realizar ajustes y mantenimiento periódico a algunos dispositivos de señalización temporal para conservar su visibilidad y estabilidad.
- Se constató que los cierres parciales de vía y las rutas alternas permitieron mantener la movilidad de residentes y usuarios sin generar afectaciones significativas.
- La coordinación entre el contratista, la Interventoría y las entidades de apoyo facilitó el desarrollo seguro de las actividades ejecutadas en los diferentes frentes de obra.

5. Cumplimiento normativo.

La Interventoría verificó el cumplimiento de:

- Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado para la ejecución del proyecto.
- Manual de Señalización Vial – Dispositivos Uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia.
- Especificaciones técnicas y obligaciones contractuales relacionadas con la implementación del PMT.
- Medidas de seguridad vial establecidas para la protección de peatones, trabajadores y usuarios de las vías intervenidas.

6. Conclusiones.

- El contratista SOLINAC S.A.S. cumplió en general con la implementación del PMT.
- Las medidas aplicadas garantizaron la seguridad de peatones, conductores y trabajadores.
- No se registraron incidentes, accidentes ni reclamaciones comunitarias.

7. Recomendaciones.

1. Mantener la inspección diaria de la señalización temporal y los dispositivos de control de tránsito, especialmente durante períodos de lluvia.
2. Continuar realizando el mantenimiento y reposición inmediata de los elementos de señalización que presenten deterioro o desplazamiento.

HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA

ING. CIVIL

M.P.

05202140753

3. Conservar la coordinación permanente entre el Contratista, la Interventoría y Aguas de El Bagre para evitar interferencias entre los frentes de trabajo y garantizar la movilidad segura.
4. Continuar con la socialización de las actividades programadas y de los cambios en la circulación vehicular y peatonal con el fin de minimizar las afectaciones a la comunidad.

8. Registro fotográfico

[Se adjunta evidencia fotográfica correspondiente al seguimiento del PMT]


HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONAC.C
98.654.946

HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA

ING. CIVIL

M.P.

05202140753

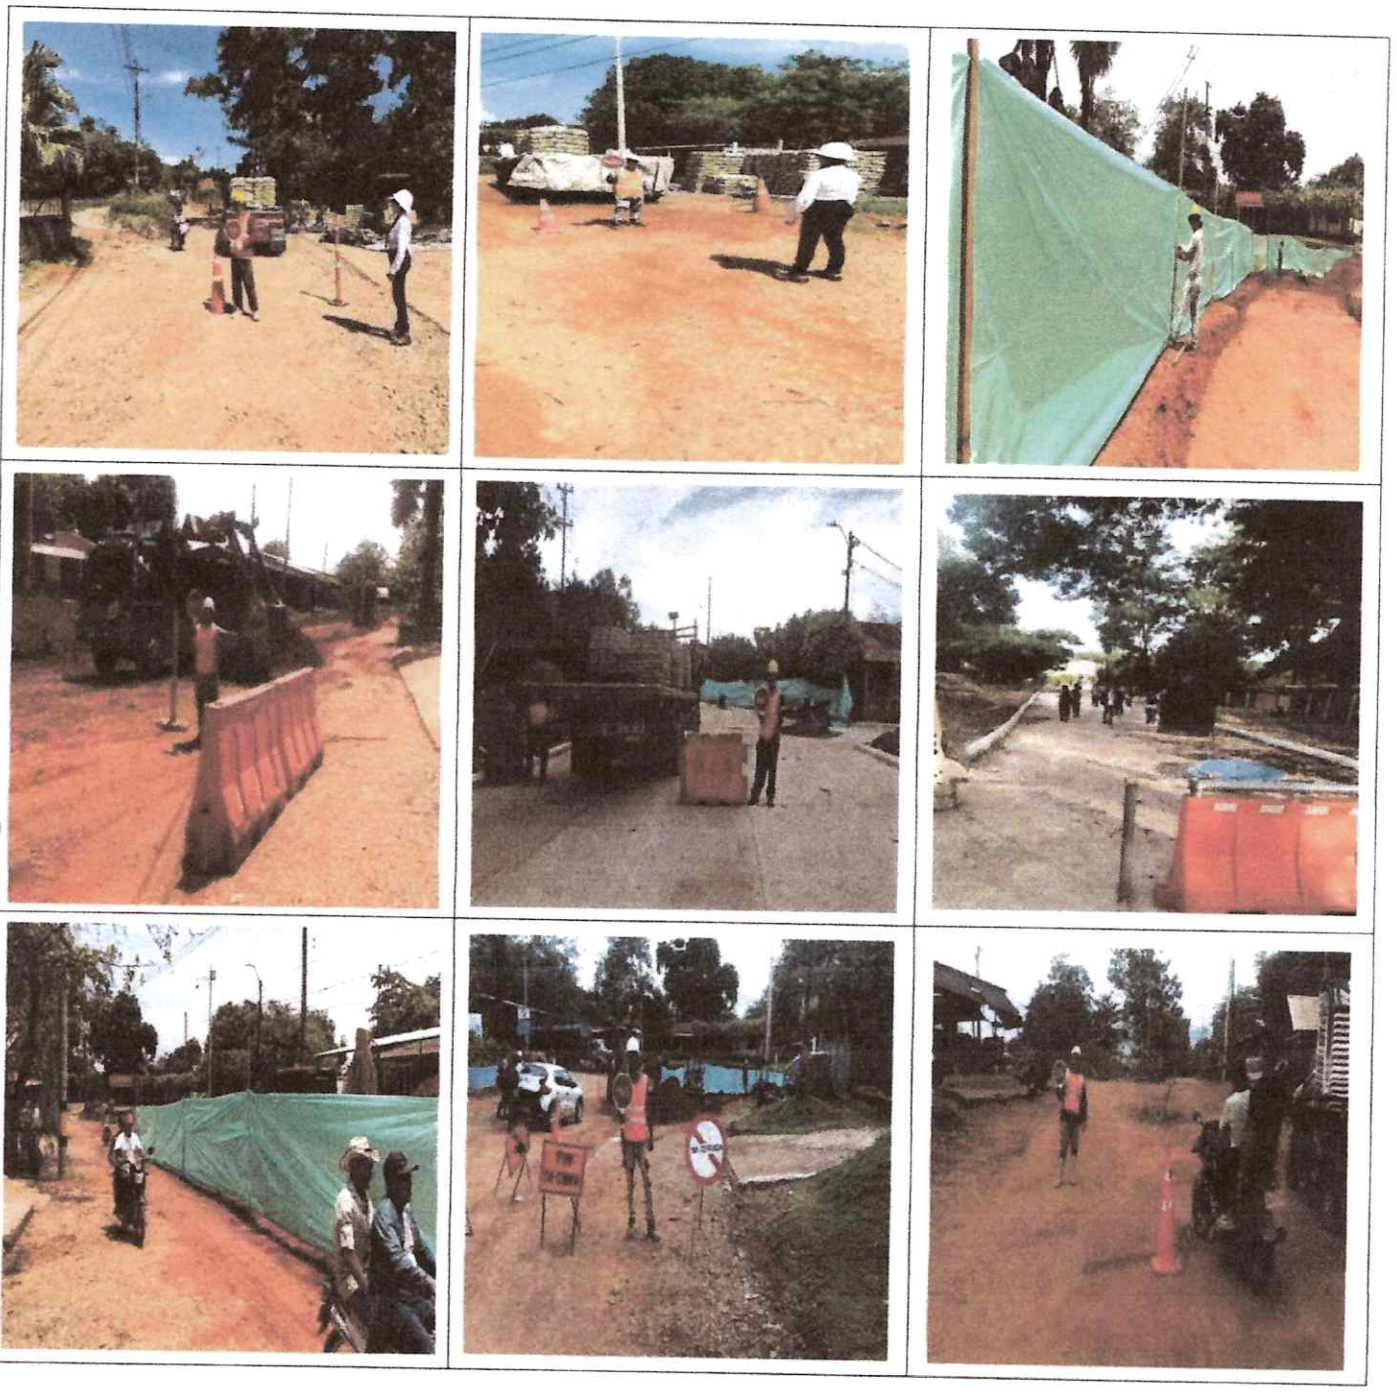

RECIBO DE NOMINA

PERIODO COMPRENDIDO LOS DIAS: 1 DE ABRIL DE 2026 AL 15 DE ABRIL DE 2026

CONTRATANTE	SOLINAC CONSTRUCTORA
NIT	900483091-7
PAGADO A NOMBRE DE	JOSE DEL CARMEN BOHORQUEZ GARCIA
CEDULA DE CIUDADANIA	15.309.827
CARGO	AUXILIAR DE TRAFICO


INFORMACION SALARIAL


SALARIO MENSUAL ACORDADO (DURANTE 30 DIAS)	$ 3.451.600,00	AUX TRANSP PRIMAS CESANTIAS LIQUIDACION ETC	VALOR INCLUIDO EN EL SALARIO MENSUAL ACORDADO
VALOR DIARIO (DIA)	$ 115.050,00	SALUD PENSION	VALOR ASUMIDO 100% POR EL CONTRATANTE


DETALLE VALOR DE NOMINA

DEVENGADOS	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DIAS LABORADOS	13	$ 115.050,00	$ 1.495.650,00
HORAS EXTRAS DIURNAS	0	$ [illegible]	$
DIAS INCAPACIDAD	0	$ 76.703,84	$

DEDUCCIONES	
PRESTAMOS	$
OTRAS DEDUCCIONES	$
TOTAL DEDUCCION	$

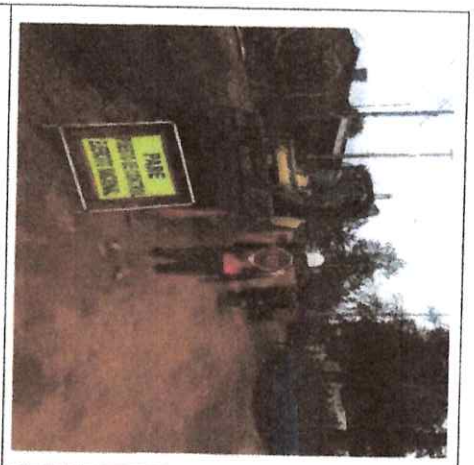

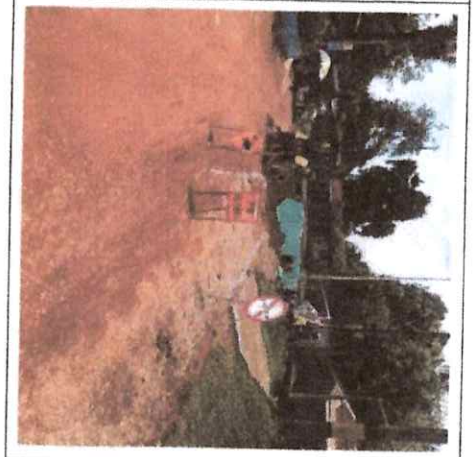

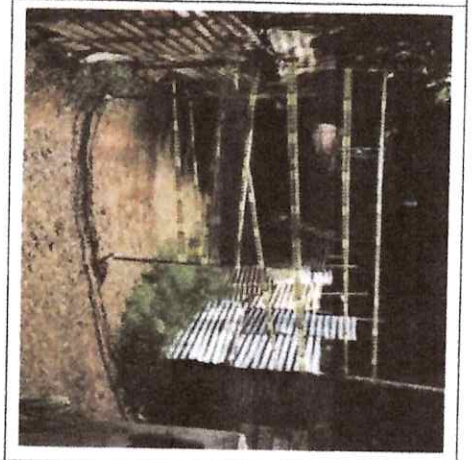

HUMBERTO ESTEBAN VIDES SALONA
ING. CIVIL
M.P.
0520140753

HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA
ING. CIVIL
M.P.
05202140753

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

N°. Certificado: 1965
Fecha: 16/01/2025

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Servicio Tecnico NOVA S.A.S
NIT. 901163978-5

DATOS DEL CLIENTE

Nombre	**INVERSIONES MEGALOSA S.A.S.**	Nit/ C.C	**900491714**
Dirección	**BRR BOSQUES DE MINEROS B 25**	Ciudad	**EL BAGRE**
Telefono	**3234201131**	Fecha de Expiración	**15/07/2025**

DATOS DEL EQUIPO

Equipo	**NIVEL AUTOMATICO**	Marca	**AUTO LEVEL**
Modelo	**DSZ32C**	N° Serial	**S/N**
Aumentos	**32X**	Precisión	**(+/-)2mm*Km en Nivelación**

Basado en los procedimientos según norma ISO 17123-1-2-3-4, estipulada por el fabricante a continuación se describen los ajustes realizados al equipo

Inspección Mecánica

Partes	AJUSTE	REPARACIÓN	MANTENIMIENTO	CAMBIO DE PIEZAS	N / A
Base Nivelante			X		
Movimientos Laterales					X
Compensador Automático					X
Optica - Lentes - Oculares					X
Nivel esférico	X				
Error Detectado	0.0003				
Error despues de Ajustado	0.000				

Equipo verificado, ajustado y patronado bajo las normas ISO 17123 de acuerdo a los procedimientos dados por el fabricante

Observaciones:

El instrumento se encuentra en buen funcionamiento, se recomienda realizar chequeos de campo.
El cliente es responsable del buen transporte del equipo, ya que las vibraciones y manipulación no adecuada pueden desajustarlo

HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
Técnico Laboratorio

N°. Certificado: 1964
Fecha: 16/01/2025

CERTIFICADO DE CALIBRACION

Servicio Tecnico NOVA S.A.S
NIT. 901163978-5

DATOS DEL CLIENTE

Nombre	**INVERSIONES MEGALOSA S.A.S.**	Nit/ C.C	**900491714**
Dirección	**BRR BOSQUES DE MINEROS B 25**	Ciudad	**EL BAGRE**
Telefono	**3234201131**	Fecha de Expiración	**15/07/2025**

DATOS DEL EQUIPO

Equipo	**ESTACION TOTAL**	Marca	**KOLIDA**
Modelo	**KTS-442UT**	N° Serial	**K158270**
Aumentos	**30X**	Precisión	**2''**

Basado en los procedimientos segun norma ISO 17123-1-2-3-4, estipulada por el fabricante a continuación se describen los ajustes realizados al equipo

Inspección Mecánica

Partes	A	R	M	CP	N/A
Base Nivelante			x		
Frenos - paso lento Hz y Vt					x
Teclados y contactos					x
Eje Hz y Vt					x
Sistema de enfoque					x
Verticalidad					x
Niveles tubulares y esférico	x				

Inspección Electrónica

Partes	A	R	M	CP	N/A
Distanciómetro					x
Nonios Hz y Vt					x
Puntero laser					x
Compensador Electrónico	x				
Plomada Láser / óptica	x				
Sensores Hz y Vt					x

(A) Ajuste (R) Reparacion (M) Mantenimiento (CP) Cambio de piezas (N/A) No aplica

AJUSTE ANGULAR Y DISTANCIA

Patrón	Fase 1	Fase 2	Residuo	Tolerancia	Cierre	Error
Vertical	90,0000	270,0012	0,0012	(+ / -) 0.0002	270.0000	0,0000
Horizontal	0,0000	180,0004	0,0004	(+ / -) 0.0002	180.0000	0,0000
Distancia	5,5290	5,5290	0.0000	(+ / -) 0.001	5,5290	0,0000

Equipo verificado, ajustado y patronado bajo las normas ISO 17123 de acuerdo a los procedimientos dados por el fabricante

Observaciones:

El instrumento se encuentra en buen funcionamiento, se recomienda realizar chequeos de campo.
El cliente es responsable del buen transporte del equipo, ya que las vibraciones y manipulacion no adecuada pueden desajustarlo

HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
Técnico Laboratorio

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO
ULTRACEM S.A.S

F.V: 01-03-2017

CEMENTO HIDRÁULICO GRIS TIPO UG DE USO GENERAL

VERSIÓN 3.

Codigo 284

PLANTA:	ULTRACEM S.A.S
DIRECCION:	Km 2.5 VIA CORDIALIDAD,GALAPA
FECHA DE PRODUCCIÓN:	1/05/2025 – 15/05/2025
PRESENTACIÓN:	GRANEL/ENSACADO
CLIENTE:	

ENSAYOS FÍSICOS	METODO DE ENSAYO	RESULTADO	NTC 121	ASTM C 1157	ULTRACEM
Contenido de Aire en volumen, %	NTC 224	8,63	Max. 12,0	Max. 12,0	Max. 12,0
Finura (permeabilidad al aire), cm^2/g	NTC 33	5510	–	–	–
Finura en tamiz N° 325 (45µm), %	NTC 294	95,81	–	–	–
Expansión barras de Mortero (14 dias), %	NTC 4927	0,006	Max. 0,020	Max. 0,020	Max. 0,020
Resistencia a la Compresión					
1 Dia, MPa (psi)	NTC 220	6,5 (940)	–	–	–
3 Dias, MPa (psi)	NTC 220	12,7 (1840)	Min. 8,0 (1160)	Min. 13,0 (1890)	Min. 8,0 (1160)
7 Dias, MPa (psi)	NTC 220	17,7 (2560)	Min. 15,0 (2176)	Min. 20,0 (2900)	Min. 15,0 (2176)
28 Dias, MPa (psi)	NTC 220		Min. 24,0 (3481)	Min. 28,0 (4060)	Min. 24,0 (3481)
Tiempo de Fraguado (Vicat) METODO A					
Tiempo inicial de fraguado, min	NTC 118	150	Min. 45; Max. 420	Min. 45; Max. 420	Min. 45; Max. 420
Tiempo final de fraguado, min	NTC 118	220	–	–	–

Se certifica que el CEMENTO HIDRÁULICO ULTRACEM GRIS TIPO USO GENERAL cumple con la norma Técnica Colombiana NTC 121 para Cemento tipo UG.

Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los metodos de muestreo y ensayos de acuerdo con las frecuencias e instructivos establecidos en el PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN PARA LA GESTION DE PRODUCCIÓN DE CEMENTO de Ultracem S.A.S. Aplica para las producciones realizadas durante el periodo comprendido en "Fecha de Producción"

FIRMA: ***Cargo: Gerente de Calidad Cementos***

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO
ULTRACEM S.A.S

F.V: 01-03-2017

VERSIÓN 3.

CEMENTO HIDRÁULICO GRIS TIPO UG DE USO GENERAL

Codigo 285

PLANTA:	ULTRACEM S.A.S
DIRECCION:	Km 2.5 VIA CORDIALIDAD,GALAPA
FECHA DE PRODUCCIÓN:	16/05/2025 — 31/05/2025
PRESENTACION:	GRANEL/ENSACADO
CLIENTE:	

ENSAYOS FÍSICOS	METODO DE ENSAYO	RESULTADO	NTC 121	ASTM C 1157	ULTRACEM
Contenido de Aire en volumen, %	NTC 224	8,30	Max. 12,0	Max. 12,0	Max. 12,0
Finura (permeabilidad al aire), cm^2/g	NTC 33	5646	—	—	—
Finura en tamiz N° 325 (45µm), %	NTC 294	95,81	—	—	—
Expansión barras de Mortero (14 dias), %	NTC 4927		Max. 0,020	Max. 0,020	Max. 0,020
Resistencia a la Compresión					
1 Dia, MPa (psi)	NTC 220	7,4 (1070)	—	—	—
3 Dias, MPa (psi)	NTC 220	13,2 (1920)	Min. 8,0 (1160)	Min. 13,0 (1890)	Min. 8,0 (1160)
7 Dias, MPa (psi)	NTC 220	0 ()	Min. 15,0 (2176)	Min. 20,0 (2900)	Min. 15,0 (2176)
28 Dias, MPa (psi)	NTC 220		Min. 24,0 (3481)	Min. 28,0 (4060)	Min. 24,0 (3481)
Tiempo de Fraguado (Vicat) METODO A					
Tiempo inicial de fraguado, min	NTC 118	145	Min. 45; Max. 420	Min. 45; Max. 420	Min. 45; Max. 420
Tiempo final de fraguado, min	NTC 118	220	—	—	—

Se certifica que el CEMENTO HIDRÁULICO ULTRACEM GRIS TIPO USO GENERAL cumple con la norma Técnica Colombiana NTC 121 para Cemento tipo UG.

Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los métodos de muestreo y ensayos de acuerdo con las frecuencias e instructivos establecidos en el PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEDICION PARA LA GESTION DE PRODUCCIÓN DE CEMENTO de Ultracem S.A.S. Aplica para las producciones realizadas durante el periodo comprendido en "Fecha de Produccion"

FIRMA: ***Cargo: Gerente de Calidad Cementos***

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**
Página Web: **www.ternium.com.co**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **PVCENTRO PARAGUAY**
Dirección: **CLL PPAL PARAGUAY CAUCASIA**
Teléfono: **8394990**

Fecha Impresión: **25/05/09**
No. Remisión: **165056407**
Página: **3 de 5**

Informe N°: **73214**
Informe Ant N°:
Centro: **Centro Monteria**

DATOS GENERALES / PROPIEDADES FISICAS

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PROD	FABRICANTE	Resistencia Fluencia MPa	Resistencia Tracción MPa	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BFO4455029	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	497	630	16.7	SinGrieta	1.27
C8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	BFO4443371	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	475	616	17.1	SinGrieta	1.30
C8001437	BARRA COR 1/4" 6m NTC2289/G60 ENDEREZADO	1AB_13533	NTC 2289 GR60	ACER. PAZ DE RIO	463.56	642.26	15.39	SinGrieta	1.39
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BFO4455382	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	470	617	17.00	SinGrieta	1.31
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BFO4457327	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	476	608	17.24	SinGrieta	1.28
C8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BID0068181	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	469	633	18.2	SinGrieta	1.35
C8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BID0068183	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	469	633	18.2	SinGrieta	1.35

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**
Página Web: **www.ternium.com.co**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **PVCENTRO PARAGUAY**
Dirección: **CLL PPAL PARAGUAY CAUCASIA**
Teléfono: **8394990**

Fecha Impresión: **25/05/09**
No. Remisión: **165056407**
Página: **4 de 5**

Informe N°: **73214**
Informe Ant N°:
Centro: **Centro Monteria**

DATOS GENERALES

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PROD	FABRICANTE	Peso Metro (Masa) Kg/m	Altura Resalte mm	Separación Extremos mm	Espaciamiento mm
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BFO4455029	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico		0.66	2.1	8.2
C8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	BFO4443371	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico		0.60	2.5	7.5
C8001437	BARRA COR 1/4" 6m NTC2289/G60 ENDEREZADO	1AB_13533	NTC 2289 GR60	ACER. PAZ DE RIO	0.243	0.38	2.1	4.3
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BFO4455382	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico		0.51	2.5	6.2
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BFO4457327	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico		0.50	2.7	6.1
C8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BID0068161	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico		0.40	2.2	5.8
C8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BID0068183	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico		0.40	2.2	5.8

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**
Página Web: **www.ternium.com.co**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **PVCENTRO PARAGUAY**
Dirección: **CLL PPAL PARAGUAY CAUCASIA**
Teléfono: **8394990**

Fecha Impresión **25/05/09**
No. Remisión: **165056407**
Página: **5 de 5**

Informe N°: **73214**
Informe Ant N°:
Centro: **Centro Monteria**

DATOS GENERALES

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PROD	FABRICANTE	Angulo Resalte °	Peso Metro (Masa) Kg/m
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BFO4455029	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	50	0.975
C8001354	BARRA COR 12mm 6m NTC2289/G60	BFO4443371	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	50	0.867
C8001437	BARRA COR 1/4" 6m NTC2289/G60 ENDEREZADO	1AB_13633	NTC 2289 GR60	ACER. PAZ DE RIO		
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BFO4455382	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	54	0.547
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BFO4457327	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55	0.546
C8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BID0068161	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55	0.506
C8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BID0068183	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55	0.506

PROPIEDADES DIMENSIONALES

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according to ISO/IEC 17067) for:

TUBERÍA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO ACAMPANADA - ACCESORIOS PARA TUBERÍA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO

Fabricado por **PVC GERFOR S.A.S** en la **Autopista Medellín kilómetro 2, 600 m, vía Parcelas, Cota, Cundinamarca, Colombia** identificada con **número de NIT 860.502.509-1**

Manufactured by **PVC GERFOR S.A.S** in the **Autopista Medellín kilómetro 2, 600 m, vía Parcelas, Cota, Cundinamarca, Colombia** identified with **NIT number 860.502.509-1**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 5055 (2018)

Tubos y accesorios de Poli (cloruro de vinilo) (PVC) perfilados para uso en alcantarillado por gravedad, controlados por el diámetro interno

Poly (vinyl chloride) (PVC) profile gravity sewer pipe and fittings based on controlled inside diameter

SECTOR ICS: 23.040.20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC -CER495354
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	2016-09-23	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	2024-10-30
Fecha de Renovación: Renewal Date:	2022-04-08	**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2028-04-07

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

GERENCIA DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO

Fecha de 21/08/2019 Hora: 12:01:45

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO	Expediente: H7414005 RMN: HHCG-01
MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (L 685)	
Vigencia Desde: 07/02/2007 Hasta: 06/02/2037	Fecha y Hora de Registro: 07/02/2007 00:00:00

TITULARES:
ARENERA SANTA CLARA S.A.S.

IDENTIFICACIÓN
N 9010111783

AREA TOTAL: 22 Hectárea(s) y 6732 ml(s)2

MUNICIPIOS: CÁCERES-ANTIOQUIA\
CAUCASIA-ANTIOQUIA

MINERALES: GRAVA\ ARENA

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

AREA: 1
PUNTO ARCIFINIO: SE TOMO EL PUNTO UNO DE LA ALINDERACION
NORTE: 1371640,0000
ESTE: 876000,0000
PLANCHA IGAC: 82

ALINDERACIÓN

Coordenada Norte	Coordenada Este
1371640,0000	876550,0000
1371183,0000	876550,0000
1371183,0000	876854,0000
1371163,0000	876854,0000
1371163,0000	876744,0000
1371090,0000	876744,0000
1371090,0000	876938,0000
1371163,0000	876938,0000
1371163,0000	876000,0000

ANOTACIONES

ANOTACIÓN: 1
TIPO ANOTACIÓN: CONTRATO UNICO DE CONCESION
DOCUMENTO CONTRATO
EXPEDIDO POR: REGIONAL BOGOTA
LUGAR: MEDELLÍN
FECHA ANOTACIÓN: 07/02/2007
FECHA EJECUTORIA: 27/12/2006
NÚMERO: 7414
FECHA DOCUMENTO: 27/12/2006

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

GERENCIA DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO

Fecha de 21/08/2019 Hora: 12:01:45

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO	Expediente: H7414005 RMN: HHCG-01
MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (L 685)	
Vigencia Desde: 07/02/2007 Hasta: 06/02/2037	Fecha y Hora de Registro: 07/02/2007 00:00:00

INSCRIPCION DEL CONTRATO DE CONCESION NO. 7414

ANOTACIÓN:	2	FECHA ANOTACIÓN:	28/12/2011
TIPO ANOTACIÓN:	CESION TOTAL DE DERECHOS	FECHA EJECUTORIA:	28/10/2011
DOCUMENTO	RESOLUCION	NÚMERO:	027059
EXPEDIDO POR:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	FECHA DOCUMENTO:	05/10/2011
LUGAR:	MEDELLÍN		
ESPECIFICACIÓN	APROBAR LA CESION DE LA TOTALIDAD DE DERECHOS MINEROS, SOLICITADA POR EL SEÑOR JHON MARIO MARTINEZ DOVAL, A FAVOR DEL SEÑOR JOSE BAYRON PIEGRAHITA CEBALLOS.		

ANOTACIÓN:	3	FECHA ANOTACIÓN:	17/10/2017
TIPO ANOTACIÓN:	CESION TOTAL DE DERECHOS	FECHA EJECUTORIA:	27/06/2017
DOCUMENTO	RESOLUCION	NÚMERO:	2017060082604
EXPEDIDO POR:	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	FECHA DOCUMENTO:	30/05/2017
LUGAR:	MEDELLÍN		
ESPECIFICACIÓN	ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR dentro del Contrato de Concesión Minera con placa No. 7414(H7414005), la CESIÓN TOTAL DE DERECHOS MINEROS pertenecientes al señor JOSE BAYRON PIEDRAHITA CEBALLOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.399.245, a favor de la sociedad ARENERA SANTA CLARA S.A.S., con Nit. 901.011.176-3. ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR como TITULAR DEL CIEN POR CIENTO (100%) de los derechos del contrato de concesión minera con placa 7414(H7414005), a la sociedad ARENERA SANTA CLARA S.A.S. De conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la Resolución No. 2017060082604, proferida por la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia el día 30/05/2017, la cual quedó legalmente ejecutoriada y en firme el día 27/06/2017.		

NOTA ACLARATORIA

De acuerdo con la circular Número 0010 del 18 de junio de 2015 expedida por la Agencia Nacional de Minería ANM -, se fija la directriz relacionada con la inscripción de prendas mineras, donde se determina que "Por disposición de la Ley 1676 de 2013 y el Decreto 400 de 2014 las garantías mineras o cualquier gravamen que recaiga sobre el derecho a explorar y explotar en los términos de la señalada norma, deben ser consultadas en el registro de Garantías Mobiliarias, el cual se desarrollará por parte de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecamaras)".

********** FIN DE ESTE DOCUMENTO **********

Nathalie Molina Villarreal
Gerente de Catastro y Registro Minero

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

Certificado

Registro Único de RUCOM

Registro **RUCOM-2023090125661**

En cumplimiento del Capítulo 6° del Decreto Único Reglamentario del Sector de Minas y Energía No. 1073 del 25 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería certifica que ARENERA SANTA CLARA S.A.S. con NIT número 901011176 acredita la calidad de comercializador autorizado inscrito en el Registro Único de Comercializadores de Minerales.

La presente certificación permite al comercializador realizar de forma regular la actividad de comprar y vender minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos, intermediarlos, exportarlos o consumirlos y tiene una vigencia del 28-06-2024 hasta el 31-07-2025. Durante el mes de mayo de 2025 el interesado debe realizar los trámites de renovación indicada en el Decreto 1073 de 2015.

Se acredita al comercializador de minerales luego de verificar y validar la información suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - y consultar en la Base de datos de Confecámaras.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO AUTORIZA AL COMERCIALIZADOR A REALIZAR ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MINERALES.

Los minerales autorizados para ser comercializados son: ARENAS Y GRAVAS NATURALES Y SILICEAS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS

Dado en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de junio del año 2024.

JAIME ALONSO GARCÍA ARANGO
Gerente - Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

JAVIER TORRES
28-06-2024 09:48

Este documento ha sido firmado digitalmente con un certificado provisto por una entidad autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28 de la ley 527 de 1999, y 15 del Decreto 1747 de 2000. La firma digital aquí impuesta es el equivalente electrónico de la firma manuscrita.
La autenticidad del presente certificado podrá ser validada ingresando a www.anm.gov.co, con el número Registro RUCOM disponible en este certificado.

CORANTIOQUIA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI		
CONSTANCIA		
CÓDIGO: FT-GIC-06	VERSIÓN: 04	PÁGINA: 1 DE 1

CORANTIOQUIA - Oficina Territorial Panzenu Caucasia
CONSTANCIA
JOSE BAYRON PIEDRAHITA CEBALLOS

160PZ-CON2304-158

Favor citar este número para responder

Anexos: ninguno
Archivar en: 160PZ3-2015-2\JOSE BAYRON PIEDRAHITA CEBALLOS
Radicado por: Jorge Luis Sierra Gaspar

HACE CONSTAR:

Que la sociedad ARENERA SANTA CLARA S.A.S identificada con el NIT N°901.011.176-3, representada legalmente por el señor RONALD TENORIO FRANCO identificado con cédula de ciudadanía N°14.472.975, funge como titular de una Licencia Ambiental vigente otorgada por esta Corporación mediante Resolución N°160PZ-1612-4029 del 29 de diciembre de 2016 dentro del expediente PZ3-2015-2, para el proyecto minero denominado "EL ARCA DE NOÉ", en el Contrato de Concesión Minera N° 7414 de 2006, con RMN HHCG-01 del 07 de febrero de 2007, para la explotación de una mina de arenas y gravas naturales, ubicado en la Vereda Río Man del Municipio de Cáceres, departamento de Antioquia.

Esta constancia se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,

JULIANA LUCIA PALACIO BERMUDEZ
Jefe Oficina Territorial Panzenu

Expediente: PZ3-2015-2
Tiempo: 0,5 Hora
Número de Asignación: PZ-23-158.
Elaboró: Carlos Esteban Monsalve.
Revisó: Carlos Esteban Monsalve.
Fecha de Elaboración: 14/04/2023.

Carrera 65 No 44A-32
Medellín – Colombia
Tel: 57 (4) 493 88 88
corantioquia@corantioquia.gov.co

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141060078558

(415)7707212489984(8020) 000014106007855 8

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 9 0 1 0 1 1 1 7 6

6. DV 3

12. Dirección seccional Impuestos de Medellin 1 1

13. Buzon electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona juridica 1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificacion

Lugar de expedición 28. Pais

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social ARENERA SANTA CLARA SAS

36. Nombre comercial

37. Sig..

UBICACIÓN

38. Pais COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento Antioquia 0 5

40. Ciudad/Municipio Medellin 0 0 1

41. Dirección principal CL 49 65 A 15 OF 202

42. Correo electrónico contadoramedellin@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1 6 0 4 2 0 5 9 3 2 1

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Numero establecimientos
0 8 1 1	2 0 1 7 1 1 0 1	4 9 2 3	2 0 1 9 0 1 0 8	4 6 6 3			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 5 7 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

07- Retención en la fuente a título de rent

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Codigo

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

984. Nombre MIRANDA AGUIRRE FRANCISCO ANDRES

985. Cargo Representante legal Certi

CamScanner

Fecha generación documento PDF: 28-04-2025 03:37:41PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141060078558

(415)7707212489984(8020) 000014106007855 8

5. Numero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzon electronico
9 0 1 0 1 1 1 7 6	3	Impuestos de Medellin	1 1

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas Asociativas	3	64. Entidades o institutos de derecho publico de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personeria juridica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Numero		
73. Fecha	2 0 1 6 0 9 1 6	
74. Numero de notaria		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 9 2 1	
77. No. Matricula mercantil	0 0 5 7 0 8 5 8 1 2	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 6 0 9 1 6	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional publico	0 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero publico	0 0 %
87. Extranjero privado	0 0 %

88. Entidad de vigilancia y control

Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 9 2 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

CamScanner

Fecha generación documento PDF 28-04-2025 03:37:41PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

Pagina 3 de 6 Hoja 3

4. Número de formulario 141060078558

(415)7707212489984(8020) 000014106007855 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 0 1 1 1 7 6 | 6. DV 3

12. Dirección seccional: Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Representación

1

98. Representación: REPRS LEGAL PRIN 1 8

99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 1 8 1 0 0 1

100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadani 1 3

101. Número de identificación: 1 0 8 9 0 0 2 6 4 6

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido: MIRANDA

105. Segundo apellido: AGUIRRE

106. Primer nombre: FRANCISCO

107. Otros nombres: ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

2

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

3

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

4

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

5

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

CamScanner

Fecha generación documento PDF 28-04-2025 03:37:41PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141060078558

(415)7707212489984(8020) 000014106007855 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 0 1 1 1 7 6 3 | 6. DV: 1 | 12. Dirección seccional: Impuestos de Medellín | 14. Buzón electrónico

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1
- 111. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía
- 112. Número de identificación: 1 3 7 0 1 6 0 7 8 8
- 113. DV:
- 114. Nacionalidad: COLOMBIA 1 6 9
- 115. Primer apellido: CIRO
- 116. Segundo apellido: PARRA
- 117. Primer nombre: FRANCISCO
- 118. Otros nombres: JAVIER
- 119. Razón social:
- 120. Valor capital del socio:
- 121. % Participación:
- 122. Fecha de ingreso: 2 0 1 6 0 9 2 1
- 123. Fecha de retiro:

2
- 111. Tipo de documento:
- 112. Número de identificación:
- 113. DV:
- 114. Nacionalidad:
- 115. Primer apellido:
- 116. Segundo apellido:
- 117. Primer nombre:
- 118. Otros nombres:
- 119. Razón social:
- 120. Valor capital del socio:
- 121. % Participación:
- 122. Fecha de ingreso:
- 123. Fecha de retiro:

3
- 111. Tipo de documento:
- 112. Número de identificación:
- 113. DV:
- 114. Nacionalidad:
- 115. Primer apellido:
- 116. Segundo apellido:
- 117. Primer nombre:
- 118. Otros nombres:
- 119. Razón social:
- 120. Valor capital del socio:
- 121. % Participación:
- 122. Fecha de ingreso:
- 123. Fecha de retiro:

4
- 111. Tipo de documento:
- 112. Número de identificación:
- 113. DV:
- 114. Nacionalidad:
- 115. Primer apellido:
- 116. Segundo apellido:
- 117. Primer nombre:
- 118. Otros nombres:
- 119. Razón social:
- 120. Valor capital del socio:
- 121. % Participación:
- 122. Fecha de ingreso:
- 123. Fecha de retiro:

5
- 111. Tipo de documento:
- 112. Número de identificación:
- 113. DV:
- 114. Nacionalidad:
- 115. Primer apellido:
- 116. Segundo apellido:
- 117. Primer nombre:
- 118. Otros nombres:
- 119. Razón social:
- 120. Valor capital del socio:
- 121. % Participación:
- 122. Fecha de ingreso:
- 123. Fecha de retiro:

CamScanner
Fecha generación documento PDF 28-04-2025 03:37:41PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

Pagina 5 de 6 **Hoja 5**

4. Número de formulario 141060078558

(415)7707212489984(8020) 000014106007855 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 0 1 1 1 7 6 | 6 DV 3

12. Dirección seccional Impuestos de Medellín 1 1

14. Buzón electrónico

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3 | 149. Número de identificación: 3 3 3 9 6 6 9 1 | 150. DV: 1 | 151. Número de tarjeta profesional: 1 0 9 2 0 2 T

152. Primer apellido: GOMEZ | 153. Segundo apellido: CORREA | 154. Primer nombre: JAVIER | 155. Otros nombres: ALONSO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 4 0 7 0 1

CamScanner

Fecha generación documento PDF 28-04-2025 03:37:41PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

Página 6 de 6 Hoja 6

4. Número de formulario 141060078558

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6 DV 12. Dirección seccional

9 0 1 0 1 1 1 7 6 3

18. Buzón electrónico

1 1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento 161. Actividad económica

Centro de explotación miner 0 5 Extracción de piedra arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita 0 8 1 1

162. Nombre del establecimiento

ARENERA SANTA CLARA SAS

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

1 Antioquia 0 5 Caceres

165. Dirección 1 2 0

PA PARCELAS DE RIO MAN VIA TRONCAL

166. Número de matrícula mercantil 167. Fecha de la matrícula mercantil

2 1 6 8 4 8 2 8 0 2 2 0 1 9 0 6 1 9

168. Teléfono 169. Fecha de cierre

3 1 3 7 2 0 6 5 1 8

160. Tipo de establecimiento 161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

2

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil 167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono 169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento 161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

3

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil 167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono 169. Fecha de cierre

CamScanner
Fecha generación documento PDF 28-04-2025 8:47:41PM

HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA

ING. CIVIL

M.P.

05202140753

CERTIFICADO CALIBRACION EQUIPOS TOPOGRAFICOS

No. Certificado:
0407

Servicio Técnico
Nit: 901.200.504 -

Certificado

Datos del Cliente			
Clientes	*DAVID FELIPE ROYO ANAYA*	**NIT/CC**	*1.063.282.961*
Dirección	*CL. 34 # 43-15*	**Ciudad**	*SANTA MARTA*
Teléfono	*3136187401*	**Fecha de expiración**	*01/11/2025*

Datos del Equipo			
Equipo	*Estación Total*	**Marca**	*Topcon*
Modelo	*ES-105*	**Serial**	*BS0383*
Aumentos	*30X*	**Precisión**	*5"*

Basado en los procedimientos según norma ISO 17123-1-2-3-4 estipulada por el fabricante a continuación se describe los ajustes realizados al equipo

Inspección Mecánica	Ajuste	Reparación	Mantenimiento	Cambio de piezas	No Aplica
Base Nivelante			X		
Frenos y Pasolento Hz y Vt			X		
Teclados y Contactos			X		
Eje Hz y Vt			X		
Sistema de enfoque			X		
Verticalidad			X		

Inspección Electrónica	Ajuste	Reparación	Mantenimiento	Cambio de piezas	No Aplica
Distanciometro			X		
Nonios Hz y Vt			X		
Puntero Láser			X		
Compensador			X		

No. Certificado:
0407

ACEG Ingeniería S.A.S
NIT: 901 200 504-7

Servicio Técnico
Nit: 901.200.504 -

Electrónico						
Plomada láser			X			
Sensores Hz y Vt			X			

No. Certificado:
0407

ACEG Ingeniería S.A.S
NIT: 901 200 504-7

Servicio Técnico
Nit: 901.200.504 -

Certificado

Ajuste angular y
distancia

Patrón	Fase 1	Fase 2	Tolerancia	Cierre	Error
Vertical	*90.0000*	*269°59´20"*	*+/-0.0005*	*270.0000*	*0.0000*
Horizontal	*0.0000*	*179°59´35"*	*+/-0.005*	*180.0000*	*0.0000*
Distancia	*8.494*	*8.495*	*+/-0.001*	*8.494*	*0.000*

Equipo verificado, ajustado y patronado bajo las normas ISO 17123 de acuerdo a los procedimientos dados por el fabricante.

Observaciones:
El instrumento se encuentra en buen funcionamiento, se recomienda realizar chequeos de campo. El cliente es responsable del buen transporte del equipo, ya que las vibraciones y manipulación no adecuada pueden desajustarlo.

~~JORGE DANIEL GONZÁLEZ~~
TORO
Técnico Laboratorio

No. Certificado:
0407

ACEG Ingenieria S.A.S
NIT 901.200.504-7

Servicio Técnico
Nit: 901.200.504 -

Certificado

Datos del Cliente

Clientes	*DAVID FELIPE ROYO ANAYA*	**NIT/CC**	*1.063.282.961*
Dirección	*CL 34 # 43-15*	**Ciudad**	*SANTA MARTA*
Teléfono	*3136187401*	**Fecha de expiración**	*01/10/2025*

Datos del Equipo

Equipo	*NIVEL DE PRECISION*	**Marca**	*Topcon*
Modelo	*AT-B4A*	**Serial**	*BS0383*
Aumentos	*20X*	**Precisión**	*5"*

Basado en los procedimientos según norma ISO 17123-1-2-3-4 estipulada por el fabricante a continuación se describe los ajustes realizados al equipo

Inspección Mecánica	**Ajuste**	**Reparación**	**Mantenimiento**	**Cambio de piezas**	**No Aplica**
Base Nivelante			*X*		
Frenos y Pasolento Hz y Vt			*X*		
Teclados y Contactos					
Eje Hz y Vt			*X*		
Sistema de enfoque			*X*		
Verticalidad			*X*		

No. Certificado:
0407

ACEG
Ingeniería S.A.S
NIT. 901.200.504-7

Servicio Técnico
Nit: 901.200.504 -

Certificado

Ajuste angular y
distancia

Patrón	Fase 1	Fase 2	Tolerancia	Cierre	Error
Vertical	*90.0000*	*269°59´20"*	*+/-0.0005*	*270.0000*	*0.0000*
Horizontal	*0.0000*	*179°59´35"*	*+/-0.005*	*180.0000*	*0.0000*
Distancia	*8.494*	*8.495*	*+/-0.001*	*8.494*	*0.000*

Equipo verificado, ajustado y patronado bajo las normas ISO 17123 de acuerdo a los procedimientos dados por el fabricante.

Observaciones:
El instrumento se encuentra en buen funcionamiento, se recomienda realizar chequeos de campo.
El cliente es responsable del buen transporte del equipo, ya que las vibraciones y manipulación no adecuada pueden desajustarlo.

~~JORGE DANIEL GONZÁLEZ~~
TORO
Técnico Laboratorio

HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA

ING. CIVIL

M.P.

05202140753

ENSAYOS DE LABORATORIO

ANALÍTICA
LABORATORIO DE SUELOS

DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E -161

PROYECTO:	CONTRATO DE OBRA N° 019 DE 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO LOS COMODATOS DE ARRIBA EN LA VIA CRA 41 ENTRE LA CALLE 33 Y FINAL DE PAVIMENTO EXISTENTE (SECTOR BASE MILITAR), CLL 33 EN CRA 41 Y 40, CRA 41 ENTRE CLL 33 Y ENTRADA AL SENA, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	**INFORME N°:**	3
LOCALIZACIÓN:	VIAS URBANAS MUNICIPIO DE EL BAGRE. BARRIO COMODATOS	**MUESTRA N°:**	1
CLIENTE:	SOLUCIONES INGENIARÍA AGRÍCOLA Y CIVIL S.A.S	**FECHA:**	2/05/2025
PROCTOR DE REFERENCIA No	2,131	**% Hum. Opt.:**	7,81

Ensayo	1	2	3		
Abscisa	KM 0 +250				
Carril	izquierdo				
Peso frasco + arena inicial (g)	6198				
Peso frasco + arena final (g)	3345				
Peso total arena usada (g)	2853				
Constante del cono (g)	1520				
Peso arena en el hueco (g)	1333				
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1,368				
Volumen del hueco (cm^3)	974,4				
Peso suelo extraído húmedo (g)	2080				
Humedad (%)	6,8				
Peso suelo extraído seco (g)	2010				
Peso material retenido en 3/4"					
% material retenido en 3/4"	0,00				
% material pasa en 3/4"	100				
Densidad del material (gr/cm^3)	2,063				
Densidad máxima del Proctor (gr/cm^3)	2,131				
Humedad óptima laboratorio (%)	7,81				
Densidad máxima corregida (gr/cm3)	2,131				
Compactación terreno (%)	**96,8**				

Observaciones: N.A

SEBASTIAN LOBO

ING. SEBASTIAN LOBO CÓRDOBA
DIRECTOR TÉCNICO DE LABORATORIO

Jeison Pacheco

JEISON PACHECO
LABORATORISTA

Caucasia - Antioquia
analitica.labsuelos@gmail.com
3243607483

ANALÍTICA
LABORATORIO DE SUELOS

ANALÍTICA
LABORATORIO DE SUELOS

DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E -161

PROYECTO:	CONTRATO DE OBRA Nº 019 DE 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO LOS COMODATOS DE ARRIBA EN LA VIA CRA 41 ENTRE LA CALLE 33 Y FINAL DE PAVIMENTO EXISTENTE (SECTOR BASE MILITAR), CLL 33 EN CRA 41 Y 40, CRA 41 ENTRE CLL 33 Y ENTRADA AL SENA, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	**INFORME N°:**	4
LOCALIZACIÓN:	VIAS URBANAS MUNICIPIO DE EL BAGRE. BARRIO COMODATOS	**MUESTRA N°:**	1
CLIENTE:	SOLUCIONES INGENIARÍA AGRÍCOLA Y CIVIL S.A.S	**FECHA:**	7/05/2025
PROCTOR DE REFERENCIA No	2,131	**% Hum. Opt.:**	7,81

Ensayo	1	2	3		
Abscisa	KM 0 +290				
Carril	Derecha				
Peso frasco + arena inicial (g)	5327				
Peso frasco + arena final (g)	2587				
Peso total arena usada (g)	2740				
Constante del cono (g)	1520				
Peso arena en el hueco (g)	1220				
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1,368				
Volumen del hueco (cm^3)	891,8				
Peso suelo extraído húmedo (g)	2065				
Humedad (%)	6,9				
Peso suelo extraído seco (g)	1875				
Peso material retenido en 3/4"					
% material retenido en 3/4"	0,00				
% material pasa en 3/4"	100				
Densidad del material (gr/cm^3)	2,102				
Densidad máxima del Proctor (gr/cm^3)	2,131				
Humedad óptima laboratorio (%)	7,81				
Densidad máxima corregida (gr/cm3)	2,131				
Compactación terreno (%)	**98,7**				

Observaciones: N.A

SEBASTIAN LOBO

ING. SEBASTIAN LOBO CÓRDOBA
DIRECTOR TÉCNICO DE LABORATORIO

Jeison Pacheco

JEISON PACHECO
LABORATORISTA

Caucasia - Antioquia
analitica.labsuelos@gmail.com
3243607483

ANALÍTICA
LABORATORIO DE SUELOS

DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E -161

PROYECTO:	CONTRATO DE OBRA N° 019 DE 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO LOS COMODATOS DE ARRIBA EN LA VIA CRA 41 ENTRE LA CALLE 33 Y FINAL DE PAVIMENTO EXISTENTE (SECTOR BASE MILITAR), CLL 33 EN CRA 41 Y 40, CRA 41 ENTRE CLL 33 Y ENTRADA AL SENA, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	**INFORME N°:**	1
LOCALIZACIÓN:	VIAS URBANAS MUNICIPIO DE EL BAGRE. BARRIO COMODATOS	**MUESTRA N°:**	1
CLIENTE:	SOLUCIONES INGENIARÍA AGRÍCOLA Y CIVIL S.A.S	**FECHA:**	25/05/2025
PROCTOR DE REFERENCIA No	2,131	**% Hum. Opt.:**	7,81

Ensayo	1	2	3	4	5	6
Abscisa	KM 0 +040	KM 0 +330	KM 0 +405	KM 0 + 050	KM 0 + 050	KM 0 + 150
Fecha	22-may-25	23-may-25	23-may-25	23-may-25	24-may-25	24-may-25
Carril	Derecha	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda
Peso frasco + arena inicial (g)	6212	5894	6089	6021	6029	6034
Peso frasco + arena final (g)	3389	3154	3297	3251	3265	3305
Peso total arena usada (g)	2823	2740	2792	2770	2764	2729
Constante del cono (g)	1520	1520	1520	1520	1520	1520
Peso arena en el hueco (g)	1303	1220	1272	1250	1244	1209
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368
Volumen del hueco (cm^3)	952,5	891,8	929,8	913,7	909,4	883,8
Peso suelo extraído húmedo (g)	2081	1984	2059	2011	1960	1936
Humedad (%)	6,7	6,5	7,0	6,3	6,4	6,9
Peso suelo extraído seco (g)	1950	1863	1924	1892	1842	1811
Peso material retenido en 3/4"						
% material retenido en 3/4"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% material pasa en 3/4"	100	100	100	100	100	100
Densidad del material (gr/cm^3)	2,048	2,089	2,070	2,070	2,026	2,049
Densidad máxima del Proctor (gr/cm^3)	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131
Humedad óptima laboratorio (%)	7,81	7,81	7,81	7,81	7,81	7,81
Densidad máxima corregida (gr/cm3)	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131
Compactación terreno (%)	**96,1**	**98,0**	**97,1**	**97,2**	**95,1**	**96,2**

Observaciones: N.A

SEBASTIAN LOBO

ING. SEBASTIAN LOBO CÓRDOBA
DIRECTOR TÉCNICO DE LABORATORIO

Jeison Pacheco

JEISON PACHECO
LABORATORISTA

Caucasia - Antioquia
analitica.labsuelos@gmail.com
3243607483

ANALÍTICA
LABORATORIO DE SUELOS

DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E -161

PROYECTO:	CONTRATO DE OBRA N° 019 DE 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO LOS COMODATOS DE ARRIBA EN LA VIA CRA 41 ENTRE LA CALLE 33 Y FINAL DE PAVIMENTO EXISTENTE (SECTOR BASE MILITAR), CLL 33 EN CRA 41 Y 40, CRA 41 ENTRE CLL 33 Y ENTRADA AL SENA, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	**INFORME N°:**	2
LOCALIZACIÓN:	VIAS URBANAS MUNICIPIO DE EL BAGRE. BARRIO COMODATOS	**MUESTRA N°:**	1
CLIENTE:	SOLUCIONES INGENIARÍA AGRÍCOLA Y CIVIL S.A.S	**FECHA:**	25/05/2025
PROCTOR DE REFERENCIA No	2,131	**% Hum. Opt.:**	7,81

Ensayo	1	2	3			
Abscisa	KM 0 +250	KM 0 +370	KM 0 + 277,2			
Fecha	25-may-25	25-may-25	25-may-25			
Carril	Izquierda	Izquierda	Izquierda			
Peso frasco + arena inicial (g)	6102	6124	6082			
Peso frasco + arena final (g)	2998	3254	3102			
Peso total arena usada (g)	3104	2870	2980			
Constante del cono (g)	1520	1520	1520			
Peso arena en el hueco (g)	1584	1350	1460			
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1,368	1,368	1,368			
Volumen del hueco (cm^3)	1157,9	986,8	1067,3			
Peso suelo extraído húmedo (g)	2017	1995	2010			
Humedad (%)	6,5	7,0	6,8			
Peso suelo extraído seco (g)	2354	2057	2194			
Peso material retenido en 3/4"						
% material retenido en 3/4"	0,00	0,00	0,00			
% material pasa en 3/4"	100	100	100			
Densidad del material (gr/cm^3)	2,033	2,084	2,056			
Densidad máxima del Proctor (gr/cm^3)	2,131	2,131	2,131			
Humedad óptima laboratorio (%)	7,81	7,81	7,81			
Densidad máxima corregida (gr/cm3)	2,131	2,131	2,131			
Compactación terreno (%)	**95,4**	**97,8**	**96,5**			

Observaciones: N.A

SEBASTIAN LOBO

ING. SEBASTIAN LOBO CÓRDOBA
DIRECTOR TÉCNICO DE LABORATORIO

Jeison Pacheco

JEISON PACHECO
LABORATORISTA

Caucasia - Antioquia
analitica.labsuelos@gmail.com
3243607483

ANALÍTICA
LABORATORIO DE SUELOS

DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E -161

PROYECTO:	CONTRATO DE OBRA N° 019 DE 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO LOS COMODATOS DE ARRIBA EN LA VIA CRA 41 ENTRE LA CALLE 33 Y FINAL DE PAVIMENTO EXISTENTE (SECTOR BASE MILITAR), CLL 33 EN CRA 41 Y 40, CRA 41 ENTRE CLL 33 Y ENTRADA AL SENA, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	**INFORME N°:**	3
LOCALIZACIÓN:	VIAS URBANAS MUNICIPIO DE EL BAGRE. BARRIO COMODATOS	**MUESTRA N°:**	3
CLIENTE:	SOLUCIONES INGENIARÍA AGRÍCOLA Y CIVIL S.A.S	**FECHA:**	26/05/2025
PROCTOR DE REFERENCIA No	2,131	**% Hum. Opt.:**	7,81

Ensayo	1	2	3	4	5	
Abscisa	KM 0 + 370	KM 0 + 445	KM 0 + 070	KM 0 + 180	KM 0 + 380	
Fecha	26-may-25	26-may-25	26-may-25	26-may-25	26-may-25	
Carril	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	
Peso frasco + arena inicial (g)	6005	6358	6412	5745	5981	
Peso frasco + arena final (g)	3128	3498	3506	2845	3205	
Peso total arena usada (g)	2877	2860	2906	2900	2776	
Constante del cono (g)	1520	1520	1520	1520	1520	
Peso arena en el hueco (g)	1357	1340	1386	1380	1256	
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	
Volumen del hueco (cm^3)	992,0	979,5	1013,2	1008,8	918,1	
Peso suelo extraído húmedo (g)	2157	2186	2205	2267	1995	
Humedad (%)	6,9	6,7	7,0	6,5	6,4	
Peso suelo extraído seco (g)	2018	2049	2061	2129	1875	
Peso material retenido en 3/4"						
% material retenido en 3/4"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% material pasa en 3/4"	100	100	100	100	100	
Densidad del material (gr/cm^3)	2,034	2,092	2,034	2,110	2,042	
Densidad máxima del Proctor (gr/cm^3)	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131	
Humedad óptima laboratorio (%)	7,81	7,81	7,81	7,81	7,81	
Densidad máxima corregida (gr/cm3)	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131	
Compactación terreno (%)	**95,5**	**98,1**	**95,4**	**99,0**	**95,8**	

Observaciones: N.A

SEBASTIAN LOBO

ING. SEBASTIAN LOBO CÓRDOBA
DIRECTOR TÉCNICO DE LABORATORIO

Jeison Pacheco

JEISON PACHECO
LABORATORISTA

Caucasia - Antioquia
analitica.labsuelos@gmail.com
3243607483

ANALÍTICA LABORATORIO DE SUELOS

NIT. 901875072

ESTUDIOS DE SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTO

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

I.N.V. - 410

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGUETAS DE CONCRETO (NTC 2871)

PROYECTO:	**CONTRATO DE OBRA N° 019 DE 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO LOS COMODATOS DE ARRIBA EN LA VIA CRA 41 ENTRE LA CALLE 33 Y FINAL DE PAVIMENTO EXISTENTE (SECTOR BASE MILITAR), CLL 33 EN CRA 41 Y 40, CRA 41 ENTRE CLL 33 Y ENTRADA AL SENA, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".**
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	**VIAS URBANAS MUNICIPIO DE EL BAGRE**
ENTIDAD SOLICITANTE DEL SERVICIO:	**SOLUCIONES INGENIARÍA AGRÍCOLA Y CIVIL S.A.S / HUMBERTO ESTEVAN VIDES SAJONA**
FECHA DEL INFORME :	**15/05/2025**
	INFORME # 7

CODIGO	ELEMENTO FUNDIDO	MÓDULO DE RUPTURA (KG/CM2)		FECHA DE FUNDIDA	EDAD DE VIGUETAS (DIAS)	LUZ (CMS)	FECHA DE ENSAYO O ROTURA	CARGA EN LA VIGUETA (KN)	RESISTENCIA (KG/CM2)	RESISTENCIA (MPA)	PORCENTAJE OBTENIDO (%)	OBSERVACIÓN
1	CONCRETO 4000 PSI - CARRIL IZQUIERDO, Km 0 + 255.00 AL Km 0 + 297.00	MR	40	3 de mayo de 2025	7	45,0	10 de mayo de 2025	23,50	31,33	3,1	76,8	CUMPLE
2	CONCRETO 4000 PSI - CARRIL DERECHO, Km 0 + 232.00 AL Km 0 + 273.00	MR	40	8 de mayo de 2025	7	45,0	15 de mayo de 2025	23,10	30,80	3,0	75,5	CUMPLE

OBSERVACIONES: N.A

SEBASTIAN LOBO

Sebastián Lobo Córdoba
Ingeniero Civil

Jeison Pacheco

JEISON PACHECO
LABORATORISTA

Dirección:
Teléfono: 3243607483 Caucasia - Antioquia / Correo: analitica.labsuelos@gmail.com

ANALÍTICA LABORATORIO DE SUELOS

NIT. 901875072

ESTUDIOS DE SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTO

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

I.N.V. - 410

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGUETAS DE CONCRETO (NTC 2871)

PROYECTO:	**CONTRATO DE OBRA N° 019 DE 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO LOS COMODATOS DE ARRIBA EN LA VIA CRA 41 ENTRE LA CALLE 33 Y FINAL DE PAVIMENTO EXISTENTE (SECTOR BASE MILITAR), CLL 33 EN CRA 41 Y 40, CRA 41 ENTRE CLL 33 Y ENTRADA AL SENA, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".**
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	**VIAS URBANAS MUNICIPIO DE EL BAGRE**
ENTIDAD SOLICITANTE DEL SERVICIO:	**SOLUCIONES INGENIARÍA AGRÍCOLA Y CIVIL S.A.S / HUMBERTO ESTEVAN VIDES SAJONA**
FECHA DEL INFORME :	**22/05/2025**
	INFORME # 8

CODIGO	ELEMENTO FUNDIDO	MÓDULO DE RUPTURA (KG/CM2)		FECHA DE FUNDIDA	EDAD DE VIGUETAS (DIAS)	LUZ (CMS)	FECHA DE ENSAYO O ROTURA	CARGA EN LA VIGUETA (KN)	RESISTENCIA (KG/CM2)	RESISTENCIA (MPA)	PORCENTAJE OBTENIDO (%)	OBSERVACIÓN
1	CONCRETO 4000 PSI - CARRIL IZQUIERDO, Km 0 + 255.00 AL Km 0 + 297.00	MR	40	3 de mayo de 2025	14	45,0	17 de mayo de 2025	27,90	37,20	3,6	91,1	CUMPLE
2	CONCRETO 4000 PSI - CARRIL DERECHO, Km 0 + 232.00 AL Km 0 + 273.00	MR	40	8 de mayo de 2025	14	45,0	22 de mayo de 2025	28,40	37,87	3,7	92,8	CUMPLE

OBSERVACIONES: N.A

Sebastian Lobo

Sebastián Lobo Córdoba
Ingeniero Civil

Jeison Pacheco

JEISON PACHECO
LABORATORISTA

Dirección:
Teléfono: 3243607483 Caucasia - Antioquia / Correo: analitica.labsuelos@gmail.com

ANALÍTICA LABORATORIO DE SUELOS

NIT. 901875072

ESTUDIOS DE SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTO

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

I.N.V. - 410

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGUETAS DE CONCRETO (NTC 2871)

PROYECTO:	**CONTRATO DE OBRA N° 019 DE 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO LOS COMODATOS DE ARRIBA EN LA VIA CRA 41 ENTRE LA CALLE 33 Y FINAL DE PAVIMENTO EXISTENTE (SECTOR BASE MILITAR), CLL 33 EN CRA 41 Y 40, CRA 41 ENTRE CLL 33 Y ENTRADA AL SENA, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".**
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	**VIAS URBANAS MUNICIPIO DE EL BAGRE**
ENTIDAD SOLICITANTE DEL SERVICIO:	**SOLUCIONES INGENIARÍA AGRÍCOLA Y CIVIL S.A.S / HUMBERTO ESTEVAN VIDES SAJONA**
FECHA DEL INFORME :	**15/05/2025**
	INFORME # 7

CODIGO	ELEMENTO FUNDIDO	MÓDULO DE RUPTURA (KG/CM2)		FECHA DE FUNDIDA	EDAD DE VIGUETAS (DIAS)	LUZ (CMS)	FECHA DE ENSAYO O ROTURA	CARGA EN LA VIGUETA (KN)	RESISTENCIA (KG/CM2)	RESISTENCIA (MPA)	PORCENTAJE OBTENIDO (%)	OBSERVACIÓN
1	CONCRETO 4000 PSI - CARRIL IZQUIERDO, Km 0 + 255.00 AL Km 0 + 297.00	MR	40	3 de mayo de 2025	7	45,0	10 de mayo de 2025	23,50	31,33	3,1	76,8	CUMPLE
2	CONCRETO 4000 PSI - CARRIL DERECHO, Km 0 + 232.00 AL Km 0 + 273.00	MR	40	8 de mayo de 2025	7	45,0	15 de mayo de 2025	23,10	30,80	3,0	75,5	CUMPLE

OBSERVACIONES: N.A

SEBASTIAN LOBO

Sebastián Lobo Córdoba
Ingeniero Civil

Jeison Pacheco

JEISON PACHECO
LABORATORISTA

Dirección:
Teléfono: 3243607483 Caucasia - Antioquia / Correo: analitica.labsuelos@gmail.com

ANALÍTICA LABORATORIO DE SUELOS

NIT. 901875072

ESTUDIOS DE SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTO

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

I.N.V. - 410

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE VIGUETAS DE CONCRETO (NTC 2871)

PROYECTO:	**CONTRATO DE OBRA N° 019 DE 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO LOS COMODATOS DE ARRIBA EN LA VIA CRA 41 ENTRE LA CALLE 33 Y FINAL DE PAVIMENTO EXISTENTE (SECTOR BASE MILITAR), CLL 33 EN CRA 41 Y 40, CRA 41 ENTRE CLL 33 Y ENTRADA AL SENA, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".**
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	**VIAS URBANAS MUNICIPIO DE EL BAGRE**
ENTIDAD SOLICITANTE DEL SERVICIO:	**SOLUCIONES INGENIARÍA AGRÍCOLA Y CIVIL S.A.S / HUMBERTO ESTEVAN VIDES SAJONA**
FECHA DEL INFORME :	**22/05/2025**

INFORME # 8

CODIGO	ELEMENTO FUNDIDO	MÓDULO DE RUPTURA (KG/CM2)		FECHA DE FUNDIDA	EDAD DE VIGUETAS (DIAS)	LUZ (CMS)	FECHA DE ENSAYO O ROTURA	CARGA EN LA VIGUETA (KN)	RESISTENCIA (KG/CM2)	RESISTENCIA (MPA)	PORCENTAJE OBTENIDO (%)	OBSERVACIÓN
1	CONCRETO 4000 PSI - CARRIL IZQUIERDO, Km 0 + 255.00 AL Km 0 + 297.00	MR	40	3 de mayo de 2025	14	45,0	17 de mayo de 2025	27,90	37,20	3,6	91,1	CUMPLE
2	CONCRETO 4000 PSI - CARRIL DERECHO, Km 0 + 232.00 AL Km 0 + 273.00	MR	40	8 de mayo de 2025	14	45,0	22 de mayo de 2025	28,40	37,87	3,7	92,8	CUMPLE

OBSERVACIONES: N.A

Sebastian Lobo

Sebastián Lobo Córdoba
Ingeniero Civil

Jeison Pacheco

JEISON PACHECO
LABORATORISTA


Dirección:
Teléfono: 3243607483 Caucasia - Antioquia / Correo: analitica.labsuelos@gmail.com

ANALÍTICA
LABORATORIO DE SUELOS

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
I.N.V. - 410

PROYECTO:	CONTRATO DE OBRA N° 019 DE 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO LOS COMODATOS DE ARRIBA EN LA VIA CRA 41 ENTRE LA CALLE 33 Y FINAL DE PAVIMENTO EXISTENTE (SECTOR BASE MILITAR), CLL 33 EN CRA 41 Y 40, CRA 41 ENTRE CLL 33 Y ENTRADA AL SENA, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".	**FECHA:**	**24/05/2025**
LOCALIZACIÓN:	VIAS URBANAS MUNICIPIO DE EL BAGRE.		
MUESTRA	CILINDROS DE CONCRETO 3500 PSI		
SOLICITANTE:	SOLUCIONES INGENIARÍA AGRÍCOLA Y CIVIL S.A.S / HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA		

NUMERO CILINDRO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO FUNDIDO	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO PSI	DATOS DE DIMENSIÓN						A	B	C	D	E	Resistencia Obtenida			CUMPLIMIENTO
						h1 (cm)	D (cm)	A (cm2)	V(cm3)	PESO (g)	Peso Unitario (g/Cm3)							DISEÑO (KN)	PSI	%	
1	**Concreto 3500 PSI para bordillos carril derecho - Km 0 + 000,00 al Km 0 + 053,00.**	10/05/2025	17/05/2025	7	3500	30	15	176,7	5301,4	13274,0	2,50				X			329,5	2716	78%	**CUMPLE**
2	**Concreto 3500 PSI para bordillos carril derecho - Km 0 + 000,00 al Km 0 + 053,00.**	10/05/2025	24/05/2025	14	3500	30	15	176,7	5301,4	13241,0	2,50					X		382,4	3152	90%	**CUMPLE**



OBSERVACIONES: Muestras tomadas por el cliente

SEBASTIAN LOBO CORDOBA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD

YEISON PACHECO
LABORATORISTA

HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA

ING. CIVIL

M.P.

05202140753

INFORME PAGA

INFORME DE REVISIÓN DE INTERVENTORÍA

Seguimiento al Plan de Adaptación a la Guía Ambiental – PAGA
Contrato N° 019 – 2025
Proyecto: "Construcción de pavimento en concreto rígido, obras complementarias y sistema de alcantarillado pluvial…"
Ubicación: Municipio de El Bagre, Antioquia
Periodo de revisión: mayo 2025
Elaborado por: Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental

---

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde a la revisión realizada por la interventoría al **Informe N° 2 de seguimiento ambiental** del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) durante el período evaluado, en el contrato de construcción de pavimento en concreto rígido, obras complementarias y sistema de alcantarillado pluvial en el barrio Los Comodatos de Arriba, municipio de El Bagre, Antioquia.

Mediante visitas técnicas, revisión documental y verificación en campo, se evaluó el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación y control de impactos ambientales asociadas a las actividades constructivas (excavaciones, instalación de redes, estructuras hidráulicas y conformación del pavimento). Se verificó el adecuado manejo de residuos, almacenamiento de materiales, operación de maquinaria, control de emisiones, orden y limpieza de los frentes de trabajo, así como la ejecución de los demás programas del PAGA.

El informe consolida los resultados del seguimiento, las observaciones de las inspecciones y las recomendaciones para fortalecer la gestión ambiental del proyecto.

OBJETIVO GENERAL

Realizar el seguimiento y la evaluación al cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), mediante la verificación en campo de las actividades ejecutadas por el contratista y la revisión de los soportes técnicos correspondientes, con el fin de determinar el nivel de implementación de los programas ambientales, promover la prevención y mitigación de los impactos generados por la ejecución de la obra y formular las recomendaciones necesarias para el mejoramiento continuo de la gestión ambiental del proyecto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar en campo el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental establecidas en el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), durante la ejecución de las actividades constructivas desarrolladas en el período objeto del presente informe.
- Realizar seguimiento a la implementación de los programas ambientales aplicables al proyecto, evaluando la eficacia de las medidas de prevención, mitigación, control y manejo de los impactos ambientales derivados de la ejecución de la obra.
- Comprobar que las actividades relacionadas con el manejo de residuos de construcción y demolición (RCD), operación de maquinaria y equipos, almacenamiento de materiales, control de emisiones atmosféricas y ruido, manejo de aguas superficiales y demás programas ambientales, se desarrollen de conformidad con lo establecido en el PAGA y la normatividad ambiental vigente.
- Identificar oportunamente aspectos susceptibles de mejora durante el desarrollo de las actividades constructivas, formulando observaciones y recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento de la gestión ambiental del proyecto.
- Documentar los resultados del seguimiento ambiental efectuado por la interventoría durante el período evaluado, dejando evidencia del estado de implementación de las medidas ambientales y estableciendo la base para el seguimiento en los informes posteriores.

LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en el municipio de El Bagre, departamento de Antioquia, específicamente en el barrio Los Comodatos de Arriba, donde se ejecutan las obras correspondientes a la construcción de pavimento en concreto rígido, obras complementarias y sistema de alcantarillado pluvial.

Las actividades constructivas se ejecutan en los diferentes tramos definidos dentro del proyecto, comprendiendo intervenciones sobre vías urbanas, construcción de estructuras hidráulicas, adecuación de la infraestructura vial y demás obras contempladas contractualmente. Por tratarse de un sector urbano consolidado, el seguimiento ambiental realizado por la interventoría se orienta a verificar la adecuada implementación de las medidas de manejo ambiental, procurando minimizar las afectaciones sobre la comunidad, el espacio público y los recursos naturales presentes en el área de influencia del proyecto.

AVANCES DE OBRA Y SEGUIMIENTO AL PAGA

Durante el período objeto del presente informe, la interventoría realizó seguimiento permanente a las actividades constructivas ejecutadas por el contratista, verificando simultáneamente la implementación de las medidas establecidas en el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA). Las inspecciones efectuadas permitieron constatar el desarrollo de actividades relacionadas con excavaciones, instalación de tuberías para el sistema de alcantarillado pluvial, construcción de pozos de inspección, conformación de la estructura del pavimento, fundida de concreto y ejecución de obras complementarias, de acuerdo con la programación establecida para el proyecto.

Como parte del seguimiento ambiental, la interventoría verificó el adecuado manejo de los materiales utilizados durante la ejecución de la obra, las condiciones de almacenamiento temporal, la organización de los frentes de trabajo, el manejo de los residuos de construcción y demolición, el control de emisiones de material particulado y ruido generados por la operación de maquinaria y equipos, así como la implementación de medidas orientadas a conservar las condiciones ambientales del área intervenida.

Durante las visitas técnicas también se verificó el cumplimiento de las medidas preventivas establecidas para minimizar posibles afectaciones sobre la comunidad y el entorno, realizando observaciones cuando fue necesario con el fin de fortalecer la aplicación de los programas ambientales contemplados en el PAGA. Así mismo, se efectuó seguimiento a las condiciones generales de orden y limpieza de la obra, constatando que las actividades ejecutadas mantuvieran condiciones adecuadas para el desarrollo del proyecto y la protección del medio ambiente.

Con base en las verificaciones realizadas durante el presente período, la interventoría evidenció que las actividades constructivas fueron acompañadas por la implementación de las medidas de manejo ambiental previstas para esta etapa del proyecto, manteniendo el seguimiento permanente a cada uno de los programas del PAGA con el propósito de verificar su cumplimiento durante el desarrollo de las siguientes fases de ejecución.

REVISIÓN POR PROGRAMA

PROGRAMA N° 1: Manejo y disposición de residuos sólidos y RCD

- **Ejecutado por contratista:** el contratista ejecutó actividades de demolición de pavimento y cunetas existentes, excavaciones mecánicas, instalación del sistema de alcantarillado pluvial, construcción de pozos de inspección, conformación de capas granulares y ejecución de pavimento en concreto rígido, actividades que generaron residuos de construcción y demolición (RCD). Como parte de la ejecución de la obra, se realizó el retiro progresivo del material sobrante y se mantuvieron condiciones generales de orden y limpieza en los frentes de trabajo, de acuerdo con el avance de las actividades programadas.

- **Observaciones interventoría:** La interventoría realizó seguimiento mediante visitas técnicas a los diferentes frentes de obra, verificando el adecuado manejo de los residuos generados durante la ejecución de las actividades constructivas. Durante el período evaluado se evidenció que el material producto de las demoliciones y excavaciones fue retirado conforme al avance de la obra, manteniendo condiciones aceptables de orden y limpieza, sin identificarse situaciones que generaran afectaciones ambientales relevantes.
- **Recomendaciones:** Continuar realizando el retiro oportuno de los residuos de construcción y demolición, mantener organizados los frentes de trabajo y fortalecer las actividades de limpieza durante la ejecución de las siguientes etapas del proyecto.

PROGRAMA N° 2: Manejo de maquinaria y equipos

- **Ejecutado por contratista:** el contratista utilizó maquinaria y equipos para la ejecución de actividades de demolición, excavaciones, transporte de materiales, conformación de capas granulares, instalación del sistema de alcantarillado pluvial y construcción del pavimento en concreto rígido. Para el desarrollo de estas labores se contó con volquetas, retrocargadores, minicargador, vibrocompactadores y hormigonera, de acuerdo con las necesidades de la obra.
- **Observaciones interventoría:** verificó la disponibilidad y operación de la maquinaria y los equipos empleados durante la ejecución de las actividades, evidenciando que estos fueron utilizados conforme al avance de la obra y sin presentarse novedades ambientales relevantes durante el período evaluado.
- **Recomendaciones:** Continuar realizando el mantenimiento preventivo de la maquinaria y equipos, verificando permanentemente sus condiciones de operación para prevenir posibles afectaciones ambientales y garantizar el adecuado desarrollo de las actividades constructivas.

PROGRAMA N° 3: Control de emisiones atmosféricas y ruido

- **Ejecutado por contratista:** el contratista ejecutó actividades de demolición, excavaciones, transporte de materiales, conformación de capas granulares, instalación del sistema de alcantarillado pluvial y construcción de pavimento en concreto rígido. Estas labores implicaron la operación de maquinaria y equipos propios de la obra, desarrollándose conforme al avance programado del proyecto.
- **Observaciones interventoría:** La interventoría realizó seguimiento a los frentes de trabajo, verificando que las actividades constructivas se desarrollaran bajo condiciones normales de operación y de acuerdo con la programación establecida. Durante las visitas de inspección no se evidenciaron situaciones relevantes que generaran afectaciones asociadas a emisiones atmosféricas o ruido por fuera de las propias de la ejecución de la obra.

- **Recomendaciones:** Continuar implementando las medidas de control durante la operación de maquinaria y el transporte de materiales, especialmente en las actividades de mayor intervención, con el fin de minimizar la generación de polvo y ruido durante el desarrollo de la obra.

PROGRAMA N° 4: Señalización y almacenamiento de obra

- **Ejecutado por contratista:** El contratista mantuvo la señalización y delimitación de los frentes de trabajo conforme al avance de las actividades ejecutadas, incluyendo labores de demolición, excavación, instalación del sistema de alcantarillado pluvial y construcción de pavimento en concreto rígido. Así mismo, los materiales, equipos y herramientas fueron organizados en las áreas destinadas para su almacenamiento, facilitando el desarrollo de las actividades constructivas y la movilidad dentro de la obra.
- **Observaciones interventoría:** verificó durante las visitas de inspección que los frentes de trabajo permanecieran debidamente señalizados y delimitados, permitiendo el desarrollo seguro de las actividades constructivas. Igualmente, se evidenció que el almacenamiento de materiales y equipos se realizó de manera organizada, manteniendo condiciones de orden en las zonas intervenidas y sin presentarse observaciones relevantes durante el período evaluado.
- **Recomendaciones:** Mantener la señalización preventiva y la delimitación de los frentes de trabajo conforme avance la obra, así como conservar organizadas las áreas de almacenamiento de materiales y equipos, garantizando condiciones seguras para los trabajadores y la comunidad.

PROGRAMA N° 5: Manejo de campamentos e instalaciones temporales

- **Ejecutado por contratista:** el contratista desarrolló las actividades constructivas utilizando las instalaciones temporales requeridas para el funcionamiento de la obra, manteniendo el almacenamiento de herramientas, equipos y materiales de apoyo en condiciones de orden y limpieza que facilitaron el desarrollo de las labores ejecutadas.
- **Observaciones interventoría:** La interventoría realizó seguimiento a las instalaciones temporales utilizadas durante la ejecución del proyecto, verificando condiciones generales de organización, orden y limpieza. Durante el período evaluado no se evidenciaron novedades ambientales relacionadas con este programa.
- **Recomendaciones:** Mantener las condiciones de orden y limpieza en las instalaciones temporales, así como el adecuado almacenamiento de herramientas, equipos y materiales utilizados durante la ejecución de la obra.

PROGRAMA N° 6: Manejo y almacenamiento de materiales pétreos

- **Ejecutado por contratista:** el contratista realizó el suministro, transporte, almacenamiento y utilización de materiales pétreos requeridos para la instalación del sistema de alcantarillado pluvial, conformación de rellenos, construcción de pavimento en concreto rígido y demás actividades desarrolladas en la obra, de acuerdo con el avance programado del proyecto.
- **Observaciones interventoría:** La interventoría verificó mediante las visitas de campo que los materiales pétreos fueron almacenados y utilizados conforme al desarrollo de las actividades constructivas, evidenciando condiciones generales de organización en las zonas de acopio y sin presentarse observaciones ambientales relevantes durante el período evaluado.
- **Recomendaciones:** Continuar con el almacenamiento organizado de los materiales pétreos y mantener las áreas de acopio en condiciones de orden y limpieza, evitando la dispersión de material durante la ejecución de las actividades.

PROGRAMA N° 7: Manejo y eliminación de vegetación

- **Ejecutado por contratista:** las actividades constructivas se desarrollaron dentro del área de intervención del proyecto, sin requerirse labores de tala o remoción de cobertura vegetal. La ejecución de las obras se concentró en la construcción del sistema de alcantarillado pluvial, pavimento en concreto rígido y obras complementarias, preservando las zonas adyacentes al área intervenida.
- **Observaciones interventoría:** La interventoría verificó durante las visitas de campo que las actividades se ejecutaron dentro de las áreas autorizadas, sin evidenciar afectaciones a la vegetación existente ni intervenciones adicionales sobre zonas verdes durante el período evaluado.
- **Recomendaciones:** Mantener el control de las áreas de intervención y continuar preservando la vegetación existente durante el desarrollo de las actividades constructivas.

PROGRAMA N° 8: Manejo de combustibles, aceites y residuos líquidos

- **Ejecutado por contratista:** el contratista utilizó maquinaria y equipos necesarios para la ejecución de las actividades constructivas, desarrollando su operación conforme al avance de la obra y aplicando las medidas de manejo establecidas para prevenir afectaciones derivadas del uso de combustibles y lubricantes.
- **Observaciones interventoría:** La interventoría realizó seguimiento a la operación de la maquinaria empleada en la obra, sin evidenciar derrames de combustibles, aceites o

residuos líquidos que generaran afectaciones ambientales durante el período objeto del presente informe.

- **Recomendaciones:** Continuar implementando las medidas preventivas para el manejo de combustibles y lubricantes, realizando inspecciones periódicas a la maquinaria y atendiendo oportunamente cualquier eventualidad que pueda presentarse.

PROGRAMA N° 9: Manejo de aguas superficiales

- **Ejecutado por contratista:** el contratista ejecutó actividades de excavación, instalación del sistema de alcantarillado pluvial y construcción de obras complementarias, manteniendo los frentes de trabajo en condiciones que permitieron el normal desarrollo de las actividades y el adecuado manejo del drenaje superficial durante la ejecución de la obra
- **Observaciones interventoría:** La interventoría verificó mediante las visitas de inspección que durante el período evaluado no se presentaron afectaciones a las aguas superficiales ni obstrucciones asociadas al desarrollo de las actividades constructivas, evidenciando cumplimiento de las medidas ambientales implementadas.
- **Recomendaciones:** Mantener el seguimiento a las condiciones de drenaje en los frentes de trabajo y realizar limpieza preventiva de las áreas intervenidas, especialmente durante períodos de lluvia.

PROGRAMA N° 10: Manejo de fauna y flora

- **Ejecutado por contratista:** las actividades constructivas se desarrollaron dentro del área de intervención establecida para el proyecto, correspondiente a la construcción del sistema de alcantarillado pluvial, pavimento en concreto rígido y obras complementarias. Durante la ejecución de la obra no fue necesaria la intervención sobre áreas con cobertura vegetal ni se evidenciaron afectaciones a la fauna presente en el sector.
- **Observaciones interventoría:** La interventoría verificó mediante las visitas de campo que las actividades se ejecutaron dentro de las áreas autorizadas para el proyecto, sin evidenciar afectaciones sobre la flora o la fauna del área de influencia, observando cumplimiento de las medidas ambientales aplicables durante el período evaluado.
- **Recomendaciones:** Continuar desarrollando las actividades dentro del área autorizada de intervención y mantener las medidas de protección de la fauna y flora durante la ejecución de las siguientes etapas del proyecto.

CONCLUSIONES GENERALES


- Se verificó el cumplimiento de las medidas ambientales establecidas en el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), mediante el seguimiento realizado a las actividades ejecutadas durante el período comprendido entre el **03 de mayo y el 03 de junio de 2025**.
- La interventoría evidenció que las actividades constructivas desarrolladas por el contratista se ejecutaron conforme al avance programado de la obra, implementando las medidas de manejo ambiental aplicables a cada uno de los programas evaluados.
- Durante las visitas de inspección se verificó el manejo de los residuos de construcción y demolición (RCD), el control de emisiones atmosféricas y ruido, la operación de maquinaria y equipos, la señalización de los frentes de trabajo, el almacenamiento de materiales pétreos, el manejo de aguas superficiales y las medidas de protección de la fauna y flora, sin evidenciar afectaciones ambientales relevantes durante el período evaluado.
- Las observaciones realizadas por la interventoría estuvieron orientadas al fortalecimiento de las medidas preventivas y al mantenimiento de las condiciones de orden, limpieza y organización en los diferentes frentes de trabajo.
- Se recomienda al contratista dar continuidad a la implementación de las medidas contempladas en el PAGA, atendiendo las recomendaciones formuladas por la interventoría y fortaleciendo las acciones de seguimiento ambiental durante las siguientes etapas de ejecución del proyecto.
- En términos generales, la interventoría considera que el desempeño ambiental del proyecto durante el período evaluado fue **satisfactorio**, evidenciando un adecuado cumplimiento de las medidas ambientales aplicables a las actividades ejecutadas y permitiendo dar continuidad al seguimiento de los programas ambientales en los próximos informes


PROGRAMA	EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA	RECOMENDACIONES
Programa N.° 1. Manejo y disposición de residuos sólidos y RCD	Se realizó el manejo y retiro progresivo de los residuos generados durante las actividades de demolición, excavación y construcción, manteniendo condiciones generales de orden y limpieza.	Se verificó el adecuado manejo de los residuos generados durante la ejecución de la obra, sin evidenciar afectaciones ambientales relevantes.	Continuar con el retiro oportuno de los residuos y mantener el orden y la limpieza en los frentes de trabajo.
Programa N.° 2. Manejo de emisiones	Se ejecutaron actividades constructivas con utilización de maquinaria y	Se verificó que las actividades se desarrollaron sin	Mantener las medidas de control durante la operación de maquinaria


atmosféricas, ruido y calidad del aire	transporte de materiales, conforme al avance programado de la obra.	evidenciar afectaciones significativas por emisiones atmosféricas o ruido.	y transporte de materiales.
Programa N.° 3. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	Se empleó la maquinaria y los equipos necesarios para el desarrollo de las actividades constructivas del proyecto.	Se verificó la adecuada operación de la maquinaria y equipos durante el período evaluado, sin novedades ambientales.	Continuar con el mantenimiento preventivo y las inspecciones periódicas de los equipos.
Programa N.° 4. Señalización y almacenamiento de obra	Se mantuvo la señalización de los frentes de trabajo y la organización de materiales, herramientas y equipos durante la ejecución de la obra.	Se verificó el adecuado estado de la señalización y el orden en las zonas de almacenamiento.	Mantener la señalización preventiva y el almacenamiento organizado durante la ejecución del proyecto.
Programa N.° 5. Manejo de campamentos e instalaciones temporales	Se utilizaron las instalaciones temporales para apoyar las actividades de obra, manteniendo condiciones de orden y limpieza.	No se evidenciaron novedades ambientales relacionadas con las instalaciones temporales.	Mantener las condiciones de organización y limpieza de las instalaciones de apoyo.
Programa N.° 6. Manejo y almacenamiento de materiales pétreos	Se realizó el suministro, almacenamiento y utilización de materiales pétreos conforme al avance de la obra.	Se verificó el adecuado almacenamiento y organización de los materiales en las zonas de acopio.	Mantener organizadas las áreas de almacenamiento y controlar la dispersión de materiales.
Programa N.° 7. Manejo y eliminación de vegetación	Las actividades se ejecutaron dentro del área de intervención, sin requerirse remoción de vegetación durante el período evaluado.	No se evidenciaron afectaciones sobre la cobertura vegetal del área de influencia del proyecto.	Continuar preservando las áreas adyacentes y limitar las actividades al área autorizada.
Programa N.° 8. Manejo de combustibles, aceites y residuos líquidos	Se operó la maquinaria requerida para la ejecución de la obra, aplicando medidas preventivas para el manejo de combustibles y lubricantes.	No se evidenciaron derrames o situaciones que generaran afectaciones ambientales.	Mantener el control del manejo de combustibles y realizar inspecciones periódicas a la maquinaria.
Programa N.° 9. Manejo de aguas superficiales	Las actividades de obra se ejecutaron sin generar afectaciones al drenaje superficial del sector intervenido.	Se verificó que no se presentaron obstrucciones ni impactos sobre las aguas superficiales durante el período.	Mantener el seguimiento a las condiciones de drenaje y realizar limpieza preventiva cuando sea necesario.

Programa N.° 10. Manejo de fauna y flora	Las actividades constructivas se desarrollaron dentro del área de intervención, sin afectar la fauna y flora presentes en el sector.	Se verificó que durante el período evaluado no se presentaron afectaciones sobre los recursos bióticos.	Continuar desarrollando las actividades dentro del área autorizada y mantener las medidas de protección ambiental.

REGISTRO FOTOGRAFICO

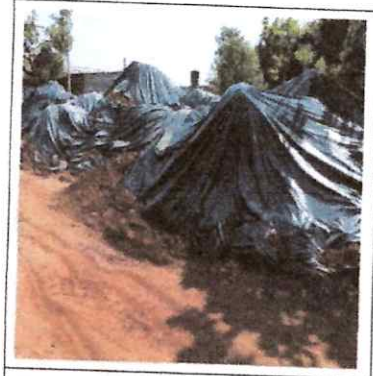


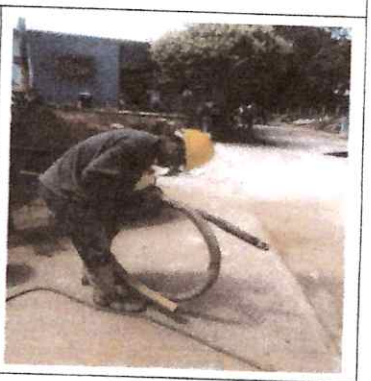

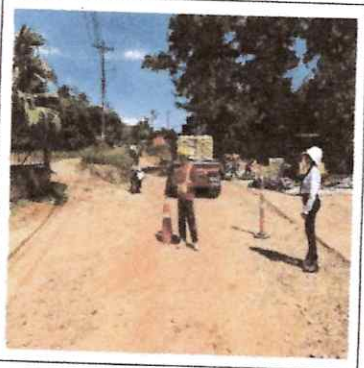



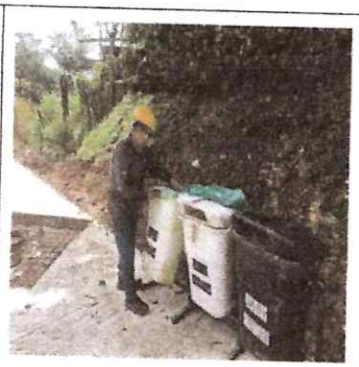


VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PAGA

CORANTIOQUIA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
CONSTANCIA
CÓDIGO FT-GIC-06 VERSIÓN 04 PAGINA 1 DE 1

160PZ-CON7384-158

HACE CONSTAR:

Que la sociedad ARENERA SANTA CLARA S.A.S identificada con el NIT N°901.011.176-3, representada legalmente por el señor RONALD TENORIO FRANCO identificado con cédula de ciudadanía N°14.472.975, funge como titular de una Licencia Ambiental vigente otorgada por esta Corporación mediante Resolución N°160PZ-1612-4029 del 29 de diciembre de 2016 dentro del expediente PZ3-2015-2, para el proyecto minero denominado "EL ARCA DE NOÉ", en el Contrato de Concesión Minera N° 7414 de 2006 con RMN HHCG-01 del 07 de febrero de 2007, para la explotación de una mina de arenas y gravas naturales, ubicado en la Vereda Río Man del Municipio de Cáceres, departamento de Antioquia.

Esta constancia se expide a solicitud del interesado

Atentamente

ULTRACEM

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO
ULTRACEM S.A.S

F.V. 01-03-2017

CEMENTO HIDRÁULICO GRIS TIPO UG DE USO GENERAL

VERSION 3

282

ENSAYOS FISICOS	METODO DE ENSAYO	RESULTADO	NTC 121	ASTM C 1157	ULTRACEM
		8.61			
		5622			
		95.10			
		0.004			
Resistencia a la Compresión					
Tiempo de Fraguado (Vicat) METODO A					

FIRMA

Cargo: Gerente de Calidad Cementos

VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PAGA

AESW ABINSK ELECTRIC STEEL WORKS

In accordance with EN 10204:2004, 3.1

Quality Certificate No. 2400293 dated 12/03/2025

Consignee: **FORMULA ACERO COLOMBIA S.A.S**
Specification №: OU-SQB-7
Product name: **STEEL ROUND BARS**

Grade	Standard	Type of package	Thickness,mm	Length, mm	Add. Marking
A36	A36/A36M-19	Bundles	31,75	6000	pink at one end

№	№ of heats	C	Si	Mn	S	P	Cu	Cr	Ni	Yield strength, N/mm2	Tensile strength, N/mm2	Elongation in 8 in., min, %	Elongation in 2 in., min, %	Unit	Quantity	Mass, tons
1	C2342262	0,18	0,24	0,48	0,006	0,004	0,02	0,03	0,03	339	477	27,0	48,0	bundles	60	58,937
2	C2342263	0,19	0,25	0,48	0,006	0,004	0,02	0,04	0,02	338	477	26,0	46,0	bundles	130	127,157
														Total	190	186,094

Product released in Conformity with the agreed requirements of the relevant Standards and Technical Specifications

Please refer to Certificate No. in case of any correspondence concerning the quality matter

ABINSK ELECTRIC STEEL WORKS LTD.
4 PROMYSHLENNAYA ST., ABINSK,
KRASNODAR REGION, RUSSIA, 353320

TEL.: +7(86 [illegible]) 4 [illegible]
TEL.: +7(86 [illegible]) 4 50 51
PRIEMNAYA@ABINMETALL.RU

AGUAS

Tu historia en cada gota

F-AGI version: 01

LA EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA S.A E.S.P –
AGUAS DE EL BAGRE S.A E.S.P.
NIT 900.649.669-8

CERTIFICA QUE:

Para el mes de abril y mayo del año 2025, se prestó el servicio público domiciliario de aseo (recolección de residuos aprovechables y no aprovechables) a la empresa **SOLUCIONES INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A** identificada con NIT N° 900483091-7 disponiendo un total de **28 KG**, distribuidos según se muestra en la tabla los cuales fueron generados en la en la ejecución de la obra cuyo objeto es "Construcción de pavimento en concreto rígido obras complementarias y sistema de alcantarillado pluvial en el barrio Los Comodatos de Arriba en la vía Cra 41 entre Cll 33 y final de pavimento existente (sector base militar) Cll 33 entre Cra 41 y 40 Cra 41 entre Cll 33 y entrada al SENA en la zona urbana del municipio de El Bagre Antioquia

TABLA DE DISTRIBUCIÓN RESIDUOS

REGISTRO CANTIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS

TIPO DE RESIDUOS	CANTIDAD (KG)
APROVECHABLES	6
NO APROVECHABLES	22
TOTAL	28

VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PAGA

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

GERENCIA DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO

Fecha de 21/08/2019 Hora 12:01:45 Página 1 de 2

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO	Expediente HI7414004 RMN HHCG-01
MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (L 685)	
Vigencia Desde 07/02/2007 Hasta 06/02/2037	Fecha y Hora de Registro 07/02/2007 00:00:00

TITULARES:
ARENERA SANTA CLARA S.A.S.

IDENTIFICACIÓN
N 9010111761

AREA TOTAL: 22 Hectárea(s) y 6732 mEs2

MUNICIPIOS: CÁCERES-ANTIOQUIA
CAUCASIA-ANTIOQUIA

MINERALES: GRAVAS ARENA

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

AREA: 1
PUNTO ARCIFINIO: SE TOMO EL PUNTO UNO DE LA ALINDERACION
NORTE: 1371640,0000
ESTE: 875000,0000
PLANCHA IGAC: 82

ALINDERACIÓN

Coordenada Norte	Coordenada Este
1371640,0000	875000,0000
1371183,0000	875000,0000

AGUAS DE EL BAGRE S.A. E.S.P

AGUAS DE EL BAGRE S.A. E.S.P
NIT 900.649.669-8
CALLE 54 N° 48 - 33 / TEL (604) 837 07 86
aguasdelbagre@elbagre-antioquia.gov.co
Vigilada por la Superintendencia de Servicios Publicos

FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS

FACTURA Nro:	0001003627
Periodo	Mayo / 2025
FECHAS DE PAGO	
Fecha SIN Recargo	23/05/2025
Fecha CON Recargo	31 / 05 / 2025
Cuentas Vencidas	0

CODIGO: 001 - 2800025691
DIRECCION: 2800025691 BARRIO LOS COMODATOS
SUSCRIPTOR: MARIA VIRGINIA RIOS SERNA
IDENTIFICACION: 22237900
MEDIDOR: 1028114567
USO: RESIDENCIAL - Bajo 2

ACUEDUCTO

Cargo Fijo	6.081,00
Consumo Basico	[illegible]
Consumo Complemen	[illegible]
Consumo Suntuario	
SubTotal Acueducto	193.340,00
Vlr Aporte Solidario(+)	0
Vlr Subsidio(-)	-16.172,60
Total Mes Acueducto	177.160,40
Vlr Deuda Anterior	0,00
Vlr Recargos Deuda	0,00
TOTAL ACUEDUCTO	177.160

ALCANTARILLADO


Cargo Fijo	3.489,00
Vertimento Básico	
Vertimento Complemt	
Vertimento Suntuario	
SubTotal Saneamiento	13.533,00
Vlr Aporte Solidario(+)	0
Vlr Subsidio(-)	-4.966,80
Total Mes Saneamiento	8.566,20
Vlr Deuda Anterior	0,00
Vlr Recargos Deuda	0,00
TOTAL ALCANTARILLADO	8.566

ASEO

Vlr Tasa de Aseo	
Vlr Aporte Solidario(+)	0,00
Vlr Subsidio(-)	0,00
Vlr Deuda Anterior	0,00
Vlr Recargos Deuda	0,00
Frecuencia Semanal	30
TOTAL ASEO	0

HISTORICO DE CONSUMOS

Promedio Ultimos Seis Meses



INFOMACION DE CONSUMOS

Consumo Desde	01 / 04 / 2025	Lectura Anterior (m3):	0
Consumo Hasta	30 / 04 / 2025	Lectura Actual (m3):	0
Dias de Consumo	30	Consumo (m3):	90

INFORMACION OTROS COBROS

VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PAGA

SOLINAC

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN			
ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCION DEL PROYECTO (meses)		
	1	2	3
Reutilizar en obra materiales de excavaciones para la reconformación del terreno previa aprobación de la interventoria	*	*	
La disposición final de residuos sólidos y de RCD en sitios previamente seleccionados y aprobados por la interventoria	*	*	
Depositar los residuos generados en los frentes de obra en su respectivo recipiente	*	*	
Disposición final de los residuos sólidos	*	*	
Punto de acopio de residuos de construcción y demolición	*	*	

INDICADORES			
Indicador 1. Disposición adecuada de residuos			
Indicador 1. Disposicion adecuada de residuos	30	15	
Residuos generados	30	15	

HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA
C.C 98.654.946

HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA
ING. CIVIL
M.P.
05202140753

INSPECCION DE BAÑOS PORTATILES

SOLINAC

INSPECCION BAÑOS PORTATILES

SOLINAC

EMPRESA: **SOLINAC**

UBICACIÓN **COMODATOS**

RESPONSABLE: **JINNA CABARCAS**

FECHA: 6/05/2025

DATOS GENERALES

N PERSONAS	HOMBRES	12	N BAÑOS	HOMBRE	2
	MUJERES	0		MUJERES	0
FRECUENCIA DE LA LIMPIEZA	DIARIO:		SEMANAL: X	MENSUAL:	

ITM	CONDICIONES DEL AREA	NO	SI	N/A	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	EXISTEN BAÑOS EN EL AREA		X			
2	LOS BAÑOS ESTAN ROTULADOS (NOMBRE DE LA EMPRESA)		X			
3	EL ACCESO ES EL ADECUADO		X			
	CONDICIONES DEL BAÑO					
1	CUENTA CON SEGUROS EXTERNOS DE LA PUERTA		X			
2	CUENTA CON SEGUROS INTERNOS DE LA PUERTA		X			
3	TIENE PISO ANTI DESLISANTE		X			
4	CUENTA CON PAPEL HIGIENICO		X			
5	CUENTA CON LACHO O BOLSA NEGRA PARA LA PAPELERA		X			
6	CUENTA CON SISTEMA DE VENTILACION		X			
7	CUENTA CON PERSONAL DE LIMPIEZA		X			
8	MANTIENE EL ORDEN Y LA LIMPIEZA		X			
9	CUENTA CON DESINFECTANTE Y / JABON LIQUIDO PARA MAÑOS		X			
10	AUSENCIA DE MALOS OLORES		X			
RESPONSABLE SST						

SOLINAC

INSPECCION BAÑOS PORTATILES

SOLINAC

EMPRESA: **SOLINAC**

UBICACIÓN **COMODATOS**

RESPONSABLE: **JINNA CABARCAS**

FECHA: 15/05/2025

DATOS GENERALES

N PERSONAS	HOMBRES	12	N BAÑOS	HOMBRE	2
	MUJERES	0		MUJERES	0
FRECUENCIA DE LA LIMPIEZA	DIARIO:		SEMANAL: X	MENSUAL:	

ITM	CONDICIONES DEL AREA	NO	SI	N/A	CANTIDAD	OBSERVACIONES
	CONDICIONES DEL AREA					
1	EXISTEN BAÑOS EN EL AREA		✓			
2	LOS BAÑOS ESTAN ROTULADOS (NOMBRE DE LA EMPRESA)		✓			
3	EL ACCESO ES EL ADECUADO		✓			
	CONDICIONES DEL BAÑO					
1	CUENTA CON SEGUROS EXTERNOS DE LA PUERTA		✓			
2	CUENTA CON SEGUROS INTERNOS DE LA PUERTA		✓			
3	TIENE PISO ANTI DESLISANTE		✓			
4	CUENTA CON PAPEL HIGIENICO		✓			
5	CUENTA CON LACHO O BOLSA NEGRA PARA LA PAPELERA		✓			
6	CUENTA CON SISTEMA DE VENTILACION		✓			
7	CUENTA CON PERSONAL DE LIMPIEZA		✓			
8	MANTIENE EL ORDEN Y LA LIMPIEZA		✓			
9	CUENTA CON DESINFECTANTE Y / JABON LIQUIDO PARA MAÑOS		✓			
10	AUSENCIA DE MALOS OLORES		✓			
RESPONSABLE SST						

SOLINAC

INSPECCION BAÑOS PORTATILES

SOLINAC

EMPRESA: SOLINAC

UBICACIÓN COMODATOS

RESPONSABLE: JINNA CABARCAS

FECHA: 23/05/2025

DATOS GENERALES

N PERSONAS	HOMBRES	12	N BAÑOS	HOMBRE	2
	MUJERES	0		MUJERES	0
FRECUENCIA DE LA LIMPIEZA	DIARIO:		SEMANAL: X	MENSUAL:	

ITM	CONDICIONES DEL AREA	NO	SI	N/A	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	EXISTEN BAÑOS EN EL AREA		X			
2	LOS BAÑOS ESTAN ROTULADOS (NOMBRE DE LA EMPRESA)		X			
3	EL ACCESO ES EL ADECUADO		X			
	CONDICIONES DEL BAÑO					
1	CUENTA CON SEGUROS EXTERNOS DE LA PUERTA		X			
2	CUENTA CON SEGUROS INTERNOS DE LA PUERTA		X			
3	TIENE PISO ANTI DESLISANTE		X			
4	CUENTA CON PAPEL HIGIENICO		X			
5	CUENTA CON LACHO O BOLSA NEGRA PARA LA PAPELERA		X			
6	CUENTA CON SISTEMA DE VENTILACION		X			
7	CUENTA CON PERSONAL DE LIMPIEZA		X			
8	MANTIENE EL ORDEN Y LA LIMPIEZA		X			
9	CUENTA CON DESINFECTANTE Y / JABON LIQUIDO PARA MAÑOS		X			
10	AUSENCIA DE MALOS OLORES		X			
RESPONSABLE SST						

SOLINAC

INSPECCION BAÑOS PORTATILES

SOLINAC

EMPRESA: **SOLINAC**

UBICACIÓN **COMODATOS**

RESPONSABLE: **JINNA CABARCAS**

FECHA: 29/05/2025

DATOS GENERALES

N PERSONAS	HOMBRES	12	N BAÑOS	HOMBRE	2
	MUJERES	0		MUJERES	0
FRECUENCIA DE LA LIMPIEZA	DIARIO: ____	SEMANAL: X	MENSUAL: ____		

ITM	CONDICIONES DEL AREA	NO	SI	N/A	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	EXISTEN BAÑOS EN EL AREA		X			
2	LOS BAÑOS ESTAN ROTULADOS (NOMBRE DE LA EMPRESA)		X			
3	EL ACCESO ES EL ADECUADO		X			
	CONDICIONES DEL BAÑO					
1	CUENTA CON SEGUROS EXTERNOS DE LA PUERTA		X			
2	CUENTA CON SEGUROS INTERNOS DE LA PUERTA		X			
3	TIENE PISO ANTI DESLISANTE		X			
4	CUENTA CON PAPEL HIGIENICO		X			
5	CUENTA CON LACHO O BOLSA NEGRA PARA LA PAPELERA		X			
6	CUENTA CON SISTEMA DE VENTILACION		X			
7	CUENTA CON PERSONAL DE LIMPIEZA		X			
8	MANTIENE EL ORDEN Y LA LIMPIEZA		X			
9	CUENTA CON DESINFECTANTE Y / JABON LIQUIDO PARA MAÑOS		X			
10	AUSENCIA DE MALOS OLORES		X			
RESPONSABLE SST						

HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA
ING. CIVIL
M.P.
05202140753

DOCUMENTOS E INSPECCION PREOPERACIONALES MAQUINARIA

MAQUINARIA DE OBRA

TIPO	EQUIPO	MODELO	MARCA
Campo	Retrocargador N5AH10542	2005	NEWHOLAND
Campo	Retrocargador CLG766A	2024	Liu gong
Campo	Minicargador XUG0SR07HPC75073	2023	XCMG
Campo	Vibro compactador	1999	CASSE
Campo	Mini vibro	2023	INTERNACIONAL
Campo	Hormigonera XUG0SR07MPC75472	2020	XCMG

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 120762

No. DE REGISTRO MC669172	MARCA XCMG	LINEA XC740K	AÑO MODELO 2023
TIPO DE MAQUINARIA CONSTRUCCION	CLASE MINICARGADOR		No. SERIE XUG0SR0JHPC005005
COLOR(ES) AMARILLO GRIS	No. MOTOR 30D2G1N80075		RODAJE NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
2155 Kg	1980 mm	1800 mm	3410 mm

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
VELEZ VALENCIA DAMARIZ

IDENTIFICACIÓN
C.C. 43.086.386

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTEYTTO ENVIGADO

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
19-09-2023	19 09 2023	******

ORIGEN
IMPORTACIÓN

DEC. IMPORTACION
352023000207575

FECHA DE LEVANTE
30/05/2023



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000057685

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 143813

No. DE REGISTRO
MC716584

MARCA
LIUGONG

LINEA
CLG766A

MODELO
2024

TIPO DE MAQUINARIA
CONSTRUCCION

CLASE
RETROCARGADOR

No. SERIE
LGIC766AZKPC00383

COLOR(ES)
AMARILLO

No. MOTOR
4P23F002005

RODAJE
NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO
8100 Kg

ALTO
2870 mm

ANCHO
2280 mm

LARGO
6970 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
INVERSIONES CONSUEGRA HERNANDEZ SA

IDENTIFICACION
NIT 900.735.670

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD
PRENDA-SOLUCIONES EN REPUESTOS Y MAQUINARIA S.A.S

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
STRIA TTEYTTO ENVIGADO

FECHA REGISTRO
23-01-2025

FECHA EXPEDICIÓN
23-01-2025

FECHA VENCIMIENTO

ORIGEN
IMPORTACIÓN

DEC. IMPORTACIÓN
352024000188879

FECHA DE LEVANTE
06/05/2024

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM07000048544

CERTIFICADO

MACTRAK

MACTRAK como distribuidor autorizado de la marca **XCMG**, certifica que:

OSCAR HERNANDO GARCIA HUETE

Identificado con T.I

1.040.496.052

Asistió a la capacitación teórico- práctica correspondiente a la operación y mantenimientos preventivos del minicargador **XC740K** marca **XCMG** la cual fue dictada por el Técnico JUMBRAINER NOREÑA en las instalaciones y punto asignadas por el cliente DAMARIS VELEZ y debido a los conocimientos adquiridos se encuentra apto para la operación y mantenimiento básico de dicho equipo

Este certificado se expide el día 29 de Septiembre de 2023

JUAN FELIPE MORENO CANO
Gerente Técnico

JUMBRAINER NOREÑA
Técnico Capacitación

MACTRAK MAC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

Año 2020

4. Número de formulario
032020000852904-3

1. Identificación Tributaria (NIT): 900824185 | 2. DV: 5 | 3. Apellidos y nombres o Razón social: HP COLOMBIA S.A.S.
15. Dirección: CL 100 7 25 BRR CHICO ALTO | 16. Teléfono: 3257300 | 12. Cod. Admón.: 03 | 10. Cod. Dpto: 11 | 17. Cod. Ciudad / Municipio: 001

Declarante
20. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830002397 | 21. DV: 9 | 22. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS DHL GLOBAL FORWARDING COLOMBIA SA NIVEL 1
29. Número declaración de importación: 807863482 | 30. Apellidos y nombres: PAEZ PARDO ANDERSON SMITH | 27. Tipo usuario: 28 | 28. Cód. tipo usuario: 0048

31. Clase importador: 02 | 32. Tipo declaración: Inicial | 33. Cód.: 1 | 37. No. Formulario Anterior: XXXXXXXXXXXXXX | 38. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX | 39. Cod. Admón.: XX | 40. Conocimiento de Embarque: No. XXXXXXXXXXXXXX | 41. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX | 42. Cód. Aforo: XX
43. Cód. lugar ingreso a la mercancía: BOG | 44. Cód. Depósito: 038 | 45. Identificación de carga: No. 577335 | 46. Año - Mes - Día: 2020 - 07 - 28 | 47. Documento de transporte: No. 5763702602 | 48. Año - Mes - Día: 2020 - 07 - 14

49. Nombre exportador / proveedor en el exterior: HP PANAMA SALES AND DISTRIBUTION, S. DE R.L.
50. Dirección exportador / proveedor en el exterior: AVE. RANDOLPH MANZ 10 LTE 809 ZON 0302-00122 | 51. Ciudad: COLON - PANAMA | 52. Cod. País Exportación: 590
53. No. de factura: 03301020882 | 54. Año - Mes - Día: 2020 - 07 - 14 | 55. Cod. país procedencia: 215 | 56. Cod. Moneda Transacción: 4 | 57. Código de incoterm: 249 | 58. Cod. Depto Destino: 0 | 59. Agencia transportadora: ATLAS AIR ING SUCURSAL COLOMBIA | 60. Tasa de cambio $ / M.E.: 3,680.15
S | 61. Subpartida arancelaria: 8517360000 | 62. Cod. Complementación: XX | 63. Cod. Departamento: XX | 64. Cod. Modalidad: C201 | 65. No. cuotas si aplica: XX | 66. Valor cuota USD: XXXX | 67. Periodicidad del pago de la cuota: XX | 68. Cod. país de origen: 215 | 69. Cod. Acuerdo: XXX
70. Forma de pago de la importación: 03 | 71. Tipo de importación: 01 | 72. Cod. país origen: 590 | 73. Peso bruto kgs.: ENTS 215.00 | 74. Peso neto kgs.: ENTS 193.50 | 75. Código asociado: CS | 76. No. bultos: 102 | 77. Asignación: 1 | 78. Cod. unidad comercial: U | 79. Cantidad comercial: 102.00

80. Valor FOB USD: 31,432.45	81. Valor flete USD: 1,168.41	82. Valor seguros USD: 1.71	83. Valor Otros Gastos USD: 0.00
84. Aumentos de valor, seguros y otros gastos USD: 1,170.12	85. Abono valor USD: 0.00	86. Valor aduana USD: 32,602.67	87. Código regimen de tributos: X
88. Tributos: XXXXXXXXXX	89. Cod. aforo: 99	90. Año: XXXX	91. Programa ex: XXXXXXXXXX
92. Cod interno del Producto: 0			

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	119,330,297	0	0	0
IVA	0.00	119,330,297	0	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Recargo	0	0	0	0	
		Total	0	0	0

[illegible] / IMPORTACION ORDINARIA DE MERCANCIAS NUEVAS [illegible]

127. Valor pagos anticipados: 0 | 128. Recibo oficial de pago anticipado No.: XXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado para uso exclusivo de funcionarios aduaneros | 131. Espacio reservado para uso exclusivo funcionario de Entidades Financieras | 132. No. Aceptación declaración: 032020000852904
134. Levante No. 032020000693850 | 135. Fecha: 2020 - 07 - 28 | 133. Fecha: 2020 07 28
Firma declarante | 897. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario | 930. Pago Total $: 0 | 995. Espacio para autoadhesivos de la entidad financiera | SYGA Autoadhesivo 92032004239968 Fecha presentación 2020-07-28 14:13:15 Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2020-07-29 16:06:03

032014208262?1

DIAN

Declaración de Importación

Aceptación : 032020000852904-3
Subpartida : 8471300000

032020000852904-3

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DIAN

1-2122022

Bogotá D.C.
Oficio No. 1 03 201 257 – 3215

Señor
ROY PARRA
Roy.parra@comexlogsas.com

Asunto: Solicitud copia documento
Radicado No. PQRSF 20228214010016058 1 del 02/12/2022

Respetado señor:

Reciba un cordial saludo. Atendiendo a la solicitud de la referencia, y conforme al numeral 12 del artículo 2.1 de la Resolución No. 0069 de 9 de agosto de 2021, adjunto al presente me permito remitir copia de la Declaración de Importación con autoadhesivo No. 07237290706881 del 25/04/2008 e identificada con formulario No 032008100370757-3 que figura registrada en la base de datos de la entidad.

Nota: El original de las mencionadas Declaraciones de Importación junto con los documentos soporte, debe ser conservado por el declarante (F.B. LOGISTIC S.I.A S.A), conforme a lo establecido en el parágrafo 6 del artículo 177 del Decreto 1165 de 2019 modificado por el artículo 57 del Decreto 360 de 2021.

Hasta otra oportunidad.

WILLIAM FORERO BARRANTES
Funcionario
División Administrativa y Financiera
Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá – Aeropuerto El Dorado

Anexo: Lo anunciado en un (1) folio.

WFB

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DIAN

Declaración de Importación | **Privada** | **500**

1. Año **2008**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de Formulario **032008100370757-3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 811001162 | 6. DV 5 | 12. Apellidos y nombres o Razón Social INVERSIONES GOMEZ UPEGUI LTDA

15. Dirección CL 73 A 45 A 81 | 16. Teléfono 2814103 | 17. Cód. Admón. -03 | 18. Cód. Dpto 05 | 19. Cód. Ciudad Municipio 380

Importador

24. Número de Identificación Tributaria (NIT) 900038800 | 25. DV 1 | 26. Nombre o razón social del declarante suministrado FB LOGISTIC S.A.S.A | 27. Tipo usuario 23 | 28. Cód. usuario

29. Número Identificación del Representante Legal 72205475 | 30. Apellidos y nombres VILLADA OSORIO JOSE CRISTOBAL

31. Clase Declarante 02 | 32. Tipo declarante Inicial | 33. Cód. 1 | 34. No. Formulario Anulado XXXXXXXXXXXXXX | 35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX | 36. Cód. Admón. XX | 37. Declaración de Importación No. XXXXXXXXXXXXXX | 38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX | 39. Cód. Admón. XX

40. Cód. Lugar Ingreso al territorio aduanero BOG | 41. Cód. Depósito 21020 | 42. Planilla de envío No. 032008100014108 | 43. Año - Mes - Día 2008 - 04 - 07 | 44. Documento de transporte No. 2422 | 45. Año - Mes - Día 2008 - 03 - 21

46. Nombre, razón social o denominación del exportador MAGNACHINE CORP | 47. Ciudad MIAMI | 48. Cód. País Exportación 249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior 1600 NW 96 AVE. MIAMI FL. 33172 | 50. Teléfono (305) 471-8350

51. No. de Ítems 053-8 | 52. Año - Mes - Día 2008 - 03 - 05 | 53. Cód. País Procedencia 249 | 54. Cód. Modo Transporte 1 | 55. Código de Cambio 103 | 56. Cód. Divisa 111 | 57. Agencia Internacional TRANSPORTES SARABIAS | 58. Tasa de Cambio $ vrs 1,782.87

S | 59. Relación de Importación 8429400002 | 60. Cód. Complementable XX | 61. Cód. Complementable XX | 62. Cód. Modalidad C100 | 63. No. Ítems a Pagar 00 | 64. Valor según CIF XXXX | 65. Forma de Pago XX | 66. Cód. País de Origen 249 | 67. Cód. Asociado XXX

68. Fecha en que pago la Importación 01 | 69. Tipo de Importación 01 | 70. Cód. país compra 249 | 71. Fecha Embarque AÑO 4,785.83 | 72. Fecha Arribo AÑO 4,785.83 | 73. Cód. Puerto PTC | 74. No. Bultos 3 | 75. Tipo Bultos 3 | 76. Cód. unidad especial 0 | 77. Cantidad Mcia 1.00

78. Valor FOB USD 8,000.00 | 79. Valor Bruto USD 913.28 | 80. Valor Negociado USD 40.00 | 81. Valor Otros Gastos USD 0.00 | 82. Diferencia de Precio negociado USD 953.28 | 83. Ajuste Valor USD 0.00 | 84. Valor Aduana USD 8,953.28 | 85. Código moneda de Factura IL | 86. Monto 20294450

87. Cód. unidad 3 | 88. Año 2008 | 89. Preimpreso No XXXXXXXXXX | 90. Cód Idioma del Producto 0

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar en esta Declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	5.00	16,052,031	802,802	802,802	0
I.V.A.	16.00	18,854,833	2,988,741	2,988,741	0
Sobretasa	0.00		0	0	0
Cuotas	0.00		0	0	0
Compensatorios	0.00		0	0	0
Cuotas Antidumping	0.00		0	0	0
Bandas	0		0	0	0
Timbre	0		0	0	0
		Total	3,499,343		0

91. Declaración de Importación Global (Marque con una X si corresponde a una declaración de importación global) | 92. Declaración de Importación Anticipada (Marque con una X si corresponde a una declaración de importación anticipada) | 93. Declaración de Importación Parcial (Marque con una X si corresponde a una declaración de importación parcial) | 94. Declaración de Importación Consolidada (Marque con una X si corresponde a una declaración de importación consolidada)

95. Observaciones (Diligencie de acuerdo con las instrucciones o deje en blanco) CONDICIONES PREFERENTES (NEGOCIACION), REPUESTOS AUXILIARES (ADQUISICION); MAQUINARIA, HERRAMIENTAS (DONACION), PALAS VOLANTES, RETENEDORA S, CUCHARAS, PALAS CARGADORAS, CONDICIONES Y APLICACIONES (APARCADAS); AUTOPROPULSADAS, CONDICIONES Y APLICACIONES (NUEVO SOLDADURA). MAQUINARIA USADA, (II) CONDICIONES MÁXIMA. CASE, MODELO, MOTO-NIVELADOR CONDICIONES 1250 HP 45 TONELADAS, CON LLANTAS TRASERA DE. PESO DE OPERACIÓN 45000. TIPO DE PROPULSION DOS VELOCIDADES MÁX. VELOCIDAD 0-7 KM/H. ALTA VELOCIDAD 0-12 KM/H. ARTICULADA, MOTOR DETRÁS DIESEL MARCA 3 TON. CON TODOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO. AÑO DE FABRICACION. 1999. PRECIO CUBICO NUEVA USD$ 18,554.00 . CONDICIÓN SUPERIOR. MARCA JD. MODELO 450H. COLOR NARANJA. VERSION. MOTOR 2 (continúa al respaldo)

102. Valor pagos anticipados 0 | 103. Fecha calidad de pago anticipado XXXXXXXXXXXXXX | 104. Factor XXXX XX-XX

105. Nombre o razón social del importador | 106. Dirección seccional que recibe la Declaración de Importación Cindadana | 107. No. Autoadhesivo declaración 032008100370757

108. Firma del representante legal | 109. Nombre representante legal | 110. Fecha 2008 04 25

Firma declarante

12 DIC 2022

GRUPO ARCHIVO
LA PRESENTE ES COPIA DEL DOCUMENTO REGISTRADO EN LA BASE DE DATOS DE LA DIAN

111. Nombre o razón social de la entidad recaudadora | 112. Fecha 2008 - 04 - 25 | 113. Modalidad | 114. C.C. No.

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario.

980. Pago Total $ 3,499,343

998. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del autoadhesivo)

BANCOLOMBIA S.A.
Autoadhesivo 07237250708867
Fecha presentación 2008-04-25 18:34:00
Valor pagado $3,499,343

Fecha de Impresión 2023-12-07 11:01:32

20081602764135

DIAN

Declaración de Importación

Aceptación : 320081003707573
Subpartida : 8429400000

Página 1 de 1

320081003707573

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRANSITO No. 10032129432

PLACA SNK559	MARCA CHEVROLET	LINEA KODIAK		MODELO 2003
CILINDRADA CC 7.200	COLOR BLANCO			SERVICIO PÚBLICO
CLASE DE VEHICULO VOLQUETA	TIPO CARROCERIA PLATON	COMBUSTIBLE DIESEL		CAPACIDAD Kg/PSJ 7000
NUMERO DE MOTOR CKM41267		REG N	VIN ******	
NÚMERO DE SERIE ******		REG N	NUMERO DE CHASIS 9GDP7H1C33B320510	REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
CONSUEGRA DAVILA RAFAEL HUMBERTO

IDENTIFICACIÓN
C.C. 8264383

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
08002110002662

VO
I

FECHA IMPORT
25/03/2003

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRICULA
13/05/2003

FECHA EXP LIC TTO
28/06/2024

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTOYTTE MCPAL SABANETA

LT0200791067S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 173441099

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ BAJO CAUCA LTDA

NIT: 900215895

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-031-001

Fecha de expedición: 2024/05/24

Fecha de vencimiento: 2025/05/24

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SNK559

CLASE: VOLQUETA

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2003

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 7200

NRO. MOTOR: 9SZ14151

NRO. CHASIS: 9GDP7H1C338320510

VIN:

LÍNEA: KODIAK

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: MARCIA T. RODRIGUEZ L.

FIRMA DEL RESPONSABLE

DIEGO ALEJANDRO RUIZ TORO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026831737

PLACA: QEG905	MARCA: INTERNATIONAL	LINEA: 4300 SBA 4X2	MODELO: 2008
CILINDRADA CC: 7.636	COLOR: BLANCO		SERVICIO: PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO: VOLQUETA	TIPO CARROCERIA: PLATON	COMBUSTIBLE: DIESEL	CAPACIDAD KG/PSJ: 8643
NUMERO DE MOTOR: 470HM2U1530941	REG: N	VIN: 3HAMMAAR88L056528	
NUMERO DE SERIE: 3HAMMAAR88L056528	REG: N	NUMERO DE CHASIS: 3HAMMAAR88L056528	REG: N
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES: HERNANDEZ ELIS YOHANA		IDENTIFICACIÓN: C.C. 43098981	

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

CILINDRAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

NÚ: 1

FECHA IMPORT

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRICULA: 14/05/2008

FECHA EXP. LIC. TTO: 05/08/2022

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRANSITO: STRIA MCPAL TTEYTTO MONTERIA



LT06004659935

SOAT



89946404

263,11
701.68
8,77
100
750

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

1.095.835.670
SANTAMARIA JIMENEZ

CARLOS ANDRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-OCT-1997
PUERTO BERRIO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

17-NOV-2015 FLORIDABLANCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2708200-00783227-M-1095835670-20160114 0048002373A 1 45093443

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1095835670

NOMBRE

CARLOS ANDRES SANTAMARIA JIMENEZ

FECHA DE NACIMIENTO
02-10-1997

RH
O+

FECHA DE EXPEDICION
12-12-2022

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTOyTTE CAUCASIA

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	12-12-2032	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	12-12-2025	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03005003505

Servicios Integrales 60947 2.0-2 04/22

SOLINAC

INSPECCION PREOPERACIONAL

RETROEXCAVADORA LLANTAS

SOLINAC

SEMANA DEL 5 Mayo 2025 AL 10 Mayo 2025 MARCA NEWHOLAND MODELO 2005

OPERADOR CARLOS PEREZ UBICACIÓN COMODATOS

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (ROPS) certificada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 10 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palancas y pedales en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores (bastidor, desgarrador)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores (brazo, balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Gatos estabilizadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Función Hidráulica en buen estado (mangueras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Mando de estacionamiento (freno de emergencia)**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Huellas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Carlos Perez													
	FIRMA SUPERVISOR SISO														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

SOLINAC

INSPECCION PREOPERACIONAL

RETROEXCAVADORA LLANTAS

SOLINAC

SEMANA DEL 12 Mayo 2025 AL 17 Mayo 2025 MARCA NEWHOLAND MODELO 2005

OPERADOR CARLOS PEREZ UBICACIÓN COMODATOS

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (ROPS) certificada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 10 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palancas y pedales en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores (bastidor, desgarrador)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores (brazo, balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Gatos estabilizadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Función Hidráulica en buen estado (mangueras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Mando de estacionamiento (freno de emergencia)**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Huellas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Carlos Perez													
	FIRMA SUPERVISOR SISO														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

SOLINAC	INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA LLANTAS	SOLINAC

SEMANA DEL 19 Mayo 2025 AL 24 Mayo 2025 MARCA NEWHOLAND MODELO 2005

OPERADOR CARLOS PEREZ UBICACIÓN COMODATOS

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (ROPS) certificada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 10 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palancas y pedales en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores (bastidor, desgarrador)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores (brazo, balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Gatos estabilizadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Función Hidráulica en buen estado (mangueras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Mando de estacionamiento (freno de emergencia)**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Huellas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Carlos Perez													
	FIRMA SUPERVISOR SISO														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

SOLINAC	INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA LLANTAS	SOLINAC

SEMANA DEL 26 Mayo AL 31 Mayo 2025 MARCA NEWHOLAND MODELO 2005

OPERADOR CARLOS PEREZ UBICACIÓN COMODATOS

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	/	/	/		/		/		/		/			
	De trabajo traseras	/	/	/		/		/		/		/			
	Direccionales delanteras	/	/	/		/		/		/		/			
	Direccionales traseras	/	/	/		/		/		/		/			
	De Stop y señal trasera	/	/	/		/		/		/		/			
CABINA	Protección antivuelco (ROPS) certificada	/		/		/		/		/		/			
	Cinturón de seguridad	/		/		/		/		/		/			
	Extintor de incendio 10 PQS	/		/		/		/		/		/			
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	/		/		/		/		/		/			
	Vidrio panoramico en buen estado	/		/		/		/		/		/			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor)	/		/		/		/		/		/			
	Tubo de escape (Exhosto)	/		/		/		/		/		/			
	Alarma de retroceso-Pito	/		/		/		/		/		/			
	Espejos	/		/		/		/		/		/			
	Escaleras y apoyos de acceso	/		/		/		/		/		/			
	Palancas y pedales en buen estado	/		/		/		/		/		/			
	Bateria y cables	/		/		/		/		/		/			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**	/		/		/		/		/		/			
	Kit ambiental	/		/		/		/		/		/			
	Estado pasadores (bastidor, desgarrador)	/		/		/		/		/		/			
	Estado pasadores (brazo, balde)	/		/		/		/		/		/			
	* Gatos estabilizadores	/		/		/		/		/		/			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	/		/		/		/		/		/			
	* Función Hidráulica en buen estado (mangueras)	/		/		/		/		/		/			
	* Freno de servicio	/		/		/		/		/		/			
	*** Mando de estacionamiento (freno de emergencia)**	/		/		/		/		/		/			
	Estado general desgarrador (balde)	/		/		/		/		/		/			
	Mandos de levante del brazo	/		/		/		/		/		/			
	*** Cilindros en buen estado**	/		/		/		/		/		/			
	Compartimiento del motor aseado	/		/		/		/		/		/			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	/		/		/		/		/		/			
	Huellas en buen estado	/		/		/		/		/		/			
FIRMAS	FIRMA OPERADOR	Carlos Perez													
	FIRMA SUPERVISOR SISO														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

SOLINAC

INSPECCION PREOPERACIONAL

MINICARGADOR

SOLINAC

SEMANA DEL 5 Mayo 2025 AL 10 Mayo 2025 MARCA **XCMG** MODELO **2023**

OPERADOR **OSCAR GARCIA** UBICACIÓN **COMODATOS**

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Direccionales delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De frenado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Frenos de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Silla del operador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo central convexo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasamanos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Dirección	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Oscar Garcia													
	FIRMA SUPERVISOR SISO														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA		ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

SOLINAC

INSPECCION PREOPERACIONAL

MINICARGADOR

SOLINAC

SEMANA DEL 12 Mayo 2025 AL 17 Mayo 2025 MARCA **XCMG** MODELO **2023**

OPERADOR **OSCAR GARCIA** UBICACIÓN **COMODATOS**

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Direccionales delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De frenado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Frenos de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Silla del operador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo central convexo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasamanos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Dirección	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Oscar Garcia													
	FIRMA SUPERVISOR SISO														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA		ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

INSPECCION PREOPERACIONAL

MINICARGADOR

SEMANA DEL 18 Mayo 2025 AL 24 Mayo 2025 MARCA **XCMG** MODELO **2023**

OPERADOR **OSCAR GARCIA** UBICACIÓN **COMODATOS**

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Direccionales delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De frenado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Frenos de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Silla del operador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo central convexo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasamanos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Dirección	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Oscar Garcia													
	FIRMA SUPERVISOR SISO														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA		ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

SOLINAC

INSPECCION PREOPERACIONAL

MINICARGADOR

SOLINAC

SEMANA DEL 26 Mayo 2025 AL 31 Mayo 2025 MARCA **XCMG** MODELO **2023**

OPERADOR **OSCAR GARCIA** UBICACIÓN **COMODATOS**

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Direccionales delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De frenado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Frenos de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Silla del operador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo central convexo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasamanos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Dirección	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Oscar Garcia													
	FIRMA SUPERVISOR SISO														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA		ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

SOLINAC	INSPECCION PREOPERACIONAL MEZCLADORA	SOLINAC

SEMANA DEL 5 Mayo 2025 AL 10/ 6a 4 07 2025 MODELO 2020 MARCA XCMG

OPERADOR ELIECER LARA UBICACIÓN COMODATOS

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Poleas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Medidor de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tapa de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	bujia	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guarda de los piñones	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Choque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Yoyo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acelerador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Volante de Operación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Filtro de cumbustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tampo de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tornillos en general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guarda de los piñones	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tapa protectora de motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tambor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estrias de compactacion interno	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Engrase en general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Balineras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de seguridad tambor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pintura	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SISO														

Si el estado del elemento o accesorio es optimo marque B

Si el equipo cuenta con el elemento o accesorio pero su estado no es el ideal, marque M

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

SOLINAC	INSPECCION PREOPERACIONAL MEZCLADORA	SOLINAC

SEMANA DEL 12 Mayo 2025 AL 18 Mayo 2025 MODELO 2020 MARCA XCMG

OPERADOR ELIECER LARA UBICACIÓN COMODATOS

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Poleas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Medidor de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tapa de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	bujia	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guarda de los piñones	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Choque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Yoyo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acelerador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Volante de Operación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Filtro de cumbustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tampo de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tornillos en general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guarda de los piñones	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tapa protectora de motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tambor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estrias de compactacion interno	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Engrase en general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Balineras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de seguridad tambor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pintura	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SISO														

Si el estado del elemento o accesorio es optimo marque B

Si el equipo cuenta con el elemento o accesorio pero su estado no es el ideal, marque M

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

SOLINAC	INSPECCION PREOPERACIONAL MEZCLADORA	SOLINAC

SEMANA DEL 19 Mayo 2025 AL 23 Mayo 2025 MODELO 2020 MARCA XCMG

OPERADOR ELIECER LARA UBICACIÓN COMODATOS

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Poleas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Medidor de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tapa de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	bujia	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guarda de los piñones	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Choque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Yoyo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acelerador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Volante de Operación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Filtro de cumbustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tampo de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tornillos en general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guarda de los piñones	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tapa protectora de motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tambor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estrias de compactacion interno	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Engrase en general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Balineras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de seguridad tambor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pintura	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SISO														

Si el estado del elemento o accesorio es optimo marque

Si el equipo cuenta con el elemento o accesorio pero su estado no es el ideal, marque

B

M

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

SOLINAC	INSPECCION PREOPERACIONAL MEZCLADORA	SOLINAC

SEMANA DEL 26/04/2025 AL 31/04/2025 MODELO 2020 MARCA XCMG

OPERADOR ELIECER LARA UBICACIÓN COMODATOS

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Poleas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Medidor de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tapa de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	bujia	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guarda de los piñones	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Choque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Yoyo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acelerador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Volante de Operación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Filtro de cumbustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tampo de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tornillos en general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guarda de los piñones	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tapa protectora de motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tambor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estrias de compactacion interno	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Engrase en general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Balineras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de seguridad tambor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pintura	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Elver													
	FIRMA SUPERVISOR SISO														

Si el estado del elemento o accesorio es optimo marque B

Si el equipo cuenta con el elemento o accesorio pero su estado no es el ideal, marque M

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA

ING. CIVIL

M.P.

05202140753

JUSTIFICACION DE GASTOS

Papelería y variedades
Génesis DM Nit 8362104-1
3116146328
los comodatos El bagre Ant

FACTURA DE VENTA
04 | 04 | 2025

Señores: Humberto Esteban Vides Sadona.
Dirección: Nit: 98.654.996.
Ciudad: El Bagre. Cel: Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR UNT	VR TOTAL
25	Resma de papel	$20.000	$500.000
1	Bolsa de gancho legador	$25.000	$25.000
1	perforadora de 6 Ojo Grande.	$180.000	$180.000
3	Carpetas #-2 Corta.	$27.000	$81.000
1	Juego de tinta 6X70	$380.000	$380.000
1	Cartucho de Almacenamiento	$180.000	$180.000
	Servicio de fotocopias.	$120.000	$120.000
3	Colas de Lapicero.	$15.000	$45.000

Este documento se asemeja en sus efectos legales a una letra de cambio según el art 1291 del 17 de octubre de 2006

SUBTOTAL	$1'511.000
TOTAL	$1'511.000

Papeleria y variedades
Génesis DM Nit 8362104-1
3116146328
los comodatos El bagre Ant

FACTURA DE VENTA
05 | 05 | 2025

Señores: Humberto Esteban Vides Solano.
Dirección: Nit: 98654946
Ciudad: El Bagre Cel: Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR UNT	VR TOTAL
20	Resmas de papel.	$20.000	$400.000
5	Memorias usb	$39.000	$195.000
1	Disco Duro 1t.	$320.000	$320.000
35	ganchos	$4.500	$157.500
1	cinta de sobre nom-	$20.000	$20.000
3	tacos de Memos	$4.500	13.500
	Servicios de fotocopia	$140.000	$140.000
1	teclado.	$85.000	$85.000
1	mouse.	$75.000	$75.000

Este documento se asemeja en sus efectos legales a una letra de cambio según el art 1291 del 17 de octubre de 2006

SUBTOTAL	$1527.000
TOTAL	$1,527.000

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO

Conste por el presente documento, el CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO que celebran de una parte:

EL ARRENDADOR:

DIANA MARCELA ARCILA RICARDO, identificada con C.C. N.º 1.038.103.212, con domicilio en el Bagre, Antioquia.

EL ARRENDATARIO:

HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA, identificado con NIT N.º 98.654.946-5, con domicilio en CL 18 # 13-09 CAUCASIA, ANTIOQUIA.

Ambas partes acuerdan celebrar el presente contrato bajo las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

EL ARRENDADOR cede el uso y goce temporal a EL ARRENDATARIO, y este acepta en arrendamiento, los equipos informáticos que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	VALOR X MES	ESTADO
1	Computador lenovo ryzen 7 con adm Radeon graphics – ideapad 5 (1 unidad)	$200.000	operativo
2	Radios motorola mototrbo r2 (4 unidades)	$50.000	operativo
	Total valor mensual	**$250.000**	

SEGUNDA: CANON DE ARRENDAMIENTO Y FORMA DE PAGO

VALOR: EL ARRENDATARIO pagará a EL ARRENDADOR por concepto de canon de arrendamiento la suma de $ 250.000 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE) mensuales.

FORMA DE PAGO: El pago se realizará dentro de los primeros TRES días de cada mes.

TERCERA: DURACIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato tendrá una duración de CUATRO (04) meses, contados a partir del 03 de ABRIL de 2025 hasta el 03 de AGOSTO de 2025. El contrato podrá renovarse mediante acuerdo entre las partes antes de su vencimiento.

CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

De EL ARRENDADOR:

Entregar los equipos en perfecto estado de funcionamiento operativo y técnico.

Asumir las reparaciones o mantenimientos preventivos/correctivos derivados del desgaste natural u operacional de los equipos.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO

De EL ARRENDATARIO:

Usar los equipos exclusivamente para actividades laborales/comerciales lícitas.

Custodiar y mantener los equipos en óptimas condiciones de uso y seguridad.

No alterar, modificar, destapar o transferir la propiedad/posesión de los equipos a terceros sin autorización escrita de EL ARRENDADOR.

Permitir la inspección periódica del estado de los equipos por parte de EL ARRENDADOR previa notificación.

QUINTA: DAÑOS, PÉRDIDA O HURTO

En caso de daño por negligencia, mal uso, fluctuaciones eléctricas imputables a la red del lugar de uso, pérdida total o parcial, o hurto del equipo, EL ARRENDATARIO asumirá el costo total de reparación o reposición del equipo por uno de iguales o superiores características técnicas.

SEXTA: RESTITUCIÓN DE LOS EQUIPOS

Al término del contrato, EL ARRENDATARIO restituirá a EL ARRENDADOR los equipos en el mismo estado en que los recibió, salvo el desgaste natural derivado del uso legítimo.

SÉPTIMA: TERMINACIÓN ANTICIPADA

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en este contrato por alguna de las partes dará derecho a la parte cumplida a dar por terminado el contrato de manera inmediata, sin perjuicio de las indemnizaciones a que haya lugar.

Para constancia de lo anterior, se firma en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor, en el municipio de EL BAGRE, ANTIOQUIA, a los 03 días del mes de ABRIL de 2025.

EL ARRENDADOR

DIANA MARCELA ARCILA RICARDO

C.C.: 1.038.103.212 DE CAUCASIA, ANT

Teléfono / Contacto: 323 420 11 31

EL ARRENDATARIO

HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA

NIT: 98.654.946-5

Teléfono / Contacto: 320 686 07 59

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.038.103.212
ARCILA RICARDO
APELLIDOS
DIANA MARCELA
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 11-MAY-1988
CAUCASIA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

05-OCT-2006 CAUCASIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL



A-0111705-00477746 1038103210 20130510 0005171433A 1 2612527161

CUENTA DE COBRO No. 01

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:

03 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2025

LA EMPRESA:

HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA

DEBE A:

DIANA MARCELA ARCILA RICARDO
C.C 1.038.103.212

La suma de: $ 250.000

Valor en letras: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE:

ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON OBJETO: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL PROYECTO IDENTIFICADO EL CONTRATO CTO18-2025 CON LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SISTEMA DE ALCANTARRILLADO PLUVIAL EN BARRIO LOS COMODATOS DE ARRIABA EN LA VIA CRA 41 ENTRE LA CALLE 33 Y FINAL DE PAVIMENTO EXISTENTE SECTOR BASE MILITAR ,CLL33 EN CRA 41Y40,CRA 41 ENTRE CALL 33 Y ENTRADA AL SENA EN ZONA URBANA DE EL MUNUCUPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA "**
DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2025.

Cordialmente,

DIANA MARCELA ARCILA RICARDO
C.C1.038.103.212

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

1.038.103.212
ARCILA RICARDO

DIANA MARCELA



11-MAY-1988
CAUCASIA
(ANTIOQUIA)

1.60 O+ F

05-OCT-2006 CAUCASIA

REGISTRADOR NACIONAL

CUENTA DE COBRO No. 02

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:

03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2025

LA EMPRESA:

HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA

DEBE A:

DIANA MARCELA ARCILA RICARDO
C.C 1.038.103.212

La suma de: $ 250.000

Valor en letras: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE:

ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON OBJETO: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL PROYECTO IDENTIFICADO EL CONTRATO CTO18-2025 CON LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SISTEMA DE ALCANTARRILLADO PLUVIAL EN BARRIO LOS COMODATOS DE ARRIABA EN LA VIA CRA 41 ENTRE LA CALLE 33 Y FINAL DE PAVIMENTO EXISTENTE SECTOR BASE MILITAR ,CLL33 EN CRA 41Y40,CRA 41 ENTRE CALL 33 Y ENTRADA AL SENA EN ZONA URBANA DE EL MUNUCUPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA "**
DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2025.

Cordialmente,

DIANA MARCELA ARCILA RICARDO
C.C1.038.103.212

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.038.103.212
ARCILA RICARDO
APELLIDOS
DIANA MARCELA
NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 11-MAY-1988
CAUCASIA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

05-OCT-2006 CAUCASIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL



A 0111705464777 F 1038103212 20130930 0025171A1A 1 2612507161

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA

Conste por el presente documento el Contrato de Arrendamiento de Equipo de Topografía, que celebran de una parte:

EL ARRENDADOR: **DAVID FELIPE ROYO ANAYA**, identificado con C.C. N.° **1.063.282.961**.

Y de otra parte:

EL ARRENDATARIO: HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA, identificado con NIT N.° 98.654.946-5, con domicilio en CL 18 # 13-09 CAUCASIA, ANTIOQUIA.

Ambas partes acuerdan celebrar el presente contrato bajo las siguientes cláusulas:

CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

El ARRENDADOR cede en arrendamiento al ARRENDATARIO el siguiente equipo de topografía, en perfecto estado de funcionamiento y conservación:

- **NIVEL DE PRECISION**

Equipo: NIVEL DE PRECISION

Marca y Modelo: TOPCON / AT-B4A

Número de Serie: BS0383

- **ESTACION TOTAL**

Equipo: ESTACION TOTAL

Marca y Modelo: TOPCON / ES-105

Número de Serie: BS0383

Accesorios incluidos: trípode de aluminio, prisma con bastón, baterías, cargador, estuche rígido de transporte.

SEGUNDA: DURACIÓN Y PLAZO

El plazo de arrendamiento será de CUATRO (04) meses, iniciando el día 03 DE ABRIL DE 2025 y finalizando el día 03 DE AGOSTO DE 2025, fecha en la cual el ARRENDATARIO deberá devolver el equipo en las mismas condiciones en que lo recibió.

TERCERA: CANON DE ARRENDAMIENTO Y FORMA DE PAGO

El valor total del alquiler se pacta en la suma de ($3.200.000) TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ML/CTE, mensuales.

La forma de pago se realizará de la siguiente manera: los primeros cuatro días de cada mes.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA

CUARTA: DEPÓSITO EN GARANTÍA

El ARRENDATARIO entrega al ARRENDADOR la suma de $1.000.000 como garantía del cumplimiento de las obligaciones contractuales y el buen uso del equipo. Este dinero será devuelto íntegramente al finalizar el contrato, previa verificación del estado del equipo.

QUINTA: OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DEL ARRENDATARIO

Uso Adecuado: El ARRENDATARIO se compromete a operar el equipo exclusivamente para los fines topográficos proyectados y por personal calificado.

Custodia y Cuidado: El ARRENDATARIO asumirá total responsabilidad por la pérdida, robo, hurto o daños parciales/totales que sufra el equipo durante el periodo de alquiler.

Mantenimiento y Calibración: El ARRENDATARIO no podrá desarmar, alterar ni intentar reparar el equipo por su cuenta. En caso de descalibración o fallo por mal uso, asumirá el costo del servicio técnico especializado.

SEXTA: ESTADO Y DEVOLUCIÓN DEL EQUIPO

El ARRENDATARIO declara recibir el equipo revisado, operativo y con certificado de calibración vigente (si aplica). Al momento de la devolución, se realizará una inspección conjunta para verificar que conserve las mismas condiciones de entrega.

SÉPTIMA: PENALIZACIÓN POR MORA EN LA DEVOLUCIÓN

Si el ARRENDATARIO no devuelve el equipo en la fecha pactada en la Cláusula Segunda, pagará una penalidad de $150.000 por cada día de retraso hasta la entrega formal.

En señal de conformidad y aceptación de las cláusulas anteriores, se firma el presente documento en dos (2) ejemplares del mismo tenor, a los 03 días del mes de ABRIL de 2025.

EL ARRENDADOR

David Royo A.

DAVID FELIPE ROYO ANAYA

C.C.: 1.063.282.961


Teléfono: 313 618 74 01

EL ARRENDATARIO

HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA

NIT: 98.654.946-5

Teléfono: 320 686 07 59

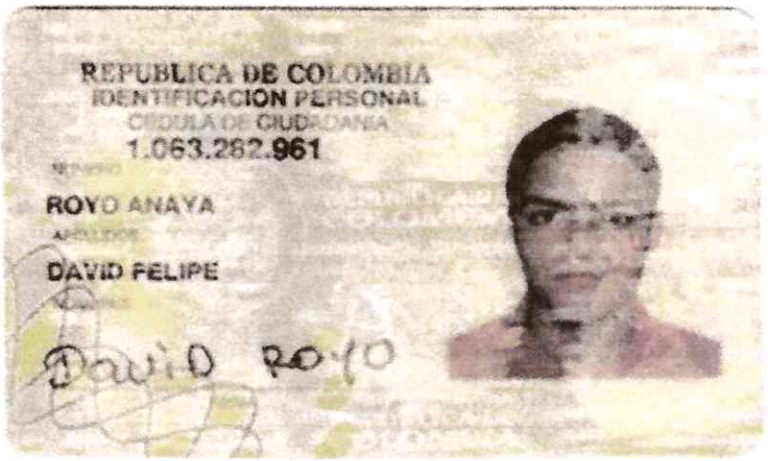

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.063.282.961
ROYO ANAYA
DAVID FELIPE
David Royo



FECHA DE NACIMIENTO 26-OCT-1988
MONTELIBANO
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
06-DIC-2006 MONTELIBANO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



02183

CUENTA DE COBRO No. 01

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:

03 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2025

LA EMPRESA:

HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA

DEBE A:

DAVID FELIPE ROYO ANAYA
C.C 1.063.282.961

La suma de: $ 3.200.000

Valor en letras: TRES MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE:

ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON OBJETO: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL PROYECTO IDENTIFICADO EL CONTRATO CTO18-2025 CON LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SISTEMA DE ALCANTARRILLADO PLUVIAL EN BARRIO LOS COMODATOS DE ARRIABA EN LA VIA CRA 41 ENTRE LA CALLE 33 Y FINAL DE PAVIMENTO EXISTENTE SECTOR BASE MILITAR ,CLL33 EN CRA 41Y40,CRA 41 ENTRE CALL 33 Y ENTRADA AL SENA EN ZONA URBANA DE EL MUNUCUPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA "**

Cordialmente,

David Royo A.
DAVID FELIPE ROYO ANAYA
C.C1.063.282.961

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.063.282.961

ROYO ANAYA

DAVID FELIPE

David Royo





FECHA DE NACIMIENTO
26-OCT-1988
MONTELIBANO
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
04-DIC-2006 MONTELIBANO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



INDICE DERECHO
02183

CUENTA DE COBRO No. 02

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:

03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2025

LA EMPRESA:

HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA

DEBE A:

DAVID FELIPE ROYO ANAYA
C.C 1.063.282.961

La suma de: $ 3.200.000

Valor en letras: TRES MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE:

ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON OBJETO: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL PROYECTO IDENTIFICADO EL CONTRATO CTO18-2025 CON LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SISTEMA DE ALCANTARRILLADO PLUVIAL EN BARRIO LOS COMODATOS DE ARRIABA EN LA VIA CRA 41 ENTRE LA CALLE 33 Y FINAL DE PAVIMENTO EXISTENTE SECTOR BASE MILITAR ,CLL33 EN CRA 41Y40,CRA 41 ENTRE CALL 33 Y ENTRADA AL SENA EN ZONA URBANA DE EL MUNUCUPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA "**
DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2025.

Cordialmente,

David Royo A.
DAVID FELIPE ROYO ANAYA
C.C1.063.282.961

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

1.063.282.961

ROYO ANAYA

DAVID FELIPE

David Royo





26-OCT-1988

MONTELIBANO

(CORDOBA)

1.67 O+ M

04-DIC-2006 MONTELIBANO

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR

Entre los suscritos a saber:

EL ARRENDADOR: ELKIN EUGENIO GARCIA SALAZAR, persona mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 6.481.350.

HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA, identificado con NIT N.° 98.654.946-5, con domicilio en CL 18 # 13-09 CAUCASIA, ANTIOQUIA.

Se ha acordado celebrar el presente CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. — OBJETO DEL CONTRATO

EL ARRENDADOR entrega a título de arrendamiento a EL ARRENDATARIO, y este recibe en el mismo concepto, el vehículo de su propiedad que se describe a continuación:

Placa: JKN484

Marca: CHEVROLET

Línea/Modelo: TRACKER

Modelo (Año): 2017

Color: GRIS MERCURIO

Número de Motor: CHL209845

Número de Chasis / Chasis: 3GNCJ8EE8HL209845

CLÁUSULA SEGUNDA. — DESTINO Y USO DEL VEHÍCULO

EL ARRENDATARIO destinará el vehículo exclusivamente para transporte del personal, del contrato que ejecuta como interventor en el municipio de el bagre cuyo objeto es INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO LOS COMODATOS DE ARRIBA EN LA VÍA CRA 41 ENTRE CLL 33 Y FINAL DE PAVIMENTO EXISTENTE (SECTOR BASE MILITAR), CLL 33 ENTRE CRA 41 Y 40, CRA 41 ENTRE CALLE 33 Y ENTRADA AL SENA, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA . Queda expresamente prohibido destinar el vehículo a actividades ilícitas, subarrendarlo, ceder su uso a terceros no autorizados, o utilizarlo para competencias automovilísticas.

CLÁUSULA TERCERA. — CANON DE ARRENDAMIENTO Y FORMA DE PAGO

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR

El valor del canon de arrendamiento se fija en la suma de $11.200.000 (ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS), los cuales serán pagados por EL ARRENDATARIO de la siguiente manera:

Periodicidad: Mensual

Fecha límite de pago: Los días 03 de cada período.

Medio de pago: Efectivo

CLÁUSULA CUARTA. — DURACIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato tendrá un término de duración de CUATRO meses, contados a partir del 03 de ABRIL de 2025 hasta el 03 de AGOSTO de 2025. El contrato podrá ser renovado únicamente por acuerdo expreso entre las partes.

CLÁUSULA QUINTA. — ESTADO DEL VEHÍCULO Y MANTENIMIENTO

Recepción: EL ARRENDATARIO declara haber recibido el vehículo en óptimas condiciones mecánicas, de latonería, pintura y aseo, con la documentación al día y equipado con el kit de carretera reglamentario.

Mantenimiento ordinario: EL ARRENDATARIO asumirá los gastos derivados del uso normal del vehículo (combustible, lavadas, pinchazos y fluidos menores).

Mantenimiento correctivo/preventivo: EL ARRENDADOR responderá por los mantenimientos preventivos de ley (cambios de aceite programados, revisiones periódicas) y fallas mecánicas no imputables al mal uso o negligencia de EL ARRENDATARIO.

CLÁUSULA SEXTA. — SEGUROS, INFRACCIONES Y RESPONSABILIDAD

Multas e Infracciones: Todas las fotomultas, comparendos o infracciones de tránsito cometidas durante la vigencia del presente contrato serán de responsabilidad exclusiva e impositiva de EL ARRENDATARIO.

Seguros: El vehículo cuenta con el SOAT No. 3566598000 vigente hasta 2026-03-29.

Siniestros y Deductibles: En caso de accidente o siniestro, EL ARRENDATARIO responderá por el pago de los deducibles de la póliza de seguro y los daños no cubiertos si el hecho ocurre por negligencia, embriaguez o violación a las normas de tránsito.

CLÁUSULA SÉPTIMA. — DEPÓSITO DE GARANTÍA

A la firma del presente contrato, EL ARRENDATARIO entrega a EL ARRENDADOR la suma de $3.000.000 (TRES MILLONES DE PESOS) en calidad de depósito en garantía, destinadas a responder por posibles multas, daños o incumplimientos. Dicho monto será devuelto dentro de los CINCO días posteriores a la restitución del vehículo, previa verificación de paz y salvo por todo concepto.

CLÁUSULA OCTAVA. — CAUSALES DE TERMINACIÓN

Son causales de terminación unilateral del contrato:

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR

El incumplimiento en el pago del canon de arrendamiento dentro del término pactado.

La destinación del vehículo para fines distintos a los autorizados.

El deterioro del vehículo por mal uso o negligencia grave de EL ARRENDATARIO.

Para constancia de lo anterior, se firma en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor, en el municipio de el bagre, Antioquia a los 03 días del mes de abril del año 2025.

EL ARRENDADOR

ELKIN EUGENIO GARCIA

C.C. No. 6.481.350

Teléfono: 314 809 32 03

EL ARRENDATARIO

HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA

NIT: 98.654.946-5

Teléfono / Contacto: 320 686 07 59

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 6.481.350

GARCIA SALAZAR

APELLIDOS

ELKIN EUGENIO

NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-ENE-1959

GRANADA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

03-OCT-1978 ARGELIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0100100-00099702-M-0006481350-20081017 0004519772A 1 2080019536

-COPIA-



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10013945296

PLACA: JKN484
MARCA: CHEVROLET
LÍNEA: TRACKER
MODELO: 2017
CILINDRADA CC: 1.795
COLOR: GRIS MERCURIO
SERVICIO: PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA
TIPO CARROCERÍA: WAGON
COMBUSTIBLE: GASOLINA
CAPACIDAD Kg/PSJ: 5
NÚMERO DE MOTOR: CHL209845
REG: N
VIN: 3GNCJ8EE8HL209845
NÚMERO DE SERIE: 3GNCJ8EE8HL209845
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 3GNCJ8EE8HL209845
REG: N
PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): GARCIA SALAZAR ELKIN EUGENIO
IDENTIFICACIÓN: C.C. 6481350

RESTRICCIÓN MOVILIDAD:
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 138
19201700002739
22/03/2017
5
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD:
PRENDA - GM FINANCIAL COLOMBIA SA
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
FECHA MATRÍCULA: 13/05/2017
FECHA EXP. LIC. TTO: 13/05/2017
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO:
STRIA TTEYTTO ENVIGADO

LT03002426672

CUENTA DE COBRO No. 01

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:

03 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2025

LA EMPRESA:

HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA

DEBE A:

ELKIN EUGENIO GARCIA SALAZAR
C.C 6.481.350

La suma de: **$ 11.200.000**

Valor en letras: ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE:

ALQUILER DE UN VEHICULO MARCA CHEVROLETLINEA / MODELO TRACKER MODELO 2017 COLOR GRIS MERCURIO NUMERO DE MOTOR CHL209845 NUMERO DE CHASIS/3GNCJ8EE8HL209845 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON OBJETO: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL PROYECTO IDENTIFICADO EL CONTRATO CTO18-2025 CON LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SISTEMA DE ALCANTARRILLADO PLUVIAL EN BARRIO LOS COMODATOS DE ARRIABA EN LA VIA CRA 41 ENTRE LA CALLE 33 Y FINAL DE PAVIMENTO EXISTENTE SECTOR BASE MILITAR ,CLL33 EN CRA 41Y40,CRA 41 ENTRE CALL 33 Y ENTRADA AL SENA EN ZONA URBANA DE EL MUNUCUPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA "**


Cordialmente,

ELKIN EUGENIO GARCIA SALAZAR
C.C 6.481.350

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 6.481.350
GARCIA SALAZAR
APELLIDOS
ELKIN EUGENIO
NOMBRES

FIRMA

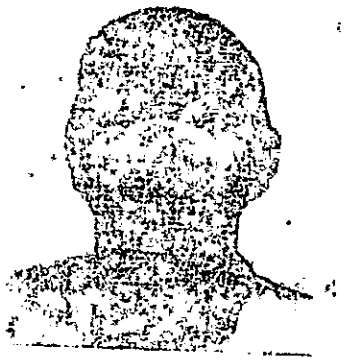



FECHA DE NACIMIENTO 11-ENE-1959
GRANADA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 ESTATURA
O+ G.S RH
M SEXO
03-OCT-1978 ARGELIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0100100-00099702-M-0006481350-20081017 0004519772A 1 2080919539

-COPIA-

CUENTA DE COBRO No. 02

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:

03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2025

LA EMPRESA:

HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA

DEBE A:

ELKIN EUGENIO GARCIA SALAZAR
C.C 6.481.350

La suma de: **$ 11.200.000**

Valor en letras: ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE:

ALQUILER DE UN VEHICULO MARCA CHEVROLETLINEA / MODELO TRACKER MODELO 2017 COLOR GRIS MERCURIO NUMERO DE MOTOR CHL209845 NUMERO DE CHASIS/3GNCJ8EE8HL209845 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON OBJETO: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL PROYECTO IDENTIFICADO EL CONTRATO CTO18-2025 CON LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SISTEMA DE ALCANTARRILLADO PLUVIAL EN BARRIO LOS COMODATOS DE ARRIABA EN LA VIA CRA 41 ENTRE LA CALLE 33 Y FINAL DE PAVIMENTO EXISTENTE SECTOR BASE MILITAR ,CLL33 EN CRA 41Y40,CRA 41 ENTRE CALL 33 Y ENTRADA AL SENA EN ZONA URBANA DE EL MUNUCUPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA "**

Cordialmente,

ELKIN EUGENIO GARCIA SALAZAR
C.C 6.481.350

HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA

ING. CIVIL

M.P.

05202140753

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8636694918
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8623209751
Fecha Pago Planilla: 2025-06-26

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	98654946	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	BARRIO CENTENARIO	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	CAUCASIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	LEONARDOLOPEZFLOREZ@YAHOO.ES	TELÉFONO	8391034
FAX	8391034	SUCURSAL	08	NOMBRE SUCURSAL	PERSONAL HERNAN
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 05	Año: 2025	Mes: 05	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		$9.270.500		8636694918

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-43609530	01	No	No	No	5	250	5421001	Fijo	DURAN BUSTAMANTE ROSA ELENA	$1.423.500
CC-30572767	01	No	No	No	5	250	5421001	Fijo	HOYOS UPARELA GILMA ROSIRIS	$2.000.000
CC-1063278180	01	No	No	No	5	250	5421001	Fijo	LOPEZ CASILLA NATALIA ANDREA	$1.500.000
CC-45543076	01	No	No	No	5	250	5421001	Fijo	MARQUEZ NAVARRO JENIFFER DEL ROSARIO	$1.423.500
CC-79501391	01	No	No	No	5	250	5421001	Fijo	PIEDRAHITA CAÑON DIEGO RICARDO	$1.423.500
CC-1063282961	01	No	No	No	5	250	5421001	Fijo	ROYO ANAYA DAVID FELIPE	$1.500.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Rat	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 43609530																													0		
CC - 30572767																													0		
CC - 1063278180																													0		
CC - 45543076																													0		
CC - 79501391																													0		
CC - 1063282961																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 43609530	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 30572767	PORVENIR	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0
CC - 1063278180	PORVENIR	30	$1.500.000	0.1600000	$240.000	$0	$0	$240.000	$0	$0	$0
CC - 45543076	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 79501391	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1063282961	PORVENIR	30	$1.500.000	0.1600000	$240.000	$0	$0	$240.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 43609530	EPS SURA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	90	0.0696000	$99.100
CC - 30572767	EPS-S MUTUAL - MOV	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	90	0.0696000	$139.200
CC - 1063278180	EPS-S MUTUAL - MOV	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.500.000	90	0.0696000	$104.400
CC - 45543076	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	90	0.0696000	$99.100
CC - 79501391	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	90	0.0696000	$99.100
CC - 1063282961	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.500.000	90	0.0696000	$104.400

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-43609530	COMFENALCOANTIOQUIACCF	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-30572767	COMFENALCOANTIOQUIACCF	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1063278180	COMFENALCOANTIOQUIACCF	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-45543076	COMFENALCOANTIOQUIACCF	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-79501391	COMFENALCOANTIOQUIACCF	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1063282961	COMFENALCOANTIOQUIACCF	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 05

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	6	$1.483.400	$0	$0	$0	$0	14	$13.400	$0	$0	$1.496.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S MUTUAL - MOV	2	$140.000	$0	0	$0	0	$0	$140.000	14	$1.300	$0	$141.300	$0	0	$0	$0	$141.300	$0	$0	$141.300
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	14	$600	$0	$57.600	$0	0	$0	$0	$57.600	$0	$0	$57.600
SANITAS	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	14	$600	$0	$57.600	$0	0	$0	$0	$57.600	$0	$0	$57.600
EPS SURA	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	14	$600	$0	$57.600	$0	0	$0	$0	$57.600	$0	$0	$57.600
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$60.000	$0	0	$0	0	$0	$60.000	14	$600	$0	$60.600	$0	0	$0	$0	$60.600	$0	$0	$60.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	6	$645.300	0	$0	$0	$645.300	14	$5.900	$651.200	0	$0	$0	$651.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFENALCOANTIOQUIACCF	6	$371.000	14	$3.400	$374.400
SENA	0	$0	14	$0	$0
ICBF	0	$0	14	$0	$0
ESAP	0	$0	14	$0	$0
MinEdu	0	$0	14	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	$374.700

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
PENSIONES	1	$1.496.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$651.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$374.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.897.100

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33542585
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-05-26

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	98654946	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	BARRIO CENTENARIO CALLE 18	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	CAUCASIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8299	CORREO ELECTRÓNICO	HUES80@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	8390759
FAX	0	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	humberto vides
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 05	Año: 2025	Mes: 05	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		33542585

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Extranjero obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario
										Salario Básico
CC-98654946	57	No	No	No	5	154	0	Salario	VIDES SAJONA HUMBERTO ESTEBAN	$1.423.500

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDF	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 98654946												X																	0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 98654946	PORVENIR	30	$3.500.000	0.1600000	$560.000	$0	$0	$560.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic
CC - 98654946	EPS-S COOSALUD	30	$3.500.000	0.1250000	$437.500	$0	0	$0	0	$0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES

Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
30	$3.500.000	98654946	0.0696000	$243.600

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-98654946	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 05

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$560.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$560.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S COOSALUD	1	$437.500	$0	0	$0	0	$0	$437.500	0	$0	$0	$437.500	$0	0	$0	$0	$437.500	$0	$0	$437.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$243.600	0	$0	$0	$243.600	0	$0	$243.600	0	$0	$0	$243.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$437.500
PENSIONES	1	$560.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$243.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.241.100

HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA

ING. CIVIL

M.P.

05202140753

CORRESPONDENCIA

13 de mayo 2025, el Bagre – Antioquia

OFICIO SST 002-2025

SOLINAC CONSTRUCTORA

13 MAY 2025

RECIBIDO

Señores
SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA SAS
SOLINAC
EMAIL: hvinterventoriapc@hotmail.com

Ref. CONTRATO DE OBRA NÚMERO CT019-2025 "cuyo objeto es: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SISTEMAS DE ALCALTARILLADO PLUVIAL EN EL BARR:IO LOS COMODATOS DE ARRIBA EN LA VIA CRA 41 ENTRE LA CALLE 33 Y FINAL DE PAVIMENTO EXISTENTE (SECTOR BASE MILITAR), CLL 33 EN CRA 41 Y 40, CRA 41 ENTRE CLL 33 Y ENTRADA AL SENA, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

Asunto: uso obligatorio de EPP.

Cordial saludo,

Por medio de la presente se le solicita al contratista realizar las debidas recomendaciones al personal teniendo encuentra que se pudo evidenciar. Que cuenta con los elementos de protección personal, pero hay algunos colaboradores que no lo están usando correctamente o simplemente no lo están usando, por esta razón hacemos un llamado de atención con la finalidad de corregir esta situación.

Agradecemos su compromiso con la seguridad y salud en el trabajo, mantenimiento y sostenimiento de las medidas de seguridad en la obra.

Atentamente,

HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONAC.C
98.654.946

Natalia López

NATALIA ANDREA LÓPEZ CASILLA
RESIDENTE SST
LICENCIA SST NO. 25-0125 DE 2022

22 de mayo 2025, el Bagre – Antioquia

OFICIO SST 003-2025

SOLINAC CONSTRUCTORA

22 MAY 2025

Nombre: _____

Firma: _____

RECIBIDO

Señores
SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA SAS
SOLINAC
EMAIL: hvinterventoriapc@hotmail.com

Ref. CONTRATO DE OBRA NÚMERO CT019-2025 "cuyo objeto es: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SISTEMAS DE ALCALTARILLADO PLUVIAL EN EL BARR:IO LOS COMODATOS DE ARRIBA EN LA VIA CRA 41 ENTRE LA CALLE 33 Y FINAL DE PAVIMENTO EXISTENTE (SECTOR BASE MILITAR), CLL 33 EN CRA 41 Y 40, CRA 41 ENTRE CLL 33 Y ENTRADA AL SENA, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

Asunto: recolección de basuras.

Cordial saludo,

Por medio de la presente se le solicita al contratista realizar la debida recolección de basuras en el momento que los recipientes estén llenos ya que se pudo evidencias que los recipientes llevan 2 días lleno.

Agradecemos su compromiso con la seguridad y salud en el trabajo, mantenimiento y sostenimiento de las medidas de seguridad en la obra.

Atentamente,

Natalia López

HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONAC.C
98.654.946

NATALIA ANDREA LÓPEZ CASILLA
RESIDENTE SST
LICENCIA SST NO. 25-0125 DE 2022

HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA

SOLINAC CONSTRUCTORA

22 MAY 2025
N° Radicado: 9502
Hora:
RECIBIDO

22 de mayo 2025, el Bagre - Antioquia

Señores
SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA SAS
SOLINAC
EMAIL: hvinterventoriapc@hotmail.com

CINTV-18-005-2025

Ref. CONTRATO DE OBRA NÚMERO CT019-2025 "cuyo objeto es: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SISTEMAS DE ALCALTARILLADO PLUVIAL EN EL BARR:IO LOS COMODATOS DE ARRIBA EN LA VIA CRA 41 ENTRE LA CALLE 33 Y FINAL DE PAVIMENTO EXISTENTE (SECTOR BASE MILITAR), CLL 33 EN CRA 41 Y 40, CRA 41 ENTRE CLL 33 Y ENTRADA AL SENA, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

Asunto: RECORDATORIO DE ENTREGA DE PRUEBAS DE DENSIDAD.

Cordial saludo,

Por medio de la presenta nos permitimos recordarles la entrega de pruebas de densidad o masa unitaria del suelo en el terreno, (método del cono de arena), de acuerdo a las especificaciones de la propuesta presentada.

Atentamente,

HUMBERTO ESTEBAN
VIDES SAJONAC.98.654.946

30 de mayo 2025, El Bagre Antioquia

HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA
INTERVENTORIA CT019-0[illegible]25

Señor
HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA.
Ciudad.

Ref. CONTRATO DE OBRA NÚMERO CT019-2025 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SISTEMAS DE ALCALTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO LOS COMODATOS DE ARRIBA EN LA VIA CRA 41 ENTRE LA CALLE 33 Y FINAL DE PAVIMENTO EXISTENTE (SECTOR BASE MILITAR), CLL 33 EN CRA 41 Y 40, CRA 41 ENTRE CLL 33 Y ENTRADA AL SENA, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

Asunto. ENTREGA DE ENSAYO DE DENSIDADES.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, y dando alcance al oficio C018-005 - 2025 se hace entrega de las densidades de la obra que tiene como objeto el antes citado, con el fin de tener la documentación al día y aprobación por parte de la interventoria, para continuación y avance en la ejecución de la obra.

Atentamente,

WILSON PACHECO DIAZ.
No. 1066174555 de Chinú
SOLUCIONES INGENIARÍA AGRÍCOLA Y CIVIL S.A.S
NIT. 900483091-7

23 de mayo de 2025. El Bagre Antioquia

HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA
INTERVENTORIA
23 MAY 2025
Nº Radicado:
Hora:

Señor:
HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA.
Ciudad.

Ref. CONTRATO DE OBRA NÚMERO CT019-2025 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SISTEMAS DE ALCALTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO LOS COMODATOS DE ARRIBA EN LA VIA CRA 41 ENTRE LA CALLE 33 Y FINAL DE PAVIMENTO EXISTENTE (SECTOR BASE MILITAR), CLL 33 EN CRA 41 Y 40, CRA 41 ENTRE CLL 33 Y ENTRADA AL SENA, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

Asunto: Respuesta recolección de basuras.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, y dando alcance al oficio 003-2025 se tomas como prioridad su recomendación, realizando la recolección de los desechos, de forma inmediata, se realiza charla de orden y aseo con el personal en obra donde se da a conocer la importancia, beneficios de mantener la obra limpia.

Atentamente,

WILSON PACHECO DIAZ,
No. 1066174555 de Chinú
SOLUCIONES INGENIARÍA AGRÍCOLA Y CIVIL S.A.S
NIT. 900483091-7

JINNA CABARCAS
SST LIC 2336

14 de mayo de 2025, El Bagre Antioquia

HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA
INTERVENTORIA
14 MAY 2025
Nº Radicado:
Folio:

Señor:
HUMBERTO ESTEBAN VIDES SAJONA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA.
Ciudad.

Ref. CONTRATO DE OBRA NÚMERO CT019-2025 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SISTEMAS DE ALCALTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO LOS COMODATOS DE ARRIBA EN LA VIA CRA 41 ENTRE LA CALLE 33 Y FINAL DE PAVIMENTO EXISTENTE (SECTOR BASE MILITAR), CLL 33 EN CRA 41 Y 40, CRA 41 ENTRE CLL 33 Y ENTRADA AL SENA, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

Asunto: Respuesta uso de EPP

Cordial saludo,

Por medio de la presente, y dando alcance al oficio 002-2025 se tomas como prioridad su recomendación, realizando las debidas sugerencias al personal en obra, dándoles a conoces las ventajas y beneficios del uso de todos y cada uno de los elementos de protección personal, reiterando el compromiso con la seguridad y salud en el trabajo.

Atentamente,

WILSON PACHECO DIAZ,
No. 1066174555 de Chinú
SOLUCIONES INGENIARÍA AGRÍCOLA Y CIVIL S.A.S
NIT. 900483091-7

JINNA CABARCAS
SST LIC 2336
