FECHA:	13/06/2026
DIAS RESTANTES	**99**
CORTE DEL INFORME:	***14/06/2026***

INFORME SEMANAL 28

OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 3"
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO EDU 2025
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SEMANA N°	28	**DEL**	8-jun-26	**AL**	14-jun-26

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	CO1.PCCNTR.8169111	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.8154784
Fecha de Iniciación	14/10/2025	**Fecha de Iniciación**	14/10/2025
Fecha de Terminación	13/05/2026	**Fecha de Terminación**	13/05/2026
Plazo Inicial	7 MESES	**Plazo Inicial**	7 MESES
Valor inicial	$ 184.210.953,00	**Valor inicial**	$ 552.624.455,00
Adiciones	$ 83.867.649,00	**Adiciones**	$ 523.987.595,00
Prorroga	4 MESES	**Prorroga**	4 MESES
Suspensión	1	**Suspensión**	1

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES							ACTIVIDADES
No.	**FRENTE**	PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR	EJECUTADO SEMANA ANTERIOR	PROGRAMADO ACUM	EJECUTADO ACUM	DESVIACIÓN	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**
1	PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
2	PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	55,00%	20,64%	70,00%	20,64%	-49,36%	Cocina: Instalacion de piso, cambio de tuberias
3	EL PORVENIR	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
4	VILLAS DEL PROGRESO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
5	PABLO DE TARSO	90,00%	91,98%	98,00%	99,68%	1,68%	Desmonte e instalación de cubierta
6	JAIRO ANIBAL NIÑO	80,00%	85,20%	80,00%	88,80%	8,80%	BAÑO Y SALONES DE PREESCOLAR: Instalación de enchape, media caña y piso
7	LUIS LOPEZ DE MESA	40,00%	73,35%	85,00%	88,31%	3,31%	BAÑO: Instalacion de manto de aluminio sobre cubierta y enchape
8	EDUARDO UMAÑA LUNA	93,00%	96,23%	93,00%	96,74%	3,74%	BAÑO: Instalacion de enchape
9	DARIO ECHANDIA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
10	LLANO ORIENTAL - ALFONSO REYES ECHANDIA	30,00%	88,13%	90,00%	88,70%	-1,30%	CERRAMIENTO: Instalación de cerramiento
TOTALES		**78,80%**	**85,55%**	**91,60%**	**88,29%**	**-3,31%**	

3. RESUMEN FINANCIERO

PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 261.167.046	$ 261.167.046	$ -		0,00%	100,00%

PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 85.000.000	$ 17.547.123	**$ 67.452.877**		0,00%	20,64%

EL PORVENIR

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 110.086.654	$ 110.086.654	$ -		0,00%	100,00%

VILLAS DEL PROGRESO

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 166.676.454	$ 166.676.454	$ -		0,00%	100,00%

PABLO DE TARSO

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 189.976.713	$ 189.373.491	**$ 603.222**		7,71%	99,68%

JAIRO ANIBAL NIÑO

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 203.141.470	$ 180.383.002	**$ 22.758.468**		3,60%	88,80%

LUIS LOPEZ DE MESA

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA						

FECHA:	13/06/2026	**INFORME SEMANAL 28**
DIAS RESTANTES	**99**	
CORTE DEL INFORME:	***14/06/2026***	

OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 3"
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO EDU 2025
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SEMANA N°	28	**DEL**	8-jun-26	**AL**	14-jun-26	

EJECUTADA	$ 292.710.605	$ 258.481.907	**$ 34.228.698**		26,90%	88,31%

EDUARDO UMAÑA LUNA

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL BALANCE**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 76.965.087	$ 74.453.620	**$ 2.511.466**		0,50%	96,74%

DARIO ECHANDIA

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL BALANCE**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 795.148.175	$ 795.148.175	**$** -		0,00%	100,00%

ALFONSO REYES ECHANDIA

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL BALANCE**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 135.987.595	$ 120.615.938	$ 15.371.657		62,60%	88,70%

FECHA:	13/06/2026	**INFORME SEMANAL 28**
DIAS RESTANTES	**99**	
CORTE DEL INFORME:	***14/06/2026***	

OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 3"
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO EDU 2025
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SEMANA N°	28	**DEL**	8-jun-26	**AL**	14-jun-26

EMERGENCIAS

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE EMERGENCIAS	**$ 114.665.609**	$ 100.539.128	**$ 14.126.481**		0,00%	87,68%

4. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:
- Mantener orden y aseo en la obras, así como la señalización
- Continuar con el uso correcto de EPP
- Apertura de más frentes de obra

CONCLUSIONES:
- Se avanzó con la subsanación de obcervaciones echas por la interventoria

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

1. Se envia informe semanal de interventoria al apoyo a la supervisión de la SED

2. El contratista envia corte de obra No. 4 a la interventoria para revisión.
3. La interventioria envia correo al apoyo a la supervisión sobre Recorridos entrega frentes de obra G7, G8 y G9

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la presente semana se mantuvo el personal previamente aprobado para el ingreso y ejecución de las actividades, verificando que cumpliera con los requisitos y lineamientos establecidos por la Interventoría para el desarrollo seguro de las labores.

De igual manera, se evidenció la ejecución de actividades en la Institución Educativa Llano Oriental, correspondientes al pañetado de piso, instalación de manto e ingreso de materiales al frente de obra. Durante la visita de seguimiento, la Interventoría verificó el desarrollo de las labores y las condiciones generales de seguridad del área intervenida.

Como resultado de la inspección, se recomienda al Contratista fortalecer las jornadas de orden y aseo, realizando el retiro oportuno de escombros y del material de manto retirado durante las actividades, con el fin de evitar la generación de condiciones inseguras que puedan ocasionar incidentes o accidentes al personal de obra y a la comunidad educativa.
Asimismo, se recomienda reforzar las actividades de capacitación y supervisión relacionadas con el uso adecuado y permanente de los EPP, garantizando que estos sean utilizados de acuerdo con los riesgos asociados a cada actividad ejecutada y conforme a los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Trabajadas: 42
Total de horas capacitación: 20 minutos
Número de accidentes de trabajo: 0
Número de días de incapacidad por AT:0
Número de días de incapacidad por enfermedad común: 0

REPORTE PERSONAL

DIRECTOR OBRA: 1 INSPECTORES SST: 1
RESIDENTE OBRA: 1 PERSONAL OPERATIVO: 7

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

IED Llano oriental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia que no cuentan con cerramiento por que se está trabajando en la parte posterior de la institución, se evidencian materiales de construcción y residuos (alto volumen), parte de ellos sin acopiar ni señalizar, por lo que se recomienda organizar la zona de acopio, realizar la disposición adecuada, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

OTROS

ING JHONER MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING HARRY ARANGO
Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FECHA:	13/06/2026	**INFORME SEMANAL**
DIAS RESTANTES	**99**	
CORTE DEL INFORME:	***14/06/2026***	

OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 3"
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO EDU 2025
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SEMANA N°	28	**DEL**	8-jun-26	**AL**	14-jun-26

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA**	
Contrato No .	CO1.PCCNTR.8169111	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.8154784
Fecha de Iniciación	14/10/2025	**Fecha de Iniciación**	14/10/2025
Fecha de Terminación	13/05/2026	**Fecha de Terminación**	13/05/2026
Plazo Inicial	7 MESES	**Plazo Inicial**	7 MESES
Valor inicial	$ 184.210.953,00	**Valor inicial**	$ 552.624.455,00
Adiciones	$ 83.867.649,00	**Adiciones**	$ 523.987.595,00
Prorroga	4 MESES	**Prorroga**	4 MESES
Suspensión	1	**Suspensión**	1

CPF	COLEGIO	SEDE	CONTRATO DE OBRA	LOCALIDAD	Silviculturales	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	ESTADO	ALCANCE	FECHA INICIO ATENCION EMERGENCIA	FECHA TERMINACION Y ENTREGA AL COLEGIO	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO
838	ISABEL II	B	CO1.PCCNTR.8154784	Kennedy	Silviculturales	100%	FINALIZADO	TALA DE UN ARBOL	30-dic.-25	30-dic.-25	$ 1.998.374,00
732	LA LIBERTAD - ORLANDO HIGUITA ROJAS	B	CO1.PCCNTR.8154784	Bosa	OBRA	100%	FINALIZADO	En el Colegio Orlando Higuita Rojas, Sede A, el día 10 de septiembre de 2025 se presentó el desprendimiento del enchape del techo en la zona de depósito de la cocina del comedor escolar, motivo por el cual se ordenó el cierre del	30-nov.-25	20-feb.-26	$ 82.116.894,00
821	SAN JOSE	B	CO1.PCCNTR.8154784	Kennedy	Silviculturales	100%	FINALIZADO	TALA DE UN ARBOL	30-dic.-25	30-dic.-25	$ 778.713,00
850	JOHN F. KENNEDY	A	CO1.PCCNTR.8154784	Kennedy	Silviculturales	100%	FINALIZADO	TALA DE UN ARBOL	30-dic.-25	30-dic.-25	$ 1.992.384,00
817	MARSELLA	A	CO1.PCCNTR.8154784	Kennedy	Silviculturales	100%	FINALIZADO	TALA Y PODA DE	30-dic.-25	30-dic.-25	$ 4.767.213,00
890	NELSON MANDELA	A	CO1.PCCNTR.8154784	Kennedy	OBRA	100%	FINALIZADO	REPARACION TUBERIA BAÑOS	13-dic.-25	27-dic.-25	$ 12.103.037,00
842	SAN RAFAEL	A	CO1.PCCNTR.8154784	Kennedy	OBRA	100%	FINALIZADO	adecuación de cuarto de almacenamiento de residuos sólidos para cocina	1-abr.-26	21-abr.-26	$ 17.000.000,00
615	"INEM SANTIAGO PEREZ"	A	CO1.PCCNTR.8154784	Tunjuelito	OBRA	0%		Equipo de bombeo de la cocina escolar no se encuentra en funcionamiento	22-may.-26	31-may.-26	$ 48.800.000,00
804	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	B	CO1.PCCNTR.8154784	Kennedy	OBRA	0%		Situación: El 9 de febrero de 2026 se realizó visita técnica con el especialista hidráulico y el 11 de febrero de 2026 se efectuó la visita del	15-may.-26	10-jun.-26	$ 58.000.000,00
746	CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ	A	CO1.PCCNTR.8154784	Bosa	OBRA	0%		El Colegio Carlos Pizarro Leongómez, Sede A, presenta deficiencias en la red de desagues de las baterías sanitarias, debido a los años de uso,	13-may.-26	5-jun.-26	$ 14.000.000,00
625	BERNARDO JARAMILLO	A	CO1.PCCNTR.8154784	Tunjuelito	OBRA	0%		Se solicita realizar actividades que requieren atención inmediata, para atender lo dispuesto en por el Juzgado Séptimo Administrativo del	21-abr.-26	20-may.-26	$ 8.000.000,00
	ISABEL II	A	CO1.PCCNTR.8154784		OBRA	100%	FINALIZADO	pintura	23-ene.-26	28-feb.-26	$ 59.000.000,00
763	BICENTENARIO	A	CO1.PCCNTR.8154784		OBRA	0%		Se requiere barrera visual en Acceso a Baños de Primera Infancia .Requerimiento de Secretaria de Salud. Mediante Comunicado S-2025-101760 la			
708	LLANO ORIENTAL	A	CO1.PCCNTR.8154784		OBRA	50%	EN PROCESO	En atención a las condiciones evidenciadas y al concepto sanitario desfavorable emitido por la autoridad competente, se solicita adelantar	28-abr.-26	26-may.-26	$ 45.000.000,00

FECHA:	13/06/2026	**INFORME SEMANAL**
DIAS RESTANTES	**99**	
CORTE DEL INFORME:	***14/06/2026***	

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA

Alfonso Lopez Michelsen Cocina

0	0,00
Pintura	Pintura


Jairo Anibal Niño

	
Acabados	Acabados
	



0


Acabados puertas sanitarios



0,00

Remates de ventana

Eduardo Umaña Luna

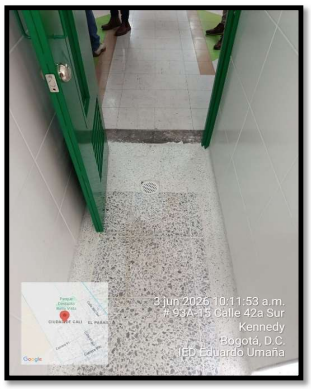	
Acabado de pisos.	cambio de interuptor.
	
Instalacion de mesones lavamanos	Retiro de material sobrante.

Luis Lopez De Mesa



Manto para cubierta



Acabados



Instalacion de Puertas



Acabados

Pablo de Tarso



Instalacion de cubierta



Instalacion de cubierta



Instalacion de cubierta



Instalacion de cubierta

Alfonso Reyes Echandia



Cerramiento



Cerramiento



Cerramiento



Cerramiento

FECHA: 13/06/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 99 Días			GRUPO 7
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			
CORTE DEL INFORME: 14 de junio de 2026	CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO EDU 2025		
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S		

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169111	CO1.PCCNTR.8154784	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796.278.928	$ 2.451.846.958
INICIO	14 de octubre de 2025	14 de octubre de 2025	SUSPENSIONES	16	16	ADICIÓN #1	$ 83.867.649,00	$ 523.987.595,00
TERMINACION INICIAL	13 de mayo de 2026	13 de mayo de 2026	PRÓRROGAS	1	1	ADICIÓN #2	$ 184.210.953,00	$ 552.624.455,00
MODIFICATORIO	29 de mayo de 2026	29 de mayo de 2026	ADICIÓN	123	115	TOTAL	$ 1.064.357.530,00	$ 3.528.459.008,00
TERMINACION FINAL	29 de septiembre de 2026	21 de septiembre de 2026	TOTAL	350	342			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	5/12/2025	$ 83.867.649,00	0	
2	29/05/2026	$ 184.210.953,00	123	
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	5/12/2025	$ 523.987.595,00	0	
2	29/05/2026	$ 552.624.455,00	115	
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — **GARANTE:** — **SEGUROS DEL ESTADO**

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
400-47	5 9 2025	5 10 2026	5 4 2026	5 4 2031	5 9 2025	5 4 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — **SEGUROS DEL ESTADO**

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
895-47	14 10 2025	15 1 2027	14 10 2025	15 5 2027	14 10 2025	15 1 2027	895-74	5 4 2026	15 5 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (31082024)		PROGR %	EJECUTADO PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	oct-2025	nov-2025	dic-2025	ene-2026	feb-2026	mar-2026	abr-2026	may-2026	jun-2026	jul-2026	ago-2026	sep-2026	oct-2026	nov-2026	dic-2026	ene-2027	feb-2027	mar-2027
751	PORTAL DEL SOL -	Bosa	A	Portal del Sol Alfonso Lopez	100,00%	100,00%		100,00%		$ 261.167.045,68	$ 261.167.045,68	12/11/2025	9/04/2026																		
751	PORTAL DEL SOL -	Bosa	A	Portal del Sol Alfonso Lopez	20,64%	20,64%		70,00%		$ 85.000.000,00	$ 47.547.123	11/01/2026	13/05/2026																		
742	EL PORVENIR	Bosa	B	El Recuerdo Santa Fe	100,00%	100,00%		100,00%		$ 110.086.654,11	$ 110.086.654,11	19/11/2025	30/03/2026																		
764	VILLAS DEL PROGRESO	Bosa	B	Enrique Dussel	100,00%	100,00%		100,00%		$ 166.676.454,24	$ 166.676.454,24	12/11/2025	9/04/2026																		
714	PABLO DE TARSO	Bosa	A	Pablo de Tarso	91,98%	99,68%		98,00%		$ 189.976.712,63	$ 189.373.491	19/11/2025	19/03/2026																		
836	JAIRO ANIBAL NIÑO	Kennedy	A	Patio Bonito I	85,20%	88,80%		80,00%		$ 203.141.470,45	$ 180.383.002	20/11/2025	19/03/2026																		
712	LUIS LOPEZ DE MESA	Bosa	A	Luis Lopéz de Mesa	73,38%	88,31%		85,00%		$ 292.710.604,53	$ 288.481.907	11/12/2025	9/04/2026																		
814	EDUARDO UMAÑA LUNA	Kennedy	A	Dindalito	96,23%	96,74%		93,00%		$ 76.965.086,69	$ 74.463.620	19/11/2025	2/02/2026																		
833	DARIO ECHANDIA	Kennedy	B	Los Patios	100,00%	100,00%		100,00%		$ 795.148.174,67	$ 795.148.174,67	12/11/2025	26/03/2026																		
748	LLANO ORIENTAL -	Bosa	A	San José de Meryland San Pedro -	86,13%	88,70%		90,00%		$ 135.987.595,00	$ 120.615.938	14/10/2025	13/05/2026																		
815	EL JAPON	Kennedy	A	El Japón	0,00%	0,00%		0,00%		$ 91.020.955,00																					
738	LA ESPERANZA	Bosa	A	La Esperanza (Cafam)	0,00%	0,00%		0,00%		$ 80.011.684,00																					
614	INSTITUTO TECNICO	Tunjuelito	C	Fatima Colmotores	0,00%	0,00%		0,00%		$ 381.591.816,00																					
}	TOTAL FRENTES DE OBRA					88,29%		91,60%		$ 2.869.484.253	$ 2.173.933.410																				
	EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																														
747	LA LIBERTAD - ORLANDO	Bosa	A	Orlando Higuita - Holanda la Libertad	100,00%	100,00%		100,00%		$ 82.116.894	$ 82.116.894	19/11/2025	15/01/2026																		
729	SAN BERNARDINO	Bosa	A	San Bernardino	0,00%	0,00%		0,00%		$ 3.922.944	$ -	24/11/2025	31/12/2025																		
838	ISABEL II	Kennedy	B	Pio XII	100,00%	100,00%		100,00%		$ 1.998.374	$ 1.998.374	29/11/2025	19/12/2025																		
850	JOHN F. KENNEDY	Kennedy	A	John F. kennedy	100,00%	100,00%		100,00%		$ 1.992.384	$ 1.992.384	29/11/2025	12/12/2025																		
817	MARSELLA	Kennedy	A	Bas-Med. Marsella.	100,00%	100,00%		100,00%		$ 4.767.213	$ 4.767.213	29/11/2025	18/12/2025																		
890	NELSON MANDELA	Kennedy	A	Compartir Tintal	100,00%	73,42%		70,00%		$ 12.103.037	$ 8.885.550	25/11/2025	10/01/2026																		
763	BICENTENARIO	Bosa	A	San José de Maryland	0,00%	0,00%		0%		$ 6.986.050	$ -	27/11/2025	16/01/2026																		
821	SAN JOSE	Kennedy	B	El Descanso	100,00%	100,00%		100%		$ 778.713	$ 778.713																				
	TOTAL FRENTES DE OBRA					71,68%		71,25%		$ 114.665.609	$ 100.539.128																				

ACUMULADO FRENTES DE OBRA

TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
4	5	0	9	$ 2.173.933.410
ACUMULADO EMERGENCIAS				
1	5	2	8	$ 100.539.128
TOTAL				
5	10	2	17	$ 2.274.472.538
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30			
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32		TOTAL INTERVENTORIA	
11	$ -			11		22		33		$ -	


AVANCE GENERAL

AVANCE	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
	88,29%	0,00%	71,05%
PROGRAMADO	91,60%		
ATRASO	-3,31%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			


AVANCE GENERAL




EMERGENCIAS



AVANCE FÍSICO




AVANCE DE LOS FRENTES

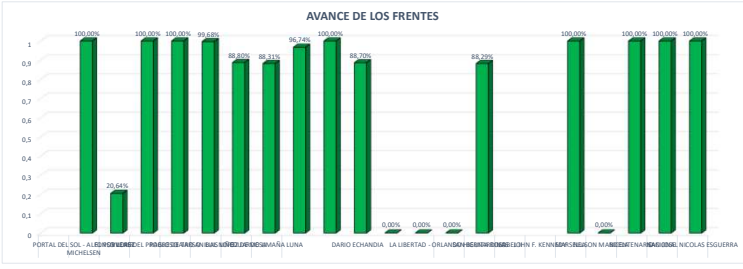

OBSERVACIONES:

FECHA: 13/06/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 99 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				
REGISTRO FOTOGRAFICO	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				GRUPO 7
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154784	CONTRATISTA:	CONSORCIO EDU 2025	
14/6/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169111	INTERVENTOR:	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE		ESTADO ACTUAL O FINAL
24 ###						
Alfonso Lopez Michelsen	Mejoramiento de baterias sanitarias y salones de preescolar	BAÑO: Instalacion de enchape, media cañas y instalación de tuberia e instalación de piso en vinisol y pintura				
Alfonso Lopez Michelsen Cocina	Mejoramiento de cocina	Cocina: Instalacion de piso, cambio de tuberias				
El Porvenir	Mejoramiento de cubierta y baterias sanitarias	BAÑO: instalacion de enchape, media cañas y instalación manto en cubierta				
Villas del Progreso	Mejoramiento de baterias y canchas sanitarias	BAÑO Y CANCHA: Instalación de enchape, Fundicion de placa				
Pablo de Tarso	Desmonte e instalación de cubierta	Desmonte e instalación de cubierta				
Jairo Anibal Niño	Mejoramiento de baterias sanitarias y pisos preescolar	BAÑO Y SALONES DE PREESCOLAR: Instalación de enchape, media caña y piso				
Luis Lopez de Mesa	Mejoramiento de baterias sanitarias	BAÑO: Instalacion de manto de aluminio sobre cubierta y enchape				
Eduardo						

Eduardo Umaña	Mejoramiento de baterias sanitarias y cerramiento	BAÑO: Instalacion de enchape				

Dario Echandia	Desmonte e instalación de cubierta	CUBIERTA: Instalación de cubierta				
ALFONSO REYES ECHANDIA	CERRAMIENTO	CERRAMIENTO: Instalación de cerramiento				

BALANCE SEMANAL POR CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS

		CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA					VIGENCIA	2026
GRUPOS	ITEM	CPF	751	IED		Alfonso Lopez Michelsen		SEMANA				
	Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	30,69	30,69		$ 4.435,43	$ 136.101,63	$ -	100,00%	100,00%	
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	3,79	3,79		$ 29.040,55	$ 110.063,69	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40,01	40,01		$ 30.062,36	$ 1.202.753,00	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	450,72	450,72		$ 30.426,62	$ 13.713.897,10	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	113,46	113,46		$ 10.621,20	$ 1.205.071,78	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.12	24	M	46.131,00	76,42		$ 28.815,57	$ 2.202.085,58	###############	0,17%	0,17%	
	1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	123,57	123,57		$ 11.807,73	$ 1.459.112,04	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	11,00	11,00		$ 19.332,69	$ 212.659,60	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	10,80	10,80		$ 30.969,00	$ 334.539,53	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	18,00	18,00		$ 25.467,57	$ 458.416,20	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	5,00	5,00		$ 6.973,21	$ 34.866,07	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40,01	40,01		$ 21.107,13	$ 844.466,77	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	1,60	1,60		$ 8.364,64	$ 13.383,43	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	18,00	18,00		$ 13.694,66	$ 246.503,87	$ -	100,00%	100,00%	
	1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	84,44	84,44		$ 20.392,00	$ 1.721.900,34	$ -	100,00%	100,00%	
	4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	27,38	27,38		$ 13.991,96	$ 383.099,91	$ -	100,00%	100,00%	
	4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	13,00	13,00		$ 59.307,81	$ 771.001,55	$ -	100,00%	100,00%	
	4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	11,00	11,00		$ 59.307,81	$ 652.385,92	$ -	100,00%	100,00%	
	4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VALVULA DE BOLA 1-1/2"	UN	2,00	2,00		$ 201.917,88	$ 403.835,76	$ -	100,00%	100,00%	
	4.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4"	UN	2,00	2,00		$ 85.229,37	$ 170.458,73	$ -	100,00%	100,00%	
	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00	2,00		$ 118.468,31	$ 236.936,62	$ -	100,00%	100,00%	
1	5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA, INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	5,00	5,00		$ 185.401,53	$ 927.007,63	$ -	100,00%	100,00%	
	7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	450,72	450,72		$ 39.814,42	$ 17.945.153,58	$ -	100,00%	100,00%	
	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	40,01	40,01		$ 42.278,54	$ 1.691.505,36	$ -	100,00%	100,00%	
	7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	40,01	40,01		$ 196.536,97	$ 7.863.169,19	$ -	100,00%	100,00%	
	7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	12,00	12,00		$ 70.333,44	$ 844.001,34	$ -	100,00%	100,00%	
	7.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	450,72	450,72		$ 241.797,92	$ 108.983.157,06	$ -	100,00%	100,00%	
	7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	116,40	116,40		$ 14.350,87	$ 1.670.383,54	$ -	100,00%	100,00%	
	7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	63,34	63,34		$ 76.716,07	$ 4.859.196,00	$ -	100,00%	100,00%	
	8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	112,85	112,85		$ 108.436,36	$ 12.237.103,23	$ -	100,00%	100,00%	
	9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	4,59	4,59		$ 853.515,01	$ 3.919.682,35	$ -	100,00%	100,00%	
	9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	7,92	7,92		$ 1.181.573,48	$ 9.358.061,97	$ -	100,00%	100,00%	
	10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	4,00	4,00		$ 721.070,81	$ 2.884.283,25	$ -	100,00%	100,00%	
	10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	11,00	11,00		$ 377.707,97	$ 4.154.787,65	$ -	100,00%	100,00%	
	10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	4,00	4,00		$ 38.396,20	$ 153.584,81	$ -	100,00%	100,00%	
	11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 4"	M2	33,87	33,87		$ 923.559,19	$ 31.283.720,51	$ -	100,00%	100,00%	
	11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1,80	1,80		$ 1.036.355,99	$ 1.865.440,78	$ -	100,00%	100,00%	
	12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	112,53	112,53		$ 38.464,50	$ 4.328.346,99	$ -	100,00%	100,00%	
	12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	66,93	66,93		$ 29.897,64	$ 2.001.049,05	$ -	100,00%	100,00%	
	12.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	59,26	59,26		$ 26.897,83	$ 1.593.965,52	$ -	100,00%	100,00%	
	14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	7,92	7,92		$ 185.164,49	$ 1.466.502,74	$ -	100,00%	100,00%	
	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	30,69	30,69		$ 4.352,40	$ 133.553,83	$ -	100,00%	100,00%	

GRUPOS	ITEM	CPF	751	IED		Alfonso Lopez Michelsen Cocina		SEMANA				
	Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,93	3,93		$ 30.062,36	$ 118.217,23	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,93	3,93		$ 30.426,62	$ 119.649,66	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	2,00		$ 25.467,57	$ 50.935,13	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	13,09	13,09		$ 21.107,13	$ 276.292,35	$ -	100,00%	100,00%	
	4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	7,35	7,35		$ 85.501,22	$ 628.434,00	$ -	100,00%	100,00%	
	4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	2,00		$ 71.024,47	$ 142.048,94	$ -	100,00%	100,00%	
	4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	4,00	4,00		$ 5.829,54	$ 23.318,15	$ -	100,00%	100,00%	
	5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	5,00			$ 534.497,49	$ -	$ 2.672.487,43	0,00%	0,00%	
	5.1.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/2", INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	127,73			$ 53.182,31	$ -	$ 6.792.908,92	0,00%	0,00%	
	5.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG THHN	M	150,20			$ 83.551,35	$ -	$ 12.549.412,59	0,00%	0,00%	
	5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA, INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	30,00			$ 185.401,53	$ -	$ 5.562.045,79	0,00%	0,00%	
1	5.1.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X125 A. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	2,00			$ 819.132,39	$ -	$ 1.638.264,79	0,00%	0,00%	

7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	13,09	13,09		$ 42.278,54	$ 553.426,14	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	12,60	12,60		$ 196.536,97	$ 2.476.365,88	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	M	90,50	90,50		$ 19.490,72	$ 1.763.909,87	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	22,42	22,42		$ 76.716,07	$ 1.719.974,33	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	131,64	131,64		$ 67.713,97	$ 8.913.587,98	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	6,00	6,00		$ 31.338,62	$ 188.031,72	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EYECTORA BARNES IC0027 VOLTAJE 220 TRIFASICA (390 GPM DESCARGA 3" 3HP)	UN	3,00			$ 6.591.038,86	$ -	$ 19.773.116,58	0,00%	0,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	131,64	131,64		$ 4.352,40	$ 572.932,00	$ -	100,00%	100,00%	
19.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMATICO CON 2 BOMBAS DE 2HP 110/220 TANQUE HIDRONEUMATICO POR MEMBRANA DE 200LTS, MARCA PEARL, TABLERO DE CONTROL CON NORMA RETIE (INCLUYE 2 BOMBAS ALTA PRESIÓN CAUDAL 2.33LP/S H.MAQ 50MT 1 TANQUE HIDROACUMULADOR MEMBRANA 200LTS VERTICAL CON MANOMETRO ACCESORIOS DE INTERCONEXIÓN ENTRE BOMBAS Y TANQUE EN HIERRO GALVANIZADO (HG), 1 FLAUTA DE DESCARGA EN 3" INCLUYE COPA DE DESCARGA 3 A 2, 2 REGISTROS EN BRONCE TIPO COMPUERTA, 2 VÁLVULAS CHEQUE HIDRONEUMATICO EN BRONCE, 1 TABLERO DE CONTROL EN COFRE METÁLICO CON NORMA RETIE 2- PRESOSTATOS RANGO 40/60, 1 SENSOR DE NIVEL (FLOTADOR), 1 MANOMETRO EN GLICERINA CON CARATULA DE 2" (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	UN	1,00			$ 18.464.640,51	$ -	$ 18.464.640,51	0,00%	0,00%	

	ITEM	CPF	742	IED	El Porvenir			SEMANA				
	Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	7,75	7,75		$ 29.040,55	$ 225.064,28	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	58,31	58,31		$ 30.426,62	$ 1.774.298,15	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,97	2,97		$ 20.817,86	$ 61.795,75	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	106,35	106,35		$ 10.621,20	$ 1.129.606,59	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	63,15	63,15		$ 28.815,57	$ 1.819.703,02	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	106,35	106,35		$ 11.807,73	$ 1.255.798,93	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	10,00	10,00		$ 19.332,69	$ 193.326,91	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12,75	12,75		$ 30.969,00	$ 394.947,66	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	24,00	24,00		$ 25.467,57	$ 611.221,59	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	4,00	4,00		$ 6.973,21	$ 27.892,86	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	24,00	24,00		$ 13.694,66	$ 328.671,82	$ -	100,00%	100,00%	
	1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	97,49	97,49		$ 20.392,00	$ 1.988.015,92	$ -	100,00%	100,00%	
	2.3.7	PERFORACIÓN NÚCLEO 3" E= 0.10 M	UN	2,00	2,00		$ 162.040,52	$ 324.081,04	$ -	100,00%	100,00%	
	3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	M2	2,44	2,44		$ 68.498,74	$ 167.383,52	$ -	100,00%	100,00%	
	4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	5,50	5,50		$ 85.501,22	$ 470.256,73	$ -	100,00%	100,00%	
	4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	100,00	100,00		$ 5.829,54	$ 582.953,76	$ -	100,00%	100,00%	
	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00	2,00		$ 118.468,31	$ 236.936,62	$ -	100,00%	100,00%	
	5.1.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4,00	4,00		$ 211.513,25	$ 846.052,99	$ -	100,00%	100,00%	
	5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA, INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	4,00	4,00		$ 185.401,53	$ 741.606,11	$ -	100,00%	100,00%	
2	7.1.5	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	57,35	57,35		$ 65.046,28	$ 3.730.404,34	$ -	100,00%	100,00%	
	7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	30,30	30,30		$ 26.316,62	$ 797.393,56	$ -	100,00%	100,00%	
	7.2.21	W IN DE ALUMINIO	M	52,48	52,48		$ 14.350,87	$ 753.133,51	$ -	100,00%	100,00%	
	7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	72,85	72,85		$ 76.716,07	$ 5.588.535,70	$ -	100,00%	100,00%	
	7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	44,37	44,37		$ 67.713,97	$ 3.004.360,49	$ -	100,00%	100,00%	
	8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	106,35	106,35		$ 108.436,36	$ 11.532.207,23	$ -	100,00%	100,00%	
	9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	4,51	4,51		$ 853.515,01	$ 3.849.352,71	$ -	100,00%	100,00%	
	9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	5,09	5,09		$ 1.181.573,48	$ 6.011.845,87	$ -	100,00%	100,00%	
	10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	4,00	4,00		$ 721.070,81	$ 2.884.283,25	$ -	100,00%	100,00%	
	10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	10,00	10,00		$ 377.707,97	$ 3.777.079,68	$ -	100,00%	100,00%	
	10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	5,00	5,00		$ 38.396,20	$ 191.981,02	$ -	100,00%	100,00%	
	10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	12,00	12,00		$ 948.374,57	$ 11.380.494,82	$ -	100,00%	100,00%	
	11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	9,00	9,00		$ 923.559,19	$ 8.312.032,73	$ -	100,00%	100,00%	
	11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2,70	2,70		$ 1.036.355,99	$ 2.798.161,17	$ -	100,00%	100,00%	
	12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	106,35	106,35		$ 38.464,50	$ 4.090.853,69	$ -	100,00%	100,00%	
	12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	68,62	68,62		$ 29.897,64	$ 2.051.683,69	$ -	100,00%	100,00%	
	12.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	30,00	30,00		$ 26.897,83	$ 806.934,96	$ -	100,00%	100,00%	
	14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	4,68	4,68		$ 185.164,49	$ 866.569,80	$ -	100,00%	100,00%	
	16.1.4	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	58,00	58,00		$ 86.678,38	$ 5.027.346,09	$ -	100,00%	100,00%	
	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	100,64	100,64		$ 4.352,40	$ 438.025,54	$ -	100,00%	100,00%	
	NP-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DOBLE DESCARGA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA CAPACIDAD MÍNIMA DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS.	UND	10,00	10,00		$ 995.640,29	$ 9.956.402,93	$ -	100,00%	100,00%	
	ITEM	CPF	764	IED	Villas del Progreso			SEMANA				
	Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	43,80	43,80		$ 29.040,55	$ 1.271.976,18	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	13,80	13,80		$ 30.426,62	$ 419.887,41	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	63,53	63,53		$ 10.621,20	$ 674.764,53	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	27,20	27,20		$ 28.815,57	$ 783.783,41	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	63,53	63,53		$ 11.807,73	$ 750.144,86	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	8,00	8,00		$ 19.332,69	$ 154.661,53	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7,68	7,68		$ 30.969,00	$ 237.841,92	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	5,00	5,00		$ 25.467,57	$ 127.337,83	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	20,00	20,00		$ 19.332,69	$ 386.653,82	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	2,00	2,00		$ 6.973,21	$ 13.946,43	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	8,00	8,00		$ 13.694,66	$ 109.557,27	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.44	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	13,80	13,80		$ 97.993,28	$ 1.352.307,29	$ -	100,00%	100,00%	
	1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	29,10	29,10		$ 20.392,00	$ 593.407,15	$ -	100,00%	100,00%	

1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	84,00	84,00		$ 17.444,42	$ 1.465.331,21	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	21,00	21,00		$ 36.375,35	$ 763.882,36	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	44,69	44,69		$ 96.359,46	$ 4.306.304,16	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	41,16	41,16		$ 22.734,26	$ 935.742,11	$ -	100,00%	100,00%	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	837,41	837,41		$ 7.440,60	$ 6.230.828,83	$ -	100,00%	100,00%	
3.2.1	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE (2 HILERAS)	M	3,20	3,20		$ 40.900,51	$ 130.881,62	$ -	100,00%	100,00%	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	56,00	56,00		$ 85.501,22	$ 4.788.068,54	$ -	100,00%	100,00%	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	10,00	10,00		$ 47.726,41	$ 477.264,10	$ -	100,00%	100,00%	
4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	8,00	8,00		$ 121.102,52	$ 968.820,13	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	18,60	18,60		$ 13.991,96	$ 260.250,49	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	7,00	7,00		$ 59.307,81	$ 415.154,68	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	8,00	8,00		$ 59.307,81	$ 474.462,49	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	6,00	6,00		$ 169.748,96	$ 1.018.493,74	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	2,00	2,00		$ 90.824,54	$ 181.649,09	$ -	100,00%	100,00%	
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	3,00	3,00		$ 64.414,18	$ 193.242,54	$ -	100,00%	100,00%	
4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	3,00	3,00		$ 71.024,47	$ 213.073,42	$ -	100,00%	100,00%	
4.7.8	RENIVELACIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	1,00	1,00		$ 78.661,93	$ 78.661,93	$ -	100,00%	100,00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	60,00	60,00		$ 5.829,54	$ 349.772,26	$ -	100,00%	100,00%	
4.9.13	SUSPENSION DE SALIDA SANITARIA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	8,00	8,00		$ 30.698,48	$ 245.587,85	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00	2,00		$ 118.468,31	$ 236.936,62	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	2,00	2,00		$ 185.401,53	$ 370.803,05	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	13,80	13,80		$ 42.278,54	$ 583.443,91	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.8	PISO EN CONCRETO A LA VISTA ENDURECIDO Y AFINADO CON HELICÓPTERO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, FORMALETAS, ACABADO CON ALLANADORA, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) E= 10 CM	M2	401,60	401,60		$ 143.272,97	$ 57.538.425,88	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.9	JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M	365,00	365,00		$ 36.001,71	$ 13.140.625,46	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	13,80	13,80		$ 196.536,97	$ 2.712.210,25	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	4,92	4,92		$ 70.333,44	$ 346.040,55	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	30,20	30,20		$ 14.350,87	$ 433.396,19	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	387,00	387,00		$ 19.237,61	$ 7.444.954,30	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	32,67	32,67		$ 76.716,07	$ 2.506.314,07	$ -	100,00%	100,00%	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	63,76	63,76		$ 108.436,36	$ 6.913.902,52	$ -	100,00%	100,00%	
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	4,18	4,18		$ 853.515,01	$ 3.564.278,70	$ -	100,00%	100,00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	1,18	1,18		$ 1.181.573,48	$ 1.391.420,93	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2,00	2,00		$ 721.070,81	$ 1.442.141,63	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	8,00	8,00		$ 377.707,97	$ 3.021.663,74	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	4,00	4,00		$ 38.396,20	$ 153.584,81	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	8,00	8,00		$ 31.338,62	$ 250.708,95	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	17,04	17,04		$ 923.559,19	$ 15.737.448,63	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2,16	2,16		$ 1.036.355,99	$ 2.238.528,94	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	63,76	63,76		$ 38.464,50	$ 2.452.496,67	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	14,25	14,25		$ 29.897,64	$ 426.049,14	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS HASTA 0,60 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	14,07	14,07		$ 18.044,38	$ 253.830,30	$ -	100,00%	100,00%	
12.3.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	1,80	1,80		$ 23.132,00	$ 41.637,60	$ -	100,00%	100,00%	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	2,21	2,21		$ 185.164,49	$ 408.843,19	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	416,78	416,78		$ 4.352,40	$ 1.814.008,07	$ -	100,00%	100,00%	

ITEM	CPF	714	IED		Pablo de Tarso		SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	151,50	151,50		$ 4.435,43	$ 671.967,71	$ -	100,00%	100,00%	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	15,30	15,30		$ 29.040,55	$ 444.320,45	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	37,88	37,88		$ 28.054,90	$ 1.062.719,64	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	156,26	156,26		$ 34.307,63	$ 5.360.909,58	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	4,00	4,00		$ 6.973,21	$ 27.892,86	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	6,80	6,80		$ 8.364,64	$ 56.879,57	$ -	100,00%	100,00%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	1.268,93	850,30	300,00	$ 6.772,33	$ 5.758.515,94	$ 2.835.102,35	67,01%	67,01%	
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	4.608,04	4608,04		$ 24.136,40	$ 111.221.504,03	$ -	100,00%	100,00%	
3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	CM	170,00	480,00		$ 9.730,63	$ 4.670.701,06	$ (3.016.494,43)	282,35%	282,35%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	6,80	6,80		$ 13.991,96	$ 95.145,34	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN	5,00	5,00		$ 5.234,93	$ 26.174,66	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	4,00	4,00		$ 185.401,53	$ 741.606,11	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	108,54	108,54		$ 22.625,78	$ 2.455.689,47	$ -	100,00%	100,00%	
13.1.4	CIELO RASO PLANO EN DRYWALL 6 MM UNA CARA, PARA TAPONAMIENTO DE LUCES EN ÁREA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA - (ALTURA HASTA 60 CM)	M	37,88	37,88		$ 84.841,00	$ 3.213.777,02	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	17,70	17,70		$ 111.316,98	$ 1.970.310,59	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	150,66	150,66		$ 247.166,77	$ 37.238.145,51	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 67,5 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, AL IGUAL QUE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	M	32,50	32,50		$ 202.701,31	$ 6.587.792,64	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	59,66	59,66		$ 4.352,40	$ 259.664,18	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG	2.133,00	2.133,00		$ 3.520,76	$ 7.509.774,25	$ -	100,00%	100,00%	

ITEM	CPF	836	IED		Jairo Anibal Niño		SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	3,80	3,80		$ 29.040,55	$ 110.354,10	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	207,43	207,43		$ 30.426,62	$ 6.311.406,79	$ -	100,00%	100,00%	

1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6,84	6,84		$ 20.817,86	$ 142.394,19	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	168,45	168,45		$ 10.621,20	$ 1.789.172,62	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	120,31	120,31		$ 28.815,57	$ 3.466.800,79	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	168,45	168,45		$ 11.807,73	$ 1.989.047,41	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	20,00	20,00		$ 19.332,69	$ 386.653,82	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	25,17	21,05		$ 30.969,00	$ 651.897,45	$ 127.697,57	83,62%	83,62%	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,04	3,04	3,04	$ 27.437,53	$ 83.341,50	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	40,00	40,00		$ 25.467,57	$ 1.018.702,66	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	12,25	12,25		$ 8.364,64	$ 102.466,88	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	31,00	31,00		$ 13.694,66	$ 424.534,44	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	121,96	121,96		$ 20.392,00	$ 2.487.008,12	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 ''	UN	8,00	8,00		$ 19.766,59	$ 158.132,74	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	4,25	4,25		$ 13.991,96	$ 59.465,84	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	13,00	13,00		$ 59.307,81	$ 771.001,55	$ -	100,00%	100,00%	
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	5,00	5,00		$ 64.414,18	$ 322.070,90	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5,00	5,00	5,00	$ 118.468,31	$ 592.341,55	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	207,43	207,43		$ 39.814,42	$ 8.258.720,24	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	1,35	1,35		$ 196.536,97	$ 265.324,92	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	207,43	207,43		$ 241.797,92	$ 50.156.238,60	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	90,30	90,30		$ 14.350,87	$ 1.295.883,31	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	118,39	118,39		$ 76.716,07	$ 9.082.415,76	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	53,42	53,42		$ 67.713,97	$ 3.617.171,91	$ -	100,00%	100,00%	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	191,29	191,29		$ 108.436,36	$ 20.742.954,57	$ -	100,00%	100,00%	
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	9,02	9,02		$ 853.515,01	$ 7.696.998,40	$ -	100,00%	100,00%	
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	3,04	3,04		$ 448.682,89	$ 1.362.874,28	$ -	100,00%	100,00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	8,17	8,17		$ 1.181.573,48	$ 9.655.818,49	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	6,00	6,00		$ 815.394,69	$ 4.892.368,12	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	5,00	5,00		$ 575.810,47	$ 2.879.052,34	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3,00	3,00		$ 721.070,81	$ 2.163.212,44	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	16,00	16,00		$ 377.707,97	$ 6.043.327,49	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	10,00	10,00	10,00	$ 38.396,20	$ 383.962,03	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	7,00	7,00	7,00	$ 31.338,62	$ 219.370,33	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	15,64	15,64		$ 923.559,19	$ 14.448.160,00	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2,70	2,70		$ 1.036.355,99	$ 2.798.161,17	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	191,29	191,29		$ 38.464,50	$ 7.357.932,36	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	21,19	21,19	21,19	$ 11.692,56	$ 247.718,47	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	72,64	72,64	72,64	$ 29.897,64	$ 2.171.863,23	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	72,64	72,64		$ 22.625,78	$ 1.643.611,61	$ -	100,00%	100,00%	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	10,22	10,22	1,91	$ 185.164,49	$ 1.892.381,07	$ 740,66	99,96%	99,96%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	60,77	55,30	30,00	$ 4.352,40	$ 240.687,72	$ 23.811,26	91,00%	91,00%	

ITEM	CPF	712	IED	Luis Lopez de Mesa			SEMANA				
Ítem	**Actividad**	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	7,80	7,80		$ 29.040,55	$ 226.516,31	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	701,99	701,99		$ 30.062,36	$ 21.103.477,22	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	56,41	56,41		$ 10.621,20	$ 599.105,51	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	32,84	32,84		$ 28.815,57	$ 946.303,20	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	56,41	56,41		$ 11.807,73	$ 666.033,70	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	6,00	6,00		$ 19.332,69	$ 115.996,15	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	12,00	12,00		$ 25.467,57	$ 305.610,80	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	4,00	4,00		$ 5.207,00	$ 20.828,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	701,99	701,99		$ 16.844,46	$ 11.824.640,79	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	14,80	14,80		$ 8.364,64	$ 123.796,72	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	8,00	8,00		$ 13.694,66	$ 109.557,27	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	74,56	74,56		$ 20.392,00	$ 1.520.427,40	$ -	100,00%	100,00%	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	1,50	1,50		$ 47.726,41	$ 71.589,61	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1'' INCLUYE ACCESORIOS	M	1,60	1,60		$ 21.103,11	$ 33.764,98	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	18,66	18,66		$ 13.991,96	$ 261.090,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	8,00	8,00		$ 59.307,81	$ 474.462,49	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	5,00	5,00		$ 59.307,81	$ 296.539,06	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	2,00	2,00		$ 90.824,54	$ 181.649,09	$ -	100,00%	100,00%	
4.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1"	UN	1,00	1,00		$ 121.077,07	$ 121.077,07	$ -	100,00%	100,00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	56,00	56,00		$ 5.829,54	$ 326.454,11	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	1,00		$ 118.468,31	$ 118.468,31	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA, INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIS CERTIFICADOS	UN	4,00	4,00		$ 185.401,53	$ 741.606,11	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.5	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	701,99	700,00		$ 65.046,28	$ 45.532.398,24	$ 129.442,10	99,72%	99,72%	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	113,76	113,76		$ 26.316,62	$ 2.993.778,60	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	0,95	0,95		$ 70.333,44	$ 66.816,77	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	50,09	50,09		$ 14.350,87	$ 718.834,94	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	46,90	46,90		$ 76.716,07	$ 3.597.983,78	$ -	100,00%	100,00%	

7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	23,66	23,66		$ 67.713,97	$ 1.602.112,52	$ -	100,00%	100,00%	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	47,61	47,61		$ 108.436,36	$ 5.162.655,25	$ -	100,00%	100,00%	
9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA, INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	2,32	2,32		$ 489.874,00	$ 1.136.752,62	$ -	100,00%	100,00%	
9.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO TIPO PERSIANA	M2	1,60	1,60	1,60	$ 698.853,48	$ 1.118.584,89	$ -	100,00%	100,00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	4,79	4,79		$ 1.181.573,48	$ 5.663.754,33	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	6,00	6,00		$ 815.394,69	$ 4.892.368,12	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2,00	2,00		$ 575.810,47	$ 1.151.620,93	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5,00	5,00		$ 377.707,97	$ 1.888.539,84	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	1,00	1,00		$ 38.396,20	$ 38.396,20	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	2,00	2,00	2,00	$ 31.338,62	$ 62.677,24	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	8,51	8,51		$ 923.559,19	$ 7.861.335,84	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1,44	1,44		$ 1.036.355,99	$ 1.492.352,63	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	58,63	58,63		$ 38.464,50	$ 2.255.173,78	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	25,11	25,11		$ 29.897,64	$ 750.819,43	$ -	100,00%	100,00%	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	0,55	0,55		$ 185.164,49	$ 101.840,47	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.4	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	701,99	700,00		$ 86.678,38	$ 60.674.866,56	$ 172.489,98	99,72%	99,72%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	727,10	600,00		$ 4.352,40	$ 2.611.440,00	$ 553.190,04	82,52%	82,52%	
19.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR DE PASAJEROS MEDIA CABINA USO PARA PERSONAS CON DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD Y PASAJEROS, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 500 KG CARGA VIVA Y TOTAL CON CABINA 890 KG APROX, 2 PARADAS, FOSO CON MEDIDAS 1.60M DE ANCHO X 1.60M DE FONDO APROX.; POSO CON MEDIDAS 1.60M DE ANCHO X 1.60M DE FONDO X 1.00M DE ALTURA APROX., MEDIDAS DE CABINA: 1.50 M DE ANCHO X 1.20M DE FONDO X 1.60M DE ALTURA, PARA EL COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA	UN	1,27	0,87	0,87	$ 76.917.022,98	$ 66.917.809,99	$ 30.766.809,19	68,50%	68,50%	

ITEM	CPF	814	IED	Eduardo Umaña Luna			SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	21,76	21,76		$ 4.435,43	$ 96.514,97	$ -	100,00%	100,00%	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	6,40	6,40		$ 29.040,55	$ 185.859,53	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,21	3,21		$ 30.062,36	$ 96.644,48	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1,89	1,89		$ 20.817,86	$ 39.345,76	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	66,41	66,41		$ 10.621,20	$ 705.300,47	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	20,97	20,97		$ 28.815,57	$ 604.262,43	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	69,88	69,88		$ 11.807,73	$ 825.147,54	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	5,00	5,00		$ 19.332,69	$ 96.663,46	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6,80	6,80		$ 30.969,00	$ 210.589,20	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	11,00	11,00		$ 25.467,57	$ 280.143,23	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	3,00	3,00		$ 6.973,21	$ 20.919,64	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,21	3,21		$ 21.107,13	$ 67.855,21	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	10,50	10,50		$ 8.364,64	$ 87.828,75	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	5,00	5,00		$ 13.694,66	$ 68.473,30	$ -	100,00%	100,00%	
1.3.1	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)	M2	549,44	549,44		$ 50.276,25	$ 27.623.780,82	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	46,09	46,09		$ 20.392,00	$ 939.867,21	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	7,00	7,00		$ 36.375,35	$ 254.627,45	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	0,95	0,95		$ 101.698,85	$ 96.613,91	$ -	100,00%	100,00%	
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	M2	3,74	3,74		$ 68.498,74	$ 256.390,79	$ -	100,00%	100,00%	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	1,00	1,00		$ 85.501,22	$ 85.501,22	$ -	100,00%	100,00%	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	2,00	2,00		$ 47.726,41	$ 95.452,82	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	48,00	48,00		$ 13.991,96	$ 671.614,16	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	7,00	7,00		$ 59.307,81	$ 415.154,68	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	5,00	5,00		$ 59.307,81	$ 296.539,06	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	1,00	1,00		$ 169.748,96	$ 169.748,96	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	2,00	2,00		$ 90.824,54	$ 181.649,09	$ -	100,00%	100,00%	
4.9.11	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	3,00	3,00		$ 170.346,24	$ 511.038,72	$ -	100,00%	100,00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	44,00	44,00		$ 5.829,54	$ 256.499,65	$ -	100,00%	100,00%	
4.9.13	SUSPENSION DE SALIDA SANITARIA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	1,00	1,00		$ 30.698,48	$ 30.698,48	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	1,00		$ 118.468,31	$ 118.468,31	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	1,00		$ 211.513,25	$ 211.513,25	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	2,00	2,00		$ 180.924,58	$ 361.849,16	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	3,21	3,21		$ 42.278,54	$ 135.917,06	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	3,21	3,21		$ 196.536,97	$ 631.827,07	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	1,80	1,80		$ 70.333,44	$ 126.600,20	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	24,70	24,70		$ 14.350,87	$ 354.466,42	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	37,48	37,48		$ 76.716,07	$ 2.875.318,38	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	24,15	24,15		$ 67.713,97	$ 1.635.387,17	$ -	100,00%	100,00%	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	72,77	72,77		$ 108.436,36	$ 7.890.914,15	$ -	100,00%	100,00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	2,73	2,73		$ 1.181.573,48	$ 3.225.695,60	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	5,00	5,00		$ 815.394,69	$ 4.076.973,43	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2,00	2,00		$ 575.810,47	$ 1.151.620,93	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5,00	5,00		$ 377.707,97	$ 1.888.539,84	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2,00	2,00		$ 38.396,20	$ 76.792,41	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	2,00	2,00		$ 31.338,62	$ 62.677,24	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	1,00	1,00		$ 948.374,57	$ 948.374,57	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	6,80	6,80		$ 923.559,19	$ 6.280.202,51	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	0,72	0,72		$ 1.036.355,99	$ 746.176,31	$ -	100,00%		
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	69,35	69,35		$ 38.464,50	$ 2.667.513,24	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	38,54	38,54		$ 29.897,64	$ 1.152.246,08	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	3,90	3,90		$ 22.625,78	$ 88.240,56	$ -	100,00%	100,00%	
12.3.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	12,00	12,00		$ 29.063,32	$ 348.759,82	$ -	100,00%	100,00%	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	2,82	2,82	0,82	$ 185.164,49	$ 521.830,56	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	368,76	368,76		$ 4.352,40	$ 1.604.991,02	$ -	100,00%	100,00%	

ITEM	CPF	833	IED	Dario Echandia			SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	123,63	123,63		$ 3.404,25	$ 420.873,79	$ -	100,00%	100,00%	
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	15,60	15,60		$ 2.407,88	$ 37.562,95	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12,80	12,80		$ 20.817,86	$ 266.468,66	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	224,64	224,64		$ 28.054,90	$ 6.302.252,92	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	686,67	686,67		$ 34.307,63	$ 23.557.934,93	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	57,00	57,00		$ 11.171,61	$ 636.781,56	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	57,00	57,00		$ 6.973,21	$ 397.473,22	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	253,30	253,30		$ 4.099,29	$ 1.038.350,46	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	6,25	6,25		$ 8.364,64	$ 52.279,02	$ -	100,00%	100,00%	

1.3.3	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METÁLICAS EN LÁMINA COLDROLLED A= 0.90 a 1.0 M X H= 2.10 M (INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN)	UN	11,00	11,00		$ 177.967,63	$ 1.957.643,90	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	26,00	26,00		$ 36.375,35	$ 945.759,11	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.16	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO).	M3	0,85	0,85		$ 1.307.170,35	$ 1.113.709,14	$ -	100,00%	100,00%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	80,60	80,60		$ 6.772,33	$ 545.850,15	$ -	100,00%	100,00%	
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	16806,93	16806,93		$ 24.136,40	$ 405.658.812,14	$ -	100,00%	100,00%	
3.1.13	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	M2	69,18	69,18		$ 12.825,52	$ 887.305,53	$ -	100,00%	100,00%	
3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	CM	108,00	108,00		$ 9.730,63	$ 1.050.907,74	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	6,25	6,25		$ 27.619,66	$ 172.622,88	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	13,00	13,00		$ 118.468,31	$ 1.540.088,04	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00	2,00		$ 163.656,94	$ 327.313,87	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	27,00	27,00		$ 197.624,40	$ 5.335.858,93	$ -	100,00%	100,00%	

5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	126,65	126,65		$ 24.422,99	$ 3.093.171,73	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	50,00	50,00		$ 46.585,41	$ 2.329.270,56	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	62,00	62,00		$ 188.899,52	$ 11.711.770,04	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	49,00	49,00		$ 185.401,53	$ 9.084.674,79	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	1.161,22	1.161,22		$ 29.762,38	$ 34.560.636,12	$ -	100,00%	100,00%	
13.1.4	CIELO RASO PLANO EN DRYWALL 6 MM UNA CARA, PARA TAPONAMIENTO DE LUCES EN ÁREA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA - (ALTURA HASTA 60 CM)	M	449,28	449,28		$ 84.841,00	$ 38.117.363,76	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	17,00	17,00		$ 111.316,98	$ 1.892.388,70	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M	40,00	40,00		$ 24.947,96	$ 997.918,27	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	642,87	642,87		$ 247.166,77	$ 158.896.101,17	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M	6,20	6,20		$ 134.793,16	$ 835.717,58	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	716,95	716,95		$ 4.352,40	$ 3.120.437,95	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG	13184,70	13184,70		$ 3.520,76	$ 46.420.122,18	$ -	100,00%	100,00%	

ITEM	CPF	748	IED		Alfonso Reyes Echandia		SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO (Para mantenimientos o reparaciones locativas la SED cuenta con un historico de planta de distribución de cada colegio pero en caso de reemplazo de carpetas asfalticas y placas de cancha se debe aplicar)	m2	73,41	73,41		$ 6.575,47	$ 482.716,28	$ -	100,00%	100,00%	$ 2.230,40
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	m2	73,41	73,41		$ 29.040,55	$ 2.131.914,99	$ -	100,00%	100,00%	$ 9.850,56
1.2.16	DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	176,00	176,00		$ 113.509,25	$ 19.977.628,49	$ -	100,00%	100,00%	$ 38.502,34
2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	2,00	2,00		$ 22.734,26	$ 45.468,52	$ -	100,00%	100,00%	$ 7.711,46
2.2.11	MUROS DE CONTENCIÓN 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDANTE, NO INCLUYE ACERO)	M3	6,00	6,00		$ 1.429.703,14	$ 8.578.218,82	$ -	100,00%	100,00%	$ 484.955,30
2.3.3	CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	64,00	64,00		$ 172.618,86	$ 11.047.607,19	$ -	100,00%	100,00%	$ 58.552,32
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	480,00	480,00		$ 6.772,33	$ 3.250.720,51	$ -	100,00%	100,00%	$ 2.297,18
4.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	73,41	73,41		$ 93.453,39	$ 6.860.568,29	$ -	100,00%	100,00%	$ 31.699,39
4.8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2	73,41	73,41		$ 12.287,16	$ 902.020,75	$ -	100,00%	100,00%	$ 4.167,80
9.3.4	CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40 M	M	73,41	60,00		$ 1.122.317,90	$ 67.339.073,95	$ 15.052.140,49	81,73%	81,73%	$ 380.690,23
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	73,41			$ 4.352,40	$ -	$ 319.516,89	0,00%	0,00%	$ 1.476,33

ITEM	CPF	747	IED		Orlando Higuita		SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	173,65	173,65		$ 30.062,36	$ 5.220.329,09	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	116,70	144,84		$ 10.621,20	$ 1.538.352,21	$ (298.809,88)	124,11%	124,11%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	116,70	144,84		$ 11.807,73	$ 1.710.206,97	$ (332.190,98)	124,11%	124,11%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	25,00	4,00		$ 6.973,21	$ 27.892,86	$ 146.437,50	16,00%	16,00%	
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	173,65	152,28		$ 16.844,46	$ 2.565.038,63	$ 360.001,43	87,69%	87,69%	
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	25,00	25,00		$ 62.547,34	$ 1.563.683,40	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	153,00	153,00		$ 42.278,54	$ 6.468.617,23	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	150,00	150,00		$ 26.316,62	$ 3.947.492,88	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	M	74,66	74,66		$ 19.490,72	$ 1.455.176,92	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	116,70	116,70		$ 22.625,78	$ 2.640.428,99	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.3	PINTURA EPÓXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	116,70	116,70		$ 29.897,64	$ 3.489.054,59	$ -	100,00%	100,00%	
13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	116,70	116,70		$ 121.679,71	$ 14.200.022,39	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.4	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	173,65	173,65		$ 86.678,38	$ 15.051.700,83	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.25	AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA)	M2	173,65	173,65		$ 106.127,58	$ 18.429.054,68	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	290,35	290,35		$ 4.352,40	$ 1.263.719,34	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.4	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	116,70	116,70		$ 7.510,23	$ 876.444,26	$ -	100,00%	100,00%	

ITEM	CPF	838	IED		Isabel II		SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	10,26	10,26		$ 4.352,40	$ 44.633,86	$ -	100,00%	100,00%	
19.1.3	TALA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1,00	1,00		$ 1.953.740,13	$ 1.953.740,13	$ -	100,00%	100,00%	

ITEM	CPF	850	IED		Jhon F Kennedy		SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	8,88	8,88		$ 4.352,40	$ 38.644,09	$ -	100,00%	100,00%	
19.1.3	TALA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1,00	1,00		$ 1.953.740,13	$ 1.953.740,13	$ -	100,00%	100,00%	

ITEM	CPF	817	IED		Marsella		SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	27,59	27,59		$ 4.352,40	$ 120.102,30	$ -	100,00%	100,00%	
19.1.2	TALA DE ARBOLES CLASE II (5M<H<15M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1,00	1,00		$ 739.630,79	$ 739.630,79	$ -	100,00%	100,00%	
19.1.6	PODA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	4,00	4,00		$ 976.870,07	$ 3.907.480,26	$ -	100,00%	100,00%	

ITEM	CPF	890	IED		Nelson Mandela		SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17,08	17,08	17,08	$ 30.426,62	$ 519.686,74	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	22,00	22,00	22,00	$ 17.444,42	$ 383.777,22	$ -	100,00%	100,00%	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	11,00	11,00	11,00	$ 85.501,22	$ 940.513,46	$ -	100,00%	100,00%	
4.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 2"	UN	22,00	22,00	22,00	$ 20.568,77	$ 452.513,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	16,00	16,00	16,00	$ 5.829,54	$ 93.272,60	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	34,16	34,16	34,16	$ 42.278,54	$ 1.444.235,06	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.30	TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2	34,16	34,16	34,16	$ 127.154,36	$ 4.343.592,99	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.3	PAÑETE LISO BAJO PLACA ACABADO LISO 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	8,54	8,54	8,54	$ 36.604,35	$ 312.601,18	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	8,54	8,54	8,54	$ 11.692,56	$ 99.854,42	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA VINILO TIPO 1 LAVABLE A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	8,54	8,54	8,54	$ 17.192,65	$ 146.825,23	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	34,16	34,16	34,16	$ 4.352,40	$ 148.677,98	$ -	100,00%	100,00%	

ITEM	CPF	763	IED		Bicentenario		SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	15,00			$ 6.772,33	$ -	$ 101.585,02	0,00%	0,00%	

8.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA).	M2	25,20			$ 195.409,37	$ -	$ 4.924.316,07	0,00%	0,00%	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	50,40			$ 22.625,78	$ -	$ 1.140.339,51	0,00%	0,00%	
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	36,60			$ 18.025,63	$ -	$ 659.738,13	0,00%	0,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	36,60			$ 4.352,40	$ -	$ 159.297,84	0,00%	0,00%	
ITEM	**CPF**	**729**	**IED**		**San bernardino**		**SEMANA**				
Ítem	**Actividad**	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
1.2.3	DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	2,00			$ 122.747,05	$ -	$ 245.494,11	0,00%	0,00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7,60			$ 20.817,86	$ -	$ 158.111,68	0,00%	0,00%	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	2,40			$ 16.375,74	$ -	$ 39.301,77	0,00%	0,00%	
2.2.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3	0,18			$ 633.678,64	$ -	$ 114.062,15	0,00%	0,00%	
2.2.17	PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO – INCLUYE ESCARIFICADO DE SUPERFICIE	M2	1,20			$ 128.126,62	$ -	$ 153.751,94	0,00%	0,00%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	13,32			$ 6.772,33	$ -	$ 90.174,99	0,00%	0,00%	
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	7,60			$ 136.417,61	$ -	$ 1.036.091,73	0,00%	0,00%	
3.1.11	RETIRO Y REPOSICIÓN DE EMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA CON MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL	M2	15,19			$ 137.324,25	$ -	$ 2.085.955,30	0,00%	0,00%	
ITEM	**CPF**	**821**	**IED**		**San Jose**		**SEMANA**				
Ítem	**Actividad**	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	8,98	8,98		$ 4.352,40	$ 39.081,94	$ -	100,00%	100,00%	
19.1.2	TALA DE ARBOLES CLASE II (5M<H<15M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1,00	1,00		$ 739.630,79	$ 739.630,79	$ -	100,00%	100,00%	

FECHA:	21/06/2026
DIAS RESTANTES	**92**
CORTE DEL INFORME:	***21/06/2026***

INFORME SEMANAL 29

OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 3"
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO EDU 2025
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SEMANA N°	29	**DEL**	15-jun-26	**AL**	21-jun-26

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	CO1.PCCNTR.8169111	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.8154784
Fecha de Iniciación	14/10/2025	**Fecha de Iniciación**	14/10/2025
Fecha de Terminación	13/05/2026	**Fecha de Terminación**	13/05/2026
Plazo Inicial	7 MESES	**Plazo Inicial**	7 MESES
Valor inicial	$ 184.210.953,00	**Valor inicial**	$ 552.624.455,00
Adiciones	$ 83.867.649,00	**Adiciones**	$ 523.987.595,00
Prorroga	4 MESES	**Prorroga**	4 MESES
Suspensión	1	**Suspensión**	1

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES							ACTIVIDADES
No.	**FRENTE**	PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR	EJECUTADO SEMANA ANTERIOR	PROGRAMADO ACUM	EJECUTADO ACUM	DESVIACIÓN	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**
1	PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	FINALIZADO
2	PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	55,00%	20,64%	70,00%	20,64%	-49,36%	Cocina: Instalacion de piso, cambio de tuberias
3	EL PORVENIR	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	FINALIZADO
4	VILLAS DEL PROGRESO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	FINALIZADO
5	PABLO DE TARSO	90,00%	91,98%	98,00%	99,68%	1,68%	Desmonte e instalación de cubierta
6	JAIRO ANIBAL NIÑO	80,00%	85,20%	80,00%	88,80%	8,80%	BAÑO Y SALONES DE PREESCOLAR: Instalación de enchape, media caña y piso
7	LUIS LOPEZ DE MESA	40,00%	73,35%	85,00%	88,31%	3,31%	BAÑO: Instalacion de manto de aluminio sobre cubierta y enchape
8	EDUARDO UMAÑA LUNA	93,00%	96,23%	93,00%	96,74%	3,74%	BAÑO: Instalacion de enchape
9	DARIO ECHANDIA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	FINALIZADO
10	LLANO ORIENTAL - ALFONSO REYES ECHANDIA	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	FINALIZADO
TOTALES		**83,80%**	**86,74%**	**92,60%**	**89,42%**	**-3,18%**	

3. RESUMEN FINANCIERO

PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 261.167.046	$ 261.167.046	$ -		0,00%	100,00%

PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 85.000.000	$ 17.547.123	**$ 67.452.877**		0,00%	20,64%

EL PORVENIR

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 110.086.654	$ 110.086.654	$ -		0,00%	100,00%

VILLAS DEL PROGRESO

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 166.676.454	$ 166.676.454	$ -		0,00%	100,00%

PABLO DE TARSO

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 189.976.713	$ 189.373.491	**$ 603.222**		7,71%	99,68%

JAIRO ANIBAL NIÑO

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 203.141.470	$ 180.383.002	**$ 22.758.468**		3,60%	88,80%

LUIS LOPEZ DE MESA

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA						

FECHA:	21/06/2026	**INFORME SEMANAL 29**
DIAS RESTANTES	**92**	
CORTE DEL INFORME:	***21/06/2026***	

OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 3"
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO EDU 2025
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SEMANA N°	29	**DEL**	15-jun-26		**AL**	21-jun-26	

EJECUTADA	$ 292.710.605	$ 258.481.907	**$ 34.228.698**			26,90%	88,31%

EDUARDO UMAÑA LUNA

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL BALANCE**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 76.965.087	$ 74.453.620	**$ 2.511.466**		0,50%	96,74%

DARIO ECHANDIA

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL BALANCE**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 795.148.175	$ 795.148.175	**$** -		0,00%	100,00%

ALFONSO REYES ECHANDIA

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL BALANCE**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 134.643.281	$ 134.643.281	$ 0		62,60%	100,00%

FECHA:	21/06/2026	**INFORME SEMANAL 29**
DIAS RESTANTES	**92**	
CORTE DEL INFORME:	***21/06/2026***	

OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 3"
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO EDU 2025
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SEMANA N°	29	**DEL**	15-jun-26	**AL**	21-jun-26

EMERGENCIAS

BALANCE EMERGENCIAS	**VR.TOTAL BALANCE**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 114.665.609	$ 100.539.128	**$ 14.126.481**		0,00%	87,68%

4. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:
- Mantener orden y aseo en la obras, así como la señalización
- Continuar con el uso correcto de EPP
- Apertura de más frentes de obra

CONCLUSIONES:
- Se avanzó con la subsanación de obcervaciones echas por la interventoria

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

1. Se envia informe semanal de interventoria al apoyo a la supervisión de la SED

2. El contratista envia corte de obra No. 4 a la interventoria para revisión.
3. La interventioria envia al contratista, EME 850 COLEGIO JOHN F. KENNEDY GRUPO 7

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la presente semana se mantuvo el personal previamente aprobado para el ingreso y ejecución de las actividades, verificando el cumplimiento de los requisitos y lineamientos establecidos por la Interventoría para el desarrollo seguro de las labores.

De igual manera, se evidenció la ejecución de actividades en la Institución Educativa Alfonso Reyes Echandía. Durante la visita de seguimiento se recomendó al contratista fortalecer las jornadas de orden y aseo, realizar el retiro oportuno de los escombros generados y garantizar el correcto etiquetado de los productos químicos almacenados en obra, con el fin de prevenir incidentes y minimizar riesgos para la comunidad educativa. Así mismo, se solicitó el retiro de las tejas sobrantes ubicadas en el área intervenida, debido a que estas pueden representar un riesgo de accidente para los estudiantes y demás usuarios de la institución.

En la Institución Educativa Llanos Orientales se evidenció personal ejecutando actividades de pendientado de piso, instalación de manto e ingreso de materiales. Se recomendó al contratista reforzar las jornadas de orden y aseo, realizar el retiro de los escombros generados y disponer adecuadamente el manto retirado durante las intervenciones, con el fin de mantener condiciones seguras en el frente de trabajo.

Finalmente, se reitera al contratista la importancia de remitir de manera oportuna los informes mensuales, con el propósito de facilitar el seguimiento y control de la información documental asociada a la ejecución del proyecto.

.
Total horas hombre trabajadas: 42
Total de horas capacitación: 20 minutos
Número de accidentes de trabajo: 0
Número de días de incapacidad por AT:0
Número de días de incapacidad por enfermedad común: 0

REPORTE PERSONAL
DIRECTOR OBRA: 1 INSPECTORES SST: 1
RESIDENTE OBRA: 1 PERSONAL OPERATIVO: 7

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

IED Llano oriental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia que no cuentan con cerramiento por que se está trabajando en la parte posterior de la institución, se evidencian materiales de construcción y residuos (alto volumen), parte de ellos sin acopiar ni señalizar, por lo que se recomienda organizar la zona de acopio, realizar la disposición adecuada, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental
IED Alfonso Reyes Echandía: Se realizo recorrido en el frente, se evidencio residuos y material de construcción, por lo que se recomendó al contratista realizar el retiro de todo, realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

OTROS

ING JHONER MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ARQ HARRY ARANGO
Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FECHA:	21/06/2026
DIAS RESTANTES	**92**
CORTE DEL INFORME:	***21/06/2026***

INFORME SEMANAL

OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 3"
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO EDU 2025
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SEMANA N°	28	**DEL**	8-jun-26	**AL**	14-jun-26

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA**	
Contrato No .	CO1.PCCNTR.8169111	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.8154784
Fecha de Iniciación	14/10/2025	**Fecha de Iniciación**	14/10/2025
Fecha de Terminación	13/05/2026	**Fecha de Terminación**	13/05/2026
Plazo Inicial	7 MESES	**Plazo Inicial**	7 MESES
Valor inicial	$ 184.210.953,00	**Valor inicial**	$ 552.624.455,00
Adiciones	$ 83.867.649,00	**Adiciones**	$ 523.987.595,00
Prorroga	4 MESES	**Prorroga**	4 MESES
Suspensión	1	**Suspensión**	1

CPF	COLEGIO	SEDE	CONTRATO DE OBRA	LOCALIDAD	Silviculturales	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	ESTADO	ALCANCE	FECHA INICIO ATENCION EMERGENCIA	FECHA TERMINACION Y ENTREGA AL COLEGIO	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO
838	ISABEL II	B	CO1.PCCNTR.8154784	Kennedy	Silviculturales	100%	FINALIZADO	TALA DE UN ARBOL	30-dic.-25	30-dic.-25	$ 1.998.374,00
732	LA LIBERTAD - ORLANDO HIGUITA ROJAS	B	CO1.PCCNTR.8154784	Bosa	OBRA	100%	FINALIZADO	En el Colegio Orlando Higuita Rojas, Sede A, el día 10 de septiembre de 2025 se presentó el desprendimiento del enchape del techo en la zona de depósito de la cocina del comedor escolar, motivo por el cual se ordenó el cierre del	30-nov.-25	20-feb.-26	$ 82.116.894,00
821	SAN JOSE	B	CO1.PCCNTR.8154784	Kennedy	Silviculturales	100%	FINALIZADO	TALA DE UN ARBOL	30-dic.-25	30-dic.-25	$ 778.713,00
850	JOHN F. KENNEDY	A	CO1.PCCNTR.8154784	Kennedy	Silviculturales	100%	FINALIZADO	TALA DE UN ARBOL	30-dic.-25	30-dic.-25	$ 1.992.384,00
817	MARSELLA	A	CO1.PCCNTR.8154784	Kennedy	Silviculturales	100%	FINALIZADO	TALA Y PODA DE	30-dic.-25	30-dic.-25	$ 4.767.213,00
890	NELSON MANDELA	A	CO1.PCCNTR.8154784	Kennedy	OBRA	100%	FINALIZADO	REPARACION TUBERIA BAÑOS	13-dic.-25	27-dic.-25	$ 12.103.037,00
842	SAN RAFAEL	A	CO1.PCCNTR.8154784	Kennedy	OBRA	100%	FINALIZADO	adecuación de cuarto de almacenamiento de residuos sólidos para cocina	1-abr.-26	21-abr.-26	$ 17.000.000,00
615	"INEM SANTIAGO PEREZ"	A	CO1.PCCNTR.8154784	Tunjuelito	OBRA	0%		Equipo de bombeo de la cocina escolar no se encuentra en funcionamiento	22-may.-26	31-may.-26	$ 48.800.000,00
804	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	B	CO1.PCCNTR.8154784	Kennedy	OBRA	0%		Situación: El 9 de febrero de 2026 se realizó visita técnica con el especialista hidráulico y el 11 de febrero de 2026 se efectuó la visita del	15-may.-26	10-jun.-26	$ 58.000.000,00
746	CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ	A	CO1.PCCNTR.8154784	Bosa	OBRA	0%		El Colegio Carlos Pizarro Leongómez, Sede A, presenta deficiencias en la red de desagues de las baterías sanitarias, debido a los años de uso,	13-may.-26	5-jun.-26	$ 14.000.000,00
625	BERNARDO JARAMILLO	A	CO1.PCCNTR.8154784	Tunjuelito	OBRA	0%		Se solicita realizar actividades que requieren atención inmediata, para atender lo dispuesto en por el Juzgado Séptimo Administrativo del	21-abr.-26	20-may.-26	$ 8.000.000,00
	ISABEL II	A	CO1.PCCNTR.8154784		OBRA	100%	FINALIZADO	pintura	23-ene.-26	28-feb.-26	$ 59.000.000,00
763	BICENTENARIO	A	CO1.PCCNTR.8154784		OBRA	0%		Se requiere barrera visual en Acceso a Baños de Primera Infancia .Requerimiento de Secretaria de Salud. Mediante Comunicado S-2025-101760 la			
708	LLANO ORIENTAL	A	CO1.PCCNTR.8154784		OBRA	60%	EN PROCESO	En atención a las condiciones evidenciadas y al concepto sanitario desfavorable emitido por la autoridad competente, se solicita adelantar	28-abr.-26	26-may.-26	$ 45.000.000,00
850	JOHN F. KENNEDY	A	CO1.PCCNTR.8154784	Kennedy	OBRA	0%	EN PROCESO	Se presenta una emergencia proveniente de las aguas lluvias ocasionada por la devolución y rebose de canales y bajantes ubicada en el área	18-jun.-26		

FECHA:	21/06/2026	**INFORME SEMANAL**
DIAS RESTANTES	**92**	
CORTE DEL INFORME:	***21/06/2026***	

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA

Alfonso Lopez Michelsen Cocina

0	0,00
Pintura	Pintura


Jairo Anibal Niño

	
Acabados	Acabados
	



0


Acabados puertas sanitarios



0,00

Remates de ventana

Eduardo Umaña Luna

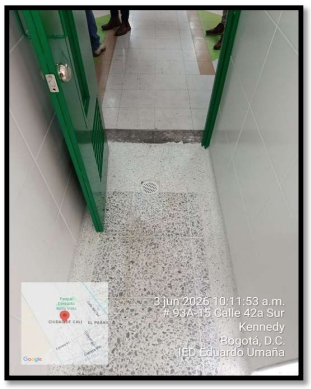

Acabado de pisos.



cambio de interuptor.



Instalacion de mesones lavamanos



Retiro de material sobrante.

Luis Lopez De Mesa



Manto para cubierta



Destape de sifon



Instalacion de Puertas



Acabados

Pablo de Tarso



Instalacion de cubierta



Instalacion de cubierta



Instalacion de cubierta



Instalacion de cubierta
