


Instalacion de Puertas



Acabados

Pablo de Tarso

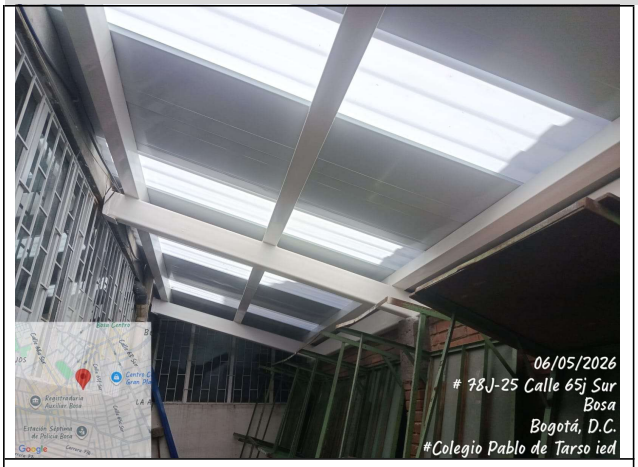

Instalacion de cubierta



Instalacion de cubierta



Instalacion de cubierta



Instalacion de cubierta

Alfonso Reyes Echandia



Cerramiento



Cerramiento



Cerramiento



Cerramiento

EL JAPÓN



Pendientado de placa de cubierta.



Pendientado de placa de cubierta.



Pendientado de placa de cubierta.



Pendientado de placa de cubierta.

EMERGENCIAS

LLANO ORIENTAL



Instalación de manto



Instlación de tuberia



Finalización




Finalización


CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ



Regatas para cambio de tuberia.

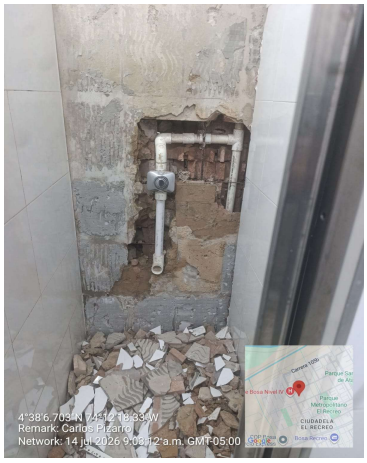

Regatas para cambio de tuberia.

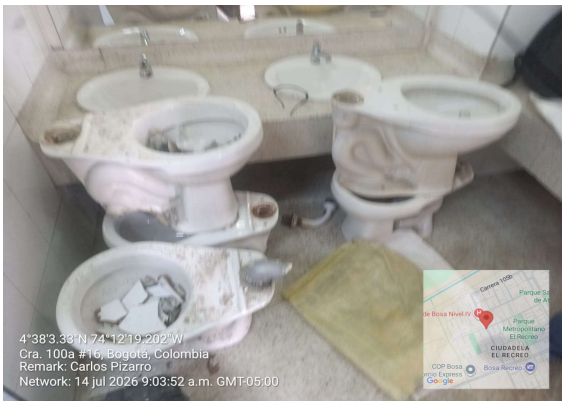

Retiro de sanitarios.



Regatas para cambio de tuberia.

FECHA: 19/07/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO		INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 64 Dias	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA		GRUPO 7
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		

CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO EDU 2025
19 de julio de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169111	CO1.PCCNTR.8154784	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796.278.928	$ 2.451.846.958
INICIO	14 de octubre de 2025	14 de octubre de 2025	SUSPENSIONES	16	16	ADICIÓN #1	$ 83.867.649,00	$ 523.987.595,00
TERMINACION INICIAL	13 de mayo de 2026	13 de mayo de 2026	PRÓRROGAS	1	1	ADICIÓN #2	$ 184.210.953,00	$ 552.624.455,00
MODIFICATORIO	29 de mayo de 2026	29 de mayo de 2026	ADICIÓN	123	115	TOTAL	$ 1.064.357.530,00	$ 3.528.459.008,00
TERMINACION FINAL	29 de septiembre de 2026	21 de septiembre de 2026	TOTAL	350	342			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	5/12/2025	$ 83.867.649,00	0	
2	29/05/2026	$ 184.210.953,00	123	
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	5/12/2025	$ 523.987.595,00	0	
2	29/05/2026	$ 552.624.455,00	115	
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
400-47	5 9 2025	5 10 2026	5 4 2026	5 4 2031	5 9 2025	5 4 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
895-47	14 10 2025	15 1 2027	14 10 2025	15 5 2027	14 10 2025	15 1 2027	895-74	5 4 2026	15 5 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (31082024)	PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	oct-2025	nov-2025	dic-2025	ene-2026	feb-2026	mar-2026	abr-2026	may-2026	jun-2026	jul-2026	ago-2026	sep-2026	oct-2026	nov-2026	dic-2026	ene-2027	feb-2027	mar-2027
751	PORTAL DEL SOL -	Bosa	A	Portal del Sol Alfonso Lopez	100,00%	100,00%	100,00%	✓	$ 231.449.333,02	$ 223.484.197,02	12/11/2025	9/04/2026																		
751	PORTAL DEL SOL -	Bosa	A	Portal del Sol Alfonso Lopez	20,64%	69,57%	70,00%	✗	$ 85.000.000,00	$ 19.305.324,74	11/01/2026	13/08/2026																		
742	EL PORVENIR	Bosa	B	El Recuerdo Santa Fe	100,00%	100,00%	100,00%	✓	$ 106.888.722,94	$ 96.932.302,94	19/11/2025	30/03/2026																		
764	VILLAS DEL PROGRESO	Bosa	B	Enrique Dussel	100,00%	100,00%	100,00%	✓	$ 147.911.865,07	$ 147.911.865,07	12/11/2025	9/04/2026																		
714	PABLO DE TARSO	Bosa	A	Pablo de Tarso	100,00%	100,00%	100,00%	✓	$ 194.585.294,37	$ 194.585.294,37	19/11/2025	19/03/2026																		
836	JAIRO ANIBAL NIÑO	Kennedy	A	Patio Bonito I	100,00%	100,00%	100,00%	✓	$ 210.214.277,79	$ 200.257.857,79	20/11/2025	19/03/2026																		
712	LUIS LOPEZ DE MESA	Bosa	A	Luis Lopez de Mesa	75,91%	74,15%	85,00%	✗	$ 311.343.210,60	$ 230.852.168,59	11/12/2025	9/04/2026																		
814	EDUARDO UMAÑA LUNA	Kennedy	A	Dindalito	100,00%	100,00%	100,00%	✓	$ 79.121.987,02	$ 79.121.987,02	19/11/2025	2/02/2026																		
833	DARIO ECHANDIA	Kennedy	B	Los Patios	100,00%	100,00%	100,00%	✓	$ 776.323.510,63	$ 776.323.510,63	12/11/2025	26/03/2026																		
748	LLANO ORIENTAL -	Bosa	A	San José de Maryland San Pedro -	100,00%	100,00%	100,00%	✗	$ 134.643.280,72	$ 134.643.280,72	14/10/2025	13/05/2026																		
815	EL JAPON	Kennedy	A	El Japón	55,60%	60,60%	62,03%	✗	$ 91.020.955,00	$ -	29/05/2026	5/08/2026																		
738	LA ESPERANZA	Bosa	A	La Esperanza (Cafam)	0,00%	0,00%	0,00%	✓	$ 80.011.684,00	$ -	29/05/2026	29/09/2026																		
614	INSTITUTO TECNICO	Tunjuelito	C	Fatima Colmotores	0,00%	0,00%	0,00%	✓	$ 381.591.816,00	$ -	29/05/2026	29/09/2026																		
	TOTAL FRENTES DE OBRA					77,25%	78,23%	✗	$ 2.829.105.937	$ 2.102.417.779	$ 699.353.070,84																			
	EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																													
747	LA LIBERTAD - ORLANDO	Bosa	A	Orlando Higuita - Holanda la Libertad	100%	100%	100,00%	✓	$ 79.057.143,46	$ 79.057.143,46	19/11/2025	15/01/2026																		
729	SAN BERNARDINO	Bosa	A	San Bernardino	100%	100%	100,00%	✓	$ 13.215.187,73	$ 13.215.187,73	24/11/2025	31/12/2025																		
838	ISABEL II	Kennedy	B	Pio XII	100%	100%	100,00%	✓	$ 2.125.746,98	$ 2.125.746,98	29/11/2025	19/12/2025																		
860	JOHN F. KENNEDY	Kennedy	A	John F. kennedy	100%	100%	100,00%	✓	$ 2.376.793,41	$ 2.376.793,41	29/11/2025	12/12/2025																		
817	MARSELLA	Kennedy	A	Bas-Med. Marsella.	100%	100%	100,00%	✓	$ 6.726.912,75	$ 6.726.912,75	29/11/2025	18/12/2025																		
890	NELSON MANDELA	Kennedy	A	Compartir Tintal	100%	100%	100,00%	✓	$ 7.140.430,63	$ 7.140.430,63	25/11/2025	10/01/2026																		
746	CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ	Bosa	A	El Recreo - Metrovivienda - Carlos Pizarro León Gómez	0%	30%	40,00%	✗	$ -	$ -	27/11/2025	16/01/2026																		
821	SAN JOSE	Kennedy	B	El Descanso	100%	100%	100,00%	✓	$ 778.715,34	$ 778.715,34																				
	LOS PERIODISTAS	Kennedy	A	LOS PERIODISTAS	100%	100%	100,00%	✓	$ 12.504.420	$ 12.504.420																				
868	LAS AMERICAS	Kennedy	A	Unidad Básica Las Americas	100%	100%	100,00%	✓	$ 22.339.254	$ 22.339.254																				
708	LLANO ORIENTAL	Bosa	A	Llano Oriental	86%	100%	100,00%	✓	$ 212.329.398	$ 212.329.398																				
625	BERNARDO JARAMILLO	Tunjuelito	A	Bernardo Jaramillo	100%	100%	100,00%	✓	$ 4.293.944,10	$ 4.293.944,10																				
615	"INEM SANTIAGO PEREZ"	Tunjuelito	A	INEM Santiago Perez	100%	100%	100,00%	✓	$ 15.000.000,00	$ -																				
804	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	Kennedy	B	Agoberto Mejia Cifuentes	0%	11%	11,00%	✓	$ 89.553.796	$ -																				
	TOTAL FRENTES DE OBRA					88,64%	89,36%	✗	$ 467.441.743	$ 362.887.947																				

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
7	2	0	9	$ 2.102.417.779
ACUMULADO EMERGENCIAS				
12	2	0	14	$ 362.887.947
TOTAL				
19	4	0	23	$ 2.465.305.726
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ -		11		22		33		$ -	


AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	77,25%	0,00%	81,29%
PROGRAMADO	78,23%		
ATRASO	-0,98%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			










OBSERVACIONES:

FECHA:	19/07/2026		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES	64	Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA					
REGISTRO FOTOGRAFICO			DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				GRUPO	7
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:		CO1.PCCNTR.8154784	CONTRATISTA:	CONSORCIO EDU 2025			
19/07/2026	CONTRATO DE INTERVENTORIA:		CO1.PCCNTR.8169111	INTERVENTOR:	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S			

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE		ESTADO ACTUAL O FINAL
24 ###						
Alfonso Lopez Michelsen	Mejoramiento de baterias sanitarias y salones de preescolar	FINALIZADO				
Alfonso Lopez Michelsen Cocina	Mejoramiento de cocina	Cocina: Instalacion de piso, cambio de tuberias				
El Porvenir	Mejoramiento de cubierta y baterias sanitarias	FINALIZADO				
Villas del Progreso	Mejoramiento de baterias y canchas sanitarias	FINALIZADO				
Pablo de Tarso	Desmonte e instalación de cubierta	Desmonte e instalación de cubierta				
Jairo Anibal Niño	Mejoramiento de baterias sanitarias y pisos preescolar	Reparación de piso en vinilo de 4mm				
Luis Lopez de Mesa	Mejoramiento de baterias sanitarias	BAÑO: Instalacion de manto de aluminio sobre cubierta y enchape				

Eduardo Umaña	Mejoramiento de baterias sanitarias y cerramiento	FINALIZADO				
Dario Echandia	Desmonte e instalación de cubierta	FINALIZADO				
ALFONSO REYES ECHANDIA	CERRAMIENTO	FINALIZADO				
EL JAPÓN	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA	Pendientado de cubierta				
EMERGENCIA LLANO ORIENTAL	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA	FINALIZADO				
EMERGENCIA CARLOS PIZARRO	CAMBIO DE TUBERIA BATERIAS SANITARIAS	Retiro de sanitarios y regatas en muros para cambio de tuberia				

BALANCE SEMANAL POR CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS

		CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2026
GRUPOS	ITEM	CPF	751	IED	Alfonso Lopez Michelsen		SEMANA				
	Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	30,69	30,69		$ 4.435,00	$ 136.110,15	$ -	100,00%	100,00%	
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	3,79	3,79		$ 29.041,00	$ 110.065,39	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	34,22	34,22		$ 30.062,00	$ 1.028.721,64	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	450,57	450,57		$ 30.427,00	$ 13.709.493,39	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	112,29	112,29		$ 10.621,00	$ 1.192.632,09	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	75,85	75,85		$ 28.816,00	$ 2.185.693,60	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	147,26	147,26		$ 11.808,00	$ 1.738.846,08	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	11,00	11,00		$ 19.333,00	$ 212.663,00	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	13,34	13,34		$ 30.969,00	$ 413.126,46	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	18,00	18,00		$ 25.468,00	$ 458.424,00	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	6,00	6,00		$ 6.973,00	$ 41.838,00	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	34,74	34,74		$ 21.107,00	$ 733.257,18	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	5,60	5,60		$ 8.364,00	$ 46.838,40	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	18,00	18,00		$ 13.694,00	$ 246.492,00	$ -	100,00%	100,00%	
	1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	84,44	84,44		$ 20.392,00	$ 1.721.900,48	$ -	100,00%	100,00%	
	4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	27,38	27,38		$ 13.992,00	$ 383.100,96	$ -	100,00%	100,00%	
	4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	13,00	13,00		$ 59.308,00	$ 771.004,00	$ -	100,00%	100,00%	
	4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	11,00	11,00		$ 59.308,00	$ 652.388,00	$ -	100,00%	100,00%	
	4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VALVULA DE BOLA 1-1/2"	UN	2,00	2,00		$ 201.918,00	$ 403.836,00	$ -	100,00%	100,00%	
	4.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VALVULA DE BOLA 1"	UN	2,00	2,00		$ 121.077,00	$ 242.154,00	$ -	100,00%	100,00%	
	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00	2,00		$ 118.468,00	$ 236.936,00	$ -	100,00%	100,00%	
1	5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	6,00	6,00		$ 185.402,00	$ 1.112.412,00	$ -	100,00%	100,00%	
	7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	450,57	450,57		$ 39.814,00	$ 17.938.993,98	$ -	100,00%	100,00%	
	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	34,22	34,22		$ 42.278,00	$ 1.446.753,16	$ -	100,00%	100,00%	
	7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	34,22	34,22		$ 196.537,00	$ 6.725.496,14	$ -	100,00%	100,00%	
	7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	6,78	6,78		$ 70.333,00	$ 476.857,74	$ -	100,00%	100,00%	
	7.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	450,57	450,57		$ 241.798,00	$ 108.946.924,86	$ -	100,00%	100,00%	
	7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	72,18	72,18		$ 14.351,00	$ 1.035.855,18	$ -	100,00%	100,00%	
	7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	63,34	63,34		$ 76.716,00	$ 4.859.191,44	$ -	100,00%	100,00%	
	8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	146,36	146,36		$ 108.436,00	$ 15.870.692,96	$ -	100,00%	100,00%	
	9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	4,60	4,60		$ 853.515,00	$ 3.926.169,00	$ -	100,00%	100,00%	
	9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	5,96	5,96		$ 1.181.573,00	$ 7.042.175,08	$ -	100,00%	100,00%	
	10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	4,00	4,00		$ 721.071,00	$ 2.884.284,00	$ -	100,00%	100,00%	
	10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	11,00	11,00		$ 377.707,97	$ 4.154.787,65	$ -	100,00%	100,00%	
	10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2,00	2,00		$ 38.396,00	$ 76.792,00	$ -	100,00%	100,00%	
	11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	7,49	7,49		$ 923.559,00	$ 6.917.456,91	$ -	100,00%	100,00%	
	11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1,35	1,35		$ 1.036.356,00	$ 1.399.080,60	$ -	100,00%	100,00%	
	12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	155,15	155,15		$ 38.464,00	$ 5.967.689,60	$ -	100,00%	100,00%	
	12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	66,94	66,94		$ 29.897,00	$ 2.001.305,18	$ -	100,00%	100,00%	
	12.2.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS HASTA 0,60 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	59,26	59,26		$ 18.044,00	$ 1.069.287,44	$ -	100,00%	100,00%	
	14.1.1	SUMINISTRO E INSTLACIÓN D ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E = 4 MM	M2	6,75	6,75		$ 129.118,00	$ 871.546,50	$ -	100,00%	100,00%	
	18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	481,26	481,26		$ 4.353,00	$ 2.094.924,78	$ -	100,00%	100,00%	
	NP-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DOBLE DESCARGA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA CAPACIDAD MÍNIMA DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS.	UN	8,00	0,00		$ 995.642,00	$ -	$ 7.965.136,00	100,00%	0,00%	

GRUPOS	ITEM	CPF	751	IED	Alfonso Lopez Michelsen Cocina		SEMANA				
	Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,93	3,93	0,00	$ 30.062,00	$ 118.143,66	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,93	3,93	0,00	$ 30.427,00	$ 119.578,11	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	2,00	0,00	$ 25.468,00	$ 50.936,00	$ -	100,00%	100,00%	
	1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	13,09	13,09	0,00	$ 21.107,00	$ 276.290,63	$ -	100,00%	100,00%	
	4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	7,35	7,35	0,00	$ 85.501,00	$ 628.432,35	$ -	100,00%	100,00%	
	4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	2,00	0,00	$ 71.025,00	$ 142.050,00	$ -	100,00%	100,00%	
	4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	43,00	43,00	0,00	$ 5.830,00	$ 250.690,00	$ -	100,00%	100,00%	
	5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	5,00	0,00	0,00	$ 534.577,31	$ -	$ 2.672.886,55	0,00%	0,00%	
	5.1.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	127,73	0,00	0,00	$ 53.182,00	$ -	$ 6.792.869,27	0,00%	0,00%	
	5.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3N°8 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG THHN	M	150,20	0,00	0,00	$ 83.551,00	$ -	$ 12.549.360,20	0,00%	0,00%	
	5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	30,00	0,00	0,00	$ 185.401,53	$ -	$ 5.562.045,79	0,00%	0,00%	

	5.1.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X125 A. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	2,00	0,00	0,00	$ 819.132,39	$ -	$ 1.638.264,79	0,00%	0,00%	
1	**7.1.2**	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	13,09	13,09	0,00	$ 42.278,00	$ 553.419,02	$ -	100,00%	100,00%	
	7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	12,60	12,60	0,00	$ 196.537,00	$ 2.476.366,20	$ -	100,00%	100,00%	
	7.2.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	M	90,50	90,50	0,00	$ 19.491,00	$ 1.763.935,50	$ -	100,00%	100,00%	
	7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	22,42	22,42	0,00	$ 76.716,00	$ 1.719.972,72	$ -	100,00%	100,00%	

7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	131,65	131,65	0,00	$ 67.714,00	$ 8.914.548,10	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERÍA TIPO PUSH Y SELLANTE)	UN	2,00	2,00	0,00	$ 764.931,00	$ 1.529.862,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	6,00	6,00	0,00	$ 31.338,00	$ 188.028,00	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA EYECTORA BARNES IC0027 VOLTAJE 220 TRIFASICA (390 GPM DESCARGA 3" 3HP)	UN	3,00	0,00	0,00	$ 6.591.038,86	$ -	$ 19.773.116,58	0,00%	0,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	131,65	131,65	0,00	$ 4.353,00	$ 573.072,45	$ -	100,00%	100,00%	
19.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMATICO CON 2 BOMBAS DE 2HP 110/220 TANQUE HIDRONEUMATICO POR MEMBRANA DE 200LTS, MARCA PEARL, TABLERO DE CONTROL CON NORMA RETIE (INCLUYE 2 BOMBAS ALTA PRESIÓN CAUDAL 2.33LP/S H.MAQ 50MT 1 TANQUE HIDROACUMULADOR MEMBRANA 200LTS VERTICAL CON MANOMETRO ACCESORIOS DE INTERCONEXIÓN ENTRE BOMBAS Y TANQUE EN HIERRO GALVANIZADO (HG), 1 FLAUTA DE DESCARGA EN 3" INCLUYE COPA DE DESCARGA 3 A 2, 2 REGISTROS EN BRONCE TIPO COMPUERTA, 2 VÁLVULAS CHEQUE HIDRONEUMATICO EN BRONCE, 1 TABLERO DE CONTROL EN COFRE METÁLICO CON NORMA RETIE 2- PRESOSTATOS RANGO 40/60, 1 SENSOR DE NIVEL (FLOTADOR), 1 MANOMETRO EN GLICERINA CON CARATULA DE 2" (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	UN	1,00	0,00	0,00	$ 18.464.640,51	$ -	$ 18.464.640,51	0,00%	0,00%	
NP-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DOBLE DESCARGA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA CAPACIDAD MÍNIMA DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS.	UN	2,00	0,00	2,00	$ 995.642,00	$ -	$ 1.991.284,00	100,00%	0,00%	

ITEM	**CPF**	**742**	**IED**	**El Porvenir**			**SEMANA**				
Ítem	**Actividad**	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	44,37	44,37		$ 4.435,00	$ 196.780,95	$ -	100,00%	100,00%	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	7,75	7,75		$ 29.041,00	$ 225.067,75	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M A 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	58,31	58,31		$ 30.427,00	$ 1.774.198,37	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,97	2,97		$ 20.818,00	$ 61.829,46	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	106,34	106,34		$ 10.621,00	$ 1.129.437,14	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	63,15	63,15		$ 28.816,00	$ 1.819.730,40	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	146,36	146,36		$ 11.808,00	$ 1.728.218,88	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	10,00	10,00		$ 19.333,00	$ 193.330,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12,78	12,78		$ 30.969,00	$ 395.783,82	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	24,00	24,00		$ 25.468,00	$ 611.232,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	4,00	4,00		$ 6.973,00	$ 27.892,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	24,00	24,00		$ 13.694,00	$ 328.656,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	97,49	97,49		$ 20.392,00	$ 1.988.016,08	$ -	100,00%	100,00%	
2.3.7	PERFORACIÓN NÚCLEO 3" E= 0.10 M	UN	2,00	2,00		$ 162.041,00	$ 324.082,00	$ -	100,00%	100,00%	
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	M2	2,44	2,44		$ 68.499,00	$ 167.137,56	$ -	100,00%	100,00%	
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	5,50	5,50		$ 73.492,00	$ 404.206,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	100,00	100,00		$ 5.830,00	$ 583.000,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00	2,00		$ 118.468,00	$ 236.936,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4,00	4,00		$ 211.513,00	$ 846.052,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	4,00	4,00		$ 185.402,00	$ 741.608,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.5	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	57,35	57,35		$ 65.046,00	$ 3.730.388,10	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	30,30	30,30		$ 26.317,00	$ 797.405,10	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	52,48	52,48		$ 14.351,00	$ 753.140,48	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	72,85	72,85		$ 76.716,00	$ 5.588.760,60	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	44,37	44,37		$ 67.714,00	$ 3.004.470,18	$ -	100,00%	100,00%	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	146,36	146,36		$ 108.436,00	$ 15.870.692,96	$ -	100,00%	100,00%	
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	4,52	4,52		$ 853.515,00	$ 3.857.887,80	$ -	100,00%	100,00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	5,06	5,06		$ 1.181.573,00	$ 5.978.759,38	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	4,00	4,00		$ 721.071,00	$ 2.884.284,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	10,00	10,00		$ 377.708,00	$ 3.777.080,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	5,00	5,00		$ 38.396,00	$ 191.980,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE	UN	2,00	2,00		$ 775.468,00	$ 1.550.936,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD FIJA 16"	UN	2,00	2,00		$ 209.657,00	$ 419.314,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	18,00	18,00		$ 948.375,00	$ 17.070.750,00	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	9,86	9,86		$ 923.559,00	$ 9.106.291,74	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	2,70	2,70		$ 1.036.356,00	$ 2.798.161,20	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	146,36	146,36		$ 38.464,00	$ 5.629.591,04	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	67,74	67,74		$ 29.897,00	$ 2.025.222,78	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.10	SUMINISTROYAPLICACIÓNSOBRESUPERFICIESYMUROSDEPINTURAEPOXICABASEAGUA ASMANOSENCARTERAS,CLARAS,VIGASHASTA0.60M(INCLUYEANDAMIOSC ERTIFICADOSYHERRAMIENTAEIMPLEMENTOSNECESARIOSPARAAPLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	3,90	3,90		$ 18.044,00	$ 70.371,60	$ -	100,00%	100,00%	
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	4,96	4,96		$ 129.118,00	$ 640.425,28	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.4	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	79,75	79,75		$ 86.679,00	$ 6.912.650,25	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	102,68	102,68		$ 4.353,00	$ 446.966,04	$ -	100,00%	100,00%	
NP-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DOBLE DESCARGA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA CAPACIDAD MÍNIMA DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS.	UND	10,00	0,00	10,00	$ 995.642,00	$ -	$ 9.956.420,00	100,00%	0,00%	

ITEM	**CPF**	**764**	**IED**	**Villas del Progreso**			**SEMANA**				
Ítem	**Actividad**	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**

2

1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	415,41	415,41		$ 4.435,00	$ 1.842.343,35	$ -	100,00%	100,00%	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M	43,82	43,82		$ 29.041,00	$ 1.272.576,62	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	13,81	13,81		$ 30.427,00	$ 420.196,87	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	63,53	63,53		$ 10.621,00	$ 674.752,13	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	27,20	27,20		$ 28.816,00	$ 783.795,20	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	82,19	82,19		$ 11.808,00	$ 970.499,52	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	8,00	8,00		$ 19.333,00	$ 154.664,00	$ -	100,00%	100,00%	

1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7,69	7,69		$ 30.969,00	$ 238.151,61	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	5,00	5,00		$ 25.468,00	$ 127.340,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	20,00	20,00		$ 19.333,00	$ 386.660,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	2,00	2,00		$ 6.973,00	$ 13.946,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	8,00	8,00		$ 13.694,00	$ 109.552,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.44	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	13,80	13,80		$ 97.993,00	$ 1.352.303,40	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	29,10	29,10		$ 20.392,00	$ 593.407,20	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	84,00	84,00		$ 17.445,00	$ 1.465.380,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	21,00	21,00		$ 36.375,00	$ 763.875,00	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	44,69	44,69		$ 96.359,00	$ 4.306.283,71	$ -	100,00%	100,00%	
2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	41,20	41,20		$ 22.734,00	$ 936.640,80	$ -	100,00%	100,00%	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	837,41	837,41		$ 7.441,00	$ 6.231.167,81	$ -	100,00%	100,00%	
3.2.1	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE (2 HILERAS)	M	3,20	3,20		$ 40.901,00	$ 130.883,20	$ -	100,00%	100,00%	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	56,00	56,00		$ 85.501,00	$ 4.788.056,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	3,50	3,50		$ 47.727,00	$ 167.044,50	$ -	100,00%	100,00%	
4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	6,00	6,00		$ 121.103,00	$ 726.618,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	49,52	49,52		$ 13.992,00	$ 692.883,84	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	7,00	7,00		$ 59.308,00	$ 415.156,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	8,00	8,00		$ 59.308,00	$ 474.464,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN	6,00	6,00		$ 169.749,00	$ 1.018.494,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	2,00	2,00		$ 90.825,00	$ 181.650,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	4,00	4,00		$ 64.414,00	$ 257.656,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	3,00	3,00		$ 71.025,00	$ 213.075,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.7.8	RENIVELACIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	1,00	1,00		$ 78.662,00	$ 78.662,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	70,00	70,00		$ 5.830,00	$ 408.100,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.9.13	SUSPENSION DE SALIDA SANITARIA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	8,00	8,00		$ 30.698,00	$ 245.584,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	1,00		$ 118.468,00	$ 118.468,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	2,00	2,00		$ 185.402,00	$ 370.804,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	13,81	13,81		$ 42.278,00	$ 583.859,18	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.8	PISO EN CONCRETO A LA VISTA ENDURECIDO Y AFINADO CON HELICÓPTERO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, FORMALETAS, ACABADO CON ALLANADORA, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) E= 10 CM	M2	401,60	401,60		$ 143.273,00	$ 57.538.436,80	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.9	JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M	365,00	365,00		$ 36.002,00	$ 13.140.730,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	13,81	13,81		$ 196.537,00	$ 2.714.175,97	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	4,92	4,92		$ 70.333,00	$ 346.038,36	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	30,20	30,20		$ 14.351,00	$ 433.400,20	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	387,00	387,00		$ 19.238,00	$ 7.445.106,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	32,67	32,67		$ 76.716,00	$ 2.506.311,72	$ -	100,00%	100,00%	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	80,50	80,50		$ 108.436,00	$ 8.729.098,00	$ -	100,00%	100,00%	
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	6,26	6,26		$ 853.515,00	$ 5.343.003,90	$ -	100,00%	100,00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	1,28	1,28		$ 1.181.573,00	$ 1.512.413,44	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2,00	2,00		$ 721.071,00	$ 1.442.142,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	6,00	6,00		$ 377.708,00	$ 2.266.248,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	3,00	3,00		$ 38.396,00	$ 115.188,00	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	4,77	4,77		$ 923.559,00	$ 4.405.376,43	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	0,45	0,45		$ 1.036.356,00	$ 466.360,20	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	82,42	82,42		$ 38.464,00	$ 3.170.202,88	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	14,24	14,24		$ 29.897,00	$ 425.733,28	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS HASTA 0,60 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	13,38	13,38		$ 18.044,00	$ 241.428,72	$ -	100,00%	100,00%	
12.3.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	1,80	1,80		$ 23.132,00	$ 41.637,60	$ -	100,00%	100,00%	
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	2,32	2,32		$ 129.118,00	$ 299.553,76	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	416,79	416,79		$ 4.353,00	$ 1.814.286,87	$ -	100,00%	100,00%	

ÍTEM	**CPF**	**714**	**IED**	**Pablo de Tarso**			**SEMANA**				
Ítem	**Actividad**	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	151,50	151,50		$ 4.435,00	$ 671.902,50	$ -	100,00%	100,00%	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	15,30	15,30		$ 29.041,00	$ 444.327,30	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	37,88	37,88		$ 28.055,00	$ 1.062.723,40	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	156,26	156,26		$ 34.308,00	$ 5.360.968,08	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	4,00	4,00		$ 6.973,00	$ 27.892,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	6,80	6,80		$ 8.364,00	$ 56.875,20	$ -	100,00%	100,00%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	8,37	8,37		$ 6.773,00	$ 56.690,01	$ -	100,00%	100,00%	
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	4.739,67	4.739,67		$ 24.136,00	$ 114.396.675,12	$ -	100,00%	100,00%	
3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	CM	680,00	680,00		$ 9.731,00	$ 6.617.080,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	6,80	6,80		$ 13.992,00	$ 95.145,60	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	4,00	4,00		$ 185.402,00	$ 741.608,00	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	108,54	108,54		$ 29.762,00	$ 3.230.367,48	$ -	100,00%	100,00%	
13.1.4	CIELO PLANO EN DRYWALL 6 MM UNA CARA, PARA TAPONAMIENTO DE LUCES EN ÁREA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA - (ALTURA HASTA 60 CM)	M	37,88	37,88		$ 84.841,00	$ 3.213.777,08	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	81,70	81,70		$ 111.317,00	$ 9.094.598,90	$ -	100,00%	100,00%	
16,1,3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1,50	1,50		$ 66.527,00	$ 99.790,50	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm, PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	150,66	150,66		$ 247.167,00	$ 37.238.180,22	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 67,5 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, AL IGUAL QUE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	M	32,00	32,00		$ 202.701,00	$ 6.486.432,00	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	150,66	150,66		$ 4.353,00	$ 655.822,98	$ -	100,00%	100,00%	

18.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS Y/O CONTAMINANTES (PINTURA CON PLOMO, CONCRETO CONTAMINADO CON ACEITE, ENTRE OTRAS) INCLUYE CERTIFICACION, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL A GESTOR AUTORIZADO	KG	2.334,00	2.334,00		$ 2.157,00	$ 5.034.438,00	$ -	100,00%	100,00%	
ITEM	**CPF**	**836**	**IED**	**Jairo Anibal Niño**			**SEMANA**				
Ítem	**Actividad**	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	207,43	207,43		$ 30.427,00	$ 6.311.472,61	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6,84	6,84		$ 20.818,00	$ 142.395,12	$ -	100,00%	100,00%	

1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	159,09	159,09		$ 10.621,00	$ 1.689.694,89	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	120,31	120,31		$ 28.816,00	$ 3.466.852,96	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	267,44	267,44		$ 11.808,00	$ 3.157.931,52	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	24,00	24,00		$ 19.333,00	$ 463.992,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	25,19	25,19		$ 30.969,00	$ 780.109,11	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,04	3,04		$ 27.437,00	$ 83.408,48	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	40,00	40,00		$ 25.468,00	$ 1.018.720,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	12,25	12,25		$ 8.364,00	$ 102.459,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	34,00	34,00		$ 13.694,00	$ 465.596,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	121,96	121,96		$ 20.392,00	$ 2.487.008,32	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	10,00	10,00		$ 19.767,00	$ 197.670,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	4,25	4,25		$ 13.992,00	$ 59.466,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	13,00	13,00		$ 59.308,00	$ 771.004,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	5,00	5,00		$ 64.414,00	$ 322.070,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5,00	5,00		$ 118.468,00	$ 592.340,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	207,43	207,43		$ 39.814,00	$ 8.258.618,02	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	0,81	0,81		$ 196.537,00	$ 159.194,97	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	207,43	207,43		$ 241.798,00	$ 50.156.159,14	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	116,58	116,58		$ 14.351,00	$ 1.673.039,58	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	121,96	121,96		$ 76.716,00	$ 9.356.283,36	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	53,44	53,44		$ 67.714,00	$ 3.618.636,16	$ -	100,00%	100,00%	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	247,98	247,98		$ 108.436,00	$ 26.889.959,28	$ -	100,00%	100,00%	
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	9,02	9,02		$ 853.515,00	$ 7.698.705,30	$ -	100,00%	100,00%	
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJÍA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	3,04	3,04		$ 448.683,00	$ 1.363.996,32	$ -	100,00%	100,00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	6,18	6,18		$ 1.181.573,00	$ 7.302.121,14	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	6,00	6,00		$ 815.395,00	$ 4.892.370,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	6,00	6,00		$ 575.810,00	$ 3.454.860,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3,00	3,00		$ 721.071,00	$ 2.163.213,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	16,00	16,00		$ 377.708,00	$ 6.043.328,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	10,00	10,00		$ 38.396,00	$ 383.960,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8	MES	14,00	14,00		$ 948.375,00	$ 13.277.250,00	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	14,98	14,98		$ 923.559,00	$ 13.834.913,82	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1,35	1,35		$ 1.036.356,00	$ 1.399.080,60	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	257,57	257,57		$ 38.464,00	$ 9.907.172,48	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	21,84	21,84		$ 11.693,00	$ 255.375,12	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	73,04	73,04		$ 29.897,00	$ 2.183.676,88	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS	M	53,36	53,36		$ 26.898,00	$ 1.435.277,28	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS HASTA 0.60 M (INCLUYE	M	15,91	15,91		$ 18.044,00	$ 287.080,04	$ -	100,00%	100,00%	
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	7,62	7,62		$ 129.118,00	$ 983.879,16	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	268,21	268,21		$ 4.353,00	$ 1.167.518,13	$ -	100,00%	100,00%	
NP-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DOBLE DESCARGA, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA CAPACIDAD MÍNIMA DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS	UND	10,00	0,00	10,00	$ 995.642,00	$ -	$ 9.956.420,00	100,00%	0,00%	

ITEM	CPF	712	IED		Luis Lopez de Mesa		SEMANA				
Ítem	**Actividad**	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance fisico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	19,40	19,40		$ 4.435,00	$ 86.039,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M	7,80	7,80		$ 29.041,00	$ 226.519,80	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	712,23	712,23		$ 30.062,00	$ 21.411.058,26	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	56,41	56,41		$ 10.621,00	$ 599.130,61	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	32,84	32,84		$ 28.816,00	$ 946.317,44	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	71,57	71,57		$ 11.808,00	$ 845.098,56	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	6,00	6,00		$ 19.333,00	$ 115.998,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	12,00	12,00		$ 25.468,00	$ 305.616,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	4,00	4,00		$ 6.973,00	$ 27.892,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	708,29	708,29		$ 16.844,00	$ 11.930.436,76	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	14,80	14,80		$ 8.364,00	$ 123.787,20	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	8,00	8,00		$ 13.694,00	$ 109.552,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	78,56	78,56		$ 20.392,00	$ 1.601.995,52	$ -	100,00%	100,00%	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	1,50	1,50		$ 47.727,00	$ 71.590,50	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	18,66	18,66		$ 13.992,00	$ 261.090,72	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	8,00	8,00		$ 59.308,00	$ 474.464,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	5,00	5,00		$ 59.308,00	$ 296.540,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	2,00	2,00		$ 90.825,00	$ 181.650,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1"	UN	2,00	2,00		$ 121.077,00	$ 242.154,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.9.11	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	6,00	6,00		$ 170.346,00	$ 1.022.076,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	100,00	100,00		$ 5.830,00	$ 583.000,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	1,00		$ 118.468,00	$ 118.468,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	3,00	3,00		$ 185.402,00	$ 556.206,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.5	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	712,73	712,73		$ 65.046,00	$ 46.360.235,58	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	310,39	310,39		$ 26.317,00	$ 8.168.533,63	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	0,95	0,95		$ 70.333,00	$ 66.816,35	$ -	100,00%	100,00%	

7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	50,09	50,09		$ 14.351,00	$ 718.841,59	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	46,90	46,90		$ 76.716,00	$ 3.597.980,40	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	19,40	19,40		$ 67.714,00	$ 1.313.651,60	$ -	100,00%	100,00%	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	68,70	68,70		$ 108.436,00	$ 7.449.553,20	$ -	100,00%	100,00%	
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	2,32	2,32		$ 853.515,00	$ 1.980.154,80	$ -	100,00%	100,00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	1,46	1,46		$ 1.181.573,00	$ 1.725.096,58	$ -	100,00%	100,00%	

10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	6,00	6,00		$ 815.395,00	$ 4.892.370,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2,00	2,00		$ 575.810,00	$ 1.151.620,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5,00	5,00		$ 377.708,00	$ 1.888.540,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	1,00	1,00		$ 38.396,00	$ 38.396,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	2,00	2,00		$ 31.338,00	$ 62.676,00	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	3,36	3,36		$ 923.559,00	$ 3.103.158,24	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1,44	1,44		$ 1.036.356,00	$ 1.492.352,64	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	79,73	79,73		$ 384.644,00	$ 30.667.666,12	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	32,35	32,35		$ 29.897,00	$ 967.167,95	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	16,21	16,21		$ 26.898,00	$ 436.016,58	$ -	100,00%	100,00%	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	2,10	2,10		$ 185.165,00	$ 388.846,50	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.4	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	708,29	708,29		$ 86.679,00	$ 61.393.868,91	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	737,35	737,35		$ 4.353,00	$ 3.209.684,55	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS Y/O CONTAMINANTES (PINTURA CON PLOMO, CONCRETO CONTAMINADO CON ACEITE, ENTRE OTRAS) INCLUYE CERTIFICACION, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL A GESTOR AUTORIZADO	KG	3.543,00	3543,00		$ 2.157,00	$ 7.642.251,00	$ -	100,00%	100,00%	
19.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR DE PASAJEROS MEDIA CABINA USO PARA PERSONAS CON DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD Y PASAJEROS, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 500 KG CARGA VIVA Y TOTAL CON CABINA 890 KG APROX, 2 PARADAS, FOSO CON MEDIDAS 1.60M DE ANCHO X 1.60M DE FONDO APROX.; POSO CON MEDIDAS 1.60M DE ANCHO X 1.60M DE FONDO X 1.00M DE ALTURA APROX., MEDIDAS DE CABINA: 1.50 M DE ANCHO X 1.20M DE FONDO X 1.60M DE ALTURA, PARA EL COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA	UN	1,00	0,00		$ 76.917.022,98	$ -	$ 76.917.022,98	0,00%	0,00%	

ITEM	CPF	814	IED	Eduardo Umaña Luna			SEMANA				
Ítem	**Actividad**	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	21,76	21,76		$ 4.435,00	$ 96.505,60	$ -	100,00%	100,00%	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	6,40	6,40		$ 29.041,00	$ 185.862,40	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	9,06	9,06		$ 30.062,00	$ 272.361,72	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,67	2,67		$ 20.818,00	$ 55.584,06	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	66,60	66,60		$ 10.621,00	$ 707.358,60	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	23,22	23,22		$ 28.816,00	$ 669.107,52	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	79,18	79,18		$ 11.808,00	$ 934.957,44	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	6,00	6,00		$ 19.333,00	$ 115.998,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6,80	6,80		$ 30.969,00	$ 210.589,20	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	11,00	11,00		$ 25.468,00	$ 280.148,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	3,00	3,00		$ 6.973,00	$ 20.919,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	9,06	9,06		$ 21.107,00	$ 191.229,42	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	10,50	10,50		$ 8.364,00	$ 87.822,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	5,00	5,00		$ 13.694,00	$ 68.470,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.3.1	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)	M2	549,44	549,44		$ 50.276,00	$ 27.623.645,44	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	46,09	46,09		$ 20.392,00	$ 939.867,28	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	7,00	7,00		$ 36.375,00	$ 254.625,00	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	0,80	0,80		$ 101.699,00	$ 81.359,20	$ -	100,00%	100,00%	
3.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	3,74	3,74		$ 70.414,00	$ 263.348,36	$ -	100,00%	100,00%	
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	0,78	0,78		$ 136.418,00	$ 106.406,04	$ -	100,00%	100,00%	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	2,00	2,00		$ 47.727,00	$ 95.454,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	19,05	19,05		$ 13.992,00	$ 266.547,60	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	7,00	7,00		$ 59.308,00	$ 415.156,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	5,00	5,00		$ 59.308,00	$ 296.540,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN	4,00	4,00		$ 90.825,00	$ 363.300,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.9.11	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	3,00	3,00		$ 170.346,00	$ 511.038,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	44,00	44,00		$ 5.830,00	$ 256.520,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	1,00		$ 118.468,00	$ 118.468,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	1,00		$ 211.513,00	$ 211.513,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	3,00	3,00		$ 185.402,00	$ 556.206,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	9,06	9,06		$ 42.278,00	$ 383.038,68	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	9,06	9,06		$ 196.537,00	$ 1.780.625,22	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	1,60	1,60		$ 70.333,00	$ 112.532,80	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	30,10	30,10		$ 14.351,00	$ 431.965,10	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M	37,48	37,48		$ 76.716,00	$ 2.875.315,68	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2	24,16	24,16		$ 67.714,00	$ 1.635.970,24	$ -	100,00%	100,00%	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	83,22	83,22		$ 108.436,00	$ 9.024.043,92	$ -	100,00%	100,00%	
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y INCLUYE DESENGRASADO, TERMINADO, COLA ANTICORROSIVO, PINTURA ALQUIDALICA	M2	3,87	3,87		$ 853.515,00	$ 3.303.103,05	$ -	100,00%	100,00%	
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	1,61	1,61		$ 1.181.573,00	$ 1.902.332,53	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5,00	5,00		$ 377.708,00	$ 1.888.540,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	5,00	5,00		$ 815.395,00	$ 4.076.975,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2,00	2,00		$ 575.810,00	$ 1.151.620,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2,00	2,00		$ 38.396,00	$ 76.792,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	2,00	2,00		$ 31.338,00	$ 62.676,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	1,00	1,00		$ 948.375,00	$ 948.375,00	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	6,44	6,44		$ 923.559,00	$ 5.947.719,96	$ -	100,00%	100,00%	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	0,32	0,32		$ 1.036.356,00	$ 331.633,92	$ -	100,00%		
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	89,75	89,75		$ 38.464,00	$ 3.452.144,00	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	38,56	38,56		$ 29.897,00	$ 1.152.828,32	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS HASTA 0,60 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	4,35	4,35		$ 18.044,00	$ 78.491,40	$ -	100,00%	100,00%	
12.3.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	12,00	12,00		$ 29.063,00	$ 348.756,00	$ -	100,00%	100,00%	

14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	2,28	2,28		$ 129.118,00	$ 294.389,04	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	368,76	368,76		$ 4.353,00	$ 1.605.212,28	$ -	100,00%	100,00%	

ITEM	CPF	833	IED	Dario Echandia			SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	123,63	123,63		$ 3.404,00	$ 420.836,52	$ -	100,00%	100,00%	
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	15,00	15,00		$ 2.408,00	$ 36.120,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12,80	12,80		$ 20.818,00	$ 266.470,40	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	1,00	1,00		$ 19.333,00	$ 19.333,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	228,44	228,44		$ 28.055,00	$ 6.408.884,20	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	M2	686,66	686,66		$ 34.308,00	$ 23.557.931,28	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELECTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	57,00	57,00		$ 11.172,00	$ 636.804,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	57,00	57,00		$ 6.973,00	$ 397.461,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	262,17	262,17		$ 4.099,00	$ 1.074.634,83	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	6,25	6,25		$ 8.364,00	$ 52.275,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.3.3	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METÁLICAS EN LÁMINA COLDROLLED A= 0.90 a 1.0 M X H= 2.10 M (INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN)	UN	11,00	11,00		$ 177.968,00	$ 1.957.648,00	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	26,00	26,00		$ 36.375,00	$ 945.750,00	$ -	100,00%	100,00%	
2.2.16	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO).	M3	0,85	0,85		$ 1.307.170,00	$ 1.111.094,50	$ -	100,00%	100,00%	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	80,60	80,60		$ 6.773,00	$ 545.903,80	$ -	100,00%	100,00%	
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	16806,93	16806,93		$ 24.136,00	$ 405.652.062,48	$ -	100,00%	100,00%	
3.1.13	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	M2	670,91	670,91		$ 12.825,00	$ 8.604.420,75	$ -	100,00%	100,00%	
3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	CM	108,00	108,00		$ 9.731,00	$ 1.050.948,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	6,25	6,25		$ 27.620,00	$ 172.625,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	15,00	15,00		$ 118.468,00	$ 1.777.020,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00	2,00		$ 163.657,00	$ 327.314,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	27,00	27,00		$ 197.625,00	$ 5.335.875,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	62,00	62,00		$ 188.900,00	$ 11.711.800,00	$ -	100,00%	100,00%	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	49,00	49,00		$ 185.402,00	$ 9.084.698,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	1,00	1,00		$ 721.071,00	$ 721.071,00	$ -	100,00%	100,00%	
10.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	MES	2,00	2,00		$ 948.375,00	$ 1.896.750,00	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	1.523,30	1.523,30		$ 18.026,00	$ 27.459.005,80	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	958,44	958,44		$ 29.762,00	$ 28.525.091,28	$ -	100,00%	100,00%	
13.1.4	CIELO RASO PLANO EN DRYWALL 6 MM UNA CARA, PARA TAPONAMIENTO DE LUCES EN ÁREA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA - (ALTURA HASTA 60 CM)	M	487,85	487,85		$ 84.841,00	$ 41.389.681,85	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	17,00	17,00		$ 111.317,00	$ 1.892.389,00	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M	40,00	40,00		$ 24.948,00	$ 997.920,00	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	642,87	642,87		$ 247.167,00	$ 158.896.249,29	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M	6,20	6,20		$ 134.793,00	$ 835.716,60	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	716,95	716,95		$ 4.353,00	$ 3.120.883,35	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS Y/O CONTAMINANTES (PINTURA CON PLOMO, CONCRETO CONTAMINADO CON ACEITE, ENTRE OTRAS) INCLUYE CERTIFICACION, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL A GESTOR AUTORIZADO	KG	13184,70	13184,70		$ 2.157,00	$ 28.439.397,90	$ -	100,00%	100,00%	

ITEM	CPF	748	IED	Alfonso Reyes Echandia			SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	282,37	282,37		$ 4.435,00	$ 1.252.310,95	$ -	100,00%	100,00%	$ 1.504,35
1.3,1	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)	m2	577,78	577,78		$ 50.276,00	$ 29.048.467,28	$ -	100,00%	100,00%	$ 17.053,62
2.2.16	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO).	M3	0,68	0,68		$ 1.307.170,00	$ 888.875,60	$ -	100,00%	100,00%	$ 443.392,06
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	171,00	171,00		$ 24.136,00	$ 4.127.256,00	$ -	100,00%	100,00%	$ 8.186,93
3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	CM	1.344,00	1.344,00		$ 9.731,00	$ 13.078.464,00	$ -	100,00%	100,00%	$ 3.300,76
9.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)	M2	161,34	161,34		$ 526.955,00	$ 85.018.919,70	$ -	100,00%	100,00%	$ 178.743,14
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	282,37	282,37		$ 4.352,40	$ 1.228.987,19	$ -	100,00%	100,00%	$ 1.476,33

ITEM	CPF	747	IED	Orlando Higuita			SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	173,65	173,65		$ 30.062,00	$ 5.220.266,30	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	173,65	173,65		$ 30.427,00	$ 5.283.648,55	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	233,41	233,41		$ 10.621,00	$ 2.479.047,61	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	233,41	233,41		$ 11.808,00	$ 2.756.105,28	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.33	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	21,86	21,86		$ 4.099,00	$ 89.604,14	$ -	100,00%	100,00%	
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	173,65	152,28		$ 16.844,00	$ 2.564.968,95	$ 359.991,65	87,69%	87,69%	
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20°A+40°C. VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	25,00	25,00		$ 62.547,34	$ 1.563.683,40	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	153,00	153,00		$ 42.278,54	$ 6.468.617,23	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	150,00	150,00		$ 26.316,62	$ 3.947.492,88	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	M	74,66	74,66		$ 19.490,72	$ 1.455.176,92	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	116,70	116,70		$ 22.625,78	$ 2.640.428,99	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	116,70	116,70		$ 29.897,64	$ 3.489.054,59	$ -	100,00%	100,00%	
13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	116,70	116,70		$ 121.679,71	$ 14.200.022,39	$ -	100,00%	100,00%	
16.1.4	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	173,65	173,65		$ 86.678,38	$ 15.051.700,83	$ -	100,00%	100,00%	

16.1.25	AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA)	M2	173,65	173,65		$ 106.127,58	$ 18.429.054,68	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	290,35	290,35		$ 4.352,40	$ 1.263.719,34	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.4	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	116,70	116,70		$ 7.510,23	$ 876.444,26	$ -	100,00%	100,00%	

ITEM	CPF	838	IED	ISABEL II SEDE B			SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	10,26	10,26		$ 4.353,00	$ 44.640,02	$ -	100,00%	100,00%	
19.1.3	TALA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1,00	1,00		$ 1.953.740,00	$ 1.953.740,00	$ -	100,00%	100,00%	
ITEM	CPF	850	IED	Jhon F Kennedy			SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	8,88	8,88		$ 4.353,00	$ 38.649,42	$ -	100,00%	100,00%	
19.1.3	TALA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1,00	1,00		$ 1.953.740,00	$ 1.953.740,00	$ -	100,00%	100,00%	
ITEM	CPF	817	IED	Marsella			SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	27,60	27,60		$ 4.353,00	$ 120.142,80	$ -	100,00%	100,00%	
19.1.2	TALA DE ARBOLES CLASE II (5M<H<15M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1,00	1,00		$ 739.631,00	$ 739.631,00	$ -	100,00%	100,00%	
19.1.6	PODA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	4,00	4,00		$ 976.870,00	$ 3.907.480,00	$ -	100,00%	100,00%	
ITEM	CPF	821	IED	SAN JOSE			SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	8,98	8,98		$ 4.353,00	$ 39.087,33	$ -	100,00%	100,00%	
19.1.2	TALA DE ARBOLES CLASE II (5M<H<15M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1,00	1,00		$ 739.631,00	$ 739.631,00	$ -	100,00%	100,00%	
ITEM	CPF	0	IED	ISABEL II SEDE A			SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	2,68	2,68		$ 30.427,00	$ 81.544,36	$ -	100,00%	100,00%	
1.3.1	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE	M2	425,85	425,85		$ 50.276,00	$ 21.410.034,60	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.3	ALISTADO DE PASO PARA ESCALERA EN MORTERO 1:3	M	11,66	11,66		$ 14.949,00	$ 174.305,34	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M	10,00	10,00		$ 14.351,00	$ 143.510,00	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	771,00	771,00		$ 19.238,00	$ 14.832.498,00	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	543,30	543,30		$ 20.803,00	$ 11.302.269,90	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS	M2	32,16	32,16		$ 29.762,00	$ 957.145,92	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	236,94	236,94		$ 26.898,00	$ 6.373.212,12	$ -	100,00%	100,00%	
12.3.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	35,18	35,18		$ 29.063,00	$ 1.022.436,34	$ -	100,00%	100,00%	
12.3.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	14,19	14,19		$ 23.132,00	$ 328.243,08	$ -	100,00%	100,00%	
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA	M	343,10	343,10		$ 9.603,00	$ 3.294.789,30	$ -	100,00%	100,00%	
ITEM	CPF	890	IED	Nelson Mandela			SEMANA				
Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17,08	17,08	17,08	$ 30.426,62	$ 519.686,74	$ -	100,00%	100,00%	
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	22,00	22,00	22,00	$ 17.444,42	$ 383.777,22	$ -	100,00%	100,00%	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	11,00	11,00	11,00	$ 85.501,22	$ 940.513,46	$ -	100,00%	100,00%	
4.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 2"	UN	22,00	22,00	22,00	$ 20.568,77	$ 452.513,00	$ -	100,00%	100,00%	
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	16,00	16,00	16,00	$ 5.829,54	$ 93.272,60	$ -	100,00%	100,00%	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	34,16	34,16	34,16	$ 42.278,54	$ 1.444.235,06	$ -	100,00%	100,00%	
7.2.30	TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2	34,16	34,16	34,16	$ 127.154,36	$ 4.343.592,99	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.3	PAÑETE LISO BAJO PLACA ACABADO LISO 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	8,54	8,54	8,54	$ 36.604,35	$ 312.601,18	$ -	100,00%	100,00%	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	8,54	8,54	8,54	$ 11.692,56	$ 99.854,42	$ -	100,00%	100,00%	
12.2.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA VINILO TIPO 1 LAVABLE A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	8,54	8,54	8,54	$ 17.192,65	$ 146.825,23	$ -	100,00%	100,00%	
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	34,16	34,16	34,16	$ 4.352,40	$ 148.677,98	$ -	100,00%	100,00%	

FECHA:	26/07/2026
DIAS RESTANTES	57
CORTE DEL INFORME:	*26/07/2026*

INFORME SEMANAL 34

OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 3"
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO EDU 2025
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SEMANA N°	34	**DEL**	20-jul-26	**AL**	26-jul-26

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	CO1.PCCNTR.8169111	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.8154784
Fecha de Iniciación	14/10/2025	**Fecha de Iniciación**	14/10/2025
Fecha de Terminación	13/05/2026	**Fecha de Terminación**	13/05/2026
Plazo Inicial	7 MESES	**Plazo Inicial**	7 MESES
Valor inicial	$ 796.278.928,00	**Valor inicial**	$ 2.451.846.958,00
Adiciones	$ 268.078.602,00	**Adiciones**	$ 1.076.612.050,00
Prorroga	4 MESES	**Prorroga**	4 MESES
Suspensión	1	**Suspensión**	1

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES							ACTIVIDADES
No.	**FRENTE**	PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR	EJECUTADO SEMANA ANTERIOR	PROGRAMADO ACUM	EJECUTADO ACUM	DESVIACIÓN	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA**
1	PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	FINALIZADO
2	PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	70,00%	20,64%	70,00%	69,57%	-0,43%	APROBACIÓN NPS
3	EL PORVENIR	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	FINALIZADO
4	VILLAS DEL PROGRESO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	FINALIZADO
5	PABLO DE TARSO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	FINALIZADO
6	JAIRO ANIBAL NIÑO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	FINALIZADO
7	LUIS LOPEZ DE MESA	100,00%	74,15%	100,00%	74,15%	-25,85%	APROBACIÓN NPS
8	EDUARDO UMAÑA LUNA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	FINALIZADO
9	DARIO ECHANDIA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	FINALIZADO
10	LLANO ORIENTAL - ALFONSO REYES ECHANDIA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	FINALIZADO
11	EL JAPON	60,00%	55,60%	62,03%	60,60%	-1,43%	INSTALACIÓN DE MANTO
12	LA ESPERANZA	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	-50,00%	RADICACIÓN NPS
13	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PILOTO	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	-50,00%	A LA ESPERA DEL INFORME ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
TOTALES		**79,29%**	**73,11%**	**80,97%**	**77,25%**	**-9,82%**	N/A

3. RESUMEN FINANCIERO

PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 231.449.333	$ 223.484.197	**$ 7.965.136**		0,00%	96,56%

PORTAL DEL SOL - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 85.000.000	$ 19.305.325	**$ 65.694.675**		0,00%	22,71%

EL PORVENIR

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 106.888.723	$ 96.932.303	**$ 9.956.420**		0,00%	90,69%

VILLAS DEL PROGRESO

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 147.911.865	$ 147.911.865	$ -		0,00%	100,00%

PABLO DE TARSO

	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA	$ 194.585.294	$ 194.585.294	$ -		7,71%	100,00%

FECHA:	26/07/2026
DIAS RESTANTES	**57**
CORTE DEL INFORME:	***26/07/2026***

INFORME SEMANAL 34

OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 3"
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO EDU 2025
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SEMANA N°	34	**DEL**	20-jul-26	**AL**	26-jul-26

JAIRO ANIBAL NIÑO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 210.214.278	$ 200.257.858	**$ 9.956.420**		3,60%	95,26%

LUIS LOPEZ DE MESA

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 311.343.211	$ 230.852.159	**$ 80.491.052**		26,90%	74,15%

EDUARDO UMAÑA LUNA

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 79.121.987,02	$ 79.121.987	$ -		0,50%	100,00%

DARIO ECHANDIA

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 775.323.511	$ 775.323.511	$ -		0,00%	100,00%

ALFONSO REYES ECHANDIA

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	VR. POR EJECUTAR	SEMANA	ACUMULADO
	$ 134.643.281	$ 134.643.281	$ 0		62,60%	100,00%

EL JAPON

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	VR. POR EJECUTAR	SEMANA	ACUMULADO
	$ 91.020.955	$ -	$ 91.020.955		0,00%	0,00%

LA ESPERANZA

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	VR. POR EJECUTAR	SEMANA	ACUMULADO
	$ 80.011.684	$ -	$ 80.011.684		0,00%	0,00%

INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	VR. POR EJECUTAR	SEMANA	ACUMULADO
	$ 381.591.816	$ -	$ 381.591.816		0,00%	0,00%

EMERGENCIAS

BALANCE EMERGENCIAS	VR.TOTAL BALANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 699.353.071	$ 440.667.320	**$ 258.685.751**		0,00%	63,01%

4. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

OBSERVACIONES:
• Se recomienda al contratista fortalecer la documentación relacionada a las emergencias.

RECOMENDACIONES:
• Mantener orden y aseo en la obras, así como la señalización
• Continuar con el uso correcto de EPP
• Reforzar el control de SST en los frentes de obra

CONCLUSIONES:
• Se avanzó con la subsanación de obcervaciones echas por la interventoria
•

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

1. Se envia a la supervisión: Informe semanal No. 33
2. El contratista envia a la interventoria: Acta parcial 6 Grupo 7
3. El contratista envia a la interventoria: Oficio 0198-012SED-25 Items No Previstos 005-006
4. Se envia al contratista: UNIOBRAS-LOTE3-676 Segundo requerimiento perentorio Balance General, Emergencias Grupo 7
5. La interventoria envia al apoyo a la supervisión: UNIOBRAS-LOTE3-689 Solicitud de especificaciones técnicas y definición de ubicación de cicloparqueaderos Lote 3
6. La interventoria envia al apoyo a la supervisión: RADICACIÓN DE ITEM NO PREVISTO No.004 LOTE 7 - OFICIOS: UNIOBRAS-LOTE 3 -604 Y 0188-012SED-25
7. El contratista envia a la interventoria: OFICIO 0199-012SED-25 Ubicación y especificación de la ficha técnica ciclo parqueadero
8. La interventoria envia al apoyo a la supervisión: UNIOBRAS-LOTE3-682 Solicitud Programacion Radicacion Cuentas de Cobro Lote 3
9. El contratista envia a la interventoria: Balance Actualizado

FECHA:	26/07/2026
DIAS RESTANTES	**57**
CORTE DEL INFORME:	***26/07/2026***

INFORME SEMANAL 34

OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 3"
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO EDU 2025
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SEMANA N°	34	**DEL**	20-jul-26	**AL**	26-jul-26

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la presente semana se mantuvo el personal previamente aprobado para el ingreso y ejecución de las actividades, verificando el cumplimiento de los requisitos y lineamientos establecidos por la Interventoría para el desarrollo seguro de las labores.

De igual manera, se realizó seguimiento a las actividades desarrolladas en la Institución Educativa Japón, donde se evidenció personal ejecutando labores de instalación de manto impermeabilizante en cubierta. Durante la visita, la Interventoría verificó el uso de andamio certificado como medio de acceso a la cubierta, así como la implementación del cerramiento perimetral para la delimitación del área de trabajo. Sin embargo, se recomendó al Contratista garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP y de los EPCC, verificando que el personal permanezca debidamente anclado durante toda la ejecución de las actividades en altura.

Asimismo, se realizó seguimiento a las actividades ejecutadas en la Institución Educativa Carlos Pizarro León Gómez, donde la Interventoría recomendó al Contratista fortalecer las jornadas de orden y aseo, realizando el retiro oportuno de materiales y residuos de construcción para mantener condiciones seguras en el frente de obra.

De igual manera, se solicitó mantener cerrados con candado los baños intervenidos, teniendo en cuenta que actualmente permanecen abiertos y con presencia de materiales y escombros, situación que representa un riesgo de ingreso para los estudiantes y puede ocasionar incidentes o accidentes. Finalmente, se reiteró la importancia de mantener la señalización y delimitación de las áreas intervenidas, con el fin de proteger a la comunidad educativa y garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las actividades.
.

Total horas hombre trabajadas: 42
Total de horas capacitación: 20 minutos
Número de accidentes de trabajo: 0

REPORTE PERSONAL
DIRECTOR OBRA: 1 INSPECTORES SST: 1
RESIDENTE OBRA: 1 PERSONAL OPERATIVO: 7

Número de días de incapacidad por AT:0
Número de días de incapacidad por enfermedad común: 0

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

IED Llano oriental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia que no cuentan con cerramiento por que se está trabajando en la parte posterior de la institución, se evidencian materiales de construcción y residuos, por lo que se recomienda realizar la disposición adecuada, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental
IED Japón: Se realizo recorrido en el frente, por lo que se recomendó al contratista realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental
IED Carlos Pizarro: Se realizo recorrido en el frente, se evidencio residuos de las demoliciones, por lo que se recomenzó disponer todo adecuadamente, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

OTROS

ING JAVIER ALEJANDRO MAESTRA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ARQ HARRY ARANGO
Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FECHA:	26/07/2026	**INFORME SEMANAL**
DIAS RESTANTES	**57**	
CORTE DEL INFORME:	***26/07/2026***	

OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 3"
INTERVENTOR	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO EDU 2025
CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SEMANA N°	34	**DEL**	20-jul-26	**AL**	26-jul-26

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA**	
Contrato No .	CO1.PCCNTR.8169111	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.8154784
Fecha de Iniciación	14/10/2025	**Fecha de Iniciación**	14/10/2025
Fecha de Terminación	13/05/2026	**Fecha de Terminación**	13/05/2026
Plazo Inicial	7 MESES	**Plazo Inicial**	7 MESES
Valor inicial	$ 184.210.953,00	**Valor inicial**	$ 552.624.455,00
Adiciones	$ 83.867.649,00	**Adiciones**	$ 523.987.595,00
Prorroga	4 MESES	**Prorroga**	4 MESES
Suspensión	1	**Suspensión**	1

CPF	COLEGIO	SEDE	CONTRATO DE OBRA	LOCALIDAD	Silviculturales	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	ESTADO	ALCANCE	FECHA INICIO ATENCION EMERGENCIA	FECHA TERMINACION Y ENTREGA AL COLEGIO	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO
838	ISABEL II	B	CO1.PCCNTR.8154784	Kennedy	Silviculturales	100%	FINALIZADO	TALA DE UN ARBOL	30-dic.-25	30-dic.-25	$ 2.125.746,98
732	LA LIBERTAD - ORLANDO HIGUITA ROJAS	B	CO1.PCCNTR.8154784	Bosa	OBRA	100%	FINALIZADO	En el Colegio Orlando Higuita Rojas, Sede A, el día 10 de septiembre de 2025 se presentó el desprendimiento del enchape del techo en la zona de depósito de la cocina del comedor escolar, motivo por el cual se ordenó el cierre del	30-nov.-25	20-feb.-26	$ 79.231.282,41
821	SAN JOSE	B	CO1.PCCNTR.8154784	Kennedy	Silviculturales	100%	FINALIZADO	TALA DE UN ARBOL	30-dic.-25	30-dic.-25	$ 778.715,34
850	JOHN F. KENNEDY	A	CO1.PCCNTR.8154784	Kennedy	Silviculturales	100%	FINALIZADO	TALA DE UN ARBOL	30-dic.-25	30-dic.-25	$ 2.376.793,41
817	MARSELLA	A	CO1.PCCNTR.8154784	Kennedy	Silviculturales	100%	FINALIZADO	TALA Y PODA DE ARBOL	30-dic.-25	30-dic.-25	$ 6.726.912,75
890	NELSON MANDELA	A	CO1.PCCNTR.8154784	Kennedy	OBRA	100%	FINALIZADO	REPARACION TUBERIA BAÑOS	13-dic.-25	27-dic.-25	$ 7.140.430,62
842	SAN RAFAEL	A	CO1.PCCNTR.8154784	Kennedy	OBRA	100%	FINALIZADO	adecuación de cuarto de almacenamiento de residuos sólidos para cocina	1-abr.-26	21-abr.-26	$ 18.302.304,83
615	"INEM SANTIAGO PEREZ"	A	CO1.PCCNTR.8154784	Tunjuelito	OBRA	100%	FINALIZADO	Equipo de bombeo de la cocina escolar no se encuentra en funcionamiento	22-may.-26	31-may.-26	$ 15.000.000,00
804	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	B	CO1.PCCNTR.8154784	Kennedy	OBRA	15%	EN PROCESO	Situación: El 9 de febrero de 2026 se realizó visita técnica con el especialista hidráulico y el 11 de febrero de 2026 se efectuó la visita del	15-may.-26	10-jun.-26	$ 89.553.795,87
746	CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ	A	CO1.PCCNTR.8154784	Bosa	OBRA	53,65%	EN PROCESO	El Colegio Carlos Pizarro Leongómez, Sede A, presenta deficiencias en la red de desagues de las baterías sanitarias, debido a los años de uso, lo que genera roturas, desacoples y fallo estructural en la red, las baterías más afectadas se localizan colindantes al salón 402 del primer nivel. La situación viene generando humedades	0-ene.-00	0-ene.-00	$ -
625	BERNARDO JARAMILLO	A	CO1.PCCNTR.8154784	Tunjuelito	OBRA	100%	FINALIZADO	Se solicita realizar actividades que requieren atención inmediata, para atender lo dispuesto en por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, tras la accion popular	21-abr.-26	20-may.-26	$ 4.294.198,72
825	ISABEL II	A	CO1.PCCNTR.8154784		OBRA	100%	FINALIZADO	pintura	23-ene.-26	28-feb.-26	$ 59.919.779,71
729	SAN BERNARDINO	A	CO1.PCCNTR.8154784		OBRA	0%		En el Colegio San Bernardino se presenta una fisura en columna del muro de cerramiento. La zona posee restricción y las medidas de	12-may.-26	5-jun.-26	
763	BICENTENARIO	A	CO1.PCCNTR.8154784		OBRA	0%	SIN VIABILIDAD	Se requiere barrera visual en Acceso a Baños de Primera Infancia .Requerimiento de Secretaria de Salud. Mediante Comunicado S-2025-101760 la			
708	LLANO ORIENTAL	A	CO1.PCCNTR.8154784		OBRA	95%	EN PROCESO	En atención a las condiciones evidenciadas y al concepto sanitario desfavorable emitido por la autoridad competente, se solicita adelantar	28-abr.-26	26-may.-26	$ 209.596.231,77
850	JOHN F. KENNEDY	A	CO1.PCCNTR.8154784	Kennedy	OBRA	0%	SIN VIABILIDAD	Se presenta una emergencia proveniente de las aguas lluvias ocasionada por la devolución y rebose de canales y bajantes ubicada en el área	18-jun.-26		
868	LAS AMERICAS	A	CO1.PCCNTR.8154784	Kennedy	OBRA	0%	FINALIZADO	Se presenta una emergencia proveniente de las aguas lluvias ocasionada por la devolución y rebose de canales y bajantes ubicada en el área	18-jun.-26		$ 22.339.311,71

FECHA:	26/07/2026	**INFORME SEMANAL**
DIAS RESTANTES	**57**	
CORTE DEL INFORME:	***26/07/2026***	

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA

Alfonso Lopez Michelsen Cocina


0	0,00
Pintura	Pintura

Jairo Anibal Niño

	
Acabados	Acabados
	
0	0,00

Acabados puertas sanitarios	Remates de ventana

Eduardo Umaña Luna

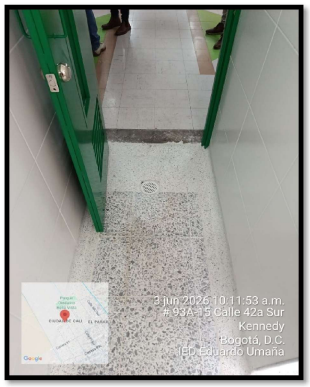


Acabado de pisos.



cambio de interuptor.



Instalacion de mesones lavamanos




Retiro de material sobrante.

Luis Lopez De Mesa



Manto para cubierta

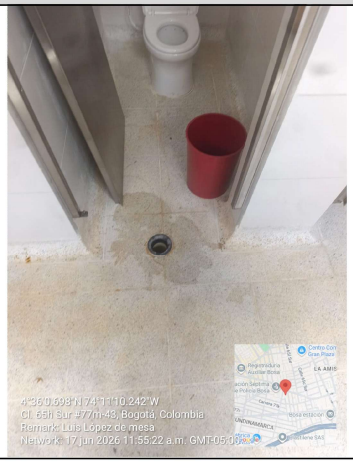

Destape de sifon




Instalacion de Puertas



Cambio de ventana.


Pablo de Tarso

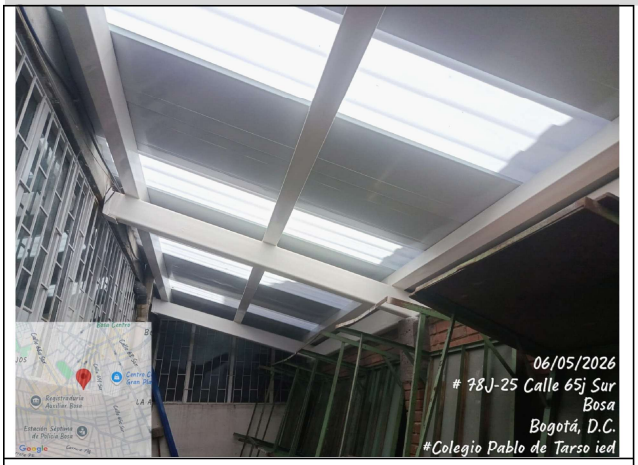

Instalacion de cubierta



Instalacion de cubierta

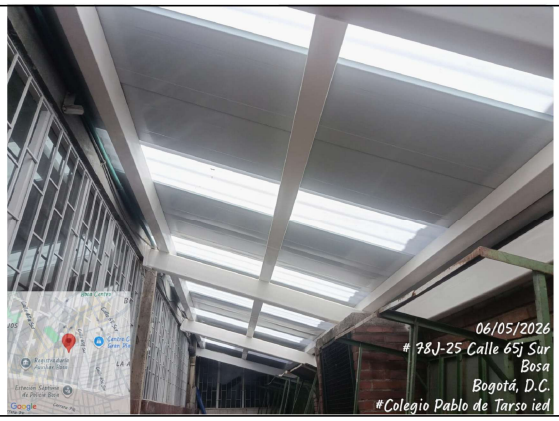

Instalacion de cubierta



Instalacion de cubierta

Alfonso Reyes Echandia



Cerramiento



Cerramiento



Cerramiento



Cerramiento

EL JAPÓN




Pendientado de placa de cubierta.



Acceso a la cubierta



Aplicad de emulsión asfaltica.

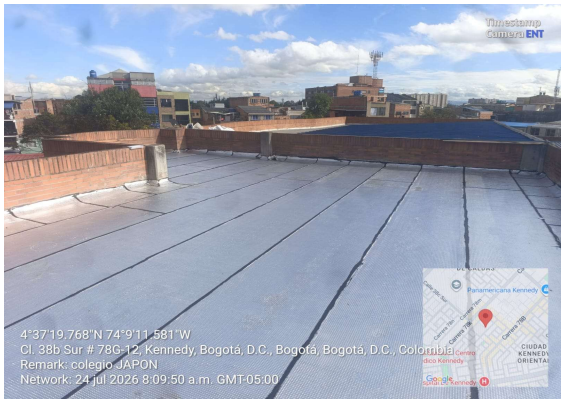

Instalación de manto asfaltico.

EMERGENCIAS

LLANO ORIENTAL



Instalación de manto



Instlación de tuberia




Finalización



Finalización

CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ

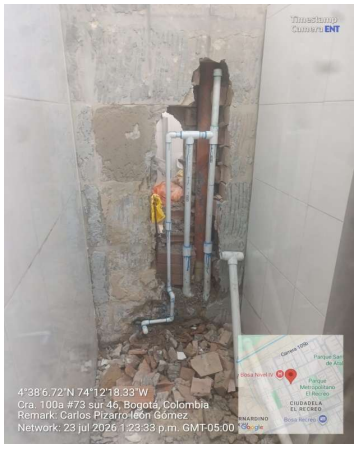

Cambio de tuberia.



Cambio de tuberia.



Pañete en regatas.



Pañete en regatas.

FECHA: 26/07/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO		INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 57 Dias	SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANANCIA		
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		GRUPO 7

CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO EDU 2025
26 de julio de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169111	CO1.PCCNTR.8154784	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796.278.928	$ 2.451.846.958
INICIO	14 de octubre de 2025	14 de octubre de 2025	SUSPENSIONES	16	16	ADICIÓN #1	$ 83.867.649,00	$ 523.987.595,00
TERMINACION INICIAL	13 de mayo de 2026	13 de mayo de 2026	PRÓRROGAS	1	1	ADICIÓN #2	$ 184.210.953,00	$ 552.624.455,00
MODIFICATORIO	29 de mayo de 2026	29 de mayo de 2026	ADICIÓN	123	115	TOTAL	$ 1.064.357.530,00	$ 3.528.459.008,00
TERMINACION FINAL	29 de septiembre de 2026	21 de septiembre de 2026	TOTAL	350	342			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	5/12/2025	$ 83.867.649,00	0	
2	29/05/2026	$ 184.210.953,00	123	
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	5/12/2025	$ 523.987.595,00	0	
2	29/05/2026	$ 552.624.455,00	115	
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
400-47	5 9 2025	5 10 2026	5 4 2026	5 4 2031	5 9 2025	5 4 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
895-47	14 10 2025	15 1 2027	14 10 2025	15 5 2027	14 10 2025	15 1 2027	5 4 2026	15 5 2026
895-74							5 4 2026	15 5 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (31082024)	PROGR %	EJECUTADO VS PROG %	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	oct-2025	nov-2025	dic-2025	ene-2026	feb-2026	mar-2026	abr-2026	may-2026	jun-2026	jul-2026	ago-2026	sep-2026	oct-2026	nov-2026	dic-2026	ene-2027	feb-2027	mar-2027
751	PORTAL DEL SOL -	Bosa	A	Portal del Sol Alfonso Lopez Michelsen	100,00%	100,00%	100,00%	✓	$ 231.449.333,02	$ 223.484.197,02	12/11/2025	9/04/2026																		
751	PORTAL DEL SOL -	Bosa	A	Portal del Sol Alfonso Lopez Michelsen	20,64%	69,57%	70,00%	✗	$ 85.000.000,00	$ 19.305.324,74	11/01/2026	13/08/2026																		
742	EL PORVENIR	Bosa	B	El Recuerdo Santa Fe	100,00%	100,00%	100,00%	✓	$ 106.888.722,94	$ 96.932.302,94	19/11/2025	30/03/2026																		
764	VILLAS DEL PROGRESO	Bosa	B	Enrique Dussel	100,00%	100,00%	100,00%	✓	$ 147.911.865,07	$ 147.911.865,07	12/11/2025	9/04/2026																		
714	PABLO DE TARSO	Bosa	A	Pablo de Tarso	100,00%	100,00%	100,00%	✓	$ 194.585.294,37	$ 194.585.294,37	19/11/2025	19/03/2026																		
836	JAIRO ANIBAL NIÑO	Kennedy	A	Patio Bonito I	100,00%	100,00%	100,00%	✓	$ 210.214.277,79	$ 200.257.857,79	20/11/2025	19/03/2026																		
712	LUIS LOPEZ DE MESA	Bosa	A	Luis Lopez de Mesa	74,15%	74,15%	100,00%	✗	$ 311.343.210,60	$ 230.852.188,69	11/12/2025	9/04/2026																		
814	EDUARDO UMAÑA LUNA	Kennedy	A	Dindalito	100,00%	100,00%	100,00%	✓	$ 79.121.987,02	$ 79.121.987,02	19/11/2025	2/02/2026																		
833	DARIO ECHANDIA	Kennedy	B	Los Patios	100,00%	100,00%	100,00%	✓	$ 776.323.510,63	$ 776.323.510,63	12/11/2025	26/03/2026																		
748	LLANO ORIENTAL -	Bosa	A	San José de Meryland San Pedro -	100,00%	100,00%	100,00%	✗	$ 134.643.280,72	$ 134.643.280,72	14/10/2025	13/05/2026																		
815	EL JAPON	Kennedy	A	El Japón	66,60%	80,60%	72,00%	✓	$ 91.020.955,00	$ -	29/05/2026	5/08/2026																		
738	LA ESPERANZA	Bosa	A	La Esperanza (Cafam)	0,00%	0,00%	50,00%	✗	$ 80.011.684,00	$ -	29/05/2026	29/09/2026																		
614	INSTITUTO TECNICO	Tunjuelito	C	Fatima Colmotores	0,00%	0,00%	50,00%	✗	$ 381.591.816,00	$ -	29/05/2026	29/09/2026																		
}	TOTAL FRENTES DE OBRA				78,79%	87,85%			$ 2.829.105.937	$ 2.102.417.779	$ 699.353.070,84																			
	EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																													
747	LA LIBERTAD - ORLANDO	Bosa	A	Orlando Higuita - Holanda la Libertad	100%	100%	100,00%	✓	$ 79.231.282,41	$ 79.231.282,41	19/11/2025	15/01/2026																		
729	SAN BERNARDINO	Bosa	A	San Bernardino	100%	100%	100,00%	✓	$ 13.215.187,73	$ 13.215.187,73	24/11/2025	31/12/2025																		
838	ISABEL II	Kennedy	B	Pio XII	100%	100%	100,00%	✓	$ 2.125.746,98	$ 2.125.746,98	29/11/2025	19/12/2025																		
860	JOHN F. KENNEDY	Kennedy	A	John F. kennedy	100%	100%	100,00%	✓	$ 2.376.793,41	$ 2.376.793,41	29/11/2025	12/12/2025																		
817	MARSELLA	Kennedy	A	Bas-Med. Marsella.	100%	100%	100,00%	✓	$ 6.726.912,75	$ 6.726.912,75	29/11/2025	18/12/2025																		
890	NELSON MANDELA	Kennedy	A	Compartir Tintal	100%	100%	100,00%	✓	$ 7.140.430,63	$ 7.140.430,63	25/11/2025	10/01/2026																		
746	CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ	Bosa	A	El Recreo - Metrovivienda - Carlos Pizarro León Gómez	30%	46%	49,48%	✗	$ -	$ -	27/11/2025	16/01/2026																		
821	SAN JOSE	Kennedy	B	El Descanso	100%	100%	100,00%	✓	$ 778.715,34	$ 778.715,34																				
	Luis lopez de mesa	Bosa	A	Luis lopez de mesa	0%	0,00%	49,98%	✗																						
842	SAN RAFAEL	Kennedy	A	San Rafael	100%	100%	100,00%	✓	$ 17.685.245,28	$ 17.685.245																				
825	ISABEL II	Kennedy	A	Isabel II	100%	100%	100,00%	✓	$ 59.919.988,96	$ 59.919.988,96																				
	LOS PERIODISTAS	Kennedy	A	LOS PERIODISTAS	100%	100%	100,00%	✓	$ 12.504.420	$ 12.504.420																				
868	LAS AMERICAS	Kennedy	A	Unidad Básica Las Americas	100%	100%	100,00%	✓	$ 22.339.254	$ 22.339.254																				
708	LLANO ORIENTAL	Bosa	A	Llano Oriental	100%	100%	100,00%	✓	$ 212.329.398	$ 212.329.398																				
625	BERNARDO JARAMILLO	Tunjuelito	A	Bernardo Jaramillo	100%	100%	100,00%	✓	$ 4.293.944,10	$ 4.293.944,10																				
615	"INEM SANTIAGO PEREZ"	Tunjuelito	A	INEM Santiago Perez	100%	100%	100,00%	✓	$ 15.000.000,00	$ -																				
804	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	Kennedy	B	Agoberto Mejia Cifuentes	11%	11%	81,82%	✗	$ 89.553.796	$ -																				
	TOTAL FRENTES DE OBRA				85,72%	93,02%	#####		$ 545.221.116	$ 440.667.320																				

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
7	2	0	9	$ 2.102.417.779
ACUMULADO EMERGENCIAS				
14	2	1	17	$ 440.667.320
TOTAL				
21	4	1	26	$ 2.543.085.099
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ -		11		22		33		$ -	


AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	78,79%	0,00%	83,33%
PROGRAMADO	87,85%		
ATRASO	-9,06%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			







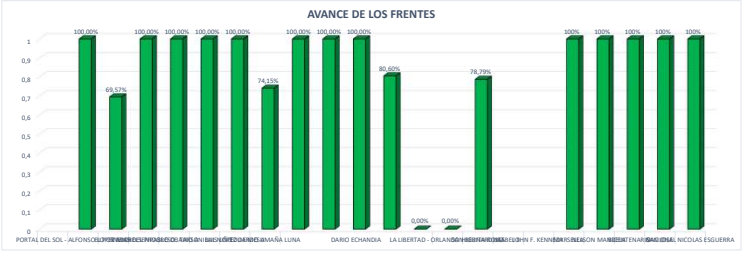

OBSERVACIONES:

FECHA:	26/07/2026		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES	57	Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA					
REGISTRO FOTOGRAFICO			DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				GRUPO	7
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:		CO1.PCCNTR.8154784	CONTRATISTA:	CONSORCIO EDU 2025			
26/07/2026	CONTRATO DE INTERVENTORIA:		CO1.PCCNTR.8169111	INTERVENTOR:	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S			

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE		ESTADO ACTUAL O FINAL
24 ###						
Alfonso Lopez Michelsen	Mejoramiento de baterias sanitarias y salones de preescolar	FINALIZADO				
Alfonso Lopez Michelsen Cocina	Mejoramiento de cocina	Cocina: Instalacion de piso, cambio de tuberias				
El Porvenir	Mejoramiento de cubierta y baterias sanitarias	FINALIZADO				
Villas del Progreso	Mejoramiento de baterias y canchas sanitarias	FINALIZADO				
Pablo de Tarso	Desmonte e instalación de cubierta	Desmonte e instalación de cubierta				
Jairo Anibal Niño	Mejoramiento de baterias sanitarias y pisos preescolar	Reparación de piso en vinilo de 4mm				
Luis Lopez de Mesa	Mejoramiento de baterias sanitarias	BAÑO: Instalacion de manto de aluminio sobre cubierta y enchape				
