CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 4450-2025

Aunar esfuerzos entre el Departamento de Nariño y el Municipio de Tangua a través del aporte de recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE TANGUA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO".

INFORME FINAL DE SUPERVISION

PERIODO: 6 DE NOVIEMBRE AL 19 DE JUNIO 2026

San Juan de Pasto, 14 de septiembre de 2026

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

2.1 FICHA INFORMATIVA CONTRATO DE OBRA

FECHA DE PRESENTACION:	9/14/2026	CON CORTE :	6/19/2026

DATOS GENERALES CONTRATO DE OBRA

PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA:	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8807157			
CONVENIO MACRO No:	N.A			
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.:	4450-2025			
CDP DEPARTAMENTO No.:	2025070328	FECHA:	7/22/2025	$ 200,000,000.00
REGISTRO No:	2025091267	FECHA:	9/19/2025	$ 200,000,000.00
CDP ADICIONAL DEPARTAMENTO No.:	2026030061	FECHA:	3/19/2026	$ 100,000,000.00
REGISTRO No:	2026050519	FECHA:	5/19/2026	$ 99,951,326.23
CDP MUNICIPIO No:	202503007	FECHA:	7/29/2025	$ 20,000,000.00
OBJETO DEL CONVENIO :	Aunar esfuerzos entre el Departamento de Nariño y el Municipio de Tangua a través del aporte de recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE TANGUA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO".			
MUNICIPIO :	TANGUA			
SUPERVISOR	ING. GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE			
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION	ING. MARIO FERNANDO ZUTTA AREVALO			
META FISICA	Conformación de calzada con un area total de 19720,00 M2 Instalación de material de recebo con un volumen de 1972,00 M3			
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	$ 219,504,128.11			
VALOR ADICIONAL	$ 99,951,326.23			
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 319,455,454.34			
APORTES DEPARTAMENTO:	$ 299,951,326.23			
APORTES MUNICIPIO	$ 19,504,128.11			
FECHA DE INICIACION:	11/6/2025			

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

PLAZO INICIAL DEL CONVENIO :	Dos (2) meses			
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	1/6/2026			
FECHA DE TERMINACION FINAL:	6/19/2026			
FECHA DE SUSPENSION No. 1:	3/5/2026			
PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No 1	4/19/2026			
REINICIO No 1	5/19/2026			
MODIFICATORIO No. 1:	12/29/2025			
MODIFICATORIO No. 2:	5/29/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN MOD No 1:	3/7/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN MOD No 2:	6/19/2026			
PORCENTAJE ANTICIPO	40%			
GARANTIAS:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			
Póliza No.:	75547994000002828 Anexo No 4			
% AVANCE FISICO	100.00%		% EJECUTADO:	100.00%
% AVANCE FINANCIERO	40.00%		% EJECUTADO	40.00%
META FISICA A LA FECHA	100.00%			

ASPECTOS FINANCIEROS: El Mantenimiento vial que se ejecuta en el Municipio de TANGUA DEPARTAMENTO DE NARIÑO, se ejecuta bajo los lineamientos del convenio Interadministrativo No 4450-2025 suscrito el 19 de septiembre de 2025, el cual se denomina: Aunar esfuerzos entre el Departamento de Nariño y el Municipio de Tangua a través del aporte de recursos económicos, técnicos y administrativos, **para contribuir a la ejecución del proyecto denominado:** "MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE TANGUA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO", con un valor total de DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON ONCE CENTAVOS ($ 219.504.128,11) MDA/CTE. El valor total de este proyecto son los recursos propios aportados por el Departamento sumado al aporte de recursos de bienes y servicios por parte del Municipio de Tangua. Se efectuó inicialmente el desembolso del 40% del anticipo y los pagos se efectuaron mediante la presentación de acta final de avance de obra debidamente avaladas, firmada y revisada por las partes.

EJECUCION

El convenio derivado se ejecutó y finalizo en la fecha estipulada en el modificatorio N°2.
inicialmente el convenio estaba para finalizar el 6 de enero de 2025, pero la ejecución finalizó el pasado 19 de junio de 2026 según modificatorio N°2.

- Se realiza una descripción general de cada uno de los capítulos y actividades importantes del contrato.

ACTIVIDADES EJECUTADAS CON EL CONVENIO SOLIDARIO SA 006 - 2025

"MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE TANGUA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"

Objeto del proyecto y alcance técnico: El objeto del contrato comprende la intervención técnica de la red vial del Municipio de Tangua mediante actividades de Conformación de calzada (13.550,00 m2) y un adicional de (6.170,00 m2) para un total ejecutado de (19.720,00 m2).

siguiendo las especificaciones técnicas INV 210. El proyecto busca mejorar la transitabilidad en los sectores rurales del municipio, facilitando la conexión intermunicipal para el transporte de productos agrícolas y el acceso de la población a servicios básicos.

Método de Ejecución:

- Corregir pendientes longitudinales y transversales.
- Compactación.
- Limpieza superficial de la Vía.
- Retiro de material sobrante.

Control de Calidad:

- Se deben cumplir las secciones y cotas con tolerancia máxima de +- 3cm.
- Se realizarán ensayos de densidad y compactación**(mínimo 5 ensayos por cada 500 m lineales o 3500 m2)
- Control de estabilidad en taludes y drenajes provisionales durante la obra.
  - Supervisión permanente de la Interventoría.
  - Cumplimiento de normas INV B-399, INV B-400.

A continuación, se muestra las cantidades ejecutadas durante el presente informe:

MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL EN EL MUNICIPIO DE PUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO					
N°	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANTIDAD INICIAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**% EJECUCION**
1	**MANTENIMIENTO VIAL**				
	MANTENIMIENTO RUTINARIO				
1,1	Conformación de calzada	M3	13550,00	19720,00	**100%**
1,2	Recebo	M2	1355,00	1972,00	**100%**

INFORMACIÓN FINANCIERA

BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SA 006 – 2025 SUCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL MUNICIPIO DE TANGUA.

DESCRIPCIÓN	VALOR
APORTE DEL DEPARTAMENTO	$ 200.000.000,00
APORTE DEL MUNICIPIO	$ 19.504.128,11
VALOR DEL ANTICIPO GIRADO DEPARTAMENTO	$ 80.000.000,00
APORTE ADICIONAL DEL DEPARTAMENTO	$ 99.951.326,23
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$ 219.504.128,11
VALOR EJECUTADO DEPARTAMENTO	$ 299.951.326,23
VALOR EJECUTADO MUNICIPIO	$ 19.504.128,11
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 319.455.454,34
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$ 219.951.326,23
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	$ 0,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00

BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO SOLIDARIO No 2025001261 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BELEN Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DESMONTES ALTOS.

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONVENIO DERIVADO:	$ 219.504.128,11
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA:	$ 319.455.454,34
APORTE DEL DEPARTAMENTO:	$ 200.000.000,00
APORTE ADICIONAL DEL DEPARTAMENTO:	$ 99.951.326,23
APORTE DEL MUNICIPIO:	$ 19.504.128,11
VALOR DEL ANTICIPO DESEMBOLSADO AL CONTRATISTA DERIVADO – (40% VALOR INICIAL DEL CONTRATO):	$ 80.000.000,00
VALOR EJECUTADO APORTE DEPTO:	$ 299.951.326,23
VALOR EJECUTADO APORTE MUNICIPIO:	$ 19.504.128,11
VALOR ACTA FINAL DE OBRA:	$ 299.951.326,23
VALOR NETO A PAGAR AL CONVENIO DERIVADO:	$ 289.951.326,23

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 100%

CONCLUSIONES

• Las obras de mantenimiento vial con recebo fueron recibidas a entera satisfacción por la supervisión municipal, evidenciando una mejora sustancial en la transitabilidad y conectividad de las vías del Municipio de Tangua.

• Las labores de ejecución se completaron el 19 de junio de 2026, conforme al cronograma actualizado.

• La ejecución del convenio se realizó en su totalidad, la ejecución es del 100%.

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Con este informe final y los demás documentos entregados por el Municipio que soporta la ejecución del Mantenimiento vial, se procederá a iniciar con el trámite del respectivo pago del acta final del convenio, para posteriormente proceder con la liquidación del convenio en mención. El avance final del convenio es del 100,00%.

Proyecto: Ing. Mario Fernando Zutta Arévalo
Contratista - SIMD
Supervisor y/o Apoyo a la Supervisión - Gobernación de Nariño

Aprobó: Ing. Gabriel Fernando Osejo Aguirre
Secretario de Infraestructura y Minas - SIMD
Gobernación de Nariño

5. REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 1: Registro inicial, Malla vial San Pedro Obraje - Cocha verde - Casco Urbano.

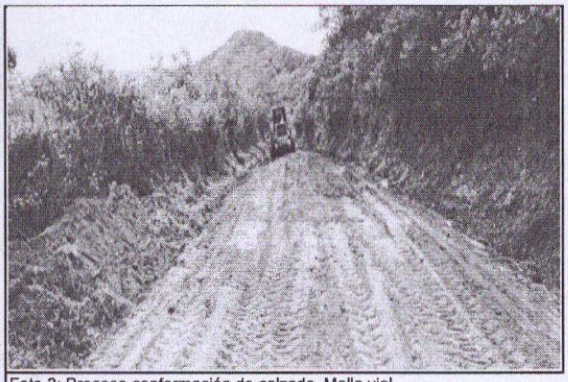


Foto 2: Proceso conformación de calzada, Malla vial



Foto 3: Proceso conformación de calzada, Malla vial



Foto 4: Proceso conformación de calzada, Malla vial.

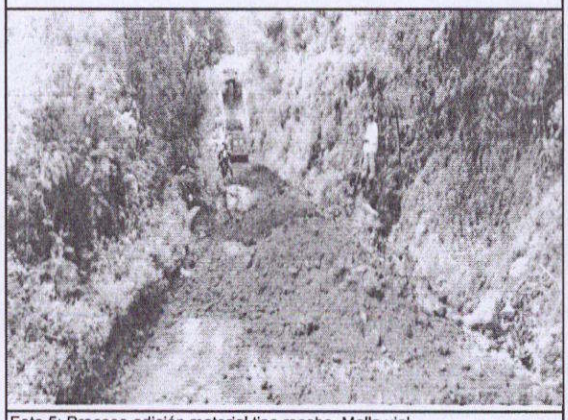


Foto 5: Proceso adición material tipo recebo, Malla vial..



Foto 6: Proceso de conformación y nivelación de calzada con adición de material, Malla vial.



Foto 7: Finalizada conformación de calzada con adición de material, Malla vial.



Foto 8: Finalizada conformación de calzada con adición de material, Malla vial.

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

6.1. INFORME FINANCIERO CONVENIO

CONTRATO OBRA No.:	GN 4450-2025
VALOR INICIAL CONVENIO	$ 219,504,128.11
PAGO ANTICIPO	$ 80,000,000.00
APORTE ADICIONAL GOBERNACION	$ 99,951,326.23
PAGO FINAL	$ 299,951,326.23
VALOR EJECUTADO	$ 319,455,454.34
TOTAL APORTE GOBERNACION	$ 299,951,326.23
TOTAL APORTE MUNICIPIO	$ 19,504,128.11
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	$ -
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ -

ACTAS	FECHA	VR. TOTAL	ACUMULADO	AMORT. ANTICIPO	VR. NETO	VR EGRESO	TOTAL DESC	COM EGRESO	FECHA PAGO
ANTICIPO 40%	5/19/2026	$ 80,000,000.00			$ 299,951,326.23	$ 80,000,000.00	$ 0.00	2026006417	**5/25/2025**
Acta Final		$ 299,951,326.23	$ 379,951,326.23	$ 80,000,000.00				SIN PAGAR	
TOTAL				**$ 80,000,000.00**	**$ 219,951,326.23**		**$ -**		

AVANCE FISICO	100.00%
AVANCE FINANCIERO	40.00%

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS	Código.: SIVEYC.FTO.
Gobernación de Nariño		Versión: 0.0
	FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS	Vig: 23/05/2016

7.1 CONTROL POLIZAS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO No 4450-2025

GARANTIAS:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza No.:	775 47 994000002808

ANEXO 1			FECHA APROBACION	11/4/2025	FECHA EXPEDICION	10/29/2025

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	$ 21,950,412.80	10%	19-Sep-25	19-May-26	CONTRATO	(111)
Buen manejo del anticipo	$ 87,801,651.20	40%	19-Sep-25	19-May-26	CONTRATO	(111)

ANEXO 2			FECHA APROBACION	3/31/2026	FECHA EXPEDICION	12/24/2025

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	$ 21,950,412.80	10%	6-Nov-25	6-Jul-26	CONVENIO	(63)
Buen manejo del anticipo	$ 87,801,651.20	40%	6-Nov-25	6-Jul-26	CONVENIO	(63)

ANEXO 3			FECHA APROBACION	3/8/2026	FECHA EXPEDICION	2/27/2026

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	$ 21,950,412.80	10%	6-Nov-25	7-Sep-26	CONVENIO	-
Buen manejo del anticipo	$ 87,801,651.20	40%	6-Nov-25	7-Sep-26	CONVENIO	-

ANEXO 4			FECHA APROBACION	6/17/2026	FECHA EXPEDICION	5/22/2026

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	$ 31,945,545.43	10%	6-Nov-25	19-Dec-26	CONVENIO	103
Buen manejo del anticipo	$ 87,801,651.24	40%	6-Nov-25	19-Dec-26	CONVENIO	103

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO- BALANCE CONTRATACION VS EJECUCION**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

7. BALANCE CONTRATACION VS EJECUCION (AVANCE)

CONVENIO No.: GN 4450- 2025

CAP.	ACT	DETALLE -ACTIVIDADES	UND	CANT	VR UNITARIO	VR CONTRATADO	VR EJECUTADO	DIFERENCIA	% ejecutado
	1	**MANTENIMIENTO VIAL**							
	1.1	Conformación de calzada	M2	19720.00	$ 1,088.63	$ 28,981,507.86	$ 28,981,507.86	$ -	100.00%
	1.2	Recebo	M3	1972.00	$ 109,110.49	$ 290,473,946.48	$ 290,473,946.48		
		COSTO TOTAL				$ 319,455,454.34	$ 319,455,454.34	$ -	100.00%

