R[illegible]I[illegible]

MINI[illegible]RIO[illegible]

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

[illegible]05[illegible]0[illegible]
[illegible]

[illegible]

DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL – LOTE 1"

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]55[illegible]0[illegible]
[illegible]

[illegible]

DE[illegible]0[illegible]

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

Contrato de Obra No. 558-2022 **Contratista:** CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL

Contrato de Interventoría No. 1052-2022 **Interventoría:** CONSORCIO VIASCOL

Objeto Contrato de Obra:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES DESDE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

INFORME MENSUAL No. 23 **MES O PERIODO:** jun-25

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	3
1	**INTRODUCCIÓN**		6
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		7
2.1	Localización		8
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		8
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		9
2.4	Características técnicas del proyecto		10
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		12
3.1	Información general del contrato		12
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		14
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		17
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		17
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		20
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	20
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	29
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	31
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	39
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	42
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	44
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	53
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	64
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		67
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	68
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	69
	• Seguimiento Programa de Obra		70
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	76
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	77
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	78
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		79
5.1	Información general del contrato		79
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		80
5.3	Informes especialistas y profesionales		82
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		100
5.5	Informe matriz de riesgos.		101
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		101
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		108
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		109
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	109
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	124
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	132
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	135
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	144
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		151
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	157
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		161
8	**Anexos**		162
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		162
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		163
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		165
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		166

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

Firma:

Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. 2248 de fecha 19/06/2025

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	□□□□□□O□□□O□□□DE□□□□ □RO□E□O M□□O□□□E□E□□□□□□DE□□RO E□□□O□DE□FR□E□□R□□□□R□DE□R□□□□OR□E M□□□□□□DE□□ER□E□□OR□□OBR□□□B□□□ RE□□ME□□ME□□□□□□E□□□□DO□□E□ER□□DE□□□RO□E□□O	□□DI□□O	M□□□MN□N□□□□R□2
		□□R□ION	□
		□□□NA	

□□□□□A 2□□□□2□2□ D□□□M□□□A□□□

□□D□DE□E□□□OR□□□ U□DIR□□□IÓN D□□IA□R□□IONA D RE□□□□□ERR□OR□□□□A□U□A □ER ODO ME□□□ □□2□

□O□□R□□O DE OBR□□□□□ □□□2.22

OB□E□O□ M□JORAMI□N□O Y MAN□□NIMI□N□O D□□□ND□RO□□□A□ONA□□□□D□□D□□A□□OMUNIDAD D□□AN□□RAN□□□□O

□A□□A□□□A□□O UR□ANO D□□MUNI□□IO D□□U□R□O NARI□O D□□AR AM□N□O D□□AMA□ONA□

□O□□R□□□□□□□ □ON□OR□IO□ARO□□ND□RO□□□A□ONA□

□□□□O□□□□□□□ FE□□□DE□□□□O□ FE□□□DE□□□□E□□□□□ FE□□□DE RE□□□D□□□□ FE□□□DE□□E□□ME□□O□ □□□□O□□□M□□DO□ U□□□□□ □□□□□□d□□22 d□□ 2□□2.2□ □□□2.2□ □□□2.2□ 15□7.2.2□ 2□□□□□□2d□□ □□□OR□□□□□□□□d□□□□□□ □□□OR□D□□O□□E□□□□□d□□□□□ □□□OR□□□M□□□DO□□□□□d□□□□□ □□□□□□O□O□□ED DO□ □□□□□□O□MOR□□□DO□

□□O□□R□□O DE□□□ER□E□□OR□□ □□□2.2.22 □□ER□E□□OR□ □ON□OR□IO□IA□□O□ □□□ER□□OR DE□□O□□R□□O DE□□ER□E□□OR□□□JESUS EDUARDO RINCON SILVA

□□□□□□□E F□□□O□□O□□R□□□DO

□□□□□D□D	□□D□D	□□□□D□D
□□□□r□□□□□		
M□□r□□□□□□		
R□□□□□□□□□		
□□□□□□		
□□□□□□□		
□□□□□□□□		
M□□□□□ □□□□		
O□r□□□ □□□□□□□□□r□ □□□□□□	□□ND□RO□□ □□A□ONA□	M2

□□□□□□E F□□□O E□E□□□□DO DE□□□O□□R□□O

□□□□□D□D	□□D□D	□□□□D□D ME□	□□□□□D□D □□□M□□□D□
□□□□r□□□□□			
M□□r□□□□□□			
R□□□□□□□□□			
□□□□□□			
□□□□□□□			
□□□□□□□□			
M□□□□□ □□□□			
O□r□□□□□□□□□□r□ □□□□□□	□□ND□RO□□ □□A□ONA□	M2	□□2 □□□□□□□

□□□□□□E F□□□□□ERO

□□□OR□□O□□□□□O□□R□□□DO□□□□□□DO□□□O□□□D□□O□□□E□□

	B□□□□O	□□□	□O□□□
O□RA□□			□□□□□□□□□□□□□□
□A□□A			□□□□□□□□□□□□
□ARA□□□RI□A□ION□IA□			□□□□□□2□□□□
			□□□□
			□□□□
A□OR□□O□A□D□□□ON□RA□O			□□□□□□2□□□□□

E□□□□□□□□□□□□□□d□□□□□□rr□□□□□d□r□□□□□r□□□□□d□□□□□□□□r□□□□□□□□□□□□□ □□□□□r□□□d□□

□□ER□□□□E□□OBR□

IN□□R□□□N□O□RA□□RO□□RAMADA A□UMU□ADA□A□□ IN□□R□□□N□O□RA□□U□□U□ADA A□UMU□ADA□□□□ A□AN□□D□□O□RA□□N□□ □□□A□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□2 □□□□□

EM□□EO□□□E□ER□DO□□E□□E□ME□

MANO D□□O□RA□□A□□□□ADA□□ MANO D□□O□RA NO□□A□□□□ADA□□ □M□□□O□□INDIR□□□O□□□N□RADO□□ □O□A□□M□□□O□□□□N□RADO□□

□ 2 5

RE□□□RO FO□O□R□F□□O





□E□DERO□E□□O□□□□□□FR□□□□□O

□E□DERO□E□□O□□□□□□FR□□□□□O

RO□ED M□E□□□O□DE M□□□□□O□□□□□□□□□d□□r□□□□□d□□□□□□□□□□□□□□□r□□□r□□□□d□□□□□r□□□□d□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□r□□

N□□r□□MAR□Y MI□□N□□ARRIA□□ON□A□□□ D□r□□□rd□I□□r□□□□r□□ M□r□□□□□r□□□□□□□□N□□2□2□2□□□2□□□ND

Or□□□□I□□r□□□r□□□□□□□□d□I□□r□□□r□□Ar□□□d□□□□□□d□□IN□IA□□ □□□□I□□r□□□rDr□□□□□□r□r□□

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 6
2 DESCRIPCION DEL PROYECTO 7
2.1 LOCALIZACION 8
2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 8
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 9
2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 10
2.4.1 Parámetros de diseño 10
2.4.2 Sección típica de la vía y estructura del pavimento 10
2.4.3 Descripción de actividades 11
3 INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 12
3.1 Información general 12
3.2 Descripción resumida de las actividades ejecutadas en el mes 13
3.3 Seguimiento de Ítems No previstos 155
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 16
4 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA 18
4.1 Informe Semanal MEPI-MN1-IN-15-FR-3 18
4.2 Control diario de maquinaria y equipo contrato de obra. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. 25
4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6. 27
4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra. Formato. MEPI-MN1-IN-15-FR-8. 33
4.5 Estado general del tiempo. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. 36
4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11. 38
4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-12. 40
4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra. FORMATO MEPI-MN-1IN-15-FR-14 55
4.9 Otros documentos de seguimiento mensual 58
4.9.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo. MEPI-MN-IN-2-FR-1 59
4.9.2 Seguimiento Programa de Obra y Programa de Inversiones 61
4.9.3 Seguimiento Programa de Inversiones. Se debe anexar copia del Programa de inversiones aprobado vigente (Formato MINFRA-MN-IN-6-FR-1) y copia del documento de seguimiento al programa de obra e inversiones realizado por la Interventoría (Formato MINFRA-MN-IN-6-FR-2) 63
4.9.4 Copia de las Actas de comité de obra (Formato MINFRA-MN-IN-14-FR-1) y Acta de

reunión (Formato MINFRA-MN-IN-14-FR-2). 66
5 INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 74
5.1 Información General del contrato 74
5.2 Descripción resumida de las actividades ejecutadas por parte del Interventor en el mes. ... 75
5.3 Informes de Especialistas y profesionales 76
5.4 Informe del Programa Anual de Caja 125
5.5 Informe de matriz del riesgo 126
5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría 126
5.7 Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. 126
6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 127
6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría - Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 127
6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría – Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 184
6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 189
6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría -Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13. 191
6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría – Formato MEPI- MN1-IN-15-FR-15. 199
6.6 Otros Documentos de Seguimiento Mensual 208
6.6.1 Informe de inversión y buen manejo del anticipo y/o pago anticipado del interventor – Formatos MEPI-MN-IN-3-FR-1 / MEPI-MN-IN-3-FR-2. 208
6.6.2 Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado- Formato MEPI-MN-IN-9-FR-2 214
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 216
8 ANEXOS 217
8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo. ..... .217
8.2 Registro fotográfico y video del avance de las obras 218
8.3 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas. 219
8.4 Copia de la Bitácora del mes correspondiente 220


[illegible] [illegible] ROD[illegible]

[illegible] obligaciones que se derivan de la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, [illegible] FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AUTOPISTAS DEL ROSARIO S.A.S. EN LA VEREDA COMUNIDAD RURAL” – LOTE 1”, para [illegible]

[illegible] INFIA [illegible] [illegible] [illegible]

CONSORCIO VIASCOL

□ □ □ □

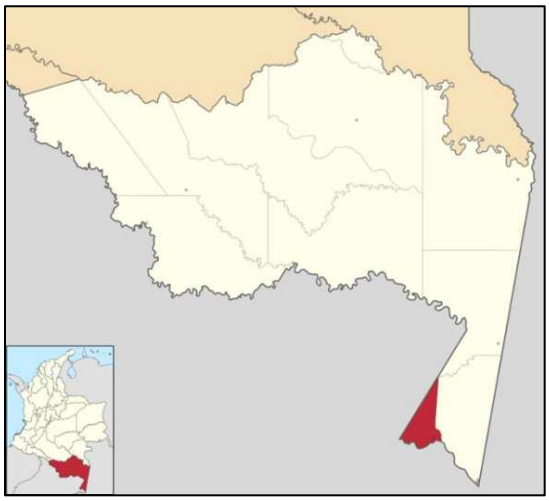



DE RO E O

E RO E DO DE

Estado inicial – Camino ancestral



Estado inicial – Camino ancestral




Estado inicial – Camino ancestral



Estado inicial – Camino ancestral

2.4.1 Parámetros de diseño

2.4.2 Sección típica de la vía y estructura del pavimento

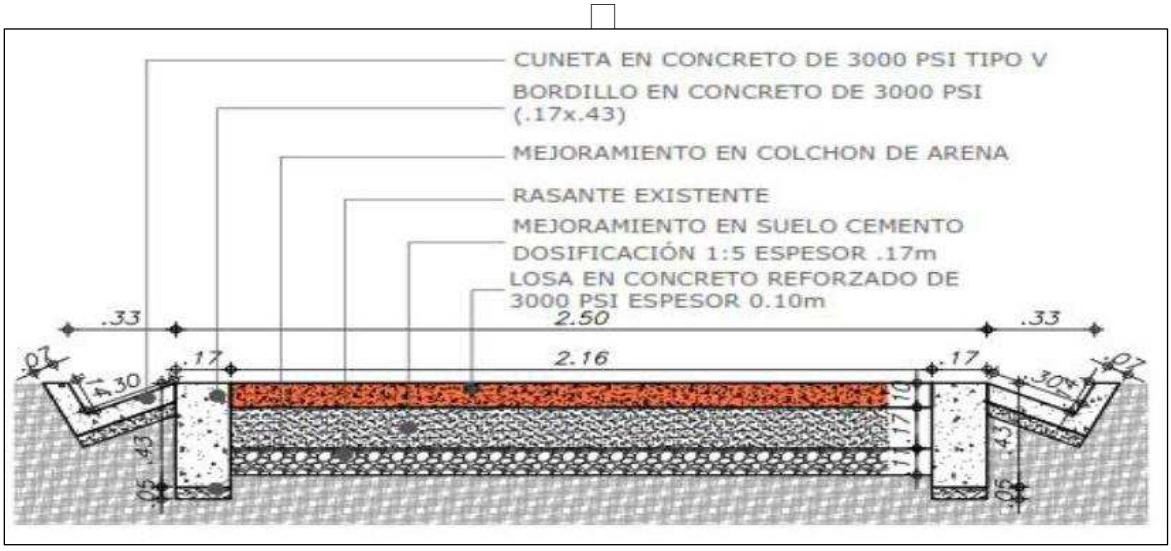

2.4.3 Descripción de actividades

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES DESDE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,00	1,01	201,00	201,90	Demolicion de andenes y pavimento en general e<= 20cm	M2	747,00	131.106,00	97.936.182,00
2,00	1,02			Retiro de demolición	M3	149,40	486.507,00	72.684.146,00
3,00	1,03			Cerramiento provisional en tela verde H = 2,00 m	M	996,00	30.048,00	29.927.808,00
Subtotal								200.548.136,00
5,00	2,01	210,00	210,1,1	Excavaciones varias en material comun	M3	2.430,36	66.869,00	162.515.743,00
6,00	2,02	610,00	610,10	Relleno compactado en material seleccionado de la excavación (incluye trasiego manual excavacion)	M3	1.600,81	285.270,00	456.663.069,00
7,00	2,03	235,00	235,10	Base en arena-cemento 1:10	M3	836,73	1.732.416,00	1.449.564.440,00
8,00	2,04	500,00	500,10	Sendero peatonal en concreto de 3.000 psi, ancho 2,5m, espesor de 10cm. Acabado estampado color rojo tipo espina de pescado. Incluye sello de juntas.	M2	4.294,00	457.496,00	1.964.487.824,00
9,00	2,05	500,00	500,10	Estampado en color tipo espina de pescado para concreto sobre bordillo.	M2	646,00	121.609,00	78.559.414,00
10,00	2,06	671,00	671,10	Cunetas en concreto de 3.000 psi, base 0,30 y altura 0,14 y de e=0,07m.	M	3.800,00	264.518,00	1.005.168.400,00
11,00	2,07	672,00	672,10	Bordillo en concrato de 3.000 psi, base=17cm, altura=43cm	M	3.800,00	200.980,00	763.735.400,00
12,00	2,08	640,00	640,10	Acero de refuerzo 60.000 psi	KG	48.086,56	11.649,00	560.160.337,00
13,00	2,09	231,00	231,10	Geotextil T2100	M2	4.750,00	12.567,00	59.693.250,00
14,00	2,10	630,00	630,10	Caja de inspección en concreto reforzado de 3.000psi, de 60x60cm con tapa en concreto y cañuela.	UN	15,00	1.847.681,00	27.715.215,00
15,00	2,11	663,00	663,10	Suministro e instalación de Tubería corrugada D=12", incluye excavación, base en arena y atraque, relleno compactado con material de la excavación.	M	84,00	288.763,00	24.256.092,00
16,00	2,12	710,00	710,10	Señalización vertical.	UN	24,00	428.927,00	10.294.248,00
Subtotal								6.562.813.432,00
							SUBTOTAL OBRAS	6.763.361.568,00

SUBTOTAL OBRAS (NO APLICA IVA)		6.763.361.568,00
PAGA	NO MODIFICAR	64.000.000,00
CARACTERIZACION VIAL	NO MODIFICAR	5.781.027,00
VALOR TOTAL		6.833.142.595,00

□□ □□FORM□□□□□ □DE□□□O□□R□□O DE OBR□□

□□□□□ □□□□r□ □□□□□□□□□□r□□□□

□□MERO DE□□□RO□E□O DE□ □E□E□□□□ □□	□I□I□A□I□N□□U□□I□A N□□□□2□D□□2□22□
□O□□R□□O□□□□	□□□□D□□2□22□
FE□□□□DE□□□□□□R□□□□□□ □□	□□□D□□NO□I□M□R□□D□□2□22□
□ OB□E□O□	M□JORAMI□N□O□Y□MAN□□NIMI□N□O□D□□□□ND□RO□□ □□A□ONA□□□□□ D□□D□□ □A□ □OMUNIDAD□ D□□ □AN□ □RAN□I□□O□ □A□□A□ □□□□ □A□□O□ UR□ANO□ D□□□ MUNI□I□IO□D□□□U□R□O□NARI□O□D□□AR□AM□N□O□D□□□ AMA□ONA□□□□
□O□□R□□□□□□□	□ON□OR□IO□□AIRO□□□□ND□RO□□□A□ONA□□ NI□□□□□□□□□


FECHA OTRO SI N° 9	14/03/2025
OTRO SI N° 10	PRORROGA N° 10- 60 DIAS
FECHA OTRO SI N° 10	28/03/2025
ACTA N° 10	SUSPENSIÓN N° 3
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3	24/06/2025
DIAS DE SUSPENSIÓN	15 DIAS
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	15/07/2025

D

- R d rd d

22



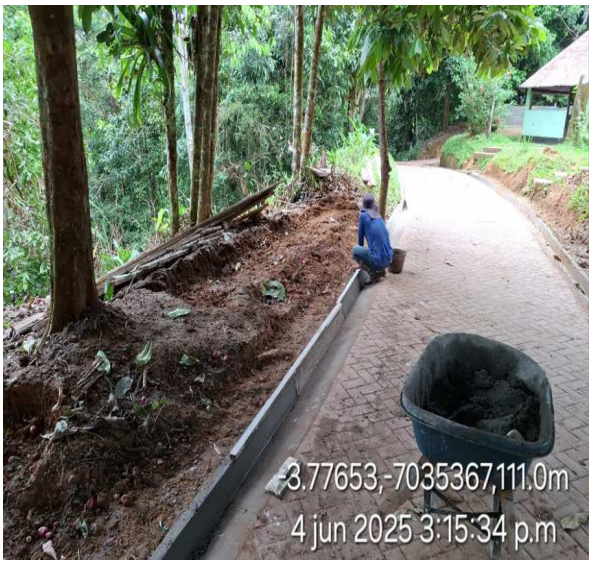

R d rd d r

R d rd d r

- R d r d

2

r





2 d r 2





- *Levantamiento topográfico*





M d IA O d d d d d d
N d r

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO
NP1	ml	cunetas en concreto 21Mpa, no incluye refuerzo de sección B=0.30m, h=0,14m y espesor=0.07m	249.685
NP2	ml	Sumideros transversales h=0.30m , A=0.40m, incluye excavación y relleno con material de la excavación	627.185
NP3	m3	Concreto resistencia 14 Mpa para solados y atraques	1.466.927
NP4	m3	Box, aletas, muros armados en concreto 28 Mpa(4000Psi) Suministro y construcción	2.127.545

E d d r r r d r r

r d d 2 2 d d r d 2 r d r d r r d r d d r d d r d 2 d 2 2 d r d r d d d r d d d d d d

M		PROGRAMADO				EJECUTADO				ADICIONAL O AMPLIACION			
N		PERIODO		ACUMULADO		PERIODO		ACUMULADO		PERIODO		ACUMULADO	
2													

PRESUPUESTO OFICIAL										
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]										
[illegible]	2[illegible]	2[illegible]	Demolicion de andenes y pavimento en general e<= 20cm	M2	570.1	$ 131,106.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100.00%
[illegible]2			Retiro de demolición	M[illegible]	58.57	$ 486,507.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]2[illegible]	100.00%
[illegible]			Cerramiento provisional en tela verde H = 2,00 m	M	996	$ 30,048.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100.00%
[illegible]							[illegible]05[illegible]00		[illegible]05[illegible]59	100.0%
2[illegible]	2[illegible]	2[illegible]	Excavaciones varias en material comun	M3	2788.75	$ 66,869.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100.00%
2.02	610	610.1	Relleno compactado en material seleccionado de la excavación (incluye trasiego manual excavacion)	M3	1494.92	$ 285,270.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100.00%
2.03	235	235.1	Base en arena-cemento 1:10	M3	870.21	$ 1,732,416.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	89.59%
2.04	500	500.1	Sendero peatonal en concreto de 3.000 psi, ancho 2,5m, espesor de 10cm. Acabado estampado color rojo tipo espina de pescado. Incluye sello de juntas.	M2	4100.4	$ 457,496.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	96.06%
2.05	500	500.1	Estampado en color tipo espina de pescado para concreto sobre bordillo.	M2	649.23	$ 121,609.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	95.50%
2.06	671	671.1	Cunetas en concreto de 3.000 psi, base 0,30 y altura 0,14 y de e=0,07m.	M			[illegible]			
2.07	672	672.1	Bordillo en concreto de 3.000 psi, base=17cm, altura=43cm	M	3798.3	$ 200,983.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	96.02%
2.08	640	640.1	Acero de refuerzo 60.000 psi	KG	43183.46	$ 11,649.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	94.42%
2.09	231	231.1	Geotextil T2100	M2	4095.9	$ 12,567.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]2	99.27%
2.10	630	630.1	Caja de inspección en concreto reforzado de 3.000psi, de 60x60cm con tapa en concreto y cañuela.	UN	15	$ 1,847,681.00	[illegible]			
2.11	663	663.1	Suministro e instalación de Tubería corrugada D=12", incluye excavación, base en arena y atraque, relleno compactado con material de la excavación.	M	84	$ 288,763.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	50.42%
2.12	710	710.1	Señalización vertical.	UN	24	$ 428,927.00	[illegible]		[illegible]	0.00%
							[illegible]55[illegible]00		[illegible]55[illegible]	93.71%
N. P 1	671	671.1	Cunetas en concreto 21 Mpa, no incluye refuerzo de seccion B= 0,30, h=0,14 y de espesor=0,07m.	M	3792.5	$ 249,685.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	74.52%
N. P 2	630	630.1	SUMIDEROS TRANSVERSALES h=0,30m, a=0,40m, incluye excavación y relleno con material de la excavación.	M	37.5	$ 627,185.00	[illegible]		[illegible]	0.00%
OBR[illegible]OM[illegible]EME[illegible]R[illegible]O[illegible]E[illegible]DO										
3.01	210	210,1,1	Excavaciones varias en material comun	M3	142.70	$ 66,869.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.02	610	610.1	Relleno compactado en material seleccionado de la excavación (incluye trasiego manual excavacion)	M3	7.51	$ 285,270.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
N. P 3	630	630.1	CONCRETO RESISTENCIA 14Mpa PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	[illegible]	$ 1,466,927.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
N. P 4	630	630.1	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20.7 MPa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	50.48	$ 2,127,545.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.03	640	640.1	Acero de refuerzo 60.000 psi	KG	[illegible]	$ 11,649.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							[illegible]00		[illegible]5[illegible]	[illegible]
AJU[illegible]A[illegible]O							[illegible]0.00			
							[illegible]5[illegible]00		[illegible]0.90[illegible]050[illegible]	
			[illegible]B[illegible]O[illegible]B[illegible]O DE OBR[illegible]				[illegible]5[illegible]00		[illegible]d[illegible]	
			[illegible]				[illegible]000.000.00		9[illegible]	
			[illegible]R[illegible]ER[illegible]				[illegible]5[illegible]0[illegible]00			
			[illegible]OR[illegible]O[illegible]				[illegible]595.00			

RE ORE E E O ME O R O DE OBR

ME M 5 FR

N 2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/06/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES DESDE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ SEMANA No.: 89 del 30/05/2025 al 5/06/2025 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA **APOYO A LA SUPERVISIÓN:** NANCY PATRICIA PARRA ROJAS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES DESDE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

1,8 KM de mejoramiento y mantenimiento de senderos peatonales desde la comunidad San Francisco hasta el Municipio de Puerto Nariño

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los senderos peatonales tendrán una sección transversal compuesta por 2,16 m de ancho de la placa, confinada con sardineles de concreto reforzado de 17 cm de ancho x 43 de alto y cunetas laterales de 40 cm de sección transversal en planta

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO KAIROS SENDEROS PEATONAL		
INTEGRANTES:	FREDDY MAURICIO CEBALLOS DELGADILLO 25% INGEGAB S.A.S. 40% EDWIN ALBERTO MESTRE HERNANDEZ 35%		
CONTRATO No.	558-2022	**VALOR INICIAL:**	$ 6.833.142.595,00
FECHA DE INICIO:	6/04/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	2/06/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 6.833.142.595,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO VIASCOL		
INTEGRANTES:	INGENOBRAS CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAS (50%) CIAF LTDA INGENIERIA (45%) PROCIVING SAS (5%)		
CONTRATO No.	1052 DE 2022	**VALOR INICIAL:**	$ 6.810.230.532,00
FECHA DE INICIO:	16/11/2022	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	**VALOR ACUMULADO:**	$ 6.810.230.532,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2025	**VALOR ANTICIPO:**	$ 386.791.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 386.791.000,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 6.833.142.595			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 5.170.249.535			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.662.893.060			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 400.000.000	$ 3.400.000.000	$ 3.010.230.532	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 400.000.000	$ 3.400.000.000	$ 2.821.953.943	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -		$ 188.276.589	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 6.763.361.568,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 6.089.054.419,67	90,03%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 6.078.909.377,32	89,88%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ **(10.145.042,35)**	**-0,15%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 6.089.054.419,67	90,03%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 6.078.909.377,32	89,88%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ **(10.145.042,35)**	**-0,15%**
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10.145.042,35	0,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 6.810.230.532,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 6.810.230.532,00	100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.995.404,50	0,59%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 40.378.914,25	0,59%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
OBSERVACIONES: Se radicaron a la territorial las actas de costos correspondientes a los meses de marzo y abril de 2025

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 2.049.942.778,50
Amortizado $	$ 1.551.074.860,50
Saldo $	$ 498.867.918,00

	INDICADOR I/C
En el mes:	3,98
Acumulado:	1,12

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 386.791.000,00
Amortizado $	$ 386.791.000,00
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 90,03% Avance o Atraso Físico % -0,15%
Meta Física Ejecutada % 89,88%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia** _____	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector 3**	**Total**	**%**
Demolicion de andenes y pavimento en general e<= 20cm	M2	510,70	510,70		Prog	83,23	268,70	158,77	510,70	100,00%
					Ejec	83,23	268,70	158,77	510,70	100,00%
* Retiro de demolición	M3	58,57	58,57		Prog	9,37	34,32	14,88	58,57	100,00%
					Ejec	9,37	34,32	14,88	58,57	100,00%
* Cerramiento provisional en tela verde H = 2,00 m	ML	996,00	996,00		Prog	110,32	654,79	230,89	996,00	100,00%
					Ejec	110,32	477,19	230,89	996,00	100,00%
* Excavaciones varias en material comun	M3	2.788,75	2.788,75		Prog	164,08	2262,94	361,73	2788,75	100,00%
					Ejec	164,08	2262,94	361,73	2788,75	100,00%
Relleno compactado en material seleccionado de la excavación (incluye trasiego manual excavacion)	M3	1.494,92	1.494,92		Prog	114,99	1040,98	338,95	1494,92	100,0%
					Ejec	114,99	1040,98	338,95	1494,92	100,00%
* Base en arena-cemento 1:10	M3	870,21	870,21		Prog	68,80	650,71	150,70	870,21	100,00%
					Ejec	56,1	587,48	136,07	779,65	89,59%
* Sendero peatonal en concreto de 3.000 psi, ancho 2,5m, espesor de 10cm. Acabado estampado color rojo tipo espina de pescado. Incluye	M2	4.100,40	4.100,40		Prog	335,09	2961,68	715,14	4011,91	97,84%
					Ejec	456,54	3482,27	699,95	3938,81	96,06%
Estampado en color tipo espina de pescado para concreto sobre bordillo.	M2	649,23	649,23		Prog	46,44	485,69	103,09	635,22	97,84%
					Ejec	47,71	474,03	98,26	620,00	95,50%
* Bordillo en concreto de 3.000 psi, base=17cm, altura=43cm	ML	3.798,30	4.079,80		Prog	249,87	2880,10	586,29	3716,26	97,84%
					Ejec	306,18	3341,09	602,8	3647,27	96,02%
Acero de refuerzo 60.000 psi	KG	43.183,46	43.183,46		Prog	4299,12	28096,16	10789,17	43184,45	100,00%
					Ejec	4086,19	26434,8	10254,36	40775,35	94,42%
* Geotextil T2100	M2	4.095,90	4.095,90		Prog	342,19	3005,05	748,66	4095,90	100,0%
					Ejec	339,69	2983,11	743,19	4065,99	99,27%
Caja de inspección en concreto reforzado de 3.000psi, de 60x60cm con tapa en concreto y cañuela.	UND	15,00	15,00		Prog					
					Ejec					
Suministro e instalación de Tubería corrugada D=12", incluye excavación, base en arena y atraque, relleno compactado con material de la excavación.	ML	84	84		Prog					
					Ejec		38,1	4,25	42,35	50,42%
Señalización vertical.	UND	24	24		Prog					
					Ejec					
NP 1 Cunetas en concreto 21 Mpa, no incluye refuerzo de seccion B= 0,30, h=0,14 y de espesor=0,07m.	ML	3792,5	3792,5		Prog	264,34	2845,61	551,86	3661,81	96,55%
					Ejec	205,22	2620,85	447,12	2826,07	74,52%
NP2 sumideros transversales h=0,30m, a=0,40m, incluye excavación y relleno con	ML	37,5	37,5		Prog					
					Ejec					
Excavaciones varias en material comun	M3	142,7	142,7		Prog		142,7		142,70	100,00%
					Ejec		142,7		142,70	100,00%
Relleno compactado en material seleccionado de la excavación (incluye trasiego manual excavacion)	M3	7,51	7,51		Prog		7,51		7,51	100,00%
					Ejec		7,51		7,51	100,00%
NP3 Concreto resistencia 14Mpa para solados y atraques	M3	5,08	5,08		Prog		5,08		5,08	100,00%
					Ejec		5,08		5,08	100,00%
NP4 Box,aletas, muros armados en concreto 20.7 MPa (4000 PSI) suminsitro y construcción	M3	50,48	50,48		Prog		48,59		48,59	96,26%
					Ejec		25,24		25,24	50,00%
Acero de refuerzo 60.000 psi	KG	6.666,88	6.666,88		Prog		6409,54		6409,54	96,14%
					Ejec		4744,42		4744,42	71,16%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: K0+000 - K0+147
TRAMO Y/O SECTOR (2): K0+000 - K1+460
TRAMO Y/0 SECTOR(3) K0+000 - K0+300

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Equipos de Topografia	1	1
Mezcladora	1	2
Compactador tipo rana	1	1
Compresor	1	
Equipo de soldadura	1	
Vibrador de concreto	1	1
Cortadora de concreto con disco		1
Molde para estampado	1	1
TOTAL	7	7

Equipo minimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

NOTA: Equipos como el compresor fueron utilizados durante las actividades iniciales, una vez terminadas salieron del proyecto, de igual forma los equipos de topografía se encuentran en sitio pero durante la semana estuvieron inactivos

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	E.B.Braulio Construções Rio Javari ubicado en Benjamin Constan (Brasil)	PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	Associação do Mineradores ubicado en Japurá (Brasil)	PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	

OBSERVACIONES: Considerando que en Amazonas no existen Canteras ni actividades de explotación minera, se contempla la compra de materiales en Brasil teniendo en cuenta los acuerdos de libre comercio entre los dos paises (Colombia y Brasil) junto con el conocimiento de las autoridades locales. En relación a las fuentes de materiales, estas están ubicadas en los municipios Benjamin-Constant y Japurá (Brasil). Respecto a los RCD, considerando que en la zona no se cuenta con lugar autorizado para la disposicion de RCD, se realizará la reutilizacion y aprovechamiento de estos en las actividades constructivas del proyecto. **No presenta novedades respecto a lo descrito en la semana anterior.**

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES: Se otorga autorizacion de ocupacion de cauce promovida por la alcaldia de Puerto Nariño mediante la resolución No. 0839 del 28/06/2024. de Corpoamazonia. Adicional, el Contratista, mediante mesa de trabajo realizada el 05 de julio de 2024, aclara que no se requiere la prorroga del permiso de Concesión de aguas superficiales dado que el suministro se hará mediante la Empresa de Servicios Publicos del municipio, para lo cual Interventoría indica que se debe demostrar que se cumplieron con las obligaciones del acto adminitrativo mediante paz y salvo emitido por la autoridad ambiental.
Interventoría solicita al Contratista informar el estado de las compensaciones establecidas en el permiso ambiental de concesión de aguas superficiales, mediante oficio CE-VIASCOL-1170. Adicional, se informa solicitar el estado de la compensación establecida establecida en el permiso de Ocupación de Cauce**. No presenta novedades respecto a lo descrito en la**

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES: El Contratista remite PAGA versión 7 mediante comunicado CKSP-128-0558-2022 recibido el 21/09/2024. A partir de la revisión realizada por la especialista ambiental, se emite concepto de aprobación. Se solicita al Contratista remitir el Plan de Inversión versión 2 mediante oficio CE-VIASCOL-1695. **No presenta novedades respecto a**

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	15	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	13	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 22

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: comunidad indigena San Francisco Puerto Nariño-Amazonas

OBSERVACIONES: Revisión del buzón de sugerencias, en el que no se encuentra ningun formato diligenciado de pqrs

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: No se requiere la adquisición de predios para la ejecución del proyecto.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Actividades de la semana

TRAMO 2 (SAN FRANCISCO)

- Instalación de formaleta y malla para cunetas del Pr 0+790 al Pr 0+780
- Relleno costados de las cunetas

TRAMO 3 (INTERNADO)

- Resane de bordillos de las cunetas
-Toma de densidades a la base arena/cemento del Pr 0+230 al Pr 0+280


Actividades acumuladas

'- Demolición de andenes y pavimento en general: del Pr0+000 al Pr0+147 tramo 1 y del Pr0+000 al Pr0+280 tramo 2
- Excavaciones varias en material común: para bordillos, Pr0+000 al Pr0+147 ambos costados tramo 1 ; Pr0+000 al Pr1+460 ambos costados tramo 2: Pr 0+000 al Pr 0+220 tramo 3 ambos costados
- Excavaciones varias en material comun: para ancho de calzada, del Pr0+000 al PR0+147 tramo 1 ; Pr0+000 al Pr1 +460 tramo 2 y del Pr 0+000 al Pr 0+300 tramo 3
- Instalación de geotextil T2100: Pr0+000 al PR0+147 tramo 1; Pr0+000 al Pr1+460 tramo 2 y del Pr0+000 al 300 tramo 3
- Base en arena cemento: Pr0+000 al PR0+147 tramo 1; Pr0+000 al Pr1+460 tramo 2 y del Pr0+000 al 0+300 tramo 3
-'Sendero peatonal en concreto incluye estampado : Pr0+000 al Pr0+147 tramo 1 ; del Pr0+000 al Pr 1+460 tramo 2 ; Pr 0+000 al Pr 0+223; del 0+284 al Pr 0+300 tramo 3
-'Bordillo en concreto Pr0+000 al Pr0+147 ambos costados tramo 1 ; del Pr0+000 al Pr1+460 tramo 2 ambos costados ; Pr 0+000 al Pr 0+223 ; del 0+284 al Pr 0+300 tramo 3 ambos costados
-'Cunetas en concreto : Pr0+000 al Pr0+147 ambos costados tramo 1 ;del Pr0+000 al Pr0+504 tramo 2 ambos costados ; Pr 0+710 al Pr 0+740 tramo 2 ambos costados;Pr 0+810 al Pr 1+460 tramo 2 ambos costados; Pr 0+123 al Pr 0+223 ambos costados tramo 3(internado)
-Acero de refuerzo para sendero peatonal: del Pr0+000 al Pr0+147 tramo 1; del Pr0+000 al Pr 1+460 tramo 2; Pr0+000 la Pr 0+223 ; del Pr 0+284 al Pr 0+300 tramo 3 : para bordlillo: Pr0+000 al Pr 0+147 tramo 1 ambos costados ; del Pr 0+000 al Pr1+460 tramo 2 ambos costados; y del Pr 0+000 al Pr 0+223 ; del Pr 0+284 al Pr 0+300 ambos costados tramo 3;para cunetas: Pr0+000 al Pr0+147 tramo 1 ambos costados; Pr 0+000 al Pr 0+504 tramo 2 ambos costados;Pr 0+710 al Pr 0+740 ambos costados tramo 2;Pr 0+930 al Pr 1+460 ambos costados tramo 2;) Pr 0+123 al Pr 0+223 ambos costado tramo 3 (internado; para box culvert :Pr 1+190 tramo 2 : box culvert :Pr 0+590 tramo 2
- Concreto para muros, aletas del box culvert Pr 1+190 tramo 2

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Concreto para sendero Pr 0+250 al Pr 0+280 tramo 3
- Concreto para bordillo Pr 0+250 al Pr +280 tramo 3 ambos costados
- Concreto para cunetas Pr 0+080 al Pr 0+123 tramo 3 ambos costados
- Concreto para cunetas Pr 0+750 al Pr 0+810 tramo 2 ambos costados
- Trasiego y acopio de material tramo N° 1 Y 2
- continuación acero del box 0+590 tramo 2
- Rellenos costados de las cunetas tramo N° 2

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

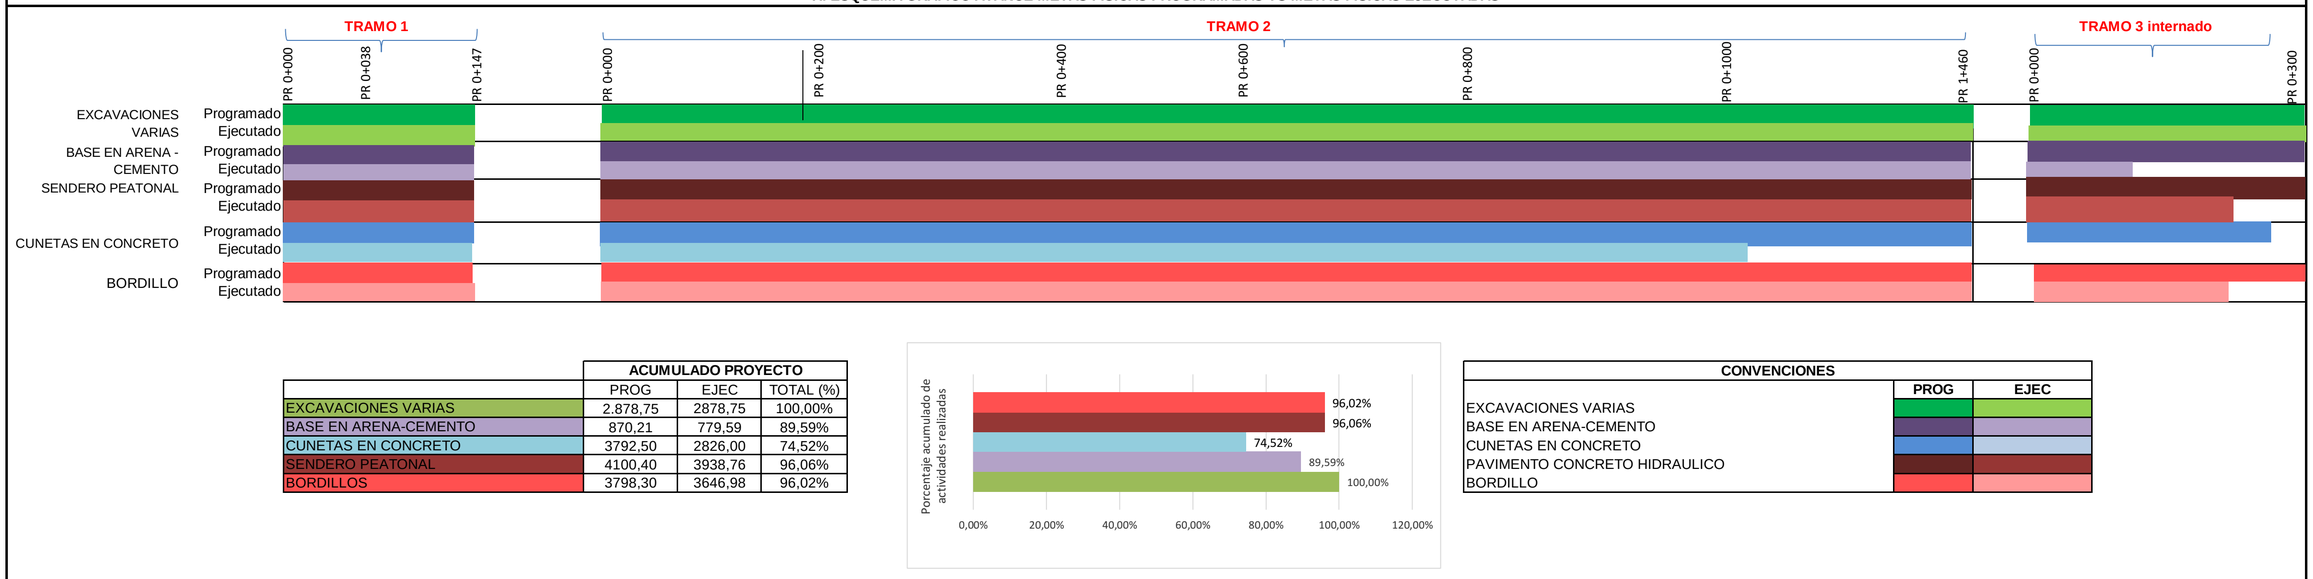

	ACUMULADO PROYECTO		
	PROG	EJEC	TOTAL (%)
EXCAVACIONES VARIAS	2.878,75	2878,75	100,00%
BASE EN ARENA-CEMENTO	870,21	779,59	89,59%
CUNETAS EN CONCRETO	3792,50	2826,00	74,52%
SENDERO PEATONAL	4100,40	3938,76	96,06%
BORDILLOS	3798,30	3646,98	96,02%


CONVENCIONES		
	PROG	EJEC
EXCAVACIONES VARIAS		
BASE EN ARENA-CEMENTO		
CUNETAS EN CONCRETO		
PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO		
BORDILLO		

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



RELLEN0S COSTADOS DE CUNETAS TRAMO 2

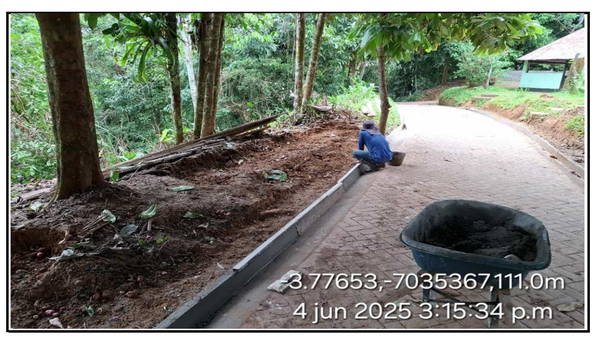

RESANE DE BORDILLOS DE CUNETAS TRAMO 3 INTERNADO



TOMA DE DENSIDADES BASE ARENA/CEMENTO TRAMO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*Chequeo permanente al cronograma de actividades y programa de inversión *Mediante oficio CE-VIASCOL-1988 se le recuerda al contratista sobre la entrega de los requerimientos ambientales necesarios para la liquidación del contrato de referencia. *Mediante oficio CE-VIASCOL-1989 se otorga el aval a la prorroga N° 11 *Mediante oficio CE-VIASCOL-1997 se le solicita al contratista la reprogramación de obra y el programa de inversión a la prorroga N° 11 *Mediante correo electrónico se le reitera al contratista la firma de formatos obra para informe mensual del mes de mayo *Seguimiento del proyecto, mediante comité de obra realizado entre contratista, interventoría y supervisión, en las cuales se menciona el estado de avance, compromisos y temas relevantes en el desarrollo de la obra. * Control al plan de inspección y ensayos de laboratorio. * Supervisión cada una de las actividades ejecutadas por el contratista	FIRMA NOMBRE: MARLY MILENE SARRIA GONZALEZ Matrícula Profesional No.: 25202-136201 CND Wilver L. Ropero A. VoBo. Residente de interventoría Wilver Ropero

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/06/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES DESDE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ SEMANA No.: 90 del 6/06/2025 al 12/06/2025 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JESUS EDUARDO RINCON SILVA **APOYO A LA SUPERVISIÓN:** NANCY PATRICIA PARRA ROJAS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES DESDE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

1,8 KM de mejoramiento y mantenimiento de senderos peatonales desde la comunidad San Francisco hasta el Municipio de Puerto Nariño

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los senderos peatonales tendrán una sección transversal compuesta por 2,16 m de ancho de la placa, confinada con sardineles de concreto reforzado de 17 cm de ancho x 43 de alto y cunetas laterales de 40 cm de sección transversal en planta

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO KAIROS SENDEROS PEATONAL		
INTEGRANTES:	FREDDY MAURICIO CEBALLOS DELGADILLO 25% INGEAB S.A.S. 40% EDWIN ALBERTO MESTRE HERNANDEZ 35%		
CONTRATO No.	558-2022	**VALOR INICIAL:**	$ 6.833.142.595,00
FECHA DE INICIO:	6/04/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	2/06/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 6.833.142.595,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO VIASCOL		
INTEGRANTES:	INGENOBRAS CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAS (50%) CIAF LTDA INGENIERIA (45%) PROCIVING SAS (5%)		
CONTRATO No.	1052 DE 2022	**VALOR INICIAL:**	$ 6.810.230.532,00
FECHA DE INICIO:	16/11/2022	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	**VALOR ACUMULADO:**	$ 6.810.230.532,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2025	**VALOR ANTICIPO:**	$ 386.791.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 386.791.000,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 6.833.142.595			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 5.170.249.535			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.662.893.060			
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 400.000.000	$ 3.400.000.000	$ 3.010.230.532	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 400.000.000	$ 3.400.000.000	$ 2.821.953.943	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -		$ 188.276.589	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 6.763.361.568,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 6.214.176.608,68	91,88%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 6.078.909.377,32	89,88%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (135.267.231,36)	-2,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 6.214.176.608,68	91,88%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 6.078.909.377,32	89,88%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (135.267.231,36)	-2,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 125.798.525,16	1,86%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 6.810.230.532,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 6.810.230.532,00	100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	-
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 40.378.914,25	0,59%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
OBSERVACIONES:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 2.049.942.778,50
Amortizado $	$ 1.551.074.860,50
Saldo $	$ 498.867.918,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,32
Acumulado:	1,12

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 386.791.000,00
Amortizado $	$ 386.791.000,00
Saldo $	$ -

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 91,88%
Meta Física Ejecutada % 89,88%
Avance o Atraso Físico % -2,00%

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
	Demolicion de andenes y pavimento en general e<= 20cm	M2	510,70	510,70		Prog	83,23	268,70	158,77	510,70	100,00%
						Ejec	83,23	268,70	158,77	510,70	100,00%
*	Retiro de demolición	M3	58,57	58,57		Prog	9,37	34,32	14,88	58,57	100,00%
						Ejec	9,37	34,32	14,88	58,57	100,00%
*	Cerramiento provisional en tela verde H = 2,00 m	ML	996,00	996,00		Prog	110,32	654,79	230,89	996,00	100,00%
						Ejec	110,32	477,19	230,89	996,00	100,00%
*	Excavaciones varias en material comun	M3	2.788,75	2.788,75		Prog	164,08	2262,94	361,73	2788,75	100,00%
						Ejec	164,08	2262,94	361,73	2788,75	100,00%
	Relleno compactado en material seleccionado de la excavación (incluye trasiego manual excavacion)	M3	1.494,92	1.494,92		Prog	114,99	1040,98	338,95	1494,92	100,0%
						Ejec	114,99	1040,98	338,95	1494,92	100,00%
*	Base en arena-cemento 1:10	M3	870,21	870,21		Prog	68,80	650,71	150,70	870,21	100,00%
						Ejec	56,1	587,48	136,07	779,65	89,59%
*	Sendero peatonal en concreto de 3.000 psi, ancho 2,5m, espesor de 10cm. Acabado estampado color rojo tipo espina de pescado. Incluye	M2	4.100,40	4.100,40		Prog	338,55	2992,25	722,52	4053,32	98,85%
						Ejec	456,54	3482,27	699,95	3938,81	96,06%
	Estampado en color tipo espina de pescado para concreto sobre bordillo.	M2	649,23	649,23		Prog	47,19	495,56	105,18	647,93	99,80%
						Ejec	47,71	474,03	98,26	620,00	95,50%
*	Bordillo en concreto de 3.000 psi, base=17cm, altura=43cm	ML	3.798,30	4.079,80		Prog	254,95	2926,61	595,76	3777,32	99,45%
						Ejec	306,18	3341,09	602,8	3647,27	96,02%
	Acero de refuerzo 60.000 psi	KG	43.183,46	43.183,46		Prog	4299,12	28096,16	10789,17	43184,45	100,00%
						Ejec	4086,19	26434,8	10254,36	40775,35	94,42%
*	Geotextil T2100	M2	4.095,90	4.095,90		Prog	342,19	3005,05	748,66	4095,90	100,0%
						Ejec	339,69	2983,11	743,19	4065,99	99,27%
	Caja de inspección en concreto reforzado de 3.000psi, de 60x60cm con tapa en concreto y cañuela.	UND	15,00	15,00		Prog					
						Ejec					
	Suministro e instalación de Tubería corrugada D=12", incluye excavación, base en arena y atraque, relleno compactado con material de la excavación.	ML	84	84		Prog					
						Ejec		38,1	4,25	42,35	50,42%
	Señalización vertical.	UND	24	24		Prog					
						Ejec					
NP 1	Cunetas en concreto 21 Mpa, no incluye refuerzo de sección B= 0,30, h=0,14 y de espesor=0,07m.	ML	3792,5	3792,5		Prog	258,07	2778,12	538,77	3574,96	94,26%
						Ejec	205,22	2620,85	447,12	2826,07	74,52%
NP2	sumideros transversales h=0,30m, a=0,40m, incluye excavación y relleno con	ML	37,5	37,5		Prog		14,06		14,06	37,49%
						Ejec					
	Excavaciones varias en material comun	M3	142,7	142,7		Prog		142,7		142,70	100,00%
						Ejec		142,7		142,70	100,00%
	Relleno compactado en material seleccionado de la excavación (incluye trasiego manual excavacion)	M3	7,51	7,51		Prog		7,51		7,51	100,00%
						Ejec		7,51		7,51	100,00%
NP3	Concreto resistencia 14Mpa para solados y atraques	M3	5,08	5,08		Prog		5,08		5,08	100,00%
						Ejec		5,08		5,08	100,00%
NP4	Box,aletas, muros armados en concreto 20.7 MPa (4000 PSI) suminsitro y construcción	M3	50,48	50,48		Prog		47,26		47,26	93,62%
						Ejec		25,24		25,24	50,00%
	Acero de refuerzo 60.000 psi	KG	6.666,88	6.666,88		Prog		6573,54		6573,54	98,60%
						Ejec		4744,42		4744,42	71,16%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Equipos de Topografia	1	1
Mezcladora	1	2
Compactador tipo rana	1	1
Compresor	1	
Equipo de soldadura	1	
Vibrador de concreto	1	1
Cortadora de concreto con disco		1
Molde para estampado	1	1
TOTAL	7	7

Equipo minimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

NOTA: Equipos como el compresor fueron utilizados durante las actividades iniciales, una vez terminadas salieron del proyecto, de igual forma los equipos de topografia se encuentran en sitio pero durante la semana estuvieron inactivos

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: K0+000 - K0+147
TRAMO Y/O SECTOR (2): K0+000 - K1+460
TRAMO Y/0 SECTOR(3) K0+000 - K0+300

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	E.B.Braulio Construções Rio Javari ubicado en Benjamin Constan (Brasil)	PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	Associação do Mineradores ubicado en Japurá (Brasil)	PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO

OBSERVACIONES: Considerando que en Amazonas no existen Canteras ni actividades de explotación minera, se contempla la compra de materiales en Brasil teniendo en cuenta los acuerdos de libre comercio entre los dos paises (Colombia y Brasil) junto con el conocimiento de las autoridades locales. En relación a las fuentes de materiales, estas están ubicadas en los municipios Benjamin-Constant y Japurá (Brasil). Respecto a los RCD, considerando que en la zona no se cuenta con lugar autorizado para la disposicion de RCD, se realizará la reutilizacion y aprovechamiento de estos en las actividades constructivas del proyecto. **No presenta novedades respecto a lo descrito en la semana anterior.**

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES: Se otorga autorizacion de ocupacion de cauce promovida por la alcaldia de Puerto Nariño mediante la resolución No. 0839 del 28/06/2024. de Corpoamazonia. Adicional, el Contratista, mediante mesa de trabajo realizada el 05 de julio de 2024, aclara que no se requiere la prorroga del permiso de Concesión de aguas superficiales dado que el suministro se hará mediante la Empresa de Servicios Publicos del municipio, para lo cual Interventoría indica que se debe demostrar que se cumplieron con las obligaciones del acto adminitrativo mediante paz y salvo emitido por la autoridad ambiental.
Interventoría solicita al Contratista informar el estado de las compensaciones establecidas en el permiso ambiental de concesión de aguas superficiales, mediante oficio CE-VIASCOL-1170.
Adicional, se informa solicitar el estado de la compensación establecida establecida en el permiso de Ocupación de Cauce. **No presenta novedades respecto a lo descrito en la semana**

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES: El Contratista remite PAGA versión 7 mediante comunicado CKSP-128-0558-2022 recibido el 21/09/2024. A partir de la revisión realizada por la especialista ambiental, se emite concepto de aprobación. Se solicita al Contratista remitir el Plan de Inversión versión 2 mediante oficio CE-VIASCOL-1695. **No presenta novedades respecto a lo descrito en la**

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	15	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	13	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 22

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: comunidad indigena San Francisco Puerto Nariño-Amazonas

OBSERVACIONES: Revisión del buzón de sugerencias, en el que no se encuentra ningun formato diligenciado de pqrs

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: No se requiere la adquisición de predios para la ejecución del proyecto.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Actividades de la semana

TRAMO 2 (SAN FRANCISCO)
- Levantamiento topográfico de la vía
- Relleno costados de las cunetas


TRAMO 3 (INTERNADO)
- Sin actividad

Actividades acumuladas
- Demolición de andenes y pavimento en general: del Pr0+000 al Pr0+147 tramo 1 y del Pr0+000 al Pr0+280 tramo 2
- Excavaciones varias en material común: para bordillos, Pr0+000 al Pr0+147 ambos costados tramo 1 ; Pr0+000 al Pr1+460 ambos costados tramo 2: Pr 0+000 al Pr 0+220 tramo 3 ambos costados
- Excavaciones varias en material comun: para ancho de calzada, del Pr0+000 al PR0+147 tramo 1 ; Pr0+000 al Pr1 +460 tramo 2 y del Pr 0+000 al Pr 0+300 tramo 3
- Instalación de geotextil T2100: Pr0+000 al PR0+147 tramo 1; Pr0+000 al Pr1+460 tramo 2 y del Pr0+000 al 300 tramo 3
- Base en arena cemento: Pr0+000 al PR0+147 tramo 1; Pr0+000 al Pr1 +460 tramo 2 y del Pr0+000 al 0+300 tramo 3
-Sendero peatonal en concreto incluye estampado : Pr0+000 al Pr0+147 tramo 1 ; del Pr0+000 al Pr 1+460 tramo 2 ; Pr 0+000 al Pr 0+223; del 0+284 al Pr 0+300 tramo 3
-Bordillo en concreto Pr0+000 al Pr0+147 ambos costados tramo 1 ; del Pr0+000 al Pr1+460 tramo 2 ambos costados ; Pr 0+000 al Pr 0+223 ; del 0+284 al Pr 0+300 tramo 3 ambos costados
-Cunetas en concreto : Pr0+000 al Pr0+147 ambos costados tramo 1 ;del Pr0+000 al Pr0+504 tramo 2 ambos costados ; Pr 0+710 al Pr 0+740 tramo 2 ambos costados;Pr 0+810 al Pr 1+460 tramo 2 ambos costados; Pr 0+123 al Pr 0+223 ambos costados tramo 3(internado)
-Acero de refuerzo para sendero peatonal: del Pr0+000 al Pr0+147 tramo 1; del Pr0+000 al Pr 1+460 tramo 2; Pr0+000 la Pr 0+223 ; del Pr 0+284 al Pr 0+300 tramo 3 : para bordillo: Pr0+000 al Pr 0+147 tramo 1 ambos costados ; del Pr 0+000 al Pr1+460 tramo 2 ambos costados; y del Pr 0+000 al Pr 0+223 ; del Pr 0+284 al Pr 0+300 ambos costados tramo 3;para cunetas: Pr0+000 al Pr0+147 tramo 1 ambos costados; Pr 0+000 al Pr 0+504 tramo 2 ambos costados;Pr 0+710 al Pr 0+740 ambos costados tramo 2;Pr 0+930 al Pr 1+460 ambos costados tramo 2;) Pr 0+123 al Pr 0+223 ambos costado tramo 3 (internado; para box culvert :Pr 1+190 tramo 2 : box culvert :Pr 0+590 tramo 2
- Concreto para muros, aletas del box culvert Pr 1+190 tramo 2


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Concreto para sendero Pr 0+250 al Pr 0+280 tramo 3
- Concreto para bordillo Pr 0+250 al Pr +280 tramo 3 ambos costados
- Concreto para cunetas Pr 0+080 al Pr 0+123 tramo 3 ambos costados
- Concreto para cunetas Pr 0+750 al Pr 0+810 tramo 2 ambos costados
- Trasiego y acopio de material tramo N° 1 Y 2
- continuación acero del box 0+590 tramo 2
- Rellenos costados de las cunetas tramo N° 2

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



ACUMULADO PROYECTO	PROG	EJEC	TOTAL (%)
EXCAVACIONES VARIAS	2.878,75	2878,75	100,00%
BASE EN ARENA-CEMENTO	870,21	779,59	89,59%
CUNETAS EN CONCRETO	3792,50	2826,00	74,52%
SENDERO PEATONAL	4100,40	3938,76	96,06%
BORDILLOS	3798,30	3646,98	96,02%



CONVENCIONES	PROG	EJEC
EXCAVACIONES VARIAS		
BASE EN ARENA-CEMENTO		
CUNETAS EN CONCRETO		
PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO		
BORDILLO		

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



RELLENOS COSTADOS DE CUNETAS TRAMO 2



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO TRAMO N° 2



RELLENO COSTADOS DE LAS CUNETAS TRAMO N° 2

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*Chequeo permanente al cronograma de actividades y programa de inversión
*Mediante oficio CE-VIASCOL-2003 se le hicieron las observaciones al plano de señalización vial radicado por el contratista
*Mediante oficio CE-VIASCOL-2007 se apremió al contratista para que haga entrega de documentos, tales como planillas de seguridad social y resultados de ensayos de labortaorio
* Control al plan de inspección y ensayos de laboratorio.
* Supervisión cada una de las actividades ejecutadas por el contratista

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARLY MILENE SARRIA GONZALEZ
Matrícula Profesional No.: 25202-136201 CND

Wilver L. Ropero A.
VoBo. Residente de interventoría
Wilver Ropero

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/06/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES DESDE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ SEMANA No.: 91 del 13/06/2025 al 19/06/2025 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JESUS EDUARDO RINCON SILVA **APOYO A LA SUPERVISIÓN:** NANCY PATRICIA PARRA ROJAS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES DESDE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

1,8 KM de mejoramiento y mantenimiento de senderos peatonales desde la comunidad San Francisco hasta el Municipio de Puerto Nariño

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los senderos peatonales tendrán una sección transversal compuesta por 2,16 m de ancho de la placa, confinada con sardineles de concreto reforzado de 17 cm de ancho x 43 de alto y cunetas laterales de 40 cm de sección transversal en planta

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO KAIROS SENDEROS PEATONAL			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO VIASCOL		
INTEGRANTES:	FREDDY MAURICIO CEBALLOS DELGADILLO 25% INGEGAB S.A.S. 40% EDWIN ALBERTO MESTRE HERNANDEZ 35%			**INTEGRANTES:**	INGENOBRAS CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAS (50%) CIAF LTDA INGENIERIA (45%) PROCIVING SAS (5%)		
CONTRATO No.	558-2022	**VALOR INICIAL:**	$ 6.833.142.595,00	**CONTRATO No.**	1062 DE 2022	**VALOR INICIAL:**	$ 6.810.230.532,00
FECHA DE INICIO:	6/04/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	16/11/2022	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	2/06/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 6.833.142.595,00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2024	**VALOR ACUMULADO:**	$ 6.810.230.532,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2025			**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	30/06/2025	**VALOR ANTICIPO:**	$ 386.791.000,00
						VALOR AMORTIZADO:	$ 386.791.000,00
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 6.833.142.595			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 5.170.249.535			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.662.893.060			
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 400.000.000	$ 3.400.000.000	$ 3.010.230.532	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 400.000.000	$ 3.400.000.000	$ 2.821.953.943	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -		$ 188.276.589	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 6.763.361.568,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 6.340.651.470,00	93,75%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 6.078.909.377,32	89,88%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	**$ (261.742.092,68)**	**-3,87%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 6.340.651.470,00	93,75%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 6.078.909.377,32	89,88%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	**$ (261.742.092,68)**	**-3,87%**
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 125.798.525,16	1,86%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 6.810.230.532,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 6.810.230.532,00	100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	-
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 40.378.914,25	0,59%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
OBSERVACIONES:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 2.049.942.778,50
Amortizado $	$ 1.551.074.860,50
Saldo $	$ 498.867.918,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,32
Acumulado:	1,12

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 386.791.000,00
Amortizado $	$ 386.791.000,00
Saldo $	$ -

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 93,75% Avance o Atraso Físico %: -3,87%
Meta Física Ejecutada %: 89,88%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia** ———	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector 3**	**Total**	**%**
	Demolicion de andenes y pavimento en general e<= 20cm	M2	510,70	510,70		Prog	83,23	268,70	158,77	510,70	100,00%
						Ejec	83,23	268,70	158,77	510,70	100,00%
*	Retiro de demolición	M3	58,57	58,57		Prog	9,37	34,32	14,88	58,57	100,00%
						Ejec	9,37	34,32	14,88	58,57	100,00%
*	Cerramiento provisional en tela verde H = 2,00 m	ML	996,00	996,00		Prog	110,32	654,79	230,89	996,00	100,00%
						Ejec	110,32	477,19	230,89	996,00	100,00%
*	Excavaciones varias en material comun	M3	2.788,75	2.788,75		Prog	164,08	2262,94	361,73	2788,75	100,00%
						Ejec	164,08	2262,94	361,73	2788,75	100,00%
	Relleno compactado en material seleccionado de la excavación (incluye trasiego manual excavacion)	M3	1.494,92	1.494,92		Prog	114,99	1040,98	338,95	1494,92	100,0%
						Ejec	114,99	1040,98	338,95	1494,92	100,00%
*	Base en arena-cemento 1:10	M3	870,21	870,21		Prog	68,80	650,71	150,70	870,21	100,00%
						Ejec	56,1	587,48	136,07	779,65	89,59%
*	Sendero peatonal en concreto de 3.000 psi, ancho 2,5m, espesor de 10cm. Acabado estampado color rojo tipo espina de pescado. Incluye	M2	4.100,40	4.100,40		Prog	342,00	3022,82	729,90	4094,72	99,86%
						Ejec	456,54	3482,27	699,95	3938,81	96,06%
	Estampado en color tipo espina de pescado para concreto sobre bordillo.	M2	649,23	649,23		Prog	47,76	501,58	99,89	649,23	100,00%
						Ejec	47,71	474,03	98,26	620,00	95,50%
*	Bordillo en concreto de 3.000 psi, base=17cm, altura=43cm	ML	3.798,30	4.079,80		Prog	256,36	2942,80	599,05	3798,21	100,00%
						Ejec	306,18	3341,09	602,8	3647,27	96,02%
	Acero de refuerzo 60.000 psi	KG	43.183,46	43.183,46		Prog	4299,12	28096,16	10789,17	43184,45	100,00%
						Ejec	4086,19	26434,8	10254,36	40775,35	94,42%
*	Geotextil T2100	M2	4.095,90	4.095,90		Prog	342,19	3005,05	748,66	4095,90	100,0%
						Ejec	339,69	2983,11	743,19	4065,99	99,27%
	Caja de inspección en concreto reforzado de 3.000psi, de 60x60cm con tapa en concreto y cañuela.	UND	15,00	15,00		Prog		2,50	1,25	3,75	25,0%
						Ejec					
	Suministro e instalación de Tubería corrugada D=12", incluye excavación, base en arena y atraque, relleno compactado con material de la excavación.	ML	84	84		Prog		17,5	3,5	21,00	25,00%
						Ejec		38,1	4,25	42,35	50,42%
	Señalización vertical.	UND	24	24		Prog		2,5	0,5	3,00	12,50%
						Ejec					
NP 1	Cunetas en concreto 21 Mpa, no incluye refuerzo de seccion B= 0,30, h=0,14 y de espesor=0,07m.	ML	3792,5	3792,5		Prog	269,84	2904,85	563,35	3738,04	98,56%
						Ejec	205,22	2620,85	447,12	2826,07	74,52%
NP2	sumideros transversales h=0,30m, a=0,40m, incluye excavación y relleno con	ML	37,5	37,5		Prog		37,5		37,50	100,00%
						Ejec					
	Excavaciones varias en material comun	M3	142,7	142,7		Prog		142,7		142,70	100,00%
						Ejec		142,7		142,70	100,00%
	Relleno compactado en material seleccionado de la excavación (incluye trasiego manual excavacion)	M3	7,51	7,51		Prog		7,51		7,51	100,00%
						Ejec		7,51		7,51	100,00%
NP3	Concreto resistencia 14Mpa para solados y atraques	M3	5,08	5,08		Prog		5,08		5,08	100,00%
						Ejec		5,08		5,08	100,00%
NP4	Box,aletas, muros armados en concreto 20.7 MPa (4000 PSI) suminsitro y construcción	M3	50,48	50,48		Prog		48,67		48,67	96,41%
						Ejec		25,24		25,24	50,00%
	Acero de refuerzo 60.000 psi	KG	6.666,88	6.666,88		Prog		6666,88		6666,88	100,00%
						Ejec		4744,42		4744,42	71,16%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: K0+000 - K0+147
TRAMO Y/O SECTOR (2): K0+000 - K1+460
TRAMO Y/0 SECTOR(3) K0+000 - K0+300

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	**Equipo Mínimo**	**Total Disponible**
Equipos de Topografia	1	1
Mezcladora	1	2
Compactador tipo rana	1	1
Compresor	1	
Equipo de soldadura	1	
Vibrador de concreto	1	1
Cortadora de concreto con disco		1
Molde para estampado	1	1
TOTAL	7	7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

NOTA: Equipos como el compresor fueron utilizados durante las actividades iniciales, una vez terminadas salieron del proyecto, de igual forma los equipos de topografía se encuentran en sitio pero durante la semana estuvieron inactivos

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	E.B.Braulio Construções Rio Javari ubicado en Benjamin Constan (Brasil)	PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	Associação do Mineradores ubicado en Japurá (Brasil)	PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO

OBSERVACIONES: Considerando que en Amazonas no existen Canteras ni actividades de explotación minera, se contempla la compra de materiales en Brasil teniendo en cuenta los acuerdos de libre comercio entre los dos paises (Colombia y Brasil) junto con el conocimiento de las autoridades locales. En relación a las fuentes de materiales, estas están ubicadas en los municipios Benjamin-Constant y Japurá (Brasil). Respecto a los RCD, considerando que en la zona no se cuenta con lugar autorizado para la disposicion de RCD, se realizará la reutilizacion y aprovechamiento de estos en las actividades constructivas del proyecto. **No presenta novedades respecto a lo descrito en la semana anterior.**

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES: Se otorga autorizacion de ocupacion de cauce promovida por la alcaldia de Puerto Nariño mediante la resolución No. 0839 del 28/06/2024. de Corpoamazonia. Adicional, el Contratista, mediante mesa de trabajo realizada el 05 de julio de 2024, aclara que no se requiere la prorroga del permiso de Concesión de aguas superficiales dado que el suministro se hará mediante la Empresa de Servicios Publicos del municipio, para lo cual Interventoría indica que se debe demostrar que se cumplieron con las obligaciones del acto administrativo mediante paz y salvo emitido por la autoridad ambiental.
Interventoría solicita al Contratista informar el estado de las compensaciones establecidas en el permiso ambiental de concesión de aguas superficiales, mediante oficio CE-VIASCOL-1170.
Adicional, se informa solicitar el estado de la compensación establecida establecida en el permiso de Ocupación de Cauce. **No presenta novedades respecto a lo descrito en la semana**

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES: El Contratista remite PAGA versión 7 mediante comunicado CKSP-128-0558-2022 recibido el 21/09/2024. A partir de la revisión realizada por la especialista ambiental, se emite concepto de aprobación. Se solicita al Contratista remitir el Plan de Inversión versión 2 mediante oficio CE-VIASCOL-1695. **No presenta novedades respecto a lo descrito en la**

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 19

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: comunidad indigena San Francisco Puerto Nariño-Amazonas

OBSERVACIONES: Revisión del buzón de sugerencias, en el que no se encuentra ningun formato diligenciado de pqrs

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: No se requiere la adquisición de predios para la ejecución del proyecto.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Actividades de la semana
TRAMO 2 (SAN FRANCISCO)
- Relleno costados de las cunetas
TRAMO 3 (INTERNADO)
- Relleno costados de las cunetas

Actividades acumuladas
- Demolición de andenes y pavimento en general: del Pr0+000 al Pr0+147 tramo 1 y del Pr0+000 al Pr0+280 tramo 2
- Excavaciones varias en material común: para bordillos, Pr0+000 al Pr0+147 ambos costados tramo 1 ; Pr0+000 al Pr1+460 ambos costados tramo 2; Pr 0+000 al Pr 0+220 tramo 3 ambos costados
- Excavaciones varias en material comun: para ancho de calzada, del Pr0+000 al PR0+147 tramo 1 ; Pr0+000 al Pr1 +460 tramo 2 y del Pr 0+000 al Pr 0+300 tramo 3
- Instalación de geotextil T2100: Pr0+000 al PR0+147 tramo 1; Pr0+000 al Pr1+460 tramo 2 y del Pr0+000 al 300 tramo 3
- Base en arena cemento: Pr0+000 al PR0+147 tramo 1; Pr0+000 al Pr1+460 tramo 2 y del Pr0+000 al 0+300 tramo 3
-'Sendero peatonal en concreto incluye estampado : Pr0+000 al Pr0+147 tramo 1 ; del Pr0+000 al Pr 1+460 tramo 2 ; Pr 0+000 al Pr 0+223; del 0+284 al Pr 0+300 tramo 3
-'Bordillo en concreto Pr0+000 al Pr0+147 ambos costados tramo 1 ; del Pr0+000 al Pr1+460 tramo 2 ambos costados ; Pr 0+000 al Pr 0+223 ; del 0+284 al Pr 0+300 tramo 3 ambos costados
-'Cunetas en concreto : Pr0+000 al Pr0+147 ambos costados tramo 1 ;del Pr0+000 al Pr0+504 tramo 2 ambos costados ; Pr 0+710 al Pr 0+740 tramo 2 ambos costados;Pr 0+810 al Pr 1+460 tramo 2 ambos costados; Pr 0+123 al Pr 0+223 ambos costados tramo 3(internado)
-Acero de refuerzo para sendero peatonal: del Pr0+000 al Pr0+147 tramo 1; del Pr0+000 al Pr 1+460 tramo 2; Pr0+000 la Pr 0+223 ; del Pr 0+284 al Pr 0+300 tramo 3 : para bordillo: Pr0+000 al Pr 0+147 tramo 1 ambos costados ; del Pr 0+000 al Pr1+460 tramo 2 ambos costados; y del Pr 0+000 al Pr 0+223 ; del Pr 0+284 al Pr 0+300 ambos costados tramo 3;para cunetas: Pr0+000 al Pr0+147 tramo 1 ambos costados; Pr 0+000 al Pr 0+504 tramo 2 ambos costados;Pr 0+710 al Pr 0+740 ambos costados tramo 2;Pr 0+930 al Pr 1+460 ambos costados tramo 2:) Pr 0+123 al Pr 0+223 ambos costado tramo 3 (internado; para box culvert :Pr 1+190 tramo 2 : box culvert :Pr 0+590 tramo 2
- Concreto para muros, aletas del box culvert Pr 1+190 tramo 2


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Concreto para sendero Pr 0+250 al Pr 0+280 tramo 3
- Concreto para bordillo Pr 0+250 al Pr +280 tramo 3 ambos costados
- Concreto para cunetas Pr 0+080 al Pr 0+123 tramo 3 ambos costados
- Concreto para cunetas Pr 0+750 al Pr 0+810 tramo 2 ambos costados
- Trasiego y acopio de material tramo N° 1 Y 2
- continuación acero del box 0+590 tramo 2

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



	ACUMULADO PROYECTO		
	PROG	EJEC	TOTAL (%)
EXCAVACIONES VARIAS	2.878,75	2878,75	100,00%
BASE EN ARENA-CEMENTO	870,21	779,59	89,59%
CUNETAS EN CONCRETO	3792,50	2826,00	74,52%
SENDERO PEATONAL	4100,40	3938,76	96,06%
BORDILLOS	3798,30	3646,98	96,02%



CONVENCIONES	PROG	EJEC
EXCAVACIONES VARIAS		
BASE EN ARENA-CEMENTO		
CUNETAS EN CONCRETO		
PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO		
BORDILLO		

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



RELLENOS COSTADOS DE CUNETAS TRAMO 3 (INTERNADO)



RELLENOS COSTADOS DE CUNETAS TRAMO 2



RELLENO COSTADOS DE LAS CUNETAS TRAMO N° 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*Chequeo permanente al cronograma de actividades y programa de inversión
*Seguimiento del proyecto, mediante comité de obra realizado entre contratista, interventoría y supervisión, en las cuales se menciona el estado de avance, compromisos y temas relevantes en el desarrollo de la obra.
* Mediante oficio CE-VIASCOL-2016 se le notificó al contratista sobre el posible incumplimiento y solicitud plan de contingencia
* Mediante oficio CE-VIASCOL-2020 se le notificó al contratista sobre el posible incumplimiento pro atraso en la programación de obra
* Mediante oficio CE-VIASCOL-2026 se le reitero al contratista sobre la subsanación de observaciones al plan de reparación de losas
* Mediante oficio CE-VIASCOL-2027 se le comunico al contratista que no procede la caracterización vial presentada por el contratistas de obra
* Mediante oficio CE-VIASCOL-2030 observaciones al acta modificatoria N° 3
* Control al plan de inspección y ensayos de laboratorio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARLY MILENE SARRIA GONZALEZ
Matricula Profesional No.: 25202-136201 CND

Wilver L. Ropero A.
VoBo. Residente de interventoría
Wilver Ropero

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/06/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES DESDE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ SEMANA No.: 92 del 20/06/2025 al 23/06/2025 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JESÚS EDUARDO RINCON SILVA **APOYO A LA SUPERVISIÓN:** NANCY PATRICIA PARRA ROJAS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES DESDE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

1,8 KM de mejoramiento y mantenimiento de senderos peatonales desde la comunidad San Francisco hasta el Municipio de Puerto Nariño

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los senderos peatonales tendrán una sección transversal compuesta por 2,16 m de ancho de la placa, confinada con sardineles de concreto reforzado de 17 cm de ancho x 43 de alto y cunetas laterales de 40 cm de sección transversal en planta

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO KAIROS SENDEROS PEATONAL		
INTEGRANTES:	FREDDY MAURICIO CEBALLOS DELGADILLO 25% INGEGAB S.A.S. 40% EDWIN ALBERTO MESTRE HERNANDEZ 35%		
CONTRATO No.	558-2022	**VALOR INICIAL:**	$ 6.833.142.595,00
FECHA DE INICIO:	6/04/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	2/06/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 6.833.142.595,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO VIASCOL		
INTEGRANTES:	INGENOBRAS CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAS (50%) CIAF LTDA INGENIERIA (45%) PROCIVING SAS (5%)		
CONTRATO No.	1052 DE 2022	**VALOR INICIAL:**	$ 6.810.230.532,00
FECHA DE INICIO:	16/11/2022	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	**VALOR ACUMULADO:**	$ 6.810.230.532,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2025	**VALOR ANTICIPO:**	$ 386.791.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 386.791.000,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 6.833.142.595			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 5.170.249.535			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.662.893.060			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 400.000.000	$ 3.400.000.000	$ 3.010.230.532	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 400.000.000	$ 3.400.000.000	$ 2.821.953.943	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -		$ 188.276.589	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 6.763.361.568,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 6.494.179.777,59	96,02%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 6.078.909.377,32	89,88%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (415.270.400,28)	-6,14%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 6.494.179.777,59	96,02%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 6.078.909.377,32	89,88%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (415.270.400,28)	-6,14%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 153.528.307,59	2,27%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 6.810.230.532,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 6.810.230.532,00	100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.995.404,50	0,59%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 40.378.914,25	0,59%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
OBSERVACIONES: Se radicaron a la territorial las actas de costos correspondientes a los meses de marzo y abril de 2025

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 2.049.942.778,50
Amortizado $	$ 1.551.074.860,50
Saldo $	$ 498.867.918,00

	INDICADOR I/C
En el mes:	0,26
Acumulado:	1,12

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 386.791.000,00
Amortizado $	$ 386.791.000,00
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 96,02% Avance o Atraso Físico % -6,14%
Meta Física Ejecutada % 89,88%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia** _____	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector 3**	**Total**	**%**
Demolicion de andenes y pavimento en general e<= 20cm	M2	510,70	510,70		Prog	83,23	268,70	158,77	510,70	100,00%
					Ejec	83,23	268,70	158,77	510,70	100,00%
* Retiro de demolición	M3	58,57	58,57		Prog	9,37	34,32	14,88	58,57	100,00%
					Ejec	9,37	34,32	14,88	58,57	100,00%
* Cerramiento provisional en tela verde H = 2,00 m	ML	996,00	996,00		Prog	110,32	654,79	230,89	996,00	100,00%
					Ejec	110,32	477,19	230,89	996,00	100,00%
* Excavaciones varias en material comun	M3	2.788,75	2.788,75		Prog	164,08	2262,94	361,73	2788,75	100,00%
					Ejec	164,08	2262,94	361,73	2788,75	100,00%
Relleno compactado en material seleccionado de la excavación (incluye trasiego manual excavacion)	M3	1.494,92	1.494,92		Prog	114,99	1040,98	338,95	1494,92	100,0%
					Ejec	114,99	1040,98	338,95	1494,92	100,00%
* Base en arena-cemento 1:10	M3	870,21	870,21		Prog	68,80	650,71	150,70	870,21	100,00%
					Ejec	56,1	587,48	136,07	779,65	89,59%
* Sendero peatonal en concreto de 3.000 psi, ancho 2,5m, espesor de 10cm. Acabado estampado color rojo tipo espina de pescado. Incluye	M2	4.100,40	4.100,40		Prog	342,48	3027,06	730,92	4100,46	100,00%
					Ejec	456,54	3482,27	699,95	3938,81	96,06%
Estampado en color tipo espina de pescado para concreto sobre bordillo.	M2	649,23	649,23		Prog	47,76	501,58	99,89	649,23	100,00%
					Ejec	47,71	474,03	98,26	620,00	95,50%
* Bordillo en concreto de 3.000 psi, base=17cm, altura=43cm	ML	3.798,30	4.079,80		Prog	256,36	2942,80	599,05	3798,21	100,00%
					Ejec	306,18	3341,09	602,8	3647,27	96,02%
Acero de refuerzo 60.000 psi	KG	43.183,46	43.183,46		Prog	4299,12	28096,16	10789,17	43184,45	100,00%
					Ejec	4086,19	26434,8	10254,36	40775,35	94,42%
* Geotextil T2100	M2	4.095,90	4.095,90		Prog	342,19	3005,05	748,66	4095,90	100,0%
					Ejec	339,69	2983,11	743,19	4065,99	99,27%
Caja de inspección en concreto reforzado de 3.000psi, de 60x60cm con tapa en concreto y cañuela.	UND	15,00	15,00		Prog		7,50	3,75	11,25	75,0%
					Ejec					
Suministro e instalación de Tubería corrugada D=12", incluye excavación, base en arena y atraque, relleno compactado con material de la excavación.	ML	84	84		Prog		52,5	10,5	63,00	75,00%
					Ejec		38,1	4,25	42,35	50,42%
Señalización vertical.	UND	24	24		Prog		14,29	2,86	17,15	71,46%
					Ejec					
NP 1 Cunetas en concreto 21 Mpa, no incluye refuerzo de seccion B= 0,30, h=0,14 y de espesor=0,07m.	ML	3792,5	3792,5		Prog	271,43	2921,94	566,66	3760,03	99,14%
					Ejec	205,22	2620,85	447,12	2826,07	74,52%
NP2 sumideros transversales h=0,30m, a=0,40m, incluye excavación y relleno con	ML	37,5	37,5		Prog		37,5		37,50	100,00%
					Ejec					
Excavaciones varias en material comun	M3	142,7	142,7		Prog		142,7		142,70	100,00%
					Ejec		142,7		142,70	100,00%
Relleno compactado en material seleccionado de la excavación (incluye trasiego manual excavacion)	M3	7,51	7,51		Prog		7,51		7,51	100,00%
					Ejec		7,51		7,51	100,00%
NP3 Concreto resistencia 14Mpa para solados y atraques	M3	5,08	5,08		Prog		5,08		5,08	100,00%
					Ejec		5,08		5,08	100,00%
NP4 Box,aletas, muros armados en concreto 20.7 MPa (4000 PSI) suminsitro y construcción	M3	50,48	50,48		Prog		49,47		49,47	98,00%
					Ejec		25,24		25,24	50,00%
Acero de refuerzo 60.000 psi	KG	6.666,88	6.666,88		Prog		6666,88		6666,88	100,00%
					Ejec		4744,42		4744,42	71,16%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: K0+000 - K0+147
TRAMO Y/O SECTOR (2): K0+000 - K1+460
TRAMO Y/0 SECTOR(3) K0+000 - K0+300

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Equipos de Topografia	1	1
Mezcladora	1	2
Compactador tipo rana	1	1
Compresor	1	
Equipo de soldadura	1	
Vibrador de concreto	1	1
Cortadora de concreto con disco		1
Molde para estampado	1	1
TOTAL	7	7

Equipo minimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

NOTA: Equipos como el compresor fueron utilizados durante las actividades iniciales, una vez terminadas salieron del proyecto, de igual forma los equipos de topografía se encuentran en sitio pero durante la semana estuvieron inactivos

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	E.B.Braulio Construções Rio Javari ubicado en Benjamin Constan (Brasil)	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Associação do Mineradores ubicado en Japurá (Brasil)	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES: Considerando que en Amazonas no existen Canteras ni actividades de explotación minera, se contempla la compra de materiales en Brasil teniendo en cuenta los acuerdos de libre comercio entre los dos paises (Colombia y Brasil) junto con el conocimiento de las autoridades locales. En relación a las fuentes de materiales, estas están ubicadas en los municipios Benjamin-Constant y Japurá (Brasil). Respecto a los RCD, considerando que en la zona no se cuenta con lugar autorizado para la disposicion de RCD, se realizará la reutilizacion y aprovechamiento de estos en las actividades constructivas del proyecto. **No presenta novedades respecto a lo descrito en la semana anterior.**

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES: Se otorga autorizacion de ocupacion de cauce promovida por la alcaldia de Puerto Nariño mediante la resolución No. 0839 del 28/06/2024. de Corpoamazonia. Adicional, el Contratista, mediante mesa de trabajo realizada el 05 de julio de 2024, aclara que no se requiere la prorroga del permiso de Concesión de aguas superficiales dado que el suministro se hará mediante la Empresa de Servicios Publicos del municipio, para lo cual Interventoría indica que se debe demostrar que se cumplieron con las obligaciones del acto adminitrativo mediante paz y salvo emitido por la autoridad ambiental.
Interventoría solicita al Contratista informar el estado de las compensaciones establecidas en el permiso ambiental de concesión de aguas superficiales, mediante oficio CE-VIASCOL-1170. Adicional, se informa solicitar el estado de la compensación establecida establecida en el permiso de Ocupación de Cauce. **No presenta novedades respecto a lo descrito en la**

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES: El Contratista remite PAGA versión 7 mediante comunicado CKSP-128-0558-2022 recibido el 21/09/2024. A partir de la revisión realizada por la especialista ambiental, se emite concepto de aprobación. Se solicita al Contratista remitir el Plan de Inversión versión 2 mediante oficio CE-VIASCOL-1695. **No presenta novedades respecto a**

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 19

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: comunidad indigena San Francisco Puerto Nariño-Amazonas

OBSERVACIONES: Revisión del buzón de sugerencias, en el que no se encuentra ningun formato diligenciado de pqrs

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: No se requiere la adquisición de predios para la ejecución del proyecto.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Actividades de la semana
TRAMO 2 (SAN FRANCISCO)
- Sin actividades


TRAMO 3 (INTERNADO)
- Sin actividades

Actividades acumuladas
'- Demolición de andenes y pavimento en general: del Pr0+000 al Pr0+147 tramo 1 y del Pr0+000 al Pr0+280 tramo 2
- Excavaciones varias en material común: para bordillos, Pr0+000 al Pr0+147 ambos costados tramo 1 ; Pr0+000 al Pr1+460 ambos costados tramo 2: Pr 0+000 al Pr 0+220 tramo 3 ambos costados
- Excavaciones varias en material comun: para ancho de calzada, del Pr0+000 al PR0+147 tramo 1 ; Pr0+000 al Pr1 +460 tramo 2 y del Pr 0+000 al Pr 0+300 tramo 3
- Instalación de geotextil T2100: Pr0+000 al PR0+147 tramo 1; Pr0+000 al Pr1+460 tramo 2 y del Pr0+000 al 300 tramo 3
- Base en arena cemento: Pr0+000 al PR0+147 tramo 1; Pr0+000 al Pr1+460 tramo 2 y del Pr0+000 al 0+300 tramo 3
-'Sendero peatonal en concreto incluye estampado : Pr0+000 al Pr0+147 tramo 1 ; del Pr0+000 al Pr 1+460 tramo 2 ; Pr 0+000 al Pr 0+223; del 0+284 al Pr 0+300 tramo 3
-'Bordillo en concreto Pr0+000 al Pr0+147 ambos costados tramo 1 ; del Pr0+000 al Pr1+460 tramo 2 ambos costados ; Pr 0+000 al Pr 0+223 ; del 0+284 al Pr 0+300 tramo 3 ambos costados
-'Cunetas en concreto : Pr0+000 al Pr0+147 ambos costados tramo 1 ;del Pr0+000 al Pr0+504 tramo 2 ambos costados ; Pr 0+710 al Pr 0+740 tramo 2 ambos costados;Pr 0+810 al Pr 1+460 tramo 2 ambos costados; Pr 0+123 al Pr 0+223 ambos costados tramo 3(internado)
-Acero de refuerzo para sendero peatonal: del Pr0+000 al Pr0+147 tramo 1; del Pr0+000 al Pr 1+460 tramo 2; Pr0+000 la Pr 0+223 ; del Pr 0+284 al Pr 0+300 tramo 3 : para bordlillo: Pr0+000 al Pr 0+147 tramo 1 ambos costados ; del Pr 0+000 al Pr1+460 tramo 2 ambos costados; y del Pr 0+000 al Pr 0+223 ; del Pr 0+284 al Pr 0+300 ambos costados tramo 3;para cunetas: Pr0+000 al Pr0+147 tramo 1 ambos costados; Pr 0+000 al Pr 0+504 tramo 2 ambos costados;Pr 0+710 al Pr 0+740 ambos costados tramo 2;Pr 0+930 al Pr 1+460 ambos costados tramo 2;) Pr 0+123 al Pr 0+223 ambos costado tramo 3 (internado; para box culvert :Pr 1+190 tramo 2 : box culvert :Pr 0+590 tramo 2
- Concreto para muros, aletas del box culvert Pr 1+190 tramo 2


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Concreto para sendero Pr 0+250 al Pr 0+280 tramo 3
- Concreto para bordillo Pr 0+250 al Pr +280 tramo 3 ambos costados
- Concreto para cunetas Pr 0+080 al Pr 0+123 tramo 3 ambos costados
- Concreto para cunetas Pr 0+750 al Pr 0+810 tramo 2 ambos costados
- Trasiego y acopio de material tramo N° 1 Y 2
- continuación acero del box 0+590 tramo 2

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

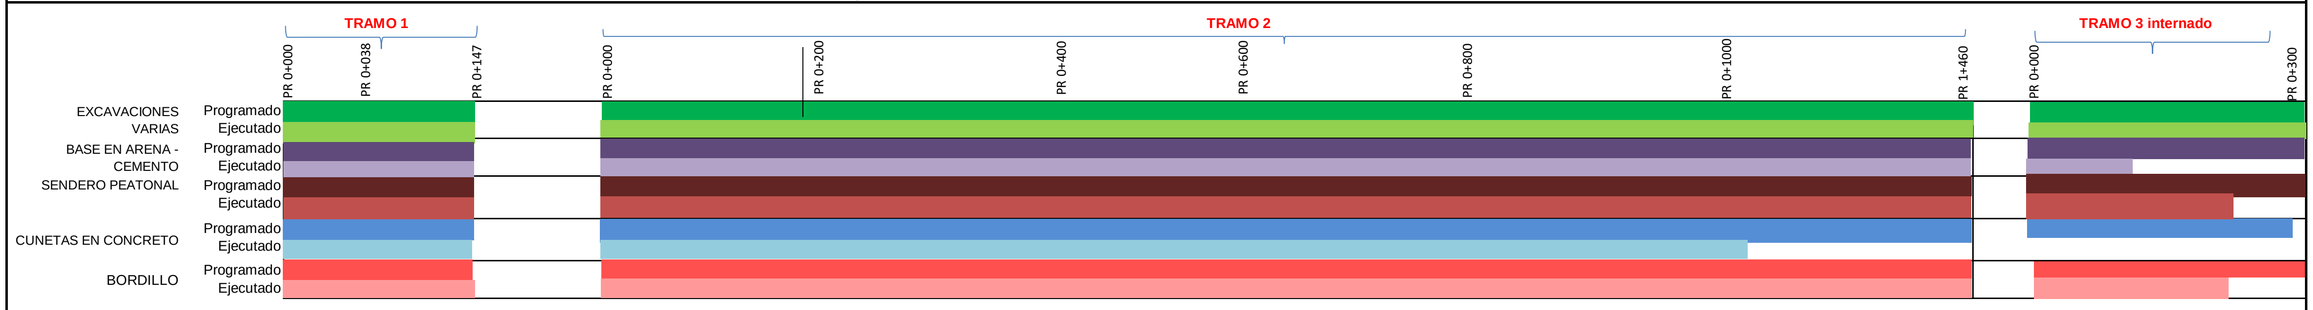

	ACUMULADO PROYECTO		
	PROG	EJEC	TOTAL (%)
EXCAVACIONES VARIAS	2.878,75	2878,75	100,00%
BASE EN ARENA-CEMENTO	870,21	779,59	89,59%
CUNETAS EN CONCRETO	3792,50	2826,00	74,52%
SENDERO PEATONAL	4100,40	3938,76	96,06%
BORDILLOS	3798,30	3646,98	96,02%




CONVENCIONES		
	PROG	EJEC
EXCAVACIONES VARIAS		
BASE EN ARENA-CEMENTO		
CUNETAS EN CONCRETO		
PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO		
BORDILLO		

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



SENDERO PEATONAL TRAMO 3 (INTERNADO)

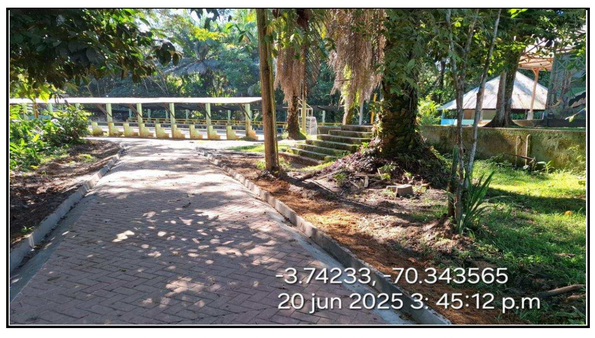

SENDERO PEATONAL TRAMO 3(INTERNADO)



SENDERO SAN FRANCISCO TRAMO N° 2

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*Chequeo permanente al cronograma de actividades y programa de inversión
*En este semana no se realizaron actividades debido a al escases de materiales en la obra(cemento, grava, acero) el contratista indica que debido a varios factores externos a la obra el proveer no ha podido suministrarle mencionado materiales, por tal razón el constructor solicito ante esta interventoría una suspensión por 15 días del contrato a partir del 24 junio 2025, esto con el fin de poder abastecerse de los materiales faltante y organizar una logística que le permita terminar el 100% de las actividades contractuales
* Mediante oficio CE-VIASCOL-2038 la interventoría concede el aval de la suspensión temporal del contrato de obra
* Mediante oficio CE-VIASCOL-2535 se le reitero al contratista sobre la notificación del presunto incumplimiento del contrato de obra

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MARLY MILENE SARRIA GONZALEZ
Matrícula Profesional No.: 25202-136201 CND

Wilver L. Ropero A.
VoBo. Residente de interventoría
Wilver Ropero

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

[illegible]

[illegible]

	□□□□□□□□O□□□□O□□□□DE□□□□□□ □RO□E□O□M□□□O□□□□E□E□□□□□□DE□□RO□E□□O□DE□□FR□E□□R□□□□R□DE□R□□□□OR□E M□□□□□□DE□□□ER□E□□OR□□OBR□□□□B□□□□ □M□□□□□□R□□□□E□□□□O□□O□□R□□O□DE□OBR□	□□DI□O	M□□I□MN□□IN□□□□□R□□
		□□R□I□N	□
		□□□INA□	

□□□□A□ 2□□□□2□2□

□D□□□M□□□□A□□□

□□**D**□**D**□**E**□**E**□□□**OR**□□ MUNI□I□IO□D□□□U□R□□O□NARI□O **D**□**RE**□□□□□□**ERR**□□**OR**□□□□ □A□U□□A

□**O**□□**RO**□**D**□□**R**□**O**□**DE**□**M**□□□□□□□**R**□□□□□**E**□□□**O**□□**O**□□**R**□□**O**□**DE**□**OBR**□

□**ER**□**ODO**□□**ME**□□□**FORME**□**ME**□□□□□□	□□□2□	□**RO**□**E**□□**O**□	M□JORAMI□N□O□Y□MAN□□NIMI□N□O□D□□□□ND□RO□□□□A□ONA□□□□D□□D□□□A□□OMUNIDAD□D□□□AN□□RAN□I□□O□□A□□A□□□□□A□□O□UR□ANO□D□□MUNI□I□IO□ D□□□U□R□O□NARI□O□D□□AR□AM□N□O□D□□AMA□ONA□
□**O**□□**R**□□**O**□□□□	□□□2□22	□**O**□□**R**□□□□□□□	□ON□OR□IO□□AIRO□□□□ND□RO□□□A□ONA□
□**O**□□**R**□□**O**□□□□**ER**□**E**□□**OR**□□□□□□	□□□2□2□22	□□□**ER**□**E**□□**OR**□□□□	□ON□OR□IO□□IA□□O□

M□□□□□□**R**□□□□**E**□□□**O**				**D**□□□**DE**□**ME**□																															
DE□□**R**□□□□□□	**M**□**R**□□□□**MODE**□**O**	□□□□□□**D**□**D**	□**O**□□□□□□□□□□	□	□	□	□	**5**	□	□	□	**9**	□**0**	□□	□□	□□	□□	□**5**	□□	□□	□□	□**9**	□**0**	□□	□□	□□	□□	□**5**	□□	□□	□□	□**9**	□**0**	□□
M□□□□ADORA□D□□□ON□R□□O	□□N□RI□A	2□□U□□O□	□AN□□RAN□I□□O	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I									
M□□□□ADORA□D□□□ON□R□□O	□□N□RI□A	2□□U□□O□	□AN□□RAN□I□□O	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I									
□I□RADOR□□ON□R□□O	□□N□RI□A	□□□□□□	□AN□□RAN□I□□O	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I									
MO□O□OM□A	□□N□RI□A	2"□□2"	□AN□□RAN□I□□O	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I									
□OM□A□□ADOR□MANUA□□RANA□	□□N□RI□A	□□□□□□	□AN□□RAN□I□□O	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I									
MO□O□AR□U□RO			□AN□□RAN□I□□O	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I									
MO□D□□□□AM□ADO			□AN□□RAN□I□□O	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I									
MO□O□AR□U□RO			□AN□□RAN□I□□O	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I									
□OM□A□□ADOR□MANUA□□RANA□	□□N□RI□A	□□□□□□	□AN□□RAN□I□□O	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I									
□I□RADOR□□ON□R□□O	□□N□RI□A	□□□□□□	□AN□□RAN□I□□O	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I									
			□**O**□□□**M**□□□□□□**R**□□□**E**□□□**O**	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□	□	□	□	□	□	□	□
			□**O**□□□□□□□□**O**	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
			□**O**□□□□**E**□**RE**□□**R**□□□□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
			□**O**□□□□□□□□□□**O**	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

RE□□**ME**□□□**ER**□**ODO**□□**ME**□	□□□	□
□**O**□□□**DE**□**M**□□□□□□**R**□□□**E**□□□□**O**	2□□	□□□□□
□**O**□□□**DE**□**M**□□□□□□**R**□□□**E**□□□□**O**□□□□□**O**□□□□	□	□□
□**O**□□□**DE**□**M**□□□□□□**R**□□□**E**□□□□**O**□□□□□□**O**□□□□	2□□	□□□□□
□**O**□□□**DE**□**M**□□□□□□**R**□□□**E**□□□□**O**□**E**□**RE**□□**R**□□□**O**□□□**R**	□	□□

□**O**□□**E**□□□**O**□**E**□□ □□□□□**O**□□□□**E**□**RE**□□**R**□□□□□□**R**□□□□□□□**O**□□□□

RE□**OR**□**E**□**DE**□□□**M**□□□□□□**R**□□□**E**□□□□**O**□□□□□□**d**□□□□□□□□□□□□□□**r**□"□□□□□□□□□□□□"□□□"**E**□□**r**□□□□**r**□□□□□□"□□**d**□□□□**r**□□□□**r**□□□□□□□□**d**□□□□□□□□□□□□**d**□□□□

OB□**ER**□□□□**O**□**E**□□**DE**□□□□□□□**ER**□**E**□□**OR**□□□□□□**R**□□**OMI**□**NDA**□**A**□□□**ON**□**RA**□I□□**A**□**D**□□**O**□**RA**□**DI**□□□**ON**□**R**□**D**□□□□**UI**□**O**□□□**U**□□□□□□□**N**□□**N**□□□□**IMA**□□□**ONDI**□**ION**□□□□**Y**□**DIARIAM**□**N**□□□**R**□**A**□**I**□**AR**□□□□□□□**R**□**O**□□**RA**□**IONA**□□□**ARA**□□□**ONO**□□□**R**□□**U**□□□□**ADO**□**AN**□□□□**D**□□**INI**□**IAR**□□**A**□**OR**□□□

□□□□□□**ER**□**E**□□**OR**□□□□**ER**□**F**□□□□□□**E**□**E**□□□**O**□□**R**□□□□□□□□□**M**□□□□□□**O**□□□□□**D**□□□**O**□**B**□□**D**□**D**□**DE**□**M**□□□□□□**R**□□□□**E**□□□□**O**□**M**□□□**MO**□□**E**□□□□**DO**□□□□**R**□**E**□□□**RO**□**E**□□**O**□

□**O**□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□

□□□□□r□□□□□□□□□□□r□□□□□□□□□□□

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 558-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-25 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES DESDE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1052-2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIASCOL

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAFAMAZ

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	CEBALLOS DELGADILLO FREDDY MAURICIO	17.419.758	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	$ 1.423.500,00	$ 99.075,60	V	NUEVA EPS		$ 56.940,00	COLPENSIONES		$ 227.760,00	$ 56.940,00	$ -	$ -	
2	CEBALLOS FORERO DARWIN DANILO	1.121.712.401	TOPOGRAFO	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	$ 1.138.000,00	$ 79.204,80	V	SANITAS	1748502962	$ 45.520,00	COLFONDOS	1748502962	$ 182.080,00	$ 45.520,00	$ -	$ -	
3	CELY CHAVEZ ANGELA NATALIA	40.046.331	PROFESIONAL SOCIAL	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	$ 1.138.000,00	$ 79.204,80	V	SANITAS	1748502962	$ 45.520,00	COLPENSIONES	1748502962	$ 182.080,00	$ 45.520,00	$ -	$ -	
4	VILLA ARIZA FABIO ALBERTO	86.053.660	RESIDENTE	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	$ 1.138.000,00	$ 79.204,80	V	SANITAS	1748502962	$ 45.520,00	COLPENSIONES	1748502962	$ 182.080,00	$ 45.520,00	$ -	$ -	
5	IRIARTE ALDANA ALVARO ENRIQUE	8.705.590	ESPECIALISTA	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	$ 1.138.000,00	$ 79.204,80	V	SURA	1748502962	$ 45.520,00	PROTECCION	1748502962	$ 182.080,00	$ 45.520,00	$ -	$ -	
6	PARENTE SANTOS YESID	1.121.218.608	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	$ 1.138.000,00	$ 79.204,80	V	NUEVA EPS	1748502962	$ 45.520,00	PORVENIR	1748502962	$ 182.080,00	$ 45.520,00	$ -	$ -	
7	PINEDO CHANCHARI LUIS HENRIQUE	1.122.266.392	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	$ 1.138.000,00	$ 79.204,80	V	NUEVA EPS	1748502962	$ 45.520,00	PORVENIR	1748502962	$ 182.080,00	$ 45.520,00	$ -	$ -	
8	NIÑO CASTILLO JHONNY	1.122.267.704	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	$ 1.138.000,00	$ 79.204,80	V	NUEVA EPS	1748502962	$ 45.520,00	PORVENIR	1748502962	$ 182.080,00	$ 45.520,00	$ -	$ -	
9	CUINTACO LOPEZ NEY FARIT	17.420.918	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	$ 1.138.000,00	$ 79.204,80	V	NUEVA EPS	1748502962	$ 45.520,00	COLPENSIONES	1748502962	$ 182.080,00	$ 45.520,00	$ -	$ -	
10	CASTILLO VALERIO ELBANO	18.050.988	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	$ 1.138.000,00	$ 79.204,80	V	NUEVA EPS	1748502962	$ 45.520,00	PROTECCION	1748502962	$ 182.080,00	$ 45.520,00	$ -	$ -	
11	MORALES UNDIEGRO FRANCISCO	1.075.287.579	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	$ 1.138.000,00	$ 79.204,80	V	NUEVA EPS	1748502962	$ 45.520,00	COLFONDOS	1748502962	$ 182.080,00	$ 45.520,00			
12	VALERIO AHUE NOVER	18.051.622	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	$ 1.138.000,00	$ 79.204,80	V	NUEVA EPS	1748502962	$ 45.520,00	COLPENSIONES	1748502962	$ 182.080,00	$ 45.520,00	$ -	$ -	
13	GOMEZ CAMPO IGNACIO	1.050.065.184	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	$ 1.138.800,00	$ 79.260,48	V	NUEVA EPS	1748502962	$ 45.552,00	COLPENSIONES	1748502962	$ 182.208,00	$ 45.552,00	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que al Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **FREDDY MAURICIO CEBALLOS DELGADILLO**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202089426

Firma
Nombre: **MARLY MILENE SARRIA GONZALEZ**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-136201 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE GENERALDE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901650394
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA 33 15 28 EDIF TORRE CASA TORO OFCI	TELÉFONO:	6666666
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	911001 - CTO PTO NARIÑO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**1748502962**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/18		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 182.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 182.300	$ 0	$ 182.300
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 364.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 364.600	$ 0	$ 364.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 1.093.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.093.800	$ 0	$ 1.093.800
230301	230301-PORVENIR	3	$ 546.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 546.900	$ 0	$ 546.900
SUBTOTALES:										**$ 2.187.600**	**$ 0**	**$ 2.187.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 228.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.000	$ 0	$ 0	$ 228.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 45.600
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 45.600
EPS041	NUEVA EPS CM	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 136.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 136.800	$ 0	$ 0	$ 136.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 91.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.200	$ 0	$ 0	$ 91.200
SUBTOTALES:													**$ 547.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 547.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 951.600	$ 951.600	$ 0	$ 0	$ 951.600
SUBTOTALES:									**$ 951.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 951.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF65	CCF65-CAFAMAZ	12	$ 547.200	$ 0	$ 547.200
SUBTOTALES:			**$ 547.200**	**$ 0**	**$ 547.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINED
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																																			
1	CC 1050065184	GOMEZ CAMPO IGNACIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		24														25-14 COLPENSIONES	24	$ 1.138.800	$ 182.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 182.300	EPS037-NUEVA EPS	24	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 45.600	14-11 - ARL SURA	24	$1.138.800	00000000	$ 79.300	24	$ 1.138.800	CCF65-CAFAMAZ	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1075287579	MORALES UNI DIEGO FRANCISCO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		24														231001-COLFONDOS	24	$ 1.138.800	$ 182.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 182.300	EPS037-NUEVA EPS	24	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 45.600	14-11 - ARL SURA	24	$ 1.138.800	00000000	$ 79.300	24	$ 1.138.800	CCF65-CAFAMAZ	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1121218608	PARENTE SANTOS JESID	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		24														230301-PORVENIR	24	$ 1.138.800	$ 182.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 182.300	EPS037-NUEVA EPS	24	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 45.600	14-11 - ARL SURA	24	$ 1.138.800	00000000	$ 79.300	24	$ 1.138.800	CCF65-CAFAMAZ	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1121712401	CEBALLOS FORERO DARWIN DANILO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		24														231001-COLFONDOS	24	$ 1.138.800	$ 182.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 182.300	EPS005-SANITAS S.A.	24	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 45.600	14-11 - ARL SURA	24	$ 1.138.800	00000002	$ 79.300	24	$ 1.138.800	CCF65-CAFAMAZ	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1122266392	PINEDO CHANCHARI LUIS ENRIQUE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		24														230301-PORVENIR	24	$ 1.138.800	$ 182.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 182.300	NUEVA EPS CM	24	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 45.600	14-11 - ARL SURA	24	$ 1.138.800	00000000	$ 79.300	24	$ 1.138.800	CCF65-CAFAMAZ	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1122267704	NINO CASTILLO JHONNY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		24														230301-PORVENIR	24	$ 1.138.800	$ 182.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 182.300	EPS037-NUEVA EPS	24	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 45.600	14-11 - ARL SURA	24	$ 1.138.800	00000000	$ 79.300	24	$ 1.138.800	CCF65-CAFAMAZ	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 17420918	CUINTACO LOPEZ NEY FARIT	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		24														25-14 COLPENSIONES	24	$ 1.138.800	$ 182.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 182.300	EPS037-NUEVA EPS	24	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 45.600	14-11 - ARL SURA	24	$ 1.138.800	00000000	$ 79.300	24	$ 1.138.800	CCF65-CAFAMAZ	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 18050988	CASTILLO VALERIO ELBANO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		24														230201-PROTECCION	24	$ 1.138.800	$ 182.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 182.300	NUEVA EPS CM	24	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 45.600	14-11 - ARL SURA	24	$ 1.138.800	00000000	$ 79.300	24	$ 1.138.800	CCF65-CAFAMAZ	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 18051622	VALERIO AHUE NOVER ELIAS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		24														25-14 COLPENSIONES	24	$ 1.138.800	$ 182.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 182.300	NUEVA EPS CM	24	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 45.600	14-11 - ARL SURA	24	$ 1.138.800	00000000	$ 79.300	24	$ 1.138.800	CCF65-CAFAMAZ	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 40046331	CELY CHAVEZ ANGELA NATALIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		24														25-14 COLPENSIONES	24	$ 1.138.800	$ 182.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 182.300	EPS005-SANITAS S.A.	24	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 45.600	14-11 - ARL SURA	24	$ 1.138.800	00000000	$ 79.300	24	$ 1.138.800	CCF65-CAFAMAZ	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 86053660	VILLA ARIZA FABIO ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		24														25-14 COLPENSIONES	24	$ 1.138.800	$ 182.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 182.300	EPS002-SALUD TOTAL	24	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 45.600	14-11 - ARL SURA	24	$ 1.138.800	00000000	$ 79.300	24	$ 1.138.800	CCF65-CAFAMAZ	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE GENERALDE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901650394
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA 33 15 28 EDIF TORRE CASA TORO OFCI	TELÉFONO:	6666666
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	911001 - CTO PTO NARIÑO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**1748502962**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/07/18		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINED
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																										
12	CC 8705590	IRIARTE ALDANA ALVARO ENRIQUE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		24															25-14 COLPENSIONES	24	$ 1.138.800	$ 182.300	$	$	$	$	Norma	$ 182.300	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	24	$ 1.138.800	$ 45.600	$	$ 45.600	14-11 - ARL SURA	24	$ 1.138.800	000000002	$ 79.300	24	$ 1.138.800	CCF65-CAFAMAZ		$ 45.600	$	$	$	$

TOTAL PAGADO: $ 4.233.600

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE GENERAL DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17419758
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FREDDY MAURICIO CEBALLOS DELGADILLO
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA3 E NO. 14 71 CS 112 QUINTAS DE MOREL	TELÉFONO:	6602274
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**1748403107**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/08		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																												PENSIÓN									SALUD							ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINED TOTAL APORTE
1	CC 17419758	CEBALLOS DELGADILLO FREDDY MAURICIO	INDEPEND		$ 1.423.500				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000				$ 0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 405.800

Planilla Pagada

CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL
NIT. 901.650.394-3

Villavicencio, junio 30 de 2025

Señores
CONSORCIO VIASCOL
Ing. MARLY MILENE SARRIA
Directora de interventoría

Con el fin de acreditar el cumplimiento de los dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO:

Que: **EL CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL**
Nit: 901.650.394-3
Contrato: No. 0558 de 2022. Objeto: **"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES DESDE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS"**

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social, en cuanto a salud, pensión, riesgos laborales y Caja de Compensación Familiar a la fecha del 30 de junio de 2025

Actúo en mi calidad de:

Firma: _____
Nombre: **JUAN CARLOS RODRIGUEZ RUIZ**
C.C. 1.121.862.386 de Villavicencio
Contador Publico
Tarjeta Profesional No. 227474-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

227474-T



JUAN CARLOS
RODRIGUEZ RUIZ
C.C. 1121862386
RES. INSCRIPCION 320 DEL 07/04/2017
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

231759 246494

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7272FC10285794AF

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN CARLOS RODRIGUEZ RUIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121862386 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 227474-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]
		[illegible]	

[illegible]: 2[illegible]2[illegible]

[illegible]: MUNI[illegible]IO D[illegible]U[illegible]R[illegible]O NARI[illegible]O

[illegible]: [illegible]A[illegible]U[illegible]

[illegible]: [illegible]2[illegible]22

[illegible]: [illegible]ON[illegible]OR[illegible]IO[illegible]AIRO[illegible][illegible]ND[illegible]RO[illegible][illegible]A[illegible]ONA[illegible]

[illegible]: [illegible]2[illegible]

[illegible]: M[illegible]JORAMI[illegible]N[illegible]O Y MAN[illegible]NIMI[illegible]N[illegible]O D[illegible][illegible]ND[illegible]RO[illegible][illegible]A[illegible]ONA[illegible][illegible]D[illegible][illegible]D[illegible][illegible]A[illegible][illegible]OMUNIDAD D[illegible][illegible]AN[illegible]RAN[illegible]I[illegible][illegible]O[illegible]A[illegible][illegible]A[illegible][illegible]A[illegible][illegible]A[illegible]O UR[illegible]ANO D[illegible][illegible]MUNI[illegible]I[illegible]IO D[illegible]

[illegible]: [illegible]2[illegible]2[illegible]22

[illegible]: [illegible]ON[illegible]OR[illegible]IO[illegible]IA[illegible][illegible]O[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2[illegible]2[illegible]	[illegible]2[illegible]	2[illegible]2[illegible]2[illegible]2	[illegible]2	N[illegible][illegible]	[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]	[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]	[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][

REPUBLICA DE COLOMBIA
PUERTO NARIñO
Nit: 800.103.161-2

SECRETARIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

Nro. : 01271

REGISTRO PRESUPUESTAL

Fecha de Expedicion: Martes 8 de Noviembre de 2022

Autorizado por: DESPACHO ALCALDE

Certifico REGISTRO PRESUPUESTAL por valor de : $ 6,833,142,595.00

( )

Con Cargo a:

CERTIFICADO	PROGRAMA	ART. C. COSTOS	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCION	VALOR
00912	2.3.2.02.02	.0052 24	1.2.3.3.04 OTRAS TRANSFERENCIAS	Vías urbanas mantenidas	6,833,142,595.00

Dentro del Presupuesto de Egresos de la VIGENCIA de2022

A favor de :CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL

Con documento No. : 901650394

Por concepto de : MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES DESDE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

CTO OBRA-0558-2022

CTA- 407276070 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAS RURALES

GEGEL ROMUALDO AHUE RUIZ
Jefa de Presupuesto

Powered by CamScanner

5. Estándares de Procedimiento para Formulación de Medidas 5FR0

	□□□□□□□□O□□□□O□□□□DE□□□□□□ □RO□E□O□M□□□O□□□□E□E□□□□□□□DE□□RO□E□□O□□DE□□□FR□E□□R□□□□R□□DE□□R□□□□OR□E M□□□□□□DE□□□ER□E□□OR□□□DE□OBR□□□□B□□□□ □E□□□DO□□E□ER□□□DE□□□□EM□O	□□DI□O	M□□I□MN□□IN□□□□□R□□□
		□□R□I□N	□
		□□□INA	

□□□□A 2□□□□□2□2□

□D□□□M□□□□A□□□

□□□D□D□E□E□□□OR□□ MUNI□I□IO□D□□□U□R□O□NARI□O

D□RE□□□□□□□ERR□□OR□□□□ □A□U□□A

□O□□R□□O□DE□OBR□□□□□ □□□□2□22

□O□□R□□□□□□□□ON□OR□IO□□AIRO□□□□ND□RO□□□A□ONA□

□RO□E□□□O□M□JORAMI□N□O□Y□MAN□□NIMI□N□O□D□□□□ND□RO□□□A□ONA□□□□D□□D□□A□□OMUNIDAD□D□□□AN□ □RAN□I□□O□□A□□A□□□□A□□O□UR□ANO□D□□MUNI□I□IO□D□□□U□R□O□NARI□O□D□□AR□AM□N□O□D□□□ AMA□ONA□

ME□□□□□O□DE□□□FORME□ME□□□□□□ □□□2□

□O□□R□□O□DE□□□□ER□E□□OR□□□□□ □□□2□2□22

□□□ER□E□□OR□□ON□OR□IO□□IA□□O□

E□□□DO□□E□ER□□□DE□□□EM□O

□□□□□d□□□□□ □□	D□□□DE□ME□																															
	□	□	□	□	5	□	□	□	9	□0	□□	□□	□□	□□	□5	□□	□□	□□	□9	□0	□□	□□	□□	□□	□5	□□	□□	□□	□9	□0	□□	□□□□□
□□□□	2□	2□	2□	2□	2□	2□	2□	2□	2□	2□	2□	2□	2□	2□	2□	□□	2□	2□	2□	2□	2□	2□	2□									□□□□
□□□□□□□□□ □d□r□d□□	□	□	□	□	2	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2	□	□	□	□	□	□	□									□
□□□□□□□□□□□□□□□□	□	□	□	2	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									□□
□□□□□□□□□r□□	2□	2□	2□	2□	2□	2□	2□	2□	2□	2□	2□	2□	2□	2□	2□	2□	2□	2□	2□	2□	2□	2□	2□	□	□	□	□	□	□	□	□	

E□□□D□□□□□□□□E□DEBE□□D□□□R□E□□□MERO□DE□□OR□□□OR□D□□□□E□□ERM□□E□E□□□□□□E□DE□□EM□O□□□□□□□OR□□□DE□□D□□□

□O□□□

A□□□□r□R□□□□r□□□□□□□□ □r□□□d□□ID□AM□□rr□□□□□d□□□□□□□□□□□□□□□

	□□□□

CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES COMUNIDAD INDIGENA SAN FRANCISCO

MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

EMPRESA: CONSORCIO KAIROS.

INGENIERO
FREDDY CEBALLOS.
DIRECTOR DEL PROYECTO.

2 DE JUNIO DE 2025

CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 3
2. OBJETIVOS Y ALCANCES. 3
   2.1. OBJETIVOS. 3
   2.2. ALCANCES. 3
3. ENSAYOS DE LABORATORIO. 3
4. TRABAJOS DE CAMPO. 4
   4.1. INSPECCIÓN Y REVISIÓN DEL TRAMO. 4
5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 5

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente documento hace parte fundamental para los trabajos y control de calidad a los concretos utilizados para el avance de la obra, construcción de senderos peatonales en la comunidad indígena de San Francisco del Municipio de Puerto Nariño Departamento del Amazonas.

2. OBJETIVOS Y ALCANCES

2.1. OBJETIVOS

El objeto de este estudio es llevar el control de calidad a los materiales y concretos para la construcción de senderos peatonales, ensayos pertinentes de laboratorio y trabajos de campo.

2.2. ALCANCES

El alcance de este informe es llevar el control de calidad a los materiales.
Ensayos pertinentes de laboratorio con las siguientes actividades:

- Conservación y transporte de las muestras.
- Ensayos, control de calidad y ruptura a la compresión de cilindros de concreto.
- Ruptura a la compresión de briquetas de arena cemento.
- Toma de densidades de campo método cono de arena.

3. ENSAYOS DE LABORATORIO.

En el laboratorio de suelos se le practicaron los ensayos ruptura a la compresión a las muestras de concreto “Cilindros” y “Briquetas” Se anexa formatos con resultados de laboratorio.

4. TRABAJOS DE CAMPO

El día Domingo de Junio 2024 se realizó una visita a la obra construcción de senderos peatonales en la Comunidad Indígena de San Francisco del Municipio de Puerto Nariño Departamento del Amazonas, con el fin de inspeccionar y realizar algunos ensayos de laboratorio a un tramo de la vía donde existe base estabilizada, “base-cementante”.

4.1. TOMA DE DENSIDADES METODO CONO DE ARENA.

En este mismo tramo se tomo una (1) densidades de campo:

- Densidad N° 1. Sendero frente al internado. Km. 2 + 725 eje de la vía

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

El proyecto consiste en la construcción de senderos peatonales, un tramo de vía desde la Comunidad indígena de San Francisco al Municipio de Puerto Nariño.

5.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto está ubicado en la Comunidad indígena de San Francisco Municipio de Puerto Nariño Departamento del Amazonas.

Se anexa formato de laboratorio, resultados de las densidades de campo. Y resultados de laboratorio a la compresión de briquetas entregados en el anterior informe.



GERMAN GUTIERREZ BAEZ

TÉCNICO LABORATORISTA.

T.P. 1104-T

C. C. 11.31.545

ANEXO FOTOGRAFICO.













LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS

DENSIDADES DE CAMPO
INV. E - 161

SECTOR: COMUNIDAD INDIGENA SAN FRANCISCO
OBRA: CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES.
INTERESADO: INGENIERO FREDY CEBALLOS
EMPRESA: CONSORCIO KAIROS
FECHA: 1 DE JUNIO 2025
CAPA: UNICA
ABCISA: FRENTE INTERNADO
SITIO: FRENTE AL INERNADO
TRAMO : SEGUNDO
DESC. MATERIAL: ARENA HABANA ESTABIL. CON CEMENTO.

ABSCISA	Frente Internado				
Capa No.	UNICA				
Costado	EJE				
(A) Peso frasco + arena inicial (g)	6890				
(B) Peso frasco + arena restante (g)	2797				
(C = A-B) Peso arena usada (g)	4093				
(D) Constante del cono	1745				
(E = C-D) Peso arena en el hueco (g)	2348				
(F) Densidad de la arena (g/cm3)	1,413				
(G = E/F) Volumen del hueco (cm3)	1662				
(H) Peso material húmedo (g)	2971				
(I) Humedad del terreno (%)	12,9				
(J = H/(1+I)) Peso material extraído seco (g)	2632				
(K = J/G) Densidad del material (g/cm3)	1,584				
(L) Densidad máx. Laboratorio (g/cm3)	1,635				
Humedad óptima de laboratorio (%)	10,90				
(K/L) COMPACTACION TERRENO (%)	96,9				
COMPACTACION ESPECIFICADA (%)	95				

Recipiente No.	9				
Peso muestra húmeda + recipiente (g)	307,7				
Peso muestra seca + recipiente (g)	279,1				
Peso del recipiente (g)	57,3				
Humedad (%)	**12,9**				

OBSERVACIONES: ARENA COLOR GRIS (PROCEDDENTE DEL RIO AMAZONAS), ESTABILIZADA CON EL 10,5% DE CEMENTO.

ELABORO:	**REVISO**	**APROBO**
GERMAN GUTIERREZ	**GERMAN GUTIERREZ**	**GERMAN GUTIERREZ**
FIRMA	**FIRMA**	**FIRMA**
CARGO	**CARGO**	**CARGO**
LABORATORISTA	**LABORATORISTA**	**LABORATORISTA**


LABORTORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS

COMPACTACIÓN EN EL LABORATORIO
INV. E - 141

No **DOS (2)**

SECTOR: COMUNIDAD INDIGENA SAN FRANCISCO. - PUERTO NARIÑO. **SITIO:** **SENDERO INTERNADO**
DESCRIPCION: ARENA COLOR GRIS Y CEMENTO **FECHA:** 23-oct-24
MARTILLO 10 libras **ENSAYO** 25-oct-24
CAIDA 18 pulgadas

PRUEBA	1	2	3			
No. de golpes	56	56	56			
Molde No.	3	3	3			
Humedad natural muestra (%)	7,7	7,7	7,7			
Humedad adicional (%)	0,0	3,0	6,0			
Peso muestra humeda, gramos	3635	3892	3933			
Densidad humeda gr/cm3	1,73	1,85	1,87			
Agua adicional, cm^3	0	180	360			
Peso muestra humeda + molde, gramos	6755	7012	7053			
Peso molde, gramos	3120	3120	3120			
% humedad (horno)	7,7	10,9	14,2			
Peso muestra seca, gramos	3375	3509	3444			
Volumen del molde, cm^3	2105	2105	2105			
Densidad muestra seca, gr/cm^3	1,603	1,667	1,636			

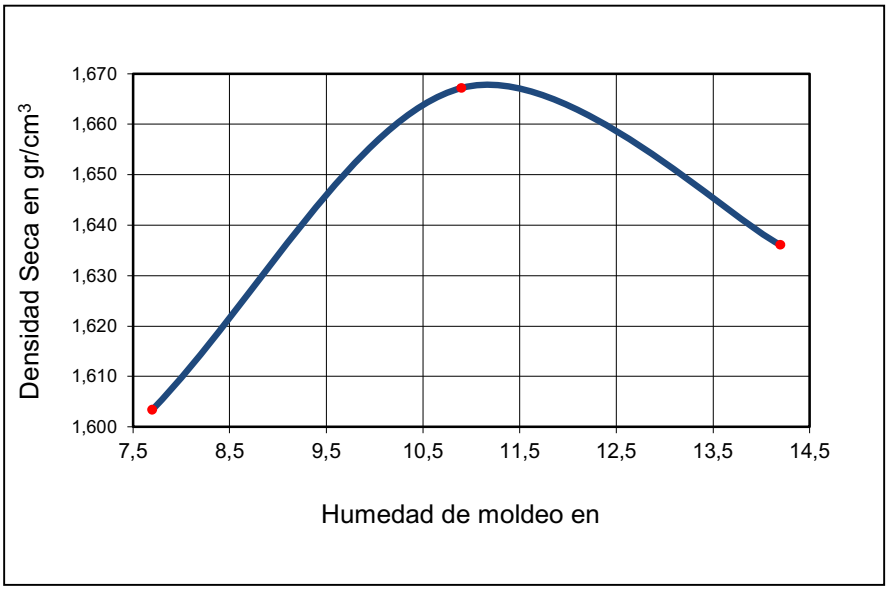

Dens. Max. gr/cc. 1,635

Hum. Optima % 10,9

CLASIFICACION

Indice de Grupo

A.A.S.H.O. A - 2 - 4

U.S.C. SMd

OBSERVACIONES: ARENA COLOR GRIS ESTABILIZADA CON EL 10,5 % DE CEMENTO.

ELABORO:	**REVISO** GERMAN GUTIERREZ	**APROBO** GERMAN GUTIERREZ
FIRMA	**FIRMA**	**FIRMA**
CARGO AUXILIAR DE LABOR.	**CARGO** LABORATORISTA.	**CARGO** LABORATORISTA

	□□□□

	□□□□

	□□□□□□□□□□O□□□□□O□□□□DE□□□□□ □RO□E□O□M□□□O□□□□E□E□□□□□□DE□□RO□E□□O□□DE□□FR□E□□R□□□□R□□DE□□R□□□□OR□E M□□□□□□DE□□□ER□E□□OR□□OBR□□□□B□□□□ □E□□□M□E□□O□□□R□□□□□□□□□E□□RO□□□O□□R□□O□DE□OBR□	□□DI□O	M□□I□MN□□IN□□□□□R□□2
		□□R□I□N	□
		□□□INA	

□□□□A	2□	□	2□2□
	□D□□□	□M□□□	□A□□□

□**O**□□□□

□□□□□□r□ □□□□ d□□□□ d□□□□□□□□□□r□□ d□ □ □□□□r□ □□□□□□□□□□□□□□ □□r□ □□d□ □□□□ d□ □□□□ □□r□□□□□□d□□ □ □□□□□□□□ d□ □ □d□□□□□□□□□□ d□ □□□□ □□r□□□□□□□□ □ □□□□□r□□ □□r□□□□d□□ □□r □□ l□□□□□□□□□□□

2□□□□l□□□r□□□□□□□r d□□□□ □□□□□□□□r □□□ □□□□□ □□□r□ □□□□ d□ □ □□□□r□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□r□ □□□□□□ □□□r□ □□□d□ □□□□ d□ □□□□ □□r□□□□□□□□d□□□ □ □□□□□□□□□ d□ □ □d□□□□□□□□□□□□ d□ □□□□ □□r□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□r□□□□□□r□□□□d□□□□□□□r□□□□l□□□□□□□□□□□□□□□

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101049806	18

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	06	2025	12	04	2023	00:00	01	07	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	NIT: 901.650.394-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 3 E 14 71 CA 112 BRR QUINTAS DE MORELIA I I	VILLAVICENCIO, META	3164306715

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE PUERTO NARINO	NIT: 800.103.161-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
PALACIO MUNICIPAL	PUERTO NARIÑO, AMAZONAS	5210013

ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - NIT 800215807-2

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NRO. 0558-2022, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES DESDE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA INICIA VIGENCIA POR CINCO AÑOS QUE SERAN CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS DEL ESTADO S.A.

ASEGURADO Y BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - NIT: 800.103.161-2 E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS - NIT: 800.215.807-2

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/04/2023	31/12/2025	$683,314,259.50	$683,314,259.50
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	12/04/2023	31/12/2025	$2,049,942,778.50	$2,049,942,778.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12/04/2023	01/07/2028	$1,366,628,519.00	$1,366,628,519.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$2,049,942,778.50	$2,049,942,778.50

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

OBJETO DE LA MODIFICACION:
DE CONFORMIDAD CON EL OTRO SI MODIFICATORIO No. 11 DE FECHA 30/05/2025 SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO EN (1) MES, POR LO ANTERIOR SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****533,546.00	$ *******8,000.00	$ *****102,893.00	$ **********644,440.00	$ ****6,149,828,335.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA.	153921	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

30-44-101049806

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101049806	18

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	06	2025	12	04	2023	00:00	01	07	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL		**NIT: 901.650.394-3**
DIRECCIÓN: CR 3 E 14 71 CA 112 BRR QUINTAS DE MORELIA I I	**CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META	**TELÉFONO:**	3164306715

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE PUERTO NARINO		**NIT: 800.103.161-2**
DIRECCIÓN: PALACIO MUNICIPAL	**CIUDAD:** PUERTO NARIÑO, AMAZONAS	**TELÉFONO:**	5210013

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
MESTRE HERNANDEZ EDWIN ALBERTO	86058542	35.00
CEBALLOS DELGADILLO FREDDY MAURICIO	17419758	25.00
INGEGAB SAS	900371122-6	40.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-44-101049806

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-40-101017803	19

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	06	2025	12	04	2023	00:00	01	07	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	NIT: 901.650.394-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 3 E 14 71 CA 112 BRR QUINTAS DE MORELIA I I	VILLAVICENCIO, META	3164306715

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PUERTO NARINO	NIT: 800.103.161-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
PALACIO MUNICIPAL	PUERTO NARIÑO, AMAZONAS	5210013

BENEFICIARIO: 800103161 - MUNICIPIO DE PUERTO NARINO ADICIONAL: BENEFICIARIO LOS TERCEROS AFECTADOS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES HASTA EL IMPORTE ASEGURADO SEÑALADO EN LA CARATULA DE LA POLIZA PARA CADA COBERTURA, QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NRO. 0558-2022, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES DESDE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

ASEGURADO ADICIONAL: MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - NIT: 800.103.161-2 E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS - NIT: 800.215.807-2. ES ASEGURADO ADICIONAL DE LA PRESENTE POLIZA, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS NICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE SU RESPONSABILIDAD CIVIL PROPIA E INDEPENDIENTE.

BENEFICIARIO ADICIONAL: MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - NIT: 800.103.161-2 E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS - NIT: 800.215.807-2. ES BENEFICIARIO ADICIONAL DE LA PRESENTE POLIZA, SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	12/04/2023	01/07/2025	$711,750,000.00	$711,750,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	12/04/2023	01/07/2025	$711,750,000.00	$711,750,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	12/04/2023	01/07/2025	$711,750,000.00	$711,750,000.00

ACLARACIONES

OBJETO DE LA MODIFICACION:
DE CONFORMIDAD CON EL OTRO SI MODIFICATORIO No. 11 DE FECHA 30/05/2025 SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO EN (1) MES, POR LO ANTERIOR SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****151,125.00	$ *******3,000.00	$ ******29,283.00	$ **********183,408.00	$ ******711,750,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA.	153921	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-40-101017803

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-40-101017803	19

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	06	2025	12	04	2023	00:00	01	07	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.650.394-3**

DIRECCIÓN: CR 3 E 14 71 CA 112 BRR QUINTAS DE MORELIA I I — **CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META — **TELÉFONO:** 3164306715

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE PUERTO NARINO — IDENTIFICACIÓN **NIT: 800.103.161-2**

DIRECCIÓN: PALACIO MUNICIPAL — **CIUDAD:** PUERTO NARIÑO, AMAZONAS — **TELÉFONO:** 5210013

BENEFICIARIO: 800103161 - MUNICIPIO DE PUERTO NARINO

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	12/04/2023	01/07/2025	$711,750,000.00	$711,750,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	12/04/2023	01/07/2025	$711,750,000.00	$711,750,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	12/04/2023	01/07/2025	$711,750,000.00	$711,750,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-40-101017803

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-40-101017803	19

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	06	2025	12	04	2023	00:00	01	07	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL		**NIT: 901.650.394-3**
DIRECCIÓN: CR 3 E 14 71 CA 112 BRR QUINTAS DE MORELIA I I	**CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META	**TELÉFONO:**	3164306715

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	MUNICIPIO DE PUERTO NARINO	IDENTIFICACIÓN	**NIT: 800.103.161-2**
DIRECCIÓN: PALACIO MUNICIPAL	**CIUDAD:** PUERTO NARIÑO, AMAZONAS	**TELÉFONO:**	5210013

BENEFICIARIO: 800103161 - MUNICIPIO DE PUERTO NARINO

OBJETO DE LA POLIZA

ACLARACION: LOS VALORES ASEGURADOS (SUBLIMITES) ESTABLECIDOS PARA LAS COBERTURAS ADICIONALES OTORGADAS EN LA PRESENTE POLIZA (SI LAS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BASICO (PREDIOS LABORES Y OPERACIONES) QUE SE CONSIDERA EL LIMITE MAXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-40-101017803

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-40-101017803	19

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	06	2025	12	04	2023	00:00	01	07	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL		**NIT: 901.650.394-3**
DIRECCIÓN: CR 3 E 14 71 CA 112 BRR QUINTAS DE MORELIA I I	**CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META	**TELÉFONO:**	3164306715

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE PUERTO NARINO		**NIT: 800.103.161-2**
DIRECCIÓN: PALACIO MUNICIPAL	**CIUDAD:** PUERTO NARIÑO, AMAZONAS	**TELÉFONO:**	5210013

BENEFICIARIO: 800103161 - MUNICIPIO DE PUERTO NARINO

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
MESTRE HERNANDEZ EDWIN ALBERTO	86058542	35.00
CEBALLOS DELGADILLO FREDDY MAURICIO	17419758	25.00
INGEGAB SAS	900371122-6	40.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-40-101017803

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y LAS TIC´S

ACTA DE APROBACION DE PÓLIZA

1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO

Número del Contrato	0558-2022
Fecha del Contrato	3 DE NOVIEMBRE DE 2022
OBJETO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES DESDE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.
Valor del Contrato	SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS. M/CTE. ($ 6.833.142.595,00)
Nombre del Contratista	CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL
Número de Identificación	901.650.394-3 — Tipo: C.C ( ) CE ( ) NIT (X)

2. IDENTIFICACION DE LA POLIZA

Compañia Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Poliza de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales- decreto 1082 de 2015			
Número de Póliza	30-44-101049806		
Fecha de Expedición	19/06/2025	Anexo	18
Poliza seguro de responsabilidad civil extracontractual			
Número de Póliza	30-40-101017803		
Fecha de Expedición	19/06/2025	Anexo	19

3. DESCRIPCION DE AMPAROS DE LA POLIZA

No	TIPO DE AMPARO	Vigencia del Amparo		Monto del Amparo	Aprobado		Observaciones
		desde	hasta		SI	NO	
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/04/2023	31/12/2025	$ 683.314.259,50	X		
2	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	12/04/2023	31/12/2025	$ 2.049.942.778,50	X		
3	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12/04/2023	1/07/2028	$ 1.366.628.519,00	X		
4	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 dias		$ 2.049.942.778,50	X		

4. DESCRIPCION DE AMPAROS DE LA POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

No	TIPO DE AMPARO	Vigencia del Amparo		Monto del Amparo	Aprobado		Observaciones
		desde	hasta		SI	NO	
1	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	12/04/2023	1/07/2025	$ 711.750.000,00	X		
2	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	12/04/2023	1/07/2025	$ 711.750.000,00	X		
3	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	12/04/2023	1/07/2025	$ 711.750.000,00	X		
4	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	12/04/2023	1/07/2025	$ 711.750.000,00	X		
5	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	12/04/2023	1/07/2025	$ 711.750.000,00	X		
6	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	12/04/2023	1/07/2025	$ 711.750.000,00	X		

5. APROBACION DE LA POLIZA

¿La póliza es aprobada?	SI	x	NO	
Nombre de quien revisa y Aprueba	EDER ALEXANDER OLIVERO			
Cargo	Secretario de Planeacion, Infraestructura y las TIC's			
Fecha de diligenciamiento	19/06/2025			

Firma

6. RECIBIDO DE DEVOLUCIÓN SIN APROBACION

	□□□□

OB□ER□□□□O□E□□

□□□□ □□BR□□□□ □□DE□E□□□□O□□□□□ □□E□□□□ □□MED□□□ □□□E□□□□O□□□□□d□□□□r□□□□□□□□r□□d□□□□□□□□□□□□□□r□□□□□r□d□□□□□□□r□□□□□□□□

□□□	□□□□d□E□□□□□	M□r□□	□□r□□	F□□□□d□□ □□□□r□□□□□	□□□□F□□□□□ □□r□□□□□d□d□□ □□□□r□□□□□	F□□□□d□□□□□□□ □□□□r□□□□□	□□□ □□□□r□□□

OB□ER□□□□O□E□□

□□□□ON□RA□I□□A□NO□□A□R□MI□IDO□NU□□O□□□□R□I□IADO□□D□□□A□I□RA□ION□D□□□O□□□□UI□O□□D□□□A□ORA□ORIO□NI□D□□□O□O□RA□IA□

□**O**□□□

□□□□ □r□□□□□□□□□□□□□d□□□□□r□□□□□□□□□□d□□□□□□□□□r□ □□□□□□□□"NO"□□□□l□□□r□□□□□r□d□□□□□d□□□r□□□□□□□□□□□□□□d□□□□□□r□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □d□□□□□r□d□r□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□r□ □

N□□ □r□□**FRED□M□□R□□□O□□EB□□□□O□□DE□□ □D□□□□O**
D□r□□□□r□d□□□□r□
M□r□□□□□□□r□□□□□□□□□N□□□2□2□2□□□□2□□□□ND

□r□ □□N□A

N□□ □r□□□□
□r□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□d□d□□□□r□□□□□d□□O□r□
M□r□□□□□□□□r□□□□□□□□□N□□□□

□r□ □

N□□ □r□□□**M□R□□□M□□E□E□□□RR□□□□O□□□□E□**
D□r□□□□r□d□I□□□r□□□□□r□□□
M□r□□□□□□□□r□□□□□□□□□N□□□2□2□2□□□□2□□□□ND

□r□ □N□A

N□□ □r□□□□
□r□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□d□d□□□□r□□□□□d□I□□□r□□□□□r□□□
M□r□□□□□□□□r□□□□□□□□□N□□□□□

Or□□□□□□I□□□r□ □□□ □□□□□□□d□I□□□r□□□□□r□□□Ar□□□□□□d□□□ □□□□□□□d□□□IN□IA□□
□□□□□□□U□d□d□□□□□□□□□r□□I□□□r□□□□□r□□□Dr□□□□□□□□□rr□□r□□□□

4.9.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo. MEPI-MN-IN-2-FR-1

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO

PLAN DE INVERSION MENSUALIZADO DEL ANTICIPO

PuertoNariño Con Autonomia Y Responsabilidad Social

PÁGINA	1	DE	1

FECHA	29	mayo	2023

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 558 **DE** 2022 **PLAN INICIAL** **PLAN No.** 2 **MODIFICACIÓN** X

OBJETO DEL CONTRATO: EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES DESDE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARINO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL Nit. 901,650,394-3 Rep. Legal FREDDY CEBALLOS DELGADILLO

INTERVENTOR: CONSORCIO VIASCOL Ing. JOSE FRANCISCO MORON OROZCO C.C. 79,787,849

SUPERVISOR: SECRETARIO DE PLANAEACION,INFRAESTRUCTURA Y LAS TIC`s Ing. CRISTIAN ANDRES PINEDA GUERRA

DATOS ESPECÍFICOS

El anticipo se utilizará exclusivamente para la inversion en elementos e insumos basicos del proyecto PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES DESDE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. Esta inversion es para la ejecución de los items de obra que representen el mayor porcentaje del valor del contrato, dandole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra.
El valor del contrato $6'833.142.595,00 y el ANTICIPO corresponde al 30% $2'049.942.778,5

No.	DESCRIPCIÓN	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VALOR TOTAL	%
1	**MATERIALES** (Compra de Cemento, Acero de refuerzo, Arena, Grava, producto cementicio color, etc.)	919.942.778,00			919.942.778,00	44,88%
2	**TRANSPORTE** (Todos los materiales deben ser transportados algunos desde leticia, otros desde bogota hasta el punto mas cercano de la obra y luego realizar el trasiego mediante el coteo con subcontratistas de la zona, Terrestre, Fluvial y Aereo)	980.000.000,00			980.000.000,00	47,81%
2	**SUBCONTRATISTAS** (Contrato de mano de obra cvil para la ejecucion de las actividades objeto del contrato)	150.000.000,00			150.000.000,00	7,32%
TOTAL		**2.049.942.778,00**	**-**	**-**	**2.049.942.778,00**	100%

NOTAS:
a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo recibido por el contratista.
b) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15 %) del anticipo para compra de equipo y respuestos

Firma:
FREDDY CEBALLOS DELGADILLO
Rep. Legal CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL
Contratista
Matricula Profe

Firma:
JOSE FRANCISCO MORON OROZCO
Rep. Legal CONSORCIO VIASCOL
Interventor
Matricula Profesional: 25202-73192 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 31/0 /2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. ..... **MES:** L -2024 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** [X]

CONTRATO DE OBRA No. 558-2022 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. 111794 **DE** 2023 ENTIDAD FINANCIERA: ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 04000005905 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: .....
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 30 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 2,049,942,778.50** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES DESDE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DPUERTO NARINO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1052-2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIASCOL

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
Documento de egreso	01	29-may-23	Jimmy Quiroz Saavedra	$ 73,500,000.00	3	Subcontratistas
Cuenta de cobro	01	8-may-23	Sandra Viviana Ossa Corrales	$ 492,128,752.50	2	Transporte
Factura	5116	1-jun-23	Group AQ SAS	$ 249,997,312.50	1	Materiales
Factura	321	1-jun-23	Raymor Danilo Maldonado Veloza	$ 183,462,825.00	1	Materiales
Factura	FE-78	13-jun-23	Kasomave S.A.S.	$ 424,125,000.00	1	Materiales
Cuenta de cobro	01	8-may-23	Sandra Viviana Ossa Corrales	$ 247,500,000.00	2	Transporte
Factura	FE-89	1-ago-23	Kasomave S.A.S.	$ 60,808,449.00	1	Materiales
Factura	FE-3	12-ago-23	Jimmy Quiroz Saavedra	$ 76,500,000.00	3	Subcontratistas
Cuenta de cobro	FEI-1478	12-sep-23	Sandra Viviana Ossa Corrales	$ 133,083,727.00	2	Transporte
Factura	F3-125	29-sep-23	Kasomave S.A.S.	$ 108,836,712.00	1	Materiales

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	Materiales	$ 919,942,778.00	$ 918,393,586.5	$ 1,549,191.50	$ 919,942,778.00	$ -
2	Transporte	$ 980,000,000.00	$ 739,628,752.5	$ 240,371,247.50	$ 980,000,000.00	$ -
3	Subcontratistas	$ 150,000,000.00	$ 150,000,000.0		$ 150,000,000.00	$ -
	TOTALES	$ 2,049,942,778.00	$ 1,808,022,339.00	$ 241,920,439.00	$ 2,049,942,778.00	$ -

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (jun-23) : $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma: .....
Nombre: **Fredy Mauricio Ceballos Delgadillo**
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-89426

Firma: .....
Nombre: **Jose Francisco Morin Orozco**
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-73192 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.9.2 Seguimiento Programa de Obra

Demolición de andenes y pavimento en general	
% Programado Acumulado	100 %
% ejecutado Acumulado	100 %

Retiro de demolición	
% Programado Acumulado	100 %
% ejecutado Acumulado	100 %

Cerramiento en tela verde	
% Programado Acumulado	100 %
% ejecutado Acumulado	100 %

Excavaciones varias en material común	
% Programado Acumulado	100 %
% ejecutado Acumulado	100 %

Relleno compactado en material seleccionado de la excavación	
% Programado Acumulado	100 %
% ejecutado Acumulado	100 %

Base arena-cemento	
% Programado Acumulado	100 %
% ejecutado Acumulado	89.59 %

Sendero peatonal en concreto 3000 P.S.I	
% Programado Acumulado	100 %
% ejecutado Acumulado	96.06 %

Estampado en color tipo espina de pescado para concreto sobre bordillos	
% Programado Acumulado	100 %
% ejecutado Acumulado	95.50%

Bordillo en concreto de 3000 P.S.I	
% Programado Acumulado	100 %
% ejecutado Acumulado	96.02 %

Acero de refuerzo 60.000 P.S.I	
% Programado Acumulado	100 %
% ejecutado Acumulado	94.42 %

Geotextil T2100	
% Programado Acumulado	100 %
% ejecutado Acumulado	99.27%

Cunetas en concreto 21 Mpa	
% Programado Acumulado	98.21 %
% ejecutado Acumulado	74.52 %


Sumidero transversal	
% Programado Acumulado	100 %
% ejecutado Acumulado	0 %

Concreto de resistencia 14 Mpa para solado y atraque	
% Programado Acumulado	100 %
% ejecutado Acumulado	100 %

Box, aletas, muros armados en concreto 4000 P.S.I suministro y construcción	
% Programado Acumulado	100 %
% ejecutado Acumulado	50 %

Reprogramacion prorroga 11 def

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	% completado
1	**Cto 558 de 2023**	**mié 12/04/23**	**lun 30/06/25**	**70%**
2	Inicio de obra	mié 12/04/23	mié 12/04/23	100%
3	Localizacion y replanteo de vias	jue 13/04/23	vie 12/05/23	100%
4	**Preliminares**	**dom 30/04/23**	**jue 11/07/24**	**100%**
5	Demolicion de andenes y pavimento en general e<= 20cm	dom 30/04/23	dom 2/07/23	100%
6	Retiro de demolición	mar 2/05/23	mar 4/07/23	100%
7	Cerramiento provisional en tela verde H = 2,00 m	dom 30/04/23	jue 11/07/24	100%
8	**Movimiento de tierras**	**vie 5/05/23**	**mar 1/10/24**	**100%**
9	Excavaciones varias en material comun	vie 5/05/23	vie 30/08/24	100%
10	Relleno compactado en material seleccionado de la excavación (incluye trasiego manual excavacion)	jue 13/07/23	mar 1/10/24	100%
11	**Pavimento**	**lun 3/07/23**	**vie 20/06/25**	**77%**
12	Base en arena-cemento 1:10	jue 13/07/23	lun 7/04/25	68%
13	Sendero peatonal en concreto de 3.000 psi, ancho 2,5m, espesor de 10cm. Acabado estampado color rojo tipo espina de pescado. Incluye sello de juntas.	lun 17/07/23	vie 20/06/25	70%
14	Estampado en color tipo espina de pescado para concreto sobre bordillo.	jue 13/07/23	lun 16/06/25	70%
15	Bordillo en concreto de 3.000 psi, base=17cm, altura=43cm	jue 13/07/23	lun 16/06/25	75%
16	Acero de refuerzo 60.000 psi	lun 3/07/23	vie 28/03/25	89%
17	Geotextil T2100	dom 23/07/23	sáb 2/11/24	100%
18	**Obras complementarias**	**mié 18/06/25**	**mié 25/06/25**	**0%**
19	Caja de inspección en concreto reforzado de 3.000psi, de 60x60cm con tapa en concreto y cañuela.	mié 18/06/25	mié 25/06/25	0%
20	Suministro e instalación de Tubería corrugada D=12", incluye excavación, base en arena y atraque, relleno compactado con material de la excavación.	mié 18/06/25	mié 25/06/25	0%
21	Señalización vertical.	jue 19/06/25	mié 25/06/25	0%
22	***ITEMS NO PREVISTOS***	***dom 23/07/23***	***dom 29/06/25***	***35%***
23	*Cunetas en concreto 21 Mpa, no incluye refuerzo de seccion B= 0,30, h=0,14 y de espesor=0,07m.*	*dom 23/07/23*	*dom 29/06/25*	*25%*
24	*SUMIDEROS TRANSVERSALES h=0,30m, a=0,*	*mar 10/06/25*	*mar 17/06/25*	*0%*
25	*Excavaciones varias en material comun*	*dom 11/08/24*	*mar 20/08/24*	*100%*
26	*Relleno compactado en material seleccionado de la excavación (incluye trasiego manual excavacion)*	*vie 25/10/24*	*dom 12/01/25*	*100%*
27	*CONCRETO RESISTENCIA 14Mpa PARA SOLADOS Y ATRAQUES*	*mié 21/08/24*	*vie 25/10/24*	*100%*
28	*BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20.7 MPa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN*	*jue 17/10/24*	*sáb 28/06/25*	*29%*
29	*Acero de refuerzo 60.000 psi*	*sáb 31/08/24*	*lun 16/06/25*	*24%*
30	Fin de Obra	lun 30/06/25	lun 30/06/25	0%

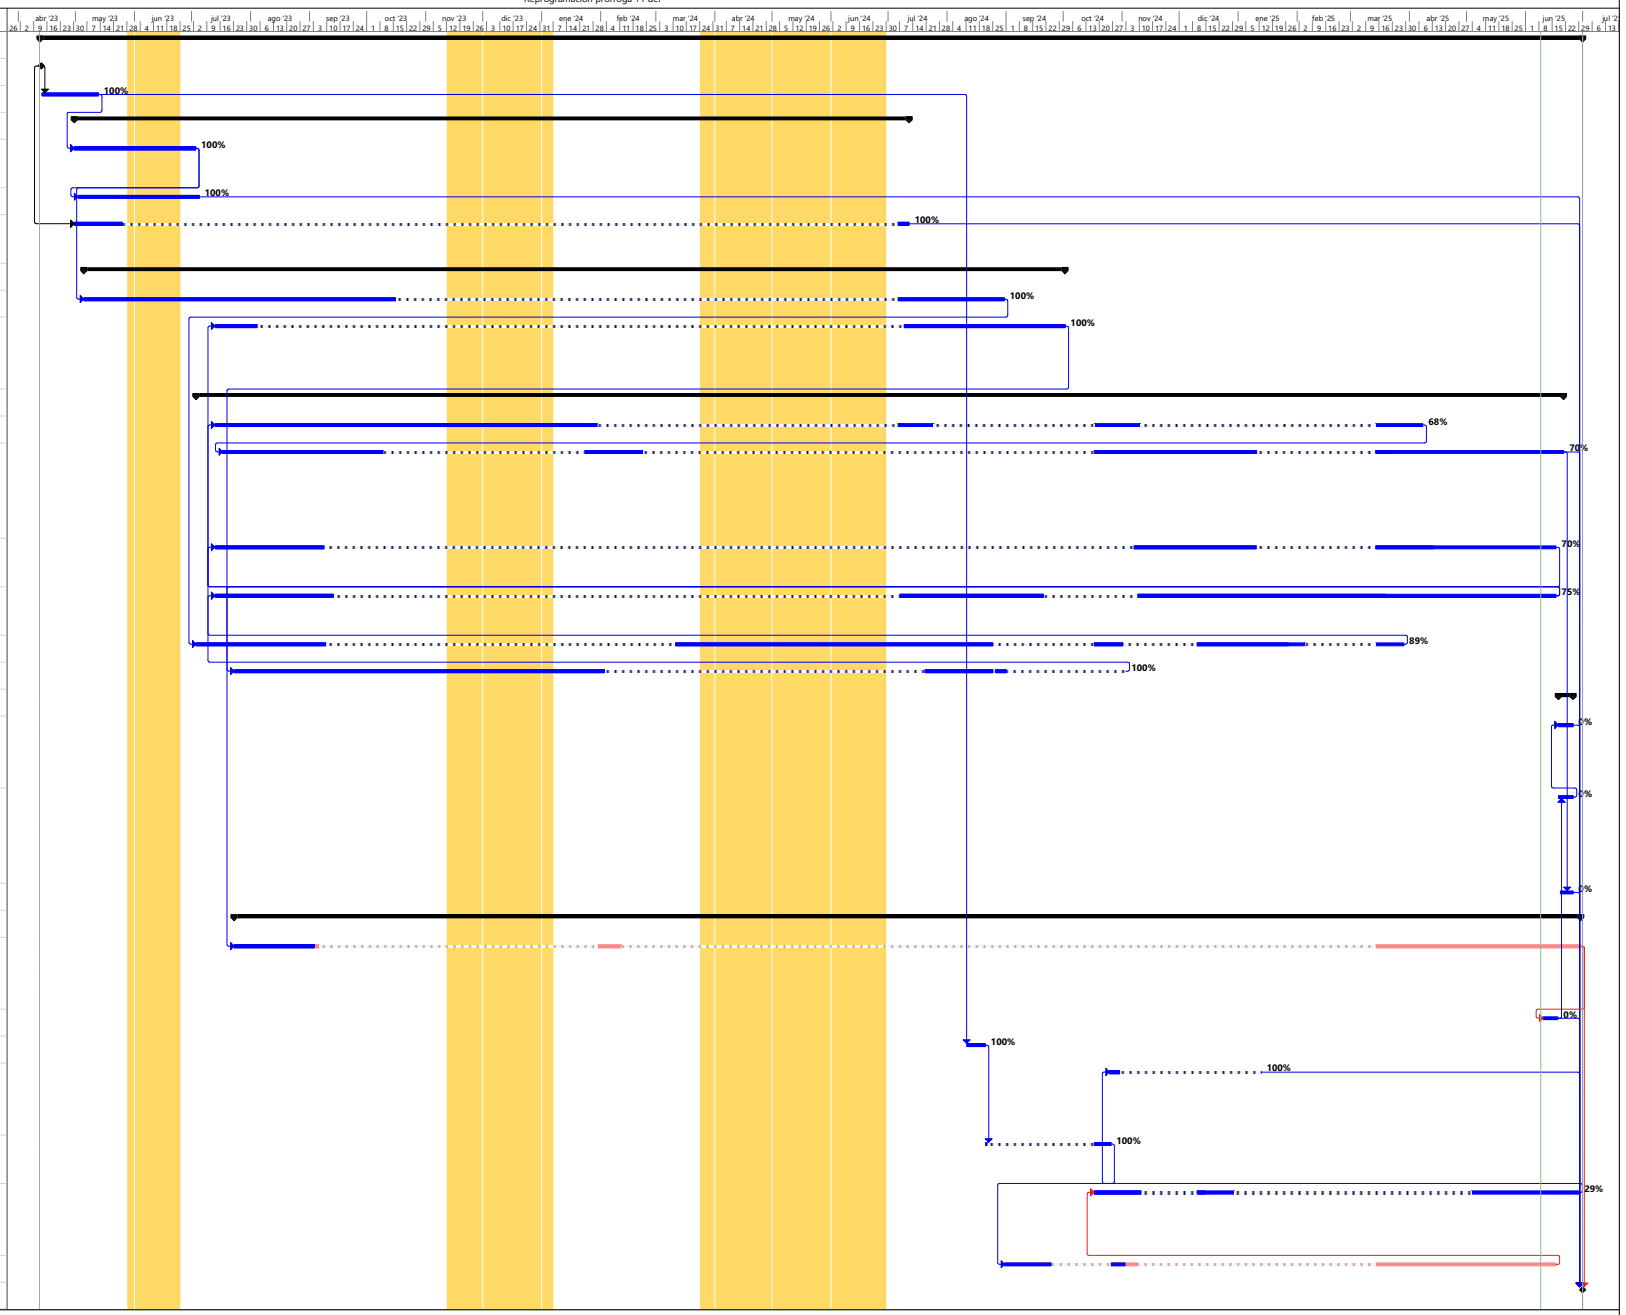

Tarea | Hito de linea base | Agrupar por síntesis | Resumen de linea base | Progreso resumido | Hito externo | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | División crítica
División | Resumen | Tarea resumida | Línea base resumida | División de la línea base | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Fecha límite | Línea base
Hito | Resumen del proyecto | Hito resumido | Hito de línea base resumida | Tareas externas | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Tareas críticas | Progreso

Página 1

Elaboro: FREDY CEBALLOS

Aprobo: MARLY SARRIA

4.9.3 Seguimiento Programa de Inversiones. Se debe anexar copia del Programa de inversiones aprobado vigente (Formato MEPI-MN-IN-6-FR-1) y copia del documento de seguimiento al programa de obra e inversiones realizado por la Interventoría (Formato MEPI-MN-IN-6-FR-2).

Se anexa los formatos mencionados debidamente diligencidos y firmados

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PROGRAMA DE INVERSIONES** --

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 14
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 558-2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES DESDE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

CONTRATISTA: CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1052-2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIASCOL

PLAZO INICIAL: 1 MES Y 22 DÍAS (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/04/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 22/03/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ **6.833.142.595,00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ **6.833.142.595,00**

PLAZO ACUMULADO: VEINTIUN MESES Y DOS DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 7/07/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / Valor Programado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	12 abril de 2023 / 30 abril de 2023	Mayo de 2023	Junio de 2023	Julio de 2023	Agosto de 2023	Septiembre de 2023	Octubre de 2023	Enero de 2024	Febrero de 2024	Marzo de 2024	Julio de 2024	Agosto de 2024	Septiembre de 2024
Demolicion de andenes y pavimento en general e<= 20cm	97.936	1,45%	1,11%	% P		1,25%	5,20%										
	74.743		$74.743	$ P		$94.591	$19.355										
				$ E		$17.978	$21.502	$6.136				$524	$19.274	$0			
				% E		0,28%	0,35%	0,09%					0,30%	0,00%			
Retiro de demolición	72.684	1,07%	0,42%	% P		0,80%	5,21%										
	28.494		$28.494	$ P		$58.147	$14.637										
				$ E			$20.350										
				% E			0,30%										
Cerramiento provisional en tela verde H = 2,00 m	29.928	0,44%	0,44%	% P	0,44%												
	29.928		$29.928	$ P	$29.928												
				$ E		$6.340	$7.633	$5.734					$6.218	$0			
				% E		0,13%	0,11%	0,08%					0,12%	0,00%			
Excavaciones varias en material comun	162.516	2,40%	2,76%	% P		0,66%	0,90%	0,93%	0,51%						0,72%	0,50%	0,54%
	186.480		$186.480	$ P		$4.063	$69.943	$62.973	$34.535						$3.194	$34.147	$36.436
				$ E	$6.129	$16.329	$23.793	$8.749	$2.444		$11.430	$9.697	$709	$15.986	$3.194	$8.095	$11.436
				% E	0,18%	0,24%	0,29%	0,50%	0,04%		0,17%	0,11%	0,01%	0,22%	0,04%	0,09%	0,12%
Relleno compactado en material seleccionado de la excavación (incluye traslego manual excavacion)	456.663	6,74%	6,31%	% P		0,95%	2,46%	2,46%	0,87%						0,21%	0,18%	
	426.425		$426.425	$ P		$64.479	$166.548	$166.548	$59.098						$1.196	$12.899	$12.899
				$ E			$16.097	$6.663	$6.196	$54.276					$14.417	$20.000	
				% E			0,15%	0,06%	0,06%	0,51%					0,13%	0,19%	0,19%
Base en arena-cemento 1:10	1.449.564	21,42%	19,97%	% P				5,24%	7,14%	7,37%		0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	1,56%	2,69%
	1.507.565		$1.350.573	$ P				$354.338	$483.188	$498.234		$56.372	$56.372	$56.372	$21.044	$105.614	$168.346
				$ E				$368.869	$142.474	$134.895	$61.164	$42.716	$193.644	$366.299	$114.830		
				% E				5,36%	2,21%	1,99%	1,20%	0,63%	2,83%	4,50%	1,69%	0,00%	0,00%
Sendero peatonal en concreto de 3.000 psi, ancho 2,5m, espesor de 10cm. Acabado estampado color rojo tipo espina de pescado. Incluye sello de juntas.	1.964.488	29,04%	26,64%	% P					7,10%	8,00%		2,26%	2,26%	6,78%		2,15%	4,30%
	1.875.916		$1.801.966	$ P					$489.298	$476.497		$152.793	$196.448	$459.399	$20.715	$145.364	$299.737
				$ E					$347.443	$559.896		$454.966	$329	$139.339	$43.760		
				% E					18,52%	29,84%		24,25%	0,02%	7,43%	2,33%		
Estampado en color tipo espina de pescado para concreto sobre bordillo.	78.559	1,17%	1,12%	% P						0,37%	0,10%	6,72%	0,00%	2,06%	0,00%	0,11%	0,22%
	78.952		$75.396	$ P					$21.580	$15.155	$14.808	$4.548	$19.858	$0	$2.116	$7.569	$15.139
				$ E					$16.956	$4.941		$4.548	$19.858		$2.116	$7.569	$15.139
				% E					1,22%	0,26%		0,67%	0,16%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%
Cunetas en concreto de 3.000 psi, base 0,30 y altura 0,14 y de e=0,07m.	1.005.168	14,86%	0,00%	% P			6,31%	6,31%	2,24%								
	0		$0	$ P			$426.852	$426.852	$151.442								
				$ E				$72.672	$132.242	$15.871		$37.833	$72.473	$52.966			
				% E				1,68%	1,96%	0,23%		0,56%	1,07%	0,78%			
Bordillo en concreto de 3.000 psi, base=17cm, altura=43cm	763.735	11,29%	10,85%	% P			3,09%	3,09%	1,10%						0,10%	0,56%	0,84%
	763.393		$732.980	$ P			$209.822	$249.219	$141.190	$64.310		$60.452	$43.069	$274.697	$9.354	$38.018	$57.227
				$ E			$20.545	$139.296	$52.787								
				% E			0,44%	0,38%	1,78%	0,48%		1,37%	0,81%	4,06%	0,14%	0,61%	0,22%
Acero de refuerzo 60.000 psi	560.160	8,28%	7,02%	% P				2,80%	7,47%	1,84%					0,16%	0,33%	0,73%
	503.044		$474.973	$ P			$192.944	$192.944	$174.272						$7.132	$22.057	$51.466
				$ E			$59.064	$68.193	$72.496	$51.830		$103.544	$36.368	$60.383			
				% E			0,15%	0,71%	1,06%	0,46%		1,52%	0,54%	0,89%	0,04%	0,54%	1,93%
Geotextil T2100	59.693	0,88%	0,75%	% P				0,11%	0,30%	0,22%	0,18%				0,01%	0,02%	0,06%
	51.473		$51.096	$ P				$7.296	$20.561	$19.898	$11.939				$315	$1.604	$3.743
				$ E				$4.618	$4.897	$4.536	$2.986		$7.458	$14.507	$4.778		
				% E				0,07%	0,07%	0,07%	0,04%	0,01%	0,10%	0,22%	0,07%	0,00%	0,00%
Caja de inspección en concreto reforzado de 3.000psi, de 60x60cm con tapa en concreto y cañuela.	27.715	0,41%	0,00%	% P						0,41%							
	27.715		$0	$ P						$27.715							
				$ E													
				% E													
Suministro e instalación de Tubería corrugada D=12", incluye excavación, base en arena y atraque, relleno compactado con material de la excavación.	24.256	0,36%	0,18%	% P					0,36%								
	24.256		$12.229	$ P					$24.256								
				$ E													
				% E													
Señalización vertical.	10.294	0,15%	0,00%	% P										0,15%			
	10.294		$0	$ P										$10.294			
				$ E													
				% E													
Cunetas en concreto 21 Mpa, no incluye refuerzo de seccion B= 0,30, h=0,14 y de espesor=0,07m	1.017.217	0,00%	10,43%	% P											1,20%	1,88%	1,88%
	946.930		$705.609	$ P											$120.839	$126.839	$126.870
				$ E													
				% E											0,49%	0,18%	0,00%
SUMIDEROS TRANSVERSALES h=0,30m, a=0,40m, incluye excavación y relleno con material de la excavación.	23.519	0,00%	0,00%	% P													
	23.519		$0	$ P													
				$ E													
				% E													
Excavaciones varias en material comun	9.542	0,00%	0,14%	% P											0,14%		
	9.542		$9.542	$ P											$9.542	$9.542	$1.363
				$ E													
				% E											0,06%	0,10%	0,04%
Relleno compactado en material seleccionado de la excavación (incluye traslego manual excavacion)	2.142	0,00%	0,03%	% P													0,00%
	2.142		$2.142	$ P													$214
				$ E													$215
				% E													0,02%
CONCRETO RESISTENCIA 14Mpa PARA SOLADOS Y ATRAQUES	7.452	0,00%	0,11%	% P											0,11%		
	7.452		$7.452	$ P											$7.452		$1.490
				$ E													$1.490
				% E											0,06%		0,11%
BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20.7 MPa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	107.398	0,00%	0,79%	% P													0,32%
	107.398		$53.699	$ P													$21.480
				$ E													$8.055
				% E													0,13%
Acero de refuerzo 60.000 psi	76.983	0,00%	0,82%	% P											0,23%	0,45%	0,46%
	77.662		$55.266	$ P											$15.397	$30.793	$6.159
				$ E											$6.165	$6.165	$6.165
				% E											0,10%	0,13%	0,15%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 6.763.361,87	100%	89,88%														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 6.763.325,04**		$ 6.078.909,00														

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	Octubre de 2024				Noviembre de 2024							Diciembre de 2024				Enero de 2025				Febrero de 2025				Marzo de 2025					Abril de 2025					Mayo de 2025					Junio de 2025		
	SEMANA 54	SEMANA 55	SEMANA 56	SEMANA 57	SEMANA 58	SEMANA 59	SEMANA 60	SEMANA 61	SEMANA 62	SEMANA 63	SEMANA 64	SEMANA 65	SEMANA 66	SEMANA 67	SEMANA 68	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	SEMANA 73	SEMANA 74	SEMANA 75	SEMANA 76	SEMANA 77	SEMANA 78	SEMANA 79	SEMANA 80	SEMANA 81	SEMANA 82	SEMANA 83	SEMANA 84	SEMANA 85	SEMANA 86	SEMANA 87	SEMANA 88	SEMANA 89	SEMANA 90	SEMANA 91	SEMANA 92
	27 sep. 2024 / 03 oct. 2024	04 oct. 2024 / 10 oct. 2024	11 oct. 2024 / 17 oct. 2024	18 oct. 2024 / 24 oct. 2024	25 oct. 2024 / 31 oct. 2024	01 nov. 2024 / 07 nov. 2024	08 nov. 2024 / 14 nov. 2024	15 nov. 2024 / 21 nov. 2024	22 nov. 2024 / 28 nov. 2024	29 nov. 2024 / 05 dic. 2024	06 dic. 2024 / 12 dic. 2024	13 dic. 2024 / 19 dic. 2024	20 dic. 2024 / 26 dic. 2024	27 dic. 2024 / 02 ene. 2025	03 ene. 2025 / 09 ene. 2025	10 ene. 2025 / 16 ene. 2025	17 ene. 2025 / 23 ene. 2025	24 ene. 2025 / 30 ene. 2025	31 ene. 2025 / 06 feb. 2025	07 feb. 2025 / 13 feb. 2025	14 feb. 2025 / 20 feb. 2025	21 feb. 2025 / 27 feb. 2025	28 feb. 2025 / 06 mar. 2025	07 mar. 2025 / 13 mar. 2025	14 mar. 2025 / 20 mar. 2025	21 mar. 2025 / 27 mar. 2025	28 mar. 2025 / 03 abr. 2025	04 abr. 2025 / 10 abr. 2025	11 abr. 2025 / 17 abr. 2025	18 abr. 2025 / 24 abr. 2025	25 abr. 2025 / 01 may. 2025	02 may. 2025 / 08 may. 2025	09 may. 2025 / 15 may. 2025	16 may. 2025 / 22 may. 2025	23 may. 2025 / 29 may. 2025	30 may. 2025 / 05 jun. 2025	06 jun. 2025 / 12 jun. 2025	13 jun. 2025 / 19 jun. 2025	20 jun. 2025 / 30 jun. 2025
Demolicion de andenes y pavimento en general e<= 20cm							0,15%																															
							$6.666																															
Retiro de demolición							0,65%																															
							$40.604																															
Cerramiento provisional en tela verde H = 2,00 m																																						
Excavaciones varias en material comun	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%																													
	$34.535	$34.535	$34.535	$34.535	$34.535	$34.535	$34.535	$34.535	$34.535																													
	$34.535	$34.535	$34.535	$34.535	$34.535	$34.535	$34.535	$34.535	$34.535																													
	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%																													
Relleno compactado en material seleccionado de la excavación (incluye traslego manual excavacion)	$13.856	$13.856	$13.856	$13.856	$13.856	$13.856	$13.856	$13.856	$13.856																							$9.904	$9.904	$9.904		$9.860			
	$12.899	$12.899	$12.899	$12.899	$12.899	$12.899	$12.899	$12.899	$12.899																													
	$14.417	$20.000																																			
	1,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%																													
	1,87%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,91%	0,91%	1,42%	0,91%																													
	$14.829	$20.067	$20.067	$20.067	$20.067	$61.799	$61.799	$92.266	$61.799																													
	$14.829	$20.067	$20.067	$20.067	$20.067	$61.799	$61.799	$92.266	$61.799																													
	$29.396	$29.396	$29.396	$29.396	$29.396	$29.396	$29.396	$29.396	$29.396																													
	2,68%	0,27%	0,27%	0,27%	0,68%	0,71%	0,71%	1,07%	0,71%																													
	$44.996	$4.906	$4.906	$4.906	$4.906	$12.037	$12.037	$18.623	$12.037																													
	4,30%	0,38%	0,27%	0,27%	0,27%	0,68%	0,67%	1,37%	0,67%																													
	$44.996	$4.906	$4.906	$4.906	$4.906	$12.037	$4.530	$4.530	$4.530																													
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																													
	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0																													
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																													
	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0																													
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																													
	0,23%																																					
	$15.611																																					

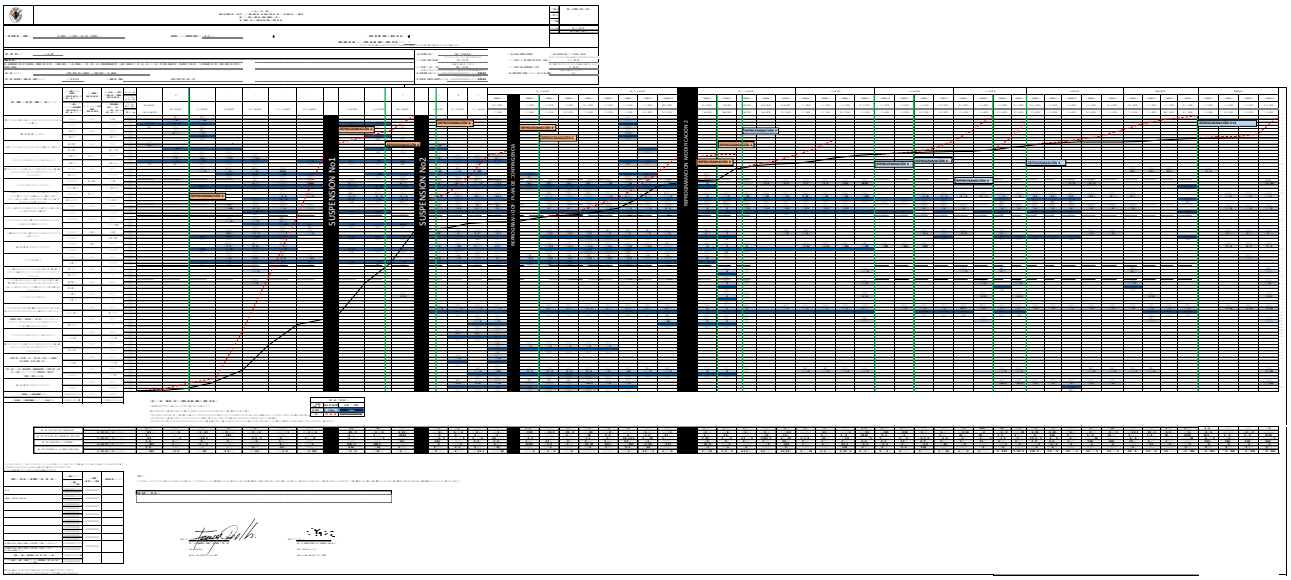

4.9.4 Copia de las Actas de comité de obra (Formato MEPI-MN-IN-14-FR-1) y Acta de reunión (Formato MEPI-MN-IN-14-FR-2).

5. FORMATO DE ORDEN DE TRABAJO

5. Orden de trabajo

ORDEN	2022
ORDEN	CONTRATO
Contratista	IN CONSTRUCCIONES Y CONSTRUCTORA S.A. NIT 2
	DIRECCIÓN: NIT
	TELÉFONO: NIT
Fecha	
REPRESENTANTE LEGAL	Jorge Mario Orozco
Cargo	
Dirección	
Email	
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 1"
VALOR	EL VALOR DE LA PRESENTE ORDEN DE TRABAJO ES POR LA SUMA DE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($1.819.264.000)
ORDEN DE TRABAJO	001
FECHA	1 DE DICIEMBRE DE 2022

5. Descripción de la actividad

Describir la actividad a realizar, incluyendo el alcance y los objetivos de la misma.

Identificación de peligros

Describir los peligros identificados para la actividad, incluyendo los riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales.

- Peligros físicos: ruido, vibración, radiación, temperatura extrema, etc.
- Peligros químicos: exposición a sustancias químicas, gases, vapores, etc.
- Peligros biológicos: exposición a microorganismos, virus, bacterias, etc.

Evaluación de riesgos

Describir la evaluación de riesgos realizada para cada peligro identificado, incluyendo la probabilidad y la severidad de los riesgos.

- Probabilidad: baja, media, alta
- Severidad: leve, moderada, grave

Medidas de control

Describir las medidas de control implementadas para cada riesgo identificado, incluyendo las medidas de ingeniería, administrativas y de protección personal.

- Medidas de ingeniería: diseño de equipos, sistemas de ventilación, etc.
- Medidas administrativas: capacitación, procedimientos de trabajo, etc.
- Medidas de protección personal: uso de equipos de protección personal, etc.

Plan de emergencia

Describir el plan de emergencia para la actividad, incluyendo los procedimientos de evacuación, los números de emergencia y los equipos de emergencia disponibles.

- Procedimientos de evacuación: rutas de evacuación, puntos de reunión, etc.
- Números de emergencia: bomberos, ambulancias, policía, etc.
- Equipos de emergencia: extintores, botiquines de primeros auxilios, etc.

- Cronograma de actividades de la interventoría, donde se incluyan las actividades de control y seguimiento del proyecto.
- Cronograma de actividades de control y seguimiento ambiental, donde se incluyan las actividades de control y seguimiento ambiental del proyecto.
- Relación de personal profesional y técnico de la interventoría, con sus hojas de vida y certificados de experiencia.

5. [illegible]

INFORME ESPECIALISTA AMBIENTAL

□O□□OR□□O□□□□O□□

**□FORME□E□E□□□□O□MB□E□□□□DE□□□ER□E□□OR□□□□

□

□□□□r□□□ IN□ □□□RI□A□I□□□□□□RRANO□□RADA□	A□r□□□□□ IN□ □MAR□Y□MI□□N□□□ARRIA□□ON□A□□□□
□□r□□□□ □□□□□IA□I□□A□AM□I□N□A□□	□□r□□□□ DIR□□□ORA□D□□IN□□R□□N□ORIA□
□r□ □□□ □	□r□ □□□□
□□r□□□□□□□□□ □□□□□□□2□□□□2□2□□	O□□□r□□□□□□□□□□□□□□□□□□r□□□□□□□□r□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□d□d□□□ □□□□□□□d□□□ □□r□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□ A□ □□□□□□□□d□□□□l□□r□□□□r□□□d□□□r□d□□□d□d□□□□□□□ □□□r□□□d□□□□□□□□ □□r□□□r□□d□□□

□

□

□

ANEXO No. 5

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL CONTRATISTA DE OBRA PÚBLICA DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 5 DE 2022 CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA MITÚ – CARURÚ, TRAMO 2, DEPARTAMENTO DE VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL – LOTE 1".

Entre los suscritos a saber, **ANA MARÍA RUIZ MONTOYA**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.020.717.326 de Bogotá D.C., quien actúa en su calidad de Directora Territorial Vaupés del Instituto Nacional de Vías, según Resolución No. 5284 del 28 de diciembre de 2021, debidamente facultada para suscribir el presente acuerdo de confidencialidad, quien en adelante se denominará **EL INVIAS**, y **[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. **[NÚMERO DE CÉDULA]** de **[CIUDAD DE EXPEDICIÓN]**, quien actúa en su calidad de **[CARGO]** de **[NOMBRE DEL CONTRATISTA]**, debidamente facultado para suscribir el presente acuerdo de confidencialidad, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente acuerdo de confidencialidad, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que el Instituto Nacional de Vías suscribió el contrato de obra pública No. 2 de 2022 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA MITÚ – CARURÚ, TRAMO 2, DEPARTAMENTO DE VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL – LOTE 1".

SEGUNDA: Que el Instituto Nacional de Vías suscribió el contrato de obra pública No. 2 de 2022 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA MITÚ – CARURÚ, TRAMO 2, DEPARTAMENTO DE VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL – LOTE 1".

TERCERA: Que el Instituto Nacional de Vías suscribió el contrato de obra pública No. 2 de 2022 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA MITÚ – CARURÚ, TRAMO 2, DEPARTAMENTO DE VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL – LOTE 1".

CUARTA: Que el Instituto Nacional de Vías suscribió el contrato de obra pública No. 2 de 2022 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA MITÚ – CARURÚ, TRAMO 2, DEPARTAMENTO DE VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL – LOTE 1".

OBJETO DEL ACUERDO

QUINTA: El presente acuerdo de confidencialidad tiene por objeto establecer las condiciones bajo las cuales **EL CONTRATISTA** se compromete a mantener la confidencialidad de la información suministrada por **EL INVIAS** en el marco del contrato de obra pública No. 2 de 2022 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA MITÚ – CARURÚ, TRAMO 2, DEPARTAMENTO DE VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL – LOTE 1".

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

SEXTA: **EL CONTRATISTA** se compromete a mantener la confidencialidad de la información suministrada por **EL INVIAS** en el marco del contrato de obra pública No. 2 de 2022 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA MITÚ – CARURÚ, TRAMO 2, DEPARTAMENTO DE VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL – LOTE 1".

SÉPTIMA: **EL CONTRATISTA** se compromete a no divulgar la información suministrada por **EL INVIAS** en el marco del contrato de obra pública No. 2 de 2022 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA MITÚ – CARURÚ, TRAMO 2, DEPARTAMENTO DE VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL – LOTE 1".

OCTAVA: **EL CONTRATISTA** se compromete a no utilizar la información suministrada por **EL INVIAS** en el marco del contrato de obra pública No. 2 de 2022 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA MITÚ – CARURÚ, TRAMO 2, DEPARTAMENTO DE VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL – LOTE 1".

VIGENCIA DEL ACUERDO

NOVENA: El presente acuerdo de confidencialidad tendrá una vigencia de **[NÚMERO DE MESES]** meses contados a partir de la fecha de suscripción del mismo.

DÉCIMA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser prorrogado por un término igual al inicialmente pactado, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA** y aceptación de **EL INVIAS**.

DÉCIMA PRIMERA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por mutuo acuerdo entre las partes, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA** y aceptación de **EL INVIAS**.

DÉCIMA SEGUNDA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

DÉCIMA TERCERA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

DÉCIMA CUARTA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

DÉCIMA QUINTA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

DÉCIMA SEXTA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

DÉCIMA SÉPTIMA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

DÉCIMA OCTAVA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

DÉCIMA NOVENA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

VIGÉSIMA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

VIGÉSIMA PRIMERA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

VIGÉSIMA SEGUNDA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

VIGÉSIMA TERCERA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

VIGÉSIMA CUARTA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

VIGÉSIMA QUINTA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

VIGÉSIMA SEXTA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

VIGÉSIMA SÉPTIMA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

VIGÉSIMA OCTAVA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

VIGÉSIMA NOVENA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

TRIGÉSIMA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

TRIGÉSIMA PRIMERA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

TRIGÉSIMA SEGUNDA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

TRIGÉSIMA TERCERA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

TRIGÉSIMA CUARTA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

TRIGÉSIMA QUINTA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

TRIGÉSIMA SEXTA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

TRIGÉSIMA OCTAVA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

TRIGÉSIMA NOVENA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

CUADRAGÉSIMA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

CUADRAGÉSIMA TERCERA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

CUADRAGÉSIMA CUARTA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

CUADRAGÉSIMA QUINTA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

CUADRAGÉSIMA SEXTA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

CUADRAGÉSIMA OCTAVA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

CUADRAGÉSIMA NOVENA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

QUINCUAGÉSIMA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

QUINCUAGÉSIMA PRIMERA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

QUINCUAGÉSIMA TERCERA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

QUINCUAGÉSIMA CUARTA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

QUINCUAGÉSIMA QUINTA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

QUINCUAGÉSIMA SEXTA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

QUINCUAGÉSIMA NOVENA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

SEXAGÉSIMA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

SEXAGÉSIMA PRIMERA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

SEXAGÉSIMA SEGUNDA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

SEXAGÉSIMA TERCERA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

SEXAGÉSIMA CUARTA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

SEXAGÉSIMA QUINTA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

SEXAGÉSIMA SEXTA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

SEXAGÉSIMA SÉPTIMA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

SEXAGÉSIMA OCTAVA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

SEXAGÉSIMA NOVENA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

SEPTUAGÉSIMA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

SEPTUAGÉSIMA PRIMERA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

SEPTUAGÉSIMA TERCERA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

SEPTUAGÉSIMA CUARTA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

SEPTUAGÉSIMA QUINTA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

SEPTUAGÉSIMA SEXTA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

SEPTUAGÉSIMA OCTAVA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

SEPTUAGÉSIMA NOVENA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

OCTOGÉSIMA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

OCTOGÉSIMA PRIMERA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

OCTOGÉSIMA SEGUNDA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

OCTOGÉSIMA TERCERA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

OCTOGÉSIMA CUARTA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

OCTOGÉSIMA QUINTA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

OCTOGÉSIMA SEXTA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

OCTOGÉSIMA SÉPTIMA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

OCTOGÉSIMA OCTAVA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

OCTOGÉSIMA NOVENA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

NONAGÉSIMA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

NONAGÉSIMA PRIMERA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

NONAGÉSIMA SEGUNDA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

NONAGÉSIMA TERCERA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

NONAGÉSIMA CUARTA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

NONAGÉSIMA QUINTA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

NONAGÉSIMA SEXTA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

NONAGÉSIMA SÉPTIMA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

NONAGÉSIMA OCTAVA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

NONAGÉSIMA NOVENA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL INVIAS**, previa solicitud escrita de **EL CONTRATISTA**.

CENTÉSIMA: El presente acuerdo de confidencialidad podrá ser terminado por incumplimiento de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, previa solicitud escrita de **EL INVIAS**.

O RE ME E E O

d r d l r r d 2 d 2 22 ON OR IO IA O r N d – IN IA l r A d d d d r A d l r r d r d d r d 0 5

B RE ME O R O DE ER E OR	
MERO DE O R O	2 D 2 22
OB E O DE O R O	IN R N OR A NI A ADMINI RA I A INAN I RA Y AM I N A ARA MAN NIMI N O Y M JORAMI N O D A R IARIA N O MUNI I IO D O D AR AM N O D AMA ONA A U Y AU D RO RAMA "O OM IA RURA " – LOTE 1".
ER E OR	ON OR IO IA O NI l r d r IN NO RA ON RU I N Y ON U OR A A – IN NO RA A NI 2 2 r d r d IA DA IN NI R A NI RO I IN A NI r d r d RO I IN A NI r d r d NI R JO RAN I O MOR N ORO O D r N A O 2
O R E	IN I U O NA IONA D A IN IA
ER OR	IN JO RI ARDO UR ANO
OR O R O	I MI O O I N O DI MI ON DO I N O R IN A MI UINI N O R IN A Y DO O 2 2 MON DA ORRI N IN UIDO I A
OR MB E O R O	NA
O D	A A D DI I M R D 2 2
FE DE O	2 22
FE DE ERM	2 2 2

FECHA DE INFORME	22 de abril de 2022
PERIODO DE EJECUCIÓN	Inicio: 22 de abril de 2022 Fecha de terminación: 22 de abril de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	

El presente informe se realiza con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 2.2.1 del Anexo Técnico de la Invitación Pública No. 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA A CARGO DE LA COMUNIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL ALTO VAUPÉS, MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – LOTE 1 VAUPÉS

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL VAUPÉS 2022

CONTRATO DE OBRA No. 2022

2. **UBICACIÓN DEL PROYECTO**

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA A CARGO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL ALTO VAUPÉS, MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – LOTE 1 VAUPÉS

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL VAUPÉS 2022

CONTRATO DE OBRA No. 2022

3. **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA A CARGO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL ALTO VAUPÉS, MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – LOTE 1 VAUPÉS

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL VAUPÉS 2022

CONTRATO DE OBRA No. 2022

4. **DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

CONTRATO DE OBRA No. 2022

CONTRATISTA

5. **CONDICIONES CLIMÁTICAS**

6. **ANEXOS**

□

□E□□□□□O□□□00□□DE□□□0□0□□□0□5□

□

M□d□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□r□□□□□d□□□□□□□□□□□□□□d□□□□□r□□□□□r□□□□□□□□d□□□□□□□□□□r□ □□□ □□r□□□rd□r□ □□□□□□□□□□□r□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□r□□□□□□□□□□□□□ □□r□□□□□□□□□□□r□□□□□□□□□□d□□□□□d□□□□□□r□□□d□□ □□r□ □□□□□□d□□2□22□□□□□□□r□□□□□□d□□□□□r□□□□□□r□□□□□□□□□□r□□□□□r□□□□□□d□□□□□□□□□□d□d□d□□□□□ □□□□r□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□rr□□□□□□d□□□□□□□□□□□□r□□d□□□□□□□□□□□□□d□□□□□□□□r□□□□

□

A□□□□□□□□□□□□□□□□□□□d□□□□□□□d□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□r□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

r d d r 2 22

F IA O 2 2

r d d r r r

□

□E□□□□□O□□□0□□□DE□□□□□0□□□0□5□

□

□□r□□ □d□□□d□□□□□□□□□□□□r□□□□□d□□□□□□□□□□□□d□□□□□r□□□□r□□□d□□□□ □□r□□□□d□□O□r□□□□□□□□□d□□ 2□22□□□□d□□□□□□d□□□□□□d□□2□2□□□□□□□□□□□□

-

INFORME PROFESIONAL SOCIAL

CONSORCIO VIASCOL	INFORME SOCIAL MES DE JUNIO
	JUAN MARTINEZ PEREZ
	RESIDENTE SOCIAL

INFORME DE ACTIVIDADES
S OCIAL No. 22
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/06/2025 AL 30/06/2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	
Contrato de obra N° 558 DE 2022	
Periodo:	junio de 2025
Objeto:	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES DESDE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.".
Fecha Inicio:	12/04/2023
Fecha Terminación:	30/06/2025
Nombre del contratista:	Consorcio Kairos Sendero Peatonal

Actividades realizadas

Se realiza seguimiento a las actividades según el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) entregado por el contratista de obra.

PROYETO 1. ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

La oficina de servicio de atención al ciudadano, se instaló dentro de la comunidad de San francisco, como punto de referencia y ubicación se concentra en la infraestructura de la casa del señor curaca Gustavo González, quien autorizo el permiso de instalación de la oficina de forma voluntaria, ésta se encuentra ubicada en la vía principal del puente de ingreso a la comunidad, quedando a la vista y acceso de todos sus residentes; presta sus servicios de atención de lunes a viernes en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. espacio propicio para atender cada una de las inquietudes relacionadas con el Proyecto, también se cuenta con una línea de atención al usuario creada para mejorar la atención Tel: (3112948700)

CONSORCIO VIASCOL	INFORME SOCIAL MES DE JUNIO
	JUAN MARTINEZ PEREZ
	RESIDENTE SOCIAL





Recepción De Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones Y Denuncias (PQRSFD):

Para el presente periodo se hace la apertura del buzón no se encontraron PQRSF.

PROYECTO 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

Teniendo en cuenta que gran parte del este periodo la obra entro en estado de suspensión, durante este periodo no se realizaron actividades referentes a la divulgación de la información.

PROYECTO 3. CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Teniendo en cuenta que gran parte del este periodo la obra entro en estado de suspensión, durante este periodo no se realizaron actividades referentes a cultura vial y participación comunitaria.

PROYECTO 4. DE MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Durante el mes de junio, no se realizaron actas de vecindad de cierre.

PROYECTO 5. MANO DE OBRA


N°	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	CARGO
1	ALVARO ENRIQUE IRIARTE ALDANA	8705590	ESPECIALISTA
2	DARWIN DANILO CEBALLOS FORERO	1121712401	TOPOGRAFO
3	FREDY MAURICIO CEBALLOS	17409758	DIRECTOR

4	DIEGO MORALES UNI	1075287579	PROFESIONAL SST
5	FABIO ALBERTO VILLA	86053660	RESIDENTE
6	ANGELA NATALIA CELY	40046331	PROFESIONAL SOCIAL
7	LUIS CABEZA	1147684367	ALMACENISTA
8	DORIS AHUANARI		APOYO SST
9	RAUL TORRES	6565687	MAESTRO DE OBRA
10	JAVIER MACEDO	18050689	MAESTRO DE OBRA
11	EDUARDO MALAFALLA	1051456	CELADOR DE OBRA
12	GERMAN MORAN	15887052	CELADOR DE OBRA
13	YERGELINA BENITEZ AHUE	1006784385	AYUDANTE DE OBRA
14	DIVA AVIGAIL MURAYARI	1122266094	AYUDANTE DE OBRA
15	GLORIA FERREIRA		AYUDANTE DE OBRA
16	ARVEY MURAYARI	1122267443	AYUDANTE DE OBRA
17	ABED DANIEL PEÑA RODRIGUEZ	1122268332	AYUDANTE DE OBRA
18	YESID PARENTE SANTOS	1121218608	AYUDANTE DE OBRA
19	ANGEL BENITEZ FERNANDEZ	15888214	AYUDANTE DE OBRA
20	EDISBAN PAIME GUERRERO	18051585	AYUDANTE DE OBRA
21	ENNIO MARICHIN PURICHO	1006784376	AYUDANTE DE OBRA
22	RUBEN FERNANDEZ BARRERA	18050998	AYUDANTE DE OBRA
23	HERMAN PINTO BETANCOURT	1149192167	AYUDANTE DE OBRA
24	JUAN CARLOS PINTO CASTILLO	1006784821	AYUDANTE DE OBRA
25	MARIO CAHUACHE CAYETANO	1006784811	AYUDANTE DE OBRA
26	JORGE LUIS PEÑA	1122269115	AYUDANTE DE OBRA
27	CESAR ARCESIO VALENTIN PURICHO	1122270837	AYUDANTE DE OBRA
28	AUGUSTE FERNANDEZ VALERIO	15887133	AYUDANTE DE OBRA
29	JORGE LUIS SILVA CAHUACHE	1006784111	AYUDANTE DE OBRA
30	FRANK ALEJANDRO CURICO BENITEZ	1122266125	AYUDANTE DE OBRA
31	MANOLO VALENTIN PURICHO	1122268858	AYUDANTE DE OBRA
32	SADAN PINTO PURICHO	1122266571	AYUDANTE DE OBRA
33	JHON JEREMIAS PEÑA LAULATE	1122269214	AYUDANTE DE OBRA
34	FRANCO FERNANDEZ	1122269922	AYUDANTE DE OBRA
35	BRAYAN LEONARDO JAVA TAPAYURI	1122266158	AYUDANTE DE OBRA

Del 100% de la mano obra contratada para la construcción, el 74% por ciento representa la mano de obra no calificada, y el 26% restante, representa la mano de obra calificada.



PROYECTO 6. INCLUSIÓN SOCIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DE TRANSVERSALIZACIÓN

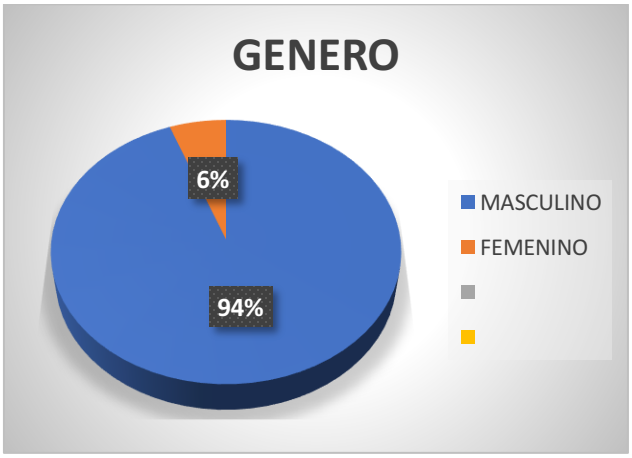

La selección del personal se ha basada o en las competencias y el perfil requeridos para cada cargo. La participación actual del equipo es de 6% mujeres (2 mujeres) y 94% hombres (33 hombres).

Conclusiones y recomendaciones

- Se le sugiere al contratista generar más presencia del componente social en las actividades correspondientes al PAGA
- Se le sugiere al contratista reportar con evidencia fotográficas cuando se abra el buzón de sugerencia.

- Realizar capacitaciones mensuales con la comunidad y veeduría de la obra, para brindar información correspondiente a los avances de la construcción.
- Tener en cuenta el proyecto de inclusión social de perspectiva de género y transverzalizacion.



JUAN ARNALDO MARTINEZ PEREZ
Residente Social
Consorcio VIASCOL
Matrícula Profesional No. 233967

5 r d r r d

A r r

CONTRATO	SUBTOTAL COSTOS BASICOS	PROVISION PARA AJUSTES	SUBTOTAL COSTOS BASICOS	IVA (19%)	VALOR CONTRATO	VIGENCIA 2022	VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024	TOTAL VIGENCIAS
INTERVENTORÍA No. 1052 DE 2022	$ 5,316,764,000.00	$ 406,118,800.00	$ 5,722,882,800.00	$ 1,087,347,732.00	$ 6,810,230,532.00	$ 400,000,000.00	$ 3,400,000,000.00	$ 3,010,230,532.00	$ 6,810,230,532.00

PLAN ANUAL DE CAJA AÑO 2022

PPTO VIGENCIA	TOTAL RECURSOS 2022	COMPONENTE DE PAGO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Valor Total ejecutado 2022	SALDOS RECURSOS 2022	ADICIONES	TOTAL RESERVA 2022	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO EN EL AÑOS 2022
		BASICOS	$ -	$ 4,873,470.00	$ -		$ -		
2022	$ 5,799,430.00	AJUSTES	$ -		$ -				
2023	$ 394,200,570.00	IVA	$ -	$ 925,959.30	$ -				
TOTAL	$ 535,789,111.00	VALOR TOTAL	$ -	$ 5,799,429.30	$ -	$ 400,000,000.00	$ -	$ 378,523,821.00	$ 6,810,230,532.00

PLAN ANUAL DE CAJA AÑO 2023

PPT VIGENCIA	TOTAL RECURSOS 2023	COMPONENTE DE PAGO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Valor Total ejecutado 2023	SALDO RECURSOS 2023	ADICIONES	TOTAL RESERVA 2023	VALOR ACTUALIZADO CONTRATO EN EL AÑO 2023
		BASICOS	$ 11,454,000.00	$ 7,490,000.00	$ 127,413,000.00	$ 173,266,000.00	$ 316,962,000.00	$ 339,922,000.00	$ 361,472,400.00	$ 368,862,800.00	$ 416,451,000.00	$ 381,381,000.00	$ 354,993,600.00	$ 324,841,600.00					
2022	$ 394,200,570.00	AJUSTES																	
2023	$ 3,400,000,000.00	IVA	$ 2,176,260.00	$ 1,423,100.00	$ 24,208,470.00	$ 32,920,540.00	$ 60,222,780.00	$ 64,585,180.00	$ 68,679,756.00	$ 70,083,932.00	$ 79,125,690.00	$ 72,462,390.00	$ 67,448,784.00	$ 61,719,904.00					
TOTAL	$ 3,794,200,570.00	VALOR TOTAL	$ 13,630,260.00	$ 8,913,100.00	$ 151,621,470.00	$ 206,186,540.00	$ 377,184,780.00	$ 404,507,180.00	$ 430,152,156.00	$ 438,946,732.00	$ 495,576,690.00	$ 453,843,390.00	$ 422,442,384.00	$ 386,561,504.00	$ 3,789,566,186.00	$ 4,634,384.00	$ -	$ 4,634,384.00	$ 6,810,230,532.00

PLAN ANUAL DE CAJA AÑO 2024


PPT VIGENCIA	TOTAL RECURSOS 2024	COMPONENTE DE PAGO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Valor Total ejecutado 2024	SALDO RECURSOS 2024	ADICIONES	TOTAL RESERVA 2024	VALOR ACTUALIZADO CONTRATO EN EL AÑO 2024
		BASICOS	$ 266,475,600.00	$ 272,975,600.00	$ 251,091,600.00	$ 209,501,600.00	$ 202,421,600.00	$ 145,477,600.00	$ 139,469,600.00	$ 145,393,600.00	$ 140,313,600.00	$ 117,693,600.00	$ 117,693,600.00	$ 123,747,000.00					
2023	$ 4,634,384.00	AJUSTES												$ 406,118,800.00					
2024	$ 3,010,230,532.00	IVA	$ 50,630,364.00	$ 51,865,364.00	$ 47,707,404.00	$ 39,805,304.00	$ 38,460,104.00	$ 27,640,744.00	$ 26,499,224.00	$ 27,624,784.00	$ 26,659,584.00	$ 22,361,784.00	$ 22,361,784.00	$ 100,674,502.00					
TOTAL	$ 3,014,864,916.00	VALOR TOTAL	$ 317,105,964.00	$ 324,840,964.00	$ 298,799,004.00	$ 249,306,904.00	$ 240,881,704.00	$ 173,118,344.00	$ 165,968,824.00	$ 173,018,384.00	$ 166,973,184.00	$ 140,055,384.00	$ 140,055,384.00	$ 630,540,302.00	$ 6,810,230,532.00	$ -	$ -	$ -	$ 6,810,230,532.00

5.5 [illegible]

[illegible]

5.[illegible] [illegible]

El Aplicativo Cifra, estuvo caído durante el mes de junio, por lo tanto no fue posible actualizarlo.

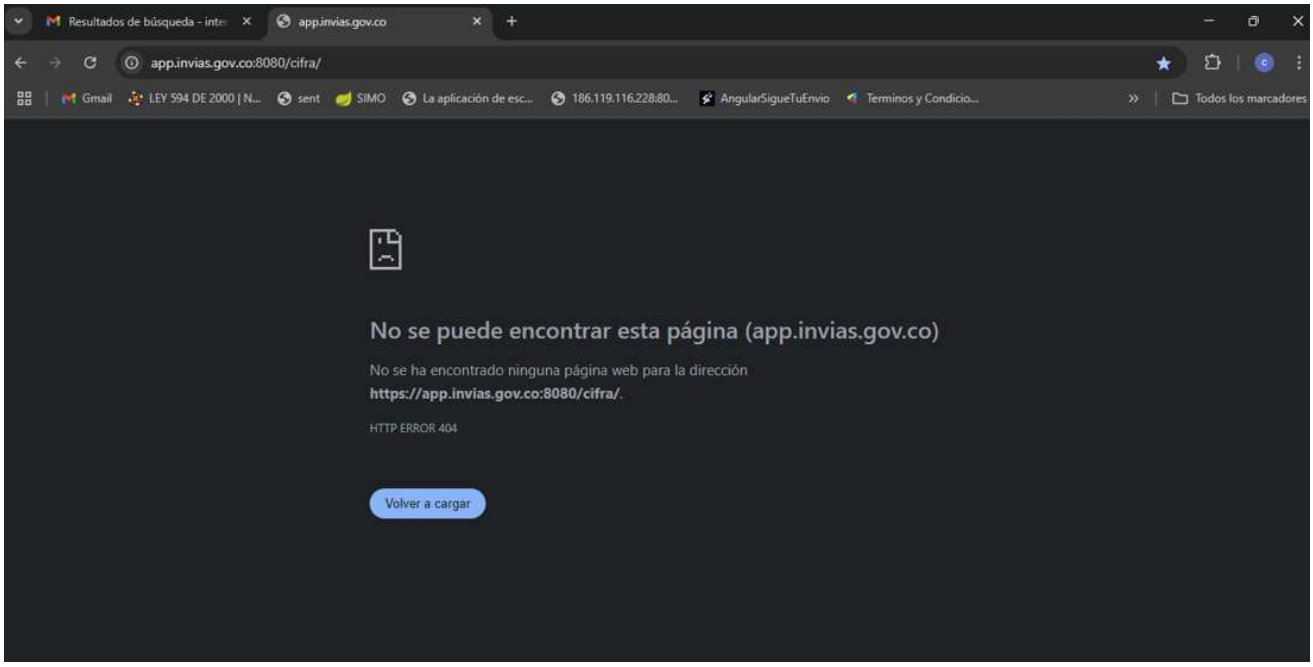

Detalle del Proceso Número: LP-0002-2022

AMAZONAS - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO

Información General del Proceso

Tipo de Proceso	Licitación obra pública
Estado del Proceso	Celebrado
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Documentos tipo	Si
Sector	Infraestructura de transporte
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Grupo	[F] Servicios
Segmento	[72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento
Familia	[7214] Servicios de construcción pesada
Clase	[721410] Servicios de construcción de autopistas y carreteras
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES DESDE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.
Cuantía a Contratar	$ 7,200,000,000
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Obra
Tipo de Gasto	Inversión

Fuentes de Financiación

Fuente	Otro Recurso	Valor
Otros recursos	OTRAS TRASFERENCIAS	$7,200,000,000

Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso

Tipo de respaldo presupuestal	Número del respaldo presupuestal	Cuantía del respaldo presupuestal
CDP	0912	$ 7,200,000,000

Ubicación Geográfica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecución	**Amazonas** : Puerto Nariño
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	**Amazonas** : Puerto Nariño
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso	calle 5 1-10 barrio centro
Departamento y Municipio de Entrega Documentos	**Amazonas** : Puerto Nariño
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso	calle 5 1-10 barrio centro

Cronograma del Proceso

Fecha y Hora de Apertura del Proceso	24-08-2022 09:00 a.m.
Fecha y Hora de Audiencia Aclaración de Pliegos	07-09-2022 10:00 a.m.
Fecha y Hora de Cierre del Proceso	16-09-2022 08:00 a.m.
Fecha y Hora de Audiencia Adjudicación	20-10-2022 10:00 a.m.
Lugar de Audiencia de Adjudicación	Secretaria de planeacion, infraestructura y las tics

Datos de Contacto del Proceso

Correo Electrónico	contratacion@puertonarino-amazonas.gov.co
Ubicación de la Sala de Consulta	calle 5 1-10 barrio centro

Información de la Adjudicación del Proceso

Documento del proponente	Nombre Proponente	Calificacion

901650394	CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	99.69

Información de los Contratos Asociados al Proceso

Número del Contrato	0558-2022
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES DESDE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
Cuantía Definitiva del Contrato	$6,833,142,595.00 Peso Colombiano
Porcentaje de Anticipo	30 %
Nombre o Razón Social del Contratista	CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 901650394
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	**Colombia** : Amazonas
Nombre del Representante Legal del Contratista	FREDDY MAURICIO CEBALLOS DELGADILLO
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 17419758
Sexo representante legar del contratista	Hombre
Sostenibilidad: Liquidación	Si
Sostenibilidad: Obligaciones Ambientales	No
Sostenibilidad: Obligaciones posconsumo	No
Sostenibilidad: Reversión	No
¿El proveedor adjudicado es Mipyme?	No
Contrato asociado a las ordenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	No
Valor Contrato Interventoría Externa	$.00 Peso Colombiano
Fecha de Firma del Contrato	01 de noviembre de 2022
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	08 de noviembre de 2022
Plazo de Ejecución del Contrato	52 Días
Destinación del Gasto	Inversión

	Fuente	Otro Recurso	Valor
Fuentes de Financiación	Otros recursos	OTRAS TRASFERENCIAS	$6,833,142,595

	Código	Fecha	Valor
Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.)	1271	08-11-2022	$6,833,142,595

Codigo Rubro Presupuestal	
Nombre Rubro Presupuestal	
Valor Rubro Presupuestal	

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	INFORME PARCIAL 3		16.58 MB	1	04-10-2024 02:54 PM
Documento Adicional	INFORME PARCIAL 2		17.19 MB	1	04-10-2024 02:54 PM
Documento Adicional	ANEXO		17.32 MB	1	03-10-2024 05:59 PM
Documento Adicional	OTROSI		16.21 MB	1	03-10-2024 05:59 PM
Documento Adicional	ANEXO PRIMER PAGO PARCIAL		31.62 MB	1	03-10-2024 05:58 PM
Documento Adicional	EVDENCIAS PRIMER PAGO PARCIAL		27.91 MB	1	03-10-2024 05:58 PM
Documento Adicional	SOPORTES ANTICIPO		3.11 MB	1	03-10-2024 05:58 PM
Documento Adicional	CRP		183 KB	1	03-10-2024 05:58 PM
Documento Adicional	APROBACIÓN DE PÓLIZA		200 KB	1	22-11-2022 08:15 PM
Documento Adicional	PÓLIZA		341 KB	1	22-11-2022 08:15 PM
Documento Adicional	OFERTA ECONÓMICA		282 KB	1	22-11-2022 08:15 PM
Documento Adicional	PROPUESTA REQUISITOS HABILITANTES		15.32 MB	1	22-11-2022 08:15 PM

Contrato	CONTRATO		3.86 MB	1	22-11-2022 08:05 PM
Acto de Adjudicación	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN		5.50 MB	1	22-11-2022 07:52 PM
Documento Adicional	SOLICITUD PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS		759 KB	1	10-11-2022 05:16 PM
Documento Adicional	OBSERVACIONES INFORME FINAL		36.24 MB	1	10-11-2022 05:16 PM
Acta de la audiencia de adjudicación	ACTA DE AUDIENCIA		5.06 MB	1	10-11-2022 04:19 PM
Documento Adicional	RESPUESTA A OBSERVACIONES REALIZADAS POR OIE SAS		331 KB	1	28-10-2022 09:09 AM
Documento Adicional	INFORME FINAL DE EVALUACIÓN		500 KB	1	27-10-2022 11:46 PM
Adendas	ADENDA 8		211 KB	1	27-10-2022 06:52 PM
Documento Adicional	CONSORCIO SAN FRANCISCO 2022 OBSERVACIONES Y SUBSANACION		2.03 MB	1	27-10-2022 05:39 PM
Documento Adicional	OBSERVACIONES OIE SAS		1.43 MB	1	27-10-2022 05:33 PM
Documento Adicional	SUBSANACION CONSORCIO SENDEROS RENACER		16.16 MB	1	27-10-2022 05:33 PM
Documento Adicional	SUBSANACION CONSORCIO ACOSER INGENIERIA		4.68 MB	1	27-10-2022 05:33 PM
Documento Adicional	SUBSANACION CONSORCIO EUREKA SENDERO SAN FANCISCO		1.88 MB	1	27-10-2022 05:32 PM
Documento Adicional	SUBSANACIÓN CONSORCIO SAN FRANCISCO		6.35 MB	1	27-10-2022 05:32 PM
Documento Adicional	SUBSANACION CONSORCIO SAN RAFAEL		886 KB	1	27-10-2022 05:32 PM
Documento Adicional	OBSERVACIONES INFORME PROPONENTE OIE SAS		890 KB	1	26-10-2022 06:20 PM
Documento Adicional	OBSERVACIONES CONSORCIO SAN FRANCISCO 2022 INFORME PRELIMINAR		233 KB	1	26-10-2022 06:20 PM
Documento Adicional	CONSORCIO SAN FRANCISCO 2022		233 KB	1	26-10-2022 06:15 PM
Documento Adicional	OBSERVACIONES AL INFORME PRELIMINAR PROPONENTE OIE SAS		890 KB	1	26-10-2022 06:15 PM
Documento Adicional	SUBSANACION CONSORCIO ARQUINCO		58.37 MB	1	26-10-2022 06:07 PM
Documento Adicional	SUBSANACION CONSORCIO KAIROS		133 KB	1	26-10-2022 06:06 PM
Documento Adicional	SUBSANACION CONSORCIO SAN RAFAEL		19.65 MB	1	26-10-2022 06:06 PM
Documento Adicional	SUBSANACION CONSORCIO EUREKA		1.88 MB	1	26-10-2022 06:06 PM
Documento Adicional	SUBSANACION CONSORCIO MANTENIMIENTO AMAZONAS		6.15 MB	1	26-10-2022 06:06 PM
Documento Adicional	RESPUESTA A OBSERVACIONES OIE		1.51 MB	1	26-10-2022 06:06 PM
Documento Adicional	OBSERVACIONES Y SUBSANACION CONSORCIO ACOSER INGENIERIA		6.36 MB	1	26-10-2022 06:06 PM
Documento Adicional	OBSERVACIONES Y SUBSANACIONES CONSORCIO RENACER		7.43 MB	1	26-10-2022 06:06 PM
Documento Adicional	CONSORCIO SAN FRANCISCO 2022 OBSERVACIONES Y SUBSANACION		2.03 MB	1	26-10-2022 06:06 PM
Documento Adicional	CERTIFICADO		474 KB	1	26-10-2022 03:32 PM
Documento Adicional	RESPUESTA OBSERVACIONES POR LA ENTIDAD		1.12 MB	1	19-10-2022 11:18 PM
Adendas	ADENDA 7		259 KB	1	19-10-2022 06:54 PM
Adendas	ADENDA 6		214 KB	1	13-10-2022 05:48 PM
Adendas	ADENDA 5		1.27 MB	1	11-10-2022 06:51 PM

Informe de evaluación	INFORME DE EVALUACIÓN		486 KB	1	03-10-2022 06:17 PM
Adendas	ADENDA 4		213 KB	1	03-10-2022 06:16 PM
Adendas	ADENDA 3		1.41 MB	1	26-09-2022 05:51 PM
Documento Adicional	ACTA DE CIERRE		2.61 MB	1	23-09-2022 11:19 AM
Adendas	ADENDA 2		836 KB	1	19-09-2022 07:02 PM
Aclaraciones durante el proceso de selección	RESPUESTA OBSERVACIONES		752 KB	1	19-09-2022 07:02 PM
Documento Adicional	OBSERVACIONES		868 KB	1	19-09-2022 07:02 PM
Adendas	ADENDA 1		248 KB	1	12-09-2022 07:04 PM
Documento Adicional	PRESUPUESTO PAGA Y CARAC VIAL		13 KB	1	05-09-2022 04:43 PM
Documento Adicional	CALCULO AIU		200 KB	1	05-09-2022 04:07 PM
Documento Adicional	APU		334 KB	1	05-09-2022 04:07 PM
Documento Adicional	ANALISIS DEL SECTOR		1.47 MB	1	05-09-2022 04:07 PM
Documento Adicional	CRONOGRAMA		35 KB	1	05-09-2022 03:42 PM
Pliegos de Condiciones definitivos	PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS		1.05 MB	1	05-09-2022 03:42 PM
Acto que ordena Apertura del Proceso	ACTO DE APERTURA		130 KB	1	05-09-2022 03:42 PM
Apreciaciones de la entidad sobre las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones	RESPUESTA OBSERVACIONES		1.30 MB	1	05-09-2022 03:25 PM
Documento Adicional	OBSERVACIONES		1.10 MB	1	02-09-2022 05:01 PM
Documento Adicional	TERCER AVISO		190 KB	1	19-08-2022 09:22 AM
Documento Adicional	SEGUNDO AVISO		229 KB	1	16-08-2022 09:27 AM
Documento Adicional	FORMULARIO 1– FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL		733 KB	1	09-08-2022 07:10 PM
Documento Adicional	MATRIZ 4 – BIENES NACIONALES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DEL SECTOR TRANSPORTE		205 KB	1	09-08-2022 07:10 PM
Documento Adicional	MATRIZ 3 – RIESGOS		439 KB	1	09-08-2022 07:10 PM
Documento Adicional	MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES		121 KB	1	09-08-2022 07:10 PM
Documento Adicional	MATRIZ 1 – EXPERIENCIA		76 KB	1	09-08-2022 07:10 PM
Documento Adicional	FORMATO 11 – AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES		165 KB	1	09-08-2022 07:10 PM
Documento Adicional	FORMATO 10 – FACTORES DE DESEMPATE		186 KB	1	09-08-2022 07:10 PM
Documento Adicional	FORMATO 9 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL		196 KB	1	09-08-2022 07:10 PM
Documento Adicional	FORMATO 8 – VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD		112 KB	1	09-08-2022 07:10 PM
Documento Adicional	FORMATO 7 – FACTOR DE CALIDAD		148 KB	1	09-08-2022 07:09 PM
Documento Adicional	FORMATO 6 – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES		84 KB	1	09-08-2022 07:09 PM
Documento Adicional	FORMATO 5 – CAPACIDAD RESIDUAL		26 KB	1	09-08-2022 07:09 PM
Documento Adicional	FORMATO 4 – CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL		166 KB	1	09-08-2022 07:09 PM

Documento Adicional	FORMATO 3 – EXPERIENCIA		57 KB	1	09-08-2022 07:09 PM
Documento Adicional	FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL		145 KB	1	09-08-2022 07:09 PM
Documento Adicional	FORMATO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA		160 KB	1	09-08-2022 07:09 PM
Documento Adicional	ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO		347 KB	1	09-08-2022 07:09 PM
Documento Adicional	ANEXO 4 – PACTO DE TRANSPARENCIA		125 KB	1	09-08-2022 07:09 PM
Documento Adicional	ANEXO 3 – GLOSARIO		346 KB	1	09-08-2022 07:08 PM
Documento Adicional	ANEXO 2 CRONOGRAMA		36 KB	1	09-08-2022 07:08 PM
Documento Adicional	ANEXO TÉCNICO		1.56 MB	1	09-08-2022 07:08 PM
Aviso de Licitación (Art.30 Ley 80 de 1993)	AVISO LEY 80		98 KB	1	09-08-2022 07:08 PM
Documento de estudios previos	ESTUDIOS PREVIOS		3.85 MB	1	09-08-2022 07:08 PM
Proyecto de pliego de condiciones	PROYECTO DE PLIEGOS		818 KB	1	09-08-2022 07:08 PM
Aviso	AVISO		3.21 MB	1	09-08-2022 07:08 PM

Hitos del Proceso

Descripcion del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Creación de Proceso	09 de August de 2022 07:09 P.M.
Convocatoria	05 de September de 2022 03:42 P.M.
Adjudicación	22 de November de 2022 07:52 P.M.
Celebración de Contrato	22 de November de 2022 08:05 P.M.
Modificación de datos al contrato	22 de November de 2022 08:15 P.M.
Modificación de datos al contrato	03 de October de 2024 05:59 P.M.
Modificación de datos al contrato	04 de October de 2024 02:54 P.M.

Ver Reporte Modificaciones

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los datos personales contenidos en esta página son clasificados como dato personal público y la finalidad de su divulgación es dar cumplimiento a la ley de Transparencia y el derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 del 2014). Cualquier uso de la información distinto a su finalidad no es aprobado por Colombia Compra Eficiente.

Si desea presentar cualquier solicitud o petición relacionada con la protección de datos personales puede ingresar a la página web www.colombiacompra.gov.co en la opción de Contáctenos o comuníquese al teléfono en Bogotá: 7 456788 o Línea Nacional: 018000 520808 o por medio de www.colombiacompra.gov.co/soporte

Copyright ©
El contenido y diseño de esta página web está protegido por las leyes colombianas.
La información incluida en esta página puede ser reproducida y descargable para usos personales de forma gratuita y sin necesidad de solicitar un permiso, bajo las siguientes condiciones:
Debe reproducirse el material de forma exacta y en su versión más actualizada.
No se debe usar el material en ninguna forma ofensiva, engañosa o confusa.
Debe reconocerse la fuente y los derechos de autor.
A pesar del esfuerzo hecho para asegurar la exactitud del contenido, Colombia Compra Eficiente no se hace responsable por errores o información incompleta.

RE OR E E E ME O R O DE ER E OR

E r d r r F r ME M 5 FR 5

A r d r r d d r r
d r r d r

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jun-25

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICÁ, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL LOS DEPARTAMENTOS DEL AMAZONAS, CAQUETA Y VAUPES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 1

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1052 - 2022

INTERVENTORÍA: CONSORCIO VIASCOL

CONTRATO DE OBRA No. 01544-2022
558-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERNACIONAL WOC
KAIROS SENDERO PEATONAL

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN				DÍAS DEL MES																													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
AMAZONAS																																		
CAMIONETA 2000 CC O MÁS	LWX390	JAC	2393CC	2024	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
MOTOCICLETA 150 CC O MÁS	DZO-42G	YAMAHA	XTZ150	2023	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
ESTACION TOTAL	GOWIN		TKS-202	8E2245	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
																																		-
																																		-

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:
CAMIONETA LUK-923 4X4 SOAT:29/05/2026
ESTACION TOTAL GOWIN TKS-202 5/02/2026

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: MARLY SARRÍA GONZÁLEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-136201 CND

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

Firma
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Supervisor del Contrato de Interventoría. (E)
Matrícula Profesional No.: 19202-65504 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

SOAT

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO MES DÍA	VIGENCIA DESDE AÑO MES DÍA LAS 00 HORAS DEL	HASTA AÑO MES DÍA LAS 23:59 HORAS DEL
2025-05-29	2025-05-30	2026-05-29

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1508006260689000	LWX390	CAMPEROS O CAMIONE	PARTICULAR	2393	2024

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	TOYOTA	DOBLE CABINA
	LÍNEA VEHICULO: HILUX	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
2GDG480770	8AJKB3CD4R1700046	8AJKB3CD4R1700046	0,90

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
INGENOBRAS CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S	3145479616	NI	8240044412	VALLEDUPAR

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	15	13543	0	PEREIRA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
221	$ 618900	$ 321800	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 942800

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

- Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
- La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel comun tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
- En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.787.849**

MORON OROZCO

APELLIDOS

JOSE FRANCISCO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-SEP-1976**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.79	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

31-OCT-1994 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031916657

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
LWX390	TOYOTA	HILUX	2024

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.393	GRIS METALICO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
2GD-G480770	N	8AJKB3CD4R1700046

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
8AJKB3CD4R1700046	N	8AJKB3CD4R1700046	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

BANCOLOMBIA S.A.

IDENTIFICACIÓN

NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 148

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 48202400232462

I/E: I

FECHA IMPORT.: 02/05/2024

PUERTAS: 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
30/05/2024	30/05/2024	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

INST MCPAL TTOYTTE VALLEDUPAR



LT07003136104



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1121200156

NOMBRE

LUIS RAFAEL ANACONA MORALES

FECHA DE NACIMIENTO

03-02-2006

GRUPO SANGUÍNEO RH

O+

FECHA DE EXPEDICIÓN

11-02-2025

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

CONDUCIR CON LENTES

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR

INST DPTAL TTOyTTE META/RESTREPO

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	11-02-2035	PARTICULAR
B1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS	11-02-2035	PARTICULAR
C1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS	11-02-2028	PUBLICO





ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC12000147357

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDIC (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2025-05-26	2025-05-27	2026-05-26

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
14289413619590	DZO42G	MOTOS	PARTICULAR	149	2023

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	YAMAHA	SIN CARROCERIA

LÍNEA VEHICUL
XTZ150-2 (XTZ150)

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
G3L1E062167	9FKDG3613P2062167	9FKDG3613P2062167	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
JIMENEZ MARTINEZ, JUAN CAMILO	3003734466	CC	1064720173	AGUSTIN CODAZ

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	10	4013	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
120	$ 213300	$ 110900	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 326300

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE VICTIMAS	8.77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la deterción del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

Protección de datos personales:

SEGUROS DEL ESTADO S.A y **SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.** informa que sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que se encontrará disponible a través de las páginas www.segurosdelestado.com/pages/ProteccionDatos y www.segurosdevidadelestado.com/pages/ProteccionDatos para su consulta.

Recuerde que, en calidad de titular de sus datos personales, podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir su información personal, así como, el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales para algunas de las finalidades dada, a través de la dirección de correo electrónico protecciondatospersonales@segurosdelestado.com

Tenga presente las principales finalidades para las que serán tratados sus datos personales por cuenta de **SEGUROS DEL ESTADO S.A** y **SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A** como es para la emisión de la póliza y vinculación como cliente, ejecutar los contratos que celebre **SEGUROS DEL ESTADO** con sus terceros encargados, controlar y prevenir fraudes, lavado de activos, la financiación del terrorismo o la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, determinar y liquidar pagos de siniestros así como mantener el contacto para dar seguimiento a peticiones, quejas y reclamos; enviar información relativa a educación financiera, encuestas de satisfacción, ofertas de productos o servicios y comunicaciones comerciales de cualquier clase, relacionadas con servicios inherentes a la actividad aseguradora, a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo ofertas de productos y servicios de Compañías con las que **SEGUROS DEL ESTADO** tenga convenio o alianzas comerciales, en los casos que corresponda, ser usados en aplicativos móviles o plataformas tecnológicas propias de **SEGUROS DEL ESTADO** como aquellas administradas a través de Encargados y/o Compañías Tratantes y todas las demás finalidades que se definan en la política de protección de datos personales de **SEGUROS DEL ESTADO** y sus actualizaciones.

Topes de cobertura gastos médicos
1 Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150,711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910,920. Decreto 2644 de 2022.
2 Para las demás tarifas no citadas en (1).

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10025844011

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
DZO42G	YAMAHA	XTZ150-2 (XTZ150)	2023

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
149	NEGRO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MOTOCICLETA	SIN CARROCERIA	GASOLINA	2

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
G3L1E062167	N	9FKDG3613P2062167

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9FKDG3613P2062167	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
JIMENEZ MARTINEZ JUAN CAMILO	C.C. 1064720173

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
12

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
902022000037187

I/E
I

FECHA IMPORT.
07/03/2022

PUERTAS
0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******



FECHA MATRÍCULA
18/04/2022

FECHA EXP. LIC. TTO.
18/04/2022

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL LA PAZ

LT03004868906

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1064720173

Libertad y Orden

NOMBRE

JUAN CAMILO JIMENEZ MARTINEZ

FECHA DE NACIMIENTO

27-09-1994

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICION

13-04-2023

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTOyTTE MCPAL LA PAZ

Powered by CamScanner

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE.	13-04-2033	PARTICULAR
B1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS.	04-02-2031	PARTICULAR



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03005770161

Servicios Integrales 60947.2.0-9 12/22

Powered by CamScanner

N°. Certificado: 2356
Fecha: 6/08/2025

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Servicio Tecnico NOVA S.A.S
NIT. 901163978-5

DATOS DEL CLIENTE			
Nombre	**NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S**	NIT / C.C	**901187919-4**
Dirección	**CL 13 4 A 24 BRR ABBAS TURBAY**	Ciudad	**MORELIA**
Telefono	**3204912919**	Fecha de Expiración	**5/02/2026**

DATOS DEL EQUIPO			
Equipo	**ESTACION TOTAL**	Marca	**GOWIN**
Modelo	**TKS-202**	N° Serial	**8E2245**
Aumentos	**30x**	Precisión	**2"**

Basado en los procedimientos según norma ISO 17123-1-2-3-4, estipulada por el fabricante a continuación se describen los ajustes realizados al equipo

Inspección Mecánica

Partes	A	R	M	CP	N/A
Base Nivelante			X		
Frenos - paso lento Hz y Vt					X
Teclados y contactos			X		
Eje Hz y Vt					X
Sistema de enfoque					x
Verticalidad					X
Niveles tubulares y esférico					X

Inspección Electrónica

Partes	A	R	M	CP	N/A
Distanciómetro					X
Nonios Hz y Vt					X
Puntero laser					X
Compensador Electrónico		X			
Plomada Láser / óptica					X
Sensores Hz y Vt					X

(**A**) Ajuste (**R**) Reparación (**M**) Mantenimiento (**CP**) Cambio de piezas (**N/A**) No aplica

AJUSTE ANGULAR Y DISTANCIA

Patrón	Fase 1	Fase 2	Residuo	Tolerancia	Cierre	Error
Vertical	90.0000	270.0012	0.0012	(+ / -) 0.0002	270.0000	0.0000
Horizontal	0.0000	180.0005	0.0005	(+ / -) 0.0002	180.0000	0.0000
Distancia	5.5290	5.5290	0.0000	(+ / -) 0.0000	5.5290	0.0000

Equipo verificado, ajustado y patronado bajo las normas ISO 17123 de acuerdo a los procedimientos dados por el fabricante

Observaciones:

El instrumento se encuentra en buen funcionamiento, se recomienda realizar chequeos de campo.
El cliente es responsable del buen transporte del equipo, ya que las vibraciones y manipulación no adecuada pueden desajustarlo



HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
Técnico Laboratorio.

CERTIFICADO DEL COLIMADOR	Servicio Tecnico NOVA S.A.S NIT. 901163978-5

SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S			
FECHA DE INSPECCION:	**23/07/2025**		
PROXIMA INSPECCION:	**22/01/2026**		
EMPRESA:	SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S	**NIT :**	901163978-5
DIRECCION :	CL 45E # 76-24 - VELODROMO	**CIUDAD:**	MEDELLIN-ANTIOQUIA
TELEFONO :	5017426	**PROXIMO CONTROL**	22/01/2026
INSTRUMENTO :	COLIMADOR	**MARCA**	SOUTH
MODELO :	W420-3	**SERIE**	S/N
ANGULO DE GRADUACION	10"2mm	**GRADUACION MINIMA**	20"

inspección sistemas mecanicos y óptimos	ajuste	lubricación	reparación	repuesto	limpieza	función aceptable
niveles tubulares y esféricos	x					
tubo superior	x					
tubo intermedio	x					
tubo inferior	x					

SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S			
inspeccion de cierres angulares de cada eje	**lectura inicial**	**errores encontrados**	**lecturas después de ajuste**
Angulo vertical tubo superior	60°00´12"	00°00´12"	00°00´00"
Angulo vertical tubo intermedio	90°00´15"	00°00´15"	00°00´00"
Angulo vertical tubo inferior	119°59´50"	00°00´10"	00°00´00"
Angulo horizontal tubo superior	00°00´07"	00°00´07"	00°00´00"
Angulo horizontal tubo intermedio	00°00´00"	00°00´00"	00°00´00"
Angulo horizontal tubo inferior	00°00´12"	00°00´12"	00°00´00"

CERTIFICADO EQUIPOS PATRONES	Servicio Tecnico NOVA S.A.S NIT. 901163978-5

SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO. CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S			
FECHA DE INSPECCION:		**24/01/2025**	
PROXIMA INSPECCION:		**23/07/2025**	
EMPRESA:	SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S	**NIT :**	901163978-5
DIRECCION :	CL 45E # 76-24 - VELODROMO	**CIUDAD:**	MEDELLIN-
TELEFONO :	5017426	**PROXIMO CONTROL**	23/07/2025
INSTRUMENTO :	ESSTACION TOTAL	**MARCA**	LEICA
MODELO :	TC 1101	**SERIE**	754687
ANGULO DE GRADUACION	1"	**GRADUACION MINIMA**	(2mm+2ppm*D)m.s.e

inspección opto mecanica	corrección	ajuste	lubricacion	reparacion	repuestos	limpieza	función aceptable
Base nivelante			x				
Niveles tubulares y esféricos		x					x
Verticalidad							x
óptica general (lentes y prisma)							x
Eje vertical y horizontal							x
Frenos y movimientos tangenciales							x

Inspección sistema de medida angular y verificacion según prueba de campo procedimiento N.	corrección	ajuste	lubricación	reparación	repuestos	limpieza	función aceptable
compensador automático							
compensador electrónico		x					
colimación vertical		x					
colimación horizontal		x					

Posición 1 (vertical)	90°	Grados	00´	Minutos	00"
Posición 2 (vertical)	170°	Grados	00´	Minutos	05"
Error detectado	00°	Grados	00´	Minutos	08"
Posición 1 (horizontal)	00°	Grados	00´	Minutos	00"
Posición 2 (horizontal)	180°	Grados	00´	Minutos	10"
Error detectado	00°	Grados	00´	Minutos	10"

INSTRUMENTO	NIVEL AUTOMATICO	**MARCA**	WILD HEERBRUGG
MODELO	N2	**SERIE**	N2-110807
AUMENTOS	26X	**PRECISIÓN EN DISTANCIA**	.+/-0.8mm*2kmde nivelación

Inspección de centro de diferencia nivel según prueba de campo procedimiento	**corrección**	**ajuste**	**lubricación**	**reparación**	**repuestos**	**limpieza**	**función aceptable**
sistema pendular automatico							x

A1	1 254	MM	B2	1 425	
A2	1 246	MM	B1	1 375	
A1-A2		MM	B1-B2		

Error detectado	**0.000**



HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
Técnico Laboratorio.

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría – Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

A la fecha del presente informe se encuentra el siguiente personal activo:

1. Directora de interventoría
2. Ingeniero Residente Frente Leticia
3. Ingeniero Residente Frente Puerto Nariño
4. Ingeniero auxiliar (2)
5. Profesional social
6. Ingeniero administrativo
7. Inspector frente Leticia
8. Comisión topográfica
9. Secretaria

Adicional se relacionan los siguientes especialistas

1. Especialista Ambiental
1. Especialista Estructural

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	1/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1052- 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIASCOL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-25 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL – LOTE 1"

CONTRATO DE OBRA No.: 01544-2022 0558-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO INTERNACIONAL WOC KAIROS SENDERO PEATONAL

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACA - COMPENSAR - CAFAM - CAFAMAZ

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
MES DE JUNIO																																																	
1	ERIKA LISET PRADA SERRANO	28020577	ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 3.303.300,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						40%	SIMA	$ 3.303.300,00	$ 229.909,68	V	SANITAS	86943926	$ 132.132,00	PROTECCION	86943926	$ 528.528,00	$ -	$ -	$ -	VALOR A DESCONTAR POR SEGURIDAD
VALOR TOTAL APORTE MES DE JUNIO																																															$ 890.569,68	
VALOR TOTAL A DESCONTAR																																															$ 890.569,68	
MES DE JUNIO																																																	
DEPARTAMENTO AMAZONAS																																																	
2	MARLY MILENE SARRIA	52904700	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	$ 6.860.700,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 6.860.700,00	$ 477.504,72	V	SANITAS	9488929806	$ 274.428,00	PORVENIR	9488929806	$ 1.166.319,00	$ 274.428,00	$ -	$ -	
3	JUAN CAMILO JIMENEZ	1064720173	INGENIERO RESIDENTE	$ 5.145.525,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 5.145.525,00	$ 358.128,54	V	NUEVA EPS	9488929806	$ 205.821,00	PORVERNIR	9488929806	$ 874.739,25	$ 205.821,00	$ -	$ -	
4	WILVER ROPERO ANGARITA	1977838	INGENIERO RESIDENTE	$ 5.145.525,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 5.145.525,00	$ 358.128,54	V	COOSALUD MOVILIDAD	9488929806	$ 205.821,00	PORVERNIR	9488929806	$ 874.739,25	$ 205.821,00	$ -	$ -	
5	CLAUDIA GISSEL PEREZ	1065906030	INGENIERA AUXILIAR	$ 3.430.350,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 3.430.350,00	$ 238.752,36	V	SANITAS	9488929806	$ 137.214,00	PROTECCION	9488929806	$ 548.856,00	$ 137.214,00	$ -	$ -	
6	JUAN ARNOLDO MARTINEZ PEREZ	1103106715	PROFESIONAL SOCIAL	$ 3.430.350,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 3.430.350,00	$ 238.752,36	V	EPS SURA	9488929806	$ 137.214,00	PORVERNIR	9488929806	$ 548.856,00	$ 137.214,00	$ -	$ -	
7	WANDERLEY CORTES BASTIDAS	1006502465	INGENIERO ADMINISTRATIVO	$ 3.430.350,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 3.430.350,00	$ 238.752,36	V	SANITAS	9488929806	$ 137.214,00	COLPENSIONES	9488929806	$ 548.856,00	$ 137.214,00	$ -	$ -	
8	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FLOREZ	15887768	INSPECTOR	$ 2.286.900,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 2.286.900,00	$ 159.168,24	V	SANITAS	9488929806	$ 91.476,00	PORVERNIR	9488929806	$ 365.904,00	$ 91.476,00	$ -	$ -	
9	ERIKA ALEJANDRA MEJIA TAPIERO	1193316989	INSPECTORA SST	$ 2.286.900,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 2.286.900,00	$ 159.168,24	V	SANITAS	9488929806	$ 91.476,00	COLPENSIONES	9488929806	$ 365.904,00	$ 91.476,00	$ -	$ -	
10	LEIDY AMAYA PERDOMO	30509941	SECRETARIA	$ 1.281.150,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 1.281.150,00	$ 89.168,04	V	NUEVA EPS	9488929806	$ 51.246,00	COLPENSIONES	9488929806	$ 204.984,00	$ 51.246,00	$ -	$ -	
DEPARTAMENTO VAUPES																																																
11	YOBANI OSCAR NIÑO RODRIGUEZ*	9531324	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	$ 1.238.737,50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						15%	CONSORCIO VIASCOL	$ 1.238.737,50	$ 86.216,13	V	NUEVA EPS	9488929806	$ 49.549,50	COLPENSIONES	9488929806	$ 198.198,00	$ 49.549,50			
12	ANDRES CAMILO CHAVES GARCIA	1012386816	INGENIERO AUXILIAR	$ 3.430.350,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						100%	CONSORCIO VIASCOL	$ 3.430.350,00	$ 238.752,36	V	COMPENSAR	9488929806	$ 137.214,00	PROTECCION	9488929806	$ 548.856,00	$ 137.214,00	$ -	$ -	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				**$ 41.270.137,50**																																												

El Interventor adjunta la certificación de fecha 1/07/2025

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: MARLY MILENE SARRIA GONZALEZ
Directora de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-136201 CND

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

Firma
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-65504 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901598877	7	CONSORCIO VIASCOL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 19 # 2C-115	FLORENCIA-CAQUETA	5824145	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1629254870	9488929806	E	2025/07/17	2025/07/15	BANCOLOMBIA	0	$13,410,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (5 Afiliados)																						$17,711,850	$2,910,500			$16,288,350	$651,900			$22,142,719	$886,100			$17,711,850		$1,114,000		$0	$0		$5,562,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$6,700		$0	$0		$348,500
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$6,700		$0	$0		$348,500
1	CC	30509941	AMAYA LEIDY																	25-14	27	$1,281,150	$205,000	EPS037	27	$1,281,150	$51,300	CCF13	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,281,150	0.522%	$6,700	27	$0	$0	Si	$314,300
2	CC	30509941	AMAYA LEIDY												X					25-14	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF13	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$34,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)																						$16,288,350	$2,682,700			$14,864,850	$594,900			$20,719,219	$829,100			$16,288,350		$1,107,300		$0	$0		$5,214,000
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (4 Afiliados)																						$16,288,350	$2,682,700			$14,864,850	$594,900			$20,719,219	$829,100			$16,288,350		$1,107,300		$0	$0		$5,214,000
3	CC	1012386816	CHAVES ANDRES																	23020 1	27	$3,430,350	$548,900	EPS008	27	$3,430,350	$137,300	CCF13	27	$3,430,350	$137,300	14-11	27	$3,430,350	6.960%	$238,800	27	$0	$0	Si	$1,062,300
4	CC	1012386816	CHAVES ANDRES												X					23020 1	3	$381,150	$61,000	EPS008	3	$381,150	$15,300	CCF13	3	$381,150	$15,300	14-11	3	$381,150	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$91,600
5	CC	1006502465	CORTES WANDERLEY		X														X	25-14	27	$3,430,350	$548,900	EPS005	27	$3,430,350	$137,300	CCF13	27	$7,861,219	$314,500	14-11	27	$3,430,350	6.960%	$238,800	27	$0	$0	Si	$1,239,500
6	CC	9531324	NIÑO YOBANI		X														X	25-14	22	$1,423,500	$227,800		0	$0	$0	CCF13	22	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	22	$0	$0	No	$383,900
7	CC	52904700	SARRIA MARLY																	23030 1	30	$7,623,000	$1,296,100	EPS005	30	$7,623,000	$305,000	CCF13	30	$7,623,000	$305,000	14-11	30	$7,623,000	6.960%	$530,600	30	$0	$0	Si	$2,436,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LETICIA -AMAZONAS (7 Afiliados)																						$25,420,650	$4,182,700			$25,420,650	$1,017,400			$26,474,356	$1,059,500			$25,420,650		$1,588,300		$0	$0		$7,847,900
Centro de Trabajo: OBRA-LETICIIA (7 Afiliados)																						$25,420,650	$4,182,700			$25,420,650	$1,017,400			$26,474,356	$1,059,500			$25,420,650		$1,588,300		$0	$0		$7,847,900
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (7 Afiliados)																						$25,420,650	$4,182,700			$25,420,650	$1,017,400			$26,474,356	$1,059,500			$25,420,650		$1,588,300		$0	$0		$7,847,900
8	CC	1121200156	ANACONA LUIS		X														X	25-14	27	$1,281,150	$205,000	EPS005	27	$1,281,150	$51,300	CCF65	27	$1,381,981	$55,300	14-11	27	$1,281,150	6.960%	$89,200	27	$0	$0	Si	$400,800
9	CC	1064720173	JIMENEZ JUAN																	23030 1	27	$5,145,525	$874,900	EPS037	27	$5,145,525	$205,900	CCF65	27	$5,145,525	$205,900	14-11	27	$5,145,525	6.960%	$358,200	27	$0	$0	Si	$1,644,900
10	CC	1064720173	JIMENEZ JUAN												X					23030 1	3	$571,725	$97,300	EPS037	3	$571,725	$22,900	CCF65	3	$571,725	$22,900	14-11	3	$571,725	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$143,100
11	CC	1103106715	MARTINEZ JUAN		X														X	23030 1	30	$3,811,500	$609,900	EPS010	30	$3,811,500	$152,500	CCF65	30	$4,764,375	$190,600	14-11	30	$3,811,500	6.960%	$265,300	30	$0	$0	Si	$1,218,300
12	CC	1193316989	MEJIA ERIKA																	25-14	27	$2,286,900	$366,000	EPS005	27	$2,286,900	$91,500	CCF65	27	$2,286,900	$91,500	14-11	27	$2,286,900	6.960%	$159,200	27	$0	$0	Si	$708,200
13	CC	1193316989	MEJIA ERIKA												X					25-14	3	$254,100	$40,700	EPS005	3	$254,100	$10,200	CCF65	3	$254,100	$10,200	14-11	3	$254,100	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$61,100
14	CC	1065906030	PEREZ CLAUDIA																	23020 1	27	$3,430,350	$548,900	EPS005	27	$3,430,350	$137,300	CCF65	27	$3,430,350	$137,300	14-11	27	$3,430,350	6.960%	$238,800	27	$0	$0	Si	$1,062,300
15	CC	1065906030	PEREZ CLAUDIA												X					23020 1	3	$381,150	$61,000	EPS005	3	$381,150	$15,300	CCF65	3	$381,150	$15,300	14-11	3	$381,150	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$91,600
16	CC	15887768	RODRIGUEZ CARLOS																	23030 1	27	$2,286,900	$366,000	EPS005	27	$2,286,900	$91,500	CCF65	27	$2,286,900	$91,500	14-11	27	$2,286,900	6.960%	$159,200	27	$0	$0	Si	$708,200
17	CC	15887768	RODRIGUEZ CARLOS												X					23030 1	3	$254,100	$40,700	EPS005	3	$254,100	$10,200	CCF65	3	$254,100	$10,200	14-11	3	$254,100	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$61,100
18	CC	1977838	ROPERO WILVER																	23030 1	24	$4,573,800	$777,700	ESSC24	24	$4,573,800	$183,000	CCF65	24	$4,573,800	$183,000	14-11	24	$4,573,800	6.960%	$318,400	24	$0	$0	Si	$1,462,100
19	CC	1977838	ROPERO WILVER												X					23030 1	6	$1,143,450	$194,600	ESSC24	6	$1,143,450	$45,800	CCF65	6	$1,143,450	$45,800	14-11	6	$1,143,450	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$286,200
Total	**Afiliados(12)**																					$43,132,500	$7,093,200			$41,709,000	$1,669,300			$48,617,075	$1,945,600			$43,132,500		$2,702,300		$0	$0		$13,410,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901598877	7	CONSORCIO VIASCOL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 19 # 2C-115	FLORENCIA-CAQUETA	5824145	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1629254870	9488929806	E	2025/07/17	2025/07/15	BANCOLOMBIA	0	$13,410,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$7,093,200	$0	$0	$7,093,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,616,200	$0	$0	$1,616,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$4,257,200	$0	$0	$4,257,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,219,800	$0	$0	$1,219,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$2,702,300	$0	$0	$2,702,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$2,702,300	$0	$0	$2,702,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				12	$1,945,600	$0	$0	$1,945,600
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	7	$1,059,500	$0	$0	$1,059,500
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	5	$886,100	$0	$0	$886,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				11	$1,669,300	$0	$0	$1,669,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$152,600	$0	$0	$152,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$228,800	$0	$0	$228,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$152,500	$0	$0	$152,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$285,800	$0	$0	$285,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$849,600	$0	$0	$849,600
TOTAL				**12**	**$13,410,400**	**$0**	**$0**	**$13,410,400**

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **SIMA INGENIERIA S.A.S**, identificada con **NI** número **900671273**, aportó por **ERIKA LISET SERRANO PRADA** identificado(a) con **CC** número **28020577** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 05 - 2025 y 06 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1							X								0		30	$5,000,000	0.04000	$200,000	$0	$0	Mayo - 2025	86943926	30/05/2025	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1							X								0		30	$5,000,000	0.06960	$348,000	$0	$0	Mayo - 2025	86943926	30/05/2025	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1							X								0		30	$5,000,000	0.16000	$800,000	$0	$0	Mayo - 2025	86943926	30/05/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1							X								0		30	$5,000,000	0.04000	$200,000	$0	$0	Junio - 2025	86943926	30/05/2025	Si

El presente certificado se expide a los **30** días del mes **Mayo**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA ADMINSITRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS CAQUETA Y VAUPES DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”

Yo, **JOSE FRANCISCO MORON OROZCO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.787.849 de Bogotá, en mi condición de Representante del CONSORCIO VIASCOL identificado con Nit 901.598.877-7 certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha actual. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Valledupar, al primer (01) días del mes de julio de 2025.



JOSE FRANCISCO MORON OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO VIASCOL

Valledupar, 02 de Julio de 2025

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

CERTIFICA

Que la sociedad **INGENOBRAS CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S - INGENOBRAS S.A.S.**, identificada con **NIT 824.004.441 – 2**; se encuentra **PAZ y SALVO** por los últimos seis (6) meses hasta la fecha de este certificado, con las obligaciones de seguridad social y parafiscales ante las entidades Promotoras de Salud EPS, Fondos de Pensiones, administradoras de Riesgos Laborales ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA; según consta en los aportes de autoliquidación y pago de estas entidades, a corte del 02 de Julio de 2025.

Se firma la presente a solicitud de la parte interesada al segundo (02) día del mes de Julio de 2025.

Atentamente,

ROGER DAVID CERVANTES ARDILA
Revisor Fiscal
T.P. 127771-T de la J.C.C. Mineducación
C.C. 12.644.407 expedida en Valledupar

Designado por:
RCA CONSULTORES Y ASESORES S.A.S.
R.P. 3300 de la J.C.C. Mineducación

Consultores & Asesores S.A.S
Generando Confianza



ESTA TARJETA PROFESIONAL ES VALIDA EXCLUSIVAMENTE PARA CERTIFICAR APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DE LA SOCIEDAD INGENOBRAS SAS



6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1052 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO VIASCOL

MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2025

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 1

CONTRATO DE OBRA No:

1554-2022 — CONSORCIO INTERNACIONAL WOC

558-2022 — CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL

CONTRATISTA:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	918622	PROGRAMA 2402 - SUBPROGRAMA 0600 - PROYETOR 012 DENOMINADO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	$ 400.000.000,00	$ -
2023	224023	PROGRAMA 2402 - SUBPROGRAMA 0600 - PROYETOR 012 DENOMINADO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	$ 3.400.000.000,00	$ -
2024	219724	PROGRAMA 2402 - SUBPROGRAMA 0600 - PROYETOR 012 DENOMINADO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	$ 3.010.230.532,00	$ 40.778.447,11
2025	2656	ESTUDIOS, CONSULTAS PREVIA, INTERVENTORIAS Y COFINANCIACION DE PROYECTOS EN LA INFRAESTRCUTRA VIAL EN EL DEPARTAMENTO		GOBERNACION DE AMAZONAS	ADICIONAL 1	$ 180.000.000,00	
2025	111525	C-2402-0600-13-51102A-2402041-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMO	10	NACION	ADICIONAL 1	$ 1.148.679.453,00	
		TOTAL					$ 40.778.447,11

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 6.810.230.532,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	nov-22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	918622 De (17/08/2022)	$ 400.000.000,00	$ 6.810.230.532,00	67660 del 12 de julio de 2023	
2	dic-22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	918622 De (17/08/2022)	$ 400.000.000,00	$ 6.810.230.532,00	67660 del 12 de julio de 2023	
3	ene-23						$ 386.791.000,00	918622 De (17/08/2022)	$ 13.209.000,00		67660 del 12 de julio de 2023	Anticipo concedido equivalente al 7,27% del valor básico, sin ajustes
3	ene-23	$ 11.454.000,00	$ 2.176.260,00	$ 13.630.260,00	$ 1.145.400,00	$ 12.484.860,00	$ 385.645.600,00	918622 De (17/08/2022)	$ 724.140,00	$ 6.796.600.272,00	67660 del 12 de julio de 2023	
4	feb-23	$ 724.140,00	$ -	$ 724.140,00	$ -	$ 724.140,00	$ 385.645.600,00	918622 De (17/08/2022)	$ -	$ 6.795.876.132,00	80880 del 30 de agosto de 2023	
4	feb-23	$ 7.174.860,00	$ 1.500.810,00	$ 8.675.670,00	$ 789.900,00	$ 7.885.770,00	$ 384.855.700,00	224023 De (03/03/2023)	$ 3.392.114.230,00	$ 6.787.200.462,00	80880 del 30 de agosto de 2023	
5	mar-23	$ 47.950.400,00	$ 9.110.576,00	$ 57.060.976,00	$ 4.795.040,00	$ 52.265.936,00	$ 380.060.660,00	224023 De (03/03/2023)	$ 3.339.848.294,00	$ 6.730.139.486,00	80907 del 31 de agosto de 2023	
6	abr-23	$ 88.091.800,00	$ 13.463.590,00	$ 101.555.390,00	$ 8.809.180,00	$ 92.746.210,00	$ 371.251.480,00	224023 De (03/03/2023)	$ 3.247.102.084,00	$ 6.628.584.096,00	82570 del 04 de octubre de 2023	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/08/2025 (Día / Mes / Año)

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
7	may-23	$ 112.211.680,00	$ 15.897.657,20	$ 128.109.337,20	$ 11.221.168,00	$ 116.888.169,20	$ 360.030.312,00	224023 De (03/03/2023)	$ 3.130.213.914,80	$ 6.500.474.758,80	83707 del 26 de octubre de 2023	
8	jun-23	$ 116.247.000,00	$ 16.902.362,00	$ 133.149.362,00	$ 11.624.700,00	$ 121.524.662,00	$ 348.405.612,00	224023 De (03/03/2023)	$ 3.008.689.252,80	$ 6.367.325.396,80	84908 del 15 de noviembre de 2023	
9	jul-23	$ 109.262.640,00	$ 15.718.586,00	$ 124.981.226,00	$ 10.926.264,00	$ 114.054.962,00	$ 337.479.348,00	224023 De (03/03/2023)	$ 2.894.634.290,80	$ 6.242.344.170,80	85257 del 19 de noviembre de 2023	
10	ago-23	$ 128.512.320,00	$ 17.705.872,00	$ 146.218.192,00	$ 12.851.232,00	$ 133.366.960,00	$ 324.628.116,00	224023 De (03/03/2023)	$ 2.761.267.330,80	$ 6.096.125.978,80	87811 del 13 de diciembre de 2023	
11	sep-23	$ 155.978.520,00	$ 22.907.783,20	$ 178.886.303,20	$ 15.597.852,00	$ 163.288.451,20	$ 309.030.264,00	224023 De (03/03/2023)	$ 2.597.978.879,60	$ 5.917.239.675,60	87827 del 13 de diciembre de 2023	
12	oct-23	$ 153.693.040,00	$ 21.726.842,00	$ 175.419.882,00	$ 15.369.304,00	$ 160.050.578,00	$ 293.660.960,00	224023 De (03/03/2023)	$ 2.437.928.301,60	$ 5.741.819.793,60	88139 del 13 de diciembre de 2023	
13	nov-23	$ 195.814.380,00	$ 25.684.960,00	$ 221.499.340,00	$ 19.581.438,00	$ 201.917.902,00	$ 274.079.522,00	224023 De (03/03/2023)	$ 2.236.010.399,60	$ 5.520.320.453,60	88324 del 13 de diciembre de 2023	
14	dic-23	$ 209.210.320,00	$ 26.533.462,00	$ 235.743.782,00	$ 20.921.032,00	$ 214.822.750,00	$ 253.158.490,00	224023 De (03/03/2023)	$ 2.021.187.649,60	$ 5.284.576.671,60	88346 del 13 de diciembre de 2023	
15	ene-24	$ 257.562.677,80	$ 33.667.185,28	$ 291.229.863,08	$ 25.756.268,00	$ 265.473.595,08	$ 227.402.222,00	224023 De (03/03/2023)	$ 1.755.714.054,52	$ 4.993.346.808,52	8631 del 9 de agosto de 2024	
16	feb-24	$ 279.314.993,00	$ 33.967.462,27	$ 313.282.455,27	$ 27.931.499,00	$ 285.350.956,27	$ 199.470.723,00	224023 De (03/03/2023)	$ 1.470.363.098,25	$ 4.680.064.353,25	8634 del 9 de agosto de 2024	
17	mar-24	$ 300.804.762,40	$ 34.324.285,46	$ 335.129.047,86	$ 30.080.476,00	$ 305.048.571,86	$ 169.390.247,00	224023 De (03/03/2023)	$ 1.165.314.526,39	$ 4.344.935.305,39	8999 del 15 de agosto de 2024	
18	abr-24	$ 289.655.338,40	$ 33.586.573,14	$ 323.241.911,54	$ 28.965.534,00	$ 294.276.377,54	$ 140.424.713,00	224023 De (03/03/2023)	$ 871.038.148,85	$ 4.021.693.393,85	9001 del 15 de agosto de 2024	
19	may-24	$ 359.263.613,40	$ 34.479.090,92	$ 393.742.704,32	$ 35.926.361,00	$ 357.816.343,3240	$ 104.498.352,00	224023 De (03/03/2023)	$ 513.221.805,53	$ 3.627.950.689,53	9975 del 29 de agosto de 2024	
20	jun-24	$ 356.995.299,00	$ 34.710.885,30	$ 391.706.184,30	$ 35.699.530,00	$ 356.006.654,30	$ 68.798.822,00	224023 De (03/03/2023)	$ 157.215.151,23	$ 3.236.244.505,23	9826 del 27 de agosto de 2024	
21	jul-24	$ 157.215.151,23	$ -	$ 157.215.151,23	$ -	$ 157.215.151,23	$ 68.798.822,00	224023 De (03/03/2023)	$ -	$ 3.079.029.354,00		
21	jul-24	$ 200.013.556,77	$ 34.533.991,04	$ 234.547.547,82	$ 35.722.871,00	$ 198.824.676,82	$ 33.075.951,00	224023 De (03/03/2023)	$ 2.811.405.855,18	$ 2.844.481.806,18		
22	ago-24	$ 352.250.259,80	$ 34.566.600,06	$ 386.816.859,86	$ 33.075.951,00	$ 353.740.908,86	$ -	219727 De (15/03/2024)	$ 2.457.664.946,32	$ 2.457.664.946,32	16837 del 20 de marzo de 2025	
23	sep-24	$ 329.396.263,80	$ 31.884.954,50	$ 361.281.218,30	$ -	$ 361.281.218,30	$ -	219727 De (15/03/2024)	$ 2.096.383.728,02	$ 2.096.383.728,02	17447 del 20 de marzo de 2025	
24	oct-24	$ 316.608.548,20	$ 28.949.021,15	$ 345.557.569,35	$ -	$ 345.557.569,35	$ -	219727 De (15/03/2024)	$ 1.750.826.158,67	$ 1.750.826.158,67	18558 del 25 de marzo de 2025	
25	nov-24	$ 324.007.988,60	$ 30.933.012,17	$ 354.941.000,77	$ -	$ 354.941.000,77	$ -	219727 De (15/03/2024)	$ 1.395.885.157,90	$ 1.395.885.157,90	18558 del 21 de marzo de 2025	
26	dic-24	$ 301.691.377,80	$ 28.032.750,10	$ 329.724.127,90	$ -	$ 329.724.127,90	$ -	219727 De (15/03/2024)	$ 1.066.161.030,00	$ 1.066.161.030,00		
27	ene-25	$ 219.606.315,46	$ 15.455.546,60	$ 235.061.862,06	$ -	$ 235.061.862,06	$ -	219727 De (15/03/2024)	$ 831.099.167,94	$ 831.099.167,94		
28	feb-25	$ 211.726.211,67	$ 10.174.509,60	$ 221.900.721,27	$ -	$ 221.900.721,27	$ -	219727 De (15/03/2024)	$ 609.198.446,67	$ 609.198.446,67		
29	mar-25	$ 213.202.253,16	$ 9.454.466,90	$ 222.656.720,06	$ -	$ 222.656.720,06	$ -	219727 De (15/03/2024)	$ 386.541.726,61	$ 386.541.726,61		
30	abr-25	$ 189.830.795,82	$ 8.434.341,30	$ 198.265.137,12	$ -	$ 198.265.137,12	$ -	219727 De (15/03/2024)	$ 188.276.589,49	$ 188.276.589,49		
31	may-25	$ 147.015.352,38	$ 482.790,00	$ 147.498.142,38	$ -	$ 147.498.142,38	$ -	219727 De (15/03/2024)	$ 40.778.447,11	$ 40.778.447,11		
32	jun-25	$ 40.778.447,11	$ -	$ 40.778.447,11	$ -	$ 40.778.447,11	$ -	219727 De (15/03/2024)	$ 0,00	$ 0,00		
32	jun-25	$ 88.434.684,29	$ -	$ 88.434.684,29	$ -	$ 88.434.684,29	$ -	2656 De (01/06/2025)	$ 91.565.315,71	$ 1.240.244.768,71		
	TOTALES	**$ 6.271.698.990,09**	**$ 626.966.226,20**	**$ 6.898.665.216,29**	**$ 386.791.000,00**	**$ 6.511.874.216,29**	**$ -**	219727 De (15/03/2024)	**$ 91.565.315,71**	**$ 1.240.244.768,71**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACUMULADO ACTA DE COSTOS	$ 6.271.698.990,09	$ 626.966.226,20	$ 6.898.665.216,29
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma:
Nombre: JOSE FRANCISCO MORON
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 -73192 CND

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

Firma:
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-65504 CAU

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría -Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

Se adjuntan las pólizas actualizadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1052-2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIASCOL

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONA, CAQUETA Y VAUPES PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 1

FECHA DE INICIO: 16/11/2022

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 6.810.230.532,00

VALOR ACUMULADO: $ 8.138.909.985,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JESUS EDUARDO RINCON SILVA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 681.023.053,20	24	6	2022	30/06/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 1.362.046.106,40	24	6	2022	31/12/2027		
Pago de Salarios, prestaciones sociales egales e indemnizaciones	20%	$ 1.362.046.106,40	24	6	2022	30	6	2025
Calidad del servicio	30%	$ 2.043.069.159,60	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 15-44-101264567

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 813.890.998,50	24	6	2022	30/12/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 1.627.781.997,00	24	6	2022	30/06/2028		
Pago de Salarios, prestaciones sociales egales e indemnizaciones	20%	$ 1.362.046.107,00	24	6	2022	30	12	2025
Calidad del servicio	30%	$ 2.441.672.995,50	31	12	2024	31	12	2029

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/06/2025
(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 15-44-101264567

Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 813.890.998,50	24	6	2022	30/06/2026		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 1.627.781.997,00	24	6	2022	31/12/2028		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 1.362.046.107,00	24	6	2022	30	6	2026
Calidad del servicio	30%	$ 2.441.672.995,50	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 15-44-101264567

Certificado de modificación o anexo No.: 9
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: MARLY MILENE SARRIA GONZALEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-136201 CND

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

Firma

Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-65504 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101264567	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	07	2025	24	06	2022	00:00	31	12	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIASCOL	NIT: 901.598.877-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 51 NRO. 71 A - 18 201	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3837687

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LOS AMPAROS DEL CONTRATO No. 1052 DE 2022 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETA Y VAUPES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL LOTE 1.

- EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA VIGENCIA DE CINCO(5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2022	30/12/2025	$813,890,998.50	$-132,867,944.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/06/2022	30/06/2028	$1,627,781,997.00	$-265,735,890.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	24/06/2022	30/12/2025	$1,362,046,107.00	$-265,735,890.00
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2024	31/12/2029	$2,441,672,995.50	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO, SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO Y SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO 1052 DE 2022 PRORROGA NUMERO DOS (02), ADICION NUMERO UNO (01) YMODIFICACION NUMERO UNO (01) DE 2025

NUEVO VALOR DEL CONTRATO $ 8.138.909.985
NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA 31/12/2025
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***5,252,106.00	$ *******8,000.00	$ *****999,420.00	$ *********6,259,526.00	$ ****6,245,392,098.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS Y SER	113284	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101264567

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oleda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101264567	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	07	2025	24	06	2022	00:00	31	12	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO VIASCOL		NIT: 901.598.877-7	
DIRECCION: CL 51 NRO. 71 A - 18 201	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	3837687

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		NIT: 800.215.807-2	
DIRECCIÓN: CL 25 G NRO. 73 B - 90	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
C I A F LTDA INGENIERIA	800130967-6	45.00
INGENOBRAS CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S INGENOBRAS S.A.S	824004441-2	50.00
PROCIVING SAS	900905675-0	5.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101264567

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101264567	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	07	2025	24	06	2022	00:00	31	12	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIASCOL	NIT: 901.598.877-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 51 NRO. 71 A - 18 201	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3837687

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LOS AMPAROS DEL CONTRATO No. 1052 DE 2022 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETA Y VAUPES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL LOTE 1.

- EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA VIGENCIA DE CINCO(5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2022	30/06/2026	$813,890,998.50	$813,890,998.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/06/2022	31/12/2028	$1,627,781,997.00	$1,627,781,997.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	24/06/2022	30/06/2026	$1,362,046,107.00	$1,362,046,107.00
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2024	31/12/2029	$2,441,672,995.50	$2,441,672,995.50

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO, SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO Y SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO 1052 DE 2022 PRORROGA NUMERO DOS (02), ADICION NUMERO UNO (01) YMODIFICACION NUMERO UNO (01) DE 2025

NUEVO VALOR DEL CONTRATO $ 8.138.909.985
NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA 31/12/2025
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3,811,134.00	$ *******8,000.00	$ *****725,635.00	$ *********4,544,769.00	$ ****6,245,392,098.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS Y SER	113284	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101264567

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oleda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101264567	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	07	2025	24	06	2022	00:00	31	12	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO VIASCOL		NIT: 901.598.877-7	
DIRECCION: CL 51 NRO. 71 A - 18 201	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	3837687

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		NIT: 800.215.807-2	
DIRECCIÓN: CL 25 G NRO. 73 B - 90	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
C I A F LTDA INGENIERIA	800130967-6	45.00
INGENOBRAS CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S INGENOBRAS S.A.S	824004441-2	50.00
PROCIVING SAS	900905675-0	5.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101264567

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

RECIBO DE CAJA No. 57729662

Nit. 860009578-6

EXPEDIDO EN	SUCURSAL	CODIGO	FECHA	CLAVE	NOMBRE
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	17/07/2025	0	

RECIBIMOS DE: 54209774-CONSORCIO VIASCOL — NIT. 901.598.877

LA SUMA DE: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.**********

POR CONCEPTO DE: APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #120179457

SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO	PRIMA	GASTO	IVA	RUNT	VALOR
NORTE - CU. ENTIDAD.EST. - 101264567 - 5	1,940,964.06	8,000.00	370,303.17	0.00	2,319,267.23
NORTE - CU. ENTIDAD.EST. - 101264567 - 8	3,311,142.00	0.00	629,116.98	0.00	3,940,258.98
NORTE - CU. ENTIDAD.EST. - 101264567 - 9	3,811,134.15	8,000.00	725,635.49	0.00	4,544,769.64

OTROS CONCEPTOS DE PAGO	VALOR
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	-10,804,295.85
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	10,804,295.85
APROVECHAMIENTOS	-0.23
APROVECHAMIENTOS	-0.98
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE PAGO	-0.64

FORMA DE PAGO

BD 120179457 1-BANCO DE BOGOTA 10,804,294.00

EFECTIVO:	0.00
CHEQUE:	0.00
TARJETA:	0.00
BD:	10,804,294.00
OTROS:	0.00

TRANSACCION 17371502

TOTAL: **10,804,294.00**

CAJERO: PAGUESTADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

RECIBO DE CAJA No. 57729662

7

EXPEDIDO EN	SUCURSAL	CODIGO	FECHA	CLAVE	NOMBRE
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	17/07/2025	0	

RECIBIMOS DE: 54209774-CONSORCIO VIASCOL — NIT. 901.598.877

LA SUMA DE: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.**********

POR CONCEPTO DE: APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #120179457

SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO	PRIMA	GASTO	IVA	RUNT	VALOR
NORTE - CU. ENTIDAD.EST. - 101264567 - 5	1,940,964.06	8,000.00	370,303.17	0.00	2,319,267.23
NORTE - CU. ENTIDAD.EST. - 101264567 - 8	3,311,142.00	0.00	629,116.98	0.00	3,940,258.98
NORTE - CU. ENTIDAD.EST. - 101264567 - 9	3,811,134.15	8,000.00	725,635.49	0.00	4,544,769.64

OTROS CONCEPTOS DE PAGO	VALOR
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	-10,804,295.85
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	10,804,295.85
APROVECHAMIENTOS	-0.23
APROVECHAMIENTOS	-0.98
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE PAGO	-0.64

FORMA DE PAGO

BD 120179457 1-BANCO DE BOGOTA 10,804,294.00

EFECTIVO:	0.00
CHEQUE:	0.00
TARJETA:	0.00
BD:	10,804,294.00
OTROS:	0.00

TRANSACCION 17371502

TOTAL: **10,804,294.00**

CAJERO: PAGUESTADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

RECIBO DE CAJA No.
57729662

Detalle de Otros Conceptos de Pago

OTROS CONCEPTOS DE PAGO	VALOR
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	-10,804,295.85
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	10,804,295.85
APROVECHAMIENTOS	-0.23
APROVECHAMIENTOS	-0.98
APROVECHAMIENTOS	-0.64

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría – Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1052 - 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONA, CAQUETA Y VAUPES PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 1

INTERVENTOR: CONSORCIO VIASCOL

FECHA DE INICIO: 16/11/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 31/12/2024 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/12/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 01544-2022 0558-2022 (Indicar número y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERNACIONAL WOC KAIROS SENDERO PEATONAL

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ---------- APROBADO: SI X NO ------ VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: 14/04/2023

OBSERVACIONES:

SE HAN VENIDO IMPLEMENTANDO LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS EN EL AREA ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL, SOCIAL Y TECNICO. SE HAN DIVULGADO LOS FORMATOS NECESARIO PARA LA LIBERACION EN CAMPO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CANTIDADES Y RECIBIDO, DONDE SE DEJA LA TRAZABILIDAD DE LAS DOS PARTES (CONTRATISTA E INTERVENTORIA) Y DE ENTREGA DE CARTERAS TOPOGRAFICAS PARA LIBERACION DE CAPAS GRANULARES. EN EL AREA SOCIAL Y AMBIENTAL SE HA VENIDO IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA DE ADAPTACIÓN AMBIENTAL (PAGA) QUE DEBE DESARROLLAR EL CONTRATISTA HACIENDO UN SEGUIMIENTO POR PARTE DE ESTA INTERVENTORIA, DEJANDO INFORMES EN CONSTANCIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI X NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 0 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: 12/04/2025

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI --------- NO ---------- No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 0 FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: 9/10/2025

OBSERVACIONES:
DURANTE EL PRESENTE MES NO SE REALIZARON AUDITORIAS DE CALIDAD TODA VEZ QUE SE EL MES ANTERIOR SE REALIZÓ LA ULTIMA AUDITORIA PROGRAMADA

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ---------- APROBADO: SI X NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: 19/04/2023

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 10 No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 8

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI X NO ------

OBSERVACIONES:
DURANTE EL PERIODO EJECUTADO SE REALIZARON ENSAYOS DE LABORATORIO EN VERIFICACIÓN DE LAS RESISTENCIAS DE LOS CONCRETOS PARA EL EL CONTRATO DE OBRA 078-2022 Y EL CONTRATO DE OBRA 01544-2022

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:
NO SE PRESENTARON NO INCONFORMIDADES

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:
NO SE PRESENTARON QUEJAS A LA INTERVENTORÍA.

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =	95,20%	ATENCIÓN CORREOS/ RESPUESTA CORREOS
IG2: Índice de gestión 2 =	80,00%	ENSAYOS PROGRAMADOS/ENSAYOS EJECUTADOS
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:
A la fecha se ha implementado los estandares de calidad para el control de correspondencia, seguimiento de obra y demás

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 28/06/2025
(Día / Mes / Año)

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	ESTACION TOTAL TKS-202	GOWIN	8E2245	23/07/2025	2356 - /01/2025	5/02/2026	

OBSERVACIONES:

SE CUENTA CON COMISIÓN DE TOPOGRAFIA Y LOS EQUIPOS DE TOPOGRAFIA SE ENCUENTRAN CON LA CALIBRACIÓN AL DÍA.

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: MARLY MILENE SARRIA GONZALEZ
Directora de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-136201 CND

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoria
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

Firma
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-65504 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL (E) CAQUETA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

N°. Certificado: 2356
Fecha: 6/08/2025

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Servicio Tecnico NOVA S.A.S
NIT. 901163978-5

DATOS DEL CLIENTE			
Nombre	**NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S**	NIT / C.C	**901187919-4**
Dirección	**CL 13 4 A 24 BRR ABBAS TURBAY**	Ciudad	**MORELIA**
Telefono	**3204912919**	Fecha de Expiración	**5/02/2026**

DATOS DEL EQUIPO			
Equipo	**ESTACION TOTAL**	Marca	**GOWIN**
Modelo	**TKS-202**	N° Serial	**8E2245**
Aumentos	**30x**	Precisión	**2"**

Basado en los procedimientos según norma ISO 17123-1-2-3-4, estipulada por el fabricante a continuación se describen los ajustes realizados al equipo

Inspección Mecánica

Partes	A	R	M	CP	N/A
Base Nivelante			X		
Frenos - paso lento Hz y Vt					X
Teclados y contactos			X		
Eje Hz y Vt					X
Sistema de enfoque					x
Verticalidad					X
Niveles tubulares y esférico					X

Inspección Electrónica

Partes	A	R	M	CP	N/A
Distanciómetro					X
Nonios Hz y Vt					X
Puntero laser					X
Compensador Electrónico		X			
Plomada Láser / óptica					X
Sensores Hz y Vt					X

(**A**) Ajuste (**R**) Reparación (**M**) Mantenimiento (**CP**) Cambio de piezas (**N/A**) No aplica

AJUSTE ANGULAR Y DISTANCIA

Patrón	Fase 1	Fase 2	Residuo	Tolerancia	Cierre	Error
Vertical	90.0000	270.0012	0.0012	(+ / -) 0.0002	270.0000	0.0000
Horizontal	0.0000	180.0005	0.0005	(+ / -) 0.0002	180.0000	0.0000
Distancia	5.5290	5.5290	0.0000	(+ / -) 0.0000	5.5290	0.0000

Equipo verificado, ajustado y patronado bajo las normas ISO 17123 de acuerdo a los procedimientos dados por el fabricante

Observaciones:

El instrumento se encuentra en buen funcionamiento, se recomienda realizar chequeos de campo.
El cliente es responsable del buen transporte del equipo, ya que las vibraciones y manipulación no adecuada pueden desajustarlo



HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
Técnico Laboratorio.

CERTIFICADO DEL COLIMADOR	Servicio Tecnico NOVA S.A.S NIT. 901163978-5

SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S			
FECHA DE INSPECCION:	**23/07/2025**		
PROXIMA INSPECCION:	**22/01/2026**		
EMPRESA:	SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S	**NIT :**	901163978-5
DIRECCION :	CL 45E # 76-24 - VELODROMO	**CIUDAD:**	MEDELLIN-ANTIOQUIA
TELEFONO :	5017426	**PROXIMO CONTROL**	22/01/2026
INSTRUMENTO :	COLIMADOR	**MARCA**	SOUTH
MODELO :	W420-3	**SERIE**	S/N
ANGULO DE GRADUACION	10"2mm	**GRADUACION MINIMA**	20"

inspección sistemas mecanicos y óptimos	ajuste	lubricación	reparación	repuesto	limpieza	función aceptable
niveles tubulares y esféricos	x					
tubo superior	x					
tubo intermedio	x					
tubo inferior	x					

SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S			
inspeccion de cierres angulares de cada eje	**lectura inicial**	**errores encontrados**	**lecturas después de ajuste**
Angulo vertical tubo superior	60°00´12"	00°00´12"	00°00´00"
Angulo vertical tubo intermedio	90°00´15"	00°00´15"	00°00´00"
Angulo vertical tubo inferior	119°59´50"	00°00´10"	00°00´00"
Angulo horizontal tubo superior	00°00´07"	00°00´07"	00°00´00"
Angulo horizontal tubo intermedio	00°00´00"	00°00´00"	00°00´00"
Angulo horizontal tubo inferior	00°00´12"	00°00´12"	00°00´00"

CERTIFICADO EQUIPOS PATRONES	Servicio Tecnico NOVA S.A.S NIT. 901163978-5

SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO. CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S			
FECHA DE INSPECCION:		**24/01/2025**	
PROXIMA INSPECCION:		**23/07/2025**	
EMPRESA:	SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S	**NIT :**	901163978-5
DIRECCION :	CL 45E # 76-24 - VELODROMO	**CIUDAD:**	MEDELLIN-
TELEFONO :	5017426	**PROXIMO CONTROL**	23/07/2025
INSTRUMENTO :	ESSTACION TOTAL	**MARCA**	LEICA
MODELO :	TC 1101	**SERIE**	754687
ANGULO DE GRADUACION	1"	**GRADUACION MINIMA**	(2mm+2ppm*D)m.s.e

inspección opto mecanica	corrección	ajuste	lubricacion	reparacion	repuestos	limpieza	función aceptable
Base nivelante			x				
Niveles tubulares y esféricos		x					x
Verticalidad							x
óptica general (lentes y prisma)							x
Eje vertical y horizontal							x
Frenos y movimientos tangenciales							x

Inspección sistema de medida angular y verificacion según prueba de campo procedimiento N.	corrección	ajuste	lubricación	reparación	repuestos	limpieza	función aceptable
compensador automático							
compensador electrónico		x					
colimación vertical		x					
colimación horizontal		x					

Posición 1 (vertical)	90°	Grados	00´	Minutos	00"
Posición 2 (vertical)	170°	Grados	00´	Minutos	05"
Error detectado	00°	Grados	00´	Minutos	08"
Posición 1 (horizontal)	00°	Grados	00´	Minutos	00"
Posición 2 (horizontal)	180°	Grados	00´	Minutos	10"
Error detectado	00°	Grados	00´	Minutos	10"

INSTRUMENTO	NIVEL AUTOMATICO	**MARCA**	WILD HEERBRUGG
MODELO	N2	**SERIE**	N2-110807
AUMENTOS	26X	**PRECISIÓN EN DISTANCIA**	.+/-0.8mm*2kmde nivelación

Inspección de centro de diferencia nivel según prueba de campo procedimiento	**corrección**	**ajuste**	**lubricación**	**reparación**	**repuestos**	**limpieza**	**función aceptable**
sistema pendular automatico							x

A1	1 254	MM	B2	1 425	
A2	1 246	MM	B1	1 375	
A1-A2		MM	B1-B2		

Error detectado	**0.000**



HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
Técnico Laboratorio.

6.6 Otros Documentos de Seguimiento Mensual

6.6.1 Informe de inversión y buen manejo del anticipo y/o pago anticipado del interventor – Formatos MEPI-MN-IN-3-FR-1 / MEPI-MN-IN-3-FR-2.

Se anexa el MEPI-MN-IN-3-FR-2 del mes de septiembre toda vez que dicho informe del buen manejo del anticipo es el último ya que se han utilizado la totalidad de los recursos de anticipo.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-3-FR-1
	VERSIÓN		1
	PÁGINA		
	FECHA		28/04/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

DATOS GENERALES

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 2
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1052 - 2022 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIASCOL

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 1.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ

JUSTIFICACIÓN:
Ampliar el plazo del plan de inversion, teniendo en cuenta que no se ha iniciado la totalidad de los contratos de obra a realizar interventoria

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO

ABRIL

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VR. MES 5	VR. MES 6	VR. MES 7	VR. MES 8	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	Salarios del personal de nómina	$ -	$ 4.800.000,00	$ 2.400.000,00	$ 9.440.000,00	$ 22.175.000,00	$ 35.000.000,00	$ 62.000.000,00	$ 75.000.000,00	$ 210.815.000,00	54,22%
2	Aportes de seguridad social	$ -	$ 1.534.100,00	$ 1.534.100,00	$ 3.187.700,00	$ 6.957.500,00	$ 12.000.000,00	$ 14.718.600,00	$ 13.000.000,00	$ 52.932.000,00	13,61%
3	Dotación del personal	$ -					$ 2.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 12.000.000,00	3,09%
4	Honorarios Especialistas	$ -		$ -	$ 5.525.000,00	$ 5.525.000,00	$ 6.500.000,00	$ 10.500.000,00	$ 15.000.000,00	$ 43.050.000,00	11,07%
7	Alquiler de oficina	$ -		$ -	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 10.000.000,00	2,57%
8	Comisión de topografía	$ -		$ -			$ 6.500.000,00	$ 6.500.000,00	$ 13.000.000,00	$ 26.000.000,00	6,69%
9	Ensayos de laboratorio	$ -		$ -			$ 644.000,00	$ 644.000,00	$ 644.000,00	$ 1.932.000,00	0,50%
10	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías...	$ -			$ 2.050.000,00	$ 2.050.000,00	$ 2.050.000,00	$ 2.050.000,00	$ 2.050.000,00	$ 10.250.000,00	2,64%
11	Comunicaciones	$ -	$ 126.000,00	$ 135.000,00	$ 171.000,00	$ 180.000,00	$ 180.000,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 1.792.000,00	0,46%
12	Viaticos Director y/o Especialistas	$ -		$ 500.000,00	$ 600.000,00	$ 1.000.000,00	$ 500.000,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ 4.600.000,00	1,18%
14	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ -		$ 1.600.000,00	$ 1.820.000,00	$ 2.000.000,00	$ 6.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 15.420.000,00	3,97%
	TOTAL	**$ -**	**$ 6.460.100,00**	**$ 6.169.100,00**	**$ 24.793.700,00**	**$ 41.887.500,00**	**$ 73.374.000,00**	**$ 106.912.600,00**	**$ 129.194.000,00**	**$ 388.791.000,00**	**100,00%**

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. **No aplica para compra ni alquiler de vehículos.**

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría especifico.

4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
Nombre: JOSE FRANCISCO MORON OROZCO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-73192 CND

Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ

Firma:
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☑ (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1052 de 2022 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 523-000030-91 **BANCO** BANCOLOMBIA **SUCURSAL:** VALLEDUPAR

ANTICIPO OTORGADO: 5,68% **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 386.791.000,00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 1.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
Documento de Egreso	NR	NA	Pago nómina empleados Consorcio Viascol Julio 2023	$ 44.135.000,00	1	Salarios del personal de nómina
Documento de Egreso	NR	NA	Aportes en linea	$ 11.501.600,00	2	Aportes de seguridad social
Documento de Egreso	NR	NA	Consorcio Viascol	$ 4.550.000,00	4	Honorarios Especialistas
Documento de Egreso	NR	NA	Consorcio Viascol	$ 2.000.000,00	5	Alquiler de oficina
Documento de Egreso	NR	NA	Consorcio Viascol	$ -	6	Comisión de topografía
Documento de Egreso	NR	NA	Consorcio Viascol	$ -	7	Ensayos de laboratorio
Documento de Egreso	NR	NA	Consorcio Viascol	$ 2.050.000,00	8	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías…
Documento de Egreso	NR	NA	Consorcio Viascol		9	Comunicaciones
Documento de Egreso	NR	NA	Consorcio Viascol		10	Viaticos Director y/o Especialistas
Documento de Egreso	NR	NA	Consorcio Viascol	$ 815.220,00	11	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	Salarios del personal de nómina	$ 209.520.000,00	$ 165.385.000,00	$ 44.135.000,00	$ 209.520.000,00	$ -
2	Aportes de seguridad social	$ 63.896.100,00	$ 52.394.500,00	$ 11.501.600,00	$ 63.896.100,00	$ -
3	Dotación del personal	$ -	$ -		$ -	$ -
4	Honorarios Especialistas	$ 38.675.000,00	$ 34.125.000,00	$ 4.550.000,00	$ 38.675.000,00	$ -
5	Alquiler de oficina	$ 14.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 14.000.000,00	$ -
6	Comisión de topografía	$ 26.000.000,00	$ 26.000.000,00	$ -	$ 26.000.000,00	$ -
7	Ensayos de laboratorio	$ 463.680,00	$ 463.680,00	$ -	$ 463.680,00	$ -
8	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	$ 14.350.000,00	$ 12.300.000,00	$ 2.050.000,00	$ 14.350.000,00	$ -
9	Comunicaciones	$ 1.332.000,00	$ 1.332.000,00	$ -	$ 1.332.000,00	$ -
10	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 3.450.000,00	$ 3.450.000,00	$ -	$ 3.450.000,00	$ -
11	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 15.104.220,00	$ 14.289.000,00	$ 815.220,00	$ 15.104.220,00	$ -
TOTALES		**$ 386.791.000,00**	**$ 321.739.180,00**	**$ 65.051.820,00**	**$ 386.791.000,00**	**$ -**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (AGOSTO-2023): $ 49.068,03
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 530.230,29
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
1482980	$ 8.456,450		mar-23	12/05/2023	$ 8.456,45
1482851	$ 155.870,75		abr-23	12/05/2023	$ 164.327,20
1584282	$ 120.555,54		may-23	17/07/2023	$ 284.882,74
1592946	$ 111,00		may-23	17/07/2023	$ 284.993,74
1584282	$ 102.855,38		jun-23	17/07/2023	$ 387.849,12
1630854	$ 93.313,14		jul-23	14/08/2023	$ 481.162,26
1709314	$ 49.068,03		ago-23	28/09/2023	$ 530.230,29

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre: JOSE FRANCISCO MORON OROZCO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-73192 CND

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENA

Firma:
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor de Contrato de Interventoría (E)
Matrícula Profesional No.:52202-46096 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VIASCOL	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" – LOTE 1”,

Valledupar, 14 de octubre de 2023

Señores:
BANCOLOMBIA
Ciudad


Ref. Cuenta de ahorros manejo de Anticipo No. **523-000030-91, BANCOLOMBIA**

Con la Presente nos permitimos solicitar a ustedes trasladar de la cuenta de la referencia a la cuenta Ahorros No 52300002395 de BANCOLOMBIA, el valor de $ 65.051.820,00 (SESENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE).

El valor y los gastos de expedición podrán ser debitados de la cuenta de la referencia.

Cordialmente,





Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENA

JOSE FRANCISCO MORON O.
Representante Legal
CONSORCIO VIASCOL
Nit. 901.598.877-7

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor Contrato de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 2202-46096 NRÑ
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Bancolombia

Valledupar, 4 de septiembre de 2023

Señores:
A QUIEN INTERESE
Valledupar

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el **CONSORCIO VIASCOL** identificado con NIT. **901598877**, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco la siguiente cuenta:

TIPO DE CUENTA	N° DE CUENTA	FECHA APERTUA	ESTADO	NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA AHORROS	523-000030-91	2022/12/06	Activa	**CONSORCIO VIASCOL**

Certificamos que los rendimientos generados desde el **1 de agosto de 2023** hasta el **corte 31 de agosto de 2023** son de **$49.068.03**

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 7273575, o en nuestra Sucursal de olímpica.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO RIVERO CASTRO
GERENTE COMERCIAL

* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Interna

VIGILADO

Solicitudes / Producto / - Envío de transferencias vía SEBRA
Detalle de la solicitud

Número de solicitud: 1709314

Estado: Procesada

Tipo cuenta origen: Ahorros

Valor a debitar: 49,068.03

Número cuenta CUD destino: 61011094

Código de la transacción: 137

Número cuenta comisión: 52300003091

Creada por: VIASCOL23_BOLE

Preparada por: VIASCOL23_BOLE

Aprobada por: OBRA5678_BOLE

Enviado por: OBRA5678_BOLE

Tipo de solicitud: Envío de transferencias vía SEBRA

NIT del ordenante (sin DV): 901598877

Número cuenta origen: 52300003091

NIT del beneficiario de los recursos: 899999090

Portafolio CUD destino: 270

Tipo cuenta comisión: Ahorros

Observación de la transferencia: RENDIMIENTOS AGOSTO 2023

Fecha de creación: 28 de septiembre de 2023 01:36:23 PM GMT-5

Fecha de preparación: 28 de septiembre de 2023 01:37:34 PM GMT-5

Fecha de aprobación: 28 de septiembre de 2023 03:07:45 PM GMT-5

Fecha de envío: 28 de septiembre de 2023 03:07:46 PM GMT-5

6.6.2 Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado- Formato MEPI-MN-IN-9-FR-2

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☑
PLAN DE CARGAS FINAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

RATO DE INTERVENTORÍA No.: 1052 DE 2022

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIASCOL
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JESUS EDUARDO RINCON SILVA

RESOLUCIÓN No.: 1912 DE 3/06/2025 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: MUNICIPIO DE ALBANIA; CONSORCIO INTERNACIONAL WOC; CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL; CONSORCIO ACARICUARA
CONVENIO No. 1790 DE 2021; 1554-2022; 558-2022
CONTRATISTA: 600-2024

PLAZO INICIAL: 25 MESES Y 14 DÍAS (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/11/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 6,810,230,532.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 8,138,909,985.00

PLAZO ACUMULADO: 37 MESES Y 14 DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 1,328,679,453.00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS 2024		ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS 2025		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 30 del 03 de junio de 2024		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Valor Total ($)	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ																												
		PERSONAL PROFESIONAL																										
1	1	Director de Interventoría	$ 6,000,000.00		20.00	$ 120,000,000	$ 7,260,000		$ 7,623,000		24.20	$ 161,943,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	24.20	$ 161,943,000.00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4,500,000.00		16.00	$ 72,000,000	$ 5,445,000		$ 5,717,250		15.73	$ 78,345,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 5,717,250	1.00	$ 5,717,250	1.00	$ 5,717,250	18.73	$ 95,496,750.00
3	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4,500,000.00		6.00	$ 27,000,000	$ 5,445,000		$ 5,717,250		15.00	$ 80,874,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	15.00	$ 80,874,000.00
4	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4,500,000.00		6.00	$ 27,000,000	$ 5,445,000		$ 5,717,250		13.36	$ 71,460,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	13.36	$ 71,460,000.00
5	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4,500,000.00		6.00	$ 27,000,000	$ 5,445,000		$ 5,717,250		3.00	$ 16,335,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	3.00	$ 16,335,000.00
6	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3,000,000.00		24.00	$ 72,000,000	$ 3,630,000		$ 3,811,500		23.13	$ 78,573,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	23.13	$ 78,573,000.00
7	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3,000,000.00		20.00	$ 60,000,000	$ 3,630,000		$ 3,811,500		0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
8	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3,000,000.00		20.00	$ 60,000,000	$ 3,630,000		$ 3,811,500		0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS																										
9	1	Especialista Ambiental y/o sostenibilidad	$ 6,500,000.00		4.80	$ 31,200,000	$ 7,865,000		$ 8,258,250		6.12	$ 43,759,300.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	6.12	$ 43,759,300.00
10	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6,500,000.00		1.35	$ 8,775,000	$ 7,865,000		$ 8,258,250		0.15	$ 975,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.15	$ 975,000.00
11	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 6,500,000.00		3.30	$ 21,450,000	$ 7,865,000		$ 8,258,250		1.65	$ 11,544,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.65	$ 11,544,000.00
12	1	Especialista en Estructuras	$ 6,500,000.00		1.35	$ 8,775,000	$ 7,865,000		$ 8,258,250		1.05	$ 7,439,250.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.05	$ 7,439,250.00
13	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6,500,000.00		1.35	$ 8,775,000	$ 7,865,000		$ 8,258,250		0.45	$ 2,925,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.45	$ 2,925,000.00
14	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6,500,000.00		1.35	$ 8,775,000	$ 7,865,000		$ 8,258,250		1.20	$ 8,619,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.20	$ 8,619,000.00
15	1	Profesional Social	$ 3,000,000.00		16.00	$ 48,000,000	$ 3,630,000		$ 3,811,500		18.50	$ 63,060,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	18.50	$ 63,060,000.00
16	1	Profesional Ambiental	$ 3,000,000.00		16.00	$ 48,000,000	$ 3,630,000		$ 3,811,500		0.20	$ 600,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.20	$ 600,000.00
17	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 3,000,000.00		16.00	$ 48,000,000	$ 3,630,000		$ 3,811,500		5.36	$ 16,080,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	5.36	$ 16,080,000.00
		PERSONAL TECNICO																										
18	1	Inspector	$ 2,000,000.00		16.00	$ 32,000,000	$ 2,420,000		$ 2,541,000		23.00	$ 51,460,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	26.00	$ 59,083,000.00
19	1	Inspector	$ 2,000,000.00		8.00	$ 16,000,000	$ 2,420,000		$ 2,541,000		16.00	$ 37,040,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	16.00	$ 37,040,000.00
20	1	Inspector	$ 2,000,000.00		8.00	$ 16,000,000	$ 2,420,000		$ 2,541,000		15.80	$ 36,640,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	15.80	$ 36,640,000.00
21	1	Inspector	$ 2,000,000.00		8.00	$ 16,000,000	$ 2,420,000		$ 2,541,000		13.74	$ 33,524,800.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	13.74	$ 33,524,800.00
22	1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		16.00	$ 32,000,000	$ 2,420,000		$ 2,541,000		19.36	$ 43,760,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	19.36	$ 43,760,000.00
23	1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		8.00	$ 16,000,000	$ 2,420,000		$ 2,541,000		15.56	$ 36,180,200.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	15.56	$ 36,180,200.00
24	1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		8.00	$ 16,000,000	$ 2,420,000		$ 2,541,000		12.63	$ 28,968,600.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	12.63	$ 28,968,600.00
25	1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		8.00	$ 16,000,000	$ 2,420,000		$ 2,541,000		0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																										
26	1	Ingeniero Administrativo	$ -		0.00	$ -	$ 3,630,000		$ 3,811,500		8.50	$ 30,855,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	8.50	$ 30,855,000.00
27	1	Abogado							$ 8,258,250		0.00	$ -	0.30	$ 2,477,475													0.30	$ 2,477,475.00
28	1	Secretaria	$ 1,050,000.00		90.00	$ 94,500,000	$ 1,300,000		$ 1,423,500		22.00	$ 26,100,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	22.00	$ 26,100,000.00
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS																												
		PERSONAL PROFESIONAL																										
29	1	Director de Interventoría	$ 6,000,000.00		10.00	$ 60,000,000	$ 7,260,000		$ 7,623,000		15.10	$ 108,921,000.00	1.00	$ 7,623,000	1.00	$ 7,623,000	1.00	$ 7,623,000	1.00	$ 7,623,000	1.00	$ 7,623,000	1.00	$ 7,623,000	1.00	$ 7,623,000	22.10	$ 162,282,000.00
30	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4,500,000.00		12.00	$ 54,000,000	$ 5,445,000		$ 5,717,250		25.19	$ 130,732,560.00	1.00	$ 5,717,250	1.00	$ 5,717,250	1.00	$ 5,717,250	1.00	$ 5,717,250	1.00	$ 5,717,250	1.00	$ 5,717,250	1.00	$ 5,717,250	32.19	$ 170,753,310.00
31	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4,500,000.00		6.00	$ 27,000,000	$ 5,445,000		$ 5,717,250		15.28	$ 84,182,850.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	15.28	$ 84,182,850.00
32	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4,500,000.00		6.00	$ 27,000,000	$ 5,445,000		$ 5,717,250		9.95	$ 54,994,500.00	1.00	$ 5,717,250		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	10.95	$ 60,711,750.00
33	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4,500,000.00		6.00	$ 27,000,000	$ 5,445,000		$ 5,717,250		6.46	$ 35,174,700.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	6.46	$ 35,174,700.00
34	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4,500,000.00		0.00	$ -	$ 5,445,000		$ 5,717,250		0.10	$ 544,500.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.10	$ 544,500.00
35	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4,500,000.00		0.00	$ -	$ 5,445,000		$ 5,717,250		0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
36	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3,000,000.00		12.00	$ 36,000,000	$ 3,630,000		$ 3,811,500		25.23	$ 87,307,500.00	1.00	$ 3,811,500	1.00	$ 3,811,500	1.00	$ 3,811,500	1.00	$ 3,811,500	1.00	$ 3,811,500	1.00	$ 3,811,500	1.00	$ 3,811,500	32.23	$ 113,988,000.00
37	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3,000,000.00		12.00	$ 36,000,000	$ 3,630,000		$ 3,811,500		0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS																										
38	1	Especialista Ambiental y/o sostenibilidad	$ 6,500,000.00		4.80	$ 31,200,000	$ 7,865,000		$ 8,258,250		4.68	$ 36,509,200.00	0.40	$ 3,303,300	0.40	$ 3,303,300	0.40	$ 3,303,300	0.20	$ 1,651,650	0.20	$ 1,651,650	0.20	$ 1,651,650	0.20	$ 1,651,650	6.68	$ 53,025,700.00
39	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6,500,000.00		1.35	$ 8,775,000	$ 7,865,000		$ 8,258,250		0.60	$ 4,309,500.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.60	$ 4,309,500.00
40	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 6,500,000.00		3.30	$ 21,450,000	$ 7,865,000		$ 8,258,250		5.25	$ 39,392,925.00	0.30	$ 2,477,475		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	5.55	$ 41,870,400.00
41	1	Especialista en Estructuras	$ 6,500,000.00		1.35	$ 8,775,000	$ 7,865,000		$ 8,258,250		0.60	$ 4,719,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.60	$ 4,719,000.00
42	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6,500,000.00		1.35	$ 8,775,000	$ 7,865,000		$ 8,258,250		0.45	$ 3,539,250.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.45	$ 3,539,250.00
43	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6,500,000.00		1.35	$ 8,775,000	$ 7,865,000		$ 8,258,250		1.20	$ 9,292,237.50		$ -	0.15	$ 1,238,738		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	1.35	$ 10,530,975.00
44	1	Profesional Social	$ 3,000,000.00		10.00	$ 30,000,000	$ 3,630,000		$ 3,811,500		23.96	$ 82,552,500.00	1.00	$ 3,811,500	1.00	$ 3,811,500	1.00	$ 3,811,500	1.00	$ 3,811,500	1.00	$ 3,811,500	1.00	$ 3,811,500	1.00	$ 3,811,500	30.96	$ 109,233,000.00
45	1	Profesional Ambiental	$ 3,000,000.00		10.00	$ 30,000,000	$ 3,630,000		$ 3,811,500		0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
46	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 3,000,000.00		10.00	$ 30,000,000	$ 3,630,000		$ 3,811,500		0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
		PERSONAL TECNICO										$ -																
47	1	Inspector	$ 2,000,000.00		8.00	$ 16,000,000	$ 2,420,000		$ 2,541,000		17.96	$ 43,438,200.00	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	24.96	$ 61,225,200.00
48	1	Inspector	$ 2,000,000.00		8.00	$ 16,000,000	$ 2,420,000		$ 2,541,000		12.52	$ 35,743,400.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	12.52	$ 35,743,400.00
49	1	Inspector	$ 2,000,000.00		8.00	$ 16,000,000	$ 2,420,000		$ 2,541,000		8.72	$ 21,102,400.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	8.72	$ 21,102,400.00
50	1	Inspector	$ 2,000,000.00		8.00	$ 16,000,000	$ 2,420,000		$ 2,541,000		8.88	$ 21,489,600.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	8.88	$ 21,489,600.00
51	1	Inspector	$ 2,000,000.00		8.00	$ 16,000,000	$ 2,420,000		$ 2,541,000		7.96	$ 19,263,200.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	7.96	$ 19,263,200.00
52	1	Inspector	$ 2,000,000.00		0.00	$ -	$ 2,420,000		$ 2,541,000		1.76	$ 4,259,200.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.76	$ 4,259,200.00
53	1	Inspector	$ 2,000,000.00		0.00	$ -	$ 2,420,000		$ 2,541,000		0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
54	1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		8.00	$ 16,000,000	$ 2,420,000		$ 2,541,000		15.26	$ 37,534,200.00	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	22.26	$ 55,321,200.00
55	1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		8.00	$ 16,000,000	$ 2,420,000		$ 2,541,000		5.92	$ 14,326,400.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	5.92	$ 14,326,400.00
56	1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		8.00	$ 16,000,000	$ 2,420,000		$ 2,541,000		0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
57	1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		8.00	$ 16,000,000	$ 2,420,000		$ 2,541,000		0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
58	1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		8.00	$ 16,000,000	$ 2,420,000		$ 2,541,000		0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																										
59	1	Ingeniero Administrativo	$ -		0.00	$ -	$ 3,630,000		$ 3,811,500		5.00	$ 19,057,500.00	1.00	$ 3,811,500	1.00	$ 3,811,500	1.00	$ 3,811,500	1.00	$ 3,811,500	1.00	$ 3,811,500	1.00	$ 3,811,500	1.00	$ 3,811,500	12.00	$ 45,738,000.00
60	1	Secretaria	$ 1,050,000.00		0.00	$ -	$ 1,300,000		$ 1,423,500		5.00	$ 7,117,500.00	1.00	$ 1,423,500	1.00	$ 1,423,500	1.00	$ 1,423,500	1.00	$ 1,423,500	1.00	$ 1,423,500	1.00	$ 1,423,500	1.00	$ 1,423,500	12.00	$ 17,082,000.00
DEPARTAMENTO DE VAUPES																												
		PERSONAL PROFESIONAL																										
61	1	Director de Interventoría	$ -		0.00	$ -	$ 7,260,000		$ 7,623,000		0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
62	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4,500,000.00		8.00	$ 36,000,000	$ 5,445,000		$ 5,717,250		0.00	$ -	1.00	$ 5,717,250	1.00	$ 5,717,250	1.00	$ 5,717,250	1.00	$ 5,717,250	1.00	$ 5,717,250	1.00	$ 5,717,250	1.00	$ 5,717,250	7.00	$ 40,020,750.00
63	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3,000,000.00		8.00	$ 24,000,000	$ 3,630,000		$ 3,811,500		3.00	$ 11,434,500.00	1.00	$ 3,811,500	1.00	$ 3,811,500	1.00	$ 3,811,500	1.00	$ 3,811,500	1.00	$ 3,811,500	1.00	$ 3,811,500	1.00	$ 3,811,500	10.00	$ 38,115,000.00
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS																										
64	1	Especialista Ambiental y/o sostenibilidad	$ 6,500,000.00		0.00	$ -	$ 7,865,000		$ 8,258,250		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.20	$ 1,651,650	0.20	$ 1,651,650	0.20	$ 1,651,650	0.20	$ 1,651,650	0.80	$ 6,606,600.00
65	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6,500,000.00		0.00	$ -	$ 7,865,000		$ 8,258,250		0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
66	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 6,500,000.00		0.00	$ -	$ 7,865,000		$ 8,258,250		0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
67	1	Especialista en Estructuras	$ 6,500,000.00		0.00	$ -	$ 7,865,000		$ 8,258,250		0.45	$ 3,716,212.50		$ -	0.15	$ 1,238,738	0.00	$ -	0.15	$ 1,238,738	0.15	$ 1,238,738	0.00	$ -	0.15	$ 1,238,738	1.05	$ 8,671,162.50
68	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6,500,000.00		0.00	$ -	$ 7,865,000		$ 8,258,250		0.00	$ -		$ -	0.15	$ 1,238,738		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.15	$ 1,238,737.50
69	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6,500,000.00		0.00	$ -	$ 7,865,000		$ 8,258,250		0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
70	1	Profesional Social	$ 3,000,000.00		4.00	$ 12,000,000	$ 3,630,000		$ 3,811,500		0.00	$ -	1.00	$ 3,811,500	1.00	$ 3,811,500	1.00	$ 3,811,500	1.00	$ 3,811,500	1.00	$ 3,811,500	1.00	$ 3,811,500	1.00	$ 3,811,500	7.00	$ 26,680,500.00
71	1	Profesional Ambiental	$ 3,000,000.00		4.00	$ 12,000,000	$ 3,630,000		$ 3,811,500		0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
72	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 3,000,000.00		4.00	$ 12,000,000	$ 3,630,000		$ 3,811,500					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
		PERSONAL TECNICO									0.00	$ -																
73	1	Inspector	$ 2,000,000.00		8.00	$ 16,000,000	$ 2,420,000		$ 2,541,000		0.00	$ -	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	0.00	$ -	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	6.00	$ 15,246,000.00
74	1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		8.00	$ 16,000,000	$ 2,420,000		$ 2,541,000		0.00	$ -	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	7.00	$ 17,787,000.00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 1,684,000,000**						**$ 1,887,714,685.00**		**$ 63,678,000**		**$ 56,722,013**		**$ 50,464,800**		**$ 54,244,538**		**$ 62,502,788**		**$ 61,264,050**		**$ 62,502,788**		**$ 2,299,093,660.00**
FACTOR MULTIPLICADOR						**2.36**						**2.36**		**2.36**		**2.36**		**2.36**		**2.36**		**2.36**		**2.36**		**2.36**		**2.36**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 3,974,240,000**						**$ 4,455,006,656.60**		**$ 150,280,080**		**$ 133,863,950**		**$ 119,096,928**		**$ 128,017,109**		**$ 147,506,579**		**$ 144,583,158**		**$ 147,506,579**		**$ 5,425,861,037.6**

TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☑
PLAN DE CARGAS FINAL ☐

RATO DE INTERVENTORÍA No.: 1052 DE 2022

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIASCOL
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JESUS EDUARDO RINCON SILVA

RESOLUCIÓN No.: 1912 DE 3/06/2025 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: MUNICIPIO DE ALBANIA / CONSORCIO INTERNACIONAL WOC / CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL / CONSORCIO ACARICUARA — CONVENIO No. 1790 DE 2021 / 1554-2022 / 558-2022 / CONTRATISTA: 800-2024

PLAZO INICIAL: 25 MESES Y 14 DÍAS (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/11/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 6,810,230,532.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 8,138,909,985.00

PLAZO ACUMULADO: 37 MESES Y 14 DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 1,328,679,453.00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS 2024		ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS 2025		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 30 del 03 de junio de 2024		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Valor Total ($)	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
No. de Orden	**Cantidad**	**CONCEPTO**	**Costos**	**Unidad**	**Total Dedicación Recurso**	**Valor Total ($)**	**Costos**	**Unidad**	**Costos**	**Unidad**	**Total Dedicación Recurso**	**Valor Total ($)**	**MES JUNIO**		**MES JULIO**		**MES AGOSTO**		**MES SEPTIEMBRE**		**MES OCTUBRE**		**MES NOVIEMBRE**		**MES DICIEMBRE**		**TOTAL**	
													H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ																												
OTROS COSTOS DIRECTOS																												
75	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 200,000.00	Dia	144	$ 28,800,000	$ 242,000		$ 254,100.00	Dia	45.50	$ 9,772,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	45.50	$ 9,772,000.00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																												
76	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 10,000,000.00	Mes	20.00	$ 200,000,000	$ 12,100,000		$ 12,705,000	Mes	4.00	$ 50,820,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 50,820,000.00
77	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 10,000,000.00	Mes	12.00	$ 120,000,000	$ 12,100,000		$ 12,705,000	Mes	22.00	$ 245,200,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0.50	$ 6,352,500	0.50	$ 6,352,500	0.50	$ 6,352,500	23.50	$ 264,257,500.00
78	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1,100,000.00	Mes	16.00	$ 17,600,000	$ 1,331,000		$ 1,397,550	Mes	21.85	$ 27,304,200.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,397,550	1.00	$ 1,397,550	1.00	$ 1,397,550	24.85	$ 31,496,850.00
79	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1,100,000.00	Mes	16.00	$ 17,600,000	$ 1,331,000		$ 1,397,550	Mes	18.85	$ 23,111,550.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	18.85	$ 23,111,550.00
80	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1,100,000.00	Mes	8.00	$ 8,800,000	$ 1,331,000		$ 1,397,550	Mes	15.00	$ 19,272,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	15.00	$ 19,272,000.00
81	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1,100,000.00	Mes	8.00	$ 8,800,000	$ 1,331,000		$ 1,397,550	Mes	15.00	$ 19,272,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	15.00	$ 19,272,000.00
82	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1,100,000.00	Mes	0.00	$ -	$ 1,331,000		$ 1,397,550	Mes	10.00	$ 13,310,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	10.00	$ 13,310,000.00
83	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1,100,000.00	Mes	0.00	$ -	$ 1,331,000		$ 1,397,550	Mes	12.00	$ 15,972,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	12.00	$ 15,972,000.00
84	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1,100,000.00	Mes	0.00	$ -	$ 1,331,000		$ 1,397,550	Mes	11.00	$ 14,641,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	11.00	$ 14,641,000.00
85	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6,500,000.00	Mes	24.00	$ 156,000,000	$ 7,865,000		$ 8,258,250	Mes	23.00	$ 160,420,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0.30	$ 2,477,475	0.30	$ 2,477,475	0.30	$ 2,477,475	23.90	$ 167,852,425.00
86	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6,500,000.00	Mes	0.00	$ -	$ 7,865,000		$ 8,258,250	Mes	15.00	$ 119,548,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	15.00	$ 119,548,000.00
87	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6,500,000.00	Mes	0.00	$ -	$ 7,865,000		$ 8,258,250	Mes	9.00	$ 70,785,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	9.00	$ 70,785,000.00
88	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6,500,000.00	Mes	0.00	$ -	$ 7,865,000		$ 8,258,250	Mes	7.50	$ 58,987,500.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	7.50	$ 58,987,500.00
89	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 644,000.00	Según comprobante por mes	16.00	$ 10,304,000	$ 779,240		$ 818,202	Según comprobante por mes	9.59	$ 7,119,864.36		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 818,202	1.00	$ 818,202	1.00	$ 818,202	12.59	$ 9,574,470.36
90	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 644,000.00	Según comprobante por mes	16.00	$ 10,304,000	$ 779,240		$ 818,202	Según comprobante por mes	4.06	$ 2,893,234.40		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4.06	$ 2,893,234.40
91	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 644,000.00	Según comprobante por mes	16.00	$ 10,304,000	$ 779,240		$ 818,202	Según comprobante por mes	2.63	$ 1,789,740.40		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2.63	$ 1,789,740.40
92	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2,000,000.00	Según comprobante por mes	24.00	$ 48,000,000	$ 2,420,000		$ 2,541,000	Según comprobante por mes	27.00	$ 61,745,000.00		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	30.00	$ 69,368,000.00
OTROS COSTOS																												
93	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 2,000,000.00	Según comprobante por mes	18.00	$ 36,000,000	$ 2,420,000		$ 2,541,000	Según comprobante por mes	15.57	$ 34,390,800.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	15.57	$ 34,390,800.00
94	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 2,050,000.00	Según comprobante por mes	24.00	$ 49,200,000	$ 2,480,500		$ 2,604,525	Según comprobante por mes	22.00	$ 50,266,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -	0.15	$ 400,638.10	0.15	$ 400,638.10	0.15	$ 400,638.10	22.46	$ 51,467,914.31
95	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 900,000.00	Según comprobante por mes	24.00	$ 21,600,000	$ 1,089,000		$ 1,143,450	Según comprobante por mes	10.77	$ 10,940,400.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -		$ -	10.77	$ 10,940,400.00
96	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	$ 550,000.00	Según comprobante por mes	12.00	$ 6,600,000	$ 665,500		$ 698,775	Según comprobante por mes	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
97	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 200,000.00	Según comprobante por mes	12.00	$ 2,400,000	$ 242,000		$ 254,100	Según comprobante por mes	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS																												
VIATICOS																												
98	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 200,000.00	Dia	98.00	$ 19,600,000	$ 242,000		$ 254,100	Dia	103.00	$ 24,232,600.00	10.00	$ 2,541,000	10.00	$ 2,541,000	10.00	$ 2,541,000	10.00	$ 2,541,000	10.00	$ 2,541,000	10.00	$ 2,541,000	10.00	$ 2,541,000	173.00	$ 42,019,600.00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																												
99	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 10,000,000.00	Mes	10.00	$ 100,000,000	$ 12,100,000		$ 12,705,000	Mes	17.50	$ 211,020,000.00	1.00	$ 12,705,000	1.00	$ 12,705,000	1.00	$ 12,705,000	1.00	$ 12,705,000	1.00	$ 12,705,000	1.00	$ 12,705,000	1.00	$ 12,705,000	24.50	$ 299,955,000.00
100	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 10,000,000.00	Mes	12.00	$ 120,000,000	$ 12,100,000		$ 12,705,000	Mes	1.00	$ 12,100,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 12,100,000.00
101	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1,100,000.00	Mes	8.00	$ 8,800,000	$ 1,331,000		$ 1,397,550	Mes	23.00	$ 28,964,650.00	1.00	$ 1,397,550		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	24.00	$ 30,362,200.00
102	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1,100,000.00	Mes	8.00	$ 8,800,000	$ 1,331,000		$ 1,397,550	Mes	20.00	$ 25,895,650.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	20.00	$ 25,895,650.00
103	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1,100,000.00	Mes	8.00	$ 8,800,000	$ 1,331,000		$ 1,397,550	Mes	16.33	$ 21,991,750.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	16.33	$ 21,991,750.00
104	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1,100,000.00	Mes	8.00	$ 8,800,000	$ 1,331,000		$ 1,397,550	Mes	10.51	$ 14,121,910.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	10.51	$ 14,121,910.00
105	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1,100,000.00	Mes	8.00	$ 8,800,000	$ 1,331,000		$ 1,397,550	Mes	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
106	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6,500,000.00	Mes	18.00	$ 117,000,000	$ 7,865,000		$ 8,258,250	Mes	8.00	$ 62,920,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	8.00	$ 62,920,000.00
107	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6,500,000.00	Mes	0.00	$ -	$ 7,865,000		$ 8,258,250	Mes	13.00	$ 104,211,250.00	1.00	$ 8,258,250	1.00	$ 8,258,250	1.00	$ 8,258,250	1.00	$ 8,258,250	1.00	$ 8,258,250	1.00	$ 8,258,250	1.00	$ 8,258,250	20.00	$ 162,019,000.00
108	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 644,000.00	Según comprobante por mes	16.00	$ 10,304,000	$ 779,240		$ 818,202	Según comprobante por mes	8.02	$ 6,359,767.26	1.00	$ 818,202	1.00	$ 818,202	1.00	$ 818,202	1.00	$ 818,202	1.00	$ 818,202	1.00	$ 818,202	1.00	$ 818,202	15.02	$ 12,087,181.26
109	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 644,000.00	Según comprobante por mes	16.00	$ 10,304,000	$ 779,240		$ 818,202	Según comprobante por mes	3.08	$ 2,400,059.20		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	3.08	$ 2,400,059.20
110	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 644,000.00	Según comprobante por mes	10.00	$ 6,440,000	$ 779,240		$ 818,202	Según comprobante por mes	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
111	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2,000,000.00	Según comprobante por mes	12.00	$ 24,000,000	$ 2,420,000		$ 2,541,000	Según comprobante por mes	35.00	$ 82,906,000.00	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	42.00	$ 100,693,000.00
OTROS COSTOS																												
112	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 2,000,000.00	Según comprobante por mes	18.00	$ 36,000,000	$ 2,420,000		$ 2,541,000	Según comprobante por mes	17.64	$ 40,976,850.00	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	24.64	$ 58,763,850.00
113	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 2,050,000.00	Según comprobante por mes	6.00	$ 12,300,000	$ 2,480,500		$ 2,604,525	Según comprobante por mes	19.00	$ 46,888,625.00	1.00	$ 2,604,525	1.00	$ 2,604,525	1.00	$ 2,604,525	1.00	$ 2,604,525	1.00	$ 2,604,525	1.00	$ 2,604,525	1.00	$ 2,604,525	26.00	$ 65,120,300.00
114	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 900,000.00	Según comprobante por mes	6.00	$ 5,400,000	$ 1,089,000		$ 1,143,450	Según comprobante por mes	13.04	$ 13,930,420.50	1.00	$ 1,143,450	1.00	$ 1,143,450	1.00	$ 1,143,450	1.00	$ 1,143,450	1.00	$ 1,143,450	1.00	$ 1,143,450	1.00	$ 1,143,450	20.04	$ 21,934,570.50
DEPARTAMENTO DE VAUPES																												
VIATICOS																												
115	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 200,000.00	Dia	46.00	$ 9,200,000	$ 242,000		$ 254,100	Dia	0.00	$ -	6.00	$ 1,524,600	6.00	$ 1,524,600	6.00	$ 1,524,600	6.00	$ 1,524,600	6.00	$ 1,524,600	6.00	$ 1,524,600	6.00	$ 1,524,600	42.00	$ 10,672,200.00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																												
116	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1,100,000.00	Mes	8.00	$ 8,800,000	$ 1,331,000		$ 1,397,550	Mes	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
117	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 1,100,000.00	Mes	0.00	$ -	$ 1,331,000		$ 1,397,550	Mes	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

MEPI-MN1-IN-9-FR-2 | 1 | 04/06/2025

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☑
PLAN DE CARGAS FINAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

RATO DE INTERVENTORÍA No.: 1052 DE 2022

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIASCOL
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JESUS EDUARDO RINCON SILVA

RESOLUCIÓN No.: 1912 DE 3/06/2025 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: CONSORCIO ACARICUARA — CONTRATISTA: 600-2024

MUNICIPIO DE ALBANIA — CONVENIO No. 1790 DE 2021
CONSORCIO INTERNACIONAL WOC — 1554-2022
CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL — 558-2022

PLAZO INICIAL: 25 MESES Y 14 DÍAS (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/11/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 6,810,230,532.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 8,138,909,985.00

PLAZO ACUMULADO: 37 MESES Y 14 DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 1,328,679,453.00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS 2024		ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS 2025		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 30 del 03 de junio de 2024		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Valor Total ($)	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
118	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6,500,000.00	Mes	6.00	$ 39,000,000	$ 7,865,000		$ 8,258,250	Mes	0.00	$ -	1.00	$ 8,258,250		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 8,258,250	1.00	$ 8,258,250	3.00	$ 24,774,750.00
119	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 644,000.00	Según comprobante por mes	6.00	$ 3,864,000	$ 779,240		$ 818,202	Según comprobante por mes	0.00	$ -	1.00	$ 818,202	1.00	$ 818,202	1.00	$ 818,202	1.00	$ 818,202	1.00	$ 818,202	1.00	$ 818,202	1.00	$ 818,202	7.00	$ 5,727,414.00
120	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2,000,000.00	Según comprobante por mes	0.00	$ -	$ 2,420,000		$ 2,541,000	Según comprobante por mes	0.00	$ -	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	7.00	$ 17,787,000.00
	OTROS COSTOS																											
121	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 2,000,000.00	Según comprobante por mes	12.00	$ 24,000,000	$ 2,420,000		$ 2,541,000	Según comprobante por mes	0.00	$ -	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	1.00	$ 2,541,000	7.00	$ 17,787,000.00
122	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 2,050,000.00	Según comprobante por mes	0.00	$ -	$ 2,480,500		$ 2,604,525	Según comprobante por mes	0.00	$ -	1.00	$ 2,604,525	1.00	$ 2,604,525	1.00	$ 2,604,525	1.00	$ 2,604,525	1.00	$ 2,604,525	1.00	$ 2,604,525	1.00	$ 2,604,525	7.00	$ 18,231,675.00
123	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 900,000.00	Según comprobante por mes	0.00	$ -	$ 1,089,000		$ 1,143,450	Según comprobante por mes	0.00	$ -	1.00	$ 1,143,450	1.00	$ 1,143,450	1.00	$ 1,143,450	1.00	$ 1,143,450	1.00	$ 1,143,450	1.00	$ 1,143,450	1.00	$ 1,143,450	7.00	$ 8,004,150.00
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																										
*	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)					**$ 1,342,524,000.00**						**$ 1,716,479,821.12**		**$ 53,981,004**		**$ 44,325,204**		**$ 44,325,204**		**$ 44,325,204**		**$ 58,312,569**		**$ 66,570,819**		**$ 66,570,819**		**$ 2,094,890,644.43**
*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)					**$ 5,316,764,000.00**						**$ 6,171,486,477.72**		**$ 204,261,084**		**$ 178,189,154**		**$ 163,422,132**		**$ 172,342,313**		**$ 205,819,148**		**$ 211,153,977**		**$ 214,077,398**		**$ 7,520,751,682.03**
*	Valor a descontar seguridad social no asumido por el consorcio					**$ -**						**$ 29,000,619.03**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 29,000,619.03**
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)					**$ 406,118,800.00**						**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		
*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)					**$ 5,722,882,800.00**						**$ 6,142,485,858.69**		**$ 204,261,084**		**$ 178,189,154**		**$ 163,422,132**		**$ 172,342,313**		**$ 205,819,148**		**$ 211,153,977**		**$ 214,077,398**		**$ 7,491,751,063.00**
	IVA = 19% * (E) = (F) (DEPARTAMENTO DE CAQUETA)					**$ 1,087,347,732.00**						**$ 626,966,226.20**		**$ 1,110,899.79**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 6,360,598.67**		**$ 6,360,598.67**		**$ 6,360,598.67**		**$ 647,158,922.00**
*	COSTO TOTAL = (E) + (F)					**$ 6,810,230,532.00**						**$ 6,769,452,084.89**		**$ 205,371,984**		**$ 178,189,154**		**$ 163,422,132**		**$ 172,342,313**		**$ 212,179,746**		**$ 217,514,576**		**$ 220,437,996**		**$ 8,138,909,985.00**

ponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
1. Por las necesidades que se presentan en la ejecución de las actividades de esta interventoría, para los departamentos de caqueta, amazonas y vaupes.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: JOSE FRANCISCO MORON OROZCO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 -73192 CND

Firma:
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Supervisor de Contrato de Interventoría (E)
Matrícula Profesional No.: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
(Suscribe según su competencia)

ginal: Archivo de Gestión del INVIAS.
ad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

[illegible]

ANEXO

Relación de radicados de correspondencia cruzada entre el Consorcio Viascol y el Consorcio Kairos Sendero Peatonal

RELACIÓN CORRESPONDENCIA				
FECHA	DE	PARA	ASUNTO/TEMA	N° OIFICIO
INTERVENTORIA/CONTRATISTA				
5/06/2025	CONSORCIO VIASCOL	CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	Solicitud de la reprogramación de obra y el programa de inversión a la prórroga N° 11	CE-VIASCOL-1997
10/06/2025	CONSORCIO VIASCOL	CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	Observaciones al plano de señalización vial	CE-VIASCOL-2003
11/06/2025	CONSORCIO VIASCOL	CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	Apremio entrega de documentación	CE-VIASCOL-2007
13/06/2025	CONSORCIO VIASCOL	CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	Notificación posible incumplimiento y solicitud de plan de contingencia	CE-VIASCOL-2016
16/06/2025	CONSORCIO VIASCOL	CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	Respuesta a Comunicado CKSP-159-0558-2022 - Solicitud de modificación, adición y prorroga N° 12 al Contrato de obra	CE-VIASCOL-2022
17/06/2025	CONSORCIO VIASCOL	CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	Reiteración subsanación de observaciones plan de reparación de losas	CE-VIASCOL-2026
19/06/2025	CONSORCIO VIASCOL	CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	Observaciones al acta modificatoria de cantidades N° 3	CE-VIASCOL-2030

RELACIÓN CORRESPONDENCIA				
FECHA	DE	PARA	ASUNTO/TEMA	N° OIFICIO
CONTRATISTA/INTERVENTORIA				
11/06/2025	CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	CONSORCIO VIASCOL	AJUSTES A LA REPROGRAMACION DE PLAN DE INVERSION PRORROGA 11	CORREO ELECTRONICO
16/06/2025	CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	CONSORCIO VIASCOL	SOLICITUD DE MODIFICACION, ADICION Y PRORROGA No 13 AL CONTRATO DE OBRA	CKSP-159-0558-2022
16/06/2025	CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	CONSORCIO VIASCOL	Respuesta a notificación de posible incumplimiento – Oficios CE-VIASCOL2016, CE-VIASCOL-2020 y CE-VIASCOL-2022	CKSP-160-0558-2022
17/06/2025	CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	CONSORCIO VIASCOL	BALANCE AJUSTADO DEL PRESUPUESTO CONTRACTUAL	CORREO ELECTRONICO
20/06/2025	CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	CONSORCIO VIASCOL	SOLICITUD DE PAGO PARCIAL No 7	CORREO ELECTRONICO
20/06/2025	CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	CONSORCIO VIASCOL	Respuesta a oficio CE-VIASCOL-2030 – Observaciones al Acta Modificatoria de Cantidades N° 3	CORREO ELECTRONICO
20/06/2025	CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	CONSORCIO VIASCOL	Respuesta CE-VIASCOL-2007	CORREO ELECTRONICO
20/06/2025	CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	CONSORCIO VIASCOL	Solicitud de suspensión temporal – Contrato de Obra No. 0558 de 2022	CKSP-161-0558-2022



DENSIDAD EN TRAMO 1 (INTERNADO)




RELLENO ATERRA CON UNETA EN TRAMO 1



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO TRAMO 2




RELLENO ATERRA CON UNETA EN TRAMO 2

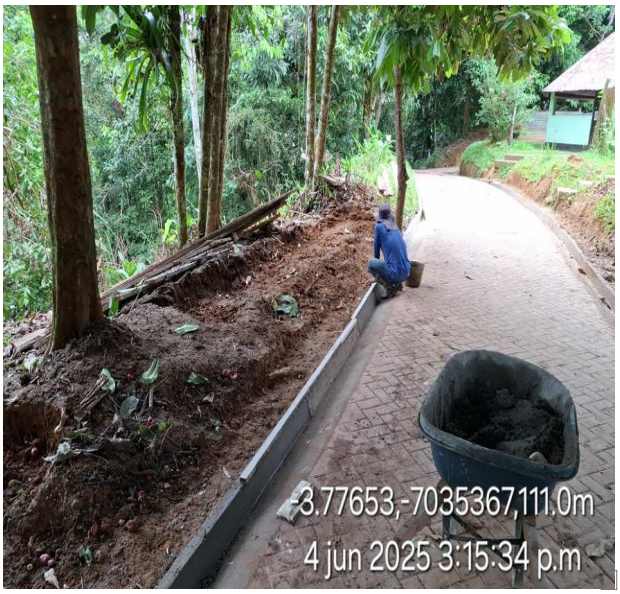

RESANE BORDILLO DE CUNETA TRAMO 3



RELLENO ATERRA CUNETAS TRAMO 2

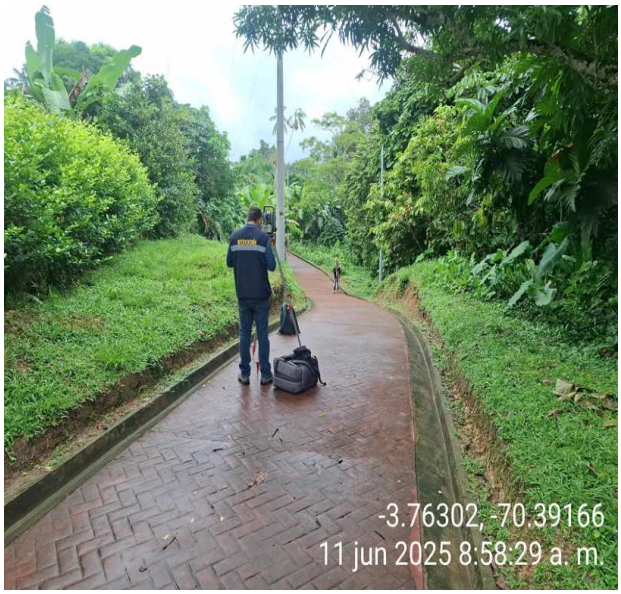

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO TRAMO 2



DENSIDAD ESTRAMO 3 (INTERNADO)



SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO



BUZÓN DE SUGERENCIAS



CHARLA COMUNICACIÓN AFECTIVA



CHARLA COMUNICACIÓN AFECTIVA

Domingo 01-Junio-2025 - Seco

No se laboró Día festivo

Residente obra

wilber Perez A.
Residente interventoría

Lunes- 02-Junio-2025
Actividades inicio:
Estado del tiempo: Seco
Actividad:

No se laboró día festivo

Residente obra

wilber Perez A.
Residente interventoría

Martes 03-Junio-2025
inicio Actividades: 7:00 AM.
Estado de tiempo: 1:00pm a 2:00pm.
Actividades:
- Relleno costados de las cunetas tramo # 2.
- Resane bordillos de cunetas tramo # 3.
Personal en obra
- Ing. residente civil
- SST
- Almacenista
- Maestro (1)
- Ayudantes (5)
Maquinaria/Equipos
- 2 Mezcladoras
- 1 Motobomba
1 planta eléctrica
1 Retroexcavadora
1 vibrador concreto

Cizalla

NOTA: se puede evidenciar una disminución del Personal de trabajo, además de la escasez de material en obra (cemento y grava)

Residente obra

Wilver C. Rocera A
Residente interventoría

Miercoles 04 junio - 2025
Inicio Actividades: 7:00 AM
Estado del tiempo: 10.00 AM y 1:00 PM.
Actividades:
- Rellenos costados de cunetas tramo #2
- Pisano bordillos de cuneta tramo #3.

Personal en obra
- Ing. residente civil
- SST
- Almacenista
- Maestro
- Ayudantes (10).

Maquinaria Equipos
- 2 Mezcladoras
- Motobomba
- Planta electrica
- Motocarro
- Vibrador concreto
- Cizalla

NOTA: Se continuan con una disminución de personal considerable, además en la obra no hay cemento ni grava.

Residente obra

Wilver C Rocera A
Residente interventoría

Jueves-05-Junio-2025
Actividad inicio: 7:00 Am
Estado del tiempo: 6:00 AM 8:00 Am; 1:00 pm 3:00 pm
Actividad:
- Rellenos costados de las cunetas trapezoidales
Personal en obra
- Ing. residente aux
- SST
- Almacenista
- Ayudantes (10).
Maquinaria / Equipos
2 Motoniveladora
1 Retroexcavadora
1 Vibrador Concreto
1 Planta Electrica
1 Motobomba
1 Retroexcavadora

NOTA: Se continuan las labores con un personal de trabajo muy reducido en la obra no hay materiales como cemento y grava, el rendimiento ha disminuido considerablemente.

Residente obra

Wilmer Ricardo
Residente interventoria

Viernes-06-Junio-2025
Inicio Actividad: 7:00 AM
Estado del tiempo: lluvias 1:00 pm a 2:00 pm
Actividad:
- Rellenos costados de las cunetas trapezoidales
Personal en obra
- Ing. residente aux.
- SST
- Almacenista

Agregados (10)
Maquinaria equipos
2 Mezcladoras
1 Motobomba
1 vibrador concreto
1 planta electrica
1 Andamio
NOTA: se continua las labores con un personal muy reducido, en la obra hay escasez de cemento y grava, El personal en obra carece de los EPP mínimos requeridos

Residente obra

Residente interventoría

Sabado 07-Jun.-2025
Hoja Actividades: 7:00 AM.
Estado del tiempo: seco
Actividad:
- Relleno contorno de las columnas tramo EJE 2

Personal en obra
- Ing. residente civil
- Almacenista
- SST
- Agregados (10)
Maquinaria (equipos
2 Mezcladoras
1 Maestro
1 Vibrador concreto
1 planta electrica
1 Motobomba

Residente obra

Residente interventoría

Scanned with CamScanner

Domingo 8 jun. 0-2025 - lluvia 2:00pm a 3:00pm
No se laboró día festivo

Residente obra Residente interventoría

Lunes 09-jun,0-2025
inicio Actividades 7:00Am
Estado del tiempo: Seco
Actividades:
-Rellenos costados de las cunetas tramo #2
Personal en obra
ing. residente aux
-Almacenista
-SST
-Ayudantes (3)
Mezcladora (Equipos
2 Mezcladoras
1 Motobomba
1 planta eléctrica
1 vibrador concreto
1 Motocarro
NOTA: continuan suspendidas las actividades de concreto para cunetas y sendero por falta de material (cemento Gravilla arena) asi mismo el box cts 30.

Residente obra Residente interventoría

Martes 10-jun. 0-2-25
inicio Actividades 7:00Am
Estado tiempo: llovia 1:00pm a 2:00pm

Actividad:
Relleno estados de las cunetas tramo #2
Personal en obra
- Ing. residente aux
- Almacenista
- SST
- Ayudantes (8)
Maquinaria / Equipos
2 Mixtos
1 Retroexcavadora
1 planta eléctrica
1 vibrador de concreto
1 Motobomba
NOTA: Escasez de material en obra (cemento, grava, acero)
- Solamente se está trabajando en el tramo #2 de Proyecto, el tramo #3 se encuentra suspendido las actividades.

Residente obra

Residente interventoría

Miércoles - 11 - Junio - 2025
Inicio Actividad: 7:00 Am.
Estado del tiempo: Seco.
Actividad:
- Rellenos estados de las cunetas tramo #2
Personal en obra
- ing. residente aux
- Almacenista
- SST
- Ayudantes (8)
Maquinaria / Equipos
2 Mixtos
1 Retroexcavadora
1 planta eléctrica

Scanned with CamScanner

1 vibrador concreto
NOTA: No hay material en obra (cemento, grava y acero), No se están ejecutando actividades en el tramo #3 (contenido).

Residente obra — Residente interventoría

Jueves -12- Junio - 2025
inicio Actividades: 7:00 AM
Estado del tiempo: Lluvia 12:00 pm a 1:00 pm
Actividades:
- Relleno costado del cuneta tramo #2
- Levantamiento topográfico tramo #2.

Personal en obra
- Ing. residente
- Almacenista
- SST
- Ayudantes (6)
- Motobomba (Equipos)
- 2 Mezcladoras)
- 1 Motobomba
- 1 planta electrica
- 1 vibrador
- 1 Motosierra
- 1 Estación total
- 1 nivel.

Residente obra — Residente interventoría

Viernes -13- Junio - 2025
inicio Actividades: 7:00 AM
Estado del tiempo: seco

Actividades:
- Rellenos costados de las cunetas tramo #2
- Levantamiento topográfico tramo #3
- Personal en obra
- ing. residente aux
- Almacenista
- SST
- Aguadores (8)
- Maquinaria (equipos)
2 Mezcladoras
1 Motobomba
1 Planta eléctrica
1 Vibrador concreto
1 Motocarro
1 Estación total
1 Nivel.

Residente obra Residente interventoría

Sabado-14-Junio-2025
Inicio Actividades: 7:00 AM
Estado del tiempo: Seco
Actividades:
- Relleno costados de las cunetas tramo #2
Personal en obra
- ing. residente aux.
- Almacenista
- SST
- Aguadores (8)
Maquinaria (equipos)
- 2 Mezcladoras
1 Motobomba
1 Planta eléctrica
1 Motocarro
1 Cuadrilla

1 V. dredes Concreto
NOTA: No hay material en obra (Concreto grava y arena), No hay acta. dadas en el tramo #3.

Residente obra

Residente interventoría

Domingo-15-Junio-2025

No se labora día festivo

Residente obra

Residente interventoría

Lunes-16-Junio-2025
Inicio Actividades: 7:00Am
Estado del tiempo: Lluvias 6:00Am a 12:00Pm.
Actividades:
-Relleno costados de las Cunetas tramo # 2.
Personal en obra
-Ing. residente aux
-SST
-Almacenista
-Ayudantes (8)
Maquinaria / Equipos:
-2 Mezcladoras
-1 Motobomba
-1 Planta electrica
-1 Retroexcavadora
1 V. dredes concreto

Residente obra

Residente interventoría

Martes-17-Junio-2025
Inicio Actividades: 7:00AM
Estado del tiempo: Seco
Actividades:
- Relleno costados de los cunetas tramo #2
Personal en obra
- Ing. residente aux
- SST
- Almacenista
- Ayudantes (8).
Maquinaria / Equipos
2 Mezcladoras
1 Motobomba
1 planta electrica
1 Motocarro
1 vibrador concreto

Residente obra

Residente interventoría

Miercoles 18-Junio-2025
Inicio Actividades: 7:00AM.
Estado del tiempo:
Actividades: Seco.
- Relleno costados de los cunetas tramo #3
internado
Personal en obra
- ing. residente aux
- SST
- Almacenista
- Ayudantes (7).
- 2 Mezcladoras
- 1 Motobomba
1 planta electrica
1 Motocarro
1 vibrador concreto

Residente obra

Residente interventoría.

19 Junio- 2025 = Jueves
Inicio Actividades: 7:00Am
Estado del tiempo: SECO
Actividades:
-Relleno costados de las cunetas tramo #3
Personal en obra
-Ing. residente civil
-SST
-Almacenista
Ayudantes (7).
Herramientas / Equipos
-2 Mezcladoras
-1 Motobomba
1 Motocarro
1 Vibrador concreto
1 Planta Electrica

Residente obra

Ing. Residente
R. Interventoría.

20 Junio- 2025 - Viernes
Inicio Actividades:
Estado del tiempo:
Actividades: No se realizaron actividades en Obra.

Residente Obra

Ing. Residente
Residente Interventoría.

21 Junio 2025 · Sábado

No se ejecutaron actividades en Obra.

Residente Obra

Ing. Residente
Residente Interventoría

22 Junio 2025 - Domingo.

No se ejecutaron actividades en Obra.

Residente Obra

Residente Interventoría

23 Junio 2025 - (Lunes Festivo)

No se ejecutaron actividades en Obra

Residente Obra

Residente Interventoría.

Scanned with CamScanner
