INFORME No. 01
DESEMBOLSO No. 02

INFORMACION CONVENIO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 01310 – 2025 CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS Y EL MUNICIPIO DE ONZAGA, SANTANDER		
OBJETO	ANUAR ESFUERZOS PARA REALIZAR OBRAS DE MITIGACION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL SECTOR LA CANCHA DE FUTBOL, BARRIO LA CANCHA, DEL MUNICIPIO DE ONZAGA – SANTANDER, MEDIANTE LA COSNTRUCCION DE GAVIONES REVESTIDOS EN CONCRETO.	
PARTES DEL CONVENIO	1. MUNICIPIO DE ONZAGA (SANTANDER) 2. CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS	
CDP INICIAL	25 – 07593 / 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
CDP NUEVO	26 – 00021 / 02 DE ENERO DE 2026	
RP INICIAL	25 – 08587 / 06 DE NOVIEMBRE DE 2026	
RP NUEVO	26 – 00065 / 09 DE ENERO DE 2026	
VALOR	DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON QUINCE CENTAVOS **($289.712.052,15)** MCTE	
APORTE CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER	DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS CON QUINCE CENTAVOS **($277.110.417,15)** MCTE	
APORTE MUNIICPIO DE ONZAGA, SANTANDER	Realiza su aporte en **especie** por valor de DOCE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS **($12.601.635,00)** MCTE	
POLIZAS INICIALES	**POLIZA DE CUMPLIMIENTO**	
	POLIZA No.	400-47-994000111034
	VIGENCIA DESDE	06/11/2025
	VIGENCIA HASTA	06/11/2026
	FECHA DE EXPEDICION	06/11/2025
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES	
FECHA DE INICIO	07 DE NOVIEMBRE DE 2025	
FECHA DE TERMINACION INICIAL	06 DE MAYO DE 2026	
PRORROGA No. 01	TRES (03) MESES	
	POLIZA DE CUMPLIMIENTO	
	POLIZA No.	400-47-994000111034

POLIZAS ACTUALIZADAS (ACTA DE INICIO Y PRORROGA)	**VIGENCIA DESDE**	07/11/2025
	VIGENCIA HASTA	06/02/2027
	FECHA DE EXPEDICION	25/03/2026
NUEVA FECHA DE TERMINACION	06 DE AGOSTO DE 2026	

INFORMACION CONTRATOS DERIVADOS

CONTRATO DE OBRA	
No. Proceso	MO – SA – 05 – 2026
No. Contrato	063 – 2026
Objeto	OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL SECTOR LA CANCHA DE FUTBOL, BARRIO LA CANCHA, DEL MUNICIPIO DE ONZAGA - SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES REVESTIDOS EN CONCRETO
Fecha de Contrato	22/04/2026
Fecha de Inicio	06/05/2026
Duración	DOS (02) MESES
Valor	DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS CON QUINCE CENTAVOS **($241.410.417,15)** MCTE
CONTRATO DE INTERVENTORIA	
No. Proceso	MO – MC – 14 – 2026
No. Contrato	066 – 2026
Objeto	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE Y FINANCIERA AL PROYECTO “OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL SECTOR LA CANCHA DE FUTBOL, BARRIO LA CANCHA, DEL MUNICIPIO DE ONZAGA - SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES REVESTIDOS EN CONCRETO”
Fecha de Contrato	04/05/2026
Fecha de Inicio	06/05/2026
Duración	DOS (02) MESES
Valor	TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS **($35.700.000)** MCTE

PRESUPUESTO ESTABLECIDO

República de Colombia - Departamento de Santander Alcaldía Municipal de Onzaga NIT 890205334-5		**PRESUPUESTO GENERAL**	**APORTES**	
OBJETO	**OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL SECTOR LA CANCHA DE**	**FUENTE DE PRESUPUESTO:**	**CAS**	**MUNICIPIO DE ONZAGA**


		FUTBOL, BARRIO LA CANCHA, DEL MUNICIPIO DE ONZAGA - SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES REVESTIDOS EN CONCRETO						
FECHA:		JULIO DE 2025						
ITEM	**ESP.**	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**	**En dinero**	**En especie**
1,0		**OBRAS PRELIMINARES**						
1,1	1,1	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMÚN, INLUYE TRANSPORTE	m3	162,00	$ 32.786,46	$ 5.311.407,00		$5.311.407,00
1,2	1,2	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO PARA MURO GAVIONES	m3	121,50	$ 60.001,88	$ 7.290.228,00		$7.290.228,00
					TOTAL, COSTOS CAPITULO	**$ 12.601.635,00**		
2,0		**OBRAS DE MITIGACION MURO GAVIONES**						**$12.601.635,00**
2,1	2,1	CONCRETO CICLÓPEO (CONCRETO CLASE D F'C = 21 MPA 60% CONCRETO - 40% PIEDRA)	m3	81,00	$ 720.659,40	$ 58.373.411,40	$58.373.411,40	
2,2	2,2	SUMINISTRO, INSTALACCION MALLA GAVION	UND	162,00	$ 279.269,23	$ 45.241.615,26	$45.241.615,26	
2,3	2,3	SUMINISTRO, E INSTALACCION DE PIEDRA LLENADO DE GAVION	m3	162,00	$ 310.081,09	$ 50.233.137,00	$50.233.137,00	
2,4	2,4	SUMINISTRO E INSTALACCION DE CONCRETO 3000 PSI RECUBRIMIENTO GAVION	m3	16,20	$1.042.692,30	$ 16.891.615,00	$16.891.615,00	
2,5	2,5	FILTRO GEOTEXTIL NT 1600 O SIMILAR SECCION 0,4*06 m	ml	27,00	$ 201.418,80	$ 5.438.308,00	$ 5.438.308,00	
					TOTAL, COSTOS CAPITULO	**$ 176.178.086,66**	**$176.178.086,66**	
					SUB TOTAL OBRA	**$ 176.178.086,66**		
					ADMINISTRACION **29%**	**$ 51.091.645,00**	**$ 51.091.645,00**	

IMPREVISTOS	1%	$ 1.761.781,00	$ 1.761.781,00	
UTILIDAD	5%	$ 8.808.904,00	$ 8.808.904,00	
VALOR PROYECTO + AIU		$ 237.840.416,66	$237.840.416,66	
PMA		$ 3.570.000,49	$ 3.570.000,49	
TOTAL, OBRA =		$ 241.410.417,15	$241.410.417,15	

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL MUNICIPIO DE ONZAGA

1.1. EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMÚN, INLUYE TRANSPORTE



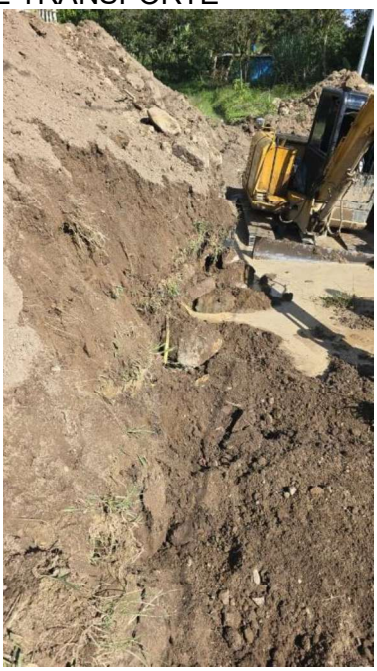









1.2. RELLENO MATERIAL SELECCIONADO PARA MURO GAVIONES






ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO		OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL SECTOR LA CANCHA DE FUTBOL, BARRIO LA CANCHA, DEL MUNICIPIO DE ONZAGA - SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES REVESTIDOS EN CONCRETO.					PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO		POR EJECUTAR	
ITEM	**ESP.**	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
2,0	**OBRAS DE MITIGACION MURO GAVIONES**									
2,1	2,1	CONCRETO CICLÓPEO (CONCRETO CLASE D F'C = 21 MPA 60% CONCRETO - 40% PIEDRA)	m3	81,00	$ 720.659,40	$ 58.373.411,40	81,00	$ 58.373.411,40	0,00	$ 0,00
2,2	2,2	SUMINISTRO, INSTALACCION MALLA GAVION	UND	162,00	$ 279.269,23	$ 45.241.615,26	5,00	$ 1.396.346,15	157,00	$ 43.845.269,11
2,3	2,3	SUMINISTRO, E INSTALACCION DE PIEDRA LLENADO DE GAVION	m3	162,00	$ 310.081,09	$ 50.233.137,00	5,00	$ 1.550.405,00	157,00	$ 48.682.731,00
2,4	2,4	SUMINISTRO E INSTALACCION DE CONCRETO 3000 PSI RECUBRIMIENTO GAVION	m3	16,20	$ 1.042.692,30	$ 16.891.615,00	0,00	$ 0,00	16,20	$ 16.891.615,00
2,5	2,5	FILTRO GEOTEXTIL NT 1600 O SIMILAR SECCION 0,4*06 m	ml	27,00	$ 201.418,80	$ 5.438.308,00	0,00	$ 0,00	27,00	$ 5.438.308,00

TOTAL COSTOS CAPITULO		$ 176.178.086,66		$ 61.320.162,55		$ 114.857.923,11
SUB TOTAL OBRA		$ 176.178.086,66		$ 61.320.162,55		$ 114.857.923,11
ADMINISTRACION	**29%**	$ 51.091.645,00		$ 17.782.847,00		$ 33.308.798,00
IMPREVISTOS	**1%**	$ 1.761.781,00		$ 613.202,00		$ 1.148.579,00
UTILIDAD	**5%**	$ 8.808.904,00		$ 3.066.008,00		$ 5.742.896,00
VALOR PROYECTO + AIU		$ 237.840.416,66		$ 82.782.219,55		$ 155.058.196,11
PMA		$ 3.570.000,49		$ 0,00		$ 3.570.000,49
VALOR PROYECTO + AIU + PMA		**$ 241.410.417,15**		**$ 82.782.219,55**		**$ 158.628.196,60**

2.1. CONCRETO CICLÓPEO (CONCRETO CLASE D F'C = 21 MPA 60% CONCRETO - 40% PIEDRA)





2.2. SUMINISTRO, INSTALACCION MALLA GAVION







2.3. SUMINISTRO, E INSTALACCION DE PIEDRA LLENADO DE GAVION







PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDADES

República de Colombia - Departamento de Santander Alcaldía Municipal de Onzaga NIT 890205334-5						PRESUPUESTO GENERAL	APORTES		PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO		
OBJETO		OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL SECTOR LA CANCHA DE FUTBOL, BARRIO LA CANCHA, DEL MUNICIPIO DE ONZAGA - SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES REVESTIDOS EN CONCRETO				FUENTE DE PRESUPUESTO:	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	PORCENTAJE DE AVANCE
ITEM	ESP.	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	En dinero	En especie			
1,0	OBRAS PRELIMINARES										
1,1	1,1	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMÚN, INLUYE TRANSPORTE	m3	162,00	$ 32.786,46	$ 5.311.407,00		$5.311.407,00	162,00	$5.311.407,00	100%
1,2	1,2	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO PARA MURO GAVIONES	m3	121,50	$ 60.001,88	$ 7.290.228,00		$7.290.228,00	121,50	$7.290.228,00	100%
TOTAL, COSTOS CAPITULO						$ 12.601.635,00					
2,0	OBRAS DE MITIGACION MURO GAVIONES							$12.601.635,00			
2,1	2,1	CONCRETO CICLÓPEO (CONCRETO CLASE D F'C = 21 MPA 60%	m3	81,00	$ 720.659,40	$ 58.373.411,40	$58.373.411,40		81,00	$ 58.373.411,40	100%

		CONCRETO - 40% PIEDRA)									
2,2	2,2	SUMINISTRO, INSTALACCION MALLA GAVION	UND	162,00	$ 279.269,23	$ 45.241.615,26	$45.241.615,26		5,00	$ 1.396.346,15	3.09%
2,3	2,3	SUMINISTRO, E INSTALACCION DE PIEDRA LLENADO DE GAVION	m3	162,00	$ 310.081,09	$ 50.233.137,00	$50.233.137,00		5,00	$ 1.550.405,00	3.09%
2,4	2,4	SUMINISTRO E INSTALACCION DE CONCRETO 3000 PSI RECUBRIMIENTO GAVION	m3	16,20	$1.042.692,30	$ 16.891.615,00	$16.891.615,00		0,00	$ 0,00	0.00%
2,5	2,5	FILTRO GEOTEXTIL NT 1600 O SIMILAR SECCION 0,4*06 m	ml	27,00	$ 201.418,80	$ 5.438.308,00	$ 5.438.308,00		0,00	$ 0,00	0.00%
TOTAL, COSTOS CAPITULO						**$ 176.178.086,66**	**$176.178.086,66**			$ 61.320.162,55	**34.80%**
SUB TOTAL OBRA						**$ 176.178.086,66**				$ 61.320.162,55	
ADMINISTRACION			**29%**			**$ 51.091.645,00**	**$ 51.091.645,00**			$ 17.782.847,00	
IMPREVISTOS			**1%**			**$ 1.761.781,00**	**$ 1.761.781,00**			$ 613.202,00	
UTILIDAD			**5%**			**$ 8.808.904,00**	**$ 8.808.904,00**			$ 3.066.008,00	
VALOR PROYECTO + AIU						**$ 237.840.416,66**	**$237.840.416,66**			$ 82.782.219,55	
PMA						**$ 3.570.000,49**	**$ 3.570.000,49**			$ 0,00	
TOTAL, OBRA =						**$ 241.410.417,15**	**$241.410.417,15**			**$ 82.782.219,55**	**34.29%**

BALANCE FINANCIERO

BALANCE CONVENIO			PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA
APORTE CAS		**$277.110.417,15**	
DESEMBOLSO No. 01	$83.133.125		30%
SALDO PENDIENTE POR DESEMBOLSO	$193.977.292,15		70%
SUMAS IGUALES	**$277.110.417,15**	**$277.110.417,15**	

BALANCE CONTRATO DE OBRA			PORCENTAJE DE EJECUCION
VALOR DEL CONTRATO OBRA		**$241.410.417,15**	
ACTA DE PAGO No. 01	$82.782.219,55		34.29%
SALDO POR EJECUTAR	$158.628.197,60		65.70%
SUMAS IGUALES	**$241.410.417,15**	**$241.410.417,15**	

BALANCE DE INTERVENTORIA		
VALOR DEL CONTRATO INTERVENTORIA		**$35.700.000,00**
SALDO POR EJECUTAR	$35.700.000	
SUMAS IGUALES	**$35.700.000,00**	**$35.700.000,00**

El presente informe se realiza a corte veintidós (22) de mayo de 2026.

Realizado Por:

Ing. Yessica Gomez Lopez
Secretaria de Planeación e Infraestructura
